

ภาคผนวกที่10

แผนงานการก่อสร้าง

แผนงานก่อสร้างหลัก

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

Baseline Program ASH

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Apr -1	May 1	Jun 2	Jul 3	Aug 4	Sep 5	Oct 6	Nov 7	Dec 8	Jan 9	Feb 10	Mar 11	Apr 12	May 13	Jun 14	Jul 15	Aug 16	Sep 17	Oct 18	Nov 19	Dec 20	Jan 21	Feb 22	Mar 23	Apr 24	May 25	Jun 26	Jul 27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
AOT STAFF HOUSING PROJECT		780	26-Apr-21	14-Jun-23	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
งานเตรียมการก่อสร้าง		66	26-Apr-21	30-Jun-21	4																															
M0100	งานสำรวจ รื้อถอน ปรับพื้นที่	66	26-Apr-21	30-Jun-21	0	21																														
M0200	งานติดตั้งรั้วชั่วคราว	30	01-Jun-21	30-Jun-21	4	1-Jun-21																														
M0300	งานก่อสร้างถนนชั่วคราว	30	01-Jun-21	30-Jun-21	4	1-Jun-21																														
M0600	ไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว	66	26-Apr-21	30-Jun-21	4	21																														
M0700	สำนักงานชั่วคราว	66	26-Apr-21	30-Jun-21	4	21																														
M0800	บ้านพักคนงาน	66	26-Apr-21	30-Jun-21	4	21																														

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023																			
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul																
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
งานเสาเข็มตอก		122	01-Jun-21	30-Sep-21	397																																												
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.22 x 0.22		16	16-Jul-21	31-Jul-21	4																																												
P1100	งานเสาเข็ม บ้านพักผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (31 ต้น)	6	16-Jul-21	21-Jul-21	4																																												
P1200	งานเสาเข็ม บ้านพักรองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 1 (26 ต้น)	10	22-Jul-21	31-Jul-21	4																																												
P1300	งานเสาเข็ม บ้านพักรองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 2 (26 ต้น)	10	22-Jul-21	31-Jul-21	4																																												
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.30 x 0.30		92	01-Jun-21	31-Aug-21	127																																												
P2100	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมผู้บริหาร อาคาร 7 (101 ต้น)	25	21-Jun-21	15-Jul-21	0																																												
P2200	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 2 (215 ต้น)	45	01-Jun-21	15-Jul-21	0																																												
P2300	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 4 (215 ต้น)	45	01-Jun-21	15-Jul-21	0																																												
P2400	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 6 (215 ต้น)	45	01-Jun-21	15-Jul-21	0																																												
P2500	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 1 (215 ต้น)	45	18-Jul-21	31-Aug-21	127																																												
P2600	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 3 (215 ต้น)	45	18-Jul-21	31-Aug-21	127																																												
P2700	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 5 (215 ต้น)	45	18-Jul-21	31-Aug-21	127																																												
P2800	งานเสาเข็ม อาคารพักขยะ (10 ต้น)	2	16-Jul-21	17-Jul-21	127																																												
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.18 x 0.18		30	01-Sep-21	30-Sep-21	397																																												
P3100	งานเสาเข็ม สานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 7 (32 ต้น)	30	01-Sep-21	30-Sep-21	127																																												
P3200	งานเสาเข็ม สานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 2 (60 ต้น)	30	01-Sep-21	30-Sep-21	127																																												
P3300	งานเสาเข็ม สานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 4 (60 ต้น)	30	01-Sep-21	30-Sep-21	127																																												
P3400	งานเสาเข็ม สานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 6 (60 ต้น)	30	01-Sep-21	30-Sep-21	127																																												
P3500	งานเสาเข็ม สานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 1 (60 ต้น)	30	01-Sep-21	30-Sep-21	397																																												
P3600	งานเสาเข็ม สานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 3 (60 ต้น)	30	01-Sep-21	30-Sep-21	397																																												
P3700	งานเสาเข็ม สานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 5 (60 ต้น)	30	01-Sep-21	30-Sep-21	397																																												

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
งานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการท่าอากาศยาน		175	22-Jul-21	12-Jan-22	158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023																	
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul														
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
งานก่อสร้างบ้านพักทรงผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 1		175	01-Aug-21	22-Jan-22	148																																										
งานโครงสร้าง		80	01-Aug-21	19-Oct-21	93																																										
R1100	งานฐานราก	20	01-Aug-21	20-Aug-21	93			01-Aug-21																																							
R1110	งานโครงสร้าง ชั้น 1	20	21-Aug-21	09-Sep-21	93			21-Aug-21																																							
R1120	งานโครงสร้าง ชั้น 2	20	10-Sep-21	29-Sep-21	93			10-Sep-21																																							
R1180	งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา	20	30-Sep-21	19-Oct-21	93			30-Sep-21																																							
งานสถาปัตยกรรม		95	20-Oct-21	22-Jan-22	148																																										
R1210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	60	09-Nov-21	07-Jan-22	148								09-Nov-21																																		
R1220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	60	09-Nov-21	07-Jan-22	148								09-Nov-21																																		
R1280	งานผนังหลังคากระเบื้อง	20	20-Oct-21	08-Nov-21	148								20-Oct-21																																		
R1290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	08-Jan-22	22-Jan-22	148									08-Jan-22																																	
งานระบบประกอบอาคาร		75	09-Nov-21	22-Jan-22	148																																										
R1310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	60	09-Nov-21	07-Jan-22	148								09-Nov-21																																		
R1320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	60	09-Nov-21	07-Jan-22	148								09-Nov-21																																		
R1370	งานทดสอบระบบ	15	08-Jan-22	22-Jan-22	148									08-Jan-22																																	
ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง)		90	10-Oct-21	07-Jan-22	148																																										
R1F10	งานผลิตและจัดส่ง	60	10-Oct-21	08-Dec-21	148								10-Oct-21																																		
R1F20	งานติดตั้ง	30	09-Dec-21	07-Jan-22	148									09-Dec-21																																	

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
งานก่อสร้างบ้านพักทรงผู้อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน หลังที่ 2		175	01-Aug-21	22-Jan-22	148																															
งานโครงสร้าง		80	01-Aug-21	19-Oct-21	93																															
R2100	งานฐานราก	20	01-Aug-21	20-Aug-21	93					01-Aug-21					20-Aug-21																					
R2110	งานโครงสร้าง ชั้น 1	20	21-Aug-21	09-Sep-21	93					21-Aug-21					09-Sep-21																					
R2120	งานโครงสร้าง ชั้น 2	20	10-Sep-21	29-Sep-21	93					10-Sep-21					29-Sep-21																					
R2180	งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา	20	30-Sep-21	19-Oct-21	93					30-Sep-21					19-Oct-21																					
งานสถาปัตยกรรม		95	20-Oct-21	22-Jan-22	148																															
R2210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	60	09-Nov-21	07-Jan-22	148								09-Nov-21																							
R2220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	60	09-Nov-21	07-Jan-22	148								09-Nov-21																							
R2280	งานผนังหลังคากระเบื้อง	20	20-Oct-21	08-Nov-21	148					20-Oct-21					08-Nov-21																					
R2290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	08-Jan-22	22-Jan-22	148									08-Jan-22																						
งานระบบประกอบอาคาร		75	09-Nov-21	22-Jan-22	148																															
R2310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	60	09-Nov-21	07-Jan-22	148								09-Nov-21																							
R2320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	60	09-Nov-21	07-Jan-22	148								09-Nov-21																							
R2370	งานทดสอบระบบ	15	08-Jan-22	22-Jan-22	148									08-Jan-22																						
ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง)		90	10-Oct-21	07-Jan-22	148																															
R2F10	งานผลิตและจัดส่ง	60	10-Oct-21	08-Dec-21	148					10-Oct-21					08-Dec-21																					
R2F20	งานติดตั้ง	30	09-Dec-21	07-Jan-22	148								09-Dec-21																							

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023							
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul				
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมผู้บริหาร อาคาร 7						331	05-Jul-21	31-May-22	19																												
งานโครงสร้าง						200	05-Jul-21	20-Jan-22	15																												
A0100	งานฐานราก	30	05-Jul-21	03-Aug-21	0	05-Jul-21 03-Aug-21																															
A0105	ล้างกับน้ำใต้ดิน	60	19-Nov-21	17-Jan-22	18	19-Nov-21 17-Jan-22																															
A0110	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 1	21	04-Aug-21	24-Aug-21	0	04-Aug-21 24-Aug-21																															
A0115	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 1	7	25-Aug-21	31-Aug-21	0	25-Aug-21 31-Aug-21																															
A0120	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 2	21	01-Sep-21	21-Sep-21	0	01-Sep-21 21-Sep-21																															
A0125	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 2	7	22-Sep-21	28-Sep-21	0	22-Sep-21 28-Sep-21																															
A0130	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 3	21	29-Sep-21	19-Oct-21	0	29-Sep-21 19-Oct-21																															
A0135	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 3	7	20-Oct-21	26-Oct-21	0	20-Oct-21 26-Oct-21																															
A0140	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 4	21	27-Oct-21	16-Nov-21	0	27-Oct-21 16-Nov-21																															
A0145	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 4	7	17-Nov-21	23-Nov-21	0	17-Nov-21 23-Nov-21																															
A0150	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 5	21	24-Nov-21	14-Dec-21	0	24-Nov-21 14-Dec-21																															
A0155	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 5	7	15-Dec-21	21-Dec-21	0	15-Dec-21 21-Dec-21																															
A0158	งานโครงสร้างรางน้ำ ชั้นดาดฟ้า	15	22-Dec-21	05-Jan-22	0	22-Dec-21 05-Jan-22																															
A0160	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นดาดฟ้า	10	22-Dec-21	31-Dec-21	3	22-Dec-21 31-Dec-21																															
A0165	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้นดาดฟ้า	7	01-Jan-22	07-Jan-22	3	01-Jan-22 07-Jan-22																															
A0170	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	10	08-Jan-22	17-Jan-22	3	08-Jan-22 17-Jan-22																															
A0180	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับหลังคา	15	06-Jan-22	20-Jan-22	0	06-Jan-22 20-Jan-22																															
A01S1	งานโครงสร้างบันได ชั้น 1	15	01-Sep-21	15-Sep-21	67	01-Sep-21 15-Sep-21																															
A01S2	งานโครงสร้างบันได ชั้น 2	15	29-Sep-21	13-Oct-21	54	29-Sep-21 13-Oct-21																															
A01S3	งานโครงสร้างบันได ชั้น 3	15	27-Oct-21	10-Nov-21	41	27-Oct-21 10-Nov-21																															
A01S4	งานโครงสร้างบันได ชั้น 4	15	24-Nov-21	08-Dec-21	28	24-Nov-21 08-Dec-21																															
A01S5	งานโครงสร้างบันได ชั้น 5	15	22-Dec-21	05-Jan-22	15	22-Dec-21 05-Jan-22																															
งานสถาปัตยกรรม						225	19-Oct-21	31-May-22	19																												
A0210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	90	19-Oct-21	16-Jan-22	19	19-Oct-21 16-Jan-22																															
A0220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	90	18-Nov-21	15-Feb-22	19	18-Nov-21 15-Feb-22																															
A0230	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	90	18-Dec-21	17-Mar-22	19	18-Dec-21 17-Mar-22																															
A0240	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4	90	17-Jan-22	16-Apr-22	19	17-Jan-22 16-Apr-22																															
A0250	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5	90	16-Feb-22	16-May-22	19	16-Feb-22 16-May-22																															
A0260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า	60	18-Mar-22	16-May-22	19	18-Mar-22 16-May-22																															
A0270	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	60	18-Mar-22	16-May-22	19	18-Mar-22 16-May-22																															
A0280	งานปูหลังคาเหล็กพร้อมฉนวน	15	21-Jan-22	04-Feb-22	120	21-Jan-22 04-Feb-22																															
A0290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	17-May-22	31-May-22	19	17-May-22 31-May-22																															
งานระบบประกอบอาคาร						225	19-Oct-21	31-May-22	19																												
A0310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	90	19-Oct-21	16-Jan-22	19	19-Oct-21 16-Jan-22																															
A0320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	90	18-Nov-21	15-Feb-22	109	18-Nov-21 15-Feb-22																															
A0330	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 3	90	18-Dec-21	17-Mar-22	79	18-Dec-21 17-Mar-22																															
A0340	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 4	90	17-Jan-22	16-Apr-22	49	17-Jan-22 16-Apr-22																															
A0350	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 5	90	16-Feb-22	16-May-22	19	16-Feb-22 16-May-22																															
A0360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นดาดฟ้า	60	18-Mar-22	16-May-22	19	18-Mar-22 16-May-22																															
A0370	งานทดสอบระบบ	15	17-May-22	31-May-22	19	17-May-22 31-May-22																															

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
วัสดุอุปกรณ์หลัก		269	21-Aug-21	16-May-22	19																															
A0410	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบลิฟต์	150	21-Aug-21	17-Jan-22	48				21-Aug-21										17-Jan-22																	
A0420	งานติดตั้งและทดสอบ ระบบลิฟต์	90	18-Jan-22	17-Apr-22	48									18-Jan-22					17-Apr-22																	
A0430	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	90	18-Dec-21	17-Mar-22	19								18-Dec-21					17-Mar-22																		
A0440	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	60	18-Mar-22	16-May-22	19									18-Mar-22					16-May-22																	
A0450	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	90	18-Dec-21	17-Mar-22	19								18-Dec-21					17-Mar-22																		
A0460	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	60	18-Mar-22	16-May-22	19									18-Mar-22					16-May-22																	
A0470	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	90	18-Dec-21	17-Mar-22	19								18-Dec-21					17-Mar-22																		
A0480	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	60	18-Mar-22	16-May-22	19									18-Mar-22					16-May-22																	
A0490	งานติดตั้งและทดสอบ Software ระบบสื่อสาร	60	18-Mar-22	16-May-22	19									18-Mar-22					16-May-22																	
ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง)		270	20-Aug-21	16-May-22	19																															
A0F10	งานผลิตและจัดส่ง	180	20-Aug-21	15-Feb-22	19				20-Aug-21										15-Feb-22																	
A0F20	งานติดตั้ง	90	16-Feb-22	16-May-22	19									16-Feb-22					16-May-22																	

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023														
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul											
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 2						335	16-Jul-21		15-Jun-22		4																																	
งานโครงสร้าง						189	16-Jul-21		20-Jan-22		15																																	
B2100	งานฐานราก	47	16-Jul-21	31-Aug-21	0	16-Jul-21				31-Aug-21																																		
B2105	ตั้งค้ำยันใต้ดิน	60	19-Nov-21	17-Jan-22	18					19-Nov-21				17-Jan-22																														
B2110	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 1	21	01-Sep-21	21-Sep-21	0			01-Sep-21				21-Sep-21																																
B2115	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 1	7	22-Sep-21	28-Sep-21	0			22-Sep-21				28-Sep-21																																
B2120	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 2 (Post-Tension Slab)	14	29-Sep-21	12-Oct-21	0			29-Sep-21				12-Oct-21																																
B2125	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 2	7	13-Oct-21	19-Oct-21	0			13-Oct-21				19-Oct-21																																
B2130	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 3 (Post-Tension Slab)	14	20-Oct-21	02-Nov-21	0			20-Oct-21				02-Nov-21																																
B2135	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 3	7	03-Nov-21	09-Nov-21	0			03-Nov-21				09-Nov-21																																
B2140	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 4 (Post-Tension Slab)	14	10-Nov-21	23-Nov-21	0			10-Nov-21				23-Nov-21																																
B2145	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 4	7	24-Nov-21	30-Nov-21	0			24-Nov-21				30-Nov-21																																
B2150	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 5 (Post-Tension Slab)	14	01-Dec-21	14-Dec-21	0			01-Dec-21				14-Dec-21																																
B2155	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 5	7	15-Dec-21	21-Dec-21	0			15-Dec-21				21-Dec-21																																
B2158	งานโครงสร้างรางน้ำ ชั้นดาดฟ้า	15	22-Dec-21	05-Jan-22	0			22-Dec-21				05-Jan-22																																
B2160	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นดาดฟ้า	10	22-Dec-21	31-Dec-21	3			22-Dec-21				31-Dec-21																																
B2165	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้นดาดฟ้า	7	01-Jan-22	07-Jan-22	3			01-Jan-22				07-Jan-22																																
B2170	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	10	08-Jan-22	17-Jan-22	3			08-Jan-22				17-Jan-22																																
B2180	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับหลังคา	15	06-Jan-22	20-Jan-22	0			06-Jan-22				20-Jan-22																																
B21S1	งานโครงสร้างบันได ชั้น 1	15	29-Sep-21	13-Oct-21	39			29-Sep-21				13-Oct-21																																
B21S2	งานโครงสร้างบันได ชั้น 2	15	20-Oct-21	03-Nov-21	33			20-Oct-21				03-Nov-21																																
B21S3	งานโครงสร้างบันได ชั้น 3	15	10-Nov-21	24-Nov-21	27			10-Nov-21				24-Nov-21																																
B21S4	งานโครงสร้างบันได ชั้น 4	15	01-Dec-21	15-Dec-21	21			01-Dec-21				15-Dec-21																																
B21S5	งานโครงสร้างบันได ชั้น 5	15	22-Dec-21	05-Jan-22	15			22-Dec-21				05-Jan-22																																
งานสถาปัตยกรรม						225	03-Nov-21		15-Jun-22		4																																	
B2210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	90	03-Nov-21	31-Jan-22	4			03-Nov-21				31-Jan-22																																
B2220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	90	03-Dec-21	02-Mar-22	4			03-Dec-21				02-Mar-22																																
B2230	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4			02-Jan-22				01-Apr-22																																
B2240	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4	90	01-Feb-22	01-May-22	4			01-Feb-22				01-May-22																																
B2250	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5	90	03-Mar-22	31-May-22	4			03-Mar-22				31-May-22																																
B2260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4			02-Apr-22				31-May-22																																
B2270	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	60	02-Apr-22	31-May-22	4			02-Apr-22				31-May-22																																
B2280	งานบุหลังคาเหล็กปิดลอนพร้อมฉนวน	15	21-Jan-22	04-Feb-22	120			21-Jan-22				04-Feb-22																																
B2290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	01-Jun-22	15-Jun-22	4							01-Jun-22				15-Jun-22																												
งานระบบประกอบอาคาร						225	03-Nov-21		15-Jun-22		4																																	
B2310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	90	03-Nov-21	31-Jan-22	4			03-Nov-21				31-Jan-22																																
B2320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	90	03-Dec-21	02-Mar-22	94			03-Dec-21				02-Mar-22																																
B2330	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 3	90	02-Jan-22	01-Apr-22	64			02-Jan-22				01-Apr-22																																
B2340	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 4	90	01-Feb-22	01-May-22	34			01-Feb-22				01-May-22																																
B2350	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 5	90	03-Mar-22	31-May-22	4			03-Mar-22				31-May-22																																
B2360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นดาดฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4			02-Apr-22				31-May-22																																
B2370	งานทดสอบระบบ	15	01-Jun-22	15-Jun-22	4							01-Jun-22				15-Jun-22																												

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
วัสดุอุปกรณ์หลัก		284	21-Aug-21	31-May-22	4																															
B2410	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบลิฟต์	150	21-Aug-21	17-Jan-22	48			21-Aug-21																												
B2420	งานติดตั้งและทดสอบ ระบบลิฟต์	90	18-Jan-22	17-Apr-22	48								18-Jan-22																							
B2430	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22																							
B2440	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B2450	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22																							
B2460	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B2470	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22																							
B2480	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B2490	งานติดตั้งและทดสอบ Software ระบบสื่อสาร	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง)		270	04-Sep-21	31-May-22	4																															
B2F10	งานผลิตและจัดส่ง	180	04-Sep-21	02-Mar-22	4			04-Sep-21																												
B2F20	งานติดตั้ง	90	03-Mar-22	31-May-22	4																															

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr -1	May 1	Jun 2	Jul 3	Aug 4	Sep 5	Oct 6	Nov 7	Dec 8	Jan 9	Feb 10	Mar 11	Apr 12	May 13	Jun 14	Jul 15	Aug 16	Sep 17	Oct 18	Nov 19	Dec 20	Jan 21	Feb 22	Mar 23	Apr 24	May 25	Jun 26	Jul 27			
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 4		335	16-Jul-21	15-Jun-22	4																															
งานโครงสร้าง		189	16-Jul-21	20-Jan-22	15																															
B4100	งานฐานราก	47	16-Jul-21	31-Aug-21	0		16-Jul-21																													
B4105	ล้างกับน้ำใต้ดิน	60	19-Nov-21	17-Jan-22	18																															
B4110	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 1	21	01-Sep-21	21-Sep-21	0																															
B4115	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 1	7	22-Sep-21	28-Sep-21	0																															
B4120	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 2 (Post-Tension Slab)	14	29-Sep-21	12-Oct-21	0																															
B4125	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 2	7	13-Oct-21	19-Oct-21	0																															
B4130	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 3 (Post-Tension Slab)	14	20-Oct-21	02-Nov-21	0																															
B4135	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 3	7	03-Nov-21	09-Nov-21	0																															
B4140	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 4 (Post-Tension Slab)	14	10-Nov-21	23-Nov-21	0																															
B4145	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 4	7	24-Nov-21	30-Nov-21	0																															
B4150	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 5 (Post-Tension Slab)	14	01-Dec-21	14-Dec-21	0																															
B4155	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 5	7	15-Dec-21	21-Dec-21	0																															
B4158	งานโครงสร้างรางน้ำ ชั้นดาดฟ้า	15	22-Dec-21	05-Jan-22	0																															
B4160	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นดาดฟ้า	10	22-Dec-21	31-Dec-21	3																															
B4165	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้นดาดฟ้า	7	01-Jan-22	07-Jan-22	3																															
B4170	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	10	08-Jan-22	17-Jan-22	3																															
B4180	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับหลังคา	15	06-Jan-22	20-Jan-22	0																															
B41S1	งานโครงสร้างบันได ชั้น 1	15	29-Sep-21	13-Oct-21	39																															
B41S2	งานโครงสร้างบันได ชั้น 2	15	20-Oct-21	03-Nov-21	33																															
B41S3	งานโครงสร้างบันได ชั้น 3	15	10-Nov-21	24-Nov-21	27																															
B41S4	งานโครงสร้างบันได ชั้น 4	15	01-Dec-21	15-Dec-21	21																															
B41S5	งานโครงสร้างบันได ชั้น 5	15	22-Dec-21	05-Jan-22	15																															
งานสถาปัตยกรรม		225	03-Nov-21	15-Jun-22	4																															
B4210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	90	03-Nov-21	31-Jan-22	4																															
B4220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	90	03-Dec-21	02-Mar-22	4																															
B4230	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4																															
B4240	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4	90	01-Feb-22	01-May-22	4																															
B4250	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5	90	03-Mar-22	31-May-22	4																															
B4260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B4270	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B4280	งานบุหลังคาเหล็กปิดลอนพร้อมฉนวน	15	21-Jan-22	04-Feb-22	120																															
B4290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	01-Jun-22	15-Jun-22	4																															
งานระบบประกอบอาคาร		225	03-Nov-21	15-Jun-22	4																															
B4310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	90	03-Nov-21	31-Jan-22	4																															
B4320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	90	03-Dec-21	02-Mar-22	94																															
B4330	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 3	90	02-Jan-22	01-Apr-22	64																															
B4340	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 4	90	01-Feb-22	01-May-22	34																															
B4350	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 5	90	03-Mar-22	31-May-22	4																															
B4360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นดาดฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B4370	งานทดสอบระบบ	15	01-Jun-22	15-Jun-22	4																															

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
วัสดุอุปกรณ์หลัก		284	21-Aug-21	31-May-22	4																															
B4410	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบลิฟต์	150	21-Aug-21	17-Jan-22	48			21-Aug-21									17-Jan-22																			
B4420	งานติดตั้งและทดสอบ ระบบลิฟต์	90	18-Jan-22	17-Apr-22	48								18-Jan-22					17-Apr-22																		
B4430	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22					01-Apr-22																		
B4440	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	60	02-Apr-22	31-May-22	4												02-Apr-22																			
B4450	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22					01-Apr-22																		
B4460	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	60	02-Apr-22	31-May-22	4												02-Apr-22																			
B4470	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22					01-Apr-22																		
B4480	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4												02-Apr-22																			
B4490	งานติดตั้งและทดสอบ Software ระบบสื่อสาร	60	02-Apr-22	31-May-22	4												02-Apr-22																			
ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง)		270	04-Sep-21	31-May-22	4																															
B4F10	งานผลิตและจัดส่ง	180	04-Sep-21	02-Mar-22	4			04-Sep-21										02-Mar-22																		
B4F20	งานติดตั้ง	90	03-Mar-22	31-May-22	4												03-Mar-22																			

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 6		335	16-Jul-21	15-Jun-22	4																															
งานโครงสร้าง		189	16-Jul-21	20-Jan-22	15																															
B6100	งานฐานราก	47	16-Jul-21	31-Aug-21	0	16-Jul-21																														
B6105	ล้างกันน้ำใต้ดิน	60	19-Nov-21	17-Jan-22	18																															
B6110	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 1	21	01-Sep-21	21-Sep-21	0																															
B6115	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 1	7	22-Sep-21	28-Sep-21	0																															
B6120	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 2 (Post-Tension Slab)	14	29-Sep-21	12-Oct-21	0																															
B6125	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 2	7	13-Oct-21	19-Oct-21	0																															
B6130	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 3 (Post-Tension Slab)	14	20-Oct-21	02-Nov-21	0																															
B6135	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 3	7	03-Nov-21	09-Nov-21	0																															
B6140	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 4 (Post-Tension Slab)	14	10-Nov-21	23-Nov-21	0																															
B6145	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 4	7	24-Nov-21	30-Nov-21	0																															
B6150	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 5 (Post-Tension Slab)	14	01-Dec-21	14-Dec-21	0																															
B6155	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 5	7	15-Dec-21	21-Dec-21	0																															
B6158	งานโครงสร้างรางน้ำ ชั้นดาดฟ้า	15	22-Dec-21	05-Jan-22	0																															
B6160	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นดาดฟ้า	10	22-Dec-21	31-Dec-21	3																															
B6165	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้นดาดฟ้า	7	01-Jan-22	07-Jan-22	3																															
B6170	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	10	08-Jan-22	17-Jan-22	3																															
B6180	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับหลังคา	15	06-Jan-22	20-Jan-22	0																															
B61S1	งานโครงสร้างบันได ชั้น 1	15	29-Sep-21	13-Oct-21	39																															
B61S2	งานโครงสร้างบันได ชั้น 2	15	20-Oct-21	03-Nov-21	33																															
B61S3	งานโครงสร้างบันได ชั้น 3	15	10-Nov-21	24-Nov-21	27																															
B61S4	งานโครงสร้างบันได ชั้น 4	15	01-Dec-21	15-Dec-21	21																															
B61S5	งานโครงสร้างบันได ชั้น 5	15	22-Dec-21	05-Jan-22	15																															
งานสถาปัตยกรรม		225	03-Nov-21	15-Jun-22	4																															
B6210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	90	03-Nov-21	31-Jan-22	4																															
B6220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	90	03-Dec-21	02-Mar-22	4																															
B6230	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4																															
B6240	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4	90	01-Feb-22	01-May-22	4																															
B6250	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5	90	03-Mar-22	31-May-22	4																															
B6260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B6270	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B6280	งานบุหลังคาเหล็กปิดลอนพร้อมฉนวน	15	21-Jan-22	04-Feb-22	120																															
B6290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	01-Jun-22	15-Jun-22	4																															
งานระบบประกอบอาคาร		225	03-Nov-21	15-Jun-22	4																															
B6310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	90	03-Nov-21	31-Jan-22	4																															
B6320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	90	03-Dec-21	02-Mar-22	94																															
B6330	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 3	90	02-Jan-22	01-Apr-22	64																															
B6340	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 4	90	01-Feb-22	01-May-22	34																															
B6350	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 5	90	03-Mar-22	31-May-22	4																															
B6360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นดาดฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B6370	งานทดสอบระบบ	15	01-Jun-22	15-Jun-22	4																															

Remaining Level of Effort Actual Work Remaining Work Critical Remaining Work Milestone Milestone

Date Date : 26-Apr-21Page 13 of 23

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
วัสดุอุปกรณ์หลัก		284	21-Aug-21	31-May-22	4																															
B6410	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบลิฟต์	150	21-Aug-21	17-Jan-22	48			21-Aug-21																												
B6420	งานติดตั้งและทดสอบ ระบบลิฟต์	90	18-Jan-22	17-Apr-22	48								18-Jan-22																							
B6430	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22																							
B6440	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B6450	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22																							
B6460	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B6470	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	90	02-Jan-22	01-Apr-22	4								02-Jan-22																							
B6480	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
B6490	งานติดตั้งและทดสอบ Software ระบบสื่อสาร	60	02-Apr-22	31-May-22	4																															
ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง)		270	04-Sep-21	31-May-22	4																															
B6F10	งานผลิตและจัดส่ง	180	04-Sep-21	02-Mar-22	4			04-Sep-21																												
B6F20	งานติดตั้ง	90	03-Mar-22	31-May-22	4																															

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 1		344	21-Jan-22	30-Dec-22	76																															
งานโครงสร้าง		207	21-Jan-22	15-Aug-22	78																															
B1100	งานฐานราก	50	21-Jan-22	11-Mar-22	62									21-Jan-22																						
B1105	ตั้งค้ำยันใต้ดิน	60	17-Jun-22	15-Aug-22	78																															
B1110	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 1	21	12-Mar-22	01-Apr-22	62									12-Mar-22																						
B1115	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 1	10	02-Apr-22	11-Apr-22	62									02-Apr-22																						
B1120	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 2 (Post-Tension Slab)	14	12-Apr-22	25-Apr-22	62									12-Apr-22																						
B1125	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 2	10	26-Apr-22	05-May-22	62									26-Apr-22																						
B1130	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 3 (Post-Tension Slab)	14	06-May-22	19-May-22	62									06-May-22																						
B1135	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 3	10	20-May-22	29-May-22	62									20-May-22																						
B1140	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 4 (Post-Tension Slab)	14	30-May-22	12-Jun-22	62									30-May-22																						
B1145	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 4	10	13-Jun-22	22-Jun-22	62									13-Jun-22																						
B1150	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 5 (Post-Tension Slab)	14	23-Jun-22	06-Jul-22	62									23-Jun-22																						
B1155	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 5	10	07-Jul-22	16-Jul-22	62									07-Jul-22																						
B1158	งานโครงสร้างรางน้ำ ชั้นดาดฟ้า	15	17-Jul-22	31-Jul-22	62									17-Jul-22																						
B1160	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นดาดฟ้า	10	17-Jul-22	26-Jul-22	78									17-Jul-22																						
B1165	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้นดาดฟ้า	10	27-Jul-22	05-Aug-22	78									27-Jul-22																						
B1170	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	10	06-Aug-22	15-Aug-22	78									06-Aug-22																						
B1180	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับหลังคา	15	01-Aug-22	15-Aug-22	62									01-Aug-22																						
B11S1	งานโครงสร้างบันได ชั้น 1	15	12-Apr-22	26-Apr-22	129									12-Apr-22																						
B11S2	งานโครงสร้างบันได ชั้น 2	15	06-May-22	20-May-22	120									06-May-22																						
B11S3	งานโครงสร้างบันได ชั้น 3	15	30-May-22	13-Jun-22	111									30-May-22																						
B11S4	งานโครงสร้างบันได ชั้น 4	15	23-Jun-22	07-Jul-22	102									23-Jun-22																						
B11S5	งานโครงสร้างบันได ชั้น 5	15	17-Jul-22	31-Jul-22	93									17-Jul-22																						
งานสถาปัตยกรรม		225	20-May-22	30-Dec-22	76																															
B1210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	90	20-May-22	17-Aug-22	76																															
B1220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	90	19-Jun-22	16-Sep-22	76																															
B1230	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	90	19-Jul-22	16-Oct-22	76																															
B1240	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4	90	18-Aug-22	15-Nov-22	76																															
B1250	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5	90	17-Sep-22	15-Dec-22	76																															
B1260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																															
B1270	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																															
B1280	งานบุหลังคาเหล็กปิดลอนพร้อมฉนวน	15	16-Aug-22	30-Aug-22	183																															
B1290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	16-Dec-22	30-Dec-22	76																															
งานระบบประกอบอาคาร		225	20-May-22	30-Dec-22	76																															
B1310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	90	20-May-22	17-Aug-22	76																															
B1320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	90	19-Jun-22	16-Sep-22	166																															
B1330	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 3	90	19-Jul-22	16-Oct-22	136																															
B1340	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 4	90	18-Aug-22	15-Nov-22	106																															
B1350	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 5	90	17-Sep-22	15-Dec-22	76																															
B1360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นดาดฟ้า	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																															
B1370	งานทดสอบระบบ	15	16-Dec-22	30-Dec-22	76																															

Remaining Level of Effort Actual Work Remaining Work Critical Remaining Work Milestone Milestone

Date Date : 26-Apr-21Page 15 of 23

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
วัสดุอุปกรณ์หลัก		272	19-Mar-22	15-Dec-22	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021								2022												2023							
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 3		344	21-Jan-22	30-Dec-22	76																												
งานโครงสร้าง		207	21-Jan-22	15-Aug-22	78																												
B3100	งานฐานราก	50	21-Jan-22	11-Mar-22	62									21-Jan-22																			
B3105	ล้างเก็บน้ำใต้ดิน	60	17-Jun-22	15-Aug-22	78																												
B3110	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 1	21	12-Mar-22	01-Apr-22	62																												
B3115	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 1	10	02-Apr-22	11-Apr-22	62																												
B3120	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 2 (Post-Tension Slab)	14	12-Apr-22	25-Apr-22	62																												
B3125	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 2	10	26-Apr-22	05-May-22	62																												
B3130	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 3 (Post-Tension Slab)	14	06-May-22	19-May-22	62																												
B3135	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 3	10	20-May-22	29-May-22	62																												
B3140	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 4 (Post-Tension Slab)	14	30-May-22	12-Jun-22	62																												
B3145	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 4	10	13-Jun-22	22-Jun-22	62																												
B3150	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 5 (Post-Tension Slab)	14	23-Jun-22	06-Jul-22	62																												
B3155	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 5	10	07-Jul-22	16-Jul-22	62																												
B3158	งานโครงสร้างรางน้ำ ชั้นดาดฟ้า	15	17-Jul-22	31-Jul-22	62																												
B3160	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นดาดฟ้า	10	17-Jul-22	26-Jul-22	78																												
B3165	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้นดาดฟ้า	10	27-Jul-22	05-Aug-22	78																												
B3170	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	10	06-Aug-22	15-Aug-22	78																												
B3180	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับหลังคา	15	01-Aug-22	15-Aug-22	62																												
B31S1	งานโครงสร้างบันได ชั้น 1	15	12-Apr-22	26-Apr-22	129																												
B31S2	งานโครงสร้างบันได ชั้น 2	15	06-May-22	20-May-22	120																												
B31S3	งานโครงสร้างบันได ชั้น 3	15	30-May-22	13-Jun-22	111																												
B31S4	งานโครงสร้างบันได ชั้น 4	15	23-Jun-22	07-Jul-22	102																												
B31S5	งานโครงสร้างบันได ชั้น 5	15	17-Jul-22	31-Jul-22	93																												
งานสถาปัตยกรรม		225	20-May-22	30-Dec-22	76																												
B3210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	90	20-May-22	17-Aug-22	76																												
B3220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	90	19-Jun-22	16-Sep-22	76																												
B3230	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	90	19-Jul-22	16-Oct-22	76																												
B3240	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4	90	18-Aug-22	15-Nov-22	76																												
B3250	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5	90	17-Sep-22	15-Dec-22	76																												
B3260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																												
B3270	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																												
B3280	งานบุหลังคาเหล็กปิดลอนพร้อมฉนวน	15	16-Aug-22	30-Aug-22	183																												
B3290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	16-Dec-22	30-Dec-22	76																												
งานระบบประกอบอาคาร		225	20-May-22	30-Dec-22	76																												
B3310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	90	20-May-22	17-Aug-22	76																												
B3320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	90	19-Jun-22	16-Sep-22	166																												
B3330	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 3	90	19-Jul-22	16-Oct-22	136																												
B3340	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 4	90	18-Aug-22	15-Nov-22	106																												
B3350	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 5	90	17-Sep-22	15-Dec-22	76																												
B3360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นดาดฟ้า	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																												
B3370	งานทดสอบระบบ	15	16-Dec-22	30-Dec-22	76																												

Remaining Level of Effort Actual Work Remaining Work Critical Remaining Work Milestone Milestone

Date Date : 26-Apr-21Page 17 of 23

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
วัสดุอุปกรณ์หลัก		272	19-Mar-22	15-Dec-22	76																															
B3410	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบลิฟต์	150	19-Mar-22	15-Aug-22	108										19-Mar-22																					
B3420	งานติดตั้งและทดสอบ ระบบลิฟต์	90	16-Aug-22	13-Nov-22	108																															
B3430	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	90	19-Jul-22	16-Oct-22	76																															
B3440	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																															
B3450	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	90	19-Jul-22	16-Oct-22	76																															
B3460	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																															
B3470	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	90	19-Jul-22	16-Oct-22	76																															
B3480	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																															
B3490	งานติดตั้งและทดสอบ Software ระบบสื่อสาร	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																															
ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง)		270	21-Mar-22	15-Dec-22	76																															
B3F10	งานผลิตและจัดส่ง	180	21-Mar-22	16-Sep-22	76										21-Mar-22																					
B3F20	งานติดตั้ง	90	17-Sep-22	15-Dec-22	76																															

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021								2022												2023							
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 5						344																											
งานโครงสร้าง						207																											
B5100	งานฐานราก	50	21-Jan-22	11-Mar-22	62										21-Jan-22																		
B5105	ล้างกับน้ำใต้ดิน	60	17-Jun-22	15-Aug-22	78																												
B5110	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 1	21	12-Mar-22	01-Apr-22	62																												
B5115	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 1	10	02-Apr-22	11-Apr-22	62																												
B5120	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 2 (Post-Tension Slab)	14	12-Apr-22	25-Apr-22	62																												
B5125	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 2	10	26-Apr-22	05-May-22	62																												
B5130	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 3 (Post-Tension Slab)	14	06-May-22	19-May-22	62																												
B5135	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 3	10	20-May-22	29-May-22	62																												
B5140	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 4 (Post-Tension Slab)	14	30-May-22	12-Jun-22	62																												
B5145	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 4	10	13-Jun-22	22-Jun-22	62																												
B5150	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 5 (Post-Tension Slab)	14	23-Jun-22	06-Jul-22	62																												
B5155	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 5	10	07-Jul-22	16-Jul-22	62																												
B5158	งานโครงสร้างรางน้ำ ชั้นดาดฟ้า	15	17-Jul-22	31-Jul-22	62																												
B5160	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นดาดฟ้า	10	17-Jul-22	26-Jul-22	78																												
B5165	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้นดาดฟ้า	10	27-Jul-22	05-Aug-22	78																												
B5170	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	10	06-Aug-22	15-Aug-22	78																												
B5180	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับหลังคา	15	01-Aug-22	15-Aug-22	62																												
B51S1	งานโครงสร้างบันได ชั้น 1	15	12-Apr-22	26-Apr-22	129																												
B51S2	งานโครงสร้างบันได ชั้น 2	15	06-May-22	20-May-22	120																												
B51S3	งานโครงสร้างบันได ชั้น 3	15	30-May-22	13-Jun-22	111																												
B51S4	งานโครงสร้างบันได ชั้น 4	15	23-Jun-22	07-Jul-22	102																												
B51S5	งานโครงสร้างบันได ชั้น 5	15	17-Jul-22	31-Jul-22	93																												
งานสถาปัตยกรรม						225																											
B5210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	90	20-May-22	17-Aug-22	76																												
B5220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	90	19-Jun-22	16-Sep-22	76																												
B5230	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	90	19-Jul-22	16-Oct-22	76																												
B5240	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4	90	18-Aug-22	15-Nov-22	76																												
B5250	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5	90	17-Sep-22	15-Dec-22	76																												
B5260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																												
B5270	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																												
B5280	งานบุหลังคาเหล็กปิดลอนพร้อมฉนวน	15	16-Aug-22	30-Aug-22	183																												
B5290	งานเก็บความเรียบร้อย	15	16-Dec-22	30-Dec-22	76																												
งานระบบประกอบอาคาร						225																											
B5310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	90	20-May-22	17-Aug-22	76																												
B5320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	90	19-Jun-22	16-Sep-22	166																												
B5330	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 3	90	19-Jul-22	16-Oct-22	136																												
B5340	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 4	90	18-Aug-22	15-Nov-22	106																												
B5350	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 5	90	17-Sep-22	15-Dec-22	76																												
B5360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นดาดฟ้า	60	17-Oct-22	15-Dec-22	76																												
B5370	งานทดสอบระบบ	15	16-Dec-22	30-Dec-22	76																												

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
วัสดุอุปกรณ์หลัก		272	19-Mar-22	15-Dec-22	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021								2022												2023							
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
งานก่อสร้างอาคารสโมสร		280	21-Jan-22	27-Oct-22	140																												
งานโครงสร้าง		160	21-Jan-22	29-Jun-22	140																												
C0100	งานฐานราก	50	21-Jan-22	11-Mar-22	140									21-Jan-22																			
C0105	ตั้งค้ำยันใต้ดิน	30	10-Feb-22	11-Mar-22	140									10-Feb-22																			
C0110	งานโครงสร้าง ชั้น 1	30	12-Mar-22	10-Apr-22	140									12-Mar-22																			
C0115	งานโครงสร้าง ชั้นลอย	20	11-Apr-22	30-Apr-22	140									11-Apr-22																			
C0120	งานโครงสร้าง ชั้น 2	30	01-May-22	30-May-22	140									01-May-22																			
C0180	งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา	30	31-May-22	29-Jun-22	140																												
งานสถาปัตยกรรม		120	30-Jun-22	27-Oct-22	140																												
C0210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	60	15-Jul-22	12-Sep-22	140																												
C0215	งานสถาปัตยกรรม ชั้นลอย	30	14-Aug-22	12-Sep-22	140																												
C0220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	60	14-Aug-22	12-Oct-22	140																												
C0260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นดาดฟ้า	30	13-Sep-22	12-Oct-22	140																												
C0280	งานมุงหลังคาเหล็กยึดลอนพร้อมฉนวน	15	30-Jun-22	14-Jul-22	140																												
C0290	งานเก็บความเรียบรอย	15	13-Oct-22	27-Oct-22	140																												
งานระบบประกอบอาคาร		105	15-Jul-22	27-Oct-22	140																												
C0310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	60	15-Jul-22	12-Sep-22	170																												
C0315	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นลอย	30	14-Aug-22	12-Sep-22	170																												
C0320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	60	14-Aug-22	12-Oct-22	140																												
C0360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นดาดฟ้า	30	13-Sep-22	12-Oct-22	140																												
C0370	งานทดสอบระบบ	15	13-Oct-22	27-Oct-22	140																												
วัสดุอุปกรณ์หลัก		120	15-Jun-22	12-Oct-22	140																												
C0430	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	60	15-Jun-22	13-Aug-22	170																												
C0440	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	30	14-Aug-22	12-Sep-22	170																												
C0450	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	60	15-Jun-22	13-Aug-22	170																												
C0460	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	30	14-Aug-22	12-Sep-22	170																												
C0470	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	60	15-Jun-22	13-Aug-22	170																												
C0480	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	30	14-Aug-22	12-Sep-22	170																												
C0490	งานติดตั้งและทดสอบ Software ระบบสื่อสาร	30	13-Sep-22	12-Oct-22	140																												
ครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง)		90	15-Jul-22	12-Oct-22	140																												
COF10	งานผลิตและจัดส่ง	60	15-Jul-22	12-Sep-22	140																												
COF20	งานติดตั้ง	30	13-Sep-22	12-Oct-22	140																												

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
งานภายนอก		547	01-Jul-21	29-Dec-22	62																															
งานโยธภายนอก		547	01-Jul-21	29-Dec-22	62																															
E1100	กำแพงกันดิน (ระยะที่ 1)	215	01-Jul-21	31-Jan-22	4	01-Jul-21 ███																														

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023						
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
งานทดสอบระบบและส่งมอบ		260	31-May-22	14-Feb-23	60																															
T1000	จุดจ่ายน้ำถาวร	0	31-May-22		0																															
T2000	จุดจ่ายไฟถาวร	0	31-May-22		0																															
T3100	งานทดสอบและอบรมการใช้งานระบบ (ระยะที่ 1)	45	05-Jun-22	19-Jul-22	0																															
T3200	งานทดสอบและอบรมการใช้งานระบบ (ระยะที่ 2)	45	01-Jan-23	14-Feb-23	60																															
T4100	งานขออนุญาตเปิดใช้อาคาร (ระยะที่ 1)	45	05-Jun-22	19-Jul-22	0																															
T4200	งานขออนุญาตเปิดใช้อาคาร (ระยะที่ 2)	45	01-Jan-23	14-Feb-23	60																															
T5100	งานทำความสะอาด และส่งมอบ (ระยะที่ 1)	45	05-Jun-22	19-Jul-22	0																															
T5200	งานทำความสะอาด และส่งมอบ (ระยะที่ 2)	45	01-Jan-23	14-Feb-23	60																															

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23
		26-Apr-21	14-Feb-23	1000000	3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0
					3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
งานเตรียมการก่อสร้าง				50695	3594	22279	24822																								
M0100	งานสำรวจ รื้อถอน ปรับพื้นที่	26-Apr-21	30-Jun-21	33937	2571	15940	15426																								
M0200	งานติดตั้งรั้วชั่วคราว	1-Jun-21	30-Jun-21	959			959																								
M0300	งานก่อสร้างถนนชั่วคราว	1-Jun-21	30-Jun-21	2301			2301																								
M0600	ไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว	26-Apr-21	30-Jun-21	959	73	450	436																								
M0700	สำนักงานชั่วคราว	26-Apr-21	30-Jun-21	1548	117	727	704																								
M0800	บ้านพักคนงาน	26-Apr-21	30-Jun-21	10991	833	5162	4996																								
งานเสาเข็มตอก				32359			8983	9904	11037	2435																					
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.22 x 0.22				689			689																								
P1100	งานเสาเข็ม บ้านพักผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (31 ต้น)	16-Jul-21	21-Jul-21	257				257																							
P1200	งานเสาเข็ม บ้านพักรองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 1 (26 ต้น)	22-Jul-21	31-Jul-21	216				216																							
P1300	งานเสาเข็ม บ้านพักรองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 2 (26 ต้น)	22-Jul-21	31-Jul-21	216				216																							
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.30 x 0.30				26778			8983	9215	8580																						
P2100	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมผู้บริหาร อาคาร 7 (101 ต้น)	21-Jun-21	15-Jul-21	1698			679	1019																							
P2200	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 2 (215 ต้น)	1-Jun-21	15-Jul-21	4152			2768	1384																							
P2300	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 4 (215 ต้น)	1-Jun-21	15-Jul-21	4152			2768	1384																							
P2400	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 6 (215 ต้น)	1-Jun-21	15-Jul-21	4152			2768	1384																							
P2500	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 1 (215 ต้น)	18-Jul-21	31-Aug-21	4152				1292	2860																						
P2600	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 3 (215 ต้น)	18-Jul-21	31-Aug-21	4152				1292	2860																						
P2700	งานเสาเข็ม อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 5 (215 ต้น)	18-Jul-21	31-Aug-21	4152				1292	2860																						
P2800	งานเสาเข็ม อาคารพักขยะ (10 ต้น)	16-Jul-21	17-Jul-21	168				168																							
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.18 x 0.18				1123					1123																						
P3100	งานเสาเข็ม ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 7 (32 ต้น)	1-Sep-21	30-Sep-21	80						80																					
P3200	งานเสาเข็ม ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 2 (60 ต้น)	1-Sep-21	30-Sep-21	150						150																					
P3300	งานเสาเข็ม ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 4 (60 ต้น)	1-Sep-21	30-Sep-21	150						150																					
P3400	งานเสาเข็ม ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 6 (60 ต้น)	1-Sep-21	30-Sep-21	150						150																					
P3500	งานเสาเข็ม ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 1 (60 ต้น)	1-Sep-21	30-Sep-21	150						150																					
P3600	งานเสาเข็ม ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 3 (60 ต้น)	1-Sep-21	30-Sep-21	150						150																					
P3700	งานเสาเข็ม ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 5 (60 ต้น)	1-Sep-21	30-Sep-21	150						150																					
P3800	งานเสาเข็ม สนามเทนนิส (57 ต้น)	16-Sep-21	30-Sep-21	143						143																					
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 x 0.40				3769					2457	1312																					
P4100	งานเสาเข็ม สะพาน (32 ต้น)	1-Aug-21	15-Aug-21	1058					1058																						
P4200	งานเสาเข็ม อาคารสโมสร (82 ต้น)	16-Aug-21	15-Sep-21	2711					1399	1312																					

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		26-Apr-21	14-Feb-23	1000000	3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0
	งานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการท่าอากาศยาน			5340	3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	งานโครงสร้าง			1658				166	688	655	149																				
V0100	งานฐานราก	22-Jul-21	10-Aug-21	332				166	166																						
V0110	งานโครงสร้าง ชั้น 1	11-Aug-21	30-Aug-21	497					497																						
V0120	งานโครงสร้าง ชั้น 2	31-Aug-21	19-Sep-21	497					25	472																					
V0180	งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา	20-Sep-21	9-Oct-21	332						183	149																				
	งานสถาปัตยกรรม			2682							340	1074	1054	214																	
V0210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	30-Oct-21	28-Dec-21	1073							36	537	500																		
V0220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	30-Oct-21	28-Dec-21	1073							36	537	500																		
V0280	งานมุงหลังคากระเบื้อง	10-Oct-21	29-Oct-21	268							268																				
V0290	งานเก็บความเรียบร้อย	29-Dec-21	12-Jan-22	268									54	214																	
	งานระบบประกอบอาคาร			1000							26	400	414	160																	
V0310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	30-Oct-21	28-Dec-21	400							13	200	187																		
V0320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	30-Oct-21	28-Dec-21	400							13	200	187																		
V0370	งานทดสอบระบบ	29-Dec-21	12-Jan-22	200									40	160																	
	งานก่อสร้างบ้านพักรองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 1			4969					496	604	419	1168	1492	790																	
	งานโครงสร้าง			1358					496	604	258																				
R1100	งานฐานราก	1-Aug-21	20-Aug-21	272					272																						
R1110	งานโครงสร้าง ชั้น 1	21-Aug-21	9-Sep-21	407					224	183																					
R1120	งานโครงสร้าง ชั้น 2	10-Sep-21	29-Sep-21	407						407																					
R1180	งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา	30-Sep-21	19-Oct-21	272						14	258																				
	งานสถาปัตยกรรม			2686							161	896	1110	519																	
R1210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	9-Nov-21	7-Jan-22	1074								394	555	125																	
R1220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	9-Nov-21	7-Jan-22	1074								394	555	125																	
R1280	งานมุงหลังคากระเบื้อง	20-Oct-21	8-Nov-21	269							161	108																			
R1290	งานเก็บความเรียบร้อย	8-Jan-22	22-Jan-22	269										269																	
	งานระบบประกอบอาคาร			925								272	382	271																	
R1310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	9-Nov-21	7-Jan-22	370								136	191	43																	
R1320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	9-Nov-21	7-Jan-22	370								136	191	43																	
R1370	งานทดสอบระบบ	8-Jan-22	22-Jan-22	185										185																	
	งานก่อสร้างบ้านพักรองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 2			4969					496	604	419	1168	1492	790																	
	งานโครงสร้าง			1358					496	604	258																				
R2100	งานฐานราก	1-Aug-21	20-Aug-21	272					272																			</			

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
26-Apr-2114-Feb-231000000					3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมผู้บริหาร อาคาร 7					54054					1740					3097					3305					3990					5313					6758					6779					4830					6110					6162					5970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
งานโครงสร้าง					19792					1740					3097					3305					3410					3395					3365					1480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
26-Apr-2114-Feb-231000000					3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยที่รวมพนักงาน อาคาร 2					91795					1094					2120					5323					7652					9733					11793					11664					8068					8405					11166					8720					6057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
งานโครงสร้าง					33213					1094					2120					5323					7652					7487					6983					2554																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26-Apr-2114-Feb-231000000					3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยที่รวมพนักงาน อาคาร 4					91795					1094					2120					5323					7652					9733					11793					11664					8068					8405					11166					8720					6057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
งานโครงสร้าง					33213					1094					2120					5323					7652					7487					6983					2554																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26-Apr-2114-Feb-231000000					3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 6					91795					1094					2120					5323					7652					9733					11793					11664					8068					8405					11166					8720					6057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
งานโครงสร้าง					33213					1094					2120					5323					7652					7487					6983					2554																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</				

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

S-Curve

[illegible]


Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23										
26-Apr-2114-Feb-231000000					3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0										
งานก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 3					3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000										
งานโครงสร้าง					91795										707	1800	3768	6098	7411	10267	11468	11764	8133	10181	9962	10236															
งานโครงสร้าง					33213										707	1800	3768	6098	6448	6899	5456	2037																			
B3100	งานฐานราก	21-Jan-22	11-Mar-22	3214										707	1800	707																									
B3105	ตั้งน้ำกับไต้ดิน	17-Jun-22	15-Aug-22	1075															251	555	269																				
B3110	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 1	12-Mar-22	1-Apr-22	3214												3061	153																								
B3115	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 1	2-Apr-22	11-Apr-22	1607													1607																								
B3120	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 2 (Post-Tension Slab)	12-Apr-22	25-Apr-22	3214													3214																								
B3125	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 2	26-Apr-22	5-May-22	1607													803	804																							
B3130	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 3 (Post-Tension Slab)	6-May-22	19-May-22	3214														3214																							
B3135	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 3	20-May-22	29-May-22	1607														1607																							
B3140	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 4 (Post-Tension Slab)	30-May-22	12-Jun-22	3214														459	2755																						
B3145	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 4	13-Jun-22	22-Jun-22	1607															1607																						
B3150	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้น 5 (Post-Tension Slab)	23-Jun-22	6-Jul-22	3214															1837	1377																					
B3155	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้น 5	7-Jul-22	16-Jul-22	1607																1607																					
B3158	งานโครงสร้างวางน้ำ ชั้นลาดฟ้า	17-Jul-22	31-Jul-22	643																643																					
B3160	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นลาดฟ้า	17-Jul-22	26-Jul-22	643																	643																				
B3165	งานโครงสร้างเสา-ผนัง ชั้นลาดฟ้า	27-Jul-22	5-Aug-22	321																	160	161																			
B3170	งานโครงสร้างพื้น-คาน ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	6-Aug-22	15-Aug-22	643																		643																			
B3180	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กกับหลังคา	1-Aug-22	15-Aug-22	964																		964																			
B31S1	งานโครงสร้างบันได ชั้น 1	12-Apr-22	26-Apr-22	321													321																								
B31S2	งานโครงสร้างบันได ชั้น 2	6-May-22	20-May-22	321														321																							
B31S3	งานโครงสร้างบันได ชั้น 3	30-May-22	13-Jun-22	321														43	278																						
B31S4	งานโครงสร้างบันได ชั้น 4	23-Jun-22	7-Jul-22	321															171	150																					
B31S5	งานโครงสร้างบันได ชั้น 5	17-Jul-22	31-Jul-22	321																321																					
งานสถาปัตยกรรม					35640										713										2495	4454	7306	5347	5525	4455	5345										
B3210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	20-May-22	17-Aug-22	5346														713	1782	1841	1010																				
B3220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	19-Jun-22	16-Sep-22	5346															713	1841	1841	951																			
B3230	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	19-Jul-22	16-Oct-22	5346																772	1841	1782	951																		
B3240	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4	18-Aug-22	15-Nov-22	5346																	832	1782	1841	891																	
B3250	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5	17-Sep-22	15-Dec-22	5346																		832	1841	1782	891																
B3260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นลาดฟ้า	17-Oct-22	15-Dec-22	1782																			446	891	445																
B3270	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาห้องเครื่อง	17-Oct-22	15-Dec-22	1782																				446	891	445															
B3280	งานมุงหลังคาเหล็กโครงสร้างพร้อมฉนวน	16-Aug-22	30-Aug-22	1782																	1782																				
B3290	งานเก็บความเรียบร้อย	16-Dec-22	30-Dec-22	3564																					3564																
งานระบบประกอบอาคาร					12466										250										873	1558	1932	1869	1777	1246	2961										
B3310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	20-May-22	17-Aug-22	1870														250	623	644	353																				
B3320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	19-Jun-22	16-Sep-22	1870															250	644	644	332																			
B3330	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 3	19-Jul-22	16-Oct-22	1870																	270	644	623	333																	
B3340	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 4	18-Aug-22	15-Nov-22	1870																		291	623	644	312																
B3350	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 5	17-Sep-22	15-Dec-22	1870																			291	644	623	312															
B3360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นลาดฟ้า	17-Oct-22	15-Dec-22	623																				156	311	156															
B3370	งานทดสอบระบบ	16-Dec-22	30-Dec-22	2493																					2493																
วัสดุอุปกรณ์หลัก					10476																						489	917	2879	4261	1930										
B3410	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบบลิฟต์	19-Mar-22	14-Aug-22	0																																					
B3420	งานติดตั้งและทดสอบ ระบบลิฟต์	16-Aug-22	13-Nov-22	2752																	489	917	948	398																	
B3430	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	19-Jul-22	15-Oct-22	0																																					
B3440	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	17-Oct-22	15-Dec-22	1213																				303	607	303															
B3450	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	19-Jul-22	15-Oct-22	0																																					

S-Curve

Page 9 of 12

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23					
		26-Apr-21	14-Feb-23	1000000	3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0					
					3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000					
งานก่อสร้างอาคารสโมสร				34573											419	1332	2160	1745	2443	1941	3104	7756	8429	5244												
งานโครงสร้าง				9940											419	1332	2160	1745	2443	1841																
C0100	งานฐานราก	21-Jan-22	11-Mar-22	1904										419	1066	419																				
C0105	ตั้งไม้กับไม้ได้ดิน	10-Feb-22	11-Mar-22	420											266	154																				
C0110	งานโครงสร้าง ชั้น 1	12-Mar-22	10-Apr-22	2380												1587	793																			
C0115	งานโครงสร้าง ชั้นลอย	11-Apr-22	30-Apr-22	952													952																			
C0120	งานโครงสร้าง ชั้น 2	1-May-22	30-May-22	2380														2380																		
C0180	งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา	31-May-22	29-Jun-22	1904														63	1841																	
งานสถาปัตยกรรม				15042																					100	2683	4588	4663	3008							
C0210	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	15-Jul-22	12-Sep-22	4513																1279	2332	902														
C0215	งานสถาปัตยกรรม ชั้นลอย	14-Aug-22	12-Sep-22	1504																	902	602														
C0220	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	14-Aug-22	12-Oct-22	4513																		1354	2257	902												
C0260	งานสถาปัตยกรรม ชั้นศาลาฟ้า	13-Sep-22	12-Oct-22	1504																			902	602												
C0280	งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอนพร้อมฉนวน	30-Jun-22	14-Jul-22	1504															100	1404																
C0290	งานเก็บความเรียบร้อย	13-Oct-22	27-Oct-22	1504																				1504												
งานระบบประกอบอาคาร				4957																					421	1512	1538	1486								
C0310	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 1	15-Jul-22	12-Sep-22	1487																421	768	298														
C0315	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นลอย	14-Aug-22	12-Sep-22	496																	298	198														
C0320	งานระบบประกอบอาคาร ชั้น 2	14-Aug-22	12-Oct-22	1487																		446	744	297												
C0360	งานระบบประกอบอาคาร ชั้นศาลาฟ้า	13-Sep-22	12-Oct-22	496																			298	198												
C0370	งานทดสอบระบบ	13-Oct-22	27-Oct-22	991																				991												
วัสดุอุปกรณ์หลัก				4634																					1656	2228	750									
C0430	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	15-Jun-22	12-Aug-22	0																																
C0440	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	14-Aug-22	12-Sep-22	368																	221	147														
C0450	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	15-Jun-22	12-Aug-22	0																																
C0460	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	14-Aug-22	12-Sep-22	1560																	936	624														
C0470	งานผลิตและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	15-Jun-22	12-Aug-22	0																																
C0480	งานติดตั้งและทดสอบวัสดุอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า	14-Aug-22	12-Sep-22	831																	499	332														
C0490	งานติดตั้งและทดสอบ Software ระบบสื่อสาร	13-Sep-22	12-Oct-22	1875																			1125	750												

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23				
26-Apr-2114-Feb-231000000					3594	22279	33805	18888	26640	40637	45895	57955	67139	68930	58255	69555	82174	79985	60854	46860	49061	43279	46481	37138	37720	1981	895	0	0	0	0				
					3594	25873	59678	78566	105206	145843	191738	249693	316832	385762	444017	513572	595746	675731	736585	783445	832506	875785	922266	959404	997124	999105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000				
งานภายนอก				251487					3796	4466	17065	17596	19633	20550	22665	22489	24766	22475	23179	5372	6013	6013	10451	10694	7252	7012									
งานโยธภายนอก				146455					3796	4466	9051	9318	11619	12137	12297	12802	14039	10571	10824	4644	4799	4799	7077	7199	3567	3450									
E1100	กำแพงกันดิน (ระยะที่ 1)	1-Jul-21	31-Jan-22	26328				3796	3796	3674	3796	3674	3796	3796																					
E1200	กำแพงกันดิน (ระยะที่ 2)	1-Feb-22	31-May-22	14177											3308	3662	3545	3662																	
E2100	รั้วโครงการ (ระยะที่ 1)	1-Sep-21	3-Apr-22	7537						1052	1087	1052	1087	1087	980	1087	105																		
E2200	รั้วโครงการ (ระยะที่ 2)	4-Apr-22	30-Oct-22	7537													967	1113	1077	1113	1113	1077	1077												
E3100	ถนนและทางเท้า (ระยะที่ 1)	1-Nov-21	31-May-22	25209								3567	3686	3686	3331	3686	3567	3686																	
E3200	ถนนและทางเท้า (ระยะที่ 2)	1-Jun-22	29-Dec-22	25209															3567	3686	3686	3567	3686	3567	3450										
E4200	สะพาน และ Box Culvert	16-Aug-21	31-Jan-22	7073				670	1256	1297	1256	1297	1297	1297						3567	3686	3686	3567	3686	3567	3450									
E5100	บ่อพรวนน้ำฝน 2 (ระยะที่ 1)	18-Dec-21	31-Jan-22	426									133	293																					
E5200	บ่อพรวนน้ำฝน 1 (ระยะที่ 2)	1-Feb-22	17-Mar-22	437											272	165																			
E6100	โรงบำบัดน้ำเสีย	1-Sep-21	31-Jan-22	10554						2070	2138	2070	2138	2138																					
E7100	อาคารพักขยะ	1-Sep-21	30-Oct-21	1999						999	1000																								
E8100	ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 7	1-Feb-22	1-Apr-22	1082											505	559	18																		
E8120	ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 2	1-Feb-22	1-Apr-22	1623											757	839	27																		
E8140	ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 4	1-Feb-22	1-Apr-22	1623											757	839	27																		
E8160	ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 6	1-Feb-22	1-Apr-22	1623											757	839	27																		
E8210	ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 1	1-Sep-22	30-Oct-22	1623																		811	812												
E8230	ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 3	1-Sep-22	30-Oct-22	1623																		811	812												
E8250	ลานจอดรถยนต์และหลังคาคลุม อาคาร 5	1-Sep-22	30-Oct-22	1623																		811	812												
E9100	ป้อมรักษาการณ์ และทางเข้าออกโครงการ	1-Feb-22	31-May-22	9149											2135	2363	2288	2363																	
งานระบบภายนอกอาคาร				93048						8014	8278	8014	8413	10368	9687	10727	10381	10727					2110	2180	2110	2039									
U1100	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง (ระยะที่ 1)	30-Dec-21	31-May-22	10143									133	2055	1856	2055	1989	2055																	
U1200	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง (ระยะที่ 2)	1-Sep-22	29-Dec-22	8299																		2075	2144	2075	2005										
U2100	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ระยะที่ 1)	1-Sep-21	31-Jan-22	15813						3102	3203	3102	3203	3203																					
U2200	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)	1-Feb-22	31-May-22	12938											3019	3342	3235	3342																	
U3100	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (ระยะที่ 1)	1-Sep-21	31-Jan-22	11317						2219	2293	2219	2293	2293																					
U3200	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)	1-Feb-22	31-May-22	9259											2160	2392	2315	2392																	
U4100	งานระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 1)	1-Sep-21	31-Jan-22	13732						2693	2782	2693	2782	2782																					
U4200	งานระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 2)	1-Feb-22	31-May-22	11236											2622	2903	2808	2903																	
U5100	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ระยะที่ 1)	30-Dec-21	31-May-22	171									2	35	30	35	34	35																	
U5200	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ระยะที่ 2)	1-Sep-22	29-Dec-22	140																		35	36	35	34										
งานภูมิสถาปัตยกรรม				6302													1523	1628					53	1575	1523										
L0100	งานภูมิสถาปัตยกรรม (ระยะที่ 1)	2-Apr-22	31-May-22	3151													1523	1628																	
L0200	งานภูมิสถาปัตยกรรม (ระยะที่ 2)	31-Oct-22	29-Dec-22	3151																			53	1575	1523										
งานก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง				5682																	728	1214	1214	1264	1262										
R1200	สนามฟุตบอล	1-Jul-22	30-Oct-22	497																126	126	123	122												
R2200	สนามบาสเก็ตบอล	1-Jul-22	30-Oct-22	1323																336	336	326	325												
R3200	สนามเทนนิส	1-Jun-22	30-Oct-22	3688															728	752	752	728	728												
R4200	สนามเด็กเล่น	1-Sep-22	30-Oct-22	174																		87	87												
งานทดสอบระบบและส่งมอบ				10784																	4569	3339					1981	895							
T3100	งานทดสอบและอบรมการใช้งานระบบ (ระยะที่ 1)	5-Jun-22	19-Jul-22	7908															4569	3339															
T3200	งานทดสอบและอบรมการใช้งานระบบ (ระยะที่ 2)	1-Jan-23	14-Feb-23	2876																						1981	895								
T4100	งานขออนุญาตเปิดใช้อาคาร (ระยะที่ 1)	5-Jun-22	18-Jul-22	0																															
T4200	งานขออนุญาตเปิดใช้อาคาร (ระยะที่ 2)	1-Jan-23	13-Feb-23	0																															
T5100	งานทำความสะอาด และส่งมอบ (ระยะที่ 1)	5-Jun-22	18-Jul-22	0																															
T5200	งานทำความสะอาด และส่งมอบ (ระยะที่ 2)	1-Jan-23	13-Feb-23	0																															
% Monthly					0.3594%	2.2279%	3.3805%	1.8888%	2.6640%	4.0637%	4.5895%	5.7955%	6.7139%	6.8930%	5.8255%	6.9555%	8.2174%	7.9985%	6.0854%	4.6860%	4.9061%	4.3279%	4.6481%	3.7138%	3.7720%	0.1981%	0.0895%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%				
% Cumulative					0.3594%	2.5873%	5.9678%	7.8566%	10.5206%	14.5843%	19.1738%	24.9693%	31.6832%	38.5762%	44.4017%	51.3572%	59.5746%	67.5731%	73.6585%	78.3445%	83.2506%	87.5785%	92.2266%	95.9404%	99.7124%	99.9105%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%				

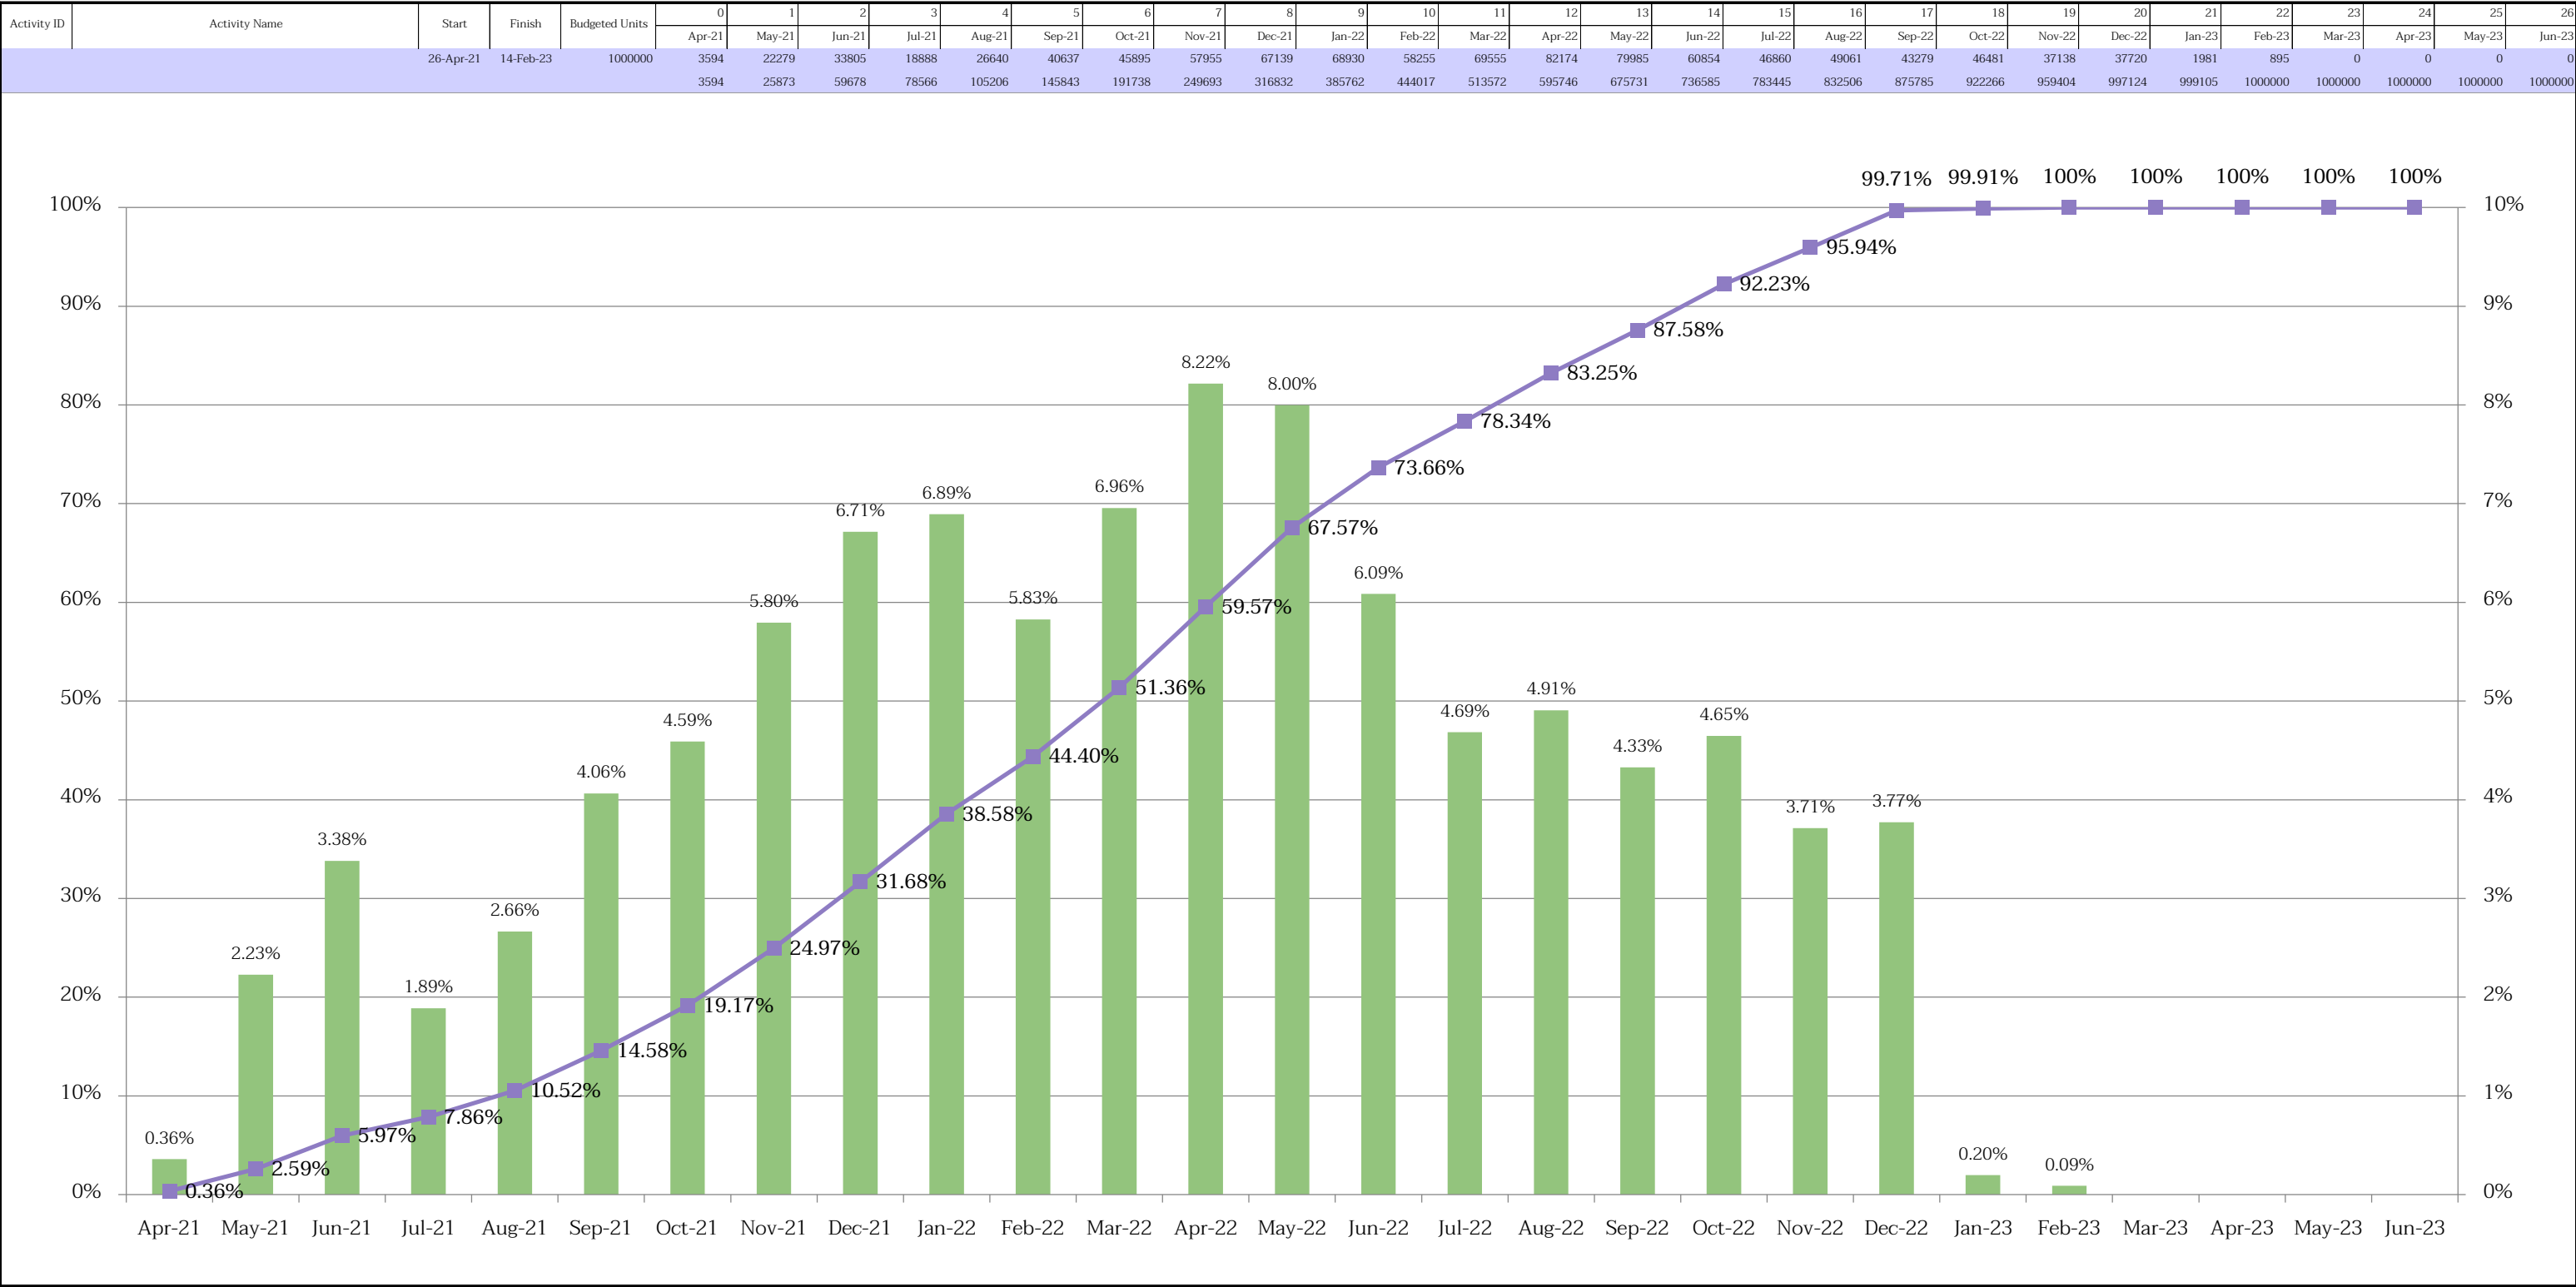

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง


โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2021	2022
1โครงการ : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต	720 days	Mon 4/26/21	Sat 4/15/23		Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec	Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2Site Preparation and Temporary Fence (ระยะที่ 1)	66 days	Mon 4/26/21	Wed 6/30/21		Apr 26 '21	
3งานปรับพื้นที่	36 days	Mon 4/26/21	Mon 5/31/21			
4งานติดตั้งรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ทำงาน	30 days	Tue 6/1/21	Wed 6/30/21	3	Jun 1 '21	
5งานเสาเข็มตอก (Driven Pile) รวมทั้งหมด 2,047 ต้น	122 days	Tue 6/1/21	Thu 9/30/21			
6เสาเข็มตอกขนาด 0.30x0.30 ม. (1,401 ต้น)	92 days	Tue 6/1/21	Tue 8/31/21			
7อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (288 ครอบครัว) อาคาร 2 (215 ต้น) ระยะที่ 1	45 days	Tue 6/1/21	Thu 7/15/21	3	Jun 1 '21	
8อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (288 ครอบครัว) อาคาร 4 (215 ต้น) ระยะที่ 1	45 days	Tue 6/1/21	Thu 7/15/21	3	Jun 1 '21	
9อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (288 ครอบครัว) อาคาร 6 (215 ต้น) ระยะที่ 1	45 days	Tue 6/1/21	Thu 7/15/21	3	Jun 1 '21	
10อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับผู้บริหาร 12 ครอบครัว (101 ต้น) ระยะที่ 1	25 days	Mon 6/21/21	Thu 7/15/21	3FS+20 days	Jun 21 '21	
11อาคารพักขยะรวมโครงการ (10 ต้น) ระยะที่ 1	2 days	Fri 7/16/21	Sat 7/17/21	8	Jul 16 '21	
12อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (288 ครอบครัว) อาคาร 1 (215 ต้น) ระยะที่ 2	45 days	Sun 7/18/21	Tue 8/31/21	9FS+2 days	Jul 18 '21	
13อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (288 ครอบครัว) อาคาร 3 (215 ต้น) ระยะที่ 2	45 days	Sun 7/18/21	Tue 8/31/21	7FS+2 days	Jul 18 '21	
14อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (288 ครอบครัว) อาคาร 5 (215 ต้น) ระยะที่ 2	45 days	Sun 7/18/21	Tue 8/31/21	11	Jul 18 '21	
15เสาเข็มตอกขนาด 0.22x0.22 ม. (83 ต้น)	16 days	Fri 7/16/21	Sat 7/31/21		Jul 16 '21	
16บ้านพัก ผอ.ท่าฯ (31 ต้น) ระยะที่ 1	6 days	Fri 7/16/21	Wed 7/21/21	10	Jul 16 '21	
17บ้านพัก รอง ผอ.ท่าฯ (52 ต้น) ระยะที่ 1	10 days	Thu 7/22/21	Sat 7/31/21	16	Jul 22 '21	
18เสาเข็มตอกขนาด 0.40x0.40 ม. (114 ต้น)	46 days	Sun 8/1/21	Wed 9/15/21		Aug 1 '21	
19สะพาน (32 ต้น) ระยะที่ 2	15 days	Sun 8/1/21	Sun 8/15/21	17	Aug 1 '21	
20อาคารสโมสร (82 ต้น) ระยะที่ 2	31 days	Mon 8/16/21	Wed 9/15/21	19	Aug 16 '21	
21เสาเข็มตอกขนาด 0.18x0.18 ม. (449 ต้น)	30 days	Wed 9/1/21	Thu 9/30/21		Sep 1 '21	
22หลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ อาคาร 2, 4, 6, 1, 3 & 5 (360 ต้น) + อาคาร 7 (32 ต้น) รวมเป็น (392 ต้น)	30 days	Wed 9/1/21	Thu 9/30/21	14	Sep 1 '21	
23สนามเทนนิส 2 สนาม (57 ต้น) ระยะที่ 2	15 days	Thu 9/16/21	Thu 9/30/21	20	Sep 16 '21	
24อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (อาคาร 2) ระยะที่ 1	414 days	Tue 6/1/21	Tue 7/19/22			
25Construction (Structure Work) ระยะที่ 1	234 days	Tue 6/1/21	Thu 1/20/22			
26อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (อาคาร 2)	234 days	Tue 6/1/21	Thu 1/20/22			
27งานเสาเข็ม คอ.	45 days	Tue 6/1/21	Thu 7/15/21		Jun 1 '21	
28งานตอกเสาเข็ม คอ. ขนาด 0.30x0.30 ม. (จำนวน 215 ต้น)	45 days	Tue 6/1/21	Thu 7/15/21	3	Jun 1 '21	
29งานฐานราก	50 days	Fri 7/16/21	Fri 9/3/21		Jul 16 '21	
30งานตัดเสาเข็ม (จำนวน 215 ต้น)	22 days	Fri 7/16/21	Fri 8/6/21	28	Jul 16 '21	
31งานโครงสร้างฐานราก	28 days	Sat 8/7/21	Fri 9/3/21	30	Aug 7 '21	
32งานโครงสร้างชั้นที่ 1	39 days	Sat 9/4/21	Tue 10/12/21		Sep 4 '21	
33งานเทเส้นและคานคอนกรีตรับพื้น RC. Slab	7 days	Sat 9/4/21	Fri 9/10/21	31	Sep 4 '21	
34งานโครงสร้างพื้น RC. Slab + งานเดินท่อระบบป้องกันปลวก	10 days	Sat 9/11/21	Mon 9/20/21	33	Sep 11 '21	
35งานเทพื้น + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น 2	7 days	Tue 9/21/21	Mon 9/27/21	34	Sep 21 '21	
36งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 1	15 days	Tue 9/28/21	Tue 10/12/21	35	Sep 28 '21	
37งานโครงสร้างชั้นที่ 2	36 days	Tue 9/28/21	Tue 11/2/21		Sep 28 '21	
38งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม และลวดสลิงค์ + เทคอนกรีตพื้น PTS ชั้นที่ 2	7 days	Tue 9/28/21	Mon 10/4/21	35	Sep 28 '21	
39งานตั้งลวดสลิงค์ PTS ชั้นที่ 2	7 days	Tue 10/5/21	Mon 10/11/21	38	Oct 5 '21	
40งานเทพื้น + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น 3	7 days	Tue 10/12/21	Mon 10/18/21	39	Oct 12 '21	
41งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 2	15 days	Tue 10/19/21	Tue 11/2/21	40	Oct 19 '21	
42งานโครงสร้างชั้นที่ 3	36 days	Tue 10/19/21	Tue 11/23/21		Oct 19 '21	
43งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม และลวดสลิงค์ + เทคอนกรีตพื้น PTS ชั้นที่ 3	7 days	Tue 10/19/21	Mon 10/25/21	40	Oct 19 '21	
44งานตั้งลวดสลิงค์ PTS ชั้นที่ 3	7 days	Tue 10/26/21	Mon 11/1/21	43	Oct 26 '21	
45งานเทพื้น + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น 4	7 days	Tue 11/2/21	Mon 11/8/21	44	Nov 2 '21	
46งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 3	15 days	Tue 11/9/21	Tue 11/23/21	45	Nov 9 '21	
47งานโครงสร้างชั้นที่ 4	36 days	Tue 11/9/21	Tue 12/14/21		Nov 9 '21	
48งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม และลวดสลิงค์ + เทคอนกรีตพื้น PTS ชั้นที่ 4	7 days	Tue 11/9/21	Mon 11/15/21	45	Nov 9 '21	
49งานตั้งลวดสลิงค์ PTS ชั้นที่ 4	7 days	Tue 11/16/21	Mon 11/22/21	48	Nov 16 '21	
50งานเทพื้น + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น 5	7 days	Tue 11/23/21	Mon 11/29/21	49	Nov 23 '21	
51งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 4	15 days	Tue 11/30/21	Tue 12/14/21	50	Nov 30 '21	
52งานโครงสร้างชั้นที่ 5	36 days	Tue 11/30/21	Tue 1/4/22		Nov 30 '21	
53งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม และลวดสลิงค์ + เทคอนกรีตพื้น PTS ชั้นที่ 5	7 days	Tue 11/30/21	Mon 12/6/21	50	Nov 30 '21	
54งานตั้งลวดสลิงค์ PTS ชั้นที่ 5	7 days	Tue 12/7/21	Mon 12/13/21	53	Dec 7 '21	
55งานเทพื้น + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นหลังคา	7 days	Tue 12/14/21	Mon 12/20/21	54	Dec 14 '21	
56งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 5	15 days	Tue 12/21/21	Tue 1/4/22	55	Dec 21 '21	
57งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า	11 days	Tue 12/21/21	Fri 12/31/21		Dec 21 '21	
58งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม + เทคอนกรีตพื้น RC. ชั้นดาดฟ้า	5 days	Tue 12/21/21	Sat 12/25/21	55	Dec 21 '21	
59งานเทพื้น + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น Roof Slab	6 days	Sun 12/26/21	Fri 12/31/21	58	Dec 26 '21	
60งานโครงสร้างชั้นหลังคา	14 days	Sat 1/1/22	Fri 1/14/22		Jan 1 '22	
61งานหล่อคอนกรีตคานพื้น Roof Slab ชั้นหลังคา	7 days	Sat 1/1/22	Fri 1/7/22	59	Jan 1 '22	
62งานโครงสร้างพื้น Roof Slab ชั้นหลังคา	7 days	Sat 1/8/22	Fri 1/14/22	61	Jan 8 '22	
63งานติดตั้งหลังคา	31 days	Tue 12/21/21	Thu 1/20/22		Dec 21 '21	
64งานคาน ค.ส.ล. + พื้น ค.ส.ล. ราน้ำ	16 days	Tue 12/21/21	Wed 1/5/22	55	Dec 21 '21	
65งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับหลังคา	15 days	Thu 1/6/22	Thu 1/20/22	64	Jan 6 '22	
66Construction (Architecture Work) ระยะที่ 1	239 days	Tue 11/23/21	Tue 7/19/22			
67อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน (ระดับ 1-8) อาคาร 2	239 days	Tue 11/23/21	Tue 7/19/22			
68งานมุงหลังคาเหล็กีร็อลอนพร้อมฉนวน	14 days	Fri 1/21/22	Thu 2/3/22			
69งานมุงหลังคาเหล็กีร็อลอนพร้อมฉนวน	14 days	Fri 1/21/22	Thu 2/3/22	65		
70งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 1	104 days	Tue 11/23/21	Sun 3/6/22			
71งานผนังอาคาร	15 days	Tue 11/23/21	Tue 12/7/21			
72งานก่ออิฐผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 1	15 days	Tue 11/23/21	Tue 12/7/21	49SS+7 days	Nov 23 '21	
73งานก่ออิฐผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 1	15 days	Tue 11/23/21	Tue 12/7/21	49SS+7 days	Nov 23 '21	
74งานฉนวนผนัง	20 days	Tue 11/30/21	Sun 12/19/21		Nov 30 '21	
75งานฉนวนผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Tue 11/30/21	Sun 12/19/21	72SS+7 days	Nov 30 '21	
76งานฉนวนผนังด้านในอาคาร และงานกรุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 1	15 days	Tue 11/30/21	Tue 12/14/21	73SS+7 days	Nov 30 '21	
77งานพื้นอาคาร	40 days	Wed 1/19/22	Sun 2/27/22			
78งานตกแต่งผิวพื้น และงานปูกระเบื้องพื้น ภายในอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Wed 1/19/22	Mon 2/7/22	83	Jan 19 '22	
79งานฉนวนภายในอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Wed 1/19/22	Mon 2/7/22	83	Jan 19 '22	
80งานบันได และส่วนประกอบบันได ชั้นที่ 1	20 days	Tue 2/8/22	Sun 2/27/22	79	Feb 8 '22	
81งานประตุนำต่าง	15 days	Mon 12/20/21	Mon 1/3/22		Dec 20 '21	
82งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 1	15 days	Mon 12/20/21	Mon 1/3/22	74	Dec 20 '21	
83งานฝ้าเพดาน	15 days	Tue 1/4/22	Tue 1/18/22		Jan 4 '22	
84งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1	15 days	Tue 1/4/22	Tue 1/18/22	81	Jan 4 '22	
85งานทาสี	7 days	Mon 2/28/22	Sun 3/6/22			
86งานทาสีภายในอาคาร ชั้นที่ 1	7 days	Mon 2/28/22	Sun 3/6/22	77	Feb 28 '22	
87งานทาสีภายนอกอาคาร ชั้นที่ 1	7 days	Mon 2/28/22	Sun 3/6/22	77	Feb 28 '22	

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

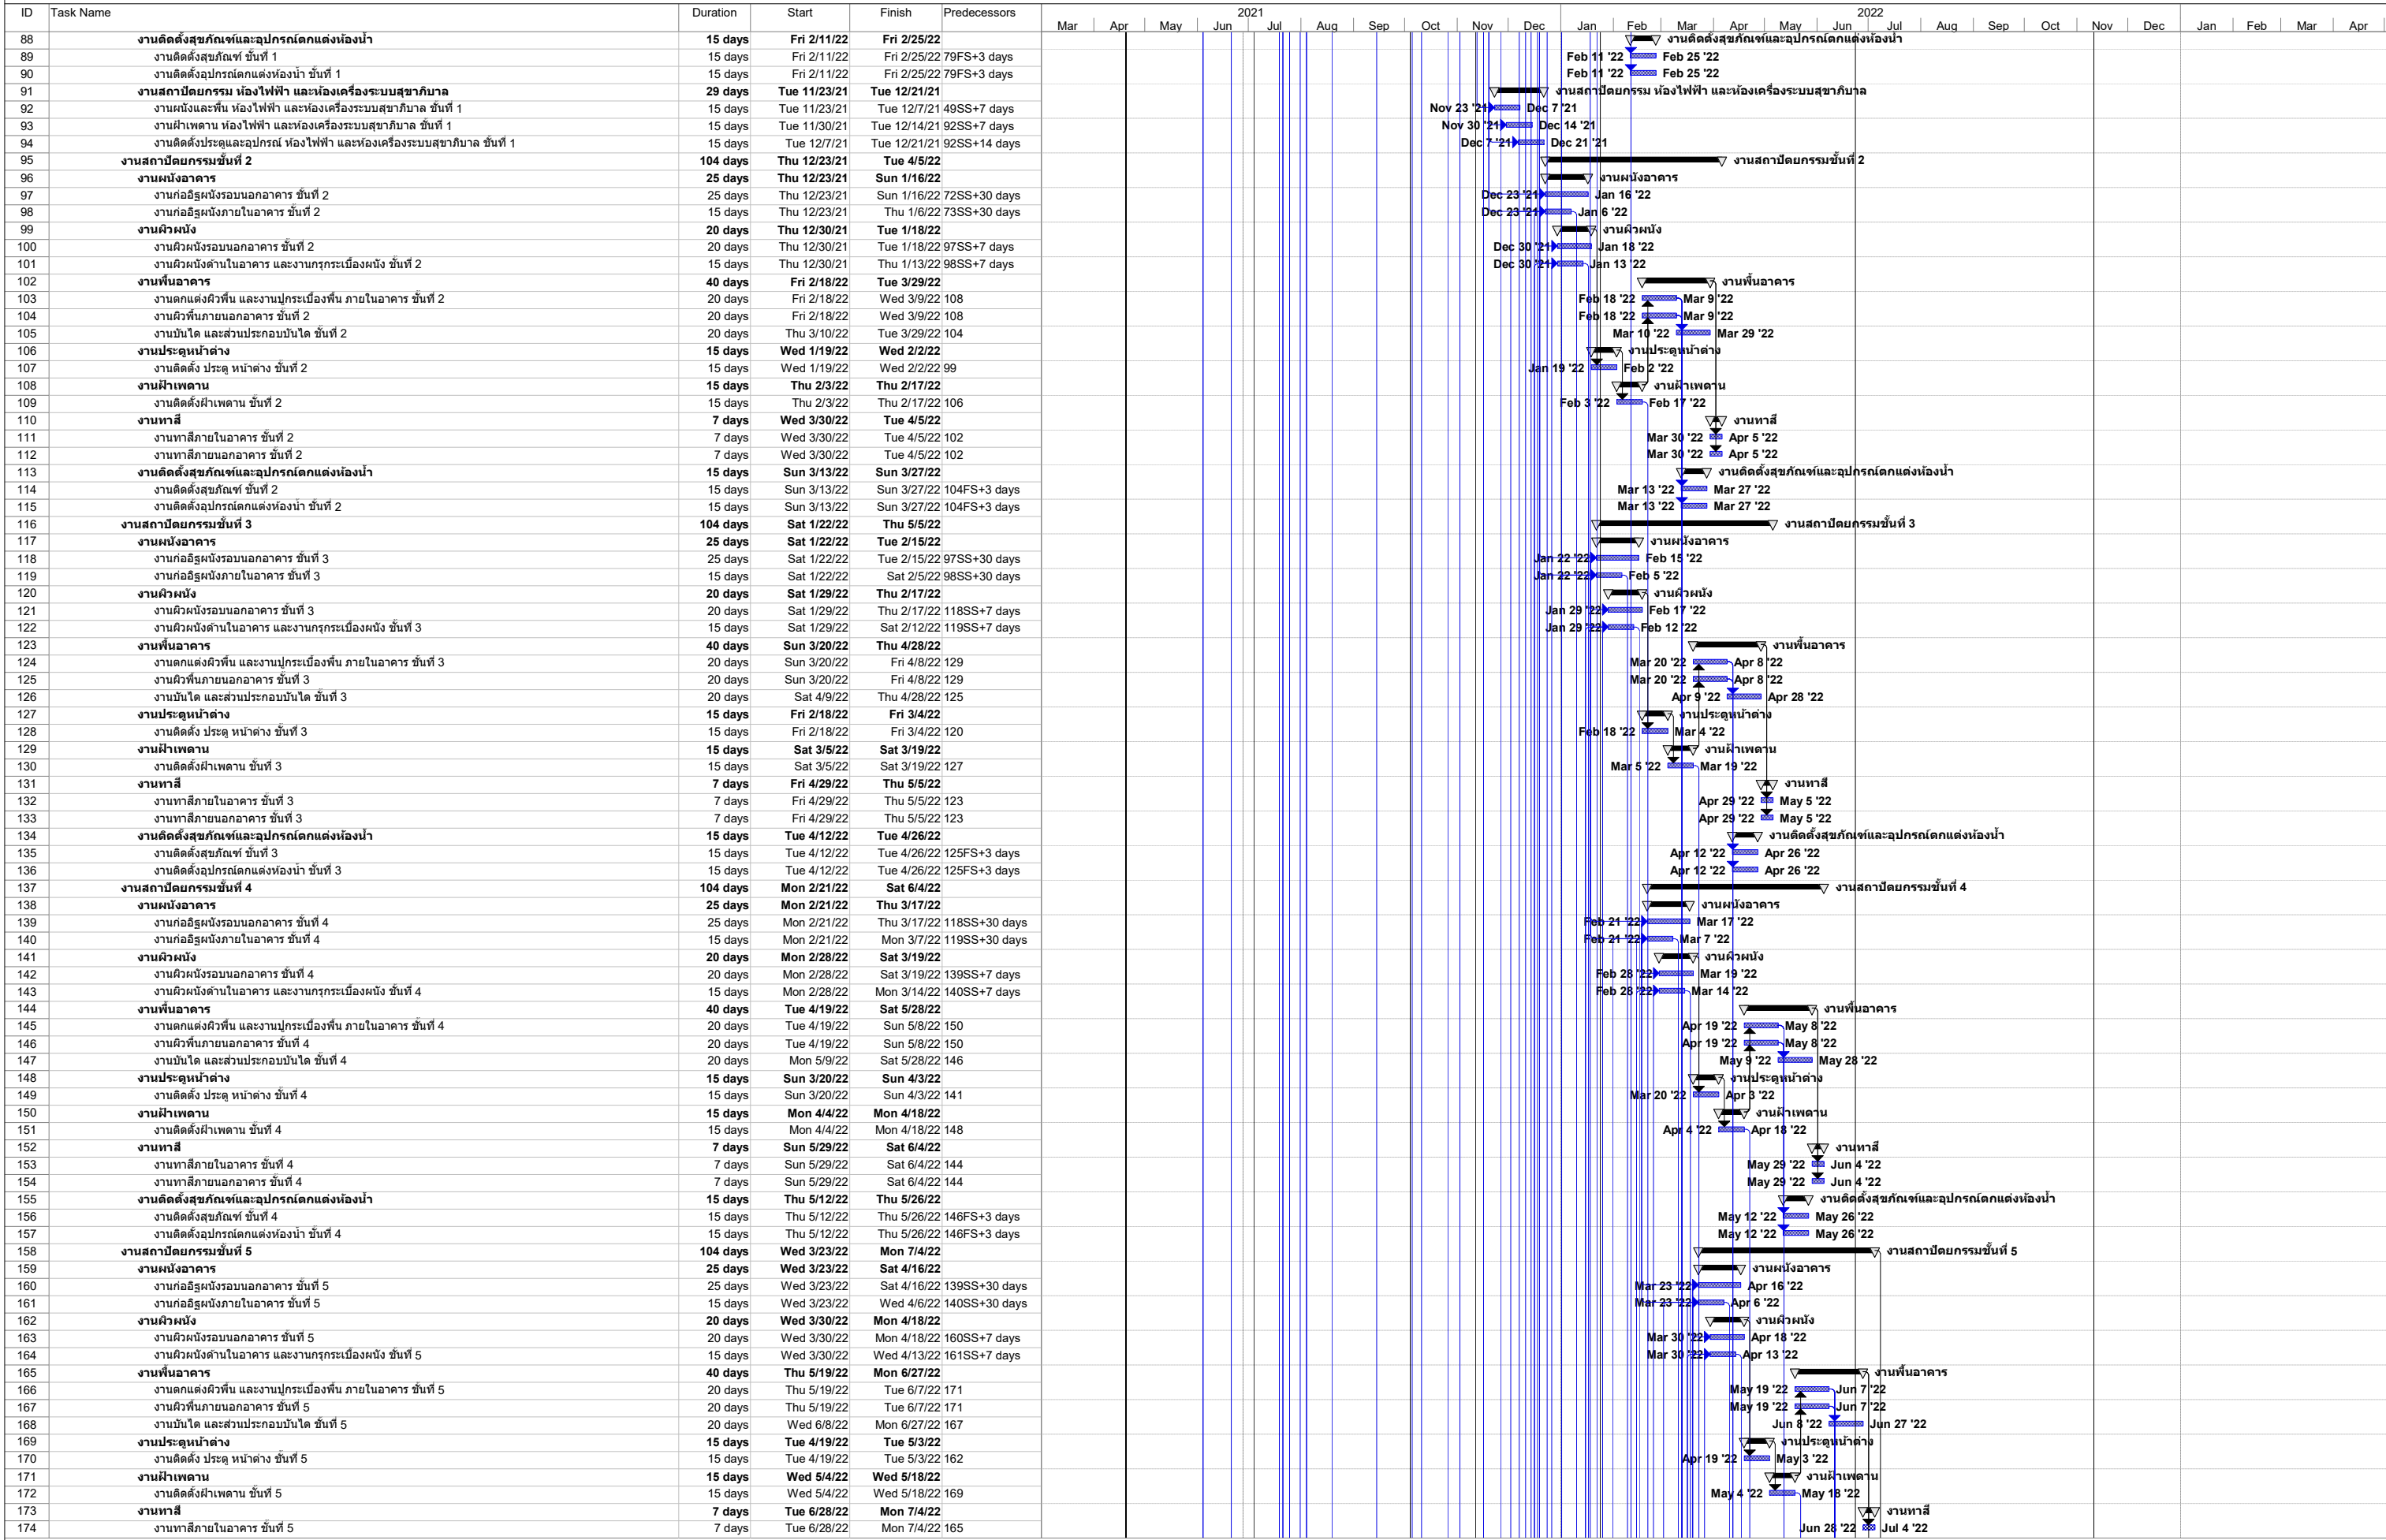

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
175	งานทาสีภายนอกอาคาร ชั้นที่ 5	7 days	Tue 6/28/22	Mon 7/4/22	165																										
176	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ	15 days	Sat 6/11/22	Sat 6/25/22																											
177	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 5	15 days	Sat 6/11/22	Sat 6/25/22	167FS+3 days																										
178	งานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ ชั้นที่ 5	15 days	Sat 6/11/22	Sat 6/25/22	167FS+3 days																										
179	งานสถาปัตยกรรมชั้นดาดฟ้า	86 days	Fri 4/22/22	Sat 7/16/22																											
180	งานผนังอาคาร	15 days	Fri 4/22/22	Fri 5/6/22																											
181	งานก่ออิฐผนังรอบนอกอาคาร ชั้นดาดฟ้า	15 days	Fri 4/22/22	Fri 5/6/22	160SS+30 days																										
182	งานก่ออิฐผนังภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า	15 days	Fri 4/22/22	Fri 5/6/22	161SS+30 days																										
183	งานคิ้วผนัง	20 days	Fri 4/29/22	Wed 5/18/22																											
184	งานคิ้วผนังรอบนอกอาคาร ชั้นดาดฟ้า	20 days	Fri 4/29/22	Wed 5/18/22	181SS+7 days																										
185	งานคิ้วผนัง ห้องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้า	15 days	Fri 4/29/22	Fri 5/13/22	182SS+7 days																										
186	งานประตูหน้าต่าง	12 days	Thu 5/19/22	Mon 5/30/22																											
187	งานติดตั้ง ประตูและอุปกรณ์ ชั้นดาดฟ้า	12 days	Thu 5/19/22	Mon 5/30/22	183																										
188	งานพื้น + เพดานอาคาร	40 days	Tue 5/31/22	Sat 7/9/22																											
189	งานเพดาน หลังคาช่องลิฟท์และบันได	20 days	Tue 5/31/22	Sun 6/19/22	186																										
190	งานคิ้วพื้นและระบบกันซึม ชั้นดาดฟ้า	20 days	Mon 6/20/22	Sat 7/9/22	189																										
191	งานบันได และส่วนประกอบบันได ชั้นดาดฟ้า	20 days	Mon 6/20/22	Sat 7/9/22	189																										
192	งานสถาปัตยกรรม ห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล	45 days	Thu 5/19/22	Sat 7/2/22																											
193	งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ ห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า	15 days	Thu 5/19/22	Thu 6/2/22	183																										
194	งานเพดาน ห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า	15 days	Fri 6/3/22	Fri 6/17/22	193																										
195	งานผนังและพื้น ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า	15 days	Sat 6/18/22	Sat 7/2/22	194																										
196	งานทาสี	7 days	Sun 7/10/22	Sat 7/16/22																											
197	งานทาสีภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า	7 days	Sun 7/10/22	Sat 7/16/22	188																										
198	งานทาสีภายนอกอาคาร ชั้นดาดฟ้า	7 days	Sun 7/10/22	Sat 7/16/22	188																										
199	งานพื้นหลังคา	15 days	Thu 5/19/22	Thu 6/2/22																											
200	งานคิ้วพื้นและระบบกันซึม หลังคา	15 days	Thu 5/19/22	Thu 6/2/22	183																										
201	เก็บงานตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอก (อาคาร 2)	15 days	Tue 7/5/22	Tue 7/19/22																											
202	เก็บงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน และภายนอก อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับ 1-8 (อาคาร 2)	15 days	Tue 7/5/22	Tue 7/19/22	158																										
203	Construction (System Work) ระยะที่ 1	347 days	Sat 8/7/21	Tue 7/19/22																											
204	อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน (ระดับ 1-8) อาคาร 2	347 days	Sat 8/7/21	Tue 7/19/22																											
205	งานระบบห้องเครื่องชั้นที่ 1	53 days	Tue 11/23/21	Fri 1/14/22																											
206	งานระบบไฟฟ้า	25 days	Tue 11/23/21	Fri 12/17/21																											
207	งานเดินท่อ ร้อยสายและแสงสว่าง ห้องชั้นที่ 1	15 days	Tue 11/23/21	Tue 12/7/21	73SS																										
208	งานทดสอบระบบไฟฟ้า ห้องชั้นที่ 1	10 days	Wed 12/8/21	Fri 12/17/21	207																										
209	งานระบบดับเพลิง	20 days	Sat 12/18/21	Thu 1/6/22																											
210	งานติดตั้งระบบดับเพลิง ห้องชั้นที่ 1	10 days	Sat 12/18/21	Mon 12/27/21	208																										
211	งานทดสอบระบบดับเพลิง ห้องชั้นที่ 1	10 days	Tue 12/28/21	Thu 1/6/22	210																										
212	ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	20 days	Sat 12/18/21	Thu 1/6/22																											
213	ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ห้องชั้นที่ 1	10 days	Sat 12/18/21	Mon 12/27/21	208																										
214	งานทดสอบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ห้องชั้นที่ 1	10 days	Tue 12/28/21	Thu 1/6/22	213																										
215	ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้	20 days	Sat 12/18/21	Thu 1/6/22																											
216	ระบบแจ้งเตือน Fire Alarm ห้องชั้นที่ 1	10 days	Sat 12/18/21	Mon 12/27/21	208																										
217	ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน Emergency ห้องชั้นที่ 1	10 days	Sat 12/18/21	Mon 12/27/21	208																										
218	งานทดสอบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ห้องชั้นที่ 1	10 days	Tue 12/28/21	Thu 1/6/22	217																										
219	ระบบอุปกรณ์พิเศษ	22 days	Fri 12/24/21	Fri 1/14/22																											
220	ติดตั้งระบบ CCTV ห้องชั้นที่ 1	10 days	Fri 12/24/21	Sun 1/2/22	208FS+6 days																										
221	ติดตั้งระบบ ปิด-เปิดประตู (Access Control System) ห้องชั้นที่ 1	10 days	Sun 12/26/21	Tue 1/4/22	220SS+2 days																										
222	งานทดสอบระบบอุปกรณ์พิเศษ ห้องชั้นที่ 1	10 days	Wed 1/5/22	Fri 1/14/22	221																										
223	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	210 days	Tue 11/9/21	Mon 6/6/22																											
224	ระบบประปา (CW)	174 days	Wed 12/8/21	Mon 5/30/22																											
225	งานชั้นที่ 1 (CW)	12 days	Wed 12/8/21	Sun 12/19/21	73																										
226	งานชั้นที่ 2 (CW)	12 days	Fri 1/7/22	Tue 1/18/22	98																										
227	งานชั้นที่ 3 (CW)	12 days	Sun 2/6/22	Thu 2/17/22	119																										
228	งานชั้นที่ 4 (CW)	12 days	Tue 3/8/22	Sat 3/19/22	140																										
229	งานชั้นที่ 5 (CW)	12 days	Thu 4/7/22	Mon 4/18/22	161																										
230	งานชั้นดาดฟ้า (CW)	12 days	Sat 5/7/22	Wed 5/18/22	182																										
231	Individual Test (CW)	12 days	Thu 5/19/22	Mon 5/30/22	230																										
232	ระบบระบายน้ำเสีย (S,W,V)	174 days	Tue 11/9/21	Sun 5/1/22																											
233	งานชั้นที่ 1 (S,W,V)	12 days	Tue 11/9/21	Sat 11/20/21	73SS-14 days																										
234	งานชั้นที่ 2 (S,W,V)	12 days	Thu 12/9/21	Mon 12/20/21	98SS-14 days																										
235	งานชั้นที่ 3 (S,W,V)	12 days	Sat 1/8/22	Wed 1/19/22	119SS-14 days																										
236	งานชั้นที่ 4 (S,W,V)	12 days	Mon 2/7/22	Fri 2/18/22	140SS-14 days																										
237	งานชั้นที่ 5 (S,W,V)	12 days	Wed 3/9/22	Sun 3/20/22	161SS-14 days																										
238	งานชั้นดาดฟ้า (S,W,V)	12 days	Fri 4/8/22	Tue 4/19/22	182SS-14 days																										
239	Individual Test (S,W,V)	12 days	Wed 4/20/22	Sun 5/1/22	238																										
240	ระบบดับเพลิง (FP)	174 days	Wed 12/15/21	Mon 6/6/22																											
241	งานชั้นที่ 1 (FP)	12 days	Wed 12/15/21	Sun 12/26/21	76																										
242	งานชั้นที่ 2 (FP)	12 days	Fri 1/14/22	Tue 1/25/22	101																										
243	งานชั้นที่ 3 (FP)	12 days	Sun 2/13/22	Thu 2/24/22	122																										
244	งานชั้นที่ 4 (FP)	12 days	Tue 3/15/22	Sat 3/26/22	143																										


[illegible]

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง



แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

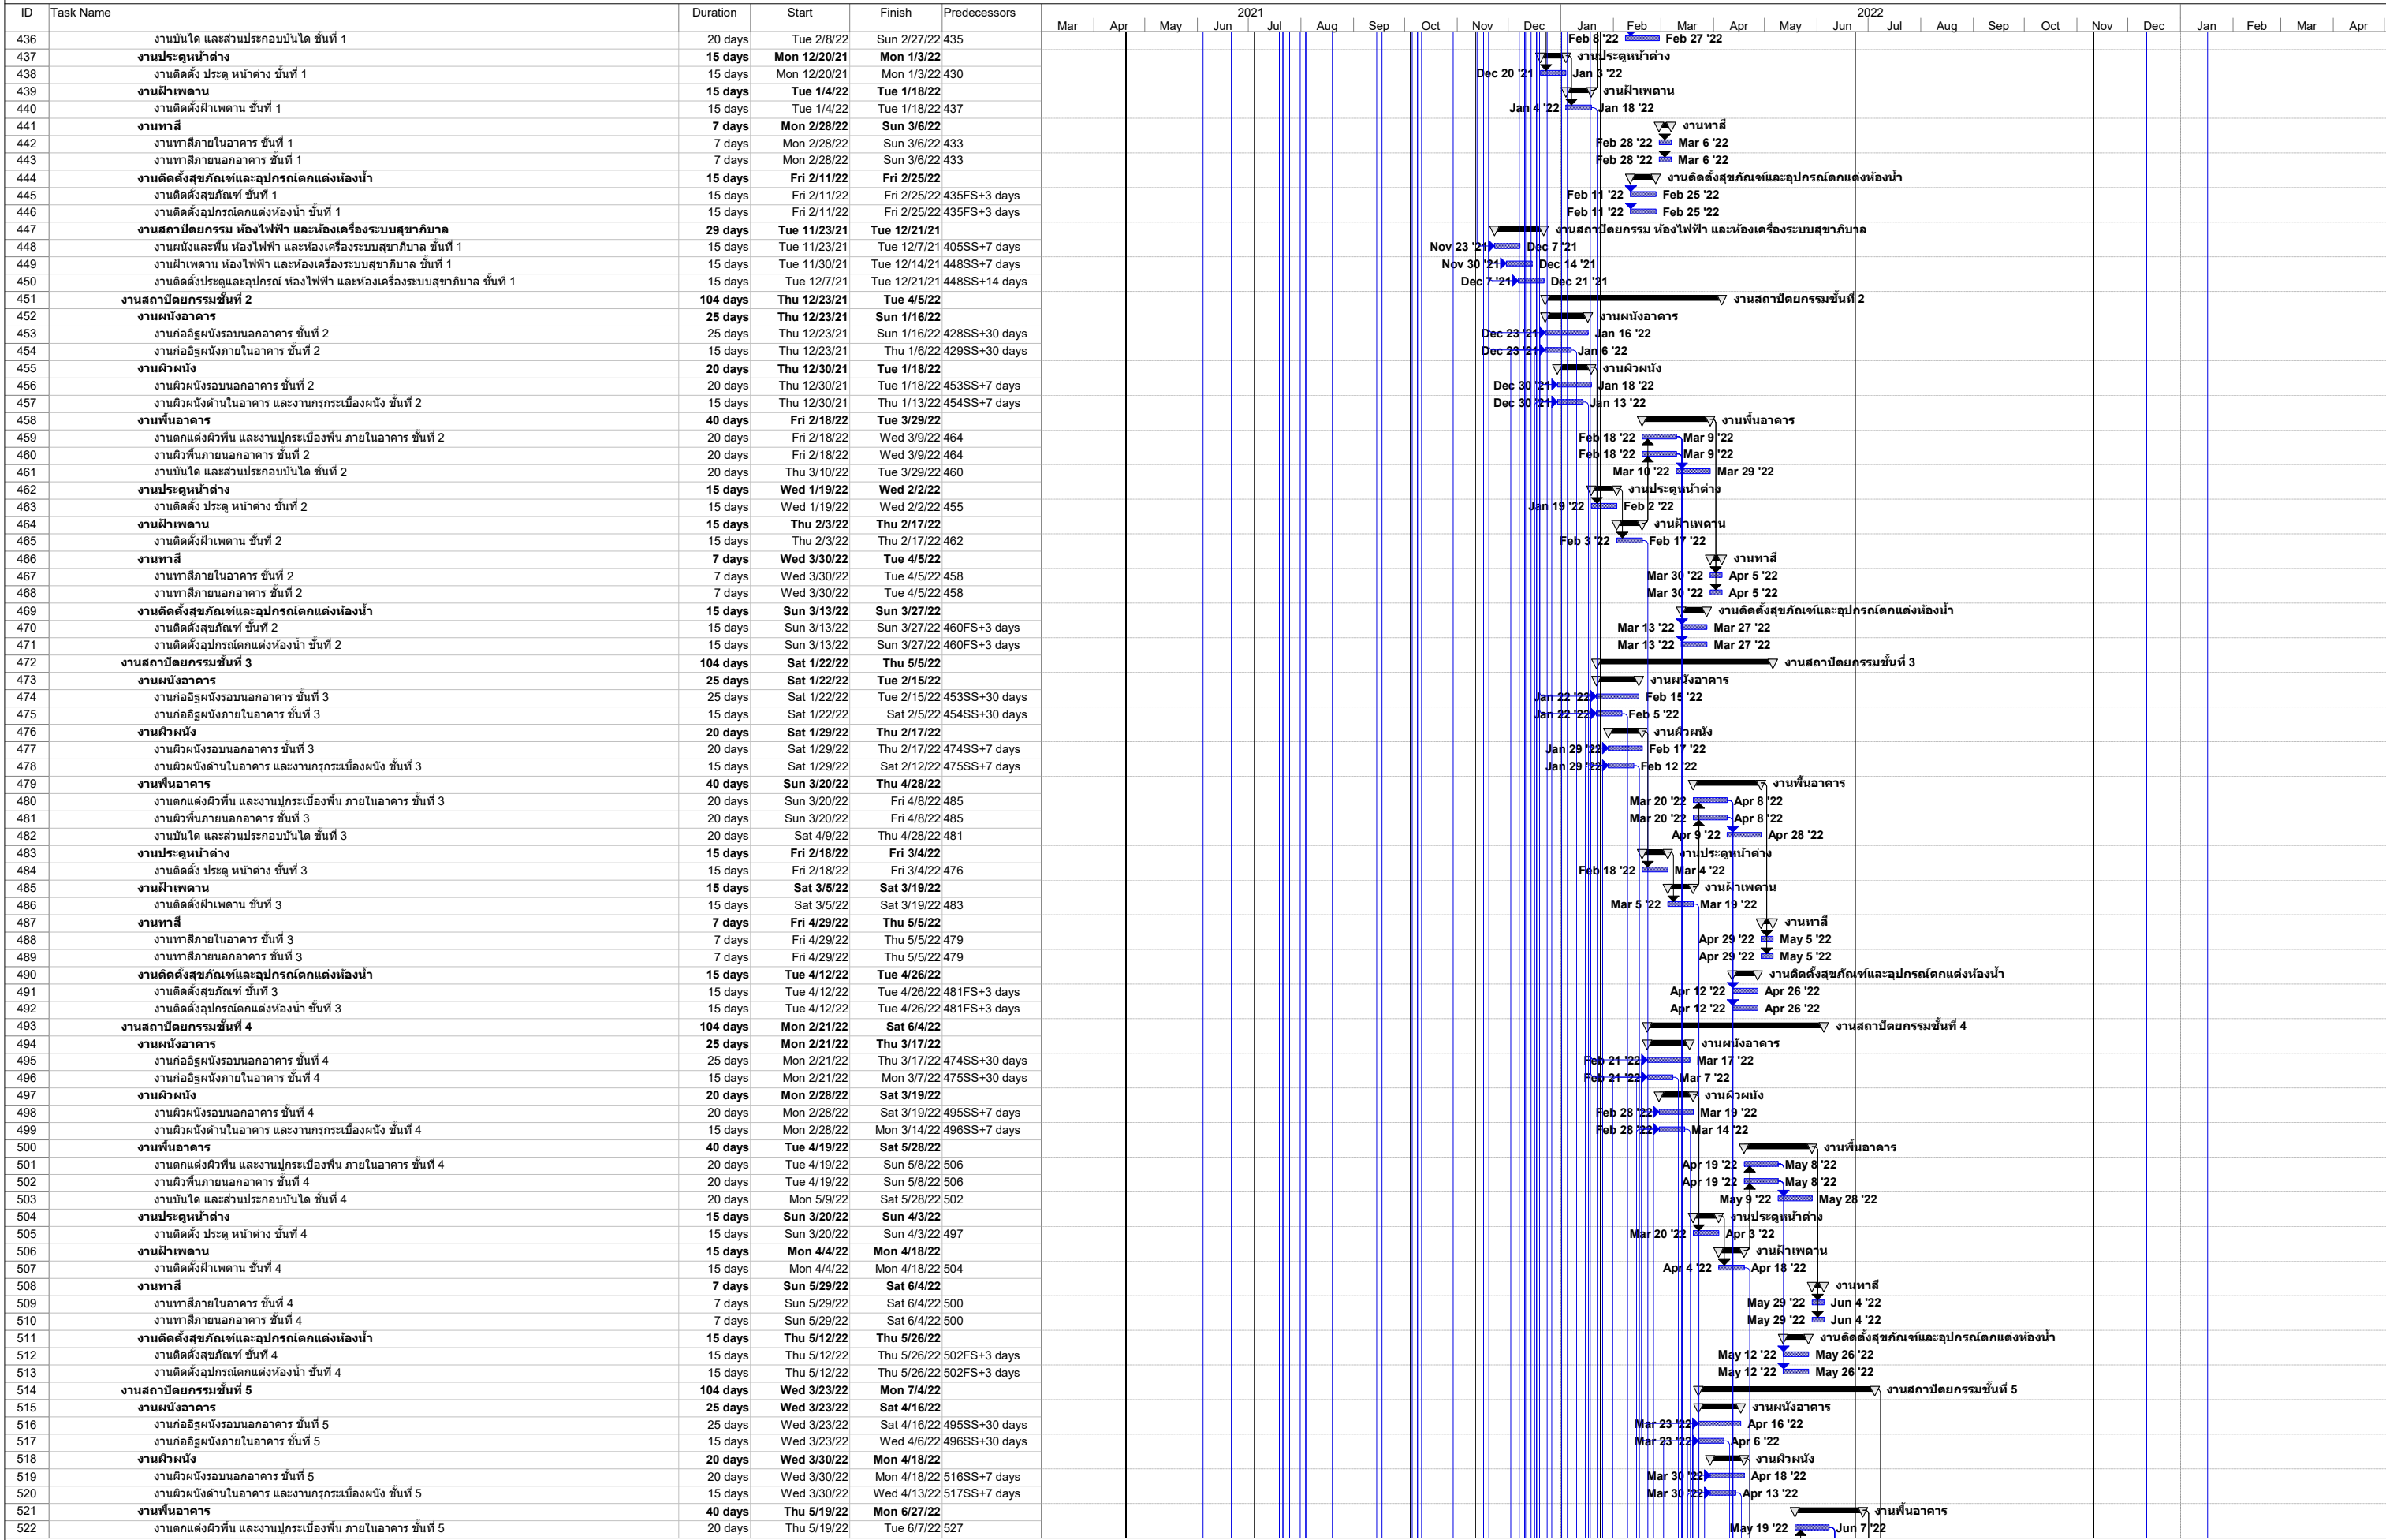


Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
523	งานคิวพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 5	20 days	Thu 5/19/22	Tue 6/7/22 527																May 19 '22	Jun 7 '22										
524	งานบันได และส่วนประกอบบันได ชั้นที่ 5	20 days	Wed 6/8/22	Mon 6/27/22 523																Jun 8 '22	Jun 27 '22										
525	งานประตูหน้าต่าง	15 days	Tue 4/19/22	Tue 5/3/22																Apr 19 '22	May 3 '22										
526	งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 5	15 days	Tue 4/19/22	Tue 5/3/22 518																May 4 '22	May 18 '22										
527	งานฝ้าเพดาน	15 days	Wed 5/4/22	Wed 5/18/22																											
528	งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 5	15 days	Wed 5/4/22	Wed 5/18/22 525																											
529	งานทาสี	7 days	Tue 6/28/22	Mon 7/4/22																											
530	งานทาสีภายในอาคาร ชั้นที่ 5	7 days	Tue 6/28/22	Mon 7/4/22 521																											
531	งานทาสีภายนอกอาคาร ชั้นที่ 5	7 days	Tue 6/28/22	Mon 7/4/22 521																											
532	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ	15 days	Sat 6/11/22	Sat 6/25/22																											
533	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 5	15 days	Sat 6/11/22	Sat 6/25/22 523FS+3 days																											
534	งานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ ชั้นที่ 5	15 days	Sat 6/11/22	Sat 6/25/22 523FS+3 days																											
535	งานสถาปัตยกรรมชั้นดาดฟ้า	86 days	Fri 4/22/22	Sat 7/16/22																											
536	งานผนังอาคาร	15 days	Fri 4/22/22	Fri 5/6/22																											
537	งานก่อสร้างผนังรอบนอกอาคาร ชั้นดาดฟ้า	15 days	Fri 4/22/22	Fri 5/6/22 516SS+30 days																											
538	งานก่อสร้างผนังภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า	15 days	Fri 4/22/22	Fri 5/6/22 517SS+30 days																											
539	งานค้ำหลัง	20 days	Fri 4/29/22	Wed 5/18/22																											
540	งานค้ำหลังผนังรอบนอกอาคาร ชั้นดาดฟ้า	20 days	Fri 4/29/22	Wed 5/18/22 537SS+7 days																											
541	งานค้ำหลัง หลังลิฟท์ ชั้นดาดฟ้า	15 days	Fri 4/29/22	Fri 5/13/22 538SS+7 days																											
542	งานประตูหน้าต่าง	12 days	Thu 5/19/22	Mon 5/30/22																											
543	งานติดตั้ง ประตูและอุปกรณ์ ชั้นดาดฟ้า	12 days	Thu 5/19/22	Mon 5/30/22 539																											
544	งานพื้น + เพดานอาคาร	40 days	Tue 5/31/22	Sat 7/9/22																											
545	งานเพดาน หลังคาช่องลิฟท์และบันได	20 days	Tue 5/31/22	Sun 6/19/22																											


Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

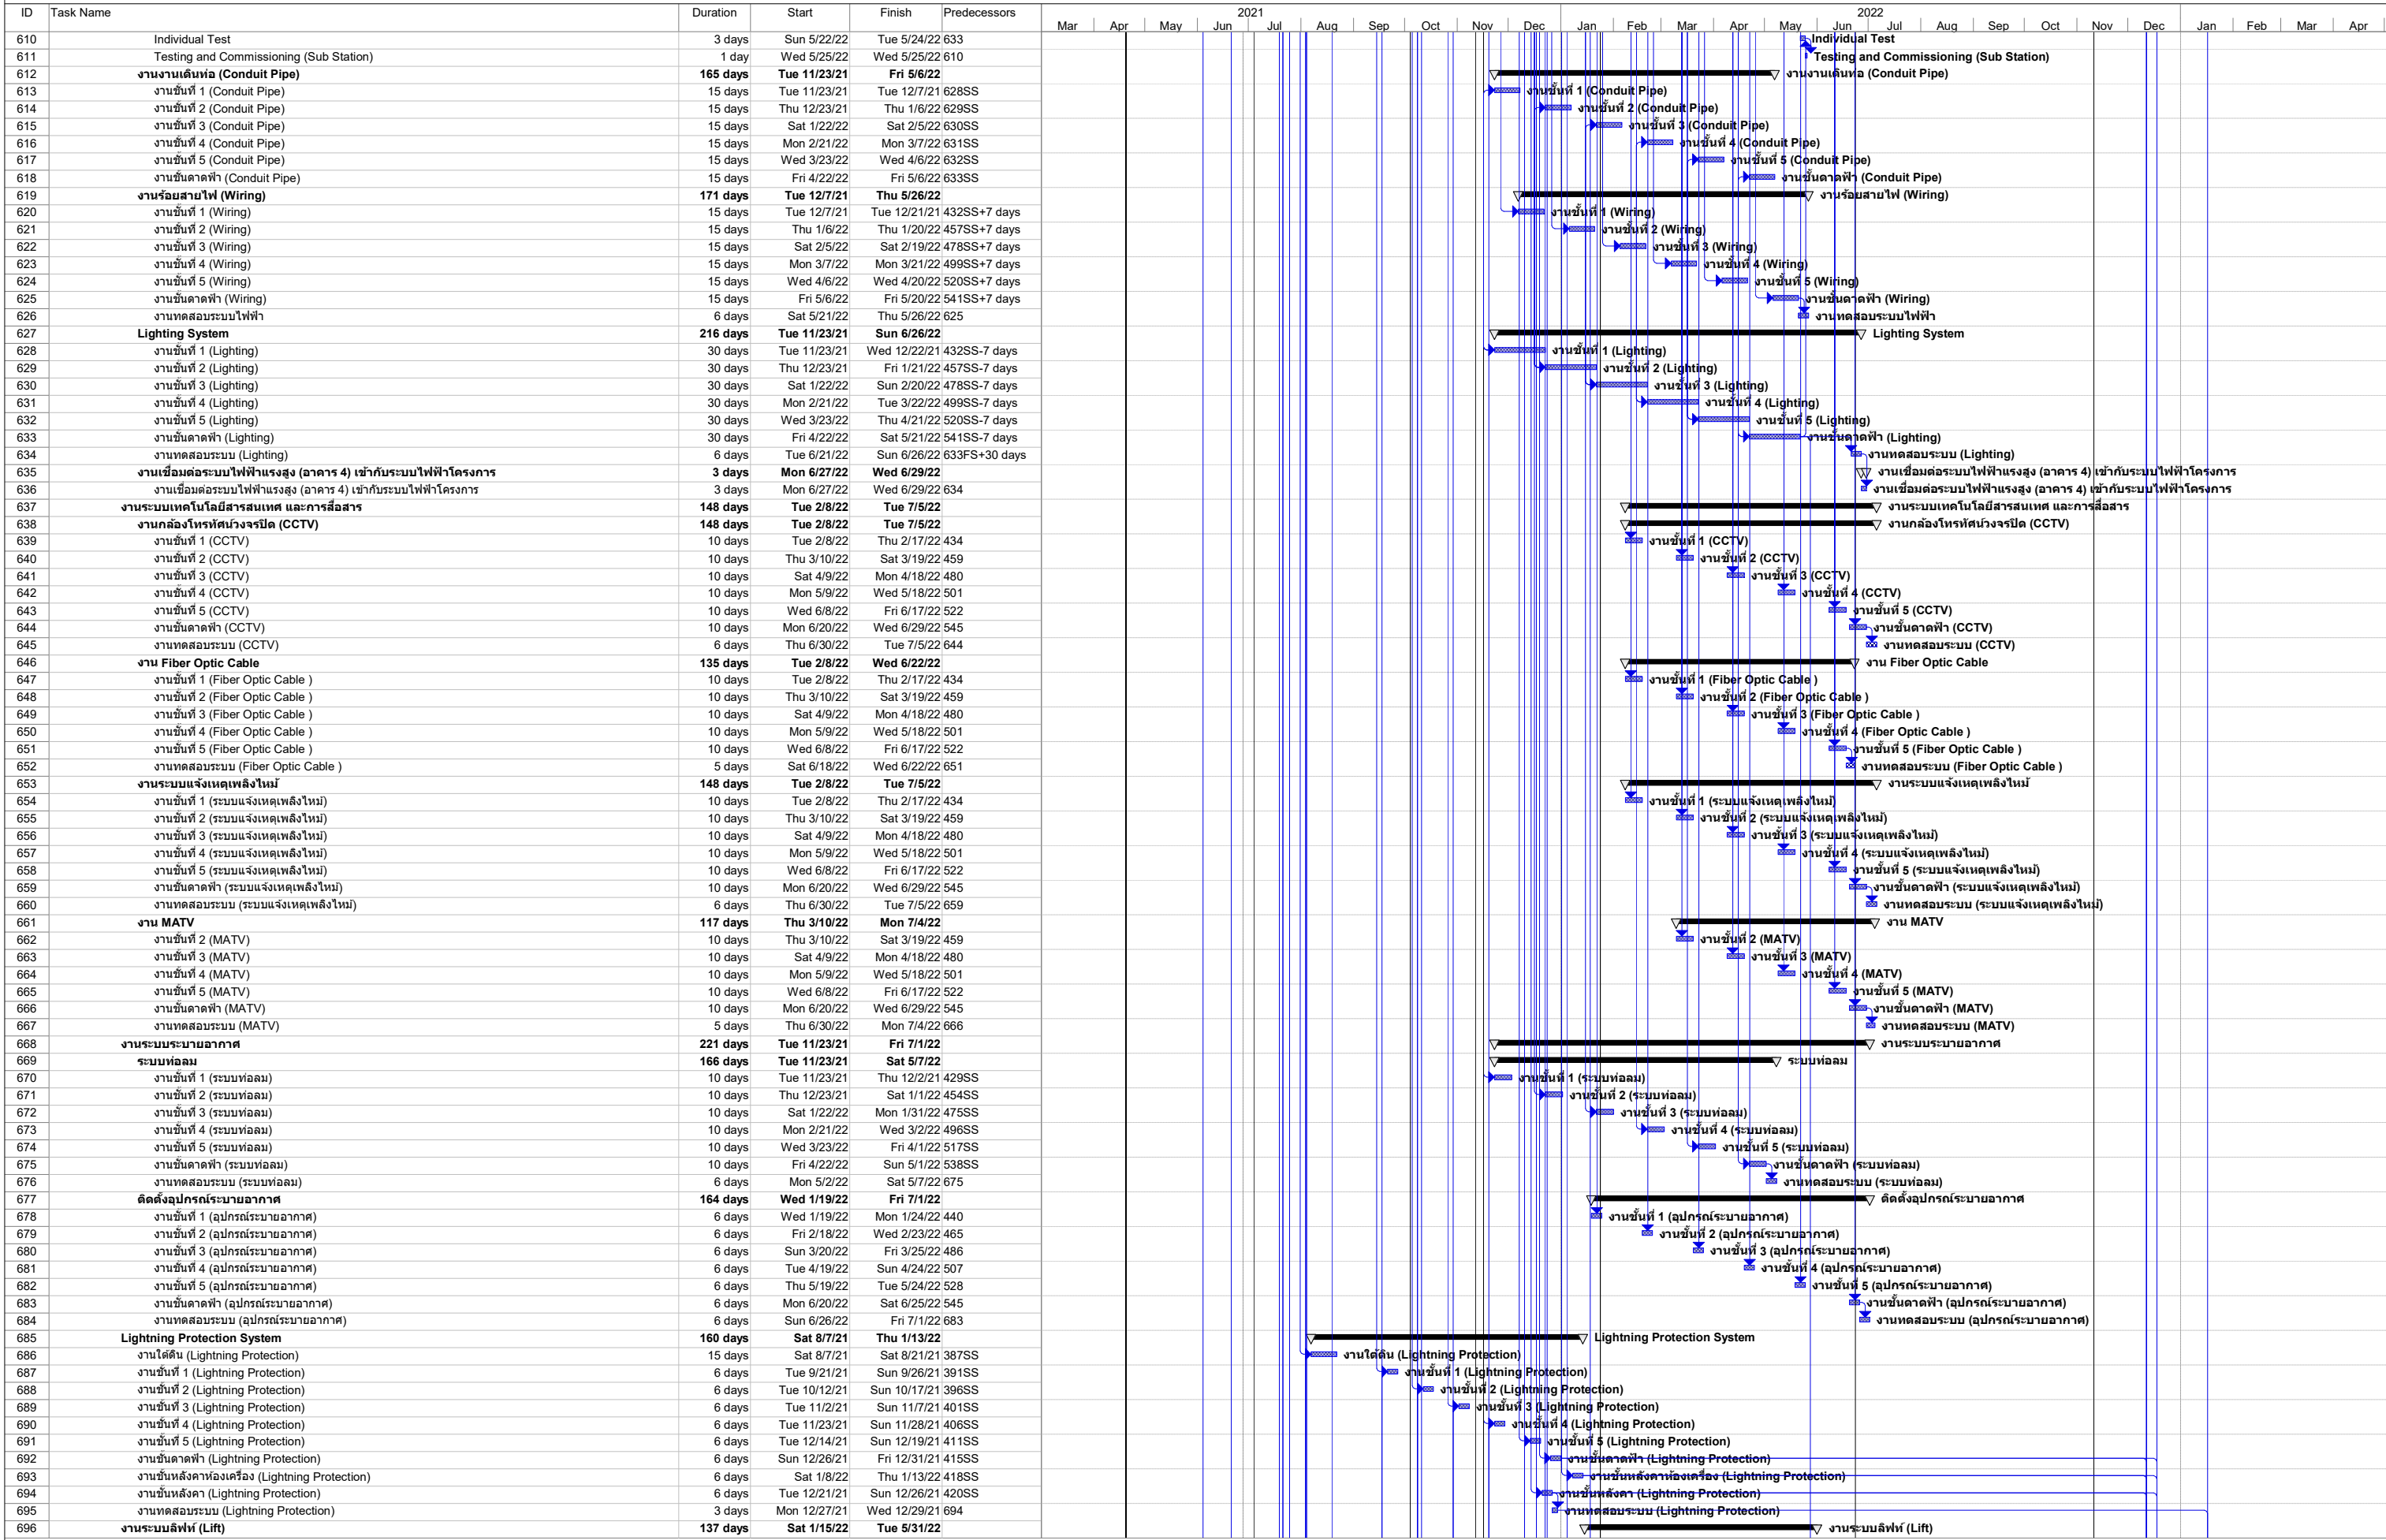


[illegible]

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

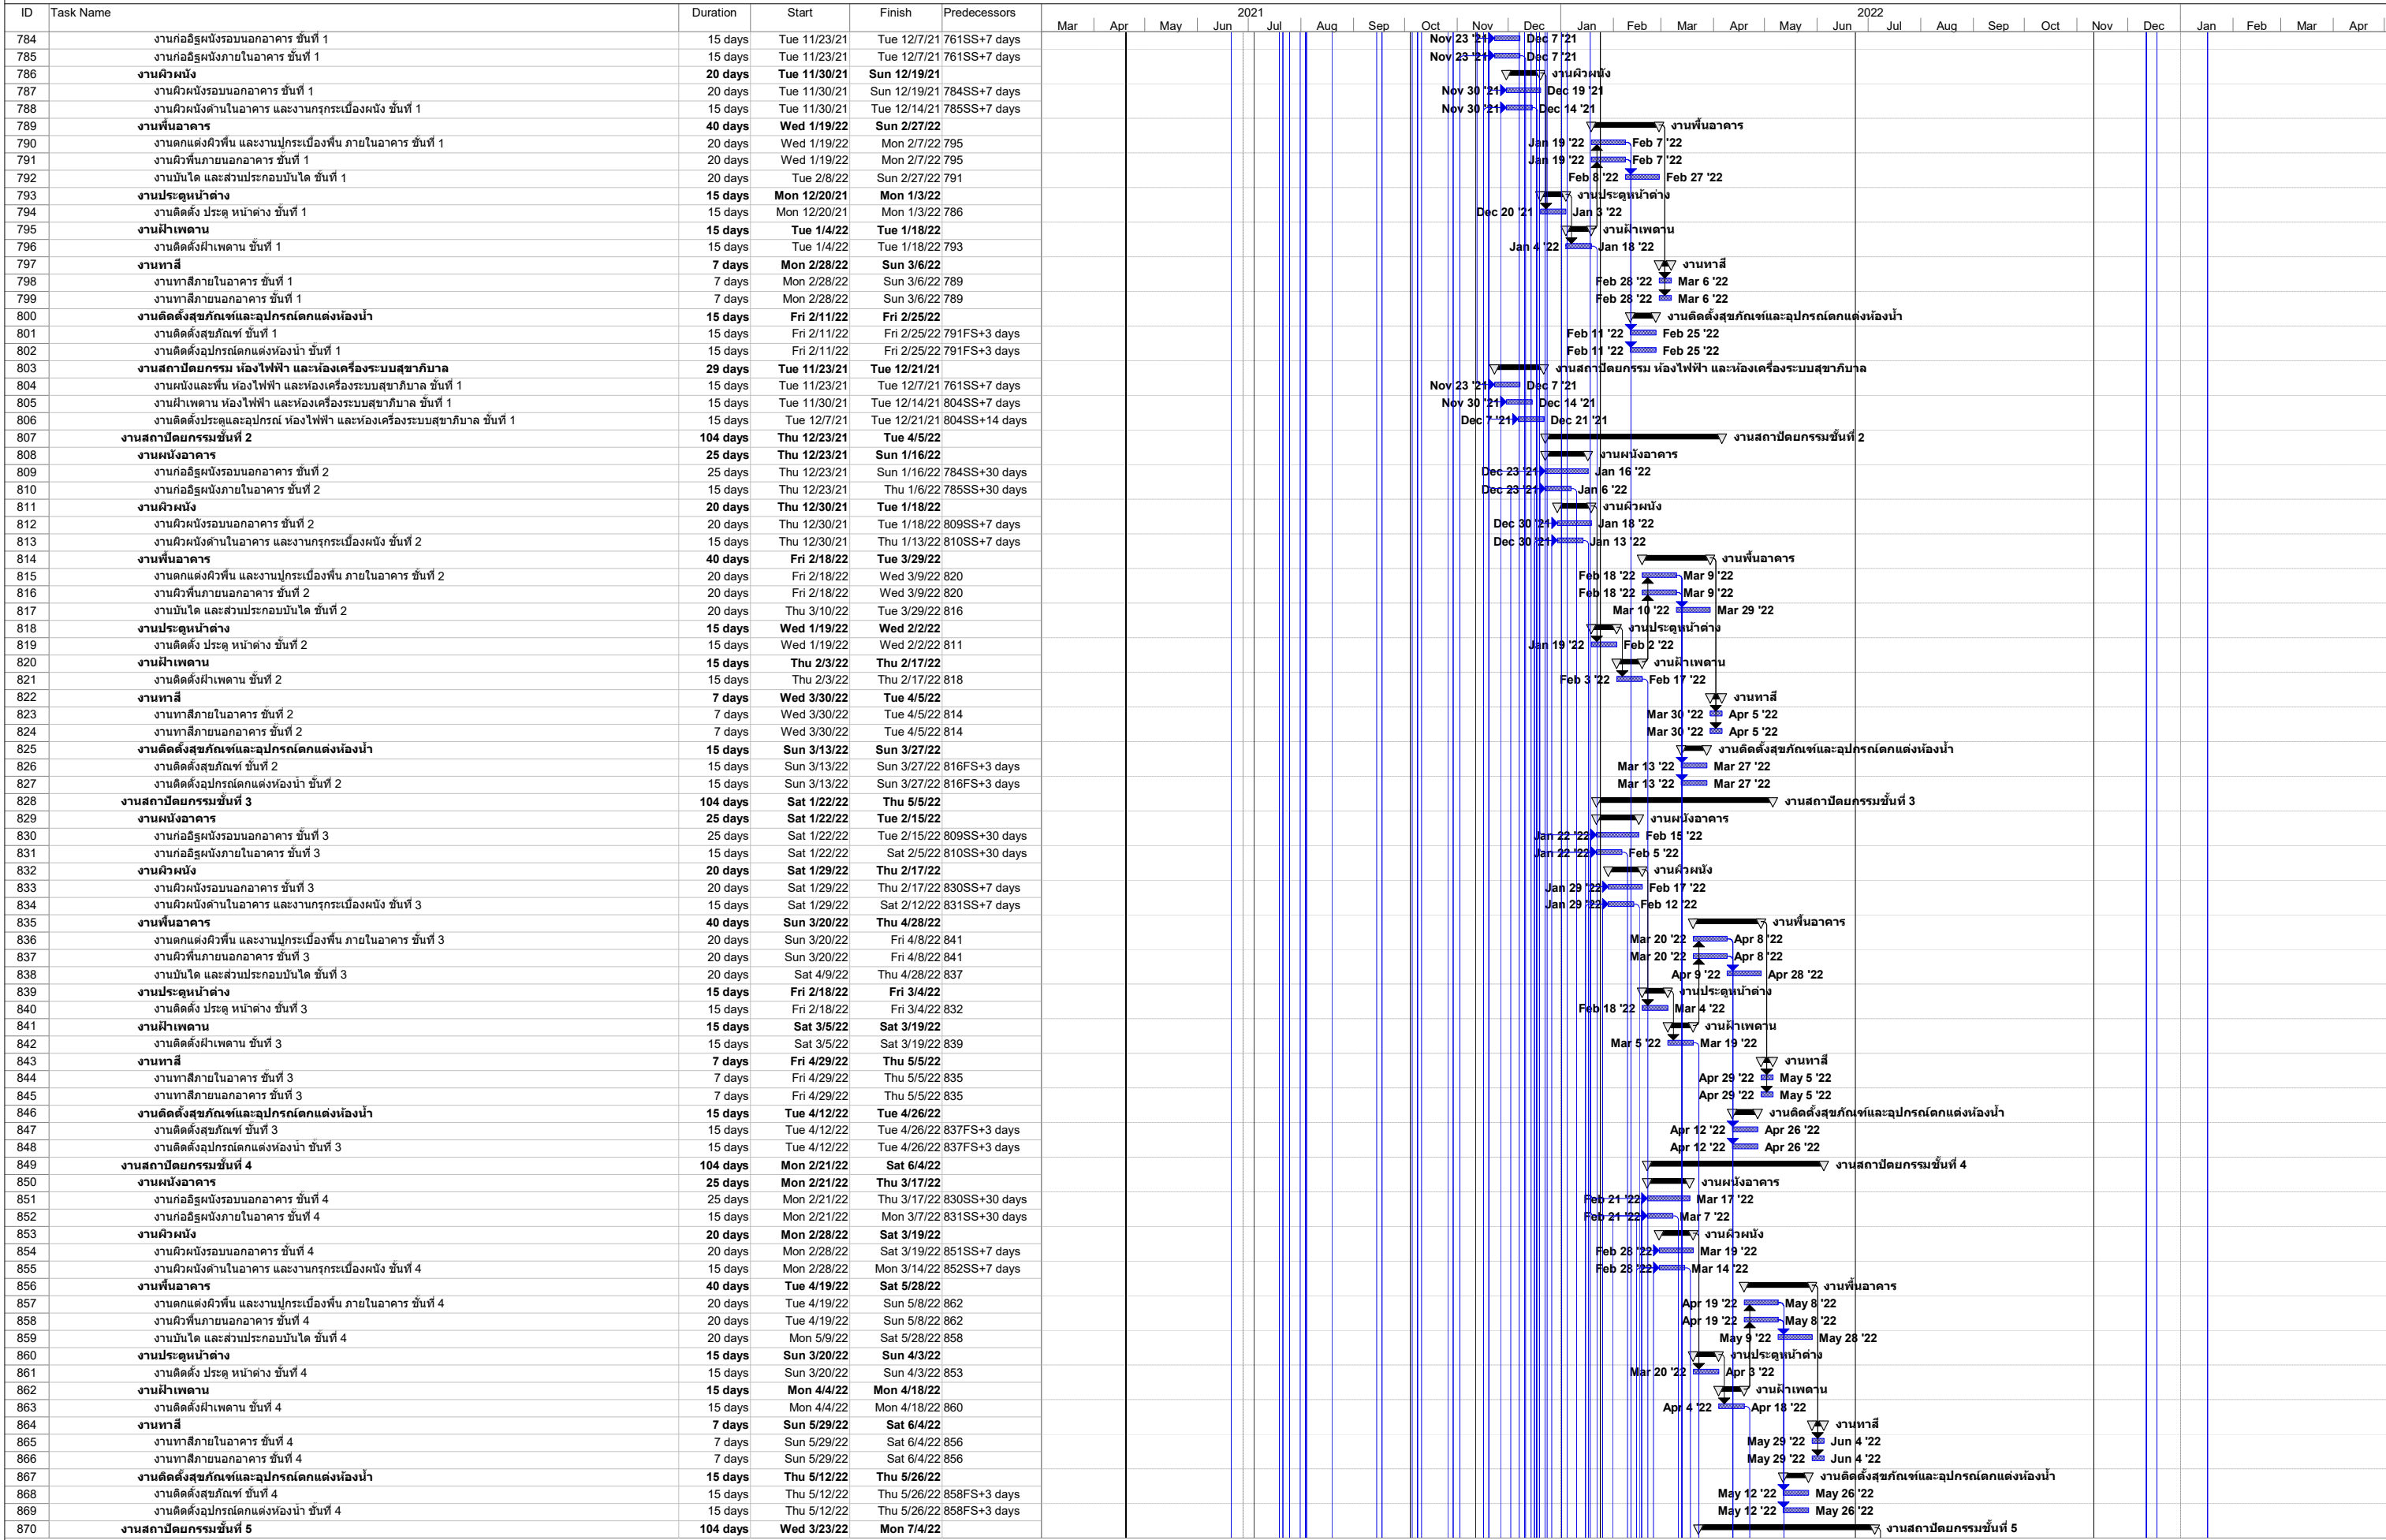

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

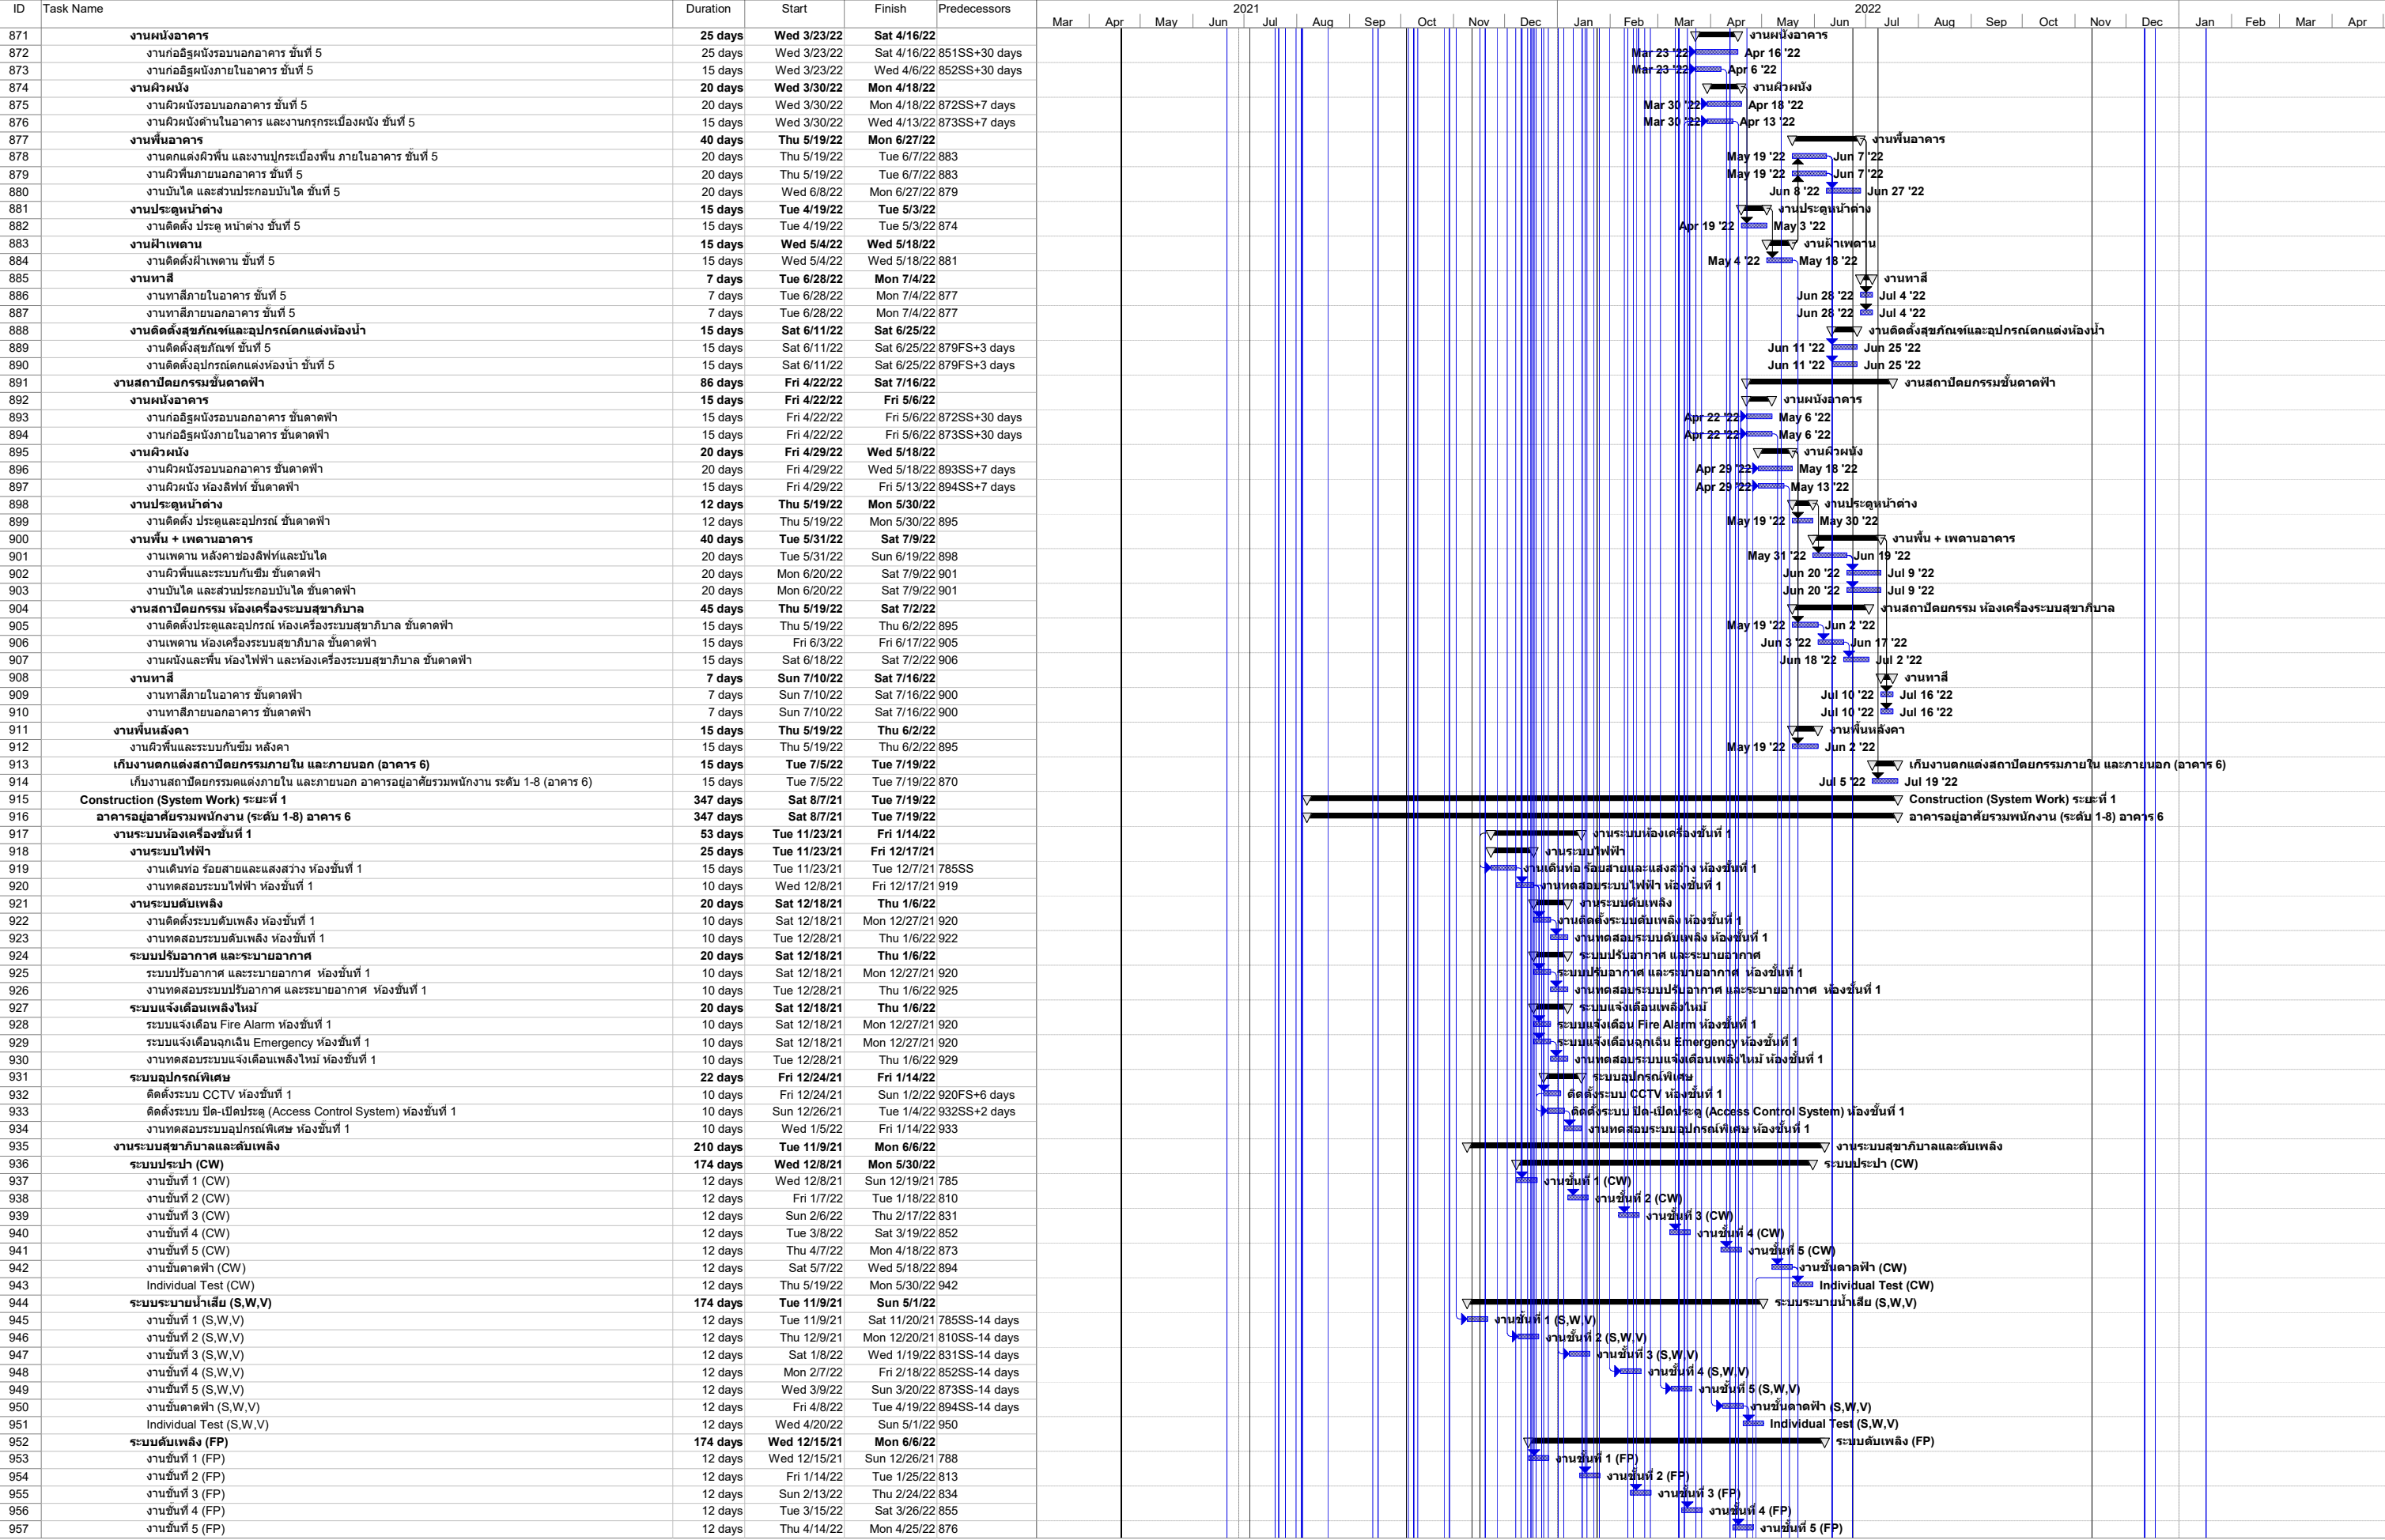

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Progress
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Deadline


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
958	งานขึ้นดาดฟ้า (FP)	12 days	Sat 5/14/22	Wed 5/25/22 897																											
959	Individual Test (FP)	12 days	Thu 5/26/22	Mon 6/6/22 958																											
960	งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำประปา (อาคาร 6) เข้ากับระบบท่อน้ำประปาโครงการ	4 days	Wed 5/4/22	Sat 5/7/22																											
961	งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำประปา (อาคาร 6) เข้ากับระบบท่อน้ำประปาโครงการ	3 days	Wed 5/4/22	Fri 5/6/22 942FS-15 days																											
962	งานทดสอบระบบสุขาภิบาล (อาคาร 6)	1 day	Sat 5/7/22	Sat 5/7/22 961																											
963	งานระบบไฟฟ้า	219 days	Tue 11/23/21	Wed 6/29/22																											
964	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ / Substation	154 days	Thu 12/23/21	Wed 5/25/22																											
965	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	10 days	Thu 12/23/21	Sat 1/1/22 985SS																											
966	Individual Test	3 days	Sun 5/22/22	Tue 5/24/22 989																											
967	Testing and Commissioning (Sub Station)	1 day	Wed 5/25/22	Wed 5/25/22 966																											
968	งานงานเดินท่อน้ำ (Conduit Pipe)	165 days	Tue 11/23/21	Fri 5/6/22																											
969	งานขั้นที่ 1 (Conduit Pipe)	15 days	Tue 11/23/21	Tue 12/7/21 984SS																											
970	งานขั้นที่ 2 (Conduit Pipe)	15 days	Thu 12/23/21	Thu 1/6/22 985SS																											
971	งานขั้นที่ 3 (Conduit Pipe)	15 days	Sat 1/22/22	Sat 2/5/22 986SS																											
972	งานขั้นที่ 4 (Conduit Pipe)	15 days	Mon 2/21/22	Mon 3/7/22 987SS																											
973	งานขั้นที่ 5 (Conduit Pipe)	15 days	Wed 3/23/22	Wed 4/6/22 988SS																											
974	งานขึ้นดาดฟ้า (Conduit Pipe)	15 days	Fri 4/22/22	Fri 5/6/22 989SS																											
975	งานร้อยสายไฟ (Wiring)	171 days	Tue 12/7/21	Thu 5/26/22																											
976	งานขั้นที่ 1 (Wiring)	15 days	Tue 12/7/21	Tue 12/21/21 788SS+7 days																											
977	งานขั้นที่ 2 (Wiring)	15 days	Thu 1/6/22	Thu 1/20/22 813SS+7 days																											
978	งานขั้นที่ 3 (Wiring)	15 days	Sat 2/5/22	Sat 2/19/22 834SS+7 days																											
979	งานขั้นที่ 4 (Wiring)	15 days	Mon 3/7/22	Mon 3/21/22 855SS+7 days																											
980	งานขั้นที่ 5 (Wiring)	15 days	Wed 4/6/22	Wed 4/20/22 876SS+7 days																											

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	




แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	2021	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	2022	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	2022	Feb	Mar	Apr
1132	งานคาน ค.ส.ล. + พื้น ค.ส.ล. วางบ่า	16 days	Tue 12/21/21	Wed 1/5/22	1123																													
1133	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กชั้นหลังคา	15 days	Thu 1/6/22	Thu 1/20/22	1132																													
1134	Construction (Architecture Work) ระยะที่ 1 อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน ระดับผู้บริหาร (อาคาร 7)	237 days	Sun 11/14/21	Fri 7/8/22																														
1135		237 days	Sun 11/14/21	Fri 7/8/22																														
1136		14 days	Fri 1/21/22	Thu 2/3/22																														
1137		14 days	Fri 1/21/22	Thu 2/3/22	1133																													
1138	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 1	104 days	Sun 11/14/21	Fri 2/25/22																														
1139	งานผนังอาคาร	15 days	Sun 11/14/21	Sun 11/28/21																														
1140	งานก่ออิฐผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 1	15 days	Sun 11/14/21	Sun 11/28/21	1117SS+7 days																													
1141	งานก่ออิฐผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 1	15 days	Sun 11/14/21	Sun 11/28/21	1117SS+7 days																													
1142	งานค้ำผนัง	20 days	Sun 11/21/21	Fri 12/10/21																														
1143	งานค้ำผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Sun 11/21/21	Fri 12/10/21	1140SS+7 days																													
1144	งานค้ำผนังด้านในอาคาร และงานกรุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 1	15 days	Sun 11/21/21	Sun 12/5/21	1141SS+7 days																													
1145	งานพื้นอาคาร	40 days	Mon 1/10/22	Fri 2/18/22																														
1146	งานตกแต่งค้ำพื้น และงานปูกระเบื้องพื้น ภายในอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Mon 1/10/22	Sat 1/29/22	1151																													
1147	งานค้ำพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Mon 1/10/22	Sat 1/29/22	1151																													
1148	งานบันได และส่วนประกอบบันได ชั้นที่ 1	20 days	Sun 1/30/22	Fri 2/18/22	1147																													
1149	งานประตูหน้าต่าง	15 days	Sat 12/11/21	Sat 12/25/21																														
1150	งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 1	15 days	Sat 12/11/21	Sat 12/25/21	1142																													
1151	งานฝ้าเพดาน	15 days	Sun 12/26/21	Sun 1/9/22																														
1152	งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1	15 days	Sun 12/26/21	Sun 1/9/22	1149																													
1153	งานทาสี	7 days	Sat 2/19/22	Fri 2/25/22																														
1154	งานทาสีภายในอาคาร ชั้นที่ 1	7 days	Sat 2/19/22	Fri 2/25/22	1145																													
1155	งานทาสีภายนอกอาคาร ชั้นที่ 1	7 days	Sat 2/19/22	Fri 2/25/22	1145																													
1156	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ	15 days	Wed 2/2/22	Wed 2/16/22																														
1157	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 1	15 days	Wed 2/2/22	Wed 2/16/22	1147FS+3 days																													
1158	งานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ ชั้นที่ 1	15 days	Wed 2/2/22	Wed 2/16/22	1147FS+3 days																													
1159	งานสถาปัตยกรรม ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล	29 days	Sun 11/14/21	Sun 12/12/21																														
1160	งานผนังและพื้น ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1	15 days	Sun 11/14/21	Sun 11/28/21	1117SS+7 days																													
1161	งานฝ้าเพดาน ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1	15 days	Sun 11/21/21	Sun 12/5/21	1160SS+7 days																													
1162	งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1	15 days	Sun 11/28/21	Sun 12/12/21	1160SS+14 days																													
1163	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 2	104 days	Tue 12/14/21	Sun 3/27/22																														
1164	งานผนังอาคาร	25 days	Tue 12/14/21	Fri 1/7/22																														
1165	งานก่ออิฐผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 2	25 days	Tue 12/14/21	Fri 1/7/22	1140SS+30 days																													
1166	งานก่ออิฐผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 2	15 days	Tue 12/14/21	Tue 12/28/21	1141SS+30 days																													
1167	งานค้ำผนัง	20 days	Tue 12/21/21	Sun 1/9/22																														
1168	งานค้ำผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 2	20 days	Tue 12/21/21	Sun 1/9/22	1165SS+7 days																													
1169	งานค้ำผนังด้านในอาคาร และงานกรุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 2	15 days	Tue 12/21/21	Tue 1/4/22	1166SS+7 days																													
1170	งานพื้นอาคาร	40 days	Wed 2/9/22	Sun 3/20/22																														
1171	งานตกแต่งค้ำพื้น และงานปูกระเบื้องพื้น ภายในอาคาร ชั้นที่ 2	20 days	Wed 2/9/22	Mon 2/28/22	1176																													
1172	งานค้ำพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 2	20 days	Wed 2/9/22	Mon 2/28/22	1176																													
1173	งานบันได และส่วนประกอบบันได ชั้นที่ 2	20 days	Tue 3/1/22	Sun 3/20/22	1172																													
1174	งานประตูหน้าต่าง	15 days	Mon 1/10/22	Mon 1/24/22																														
1175	งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 2	15 days	Mon 1/10/22	Mon 1/24/22	1167																													
1176	งานฝ้าเพดาน	15 days	Tue 1/25/22	Tue 2/8/22																														
1177	งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 2	15 days	Tue 1/25/22	Tue 2/8/22	1174																													
1178	งานทาสี	7 days	Mon 3/21/22	Sun 3/27/22																														
1179	งานทาสีภายในอาคาร ชั้นที่ 2	7 days	Mon 3/21/22	Sun 3/27/22	1170																													
1180	งานทาสีภายนอกอาคาร ชั้นที่ 2	7 days	Mon 3/21/22	Sun 3/27/22	1170																													
1181	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ	15 days	Fri 3/4/22	Fri 3/18/22																														
1182	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 2	15 days	Fri 3/4/22	Fri 3/18/22	1172FS+3 days																													
1183	งานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ ชั้นที่ 2	15 days	Fri 3/4/22	Fri 3/18/22	1172FS+3 days																													
1184	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 3	104 days	Thu 1/13/22	Tue 4/26/22																														
1185	งานผนังอาคาร	25 days	Thu 1/13/22	Sun 2/6/22																														
1186	งานก่ออิฐผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 3	25 days	Thu 1/13/22	Sun 2/6/22	1165SS+30 days																													
1187	งานก่ออิฐผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 3	15 days	Thu 1/13/22	Thu 1/27/22	1166SS+30 days																													
1188	งานค้ำผนัง	20 days	Thu 1/20/22	Tue 2/8/22																														
1189	งานค้ำผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 3	20 days	Thu 1/20/22	Tue 2/8/22	1186SS+7 days																													
1190	งานค้ำผนังด้านในอาคาร และงานกรุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 3	15 days	Thu 1/20/22	Thu 2/3/22	1187SS+7 days																													
1191	งานพื้นอาคาร	40 days	Fri 3/11/22	Tue 4/19/22																														
1192	งานตกแต่งค้ำพื้น และงานปูกระเบื้องพื้น ภายในอาคาร ชั้นที่ 3	20 days	Fri 3/11/22	Wed 3/30/22	1197																													
1193	งานค้ำพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 3	20 days	Fri 3/11/22	Wed 3/30/22	1197																													
1194	งานบันได และส่วนประกอบบันได ชั้นที่ 3	20 days	Thu 3/31/22	Tue 4/19/22	1193																													
1195	งานประตูหน้าต่าง	15 days	Wed 2/9/22	Wed 2/23/22																														
1196	งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 3	15 days	Wed 2/9/22	Wed 2/23/22	1188																													
1197	งานฝ้าเพดาน	15 days	Thu 2/24/22	Thu 3/10/22	</																													

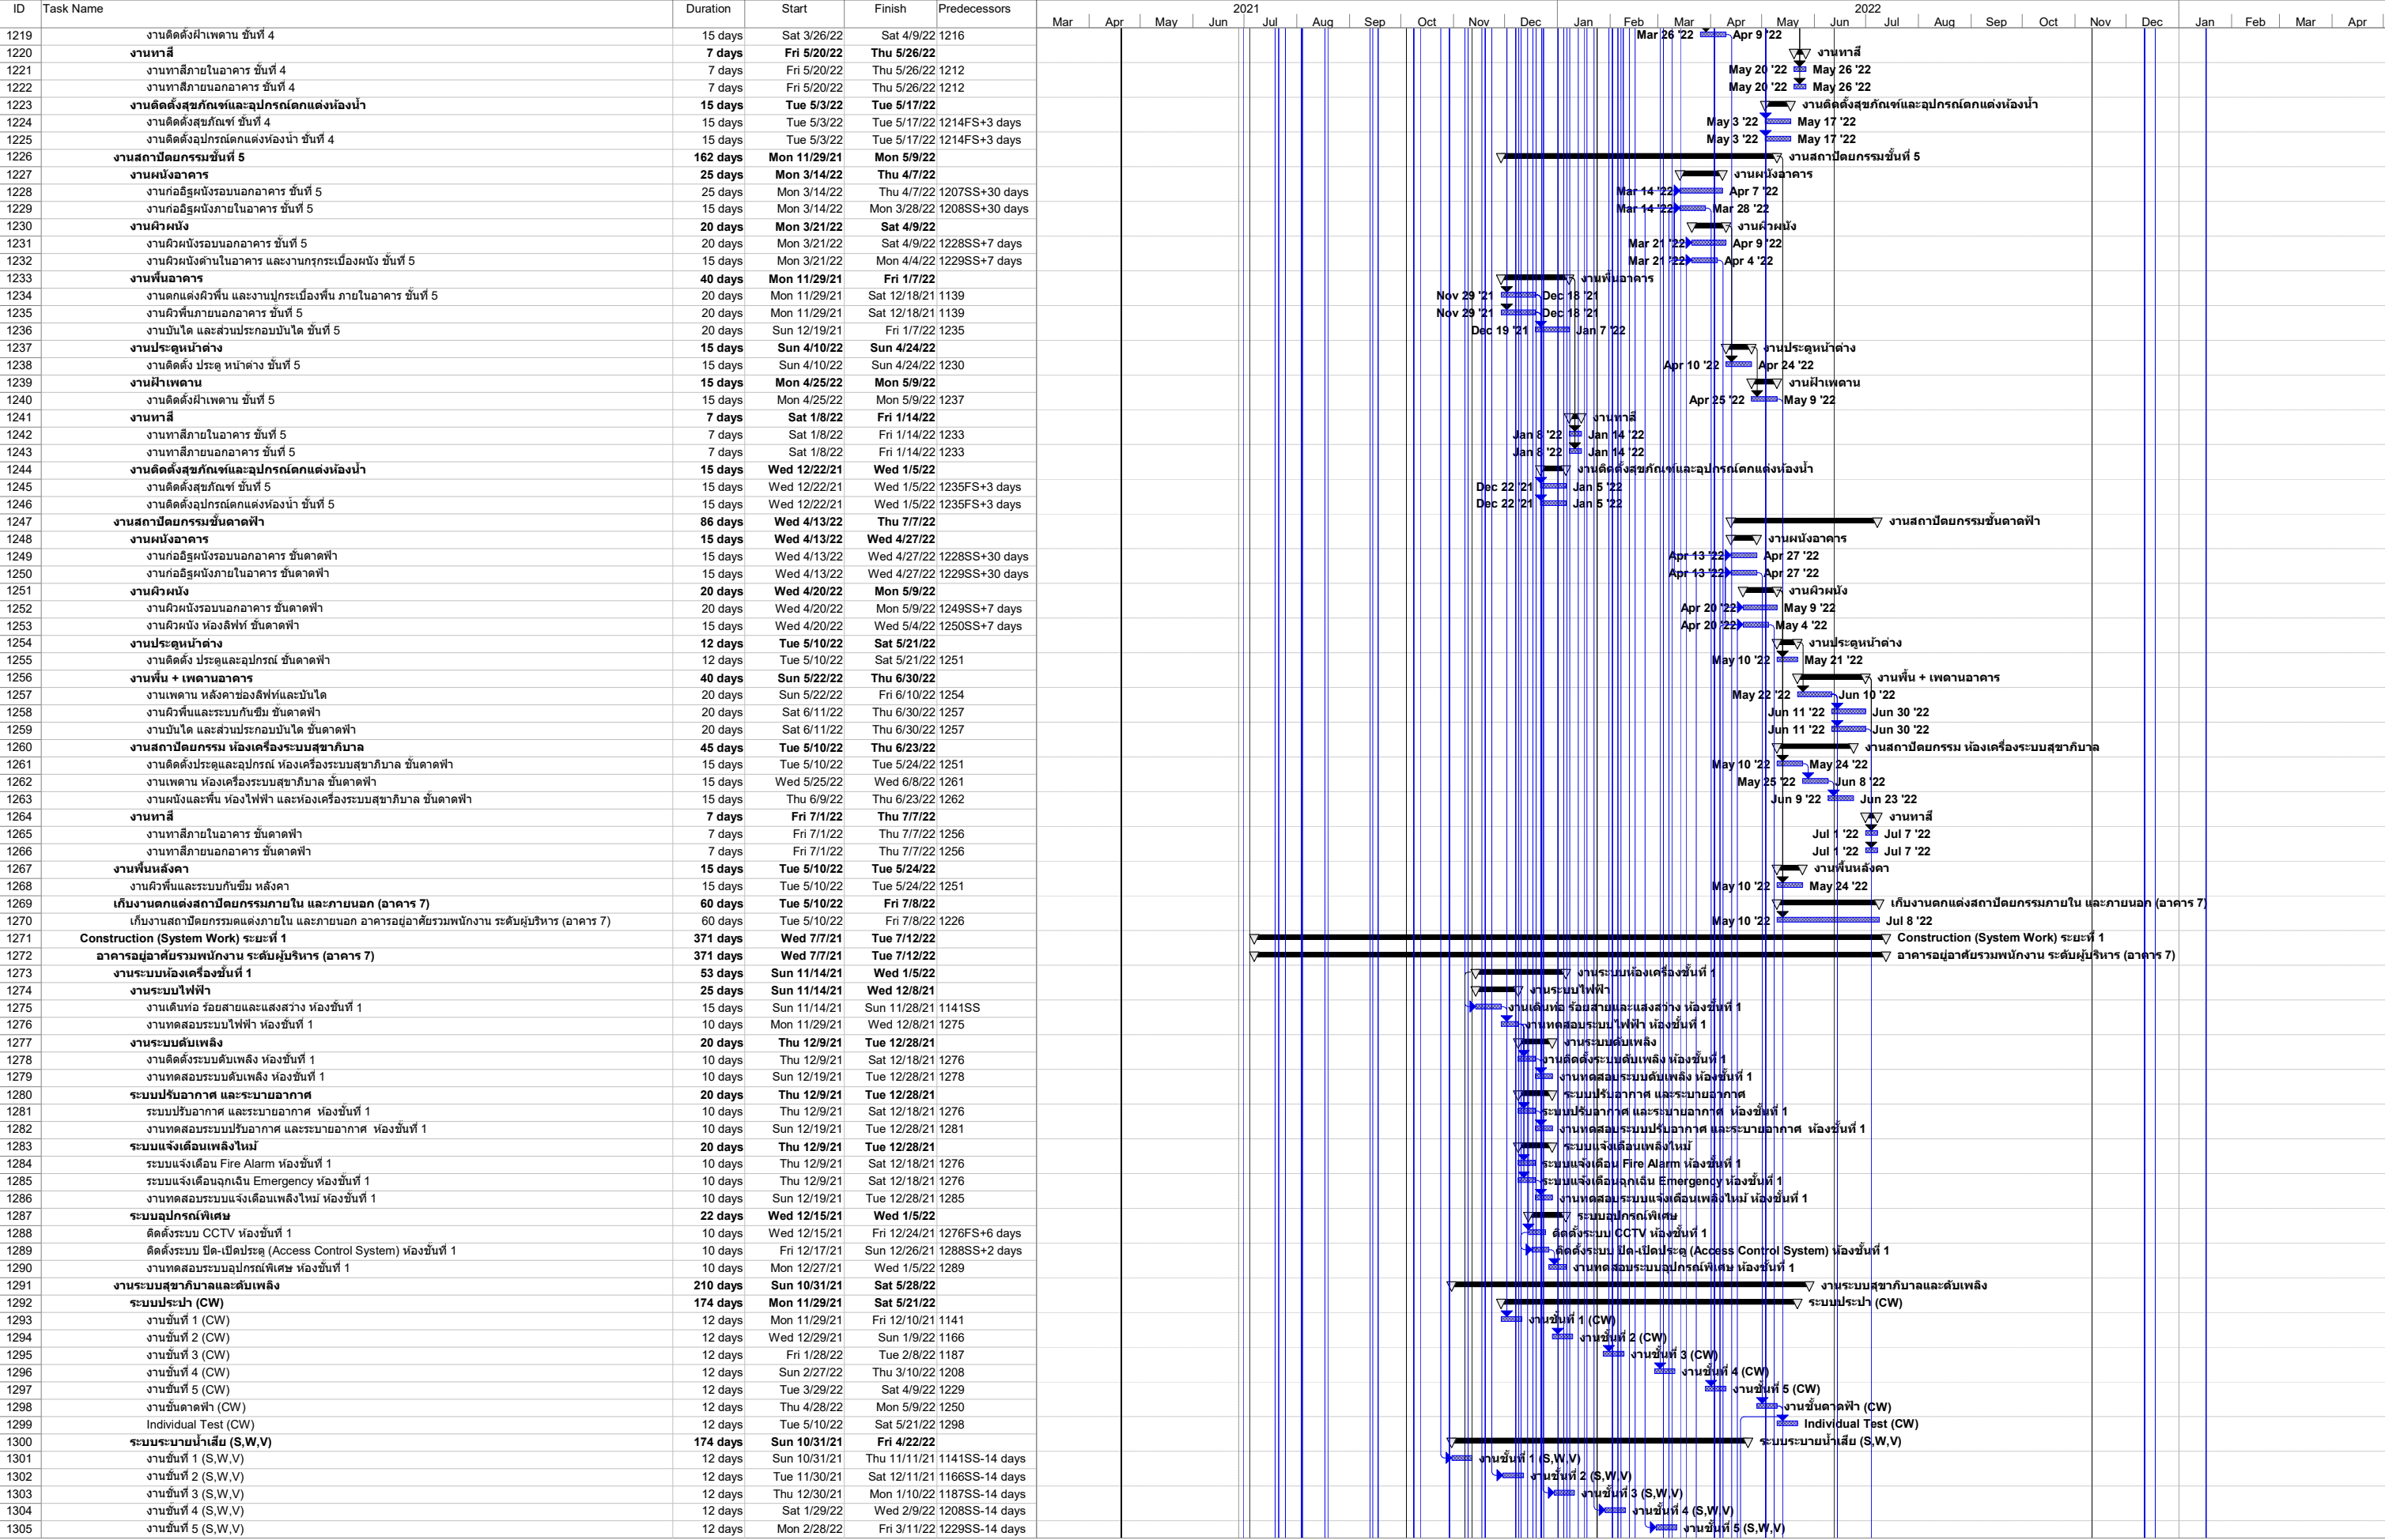



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
1306	งานขึ้นคานฟ้า (S,W,V)	12 days	Wed 3/30/22	Sun 4/10/22	1250SS-14 days																										
1307	Individual Test (S,W,V)	12 days	Mon 4/11/22	Fri 4/22/22	1306																										
1308	ระบบต้นเพลิง (FP)	174 days	Mon 12/6/21	Sat 5/28/22																											
1309	งานขึ้นที่ 1 (FP)	12 days	Mon 12/6/21	Fri 12/17/21	1144																										
1310	งานขึ้นที่ 2 (FP)	12 days	Wed 1/5/22	Sun 1/16/22	1169																										
1311	งานขึ้นที่ 3 (FP)	12 days	Fri 2/4/22	Tue 2/15/22	1190																										
1312	งานขึ้นที่ 4 (FP)	12 days	Sun 3/6/22	Thu 3/17/22	1211																										
1313	งานขึ้นที่ 5 (FP)	12 days	Tue 4/5/22	Sat 4/16/22	1232																										
1314	งานขึ้นคานฟ้า (FP)	12 days	Thu 5/5/22	Mon 5/16/22	1253																										
1315	Individual Test (FP)	12 days	Tue 5/17/22	Sat 5/28/22	1314																										
1316	งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำประปา (อาคาร 7) เข้ากับระบบท่อน้ำประปาโครงการ	4 days	Mon 4/25/22	Thu 4/28/22																											
1317	งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำประปา (อาคาร 7) เข้ากับระบบท่อน้ำประปาโครงการ	3 days	Mon 4/25/22	Wed 4/27/22	1298FS-15 days																										
1318	งานทดสอบระบบสุขาภิบาล (อาคาร 7)	1 day	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	1317																										
1319	งานระบบไฟฟ้า	219 days	Sun 11/14/21	Mon 6/20/22																											
1320	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ / Substation	154 days	Tue 12/14/21	Mon 5/16/22																											
1321	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	10 days	Tue 12/14/21	Thu 12/23/21	1341SS																										
1322	Individual Test	3 days	Fri 5/13/22	Sun 5/15/22	1345																										
1323	Testing and Commissioning (Sub Station)	1 day	Mon 5/16/22	Mon 5/16/22	1322																										
1324	งานงานเดินท่ (Conduit Pipe)	165 days	Sun 11/14/21	Wed 4/27/22																											
1325	งานขึ้นที่ 1 (Conduit Pipe)	15 days	Sun 11/14/21	Sun 11/28/21	1340SS																										
1326	งานขึ้นที่ 2 (Conduit Pipe)	15 days	Tue 12/14/21	Tue 12/28/21	1341SS																										
1327	งานขึ้นที่ 3 (Conduit Pipe)	15 days	Thu 1/13/22	Thu 1/27/22	1342SS																										
1328	งานขึ้นที่ 4 (Conduit Pipe)	15 days	Sat 2/12/22																												

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	



แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

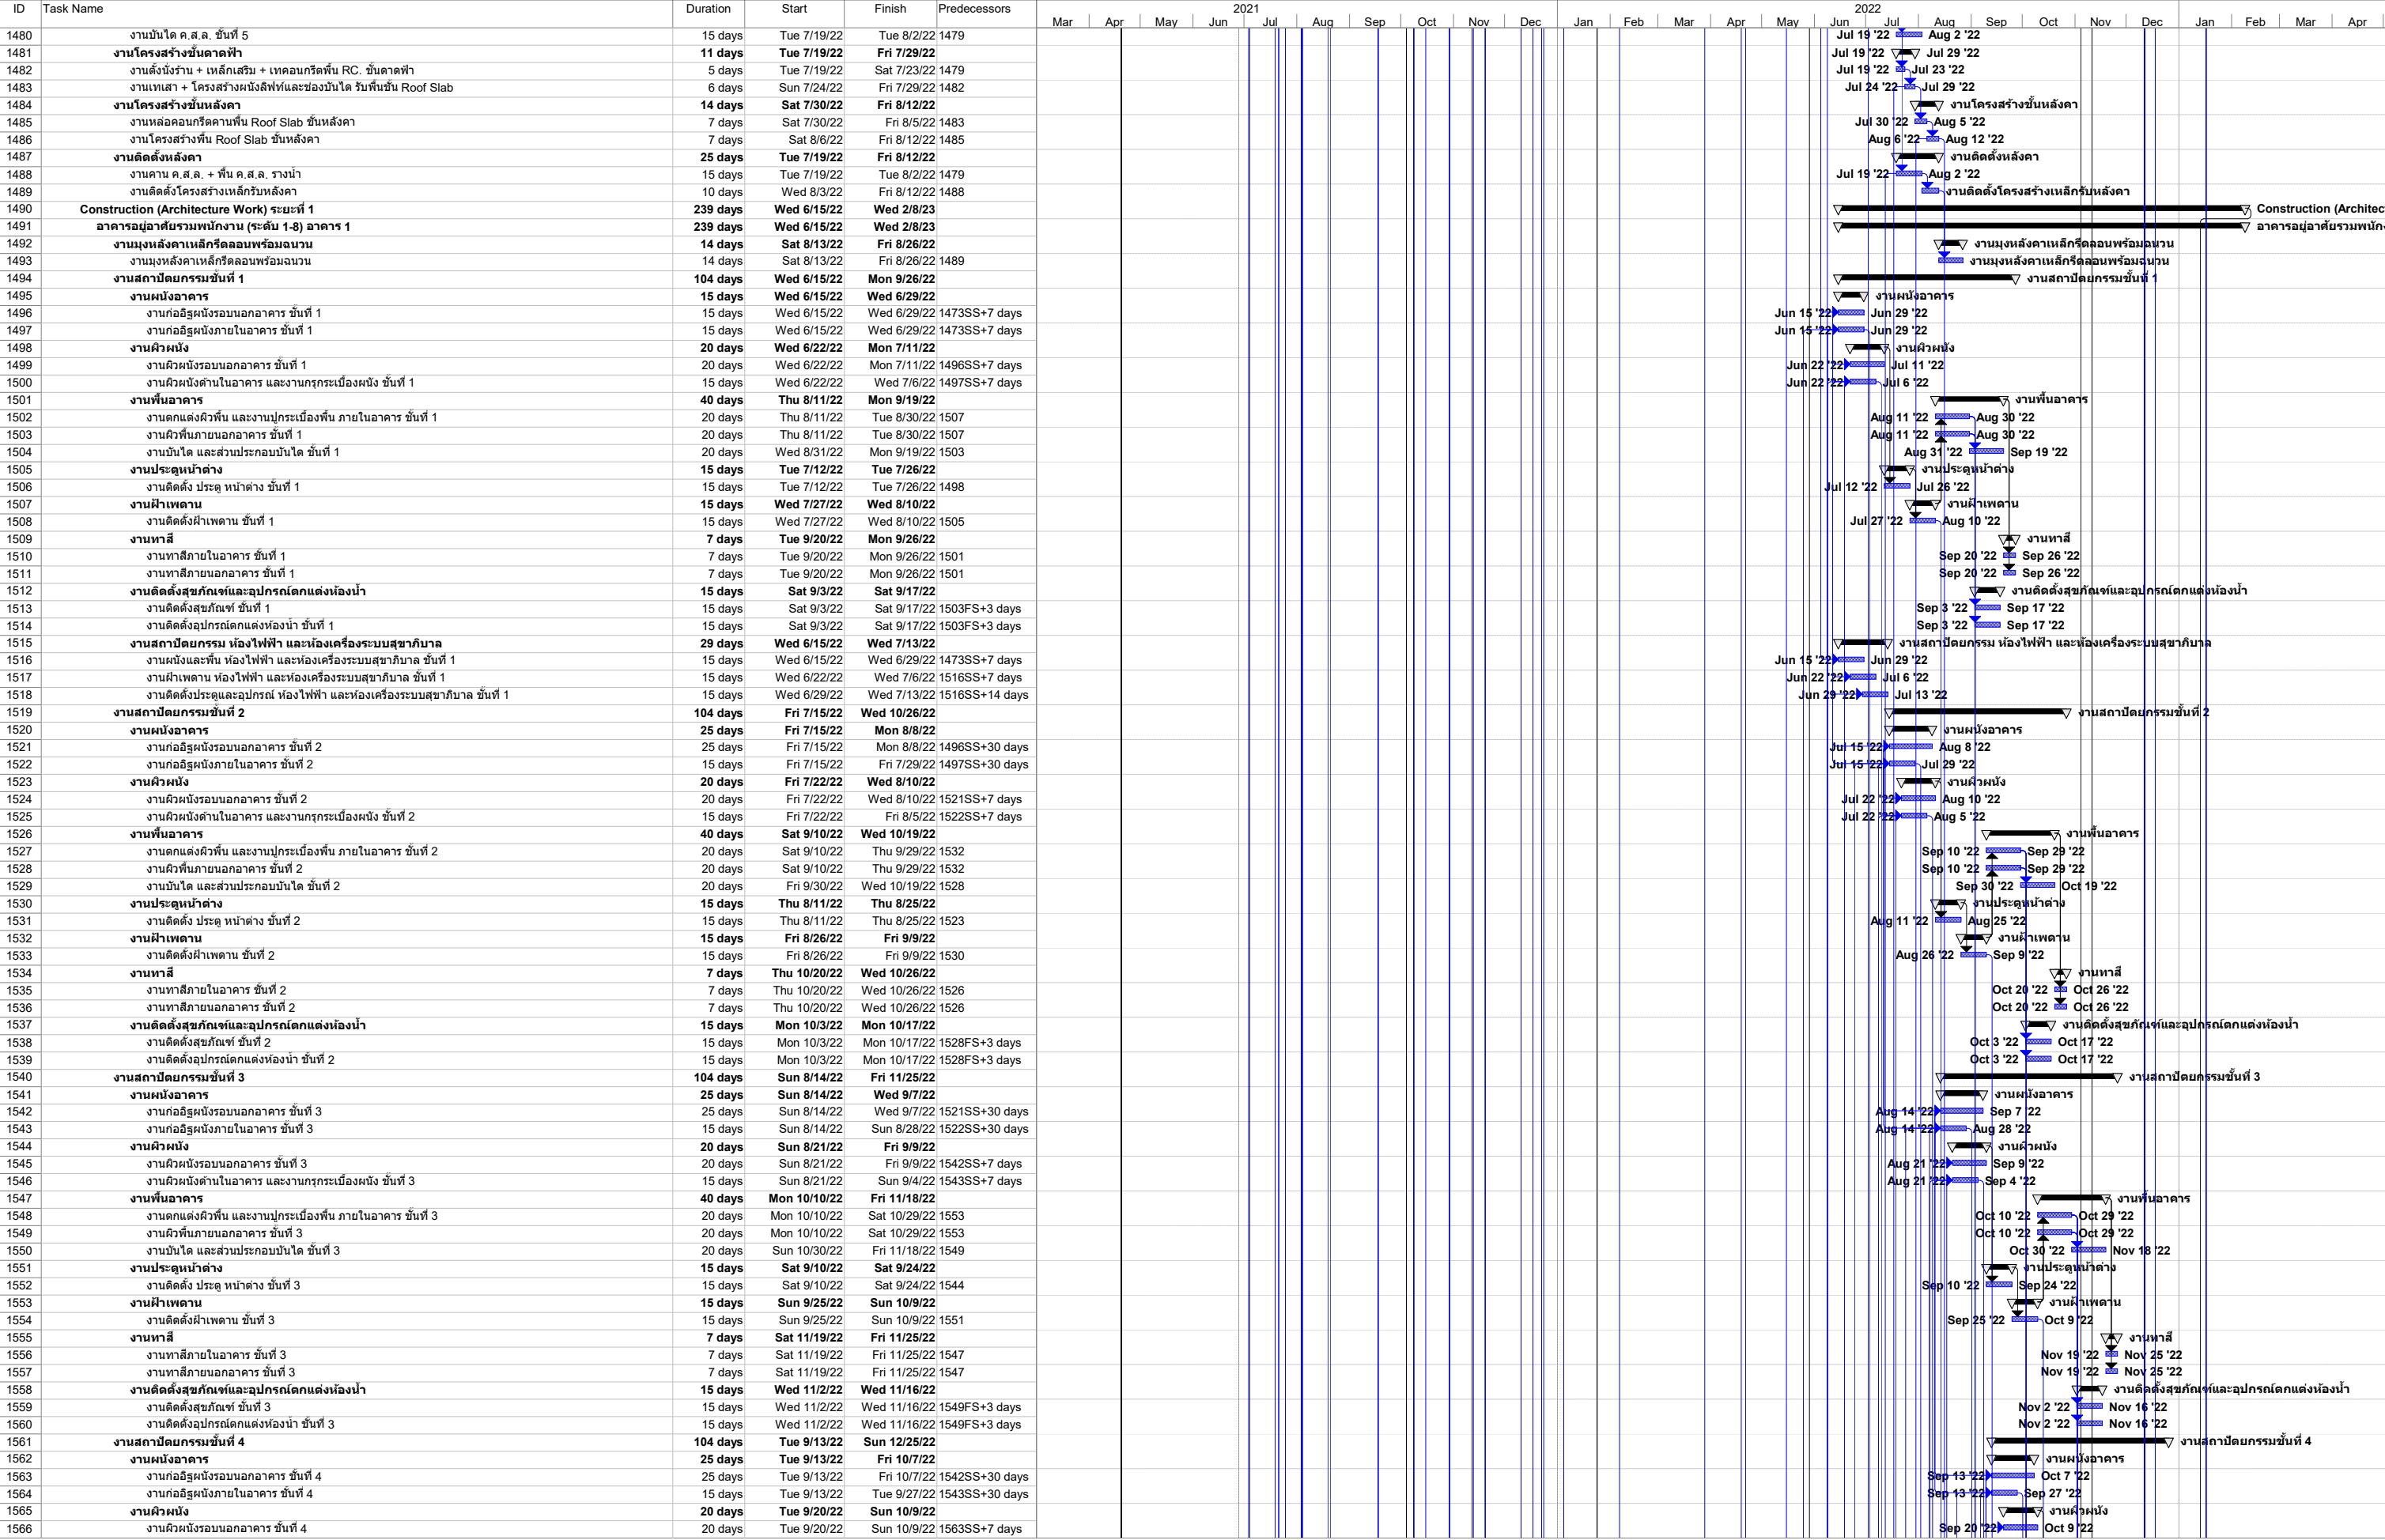


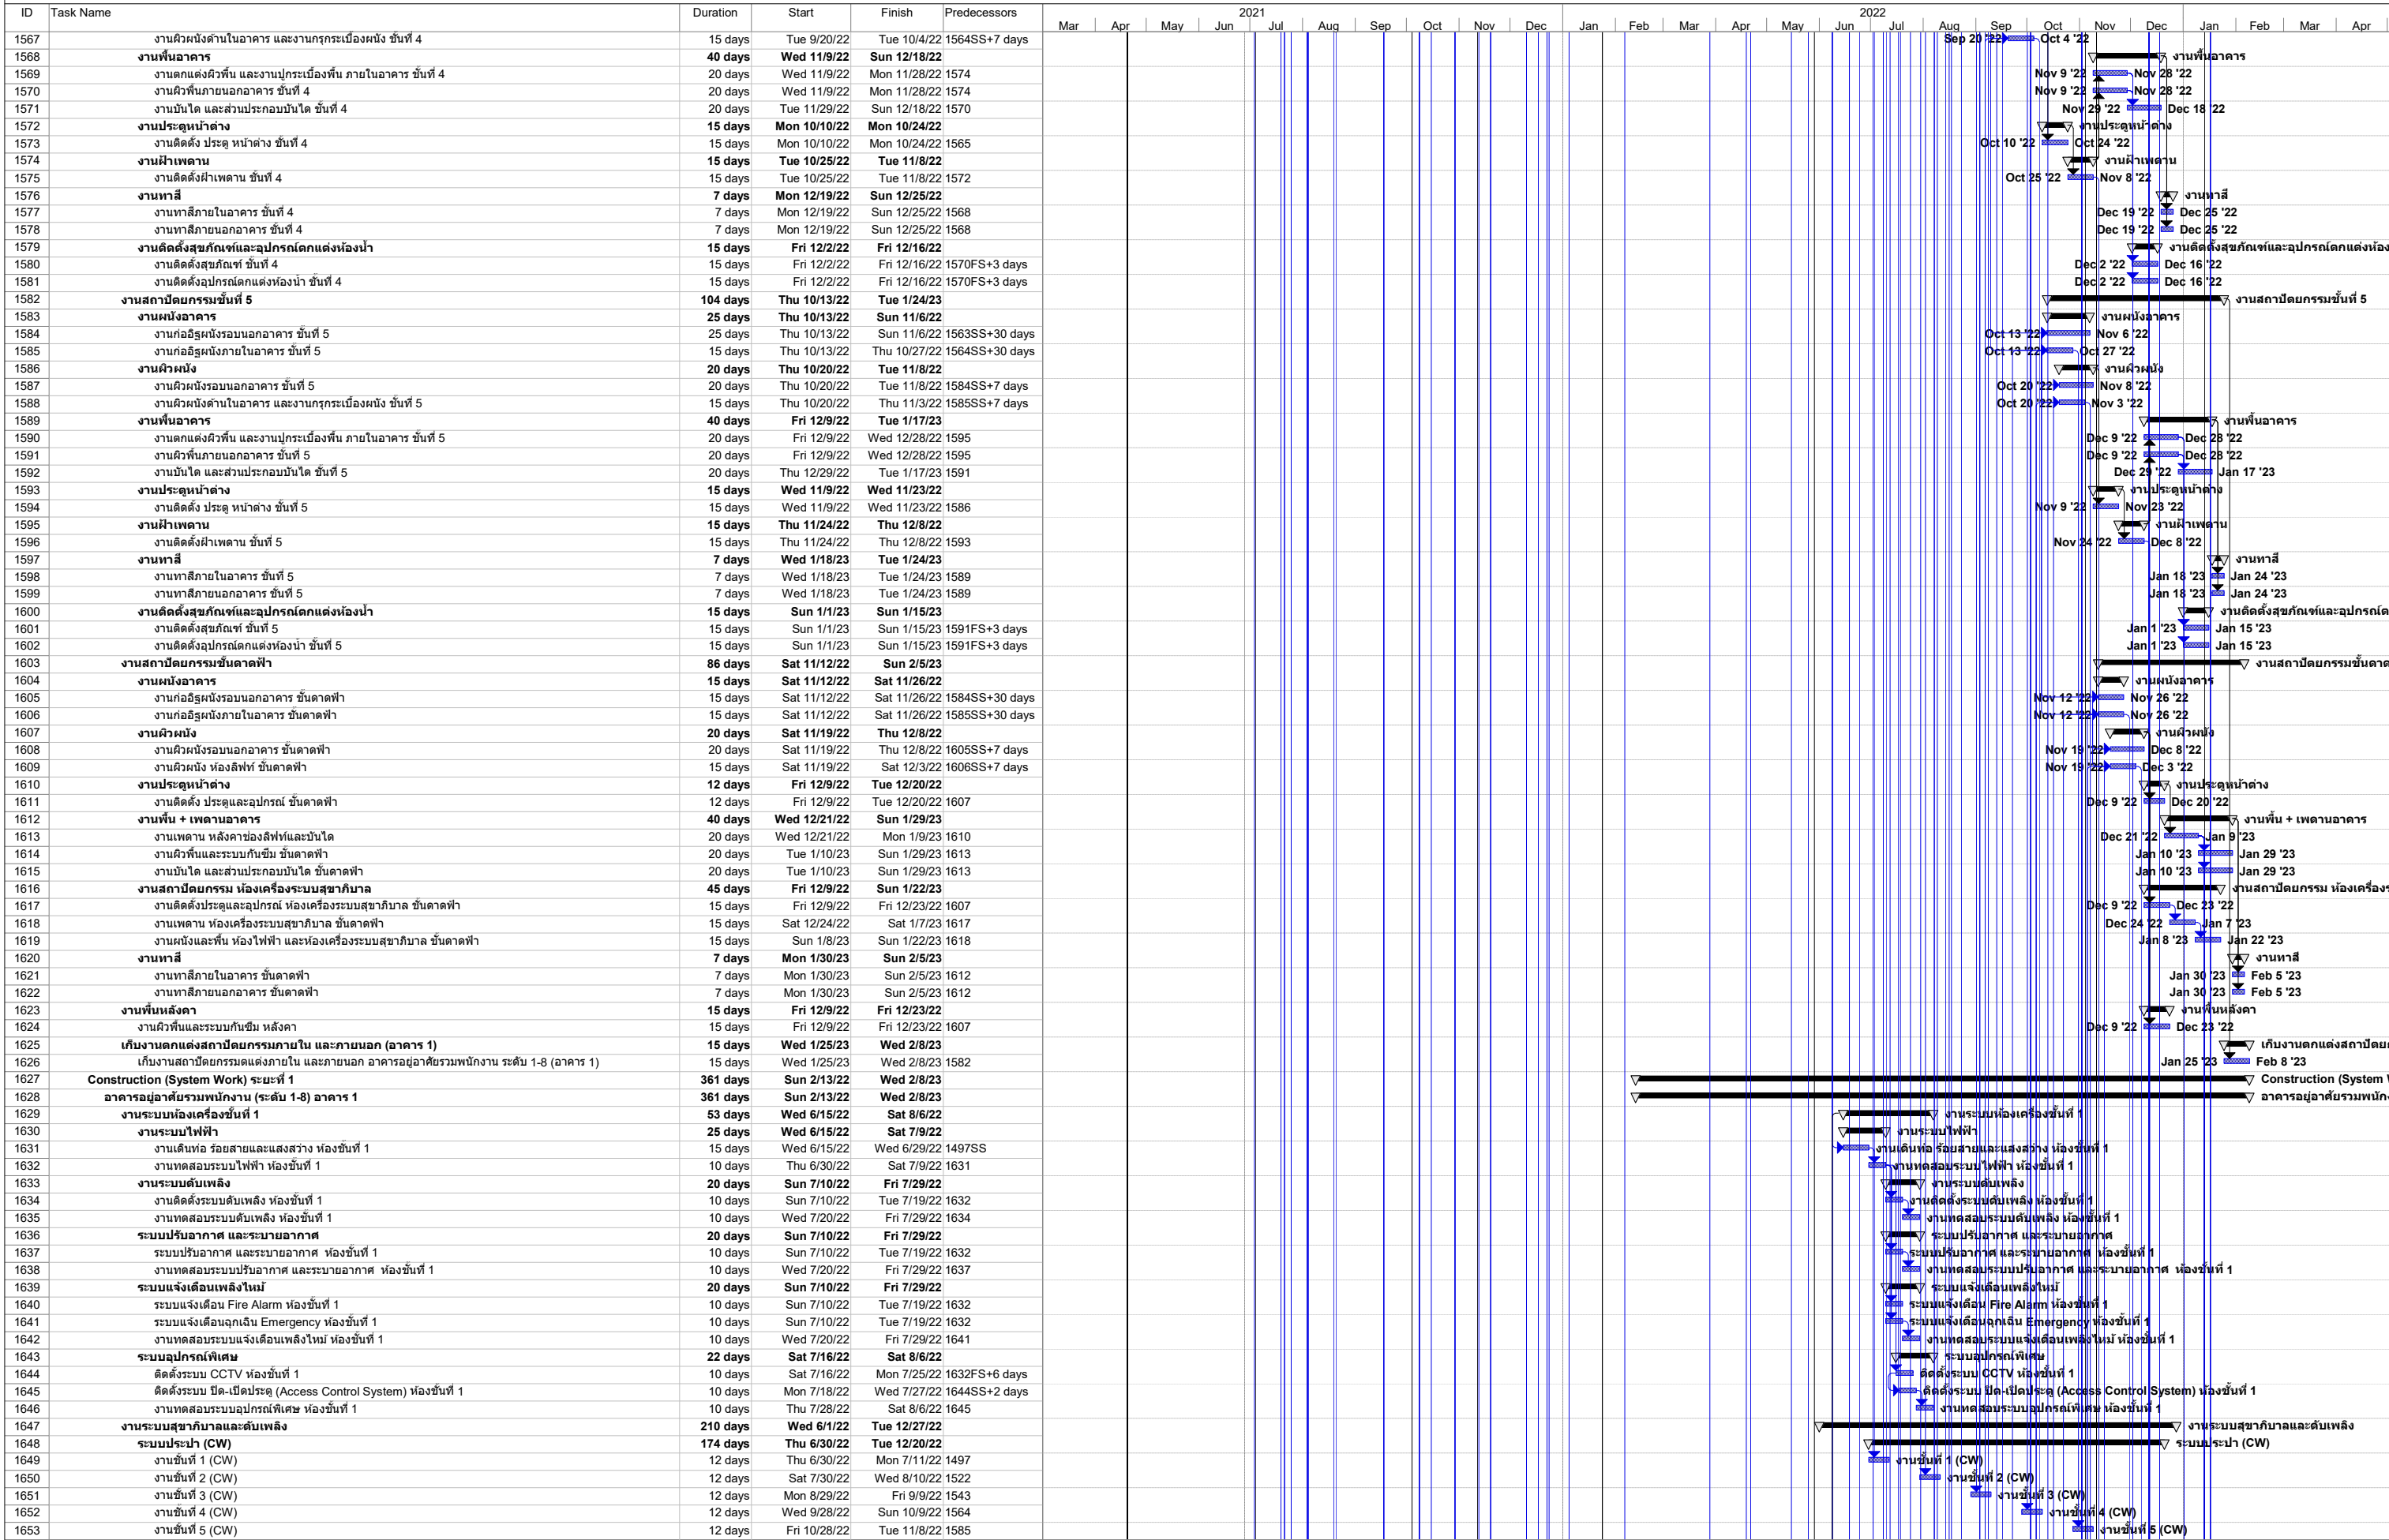


Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	


[illegible]

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

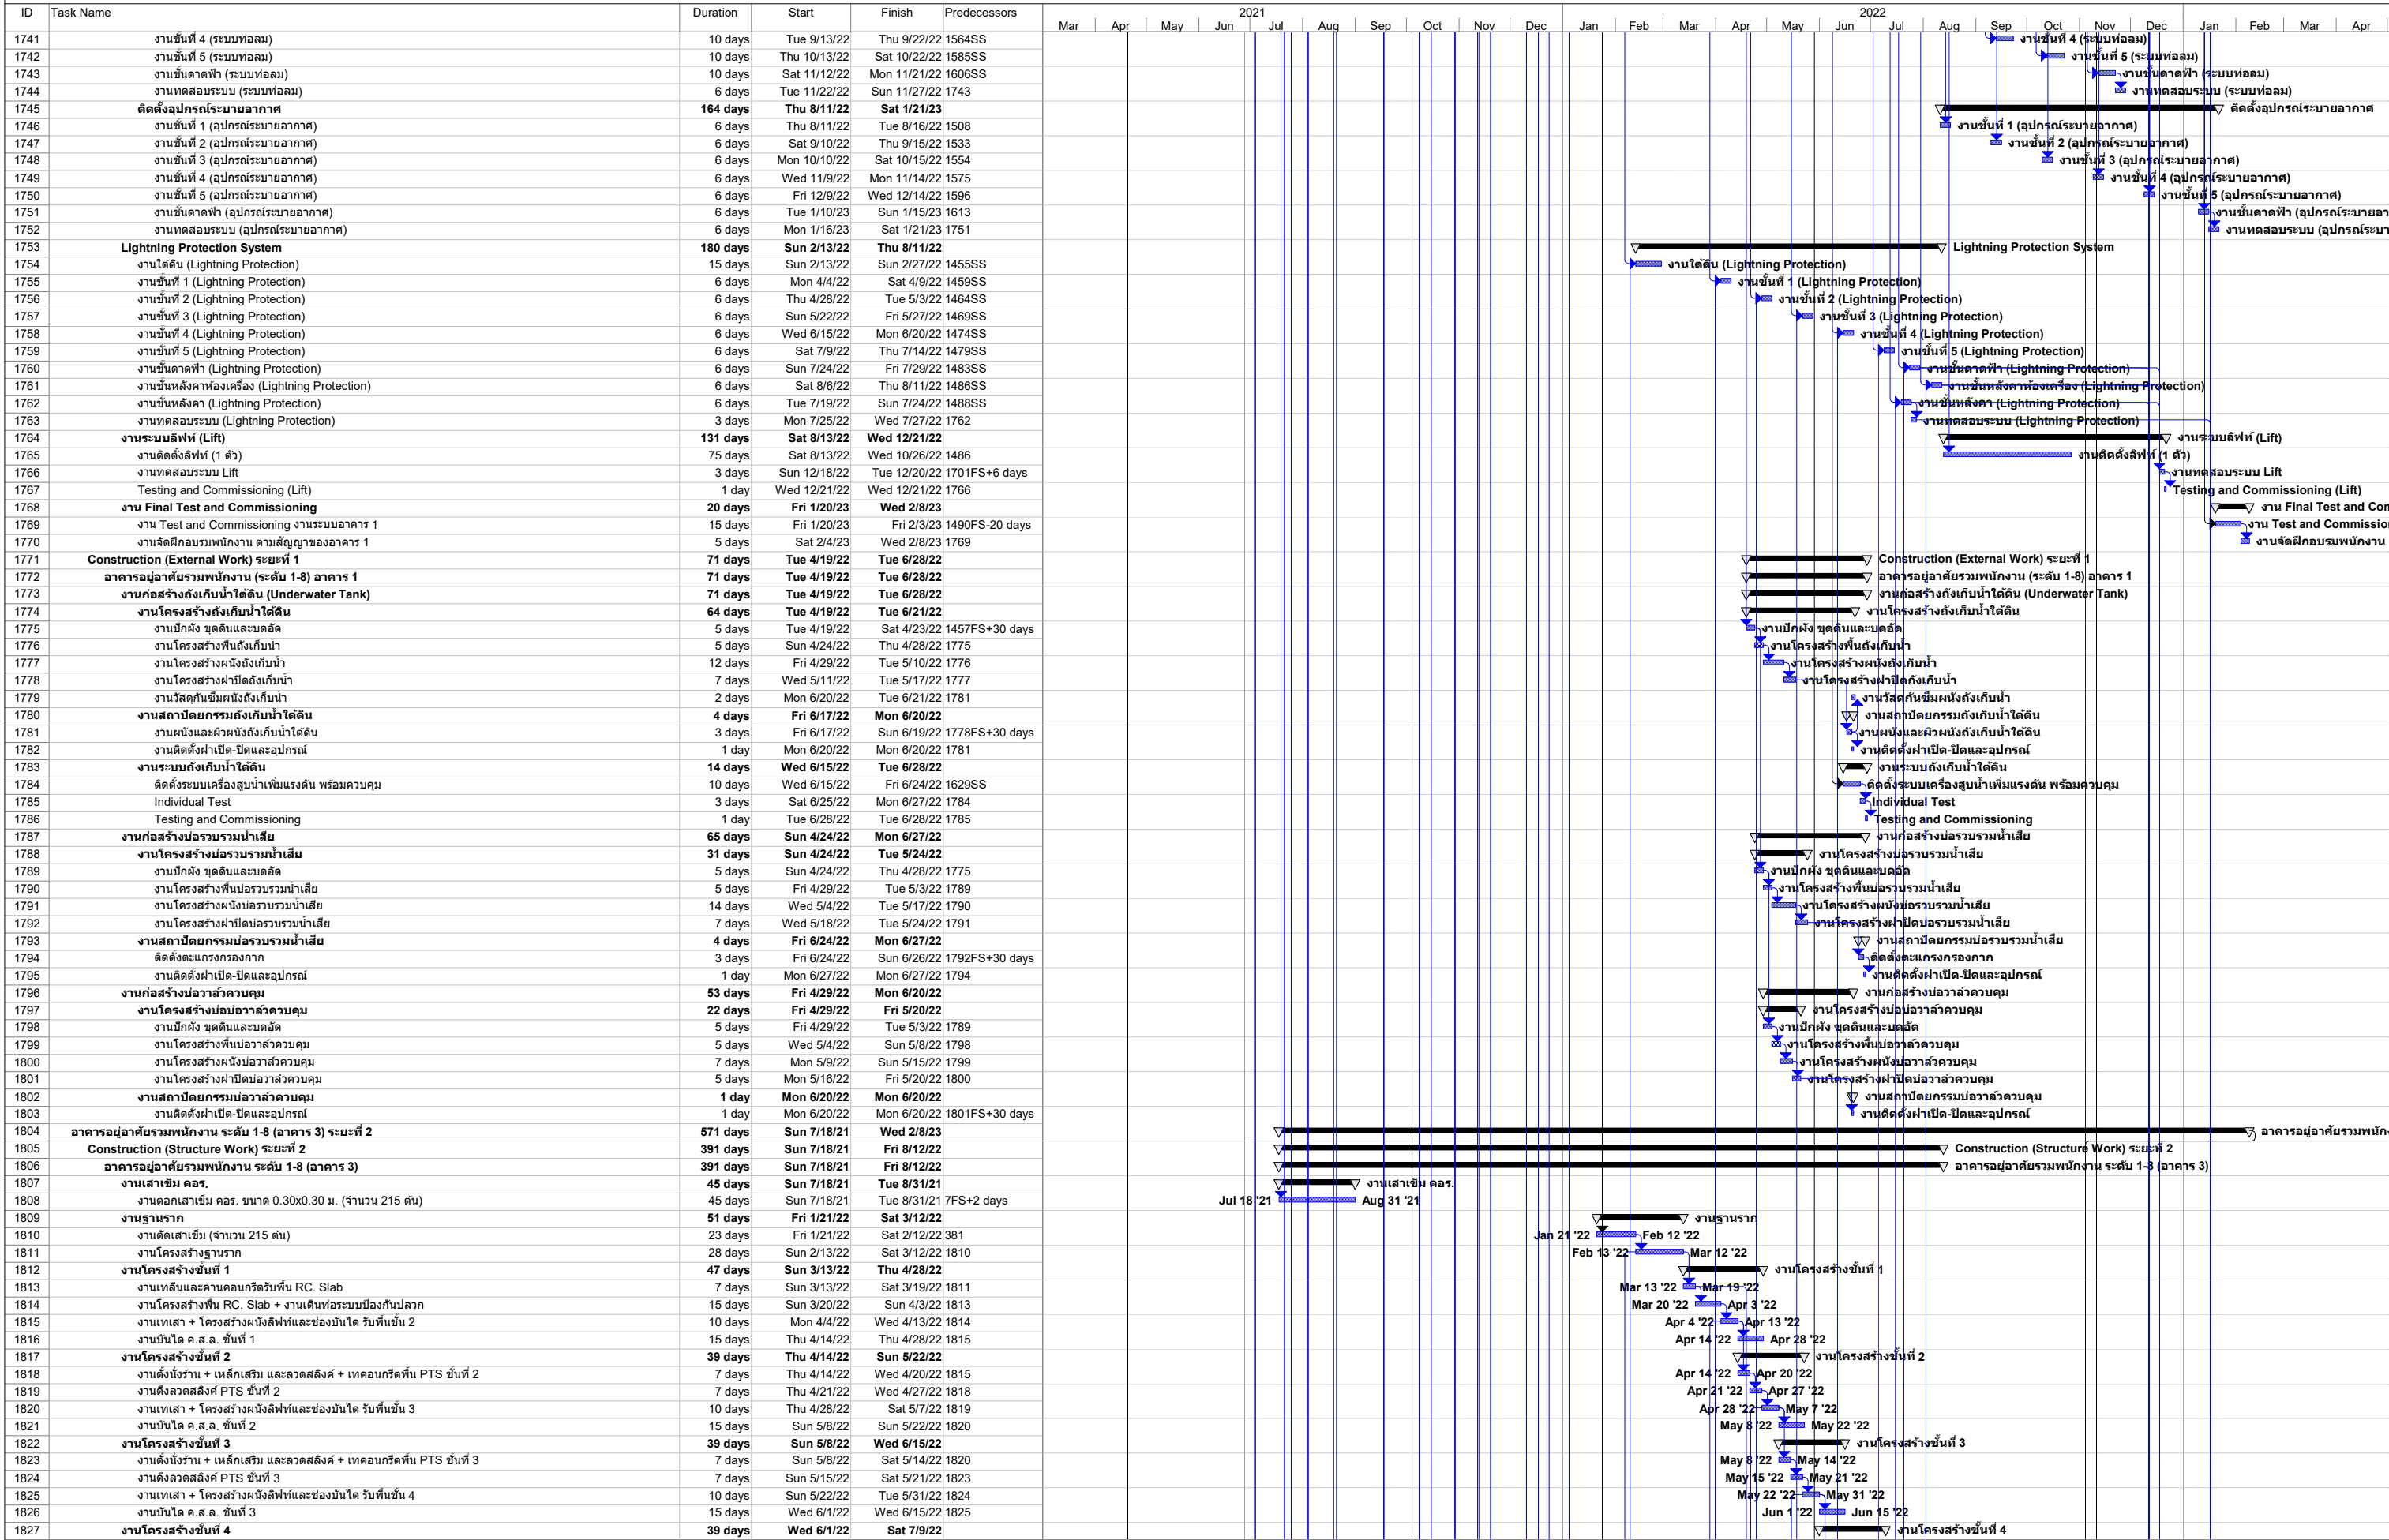

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

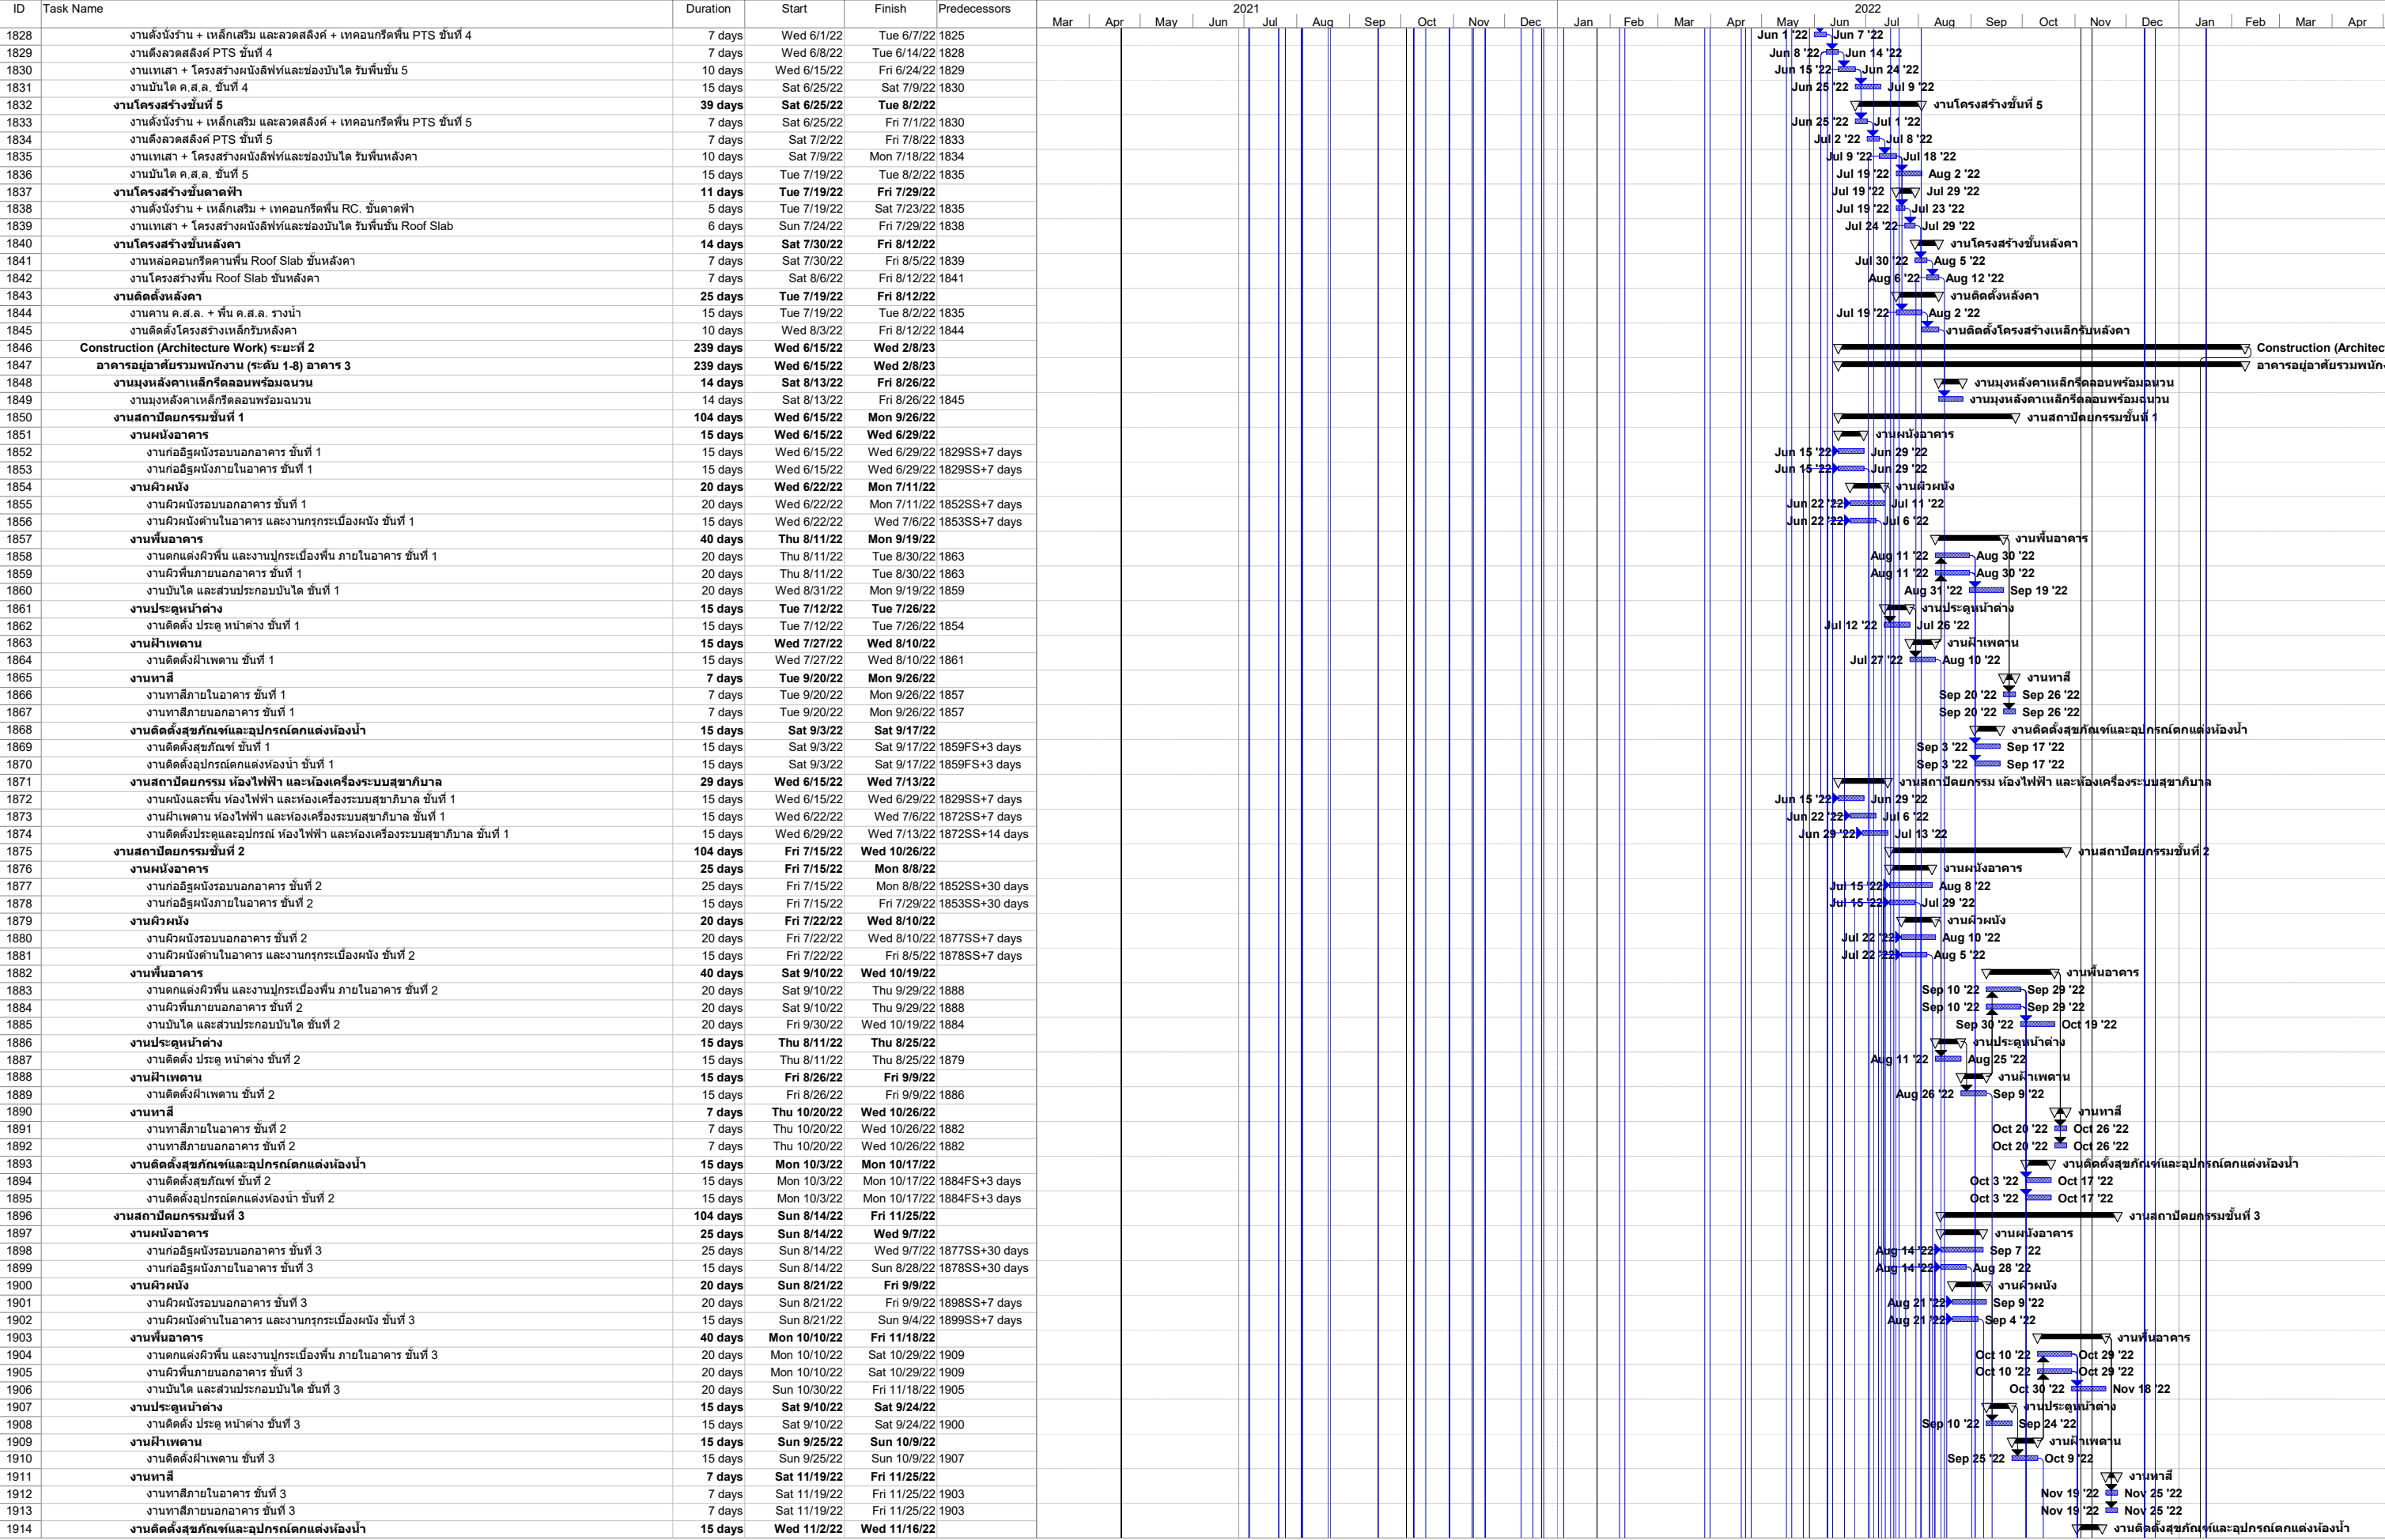

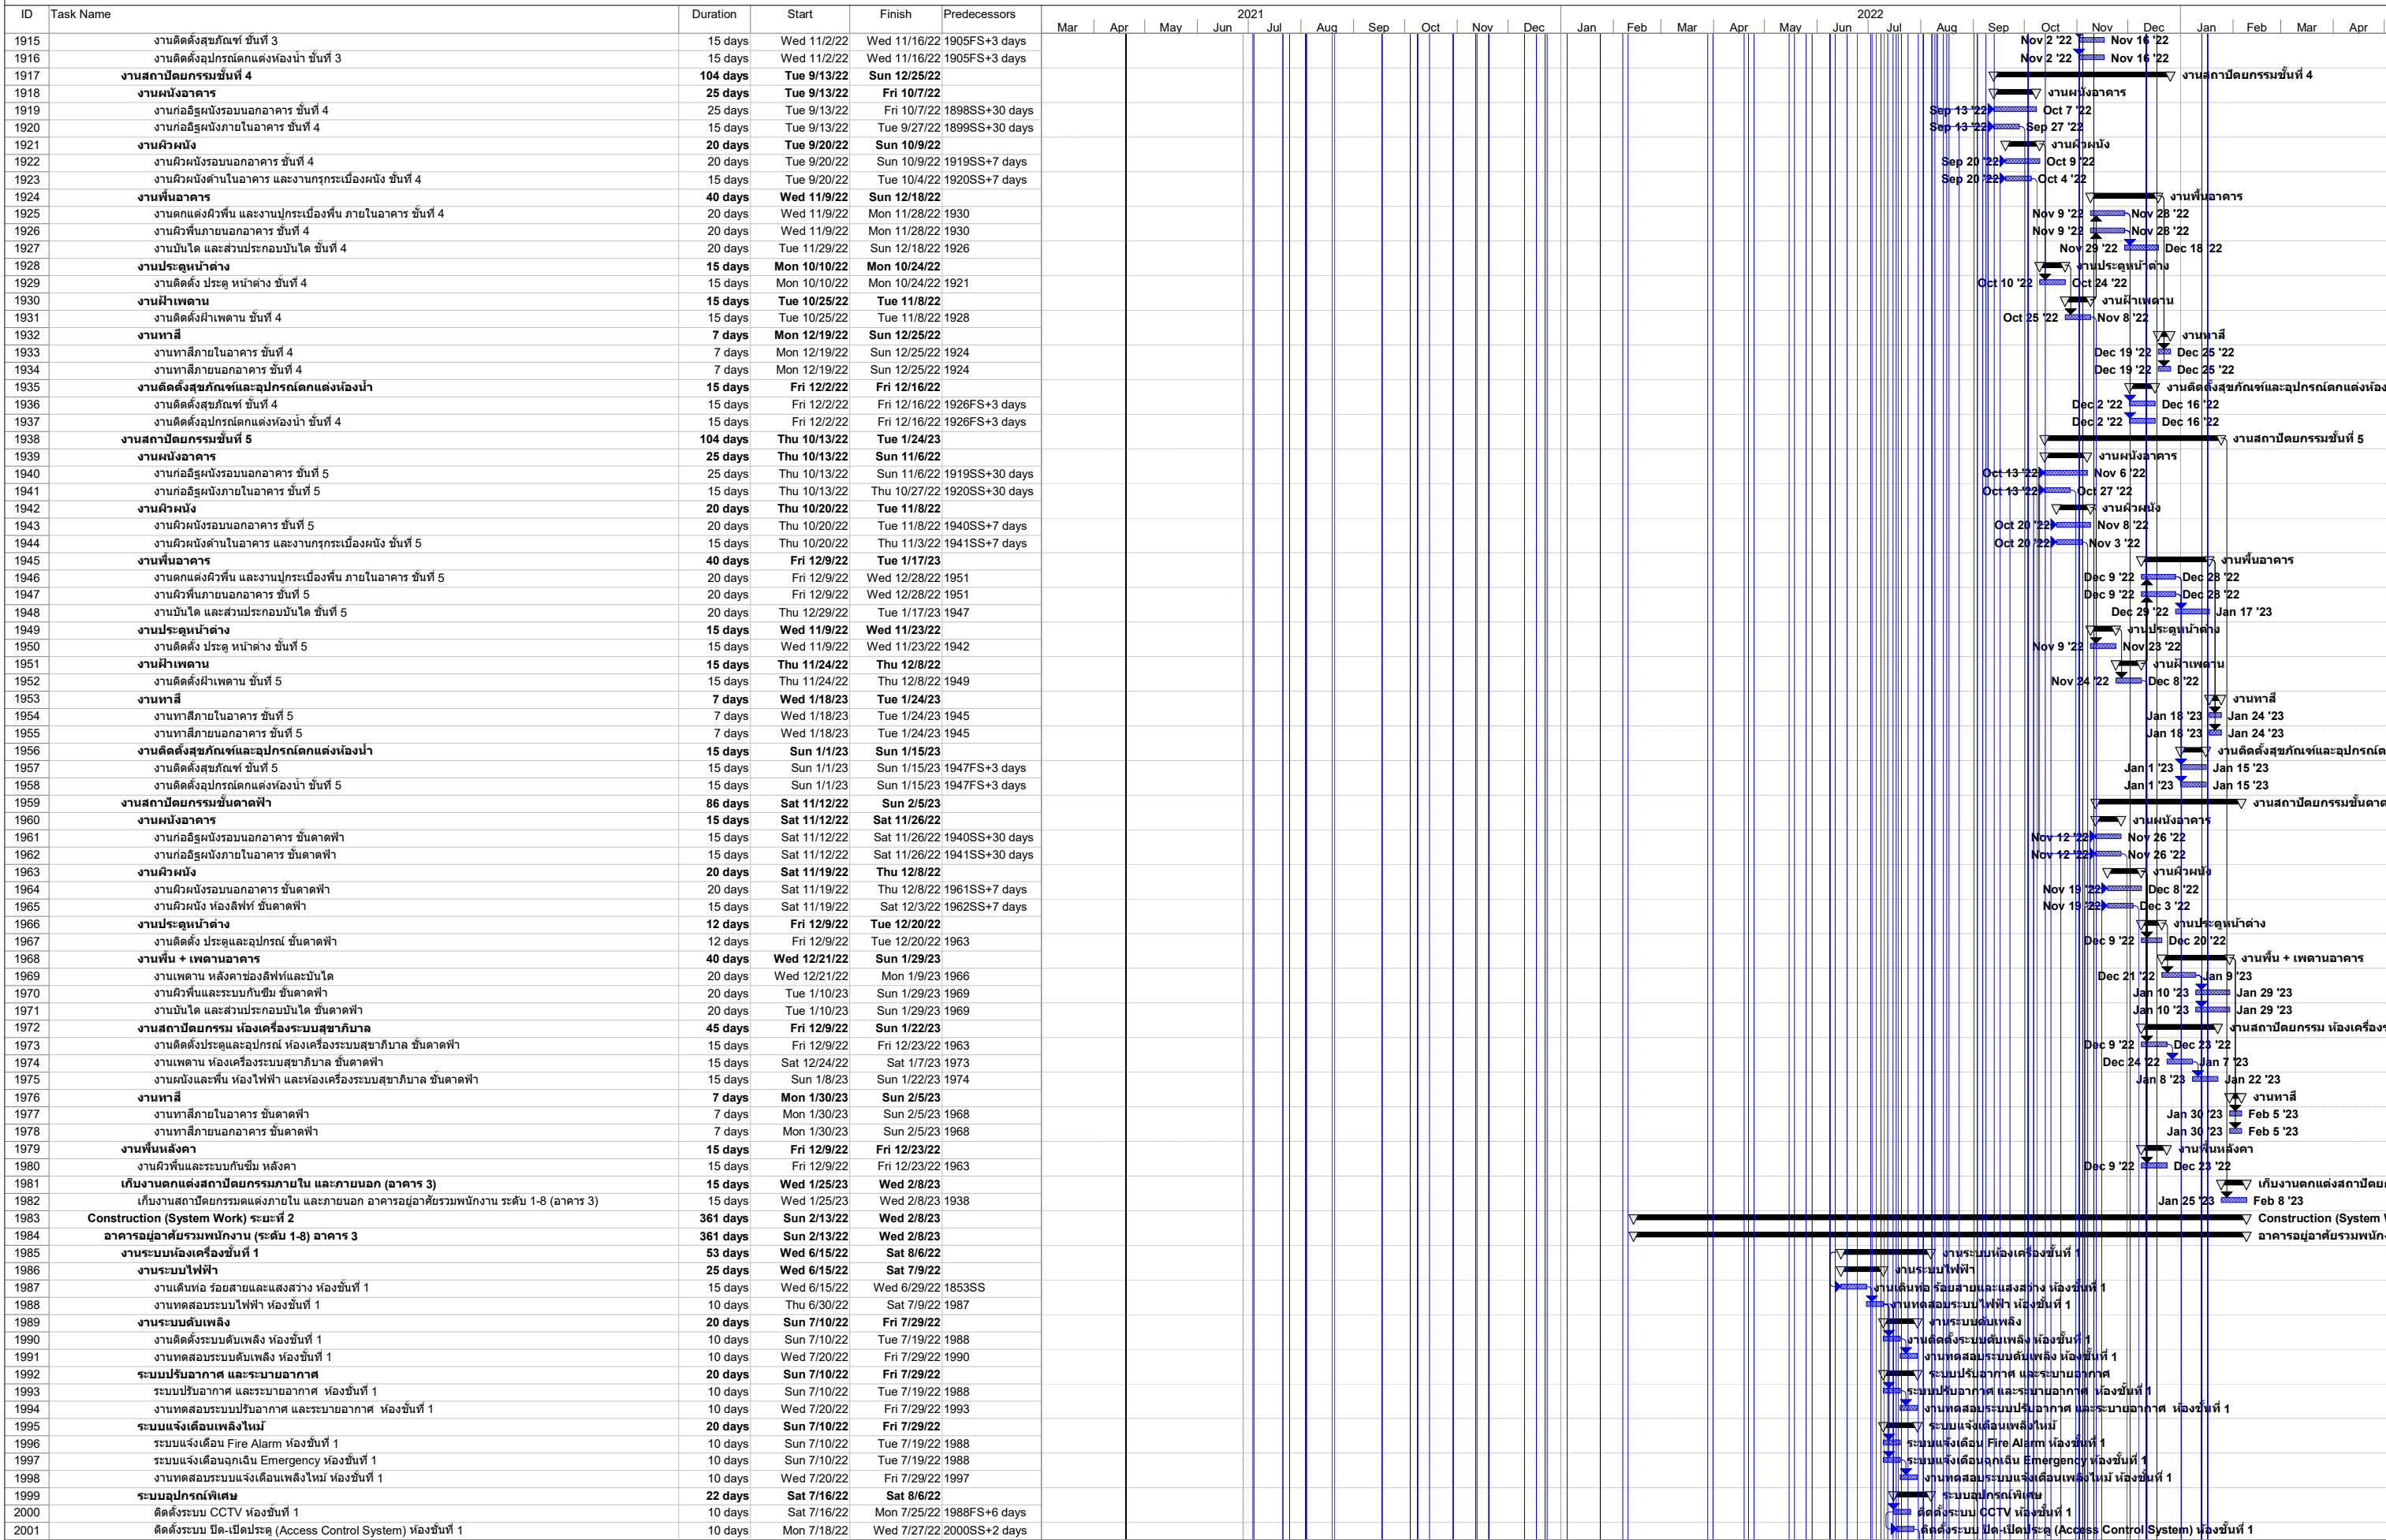


Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

[illegible]


Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	



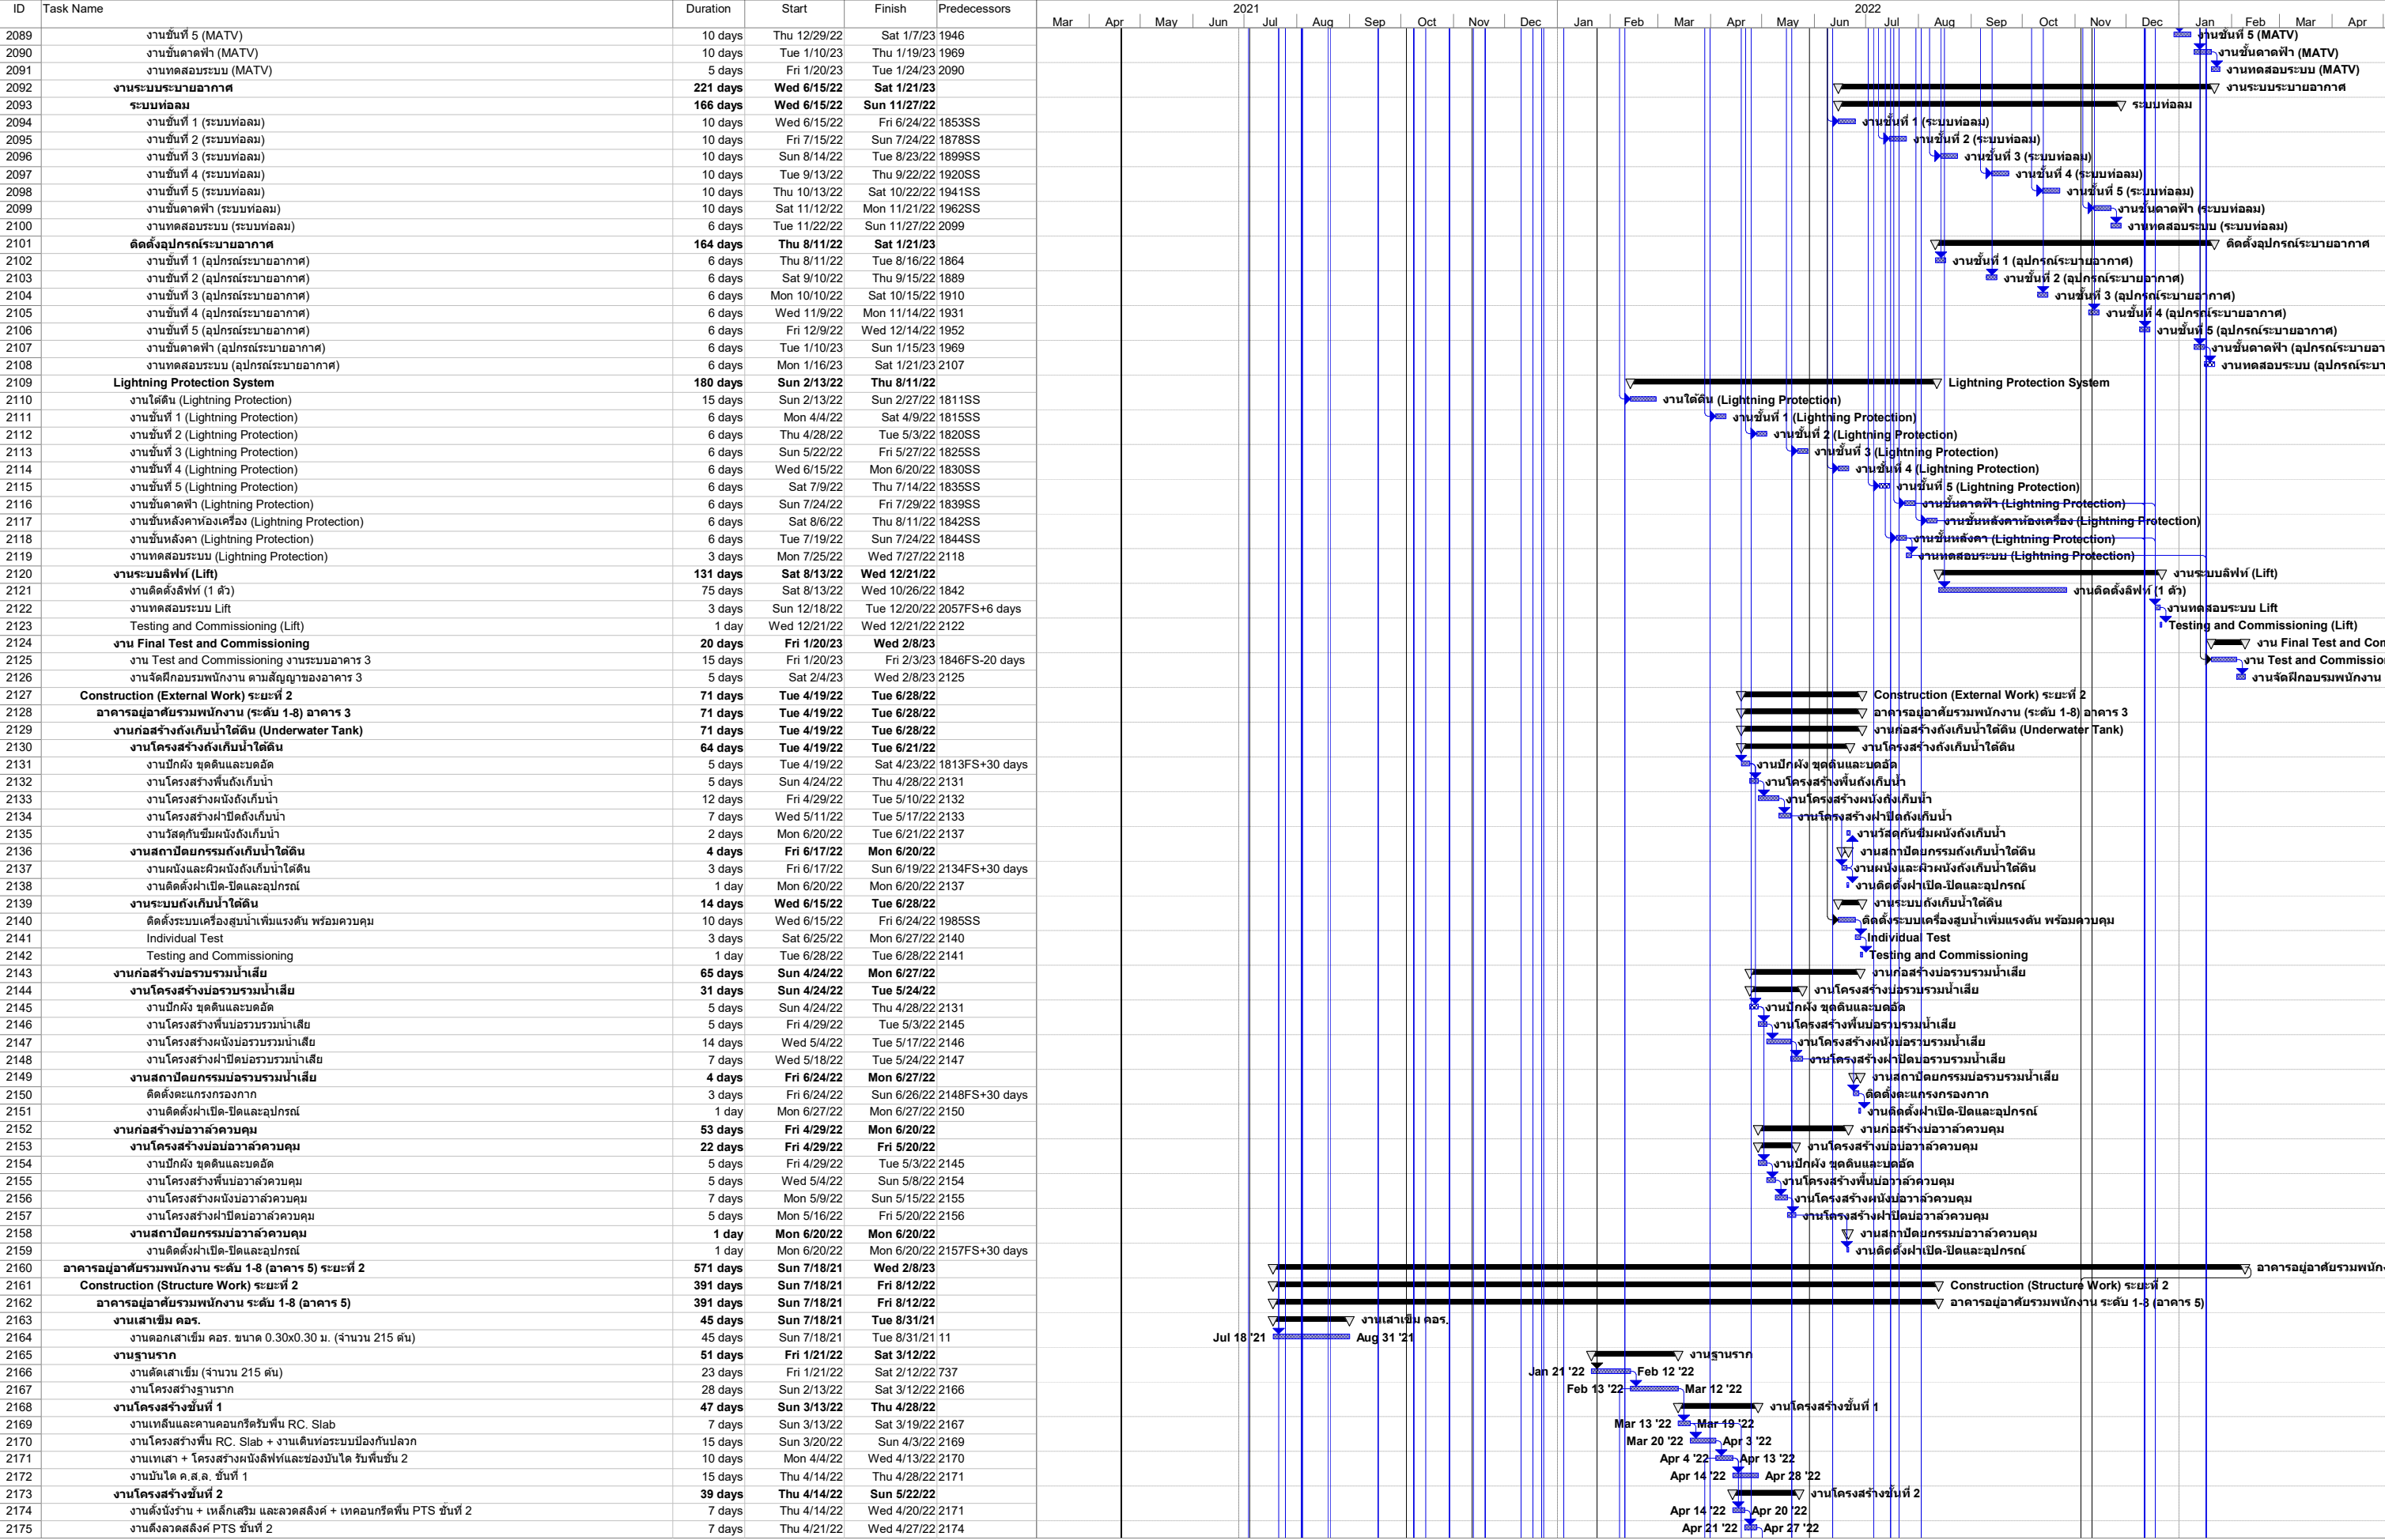





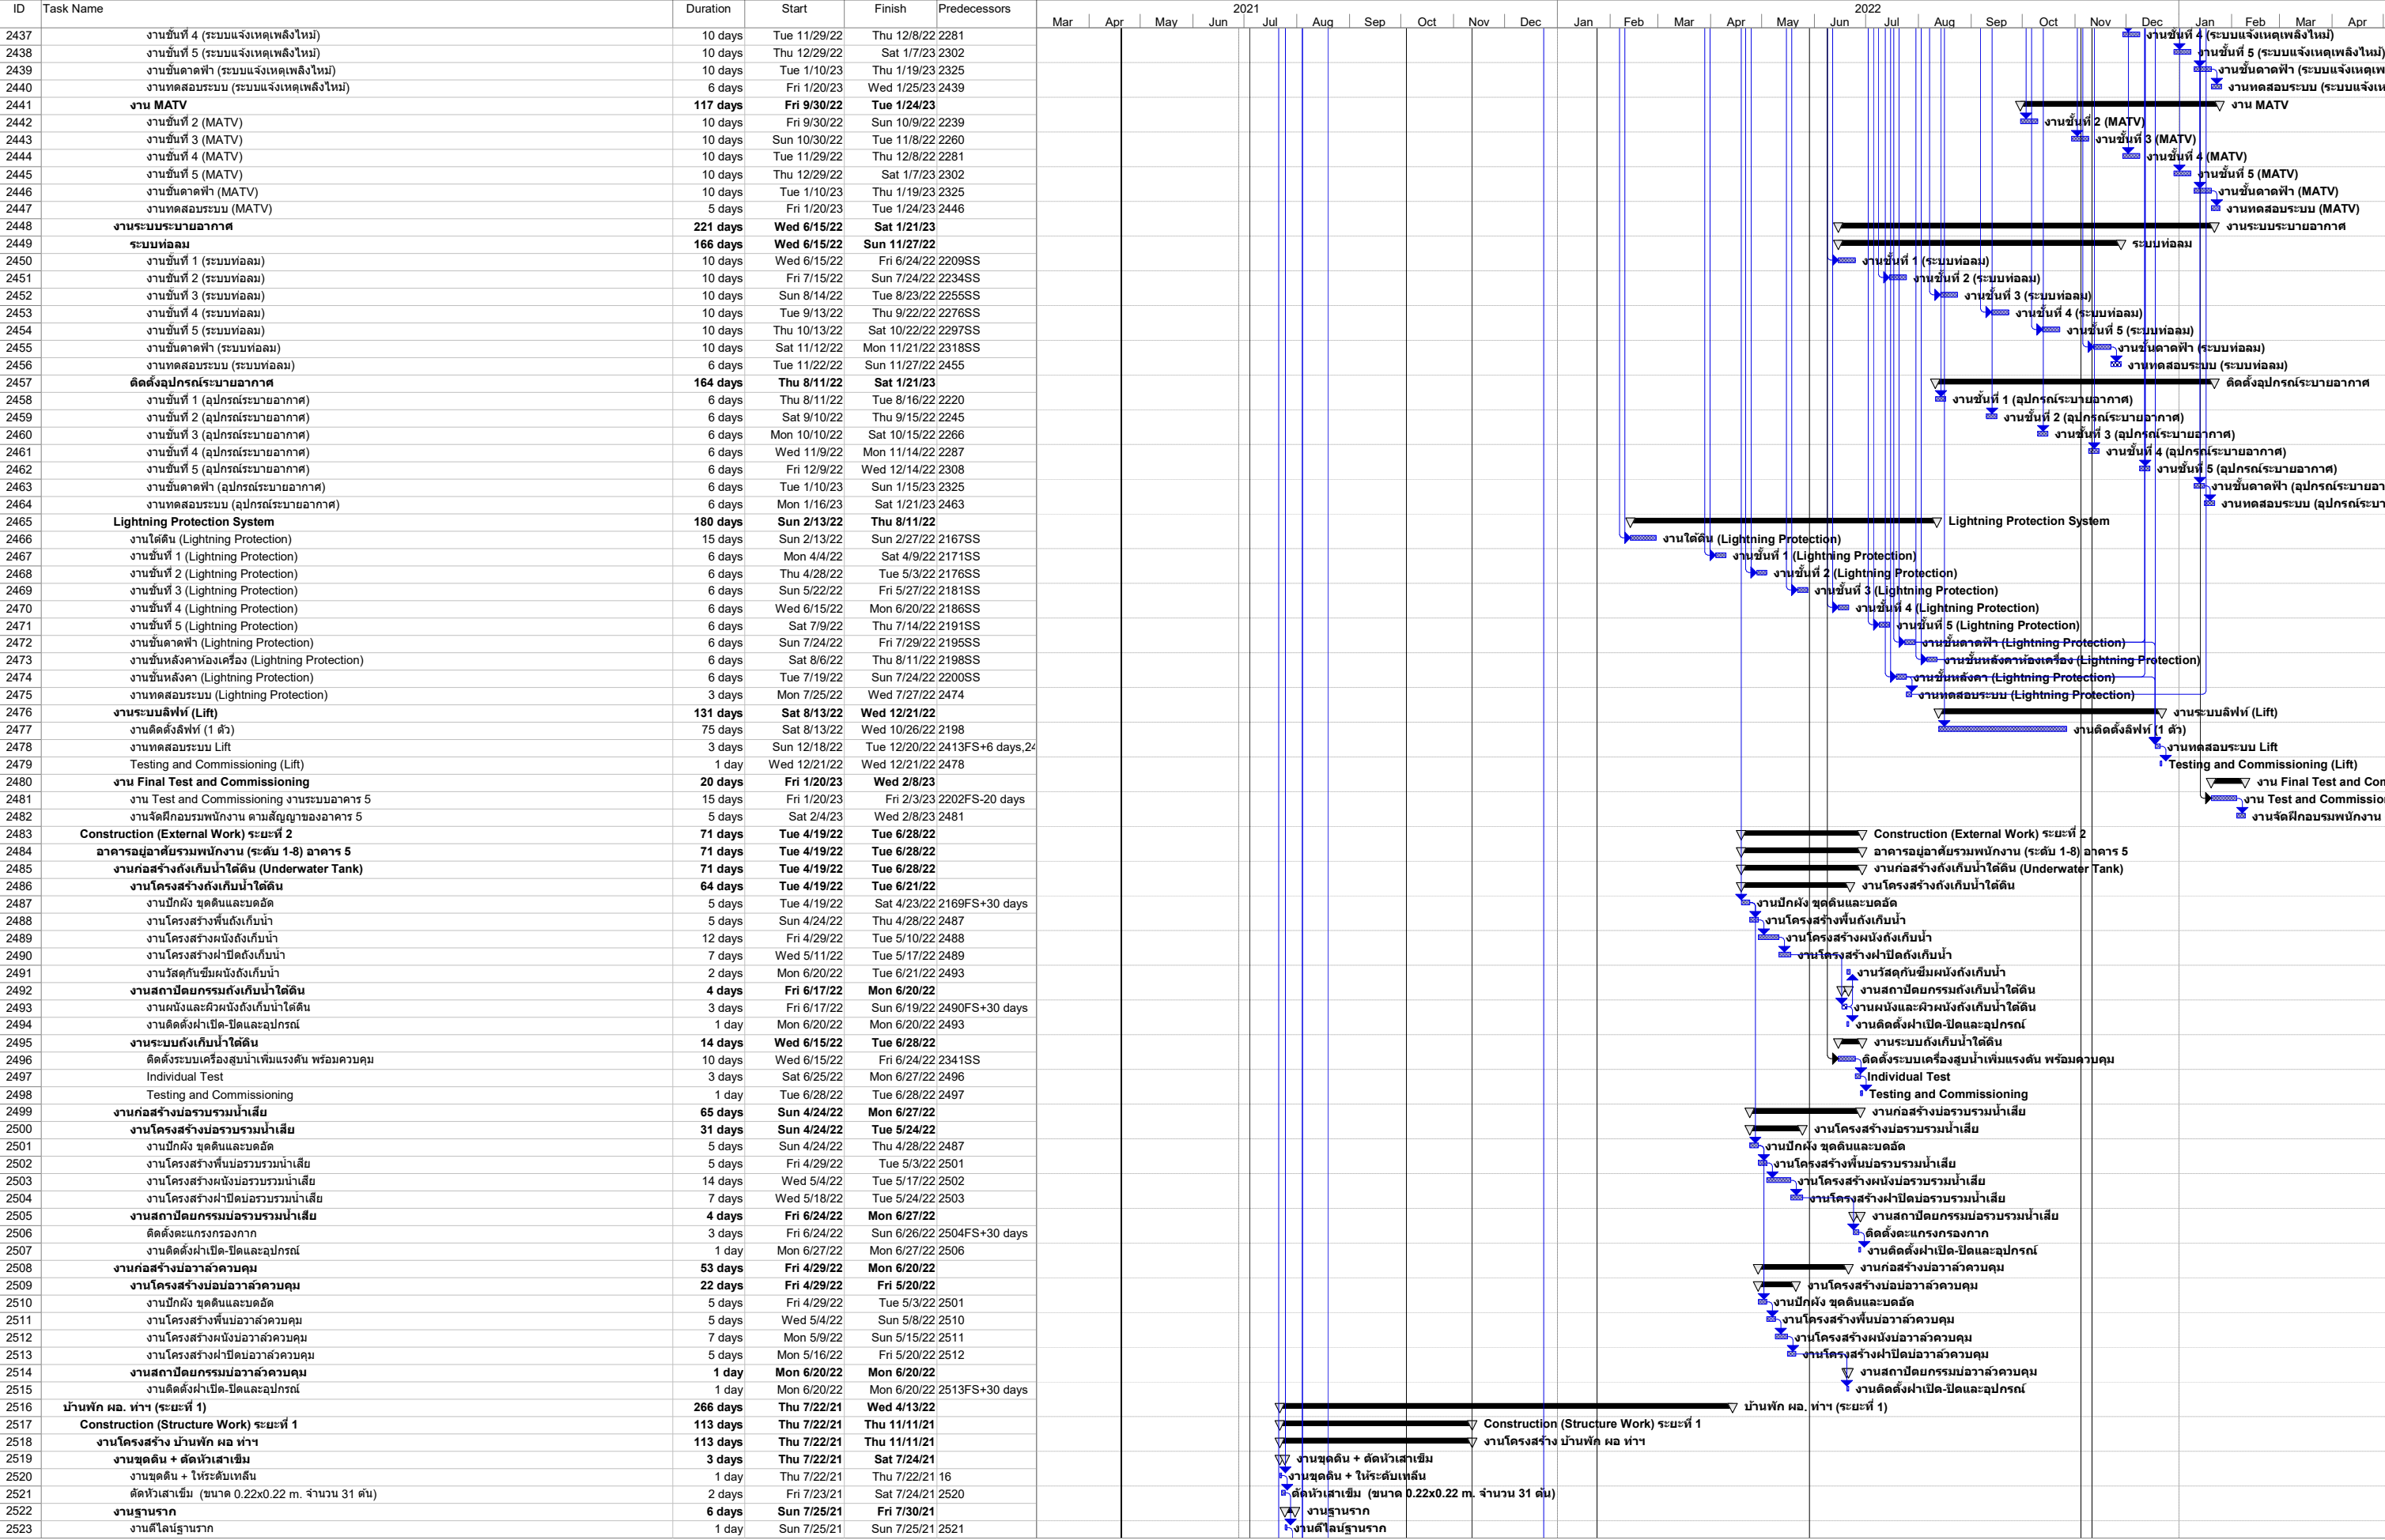









แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	2021	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	2022	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
2176	งานเสา + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น 3	10 days	Thu 4/28/22	Sat 5/7/22 2175																	Apr 28 '22	May 7 '22											
2177	งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 2	15 days	Sun 5/8/22	Sun 5/22/22 2176																	May 8 '22	May 22 '22											
2178	งานโครงสร้างชั้นที่ 3	39 days	Sun 5/8/22	Wed 6/15/22																													
2179	งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม และลาดสลิงค์ + เทคอนกรีตพื้น PTS ชั้นที่ 3	7 days	Sun 5/8/22	Sat 5/14/22 2176																													
2180	งานตั้งลาดสลิงค์ PTS ชั้นที่ 3	7 days	Sun 5/15/22	Sat 5/21/22 2179																													
2181	งานเสา + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น 4	10 days	Sun 5/22/22	Tue 5/31/22 2180																													
2182	งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 3	15 days	Wed 6/1/22	Wed 6/15/22 2181																													
2183	งานโครงสร้างชั้นที่ 4	39 days	Wed 6/1/22	Sat 7/9/22																													
2184	งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม และลาดสลิงค์ + เทคอนกรีตพื้น PTS ชั้นที่ 4	7 days	Wed 6/1/22	Tue 6/7/22 2181																													
2185	งานตั้งลาดสลิงค์ PTS ชั้นที่ 4	7 days	Wed 6/8/22	Tue 6/14/22 2184																													
2186	งานเสา + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น 5	10 days	Wed 6/15/22	Fri 6/24/22 2185																													
2187	งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 4	15 days	Sat 6/25/22	Sat 7/9/22 2186																													
2188	งานโครงสร้างชั้นที่ 5	39 days	Sat 6/25/22	Tue 8/2/22																													
2189	งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม และลาดสลิงค์ + เทคอนกรีตพื้น PTS ชั้นที่ 5	7 days	Sat 6/25/22	Fri 7/1/22 2186																													
2190	งานตั้งลาดสลิงค์ PTS ชั้นที่ 5	7 days	Sat 7/2/22	Fri 7/8/22 2189																													
2191	งานเสา + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นหลังคา	10 days	Sat 7/9/22	Mon 7/18/22 2190																													
2192	งานบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 5	15 days	Tue 7/19/22	Tue 8/2/22 2191																													
2193	งานโครงสร้างชั้นลาดฟ้า	11 days	Tue 7/19/22	Fri 7/29/22																													
2194	งานตั้งนั่งร้าน + เหล็กเสริม + เทคอนกรีตพื้น RC. ชั้นลาดฟ้า	5 days	Tue 7/19/22	Sat 7/23/22 2191																													
2195	งานเสา + โครงสร้างผนังลิฟท์และช่องบันได รับพื้นชั้น Roof Slab	6 days	Sun 7/24/22	Fri 7/29/22 2194																													
2196	งานโครงสร้างชั้นหลังคา	14 days	Sat 7/30/22	Fri 8/12/22																													
2197	งานหล่อคอนกรีตคานพื้น Roof Slab ชั้นหลังคา	7 days	Sat 7/30/22	Fri 8/5/22 2195																													
2198	งานโครงสร้างพื้น Roof Slab ชั้นหลังคา	7 days	Sat 8/6/22	Fri 8/12/22 2197																													
2199	งานติดตั้งหลังคา	25 days	Tue 7/19/22	Fri 8/12/22																													
2200	งานคาน ค.ส.ล. + พื้น ค.ส.ล. รางน้ำ	15 days	Tue 7/19/22	Tue 8/2/22 2191																													
2201	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กชั้นหลังคา	10 days	Wed 8/3/22	Fri 8/12/22 2200																													
2202	Construction (Architecture Work) ระยะที่ 2	239 days	Wed 6/15/22	Wed 2/8/23																													
2203	อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน (ระดับ 1-8) อาคาร 5	239 days	Wed 6/15/22	Wed 2/8/23																													
2204	งานมุงหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมฉนวน	14 days	Sat 8/13/22	Fri 8/26/22																													
2205	งานมุงหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมฉนวน	14 days	Sat 8/13/22	Fri 8/26/22 2201																													
2206	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 1	104 days	Wed 6/15/22	Mon 9/26/22																													
2207	งานผนังอาคาร	15 days	Wed 6/15/22	Wed 6/29/22																													
2208	งานก่ออิฐผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 1	15 days	Wed 6/15/22	Wed 6/29/22 2185SS+7 days																													
2209	งานก่ออิฐผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 1	15 days	Wed 6/15/22	Wed 6/29/22 2185SS+7 days																													
2210	งานค้ำผนัง	20 days	Wed 6/22/22	Mon 7/11/22																													
2211	งานค้ำผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Wed 6/22/22	Mon 7/11/22 2208SS+7 days																													
2212	งานค้ำผนังด้านในอาคาร และงานกรุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 1	15 days	Wed 6/22/22	Wed 7/6/22 2209SS+7 days																													
2213	งานพื้นอาคาร	40 days	Thu 8/11/22	Mon 9/19/22																													
2214	งานตกแต่งผิวพื้น และงานปูกระเบื้องพื้น ภายในอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Thu 8/11/22	Tue 8/30/22 2219																													
2215	งานผิวพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1	20 days	Thu 8/11/22	Tue 8/30/22 2219																													
2216	งานบันได และส่วนประกอบบันได ชั้นที่ 1	20 days	Wed 8/31/22	Mon 9/19/22 2215																													
2217	งานประตูหน้าต่าง	15 days	Tue 7/12/22	Tue 7/26/22																													
2218	งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 1	15 days	Tue 7/12/22	Tue 7/26/22 2210																													
2219	งานฝ้าเพดาน	15 days	Wed 7/27/22	Wed 8/10/22																													
2220	งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1	15 days	Wed 7/27/22	Wed 8/10/22 2217																													
2221	งานทาสี	7 days	Tue 9/20/22	Mon 9/26/22																													
2222	งานทาสีภายในอาคาร ชั้นที่ 1	7 days	Tue 9/20/22	Mon 9/26/22 2213																													
2223	งานทาสีภายนอกอาคาร ชั้นที่ 1	7 days	Tue 9/20/22	Mon 9/26/22 2213																													
2224	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์กดถังล้างห้องน้ำ	15 days	Sat 9/3/22	Sat 9/17/22																													
2225	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 1	15 days	Sat 9/3/22	Sat 9/17/22 2215FS+3 days																													
2226	งานติดตั้งอุปกรณ์กดถังล้างห้องน้ำ ชั้นที่ 1	15 days	Sat 9/3/22	Sat 9/17/22 2215FS+3 days																													
2227	งานสถาปัตยกรรม ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล	29 days	Wed 6/15/22	Wed 7/13/22																													
2228	งานผนังและพื้น ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1	15 days	Wed 6/15/22	Wed 6/29/22 2185SS+7 days																													
2229	งานฝ้าเพดาน ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1	15 days	Wed 6/22/22	Wed 7/6/22 2228SS+7 days																													
2230	งานติดตั้งประตูและอุปกรณ์ ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1	15 days	Wed 6/29/22	Wed 7/13/22 2228SS+14 days																													
2231	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 2	104 days	Fri 7/15/22	Wed 10/26/22																													
2232	งานผนังอาคาร	25 days	Fri 7/15/22	Mon 8/8/22																													
2233	งานก่ออิฐผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 2	25 days	Fri 7/15/22	Mon 8/8/22 2208SS+30 days																													
2234	งานก่ออิฐผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 2	15 days	Fri 7/15/22	Fri 7/29/22 2209SS+30 days																													
2235	งานค้ำผนัง	20 days	Fri 7/22/22	Wed 8/10/22																													
2236	งานค้ำผนังรอบนอกอาคาร ชั้นที่ 2	20 days	Fri 7/22/22	Wed 8/10/22 2233SS+7 days																													
2237	งานค้ำผนังด้านในอาคาร และงานกรุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 2	15 days	Fri 7/22/22	Fri 8/5/22 2234SS+7 days																													
2238	งานพื้นอาคาร	40 days	Sat 9/10/22	Wed 10/19/22																													
2239	งานตกแต่งผิวพื้น และงานปูกระเบื้องพื้น ภายในอาคาร ชั้นที่ 2	20 days	Sat 9/10/22	Thu 9/29/22 2244																													
2240	งานผิวพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 2	20 days	Sat 9/10/22	Thu 9/29/22 2244																													
2241	งานบันได และส่วนประกอบบันได ชั้นที่ 2	20 days	Fri 9/30/22	Wed 10/19/22 2240																													
2242	งานประตูหน้าต่าง	15 days	Thu 8/11/22	Thu 8																													

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	2021	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	2022	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
2350	งานทดสอบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ห้องชั้นที่ 1	10 days	Wed 7/20/22	Fri 7/29/22 2349																													
2351	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	20 days	Sun 7/10/22	Fri 7/29/22																													
2352	ระบบแจ้งเตือน Fire Alarm ห้องชั้นที่ 1	10 days	Sun 7/10/22	Tue 7/19/22 2344																													
2353	ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน Emergency ห้องชั้นที่ 1	10 days	Sun 7/10/22	Tue 7/19/22 2344																													
2354	งานทดสอบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ห้องชั้นที่ 1	10 days	Wed 7/20/22	Fri 7/29/22 2353																													
2355	ระบบอุปกรณ์พิเศษ	22 days	Sat 7/16/22	Sat 8/6/22																													
2356	ติดตั้งระบบ CCTV ห้องชั้นที่ 1	10 days	Sat 7/16/22	Mon 7/25/22 2344FS+6 days																													
2357	ติดตั้งระบบ ปิด-เปิดประตู (Access Control System) ห้องชั้นที่ 1	10 days	Mon 7/18/22	Wed 7/27/22 2356SS+2 days																													
2358	งานทดสอบระบบอุปกรณ์พิเศษ ห้องชั้นที่ 1	10 days	Thu 7/28/22	Sat 8/6/22 2357																													
2359	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	210 days	Wed 6/1/22	Tue 12/27/22																													
2360	ระบบประปา (CW)	174 days	Thu 6/30/22	Tue 12/20/22																													
2361	งานชั้นที่ 1 (CW)	12 days	Thu 6/30/22	Mon 7/11/22 2209																													
2362	งานชั้นที่ 2 (CW)	12 days	Sat 7/30/22	Wed 8/10/22 2234																													
2363	งานชั้นที่ 3 (CW)	12 days	Mon 8/29/22	Fri 9/9/22 2255																													
2364	งานชั้นที่ 4 (CW)	12 days	Wed 9/28/22	Sun 10/9/22 2276																													
2365	งานชั้นที่ 5 (CW)	12 days	Fri 10/28/22	Tue 11/8/22 2297																													
2366	งานชั้นลาดฟ้า (CW)	12 days	Sun 11/27/22	Thu 12/8/22 2318																													
2367	Individual Test (CW)	12 days	Fri 12/9/22	Tue 12/20/22 2366																													
2368	ระบบระบายน้ำเสีย (S,W,V)	174 days	Wed 6/1/22	Mon 11/21/22																													
2369	งานชั้นที่ 1 (S,W,V)	12 days	Wed 6/1/22	Sun 6/12/22 2209SS-14 days																													
2370	งานชั้นที่ 2 (S,W,V)	12 days	Fri 7/1/22	Tue 7/12/22 2234SS-14 days																													
2371	งานชั้นที่ 3 (S,W,V)	12 days	Sun 7/31/22	Thu 8/11/22 2255SS-14 days																													
2372	งานชั้นที่ 4 (S,W,V)	12 days	Tue 8/30/22	Sat 9/10/22 2276SS-14 days																													
2373	งานชั้นที่ 5 (S,W,V)	12 days	Thu 9/29/22	Mon 10/10/22 2297SS-14 days																													
2374	งานชั้นลาดฟ้า (S,W,V)	12 days	Sat 10/29/22	Wed 11/9/22 2318SS-14 days																													
2375	Individual Test (S,W,V)	12 days	Thu 11/10/22	Mon 11/21/22 2374																													
2376	ระบบดับเพลิง (FP)	174 days	Thu 7/7/22	Tue 12/27/22																													
2377	งานชั้นที่ 1 (FP)	12 days	Thu 7/7/22	Mon 7/18/22 2212																													
2378	งานชั้นที่ 2 (FP)	12 days	Sat 8/6/22	Wed 8/17/22 2237																													
2379	งานชั้นที่ 3 (FP)	12 days	Mon 9/5/22	Fri 9/16/22 2258																													
2380	งานชั้นที่ 4 (FP)	12 days	Wed 10/5/22	Sun 10/16/22 2279																													
2381	งานชั้นที่ 5 (FP)	12 days	Fri 11/4/22	Tue 11/15/22 2300																													
2382	งานชั้นลาดฟ้า (FP)	12 days	Sun 12/4/22	Thu 12/15/22 2321																													
2383	Individual Test (FP)	12 days	Fri 12/16/22	Tue 12/27/22 2382																													
2384	งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำประปา (อาคาร 5) เข้ากับระบบท่อน้ำประปาโครงการ	4 days	Thu 11/24/22	Sun 11/27/22																													
2385	งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำประปา (อาคาร 5) เข้ากับระบบท่อน้ำประปาโครงการ	3 days	Thu 11/24/22	Sat 11/26/22 2366FS-15 days																													
2386	งานทดสอบระบบสุขาภิบาล (อาคาร 5)	1 day	Sun 11/27/22	Sun 11/27/22 2385																													
2387	งานระบบไฟฟ้า	219 days	Wed 6/15/22	Thu 1/19/23																													
2388	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ / Substation	154 days	Fri 7/15/22	Thu 12/15/22																													
2389	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	10 days	Fri 7/15/22	Sun 7/24/22 2409SS,2468SS,2																													
2390	Individual Test	3 days	Mon 12/12/22	Wed 12/14/22 2413,2472,2473,2																													
2391	Testing and Commissioning (Sub Station)	1 day	Thu 12/15/22	Thu 12/15/22 2390																													
2392	งานงานเดินท่อ (Conduit Pipe)	165 days	Wed 6/15/22	Sat 11/26/22																													
2393	งานชั้นที่ 1 (Conduit Pipe)	15 days	Wed 6/15/22	Wed 6/29/22 2408SS,2467SS,2																													
2394	งานชั้นที่ 2 (Conduit Pipe)	15 days	Fri 7/15/22	Fri 7/29/22 2409SS,2468SS,2																													
2395	งานชั้นที่ 3 (Conduit Pipe)	15 days	Sun 8/14/22	Sun 8/28/22 2410SS,2469SS,2																													
2396	งานชั้นที่ 4 (Conduit Pipe)	15 days	Tue 9/13/22	Tue 9/27/22 2411SS,2470SS,2																													
2397	งานชั้นที่ 5 (Conduit Pipe)	15 days	Thu 10/13/22	Thu 10/27/22 2412SS,2471SS,2																													
2398	งานชั้นลาดฟ้า (Conduit Pipe)	15 days	Sat 11/12/22	Sat 11/26/22 2413SS,2472SS,2																													
2399	งานร้อยสายไฟ (Wiring)	171 days	Wed 6/29/22	Fri 12/16/22																													
2400	งานชั้นที่ 1 (Wiring)	15 days	Wed 6/29/22	Wed 7/13/22 2212SS+7 days																													
2401	งานชั้นที่ 2 (Wiring)	15 days	Fri 7/29/22	Fri 8/12/22 2237SS+7 days																													
2402	งานชั้นที่ 3 (Wiring)	15 days	Sun 8/28/22	Sun 9/11/22 2258SS+7 days																													
2403	งานชั้นที่ 4 (Wiring)	15 days	Tue 9/27/22	Tue 10/11/22 2279SS+7 days																													
2404	งานชั้นที่ 5 (Wiring)	15 days	Thu 10/27/22	Thu 11/10/22 2300SS+7 days																													
2405	งานชั้นลาดฟ้า (Wiring)	15 days	Sat 11/26/22	Sat 12/10/22 2321SS+7 days																													
2406	งานทดสอบระบบไฟฟ้า	6 days	Sun 12/11/22	Fri 12/16/22 2405																													
2407	Lighting System	216 days	Wed 6/15/22	Mon 1/16/23																													
2408	งานชั้นที่ 1 (Lighting)	30 days	Wed 6/15/22	Thu 7/14/22 2212SS-7 days																													
2409	งานชั้นที่ 2 (Lighting)	30 days	Fri 7/15/22	Sat 8/13/22 2237SS-7 days																													
2410	งานชั้นที่ 3 (Lighting)	30 days	Sun 8/14/22	Mon 9/12/22 2258SS-7 days																													
2411	งานชั้นที่ 4 (Lighting)	30 days	Tue 9/13/22	Wed 10/12/22 2279SS-7 days																													
2412	งานชั้นที่ 5 (Lighting)	30 days	Thu 10/13/22	Fri 11/11/22 2300SS-7 days																													
2413	งานชั้นลาดฟ้า (Lighting)	30 days	Sat 11/12/22	Sun 12/11/22 2321SS-7 days																													
2414	งานทดสอบระบบ (Lighting)	6 days	Wed 1/11/23	Mon 1/16/23 2413FS+30 days																													
2415	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (อาคาร 5) เข้ากับระบบไฟฟ้าโครงการ	3 days	Tue 1/17/23	Thu 1/19/23																													
2416	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (อาคาร 5) เข้ากับระบบไฟฟ้าโครงการ	3 days	Tue 1/17/23																														



Task	 Summary	 External Milestone	 Inactive Summary	 Manual Summary Rollup	 Finish-only	 Deadline
Split	 Project Summary	 Inactive Task	 Manual Task	 Manual Summary	 Progress	 Deadline
Milestone	 External Tasks	 Inactive Milestone	 Duration-only	 Start-only	 Deadline	 Deadline

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

[illegible]

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง


Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
งานสถาปัตยกรรมและงานระบบชั้น 2	102 days	Fri 11/19/21	Mon 2/28/22																											
ตีไลน์ผนังห้อง และประตู-หน้าต่าง + ตรวจสอบไลน์	2 days	Fri 11/19/21	Sat 11/20/21 2598																											
งานเพ้นท์+เดินท่อน้ำงานระบบ S,W,V	3 days	Wed 11/24/21	Fri 11/26/21 2599																											
งานก่ออิฐ, เสาเอ็นทับหลังและวงกบ + โครงสร้างคานาเคอร์ล่าง	7 days	Sat 12/4/21	Fri 12/10/21 2600																											
เดินท่อน้ำงานระบบฝังในผนัง และได้ห้องพื้น	3 days	Tue 12/14/21	Thu 12/16/21 2601																											
งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นที่ทั้งชั้น	7 days	Fri 12/24/21	Thu 12/30/21 2602																											
งานทำกันซึมพื้น, ผนังห้องน้ำ และพื้นระเบียบพร้อมขังน้ำทดสอบ	3 days	Mon 1/3/22	Wed 1/5/22 2603																											
งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ + ตรวจสอบตำแหน่งและระดับข้อต่องานระบบบริเวณจุดเชื่อมต่อสุขภัณฑ์	3 days	Sun 1/9/22	Tue 1/11/22 2604																											
งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบสายงานระบบ	4 days	Sun 1/16/22	Wed 1/19/22 2605																											
ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน + ตรวจสอบการยึดโครงสร้าง	2 days	Sat 1/22/22	Sun 1/23/22 2606																											
งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน + ฉาบรอยต่อแผ่น + เจาะช่องอุปกรณ์งานระบบ	3 days	Thu 1/27/22	Sat 1/29/22 2607																											
งานปูพื้นกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และระเบียบ	5 days	Sun 2/6/22	Thu 2/10/22 2608																											
งานติดตั้งประตูไม้ และประตู WPC	7 days	Fri 2/18/22	Thu 2/24/22 2609																											
งานพื้นโวลิตลายไม้ และบัวพื้น	3 days	Sat 2/26/22	Mon 2/28/22 2610																											
งานอื่นๆ + งานภายนอก	91 days	Sun 1/2/22	Sat 4/2/22																											
งานฉาบภายนอก	7 days	Sun 1/2/22	Sat 1/8/22 2616FS+2 days																											
งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม + ราวจับเบี่ยง	7 days	Sun 1/9/22	Sat 1/15/22 2626																											
งานติดตั้งฉากกันอาบน้ำ	2 days	Sun 1/16/22	Mon 1/17/22 2627																											
ติดตั้งบันไดไม้และราวบันได	7 days	Tue 1/18/22	Mon 1/24/22 2628																											
ติดตั้งราวไม้ระเบียง	3 days	Tue 1/25/22	Thu 1/27/22 2629																											
ติดตั้งสวิตช์ + ปลั๊ก	1 day	Fri 1/28/22	Fri 1/28/22 2630																											
งานทาสีรองพื้นภายใน	2 days	Sun 1/30/22	Mon 1/31/22 2621,2626																											
งานทาสีฝ้าเพดานห้องภายใน, ห้องน้ำ และระเบียบ	3 days	Tue 2/1/22	Thu 2/3/22 2632																											
งานทาสีผนังภายใน	3 days	Fri 2/4/22	Sun 2/6/22 2633																											
งานทาสีผนังระเบียบ	3 days	Mon 2/7/22	Wed 2/9/22 2634																											
งานทาสีราวจับเบี่ยง	3 days	Thu 2/10/22	Sat 2/12/22 2635																											
งานทาสีราวบันไดหลัก	3 days	Sun 2/13/22	Tue 2/15/22 2636																											
งานติดตั้งสุขภัณฑ์	2 days	Wed 2/16/22	Thu 2/17/22 2637																											
ติดตั้งฝาคอมมสวิตช์ + ปลั๊ก	1 day	Fri 2/18/22	Fri 2/18/22 2638																											
ติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	2 days	Sat 2/19/22	Sun 2/20/22 2639																											
ติดตั้งตู้ดับเพลิง	1 day	Mon 2/21/22	Mon 2/21/22 2640																											
งานทาสีรองพื้นภายนอก + เติร์มการ	3 days	Wed 2/16/22	Fri 2/18/22 2637																											
ทาสีผนังภายนอก	3 days	Sat 2/19/22	Mon 2/21/22 2642																											
ชุดดับเพลิงวางถังบ้ำดับ	1 day	Thu 2/24/22	Thu 2/24/22 2643FS+2 days																											
งานเหล็กเสริมฐานรองรับถังบ้ำดับ	1 day	Fri 2/25/22	Fri 2/25/22 2644																											
งานไม้แบบฐานรองรับถังบ้ำดับ	1 day	Sat 2/26/22	Sat 2/26/22 2645																											
งานเทคอนกรีตฐานรองรับถังบ้ำดับ	1 day	Sun 2/27/22	Sun 2/27/22 2646																											
งานติดตั้งถังบ้ำดับไฟเบอร์	1 day	Mon 2/28/22	Mon 2/28/22 2647																											
งานกลบดินปรับระดับ	1 day	Tue 3/1/22	Tue 3/1/22 2648																											
ติดตั้งบ๊นน้ำแรงดันคงที่	1 day	Wed 3/2/22	Wed 3/2/22 2649																											
ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1 day	Tue 2/22/22	Tue 2/22/22 2640FS+1 day																											
ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล	1 day	Thu 3/3/22	Thu 3/3/22 2650																											
เคลียร์งานโดยรวมร่วมกันงานภูมิสถาปัตย์	30 days	Fri 3/4/22	Sat 4/2/22 2650,2652																											
งานเก็บความเรียบร้อย และทำความสะอาดส่งมอบ	11 days	Sun 4/3/22	Wed 4/13/22																											
งาน QC1	1 day	Sun 4/3/22	Sun 4/3/22 2651,2653																											
งานเก็บความเรียบร้อย	7 days	Mon 4/4/22	Sun 4/10/22 2655																											
งาน QC End	1 day	Mon 4/11/22	Mon 4/11/22 2656																											
งานทำความสะอาดก่อนส่งมอบ	1 day	Tue 4/12/22	Tue 4/12/22 2657																											
ส่งมอบงาน	1 day	Wed 4/13/22	Wed 4/13/22 2658																											
บ้านพัก รอง ผอ. ท้า (หลังที่ 1) ระยะที่ 1	255 days	Sun 8/1/21	Tue 4/12/22																											
Construction (Structure Work) ระยะที่ 1	102 days	Sun 8/1/21	Wed 11/10/21																											
งานโครงสร้าง บ้านพัก รอง ผอ. ท้า (หลังที่ 1)	102 days	Sun 8/1/21	Wed 11/10/21																											
งานขุดดิน + ตัดหัวเสาเข็ม	3 days	Sun 8/1/21	Tue 8/3/21																											

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

Task Name			Duration	Start	Finish	Predecessors	2021												2022													
							Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
2698	งานเทคอนกรีต + ตรวจสอบค้ำยัน + เคลียร์ความสะดวก			1 day	Sun 9/12/21	Sun 9/12/21	2697																									
2699	งานเชื่อมแบบข้าง + เคลียร์จัดเก็บพื้นที่โดยรอบ			2 days	Mon 9/13/21	Tue 9/14/21	2698																									
2700	งานพื้นชั้น 2			12 days	Wed 9/15/21	Sun 9/26/21																										
2701	งานตั้งแบบหล่อพื้น RC + ค้ำยัน			4 days	Wed 9/15/21	Sat 9/18/21	2699																									
2702	งานดีไล่น้พื้น			1 day	Sun 9/19/21	Sun 9/19/21	2701																									
2703	วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป			2 days	Mon 9/20/21	Tue 9/21/21	2702																									
2704	งานไม้แบบข้างพื้น			1 day	Wed 9/22/21	Wed 9/22/21	2703																									
2705	งานผูกเหล็กเสริม			2 days	Thu 9/23/21	Fri 9/24/21	2704																									
2706	งานเทคอนกรีต + ตรวจสอบค้ำยัน + เคลียร์ความสะดวก			1 day	Sat 9/25/21	Sat 9/25/21	2705																									
2707	งานเชื่อมแบบข้าง + เคลียร์จัดเก็บพื้นที่โดยรอบ			1 day	Sun 9/26/21	Sun 9/26/21	2706																									
2708	งานบันได ค.ส.ล. ชั้น 1			6 days	Mon 9/27/21	Sat 10/2/21																										
2709	งานดีไล่น้บันได			1 day	Mon 9/27/21	Mon 9/27/21	2707																									
2710	งานเข้าแบบบันได + ค้ำยัน			2 days	Tue 9/28/21	Wed 9/29/21	2709																									
2711	งานผูกเหล็กเสริม			2 days	Thu 9/30/21	Fri 10/1/21	2710																									
2712	งานเทคอนกรีต			1 day	Sat 10/2/21	Sat 10/2/21	2711																									
2713	งานเสาชั้น 2			6 days	Mon 9/27/21	Sat 10/2/21																										
2714	งานดีไล่น้เสา			1 day	Mon 9/27/21	Mon 9/27/21	2707																									
2715	งานผูกเหล็กเสริม			2 days	Tue 9/28/21	Wed 9/29/21	2714																									
2716	งานเข้าแบบเสา + ค้ำยัน + เช็ดคัง + ระดับหลังเสา			2 days	Wed 9/29/21	Thu 9/30/21	2715FS-1 day																									
2717	งานเทคอนกรีต			1 day	Fri 10/1/21	Fri 10/1/21	2716																									
2718	งานเชื่อมแบบข้าง + เคลียร์จัดเก็บพื้นที่โดยรอบ			1 day	Sat 10/2/21	Sat 10/2/21	2717																									
2719	งานคานรับโครงหลังคา			9 days	Sun 10/3/21	Mon 10/11/21																										
2720	งานตั้งแบบห้องคาน+ค้ำยัน			3 days	Sun 10/3/21	Tue 10/5/21	2718																									
2721	งานดีไล่น้คาน			1 day	Wed 10/6/21	Wed 10/6/21	2720																									
2722	งานผูกเหล็กเสริม			2 days	Thu 10/7/21	Fri 10/8/21	2721																									
2723	งานไม้แบบข้างคาน			2 days	Fri 10/8/21	Sat 10/9/21	2722FS-1 day																									
2724	งานเทคอนกรีต + ตรวจสอบค้ำยัน + เคลียร์ความสะดวก			1 day	Sun 10/10/21	Sun 10/10/21	2723																									
2725	งานเชื่อมแบบข้าง + เคลียร์จัดเก็บพื้นที่โดยรอบ			1 day	Mon 10/11/21	Mon 10/11/21	2724																									
2726	งานเชื่อมแบบค้ำยันคานรับโครงหลังคา			1 day	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21																										
2727	งานเชื่อมแบบค้ำยัน + เคลียร์จัดเก็บพื้นที่โดยรอบ			1 day	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21	2724FS+18 days																									
2728	งานโครงหลังคานเหล็กรูปพรรณ			12 days	Sat 10/30/21	Wed 11/10/21																										
2729	งานเตรียมการเหล็ก			5 days	Sat 10/30/21	Wed 11/3/21	2727																									
2730	งานอะเสเหล็ก			1 day	Thu 11/4/21	Thu 11/4/21	2729																									
2731	งานตั้งเหล็ก			1 day	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21	2730																									
2732	อกไก่เหล็ก			1 day	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21	2730																									
2733	ตะเข้เหล็ก			1 day	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21	2730																									
2734	ตะเข้รางเหล็ก			1 day	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21	2730																									
2735	ฉันทันเหล็ก			2 days	Sat 11/6/21	Sun 11/7/21	2732,2733,2734																									
2736	แปเหล็ก			3 days	Mon 11/8/21	Wed 11/10/21	2735																									
2737	Construction (Architecture Work & System Work) ระยะที่ 1			153 days	Thu 11/11/21	Tue 4/12/22																										
2738	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก รอง ผอ. ท่าฯ (หลังที่ 1)			153 days	Thu 11/11/21	Tue 4/12/22																										
2739	งานมุงกระเบื้องหลังคา			5 days	Thu 11/11/21	Mon 11/15/21																										
2740	งานมุงหลังคากระเบื้อง			5 days	Thu 11/11/21	Mon 11/15/21	2728																									
2741	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบชั้น 1			101 days	Tue 11/16/21	Thu 2/24/22																										
2742	ดีไล่น้ผนังห้อง และประตู-หน้าต่าง + ตรวจสอบไลน์			2 days	Tue 11/16/21	Wed 11/17/21	2739																									
2743	งานเขียน+เดินท่อนงานระบบ S,W,V			3 days	Sat 11/20/21	Mon 11/22/21	2756																									
2744	งานก่ออิฐ, เสาเอ็นทับหลังและวงกบ + โครงสร้างเคาน์เตอร์อ่าง			7 days	Fri 11/26/21	Thu 12/2/21	2757																									
2745	เดินท่อนงานระบบสิ่งในผนัง และใต้ห้องพื้น			3 days	Fri 12/10/21	Sun 12/12/21	2758																									
2746	งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นที่ทั้งชั้น			7 days	Thu 12/16/21	Wed 12/22/21	2759																									
2747	งานทำกันซึมพื้น, ผนังห้องน้ำ และพื้นเฉลียงพร้อมขังน้ำทดสอบ			3 days	Thu 12/30/21	Sat 1/1/22	2760																									
2748	งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ + ตรวจสอบตำแหน่งและระดับข้อต่องานระบบบริเวณจุดเชื่อมต่อสุขภัณฑ์			3 days	Wed 1/5/22	Fri 1/7/22	2761																									
2749	งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบงานระบบภายใน			4 days	Tue 1/11/22	Fri 1/14/22	2762																									
2750	ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน + ตรวจสอบการยึดโครง			2 days	Wed 1/19/22	Thu 1/20/22	2763																									
2751	งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน + ฉาบรอยต่อแผ่น + เจาะช่องอุปกรณ์งานระบบ			3 days	Sun 1/23/22	Tue 1/25/22	2764																									
2752	งานปูพื้นกระเบื้องห้องภายใน, ห้องครัว, ห้องน้ำ และเฉลียง			7 days	Sat 1/29/22	Fri 2/4/22	2765																									
2753	งานติดตั้งประตูไม้ และประตู WPC			7 days	Thu 2/10/22	Wed 2/16/22	2766																									
2754	งานบัวพื้น			1 day	Thu 2/24/22	Thu 2/24/22	2767																									
2755	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบชั้น 2			102 days	Thu 11/18/21	Sun 2/27/22																										
2756	ดีไล่น้ผนังห้อง และประตู-หน้าต่าง + ตรวจสอบไลน์			2 days	Thu 11/18/21	Fri 11/19/21	2742																									
2757	งานเขียน+เดินท่อนงานระบบ S,W,V			3 days	Tue 11/23/21	Thu 11/25/21	2743																									
2758	งานก่ออิฐ, เสาเอ็นทับหลังและวงกบ + โครงสร้างเคาน์เตอร์อ่าง			7 days	Fri 12/3/21	Thu 12/9/21	2744																									
2759	เดินท่อนงานระบบสิ่งในผนัง และใต้ห้องพื้น			3 days	Mon 12/13/21	Wed 12/15/21	2745																									
2760	งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นที่ทั้งชั้น			7 days	Thu 12/23/21	Wed 12/29/21	2746																									
2761	งานทำกันซึมพื้น, ผนังห้องน้ำ และพื้นเฉลียงพร้อมขังน้ำทดสอบ			3 days	Sun 1/2/22	Tue 1/4/22	2747																									
2762	งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ + ตรวจสอบตำแหน่งและระดับข้อต่องานระบบบริเวณจุดเชื่อมต่อสุขภัณฑ์			3 days	Sat 1/8/22	Mon 1/10/22	2748																									
2763	งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบสายงานระบบ			4 days	Sat 1/15/22	Tue 1/18/22	2749																									
2764	ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน + ตรวจสอบการยึดโครง			2 days	Fri 1/21/22	Sat 1/22/22	2750																									
2765	งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน + ฉาบรอยต่อแผ่น + เจาะช่องอุปกรณ์งานระบบ			3 days	Wed 1/26/22	Fri 1/28/22	2751																									
2766	งานปูพื้นกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และเฉลียง			5 days	Sat 2/5/22	Wed 2/9/22	2752																									
2767	งานติดตั้งประตูไม้ และประตู WPC			7 days	Thu 2/17/22	Wed 2/23																										

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

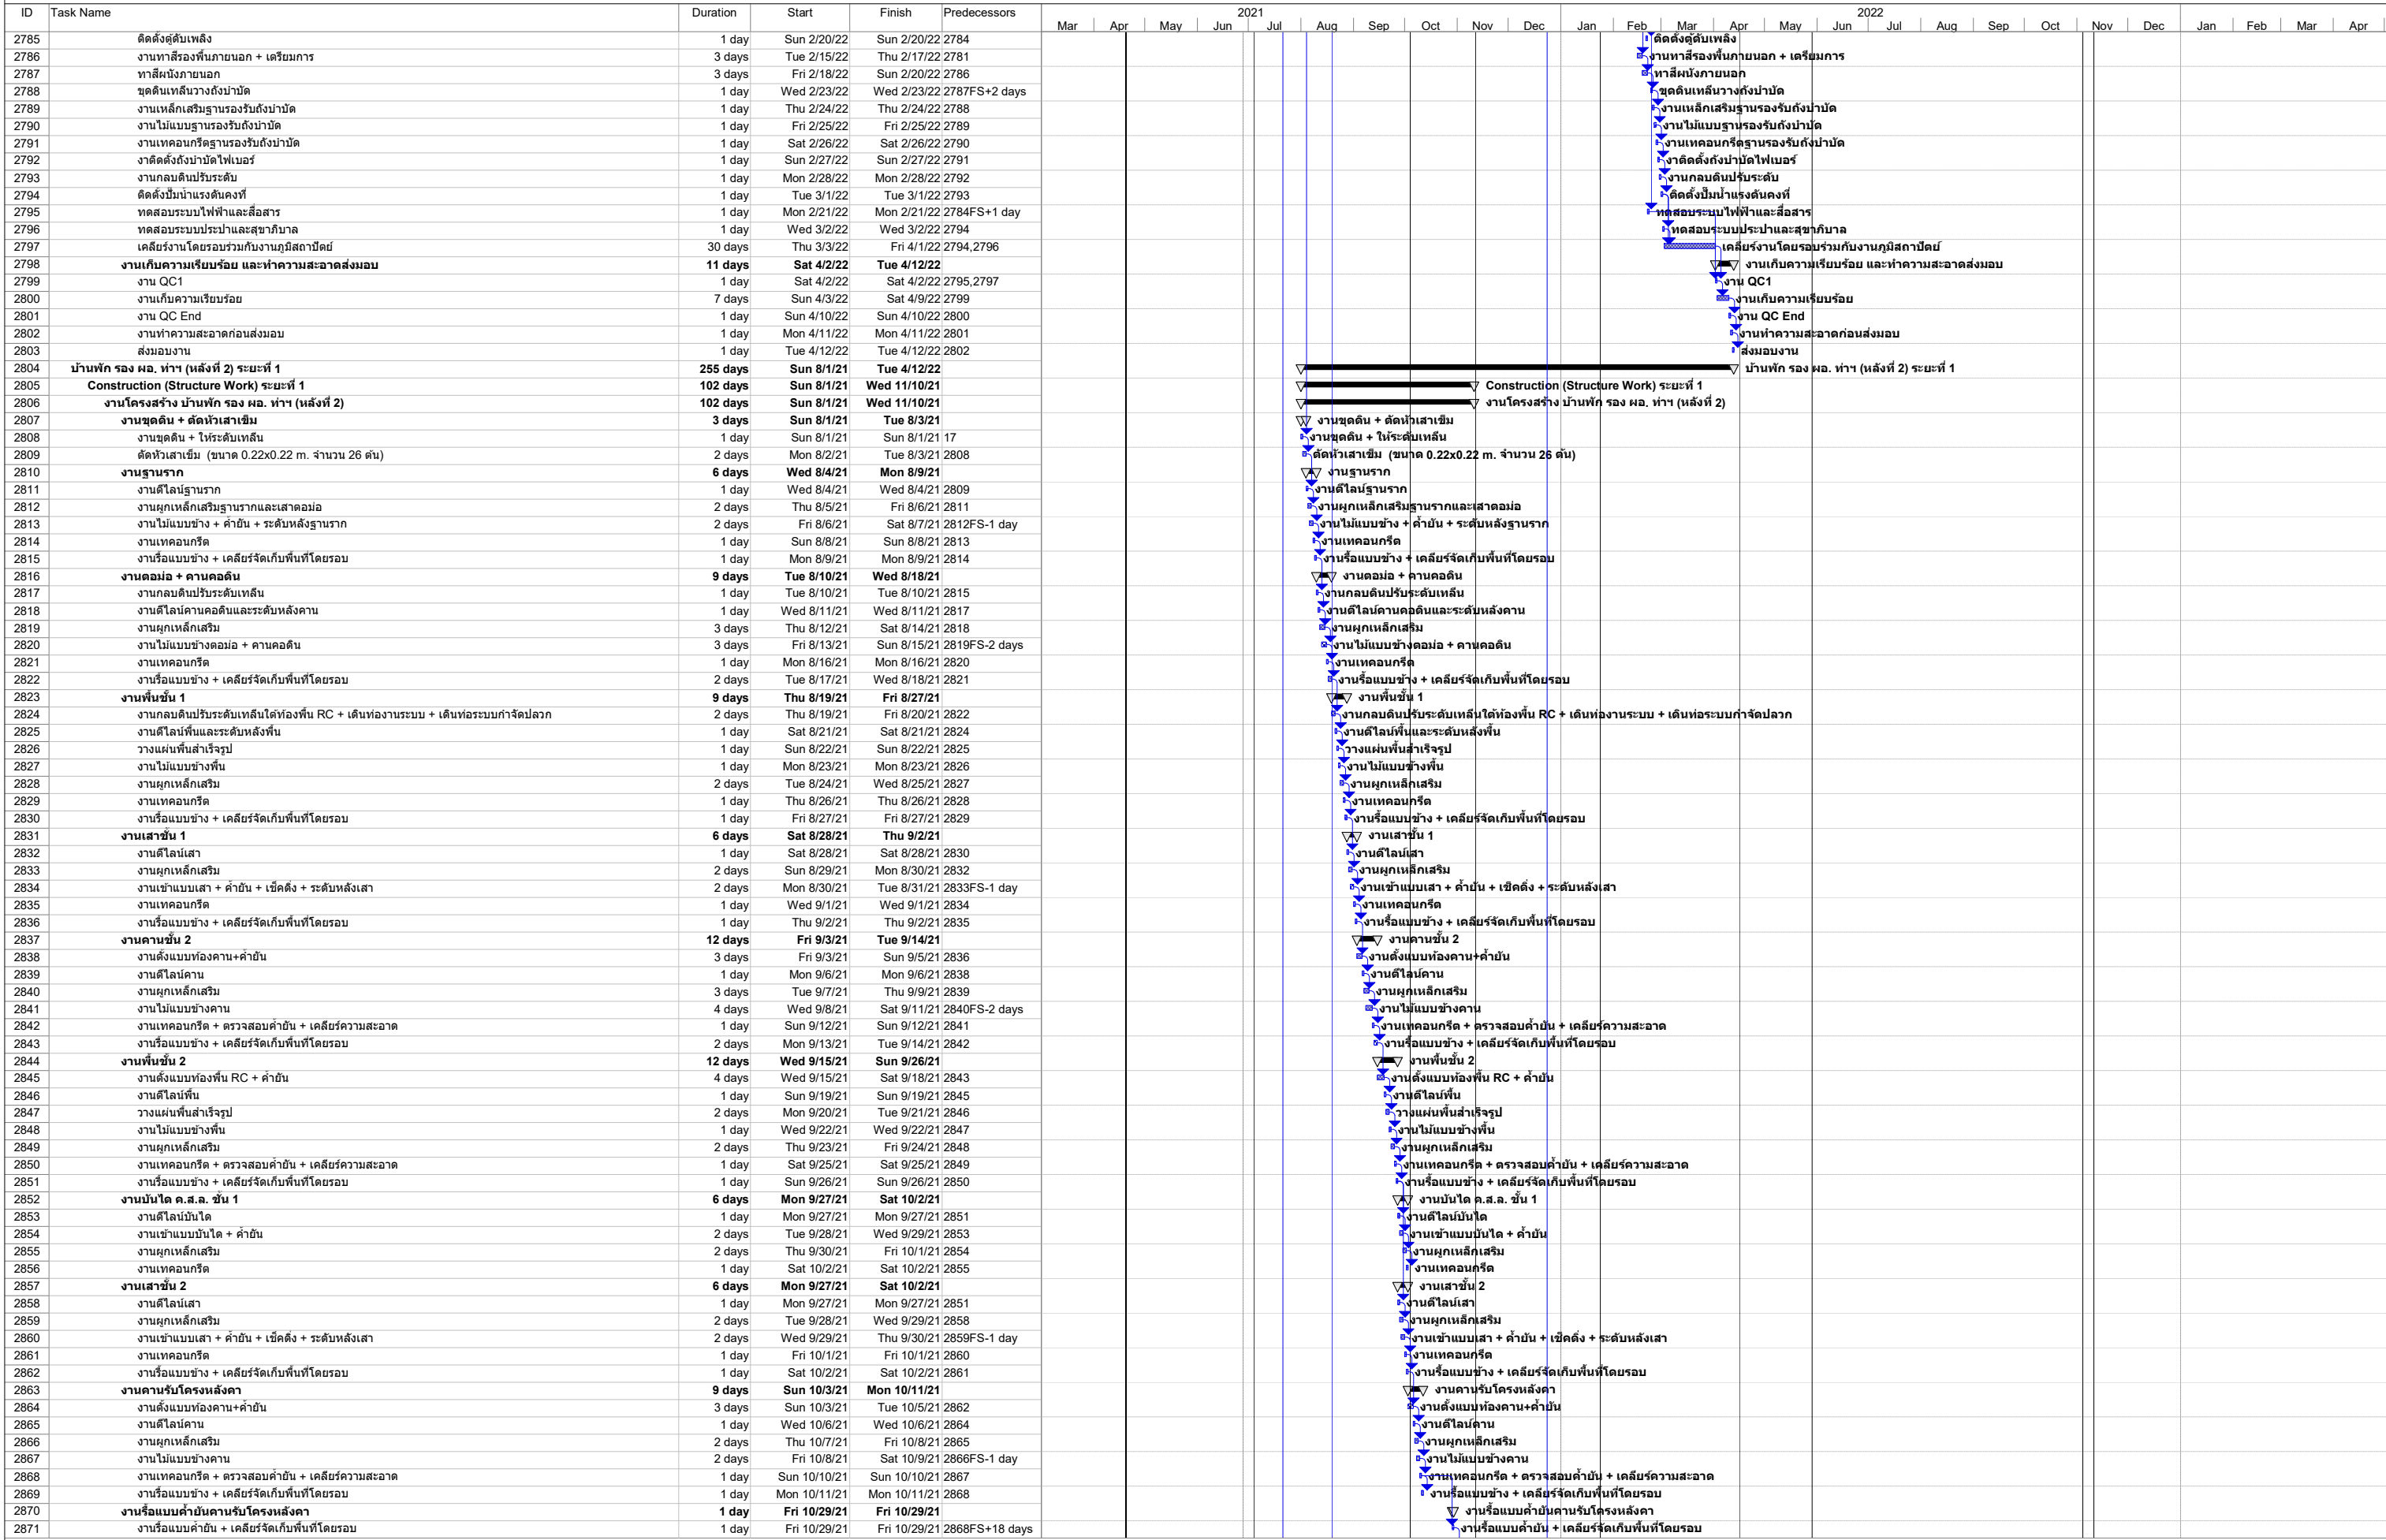

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
2872	งานโครงสร้างอาคารหลักรูปพรรณ	12 days	Sat 10/30/21	Wed 11/10/21																											
2873	งานเตรียมการเหล็ก	5 days	Sat 10/30/21	Wed 11/3/21 2871																											
2874	งานอะเสเหล็ก	1 day	Thu 11/4/21	Thu 11/4/21 2873																											
2875	งานตั้งเหล็ก	1 day	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21 2874																											
2876	อกโกเหล็ก	1 day	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21 2874																											
2877	ตะเข้เหล็ก	1 day	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21 2874																											
2878	ตะเข้รางเหล็ก	1 day	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21 2874																											
2879	รับพื้นเหล็ก	2 days	Sat 11/6/21	Sun 11/7/21 2876,2877,2878																											
2880	แปเหล็ก	3 days	Mon 11/8/21	Wed 11/10/21 2879																											
2881	Construction (Architecture Work & System Work) ระยะที่ 1	153 days	Thu 11/11/21	Tue 4/12/22																											
2882	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก รอง ผอ. ท่าฯ (หลังที่ 1)	153 days	Thu 11/11/21	Tue 4/12/22																											
2883	งานมุงกระเบื้องหลังคา	5 days	Thu 11/11/21	Mon 11/15/21																											
2884	งานมุงหลังคากระเบื้อง	5 days	Thu 11/11/21	Mon 11/15/21 2872																											
2885	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบชั้น 1	101 days	Tue 11/16/21	Thu 2/24/22																											
2886	ตีโลนผนังห้อง และประตู-หน้าต่าง + ตรวจสอบโลน	2 days	Tue 11/16/21	Wed 11/17/21 2883																											
2887	งานเทพื้น+เดินห้องงานระบบ S,W,V	3 days	Sat 11/20/21	Mon 11/22/21 2900																											
2888	งานก่ออิฐ, เสาค้ำยันหลังและวางกบ + โครงสร้างคานาเดือร่อ	7 days	Fri 11/26/21	Thu 12/2/21 2901																											
2889	เดินท่องานระบบฝังในผนัง และใต้ห้องพื้น	3 days	Fri 12/10/21	Sun 12/12/21 2902																											
2890	งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นทั้งชั้น	7 days	Thu 12/16/21	Wed 12/22/21 2903																											
2891	งานทำกันซึมพื้น, ผนังห้องน้ำ และพื้นเฉลียงพร้อมขังน้ำทดสอบ	3 days	Thu 12/30/21	Sat 1/1/22 2904																											
2892	งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ + ตรวจสอบตำแหน่งและระดับข้อต่องานระบบบริเวณจุดเชื่อมต่อสุขภัณฑ์	3 days	Wed 1/5/22	Fri 1/7/22 2905																											
2893	งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบงานระบบภายใน	4 days	Tue 1/11/22	Fri 1/14/22 2906																											
2894	ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน + ตรวจสอบการยึดโครง	2 days	Wed 1/19/22	Thu 1/20/22 2907																											
2895	งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน + ฉาบรอยต่อแผ่น + เจาะช่องอุปกรณ์งานระบบ	3 days	Sun 1/23/22	Tue 1/25/22 2908																											
2896	งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำภายใน, ห้องครัว, ห้องน้ำ และเฉลียง	7 days	Sat 1/29/22	Fri 2/4/22 2909																											
2897	งานติดตั้งประตูไม้ และประตู WPC	7 days	Thu 2/10/22	Wed 2/16/22 2910																											
2898	งานบัวพื้น	1 day	Thu 2/24/22	Thu 2/24/22 2911																											
2899	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบชั้น 2	102 days	Thu 11/18/21	Sun 2/27/22																											
2900	ตีโลนผนังห้อง และประตู-หน้าต่าง + ตรวจสอบโลน	2 days	Thu 11/18/21	Fri 11/19/21 2886																											
2901	งานเทพื้น+เดินห้องงานระบบ S,W,V	3 days	Tue 11/23/21	Thu 11/25/21 2887																											
2902	งานก่ออิฐ, เสาค้ำยันหลังและวางกบ + โครงสร้างคานาเดือร่อ	7 days	Fri 12/3/21	Thu 12/9/21 2888																											
2903	เดินท่องานระบบฝังในผนัง และใต้ห้องพื้น	3 days	Mon 12/13/21	Wed 12/15/21 2889																											
2904	งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นทั้งชั้น	7 days	Thu 12/23/21	Wed 12/29/21 2890																											
2905	งานทำกันซึมพื้น, ผนังห้องน้ำ และพื้นระเบียงพร้อมขังน้ำทดสอบ	3 days	Sun 1/2/22	Tue 1/4/22 2891																											
2906	งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ + ตรวจสอบตำแหน่งและระดับข้อต่องานระบบบริเวณจุดเชื่อมต่อสุขภัณฑ์	3 days	Sat 1/8/22	Mon 1/10/22 2892																											
2907	งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบสายงานระบบ	4 days	Sat 1/15/22	Tue 1/18/22 2893																											
2908	ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน + ตรวจสอบการยึดโครง	2 days	Fri 1/21/22	Sat 1/22/22 2894																											
2909	งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน + ฉาบรอยต่อแผ่น + เจาะช่องอุปกรณ์งานระบบ	3 days	Wed 1/26/22	Fri 1/28/22 2895																											
2910	งานปูพื้นกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และระเบียง	5 days	Sat 2/5/22	Wed 2/9/22 2896																											
2911	งานติดตั้งประตูไม้ และประตู WPC	7 days	Thu 2/17/22	Wed 2/23/22 2897																											
2912	งานพื้นไวนิลลายไม้ และบัวพื้น	3 days	Fri 2/25/22	Sun 2/27/22 2898																											
2913	งานอื่นๆ + งานภายนอก	91 days	Sat 1/1/22	Fri 4/1/22																											
2914	งานฉาบภายนอก	7 days	Sat 1/1/22	Fri 1/7/22 2904FS+2 days																											
2915	งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม + ราวระเบียง	7 days	Sat 1/8/22	Fri 1/14/22 2914																											
2916	งานติดตั้งจากกันอาบนํ้า	2 days	Sat 1/15/22	Sun 1/16/22 2915																											
2917	ติดตั้งบันไดไม้และราวบันได	7 days	Mon 1/17/22	Sun 1/23/22 2916																											
2918	ติดตั้งราวไม้ระเบียง	3 days	Mon 1/24/22	Wed 1/26/22 2917																											
2919	ติดตั้งสวิตช์ + ปลั๊ก	1 day	Thu 1/27/22	Thu 1/27/22 2918																											
2920	งานทาสีรองพื้นภายใน	2 days	Sat 1/29/22	Sun 1/30/22 2909,2914																											
2921	งานทาสีฝ้าเพดานห้องภายใน, ห้องน้ำ และระเบียง	3 days	Mon 1/31/22	Wed 2/2/22 2920																											
2922	งานทาสีผนังภายใน	3 days	Thu 2/3/22	Sat 2/5/22 2921																											
2923	งานทาสีผนังระเบียง	3 days	Sun 2/6/22	Tue 2/8/22 2922																											
2924	งานทาสีราวระเบียง	3 days	Wed 2/9/22	Fri 2/11/22 2923																											
2925	งานทาสีราวบันไดหลัก	3 days	Sat 2/12/22	Mon 2/14/22 2924																											
2926	งานติดตั้งสุขภัณฑ์	2 days	Tue 2/15/22	Wed 2/16/22 2925																											
2927	ติดตั้งฝ้าครอบสวิตช์ + ปลั๊ก	1 day	Thu 2/17/22	Thu 2/17/22 2926																											
2928	ติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	2 days	Fri 2/18/22	Sat 2/19/22 2927																											
2929	ติดตั้งตู้ดับเพลิง	1 day	Sun 2/20/22	Sun 2/20/22 2928																											
2930	งานทาสีรองพื้นภายนอก + เตรียมการ	3 days	Tue 2/15/22	Thu 2/17/22 2925																											
2931	ทาสีผนังภายนอก	3 days	Fri 2/18/22	Sun 2/20/22 2930																											
2932	ชุดดินเหนียววางถังบำบัด	1 day	Wed 2/23/22	Wed 2/23/22 2931FS+2 days																											
2933	งานเหล็กเสริมฐานรองรับถังบำบัด	1 day	Thu 2/24/22	Thu 2/24/22 2932																											
2934	งานไม้แบบฐานรองรับถังบำบัด	1 day	Fri 2/25/22	Fri 2/25/22 2933																											
2935	งานเทคอนกรีตฐานรองรับถังบำบัด	1 day	Sat 2/26/22	Sat 2/26/22 2934																											
2936	งานติดตั้งถังบำบัดไฟเบอร์	1 day	Sun 2/27/22	Sun 2/27/22 2935																											
2937	งานกลบดินปรับระดับ	1 day	Mon 2/28/22	Mon 2/28/22 2936																											
2938	ติดตั้งบ่อน้ำแรงดันคงที่	1 day	Tue 3/1/22	Tue 3/1/22 2937																											
2939	ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1 day	Mon 2/21/22	Mon 2/21/22 2928FS+1 day																											
2940	ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล	1 day	Wed 3/2/22	Wed 3/2/22 2938																											
2941	เคลียร์งานโดยรวมร่วมกับงานภูมิสถาปัตย์	30 days	Thu 3/3/22	Fri 4/1/22 29																											

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

[illegible]

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

Task Name			Duration	Start	Finish	Predecessors	2021												2022													
							Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
3046	งานเตรียมการหลัก		5 days	Tue 6/21/22	Sat 6/25/22	3044																										
3047	งานอะเสเหล็ก		1 day	Sun 6/26/22	Sun 6/26/22	3046																										
3048	งานสังเหล็ก		1 day	Mon 6/27/22	Mon 6/27/22	3047																										
3049	อกไก่เหล็ก		1 day	Mon 6/27/22	Mon 6/27/22	3047																										
3050	ตะแวงเหล็ก		1 day	Mon 6/27/22	Mon 6/27/22	3047																										
3051	ตะแวงเหล็ก		1 day	Mon 6/27/22	Mon 6/27/22	3047																										
3052	รับพื้นเหล็ก		2 days	Tue 6/28/22	Wed 6/29/22	3049,3050,3051																										
3053	แปเหล็ก		3 days	Thu 6/30/22	Sat 7/2/22	3052																										
3054	Construction (Architecture Work & System Work) ระยะที่ 2		146 days	Sun 7/3/22	Fri 11/25/22																											
3055	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ อาคารสโมสร		146 days	Sun 7/3/22	Fri 11/25/22																											
3056	งานมุงกระเบื้องหลังคา		7 days	Sun 7/3/22	Sat 7/9/22																											
3057	งานมุงหลังคากระเบื้อง		7 days	Sun 7/3/22	Sat 7/9/22	3045																										
3058	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบชั้น 1		52 days	Sun 7/10/22	Tue 8/30/22																											
3059	ดีไลน์ผนังห้อง และประตู-หน้าต่าง + ตรวจสอบไลน์		2 days	Sun 7/10/22	Mon 7/11/22	3057																										
3060	งานเขียน+เดินท่อนงานระบบ S,W,V		3 days	Tue 7/12/22	Thu 7/14/22	3059																										
3061	งานก่ออิฐ, เสาค้ำยันหลังและวางกบ + โครงสร้างเคาน์เตอร์อ่าง		7 days	Fri 7/15/22	Thu 7/21/22	3060																										
3062	เดินท่อนงานระบบฝังในผนัง และใต้ท้องพื้น		3 days	Fri 7/22/22	Sun 7/24/22	3061																										
3063	งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นทั้งชั้น		7 days	Mon 7/25/22	Sun 7/31/22	3062																										
3064	งานทำกันซึมพื้น, ผนังห้องน้ำ และพื้นเฉลียงพร้อมซิงน้ำทดสอบ		3 days	Mon 8/1/22	Wed 8/3/22	3063																										
3065	งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ + ตรวจสอบตำแหน่งและระดับข้อต่องานระบบบริเวณจุดเชื่อมต่อสุขภัณฑ์		3 days	Thu 8/4/22	Sat 8/6/22	3064																										
3066	งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบงานระบบภายใน		4 days	Sun 8/7/22	Wed 8/10/22	3065																										
3067	ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน + ตรวจสอบการยึดโครง		2 days	Thu 8/11/22	Fri 8/12/22	3066																										
3068	งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน + ฉาบรอยต่อแผ่น + เจาะช่องอุปกรณ์งานระบบ		3 days	Sat 8/13/22	Mon 8/15/22	3067																										
3069	งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำใน, ห้องน้ำ และเฉลียง		7 days	Tue 8/16/22	Mon 8/22/22	3068																										
3070	งานติดตั้งประตูเหล็ก และประตู WPC		7 days	Tue 8/23/22	Mon 8/29/22	3069																										
3071	งานบัวพื้น		1 day	Tue 8/30/22	Tue 8/30/22	3070																										
3072	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบชั้นลอย		43 days	Fri 7/22/22	Fri 9/2/22																											
3073	ดีไลน์ผนังห้อง และประตู-หน้าต่าง + ตรวจสอบไลน์		2 days	Fri 7/22/22	Sat 7/23/22	3061																										
3074	งานเขียน+เดินท่อนงานระบบ S,W,V		3 days	Sun 7/24/22	Tue 7/26/22	3073																										
3075	งานก่ออิฐ, เสาค้ำยันหลังและวางกบ + โครงสร้างเคาน์เตอร์อ่าง		7 days	Wed 7/27/22	Tue 8/2/22	3074																										
3076	เดินท่อนงานระบบฝังในผนัง และใต้ท้องพื้น		3 days	Wed 8/3/22	Fri 8/5/22	3075																										
3077	งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นทั้งชั้น		7 days	Sat 8/6/22	Fri 8/12/22	3076																										
3078	งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบงานระบบภายใน		4 days	Sat 8/13/22	Tue 8/16/22	3077																										
3079	งานฉาบฝ้าเพดานใต้ท้องพื้น ค.ส.ล.		3 days	Wed 8/17/22	Fri 8/19/22	3078																										
3080	งานพื้นห้องเครื่อง		7 days	Sat 8/20/22	Fri 8/26/22	3079																										
3081	งานติดตั้งประตูประตู WPC		7 days	Sat 8/27/22	Fri 9/2/22	3080																										
3082	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบชั้น 2		52 days	Wed 8/3/22	Fri 9/23/22																											
3083	ดีไลน์ผนังห้อง และประตู-หน้าต่าง + ตรวจสอบไลน์		2 days	Wed 8/3/22	Thu 8/4/22	3075																										
3084	งานเขียน+เดินท่อนงานระบบ S,W,V		3 days	Fri 8/5/22	Sun 8/7/22	3083																										
3085	งานก่ออิฐ, เสาค้ำยันหลังและวางกบ + โครงสร้างเคาน์เตอร์อ่าง		7 days	Mon 8/8/22	Sun 8/14/22	3084																										
3086	เดินท่อนงานระบบฝังในผนัง และใต้ท้องพื้น		3 days	Mon 8/15/22	Wed 8/17/22	3085																										
3087	งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นทั้งชั้น		7 days	Thu 8/18/22	Wed 8/24/22	3086																										
3088	งานทำกันซึมพื้น, ผนังห้องน้ำ และพื้นเฉลียงพร้อมซิงน้ำทดสอบ		3 days	Thu 8/25/22	Sat 8/27/22	3087																										
3089	งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ + ตรวจสอบตำแหน่งและระดับข้อต่องานระบบบริเวณจุดเชื่อมต่อสุขภัณฑ์		3 days	Sun 8/28/22	Tue 8/30/22	3088																										
3090	งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบงานระบบภายใน		4 days	Wed 8/31/22	Sat 9/3/22	3089																										
3091	ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน + ตรวจสอบการยึดโครง		2 days	Sun 9/4/22	Mon 9/5/22	3090																										
3092	งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน + ฉาบรอยต่อแผ่น + เจาะช่องอุปกรณ์งานระบบ		3 days	Tue 9/6/22	Thu 9/8/22	3091																										
3093	งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำใน และห้องน้ำ		7 days	Fri 9/9/22	Thu 9/15/22	3092																										
3094	งานติดตั้งประตู WPC		7 days	Fri 9/16/22	Thu 9/22/22	3093																										
3095	งานบัวพื้น		1 day	Fri 9/23/22	Fri 9/23/22	3094																										
3096	งานสถาปัตยกรรมและงานระบบหลังคา		30 days	Mon 8/15/22	Tue 9/13/22																											
3097	ดีไลน์ผนัง + ตรวจสอบไลน์		2 days	Mon 8/15/22	Tue 8/16/22	3085																										
3098	งานเขียน+เดินท่อนงานระบบ		3 days	Wed 8/17/22	Fri 8/19/22	3097																										
3099	งานก่ออิฐ, เสาค้ำยันหลัง		7 days	Sat 8/20/22	Fri 8/26/22	3098																										
3100	เดินท่อนงานระบบฝังในผนัง		3 days	Sat 8/27/22	Mon 8/29/22	3099																										
3101	งานฉาบปูนผนัง + งานเทพื้นระดับพื้นทั้งชั้น		7 days	Tue 8/30/22	Mon 9/5/22	3100																										
3102	งานทำกันซึมพื้นพร้อมซิงน้ำทดสอบ		4 days	Tue 9/6/22	Fri 9/9/22	3101																										
3103	งานร้อยสายงานระบบ + ทดสอบสายงานระบบ		4 days	Sat 9/10/22	Tue 9/13/22	3102																										
3104	งานอื่นๆ + งานภายนอก		54 days	Thu 9/8/22	Mon 10/31/22																											
3105	งานฉาบภายนอก		7 days	Thu 9/8/22	Wed 9/14/22	3101FS+2 days																										
3106	งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม + ราวจับเบียง		7 days	Thu 9/15/22	Wed 9/21/22	3105																										
3107	งานติดตั้งจากกันอาบนํ้า		3 days	Thu 9/22/22	Sat 9/24/22	3106																										
3108	ติดตั้งบันไดและราวบันได		7 days	Sun 9/25/22	Sat 10/1/22	3107																										
3109	ติดตั้งราวจับเบียง		4 days	Sun 10/2/22	Wed 10/5/22	3108																										
3110	ติดตั้งสวิตช์ + ปลั๊ก		2 days	Thu 10/6/22	Fri 10/7/22	3109																										
3111	งานหาสีรองพื้นภายใน		4 days	Thu 9/15/22	Sun 9/18/22	3105																										
3112	งานทาสีฝ้าเพดานห้องภายใน, ห้องน้ำ และเบียง		4 days	Mon 9/19/22	Thu 9/22/22	3111																										
3113	งานทาสีผนังภายใน		3 days	Fri 9/23/22	Sun 9/25/22	3112																										
3114	งานทาสีผนังระเบียง		3 days	Mon 9/26/22	Wed 9/28/22	3113																										
3115	งานทาสีราวจับเบียง		3 days	Thu 9/29/22	Sat 10/1/22	3114																										

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานก่อสร้างย่อยในแต่ละช่วง

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
3133	เตรียมงานโดยรวมร่วมกันงานภูมิสถาปัตย์	8 days	Mon 10/24/22	Mon 10/31/22	3130,3131,3132														
3134	งานเก็บความเรียบร้อย และทำความสะอาดส่งมอบ	25 days	Tue 11/1/22	Fri 11/25/22															
3135	งาน QC1	1 day	Tue 11/1/22	Tue 11/1/22	3133														
3136	งานเก็บความเรียบร้อย	21 days	Wed 11/2/22	Tue 11/22/22	3135														
3137	งาน QC End	1 day	Wed 11/23/22	Wed 11/23/22	3136														
3138	งานทำความสะอาดก่อนส่งมอบ	1 day	Thu 11/24/22	Thu 11/24/22	3137														
3139	ส่งมอบงาน	1 day	Fri 11/25/22	Fri 11/25/22	3138														
3140	งานภายนอกอาคาร (External Work)	578 days	Thu 7/1/21	Sun 1/29/23															
3141	งานถนน	420 days	Sun 10/31/21	Sat 12/24/22															
3142	งานถนน (ระยะที่ 1)	210 days	Sun 10/31/21	Sat 5/28/22															
3143	งานขึ้นรองพื้นทาง และชั้นพื้นทาง	150 days	Sun 10/31/21	Tue 3/29/22	3200SS+30 days														
3144	งานผิวทาง	120 days	Thu 12/30/21	Thu 4/28/22	3143SS+60 days														
3145	งานคันหิน ทางเท้า	120 days	Sat 1/29/22	Sat 5/28/22	3144SS+30 days														
3146	งานถนน (ระยะที่ 2)	210 days	Sun 5/29/22	Sat 12/24/22															
3147	งานขึ้นรองพื้นทาง และชั้นพื้นทาง	150 days	Sun 5/29/22	Tue 10/25/22	3142														
3148	งานผิวทาง	120 days	Thu 7/28/22	Thu 11/24/22	3147SS+60 days														
3149	งานคันหิน ทางเท้า	120 days	Sat 8/27/22	Sat 12/24/22	3148SS+30 days														
3150	งานสะพาน (ระยะที่ 2)	120 days	Mon 8/16/21	Mon 12/13/21															
3151	งานโครงสร้างฐานรากและเสาหมั่ง	60 days	Mon 8/16/21	Thu 10/14/21	19														
3152	งานโครงสร้างหล่อและวางคานพร้อมเทคอนกรีตพื้นที่หน้า	60 days	Fri 10/15/21	Mon 12/13/21	3151														
3153	งาน Box Culvert (ระยะที่ 2)	60 days	Tue 12/14/21	Fri 2/11/22															
3154	งานโครงสร้างพื้นฐานล่าง	10 days	Tue 12/14/21	Thu 12/23/21	3152														
3155	งานโครงสร้างผนัง	30 days	Fri 12/24/21	Sat 1/22/22	19,3154														
3156	งานโครงสร้างปิดหลังบน	20 days	Sun 1/23/22	Fri 2/11/22	3155														
3157	งานอาคารป้อมรักษาความปลอดภัย และทางเข้า-ออก (ระยะที่ 1)	120 days	Wed 4/13/22	Wed 8/10/22															
3158	งานโครงสร้าง	60 days	Wed 4/13/22	Sat 6/11/22	2660														
3159	งานสถาปัตยกรรม	60 days	Sun 6/12/22	Wed 8/10/22	3158														
3160	งานระบบไฟฟ้า	53 days	Sun 6/19/22	Wed 8/10/22	3159SS+7 days														
3161	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	53 days	Sun 6/19/22	Wed 8/10/22	3159SS+7 days														
3162	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	53 days	Sun 6/19/22	Wed 8/10/22	3159SS+7 days														
3163	งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	53 days	Sun 6/19/22	Wed 8/10/22	3159SS+7 days														
3164	งานรั้วโครงการ	390 days	Sat 7/31/21	Wed 8/24/22															
3165	งานรั้วโครงการ (ระยะที่ 1) รั้วด้านทิศตะวันออก และรั้วบนกำแพงด้านทิศเหนือ	210 days	Sat 7/31/21	Fri 2/25/22	3168SS+30 days														
3166	งานรั้วโครงการ (ระยะที่ 2) ด้านในส่วนที่เหลือ	180 days	Sat 2/26/22	Wed 8/24/22	3165														
3167	งานกำแพงกันดิน	330 days	Thu 7/1/21	Thu 5/26/22															
3168	งานกำแพงกันดิน (ระยะที่ 1) ด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือ	210 days	Thu 7/1/21	Wed 1/26/22	2														
3169	งานกำแพงกันดิน (ระยะที่ 2) ด้านในส่วนที่เหลือ	120 days	Thu 1/27/22	Thu 5/26/22	3168														
3170	งานระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะที่ 1)	225 days	Sun 7/18/21	Sun 2/27/22															
3171	อาคารพักขยะรวม และโรงบำบัดน้ำเสีย	120 days	Sun 7/18/21	Sun 11/14/21	11														
3172	บ่อพักน้ำเสีย	60 days	Mon 11/15/21	Thu 1/13/22	3171														
3173	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	45 days	Fri 1/14/22	Sun 2/27/22	3172														
3174	งานบ่อน้ำฝน	90 days	Sat 2/12/22	Thu 5/12/22															
3175	งานบ่อน้ำฝน 2 (ระยะที่ 1)	45 days	Sat 2/12/22	Mon 3/28/22	3150,3153														
3176	งานบ่อน้ำฝน 1 (ระยะที่ 2)	45 days	Tue 3/29/22	Thu 5/12/22	3175														
3177	งานหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์	258 days	Fri 11/12/21	Wed 7/27/22															
3178	งานหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ (อาคาร 2, 4, 6 & 7) ระยะที่ 1	60 days	Fri 11/12/21	Mon 1/10/22	32FS+30 days														
3179	งานหลังคาคลุมลานจอดรถยนต์ (อาคาร 1, 3 & 5) ระยะที่ 2	60 days	Sun 5/29/22	Wed 7/27/22	1456FS+30 days														
3180	งานภูมิสถาปัตยกรรม (ปรับเกลียดิน, ปลูกหญ้าและต้นไม้)	80 days	Fri 11/11/22	Sun 1/29/23															
3181	งานภูมิสถาปัตยกรรม (ปรับเกลียดิน, ปลูกหญ้าและต้นไม้) ระยะที่ 1	60 days	Fri 11/11/22	Mon 1/9/23	24FS-90 days,380														
3182	งานภูมิสถาปัตยกรรม (ปรับเกลียดิน, ปลูกหญ้าและต้นไม้) ระยะที่ 2	60 days	Thu 12/1/22	Sun 1/29/23															
3183	งานพื้นที่สีนเทาการ (ระยะที่ 2)	183 days	Sat 5/21/22	Sat 11/19/22															
3184	สนามฟุตบอล 7 คน	153 days	Mon 6/20/22	Sat 11/19/22	2SS+420 days														
3185	สนามบาสเก็ตบอล	153 days	Mon 6/20/22	Sat 11/19/22	2SS+420 days														
3186	สนามเทนนิส	183 days	Sat 5/21/22	Sat 11/19/22	2SS+390 days														
3187	สนามเด็กเล่น	92 days	Fri 8/19/22	Fri 11/18/22	2SS+480 days														
3188	งานระบบภายนอกอาคาร	663 days	Mon 4/26/21	Fri 2/17/23															
3189	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า	491 days	Mon 4/26/21	Mon 8/29/22															
3190	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า (เตรียมการและประสานงาน)	61 days	Mon 4/26/21	Fri 6/25/21	2SS														
3191	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า (ระยะที่ 1)	60 days	Mon 11/1/21	Thu 12/30/21															
3192	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า (ระยะที่ 2)	60 days	Fri 7/1/22	Mon 8/29/22															
3193	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	505 days	Fri 10/1/21	Fri 2/17/23															
3194	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ระยะที่ 1)	287 days	Fri 10/1/21	Thu 7/14/22	3201SS														
3195	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)	355 days	Mon 2/28/22	Fri 2/17/23	3203SS														
3196	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	505 days	Fri 10/1/21	Fri 2/17/23															
3197	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (ระยะที่ 1)	287 days	Fri 10/1/21	Thu 7/14/22	3201SS														
3198	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)	355 days	Mon 2/28/22	Fri 2/17/23	3203SS														
3199	งานระบบระบายน้ำ	450 days	Fri 10/1/21	Sat 12/24/22															
3200	งานระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 1)	150 days	Fri 10/1/21	Sun 2/27/22															
3201	งานท่อกลม และบ่อพัก คสล.	150 days	Fri 10/1/21	Sun 2/27/22	5														
3202	งานระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 2)	300 days	Mon 2/28/22	Sat 12/24/22															
3203	งานท่อกลม และบ่อพัก คสล.	300 days	Mon 2/28/22	Sat 12/24/22	3200														
3204	งานระบบสื่อสาร (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ในส่วนการเชื่อม FACP)	302 days	Mon 11/1/21	Mon 8/29/22															
3205	งานระบบสื่อสาร (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ในส่วนการเชื่อม FACP) ระยะที่ 1	60 days	Mon 11/1/21	Thu 12/30/21															
3206	งานระบบสื่อสาร (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ในส่วนการเชื่อม FACP) ระยะที่ 2	60 days	Fri 7/1/22	Mon 8/29/22															
3207	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)	180 days	Fri 1/21/22	Tue 7/19/22															
3208	งานพิจารณาอนุมัติเอกสาร และเตรียมสิ่งของ	31 days	Fri 1/21/22	Sun 2/20/22	2SS+270 days														
3209	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบควบคุมเข้าออก	61 days	Fri 5/20/22	Tue 7/19/22	2SS+389 days														
3210	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	61 days	Fri 5/20/22	Tue 7/19/22	2SS+389 days														
3211	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	61 days	Fri 5/20/22	Tue 7/19/22	2SS+389 days														
3212	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ งานระบบอ่านบัตรประชาชน และใบอนุญาตขับรถยนต์	61 days	Fri 5/20/22	Tue 7/19/22	2SS+389 days														
3213	งานเก็บความเรียบร้อย,ทำความสะอาดและส่งมอบ (ระยะที่ 1)	90 days	Thu 4/21/22	Tue 7/19/22															
3214	งานทำความสะอาดภายใน (Interior)	61 days	Thu 4/21/22	Mon 6/20/22	2SS+360 days														
3215	งานทำความสะอาดภายนอก (Exterior)	61 days	Fri 5/20/22	Tue 7/19/22	2SS+389 days														
3216	งานเก็บความเรียบร้อย,ทำความสะอาดและส่งมอบ (ระยะที่ 2)	90 days	Mon 1/16/23	Sat 4/15/23															
3217	งานทำความสะอาดภายใน (Interior)	61 days	Mon 1/16/23	Fri 3/17/23	2SS+630 days														
3218	งานทำความสะอาดภายนอก (Exterior)	60 days	Wed 2/15/23	Sat 4/15/23	2SS+660 days														

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

แผนงานติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

แผนงานติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

Activity ID	Activity Name	Dur	Early Start	Early Finish	Total Float	2021												2022												2023											
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul								
						-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
AOT STAFF HOUSING PROJECT		780	26-Apr-21	14-Jun-23	0																																				
K0000	NTP : Notice to Proceed	0	26-Apr-21		0	◇ 26-Apr-21*,																																			
K0110	MS-01 : งานโครงสร้าง บ้านพักผู้บัญชาการท่าอากาศยาน แล้วเสร็จ	0		20-Jan-22	0	◇ 20-Jan-22*																																			
K0120	MS-01 : งานโครงสร้าง บ้านพักรองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 1 แล้วเสร็จ	0		20-Jan-22	0	◇ 20-Jan-22*																																			
K0130	MS-01 : งานโครงสร้าง บ้านพักรองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หลังที่ 2 แล้วเสร็จ	0		20-Jan-22	0	◇ 20-Jan-22*																																			
K0140	MS-01 : งานโครงสร้าง อาคารอยู่อาศัยรวมผู้บริหาร อาคาร 7 แล้วเสร็จ	0		20-Jan-22	0	◇ 20-Jan-22*																																			
K0150	MS-01 : งานโครงสร้าง อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 2 แล้วเสร็จ	0		20-Jan-22	0	◇ 20-Jan-22*																																			
K0160	MS-01 : งานโครงสร้าง อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 4 แล้วเสร็จ	0		20-Jan-22	0	◇ 20-Jan-22*																																			
K0170	MS-01 : งานโครงสร้าง อาคารอยู่อาศัยรวมพนักงาน อาคาร 6 แล้วเสร็จ	0		20-Jan-22	0	◇ 20-Jan-22*																																			
K0210	MS-02 : งานตามขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ	0		19-Jul-22	0	◇ 19-Jul-22*																																			
K0600	SC : Substantial Completion	0		15-Apr-23	0	◇ 15-Apr-23*																																			
K0700	FA : Final Acceptance	0		14-Jun-23	0	◇ 14-Jun-23*																																			
งานเตรียมการก่อสร้าง		66	26-Apr-21	30-Jun-21	4																																				
M0600	ไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว	66	26-Apr-21	30-Jun-21	4	21 30-Jun-21																																			
งานภายนอก		485	01-Sep-21	29-Dec-22	62																																				
งานโยธภายนอก		198	01-Sep-21	17-Mar-22	19																																				
E5100	บ่อน้ำหน้าผ่น 2 (ระยะที่ 1)	45	18-Dec-21	31-Jan-22	4	18-Dec-21 31-Jan-22																																			
E5200	บ่อน้ำหน้าผ่น 1 (ระยะที่ 2)	45	01-Feb-22	17-Mar-22	19	01-Feb-22 17-Mar-22																																			
E6100	โรงบำบัดน้ำเสีย	153	01-Sep-21	31-Jan-22	4	01-Sep-21 31-Jan-22																																			
E7100	อาคารพักขยะ	60	01-Sep-21	30-Oct-21	97	01-Sep-21 30-Oct-21																																			
งานระบบภายนอกอาคาร		485	01-Sep-21	29-Dec-22	62																																				
U1100	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง (ระยะที่ 1)	153	30-Dec-21	31-May-22	4	30-Dec-21 31-May-22																																			
U1200	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง (ระยะที่ 2)	120	01-Sep-22	29-Dec-22	62	01-Sep-22 29-Dec-22																																			
U2100	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ระยะที่ 1)	153	01-Sep-21	31-Jan-22	4	01-Sep-21 31-Jan-22																																			
U2200	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)	120	01-Feb-22	31-May-22	4	01-Feb-22 31-May-22																																			
U3100	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (ระยะที่ 1)	153	01-Sep-21	31-Jan-22	4	01-Sep-21 31-Jan-22																																			
U3200	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (ระยะที่ 2)	120	01-Feb-22	31-May-22	4	01-Feb-22 31-May-22																																			
U4100	งานระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 1)	153	01-Sep-21	31-Jan-22	4	01-Sep-21 31-Jan-22																																			
U4200	งานระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 2)	120	01-Feb-22	31-May-22	4	01-Feb-22 31-May-22																																			
U5100	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ระยะที่ 1)	153	30-Dec-21	31-May-22	4	30-Dec-21 31-May-22																																			
U5200	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ระยะที่ 2)	120	01-Sep-22	29-Dec-22	62	01-Sep-22 29-Dec-22																																			
งานทดสอบระบบและส่งมอบ		0	31-May-22	31-May-22	0																																				
T1000	จุดจ่ายน้ำถาวร	0	31-May-22		0	◇ 31-May-22*,																																			
T2000	จุดจ่ายไฟถาวร	0	31-May-22		0	◇ 31-May-22*,																																			
