


ภาคผนวก ข-9


แผนการดำเนินงานโครงการ Albar Peninsula

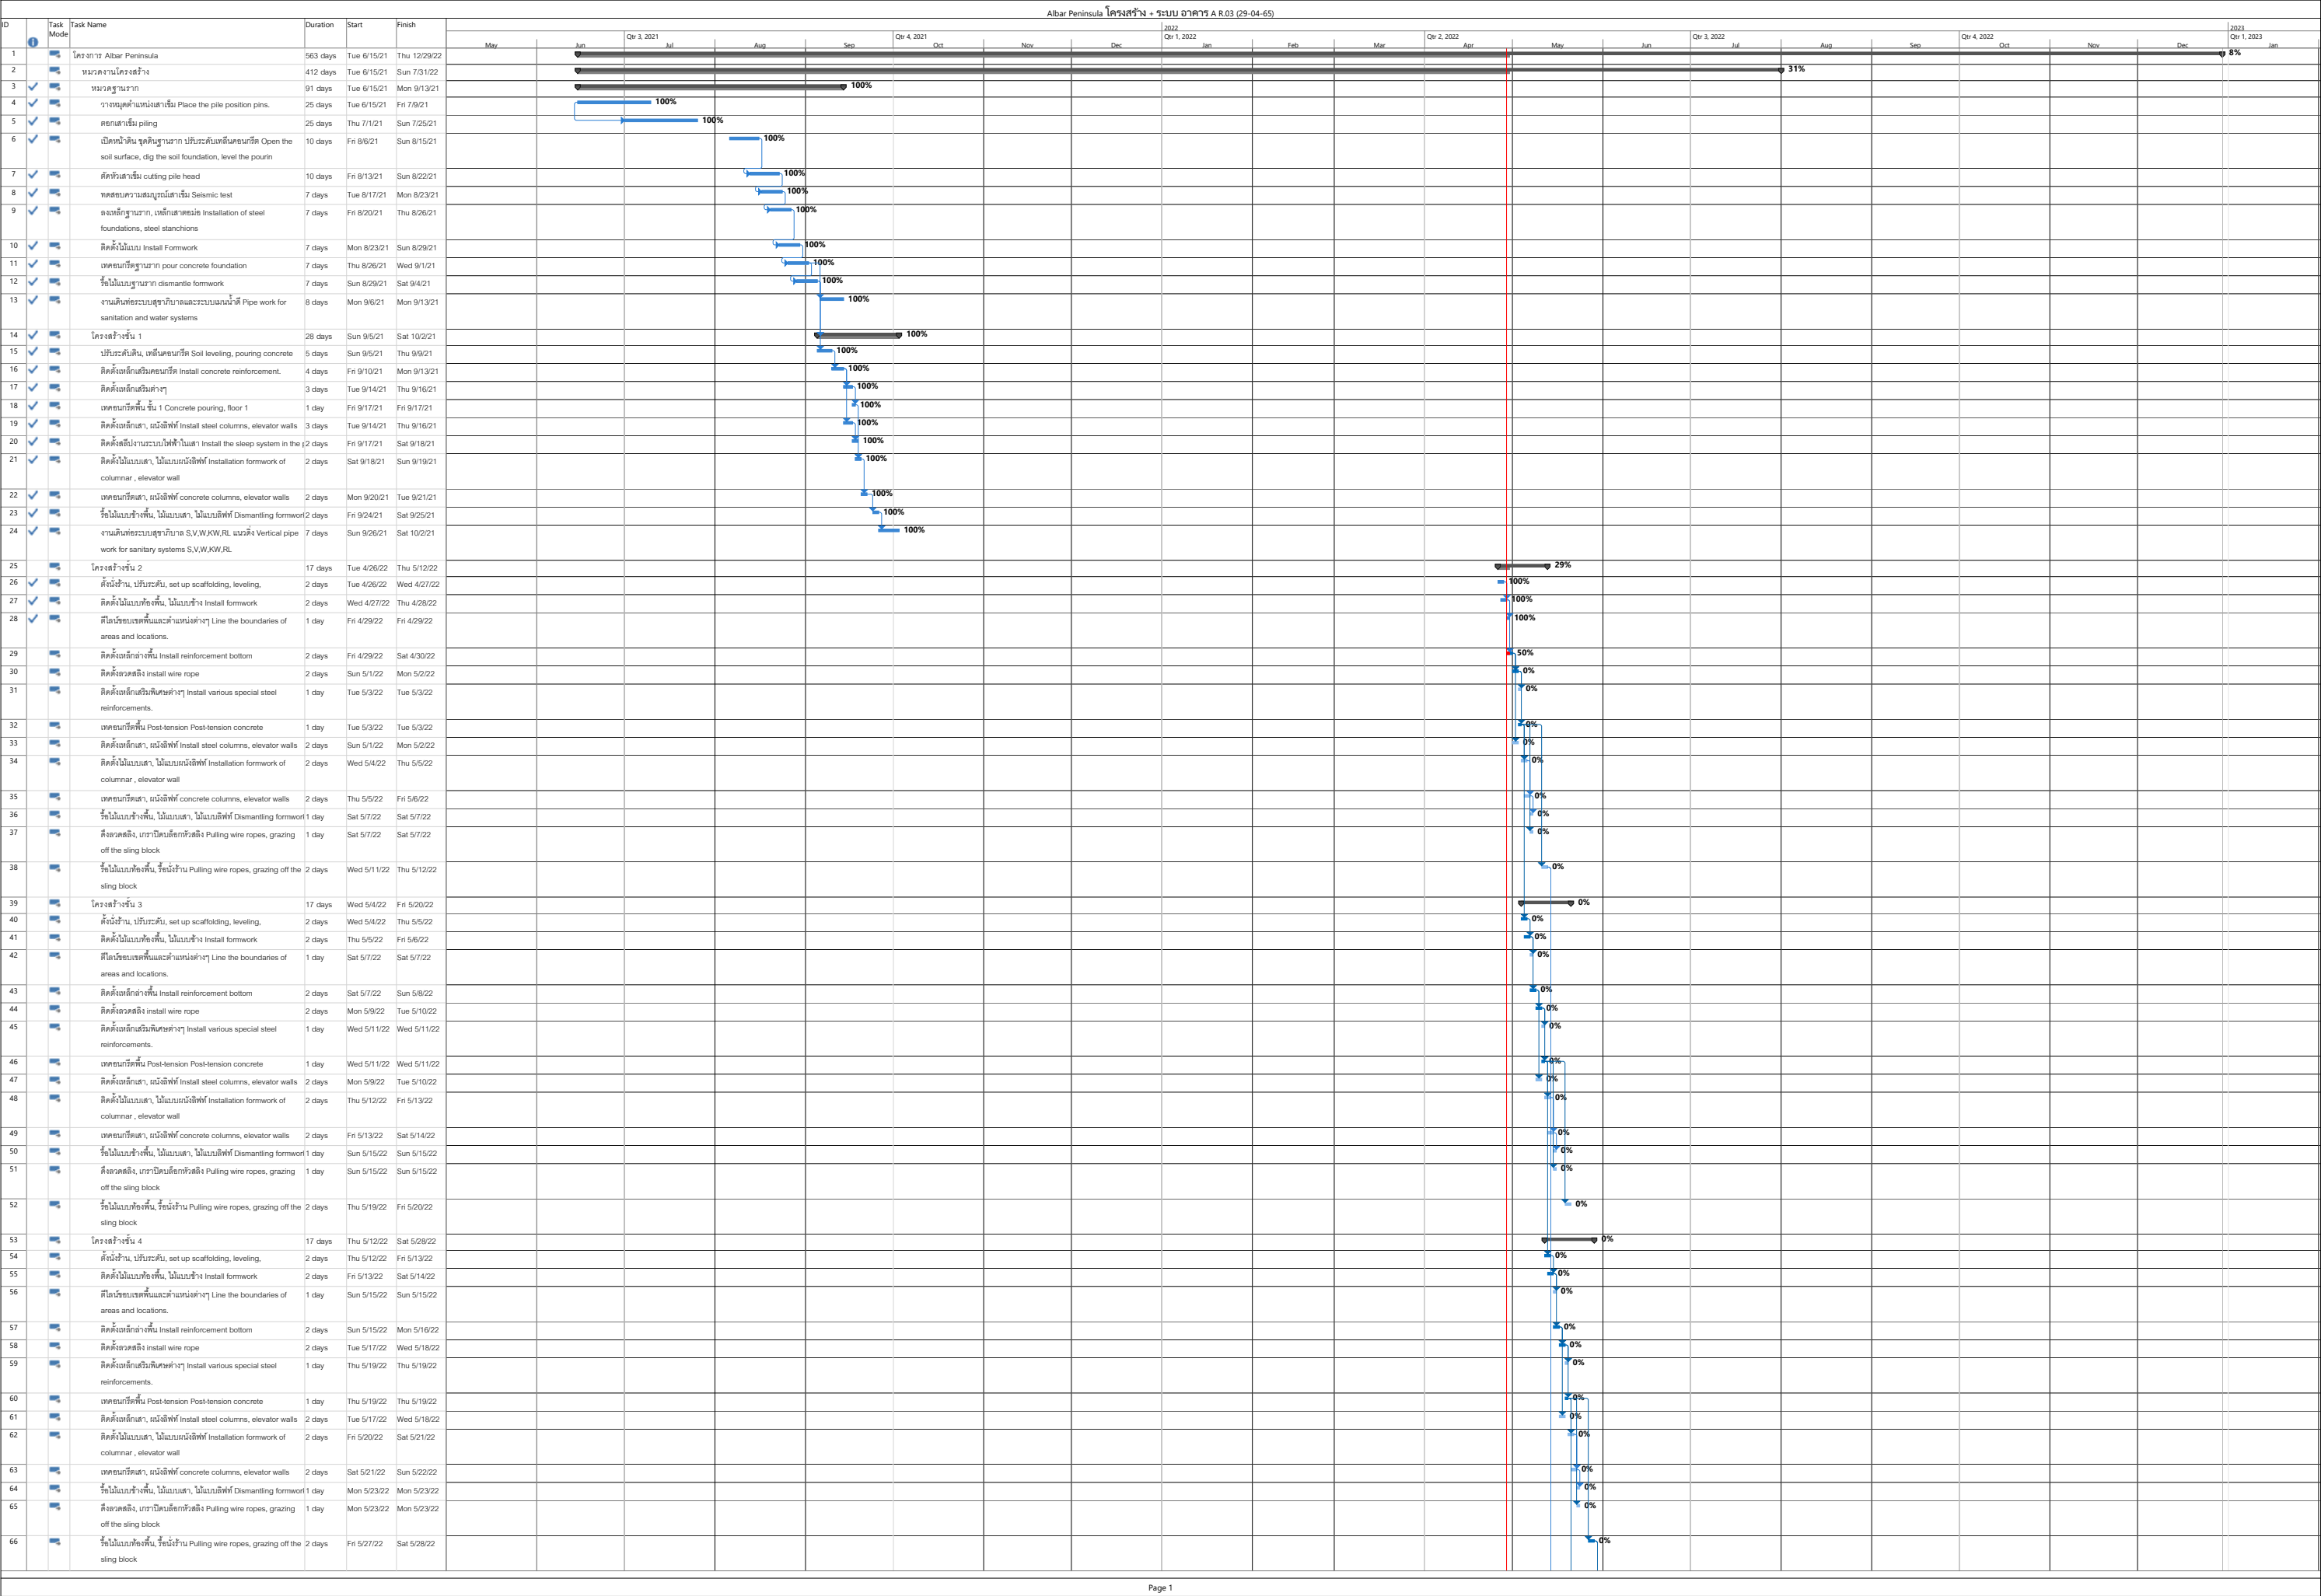


[illegible]

Albar Peninsula โครงสร้าง • ระบบ อาคาร A R.03 (29-04-65)																								
ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish																			
						May	Jun	Qtr 3, 2021	Jul	Aug	Sep	Qtr 4, 2021	Oct	Nov	Dec	2022	Qtr 1, 2022	Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2022	Apr	May	Jun
260	🔧📅	งานติดตั้งดวงโคม อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร Installation of lamps electrical and communication equipment	5 days	Sun 9/18/22	Thu 9/22/22																			
261	🔧📅	งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ Installation of air conditioning equipment	5 days	Sun 9/18/22	Thu 9/22/22																			
262	🔧📅	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ Sanitary ware installation	5 days	Fri 9/23/22	Tue 9/27/22																			
263	🔧📅	งาน Defect	10 days	Wed 9/28/22	Fri 10/7/22																			
264	🔧📅	ชั้น 5	78 days	Tue 8/9/22	Tue 10/25/22																			
265	🔧📅	งานเดิน line work	4 days	Tue 8/9/22	Fri 8/12/22																			
266	🔧📅	งานเดินท่อน้ำไฟฟ้าประจำชั้น Electrical main pipe work on the floor	7 days	Sat 8/13/22	Fri 8/19/22																			
267	🔧📅	งานเดินท่อน้ำยกระบนไฟฟ้าและสื่อสารส่วนกลางทั้งพื้นที่ Electrical and communication sub-pipe work on the ground	7 days	Sat 8/13/22	Fri 8/19/22																			
268	🔧📅	งานเดินท่อน้ำยกระบนปรับอากาศและระบบสายส่งส่วนกลางทั้งพื้นที่ Electrical and communication sub-pipe work on the	7 days	Sat 8/13/22	Fri 8/19/22																			
269	🔧📅	งานหล่อชิ้น casting work	5 days	Sat 8/13/22	Wed 8/17/22																			
270	🔧📅	งานเสาเข็ม, ทับหลัง tendon pole work, intel	5 days	Sat 8/27/22	Wed 8/31/22																			
271	🔧📅	งานติดตั้งวงกบประตู Door frame installation	7 days	Thu 9/1/22	Wed 9/7/22																			
272	🔧📅	งานก่ออิฐ brickwork	14 days	Thu 8/18/22	Wed 8/31/22																			
273	🔧📅	งานกันซึมในห้องน้ำ Waterproofing in the bathroom	5 days	Thu 9/22/22	Mon 9/26/22																			
274	🔧📅	งานกรีดท่อลงผนังระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้อง Cutting pipes into the walls of electrical and communication systems	7 days	Thu 9/1/22	Wed 9/7/22																			
275	🔧📅	งานเดินท่อน้ำดื่มภายในห้องพัก Water pipe work in the room	7 days	Thu 9/1/22	Wed 9/7/22																			
276	🔧📅	งานฉาบ plaster work	14 days	Thu 9/8/22	Wed 9/21/22																			
277	🔧📅	งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องพัก Electrical wiring work and communication in the room	7 days	Thu 9/22/22	Wed 9/28/22																			
278	🔧📅	งานร้อยสายเมนไฟฟ้าและสื่อสารประจำชั้น Electrical and communication wiring work on the floor	7 days	Thu 9/29/22	Wed 10/5/22																			
279	🔧📅	งานกระเบื้องผนัง wall tile work	10 days	Tue 9/27/22	Thu 10/6/22																			
280	🔧📅	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก Installation of air conditioning in the room	7 days	Thu 9/22/22	Wed 9/28/22																			
281	🔧📅	งานฝ้าเพดาน ceiling work	7 days	Thu 9/22/22	Wed 9/28/22																			
282	🔧📅	งานสกิน งานทาสี skim paint	7 days	Thu 9/29/22	Wed 10/5/22																			
283	🔧📅	งานกระเบื้องพื้น floor tile work	10 days	Thu 9/29/22	Sat 10/8/22																			
284	🔧📅	งานติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ Installation of door panels with accessories	7 days	Thu 10/6/22	Wed 10/12/22																			
285	🔧📅	งานอลูมิเนียม aluminum work	7 days	Thu 10/6/22	Wed 10/12/22																			
286	🔧📅	งานติดตั้งดวงโคม อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร Installation of lamps electrical and communication equipment	5 days	Thu 10/6/22	Mon 10/10/22																			
287	🔧📅	งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ Installation of air conditioning equipment	5 days	Tue 8/9/22	Sat 8/13/22																			
288	🔧📅	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ Sanitary ware installation	5 days	Tue 10/11/22	Sat 10/15/22																			
289	🔧📅	งาน Defect	10 days	Sun 10/16/22	Tue 10/25/22																			
290	🔧📅	ชั้น 6	78 days	Sat 8/27/22	Sat 11/12/22																			
291	🔧📅	งานเดิน line work	4 days	Sat 8/27/22	Tue 8/30/22																			
292	🔧📅	งานเดินท่อน้ำไฟฟ้าประจำชั้น Electrical main pipe work on the floor	7 days	Wed 8/31/22	Tue 9/6/22																			
293	🔧📅	งานเดินท่อน้ำยกระบนไฟฟ้าและสื่อสารส่วนกลางทั้งพื้นที่ Electrical and communication sub-pipe work on the ground	7 days	Wed 8/31/22	Tue 9/6/22																			
294	🔧📅	งานเดินท่อน้ำยกระบนปรับอากาศและระบบสายส่งส่วนกลางทั้งพื้นที่ Electrical and communication sub-pipe work on the	7 days	Wed 8/31/22	Tue 9/6/22																			
295	🔧📅	งานหล่อชิ้น casting work	5 days	Wed 8/31/22	Sun 9/4/22																			
296	🔧📅	งานเสาเข็ม, ทับหลัง tendon pole work, intel	5 days	Wed 9/14/22	Sun 9/18/22																			
297	🔧📅	งานติดตั้งวงกบประตู Door frame installation	7 days	Mon 9/19/22	Sun 9/25/22																			
298	🔧📅	งานก่ออิฐ brickwork	14 days	Mon 9/5/22	Sun 9/18/22																			
299	🔧📅	งานกันซึมในห้องน้ำ Waterproofing in the bathroom	5 days	Mon 10/10/22	Fri 10/14/22																			
300	🔧📅	งานกรีดท่อลงผนังระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้อง Cutting pipes into the walls of electrical and communication systems	7 days	Mon 9/19/22	Sun 9/25/22																			
301	🔧📅	งานเดินท่อน้ำดื่มภายในห้องพัก Water pipe work in the room	7 days	Mon 9/19/22	Sun 9/25/22																			
302	🔧📅	งานฉาบ plaster work	14 days	Mon 9/26/22	Sun 10/9/22																			
303	🔧📅	งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องพัก Electrical wiring work and communication in the room	7 days	Mon 9/26/22	Sun 10/2/22																			
304	🔧📅	งานร้อยสายเมนไฟฟ้าและสื่อสารประจำชั้น Electrical and communication wiring work on the floor	7 days	Mon 10/10/22	Sun 10/16/22																			
305	🔧📅	งานกระเบื้องผนัง wall tile work	10 days	Sat 10/15/22	Mon 10/24/22																			
306	🔧📅	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก Installation of air conditioning in the room	7 days	Mon 10/10/22	Sun 10/16/22																			
307	🔧📅	งานฝ้าเพดาน ceiling work	7 days	Mon 10/10/22	Sun 10/16/22																			
308	🔧📅	งานสกิน งานทาสี skim paint	7 days	Mon 10/17/22	Sun 10/23/22																			
309	🔧📅	งานกระเบื้องพื้น floor tile work	10 days	Mon 10/17/22	Wed 10/26/22																			
310	🔧📅	งานติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ Installation of door panels with accessories	7 days	Mon 10/24/22	Sun 10/30/22																			
311	🔧📅	งานอลูมิเนียม aluminum work	7 days	Mon 10/24/22	Sun 10/30/22																			
312	🔧📅	งานติดตั้งดวงโคม อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร Installation of lamps electrical and communication equipment	5 days	Mon 10/24/22	Fri 10/28/22																			
313	🔧📅	งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ Installation of air conditioning equipment	5 days	Mon 10/24/22	Fri 10/28/22																			
314	🔧📅	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ Sanitary ware installation	5 days	Sat 10/29/22	Wed 11/2/22																			
315	🔧📅	งาน Defect	10 days	Thu 11/3/22	Sat 11/12/22																			
316	🔧📅	ชั้น 7	78 days	Wed 9/14/22	Wed 11/30/22																			
317	🔧📅	งานเดิน line work	4 days	Wed 9/14/22	Sat 9/17/22																			
318	🔧📅	งานเดินท่อน้ำไฟฟ้าประจำชั้น Electrical main pipe work on the floor	7 days	Sun 9/18/22	Sat 9/24/22																			
319	🔧📅	งานเดินท่อน้ำยกระบนไฟฟ้าและสื่อสารส่วนกลางทั้งพื้นที่ Electrical and communication sub-pipe work on the ground	7 days	Sun 9/18/22	Sat 9/24/22																			
320	🔧📅	งานเดินท่อน้ำยกระบนปรับอากาศและระบบสายส่งส่วนกลางทั้งพื้นที่ Electrical and communication sub-pipe work on the	7 days	Sun 9/18/22	Sat 9/24/22																			

Albar Peninsula • โครงสร้าง • ระบบอาคาร A R.03 (29-04-65)																										
D	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	May	Jun	Qtr 3, 2021 Jul	Aug	Sep	Qtr 4, 2021 Oct	Nov	Dec	2022 Qtr 1, 2022 Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2022 Apr	May	Jun	Qtr 3, 2022 Jul	Aug	Sep	Qtr 4, 2022 Oct	Nov	Dec	2023 Qtr 1, 2023 Jan
321	1	งานหล่อชิ้น casting work	5 days	Sun 9/18/22	Thu 9/22/22																	0%				
322		งานเสาเข็ม, ท่อน้ำ tendon pole work, intel	5 days	Sun 10/2/22	Thu 10/6/22																	0%	0%			
323		งานติดตั้งวงกบประตู Door frame installation	7 days	Fri 10/7/22	Thu 10/13/22																	0%	0%			
324		งานก่ออิฐ brickwork	14 days	Fri 9/23/22	Thu 10/6/22																	0%	0%			
325		งานกันซึมในห้องน้ำ Waterproofing in the bathroom	5 days	Fri 10/28/22	Tue 11/1/22																	0%	0%			
326		งานกรีดท่อลมน้ำประปาไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้อง Cutting pipes into the walls of electrical and communication systems	7 days	Fri 10/7/22	Thu 10/13/22																	0%	0%			
327		งานเดินท่อน้ำภายในห้องพัก Water pipe work in the room	7 days	Fri 10/7/22	Thu 10/13/22																	0%	0%			
328		งานฉาบ plaster work	14 days	Fri 10/14/22	Thu 10/27/22																	0%	0%			
329		งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารภายในห้องพัก Electrical wiring work and communication in the room	7 days	Fri 10/28/22	Thu 11/3/22																	0%	0%			
330		งานร้อยสายเมนไฟฟ้าและสื่อสารประจำชั้น Electrical and communication wiring work on the floor	7 days	Fri 10/28/22	Thu 11/3/22																	0%	0%			
331		งานกระเบื้องผนัง wall tile work	10 days	Wed 11/2/22	Fri 11/11/22																	0%	0%			
332		งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก Installation of air conditioning in the room	7 days	Fri 10/28/22	Thu 11/3/22																	0%	0%			
333		งานฉาบเพดาน ceiling work	7 days	Fri 10/28/22	Thu 11/3/22																	0%	0%			
334		งานสีมึน งานทาสี skim paint	7 days	Fri 11/4/22	Thu 11/10/22																	0%	0%			
335		งานกระเบื้องพื้น floor tile work	10 days	Fri 11/4/22	Sun 11/13/22																	0%	0%			
336		งานติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ Installation of door panels with accessories	7 days	Fri 11/11/22	Thu 11/17/22																	0%	0%			
337		งานอลูมิเนียม aluminum work	7 days	Fri 11/11/22	Thu 11/17/22																	0%	0%			
338		งานติดตั้งดวงโคม อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร Installation of lamps electrical and communication equipment	5 days	Fri 11/11/22	Tue 11/15/22																	0%	0%			
339		งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ Installation of air conditioning equipment	5 days	Fri 11/11/22	Tue 11/15/22																	0%	0%			
340		งานติดตั้งสุขภัณฑ์ Sanitary ware installation	5 days	Wed 11/16/22	Sun 11/20/22																	0%	0%			
341		งาน Defect	10 days	Mon 11/21/22	Wed 11/30/22																	0%	0%			
342		ชั้น 8	78 days	Sun 10/2/22	Sun 12/18/22																	0%	0%			
343		งานเดิน line work	4 days	Sun 10/2/22	Wed 10/5/22																	0%	0%			
344		งานเดินท่อเมนไฟฟ้าประจำชั้น Electrical main pipe work on the floor	7 days	Thu 10/6/22	Wed 10/12																					

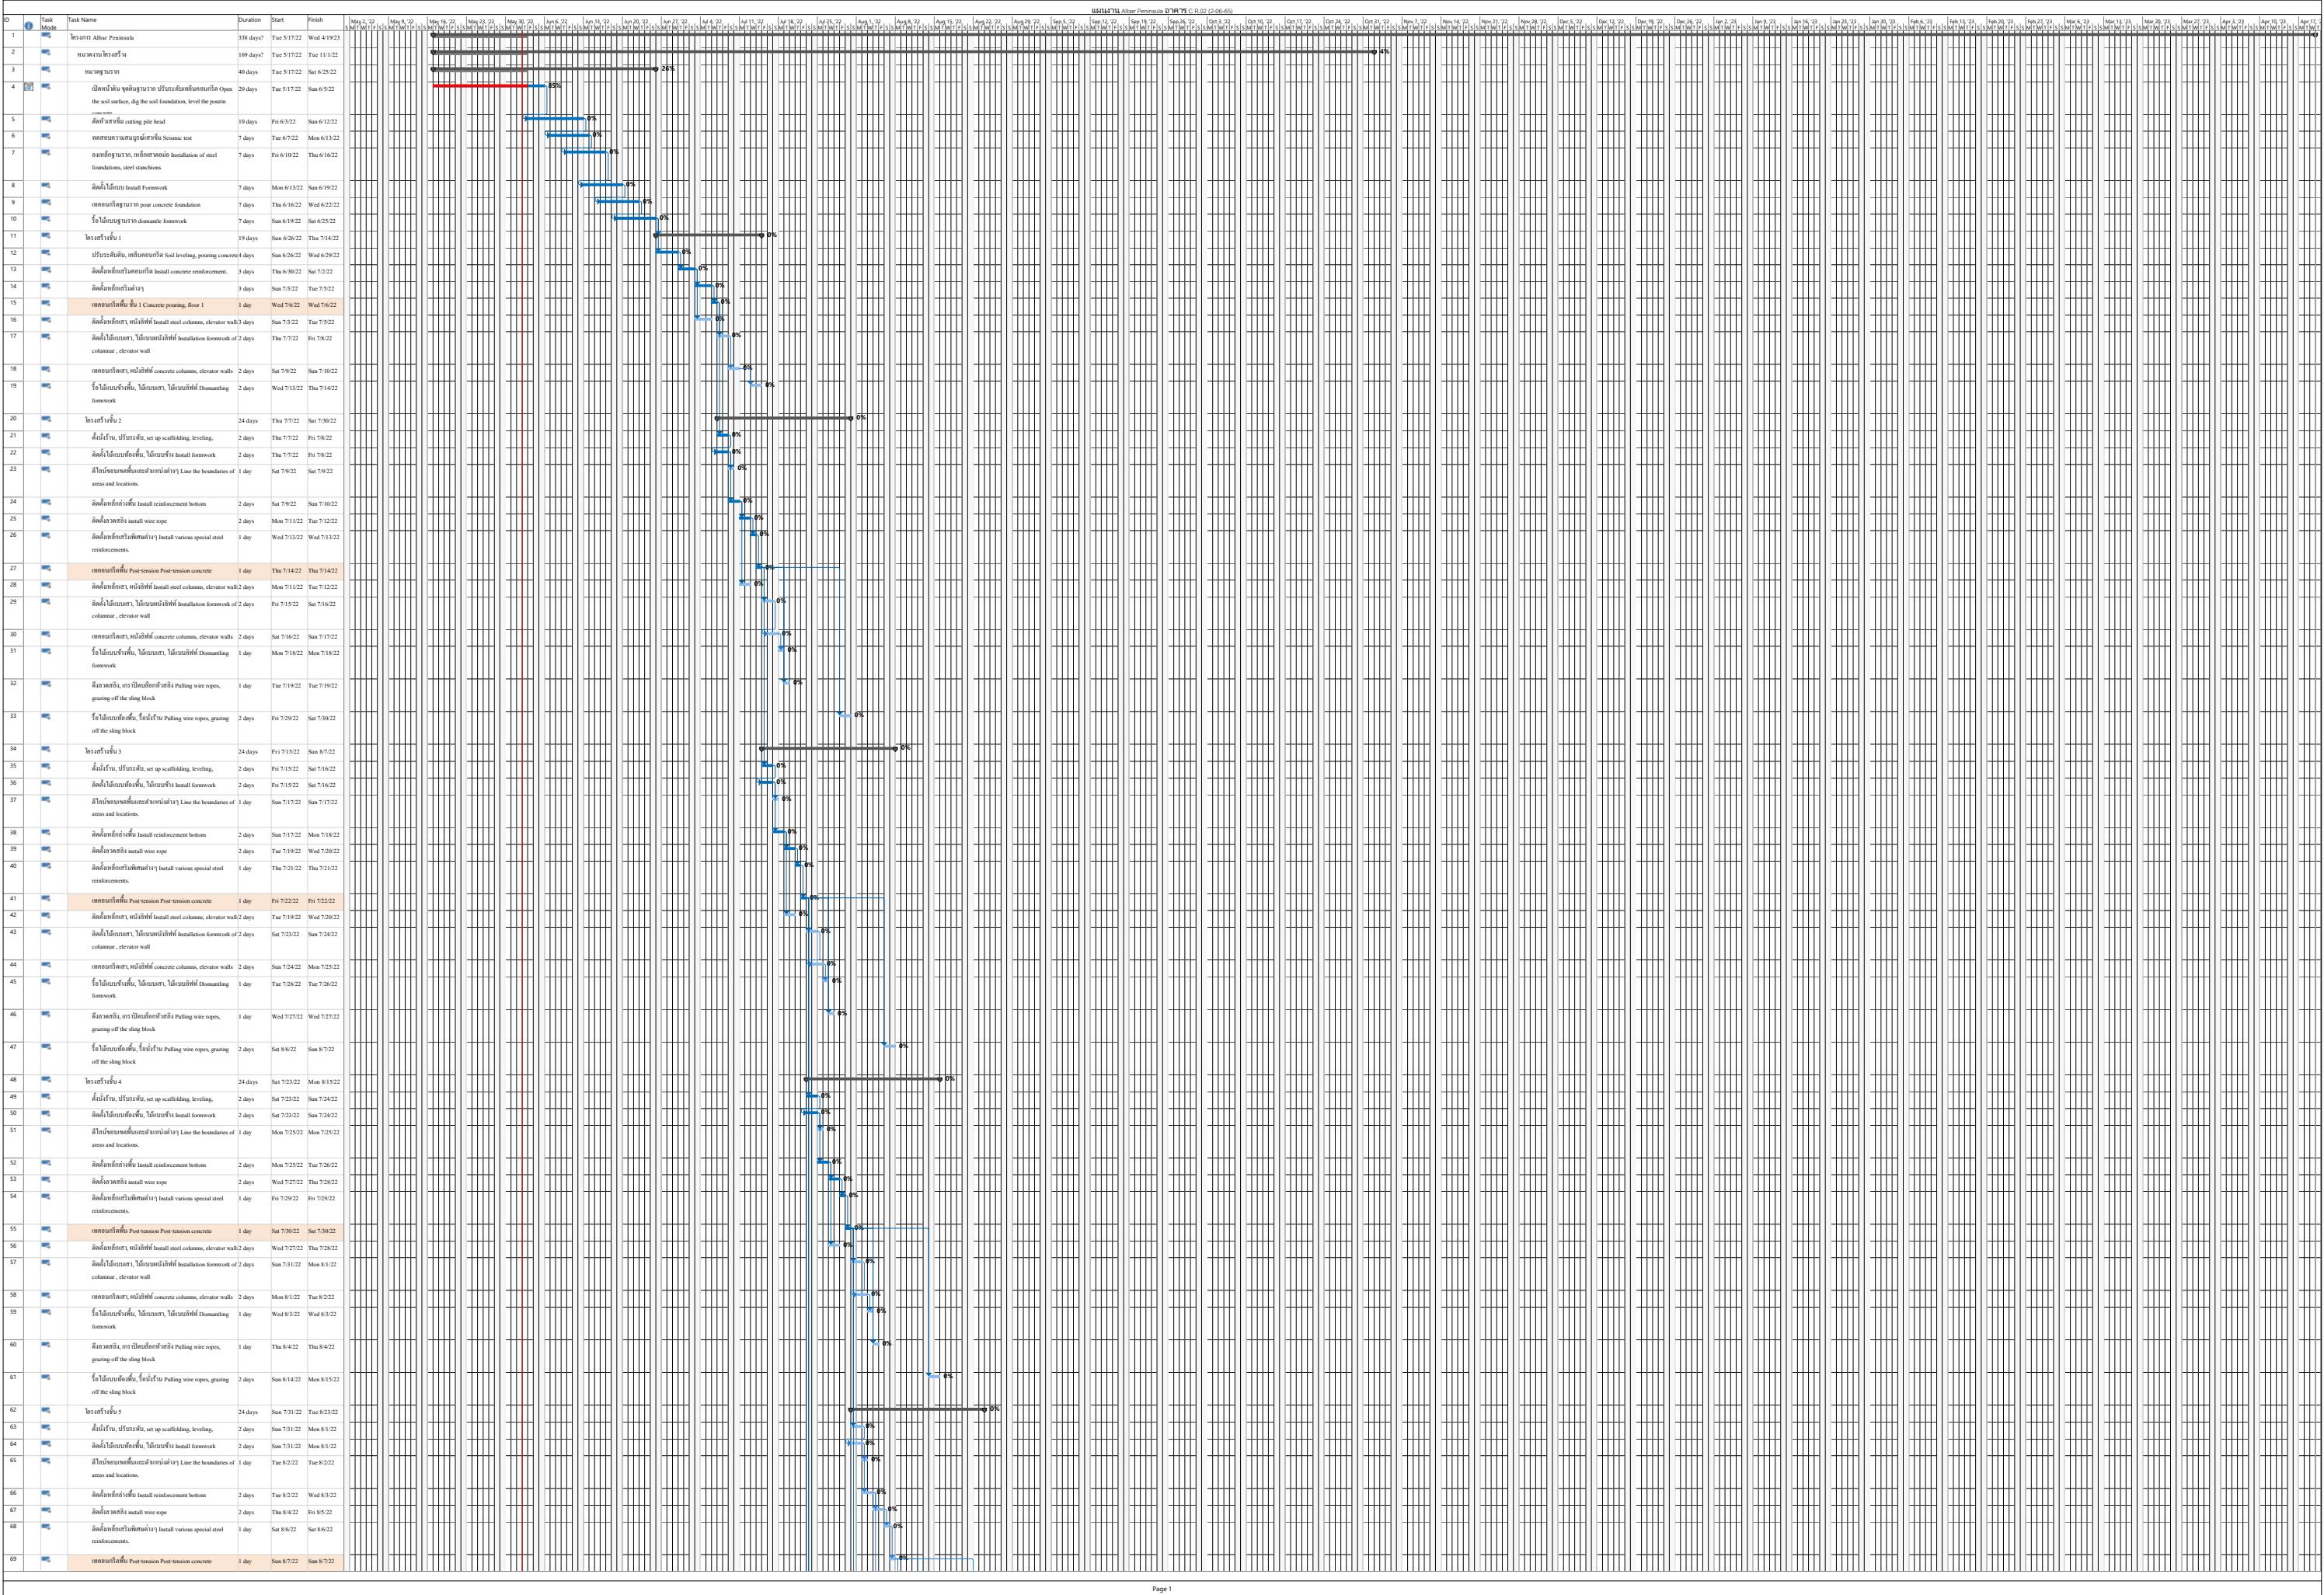

Page 3

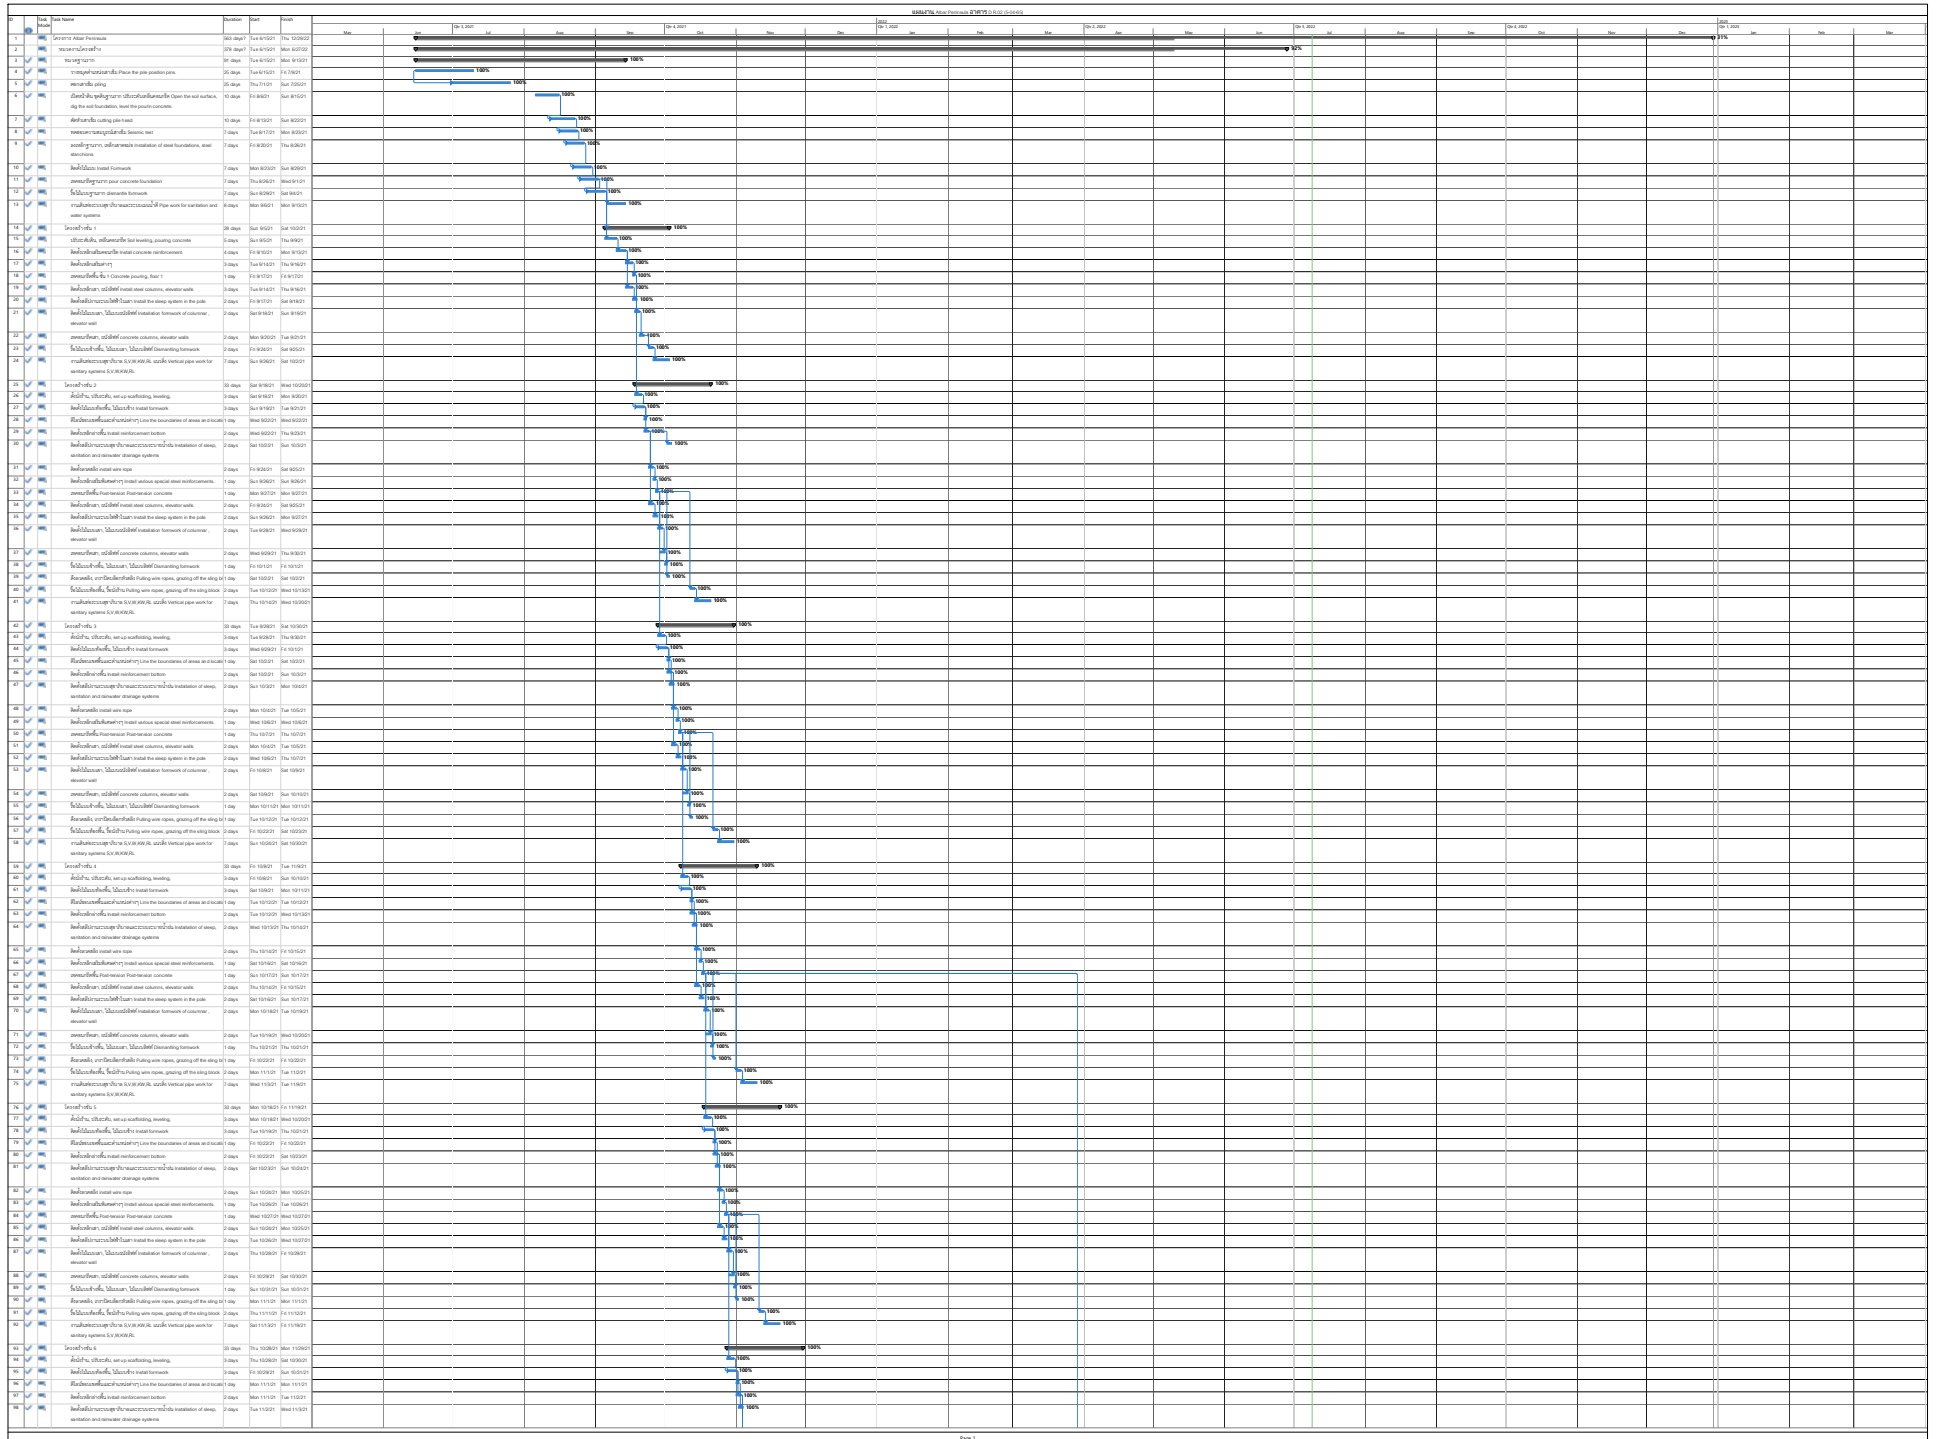

Page 3

