

# ภาคผนวก ค-9

---

หนังสือแจ้งล่วงหน้าการทำงานเกินเวลา





บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด  
T.T.S.ENGINEERING(2004) CO.,LTD

3 เฉลิมพระเกียรติ 5.9 ซอย 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-726-8731-4 โทรสาร 02-726-8731-5  
3 Chalermprakiat R.9 Soi 72 Pravaj ,Pravaj District Bangkok 10250 Tel 02-726-8731-4 Fax 02-726-8731-5

โครงการ ฌริวา เจริญนคร

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งแผนงานประจำสัปดาห์ และการทำงานล่วงเวลา  
ของบริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด

เรียน ท่านเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง เลขที่..

บริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ฌริวา เจริญนคร ขอแจ้งแผนงานประจำสัปดาห์  
วันที่ 20 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และในระหว่างสัปดาห์มีงานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย และงานอื่นๆที่  
ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ งานเอกสาร งานทำความสะอาด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงเวลาไม่เกิน 20.00 น. ดังนี้

ตารางแจ้งการทำงานล่วงเวลา 18.00 – 20.00 น.		
ที่	วันที่ทำล่วงเวลา	งาน/กิจกรรมที่ทำ
1	20 มิถุนายน 2565	งานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย , งานเอกสาร , ทำความสะอาด
2	22 มิถุนายน 2565	งานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย , งานเอกสาร , ทำความสะอาด
3	23 มิถุนายน 2565	งานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย , งานเอกสาร , ทำความสะอาด

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบและขอความอนุเคราะห์

(คุณตฤณ ทองน้อย)

Project manager

T.T.S.Engineering (2004) Co., Ltd

ขอแสดงความนับถือ

(คุณณัฐคนัย ปัญญา)

Engineering Plus Co., Ltd

รับทราบ .....

( ) ชื่อตัวบรรจง

ท่านเจ้าของบ้าน/อาคาร

สำเนา : คุณเกียรติคุณ มุสทองสุข / ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้ประสานงาน : คุณวรรณัน เพ็ญนอก โทร


## แผนงานประจำปี ( 20 มิ.ย.65 - 25 มิ.ย.65 )

โครงการ : ณ รื่นา เจริญนคร

เจ้าของ : บริษัท นวรางค์ เจริญนคร จำกัด

บริหารงานและควบคุมงานโครงการ : บริษัท เอ็นอีเนียริง พลัส จำกัด

ก่อสร้างโดย : บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

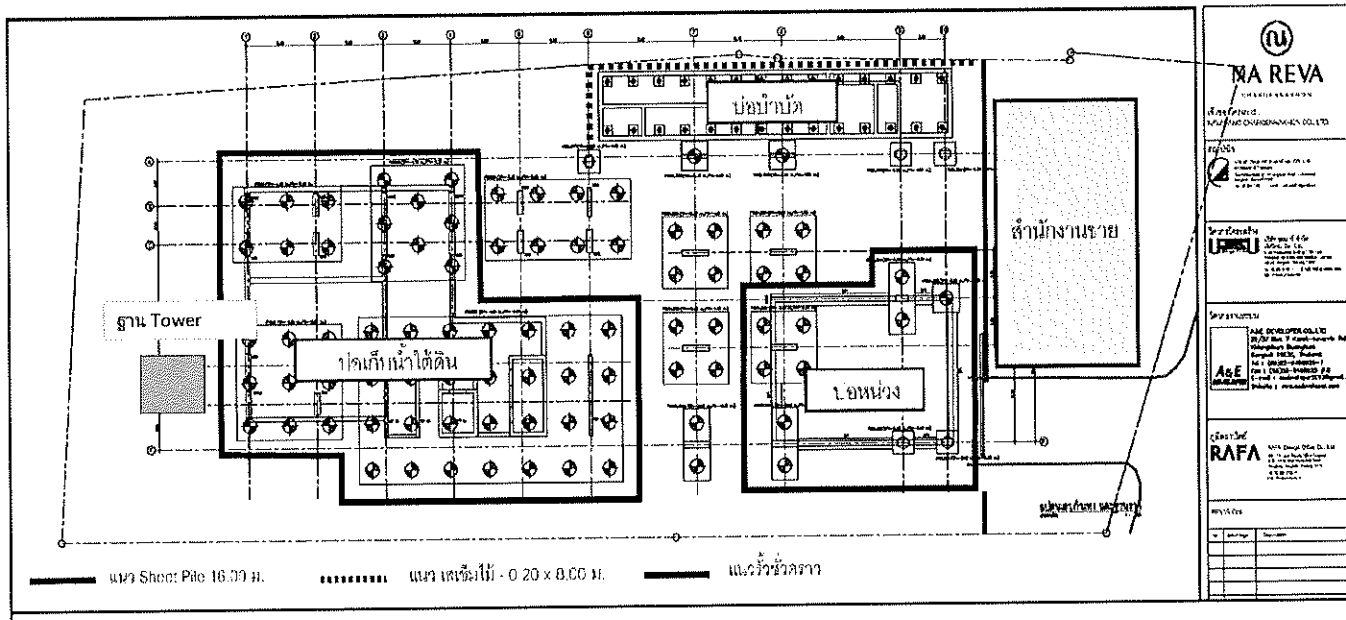

วัน จันทร์ ที่ 20 มิ.ย.65 OT (18.00-20.00)	วัน อังคาร ที่ 21 มิ.ย.65	วัน พุธ ที่ 22 มิ.ย.65 OT (18.00-20.00)
1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย	1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย	1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย
-งานติดตั้งแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด	-งานติดตั้งแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด	- งานเทคอนกรีตผนังบ่อน้ำบาด
2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน
-งานเทคอนกรีต Wale Ly.2	-งาน Pre Load Bracing Ly 2	-งานขุดดิน Ly.3 ระดับ -4.50 ถึง -5.70
	-งานขุดดิน Ly.3 ระดับ -4.50 ถึง -5.70	
3.บ่อหลวงน้ำ	3.บ่อหลวงน้ำ	3.บ่อหลวงน้ำ
4.อื่นๆ	4.อื่นๆ	4.อื่นๆ
- งานเชื่อมเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane	- งานเชื่อมเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane	- งานเชื่อมเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิ.ย.65 (18.00-20.00)	วัน ศุกร์ ที่ 24 มิ.ย.65	วัน เสาร์ ที่ 25 มิ.ย.65
1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย	1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย	1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย
-งานรื้อแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด	-งานรื้อแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด	-งานรื้อแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด
2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	-งานติดตั้งค้ำยันผนังบ่อน้ำบาด	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน
-งานขุดดิน Ly.3 ระดับ -4.50 ถึง -5.70	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	-งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 3 ระดับ-5.00ม.
	-งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 3 ระดับ-5.00ม.	
3.บ่อหลวงน้ำ	3.บ่อหลวงน้ำ	3.บ่อหลวงน้ำ
4.อื่นๆ	4.อื่นๆ	4.อื่นๆ
- งานเชื่อมเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane	- งานเชื่อมเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane	- งานเชื่อมเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane

## แผนกำหนดส่งวัสดุเข้าหน้างาน ณรีวา

Update 18/6/65

ลำดับ	รายการ	วันที่ส่ง	ช่วงเวลา	จำนวน(คัน)	ชนิดรถ	หมายเหตุ
1	ส่งปื้มงานบ่อ	21/6/65	9.00-12.00	1	รถหกล้อ	หน่วยงาน
2	เทปูน	22/6/65	8.00-15.00	ทั้งวัน	รถคอนกรีต	หน่วยงาน
3	ขนดินออก	22/6/65	9.00-16.00	ทั้งวัน	รถสิบล้อ	หน่วยงาน
4	ส่งวัสดุหน้างาน (เครื่องมือ เครื่องจักร)	23/6/65	9.00-12.00	1	รถหกล้อ	หน่วยงาน
5	ขนดินออก	24/6/65	9.00-16.00	ทั้งวัน	รถสิบล้อ	หน่วยงาน
6	ส่งวัสดุหน้างาน( On Site)	24/6/65	9.00-12.00	1	รถกระบะ	หน่วยงาน



บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด  
T.T.S.ENGINEERING(2004) CO.,LTD

3 เอลิมพรเกียสดี ส.9 ซอย 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-726-8731-4 โทรสาร 02-726-8731-5  
3 Chalermprakiat R.9 Soi 72 Pravaj ,Pravaj District Bangkok 10250 Tel 02-726-8731-4 Fax 02-726-8731-5

โครงการ ฌรีวา เจริญนคร

วันที่ 18 มิถุนายน 2565


เรื่อง แจ้งแผนงานประจำสัปดาห์ และการทำงานล่วงเวลา  
ของบริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด

เรียน ท่านเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง เลขที่.....

บริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ฌรีวา เจริญนคร ขอแจ้งแผนงานประจำสัปดาห์  
วันที่ 20 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และในระหว่างสัปดาห์มีงานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย และงานอื่นๆที่  
ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ งานเอกสาร งานทำความสะอาด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงเวลาไม่เกิน 20.00 น. ดังนี้

ตารางแจ้งการทำงานล่วงเวลา 18.00 – 20.00 น.		
ที่	วันที่ทำล่วงเวลา	งาน/กิจกรรมที่ทำ
1	20 มิถุนายน 2565	งานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย , งานเอกสาร , ทำความสะอาด
2	22 มิถุนายน 2565	งานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย , งานเอกสาร , ทำความสะอาด
3	23 มิถุนายน 2565	งานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย , งานเอกสาร , ทำความสะอาด

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบและขอความอนุเคราะห์



(คุณตฤณ ทองน้อย)

Project manager

T.T.S.Engineering (2004) Co., Ltd

ขอแสดงความนับถือ



Engineering Plus Co., Ltd

รับทราบ .....

( ) ชื่อตัวบรรจง

ท่านเจ้าของบ้าน/อาคาร

สำเนา : คุณเกียรติคุณ มูลทองสุข / ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้ประสานงาน : คุณวรรณ เฟื่องนอก โทร.....


## แผนงานประจำสัปดาห์ ( )

โครงการ : ณ รวิรา เจริญนคร

บริหารงานและควบคุมงานโครงการ : บริษัท เอ็นอีเวิลด์ จำกัด

เจ้าของ : บริษัท ณรารักษ์ เจริญนคร จำกัด

ก่อสร้างโดย : บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นอีเวิลด์ (2004) จำกัด

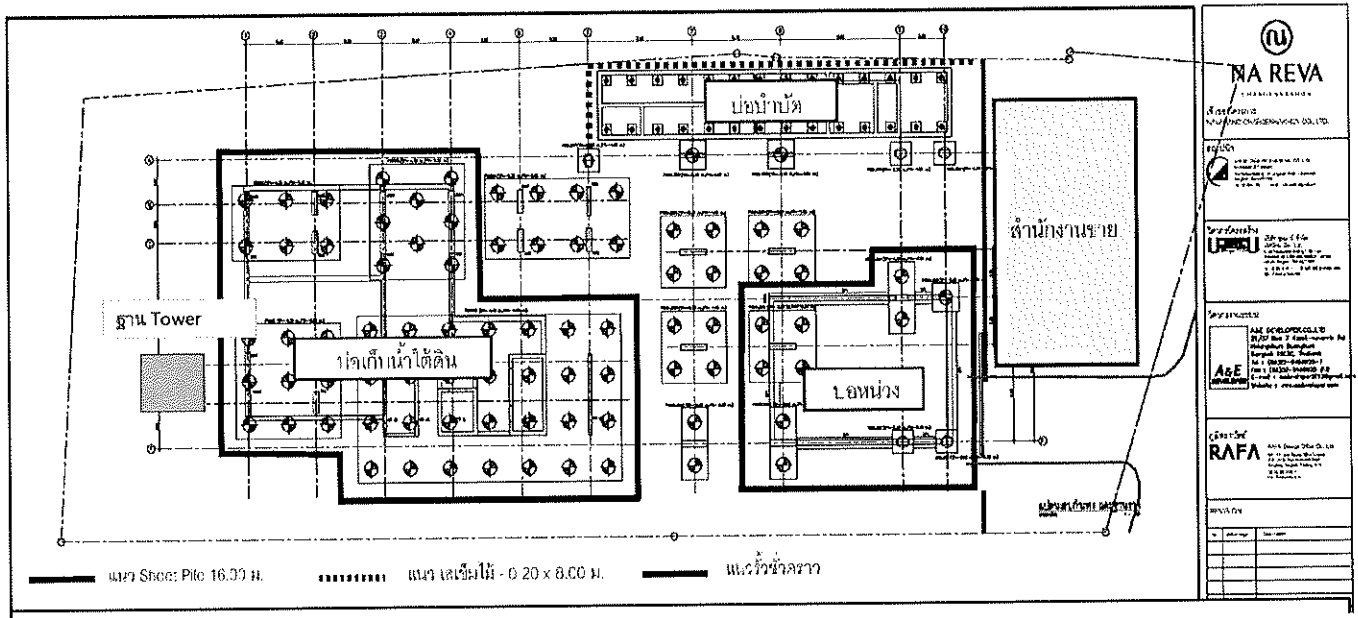

วัน จันทร์ ที่ 20 มิ.ย.65 OT (18.00-20.00)	วัน อังคาร ที่ 21 มิ.ย.65	วัน พุธ ที่ 22 มิ.ย.65 OT (18.00-20.00)
1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย	1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย	1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย
-งานติดตั้งแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด	-งานติดตั้งแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด	- งานเทคอนกรีตผนังบ่อน้ำบาด
2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน
-งานเทคอนกรีต Wale Ly 2	-งาน Pre Load Bracing Ly.2	-งานขุดดิน Ly.3 ระดับ -4.50 ถึง -5.70
3.บ่อน้ำขังน้ำ	3.บ่อน้ำขังน้ำ	3.บ่อน้ำขังน้ำ
4.อื่นๆ	4.อื่นๆ	4.อื่นๆ
- งานเริ่มเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane	- งานเริ่มเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane	- งานเริ่มเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิ.ย.65 (18.00-20.00)	วัน ศุกร์ ที่ 24 มิ.ย.65	วัน เสาร์ ที่ 25 มิ.ย.65
1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย	1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย	1.บ่อน้ำบาดน้ำเสีย
-งานรื้อแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด	-งานรื้อแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด	-งานรื้อแบบหล่อผนังบ่อน้ำบาด
2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน
-งานขุดดิน Ly.3 ระดับ -4.50 ถึง -5.70	-งานติดตั้งค้ำยันผนังบ่อน้ำบาด	-งานติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 3 ระดับ-5.00ม.
3.บ่อน้ำขังน้ำ	3.บ่อน้ำขังน้ำ	3.บ่อน้ำขังน้ำ
4.อื่นๆ	4.อื่นๆ	4.อื่นๆ
- งานเริ่มเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane	- งานเริ่มเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane	- งานเริ่มเจาะพร้อมเทคอนกรีตเสาเข็ม Tower Crane



บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด  
T.T.S.ENGINEERING(2004) CO.,LTD

3 เอลัมพรเกียรติ 5.9 ซอย 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-726-8731-4 โทรสาร 02-726-8731-5  
3 Chalermprakiat R.9 Soi 72 Pravaj ,Pravaj District Bangkok 10250 Tel 02-726-8731-4 Fax 02-726-8731-5

โครงการ ณ ริ้วาเจริญนคร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนงานประจำสัปดาห์ และการทำงานล่วงเวลา (งานผูกเหล็กผนัง)  
ของบริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด

เรียน ท่านเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง เลขที่. [REDACTED]

บริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ณ ริ้วาเจริญนคร ขอแจ้งแผนงานประจำสัปดาห์ วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และในระหว่างสัปดาห์มีงานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงเวลาไม่เกิน 20.00 น. เนื่องจากจำเป็นต้องเตรียมพื้นที่สำหรับเข้าแบบเทพื้น ดังนี้

ตารางแจ้งการทำงานล่วงเวลา 18.00 – 20.00 น.		
ที่	วันที่ทำล่วงเวลา	งาน/กิจกรรมที่ทำ
1	30 พฤษภาคม 2565	ผูกเหล็กผนัง
2	31 พฤษภาคม 2565	ผูกเหล็กผนัง
3	1 มิถุนายน 2565	ผูกเหล็กผนัง , เข้าแบบ

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบและขอความอนุเคราะห์

(คุณตฤณ ทองน้อย)

Project manager

T.T.S.Engineering (2004) Co., Ltd

ขอแสดงความนับถือ

(คุณณฐดนัย ปญญา)

Engineering Plus Co., Ltd


รับทราบ ..... 

( ..... ) ชื่อตัวบรรจง

ท่านเจ้าของบ้าน/อาคาร

สำเนา : คุณเกียรติคุณ นุตทองสุข / ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้ประสานงาน : คุณวรรณ เเพ็งนอก โทร. 095 770 8535



บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด  
T.T.S.ENGINEERING(2004) CO.,LTD

3 เอลิมพรเกียสดี 5.9 ซอย 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-726-8731-4 โทรสาร 02-726-8731-5  
3 Chalmprakiat R.9 Soi 72 Pravaj ,Pravaj District Bangkok 10250 Tel 02-726-8731-4 Fax 02-726-8731-5

โครงการ ณ รีวา เจริญนคร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้างแผนงานประจำสัปดาห์ และการทำงานล่วงเวลา (งานผูกเหล็กผนัง)  
ของบริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด

เรียน ท่านเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง เลขที่.....

บริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ณ รีวา เจริญนคร ขอแจ้งแผนงานประจำสัปดาห์  
วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. และในระหว่างสัปดาห์มีงานทำผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ มี  
ความจำเป็นที่จะต้องทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงเวลาไม่เกิน 20.00 น. เนื่องจากจำเป็นต้องเตรียมพื้นที่สำหรับเข้า  
แบบเทพื้น ดังนี้

ตารางแจ้งการทำงานล่วงเวลา 18.00 – 20.00 น.		
ที่	วันที่ทำล่วงเวลา	งาน/กิจกรรมที่ทำ
1	30 พฤษภาคม 2565	ผูกเหล็กผนัง
2	31 พฤษภาคม 2565	ผูกเหล็กผนัง
3	1 มิถุนายน 2565	ผูกเหล็กผนัง , เข้าแบบ

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบและขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(คุณเตจณ ทองน้อย)

Project manager

T.T.S.Engineering (2004) Co., Ltd

(คุณณัฐดนัย ปญญา)

Engineering Plus Co., Ltd

รับทราบ ..... sue .....

( ) ชื่อตัวบรรจง

ท่านเจ้าของบ้าน/อาคาร

สำเนา : คุณเกียรติคุณ มูลทองสุข / ผู้อำนวยการ โครงการ

ผู้ประสานงาน : คุณวรรณัน เฟื่องนอก โทร. 095 770 8535




## แผนงานประจำสัปดาห์ ( 30 พ.ค.65 - 4 มิ.ย.65 )

โครงการ : ถนนฯ เจริญนคร


บริหารงานและควบคุมงานโครงการ : บริษัท เอ็นจิเนียริง พลัส จำกัด

เจ้าของ : บริษัท ผนวรงค์ เจริญนคร จำกัด

ก่อสร้างโดย : บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด

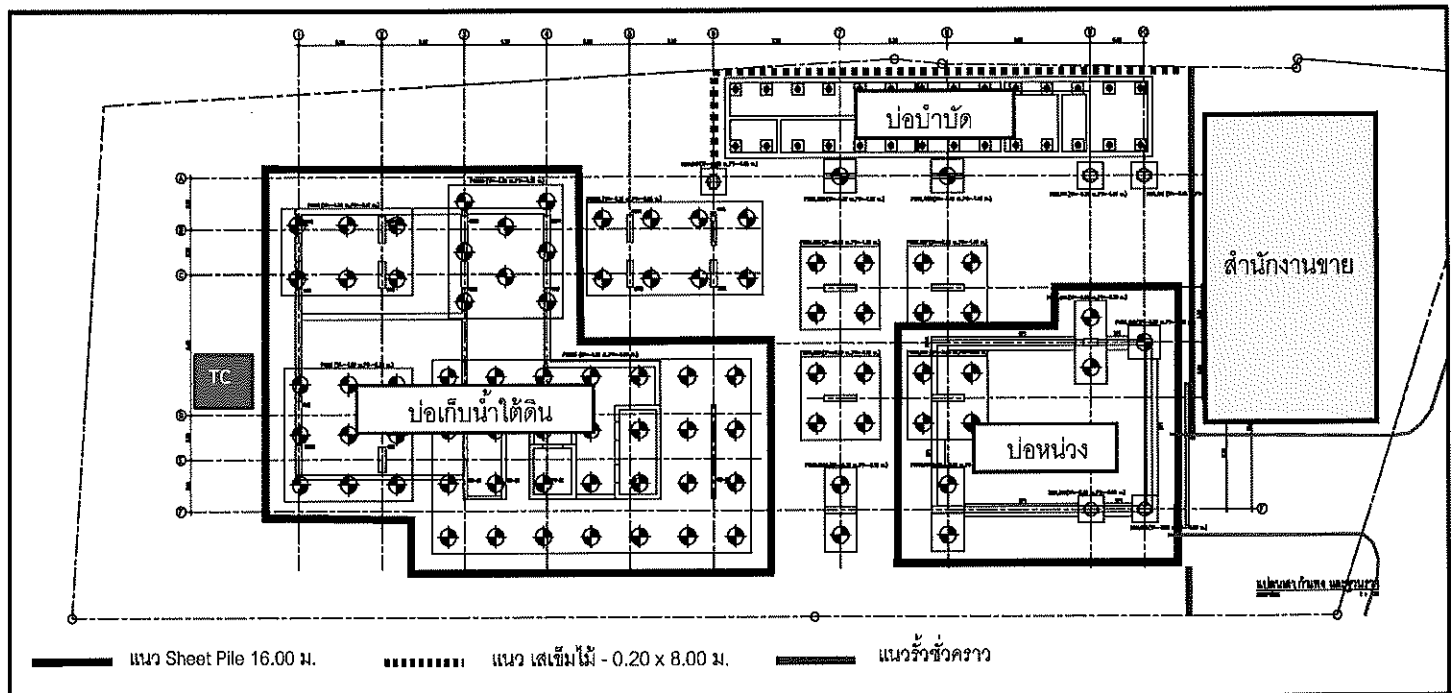

วันที่ 30 พ.ค.65	วันที่ 31 พ.ค.65	วันที่ 1 มิ.ย.65
1.บ่อบำบัดน้ำเสีย	1.บ่อบำบัดน้ำเสีย	1.บ่อบำบัดน้ำเสีย
- ผูกเหล็กคาน	- ผูกเหล็กคาน	- ผูกเหล็กคาน + เข้าแบบ
2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน
- ขุดดิน -2.00ม.	- ขุดดิน -2.00ม.	- ขุดดิน -2.00ม.
- ใส Bracing ชั้นที่1 -1.50ม.	- ใส Bracing ชั้นที่1 -1.50ม.	- ใส Bracing ชั้นที่1 -1.50ม.
3.บ่อนองน้ำ	3.บ่อนองน้ำ	3.บ่อนองน้ำ
- กัดซีทไฟส	- กัดซีทไฟส	- กัดซีทไฟส
4.อื่นๆ	4.อื่นๆ	4.อื่นๆ
วันที่ 2 มิ.ย.65	วันที่ 3 มิ.ย.65	วันที่ 4 มิ.ย.65
1.บ่อบำบัดน้ำเสีย		1.บ่อบำบัดน้ำเสีย
- เข้าแบบผนังรอบใน	วันหยุด	- เข้าแบบผนังรอบใน
2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน		2.บ่อเก็บน้ำใต้ดิน
- ใส Bracing ชั้นที่1 -1.50ม.		- ใส Bracing ชั้นที่1 -1.50ม.
3.บ่อนองน้ำ		3.บ่อนองน้ำ
- กัดซีทไฟส		- ขุดดิน -2.00ม.
4.อื่นๆ		4.อื่นๆ

[illegible]
