

รายงานการปฏิบัติงาน
ในการดำเนินการ ตรวจสอบ Tank เก็บน้ำ
(Middle Tank) ความลึก 2 เมตร จำนวน 2 Tank



085-066-8788

ดำเนินการ โดย บริษัท GreenLine จำกัด

ในระหว่างวันที่ 2-10 /10/2566

17/10/2566

- วันที่ 2,3,4/10/2566เข้าดูตะกอน Middle ที่ 1 และ 2




17/10/2566




17/10/2566



17/10/2566

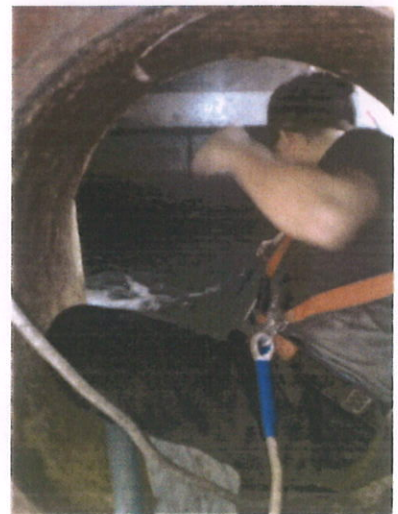

17/10/2566

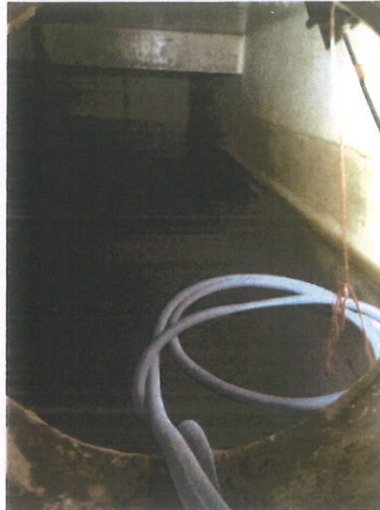

สรุปการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดีเยี่ยม

รายงานการปฏิบัติงาน

ในการดำเนินการ ติดตั้ง ท่อส่งน้ำ

(Roof Tank) ความลึก 4 เมตร จำนวน 4 Tank



085-066-8788

ดำเนินการ โดย บริษัท GreenLine จำกัด


ในระหว่างวันที่ 1-13 /6/2566

13/06/2566

- วันที่ 29,30,31/5/2566 เข้าดูตะกอน Roof Tank ที่ 1



13/06/2566

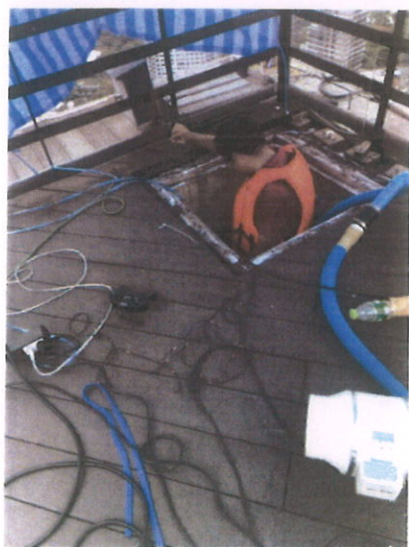

13/06/2566

- วันที่ 5,6/6/2566 เข้าดูตะกอน Roof Tank ที่ 2



13/06/2566

- วันที่ 7,8/6/2566 เข้าดูตะกอน Roof Tank ที่ 3



13/06/2566

- วันที่ 12/6/2566 เข้าดูตะกอน Roof Tank ที่ 4



สรุปการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดีเยี่ยม

รายงานการปฏิบัติงาน

ในการดำเนินการ คัดตะกอน Tank เก็บน้ำ
ขนาดความจุ 626 ลูกบาศก์เมตร ความลึก 5 เมตร
จำนวน 2 Tank







085-066-8788

ดำเนินการ โดย บริษัท GreenLine จำกัด

ในระหว่างวันที่ 4-26 /4/2566 ✓

01/05/23
28/04/23

- ในวันที่ 7/3/2566 เข้าดำเนินการสำรวจหน้างานโดยละเอียดโดยการนำ Robot
ถ่ายรูปใต้น้ำ เพื่อประเมินหน้างาน

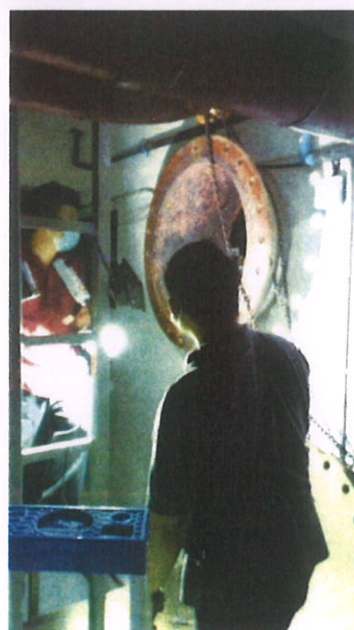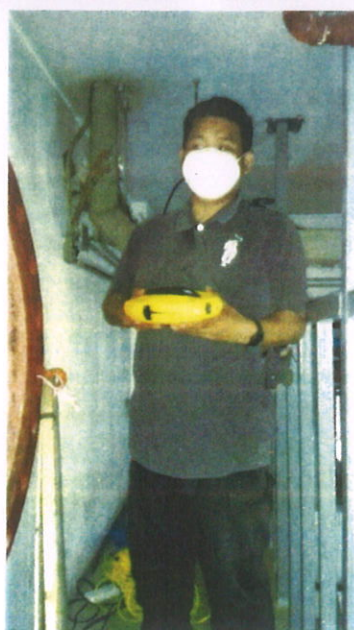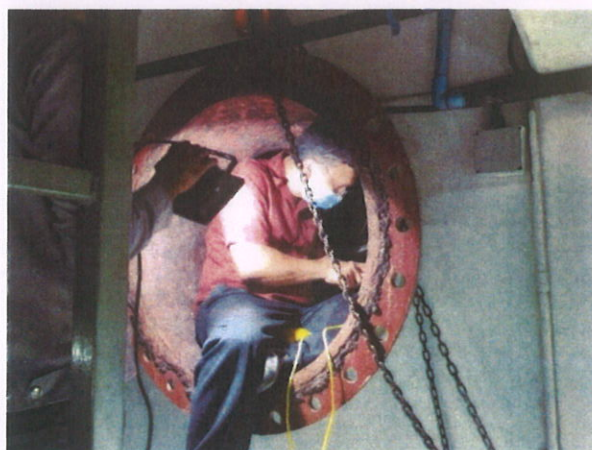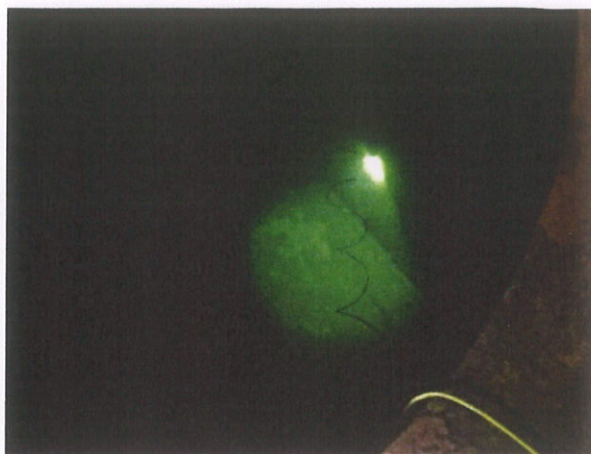

27/4/2566

- ภาพใต้น้ำก่อนดำเนินงาน พบตะกอนจำนวนมาก



27/4/2566






- วันที่ 3-12/4/2566 เข้าดูตะกอน Tank A









27/4/2566





27/4/2566

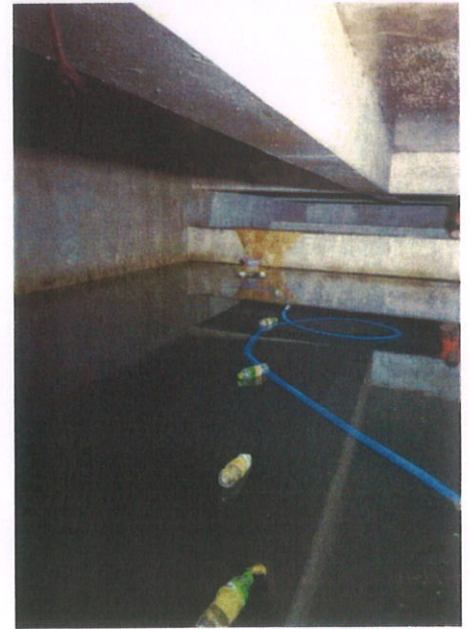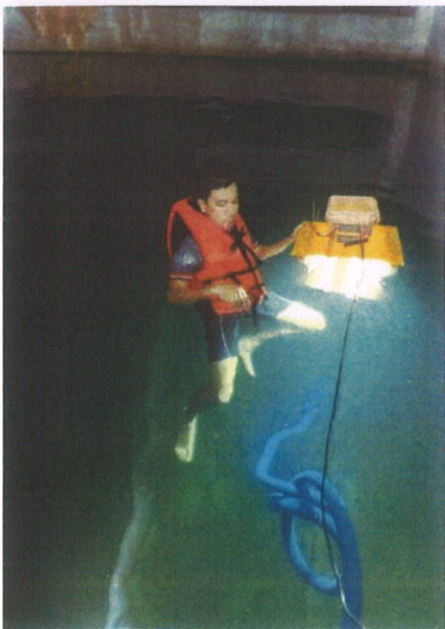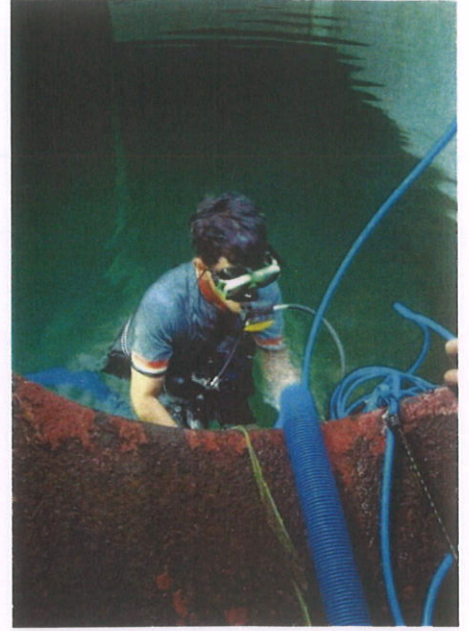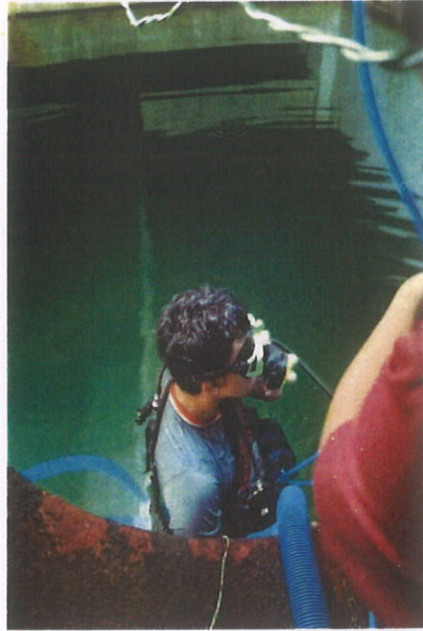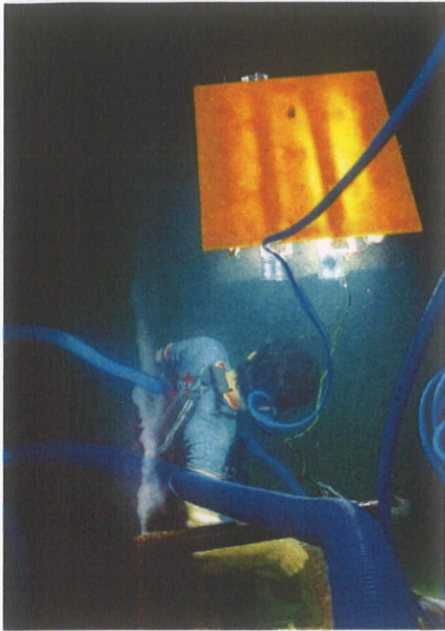

27/4/2566

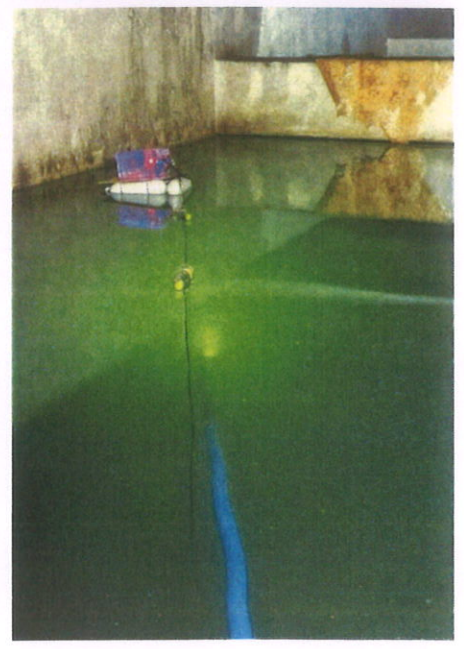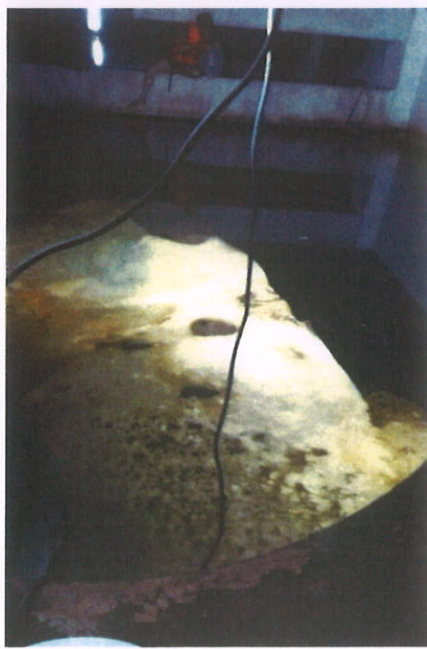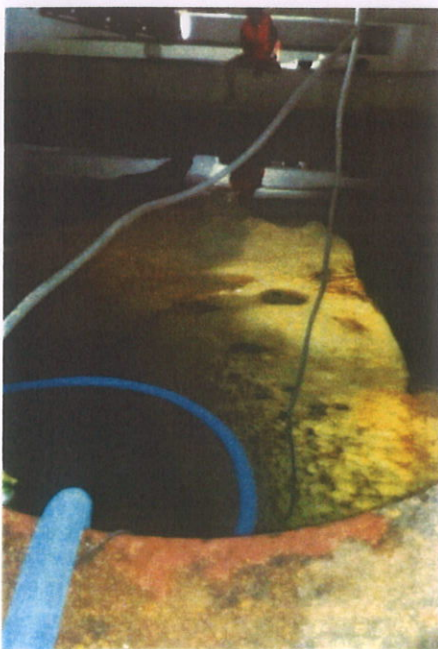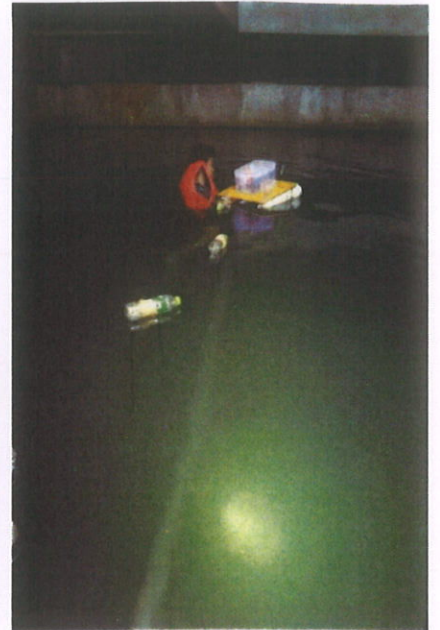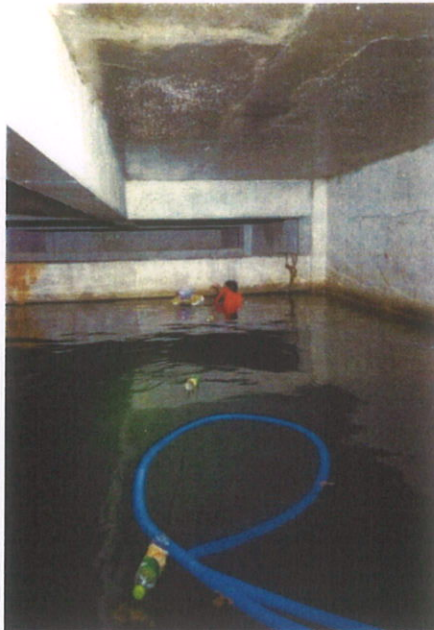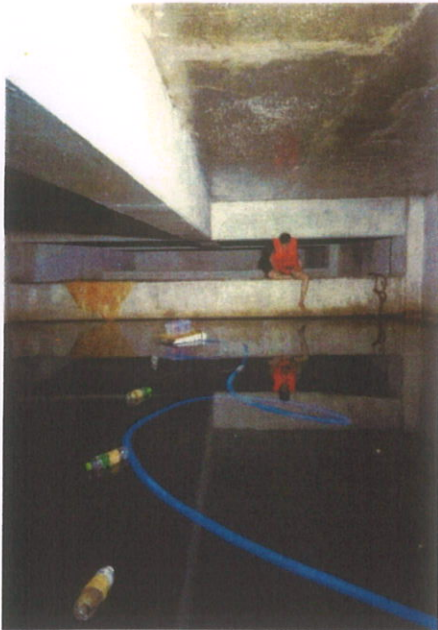

27/4/2566

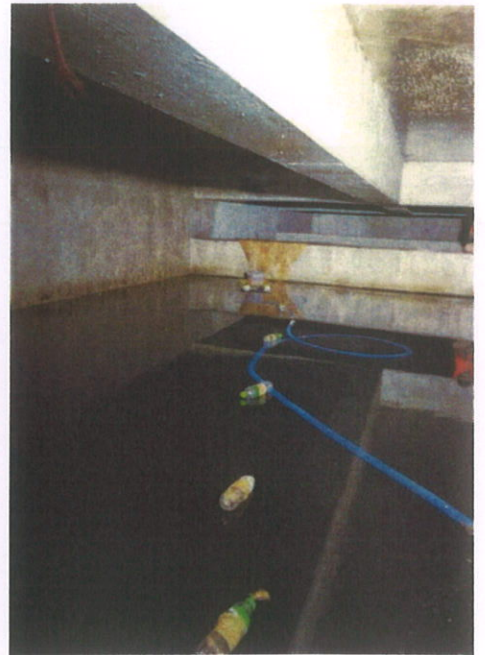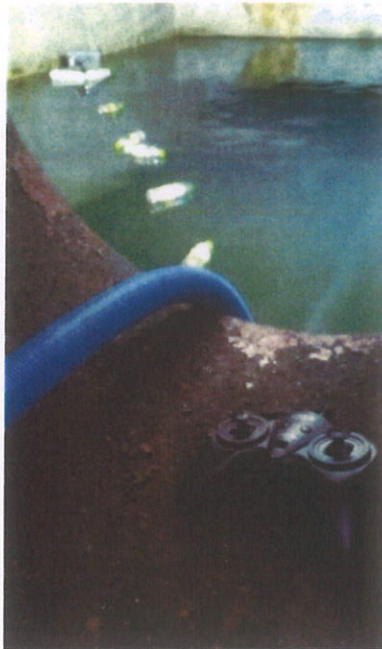


27/4/2566

- ภาพได้นำหลังดำเนินงาน (Tank A) พบว่าตะกอนถูกดูด จนหมด พบเพียงฟุ้งฟุ้งได้ Tank



27/4/2566



- วันที่ 24-26/4/2566 เข้าดูตตะกอน Tank B (ติดบันได)

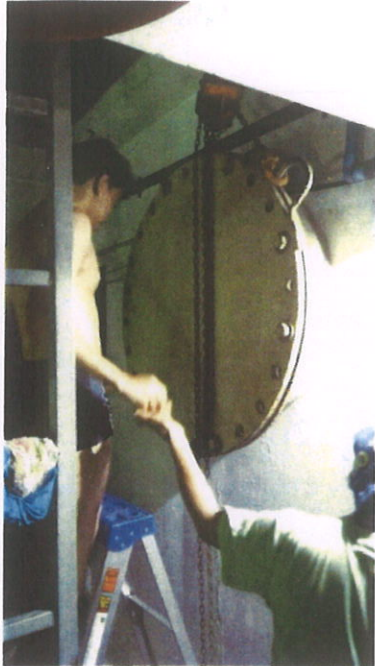


27/4/2566



27/4/2566

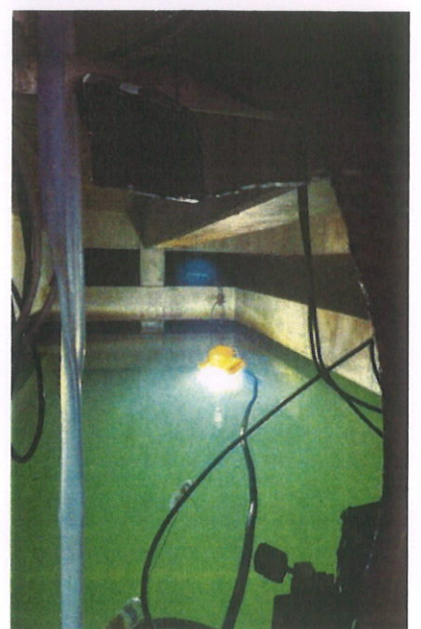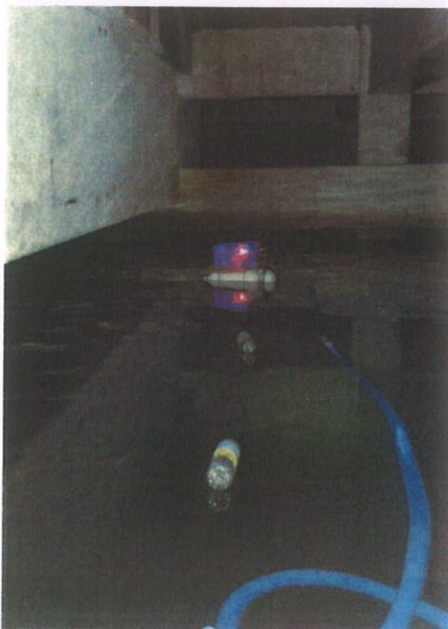

27/4/2566

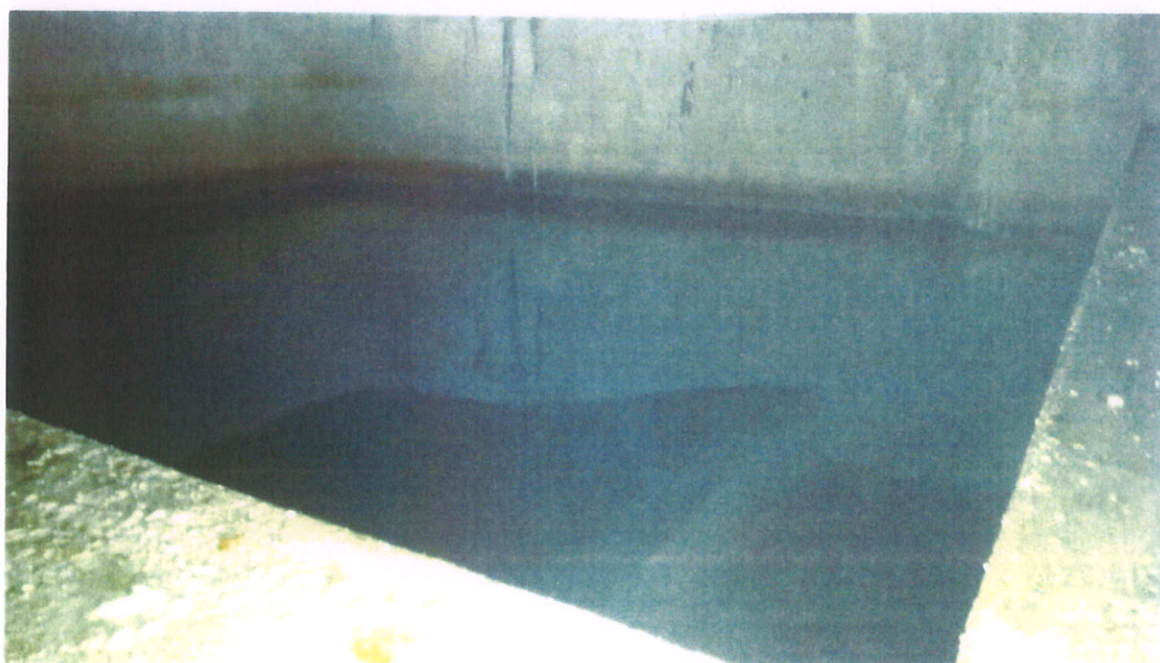

- ภาพใต้น้ำหลังดำเนินงาน (Tank B) พบว่าตะกอนถูกดูด จนหมด พบเพียงฟุ้งปูนใต้ Tank



แผนสำหรับ การปฏิบัติงาน ดุดตะกอนใต้น้ำ สถานที่ โรงแรม Banyan Tree

07/03/66 07/03/66 31/03/2566 03/04/66 10/04/66 11/04/66 24/4/66 25/4/66 26/4/66 02/05/66 03/05/66 04/05/66

- 1 เข้าสำรวจหน้างาน ถ่ายภาพใต้น้ำโดยละเอียด ทำแผนที่ใต้น้ำ โดยละเอียด
 - 1.1 Tank เก็บน้ำ บริเวณ B1 ความจุ 650 cubic mater (A) ความลึก 5 เมตร
 - 1.2 Tank เก็บน้ำ บริเวณ B1 ความจุ 650 cubic mater (B) ความลึก 5 เมตร

2 เตรียมงาน

- 3 ดำเนินการ ดุดตะกอนใต้น้ำ อย่างน้อย 3 รอบ
 - 1.1 tank เก็บน้ำ บริเวณ B1 ความจุ 650 cubic mater (A) ความลึก 5 เมตร
 - 1.2 Tank เก็บน้ำ บริเวณ B1 ความจุ 650 cubic mater (B) ความลึก 5 เมตร(ติดบันได)
 - 1.3 Tank เก็บน้ำ บริเวณ ชั้น 35 ความจุ 45 cubic mater จำนวน 2 tank

หมายเหตุ : ในการปฏิบัติงาน จะทำงานร่วมกับ นักดำน้ำ และ Robot

เนื่องจาก ในการปฏิบัติงานในวันที่ 03/04/66 เศษตะกอนใต้น้ำ มีขนาดใหญ่ผิดปกติ กว่าตะกอนทั่วไป

จึงมีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 10-12/04/66 โดยจะนำบับดูดที่มีขนาดใหญ่

และแรงกว่าเข้าปฏิบัติงาน

Tank เก็บน้ำ (A) ดำเนินการดูดตะกอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Tank เก็บน้ำ (B) ดำเนินการดูดตะกอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บับเครื่องขนาด 5.5 แรงม้า , หัวดูด 2 นิ้ว

