



เอกสารแนบที่ 2.3

แผน PM และผลดำเนินการ ประจำปี 2568



ID	Text 1 Type	Text 2 Main Machine	Text 3 Machine Group	Text4 (Unit)	Text5 (componence)	% omplet	Task Name	Resource Names	Supplier	Duration	Start	Finish
1						100%	1 PM & Shutdown RM			120 hrs?	31/5/25 8:00	5/6/25 8:00
2						100%	1.1 Plant Stop	Start Plant		0 hrs	31/5/25 8:00	31/5/25 8:00
3						100%	1.2 Plant Start	Start Plant		0 hrs	5/6/25 8:00	5/6/25 8:00
4						100%	1.3 Cooldown Temp 48 hr.	OP BD		48 hrs	31/5/25 8:00	2/6/25 8:00
5						100%	1.4 จุดเผา Heat Up 30 hr.	OP BD		30 hrs	4/6/25 2:00	5/6/25 8:00
6						100%	1.5 งานแท่นรีด Offline	OP Roll shop,OP SM		24 hrs	4/6/25 8:00	5/6/25 8:00
7						100%	1.6 Test เครื่องจักร	Test เครื่องจักร		24 hrs	4/6/25 8:00	5/6/25 8:00
8	UT	Main Sub	Main Sub 115	Tranformer	Other	100%	1.7 Off Main Sub 115 kV			13.67 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 21:40
9						100%	1.7.1 ดับไฟฟ้าครั้งที่ 1 เพื่อสลับจ่ายไฟฟ้าสำรอง			12.83 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 20:50
10						100%	1.7.1.1 ดับไฟAdmin,เครื่องซึ่ง,การบดคด,โรงอาหารเศษเหล็ก	UT		10 mins	2/6/25 8:00	2/6/25 8:10
11						100%	1.7.1.2 ดับไฟส่วนผลิตเหล็กแท่ง(มพ.), Water Treatment Plant(ระบบไฟ380V, 220V)	MTSP,UT		10 mins	2/6/25 8:10	2/6/25 8:20
12						100%	1.7.1.3 ดับไฟส่วนผลิตเหล็กรีด,ส่วนซ่อมบำรุง,ส่วนพัสดุ (มพ.) (ระบบไฟ380V, 220V)	MTRM,UT		10 mins	2/6/25 8:20	2/6/25 8:30
13						100%	1.7.1.4 Off Sub. 22KV	Off Sub. 22KV		10 mins	2/6/25 8:30	2/6/25 8:40
14						100%	1.7.1.5 Off Sub.R/Y, 6.6kV	Off Sub.R/Y,6.6kV		10 mins	2/6/25 8:40	2/6/25 8:50
15						100%	1.7.1.6 Off Main Sub-MT1,MT2	Off Main Sub-MT1,MT2		10 mins	2/6/25 8:50	2/6/25 9:00
16						100%	1.7.1.7 Run Gennerator ใช้งาน	Run Gennerator ใช้งาน		12 hrs	2/6/25 8:50	2/6/25 20:50
17						100%	1.7.2 ดับไฟฟ้าครั้งที่ 2 เพื่อสลับคืนไฟระบบปกติ			0.67 hrs	2/6/25 21:00	2/6/25 21:40
18						100%	1.7.2.1 Off Gennerator	Off Gennerator		10 mins	2/6/25 21:00	2/6/25 21:10
19						100%	1.7.2.2 จ่ายไฟปกติเข้า Main Sub-MT1,MT2	จ่ายไฟปกติเข้า Main Sub-MT1,MT2		10 mins	2/6/25 21:10	2/6/25 21:20
20						100%	1.7.2.3 จ่ายไฟปกติเข้า Sub. 22KV	จ่ายไฟปกติเข้า Sub. 22KV		10 mins	2/6/25 21:20	2/6/25 21:30
21						100%	1.7.2.4 จ่ายไฟปกติเข้า Off Sub.R/Y, 6.6kV	จ่ายไฟปกติเข้า Off Sub.R/Y,6.6kV		10 mins	2/6/25 21:30	2/6/25 21:40
22						100%	1.7.2.5 จ่ายไฟฟ้าปกติเข้าระบบอื่นๆ	จ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าปกติ		10 mins	2/6/25 21:30	2/6/25 21:40
23						100%	1.8 งานซ่อมบำรุง			104 hrs?	31/5/25 8:00	4/6/25 16:00
24	ET	Main Sub	Main Sub 115	Tranformer	Other	100%	1.8.1 จัดเก็บ Punch List บริเวณเสา 22kV ใต้ Switch Gear ที่ 115/22kV	อนุสรณ์ น.		8 hrs	2/6/25 13:00	2/6/25 21:00
25	EE	RHF Area	Charge Machine	Charge Machir	Drag Chain	100%	1.8.2 เปลี่ยน Drag chain Temposonic Charge Machine	สมชาติ ต.,นิกร ส.	-	4 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 12:00
26	ME	RHF Area	Charge Machine	Charge Machir	Pipe Hyd	100%	1.8.3 ดัดเปลี่ยน pipe Hyd Charge Machine	สุรศักดิ์ ว.	JAW	24 hrs	31/5/25 8:00	3/6/25 16:00
27	ME	RHF Area	Charge Door	Charge Door	Chain	100%	1.8.4 A RP Chain of Discharge Door	สุรศักดิ์ ว.	SCP.-Job.2	1 hr	4/6/25 12:00	4/6/25 13:00
28	EE	RHF Area	Dilution	Dilution	Drive	100%	1.8.5 ดัดตั้ง Drive Dilution	ศักดิ์นันท์ ส.	SAW-EE	24 hrs	31/5/25 8:00	3/6/25 16:00
29	OP	RHF Area	Burner	Burner	Scale	100%	1.8.6 Clear Scale ในเตาบังหัว burner zone 5	OP	-	16 hrs	2/6/25 8:00	3/6/25 16:00
30	OP	RHF Area	Scale	Scale	Scale	100%	1.8.7 Clear Scale ใต้เตา	OP	-	24 hrs	2/6/25 8:00	3/6/25 8:00
31	OP	RHF Area	Discharge Door	Discharge Do	Scale	100%	1.8.8 Clear Scale หน้าประตู Discharge door	OP	-	8 hrs	3/6/25 8:00	3/6/25 16:00
32	EE	RHF Area	Discharge Door	Discharge Doc	Motor	100%	1.8.9 ตรวจสอบ Motor Discharge A,B	สมชาติ ต.,วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	6 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 14:00
33	ME	RHF Area	Discharge Door	Discharge Doc	Door	100%	1.8.10 เปลี่ยน Discharge Door + Pillow Block	สุรศักดิ์ ว.	SCP.-Job.2	8 hrs	3/6/25 10:00	3/6/25 18:00
34	ME	RHF Area	Discharge Roller	Discharge Roll	Roller	100%	1.8.11 เปลี่ยน Discharge Roller B1, B2	สุรศักดิ์ ว.	SCP.-Job.2	8 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 16:00
35	ME	RHF Area	Delivery Roller T	Delivery Roller	Motor	100%	1.8.12 เปลี่ยน motor roller delivery no.1	วรวัฒน์ พ.	SR.-Job.	3 hrs	4/6/25 8:00	4/6/25 11:00
36	ME	RHF Area	Delivery Roller T	Water Flusing	Pipe water	100%	1.8.13 แกไขท่อน้ำ flushing sluice Delivery roller	สุรศักดิ์ ว.	SAW-ME day	8 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 16:00
37	ME	RHF Area	Discharge Roller	Discharge Roller	Rotary joint	100%	1.8.14 RHF Discharge Roller A4 Rotary Joint มีน้ำหยด	อารีย์ อ.	SAW-ME	4 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 12:00
38	ME	RHF Area	Walking Beam	Walking Beam	Wheel	100%	1.8.15 RHF ล้อ Walking Beam Transverse A6 Slide ตัวโป๊ส Rail	สุรศักดิ์ ว.	SCP.-Job.	2 hrs	4/6/25 10:00	4/6/25 12:00
39	ME	RHF Area	Zone 2	Burner Zone 2	Control Valve	100%	1.8.16 Control valve burner zone2หัว2 ไม่ต่อใช้งาน	สุรศักดิ์ ว.	SCP.-Job.2	2 hrs	3/6/25 8:00	3/6/25 10:00
40	ME	RHF Area	RHF Combustion	RHF Combusti	RHF Combust	100%	1.8.17 B CI Combustion Air Blower	อารีย์ อ.	SAW-ME	2 hrs	31/5/25 8:00	31/5/25 10:00
41	ME	RHF Area	Combustion Fan	Combustion F	Bearing	100%	1.8.18 B LU Combustion Air Fan	สุรศักดิ์ ว.	SAW-ME	2 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 10:00
42	ME	RHF Area	Recuperator	Recuperator	Recuperator	100%	1.8.19 ตรวจสอบ recuperator	สุรศักดิ์ ว.,OP	-	24 hrs	2/6/25 8:00	3/6/25 8:00
43	ME	BD Area	Run Out Table	Run Out 1-3	Gear Motor	100%	1.8.20 Check เปลี่ยนถ่าย oil gear motor BD run Out1-3	มงคล ท.	SAW-ME day	8 hrs	31/5/25 8:00	31/5/25 16:00
44	ME	BD Area	Run Out Table	Run Out 3 no.1	Motor	100%	1.8.21 BD runout #3 no.2 motor ground	วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	2 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 10:00
45	ME	BD Area	Manipulator Fron	Manipulator Fr	Pipe	100%	1.8.22 เชื่อมท่อหน้าลิ้นง Manipulator ws รั่ว	ชัชรัฐ ท.	SAW-ME	4 hrs	1/6/25 8:00	1/6/25 12:00
46	ME	BD Area	Roller table	Roller table	Roller	100%	1.8.23 check pass line roller	ชัชรัฐ ท.	SAW-ME	4 hrs	31/5/25 8:00	31/5/25 12:00
47	ME	BD Area	Spindle Shaft	Spindle Cross	Bearing	100%	1.8.24 อัลดจารบี cross bearing	มงคล ท.	SAW-ME day	2 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 10:00
48	ME	BD Area	Manipulator	Manipulator	Wheel	100%	1.8.25 Check Daimiter wheel manipulator	ชัชรัฐ ท.	SAW-ME	4 hrs	31/5/25 12:00	31/5/25 16:00
49	ME	BD Area	Separator	Separator	Separator	100%	1.8.26 Check Separator	ชัชรัฐ ท.	SAW-ME	4 hrs	1/6/25 12:00	1/6/25 16:00
50	ME	BD Area	Working Roller F	Working Roller	Frame	100%	1.8.27 เชื่อม Table Frame Roller Working No.10 front	อารีย์ อ.	SAW-ME	8 hrs	1/6/25 8:00	1/6/25 16:00
51	ME	BD Area	Scale Pit	Scale Pit	Scale	100%	1.8.28 ตัก scale ปัก pump BD	สุรสิทธิ์ พ.	ATS	24 hrs	2/6/25 8:00	3/6/25 20:00
52	ME	BD Area	BD Manipulator	BD Manipulat	Wheel	100%	1.8.29 B LU BD Manipulator wheel	มงคล ท.	SAW-ME day	3 hrs	2/6/25 16:00	2/6/25 19:00
53	ME	TCS Area	Bearing Housing	Bearing Housin	Hose	100%	1.8.30 Hose Oil Bearing Housing TCS รั่วซึม (ตัวเล็ก)	สรายุช พ.	SAW-ME	4 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 12:00
54	ME	DSL	Section Pump	Section Pump	Pipe	100%	1.8.31 Pipe นำ Line Section Pump DSL No.1 มีน้ำรั่ว	สุรศักดิ์ ว.	SAW-ME day	2 hrs	2/6/25 16:00	2/6/25 18:00
55	EE	UR Area	UR Tilting No.3	UR Tilting No.	Motor	100%	1.8.32 ดัดตั้ง Cover พัดลม motor UR Tilting No.3	สมชาติ ต.,วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	2 hrs	1/6/25 8:00	1/6/25 10:00
56	ME	UR Area	Stand Lift jack	Stand Lift jack	Screw Jack	100%	1.8.33 เปลี่ยน stand lift jack UR	สุรสิทธิ์ พ.	SR.-Job.	24 hrs	2/6/25 8:00	3/6/25 20:00
57	OP	UR Area	Scale	Scale	Scale	100%	1.8.34 ตัก Scale ใต้ tilting UR	OP	-	24 hrs	1/6/25 8:00	3/6/25 16:00
58	ME	UR Area	Spindle Shaft	Spindle Cross	Bearing	100%	1.8.35 อัลดจารบี cross bearing	มงคล ท.	SAW-ME day	3 hrs	2/6/25 10:00	2/6/25 13:00
59	EE	UR Area	UR1 Mill Stand	UR1 Screw up	encoder	100%	1.8.36 (CIL) A RP Coupling Encoder UR1 SU	วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	2 hrs	31/5/25 8:00	31/5/25 10:00
60	EE	UR Area	UR1 Mill Stand	UR1 V-screw	motor	100%	1.8.37 (CIL) A RP UR V - screw MDS	วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	2 hrs	31/5/25 10:00	31/5/25 12:00
61	EE	UR Area	UR2 Mill Stand	UR2 Screw up	motor	100%	1.8.38 (CIL) A RP UR2 SU motor	วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	2 hrs	31/5/25 12:00	31/5/25 14:00
62	EE	UR Area	UR1 Mill Stand	UR1 V-screw	pulse gen.	100%	1.8.39 (CIL) B RP Pluse Gen UR1 V Screw WS	วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	2 hrs	31/5/25 14:00	31/5/25 16:00
63	ME	UR Area	UR2 Mill Stand	UR2 Screw do	gear coupling	100%	1.8.40 A TI Coupling of UR2 SD , SU & V- Screw	ชัชรัฐ ท.	SAW-ME	3 hrs	1/6/25 16:00	1/6/25 19:00
64	ME	UR Area	UR2 Mill Stand	UR2 Stand Cl	UR2 Stand C	100%	1.8.41 B VI Stand Clamp Liner Checking UR2	อารีย์ อ.	SAW-ME	2 hrs	1/6/25 19:00	1/6/25 21:00
65	EE	UR Area	UR2 Mill Stand	UR2 Screw do	pulse com	100%	1.8.42 (CIL) A RP Encoder UR2 SD	วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	2 hrs	2/6/25 8:00	2/6/25 10:00
66	ME	UR Area	Tilting Roller Tab	Tilting Roller T	Roller	100%	1.8.43 B LU UR Tilting Roller	สรายุช พ.	SAW-ME	2 hrs	31/5/25 8:00	31/5/25 10:00
67	ME	E Area	Spindle Shaft	Spindle Cross	Bearing	100%	1.8.44 อัลดจารบี cross bearing	มงคล ท.	SAW-ME day	3 hrs	2/6/25 13:00	2/6/25 16:00
68	ME	E Area	E Online	E Online	Pipe	100%	1.8.45 B CI สภาพการรั่วซึมบริเวณ E-Mill	อารีย์ อ.	SAW-ME	4 hrs	31/5/25 10:00	31/5/25 14:00
69	ME	E Area	E2 Mill Stand	E2 Screw Dow	encoder	100%	1.8.46 (CIL) A RP Encoder E2 Screw Down	วรวัฒน์ พ.	SAW-EE	2 hrs	2/6/25 10:00	2/6/25 12:00
70	ME	E Area	E1 Mill Stand	E1 Screw Dow	pneu. Cylind	100%	1.8.47 B VI E Hyd. Cyl (ON Line)	สรายุช พ.	SAW-ME	4 hrs	2/6/25 12:00	2/6/25 16:00
71	ME	E Area	E side guide	E Side guide V	pulse gen.	100%	1.8.48 A CI pulse com. UR/E side guide	จักรพร ส.	SAW-EE	3 hrs	31/5/25 8:00	31/5/25 11:00

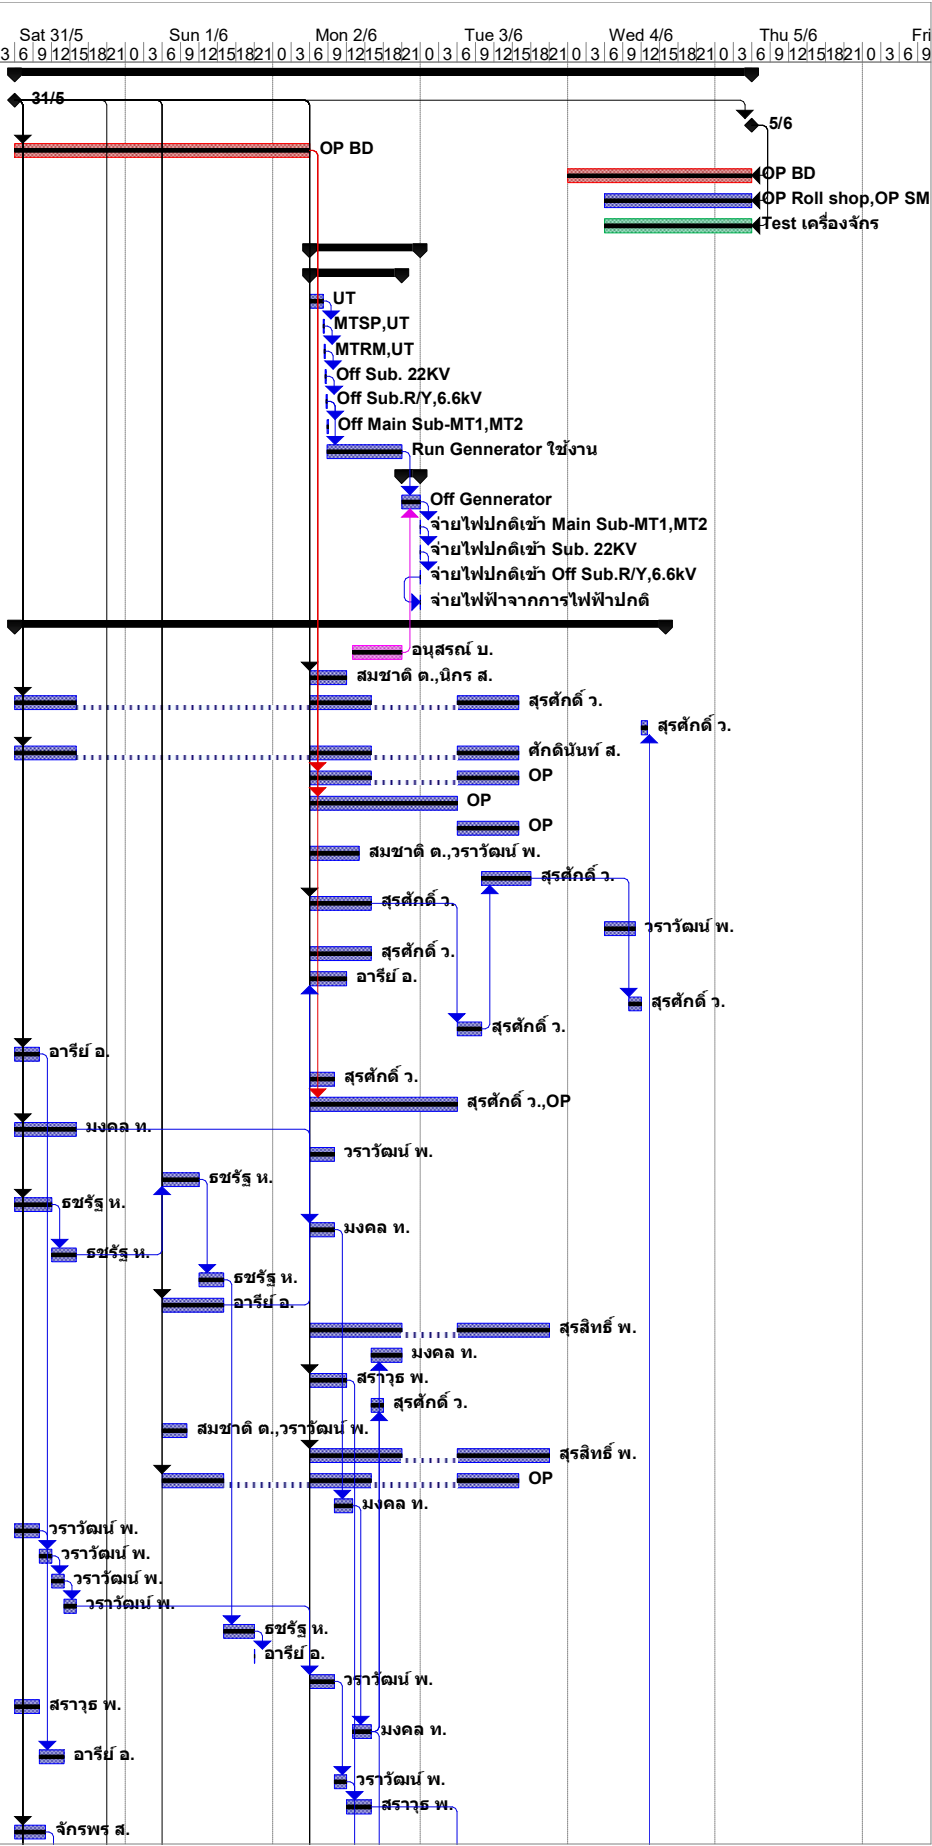

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External MileTask

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Progress

Split

Slippage

Task	Summary	External MileTask	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Split
Split	Project Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Slippage
Milestone	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Progress	
