

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่าย เพื่อใช้ในการประกอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1009.7/866 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก-8) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ตามหนังสือที่ 1009.7/18143 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 (ภาคผนวก ก-1) แล้วซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยการสำรวจภาคสนามของพื้นที่โครงการ การตรวจสอบจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้างของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ฉบับนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ของโครงการอยู่ในระยะการก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามแบบทางด้านวิศวกรรมในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 นอกจากนี้โครงการได้มีกิจกรรมต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นควบคู่กับการเตรียมงานก่อนการก่อสร้างด้วยเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-32

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อย่างเคร่งครัด และให้นำไปกำหนดเป็นเงื่อนไข สัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างในปัจจุบันซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง เช่น การออกแบบทางด้านวิศวกรรม และการตอกเสาเข็มในพื้นที่โครงการ รวมถึงจัดส่งรายงานผลการดำเนินการแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน ซึ่งทางโครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครึ่งล่าสุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569	-	ภาคผนวก ก-1 หนังสือนำเสนอรายงานฯ ครั้งที่ 2/2568 เล่ม เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568
	- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุจากการดำเนินโครงการให้บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดปราจีนบุรี ทราบทุกครั้งเพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหา	- โครงการมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการกำหนด หากพบปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุจากการดำเนิน ทางโครงการฯ จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดปราจีนบุรี ทราบทุกครั้ง	-	ภาคผนวก ข-1 แบบฟอร์มและผล บันทึกข้อร้องเรียน-ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- ให้จัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณา ทุก ๆ 6 เดือน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด	- โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด อย่างเคร่งครัดและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน และจัดส่งครั้งล่าสุดรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569 สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ 1/2569 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง เช่น การออกแบบทางด้านวิศวกรรมและการต่อเสาค้ำในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างจะดำเนินการตามที่มาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ก-1 หนังสือนำเสนอรายงานฯ ครั้งที่ 2/2568 เล่ม เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2568
	- แจ้งข้อมูลกิจกรรมในระยะก่อสร้างให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทราบก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอย่างน้อย 1 สัปดาห์	- ทางโครงการได้ลงพื้นที่แจ้งแผนการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างของโครงการผ่านคณะกรรมการไตรภาคี ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	-	รูปที่ 2-1 การลงพื้นที่ แจ้งแผนการก่อสร้าง รูปที่ 2-32 การประชุม ไตรภาคี และภาคผนวก ข-2 สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แผนการก่อสร้าง โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต เป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 1) หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านมาพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาต รับจัดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจัดแจ้งไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ	- โครงการได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2568 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ก-1 หนังสือนำเสนอรายงานฯ ครั้งที่ 2/2568 เล่มเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย			
2. คุณภาพอากาศ	- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย) ในช่วงวันที่ฝนไม่ตก หรือลดจำนวนลงตามความเหมาะสมในวันที่มีฝนตก	- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) เพื่อลดการกระจายของฝุ่นละออง และพิจารณาเพิ่มความถี่การฉีดพรมน้ำ กรณีที่อากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	-	รูปที่ 2-2 การฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นและภาคผนวก ข-3 ตารางการฉีดพรมน้ำ
	- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีผ้าใบปิดคลุมวัสดุอย่างมิดชิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่	- โครงการได้กำหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมีการปิดคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด ผู้กมิตอุปกรณ์ต่างๆ อย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันการตกหล่นขณะขนส่งตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผ่านช่องทางกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน	-	รูปที่ 2-3 การใช้ผ้าใบปิดคลุมส่วนบรรทุกของรถบรรทุก

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- จำกัดความเร็วของรถทุกชนิดที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ก่อสร้างให้ ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการกำชับและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถบรรทุกทราบ เกี่ยวกับกฎจราจร และข้อบังคับความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการควบคุมจำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างของโครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่โครงการ และในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน และไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่ ทั่วไป โดยการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 2-4 ป้ายจำกัด ความเร็ว
	- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักร ที่ใช้ในการ ก่อสร้างเพื่อลดการระบายมลพิษทางอากาศ	- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ใน การก่อสร้างให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	-	รูปที่ 2-5 เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสภาพ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ และภาคผนวก ข-4 เอกสารบันทึกการ ตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ แบบรายเดือน
	- ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการควบคุมไม่ให้มีการเผาทำลายเศษวัสดุก่อสร้างหรือขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยโครงการมีจุดรวบรวมขยะ ถึงขยะประจำจุด และกำชับคนงานห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ ก่อสร้าง	-	รูปที่ 2-18 ถึงขยะมูล ฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน และเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเศษดินหรือเศษวัสดุต่างๆ ที่ติดมากับล้อรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อเป็นการป้องกันเศษหินดินโคลน หรือทรายที่อาจก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตราย และความสกปรกบนท้องถนน รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดหรือเก็บวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอ		รูปที่ 2-6 พื้นที่ล้างล้อและการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ
3. ด้านเสียง	- กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และ/หรือก่อสร้างฐานราก ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินระยะเวลาที่กำหนด ต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบและได้รับเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาต และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่ควรก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.	- ผู้รับเหมาของโครงการมีการดำเนินการก่อสร้างฐานราก และขึ้นโครงสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังเฉพาะช่วงเวลากลางวัน หากมีกิจกรรมการก่อสร้างช่วงกลางคืนที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ โครงการจะแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 7 วัน	-	รูปที่ 2-1 การลงพื้นที่แจ้งแผนการก่อสร้างและภาคผนวก ข-5 แผนงานก่อสร้างของโครงการ
	- ให้อักรั้วชั่วคราวในระดับที่สูงกว่าสายตารอบพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยโครงการจะสร้างแนวรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ทำด้วย Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง	-	รูปที่ 2-7 รั้วกันเสียงของโครงการ
	- ให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำ หรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อลดระดับเสียงจากอุปกรณ์ดังกล่าว	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์ลดเสียง รวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นประจำอย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสถานประกอบการใกล้เคียง	-	รูปที่ 2-5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ และภาคผนวก ข-4 เอกสารบันทึกการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์แบบรายเดือน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. ด้านเสียง (ต่อ)	- ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)	- โครงการมีการติดป้ายเตือนความปลอดภัย และกำหนดให้พนักงานสวมใส่ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ)	-	รูปที่ 2-8 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบด้านเสียง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป็นระยะๆ เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบ ด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	-	รูปที่ 2-1 การลงพื้นที่แจ้งแผนการก่อสร้าง
4. ด้านน้ำใช้	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมน้ำใช้ให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้น้ำ	- โครงการมีการกำหนดให้ทางผู้รับเหมาจัดเตรียมน้ำใช้ให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้น้ำ	-	-
5. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน	- จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลหรือที่มีถังรองรับสิ่งปฏิกูลด้านล่างให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้าง ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีห้องสุขาไว้ในพื้นที่พักผ่อนของคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอกับจำนวนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และมีระยะห่างจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมากกว่า 15 เมตร ซึ่งมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม (บ่อเกรอะ) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคครบถ้วน	-	รูปที่ 2-9 ห้องน้ำห้องส้วมคนงาน
	- ปลูกพืชคลุมดินปกคลุมพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้วเสร็จให้มากที่สุด	- ปัจจุบันโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะดำเนินการปลูกพืชคลุมดินในพื้นที่ว่างและพื้นที่ที่ไม่ใช้งานตามความเหมาะสม	-	-
	- หากโครงการมีความจำเป็นต้องก่อสร้างหรือวางแนวท่อขนส่งเชื้อเพลิงพลาสดผ่านคลองสาธารณะ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด	- โครงการอยู่ในระยะการก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามแบบทางด้านวิศวกรรมในพื้นที่โครงการ หากโครงการมีความจำเป็นต้องก่อสร้างหรือวางแนวท่อขนส่งเชื้อเพลิงพลาสดผ่านคลองสาธารณะโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ	- ติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในแหล่งน้ำของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ปลา และสัตว์น้ำวัยอ่อน	- โครงการดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในแหล่งน้ำตามแผนที่กำหนดในรายงานฯ โดยเก็บตัวอย่างตามความถี่ที่กำหนดและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน	-	ภาคผนวก ค-1 ใบรายงานผลคุณภาพน้ำผิวดิน
	- วิเคราะห์ผลการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำผิวดินเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการศึกษาผลกระทบของโครงการที่นำเสนอในรายงานฯ	- โครงการดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในแหล่งน้ำตามแผนที่กำหนดในรายงานฯ โดยเก็บตัวอย่างตามความถี่ที่กำหนดและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน	-	ภาคผนวก ค-1 ใบรายงานผลคุณภาพน้ำผิวดิน
8. ด้านการคมนาคมขนส่ง	- กำหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่รถขนส่ง เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	- โครงการดำเนินการติดเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่รถขนส่งและติดป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	-	รูปที่ 2-14 ป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ และภาคผนวก ข-1 แบบฟอร์มและผลบันทึกข้อร้องเรียน-ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. ด้านการ คมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	- โครงการกำกับและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถบรรทุกทุกทราบเกี่ยวกับกฎจราจร และข้อบังคับความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการควบคุมจำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่โครงการ และในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน และไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป โดยการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 2-4 ป้ายจำกัดความเร็ว รูปที่ 2-16 การอบรมพนักงานขับรถในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และภาคผนวก ข-6 เอกสารอบรมการใช้ยานพาหนะในงานก่อสร้าง
	- จัดระบบทิศทางการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการดำเนินการทำแผนผังการสัญจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถเข้า-ออกให้พื้นที่ก่อสร้าง	-	รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และภาคผนวก ข-7 แผนการจัดการด้านการจราจร
	- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น.	- โครงการมีการอบรมพนักงานขับรถในการปฏิบัติตามกฎจราจร และเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลา 07.00-08.00น. และ 16.00-17.00น. อย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-16 การอบรมพนักงานขับรถในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- แจ้งประชาชนในท้องถิ่น และพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบพื้นที่โครงการ รับทราบเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างและระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนและแจ้งเตือนซ้ำอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนมีกิจกรรมก่อสร้าง	- โครงการได้ลงพื้นที่แจ้งแผนการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างของโครงการผ่านคณะกรรมการไตรภาคี ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงมีการสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเป็นระยะๆ	-	รูปที่ 2-1 การลงพื้นที่แจ้งแผนการก่อสร้าง รูปที่ 2-32 การประชุมไตรภาคีและภาคผนวก ข-5 แผนงานก่อสร้างของโครงการ
	- จำกัดความเร็วของรถขนส่งเครื่องจักร/วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชนและบนทางหลวงไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	- โครงการกำชับและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถบรรทุกทราบเกี่ยวกับกฎจราจร และข้อบังคับความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการควบคุมจำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่โครงการ และในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน และไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป โดยการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	รูปที่ 2-4 ป้ายจำกัดความเร็ว รูปที่ 2-16 การอบรมพนักงานขับรถในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
	- ติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	รูปที่ 2-17 สัญญาณเตือนภัยในพื้นที่โครงการ
	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำต่อไปได้แก่ สาเหตุผลต่อสุขภาพคนงาน/พนักงาน ความเสียหาย/ความสูญเสีย และการแก้ไขปัญหา	- โครงการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำต่อไป จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่โครงการ และในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน และไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป และหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น.	-	ภาคผนวก ข-8 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. ด้านการ คมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- กรณีที่มีการใช้รถสำหรับการขนส่งระหว่างก่อสร้างโครงการฯ แล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นทาง หรือถนนสาธารณะ โครงการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและปรับปรุงให้กลับสู่สภาพปกติ	- โครงการอยู่ในระยะการก่อสร้างหากรถสำหรับการขนส่งระหว่างก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นทาง หรือถนนสาธารณะ โครงการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและปรับปรุงให้กลับสู่สภาพปกติ	-	-
9. ด้านการจัดการ ขยะและ ของเสีย	- จัดเตรียมภาชนะ สถานที่เก็บ/รองรับขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง และของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างให้เพียงพอ ก่อนให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัด	- โครงการได้จัดเตรียมภาชนะรองรับของเสียที่มีฝาปิดมิดชิดกระจายตามจุดพักของคนงานก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ และมีการรวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมรับไปกำจัดต่อไป	-	รูปที่ 2-18 ถึงขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดและภาคผนวก ข-9 เอกสารการส่งกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง (ใบเสร็จ)
	- คัดแยกของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ให้พิจารณานำกลับมาใช้ให้มากที่สุด	- โครงการดำเนินการคัดแยกขยะ เช่น แยกภาชนะบรรจุเครื่องดื่มออกจากขยะทั่วไป เพื่อลดการกำจัดขยะภายในโครงการ และสามารถรีไซเคิลขยะกลับมาใช้ใหม่	-	รูปที่ 2-19 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมของเสียในพื้นที่โครงการ
	- ห้ามทิ้งของเสียลงในรางระบายน้ำ ท่อรวบรวมน้ำเสีย และแหล่งน้ำต่างๆ ของโครงการ	- โครงการได้ควบคุมกำชับพนักงานไม่ให้ทิ้งของเสีย หรือระบายน้ำทิ้งที่ยังไม่ผ่านการบำบัด น้ำปนเปื้อนน้ำมันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงรางระบายน้ำ และได้ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบความเรียบร้อยของรางระบายน้ำ นอกจากนี้ โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่รางระบายน้ำ	-	รูปที่ 2-12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำและรูปที่ 2-20 ป้ายห้ามทิ้งขยะลงรางระบายน้ำ
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสียไว้ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสีย และนำไปจัดเก็บ ณ จุดพักของเสียที่กำหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	-	รูปที่ 2-19 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมของเสียในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. ด้านอาชีพ อนามัย และความ ปลอดภัย	- พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาที่มีการกำหนดแผนงานการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ กิจกรรมงานก่อสร้างของโครงการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาที่มีการกำหนดแผนงานการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมงานก่อสร้างของโครงการ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามมาตรการที่กำหนด	-	ภาคผนวก ข-10 กฎระเบียบความ ปลอดภัย
	- ให้ระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ ผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน	- โครงการได้ระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยกับผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้าง คู่มือด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการอบรม	-	ภาคผนวก ข-11 คู่มือ ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย
	- จัดทำป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้สามารถได้ยินทั่วถึงโครงการ	- โครงการได้จัดทำป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้สามารถได้ยินทั่วถึงโครงการ	-	รูปที่ 2-8 พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคล และรูปที่ 2-17 สัญญาณเตือนภัยใน พื้นที่โครงการ
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร/ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ ปลอดภัย	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของ เครื่องจักร/อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย	-	รูปที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและ หัวหน้าคนคุมงาน ก่อสร้าง และภาคผนวก ข-4 เอกสารบันทึกการ ตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ แบบรายเดือน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. ด้านอาชีพ อนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- กำหนดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือการก่อสร้าง เขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่มีความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน มีการแบ่งเขตก่อสร้าง เขตพื้นที่กองเก็บวัสดุ พื้นที่พักคนงาน พื้นที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงสำนักงานสนามชั่วคราว และได้จัดทำป้ายเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และป้ายบ่งชี้ต่างๆ	-	รูปที่ 2-22 พื้นที่เก็บ กองวัสดุก่อสร้างอย่าง เป็นระเบียบ รูปที่ 2-23 พื้นที่พัก คนงาน รูปที่ 2-24 พื้นที่กอง เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ ไม่ใช้แล้ว และรูปที่ 2-25 สำนักงานสนามชั่วคราว
	- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ สำหรับ คนงานก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม และพื้นที่พักคนงานภายในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง สำหรับคนงานก่อสร้างตามกฎหมายกำหนดอย่าง เคร่งครัด	-	รูปที่ 2-9 ห้องน้ำห้อง ส้วมคนงาน รูปที่ 2-23 พื้นที่พัก คนงาน
	- จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การปฐมพยาบาลตามกฎหมาย กำหนด รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้ทันที	- โครงการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานในกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้ทันที	-	รูปที่ 2-26 กล่องยา และอุปกรณ์ปฐม พยาบาล และรูปที่ 2-27 รถ ฉุกเฉินหรือเบอร์ติดต่อ สถานพยาบาล ใกล้เคียง

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. ด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานแก่คนงานก่อสร้าง และออกเกณฑ์ควบคุมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน	-	รูปที่ 2-8 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และภาคผนวก ข-12 บันทึกการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	- จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อนเริ่มต้นการทำงานและการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการดำเนินการจัดการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก่อนเริ่มงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานและมีการกำหนดให้มีกิจกรรม Safety Talk อย่างสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 2-28 การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน และภาคผนวก ข-13 บันทึกกิจกรรม Safety Talk
	- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และฝึกอบรมงานเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และฝึกอบรมงาน เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	ภาคผนวก ข-14 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. ด้านอาชีพ อนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยเขตที่ก่อสร้าง เขตอันตรายและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในด้านความปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลแก่คนงานก่อสร้างและพนักงานเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัยดังกล่าว	- โครงการดำเนินการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เขตอันตราย และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลแก่คนงานก่อสร้าง และพนักงานเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัยดังกล่าว ผ่านการอบรมด้านอาชีพอนามัยความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน	-	รูปที่ 2-17 สัญญาณเตือนภัยในพื้นที่โครงการ และรูปที่ 2-28 การอบรมด้านอาชีพอนามัยความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
	- ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดร่วมกันระหว่างบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด และบริษัทรับเหมา	- โครงการกำหนดแผนการตรวจสอบความปลอดภัย ระหว่างบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด และบริษัทรับเหมาในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีพอนามัยและหัวหน้าคนคุมงานก่อสร้าง
	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ความรุนแรง ผลต่อสุขภาพคนงานและพนักงาน จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความสูญเสีย พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และข้อเสนอแนะ	- โครงการจัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ความรุนแรง ผลต่อสุขภาพคนงานและพนักงาน จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความสูญเสีย พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหา การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มสอบสวนอุบัติเหตุ และบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	-	ภาคผนวก ข-8 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
	- จัดให้มีเอกสารขออนุญาตเข้า-ออก เขตก่อสร้างและเขตอันตรายที่ชัดเจน	- โครงการมีข้อกำหนดในการเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่โครงการ โดยจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง และหากต้องการผ่านเข้า-ออกประตู จะต้องทำเรื่องขออนุญาตผ่านระบบ Visitor Management System (VMS) ของบริษัท	-	รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และภาคผนวก ข-15 เอกสารขออนุญาต เข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ- สังคมและการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน	- พิจารณาการรับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการ เข้าทำงานเป็นอันดับแรก และควบคุมการรับคนงานต่างด้าวโดยต้อง ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- โครงการมีนโยบายในการจัดจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ และควบคุมการรับ คนงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย	-	-
	- จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีขอบเขตที่พนักงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน	- โครงการมีข้อกำหนดในการเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่โครงการ โดย จะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง และหาก ต้องการผ่านเข้า-ออกประตู จะต้องทำเรื่องขออนุญาตผ่านระบบ Visitor Management System (VMS) ของบริษัท	-	รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ ดูแลการเข้า-ออก พื้นที่โครงการ และภาคผนวก ข-15 เอกสารขออนุญาต เข้า- ออก พื้นที่ก่อสร้าง
	- จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนรับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยผู้ได้รับผลกระทบ สามารถร้องเรียนลักษณะผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทาง ต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือตามความเหมาะสม อาทิ เช่น โดยวาจา โทรศัพท์ บันทึกลงจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	- โครงการมีศูนย์ประสานงานรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ความเดือดร้อนที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการผ่านช่องทางการ ประชุมไตรภาคีประจำเดือน และจากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เช่น การลง พื้นที่ชุมชน กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้ ในระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการไม่มีข้อร้องเรียนจาก ประชาชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	-	รูปที่ 2-29 ช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนของโครงการ และภาคผนวก ข-16 ขั้นตอนการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียนและ แบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ- สังคมและการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	- ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และกำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่าง ชัดเจนเพื่อควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และหัวหน้าคนงานก่อสร้าง ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และดำเนินการจัดการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก่อนเริ่มงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน และมีการกำหนดให้มีกิจกรรม Safety Talk อย่างสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและ หัวหน้าคนงาน ก่อสร้าง รูปที่ 2-28 การอบรม ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยก่อน เริ่มงาน และภาคผนวก ข-13 บันทึกกิจกรรม Safety Talk
	- ประชาสัมพันธ์กับชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจ้ง ให้ชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างและ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และแจ้ง เตือนซ้ำอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนมีกิจกรรมก่อสร้าง	- ทางโครงการได้ลงพื้นที่แจ้งแผนการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างของโครงการผ่าน คณะกรรมการไตรภาคี ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	-	รูปที่ 2-1 การลงพื้นที่ แจ้งแผนการก่อสร้าง รูปที่ 2-32 การ ประชุมไตรภาคี และภาคผนวก ข-2 สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แผนการก่อสร้าง โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- กำหนดให้มีการชดเชยเยียวยา โดยมีแผนการจัดการที่ชัดเจน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโครงการในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- โครงการได้ทำประกันภัยสาธารณะเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ ยังไม่พบความเสียหายจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการแต่อย่างใด	-	รูปที่ 2-29 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ
	- จัดตั้งคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขในกรณีที่มีข้อร้องเรียนต่อการดำเนินโครงการ	- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไตรภาคี ในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	-	รูปที่ 2-32 การประชุมไตรภาคี ภาคผนวก ข-17 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
	- องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ (1) ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นำชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 36 คน มาจากการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เช่น ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ อบต. ท่าตูม จำนวน 20 คน เช่น - ตัวแทนหมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จำนวน 1 คน - ตัวแทนหมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 คน - ตัวแทนหมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จำนวน 3 คน	- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไตรภาคี ในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	-	รูปที่ 2-32 การประชุมไตรภาคี ภาคผนวก ข-17 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี

**ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- ตัวแทนหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 5 คน - ตัวแทนหมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 2 คน - ตัวแทนหมู่ที่ 6 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 1 คน - ตัวแทนหมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 3 คน - ตัวแทนหมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 1 คน - ตัวแทนหมู่ที่ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 1 คน - ตัวแทนหมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 1 คน ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ อบต. กรอกรสมบูรณ์ จำนวน 3 คน เช่น - ตัวแทนหมู่ที่ 3 ตำบลกรอกรสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ - ตัวแทนหมู่ที่ 4 ตำบลกรอกรสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ - ตัวแทนหมู่ที่ 5 ตำบลกรอกรสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ อบต. บ้านทาม จำนวน 4 คน เช่น - ตัวแทนหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ - ตัวแทนหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ - ตัวแทนหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ - ตัวแทนหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ อบต. ศรีมหาโพธิ จำนวน 3 คน เช่น - ตัวแทนหมู่ที่ 6 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ - ตัวแทนหมู่ที่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ - ตัวแทนหมู่ที่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ อบต.ลาดตะเคียน จำนวน 2 คน เช่น - ตัวแทนหมู่ที่ 10 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี - ตัวแทนหมู่ที่ 13 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ อบต. หาดนางแก้ว จำนวน 3 คน เช่น - ตัวแทนหมู่ที่ 3 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอภินทรบุรี - ตัวแทนหมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอภินทรบุรี - ตัวแทนหมู่ที่ 5 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอภินทรบุรี ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ อบต. วังตาล จำนวน 1 คน เช่น - ตัวแทนหมู่ที่ 6 ตำบลวังตาล อำเภอภินทรบุรี (2) กรรมการผู้แทนภาคราชการ จำนวน 19 คน มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เช่น นายอำเภอศรีมหาโพธิ หรือผู้แทน นายอำเภอภินทรบุรี หรือผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ หรือผู้แทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี (พื้นที่เขตตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ) หรือผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม หรือผู้แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม หรือผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุญณ์ หรือผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม หรือผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หรือผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หรือผู้แทน			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ- สังคมและการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว หรือผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล หรือผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ หรือผู้แทน กำนันตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ หรือผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ หรือผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ หรือผู้แทน (3) ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 12 คน เช่น ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ตัวแทนฝ่ายประสานงาน บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด จำนวน 2 คน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการไต่รภาคี ตัวแทนฝ่ายประสานงานทั่วไป และเลขานุการกรรมการไต่รภาคี			

**ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ- สังคมและการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	(4) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน - คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ (1) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ (5) สำหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการต้องเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติทำงานอยู่ภายใต้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง - คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ (1) ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหาสีงแวดล้อมในระหว่างการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนเนื่องจากการดำเนินโครงการฯ และ			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการฯ สามารถเรียกประชุมนอกจากวาระปกติได้ (3) พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจเชิญบุคคล องค์กรและ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา (4) เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการฯ กับชุมชน - ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย และหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาทปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการฯ กับชุมชน - ร่วมตรวจสอบความเสียหาย และพิจารณากำหนดค่าชดเชย แนวทางและมาตรการเยียวยา และจ่ายค่าชดเชยในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน - วาระของคณะกรรมการและการฟื้นฟูสภาพ (1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกเมื่อครบกำหนดวาระ ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ในกรณีที่ตัวแทนพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ (4) ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทันที และให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ชุดเดิมสรรหาตัวแทนใหม่ และยังคงให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ (2) เมื่อครบกำหนดวาระ หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น (3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันเพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน (4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ย้ายภูมิลำเนาออกจากตำบลใน ทม./ทต./อบต. ที่มีภูมิลำเนาในขณะที่การสรรหาเกินกว่าเก้าสิบวัน พ้นสภาพการเป็นพนักงานของโครงการ			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ความประพฤติไม่เหมาะสม ทุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถและคณะกรรมการ มีมติเสียงข้างมากให้ออกจากตำแหน่ง	-		
	- ความถี่ในการประชุม (1) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนด เวลาปกติได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้อื้อเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด			
	- กำหนดให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการให้ชุมชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผู้นำชุมชน หอกระจายข่าวหมู่บ้าน การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแทรกการประชุมอำเภออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- โครงการได้เผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการผ่านการประชุมไตรภาคี และแจ้งผู้นำชุมชนให้รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ	-	รูปที่ 2-1 การลงพื้นที่แจ้งแผนการก่อสร้างและภาคผนวก ข-2 สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างโครงการ
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาติดตั้ง CCTV ในบริเวณจุดพักของคนงานสร้าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนงานก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาติดตั้ง CCTV ในบริเวณจุดพักของคนงานสร้าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนงานก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	รูปที่ 2-30 CCTV และจอภาพภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ- สังคมและการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	- กำหนดให้ผู้รับเหมามีการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดและของมีนเมาในคนงาน ก่อสร้าง อย่างน้อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมของคนงานก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่อชุมชน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมามีการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดและของมีนเมา ในคนงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของคนงานก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่อชุมชนโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ข-19 ผล การสุ่มตรวจสอบสารเสพติด และของมีนเมา คนงานก่อสร้าง
	- ศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นของประชาชน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยรอบโครงการ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สถานประกอบการ และพื้นที่ อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อสอบถามและรับฟังความ คิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สถานประกอบการ ถึงผลกระทบที่ได้รับจาก กิจกรรมก่อสร้างของโครงการ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น	-	รูปที่ 2-1 การลงพื้นที่ แจ้งแผนการก่อสร้าง และรูปที่ 2-31 โครงการดำเนิน กิจกรรมร่วมกับชุมชน (CSR)
	- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข	- โครงการมีศูนย์ประสานงานรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ความเดือดร้อนที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการผ่านช่องทางการ ประชุมไตรภาคีประจำเดือน และจากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เช่น การลง พื้นที่ชุมชน กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้ ในระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการไม่มีข้อร้องเรียนจาก ประชาชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	-	รูปที่ 2-29 ช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนของโครงการ และภาคผนวก ข-16 ขั้นตอนการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียนและ แบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่	- โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนในพื้นที่	-	รูปที่ 2-31 โครงการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน (CSR) และภาคผนวก ข-18 บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ (CSR)
12. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	- บันทึกผลการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ทางโครงการมีบันทึกผลการดำเนินการของคณะกรรมการไตรภาคีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวก ข-17 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีและการประชุมไตรภาคี
	- จัดให้มีระบบสุขภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ มีการดำเนินการ ดังนี้ - จัดหาวัคซีนที่สะอาดสำหรับอุปกรณ์โรคแก่คนงาน - มีการจัดการของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะของโรค - จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานก่อนที่จะส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง - จัดให้มีเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการมีจุดรวบรวมขยะ ถังขยะในพื้นที่โครงการ ซึ่งรวบรวมของเสียในพื้นที่ก่อสร้างส่งให้หน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมรับไปกำจัด สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และทางโครงการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้ทันที	-	รูปที่ 2-18 ถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด รูปที่ 2-19 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมของเสียในพื้นที่โครงการ รูปที่ 2-26 กล่องยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และรูปที่ 2-27 รถฉุกเฉินหรือเบอร์ติดต่อสถานพยาบาลใกล้เคียง

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
12. ด้าน สาธารณสุข และสุขภาพ (ต่อ)	- อบรมคนงานเรื่องสุขอนามัยและการป้องกันโรค ความประพฤติกการไม่ก่อเหตุรำคาญ และสิ่งเสพติด	- โครงการดำเนินการจัดการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก่อนเริ่มงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน และมีการกำหนดให้มีกิจกรรม Safety Talk อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดและของมีนเมาในคนงานก่อสร้าง	-	รูปที่ 2-28 การอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน และภาคผนวก ข-13 บันทึกกิจกรรม Safety Talk ภาคผนวก ข-19 ผลการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดและของมีนเมาคนงานก่อสร้าง
	- ต้องจัดทำทะเบียนคนงาน และจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังทำงาน	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำทะเบียนคนงาน และจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังทำงาน	-	ภาคผนวก ข-20 ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
	- สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น รพ.สต. ทำตูม รพ.สต. ศรีมหาโพธิ์ รพ.สต. ลาดตะเคียน รพ.สต. หาดนางแก้ว และ รพ.สต. กรอกสมบูรณ์ เป็นต้น ในด้านความพร้อมของสถานบริการและศักยภาพของบุคลากรผ่านแผนงานและโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- โครงการได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น รพ.สต. ทำตูม รพ.สต. ศรีมหาโพธิ์ รพ.สต. ลาดตะเคียน รพ.สต. หาดนางแก้ว และ รพ.สต. กรอกสมบูรณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ชัฟฟลาย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ดับเบิล เอ อย่างต่อเนื่อง	-	รูปที่ 2-31 โครงการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน (CSR) และภาคผนวก ข-18 บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ (CSR)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ระยะก่อสร้าง
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
12. ด้าน สาธารณสุข และสุขภาพ (ต่อ)	- จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น รพ.สต. ท่าตูม รพ.สต. ศรีมหาโพธิ์ รพ.สต. ลาดตะเคียน รพ.สต. หาดนางแก้ว และ รพ.สต. กรอกสมบูรณ์ เป็นต้น ร่วมกับโครงการฯ โดยการเชิญหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยเฉพาะกรณีมีโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้กับคนงานก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- หากเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่กับคนงานก่อสร้าง ทางโครงการจะดำเนินการโดยเชิญหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคติดต่อ	-	-
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสภาพพื้นที่ที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี มีการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของโรค และการแพร่กระจายของโรคติดต่อ รวมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำใช้ ระบบการจัดการน้ำเสีย ขยะและของเสีย เป็นต้น	- ปัจจุบันคนงานก่อสร้างพักอาศัยอยู่นอกพื้นที่โครงการ โดยผู้รับเหมาดูแลสถานที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ มีการจัดการน้ำเสียและขยะอย่างเหมาะสม	-	-
	- กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	- หากเกิดกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง โครงการจะดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	-	-



รูปที่ 2-1 การลงพื้นที่แจ้งแผนการก่อสร้าง



รูปที่ 2-2 การฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่น



รูปที่ 2-3 การใช้ผ้าใบปิดคลุมส่วนบรรทุกของรถบรรทุก



รูปที่ 2-4 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 2-5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์




รูปที่ 2-6 พื้นที่ล้างล้อและการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-7 รื้อกันเสียงของโครงการ



รูปที่ 2-8 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

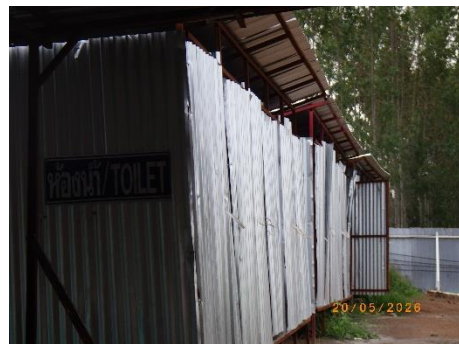

รูปที่ 2-9 ห้องน้ำห้องส้วมคนงาน



รูปที่ 2-10 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจากห้องน้ำห้องส้วม



รูปที่ 2-11 ระบบระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดิน



รูปที่ 2-12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำ




รูปที่ 2-13 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ




รูปที่ 2-14 ป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก พื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-16 การอบรมพนักงานขับรถในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

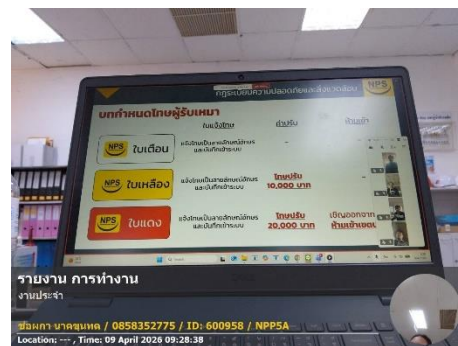

รูปที่ 2-17 สัญญาณเตือนภัยในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-18 ถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด



รูปที่ 2-19 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมของเสียในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-20 ป้ายห้ามทิ้งขยะลงรางระบายน้ำ



รูปที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและหัวหน้าคนคุมงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-22 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ



รูปที่ 2-23 พื้นที่พักคนงาน



รูปที่ 2-24 พื้นที่กองเก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว





รูปที่ 2-25 สำนักงานสนามชั่วคราว



รูปที่ 2-26 กล่องยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

รูปที่ 2-27 รถฉุกเฉินหรือเบอร์ติดต่อสถานพยาบาลใกล้เคียง

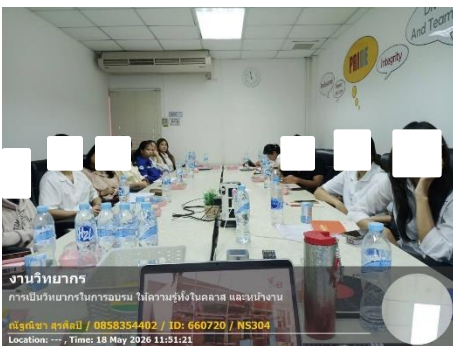

รูปที่ 2-28 การอบรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

รูปที่ 2-29 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ



รูปที่ 2-30 CCTV และจอภาพภายในโครงการ



รูปที่ 2-31 โครงการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน (CSR)



รูปที่ 2-32 การประชุมไตรภาคี
