

แผนการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม

1.ปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม 3ปี



ปี2555 เป็นเงิน 35 ล้านบาท(เสร็จแล้ว)




ปี2556 เป็นเงิน 20 ล้านบาท



ปี2557 เป็นเงิน 17 ล้านบาท

Level(MSL)

7
6
5
4
3
2
1
0

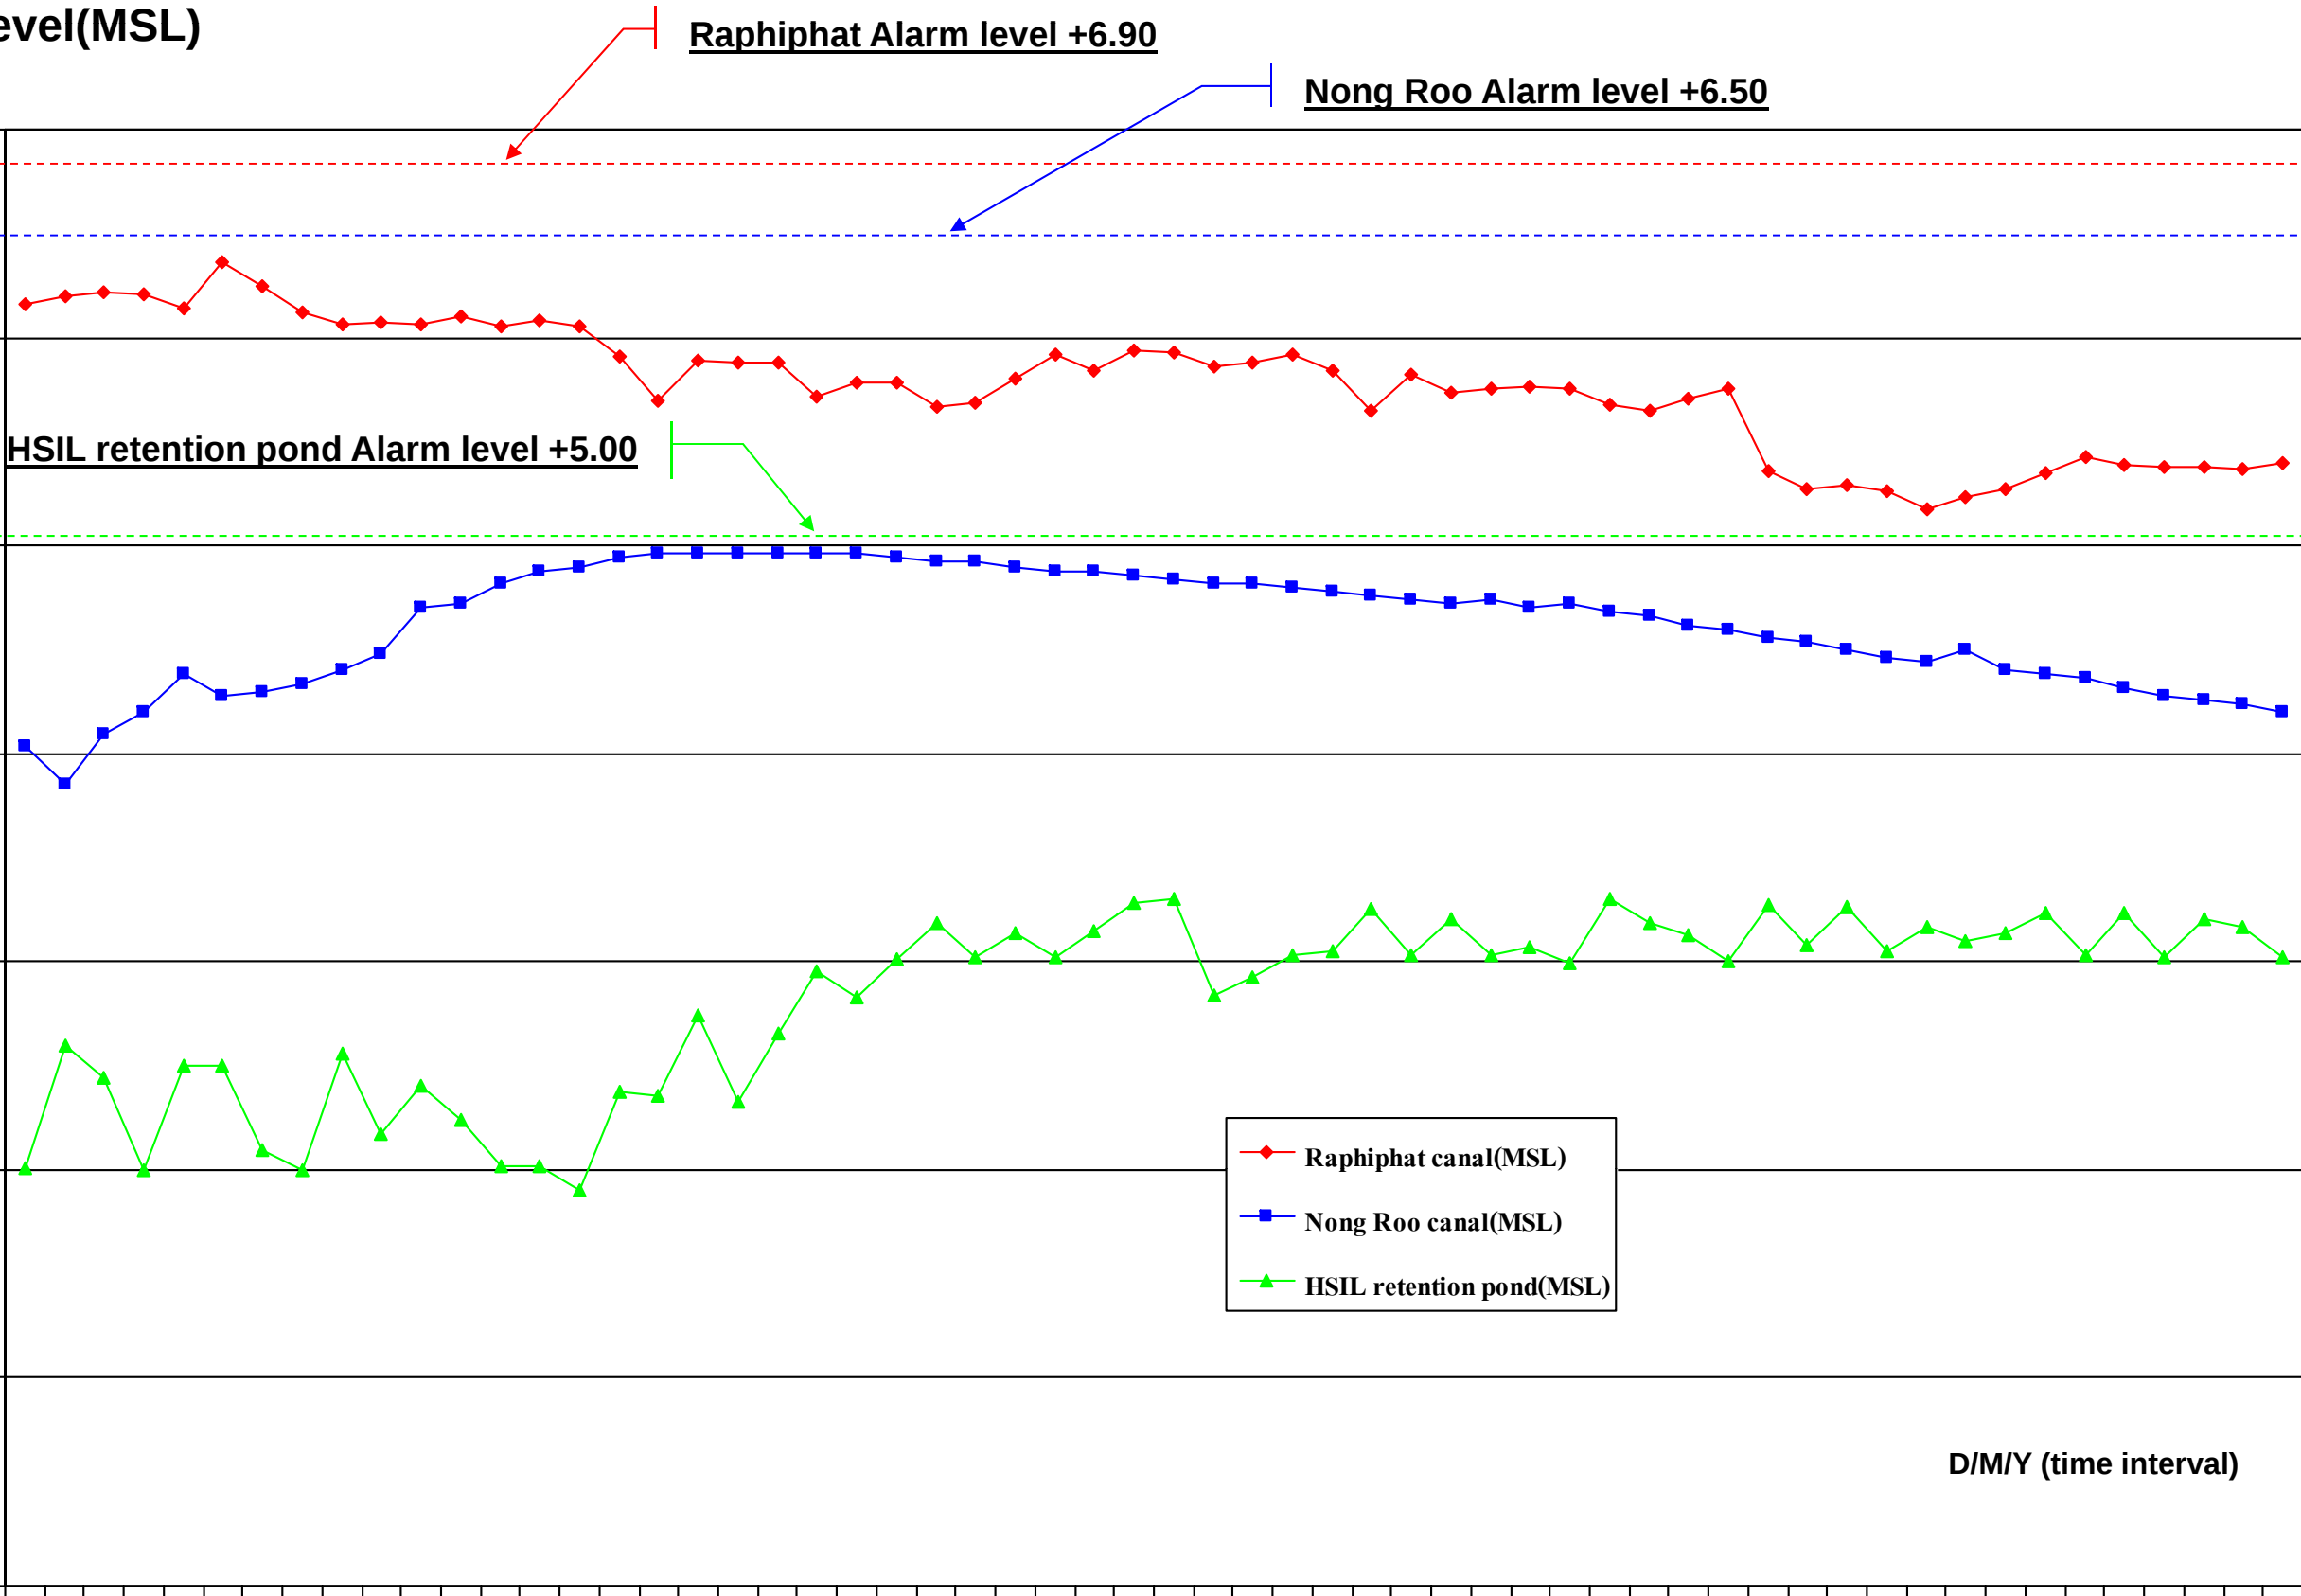

Raphiphat Alarm level +6.90

Nong Roo Alarm level +6.50

HSIL retention pond Alarm level +5.00

- Raphiphat canal(MSL)
- Nong Roo canal(MSL)
- HSIL retention pond(MSL)

D/M/Y (time interval)

แผนการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)

2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม.ต่อวินาที ใหม่ จำนวน 3 ชุด
เป็นเงิน 4.5 ล้านบาท (ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำใช้งาน 5ชุด และสำรองอีก3ชุด)



แผนการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)

3.ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด1000KVA 1 เครื่อง

เป็นเงิน16.5ล้านบาท (อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร GENERATOR)




แผนการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)


4.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1 ล้านบาท
(ปัจจุบันติดตั้งเสร็จแล้ว)



แผนการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)

5.ระบบระบายน้ำพื้นที่ ต.หนองปลาหมอ ทิศตะวันออกของโครงการ
(อยู่ระหว่างออกแบบและประมาณราคา)

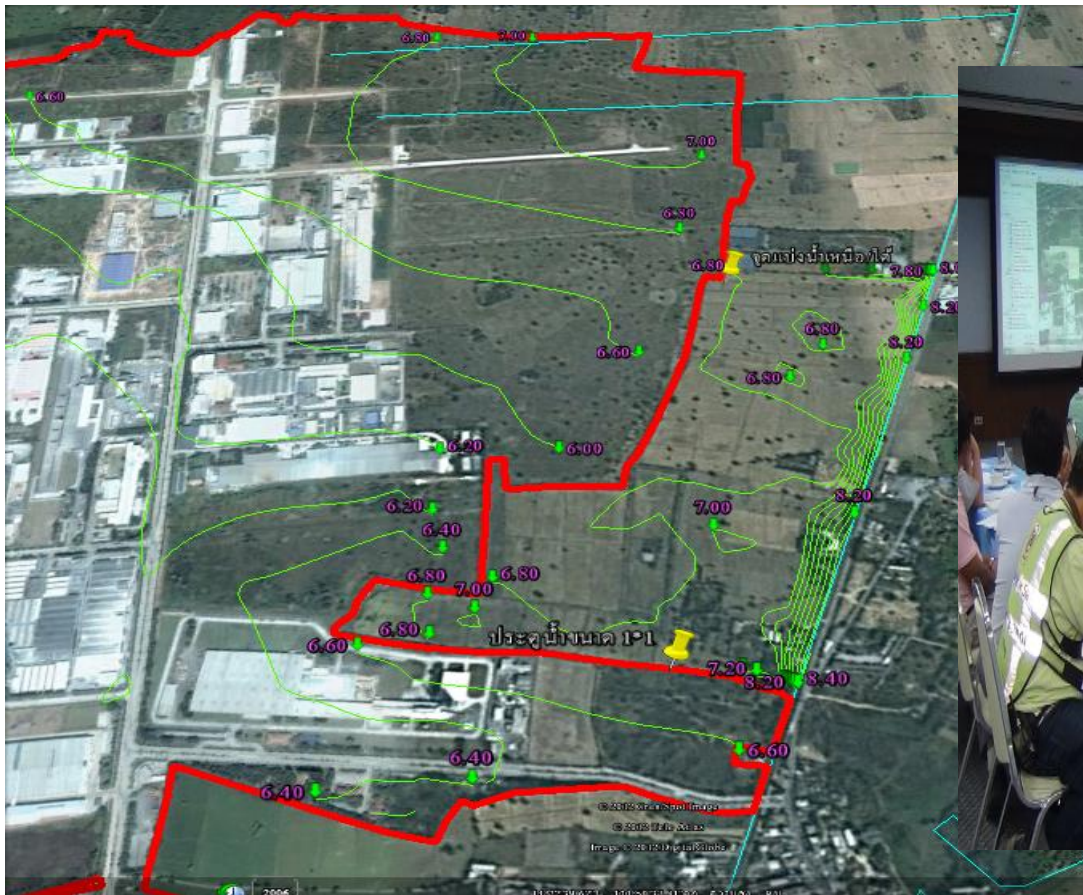

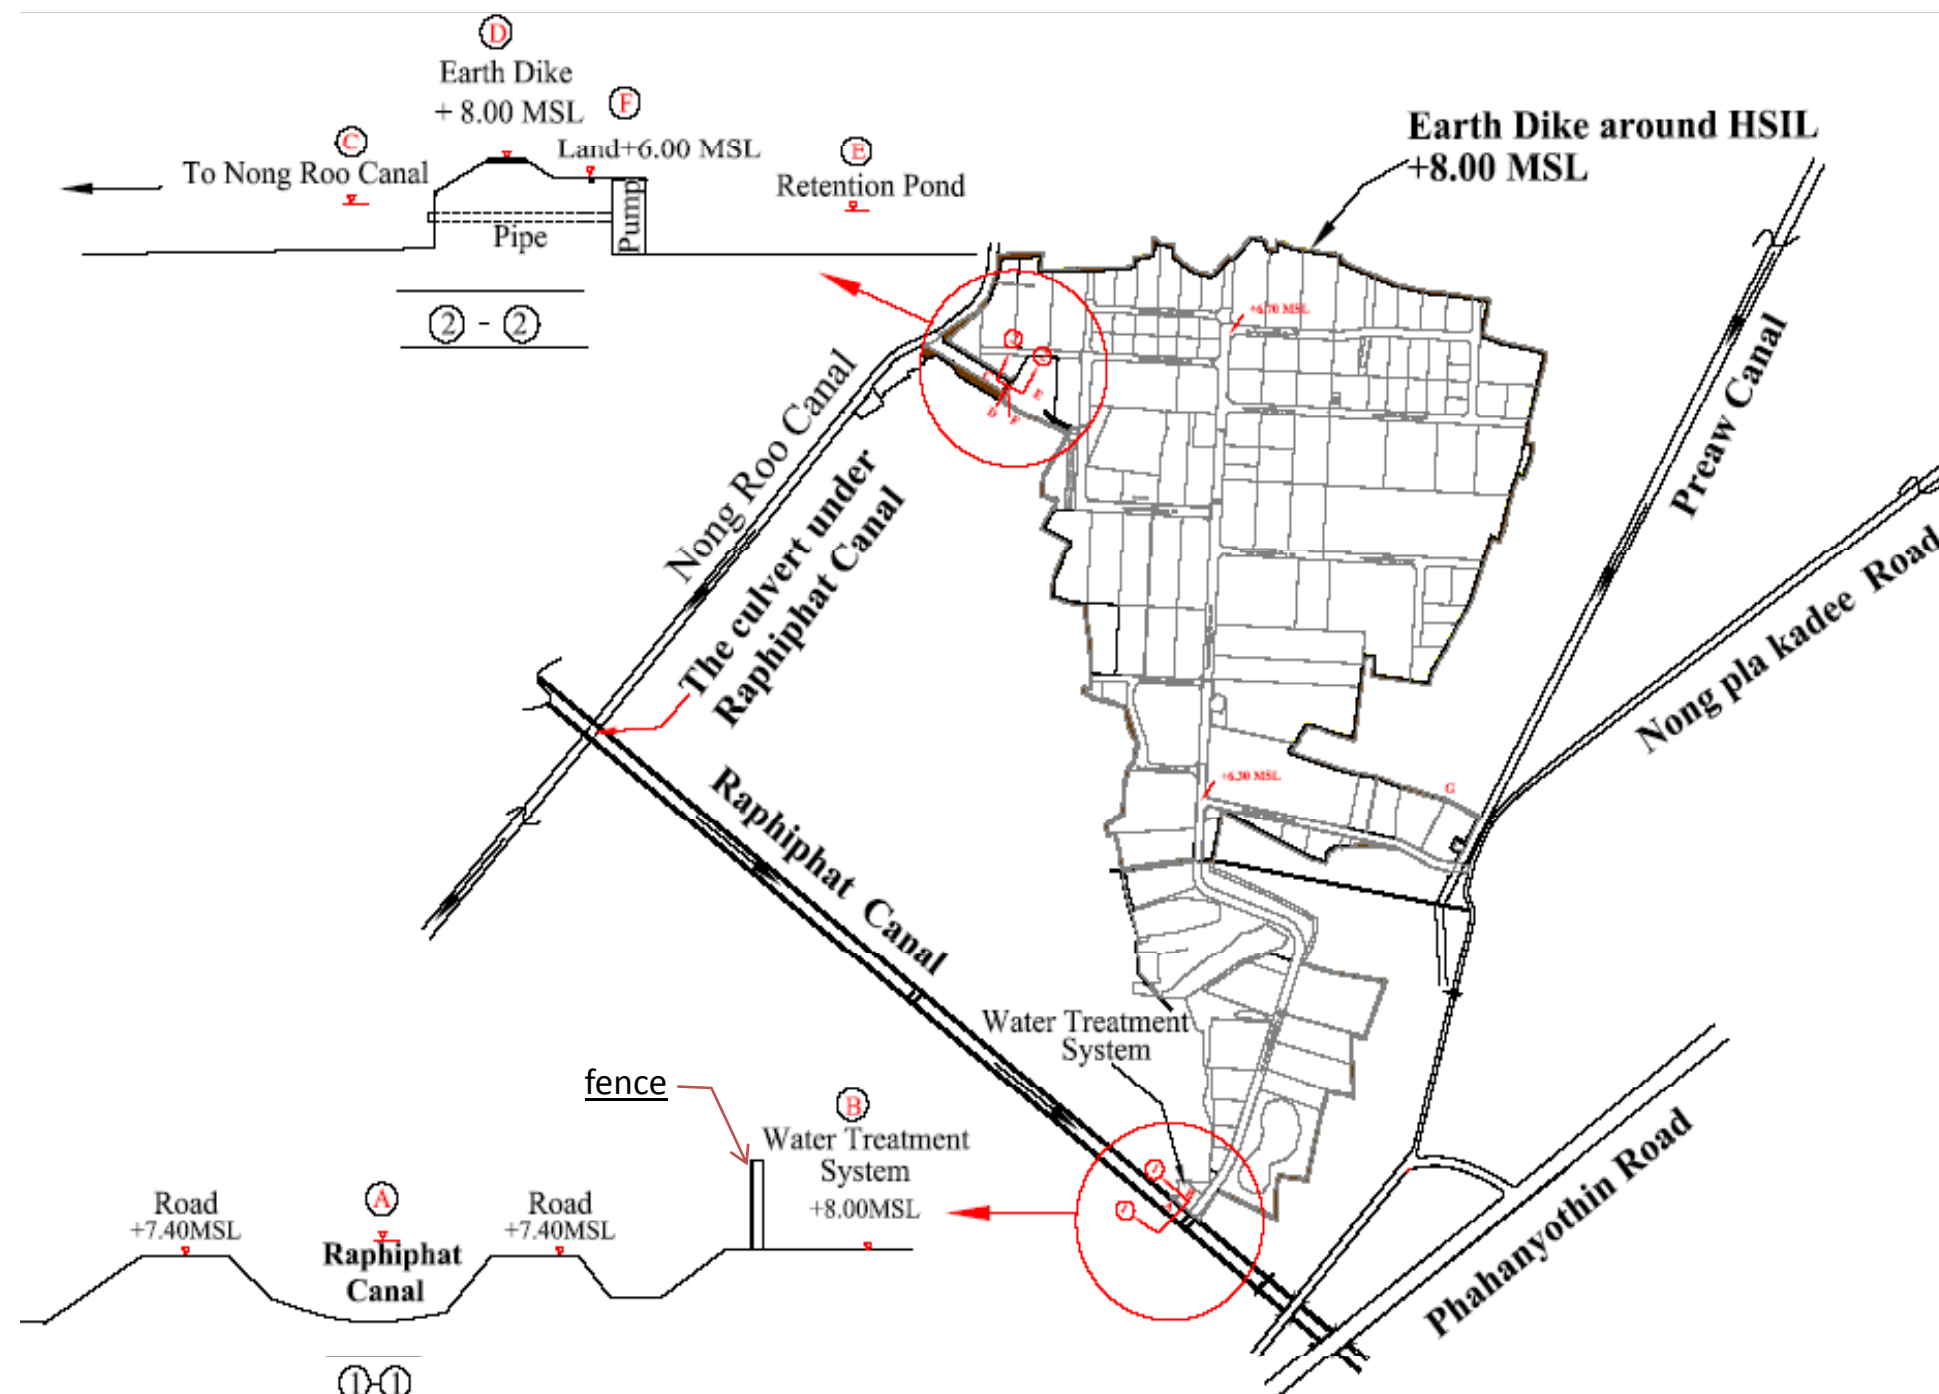


9 Nov. 2011 : 08.00 am.

Locations	Level 12hr ago (MSL)	Level (MSL)	Difference (m)	Remark
A:Raphiphat Canal(RC) B:Water Treatment System(WS)	+5.42	+5.40 +8.00	2.60	Water level in RC lower than WS land level 2.60 m.
C:Nong Roo canal(NC) D:HSIL earth dike(ED)	+4.22	+4.20 +8.00	3.80	Water level in NC lower than ED level 3.80m.
E:HSIL retention pond(RP) F:HSIL land level (LL)	+3.27	+3.02 +6.00	2.98	Water level in RP lower than HSIL Land level 2.98m.
G: Outside HSIL	-	-	-	Not effect

NB: HSIL provide sand bag and back-hoe to prevent outflow flood in estate.

แผนฉุกเฉินป้องกันน้ำท่วมเขตประกอบการอุตสาหกรรม เหมราช สระบุรี

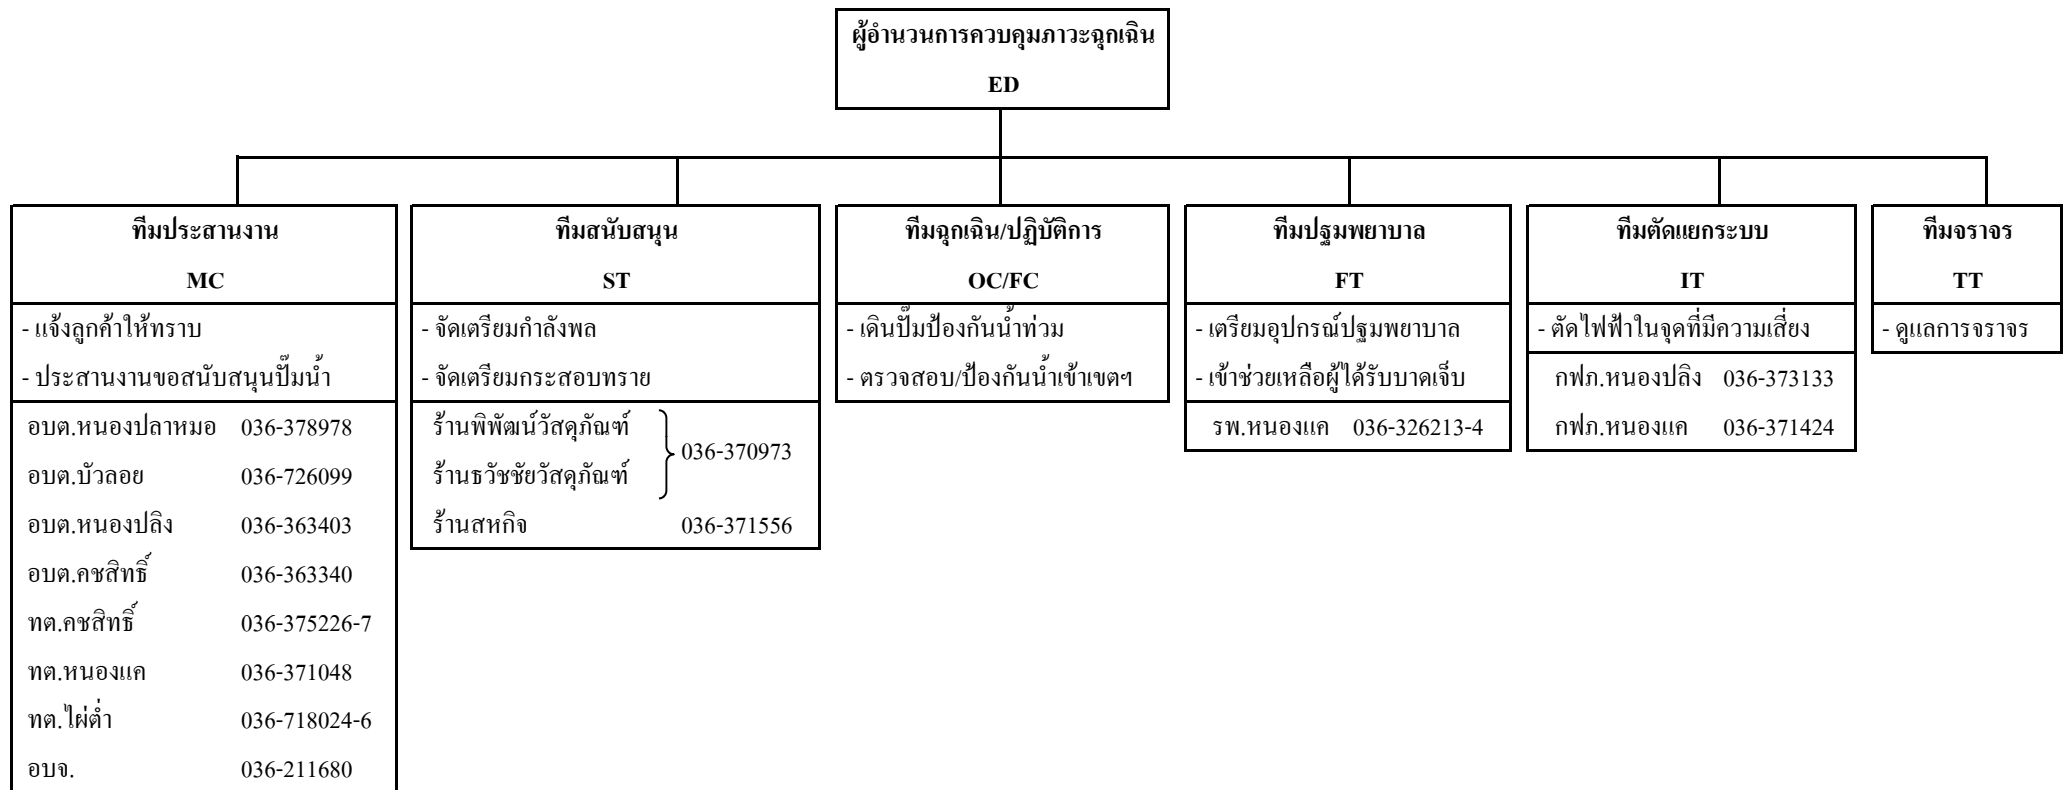

ผังขั้นตอนการสื่อสารและแนวทางในการจัดการน้ำท่วม

