

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




เอกสารแนบที่ 2.1

ตัวอย่างแบบบันทึกการร่วมฟังความคิดเห็น
ช่วงทำการระบือร่วมกับชุมชน


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...10...เดือน...มิถุนายน.....พ.ศ...2569.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน

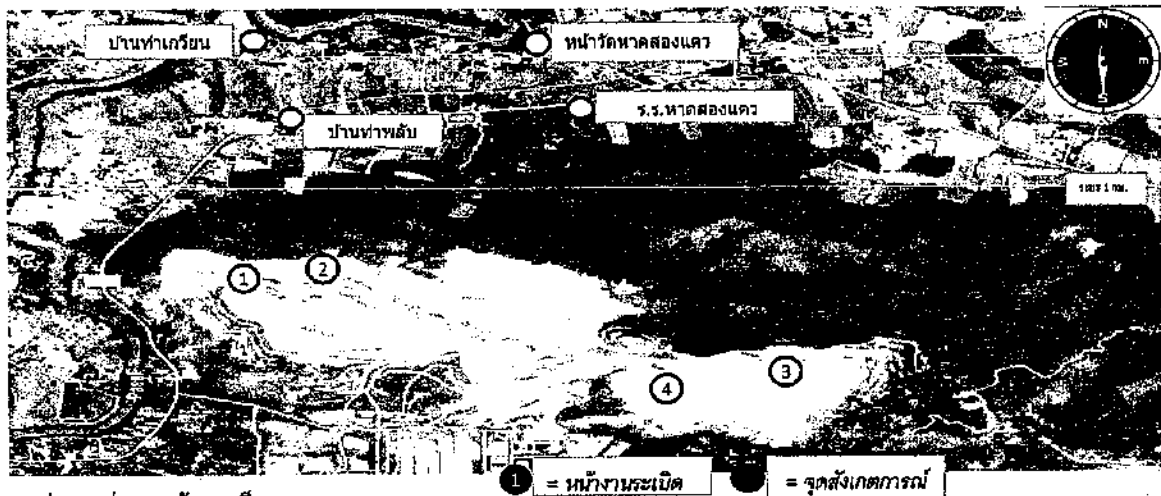

2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง

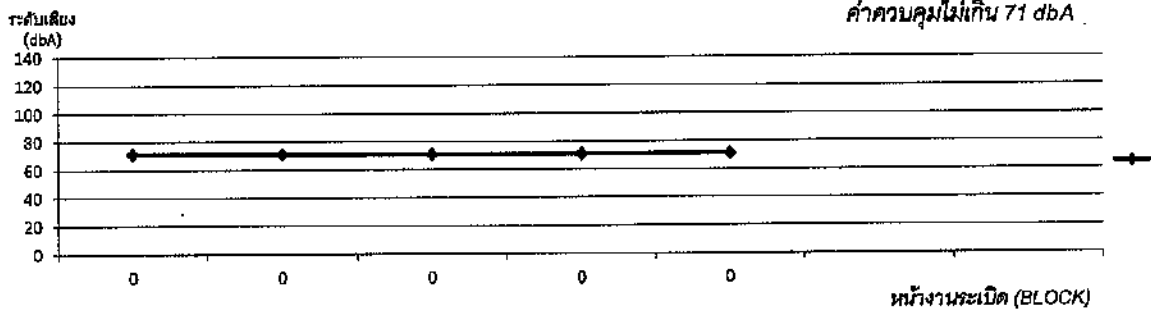

3 ตารางแสดงข้อมูลการตรวจวัด

☒ บ้านท่าพลับ ☐ บ้านท่าเกรียน ☐ ร.ร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dba)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	
1	DOI	16:00	/			1	1	0	1	1	0	พวงพัฒนา 12 หลุม
2	JRL	16:01	/			1	1	0	1	1	0	
3	CH	16:00	/			1	1	0	1	1	0	
4	AGW	16:01	/			1	1	0	1	1	0	
5												
6												
7												
						ชุมชนร่วมสังเกตการณ์			ผู้รายงาน			

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม)

FM:Q MO 017-03(01/11/66)

หมายเหตุ

อายุการจกเก็บ 1 ปี

0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2=มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)


Ref.WI:Q MO 009

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ขอมรับไม่ได้ (>81 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...29...เดือน...พฤษภาคม.....พ.ศ...2569.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน

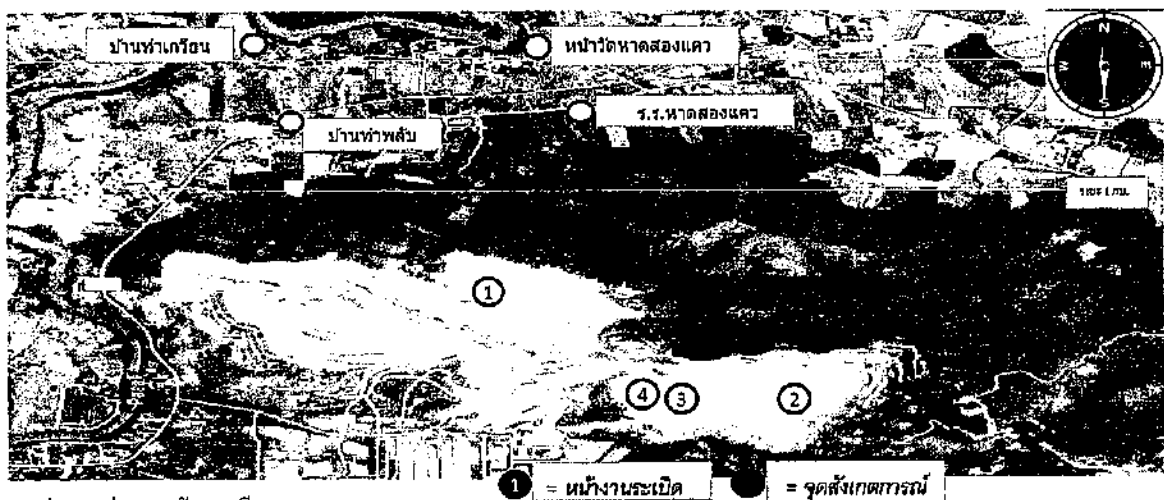

2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง

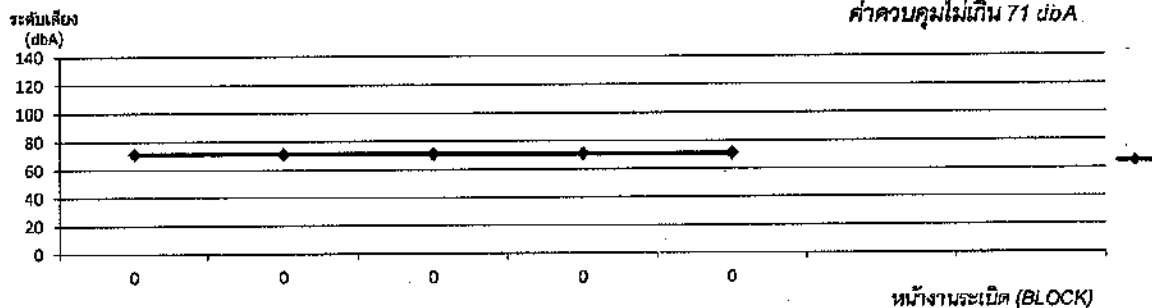

3 ตารางแสดงข้อมูลการตรวจวัด

☐ บ้านท่าพลับ ☒ บ้านท่าเกวียน ☐ ร.ร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dbA)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนา		เสียง	อันตราย	ฝุ่น	เสียง	อันตราย	ฝุ่น	
1	JOQ	16:00	/		48	0	0	0	0	0	0	
2	EG-	16:22	/		50	0	0	0	0	0	0	
3	BFW	16:00	/		49	0	0	0	0	0	0	
4	BGV	16:10	/		45	0	0	0	0	0	0	
5												
6												
7												

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์

ผู้รายงาน

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม)

FM:Q MO 017-03(01/11/66)

หมายเหตุ

0= ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2= มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3= มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4= ขอมรับไม่ได้ (>81 dbA)


อายุการจัดเก็บ 1 ปี

Ref.WI:Q MO 009


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...22...เดือน...เมษายน.....พ.ศ...2569.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน

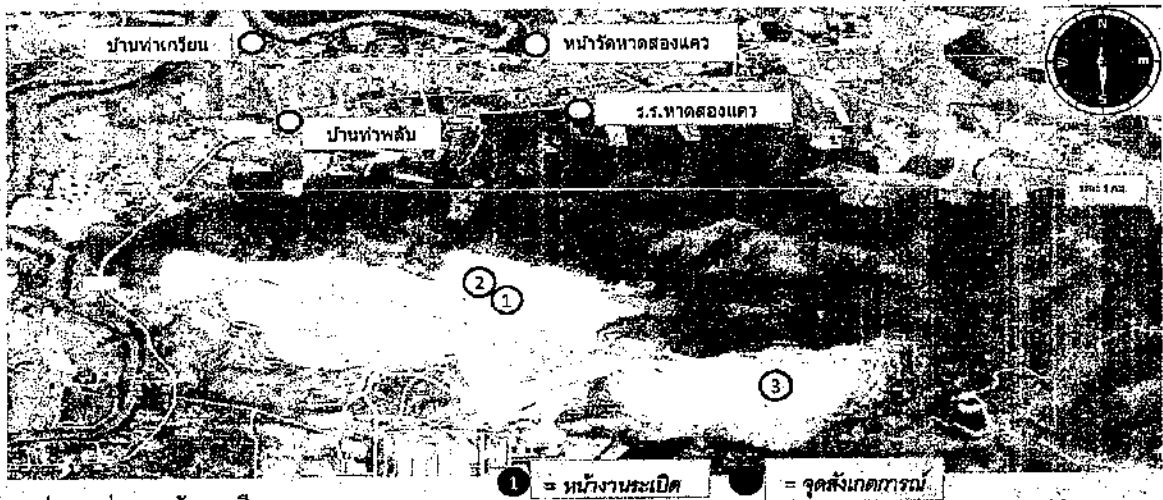

2. กราฟแสดงค่าความดังของเสียง

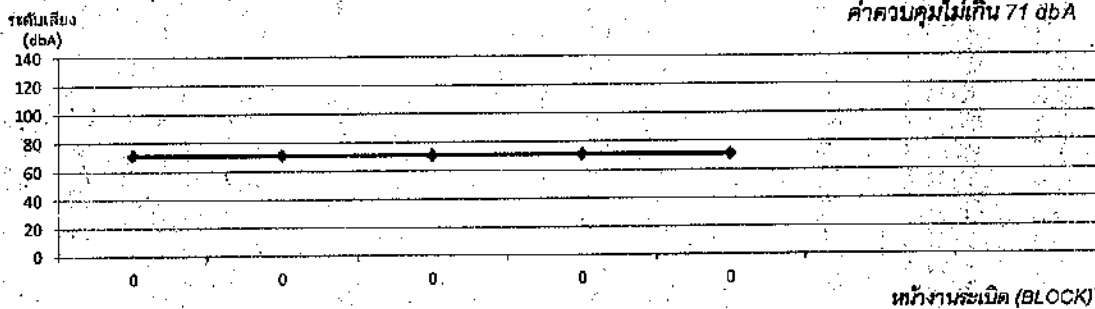

3 ตารางแสดงข้อมูลการตรวจวัด

☐ บ้านท่าพลับ ☐ บ้านท่าเกวียน ☒ รร. หาดสองแคว ☐ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
☐ อื่นๆ.....

[illegible]

제외

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์

Ashtn!

ผู้รายงาน

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม)

FM:Q MO 017-03(01/11/66)

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

ကုမ္ပဏီ

Ref:W1:Q MO 009


0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ขอมรับไม่ได้ (>81 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...13...เดือน...มีนาคม.....พ.ศ...2569.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน

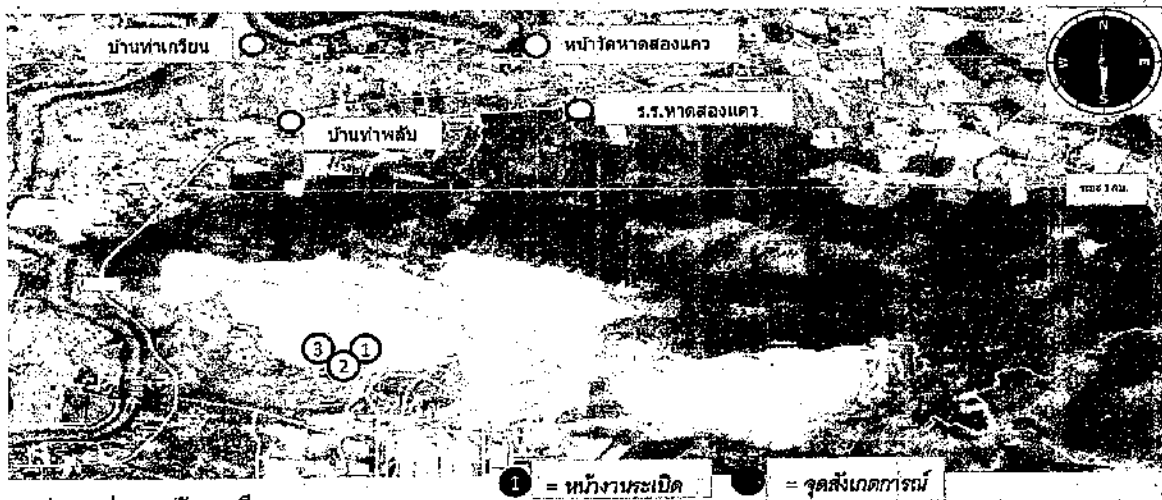

2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง

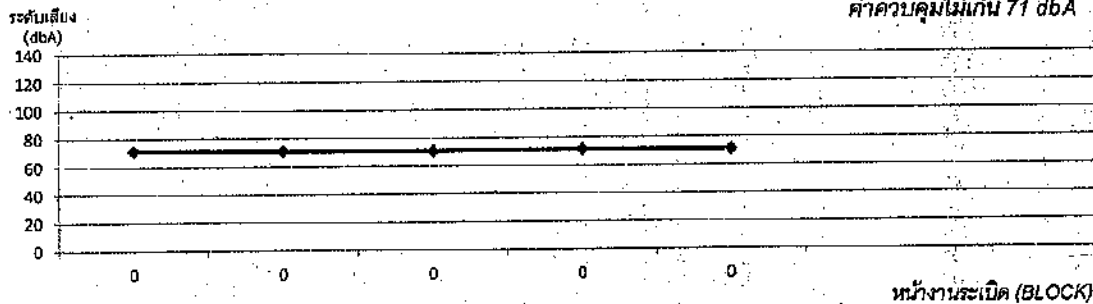

3 ตารางแสดงข้อมูลการตรวจวัด

☐ บ้านท่าพลับ ☒ บ้านท่ากรียน ☐ ร.ร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dba)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	กลิ่น	ฝุ่น	เสียง	กลิ่น	ฝุ่น	
1	AKM	16.08	/			๑	๑	๑	๑	๑	๑	ช่วงพัฒนา 12 หมู่
2	AJN	16.00	/			๑	๑	๑	๑	๑	๑	
3	AIN	16.01	/			๑	๑	๑	๑	๑	๑	
4												
5												
6												
7												

ผู้ตรวจวัด

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์

ผู้รายงาน

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม)

PM:Q MO 017-03(01/11/66)

หมายเหตุ

ข้อมูลการจัดเก็บ ปี

Ref.Wt:Q MO 009


0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ขอบรับไม่ได้ (>81 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...04...เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2569.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน

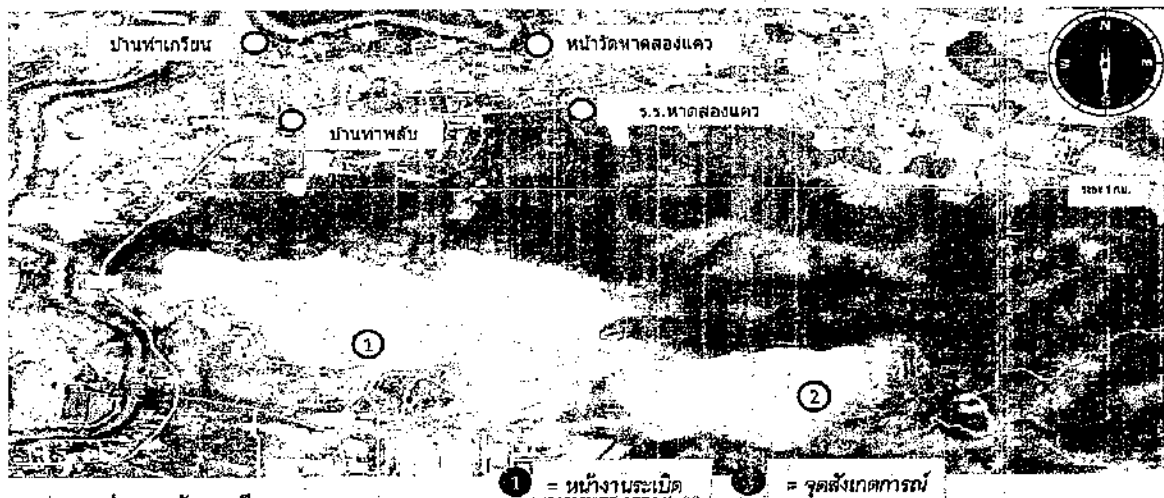

2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง

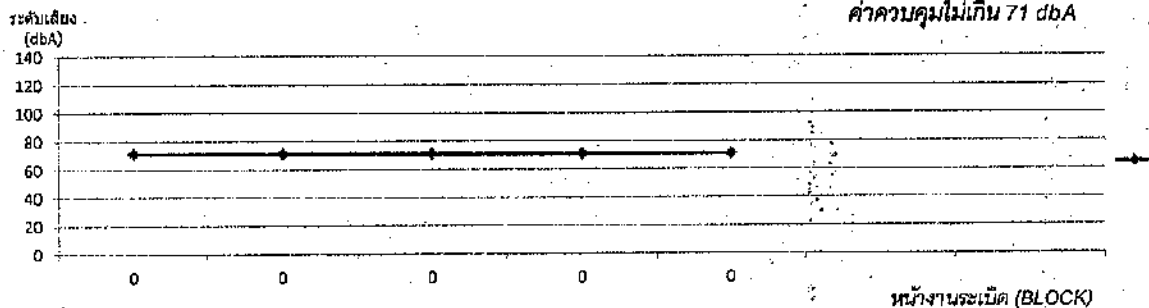

3 ตารางแสดงข้อมูลการตรวจวัด

☐ บ้านท่าพลับ ☒ บ้านท่าเกวียน ☐ ร.ร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dbA)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	
1	AIM	16.00	/		48	0	0	0	0	0	0	ฟังพัฒนาฯ 12 หมู่
2	EG	16.01	/		48	0	0	0	0	0	0	
3												
4												
5												
6												
7												

.....
ชุมชนร่วมสังเกตการณ์

.....
ผู้รายงาน

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม)

FM:Q MO 017-03(01/11/66)

หมายเหตุ

ข้อมูลการจัดเก็บ 1 ปี

Ref.WI:Q MO 009


0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4= ยอมรับไม่ได้ (>81 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน

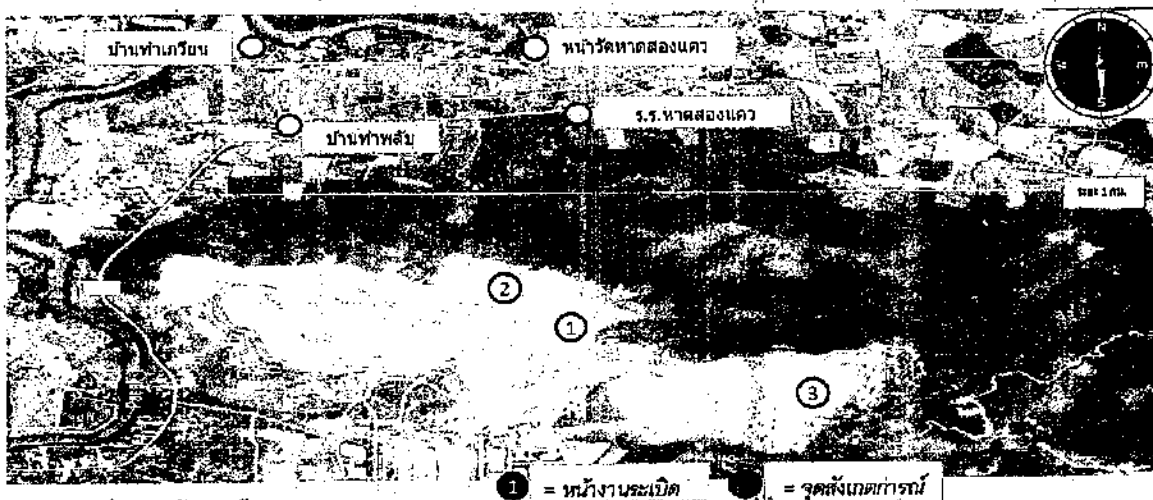

2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง

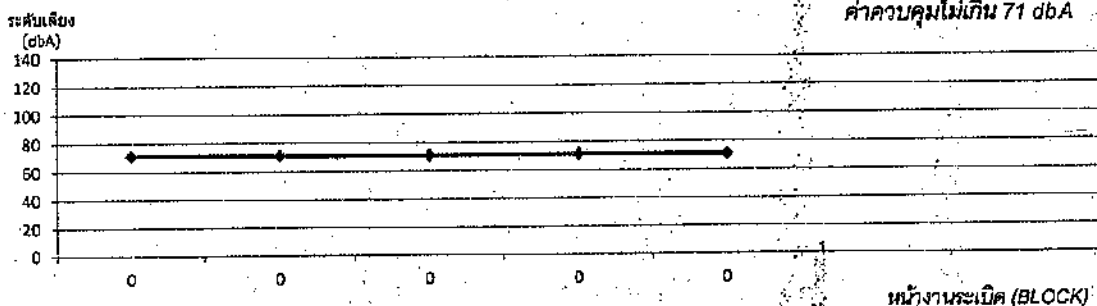

3 ตารางแสดงข้อมูลการตรวจวัด

☐ บ้านท่าพลับ ☐ บ้านท่ากรีน ☐ ร.ร.หาดสองแคว ☒ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dB(A)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ	
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	กลิ่น	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	กลิ่น		สั่นสะเทือน
1	HLV	16.09	/		45	0	0	0	0	0	0	0	ช่วงพัฒนา 12 หลุม
2	GRQ	16.00	/		45	0	0	0	0	0	0	0	
3	EF-	16.01	/		45	0	0	0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์:

ผู้รายงาน

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม)

FM:Q MO 017-03(01/11/66)

หมายเหตุ

อายุการจัดเก็บ 1 ปี

0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

Ref.WI:Q MO 009

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ขอมรับไม่ได้ (>81 dbA)

เอกสารแนบที่ 2.2

แผนงานการฟื้นฟูเหมืองหินปูน ประจำปี 2569

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แ่งกคอย) จำกัด
ฝ่าย/โรงงาน.....ปูนแ่งกคอย
ส่วน.....เหมือง

แผน-ผล งานฟื้นฟูเหมืองหินปูน2569

หน่วยงาน	ส่วน
Mine Planningฟื้นฟูเหมือง	เหมือง
...../...../.....	

หัวข้อแผนงาน	หัวข้อดำเนินการ (วิธีหรือแนวทางเพื่อให้ได้เป้าหมาย)	จุดควบคุม		กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล (Plan / Actual)												งบประมาณ (บาท)	
		หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย			เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1. ฟื้นฟูสภาพเหมือง	1.1 เตรียมพื้นที่การฟื้นฟูเหมืองหินปูน (A : 0-0-0, B : 5-1-0, C : 4-0-0 ไร่)	จำนวนพื้นที่(ไร่)	9-1-0	30-Jun	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	1.2 ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูน (2,479 ต้น)	จำนวนพื้นที่(ไร่)	9-1-0	31-Aug	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	1.3 จัดทำดินอินทรีย์สำหรับใช้งาน	ปริมาณ (Kg.)	206	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	1.4 ปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินดินดาน (250 ต้น แนวคันไถล่งทาง)	จำนวนพื้นที่(ไร่)	1	31-May	มาโนช, กอบชัย, อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	1.5 บำรุงรักษาพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองโคกสูง (พรวนดิน, ใส่ปุ๋ย, กำจัดวัชพืช)	จำนวนพื้นที่(ไร่)	19	31-May	มาโนช, กอบชัย, อธิคม, สุโสมาลัย	P A													ยกเลิก project
	1.6 ปลูกต้นไม้ (ขอบบ่อเหมือง 10 ไร่) และบำรุงรักษาพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองปางอโคท (10 ไร่)	จำนวนพื้นที่(ไร่)	20	31-Aug	มาโนช, กอบชัย, อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
2. งานบำรุงรักษาและปลูกซ่อมแซม	2.1 รับผิดชอบการเจริญเติบโต, รับผิดชอบการรอดตาย และใส่ปุ๋ย-พรวนดิน-กำจัดวัชพืชเหมืองหินปูนแ่งกคอย 1 พื้นที่ฟื้นฟูย้อนหลัง 3 ปี (2566 : 8 ไร่, 2567 : 9 ไร่, 2568 : 4 ไร่)	จำนวนพื้นที่(ไร่)	21	31-May	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	2.2 ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมแปลงฟื้นฟูเหมืองหินปูน ย้อนหลัง 3 ปี	แล้วเสร็จ	100%	31-Aug	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
3. งานทำแนวป้องกันไฟฟ้า	3.1 ทำแนวป้องกันไฟฟ้าขอบแปลงฟื้นฟูเหมืองหินปูนแ่งกคอย 1	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	3.2 ทำแนวป้องกันไฟฟ้า, ใส่ปุ๋ยพรวนดิน, บำรุงรักษาดินไม้ เหมืองหินแ่งกคอย 2	แล้วเสร็จ	100%	31-Mar	สุโสมาลัย อธิคม	P A													
4. งานเรือนเพาะชำ	4.1 เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้	จำนวน (ชนิดพันธุ์)	30	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	4.2 เครื่องกล้าไม้ปลูกฟื้นฟู (เหมืองหินปูน 2,479 ต้น, เหมืองปากอโคท 2,680 ต้น และเหมืองหินดินดาน 250 ต้น)	จำนวน (ต้น)	5,500	30-Jun	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
5. งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ	5.1 เทคอนกรีตพื้นทางเดินเข้าห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	5.2 เทคอนกรีตปรับระดับพื้นทางเดินในเรือนเพาะชำ	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	5.3 ปรับปรุงร่องระบายน้ำหน้าห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	5.4 ปรับปรุง Model แบบจำลองการเตรียมดิน	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	5.5 ปรับปรุงแปลงตัวอย่างพืชคลุมดิน	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	5.6 ปรับปรุงตัวอาคาร และข้อมูลบอร์ดองค์ความรู้	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	5.7 ทำบ่อ-ลานย่อยไม้สำหรับดินอินทรีย์	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													ยกเลิก project
	5.8 เปลี่ยนสแลนกันแดดหลังคาเรือนเพาะชำ	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
6.โครงการระบบรดน้ำต้นไม้ด้วยอัตโนมัติในศูนย์เรียนรู้ฯ	6.1 ระบบรดน้ำอัตโนมัติรอบพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
7.อื่นๆ	7.1 ปรับปรุงสวนหย่อมจุดชมวิวมืองหินปูน	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	7.2 ปรับปรุงสวนหย่อมจุดชมวิวมืองหินดินดาน	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A													
	7.3 สำรวติดตามการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์	แล้วเสร็จ	100%	31-Dec	มาโนช, กอบชัย อธิคม, สุโสมาลัย	P A				A	C			A	C			A	C
ผู้จัดทำ ทีมงานฟื้นฟูสภาพเหมือง	ผู้อนุมัติ		วันที่จัดทำ วันที่เริ่มใช้	2 มกราคม 2569 3 มกราคม 2569										แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข					

เอกสารแนบที่ 2.3

สถานะกองทุนฟื้นฟูเมือง

กองทุนฟื้นฟูเหมืองหินปูน + Shale บ่อบน

ประจำปี 2569	ประมาณกองทุนที่ตั้งสำรอง		การนำกองทุนไปใช้		ยอดเงินคงเหลือ
	ปริมาณหินที่ผลิต (ตัน)	เงินกองทุน = ต้น*อัตรา	รายการที่ใช้	จำนวนเงิน	(บาท)
(ยอดยกมา)		100,717,930.61		65,012,793.09	35,705,137.52
ม.ค.	873,169	462,779.58			36,167,917.10
ก.พ.	797,455	422,651.24		426,475.00	36,164,093.34
มี.ค.	852,149	451,638.86		174,252.15	36,441,480.05
เม.ย.	850,881	450,967.00		146,679.77	36,745,767.28
พ.ค.	913,125	483,956.25		81,619.77	37,148,103.76
มิ.ย.	777,841	412,255.73		8,918.98	37,551,440.51
ก.ค.					
ส.ค.					
ก.ย.					
ต.ค.					
พ.ย.					
ธ.ค.					
รวมในปี	5,064,620	2,684,248.66		65,850,738.76	37,551,440.51

เอกสารแนบที่ 2.4

รายงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

๕ มกราคม ๒๕๖๕

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพมหานคร

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แ่งคอย) จำกัด

ตามที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แ่งคอย) จำกัด ได้รับประทานบัตรแร่หินปูนและดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ประทานบัตรที่ ๓๒๔๔๔/๑๕๕๔๑ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ ๓๒๔๓๙/๑๕๕๓๓, ๑๔๐๘๓/๑๕๕๓๘, ๑๔๐๘๔/๑๕๕๓๙, ๑๔๐๘๕/๑๕๕๔๐, ๑๔๐๘๗/๑๕๕๔๒, ๓๒๔๔๓/๑๕๕๔๓, ๓๒๔๔๐/๑๕๕๔๔, ๓๒๔๓๖/๑๕๕๔๕ และ ๓๒๔๔๕/๑๕๕๔๖) ที่อยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแ่งคอย จังหวัดสระบุรี และตามเงื่อนไขที่กำหนดใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ (Post Evaluation) จะต้องดำเนินการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ และส่งให้กับกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังความละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ สำหรับ ประทานบัตรแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ดังกล่าว ประจำปี ๒๕๖๘ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แ่งคอย) จำกัด แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ ฉบับดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ แนบ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม)

ผู้รับมอบอำนาจ



รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ประทานบัตรที่ ๓๒๔๔๔/๑๕๕๔๑, ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอ
ประทานบัตรที่ ๓๒๔๓๕/๑๕๕๓๗, ๑๔๐๘๓/๑๕๕๓๘, ๑๔๐๘๔/๑๕๕๓๕, ๑๔๐๘๕/๑๕๕๔๐ และ
๑๔๐๘๗/๑๕๕๔๒, ๓๒๔๔๓/๑๕๕๔๓, ๓๒๔๔๐/๑๕๕๔๔, ๓๒๔๓๖/๑๕๕๔๕, ๓๒๔๔๕/๑๕๕๔๖
(คำขอประทานบัตรที่ ๑๘/๒๕๔๒ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๑๔-๑๗/
๒๕๔๒ และ ๑๕-๒๓/๒๕๔๒)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประจำปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ประทานบัตรที่ ๓๒๔๔๔/๑๕๕๔๑, ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอ
ประทานบัตรที่ ๓๒๔๓๘/๑๕๕๓๗, ๑๔๐๘๓/๑๕๕๓๘, ๑๔๐๘๔/๑๕๕๓๙, ๑๔๐๘๕/๑๕๕๔๐ และ
๑๔๐๘๖/๑๕๕๔๑, ๓๒๔๔๓/๑๕๕๔๓, ๓๒๔๔๐/๑๕๕๔๔, ๓๒๔๓๖/๑๕๕๔๕, ๓๒๔๔๕/๑๕๕๔๖
(คำขอประทานบัตรที่ ๑๘/๒๕๔๒ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๑๔-๑๗/
๒๕๔๒ และ ๑๘-๒๓/๒๕๔๒)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประจำปี ๒๕๖๘

บทนำ

โครงการทำเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แ่งคอย) จำกัด ประธานบัตรที่ ๓๒๔๔๔/๑๕๕๔๑ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประธานบัตรที่ ๓๒๔๓๙/๑๕๕๓๗, ๑๔๐๘๓/๑๕๕๓๘, ๑๔๐๘๔/๑๕๕๓๙, ๑๔๐๘๕/๑๕๕๔๐ และ ๑๔๐๘๖/๑๕๕๔๑, ๓๒๔๔๓/๑๕๕๔๓, ๓๒๔๔๐/๑๕๕๔๔, ๓๒๔๓๖/๑๕๕๔๕, ๓๒๔๔๕/๑๕๕๔๖ (คำขอประธานบัตรที่ ๑๘/๒๕๔๒) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประธานบัตรที่ ๑๔-๑๗/๒๕๔๒ และ ๑๙-๒๓/๒๕๔๒) ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแ่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้รับความเห็นชอบในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ (Post Evaluation) จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมติดังกล่าวกำหนดให้โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี

โครงการจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ประจำปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบและพิจารณาให้ความเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ให้มีความถูกต้องเหมาะสม



พร.๒๓๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้ง.....๑...../วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

หมายเลขประทานบัตร.....ตามเอกสารแนบ.....หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....๑๔-๒๓/๒๕๔๒

ที่ตั้ง ตำบล.....ทับทิม/ท่าคล้อ/บ้านป่า อำเภอ.....แก่งคอย.....จังหวัด.....สระบุรี

ชนิดแร่.....หินปูนและหินดินดาน.....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองหาบ

อายุประทานบัตร... ๒๕ ปี เริ่มตั้งแต่... ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ วันสิ้นอายุ... ๒๖ กันยายน ๒๕๗๐

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....๒,๕๗๕-๑-๓๗.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. ๓ก, นส.๓ ฯลฯ).....ไร่

☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).....ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๗๕-๑-๓๗.....ไร่

☐ อื่น ๆ (ระบุ).....ไร่

๒. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

☒ เปิดการทำเหมือง

☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน. ๑,๕๖๗ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.....๑.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... ๑,๕๓๑ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน..... -แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... -ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม..... ๕๒ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว..... -แห่ง ขนาด..... -ไร่ ลึก..... -เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว..... ๒๕๓-๓-๗๒ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว..... ๒๕๓-๓-๗๒ไร่

๓. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☐ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☒ ปลุกสร้างสวนป่า

☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

๔. ผลการดำเนินการในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....๑.....แห่ง เนื้อที่..... ๕-๐-๐๐ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย)...ปรับถมพื้นที่ทำเหมือง...
ให้มีความลาดชันน้อยกว่า ๔๕ องศา ถมดินปลูกต้นไม้, ปลูกพืชคลุมดินป้องกันการพังทลายหน้าดิน

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....๑.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....๑๕ x ๕๓๔..... เมตร

วิธีดำเนินการปรับพื้นที่เป็นชั้นบันไดให้มีความลาดชันน้อยกว่า ๔๕ องศา แล้วใช้

หน้าดินบนเหมืองปรับถม หน้า 30-50 เซนติเมตร พร้อมดำเนินการปลูกต้นไม้กับพืชคลุมดิน

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนเป็นต้น

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....-..... เมตร

วิธีดำเนินการ

☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....
ไร่

วิธีดำเนินการ.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....๔๕๐,๐๐๐.....บาท

๕. แผนการดำเนินงานในช่วง ๑ ปีข้างหน้า

๕.๑ แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง ๑ ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะ
ดำเนินการใน ๑ ปีข้างหน้า)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....๔.....แห่ง เนื้อที่.....๕-๑-๐๐.....ไร่

วิธีดำเนินการ ปรับพื้นที่สำหรับการฟื้นฟูเหมือง โดยมีความลาดชันน้อยกว่า ๔๕ องศา
ปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการพังทลายของผิวดิน

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บ
กอง เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน
เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ

☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประตานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

๕.๒ การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....๖๐๐,๐๐๐.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่และหรือส่วนราชการอื่นๆ.....

วิธีดำเนินการ

๑.ขอเข้าศึกษาป่าไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ลักษณะของป่าที่สมบูรณ์ การ
ดำเนินกิจกรรมและการจัดการพื้นที่ คนอยู่ร่วมกับป่า

๒.เข้าชมกิจกรรมของกรมอุทยาน เรื่องการฟื้นฟูป่าเพิ่มปริมาณพันธุ์ไม้ในป่า

(ลงชื่อ).....

(..... นายถาวร ศรีวิสัย))

ตำแหน่ง..... Mine Planning Manager.....ผู้จัดทำรายงาน

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(..... นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม))


ตำแหน่ง..... Mining and Circularity Operation Manager – KK.....

แผนแม่บทงานฟื้นฟูพื้นที่หนองหินปูน SCG แก่งคอย

Total Area 1,613 Rai


Legend

- Phase 1 2003-2007 (95 Rai)
- Phase 2 2008-2012 (48 Rai)
- Phase 3 2013-2017 (75 Rai)
- Phase 4 2018-2022 (90 Rai)
- Phase 5 2023-2027 (105 Rai)
- Last Area after 2027 (1,200 Rai)

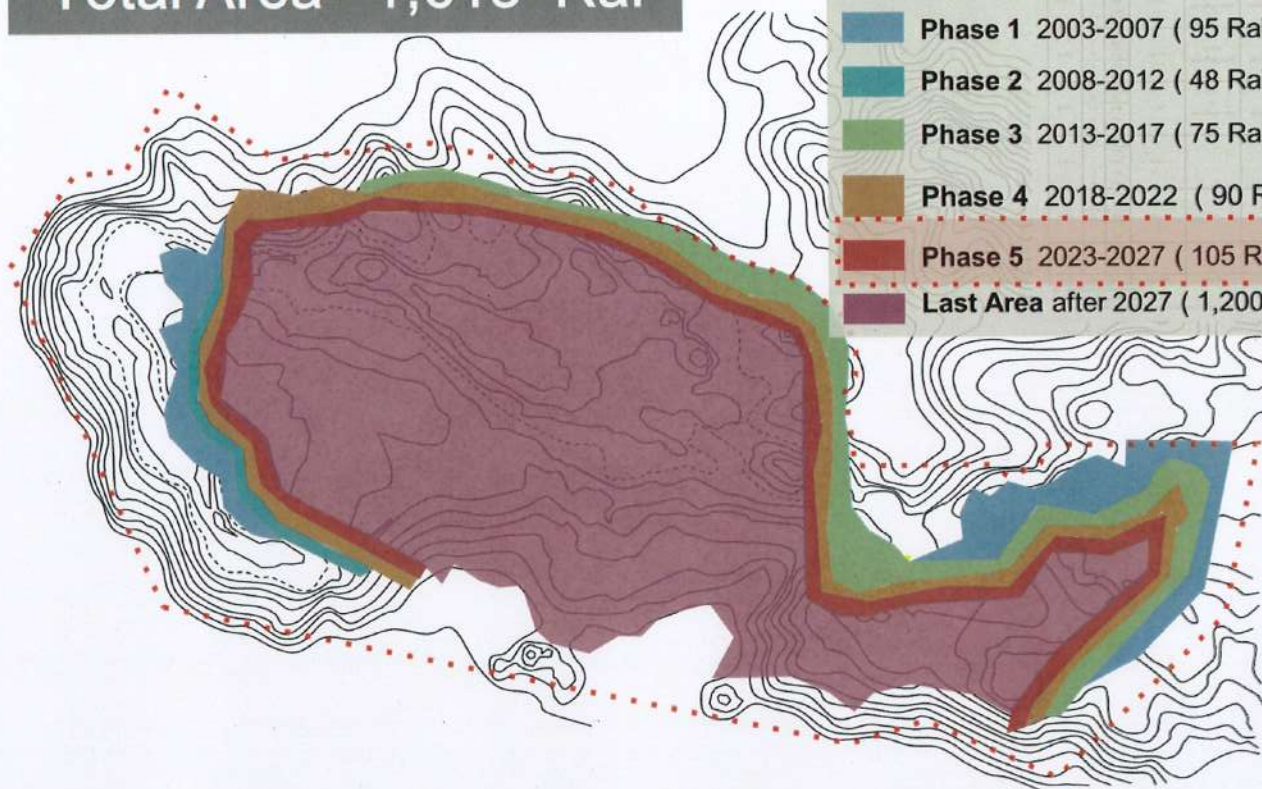


ข้อมูลผลการฟื้นฟูเมืองสะสมถึงปัจจุบัน

Disturbed Area 1613 Rai Result 17.98 % Rehabilitation Area 290 Rai

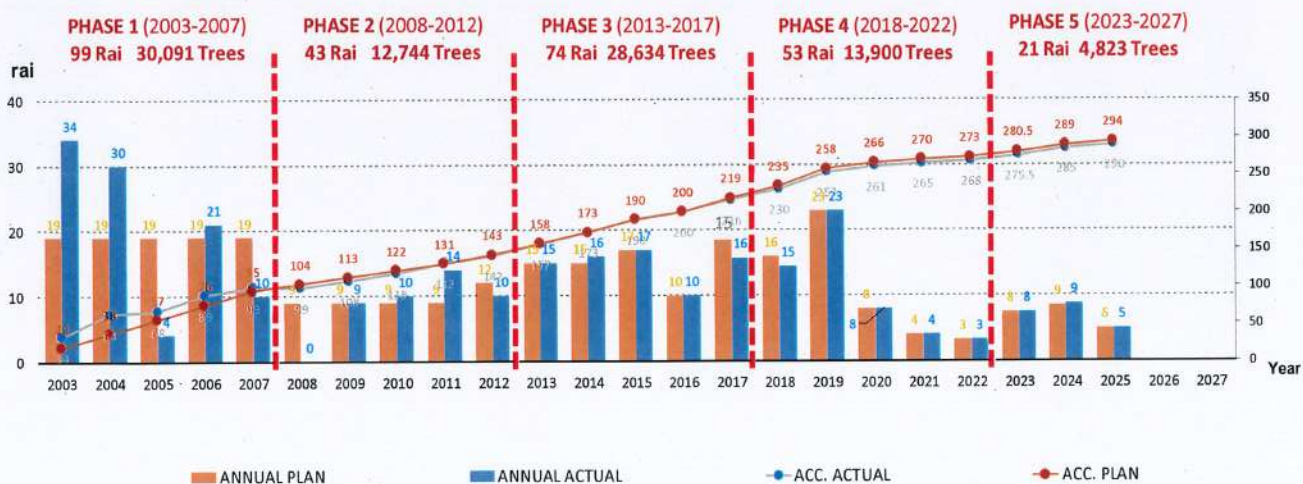

แผนและผลการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่เหมืองสะสมถึงปัจจุบัน

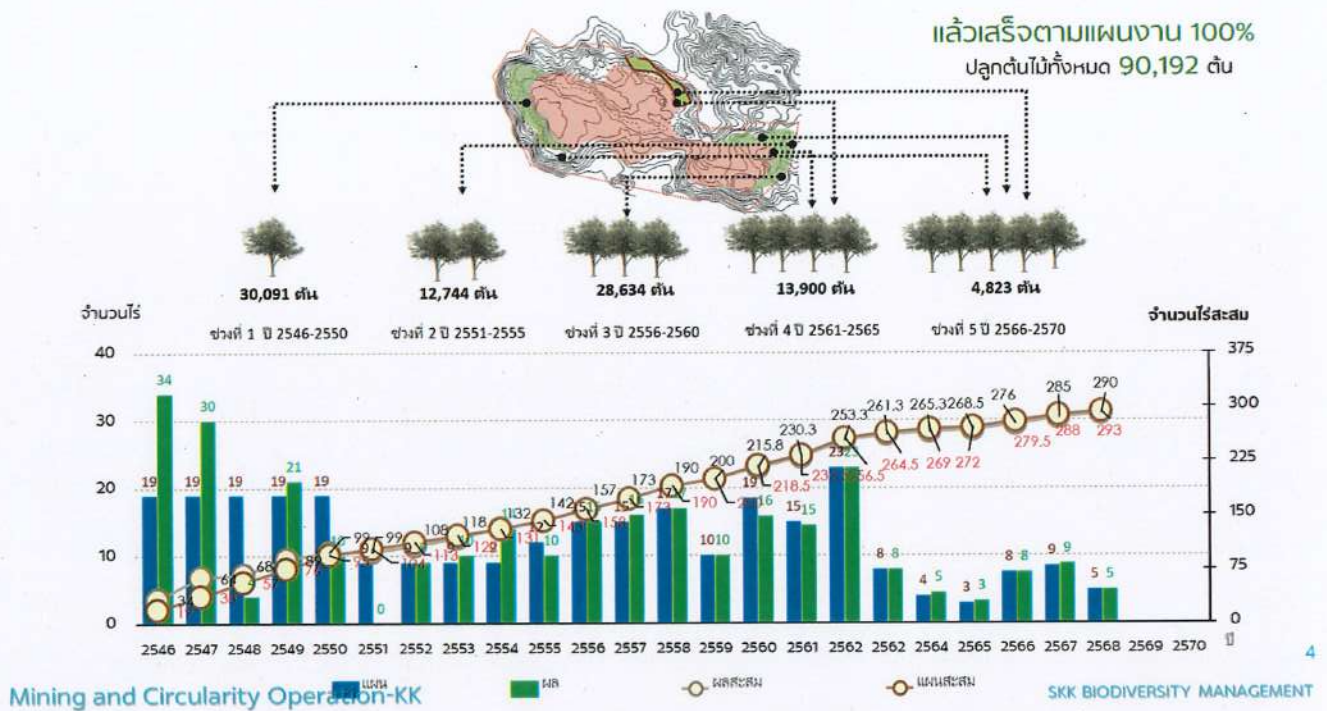


ภาพกิจกรรมงานฟื้นฟูเหมือง



แผนฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2568 จำนวน 5-0-00 ไร่
โดยมีพื้นที่ อยู่ในโซน C



ภาพหน้างานฟื้นฟูโซน C

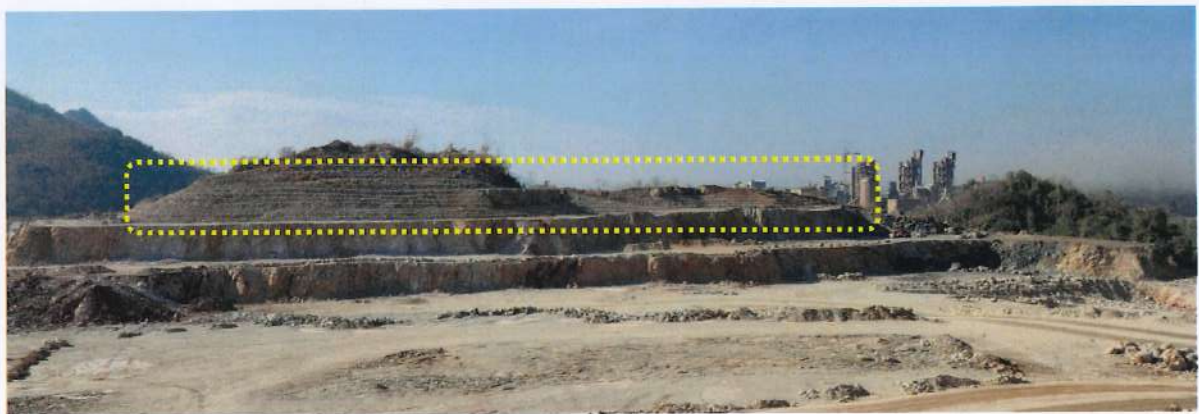

การเตรียมงานฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2568

งานเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้จากแม่ไม้ท้องถิ่นสำหรับเพาะกล้า



งานเพาะและบำรุงรักษากลับไม้พื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2568

แปลงเพาะกล้า



กล้าไม้ที่พร้อมย้ายลงถุง



ย้ายกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ



กล้าไม้พร้อมปลูก สูงมากกว่า 30 cm. ขึ้นไป



งานปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2568

การดำเนินงานปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเหมืองโซน C พื้นที่ 5-0-00 ไร่



รายการต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟู โซน C จำนวน 1,064 ต้น 31 ชนิดพันธุ์					
1	ขี้หนอน	11	ปออีแก้ง	21	โมกมัน
2	ขี้เหล็ก	12	มะกล่ำ	22	ยมหิน
3	แคนา	13	มะกัก	23	ส้มกบ
4	แคนหางค่าง	14	มะเกลือ	24	สะแกนา
5	จามจุรี	15	มะขวิด	25	สะเดา
6	ขงโค	16	มะขาม	26	สัก
7	ถ่านไฟผี้	17	มะขามเทศ	27	สาธร
8	ประดู่	18	มะค่าโมง	28	ลำโรง
9	ปอแก่นเทา	19	มะฝ่อ	29	เสลาดำ
10	ปอขาว	20	มะรุมป่า	30	เลี้ยว
				31	หว่า

งานบำรุงรักษา ทำแนวกันไฟป่าเข้าแปลงฟื้นฟูเมืองหินปูนแก่งคอย ประจำปี 2568

แผนที่แนวกันไฟป่า



แนวกันไฟโซน A



แนวกันไฟโซน B



แนวกันไฟโซน C



คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สํารวจข้อมูลต้นไม้และดินของแปลงฟื้นฟูเมือง
เพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงฟื้นฟูเมืองแก่งคอย 1 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2568



Work Shop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กพร.การจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองและปิดเหมือง

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2568

คู่มือการจัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นที่ ผ่านการทำเหมืองและการปิดเหมือง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร่วมกับ

THE INTERGOVERNMENTAL FORUM ON MINING, MINERALS,
METALS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT



พฤษภาคม 2568

ส่วนที่ 1 – การวางแผนการปิดเหมือง แนวคิด และข้อกำหนดทางกฎหมาย

1. หลักการและแนวคิดด้านการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง
หลักการการปิดเหมือง
การจัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองและการปิดเหมือง และการวางแผนการใช้ที่ดินหลังการทำเหมือง
2. กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
การเห็นชอบแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองและการปิดเหมือง -
แผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองและการปิดเหมืองโดยทั่วไปต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบในกรณีต่อไปนี้
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การประเมินค่าใช้จ่ายในการปิดเหมือง
ข้อกำหนดในการรายงานผล
การคืนประทานบัตร/คืนสิทธิตามประทานบัตร

ส่วนที่ 2 – โครงสร้างและข้อกำหนดของแผนการปิดเหมือง

1. สรุปสาระสำคัญ
2. บทนาและการบริหารจัดการการปิดเหมือง
3. ข้อกำหนดด้านการปิดเหมือง (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชน การใช้ที่ดิน กฎหมาย)
4. วัตถุประสงค์โดยรวมของแผนฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองและการปิดเหมือง
5. ลักษณะโครงการ
6. สภาพแวดล้อมของโครงการ (สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเศรษฐกิจ)
7. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
8. การฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
9. วัตถุประสงค์การปิดเหมืองและเกณฑ์การเสร็จสิ้นตามส่วนประกอบของเหมือง
10. การหยุดการชั่วคราว
11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมและแผนการจัดสรรทรัพยากร
12. การประเมินค่าใช้จ่ายในการปิดเหมือง
13. การติดตามเฝ้าระวังและดูแลรักษาพื้นที่หลังการปิดเหมือง

Work Shop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กพร.การจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองและปิดเหมือง



บำรุงรักษาและเติมน้ำให้สัตว์ป่า ช่วงฤดูแล้ง



ลักษณะบ่อน้ำให้สัตว์ป่า



ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ชมศูนย์เรียนรู้งานฟื้นฟูเหมืองประจำปี 2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568 ให้การต้อนรับคณะ กพร.เข้าศึกษาดูงาน



ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ชมศูนย์เรียนรู้ฐานฟื้นฟูเหมืองประจำปี 2568

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ให้การต้อนรับคณะตรวจรับรอง Green Industry Level 5
ที่ศูนย์เรียนรู้ฐานฟื้นฟูเหมือง



แผนฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2569 จำนวน 9-1-00 ไร่
โดยมีพื้นที่โซน โซน B 5-1-00 ไร่ และโซน C 4-0-00 ไร่



ภาพหน้างานโซน B



ภาพหน้างานโซน C



งานบำรุงรักษาร่องน้ำ EIA
เคลียร์สิ่งปฏิกูลที่ลอยบนผิวน้ำออก ลดการกีดขวางจุดต้นของท่อระบายน้ำ



กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ

ติดตามผลการปลูกต้นไม้ โครงการ"นคราฟ้าร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว"
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี

สรุปรายงานการสำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่า

5 มิถุนายน 2568

ผลการสำรวจพื้นที่ (25 ไร่)

แนวทางดำเนินการต่อไป

✅ Survival rate มากกว่า 95%

❌ ต้นไม้ตายประมาณ 150 ต้น

ชนิดที่ตายมาก: ขางนา, เตยฝรั่งนางแอ, กันเกรา

🌱 ต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว: ชี้เหล็ก, หางนกยูง

หว้า, ตะแบก, มะฮอกกานี, เหลืองปรีดียาธร

🌿 ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 (ต้นละ 1 ช้อนโต๊ะ บริเวณโคนต้น) (รณนก)

🌿 กำจัดเถาวัลย์ที่ขึ้นพันต้นไม้ (รณนก)

🚧 จัดทำป้ายชื่อหลักถาวร สำหรับแขก VVIP (TCMA)

🌻 เปลี่ยนต้นรวงผึ้งของท่าน ผบ.ทอ (TCMA)

🌳 จัดงานปลูกต้นไม้ซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย

กำหนดการ: ต้นเดือนกรกฎาคม 2568 (หรือ รอท่าน ผบ.รณนก ขึ้นชั้น)

📷 ภาพพื้นที่ปลูกป่าปัจจุบัน

ภาพมุมสูงของพื้นที่



ภาพต้นไม้โตเร็ว



ภาพต้นไม้ที่ตายหรือมีปัญหา



สนับสนุนงานปลูกต้นไม้ซ่อมแซม โครงการ"นคราฟ้าร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว"
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 สนับสนุนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้ในการปลูกซ่อมแซม



กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน

ปลูกต้นไม้บริเวณทางแยกด้านขึ้นเหมืองจำนวน 55 ต้น รวม 5 ชนิดพันธุ์ ศรีตรัง , ชมพูพันธุ์ทิพย์ , เหลืองปรีดียาธร , แคแสด , ทองอุไร และหวานแก้วฮามาต้าคลุมดินตลอดแนวปลูก



กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน



ขอเชิญพนักงานและคู่ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม

“ โรงปูนซีเมนต์ไทยสระบุรีรวมใจ ปลุกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ”

❤️ **ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน** ”

Forest for Future



กำหนดการ

10 มิ.ย. 68

KW

พบกันที่ แนวกอง Pet Coke SWCC

เวลา 07:30 น.

1) ตลอดจนแนวกำแพง ฝั่งประตู 4

ริมกองปูนเม็ด

2) แนวกอง Pet Coke SWCC

พื้นที่ปลูกต้นไม้

กำหนดการ

11 มิ.ย. 68

TL

พบกันที่ ลานกองเอนา Station 3

เวลา 07:30 น.

1) Station 3 ฝั่งทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก และทิศใต้

2) แนวคันดินรอบกองดิน Outdoor

พื้นที่ปลูกต้นไม้

กำหนดการ

16 มิ.ย. 68

KK

พบกันที่ ถนนทางเข้าเหมืองเซล

เวลา 07:30 น.

23 มิ.ย. 68

พบกันที่ พื้นที่เก็บตัวอย่าง Biomass (Auto Sampling)

เวลา 07:30 น.

30 มิ.ย. 68

พบกันที่ ริมถนนทางออกหลังโรงงาน (ทางไปตลาดสายหยุด)

เวลา 07:30 น.

1) แนวคันดินพื้นที่เก็บตัวอย่าง Biomass (Auto Sampling)

2) สองข้างทางริมถนนทางออก

หลังโรงงาน (ทางไปตลาดสายหยุด)

3) ถนนทางเข้าเหมืองเซล

พื้นที่ปลูกต้นไม้



กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน



ขอเชิญพนักงานและคู่ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม



“ โรงปูนซิเมนต์ไทยสระบุรีรวมใจ ปลุกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ”

❤️ **ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน** ”

Forest for Future

กำหนดการ
10 มิ.ย. 68

KW

พบกันที่ แนวกอง Pet Coke SWCC
เวลา 07:30 น.



- 1) ตลอดแนวกำแพง ฝั่งประตู 4
ริมกองปูนเม็ด
- 2) แนวกอง Pet Coke SWCC

พื้นที่ปลูกต้นไม้

กำหนดการ
11 มิ.ย. 68

TL

พบกันที่ ลานกองเอนา Station 3
เวลา 07:30 น.



- 1) Station 3 ฝั่งทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก และทิศใต้
- 2) แนวคันดินรอบกองดิน Outdoor

พื้นที่ปลูกต้นไม้

กำหนดการ
16 มิ.ย. 68

KK

พบกันที่ ถนนทางเข้าเมืองเซ
เวลา 07:30 น.

23 มิ.ย. 68

พบกันที่ พื้นที่เก็บตัวอย่าง Biomass (Auto Sampling)
เวลา 07:30 น.

30 มิ.ย. 68

พบกันที่ ริมถนนทางออกหลังโรงงาน (ทางไปตลาดสายหยุด)
เวลา 07:30 น.



- 1) แนวคันดินพื้นที่เก็บตัวอย่าง
Biomass (Auto Sampling)
- 2) สองข้างทางริมถนนทางออก
หลังโรงงาน (ทางไปตลาดสายหยุด)
- 3) ถนนทางเข้าเมืองเซ

พื้นที่ปลูกต้นไม้



กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน



ขอเชิญพนักงานและคู่ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม

“ โรงปูนซีเมนต์ไทยสระบุรีรวมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ”

❤️ ท้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ”

Forest for Future



กำหนดการ

10 มิ.ย. 68

KW

📍 พบกันที่ แนวกอง Pet Coke SWCC

เวลา 07:30 น.



- 1) ตลอดแนวกำแพง ฟังประตู 4 รับกองปูนเม็ด
- 2) แนวกอง Pet Coke SWCC

พื้นที่ปลูกต้นไม้

กำหนดการ

11 มิ.ย. 68

TL

📍 พบกันที่ ลานกองแกลบ Station 3

เวลา 07:30 น.



- 1) Station 3 ฟังทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้
- 2) แนวคันดินรอบกองดิน Outdoor

พื้นที่ปลูกต้นไม้

กำหนดการ

16 มิ.ย. 68

KK

📍 พบกันที่ ถนนทางเข้าเหมืองเซล

เวลา 07:30 น.

23 มิ.ย. 68

📍 พบกันที่ พื้นที่เก็บตัวอย่าง Biomass (Auto Sampling)

เวลา 07:30 น.

30 มิ.ย. 68

📍 พบกันที่ รังนกทางออกหลังโรงงาน (ทางไปตลาดสายหยุด)

เวลา 07:30 น.




- 1) แนวคันดินพื้นที่เก็บตัวอย่าง Biomass (Auto Sampling)
- 2) สองข้างทางริมถนนทางออกหลังโรงงาน (ทางไปตลาดสายหยุด)
- 3) ถนนทางเข้าเหมืองเซล

พื้นที่ปลูกต้นไม้



เอกสารแนบที่ 2.5

แผนผังกำหนดขอบเขตการเดินน้ำเหมืองและทิศ
ทางการเดินน้ำเหมือง

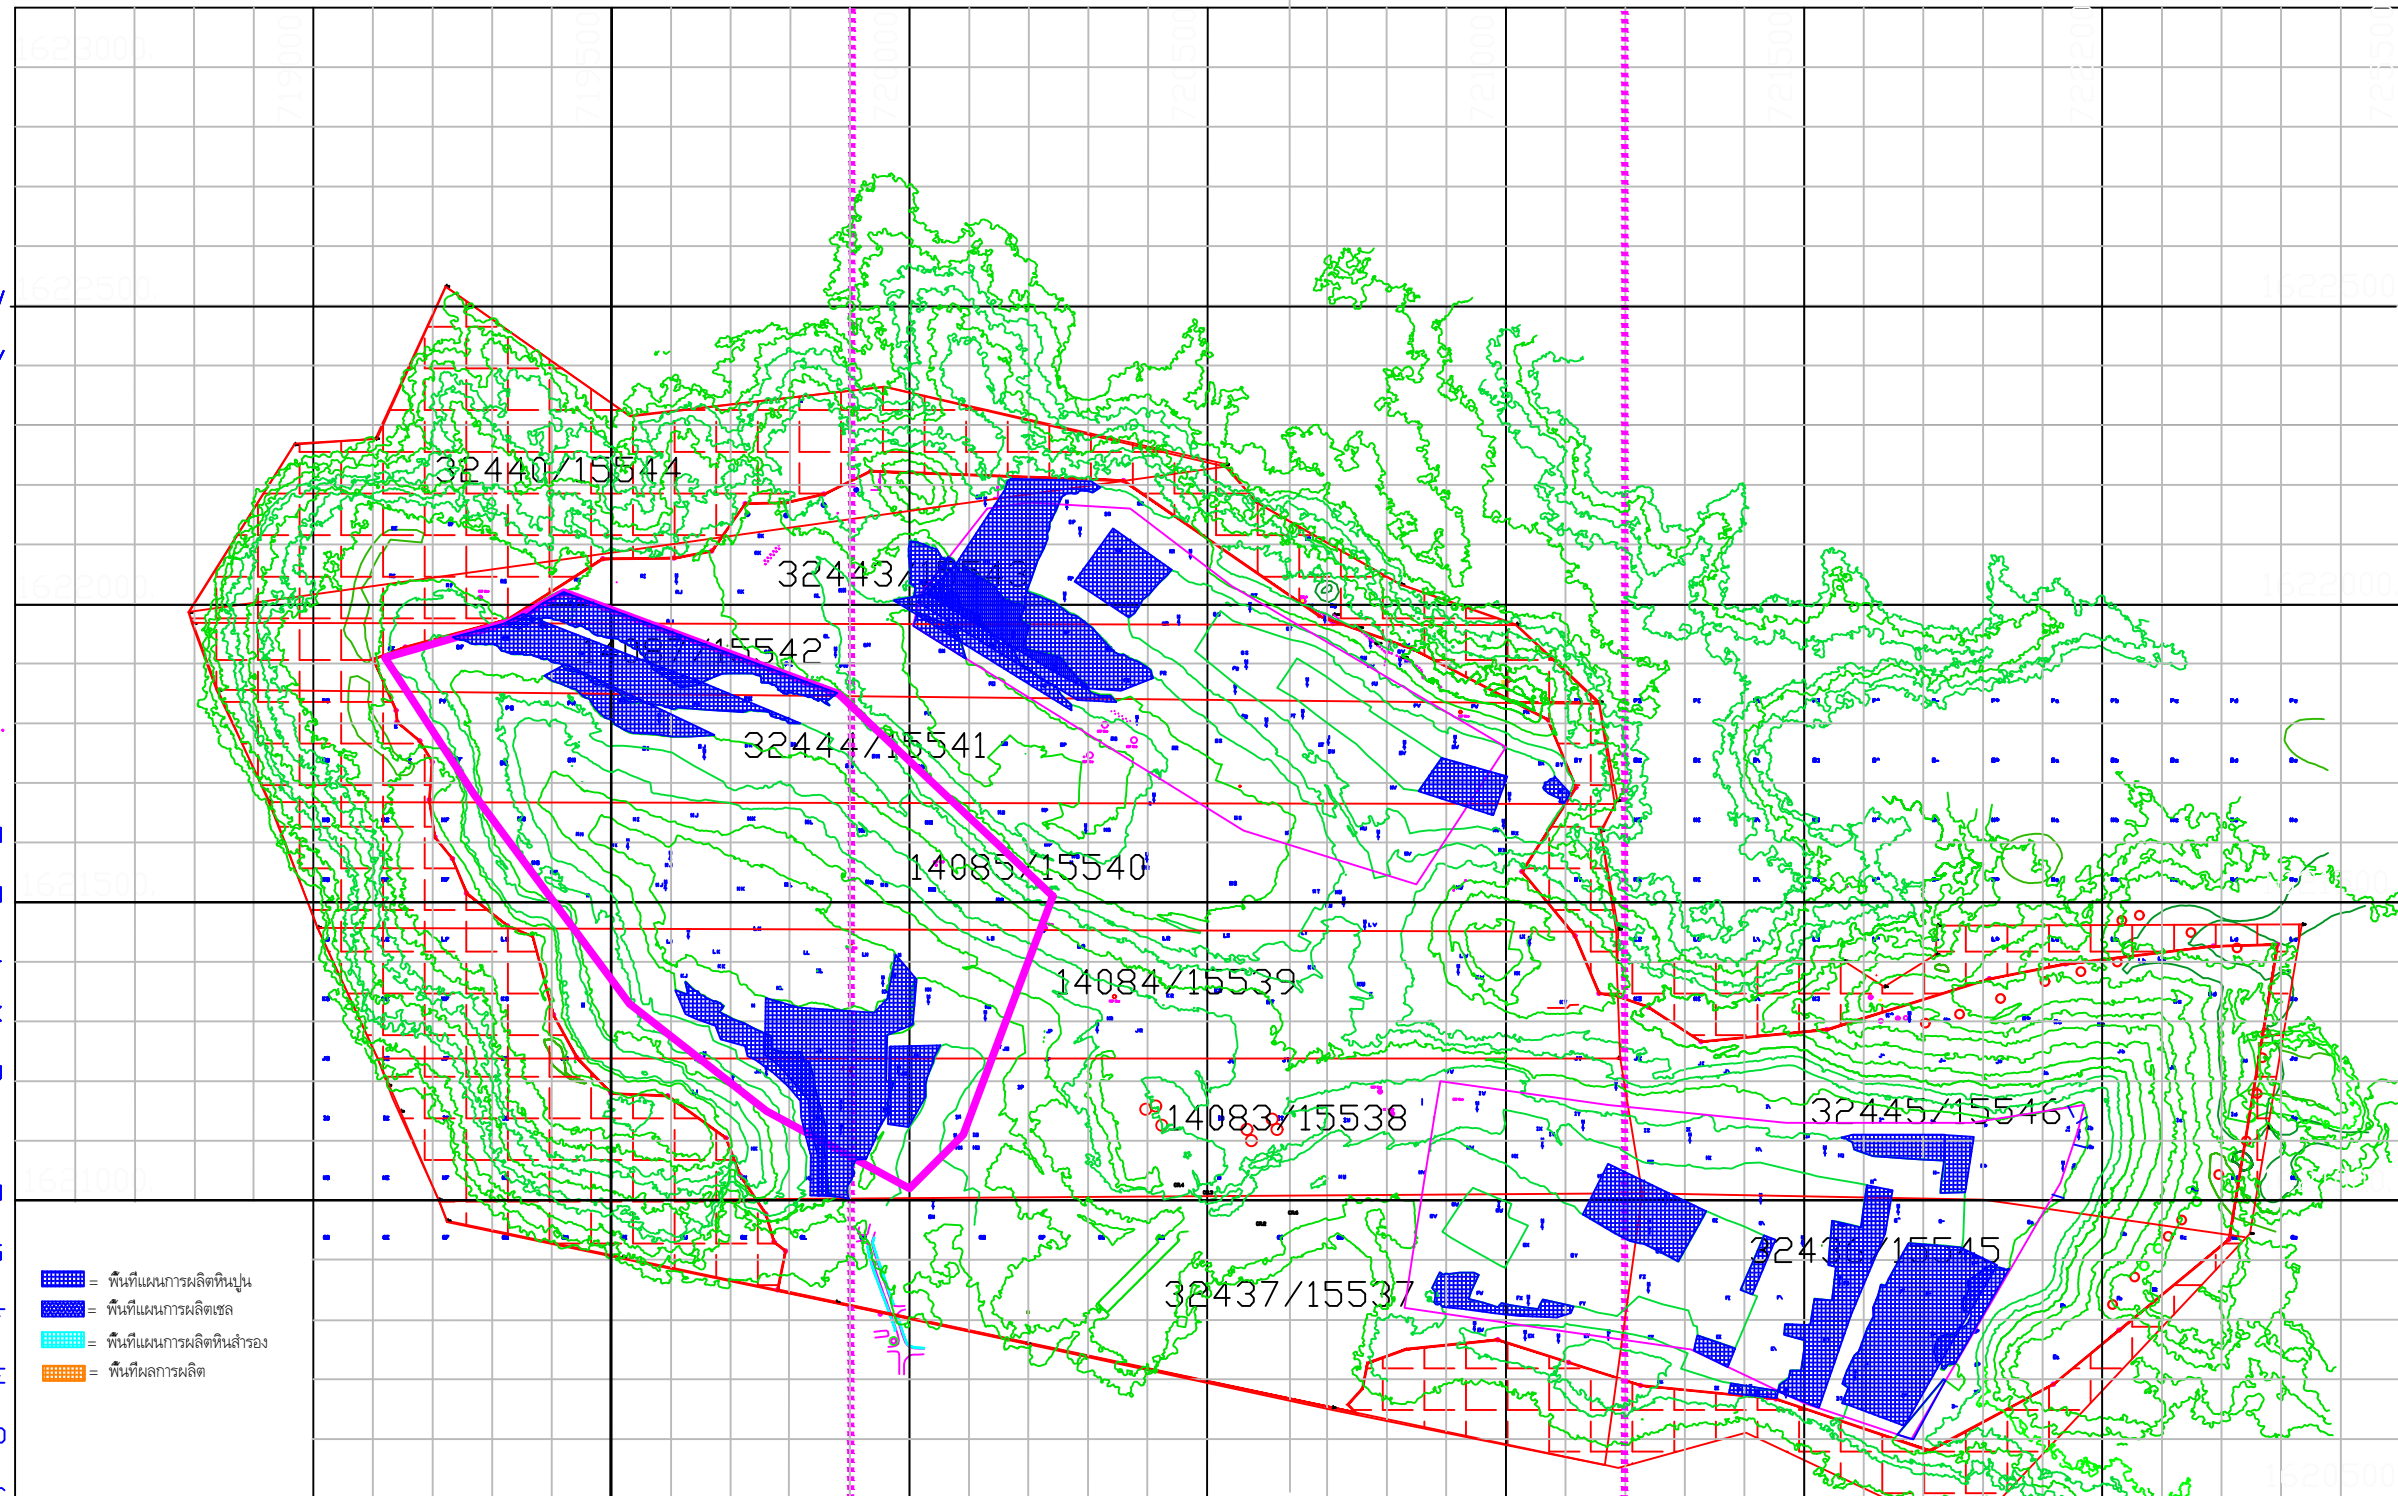

ชั้นอ้างอิง	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
ระดับ +	97	109	121	133	145	157	169	181	193	205	217

ปริมาณแผน - ต้น
% SIO2 = -
% AL2O3 = -
% CaO = -
% MgO = -
% Alkali = -

แปลงที่	แปลงเลขที่	พื้นที่	แปลงที่	แปลงเลขที่	พื้นที่
1	32439/15537	299 - 3 - 40 ไร่	6	14087/15542	170 - 3 - 06 ไร่
2	14083/15538	299 - 1 - 33 ไร่	7	32443/15543	187 - 3 - 49 ไร่
3	14084/15539	290 - 2 - 92 ไร่	8	32440/15544	226 - 3 - 89 ไร่
4	14085/15540	293 - 2 - 11 ไร่	9	32436/15545	259 - 0 - 23 ไร่
5	32444/15541	252 - 1 - 28 ไร่	10	32445/15546	295 - 0 - 66 ไร่

แผนที่แสดงพื้นที่แผนการทำเหมืองเดือน 2568

หินผลิต CR3&4

ปริมาณแผน 8,030,820 ตัน

% SIO2 = -

% AL2O3 = -

% CaO = -

% MgO = -

% Alkali = -

แผนที่แสดงพื้นที่แผนการทำเหมืองเดือน 2568

หินSMC&Admixture CR2,6

ปริมาณแผน 2,512,800 ตัน

% SIO2 = -

% AL2O3 = -

% CaO = -

% MgO = -

% Alkali = -

อีกครึ่งที่ 1 = ชั้นอ้างอิง

ในแผนที่

อีกครึ่งที่ 2 = แกน Y ของ

แผนที่

อีกครึ่งที่ 3 = แกน X ของ

แผนที่

แผนที่แสดงแผนการทำเหมือง ปี 2568

TOPOGRAPHICS MAP ,AS.AT YEAR

MINING METHOD OPEN PIT

ประทานบัตร 10 แปลง รวม 2,575 - 1 - 37 ไร่

SCALE 1:4,000 FILE =

เอกสารแนบที่ 2.6

แผนผังพื้นที่สำหรับผลิตหินปูนภายในเขตประทานบัตร
ประจำปี 2569

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

สัปดาห์ที่ 11 ช่วงวันที่ 1 ถึง 11

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3,4(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-1	P	1			FOK	7	7	14.50	16	29,557	10.95	47.25	1.77	1.06	0.26	2,300	5-ม.ค.
1-1	A	1			FOK					28,540	1.70	52.25	0.84	0.52	0.03	2,300	5-ม.ค.
2-1	P	1			AJN1	7	7	13.50	22	37,838	4.44	49.75	1.75	0.63	0.16	3,200	5-ม.ค.
2-1	A	1			AJN					36,435	4.12	49.13	1.58	0.74	0.07	3,200	5-ม.ค.
3-1	P			1	DEJ	7	7	14.00	23	38,093	2.45	52.28	1.13	0.54	0.06	3,000	5-ม.ค.
3-1	A			1	DEJ					36,630	2.07	52.28	0.52	0.55	0.02	3,000	5-ม.ค.
4-1	P	1			BKK1	7	7	12.00	10	15,288	3.90	50.53	1.10	1.01	0.09	2,000	7-ม.ค.
4-1	A	1			BKJ					4,000	2.86	52.34	0.84	0.51	0.05	2,000	7-ม.ค.
5-1	P		1		GRQ1	6	6	14.00	17	20,686	3.74	46.23	0.81	2.79	0.16	2,200	7-ม.ค.
	A				หน้างานไม่ใส่ระเบิด												
6-1	P		1		JOR	6	6	14.00	22	25,553	19.86	38.07	3.74	1.01	0.52	2,000	7-ม.ค.
	A				หน้างานไม่ใส่ระเบิด												
7-1	P	1			AJM1	7	7	13.50	16	27,518	2.54	51.01	0.97	0.54	0.16	3,200	9-ม.ค.
6-1	A	1			AJM					27,520	4.44	49.75	1.75	0.63	0.16	3,200	9-ม.ค.
8-1	P			1	CGJ1	7	7	14.00	24	39,749	10.09	44.79	3.74	0.71	0.13	2,600	9-ม.ค.
5-1	A			1	CGJ					36,690	10.09	44.79	3.74	0.71	0.13	2,600	9-ม.ค.
9-1	P			1	BGY1	7	7	14.00	16	25,480	5.09	49.45	1.16	0.53	0.06	3,200	9-ม.ค.
7-1	A			1	BGY					29,555	3.64	50.71	0.87	0.54	0.04	3,200	9-ม.ค.
10-1	P			1	BGJ1	7	7	13.00	26	39,749	5.88	49.38	1.91	0.61	0.10		9-ม.ค.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
	P																
	A																
สรุป	P	4	2	3					166	299,510	6.89	48.01	1.91	0.85	0.16	2,349	
	A	4	0	3					0	199,370	4.44	49.74	1.58	0.62	0.07	2,426	
สะสมสัปดาห์ที่ 1										P	299,510	6.89	48.01	1.91	0.85	0.16	
										A	199,370	4.44	49.74	1.58	0.62	0.07	

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-1	P			1	EH1	4	4.8	14.00	29	18,096	0.56	54.36	0.28	0.61	0.03	2,400	5-ม.ค.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
2-1	P	1			BKK1	7	7	12.00	12	16,170	1.43	52.80	0.58	0.50	0.04	3,500	7-ม.ค.
1-1	A	1			BKJ					28,230	1.45	53.41	0.59	0.51	0.02	3,500	7-ม.ค.
3-1	P			1	BGJ1	7	7	13.00	26	14,700	1.57	52.97	0.45	0.68	0.03	1,500	9-ม.ค.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	1	0	2					67	48,966	1.15	53.43	0.43	0.59	0.03	2,493	
	A	1	0	0					0	28,230	1.45	53.41	0.59	0.51	0.02	3,500	
ทำงานเป็นช่วงที่ค่า Al2O3 มากกว่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินผลิตซีเมนต์										P	48,966	1.15	53.43	0.43	0.59	0.03	
										A	28,230	1.45	53.41	0.59	0.51	0.02	
สะสมสัปดาห์ที่ 1										P	48,966	1.15	53.43	0.43	0.59	0.03	
										A	28,230	1.45	53.41	0.59	0.51	0.02	

เปล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
สะสมสัปดาห์ที่ 1										P	-	-	-	-	-	-	
										A	-	-	-	-	-	-	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

1, 2, 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

.....

Manager/Supervisor

Mine Operation

.....

Manager/Supervisor

Mine Processing & Raw Material Preparation

.....

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการย่อยหินผลิต

846,300 ตัน

สต็อกควบคุม

200,000 ตัน

STOCK 31 ธ.ค. 68

281,863 ตัน

แผนการผลิต

851,984 ตัน

แยกเป็นสัดส่วนหินที่การผลิต (A:B:C)

29:28:43

คาดการณ์ STOCK 31 ม.ค. 69

287,547 ตัน

แผนการย่อยหิน SMC&admixture

196,400 ตัน

สต็อกควบคุม

70,000 ตัน

STOCK 31 ธ.ค. 68

65,484 ตัน

แผนการผลิต

242,452 ตัน

คาดการณ์ STOCK 31 ม.ค. 69

111,536 ตัน

Stock 31-ธ.ค. 281,863

คาดการณ์(STOCK หินผลิตซีเมนต์หน้าเหมือง (ตัน))			
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	คงเหลือ
ตัน	จำนวน	ปริมาณการย่อย	
(พ)1			281,863
			281,863
(ค)2		32,200	249,663
		21,580	281,863
(ล)3		18,200	231,463
			253,688
(อ)4		32,200	199,263
		24,840	236,897
(จ)5	105,487	61	32,200
	101,605		22,400
(อ)6			32,200
			27,200
(พ)7	61,526	49	32,200
	4,000		28,600
(พ)8			32,200
			21,800
(ค)9	132,496	82	32,200
	93,765		10,160
(ล)10			32,200
			25,600
(อ)11			32,200
			299,46
รวมการย่อย (ตัน)		P	275,800
		A	186,526

Stock 31-ธ.ค. 65,484

คาดการณ์(STOCK หินSMC&admixtureหน้าเหมือง (ตัน))			
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	คงเหลือ
ตัน	จำนวน	ปริมาณการย่อย	
(พ)1			65,484
			65,484
(ค)2		4,032	61,452
			65,484
(ล)3		6,586	54,866
		17,514	61,520
(อ)4		6,586	48,281
		2,860	49,027
(จ)5	18,096	29	5,309
			4,516
(อ)6			4,032
			4,260
(พ)7	16,170	12	6,586
	28,230		-
(พ)8			1,976
			7,040
(ค)9	14,700	26	3,992
			-
(ล)10			6,586
			12,132
(อ)11			4,032
			17,246
สะสมการย่อย		P	44,406
		A	61,052

คาดการณ์STOCK เชลหน้าเหมือง (ตัน)			Stockวันที่ 31/12/68	75,000
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์ปริมาณการขาย	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู้		
(พ)1	-	-	-	75,000
(ค)2	-	-	-	75,000
(ล)3	-	-	-	75,000
(อ)4			-	75,000
(จ)5			-	75,000
(อ)6			-	75,000
(พ)7			-	75,000
(พ)8			4,462	70,538
(ค)9			-	70,538
(ล)10			-	70,538
(อ)11			-	70,538
สะสมการขาย		P	4,462	
		A	-	

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 สัปดาห์ที่ 2 ช่วงวันที่ 12 ถึง 18

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4 (เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
11-1	P		1		KOQ	6	6	12.00	20	20,592	18.47	39.75	3.75	0.96	0.49	2,000	12-ม.ค.
10-1	A		1		KOQ					15,115	28.58	31.37	5.28	1.01	0.68	2,000	14-ม.ค.
12-1	P			1	EF-	7	7	12.00	20	28,028	2.38	52.55	0.99	0.57	0.04	2,800	12-ม.ค.
9-1	A			1	EF-					38,090	4.14	50.59	1.85	0.65	0.05	2,800	12-ม.ค.
13-1	P	1			BKK2	7	7	12.00	7	10,702	3.90	50.53	1.10	1.01	0.09	2,000	14-ม.ค.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
14-1	P	1			AIM1	7	7	16.50	16	15,288	2.24	53.20	1.05	0.55	0.08	2,800	14-ม.ค.
12-1	A	1			AIM					25,225	2.83	50.41	1.57	0.62	0.09	2,800	16-ม.ค.
15-1	P	1			FOJ	7	7	14.50	16	29,557	10.95	47.25	1.77	1.06	0.26	2,300	14-ม.ค.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
16-1	P		1		FQS1	6	6	13.00	16	17,222	5.77	46.38	1.64	3.12	0.15	2,200	14-ม.ค.
13-1	A		1		FQS					19,250	4.33	46.72	1.35	2.45	0.12	2,200	16-ม.ค.
17-1	P	1			FQH	7	7	9.00	13	14,906	3.49	51.65	0.39	0.55	0.01	2,400	16-ม.ค.
11-1	A		1		HRO					30,420	5.27	49.26	1.67	1.60	0.11	2,600	14-ม.ค.
18-1	P		1		GRR	6	6	14.00	7	8,190	4.07	49.11	0.86	2.28	0.13	2,200	16-ม.ค.
8-1	A		1		GRQ					17,550	13.38	41.13	3.61	2.01	0.49	2,200	12-ม.ค.
19-1	P			1	BGY2	7	7	14.00	16	25,480	5.09	49.45	1.16	0.53	0.06	3,000	16-ม.ค.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
	P																
	A																
สรุป	P	5	7	3					131	169,965	6.83	48.67	1.50	1.06	0.16	2,442	
	A	1	4	1					0	145,650	7.82	46.43	2.27	1.28	0.20	834	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-2										P	469,474	6.87	48.25	1.76	0.93	0.16	
										A	345,020	5.87	48.34	1.87	0.90	0.13	

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
4-1	P	1			BKK2	7	7	12.00	8	10,780	1.43	52.80	0.58	0.50	0.04	3,500	14-ม.ค.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
5-1	P	1			AIM1	7	7	12.00	8	10,780	0.91	53.34	0.47	0.52	0.01	4,000	14-ม.ค.
	A				สภาพไม่ผ่านเกณฑ์												
6-1	P	1			FQH	7	7	13.00	9	13,230	3.49	51.65	0.39	0.55	0.01	4,000	16-ม.ค.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
7-1 3-1	P		1		GRR	6	6	7.00	14	8,190	1.29	53.00	0.44	0.52	0.02	3,500	16-ม.ค.
	A		1		FQS					10,000	1.94	48.57	0.56	2.87	0.08	3,500	16-ม.ค.
2-1	P																
	A			1	EH ⁺					30,195	0.23	54.54	0.12	0.57	0.01	2,200	14-ม.ค.
	P																
	A																
สรุป	P	3	1	0	หน้างานไม่อิสระที่ Al2O3 มากกว่า 6.60 จะตัดเป็นหินชนิดอื่น				39	42,980	1.91	52.62	0.47	0.52	0.02	3779	
	A	0	1	0					0	40,195	0.66	53.05	0.23	1.14	0.03	2623	
1-2						สะสมสัปดาห์ที่ 1-2			P	91,946	1.50	53.05	0.45	0.56	0.03		
								A	68,425	0.98	53.20	0.38	0.88	0.02			

เขิล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6 (เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-1	P		1		HLV	8	8	12.00	18	31,795	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02	2,500	12-ม.ค.
1-1	A		1		HLV					31,795	59.16	8.76	12.14	1.63	1.36	2,500	12-ม.ค.
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	0	1	0					18	31,795	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02	2,500	
	A	0	1	0					0	31,795	59.16	8.76	12.14	1.63	1.36	2,500	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-2										P	31,795	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02	
										A	31,795	59.16	8.76	12.14	1.63	1.36	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

1, 2, 69

ผู้อนุมัติ..... Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing & Raw Material Preparation

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการขุดหินผลิต

846,300 ตัน

สต็อกควบคุม

200,000 ตัน

STOCK 31 ธ.ค. 68

281,863 ตัน

แผนการผลิตแยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

851,984 ตัน

คาดการณ์ STOCK 31 ม.ค. 69

29:28:43 ตัน

แผนการขุดหิน SMC&admixture

196,400

สต็อกควบคุม

70,000

STOCK 31 ธ.ค. 68

65,484

แผนการผลิต

242,452

คาดการณ์ STOCK 31 ม.ค. 69

111,536 Stock ตาม 11-ม.ค. 273,372

คาดการณ์ STOCK หินผลิตซีเมนต์นำเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต ตัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ
(จ)12	48,620	40	32,200	289,792
	55,640		30,040	392,665
(ฉ)13			14,000	275,792
			29,000	376,240
(พ)14	72,769	55	25,200	323,361
	45,535		22,260	417,146
(พฤ)15			23,100	300,261
			23,880	382,664
(ค)16	48,576	36	25,200	323,637
	44,475		21,380	378,403
(ส)17			32,200	291,437
			43,380	361,452
(อา)18			32,200	259,237
			43,796	341,506
สะสมการขุด			P	184,100
			A	213,736

Stock ตาม 11-ม.ค. 64,735

คาดการณ์ STOCK หินSMC&admixtureนำเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต ตัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ
(จ)12			6,586	58,150
			12,734	59,796
(ฉ)13			7,983	50,166
			17,486	56,646
(พ)14	21,560	16	7,284	64,442
	30,195		5,408	52,446
(พฤ)15			3,293	61,149
			-	48,006
(ค)16	21,420	23	9,717	72,852
	10,000		-	44,086
(ส)17			6,586	66,266
			7,408	44,086
(อา)18			8,898	57,369
			-	40,382
สะสมการขุด			P	50,347
			A	35,628

คาดการณ์ STOCK เหล็กนำเหมือง (ตัน) Stock ตาม 11/1/69				
วันที่	ปริมาณการผลิต ตัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ
(จ)12	31,795	18	-	102,333
	31,795		2,433	
(ฉ)13			-	102,333
			8,639	
(พ)14			-	102,333
			2,570	
(พฤ)15			8,924	93,409
(ค)16			-	93,409
(ส)17			-	93,409
(อา)18			-	93,409
สะสมการขุด			P	8,924
			A	13,642

สัปดาห์ที่ ..3....ช่วงวันที่...19.....ถึง.....25.....

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหนือลง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 3,4(เมตร)	วันที่ ตักขนแล้วเสร็จ
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
20-1	P		1		HR01	6	6	15.00	24	31,450	17.08	37.50	4.97	1.76	0.41	2,800	
	A				หน้างานไม่อิสระ												
21-1	P		1		HSO1	6	6	10.00	15	13,104	4.78	49.50	1.52	1.09	0.12	2,600	19-ม.ค.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
22-1	P			1	BGX1	7	7	14.00	10	16,562	1.72	52.40	0.49	0.56	0.02	3,000	19-ม.ค.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
23-1 14-1	P	1			AJM2	7	7	13.50	16	27,518	2.54	51.01	0.97	0.54	0.16	2,800	21-ม.ค.
	A	1			FPH					6,405	1.32	52.87	0.21	0.71	0.02	2,400	19-ม.ค.
24-1 15-1	P		1		GRQ2	6	6	7.00	14	8,190	3.74	46.23	0.81	2.79	0.16	2,200	21-ม.ค.
	A		1		GRQ					13,105	5.48	46.58	1.63	1.9	0.14	2,200	19-ม.ค.
25-1 16-1	P			1	DG-1	7	7	14.00	10	16,562	1.44	53.55	0.67	0.60	0.05	2,800	21-ม.ค.
	A			1	CHJ					20,000	3.57	49.93	1.73	0.57	0.07	2,800	19-ม.ค.
26-1 19-1	P	1			AIM2	7	7	10.00	12	15,288	0.90	53.34	0.47	0.52	0.02	2,800	23-ม.ค.
	A	1			BKK					16,305	2.04	51.66	1.03	0.50	0.02	2,800	21-ม.ค.
27-1 17-1	P			1	DH-	4	4.8	10.00	14	6,490	5.12	50.27	1.80	0.88	0.11	3,000	23-ม.ค.
	A			1	DH^					10,000	1.72	51.99	0.78	0.54	0.01	3,000	21-ม.ค.
28-1 18-1	P			1	BGY3	7	7	14.00	16	25,480	5.09	49.45	1.16	0.53	0.06	3,000	23-ม.ค.
	A			1	BGY					22,675	4.07	49.54	1.71	0.53	0.08	3,000	21-ม.ค.
สรุป	P																
	A																
	P	2	3	4					101	160,644	5.79	48.35	1.73	0.96	0.15	2,334	
	A	2	1	3					0	88,490	3.33	50.10	1.36	0.75	0.06	1,987	
รวม SMC & Admixture						สะสมสัปดาห์ที่ 1-3			P	630,118	6.59	48.27	1.75	0.94	0.16		
						A	433,510	5.35	48.70	1.77	0.87	0.11					

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนแถว	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
8-1	P		1		HSO1	6	6	15.00	12	15,120	2.07	52.28	0.60	1.06	0.08	3,500	19-ม.ค.
	A				หน้างานโบลิสระ												
9-1	P			1	BGX1	7	7	6.00	14	9,555	1.72	52.40	0.49	0.56	0.02	2,000	19-ม.ค.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
10-1	P		1		GRQ2	6	6	14.00	10	11,700	1.29	53.00	0.44	0.52	0.02	3,500	21-ม.ค.
	A		1		GRQ					13,105	1.92	49.25	0.56	2.34	0.07	3,500	19-ม.ค.
11-1	P			1	DG-1	7	7	14.00	10	15,925	1.56	53.76	0.58	0.61	0.05	2,200	21-ม.ค.
	A			1	CHJ					4,905	1.09	53.11	0.52	0.55	0.03	2,200	19-ม.ค.
12-1	P	1			AIM2	7	7	8.00	12	10,780	0.91	53.34	0.47	0.52	0.01	3,500	23-ม.ค.
	A	1			FPH					15,000	1.32	52.87	0.21	0.71	0.02	3,500	19-ม.ค.
13-1	P			1	DH-	4	4.8	14.00	15	9,360	1.56	53.76	0.58	0.61	0.05	2,000	23-ม.ค.
	A			1	DH^					30,260	1.02	52.91	0.38	0.58	0.01		
สรุป	P	0	2	3	หน้างานโบลิสระที่ค่า A2033 มากกว่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินผลิตซิเมนต์				61	72,440	1.55	53.09	0.53	0.67	0.04	2,302	
	A	0	1	2					0	63,270	1.28	52.16	0.39	0.97	0.03	896	
รวม	P									164,386	1.52	53.07	0.49	0.61	0.03		
	A									131,695	1.13	52.70	0.38	0.93	0.03		

ថេរ

Blast ที่		ZONE เหนือ			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A															-	
	P																
	A															-	
	P																
	A															-	
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
						สะสมสัปดาห์ที่ 1-3			P	31,795	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02		
									A	31,795	59.16	8.76	12.14	1.63	1.36		

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.

អ្នកប្រតិបត្តិ :

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing & Raw
Material Preparation

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

Mine Planning Manager

1. 2. 59

แผนการขบฉิน SMC&admixture	196,400
---------------------------	---------

ผลิตภัณฑ์ควบคุม	70,000
-----------------	--------

STOCK 31 日. 68	65,484
----------------	--------

แผนการผลิต	242,452
ต้นทุนการผลิต	114,530

ตลาดหลักทรัพย์ STOCK 31 ม.ค. 69


111,536 Stockยกมา 18-ม.ค. 259,237

คาดการณ์(STOCK) สินค้าผลิตขึ้นบนต้นน้ำหมอง (ต้น)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู		
(จ)19	61,116	49	32,200	288,153
	39,510		23,400	373,730
(ง)20			23,100	265,053
			14,400	356,735
(พ)21	52,270	40	25,200	292,123
	48,980		26,000	345,686
(พค)22			23,100	269,023
			22,300	362,729
(ค)23	47,258	42	32,200	284,081
			30,400	335,005
(ส)24			32,200	251,881
			28,360	307,845
(อา)25			25,200	226,681
			24,940	286,608
สะสมการย่อย		P	193,200	
		A	167,800	

Stockตาม 18-ม.ค. 57,369

[illegible]

คาดการณ์STOCK เซลล์เป้าหมายเมือง (ต้น)		Stockยกมา 18/1/69	93,409.0
วันที่	ปริมาณการมิลัด		คงเหลือ
	ต้น	จำนวน	
(จ)19			93,409
(ฉ)20			93,409
(ค)21			93,409
(ค)22		8,924	84,485
(ค)23		-	84,485
(ค)24		3,483	84,485
(อ)25		-	84,485
สะสมการขอยบ		P	8,924
		A	3,483

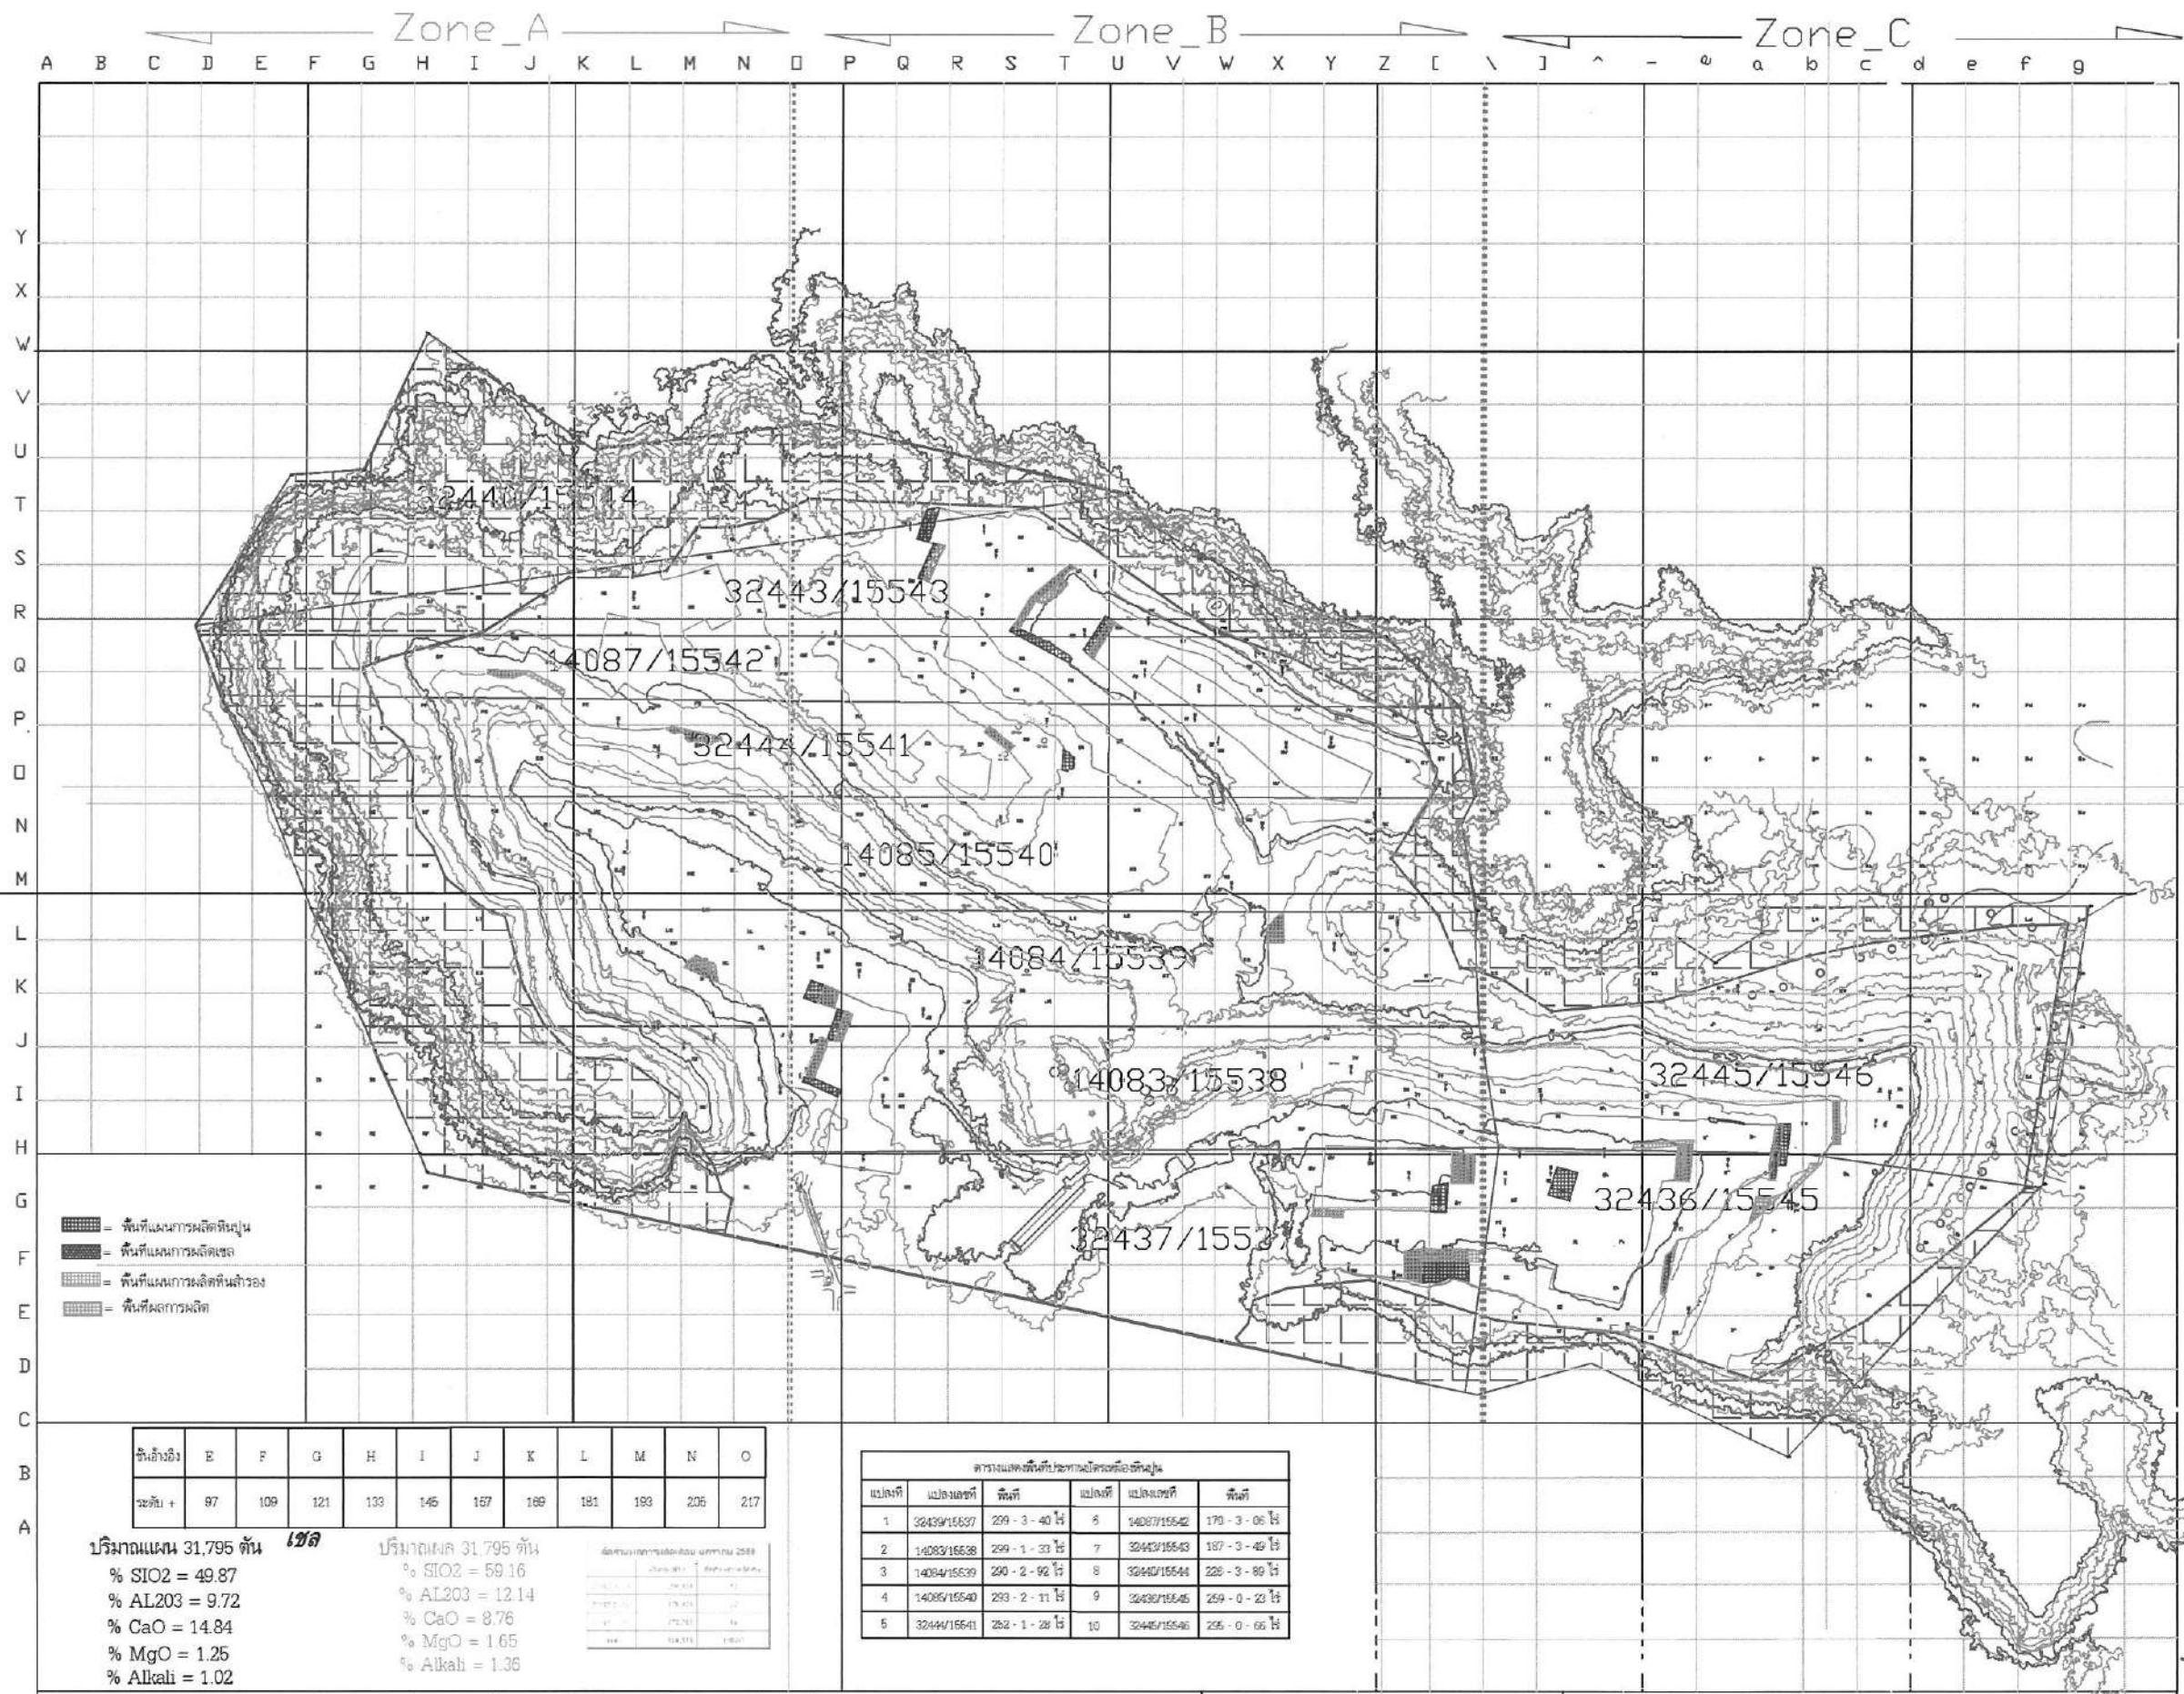

แผนที่แสดงพื้นที่แผน-ผลการทำเหมืองเดือนมกราคม 2569			
ปริมาณแผน 851,984 ตัน	ปริมาณผล 601,795 ตัน	ปริมาณแผน 242,452 ตัน	ปริมาณแผน 176,985 ตัน
% SiO ₂ = 6.50	% SiO ₂ = 6.00	% SiO ₂ = 1.47	% SiO ₂ = 1.73
% AL ₂ O ₃ = 1.82	% AL ₂ O ₃ = 1.92	% AL ₂ O ₃ = 0.47	% AL ₂ O ₃ = 0.43
% CaO = 48.22	% CaO = 48.38	% CaO = 53.11	% CaO = 52.35
% MgO = 0.98	% MgO = 0.89	% MgO = 0.63	% MgO = 0.84
% Alkali = 0.15	% Alkali = 0.12	% Alkali = 0.03	% Alkali = 0.04

แผนที่แสดงพื้นที่แผน-ผลการทำเหมือง เดือนมกราคม 2569

TOPOGRAPHICS MAP ,AS.AT YEAR

MINING METHOD OPEN PIT

ประทานบัตร 10 แปลง รวม 2,575 - 1 - 37 ไร่

SCALE 1:4,000 FILE =

ประจำเดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ. 2569..... สัปดาห์ที่ ..1.....ช่วงวันที่ 1.....ถึง.....8.....

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 3,4 (เมตร)	วันที่ทำการระเบิด
						กว้าง	ยาว	สูง			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
		Burden	Spacing	Hight													
1-2	P		1		GQQ	6	6	13.00	10	10,764	2.51	50.58	0.85	0.76	0.06	3,000	2-ก.พ.
1-2	A		1		GQQ					10,000	6.01	47.35	1.86	0.91	0.14	3,000	2-ก.พ.
2-2	P		1		KQM	6	6	12.00	8	8,986	22.55	36.72	4.37	1.36	0.53	3,500	2-ก.พ.
3-2	A		1		KQM					8,705	12.61	42.35	2.81	0.58	0.36	3,500	2-ก.พ.
3-2	P			1	DH-	7	7	14.00	13	21,403	5.12	50.27	1.81	0.89	0.11	3,500	2-ก.พ.
2-2	A			1	DH-					26,630	4.65	49.55	1.51	0.68	0.06	3,500	2-ก.พ.
4-2	P	1			AIM1	7	7	12.50	8	12,740	2.24	53.20	1.05	0.55	0.08	3,600	4-ก.พ.
5-2	A	1			AIM1					5,480	1.30	52.55	0.74	0.50	0.05	3,600	4-ก.พ.
5-2	P			1	EG ⁺	7	7	13.00	14	21,403	4.15	50.59	1.85	0.65	0.05	3,600	4-ก.พ.
4-2	A			1	EG ⁻					23,445	2.29	51.84	0.85	0.55	0.08	3,600	4-ก.พ.
6-2	P			1	BGX	7	7	14.00	12	19,110	3.64	50.71	0.87	0.54	0.04	3,200	4-ก.พ.
6-2	A			1	BGY					38,795	6.49	48.8	1.6	0.56	0.07	3,200	6-ก.พ.
7-2	P	1			AIM2	7	7	12.00	23	35,162	2.24	53.20	1.05	0.55	0.08	3,600	4-ก.พ.
7-2	A	1			AIM2					33,695	2.90	51.8	1.17	0.51	0.08	3,600	6-ก.พ.
8-2	P		1		JOR	6	6	14.00	21	25,553	19.86	38.07	3.74	1.01	0.52	3,200	6-ก.พ.
	A				หน่วยงานไม่อิสระ												
9-2	P		1		GRR1	6	6	14.00	20	24,336	13.38	44.83	3.61	2.50	0.49	3,000	6-ก.พ.
	A				หน่วยงานไม่อิสระ												
10-2	P			1	BG1	7	7	13.00	24	36,691	4.13	50.46	1.14	0.69	0.06	3,000	6-ก.พ.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
	P																
	A																
สรุป	P	2	4	3					129	216,148	7.35	48.42	1.94	0.93	0.19	2,795	
	A	2	2	3					0	146,750	4.80	49.77	1.42	0.59	0.09	3,429	

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ล้าง	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-2	P		1		GQQ	6	6	12.00	28	30,240	1.38	50.59	0.45	1.66	0.05	4,000	2-ก.พ.
1-2	A		1		GQQ					34,555	1.81	51.66	0.52	0.75	0.07	4,000	2-ก.พ.
2-2	P			1	DH-	7	7	13.00	10	14,700	1.02	52.91	0.37	0.58	0.01	2,200	2-ก.พ.
2-2	A			1	DH-					14,140	1.14	53.11	0.33	0.56	0.04	2,200	2-ก.พ.
3-2	P	1			AIM1	7	7	12.50	10	14,088	1.16	54.10	0.60	0.51	0.05	4,200	4-ก.พ.
3-2	A	1			AIM1					20,000	0.87	53.19	0.46	0.51	0.03	4,200	4-ก.พ.
4-2	P			1	EG ⁺	7	7	13.00	8	11,760	1.51	53.19	0.60	0.60	0.04	2,500	4-ก.พ.
4-2	A			1	EG ⁺					10,000	1.38	52.98	0.54	0.57	0.05	2,500	4-ก.พ.
5-2	P			1	BGX	7	7	14.00	6	9,555	1.72	52.39	0.49	0.56	0.02	2,300	4-ก.พ.
	A																
6-2	P			1	BG1	7	7	13.00	10	14,700	1.57	52.97	0.45	0.68	0.03	2,300	6-ก.พ.
	A																
สรุป	P	1	1	3	ทั้งหมดในส่วนที่ค่า Al2O3 มากกว่า 0.60 จะหักเข้าเป็นหินชนิดอื่นแทน				72	95,043	1.37	52.34	0.48	0.93	0.04	3,132	
	A	1	1	2					0	78,695	1.40	52.48	0.47	0.63	0.05	3,537	
						สะสมสับดานที่ 1			P	95,043	1.37	52.34	0.48	0.93	0.04		
									A	78,695	1.40	52.48	0.47	0.63	0.05		

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
						สะสมสปีดงานที่ 1			P	-	-	-	-	-	-		
									A	-	-	-	-	-	-		

.....1.....1.....1.....

Stock List

Stock ณ 31-ม.ค.  362,257

ตลาดการไฟฟ้ STOCK ดินผลิตซีเมนต์ท่ามะปราง					
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ	
	ต้น	จำนวน	ปริมาณการขาย		
(อา)1			14,000	348,257	
			16,232	342,808	
(จ)2	41,153	31	21,000	368,410	
	45,335		22,000	422,067	
(อ)3			21,000	347,410	
			16,201	373,189	
(พ)4	88,416	57	14,000	421,826	
	28,925		13,531	412,114	
(พอ)5			30,800	391,026	
			18,634	347,707	
(ศ)6	86,580	65	23,800	453,806	
	72,490		12,960	312,878	
(ส)7			30,800	423,006	
			15,498	291,090	
(ลา)8			30,800	392,206	
			13,517	283,093	
		P	186,200		
		A	128,593		
รวมการขาย (ต้น)					

Stockยกมา 31-ม.ค. 47,081

คาดการณ์(STOCK หินSMC&admixtureหน้าเหมือง (ต้น)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู		
(อา)1			7,701	39,380
			6,988	41,991
(จ)2	44,940	28	11,552	72,768
	48,695		13,198	39,888
(อ)3			11,552	61,217
			4,640	69,159
(พ)4	35,403	24	10,436	86,183
	30,000		7,613	72,103
(พอ)5			9,878	76,305
			3,408	109,472
(ศ)6	14,700	10	6,586	84,419
			8,266	106,472
(ส)7			6,586	77,834
			6,091	102,272
(อา)8			6,586	71,248
			5,767	96,172
สะสมการย่อย		P	60,997	
		A	52,563	

คาดการณ์(STOCK) เชลน่านเมือง (ต้น)			Stockman 31/1/69	82,414
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวน	ปริมาณการย่อย	
(อา)1				82,414
(จ)2				82,414
(อ)3				82,414
(พ)4				82,414
(พอ)5				82,414
(ศ)6			4,462	77,952
(ส)7				77,952
(อา)8				77,952
สะสมการย่อย	P A		4,462 -	

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569..... สัปดาห์ที่ ..2....ช่วงวันที่....9.....ถึง.....15.....

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
11-2	P	1			AJM1	7	7	13.50	15	25,799	4.12	49.13	1.57	0.74	0.07	3,600	9-ก.พ.
8-2	A	1			AJN					30,765	8.14	45.21	3.06	1.23	0.17	3,600	9-ก.พ.
12-2	P			1	CGJ	7	7	13.00	24	36,691	10.09	44.79	3.74	0.71	0.13	3,800	9-ก.พ.
9-2	A			1	CGJ					19,045	8.78	48.08	2.46	0.71	0.09	3,800	9-ก.พ.
13-2	P			1	BFW1	7	7	12.00	14	19,110	3.87	50.06	1.56	0.59	0.09	4,000	9-ก.พ.
10-2	A			1	BFW					10,000	3.06	52.04	0.89	0.54	0.06	4,000	9-ก.พ.
14-2	P	1			FPH	7	7	13.00	8	13,250	1.32	52.87	0.21	0.71	0.02	2,400	11-ก.พ.
	A				เป็นหินก่อสร้าง												
15-2	P			1	DG-	7	7	13.00	14	21,403	1.02	52.91	0.37	0.58	0.01	3,800	11-ก.พ.
11-2	A			1	DH-					21,915	3.20	51.48	1.08	0.70	0.05	3,800	11-ก.พ.
16-2	P		1		HSO1	6	6	15.00	10	13,104	15.23	42.52	3.52	1.58	0.41	3,600	11-ก.พ.
	A				รอกแก๊สไฮโดร												
17-2	P		1		GRQ1	6	6	14.00	13	15,725	4.60	48.12	1.38	1.34	0.10	3,000	13-ก.พ.
	A				หน้างานไม่มีอิสระ												
18-2	P			1	BGY1	7	7	14.00	20	31,850	5.09	49.45	1.15	0.53	0.07	3,200	13-ก.พ.
	A				หน้างานไม่มีอิสระ												
19-2	P		1		FQR1	6	6	12.00	12	11,794	4.33	46.72	1.35	2.46	0.12	3,200	13-ก.พ.
	A				หน้างานไม่มีอิสระ												
	P																
	A																
สรุป	P	3	3	7					130	188,725	5.70	48.43	1.79	0.88	0.10	3,694	
	A	1	0	3					0	81,725	6.34	47.93	2.12	0.88	0.11	489	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-2										P	404,873	6.58	48.43	1.87	0.91	0.15	
										A	228,475	5.35	49.11	1.67	0.70	0.10	

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
6-2	P	1			FPH	7	7	13.00	10	14,700	1.32	52.87	0.21	0.71	0.02	4,000	11-ก.พ.
7-2	A	1			FPH					36,180	0.47	54.37	0.14	0.57	0.01	4,000	13-ก.พ.
7-2	P		1		HSO1	6	6	15.00	8	10,080	2.07	52.28	0.60	1.06	0.08	4,000	11-ก.พ.
	A				รอกแก๊สไฮโดร												
8-2	P			1	DG-	7	7	13.00	12	17,640	1.02	52.91	0.37	0.58	0.01	2,500	11-ก.พ.
6-2	A			1	DG-					15,290	0.92	53.82	0.39	0.59	0.02	2,500	11-ก.พ.
9-2	P		1		GRQ1	6	6	14.00	10	10,800	2.17	42.30	0.54	2.04	0.16	3,400	13-ก.พ.
	A				หน้างานไม่มีอิสระ												
10-2	P		1		FQR1	6	6	12.00	8	7,920	2.00	47.94	0.60	3.15	0.08	3,800	13-ก.พ.
	A				หน้างานไม่มีอิสระ												
5-2	P																
	A			1	BFW					11,405	1.61	53.39	0.51	0.55	0.05	2,500	9-ก.พ.
	P																
	A																
สรุป	P	1	3	1	หน้างานเป็นส่วนใหญ่ที่ค่า Al2O3 มากกว่า 0.60 จะหักเข้าเป็นหินชนิดอื่น				40	61,140	1.60	50.28	0.43	1.28	0.06	3435	
	A	1	0	1					0	82,875	0.79	54.06	0.27	0.57	0.02	3363	
รวม					สะสมสัปดาห์ที่ 1-2				P	156,183	1.46	51.53	0.46	1.07	0.05		
						A	141,570	1.13	53.18	0.38	0.61	0.04					

เชล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-2	P		1		HMT	7	7	13.00	17	24,907	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02	2,500	11-ก.พ.
1-2	A		1		HMT					23,330	47.67	16.86	9.25	1.22	1.10	2,500	11-ก.พ.
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	0	1	0					17	24,907	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02	2,500	
	A	0	1	0					0	23,330	47.67	16.86	9.25	1.22	1.1	2,500	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-2										P	24,907	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02	
										A	23,330	47.67	16.86	9.25	1.22	1.10	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

5.3.69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการย่อยหินผลิต

709,800

ตัน

แผนการย่อยหิน SMC&admixture

220,437

สต็อกควบคุม

200,000

ตัน

สต็อกควบคุม

70,000

STOCK 31 ส.ค. 68

362,257

ตัน

STOCK 31 ส.ค. 68

47,081

แผนการผลิต

734,731

ตัน

แผนการผลิต

249,908

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

29:33:38

ตัน

คาดการณ์ STOCK 28 ก.พ. 69

76,552

Stockเก่า 8-ก.ค.

392,206

คาดการณ์(STOCK หินผลิตซีเมนต์หน้าเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
	ตัน	จำนวน		
(จ)9	81,600	53	30,800	443,006
	59,810		17,789	348,194
(ฉ)10			14,000	429,006
			29,838	334,402
(ค)11	47,757	22	23,800	452,963
	21,915		24,668	349,400
(ค)12			30,800	422,163
			25,423	329,283
(ค)13	59,368	45	23,800	457,731
			20,727	307,414
(ค)14			30,800	426,931
			16,610	298,769
(อ)15			30,800	396,131
			23,495	275,558
สะสมการย่อย				
				P 184,800
				A 158,550

Stockเก่า 8-ก.ค.

71,248

คาดการณ์(STOCK หินSMC&admixtureหน้าเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
	ตัน	จำนวน		
(จ)9			6,586	64,663
	11,405		1,518	90,406
(ฉ)10			10,436	54,226
			5,949	88,406
(ค)11	42,420	30	10,436	86,210
	15,290		2,797	79,432
(ค)12			3,293	82,917
			6,189	72,301
(ค)13	18,720	18	6,586	95,052
	36,180		5,715	102,304
(ค)14			6,586	88,466
			8,420	96,544
(อ)15			8,898	79,569
			4,801	93,494
สะสมการย่อย				
				P 52,820
				A 21,254

คาดการณ์(STOCK เชลหน้าเหมือง (ตัน) Stockเก่า 8/1/69				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
	ตัน	จำนวน		
(จ)9				77,952
(ฉ)10				77,952
(ค)11	24,907			102,859
	23,330			
(ค)12			4,462	98,397
(ค)13			4,462	93,934
(ค)14				93,934
(อ)15				93,934

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ พ.ศ.....2569..... สัปดาห์ที่ ..3.....ช่วงวันที่....16.....ถึง.....22.....

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4(เมตร)	วันที่ ดักชน แล้วเสร็จ
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
20-2	P	1			AJN1	7	7	13.50	22	37,838	4.12	49.13	1.57	0.74	0.07	3,600	16-ก.พ.
16-2	A	1			AJN					22,930	3.92	49.86	1.75	0.76	0.07	3,600	20-ก.พ.
21-2	P	1			EOH	7	7	12.00	10	15,288	1.76	53.52	0.80	0.60	0.05	2,400	16-ก.พ.
	A				หน้างานไม่พร้อม												
22-2	P		1		KOQ	6	6	12.00	20	17,971	28.58	31.37	5.28	1.01	0.68	3,200	16-ก.พ.
12-2	A		1		GRQ					9,735	8.86	43.2	2.78	2.14	0.17	3,200	16-ก.พ.
23-2	P	1			AJM2	7	7	13.50	15	25,799	4.12	49.13	1.57	0.74	0.07	3,600	18-ก.พ.
	A				หน้างานไม่พร้อม												
24-2	P			1	BG[2	7	7	13.00	12	17,581	4.13	50.46	1.14	0.69	0.06	3,000	18-ก.พ.
15-2	A			1	BG[					47,585	4.34	50.93	0.98	0.69	0.04	3,000	18-ก.พ.
25-2	P			1	BFW2	7	7	12.00	14	19,874	3.87	50.06	1.56	0.59	0.09	4,000	18-ก.พ.
14-2	A			1	BGY					31,850	2.96	50.37	1.28	0.66	0.06	4,000	16-ก.พ.
26-2	P		1		HRO1	6	6	15.00	22	28,829	5.27	48.26	1.67	1.60	0.11	3,600	20-ก.พ.
	A				รอแก้ไขยอด												
27-2	P			1	DH[	7	7	13.00	12	21,403	4.71	50.57	1.65	0.56	0.10	3,200	20-ก.พ.
13-2	A			1	DHY					33,445	7.75	46.01	2.59	0.60	0.11		16-ก.พ.
	P																
17-2	A			1	DG^					20,000	5.69	48.65	2.05	1.00	0.05	3,000	20-ก.พ.
	P																
	A																
สรุป	P	3	2	3					115	184,583	6.53	48.02	1.85	0.85	0.14	2,898	
	A	1	1	4					0	165,545	5.13	48.95	1.70	0.80	0.07	2,319	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-3										P	589,456	6.56	48.30	1.86	0.89	0.15	
										A	394,020	5.26	49.04	1.69	0.74	0.09	

หินSMC&Admixture

Blast ที่	ZONE เหมือง				สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
	A	B	C	กว้าง Burden		ยาว Spacing	สูง Hight	SiO2			CaO	Al2O3	MgO	Alkali			
11-2	P	1			EOH	7	7	12.00	22	29,645	1.76	53.52	0.55	0.60	0.04	4,000	16-ก.พ.
	A				หน้างานไม่พร้อม												
12-2	P			1	BG[2	7	7	13.00	8	11,760	1.57	52.97	0.45	0.68	0.03	2,500	18-ก.พ.
	9-2	A		1	BG[					10,000	1.90	52.92	0.46	0.69	0.02	2,500	18-ก.พ.
13-2	P			1	DH[	7	7	13.00	6	8,820	2.78	52.94	0.46	0.53	0.06	2,400	20-ก.พ.
	10-2	A		1	DG^					8,665	0.87	53.92	0.36	0.58	0.02	2,400	20-ก.พ.
8-2	P																
	A		1		GQQ					12,165	1.76	48.79	0.52	2.69	0.07	4,000	16-ก.พ.
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	1	0	2	หน้างานในส่วนที่ค่า Al2O3 มากกว่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินผลิติดิบ				36	50,225	1.89	53.29	0.51	0.61	0.04	3,368	
	A	0	1	2					0	30,830	1.56	51.57	0.46	1.45	0.04	3,064	
รวม						สะสมสัปดาห์ที่ 1-3			P	206,408	1.57	51.96	0.47	0.95	0.04		
									A	172,400	1.20	52.89	0.40	0.76	0.04		

เปล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-3										P	24,907	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02	
										A	23,330	47.67	16.86	9.25	1.22	1.10	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

5, 3, 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการย่อยหินผลิต

709,800 ดัน

สต็อกควบคุม

200,000 ดัน

STOCK 31 ธ.ค. 68

362,257 ดัน

แผนการผลิต

734,731 ดัน

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

29:33:38

คาดการณ์ STOCK 28 ก.พ. 69

387,188 ดัน

แผนการย่อยหิน SMC&admixture

220,437

สต็อกควบคุม

70,000

STOCK 31 ธ.ค. 68

47,081

แผนการผลิต

249,908

คาดการณ์ STOCK 28 ก.พ. 69

76,552

Stockยกมา 15-ม.ค. 69

396,131

คาดการณ์(STOCK) หินผลิตซีเมนต์บ้านเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต ดัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
(จ)16	71,097	52	30,800	436,428
	75,030		12,911	334,599
(อ)17			22,400	414,028
			29,443	322,127
(พ)18	63,254	41	16,800	460,482
	47,585		24,576	351,206
(พ)19			30,800	429,682
			23,691	366,290
(ศ)20	50,232	34	22,400	457,514
	42,930		19,814	399,220
(ส)21			30,800	426,714
			22,726	386,061
(อา)22			30,800	395,914
			32,353	369,119
สะสมการย่อย			P	184,800
			A	165,514

Stockยกมา 15-ม.ค. 69

79,569

คาดการณ์(STOCK) หินSMC&admixtureบ้านเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต ดัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
(จ)16	29,645	22	6,586	102,628
	12,165		6,259	86,421
(อ)17			10,436	92,192
			8,001	60,162
(พ)18	11,760	8	10,436	93,516
	10,000		13,934	55,496
(พ)19			3,293	90,223
			10,751	59,664
(ศ)20	8,820	6	6,586	92,457
	8,665		5,120	78,329
(ส)21			6,586	85,872
			7,513	74,170
(อา)22			8,898	76,974
			3,839	74,170
สะสมการย่อย			P	46,234
			A	50,297

คาดการณ์(STOCK) เชลมน้ำเมือง (ตัน) Stockยกมา 15/1/69				
วันที่	ปริมาณการผลิต ดัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
(จ)16				93,934
(อ)17				93,934
(พ)18				93,934
(พ)19			4,462	89,472
(ศ)20			4,462	85,010
(ส)21				85,010
(อา)22				85,010
สะสมการย่อย			P	8,924
			A	-

ประจำเดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ. 2569 สัปดาห์ที่ ..4..... ช่วงวันที่.....23.....ถึง.....28.....

แผนการย่อยหนี้ผลิต
สต็อกควบคุม
STOCK 31 ธ.ค. 68
แผนการผลิต
แยกเป็นสัดส่วนเงินที่การผลิต (A:B:C)
คาดการณ์ STOCK 28 ก.พ. 69

709,800	ตัน
200,000	ตัน
362,257	ตัน
734,731	ตัน
29:33:38	
387.188	ตัน

แผนการปล่อยดิน SMC&admixture	220,437
สดีอกควบคุม	70,000
STOCK 31 ธ.ค. 68	47,081
แผนการผลิต	249,908
คาดการณ์ STOCK 28 ก.พ. 69	76,552

76,552 Stockยกมา 22-ม.ค. 395,914

[illegible]

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
14-2	P	1			FPG	7	7	13.00	10	14,700	1.32	52.87	0.21	0.71	0.02	4,000	23-ก.พ.
	A				หน่วยงานไม่อิสระ												
15-2	P		1		HSO2	6	6	15.00	8	10,080	2.07	52.28	0.60	1.06	0.08	4,000	25-ก.พ.
	A				รณเกาชีงไม่ชด												
16-2	P		1		GRQ2	6	6	13.00	10	10,800	2.17	42.30	0.54	2.04	0.16	3,800	27-ก.พ.
	A				หน่วยงานไม่อิสระ												
17-2	P		1		FQR2	6	6	12.00	8	7,920	2.00	47.94	0.60	3.15	0.08	3,800	27-ก.พ.
	A		1		FQR					10,000	1.94	48.57	0.56	2.45	0.77	3,800	23-ก.พ.
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	1	3	0	หน่วยงานเป็นส่วนที่ 6 Al2O3 มากกว่า 0.50 จะตัดเข้าเป็นหินมดึกซิมมาร์ท				36	43,500	1.83	49.21	0.45	1.57	0.08	3914	
	A	0	1	0					0	10,000	1.94	48.57	0.56	2.45	0.77	3800	
รวม						สะสมสปีดค่าที่ 1-4			P	249,908	1.61	51.48	0.47	1.06	0.05		
									A	182,400	1.24	52.65	0.40	0.85	0.08		

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A															-	
	P																
	A															-	
	P																
	A															-	
สรุป	P	0	0	0				0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
	A	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
						สะสมสัปดาห์ที่ 1-4			P	24,907	49.87	14.84	9.72	1.25	1.02		
									A	23,330	47.67	16.86	9.25	1.22	1.10		

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

ผอ.บัณฑิต Mining Engineer

Mine Planning Manager

5, 3, 69

Manager/Supervisor

Mine Operation


Measures of interest

Manager/Supervisor
Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

คาดการณ์(STOCK) เหลือหน้าเหมือง (ตัน)			Stockยกมา 22/1/69	85,010
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู	ปริมาณการย่อย	
(จ)23				85,010
(อ)24				85,010
(พ)25				85,010
(พ)26			4,462	80,548
			8,459	
(ศ)27				80,548
(ส)28				80,548
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
สะสมการย่อย		P	4,462	
		A	8,459	

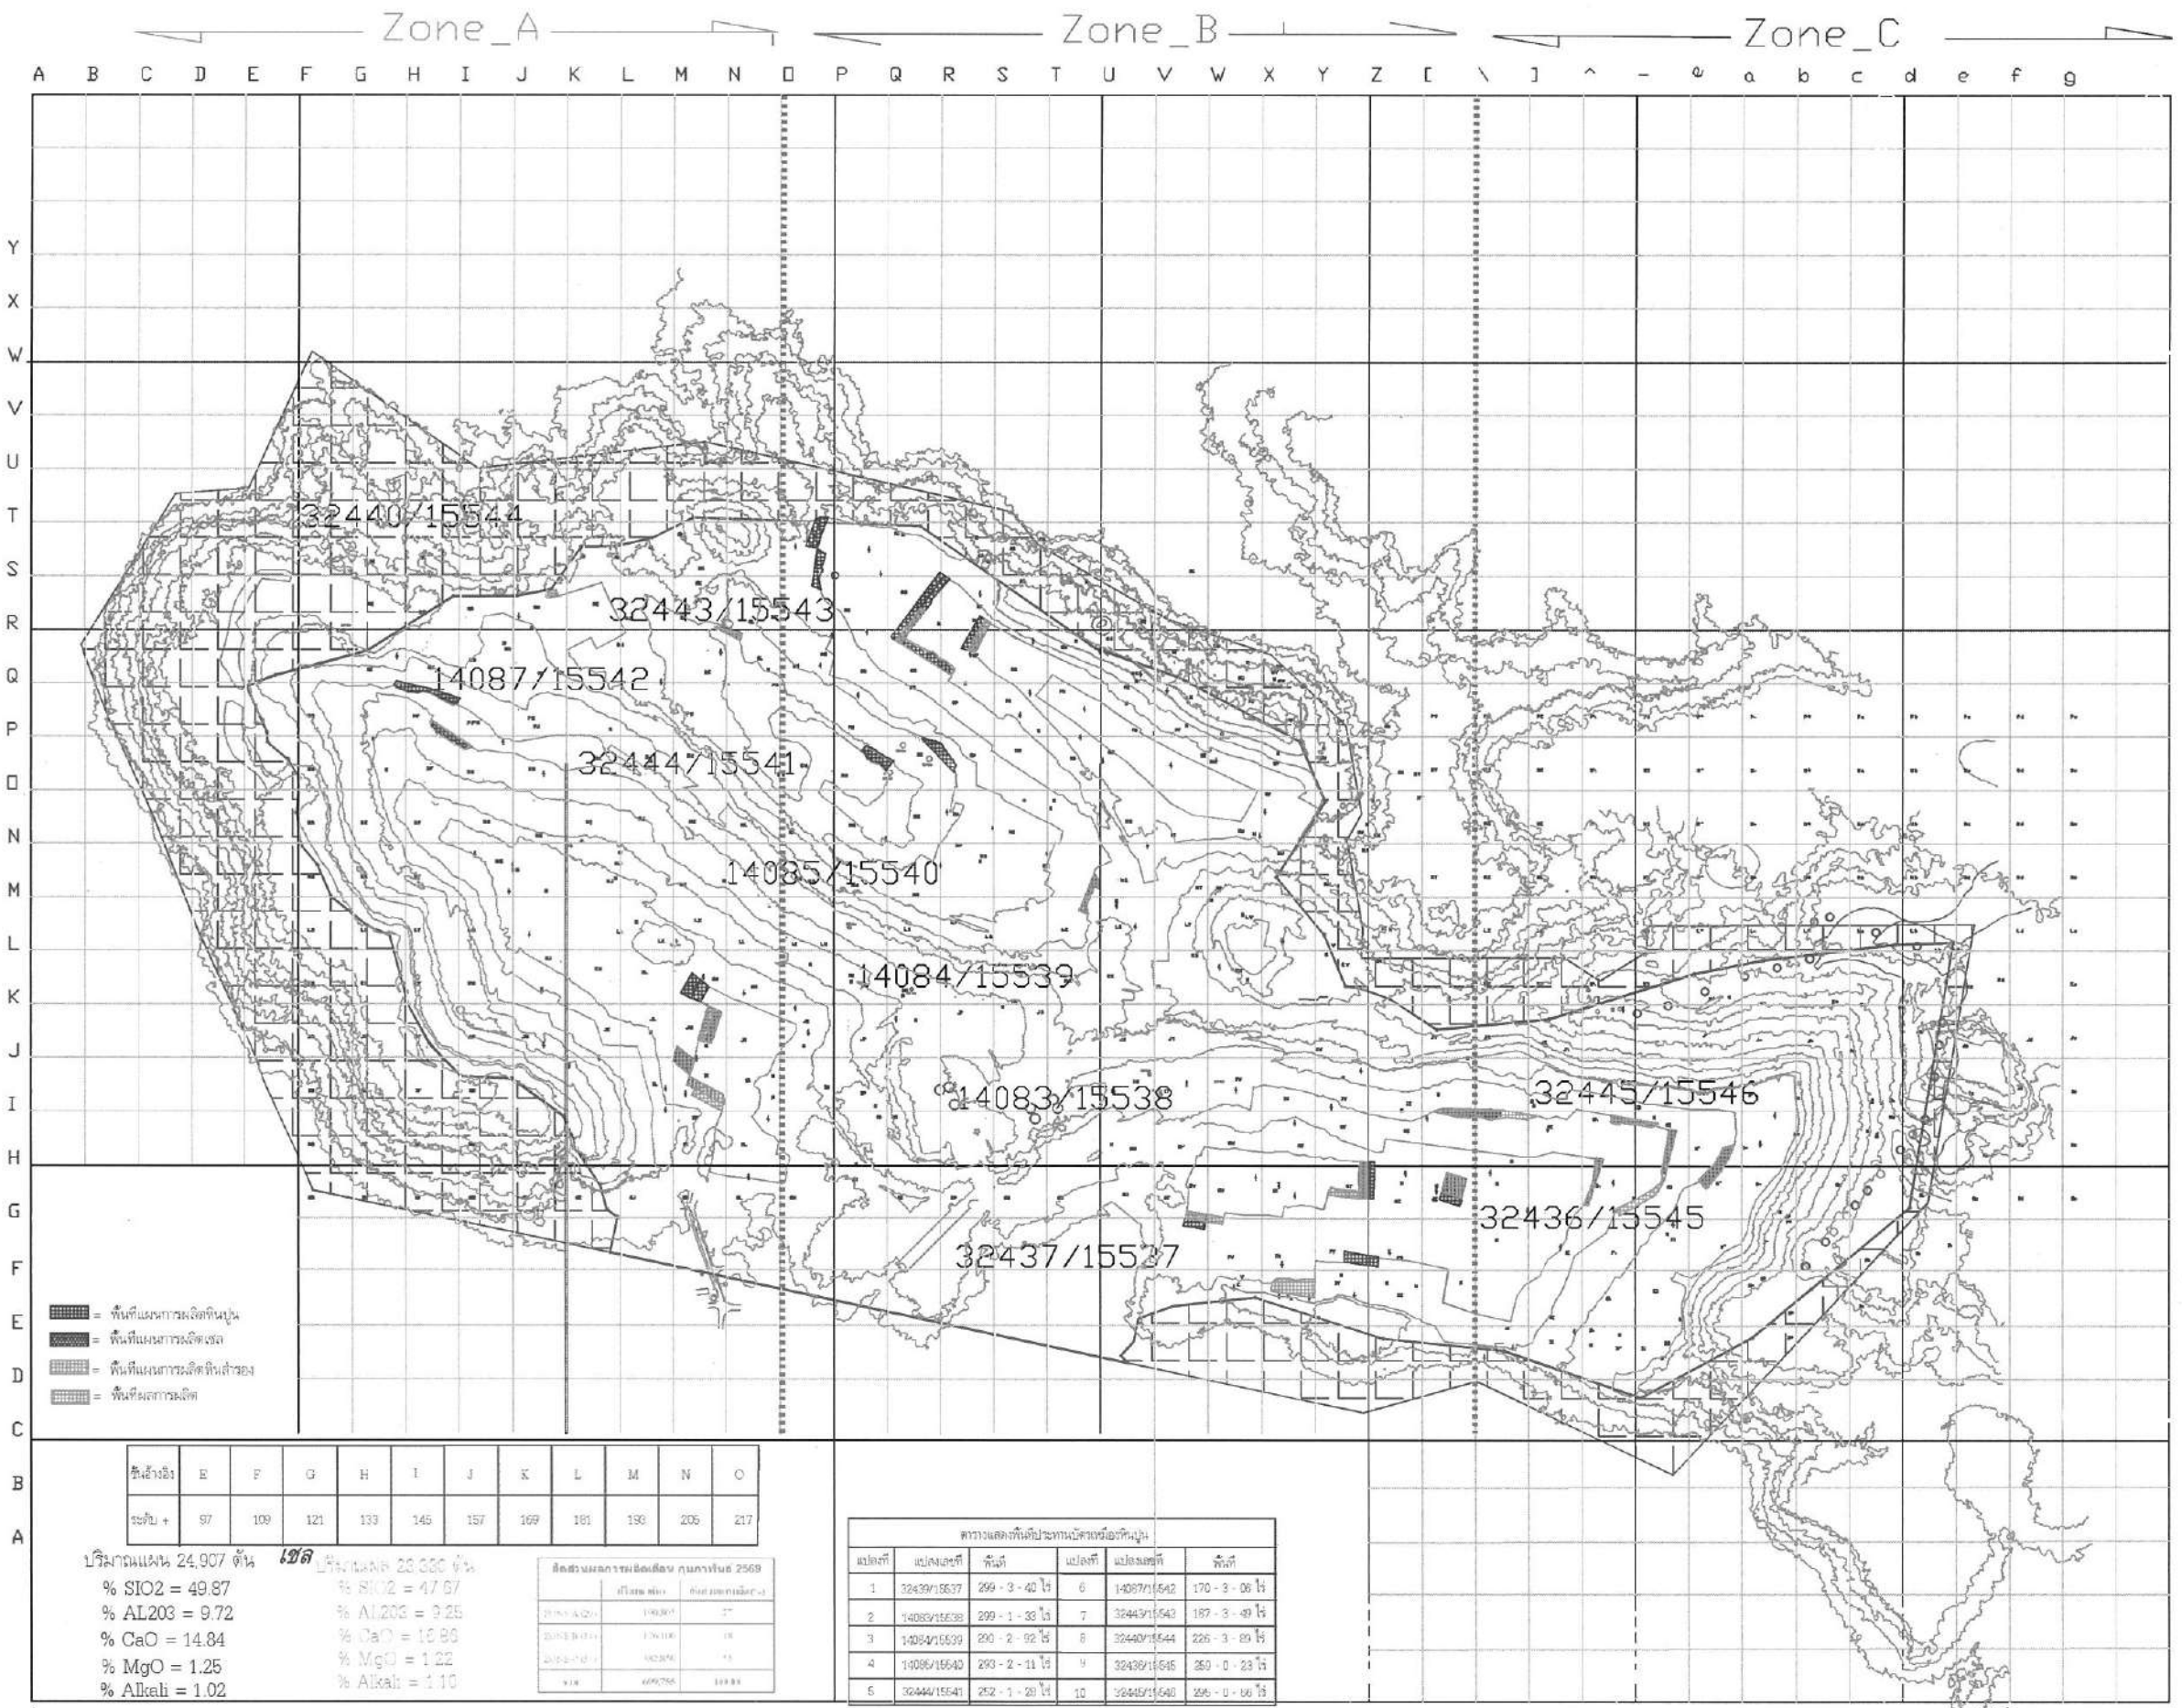

แผนที่แสดงพื้นที่แผน-ผลการทำเหมืองเดือนกุมภาพันธ์ 2569			
หินผลิต		หินSMC&Admixture	
ปริมาณแผน 734,731 ตัน	ปริมาณผล 494,025 ตัน	ปริมาณแผน 249,908 ตัน	ปริมาณแผน 182,400 ตัน
% SiO ₂ = 6.55	% SiO ₂ = 5.18	% SiO ₂ = 1.61	% SiO ₂ = 1.24
% Al ₂ O ₃ = 1.85	% Al ₂ O ₃ = 1.62	% Al ₂ O ₃ = 0.47	% Al ₂ O ₃ = 0.40
% CaO = 48.25	% CaO = 49.00	% CaO = 51.48	% CaO = 52.65
% MgO = 0.96	% MgO = 0.79	% MgO = 1.06	% MgO = 0.85
% Alkali = 0.15	% Alkali = 0.09	% Alkali = 0.05	% Alkali = 0.08

SCALE

แผนที่แสดงแผน-ผลการทำเหมือง เดือนกุมภาพันธ์ 2569			
TOPOGRAPHICS MAP ,AS.AT YEAR			
MINING METHOD		OPEN PIT	
ประทานบัตร	10	แปลง	รวม 2,575 - 1 - 37 ไร่
1:4,000		FILE =	

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569..... สัปดาห์ที่ 1..... ช่วงวันที่ 1..... ถึง 8.....

แผนการย่อยหินผลิต	770,000	ต้น
สัณคความคุม	200,000	ต้น
STOCK 28 ก.พ. 69	314,627	ต้น
แผนการผลิต	781,972	ต้น
แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)	37:26:37	
คาดการณ์ STOCK 31 มี.ค. 69	326,599	ต้น

แบบการผสมดิน SMC&admixture	243,776	ตัน
สัณ้ฉกความคุม	70,000	ตัน
STOCK 28 ก.พ. 69	69,549	ตัน
แบบการผสม	268,460	ตัน
คาดการณ์ STOCK 31 มี.ค. 69	94,233	ตัน
Stockตาม 28-ก.พ.		314,627

คาดการณ์(STOCK) สินค้าผลิตขึ้นตามต้นน้ำเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ตัน	จำนวนรู	ปริมาณการย่อย	
(ฉา)1			30,800	283,827
			30,161	282,330
(จ)2	78,397	51	30,800	331,424
	88,260	-	31,715	380,592
(ฉ)3			16,800	314,624
			1,343	351,741
(ท)4	106,972	63	23,800	397,796
	69,495	-	17,470	448,939
(ทฉ)5			30,800	366,996
			31,631	404,419
(ศ)6	46,852	35	30,800	383,048
	102,140	-	30,594	474,197
(ส)7			30,800	352,248
			30,506	455,052
(ฉา)8			30,800	321,448
			31,311	405,232
รวมการย่อย (ตัน)		P	225,400	
		A	204,731	

Stockmarket 28-nov. 69,549

Blast ที่		ZONE เหลือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-3	P		1		HRO	6	6	15.00	9	11,340	1.95	51.49	0.55	1.53	0.05	3,800	2-มิ.ค.
1-3	A		1		HRO					10,000	1.72	50.64	0.45	1.67	0.05	3,800	2-มิ.ค.
2-3	P			1	CFJ	7	7	13.50	5	7,963	1.31	53.29	0.60	0.57	0.05	2,200	2-มิ.ค.
	A				หน้างานไม่มีสระ												
3-3	P		1		GQQ1	6	6	14.50	11	13,365	2.94	49.41	0.60	2.40	0.07	3,800	4-มิ.ค.
2-3	A		1		GQQ					13,385	2.36	48.73	0.53	2.84	0.08	3,800	4-มิ.ค.
4-3	P		1		GRQ1	6	6	14.50	6	7,290	2.94	49.41	0.60	2.40	0.07	3,800	4-มิ.ค.
3-3	A		1		GRQ					4,540	2.36	48.73	0.53	2.84	0.08	3,800	4-มิ.ค.
5-3	P			1	BGY	7	7	13.00	6	8,820	1.24	53.63	0.48	0.56	0.03	2,500	6-มิ.ค.
4-3	A			1	BGY					9,290	1.79	52.17	0.56	0.57	0.02	2,500	4-มิ.ค.
6-3	P	1			AJN	7	7	11.00	12	14,700	1.37	52.63	0.60	0.52	0.05	4,000	6-มิ.ค.
5-3	A	1			AJN					10,000	1.16	52.61	0.57	0.49	0.02	4,000	6-มิ.ค.
สรุป	P	1	3	1	หน้างานเป็นสระที่ค่า Al2O3 มากกว่า 0.60 จะหักเพิ่มปริมาณหลักจึงรวมที่				49	63,478	1.96	51.60	0.57	1.32	0.05	3,465	
	A	1	3	0					0	47,215	1.86	50.63	0.53	1.65	0.05	3,095	
						สะสมสปาดาที			P	63,478	1.96	51.60	0.57	1.32	0.05		
						1			A	47,215	1.86	50.63	0.53	1.65	0.05		

คาดการณ์(STOCK คำนวณSMC&admixtureหน้าเหมือง (ต้น)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ตัน	จำนวนรู	ปริมาณการย่อย	
(อา)1			6,989	62,560
			8,869	60,949
(จ)2	19,303	14	6,586	75,277
	10,000	-	6,116	60,949
(อ)3			6,586	68,692
			12,740	60,949
(พ)4	20,655	17	12,190	77,156
	27,215	-	11,194	60,949
(พฤ)5			6,586	70,571
			5,593	61,332
(ศ)6	23,520	18	6,586	87,505
	10,000	-	5,804	55,740
(ส)7			8,898	78,607
			6,713	52,840
(อา)8			6,586	72,022
			2,444	43,778
สะสมการย่อย		P A	54,419 53,880	

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A															-	
สรุป	P	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
							สะสมสปีดไลท์ที่ 1	P	-	-	-	-	-	-			
								A	-	-	-	-	-	-			

ราคาการถือ STOCK เชลน้าเหมือง (ต้น)		Stock ณ วันที่ 28/2/69	100,100	
วันที่	ปริมาณการผลิต	ราคาการถือ	คงเหลือ	
	ต้น	จำนวน		ปริมาณการย่อย
(ลา)1			-	100,100
(จ)2	-	-	-	100,100
(ฉ)3			-	100,100
(พ)4	-	-	-	100,100
(พล)5			-	100,100
(ศ)6	-	-	-	100,100
(ล)7			-	100,100
(ลา)8			-	100,100
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
สะสมการย่อย		P A	-	

ผู้จัดทำ.....
Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....
Mining Engineer

Mine Planning Manager

3, 4, 69

		
Manager/Supervisor	Manager/Supervisor	Manager/Supervisor
Mine Operation	Mine Processing	Mine Maintenance

หินทำซีเมนต์

34,233

หินSMC&Admixture

๒๕๓

Blast ที่		ZONE เหนือ			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ สัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P															-	
	A																
	P															-	
	A																
	P															-	
	A																
สรุป	P	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
						สะสมสัปดาห์ที่ 1-2			P	-	-	-	-	-			
									A	-	-	-	-	-			

3, 4, 69

Stockยกมา 8-มี.ค.  72,022

ค่าคงที่ (STOCK) (ส่วนแบ่งต่อหุ้น) (ตัว)	Stockown 8/3/69	100 100
--	-----------------	---------

[illegible]

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน..... มีนาคม.....พ.ศ....2569.....

สัปดาห์ที่ ..3.....ช่วงวันที่....16.....ถึง.....22.....

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4(เมตร)	วันที่ ดักชน แล้วเสร็จ
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
19-3	P	1			AKM1	7	7	12.50	15	23,888	4.44	49.75	1.75	0.63	0.16	3,600	16-มี.ค.
18-3	A	1			AIN					16,850	7.42	46.43	2.55	1.00	0.19	3,600	16-มี.ค.
20-3	P		1		JOP	6	6	13.50	15	17,550	8.17	47.50	1.55	1.24	0.24	3,000	16-มี.ค.
21-3	A		1		JOR					18,390	12.22	42.53	2.37	0.95	0.35	3,000	18-มี.ค.
21-3	P			1	CH^	7	7	13.50	12	19,110	6.57	49.93	1.73	0.57	0.06	3,800	16-มี.ค.
19-3	A			1	BG[					10,000	0.52	53.92	0.19	0.71	0.04	3,800	16-มี.ค.
22-3	P	1			AJM2	7	7	12.50	26	41,405	3.91	49.88	1.72	0.76	0.06	3,600	18-มี.ค.
	A																
23-3	P		1		GQQ2	6	6	14.50	9	11,372	8.86	43.20	2.78	2.14	0.17	3,200	18-มี.ค.
22-3	A		1		INT					13,385	19.59	37.01	3.75	0.78	0.53	3,000	20-มี.ค.
24-3	P		1		FQR	6	6	13.50	10	11,232	4.33	47.72	1.35	2.45	0.12	3,000	18-มี.ค.
23-3	A		1		HSO					20,310	19.51	34.96	5.61	1.73	0.47	3,200	20-มี.ค.
25-3	P	1			IRK2	7	7	12.00	10	15,288	18.93	39.89	3.33	0.85	0.51	2,800	20-มี.ค.
20-3	A	1			IRK					14,600	7.96	46.22	2.46	0.60	0.16	2,800	18-มี.ค.
26-3	P			1	DFJ	7	7	13.80	28	44,690	6.60	49.05	2.07	0.62	0.09	4,000	20-มี.ค.
21-3	A			1	BFW					26,435	22.40	34.48	6.06	1.02	0.46	4,000	18-มี.ค.
	P																
24-3	A			1	BGY					22,000	1.62	52.67	0.48	0.60	0.04	4,000	20-มี.ค.
	P																
25-3	A			1	DHZ					20,700	2.69	51.43	1.17	0.52	0.09	3,600	20-มี.ค.
สรุป	P	3	3	2					97	184,435	6.89	48.07	1.97	0.93	0.15	2,725	
	A	2	3	4					0	162,670	11.15	43.76	2.97	0.90	0.27	3,489	

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
11-3	P			1	CH^	7	7	13.50	10	15,313	1.09	53.11	0.52	0.55	0.03	2,500	16-มี.ค.
10-3	A			1	BG[					14,460	0.52	53.92	0.19	0.71	0.04	2,500	16-มี.ค.
12-3	P		1		GQQ2	6	6	14.50	11	13,365	2.94	49.41	0.60	2.40	0.07	3,800	18-มี.ค.
	A																
13-3	P		1		FQR	6	6	13.50	14	15,750	1.94	48.57	0.56	2.45	0.77	3,800	18-มี.ค.
	A																
11-3	P																
	A				BGY					20,550	1.62	52.67	0.48	0.6	0.04	2,500	20-มี.ค.
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	0	2	1	หน้างานในส่วนที่ 1 Al2O3 มีค่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินลดปริมาณ					35	44,428	1.95	50.39	0.56	1.78	0.30	3,281
	A	0	0	1						0	35,010	1.17	53.19	0.36	0.65	0.04	2,559
						สะสมสปัดวันที่ 1-3			P	193,235	1.84	51.64	0.48	1.15	0.11		
									A	151,700	1.27	52.67	0.39	0.96	0.04		

เปล

Blast ที่	ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
	A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P															
	A															
	P															
	A															
	P															
	A															
	P															
	A															
สรุป	P	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

3 4 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการย่อยหินผลิต

770,000

ตัน

แผนการย่อยหิน SMC&admixture

243,776

สต็อกควบคุม

200,000

ตัน

สต็อกควบคุม

70,000

STOCK 28 ก.พ. 69

314,627

ตัน

STOCK 28 ก.พ. 69

69,549

แผนการผลิต

781,972

ตัน

แผนการผลิต

268,460

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

37:26:37

ตัน

คาดการณ์ STOCK 31 มี.ค. 69

94,233

Stockยกมา 15-มี.ค. 69

362,501

คาดการณ์(STOCK) หินผลิตซีเมนต์ป่าเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ	
(จ)16	60,548	42	16,800	406,249
	26,850	-	17,055	329,828
(อ)17			16,800	389,449
			17,420	316,196
(พ)18	64,009	45	25,200	428,258
	59,425	-	17,200	341,718
(พ)19			16,800	411,458
			10,779	279,636
(ศ)20	59,878	38	25,200	446,136
	76,395	-	5,838	341,993
(ส)21			16,800	429,336
			9,634	335,974
(อา)22			16,800	412,536
			17,110	327,760
สรุป		P	134,400	
		A	95,036	

Stockยกมา 15-มี.ค. 69 97,853

คาดการณ์(STOCK) หินSMC&admixtureหน้าเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ	
(จ)16	15,313	10	6,586	106,579
	14,460	-	8,057	58,382
(อ)17			6,586	99,994
			7,103	49,232
(พ)18	29,115	25	6,586	122,523
	20,550	-	7,999	58,212
(พ)19			6,989	115,534
			10,277	47,794
(ศ)20	-	-	10,282	105,253
			5,923	80,067
(ส)21			10,282	94,971
			11,046	75,567
(อา)22			10,282	84,690
			7,759	66,867
สรุป		P	47,309	
		A	52,241	

คาดการณ์(STOCK) เปลหน้าเหมือง (ตัน) Stockยกมา 15/3/69 91,176				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ	
(จ)16	-	-	-	91,176
(อ)17			8,924	82,252
			5,571	
(พ)18	-	-	4,462	77,790
			2,941	
(พ)19			-	77,790
(ศ)20	-	-	-	77,790
(ส)21			-	77,790
(อา)22			-	77,790
สรุป		P	13,386	
		A	8,512	

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 สัปดาห์ที่ 4 ช่วงวันที่ 23 ถึง 31

หินทำซีเมนต์

Blast ที่	ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4(เมตร)	วันที่ ตักขน แล้วเสร็จ
	A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
27-3	P	1		HSO2	6	6	15.00	10	13,104	15.23	42.52	3.52	1.58	0.41	3,400	23-มี.ค.
	A			หน้างานไม่อิสระ												
28-3	P		1	BGZ2	7	7	13.00	32	46,883	4.32	48.73	1.91	0.66	0.09	3,800	25-มี.ค.
27-3	A		1	BHW					16,810	3.01	51.16	1.01	0.64	0.05	3,800	23-มี.ค.
29-3	P	1		AKM2	7	7	12.50	15	23,888	4.44	49.75	1.75	0.63	0.16	3,600	25-มี.ค.
29-3	A	1		AKM					10,510	1.06	53.21	0.44	0.53	0.05	3,600	25-มี.ค.
30-3	P		1	CGA	7	7	13.50	14	19,110	12.13	46.08	3.67	1.18	0.12	3,800	27-มี.ค.
	A			หน้างานไม่อิสระ												
31-3	P		1	BFW2	7	7	11.00	18	22,932	6.69	48.65	1.82	0.53	0.12	3,800	27-มี.ค.
32-3	A		1	BGZ					18,220	0.57	53.54	0.19	0.68	0.01	38,000	30-มี.ค.
32-3	P	1		GRQ2	6	6	14.50	22	26,770	8.66	46.70	2.41	1.87	0.15	3,400	30-มี.ค.
31-3	A		2	GRQ,GQP					63,530	9.91	43.39	2.31	1.42	0.28	3,400	30-มี.ค.
33-3	P		1	BG[2	7	7	12.00	10	13,377	1.89	52.92	0.81	0.69	0.02	3,800	30-มี.ค.
30-3	A		1	BHX					34,720	6.49	48.8	1.6	0.56	0.07	3,800	27-มี.ค.
	P															
26-3	A	1		AHN					8,425	5.21	48.49	2.14	0.53	0.08	3,800	23-มี.ค.
	P															
28-3	A	1		AJM					20,510	1.00	53.41	0.43	0.49	0.04	3,800	25-มี.ค.
	P															
	A															
	P															
	A															
	P															
	A															
สรุป	P	1	2	4				111	166,063	6.93	48.08	2.20	0.97	0.14	3675	
	A	2	2	3				0	172,725	5.74	48.34	1.47	0.89	0.13	7248	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-4									P	781,972	6.53	48.31	1.92	0.88	0.13	
									A	762,905	7.40	47.06	2.05	0.85	0.16	

หินSMC&Admixture

Blast ที่	ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
	A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
14-3	P	1		HSO2	6	6	15.00	9	11,340	3.44	49.03	0.60	0.93	0.14	3,800	23-มี.ค.
	A			หน้างานไม่อิสระ												
15-3	P	1		DPH	7	7	12.00	32	43,120	1.32	52.87	0.21	0.71	0.02	4,000	25-มี.ค.
13-3	A	1		AKM					10,000	1.00	53.41	0.43	0.49	0.04	3,800	25-มี.ค.
16-3	P		1	GRQ2	6	6	14.50	6	7,290	2.94	49.41	0.60	2.40	0.07	3,600	30-มี.ค.
15-3	A		1	GQP					10,000	2.94	52.20	0.61	1.22	0.27	3,600	30-มี.ค.
17-3	P		1	BG[2	7	7	12.00	10	13,475	1.90	52.92	0.46	0.69	0.02	2,500	30-มี.ค.
14-3	A		1	BHX					40,000	1.24	53.63	0.48	0.56	0.03	2,500	27-มี.ค.
	P															
12-3	A		1	BHW					5,000	1.68	52.78	0.56	0.63	0.02	2,500	23-มี.ค.
	P															
16-3	A		1	BGZ					20,000	0.57	53.54	0.19	0.68	0.01	2,500	30-มี.ค.
สรุป	P	1	2	0	หน้างานในส่วนที่ 1 Al2O3 นานกว่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินชนิดอื่นยกเว้น				57	75,225	1.90	51.96	0.35	0.90	3662	
	A	1	1	2				0	85,000	1.28	53.36	0.43	0.66	0.05	2782	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-4									P	268,460	1.86	51.73	0.44	1.08	0.09	
									A	236,700	1.27	52.92	0.40	0.85	0.05	

เปล

Blast ที่	ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
	A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-1	P	1		IMS	7	7	13.00	16	21,638	45.61	14.21	9.84	1.19	1.18	3,400	23-มี.ค.
1-1	A	1		IQK					10,745	42.65	20.24	10.05	1.75	1.05	4,000	25-มี.ค.
	P															
	A															
	P															
	A															
	P															
	A															
สรุป	P	0	1	0				16	21,638	45.61	14.21	9.84	1.19	1.18	3,400	
	A	1	0	0				0	10,745	42.65	20.24	10.05	1.75	1.05	4,000	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-4									P	21,638	45.61	14.21	9.84	1.19	1.18	
									A	10,745	42.65	20.24	10.05	1.75	1.05	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

3, 1, 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

.....

Manager/Supervisor

Mine Operation

.....

Manager/Supervisor

Mine Processing

.....

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการย่อยหินผลิต

770,000 ตัน

สต็อกความคุม

200,000 ตัน

STOCK 28 ก.พ. 69

314,627 ตัน

แผนการผลิต

781,972 ตัน

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

37:26:37 ตัน

คาดการณ์ STOCK 31 มี.ค. 69

326,599 ตัน

แผนการย่อยหิน SMC&admixture

243,776

สต็อกความคุม

70,000

STOCK 28 ก.พ. 69

69,549

แผนการผลิต

268,460

คาดการณ์ STOCK 31 มี.ค. 69

94,233

Stockยกมา 22-มี.ค. 00

412,536


คาดการณ์(STOCK หินผลิตซีเมนต์นำเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต ตัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
(จ)23	13,104	10	30,800	394,840
	25,235	-	17,986	346,848
(อ)24			14,000	380,840
			10,980	325,010
(พ)25	70,771	47	30,800	420,811
	31,020	-	15,980	344,230
(พ)26			30,800	390,011
			21,500	347,602
(ค)27	42,042	32	30,800	401,253
	34,720	-	14,120	334,931
(ส)28			30,800	370,453
			26,928	318,496
(อ)29			30,800	339,653
			29,141	294,678
(จ)30	40,147	32	30,800	349,000
	81,750	-	26,330	294,678
(อ)31			22,400	326,600
			21,630	324,288
สะสมการย่อย			P	252,000
			A	162,965

Stockยกมา 22-มี.ค. 00

84,690

คาดการณ์(STOCK หินSMC&admixtureนำเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต ตัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
(จ)23	11,340	9	6,586	89,444
	5,000	-	8,551	56,873
(อ)24			6,586	82,858
			5,804	54,750
(พ)25	43,120	32	6,586	119,393
	10,000	-	6,597	59,050
(พ)26			8,898	110,495
			11,041	30,079
(ค)27			6,586	103,910
	40,000	-	10,525	77,602
(ส)28			6,586	97,324
			6,076	74,002
(อ)29			6,969	90,335
			7,678	57,926
(จ)30	20,765	16	6,586	104,515
	30,000	-	5,510	57,926
(อ)31			10,282	94,233
			6,055	20,848
			-	
สะสมการย่อย			P	59,096
			A	57,312

คาดการณ์(STOCK เปลนำเหมือง (ตัน) Stockยกมา 22/3/69				
วันที่	ปริมาณการผลิต ตัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
(จ)23	-	-	-	77,790
	-	-	-	-
(อ)24			8,924	68,865
			5,191	-
(พ)25			-	68,865</

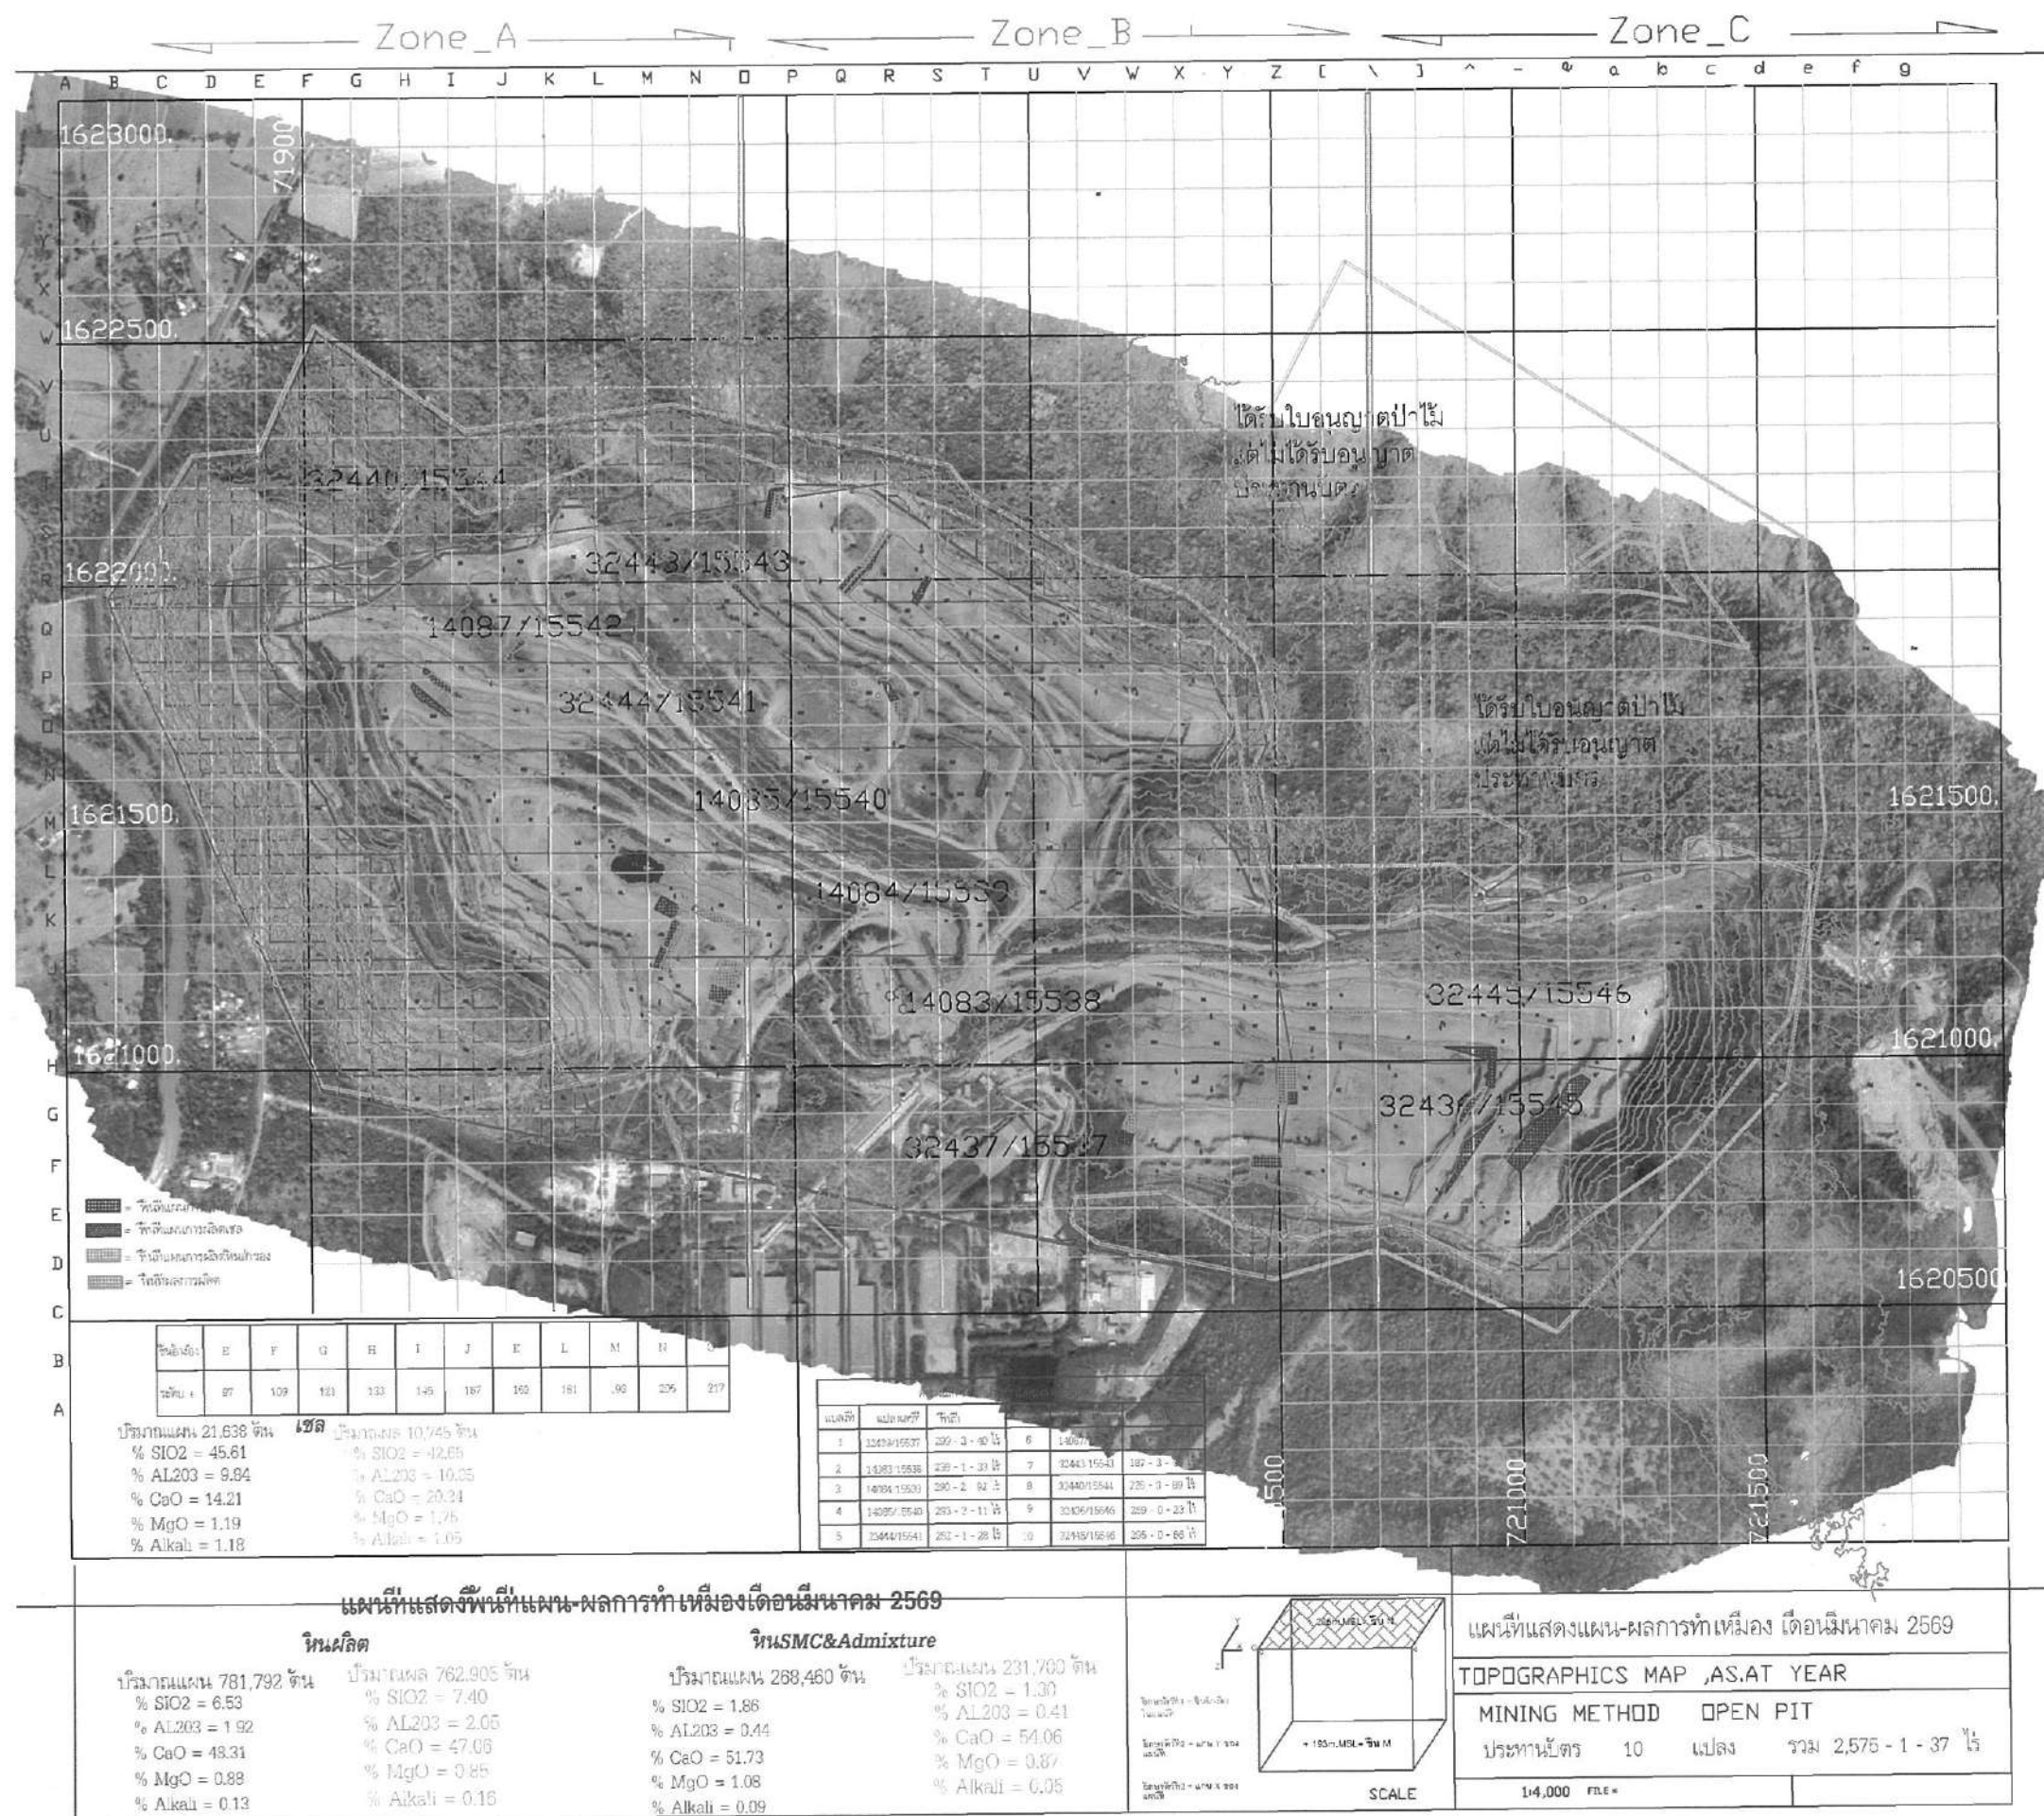

สัปดาห์ที่ ..1.....ช่วงวันที่....1.....ถึง.....5....

ต้น

ต้น

ค้น

ต้น

ส่วน

324,288

20,848

สะสมลำดับที่ 1

คาดการณ์(Stock สินค้าSMC&admixtureหน้าเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู	ปริมาณการขย้อ	
(ท)1	23,765	16	6,586	38,027
	10,000		7,131	52,577
(พท)2			6,989	31,039
			7,387	56,713
(ศ)3	9,555	14	6,586	34,008
	8,000		3,307	49,327
(ล)4			6,586	27,422
			5,776	45,020
(ฉา)5			8,898	18,525
			8,303	39,244
สะสมการขย้อม		P A	26,746 23,601	

๑

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
						สะสมลำดับที่ 1			P	-	-	-	-	-	-		
									A	-	-	-	-	-	-		

Mine Planning Staff

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

Mine Maintenance

[illegible]

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2569..... สัปดาห์ที่ ..2.....ช่วงวันที่.....6.....ถึง.....12.....

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
9-4	P	1			IRK	6	6	15.50	21	28,501	16.92	40.45	3.33	0.85	0.50	2,800	8-เม.ย.
	A				อยู่ระหว่างการเจาะ												
10-4	P	1			EPH	7	7	12.00	4	6,115	1.97	53.13	0.38	0.54	0.03	2,600	8-เม.ย.
9-4	A	1			EPH					15,000	1.97	53.13	0.38	0.54	0.03	2,600	10-เม.ย.
11-4	P			1	BGZ2	7	7	13.50	14	21,403	2.78	53.54	0.74	0.55	0.05	3,600	8-เม.ย.
6-4	A			1	BGZ					20,515	1.21	52.67	0.3	0.64	0.02	3,600	8-เม.ย.
12-4	P			1	CGA	7	7	13.50	22	33,634	12.14	42.69	3.67	1.18	0.12	3,600	8-เม.ย.
7-4	A			1	CGA					27,520	2.63	50.74	1.15	0.63	0.06	3,600	8-เม.ย.
13-4	P	1			AJM	7	7	12.50	20	31,850	1.20	53.20	0.58	0.49	0.04	3,600	10-เม.ย.
10-4	A	1			AJM					25,160	1.20	53.2	0.58	0.49	0.04	3,600	10-เม.ย.
14-4	P	1			AKN1	7	7	14.00	14	24,079	3.01	50.94	1.45	0.57	0.16	3,600	10-เม.ย.
8-4	A	1			AKN					26,370	1.45	52.18	0.75	0.48	0.04	3,600	8-เม.ย.
15-4	P		1		GQQ	6	6	15.00	10	12,636	7.01	47.35	1.85	0.91	0.14	3,400	10-เม.ย.
	A				หน่วยงานในอิสระ												
16-4	P			1	BFY	7	7	13.50	14	22,295	3.41	51.07	0.92	0.57	0.05	3,800	10-เม.ย.
11-4	A			1	BFY					20,000	2.78	51.63	0.74	0.55	0.05	3,800	10-เม.ย.
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	7	1	6					119	180,513	6.85	48.29	1.85	0.73	0.15	4,025	
	A	3	0	3					0	134,565	1.86	52.18	0.69	0.55	0.04	1,254	
										สะสมสัปดาห์ที่ 1-2	P	391,516	6.45	48.49	1.78	0.75	0.15
										A	268,605	5.07	49.21	1.41	0.63	0.10	

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
4-4	P	1			EPH	7	7	12.00	20	26,950	1.97	53.13	0.38	0.54	0.03	4,200	8-เม.ย.
5-4	A	1			EPH					42,930	1.97	53.13	0.38	0.54	0.03	4,200	10-เม.ย.
5-4	P			1	BGZ2	7	7	13.50	10	15,313	0.57	53.54	0.19	0.68	0.01	2,500	8-เม.ย.
3-4	A			1	BGZ					20,000	1.21	52.67	0.30	0.64	0.02	2,500	8-เม.ย.
6-4	P	1			AJM	7	7	12.50	8	11,270	1.20	53.20	0.58	0.49	0.04	3,800	10-เม.ย.
6-4	A	1			AJM					10,000	1.20	53.2	0.58	0.49	0.04	3,800	10-เม.ย.
7-4	P	1			AKN	7	7	14.00	6	9,188	1.00	53.56	0.55	0.46	0.04	3,800	10-เม.ย.
4-4	A	1			AKN					8,665	1.25	53.02	0.62	0.49	0.04	3,800	8-เม.ย.
8-4	P		1		GQQ	6	6	15.00	8	10,080	1.81	51.66	0.52	0.75	0.07	3,400	10-เม.ย.
	A				หน่วยงานในอิสระ												
9-4	P			1	BFY	7	7	13.50	8	12,250	0.91	53.30	0.31	0.61	0.03	2,500	10-เม.ย.
7-4	A			1	BFY					15,800	0.91	53.3	0.31	0.61	0.03	2,500	10-เม.ย.
	P																
	A																
สรุป	P	3	1	2					44	85,050	1.34	53.11	0.40	0.58	0.03	3458	
	A	3	0	1					0	97,395	1.18	53.06	0.39	0.56	0.03	3498	
										หน่วยงานในส่วนที่ค่า A1203 มาค่า 0.60 จะคิดเข้าเป็นหินผลิตซีเมนต์							
										สะสมสัปดาห์ที่ 1-2	P	118,370	1.25	53.17	0.39	0.59	0.03
										A							

เขบล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
										สะสมสัปดาห์ที่ 1-2	P						
										A							

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

5 5 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการย่อยหินผลิต

817,600

ตัน

แผนการย่อยหิน SMC&admixture

189,600

สต็อกความคุม

200,000

ตัน

สต็อกความคุม

70,000

STOCK 31 มี.ค. 69

324,288

ตัน

STOCK 31 มี.ค. 69

20,848

แผนการผลิต

825,999

ตัน

แผนการผลิต

289,158

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

35:23:42

ตัน

คาดการณ์ STOCK 30 เม.ย. 69

120,406 Stockยกมา 5-เม.ย.

389,691

คาดการณ์(STOCK) หินผลิตซีเมนต์บ้านเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ	
	ตัน	จำนวนรู		
(จ)6			15,400	374,291
			20,376	322,625
(ง)7			30,800	343,491
			21,839	308,142
(พ)8	89,653	61	23,800	409,344
	74,405		20,277	398,050
(พ)9			30,800	378,544
			36,307	383,478
(ศ)10	90,860	58	30,800	438,604
	60,160		26,374	347,889
(ส)11			30,800	407,804
			22,648	347,889
(อา)12			39,200	368,604
			33,879	333,396
สะสมการย่อย			P	201,600
			A	181,700

Stockยกมา 5-เม.ย. 18,525

คาดการณ์(STOCK) หินSMC&admixtureบ้านเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ	
	ตัน	จำนวนรู		
(จ)6			3,293	15,232
			7,080	30,941
(ง)7			6,586	8,646
			7,463	23,862
(พ)8	42,263	30	10,282	40,628
	28,665		-	52,467
(พ)9			-	40,628
			3,747	47,881
(ศ)10	42,788	30	6,586	76,830
	68,730		4,181	48,720
(ส)11			8,898	67,933
			8,147	48,720
(อา)12			6,586	61,347
			8,043	40,573
สะสมการย่อย			P	42,229
			A	26,333

คาดการณ์(STOCK) เซลล์บ้านเมือง (ตัน) Stockยกมา 5/4/69				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ	
	ตัน	จำนวนรู		
(จ)6				100,100
(ง)7				100,100
(พ)8				100,100
			4,879	
(พ)9			8,924	91,176
			-	
(ศ)10				91,176
(ส)11				91,176
(อา)12				91,176
สะสมการย่อย			P	8,924
			A	4,879

ประจำเดือน.....เมษายน พ.ศ.....2569.....

แผนการย่อยหินผลิต

817,600

คัน

แผนการปล่อยดิน SMC&admixture

189,600

สวัสดีครับ

200,000

ต้น

สตั๊อภควบคุม

70,000

STOCK 31 มี.ค. 69

324,288

ดับ

STOCK 31 มี.ค. 69

20,848

แผนการผลิต

825,999

ต้น

แผนการผลิต

289,158

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

35:23:42

คาดการณ์ STOCK 30 เม.ย. 69

120,406

06 Stock market 12-เม.ย. 368,604

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณตัน	คุณภาพ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 3,4(เมตร)	วันที่ ตักขนแล้วเสร็จ
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
17-4	P	1			AKM2	7	7	12.50	10	15,925	3.39	50.50	1.16	0.76	0.12	3,600	17-เม.ย.
12-4	A	1			AKM					31,725	1.28	53.34	0.55	0.52	0.04	3,600	17-เม.ย.
18-4	P		1		JNR	6	6	15.50	10	13,572	14.05	43.53	2.03	0.61	0.23	3,600	17-เม.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
19-4	P		1		GRP1	6	6	15.00	10	13,104	9.54	42.93	1.87	2.09	0.34	3,600	17-เม.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
20-4	P			1	BGZ3	7	7	13.50	14	21,403	2.78	53.54	0.74	0.55	0.05	3,800	17-เม.ย.
13-4	A			1	CH1					36,560	3.31	50.62	0.78	0.53	0.07	3,800	17-เม.ย.
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	1	2	1					44	64,004	6.71	48.49	1.35	0.93	0.16	2,396	
	A	1	0	1					0	68,285	2.37	51.88	0.67	0.53	0.06	3,707	
รวม SMC & Administration						สะสมสัปดาห์ที่ 1-3			P	455,520	6.49	48.49	1.72	0.78	0.15		
						A	336,890	4.52	49.75	1.26	0.61	0.09					

Blast ที่		ZONE เหลือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
10-4	P	1			AKM2	7	7	12.50	6	8,453	1.25	53.23	0.51	0.60	0.05	4,000	17-เม.ย.
8-4	A	1			AKM					20,000	1.28	53.34	0.55	0.52	0.04	4,000	17-เม.ย.
11-4	P		1		GRP1	6	6	15.00	10	12,600	2.94	52.20	0.60	1.22	0.27	3,800	17-เม.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
12-4	P			1	BGZ3	7	7	13.50	10	15,313	0.57	53.54	0.19	0.68	0.01	2,500	17-เม.ย.
9-4	A			1	CH1					8,155	1.33	52.34	0.29	0.52	0.02	2,500	17-เม.ย.
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	1	1	1	หน้างานไม่อิสระ Al2O3 มากกว่า 0.60 จะพิจารณาเป็นหินผลิตซีเมนต์				26	36,365	1.55	53.00	0.41	0.85	0.11	3,299	
	A	1	0	1					0	28,155	1.29	53.05	0.47	0.52	0.03	3,566	
รวม	P									154,735	1.32	53.13	0.40	0.65	0.05		
	A									143,550	1.31	52.91	0.44	0.55	0.03		

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาตร ตัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,6.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A															-	
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
						สะสมสัปดาห์ที่ 1-3			P								
									A								

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึก

Mining Engineer

Maneger/Supervisor

Manager/Supervisor

Manager/Supervisor

Mine Planning Manager

5 5 60

Mine Operation

Mine Processing

Mine Maintenance

คาดการณ์(STOCK) หักผลผลิตซีเมนต์ต้นน้ำเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู	ปริมาณการขอยย	
(จ)13			-	368,604
				368,604
(ง)14			-	368,604
				368,604
(พ)15			30,800	337,804
			23,344	293,666
(พล)16			30,800	307,004
			39,553	293,228
(ค)17	64,004	44	30,800	340,208
	68,285		20,920	345,480
(ล)18			30,800	309,408
			26,915	329,285
(ลา)19			30,800	278,608
			18,100	308,054
สะสมการขอยย		P	154,000	
		A	128,832	

Stockman 12-เม.ย. 61 61,347

คาดการณ์(STOCK หินSMC&admixtureเข้าน้ำเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู		
(จ)13			-	61,347
				61,347
(อ)14			*	61,347
				61,347
(พ)15			8,898	52,449
			-	40,573
(พฤ)16			6,586	45,864
			-	51,679
(ศ)17	36,365	26	6,586	75,643
	29,155		6,731	54,437
(ส)18			6,586	69,058
			9,049	51,207
(อา)19			8,898	60,160
			7,785	47,507
สะสมการย่อย		P	30,966	
		A	16,834	

ผลการดำเนินงาน STOCK เซลล์น้ำหมัก (ต้น)			Stocking 12/4/69	91,176
วันที่	ปริมาณการผลิต		ค่าการ	คงเหลือ
	ต้น	จำนวน	ปริมาณการขาย	
(จ)13				91,176
(ฉ)14				91,176
(ค)15				91,176
(ด)16				91,176
(ค)17				91,176
(ส)18				91,176
(อา)19				91,176
สะสมการปล่อย		P A	- -	

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน..... เมษายน..... พ.ศ. 2569..... ลำดับที่ 4..... ช่วงวันที่..... 20..... ถึง..... 26.....

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4(เมตร)	วันที่ ตักขน แล้วเสร็จ
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
21-4	P	1			AKM3	7	7	12.50	8	15,925	3.39	50.50	1.16	0.76	0.12	3,800	20-เม.ย.
21-4	A	1			AKN					35,670	4.87	48.46	1.41	0.51	0.09	3,800	24-เม.ย.
22-4	P		1		GRQ2	6	6	15.00	22	28,829	10.21	43.75	2.66	0.89	0.23	3,600	20-เม.ย.
17-4	A		1		GQ2					10,965	5.49	47.45	1.69	0.98	0.09	3,600	22-เม.ย.
23-4	P			1	CHL	7	7	13.00	22	33,634	12.14	42.69	3.67	1.18	0.12	3,600	20-เม.ย.
18-4	A			1	CH ⁺					43,000	10.94	41.58	3.46	1.86	0.26	3,600	22-เม.ย.
24-4	P			1	DFJ	7	7	14.00	20	33,124	6.60	52.02	2.07	0.62	0.09	3,600	20-เม.ย.
15-4	A			1	DEJ					29,045	1.69	51.98	0.73	0.55	0.04	3,600	20-เม.ย.
25-4	P	1			AIN	7	7	13.50	20	31,850	3.09	51.52	0.87	0.52	0.06	3,800	22-เม.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
26-4	P		1		HRO	6	6	15.00	19	24,898	5.89	46.90	1.58	1.61	0.18	3,800	22-เม.ย.
19-4	A		1		GRP					15,740	5.17	48.04	2.04	0.53	0.09	3,800	22-เม.ย.
27-4	P		1		FQR	6	6	13.50	14	15,725	4.33	47.72	1.35	2.45	0.12	3,600	22-เม.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
28-4	P			1	AHW	7	7	8.00	15	13,377	4.01	51.94	1.18	0.55	0.01	3,800	22-เม.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
29-4	P	1			AKM4	7	7	12.50	12	19,110	3.39	50.50	1.16	0.76	0.12	3,800	24-เม.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
30-4	P			1	BG[1	7	7	13.50	10	15,288	2.78	53.54	0.74	0.55	0.05	3,800	24-เม.ย.
14-4	A			1	BGZ					10,220	0.44	52.74	0.16	0.60	0.02	3,800	20-เม.ย.
31-4	P			1	BFW	7	7	20.00	13	30,576	12.12	43.56	2.33	0.89	0.36	3,800	24-เม.ย.
20-4	A			1	BFW					20,705	2.08	52.09	0.45	0.64	0.07	3,800	24-เม.ย.
	P																
16-4	A			1	DH-					10,640	1.02	52.57	0.24	0.54	0.03	3,800	20-เม.ย.
	P																
22-4	A			1	JQN					20,870	18.48	37.18	4.01	0.78	0.61	3,800	24-เม.ย.
สรุป	P	2	3	4					154	262,335	6.94	48.01	1.89	0.96	0.14	3715	
	A	1	3	3					0	196,855	6.50	47.02	1.87	0.89	0.17	3716	
สะสมลำดับที่ 1-4										P	717,855	6.65	48.32	1.78	0.84	0.15	
										A	533,745	5.25	48.74	1.49	0.71	0.12	

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
13-4	P	1			AKM3	7	7	12.50	6	8,453	1.25	53.23	0.51	0.60	0.05	4,000	20-เม.ย.
13-4	A			1	CHJ					10,000	0.94	51.5	0.31	1.26	0.04	2,500	22-เม.ย.
14-4	P		1		FQR	6	6	13.50	8	9,000	1.94	48.57	0.56	2.45	0.77	3,800	22-เม.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
15-4	P	1			AKM4	7	7	12.50	8	11,270	1.25	53.23	0.51	0.60	0.05	4,000	24-เม.ย.
12-4	A				GQQ					10,000	1.06	51.61	0.49	0.73	0.07	3,800	22-เม.ย.
16-4	P			1	BGJ1	7	7	13.50	14	21,438	0.57	53.54	0.19	0.68	0.01	2,500	24-เม.ย.
10-4	A			1	BGZ					28,000	0.44	52.74	0.16	0.6	0.02	2,500	20-เม.ย.
11-4	P																
	A			1	DH-					10,000	0.59	53.05	0.17	0.6	0.03	2,500	20-เม.ย.
	P																
14-4	A			1	GRP					10,000	1.24	52.44	0.66	0.53	0.02	3,800	22-เม.ย.
สรุป	P	2	1	0	หน้างานเป็นส่วนที่ค่า Al2O3 น้อยกว่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินผลิตซีเมนต์					36	50,160	1.08	52.53	0.38	0.97	0.16	3323
	A	0	1	2							0	68,000	0.74	52.39	0.31	0.71	0.03
						สะสมลำดับที่ 1-4			P	204,895	1.26	52.98	0.39	0.73	0.08		
									A	211,550	1.13	52.74	0.39	0.60	0.03		

เปล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
สะสมลำดับที่ 1-4										P							
										A							

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

5, 5, 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการปล่อยหินผลิต

817,600

ตัน

แผนการปล่อยหิน SMC&admixture

189,600

สต็อกความคุม

200,000

ตัน

สต็อกความคุม

70,000

STOCK 31 มี.ค. 69

324,288

ตัน

STOCK 31 มี.ค. 69

20,848

แผนการผลิต

825,999

ตัน

แผนการผลิต

289,158

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

35:23:42

ตัน

คาดการณ์ STOCK 30 เม.ย. 69

120,406

Stockยกมา 19-เม.ย. 69

278,608

คาดการณ์(STOCK หินผลิตซีเมนต์นำเหมือง (ตัน)			
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการขอยืม	คงเหลือ
(จ)20	111,511	30,800	359,319
	49,905	24,047	308,054
(อ)21		30,800	328,519
		15,900	243,895
(พ)22	85,849	23,800	390,568
	69,705	20,160	306,339
(พ)23		30,800	359,768
		27,400	302,346
(ศ)24	64,974	30,800	393,942
	77,245	21,076	324,744
(ส)25		30,800	363,142
		23,755	306,544
(อา)26		30,800	332,342
		21,955	274,958
สะสมการขอยืม			
	P	208,600	
	A	154,293	

Stockยกมา 19-เม.ย. 69

60,160

คาดการณ์(STOCK หินSMC&admixtureนำเหมือง (ตัน)			
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการขอยืม	คงเหลือ
(จ)20	8,453	6,586	62,027
	38,000	8,441	47,507
(อ)21		3,293	58,734
		6,632	74,447
(พ)22	9,000	6,586	61,149
	30,000	6,168	94,565
(พ)23		8,898	52,251
		6,369	77,569
(ศ)24	32,708	6,586	78,373
		8,300	90,311
(ส)25		6,586	71,788
		7,071	82,012
(อา)26		6,989	64,799
		-	79,596
สะสมการขอยืม			
	P	38,936	
	A	34,601	

คาดการณ์(STOCK เซลล์น้ำเหมือง (ตัน)			Stockยกมา 19/4/69	91,176
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู	ปริมาณการขอยืม	
(จ)20				91,176
(อ)21			4,462	86,714
			8,625	
(พ)22			4,462	82,252
			-	
(พอ)23				82,252
(ค)24				82,252
(ศ)25				82,252
(อา)26	-	-		82,252
			9,040	
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
สะสมการปล่อย		P	8,924	
		A	17,665	

สัปดาห์ที่ ..5....ช่วงวันที่...27.....ถึง.....30.....

189,600

70.000

20.848

289,158

120,400

106	Stock ยกรว	26-เม.ย.		332,342
-----	------------	----------	---	---------

Stock market 26-Aug. 64,799

จำนวนเงิน (บาท)	Stockmarket 26/4/69	82 252
-----------------	---------------------	--------


ตลาดการ(STOCK) เชลหบ้านเมือง (ต้น)		Stockยกมา 26/4/69		82,252
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู	ปริมาณการขาย	
(จ)27				82,252
(อ)28			4,462	77,790
(พ)29			4,462	73,328
(พฤ)30	27,048	20		100,376
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
สะสมการขาย		P A	8,924 -	

Mine Planning Staff

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

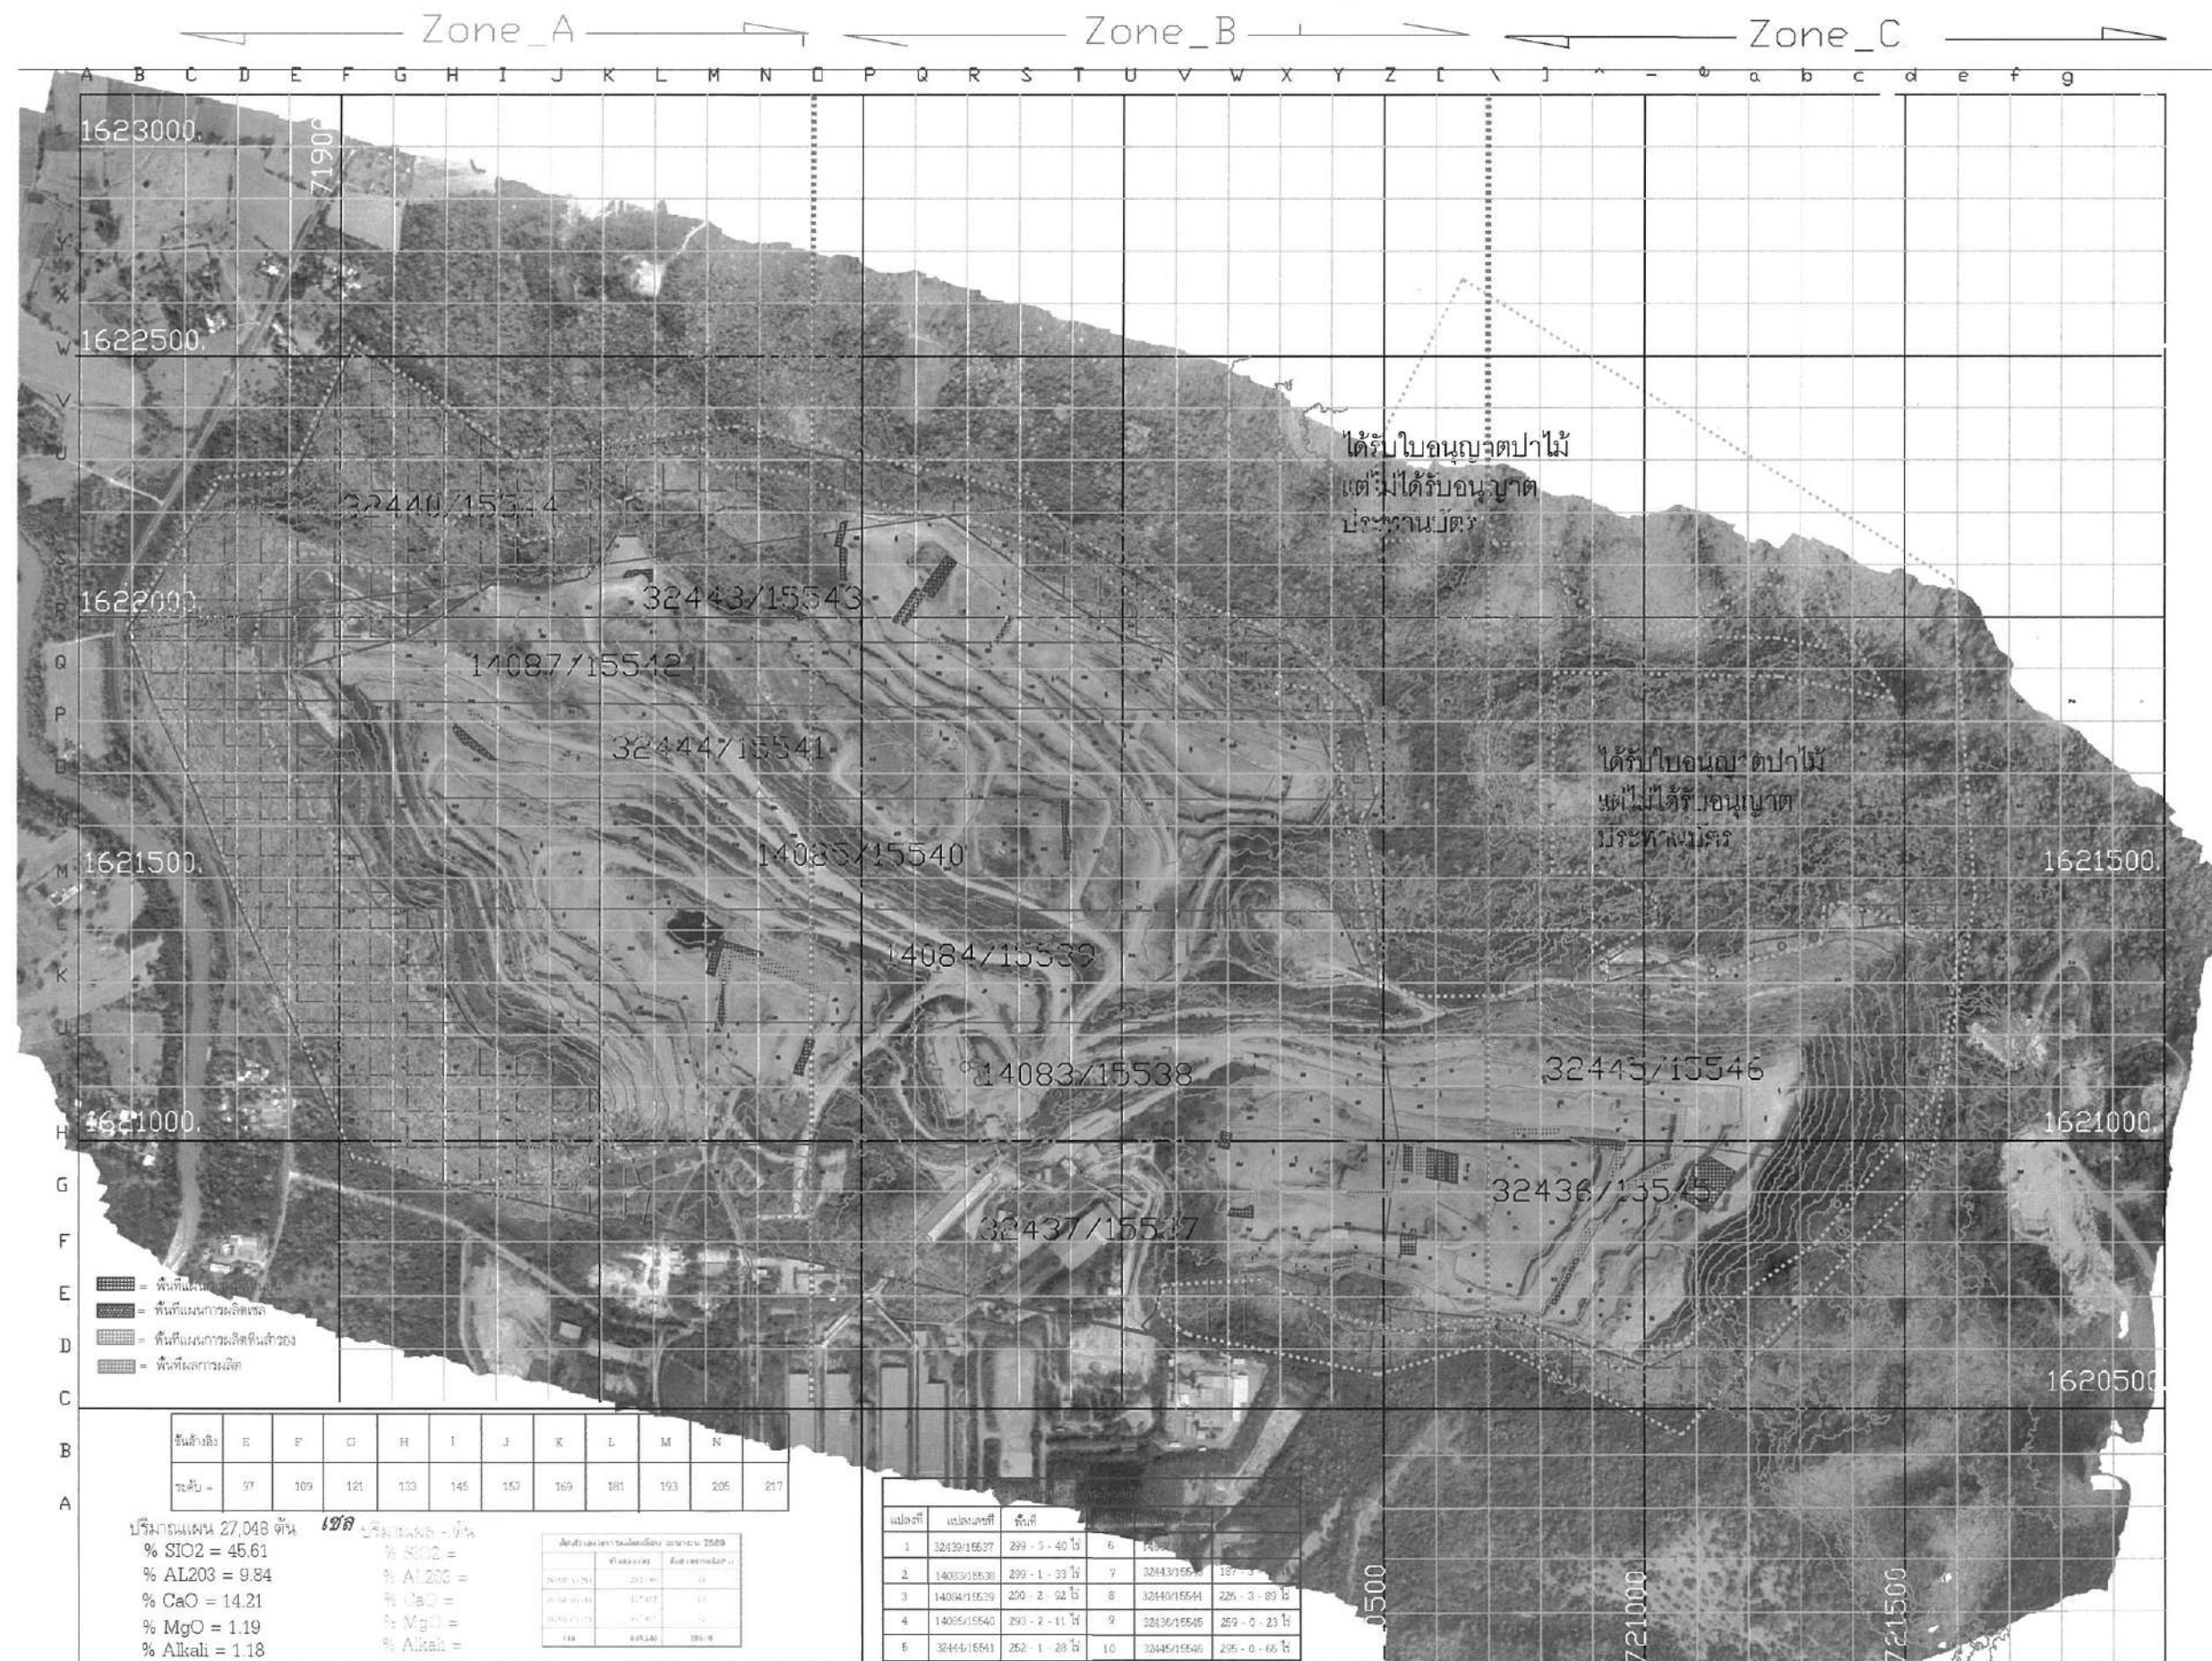

แผนที่แสดงพื้นที่แผน-ผลการทำเหมืองเดือนเมษายน 2569			
หินผลิต		หินSMC&Admixture	
ปริมาณแผน 825,999 ตัน	ปริมาณผล 600,216 ตัน	ปริมาณแผน 289,158 ตัน	ปริมาณแผน 248,030 ตัน
% SiO2 = 6.61	% SiO2 = 516	% SiO2 = 1.34	% SiO2 = 1.19
% Al2O3 = 1.79	% Al2O3 = 1.46	% Al2O3 = 0.40	% Al2O3 = 0.40
% CaO = 48.29	% CaO = 48.81	% CaO = 53.03	% CaO = 52.51
% MgO = 0.86	% MgO = 0.77	% MgO = 0.71	% MgO = 0.70
% Alkali = 0.14	% Alkali = 0.12	% Alkali = 0.07	% Alkali = 0.03

แผนที่แสดงพื้นที่แผน-ผลการทำเหมือง เดือนเมษายน 2569

TOPOGRAPHICS MAP ,AS.AT YEAR

MINING METHOD OPEN PIT

ประทานบัตร 10 แปลง รวม 2,575 - 1 - 37 ไร่

SCALE 1:4,000 FILE =

Handwritten signature or mark.

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 สัปดาห์ที่ 1 ช่วงวันที่ 1 ถึง 10...

หินทำซีเมนต์

Blast ที่	ZONE เหมือง				สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3,4(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
	A	B	C	กว้าง Burden		ยาว Spacing	สูง Hight	SiO2			CaO	Al2O3	MgO	Alkali			
1-5	P	1			AJM	7	7	12.50	14	22,295	2.38	51.35	1.15	0.47	0.07	3,600	04-พ.ค.
3-5	A	1			AJM					22,105	1.34	52.98	0.67	0.50	0.03	3,600	06-พ.ค.
2-5	P	1			AKM1	7	7	12.50	8	12,740	3.08	52.11	0.60	0.55	0.04	3,600	04-พ.ค.
1-5	A	1			AKM					9,110	0.78	53.27	0.26	0.52	0.02	3,600	04-พ.ค.
3-5	P			1	CG^	7	7	14.50	21	36,118	3.37	49.93	1.48	0.59	0.08	3,800	04-พ.ค.
2-5	A			1	CG^					36,120	1.48	52.24	0.65	0.56	0.04	3,800	04-พ.ค.
4-5	P	1			FPI	7	7	15.00	21	40,131	8.42	46.03	2.83	1.05	0.18	3,000	06-พ.ค.
4-5	A	1			FPI					40,005	8.42	46.03	2.83	1.05	0.18	3,000	06-พ.ค.
5-5	P		1		GRQ1	6	6	15.00	24	31,450	12.65	43.75	2.67	0.89	0.24	3,800	06-พ.ค.
6-5	A		1		GRQ					20,215	10.22	43.75	2.67	0.89	0.24	3,800	06-พ.ค.
6-5	P			1	DF^	7	7	14.00	22	36,436	4.54	49.87	1.18	0.56	0.07	3,800	06-พ.ค.
5-5	A			1	DFJ					31,470	4.54	49.87	1.18	0.56	0.07	3,800	08-พ.ค.
7-5	P	1			GPI	7	7	12.00	22	30,831	19.06	43.02	2.91	0.75	0.36	3,000	08-พ.ค.
7-5	A	1			GPI					28,030	19.06	43.02	2.91	0.75	0.36	3,000	08-พ.ค.
8-5	P			1	BGZ1	7	7	13.50	10	15,288	2.17	53.09	0.35	0.67	0.02	4,000	08-พ.ค.
	A				หน้างานป่าท่มซัง												
9-5	P			1	BFW1	7	7	12.50	6	8,791	2.08	52.09	0.45	0.64	0.07	3,800	08-พ.ค.
8-5	A			1	BFW					6,560	3.06	52.04	0.89	0.54	0.07	3,800	08-พ.ค.
	P																
	A																
	P																
สรุป	P	4	1	4					148	234,079	7.49	48.05	1.82	0.72	0.15	3,541	
	A	4	1	3					0	193,615	6.87	48.48	1.72	0.71	0.14	3,358	
หินSMC & Admixture						สะสมสัปดาห์ที่ 1			P	234,079	7.49	48.05	1.82	0.72	0.15		
						A	193,615	6.87	48.48	1.72	0.71	0.14					

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-5	P	1			AJM1	7	7	12.50	7	9,861	1.20	53.20	0.58	0.49	0.04	4,500	04-พ.ค.
2-5	A	1			AJM					10,000	1.28	53.08	0.60	0.51	0.03	4,500	06-พ.ค.
2-5	P	1			AKM1	7	7	12.50	6	8,453	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,500	04-พ.ค.
1-5	A	1			AKM					10,000	0.78	53.27	0.26	0.52	0.02	4,500	04-พ.ค.
3-5	P			1	BGZ1	7	7	13.50	14	21,438	1.21	52.67	0.31	0.64	0.02	2,500	08-พ.ค.
	A				หน้างานป่าท่มซัง												
4-5	P			1	BFW1	7	7	12.50	8	11,270	2.08	52.09	0.45	0.64	0.07	2,500	08-พ.ค.
3-5	A			1	BFW					10,000	1.86	53.4	0.56	0.54	0.05	2,500	08-พ.ค.
	P																
4-5	A			1	BHW					3,745	1.49	53.17	0.52	0.59	0.06	2,500	08-พ.ค.
	P																
	A																
สรุป	P	2	0	2	หน้างานป่าท่มซังที่ Al2O3 มากกว่า 0.60 จะตัดเข้าป็นหินผลิตซีเมนต์				35	51,021	1.45	52.55	0.44	0.60	0.04	3,218	
	A	2	0	1					0	33,745	1.33	53.24	0.48	0.53	0.04	3,408	
						สะสมปลดวันที่ 1			P	51,021	1.45	52.55	0.44	0.60	0.04		
									A	33,745	1.33	53.24	0.48	0.53	0.04		

เปล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A															-	
สรุป	P	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
						สะสมรื้ปดานที่ 1			P	-	-	-	-	-	-		
									A	-	-	-	-	-	-		

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

5 6 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการย่อยหินผลิต

833,000

ตัน

แผนการย่อยหิน SMC&admixture

231,533

ตัน

สต็อกความคุม

200,000

ตัน

สต็อกความคุม

70,000

ตัน

STOCK 30 เม.ย. 69

251,952

ตัน

STOCK 30 เม.ย. 69

63,312

ตัน

แผนการผลิต

857,926

ตัน

แผนการผลิต

275,520

ตัน

แยกเป็นสัดส่วนหินที่การผลิต (A:B:C)

38:23:39

ตัน

คาดการณ์ STOCK 31 พ.ค. 69

107,299

ตัน

คาดการณ์ STOCK 31 พ.ค. 69

276,878

ตัน

Stockยกมา 30-เม.ย.

251,952

คาดการณ์(STOCK หินผลิตหินปูนน้ำเหมือง (ตัน)			
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	คงเหลือ
ตัน	จำนวน	ปริมาณการย่อย	
(ค)1	-	-	251,952
	-	-	238,242
(ค)2		30,800	221,152
		24,105	238,242
(จ)3		23,800	197,352
		26,656	231,922
(จ)4	71,153	43	22,400
	45,230		20,333
(อ)5			22,400
			15,846
(พ)6	108,017	67	30,800
	82,325		30,489
(พ)7			30,800
			28,272
(ค)8	54,909	38	16,800
	66,060		30,154
(ส)9			30,800
			29,117
(จ)10			30,800
			29,102
รวมการย่อย (ตัน)		P	208,600
		A	204,972

Stockยกมา 30-เม.ย.

63,312

คาดการณ์(STOCK หินSMC&admixtureน้ำเหมือง (ตัน)			
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	คงเหลือ
ตัน	จำนวน	ปริมาณการย่อย	
(ค)1	-	-	63,312
	-	-	56,224
(ค)2		7,258	56,054
		7,342	56,224
(จ)3		8,898	47,157
		7,511	37,116
(จ)4	18,314	13	7,258
	10,000		6,324
(อ)5			7,258
			6,918
(พ)6			7,258
	10,000		4,116
(พ)7			8,898
			8,220
(ค)8	32,708	22	7,258
	13,745		3,108
(ส)9			7,258
			5,831
(จ)10			8,898
			3,897
รวมการย่อย		P	62,981
		A	46,349

คาดการณ์(STOCK เซลล์น้ำเหมือง (ตัน)

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 สัปดาห์ที่ 2 ช่วงวันที่ 11 ถึง 17

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
10-5	P	1			IRK	6	6	15.00	21	27,518	3.89	51.50	0.78	0.73	0.13	3,200	11-พ.ค.
9-5	A	1			IRK					27,985	3.89	51.5	0.78	0.73	0.13		11-พ.ค.
11-5	P		1		JOQ	6	6	15.00	16	20,966	12.22	42.53	2.37	0.95	0.35	3,800	11-พ.ค.
12-5	A		1		JPO					19,890	6.24	47.95	1.54	0.86	0.11	3,800	13-พ.ค.
12-5	P			1	EHa	7	7	13.50	6	9,555	1.76	54.46	0.55	0.56	0.02	4,000	11-พ.ค.
10-5	A			1	EH					5,000	1.08	53.89	0.42	0.60	0.02	4,000	11-พ.ค.
13-5	P	1			AKM2	7	7	12.50	8	12,740	3.08	52.11	0.60	0.55	0.04	3,800	13-พ.ค.
	A				รูเจาะมีน้ำ												
14-5	P	1			IQJ	6	6	13.50	22	25,740	9.95	46.22	2.46	0.60	0.17	3,200	13-พ.ค.
11-5	A	1			IQK					24,710	7.95	46.22	2.46	0.60	0.17	3,200	11-พ.ค.
15-5	P			1	BGZ4	7	7	14.00	6	9,173	2.17	53.09	0.35	0.67	0.02	3,800	13-พ.ค.
	A				หน้างานป่าห่มขัง												
16-5	P	1			FPJ	7	7	15.00	22	42,042	8.42	46.03	2.83	1.05	0.18	3,000	15-พ.ค.
14-5	A	1			DOH					5,035	0.68	53.32	0.25	0.57	0.04	3,000	15-พ.ค.
17-5	P			1	BGX	7	7	13.50	10	15,288	1.75	52.33	0.47	0.56	0.02	3,800	15-พ.ค.
13-5	A			1	BHY					10,000	2.33	52.32	0.84	0.58	0.07	3,800	15-พ.ค.
18-5	P			1	AHW	7	7	8.00	15	13,377	4.01	51.94	1.18	0.55	0.01	3,800	15-พ.ค.
15-5	A			1	DH-					10,000	1.39	52.85	0.27	0.60	0.03	3,800	15-พ.ค.
19-5	P		1		HSO	6	6	15.00	22	28,829	9.89	43.87	3.10	0.81	0.15	3,800	15-พ.ค.
	A				หน้างานไม้ใส่สระ												
สรุป	P	7	3	7					148	205,228	6.89	48.07	1.86	0.77	0.14	3,586	
	A	3	1	3					0	102,620	4.63	49.96	1.24	0.68	0.11	712	
สรุปรวมสัปดาห์ที่ 1-2										P	439,308	7.21	48.06	1.84	0.74	0.14	
										A	296,235	6.10	48.99	1.55	0.70	0.13	

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
5-5	P			1	EHa	7	7	13.50	10	15,313	0.76	54.46	0.35	0.56	0.02	2,800	11-พ.ค.
5-5	A			1	EH					37,675	0.56	54.36	0.28	0.61	0.03	2,800	11-พ.ค.
6-5	P	1			AKM2	7	7	12.50	6	8,453	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,500	13-พ.ค.
	A				รูเจาะมีน้ำ												
7-5	P			1	BGZ4	7	7	14.00	10	15,313	1.21	52.67	0.31	0.64	0.02	2,800	13-พ.ค.
	A				หน้างานป่าห่มขัง												
8-5	P			1	BGX	7	7	13.50	10	15,313	1.75	52.33	0.47	0.56	0.02	2,800	15-พ.ค.
6-5	A			1	BHY					9,110	1.49	53.17	0.52	0.59	0.06	2,800	15-พ.ค.
	P																
7-5	A	1			DOH					50,000	0.68	53.32	0.25	0.57	0.04	4,000	15-พ.ค.
	P																
8-5	A			1	DH-					14,080	1.39	52.85	0.27	0.60	0.03	2,500	15-พ.ค.
	P																
สรุป	P	1	0	3	หน้างานในส่วนที่ค่า Al2O3 มากกว่า 0.69 จะคิดว่าเป็นหินลิกซิมบ์					36	54,390	1.28	52.99	0.41	0.58	0.02	3064
	A	0	0	2						0	110,865	0.80	53.60	0.28	0.59	0.04	3303
สรุปรวมสัปดาห์ที่ 1-2						สะสมสัปดาห์ที่ 1-2			P	105,411	1.36	52.78	0.43	0.59	0.03		
									A	144,610	0.92	53.52	0.33	0.58	0.04		

เชล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-5	P		1		KNQ	7	7	16.00	16	27,048	47.96	16.00	12.04	2.35	1.23	3,800	11-พ.ค.
1-5	A		1		KNQ					27,050	44.88	17.38	10.68	2.30	1.25	3,800	13-พ.ค.
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	0	1	0					16	27,048	47.96	16.00	12.04	2.35	1.23	3,800	
	A	0	1	0					0	27,050	44.88	17.38	10.68	2.30	1.25	3,800	
สรุปรวมสัปดาห์ที่ 1-2										P	27,048	47.96	16.00	12.04	2.35	1.23	
										A	27,050	44.88	17.38	10.68	2.30	1.25	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

5 6 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการขอยืมผลิต

833,000

ตัน

แผนการขอยืม SMC&admixture

231,533

สต็อกควบคุม

200,000

ตัน

สต็อกควบคุม

70,000

STOCK 30 เม.ย. 69

251,952

ตัน

STOCK 30 เม.ย. 69

63,312

แผนการผลิต

857,926

ตัน

แผนการผลิต

275,520

แยกเป็นสัดส่วนหินที่การผลิต (A:B:C)

38:23:39

ผลการ STOCK 31 พ.ค. 69

107,299

Stock 10-พ.ค.

246,831

ผลการผลิต (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	จำนวน	ผลการผลิต	คงเหลือ
(จ)11	58,040	43	30,800	273,871
	57,695	-	20,806	279,497
(อ)12			22,400	251,471
			14,620	279,497
(พ)13	47,653	36	30,800	268,324
	19,890	-	24,038	264,016
(พ)14			30,800	237,524
			34,310	242,005
(ค)15	99,536	69	23,800	313,260
	25,000	-	14,100	253,630
(ส)16			30,800	282,460
			21,883	248,760
(อา)17			30,800	251,660
			17,900	226,440
สรุปรวม				
	P		200,200	
	A		147,657	

Stock 10-พ.ค. 44,096

ผลการผลิต (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	จำนวน	ผลการผลิต	คงเหลือ
(จ)11	15,313	10	7,258	52,151
	37,675	-	10,125	66,429
(อ)12			10,954	41,197
			22,943	47,438
(พ)13	23,765	16	7,258	57,704
			11,457	24,465
(พ)14			3,629	54,076
			5,133	21,455
(ค)15	15,313	10	7,258	62,130
	73,190	-	7,169	88,066
(ส)16			7,325	54,806
			5,746	88,066
(อา)17			7,258	47,548
			15,092	81,066
สรุปรวม				
	P		50,938	
	A		64,750	

ผลการผลิต(STOCK เซลล์หมักเหือง (ตัน)			Stockหมัก 10/5/89	73,076
วันที่	ปริมาณการผลิต		ผลการผลิต	คงเหลือ
	ตัน	จำนวน	ปริมาณการย่อย	
(จ)11	27,048	16	-	100,124
	-	-	-	-
(อ)12			-	100,124
			-	-
(พ)13	-	-	-	100,124
	27,050	-	-	-
(พ)14			4,462	95,662
			-	-
(ค)15	-	-	4,462	91,200
	-	-	8,170	-
(ส)16			-	91,200
			3,580	-
(อา)17				91,200
				-

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สัปดาห์ที่ 3 ช่วงวันที่ 18 ถึง 24

หินทำซีเมนต์

Blast ที่	ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไปกลับถึง CR 3.4 (เมตร)	วันที่ ตักขนแล้วเสร็จ
	A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
20-5	P	1			AIN	7	7	12.50	12	19,110	5.25	48.94	1.41	0.51	0.09	4,000
	A				หน้างานไม่อิสระ											18-พ.ค.
21-5	P		1		GRP	6	6	15.00	10	13,104	5.17	50.88	1.13	0.53	0.05	3,800
19-5	A		1		GRP					20,000	6.26	44.63	1.84	2.12	0.25	3,800
22-5	P			1	BGZ2	7	7	13.50	10	15,288	2.17	53.09	0.35	0.67	0.02	4,000
	A				หน้างานไม่อิสระ											18-พ.ค.
23-5	P	1			AJO1	7	7	14.00	14	24,079	5.25	48.94	1.41	0.51	0.09	4,000
	A				หน้างานไม่อิสระ											20-พ.ค.
24-5	P	1			AJM2	7	7	12.50	14	22,295	2.38	51.35	1.15	0.47	0.07	3,800
15-5	A	1			AJL					16,940	1.35	52.32	0.63	0.51	0.05	3,800
25-5	P		1		HRO	6	6	15.00	22	28,829	5.89	46.90	1.58	1.61	0.18	3,800
	A				หน้างานไม่อิสระ											20-พ.ค.
26-5	P		1		CH ^A	7	7	14.00	20	33,124	6.71	46.91	2.14	1.53	0.16	3,800
16-5	A		1		DF ^A					30,765	1.85	51.79	0.92	0.56	0.05	3,800
27-5	P		1		FQR	6	6	15.00	20	26,208	6.58	45.35	1.32	2.87	0.13	3,800
	A				หน้างานไม่อิสระ											22-พ.ค.
28-5	P		1		BFV	7	7	12.50	10	14,651	2.78	51.63	0.74	0.55	0.05	3,800
17-5	A		1		BFW					12,930	2.81	51.23	0.72	0.53	0.05	3,800
29-5	P		1		CHJ	7	7	14.00	20	33,124	6.71	46.91	2.14	1.53	0.16	3,800
18-5	A		1		BGX					16,500	2.81	51.07	0.87	0.55	0.03	3,800
สรุป	P	3	3	4					121.5	229,811	5.26	48.48	1.48	1.22	0.11	3,432
	A	1	1	3					0	97,135	2.96	50.21	1.02	0.87	0.09	3,800
สะสมสัปดาห์ที่ 1-3									P	669,119	6.54	48.20	1.72	0.91	0.13	
									A	393,370	5.32	49.29	1.42	0.74	0.12	

หินSMC&Admixture

Blast ที่	ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไปกลับถึง CR 2.5.6 (เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
	A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
9-5	P	1			AIN	7	7	12.50	8	11,270	1.51	50.03	0.59	0.51	0.02	4,500
	A															18-พ.ค.
10-5	P		1		GRP	6	6	15.00	10	12,600	1.24	52.44	0.66	0.53	0.02	4,000
12-5	A		1		GRP					5,085	1.48	49.42	0.42	2.03	0.07	4,000
11-5	P			1	BGZ2	7	7	13.50	14	21,438	1.21	52.67	0.31	0.64	0.02	2,500
10-5	A			1	BFW					10,000	1.10	52.51	0.53	0.51	0.03	2,500
12-5	P	1			AJO1	7	7	14.00	6	9,188	2.01	51.09	0.60	0.48	0.02	4,500
	A				หน้างานไม่อิสระ											20-พ.ค.
13-5	P	1			AJM2	7	7	12.50	7	9,861	1.20	53.20	0.58	0.49	0.04	4,500
9-5	A	1			AJL					7,520	1.04	52.32	0.53	0.51	0.05	4,500
	P															18-พ.ค.
11-5	A		1		BGX					10,000	1.79	52.17	0.56	0.57	0.02	2,500
สรุป	P	2	1	1					38	64,356	1.38	52.02	0.51	0.55	0.02	3,046
	A	0	1	2					0	32,605	1.36	51.88	0.52	0.77	0.04	2,157
สะสมสัปดาห์ที่ 1-3									P	169,768	1.37	52.49	0.46	0.57	0.03	
									A	177,215	1.00	53.22	0.37	0.61	0.04	

เขล

Blast ที่	ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไปกลับถึง CR 2.5.6 (เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
	A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P															
	A															
	P															
	A															
	P															
	A															
	P															
	A															
สรุป	P	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
สะสมสัปดาห์ที่ 1-3									P	27,048	47.96	16.00	12.04	2.35	1.23	
									A	27,050	44.88	17.38	10.68	2.30	1.25	

ผู้จัดทำ

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ

Mine Planning Manager

5, 6, 69

ผู้อนุมัติ

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการขุดหินผลิต

833,000

ตัน

แผนการขุดหิน SMC&admixture

231,533

สต็อกควบคุม

200,000

ตัน

สต็อกควบคุม

70,000

STOCK 30 เม.ย. 69

251,952

ตัน

STOCK 30 เม.ย. 69

63,312

แผนการผลิต

857,926

ตัน

แผนการผลิต

275,520

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

38:23:39

คาดการณ์ STOCK 31 พ.ค. 69

107,299

Stock ย่อม 17-พ.ค.

251,660

คาดการณ์(STOCK) หินผลิตซีเมนต์นำเหมือง (ตัน)

วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ
	ตัน	จำนวนรู		
(จ)18	47,502	32	30,800	268,362
	60,635	-	19,334	312,809
(ฉ)19			22,400	245,962
			13,301	294,245
(พ)20	108,326	70	23,800	330,488
	-	-	19,380	270,455
(พ)21			30,800	299,688
			24,775	270,455
(ค)22	73,983	50	30,800	342,871
	36,500	-	25,884	295,006
(ส)23			30,800	312,071
			31,359	262,695
(อา)24			30,800	281,271
			16,181	231,962
สะสมการขุด		P	200,200	
		A	150,214	

Stock ย่อม 17-พ.ค.

47,548

คาดการณ์(STOCK) หินSMC&admixtureนำเหมือง (ตัน)

วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ
	ตัน	จำนวนรู		
(จ)18	45,308	32	7,325	85,531
	17,520	-	3,973	83,042
(ฉ)19			12,526	73,005
			7,421	79,042
(พ)20	-	-	7,258	65,747
	-	-	7,849	36,598
(พ)21			3,629	62,118
			4,675	36,598
(ค)22	19,049	13	7,258	73,910
	15,085	-	7,077	31,923
(ส)23			8,898	65,012
			4,503	24,848
(อา)24			7,258	57,755
			6,390	20,355
สะสมการขุด		P	46,893	
		A	34,811	

คาดการณ์(STOCK) เขลนำเหมือง (ตัน) Stock ย่อม 17/5/69 91,200

วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ
	ตัน	จำนวนรู		
(จ)18	-	-	-	91,200
	-	-	-	-
(ฉ)19			-	91,200
			-	-
(พ)20	-	-	4,462	86,738
	-	-	-	-
(พ)21			4,462	82,276
			-	-
(ค)22	-	-	-	82,276
	-	-	-	-
(ส)23			-	82,276
			-	-
(อา)24			-	82,276
			-	-
สะสมการขุด		P	8,924	
		A	-	

ประจำเดือน... พฤษภาคม พ.ศ. 2569.....

สัปดาห์ที่ ..4.....ช่วงวันที่...25.....ถึง.....31.....

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณสมบัติ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 3,4(เมตร)	วันที่ ตักขนแล้วเสร็จ
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
30-5	P	1			AKM3	7	7	12.50	12	19,110	3.08	52.11	0.60	0.55	0.04	4,000	25-พ.ค.
22-5	A	1			AKM					20,000	1.52	52.11	0.6	0.55	0.04	4,000	27-พ.ค.
31-5	P		1		JRN	6	6	14.00	14	17,035	18.48	37.18	4.01	0.78	0.61	4,000	25-พ.ค.
26-5	A		1		JOQ					13,900	17.50	37.76	3.00	0.81	0.48	3,800	29-พ.ค.
32-5	P			1	BFW2	7	7	12.50	14	20,511	11.12	46.78	2.34	0.89	0.36	4,200	25-พ.ค.
27-5	A			1	BFW					13,345	6.75	47.58	1.38	0.54	0.1	4,200	29-พ.ค.
33-5	P		1		CE\	7	7	14.00	10	16,562	1.59	53.41	0.68	0.71	0.04	4,000	25-พ.ค.
21-5	A			1	CH\					23,185	5.40	49	0.88	0.58	0.10	3,800	25-พ.ค.
34-5	P	1			DOH	7	7	12.00	6	9,173	1.97	53.13	0.38	0.54	0.03	3,200	27-พ.ค.
20-5	A	1			DOI					10,000	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	3,200	25-พ.ค.
35-5	P		1		GQQ	6	6	13.50	14	15,725	5.49	47.45	1.69	0.98	0.09	3,600	27-พ.ค.
	A				หน่วยงานไม่อิสระ												
36-5	P			1	BGY	7	7	13.50	6	9,555	2.78	51.63	0.74	0.55	0.05	4,000	27-พ.ค.
28-5	A			1	BGV					15,445	4.95	50.26	1.63	0.59	0.11	4,000	29-พ.ค.
37-5	P	1			AJO2	7	7	13.50	20	34,398	5.25	48.94	1.41	0.51	0.09	4,000	29-พ.ค.
24-5	A	1			FOI					31,405	8.42	46.03	2.83	1.05	0.18	3,000	27-พ.ค.
38-5	P		1		GRQ2	6	6	15.00	24	31,450	12.65	43.75	2.67	0.89	0.24	3,800	29-พ.ค.
	A				หน่วยงานไม่อิสระ												
39-5	P			1	BGZ3	7	7	13.50	10	15,288	2.17	53.09	0.35	0.67	0.02	4,200	29-พ.ค.
	A				หน่วยงานไม่อิสระ												
	P																
23-5	A			1	AGV					21,715	4.95	50.26	1.63	0.59	0.11	4,000	27-พ.ค.
	P																
25-5	A	1			AHN					8,370	8.82	42.89	3.80	0.72	0.14	4,000	27-พ.ค.
	P																
29-5	A			1	EG-					27,520	4.15	50.59	1.85	0.65	0.05	4,000	29-พ.ค.
สรุป	P	3	2	4													

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Height			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
14-5	P	1			AKM3	7	7	12.50	8	11,270	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,500	25-พ.ค.
16-5	A	1			AKM					18,220	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,500	27-พ.ค.
15-5	P			1	CE\	7	7	14.00	10	15,313	1.13	53.85	0.53	0.74	0.04	2,500	25-พ.ค.
15-5	A			1	CH\					19,875	2.07	51.93	0.41	0.57	0.04	2,500	25-พ.ค.
16-5	P	1			DOH	7	7	12.00	24	32,340	1.97	53.13	0.38	0.54	0.03	4,500	27-พ.ค.
13-5	A	1			DOH					26,120	0.53	53.2	0.18	0.67	0.02	4,500	25-พ.ค.
17-5	P		1		GQQ	6	6	13.50	8	10,080	1.64	51.61	0.49	0.73	0.07	3,600	27-พ.ค.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
18-5	P			1	BGY	7	7	13.50	10	15,313	0.91	53.30	0.31	0.61	0.03	2,500	27-พ.ค.
14-5	A			1	BHX					17,835	0.53	53.37	0.17	0.6	0.02	2,500	25-พ.ค.
19-5	P			1	BGZ3	7	7	13.50	14	21,438	1.21	52.67	0.31	0.64	0.02	2,500	29-พ.ค.
17-5	A			1	BFW					5,000	1.86	53.40	0.56	0.54	0.05	2,500	29-พ.ค.
สรุป	P	2	1	1	หน้างานเป็นส่วนที่ค่า Al2O3 มากกว่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินผลัดชิ้นอื่น				64	105,753	1.46	52.91	0.41	0.62	0.03	3430	
	A	2	0	2					0	87,050	1.17	52.728	0.340	0.600	0.03	3519	
						สะสมสัปดาห์ที่ 1-4			P	275,520	1.41	52.65	0.44	0.59	0.03		
									A	264,265	1.05	53.06	0.36	0.61	0.03		

Blast ที่		ZONE เหนือ			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A															-	
สรุป	P	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	A	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
						สะสมลำดับที่ 1-4			P	27,048	47.96	16.00	12.04	2.35	1.23		
									A	27,050	44.88	17.38	10.68	2.30	1.25		

5, 6, 69

สมัครสอบ Mining Engineer

Mine Operation

Mine Processing

Mine Maintenance

แผนการย่อยหนี้ผลิต	833,000	ต้น	แผนการย่อยหนี้ SMC&admixture	231,533
สต็อกควบคุม	200,000	ต้น	สต็อกควบคุม	70,000
STOCK 30 ม.ย. 69	251,952	ต้น	STOCK 30 ม.ย. 69	63,312
แผนการผลิต	857,926	ต้น	แผนการผลิต	275,520
แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)	38:23:39		คาดการณ์ STOCK 31 พ.ค. 69	107,299
คาดการณ์ STOCK 31 พ.ค. 69	276,878	ต้น		

แผนการดำเนินงาน SMC&admixture	231,533
สต็อกควบคุม	70,000
STOCK 30 ณ.ย. 69	63,312
แผนการผลิต	275,520
ค่าการนำ STOCK 31 พ.ค. 69	107,299

231,533

70,000

STOCK 30 เม.ย. 69	63,312
แผนการผลิต	275,520
คาดการณ์ STOCK 31 พ.ค. 69	107,299

107,299 Stockยกมา 24-พ.ค. 281,271

วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนร	ปริมาณการขาย	
(จ)25	73,219	50	30,800	323,690
	33,185	-	15,550	277,416
(ังง)26			22,400	301,290
			30,118	268,367
(พ)27	34,453	36	23,800	311,943
	81,490	-	21,609	334,665
(พฤ)28			30,800	281,143
			10,650	294,373
(ศ)29	81,136	54	23,800	338,479
	70,210	-	5,720	345,487
(ส)30			30,800	307,679
			20,226	344,158
(อา)31			30,800	276,879
			33,344	330,029
		P	193,200	
		A	137,217	
สะสมการขาย				

Stockยกมา 24-พ.ค. 57,755

วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู	ปริมาณการย่อย	
(จ)25	26,583	18	7,258	77,080
	63,830	-	6,390	52,557
(ฉ)26			10,954	66,126
			3,774	50,670
(ท)27	57,733	42	10,954	112,906
	18,220	-	7,677	42,993
(พ)28			3,629	109,277
			3,689	64,233
(ค)29	21,438	14	7,258	123,457
	5,000	-	13,351	74,233
(ส)30			7,258	116,199
			10,975	66,946
(อา)31			8,898	107,302
			6,176	64,246
		P	48,949	
		A	38,681	

วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์ ปริมาณการย่อย	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู		
(จ)25	-	-	-	82,276
	-	-	-	-
(ง)26			-	82,276
			-	-
(พ)27	-	-	-	82,276
	-	-	-	-
(พฤ)28			4,462	77,813
			-	-
(ศ)29	-	-	4,462	73,351
	-	-	2,732	-
(ส)30			-	73,351
			-	-
(อา)31				73,351
			5,104	-
สะสมการย่อย		P	8,924	
		A	7,836	

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 สัปดาห์ที่ 1 ช่วงวันที่ 1 ถึง 7

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3,4(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-6	P	1			DOH1	7	7	12.50	8	12,740	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	3,000	03-มิ.ย.
1-6	A	1			DOH	-	-	-		5,000	0.64	53.54	0.22	0.56	0.02	3,000	03-มิ.ย.
2-6	P	1			AKL1	7	7	12.50	16	25,480	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,000	03-มิ.ย.
2-6	A	1			AKL	-	-	-		37,395	1.78	52.08	0.69	0.52	0.06	4,000	03-มิ.ย.
3-6	P			1	AGV1	7	7	12.50	16	22,422	4.95	50.26	1.63	0.59	0.11	4,200	03-มิ.ย.
3-6	A			1	AGV	-	-	-		26,500	1.12	52.79	0.45	0.55	0.03	4,200	03-มิ.ย.
4-6	P		1		GRQ1	6	6	15.00	24	31,450	10.21	43.75	2.60	0.89	0.24	4,000	05-มิ.ย.
4-6	A		1		GRQ	-	-	-		30,325	7.56	46.02	1.92	0.81	0.15	4,000	05-มิ.ย.
5-6	P		1		FQR1	6	6	15.00	20	26,208	6.57	45.89	1.88	2.37	0.20	4,000	05-มิ.ย.
5-6	A		1		FQR	-	-	-		15,000	5.92	44.52	1.7	2.32	0.32	4,000	05-มิ.ย.
6-6	P			1	CHI	7	7	14.50	12	20,639	5.53	49.03	0.96	0.51	0.07	3,900	05-มิ.ย.
6-6	A			1	CHI	-	-	-		20,000	0.47	53.63	0.23	0.55	0.02	3,900	05-มิ.ย.
7-6	P			1	BFX1	7	7	12.50	8	11,721	2.81	51.23	0.72	0.53	0.05	4,200	05-มิ.ย.
7-6	A			1	BFW	-	-	-		10,000	0.90	53.13	0.33	0.61	0.03	4,200	05-มิ.ย.
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	2	2	3					104	150,660	5.33	48.56	1.43	0.95	0.12	3,947	
	A	2	2	3					0	144,220	3.02	50.49	0.90	0.79	0.09	4,002	
สะสมสัปดาห์ที่ 1										P	150,660	5.33	48.56	1.43	0.95	0.12	
										A	144,220	3.02	50.49	0.90	0.79	0.09	

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-6	P	1			DOH1	7	7	12.50	15	21,131	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	4,500	03-ถ.ย.
1-6	A	1			DOH	-	-	-		34,560	0.64	53.54	0.22	0.56	0.02	4,500	03-ถ.ย.
2-6	P	1			AKL1	7	7	12.50	15	21,131	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,500	03-ถ.ย.
2-6	A	1			AKM	-	-	-		10,000	1.60	52.48	0.59	0.52	0.06	4,500	03-ถ.ย.
3-6	P			1	CHI	7	7	14.50	10	16,538	2.07	51.93	0.41	0.57	0.04	2,500	05-ถ.ย.
3-6	A			1	CHI	-	-	-		17,840	0.47	53.63	0.23	0.55	0.02	2,500	05-ถ.ย.
4-6	P			1	BFX1	7	7	12.50	6	8,453	1.10	52.51	0.53	0.51	0.03	2,500	05-ถ.ย.
4-6	A			1	BFW	-	-	-		8,345	0.90	53.13	0.33	0.61	0.03	2,500	05-ถ.ย.
5-6	P																
	A		1		FQR	-	-	-		1,850	1.90	46.63	0.49	3.28	0.08	4,000	05-ถ.ย.
	P																
สรุป	A																
	P	2	0	2	หินปูนในสัปดาห์ที่ 1 Al2O3 มากกว่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินผลิตซีเมนต์					46	67,253	1.45	52.26	0.47	0.59	0.03	3,757
	A	2	0	2						0	72,595	0.79	53.19	0.29	0.63	0.03	3,664
รวม						สะสมสัปดาห์ที่ 1			P	67,253	1.45	52.26	0.47	0.59	0.03		
									A	72,595	0.79	53.19	0.29	0.63	0.03		

เขล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
	P																-
	A																-
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
สะสมสัปดาห์ที่ 1										P	-	-	-	-	-	-	
										A	-	-	-	-	-	-	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Mine Planning Manager

3, 7, 69

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการขุดหินผลิต

707,900

ตัน

แผนการขุดหิน SMC&admixture

244,542

ตัน

สต็อกความคุม

200,000

ตัน

สต็อกความคุม

70,000

ตัน

STOCK 31 พ.ค. 69

330,029

ตัน

STOCK 31 พ.ค. 69

64,246

ตัน

แผนการผลิต

739,070

ตัน

แผนการผลิต

275,214

ตัน

แยกเป็นสัดส่วนหินที่การผลิต (A:B:C)

32:26:42

ตัน

คาดการณ์ STOCK 30 มิ.ย. 69

94,918

ตัน

Stockยกมา 31-พ.ค.

330,029

คาดการณ์(STOCK หินผลิตซีเมนต์บ้านเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	ปริมาณการขุด	คงเหลือ
ตัน	จำนวน	ปริมาณการขุด		
(จ)1	-	-	29,400	300,629
	-	-	24,050	313,103
(อ)2	-	-	29,400	271,229
	-	-	28,500	289,053
(พ)3	60,642	40	29,400	302,471
	68,895	-	21,876	340,020
(พฤ)4	-	-	29,400	273,071
	-	-	28,036	282,250
(ศ)5	90,017	64	21,700	341,388
	75,325	-	11,360	385,610
(ส)6	-	-	29,400	311,988
	-	-	32,314	372,501
(อา)7	-	-	29,400	282,588
	-	-	12,430	339,089
รวมการขุด (ตัน)			P	198,100
			A	158,566

Stockยกมา 31-พ.ค.

64,246

คาดการณ์(STOCK หินSMC&admixtureบ้านเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	ปริมาณการขุด	คงเหลือ
ตัน	จำนวน	ปริมาณการขุด		
(จ)1	-	-	8,898	55,348
	-	-	9,350	64,246
(อ)2	-	-	7,258	48,091
	-	-	8,063	54,704
(พ)3	42,263	30	8,898	81,456
	44,560	-	4,546	88,698
(พฤ)4	-	-	7,258	74,199
	-	-	3,817	86,583
(ศ)5	24,990	16	3,629	95,560
	28,035	-	8,149	88,583
(ส)6	-	-	7,258	88,302
	-	-	9,136	78,383
(อา)7	-	-	8,898	79,405
	-	-	5,833	65,247
สะสมการขุด			P	48,466
			A	40,745

คาดการณ์(STOCK เซลหน้าเมือง (ตัน)		Stockยกมา 31/2/69		90,000
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์	ปริมาณการข่ย	คงเหลือ
	ตัน	จำนวน		
(จ)1	-	-	-	90,000
	-	-	-	-
(อ)2	-	-	-	90,000
	-	-	-	-
(พ)3	-	-	-	90,000
	-	-	4,932	-
(พฤ)4	-	-	-	90,000
	-	-	2,959	-
(ศ)5	-	-	8,924	81,076
	-	-	-	-
(ส)6	-	-	-	81,076
	-	-	-	-
(อา)7	-	-	-	81,076
	-	-	-	-
สะสมการข่ย		P	8,924	
		A	7,891	

ประจำเดือน **มิถุนายน** พ.ศ. 2569 สัปดาห์ที่ ..2..... ช่วงวันที่ ..8..... ถึง ..14.....

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3,4(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
						กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
		A	B	C													
8-6	P		1		INS	6	6	11.50	20	19,656	17.13	39.05	3.25	0.79	0.46	3,800	08-ถ.ย.
-	A				หน้างานไม่อิสระ	-	-	-								-	
9-6	P			1	CH	7	7	14.50	27	44,717	5.53	49.03	0.96	0.51	0.07	4,000	08-ถ.ย.
9-6	A			1	CH	-	-	-		46,925	14.72	39.98	3.27	0.60	0.15	4,000	10-ถ.ย.
10-6	P			1	CG^	7	7	14.50	20	34,398	3.97	49.32	1.75	0.59	0.09	4,000	08-ถ.ย.
8-6	A			1	CG^	-	-	-		26,120	1.58	51.55	0.6	0.57	0.03	4,000	08-ถ.ย.
11-6	P	1			JRL	6	6	13.50	12	15,163	7.95	46.22	2.46	0.60	0.17	4,300	10-ถ.ย.
11-6	A	1			JRL	-	-	-		19,655	1.38	52.22	0.32	0.68	0.04	4,300	10-ถ.ย.
12-6	P		1		GRP	6	6	15.00	10	13,104	6.26	44.63	1.84	2.12	0.25	4,000	10-ถ.ย.
-	A				หน้างานไม่อิสระ	-	-	-								-	
13-6	P			1	AGV2	7	7	13.00	16	22,422	4.95	50.26	1.63	0.59	0.11	4,200	10-ถ.ย.
10-6	A			1	AGW	-	-	-		30,325	1.63	51.52	0.64	0.51	0.04	4,200	10-ถ.ย.
14-6	P	1			DOI	7	7	14.00	8	14,269	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	3,000	12-ถ.ย.
12-6	A	1			DOI	-	-	-		5,960	0.64	53.54	0.22	0.56	0.02	3,000	10-ถ.ย.
15-6	P		1		HSO	6	6	15.00	22	28,829	9.89	43.87	3.10	0.81	0.15	4,200	12-ถ.ย.
-	A				หน้างานไม่อิสระ	-	-	-								-	
16-6	P			1	BFX2	7	7	12.50	8	11,211	2.81	51.23	0.72	0.53	0.05	4,200	12-ถ.ย.
13-6	A			1	BFX	-	-	-		15,000	1.61	52.33	0.61	0.59	0.07	4,200	12-ถ.ย.
	P																
	A																
สรุป	P	4	3	8					143	203,770	6.70	47.40	1.80	0.72	0.14	4,269	
	A	2	0	4					0	142,985	5.75	48.08	1.41	0.58	0.08	2,187	

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณดิน	คุณภาพ					ระยะทางไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
5-6	P			1	CG^	7	7	14.50	8	13,230	2.07	51.93	0.41	0.57	0.04	2,700	08-ถ.ย.
6-6	A			1	CG^					10,000	1.58	51.55	0.60	0.57	0.03	2,700	08-ถ.ย.
6-6	P		1		GRP	6	6	15.00	8	12,600	1.48	49.42	0.42	2.03	0.07	4,500	10-ถ.ย.
	A				หน้างานไม่มีสระ												
7-6	P	1			DOI	7	7	14.00	10	15,925	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	4,500	12-ถ.ย.
7-6	A	1			DOH					25,000	0.64	53.54	0.22	0.56	0.02	4,500	10-ถ.ย.
8-6	P			1	BFX2	7	7	12.50	6	8,453	1.10	52.51	0.53	0.51	0.03	2,500	12-พ.ค.
8-6	A			1	BFX					6,400	0.78	53.12	0.33	0.63	0.04	2,500	12-ถ.ย.
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	1	1	2	หน้างานในส่วนที่ค่า Al2O3 นานกว่า 0.60 จะต้องมีเป็นหินผลึกซิเมนต์				32	50,208	1.43	51.60	0.41	0.96	0.04	3689	
	A	1	0	2					0	41,400	0.89	52.99	0.33	0.57	0.03	3756	
									P	117,460	1.44	51.98	0.44	0.75	0.04		
									A	113,995	0.83	53.12	0.31	0.61	0.03		

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดิน	คุณสมบัติ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5.6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P															-	
	A																
	P															-	
	A															-	
	P															-	
	A																
	P															-	
	A															-	
สรุป	P	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	A	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
						สะสมสัปดาห์ที่ 1-2			P								
									A	-	-	-	-	-			

Mine Maintenance

Mine Maintenance

94,918

282 588

คาดการณ์(STOCK) เงินผลเขียนต้นบ้านเมือง (ตัว)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวน	ปริมาณการย่อย	
(จ)8	98,771	67	29,400	351,959
	26,120	-	13,800	251,856
(ลึง)9	-	-	14,000	337,959
	-	-	21,650	359,111
(พ)10	50,690	38	22,400	366,249
	101,865	-	16,550	404,411
(พฤ)11	-	-	29,400	336,849
	-	-	17,500	374,184
(ศ)12	54,309	38	29,400	361,758
	15,000	-	13,260	414,851
(ส)13	-	-	25,400	336,358
	-	-	30,207	402,414
(อา)14	-	-	29,400	306,958
	-	-	27,082	393,542
สะสมการย่อย		P A	179,400 140,049	

Stockยกมา 07-ธ.พ. 79,405

คาดการณ์(STOCK นินSMC&admixtureหน้าเหมือง (ต้น)				
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ตัน	จำนวนร	ปริมาณการยกย	
(จ)8	13,230	8	7,258	85,377
	10,000	-	7,119	86,593
(ส)9	-	-	7,258	78,119
	-	-	4,718	58,117
(พ)10	12,600	8	7,258	83,462
	25,000	-	6,991	82,369
(พฤ)11	-	-	8,898	74,564
	-	-	6,648	72,747
(ศ)12	24,378	16	7,258	91,695
	6,400	-	2,659	67,747
(ด)13	-	-	7,258	84,427
	-	-	4,546	67,747
(อา)14	-	-	7,258	77,169
	-	-	7,720	51,947
สะสมการยกย		P Δ	52,443 33,196	

คาดการณ์(STOCK) เซลล์น้ำหมອງ (ต้น)			Stockยกมา 7/6/69	81,076
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ต้น	จำนวนรู	ปริมาณการย่อย	
(จ)8	-	-	-	81,076
	-	-	-	-
(อ)9	-	-	8,924	72,152
	-	-	5,318	-
(พ)10	-	-	4,462	67,690
	-	-	7,128	-
(พฤ)11	-	-	-	67,690
	-	-	5,449	-
(ค)12	-	-	-	67,690
	-	-	-	-
(ส)13	-	-	-	67,690
	-	-	-	-
(อา)14	-	-	-	67,690
	-	-	-	-
สะสมการย่อย		P	13,386	
		A	17,895	

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2569..... สัปดาห์ที่ ..3.....ช่วงวันที่.....15.....ถึง.....21.....

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3.4(เมตร)	วันที่ ตักขน แล้วเสร็จ
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
17-6	P	1			AJL	7	7	12.50	10	15,925	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,000	15-มิ.ย.
19-6	A	1			AKL1	7	7	12.50	10	19,875	1.77	52.08	0.69	0.52	0.06	4,000	19-มิ.ย.
18-6	P		1		GQQ	6	6	13.50	14	16,380	5.49	47.45	1.69	0.98	0.09	4,000	15-มิ.ย.
16-6	A		1		GRP					20,000	9.74	41.23	3.13	2.45	0.95	4,000	15-มิ.ย.
19-6	P			1	CHJ	7	7	14.50	20	34,398	2.56	49.85	0.82	1.26	0.07	4,000	15-มิ.ย.
14-6	A			1	CH ^α					30,575	4.78	48.85	1.73	0.79	0.09	4,000	15-มิ.ย.
20-6	P	1			IQJ	6	6	14.00	22	27,799	9.95	46.22	2.46	0.60	0.17	3,500	17-มิ.ย.
20-6	A	1			AKL2					13,760	1.77	52.08	0.69	0.52	0.06	3,800	19-มิ.ย.
21-6	P		1		FQR2	6	6	15.00	20	26,208	6.57	45.89	1.88	2.37	0.20	4,000	17-มิ.ย.
17-6	A		1		HSO					17,690	8.82	43.55	2.36	1.81	0.18	4,000	15-มิ.ย.
22-6	P			1	DH-	7	7	12.50	10	14,651	1.39	52.85	0.27	0.60	0.03	4,000	17-มิ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
23-6	P	1			GPI	7	7	12.00	20	30,576	19.06	43.02	2.91	0.75	0.36	3,500	19-มิ.ย.
22-6	A	1			DOH					8,310	0.64	53.54	0.22	0.56	0.02	3,000	19-มิ.ย.
24-6	P			1	BGZ1	7	7	13.50	10	15,925	2.17	53.09	0.35	0.67	0.02	4,000	19-มิ.ย.
21-6	A			1	BFX					13,000	1.61	52.33	0.61	0.59	0.07	4,000	19-มิ.ย.
25-6	P			1	CEI	7	7	14.00	10	16,562	1.59	53.41	0.68	0.71	0.04	4,200	19-พ.ค.
15-6	A			1	CFJ					18,220	1.09	52.8	0.41	0.59	0.03	4,200	15-มิ.ย.
	P																
18-6	A		1		INS					20,030	17.3	36.8	4.63	1.26	0.31	3,800	17-มิ.ย.
สรุป	P	3	2	4					116	198,424	6.63	48.53	1.48	1.01	0.14	3,379	
	A	3	3	3					0	162,460	5.85	47.51	1.79	1.06	0.21	3,928	
									0	552,854	6.30	48.12	1.58	0.89	0.13		
									0	449,865	4.51	44.65	1.27	0.75	0.12		

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
9-6	P	1			AJL	7	7	12.50	10	14,088	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,500	15-มิ.ย.
11-6	A	1			DOH					30,900	0.64	53.54	0.22	0.56	0.02	4,500	19-มิ.ย.
10-6	P		1		GQQ	6	6	13.50	8	10,080	1.64	51.61	0.49	0.73	0.07	4,500	15-มิ.ย.
10-6	A		1		GRP					9,250	1.59	49.79	0.45	2.08	1.36	4,500	15-มิ.ย.
11-6	P			1	DH-	7	7	12.50	10	14,088	1.39	52.85	0.27	0.60	0.03	2,500	17-มิ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
12-6	P			1	BGZ1	7	7	13.50	14	21,438	1.21	52.67	0.31	0.64	0.02	2,500	19-มิ.ย.
12-6	A			1	BFX					8,910	0.78	53.12	0.33	0.63	0.04	2,500	19-มิ.ย.
13-6	P			1	CEI	7	7	14.00	10	15,313	1.13	53.85	0.53	0.74	0.04	2,500	19-มิ.ย.
9-6	A			1	CEJ					18,600	1.09	52.80	0.41	0.59	0.03	2,500	15-มิ.ย.
	P																
	A																
สรุป	P	1	1	3	หน้างานในส่วนที่ 1 Al2O3 มากกว่า 0.60 จะตัดเข้าเป็นหินผลิตซีเมนต์				42	75,005	1.34	52.70	0.43	0.65	0.04	2,634	
	A	1	1	1					0	66,760	0.92	52.76	0.32	0.79	0.21	3,676	
									0	192,465	1.40	52.26	0.44	0.71	0.04		
									0	180,755	0.86	52.99	0.31	0.67	0.10		

เชลล์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ดัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2.5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	A	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

3 7 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

.....

Manager/Supervisor

Mine Operation

.....

Manager/Supervisor

Mine Processing

.....

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการขุดหินผลิต
สต็อกควบคุม
STOCK 31 พ.ค. 69
แผนการผลิต
แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)
คาดการณ์ STOCK 30 มิ.ย. 69

707,900
200,000
330,029
739,070
32:26:42
361,199

แผนการขุดหิน SMC&admixture
สต็อกควบคุม
STOCK 31 พ.ค. 69
แผนการผลิต
คาดการณ์ STOCK 30 มิ.ย. 69

244,542
70,000
64,246
275,214
94,918
306,958

คาดการณ์(STOCK) หินผลิตซีเมนต์นำเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ	
(จ)15	66,703	44	29,400	344,261
	86,485	-	15,900	493,470
(อ)16	-	-	29,400	314,861
	-	-	14,108	472,989
(พ)17	68,658	52	29,400	354,119
	20,030	-	27,512	461,030
(พ)18	-	-	29,400	324,719
	-	-	19,850	382,225
(ศ)19	63,063	40	14,000	373,782
	55,945	-	13,160	383,294
(ส)20	-	-	14,000	359,782
	-	-	7,140	388,294
(อา)21	-	-	14,000	345,782
	-	-	4,100	373,574
สะสมการขุด	P		159,600	
	A		101,770	

Stockยกมา 14-มิ.ย. 306,958

คาดการณ์(STOCK) หินSMC&admixtureนำเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ	
(จ)15	24,168	18	7,258	94,080
	27,850	-	15,718	34,307
(อ)16	-	-	8,898	85,182
	-	-	11,347	28,667
(พ)17	14,088	10	7,258	92,012
	-	-	-	37,867
(พ)18	-	-	7,258	84,754
	-	-	4,418	63,439
(ศ)19	36,750	24	7,258	114,247
	38,910	-	4,933	114,052
(ส)20	-	-	10,954	103,293
	-	-	14,545	99,052
(อา)21	-	-	10,954	92,340
	-	-	11,648	95,052
สะสมการขุด	P		52,578	
	A		57,676	

คาดการณ์(STOCK) เชลล์นำเหมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต	คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ	
(จ)15	-	-	-	67,690
	-	-	-	-
(อ)16	-	-	-	67,690
	-	-	-	-
(พ)17	-	-	-	67,690
	-	-	11,237	-
(พ)18	-	-	-	67,690
	-	-	-	-
(ศ)19	-	-	8,924	58,765
	-	-	-	-
(ส)20	-	-	-	58,765
	-	-	-	-
(อา)21	-	-	-	58,765
	-	-	5,876	-
สะสมการขุด	P		8,924	
	A		17,113	

แผน - ผลการทำเหมืองหินปูน

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 สัปดาห์ที่ 4 ช่วงวันที่ 22 ถึง 30

หินทำซีเมนต์

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 3,4(เมตร)	วันที่ ตักขนแล้วเสร็จ
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
26-6	P	1			CNH	7		12.50	10	15,925	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	3,000	22-ถ.ย.
23-6	A	1			CNJ					10,210	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	3,000	22-ถ.ย.
27-6	P		1		HRO	6	6	15.00	22	28,829	5.89	46.90	1.58	1.61	0.18	4,200	22-ถ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
28-6	P			1	BGV	7	7	8.00	21	17,390	4.95	50.26	1.63	0.59	0.11	4,500	22-ถ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
29-6	P	1			HRJ	6	6	13.50	12	15,163	9.95	46.22	2.46	0.60	0.17	3,000	24-ถ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
30-6	P		1		GRQ2	6	6	24.00	15	31,450	10.21	43.75	2.60	0.89	0.24	4,000	24-ถ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
31-6	P			1	CH^	7	7	14.50	12	20,639	12.53	40.38	3.99	1.91	0.30	4,000	24-ถ.ย.
24-6	A			1	CFJ					20,260	12.53	40.38	3.99	1.91	0.30	4,000	24-ถ.ย.
32-6	P	1			DOH2	7	7	12.50	8	12,740	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	3,000	26-ถ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
33-6	P			1	EHa	7	7	13.50	8	12,740	1.08	53.89	0.42	0.60	0.02	4,200	26-ถ.ย.
25-6	A			1	EH^					9,820	1.43	52.21	0.52	0.55	0.05	4,200	24-ถ.ย.
34-6	P	1			AKL2	7	7	12.50	12	19,110	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,000	29-ถ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
35-6	P			1	BGZ2	7	7	13.50	8	12,230	2.17	53.09	0.35	0.67	0.02	4,200	29-ถ.ย.
	A				หน้างานไม่อิสระ												
	P																
	A																
	P																
	A																
	P																
	A																
สรุป	P	3	2	4					118	186,216	5.83	48.20	1.65	0.96	0.14	3869	
	A	1	0	2					0	40,290	6.91	46.35	2.22	1.27	0.17	3795	
อึ้ง SMC & Admixture						สะสมสัปดาห์ที่ 1-4			P	739,070	6.18	48.14	1.60	0.91	0.13		
									A	489,955	5.07	48.46	1.45	0.86	0.13		

หินSMC&Admixture

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
14-6	P	1			CNH	7	7	12.50	10	14,088	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	4,500	22-มิ.ย.
13-6	A	1			CNJ					35,000	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	4,500	22-มิ.ย.
15-6	P	1			DOH2	7	7	12.5	15	21,131	1.04	52.57	0.35	0.68	0.02	4,500	26-มิ.ย.
	A				หน้างานไม่ใส่สระ												
16-6	P			1	EHa	7	7	13.50	12	18,375	1.08	53.89	0.42	0.60	0.02	2,800	26-มิ.ย.
15-6	A			1	EH*					30,000	1.43	52.21	0.52	0.55	0.05	2,800	24-มิ.ย.
17-6	P	1			AKL2	7	7	12.50	12	16,905	1.52	52.11	0.60	0.55	0.04	4,500	29-มิ.ย.
	A				หน้างานไม่ใส่สระ												
18-6	P			1	BG22	7	7	13.50	8	12,250	1.21	52.67	0.31	0.64	0.02	2,500	29-มิ.ย.
14-6	A			1	CFJ					5,220	1.21	52.67	0.31	0.64	0.02	2,500	24-มิ.ย.
	P																
	A																
สรุป	P	3	0	0	หน้างานเก็บตัวอย่างค่า Al2O3 มากกว่า 0.60 จะพัฒนาเป็นหินชนิดพิเศษ				49	82,749	1.17	52.78	0.41	0.63	0.02	3826	
	A	1	0	1					0	70,220	1.22	52.424	0.420	0.621	0.03	3625	
						สะสมสัปดาห์ที่ 1-4			P	275,214	1.33	52.42	0.43	0.69	0.03		
									A	250,975	0.96	52.83	0.34	0.66	0.08		

เชล

Blast ที่		ZONE เหมือง			สถานที่ Block	Pattern การเจาะ			จำนวนรูเจาะ	ปริมาณ ตัน	คุณภาพ					ระยะทาง ไป-กลับถึง CR 2,5,6(เมตร)	วันที่ ทำการระเบิด
		A	B	C		กว้าง Burden	ยาว Spacing	สูง Hight			SiO2	CaO	Al2O3	MgO	Alkali		
1-6	P		1		IMS	7	7	13.00	16	21,638	45.61	14.21	9.84	1.19	1.18	3,800	29-มิ.ย.
1-6	A		1		IMS					23,185	53.02	8.97	10.43	1.47	1.26	3,800	26-มิ.ย.
2-6	P																
	A	1			IQK					10,530	49.04	14.97	11.65	1.92	1.18	4,300	29-มิ.ย.
	P																-
	A																
	P																-
	A																
	P																-
	A																
สรุป	P	0	1	0					16	21,638	45.61	14.21	9.84	1.19	1.18	3,800	
	A	1	1	0					0	33,715	51.78	10.84	10.81	1.61	1.24	3,956	
						สะสมสัปดาห์ที่ 1-4				P	21,638	45.61	14.21	9.84	1.19	1.18	
										A							

ผู้จัดทำ.....

Mine Planning Staff

ผู้ตรวจสอบ.....

Mine Planning Manager

3 / 7 / 69

ผู้อนุมัติ.....

Mining Engineer

Manager/Supervisor

Mine Operation

Manager/Supervisor

Mine Processing

Manager/Supervisor

Mine Maintenance

แผนการขุดหินผลิต

707,900 ตัน

สต็อกความคุม

200,000 ตัน

STOCK 31 พ.ค. 69

330,029 ตัน

แผนการผลิต

739,070 ตัน

แยกเป็นสัดส่วนพื้นที่การผลิต (A:B:C)

32:26:42

คาดการณ์ STOCK 30 มิ.ย. 69

361,199 ตัน

แผนการขุดหิน SMC&admixture

244,542

สต็อกความคุม

70,000

STOCK 31 พ.ค. 69

64,246

แผนการผลิต

275,214

คาดการณ์ STOCK 30 มิ.ย. 69

94,918

Stockยกมา 21-มิ.ย. 100

345,782


คาดการณ์(STOCK) หินผลิตซีเมนต์น้ำเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต ตัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ
(จ)22	62,144	53	14,000	393,926
	10,210	-	-	411,474
(ง)23	-	-	14,000	379,926
	-	-	-	397,067
(พ)24	67,252	39	14,000	433,178
	30,080	-	-	449,399
(พฤ)25	-	-	21,000	412,178
	-	-	-	398,472
(ศ)26	25,480	16	21,000	416,658
	-	-	-	350,111
(ส)27	-	-	14,000	402,658
	-	-	-	343,116
(อา)28	-	-	14,000	388,658
	-	-	-	343,116
(จ)29	31,340	20	29,400	390,598
	-	-	-	409,482
(ง)30	-	-	29,400	361,198
	-	-	-	433,982
สะสมการขุด			P	170,800
			A	85,373

Stockยกมา 21-มิ.ย. 100

92,340


คาดการณ์(STOCK) หินSMC&admixtureน้ำเมือง (ตัน)				
วันที่	ปริมาณการผลิต ตัน	จำนวนรู	คาดการณ์ ปริมาณการขุด	คงเหลือ
(จ)22	14,088	10	10,954	95,474
	35,000	-	-	89,202
(ง)23	-	-	10,954	84,520
	-	-	-	85,702
(พ)24	-	-	7,258	77,262
	35,220	-	-	74,082
(พฤ)25	-	-	3,629	73,634
	-	-	-	86,397
(ศ)26	39,506	24	10,954	102,186
	-	-	-	93,793
(ส)27	-	-	10,954	91,232
	-	-	-	81,068
(อา)28	-	-	10,954	80,279
	-	-	-	81,068
(จ)29	29,155	20	7,258	102,176
	-	-	-	82,197
(ง)30	-	-	7,258	94,919
	-	-	-	77,697
สะสมการขุด			P	69,216
			A	57,006

คาดการณ์(STOCK) เชลนน้ำเหมือง (ตัน)			Stockยกมา 21/6/69	58,765
วันที่	ปริมาณการผลิต		คาดการณ์	คงเหลือ
	ตัน	จำนวนรู	ปริมาณการข่อย	
(จ)22	21,638	16		80,404
(ง)23	-	-	-	-
	-	-	10,936	80,404
(พ)24	-	-	4,462	75,942
	-	-	-	-
(พฤ)25	-	-	4,462	71,480
	-	-	-	-
(ศ)26	-	-	-	71,480
	23,185		-	-
(ส)27	-	-	-	71,480
	-	-	-	-
(อา)28	-	-	-	71,480
	-	-	-	-
(จ)29	-	-	-	-
	10,530		-	-
(ง)30	-	-	-	-
	-	-	2,669	-
	-	-		
สะสมการข่อย		P	8,924	
		A	13,605	

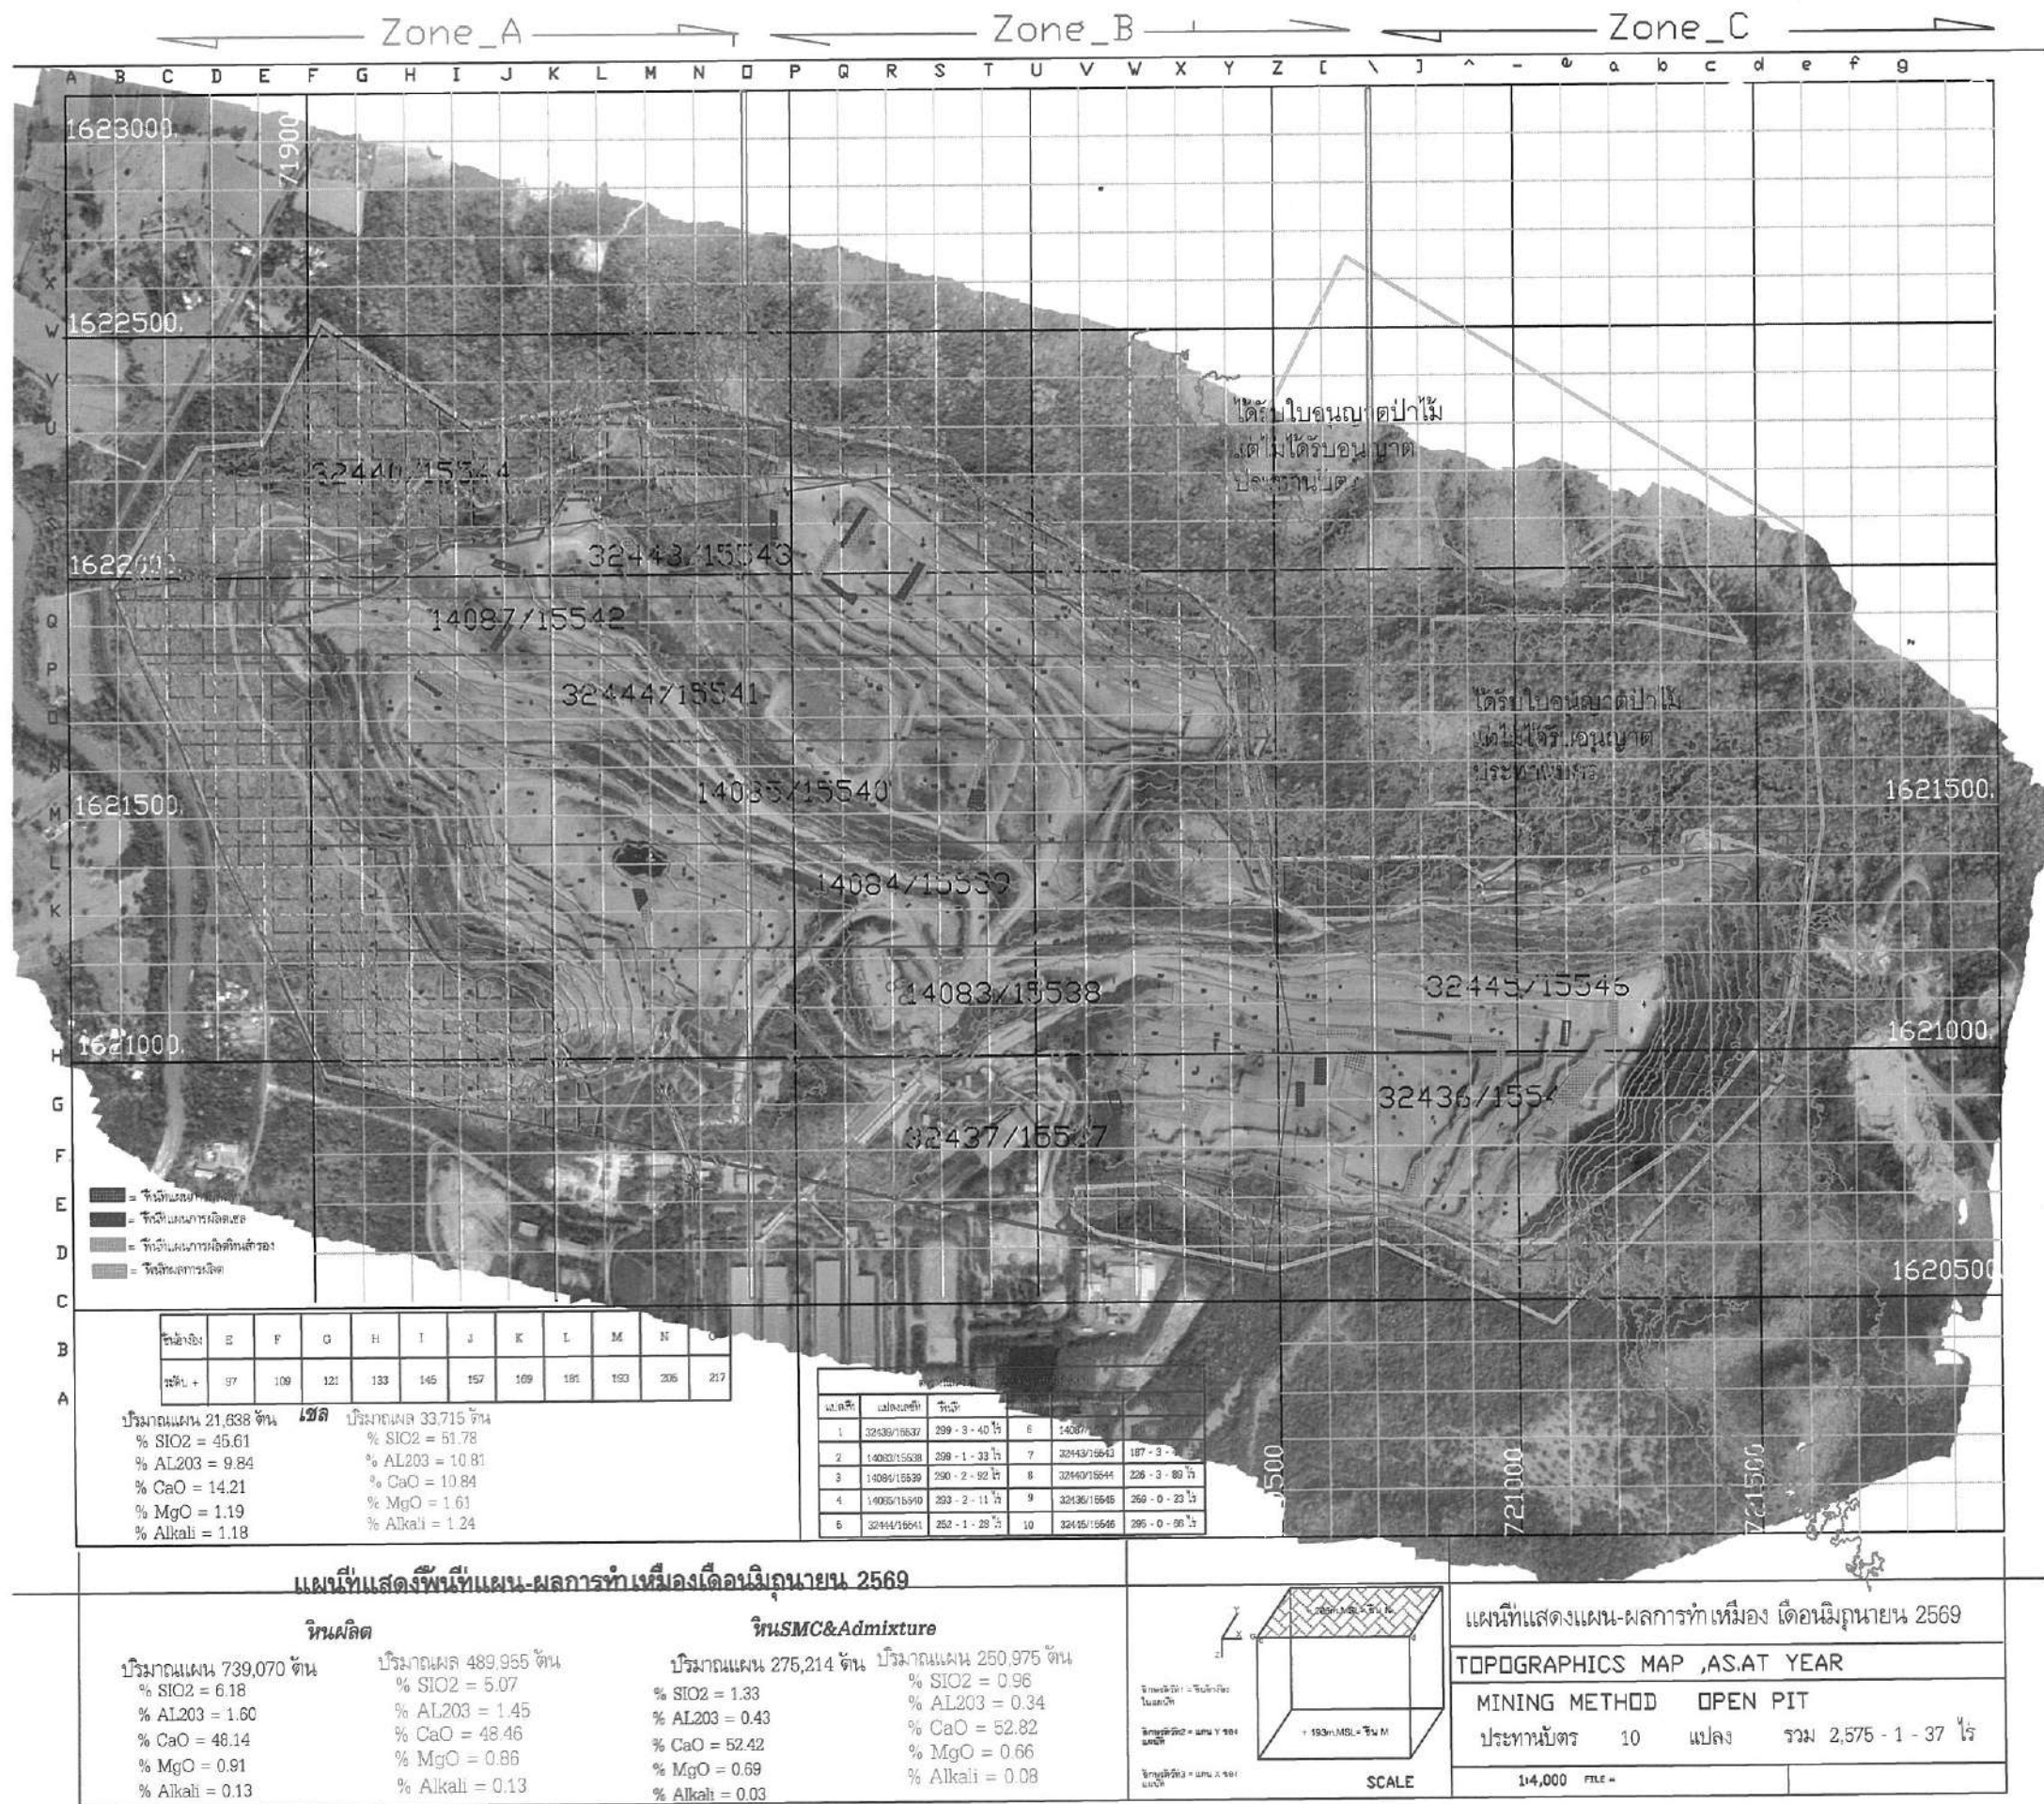

เอกสารแนบที่ 2.7

แผนผังการออกแบบหน้าเหมืองที่เว้นปีกเขา
เป็น Buffer Zone

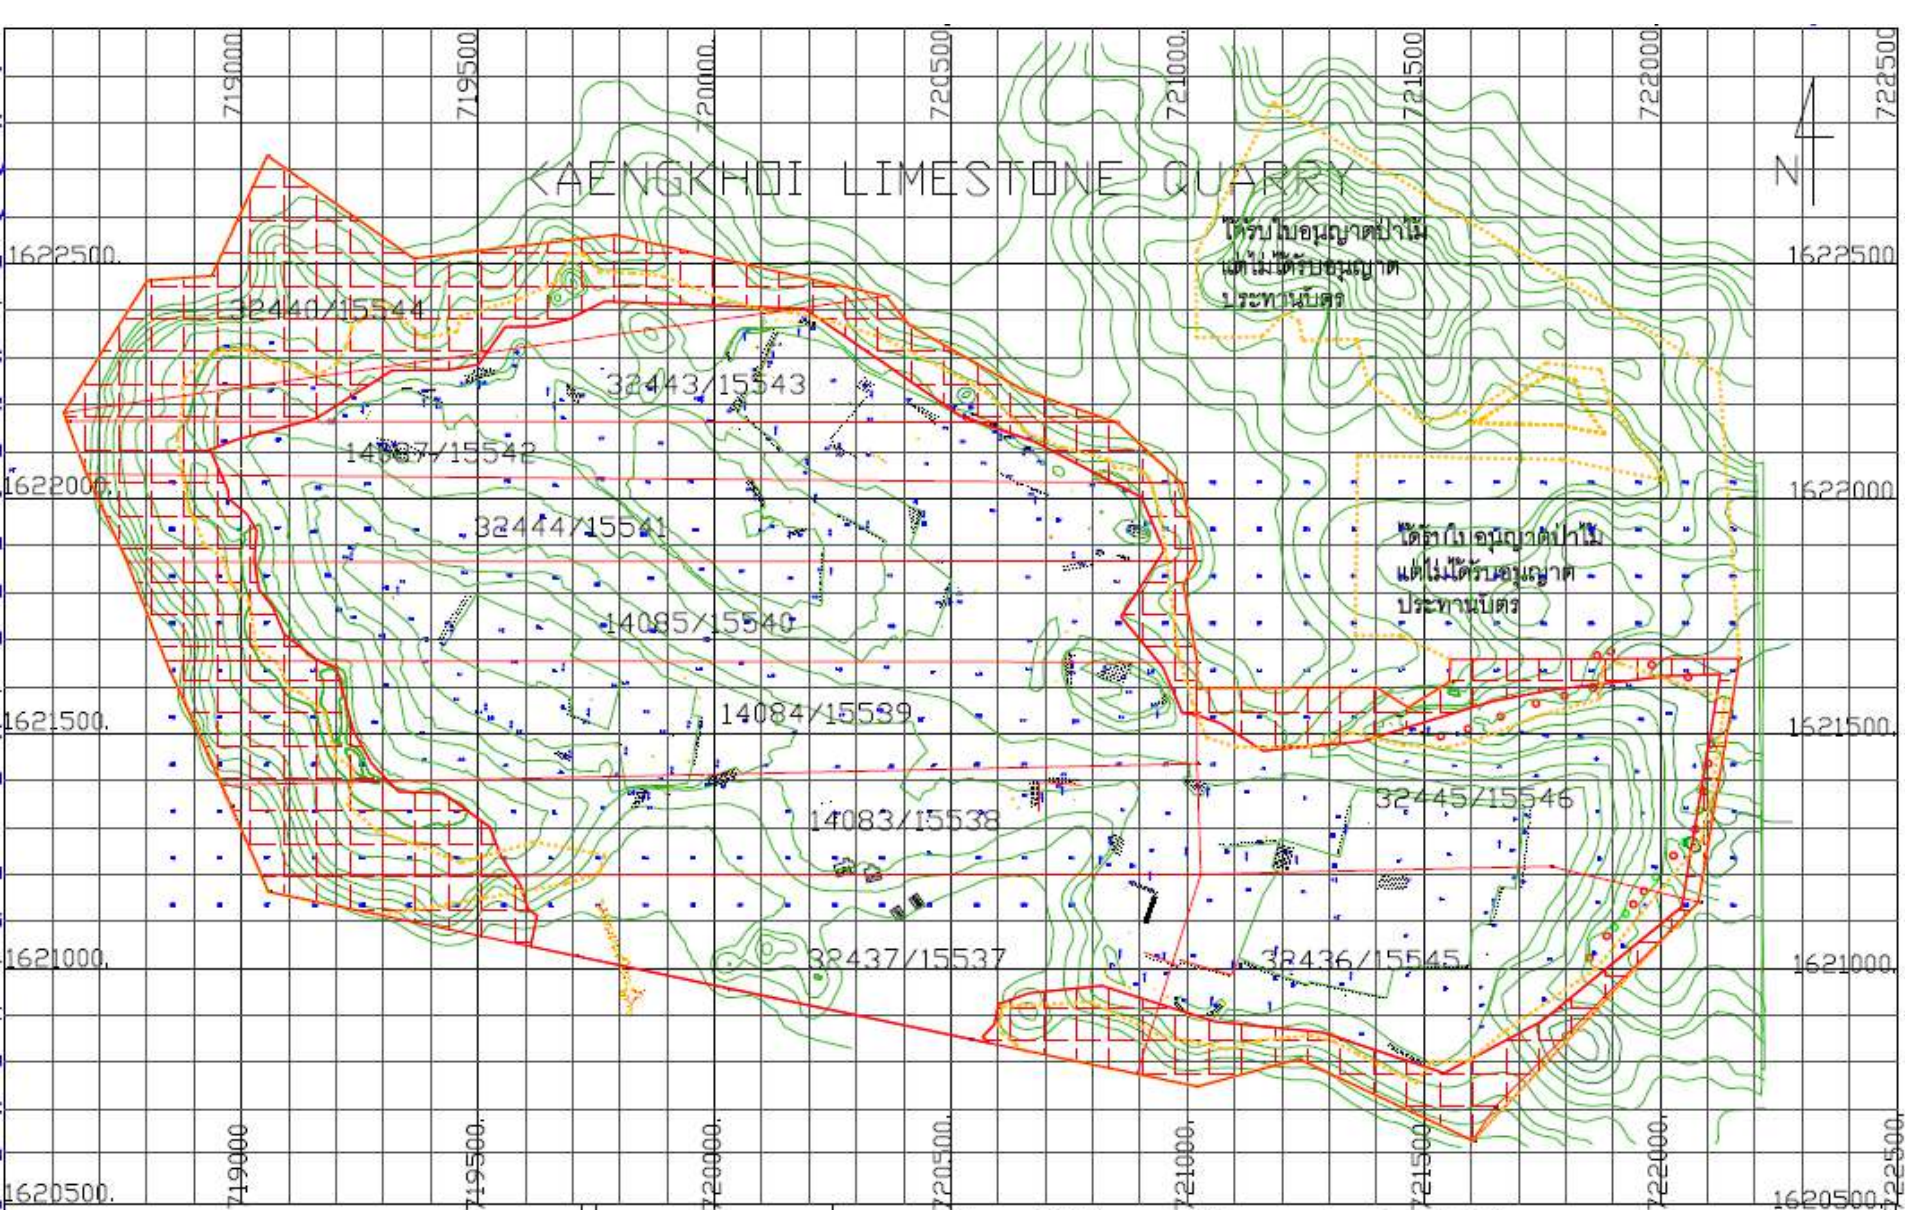

SCALE

1:12,500

แผนที่แสดงพื้นที่ แนวนผังโครงการทำเหมืองหินปึกเขาและ Buffer Zone

TOPOGRAPHICS MAP ,AS,AT YEAR 2004 A.D.

MINING METHOD OPEN PIT

ประทานบัตร 10 แปลง รวม 2,575 - 2 - 37 ไร่

FILE = KKMINING-ID:/CHAI/MAP MASTER /รายละเอียด

Buffer Zone

UpDate = 17/12/62
