

ภาคผนวกที่ 2
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1

สำเนาตอบรับการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568



- | | |
|---|---|
| ☐ ๑ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | ☒ ๔ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง |
| ☐ ๒ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ | ☐ ๕ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก |
| ☐ ๓ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้ | ☐ ๖ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ |

ชื่อโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
วันที่ยื่น ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๕
รหัสรับเรื่อง ๑๖๓๕
ผู้รับเรื่อง

ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ

หมายเหตุ: ๑. เอกสารนี้เป็นเพียงการยื่นคำร้องขอส่งรายงาน Monitor เท่านั้น (ไม่ใช่ ใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ)

๒. ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ ผ่านช่องทาง Line OA (ตาม QR Code) เท่านั้น

๓. โปรดเก็บหลักฐานส่วนนี้ไว้ เพื่อนำมาติดต่อรับใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ ภายใน ๗-๑๔ วัน นับจากวัน เวลา ที่ยื่นใบคำขอ

โปรดเก็บส่วนนี้ไว้

เป็นหลักฐาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ฉบับบรรณาธิการกลุ่ม กรม - ฉบับ ก.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/757 ลงวันที่ 27 มกราคม 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ บนที่ดินแปลงเลขที่ ๓ จำนวน 3 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จึงขอส่งให้กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานไทย)

เลขที่ 111 อาคาร M2 ชั้น 21 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 02-121-9999 เว็บไซต์: www.theplatinumgroup.co.th

The Platinum Group Public Company Limited (Head Office)

111, M2 Building, 21st Floor, Rajchadamri Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Tel: +66 (0) 2 121 9999 website: www.theplatinumgroup.co.th

เลขที่ PG-006/2569

วันที่ 16 มกราคม 2569



- เรื่อง** ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
- เรียน** ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี
- อ้างอิง** หนังสือสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/757 ลงวันที่ 27 มกราคม 2568
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ จำนวน 1 ชุด
 2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานฯ ระยะก่อสร้าง เสนอต่อสำนักงานเขตราชเทวี นั้น

บัดนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 22 จึงขอส่งให้สำนักงานเขตราชเทวีพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 111 อาคาร M2 ชั้น 21 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-121-9999 เว็บไซต์: www.theplatinumgroup.co.th

The Platinum Group Public Company Limited (Head Office)

111, M2 Building, 21st Floor, Ratchadamri Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2 121 9999 website: www.theplatinumgroup.co.th

ภาคผนวกที่ 2-2
เอกสารกรรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ

ภาคผนวกที่ 2-3
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการก่อนก่อสร้าง



ช่องทางติดต่อเรื่องร้องเรียน

• ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์

โครงการเดอะแพลทินัม สแควร์ (The Platinum Square)
ที่อยู่ : 222/1397 อาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นบอสส์ ชั้น 11
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 02-121-9999
E-mail : theplatinumsquare66@gmail.com

• ผู้รับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ

โครงการเดอะแพลทินัม สแควร์ (The Platinum Square)

รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน



สแกน QR Code



โครงการก่อสร้าง เดอะ แพลทินัม สแควร์ (The Platinum Square)



บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร



สถานที่ตั้งโครงการ

โครงการตั้งอยู่ : ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 P 666619.76 E, 1520737.77 N



พื้นที่โครงการ



รายละเอียดโครงการ

- ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประเภทและขนาดโครงการ : โครงการประเภทโรงแรม จำนวนห้องพัก 630 ห้อง และพื้นที่พารกียกรรรม
- ลักษณะอาคาร : อาคารสูง 49 ชั้น (ชั้นลอย 1 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)
- ที่จอดรถยนต์ : จำนวน 615 คัน
- รายละเอียดการก่อสร้าง : ระยะเวลาการก่อสร้าง ประมาณ 1,620 วัน (54 เดือน) วิธีการก่อสร้าง : การก่อสร้างฐานรากใช้เสาเข็มเจาะซึ่งเป็นวิธีที่มีความสิ้นเปลืองต่ำ
- เส้นทางขนส่ง : ถนนเพชรบุรี และถนนราชประสงค์
- บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท คอนกรีตคอนกรีต แบมเบตตัน จำกัด
- บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) (ระยะเวลา 90 วัน)



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• คุณภาพอากาศ

- 1 กำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในช่วงการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ และแสดงผลการตรวจวัดแบบ Real Time ด้านหน้าพื้นที่โครงการ ในกรณีที่ผลตรวจวัดเกินค่ามาตรฐานโครงการจะแจ้งเตือนหรือลดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เช่น งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานตัด งานเจาะ และงานเขี่ย เป็นต้น
- 2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาขบวนพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นประจำตามคำแนะนำ/คู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
- 3 ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นเขตอันตรายและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก
- 4 จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเรียบร้อยและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกวันภายหลังเลิกงานและพรมน้ำให้ชื้นก่อนการทำความสะอาดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

• เสียง

- 1 ติดตั้งรั้วชั่วคราวสูง 6 ม. รอบพื้นที่โครงการ โดยวัสดุที่ใช้เป็น Galvanized Steel 24 ga หนา 0.64 มม. หรือประติรูปยู-ออกดอลหรือระยะเวลาก่อสร้างซึ่งจะกำหนดให้เป็นกำหนดเสียงตามความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ
- 2 กำหนดใช้บริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด
- 3 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

• ความสั่นสะเทือน

- 1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างและให้ข้อพรหมานะโยหรือพื้นที่ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง
- 2 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนน้อยที่สุด
- 3 จัดให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ตัวอย่าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

• ทรัพยากรน้ำ

- 1 ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2 ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเดิมขนาดความจุ้ยน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเพชรบุรีและไปเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดิบของกรม



• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- 1 กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับหรือใกล้เสียงเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีเสียงดังในระหว่าง 1.0 และ 5.0 ม. ต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียงที่มีค่าลดเสียง (NRR) 32 dB(A) หรือสวมใส่ที่ครอบหูแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าลดเสียง (NRR) 32 dB(A) โดยการเฉลี่ยค่าที่ครอบหูลดเสียง คนงานสามารถปรับได้ไม่ต่ำกว่า 8 ซม./วัน ส่วนกรณีสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ถ้าทำงานกับหรือใกล้เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีเสียงดังในระหว่าง 1.0 ม. ให้ทำงานได้ไม่เกิน 3 ชม. ในช่วงงานเตรียมพื้นที่, ไม่เกิน 1 ชม. ในช่วงงานฐานรากอาคาร, ไม่เกิน 2 ชม. ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและไม่เกิน 3 ชม. ในช่วงงานตกแต่งอาคาร โดยจัดให้มีการพักของงานและมีการหมุนเวียนคนงานในการทำงาน
- 2 จัดให้มีการติดประกาศมาตรฐานเสียง/ข้อบังคับที่คนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังหรือทำงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง
เพิ่มเติมได้จาก QR ด้านล่าง



สแกน QR Code




ภาคผนวกที่ 2-4
ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดส่งผ่านช่องทาง ปณ.

พื้นที่สีแดงรวม จำนวน 11 แห่ง		ที่อยู่จัดส่ง ปณ.		ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ก่อนก่อสร้าง	
1	โรงแรม Amari Watergate Bangkok เลขที่ 847	โรงแรม Amari Watergate Bangkok เลขที่ 847 ถ. เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055041 7 TH	รับเอกสาร	
2	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055042 5 TH	รับเอกสาร	
3	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055043 4 TH	รับเอกสาร	
4	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055044 8 TH	รับเอกสาร	
5	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055045 1 TH	รับเอกสาร	
6	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055046 5 TH	รับเอกสาร	
7	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055047 9 TH	รับเอกสาร	
8	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055048 2 TH	รับเอกสาร	
9	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055049 6 TH	รับเอกสาร	
10	อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า)	ท่านเจ้าของบ้านเลขที่	RB04055050 5 TH	รับเอกสาร	
กลุ่มโรงแรม/สถานประกอบการ					
1	อาคารแพลตินัม แฟชั่น มอลล์	อาคารแพลตินัม แฟชั่น มอลล์ กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055051 9 TH	รับเอกสาร	
2	โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ	โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055052 2 TH	รับเอกสาร	
3	โรงแรมบางกอกฮิลล์ อินน์	โรงแรมบางกอกฮิลล์ อินน์ นคร 10330	RB04055053 6 TH	รับเอกสาร	
4	อาคารเดอะ พลาเซียม เวสต์ ซอยปิ้ง	อาคารเดอะ พลาเซียม เวสต์ กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055054 0 TH	รับเอกสาร	
5	โรงแรม The Berkeley Hotel	The Berkeley Hotel กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055055 3 TH	รับเอกสาร	
6	อาคาร Centara Watergate Pavilion Hotel Bangkok	อาคาร Centara Watergate กรุงเทพมหานคร แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055056 7 TH	รับเอกสาร	
7	อาคาร Baiyoke Galley Night Market	อาคาร Baiyoke Galley Night Market กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055057 5 TH	ปณ. ติดลบ (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่)	
8	อาคารไนท์พาร์คไนท์	อาคารไนท์พาร์คไนท์ กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055058 4 TH	รับเอกสาร	
9	อาคารซีดี คอมเพล็กซ์	อาคารซีดี คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055059 8 TH	ไม่ยอมรับ	
10	อาคารกรุงทองพลาซ่า	อาคารกรุงทองพลาซ่า กรุงเทพมหานคร 10400	RB04055060 7 TH	รับเอกสาร	
20 แห่ง					

พื้นที่ในประะยะ 100 เมตร Zone A		ที่อยู่จัดส่ง ปณ.		ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ก่อนก่อสร้าง	
1	ร้านปลาวันเพียว 3 ชั้น เลขที่ 3	ร้านปลาวันเพียว by อิมเมจิอ กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055061 5 TH	รับเอกสาร	
2	Feel Restaurant 3 ชั้น เลขที่ 3	ร้าน Feel Restaurant เลขที่ 3 กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055062 4 TH	รับเอกสาร	
3	ร้าน อานอนวด 3 ชั้น เลขที่ 3	ร้าน อานอนวด 39-39/1-39/1 กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055063 8 TH	รับเอกสาร	
4	MR. Feet(Thailand) 4 ชั้น เลขที่ 3	MR. Feet(Thailand) เลขที่ 19/1 กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055064 1 TH	รับเอกสาร	
5	สุชาติพยนต์ 4 ชั้น เลขที่ 12-1	สุชาติพยนต์ เลขที่ 13 ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055065 5 TH	รับเอกสาร	
6	ร้านจำหน่ายพระเครื่อง 4 ชั้น เลขที่ 10	เลขที่ 11 อ.ราชดำริ แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055066 9 TH	รับเอกสาร	
7	ร้านขายของชำ 4 ชั้น เลขที่ 10	เลขที่ 10 อ.ราชดำริ แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055067 2 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจาก ปณ. แจ้งว่าไม่มีเลขที่บ้านตามเจ้าหน้าที่ของ	
8	ร้านขายยาภูเขา 4 ชั้น เลขที่ 8	ร้าน City of Massage เลขที่ 2 กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055068 6 TH	รับเอกสาร	
9	ร้านข้าวมันไก่เจ๊สุบิ 4 ชั้น เลขที่ 9	ร้านข้าวมันไก่เจ๊สุบิ เลขที่ 9 ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055069 0 TH	รับเอกสาร	
11	ร้านจำหน่ายพระเครื่อง 3 ชั้น เลขที่ 9	เลขที่ 912 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055070 9 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจาก ปณ. แจ้งว่าไม่มีเลขที่บ้านตามเจ้าหน้าที่ของ	
12	รถแท็กซี่ภูเขา 3 ชั้น เลขที่ 9	เลขที่ 913 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055071 2 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่	
13	ร้านสีกาย 3 ชั้น เลขที่ 914-9	ร้าน All Style Tattoo เลขที่ 9 กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055072 6 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่	
14	พรทิพย์ไวยเสียว 3 ชั้น เลขที่ 9	เลขที่ 920-921 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055073 0 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่ยอมรับ	
15	ห้างพนาทอง 3 ชั้น เลขที่ 930	ห้างพนาทอง จำกัด กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055074 3 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากเลิกกิจการ	
16	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 938	เลขที่ 938 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055075 7 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่	
17	โรงแรม ข้าวมันไก่ 3 ชั้น เลขที่ 938	ร้านกวงเฮงข้าวมันไก่ เลขที่ 938 กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055076 5 TH	รับเอกสาร	
18	ประมณณ์ 3 ชั้น เลขที่ 948	เลขที่ 948 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055077 4 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่	
19	ซีเอ็ม 3 ชั้น เลขที่ 950 อ.เพชรบุรี	เลขที่ 950 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055078 8 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่	
20	ไทยเจริญประตูนํ้า 3 ชั้น เลขที่ 950	ร้านไทยเจริญประตูนํ้า เลขที่ 22 กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055079 1 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน	
21	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/13 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055080 5 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่	
22	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/11-12 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055081 4 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่	
23	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/4-5 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055082 8 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่	
24	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/3 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055083 1 TH	รับเอกสาร	
25	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/2 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055084 5 TH	รับเอกสาร	
26	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/1 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055085 9 TH	รับเอกสาร	
มีไม่แสดงรายละเอียดในหน้าผู้จัด					
27	บ้านสุโขทัย 3 ชั้น เลขที่ 917-9	เลขที่ 917-919 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055086 2 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจาก ปณ. แจ้งว่าไม่มีเลขที่บ้านตามเจ้าหน้าที่ของ	
28	โรงเรียนจำปา 3 ชั้น เลขที่ 922-9	เลขที่ 922-924 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055087 6 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจาก ปณ. แจ้งว่าไม่มีเลขที่บ้านตามเจ้าหน้าที่ของ	
29	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/9 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055088 0 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจาก ปณ. แจ้งว่าไม่มีเลขที่บ้านตามเจ้าหน้าที่ของ	
30	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/8 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055089 3 TH	รับเอกสาร	
31	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/7 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055090 2 TH	รับเอกสาร	
32	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958	เลขที่ 958/6 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055091 6 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่	
จำนวนผู้ที่ไม่ประสงค์แสดง					
33	4 ชั้น เลขที่ 16-21 อ.ราชดำริ	เลขที่ 16-21 อ.ราชดำริ แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055092 0 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีเลขที่บ้านตามเจ้าหน้าที่	
34	สนามกีฬา 4 ชั้น เลขที่ 9 อ.ราชดำริ	เลขที่ 9 อ.ราชดำริ แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055093 3 TH	รับเอกสาร	
35	ห้างพนาทอง 3 ชั้น เลขที่ 930	เลขที่ 930 อ.เพชรบุรี แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055094 7 TH	รับเอกสาร	
36	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 958/14 อ.ราชดำริ	เลขที่ 958/14 อ.ราชดำริ แขวงมณีพิก กรุงเทพมหานคร 10330	RB04055095 5 TH	ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่มีเลขที่บ้านตามเจ้าหน้าที่	

ภาคผนวกที่ 2-5
ผังรับเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง

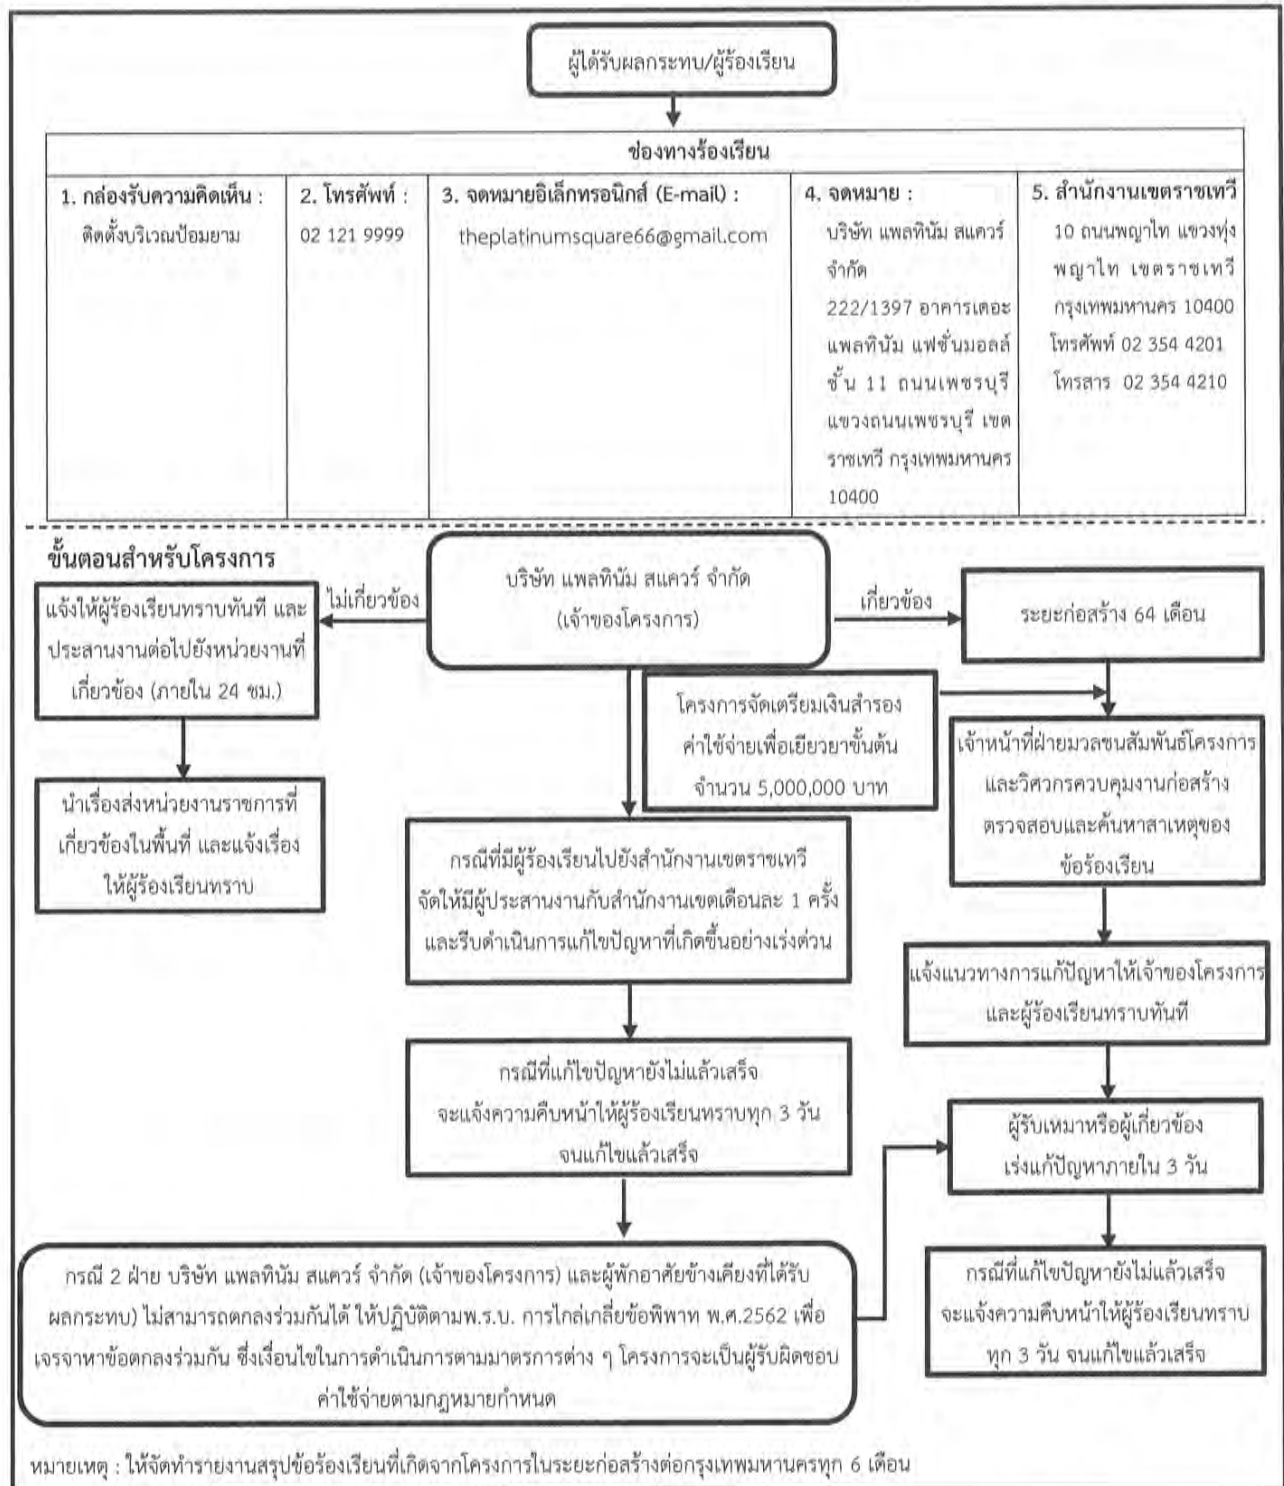

รูปที่ 6 : แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและชดเชยเยียวยาในระยะก่อสร้าง

ภาคผนวกที่ 2-6
หนังสือใบรับแจ้งการขุดดิน-ถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 แบบ ด.2

ที่ ทก.๐๐๐



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗๓ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขอย้ายที่ดินจากโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์

เรียน นาย

กรรมการบริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด ฉบับที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังพื้นที่ถมดินของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด ผู้เช่าที่ดินบริเวณเพชรบุรีตอนเชิงสะพานเฉลิมโลก ระยะเวลาก่อสร้าง ๖ ปี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และระยะเวลาการเช่า ๓๐ ปี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๗๒ มีวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อพัฒนาที่ดินก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์เป็นอาคารพาณิชย์กรรม อาคารศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน โรงแรมรีสอร์ท และโรงแรม ภายใต้ชื่อ “โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์” ได้แจ้งปริมาณดิน และขอทราบพื้นที่รองรับดินสำหรับโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ เพื่อนำไประบุลงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และนำส่งข้อมูลการคำนวณปริมาณดิน จำนวน ๙๖,๔๕๒ ลูกบาศก์เมตร มาให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ก่อนดำเนินการ นั้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาปริมาณดินที่ขอย้ายออกจากโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ จำนวน ๙๖,๔๕๒ ลูกบาศก์เมตร พบว่ามีรายการคำนวณถูกต้อง และได้พิจารณาพื้นที่รองรับดินที่จะขอย้ายออกจากโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ แล้วคือที่ดินแปลงที่

บางบอน (ริมคลองบางบอน) ซอยเอกชัย ๑๐๙ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

/เมื่อ...

เมื่อบริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ แล้ว ให้ขณย้ายดินจากโครงการดังกล่าวไปถมยังพื้นที่ว่างข้างต้น ทั้งนี้ ให้บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงให้เป็นไปตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้-

๑. ให้ดำเนินการถมดินทั้งพื้นที่ได้สูงไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร จากระดับผิวน้ำ ณ ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร และหากพื้นที่ข้างเคียงมีลักษณะเป็นร่องน้ำ หรือคูคลอง ก็ต้องเว้นระยะห่างเพิ่มเติมเพื่อกันไม่ให้เกิดดินเคลื่อนตัวลงไปในน้ำ พร้อมปรับคันดินรอบบริเวณให้เรียบร้อย โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินอย่างเคร่งครัด

๒. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดผลต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง

๓. ติดตั้งป้ายโครงการที่มีความมั่นคงแข็งแรงขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ระบุชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้รับผิดชอบการถมดินในพื้นที่

โดยจัดทำเป็นสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เรื่องการขณย้ายดินจากโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดส่งสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติมดังกล่าวให้บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด พิจารณาลงนามต่อไป ทั้งนี้ สามารถประสานงานเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนิตยา เนติธรรมกุล หัวหน้ากองบริหารโครงการเชิงธุรกิจ ฝ่ายโครงการพิเศษ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัทร ทองสุก)

รองผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงนามแทนผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองบริหารโครงการเชิงธุรกิจ ฝ่ายโครงการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐-๒๗๘๗-๖๑๔๗

โทรสาร ๐-๒๗๘๗-๖๑๔๒

www.crownproperty.or.th



แบบ ด.๒

ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

เลขที่ ๖ / ๒๕๖๘

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก นายบัณฑิต [REDACTED]
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ว่ามีความประสงค์จะทำการถมดิน ดังต่อไปนี้

ถมดินพื้นที่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร ในที่ดินโฉนดเลขที่ [REDACTED]
ตำบลบางบอนใต้ อำเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ ถนนพระรามที่ ๒
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมี

๑. นายบัณฑิตวิช [REDACTED] เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ
๒. นายบัณฑิตวิช [REDACTED] เป็นผู้ควบคุมงาน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงให้ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ
ขุดดิน/ถมดิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๘ โดยต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหลังใบรับแจ้งนี้ จำนวน ๑๑ ข้อด้วย

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม [REDACTED]

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)

ผู้อนุญาต

(นายสมศักดิ์ ตั้งเยี่ยมสกุล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต วิศวกรรมสถาน

ผู้ช่วยวิศวกรเขตบางบอน

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

คำเตือน ผู้ขุดดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕
- (๒) ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่
- (๓) การฝ่าฝืน(๑)-(๓) อาจมีโทษจำคุก โทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี
- (๔) ข้อปฏิบัติข้อกำหนดในการขุดดิน หรือ ถมดินแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้

เงื่อนไขหลังใบรับแจ้งในการขุดดิน/ถมดิน เลขที่ ๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

- ข้อ ๑. การขุดดินหรือถมดิน จะต้องกระทำให้ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร โดยรอบ
- ข้อ ๒. การถมดิน จะต้องมีการป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในที่ดินข้างเคียง
- ข้อ ๓. ค่าพิกัดความปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดินต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร
- ข้อ ๔. ในการขุดดิน หรือถมดิน ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของเขตที่ดินให้ชัดเจน ณ บริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน
- ข้อ ๕. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องติดตั้งป้าย ณ บริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร และสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินหรือถมดิน โดยแสดงข้อความเลขที่ใบรับแจ้งการถมดิน ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ควบคุมงาน
- ข้อ ๖. การขุดดินหรือถมดิน จะต้องจัดให้มีโครงสร้างป้องกันดินพังทลายของที่ดินข้างเคียงโดยอยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดินหรือถมดิน
- ข้อ ๗. การขุด การถม การขน การบรรทุก หรือการเคลื่อนย้ายดิน ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
- การใช้รถบรรทุกดิน น้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และในกรณีที่มีประกาศผู้อำนวยการทางหลวงใช้บังคับก็ต้องปฏิบัติตามให้เป็นที่ไปตามประกาศนั้น โดยเคร่งครัด
- (๑) การขุด การถม การขน การบรรทุก หรือการเคลื่อนย้ายดิน จะกระทำได้นเฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- (๒) ห้ามใช้เครื่องจักรกล ที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า ๗๕ เดซิเบล ภายในรัศมี ๓๐ เมตร
- (๓) ห้ามใช้เครื่องจักรกลในการขุดดิน หรือถมดิน อันก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง
- (๔) เศษวัสดุ หรือดินที่นำมาถมจะต้องปกคลุมการบรรทุกด้วยผ้าคลุมมิดชิดทั้งด้านบนและด้านล่าง ทั้ง ๓ ด้าน
- ข้อ ๘. ในกรณีที่จำเป็นต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
- ข้อ ๙. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดคนคอยอำนวยความสะดวกและทำความสะอาดเศษดิน หรือเศษวัสดุที่ร่วงหล่นในถนนสาธารณะตลอดเวลาที่ทำการบรรทุกดิน
- ข้อ ๑๐. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หากทำผิดเงื่อนไขจะต้องหยุดงานและแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่ทักท้วงก่อนถึงจะดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๑๑. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด



แบบ ด.๒

ใบรับแจ้งการชูดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการชูดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที่ ๑๒ / ๒๕๖๘

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก [redacted]
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ว่ามีความประสงค์จะทำการถมดิน ดังต่อไปนี้

ถมดินพื้นที่ ๒๑,๔ [redacted]
ตำบลบางบอน อำเภอบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ ถนนพระรามที่ ๒
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินของ สำนักงานพระคลังข้างที่ โดยมี

๑. นายอภิร [redacted] เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ
๒. นายอภิร [redacted] เป็นผู้ควบคุมงาน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงให้ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ
ชูดิน/ถมดิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหลังใบรับแจ้งนี้ จำนวน ๑๑ ข้อด้วย

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม [redacted] (น)
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการชูดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖

(ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้อนุญาต

(นางลออ [redacted])

ผู้อำนวยการเขตบางบอน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน ผู้ชูดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕
- (๒) ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่
- (๓) การฝ่าฝืน(๑)-(๓) อาจมีโทษจำคุก โทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี
- (๔) ข้อปฏิบัติข้อกำหนดในการชูดิน หรือ ถมดินแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้

เงื่อนไขหลังใบรับแจ้งในการขุดดิน/ถมดิน เลขที่ ๑๒ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

ราย นายอภิราช จันทร์ประดับ

- ข้อ ๑. การขุดดินหรือถมดิน จะต้องกระทำให้ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร โดยรอบ
- ข้อ ๒. การถมดิน จะต้องมีการป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในที่ดินข้างเคียง
- ข้อ ๓. ค่าพิกัดความปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดินต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร
- ข้อ ๔. ในการขุดดิน หรือถมดิน ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของเขตที่ดินให้ชัดเจน ณ บริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน
- ข้อ ๕. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องติดตั้งป้าย ณ บริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร และสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินหรือถมดิน โดยแสดงข้อความเลขที่ใบรับแจ้งการถมดิน ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ควบคุมงาน
- ข้อ ๖. การขุดดินหรือถมดิน จะต้องจัดให้มีโครงสร้างป้องกันดินพังทลายของที่ดินข้างเคียงโดยอยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดินหรือถมดิน
- ข้อ ๗. การขุด การถม การขน การบรรทุก หรือการเคลื่อนย้ายดิน ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
การใช้รถบรรทุกทุกคัน น้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และในกรณีที่มีประกาศผู้อำนวยการทางหลวงใช้บังคับก็ต้องปฏิบัติตามประกาศนั้น โดยเคร่งครัด
 - (๑) การขุด การถม การขน การบรรทุก หรือการเคลื่อนย้ายดิน จะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 - (๒) ห้ามใช้เครื่องจักรกล ที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า ๗๕ เดซิเบล ภายในรัศมี ๓๐ เมตร
 - (๓) ห้ามใช้เครื่องจักรกลในการขุดดิน หรือถมดิน อันก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง
 - (๔) เศษวัสดุ หรือดินที่นำมาถมจะต้องปกคลุมการบรรทุกด้วยผ้าคลุมมิดชิดทั้งด้านบนและด้านล่างข้างทั้ง ๓ ด้าน
- ข้อ ๘. ในกรณีที่จำเป็นต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
- ข้อ ๙. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดคนคอยอำนวยความสะดวกและทำความสะอาดเศษดิน หรือเศษวัสดุที่ร่วงหล่นในถนนสาธารณะตลอดเวลาที่ทำการบรรทุกดิน
- ข้อ ๑๐. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หากทำผิดเงื่อนไขจะต้องหยุดงานและแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่ทักท้วงก่อนถึงจะดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๑๑. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด

ภาคผนวกที่ 2-7

ตัวอย่างเอกสารรายงานการสำรวจอาคารข้างเคียง
(ก่อนก่อสร้าง)

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

โรงแรม
อมารี วอเตอร์เกท
กรุงเทพฯ

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1257-1258

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1259-1260

สภาพบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1261-1262

สภาพบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1263-1264

สภาพบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1265-1266

สภาพบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1267-1268

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1269-1270

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1271-1272

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1273-1274

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

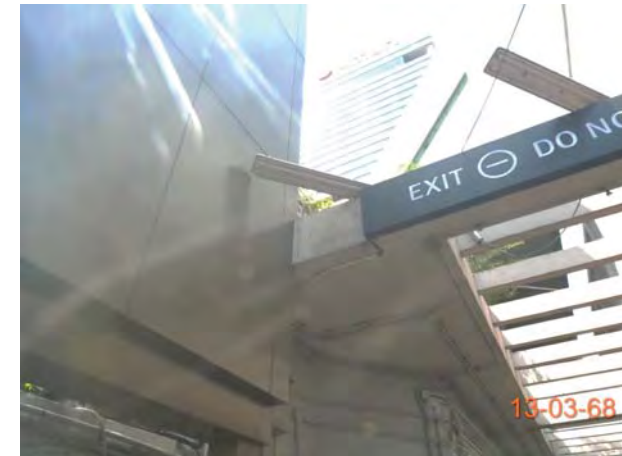

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1275-1276

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1277-1278

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1279-1280

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1281-1282

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1283-1284

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1285-1286

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1287-1288

รอยแตกร้าว ครอบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1289-1290

รอยแตกร้าว ครอบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

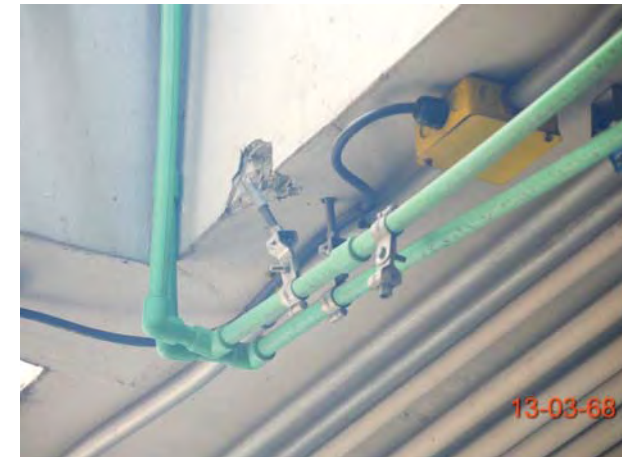

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1291-1292

รอยแตกร้าว ครอบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1293-1294

รอยแตกร้าว ครอบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

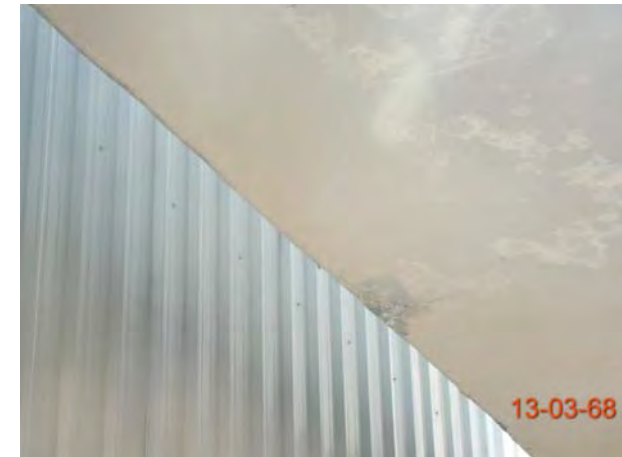

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1295-1296

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1297-1298

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1299-1300

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1301-1302

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1303-1304

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1305-1306

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1307-1308

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1309-1310

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1311-1312

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1313-1314

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

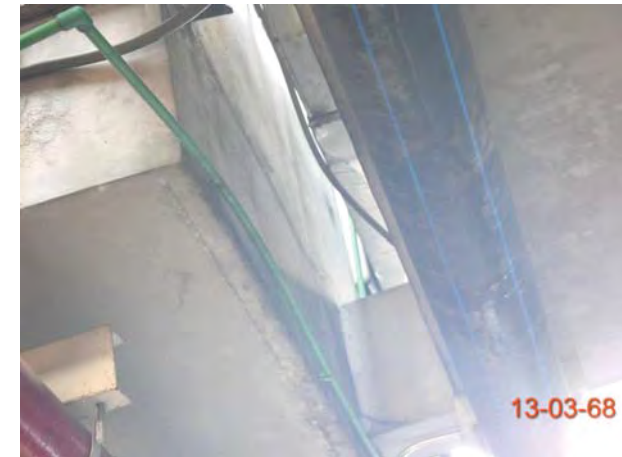

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1315-1316

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1317-1318

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1319-1320

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1321-1322

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1323-1324

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

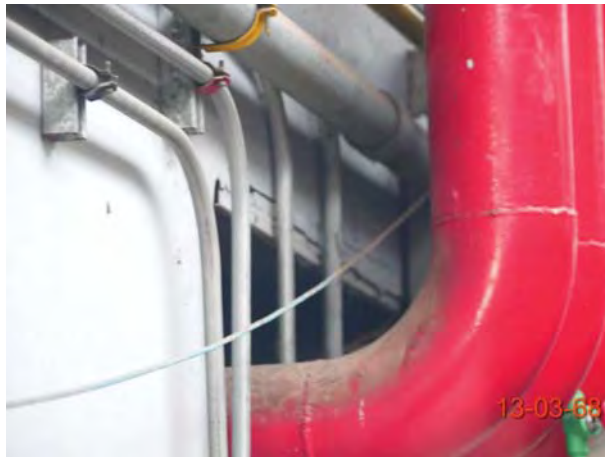

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1325-1326

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1327-1328

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

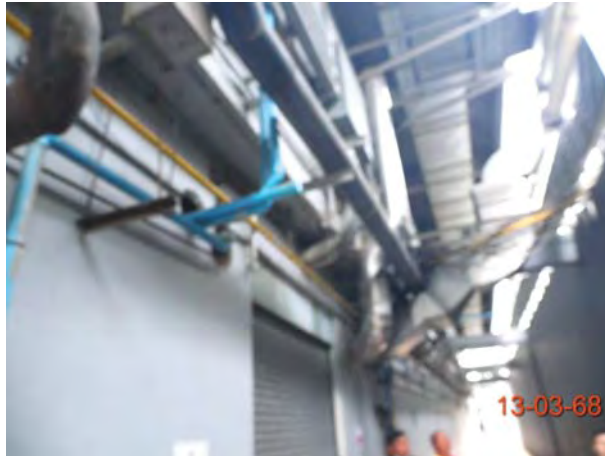

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1329-1330

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1331-1332

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

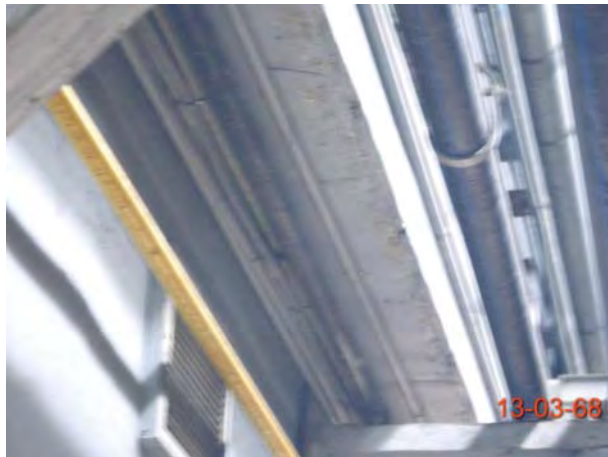

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1333-1334

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1335-1336

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1337-1338

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1339-1340

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1341-1342

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1343-1344

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1345-1346

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1347-1348

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1349-1350

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1351-1352

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1353-1354

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1355-1356

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1357-1358

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1359-1360

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

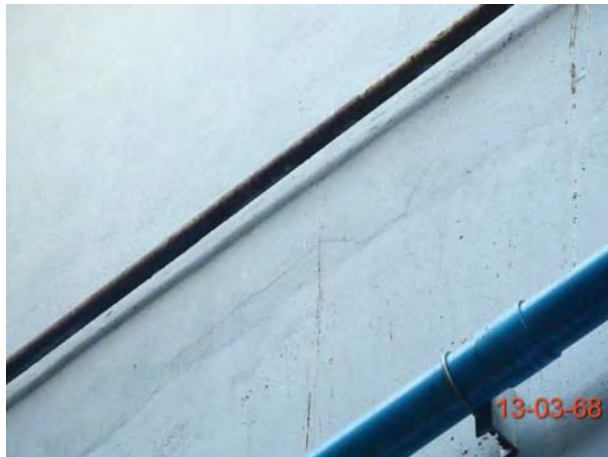

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1361-1362

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

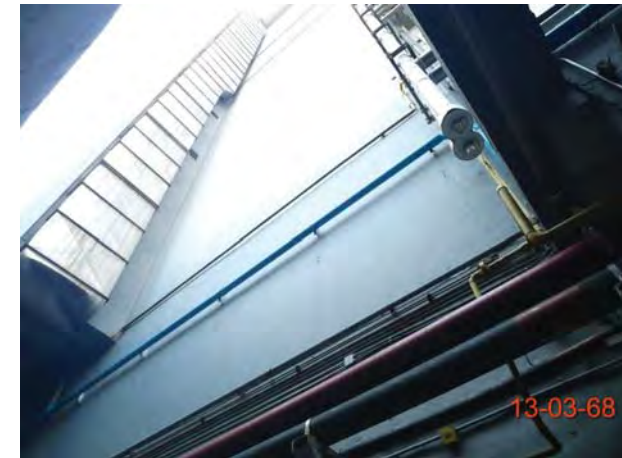

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด



Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1363-1364

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

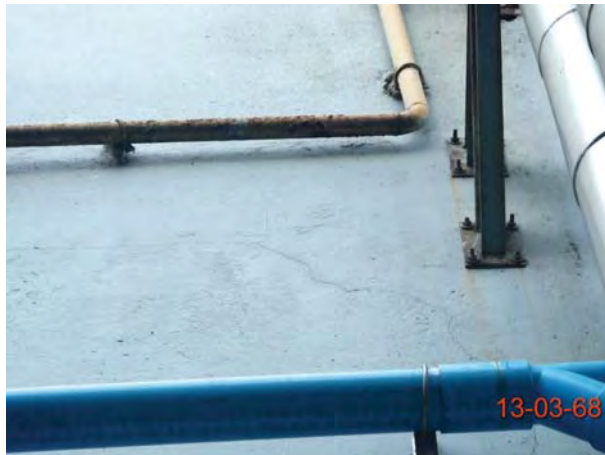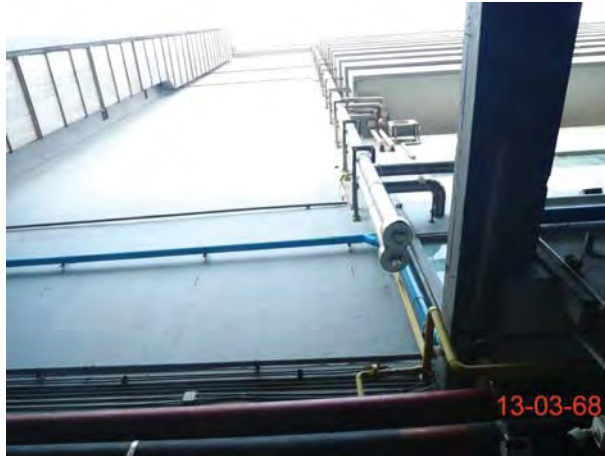

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1365-1366

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

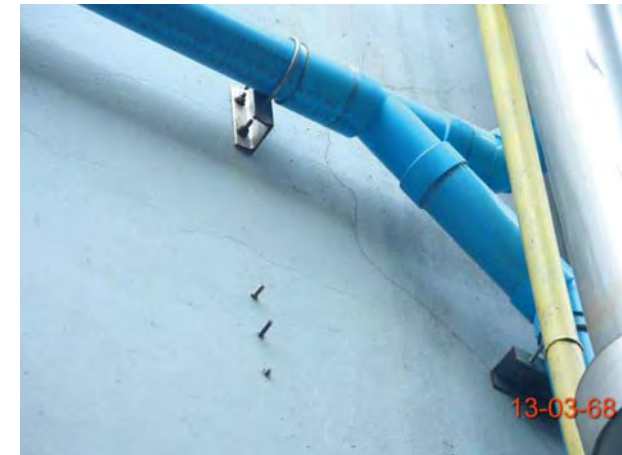

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1367-1368

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1369-1370

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1371-1372

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1373-1374

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

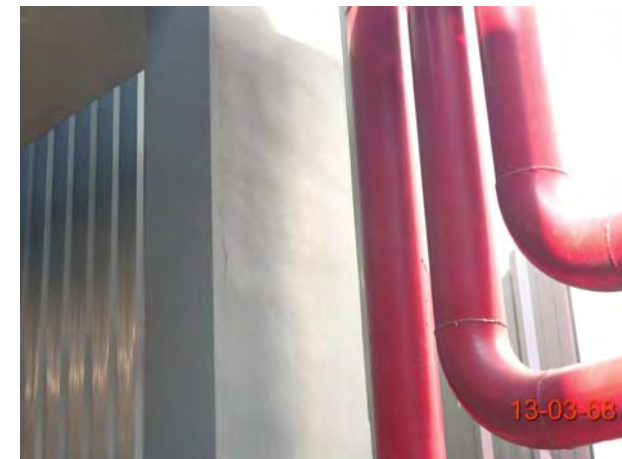

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1375-1376

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1377-1378

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1379-1380

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1381-1382

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1383-1384

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1385-1386

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1387-1388

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1389-1390

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1391-1392

รอยแตกร้าว ครอบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1393-1394

รอยแตกร้าว ครอบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1395-1396

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

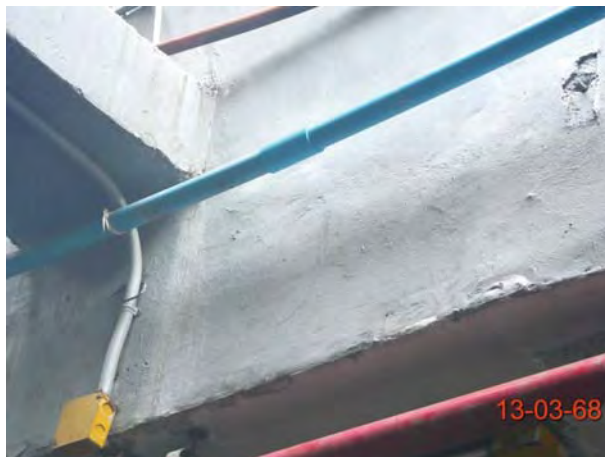

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1397-1398

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1399-1400

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1401-1402

รอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณทางออกด้านซ้ายอาคาร

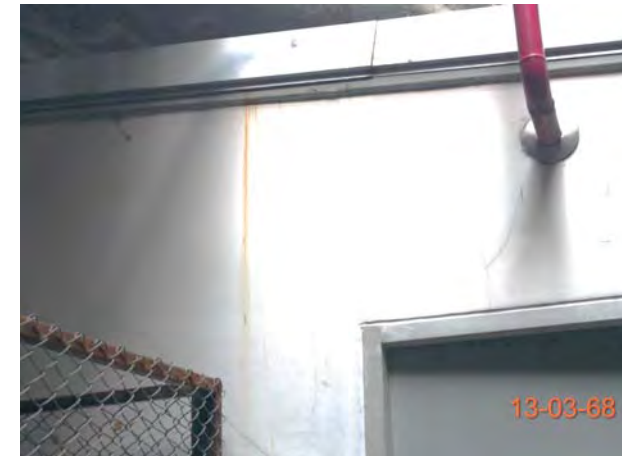

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1403-1404

สภาพพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1405-1406

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1407-1408

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1409-1410

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1411-1412

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1413-1414

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1415-1416

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1417-1418

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1419-1420

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1421-1422

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1423-1424

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1425-1426

รอยแตกร้าวพื้นทางออกด้านซ้ายอาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1427-1428

สภาพบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1429-1430

สภาพบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1431-1432

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1433-1434

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1435-1436

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1437-1438

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1439-1440

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1441-1442

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1443-1444

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1445-1446

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1447-1448

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1449-1450

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1451-1452

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1453-1454

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1455-1456

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1457-1458

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร

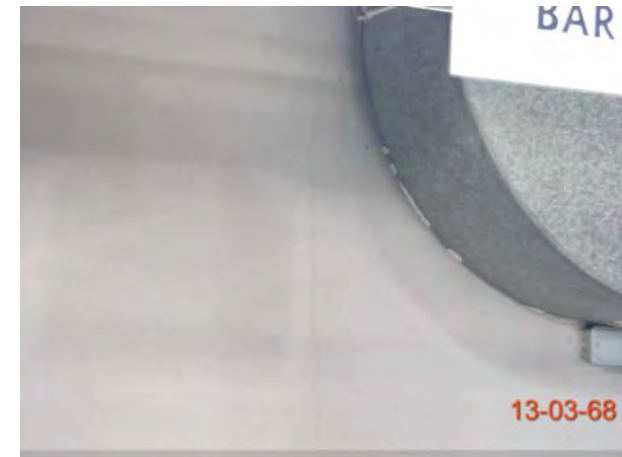

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1459-1460

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1461-1462

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1463-1464

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1465-1466

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1467-1468

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1469-1470

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1471-1472

รอยแตกร้าวบริเวณใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1473-1474

สภาพพื้นที่อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1475-1476
รอยแตกร้าวพื้นใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1477-1478
รอยแตกร้าวพื้นใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1479-1480
รอยแตกร้าวพื้นใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1481-1482
รอยแตกร้าวพื้นใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1483-1484
รอยแตกร้าวพื้นใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1485-1486
รอยแตกร้าวพื้นใต้อาคาร



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1487-1488

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1489-1490

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1491-1492

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย

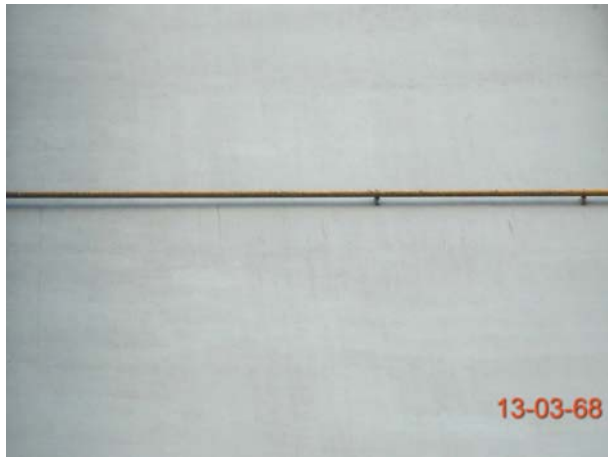

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1493-1494

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1495-1496

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1497-1498

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1499-1500

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1501-1502

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย

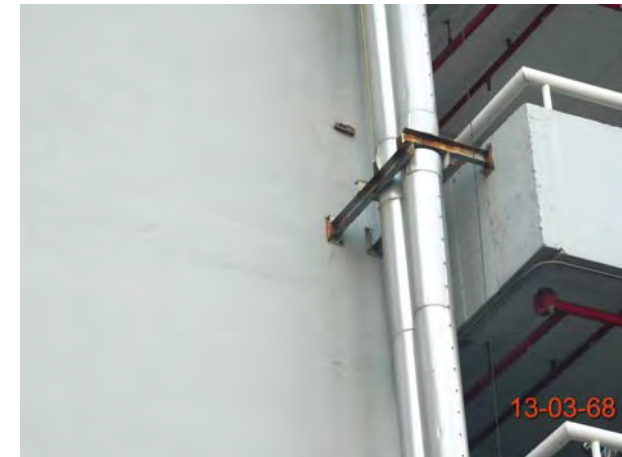

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1503-1504

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย

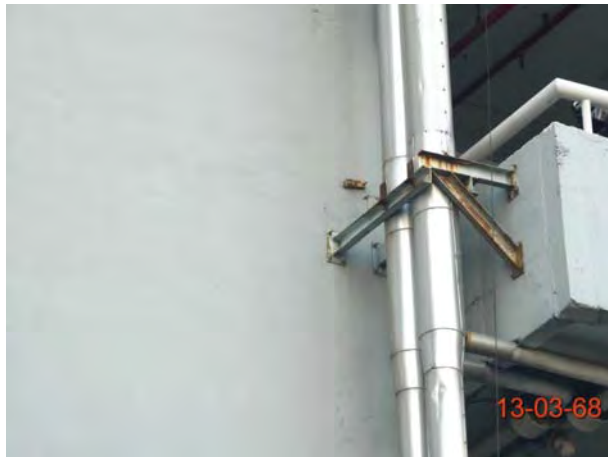

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1505-1506

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1507-1508

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย



บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1509-1510

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย

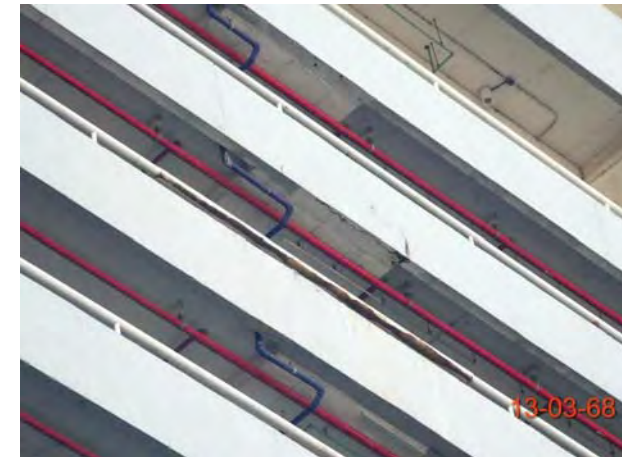

บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด


Bell Survey Ltd.

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2K25/N-0154/STS/ns

รูปที่ 1511-1512

รอยแตกร้าวภายนอกด้านซ้าย

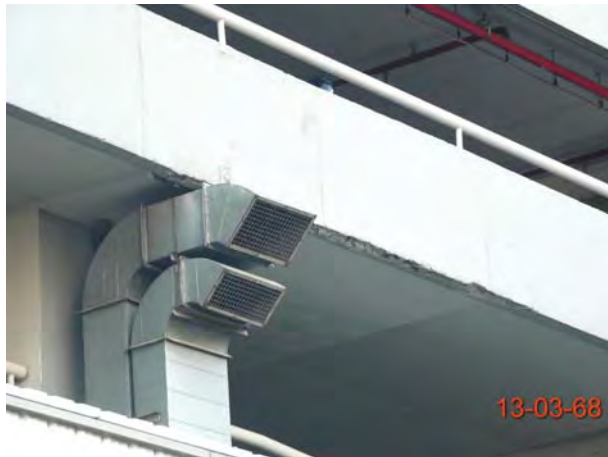



PRE-BUILT

เลขที่ PB/PSQ/CSM/LT-EX-001/2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน คุณวิ [REDACTED]
โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น. เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นาย

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

Pre-Built Public Company Limited

503 1st Floor Muang Thong Thane 3, Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi, 11120

T +66 (2) 960 1380 - 9 F +66 (2) 960 1390

www.prebuilt.co.th

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน คุณจิรา [REDACTED]
THE HERBAHOLIC'S

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ ขอลงพื้นที่ โดยได้ทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด เรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

[REDACTED SIGNATURE]

(นายนิมิต

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน คุณนิติ (288/12)

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 ช่วงบ่าย เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รับทราบ.

วันที่ 13.00 น.

2

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ร้านค้า 288/13

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจระดับพื้นที่เพิ่มเติม ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น. เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ขอแสดงความนับถือ



(นายนิมิ

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ร้านพรทิพย์ ภูเก็ต (288/14)

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ ขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยได้ทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด เรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

503
พรทิพย์

ขอแสดงความนับถือ


.....
(นายนิมิตร

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)



PRE-BUILT

เลขที่ PB/PSQ/CSM/LT-EX-005/2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ร้านแซมเปญ (288/15)

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น. เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิฑูรย์

วิฑูรย์

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ร้าน RAYON FACTORY (288/16-18)

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 ช่วงบ่าย เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อิทธิพล
570

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ร้านแอปเปิล (288/19)

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 ช่วงบ่าย เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รับทราบ.

สุทธพินธุ์
1

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิมิตร แสนศรี)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน คุณจักรินทร์ (288/20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 เวลา 14:00 น. เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิฑธรรบ.

จก/ม

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิมิตร แสนศรี)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ร้านค้า 288/21

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจระดับพื้นที่เพิ่มเติม ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น. เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สุทธาภ

นอญ

สคช

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิมิตร แสนศรี)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน คุณจันทร์เพ็ญ (288/22)

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น. เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รับทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร เ

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอลงพื้นที่อาคารเพื่อดำเนินการสำรวจ ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน เจ้าของตึกแถว

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572 นั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอเข้าสำรวจพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจระดับพื้นที่เพิ่มเติม ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เบลล์ เซอร์เวย์ จำกัด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 น. เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร แสงสว่าง)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

SAFETY

ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง
(CSR) Corporate Social Responsibility on adjacent neighborhoods.

- สำรวจบ้านเคียงก่อนเริ่มงาน รร.อมารี



จงตระหนัก
ความปลอดภัยของทุกคน
**THINK
SAFETY IS
EVERYBODY'S JOB**
ติติ
สุวิทย์วิศวกรรมและสถาปัตย์

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

**CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY**

IS NOT AN ADD-ON
IT'S OUR CORE

Corporate Social
Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร

PRE - BUILT PUBLIC CO., LTD

- สำรวจบ้านเคียงก่อนเริ่มงาน บ้านเลขที่ 288/12




PRE - BUILT PUBLIC CO., LTD

SAFETY

ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง
(CSR) Corporate Social Responsibility on adjacent neighborhoods.

- สำรวจบ้านเคียงก่อนเริ่มงาน บ้านเลขที่ 288/15

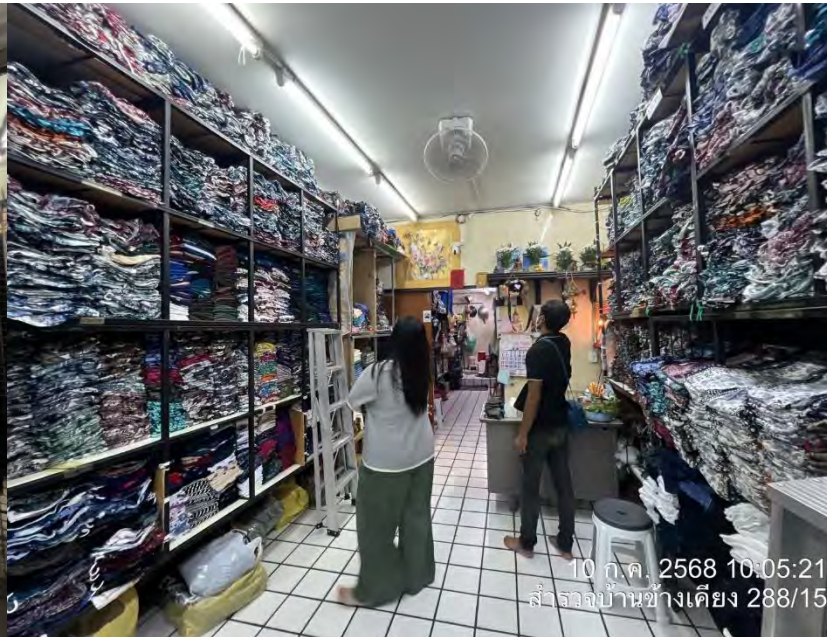

SAFETY

ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง
(CSR) Corporate Social Responsibility on adjacent neighborhoods.

- สำรวจบ้านเคียงก่อนเริ่มงาน บ้านเลขที่ 288/16-18



จงตระหนัก
ความปลอดภัยของทุกคน
**THINK
SAFETY IS
EVERYBODY'S JOB**
ติติ
ผู้พัฒนาโครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

**CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY**

IS NOT AN ADD-ON.
IT'S OUR CORE.

Corporate Social
Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร

PRE - BUILT PUBLIC CO., LTD

SAFETY

ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง
(CSR) Corporate Social Responsibility on adjacent neighborhoods.

- สำรวจบ้านเคียงก่อนเริ่มงาน บ้านเลขที่ 288/19



จงตระหนัก
ความปลอดภัยของทุกคน
**THINK
SAFETY IS
EVERYBODY'S JOB**
ติติ
สุวิทย์วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

**CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY**

IS NOT AN ADD-ON
IT'S OUR CORE



Corporate Social
Responsibility
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร

PRE - BUILT PUBLIC CO., LTD

SAFETY

ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง
(CSR) Corporate Social Responsibility on adjacent neighborhoods.

- สำรวจบ้านเคียงก่อนเริ่มงาน บ้านเลขที่ 288/20

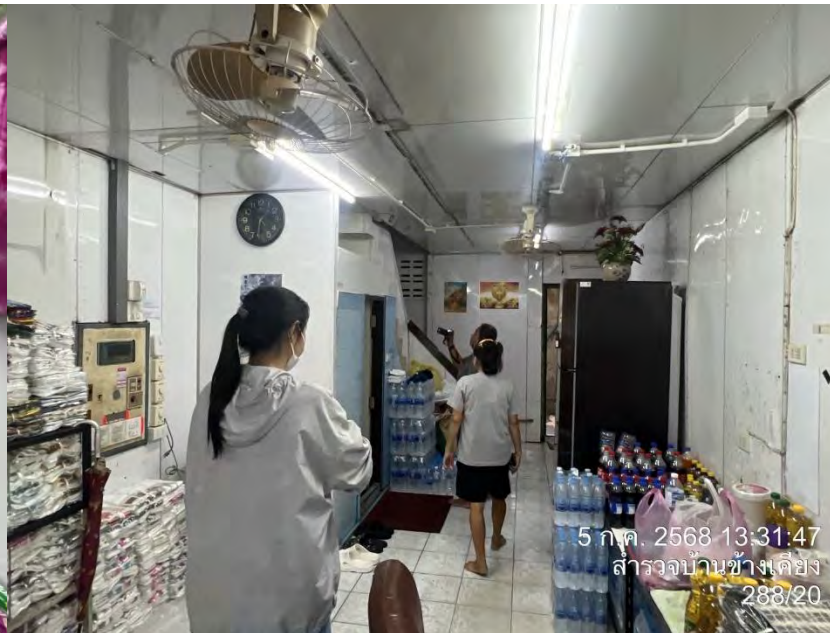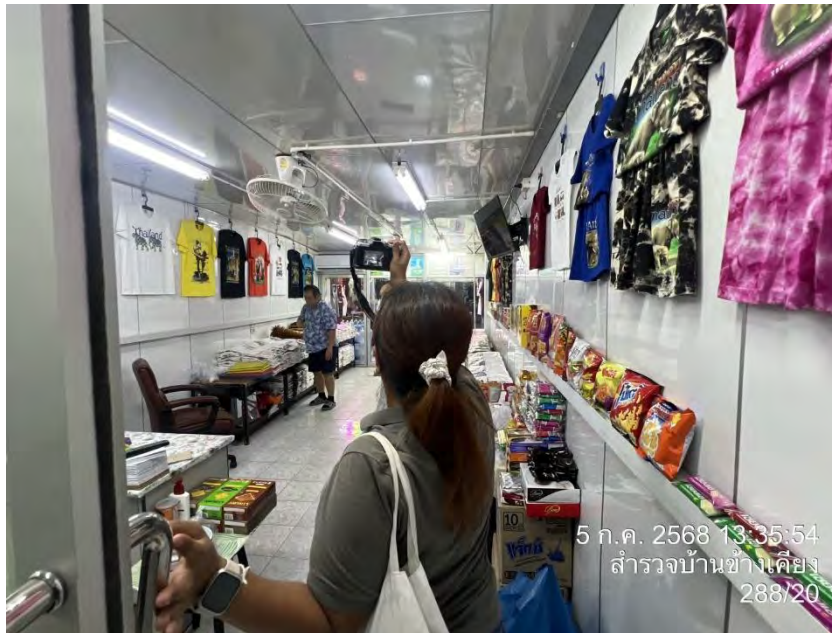


- ตำรวจบ้านเคียงก่อนเริ่มงาน บ้านเลขที่ 288/22



PRE - BUILT PUBLIC CO., LTD

ภาคผนวกที่ 2-8
ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง inclinometer

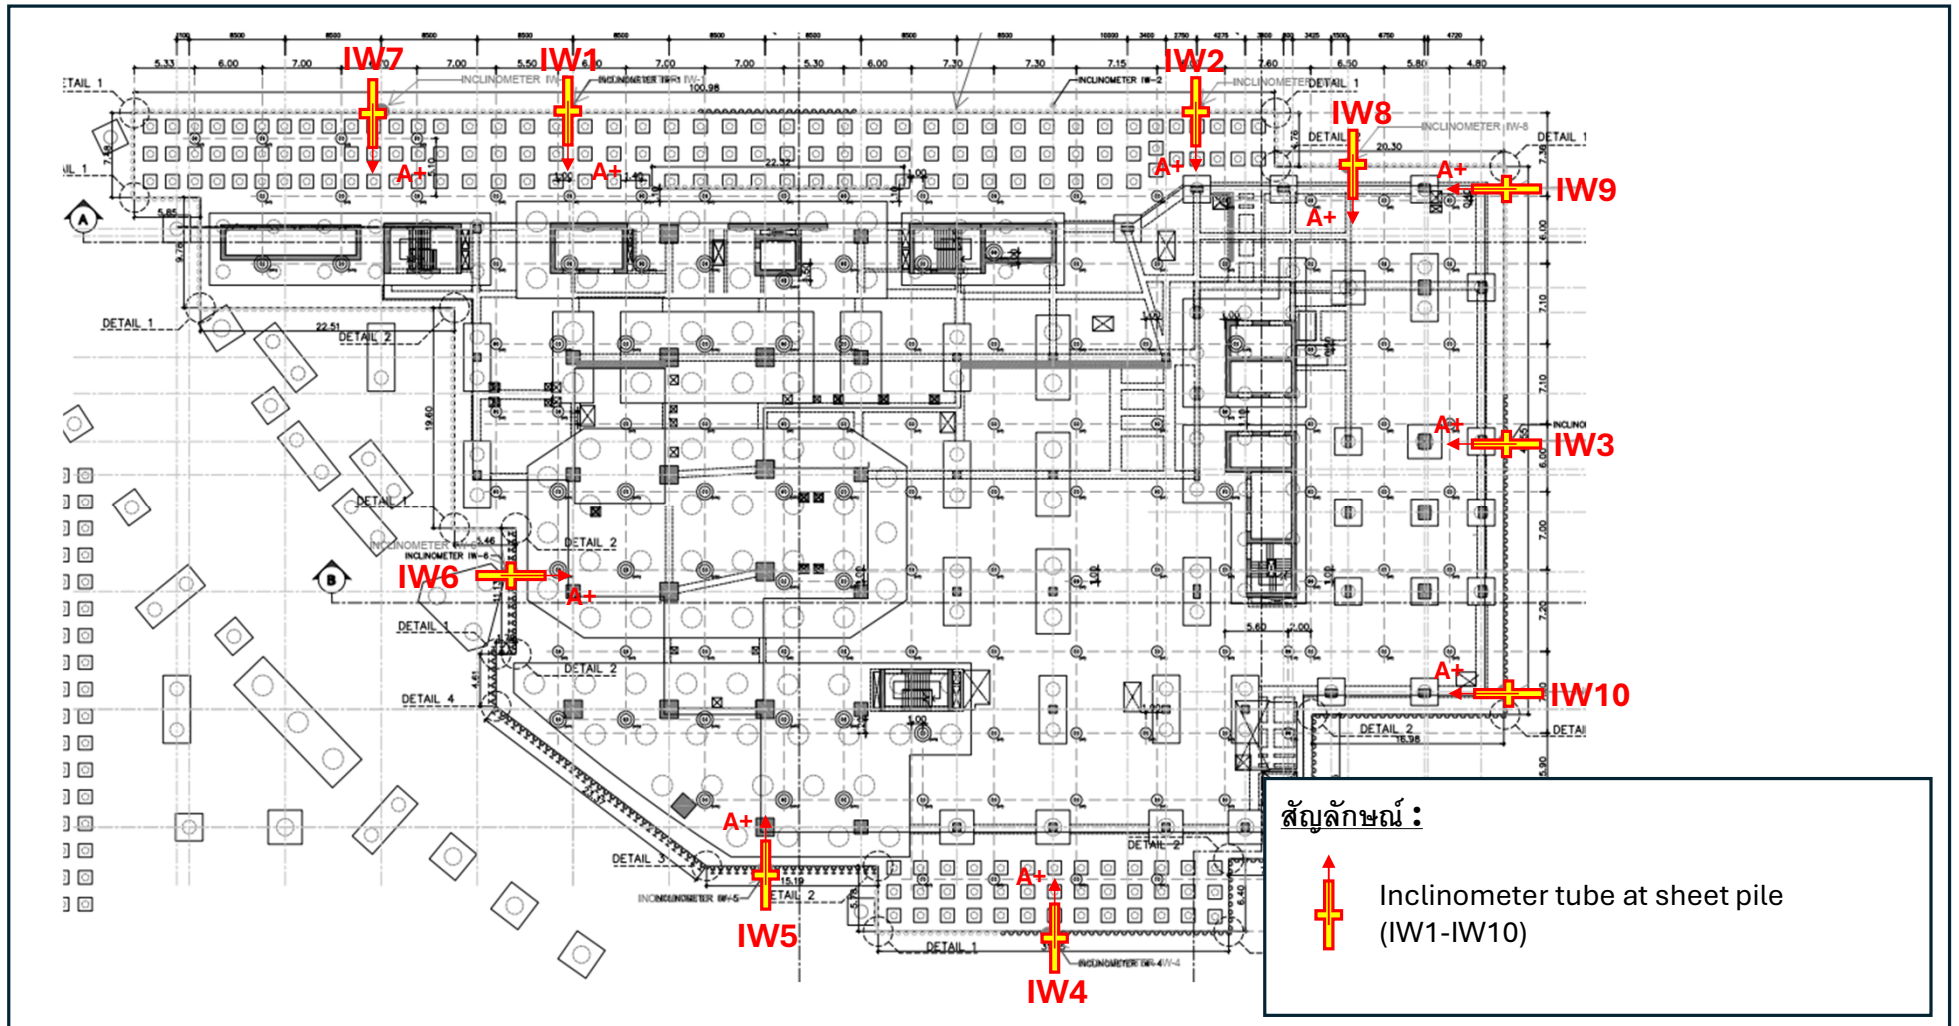

ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดินที่โครงการ The Platinum Square

ภาคผนวกที่ 2-9
รายงานตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer)

ตารางสรุปการเคลื่อนตัวของดินในระหว่างการขุดฐานราก
โครงการ The Platinum Square
ถนนพญาไท, กรุงเทพมหานคร

Monitoring No.

Monitoring dated: 13-02-26


item	Instruments	Monitoring	No. of Monitoring Point	Maximum measured value			Warning		Comment	Remark
		Date		Location	Value	Unit or Direction	Level	Value		
1	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	-	1 (IW1)	IW1 (A) IW1 (B)	- -	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 39.90 mm 45.60 mm 51.30 mm	-	ไม่ได้ทำการตรวจวัดตำแหน่งนี้
2	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	-	1 (IW2)	IW2 (A) IW2 (B)	- -	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 39.90 mm 45.60 mm 51.30 mm	-	ไม่ได้ทำการตรวจวัดตำแหน่งนี้
3	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	12-03-26	1 (IW3)	IW3 (A) IW3 (B)	161.25 11.96	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 112.00 mm 128.00 mm 144.00 mm	สูงกว่า Action level	
4	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	-	1 (IW4)	IW4 (A) IW4 (B)	- -	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 137.20 mm 156.80 mm 176.40 mm	-	ไม่ได้ทำการตรวจวัดตำแหน่งนี้
5	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	-	1 (IW5)	IW5 (A) IW5 (B)	- -	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 105.00 mm 120.00 mm 135.00 mm	-	ไม่ได้ทำการตรวจวัดตำแหน่งนี้
6	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	-	1 (IW6)	IW6 (A) IW6 (B)	- -	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 105.00 mm 120.00 mm 135.00 mm	-	ไม่ได้ทำการตรวจวัดตำแหน่งนี้

ตารางสรุปการเคลื่อนตัวของดินในระหว่างการขุดฐานราก
โครงการ The Platinum Square
ถนนพญาไท, กรุงเทพมหานคร

Monitoring No.

Monitoring dated: 13-02-26



item	Instruments	Monitoring	No. of Monitoring Point	Maximum measured value			Warning		Comment	Remark
		Date		Location	Value	Unit or Direction	Level	Value		
7	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	-	1 (IW7)	IW7 (A) IW7 (B)	- -	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 39.90 mm 45.60 mm 51.30 mm	-	ไม่ได้ทำการตรวจวัดตำแหน่งนี้
8	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	-	1 (IW8)	IW8 (A) IW8 (B)	- -	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 137.20 mm 156.80 mm 176.40 mm	-	ไม่ได้ทำการตรวจวัดตำแหน่งนี้
9	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	12-03-26	1 (IW9)	IW9 (A) IW9 (B)	93.13 10.62	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 112.00 mm 128.00 mm 144.00 mm	ต่ำกว่า Alarm level	
10	Inclinometer in sheet pile [SITE AREA]	12-03-26	1 (IW10)	IW10 (A) IW10 (B)	56.86 -2.15	mm mm	Alarm level Alert level Action level	[Lateral Movement] 112.00 mm 128.00 mm 144.00 mm	ต่ำกว่า Alarm level	

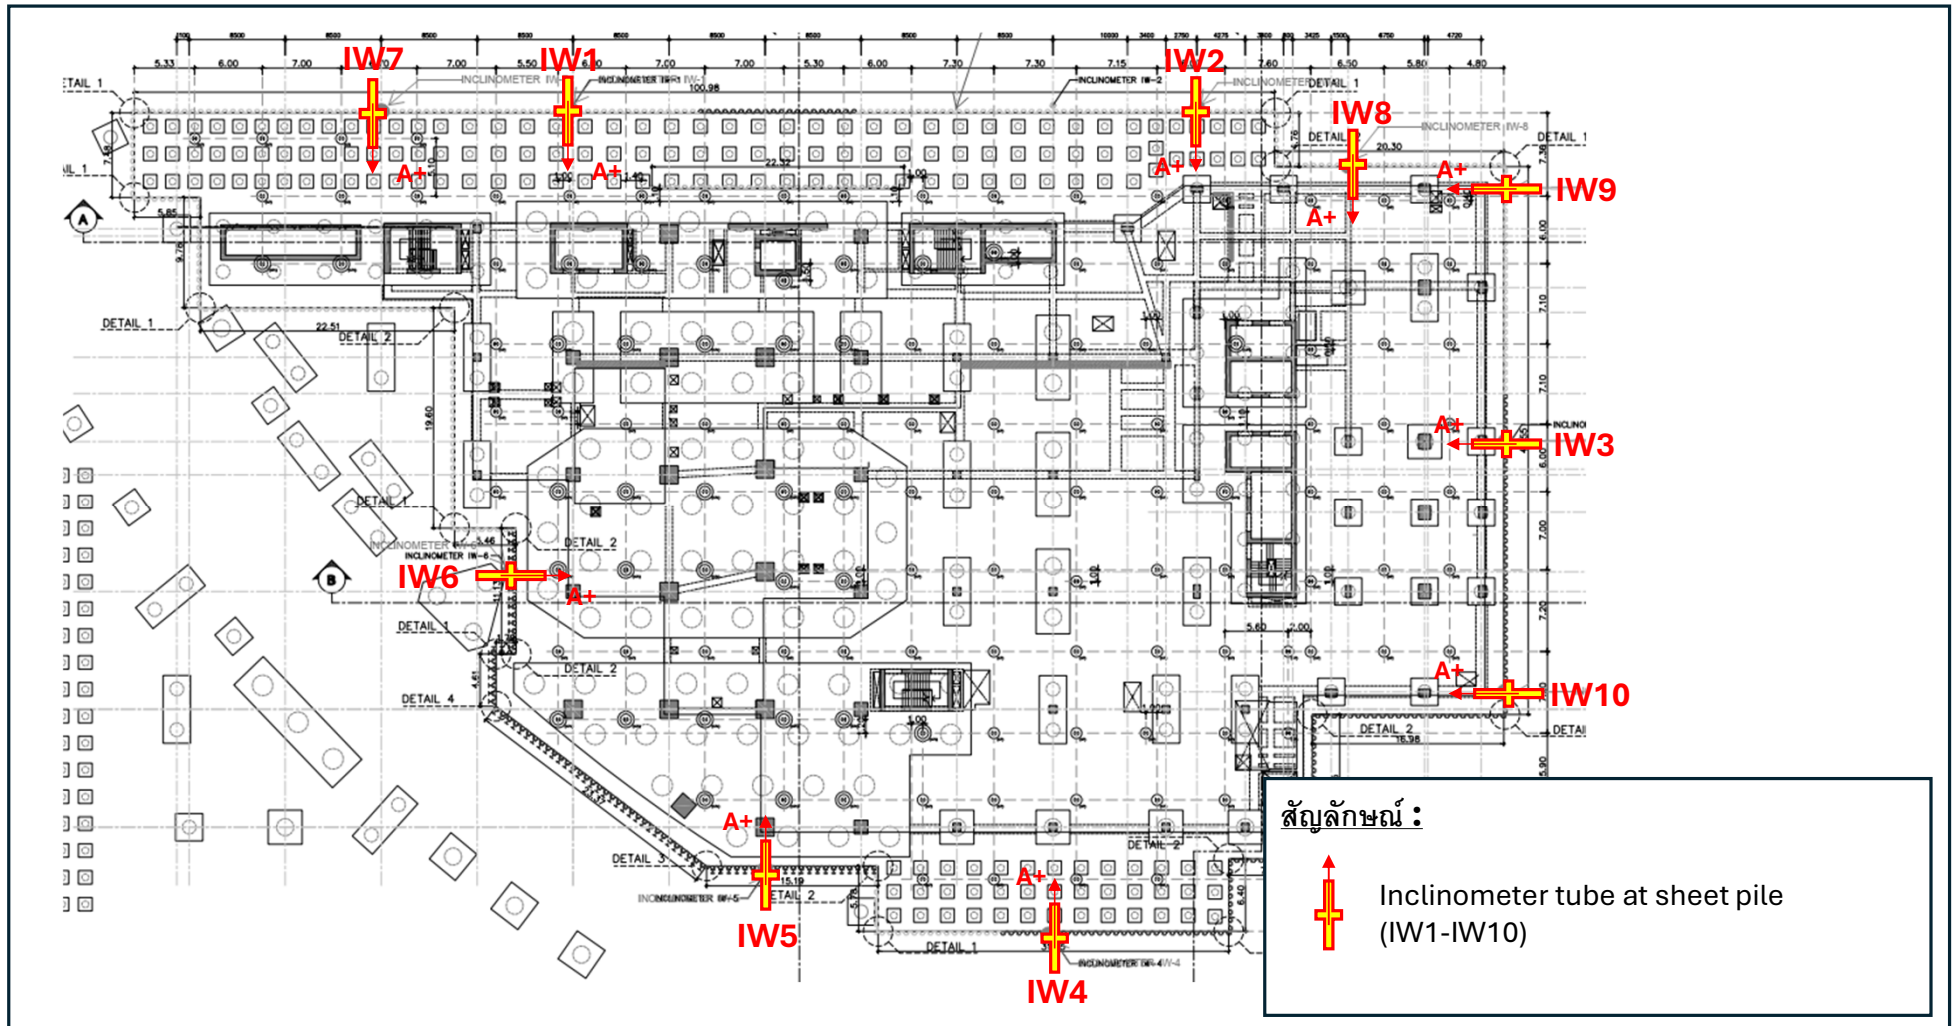

ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดินที่โครงการ The Platinum Square



The Platinum Square

Inclinometer Tube No. IW3

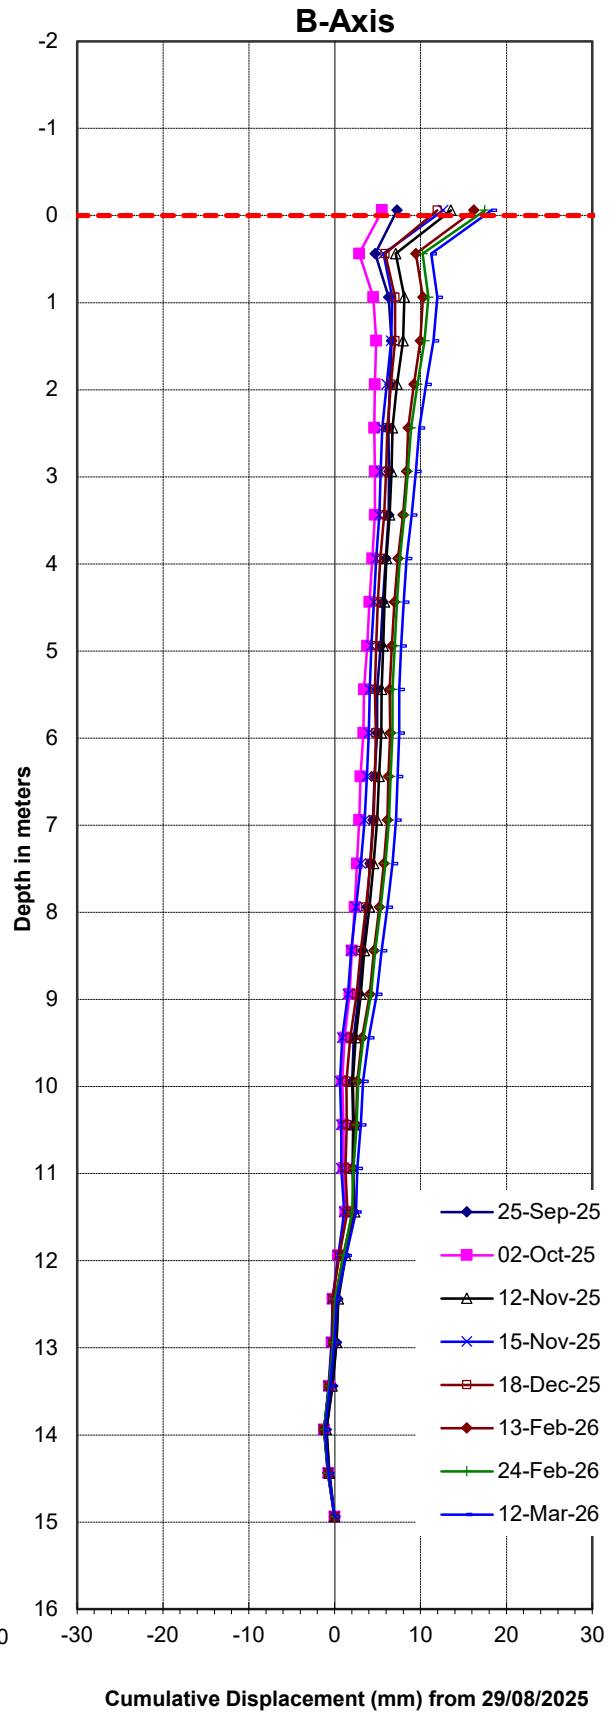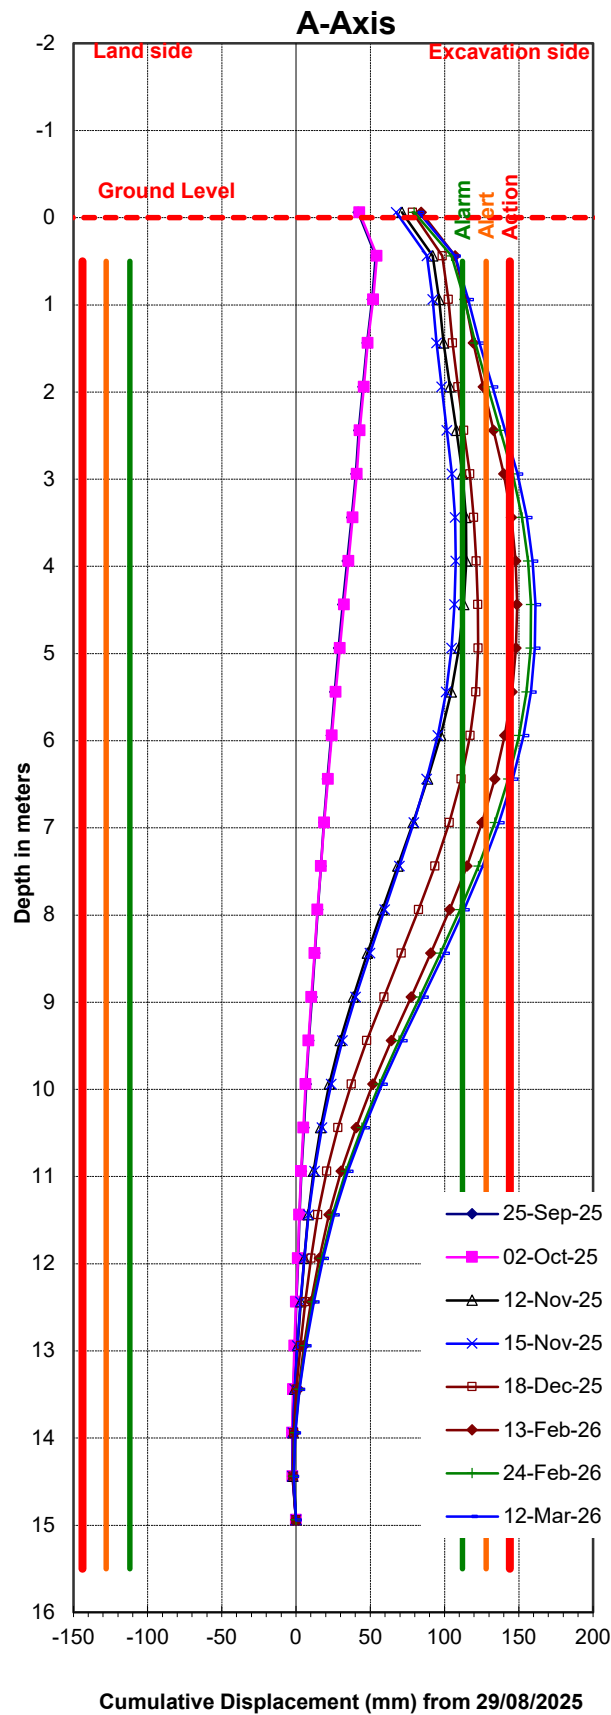



The Platinum Square

Inclinometer Tube No. IW9

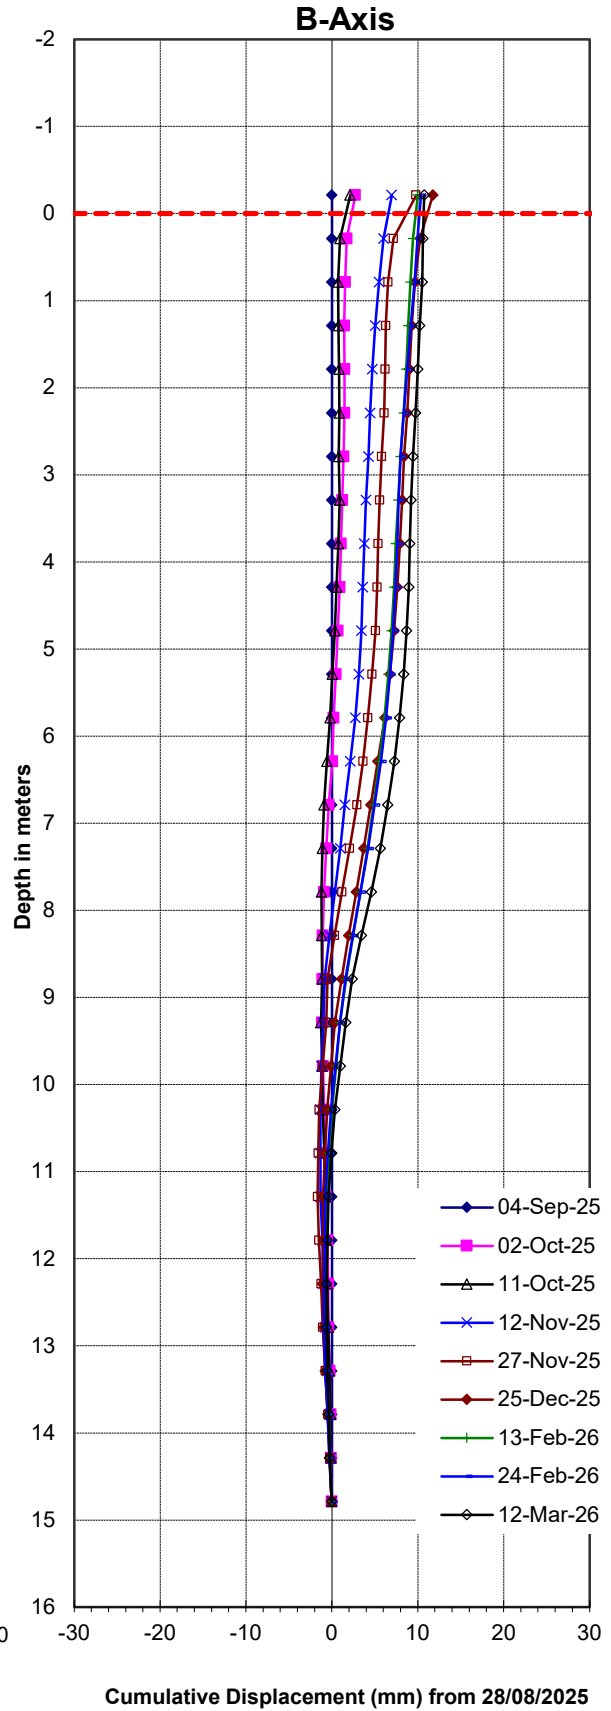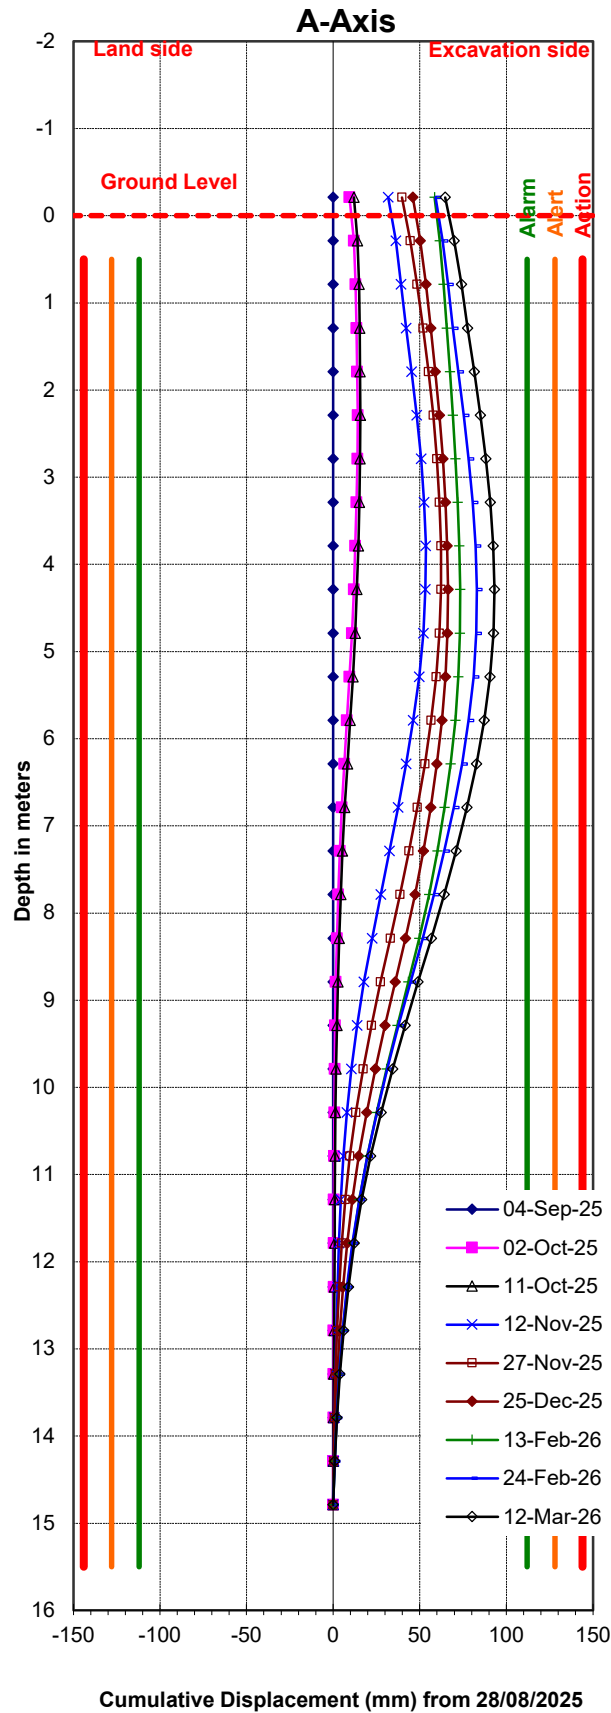

The Platinum Square

Inclinometer Tube No. IW10

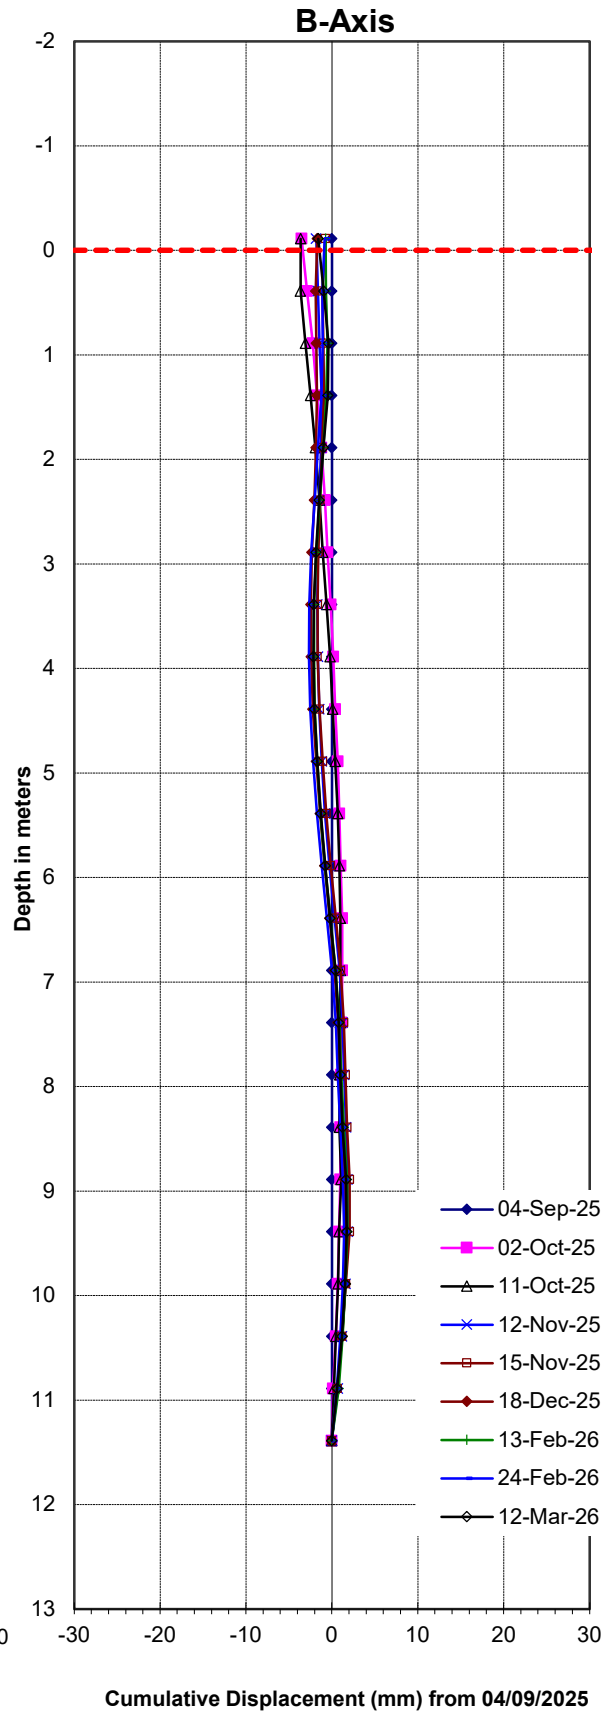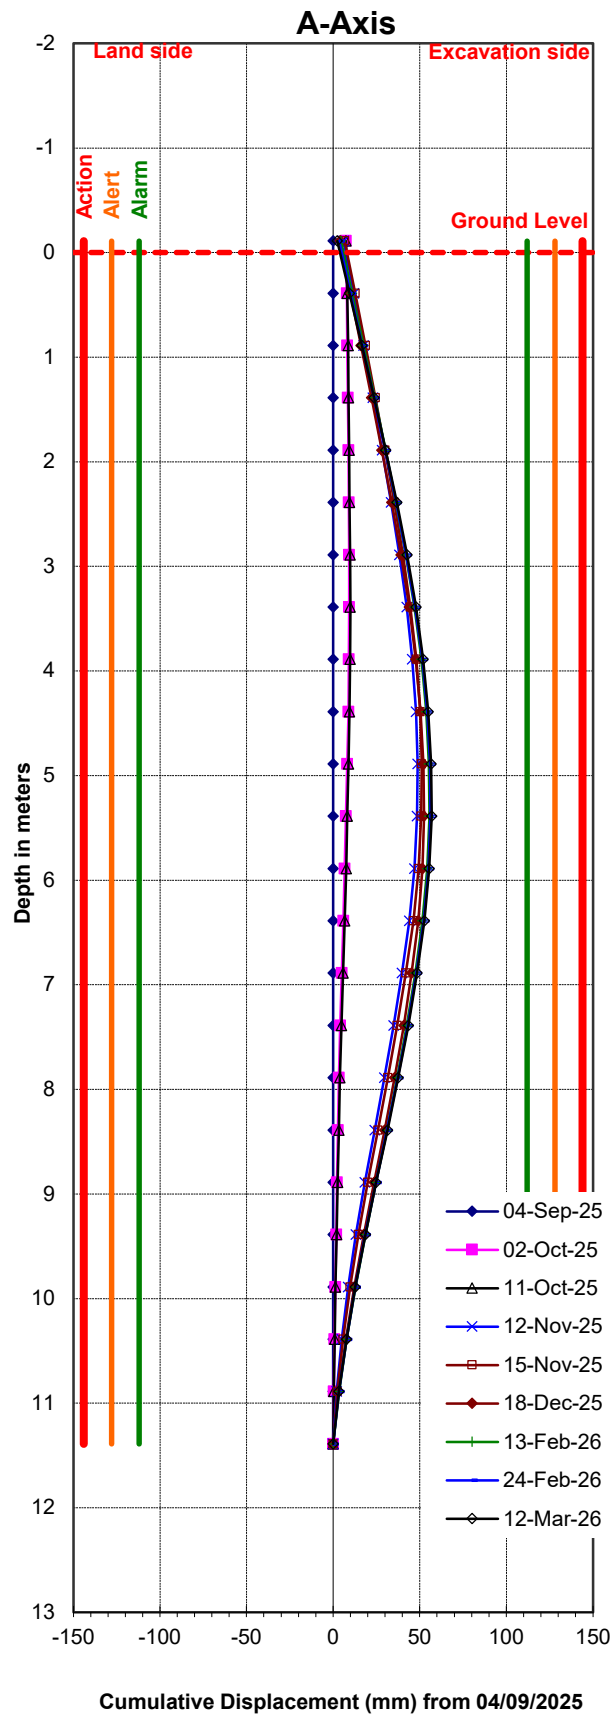

MONITORING DATA RECORDInstrument Type : InclinometerInstrument ID : IW3LENGTH : 16.0 m

Instrument Location, ถนนพญาไท, กรุงเทพมหานคร

Base Reading Date: 23-Aug-25

Base Reading Sensor SN: 1838127 (SLOPE INDICATOR)


Current Reading Date: 12-Mar-26

Current Sensor SN: 1838127 (SLOPE INDICATOR)

Reading No: 8

STD.DEV. A : 4.72

B : 5.92



DEPTH M.	Current Reading			Base (A) INCR.DEV	CUM.DIS (A) mm.	Current Reading			Base (B) INCR.DEV	CUM.DIS (B) mm.
	A+	A-	INCR.DEV			B+	B-	INCR.DEV		
-0.06	-1058	1034	-20.92	3.76	82.58	1032	-1049	20.81	13.80	18.25
0.44	-330	306	-6.36	2.37	107.26	629	-618	12.47	13.19	11.24
0.94	-352	329	-6.81	0.87	115.99	663	-656	13.19	12.74	11.96
1.44	-447	427	-8.74	-0.04	123.67	657	-650	13.07	12.22	11.51
1.94	-465	445	-9.10	-0.60	132.37	643	-635	12.78	11.99	10.66
2.44	-515	499	-10.14	-1.74	140.87	586	-572	11.58	11.17	9.87
2.94	-635	610	-12.45	-6.20	149.27	526	-523	10.49	10.03	9.45
3.44	-459	437	-8.96	-5.07	155.52	583	-576	11.59	10.98	8.99
3.94	-306	281	-5.87	-4.02	159.41	609	-604	12.13	11.77	8.39
4.44	-148	126	-2.74	-3.07	161.25	636	-632	12.68	12.40	8.03
4.94	-23	2	-0.25	-2.88	160.92	676	-670	13.46	13.23	7.75
5.44	74	-88	1.62	-3.39	158.29	705	-699	14.04	14.05	7.53
5.94	108	-132	2.40	-4.94	153.28	661	-661	13.22	13.02	7.53
6.44	159	-181	3.40	-5.80	145.94	681	-679	13.60	13.42	7.33
6.94	192	-214	4.06	-6.93	136.73	695	-693	13.88	13.48	7.15
7.44	194	-213	4.07	-8.37	125.74	723	-722	14.45	13.86	6.75
7.94	178	-198	3.76	-9.77	113.31	746	-742	14.88	14.19	6.15
8.44	156	-176	3.32	-10.82	99.77	824	-826	16.50	15.96	5.46
8.94	178	-192	3.70	-10.58	85.63	950	-946	18.96	18.00	4.92
9.44	86	-103	1.89	-11.48	71.35	960	-951	19.11	18.45	3.97
9.94	-5	-16	0.11	-11.97	57.97	927	-920	18.47	18.22	3.31
10.44	-99	81	-1.80	-12.72	45.89	911	-902	18.13	17.72	3.06
10.94	-198	181	-3.79	-13.01	34.98	822	-812	16.34	16.18	2.65
11.44	-327	327	-6.54	-13.88	25.75	883	-878	17.61	16.44	2.49
11.94	-429	406	-8.35	-14.75	18.41	1111	-1112	22.23	21.18	1.32
12.44	-516	498	-10.14	-15.38	12.01	1029	-1022	20.51	20.25	0.27
12.94	-579	555	-11.34	-15.62	6.76	1031	-1027	20.58	20.05	0.01
13.44	-673	653	-13.26	-16.20	2.48	1011	-1012	20.23	19.59	-0.52
13.94	-758	739	-14.97	-16.13	-0.45	954	-954	19.08	19.54	-1.16
14.44	-915	897	-18.12	-16.51	-1.61	927	-936	18.63	19.33	-0.70
14.94	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00

END OF RECORDS

Engineer :

Record By :

MONITORING DATA RECORDInstrument Type : InclinometerInstrument ID : IW9LENGTH : 15.0 m

Instrument Location, ถนนพญาไท, กรุงเทพมหานคร

Base Reading Date: 04-Sep-25

Base Reading Sensor SN: 1838127 (SLOPE INDICATOR)


Current Reading Date: 12-Mar-26

Current Sensor SN: 1838127 (SLOPE INDICATOR)

Reading No: 8

STD.DEV. A : 3.45

B : 4.41



DEPTH M.	Current Reading			Base (A) INCR.DEV	CUM.DIS (A) mm.	Current Reading			Base (B) INCR.DEV	CUM.DIS (B) mm.
	A+	A-	INCR.DEV			B+	B-	INCR.DEV		
-0.21	-56	40	-0.96	4.25	64.76	702	-716	14.18	14.05	10.75
0.29	-176	162	-3.38	0.71	69.97	674	-669	13.43	13.35	10.62
0.79	-153	128	-2.81	0.82	74.07	673	-672	13.45	13.15	10.54
1.29	-134	110	-2.44	1.39	77.70	666	-665	13.31	13.07	10.24
1.79	-85	61	-1.46	2.14	81.52	663	-658	13.21	12.95	10.00
2.29	-37	14	-0.51	2.60	85.12	684	-682	13.66	13.35	9.74
2.79	-28	8	-0.36	2.16	88.23	506	-500	10.06	9.84	9.44
3.29	29	-52	0.81	2.51	90.76	420	-410	8.30	8.17	9.22
3.79	127	-144	2.71	3.38	92.46	472	-465	9.37	9.24	9.09
4.29	232	-250	4.82	4.28	93.13	524	-517	10.41	10.16	8.96
4.79	345	-364	7.09	5.17	92.60	560	-555	11.15	10.79	8.71
5.29	433	-457	8.90	5.53	90.67	548	-547	10.95	10.49	8.35
5.79	535	-552	10.87	6.38	87.30	648	-647	12.95	12.34	7.89
6.29	582	-604	11.86	6.35	82.81	729	-723	14.52	13.74	7.28
6.79	590	-612	12.02	5.78	77.31	667	-666	13.33	12.47	6.50
7.29	568	-592	11.60	4.79	71.06	614	-611	12.25	11.21	5.64
7.79	526	-545	10.71	3.30	64.25	562	-560	11.22	10.07	4.60
8.29	482	-501	9.83	2.06	56.84	500	-499	9.99	8.92	3.45
8.79	522	-536	10.58	3.09	49.07	708	-714	14.22	13.48	2.37
9.29	481	-505	9.86	2.64	41.58	876	-870	17.46	16.82	1.63
9.79	402	-423	8.25	1.66	34.36	875	-870	17.45	16.81	0.99
10.29	317	-333	6.50	0.42	27.77	882	-878	17.60	17.19	0.35
10.79	194	-213	4.07	-1.13	21.69	906	-903	18.09	17.75	-0.06
11.29	41	-54	0.95	-3.30	16.50	913	-911	18.24	18.13	-0.39
11.79	-108	91	-1.99	-5.32	12.25	971	-967	19.38	19.29	-0.50
12.29	-221	197	-4.18	-7.01	8.92	1013	-1017	20.30	20.27	-0.59
12.79	-324	302	-6.26	-8.44	6.10	988	-988	19.76	19.83	-0.62
13.29	-391	371	-7.62	-9.27	3.91	957	-955	19.12	19.31	-0.55
13.79	-430	409	-8.39	-9.63	2.26	934	-933	18.67	18.81	-0.37
14.29	-441	417	-8.58	-9.61	1.03	892	-893	17.85	18.07	-0.22
14.79	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00

END OF RECORDS

Engineer :

Record By :

MONITORING DATA RECORDInstrument Type : InclinometerInstrument ID : IW10LENGTH : 11.50 m

Instrument Location, ถนนพญาไท, กรุงเทพมหานคร

Base Reading Date: 04-Sep-25

Base Reading Sensor SN: 1838127 (SLOPE INDICATOR)


Current Reading Date: 12-Mar-26

Current Sensor SN: 1838127 (SLOPE INDICATOR)

Reading No: 8

STD.DEV. A : 3.43

B : 5.41



DEPTH M.	Current Reading			Base (A) INCR.DEV	CUM.DIS (A) mm.	Current Reading			Base (B) INCR.DEV	CUM.DIS (B) mm.
	A+	A-	INCR.DEV			B+	B-	INCR.DEV		
-0.11	-394	369	-7.63	-0.61	2.37	-55	40	-0.95	-0.29	-1.59
0.39	-387	355	-7.42	-0.14	9.38	-43	47	-0.90	-0.37	-0.93
0.89	-326	302	-6.28	0.76	16.66	-28	36	-0.64	-0.71	-0.40
1.39	-301	278	-5.79	0.87	23.70	-48	46	-0.94	-1.45	-0.47
1.89	-270	249	-5.19	1.17	30.35	-95	92	-1.87	-2.37	-0.98
2.39	-215	192	-4.07	1.86	36.72	49	-46	0.95	0.58	-1.48
2.89	-157	134	-2.91	2.30	42.64	43	-48	0.91	0.67	-1.85
3.39	-60	40	-1.00	3.18	47.86	-20	18	-0.38	-0.44	-2.09
3.89	53	-71	1.24	4.14	52.03	-103	99	-2.02	-1.90	-2.15
4.39	160	-186	3.46	5.08	54.94	-179	176	-3.55	-3.23	-2.03
4.89	269	-288	5.57	5.88	56.56	-244	237	-4.81	-4.38	-1.70
5.39	105	-125	2.30	0.98	56.86	-248	250	-4.98	-4.46	-1.27
5.89	106	-130	2.36	-0.43	55.54	-270	271	-5.41	-4.84	-0.75
6.39	195	-222	4.17	-0.05	52.75	-266	265	-5.31	-4.70	-0.19
6.89	255	-278	5.33	0.17	48.54	-271	277	-5.48	-5.11	0.42
7.39	317	-337	6.54	0.75	43.37	-287	289	-5.76	-5.58	0.79
7.89	357	-378	7.35	1.12	37.58	-331	339	-6.70	-6.44	0.98
8.39	382	-406	7.88	1.39	31.35	-174	180	-3.54	-3.11	1.23
8.89	362	-383	7.45	1.20	24.87	-200	207	-4.07	-4.00	1.66
9.39	303	-323	6.26	0.51	18.61	-329	335	-6.64	-6.82	1.73
9.89	247	-271	5.18	0.04	12.87	-439	437	-8.76	-9.13	1.55
10.39	153	-172	3.25	-1.09	7.72	-565	569	-11.34	-11.91	1.18
10.89	53	-68	1.21	-2.18	3.39	-693	694	-13.87	-14.49	0.62
11.39	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00

END OF RECORDS

Engineer :

Record By :

ภาคผนวกที่ 2-10

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ Air4thai/AirBKK

รายงานผลการตรวจวัด

เลือกกลุ่มเขต

กลุ่มกรุงเทพมหานคร

สถานี

ไม่ทราบ

เลือกพารามิเตอร์

PM10PM2.5CO₂NO₂NO₃NO_xO₃WSWDTempRHBP

ล้าง

ประเภทข้อมูล

☐ รายชั่วโมง☒ รายวัน☐ รายเดือน☐ AQI

ช่วงวันที่

01/01/2569

→

31/01/2569

รูปแบบ

☒ ตาราง☐ กราฟ

แสดงข้อมูล

Search:

Show 30 entries

เวลา	PM10_มต รายชั่วโมง	PM2.5_มต รายชั่วโมง	CO_มต รายชั่วโมง	NO2_มต รายชั่วโมง	NO_มต รายชั่วโมง	NOX_มต รายชั่วโมง	O3_มต รายชั่วโมง	WS_มต รายชั่วโมง	WD_มต รายชั่วโมง	Temp_มต รายชั่วโมง	RH_มต รายชั่วโมง	BP_มต รายชั่วโมง
01/01/2569	70.0	45.0	0.9	35.8	2.9	38.5	25.4	0.8	297.8	34.1	50.6	1003.6
02/01/2569	45.3	29.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	324.0	33.1	48.6	1006.2
03/01/2569	42.4	25.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	329.4	32.4	51.1	1008.0
04/01/2569	43.8	27.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	327.8	31.9	54.0	1007.8
05/01/2569	49.5	28.8	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	307.1	32.4	50.6	1007.7
06/01/2569	47.9	28.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.2	325.6	32.5	51.9	1007.8
07/01/2569	46.4	25.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.4	329.8	31.3	52.2	1009.3
08/01/2569	48.6	30.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.2	325.8	29.7	49.0	1010.6
09/01/2569	59.2	38.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	323.5	28.7	48.3	1010.2
10/01/2569	55.4	35.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.0	325.0	29.2	43.6	1009.2
11/01/2569	58.1	37.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.0	318.8	29.2	46.7	1010.5
12/01/2569	69.0	42.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	329.5	29.9	50.2	1009.7
13/01/2569	82.0	55.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	331.1	31.1	49.3	1008.3
14/01/2569	82.5	55.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	270.5	32.2	51.8	1006.3
15/01/2569	83.6	59.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	264.9	33.0	57.9	1005.6

รายงานผลการตรวจวัด

เลือกกลุ่มเขต

กลุ่มกรุงเทพมหานคร

สถานี

ปิ่นเกล้า

เลือกพารามิเตอร์

PM10PM2.5COH2NOHNO3WSWDTempRHBP

ประเภทข้อมูล

รายชั่วโมงรายวันรายเดือนAQI

ช่วงวันที่

01/02/202628/02/2026

รูปแบบ

ตารางกราฟ

แสดงข้อมูล

Show 30 entries

Search:

เวลา	PM10_มก รายชั่วโมง	PM2.5_มก รายชั่วโมง	CO_มก รายชั่วโมง	NO2_มก รายชั่วโมง	NO_มก รายชั่วโมง	NOX_มก รายชั่วโมง	O3_มก รายชั่วโมง	WS_มก รายชั่วโมง	WD_มก รายชั่วโมง	Temp_มก รายชั่วโมง	RH_มก รายชั่วโมง	BP_มก รายชั่วโมง
01/02/2569	55.7	43.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	214.5	29.8	72.1	1008.0
02/02/2569	61.9	27.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	2.5	102.9	28.8	57.3	1012.6
03/02/2569	56.4	20.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	3.5	50.2	28.5	54.3	1014.9
04/02/2569	70.9	33.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	2.0	155.7	29.6	54.8	1011.7
05/02/2569	63.0	49.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	19.5	0.6	247.8	31.4	54.8	1006.7
06/02/2569	47.8	36.4	1.1	36.5	9.7	46.2	Cal.	0.7	202.8	30.1	68.6	1005.4
07/02/2569	38.1	29.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	192.0	30.4	69.6	1004.4
08/02/2569	33.0	23.9	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	227.1	29.3	74.8	1005.1
09/02/2569	43.0	37.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	292.7	29.4	66.2	1006.0
10/02/2569	53.9	41.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	316.4	29.2	60.2	1006.3
11/02/2569	65.2	51.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	309.7	31.2	52.9	1007.0
12/02/2569	66.4	53.8	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	204.4	31.1	63.3	1006.1
13/02/2569	40.8	32.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	205.0	30.4	68.3	1004.6
14/02/2569	40.1	31.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	193.7	30.6	68.8	1004.0
15/02/2569	34.7	28.8	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	194.4	30.9	67.2	1003.6
16/02/2569	46.3	38.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	203.8	31.5	67.2	1002.6
17/02/2569	40.6	34.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	198.1	30.9	68.8	1003.2

รายงานผลการตรวจวัด

เลือกกลุ่มเขต

กลุ่มกรุงเทพมหานคร

สถานี

ปทุมธานี

เลือกพารามิเตอร์

PM10PM2.5CO₂NO₂PMONOXO₃WSWDTempRHBP

ประเภทข้อมูล

☐ รายชั่วโมง☒ รายวัน☐ รายเดือน☐ AQI

ช่วงวันที่

01/03/2026 → 31/03/2026

รูปแบบ

☒ ตาราง☐ กราฟ

แสดงข้อมูล

Show 30 entries

Search:

วันที่	PM10_มท รายวัน	PM2.5_มท รายวัน	CO ₂ _มท รายวัน	NO ₂ _มท รายวัน	NO_มท รายวัน	NOX_มท รายวัน	O ₃ _มท รายวัน	WS_มท รายวัน	WD_มท รายวัน	Temp_มท รายวัน	RH_มท รายวัน	BP_มท รายวัน
01/03/2569	25.8	20.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	244.4	31.6	59.6	1000.8
02/03/2569	34.2	27.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	7.2	0.8	253.2	32.5	53.7	1002.0
03/03/2569	43.2	35.8	2.0	30.5	5.0	35.5	Cal.	0.7	256.3	32.5	50.5	1002.3
04/03/2569	47.7	41.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	264.9	32.3	41.9	1002.4
05/03/2569	53.2	44.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	206.8	31.7	47.4	1002.0
06/03/2569	48.3	31.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	261.8	31.8	54.0	1003.6
07/03/2569	36.8	28.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	282.2	31.3	55.6	1005.1
08/03/2569	38.2	30.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	240.6	31.9	58.2	1004.8
09/03/2569	48.1	39.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	268.1	32.6	53.7	1005.4
10/03/2569	48.8	36.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	309.0	31.8	51.3	1006.5
11/03/2569	48.6	34.9	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	303.2	31.7	49.8	1005.6
12/03/2569	45.3	37.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	252.0	28.9	66.4	1004.8
13/03/2569	57.8	49.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	306.5	30.1	57.9	1005.2
14/03/2569	43.0	34.9	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	313.0	30.3	55.8	1006.8
15/03/2569	46.9	38.8	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	313.2	31.7	48.7	1006.5

รายงานผลการตรวจวัด

เลือกกลุ่มเขต

กลุ่มกรุงเทพมหานคร

สถานี

ปิ่นเกล้า

เลือกพารามิเตอร์

PM10PM2.5COHCHOXO3WSWDTempRHBP

ล้าง

ประเภทข้อมูล

☐ รายชั่วโมง☒ รายวัน☐ รายเดือน☐ AQI

ช่วงวันที่

01/04/2566

→

30/04/2566

รูปแบบ

☒ ตาราง☐ กราฟ

แสดงข้อมูล

Show 30 entries

Search:

วันที่	PM10_มก รายวัน	PM2.5_มก รายวัน	CO_มก รายวัน	NO2_มก รายวัน	NO_มก รายวัน	NOX_มก รายวัน	O3_มก รายวัน	WS_มก รายวัน	WD_มก รายวัน	Temp_มก รายวัน	RH_มก รายวัน	BP_มก รายวัน
01/04/2569	34.9	26.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.2	185.1	31.8	67.9	1002.9
02/04/2569	31.3	24.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	186.7	31.8	66.2	1003.3
03/04/2569	33.0	24.9	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.3	185.0	31.5	65.3	1002.7
04/04/2569	41.7	34.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	185.7	32.0	65.0	1001.2
05/04/2569	51.9	42.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	211.2	32.8	56.4	1000.5
06/04/2569	49.4	41.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.0	228.9	32.7	58.2	1001.7
07/04/2569	51.9	41.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	222.5	33.1	57.5	1002.5
08/04/2569	46.4	37.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.0	184.1	32.9	62.4	1002.5
09/04/2569	41.1	30.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	187.9	32.3	65.8	1003.6
10/04/2569	37.3	27.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	187.6	32.2	67.5	1003.7
11/04/2569	38.4	29.9	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	200.1	32.8	61.4	1002.7
12/04/2569	45.9	32.8	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.0	213.5	32.9	59.5	1001.3
13/04/2569	38.7	30.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	197.8	32.8	62.1	1002.8
14/04/2569	51.0	42.9	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	212.2	35.2	53.2	1001.9
15/04/2569	42.5	26.8	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	216.1	33.3	62.0	1002.7

รายงานผลการตรวจวัด

เลือกกลุ่มเขต

กลุ่มกรุงเทพมหานคร

สถานี

ปทุมธานี

เลือกพารามิเตอร์

PM10 PM2.5 CO NO2 PM NOX O3 WS WD Temp RH BP

จำนวน

ประเภทข้อมูล

รายชั่วโมง

รายวัน

รายเดือน

AQI

ช่วงวันที่

01/05/2569

→

31/05/2569

รูปแบบ

ตาราง

กราฟ

แสดงข้อมูล

Show 30 entries

Search:

เวลา	PM10_มอ รายชั่วโมง	PM2.5_มอ รายชั่วโมง	CO_มอ รายชั่วโมง	NO2_มอ รายชั่วโมง	NO_มอ รายชั่วโมง	NOX_มอ รายชั่วโมง	O3_มอ รายชั่วโมง	WS_มอ รายชั่วโมง	WD_มอ รายชั่วโมง	Temp_มอ รายชั่วโมง	RH_มอ รายชั่วโมง	BP_มอ รายชั่วโมง
01/05/2569	35.3	23.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	269.1	30.8	66.0	1007.8
02/05/2569	34.5	20.7	0.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	197.1	32.7	60.4	1005.8
03/05/2569	28.2	14.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	206.4	32.1	65.2	1006.6
04/05/2569	33.4	19.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	223.3	31.9	69.2	1008.3
05/05/2569	45.1	27.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.0	267.2	31.5	65.2	1010.0
06/05/2569	49.3	31.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	238.7	32.8	67.8	1008.7
07/05/2569	45.0	26.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	213.5	32.2	72.0	1008.5
08/05/2569	48.0	29.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	301.4	30.9	73.6	1008.7
09/05/2569	57.3	34.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	9.9	0.9	310.0	30.8	73.5	1009.1
10/05/2569	49.7	31.5	2.8	32.3	3.2	35.6	Cal.	0.7	277.9	30.3	75.5	1009.4
11/05/2569	45.2	23.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	231.6	31.7	69.3	1009.1
12/05/2569	42.5	23.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	261.1	30.7	71.3	1008.7
13/05/2569	34.9	15.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	214.7	31.9	71.5	1007.5
14/05/2569	39.7	15.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	220.3	32.1	69.3	1006.8
15/05/2569	39.7	13.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	254.8	32.8	64.8	1006.6

ວັນ	PM10_ພວ ຮາຍຫວັ	PM2.5_ພວ ຮາຍຫວັ	CO_ພວ ຮາຍຫວັ	NO2_ພວ ຮາຍຫວັ	NO_ພວ ຮາຍຫວັ	NOX_ພວ ຮາຍຫວັ	O3_ພວ ຮາຍຫວັ	WS_ພວ ຮາຍຫວັ	WD_ພວ ຮາຍຫວັ	Temp_ພວ ຮາຍຫວັ	RH_ພວ ຮາຍຫວັ	BP_ພວ ຮາຍຫວັ
01/06/2569	38.3	21.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	273.4	30.7	73.2	1008.2
02/06/2569	39.9	22.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	257.3	31.7	70.6	1006.6
03/06/2569	34.4	17.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	13.5	0.6	264.9	31.8	67.5	1004.9
04/06/2569	31.0	12.5	0.7	24.3	5.0	29.5	Cal.	0.8	195.8	32.0	68.1	1004.4
05/06/2569	35.9	15.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	186.0	32.4	65.2	1005.4
06/06/2569	31.7	14.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	183.4	31.9	66.9	1007.5
07/06/2569	29.6	12.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	200.4	30.7	73.7	1008.5
08/06/2569	34.0	15.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	235.7	32.0	70.3	1007.6
09/06/2569	38.5	17.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.5	255.9	31.3	73.0	1007.3
10/06/2569	35.4	14.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.5	210.2	31.4	71.5	1007.6
11/06/2569	34.0	14.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	245.4	30.7	72.4	1010.2
12/06/2569	33.3	12.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	229.2	29.4	78.9	1012.3
13/06/2569	44.9	15.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	251.3	30.9	71.8	1011.2
14/06/2569	40.8	11.9	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	235.7	32.3	66.2	1009.4
15/06/2569	40.7	9.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	277.0	32.4	67.2	1009.3
16/06/2569	41.6	11.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	242.1	31.3	71.7	1010.0
17/06/2569	45.3	12.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	283.7	32.7	65.1	1010.3
18/06/2569	37.6	10.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	294.2	31.7	67.6	1010.0
19/06/2569	37.9	11.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	286.4	30.6	71.6	1009.5
20/06/2569	37.7	11.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	274.8	30.0	74.1	1009.7
21/06/2569	35.7	12.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	288.2	32.4	63.0	1009.8
22/06/2569	44.0	13.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	335.3	33.0	58.5	1009.6
23/06/2569	45.7	14.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	1.1	288.6	33.4	57.8	1008.4
24/06/2569	40.9	10.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.9	246.0	33.7	59.9	1007.7
25/06/2569	37.8	11.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.8	242.1	31.7	70.5	1008.2
26/06/2569	37.2	12.9	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	229.0	30.4	72.7	1007.9
27/06/2569	42.2	13.7	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.7	278.5	31.9	70.2	1007.6
28/06/2569	36.3	10.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	8.8	0.8	265.1	31.3	68.9	1007.4
29/06/2569	37.2	8.6	0.5	19.4	15.2	34.6	Cal.	0.8	172.5	31.3	67.8	1007.0
30/06/2569	47.0	9.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	4.2	0.7	33.0	29.6	70.0	1008.0
ຄຳເລື້ອຍ	38.22	13.27	0.60	21.85	10.10	32.05	8.83	0.76	242.04	31.55	68.86	1008.38
ຄຳສູງສຸດ	47	22.6	0.7	24.3	15.2	34.6	13.5	1.1	335.3	33.7	78.9	1012.3
ຄຳຕ່ຳສຸດ	29.6	8.6	0.5	19.4	5	29.5	4.2	0.5	33	29.4	57.8	1004.4
ຄຳລົງປັກດີ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ภาคผนวกที่ 2-11
เอกสารตรวจสอบเครื่องยนต์-เครื่องจักร ปจ.1-2



เอกสารตรวจรับรองทาวเวอร์เครน (TOWER CRANE)

ZOOMLION QTZ125(L125-8F) S/N : 1012TCR220186

โครงการ โครงการ The Platinum Square - ประตูน้ำ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)



ตรวจสอบ วันที่ 20 เมษายน 2569

ตรวจสอบครั้งต่อไป วันที่ 20 กรกฎาคม 2569



แบบ ปจ.1

ครั้งที่ 1

INSPECTION REPORT

เริ่มมีผลบังคับใช้

20 เมษายน 2569

OUR REF LTT-GETEC 03/2604012

วันหมดอายุ

20 กรกฎาคม 2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

1. การทดสอบกรณี

☑ (1) การทดสอบตามข้อ 57

☑ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☑ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด _____ ตัน

☑ ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด 2 ตัน

☐ ประเภทอื่น ๆ _____ ระบุตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด _____ ตัน

☐ (2) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ 58

(2.1) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่น ๆ ระบุ _____

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่น ๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ _____

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ทดสอบอย่างน้อย 6

เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☑ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่น ๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน ทดสอบ อย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☑ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึ้นไปทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

แบบ ปจ.1

2. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท จีเทค

เลขทะเบียนนิติบุคคล -

ประกอบกิจการ ให้บริการรถบัสคอนกรีต

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน -

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 40/42 ซอย/ถนน งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง

เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-954-7800

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่นจำนวน เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่โครงการ The Platinum Square

- ประจํา บริษัท พรีเมียมท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

- (1) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (2) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (3) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

- (1) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (2) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (3) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- (1) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (2) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (3) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

- (1) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (2) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (3) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

3. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

☒ โดย :ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง ZOOMLION

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชื่อ ZOOMLION เลขทะเบียนชานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ)

ประเทศ CHINA ปีที่ผลิต 2022 หมายเลขเครื่อง 1012TCR2200186

รุ่น QTZ125 (L125-8F) ขนาดเครื่องค้ำถั่ง 93 กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)

แบบ ปจ.1

ที่อยู่ _____ (ไม่มี) _____

โทรศัพท์ _____ (ไม่มี) _____ โทรสาร _____ (ไม่มี) _____

4. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ วัตถุประสงค์ _____

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) _____ - _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 155(_____)

ที่อยู่เลขที่ 77/43 ซอย _____ - _____ ถนน _____ - _____

แขวง/ตำบล _____ มานายพร _____ เขต/อำเภอ _____ เมือง _____

จังหวัด _____ ระยอง _____ โทรศัพท์/โทรสาร _____ - _____

E-mail _____

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

- ☒ (1) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน _____ วก. _____ ระดับ _____ วุฒิวิศวกร _____ หมดอายุวันที่ 11 มกราคม 2574

และใบสำคัญ (ตามมาตรา 9) เลขที่ 0601- _____

- ☒ (2) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน 2512/66 หมดอายุวันที่ 12 มีนาคม 2569

และใบอนุญาต (ตามมาตรา 11) เลขที่ 0602- _____

หมดอายุวันที่ 23 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ _____

เลขทะเบียน _____ ระดับ _____ หมดอายุวันที่ _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

- 1) แบบปั้นจั่น (Type) ☒ บันจั่นหอสูง (Tower Crane) ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)
- ☐ บันจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (Other): _____

2) ขนาดพิกัดการยก

2.1) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด

☐ บันจั่นขาสูง _____ ตัน ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ _____ ตัน

☐ อื่นๆ (ระบุ) _____ ตัน

แบบ ปจ.1

2.2) ตารางแสดงพิถันน้ำหนักยก (Load chart)

☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด

สำหรับกรณีปั้นจั่นห้อยสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิถันน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 2.22 ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 4 ตัน☒ ที่มุมมองสามกสุด 4 ตัน และที่มุมมองน้อยสุด 2.22 ตัน☐ อื่นๆ _____ ตัน

3) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล _____

4) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น

☐ มี (ระบุ) _____ ☒ ไม่มี

5) โครงสร้างปั้นจั่น

5.1) สภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.2) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.3) สภาพเนื้อมัดและหมุดยึด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____6) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง⁴☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

7) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8) ระบบคั่นกำลัง

8.1) สภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ ไม่มีการใช้งานในส่วนนี้

8.1.1) ระบบหล่อลื่น

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.2) ระบบเชื้อเพลิง

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.3) ระบบระบายความร้อน

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.4) ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.5) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบ ปจ.1

8.2) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า

8.2.1) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.2.2) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.2.3) สภาพแผงหรือสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์ และอุปกรณ์อื่น

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.3) ระบบส่งกำลัง ระบบคัตต้อกำลังและระบบเบรก

8.3.1) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.3.2) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.3.3) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

9) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยาวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____10) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น⁵

10.1) สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

10.2) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____11) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) ไม่มีการใช้งานในส่วนนี้

11.1) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

11.2) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

12) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)

12.1) การทำงานของคตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

12.2) การทำงานของชุดรางเลื่อน

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

12.3) มุมแขนปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบ ปจ.1

13) การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

14) การทำงานของชุดควบคุมพิคคาน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

15.1) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.2) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่คุณผลิตกำหนด

15.3.1) รอกปลายแขนปั้นจั่น ไม่น้อยกว่า 18 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3.2) รอกของตะขอ ไม่น้อยกว่า 16 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3.3) รอกหลังแขนปั้นจั่น ไม่น้อยกว่า 15 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4) สภาพตะขอ

15.4.1) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.2) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.3) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.4) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.5) ไม่มีการเสีรูปร่างหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.6) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

16) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

16.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 mm. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)

เท่ากับ _____ N/A อายุการใช้งาน _____ N/A เดือน / ปี

แบบ ปจ.1

16.2) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

17) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

17.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลาง N/A ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 3.5 (Safety Factor)

เท่ากับ N/A อายุการใช้งาน N/A เดือน/ปี

17.2) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อไม่น้อยกว่า 2 เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18) สภาพลวดสลิง

18.1) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.2) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แฉกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.3) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.4) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.5) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

19) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราว

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

20) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนบันไดหรืออุปกรณ์อื่นของบันไดที่มีความสูงเกิน 2 เมตร ต้องมีบันได พร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

21) การจัดทำพื้นชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันดกระดืบพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้นและทางเดิน)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

22) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่บันไดทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

23) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่บันได และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับบันไดเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบ ปจ.1

25) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบับัน ดัดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง ที่ถูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

26) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับบับัน หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

27) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁷

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ _____ เหล็ก DB 20 น้ำหนัก 2.2 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ _____ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน

วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) อื่นๆ ระบุ _____

28) การทดสอบการรับน้ำหนักของบับันในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation)

28.1) บับันใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)

ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)

☒ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 – 1.25 เท่า

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จากพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตัน ขึ้นไป ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.1 เท่า

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☒ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับบับันหอย ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและค่าสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

28.2) บับันที่ใช้งานแล้ว

28.2.1) ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☐ ตามวาระทุก _____ เดือน / ปี

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☒ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

28.2.2) กรณีปั่นจั่นหอสูง ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 - 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด⁸

☐ ตามวาระทุก	เดือน/ปี	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)		☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป		☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย		☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง		☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

29) นำนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

29.2) กรณีขึ้นจั่นหอสูงพิทักษ์น้ำหนักรกที่อนุญาตให้ใช้งาน

น้ำหนักรกที่อนุญาตให้ใช้งาน	2.62 - 1.93	คัน ที่ระยะ	40 - 50 m.
น้ำหนักรกที่อนุญาตให้ใช้งาน	3.79 - 2.62	คัน ที่ระยะ	30 - 40 m.
น้ำหนักรกที่อนุญาตให้ใช้งาน	6.20 - 3.79	คัน ที่ระยะ	20 - 30 m.
น้ำหนักรกที่อนุญาตให้ใช้งาน	8	คัน ที่ระยะ	0 - 15 m.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

1. กรณีข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปืนนั้น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

2. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของบับิ้นจำเป็นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ ทำเนียบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุม และสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

แบบ ปจ.1

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

1. วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
2. วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก
3. โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
4. ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
5. ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
6. Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด - ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด กรณีปั้นจั่นหอยสูงแขนเลื่อนไกลสุด - ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด - ขวาสุด
7. น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียสคาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัด ไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

8. กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6 x 1.25 จะเท่ากับ 7.5 ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน

ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9 x 1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม

แบบ ปจ.1

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปืนจันทันครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปืนจันทัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ 4 (1) ลงชื่อ _____ วันที่ _____
(_____)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ 4 (2) ลงชื่อ เลอ... วันที่ 20 เมษายน 2569
(น.า.)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 / หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ ลงชื่อ เลอ... วันที่ 20 เมษายน 2569
(นายว.)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ 2 (2) ซึ่งเป็นวิศวกร และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ

ลงชื่อ นางสาว... วันที่ 20 เมษายน 2569
(นางสาว)


นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปืนจันทันนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ ของวิศวกรเท่านั้น แต่
ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

รูปภาพวิศวกรกับเครื่องจักร



วิศวกรผู้ตรวจสอบ

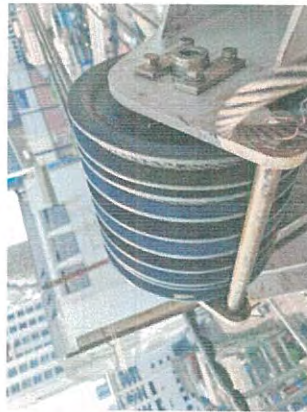





ทดสอบยกโหลดขนาด (Capacity) 2.2 ตัน ค้างไว้ (Holding Time) 10 นาที



4 [Redacted]



Load Test Report

Test Specification

Working Radius 45.0 meter

Load test 2.2 tons

Boom Angle 15 degrees

Load Chart

塔机型号 Crane Type		QTZ125(L125-8F)												
制造许可证 License No.		TS2443100-2024												
出厂日期 Date		2022-03-21												
出厂编号 No.	1G12TCR2300186	设备代码 No.	431043100-202200186											
幅度 Radius(m)	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	Max(t/m)
80°	8.00	7.88	6.74	5.77	4.98	4.37	3.89	3.48	3.12	2.82	2.51	2.20	1.92	8.022.16
	45°	8.00	8.91	9.85	10.81	11.79	12.79	13.80	14.82	15.85	16.89	17.94	18.99	8.022.48
	30°	8.00	8.00	7.70	6.98	6.28	5.59	4.92	4.28	3.67	3.08	2.51	1.97	8.022.79
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.023.11
60°	8.00	8.00	6.97	6.07	5.31	4.64	4.00	3.39	2.80	2.24	1.70	1.18	0.68	8.023.43
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.023.75
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.024.07
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.024.39
45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.024.71
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.025.03
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.025.35
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.025.67
30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.025.99
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.026.31
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.026.63
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.026.95
15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.027.27
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.027.59
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.027.91
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.028.23
80°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.028.55
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.028.87
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.029.19
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.029.51
45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.029.83
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.030.15
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.030.47
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.030.79
30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.031.11
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.031.43
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.031.75
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.032.07
15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.032.39
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.032.71
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.033.03
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.033.35
80°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.033.67
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.033.99
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.034.31
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.034.63
45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.034.95
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.035.27
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.035.59
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.035.91
30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.036.23
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.036.55
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.036.87
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.037.19
15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.037.51
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.037.83
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.038.15
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.038.47
80°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.038.79
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.039.11
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.039.43
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.039.75
45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.040.07
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.040.39
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.040.71
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.041.03
30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.041.35
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.041.67
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.041.99
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.042.31
15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.042.63
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.042.95
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.043.27
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.043.59
80°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.043.91
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.044.23
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.044.55
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.044.87
45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.045.19
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.045.51
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.045.83
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.046.15
30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.046.47
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.046.79
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.047.11
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.047.43
15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.047.75
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.048.07
	30°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.048.39
	15°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.048.71
80°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	1.46	8.049.03
	45°	8.00	8.00	6.98	6.09	5.40	4.82	4.28	3.76	3.26	2.78	2.32	1.88	8.049.35
	30°													

Quality Certificate

产品合格证

QUALITY CERTIFICATE

产品名称: 塔式起重机	产品型号: QTZ125 (L125-8F)	制造许可证: TS2443100-2024
Commodity: Tower Crane	Type	License No
出厂编号: 1012TCR2200186	设备代码: 431043100202200186	出厂日期: 2022-3-21
No	No	Date of production
公称起重力矩: 1250kN.m	工作幅度: 50m	独立工作高度 (固定式/内爬式): 29.31/27.66m
Rated hoisting moment	Radius	Free stationary (Stationary/Internal climbing)
最大起重量: 8t	起升速度:	两倍率 (Two Fall) 四倍率 (Four Fall)
Max hoisting capacity	Hoisting speed	0~132m/min 0~66m/min
变频时间: 2.2min	回转速度: 0~0.79r/min	行走速度:
Luffing speed	Slewing speed	Travelling speed
制造地址: B		

Address of manufacturer

经检验该产品符合图纸及 GB/T 5031-2019、GB/T 3811-2008、GB/T 13752-2017 等标准以及有关技术条件。

It is hereby certified that the tower crane has been tested and found to conform with the GB/T 5031-2019 and GB/T 3811-2008 and GB/T 13752-2017 standard and all the requirements of the drawings and on other technical documents.

产品合格章:

Product qualification stamp

出厂检验员章:

Factory inspector stamp

(08)

产品合格章

检01

Certificate No: LE-CERT-2602-004

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

This Certificate Is Presented to

Mr. THAT [REDACTED]

Was a successful participant of training devoted to the basic of

หลักสูตร การอบรมทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั๊ม (ชนิดอยู่กับที่)

ผู้บังคับปั๊ม (On The Job Training)

ให้ไว้ ณ. 17 กุมภาพันธ์ 2569



**Lanna Engineering
And Supply Co., Ltd.**

Lanna Engineering And Supply Co., Ltd.

S.S. [REDACTED]

Mr. Kittisa [REDACTED]

Instructor / วิทยากรบรรยาย

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเตะเว

ได้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (จำนวน ๑๒ ชั่วโมง)

สถานที่ตั้งในการฝึกอบรม ณ บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน) (สโตร์กลางคลอง ๘) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตามข้อที่ ๗๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจั้น และหมอน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปืนจั้น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
หรือผู้ควบคุมการใช้ปืนจั้น และการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปืนจั้น
(ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

นายณัฐพ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารคลังพัสดุอาวุโส

เลขที่วุฒิบัตร CN25-0862

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเพ็ญพงษ์

ได้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (จำนวน ๑๒ ชั่วโมง)

สถานที่ตั้งในการฝึกอบรม ณ บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) (สโตร์กลางคลอง ๘) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตามข้อที่ ๗๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจั้น และหมอน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปืนจั้น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปืนจั้น และการฝึกอบรมทวนการทำงานเกี่ยวกับปืนจั้น
(ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

นายณัฐพงษ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารคลังพัสดุอาวุโส



เอกสารตรวจรับรองทาวเวอร์เครน (TOWER CRANE)

ZOOMLION QTZ125 (L125-8F) S/N : 1012TCR2200185

โครงการ The Platinum Square - ประตูนํ้า

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)



ตรวจสอบ วันที่ 21 เมษายน 2569

ตรวจสอบครั้งต่อไป วันที่ 21 กรกฎาคม 2569



แบบ ปจ.1

ครั้งที่ 2

INSPECTION REPORT

เริ่มมีผลบังคับใช้

21 เมษายน 2569

OUR REF LTT-GETEC 03/2604011

วันหมดอายุ

21 กรกฎาคม 2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

1. การทดสอบกรณี

☑ (1) การทดสอบตามข้อ 57

☑ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☑ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด _____ ตัน

☑ ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด 1.89 ตัน

☐ ประเภทอื่น ๆ _____ ระบุดันต์ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด _____ ตัน

☑ (2) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ 58

(2.1) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่น ๆ ระบุ _____

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่น ๆ _____

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ _____

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้ เป็นรอบที่ ☐ 1 ☑ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่น ๆ _____

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

☑ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน ทดสอบ อย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึ้นไปทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1

แบบ ปจ.1

2. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจัน

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท จีเทค คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล -

ประกอบกิจการ ให้บริการรถปัมคอนกรีต

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน -

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 40/42 ซอย/ถนน งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง

เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-954-7800

สถานประกอบกิจการมีบันจันจำนวน เครื่อง บันจันเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ขณะทดสอบบันจันใช้งานอยู่ที่โครงการ The Platinum Square

- ประตูน้ำ บริษัท พรินท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับบันจัน

- (1) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (2) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (3) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบันจัน

- (1) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (2) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (3) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ชักเกาะวัสดุ

- (1) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (2) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (3) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้บันจัน

- (1) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (2) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม
- (3) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

3. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้กำหนดออกแบบบันจัน

☒ โดย :ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง ZOOMLION

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ชื่อ ZOOMLION เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ)

ประเทศ CHINA ปีที่ผลิต 2022 หมายเลขเครื่อง 1012TCR2200185

รุ่น QTZ125 (L125-8F) ขนาดเครื่องค้ำกำลัง 93 กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)

แบบ ปจ.1

ที่อยู่ _____ (ไม่มี)

โทรศัพท์ _____ (ไม่มี) โทรสาร _____ (ไม่มี)

4. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) _____ วรพล ตีตแก้ว

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) _____ -

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____

ที่อยู่เลขที่ 77/43 ซอย _____ ถนน _____ -

แขวง/ตำบล _____ มานายพร เขต/อำเภอ _____ เมือง _____

จังหวัด _____ ระยอง โทรศัพท์/โทรสาร 086-835-7376

E-mail Sakworapon@gmail.com

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

- ☒ (1) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน _____ ระดับ วุฒิวิศวกร _____ หมดอายุวันที่ 11 มกราคม 2574

และใบสำคัญ (ตามมาตรา 9) เลขที่ 06(_____)

- ☒ (2) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน 2512/66 หมดอายุวันที่ 12 มีนาคม 2569

และใบอนุญาต (ตามมาตรา 11) เลขที่ 0 _____

หมดอายุวันที่ 23 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ

เลขทะเบียน _____ ระดับ _____ หมดอายุวันที่ _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

- 1) แบบปั้นจั่น (Type) ☒ บันจั่นหอสูง (Tower Crane) ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)
- ☐ บันจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (Other): _____

2) ขนาดพิกัดการยก

2.1) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด

☐ บันจั่นขาสูง _____ ตัน ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ _____ ตัน

☐ อื่นๆ (ระบุ) _____ ตัน

แบบ ปจ.1

2.2) ตารางแสดงพิสัยน้ำหนักยก (Load chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด

สำหรับกรณีปั้นจั่นหอยสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิสัยน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

- ☒ ที่แขวนปั้นจั่นไกลสุด 2.2 ตัน และที่แขวนปั้นจั่นใกล้สุด 8 ตัน
- ☒ ที่ม้วนองศาสูงสุด 8 ตัน และที่ม้วนองศาต่ำสุด 2.2 ตัน
- ☐ อื่นๆ _____ ตัน

3) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

- ☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล _____

4) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น

- ☐ มี (ระบุ) _____ ☒ ไม่มี

5) โครงสร้างปั้นจั่น

5.1) สภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.2) สภาพรอยเชื่อมต่อน

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.3) สภาพเนื้อถาดและหมุดยึด

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

6) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง⁴

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

7) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8) ระบบต้นกำลัง

8.1) สภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ ไม่มีการใช้งานในส่วนนี้

8.1.1) ระบบหล่อลื่น

- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.2) ระบบเชื้อเพลิง

- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.3) ระบบระบายความร้อน

- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.4) ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.5) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบ ปจ.1

- 8.2) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า
- 8.2.1) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.2.2) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.2.3) สภาพแผงหรือสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์ และอุปกรณ์อื่น
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3) ระบบส่งกำลัง ระบบคัตต้อกำลังและระบบเบรก
- 8.3.1) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เพื่อง โซ่ สายพาน
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3.2) ระบบคลัทช์
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3.3) ระบบเบรก
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 9) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย
- ☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 10) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น⁵
- 10.1) สภาพของแผงควบคุม
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 10.2) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 11) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) ไม่มีการใช้งานในส่วนนี้
- 11.1) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ
- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 11.2) สภาพของท่อลมและข้อต่อ
- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)
- 12.1) การทำงานของตะขอหยุดยัก (Upper Limit Switches)
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12.2) การทำงานของชุดรางเลื่อน
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12.3) มุมแขนปั้นจั่น
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบ ปจ.1

13) การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

14) การทำงานของชุดควบคุมพิทักษ์น้ำหนักรอก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

15.1) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.2) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่ผู้ผลิตกำหนด

15.3.1) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18 : 1 หรืออัตราส่วน _____

ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3.2) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16 : 1 หรืออัตราส่วน _____

ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3.3) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15 : 1 หรืออัตราส่วน _____

ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4) สภาพตะขอ

15.4.1) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.2) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.3) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.4) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.5) ไม่มีการเสีรูปทรงหรือสึกหรอของหางตะขอ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.6) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

16) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

16.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 mm. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)

เท่ากับ _____ N/A

อายุการใช้งาน _____ N/A

เดือน / ปี

แบบ ปจ.1

- 16.2) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน
- หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 17) ลวดสลิงช็อค โยง (Standing Ropes)
- 17.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ N/A ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 3.5 (Safety Factor) เท่ากับ _____ N/A อายุการใช้งาน _____ N/A เดือน/ปี _____
- 17.2) เส้นลวดขนาดตรงข้อน้อยกว่า 2 เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว
- หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 18) สภาพลวดสลิง
- 18.1) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 18.2) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แดกเกลียวหรือชำรุด
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 18.3) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 18.4) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 18.5) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 19) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 20) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนบันไดหรืออุปกรณ์อื่นของบันไดที่มีความสูงเกิน 2 เมตร ต้องมีบันได พร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 21) การจัดทำพื้นชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันดกระดืบพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้นและทางเดิน)
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 22) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่บันไดทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 23) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่บันได และรอกของตะขอ (Hook Block)
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 24) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับบันไดเห็นได้ชัดเจน
- ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบ ปจ.1

25) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบับัน ดิดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง ที่ ถูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

26) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งาน ใต้ที่ห้องบังคับบับัน ดิด หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งาน ได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

27) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁷

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ _____ เหล็ก DB 16 150 เส้น น้ำหนัก 2.2 ตัน
เครื่องมือวัด ระบุ _____ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน

วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) อื่นๆ ระบุ _____

28) การทดสอบการรับน้ำหนักของบับัน ดิด ในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้ การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation)

28.1) บับัน ดิด ใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)

ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)

☒ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับ น้ำหนักที่ 1 – 1.25 เท่า

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จากพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตัน ขึ้นไป ให้ทดสอบ การรับน้ำหนักที่ 1.1 เท่า

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

☒ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับบับัน ดิด สูง ให้ ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

28.2) บับัน ดิด ที่ใช้งานแล้ว

28.2.1) ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนัก ยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ความวาระทุก 3 เดือน เดือน / ปี ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

28.2.2) กรณีเป็นจั่นหอสูง ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 - 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด⁸

☐ ตามวาระทุก	เดือน/ปี	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการคิดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)		☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป		☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย		☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง		☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

29) นำนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

29.2) กรณีปั่นจั่นหอสูงพิศคน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน	3.90 - 2.20	ตัน ที่ระยะ	35 - 35 m.
น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน	5.15 - 3.90	ตัน ที่ระยะ	30 - 35 m.
น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน	8.0 - 5.15	ตัน ที่ระยะ	22.5 - 30 m.
น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน	8	ตัน ที่ระยะ	0 - 22.5 m.

30) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page.

แบบ ปจ.1

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

1. วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
2. วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีการคิดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก
3. โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนค่อ ข้อค่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชือก เป็นต้น
4. ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
5. ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
6. Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด - ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด กรณีปั้นจั่นหอยสูงแขนเลื่อน โกลสุด - โกลต่ำสุด, มุมกวาดซ้ายสุด - ขวาสุด
7. น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว คะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชือกโดยให้ดูลวดพินของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

8. กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6×1.25 จะเท่ากับ 7.5 ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน

ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9×1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้งานไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม

แบบ ปจ.1

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปืนจันทันครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปืนจันทัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะและผู้ถือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและผู้ถือที่กำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ 4 (1) ลงชื่อ เลบ [Redacted] วันที่ 21 เมษายน 2569
([Redacted])

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ 4 (2) ลงชื่อ เลบ [Redacted] วันที่ 21 เมษายน 2569
(นาย [Redacted])

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 / หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ ลงชื่อ _____ วันที่ _____
(_____)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ 2 (2) ซึ่งเป็นวิศวกร และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ

ลงชื่อ นาย [Redacted] วันที่ 21 เมษายน 2569
(นางสาว [Redacted])

นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปืนจันทันนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ ของวิศวกรเท่านั้น
แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

รูปภาพวิศวกรกับเครื่องจักร



Wong [Redacted]
วิศวกรผู้ตรวจสอบ







ทดสอบยกโหลดขนาด (Capacity) 2.2 ตัน ค้างไว้ (Holding Time) 10 นาที



๔





Quality Certificate

产品合格证		
QUALITY CERTIFICATE		
产品名称: 塔式起重机	产品型号: QTZ125(L125-8F)	制造许可证: TS2443100-2024
Commodity: Tower Crane	Type	License No
出厂编号: 1012TCR2200185	设备代码: 431043100202200185	出厂日期: 2022-3-21
No	No	Date of production
公称起重力矩: 1250kN.m	工作幅度: 50m	独立工作高度(固定式/内爬式): 29.31/37.50m
Rated hoisting moment	Radius	Free stationary (Stationary/Internal climbing)
最大起重量: 8t	起升速度: 两倍率(Two Fall) 四倍率(Four Fall)	
Max hoisting capacity	Hoisting speed	0~132m/min 0~66m/min
变幅时间: 2.2min	回转速度: 0~0.79r/min	行走速度: /
Luffing speed	Slewing speed	Travelling speed
制造地址: B		
Address of manufacturer		
经检验该产品符合图样及 GB/T 3811-2019、GB/T 3811-2008、GB/T 13752-2017 等标准以及有关技术要求。		
It is hereby certified that the product has been tested and found to conform with the GB/T 3811-2019 and GB/T 3811-2008 and GB/T 13752-2017 standard and all the requirements or drawings and on other technical documents.		
产品合格章: (08)	出厂检验员章: 检01	
Product qualification stamp	Factory inspector stamp	



บริษัท เซฟ ลอว์ วิศวกรรม จำกัด
SAFE LAW ENGINEERING CO.,LTD.

วุฒิบัตรฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย ประมวล [REDACTED]

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน

“ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะวัสดุ,ผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิด รถปั้นจั่น ปั้นจั่นหอสูง”

ฝึกอบรมในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗



[Signature]
(นายวิรัชยุทธ [REDACTED])

วิทยากรฝึกอบรม Certificate: 591897

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๒)

Certificate: SL- M671013

Issue Date: 5/10/2567

Expire Date: 5/10/2569



บริษัท เซฟ ลอว์ วิศวกรรม จำกัด
SAFE LAW ENGINEERING CO.,LTD.

วุฒิบัตรฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาง พิมพ์ [REDACTED]

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน

“ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะวัสดุ,ผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิด รถปั้นจั่น ปั้นจั่นหอสูง”

ฝึกอบรมในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นายวีรยุทธ [REDACTED])

วิทยากรฝึกอบรม Certificate: 591897

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๒)

Certificate: SL- M671014

Issue Date: 5/10/2567

Expire Date: 5/10/2569

แบบตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างประจำปี(งานชุด)

CERTIFICATE OF INSPECTION & TEST


Hydraulic Excavator brand name KOMATSU model PC120,หมายเลข.NO.4

ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซด เจริญทรัพย์

ใช้งานอยู่ที่/เก็บรักษาอยู่ที่(Place of used or storage) (Job Site Location)

ที่หน่วยงาน : โกดังตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ตรวจสอบทดสอบเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

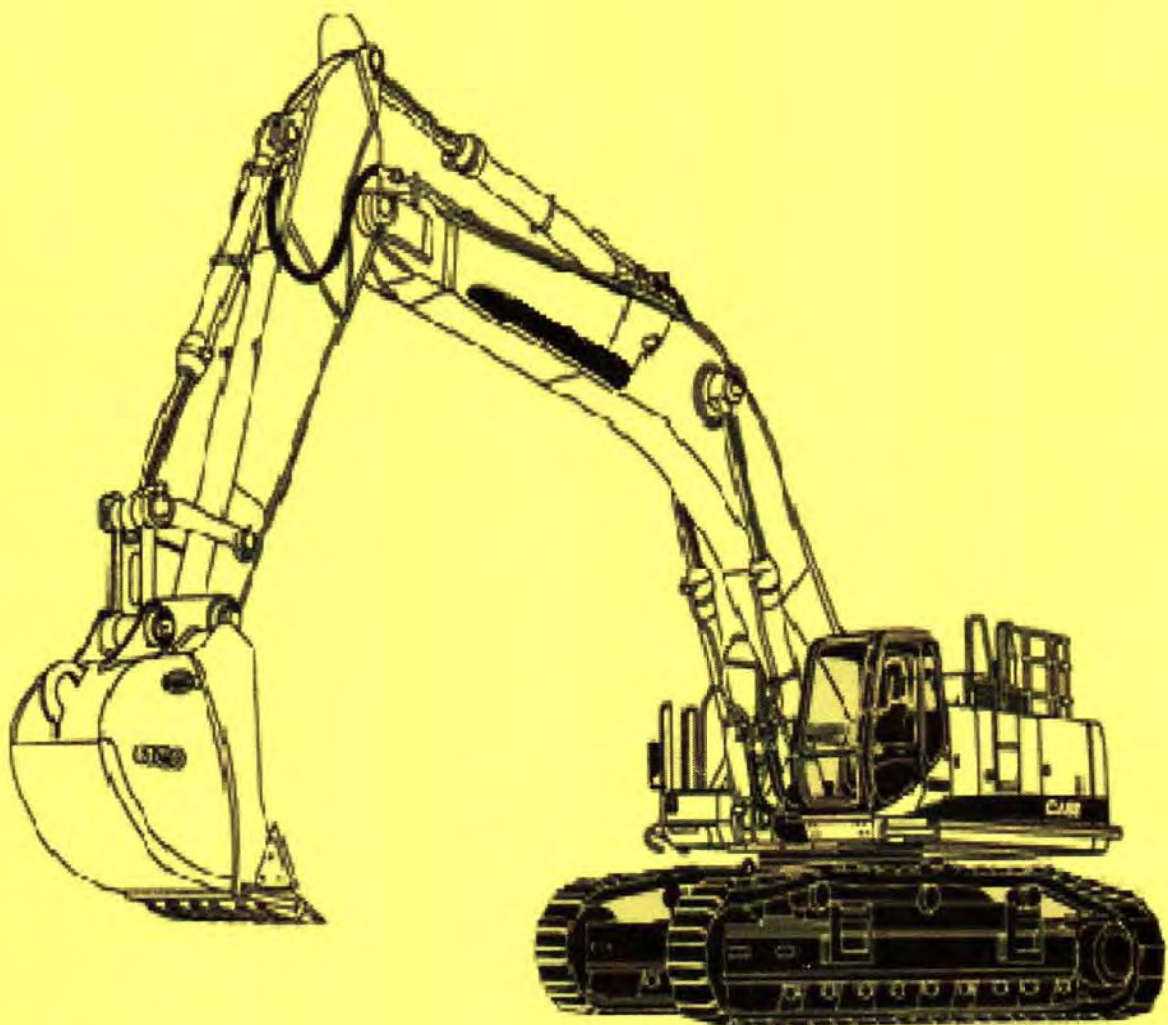



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริง แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด (International Engineering And Inspection Co.,Ltd.)

เลขที่ 120/228 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขที่ IEIC006/2026

Tel.08-7101-0626,08-5125-1333,099-126-9595 Fax. 02-336-1419

หน้า 1

แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง (Construction Equipment and Components Inspection Form)

ข้อมูลของผู้ครอบครองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง (Construction Equipment and Components Owner Information)

ผู้ครอบครอง/นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซด เจริญทรัพย์ เจ้าของ/ผู้กระทำการแทน(Owner / Manager) นาย

ที่อยู่(Address)เลขที่ 108/6 หมู่ 7 ตรอก/ซอย(Soi) - ถนน(Road) - ตำบล/แขวง(Kweang) บางกร่าง

อำเภอ/เขต (Khet) เมืองนนทบุรี จังหวัด(Province) นนทบุรี 11000 (Nonthaburi 11000), Tel. 084-399-6683,084-925-7290

ใช้งานอยู่ที่/เก็บรักษาอยู่ที่(Place of used or storage) โครงการ(Job Site Location of Inspection)

หน่วยงาน(Job Site Location) : โกดังตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง (Construction Equipment and Components Information)

เครื่องจักร และอุปกรณ์นี้ มีชื่อเรียกอันเป็นที่เข้าใจว่า รถขุด (Hydraulic Excavator)

หมายเลข.NO.4

เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างชนิดและประเภท(Machine Type) รถขุด (Hydraulic Excavator)

ยี่ห้อ(brand name)รถขุด KOMATSU รุ่น(model) PC120 ปีที่ผลิต(Year of Man.) -

หมายเลขชassis(Chassis No.) - หมายเลขเครื่อง ENG NO.-

สร้างโดย(Manufacturer) KOMATSU CO.,LTD. ประเทศ(Country) JAPAN/TAIWAN ตามมาตรฐาน(Standard)(ถ้ามี) JIS STANDARD

☒ มีคู่มือการใช้งาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification)ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งผู้ผลิตได้กำหนดขึ้น

☐ มีคู่มือการใช้งาน ซึ่งวิศวกรเป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ (by qualified engineer)

ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย(ถ้ามี) N/A

☒ เครื่องจักร และอุปกรณ์นี้ ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลการดำเนินการ

ข้าพเจ้านาย สมชัย นี อายุ(Age) 59 ปี (years) ที่อยู่ (Address) เลขที่ 99/856 หมู่ (Moo) 4 , ตรอก/ซอย - , ถนน(Road) -

ตำบล/แขวง(Kweang)บางโหลง(Bangchalong), อำเภอ/เขต (Khet) บางพลี(Bangplee) จังหวัด(Province) สมุทรปราการ 10540(Samutprkran)

โทรศัพท์(Tel.)08-7101-0626,08-5125-1333,099-126-9595 , E-mail: ieic.ltd@gmail.com

☒ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมเครื่องกล แขนง ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พศ.๒๕๔๒

และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ,

ใบอนุญาตระดับ สามัญวิศวกร เลขที่ทะเบียน สก.3127 วันที่หมดอายุ 8 พฤษภาคม 2573

☒ เครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ ได้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ ตามข้อกำหนด และ

รอบระยะเวลา ดังรายการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้มีการดำเนินการแก้ไขสภาพบกพร่อง สึกหรอ หรือชำรุดอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานให้สามารถใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อไปได้ดีและปลอดภัย

☐ เครื่องจักร และอุปกรณ์นี้ได้ถูกบัญญัติให้มีการตรวจสอบ หรือรับรองว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งาน

ต่อไปได้ดีและปลอดภัยตามกฎหมายอื่น ดังเอกสารรายการที่ระบุไว้แนบท้ายนี้

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบเครื่องจักรประจำปีตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร บันจัน และ หมอน้ำ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๙ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

กำหนดการตรวจประจำปีครั้งต่อไปในวันที่ 20 เมษายน 2570



(ลงชื่อ)

(นาย)

วิศวกรผู้รับรอง

Cert. Date: 20 April 2026

(ลงชื่อ)

(นาย)

นายจ้าง/เจ้าของ/ผู้ครอบครอง หรือมีไว้ใช้งาน

Cert. Date: 20 April 2026

Hydraulic Excavator brand name KOMATSU model PC120 , หมายเลข. NO.4

หมวดโยธา (Structure Section)

๑. การติดตั้งโครงสร้างหลัก(Structure condition)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๒. ฐานของเครื่องจักร(Foundation of machine)	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๓. โครงสร้างส่วนหมุน (Rotation Structure condition)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๔. สภาพส่วนรับน้ำหนัก(Condition of Carrier Part)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๕. สภาพรอยเชื่อมต่อน (Welding Joints condition)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๖. สภาพของแป้นเกลียว สลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ(Locking Bolts-Nuts con		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๗. น้ำหนักถ่วง(Counter weight)	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๘. อื่นๆ (Other)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)

หมวดเครื่องกล(Mechanical Section)

๑. ระบบต้นกำลัง(Power Source System)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๒. สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ (Engine Condition)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๓. ระบบหล่อลื่น(Lubrication System)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๔. ระบบช่วงล่าง (Under Carriage System)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๕. ระบบควบคุมการทำงาน(Control system)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๖. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่(Steering Control system)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๗. ระบบเชื้อเพลิง(Fuel System)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๘. ระบบระบายความร้อน(Cooling System)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๙. ที่ครอบปิด หรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย(Insulation at exhaust pipe)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๐. ระบบส่งกำลัง(Transmission System)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๑. ระบบตัดต่อ (คลัตช์)(Condition of clutch system)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๒. สภาพของเพลาลูกเบี้ยว ข้อต่อเพลาลูกเบี้ยว โซ่ สายพาน(Condition of shaft&con		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๓. ระบบควบคุมไฮดรอลิก (Hydraulic Control System)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๔. ระบบลม(Pneumatic)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๕. สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม (Condition of mechanisms and mechanical cl		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๖. สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ (Condition of oil and pipe)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๗. สภาพของท่อลมและข้อต่อ (Condition of pneumatic and pipe)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๘. ระบบเบรก (Brake System)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๙. สภาพลวดสลิง ม้วนลวดสลิง	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๒๐. สภาพรอก และตะขอ	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๒๑. อื่นๆ (Other)	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)

หมวดไฟฟ้า(Electrical Section)

๑. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่(Movement Control system)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๒. ระบบควบคุมการทำงาน (Control system)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๓. ระบบควบคุมนิรภัย(Emergency stop switch)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๔. สภาพของแผงวงจรควบคุม(Condition of control panel)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๕. อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า(Cable fitting and guiding)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๖. สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า(Condition of electric motors)		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๗. สภาพสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น(Condition of contactors relays a		☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๘. อื่นๆ (Other)		☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)

หมวดความปลอดภัย(Safety devices Section)

๑. สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๒. สภาพพื้นกันลื่น	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๓. ราวจับ	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๔. รวากันตก	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๕. แผงกั้นวัสดุตกหล่นระดับพื้น	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๖. เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่น ของหลังคาห้องบังคับ(Cab Guard)	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๗. เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนเคลื่อนไหว ของเครื่องจักร	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๘. เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็น ของวัสดุเนื่องจากการทำงาน	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๙. ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๐. ระบบเบรก (ป้องกันการเล่นไหลขณะทำงาน)(Brake System)	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๑๑. อุปกรณ์สำหรับป้องกันการไหลขณะจอด(Parking Brake)	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๑๒. แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๑๓. สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน(Emergency stop switch)	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๑๔. สัญญาณเสียงเตือนขณะทำงาน (Siren on all time when operating)	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๑๕. สัญญาณแสงวาบเตือนขณะทำงาน(Light on all time when operating)	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๑๖. รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๗. กลไกจำกัดขอบเขตการทำงาน(Limit Switches)	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)
๑๘. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานที่ห้องบังคับ (Fier Extinguisher in Cab)	☒ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ ไม่เรียบร้อย (Un Satisfactory,Note)(ระบุ)	
๑๙. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานสำหรับบริเวณ ที่มีการใช้งานเครื่องจักร (Fier Extinguisher in area)	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	
๒๐. ระบบสายดิน(Earthing of the site switch)	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)
๒๑. ระบบสายล่อฟ้า	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)
๒๒. อื่นๆ	N/A	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)	☐ เรียบร้อย (Satisfactory)

คำแนะนำ การตรวจรับรองประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยการควบคุม และดูแลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาตามข้อกำหนด และรอบระยะเวลาตามคู่มือการใช้งาน หรือตามที่วิศวกรได้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ เพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย การนำแนวทางการตรวจสอบ และบำรุงรักษาฯ ไปใช้ ต้องมีความสอดคล้องกับสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้น และอาจเพิ่มเติมให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นได้ หากไม่มีความรู้ในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ควรขอคำปรึกษาแนะนำจากพนักงานตรวจความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือวิศวกร



๓๒
นายสมชัย นิยมเกียรติกิจ







นายสมชัย นิชมเกียรติกุล



เอกสารตรวจสอบความปลอดภัย (ปจ.๒)

MOBILE CRANE

ทะเบียน 70-9240 สมุทรสาคร

TADANO GR-250N-1

S/N:FB3839 CAP. 25 TONS

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2569

หจก.ชัยอารีเครน

วันที่ตรวจสอบ : 18 พฤษภาคม 2569

ตรวจสอบครั้งต่อไป : 18 สิงหาคม 2569



ตรวจสอบโดย : บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
128/102 ม.4 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

**แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่**

๑. การทดสอบกรณี

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ แต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาดตัน

☒ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด๒๕.....ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาดตัน

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน
ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☒ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙.....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน
ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปืนจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ หจก.ชัยอารีคอน.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๗๔๓๕๔๐๐๐๐๙๖๑.....

ประกอบกิจการ ให้บริการเช่ารถเครน.....

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน นายประพันธ์ จาตุรพันธ์.....

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ๖๕/๙ หมู่ ๖..... ซอย ... เพชรเกษม ๑๒๖..... ถนน เพชรเกษม.....

แขวง/ตำบล อ้อมน้อย..... เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน.....

จังหวัด สมุทรสาคร..... โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๐๖๒๔๔-๕.....

สถานประกอบกิจการมีปืนจั่น จำนวน เครื่อง ปืนจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่

ทำการทดสอบเมื่อวันที่... ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙... ขณะทดสอบปืนจั่นใช้งานอยู่ที่... เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร.....

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปืนจั่น

(๑) ตามเอกสารแนบ ☒ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั่น

(๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

(๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปืนจั่น

(๑) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปืนจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง..... TADANO LTD.....

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....

ยี่ห้อ..... TADANO..... เลขทะเบียนยานพาหนะ(จากหน่วยงานของรัฐ..... 70-9240 สมุทรสาคร.....

ประเทศ JAPAN..... ปีที่ผลิต 2004..... หมายเลขเครื่อง FB3839.....

รุ่น GR-250N-1..... ขนาดเครื่องต้นกำลัง N/A..... กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) JIS..... ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)



วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

ที่อยู่.....

โทรศัพท์ โทรสาร

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ชาญชัย วงชารี.....
 หรือนิติบุคคล (ชื่อ)บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่๐๑๑๕๕๖๒๐๒๔๒๙๑.....
 ที่อยู่เลขที่๑๒๘/๑๐๒ หมู่ ๔..... ซอย ถนน
 แขวง/ตำบลบางเมือง..... เขต/อำเภอเมือง.....
 จังหวัดสมุทรปราการ.....๑๐๒๗๐... โทรศัพท์/โทรสาร๐๖๓-๒๒๔๙๒๖๙.....
 E-mailtongtaweewsup.09@gmail.com.....

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน ระดับ..... หมุดอายุวันที่

และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

☒ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน๒๑๖๘/๖๕..... หมุดอายุวันที่๑๐ เมษายน ๒๕๗๑.....

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๗๖.....

หมุดอายุวันที่๗ มิถุนายน ๒๕๗๑.....ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูก

สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อนายชาญชัย วงชารี.....

เลขทะเบียน.....สก 3898..... ระดับ.....สามัญ..... หมุดอายุวันที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๗๑.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน๓๑๐๑๒๐๐๗๔๗๒๖๑.....

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

๑) แบบปั้นจั่น ☒ บันจั่นไฮดรอลิกล้อย่าง ☐ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขา
☐ เรือปั้นจั่น ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก(Load chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด* ให้แนบเอกสารตาราง
 แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด.....0.95.....ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด25.....ตัน

☒ ที่มุมมองสามกาศ25.....ตัน และที่มุมมองศาน้อยสุด0.95.....ตัน

☐ อื่นๆ (ระบุ)ตัน

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๔ -

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น^๒

☐ มี (ระบุ) ☒ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น^๓

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๖) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือยานพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง^๔

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘) ระบบต้นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ และสายพาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๕ -

๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยาวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น^๕

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)^๖

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ถูกผลิตกำหนด

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๖ -

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั่นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...15.9/15.7...mm....ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor)

เท่ากับ N/A อายุการใช้งาน N/A เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor)

เท่ากับ อายุการใช้งาน เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)



.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔) ระบบความปลอดภัย^๗

๒๔.๑) Anti-two block devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๒) Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๓) Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๔) Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๕) อื่นๆ ระบุ

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)^๘

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ^๙

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ เหล็ก..... น้ำหนัก๒.๒.....ตัน
เครื่องมือวัด ระบุเวอร์เนีย,ตลับเมตร..... วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุตรวจเช็คด้วยสายตา.....
อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นารทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ)

๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด^{๑๐} แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระทุก๓.....เดือน/ปี	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน75%ตาม Load Chart... ตัน ที่ระยะ

๒๙.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

๑ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด

๒ วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก

๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น

๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือยานพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก

๖ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด

๗ ระบบความปลอดภัย

Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน

Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมขึ้นเกิดพิกัด

Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด

Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก

๘ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ข่ายันสลักยึด แผ่นรองและระบบไฮดรอลิก

๙ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

๑๐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

- ๑๑ -

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ วันที่

(.....)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ



ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙...

(.....นายช.....)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบ..... ๑ /หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ วันที่...๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙...

(.....นาย.....)

บุคลากรของนิติ..... ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบ..... ควบคุม เป็นผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วันที่

(.....นายป.....)


นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน



หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เอกสารแนบ

ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน้ำหนัก

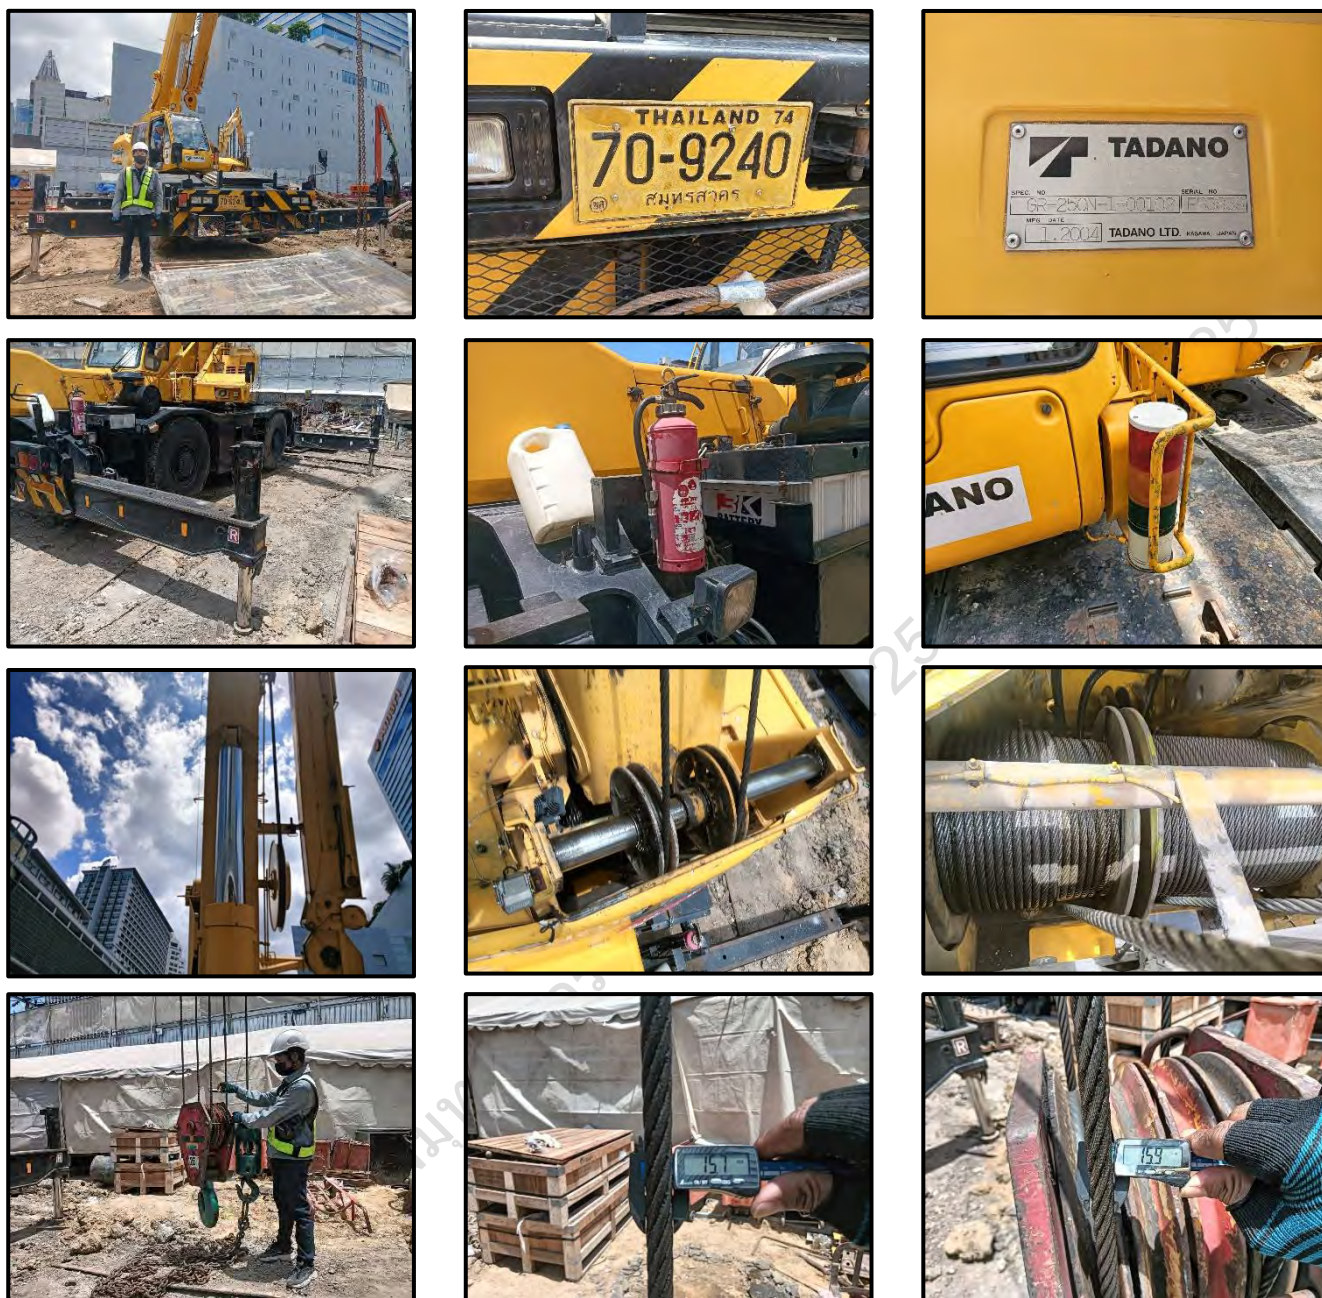

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

เอกสารแนบ

LOAD TEST DATA



MAIN HOIST & AUX HOIST

TEST LOAD 2.2 TON

ANGLE 49.8 DEGREE

RADIUS 18.8 M.

BOOM LENGTH 30.1 M.

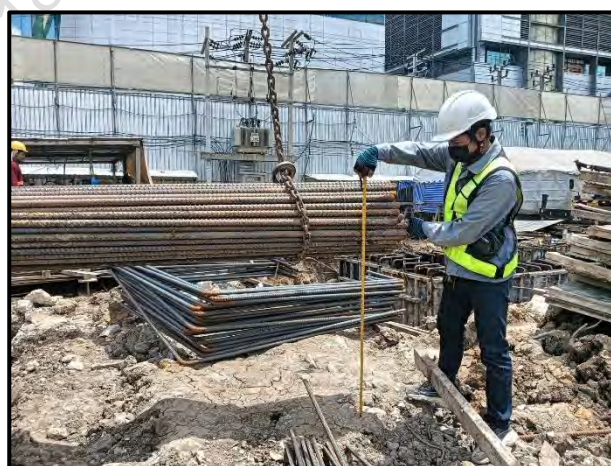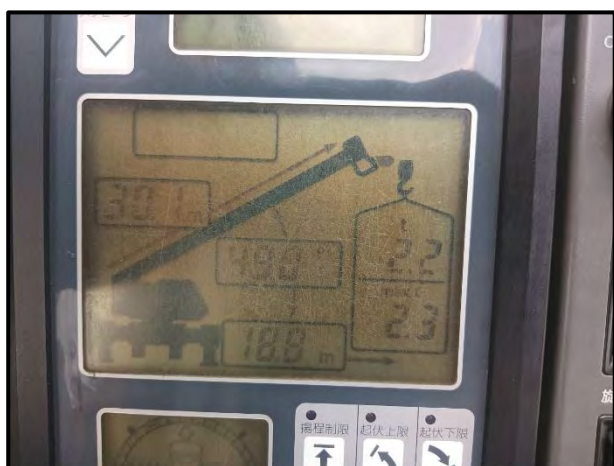

.....วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ

Issued Date : 29 Jul 2024

Exp. Date : 29 Jul 2026

บริษัท ชัยอารี เครน โพร จำกัด

วุฒิบัตร
(Certificate)

จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง (บริษัท ชัยอารี เครน โพร จำกัด)

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้ให้แก่

คุณสุรชัย

เพื่อแสดงว่าได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (18 ชม./2 วัน)

หลักสูตร

"ผู้บังคับรถปั้นจั่น-เครน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น"

ตามข้อ 13, 53 และข้อ 72 ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรม ฯ พ.ศ. 2554

ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ณ ที่ทำการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอารีเครน

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(ส.ด. ดร. วศ.ไชย)

เลขที่ใบสำคัญการทดสอบเครื่องจักร- ปั้นจั่น-หม้อน้ำ : 0602-01-2565-0179

Course Instructor

Certificate Number : CA-147/24

ภาคผนวกที่ 2-12

เอกสารผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพลู

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานที่ตรวจวัด : โครงการแพลทตินัม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ตรวจวัดวันที่ 21 มกราคม 2569

1. บทนำ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งเลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สถานที่ตรวจวัด โครงการแพลทตินัม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมและป้องกันมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและสาธารณชนต่อไป โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมวันที่ 21 มกราคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลของระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แก่ ค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานตามหลักวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัท เพื่อนำไปประเมินผลสำเร็จของระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและสาธารณชนต่อไป

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงสภาพหรือลักษณะงาน เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เนื่องจากการสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของพนักงาน ที่มีระดับความเข้มข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ตรวจวัด โครงการแพลตฟอร์ม สแควร์ ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ โดยมีขอบเขตการดำเนินงานแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ขอบเขตการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด
1. ค่าควันดำจากยานพาหนะ 1.1 รถเครน รุ่น KR-25H-III L 1.2 รถเครน รุ่น GR-500 E-3 ทะเบียนรถ 53-1554 1.3 รถแบคโฮ รุ่น SK-210LC-10 1.4 รถเครน รุ่น KR-25H-V3 1.5 รถแบคโฮ รุ่น KX-91-3SX 1.6 รถเครน รุ่น GR-250N-1-00102 ทะเบียนรถ 70-9240 1.7 รถแบคโฮ รุ่น SK-200-8	21 มกราคม 2569	- ค่าควันดำ (Smoke Opacity)

4. วิธีการเก็บและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) โครงการแพลตฟอร์ม สแควร์ ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์แสดงรายละเอียดดังนี้

4.1 ทำการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Smoke Opacity Meter Model 8500 S/N EOPWA850015944

4.2 ทำการตรวจวัดรถยนต์คันละ 2 ครั้ง แล้วใช้ค่าที่มากที่สุด โดยผลต่างทั้งสองครั้งต้องไม่เกินร้อยละ 5 หากเกินกว่าค่าที่กำหนดต้องทำการตรวจวัดใหม่

5. ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ


ผลการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 21 มกราคม 2569 จำนวน 6 คัน ผลการตรวจวัดแสดงผลดังตารางที่ 5-1 รูปที่ 5-1 และภาพการตรวจวัดภาพที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 ผลการตรวจวัดควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ


ลำดับ	ประเภท	รุ่น/ทะเบียนรถ	เวลา	ผลการตรวจวัด (%)	มาตรฐาน (%)
1	รถเครน	KR-25H-III L	09:20	5.3	≤20
2	รถเครน	GR-500 E-3/53-1554	09:30	4.6	
3	รถแบคโฮ	SK-210LC-10	09:40	1.0	
4	รถเครน	KR-25H-V3	09:50	10.1	
5	รถแบคโฮ	KX-91-3SX	10:00	0.7	
6	รถเครน	GR-250N-1-00102/70-9240	10:10	13.7	
7	รถแบคโฮ	SK-200-8	10:20	1.8	

มาตรฐาน (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2568


หมายเหตุ ตรวจวัดค่าควันดำจากรถยนต์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีการะ

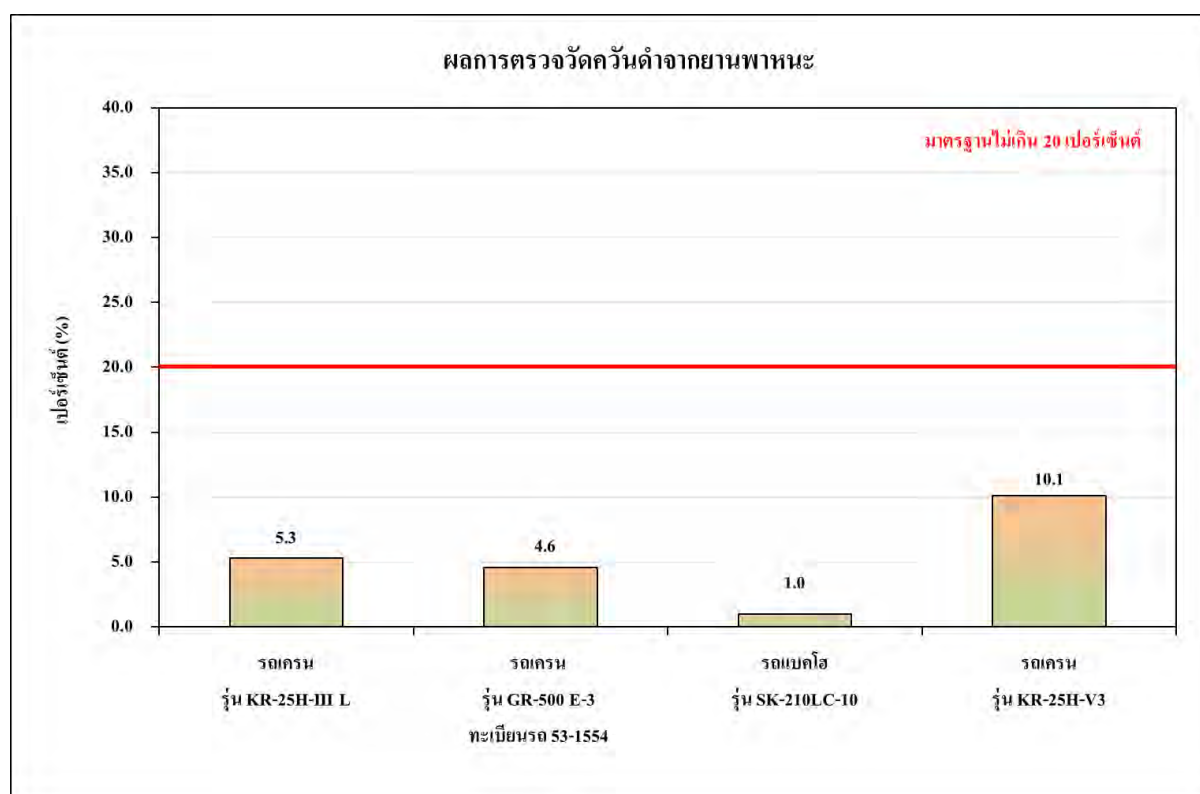

รูปที่ 5-1 ผลการตรวจวัดปริมาณควันดำจากยานพาหนะ

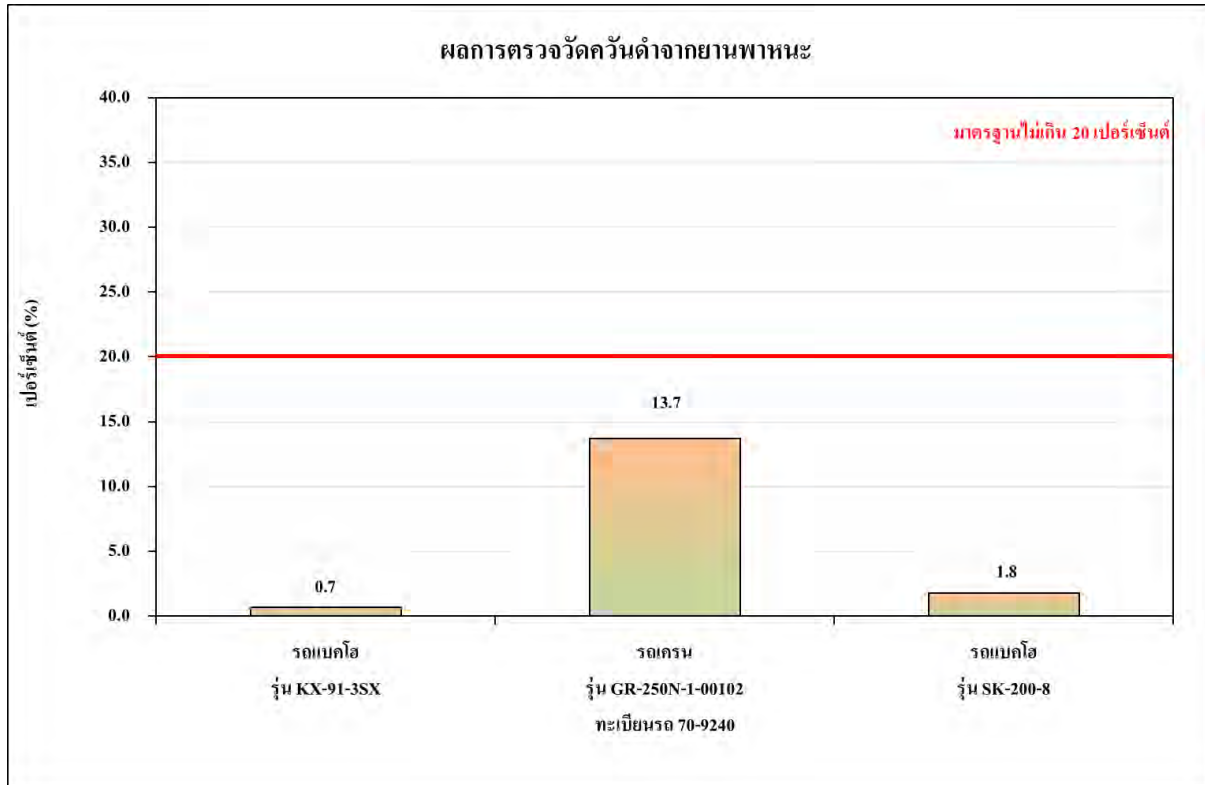

รูปที่ 5-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณควันดำจากยานพาหนะ

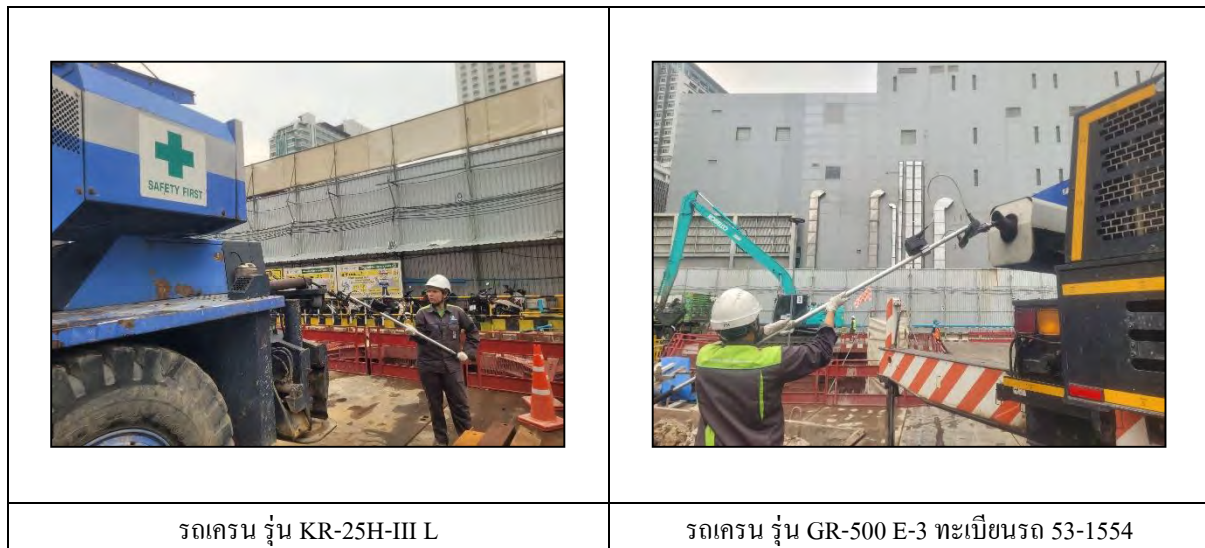

ภาพที่ 5-1 การตรวจวัดปริมาณควันดำจากยานพาหนะ

	
รถแบคโฮ รุ่น SK-210LC-10	รถเครน รุ่น KR-25H-V3
	
รถแบคโฮ รุ่น KX-91-3SX	รถเครน รุ่น GR-250N-1-00102 ทะเบียนรถ 70-9240
	
รถแบคโฮ รุ่น SK-200-8	

ภาพที่ 5-1 (ต่อ) การตรวจวัดปริมาณควันดำจากยานพาหนะ

6. สรุปผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ

ผลการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 21 มกราคม 2569 จำนวน 7 คัน ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตาม (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2568 ตรวจวัดค่าควันดำจากเครื่องยนต์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีการะ ซึ่งกำหนดไว้ว่าค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน และระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานที่ตรวจวัด : โครงการแพลทดินัม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ตรวจวัดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

1. บทนำ

บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งเลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สถานที่ตรวจวัด โครงการแพลทดินัม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมและป้องกันมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและสาธารณชนต่อไป โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายละเอียดดังนี้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลของระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แก่ ค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานตามหลักวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัทฯ เพื่อนำไปประเมินผลสำเร็จของระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและสาธารณชนต่อไป

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงสภาพหรือลักษณะงาน เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เนื่องจากการสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของพนักงาน ที่มีระดับความเข้มข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟริบิลท์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ตรวจวัด โครงการแพลตฟอร์ม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ โดยมีขอบเขตการดำเนินงานแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด
1. ค่าควันดำจากยานพาหนะ 1.1 รถเครน GR-250N/No.1 1.2 รถเครน KR-25H-III L/No.3 1.3 รถแบคโฮ SK-210LC-10/No.2 1.4 รถเครน GR-250N-1-00102/No.5 (70-9240) 1.5 รถแบคโฮ SK-210LC-10/No.3 1.6 รถแบคโฮ VC30	24 กุมภาพันธ์ 2569	- ค่าควันดำ (Smoke Opacity)

4. วิธีการเก็บและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ บริษัท ฟริบิลท์ จำกัด (มหาชน) โครงการแพลตฟอร์ม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์แสดงรายละเอียดดังนี้

4.1 ทำการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Smoke Opacity Meter Model 8500 S/N EOPWA850015944

4.2 ทำการตรวจวัดกันละ 2 ครั้ง แล้วใช้ค่าที่มากที่สุด โดยผลต่างทั้งสองครั้งต้องไม่เกินร้อยละ 5 หากเกินกว่าค่าที่กำหนดต้องทำการตรวจวัดใหม่

5. ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ


ผลการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 6 คัน ผลการตรวจวัดแสดงผลดังตารางที่ 5-1 รูปที่ 5-1 และภาพการตรวจวัดภาพที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 ผลการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ


ลำดับ	ประเภท	รุ่น/ทะเบียนรถ	เวลา	ผลการตรวจวัด (%)	มาตรฐาน (%)
1	รถเครน	GR-250N/No.1	09:37-08:41	4.5	≤20
2	รถเครน	KR-25H-III L/No.3	09:42-08:46	5.5	
3	รถแบคโฮ	SK-210LC-10/No.2	09:47-08:51	1.3	
4	รถเครน	GR-250N-1-00102/No.5 (70-9240)	09:52-08:56	14.0	
5	รถแบคโฮ	SK-210LC-10/No.3	09:00-09:04	1.6	
6	รถแบคโฮ	VC30	09:06-09:10	2.2	

มาตรฐาน (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2568

หมายเหตุ ตรวจวัดค่าควันดำจากรถยนต์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ

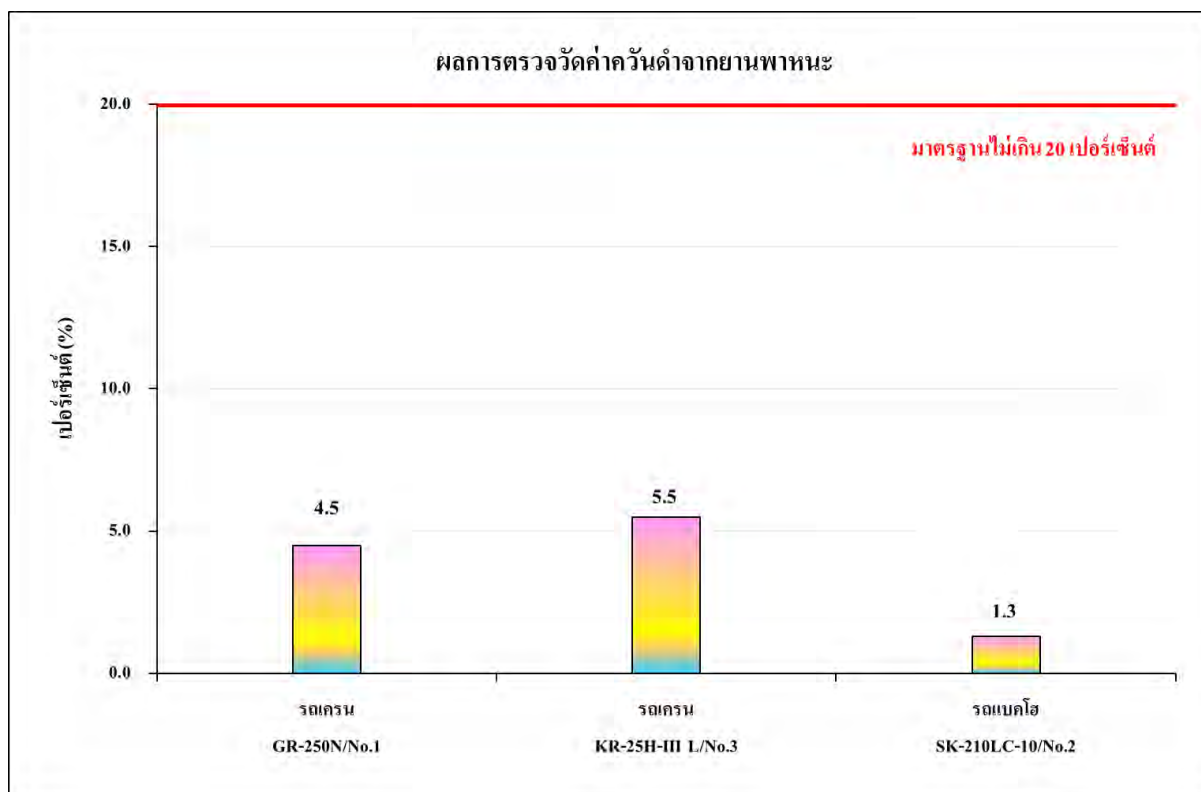

รูปที่ 5-1 ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ

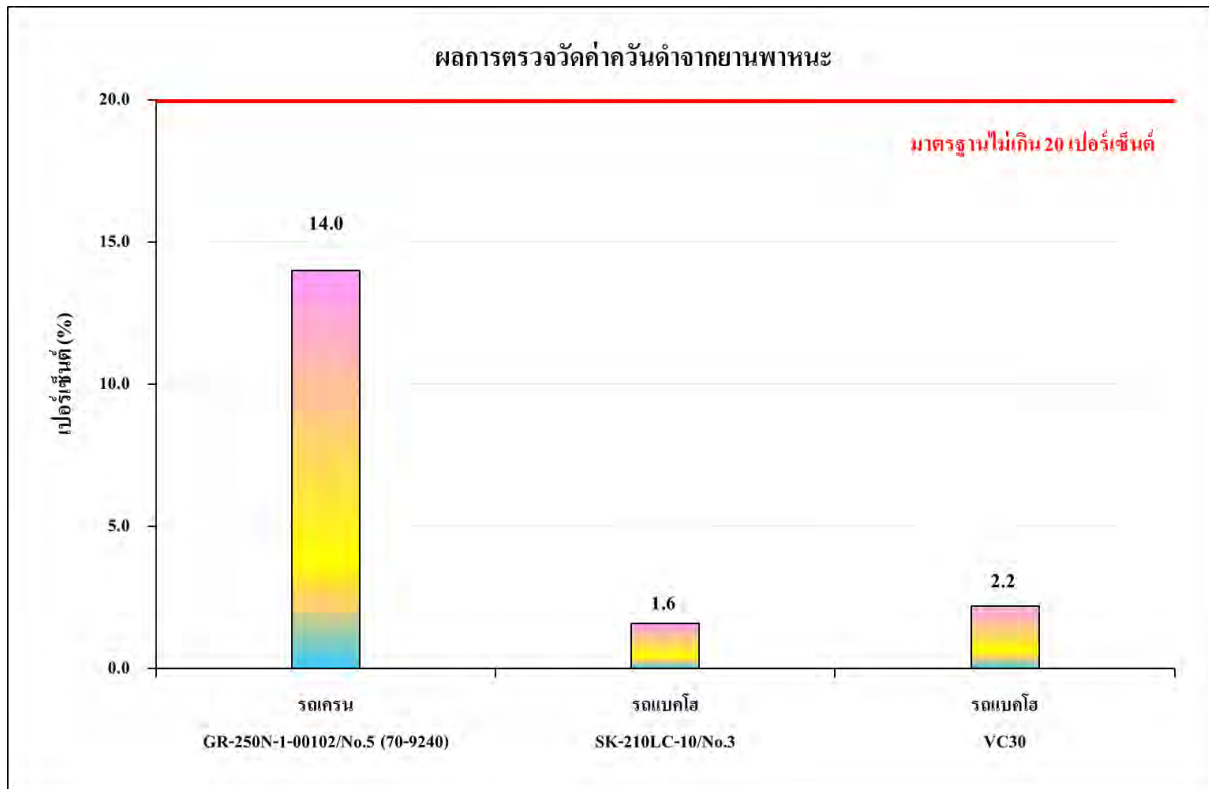

รูปที่ 5-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าวันดำจากยานพาหนะ



ภาพที่ 5-1 การตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะ

	
รถแบคโฮ SK-210LC-10/No.2	รถเครน GR-250N-1-00102/No.5 (70-9240)
	
รถแบคโฮ SK-210LC-10/No.3	รถแบคโฮ VC30

ภาพที่ 5-1 (ต่อ) การตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะ

6. สรุปผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ

ผลการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 6 คัน ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตาม (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2568 ตรวจวัดค่าควันดำจากรถยนต์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ซึ่งกำหนดไว้ว่าค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน และระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพลู

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานที่ตรวจวัด : โครงการแพลทตินัม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ตรวจวัดวันที่ 26 มีนาคม 2569

1. บทนำ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งเลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สถานที่ตรวจวัด โครงการแพลทตินัม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมและป้องกันมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและสาธารณชนต่อไป โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลของระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แก่ ค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานตามหลักวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัทฯ เพื่อนำไปประเมินผลสำเร็จของระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและสาธารณชนต่อไป

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงสภาพหรือลักษณะงาน เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เนื่องจากการสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของพนักงาน ที่มีระดับความเข้มข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ตรวจวัด โครงการแพลตฟอร์ม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ โดยมีขอบเขตการดำเนินงานแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ขอบเขตการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด
1. ค่าควันดำจากยานพาหนะ 1.1 รถเครน KR-25H-III L/No.3 1.2 รถแบคโฮ SK-210/No.1 1.3 รถเครน GR-250N-1-00102/(70-9240) 1.4 รถเครน GR-250N-1/No.1	26 มีนาคม 2569	- ค่าควันดำ (Smoke Opacity)

4. วิธีการเก็บและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) โครงการแพลตฟอร์ม สแควร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์แสดงรายละเอียดดังนี้

4.1 ทำการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Smoke Opacity Meter Model 8500 S/N EOPWA850015944

4.2 ทำการตรวจวัดกันละ 2 ครั้ง แล้วใช้ค่าที่มากที่สุด โดยผลต่างทั้งสองครั้งต้องไม่เกินร้อยละ 5 หากเกินกว่าค่าที่กำหนดต้องทำการตรวจวัดใหม่

5. ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ


ผลการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 26 มีนาคม 2569 จำนวน 4 คัน ผลการตรวจวัดแสดงผลดังตารางที่ 5-1 รูปที่ 5-1 และภาพการตรวจวัดภาพที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 ผลการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ


ลำดับ	ประเภท	รุ่น/ทะเบียนรถ	เวลา	ผลการตรวจวัด (%)	มาตรฐาน (%)
1	รถเครน	KR-25H-III L/No.3	09:08-09:12	12.1	≤20
2	รถแบคโฮ	SK-210/No.1	09:12-09:15	1.6	
3	รถเครน	GR-250N-1-00102/(70-9240)	09:15-09:19	4.8	
4	รถเครน	GR-250N-1/No.1	09:19-09:22	7.4	

มาตรฐาน (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2568

หมายเหตุ ตรวจวัดค่าควันดำจากรถยนต์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีการะ

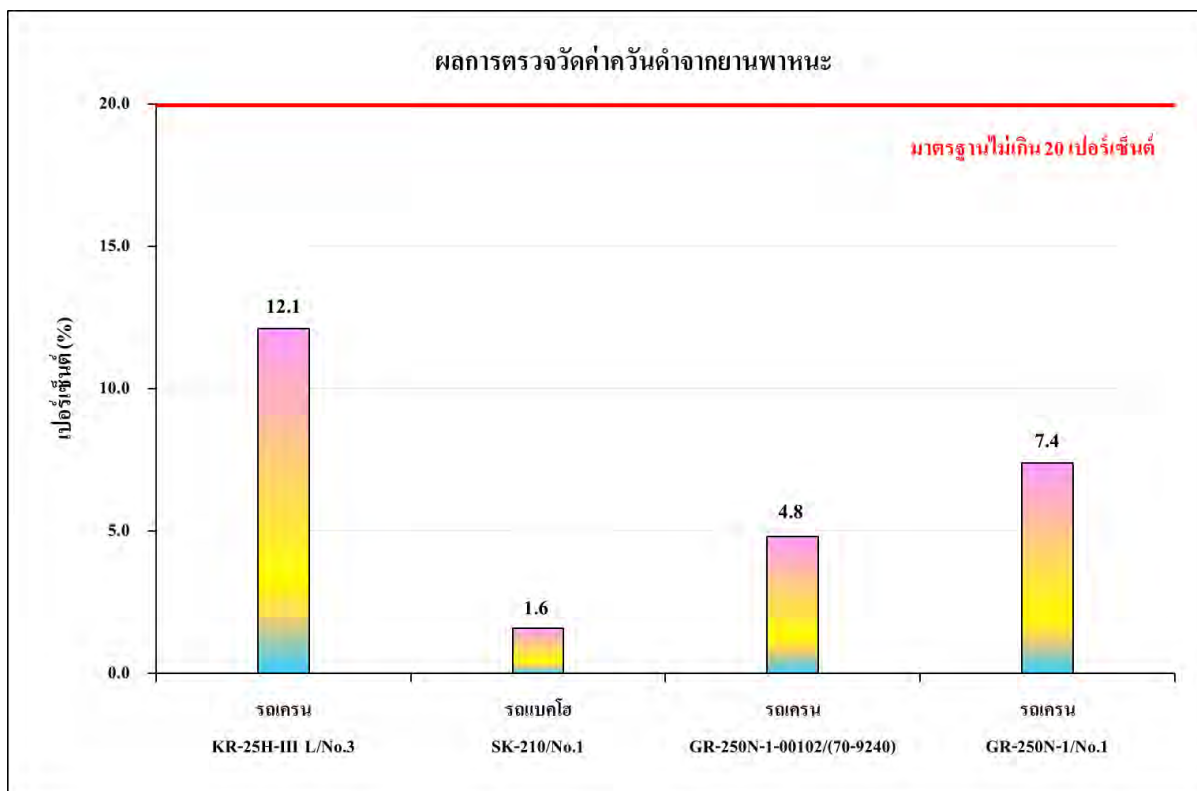

รูปที่ 5-1 ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ

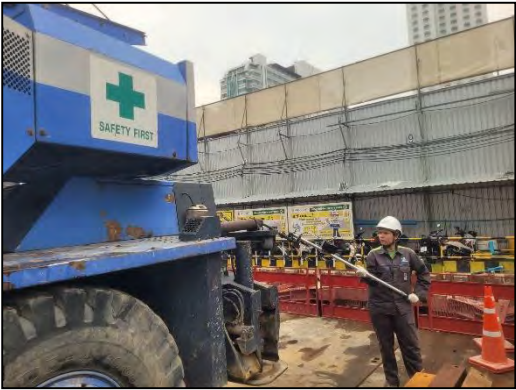	
รถเครน KR-25H-III L/No.3	รถแบคโฮ SK-210/No.1
	
รถเครน GR-250N-1-00102/(70-9240)	รถเครน GR-250N-1/No.1

ภาพที่ 5-1 การตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะ

6. สรุปผลการตรวจวัดค่าควันดำจากยานพาหนะ


ผลการตรวจวัดค่าควันดำ (Smoke Opacity) จากยานพาหนะ ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 26 มีนาคม 2569 จำนวน 4 คัน ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตาม (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2568 ตรวจวัดค่าควันดำจากรถยนต์ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ซึ่งกำหนดไว้ว่าค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน และระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง

ภาคผนวกที่ 2-13

Site Layout Plan และการจัดวางเครื่องจักร


SAFETY

ตำแหน่งเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

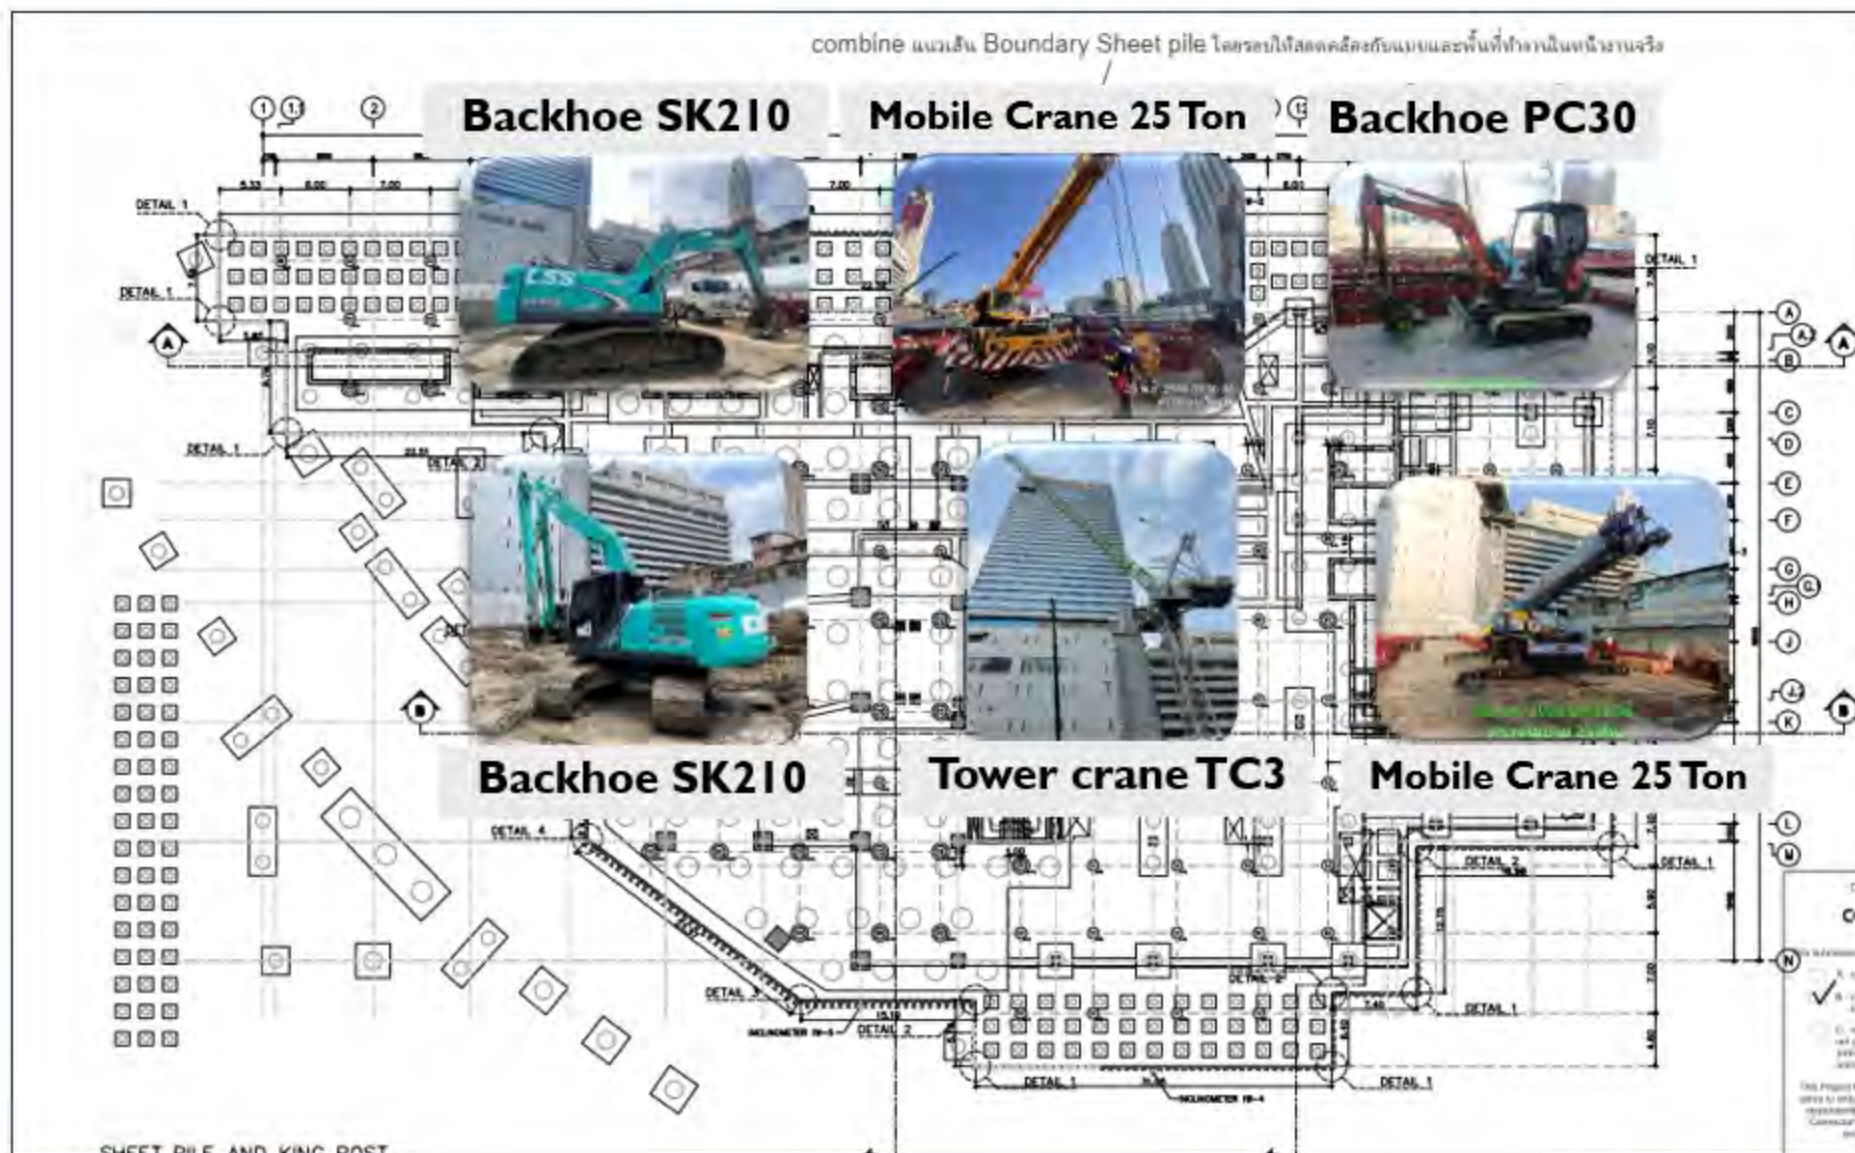

SAFETY

ตำแหน่งเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

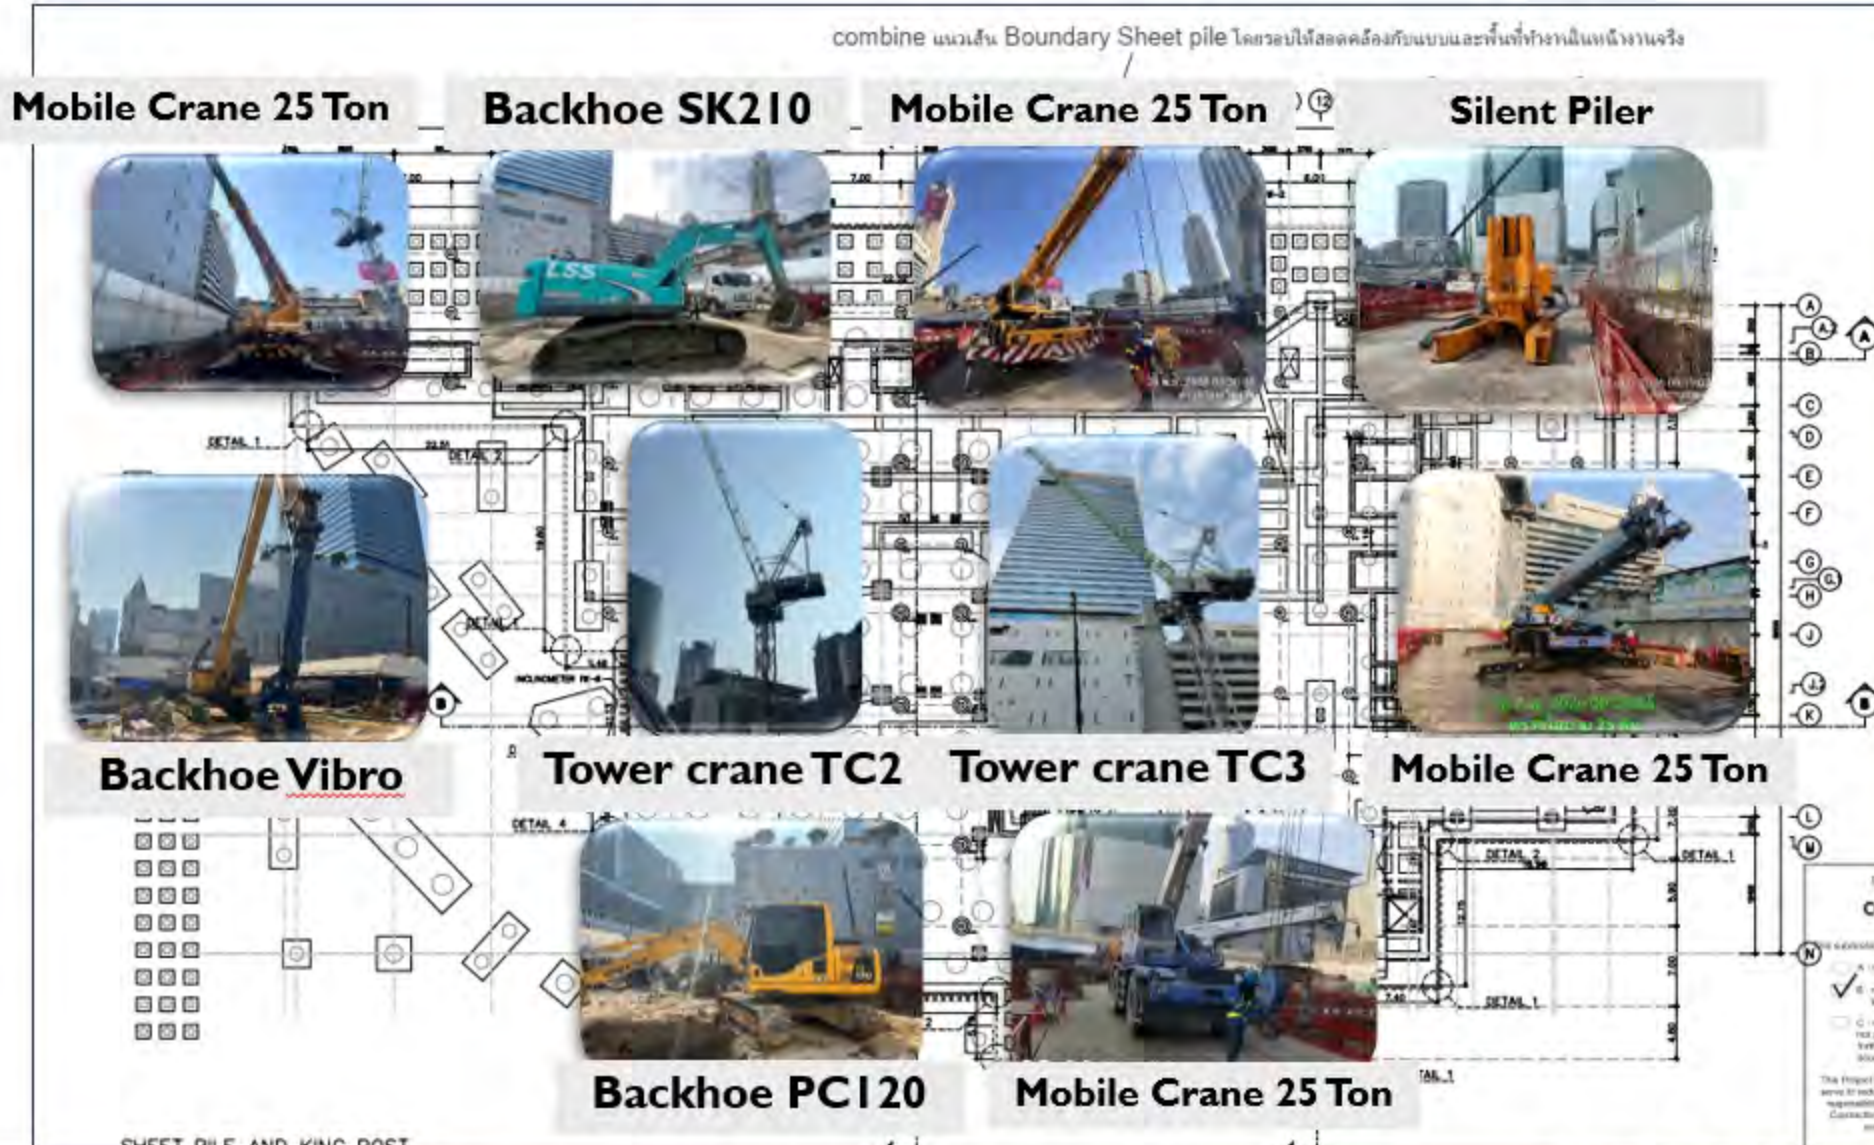

องค์กรหลัก

ความปลอดภัยคืองานของเราทุกคน

THINK
SAFETY IS
EVERYBODY'S JOB

พิธี

สุราษฎร์ธานี



ภาคผนวกที่ 2-14
หนังสือรายงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์



PRE-BUILT

สำนักงานเขตราชเทวี
เลขรับ..... 1280
วันที่..... 06 กพ. 2569
ผู้รับ..... ตำแหน่ง..... 14:27

วันที่ 6 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2569

ตามที่บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยทางบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิ

ผู้จัดการโครงการฯ

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

1.กิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าหน้าโครงการทุกวัน




2.กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำสัปดาห์



3.ล้างล้อ,คลุมผ้าใบรถบรรทุกก่อนออกโครงการ



4.ปรับปรุงฟุตบาท บริเวณหน้าโครงการประตู 1

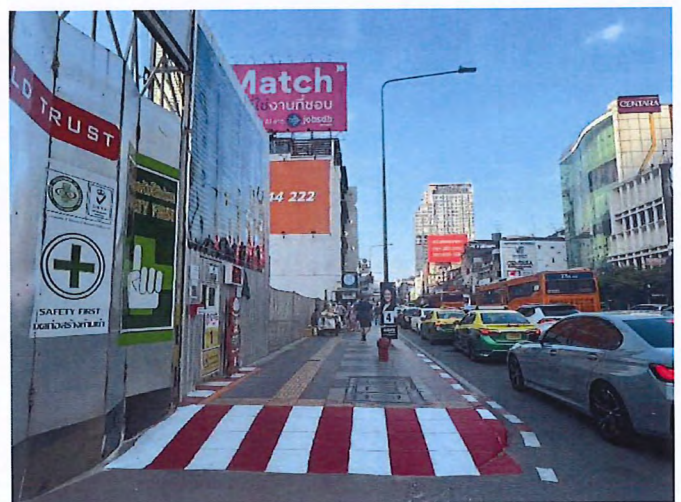

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี	
เลขรับ	2208
วันที่	6/3/69
เวลา	
ผู้รับ	9
ตำแหน่ง	14:21

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ตามที่บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยทางบริษัทฯ ขอส่งรายงานการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิมิต)

ผู้จัดการโครงการฯ

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)


1.กิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าหน้าโครงการทุกวัน



2.กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำสัปดาห์



3.ตรวจวัดค่าควันดำเครื่องจักรประจำเดือน

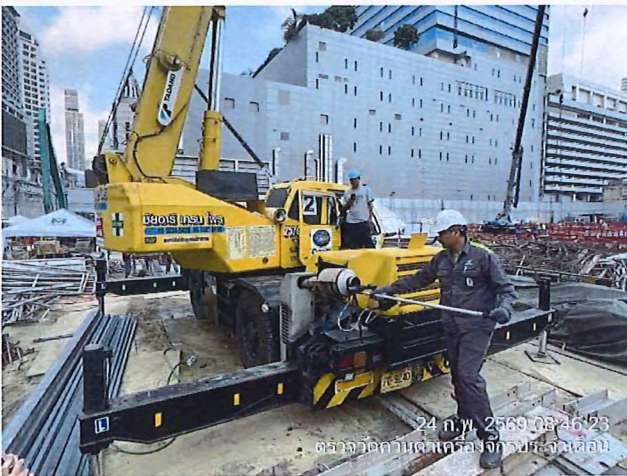



PRE-BUILT



วันที่ 9 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2569

ตามที่บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยทางบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิ: [Redacted Signature])

ผู้จัดการโครงการฯ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

Pre-Built Public Company Limited

503 1st Floor Muang Thong Thane 3, Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi, 11120


T +66 (2) 960 1380 - 9 F +66 (2) 960 1390

www.prebuilt.co.th

1.กิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าหน้าโครงการทุกวัน



2.กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำสัปดาห์

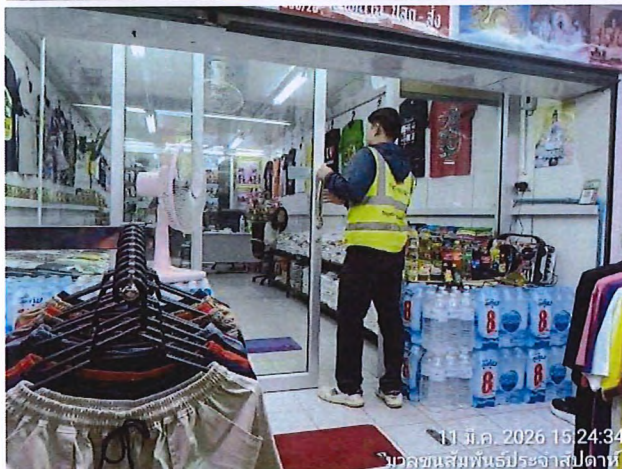

3. ตรวจวัดค่าควันดำเครื่องจักรประจำเดือน




4. ล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ



วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน
โครงการ THE PLATINUM SQUARE

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี



สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2569

ตามที่บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ THE PLATINUM SQUARE โดยทางบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นาย) [Redacted Signature]

ผู้จัดการโครงการฯ

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)


1.กิจกรรมทำความสะอาดทางเท้าหน้าโครงการทุกวัน



2.กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำสัปดาห์



3. ล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ

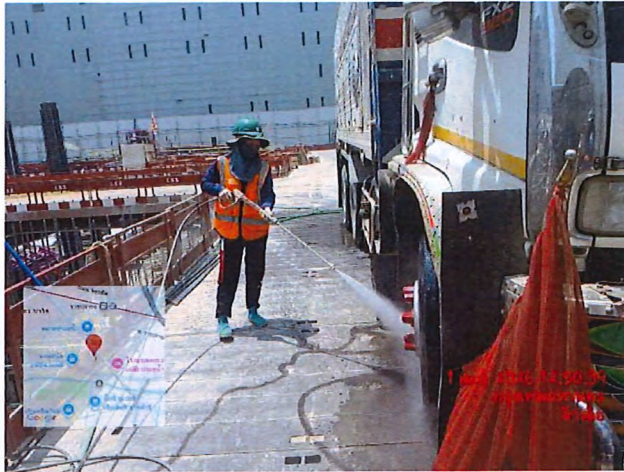

ภาคผนวกที่ 2-15
สำเนาเอกสารค่าจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์อ่อนนุช)



บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

☒ โบนัสเงินสดย่อย

☐ โบนัสเงินทดรองจ่าย

☐ โบนัสเงินอื่นๆ

☐ โบนัสค่าเลี้ยงรับรอง

เลขที่ OF202602645

วันที่ 12 พฤษภาคม 2569

จ่ายให้ : (03702) นายนิมิตร แสนศรี

จำนวนเงิน : 2,005.00 -สองพันห้าบาทถ้วน-

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย : เงินสดย่อย ชุด (PSQ-099/1/2026)

โครงการ : The Platinum Square (PSQ)

CIVIL

ลำดับ	Cost code	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
1	C240007	ค่าเก็บขยะบ้านพักชั่วคราว กรุงเทพมหานคร ค่าขนเศษวัสดุ ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 099606/14 วันที่ 07/05/2026	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00

2,005.00 0.00 0.00 2,005.00
=====

รวมเป็นเงิน -สองพันห้าบาทถ้วน-

..... ผู้ขอเบิก วันที่ 12-5-69	 ผู้อนุมัติ วันที่ 015/69	 ผู้จ่ายเงิน วันที่	 ผู้รับเงิน วันที่
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------



PETTY CASH VOUCHER

เลขที่ **PSQ-099/1/2569**

วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

โครงการ : **The Platinum Square (PSQ)**

จ่ายให้ : นายธนา

รายการ		จำนวนเงิน
ค่าขนส่งวัสดุ ใน Site งาน	C-240	2,005.00
	VAT 7%	
สองพันห้าบาทถ้วน	รวมเงิน	2,005.00

២២
 ជួរ

ผู้จ่าย

ผู้อนุมัติ

ใบรับเงิน

ข้าพเจ้า

นางจรรยา จันทร์โสด

ที่อยู่

14 ม.ท ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ. กุญชร

ได้รับชำระเงินสุทธิจำนวน

๕๐๐๖

บาท

สองพันห้าหมื่นหกพัน

จาก บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินค่างาน

ช่างเหล็ก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานเอกสารทั้งหมดในการรับเงินที่ข้าพเจ้าได้ทำให้แก่ บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เป็นเอกสารที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการยืนยันการรับเงินจำนวนนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน





7 พ.ค. 2026 10:00:49
เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร



7 พ.ค. 2026 09:40:05
1 ซอย อ่อนนุช 86 แยก 2
เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

ภาคผนวกที่ 2-16
สำเนาเอกสารค่าจัดเก็บมูลฝอย (สำนักงานเขตราชเทวี)



บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

☒ ใบเบิกเงินสดย่อย

☐ ใบเบิกเงินทดรองจ่าย

☐ ใบเบิกเงินอื่นๆ

☐ ใบเบิกค่าเลี้ยงรับรอง

เลขที่ OF202601950

วันที่ 7 เมษายน 2569

จ่ายให้ : (03702) นายนิ : [REDACTED]

จำนวนเงิน : 1,455.00 -หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย : เงินสดย่อย ชุด (PSQ-087/1/2026)

โครงการ : The Platinum Square (PSQ)

CIVIL

ลำดับ	Cost code	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
1	C240007	ค่าเก็บขยะบ้านพักชั่วคราว นายศุภกพ ค่าขยะ หัก ณ ที่จ่ายเรื่อง ค่าบริการ วันที่ 04/04/2026				
			- - -			
			= = =			

รวมเป็นเงิน -หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

[REDACTED]		[REDACTED]	
ผู้ขอเบิก	ผู้อนุมัติ	ผู้จ่ายเงิน	ผู้รับเงิน
วันที่ 7-1-69	วันที่ 7/4/69	วันที่	วันที่

เลขที่ PSQ-087/1/2569วันที่ 4 เมษายน 2569โครงการ : The Platinum Square (PSQ)จ่ายให้ : นายสุภณ

รายการ		จำนวนเงิน
ค่าขยะ Site เดือน เม.ย	C-240	
หัก ณ ที่จ่าย 3 %		
	VAT 7%	
หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน	รวมเงิน	

ผู้รับ

ผู้จ่าย

ผู้อนุมัติ

၁၈၇၃

5002150

n. Interims

11800 55070250

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

บาท

→ ผลิตสินค้าส่งออก

ମିଆର ଲୋକ ବାଦ

เป็นเอกสารที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการยืนยันการรับเงินจำนวนนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

१७३

9



บริษัท 프리빌ท์ จำกัด (มหาชน)

☒ ใบเบิกเงินสดย่อย

☐ ใบเบิกเงินทดรองจ่าย

☐ ใบเบิกเงินอื่นๆ

☐ ใบเบิกค่าเลี้ยงรับรอง

เลขที่ OF202602456

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

จ่ายให้ : (03702) นายนิมิต [REDACTED]

จำนวนเงิน : 1,455.00 -หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย : เงินสดย่อย ชุด (PSQ-096/1/2026)

โครงการ : The Platinum Square (PSQ)

CIVIL

ลำดับ	Cost code	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
1	C240007	ค่าเก็บขยะบ้านพักชั่วคราว นายสุภกิต [REDACTED] หัก ณ ที่จ่ายเรื่อง ค่าบริการ วันที่ 05/05/2026				
รวมเป็นเงิน			- -			-
			= =			=

รวมเป็นเงิน -หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

[REDACTED]			
ผู้ขอเบิก	ผู้อนุมัติ	ผู้จ่ายเงิน	ผู้รับเงิน
วันที่ 6 - 5 - 69	วันที่ 6/5/69	วันที่	วันที่



PETTY CASH VOUCHER

เลขที่ PSQ-096/1/2569

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

โครงการ: The Platinum Square (PSQ)

จ่ายให้ : นายสุข

[illegible]

ผู้รับ

ผู้จ่าย

ผู้อำนวย

ใบรับเงิน

ข้าพเจ้า

นายสุภกต

ที่อยู่

คต๑๒/๑๐ อ.ฉัตรโมฬี เขตหนองแขก กรุงเทพมหานคร.

ได้รับชำระเงินสดจำนวน

บาท

หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

จาก บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินค่างาน

ทำ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานเอกสารทั้งหมดในการรับเงินที่ข้าพเจ้าได้ทำให้แก่ บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)


เป็นเอกสารที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการยืนยันการรับเงินจำนวนนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

ภาคผนวกที่ 2-17

ตัวอย่างเอกสารการจัดเก็บประวัติและการตรวจสอบสุขภาพคนงาน


ทะเบียนประวัติลูกจ้างรายวันเข้าใหม่ / โอนย้าย



โครงการ The Platinum Square

ลำดับ	รหัสพนักงาน	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ/สกุล	ที่อยู่ตามบัตรประชาชน	ตำแหน่ง	วันเริ่มงาน Apac Tower	ค่าแรง ปัจจุบัน	โอนย้ายจากไซต์-1	หมายเหตุ
1	PSQ-680706 001		นายณันทกานต์		177 หมู่ที่ 3 ต.โคกนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	ขับรถ	6 ก.ค. 68	372	Apac Tower
2	PSQ-680706 002		นายเนรมิต		37 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	ผช.จป.	6 ก.ค. 68	372	Apac Tower
3	PSQ-680716 003		นายทิวทัศน์		73 หมู่ที่ 5 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	ผช.สโตร์	16 ก.ค. 68	372	Apac Tower
4	PSQ-680721 004		นายเทวฤทธิ์		62 หมู่ที่ 4 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	H/M ช่างไฟฟ้า	21 ก.ค. 68	372	Apac Tower
5	PSQ-680721 005		นางสาวแจ่มจันทร์		37 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	กรรมกร	21 ก.ค. 68	372	Apac Tower
6	PSQ-680726 006		นางสาวศิริรัตน์		29 หมู่ที่ 12 ต.ศรีชุมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	เช็คเกอร์	26 ก.ค. 68	372	Apac Tower
7	PSQ-680728 007		นางสาวธิดาพรรณ		200 หมู่ที่ 18 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	กรรมกร	28 ก.ค. 68	372	Apac Tower
8	PSQ-680728 008		นางสาวสุภารัตน์		124 หมู่ที่ 14 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร	กรรมกร	28 ก.ค. 68	372	Apac Tower
9	PSQ-680801 009		นายสันธาน		134 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร	H/M	1 ส.ค. 68	430	Apac Tower
10	PSQ-680801 010		นายวิรุฒ		63 หมู่ที่ 13 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ช่างปูน	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
11	PSQ-680801 011		นางสาวดวงใจ		63 หมู่ที่ 13 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	กรรมกร	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
12	PSQ-680801 013		นางสาวนุชนาฏ		81 หมู่ที่ 15 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	ผช.สโตร์	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
13	PSQ-680801 014		นายพลชัย		370 หมู่ที่ 9 ต.โนนสะอาด อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ	ช่างปูน	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
14	PSQ-680801 015		นางสาวหนูเสียม		370 หมู่ที่ 9 ต.โนนสะอาด อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ	กรรมกร	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
15	PSQ-680801 016		นางด้อย		55 หมู่ที่ 5 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน	กรรมกร	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
16	PSQ-680801 017		นายนิพน		63 หมู่ที่ 10 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.อุบลราชธานี	ขับรถ	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
17	PSQ-680801 020		นายพีรพัฒน์		84 หมู่ที่ 17 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ช่างปูน	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
18	PSQ-680801 021		นางสาววาสนา		33/1 หมู่ที่ 8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	กรรมกร	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
19	PSQ-680801 023		นายวุฒินันท์		368 หมู่ที่ 2 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ขับรถ	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
20	PSQ-680801 024		นางสาวเฟื่องฟ้า		297 หมู่ที่ 10 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	กรรมกร	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
21	PSQ-680801 025		นางสาวนภัสสร		33 หมู่ที่ 10 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	กรรมกร	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
22	PSQ-680801 026		นายเรืองศักดิ์		216 หมู่ที่ 8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ช่างปูน	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
23	PSQ-680801 027		นายอนิวรรณ		135 หมู่ที่ 5 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร	ช่างปูน	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
24	PSQ-680801 028		นางรจนา		410/5 หมู่ที่ 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ	กรรมกร	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
25	PSQ-680801 029		นายรุ่งเสมอ		231 หมู่ 2 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	ช่างไฟฟ้า	1 ส.ค. 68	372	
26	PSQ-680801 031		นางสาวเดิมขวัญ		36 หมู่ที่ 9 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	กรรมกร	1 ส.ค. 68	372	Apac Tower
27	PSQ-680916 041		นายอภิชน		231 หมู่ที่ 4 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	ผช.เซอร์เวย์	16 ก.ย. 68	372	
28	PSQ-681201 043		นายกฤตภัค		48/1 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร	ช่างปูน	1 ธ.ค. 68	372	
29	PSQ-690101 044		นายเพ็ญพงษ์		37 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	H/M	1 ม.ค. 69	372	RSU INTERNATIONAL HOSPITAL (RIH)
30	PSQ-690101 045		นายตะเว		101/พ หมู่ที่ 4 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	ผช.จป.	2 ม.ค. 69	372	RSU INTERNATIONAL HOSPITAL (RIH)
31	PSQ-690101 046		นายศิริวัฒน์		165 หมู่ที่ 3 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	ผช.จป.	3 ม.ค. 69	372	RSU INTERNATIONAL HOSPITAL (RIH)
32	PSQ-690101 047		นางสาวมณฑิ		64 หมู่ที่ 14 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่ามะแซ จ.ชุมพร	กรรมกร	4 ม.ค. 69	372	RSU INTERNATIONAL HOSPITAL (RIH)
33	PSQ-690107 048		นายพาดิ์จะ		129 หมู่ที่ 7 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	ผช.จป.	7 ม.ค. 69	372	
34	PSQ-690107 049		นางสาวปิยะนาถ		1/1 หมู่ที่ 7 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	กรรมกร	7 ม.ค. 69	372	
35	PSQ-690107 050		นางสาวภูวพร		7 หมู่ที่ 14 ต.สะพุง อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ	กรรมกร	7 ม.ค. 69	372	
36	PSQ-690116 051		นางสาวกานต์ธิดา		37 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	กรรมกร	16 ม.ค. 69	372	
37	PSQ-690116 052		นายอธิกานัน		13 ซ.สามวา 14 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร	ช่างปูน	16 ม.ค. 69	372	
38	PSQ-690116 053		นางสาวรพิน		7 หมู่ที่ 14 ต.สะพุง อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ	แม่บ้าน	16 ม.ค. 69	372	
39	PSQ-690116 054		นางสาวสุภารัตน์		180 หมู่ที่ 2 ต.โคกนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	แม่บ้าน	16 ม.ค. 69	372	


ทะเบียนประวัติลูกจ้างรายวันเข้าใหม่ / โอนย้าย



โครงการ The Platinum Square

ลำดับ	รหัสพนักงาน	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ/สกุล	ที่อยู่ตามบัตรประชาชน	ตำแหน่ง	วันเริ่มงาน Apac Tower	ค่าแรง ปัจจุบัน	โอนย้ายจากไซต์-1	หมายเหตุ
40	PSQ-690116 055	3	นาง	80 หมู่ที่ 5 ต.หนองคัน อ.กุหลวง จ.เลย	กรรมกร	16 ม.ค. 69	372		
41	PSQ-690123 056	3	นาง	62 หมู่ที่ 4 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	กรรมกร	23 ม.ค. 69	372		
42	PSQ-690216 057	1	นาย	114 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	ผช.เชอร์เวย์	16 ก.พ. 69	372		
43	PSQ-690216 058	3	นาย	36 หมู่ที่ 11 ต.สมเส้า อ.เพี้ย จ.อุดรธานี	ช่างไม้	16 ก.พ. 69	372		
44	PSQ-690219 059	3	นาง	11 หมู่ที่ 4 ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	บอกเครณ	19 ก.พ. 69	372	Benchasiri Alliance Hotel	
45	PSQ-690309 060	1	นาง	266 หมู่ที่ 15 ต.วังพิกูล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	กรรมกร	9 มี.ค. 69	372		
46	PSQ-690316 061	1	น.ส.	33/1 หมู่ที่ 8 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	กรรมกร	16 มี.ค. 69	372	RSU INTERNATIONAL HOSPITAL (RIH)	
47	PSQ-690421 062	1	นาย	86/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุดรดิตถ์	ผช.เชอร์เวย์	21 เม.ย. 69	372		
48	PSQ-690423 063	2	นาย	108 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร	ช่างปูน	23 เม.ย. 69	372		

PRE-BUILT																						
หน่วยงาน The Platinum Square														ประจำเดือน เมษายน 2569								
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		สัญชาติ	รหัสพนักงาน	เริ่มงาน	เลขที่บัตรประกันสังคม	Work permit				PASSPORT			หน่วยงานปัจจุบัน	สถานะ visa + work permit และสัญญา MOU					วันเกิด	อายุ	
							เลขที่ใบอนุญาต	วันที่ออกบัตรครั้งแรก	วันที่ครบหมดอายุครั้งที่ 1	วันที่ครบหมดอายุครั้งที่ 2	เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุPASSPORT	VISA หมดอายุ		VISAเหลืออีก	MOU ครบ 4 ปี	MOU คงเหลือ					
1	MR.AUNG		พม่า	1000902	6 ก.ค. 68	601	554	9 Apr 24	8 Apr 26	4 Apr 28	MI079934	17 Dec 28	8 Apr 28	The Platinum Square	712	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	8 Apr 28	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	15 Mar 95	31		
2	MR.HTET		พม่า	1001178	7 ก.ค. 68	601	619	21 Dec 23	19 Dec 25	19 Dec 27	MG018645	20 Jun 27	20 Jun 27	The Platinum Square	419	1 ปี 1 เดือน 24 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	21 Mar 97	29		
3	MR.BO SA		พม่า	1000930	1 ส.ค. 25	601	360	19 Dec 25	19 Dec 27		MG033129	4 Jul 27	4 Jul 27	The Platinum Square	433	1 ปี 2 เดือน 8 วัน	18 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 26 วัน	6 Feb 83	43		
4	MR. MYO		พม่า	1001175	1 ส.ค. 68	601	614	21 Dec 23	19 Dec 25	19 Dec 27	MG391386	21 Sep 27	20 Jun 27	The Platinum Square	419	1 ปี 1 เดือน 24 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	2 Aug 88	37		
5	MRS.EI M		พม่า	1006193	1 ส.ค. 68	601	554	21 Dec 23	19 Dec 25		MG018392	20 Jun 27	20 Jun 27	The Platinum Square	419	1 ปี 1 เดือน 24 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	9 Mar 85	41		
6	MR.OO AU		พม่า	1002756	1 ส.ค. 68	601	866	22 Dec 23	13 Feb 25	13 Feb 27	MG019555	21 Jun 27	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	21 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 28 วัน	7 Oct 89	36		
7	MR.ZAYA		พม่า	1002992	1 ส.ค. 68	601	865	22 Dec 23	13 Feb 25	13 Feb 27	MH204061	31 Mar 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	21 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 28 วัน	14 Jan 94	32		
8	MRS.CHA		พม่า	1002994	1 ส.ค. 68	601	789	21 Dec 23	13 Feb 25	13 Feb 27	MH204069	31 Mar 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	3 Jan 95	31		
9	MRS.AYE		พม่า	1003502	1 ส.ค. 68	601	882	22 Dec 23	13 Feb 25	13 Feb 27	MH204063	31 Mar 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	21 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 28 วัน	14 Nov 82	43		
10	MR.TIN LI		พม่า	1000889	1 ส.ค. 68	601	631	9 Apr 24	8 Apr 26	4 Apr 28	MI078817	17 Dec 28	8 Apr 28	The Platinum Square	712	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	8 Apr 28	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	18 Jul 88	37		
11	MR.LIN LI		พม่า	1000890	1 ส.ค. 68	601	632	9 Apr 24	8 Apr 26	4 Apr 28	MI079919	17 Dec 28	8 Apr 28	The Platinum Square	712	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	8 Apr 28	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	11 Dec 88	37		
12	MR.KYAV		พม่า	1000912	1 ส.ค. 68	601	564	21 Dec 23	19 Dec 25	19 Dec 27	MG019467	21 Jun 27	20 Jun 27	The Platinum Square	419	1 ปี 1 เดือน 24 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	9 Dec 91	34		
13	MR.PHOE		พม่า	1000913	1 ส.ค. 68	601	604	21 Dec 23	19 Dec 25	19 Dec 27	MG019627	21 Jun 27	20 Jun 27	The Platinum Square	419	1 ปี 1 เดือน 24 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	20 Oct 85	40		
14	MRS.MI K		พม่า	1000904	1 ส.ค. 68	601	557	9 Apr 24	8 Apr 26	4 Apr 28	MI079923	17 Dec 28	8 Apr 28	The Platinum Square	712	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	8 Apr 28	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	23 Feb 80	46		
15	MR.ZAW Z		พม่า	1001633	1 ส.ค. 68	601	302	10 Sep 24	9 Sep 26		MG025957	27 Jun 27	9 Sep 26	The Platinum Square	135	0 ปี 4 เดือน 15 วัน	9 Sep 28	2 ปี 4 เดือน 16 วัน	10 Apr 93	33		
16	MISS.EI E		พม่า	1001634	1 ส.ค. 68	601	301	10 Sep 24	9 Sep 26		MG025956	27 Jun 27	9 Sep 26	The Platinum Square	135	0 ปี 4 เดือน 15 วัน	9 Sep 28	2 ปี 4 เดือน 16 วัน	4 Dec 95	30		
17	MR.NAY M		พม่า	1000886	1 ส.ค. 68	601	563	9 Apr 24	8 Apr 26	4 Apr 28	MI078899	17 Dec 28	8 Apr 28	The Platinum Square	712	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	8 Apr 28	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	10 Apr 81	45		
18	MR.THIEM		กัมพูชา	1000908	1 ส.ค. 68	601	199	7 Aug 23	6 Aug 25	13 Mar 27	N00784089	13 Mar 27	12 Mar 27	The Platinum Square	319	0 ปี 10 เดือน 19 วัน	6 Aug 27	1 ปี 3 เดือน 11 วัน	6 May 80	45		
19	MRS.PHA		กัมพูชา	1000909	1 ส.ค. 68	601	385	9 Jul 24	8 Jul 26		N01171539	26 Feb 28	8 Jul 26	The Platinum Square	72	0 ปี 2 เดือน 12 วัน	8 Jul 28	2 ปี 2 เดือน 13 วัน	10 Aug 88	37		
20	MR.BO LI		พม่า	1000953	1 ส.ค. 68	601	558	9 Apr 24	8 Apr 26	20 Oct 27	MG489892	20 Oct 27	8 Apr 28	The Platinum Square	712	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	8 Apr 28	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	7 Nov 96	29		
21	MR.ORN C		กัมพูชา	1000888	1 ส.ค. 68	601	077	6 Feb 24	5 Feb 26	4 Feb 28	N02497737	5 Dec 33	4 Feb 28	The Platinum Square	648	1 ปี 9 เดือน 13 วัน	5 Feb 28	1 ปี 9 เดือน 14 วัน	6 Feb 83	43		
22	MISS.ZAR		พม่า	1003505	1 ส.ค. 68	601	489	9 Apr 24	8 Apr 26	4 Apr 28	MI286121	6 Dec 28	8 Apr 28	The Platinum Square	712	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	8 Apr 28	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	11 Jul 89	36		
23	MISS.KEM		กัมพูชา	1006480	1 ส.ค. 68	601	379	9 Jul 24	8 Jul 26		N02128381	19 Sep 32	8 Jul 26	The Platinum Square	72	0 ปี 2 เดือน 12 วัน	8 Jul 28	2 ปี 2 เดือน 13 วัน	5 Apr 94	32		
24	MRS. SAN		พม่า	1001216	1 ส.ค. 68	601	518	21 Dec 23	19 Dec 25	19 Dec 27	MG033128	4 Jul 27	4 Jul 27	The Platinum Square	433	1 ปี 2 เดือน 8 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	6 Mar 85	40		
25	MR. KHIN		พม่า	1001179	1 ม.ค. 69	601	407	21 Dec 23	19 Dec 25	21 Sep 27	MG391374	21 Sep 27	27 Sep 27	The Platinum Square	518	1 ปี 5 เดือน 3 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	19 Jun 79	46		
26	MR.MIN K		พม่า	111380	1 ม.ค. 69	601	018	8 Sep 22	6 Sep 26		MG116767	4 Jul 27	11 Dec 26	The Platinum Square	228	0 ปี 7 เดือน 18 วัน	7 Sep 26	เกินทำ MOU ใหม่	22 Mar 02	24		
27	MR.MIN A		พม่า	1001252	1 ม.ค. 69	601	404	21 Dec 23	19 Dec 25	21 Sep 27	MG391380	21 Sep 27	21 Sep 27	The Platinum Square	512	1 ปี 4 เดือน 27 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	17 Apr 83	43		
28	MRS.KHA		พม่า	1005803	1 ม.ค. 69	601	027	8 Sep 22	6 Sep 26		MF708939	4 Mar 27	11 Dec 26	The Platinum Square	228	0 ปี 7 เดือน 18 วัน	7 Sep 26	เกินทำ MOU ใหม่	5 Jun 81	44		
29	MISS.SAB		พม่า	1003504	1 ม.ค. 69	601	487	9 Apr 24	8 Apr 26	4 Apr 28	MI295489	10 Dec 28	8 Apr 28	The Platinum Square	712	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	8 Apr 28	1 ปี 11 เดือน 17 วัน	10 Jun 98	27		
30	MRS.KHIN		พม่า	1003482	1 ม.ค. 69	601	845	26 Dec 23	13 Feb 25	13 Feb 27	MH204066	31 Mar 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	25 Dec 27	1 ปี 8 เดือน 2 วัน	12 Aug 76	49		
31	MR.HOKH		กัมพูชา	1000928	1 ม.ค. 69	601	389	9 Jul 24	8 Jul 26		N01145192	25 Jan 28	8 Jul 26	The Platinum Square	72	0 ปี 2 เดือน 12 วัน	8 Jul 28	2 ปี 2 เดือน 13 วัน	25 Feb 86	40		
32	MRS.SAVI		กัมพูชา	1000327	1 ม.ค. 69	601	382	9 Jul 24	8 Jul 26		N01171491	26 Feb 28	8 Jul 26	The Platinum Square	72	0 ปี 2 เดือน 12 วัน	8 Jul 28	2 ปี 2 เดือน 13 วัน	2 Apr 85	41		
33	MR.KHIN		พม่า	1000893	7 ม.ค. 69	601	168	15 Dec 25	13 Feb 27		MB641905	6 Dec 27	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	14 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 22 วัน	11 Aug 86	39		
34	MR.YE AU		พม่า	1000957	7 ม.ค. 69	601	608	21 Dec 23	19 Dec 25	19 Dec 27	MG391377	21 Sep 27	21 Sep 27	The Platinum Square	512	1 ปี 4 เดือน 27 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	27 Sep 95	30		
35	MR.AUNG		พม่า	1004770	7 ม.ค. 69	601	069	8 Dec 25	13 Feb 27		MD479565	16 Mar 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	7 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 15 วัน	23 Jun 88	37		
36	MR.AUNG		พม่า	1004772	7 ม.ค. 69	601	062	11 Dec 25	13 Feb 27		MH201251	28 Mar 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	10 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 18 วัน	30 Sep 95	30		
37	MR.PHYO		พม่า	1004776	7 ม.ค. 69	601	068	8 Dec 25	13 Feb 27		MD489999	28 Mar 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	7 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 15 วัน	12 Jul 94	31		
38	MR.HTEIN		พม่า	1004777	7 ม.ค. 69	601	076	12 Dec 25	13 Feb 27		MD465818	16 Mar 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	11 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 19 วัน	5 Jun 81	44		
39	MRS.THU		พม่า	1000974	7 ม.ค. 69	601	591	21 Dec 23	19 Dec 25	19 Dec 27	MF817921	18 Apr 27	18 Apr 27	The Platinum Square	356	0 ปี 11 เดือน 26 วัน	20 Dec 27	1 ปี 7 เดือน 27 วัน	25 Nov 98	27		
40	MRS.NWE		พม่า	111277	7 ม.ค. 69	601	968	8 Sep 22	6 Sep 26		MF704097	3 Mar 27	11 Dec 26	The Platinum Square	228	0 ปี 7 เดือน 18 วัน	7 Sep 26	เกินทำ MOU ใหม่	16 Apr 99	27		
41	MR.AUNG		พม่า	111284	7 ม.ค. 69	601	190	8 Sep 22	6 Sep 26		MF600029	10 Jan 27	11 Dec 26	The Platinum Square	228	0 ปี 7 เดือน 18 วัน	7 Sep 26	เกินทำ MOU ใหม่	5 May 89	36		
42	MR.KYAV		พม่า	1006666	7 ม.ค. 69	601	306	22 Apr 25	31 Mar 26	31 Mar 27	MG672577	21 Oct 27	31 Mar 27	The Platinum Square	338	0 ปี 11 เดือน 8 วัน	21 Apr 29	2 ปี 12 เดือน 0 วัน	9 Apr 03	23		
43	MISS.MOE		พม่า	1006668	7 ม.ค. 69	601	053	18 Jan 25	31 Mar 26	31 Mar 27	MG391376	21 Sep 27	31 Mar 27	The Platinum Square	338	0 ปี 11 เดือน 8 วัน	17 Jan 29	2 ปี 8 เดือน 26 วัน	9 Dec 92	33		
44	MR.MG Z		พม่า		10 ม.ค. 69	601					CC8625094	26 May 28		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	21 May 04	21		
45	MR.MYO		พม่า		10 ม.ค. 69	601					MG149624	13 Jul 27		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	13 Sep 01	24		
46	MRS.HLA		พม่า		10 ม.ค. 69	601					MH713399	19 Jul 28		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	3 Sep 88	37		
47	MRS.EI PH		พม่า		10 ม.ค. 69	601					MH399323	10 May 28		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	6 Sep 00	25		
48	MRS.SOE		พม่า		10 ม.ค. 69	601					MK474081	29 Sep 30	</									




หน่วยงาน The Platinum Square

ประจำเดือน เมษายน 2569

ลำดับที่		ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	รหัสพนักงาน	เริ่มงาน	เลขที่บัตร ประกันสังคม	Work permit				PASSPORT			หน่วยงานปัจจุบัน	สถานะ visa + work permit และสัญญา MOU				วันเกิด	อายุ
							เลขที่ใบอนุญาต	วันที่ออกบัตร ครั้งแรก	วันที่บัตรหมดอายุ ครั้งที่ 1	วันที่บัตรหมดอายุ ครั้งที่ 2	เลขที่หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุPASSPORT	VISA หมดอายุ		VISAเหลืออีก		MOU ครบ 4 ปี	MOU คงเหลือ		
49	ME		พม่า		10 ม.ค. 69	6016900113311					MI235469	17 Nov 28		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	5 Jan 04	22
50	ME		พม่า		12 ม.ค. 69						MI724921	18 Nov 29		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	10 May 95	30
51	ME		พม่า		12 ม.ค. 69						CC7471832	19 Jan 27		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	18 Mar 04	22
53	ME		พม่า		12 ม.ค. 69						MF847493	14 Apr 27		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	7 Jul 89	36
54	ME		พม่า		12 ม.ค. 69						MI156475	12 Mar 29		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	17 Jan 92	34
55	ME		พม่า		12 ม.ค. 69						MI1095908	25 Jan 29		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	6 Jul 96	29
56	ME		พม่า		16 ม.ค. 69						MF845626	14 Apr 27		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	5 Jan 01	25
57	ME		พม่า		16 ม.ค. 69						MI114281	18 Oct 28		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	2 Jun 04	21
58	ME		พม่า		16 ม.ค. 69						MK378003	8 Sep 30		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	18 Apr 94	32
59	ME		พม่า		16 ม.ค. 69						MG673408	20 Oct 27		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	1 Feb 99	27
60	ME		พม่า		16 ม.ค. 69						MK382285	10 Sep 30		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	14 Aug 97	28
61	MI		พม่า		16 ม.ค. 69						MK382290	10 Sep 30		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	14 Jan 05	21
62	ME		พม่า		16 ม.ค. 69						MK378026	8 Sep 30		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	1 Jun 01	24
63	ME		พม่า		16 ม.ค. 69						MK382288	10 Sep 30		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	3 Sep 89	36
64	ME		พม่า		16 ม.ค. 69						MK382286	10 Sep 30		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	4 Jan 93	33
65	ME		พม่า		16 ม.ค. 26						MI114287	18 Oct 28		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	11 Jan 04	22
66	ME		กัมพูชา		16 ก.พ. 26		449	12 Jan 24	10 Jan 26	14 Nov 27	N01071359	14 Nov 27	14 Nov 27	The Platinum Square	566	1 ปี 8 เดือน 21 วัน	11 Jan 28	1 ปี 8 เดือน 19 วัน	15 May 85	40
67	MI		กัมพูชา		16 ก.พ. 26		822	10 Nov 25	12 Nov 27		N02230280	27 Jan 33	11 Nov 27	The Platinum Square	563	1 ปี 6 เดือน 18 วัน	9 Nov 29	3 ปี 6 เดือน 17 วัน	15 Apr 87	39
68	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		538	11 Dec 25	13 Feb 27		CC8628243	30 May 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	10 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 18 วัน	10 Jan 03	23
69	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		530	11 Dec 25	13 Feb 27		CC8074096	4 Apr 27	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	10 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 18 วัน	14 May 01	24
70	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		534	11 Dec 25	13 Feb 27		CC8628123	30 May 28	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	10 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 18 วัน	4 Sep 04	21
71	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		402	8 Dec 25	7 Apr 26		CA073645	30 Dec 29	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	7 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 15 วัน	5 Oct 87	38
72	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		528	11 Dec 25	13 Feb 27		CC8159071	5 Apr 27	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	10 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 18 วัน	6 Feb 80	46
73	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		255	8 Dec 25	13 Feb 27		MG466574	20 Oct 27	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	7 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 15 วัน	14 Oct 85	40
74	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		504	11 Dec 25	13 Feb 27		CC8074086	4 Apr 27	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	10 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 18 วัน	9 Dec 01	24
75	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		761	8 Dec 25	29 Dec 26		CA073480	29 Dec 29	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	7 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 15 วัน	6 Dec 02	23
76	ME		พม่า		7 มี.ค. 26		526	11 Dec 25	13 Feb 27		CC8074136	4 Apr 27	13 Feb 27	The Platinum Square	292	0 ปี 9 เดือน 22 วัน	10 Dec 29	3 ปี 7 เดือน 18 วัน	1 May 02	23
77	ME		พม่า		18/3/2026									The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	31 Dec 98	27
78	ME		พม่า		23/3/2026		736				MG920343	2 Dec 27		The Platinum Square	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	ไม่มีข้อมูล	หมดแล้ว	26 Sep 95	30

ภาคผนวกที่ 2-18

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / Occupational Health Safety and Environment Master Plan

ประจำปี 2569

รหัสเอกสาร :
FM-SAF-006-2
เริ่มใช้วันที่ : 20/8/2568
แก้ไขครั้งที่ : 00
แผ่นที่ :

ต้นฉบับ

[illegible]



ลำดับ Item	รายการ/Description	งบประมาณ COST	การปฏิบัติ Action	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	พ.ย.-69	ธ.ค.-69	หมายเหตุ/Remark
3	การจัดการรายงาน และประชุมด้านความปลอดภัย Safety report and safety meeting														
3.1	การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยของโครงการ Site safety committee meeting		PLAN												ประชุมทุกสัปดาห์สุดท้าย
			ACTUAL												
3.2	รายงาน ชปว. Safety village vocational report		PLAN												ทุก 6 เดือน
			ACTUAL												
4	โครงการส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม Encourage sanitation and environment promotion														
4.1	การจัดเก็บทำความสะอาด Big Housekeeping Day		PLAN												ทุกวัน
			ACTUAL												
4.2	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโครงการ Environment inspection		PLAN												ทุกวันช่วงงานดิน
			ACTUAL												
4.3	การปฏิบัติตามมาตรการ EIA ของโครงการ Comply with environmental measures		PLAN												ทุกวัน
			ACTUAL												
4.4	การเข้าพบขอความร่วมมือ ชปบ.ข้างเคียง Public relations		PLAN												ทุกวันพุธ
			ACTUAL												
5	การปรับปรุงและแก้ไขสภาพการทำงาน Diagnoses and troubleshooting of working problems														
5.1	ติดตั้งราวกันตก Install handrail		PLAN												*ช่วงงานดิน
			ACTUAL												
5.2	ติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่น Install toe boards		PLAN												*ช่วงงานดิน
			ACTUAL												
5.3	ป้ายและสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย Install safety signage		PLAN												
			ACTUAL												
5.4	จัดทำแผนฉุกเฉิน Update เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Emergency plans		PLAN												เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
			ACTUAL												
5.5	รายงานสถิติ อุบัติเหตุ และชั่วโมงการทำงาน Safety statistics		PLAN												จป./พช.จป.
			ACTUAL												ทุกสัปดาห์
6	การจราจร Traffic														
6.1	จัดผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก Arrange traffic supervisors		PLAN												*ทุกวัน
			ACTUAL												
6.2	ล้างล้อ,คลุมผ้าก่อนออกจากโครงการ Wheel washing and canvas control		PLAN												*ทุกวัน
			ACTUAL												
6.3	ตรวจสอบสัญญาณระบบไฟจราจรหน้าโครงการ Check traffic lights		PLAN												*ทุกวัน
			ACTUAL												



รหัสเอกสาร : FM-SAF-007-2

แบบฟอร์มเอกสาร


เริ่มใช้วันที่ : 20/8/2568

เรื่อง : สรุปรายงานการสอบสวน วิเคราะห์ และรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

แก้ไขครั้งที่ : 00

แผ่นที่ :

ACCIDENT WEEKLY REPORT

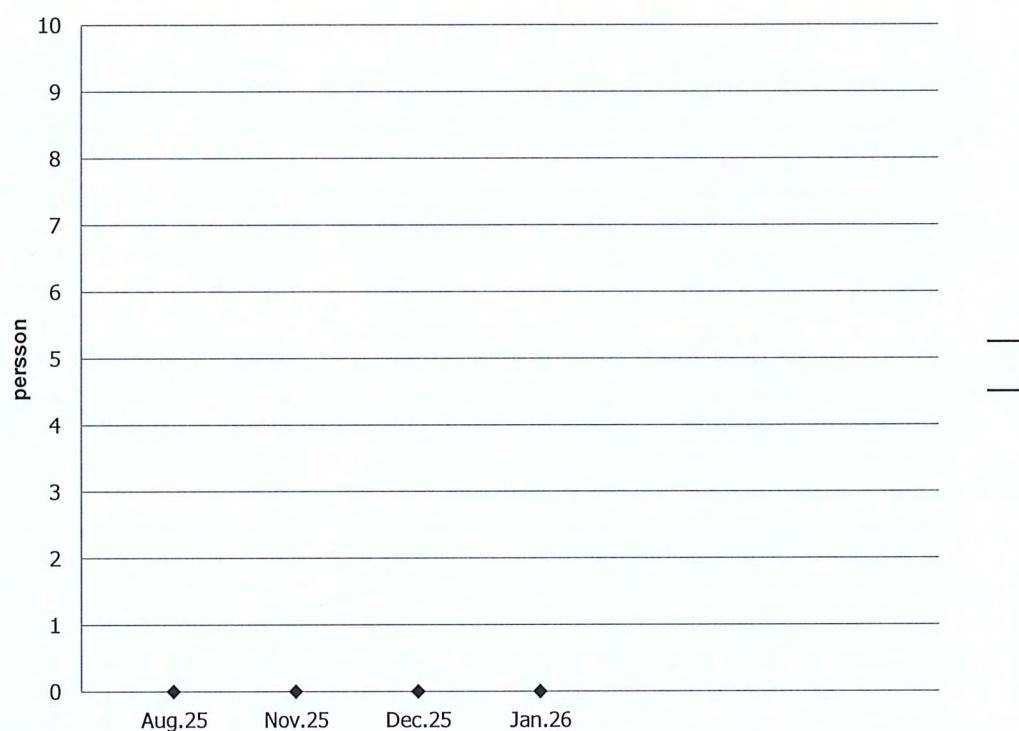

รายงานโดย(Report By) :

(M

จป.วิชาชีพ

วันที่(Date) : 31 Jan. 2026



PRE-BUILT

รหัสเอกสาร : FM-SAF-007-2

แบบฟอร์มเอกสาร


เริ่มใช้วันที่ : 20/8/2568

เรื่อง : สรุปรายงานการสอบสวน วิเคราะห์ และรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

แก้ไขครั้งที่ : 00

แผ่นที่ :

ACCIDENT WEEKLY REPORT

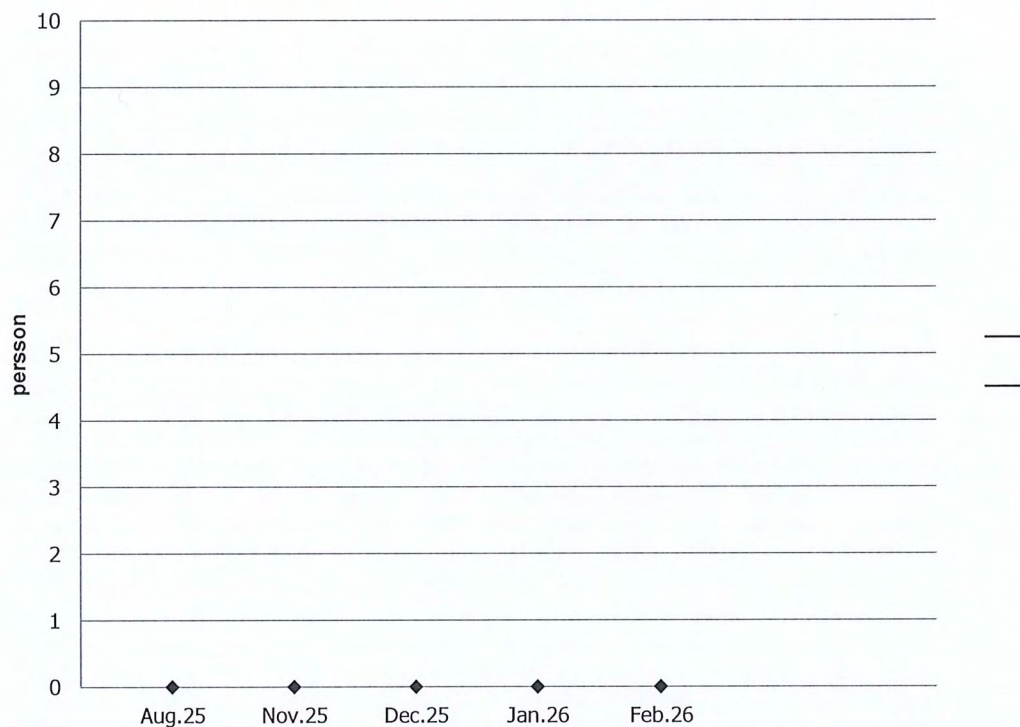

รายงานโดย(Report By) :

(M [Redacted]

จป.วิชาชีพ

วันที่(Date) : 28 Feb. 2026



แบบฟอร์มเอกสาร

เรื่อง : สรุปรายงานการสอบสวน วิเคราะห์ และรายงานการเกิดอุบัติเหตุ


รหัสเอกสาร : FM-SAF-007-2

เริ่มใช้วันที่ : 20/8/2568

แก้ไขครั้งที่ : 00

แผ่นที่ :

ACCIDENT WEEKLY REPORT

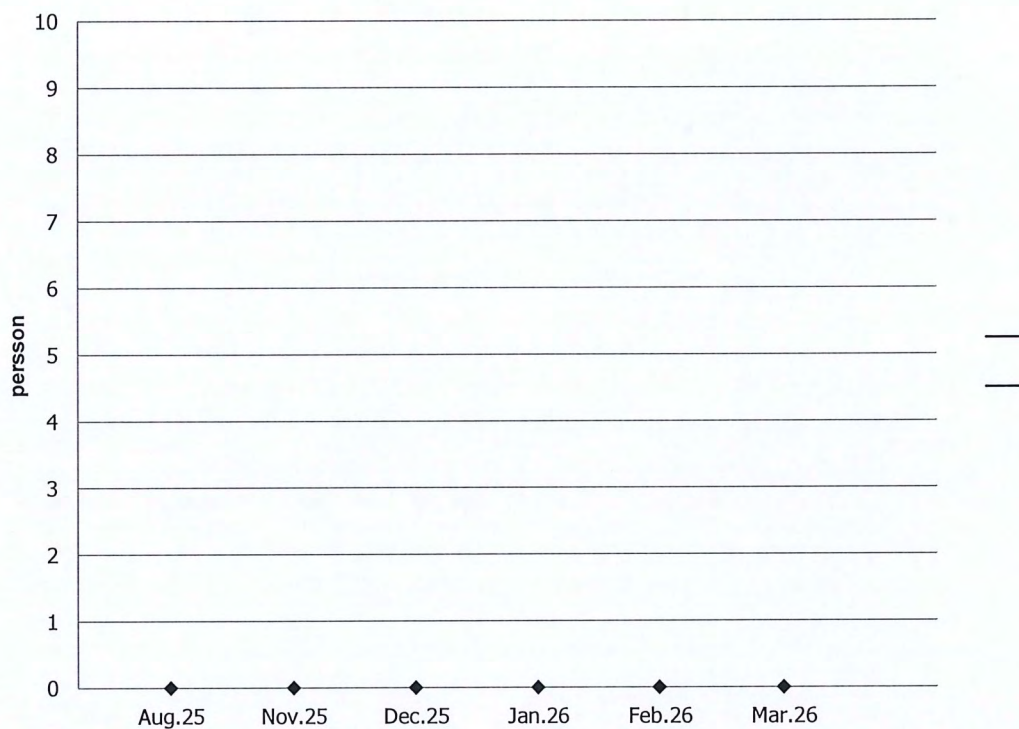

รายงานโดย(Report By) :

(MR.Y

ชาชีพ

Date) : 31 Mar. 2026



PRE-BUILT

รหัสเอกสาร : FM-SAF-007-2

แบบฟอร์มเอกสาร


เริ่มใช้วันที่ : 20/8/2568

เรื่อง : สรุปรายงานการสอบสวน วิเคราะห์ และรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

แก้ไขครั้งที่ : 00

แผ่นที่ :

ACCIDENT WEEKLY REPORT

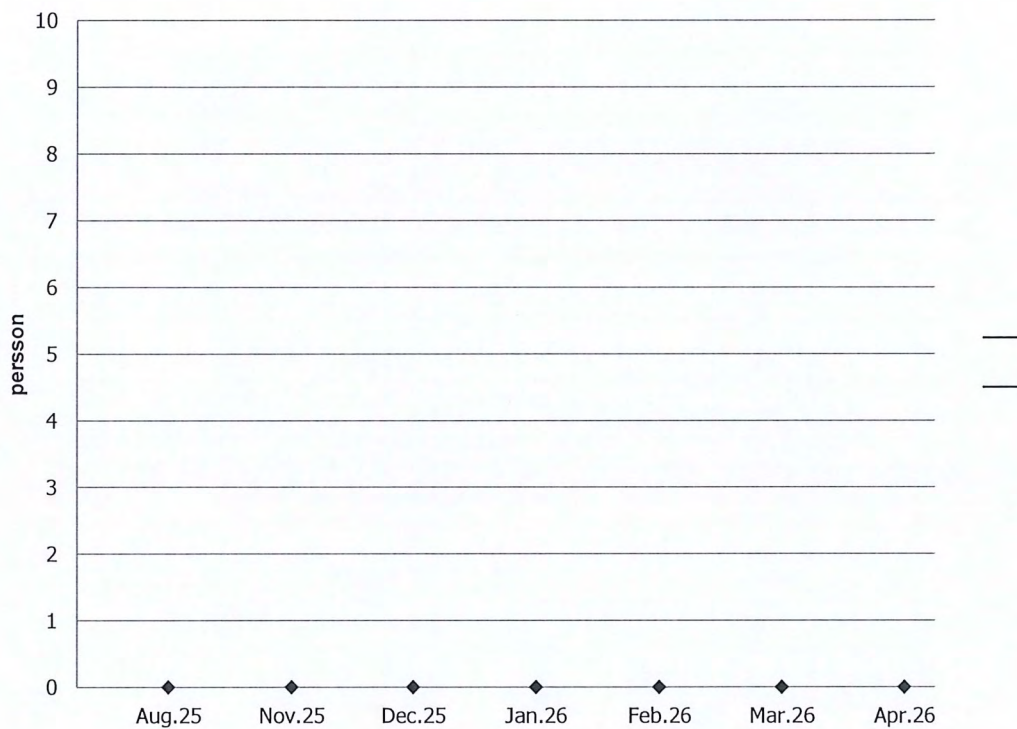

รายงานโดย(Report By) :

(MR.Yutt

ป.วิชาชีพ

วันที่(Date) : 30 Apr. 2026

ภาคผนวกที่ 2-19

ตัวอย่างเอกสารบันทึกการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน



PRE-BUILT

แบบฟอร์มเอกสาร

เรื่อง : แบบบันทึกการอบรมการอบรมความปลอดภัย

รหัสเอกสาร : FM-SAF-006-1

เริ่มใช้วันที่ : 20/8/2568

แก้ไขครั้งที่ : 00

แผ่นที่ :

แบบบันทึกการอบรมความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ ตามมาตรา ๑๖

วันที่(Date) : 16/2/69 เวลา(Time) : 8.00 สถานที่ฝึกอบรม(Location) : PSQ

หัวข้อการฝึกอบรม(Topic) 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 2. กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

3. จิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4. อันตรายจากการทำงานในแต่ละประเภทงาน

5. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/List of Trainees

ลำดับ/No.	ชื่อ - นามสกุล/Name	ตำแหน่ง/Position	ลายเซ็น	สังกัด/Under
1	พ.อ. [Redacted]	หัวหน้างาน	[Redacted]	บริษัท [Redacted]
2	พ.อ. [Redacted]			
3	พ.อ. [Redacted]			
4	พ.อ. [Redacted]			
5	พ.อ. [Redacted]			
6	พ.อ. [Redacted]			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

หมายเหตุ/Remark

1
2
3

ผู้ฝึกอบรม/Name of Safety Instruction :

จป.วิชาชีพ(Safety Officer.)

วันที่(Date) : 16/2/69



PRE-BUILT

แบบฟอร์มเอกสาร

เรื่อง : แบบบันทึกการอบรมการอบรมความปลอดภัย

รหัสเอกสาร : FM-SAF-006-1

เริ่มใช้วันที่ : 20/8/2568

แก้ไขครั้งที่ : 00

แผ่นที่ :

แบบบันทึกการอบรมความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ ตามมาตรา ๑๖

วันที่(Date) : 11/5/69

เวลา(Time) : 8.00 - 15.00

สถานที่ฝึกอบรม(Location) : PSA

หัวข้อการฝึกอบรม(Topic) 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 2. กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

3. จิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4. อันตรายจากการทำงานในแต่ละประเภทงาน

5. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/List of Trainees

ลำดับ/No.	ชื่อ - นามสกุล/Name	ตำแหน่ง/Position	ลายเซ็น	สังกัด/Under
1		HM.		ชุดกอล์ฟ
2		HM.		
3		นางสาว		
4		น		
5		น		
6		น		
7		น		
8		น		
9		น		
10	Aung	น		
11		น		
12		น		
13		น		
14		น		
15	ETELN	น		
16	em	HM.		
17	h	นางสาว		
18		น		
19		น		
20		น		

หมายเหตุ/Re

1

2

3

ผู้ฝึกอบรม/Name of Safety Instruction :

จป.วิชาชีพ(Safety Officer.)

วันที่(Date) : 11/5/69



PRE-BUILT

แบบฟอร์มเอกสาร

เรื่อง : แบบบันทึกการอบรมการอบรมความปลอดภัย

รหัสเอกสาร : FM-SAF-006-1

เริ่มใช้วันที่ : 20/8/2568

แก้ไขครั้งที่ : 00

แผ่นที่ :

แบบบันทึกการอบรมความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ ตามมาตรา ๑๖

วันที่(Date) : 4/5/69

เวลา(Time) : 8.00-15.00

สถานที่ฝึกอบรม(Location) : PSQ

หัวข้อการฝึกอบรม(Topic) 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 2. กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

3. จิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4. อันตรายจากการทำงานในแต่ละประเภทงาน

5. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/List of Trainees

ลำดับ/No.	ชื่อ - นามสกุล/Name	ตำแหน่ง/Position	ชั้น	สังกัด/Under
1	นาย [REDACTED]	บอกรเรน	[REDACTED]	Safety
2	นาง [REDACTED]	บอกรเรน	[REDACTED]	Safety
3	[REDACTED]			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

หมายเหตุ/Remark

1

2

3

ผู้ฝึกอบรม/Name of Safety Instruction :

(นาย [REDACTED])

จป.วิชาชีพ(Safety Officer.)

วันที่(Date) : 4/5/69.

ภาคผนวกที่ 2-20

ตัวอย่างเอกสารรับรองการอบรมผู้ควบคุมทาวเวอร์เครน



บริษัท เซฟ ลอว์ วิศวกรรม จำกัด
SAFE LAW ENGINEERING CO.,LTD.

วุฒิบัตรฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาง [REDACTED]

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน

“ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะวัสดุ,ผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิด รถปั้นจั่น ปั้นจั่นหอสูง”

ฝึกอบรมในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗



[REDACTED SIGNATURE]

(นายวิรัช)

วิทยากรฝึกอบรม Certificate: 091897

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๒)

Certificate: SL- M671014

Issue Date: 5/10/2567

Expire Date: 5/10/2569

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

จัดฝึกอบรมโดยนางจ่าง

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเพื่อยง

ได้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (จำนวน ๑๒ ชั่วโมง)

สถานที่ตั้งในการฝึกอบรม ณ บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) (สโตร์กลางคลอง ๘) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตามข้อที่ ๗๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจั้น และหมอน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปืนจั้น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปืนจั้น และการฝึกอบรมทวนการทำงานเกี่ยวกับปืนจั้น (ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

นายณัฐพ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารคลังพัสดุอาวุโส

บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง
มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเตะเว ว [REDACTED]

ได้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (จำนวน ๑๒ ชั่วโมง)

สถานที่ตั้งในการฝึกอบรม ณ บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน) (สโตร์กลางคลอง ๘) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตามข้อที่ ๗๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจั้น และหมอน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปืนจั้น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปืนจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
หรือผู้ควบคุมการใช้ปืนจั้น และการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปืนจั้น
(ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

[Signature]

นาย [REDACTED]

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารคลังพัสดุอาวุโส

เลขที่วุฒิบัตร CN25-0862

*กำหนดอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปืนจั้น ภายใน ๙๐ วัน ก่อนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๗๐ (วิทยากร นายสุรพงษ์ รัตโยธิน)



บริษัท แอฟดี เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มอบคุณบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย วัชรชัย

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร

บทบาทการทำงานกับบันจั้น (๒ ชั่วโมง)

ผู้ควบคุมการให้บันจั้น ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบันจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับบันจั้น หนีคบันจั้นและ

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามข้อที่ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั้น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบันจั้น

ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบันจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการให้บันจั้นและการอบรมบทบาทการทำงานเกี่ยวกับบันจั้น พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นาย วัชรชัย

กรรมการผู้จัดการและวิทยากร

ให้ไว้ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

CERT.C๒๔-๐๓๘๓

ภาคผนวกที่ 2-21
หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ
(แต่งตั้ง จป.)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2568

เลขที่ : PSQ-ST-001/2568

เรื่อง : ขอบ้างซื้อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียน

เรียน : ผู้อำนวยการ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5


สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ กก.จพ.
2. เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จำนวน 1 ฉบับ
3. เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
4. เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย ข้าพเจ้า นายนิมิตร แสนศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ของสถานประกอบกิจการชื่อ บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำลังทำการก่อสร้าง โครงการอาคาร ค.ส.ล.สูง 47 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เพื่อใช้เป็นโรงแรม 578 ห้อง, พาณิชยกรรม (ร้านค้า) ภัตตาคาร, สำนักงานและที่จอดรถ โครงการชื่อ The Platinum Square ประเภทของกิจการ คือ รับเหมาก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ บริเวณ ถนนเพชรบุรี, ราชปรารภ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะขอทำการจ้างซื้อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียน ดังนี้

1. ระดับบริหาร จำนวน 1 คน คือ
 - 1.1 นายนิมิตร [REDACTED]
2. ระดับวิชาชีพ จำนวน 1 คน คือ
 - 2.1 นายยุทธนา [REDACTED]
3. ระดับหัวหน้างาน จำนวน 1 คน คือ
 - 3.1 นายจรัสศักดิ์ [REDACTED]

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ



ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตร แสนศรี)

ผู้จัดการโครงการ/หรือผู้ที่รับมอบอำนาจลงแทน

Pre-Built Public Company Limited

503 1st Floor, Muang Thong Thane 3, Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi, 11120

T +66 (2) 960 1380 - 9 F +66 (2) 960 1390

www.prebuilt.co.th

แบบคำขอการแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

เขียนที่ บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

โครงการ The Platinum Square

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2568

ข้าพเจ้า นายนิมิตร ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) โครงการ The Platinum Square ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรีราชมรรคา แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

☒ การขึ้นทะเบียน จำนวน 1 คน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน
1	นายนิมิตร	

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

☒ การขึ้นทะเบียน จำนวน 1 คน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน
1	นายยุทธนา	

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

☒ การขึ้นทะเบียน จำนวน 1 คน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน
1	นายขจรศักดิ์	

พร้อมได้แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (1) สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
- (2) สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย หรือสำเนาวุฒิการศึกษาในกรณีที่มีคุณสมบัติโดยใช้วุฒิการศึกษา
- (3) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- (4) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ 1. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้บริหารหน่วยงาน ใช้เอกสาร หรือหลักฐานตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วแต่กรณี

2. การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ ใช้เอกสารหรือหลักฐานตาม (4)

ลงชื่อ.....

(นายนิมิตร แสง

นายจ้างหรือผู้มีอำนาจจะทำแทน/บุคคล

คำสั่ง บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ PSQ – ST 002 / 2568

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

.....

ตามที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กำหนดให้นายจ้าง แต่งตั้งลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ประจำสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างจำนวนประมาณ 100 คน ชาย 50 คน หญิง 50 คน จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 11 ประจำสถานประกอบกิจการ หน่วยงานโครงการ The Platinum Square ถนน เพชรบุรี,ราชปรวรก แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. นายนิมิตร แสนศรี

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตาม แผนงานโครงการเพื่อให้การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือ ตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการหรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568




(นายนิมิตร แสนศรี)

ผู้จัดการโครงการ/หรือผู้ที่รับมอบอำนาจลงแทน

คำชี้แจง

1. นายจ้างคนหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่ง อาจมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ระบุที่ตั้งสถานประกอบการตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำงานอยู่หรือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอยู่

2. กฎกระทรวงมิได้กำหนดรูปแบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ข้อ 4(2) ใช้คำว่า “เอกสารการแต่งตั้ง” อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีหน้าที่หลายประการรวมถึงต้องรายงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง จึงควรออกเป็นคำสั่งของนายจ้างมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ



บริษัท ออลอิสวัน จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทะเบียนเลขที่ จป. 53-011

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

No. AIO-533.00309

นายนิมิตร

ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

(นางสาวปิยนุช

ประธานกรรมการ

คำสั่ง บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ PSQ - ST 003 / 2568

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

.....

ตามที่กฎกระทรวงการสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กำหนดให้นายจ้าง แต่งตั้งลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ประจำสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างจำนวนประมาณ 100 คน ขอ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 21 ประจำสถานประกอบกิจการ หน่วยงานโครงการ The platinum Square ถนน เพชรบุรี, ราชปรารภ แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. นายยุทธนา มานะเฝ้า

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
5. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ซ้ำ

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอดต่อนายจ้าง

12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(นายนิมิต)

ผู้จัดการโครงการ/หรือผู้ที่รับมอบอำนาจลงแทน



คำชี้แจง

1. นายจ้างคนหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่ง อาจมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้ระบุที่ตั้งสถานประกอบกิจการตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำงานอยู่หรือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอยู่

2. กฎกระทรวงมิได้กำหนดรูปแบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ข้อ 4(2) ใช้คำว่า “เอกสารการแต่งตั้ง” อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีหน้าที่หลายประการรวมถึงต้องรายงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง จึงควรออกเป็นคำสั่งของนายจ้างมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ



ที่ ๒๕๖/๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

หนังสือรับรองคุณวุฒิ



หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายยุทธนา



รหัสประจำตัว ๕๓๑๙๓๐๘๒

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ออกให้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



คำสั่ง บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ PSQ - ST 004 / 2568

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

.....

ตามที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กำหนดให้นายจ้าง แต่งตั้งลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน ประจำสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างจำนวนประมาณ 100 คน ชาย 50 คน หญิง 50 คน จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 8 ประจำสถานประกอบกิจการ หน่วยงานโครงการ The Platinum Square ถนน เพชรบุรี,ราชปรารภ แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. นายขจรศักดิ์



ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นจากการทำงาน โดย อาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
- จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ วิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง และแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้าง กำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน

ต่อ...



4. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
6. กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
7. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
8. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับ เทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาลูกจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(นายนิมิตร)

ผู้จัดการโครงการ/หรือผู้ที่รับมอบอำนาจลงแทน



PRE-BUILT

คำชี้แจง

1. นายจ้างคนหนึ่งหรือนิติบุคคลหนึ่ง อาจมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้ระบุที่ตั้งสถานประกอบกิจการตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำงานอยู่หรือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอยู่
2. กฎกระทรวงมิได้กำหนดรูปแบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ข้อ 4(2) ใช้คำว่า "เอกสารการแต่งตั้ง" อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งมีหน้าที่หลายประการรวมถึงต้องรายงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง จึงควรออกเป็นคำสั่งของนายจ้าง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

Pre-Built Public Company Limited

503 1st Floor, Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi, 11120

T +66 (2) 960 1380 - 9 F +66 (2) 960 1390

www.prebuilt.co.th



สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND)
UNDER HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHACHAKRI SIRINDHORN PATRONAGE

(เป็นหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนเลขที่ จป.62-009).

A training organization is registered by the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour-Registration No.62-009

ขออบวติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
With this certificate, hereto certifies that

นายขจรศักดิ์

ได้ผ่านการฝึกอบรม

has completed the training program, namely

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Safety Officer at Supervisory level

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
In accordance with MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT: 2549 (B.E)

Organized date
February 4-5, 2020

Period of training
12 hrs.

This certificate is Issued on
February 5, 2020

(Assoc. Prof. Dr. Chalermchai Chaikittiporn)
President of Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)

Name of Registrar: 

Certificate No. 630647

ภาคผนวกที่ 2-22
แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
