

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2.1 เอกสารสำรวจสภาพรั้วกำแพงบ้านและตัวอาคารของอาคารข้างเคียง

ภาคผนวกที่ 2.2 เอกสารกรรมธรรม์ประกันภัย

ภาคผนวกที่ 2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ภาคผนวกที่ 2.4 ผังดำเนินการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวกที่ 2.5 เอกสารตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์

ภาคผนวกที่ 2.6 หนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่อง การบดบัง
ทิศทางลม/แสงแดด และการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์

ภาคผนวกที่ 2.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ภาคผนวกที่ 2.8 มาตรการป้องกัน COVID-19

ภาคผนวกที่ 2.9 การอบรมความปลอดภัยของคนงาน

ภาคผนวกที่ 2.10 รายการคำนวณงานออกแบบโครงสร้างรองรับแผ่นดินไหว

ภาคผนวกที่ 2.11 เอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ภาคผนวกที่ 2.12 เอกสารตรวจสอบทาวเวอร์เครน

ภาคผนวกที่ 2.13 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมทาวเวอร์เครน

ภาคผนวกที่ 2.1

เอกสารสำรวจสภาพรั้วกำแพงบ้านและตัวอาคารของอาคารข้างเคียง



รายงานการสำรวจบ้านข้างเคียง

โครงการก่อสร้าง : J071 ONEDER Kaset (วันเดอร์ เกษตร)

สำรวจโดย : บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

50/1203 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร 02-981-7992-94, แฟกซ์ 02-981-7995



แผนงานการดำเนินการ กรณีปัญหาข้อร้องเรียนจากข้างเคียง
จากผลกระทบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง J071 ONEDER Kaset (วันเดอร์ เกษตร)



Item	Description	ระยะเวลาดำเนินการ : 2021 - 2022																						Remark
		Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	
1	สำรวจและจัดทำรายงานการสำรวจบ้านข้างเคียง <u>ก่อน</u> ดำเนินงานก่อสร้าง	1 Feb 2021 - 13 Mar 2021																						
2	สำรวจและจัดทำรายงานการสำรวจบ้านข้างเคียง <u>ระหว่าง</u> ดำเนินงานก่อสร้าง																							
3	สำรวจและจัดทำรายงานการสำรวจบ้านข้างเคียง <u>หลังการ</u> ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ																							

แบบบันทึกข้อมูลการการเข้าสำรวจบ้านข้างเคียง โครงการก่อสร้าง :

J071 ONEDER Kaset (วันเตอร์ เกษตร)

ลำดับ	ข้อมูลผู้พักอาศัย บ้านเลขที่ ชื่อ-นามสกุล : เบอร์โทรศัพท์:	ข้อมูลการเข้าสำรวจ												หมายเหตุ
		ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง				ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง				หลังการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ				
		วัน เดือน ปี ที่เข้าสำรวจ	ผู้สำรวจ	ข้อมูลปัญหาข้อ ร้องเรียน/ ผลกระทบ	การประเมิน ปัญหาเบื้องต้น	วัน เดือน ปี ที่เข้าสำรวจ	ผู้สำรวจ	ข้อมูลปัญหาข้อ ร้องเรียน/ ผลกระทบ	การประเมิน ปัญหาเบื้องต้น	วัน เดือน ปี ที่เข้าสำรวจ	ผู้สำรวจ	ข้อมูลปัญหาข้อ ร้องเรียน/ ผลกระทบ	การประเมิน ปัญหาเบื้องต้น	
1	บ้านเลขที่ 93 ร้าน ก่วยเตี่ยวตำรังกั๊ก 02-589-1274	06/Mar/2021	จักร์กริช สังห์ พรพิมล ธีระศุภดา	กังวลใจเรื่องการ ทำงานที่ก่อให้เกิด เสียงดัง ฝุ่นละออง บ้านทรุดตัว	-									
2	บ้านเลขที่ 92 บ้านคุณ สุวรรณ 062-435-2625	02/Mar/2021	จักร์กริช สังห์ พรพิมล ธีระศุภดา	กังวลใจเรื่อง บ้านพักทรุดตัว เสียงดัง	-									
3	บ้านเลขที่ 91 คุณสุ กัญญา 061-860-0770	02/Mar/2021	จักร์กริช สังห์ พรพิมล ธีระศุภดา	กังวลใจเรื่องการ ทำงานที่ก่อให้เกิด เสียงดัง บ้านพัก ทรุดตัว	-									
4	ร้านลุงโป บ้านคุณลุงช้าง : 080-816-3625 089-985-2597	02/Mar/2021	จักร์กริช สังห์ พรพิมล ธีระศุภดา	กังวลใจเรื่อง บ้านพักทรุดตัว เสียงดัง	-									
5	บ้านเลขที่ 60/1 คุณวัช รพล/หนุ่ย 094-375-9515	02/Mar/2021	จักร์กริช สังห์ พรพิมล ธีระศุภดา	กังวลใจเรื่องการ ทำงานที่ก่อให้เกิด เสียงดัง บ้านพัก ทรุดตัว	-									
6	บ้านเลขที่ 60 ร้านค้าคุณ รัชนี้ 089-768-5202	02/Mar/2021	จักร์กริช สังห์ พรพิมล ธีระศุภดา	กังวลใจเรื่อง บ้านพักทรุดตัว	-									
7	The Nigh Condo 3 คุณ ภัทรพงษ์ 083-885-8517	11/Mar/2021	พรพิมล ธีระศุภดา	-	-									
8	The Nigh Condo 2 คุณ แพรว 062-156-3261	11/Mar/2021	พรพิมล ธีระศุภดา	-	-									
9	The Nigh Condo 1 คุณ ภาดิน 097-392-3989	11/Mar/2021	พรพิมล ธีระศุภดา	-	-									
10	งามวดีเพลสคอนโด คุณ หน้อย 082-321-0609	13/Mar/2021	พรพิมล ธีระศุภดา	-	-									
11	PEA การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	06/Mar/2021	พรพิมล ธีระศุภดา	-	-									

แบบบันทึกข้อมูลการการเข้าสำรวจบ้านข้างเคียง














ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด				หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง :	J071 ONEDER Kaset (วันเดอร์ เกษตร)				
2	ข้อมูลผู้พักอาศัย - บ้านเลขที่: - ชื่อ-นามสกุล : - เบอร์โทรศัพท์:	บ้านเลขที่ 92 บ้านคุณสุวรรณ 062-435-2625				
3	ระยะเวลาการเข้าสำรวจ	วันที่เข้าสำรวจ :	ชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่/ ทีมงานที่เข้าเยี่ยม :	ข้อมูลปัญหาข้อร้องเรียน/ ผลกระทบ	การประเมินปัญหาเบื้องต้น	
	- ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	02/Mar/2021	จักรกริช สังข์หัต พรพิมล ธีระศุภดา	กังวลใจเรื่องบ้านพักทรุด ตัว เสียงดัง	-	
	- ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง					
	- การก่อสร้างแล้วเสร็จ					
4	แปลนที่ตั้ง	ตามเอกสารแนบ				















ตารางแสดงรายละเอียดและภาพถ่าย จากการสำรวจ







บ้านเลขที่ 92 บ้านคุณสุวรรณ 062-435-2625







ลำดับที่	ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
วันที่	06/Mar/2021	0	0	
1				
2				
3				
4				
5				ชั้น 1 พื้นหน้า บ้านมีรอยแตกร้าว






ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
6				ชั้น 1 พื้นหน้า บ้านมีรอยแตกร้าว
7				
8				
9				
10				
11				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
12				ชั้น 1 เสาดูกร่อน
13				
14				ชั้น 1 เสาดูกร่อน
15				
16				
17				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
18				ชั้น 1 เสาและ ผนังมีรอยแตกร้าว
19				ชั้น 1 เสาและ ผนังมีรอยแตกร้าว
20				
21				
22				
23				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
24				ชั้น 1 ใต้บันไดมีรอยแตกร้าว
25				
26				
27				
28				ชั้น 1 ผนังมีรอยแตกร้าว
29				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
30				
31				
32				
33				
34				
35				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
36				
37				
38				
39				
40				
41				

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
42				
43				
44				
45				
46				
47				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
48				ชั้น 1 ฝ้าฯ บวม
49				ชั้น 1 ฝ้าฯ บวม
50				
51				
52				
53				

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
54				
55				ชั้น 1 ผนังมีรอยแตกร้าว
56				ชั้น 1 ผนังมีรอยแตกร้าว
57				ชั้น 1 ผนังมีรอยแตกร้าว
58				
59				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
60				
61				ชั้น 1 ผงมีรอยแตกกร้าว
62				
63				
64				
65				






ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
66				
67				
68				ชั้น 2 ผนังมีรอยร้าว
69				ชั้น 2 ผนังมีรอยร้าว
70				ชั้น 2 ผนังมีรอยร้าว
71				




ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
72				ชั้น 2 พื้นไม้หลุด ร่อน
73				ชั้น 2 พื้นไม้หลุด ร่อน
74				
75				
76				
77				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
78				
79				ชั้น 2 มีรอยยาแนวตามแนวเสาและผนัง
80				ชั้น 2 มีรอยยาแนวตามแนวเสาและผนัง
81				ชั้น 2 มีรอยยาแนวตามแนวพื้นและผนัง
82				ชั้น 2 มีรอยยาแนวตามแนวเสาแนวพื้นและผนัง
83				


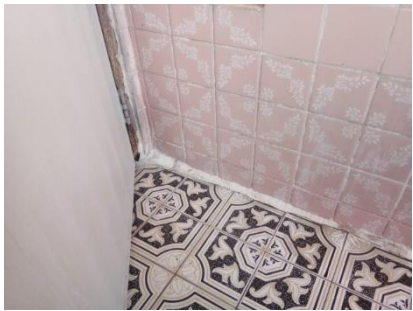




ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
84				
85				
86				ชั้น 2 ไม้ผุ บวม
87				
88				
89				

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
90				ชั้น 2 ขอบ หน้าต่างมีรอยยา แนวและการ แตกกร้าว
91				ชั้น 2 ขอบ หน้าต่างมีรอยยา แนวและการ แตกกร้าว
92				ชั้น 2 ขอบ หน้าต่างมีรอย แตกกร้าว
93				
94				
95				ชั้น 3 ผนังมีรอย แตกกร้าว

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
96				
97				
98				
99				
100				
101				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
102				
103				ชั้น 3 พื้นมีรอยแตกกร้าว
104				
105				ชั้น 3 ผนังมีรอยแตกกร้าว
106				ชั้น 3 ผนังมีรอยแตกกร้าว
107				





ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
108				ชั้น 3 กระเบื้อง ขอบประตูแตกร้าว
109				ชั้น 3 กระเบื้อง ขอบประตูแตกร้าว
110				ชั้น 3 ปูนขอบ ประตูแตกร้าว
111				
112				ชั้น 3 ผนังมีรอย ร้าว
113				







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
114				
115				ชั้น 3 มีรอยยาแนวตามแนวมุมห้อง
116				ชั้น 3 มีรอยยาแนวและกระเบื้องแตกร้าวตามแนวมุมห้อง
117				ชั้น 3 มีรอยยาแนวและกระเบื้องแตกร้าวตามแนวมุมห้อง
118				ชั้น 3 มีรอยแตกร้าวตามแนวมุมห้อง
119				

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
120				
121				
122				
123				
124				
125				ชั้น 3 ผันมีรอยแตกร้า







ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
126				
127				
128				
129				ชั้น 3 ผนังมีรอยแตกกร้าว
130				ชั้น 3 ผนังมีรอยแตกกร้าว
131				





ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
132				
133				ชั้น 3 พื้นมีรอยแตกกร้าว
134				
135				ชั้น 3 ผนังมีรอยแตกกร้าว
136				ชั้น 3 ผนังมีรอยแตกกร้าว
137				

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
138				
139				
140				
141				ชั้น 4 ผนังมีรอยแตกกร้าว
142				ชั้น 4 ผนังมีรอยแตกกร้าว
143				ชั้น 4 ผนังมีรอยแตกกร้าว

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
144				ชั้น 4 เพดานทรุด
145				ชั้น 4 เพดานทรุด
146				
147				ชั้น 4 พื้นมีรอยแตกกร้าว
148				
149				

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
150				ชั้น 4 เพดานทรุด
151				
152				
153				ชั้น 4 ผนังมีรอยแตกกร้าว
154				ชั้น 4 ผนังมีรอยแตกกร้าว
155				ชั้น 4 พื้นมีรอยแตกกร้าว

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
156				ชั้น 4 ผึงมีรอยแตกร้าว
157				
158				ชั้น 4 ผึงมีรอยแตกร้าว
159				ชั้น 4 พื้นและผึงมีรอยแตกร้าว
160				
161				ชั้น 4 ไม้หลังคาหลุดร่อน

ลำดับที่	ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	การก่อสร้างแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
162				ชั้น 4 พื้นและผนังมีรอยแตกร้าว
163				ชั้น 4 พื้นและผนังมีรอยแตกร้าว
164				ชั้น 4 พื้นและผนังมีรอยแตกร้าว
165				ชั้น 4 พื้นและผนังมีรอยแตกร้าว

ภาคผนวกที่ 2.2

เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย



หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเลขที่ CN-E.080/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (COVER NOTE)

- หนังสือคุ้มครองเลขที่ : CN-E.080/2564
- ประเภทการประกันภัย : การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)
- ผู้เอาประกันภัย : บริษัท เอกภูมิทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาร่วม และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ
- โครงการ : อาคารชุดวันเคอร์ เกษตร (ONEDER KASET)
- งานตามสัญญา : งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 3 อาคาร (ไม่มีชั้นใต้ดิน) จำนวนห้องชุดรวมประมาณ 585 ห้องชุด อาคารจอดรถอัตโนมัติ 1 อาคาร (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) รวมงานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามสัญญาว่าจ้างที่ระบุรวมอยู่ในทุนประกันภัย
(ยกเว้นความเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักรของผู้รับเหมาที่ใช้ในการก่อสร้าง)
- สถานที่เอาประกันภัย : ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10800
- ระยะเวลาเอาประกันภัย : 21 พฤษภาคม 2564 ถึง 21 กันยายน 2565
รวม ระยะเวลาทดสอบระบบไม่เกิน 4 สัปดาห์ (Testing and Commissioning)
บวก ระยะเวลาบำรุงรักษา 24 เดือน
- มูลค่างานตามสัญญา : 440,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ความคุ้มครอง : งานตามสัญญา (คุ้มครองหมวดที่ 1 และ 2 ในกรมธรรม์)
ความสูญเสียหรือเสียหายโดยอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติต่างๆ หรือจากสาเหตุซึ่งมิได้คาดไว้ เช่น อัคคีภัย, ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยระเบิด, ภัยเนื่องจากน้ำ, ลักทรัพย์, ปล้นทรัพย์, การกระทำอันป่าเถื่อน และ/หรือ เจตนาอันมุ่งร้าย และภัยอื่น ๆ นอกเหนือจากเหตุที่ได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์
- กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองความสูญเสียจากภัยน้ำท่วม
ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 - กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองความสูญเสียจาก ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว (รวมคลื่นใต้น้ำ สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด) และภัยลูกเห็บ
ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (หมวดที่ 3 ในกรมธรรม์)
ให้ความคุ้มครองสำหรับความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก สำหรับการเสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและสาเหตุนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตามสัญญา





หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเลขที่ CN-E.080/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทุนประกันภัย : งานตามสัญญา (คุ้มครองหมวดที่ 1 และ 2 ในกรมธรรม์)
งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา (หมวดที่ 1 และ 2)
งานตกแต่งภายใน งานระบบต่าง ๆ งานติดตั้ง รวมถึงบรรดาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
440,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง (Existing property)
2,000,000.- บาท

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(หมวดที่ 3 ในกรมธรรม์)
รวมจำกัดความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
40,000,000.- บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้อง : งานตามสัญญา
รับผิดชอบเอง(ต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งและทุกครั้ง)
งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
- 10% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นต่ำ 50,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
สำหรับความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว (รวมคลื่นใต้น้ำ สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด)
ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ดินทรุด ดินถล่มเลื่อน การพังทลาย
- 10% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นต่ำ 50,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
สำหรับการทดสอบระบบ (Testing and Commissioning) ช่วงระยะเวลาบำรุงรักษา
ภัยเนื่องจากน้ำ และการโจรกรรม
- 40,000.- บาทแรกของความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
สำหรับความเสียหายจากสาเหตุอื่นๆ

ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง (Existing property)
- 10% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นต่ำ 30,000.- บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
และทุกครั้งแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
- ไม่มีความเสียหายส่วนแรก สำหรับการบาดเจ็บและเสียชีวิต
- 40,000.-บาทแรก ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- 10% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นต่ำ 80,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
ต่อบ้าน/อาคารแต่ละหลัง ต่อผู้เรียกร้องแต่ละราย สำหรับความเสียหายจากการสั่นสะเทือน
การถดถอย หรือการอ่อนตัวของสิ่งถ้ำจุน (VRWS) และความเสียหายต่อทรัพย์สินใต้ดิน





หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเลขที่ CN-E.080/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขพิเศษ :

1. CROSS LIABILITY CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยความรับผิดชอบต่อกันและกัน จะไม่มีการไล่เบี้ยซึ่งกันและกันจากผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง กรณีที่เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหาย
2. REMOVAL OF DEBRIS CLAUSE
เงื่อนไขคุ้มครองค่าขนย้ายซากปรักหักพังกรณีเกิดอุบัติเหตุ
With Limit Baht 50,000,000.- any one accident and in aggregate
3. EXPEDITING COSTS (INCLUDING AIRFREIGHT) CLAUSE (20% OF REPAIR COST)
เงื่อนไขว่าด้วยการเร่งงาน (ขยายความคุ้มครองถึงวัสดุที่จำเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศ)
4. ERRORS AND OMISSIONS CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยการคุ้มครองความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่องในการแจ้งข้อเท็จจริง
5. CONTRACT WORKS TAKEN OVER OR PUT INTO SERVICE
เงื่อนไขว่าด้วยการความคุ้มครองงานตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงาน/ใช้งานแล้ว
6. PRINCIPAL'S EMPLOYEES AND REPRESENTATIVE CLAUSE
การประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้รับเหมาอันทำให้เกิด การบาดเจ็บต่อตัวแทน/เจ้าหน้าที่ของผู้อ้าง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการนี้
7. RIOT AND STRIKE CLAUSE
การประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายอันเนื่องจากการนัดหยุดงานและการจลาจล
8. ARCHITECTS' SURVEYOR'S AND CONSULTING ENGINEERS FEES
เงื่อนไขความคุ้มครองค่าออกแบบ ค่าสำรวจ และค่าที่ปรึกษาอันอาจเกิดขึ้นภายหลังเมื่อเกิดความเสียหาย
with limit Baht 40,000,000.-any one accident and in aggregate.
9. SPECIAL CONDITIONS CONCERNING FIRE-FIGHTING FACILITIES AND FIRE SAFETY ON CONSTRUCTION SITE
เงื่อนไขว่าด้วยข้อรับรองเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเหมาะสมในหน่วยงานก่อสร้าง
With Limit Bhat. 10,000,000.- any one accident and in aggregate
Deductible: 10% of loss, minimum Baht 80,000.- each and every loss per each house/building per claimant
10. FIRE PREVENTION MEASURE
ผู้ออกประกันภัยต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อย่างเพียงพอ วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงได้นั้น ต้องเก็บแยกไว้ให้ห่างจากสถานที่ก่อสร้างพอสมควร และจะต้องมีเครื่องดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้เสมอ
11. NO CLAIM WARRANTY
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยข้อรับรองไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆจากความสูญเสียหรือเสียหายใดๆซึ่งเกิดขึ้นก่อนการรับประกันภัย
12. SPECIAL CONDITIONS CONCERNING UNDERGROUND CABLES, PIPES AND OTHER FACILITIES CLAUSE
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินใต้ดินที่มีอยู่เดิม
With Limit Bhat. 10,000,000.- any one accident and in aggregate
Deductible: 10% of loss, minimum Baht 80,000.- each and every loss per each house/building per claimant
13. LOSS NOTIFICATION CLAUSE (45 DAYS)
เงื่อนไขว่าด้วยการแจ้งเหตุ การเรียกร้องค่าเสียหาย
14. TEMPORARY REMOVAL CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยการ โยกย้ายทรัพย์สิน
With Limit Baht 30,000,000.- any one accident and in aggregate.
15. TEMPORARY REPAIRS
เงื่อนไขว่าด้วยงานซ่อมแซมชั่วคราว
With Limit Baht 30,000,000.- any one accident and in aggregate.
16. TEMPORARY PROTECTION CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว





หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเลขที่ CN-E.080/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

- With Limit Baht 30,000,000.- any one accident and in aggregate.
17. FIRE BRIGADE CHARGE CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
With Limit Baht 30,000,000.- any one accident and in aggregate.
18. FIRE EXTINGUISHING EXPENSE CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดับเพลิง
With Limit Baht 30,000,000.- any one accident and in aggregate.
19. PLAN AND DOCUMENTS
เงื่อนไขว่าด้วยการคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อ แผนผัง และ เอกสารต้นฉบับ
With Limit Baht 30,000,000.- any one accident and in aggregate.
20. PILING FOUNDATION AND RETAINING WALL WORK CLAUSE (MR121)
21. VIBRATION, REMOVAL OR WEAKENING OF SUPPORT CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหรืออาคารข้างเคียงของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน การถอดถอน หรือการย่นตัวของสิ่งก่อสร้าง (MR120)
With Limit Baht. 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Deductible: 10% of loss, minimum Baht 80,000.- each and every loss per each house/building per claimant
22. 72 HOURS FLOOD/STORM/EARTHQUAKE
ในกรณีที่ความสูญเสียหรือเสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจาก ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภายในเวลา ทุกๆ 72 ชั่วโมง จะคิดความรับผิดชอบเป็น 1 เหตุการณ์
23. WAIVER OF SUBROGATION
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ
24. OFFSITE STORAGE CLAUSE (SUBJECT TO 24 HOURS SECURITY GUARD)
เงื่อนไขว่าด้วยการคุ้มครองการเก็บทรัพย์สินภายนอกสถานที่ปฏิบัติงาน
With Limit Bht. 30,000,000.- any one accident and in aggregate
25. PRINCIPLE'S EMPLOYEES NOT CONCERNING WITH THE PROJECT SHALL BE TREATED AS THIRD PARTY
26. TEMPORARY SITE OFFICE, STORE & CONTENTS CLAUSE AND EMPLOYEES' CAMPS CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยการคุ้มครองอุปกรณ์และสำนักงานชั่วคราว และสำนักงานชั่วคราวซึ่งเป็นของผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้าง และ ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง
With Limit Bht. 30,000,000.- any one accident and in aggregate
27. SUE AND LABOUR CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย
With Limit Bht. 30,000,000.- any one accident and in aggregate.
28. ESCALATION CLAUSE (20%)
เงื่อนไขความคุ้มครองอัตโนมัติสำหรับทุนประกันภัยที่อาจปรับเพิ่มขึ้น กำหนดให้ 20% ของทุนประกันภัยเดิม โดยผู้เอา ประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
29. INLAND TRANSIT (MR 113)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการขนส่งวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
Truck Clause Only Limit: THB 10,000,000 per occurrence and in aggregate
Deductible 10% of loss or minimum Bht. 30,000.-each and every loss
30. ELECTRONIC DATA AND INTERNET ENDORSEMENT
เงื่อนไขว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
31. WAR AND TERRORISM EXCLUSION CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย
32. CIVIL COMMOTION EXCLUSION CLAUSE
เงื่อนไขว่าด้วยข้อยกเว้นการลุกฮือของประชาชน





หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเลขที่ CN-E.080/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

33. SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION
เงื่อนไขว่าด้วยการการคว่ำบาตรและบทลงโทษทางการค้า
34. POLITICAL DEMONSTRATION OR MOTIVE EXCLUSION ENDORSEMENT
เงื่อนไขว่าด้วยการชุมนุมหรือแรงจูงใจทางการเมือง
35. NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE
36. RADIOACTIVE EXCLUSION CLAUSE
37. TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
38. TRANSMISSION & DISTRIBUTION LINED ENDORSEMENT
39. COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION LMA 5394
40. PROPERTY CYBER AND DATA ENDORSEMENT LMA 5400
41. PRINCIPAL'S EXISTING PROPERTY CLAUSE เงื่อนไขว่าด้วยทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง
With Limit Bht. 2,000,000.- any one accident and in aggregate Deductible: 10% of loss, minimum Bht.30,000.- each and every loss
42. EXTENDED MAINTENANCE PERIOD CLAUSE (24 MONTHS) เงื่อนไขว่าด้วยการให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาบำรุงรักษา (24 เดือน) นับจากงานตามสัญญาเสร็จสิ้น
43. AUTOMATIC EXTENSION OF CONTRACT PERIOD
90 days with additional premium and terms to be agreed เงื่อนไขว่าด้วยการขยายระยะเวลาให้ความคุ้มครอง สามารถขอขยายไปอีก 90 วัน (โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามตกลง) และการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ต้องแจ้งความประสงค์ให้ประกันภัยทราบ ก่อนที่กรมธรรม์จะหมดอายุ

ผู้รับประกันภัย : บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน

- ข้อรับรอง :
1. ผู้เอาประกันภัยต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อป้องกันความสูญเสียชีวิตจากการโจรกรรม
 2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องปิดกั้นบริเวณก่อสร้างเพื่อมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ทำงาน





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dinsoeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเลขที่ CN-E.080/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เบี้ยประกันภัย	ค่าเบี้ยประกันภัย	486,200.00	บาท
	อากร	1,945.00	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	34,17.15	บาท
	เบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น	522,315.15	บาท

ภายใต้ข้อสัญญา ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ สำหรับการประกันภัยตามประเภทการประกันภัยที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งบริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตกลงให้การคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ตามรายการและระยะเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น หนังสือคุ้มครองนี้ให้ถือว่ายกเลิกเมื่อบริษัทฯ ได้ทำกรมธรรม์ประกันภัย และส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว หนังสือคุ้มครองการประกันภัยชั่วคราวฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มให้การคุ้มครองและผู้เอาประกันภัยรับรองว่าจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยให้บริษัทฯ ทราบ ตามแบบคำขอเอาประกันภัยของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อการออกกรมธรรม์ประกันภัย

วันทำหนังสือและออกหนังสือฉบับนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร


กรรมการ – Director


กรรมการ - Director

AS PER CO-INSURANCE CLAUSE ATTACHED

ผู้รับมอบอำนาจ – Authorized Person

ภาคผนวกที่ 2.3

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ที่ รง ๐๕๑๙/๒๓๕๓



สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙
สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น ๗ ซอยวิภาวดีรังสิต ๓๔
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เวล เกรต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โครงการ Oneder Kaset

สิ่งที่ส่งมาด้วย ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถานประกอบกิจการท่านได้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ๑ คน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ๑ คน ครบถ้วนแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายชล แจ่มแจ้ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โทร. ๐๒ ๕๑๓ ๗๙๒๒, ๐๒ ๕๑๓ ๕๘๕๔

โทรสาร ๐๒ ๕๑๓ ๒๐๔๒

แบบติดขอบ สรพ.9 (จัดจักร ตอนเมือง บางชน บางชื่อ หลักสี่) สถานประกอบกิจการ บริษัทจำกัด (มหาชน)เวล เกรด เอ็นจิเนียริง โครงการ Oneder Kaset

ระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

27/05/2564

ลำดับ	ชื่อ-สกุล จป.	เลขบัตรประจำตัว	ประเภท จป.	เลขทะเบียน จป.	วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ชื่อสถานประกอบกิจการ	ที่ตั้ง	ประเภทอุตสาหกรรม
1.	นางสาวพรมล ถิระสุภา	1129700015081	ระดับวิชาชีพ	กสร.จป.ว 102-001699	20/5/2564		01-07-563000061 บริษัทจำกัด (มหาชน)เวล เกรด เอ็นจิเนียริง โครงการ Oneder Kaset (01278040)	โครงการ Oneder Kaset เลขที่ 99 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900	การก่อสร้างอาคารทั่วไป

ภาคผนวกที่ 2.4

ผังดำเนินการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหารื่องร้องเรียน

ภาคผนวกที่ 2.5

เอกสารตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์

CERT.NO. ST00529/22
DATE: April 1, 2022.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

WE HEREBY CERTIFY THAT

NIKON TOTAL STATION MODEL NPL-322+ 2" SERIAL NO. D150615

RECEIVED FROM WELLGRADED PUBLIC COMPANY LIMITED.

HAS BEEN CALIBRATED BY OUR SERVICE CENTER IN ACCORDANCE
WITH NIKON-TRIMBLE CO., LTD. STANDARD.

CALIBRATED BY






MR. NATTHAPONG NIYOMTHAM
TECHNICAL SERVICE ENGINEER

APPROVED BY



MR. SURIYACHART SOMVIPHAT
ASST. TECHNICAL SERVICE MANAGER



SERVICE CHECK LIST

DATE: 1 April 2022.

COMPANY NAME: WELLGRADED PUBLIC COMPANY LIMITED.

BRAND : NIKON

MODEL : TOTAL STATION MODEL NPL-322+ 2"

SERIAL NO. : D150615

TYPE OF SERVICE PARTS NAME	CHECK	CLEAN	ADJUST	REMARK	
				BEFORE	AFTER
External Cleaning		✓			
Internal Cleaning		N/A			
Lens Cleaning		✓			
Circular Level Adjusting	✓				Center
Plate Level Adjust			✓	Out of center 2 mm.	Center
Cross Hair Adjust	✓				Pendicular
Optical Plummet Adjustment			✓	Out of center 1 mm.	Center
Vertical Axis Adjustment	✓				Center
Vertical Angle Adjustment	✓				Non error
Line Adjustment			✓	Exceed the center line 5"	Center
Level Adjust		N/A			
Focus Adjustment	✓				Clear
Electronic Adjustment	✓				Non Error
Prism Adjustment		N/A			
Measuring Distance	✓				Correct
Compensator Adjustment		N/A			

This document refers to Certificate of Calibration No.ST00529/22


DATE: 1 April 2022

MODEL : TOTAL STATION "NIKON" NPL-322+ 2"

SERIAL NO. : D150615

STATION	SIGHT POINT	FACE	ANGLE	DIFFERENCE 180
[1]	A	L	000 00 00	ERROR 1
	B	L	179 59 59	
	A	R	000 00 00	ERROR 1
	B	R	180 00 01	
[2]	C	L	000 00 00	ERROR 1
	D	L	179 59 59	
	C	R	000 00 00	ERROR 1
	D	R	180 00 01	

REMARK : ACCURACY FOR ANGLE MEASURING : 2"

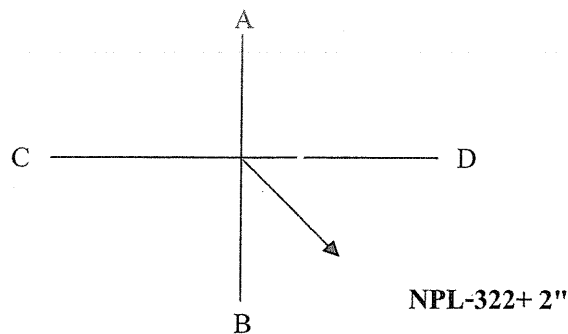

COMPARISON OF ACCURACY TESTING

POINT	STANDARD DISTANCE	ACTUAL DISTANCE
1	10.9997 M	11.000 M
2	11.2504 M	11.250 M
3	11.5002 M	11.500 M
4	11.7505 M	11.750 M
5	12.0005 M	12.000 M

REMARK : ACCURACY FOR DISTANCE MEASUREMENT : $\pm(2+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$

This document refers to Certificate of Calibration No.ST00529/22

ภาคผนวกที่ 2.6

หนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เรื่อง การบดบังทิศทางลม/แสงแดด และการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์



WELL GRADED ENGINEERING P.L.C.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564.

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานโครงการวันเดอร์ เกษตร (Oneder Kaset)

เรียน เจ้าบ้าน/ผู้พักอาศัยบ้านข้างเคียง โครงการก่อสร้างคอนโด วันเดอร์ เกษตร (Oneder Kaset)

ด้วย บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการคอนโด วันเดอร์ เกษตร (Oneder Kaset) และได้เริ่มดำเนินงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา

ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด โดยหากมีกรณีที่บ้าน/อาคารของท่านได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ อาทิเช่น การบดบังแสงแดด ทิศทางลม ทัศนียภาพ และคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ขอให้ท่านได้โปรดแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทางโครงการทราบ

โดยท่านสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานโครงการก่อสร้าง วันเดอร์ เกษตร เลขที่ 99 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือโทรแจ้งได้ที่ นางสาวพรพิมล ธีระศุภดา เบอร์โทรศัพท์ 080-5877411 โดยทางโครงการจะรีบประสานงานกลับไปยังท่านโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา ประเสริฐเรืองชัย)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวกที่ 2.7

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒



ชื่อ-สกุล นายณัฏฐพงษ์ อัครปรีดี
 เลขประจำตัวประชาชน 1309901014846
 ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา โยธา
 ระดับ **ภาคีวิศวกร** เลขทะเบียน ทย.69322
 วิชาเฉพาะ 13 ก.พ. 2561 วิชาสามัญ 12 ก.พ. 2566
 ประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่ 264059
 วันออกบัตร 13 ก.พ. 2561 วันหมดอายุ 12 ก.พ. 2566

นายณัฏฐพงษ์ อัครปรีดี

ผู้ได้รับใบอนุญาต

นายกสภาีวิศวกร

วิภาดา กุศล
 วิศวกร รก/ก

วิภาดา กุศล

ใช้รับแบบแปลน มคอ. EIA
 โครงการจัดตั้งโรงงาน บริษัท เทคโนโลยี
 อินดิเพนเดีย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น



ภาคผนวกที่ 2.8

มาตรการป้องกัน COVID-19



WELL GRADED ENGINEERING CO.,LTD.

ประกาศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฉบับที่ ..2../2563

เรื่อง ข้อปฏิบัติการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำหรับโครงการ

เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ในบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับโครงการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จึงกำหนดข้อปฏิบัติการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับโครงการ ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับโครงการ

1. ให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศ ทั้ง 5 ฉบับที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างเคร่งครัด

ฉบับที่ 1 ประกาศที่ 003/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับที่ 2 ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

ฉบับที่ 3 ประกาศที่ 006/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันหยุดรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ฉบับที่ 4 ประกาศที่ 001/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

ฉบับที่ 5 ประกาศที่ LM-PL001/63 เรื่อง ข้อปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 (ฉบับที่ 2)

ข้อปฏิบัติการคัดกรองสำหรับโครงการ

- | | | |
|---------------|---|---|
| จุดคัดกรองที่ | 1 | <u>บริเวณบ้านพักพนักงานรายวัน</u>
ให้ปฏิบัติตามผังข้อปฏิบัติการคัดกรอง จุดที่ 1 |
| จุดคัดกรองที่ | 2 | <u>บริเวณก่อนเข้าโครงการก่อสร้าง</u>
ให้ปฏิบัติตามผังข้อปฏิบัติการคัดกรอง จุดที่ 2 |

ประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นการสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน พนักงานแรงงานรายวัน ทุกคนและทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และยึดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

(นายเกรียงศักดิ์ บัวน่วม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



WELL GRADED ENGINEERING PLO.

ประกาศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฉบับที่...3../2563

เรื่อง ข้อปฏิบัติและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 เป็นจำนวนมากในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีการแพร่กระจายในอีกหลายจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จึงกำหนดข้อปฏิบัติและการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ดังนี้

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามประกาศ ฉบับที่ 2 / 2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติการคัดกรองและการควบคุมฯ สำหรับโครงการ
2. ห้ามพนักงานเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาคร โดยเด็ดขาด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะทุเลาลง
3. งดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค Co-vid 19 ติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมโรคฯอย่างใกล้ชิด
4. หลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัดหรือที่ชุมนุมชนจำนวนมาก และดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวมอย่างเคร่งครัด
5. พนักงานแรงงานรายวัน ห้ามออกจากที่พักอาศัย(แคมป์พัก) ในช่วงเวลาดังแต่ 22.00น. ถึง 05.00น.
6. ผู้บริหาร โครงการจะต้องจัดเตรียมพื้นที่โครงการ รวมถึงที่พักอาศัย(แคมป์พัก) กรณีได้รับการร้องขอหรือมีคำสั่งจากหน่วยงานราชการในการขอเข้าตรวจเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ Co-vid 19

ประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นการสื่อสาร ไปยังผู้บริหาร พนักงาน พนักงานแรงงานรายวัน ทุกคนและทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และยึดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

(นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ข้อปฏิบัติการคัดกรอง จุดที่ 1
บ้านพักพนักงานรายวัน

ผู้รับผิดชอบ

1. ก่อนออกเดินทางไปยังโครงการ ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

พ่อบ้าน หรือ ผู้ช่วยพ่อบ้าน
หรือ จป. หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง

2. ผลตรวจอุณหภูมิร่างกายปกติ ให้เดินทางไปปฏิบัติงานได้

3. พนักงานรายวันที่มีผลตรวจอุณหภูมิร่างกาย $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$
ให้ปฏิบัติดังนี้

3.1 ให้หยุดพัก 5 นาที รอตรวจซ้ำ

3.2 ตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำ อีก 4-5 ครั้ง

3.3 ผลอุณหภูมิร่างกายปกติ ให้ไปปฏิบัติงานที่โครงการได้

3.4 ผลอุณหภูมิร่างกายยังไม่ปกติ ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 4 ต่อไป

พ่อบ้าน หรือ ผู้ช่วยพ่อบ้าน
หรือ จป. หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง

4. พนักงานรายวันที่ไม่ผ่านการคัดกรองตาม ข้อ 3.1 และ 3.2
ให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 ให้หยุดพักรักษาอาการที่บ้านพักพนักงานรายวัน (ใช้สิทธิลาป่วย)
สามารถเบิกยาสมาัญฯ ได้ที่ผู้ดูแลบ้านพักพนักงานรายวัน

4.2 สอบประวัติพนักงานรายวันที่หยุดพัก

4.3 หากหยุดพักรักษาอาการเกิน 2 วัน อาการยังไม่ทุเลา
ผู้ดูแลบ้านพักแรงงานหรือ จป. ต้องรายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทันทีเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป

พ่อบ้าน หรือ ผู้ช่วยพ่อบ้าน
หรือ จป. หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดำเนินการพิจารณาสั่งการ

นายอำนาจ บารมีเกื้อกูล
นายจักรกริช สังข์ทนต์



ข้อปฏิบัติการคัดกรอง จุดที่ 2
บริเวณก่อนเข้าโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ก่อนเข้าโครงการเพื่อปฏิบัติงาน ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

จป. หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง

2. ผลตรวจอุณหภูมิร่างกายปกติ ให้เข้าโครงการปฏิบัติงานได้

3. พนักงานรายวันที่มีผลตรวจอุณหภูมิร่างกาย $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$
ให้ปฏิบัติดังนี้

3.1 ให้หยุดพัก 5 นาที รอตรวจซ้ำ

3.2 ตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำ อีก 4-5 ครั้ง

3.3 ผลอุณหภูมิร่างกายปกติ ให้ไปปฏิบัติงานได้

3.4 ผลอุณหภูมิร่างกายยังไม่ปกติ ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 4 ต่อไป

จป. หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง

4. พนักงานรายวันที่ไม่ผ่านการคัดกรองตาม ข้อ 3.1 และ 3.2
ให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 ให้กลับบ้านพักพนักงานรายวัน เพื่อรักษาอาการ (ใช้สิทธิลาป่วย) สามารถเบิกยาสามัญฯ ได้ที่ผู้ดูแลบ้านพักพนักงานรายวัน

4.2 สอบประวัติพนักงานรายวันที่หยุดพัก

4.3 หากหยุดพักรักษาอาการเกิน 2 วัน อาการยังไม่ทุเลา

ผู้ดูแลบ้านพักแรงงานหรือ จป. ต้องรายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทันทีเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป

พ่อบ้าน หรือ ผู้ช่วยพ่อบ้าน
หรือ จป. หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดำเนินการพิจารณาสั่งการ

นายอำนาจ บารมีเกื้อกูล
นายจักรกริช สังข์ทนต์



WELL GRADED ENGINEERING PLC.

ประกาศ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฉบับที่ 4
เรื่อง ข้อปฏิบัติและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 แพร่กระจายในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด และมีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จึงกำหนดข้อปฏิบัติและการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ดังนี้

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามประกาศ ฉบับที่ 022 / 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
2. พนักงานต้องปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19
3. พนักงานแรงงานรายวัน ห้ามเข้า-ออกที่พักอาศัย(แคมป์พัก) ในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประเพณีต่างๆ
4. พนักงาน , พนักงานแรงงานรายวัน ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการประกาศนี้ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย

ทั้งนี้ขอให้พนักงาน , พนักงานแรงงานรายวัน ยึดถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

(นายเกรียงศักดิ์ บัวน่วม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



WELL GRADED ENGINEERING PLO.

ประกาศ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19

บริษัทฯ เข้าใจดีว่าพนักงานอยากจะจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่กับครอบครัว แต่ก็เป็นที่หวังว่าพนักงานจะติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในเวลานี้ ด้วยความปรารถนาดี บริษัทฯจึงขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนช่วยปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. หลักปฏิบัติทั่วไป

- 1.1 ก่อนออกเดินทาง หรือ ก่อนไปร่วมกิจกรรม ให้เตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้พอเพียงที่จะใช้ในช่วงวันหยุด หรือ เตรียมไปเผื่อบุคคลในครอบครัวด้วย เพื่อป้องกันร่วมกันทุกคน
- 1.2 สอบถามคนในครอบครัว หรือ คนที่ไปร่วมงานว่าไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ หรือ มีอาการไอ ไข้ เจ็บคอหรืออาการคล้ายโควิดหรือไม่ หากมีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยง ป้องกันให้มากที่สุด
- 1.3 หากคนในครอบครัวหรือคนที่มาร่วมงานมีความเสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพื้นที่(อสม., ผู้ใหญ่บ้าน) เข้าไปตรวจโดยเร็ว และรักษาระยะห่าง หรือ แยกห้องนอน เท่าที่ทำได้
*** ถ้าเป็นไปได้ หรือมีเด็กไปด้วย แนะนำให้เดินทางกลับทันที เพื่อป้องกัน เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน
- 1.4 การพูดคุยกับญาติหรือเพื่อน ให้รักษาระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่จับมือ ไม่อุ้มเด็กเล็ก ไม่สัมผัสเนื้อตัวกับบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น
- 1.5 ระหว่างร่วมกิจกรรม ทานอาหาร แนะนำให้นั่งห่างกันพอสมควร ใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ
- 1.6 หลีกเลี่ยง ไม่ไปร่วมกิจกรรม หรือ ชุมชน ที่มีคนจำนวนมาก
- 1.7 การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ไม่ควรไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ไม่ไปจังหวัดที่รัฐบาลประกาศว่ามีการระบาด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ไม่สัมผัสสิ่งของที่มีคนจับก่อนหน้า หลีกเลี่ยงคนที่มีน้ำมูก ไอ จาม
- 1.8 ติดตามข่าวสารของทางราชการตลอดเวลา เพื่อมีการระบาดในพื้นที่ใกล้ตัว จะได้ป้องกัน แก้ไขได้ทัน
- 1.9 แนะนำให้จัดบันทึกการเดินทาง สถานที่ไป หรือกิจกรรมที่ทำแต่ละวันไว้ด้วย เพื่อติดตามป้องกัน แก้ไขในกรณีติดเชื้อโควิด

2. หลักปฏิบัติเมื่อเจ็บป่วย

- 2.1 ถ้าตนเอง หรือคนในครอบครัว มีอาการไอ เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ อันเป็นอาการเบื้องต้นของการติดเชื้อโควิด-19 ให้แจ้ง อสม.,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว...(ถ้ามีอาการ ตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลที่รับตรวจ..ให้ค้นหารายชื่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดไว้ก่อนล่วงหน้าด้วย)

2.2 แจ้งให้บริษัทฯ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณอรรณพ ประทีป ณ ถลาง โทร. 086-919-4400 หรือ หัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการต้นสังกัดของตน) ทราบโดยเร็ว เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการรักษาทันเหตุการณ์ ถ้าติดเชื้อมีอาการเป็น ผู้ป่วยจะได้รับค่าจ้างจากบริษัทปีละ 30 วันทำงาน ถ้าเกิน 30 วัน จะได้รับจากประกันสังคม 50% ตามสิทธิปกติ จนกว่าจะกลับเข้ามาทำงานปกติ

3. หลักปฏิบัติเมื่อกลับมาทำงาน

- 3.1 ในแรกที่จะเข้าทำงาน หากมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หรือสงสัยมีอาการติดเชื้อ ให้โทรศัพท์แจ้งหัวหน้างาน หรือ ฝ่ายบุคคลทราบก่อนการเข้าทำงาน ไม่ต้องมาทำงาน ให้ไปพบแพทย์ตรวจก่อน
- 3.2 ถ้าติดเชื้อมีอาการป่วย จะได้รับค่าจ้างตามปกติ
- 3.3 หากไม่ป่วย แต่แพทย์มีความเห็นว่าต้องกักตัว 14 วัน บริษัทฯจะจ่ายค่าจ้างให้ 50% และไปรับจากประกันสังคม อีก 50%
- 3.4 หากไม่ป่วย ไม่ต้องกักตัว ให้นำใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบริษัทฯ (วันแรกที่ไปตรวจจะจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ)
- 3.5 ให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิหรือมาตรการป้องกันที่บริษัทฯกำหนดอย่างเคร่งครัด

4. บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน

- 4.1 ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสูง หรือพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศว่ามีการระบาด ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ สัมผัสผู้มีความเสี่ยง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงส่วนตัวอื่นใด ถือว่ามีเจตนากระทำความผิดตามประกาศของราชการ เป็นการจงใจทำให้สังคม ประเทศชาติเกิดความเสียหาย และเป็นฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของบริษัทกรณีร้ายแรง บริษัทฯลงโทษ ถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ
- 4.2 หากการติดเชื้อ หรือการกักตัวนั้นเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงส่วนตัว หรือ ฝ่าฝืนประกาศของราชการ หรือฝ่าฝืนประกาศของบริษัท บริษัทฯจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย หรือ ไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่กักตัว
- 4.3 ผู้ใดที่ติดเชื้อ แต่ไม่แจ้ง ไม่ตรวจตามที่บริษัทฯกำหนด เข้ามาทำงานแล้วแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น จนบริษัทฯ ต้องหยุดงาน ถือว่าผู้นั้นจงใจทำให้บริษัทฯเสียหาย ถือเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทฯจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ด้วยความปรารถนาดีต่อพนักงานทุกคน จึงขอให้พนักงานช่วยปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทฯกำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงานและครอบครัว รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของสังคม ประเทศชาติของเราร่วมกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ.....

(นายเกียรติศักดิ์ บัวน่วม)

กรรมการผู้จัดการ



WELL GRADED ENGINEERING CO.,LTD.

LM-PL001/63

เรียน พนักงานโครงการ และพนักงานรายวันทุกท่าน

เรื่อง ข้อปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2)

(สำหรับพนักงานรายวัน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด)

อ้างถึง 1. ข้อปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 1)

(สำหรับพนักงานรายวัน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจาย การติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงมีคำสั่งเพิ่มเติม ให้แรงงานต่างด้าวของ บริษัทฯ ปฏิบัติดังนี้

1. แรงงานต้องพักอาศัยในพื้นที่ที่บริษัทฯ จัดให้เท่านั้น (แคมป์พัก)
2. ห้ามแรงงานเดินทางไปพบปะสังสรรค์กับบุคคลภายนอก ในทุกกรณี
3. ห้ามแรงงานเดินทางออกนอกพื้นที่ทำงาน และ แคมป์พัก โดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ห้ามพนักงานที่เดินทางกลับต่างประเทศ กลับเข้ามาทำงานในบริษัท เป็นการชั่วคราว จนกว่าโรคระบาดจะคลี่คลาย
5. หากพนักงานฝ่าฝืนข้อปฏิบัติข้างต้น ถือว่า กระทำความผิดฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานร้ายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบต่อไป

บริษัทฯ ขอให้พนักงานรายวัน ถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


(นายวายุ ทองพูน)

รองกรรมการผู้จัดการ

23 มีนาคม 2563

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด

50/1203 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-9817992-4 แฟกซ์. 02-9817995



ภาคผนวกที่ 2.9

การอบรมความปลอดภัยของคนงาน

