

เอกสารระบบเตือนสัญญาณเตือนอันตรายที่ตัดระบบเชื้อเพลิง

51

52

2020-07-14

SIEMENS
PCS

InstantSD

push button	☐	HH Bearing 1 Vibration	☐	☐	☐
PB GT CJD	☐	HH Bearing 2 Vibration	☐	☐	☐
PB GT Skid	☐	Rotor Overspeed	☐	☐	☐
	☐	HH T7 Average	☐	☐	☐
	☐	T7 Max To Average	☐	☐	☐
	☐	T7 Min To Average	☐	☐	☐
Trip	☐	Bleed valve 1 not closed	☐	☐	☐
Rack CJP11	☐	Bleed valve 2 not closed	☐	☐	☐
ipped (Ext cause	☐	HH gear box case vibration	☐	☐	☐
ection Ch1	☐	LL Gas Fuel Pressure	☐	☐	☐
ection Ch2	☐	LL lube oil supply pressure	☐	☐	☐
on	☐	HH lube oil supply temperature	☐	☐	☐
ment	☐	HH Generator DE Vibration	☐	☐	☐
haust Diff Press	☐	HH Generator NDE Vibration	☐	☐	☐
on	☐	Rotating diode failure	☐	☐	☐
ency Pulsation	☐	CO2 jalusies inlet not open	☐	☐	☐
quency Pulsation	☐	CO2 jalusies outlet not open	☐	☐	☐
ency Pulsator	☐	LL GT Room Ven Fan Diff Pres	☐	☐	☐
quency Pulsat	☐	HH (5% LEL) level gas	☐	☐	☐
iled	☐	HH (5% LEL) level gas	☐	☐	☐
iled	☐	Fire detected	☐	☐	☐
ep 2	☐				

Click for details

Unload 90

Generator Protection Failure	☐	☐	☐
HH T52 Deviation	☐	☐	☐
HH Low Frequency Pulsation	☐	☐	☐
HH Medium Frequency Pulsation	☐	☐	☐
HH High Frequency Pulsation	☐	☐	☐
HH Bearing 1 Vibration	☐	☐	☐
HH Bearing 2 Vibration	☐	☐	☐
HH Gear Box Casing Vibration	☐	☐	☐
HH Air Intake Filter Diff Pressur	☐	☐	☐
HH Lube Oil Tank Pressure	☐	☐	☐
Long DC Run Time	☐	☐	☐
2 or 3 Lube Oil Groups Out Of Service	☐	☐	☐
HH Generator Stator Temp Ph 1	☐	☐	☐
HH Generator Stator Temp Ph 2	☐	☐	☐
HH Generator Stator Temp Ph 3	☐	☐	☐
HH Generator DE Vibration	☐	☐	☐
HH Generator NDE Vibration	☐	☐	☐
HH Drying System Temperature	☐	☐	☐
LL Compressor Inlet Temperature	☐	☐	☐

Unload 30

Air intake DP	☐	☐	☐
H T7 average	☐	☐	☐
T7 MAX to average deviation	☐	☐	☐
T7 MIN to average deviation	☐	☐	☐
LL gas fuel temperature	☐	☐	☐
LL gas fuel pressure	☐	☐	☐

GCB ESD

24-1 Overexcitation	☐	HIGS Arc Protection	☐
24-2 Overexcitation	☐	51GN Earth Current	☐
27-1 Undervoltage	☐	51V O/C ip	☐
27-2 Undervoltage	☐	59-1 Overvoltage	☐
27-59TN Generator protection	☐	59-2 Overvoltage	☐
27-59TN Generator protection	☐	59N Stator Earth Fault 95%	☐
32 Reverse Power Long-time	☐	81-1 Underfrequency f3	☐
40-1 Underexcitation	☐	81-2 Underfrequency f4	☐
40-2 Underexcitation	☐	81-3 Overfrequency f1	☐
40-3 Underexcitation	☐	81-4 Overfrequency f2	☐
40-4 Underexcitation	☐	87-1 Generator Diff Protection	☐
46 Unbalanced Load	☐	87-2 Generator Diff Protection	☐
46 Theta Unbalanced Load	☐	GCB ESD Underspeed Step 1	☐
50 Breaker Failure	☐	Generator Protection Customer	☐

Hardwire Trips

HH axial displacement	☐
HH axial displacement	☐
HH bearing 1 vibration	☐
HH bearing 2 vibration	☐
HH gear box casing vibration	☐
HH generator NDE vibration	☐
HH generator DE vibration	☐

GCB ES

Click for de

Ackn Pass

Reset Overspeed

Show Tags

บันทึกการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำ และระบบหม้อไอน้ำ

Approved by : Charut

Approved by : Charut

WATER ANALYSIS RECORD

Amata B.Grimm Power 5

Sampling Date : 21-Mar-23

Sampling Time : 14:00

Parameter	Demin Tank		Condensate		Feed Water		LP Boiler		HP Boiler		LP Sup Steam		HP Sup Steam		HP Sat Steam						
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target			
pH	7.02	6.5-7.5	9.60	9.0-9.6	9.56	9.0-9.6	9.58	9.52	9.3-10	9.60	9.55	9.2-9.8	9.50	9.51	9.0-9.6	9.55	9.56	9.0-9.6	-	-	9.0-9.6
Online pH			9.25	9.0-9.6	9.34	9.0-9.6	9.38	9.41	9.3-10	9.30	9.34	9.2-9.8							-	-	<20
Conductivity (µS/cm)	0.9	<1	13.45	<20	13.30	<20	24.78	20.51	<150	17.33	16.24	<150	13.87	13.52	<20	13.92	14.14	<20	-	-	<20
Online Conductivity		<0.2	13.13	<20	13.54	<20	25.78	20.31	<150	17.05	15.70	<150	14.19	11.61	<20	14.04	13.12	<20	-	-	<20
Cation Conductivity			0.340	<0.3									0.230	0.250	<0.3	0.290	0.290	<0.3			<0.3
Online-Cation Conductivity			0.326	<0.3									0.229	0.233	<0.3	0.285	0.288	<0.3	-	-	<0.3
Total Hardness (ppm)	Nil	Nil																			
Silica (ppm as SiO2)	0.006	<0.02	0.005	<0.02	0.006	<0.02	0.063	0.045	<8	0.062	0.045	<2	0.005	0.006	<0.02	0.006	0.007	<0.02	-	-	<0.02
Online Silica										0.036	0.041	<2				0.002	0.002	<0.02	-	-	<0.02
Total Iron (ppm as Fe)	0.005	<0.01	0.003	<0.01	0.007	<0.01	0.032	0.043	<0.5	0.005	0.007	<0.5	0.007	0.008	<0.01	0.007	0.008	<0.01	-	-	<0.01
Nalco 1700 (ppm) Elimin-ox			0.13	0.1-0.4	0.24	0.1-0.4															
Online DO (ppb)			-	<10	-	<7															
Phosphate (ppm)							2.4	2.6	2-10	1.59	1.17	1-4									
Parameter	Raw Water		Clarifier out		Make up Water		Service Water		MCW		Chiller		CCC System		Chemical consumption						
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	CCT	Target	CCC	Target	Actual	Target	HRSG	Previous	Today	Total	
pH Value	7.32	6.5-8.5	7.14	6.5-8.5	7.39	6.5-8.5	6.96	6.5-8.5	7.64	7.5-7.8	-	7.8-8.1	-	>8.5	-	>8.5	Nalco 1700	256	243	13	
Online pH	6.48	6.5-8.5	6.81	6.5-8.5					7.69	7.5-7.8	-	7.8-8.1					Ammonia	254	250	4	
Conductivity (µS/cm)	1051	<1250	1013	<1250	998	<1250	1021	<1250	4380	<5000	-	<5000	-	<5000	-	<5000	BT 3811	252	248	4	
Online Conductivity	986	<1250							4392	<5000	-	<5000					MCT	Previous	Today	Total	
Turbidity (NTU)	23.1	<100	2.18	<5	1.89	<5	1.24	<5	9.12	<20	-	<20					H2SO4	700	589	111	
Online Turbidity (NTU)	29.80	<100	1.69	<5													3DT 125	520	518	2	
Temperature (°C)									34.12								3DT 394	630	620	10	
Total Hardness (ppm as CaCO3)	150	<300	130	<300	135	<300	140	<300	515	<800	-	<800	-	<5	-	<5	NaOCl	1520	1020	500	
Ca Hardness (ppm as CaCO3)	110	<200	125	<200	100	<200	110	<200	410	<600	-	<600					60612	197	185	12	
Mg Hardness (ppm as CaCO3)	40		5	<150	35	<150	30	<150	105	<200	-	<200					CCT	Previous	Today	Total	
M-Alkalinity (ppm as CaCO3)	182		143		147	monitor	126	monitor	90	monitor	-	monitor					H2SO4	-	-	-	
Total Iron (ppm)	0.66	<5	0.16	<0.5	0.15	<0.5	0.12	<0.5	0.66	<3	-	<3	-	<3	-	<3	3DT 222	-	-	-	
Chloride (ppm)	225.35	<350	21.58	<350	209.75	<350	219.67	<350	937.89	<1100	-	<1100	-	<1100	-	<1100	NaOCl	-	-	-	
Nitrite (ppm)																					
Online ORP									-	monitor	-	monito		HRSG	% Blow down		Nalco 1700		35		
Silica (ppm)	24.8		19.7	<40	16.4	<40	18.7	<40	68.7	<150	-	<150	LP 51	off			Ammonia		100		
Total Dissolved Solid (ppm)	599.1	<750			558.9	<750	582.0	<750	2847	<3000	-	<3000	LP 52	off			BT 3811 LP 51		58		
Suspended Solid (ppm)	-				-	<5	-	<5	-	<20	-	<20	HP 51	off			BT 3811 LP 52		66		
Nitrite (ppm)													HP 52	off			BT 3811 HP 51		60		
ORC / TRC (ppm)	0.94	monitor	0.51	0.5-1.0	0.46	0.2-0.5	0.01	0.2-0.5	2.09	>1.5	-	0.2-0.5					BT 3811 HP 52		60		
Online 3DT125 (ppm)									9.07	5-20							Cooling system	% Blow down	MCT	Stroke pump	
Online 3DT394 (ppm)									11.49	10-25							MCT 5	off			
Online 3DT222 (ppm)																	50-25	off			
Cycle of concentration									4.1	4-5	-	5-7					H2SO4	90/90			
Langlier (LSI)									-0.18	0.5-0.5	-	5-7					3DT 125	50/50			
Phosphate (ppm)	5.35	Monitor	0.64	<0.75	0.54	<0.75			2.04	2-4	-	6-10					3DT 120	40/40			
Zinc (ppm)									1.96	0.5-3	-	0.5-3					NaOCl	60+43			
Manganese	0.143	Monitor	0.148	<0.15	0.152	<0.15			0.673	<0.6	-						CB70	50/100			
Ammonia (ppm)	5.35	Monitor	6.25	Monitor	5.45	Monitor			0.55	Monitor							CCT	Stroke pump			
																	H2SO4	90/100			
																	3DT 222	100/100			
																	NaOCl	50/50			

Checked by : Thitiporn

Approved by : Charut

ABP45-FM-LI-007-rev.00

WATER ANALYSIS RECORD

Amata B.Grimm Power 5

Sampling Date : 21-Apr-23

Sampling Time : 14:00

Parameter	Demin Tank		Condensate		Feed Water		LP Boiler		HP Boiler		LP Sup Steam		HP Sup Steam		HP Sat Steam					
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target	LP-1	LP-2	Target	HP-1	HP-2	Target		
pH	7.02	6.5-7.5	9.45	9.0-9.6	9.50	9.0-9.6	9.58	9.58	9.3-10	9.57	9.55	9.2-9.8	9.54	9.50	9.0-9.6	9.56			9.0-9.6	
Online pH			9.30	9.0-9.6	9.42	9.0-9.6	9.24	9.56	9.3-10	9.38	9.47	9.2-9.8					-	-		
Conductivity (µS/cm)	0.85	<1	14.77	<20	15.24	<20	18.83	29.56	<150	20.30	21.29	<150	14.78	14.87	<20	15.03	14.93	<20	-	<20
Online Conductivity		<0.2	14.31	<20	15.04	<20	19.91	30.06	<150	20.13	20.06	<150	15.56	13.41	<20	14.85	14.56	<20	-	<20
Cation Conductivity			0.240	<0.3									0.240	0.230	<0.3	0.200	0.370	<0.3	-	<0.3
Online-Cation Conductivity			0.265	<0.3									0.221	0.247	<0.3	0.171	0.360	<0.3	-	<0.3
Total Hardness (ppm)	Nil	Nil																		
Silica (ppm as SiO2)	0.006	<0.02	0.005	<0.02	0.006	<0.02	0.042	0.061	<8	0.035	0.064	<2	0.005	0.004	<0.02	0.005	0.005	<0.02	-	<0.02
Online Silica										0.031	0.052	<2				0.008	0.009	<0.02	-	<0.02
Total Iron (ppm as Fe)	0.006	<0.01	0.004	<0.01	0.005	<0.01	0.072	0.054	<0.5	0.008	0.002	<0.5	0.004	0.004	<0.01	0.005	0.004	<0.01	-	<0.01
Nalco 1700 (ppm) Elimin-ox			0.21	0.1-0.4	0.2	0.1-0.4														
Online DO (ppb)			-	<10	-	<7														
Phosphate (ppm)							2.5	2.2	2-10	2.17	1.99	1-4								
Parameter	Raw Water		Clarifier out		Make up Water		Service Water		MCW		Chiller		CCC System		Chemical consumption					
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	CCT	Target	CCC	Target	Actual	Target	HRSG	Previous	Today	Total
pH Value	7.30	6.5-8.5	7.15	6.5-8.5	7.42	6.5-8.5	6.93	6.5-8.5	7.44	7.5-7.8	-	7.8-8.1	-	> 8.5	-	> 8.5	Nalco 1700	225	220	5
Online pH	5.25	6.5-8.5	6.87	6.5-8.5					7.47	7.5-7.8	-	7.8-8.1					Ammonia	117	112	5
Conductivity (µS/cm)	1043	<1250	1056	<1250	1044	<1250	1029	<1250	4390	<5000	-	<5000	-	<5000	-	<5000	BT 3811	218	213	5
Online Conductivity	1072	<1250							4395	<5000	-	<5000					MCT	Previous	Today	Total
Turbidity (NTU)	11.4	<100	0.66	<5	1.21	<5	1.22	<5	8.06	<20	-	<20					H ₂ SO ₄	1667	1611	56
Online Turbidity (NTU)	11.80	<100	1.42	<5													3DT 125	530	525	5
Temperature (°C)									34.07		-						3DT 394	690	680	10
Total Hardness (ppm as CaCO3)	145	<300	140	<300	150	<300	150	<300	540	<800	-	<800	-	<5	-	<5	NaOCl	4660	4100	560
Ca Hardness (ppm as CaCO3)	110	<200	110	<200	105	<200	125	<200	420	<600	-	<600					50612	454	454	0
Mg Hardness (ppm as CaCO3)	35		30	<150	45	<150	25	<150	120	<200	-	<200					CCT	Previous	Today	Total
M-Alkalinity (ppm as CaCO3)	142		144		146	monitor	118	monitor	88	monitor	-	monitor					H ₂ SO ₄	-	-	-
Total Iron (ppm)	0.49	<5	0.11	<0.5	0.11	<0.5	0.14	<0.5	0.61	<3	-	<3	-	<3	-	<3	3DT 222	-	-	-
Chloride (ppm)	197.7	<350	214	<350	214	<350	221.09	<350	983.27	<1100	-	<1100					NaOCl	-	-	-
Nitrite (ppm)																				
Online ORP									-	monitor	-	monitor					HRSG	% Blow down		
Silica (ppm)	21.2		18.5	<40	19.5	<40	19.5	<40	78.1	<150	-	<150	LP 51	off			Nalco 1700			35
Total Dissolved Solid (ppm)	594.5	<750			584.6	<750	586.5	<750	2853.5	<3000	-	<3000	LP 52	off			Ammonia			100
Suspended Solid (ppm)	-				-	<5	-	<5	-	<20	-	<20	HP 51	off			BT 3811 LP 51			58
Nitrite (ppm)													HP 52	off			BT 3811 LP 52			60
ORC / TRC (ppm)	1.09	monitor	0.66	0.5-1.0	0.6	0.2-0.5	0.01	0.2-0.5	0.45	> 1.5	-	0.2-0.5					BT 3811 HP 51			60
Online 3DT125 (ppm)									8.97	5-20							BT 3811 HP 52			60
Online 3DT394 (ppm)									11.01	10-25										
Online 3DT222 (ppm)																				
Cycle of concentration									4.0	4-5	-	150-254								
Langley (LSI)									0.15	0.5- 0.5	-	0.5- 0.5								
Phosphate (ppm)	4.85	Monitor	0.52	<0.75	0.42	<0.75			2.98	2-4	-	6-10					NaOCl			60-43
Zinc (ppm)	0.122	Monitor	0.124	<0.15	0.127	<0.15			1.3	0.5-3	-	0.5-3					C ₈ H ₁₈ O			50/100
Manganese									0.52	< 0.6							H ₂ SO ₄			Stroke pump
Ammonia (ppm)	4.35	Monitor	4.55	Monitor	4.5	Monitor			0.55	Monitor							3DT 222			100/100
																	NaOCl			50/50

เอกสารแนบที่ 33

ระเบียบการปฏิบัติงานระบบน้ำดื่มหม้อไอน้ำ (ABP45-OI-001)

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 1 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Revision 03

เอกสารอ้างอิง

1. ABP4-G-T-PJ-0024-R1 Condensate Water System (BE)
2. ABP4-G-T-PJ-0023-R2 Boiler Feed water System (BD)

เอกสารสนับสนุน

-

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

-

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องทั้งในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการใช้พลังงาน.

ขอบเขต

วิธีการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานภายใน โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4&5

คำจำกัดความ

1. Condensate Water คือ น้ำที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ หลังจากที่มีการถ่ายเทความร้อนแฝง ไปสู่ ขบวนการผลิต
2. Feed Water System คือ ระบบป้อนน้ำเข้าสู่ขบวนการผลิต หม้อต้มไอน้ำ

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 2 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Revision 03

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อเตือนระวัง

1. ด้านความปลอดภัย
 - จัด E-log sheet มีชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - ท่อน้ำแตกหรือรั่ว ที่มีแรงดันน้ำสูงและมีความร้อนสูง กระแทกหรือสัมผัสถูกร่างกายทำให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - การปฏิบัติงานบนที่สูง ทำให้เกิดอันตราย พลัดตกจากที่สูง ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - Chemical รั่วไหล สัมผัสถูกร่างกายทำให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
2. ด้านสุขภาพอนามัย
 - ผลกระทบจากการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
 - การจัด E-log sheet มี Battery เสื่อมสภาพทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 - ท่อน้ำแตกหรือรั่ว ลงพื้นในปริมาณมากทำให้สิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้ำ
 - การ Isolate อุปกรณ์มีการใช้กระดาษทำให้ทรัพยากรมาผลิตกระดาษและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 - อุปกรณ์ เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ทำให้น้ำมันหกรั่วไหล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่

อุปกรณ์ PPE ขั้นพื้นฐานในการเข้าพื้นที่การผลิต ทั้งหมด คือ รองเท้านิรภัย แวนดานิรภัย หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว

ขั้นตอนที่ต้องสวม PPE เพิ่มเติม	รายการ PPE ที่ต้องสวมใส่	หมายเหตุ
การ Isolate valve	ถุงมือผ้า	
การจัด E-log sheet	Ear muff	

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 3 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

วิธีการปฏิบัติงาน

ABP4 - Condensate and Feed Water System

1. ข้อมูลทั่วไป (General)

Setting Limits

Designation	Instrument	Lower alarm	Normal values	Upper alarm	Extreme values
Condensate Hot well Level	40MAG10CL001/002/003	L -170 mm	-50 mm	H 152 mm	HH 252 mm LL -322 mm
CEP discharge pressure	40LCA30CP001	L 18.6barg	19.8-24.8 barg	H24.9barg	LL18.6 barg HH25.4 barg
CEP Outlet diff press	40LCA30FP001	L18.7	19.8-24.9 barg	H25.0 bar[g]	LL18.6 barg HH25.5 barg
Condensate water flow	40LCA40CF001	L56 t/h	-	H249 t/h	<56 t/h >249 t/h
CEP Current	40LCB11,12CE001		200-230A		>240A
HP BFP1,2,3 Discharge Pressure	04LAB21,22,23CP001	L92.2 barg (L limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	105 barg +/-3	H117 barg (H limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	HH 118 barg (HH limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)
HP Feed water Pressure	04LAB30CP001	L92.2barg	105 barg +/-3	-	If 100barg BU start.
HP Feed water pump current			22-30 A		> 40A
HP BFP1, 2, 3 Balancing Temp.	04LAC11,12,13CT004	L 25C	65-80 C	H 130C	HH 140C
HP BFP1, 2, 3 motor Winding temp. UVW.	04LAC11,12,13 CT001/002/003	L 30C	65-90C	H 135C	HH 140C
LP BFP1,2,3 Discharge Pressure	04LAB51,52,53CP001	L16.7 barg (L limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	21 barg +/-2	H25.5 barg (H limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	HH26.5 barg (HH limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)
LP Feed water Pressure	04LAB60CP001	L16.7 barg	21 barg +/-2	-	If 16.7 barg BU start.

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 4 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

Feed water tank level	40LAA10CL001/002	L-1177 mm.	50 mm.	H 152mm.	HH 304 mm. LL-1905
LP Feed water pump current			40-50A		>60A

2. ขั้นตอนการเตรียมระบบหลังจาก Drain น้ำ Condensate ใน Hot well.

2.1 การตรวจสอบความพร้อมโดยทั่วไป.

2.1.1.All Permit to work "Closed"	Time_____
2.1.2.All isolate list "Closed"	Time_____
2.1.3.All Hot well manhole "Closed"	Time_____
2.1.4.Demine water tank level >700 mm	Time_____

2.2 ตรวจเช็คตำแหน่งของวาล์วต่างๆดังนี้

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	Demine MU manual ISO-V ST40	00GCK44AA001	Open	
2	COND MU manual Bypass-V	40GCK44AA505	Close	
3	CEP 1 SUC ISO VLV	40LCA11AA001	Open	
4	CEP 1 SUC STR DRN VLV	40LCA11AA501	Close	
5	CEP 1 SUC VENT VLV	40LCA11AA601	Close	
6	CEP 1 DIS DRN VLV	40LCA21AA501	Close	
7	CEP 1 DIS ISO VLV	40LCA21AA002	Open	
8	CEP 1 BALANCE AIR ISO VLV	40LCA15AA001	Open	
9	CEP 2 SUC ISO VLV	40LCA12AA001	Open	
10	CEP 2 SUC STR DRN VLV	40LCA12AA501	Close	
11	CEP 2 SUC VENT VLV	40LCA12AA601	Close	
12	CEP 2 DIS DRN VLV	40LCA22AA501	Close	
13	CEP 2 DIS ISO VLV	40LCA22AA002	Open	
14	CEP 2 BALANCE AIR ISO VLV	40LCA16AA001	Open	
15	SEAL WTR ISO VLV	40LCA31AA001	Open	
16	SEAL WTR ISO VLV FOR VLV SEAL	40LCA36AA001	Open	
17	SEAL WTR ISO VLV FOR VAC BREAK VLV	40LCA34AA001	Open	
18	SAMPLING COND WTR ISO VLV	40QUA10AA801	Open	
19	CHEM DOS AMONIA ISO VLV	40QCA26AA201	AUTO	
20	CHEM DOS OXYGEN SCAVENGER ISO VLV	40QCA15AA201	AUTO	
21	COND GSC IN VLV	40LCA30AA001	Open	
22	COND GSC BYP VLV	40LCA35AA001	Close	
23	COND GSC OUT VLV	40LCA40AA001	Open	

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 5 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

24	FWT HEX COND IN ISO VLV	40LCA40AA003	Open
25	FWT HEX COND OUT ISO VLV	40LCA50AA004	Open
26	SPILL OVER -V	40LCA42AA201	AUTO
27	COND GSC IN WTR DRN VLV	40LCA30AA501	Close
28	COND GSC OUT DRN VLV	40LCA40AA501	Close
29	COND FWT HEX IN DRNVLV	40LCA40AA501	Close
30	COND FWT HEX OUT VNT VLV	40LCA50AA501	Close
31	DEA IN DRN VLV	04LCA50AA503	Close
32	DRN FLSH TNK DRN VLV	40MAL70AA513	Close
33	DRN DEMIN TO COND VLV	00GCK45AA501	Close
34	DRN MUW TO COND VLV	40GCK44AA501	Close
35	COND MU LEVEL CV MV	40GCK44AA201	Keep Manual- close
36	COND RECIRCULATION	40LCA41AA201	AUTO
37	FWT HEX CNT-V	40LCA45AA002	AUTO
38	FWT HEX COND OUT V-V	40LCA50AA601	Close
39	FWT HEX COND OUT V-V	40LCA50AA602	Close
40	DEARATOR LCVMV	40LCA50AA201	Keep Manual- close

2.3 ขั้นตอนการเติมน้ำ Hot well และ Feed water tank ดังนี้

- _____ 2.3.1 Manual เปิด COND MU LEVEL CV MV (40GCK44AA201) 5% หรือ Flow = 10 T/H เติมน้ำระดับน้ำ = -50mm. (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
- _____ 2.3.2 Demine MU control valve (40GCK44AA201) เข้า AUTO
- _____ 2.3.3 เปิด Valve Demine fill to discharge line CEP 00GCK45AA001 ให้ได้ประมาณ 5barg.
- _____ 2.3.4 ปิด Valve CEP DIS ISO VLV (40LCA21/22AA002) ของ Pump ที่ต้องการ start ตัวแรกให้เหลือ 1 รอบ
- _____ 2.3.5 Manual Start CEP ตัวที่ทำการหว่านแล้ว หลังจาก CEP ทำงานเลือก Auto และ Duty
- _____ 2.3.6 เปิด Valve CEP DIS ISO VLV (40LCA21/22AA002) ของ Pump ที่ทำการ start ให้ fully open
- _____ 2.3.7 ปิด Valve Demine fill to discharge line CEP 00GCK45AA001.
- _____ 2.3.8 Start Ammonia pumps 1 ตัว ที่ stroke 100%. เพื่อปรับค่า pH ให้ได้ค่าประมาณ 9.0 – 9.6.
- _____ 2.3.9 Start pumps oxygen scavenger 1 pump stroke 100% และตรวจเช็คให้ค่าประมาณ 1.0 ppm (preferred 1.5-2.0 ppm).

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 6 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

_____ 2.3.10 เมื่อได้ค่าตามต้องการแล้วให้เปิด DEARATOR Level CNT-V ประมาณ 5% (ให้ค่า COND MU flow 10 T/H) ให้ระดับน้ำ = 50 mm. (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

_____ 2.3.11 DEARATOR Level CNT-V เข้า AUTO.

_____ 2.3.12 Stop Ammonia pump และ oxygen scavenger

*จะ start pump อีกครั้งเมื่อมีการเติมน้ำเข้า Feed water tank.

3. ขั้นตอนการเตรียมระบบ Feed water pump และ Feed water.

3.1 การตรวจสอบความพร้อมโดยทั่วไป.

- _____ 3.1.1. All Permit to work "Closed" Time _____
- _____ 3.1.2. All isolate list "Closed" Time _____
- _____ 3.1.3. Feed water tank level 50 mm Time _____

3.2 การเตรียม LP FWP เข้าใช้งาน. (กรณี LP FWP1)

- _____ 3.2.1. "ปิด" LP FWP 1 SUC STR DRN VLV (04LAB41AA501)
- _____ 3.2.2. "เปิด" LP FWP 1 SUC VLV (04LAB41AA001)
- _____ 3.2.3. "เปิด" LP FWP 1 SUC VNT VLV (04LAB41AA601) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจากรัง "ปิด"
- _____ 3.2.4. "เปิด" LP FWP 1 DIS DRN VLV (04LAB51AA501) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจากรัง "ปิด"
- _____ 3.2.5. "เปิด" LP FWP 1 MIN FLW VLV (04LAB54AA010)
- _____ 3.2.6. "เช็ค" HRSG LP FWT INL block-V (41/42LAB50AA101) อยู่ในตำแหน่ง "ปิด"
- _____ 3.2.7. "เปิด" LP FWP 1 DIS ISO VLV (04LAB51AA002)
- _____ 3.2.8. ทำการ Manual start LP Feed water pump จำนวน 1 ตัว เพื่อ Circulate น้ำ ให้ได้คุณภาพตามค่า

ควบคุม

- _____ 3.2.9. "เปิด" LP FW Sampling VLV (04QUA20AA801) เพื่อตรวจเช็คคุณภาพน้ำ
- _____ 3.2.10. ควบคุมคุณภาพน้ำ Feed water ให้ได้คุณภาพดังนี้
 - PH 9.4-9.6.
 - Ect 0.2-0.5 ppm.

(ทำตามขั้นตอนซ้ำ 1-7 กรณี LP FWP2 และ 3 เข้าใช้งาน)

*หากไม่มีการ Drain น้ำในระบบ สามารถเริ่มทำตั้งแต่ข้อ 8

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	LP FWP 1 SUC STR DRN VLV	04LAB41AA501	Close	
2	LP FWP 1 SUC VLV	04LAB41AA001	Open	
3	LP FWP 1 SUC VNT VLV	04LAB41AA601	Close	
4	LP FWP 1 DIS DRN VLV	04LAB51AA501	Close	
5	LP FWP 1 MIN FLW VLV	04LAB54AA010	Open	
6	HRSG1 LP FWT INL block-V	41LAB50AA101	Close	
7	HRSG2 LP FWT INL block-V	42LAB50AA101	Close	

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมนัณ	Page 7 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

8	LP FWP 1 DIS ISO VLV	04LAB51AA002	Open	
9	LP FWP 2 SUC STR DRN VLV	04LAB42AA501	Close	
10	LP FWP 2 SUC VLV	04LAB42AA001	Open	
11	LP FWP 2 SUC VNT VLV	04LAB42AA601	Close	
12	LP FWP 2 DIS DRN VLV	04LAB52AA501	Close	
13	LP FWP 2 DIS ISO VLV	04LAB52AA002	Open	
14	LP FWP 2 MIN FLW VLV	04LAB55AA010	Open	
15	LP FWP 3 SUC STR DRN VLV	04LAB43AA501	Close	
16	LP FWP 3 SUC VLV	04LAB43AA001	Open	
17	LP FWP 3 SUC VNT VLV	04LAB43AA601	Close	
18	LP FWP 3 DIS DRN VLV	04LAB53AA501	Close	
19	LP FWP 3 DIS ISO VLV	04LAB53AA002	Open	
20	LP FWP 3 MIN FLW VLV	04LAB56AA010	Open	

NALCO Water
An Ecolab Company

Nalco Industrial Services (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok : President Tower, 10th Fl., No.973, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Rayong : 14/9 Rayong Highway 3191 Maptaphut, Muang, Rayong 21150.

13/12/2018

Table: Acceptable target of water quality control during start-up period.

	pH	Conductivity (uS/cm)	Fe (ppb)	Silica (ppb)	Eliminox (ppm)	Phosphate (ppm)	Cation Conductivity (uS/cm)
Demin	●	●	●	●			
	6.5-7.5	<1	<10	<20			
Feed water	●	●	●	●	●		
	9.0-9.6	<20	<10	<20	0.2-0.5		
LP Boiler	●	●	●	●		●	
	9.3-10.5	<150	<500	<1000		2-10	
HP Boiler	●	●	●	●		●	
	9.2-9.8	<150	<500	<1000		1-4	
LP Sup	●	●	●	●			●
	9.0-9.6	<20	<10	<20			< 0.6
HP Sup	●	●	●	●			●
	9.0-9.6	<20	<10	<20			< 0.6

3.3.6.เปิด HP FWP 1 DIS ISO VLV (04LAB21AA002) อย่างช้าๆ

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมนัณ	Page 8 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

3.3.7.เปิด HP FWP 1 MIN FLW VLV (04LAC24AA501)

(ทำตามขั้นตอนข้อที่ 3.3 กรณี HP FWP2 และ 3 เข้าใช้งาน)

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	HP FWP 1 SUC STR DRN VLV	04LAB11AA501	Close	
2	HP FWP 1 GSC DRN	04LAC11AA501	Close	
3	HP FWP 1 SUC VLV	04LAB11AA001	Open	
4	HP FWP 1 SUC WTR VNT VLV	04LAB11AA001	Close	
5	HP FWP 1 DIS ISO	04LAB21AA501/502	Close	
6	HP FWP 1 DIS ISO VLV	04LAB21AA002	Close	
7	HP FWP 1 MIN FLW VLV	04LAC24AA007	Open	
8	HP FWP 2 SUC STR DRN VLV	04LAB12AA501	Close	
9	HP FWP 2 GSC DRN	04LAC12AA501	Close	
10	HP FWP 2 SUC VLV	04LAB12AA001	Open	
11	HP FWP 2 SUC WTR VNT VLV	04LAB12AA001	Close	
12	HP FWP 2 DIS ISO	04LAB22AA501/502	Close	
13	HP FWP 2 DIS ISO VLV	04LAB22AA002	Close	
14	HP FWP 2 MIN FLW VLV	04LAC25AA007	Open	
15	HP FWP 3 SUC STR DRN VLV	04LAB13AA501	Close	
16	HP FWP 3 GSC DRN	04LAC13AA501	Close	
17	HP FWP 3 SUC VLV	04LAB13AA001	Open	
18	HP FWP 3 SUC WTR VNT VLV	04LAB13AA001	Close	
19	HP FWP 3 DIS ISO	04LAB23AA501/502	Close	
20	HP FWP 3 DIS ISO VLV	04LAB23AA002	Close	
21	HP FWP 3 MIN FLW VLV	04LAC26AA007	Open	

วิธีการปฏิบัติงาน

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 9 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

ABP5 - Condensate and Feed Water System

1. ข้อมูลทั่วไป (General)

Setting Limit

Designation	Instrument	Lower alarm	Normal values	Upper alarm	Extreme values
Condensate Hot well Level	50MAG10CL001/002/003	L-170 mm	-50 mm	H152 mm	HH252 mm LL-322 mm
CEP discharge pressure	50LCA30CP001	L18.6 barg	19.8-24.8 barg	H24.9 barg	LL18.6 barg HH25.4 barg
CEP Outlet diff press	50LCA30FP001	L18.7	19.8-24.9 barg	H25.0 barg	LL18.6 barg HH25.5 barg
Condensate water flow	50LCA40CF001	L56 t/h	-	H249 t/h	<56 t/h >249 t/h
CEP Current	50LCB11,12CE001		200-230A		>240A

Designation	Instrument	Lower alarm	Normal values	Upper alarm	Extreme values
HP BFP1,2,3 Discharge Pressure	05LAB21,22,23CP001	L92.2 barg (L limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	105 barg +/-3	H117 barg (H limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	HH118 barg (HH limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)
HP Feed water Pressure	05LAB30CP001	L92.2barg	105 barg+/-3	-	If 100barg BU start.
HP Feed water pump current			22-30A		>40A
HP BFP1, 2, 3 Balancing Temp.	05LAC11,12,13CT004	L 25°C	65-80C	H 130C	HH140C
HP BFP1, 2, 3 motor winding Temp.UVV.	05LAC11,12,13 CT001/002/003	L 30°C	65-90C	H 135C	HH 140C
LP BFP1,2,3 Discharge Pressure	05LAB51,52,53CP001	L16.7 barg (L limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	21 barg +/-2	H25.5 barg (H limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)	HH26.8 barg (HH limit +Deaerator Pressure 0.3 barg.)
LP Feed water Pressure	05LAB60CP001	L16.7 barg	21 barg +/-2	-	If 17.6barg BU start.

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 10 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

Feed water tank level	50LAA10CL001/002	L-1177 mm.	50 mm.	H152mm.	HH304 mm. LL-1905
LP Feed water pump current			40-50A		>60A

2. ขั้นตอนการเตรียมระบบหลังจาก Drain น้ำ Condensate ใน Hot well .

2.1 การตรวจสอบความพร้อมโดยทั่วไป.

2.1.1.All Permit to work "Closed"	Time_____
2.1.2.All isolate list "Closed"	Time_____
2.1.3.All Hot well manhole "Closed"	Time_____
2.1.4.Demine water tank level >700 mm	Time_____

2.2 ตรวจสอบตำแหน่งขอลาวต่างๆดังนี้

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	Demine MU manual ISO-V ST50	00GCK55AA001	Open	
2	COND MU manual Bypass-V	50GCK44AA505	Close	
3	CEP 1 SUC ISO VLV	50LCA11AA001	Open	
4	CEP 1 SUC STR DRN VLV	50LCA11AA501	Close	
5	CEP 1 SUC VENT VLV	50LCA11AA601	Close	
6	CEP 1 DIS DRN VLV	50LCA21AA501	Close	
7	CEP 1 DIS ISO VLV	50LCA21AA002	Open	
8	CEP 1 BALANCE AIR ISO VLV	50LCA15AA001	Open	
9	CEP 2 SUC ISO VLV	50LCA12AA001	Open	
10	CEP 2 SUC STR DRN VLV	50LCA12AA501	Close	
11	CEP 2 SUC VENT VLV	50LCA12AA601	Close	
12	CEP 2 DIS DRN VLV	50LCA22AA501	Close	
13	CEP 2 DIS ISO VLV	50LCA22AA002	Open	
14	CEP 2 BALANCE AIR ISO VLV	50LCA16AA001	Open	
15	SEAL WTR ISO VLV	50LCA31AA001	Open	
16	SEAL WTR ISO VLV FOR VLV SEAL	50LCA36AA001	Open	
17	SEAL WTR ISO VLV FOR VAC BREAK VLV	50LCA34AA001	Open	
18	SAMPLING COND WTR ISO VLV	50QUA10AA801	Open	
19	CHEM DOS AMONIA ISO VLV	50QCA26AA201	AUTO	
20	CHEM DOS OXYGEN SCAVENGER ISO VLV	50QCA15AA201	AUTO	
21	COND GSC IN VLV	50LCA30AA001	Open	
22	COND GSC BYP VLV	50LCA35AA001	Close	
23	COND GSC OUT VLV	50LCA40AA001	Open	
24	FWT HEX COND IN ISO VLV	50LCA40AA003	Open	
25	FWT HEX COND OUT ISO VLV	50LCA50AA004	Open	

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 11 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

26	SPILL OVER -V	50LCA42AA201	AUTO	
27	COND GSC IN WTR DRN VLV	50LCA30AA501	Close	
28	COND GSC OUT DRN VLV	50LCA40AA501	Close	
29	COND FWT HEX IN DRNVLV	50LCA40AA501	Close	
30	COND FWT HEX OUT VNT VLV	50LCA50AA501	Close	
31	DEA IN DRN VLV	05LCA50AA503	Close	
32	DRN FLSH TNK DRN VLV	50MAL70AA513	Close	
33	DRN DEMIN TO COND VLV	00GCK56AA501	Close	
34	DRN MUW TO COND VLV	50GCK44AA501	Close	
35	COND MU LEVEL CV MV	50GCK44AA201	Keep Manual- close	
36	COND RECIRCULATION	50LCA41AA201	AUTO	
37	FWT HEX CNT-V	50LCA45AA002	AUTO	
38	FWT HEX COND OUT V-V	50LCA50AA601	Close	
39	FWT HEX COND OUT V-V	50LCA50AA602	Close	
40	DEARATOR LCMV	50LCA50AA201	Keep Manual- close	

2.3 ขั้นตอนการเติมน้ำ HOT WELL และ Feed water tank ดังนี้

2.3.1 Manual เปิด COND MU LEVEL CV MV (50GCK44AA201) 5% หรือ Flow = 10 T/H เติมน้ำระดับน้ำ = -50mm. (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

2.3.2 Demine MU control v. (50GCK44AA201) เข้า AUTO

2.3.3 เปิด Valve Demine fill to discharge line CEP 00GCK56AA001 ให้ได้ประมาณ 5barg.

2.3.4 ปิด Valve CEP DIS ISO VLV (50LCA21/22AA002) ของ Pump ที่ต้องการ start ตัวแรกให้เหลือ 1 รอบ.

2.3.5 Manual Start CEP ตัวที่ทำการหิ้วส่วไว้ หลังจาก CEP ทำงานเลือก Auto และ Duty

2.3.6 เปิด Valve CEP DIS ISO VLV (50LCA21/22AA002) ของ Pump ที่ทำการ start ให้ fully open

2.3.7 ปิด Valve Demine fill to discharge line CEP 00GCK56AA001.

2.3.8 Start Ammonia pumps 1 ตัว ที่ stroke 100%.เพื่อปรับค่า pH ให้ได้ค่าประมาณ 9.0 – 9.6.

Approve by: (Narong Boonkhum)

Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 12 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System		Revision 03

2.3.9 Start pumps oxygen scavenger 1 pump stroke 100% และตรวจเช็คให้ค่าประมาณ 1.0 ppm (preferred 1.5-2.0 ppm).

2.3.10 เมื่อได้ค่าน้ำตามต้องการแล้วให้เปิด DEARATOR Level CNT-V ประมาณ 5% (ให้ค่า COND MU flow 10 T/H) ให้ระดับน้ำ = 50 mm. (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

2.3.11 DEARATOR Level CNT-V เข้า AUTO

2.3.12 Stop Ammonia pump และ oxygen scavenger

*จะ start pump อีกครั้งเมื่อมีการเติมน้ำเข้า Feed water tank.

3. ขั้นตอนการเตรียมระบบ Feed water pump และ Feed water.

3.1 การตรวจสอบความพร้อมโดยทั่วไป.

3.1.1. All Permit to work "Closed" Time _____

3.1.2. All isolate list "Closed" Time _____

3.1.3. Feed water tank level 50 mm Time _____

3.2 การเตรียม LP FWP เข้าใช้งาน. (กรณี LP FWP1)

3.2.1. "ปิด" LP FWP 1 SUC STR DRN VLV (04LAB41AA501)

3.2.2. "เปิด" LP FWP 1 SUC VLV (05LAB41AA001)

3.2.3. "เปิด" LP FWP 1 SUC VNT VLV (05LAB41AA601) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจก "ปิด"

3.2.4. "เปิด" LP FWP 1 DIS DRN VLV (05LAB51AA501) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจก "ปิด"

3.2.5. "เปิด" LP FWP 1 MIN FLW VLV (05LAB54AA010)

3.2.6. "เช็ค" HRSG LP FWT INL block-V (51/52LAB50AA101) อยู่ในตำแหน่ง "ปิด"

3.2.7. "เปิด" LP FWP 1 DIS ISO VLV (05LAB51AA002)

3.2.8. ทำการ Manual start LP Feed water pump จำนวน 1 ตัว เพื่อ Circulate น้ำ ให้ได้คุณภาพตามค่า

ควบคุม

3.2.9. "เปิด" LP FW Sampling VLV (05QUA20AA801) เพื่อตรวจเช็คคุณภาพน้ำ

3.2.10. ควบคุมคุณภาพน้ำ Feed water ให้ได้คุณภาพดังนี้

PH 9.4-9.6.

ELIMINOX 0.2-0.5 ppm.

(ทำตามขั้นตอนซ้ำ 1-7 กรณี LP FWP2 และ 3 เข้าใช้งาน)

*หากไม่มีการ Drain น้ำในระบบ สามารถเริ่มทำตั้งแต่ข้อ 8 *

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
-----	-------------	-----	----------------	-----------

Approve by: (Narong Boonkhum)

Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 13 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Revision 03	

1	LP FWP 1 SUC STR DRN VLV	05LAB41AA501	Close
2	LP FWP 1 SUC VLV	05LAB41AA001	Open
3	LP FWP 1 SUC VNT VLV	05LAB41AA601	Close
4	LP FWP 1 DIS DRN VLV	05LAB51AA501	Close
5	LP FWP 1 MIN FLW VLV	05LAB54AA010	Open
6	HRSG1 LP FWT INL block-V	51LAB50AA101	Close
7	HRSG2 LP FWT INL block-V	52LAB50AA101	Close
8	LP FWP 1 DIS ISO VLV	05LAB51AA002	Open
9	LP FWP 2 SUC STR DRN VLV	05LAB42AA501	Close
10	LP FWP 2 SUC VLV	05LAB42AA001	Open
11	LP FWP 2 SUC VNT VLV	05LAB42AA601	Close
12	LP FWP 2 DIS DRN VLV	05LAB52AA501	Close
13	LP FWP 2 DIS ISO VLV	05LAB52AA002	Open
14	LP FWP 2 MIN FLW VLV	05LAB55AA010	Open
15	LP FWP 3 SUC STR DRN VLV	05LAB43AA501	Close
16	LP FWP 3 SUC VLV	05LAB43AA001	Open
17	LP FWP 3 SUC VNT VLV	05LAB43AA601	Close
18	LP FWP 3 DIS DRN VLV	05LAB53AA501	Close
19	LP FWP 3 DIS ISO VLV	05LAB53AA002	Open
20	LP FWP 3 MIN FLW VLV	05LAB56AA010	Open

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมณี	Page 14 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Revision 03	

NALCO Water
An Ecolab Company

Nalco Industrial Services (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok : President Tower, 10th Fl., No.973, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Rayong : 14/9 Rayong Highway 3191 Maptaphut, Muang, Rayong 21150.

13/12/2018

Table: Acceptable target of water quality control during start-up period.

	pH	Conductivity (uS/cm)	Fe (ppb)	Silica (ppb)	Eliminox (ppm)	Phosphate (ppm)	Cation Conductivity (uS/cm)
Demin	6.5-7.5	<1	<10	<20			
Feed water	9.0-9.6	<20	<10	<20	0.2-0.5		
LP Boiler	9.3-10.5	<150	<500	<1000		2-10	
HP Boiler	9.2-9.8	<150	<500	<1000		1-4	
LP Sup	9.0-9.6	<20	<10	<20			< 0.6
HP Sup	9.0-9.6	<20	<10	<20			< 0.6

3.3 การเตรียม HP FWP เข้าใช้งาน.(กรณี HP FWP1)

- _____ 3.3.1.เปิด HP FWP 1 SUC STR DRN VLV (05LAB11AA501)
- _____ 3.3.2.เปิด HP FWP 1 GSC DRN VLV (05LAC11AA501)
- _____ 3.3.3.เปิด HP FWP 1 SUC VLV(05LAB11AA001)
- _____ 3.3.4.เปิด HP FWP 1 SUC WTR VNT VLV (05LAB11AA001) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจากรัง " ปิด"
- _____ 3.3.5.เปิดHP FWP 1 DIS DRN 1ST VLV (05LAB21AA501/502) จนกระทั่งไม่มีอากาศออกจากรัง " ปิด"
- _____ 3.3.6.เปิด HP FWP 1 DIS ISO VLV (05LAB21AA002) อย่างช้าๆ
- _____ 3.3.7.เปิด HP FWP 1 MIN FLW VLV (05LAC24AA501)

(ทำตามขั้นตอนข้อที่ 3.3 กรณี HP FWP2 และ 3 เข้าใช้งาน)

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

	Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)	Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 15 of 15
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-001	Condensate and Feed Water System	Thirawat Sangmani ธีรวัฒน์ แสงมนต์	Revision 03

No.	Description	KKS	Normal status.	Check by.
1	HP FWP 1 SUC STR DRN VLV	05LAB11AA501	Close	
2	HP FWP 1 GSC DRN	05LAC11AA501	Close	
3	HP FWP 1 SUC VLV	05LAB11AA001	Open	
4	HP FWP 1 SUC WTR VNT VLV	05LAB11AA001	Close	
5	HP FWP 1 DIS ISO	05LAB21AA501/502	Close	
6	HP FWP 1 DIS ISO VLV	05LAB21AA002	Close	
7	HP FWP 1 MIN FLW VLV	05LAC24AA007	Open	
8	HP FWP 2 SUC STR DRN VLV	05LAB12AA501	Close	
9	HP FWP 2 GSC DRN	05LAC12AA501	Close	
10	HP FWP 2 SUC VLV	05LAB12AA001	Open	
11	HP FWP 2 SUC WTR VNT VLV	05LAB12AA001	Close	
12	HP FWP 2 DIS ISO	05LAB22AA501/502	Close	
13	HP FWP 2 DIS ISO VLV	05LAB22AA002	Close	
14	HP FWP 2 MIN FLW VLV	05LAC25AA007	Open	
15	HP FWP 3 SUC STR DRN VLV	05LAB13AA501	Close	
16	HP FWP 3 GSC DRN	05LAC13AA501	Close	
17	HP FWP 3 SUC VLV	05LAB13AA001	Open	
18	HP FWP 3 SUC WTR VNT VLV	05LAB13AA001	Close	
19	HP FWP 3 DIS ISO	05LAB23AA501/502	Close	
20	HP FWP 3 DIS ISO VLV	05LAB23AA002	Close	
21	HP FWP 3 MIN FLW VLV	05LAC26AA007	Open	

Approve by: [Narong Boonkhum]

Date: [20/04/2020]

ABP-FM-QP-001-rev.02

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ

รายงานการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

ของ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
เลขที่ 700/696 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หม้อน้ำหมายเลข 17481-1 (HRSG51)

วันที่เข้าทำการตรวจทดสอบ 12 เมษายน 2566

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สปก.๑-๒๘

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ข้าพเจ้า.....นายพจน์ คุณชนเสถียร..... e-mail : phot.k@bgrimpower.com.....
โทรศัพท์.....081-7612320..... ได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน เลขทะเบียน.....6-64-1133..... หม้ออายุวันที่.....31 ธันวาคม 2568.....
ได้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลโรงงาน: บริษัท.....บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด..... ทะเบียนโรงงาน เลขที่.....น.๘๘-๒/๒๕๕๖-นอน..... สถานที่ตั้ง.....700/696 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้..... ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี..... 20000 (038-193286)..... จำนวนหม้อน้ำทั้งหมด.....2 เครื่อง.....	ข้อมูลหม้อน้ำ : ผู้ผลิต.....Vogt Power International..... รุ่นหม้อน้ำ..... หมายเลขหม้อน้ำ.....HRSG51 (17481-1)..... Serial Number.....17481-1A, 17481-1B, 17481-1C..... อัตราการผลิตไอน้ำ.....HP 66.371 /LP 12.108 kg/h..... วันที่ตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด.....16 เมษายน 2565..... วันที่ตรวจ.....12 เมษายน 2566.....
--	---

๑.สรุปผลการตรวจภายนอกหม้อน้ำ

☒ เรียบร้อย

☐ บกพร่อง (ระบุ)

การตรวจสอบสภาพภายนอกหม้อน้ำไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลต่อความปลอดภัยและการใช้งาน

(ลงชื่อ)

(.....นายพจน์ คุณชนเสถียร.....)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(.....นาย.ธนวัชร ดีแสน.....)

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



๒.สรุปผลการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ / เครื่องมือ	สภาพการตรวจสอบ		หมายเหตุ
เครื่องสูบล้างหม้อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ลิ้นนิรภัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบควบคุมระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบไล่อากาศอัตโนมัติ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์ตรวจหาเปลวไฟ	☐ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบการตัดจ่ายเชื้อเพลิง	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบสัญญาณเตือนภัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
มาตรวัดความดันไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบควบคุมความดันไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ลิ้นระบายใต้ท้องหม้อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบ Interlock ต่างๆ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและความเห็นของวิศวกร

หมายเหตุ : 1.มีการทดสอบการทำงานของ Safety valves ด้วยวิธี EVT เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผลการตรวจสอบไม่พบค่าเบี่ยงเบนเกินมาตรฐานที่กำหนดของ ASME Code และกฎหมายฯ

2.หม้อน้ำหมายเลข HRSG51 (17481-1) ได้มีการตรวจสอบภายใน (Hydrostatic Test) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง

3.การตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ HRSG51 ไม่พบข้อบกพร่อง

ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของวิศวกรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

(ลงชื่อ) _____
(นายพจน์ คูธนเสถียร.....)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) _____
(นาย ธนวัชร ดีแสน.....)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



รูปถ่ายวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด





หม้อน้ำหมายเลข HRSG51 (17481-1)

เข้าทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

(นายพจน์ คูธนเสถียร / วก.1002)






HRSG51 Boiler name plate

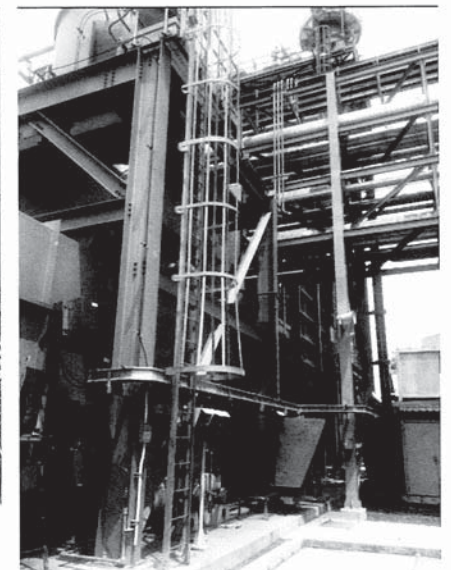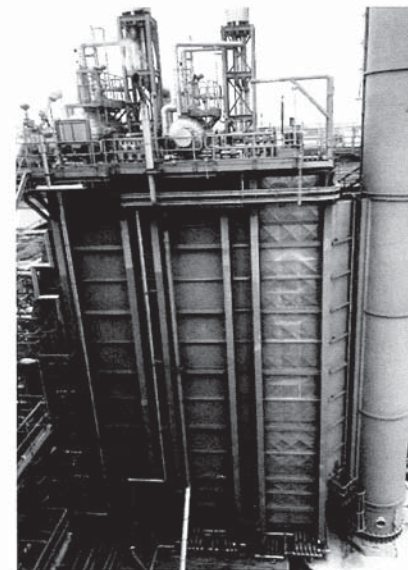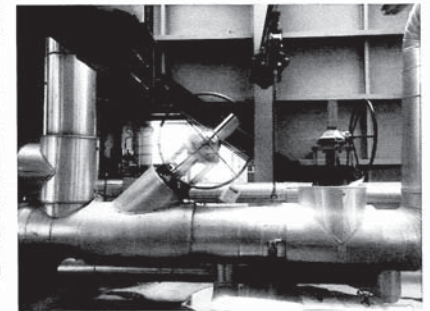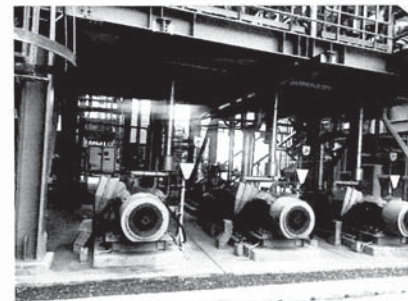





ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

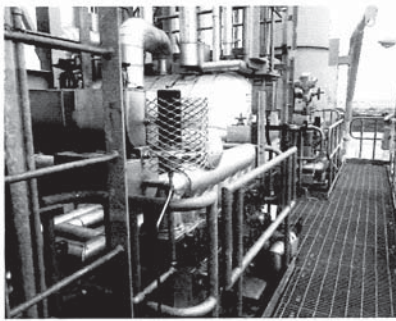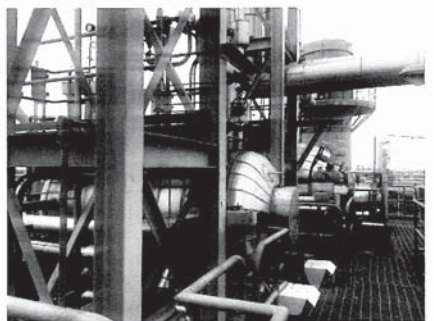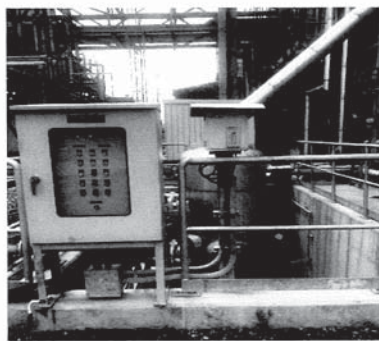

ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG51

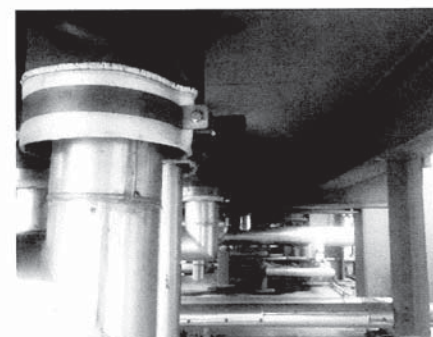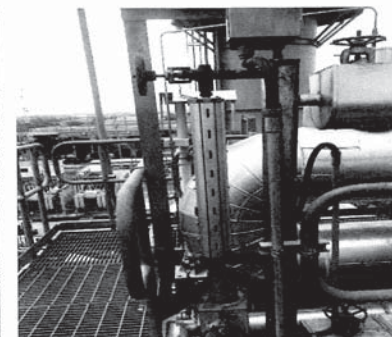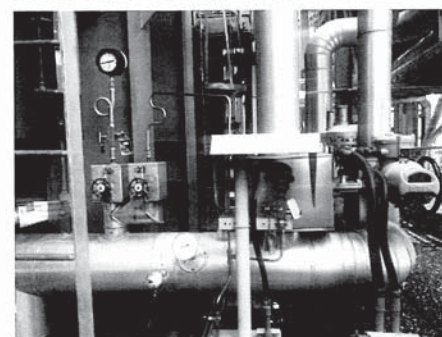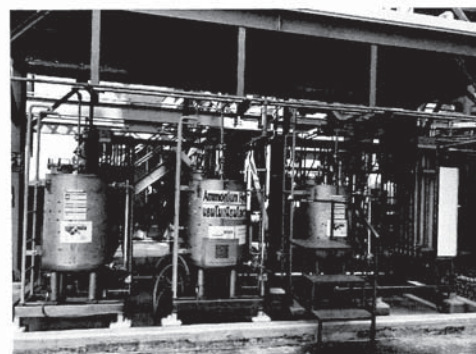

ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG51

สำนักงานเทคโนโลยีและความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

การตรวจสอบ (Inspection)

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

หม้อไอน้ำหมายเลข HRSG51 ตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

1. ประวัติการชำรุดและการซ่อมแซมโครงสร้าง อุปกรณ์ และการล้างถังภายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ลักษณะการชำรุด - ซ่อมโดย - เมื่อ -
2. ลักษณะการชำรุด - ซ่อมโดย - เมื่อ -
3. วิศวกรควบคุมและอำนาจการซ่อมชื่อ - ทะเบียนเลขที่ -

2. การตรวจสอบสภาพภายนอก (External Inspection)

การติดตั้งหม้อไอน้ำ ปกติ การติดตั้งระบบท่อ ปกติ
สภาพภายนอกหม้อไอน้ำ (โครงสร้าง) ปกติ
การติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไป หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง (ระบุ)

3. การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection)

3.1. สภาพผิวด้านสัมผัสไฟ

สภาพท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ท่อน้ำ ผงังเตา ผงังหน้า-หลัง Smoke Chamber ปูนทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน (ลักษณะการชำรุด เสียรูป แตกร้าว รั่วซึม กัดกร่อน ขี้เขม่าขาว หรือความผิดปกติต่างๆ)

3.2. สภาพผิวด้านสัมผัสน้ำ

สภาพท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ท่อน้ำ ผงังเตา ผงังหน้า-หลัง Upper Drum Lower Drum (ลักษณะการชำรุด เสียรูป แตกร้าว รั่วซึม กัดกร่อน ตะกรัน โคลนตะกอน การอุดตันของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ)

4. การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างโดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Test)

กรณี ☐ สร้างใหม่ ☐ ประจำปี ☐ คัดแปลง ☐ ซ่อมแซม ☐ เปลี่ยนโครงสร้าง ☒ อื่นๆ ได้รับการขยายฯ
ทดสอบที่ความดัน ผลการทดสอบ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
หากควรปรับปรุง สาเหตุ วิธีการปรับปรุง
การทำงานของลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ผลการทดสอบ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
หากควรปรับปรุง สาเหตุ วิธีการปรับปรุง

5. การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย (Function Test)

- การทำงานของเกจวัดความดัน ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (feed water pump) ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องควบคุมระดับน้ำ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของระบบสัญญาณเตือนภัย ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง


- หลอดแก้วบอกระดับน้ำ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของลิ้นกักกลับ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง

6. การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ทั่วไป (General Equipment)


- การทำงานของเกจวัดอุณหภูมิปล่อย ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- ภาชนะเก็บน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำหรือถังคอนเดนเสทรวมถึงระบบท่อ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อไอน้ำ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- ฉนวนทั้งหมด (ตัวหม้อไอน้ำ ระบบท่อ อุปกรณ์การใช้ไอน้ำ ฯลฯ) ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- วาล์วถ่วงน้ำ (Blow down valve) ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง
- ลิ้นหรือวาล์วที่ติดตั้งกับหม้อไอน้ำ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง

7. รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

1. เสนอแนะปรับปรุงแก้ไข steam insulation ที่ชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและ insulation จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
เมื่อมีน้ำฝนเข้าไปด้านใน
2.
3.

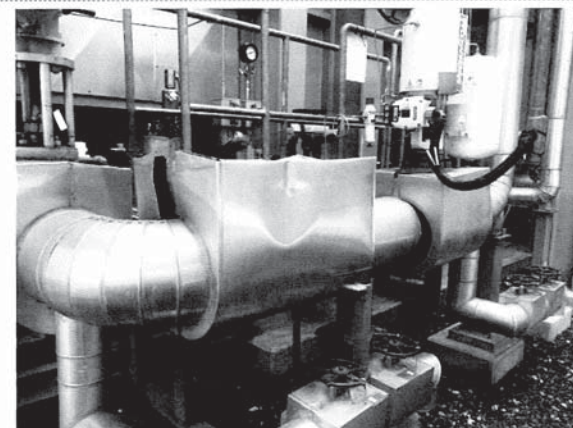

[Handwritten signature]

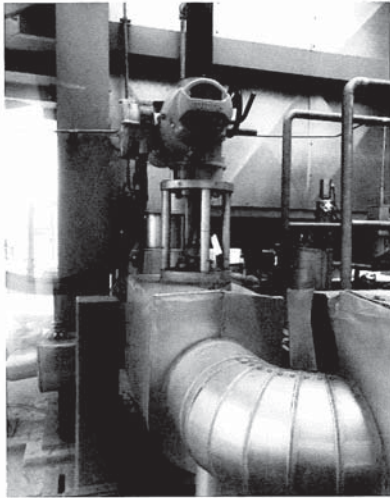

8.สรุปผลการตรวจสอบ

- 8.1. ขอรับรองว่าหม้อไอน้ำเครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัยภายใต้ความดันใช้งานไม่เกิน 79.0 barg / 8.3 barg (HP/LP) เป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตรวจสอบ
- 8.2. ขอรับรองว่าหม้อไอน้ำเครื่องนี้ตามข้อ 8.1 และผู้ประกอบกิจการโรงงานได้แก้ไขตามรายละเอียดดังนี้แล้ว
- 8.2.1.....
- 8.2.2.....
- 8.2.3.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน

..... (วิศวกรผู้ตรวจสอบ)
(นาย พงษ์ ฤทธิเดช)

ที่ อภ ๐๓๑๖/ ๑๘๘๖๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด

อ้างถึง หนังสือของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนหัวฝ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘๒/๒๕๕๖ นอน. ได้ยื่นคำขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ท่านตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ดังนี้

ลำดับ	หม้อไอน้ำ หมายเลข	หม้อไอน้ำหมายเลข เครื่อง	อัตราการผลิตไอน้ำ (ตันต่อชั่วโมง)	ตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำ ครั้งต่อไป ไม่เกินวันที่	หมายเหตุ
๑	HRS651	17481-1	๗๘.๔๗๐๔	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	๓ ปี
๒	HRS652	17481-2	๗๘.๔๗๐๔	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	๓ ปี

ทั้งนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด และเมื่อครบกำหนดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำดังกล่าวแล้ว ท่านจะต้องยื่นคำขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งอีกครั้งต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสุภกิจ บุญศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๖ ต่อ ๒๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๖ ต่อ ๒๓๐๔

ประณิธิอิเล็กทรอนิกส์ sarabangadiv@mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวหน้า ประเทศมั่นคงก้าวไกล ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



.....

จี.ภา.๐๓๑๐ / ๙๔.๖๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

เรียน นายพจน์ คูทองเสถียร

ตามที่ท่าน นายพจน์ คูทองเสถียร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒ ประเภท ภูมิวิศวกร สาขาเบี่ยง วก.๑๐๐๒ ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนไว้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายพจน์ คูทองเสถียร ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๑๑๑๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมีการต่ออายุเป็นที่ยอมรับแล้ว

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ “ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน” เพื่อให้วิศวกรตรวจทดสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรณ์ สุขยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย



(https://www.dew.go.th/res_en/enenocv/)

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๑๔๒

<http://www.dew.go.th/>

นางสาว อ.ก.บ.ค.



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ในสำคัญ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบหม้อน้ำ

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๓๗๕

นี้เพื่อเจาให้ นายพจน์ คูทองเสถียร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๙-๒๐๐๗-๐๖๐๗๕๐๕๑๑

ที่อยู เลขที่ ๒๑๒/๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสุตา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เป็นผู้คนผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการบริหารความปลอดภัย การควบคุมมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน และภาชนะรับความดัน ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และกรอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายศักดิ์ศิริ สุขยาว)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน




ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thailand Professional Engineering License

ชื่อและนามสกุล



ให้รับรองความ



วิศวกรผู้ตรวจสอบ)

12/04/2023

รายงานการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

ของ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

เลขที่ 700/696 หมู่ 7 ต.คอนหัวพ้อ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หม้อน้ำหมายเลข 17481-2 (HRSG52)

วันที่เข้าทำการตรวจทดสอบ 12 เมษายน 2566

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ
และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ข้าพเจ้า นายพจน์ คูณหงส์เกียรติ..... e-mail : ...phot.k@bgrimpower.com.....
โทรศัพท์ 081-7612320..... ได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน เลขทะเบียน 6-64-1133..... หมอดำเนินวันที่ 31 ธันวาคม 2568.....
ได้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลโรงงาน:	ข้อมูลหม้อน้ำ :
บริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด.....	ผู้ผลิต Vogt Power International.....
ทะเบียนโรงงาน เลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖ นอน.....	รุ่นหม้อน้ำ.....
.....	หมายเลขหม้อน้ำ HRSG52 (17481-2)
สถานที่ตั้ง 700/696 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	Serial Number 17481-2A, 17481-2B, 17481-2C
ชลบุรี ต. คอนหัวพ้อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี.....	อัตราการผลิตไอ HP 66.371 /LP 12.108 kg/h
20000 (038-193286)	วันที่ตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด 13 เมษายน 2565
จำนวนหม้อน้ำทั้งหมด 2 เครื่อง	วันที่ตรวจ 12 เมษายน 2566

๑.สรุปผลการตรวจภายนอกหม้อน้ำ

☒ เรียบร้อย

☐ บกพร่อง (ระบุ)

การตรวจสอบสภาพภายนอกหม้อน้ำไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลต่อความปลอดภัยและการใช้งาน

(ลงชื่อ)
(.....นายพจน์ คูณหงส์เกียรติ.....)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)
(.....นาย.ธนวัชร ดีแสน.....)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



๒.สรุปผลการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ / เครื่องมือ	สภาพการตรวจสอบ		หมายเหตุ
เครื่องสูบล้างหม้อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ลิ้นนํ้ารัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบควบคุมระดับน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบไล่อากาศอัตโนมัติ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์ตรวจหาเปลวไฟ	☐ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบการตัดจ่ายเชื้อเพลิง	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบสัญญาณเตือนภัย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
มาตรวัดความดันไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบควบคุมความดันไอน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ลิ้นระบายใต้ท้องหม้อน้ำ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	
ระบบ Interlock ต่างๆ	☒ เรียบร้อย	☐ บกพร่อง	

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและความเห็นของวิศวกร

หมายเหตุ : 1.หม้อน้ำหมายเลข HRS52 (17481-2) ได้มีการตรวจสอบภายใน (Hydrostatic test) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565

ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง

2.มีการทดสอบการทำงานของ Safety valves ด้วยวิธี FVT เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผลการตรวจสอบไม่พบค่าเบี่ยงเบนเกินมาตรฐานที่กำหนดของ ASME Code และกฎหมาย

3.การตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ HRS52 ไม่พบข้อบกพร่อง

ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของวิศวกรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

(ลงชื่อ)
(.....นายพจน์ คูหนองเสถียร.....)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)
(.....นาย.ธนวัชร ดีแสน.....)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน




รูปถ่ายวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด


หม้อน้ำหมายเลข HRS52 (17481-2)

เข้าทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566




.....
(นายพจน์ คูหนองเสถียร / วท.1002

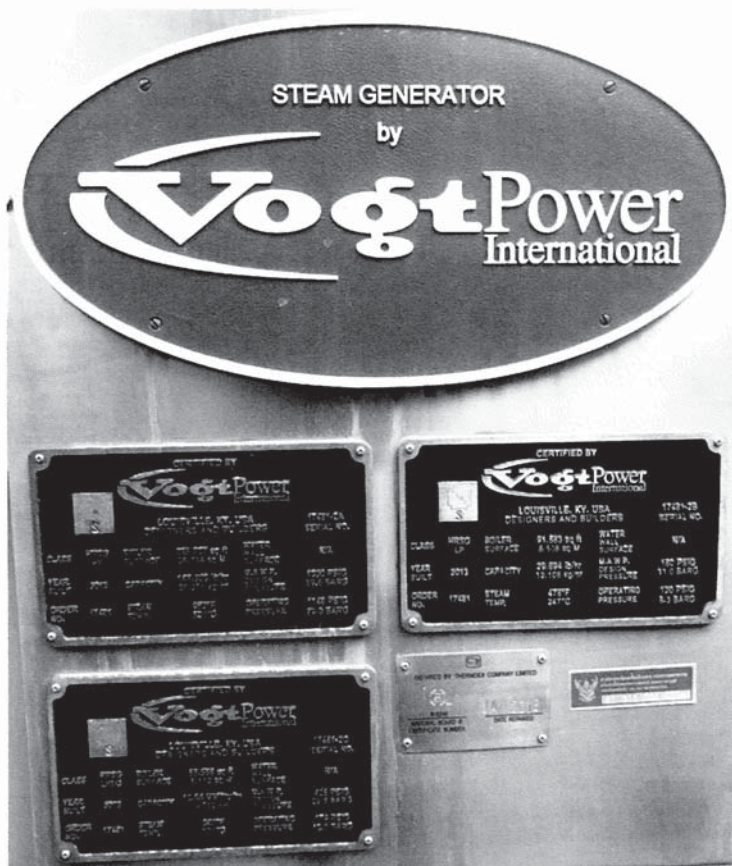

HRSG52 Boiler name plate



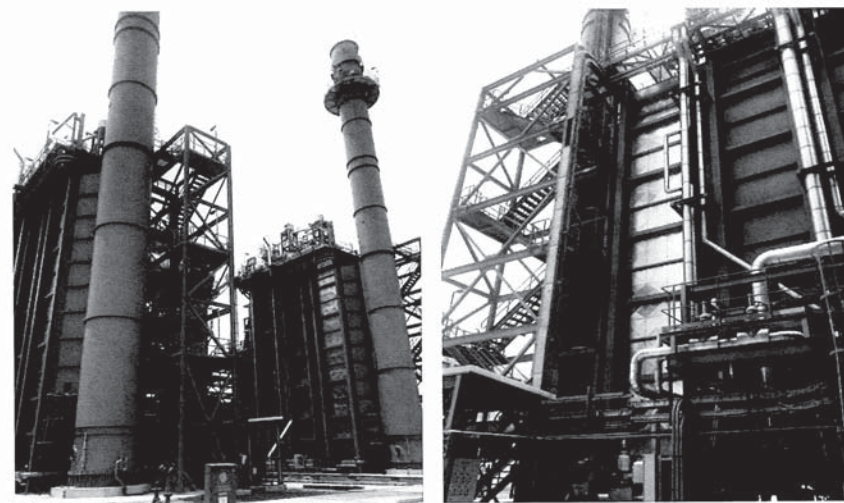


ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG52

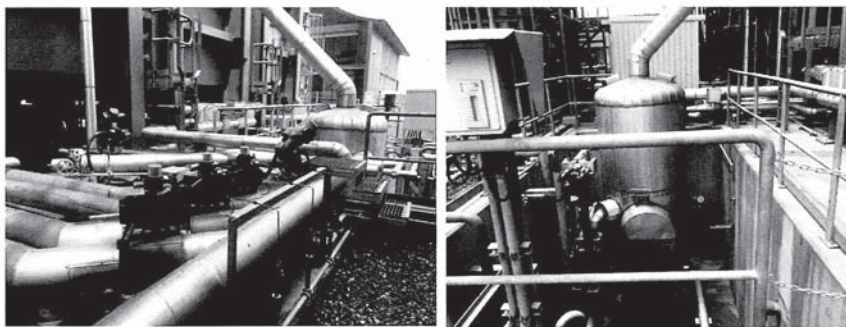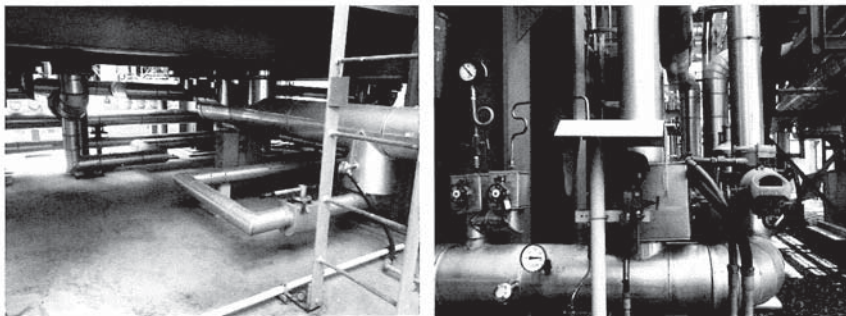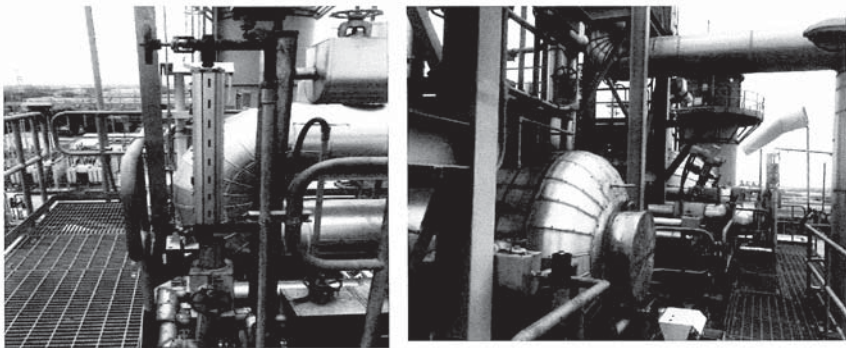


ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG52

[Handwritten signature]

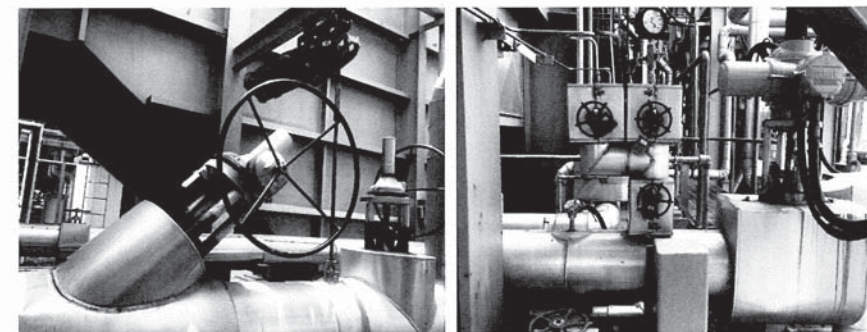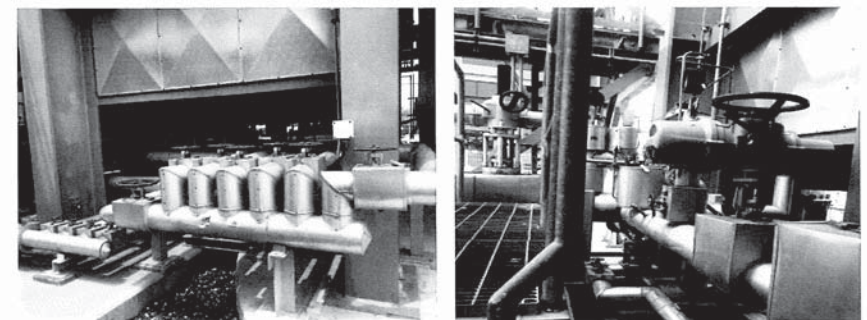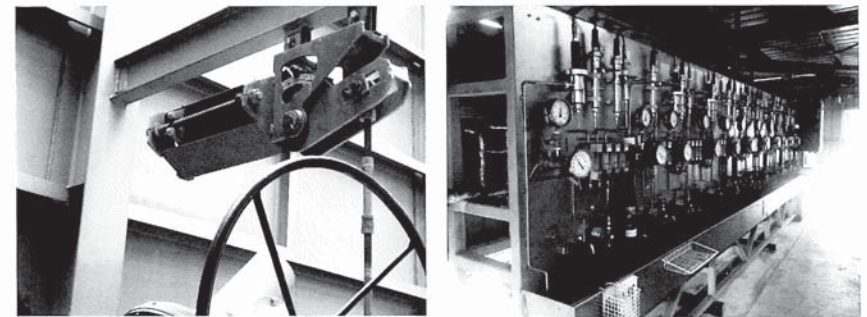

ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG52

[Handwritten signature]

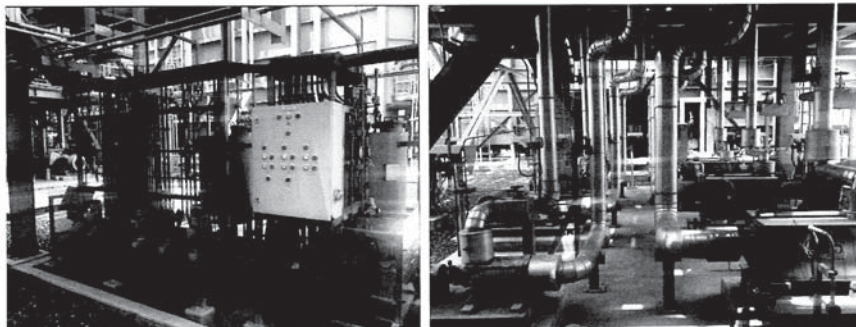

ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ของหม้อน้ำ HRSG52

ที่ อก ๐๓๑๖/ ๑๘๘๖ ๖๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด

อ้างถึง หนังสือของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖ นอน. ได้ยื่นคำขอความเห็นชอบในการตรวจสอบ ภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งคือ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ท่านตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลา เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ดังนี้

ลำดับ	หม้อน้ำ หมายเลข	หม้อน้ำหมายเลข เครื่อง	อัตราการผลิตไอน้ำ (ตันต่อชั่วโมง)	ตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ครั้งต่อไป ไม่เกินวันที่	หมายเหตุ
๑	HRSG51	17481-1	๙๘.๔๙๙๔	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	๓ ปี
๒	HRSG52	17481-2	๙๘.๔๙๙๔	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	๓ ปี

ทั้งนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด และเมื่อครบกำหนดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำดังกล่าวแล้ว ท่านจะต้องยื่นคำขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งอีกครั้งต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิจ บุญศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๖ ต่อ ๒๓๐๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๖ ต่อ ๒๓๑๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabangdiw@mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทเป็นก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"






ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thailand Professional Engineering License



ได้รับรอง



วิศวกรผู้ตรวจสอบ)
12/04/2023

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 5 ปี



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๐ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ที่ กว ๐๓๓๒ / ๕๔ ๒๒

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
เรียน นายพจน์ คูหณเสถียร

ตามที่ท่าน นายพจน์ คูหณเสถียร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒ ประเภท วิศวกร เลหะเบียน วก.๑๐๐๒
ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนไว้ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายพจน์ คูหณเสถียร ต่ออายุทะเบียนเป็น
วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๑๑๑๓
จนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมี
การต่ออายุเป็นที่ยอมรับแล้ว

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ "ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ
ความร้อน" เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ
ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

Ummul

(นายปณตสรณ์ สุธยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย



[https://www.dew.go.th/reqs_engin000/]

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๖๖๒
<http://www.dew.go.th/>

สำนักงานเทคโนโลยีและความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

UNP0572197

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบหม้อน้ำ

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๓-๐๑-๒๕๖๕-๐๓๗๕

ចំពោះលើកទី ២ របស់ក្រុម ព្រះស្តេច

เพื่อปิดประกาศไว้ที่ราชการ ณ วันที่ ๒๐๒๖/๗/๒๕๖๕

ที่ภูมิลำเนาที่ ๒๐๒๖/๗/๒๕๖๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑ ตำบลบ้านทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตามมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร บันได และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการเป็นผู้ใช้บริการทดสอบหม้อน้ำ หม้อต้มน้ำใช้ของเหลวในเครื่องทำความร้อน และภาชนะรับความดัน ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงาน ตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีสาร ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตและขนส่งของเหลวในเครื่องทำความร้อน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้บริการเพื่อผลิตและขนส่งของเหลวในเครื่องทำความร้อน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

(นายศักดิ์สิทธิ์ บิลสาธิต)

ผู้ชำนาญการกองการพลเรือน

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

การตรวจสอบ (Inspection)

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

หมอนำหมายเลข HRSG52 ตรวจทดสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

1.ประวัติการชำรุดและการซ่อมแซมโครงสร้าง อุปกรณ์ และการล้างตะกอนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ลักษณะการชำรุด	-	ซ่อมโดย	-	เมื่อ	-
2. ลักษณะการชำรุด	-	ซ่อมโดย	-	เมื่อ	-
3. วิศวกรควบคุมและอำนาจการซ่อมชื่อ	-	ทะเบียนเลขที่	-		

2.การตรวจสอบสภาพภายนอก (External Inspection)

การติดตั้งหม้อไอน้ำ.....ปกติ.....การติดตั้งระบบท่อ.....ปกติ.....

สภาพภายนอกหม้อไอน้ำ (โครงสร้าง).....ปกติ.....

การติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไป หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง (ระบุ).....

3.การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection)

3.1.สภาพแวดล้อมด้านสัมผัสไฟ

สภาพท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ท่อน้ำ ฉนวนเตา ฉนวนหน้าหลัง Smoke Chamber ปูนทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน (ลักษณะการชำรุดเสียหาย แตกร้าว รั่วซึม กัดกร่อน ขึ้นฝ้าเขม่า หรือความผิดปกติต่างๆ).....

3.2.สภาพแวดล้อมต้นน้ำ

สภาพท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ท่อน้ำ ฉนวนเตา ฉนวนหน้า-หลัง Upper Drum Lower Drum (ลักษณะการชำรุด เสื่อมรูป แตกร้าว รั่วซึม กัดกร่อน ตะกรัน โคลนตะกอน การอุดตันของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ).....

4.การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างโดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Test)

กรณี ☐ สร้างใหม่ ☐ ประจำปี ☐ คัดแปลง ☐ ซ่อมแซม ☐ เปลี่ยนโครงสร้าง ☒ อื่นๆ.....ได้รับการขอขยาย.....
ทดสอบที่ความดัน.....ผลการทดสอบ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง.....
หากควรปรับปรุง สาเหตุ.....วิธีการปรับปรุง.....
การทำงานของวาล์วนิรภัย (Safety Valve).....ผลการทดสอบ ☒ ปกติ ☐ ควรปรับปรุง.....
หากควรปรับปรุง สาเหตุ.....วิธีการปรับปรุง.....

5.การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย (Function Test)


- การทำงานของเกจวัดความดัน	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (feed water pump)	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องควบคุมระดับน้ำ	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของระบบสัญญาณเตือนภัย	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของเครื่องควบคุมความดัน (Pressure Control Switch)	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- หลอดแก้วบอกระดับน้ำ	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง
- การทำงานของลิ้นก้นกลับ	☒ ปกติ	☐ ควรปรับปรุง

6.การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ทั่วไป (General Equipment)


- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| - การทำงานของเกจวัดอุณหภูมิปล่อย | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - ภาชนะเก็บน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำหรือถังคอนเดนเสทรวมถึงระบบท่อ | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อไอน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - ฉนวนทั้งหมด (ตัวหม้อไอน้ำ ระบบท่อ อุปกรณ์การใช้ไอน้ำ ฯลฯ) | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - วาล์วล้างน้ำ (Blow down valve) | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |
| - ถังหรือวาล์วที่ติดตั้งกับหม้อไอน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ควรปรับปรุง |

7.รายละเอียดของวุ่นที่บกพร่องเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

1. เสนอแนะปรับปรุงแก้ไข steam insulation ที่ชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและ insulation จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อมีน้ำฝนเข้าไปด้านใน
- 2.
- 3.

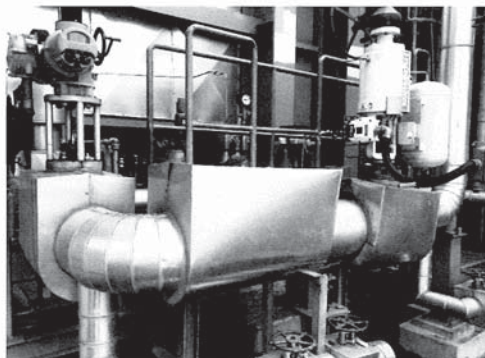

[Handwritten signature]

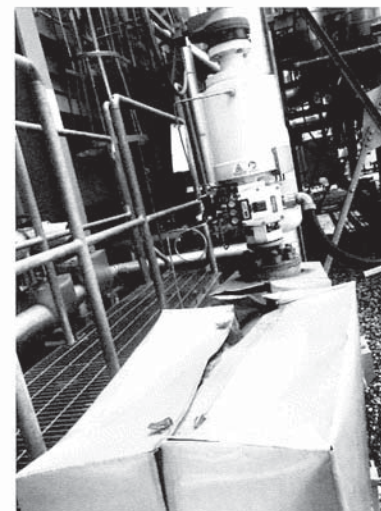

8.สรุปผลการตรวจสอบ

- 8.1. ขอรับรองว่าหม้อไอน้ำเครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัยภายใต้ความดันใช้งาน ไม่เกิน 79.0 barg / 8.3 barg (HR/LP) เป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ตรวจสอบ
- 8.2. ขอรับรองว่าหม้อไอน้ำเครื่องนี้ตามข้อ 8.1 และผู้ประกอบกิจการโรงงานได้แก้ไขตามรายละเอียดดังนี้แล้ว
 - 8.2.1.
 - 8.2.2.
 - 8.2.3.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน

[Handwritten signature] (วิศวกรผู้ตรวจสอบ)
(.....นาย พจน์ อุทมนเทียร.....)

เอกสารแนบที่ 35

เอกสารขึ้นทะเบียนรับรองผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๖๔๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน

เรียน นายกิตติโชค นิตรกุล

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อนของโรงงาน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖-นอน. ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๗ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๗๓๑-๔๑๘๖๔ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรค์ สูญยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

<http://www.diw.go.th>

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๖๔๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน

เรียน นายอดิศักดิ์ อุดมสุข

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อนของโรงงาน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖-นอน. ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๗ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๗๓๑-๓๘๕๐๖ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรค์ สูญยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

<http://www.diw.go.th>

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๘ ๔ ๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํ้าความร้อน

เรียน นายศิริศักดิ์ ศรีสร้อย

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํ้า
ความร้อนของโรงงาน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๕ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๘๘-๒/๒๕๕๖-นอน.
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐/๖๙๖ หมู่ที่ ๗ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํ้าความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๗๓๑-๓๘๕๑๑ ประจําโรงงานดังกล่าวได้
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยได้ยกเลิกเลขทะเบียน ๓๑๑-๓๒๔-๓๘๕๑๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรรค์ สุทยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๔๒
<http://www.diw.go.th>




รายงานผลการซ่อมแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4,5 จำกัด

Amata B.Grimm Power 4, 5 Ltd.

■ ABP 4

■ ABP 5

รายงานผลการฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการประเมินผล แผนเตรียมพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด สารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหล วันที่ 28 กันยายน 2565	หน้า ที่ ...1./3....	
	ผู้รายงาน: 	วันที่: 28/9/65
	ผู้ตรวจสอบ (Sr.SHESM): 	วันที่: 28/9/65
	ผู้รับรอง (PPM): 	วันที่: 28/9/65

วัน/เดือน/ปี ที่ฝึกซ้อมแผน 28 กันยายน 2565 เวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมแผน 13.35 – 13.55 น.

1. การระงับภาวะฉุกเฉิน

ผลการระงับ

ลำดับเหตุการณ์

- 13.35 น. ระบบ Control และ ระบบ Protection ของ GT51 Fail 100 % แต่ GT52 สั่ง Trip ได้
- 13.35 น. ST50 Trip เนื่องจาก ระบบ Protection fail แล้ว ESV Command close.
- 13.35 น. CRO ABP5 พบว่า Press HP main STM ขึ้นไปถึง 72 bar , แต่ HP by pass control valve ไม่เปิด
(Set point HP by pass: open = 70.3 bar)
- 13.36 น. CRO ABP5 ลด load ไม่ได้ จึงกด Emergency Trip HRSG51 ไม่ได้ จึงทำให้ Pressure ของ
HP Superheat steam สูงขึ้นไปถึง 87 bar, แต่ Safety valve HP Superheat steam ไม่ทำงาน (Safety valve HP
Main STM Open : pressure > 85.2 bar)
- 13.37 น. OSM ติดต่อ PPM, ODM, MDM เมื่อไม่มีใครอยู่จึงทำหน้าที่เป็น EC
- 13.37 น. ประกาศแต่งตั้ง EC (คุณภูวนธร ทารัตน์)
- 13.38 น. EC ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 และให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอพยพไปยังจุดรวมพล
- 13.39 น. CRO ABP5 S/D HRSG & GT ไม่ได้ และไม่สามารถไปปิด valve gas ที่ PTT station ได้ทัน
- 13.40 น. Pressure ที่ HP drum ขึ้นไปที่ 120 bar แต่ HP Drum safety valve ทั้ง 1 ตัวไม่ทำงาน,
Safety valve1 ของ HP Drum ทำงานที่ มากกว่า 89.7 bar
Safety valve1 ของ LP Drum ทำงานที่ มากกว่า 12.0 bar
Safety valve2 ของ LP Drum ทำงานที่ มากกว่า 12.8 bar
Safety valve ของ LP main steam ทำงานที่ มากกว่า 11.0 bar
- 13.32 น. Pressure สูงเกิน 120 bar จนทำให้ HP drum 51 เกิดการระเบิด
- 13.35 น. ทาง Operators สามารถปิด valve gas ที่ PTT gas station ได้ จึงทำให้ GT52 trip ไป.
- 13.35 น. มีโลหะที่เกิดจากการระเบิด ที่อยู่ด้านข้าง HRSG51 แตกเสียหายเป็นจำนวนมาก และพบชิ้นส่วน โลหะกระเด็น
ไปโดนแท่งสารเคมี Sulfuric Acid 98% บริเวณ CTW ABP5 ทำให้แตกและเกิดการรั่วไหล
- 13.37 น. EC แจ้ง ทีม PR ทำการแจ้งชุมชนโดยรอบ ABP4,5
- 13.38 น. EC แต่งตั้ง OC (คุณณัฐวัตร คำสี)
- 13.39 น. OC มาถึงที่เกิดเหตุ
- 13.39 น. FS แจ้ง EC ว่าจุด Safe Zone บริเวณหน้าตึก LMT
- 13.40 น. ทีม E4,E5,E6,E7 มาที่จุดเกิดเหตุ และทีม FS,CO Stand by ที่จุดรวมพล (บริเวณปั๊ม รปภ. ABP4)

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4,5 จำกัด

Amata B.Grimm Power 4, 5 Ltd.

■ ABP 4

■ ABP 5

- 13.42 น. EC แต่งตั้ง CO (คุณจริยา โคทอง)
- 13.42 น. OC สั่งการทีม E7 เข้าควบคุมเหตุฉุกเฉิน ใส่ชุดกันสารเคมีและอยู่ในทิศทางเหนือลม (หน้าอาคาร ST 50)
- 13.43 น. EC สั่ง OC ระงับการรั่วไหล และเก็บกู้ สารเคมีปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet : ของสาร Sulfuric 98%) พร้อมสั่ง รปภ.ปิดกั้นรางระบายน้ำเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลออกสู่ภายนอก
- 13.43 น. CO แจ้ง EC จำนวนพนักงานที่มาดูรวมพล และพบผู้สูญหาย จำนวน 1 คน
- 13.46 น. OC แจ้ง EC เจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ขาขวาหัก หัวแตก ที่บริเวณข้าง MCT B.5
- 13.47 น. OC สั่ง ทีม E5 กันเขต – โดยระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 ม.
- 13.48 น. OC สั่ง ทีม E6 เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ปฏิบัติตาม SDS และ หลักการปฐมพยาบาล
- 13.50 น. EC สั่ง ทีม FS ทำการส่งต่อผู้บาดเจ็บนำรถ On call ส่งไปโรงพยาบาลวิภาวดี
- 13.55 น. EC สั่ง OC เก็บกู้และตรวจสอบสภาพความเสียหาย

ณ.จุด Safe Zone

- 13.51 น. CO แจ้ง EC ว่ามีนักข่าวและหน่วยงานราชการขอเข้าพื้นที่ โดยอยู่ที่ห้องประชุมตึก Admin
- 13.52 น. OC รายงาน EC สามารถควบคุมได้และกันเขต-ตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อย
- 13.53 น. EC ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
- 13.54 น. EC ติดต่อ BC เพื่อรายงานปัญหา (โทรรายงานต่อ PPM)
- 13.55 น. BC ปฏิบัติตามแผน BCP ดังนี้

1. สรุปความเสียหาย และผลกระทบ และกำหนดมาตรการแก้ไข ป้องกัน
2. การฟื้นฟูสภาพ และการทำ Big Cleaning Day
3. สรุปความเสียหาย และผลกระทบ และกำหนดมาตรการแก้ไข ป้องกัน
4. การฟื้นฟูสภาพ และการทำ Big Cleaning

ทุกทีม Clear พื้นที่และเข้าร่วมประชุมภายหลังซ่อมแผนฉุกเฉิน กรณีหม้อไอน้ำระเบิด สารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหล

ปัญหาที่พบ ตามเอกสารแนบ แบบบันทึกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบจากการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด สารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหล (ABP45-FM-SP-015)

2. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการจำลองสถานการณ์ไม่มีการใช้สารเคมีจริง

มาตรการจัดการ

ขยะที่เกิดจากการฝึกซ้อม จัดการทิ้งถึงขยะตามประเภทที่จัดเตรียมไว้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4,5 จำกัด

Amata B.Grimm Power 4, 5 Ltd.

■ ABP 4

■ ABP 5

3. การอพยพ

ผลการอพยพ

การอพยพพนักงานและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมายังจุดรวมพลภายในอาคารที่ปลอดภัยโดยการกวดสัญญาณอพยพและประกาศอพยพ เวลา 13.38 น. และทุกคนสามารถมายังจุดรวมพลได้ถูกต้องและพร้อมเพรียงกัน

ปัญหาที่พบ

-

4. การดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มีการประชุมสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขเป็นไปตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่พบ

-

5.การดำเนินการทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการหลังการฝึกซ้อม

จากการทบทวนหลังการฝึกซ้อม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาที่พบ

-

ผลการประเมิน

.....ผ่าน

✓ ผ่าน โดยต้องแก้ไขปรับปรุงในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป

.....ไม่ผ่าน 1. ฝึกซ้อมใหม่

.....2. ปรับปรุงแผน.....และฝึกซ้อมใหม่

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานสถานีใช้ก๊าซธรรมชาติ

ระเบียบการปฏิบัติงานการลดความเสี่ยงกรณีวาล์วควบคุมระบบท่อล้มเหลว (ABP45-OI-002)

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 1 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

เอกสารอ้างอิง

- PID A 3-1302.43-5651-002
- ABP4&5-TE-CNG-TR-0002 - 066

เอกสารสนับสนุน

-

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

-

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องทั้งในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการใช้พลังงาน

ขอบเขต

วิธีการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานภายในภายใน โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4&5

คำจำกัดความ

- **Gas Metering and Regulating Station** คือสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ที่ได้รับ จาก ปตท. นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
 - GMRS จะมี valve หลักอยู่ 3 ชนิดคือ SSV(safety shutoff valve), PCV(pressure control valve) และ PSV(pressure safety valve)PCV จะใช้สำหรับควบคุมแรงดันของ gas ที่จ่ายเข้าสู่โรงไฟฟ้า ในกรณีที่มีการหยุดใช้ gas กระทั่งหนึ่งอาจทำให้แรงดันของ gas ในระบบสูงเกินไป ก็จะมี SSV ทำการปิด gas ก่อนเข้า PCV ได้ แต่ถ้าแรงดันยังไม่ลดลง ก็จะมี PSV เปิดเพื่อระบาย gas ออกจากระบบให้แรงดันกลับเข้าสู่ปกติ
 - สำหรับ SSV นั้นถ้ามีการปิดตัวอัตโนมัติแล้วจะไม่สามารถเปิดได้เอง ต้องไปทำการ reset manual เปิดขึ้นมาใหม่
 - ในGMRS จะมี line gas อยู่ 2 line กรณีที่ SSV ใน line main เกิดการปิดไปแล้วยังไม่ได้ทำการ reset manual เพื่อเปิด valve ก็จะมี line standby ซึ่งจะมีอุปกรณ์เหมือนกันกับ line main ทุกอย่าง เพียงแต่ตั้งค่าแรงดันของ gas ไม่เท่ากัน จะทำการเปิดใช้วาล์วอัตโนมัติขึ้นมาแทนที่

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 2 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อเตือนระวัง

- ด้านความปลอดภัย
 - จด E-log sheet มีชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - การ Isolate อุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ทำให้ไฟฟ้าช็อต ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - การ Isolate วาล์วและระบบท่อก๊าซ แดกหรือรั่ว ที่มีความแรงดันสูง กระแทกหรือสัมผัสถูกร่างกายทำให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 - ท่อก๊าซชำรุด แดก รั่ว เกิดประกายไฟทำให้ระบบเกิดการระเบิด
- ด้านสุขภาพอนามัย
 - ท่อก๊าซชำรุด แดก รั่ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
- ด้านสิ่งแวดล้อม
 - ท่อก๊าซชำรุด แดก รั่ว สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ
 - ท่อก๊าซชำรุด แดก รั่ว ในปริมาณมากเกิดสภาวะเรือนกระจก

อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่

อุปกรณ์ PPE ขั้นพื้นฐานในการเข้าพื้นที่การผลิตฯ ทั้งหมด คือ รองเท้านิรภัย แวนดานิรภัย หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว

ขั้นตอนที่ต้องสวม PPE เพิ่มเติม	รายการ PPE ที่ต้องสวมใส่	หมายเหตุ
การ Isolate valve และอุปกรณ์	ถุงมือผ้า	

Approve by: (Narong Boonkhum)
Date: (20/04/2020)

ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 3 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

วิธีการปฏิบัติงาน

1. ข้อมูลทั่วไป (General)

1.1 อุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้อง (Major Equipment)

- Hydraulic Operated Valve (HOV)
- Gas Filter
- Active Pressure Regulator Valve
- Monitor Pressure Regulator Valve
- Safety Shut off Valve
- Pressure Relief Valve
- Gas turbine Meter
- Gas Vent Valve

1.2 ระบบควบคุมอุปกรณ์

Drive/Function	DCS/RTU		Local	
	Auto	Manual	Auto	Manual
Hydraulic Operated Valve (HOV)	On	Open/Close	-	Open/Close
Active Pressure Regulator Valve	On	Open/Close	-	Open/Close
Monitor Pressure Regulator Valve	On	Open/Close	-	Open/Close
Safety Shut off Valve	On	Open/Close	-	Open/Close
Gas Filter	-	Open/Close	-	Open/Close
Gas turbine Meter	-	Open	-	Open

2. ขั้นตอนการเตรียมระบบ (Preparations System)

2.1 การเตรียมระบบ กรณี เข้าใช้งาน RUN A

- ___ OPEN 5651-HOV-0201 Hydraulic Operated Valve (HOV)
- ___ OPEN 5651-HV-0220A Gas inlet Manual Valve Run A
- ___ OPEN 5651-HV-0220B Gas inlet Manual Valve Run B
- ___ Gas Filter Run A "IN SERVICE"

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 4 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

- ___ Gas Filter Run B "IN SERVICE"
- ___ Safety Shut off Valve Run A 5651-SSV-0203A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Safety Shut off Valve Run B 5651-SSV-0203B อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0204A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0204B อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV- 0205A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0205B อยู่ตำแหน่ง Close

2.2 การเตรียมระบบ กรณี เข้าใช้งาน RUN B

- ___ OPEN 5651-HOV-0201 Hydraulic Operated Valve (HOV)
- ___ OPEN 5651-HV-0220A Gas inlet Manual Valve Run A
- ___ OPEN 5651-HV-0220B Gas inlet Manual Valve Run B
- ___ Gas Filter Run A "IN SERVICE"
- ___ Gas Filter Run B "IN SERVICE"
- ___ Safety Shut off Valve Run A 5651-SSV-0203A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Safety Shut off Valve Run B 5651-SSV-0203B อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0204A อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0204B อยู่ตำแหน่ง OPEN
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0205A อยู่ตำแหน่ง Close
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0205B อยู่ตำแหน่ง Open

3. ขั้นตอนการใช้งาน

3.1 การเตรียมระบบ และนำเข้าใช้งาน RUN A

- ___ ระบบ Control Gas Metering and Regulating Station (GMRS) "IN SERVICE"
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0204A "IN SERVICE"
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0204B "IN SERVICE"
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0205A "IN SERVICE"
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0205B "IN SERVICE"

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสนแป]	Page 5 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station (GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ	[Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสนแป]	Revision 02

- ___ Hydraulic Operated Valve (HOV) **"IN SERVICE"**
- ___ ตรวจสอบอุปกรณ์วัด Pressure, Flow, Temp ของระบบทุกตัว **"IN SERVICE"**
- ___ ตรวจสอบ **All Valve** อยู่ตำแหน่ง **"OPEN"**

Hydraulic Operated Valve (HOV)	5651-HOV-0201
Gas inlet Manual Valve Run A	5651-HV-0220A
Gas inlet Manual Valve Run B	5651-HV-0220B
Inlet Filter run A Valve	-
Inlet Filter run B Valve	-
Safety Shut off Valve Run A	5651-SSV-0203A
Safety Shut off Valve Run B	5651-SSV-0203B
Monitor Pressure Regulator Valve Run A	5651-PCV-0204A
Monitor Pressure Regulator Valve Run B	5651-PCV-0204B
Active Pressure Regulator Valve Run A	5651-PCV-0205A
Gas Outlet Valve Run A	5651-HV-0225A
Gas Outlet Valve Run B	5651-HV-0225B
Bypass Valve	5651-HV-0226
Gas turbine Meter Inlet Isolation Valve Run A	5651-HV-0227A
Gas turbine Meter Outlet Isolation Valve Run A	5651-HV-0230A
Gas Supply Outlet Valve (Emergency)	5651-HV-0231

- ตรวจสอบ **All Valve** อยู่ตำแหน่ง **"CLOSED"**

Active Pressure Regulator Valve Run B	5651-PCV-0205B
Gas turbine Meter Inlet Isolation Valve Run B	5651-HV-0227B
Gas turbine Meter Outlet Isolation Valve Run B	5651-HV-0230B

 Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสนแป]	Page 6 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station (GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ	[Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสนแป]	Revision 02

3.2 การเตรียมระบบ และนำเข้าใช้งาน RUN B

- ___ ระบบ Control Gas Metering and Regulating Station (GMRS) **"IN SERVICE"**
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0204A **"IN SERVICE"**
- ___ Monitor Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0204B **"IN SERVICE"**
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run A 5651-PCV-0205A **"IN SERVICE"**
- ___ Active Pressure Regulator Valve Run B 5651-PCV-0205B **"IN SERVICE"**
- ___ Hydraulic Operated Valve (HOV) **"IN SERVICE"**
- ___ ตรวจสอบอุปกรณ์วัด Pressure, Flow, Temp ของระบบทุกตัว **"IN SERVICE"**
- ___ ตรวจสอบ **All Valve** อยู่ตำแหน่ง **"OPEN"**

Hydraulic Operated Valve (HOV)	5651-HOV-0201
Gas inlet Manual Valve Run A	5651-HV-0220A
Gas inlet Manual Valve Run B	5651-HV-0220B
Inlet Filter run A Valve	-
Inlet Filter run B Valve	-
Safety Shut off Valve Run A	5651-SSV-0203A
Safety Shut off Valve Run B	5651-SSV-0203B
Monitor Pressure Regulator Valve Run A	5651-PCV-0204A
Monitor Pressure Regulator Valve Run B	5651-PCV-0204B
Active Pressure Regulator Valve Run B	5651-PCV-0205B
Gas Outlet Valve Run A	5651-HV-0225A
Gas Outlet Valve Run B	5651-HV-0225B
Bypass Valve	5651-HV-0226
Gas turbine Meter Inlet Isolation Valve Run B	5651-HV-0227B
Gas turbine Meter Outlet Isolation Valve Run B	5651-HV-0230B
Gas Supply Outlet Valve (Emergency)	5651-HV-0231

	Amata B. Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)	Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย [Thirawat Sangman] [นายธีรวัฒน์ แสงมณี]	Page 7 of 7
Work Instruction วิธีการปฏิบัติงาน	ABP45-01-020	Gas Metering and Regulating Station(GMRS) สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ		Revision 02

___ ตรวจสอบ All Valve อยู่ตำแหน่ง “CLOSED”

Active Pressure Regulator Valve Run A	5651-PCV-0205A
Gas turbine Meter Inlet Isolation Valve Run A	5651-HV-0227A
Gas turbine Meter Outlet Isolation Valve Run A	5651-HV-0230A

การปฏิบัติงานเมื่อ PTT มีการ Calibrate flow meter

- (1) **Calibrate turbine meter** จะต้องจดบันทึกหรือถ่ายรูป meter ก่อนถอด Calibrate turbine meter และ
หลังติดตั้งก่อนเข้าใช้งาน
- (2) **Calibrate flow computer** จะต้อง print Metering Daily Billing Report ก่อนทาง PTT Calibrate flow
computer และก่อน In-service ทาง PTT เซ็นต์ชื่อรับรอง

เอกสารแนบที่ 39

เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

தமிழ்நாடு : 157A21 2566

ໂທ: ໐໙໔໔໔໔໔໔ / ອີເມວ: info@x.com, ອີເມວ: info@x.com, ອີເມວ: info@x.com, ອີເມວ: info@x.com, ອີເມວ: info@x.com

ลำดับ No.	ชนิด Type	วันที่ Date (Day)	สถานที่ตั้ง Location (Address)	รายละเอียด Details	ผู้ User	ชื่อ Name	เบอร์ Phone	อีเมล Email	สถานะ Status	หมายเหตุ Remarks
1	Dry Chemical	15		Guard House (ABPS)						
2	CO2	15	18.40	PEA Terminal Station					19.75	
3	Dry Chemical	15		Guard House (ABPA)						
4	Dry Chemical	15		GMS (ABPA)						
5	Dry Chemical	15		GHS (ABPA)						
6	Dry Chemical	15		GHS (ABPS)						
7	Dry Chemical	15		GHS (ABPS)						
8	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station					21.66	
9	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station					21.57	
10	CO2	10	10.00	Gas Turbine 42					11.82	
11	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 42					11.93	
12	Dry Chemical	15		HRSO 42						
13	Dry Chemical	15		HRSO 42						
13	Dry Chemical	15		HRSO 41						
14	CO2	10	10.00	Gas Turbine 41					11.31	
15	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 41					11.67	
16	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (W)					11.74	
17	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (W)					11.67	
17	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)					11.70	
18	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)					11.49	
18	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (W)						
18	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (W)					10.97	
19	Dry Chemical	15		2F Battery Room						
20	CO2	10	10.00	2F Battery Room					11.70	
20	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (E)						
20	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (E)					11.72	
21	Dry Chemical	15		3F Electrical/Control Building (W)						
21	CO2	10	10.00	3F Electrical/Control Building (W)					11.84	
22	Dry Chemical	15		3F Electrical/Control Building (E)						
22	CO2	10	10.00	3F Electrical/Control Building (E)					11.81	
23	Dry Chemical	15		STG Building (ABPA,W)						
23	CO2	10	10.00	STG Building (ABPA,W)					10.49	
24	Dry Chemical	15		STG Building (ABPA,S)						
24	CO2	10	10.00	STG Building (ABPA,S)					10.64	
25	Dry Chemical	15		HRSO Local Control Building (ABPA)						
25	CO2	10	14.20	HRSO Local Control Building (ABPA)					10.67	
26	CO2	10	10.00	Sludge Container					15.18	
27	Dry Chemical	15		Water Treatment Plant						
27	CO2	10	14.20	Water Treatment Plant					15.20	
28	Dry Chemical	15		Laboratory						
28	CO2	10	10.00	Laboratory					11.63	
29	CO2	10	14.20	Electrical Room WTP					15.21	
30	CO2	10	10.00	Electrical Room WTP					10.71	
30	Dry Chemical	15		Fire Pump						
31	CO2	10	10.00	Fire Pump					11.04	
31	CO2	10	14.20	Air Compressor					15.16	
32	CO2	10	10.00	Air Compressor					10.54	
32	Dry Chemical	15		Emergency Diesel Generator (ABPA)						
32	CO2	10	10.00	Emergency Diesel Generator (ABPA)						
33	Dry Chemical	15		Emergency Diesel Generator (ABPS)					11.0	
33	CO2	10	10.00	Emergency Diesel Generator (ABPS)					11.90	
34	Dry Chemical	15		Chiller Plant (ABPA)						
34	CO2	10	10.00	Chiller Plant (ABPA)					16.40	
35	Dry Chemical	15		Electrical Room Chiller Plant (ABPA)						
36	Dry Chemical	15		Chiller Plant (ABPS)						
36	CO2	10	10.00	Chiller Plant (ABPS)					11.70	
37	Dry Chemical	15		Electrical Room Chiller Plant (ABPS)						
38	Dry Chemical	15		STG building (ABPS,W)						
38	CO2	10	10.00	STG building (ABPS,W)					11.00	
39	Dry Chemical	15		STG building (ABPS,S)						
39	CO2	10	10.00	STG building (ABPS,S)					11.67	
40	CO2	10	10.00	Gas Turbine 52					15.16	
41	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 52					15.63	
42	Dry Chemical	15		HRSO 52						
43	Dry Chemical	15		HRSO 52						
43	CO2	10	10.00	Gas Turbine 51					10.94	
44	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 51					15.04	
45	Dry Chemical	15		HRSO 51						
46	Dry Chemical	15		HRSO 51						
46	Dry Chemical	15		HRSO Local Control Building (ABPS)						
46	CO2	10	10.00	HRSO Local Control Building (ABPS)					11.93	
47	Dry Chemical	15		2F Warehouse						
48	CO2	10	10.00	2F Warehouse					11.69	
48	Dry Chemical	15		1F Warehouse						
48	CO2	10	10.00	1F Warehouse					11.90	
49	Dry Chemical	15		1F Warehouse						
49	CO2	10	10.00	1F Warehouse					10.46	
50	Dry Chemical	15		1F Warehouse						
50	CO2	10	10.00	1F Warehouse					11.65	
51	Dry Chemical	15		1F Workshop						
51	CO2	10	10.00	1F Workshop					11.60	
52	Dry Chemical	15		1F Workshop						
52	CO2	10	10.00	1F Workshop					11.39	
53	Dry Chemical	15		1F Workshop						
53	CO2	10	10.00	1F Workshop					11.40	

ลำดับ No.	ประเภท Type	ขนาด Size (sq)	ชนิด ชนิด ประเภท (No.)	ตำแหน่งติดตั้งถังเก็บ Fire extinguisher installed area	ผลการประเมินความเสี่ยง				ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย	หมายเหตุ
					ต่ำ	สูง	ระดับ	ระดับ		
54	Dry Chemical	15		1F Workshop	✓	✓	✓	✓	11.66	
55	Dry Chemical	10	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	✓	11.61	
56	Dry Chemical	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	✓	11.61	
57	Dry Chemical	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	✓	11.61	
58	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.69	
59	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.69	
60	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.67	
61	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.10	
62	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.65	
63	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.42	
64	Dry Chemical	15		1F Workshop (Fire hose cabinet)	✓	✓	✓	✓		
65	Dry Chemical	15		2F Workshop (Fire hose cabinet)	✓	✓	✓	✓		
66	Dry Chemical	15		3F Workshop (Fire hose cabinet)	✓	✓	✓	✓		
67	Dry Chemical	15		Warehouse	✓	✓	✓	✓		
68	Dry Chemical	15		Boiler41	✓	✓	✓	✓		
69	Dry Chemical	15	14.20	Boiler41	✓	✓	✓	✓	19.99	
70	Dry Chemical	15	11.70	Boiler41	✓	✓	✓	✓	16.20	
71	Dry Chemical	15	11.70	Boiler42	✓	✓	✓	✓	15.47	
72	Dry Chemical	15	11.70	Boiler42	✓	✓	✓	✓	16.02	
73	Dry Chemical	15	11.70	Boiler42	✓	✓	✓	✓	16.02	
74	Dry Chemical	15	11.70	Boiler42	✓	✓	✓	✓	16.12	
75	Dry Chemical	15	11.70	Boiler42	✓	✓	✓	✓	16.12	
76	Dry Chemical	15	11.70	Boiler42	✓	✓	✓	✓	16.12	
77	Dry Chemical	15	14.20	Boiler51	✓	✓	✓	✓	16.11	
78	Dry Chemical	15	14.20	Boiler51	✓	✓	✓	✓	16.11	
79	Dry Chemical	15	14.20	Boiler51	✓	✓	✓	✓	16.11	
80	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
81	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
82	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
83	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
84	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
85	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
86	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
87	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
88	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
89	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
90	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
91	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
92	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
93	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
94	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
95	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
96	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
97	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
98	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
99	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	
100	Dry Chemical	15	14.20	Boiler52	✓	✓	✓	✓	16.15	

Inspector	SGO
A5735	322611
Date: 9/11/66	Date: 9/11/66

မှားယွင်းမှု $\text{DOF} = 4$ ဖြစ်ပြီး, CO_2 = စာနယ်ဇင်းစီစဉ်

ឧទាហរណ៍: DCP = អនីតិសីល, CO₂ = ការបំបែកកាបូន

APP-45-EM-SP-004 Rev.01

Districte de Sant Joan de Vilatorrada, 100. 08130 Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, Spain

CO2	10	15	19
หมายเหตุ	file Pumping/MS3		
1.CO2 ขนาด 10 ลิบ. ต้องฉีดเข้าดินตามอัตรา 11.7 Kg. ต้องฉีดเข้าดินตามอัตรา 10.0 Kg. (ใช้สาร 10% ± สดประมาณ 5% จากการฉีดเข้าดิน สดตามอัตรา 15%)			
2.CO2 ขนาด 10 ลิบ. ต้องฉีดเข้าดินตามอัตรา 16.7 Kg. ต้องฉีดเข้าดินตามอัตรา 14.2 Kg. (ใช้สาร 10% ± สดประมาณ 5% จากการฉีดเข้าดิน สดตามอัตรา 15%)			
3.CO2 ขนาด 15 ลิบ. ต้องฉีดเข้าดินตามอัตรา 17.7 Kg. ต้องฉีดเข้าดินตามอัตรา 18.4 Kg. (ใช้สาร 10% ± สดประมาณ 5% จากการฉีดเข้าดิน สดตามอัตรา 15%)			
4.CO2 ขนาด 50 ลิบ. ต้องฉีดเข้าดินตามอัตรา 77.8 Kg. ต้องฉีดเข้าดินตามอัตรา 70.0 Kg. (ใช้สาร 10% ± สดประมาณ 5% จากการฉีดเข้าดิน สดตามอัตรา 15%)			

ឧបបទ ៧៤ ឧបបទ ៧៥ ឧបបទ ៧៦

Information / ព័ត៌មាន X ផ្តល់ដោយ CO, ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ DCP ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម

ABP45-FM-SP-004 Rev.01

វិស័យនៃការងារ រ ព័ត៌មាន x ព័ត៌មាន, co, គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, co ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

[illegible]

ABP45-FM-SP-004 Rev.01

ការបោះឆ្នោត DCP = គេងប៉ែក, CD₁ = ការបោះឆ្នោតដំបូង

စာအုပ်အမှတ် ၆၀၂၇၁၆ no 2566

Unit No.	Unit Type	Unit Size (sqm)	Total installed area (sqm)	Fire extinguisher installed area	Fire Extinguisher Installation Condition					Remarks	Remarks
					1	2	3	4	5		
54	Dry Chemical	15		1F Workshop	✓	✓	✓	✓	11.25		
55	Dry Chemical	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	✓	11.25		
56	Dry Chemical	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	✓	11.25		
57	Dry Chemical	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	✓	11.25		
58	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
59	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
60	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
61	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
62	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
63	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
64	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
65	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
66	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
67	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
68	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
69	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
70	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
71	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
72	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
73	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
74	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
75	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
76	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
77	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
78	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
79	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
80	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
81	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
82	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
83	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
84	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
85	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
86	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
87	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
88	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
89	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
90	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
91	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
92	Dry Chemical	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	✓	11.25		
93	Dry Chemical	15	10.00								

APP-45-FM-SP-004 Rev.01

កន្លែងកុះកម្រៃ COF = កម្រៃកុះកម្រៃ, CO₂ = ការប្រែប្រួលកម្រៃកុះកម្រៃ

កន្លែងកុះកម្រៃ COF = កម្រៃកុះកម្រៃ, CO₂ = ការប្រែប្រួលកម្រៃកុះកម្រៃ

ลำดับ No.	ประเภท Type	ขนาด Size (sq.)	จำนวน จำนวน (No.)	ชื่อ ชื่อ (Name)	สถานะ/การบำรุงรักษา/Condition				หมายเหตุ Remarks
					ดี Good	ใช้ Use	แก้ไข Repair	ชำรุด Defect	
1	Dry Chemical	15		Guard House (ABPS)	✓				
2	CO2	15	18.40	RCA Terminal Station	✓				11.57
3	Dry Chemical	15		Guard House (ABPA)	✓				
4	Dry Chemical	15		QHRS (ABPA)	✓				
5	Dry Chemical	15		QHRS (ABPA)	✓				
6	Dry Chemical	15		QHRS (ABPS)	✓				
7	Dry Chemical	15		QHRS (ABPS)	✓				
8	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station	✓				21.60
9	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station	✓				21.60
10	CO2	10	10.00	Gas Turbine 42	✓				10.01
11	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 42	✓				11.71
12	Dry Chemical	15		HRSQ 42	✓				
13	Dry Chemical	15		HRSQ 42	✓				
14	Dry Chemical	15		HRSQ 41	✓				
15	CO2	10	10.00	Gas Turbine 41	✓				11.21
16	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 41	✓				11.21
17	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (W)	✓				11.66
18	Dry Chemical	15		1F SWGR Room (W)	✓				11.26
19	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)	✓				11.71
20	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)	✓				10.61
21	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (W)	✓				
22	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (W)	✓				11.06
23	Dry Chemical	15		2F Battery Room	✓				
24	CO2	10	10.00	2F Battery Room	✓				11.71
25	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (E)	✓				
26	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (E)	✓				11.44
27	Dry Chemical	15		3F Electrical/Control Building (W)	✓				
28	CO2	10	10.00	3F Electrical/Control Building (W)	✓				11.01
29	Dry Chemical	15		3F Electrical/Control Building (E)	✓				
30	CO2	10	10.00	3F Electrical/Control Building (E)	✓				11.29
31	Dry Chemical	15		STG Building (ABPA,W)	✓				10.62
32	CO2	10	10.00	STG Building (ABPA,W)	✓				
33	Dry Chemical	15		STG Building (ABPA,S)	✓				11.67
34	CO2	10	10.00	STG Building (ABPA,S)	✓				11.67
35	Dry Chemical	15		HRSQ Local Control Building (ABPA)	✓				11.17
36	CO2	10	14.20	HRSQ Local Control Building (ABPA)	✓				11.15
37	Dry Chemical	15		Sludge Container	✓				11.01
38	CO2	10	10.00	Water Treatment Plant	✓				
39	Dry Chemical	15		Water Treatment Plant	✓				15.17
40	CO2	10	14.20	Laboratory	✓				
41	Dry Chemical	15		Laboratory	✓				11.66
42	CO2	10	10.00	Electrical Room WTP	✓				11.61
43	CO2	10	14.20	Electrical Room WTP	✓				16.01
44	Dry Chemical	15		Fire Pump	✓				11.10
45	CO2	10	10.00	Fire Pump	✓				15.15
46	Dry Chemical	15		Air Compressor	✓				11.61
47	CO2	10	14.20	Air Compressor	✓				11.61
48	Dry Chemical	15		Emergency Diesel Generator (ABPA)	✓				11.62
49	CO2	10	10.00	Emergency Diesel Generator (ABPA)	✓				
50	Dry Chemical	15		Emergency Diesel Generator (ABPS)	✓				11.28
51	CO2	10	10.00	Emergency Diesel Generator (ABPS)	✓				
52	Dry Chemical	15		Chiller Plant (ABPA)	✓				
53	CO2	10	10.00	Chiller Plant (ABPA)	✓				11.20
54	Dry Chemical	15		Electrical Room Chiller Plant (ABPA)	✓				
55	CO2	10	10.00	Chiller Plant (ABPS)	✓				11.66
56	Dry Chemical	15		Chiller Plant (ABPS)	✓				
57	CO2	10	10.00	Chiller Plant (ABPS)	✓				11.66
58	Dry Chemical	15		Electrical Room Chiller Plant (ABPS)	✓				
59	CO2	10	10.00	STG Building (ABPS,W)	✓				10.11
60	Dry Chemical	15		STG Building (ABPS,W)	✓				
61	CO2	10	10.00	STG Building (ABPS,S)	✓				11.66
62	Dry Chemical	15		STG Building (ABPS,S)	✓				11.76
63	CO2	10	10.00	Gas Turbine 52	✓				11.62
64	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 52	✓				11.62
65	Dry Chemical	15		HRSQ 52	✓				
66	CO2	10	10.00	Gas Turbine 51	✓				10.63
67	Dry Chemical	15		Gas Turbine Control Room 51	✓				11.07
68	CO2	10	10.00	HRSQ 51	✓				
69	Dry Chemical	15		HRSQ 51	✓				
70	Dry Chemical	15		HRSQ Local Control Building (ABPS)	✓				
71	CO2	10	10.00	HRSQ Local Control Building (ABPS)	✓				11.70
72	Dry Chemical	15		2F Warehouse	✓				
73	CO2	10	10.00	2F Warehouse	✓				11.66
74	Dry Chemical	15		1F Warehouse	✓				
75	CO2	10	10.00	1F Warehouse	✓				11.66
76	Dry Chemical	15		1F Warehouse	✓				10.53
77	CO2	10	10.00	1F Warehouse	✓				
78	Dry Chemical	15		1F Warehouse	✓				11.66
79	CO2	10	10.00	1F Warehouse	✓				
80	Dry Chemical	15		1F Warehouse	✓				11.66
81	CO2	10	10.00	1F Warehouse	✓				11.40
82	Dry Chemical	15		1F Warehouse	✓				
83	CO2	10	10.00	1F Warehouse	✓				11.72

ໂທດສະໄຊ ດຣ. ປະຊາທິປະໄຕ ສປປ ລາວ

ลำดับ No.	ประเภท Type	ขนาด Size (sq)	พื้นที่ Area (sqm)	จำนวนถังเก็บน้ำ Fire extinguisher installed area	มี ✓	ไม่มี ✗	อื่น Other	หมายเหตุ (Remarks)	สถานะ Status	วันที่ Date
54	Dry Chemical CO2	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓			
55	Dry Chemical CO2	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	11.20		
56	Dry Chemical CO2	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	11.76		
57	Dry Chemical CO2	15	10.00	1F Workshop	✓	✓	✓	11.79		
58	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.37		
59	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.10		
60	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.67		
61	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.19		
62	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
63	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.18		
64	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
65	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
66	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
67	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
68	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
69	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
70	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
71	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
72	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
73	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
74	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
75	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
76	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
77	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
78	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
79	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
80	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
81	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
82	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
83	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
84	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
85	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
86	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
87	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
88	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
89	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
90	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
91	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
92	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
93	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
94	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
95	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
96	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
97	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
98	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
99	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		
100	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	✓	✓	✓	11.16		

CO2	10	10	10	Pine Pump/VIS		10	10	10
MATHEMATICS	1.CO2 บวก 10 Lbs. ผลลัพธ์ น้ำหนักคนได้ 11.7 Kg ส่วนที่น้ำหนักคนได้ไม่ออก 10.0 Kg. (ไม่บวกค่า 10 % ± สหพันธ์ 5% จากการผิดพลาด คำนวณค่าไม่ได้ออก 15%)							
	2.CO2 บวก 10 Lbs. ผลลัพธ์ น้ำหนักคนได้ 16.7 Kg ส่วนที่น้ำหนักคนได้ไม่ออก 14.2 Kg. (ไม่บวกค่า 10 % ± สหพันธ์ 5% จากการผิดพลาด คำนวณค่าไม่ได้ออก 15%)							
	3.CO2 บวก 15 Lbs. ผลลัพธ์ น้ำหนักคนได้ 21.7 Kg ส่วนที่น้ำหนักคนได้ไม่ออก 18.4 Kg. (ไม่บวกค่า 10 % ± สหพันธ์ 5% จากการผิดพลาด คำนวณค่าไม่ได้ออก 15%)							
	4.CO2 บวก 50 Lbs. ผลลัพธ์ น้ำหนักคนได้ 77.8 Kg ส่วนที่น้ำหนักคนได้ไม่ออก 70.0 Kg. (ไม่บวกค่า 10 % ± สหพันธ์ 5% จากการผิดพลาด คำนวณค่าไม่ได้ออก 15%)							

Inspector	SEO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Date: 9/5/11	Date: 9/5/11

ประจวบคีรีขันธ์ ๘๑.๕๑ น.ศ. ๖๖

No.	Substance Type	Date (Year)	Material Quantity (kg)	Location / Facility Name	Safety Status / Condition						Remarks
					Is it safe?	Is it secure?	Is it clean?	Is it dry?	Is it well-maintained?		
1	Dry Chemical	15		Guard House (ABPS)	/	/	/	/	/		
2	CO2	15	18.40	RCA Terminal Station	/	/	/	/	/	15.5.8	
3	Dry Chemical	15		Guard House (ABPA)	/	/	/	/	/		
4	Dry Chemical	15		QMS (ABPA)	/	/	/	/	/		
5	Dry Chemical	15		QMS (ABPA)	/	/	/	/	/		
6	Dry Chemical	15		QMS (ABPS)	/	/	/	/	/		
7	Dry Chemical	15		QMS (ABPS)	/	/	/	/	/		
8	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station	/	/	/	/	/	0.5.2	
9	CO2	15	18.40	Control Room Gas Metering Station	/	/	/	/	/	0.5.2	
10	CO2	10	10.00	Gas Turbine 42	/	/	/	/	/	14.4.0	
11	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 42	/	/	/	/	/	11.7.1	
12	Dry Chemical	15		HSG 42	/	/	/	/	/		
13	Dry Chemical	15		HSG 42	/	/	/	/	/		
14	CO2	10	10.00	HSG 41	/	/	/	/	/		
15	CO2	10	10.00	Gas Turbine 41	/	/	/	/	/	11.4.0	
16	CO2	10	10.00	Gas Turbine Control Room 41	/	/	/	/	/	10.4.0	
17	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (W)	/	/	/	/	/	11.4.0	
18	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (W)	/	/	/	/	/	11.4.0	
19	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	/	11.4.0	
20	CO2	10	10.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	/	11.4.0	
21	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/		
22	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/	10.4.0	
23	Dry Chemical	15		2F Battery Room	/	/	/	/	/		
24	CO2	10	10.00	2F Battery Room	/	/	/	/	/	11.7.1	
25	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		
26	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/	10.7.4	
27	Dry Chemical	15		2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/		
28	CO2	10	10.00	2F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	/	10.7.4	
29	Dry Chemical	15		3P Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/		
30	CO2	10	10.00	3P Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	/	11.3.0	
31	Dry Chemical	15		STG Building (ABPA,W)	/	/	/	/	/		
32	CO2	10	10.00	STG Building (ABPA,W)	/	/	/	/	/	10.3.8	
33	Dry Chemical	15		STG Building (ABPA,S)	/	/	/	/	/		
34	CO2	10	10.00	STG Building (ABPA,S)	/	/	/	/	/	11.6.7	
35	Dry Chemical	15		HSG Local Control Building (ABPA)	/	/	/	/	/		
36	CO2	10	14.20	HSG Local Control Building (ABPA)	/	/	/	/	/	14.4.0	
37	CO2	10	14.20	HSG Local Control Building (ABPA)	/	/	/	/	/	11.0.0	
38	Dry Chemical	15		Sudge Container	/	/	/	/	/		
39	CO2	10	14.20	Water Treatment Plant	/	/	/	/	/	15.1.7	
40	Dry Chemical	15		Water Treatment Plant	/	/	/	/	/		
41	CO2	10	14.20	Laboratory	/	/	/	/	/	10.6.5	
42	Dry Chemical	15		Laboratory	/	/	/	/	/		
43	CO2	10	14.20	Electrical Room WTP	/	/	/	/	/	10.6.1	
44	CO2	10	10.00	Electrical Room WTP	/	/	/	/	/	10.2.0	
45	Dry Chemical	15		Fire Pump	/	/	/	/	/		
46	CO2	10	10.00	Fire Pump	/	/	/	/	/	11.0.0	
47	CO2	10	14.20	Air Compressor	/	/	/	/	/	11.4.0	
48	CO2	10	10.00	Air Compressor	/	/	/	/	/	10.5.4	
49	Dry Chemical	15		Emergency Diesel Generator (ABPA)	/	/	/	/	/		
50	CO2	10	10.00	Emergency Diesel Generator (ABPA)	/	/	/	/	/	11.6.0	
51	Dry Chemical	15		Emergency Diesel Generator (ABPS)	/	/	/	/	/		
52	CO2	10	10.00	Emergency Diesel Generator (ABPS)</							


ลำดับ No.	ประเภท Type	ขนาด Size (sq.)	พื้นที่ รวม (sq.m)	จุดติดตั้งถังดับเพลิง Fire extinguisher installed area	มี	ไม่มี	อื่น	ไม่ทราบ (not)	จำนวน ตัว	สถานะการ ใช้งาน	หมายเหตุ
54	Dry Chemical CO2	15		1F Workshop	/	/	/	/	11.9		
55	Dry Chemical CO2	10	10.00	1F Workshop	/	/	/	/	11.76		
56	Dry Chemical CO2	15	10.00	1F Workshop	/	/	/	/	11.72		
57	Dry Chemical CO2	10	10.00	2F Warehouse	/	/	/	/	11.70		
58	Dry Chemical CO2	15	10.00	2F Warehouse	/	/	/	/	11.65		
59	Dry Chemical CO2	10	10.00	2F Warehouse	/	/	/	/	11.10		
60	Dry Chemical CO2	15	10.00	3F Warehouse	/	/	/	/	11.10		
61	Dry Chemical CO2	10	10.00	3F Warehouse	/	/	/	/	11.10		
62	Dry Chemical CO2	10	10.00	3F Warehouse	/	/	/	/	11.10		
63	Dry Chemical	15		1F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/	/			
64	Dry Chemical	15		2F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/	/			
65	Dry Chemical	15		3F Workshop (Fire hose cabinet)	/	/	/	/			
66	Dry Chemical	15		Warehouse	/	/	/	/			
67	Dry Chemical	15		Warehouse	/	/	/	/			
68	Dry Chemical CO2	10	14.20	Bottle#1	/	/	/	/	16.10		
69	Dry Chemical CO2	10	11.70	Bottle#1	/	/	/	/	16.10		
70	Dry Chemical CO2	10	11.70	Bottle#2	/	/	/	/	16.10		
71	Dry Chemical CO2	10	11.70	Bottle#2	/	/	/	/	16.10		
72	Dry Chemical CO2	10	11.70	Feed Tank ABP4	/	/	/	/	16.03		
73	Dry Chemical CO2	10	11.70	Feed Tank ABP4	/	/	/	/	16.10		
74	Dry Chemical CO2	15	11.70	Cooling Tower 40	/	/	/	/	16.50		
75	Dry Chemical CO2	10	11.70	Cooling Tower 40	/	/	/	/	16.50		
76	Dry Chemical CO2	10	11.70	Cooling Tower 40	/	/	/	/	16.50		
77	Dry Chemical CO2	15	14.20	Bottle#1	/	/	/	/	16.10		
78	Dry Chemical CO2	10	14.20	Bottle#1	/	/	/	/	16.10		
79	Dry Chemical CO2	10	14.20	Bottle#2	/	/	/	/	16.10		
80	Dry Chemical CO2	10	14.20	Bottle#2	/	/	/	/	16.10		
81	Dry Chemical CO2	15	14.20	Feed Tank ABP5	/	/	/	/	16.10		
82	Dry Chemical CO2	10	10.00	Cooling Tower 50	/	/	/	/	16.03		
83	Dry Chemical CO2	10	10.00	Cooling Tower 50	/	/	/	/	17.05		
84	Dry Chemical CO2	10	10.00	Cooling Tower 50	/	/	/	/	17.05		
85	Dry Chemical CO2	15	10.00	Oil Room	/	/	/	/	16.10		
86	Dry Chemical CO2	10	10.00	Oil Room	/	/	/	/	16.10		
87	Dry Chemical CO2	15	10.00	Chemical Room	/	/	/	/	16.10		
88	Dry Chemical CO2	10	10.00	Chemical Room	/	/	/	/	16.10		
89	Dry Chemical CO2	10	10.00	Gas Room	/	/	/	/	16.10		
90	Dry Chemical CO2	15	10.00	Gas Room	/	/	/	/	16.10		
91	Dry Chemical CO2	10	14.20	Waste Room	/	/	/	/	16.10		
92	Dry Chemical CO2	10	10.00	Waste Room	/	/	/	/	16.10		
93	Dry Chemical CO2	50	70.00	3F Electrical/Control Building (W)	/	/	/	/	16.10		
94	Dry Chemical CO2	50	70.00	3F Electrical/Control Building (E)	/	/	/	/	16.10		
95	Dry Chemical CO2	50	70.00	1F SWGR Room (W)	/	/	/	/	16.10		
96	Dry Chemical CO2	50	70.00	1F SWGR Room (E)	/	/	/	/	16.10		
97	Dry Chemical CO2	10	10.00	Conference building	/	/	/	/	16.10		
98	Dry Chemical CO2	15	10.00	Conference building	/	/	/	/	16.10		
99	Dry Chemical	2		Fan/Rot	/	/	/	/			
100	Dry Chemical	10	10.00	Pipe Pump/SB3	/	/	/	/	16.10		

CO2	10	100	Fire Pump/RS3
MAHACHULABHONJ	1.CO2 ขนาด 10 Lbs. สลายตัว ปริมาตรน้ำ 11.7 Kg. สลายตัว ปริมาตรน้ำในถัง 10.0 Kg. (ไม่ละลาย) 10 % ± ส่วนผสม 5% ของสารที่ละลายในถัง 15%		
	2.CO2 ขนาด 10 Lbs. สลายตัว ปริมาตรน้ำ 16.7 Kg. สลายตัว ปริมาตรน้ำในถัง 14.2 Kg. (ไม่ละลาย) 10 % ± ส่วนผสม 5% ของสารที่ละลายในถัง 15%		
	3.CO2 ขนาด 15 Lbs. สลายตัว ปริมาตรน้ำ 21.7 Kg. สลายตัว ปริมาตรน้ำในถัง 18.4 Kg. (ไม่ละลาย) 10 % ± ส่วนผสม 5% ของสารที่ละลายในถัง 15%		
	4.CO2 ขนาด 50 Lbs. สลายตัว ปริมาตรน้ำ 77.8 Kg. สลายตัว ปริมาตรน้ำในถัง 70.0 Kg. (ไม่ละลาย) 10 % ± ส่วนผสม 5% ของสารที่ละลายในถัง 15%		

Inspector	SEO
<i>W. B. King</i>	<i>W. B. King</i>
Date: Jan 10, 1972	Date: Jan 10, 1972

เอกสารแนบที่ 40

บันทึกการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุม

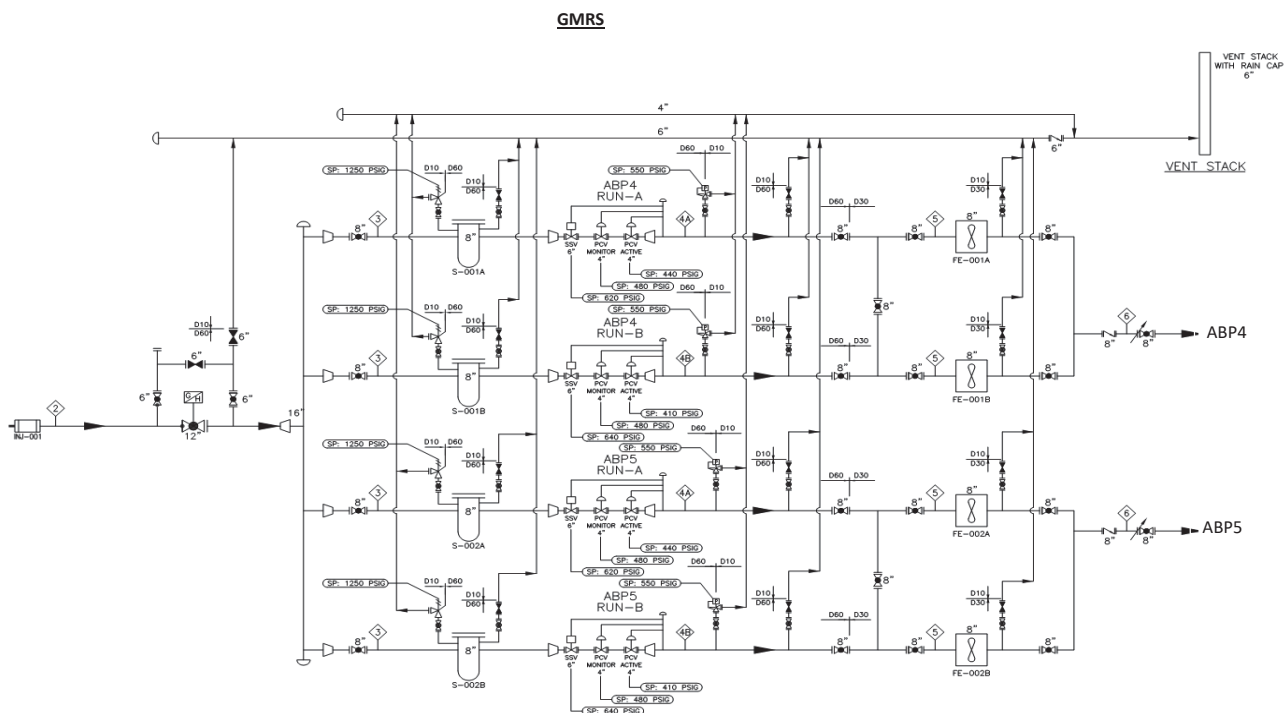

Comment 13:30-13:50 ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager


Checked by

24 / 01 / 23

24 / 01 / 23

GT51

4 of 5

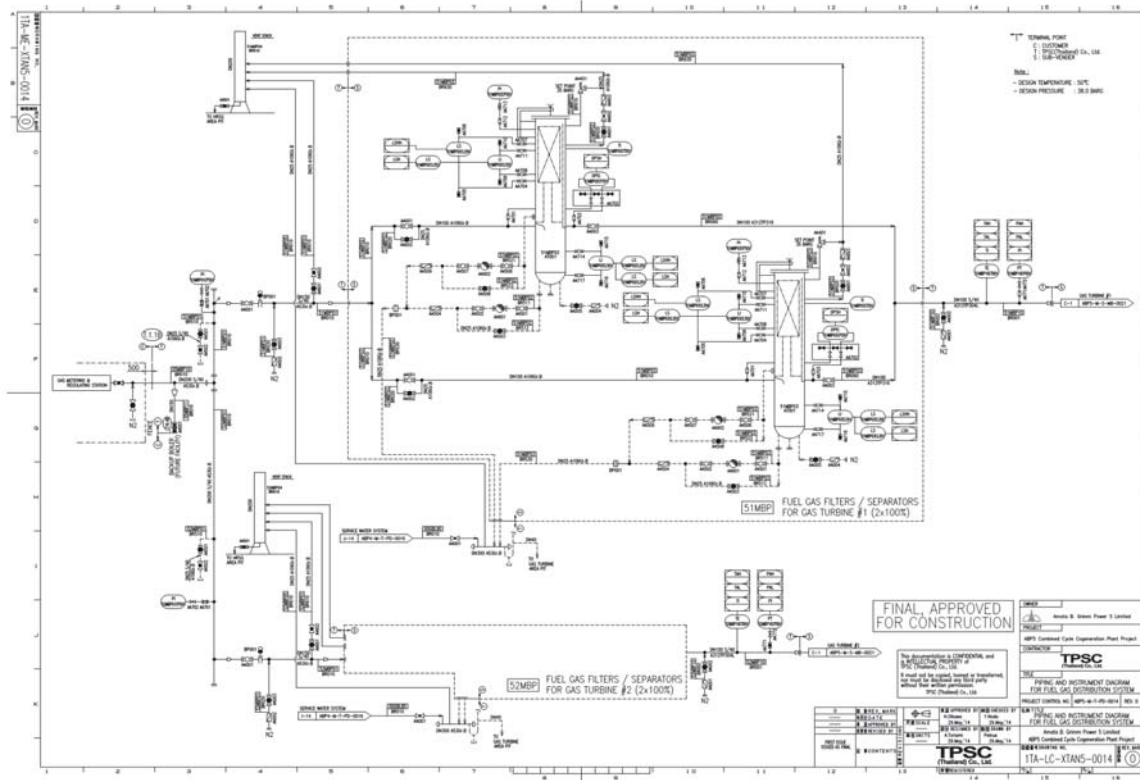


Comment 10:05 - 10:20 น.ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager

Checked by

24 / 01 / 23

24 / 01 / 23

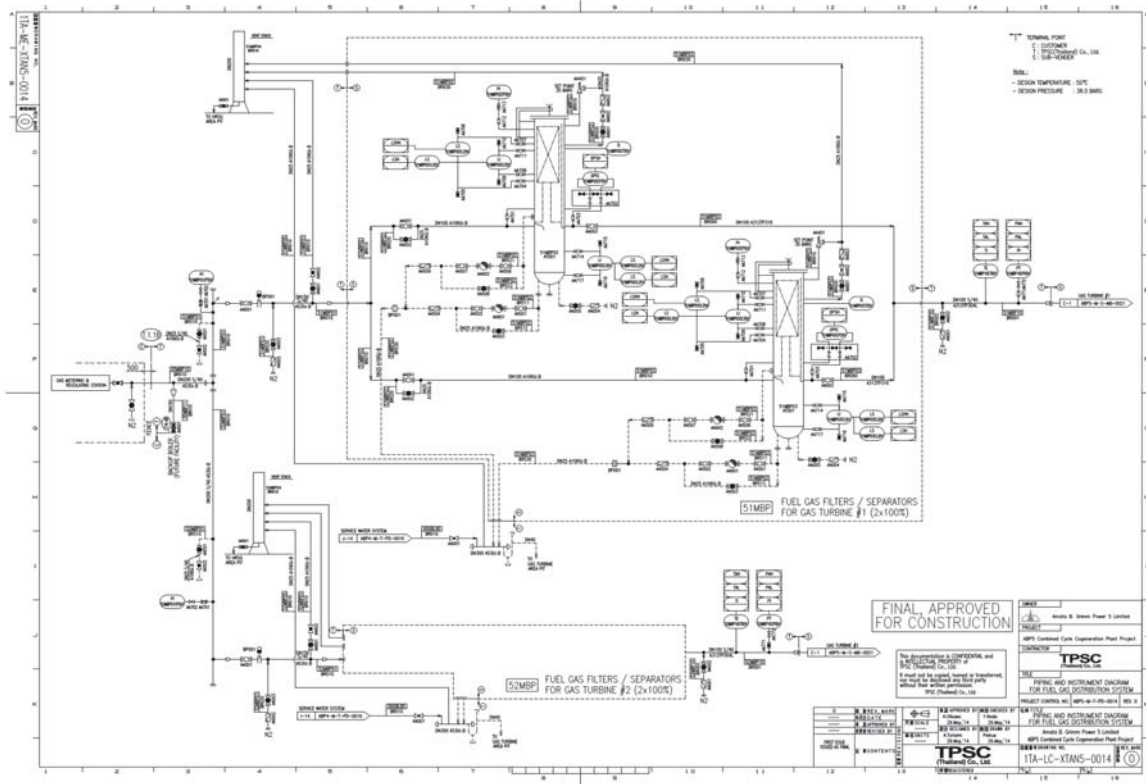

Comment 10:25 - 10:35 น. ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager

Checked by

24 / 01 / 23


24 / 01 / 23



FUEL GAS LINE WEEKLY CHECK LEAK

1 of 5

GMRS

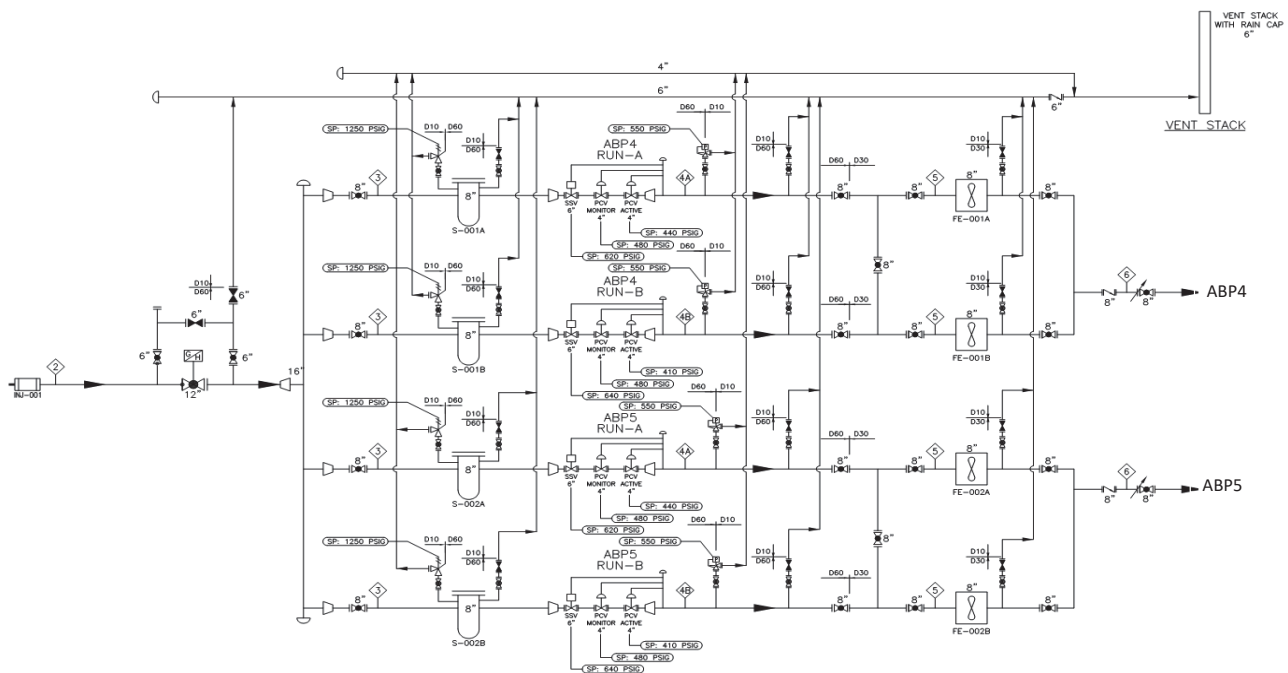


Comment 16:20-16:30 ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager

Checked by

21 / 02 / 23

21 / 02 / 23

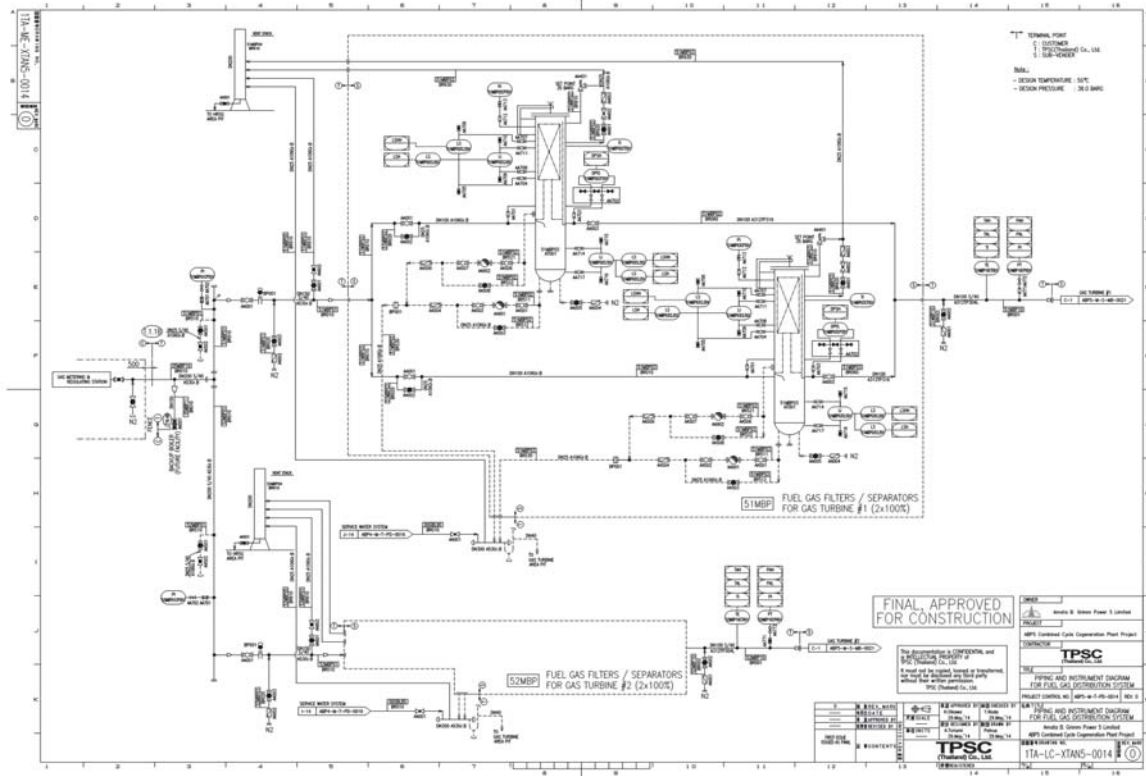


Comment 14:10 - 14:20 น.ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager

Checked by

21 / 02 / 23

21 / 02 / 23

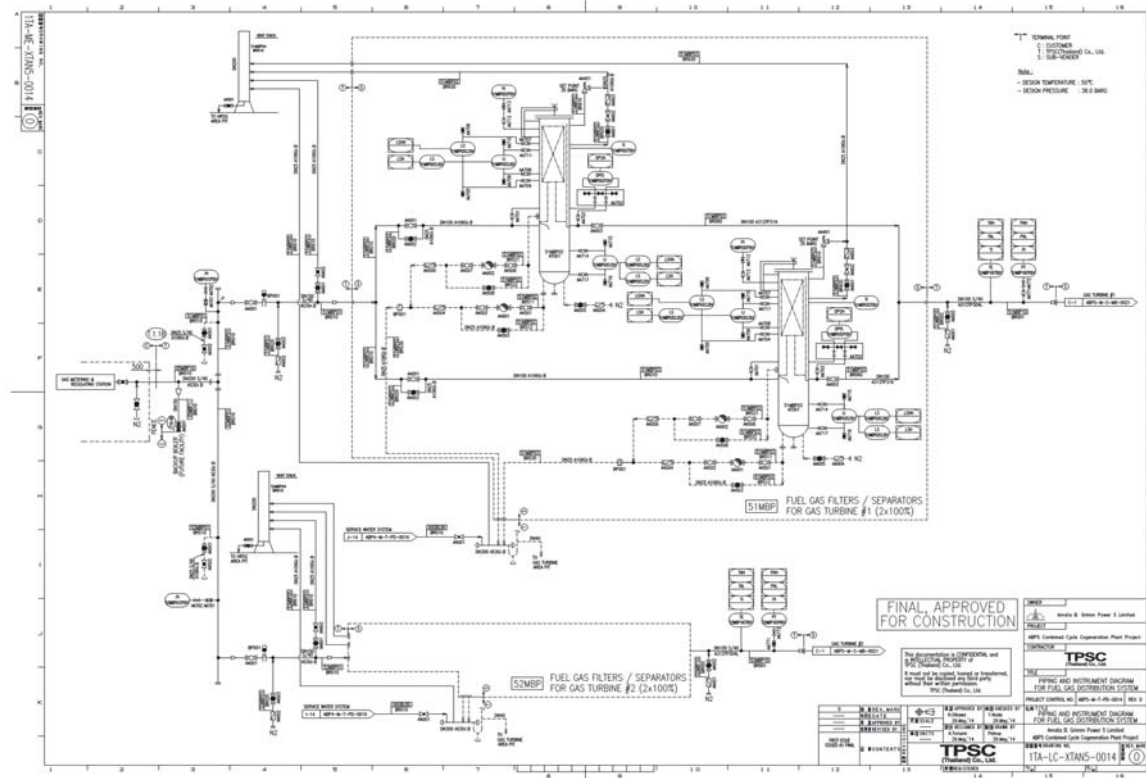

Comment 14:00 - 14:08 น. ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak


Operation Section Manager

Checked by

21 / 02 / 23

21 / 02 / 23

GMRS

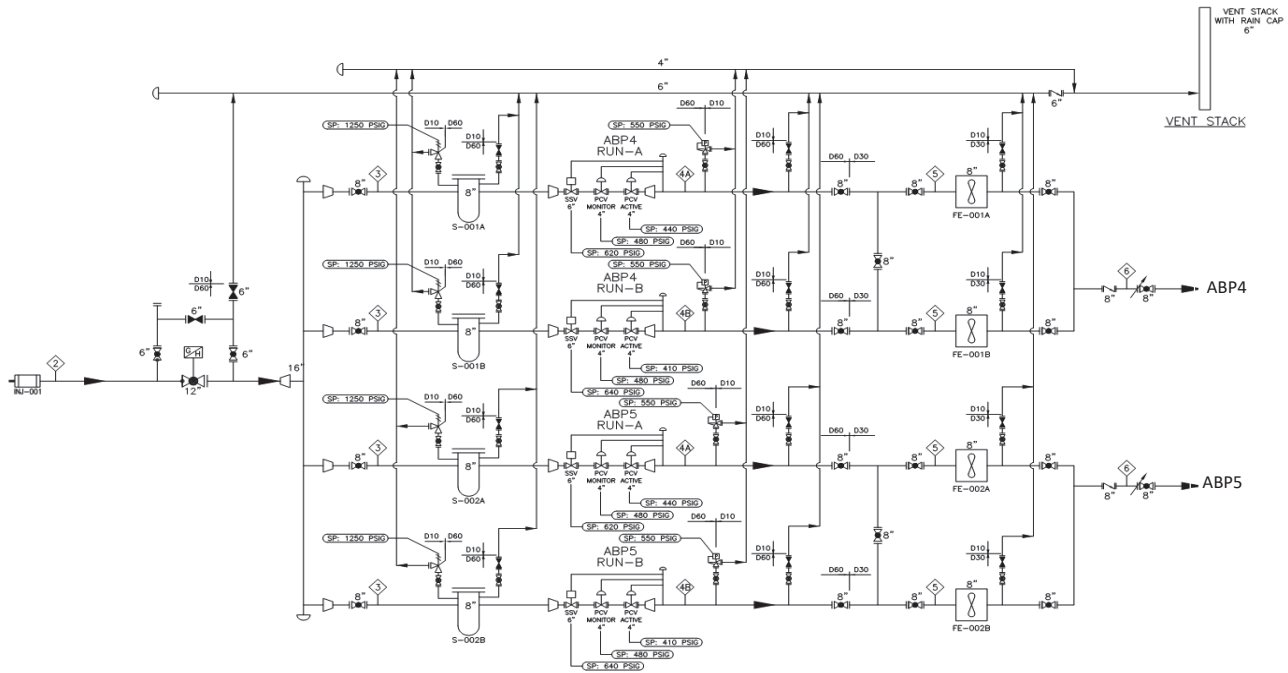

Comment 13:30-13:43 ตรวจสอบทํางานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager


Checked by

21 / 03 / 23

21 / 03 / 23

GT51

4 of 5

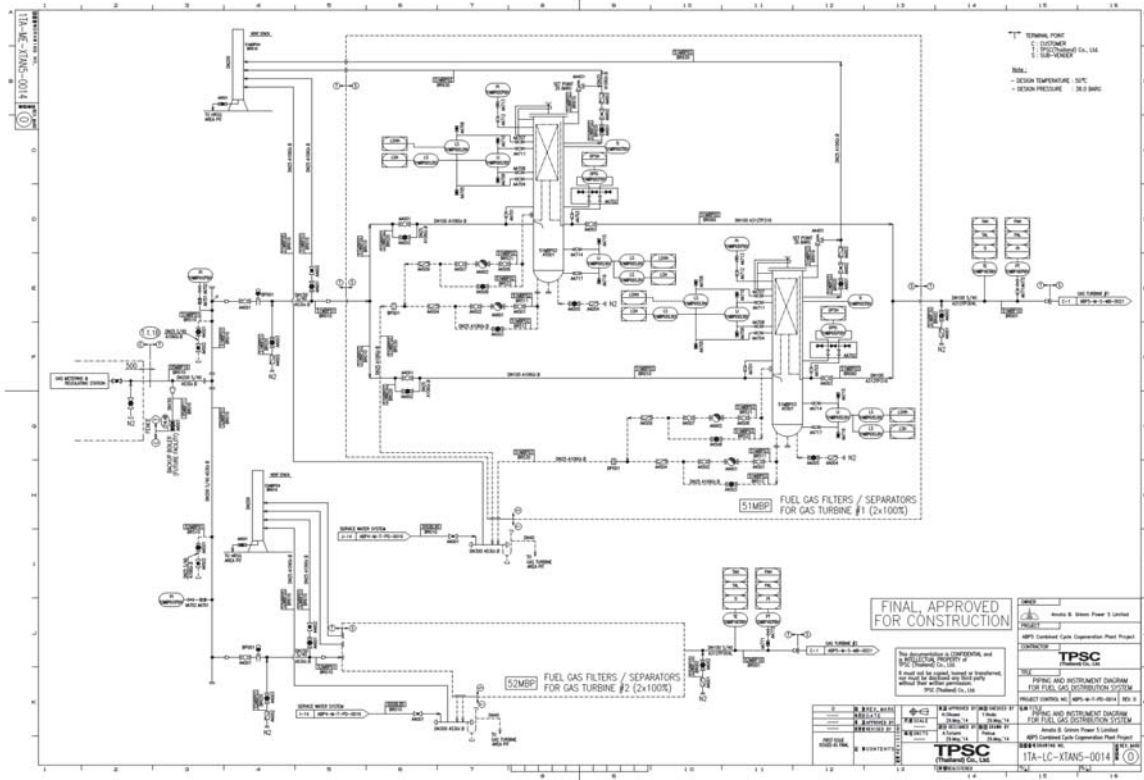


Comment 15:00 - 15:10 น.ตรวจสอบทํางานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager

Checked by

21 / 03 / 23

21 / 03 / 23

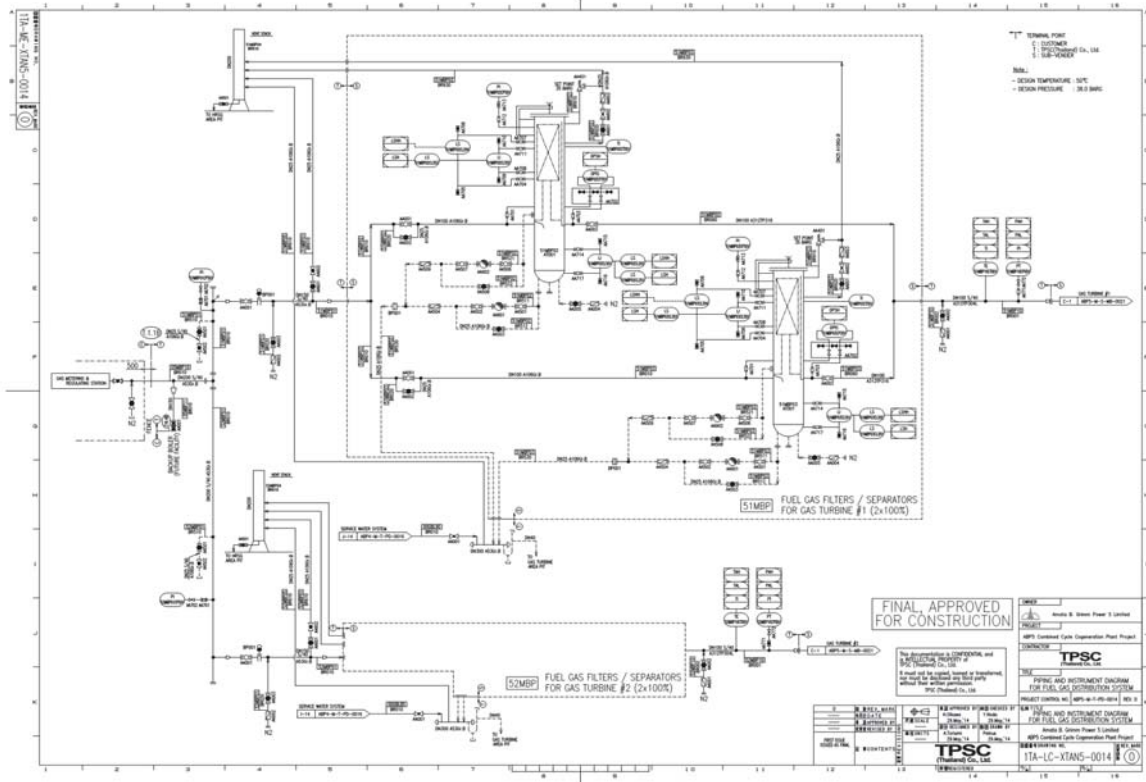

Comment 15:10 - 15:22 น. ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager

Checked by

21 / 03 / 23


21 / 03 / 23



FUEL GAS LINE WEEKLY CHECK LEAK

1 of 5

GMRS

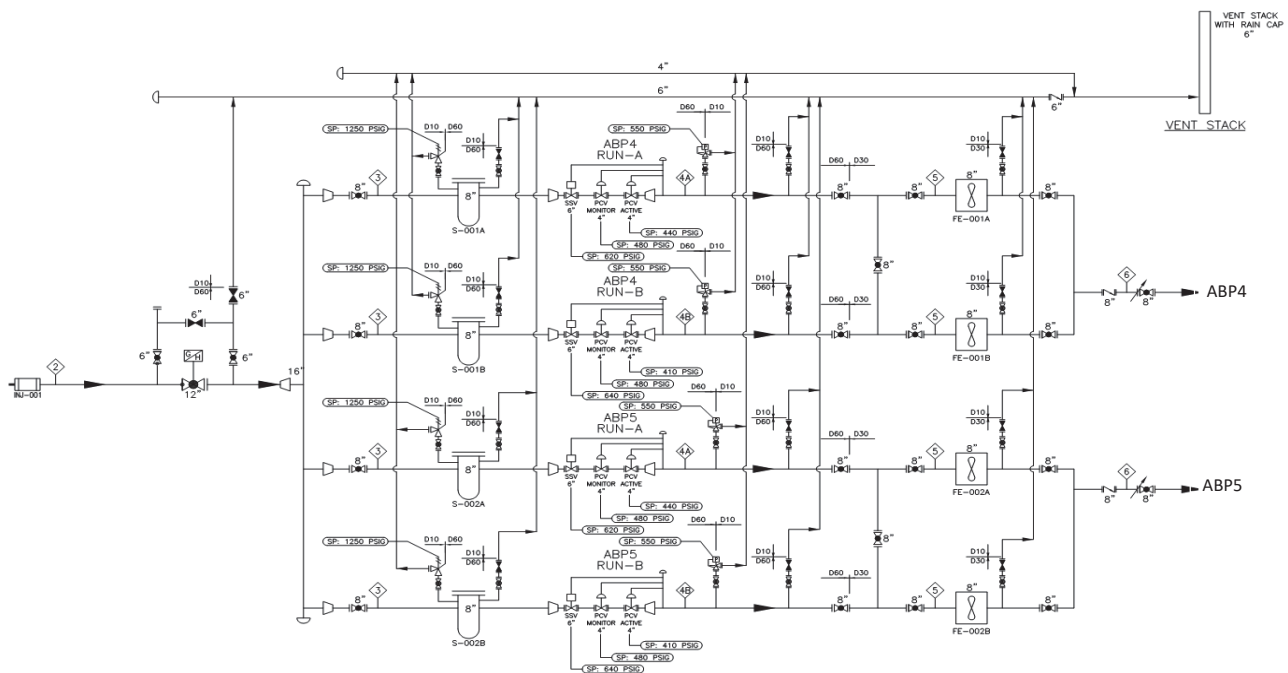

Comment 14:20-14:50 ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak


Operation Section Manager

สถิตย์วัฒน์ แพงคำท้าว

Checked by

25 / 04 / 23

25 / 04 / 23

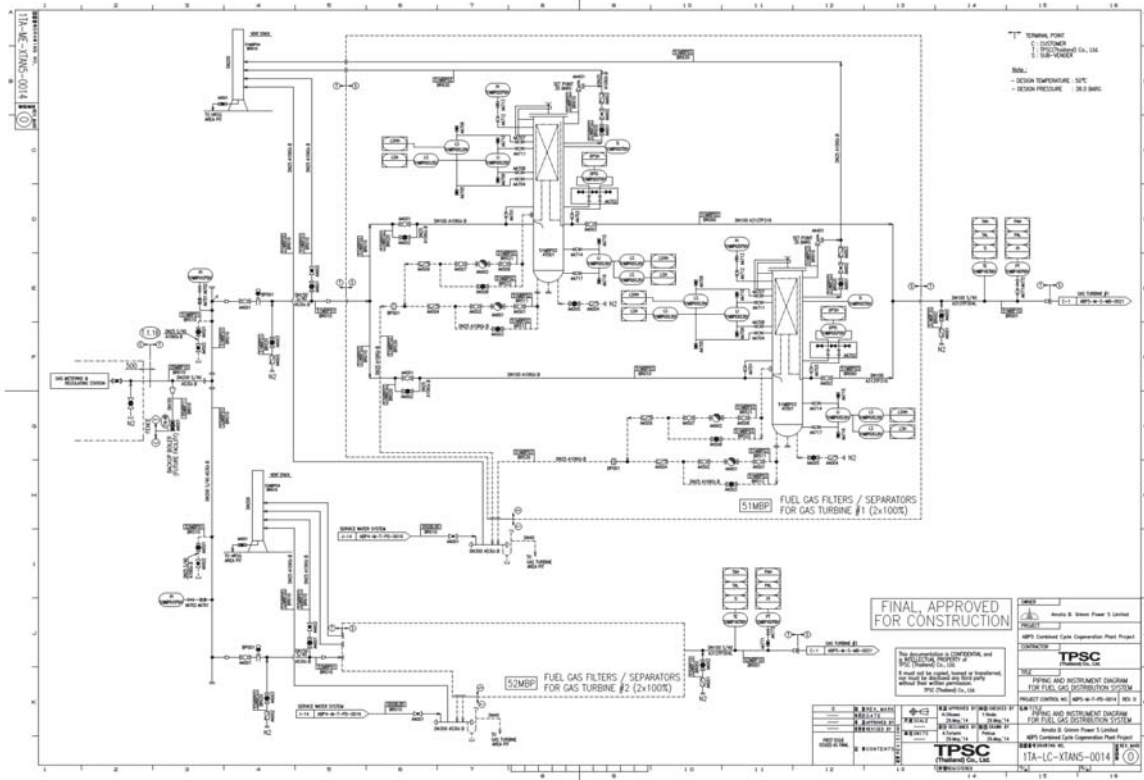


Comment 10:30 - 10:40 น.ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Operation Section Manager

Checked by

25 / 04 / 23

25 / 04 / 23

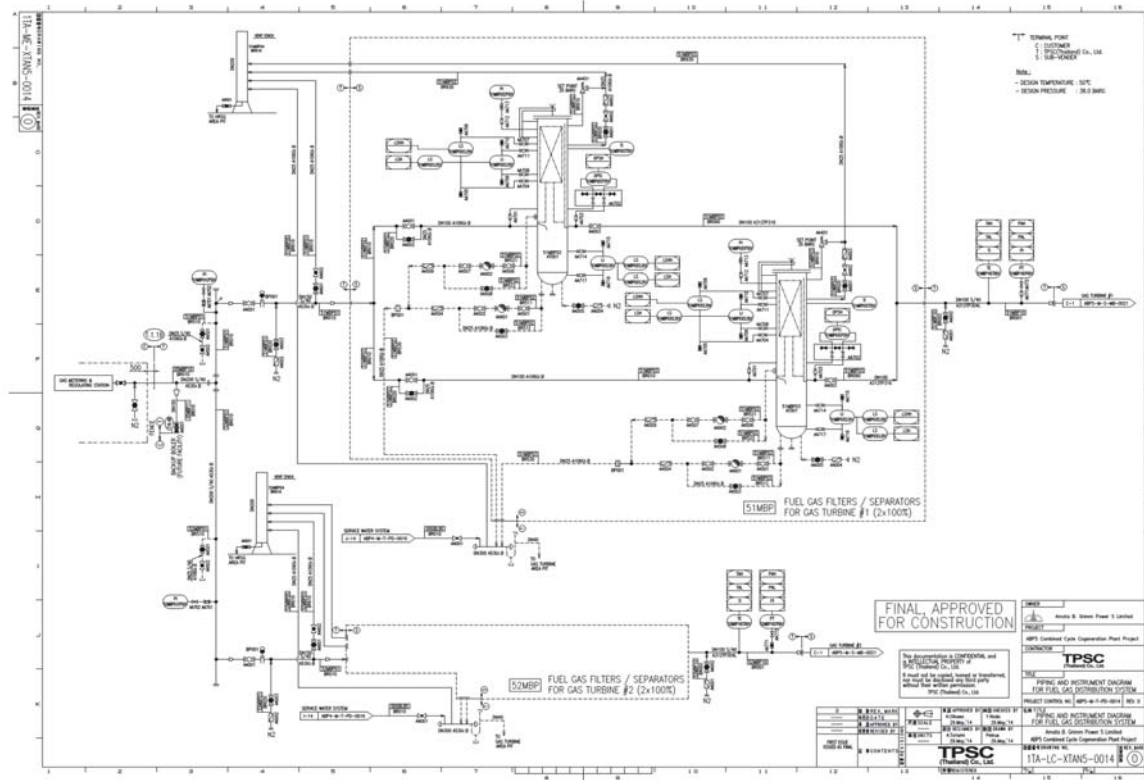

Comment 10:45 - 10:55 น. ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak


Operation Section Manager

Checked by

25 / 04 / 23

25 / 04 / 23

GMRS

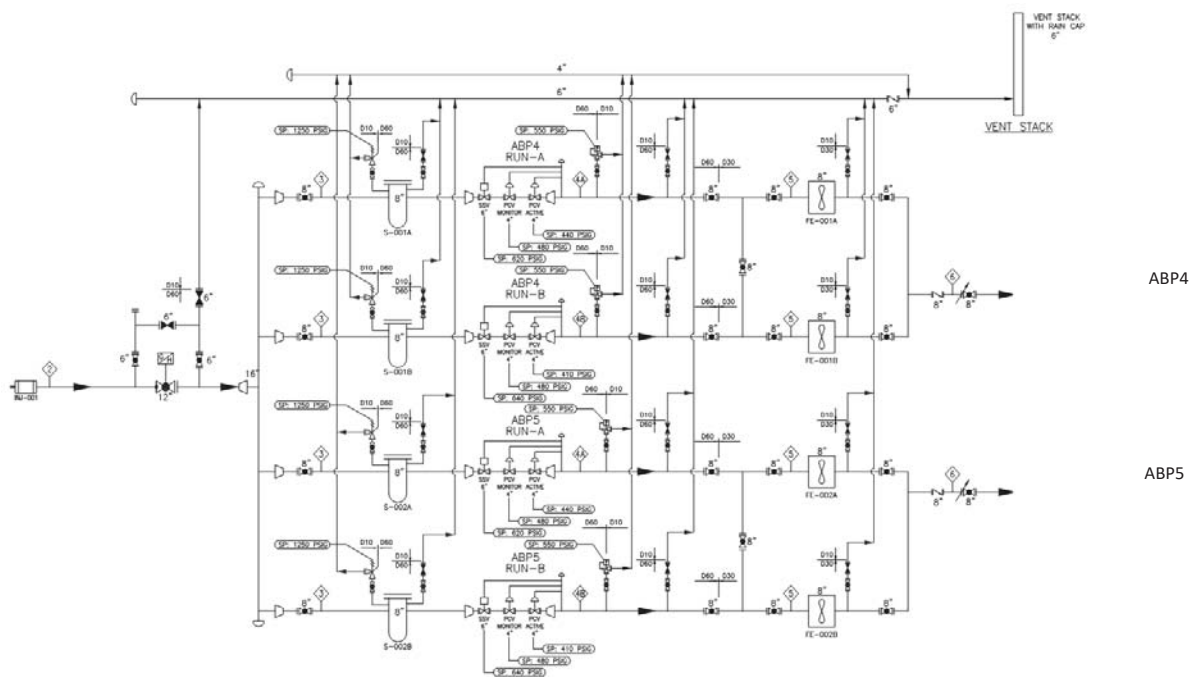


Comment

16:00-16:20 ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Checked by
16-05-23

Operation Section Manager
16-05-23

GT51

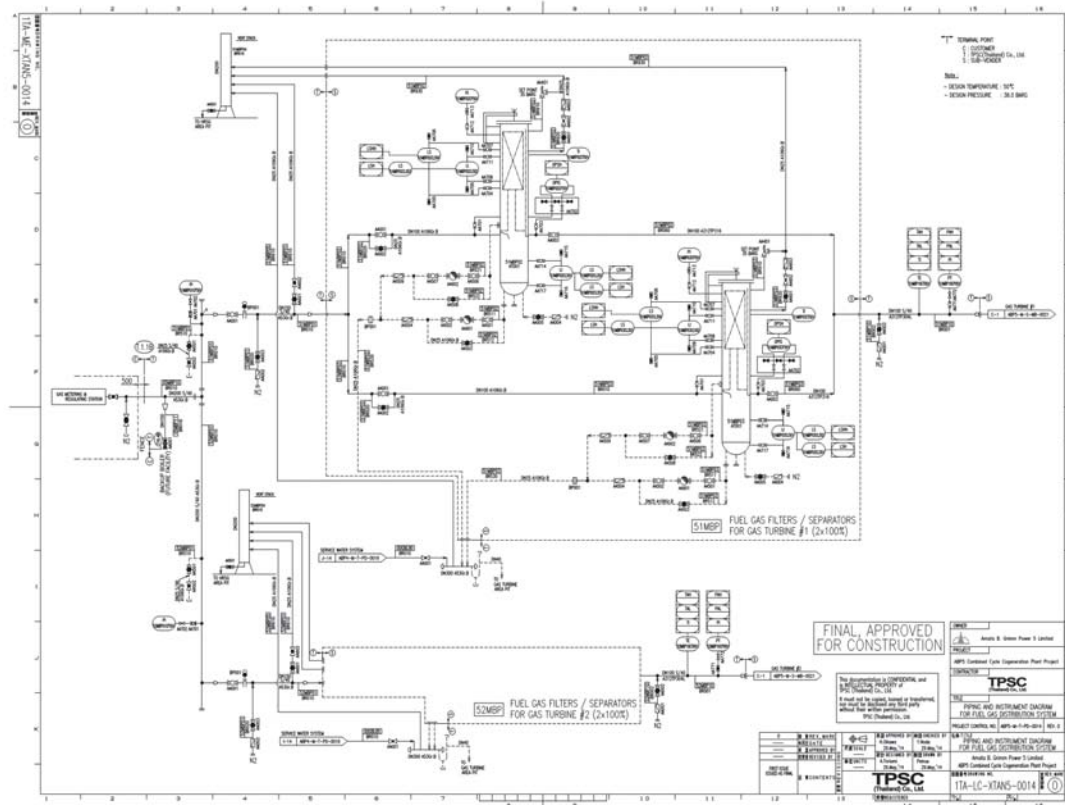


Comment

15:10 - 15:25 น.ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Checked by
16-05-23

Operation Section Manager
16-05-23

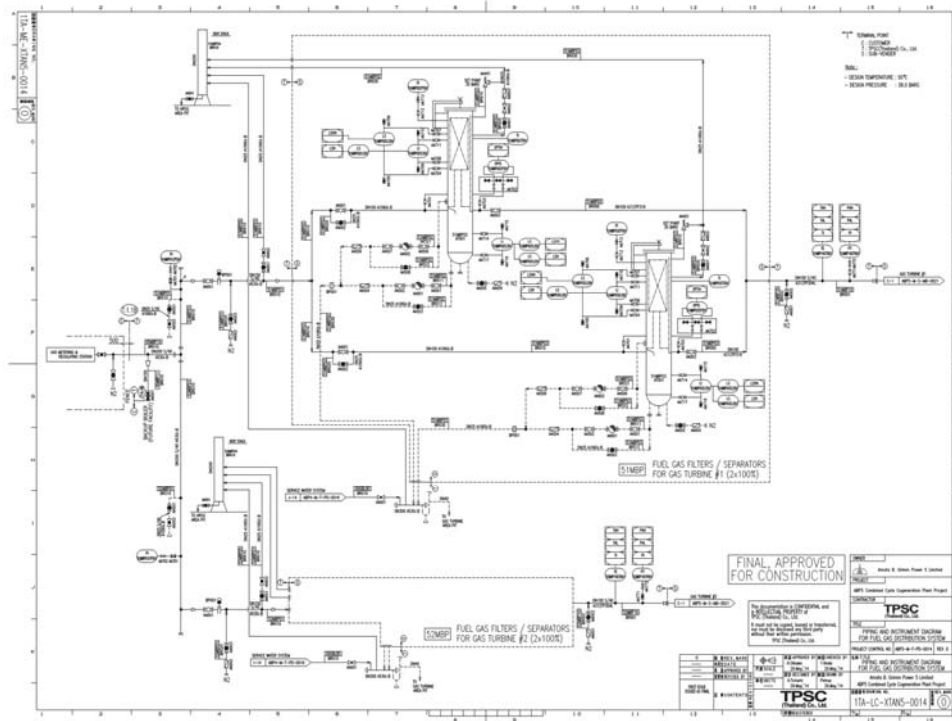

Comment


10:05-10:20 ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Checked by

27/06/2023

Operation Section Manager

27/06/2023

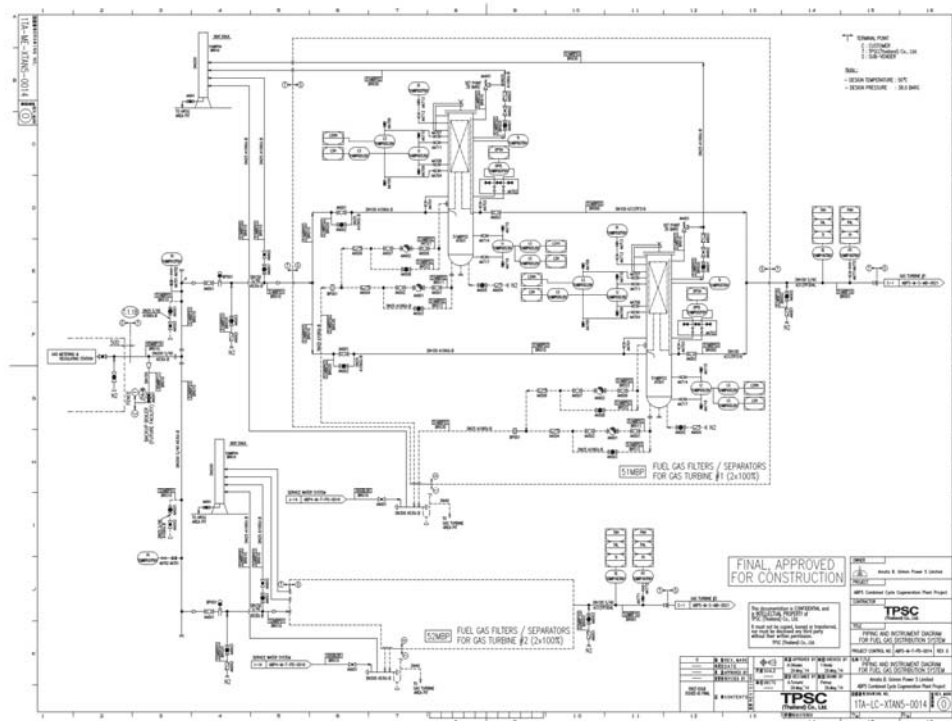

Comment

10:30 -10:45 น.ตรวจสอบหน้างานปกติไม่พบleak

Checked by

27/06/2023

Operation Section Manager

27/06/2023
