



รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างดำเนินการประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569
โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคาร ดี



นิติบุคคลอาคารชุด เอกสิน คอนโดมิเนียม
33/219 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เจ้าของโครงการ บริษัท เอกสิน การ์เด็นโฮม จำกัด
บริหารงานโดย บริษัท โกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 41/112 ม.11 ซอย 11 ต.บางแม่นางอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

สารบัญ

เรื่อง

บทที่ 1 บทนำ

- 1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
- 1.2 กิจกรรมภายในโครงการ
- 1.3 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ
- 2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 1 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก 2 เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ภาคผนวก 3 รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน

ภาคผนวก 4 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่าง ๆ ของโครงการ

ภาคผนวก 5 พื้นที่สีเขียว และงานดูแลสวน

ภาคผนวก 6 ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

ภาคผนวก 7 ความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก 8 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ภาคผนวก 9 การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร

ภาคผนวก 10 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 11 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก 12 เอกสารสำคัญนิติบุคคลฯ

ภาคผนวก 13 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 68

ภาคผนวก 14 หนังสือเห็นชอบ

ภาคผนวก 15 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการ

โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 69

วันที่ 7 กรกฎาคม 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุดเอกสิน คอนโดมิเนียม โดย บริษัท โกล พร็อพ
เพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี ประจำเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2569 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ตำแหน่ง
นายอุทัย	ผอ.บ.หลัก	ช่างประจำอาคาร
นางสาวทัศนีย์	จันทร์สง่า	ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการนิติลงนาม

ลงชื่อผู้ลงนาม

นายเวทิน วงศ์อ่อน เป็นผู้กระทำการแทน

ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี

โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี

1. ชื่อโครงการ : โครงการเอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี
: Akesin ConDominium
 2. สถานที่ตั้ง : ซอยงามวงศ์วาน 23 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 3. เจ้าของโครงการ : บริษัท เอกสิน การ์เด็นโฮม จำกัด
 4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 33/219 ซอยงามวงศ์วาน 23 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-580-9868
โทรสาร : 02-580-9868
E-mail : Akesin_d@hotmail.com
 5. จัดทำโดย : บริษัท โกล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
ตามหนังสือที่ ทส.1009/1709
 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565
 8. รายละเอียดโครงการ
-
- ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
 - ขนาดพื้นที่โครงการ : 1 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา
 - กิจกรรมในโครงการ
- การใช้น้ำ : การประปานครหลวง สาขานนทบุรี
การใช้ไฟ : การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
การจัดการขยะมูลฝอย : เทศบาลนครนนทบุรี

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ชื่อโครงการ	โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี
สถานที่ตั้งโครงการ	33/219 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของโครงการ	บริษัท เอกสิน การ์เด็น โฮม จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 83/5-8 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

บทที่ 1

บทนำ



1.1 รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี
2. สถานที่ตั้งโครงการ 33/219 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เอกสิน การ์เด็น โฮม จำกัด
4. จัดทำโดย บริษัท วิลล์คอน แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550
6. รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน:

ประเภทโครงการ บริการชุมชน และที่พักอาศัย – อาคารพักอาศัย

พื้นที่โครงการ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บริษัทไนซ์แอฟพาแรล จำกัด

ทิศใต้ ติดต่อกับ ร้านรุ่งดาร์งค์การช่าง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บริษัท ท็อปทริปปเบิลไนล์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางด่วนงามวงศ์วาน

ตารางที่ 1 กิจกรรมภายในโครงการ

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในปัจจุบัน
1. ลักษณะและรายละเอียดโครงการ พื้นที่โครงการ 1 -3- 31 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมด 189 ห้องชุด ร้านค้า 4 ร้าน	1. ลักษณะและรายละเอียดโครงการ - ขนาดพื้นที่โครงการ 1 -3-31 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมด 189 ห้องชุด ร้านค้า 4 ร้าน โดยปัจจุบันมีการเข้าพักอาศัยแล้วจำนวน 68 ห้องชุดคิดเป็นร้อยละ 68
2. แหล่งน้ำใช้ รับน้ำจากการประปานครหลวงสาขาประชาชื่นโดยมีการใช้น้ำประมาณ 135.8 ลบ.ม./วัน	2. แหล่งน้ำใช้ - รับน้ำจากการประปานครหลวง สาขาประชาชื่น ปริมาณการใช้น้ำในปัจจุบันประมาณ 135.8 ลบ.ม./ วัน - มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน มีความจุ 140 ลบ.ม. - มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ความจุ 60 ลบ.ม. - รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 190 ลบ.ม.
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge น้ำหลังจากการบำบัดระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	3. ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge น้ำหลังจากการบำบัดระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
4. การระบายน้ำ ออกแบบให้ระบบระบายน้ำสามารถหน่วงน้ำไว้ในระบบท่อระบายน้ำของโครงการปริมาตร 111 ลบ.ม. และควบคุมอัตราการระบายออกสู่ภายนอก	4. ลักษณะการระบายน้ำ - มีระบบระบายน้ำสามารถหน่วงน้ำไว้ในระบบท่อระบายน้ำของโครงการ และควบคุมอัตราการระบายออกสู่ภายนอก
5. การจัดการขยะ จัดเตรียมภาชนะรองรับรองรับมูลฝอยทั้งหมด 17 ถัง และมูลฝอยแห้งขนาด 7 ถัง ขยะเปียก 7 ถัง ในแต่ละชั้นของอาคาร ตั้งแต่ชั้น 1 – ชั้น 8 และมีการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารจำนวน 2 ถัง	5. การจัดการขยะ จัดเตรียมภาชนะรองรับรองรับมูลฝอยทั้งหมด 17 ถัง และมูลฝอยแห้งขนาด 7 ถัง ขยะเปียก 7 ถัง ในแต่ละชั้นของอาคาร ตั้งแต่ชั้น 1 – ชั้น 8 และมีการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารจำนวน 2 ถัง พนักงานทำความสะอาดจะเก็บลงมาชั้นล่างคัดแยกขยะออกไว้ตรงที่จัดไว้ให้ จากนั้นเจ้าหน้าที่เทศบาลจะเข้ามาทำการเก็บทุก ๆ เช้าเวลาประมาณ 04.00 น.

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในปัจจุบัน
6. การจัดการจราจรภายในโครงการ จัดให้มีพื้นที่จอดรถอย่างน้อย 60 คัน จำนวน 60 ช่องจอด	- โครงการได้จัดที่ไว้สำหรับจอดรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ ปัจจุบันมีการใช้จำนวนสูงสุด 88 ช่องจอด คิดเป็นร้อยละ 45 จัดให้มี การติดตั้งป้ายการจราจรภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ภายในโครงการ
7. ระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการควบคุม มลพิษของโครงการ	- แยกระบบระบายน้ำและน้ำเสีย โดยระบบระบายน้ำฝนระบายลง สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ สำหรับน้ำทิ้งจากครัวเรือนจะเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียชนิด Activated Sludge ปัจจุบันระบบบำบัดสามารถ รองรับปริมาณน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดถูก ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

1.2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เอกสินคอน โคมิเนียม จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินการโครงการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ตาม
หนังสือที่ EIA 07103/404913D ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานติดตามตรวจสอบฯ 2 ครั้งต่อปีคือภายในเดือน
กรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวม
ผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ของปีก่อน)

1.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้โครงการต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้งจากโครงการ ระบบระบายน้ำ การจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนภัย น้ำใช้และการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดให้มี
ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แตกต่างกันดังนี้

1. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุก 6 เดือน
2. ตรวจสอบรอยรั่วซึม หรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง
3. ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. ตรวจสอบอุปกรณ์อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำวัน
6. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าในโครงการประจำวัน

บทที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ

โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โดยการตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการ ร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 และเสนอผลการปฏิบัติที่ได้มี การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ และแนวทางการแก้ไขโครงการ และแสดงรูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงาน^๕ตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม^๖

ตารางที่ 2. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ

[illegible]

ตารางที่ 2. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและแนวโน้มการของโครงการ

ตารางที่ 2. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและแนวโน้มการของโครงการ

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติงานเงินใจของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและแผนงาน	เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพอากาศ					
4.1 สภาพสิ่งแวดล้อม					
ที่ตั้งโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 36,246 คน เป็นผู้ชาย 17,322 คน หญิง 18,924 คน จำนวนครัวเรือน 15,426 ครัวเรือน ความหนาแน่นค่อนข้างต่ำไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากนัก		(1) หากได้รับการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยว่าได้รับความเดือดร้อนจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จะต้องแจ้งให้ทางเทศบาลและแก้ไขผลกระทบความเดือดร้อน ปรึกษาผู้ให้แจ้งเสียโดยเร็วที่สุด	(1) โครงการฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยว่าได้รับความเดือดร้อนจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จะต้องแจ้งให้ทางเทศบาลและแก้ไขผลกระทบความเดือดร้อน ปรึกษาผู้ให้แจ้งเสียโดยเร็วที่สุด		ภาคผนวก 9
4.2 สาธารณสุข					
อำเภอเมืองนนทบุรี ให้สามารถดำเนินการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเพียงพอ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการรักษาพื้นที่เป็นรัฐบาลและเอกชน หลายระดับมีการดำเนินการด้านสาธารณสุขของรัฐบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 3 แห่ง สถานอนามัย 15 แห่งศูนย์บริการสาธารณสุข 76 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาล 3 แห่ง คลินิกแพทย์ 105 แห่ง คลินิกทันตกรรม 50 แห่ง จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีจำนวนทั้งสิ้น 1,189 คน		(1) ต้องมีระบบป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากกิจกรรมการดำเนินงาน, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยความปลอดภัยตามที่เป็นอยู่ในรายงานประกอบด้วย 1) น้ำสำรองถึงหลังของอาคาร 60 ลูกบาศก์เมตร (ถังสำรองน้ำดับเพลิงชนิดแห้ง) 2) ระบบป้องกันดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) จำนวน 8 เครื่อง และถังดับเพลิง จำนวน 39 เครื่อง ดังรูปที่ 4 3) หัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคารชนิดข้อต่อสามเร็ว 4) หัวดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง ดังรูปที่ 5 5) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Smoke Detector, Heat Detector) 6) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติ ที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุที่ไซโลเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ (Alarm Bell) ขึ้นล่าง 2 แห่ง ขึ้น 2-8 จำนวน 2 แห่ง รวม 9 แห่ง ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 7) หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkle System) ทุกชั้น ประกอบด้วยชั้นที่ 1 จำนวน 8 จุด ชั้นที่ 2-8 จำนวน 28 จุด รวมทั้งหมด 196 จุด ดังนั้นภายในอาคารจะมีหัวกระจายน้ำดับเพลิงทั้งหมด 204 จุด ดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5 (2) โครงการต้องประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถานีดับเพลิงวัดเนินพิศกร กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ สถานะของอาคารหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวนอื่น โดยข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ เส้นทางเข้า-ออกหลัก จุดติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้นในการติดต่อ คำนึงถึงบันไดหนีไฟและตู้ดับเพลิงประจำชั้น (3) โครงการต้องมีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับบุคลากรอาคารชุดเพื่อเตรียมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (4) โครงการต้องมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยระบุวิธีการอพยพผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ (5) โครงการต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกโครงการ	(1) โครงการฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยว่าได้รับความเดือดร้อนจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จะต้องแจ้งให้ทางเทศบาลและแก้ไขผลกระทบความเดือดร้อน ปรึกษาผู้ให้แจ้งเสียโดยเร็วที่สุด		ภาพที่ 5.6
4.3 การป้องกันและลดผลกระทบ					

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓

๒. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของโครงการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง	เอกสารอ้างอิง
4.4 คุณภาพ จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวนาและเกษตรกรรมที่หมู่บ้านชาวนาอู๋ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา วัดเขาพระบาทวังตาคู่ วัดอัมพวัน เป็นต้น ตัวเลขของชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการไม่ปรากฏตามที่ตั้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	(1) ต้องมีและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวขนาด 712 หรือร้อยละ 24.4 ของพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่สีเขียวที่เลือกปลูก ได้แก่ - พันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ทองหลางฝรั่ง และอินทนิล ขนาด 360 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - พันธุ์ไม้พุ่ม ได้แก่ ขี้เหล็กขนาด 190 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - พันธุ์ไม้ยืนต้นขนาด 162 ตารางเมตร - พันธุ์ไม้พุ่มขนาดเล็กในโครงการ ดำเนินการปลูกและพื้นที่สีเขียวในรูปที่ 7 และรูปที่ 8	(1) โครงการ ต้องมีและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวขนาด 712 หรือร้อยละ 24.4 ของพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่สีเขียวที่เลือกปลูก ได้แก่ - พันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ทองหลางฝรั่ง และอินทนิล ขนาด 360 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - พันธุ์ไม้พุ่ม ได้แก่ ขี้เหล็กขนาด 190 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - พันธุ์ไม้ยืนต้นขนาด 162 ตารางเมตร - พันธุ์ไม้พุ่มขนาดเล็กในโครงการ ดำเนินการปลูกและพื้นที่สีเขียวในรูปที่ 7 และรูปที่ 8	ภาพรวมภาพ	
4.5 วัสดุและการจัดการของเสีย 4.6 มาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน	(1) การลดการปล่อยของเสียจากพื้นที่สีเขียวในอาคาร โดยคิดต้นทุนการปลูกที่ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่สีเขียว (2) เครื่องปรับอากาศ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน (3) การใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟประหยัดพลังงาน (4) การจัดการของเสีย - อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานเป็นประจำวัน	(1) โครงการลดการปล่อยของเสียจากพื้นที่สีเขียวในอาคาร โดยคิดต้นทุนการปลูกที่ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่สีเขียว (2) โครงการเครื่องปรับอากาศ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน (3) โครงการพลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟประหยัดพลังงาน (4) โครงการจัดการของเสีย - อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานเป็นประจำวัน	ภาพรวมภาพ	
4.7 มาตรการในการลดปริมาณการปล่อย	(1) มีพื้นที่สีเขียวที่เลือกปลูกให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่โครงการ โดยเลือกใช้พันธุ์ไม้ยืนต้นที่ทนแล้งและประหยัดน้ำ (2) การลดการปล่อยของเสียจากพื้นที่สีเขียวในอาคาร โดยกำหนดค่าเฉลี่ยการปล่อยของเสีย (3) จัดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการปลูกไม้ประดับเพิ่มเติมในส่วนบริเวณของพื้นที่ปลูก (4) จัดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการปลูกไม้ประดับเพิ่มเติมในส่วนบริเวณของพื้นที่ปลูก	(1) โครงการมีพื้นที่สีเขียวที่เลือกปลูกให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่โครงการ โดยเลือกใช้พันธุ์ไม้ยืนต้นที่ทนแล้งและประหยัดน้ำ (2) โครงการลดการปล่อยของเสียจากพื้นที่สีเขียวในอาคาร โดยกำหนดค่าเฉลี่ยการปล่อยของเสีย (3) โครงการจัดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการปลูกไม้ประดับเพิ่มเติมในส่วนบริเวณของพื้นที่ปลูก (4) โครงการจัดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการปลูกไม้ประดับเพิ่มเติมในส่วนบริเวณของพื้นที่ปลูก	ภาพรวมภาพ	

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการของโครงการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง	เอกสารอ้างอิง
	ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการได้เครื่องปรับอากาศ (5) ออกแบบและติดตั้งสวิตช์เปิดปิดเครื่องปรับอากาศแยกออกจากกันในแต่ละพื้นที่ของอาคาร เพื่อความสะดวกในการเปิดปิดให้ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าและลดปริมาณความร้อนที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ (6) กำหนดใช้วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้าง โดยคำนึงกระบวนความร้อนจากอาคารออกสู่ภายนอก และไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิภายในอาคารเพื่อลดปัญหาการได้เครื่องปรับอากาศ (7) การติดตั้งหน้าต่าง ช่องระบายอากาศในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลมในบริเวณพื้นที่โครงการ (8) กำหนดให้วัสดุบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของอาคารลดพื้นที่ที่สามารถเพิ่มการดูดซับและไม่สะท้อนอุณหภูมิของอาคาร โครงการออกสู่ภายนอก (9) โครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ภายในพื้นที่โครงการส่วนที่สามารถลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ที่โครงการได้ (10) คัดสรรจำนวนกันลวามร้อนที่หลังคาหรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์	ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการได้เครื่องปรับอากาศ (5) โครงการออกแบบและติดตั้งสวิตช์เปิดปิดเครื่องปรับอากาศแยกออกจากกันในแต่ละพื้นที่ของอาคาร เพื่อความสะดวกในการเปิดปิดให้ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าและลดปริมาณความร้อนที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ (6) โครงการกำหนดใช้วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้าง โดยคำนึงกระบวนความร้อนจากอาคารออกสู่ภายนอก และไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิภายในอาคารเพื่อลดปัญหาการได้เครื่องปรับอากาศ (7) โครงการการติดตั้งหน้าต่าง ช่องระบายอากาศในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลมในบริเวณพื้นที่โครงการ (8) โครงการกำหนดให้วัสดุบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของอาคารลดพื้นที่ที่สามารถเพิ่มการดูดซับและไม่สะท้อนอุณหภูมิของอาคาร โครงการออกสู่ภายนอก (9) โครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ภายในพื้นที่โครงการส่วนที่สามารถลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ที่โครงการได้ (10) โครงการการคัดสรรจำนวนกันลวามร้อนที่หลังคาหรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์	ภาคผนวก 6 ภาคผนวก 9 ภาคผนวก 9 ภาคผนวก 9 ภาคผนวก 5 ภาคผนวก 9	

โครงการเอกสินคอน โคมิเนยม อาคารดี

รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ

บริเวณพื้นที่รอบโครงการ

ป้ายชื่อและบริเวณภายนอกอาคาร

ป้อมยาม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ

อุปกรณ์ดับเพลิง


วางระบายนํ้าภายในโครงการ

บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ

บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่สีเขียว

แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ

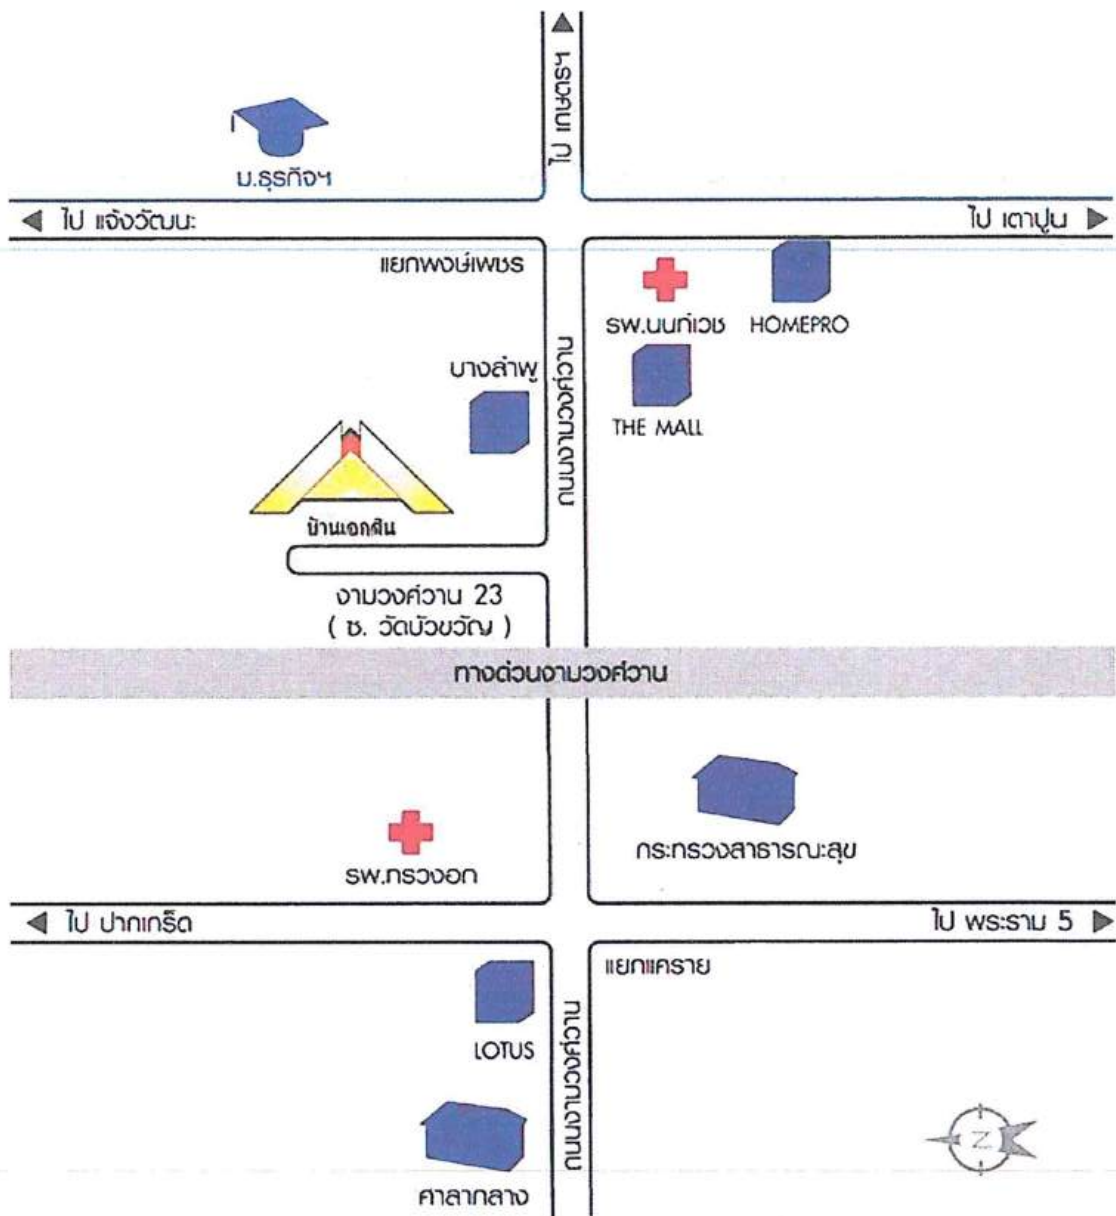

ภาพที่ 1 บริเวณพื้นที่รอบโครงการ

ภาพด้านหน้าโครงการ



ภาพด้านหลังโครงการ




ภาพด้านขวาโครงการ



ภาพด้านซ้ายโครงการ



ภาพที่ 2 ป้ายชื่อโครงการ และ บริเวณภายนอกตัวอาคาร

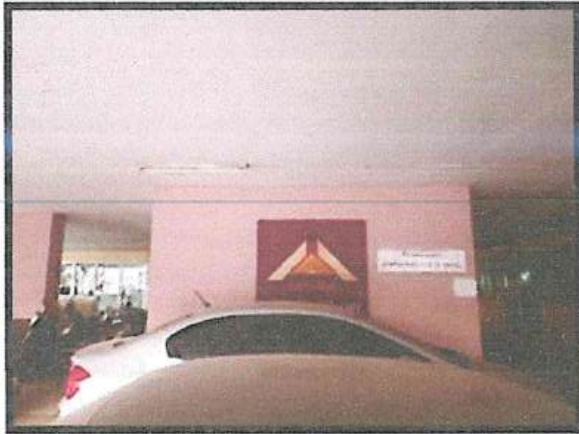

ภาพที่ 3 ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง




ภาพที่ 4 กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 6 อุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 7 รางระบายน้ำภายในโครงการ

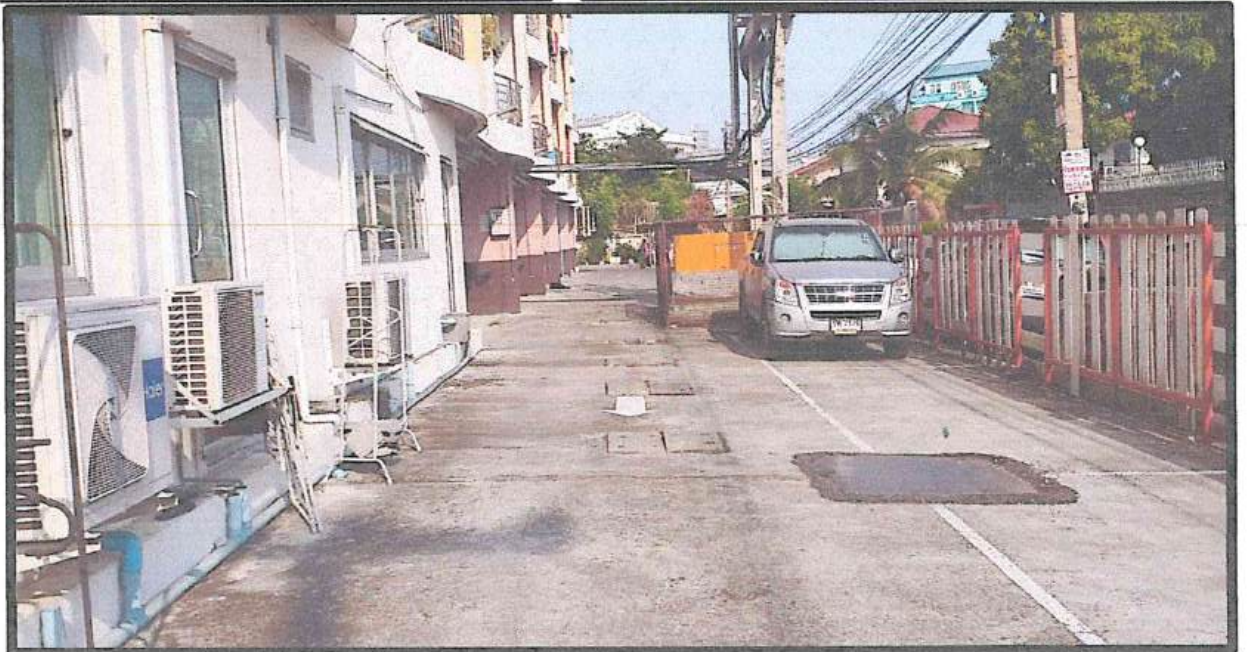

ภาพที่ 8 บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ



ภาพที่ 9 บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่สีเขียว



2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่นิคมอุตสาหกรรมชุด เอกสินคอน โคมิเนียม ได้ทำการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอกสิน คอน โคมิเนียมในระยะดำเนินการ ระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ เสนอต่อ สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำทิ้ง ในระยะดำเนินการ ซึ่งมีวิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของกรมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเปิดดำเนินการ 1. คุณภาพอากาศ 1.1ฝุ่นละออง	1)ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2)ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-ความสะอาด -ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ -ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	-ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ -สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมีเนียม
1.2 มลพิษทางอากาศ	1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามติด เครื่องหมาย ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 4) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	-ความสะอาด -ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ ละชนิด -สภาพที่มองเห็นชัดเจน และ ไม่บดบัง -ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ -ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ -ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ -ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	-ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ -ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ -เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ -สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมีเนียม
2..เสียง	1) ภายในพื้นที่โครงการ -ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายห้าม แรงเครื่องยนต์ สิ้นสุดชะลอ ความเร็ว เป็นต้น 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	-สภาพที่มองเห็นชัดเจน และ ไม่บดบัง -ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมีเนียม
			-ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	-สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมีเนียม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
3. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา - ถึงกับน้ำใช้ - วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา - ความสะอาด - การปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น.	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมิเนียม
5. น้ำเสีย 5.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (1) คุณภาพน้ำทั้ง ก่อนการบำบัด	บ่อแยกกากตะกอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด	-pH -BOD -Suspended Solids -Settleable Solids -Total Dissolved Solids -TKN -Fat Oil & Grease -Total Coliform Bacteria -Fecal Coliform Bacteria	-เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมิเนียม
(2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	-pH -BOD -Suspended Solids -Settleable Solids -Total Dissolved Solids -TKN -Fat Oil & Grease -Total Coliform Bacteria -Fecal Coliform Bacteria	-เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมิเนียม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	-ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1.ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2.ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) 3.ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 4.การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย) 5.ปริมาณเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ต่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) 6.การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 7.การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) 8.การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 9.การทำงานของเครื่องกวาดผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 10.การทำงานของเครื่องผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	-เก็บสถิติและข้อมูลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ จัดทำบันทึกรายละเอียดและ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามทบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535)	1.จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ พส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ นั้น เป็นเวลา 2 ปี 2.จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือน ตามแบบ พส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตบางเขน) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	นิติบุคคลอาคารชุดเอ็กสโตนคอนโดมิเนียม

รายงานผลการปฏิบัติงานเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

			11.เครื่องสูบลูกบอล(ปกติ/ผิดปกติ) 12.อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 13.ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลูกบาศก์เมตร) 14.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข				
6.การระบายน้ำ	- บ่อพักน้ำภายในโครงการ ระบายน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการ	-การสะสมของตะกอนดินในบ่อพักและท่อระบายน้ำ	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		นิติบุคคลอาคารชุดเอกชน คนใดมีเนียม	
	-เครื่องสูบน้ำภายในบ่อน้ำ	-สภาพพร้อมใช้งาน -อายุการใช้งาน	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	-3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		นิติบุคคลอาคารชุดเอกชน คนใดมีเนียม	

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านเงิน ไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
7. มลพิษ	พื้นที่โครงการ -บริเวณที่ตั้งถังมูลปล่อย ห้องพัก มูลปล่อยประจำชั้น และห้องพัก มูลปล่อยรวมของโครงการ 2) ผู้อาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	-ปริมาณมูลปล่อยตกค้าง -ความสะอาด -กลิ่น และทัศนียภาพ	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ -ติดตามประเมินจากส่วนรับ เรื่องร้องเรียนและความ คิดเห็น	-ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมิเนียม
8. ระบบไฟฟ้า	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระวังอันตราย 2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	-สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนไม่ ลบเลือน -สภาพการใช้งาน -อายุการใช้งาน -สภาพพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ -ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	-ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ -3 เดือน / ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมิเนียม
9. การอนุรักษ์พลังงาน	-ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนกลาง -ระบบปรับอากาศส่วนกลาง -เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น จุดติดประกาศและป้าย ประชาสัมพันธ์	-เครื่องหมายแสดง ประสิทธิภาพ -ประหยัดพลังงานที่ระบุมากับ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า -อายุการใช้งานของอุปกรณ์ ไฟฟ้า -สภาพดี มองเห็นได้อย่าง ชัดเจนไม่ลบเลือน	-ตรวจสอบตามชนิดของ อุปกรณ์ -ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ -เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลิน คอนโดมิเนียม

รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายนของกรมการช่างป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	บริเวณที่ตรวจสอบ 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 2) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	-สภาพดี มองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่เลบเลือน	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	-3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลีน คอนโดมิเนียม
11. ระบบระบายอากาศ	1. ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง ประตู	-ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลีน คอนโดมิเนียม
12. การจราจร	1) พื้นที่โครงการ -ป้ายและเครื่องหมายจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ -ถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	-สภาพมองเห็นได้ชัดและไม่เลบเลือน -ความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ -เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ -ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ -ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	-3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ -ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ -ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลีน คอนโดมิเนียม


รายงานผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น ใจของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลีน คอนโดมิเนียม
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลีน คอนโดมิเนียม
14. ทัศนียภาพ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลีน คอนโดมิเนียม

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
15. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดเอกลีน คอนโดมีเนียม

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

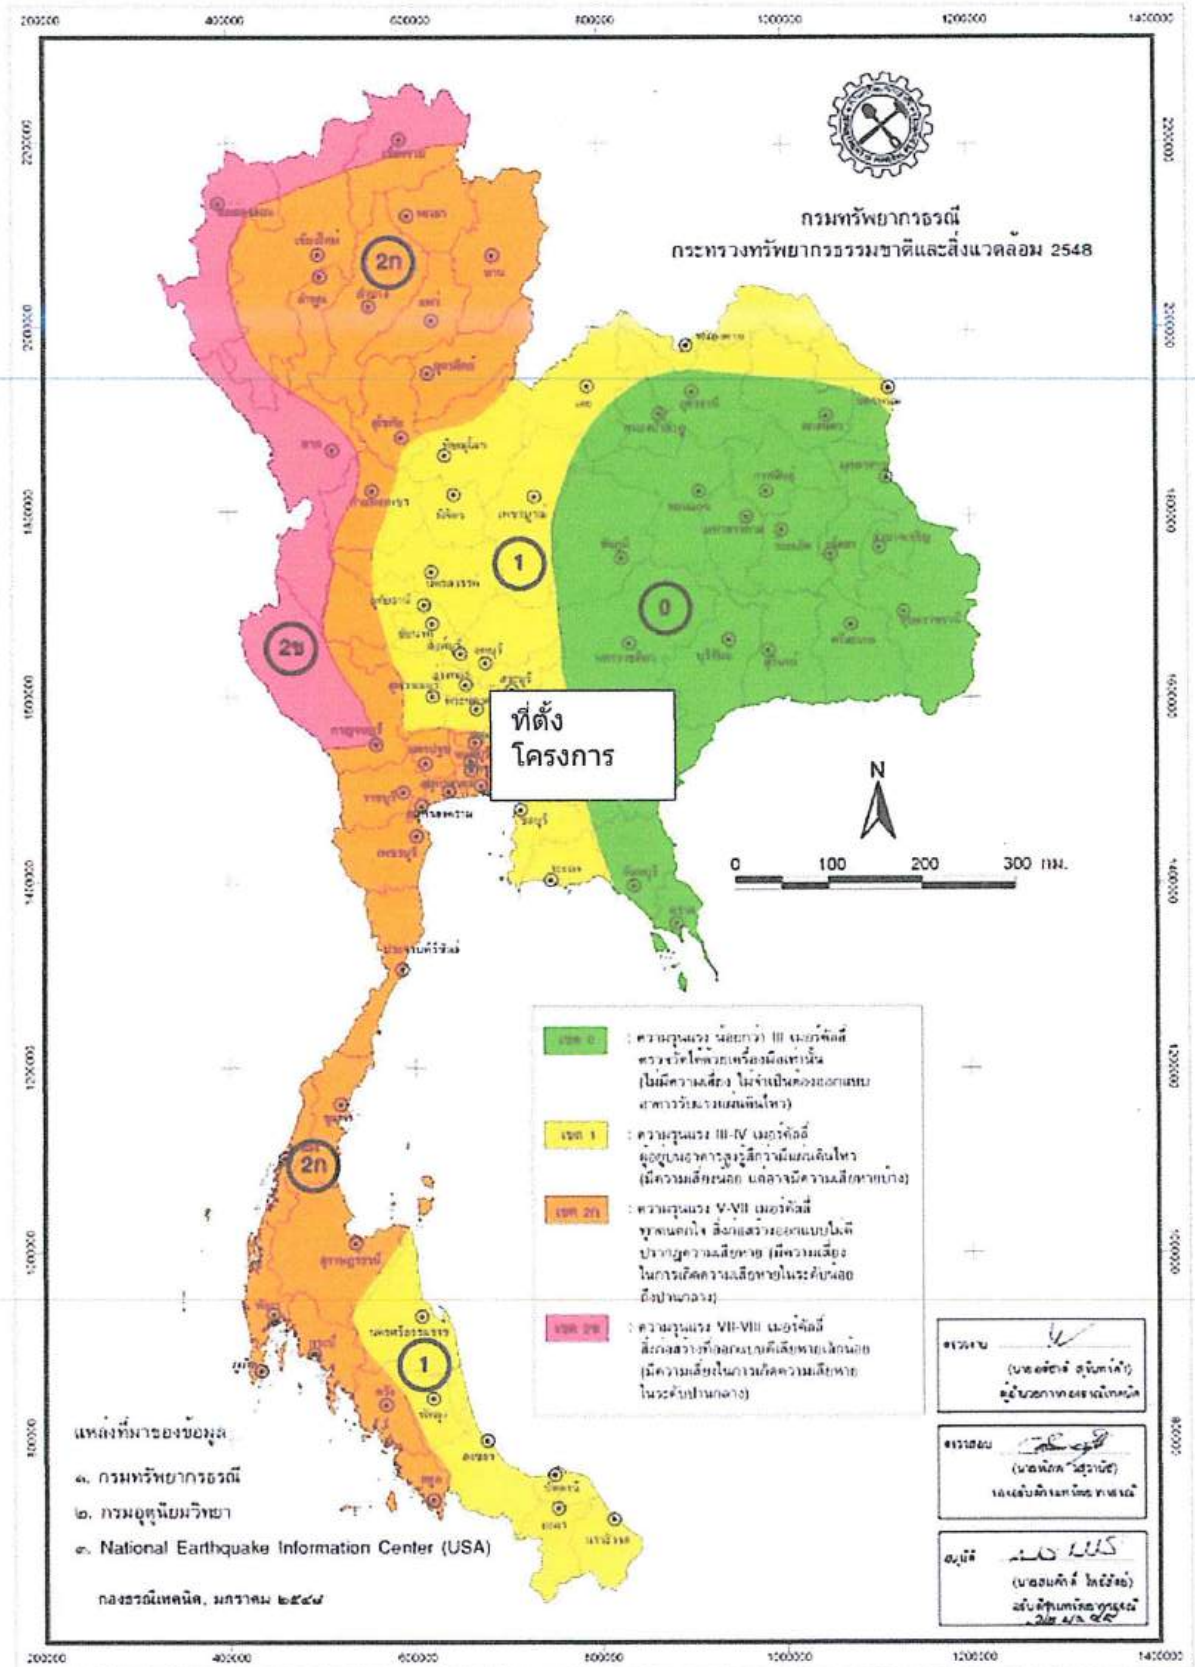

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง	แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ชื่อโครงการ	เอกสิน คอนโดเนียม
สถานที่ตั้งโครงการ	33/219 หมู่ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของโครงการ	บริษัท เอกสิน การ์เด็นโฮม จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 83/5-8 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


สถานที่เก็บตัวอย่าง

1. จุลรวบรวมน้ำเสียของอาคาร
2. จุลระบายน้ำออกจากระบบ
3. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด					
		pH	BOD	Suspended	Fat,Oil &	TKN	Sulfide
				Solids	Grease		
			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
26-ม.ค.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.4	468	6120	161	400	33
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.7	12	< 10	< 2	11	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
16-ก.พ.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.3	550	43733	307	420	33
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.7	20	25	< 2	14	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
23-มี.ค.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.5	114	134	8	222	7
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.8	18	30	3	15	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
16-เม.ย.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.7	70	36	< 2	251	1.6
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.9	15	24	3	20	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
21-พ.ค.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.4	503	14378	151	417	34
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.8	16	< 10	< 2	6	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
10-มิ.ย.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.2	483	11680	243	99	26
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.6	14	< 10	< 2	12	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0

หมายเหตุ : *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

ภาพแสดงระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการ

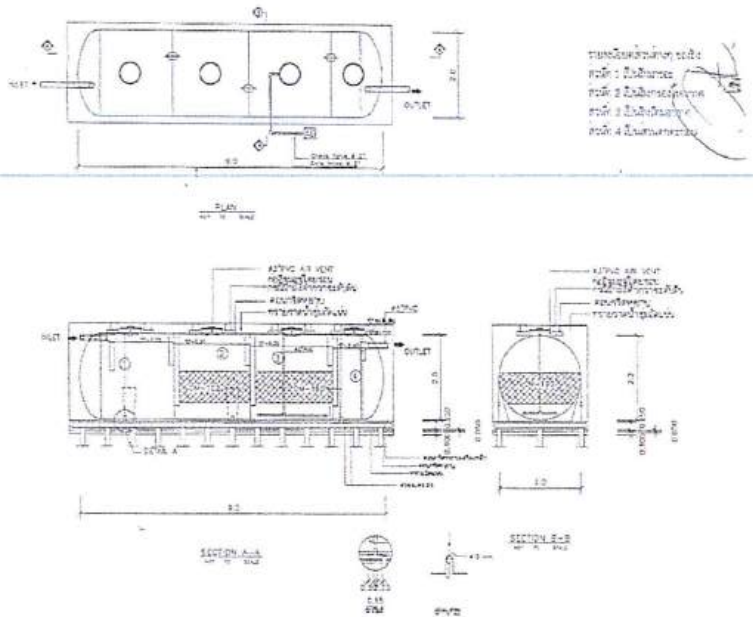

ภาพดูตากบ่อบำบัดและทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย





เติมจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย



บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ เอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี ของบริษัท เอกสิน การ์เด็น โฮม จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำพบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ภาคผนวก 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล

การดูแลระบบบ่อน้ำบาดน้ำเสีย

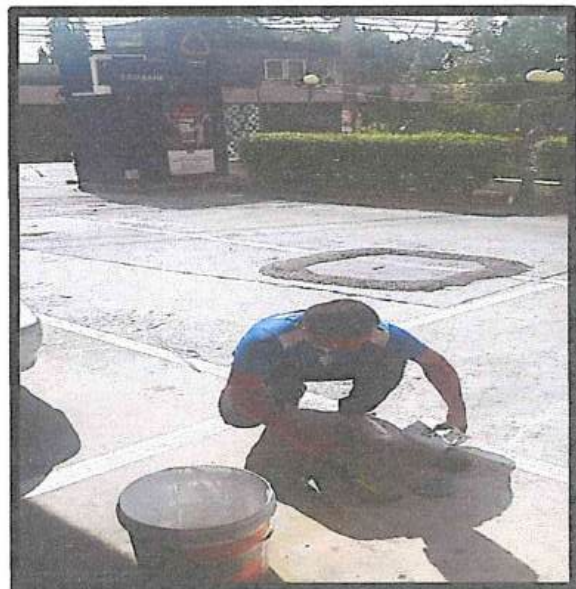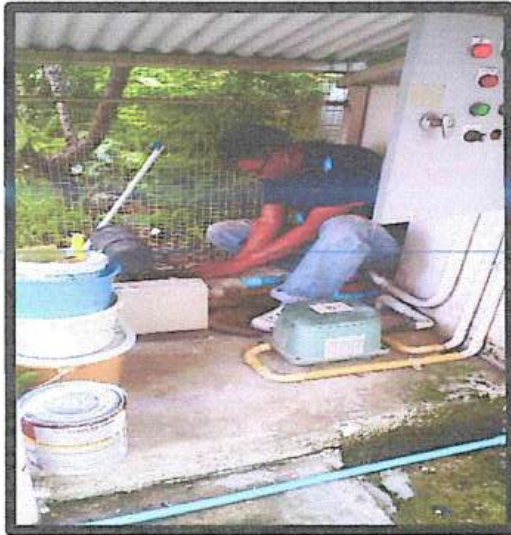


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 33/219 หมู่ 2 ซอย งานวงศ์วาน 23 ถนน งานวงศ์วาน
ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-5809868 โทรสาร 02-
5809868 มี นิติบุคคลอาวรสุมเมกสัน คอนโดมิเนียม อาคารดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท.....ที่.....ใบอนุญาตเลขที่.....
มี)..... ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

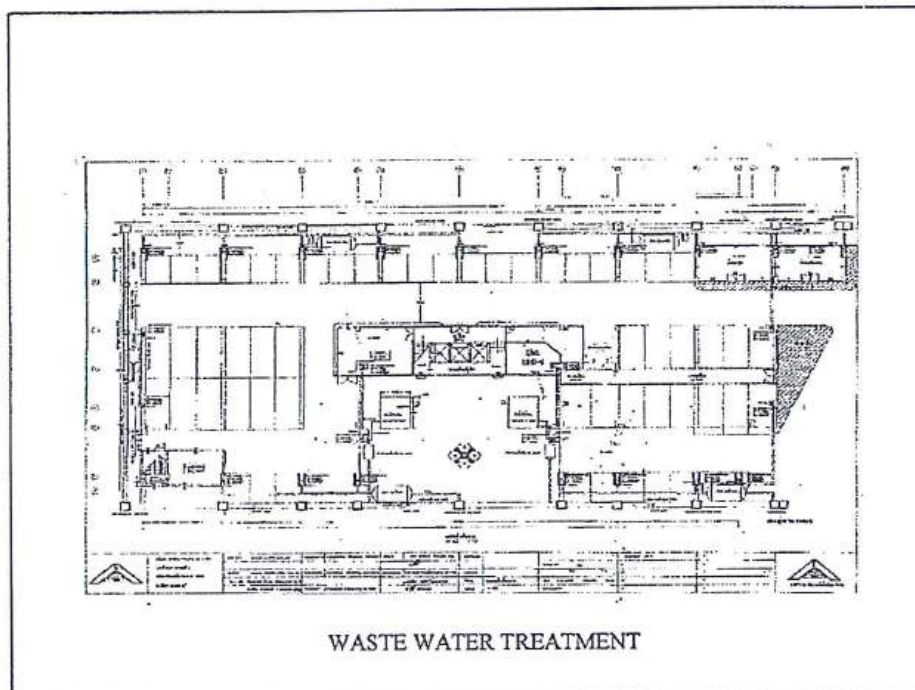

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

การทางานของระบบภาษี

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แบบให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบรรจุสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย


..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 33/219 หมู่ 2 ซอย งามวงศ์วาน 23 ถนน งามวงศ์วาน
ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-5809868 โทรสาร 02-
5809868 มี นิติบุคคลอาวรวรเดชสิน คอนโดมิเนียม อาวรวรดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ดำ
มี) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

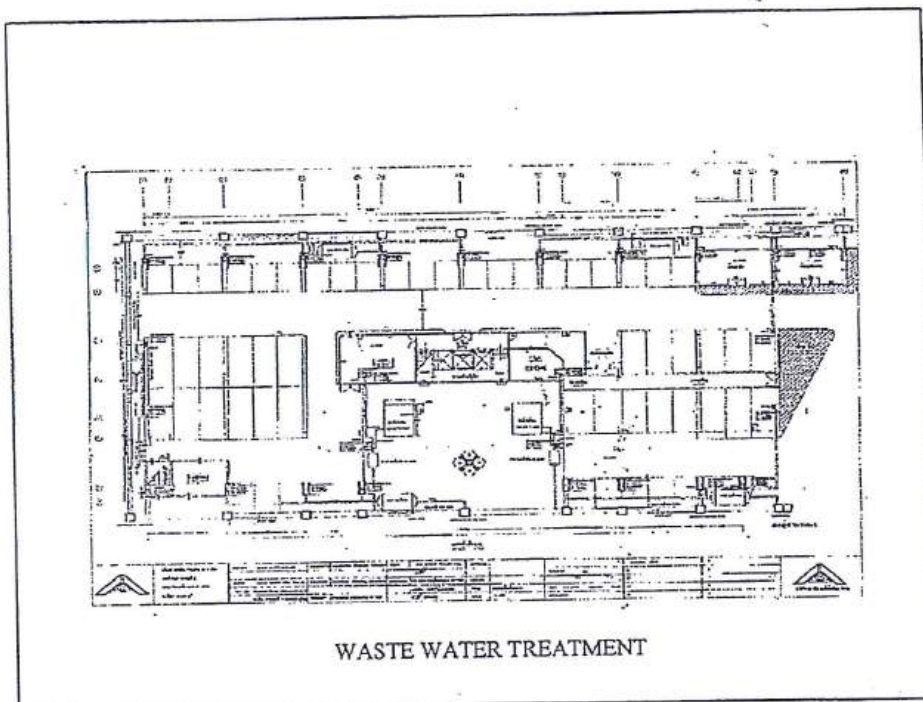

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

พฤติกรรมและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

กรมการปกครอง

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการ
ทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบรรจุสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย


..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 33/219 หมู่ 2 ซอย งามวงศ์วาน 23 ถนน งามวงศ์วาน
ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-5809868 โทรสาร 02-
5809868 มี นิติบุคคลอาวรสกุลเดกสิน ถอนไอมีเนียม อาวรสดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ดำ
มี) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

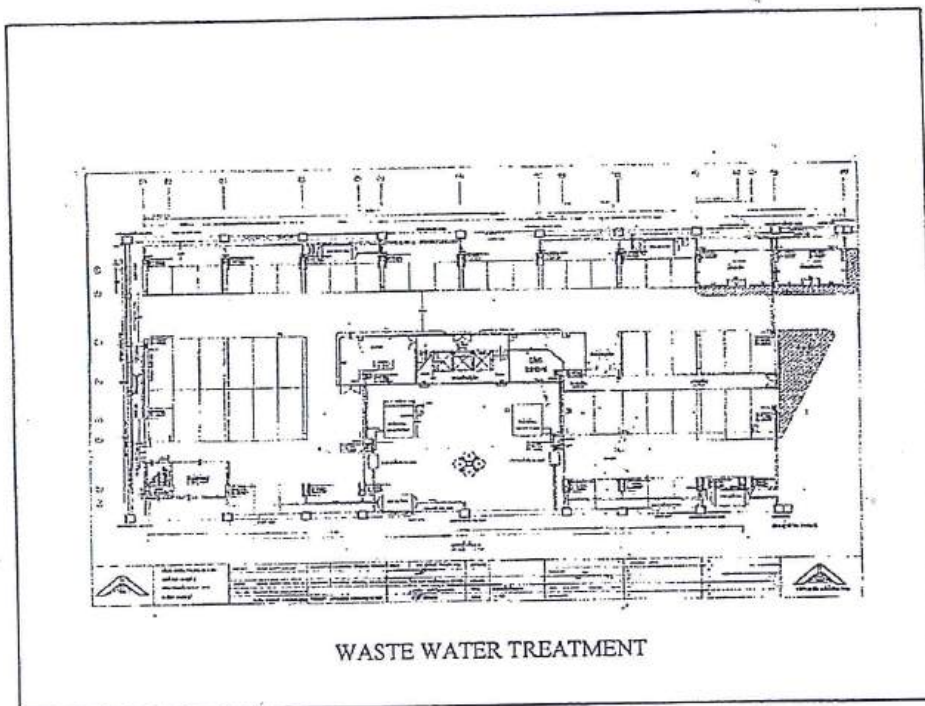

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

การดำเนินงานในระยะเวลาดังกล่าวได้

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แบบ
ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการ
ทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบรรจุทุกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบ้านที่รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
นำบัตรนำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 33/219 หมู่ 2 ซอย งานวงกว้าง 23 ถนน งานวงกว้าง
ตำบล นางพูน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-5809868 โทรสาร 02-
5809868 มี นิติบุคคลอาวารถเถลิง สอนโสมนิมิต ลาวารดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ดำ
มี) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี หมายเลข.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

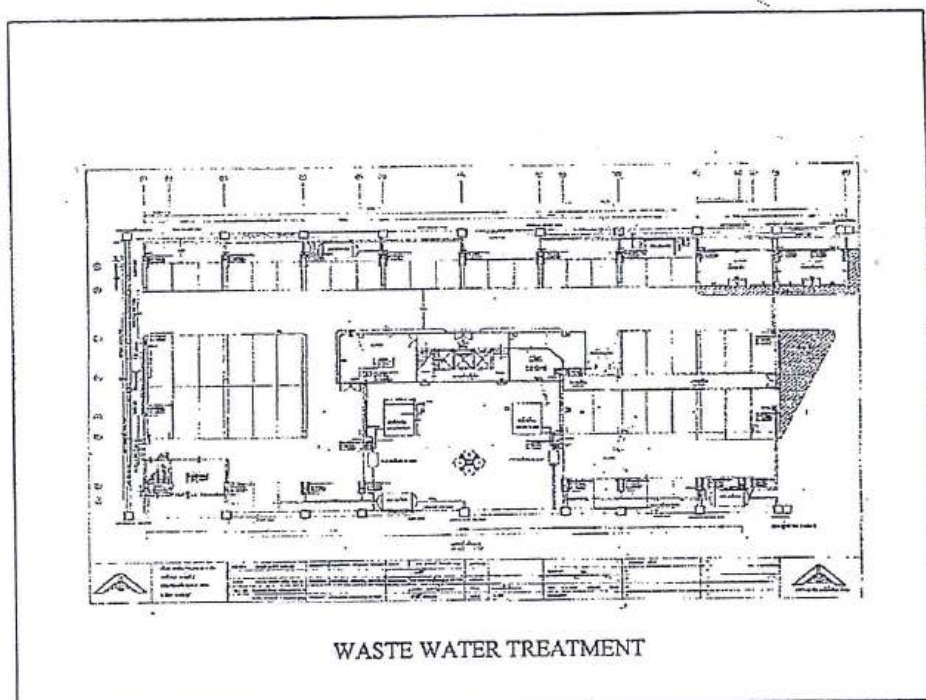

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														
ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ซื้อ/ปริมาณหรือใช้เอง)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำ (ลบ.ม.)	ปัญหาที่ตรวจพบ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)		
1-04-69	9	26	21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
2-04-69	9	26	21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
3-04-69	9	26	21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
4-04-69	9	26	21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
5-04-69	9	26	21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
6-04-69	9	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
7-04-69	9	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
8-04-69	9	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
9-04-69	9	24	19	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
10-04-69	9	28	23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
11-04-69	9	27	22	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
12-04-69	9	28	23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
13-04-69	9	27	22	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
14-04-69	9	27	22	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
15-04-69	9	28	23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
16-04-69	9	32	27	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
17-04-69	9	27	22	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
18-04-69	9	28	23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
19-04-69	9	28	23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
20-04-69	9	29	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
21-04-69	9	29	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
22-04-69	9	31	26	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
23-04-69	9	32	27	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
24-04-69	9	30	25	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
25-04-69	9	30	25	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
26-04-69	9	29	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
27-04-69	9	29	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
28-04-69	9	28	23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
29-04-69	9	33	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
30-04-69	9	32	27	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	อุทัย
รวม	270	841	691											

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการ
ทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบรรจุสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 33/219

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ท่าทราย

เขต/ตำบล : เมืองนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02580-9868

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2551

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

หมดอายุ : วว/ดค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธนกฤต กล้าแข็ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบทะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางระบายของถนนทพรี

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทภายนอก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 270.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 841.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 691.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 33/219 หมู่ 2 ซอย งามวงศ์วาน 23 ถนน งามวงศ์วาน
ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-5809868 โทรสาร 02-
5809868 มี นิติบุคคลอาวารชุดเลขที่.....ตอนโคนันณ.....อาวาลี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท.....ที่.....ใบอนุญาตเลขที่.....
มี).....ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

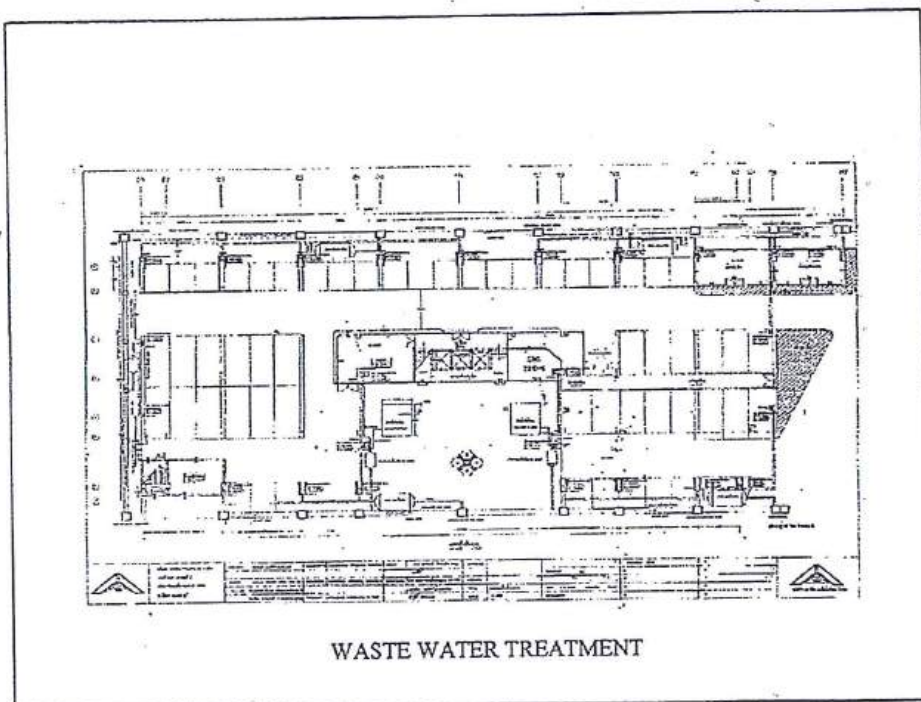

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523</
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการ
ทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบรรจุทุกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอกสิน คอนโดมิเนียม อาคารดี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 33/219

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ท่าทราย

เขต/ตำบล : เมืองนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02580-9868

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2551

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธนภุต กล้าแข็ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางระบายของถนนทพรี

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทภายนอก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 279.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 827.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 672.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 33/219 หมู่ 2 ซอย งามวงศ์วาน 23 ถนน งามวงศ์วาน
ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-5809868 โทรสาร 02-
5809868 มี นิติบุคคลอรรถพรเดชเอกสิน ถอนโกมเนียม ลาวลวดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้า
มี) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

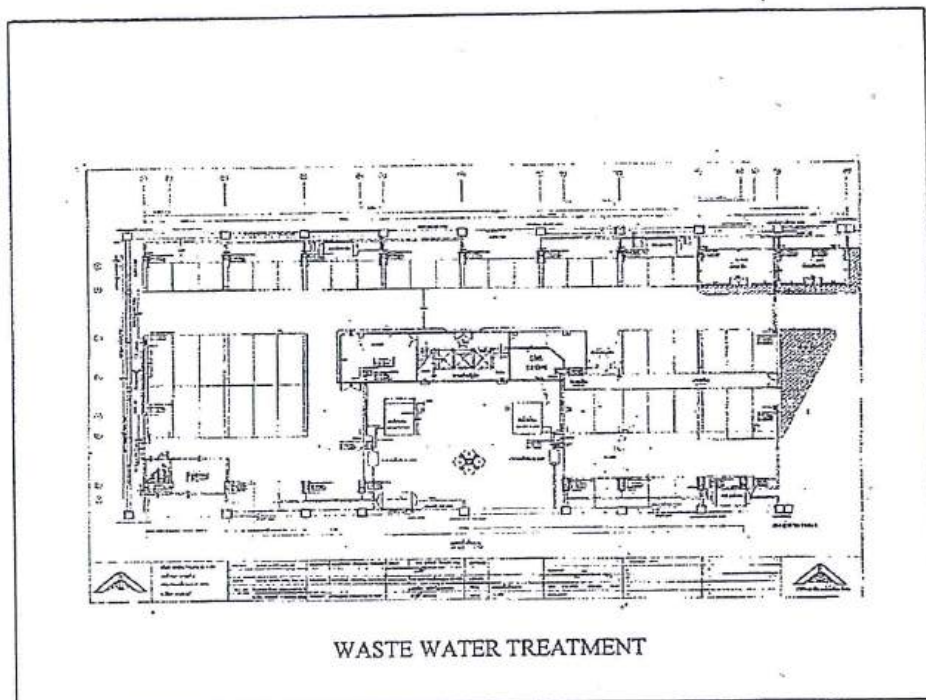

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการ
ทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบรรจุสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดเอกสิน คอนโดเนียม อาคารดี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 33/219

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ท่าทราย

เขต/ตำบล : เมืองนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02580-9868

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2551

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธนกฤต กล้าแข็ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางระบายของนันทบุรี

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทภายนอก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 270.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 711.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 561.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 2

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา Emergency Light

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Jan-69



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month (เดือน) / Year (ปี) 01/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Serial	Capacity	Date	สภาพชุดควบคุม		สภาพหลอดไฟ		จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง	Number	ขนาด	Install					จ่ายไฟ
		(Volt)	(Amp)	เลขเครื่อง	(V / Ah)	วันที่ติดตั้ง	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด Halogen	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	ทางเดินหน้าห้องนิติ	4 V.	5Ah	1	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	30	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดินโซน VIP	12 V.	7Ah	12064	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	4	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	3	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	32	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	5	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12048	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	2	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	31	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	7	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	8	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12096	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	33	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12055	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	9	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	6	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	34	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	12	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	11	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12021	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	36	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	13	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12032	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	10	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	35	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (PM./ผู้จัดการอาคาร)

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (PM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/01/69

Date/วันที่ 31/01/69

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Jul-68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Month (เดือน) / Year (ปี) 01/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floorชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกถ่านแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Serial	Capacity	Date	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง	Number	ขนาด	Install					
		(Volt)	(Amp)	เลขเครื่อง	(V / Ah)	วันที่ ติดตั้ง	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด Halogen	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	14	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	12045	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
5	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12041	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
5	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	37	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	15	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12028	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
5	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12023	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
6	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	38	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	20	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	19	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	18	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12018	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
6	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12029	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
6	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	17	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	16	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	39	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	22	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	21	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12039	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
7	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12011	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
7	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	23	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12053	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
7	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12009	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
8	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	40	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
8	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	29	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
8	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	28	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

07/4 นวชนนทิพย์

07/4 นวชนนทิพย์

Date/วันที่ 31/01/69

Date/วันที่ 31/01/69

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Feb-69



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month (เดือน) / Year (ปี) 02/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Serial	Capacity	Date	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Number	ขนาด	Install					
		(Volt)	(Amp)	เลขเครื่อง	(V / Ah)	วันที่ติดตั้ง	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด Halogen	จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ทางเดินหน้าห้องนิติ	4 V.	5Ah	1	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	30	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดินโซน VIP	12 V.	7Ah	12064	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	4	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดลิฟท์	4 V.	5Ah	3	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	32	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	5	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12048	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	2	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	31	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	7	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	8	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	บันไดลิฟท์	12 V.	7Ah	12096	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	33	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12055	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	9	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	6	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	34	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	12	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	11	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	บันไดลิฟท์	12 V.	7Ah	12021	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	36	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	13	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12032	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	10	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	35	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

..... อ.ท. น. ๒๐๒๒๒๒๒

Date/วันที่ 28/02/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

..... อ.ท. น. ๒๐๒๒๒๒๒

Date/วันที่ 28/02/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (PM./ผู้จัดการอาคาร)

..... ๒๐

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Jul-68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Month (เดือน) / Year (ปี) 02/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกถ่านแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Serial	Capacity	Date	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		แรงดันไฟฟ้าให้กระแสตรง (Volt)	กระแสไฟฟ้าให้กระแสตรง (Amp)	เลขเครื่อง Number	ขนาด (V / Ah)	วันที่ ติดตั้ง Install	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด Halogen	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	14	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	12045	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
5	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12041	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
5	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	37	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	15	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12028	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
5	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12023	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
6	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	38	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	20	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	19	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	18	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12018	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
6	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12029	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
6	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	17	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
6	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	16	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	39	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	22	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	21	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12039	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
7	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12011	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
7	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	23	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
7	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12053	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
7	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12009	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
8	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	40	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
8	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	29	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
8	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	28	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....
อ.ท.ว. ผ.อ.อ.บ.บ.ก.

.....
อ.ท.ว. ผ.อ.อ.บ.บ.ก.

Date/วันที่ 22/02/69

Date/วันที่ 22/02/69

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Mar-69



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month (เดือน) / Year (ปี) 03/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (Amp)	Serial Number เลขเครื่อง	Capacity ขนาด (V / Ah)	Date Install วันที่ติดตั้ง	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	จุดดวงโคม	หลอดชนิด / ขนาด Halogen	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
1	ทางเดินหน้าห้องนิติ	4 V.	5Ah	1	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	30	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดินโซน VIP	12 V.	7Ah	12064	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	4	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	3	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	32	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	5	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12048	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	2	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	31	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	7	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	8	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12096	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	33	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12055	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	9	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	6	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	34	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	12	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	11	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12021	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	36	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	13	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12032	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	10	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	35	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/03/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 31/03/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Jul-68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Month (เดือน) / Year (ปี) 03/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floorชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Serial	Capacity	Date	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Number	ขนาด	Install	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		กระแสตรง	กระแสตรง	เลขเครื่อง	(V / Ah)	วันที่ ติดตั้ง	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(Volt)	(Amp)	เลขเครื่อง	(V / Ah)	วันที่ ติดตั้ง				Halogen	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	14	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	12045	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12041	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	37	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	15	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12028	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12023	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	38	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	20	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	19	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	18	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12018	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12029	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	17	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	16	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	39	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	22	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	21	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12039	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12011	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	23	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12053	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12009	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
8	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	40	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
8	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	29	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
8	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	28	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

๑๖/๖๘ ๒๕๖๘

Date/วันที่ 31/03/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

๑๖/๖๘ ๒๕๖๘

Date/วันที่ 31/03/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Building / อาคาร AKD / เอเคสิน คอนโด ดีก ดี

Villecon Management Co., Ltd.

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Jun-69



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month (เดือน) / Year (ปี) 06/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC, Voltage	DC, Amperes	Serial	Capacity	Date	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวนชั่วโมงที่
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (Amp)	Number เลขเครื่อง	ขนาด (V / Ah)	วันที่ ติดตั้ง	อื่นๆ	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด Halogen	จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ทางเดินหน้าห้องนิติ	4 V.	5Ah	1	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	30	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดินโซน VIP	12 V.	7Ah	12064	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	4	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	3	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	32	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	5	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12048	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	2	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	31	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	7	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	8	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12096	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	33	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12055	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	9	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	6	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	34	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	12	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	11	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12021	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	36	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	13	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12032	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	10	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	35	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/6/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/6/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (B.M./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Jun-68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Month (เดือน) / Year (ปี) 06/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor/ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกถ่านแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง	Serial Number เลขเครื่อง	Capacity ขนาด (V / Ah)	Date วันที่ ติดตั้ง	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(Volt)	(Amp)	(3)	(4)	(5)	อื่นๆ (6)	ผลการทดสอบ (7)	ชุดดวงโคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด Halogen (9)	
5	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	14	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	12045	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12041	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	37	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	15	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12028	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	ทางเดินหลังลิฟท์	12 V.	7Ah	12023	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	38	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	20	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	19	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	18	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12018	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12029	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	17	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	16	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	39	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	22	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	21	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12039	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12011	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	23	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12053	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	ทางเดินหลังลิฟท์	12 V.	7Ah	12009	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
8	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	40	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
8	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	29	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
8	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	28	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

ชื่อ/นามสกุล

Date/วันที่ 20/6/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

ชื่อ/นามสกุล

Date/วันที่ 20/6/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-May-69



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month (เดือน) / Year (ปี) 05/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกถ่านแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Serial	Capacity	Date	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง	Number	ขนาด	Install	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(Volt)	(Amp)	เลขเครื่อง	(V / Ah)	วันที่ติดตั้ง			Halogen	(9)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ทางเดินหน้าห้องนิติ	4 V.	5Ah	1	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	30	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดินโซน VIP	12 V.	7Ah	12064	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	4	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	3	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	32	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	5	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
2	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12048	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
2	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	2	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	31	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	7	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	8	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12096	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	33	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12055	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
3	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	9	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
3	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	6	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	34	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	12	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	11	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12021	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	36	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	13	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
4	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12032	5	2008	/	/	/	2 x 20 Watt	/
4	ทางเดินหลังลิฟท์	4 V.	5Ah	10	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/
5	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	35	5	2019	/	/	/	2 x 6 Watt	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

อ.ก.ว. พ.อ.อ.อ.อ.

Date/วันที่ 31/5/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

อ.ก.ว. พ.อ.อ.อ.อ.

Date/วันที่ 31/5/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-May-68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Month (เดือน) / Year (ปี) 05/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor/ชั้น	Location/สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง	Serial Number เลขเครื่อง	Capacity ขนาด	Date วันที่ ติดตั้ง	สภาพชุดควบคุม		สภาพหลอดไฟ		
		(Volt)	(Amp)	เลขเครื่อง	(V / Ah)	วันที่ ติดตั้ง	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด Halogen	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	14	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	12045	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	ห้องน้ำ	12 V.	7Ah	12041	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	37	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	15	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12028	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12023	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	38	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	20	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	19	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ห้องน้ำ	4 V.	5Ah	18	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12018	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12029	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	17	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	16	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	39	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	22	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	21	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ห้องน้ำ	12 V.	7Ah	12039	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12011	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	23	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12053	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12009	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
8	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	40	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
8	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	29	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
8	ทางเดินแยก VIP	12 V.	7Ah	28	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

ชื่อ นามสกุล

Date/วันที่ 21/5/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)

ชื่อ นามสกุล

Date/วันที่ 31/5/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Apr-69



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month (เดือน) / Year (ปี) 04/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor ชั้น	Location ที่งานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง	Serial Number เลขเครื่อง	Capacity ขนาด (V / Ah)	Date วันที่ติดตั้ง	ภาพชุดควบคุม	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอดชนิด / ขนาด Halogen	
		(Volt)	(Amp)	(เลขเครื่อง)	(V / Ah)	(วันที่ติดตั้ง)					
1	ทางเดินหน้าห้องนิติ	4 V.	5Ah	1	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
2	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	30	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
2	ทางเดินโซน VIP	12 V.	7Ah	12064	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
2	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	4	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
2	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	3	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
2	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	32	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
2	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	5	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
2	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12048	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
2	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	2	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
3	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	31	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
3	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	7	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
3	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	8	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
3	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12096	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
3	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	33	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
3	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12055	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
3	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	9	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
3	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	6	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
4	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	34	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
4	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	12	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
4	ทางเดินแยก VIP	4 V.	5Ah	11	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
4	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12021	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
4	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	36	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
4	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	13	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
4	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12032	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
4	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	10	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	35	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 20/4/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 20/4/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BML/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	Villecon - ENG
Code	ENG M-04
Date	01-Apr-68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Month (เดือน) / Year (ปี) 04/69

Building / อาคาร AKD / เอกสิน คอนโด ตึก ดี

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Serial	Capacity	Date	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง	Number	ขนาด	Install					
		(Volt)	(Amp)	เลขเครื่อง	(V / Ah)	วันที่ ติดตั้ง	อื่นๆ	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอด ชนิด / ขนาด Halogen	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	14	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดินแขก VIP	12 V.	7Ah	12045	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12041	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	บันไดหนีไฟหลัง	4 V.	5Ah	37	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	15	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
5	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12028	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
5	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12023	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	38	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	20	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินแขก VIP	4 V.	5Ah	19	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	หน้าลิฟท์	4 V.	5Ah	18	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12018	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	ทางเดิน 2 แยกนอก	12 V.	7Ah	12029	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
6	ทางเดิน 2 แยกใน	4 V.	5Ah	17	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
6	ทางเดินหลังลิฟต์	4 V.	5Ah	16	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	39	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	22	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดินแขก VIP	4 V.	5Ah	21	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	หน้าลิฟท์	12 V.	7Ah	12039	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	บันไดหนีไฟหลัง	12 V.	7Ah	12011	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	ทางเดิน 2 แยกนอก	4 V.	5Ah	23	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
7	ทางเดิน 2 แยกใน	12 V.	7Ah	12053	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
7	ทางเดินหลังลิฟต์	12 V.	7Ah	12009	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓
8	บันไดหนีไฟหน้า	4 V.	5Ah	40	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
8	ทางเดินโซน VIP	4 V.	5Ah	29	5	2019	✓	✓	✓	2 x 6 Watt	✓
8	ทางเดินแขก VIP	12 V.	7Ah	28	5	2008	✓	✓	✓	2 x 20 Watt	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/4/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ 30/4/69

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา Fire Alarm



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Fire Alarm

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 01/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Fire Alarm

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 02/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 <i>อหัง</i>	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Fire Alarm

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 03/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.พริ้ง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แจ้งไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Fire Alarm

หน่วยงาน AKD

ENG-VCM

ประจำเดือน 04/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Fire Alarm

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 05/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Fire Alarm

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 06/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา Fire Hose

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ตู้และถังดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

Building / อาคาร AKD / เอคติน คอนโด D

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

အမျိုးသမီး

Date/วันที่ 30/6/69

Time/2001

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
 ၁၇၆၆ မ.ဝ.လ. ၁၆၆၆

Date/วันที่ 30/6/69

Time/1201

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่

Time/1201

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

× Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา Jocky pump



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Jocky Pump No.1,2

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 01/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Jocky Pump No.1,2

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 02/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Jocky Pump No.1,2

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 03/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิวิ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แจ้งไขเบ้องคัน ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Jocky Pump No.1,2

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 04/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Jocky Pump No.1,2

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 05/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ Jocky Pump No.1,2

ENG-VCM

หน่วยงาน AKD

ประจำเดือน 06/2569

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	12.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	22.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานผิดปกติของระบบให้แจ้งให้ช่างซ่อมบำรุงทันที หากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา ห้อง MDB

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 1 หน่วยงาน AKD						ENG-VCM ประจำเดือน 01/2569	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
			ลายเซ็น			ลายเซ็น			ลายเซ็น	
1	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 2						ENG-VCM
		หน่วยงาน AKD						ประจำเดือน 01/2569
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

วันที่		กะเช้า	เวลา	กะบ่าย	เวลา	กะดึก	เวลา	หมายเหตุ
		(A)	ลายเซ็น	(B)	ลายเซ็น	(C)	ลายเซ็น	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานจากระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 2						ENG-VCM
		หน่วยงาน AKD						ประจำเดือน 02/2569
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑.๐๐ ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ๑พ.ย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 1 หน่วยงาน AKD						ENG-VCM ประจำเดือน 03/2569	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
			ลายเซ็น			ลายเซ็น			ลายเซ็น	
1	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	11.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	9.00 อดิษฐ์	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 2						ENG-VCM
		หน่วยงาน AKD						ประจำเดือน 03/2569
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 อ.ท.ข.	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 1						ENG-VCN
		หน่วยงาน AKD						ประจำเดือน 04/2569
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9/16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานจากระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 2						ENG-VCM
		หน่วยงาน AKD						ประจำเดือน 04/2569
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขได้

2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 1						ENG-VCM
		หน่วยงาน AKD						ประจำเดือน 05/2569
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 11.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.00	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานจากระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 2						ENG-VCM
		หน่วยงาน AKD						ประจำเดือน 05/2569
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9.00 9.15	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

วันที่		กะเช้า		เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย		เวลา ลายเซ็น	กะดึก		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ
		(A)			(B)	(C)					
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
4	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
17	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
18	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		9.00 9.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11.00 11.30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ				

หมายเหตุ: 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แจ้งไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบ MDB - 2 หน่วยงาน AKD						ENG-VCM ประจำเดือน 06/2569
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ภายหลัง	กะบ่าย (B)	เวลา ภายหลัง	กะดึก (C)	เวลา ภายหลัง	หมายเหตุ	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	12.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	22.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11.00 ภายหลัง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

ภาคผนวก 3

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน



ประจำเดือนมกราคม.....2569

วันที่	ช่วงเวลา	มิเตอร์ไฟฟ้า			มิเตอร์ประปา			ผู้บันทึก
		มิเตอร์หมายเลข 0299325239165280			มิเตอร์หมายเลข D170F0307841			
		ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	
1/1/2569	09.00 - 11.00	7972	7971	1	324	299	25	อุทัย
2/1/2569	09.00 - 11.00	7973	7972	1	348	324	24	อุทัย
3/1/2569	09.00 - 11.00	7974	7973	1	373	348	25	อุทัย
4/1/2569	09.00 - 11.00	7975	7974	1	400	373	27	อุทัย
5/1/2569	09.00 - 11.00	7976	7975	1	427	400	27	อุทัย
6/1/2569	09.00 - 11.00	7977	7976	1	453	427	26	อุทัย
7/1/2569	09.00 - 11.00	7979	7977	2	480	453	27	อุทัย
8/1/2569	09.00 - 11.00	7980	7979	1	505	480	25	อุทัย
9/1/2569	09.00 - 11.00	7981	7980	1	533	505	28	อุทัย
10/1/2569	09.00 - 11.00	7982	7981	1	560	533	27	อุทัย
11/1/2569	09.00 - 11.00	7983	7982	1	586	560	26	อุทัย
12/1/2569	09.00 - 11.00	7984	7983	1	614	586	28	อุทัย
13/1/2569	09.00 - 11.00	7985	7984	1	643	614	29	อุทัย
14/1/2569	09.00 - 11.00	7986	7985	1	670	643	27	อุทัย
15/1/2569	09.00 - 11.00	7987	7986	1	696	670	26	อุทัย
16/1/2569	09.00 - 11.00	7989	7987	2	721	696	25	อุทัย
17/1/2569	09.00 - 11.00	7990	7989	1	749	721	28	อุทัย
18/1/2569	09.00 - 11.00	7991	7990	1	776	749	27	อุทัย
19/1/2569	09.00 - 11.00	7992	7991	1	803	776	27	อุทัย
20/1/2569	09.00 - 11.00	7994	7992	2	831	803	28	อุทัย
21/1/2569	09.00 - 11.00	7995	7994	1	859	831	28	อุทัย
22/1/2569	09.00 - 11.00	7996	7995	1	886	859	27	อุทัย
23/1/2569	09.00 - 11.00	7997	7996	1	912	886	26	อุทัย
24/1/2569	09.00 - 11.00	7998	7997	1	938	912	26	อุทัย
25/1/2569	09.00 - 11.00	7999	7998	1	963	938	25	อุทัย
26/1/2569	09.00 - 11.00	8000	7999	1	988	963	25	อุทัย
27/1/2569	09.00 - 11.00	8001	8000	1	1015	988	27	อุทัย
28/1/2569	09.00 - 11.00	8002	8001	1	1042	1015	27	อุทัย
29/1/2569	09.00 - 11.00	8003	8002	1	1069	1042	27	อุทัย
30/1/2569	09.00 - 11.00	8004	8003	1	1096	1069	27	อุทัย
31/1/2569	09.00 - 11.00	8005	8004	1	1126	1096	30	อุทัย
รวมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ =		34	หน่วย	รวมจำนวนหน่วยประปาที่ใช้ =		827	หน่วย	

SUPERVISOR

DATE.....

By : Thaweesak Thanok



ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

วันที่	ช่วงเวลา	มิเตอร์ไฟฟ้า			มิเตอร์ประปา			ผู้บันทึก
		มิเตอร์หมายเลข 0299325239165280			มิเตอร์หมายเลข D170F0307841			
		ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	
1/2/2569	09.00 - 11.00	8006	8005	1	1154	1126	28	อุทัย
2/2/2569	09.00 - 11.00	8007	8006	1	1182	1154	28	อุทัย
3/2/2569	09.00 - 11.00	8008	8007	1	1211	1182	29	อุทัย
4/2/2569	09.00 - 11.00	8009	8008	1	1239	1211	28	อุทัย
5/2/2569	09.00 - 11.00	8010	8009	1	1269	1239	30	อุทัย
6/2/2569	09.00 - 11.00	8011	8010	1	1301	1269	32	อุทัย
7/2/2569	09.00 - 11.00	8012	8011	1	1331	1301	30	อุทัย
8/2/2569	09.00 - 11.00	8013	8012	1	1361	1331	30	อุทัย
9/2/2569	09.00 - 11.00	8015	8013	2	1396	1361	35	อุทัย
10/2/2569	09.00 - 11.00	8016	8015	1	1424	1396	28	อุทัย
11/2/2569	09.00 - 11.00	8017	8016	1	1453	1424	29	อุทัย
12/2/2569	09.00 - 11.00	8018	8017	1	1481	1453	28	อุทัย
13/2/2569	09.00 - 11.00	8019	8018	1	1509	1481	28	อุทัย
14/2/2569	09.00 - 11.00	8020	8019	1	1538	1509	29	อุทัย
15/2/2569	09.00 - 11.00	8021	8020	1	1567	1538	29	อุทัย
16/2/2569	09.00 - 11.00	8022	8021	1	1595	1567	28	อุทัย
17/2/2569	09.00 - 11.00	8023	8022	1	1623	1595	28	อุทัย
18/2/2569	09.00 - 11.00	8024	8023	1	1651	1623	28	อุทัย
19/2/2569	09.00 - 11.00	8025	8024	1	1678	1651	27	อุทัย
20/2/2569	09.00 - 11.00	8026	8025	1	1707	1678	29	อุทัย
21/2/2569	09.00 - 11.00	8027	8026	1	1736	1707	29	อุทัย
22/2/2569	09.00 - 11.00	8029	8027	2	1771	1736	35	อุทัย
23/2/2569	09.00 - 11.00	8030	8029	1	1799	1771	28	อุทัย
24/2/2569	09.00 - 11.00	8031	8030	1	1828	1799	29	อุทัย
25/2/2569	09.00 - 11.00	8032	8031	1	1860	1828	32	อุทัย
26/2/2569	09.00 - 11.00	8033	8032	1	1892	1860	32	อุทัย
27/2/2569	09.00 - 11.00	8034	8033	1	1923	1892	31	อุทัย
28/2/2569	09.00 - 11.00	8035	8034	1	1955	1923	32	อุทัย
รวมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ =		30	หน่วย		รวมจำนวนหน่วยประปาที่ใช้ =		829	หน่วย

SUPERVISOR

DATE

By : Thaweesak Thanok



แบบฟอร์มจดมิเตอร์สาธารณะประเภทบ้านกลาง

ประจำเดือน มีนาคม 2569

วันที่	ช่วงเวลา	มิเตอร์ไฟฟ้า			มิเตอร์ประปา			ผู้บันทึก
		มิเตอร์หมายเลข 0299325239165280			มิเตอร์หมายเลข D170F0307841			
		ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	
1/3/2569	09.00 - 11.00	8036	8035	1	1983	1955	28	อุทัย
2/3/2569	09.00 - 11.00	8037	8036	1	2011	1983	28	อุทัย
3/3/2569	09.00 - 11.00	8039	8037	2	2040	2011	29	อุทัย
4/3/2569	09.00 - 11.00	8040	8039	1	2069	2040	29	อุทัย
5/3/2569	09.00 - 11.00	8041	8040	1	2097	2069	28	อุทัย
6/3/2569	09.00 - 11.00	8042	8041	1	2125	2097	28	อุทัย
7/3/2569	09.00 - 11.00	8043	8042	1	2155	2125	30	อุทัย
8/3/2569	09.00 - 11.00	8044	8043	1	2184	2155	29	อุทัย
9/3/2569	09.00 - 11.00	8045	8044	1	2214	2184	30	อุทัย
10/3/2569	09.00 - 11.00	8046	8045	1	2245	2214	31	อุทัย
11/3/2569	09.00 - 11.00	8048	8046	2	2270	2245	25	อุทัย
12/3/2569	09.00 - 11.00	8049	8048	1	2294	2270	24	อุทัย
13/3/2569	09.00 - 11.00	8050	8049	1	2319	2294	25	อุทัย
14/3/2569	09.00 - 11.00	8051	8050	1	2342	2319	23	อุทัย
15/3/2569	09.00 - 11.00	8052	8051	1	2366	2342	24	อุทัย
16/3/2569	09.00 - 11.00	8053	8052	1	2388	2366	22	อุทัย
17/3/2569	09.00 - 11.00	8054	8053	1	2411	2388	23	อุทัย
18/3/2569	09.00 - 11.00	8055	8054	1	2432	2411	21	อุทัย
19/3/2569	09.00 - 11.00	8056	8055	1	2454	2432	22	อุทัย
20/3/2569	09.00 - 11.00	8057	8056	1	2475	2454	21	อุทัย
21/3/2569	09.00 - 11.00	8058	8057	1	2496	2475	21	อุทัย
22/3/2569	09.00 - 11.00	8059	8058	1	2519	2496	23	อุทัย
23/3/2569	09.00 - 11.00	8060	8059	1	2542	2519	23	อุทัย
24/3/2569	09.00 - 11.00	8061	8060	1	2566	2542	24	อุทัย
25/3/2569	09.00 - 11.00	8062	8061	1	2587	2566	21	อุทัย
26/3/2569	09.00 - 11.00	8063	8062	1	2608	2587	21	อุทัย
27/3/2569	09.00 - 11.00	8064	8063	1	2628	2608	20	อุทัย
28/3/2569	09.00 - 11.00	8065	8064	1	2654	2628	26	อุทัย
29/3/2569	09.00 - 11.00	8066	8065	1	2675	2654	21	อุทัย
30/3/2569	09.00 - 11.00	8067	8066	1	2696	2675	21	อุทัย
31/3/2569	09.00 - 11.00	8068	8067	1	2717	2696	21	อุทัย
รวมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ =		33	8068	รวมจำนวนหน่วยประปาที่ใช้ =		762	หน่วย	

SUPERVISOR

DATE...../...../.....

By : Thaweesak Thanok



แบบฟอร์มจดมิเตอร์สาธารณะปโภคส่วนกลาง

ประจำเดือนเมษายน.....2569

วันที่	ช่วงเวลา	มิเตอร์ไฟฟ้า			มิเตอร์ประปา			ผู้บันทึก
		มิเตอร์หมายเลข 0299325239165280			มิเตอร์หมายเลข D170F0307841			
		ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	
1/4/2569	09.00 - 11.00	8036	8035	1	2743	2717	26	อุทัย
2/4/2569	09.00 - 11.00	8037	8036	1	2769	2743	26	อุทัย
3/4/2569	09.00 - 11.00	8038	8037	1	2795	2769	26	อุทัย
4/4/2569	09.00 - 11.00	8039	8038	1	2821	2795	26	อุทัย
5/4/2569	09.00 - 11.00	8040	8039	1	2847	2821	26	อุทัย
6/4/2569	09.00 - 11.00	8043	8040	1	2872	2847	25	อุทัย
7/4/2569	09.00 - 11.00	8044	8043	1	2897	2872	25	อุทัย
8/4/2569	09.00 - 11.00	8046	8044	2	2922	2897	25	อุทัย
9/4/2569	09.00 - 11.00	8047	8046	1	2946	2922	24	อุทัย
10/4/2569	09.00 - 11.00	8048	8047	1	2974	2946	28	อุทัย
11/4/2569	09.00 - 11.00	8049	8048	1	3001	2974	27	อุทัย
12/4/2569	09.00 - 11.00	8050	8049	1	3029	3001	28	อุทัย
13/4/2569	09.00 - 11.00	8051	8050	1	3056	3029	27	อุทัย
14/4/2569	09.00 - 11.00	8052	8051	1	3083	3056	27	อุทัย
15/4/2569	09.00 - 11.00	8053	8052	1	3111	3083	28	อุทัย
16/4/2569	09.00 - 11.00	8054	8053	1	3143	3111	32	อุทัย
17/4/2569	09.00 - 11.00	8056	8054	2	3170	3143	27	อุทัย
18/4/2569	09.00 - 11.00	8057	8056	1	3198	3170	28	อุทัย
19/4/2569	09.00 - 11.00	8059	8057	2	3226	3198	28	อุทัย
20/4/2569	09.00 - 11.00	8060	8059	1	3255	3226	29	อุทัย
21/4/2569	09.00 - 11.00	8062	8060	2	3284	3255	29	อุทัย
22/4/2569	09.00 - 11.00	8063	8062	1	3315	3284	31	อุทัย
23/4/2569	09.00 - 11.00	8064	8063	1	3347	3315	32	อุทัย
24/4/2569	09.00 - 11.00	8065	8064	1	3377	3347	30	อุทัย
25/4/2569	09.00 - 11.00	8066	8065	1	3407	3377	30	อุทัย
26/4/2569	09.00 - 11.00	8067	8066	1	3436	3407	29	อุทัย
27/4/2569	09.00 - 11.00	8068	8067	1	3465	3436	29	อุทัย
28/4/2569	09.00 - 11.00	8069	8068	1	3493	3465	28	อุทัย
29/4/2569	09.00 - 11.00	8070	8069	1	3526	3493	33	อุทัย
30/4/2569	09.00 - 11.00	8071	8070	1	3558	3526	32	อุทัย
รวมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ =		34	หน่วย		รวมจำนวนหน่วยประปาที่ใช้ =		841	หน่วย

SUPERVISOR

DATE...../...../.....

By : Thaweesak Thanok



แบบฟอร์มจดมิเตอร์สาธารณะบริเวณกลาง

ประจำเดือนพฤษภาคม.....2569

วันที่	ช่วงเวลา	มิเตอร์ไฟฟ้า			มิเตอร์ประปา			ผู้บันทึก
		มิเตอร์หมายเลข 0299325239165280			มิเตอร์หมายเลข D170F0307841			
		ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	
1/5/2569	09.00 - 11.00	8072	8071	1	3585	3558	27	อุทัย
2/5/2569	09.00 - 11.00	8073	8072	1	3611	3585	26	อุทัย
3/5/2569	09.00 - 11.00	8074	8073	1	3639	3611	28	อุทัย
4/5/2569	09.00 - 11.00	8075	8074	1	3666	3639	27	อุทัย
5/5/2569	09.00 - 11.00	8076	8075	1	3692	3666	26	อุทัย
6/5/2569	09.00 - 11.00	8077	8076	1	3717	3692	25	อุทัย
7/5/2569	09.00 - 11.00	8078	8077	1	3742	3717	25	อุทัย
8/5/2569	09.00 - 11.00	8079	8078	1	3768	3742	26	อุทัย
9/5/2569	09.00 - 11.00	8080	8079	1	3795	3768	27	อุทัย
10/5/2569	09.00 - 11.00	8081	8080	1	3821	3795	26	อุทัย
11/5/2569	09.00 - 11.00	8082	8081	1	3846	3821	25	อุทัย
12/5/2569	09.00 - 11.00	8083	8082	1	3873	3846	27	อุทัย
13/5/2569	09.00 - 11.00	8084	8083	1	3900	3873	27	อุทัย
14/5/2569	09.00 - 11.00	8086	8084	2	3930	3900	30	อุทัย
15/5/2569	09.00 - 11.00	8087	8086	1	3957	3930	27	อุทัย
16/5/2569	09.00 - 11.00	8088	8087	1	3983	3957	26	อุทัย
17/5/2569	09.00 - 11.00	8089	8088	1	4008	3983	25	อุทัย
18/5/2569	09.00 - 11.00	8090	8089	1	4033	4008	25	อุทัย
19/5/2569	09.00 - 11.00	8091	8090	1	4058	4033	25	อุทัย
20/5/2569	09.00 - 11.00	8092	8091	1	4082	4058	24	อุทัย
21/5/2569	09.00 - 11.00	8093	8092	1	4108	4082	26	อุทัย
22/5/2569	09.00 - 11.00	8094	8093	1	4136	4108	28	อุทัย
23/5/2569	09.00 - 11.00	8095	8094	1	4164	4136	28	อุทัย
24/5/2569	09.00 - 11.00	8096	8095	1	4191	4164	27	อุทัย
25/5/2569	09.00 - 11.00	8097	8096	1	4219	4191	28	อุทัย
26/5/2569	09.00 - 11.00	8098	8097	1	4248	4219	29	อุทัย
27/5/2569	09.00 - 11.00	8099	8098	1	4275	4248	27	อุทัย
28/5/2569	09.00 - 11.00	8101	8099	2	4300	4275	25	อุทัย
29/5/2569	09.00 - 11.00	8102	8101	1	4325	4300	25	อุทัย
30/5/2569	09.00 - 11.00	8103	8102	1	4352	4325	27	อุทัย
31/5/2569	09.00 - 11.00	8104	8103	1	4385	4352	33	อุทัย
รวมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ =		33			รวมจำนวนหน่วยประปาที่ใช้ =		827	หน่วย

SUPERVISOR

DATE...../...../.....

By : Thaweesak Thanok



แบบฟอร์มจดมิเตอร์สาธารณะประเภทบ้านกลาง

ประจำเดือนมิถุนายน.....2569

วันที่	ช่วงเวลา	มิเตอร์ไฟฟ้า			มิเตอร์ประปา			ผู้บันทึก
		มิเตอร์หมายเลข 0299325239165280			มิเตอร์หมายเลข D170F0307841			
		ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	ค่าปัจจุบัน	ค่าครั้งก่อน	ผลต่าง	
1/6/2569	09.00 - 11.00	8105	8104	1	4410	4385	25	อุทัย
2/6/2569	09.00 - 11.00	8106	8105	1	4434	4410	24	อุทัย
3/6/2569	09.00 - 11.00	8107	8106	1	4460	4434	26	อุทัย
4/6/2569	09.00 - 11.00	8108	8107	1	4485	4460	25	อุทัย
5/6/2569	09.00 - 11.00	8109	8108	1	4510	4485	25	อุทัย
6/6/2569	09.00 - 11.00	8110	8109	1	4534	4510	24	อุทัย
7/6/2569	09.00 - 11.00	8111	8110	1	4559	4534	25	อุทัย
8/6/2569	09.00 - 11.00	8112	8111	1	4584	4559	25	อุทัย
9/6/2569	09.00 - 11.00	8113	8112	1	4608	4584	24	อุทัย
10/6/2569	09.00 - 11.00	8114	8113	1	4633	4608	25	อุทัย
11/6/2569	09.00 - 11.00	8115	8114	1	4656	4633	23	อุทัย
12/6/2569	09.00 - 11.00	8116	8115	1	4679	4656	23	อุทัย
13/6/2569	09.00 - 11.00	8117	8116	1	4703	4679	24	อุทัย
14/6/2569	09.00 - 11.00	8118	8117	1	4725	4703	22	อุทัย
15/6/2569	09.00 - 11.00	8119	8118	1	4747	4725	22	อุทัย
16/6/2569	09.00 - 11.00	8120	8119	1	4772	4747	25	อุทัย
17/6/2569	09.00 - 11.00	8121	8120	1	4793	4772	21	อุทัย
18/6/2569	09.00 - 11.00	8122	8121	1	4817	4793	24	อุทัย
19/6/2569	09.00 - 11.00	8123	8122	1	4841	4817	24	อุทัย
20/6/2569	09.00 - 11.00	8124	8123	1	4863	4841	22	อุทัย
21/6/2569	09.00 - 11.00	8125	8124	1	4885	4863	22	อุทัย
22/6/2569	09.00 - 11.00	8126	8125	1	4909	4885	24	อุทัย
23/6/2569	09.00 - 11.00	8127	8126	1	4931	4909	22	อุทัย
24/6/2569	09.00 - 11.00	8128	8127	1	4955	4931	24	อุทัย
25/6/2569	09.00 - 11.00	8129	8128	1	4978	4955	23	อุทัย
26/6/2569	09.00 - 11.00	8130	8129	1	5001	4978	23	อุทัย
27/6/2569	09.00 - 11.00	8131	8130	1	5025	5001	24	อุทัย
28/6/2569	09.00 - 11.00	8132	8131	1	5049	5025	24	อุทัย
29/6/2569	09.00 - 11.00	8133	8132	1	5072	5049	23	อุทัย
30/6/2569	09.00 - 11.00	8134	8133	1	5096	5072	24	อุทัย
รวมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ = 30 หน่วย				รวมจำนวนหน่วยประปาที่ใช้ = 711 หน่วย				

SUPERVISOR



DATE...../...../.....

By : Thaweesak Thanok

ภาคผนวก 4

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่าง ๆ ของโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

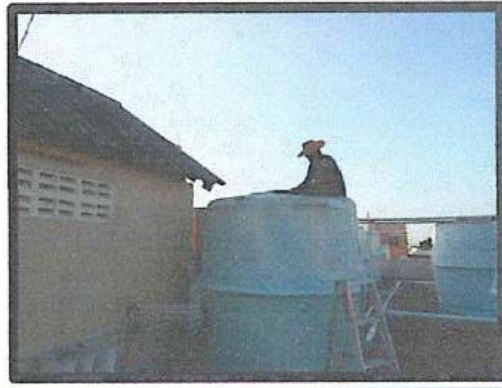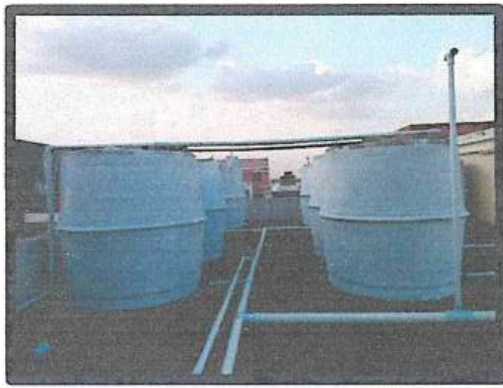

ภาคผนวก 5

พื้นที่สีเขียว และงานสวน

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก 6

ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก 7

ความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย


ภาพแสดงภาชนะรองรับมูลฝอยตามชั้น



ภาพแสดงการจัดเก็บขยะ



ภาพแสดงการจัดเก็บของเทศบาลนทบุรี

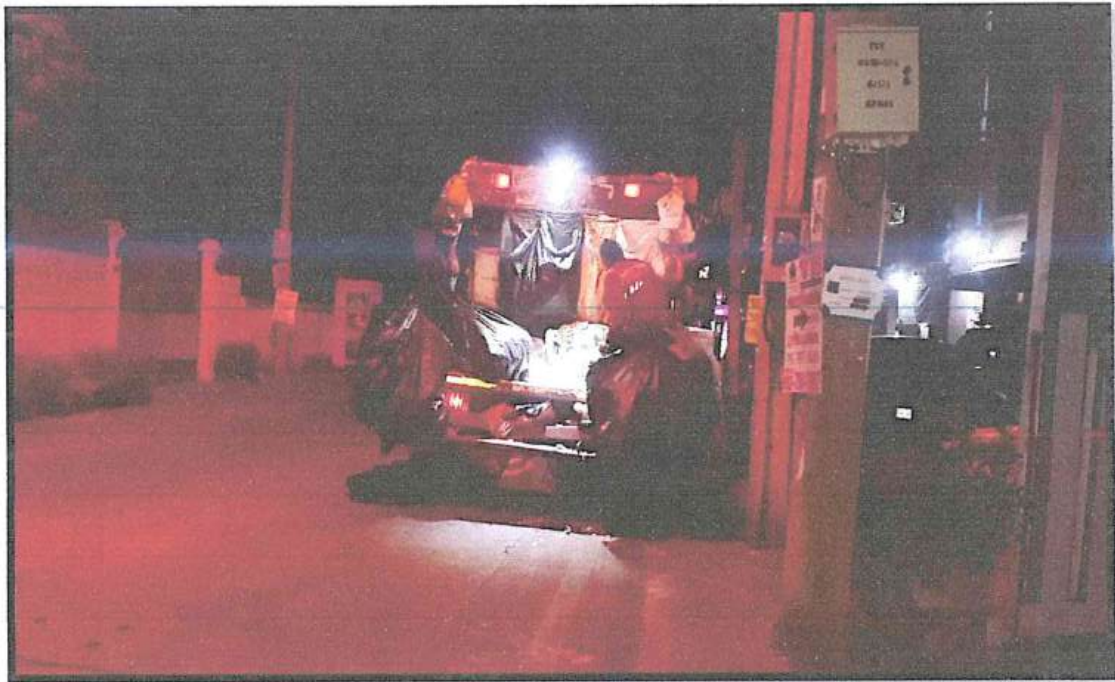

ภาคผนวก 8

กิจกรรมข่มหนีไฟ และเศรษฐกิจและสังคม

ภาพแสดงกิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี



ภาพแสดงจุดรวมพลของโครงการ




ภาพแสดงหัวรับน้ำดับเพลิงของอาคาร





ภาคผนวก 9

การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร


ภาพแสดงการตรวจสอบอาคาร

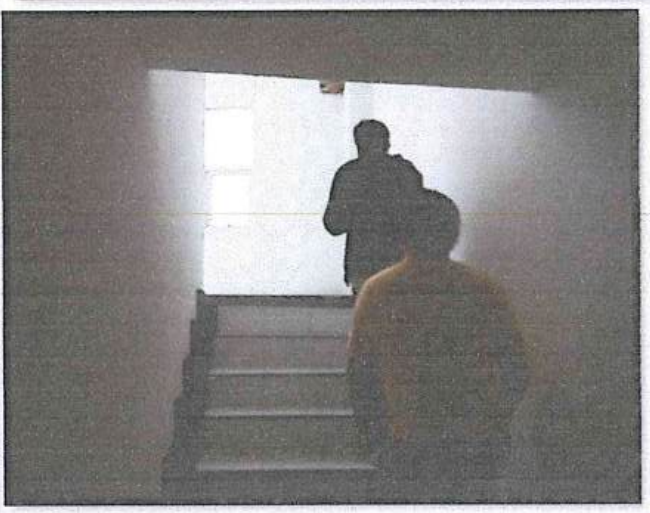

การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร

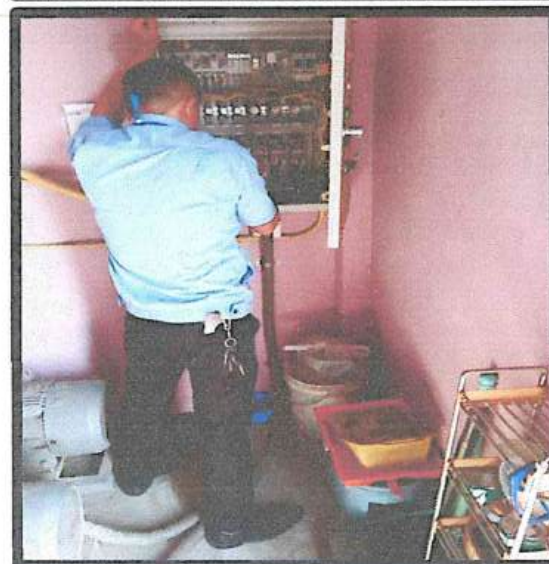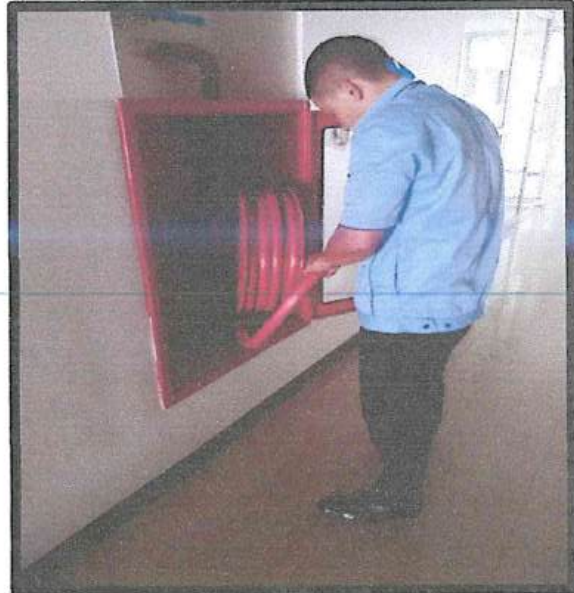

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

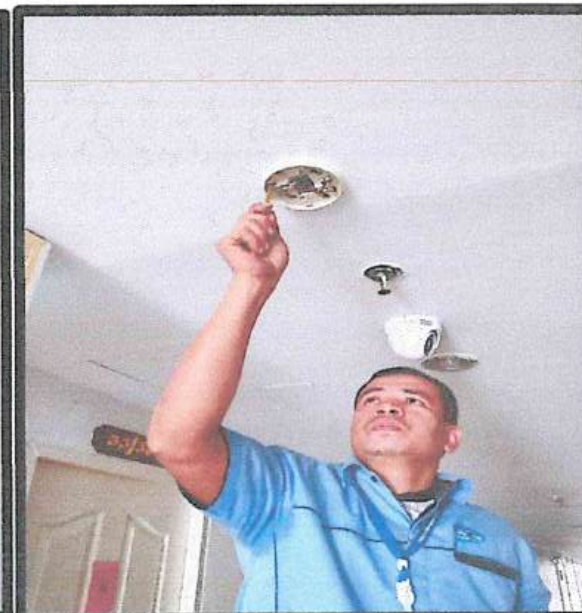

การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน



ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน

อย่าลืม

เรื่องน้ำไว้ในคอนโด

ใส่ใจดำเนินการเรื่องเหล่านี้
ในวันหยุดสงกรานต์

ตรวจสอบ และถอดปลั๊กไฟ
(ป้องกันการเกิดไฟช็อต/เพลิงไหม้)

ปิดก๊อกน้ำ และปิดวาล์วน้ำ
(เพื่อป้องกันน้ำรั่ว และน้ำท่วม)

ตรวจสอบระดับน้ำต่าง และเผื่อให้เรียบร้อย
(เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน)

และอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางนะคะ

ติดต่อที่ 34-449 อาคารสามัคคีคอนโด หมู่ 4 แขวงบางนาใต้ เขตเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทร 02 002 9266-8 แฟกซ์ 02 002 9369 E-Mail : admin@villacn.com.th

Ville Con
Management Co., Ltd.


ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ หยุดหลายวัน ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง เพื่อความปลอดภัย แจ้งปิดมิเตอร์น้ำป้องกันน้ำรั่ว และปิดเบรกเกอร์ไฟที่ไม่ได้ใช้

In long holidays and absence from the facility please inform the management to turn off the electricity and water during this period to prevent accidents

在长假的时候，出发前请核实汽车的情况，通知关水表为避免漏水，将断路器关掉。

Ville Con
Management Co., Ltd.
ติดต่อที่ 34-449 อาคารสามัคคีคอนโด หมู่ 4 แขวงบางนาใต้ เขตเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โทร 02 002 9266-8 แฟกซ์ 02 002 9369 E-Mail : admin@villacn.com.th

ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

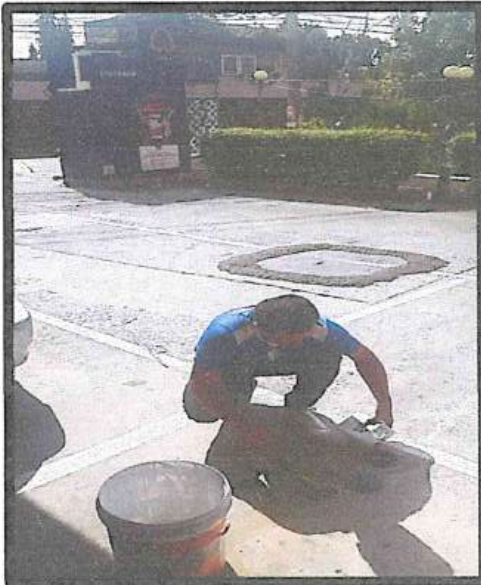

ภาคผนวก 10

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่เก็บตัวอย่าง	ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด					
		pH	BOD (mg/L)	Suspended Solids (mg/L)	Fat,Oil & Grease (mg/L)	TKN (mg/L)	Sulfide (mg/L)
26-ม.ค.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.4	468	6120	161	400	33
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.7	12	< 10	< 2	11	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
16-ก.พ.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.3	550	43733	307	420	33
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.7	20	25	< 2	14	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
23-มี.ค.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.5	114	134	8	222	7
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.8	18	30	3	15	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
16-เม.ย.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.7	70	36	< 2	251	1.6
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.9	15	24	3	20	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
21-พ.ค.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.4	503	14378	151	417	34
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.8	16	< 10	< 2	6	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0
10-มิ.ย.-69	1.น้ำเสียก่อนบำบัด	7.2	483	11680	243	99	26
	2.น้ำเสียหลังจากบำบัด	7.6	14	< 10	< 2	12	< 0.10
	ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0

ภาคผนวก 11

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



๐ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๔ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางนิรมล ผดุงสงฆ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ก-๐๐๐๑

๒) นางสาวเปรมฤดี ปิยะศิลป์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ก-๐๐๐๒

๓) นางสาวนิตยา ชันธบุตร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ก-๐๐๐๓

๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูผ่าน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ก-๐๐๐๔

๕) นางสาวสุวิไล บังแสงอ่อน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ก-๐๐๐๕

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาวอนุสรฯ แพงดวงแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๑

๒) นายรังษิกร โกสุมภ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาววรารพร วันวิเศษ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๔

๔) นางสุนันทา แจ่มมิน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๕

๕) นายพุดพิงค์ วรสุมนต์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๖

๖) นางสาวอรรพรรณ สีใต้

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๗

๗) นายวชิราวุฒิ อุไรวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๘

๘) นางสาวรณกร ผดุงเวียง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๐

๙) นายมานพ สลามขอ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๑

๑๐) นายรัตพล ไบไกร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๕

๑๑) นางสาวสมมาต อยู่สา

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๖

๑๒) นายภูเบศร์ สารยศ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๗

๑๓) นายธนภฤต สุจริต

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๐

๑๔) นางสาวกนกพร หลวงประมูล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๑

๑๕) นางสาวอาภรณ์ แซ่เฮ้อ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๕

๑๖) นางสาวทิพรัตน์...


๑๖) นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๖
๑๗) นายนิเทศ พูลศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๗
๑๘) นายจิตติวัชร วงศ์หมากเห็บ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๘
๑๙) นายกฤษณะ ธรรมชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๙
๒๐) นางสาวแคทรียา มีแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๐
๒๑) นางสาวอัญชิสา แผลงศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๑
๒๒) นางสาวอรรณณ สุตรง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๒
๒๓) นางสาววันดี เปรมประคิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๓
๒๔) นางสาวสุธิดา สิงหาเพ็ญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๔
๒๕) นายคณิน ยศไธสง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๕
๒๖) นางสาวมีนา เมฆา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๖
๒๗) นางสาววรรณวิไล วงษ์ใหญ่	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๗
๒๘) นางสาวไอริน ลำภา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๘
๒๙) นางสาวศุภนิดา อนุชาติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๓๙

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเลือกมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเลือกมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๑๙๐

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๗ ๒ ๕

ลงวันที่ ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒๙ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 44 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
2	Arsenic	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
3	Barium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
4	α -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
5	β -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
6	δ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
7	γ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method ^[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
10	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[3]
11	Chromium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
12	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[3]
13	Copper	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
14	Cyanide	Total Cyanide after Distillation, Colorimetric Method ^[3]
15	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
16	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]

อนุมัติ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
18	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
19	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
20	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
21	Endosulfan sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
22	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
23	Endrin aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
24	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[1]
25	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[3]
26	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[3]
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
28	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
29	Lead	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
30	Manganese	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
31	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
32	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
33	Nickel	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
34	Oil & Grease	Soxhlet Extraction Method ^[3]
35	pH	Electrometric Method ^[3]
36	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
37	Selenium	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]

๓๗

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
38	Sulfide	Iodometric Method ^[3]
39	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
40	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
41	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[3]
42	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[3]
43	Trivalent Chromium	Calculation ^[3]
44	Zinc	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]

น้ำใต้ดิน จำนวน 31 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
2	Antimony	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
4	Barium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
5	Beryllium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
6	Cadmium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
7	Chromium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
8	Chromium (III)	Calculation ^[3]
9	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^[3]
10	Cyanide	Total Cyanide after Distillation, Colorimetric Method ^[3]
11	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
12	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
13	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
14	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
16	α -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
17	β -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
18	γ -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
19	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
20	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
21	Lead	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
22	Manganese	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
23	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
24	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
25	Nickel	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
26	pH	Electrometric Method ^[3]
27	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
28	Selenium	Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
29	Silver	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
30	Vanadium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
31	Zinc	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]

อนุทิน

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 25 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
2	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9]
3	Arsenic	2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] 1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,10] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,10]
4	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
5	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
6	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
7	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
8	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method ^[2,11] 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,11]
9	Copper	1) Waste Extraction; Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]

๓๗

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
10	DDD	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
11	DDE	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
12	DDT	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
13	Dieldrin	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
14	Endrin	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
15	Heptachlor	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
16	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
17	Lindane	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[2,7,15]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
18	Mercury	2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15] 1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,12] 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[13]
19	Methoxychlor	Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid
20	Nickel	Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
21	pH	Electrometric Method ^[19,20]
22	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,14] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,14]
23	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
24	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
25	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]

ดิน จำนวน 29 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
2	Antimony	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,10]
4	Barium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
5	Beryllium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
6	Cadmium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
7	Chromium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
8	Chromium (III)	Calculation ^[5,6,9,11]
9	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,11]
10	Cyanide	Extraction, Distillation, Colorimetric Method ^[16,17,18]
11	DDD	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
12	DDE	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
13	DDT	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
14	Dieldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
15	Endrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
16	α -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
17	β -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
18	γ -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
19	Heptachlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
20	Heptachlor epoxide	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
21	Lead	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
22	Manganese	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]

๓๖

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
23	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[13]
24	Methoxychlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15]
25	Nickel	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
26	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,14]
27	Silver	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
28	Vanadium	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
29	Zinc	Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2566. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.ราชกิจจานุเบกษา. 31 พฤษภาคม 2566. เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 126 ง.
3. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846, 2014.
5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C, 1996.
8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C, 1996.
9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2007. อนุทิน
10. United...

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062, 1994.
11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold Vapor Technique). SW-846 Method 7470A, 1994.
13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B, 1998.
14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742, 1994.
15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. SW-846 Method 8270E, 2018.
16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Total and Amenable Cyanide; Distillation. SW-846 Method 9010C, 2004.
17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils. SW-846 Method 9013A, 2014.
18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide in Waters and Extracts using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014, 2014.
19. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.
20. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004.

๗๖๖

ภาคผนวก 12

เอกสารสำคัญ นิติบุคคลฯ

สำเนาทะเบียนบ้านนิติ

ความสำคัญของเอกสาร

56-30-13

เอกสารนี้เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้านเป็นผู้เก็บรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
- ข้อ 2 กรณีมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
- ข้อ 3 เมื่อผู้ผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 - ผู้ใดทำใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอันโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ในกรณีผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1299-066915-9 สำนักทะเบียน กิ่งกั้น เทศบาลนครนนทบุรี
รายการที่อยู่ 114/1 ซอยงามวงศ์วาน 23
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน เอกสินคอนโดมิเนียม
ประเภทบ้าน ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลักษณะบ้าน อาคารชุด 8 ชั้น
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 18 สิงหาคม 2551

ลงชื่อ (น.ส. อารุมา เหมือนครุฑ) นายทะเบียน

แนบฉบับเดิมที่สูญหาย

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 13 ธันวาคม 2561

รับรองเลขที่ 5568/2561

แบบ อ.1

แบบ อ.1



อาคารประเภทควบคุม
การใช้ ตามมาตรา 32

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร - ~~ตัดแปลงอาคาร~~ หรือ ~~รื้อถอนอาคาร~~

เลขที่ 498 / 2550

อนุญาตให้ บริษัท เอเคส-การเคมโธม จำกัด (โดยนายแพทย์ อังกรกมล นายเจริญ อังกรกมล) เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 83/5, 6, 7, 8 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง - หมู่ที่ 2

ตำบล/แขวง - บางเขน อำเภอ/เขต - เมือง จังหวัด - นนทบุรี

ข้อ 1 ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - แขวง - หมู่ที่ 2

ตำบล/แขวง - บางเขน อำเภอ/เขต - เมือง จังหวัด - นนทบุรี

ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ก.1 เลขที่ 24127

เป็นที่ดินของ บริษัท เอเคส-การเคมโธม จำกัด (โดยนายแพทย์ อังกรกมล, นายเจริญ อังกรกมล)

ข้อ 2 เป็นอาคาร อาคาร - อพาร์ทเมนต์ (อาคารชุด)

(1) ชนิด ก.ต.ช. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง (193 ห้องชุด) เพื่อใช้เป็น อพาร์ทเมนต์-อาคารชุด

พื้นที่/ความยาว 12,632.00 ตารางเมตร และสำนักงานบุคคล 1 หน่วย

จำนวน 60 คัน พื้นที่ 990.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ

(2) ชนิด หอระแนบ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่ระแนบ

พื้นที่/ความยาว 166.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(3) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 145 / 2550 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ นายวันชัย จันทะวงษ์ วย. 126 ถึง ทสอ.ศก

วันที่ 145 / 2550 เป็นผู้คำนวณ

ข้อ 3 โดยมี นวณเสถียร สว่างสินธุ อย. 8892 ถึง 2 ส.ก. 2551 เป็นผู้ควบคุมงาน

นายไพฑูรย์ รัตนชัย ส-สอ. 441 ถึง 12 ส.ก. 2551 เป็นผู้ออกแบบ

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ นายสุทธิพันธุ์ รัตนังสรรค์ อย. 4284 ถึง 15 ส.ก. 2551 เป็นผู้ควบคุมงาน

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

(2) ค่าธรรมเนียมตรวจแบบและค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคารคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 51,209.00 บาท

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

ผู้ได้รับอนุญาต, เจ้าของอาคาร, ผู้ดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยื่นวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

จะต้องปฏิบัติตามใบอนุญาต, แบบแปลน, แผนผัง, เงื่อนไข

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

และให้ใช้เงินเพื่อป้องกันความเสียหายหรือก่อเหตุ

รำคาญต่อข้างเคียง ก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องแจ้ง

นายตรวจเขตตรวจความถูกต้อง

(ลายมือชื่อ) นายพงศ์ พงษ์โพพ

(รองนายกเทศมนตรี-ปฏิบัติราชการแทน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

(นายก อบ.นนทบุรี)

แบบ อ.6

แบบ อ. 6

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร-คัดแปลงอาคาร-หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ บม 52006/ 5031

อนุญาตให้บริษัท เอกสิน การเคมโสม จำกัด โดย นายเทพกร อิงค์รัตนกุล และนายจรัส อิงค์รัตนกุล
อยู่บ้านเลขที่ 83/5,6,7,8 ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง - หมู่ที่ 2
ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี
ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่ 498 / 2550 ลงวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2550 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เป็นอาคาร อาคารชุด

(1) ชนิด ก.ส.อ. 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง (193 ห้องชุด) เพื่อใช้เป็น อาคารชุด-อยู่อาศัย
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 60 และสำนักงานบุคคล 1 หน่วย

(2) ชนิด หอระฆังไม้ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ที่รมายน้ำ
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(3) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - แขวง - หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - เมือง - จังหวัด - นนทบุรี

โดย บริษัท เอกสิน การเคมโสม จำกัด โดย นายเทพกร อิงค์รัตนกุล และนายจรัส อิงค์รัตนกุล
เป็นเจ้าของอาคาร

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส. 3 เลขที่ / ร.ค. 1 เลขที่ 24127

เป็นที่ดินของ บริษัท เอกสิน การเคมโสม จำกัด โดย นายเทพกร อิงค์รัตนกุล และนายจรัส อิงค์รัตนกุล

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อปฏิบัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) มาตรา 9 หรือมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(2) ค่าธรรมเนียมใบรับรองการใช้อาคารคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 20,00 บาท

ออกให้ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2551 เดือน - พ.ศ. -

สำเนาถูกต้อง

(ลายมือชื่อ)

(นายอนุเมธี อัคราเมธี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี

(นายคม แสงบำรุง)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบ อ.ช. 13



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "เอกสินคอนโดมิเนียม"
๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ตลอดจนกิจการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องของอาคารชุด "เอกสินคอนโดมิเนียม"

ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่เลขที่ ๓๓/๒๑๙ หมู่ที่ ๒ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสมชาย นิลสุวรรณ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

ภาคผนวก 13

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการ
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 68

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ตารางที่ 2. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางอากาศ 1.1 ภัยมลพิษทางอากาศ พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ด้านถนนขุมขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นป่าชุมชน มีคลองน้ำที่ไหลตามธรรมชาติ และทิศของลมเป็นด้าน ความกดอากาศมีพื้นที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจายเป็นตัวนำพาฝุ่น แต่เนื่องจากมีการขยายตัวทางพื้นที่และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจเพิ่มขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนพฤษชาชนนนทบุรี	โครงการจัดทำพื้นที่สีเขียวบนที่ดินที่ 712 ตารางเมตร โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น 50 ต้น เพื่อสร้างทัศนียภาพและบดบังอาคารได้บางส่วนซึ่งมีอยู่ต้น ไม่มีขนาดโตขึ้นจะช่วยให้สามารถขยายงานและความร่มรื่นให้กับผู้ที่อาศัยในโครงการได้ทางหนึ่ง	โครงการจัดทำพื้นที่สีเขียวบนที่ดินที่ 712 ตารางเมตร โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น 50 ต้น เพื่อสร้างทัศนียภาพและบดบังอาคารได้บางส่วนซึ่งมีอยู่ต้น ไม่มีขนาดโตขึ้นจะช่วยให้สามารถขยายงานและความร่มรื่นให้กับผู้ที่อาศัยในโครงการได้ทางหนึ่ง		ภาพที่ 9
1.2 ภัยมลพิษทางอากาศและคุณภาพอากาศ ภัยมลพิษทางอากาศของนนทบุรีภายใต้สิทธิของระบบถนนสำคัญที่ตัดตามฤดูกาลจากทางหลวงชนบทที่ 307 (พ.ศ. 2514-2543) ทางความคืบหน้าขยายทางรถไฟสายรถไฟที่ 1,009.49 กิโลเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 28.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 73 ปริมาณฝนตลอดปีเฉลี่ยอยู่ที่ 1,227.5 มิลลิเมตร	(1) พบปัญหาความชื้นของอากาศในโครงการ เช่น น้ำขังจากมีความชื้นบนพื้นดินตลอดความชื้น เพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่อาจจะขงของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน (2) หมั่นนำพาความสะอาดมีความเหมาะสม พื้นที่ผิวถนนทาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว (3) ประสานกับทีมอื่น ไม่มีการผลิตหรือข่มขืนและขอรถขนถ่ายในโครงการ -มาตรการลดการสะสมตัวของ CO (1) เพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงและลดอัตราการระบายมลพิษ(CO) จากเครื่องยนต์ กำหนดให้ใช้เชื้อเพลิงดีเซลให้รถยนต์ที่เข้ามาจอดในท้องถองภายในอาคารโครงการด้วยเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำมันดีเซล (2) จัดพื้นที่ที่พื้นที่บริเวณบริเวณพื้นที่ที่ว่างภายในที่จอดรถยนต์ เพื่อช่วยป้องกันมลพิษ(CO) ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยภายในอาคาร	(1) โครงการความชื้นของอากาศในโครงการ เช่น น้ำขังจากมีความชื้นบนพื้นดินตลอดความชื้น เพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่อาจจะขงของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน (2) โครงการหมั่นนำพาความสะอาดมีความเหมาะสม พื้นที่ผิวถนนทาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว (3) โครงการประสานกับทีมอื่น ไม่มีการผลิตหรือข่มขืนและขอรถขนถ่ายในโครงการ -มาตรการลดการสะสมตัวของ CO (1) โครงการเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงและลดอัตรา การระบายมลพิษ(CO) จากรถยนต์กำหนดให้ใช้เชื้อเพลิงดีเซลให้รถยนต์ที่เข้ามาจอดในท้องถองภายในอาคารโครงการด้วยเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำมันดีเซล (2) โครงการจัดพื้นที่พื้นที่บริเวณบริเวณพื้นที่ที่ว่างภายในที่จอดรถยนต์ เพื่อช่วยป้องกันมลพิษ(CO) ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยภายในอาคาร		ภาพที่ 8 ภาพที่ 8 ภาพที่ 1, 2
1.3 เสียงและกลิ่น จากการสำรวจจอมพื้นที่โครงการวัดที่ 1 กิโลเมตร ไม่พบว่ามีแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ	-ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บรวบรวมผ่านกระบวนการตามเดิมและตามเดิมอาคารตามการตรวจวัดน้ำเสียในแต่ละส่วนของอาคาร ได้ด้วยเสียงของบริเวณ 110.6 ดบม.วัน และป้องกันประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบไว้ -ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจนถึงก่อนการบำบัดให้คุณภาพอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537 สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำของอาคาร พ.ศ.2537 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ยกเว้นไปไม่ได้เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร กำหนดตามเกณฑ์ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร กำหนดวันและจำนวน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยของน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	-โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บรวบรวมผ่านกระบวนการตามเดิมและตามเดิมอาคารตามการตรวจวัดน้ำเสียในแต่ละส่วนของอาคาร ได้ด้วยเสียงของบริเวณ 110.6 ดบม.วัน และป้องกันประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบไว้ -โครงการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจนถึงก่อนการบำบัดให้คุณภาพอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537 สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำของอาคาร พ.ศ.2537 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) เรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ยกเว้นไปไม่ได้เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร กำหนดตามเกณฑ์ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร กำหนดวันและจำนวน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยของน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด		บทที่ 3 ภาพที่ 7

รายงานผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาในการของโครงการ

องค์ประกอบตัวชี้วัด		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามผลการ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ		(1) หากได้รับการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน รวดเร็ว ให้ได้รับสิ่งโดยเร็วที่สุด	(1) โครงการหากได้รับการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน รวดเร็ว ให้ได้รับสิ่งโดยเร็วที่สุด	ภาคผนวก 9	
4.2 ชุมชนชุมชน		(1) ต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมตามต่างประเทศ (ไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยความปลอดภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ) ว่าเป็นความเสี่ยง ราชบัณฑิตยสถาน 1) นำตัวกรองและฟิล์มของอาคาร 60 ชุดตามต้นแบบ (แจ้งตัวกรองนำตัวกรองฟิล์มและฟิล์ม) 2) ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติพร้อมสัญญาณเตือนภัย (Hose Cabinet) จำนวน 8 เครื่อง และถังดับเพลิงดับเพลิง จำนวน 39 เครื่อง สัญญาณเตือนภัย 4 3) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 4) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 5) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 6) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 7) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 1 จำนวน 8 ชุด ขึ้นที่ 2-8 จำนวน 28 ชุด รวมทั้งหมด 196 ชุด ถังดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิง 204 ชุด สัญญาณเตือนภัย 3 สัญญาณเตือนภัย	(1) โครงการต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมตามต่างประเทศ (ไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยความปลอดภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ) ว่าเป็นความเสี่ยง ราชบัณฑิตยสถาน 1) นำตัวกรองและฟิล์มของอาคาร 60 ชุดตามต้นแบบ (แจ้งตัวกรองนำตัวกรองฟิล์มและฟิล์ม) 2) ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติพร้อมสัญญาณเตือนภัย (Hose Cabinet) จำนวน 8 เครื่อง และถังดับเพลิงดับเพลิง จำนวน 39 เครื่อง สัญญาณเตือนภัย 4 3) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 4) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 5) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 6) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 7) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 1 จำนวน 8 ชุด ขึ้นที่ 2-8 จำนวน 28 ชุด รวมทั้งหมด 196 ชุด ถังดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิง 204 ชุด สัญญาณเตือนภัย 3 สัญญาณเตือนภัย	ภาคผนวก 5.6	
4.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		(1) โครงการต้องมีการแจ้งเตือนภัยพิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมตามต่างประเทศ (ไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยความปลอดภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ) ว่าเป็นความเสี่ยง ราชบัณฑิตยสถาน 1) นำตัวกรองและฟิล์มของอาคาร 60 ชุดตามต้นแบบ (แจ้งตัวกรองนำตัวกรองฟิล์มและฟิล์ม) 2) ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติพร้อมสัญญาณเตือนภัย (Hose Cabinet) จำนวน 8 เครื่อง และถังดับเพลิงดับเพลิง จำนวน 39 เครื่อง สัญญาณเตือนภัย 4 3) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 4) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 5) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 6) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 7) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 1 จำนวน 8 ชุด ขึ้นที่ 2-8 จำนวน 28 ชุด รวมทั้งหมด 196 ชุด ถังดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิง 204 ชุด สัญญาณเตือนภัย 3 สัญญาณเตือนภัย	(1) โครงการต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมตามต่างประเทศ (ไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยความปลอดภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ) ว่าเป็นความเสี่ยง ราชบัณฑิตยสถาน 1) นำตัวกรองและฟิล์มของอาคาร 60 ชุดตามต้นแบบ (แจ้งตัวกรองนำตัวกรองฟิล์มและฟิล์ม) 2) ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติพร้อมสัญญาณเตือนภัย (Hose Cabinet) จำนวน 8 เครื่อง และถังดับเพลิงดับเพลิง จำนวน 39 เครื่อง สัญญาณเตือนภัย 4 3) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 4) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 5) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 6) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 7) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 1 จำนวน 8 ชุด ขึ้นที่ 2-8 จำนวน 28 ชุด รวมทั้งหมด 196 ชุด ถังดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิง 204 ชุด สัญญาณเตือนภัย 3 สัญญาณเตือนภัย	ภาคผนวก 8	
4.4 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		(1) โครงการต้องมีการแจ้งเตือนภัยพิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมตามต่างประเทศ (ไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยความปลอดภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ) ว่าเป็นความเสี่ยง ราชบัณฑิตยสถาน 1) นำตัวกรองและฟิล์มของอาคาร 60 ชุดตามต้นแบบ (แจ้งตัวกรองนำตัวกรองฟิล์มและฟิล์ม) 2) ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติพร้อมสัญญาณเตือนภัย (Hose Cabinet) จำนวน 8 เครื่อง และถังดับเพลิงดับเพลิง จำนวน 39 เครื่อง สัญญาณเตือนภัย 4 3) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 4) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 5) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 6) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 7) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 1 จำนวน 8 ชุด ขึ้นที่ 2-8 จำนวน 28 ชุด รวมทั้งหมด 196 ชุด ถังดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิง 204 ชุด สัญญาณเตือนภัย 3 สัญญาณเตือนภัย	(1) โครงการต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมตามต่างประเทศ (ไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยความปลอดภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ) ว่าเป็นความเสี่ยง ราชบัณฑิตยสถาน 1) นำตัวกรองและฟิล์มของอาคาร 60 ชุดตามต้นแบบ (แจ้งตัวกรองนำตัวกรองฟิล์มและฟิล์ม) 2) ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติพร้อมสัญญาณเตือนภัย (Hose Cabinet) จำนวน 8 เครื่อง และถังดับเพลิงดับเพลิง จำนวน 39 เครื่อง สัญญาณเตือนภัย 4 3) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 4) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 5) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 6) ระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ด้วย Smoke Detector (Hose Cabinet) 7) หัวรับน้ำดับเพลิงดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สามชั้น 1 จำนวน 8 ชุด ขึ้นที่ 2-8 จำนวน 28 ชุด รวมทั้งหมด 196 ชุด ถังดับเพลิงตามอาคารพาณิชย์ดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิง 204 ชุด สัญญาณเตือนภัย 3 สัญญาณเตือนภัย	ภาคผนวก 8	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 2. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาในการของโครงการ

องค์ประกอบแห่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง	เอกสารอ้างอิง
	ซึ่งจะเป็นการร่วมลดการใช้สิ่งของบริโภค	ซึ่งจะเป็นการร่วมลดการใช้สิ่งของบริโภค		
	(5) ออกแบบและติดตั้งวิถีชีวิตบริโภคเครื่องปรับอากาศแยกออกจากกันในแต่ละพื้นที่ของอาคาร เพื่อความสะดวกในการบริโภคทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณความร้อนที่ระบายออกสู่บรรยากาศ	(5) โครงการออกแบบและติดตั้งวิถีชีวิตบริโภคเครื่องปรับอากาศแยกออกจากกันในแต่ละพื้นที่ของอาคาร เพื่อความสะดวกในการบริโภคทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณความร้อนที่ระบายออกสู่บรรยากาศ	ภาคผนวก 6	
	(6) กำหนดใช้วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้าง โดยคำนึงการระบายความร้อนจากอาคารออกสู่ภายนอก และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอาคารเพื่อลดปัญหาการใช้เครื่องปรับอากาศ	(6) โครงการกำหนดใช้วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้าง โดยคำนึงการระบายความร้อนจากอาคารออกสู่ภายนอก และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอาคาร เพื่อลดปัญหาการใช้เครื่องปรับอากาศ	ภาคผนวก 9	
	(7) การติดตั้งหน้าต่าง ช่องระบายอากาศในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลมในบริเวณพื้นที่โครงการ	(7) โครงการติดตั้งหน้าต่าง ช่องระบายอากาศในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศทางลมในบริเวณพื้นที่โครงการ	ภาคผนวก 9	
	(8) กำหนดให้วัสดุบริเวณพื้นที่สัมผัสผิวของอาคารสะท้อนที่ตามารถกับการดูดซับและไม่สะท้อนอุณหภูมิของอาคาร โครงการออกสู่ภายนอก	(8) โครงการกำหนดให้วัสดุบริเวณพื้นที่สัมผัสผิวของอาคารสะท้อนที่ตามารถกับการดูดซับและไม่สะท้อนอุณหภูมิของอาคาร โครงการออกสู่ภายนอก	ภาคผนวก 9	
	(9) โครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ภายในพื้นที่โครงการแล้วนั้น สามารถลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่โครงการได้	(9) โครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ภายในพื้นที่โครงการแล้วนั้น สามารถลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่โครงการได้	ภาคผนวก 5	
	(10) ติดตั้งหมวกันความร้อนที่หลังคาบริเวณนี้ก็จะเหมาะสมกับแสงอาทิตย์	(10) โครงการติดตั้งหมวกันความร้อนที่หลังคาบริเวณนี้ก็จะเหมาะสมกับแสงอาทิตย์	ภาคผนวก 9	

ภาคผนวก 14

หนังสือเห็นชอบ

ที่ ทส 1009/ 1709

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

20 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอกสินคอนโดมิเนียม

เรียน นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการเอกสินคอนโดมิเนียม ของบริษัท เอกสิน การ์เด็นโฮม จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยของบริษัท เอกสิน การ์เด็นโฮม จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอกสินคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยงามวงศ์วาน 23 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่ 1-3-31 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 24127 เลขที่ดิน 275 ประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 189 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยในการประชุมครั้งที่ 3/2550 วันที่ 16 มกราคม 2550 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอกสิน

2/คอนโดมิเนียม....

-2-

คอนโดมิเนียม และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการเอกชนคอนโดมิเนียม ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนันท์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ภาคผนวก 15

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการ

**เงื่อนไขที่โครงการเอกสินคอนโดมิเนียม
ของบริษัท เอกสิน การ์เด็นโฮม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอกสินคอนโดมิเนียม บริษัท เอกสิน การ์เด็นโฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยงามวงศ์วาน 23 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่ 1 - 3 - 31 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 24127 เลขที่ดิน 275 ประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 189 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักรักษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอกสินคอนโดมิเนียม บริษัท เอกสิน การ์เด็นโฮม จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

โครงการเขตศึกษาโลกสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จังหวัด

6470. *Am. Utr.* var.

สรุปการรวมเอกสาร (ข้อ ๒)

หน้า 4 ทั้งหมด 30 หน้า
ลงชื่อ *Dr. Ching* ติงชิ่ง

สรุปประเมินผลกระทบ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ช่วงดำเนินการ เนื่องจากโครงการเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัยและ ไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบแต่อย่างใด สิ่งที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบจากจราจรเข้า-ออกภายในและถนนด้านหน้าโครงการ ซึ่งมีสาเหตุที่เกิดอยู่ในระดับต่ำ แต่โครงการมีที่จอดรถยนต์บริเวณชั้นล่างซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากบริเวณที่จอดรถของโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนี้ ในช่วงดำเนินการของโครงการคาดว่าจะมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการในขนาดคิดในกรณีพื้นที่ที่จอดรถยนต์ของโครงการเต็มพื้นที่จำนวน 40 คัน หรือคิดในกรณีเฉลี่ยที่ประมาณ 40 คันชั่วโมง และให้ถือว่าปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นให้เป็นค่าของระดับถนนวันเนื่องจากเป็นกรณีของพื้นที่ที่มีอัตราจราจรที่ค่อนข้างน้อยและอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าระดับถนนที่ปลอดภัย (กรณีควบคุมระดับถนน 2537) (1) การประเมินค่าปริมาณการปล่อย CO 1.1) ปริมาณ CO ที่ปล่อยออกจากถนนด้านในโครงการ วัน (คำนวณตามระยะทาง) ระยะทาง 1 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถปล่อย CO = 1.206 กรัม เนื่องจากระยะทางในโครงการทั้งสิ้นประมาณ 0.2 กิโลเมตร ความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถปล่อย CO = 0.24 กรัม ดังนั้นปริมาณการปล่อย CO ทั้งหมดในโครงการจำนวน 40 คัน สามารถปล่อย CO = 0.24 x 40 = 9.6 กรัม อัตราการเข้า-ออกปกติวันละ 2 เที่ยว ดังนั้นปริมาณ CO ทั้งหมด 19.2 กรัม	รับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 3) ห้ามผู้ใดสร้างรถคันหรือยึดถนนบนถนนที่สาธารณะและทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก 4) ห้ามผู้ใดปล่อยควันหรือฝุ่นหรือเสียงจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมาบริเวณหรือที่ติดค้างบนถนน ทางระบายน้ำหรือในที่สาธารณะใด ๆ ช่วงดำเนินการ (1) ความรุนแรงของผลกระทบในโครงการ เช่น บ้างขึ้นความเร็ว ต้นไม้ที่ลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบของฝุ่นละอองมากเกินกว่า (2) ห้ามทำกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะติดตั้งถนนเป็นครั้งคราว (3) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการก่อมลพิษของผลกระทบ ภายในโครงการ มาตรการลดการสะสมตัว CO (1) เพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงและลดอัตราการสะสมมลพิษ (CO) จากรถยนต์ กำหนดให้มีป้ายเตือนที่ใกล้หรือถนนที่เข้ามายังถนนที่จอดรถภายในอาคารโครงการด้วยเครื่องหมายที่ทุกครั้งที่มีการเข้าออก (2) จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างภายในที่จอดรถยนต์ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ (CO) ที่อาจสะสมภายในที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร	หน้า 5 ทั้งหมด 90 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

สรุปประเมินผลกระทบ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1.2) การปรับเปลี่ยน CO เพื่อเป็น CO₂ ปริมาณ CO 28.8 กรัม คิดเป็น CO₂ = $44 \times 19.2 / 28 = 30.17$ กรัม = 0.68 mol 1.3) การประมาณค่าการเผาไหม้และกระบวนการดูดซับ ผลจากอัตราการใช้เชื้อเพลิงและของพื้นที่ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงในโครงการพื้นที่ใช้เชื้อเพลิง 712 ตารางเมตร มีการดูดซับและการสลายตัวและจะมีค่า 351.4 mol ในขณะที่มีการคำนวณ CO จากถนนด้านในโครงการจำนวน 40 คัน โดยคำนวณค่าในระหว่างการจราจรที่กึ่งมีปริมาณ 0.68 mol ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างมลพิษภายในโครงการด้วย (2) การแพร่กระจายของ CO ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยรอบด้วยกระบวนการซึ่งประเมินค่าความเข้มข้นได้จากการใช้ Box Model (Csanter, L.W., 1996) CONC = CO/dxwM โดยที่ COND = ความเข้มข้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ CO = ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ d = ความกว้างของพื้นที่ เมตร w = ความเร็วลม เมตรต่อวินาที M = Mixing Height : เมตร จากสมการข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่คำนวณได้จะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ แนวทางการวิจัยไปสู่ผู้รับผลกระทบ (Receptor) ตลอดแนวทางวิ่ง ดังนั้นความถี่ของพื้นที่ (d) คือ ความถี่ของพื้นที่ที่ตั้งฉากกับทิศทางการไหลของลม ความเร็วลมจากทิศทางที่ทิศทางทางวิ่งของถนนด้านในอาคาร สอดคล้องกับประมาณ 2.7 เมตรวินาที และค่า Mixing Height ซึ่งเป็นค่าความสูงของอาคารพาณิชย์หรืออาคารพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.142 เมตร สามารถประเมินค่าความเข้มข้นของการแพร่กระจายคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ CO = 45.25 กรัมต่อชั่วโมง = 0.01 กรัมต่อวินาที d = 200 เมตร w = 2.7 เมตรต่อวินาที M = 1.142 เมตร ดังนั้น CONC = $0.01 \times 1000 / 200 \times 2.7 \times 1.142$		หน้า 6 ทั้งหมด 30 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

สรุปการประเมินผลการ (ต่อ)

ข้อที่/ประเภทงาน/สิ่งแวดล้อมและจุดต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเพิ่มมากขึ้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ/การประเมินผล
	= 6.25×10^{-3} มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากผลการประเมินข้างต้น การทำงานบนยอดภูเขาในบรรยากาศ การผิวดินเข้า-ออกปกติ วันละ 2 เท่า ประมาณ 6.25×10^{-3} มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในคุณภาพในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) กำหนดไว้สำหรับบริเวณนอกเขต เขตเมือง ชั่วคราว เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผิวดินระหว่างการเข้า-ออกโครงการอยู่ในระดับต่ำ		
1.3 เสียงและกลิ่น	- ช่วงก่อสร้าง สำหรับผลกระทบจากระดับเสียงดังเกินกว่าที่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเสียงจากเสาเข็มเจาะในช่วงการก่อสร้างฐานราก มีระดับเสียง (Leq) อยู่ที่ 88 dBA) แม้แต่จากโครงการ ได้พิจารณาใช้เสาเข็มเจาะ ดังบนเสียงดังของผลกระทบดังอยู่ที่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง คือเสียงจากการเก็บงานและงานคอกด โดยมีระดับเสียง (Leq) อยู่ที่ 84 dBA) ซึ่งในช่วงเวลาที่เสียงดังจะเกิดเฉพาะช่วงกลางวัน ประมาณ ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คืออยู่ห่างจากแนวเขตก่อสร้างแล้วออกไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร อากาศที่พัดพา ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงมากที่สุดคือประมาณ 10 เมตร จากความสูงหน้าอาคารตึกเดิม เสียงของเครื่องจักรไม่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนคนต่างของโครงการ (คนที่มาทำสัมปะการณการปลูกต้นไม้ที่ 0.07) ที่ระยะผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการประมาณ 10 เมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 87.50 dBA) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องการกำหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้คือไม่เกิน 70 dBA) พบว่าจะเกินเสียงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการประมาณ 10 เมตร ได้รับมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามการประเมินนี้เป็นการประเมินที่ทำการประเมินเสียงจากแหล่งกำเนิดมีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งเมื่อผ่านแหล่งกั้นการกั้นแนวรั้วหรือถนนและอาคารพักอาศัยที่อยู่ระหว่างกลางทำให้ส่งผลถึงเสียงที่เกินจากผลกระทบที่จะถูกกั้นโดยอาคาร ซึ่งสามารถช่วยจุดเสียงเกินได้โดยระดับหนึ่ง	- ช่วงก่อสร้าง (1) จำกัดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. เท่านั้น (2) ติด Sheet Pile ลึกลงเป็นหลุมลวดเบ็ดที่มีมีการเจาะตามแนวโดย Sheet Pile ที่ใช้จะป้องกันเสียงที่จะเกิดขึ้นกับระดับใกล้เคียงได้ (3) ขุดคูวางประมาณ 2 เมตร และลึกประมาณ 2 เมตร เพื่อลดคลื่นความถี่เสียงเกินระดับเสียงจากโครงการตามแนว (4) กรณีที่ใช้เครื่องจักรที่ส่งเสียงดังมากเป็นพิเศษให้ใช้เสียงดัง เช่น เสาเข็มเจาะ ปั่นหิน ต้องใช้ผ้าคลุม ครอบ เครื่อง หรือคลุมอื่น ๆ มารองรับไว้เพื่อลดเสียงจากกิจกรรมต่าง (5) ห้ามการขุดเจาะหรือการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีในการใช้งานและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปิดกั้นหรือลดระดับเสียงดังที่จะทำได้ (6) ติดเสากำแพงหรือรั้วที่ใช้ในการกั้นเสียงหรือใช้วัสดุที่ทนทานได้ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมการใช้ความถี่ในย่านชุมชนไม่ให้เกิน 30 กม./ชั่วโมง (7) ขณะทำงานจะหาทางทำให้เกิดเสียงดังจนเกินจากข้อกำหนดระยะ 5-10 นาที ดังนั้นหาทางลดระดับเสียงหรือเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังหรือเครื่องจักร	- ช่วงก่อสร้าง ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพลดเสียงดังหรือตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้ให้ลดเสียงดังก่อสร้าง

ការបំបែកប្រភេទការងារ (តំបន់)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง...	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ช่วงดำเนินการ เนื่องจากโครงการเป็นโครงการประเภทการขุดทำเหมือง กิจกรรมส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขุด ผ่อนและอยู่อาศัย ซึ่งไม่พบว่ามีกิจกรรมใดในโครงการที่จะก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยเสียงรบกวนที่พบบริเวณโครงการจะมาจากกิจกรรมด้านการจราจร เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางจราจร แต่การเกิดเสียงรบกวนจะเกิดเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งในช่วงเวลาทำงานและอยู่ในช่วงเวลากลางวัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่เป็นปกติตามวิถีชีวิตและลักษณะสังคมแบบสังคมเมือง ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ		
1.4 น้ำใต้ดิน จากการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณโครงการวัดมี 1 กิโลเมตร ไม่พบว่ามีแหล่งน้ำใต้ดินที่สำคัญ	- ช่วงก่อสร้าง น้ำใต้ดินที่อาจพบจากบ่อตื้นและแหล่งอุปโภคบริโภคประมาณ 2.7 เมตร/วัน จะผ่านการบำบัด โดยระบบบำบัดกรอง-บ่อซึม จำนวน 3 ชุด มีประสิทธิภาพ 3.75 ลบ.ม. มีระยะเวลาพักน้ำเท่ากับ 1.4 วัน โดยทั่วไปถือว่าแหล่งน้ำที่เข้าสู่โดยปกติโลกที่ห่างจากท้องถื่นมาหรือแหล่งน้ำใต้โลกต่าง ๆ ที่ระยะประมาณ 30 เมตร เป็นระยะที่ปลอดภัย และบริเวณใกล้เคียงโครงการไม่มีแหล่งน้ำใต้ดิน ดังนั้นการบำบัดน้ำเสียจากท้องถื่นมาจะปลอดภัย โดยใช้บ่อกรอง-บ่อซึม จึงเพียงพอต่อการบำบัดคุณภาพน้ำในโครงการเชิงพาณิชย์ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำใต้ดินที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ - ช่วงดำเนินการ เมื่อเปิดดำเนินการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการประมาณ 110.6 ลบ.ม./วัน (คิดร้อยละ 80 ของเสียจากน้ำภายในโครงการ) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบส่วนกลางจะ ส่วนกรองและส่วนเติมอากาศ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 120 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 5 ชุดของโครงการประกอบด้วย บ่อ DFA 25K จำนวน 4 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ถึง 25 ลบ.ม. (รวมทั้ง 4 ชุดเท่ากับ 100 ลบ.ม.) และถังใบ DFA 12K จำนวน 1 ชุดสามารถรองรับน้ำเสียได้ 12 ลบ.ม. มีลำไยใต้ดินข้างทางเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 ดังนั้น	- ช่วงก่อสร้าง (1) ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย โดยให้ระบบบำบัดกรองบ่อซึม โดยบ่อกรองจะใช้เวลามากกว่า 1.4 วัน และบ่อซึมใช้เวลาที่มากกว่า 1.25 วัน และบ่อพักน้ำที่มีอัตราการตกตะกอนน้ำเสียตามระดับน้ำโครงการ - ช่วงดำเนินการ - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบส่วนกลาง ส่วนกรองและส่วนเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียในแต่ละส่วนของอาคารได้อย่างเพียงพอประมาณ 110.6 ลบ.ม./วัน และมีบ่อที่ประกอบครบถ้วนตามที่ออกแบบไว้ - ความคุ้มค่าทางสิ่งแวดล้อมจากการบำบัดน้ำเสียจากอาคารอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคาร พ.ศ. 2537 และ	- ช่วงก่อสร้าง (1) ถ้าหากไม่มีการควบคุมก่อนจากบ่อกรองน้ำทิ้งจากอาคารนี้เมื่อบ่อกรองเต็ม (2) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขาให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ - ช่วงดำเนินการ (1) ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งโดยวิธีที่ทำการตรวจสอบอย่างน้อย คือ pH, BOD, ทดสอบของแขวนลอย (Suspended Solids) TKN น้ำดื่มและไขมัน (Oil & Grease) และ Fecal Coliform จำนวน 10 ชุด ได้แก่ บริเวณจุดน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบและจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง ของระบบบำบัดน้ำเสีย

การประเมินผลโครงการ (๓๑)

[illegible]

สรุปการงานเกษตร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลักของชุมชนอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการประปาส่วนกลาง สาขานนทบุรี ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 94 ตร.กม. และพื้นที่ให้บริการ 77 ตร.กม. ผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 102,123 ราย มีปริมาณน้ำดิบที่จ่าย 72.73 ล้านลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำจำหน่าย 52.22 ล้านลบ.ม./ปี	เพียงพอ ประกอบกับการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างมีปริมาณน้อย และในช่วงระยะเวลาที่จำกัด ดังนั้น คาดว่าการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ชุมชนในระดับต่ำ - ช่วงดำเนินการ ความต้องการใช้น้ำของโครงการเท่ากับ 128.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะรับบริการน้ำจากการประปาส่วนกลางสาขานนทบุรี ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอและมีปริมาณสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ รวมทั้งสิ้น 220 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย ดังนี้ ความจุ 140 ลบ.ม. ตั้งแต่ต้นน้ำโสมหิน ความจุ 20 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำจั่นกลาง 60 ลบ.ม. ปริมาณน้ำสำรองที่เหลือของโครงการจำนวน 60 ลบ.ม.) ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ในหัตถ์กว่า 1 วัน และสามารถสำรองน้ำดื่มได้ถึง 1 วันตามการวัดรอบ นาฬิกา ในช่วงน้ำประปาผลิตจัดซื้อ คาดว่าผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ	- ช่วงดำเนินการ (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเก็บกักประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที (2) ประชาสัมพันธ์วิธีใช้ที่ถูกต้องตามโอกาส โครงการ ให้อ่านอย่างละเอียด (3) โครงการมีการสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งสิ้น 220 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้กรณีประปาผลิตขัดข้องไม่น้อยกว่า 1 วัน	
(2) การใช้ไฟฟ้า การแยกอาคารเสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (รวมพื้นที่โครงการ) อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนกลาง ซึ่งมีอยู่พื้นที่ทั้งหมดในเขตจังหวัดนนทบุรี 3,192 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนกลางสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ	- ช่วงก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการขอใช้บริการไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนกลางเขตนนทบุรี ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะมีปริมาณน้อย ช่วงเวลาจำกัด ผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ำ - ช่วงดำเนินการ พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนกลางเขตนนทบุรี จากข้อมูลการไฟฟ้าส่วนกลางสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่สำนักงานคณะกรรมการการโยธาพลีงานแห่งชาติกำหนด ซึ่งมีความเพียงพอปริมาณความต้องการของไฟฟ้าใช้ และได้มีการพัฒนาในด้านเทคนิคและมาตรฐานการให้บริการทั่วไปเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว รับผิดชอบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและเพียงพอ ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการติดตั้งไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและเพียงพอ นอกจากนี้โครงการได้สมัครยื่นไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้ใช้ตามอุปกรณ์ โดยการผลิตพลังงานสำรองฉุกเฉินขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด		หน้า 10 จาก 30 หน้า Don U... ผู้รับรอง

สรุปการประเมินผล (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การจัดการมูลฝอย พื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครน่านบุรี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการจัดสรร ให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถตามหน้าที่ ที่วางตำแหน่งและแรงงานกับขนมูลฝอย จากอาคารบ้านเรือน คลอด สถานที่พักคน การ ศาล โรงงานอุตสาหกรรม และมูลฝอย ที่ตกค้างตามสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่ของ เทศบาลทั้งหมด แล้วนำไปกำจัด โดยวิธี ฝังกลบที่จังหวัดอุดรธานี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดน่านบุรี ขนาดพื้นที่ 123 ไร่	ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าชุมชนอยู่ในระดับต่ำ - ช่วงก่อสร้าง ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็น 2 ประเภท (1) มูลฝอยจากการรวมการก่อสร้าง เช่น เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น โดยเมื่อก่อนมีรถบรรทุก มาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐจะนำไปหลอมใหม่ เศษปูน เศษไม้ นำไปปรับระดับพื้นที่ ไม่เคย สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ ประโยชน์อีกต่อไปก็จะนำรถบรรทุกไปกำจัด โดย จะติดต่อให้เทศบาลนครน่านบุรีรับขนไปกำจัดต่อไป (2) มูลฝอยจากการรวมของหน่วยงาน 60 คน เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ภาชนะมีปริมาณ 176 ลิตร/วัน ผู้รับเหมานำไปมี ถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ตามจุด ต่าง ๆ ในบริเวณก่อสร้างและในเคอร์เรนซ์มีการเก็บ รวบรวมไว้บริเวณก่อสร้างและรวบรวมไว้ในบริเวณที่พัก มูลฝอยเพื่อไม่ให้เทศบาลนครน่านบุรีมาทำการเก็บขนไป กำจัดต่อไปหาผู้รับเหมามีการควบคุมและการจัดการ มูลฝอยที่ดีพอ ค่าใช้จ่ายผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับต่ำ - ช่วงดำเนินการ (1) ความเสี่ยงของโครงการที่จะรับมูลฝอยของโครงการ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการแล้วจะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิด ขึ้นถึงวัน 2.3 ตัน/ม.วัน มูลฝอยจากอาคารจะถูกรวบรวม ลงไปห้องเก็บมูลฝอยของโครงการ ก่อนเทศบาลนครน่านบุรี จะมารับขนไปกำจัดต่อไป โดยที่ทุกมูลฝอยรวมของอาคาร มีความปลอดภัยที่จะรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ ได้มา เกินกว่า 3 วัน ค่าใช้จ่ายผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับต่ำ (2) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานราชการ มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการมีประมาณ 2.3 ตัน/ม.วัน โดย พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบในการเก็บขน	- ช่วงก่อสร้าง (1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (2) กำจัดไปหน่วยงานที่รับผิดชอบงานรวบรวมที่จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด (3) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ใหม่ โดยทำการแยกประเภทวัสดุเพื่อใช้จากการก่อสร้าง โดย พื้นที่ของประมาณ 800 ตารางเมตร บริเวณด้านข้างโครงการ ส่วน มูลฝอยที่ไม่ได้ใช้โครงการจะทำการติดต่อบริษัทที่รับซื้อวัสดุ ก่อสร้างต่อไป - ช่วงดำเนินการ - รวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นใช้ไว้ในจุดพลาสติกสีฟ้า (จุดสี) มัดปึกปากถุง ก่อนนำไปรวบรวมไว้ในห้องเก็บมูลฝอย บริเวณด้านข้างของโครงการด้านที่ติดกับถนนซอย ๖ ขนาดความ 24 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อรองรับมูลฝอยจากโครงการ ทั้งหมด ก่อนที่เทศบาลนครน่านบุรีจะมารับไปกำจัดต่อไป ภายใน ห้องเก็บมูลฝอยของโครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยจำนวน ๖ ขนาด 200 ลิตร โดยแบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ ถัง รองรับมูลฝอยอินทรีย์ ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป ถัง และถังรองรับ มูลฝอยเปลือก 1 ถัง - ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเทศบาลนครน่านบุรี ในเรื่องความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ	- ช่วงก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดบริเวณ ถังรองรับมูลฝอยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่กองเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้างและติดต่อให้ผู้รับซื้อมารับซื้อต่อไป - ช่วงดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าทำความสะอาดห้อง เก็บมูลฝอยของโครงการทุกครั้งหลังจาก รถเก็บขนของเทศบาลนครน่านบุรีเข้ามาเก็บ ขนขยะไปเรียบร้อยแล้ว หน้า 11 ทั้งหมด 30 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

สรุปการประเมินผล (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - ระบบระบายน้ำ การระบายน้ำภายในพื้นที่ที่กั้นส่วนใหญ่ เป็นระบบระบายน้ำแบบรวม โดยมีทั้งท่อลอดและ ท่อเปิดดิน โดยท่อจะผ่านพื้นที่ระบายน้ำและ ระบายน้ำเสียที่ส่งต่อไปยังระบบรวมน้ำเสีย และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย การวางท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครน่านบุรี ประกอบด้วย ท่อที่ บริเวณถนนสามัคคี ถนนวิเศษชัยชาญ ซอยบ่อปลา และถนนประจักษ์ ๒๓๒ - ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพดี เป็นระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกะดกแอโรบิก (Activated Sludge) สามารถรองรับน้ำเสียได้สูงสุด 38,500 ลบ.ม./วัน มีท่อเป็นรูปตัว Z ขนาด ๓๐ นิ้ว ๓๐๖ เมตร เปิดรับน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำดิบบริเวณ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียในรูป OOD, COD และ SS เท่ากับร้อยละ 68.44, 73.52 และ 80.86 ตามลำดับ และผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบ	ผลกระทบจากการระบายน้ำมีความสามารถในการให้บริการกับ มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงพื้นที่โครงการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (3) ความสามารถในการกำจัดมูลฝอยของหน่วยงานราชการ มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการเก็บขนโดยเทศบาลนครน่านบุรี จะนำไปกำจัด โดยวิธีฝังกลบที่จังหวัดอุดรธานี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดน่านบุรี โดยเทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด ๕๒ คัน ทำการเก็บขน 6 วัน/สัปดาห์ โดยจะเก็บ 2 เที่ยว/วัน คือ เวลา 15.00 และ 16.30 น. มีจำนวนพนักงานเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 21 คน โดยปริมาณมูลฝอย ภายในพื้นที่ให้บริการทั้งหมด ๖๖๐ ตัน/วัน แผนการขยายงานบริการ ปัจจุบันพื้นที่มีกลุ่มมูลฝอยของเทศบาลฯ ๕ ชิ้นที่มีผลกระทบคือ ไป บางส่วนจะมีระยะเวลาในการใช้ต่อไปอีกประมาณ ๒๐ ปี - ช่วงก่อสร้าง กรณีเกิดฝนตกในช่วงก่อสร้าง โครงการจะมีการควบคุมการระบายน้ำ โดยก่อสร้างร่องระบายน้ำที่รองรับน้ำฝน และระบายน้ำฝนลง ลงสู่ท่อที่ก่อให้เกิดการคุดคอง ก่อนระบายออกสู่ที่ระบายน้ำ สาธารณะที่ติดกับถนนกว่า 23 คอไป ดังนั้น ค่าใช้จ่ายผลกระทบ ระบบระบายน้ำชุมชนในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ - ช่วงดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครน่านบุรีมีดินชั้นตะกอนไหลเข้าสู่บ่อรับน้ำ ประมาณ 399 ลบ.ม. ขนาดของบ่อรับน้ำที่จัดเตรียม ขนาดปริมาตรในการรับน้ำได้ 240 ลบ.ม. ซึ่งทางโครงการ ได้จัดเตรียมบ่อรับน้ำไว้ 2 บ่อ ปริมาตรเก็บกักหรือปริมาตรที่ สามารถรองรับน้ำได้ 240 (บ่อละ 120 ลบ.ม.) (ที่ระดับ -5.0 ม.) ซึ่งขนาดของบ่อน้ำนี้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดได้ทั้งหมด ทำให้มีความสามารถรับน้ำฝนทั้งหมดนี้โดยไม่เกิดอันตราย ต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมระบบน้ำหลังการพัฒนานี้จะมีค่าไม่เกิน อัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.037 ลบ.ม./วินาที	- พิจารณาหาเตรียมมาตรการกักเก็บมูลฝอยอย่างจริงจัง - ช่วงดำเนินการ - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการระบายน้ำเข้าสู่ที่ระบายน้ำ และมีการออกตรวจและรายงาน - จัดให้มีบ่อน้ำรับน้ำจำนวน 2 บ่อ เพื่อรองรับน้ำฝนรวม 240 ลูกบาศก์เมตร (ที่ระดับ -5.0 ม.) เพื่อระบายน้ำฝนในทาง ที่ระบายน้ำนี้ เมื่อฝนตกจะทำการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ 0.012 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อให้อัตราการระบายน้ำสามารถ ระบายน้ำในครั้งต่อไปได้ - บำบัดน้ำจากบ่อน้ำรับน้ำไว้ประโยชน์น้ำที่สุก เช่น รดน้ำต้นไม้ข้างต้น เป็นต้น	- ช่วงดำเนินการ ทำการตรวจสอบการระบายน้ำก่อน ระบายน้ำสู่สาธารณะทุกจุด หน้า 12 ทั้งหมด 30 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

การปล่อยแบบหาคำตอบ (ข้อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข่ามีน้ำเสียในพื้นที่ประชาคมที่มีค่าBOD ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 8.05 มีกลิ่นเหม็นคั่งอยู่ในเขตตัวมาทรวงวน การควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ซึ่งถือว่ามีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมลิตร	เมื่อค้นพบผลกระทบจากการดำเนินการขุดนำท่อประปาออกทั้งหมด โดยให้เครื่องสูบน้ำขุดดินที่ใช้สูบน้ำออกจากท่อประปานั้นช่วงบนลง ซึ่งไม่มีการขุดการระบายน้ำก่อนการพัฒนา คือ 0.037 ลบ.ม.วินาที โครงการ ได้มีการการลดผลกระทบด้านการระบายน้ำอย่างเพียงพอ โดยสามารถควบคุมอัตรา การระบายน้ำของโครงการ ไม่ให้มีความสูงกว่า อัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนา ดังนั้น ค่าว่าการดำเนินการโครงการจะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบระบายน้ำ ของชุมชนแต่อย่างใด ทั้งนี้ควรเฝ้าระวังการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สำหรับผลกระทบ ระบายน้ำเสีย น้ำฝนและน้ำชีในโครงการดังกล่าวในรูปที่ 1		
3.3 การคมนาคมขนส่ง เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญของจังหวัด นครบุรี คือ ถนน ซึ่งถนนภายในจังหวัด มีทั้งหมด สายของ ขอด ตลอดจนทางส่วนพิเศษ และนี้แนวโครงการระบบขนส่งมวลชนส่วน ภายในจังหวัดคือ	- ช่วงก่อสร้าง (1) ผลกระทบด้านจราจรหรือการจราจรที่หนาแน่นกว่าความหนาแน่นจราจร ในช่วงก่อสร้าง (ปี 2550) มีรถบรรทุกเข้าออกโครงการประมาณ 2 เที่ยววัน หรือเท่ากับ 3 PCU/วัน หากคิดในกรณีที่มีรถบรรทุก เดินทางไปเข้าในเขตเมือง และเปรียบเทียบกับ V/C Ratio ในกรณี ที่ไม่มีโครงการปี 2550 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.19 และกรณีมี โครงการ ในช่วงปี 2550 มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.19 จะเห็นได้ว่า ในช่วงก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ V/C Ratio กับตรงกลางทาง การจราจรในช่วงก่อสร้างโครงการ บนถนนแนวเส้นทาง-แยกถนนวินัยหรืออยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดี ผลกระทบของจราจรที่หนาแน่นกว่าความหนาแน่นจราจร ในช่วง ก่อสร้างที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นผลกระทบของการจราจรจึงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ - ช่วงดำเนินการ (1) ความเพียงพอของที่จอดรถภายในโครงการ	- ช่วงก่อสร้าง (1) ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ให้บรรทุก น้ำหนักเกิน เพราะอาจทำให้ถนนชำรุด และทำให้เกิดการจราจร ไม่ไหลเวียน 30 ซม.ขี้นมา (2) ถ้าเลือกให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและทำให้ปฏิบัติตามระเบียบจราจรเป็นปกติขณะขับผ่านชุมชน (3) จัดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในคืนที่โครงการและเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้าออก พื้นที่โครงการ จัดให้มีป้ายชี้โครงการและแสดงอุปกรณ์ที่ทางเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน (4) รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีให้การได้ผลลดและหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการในช่วงก่อสร้างเพื่อป้องกันและช่วยลดผลกระทบด้านการเคลื่อนตัวของจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (6) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเก็บขนดินในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือช่วงเวลาการวิ่ง แต่ให้ขนส่งในช่วงเวลาว่างเว้น หรือในช่วงกลางคืนแทน - ช่วงดำเนินการ (1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ	- ช่วงก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพถนนภายในโครงการให้อยู่ในสภาพให้การ ได้ดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ช่วงดำเนินการ (1) ตรวจสอบสภาพถนนภายในโครงการให้มี

สรุปการงานเกษตรกรรม (ต่อ)

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ	ผลกระทบที่มีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการได้จัดเตรียมข้อควรระวัง 40 คัน ซึ่งมีเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2479 สำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเวียงจันทน์ขนาดใหญ่ไม่มีข้อควรระวังไม่น้อยกว่า 1 คันพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เกษของ 240 ตารางเมตรให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ดังนั้นทางโครงการต้องจัดเตรียมข้อควรระวัง 40 คัน ความเพียงพอที่จอดรถภายในโครงการจึงสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ที่จะเข้าจอดได้ทั้งหมด ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ แม้จะเปลี่ยนแปลงข้อควรระวังโครงการดังแสดงในรูปที่ 2 (2) ผลกระทบด้านการจราจรต่อถนนวงเวียนวงกลมนครพนมมิตรโครงการคาดว่าจะเกิดดำเนินการประมาณปี พ.ศ. 2551 โดยปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการ คิดในกรณีที่มีรถบรรทุกคันที่หนักเท่ากับ 40 คัน หรือ 40 PCU และกำหนดให้รถยนต์จากโครงการออกถึงจุดไปบนถนนวงเวียนวงกลม นครพนมมิตร ซึ่งสามารถคำนวณค่า VIC Ratio โดยเปรียบเทียบในกรณีที่มีโครงการในปี พ.ศ. 2551 มีค่า VIC Ratio เท่ากับ 0.20 และกรณีที่โครงการเปิดดำเนินการในปี 2551 พบว่ามีค่า VIC Ratio เท่ากับ 0.23 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า VIC Ratio กับทางสภาพจราจรการจราจรในช่วงเปิดดำเนินการโครงการบนถนนวงเวียนวงกลมนครพนมมิตรอยู่ในสภาพคล่อง แต่เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษาคำนวณค่า PCU ของปริมาณรถใน 1 วันจำนวน 500 PCU (คิดที่ 1 ชั่วโมง) สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานกิจที่จัดปับวิจัย แต่ในความเป็นจริงผู้ที่มาปฏิบัติงานกิจที่จัดของของมาไม่ได้มาพร้อมกัน และจะมาปฏิบัติงานกิจในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ สำหรับช่วงดำเนินการโครงการ การเข้าออก ช่วงเช้าเย็น หากทางโครงการมีการจัดการจราจรและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยทางเข้าออกโครงการ จะช่วยการจราจรคล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นผลกระทบจากโครงการต่อถนนดังกล่าวจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (3) ผลกระทบด้านการจราจรต่อถนนวงเวียนวงกลม 23โครงการคาดว่าจะเกิดดำเนินการประมาณปี พ.ศ. 2551 โดยปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการ คิดในกรณีที่มีรถบรรทุกคันที่หนักเท่ากับ 40 คัน หรือ 40 PCU และกำหนดให้รถยนต์จากโครงการ	1) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ขับรถทางแยกทางแยกและป้ายแสดงทางไปถนนจราจร 2) จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางจราจร 3) ใช้ Overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกถนนจราจร 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณถนนจราจรและบริเวณทางแยก (2) การควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าออกที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ 1) ทิศทางเข้าใช้รถควบคุมรถที่เชื่อมถนนวงเวียนวงกลม 2) จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้าออก 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าออกตลอดเวลา ทิศทางการเข้าออกโครงการและพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการดังรูปที่ 2	สภาพโครงการ ได้ติดผลกระทบดำเนินการ (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรภายในโครงการรวมทั้งสิ้นการเข้าออกตลอดการดำเนินการของโครงการ หน้า 14 ทั้งหมด 30 หน้า ลงชื่อ..... ฐานรอง

หน้า 15 ทั้งหมด 30 หน้า
ชื่อ อ. อิง อ. อิง

หน้า 16 ถึงหน้า 30
โดย อ. ชัย ชื่นชอบ

สรุปความเสี่ยงมาตรการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบอันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
15 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 76 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาล 3 แห่ง คลินิกแพทย์ 105 แห่ง คลินิกทันตกรรม 30 แห่ง จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 1,189 คน	- ช่วงดำเนินการ เมื่อเปิดดำเนินการ ทางโครงการได้จัดเตรียมระบบการดูแลสุขภาพและ สาธารณสุขการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ในเขตเทศบาลนครบางปะอิน และในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการยังมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หลายแห่ง ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้ารับบริการ ได้ อย่างสะดวกจึงคาดว่าผลกระทบด้านบริการของโครงการจะส่งผลกระทบต่อ ด้านสาธารณสุขในระดับต่ำ		
4.3 อากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ช่วงก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้างเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก การก่อสร้าง โครงการจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย สำหรับคนงาน หากผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ กำหนดแล้วผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ	- ช่วงก่อสร้าง - ในการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาโครงการควรพิจารณาการจัดการ ด้านความปลอดภัยประกอบในสัญญาว่าจ้างระหว่าง เจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุ รายละเอียดวิธีการในการระงับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ - กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลต่าง ๆ - การตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความ ปลอดภัยในการทำงาน - บริษัทรับเหมามีต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับสภาพการทำงานไว้เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่อาจเกิดได้แก่ หมวก รองเท้าบูต ถุงมือกันความร้อน (Safety Glasses with Side Shield) ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เช่น จักรวรรดิ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือที่อุ่นที่สูง หน้ากาก ข้างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์คัดกรอง ไม้กีดขวาง รั้วครอบบูต เป็นต้น - ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน - กำหนดขอบเขตและจัดพื้นที่แนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไว้ชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดจุดเข้าออก - ต้องทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ในบริเวณที่จำป็น เช่น "เขตก่อสร้างความปลอดภัย" หรือป้าย "เขตห้ามเข้าบริเวณ" เป็นต้น - ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องมือ	- ช่วงก่อสร้าง (1) การตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ทุก ชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงานตลอด ช่วงก่อสร้าง (1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน ตลอดช่วงก่อสร้าง (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของ ห้องนั่งเล่นและห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะตลอด ช่วงก่อสร้าง

หน้า 17 ทั้งหมด 30 หน้า
ลงชื่อ.....วันที่.....

เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

สรุปความเสี่ยงมาตรการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบอันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		อุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย - ต้องมีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล หอพยาบาลประจำ รวมทั้งเครื่องมือสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รุนแรงเพื่อส่งไปยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง - ต้องมีห้องส้วมไว้เพื่อรองรับจำนวนคนงานก่อสร้าง โดยคำนวณของห้องส้วมต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร	
	- ช่วงดำเนินการ (1) ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ โครงการเอกชนเอกชนได้มีแผน มีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัย ความสูงจากพื้นดินถึงชั้นหลังคา 22.90 เมตร จำนวน 189 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 9,506 ตร.ม. จัดอยู่ประเภทอาคารขนาดใหญ่ โครงการมีความสามารถเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในการ ป้องกัน และระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยโครงการ ได้กำหนดวิธี ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ โครงการตามกฎหมายกำหนด และเมื่อพิจารณาจากความสูงของอาคารโครงการ ได้แก่ สถานี ดับเพลิงรถดับเพลิงซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาทางประมาณ 5-10 นาที คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ	- ช่วงดำเนินการ (1) ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยความ ปลอดภัยตามที่เสนอไว้ในรายงานประกอบด้วย 1) นำสารเคมีดับเพลิงของอาคาร 60 ลูกบาศก์เมตร (ถังสารเคมีดับเพลิงแบบขึ้นสภาพ) 2) ระบบท่อฉีดน้ำดับเพลิง หรือมีตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) จำนวน 8 เครื่อง และถังดับเพลิงจำนวน 39 เครื่อง ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 3) หัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคารชนิดข้อต่อสามนิ้ว 4) หัวน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง ดังรูปที่ 5 5) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ชนิดไม่ดับ (Smoke Detector, Heat Detector) 6) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ชนิดไม่ดับ ที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุ ที่ไร้สาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงาน (Alarm Bell) ขึ้นล่าง 2 แห่ง ชั้น 2-8 จำนวน 2 แห่ง ชั้น 9-10 แห่ง ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 7) หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkle System) ชุดขึ้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 จำนวน 8 ชุด ชั้นที่ 2-8 จำนวน 28 ชุด รวมทั้งหมด 196 ชุด ดังนั้นภายในอาคารจะมีหัวกระจายน้ำดับเพลิงทั้งหมด 204 ชุด ดังรูปที่ 3 ดังรูปที่ 5 (2) ติดตั้งระบบความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถานีดับเพลิงที่รับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถ ระงับเหตุความเสียหายได้ หน่วยงานอื่น โดยชุดดับเพลิงซึ่งเคลื่อนย้ายจากสถานีดับเพลิง จุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง หมายถึงโครงการที่ไว้ในการติดตั้ง - กำหนดพื้นที่ดับเพลิง และติดตั้งอุปกรณ์	- ช่วงดำเนินการ (1) ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด (2) ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงของโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (3) ดำเนินการฝึกอบรมการอพยพหนีภัย เกิดเพลิงไหม้ในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน้า 18 ทั้งหมด 30 หน้า
ลงชื่อ.....วันที่.....

สรุปการประเมินผลการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง...	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ดำเนินการด้านเทคนิคของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 304.6 ตารางเมตร เมื่อคิดอัตราส่วนพื้นที่ที่ถูกรบกวนกับจำนวนผู้พักอาศัยเท่ากับ 0.45 ตารางเมตร/คน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ สผ ที่กำหนดไว้สัดส่วนพื้นที่ที่อยู่อาศัยต่อพื้นที่อาคาร 0.25 ตารางเมตร/คน สำหรับโครงการพัฒนาโครงการในรูปแบบที่ 6 (4) ความสามารถในการให้บริการด้านหลังของหน่วยงานราชการ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นจนรุนแรงถูกเผาไหม้โครงการ ทางโครงการได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้เคียงโครงการที่สุด คือ สถานีดับเพลิงพัฒนาวิทยุ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อเกิดเพลิงไหม้สามารถใช้เวลาดับเพลิงจากสถานีมาไม่ถึงโครงการประมาณ 5-10 นาที	(3) ต้องมีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการ หรือกรณีที่สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้อยู่อาศัยร่วมดับเพลิง บุคคลอาคารชุดเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (4) ต้องมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโครงการแจ้งวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในการแจ้งเตือนต่าง ๆ (5) ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกโครงการ	
4.4 คุณภาพ จังหวัดนนทบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ชนบทชาตินิเวศนาเกษตร ศูนย์วัฒนธรรมบ้านสวนอ้อย หมู่บ้านเกร็ดประเพณีดินเผา วัดชลประทานรังสรรค์ วัดอัมพวัน เป็นต้น ส่วนลักษณะชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ ไม่ปรากฏสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแต่อย่างใด	- ช่วงก่อสร้าง การดำเนินการช่วงก่อสร้างอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยที่รื้อฟื้นจุด 2 เมตร สิ้นรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่ไม่เหมาะสมจากการก่อสร้าง ซึ่งสามารถลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง - ช่วงดำเนินการ (1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ จากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(2531) และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพิธีราชการของโบราณคดี กรมศิลปากร(2523) ไม่พบว่ามีแหล่งสำคัญใดอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ การดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งสำคัญดังกล่าวแต่อย่างใด (2) ความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ ทัศนียภาพก่อนมีโครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ช่วงก่อสร้าง มีการวางแผนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่อาศัยของชุมชน และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ช่วงดำเนินการ (1) ต้องมีและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวขนาด 712 หรือร้อยละ 24.4 ของพื้นที่โครงการ โดยมีพันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก ได้แก่ - พันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ทองหลางแดง และอินทนิลชบา ขนาด 360 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - พันธุ์ไม้พุ่ม ได้แก่ อโศกอินเดีย ขนาด 190 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - พื้นที่สนามหญ้า ขนาด 162 ตารางเมตร คำนวณพื้นที่สีเขียวในโครงการคิดแล้วได้ 7 และรูปปิดอาคารแสดงระบบระบายน้ำภายในโครงการ	วันที่.....19.....ถึงวันที่.....30.....หน้า ผู้ชื่อ.....<i>Dr. Chai</i>.....ผู้รับรอง

สรุปการประเมินผลการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง...	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มีลักษณะเป็นย่านที่พักอาศัย และพาณิชย์กรรม เป็นส่วนใหญ่ และมีพื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณและแนวโค้ง กระทั่งอยู่ทั่วไปโดยลักษณะบริเวณโดยรอบแนวของถนนทางหลวง 22 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และอาคารพักอาศัย ศูนย์การค้า เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอาคารจะตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน ถือเป็นแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่นโดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม โครงการและสิ่งแวดล้อมข้างเคียง โครงการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคารบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบด้านพื้นที่สีเขียวในโครงการ มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 712 ตารางเมตร แบบแปลนพื้นที่สีเขียวในรูปที่ 7 ดังนั้นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในระดับต่ำ		
4.5 สวัสดิการและการบริการของชุมชน		- ช่วงก่อสร้าง (1) จัดให้มีระบบส่งพลังงานเป็นประจําทุกวันทำงานไปถาวรระหว่างที่พัฒนาก่อสร้าง (2) กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรับกิจกรรมจากชุมชนก่อสร้างอย่างเพียงพอตามกฎหมายกำหนด (3) จัดให้มีถังขยะรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอภายในพื้นที่ก่อสร้าง (4) จัดให้มีถังขยะรับขยะมูลฝอยประจำบริเวณที่ทำการชุมชน	
4.6 มาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน		(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคารโดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่ระบายนํ้าแสงอาทิตย์ (2) เครื่องปรับอากาศ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่จะเกิดเครื่องปรับอากาศที่ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด(Efficient Economic Efficiency Ratio (EER)) (3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดยเลือกใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน อาทิ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟที่ติดตั้งบนกระเบื้องแสง การใช้หลอดประหยัด Low Watt Loss หรือชนิด Electronics Ballast (4) บุคลากร - อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำสม่ำเสมอ	- ช่วงดำเนินการ (1) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อรักษาประสิทธิภาพให้ใช้ให้ต่ำ โดยขณะนำเข้าไปมีดังนี้ 1) ทดสอบและปรับตั้งระบบอย่างสม่ำเสมอ เป็นครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้โดยตรวจสอบการใช้งานของระบบโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์และระบบในครั้งแรกมักจะเป็นการปรับตั้งครั้งเดียวที่ได้มาจากระบบทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง 2) ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมและความสบายเท่านั้น ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ไว้ที่ต่ำเกินไป และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่

สรุปการเฝ้าระวัง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุกค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิดปิดไฟ ในจุดที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เป็นประจำทุกวัน จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	ดูแลหม้อที่หม้อเบอร์ 24-26 องค์ประกอบเชื้อเพลิง 3) เครื่องส่งลมเย็น ความถี่การทำงานจะลดลง เพราะอุณหภูมิอากาศ ถ้าอุณหภูมิสูงค่าต่างจากปกติ ที่ควรรับความร้อนจะต่ำลงความร้อนได้ ไม่ถี่ ทำให้น้ำเย็นที่กลับไปยังเครื่องทำความ เย็นยังมีอุณหภูมิสูงอยู่ ทำให้อุปกรณ์ที่ เครื่องทำงานขึ้นค่าสูงแล้ว 4) ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบาย ความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำและ ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมจากแผงที่ใช้น้ำ การระบายความร้อน 5) ทดสอบทุกตัวจะต้องทำการทดสอบโดย การอัดจารบีหรือหยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลา 6) ตรวจสอบการรั่วของท่อที่อาจเกิดขึ้น ได้รวมถึงการซ่อมแซมจนกว่าจะเรียบร้อย 7) ตรวจสอบหม้อน้ำและประตูดึงจากอาคาร ว่าปฏิกิริยาให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคาร หรือไม่
4.7 มาตรการในการลดปริมาณความร้อน		(1) มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่จอดรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อ นำรถยนต์เข้าจอดเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดปริมาณความร้อนที่จะเกิดขึ้น (2) ลดการใช้สภาวะปรับอากาศหรือเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนด ช่วงเวลาเปิดปิด ในบริเวณที่ไม่มีมีการใช้สภาวะปรับอากาศ ตลอดทั้งวัน เช่น บริเวณสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น (3) จัดพื้นที่ให้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ประดับในสวนบริเวณ ของห้องพักแต่ละห้อง (4) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งแสดงอาทิตย์สามารถ ส่งถึงได้หรือคิดสิ่งจรรยาบรรณกับความร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้ อากาศภายในอาคารสูงจนเกินไป ซึ่งเป็นภาระของอาคาร การใช้เครื่องปรับอากาศ (5) ออกแบบและติดตั้งตัวรับเปิดปิดเครื่องปรับอากาศแบบออก	หน้า 21 ทั้งหมด 30 หน้า ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

สรุปการเฝ้าระวัง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและทุกค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		จากกันในแต่ละพื้นที่ของอาคาร เพื่อความสะดวกในการเปิดปิด ทำให้อากาศถ่ายเทได้ง่ายขึ้นและลดปริมาณความร้อนที่จะ ระบายออกสู่บรรยากาศ (6) กำหนดการใช้วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างโดยคำนึงถึง การระบายความร้อนจากอาคารออกสู่ภายนอก และไม่ส่งผล ต่ออุณหภูมิภายในอาคารเพื่อลดปัญหาการใช้เครื่องปรับอากาศ (7) การติดตั้งหน้าต่าง ช่องระบายอากาศในทิศทางที่เหมาะสมกับทิศ ทางลมในบริเวณพื้นที่โครงการ (8) กำหนดให้วัสดุบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของอาคารส่วนที่ ที่สามารถเพิ่มการดูดซับและปล่อยอุณหภูมิของอาคาร โครงการออกสู่ภายนอก (9) โครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ภายในพื้นที่โครงการแล้ว นั้น สามารถลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่โครงการได้ (10) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะตรวจสอบและรายงาน	

หน้า 1: บริษัท คอนสตรัคชั่น ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด 2550

หน้า 23 ทั้งหมด 30 หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง
