

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

#### 2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลโครงการ
  - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
  - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

## 2.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรการทั่วไป
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต

**ตารางที่ 2.2-1** การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง)  
บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>- มาตรการทั่วไป</b></p> <p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ตั้งอยู่ที่ห้วยมถนชอยสุขุมวิท 59 และถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ โดยบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด โดยโครงการประกอบด้วย อาคาร โรงแรม ขนาดความสูง 32 ชั้น ความสูง 126.2 เมตร (ความสูงวัดถึง ระดับพื้นหลังคา) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 241 ห้อง ทั้งนี้โครงการจะก่อสร้างบนโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง ได้แก่ โฉนด ที่ดินเลขที่ 8554 เลขที่ดิน 1187 ขนาดพื้นที่ 1-1-82 ไร่ หรือ 2,328 ตารางเมตร โดยที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท วรรณวรินทร์ แอนด์ แอช โซซิเอท จำกัด ซึ่งบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ได้ทำหนังสือ สัญญาเช่ากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามสัญญาที่ดิน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2594 จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p>	<p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ดำเนินการ เข้าที่ดิน จำนวน 1 แปลง จากบริษัท วรรณวรินทร์ แอนด์ แอช โซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยทำหนังสือเช่า 30 ปี</p>	-	<p>- ภาคผนวก 1ก</p> <p>- ภาคผนวก 2ก</p> <p>- ภาคผนวก 1ข</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> 1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 1ก - ภาคผนวก 2ก

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามฯ โดยรายงานฉบับนี้ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) เป็นรายงานฉบับที่ 2 ปี 2565	-	<p>- ภาคผนวก 1ก</p> <p>- ภาคผนวก 2ก</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p>	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการตามที่เสนอไว้แต่อย่างใด	-	<p>- ภาคผนวก 1ก</p> <p>- ภาคผนวก 2ก</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b></p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจกให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>				

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>				



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับทีมบริหาร (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการอยู่ในระยะการก่อสร้าง ทั้งนี้เมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น และมีการโอนสิทธิ์ให้กับทีมบริหารโครงการจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ให้ทีมบริหารทราบและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p>- มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย แก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา ต่อไป</p>	- พื้นที่โครงการ	- หากประชาชนโดยรอบโครงการได้รับ ผลกระทบและเดือดร้อนรำคาญจาก การดำเนินการก่อสร้างสามารถแจ้ง ร้องเรียนมายังโครงการซึ่งโครงการ จะรับและดำเนินการตามขั้นตอนการ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดยทันที และ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งในปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2565 หากพบข้อร้องเรียน จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	<p>- ภาคผนวก 2ข</p> <p>- ภาคผนวก 3ข</p> <p>- รูปที่ 2 กล้องรับ ร้องร้องเรียน</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b> 1) จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร กัน ขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และจัดทำกำแพงกันดิน โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  2) จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในโครงการช่วงก่อสร้างโดยจัดให้มีราง ระบายน้ำชั่วคราว ขนาด 0.4 x 0.2 เมตร และความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีบ่อดักขยะเพื่อให้ เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป โดยไม่ให้น้ำ หลากไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-  -	- โครงการแบ่งขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่าง ชัดเจน โดยจัดทำรั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการสูง 6 เมตร พร้อมทั้ง จัดทำกำแพงกันดินเพื่อป้องกันการ พังทลายของดินที่อาจเกิดขึ้น โดยปัจจุบันโครงการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออก และก่อสร้างรั้วคอนกรีต เรียบร้อยแล้ว  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงตกแต่งภายใน ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งมีบ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อ เข้าบำบัดก่อนระบายออกสู่แหล่ง น้ำสาธารณะ	-  -	- รูปที่ 3 รั้วคอนกรีต รอบพื้นที่โครงการ  - รูปที่ 4 บ่อรวบรวม น้ำเสีย - รูปที่ 5 ท่อระบายน้ำ ของโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</b> 3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงาน เขตวัฒนา และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- ในปัจจุบันโครงการรื้อถอนรั้วรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งมีป้ายแจ้งรายละเอียดการก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการออก เนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บงานบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</b> 4) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- -	- โครงการได้ปรับสภาพพื้นที่โครงการและก่อสร้างภายในแนวขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพรั้วของโครงการเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงความถี่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งในปัจจุบันโครงการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออกและก่อสร้างรั้วคอนกรีตเรียบร้อย	- -	- รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> 1) มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1. ฉีดน้ำลดฝุ่นละอองตลอดเวลาการเจาะ ทับ การขนถ่าย เศษวัสดุ และบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุก่อนขนส่งออกนอกพื้นที่ โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย  2. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้น ล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจาก อาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	-  -	- โครงการได้ฉีดพรมน้ำบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อลด ปริมาณฝุ่นที่เกิดการฟุ้งกระจาย ขณะเจาะหรือระหว่างการขนส่งดินและ วัสดุก่อสร้าง  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet ตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-  -	- รูปที่ 6 การฉีดพรมน้ำ เพื่อลดฝุ่น  - รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้าง โครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 1) มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 3. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ Mesh Sheet ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่าการชำรุด เสียหายต้องซ่อมแซมโดยทันที  4. ติดหัวฉีดน้ำแบบสเปรย์ Spinkle รอบโครงการ	-          -	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet ตามมาตรการกำหนด หาก พบว่าการชำรุดเสียหายจะ ซ่อมแซมทันที  - โครงการได้ดำเนินการติดตั้งหัวฉีด น้ำแบบสเปรย์ (Spinkle) เพื่อฉีดพ่น น้ำลดปริมาณฝุ่นโดยรอบพื้นที่ โครงการ	-          -	- รูปที่ 1 พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ          - ภาคผนวก 4ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 2) มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด 2. ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 3. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด		- โครงการได้จัดวางตำแหน่งของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายห่างจากแนวอาคารบ้านเรือน รวมทั้งลดการใช้น้ำโดยใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อลดปริมาณน้ำโคลนที่เกิดขึ้นอีกทั้งไม่กองเก็บวัสดุเหลือใช้ไว้ในโครงการ ซึ่งจะเก็บขนออกไปกำจัดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์	-	- รูปที่ 7 ตำแหน่งการวางเครื่องจักร - รูปที่ 8 ป้ายรณรงค์ - รูปที่ 9 พื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 3) มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร <ol style="list-style-type: none"> <li>ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการรบกวนลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</li> <li>อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก</li> <li>ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> </ol>	-	- โครงการได้กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและขนส่งดิน มีการปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการรบกวนบนถนน - เครื่องจักรที่ไม่มีการใช้งาน จะดับเครื่องไม่ติดเครื่องไว้ - กำหนดให้พื้นที่ก่อสร้างรถวิ่งได้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 7 ตำแหน่งการวางเครื่องจักร - รูปที่ 10 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 4) มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และ ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง  2. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ บริเวณปากทาง เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ  5) มาตรการด้านการจัดการของเสีย - กำชับผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	-  -  -	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรก่อนใช้งาน อยู่เสมอหากชำรุดจะดำเนินการ ซ่อมแซมทันที  - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการ โดยทำความสะอาด สะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การทำงาน  - โครงการได้กำหนดไม่ให้มีการเผาขยะ มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโดยให้รวบรวม ทิ้งในถังรองรับขยะมูลฝอยเท่านั้น	-  -  -	- ภาคผนวก 5ข  - รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด  - รูปที่ 12 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 6) มาตรการด้านการก่อสร้าง 1. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 2. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน Bund และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 3. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด 4. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	-	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) เป็นช่วงตกแต่งภายใน โดยกิจกรรมที่จะใช้ทรายและปูนซีเมนต์ผงโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ที่มิดชิด	-	- รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 7) มาตรการด้านการขนส่งดิน 1. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา เร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุก สามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืน กำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขน ย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่ง เฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถให้ รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้ โดยรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00- 15.00 น. หากมีรถบรรทุกเข้ามาใน ช่วงเวลากลางคืนจะมีเพียงนำรถมา จอดไว้ไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์ลง จากรถ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 7) มาตรการด้านการขนส่งดิน (ต่อ) 2. จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่ง โดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก  3. บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสุขุมวิท ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และ ต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือ ฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ		- โครงการได้กำหนดให้รถทุกคันที่ออกจากโครงการ ต้องฉีดล้างทำความสะอาดล้อทุกครั้ง เพื่อป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและปนเปื้อนบนทาง สาธารณะ  - บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับ ถนนสุขุมวิท มีการปิดทึบตลอดเวลาและจะเปิด เฉพาะช่วงเวลาที่มียรถเข้า-ออกเท่านั้น พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นผิวถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ การปนเปื้อนของเศษดินลงบนทางสาธารณะ	-      -	- รูปที่ 13 การล้าง ทำความสะอาดล้อ รถบรรทุก  - รูปที่ 14 ทางเข้า- ออกโครงการ  - รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด  - รูปที่ 14 ทางเข้า- ออกโครงการ  - ภาพผนวก 30ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากใน แต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตาม สภาพหน้างานต่อไป  5. ห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดินบนถนนสุขุมวิท และถนนซอย สุขุมวิท 59 และถนนโดยรอบพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด		- โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ และ หากพบการฟุ้งกระจายของฝุ่น ในปริมาณที่มากขึ้นก็จะดำเนินการ เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำเพื่อลด ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น  - โครงการจอดรถขนส่งบนถนน สุขุมวิทเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะ จอดรถในเวลาสั้นๆ เพื่อรอเข้า พื้นที่ก่อสร้างโดยได้คำนึงถึง ความปลอดภัยของผู้สัญจรบนทาง สาธารณะ	-          -	- รูปที่ 6 การฉีดพรม น้ำเพื่อลดฝุ่น          - รูปที่ 15 ถนน ด้านหน้าโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 8) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างโครงการชั่วคราว โครงการต้องให้ความร่วมมืองดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละออง อาทิเช่น การตัดคอนกรีต และการขัดแต่ง ผิวคอนกรีต เป็นต้น โดยให้ดำเนินกิจกรรมอื่นที่ไม่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองเท่านั้น	-	- โครงการได้ติดตามสถานการณ์ด้านคุณภาพอากาศอยู่เสมอหากหน่วยงานภาครัฐประกาศให้หยุดการก่อสร้างหรือขอความร่วมมืองดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง โครงการพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม	-	- ภาคผนวก 6ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง</b> 1) กำหนดช่วงเวลาในการทำงานก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทำงานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราวต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน (เช่น การเก็บกวาด การเก็บเครื่องมือ) ยกเว้นการเทปูนให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์) และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญและมีวันหยุดติดต่อกัน เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ และวันแรงงาน เป็นต้น จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	-	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลาการทำงาน 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา โครงการจะทำในส่วนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ทราบโดยไม่ทำงานในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน	-	- ภาคผนวก 7ข



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 2) ช่วงงานทำฐานราก และงานปรับสภาพพื้นที่ จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A)  3) ช่วงงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม และงานระบบ สาธารณูปโภค รวมงานตกแต่งภายในและภายนอก ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยเลือกใช้ Metal Sheet รายละเอียด ดังนี้	-  -	- ช่วงทำฐานรากโครงการได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความหนา 0.30 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการเพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันโครงการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออก และมีการสร้างรั้วด้วยคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ  - ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการอยู่ในระยะการขึ้นโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรม และงานระบบ สาธารณูปโภคโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-  -	- รูปที่ 3 รั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ  - รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชั้นที่ 1 ของอาคาร จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A)</li> <li>2. ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป ของอาคาร จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียง ความสูง 2.4 เมตร ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทิศเหนือ ติดตั้งแผ่นกันเสียงในการก่อสร้างอาคาร ชั้นที่ 2-4</li> <li>- ทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียงในการก่อสร้างอาคาร ชั้นที่ 2-32</li> </ul> </li> </ol>				

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 4) ช่วงงานตกแต่งภายในและภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และ ทิศตะวันตก ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A) และจะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้น ของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกัน เสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง (ประเมินกรณีมีกิจกรรม ก่อสร้าง งานตกแต่ง และงานเก็บทำความสะอาดพร้อมกัน) 5) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่อง หรือเบาคีรื่องลงระหว่างการพัก 6) ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม ใช้งานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง	-          -          -	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการอยู่ในระยะเวลาก่อสร้างตกแต่ง ภายในและภายนอกโครงการปฏิบัติ ตามที่มาตรการกำหนด   - เครื่องจักรที่ไม่มีการใช้งานโครงการ จะดับเครื่องและไม่ติดเครื่องทิ้งไว้  - โครงการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร ก่อนใช้งานเสมอหากชำรุดขัดข้อง จะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-          -          -	- รูปที่ 1 พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ          -          - ภาคผนวก 5ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 7) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 8) โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 9) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้ายและควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดังการขนวัสดุก่อสร้างเข้ามาในเวลากลางคืน ให้จอดรอไว้ภายในพื้นที่โครงการและยกลงในตอนเช้า	- - -	- โครงการได้ใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีของเครื่องจักร - โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังที่จะทำให้รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง - โครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการขนย้าย โดยควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและหากมีการขนเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนจะมีเพียงขั้รถเข้ามาจอดและจะขนถ่ายในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น	- - -	- - ภาคผนวก 8ข -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 10) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด  11) จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการทุกด้าน	-  -	- โครงการได้จัดให้มีบริษัทควบคุม งานก่อสร้างชื่อบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อควบคุมงานผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ ตามมาตรการที่ระบุในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด  - โครงการได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการสูง 6 เมตร ซึ่งในปัจจุบันโครงการรื้อ ถอนรั้ว Metal Sheet และ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง 2.5 เมตร รอบพื้นที่โครงการ	-  -	- ภาคผนวก 9ข  - รูปที่ 3 รั้วคอนกรีต รอบพื้นที่โครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 12) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องถิ่นที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถให้รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้ โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยหากมีรถบรรทุกเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนจะมีเพียงนำรถมาจอดไว้ ไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b> 13) กำหนดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก เป็นต้น อยู่บริเวณด้านถนนสุขุมวิท เพื่อลดผลกระทบกับผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- โครงการได้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยจะมีกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การตัดเหล็กจะดำเนินการทางด้านถนนสุขุมวิทเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- รูปที่ 16 กิจกรรมก่อสร้างทางด้านถนนสุขุมวิท
14) จัดเตรียมเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้น ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยไม่ต้องรอเงินประกัน	-	- โครงการเตรียมแผนชดเชยเบื้องต้นกรณีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการได้จัดทำรูปแบบค่าธรรมเนียมประกันภัยคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	- ภาคผนวก 10ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน</b> 1) เลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน  2) กำหนดช่วงเวลาในการทำงานก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทำงาน ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้าง เกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ต้องเป็นกิจกรรมที่ ไม่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน (เช่น การเก็บกวาด การเก็บ เครื่องมือ) ยกเว้นการเทปูน ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 ครั้ง/ สัปดาห์) และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ที่สำคัญและมีวันหยุดติดต่อกัน เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ และ วันแรงงาน เป็นต้น จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะกำชับให้ผู้รับเหมาและ คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	-  -	- โครงการเลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน ตามมาตรการกำหนด  - โครงการได้กำหนดช่วงเวลา การก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ช่วงเวลาการทำงาน 08.00-18.00 น. ทั้งนี้หากมี ความจำเป็นต้องทำงาน ล่วงเวลา โครงการจะทำใน ส่วนกิจกรรมที่ไม่ให้เกิด เสียงดัง และจะแจ้งให้ผู้พัก อาศัยข้างเคียงได้ทราบและ ไม่ทำงานในช่วงที่มีวันหยุด ติดต่อกัน	-  -	- ภาคผนวก 7ข



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 3) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และ ตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและ รับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 เดือน  4) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดส่งสำเนาให้กับผู้พัก อาศัยที่อยู่ประชิดโครงการและบ้านเลขที่ 24/2 และ 24/3 อย่างไร ก็ตามในระหว่างประสานบริษัทประกัน โครงการจะดำเนินการ แก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายโดยกำหนด วงเงินชดเชยเบื้องต้นให้ชัดเจน	-  -	- โครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจสภาพที่ พักอาศัยข้างเคียงก่อนดำเนินการ ก่อสร้างเพื่อเก็บเป็นข้อมูล และ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับผิดชอบ กรณีบ้านพักอาศัยข้างเคียงได้รับความ เสียหาย  - โครงการได้จัดให้มีประกันภัยเพื่อ รับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ได้แสดงสำเนา ประกันภัยไว้บริเวณพื้นที่โครงการและ ได้จัดส่งสำเนาประกันภัยไปยังบ้านพัก อาศัยข้างเคียงเลขที่ 24/2 และ 24/3 เพื่อให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อที่ โครงการมีต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	-  -	- ภาคผนวก 11ข  - ภาคผนวก 10ข - ภาคผนวก 12ข - รูปที่ 17 สำเนา กรมธรรม์ประกันภัย ติดไว้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 5) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด  6) โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	-  -	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม  - โครงการได้นำรายละเอียดมาตรการฯ มาติดไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรการกำหนด	-  -	- ภาคผนวก 13ข  - รูปที่ 18 รายละเอียดมาตรการฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 7) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- โครงการได้จัดให้มีบริษัทควบคุมงาน ก่อสร้างชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อควบคุมงาน ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 9ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> 8) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืน กำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถให้รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยหากรถบรรทุกเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนจะมีเพียงนำรถมาจอดไว้ไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.5 การพังทลายของดิน</b> 1) โครงการจะก่อสร้างแนว Sheet Pile ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณแนวอาคารโครงการ ส่วนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อน้ำ โครงการจะสร้างโดยใช้วิธีจนถึงในชั้นดินเหนียวอ่อน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินข้างเคียง และในช่วงการถอน Sheet Pile ต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินกลับให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	- ในช่วงที่มีการก่อสร้าง (ฐานราก) โครงการได้วางแนว Sheet Pile เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงตกแต่งภายในและภายนอกของโครงการ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)</b> 2) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด  3) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และ ตัวอาคาร เพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน	-  -	- โครงการได้จัดให้มีบริษัทควบคุมงาน ก่อสร้างชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อควบคุมงาน ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม  - โครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจสภาพ ที่พังก่อสร้างข้างเคียงก่อนดำเนินการ ก่อสร้างเพื่อเก็บเป็นข้อมูลและ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับผิดชอบ กรณีบ้านพังก่อสร้างข้างเคียงได้รับความ เสียหาย	-  -	- ภาคผนวก 9ข  - ภาคผนวก 11ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.6 คุณภาพน้ำ</b> 1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 20 ห้อง อยู่ทางด้านทิศใต้ ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ไม่น้อย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบ บำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป	-  -	- โครงการได้จัดให้มีห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างจำนวน 5 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีการติดตั้งไม่ให้ติดกับ บ้านพักอาศัยข้างเคียง  - โครงการได้จัดให้มีถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับ น้ำเสียได้ปริมาณ 20 ลูกบาศก์ เมตร/วัน	-  -	- รูปที่ 19 ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้าง  - รูปที่ 20 ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> 3) จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวัน  4) โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชีย เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำ  5) จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน	-  -  -	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมทุกวัน  - กรณีมีกากตะกอนในปริมาณที่มาก โครงการจะประสานไปยังสำนักงานเขตวัฒนา เพื่อมาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัด  - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมทุกวัน	-  -  -	- รูปที่ 11 พนักงานทำความสะอาด  - ภาพผนวก 14ข  - รูปที่ 11 พนักงานทำความสะอาด



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b> <b>1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> 6) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัด แมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัด ลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 7) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาด และไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-          -	- โครงการได้จัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดประจำโครงการ โดยหากพบสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค จะดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ โดยทันที - โครงการกำหนดให้พนักงาน ทำความสะอาดคอยตรวจสอบการ รั่วซึมของห้องน้ำและทำความ สะอาดเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนพื้นที่ข้างเคียง	-          -	- รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด          - รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	-	- โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด	-	- ภาคผนวก 1ก - ภาคผนวก 2ก

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.1 น้ำใช้</b> 1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้ อย่างน้อย 1 วัน)  2) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	-  -	- โครงการได้จัดให้มีถังน้ำสำรองโดย มาจากแหล่งน้ำประปาขนาด 2,000 ลบ.ม.จำนวน 3 ถัง ซึ่งปริมาณ มีความเพียงพอต่อการใช้ 1 วัน  - โครงการได้รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำ อย่างประหยัด โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านป้ายและการอบรมให้ความรู้ ก่อนเริ่มงาน	-  -	- รูปที่ 21 ถังสำรอง น้ำใช้  - รูปที่ 8 ป้ายรณรงค์ - รูปที่ 22 Safety Talk

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.2 น้ำเสีย</b> 1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 20 ห้อง ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีลักษณะมิดชิด ไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป	-  -	- โครงการได้จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 5 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานและติดตั้งไม่ให้ติดกับบ้านพักอาศัยข้างเคียง  - โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน	-  -	- รูปที่ 19 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง  - รูปที่ 20 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.2 น้ำเสีย (ต่อ)</b> 3) จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน  4) โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำ  5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถึงบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-  -  -	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการตามมาตรการกำหนด  - กรณีมีกากตะกอนในปริมาณที่มาก โครงการจะประสานงานไปยังสำนักงานเขตวัฒนาเพื่อมาสูกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัด  - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลถึงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	-  -  -	- รูปที่ 11 พนักงานทำความสะอาด  - ภาพผนวก 14ข  -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.2 น้ำเสีย (ต่อ)</b> 6) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัด แมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อ กำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 7) ควรตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาด และไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-       -	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการ โดยหากพบสัตว์ ที่เป็นพาหะนำโรคจะดำเนินการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์โดยทันที - โครงการกำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยตรวจสอบการรั่วซึมของ ห้องน้ำและทำความสะอาดเพื่อไม่ให้ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่พักอาศัย ข้างเคียง	-       -	- รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด       - รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม</b> - จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว ขนาด 0.4 x 0.2 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีบ่อดักขยะเพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราบ ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบาย น้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป	-	- โครงการอยู่ในช่วงตกแต่งภายใน และภายนอกพื้นที่โครงการ ปัจจุบัน มีรางระบายน้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งให้มี บ่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อดักเศษ ก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	-	- รูปที่ 4 บ่อรวบรวม น้ำเสีย - รูปที่ 5 ท่อระบาย น้ำของโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย</b> 1) มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง - ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน  - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด กำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	-  -	- โครงการได้กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถขนส่งดิน ของโครงการในส่วนสำหรับบรรทุกต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ  - โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือขนส่งดินให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	-  -	- รูปที่ 10 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ  -



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> - ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ โดยจะกำหนดมาตรการให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐโมย และผนังปู เทานั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์	-	- โครงการอยู่ในช่วงตกแต่งภายใน และภายนอกซึ่งวัสดุก่อสร้างยังมีปริมาณน้อย โดยโครงการไม่ได้ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลา กลางคืนกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถให้รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้ โดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 และรถบรรทุก 10 ล้อขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. หากมีรถบรรทุกเข้ามาในช่วงเวลา กลางคืนจะมีเพียงนำรถมาจอดไว้ไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ</li> </ul>	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนักของเศษวัสดุก่อสร้างที่นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชทุกครั้ง ที่มีการนำเศษวัสดุออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงตกแต่งภายในและภายนอกของโครงการ ซึ่งเศษวัสดุก่อสร้างยังมีปริมาณน้อย โครงการไม่ได้ทิ้งในพื้นที่สาธารณะ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> 2) มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 9 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยแห้ง 2 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 3 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 3 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตพัฒนามาเก็บขนไปกำจัดเป็นประจำทุกวันต่อไป</li> <li>- กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	-	- โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยไว้อย่างเพียงพอ จำนวน 8 ถัง และมีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมเพื่อให้หน่วยงานรับนำไปกำจัด  - โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงถังที่จัดเตรียมไว้ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 12 ถังรองรับขยะมูลฝอย - ภาคนวก 14ข  - รูปที่ 12 ถังรองรับขยะมูลฝอย - รูปที่ 8 ป้ายรณรงค์

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ติดตั้งมูลฝอย พื้นที่พักขยะและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง</li> <li>- หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่น รบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วย กำจัดกลิ่น</li> <li>- ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหนะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้อง กำจัดทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำ ความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ตั้ง ถังขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดความสกปรก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำ ความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ตั้งถัง ขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำโครงการหากพบสัตว์ พาหนะนำโรค โครงการจะกำจัดโดยทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด</li> <li>- รูปที่ 12 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย</li> <li>- รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด</li> <li>- รูปที่ 12 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย</li> <li>- รูปที่ 11 พนักงาน ทำความสะอาด</li> <li>- รูปที่ 12 ถังรองรับ ขยะมูลฝอย</li> </ul>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.5 ระบบไฟฟ้า</b> - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดเป็นป้ายณรงค์ติดไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 8 ป้ายณรงค์

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย</b> 1) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นแต่ละ ช่วงกิจกรรม 1.1) ในช่วงทำฐานราก ต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 3 ถัง 1.2) ในช่วงที่ขึ้นโครงการและตกแต่ง จะต้องติดตั้งถังดับเพลิง ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง/ชั้น		- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะ ก่อสร้าง ช่วงการทำฐานราก ซึ่งมีการติดตั้งถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ถัง		- รูปที่ 23 ถังเคมี ดับเพลิง





**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b> 5) ในระหว่างก่อสร้างต้องจัดให้มีจุดรวมพล โดยจะใช้พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ว่าง ขนาดพื้นที่ประมาณ 75 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 300 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 300 คน 6) โครงการจะต้องประสานสถานดับเพลิงคลองเตย มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-     -	- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในปัจจุบันได้   - โครงการอยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อประสานงานสถานดับเพลิงเพื่อฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟให้กับคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการมีการให้ความรู้ผ่านการสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) ในช่วงเช้าก่อนเริ่มงาน	-   -	- รูปที่ 26 จุดรวมพล   - รูปที่ 22 Safety Talk

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b> 7) โครงการต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง  8) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม การชักซ้อม การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ คอยดูแลควบคุม งานก่อสร้าง  9) โครงการจะต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ในช่วงที่ ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ บริเวณบันไดของอาคารให้ชัดเจน	-  -  -	- โครงการมีแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในพื้นที่ก่อสร้างตาม มาตรการกำหนด  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานคอยอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ ผ่านการสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) ในช่วงเข้าก่อนเริ่ม งาน  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะ ก่อสร้าง ซึ่งจะดำเนินการจัดทำ แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ตามมาตรการกำหนด	-  -  -	- ภาคผนวก 15ข  - รูปที่ 22 Safety Talk  - รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้าง โครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร</b> 1) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจ ท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วน ในช่วงเวลากลางคืนกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้ โดยไม่ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการ ขนส่งเฉพาะนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถ ให้รถบรรทุกวิ่งสัญจรได้ โดย รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 และ รถบรรทุก 10 ล้อขนส่ง ในช่วง เวลา 10.00-15.00 น. หากมี รถบรรทุกเข้ามาในช่วงเวลา กลางคืนจะมีเพียงนำรถมาจอดไว้ ไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ลงจากรถ	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 2) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม  3) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถจนต้องออกไปวิ่งหล่นบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ	-  -	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกทุกคันปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อให้เศษดินปนเปื้อนลงทางสาธารณะ	-  -	-  - รูปที่ 13 การล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 4) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับ จอดรถบรรทุก และรถปูนซีเมนต์ภายในโครงการโดยไม่ให้จอด ในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ  5) จัดให้มีแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้ อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน  6) จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการ ตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง	-          -	- โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่จอด รถตามมาตรการกำหนด โดย ลดการจอดรถบริเวณพื้นที่ทาง สาธารณะ  - โครงการได้กำหนดให้รถขนส่ง วัสดุก่อสร้างของโครงการติด แผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสี บริเวณ ท้าย รถ เพื่อให้ ยานพาหนะคันอื่นสามารถ สังเกตได้เพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุ  - โครงการได้กำหนดให้ รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและ ขนส่งดินมีการปิดคลุม รถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วง หล่นของวัสดุก่อสร้างลงบน ทางสาธารณะ	-          -	- รูปที่ 27 พื้นที่จอดรถ          - รูปที่ 28 ธงสีท้าย รถบรรทุก          - รูปที่ 10 รถบรรทุก ปิดคลุมด้วยผ้าใบ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก รวมทั้งจำกัดความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่ก่อสร้างและได้จำกัดความเร็วของรถบรรทุกทุกภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 8) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ หากความเสียหายเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 9) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนสุขุมวิท หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการ และจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ โครงการจะรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ตั้งของโครงการ ให้เข้ามาดูแลกดดันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ 10) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัทและเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก	-  -  -	- ปัจจุบันถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการยังอยู่ในสภาพปกติและไม่ชำรุดเสียหาย - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการคอยอำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการโดยไม่ให้มีการจอดรถนานหรือกีดขวางการจราจรบนทางสาธารณะ - โครงการได้กำหนดให้รถผู้รับเหมาดำเนินการติดชื่อบริษัท และเบอร์โทรบริเวณด้านข้างรถตามมาตรการกำหนด	-  -  -	- รูปที่ 15 ถนนด้านหน้าโครงการ - รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ - รูปที่ 30 ชื่อและเบอร์โทรติดข้างรถ

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b> <b>3.7 การจราจร (ต่อ)</b> 11) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุด เข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องกำชับไม่ให้อำนวยความสะดวก ให้รถที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิด ผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนนแต่จะต้องอำนวยความสะดวก สะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 12) การจอดรถปูนเพื่อรอคิวเข้าสู่พื้นที่โครงการ จะไม่จอดรถ รอริมถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 59 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ คอยจัดคิวรถปูนเข้า-ออก เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับการเดินรถบน ถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 59 บริเวณโครงการ	-          -	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาอบรมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมกับคนงานก่อสร้างให้เข้าใจถึง กฎจราจรโดยได้ให้ความรู้ก่อนเริ่มงาน ในแต่ละวันพร้อมกับคนงานก่อสร้าง       - กรณีมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างขนส่ง ปูนซีเมนต์เข้าสู่พื้นที่โครงการจะไม่ให้มี การจอดรถรอบถนนสุขุมวิทและ ถนนซอยสุขุมวิท 59 หากมีความ จำเป็นต้องจอดรถ โครงการจะให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมให้จอดในระยะเวลาที่สั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ยานพาหนะอื่นบนถนนสุขุมวิทและ ถนนซอยสุขุมวิท 59	-          -	- รูปที่ 22 Safety Talk          - รูปที่ 15 ถนนด้านหน้า โครงการ - รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ประจำโครงการ



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม</b> <b>(1) วิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม</b> 1) พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก 2) กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- -	- โครงการได้พิจารณาเลือกคนงานตามความเหมาะสมแต่ละลักษณะงาน - กรณีมีการรับแรงงานอื่นนอกเหนือจากแรงงานคนไทยเข้าทำงาน โครงการจะดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด	- -	- ภาคผนวก 16ข - ภาคผนวก 17ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(1) วิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม (ต่อ)</b> 3) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้  4) โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัดรวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	-  -	- กรณีมีการรับแรงงานอื่นนอกเหนือจากแรงงานคนไทยเข้าทำงาน โครงการจะดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด  - โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานและมีการตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน	-  -	- ภาคผนวก 17ข  - รูปที่ 31 การแต่งกายของคนงานก่อสร้าง - ภาคผนวก 18ข



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(2) ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง (ต่อ)</b> 3) หากพิสูจน์ได้ว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ทำให้สระว่ายน้ำ บ่อน้ำของอาคาร Hyde Heritage Thonglor สกปรก โครงการต้องถ่ายน้ำออกถังสระด้วยค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมถึงการทำความสะอาดกระจกอาคารของอาคาร Hyde Heritage Thonglor 4) ติดหัวฉีดน้ำแบบสเปรย์ Sprinkle รอบโครงการ	-          -	- กรณีกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ส่งผลกระทบต่ออาคาร Hyde Heritage Thonglor เกิดความสกปรกเนื่องจาก ฝุ่นละออง โครงการจะดำเนินการแก้ไข และปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด - โครงการได้ดำเนินการติดตั้งหัวฉีดน้ำ แบบสเปรย์ (Spinkle) เพื่อฉีดพ่นน้ำลด ปริมาณฝุ่น	-          -	-          - ภาคผนวก 4ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b> 1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง  2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง  3) จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-  -  -	- โครงการได้จัดให้มีบ้านพัก คนงาน ซึ่งไม่อนุญาตให้พัก ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยบ้านพัก คนงานตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการ ที่ 32  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง  - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-  -  -	- ภาคผนวก 2ข - ภาคผนวก 19ข - รูปที่ 32 บ้านพัก คนงาน  - รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ประจำโครงการ  - ภาคผนวก 20ข - รูปที่ 33 กล้องวงจร ปิด ภายใน พื้นที่ ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)</b> 4) โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง  5) จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน ดังนี้ 5.1) จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานของเครนอย่างใกล้ชิด 5.2) ขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยก จะต้องได้รับการ พิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบว่า ถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบว่า ถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร	-  -	- โครงการได้จัดให้มีแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้างตาม มาตรการกำหนด  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงตกแต่งภายใน และภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งหากมี การใช้ทาวเวอร์เครนโครงการจะปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่ระบุในมาตรการอย่าง เคร่งครัด	-  -	- ภาคผนวก 15ข  - ภาคผนวก 21ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> <b>(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)</b> 5.3) ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพของการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยก และจะต้องทดลองควบคุมโดยไม่มี Load 5.4) ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที 5.5) การติดตั้งเครนจะต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรองรวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น 5.6) จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้เครนที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านงานยกควบคุมตลอดเวลาที่มีการทำงาน 5.7) กำหนดให้ใช้เครนแบบพับแขนได้ และแขนของเครนจะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงตกแต่งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ โดยหากมีการใช้ทาวเวอร์เครน โครงการจะปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)</b> 6) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดส่งสำเนาให้กับผู้พักอาศัยที่อยู่ประชิดโครงการและบ้านเลขที่ 24/2 และ 24/3 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างประสานบริษัทประกัน โครงการจะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายโดยกำหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นให้ชัดเจน	-	- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยเพื่อรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ได้แสดงสำเนาประกันภัยไว้บริเวณพื้นที่โครงการและได้จัดส่งสำเนาประกันภัยไปยังบ้านพักอาศัยข้างเคียงเลขที่ 24/2 และ 24/3 เพื่อให้ทราบถึงความรับผิดชอบที่โครงการมีต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 10ข - ภาคผนวก 12ข - รูปที่ 17 สำเนากฎมธรรม์ประกันภัยติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<p><b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b></p> <p><b>4.2 ผลกระทบด้านการบริการสาธารณสุข</b></p> <p><b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ</b></p> <p>1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>1.1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง แสงสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการขนส่ง และการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้าง ด้านกลิ่น การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ</p> <p>1.2) เจ้าของโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	-	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านพักคนงานหากพบข้อบกพร่อง เช่น ความไม่ปลอดภัย ความสกปรก การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โครงการจะแจ้งให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ภาคผนวก 1ก</p> <p>- ภาคผนวก 22ข</p>

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</b> 1.3) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดย ผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการ ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใน สัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมา ปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้พิจารณาดักเตือน ก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม 1.4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ ทราบถึงการดำเนินงาน โครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมก่อสร้าง 1.5) มาตรการสำหรับทาวเวอร์เครน ดำเนินการตามที่น่าเสนอ ในหัวข้อผลกระทบทางสังคม	-  -  -	- โครงการได้กำชับและกำหนดให้ ผู้รับเหมาดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง หากมีการใช้ปั้นจั่น และทาวเวอร์ เครน โครงการจะปฏิบัติตาม รายละเอียดที่ระบุในมาตรการ อย่างเคร่งครัด	-  -  -	- ภาคผนวก 1ก - ภาคผนวก 23ข - ภาคผนวก 21ข



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง</b> 1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ  1) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	-       -	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงานและกำชับให้มีการสวมใส่ให้เหมาะสมตามลักษณะงานแต่ละประเภท  - โครงการมีการควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น	-       -	- รูปที่ 34 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  - รูปที่ 35 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป  4) ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง  5) ในกรณีที่คนงานเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ โครงการจะให้คนงานหยุดงานหรือพักงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ	-  -  -	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอตามสภาพหน้างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดพรมน้ำหากพบว่ามีปริมาณฝุ่นมีการฟุ้งกระจายในปริมาณที่มาก  - โครงการได้ควบคุมยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการให้วิ่งได้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง  - กรณีคนงานเจ็บป่วยจะกำหนดให้มีการหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวให้หายก่อนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง	-  -  -	- รูปที่ 6 การฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่น  -  -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 6) จัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ย น้อยกว่า 85 dB(A) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และ เครื่องจักร 7) ติดตั้งตารางสรุปการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรให้เห็นชัดเจน	-       -	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมา จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลให้กับคนงานและมีการ กำชับให้มีการสวมใส่ให้เหมาะสม ตามลักษณะงานแต่ละประเภท - โครงการได้จัดทำตารางสรุปการ ใช้อุปกรณ์ลดเสียงตามแต่ละช่วง กิจกรรมพร้อมระยะห่างในการ ปฏิบัติงานจากเครื่องจักร	-       -	- รูปที่ 34 อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล - รูปที่ 35 การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล - ภาพผนวก 24ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 8) เปลี่ยนงานให้คนงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่าง คนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอด ระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A)  9) โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ ลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับ ได้แก่ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการและดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินใน สถานประกอบกิจการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนมิถุนายน 2561	-  -	- โครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างลด การสัมผัสเสียงดัง โดยเว้นระยะห่างการ ทำงานจากเครื่องจักร เครื่องจักรที่ไม่มี การใช้งานให้ดับเครื่องยนต์และให้มีการ สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง  - โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพ ของคนงาน	-  -	- รูปที่ 34 อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล  - รูปที่ 35 การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล  -

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 10) มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน - ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องเจาะ เสาเข็ม - ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และ ตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	-	- โครงการได้เลือกใช้เครื่องเจาะ เสาเข็มที่ได้มาตรฐานที่สามารถ ลดความสั่นสะเทือนที่จะเกิด ขึ้นกับคนงานและพื้นที่ข้างเคียง ได้พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาให้มี ความปลอดภัยมีสภาพพร้อมใช้ งาน	-	- ภาคผนวก 25ข - ภาคผนวก 26ข



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 11) มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง</li> <li>- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงทำเบาะที่นึ่งสำหรับรถขุดเจาะ</li> <li>- ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด</li> </ul>	-	- โครงการได้เลือกใช้เครื่องเจาะเสาเข็มที่ได้มาตรฐานที่สามารถลดความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นกับคนงานและพื้นที่ข้างเคียงได้ โดยการใช้เครื่องเจาะเสาเข็มแต่ละครั้งจะใช้เวลาตามความเหมาะสมไม่กระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาให้มีความปลอดภัยมีสภาพพร้อมใช้งาน	-	- ภาคผนวก 25ข - ภาคผนวก 26ข

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 12) โครงการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน 13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-  -	- โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คนงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) คอยควบคุมดูแลคนงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยและคอยตรวจสอบควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-  -	-  - ภาคผนวก 27ข - รูปที่ 22 Safety Talk

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b> 14) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการทำงาน และกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน เป็นต้น	-	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมา อบรมให้ความรู้คนงานในการ ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย เป็นประจำอย่างต่อเนื่องใน กิจกรรมสนาความปลอดภัย (Safety Morning Talk) ทุกเช้า ก่อนเริ่มงาน	-	- รูปที่ 22 Safety Talk
<b>4.5 การดำเนินการเกิดแผ่นดินไหว</b> - ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่ รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์	-	- โครงการได้ออกแบบอาคารที่ สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ ตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ภาคผนวก 28ข

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

### มาตรการทั่วไป



รูปที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 2 กล้องรับเรื่องร้องเรียน

### มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ



รูปที่ 3 รั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 4 บ่อรวบรวมน้ำเสีย



รูปที่ 5 ท่อระบายน้ำของโครงการ



รูปที่ 6 การฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่น



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)




รูปที่ 7 ตำแหน่งการวางเครื่องจักร



รูปที่ 8 ป้ายรณรงค์

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)

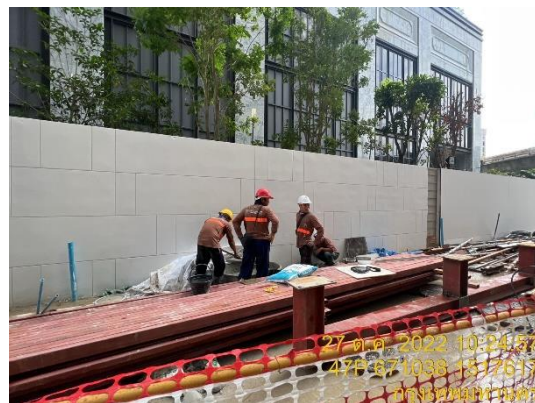

กองวัสดุก่อสร้าง



พื้นที่กองเก็บปูนซีเมนต์ผง

รูปที่ 9 พื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้าง



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 10 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ



รูปที่ 11 พนักงานทำความสะอาด



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 12 ถังรองรับขยะมูลฝอย



รูปที่ 13 การล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 14 ทางเข้า-ออกโครงการ



ติดถนนสุขุมวิท



ติดถนนเข้าซอยสุขุมวิท 59


รูปที่ 15 ถนนด้านหน้าโครงการ

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

### มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 16 กิจกรรมก่อสร้างทางด้านถนนสุขุมวิท

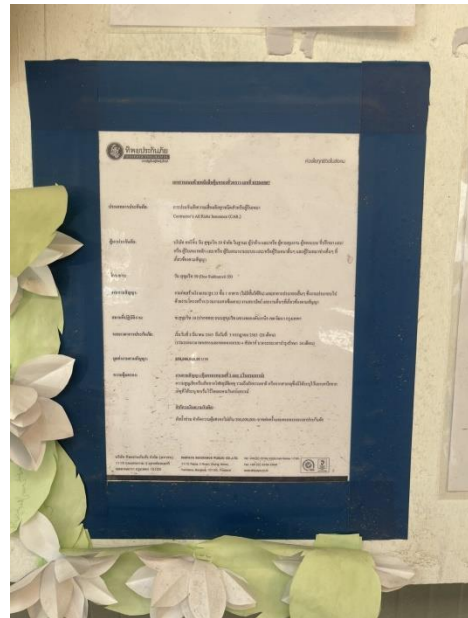


รูปที่ 17 สำเนากรมธรรม์ประกันภัยติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)

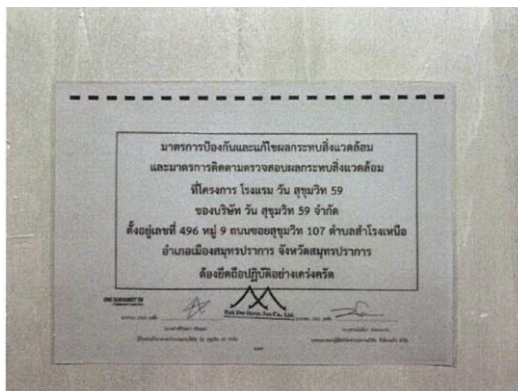

รูปที่ 18 รายละเอียดมาตรการฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



ห้องน้ำ



อ่างล้างมือ

รูปที่ 19 ห้องสุขาสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 20 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์



รูปที่ 21 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 22 Safety Talk



รูปที่ 23 ถังเคมีดับเพลิง



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 24 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 25 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 26 จุดรวมพล



รูปที่ 27 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 28 ช่งสีท้ายรถบรรทุก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ



รูปที่ 30 ชี้อและเบอร์โทรติดข้างรถ



รูปที่ 31 การแต่งกายของคนงานก่อสร้าง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต



รูปที่ 32 บ้านพักคนงาน



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)



รูปที่ 33 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 34 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 35 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
