

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทาง สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- 4.1 คุณภาพอากาศ
- 4.2 คุณภาพน้ำ
- 4.3 คุณภาพน้ำใต้ดิน
- 4.4 คุณภาพดิน
- 4.5 คมนาคม
- 4.6 ระดับเสียง
- 4.7 การจัดการกากของเสีย
- 4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 4.9 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ความถี่ในการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- วัดมาบชลูด	- ฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - โพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) - ทิศทางและความเร็วลม	- Gravimetric - Gravimetric - Chemiluminescence - NIOSH 1612/GC-FID - WS/WD Equipment	ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง)	5-12 เม.ย. 66 และ 22-29 มิ.ย. 66
1.2 คุณภาพอากาศ จากปล่องระบาย	- ปล่องระบาย จำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ ● ปล่องของระบบ TO	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - สารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOC _s)	- Phenoldisulfonic Acid Method - Isokinetic, Gravimetric Method - เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย แบบพกพา/U.S.EPA Method 21 หรือวิธีอื่นๆตามที่หน่วยงานราชการ กำหนด	ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ)	7 เม.ย. 66
	● ปล่องของ Liquid Incinerator	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - สารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOC _s) - เบนซีน (Benzene)*	- Phenoldisulfonic Acid Method - Isokinetic, Gravimetric Method - เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยแบบ พกพา/U.S.EPA Method 21 หรือวิธี อื่นๆตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ)	23 มิ.ย. 66

หมายเหตุ * ปริมาณ Benzene ดำเนินการตรวจวัดตามที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและบันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานของโครงการ เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ความถี่ในการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
2. คุณภาพน้ำ	- บริเวณ Final Check Basin	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ค่าบีโอดี (BOD₅) - ค่าซีโอดี (COD) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - สารประกอบฟีนอล (Phenolics) 	<ul style="list-style-type: none"> - Electrometric - Laboratory and Field - Dried at 180 degree Celsius (SM : 2540C) - Dried at 103-105 degree Celsius (SM : 2540D) - 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (SM : 5210B) - Closed Reflux, Titrimetric (SM : 5220C) - Partition-Gravimetric (SM : 5520B) - Distillation, Direct Photometric (SM : 5530B, D) 	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 66
	- บริเวณ Salt Solution Package	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ค่าบีโอดี (BOD₅) - ค่าซีโอดี (COD) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - สารประกอบฟีนอล (Phenolics) 	<ul style="list-style-type: none"> - Electrometric - Laboratory and Field - Dried at 180 degree Celsius (SM : 2540C) - Dried at 103-105 degree Celsius (SM : 2540D) - 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (SM : 5210B) - Closed Reflux, Titrimetric (SM : 5220C) - Partition-Gravimetric (SM : 5520B) - Distillation, Direct Photometric (SM : 5530B, D) 	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 66

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ความถี่ในการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- บริเวณ Cooling Water Blowdown Check Basin	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ค่าซีโอดี (COD) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- Electrometric - Laboratory and Field - Dried at 180 degree Celsius (SM : 2540C) - Dried at 103-105 degree Celsius (SM : 2540D) - Closed Reflux, Titrimetric (SM : 5220C) - Partition-Gravimetric (SM : 5520B)	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 66
3. คุณภาพน้ำใต้ดิน	- ตรวจวัดจำนวน 3 จุด ได้แก่ ● ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (MW02) ● ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ (MW01) ● ทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (MW03)	- pH - Acetone - Ethylbenzene - Total Petroleum (TPH) ● TPH C5-C8 ● TPH C>8-C16 ● TPH C>16-C35	- APHA, AWWA and WEF 23 rd Edition, 2017 หรือวิธีอื่นๆตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	ทุก 1 ปี	ช่วงปลายปี

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ความถี่ในการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
4. ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 3 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (MW02) ● ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ (MW01) ● ทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (MW03) 	<ul style="list-style-type: none"> - pH - Acetone - Ethylbenzene - Total Petroleum (TPH) <ul style="list-style-type: none"> ● TPH C5-C8 ● TPH C>8-C16 ● TPH C>16-C35 	<ul style="list-style-type: none"> - Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด 	ทุก 3 ปี	25 มิ.ย. 64
5. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการและตลอดเส้นทาง การขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ รวมถึงสาเหตุความสูญเสียการแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ - จุดบันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดบันทึก 	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 66
6. ระดับเสียง 6.1 ระดับเสียง ริมรั้วโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก 	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr.}$) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrated Sound Level Meter 	ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง)	5-12 เม.ย. 66

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/ วิเคราะห์	ความถี่ในการ ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินการ
7. การจัดการ กากของเสีย	- พื้นที่โรงงาน	- จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิด ที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงงาน และสัดส่วน ปริมาณกากของเสียที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) และที่ส่งไปกำจัดพร้อมนำเนาเอกสารส่งกำจัด	- จัดบันทึก	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 66
8. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 8.1 คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน	- Oxidation section	- Cumene	- NIOSH 1501 / GC-FID	ปีละ 4 ครั้ง	12 เม.ย. 66 และ 29 มิ.ย. 66
	- Epoxidation section	- Cumene - Acetone - Propylene Oxide	- NIOSH 1300 / GC-FID - NIOSH 1300 / GC-FID - NIOSH 1612 / GC-FID	ปีละ 4 ครั้ง	12 เม.ย. 66 และ 29 มิ.ย. 66
	- C3/PO Purification section	- Cumene - Acetone - Propylene Oxide	- NIOSH 1300 / GC-FID - NIOSH 1300 / GC-FID - NIOSH 1612 / GC-FID	ปีละ 4 ครั้ง	12 เม.ย. 66 และ 29 มิ.ย. 66
	- Hydrogenation section	- Cumene	- NIOSH 1501 / GC-FID	ปีละ 4 ครั้ง	12 เม.ย. 66 และ 29 มิ.ย. 66
	- PO Purification section	- Acetone - Propylene Oxide	- NIOSH 1300 / GC-FID - NIOSH 1612 / GC-FID	ปีละ 4 ครั้ง	12 เม.ย. 66 และ 29 มิ.ย. 66
	- Tank Farm	- Total VOCs	- Flame Ionization Detection	ปีละ 4 ครั้ง	12 เม.ย. 66 และ 29 มิ.ย. 66

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ความถี่ในการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 8.2 คุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล	- พนักงานที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เสี่ยงในกระบวนการผลิต	- Propylene Oxide	- NIOSH 1612 / GC-FID	ปีละ 4 ครั้ง	12 เม.ย. 66
8.3 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน 8.3.1 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทำงาน (L_{eq})	- Air Compressors - C3 Recycle Compressors	- L_{eq} 12 hr.	- Integrated Sound Level Meter	ปีละ 2 ครั้ง	12 เม.ย. 66
8.3.2 ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัว พนักงานและคำนวณระดับเสียง เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA)	- พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	- Noise Dosimeter	- Noise dosimeter	ปีละ 2 ครั้ง	12-26 เม.ย. 66
8.3.3 จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- Noise Contour Map	- Grid Measurement/Sound Level Meter/ Integrate Noise to the Project Map	ทุก 3 ปี หรือกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลง การผลิต ซึ่งอาจส่งผล ให้ระดับเสียงในพื้นที่ โครงการมีการ เปลี่ยนแปลง	4-12 มี.ค. 64

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/ วิเคราะห์	ความถี่ในการ ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินการ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 8.4 ตรวจสอบสภาพพนักงาน โดยแพทย์อาชีวเวช ศาสตร์	- พนักงานทุกคน	* ตรวจสอบสภาพพนักงานทั่วไป ดังนี้ - ตรวจสอบสภาพทั่วไป เช่น ความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง สภาพทั่วไปของตา หู คอ จมูก และปอด - เอกซเรย์ทรวงอก - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด - ตรวจการทำงานของไต - ตรวจไขมันในเลือด - ตรวจการทำงานของตับ - ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นด้านอาชีวอนามัย	- โดยแพทย์อาชีว เวชศาสตร์	ตรวจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 1 ครั้ง หลังจากนั้นตรวจ ปีละ 1 ครั้ง	ช่วงปลายปี
	- พนักงานที่สัมผัส ปัจจัยเสี่ยง	* ตรวจสอบสภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - ตรวจอะซิโตนในปัสสาวะ - ตรวจ Mandelic acid และ Phenylglyoxylic acid ในปัสสาวะ	- โดยแพทย์อาชีว เวชศาสตร์	ปีละ 1 ครั้ง	23-29 มี.ค. 66

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/ วิเคราะห์	ความถี่ในการ ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินการ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 8.5 รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและจากการทำงาน รวมถึงวิธีการแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและจากการทำงาน รวมถึงวิธีการแก้ไขและมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ	- จัดบันทึก	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 66
9. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ชุมชนในพื้นที่ 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชนพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล	- วิธีการสำรวจและจำนวนตัวอย่างเป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ	ปีละ 1 ครั้ง	มิ.ย.-ส.ค. 66
	- พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไข ปัญหาและมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง	- จัดบันทึก	ทุกเดือน	ม.ค.-มิ.ย. 66


ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/ วิเคราะห์	ความถี่ในการ ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินการ
9. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	- ชุมชนในพื้นที่ 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่ง โบราณสถาน วัด โรงเรียน และสถานที่ สำคัญต่างๆ เป็นต้น	- สรุปผลการดำเนินงาน และการประเมินผลจาก แผนงานชุมชนสัมพันธ์ แผนงานความรับผิดชอบต่อ สังคม โดยประเมินผลการดำเนินงานชุมชน สัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นและ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการขึ้นต้นทั้งในแง่ ของ Output และ Outcome ที่เกิดขึ้นกับ กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ จากโครงการ โดยการประเมินประสิทธิภาพการ ปฏิบัติตามโครงการหรือมาตรการเดิมถึงความ เหมาะสมและความเพียงพอ รวมถึงการปรับปรุง แผนงานของโครงการในอนาคต	- วิธีการสำรวจและ จำนวนตัวอย่างเป็นไป ตามหลักวิชาการและ สถิติ	ปีละ 1 ครั้ง	มิ.ย.-ส.ค. 66

4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

4.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย จำนวน 1 สถานี ได้แก่ วัดมาบชลูด แผนที่จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังภาพที่ 4.1 และรูปภาพแสดง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 4.1

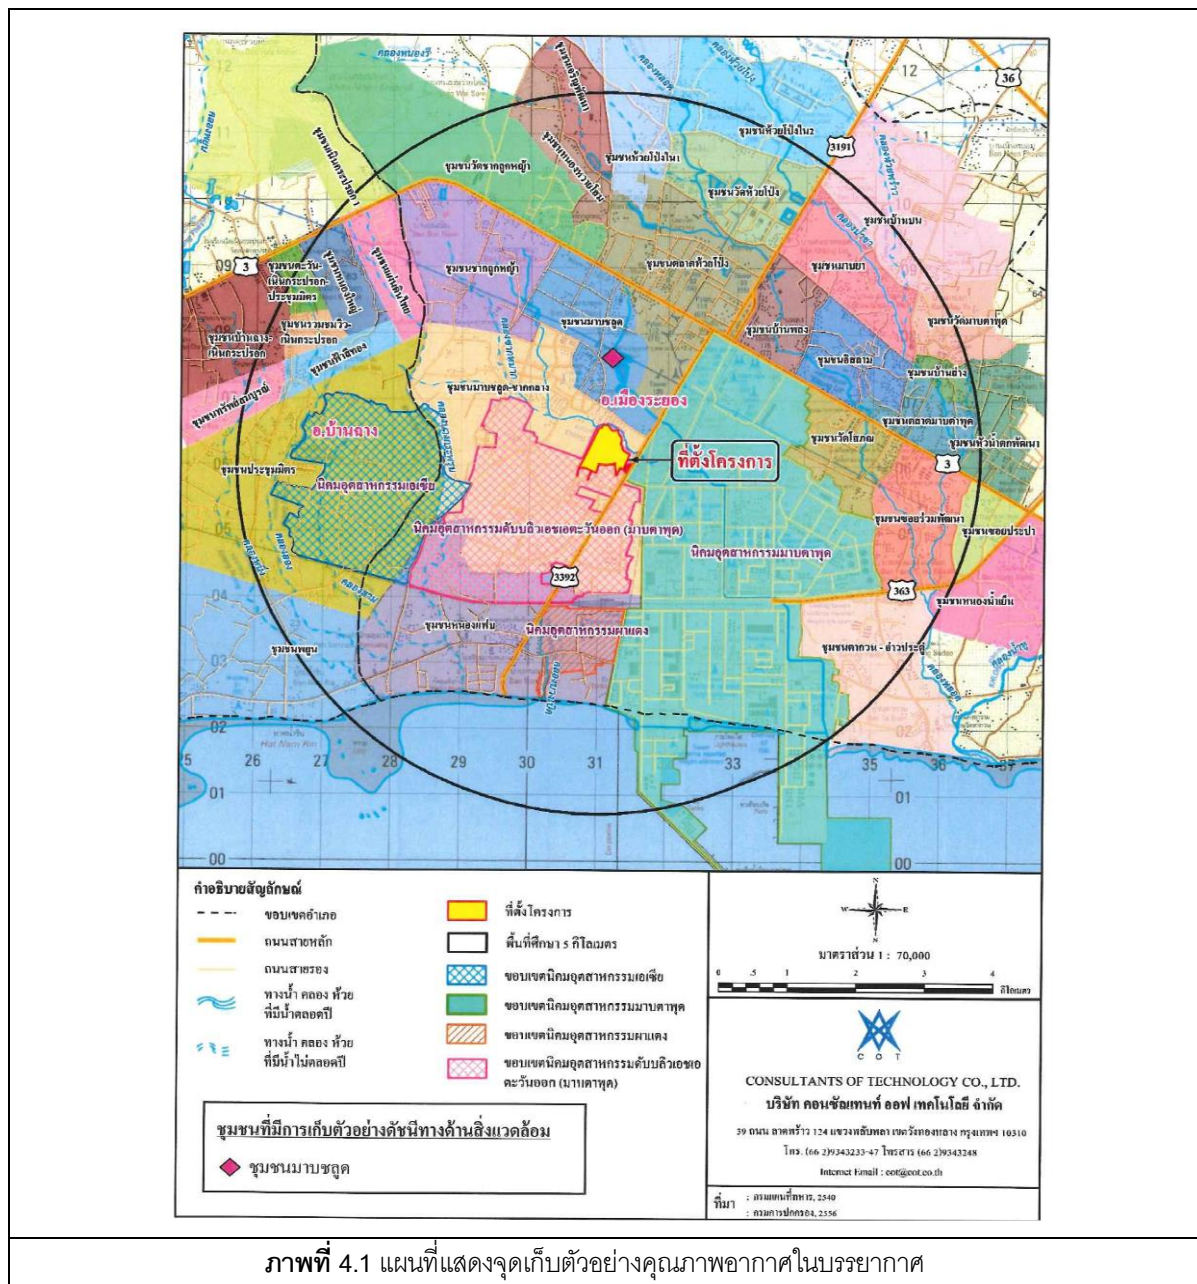

ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



รูปที่ 4.1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ วัดมาบชูด

4.1.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณวัดมาบชูด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน 2566 และ 22-29 มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 4.2 ถึง ตารางที่ 4.3 และผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจวัดปริมาณ (TSP, PM10, Propylene Oxide (PO)) ในบรรยากาศ

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 47P 0730817 UTM 1407375

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		TSP (mg/m ³)	PM10 (mg/m ³)	Propylene Oxide (PO) (ppm)
วัดมาบชอุตสาหกรรม	5-6 เม.ย. 66	0.084	0.033	0.05
	6-7 เม.ย. 66	0.088	0.033	ND
	7-8 เม.ย. 66	0.058	0.021	ND
	8-9 เม.ย. 66	0.064	0.030	ND
	9-10 เม.ย. 66	0.077	0.025	ND
	10-11 เม.ย. 66	0.111	0.031	ND
	11-12 เม.ย. 66	0.086	0.039	ND
	ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	0.058-0.111	0.021-0.039	ND-0.05
	22-23 มิ.ย. 66	0.047	0.031	0.43
	23-24 มิ.ย. 66	0.051	0.035	ND
	24-25 มิ.ย. 66	0.032	0.023	ND
	25-26 มิ.ย. 66	0.031	0.028	ND
	26-27 มิ.ย. 66	0.032	0.028	ND
	27-28 มิ.ย. 66	0.048	0.021	ND
	28-29 มิ.ย. 66	0.037	0.026	ND
	ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	0.031-0.051	0.021-0.035	ND-0.43
มาตรฐาน		0.33	0.12	-

มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
หมายเหตุ	: 1. ผลตรวจวัดระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการตรวจวัดคุณภาพปล่องระบาย Liquid Incinerator ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 2. ND = Non detectable [Method Detection Limit of Propylene Oxide = < 0.05 ppm]
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้บันทึก	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวรรณ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นายกะวีร์ สุทธาทิตย์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งตรวจวัด	: -5-12 เมษายน 2566 : จุดเก็บตัวอย่างมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบบริเวณเครื่องตรวจวัด จุดตรวจวัดมีระยะห่างจากถนนด้านหน้าวัด ประมาณ 50 เมตร ภายในวัดมีการเชื่อมเสาสไฟฟ้า และบริเวณหน้าวัดมีกิจกรรมก่อสร้างถนน ซึ่งมีการทำงานของเครื่องจักร -28-29 มิถุนายน 2566 : จุดเก็บตัวอย่างมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบบริเวณเครื่องตรวจวัด จุดตรวจวัดมีระยะห่างจากถนนด้านหน้าวัด ประมาณ 50 เมตร บริเวณหน้าวัดมีกิจกรรมก่อสร้างถนน มีการทำงานของเครื่องจักร และมีรถสัญจรไป-มา

ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโพพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 47P 0730817 UTM 1407375 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M200E S/N 3998

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) บริเวณ วัดมาบชลูด (ppm)						
	5-6 เม.ย. 66	6-7 เม.ย. 66	7-8 เม.ย. 66	8-9 เม.ย. 66	9-10 เม.ย. 66	10-11 เม.ย. 66	11-12 เม.ย. 66
11:00 – 12:00	0.006	0.012	0.008	0.021	0.006	0.010	0.011
12:00 – 13:00	0.007	0.010	0.008	0.024	0.005	0.010	0.011
13:00 – 14:00	0.006	0.015	0.009	0.015	0.004	0.007	0.008
14:00 – 15:00	0.012	0.018	0.007	0.008	0.005	0.007	0.010
15:00 – 16:00	0.009	0.011	0.013	0.006	0.005	0.007	0.009
16:00 – 17:00	0.011	0.009	0.029	0.008	0.005	0.007	0.011
17:00 – 18:00	0.013	0.006	0.028	0.007	0.004	0.008	0.013
18:00 – 19:00	0.009	0.006	0.009	0.010	0.005	0.006	0.010
19:00 – 20:00	0.011	0.007	0.008	0.009	0.005	0.006	0.018
20:00 – 21:00	0.017	0.006	0.010	0.006	0.005	0.007	0.017
21:00 – 22:00	0.010	0.009	0.022	0.004	0.005	0.006	0.022
22:00 – 23:00	0.014	0.009	0.021	0.005	0.005	0.007	0.020
23:00 – 00:00	0.009	0.012	0.021	0.006	0.004	0.005	0.013
00:00 – 01:00	0.008	0.008	0.018	0.005	0.005	0.005	0.006
01:00 – 02:00	0.008	0.007	0.013	0.006	0.005	0.005	0.007
02:00 – 03:00	0.015	0.006	0.013	0.006	0.005	0.006	0.005
03:00 – 04:00	0.008	0.007	0.012	0.006	0.004	0.006	0.006
04:00 – 05:00	0.015	0.006	0.010	0.005	0.005	0.004	0.006
05:00 – 06:00	0.012	0.006	0.009	0.006	0.005	0.006	0.007
06:00 – 07:00	0.016	0.006	0.010	0.009	0.006	0.006	0.006
07:00 – 08:00	0.016	0.006	0.011	0.013	0.007	0.006	0.007
08:00 – 09:00	0.018	0.007	0.014	0.011	0.007	0.007	0.008
09:00 – 10:00	0.015	0.007	0.017	0.014	0.006	0.007	0.010
10:00 – 11:00	0.014	0.007	0.019	0.006	0.008	0.008	0.013
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	0.006-0.018	0.006-0.018	0.007-0.029	0.004-0.024	0.004-0.008	0.004-0.010	0.005-0.022
ค่าเฉลี่ย ^(24 ชม.)	0.012	0.008	0.014	0.009	0.005	0.006	0.011
มาตรฐาน ^(1 ชม.)	0.17						

ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 47P 0730817 UTM 1407375 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 7874

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) บริเวณ วัดมาบชลุด (ppm)						
	22-23 มิ.ย. 66	23-24 มิ.ย. 66	24-25 มิ.ย. 66	25-26 มิ.ย. 66	26-27 มิ.ย. 66	27-28 มิ.ย. 66	28-29 มิ.ย. 66
11:00 – 12:00	0.006	0.003	0.004	0.003	0.002	0.009	0.003
12:00 – 13:00	0.005	0.008	0.007	0.005	0.003	0.009	0.004
13:00 – 14:00	0.009	0.005	0.007	0.003	0.004	0.010	0.002
14:00 – 15:00	0.013	0.002	0.006	0.002	0.002	0.009	0.002
15:00 – 16:00	0.007	0.004	0.004	0.002	0.001	0.004	0.002
16:00 – 17:00	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002
17:00 – 18:00	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003
18:00 – 19:00	0.002	0.003	0.001	0.001	0.005	0.002	0.007
19:00 – 20:00	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.009
20:00 – 21:00	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.012
21:00 – 22:00	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.002	0.013
22:00 – 23:00	0.002	0.008	0.003	0.004	0.004	0.002	0.014
23:00 – 00:00	0.004	0.007	0.004	0.004	0.005	0.002	0.025
00:00 – 01:00	0.009	0.007	0.003	0.005	0.004	0.002	0.020
01:00 – 02:00	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.016
02:00 – 03:00	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006
03:00 – 04:00	0.008	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004
04:00 – 05:00	0.005	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
05:00 – 06:00	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001
06:00 – 07:00	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001
07:00 – 08:00	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
08:00 – 09:00	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001
09:00 – 10:00	0.001	0.002	0.003	0.003	0.007	0.001	0.001
10:00 – 11:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.008	0.001	0.005
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	0.001-0.013	0.001-0.008	0.001-0.007	0.001-0.005	0.001-0.008	0.001-0.010	0.001-0.025
ค่าเฉลี่ย ^(24 ชม.)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007
มาตรฐาน ^(1 ชม.)	0.17						

หมายเหตุ	:	ผลตรวจวัดระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการตรวจวัดคุณภาพปล่องระบาย Liquid Incinerator ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566
มาตรฐาน	:	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้บันทึก	:	นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวงษ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	:	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	:	นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวงษ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183
เบอร์โทรศัพท์	:	0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
สภาพแวดล้อมบริเวณ	:	จุดเก็บตัวอย่างมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบบริเวณเครื่องตรวจวัด จุดตรวจวัดมีระยะห่างจากถนนด้านหน้าวัด
ตำแหน่งตรวจวัด	:	ประมาณ 50 เมตร ภายในวัดมีการซ่อมเสาไฟฟ้า และบริเวณหน้าวัดมีกิจกรรมก่อสร้างถนน ซึ่งมีการทำงานของเครื่องจักร

ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ


เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m ³)	PM10 (mg/m ³)	Propylene Oxide (PO) (ppm)	NO ₂ ^(1 hr.) (ppm)	NO ₂ ^(24 hr.) (ppm)
วัดมาบชลด	5-12 พ.ค. 64	0.017-0.046	0.013-0.033	< 0.13	0.006-0.0049	0.0016-0.0033
	21-28 พ.ย. 64	0.037-0.052	0.025-0.037	ND-1.08	0.002-0.020	0.004-0.010
	6-13 มิ.ย. 65	0.031-0.078	0.020-0.048	ND	0.001-0.012	0.003-0.006
	5-12 ต.ค. 65	0.026-0.045	0.014-0.040	ND-0.44	0.002-0.020	0.006-0.009
	5-12 เม.ย. 66	0.058-0.111	0.021-0.039	ND-0.05	0.004-0.029	0.005-0.014
	22-29 มิ.ย. 66*	0.031-0.051	0.021-0.035	ND-0.43	0.001-0.025	0.003-0.007
มาตรฐาน		0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾	-	0.17 ⁽²⁾	-


มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป


- หมายเหตุ :
1. ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/64 ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 2. * = ผลตรวจวัดระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการตรวจวัดคุณภาพปล่องระบาย Liquid Incinerator ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566
 3. ND = Non detectable [Method Detection Limit of Propylene Oxide = < 0.05 ppm]

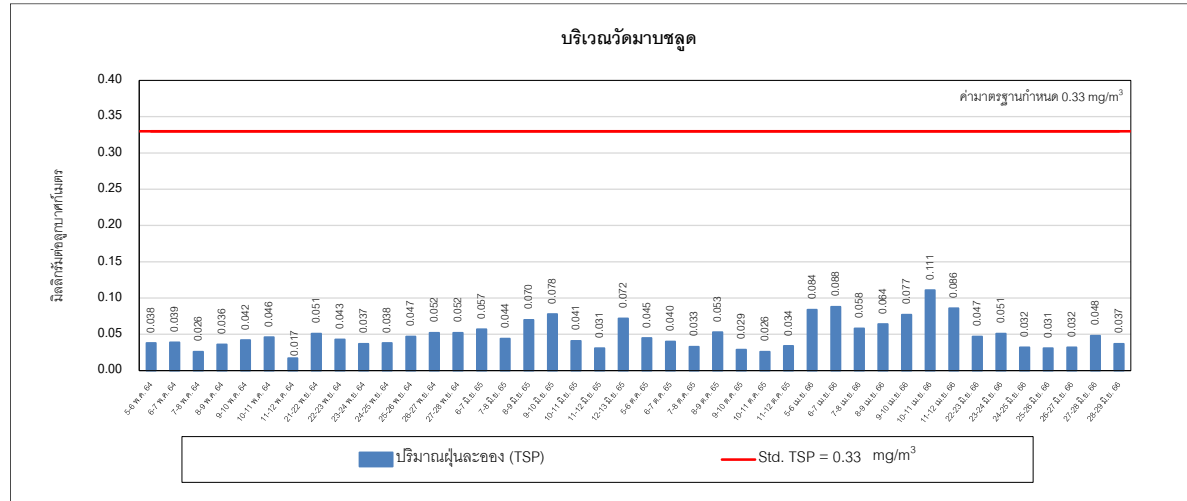



ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) ในบรรยากาศ

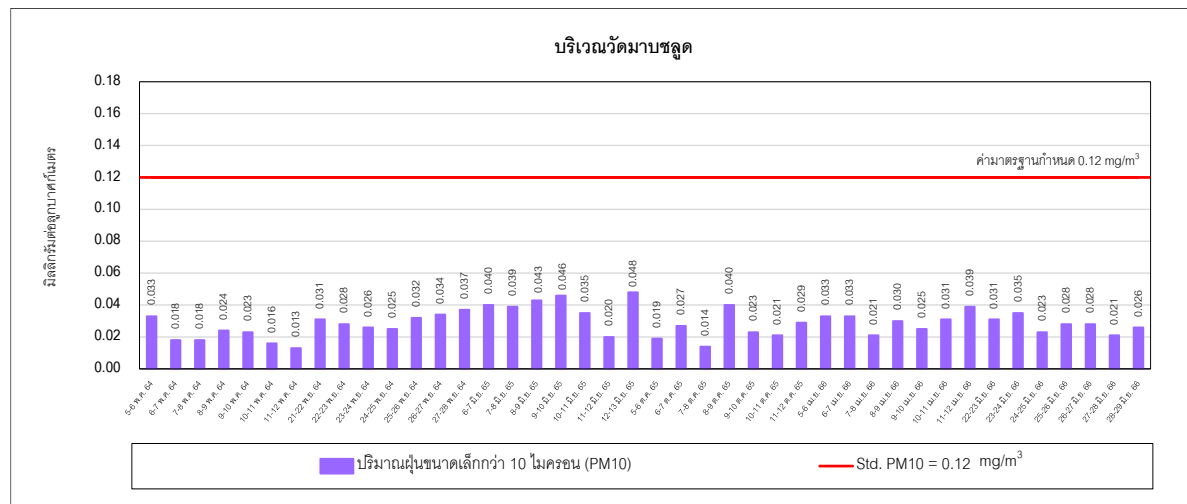

ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ

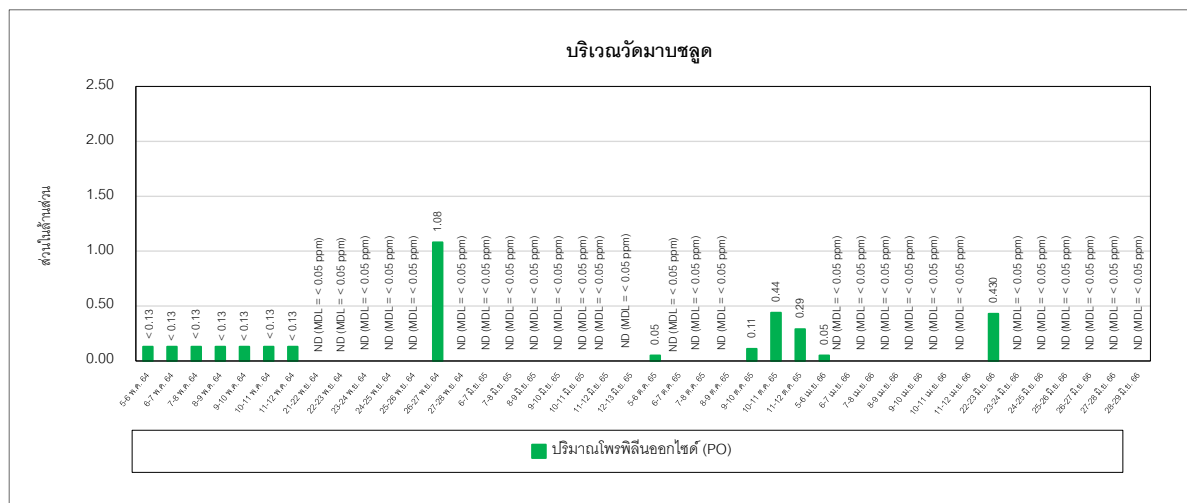

ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) ในบรรยากาศ

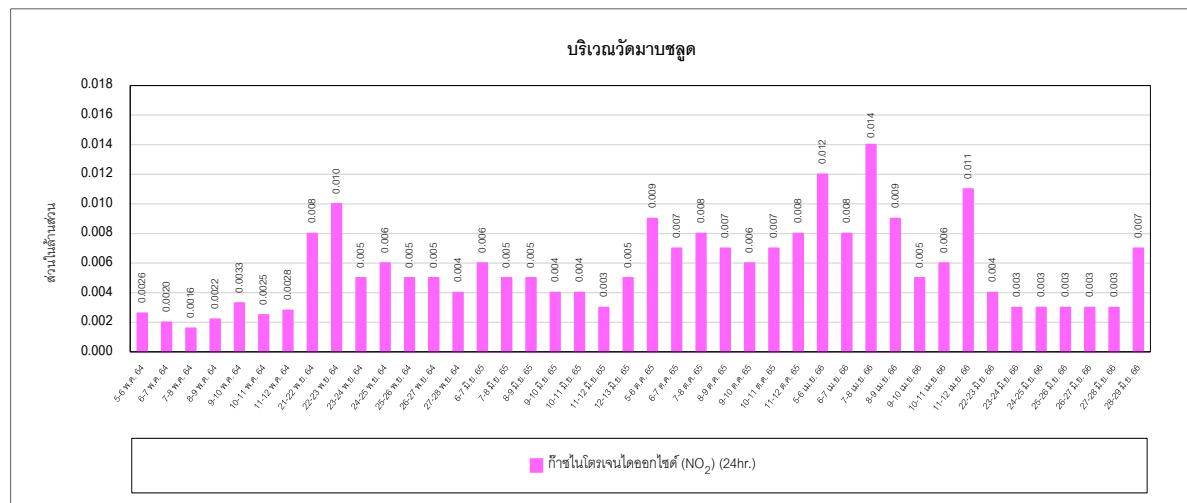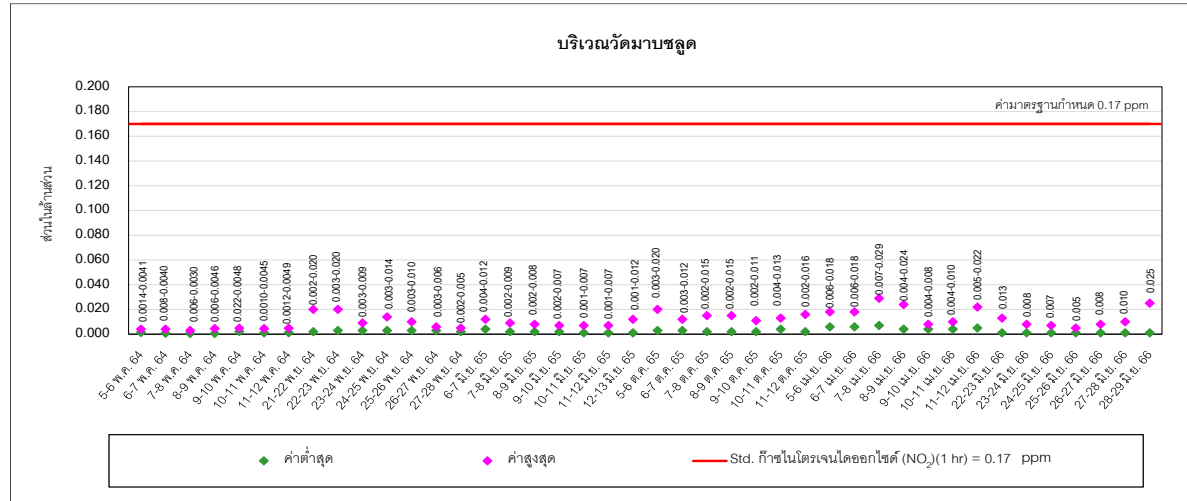

ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในบรรยากาศ

4.1.1.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณวัดมาบชูดุ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน 2566 และ 22-29 มิถุนายน 2566 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.058-0.111 และ 0.031-0.051 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.021-0.039 และ 0.021-0.035 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป กำหนด ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง (NO_2 (1 hr.)) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.004-0.029 และ 0.001-0.025 ส่วนในล้านส่วนตามลำดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปกำหนด ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (NO_2 (24 hr.)) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.005-0.014 และ 0.003-0.007 ส่วนในล้านส่วนตามลำดับ ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และปริมาณโพรพิลีน-ออกไซด์ (Propylene Oxide) มีค่าอยู่ระหว่าง ND (Non detectable, MDL = < 0.05 ส่วนในล้านส่วน)-0.05 และ ND (Non detectable, MDL = < 0.05 ส่วนในล้านส่วน)-0.43 ส่วนในล้านส่วนตามลำดับ ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อเปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 พบว่า

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง (NO_2 (1 hr.)) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั่วโมง (NO_2 (24 hr.)) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) มีแนวโน้มขึ้นลงไม่คงที่จากครั้งที่ผ่านมา

4.1.1.3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณวัดมาบชูดุ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน 2566 และ 22-29 มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.6

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 47P 0730817 UTM 1407375

เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดมาบชลูด							
	5-6 เม.ย. 66		6-7 เม.ย. 66		7-8 เม.ย. 66		8-9 เม.ย. 66	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
11:00-12:00	0.4	SSW	0.9	ESE	1.3	N	0.4	SE
12:00-13:00	0.9	SSW	0.9	SSW	0.4	WNW	0.9	SE
13:00-14:00	0.9	S	1.3	SSW	0.4	WSW	0.9	SW
14:00-15:00	0.9	SSW	1.3	S	0.4	N	0.9	S
15:00-16:00	0.9	SSE	1.3	SE	0.4	NNE	1.3	SW
16:00-17:00	0.9	SSW	0.9	S	0.4	S	0.9	SSW
17:00-18:00	0.4	S	0.9	SW	0.4	SW	0.9	SW
18:00-19:00	0.9	SE	0.9	SSW	0.9	SW	0.9	SE
19:00-20:00	0.4	SE	0.9	SW	0.4	WSW	0.9	SW
20:00-21:00	0.4	SE	0.4	SW	0.0	-	0.9	SW
21:00-22:00	0.4	SE	0.4	SE	0.0	-	0.9	WSW
22:00-23:00	0.4	S	0.4	SE	0.4	NNE	0.4	WSW
23:00-00:00	0.9	SSE	0.4	S	0.4	NNE	0.0	-
00:00-01:00	0.4	SE	0.4	SE	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.4	SSE	0.4	S	0.4	SE	0.4	SE
02:00-03:00	0.4	S	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.4	SSW	0.0	-	0.4	SE	0.4	SE
04:00-05:00	0.0	-	0.4	SSW	0.4	S	0.0	-
05:00-06:00	0.4	S	0.4	S	0.0	-	0.4	SSE
06:00-07:00	0.0	-	0.9	SE	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.4	SSE	0.4	S	0.4	SE	0.0	-
08:00-09:00	0.4	S	0.9	SSW	0.4	SE	0.0	-
09:00-10:00	0.4	SW	0.9	SW	0.4	SE	0.4	WSW
10:00-11:00	0.4	SSW	0.4	SW	0.4	SE	0.9	WSW
ความเร็วต่ำสุด	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-
ความเร็วสูงสุด	0.9	-	1.3	-	1.3	-	1.3	-

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 47P 0730817 UTM 1407375

เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดมาบชลูด (ต่อ)					
	9-10 เม.ย. 66		10-11 เม.ย. 66		11-12 เม.ย. 66	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
11:00-12:00	0.9	SSW	0.9	SW	0.9	SW
12:00-13:00	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SW
13:00-14:00	0.9	SSE	0.9	SW	0.9	S
14:00-15:00	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SW
15:00-16:00	0.9	SW	1.3	SSW	0.9	SSE
16:00-17:00	0.9	SSW	0.9	S	0.9	SSE
17:00-18:00	0.9	SSW	0.9	SW	0.9	SSE
18:00-19:00	0.9	SW	0.9	SW	0.4	S
19:00-20:00	0.9	SW	0.4	SW	0.4	SSE
20:00-21:00	0.9	SW	0.4	S	0.4	SE
21:00-22:00	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SE
22:00-23:00	0.4	SW	0.4	SSE	0.4	SSE
23:00-00:00	0.9	SW	0.4	SSW	0.4	SSE
00:00-01:00	0.4	SSW	0.9	SSW	0.4	SSE
01:00-02:00	0.4	SW	0.4	SSW	0.4	S
02:00-03:00	0.9	SW	0.9	SW	0.4	SW
03:00-04:00	0.4	SW	0.9	SSW	0.4	SSW
04:00-05:00	0.9	WSW	0.9	SW	0.4	SSE
05:00-06:00	0.9	SW	0.9	SSW	0.4	SE
06:00-07:00	0.4	WSW	0.4	SW	0.4	SSW
07:00-08:00	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SE
08:00-09:00	0.4	WSW	0.4	SW	0.9	SE
09:00-10:00	0.9	WSW	0.4	SW	0.9	SE
10:00-11:00	0.4	WSW	0.9	SE	1.3	SSW
ความเร็วต่ำสุด	0.4	-	0.4	-	0.4	-
ความเร็วสูงสุด	0.9	-	1.3	-	1.3	-

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 47P 0730817 UTM 1407375

เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดมาบชูด							
	22-23 มิ.ย. 66		23-24 มิ.ย. 66		24-25 มิ.ย. 66		25-26 มิ.ย. 66	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
11:00-12:00	0.0	SSW	0.0	ESE	0.4	N	0.0	SE
12:00-13:00	0.4	SSW	0.0	SSW	0.9	WNW	0.4	SE
13:00-14:00	0.4	S	0.0	SSW	0.9	WSW	0.4	SW
14:00-15:00	0.9	SSW	0.4	S	1.3	N	0.4	S
15:00-16:00	0.9	SSE	0.4	SE	0.4	NNE	0.4	SW
16:00-17:00	0.9	SSW	0.4	S	0.4	S	0.4	SSW
17:00-18:00	0.4	S	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW
18:00-19:00	0.4	SE	0.4	SSW	0.0	SW	0.4	SE
19:00-20:00	0.4	SE	0.4	SW	0.0	WSW	0.0	SW
20:00-21:00	0.4	SE	0.0	SW	0.0	-	0.4	SW
21:00-22:00	0.4	SE	0.0	SE	0.4	-	0.0	WSW
22:00-23:00	0.0	S	0.0	SE	0.0	NNE	0.0	WSW
23:00-00:00	0.4	SSE	0.4	S	0.4	NNE	0.0	-
00:00-01:00	0.4	SE	0.4	SE	0.4	-	0.0	-
01:00-02:00	0.4	SSE	0.0	S	0.4	SE	0.0	SE
02:00-03:00	0.4	S	0.0	SSW	0.4	-	0.0	-
03:00-04:00	0.4	SSW	0.4	-	0.4	SE	0.0	SE
04:00-05:00	0.4	-	0.4	SSW	0.0	S	0.0	-
05:00-06:00	0.9	S	0.0	S	0.0	-	0.0	SSE
06:00-07:00	0.9	-	0.0	SE	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.4	SSE	0.0	S	0.0	SE	0.0	-
08:00-09:00	0.0	S	0.0	SSW	0.0	SE	0.0	-
09:00-10:00	0.0	SW	0.4	SW	0.4	SE	0.0	WSW
10:00-11:00	0.0	SSW	0.4	SW	0.4	SE	0.0	WSW
ความเร็วต่ำสุด	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-
ความเร็วสูงสุด	0.9	-	0.4	-	1.3	-	0.4	-

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 47P 0730817 UTM 1407375

เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดมาบชลูด					
	26-27 มิ.ย. 66		27-28 มิ.ย. 66		28-29 มิ.ย. 66	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
11:00-12:00	0.4	SSW	0.4	SW	0.0	SW
12:00-13:00	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW
13:00-14:00	0.4	SSE	0.4	SW	0.4	S
14:00-15:00	0.4	SSW	0.4	SSW	0.4	SW
15:00-16:00	0.4	SW	0.4	SSW	0.9	SSE
16:00-17:00	0.4	SSW	0.4	S	0.9	SSE
17:00-18:00	0.4	SSW	0.4	SW	0.9	SSE
18:00-19:00	0.4	SW	0.4	SW	0.9	S
19:00-20:00	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SSE
20:00-21:00	0.0	SW	0.0	S	0.4	SE
21:00-22:00	0.0	SW	0.4	SW	0.4	SE
22:00-23:00	0.0	SW	0.4	SSE	0.4	SSE
23:00-00:00	0.0	SW	0.0	SSW	0.0	SSE
00:00-01:00	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSE
01:00-02:00	0.0	SW	0.0	SSW	0.0	S
02:00-03:00	0.0	SW	0.0	SW	0.0	SW
03:00-04:00	0.0	SW	0.0	SSW	0.0	SSW
04:00-05:00	0.0	WSW	0.0	SW	0.0	SSE
05:00-06:00	0.0	SW	0.4	SSW	0.0	SE
06:00-07:00	0.0	WSW	0.0	SW	0.0	SSW
07:00-08:00	0.0	SW	0.0	SW	0.0	SE
08:00-09:00	0.0	WSW	0.0	SW	0.0	SE
09:00-10:00	0.0	WSW	0.0	SW	0.0	SE
10:00-11:00	0.0	WSW	0.0	SE	0.0	SSW
ความเร็วต่ำสุด	0.4	-	0.4	-	0.4	-
ความเร็วสูงสุด	0.4	-	0.4	-	0.9	-


หมายเหตุ	: WS = wind Speed (เมตร/วินาที), WD = Wind Direction			
	N	= 349-360-11	SE	= 124-146 W = 259-270-281
	NNE	= 12-33	SSE	= 147-168 WNW = 282-303
	NE	= 34-56	S	= 169-180-191 NW = 304-326
	ENE	= 57-78	SSW	= 192-213 NNW = 327-348
	E	= 79-90-101	SW	= 214-236
	ESE	= 102-123	WSW	= 237-258
	ผลตรวจวัดระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจวัดเพิ่มเติม เนื่องจากการตรวจวัดคุณภาพปล่องระบาย Liquid Incinerator ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566			
ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ			
ชื่อผู้บันทึก	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวงษ์			
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด			
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวงษ์		เลขทะเบียนผู้ควบคุม	: ว-003-ค-2183
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2			
ข้อสรุป	: ผลการตรวจวัดในวันที่ 5-12 เมษายน 2566 พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ 0.4-1.3 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 9.5 % โดยลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) 25.6 % รองลงมาคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 16.7 % เท่ากัน ทิศใต้ (S) 11.9 % และทิศอื่นๆ บ้างประปราย			
	ผลการตรวจวัดในวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ 0.4-1.3 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 48.8 % โดยลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 12.5 % รองลงมาคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) 11.9% ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ (NNE) 8.3 % และทิศอื่นๆ บ้างประปราย			

4.1.1.4 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน 2566 และ 22-29 มิถุนายน 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณวัดมาบชูด


- ผลการตรวจวัดในวันที่ 5-12 เมษายน 2566 พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ 0.4-1.3 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 9.5 % โดยลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) 25.6 % รองลงมาคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 16.7 % เท่ากัน ทิศใต้ (S) 11.9 % และทิศอื่นๆ บ้างประปราย ซึ่งโครงการตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSE) ของจุดตรวจวัด และมีลมจากโครงการพัดผ่าน 8.9 % โดยพัดผ่านเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้นพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ หรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่องตามที่มาตรการกำหนด

- ผลการตรวจวัดในวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ 0.4-1.3 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 48.8 % โดยลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) 12.5 % รองลงมาคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) 11.9% ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ (NNE) 8.3 % และทิศอื่นๆ บ้างประปราย ซึ่งโครงการตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSE) ของจุดตรวจวัด และมีลมจากโครงการพัดผ่าน 1.2 % โดยพัดผ่านเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้นพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศหรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่องตามที่มาตรการกำหนด

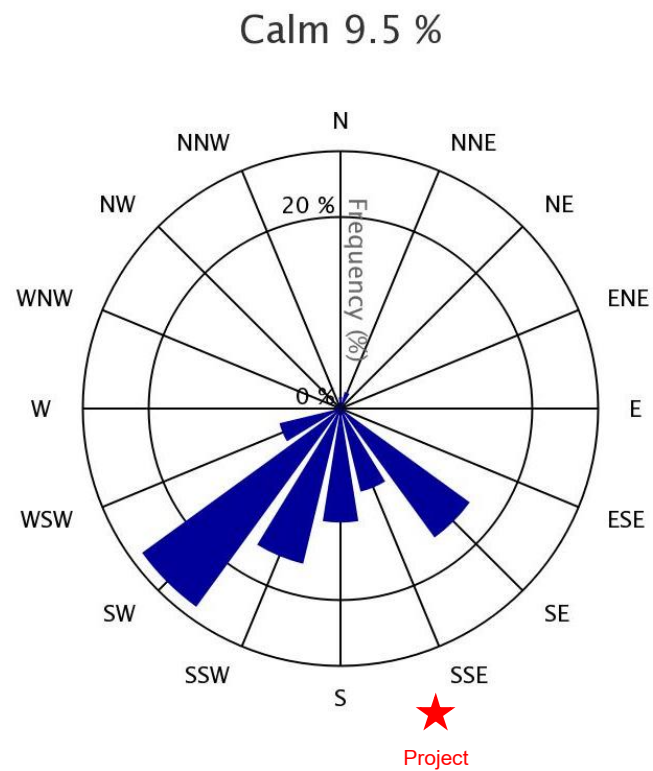

■ 0.4-1.9 ■ 2.0-3.9 ■ 4.0-5.9 ■ 6.0-7.9 ■ 8.0-9.9 ■ > 9.9 (m/s)

5-12 เมษายน 2566

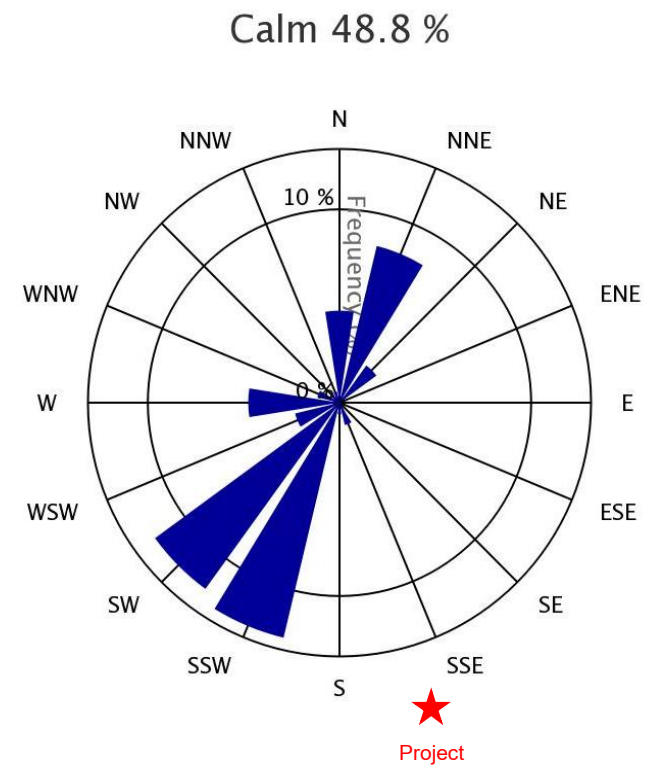


ภาพที่ 4.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม


ที่มา : ผลการตรวจวัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

4.1.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 2 ปล่อง คือ ปล่องของระบบ TO และ ปล่องของ Liquid Incinerator แผนที่จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย แสดงดังภาพที่ 4.7 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย แสดงดังรูปที่ 4.2

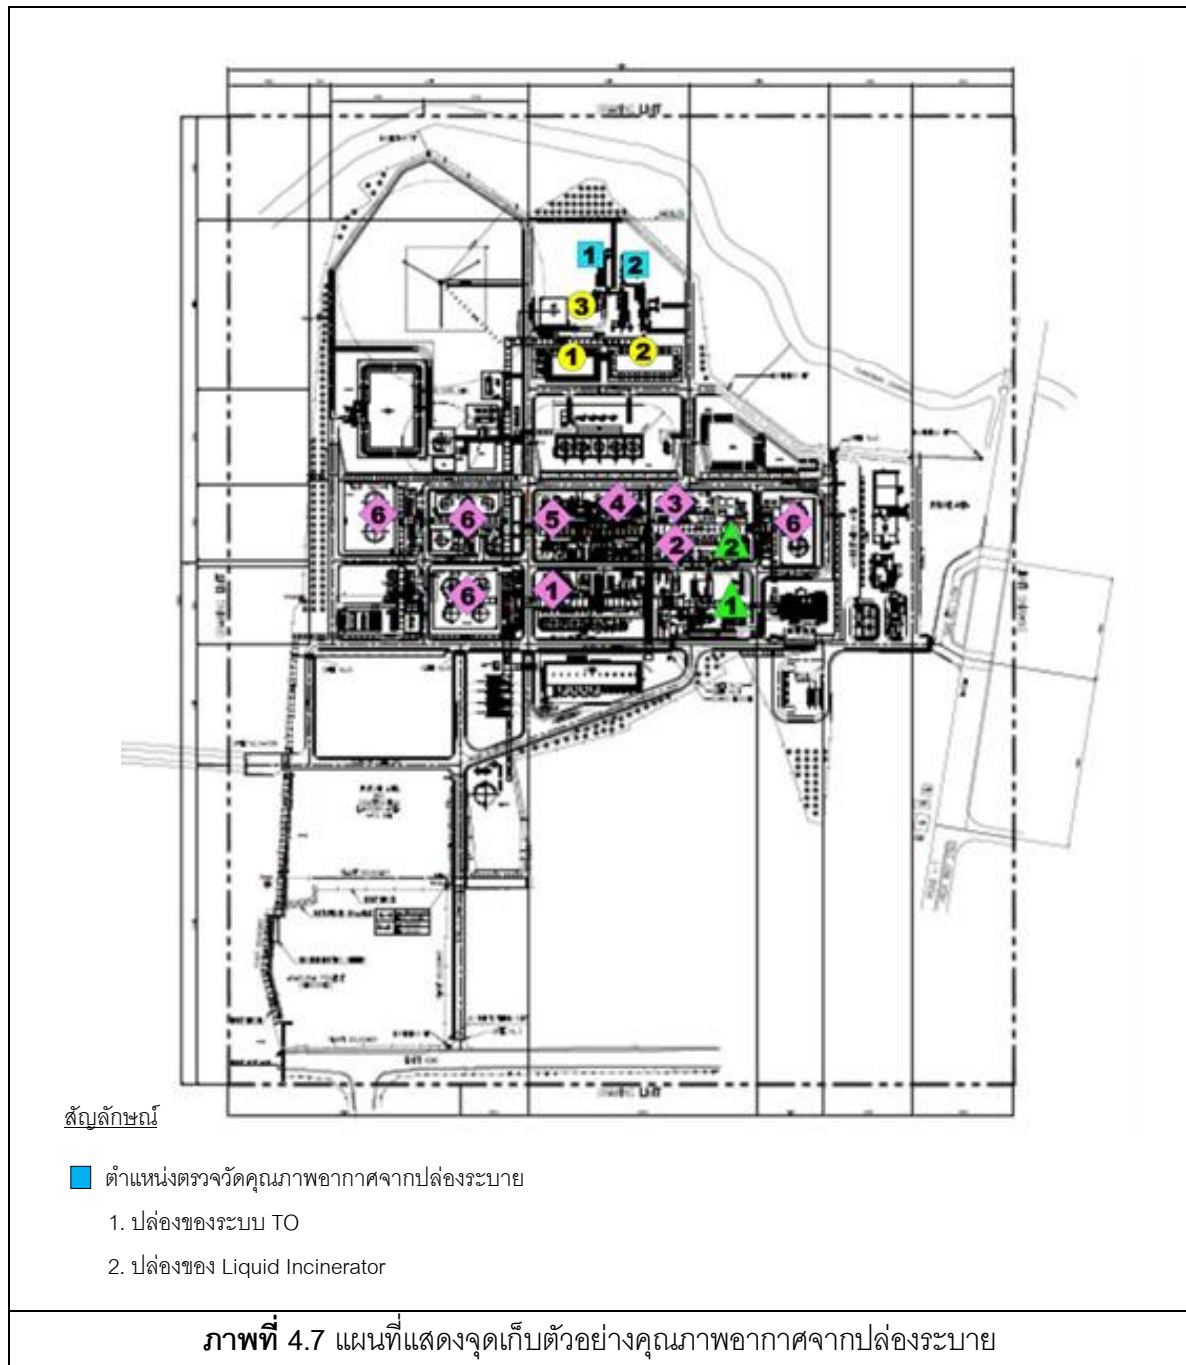

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

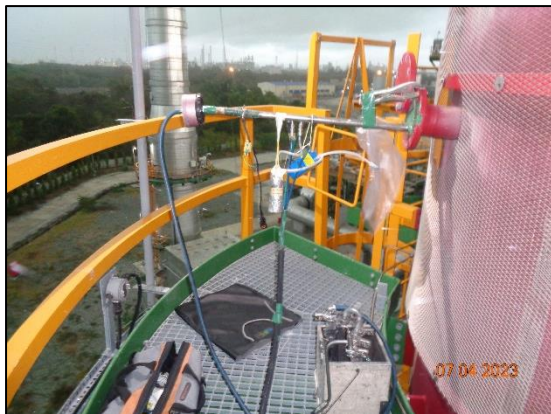

ปล่องของระบบ TO



ปล่องของ Liquid Incinerator

รูปที่ 4.2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

4.1.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 2 ปล่อง คือ ปล่องของระบบ TO และปล่องของ Liquid Incinerator ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดปล่องของระบบ TO ในวันที่ 7 เมษายน 2566 และดำเนินการตรวจวัดปล่องของ Liquid Incinerator ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.6 และเปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

UTM		วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด	ความสูงปล่อง (ม.)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.)	ผลการตรวจวัด								ค่าความเข้มข้น*		ค่ามาตรฐาน		อัตราการระบายจริง (g/s)	เกณฑ์อัตราการระบาย (g/s) ⁽²⁾	ลักษณะปากปล่อง
X	Y					เวลาตรวจวัด	ความเร็วก๊าซ (m³/s)	อัตราการไหลก๊าซ (m³/s)	อุณหภูมิ (°C)	Actual %O ₂	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	% O ₂	7% O ₂	(1)	(2)			
0731246E	1406443N	7 เม.ย. 66	ปล่องของระบบ TO	60	2.70	09:50-10:35	10.41	23.22	436.00	2.27	6.89	TSP	mg/m³	1.5	1.1	320	113	0.035	2.866	กลม
						10:10-10:15	10.41	23.22	436.00	2.27	6.89	NO _x	mg/m³	17.8	13.3	-	28.6	0.413	0.725	
													ppm	9.5	7.1	200	15.2	-	-	
						09:50-10:20	10.41	23.22	436.00	2.27	6.89	Total VOCs	ppm	2.07	1.54	-	-	0.048	2.383	
0731287E	1406416N	23 มิ.ย. 66	ปล่องของ Liquid Incinerator	60	2.20	10:35-11:15	17.85	31.68	315.00	11.14	6.93	TSP	mg/m³	0.2	0.3	35	28	0.006	0.880	กลม
						10:45-10:50	17.85	31.68	315.00	11.14	6.93	NO _x	mg/m³	5.3	7.5	150 ⁽³⁾	15.7	0.168	0.490	
													ppm	2.8	4.0	79.7 ⁽³⁾	8.3	-	-	
						10:40-11:10	17.85	31.68	315.00	11.14	6.93	Total VOCs	ppm	1.67	2.38	-	-	0.053	2.989	
						10:10-11:10	17.85	31.68	315.00	11.14	6.93	Benzene**	mg/m³	< 1.68	< 1.68	-	-	< 0.053	-	กลม
													ppm	< 0.52	< 0.52	-	-	-	-	

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

(2) เกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 พ.ศ. 2564

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545

หมายเหตุ : * ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

** ปริมาณ Benzene ดำเนินการตรวจวัดตามที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและบันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานของโครงการ เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ชนิดเชื้อเพลิง : ก๊าซธรรมชาติ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเมธี สุขประเสริฐ

ชื่อผู้บันทึก : นายเมธี สุขประเสริฐ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นายกะวีร์ สุทธาทิพย์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ตารางที่ 4.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

จุดตรวจวัด	ข้อมูลทั่วไป	หน่วย	ผลการตรวจวัด*					มาตรฐาน
			ครั้งที่ 1/2564	ครั้งที่ 2/2564	ครั้งที่ 1/2565	ครั้งที่ 2/2565	ครั้งที่ 1/2566	
ปล่องของระบบ TO	อุณหภูมิ	°C	461	450.00	451.00	440.00	436.00	-
	ความเร็วก๊าซ	m/s	8.0	11.06	10.88	10.74	10.41	-
	อัตราการไหลก๊าซ	m ³ /s	17.6	24.90	23.78	23.81	23.22	-
	ร้อยละความชื้นสัมพัทธ์	%	4.53	3.95	6.89	6.77	6.89	-
	ร้อยละของออกซิเจน	%	2.3	2.51	3.20	2.90	2.27	-
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	mg/m ³	0.7	4.1	2.2	36.6	1.1	320 ⁽¹⁾ , 113 ⁽²⁾
		g/s	0.016	0.134	0.067	1.129	0.035	2.866 ⁽²⁾
	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	mg/m ³	18.56	9.1	4.7	6.2	13.3	28.6 ⁽²⁾
		ppm	9.89	4.8	2.5	3.3	7.1	200 ⁽¹⁾ , 15.2 ⁽²⁾
		g/s	0.438	0.301	0.143	0.190	0.413	0.725 ⁽²⁾
	สารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs)	ppm	1.66	2.31	1.48	1.68	1.54	-
		g/s	0.090	0.076	0.045	0.052	0.048	2.383 ⁽²⁾

ตารางที่ 4.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (ต่อ)

จุดตรวจวัด	ข้อมูลทั่วไป	หน่วย	ผลการตรวจวัด*					มาตรฐาน
			ครั้งที่ 1/2564	ครั้งที่ 2/2564	ครั้งที่ 1/2565***	ครั้งที่ 2/2565	ครั้งที่ 1/2566	
ปล่องของ Liquid Incinerator	อุณหภูมิ	°C	371	270.00	307.00	308.00	315.00	-
	ความเร็วก๊าซ	m/s	20.9	16.26	17.82	17.69	17.85	-
	อัตราการไหลก๊าซ	m ³ /s	32.6	31.20	31.99	31.74	31.68	-
	ร้อยละความชื้นสัมพัทธ์	%	10.60	7.38	7.65	7.39	6.93	-
	ร้อยละของออกซิเจน	%	6.1	6.20	9.11	8.74	11.14	-
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	mg/m ³	5.7	5.4	0.1	4.0	0.3	35 ⁽¹⁾ , 28 ⁽²⁾
		g/s	0.197	0.178	0.003	0.111	0.006	0.880 ⁽²⁾
	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	mg/m ³	8.83	11.5	4.1	11.7	7.5	150 ⁽³⁾ , 15.7 ⁽²⁾
		ppm	4.70	6.1	2.2	6.2	4.0	79.7 ⁽³⁾ , 8.3 ⁽²⁾
		g/s	0.307	0.381	0.112	0.324	0.168	0.490 ⁽²⁾
	สารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs)	ppm	1.26	3.91	49.13	2.75	2.38	-
		g/s	0.29	0.129	1.333	0.076	0.053	2.898 ⁽²⁾
	เบนซีน (Benzene)**	ppm	< 0.0003	-	< 0.52	-	< 0.52	-
		g/s	< 0.00003	-	< 0.054	-	< 0.053	-

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

(2) เกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 พ.ศ. 2564




(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545

หมายเหตุ : 1. ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/2564 ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




2. * ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

3. ** ปริมาณ Benzene ดำเนินการตรวจวัดตามวิธีระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและบันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง




4. *** ผลตรวจวัดปล่องของ Liquid Incinerator (ครั้งที่ 1/2565) ในวันที่เก็บตัวอย่างมีการซ่อมบำรุงเตาเผา จำนวน 1 เตา

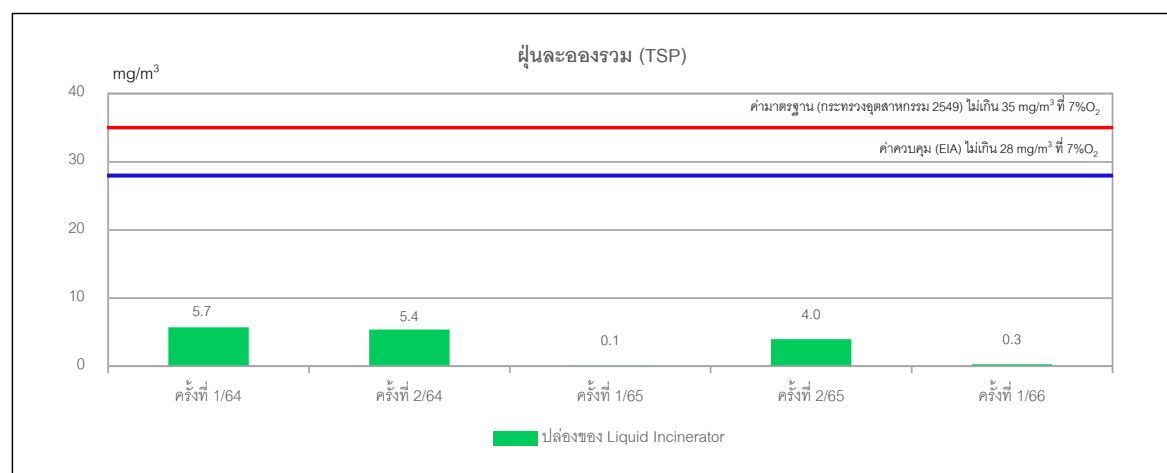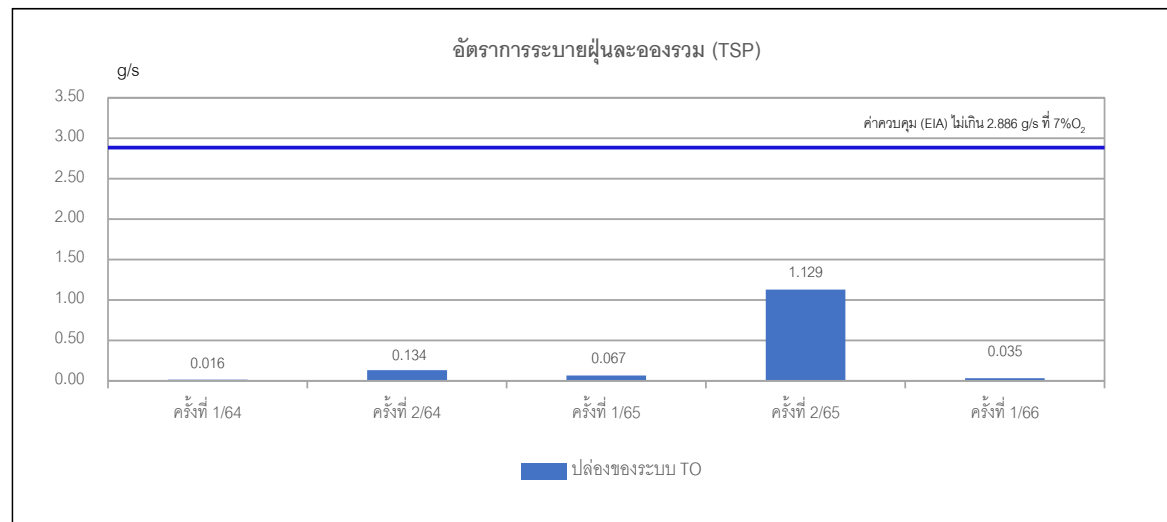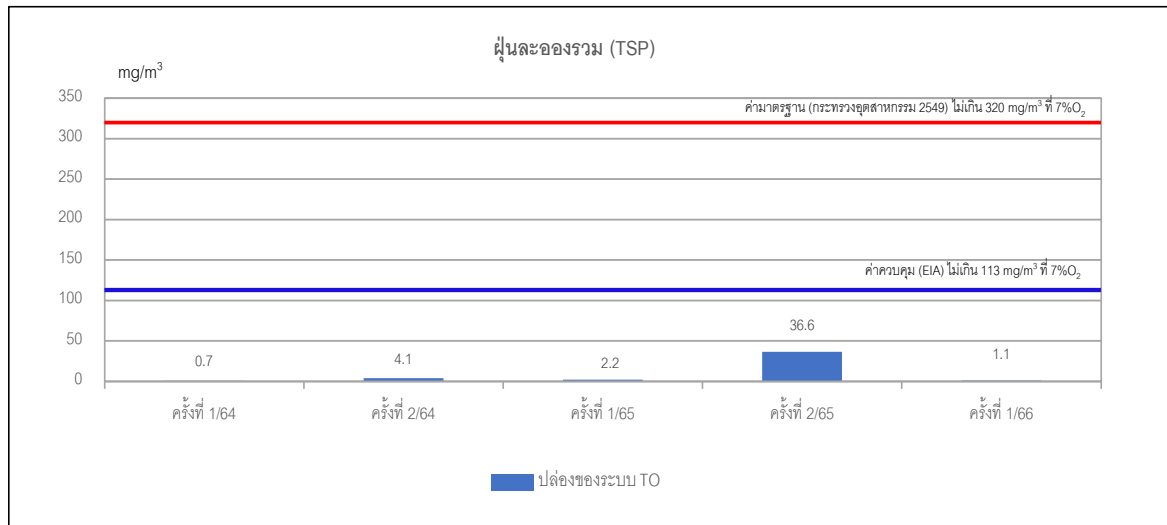




ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย

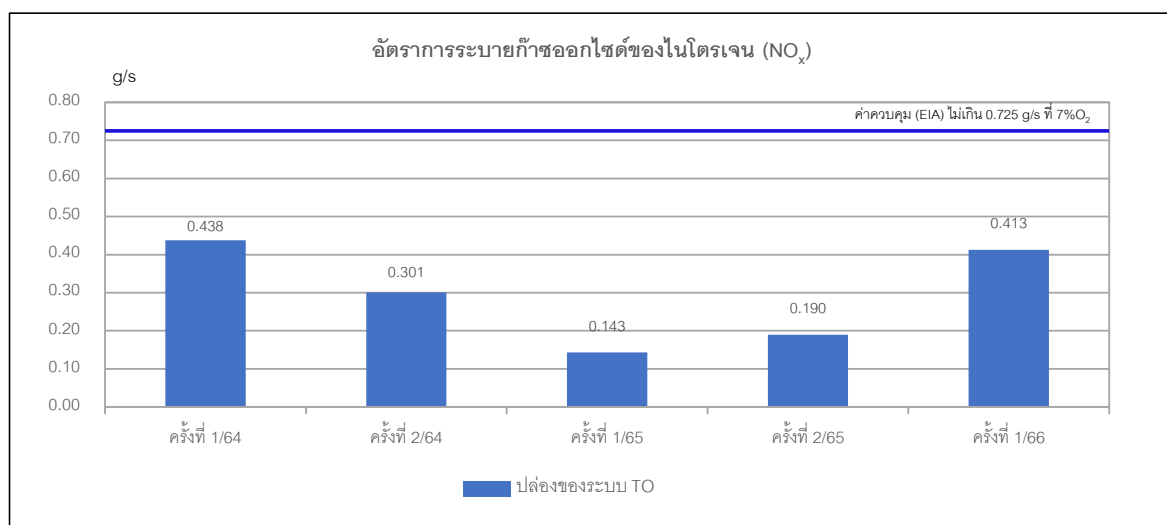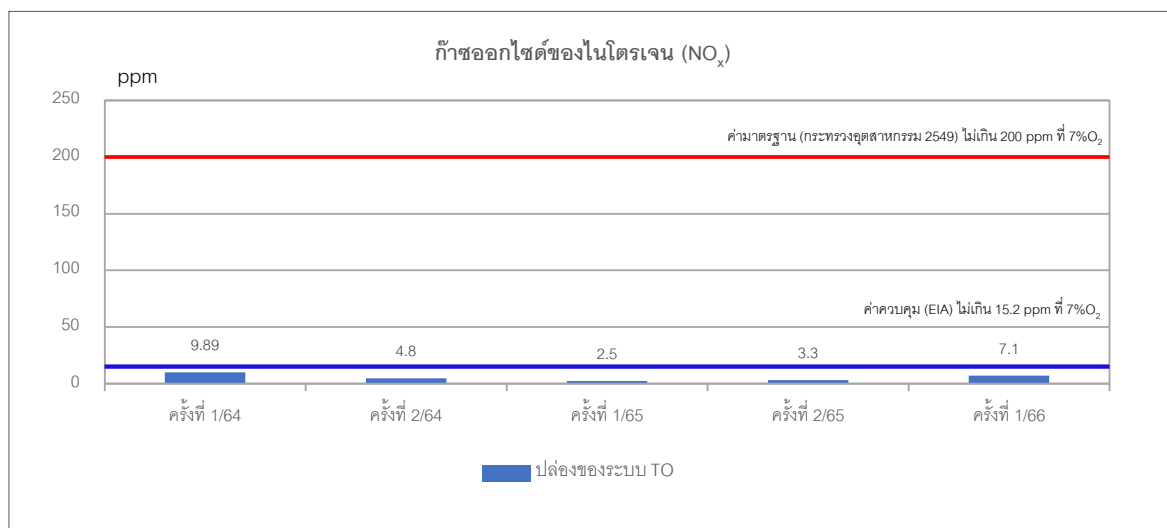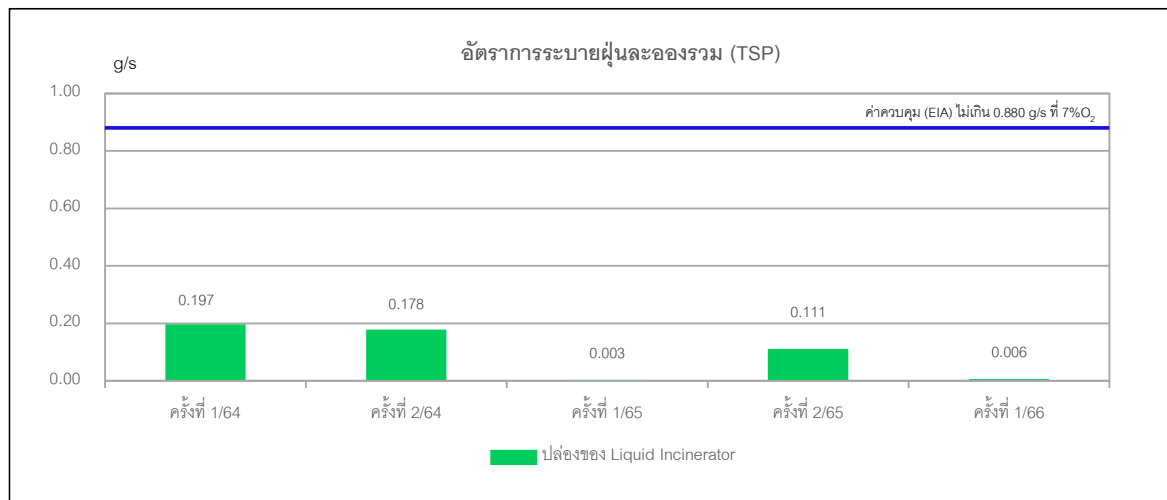


ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย (ต่อ)

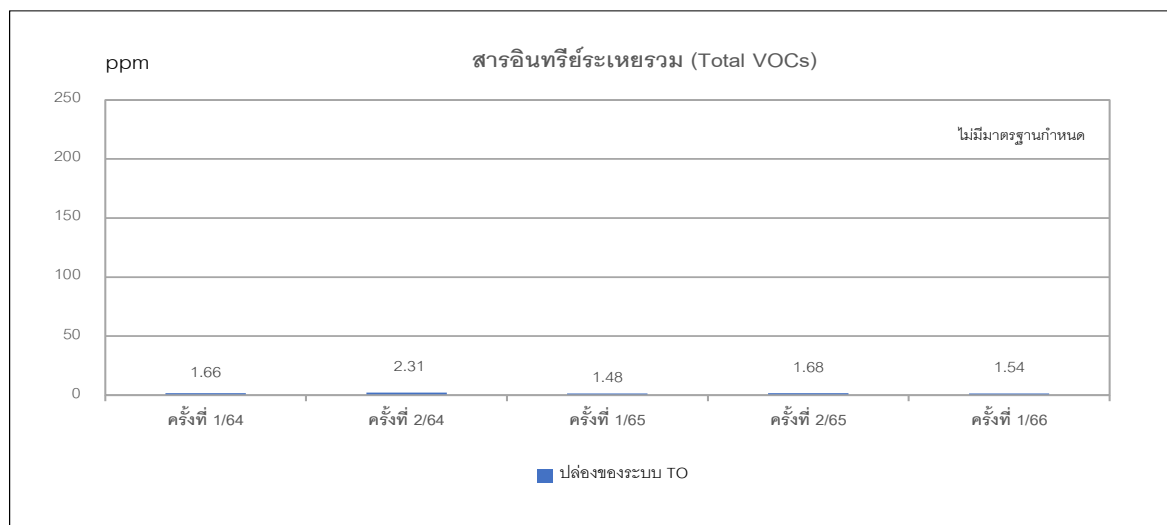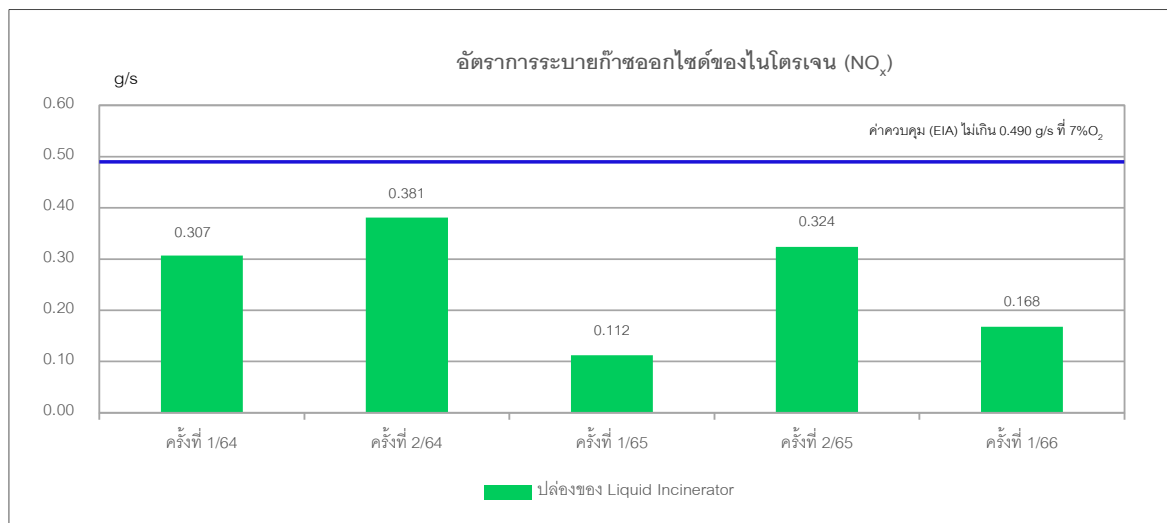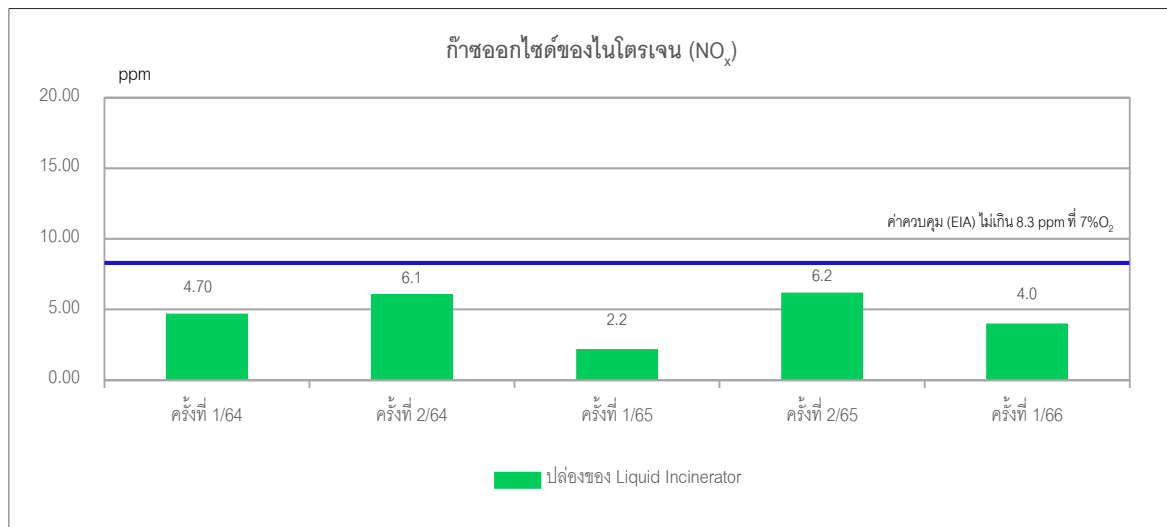

ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย (ต่อ)

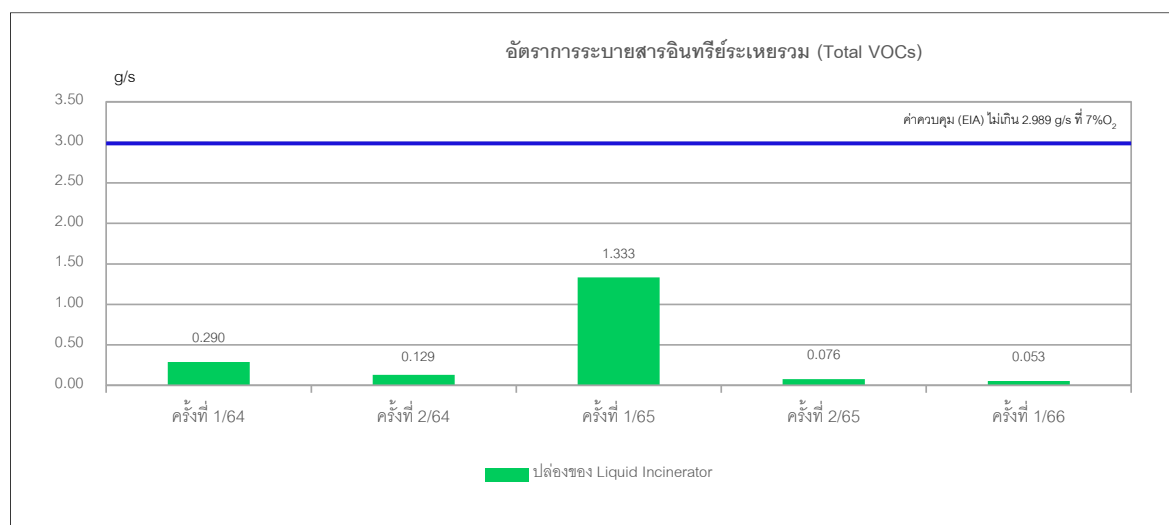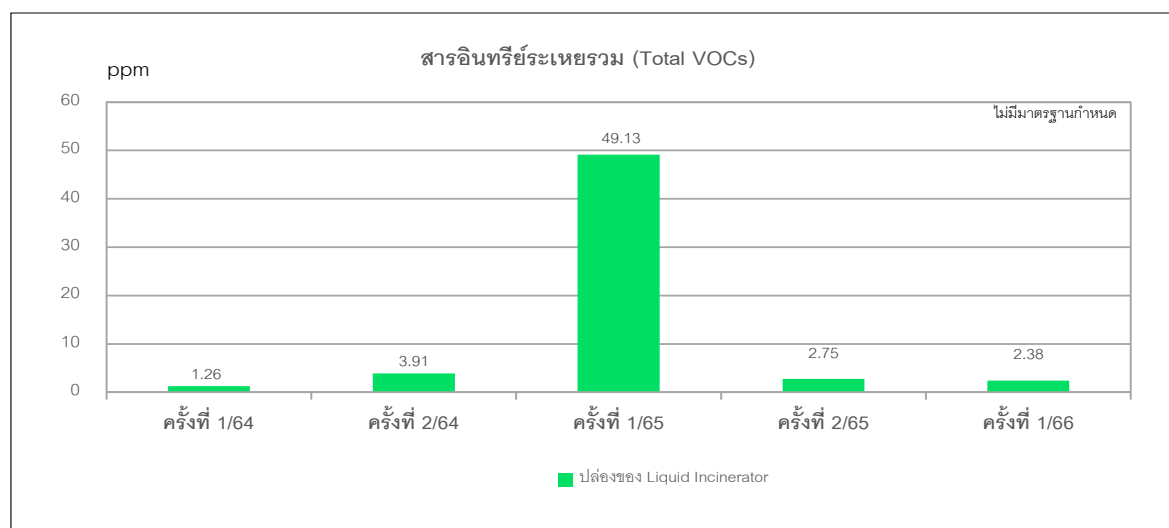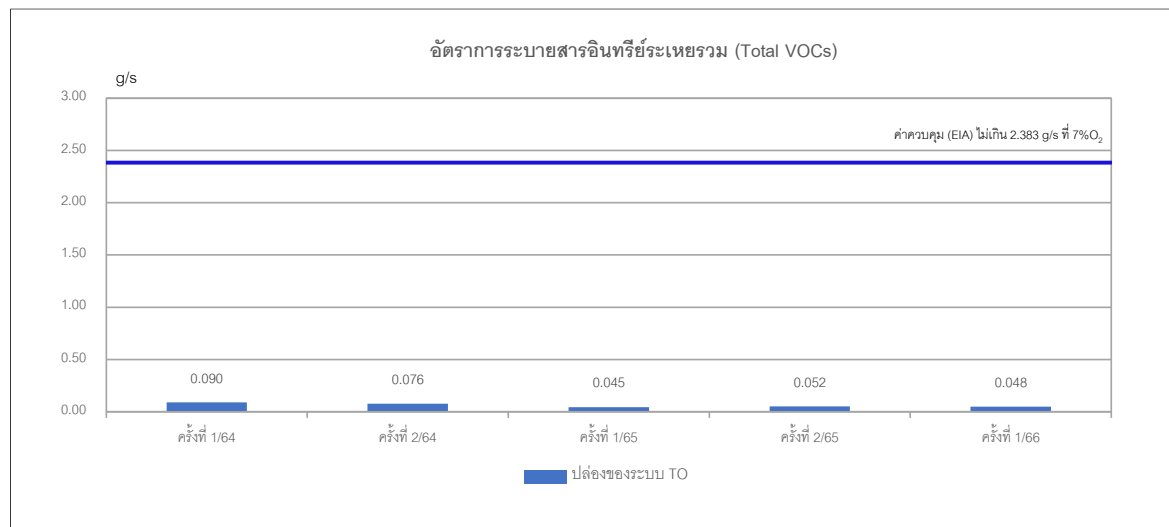

ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย (ต่อ)

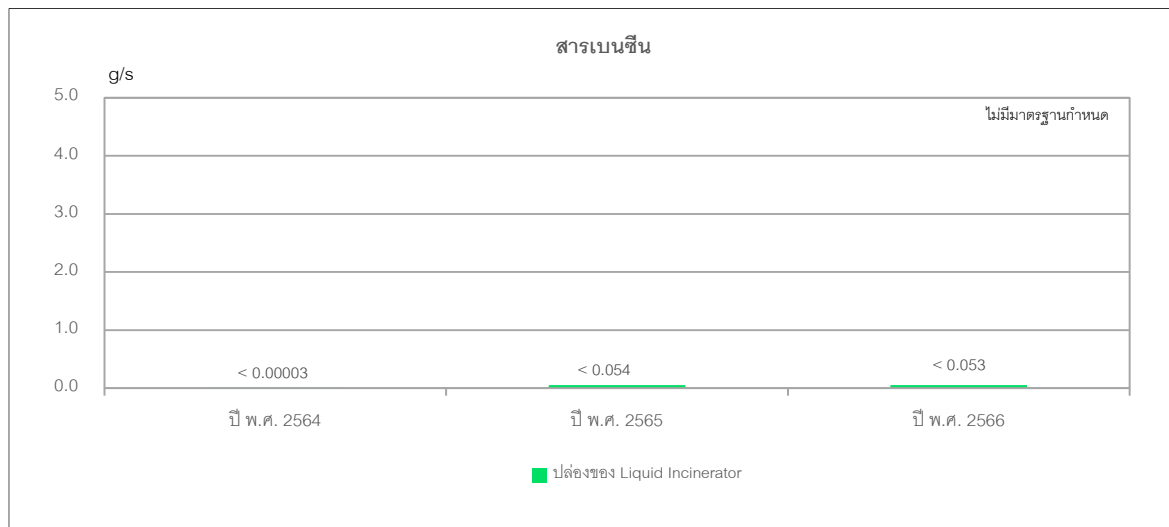

ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย (ต่อ)

4.1.2.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 2 ปล่อง คือ ปล่องของระบบ TO และปล่องของ Liquid Incinerator ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 7 เมษายน 2566 และ 23 มิถุนายน 2566 ที่สภาวะอากาศแห้งความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

- **ปล่องของระบบ TO** พบค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และฝุ่นละอองรวม (TSP) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และมาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 พ.ศ. 2564 สำหรับสารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs) ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- **ปล่องของ Liquid Incinerator** พบมีค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และฝุ่นละอองรวม (TSP) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 และมาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 พ.ศ. 2564 สำหรับสารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs) และเบนซีน (Benzene) ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด


เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 พบว่า

- **ปล่องของระบบ TO** ค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่าลดลง และค่าสารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา

- **ปล่องของ Liquid Incinerator** ค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา สำหรับสารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด (Total VOCs) มีค่าสูงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา และค่าเบนซีน (Benzene) มีค่าคงที่ สำหรับอัตราการระบายความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และสารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด (Total VOCs) ครั้งที่ 1/2566 พบว่า มีอัตราการระบายสูงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในการเก็บตัวอย่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 1/2565) ทางโครงการมีการปิดซ่อมบำรุงเตาเผาจำนวน 1 เตา จึงอาจทำให้ผลตรวจวัดครั้งดังกล่าวมีค่าต่ำกว่าปกติ

4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการโรงงานผลิตโพพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือ บริเวณ Final Check Basin บริเวณ Salt Solution Package และบริเวณ Cooling Water Blowdown Check Basin แผนที่จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง แสดงดังภาพที่ 4.9 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง แสดงดังรูปที่ 4.3

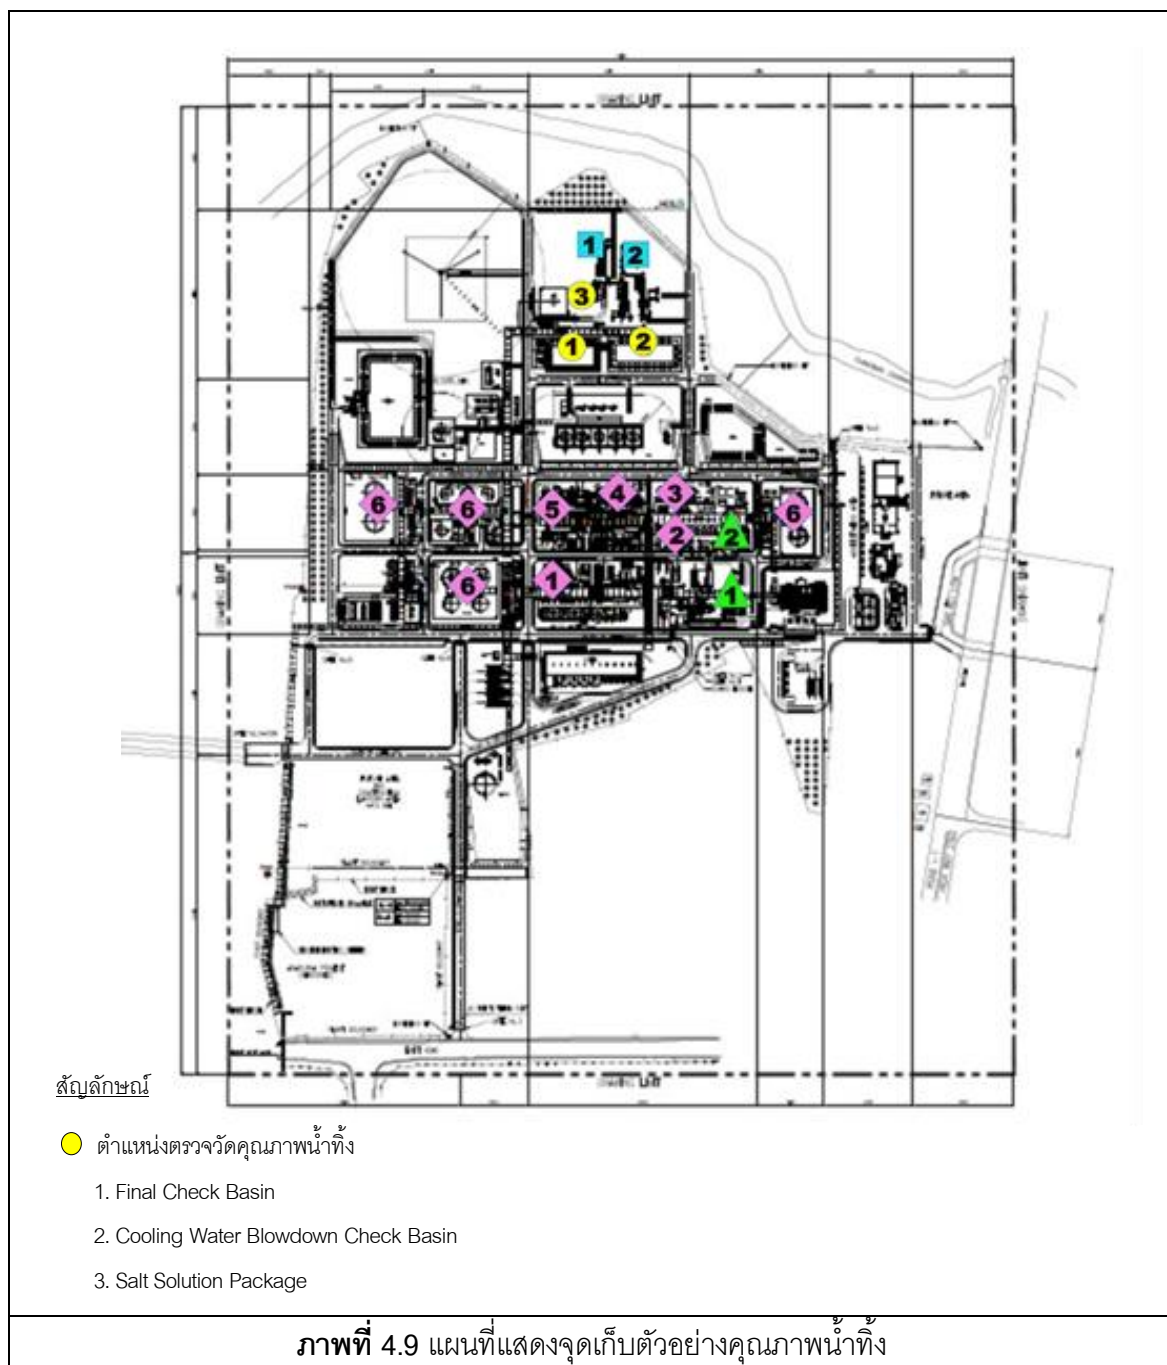

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



บริเวณ Final Check Basin



บริเวณ Salt Solution Package



บริเวณ Cooling Water Blowdown Check Basin

รูปที่ 4.3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

4.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการโรงงานผลิตโพพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือ บริเวณ Final Check Basin บริเวณ Salt Solution Package และบริเวณ Cooling Water Blowdown Check Basin ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 4.8 และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณ Final Check Basin ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731183 UTM 1406370

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						ค่าต่ำสุด-สูงสุด	มาตรฐาน
		Final Check Basin							
		4 ม.ค. 66	ก.พ. 66**	มี.ค. 66**	5 เม.ย. 66	พ.ค. 66**	มิ.ย. 66		
pH	-	8.0	-	-	8.9	-	8.1	8.0-8.9	5.5-9.0
Temperature	°C	27	-	-	31	-	35	27-35	45
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	252	-	-	640	-	194	194-640	3,000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	9	-	-	10	-	7	7-10	200
Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	mg/L	20.2	-	-	3.4	-	68.8	3.4-68.8	500
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	174	-	-	61	-	172	61-174	750
Oil & Grease	mg/L	< 3.0	-	-	< 3.0	-	< 3.0	< 3.0	10
Phenolics	mg/L	0.029	-	-	0.015	-	0.863	0.015-0.863	1

มาตรฐาน : เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (บ่อต้นทาง) ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

หมายเหตุ : ** ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และพฤษภาคม 2566 ไม่มีการเก็บตัวอย่างเนื่องจากโครงการมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อการพาณิชย์ (Commercial shutdown)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึกข้อมูล : นายศุภฤกษ์ พาดกลาง และนางสาวจันทน์ สายพันธ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นายกะวีร์ สุทธทรัพย์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ตารางที่ 4.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณ Cooling Water Blowdown Check Basin

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731286 UTM 1406342

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						ค่าต่ำสุด-สูงสุด	มาตรฐาน
		Cooling Water Blowdown Check Basin							
		4 ม.ค. 66	ก.พ. 66**	มี.ค. 66**	5 เม.ย. 66	พ.ค. 66**	มิ.ย. 66		
pH	-	7.7	-	-	8.0	-	8.4	7.7-8.4	5.5-9.0
Temperature	°C	30	-	-	33	-	36	30-36	45
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	618	-	-	498	-	812	498-812	3,000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	6	-	-	10	-	10	6-10	200
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	40	-	-	48	-	48	40-48	750
Oil & Grease	mg/L	< 3.0	-	-	< 3.0	-	< 3.0	< 3.0	10

มาตรฐาน : เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (บ่อต้นทาง) ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

หมายเหตุ : ** ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และพฤษภาคม 2566 ไม่มีการเก็บตัวอย่างเนื่องจากโครงการมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อการพาณิชย์ (Commercial shutdown)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึกข้อมูล : นายศุภฤกษ์ พาดกลาง และนางสาวจันทน์ สายพันธ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวรรณ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นายกะวีร์ สุทธทรัพย์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ตารางที่ 4.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณ Salt Solution Package

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731235 UTM 1406409

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						ค่าต่ำสุด-สูงสุด	มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾
		Salt Solution Package							
		4 ม.ค. 66	ก.พ. 66**	มี.ค. 66**	5 เม.ย. 66	พ.ค. 66**	มิ.ย. 66		
pH	-	7.8	-	-	8.5	-	8.6	7.8-8.6	5.5-9.0
Temperature	°C	31	-	-	34	-	36	31-36	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	9,875	-	-	11,700	-	17,895	9,875-17,895	*
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	16	-	-	18	-	14	16-18	50
Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	mg/L	< 2.0	-	-	< 2.0	-	< 2.0	< 2.0	20
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	< 40	-	-	< 40	-	< 40	< 40	120
Oil & Grease	mg/L	< 3.0	-	-	< 3.0	-	< 3.0	< 3.0	5
Phenolics	mg/L	0.006	-	-	< 0.005	-	< 0.005	< 0.005-0.006	1

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

* ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

- คลองบางเบ็ด บริเวณระยะห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 500 เมตร มีค่า Total Dissolved Solids ในเดือนมกราคม 2566 = 38,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
- คลองบางเบ็ด บริเวณระยะห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 500 เมตร มีค่า Total Dissolved Solids ในเดือนเมษายน 2566 = 42,060 มิลลิกรัมต่อลิตร
- คลองบางเบ็ด บริเวณระยะห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 500 เมตร มีค่า Total Dissolved Solids ในเดือนมิถุนายน 2566 = 41,160 มิลลิกรัมต่อลิตร

หมายเหตุ : ** ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และพฤษภาคม 2566 ไม่มีการเก็บตัวอย่างเนื่องจากโครงการมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อการพานิชย์ (Commercial shutdown)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึกข้อมูล : นายศุภฤกษ์ พาดกลาง และนางสาวจันทนี สายพันธ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นายกะวีร์ สุธาทิพย์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

โครงการโรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณ Final Check Basin

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731183 UTM 1406370

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์					มาตรฐาน
		Final Check Basin					
		ครั้งที่ 1/2564	ครั้งที่ 2/2564	ครั้งที่ 1/2565	ครั้งที่ 2/2565	ครั้งที่ 1/2566	
pH	-	6.67-8.4	7.1-8.7	7.1-8.8	6.4-8.6	8.0-8.9	5.5-9.0
Temperature	°C	28.0-32.8	29-34	28-32	28-35	27-35	45
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	254-549	156-704	328-740	63-712	194-640	3,000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	8-20	5-44	< 5-19	7-29	7-10	200
Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	mg/L	2-33.7	< 2.0-70.7	5.2-138	12.8-149	3.4-68.8	500
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	34-98	< 40-223	< 40-300	< 40-414	61-174	750
Oil & Grease	mg/L	< 3.0-1.5	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	10
Phenolics	mg/L	< 0.001-0.009	< 0.005-0.316	< 0.005-0.333	< 0.005-0.945	0.015-0.863	1

มาตรฐาน : เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (บ่อดักตะกอน) ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

หมายเหตุ : ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/2564 ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณ Cooling Water Blowdown Check Basin

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731286 UTM 1406342

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์					มาตรฐาน
		Cooling Water Blowdown Check Basin					
		ครั้งที่ 1/2564	ครั้งที่ 2/2564	ครั้งที่ 1/2565	ครั้งที่ 2/2565	ครั้งที่ 1/2566	
pH	-	6.6-8.97	7.4-8.5	7.1-8.0	7.0-8.3	7.7-8.4	5.5-9.0
Temperature	°C	30-37.0	30-38	29-36	28-37	30-36	45
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	454-888	670-1,060	382-996	472-848	498-812	3,000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	< 2.5-11	< 5-7	< 5-11	< 5-16	6-10	200
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	< 40-57	< 40-56	< 40-109	< 40-108	40-48	750
Oil & Grease	mg/L	< 3.0-0.7	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	10

มาตรฐาน : เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (บ่อต้นทาง) ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

หมายเหตุ : ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/2564 ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 4.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณ Salt Solution Package ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731235 UTM 1406409

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์					มาตรฐาน ^{(1),(2)}
		Salt Solution Package					
		ครั้งที่ 1/2564	ครั้งที่ 2/2564	ครั้งที่ 1/2565	ครั้งที่ 2/2565	ครั้งที่ 1/2566	
pH	-	7.02-8.22	7.2-8.4	7.9-8.3	7.7-8.2	7.8-8.6	5.5-9.0
Temperature	°C	28-35.9	30-32	30-32	30-34	31-36	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	192-1,128	312-16,850	276-6,380	10,940-16,440	9,875-17,895	*
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	< 2.5-7.0	< 5-26	< 5-11	5-10	16-18	50
Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	mg/L	< 1-< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	20
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	< 40-12	< 40	< 40	< 40	< 40	120
Oil & Grease	mg/L	< 3.0-0.7	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	5
Phenolics	mg/L	< 0.001-0.029	< 0.005-0.045	< 0.005-0.018	< 0.005-0.110	< 0.005-0.006	1

มาตรฐาน : ⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560




⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

* ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร




คลองบางเบิด บริเวณระยะห่างจากจุดระบายน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 500 เมตร มีค่า Total Dissolved Solids ดังนี้

ม.ค. 64	35,120 mg/L	ก.พ. 64	32,920 mg/L	มี.ค. 64	35,420 mg/L	เม.ย. 64	34,260 mg/L	พ.ค. 64	35,680 mg/L	มิ.ย. 64	36,680 mg/L
ก.ค. 64	34,380 mg/L	ส.ค. 64	37,760 mg/L	ก.ย. 64	32,100 mg/L	ต.ค. 64	32,280 mg/L	พ.ย. 64	30,460 mg/L	ธ.ค. 64	32,680 mg/L
ม.ค. 65	37,400 mg/L	ก.พ. 65	38,500 mg/L	มี.ค. 65	39,680 mg/L	เม.ย. 65	41,320 mg/L	ส.ค. 65	37,140 mg/L	ก.ย. 65	37,260 mg/L
ต.ค. 65	32,340 mg/L	ม.ค. 66	38,500 mg/L	เม.ย. 66	42,060 mg/L	มิ.ย. 66	41,1160 mg/L				




- หมายเหตุ** :
1. ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/2564 ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 2. ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/2565 บริเวณ Salt Solution Package ไม่มีการติดตามตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2565 เนื่องจากระบบไม่มีการทำงาน
 3. ผลตรวจวัดครั้งที่ 2/2565 บริเวณ Salt Solution Package ไม่มีการติดตามตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม และ ธันวาคม 2565 เนื่องจากระบบไม่มีการทำงาน
และในเดือนพฤศจิกายน 2565 ไม่มีการเก็บตัวอย่างเนื่องจากโครงการมีการหยุดกิจกรรมการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Shutdown/Turnaround)
 4. ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/2566 ในเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และพฤษภาคม 2566 ไม่มีการเก็บตัวอย่างเนื่องจากโครงการมีการหยุดกิจกรรมการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Shutdown/Turnaround)

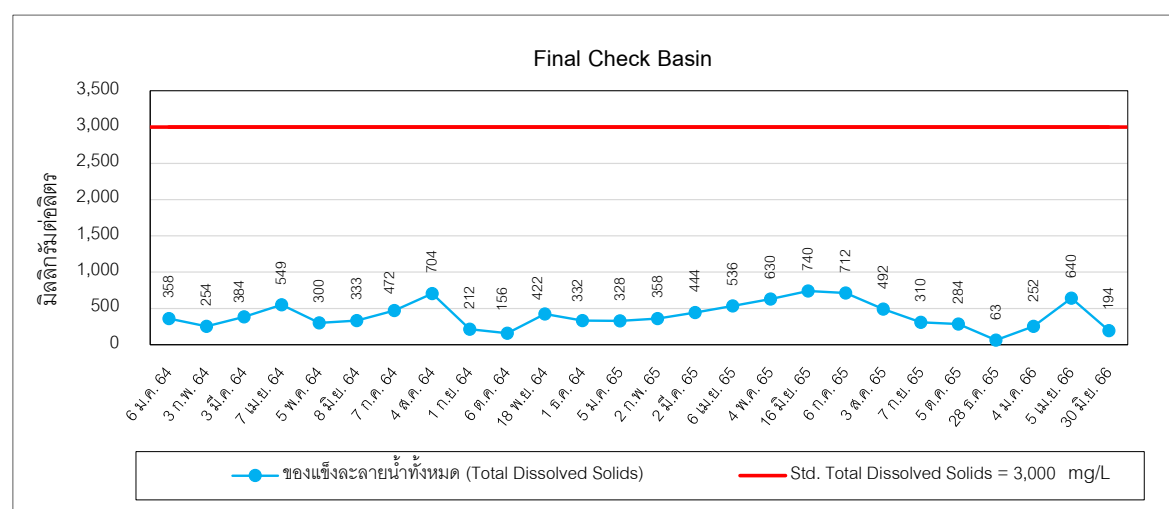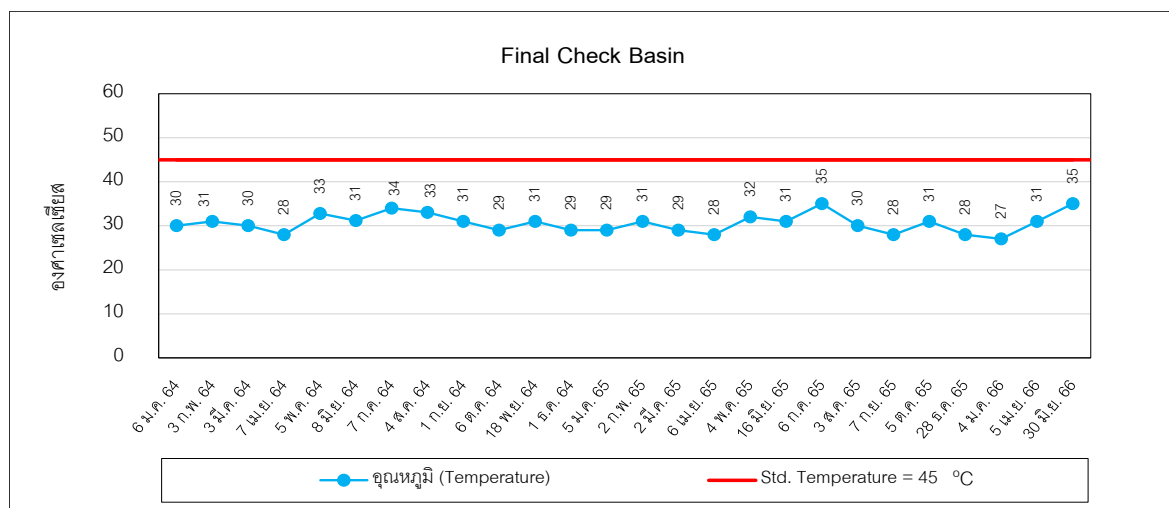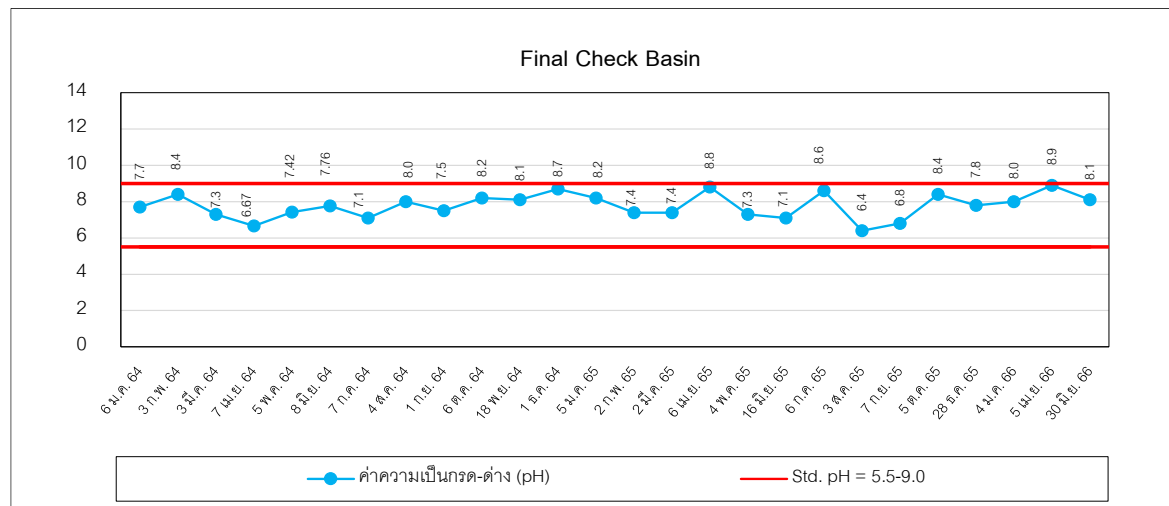




ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

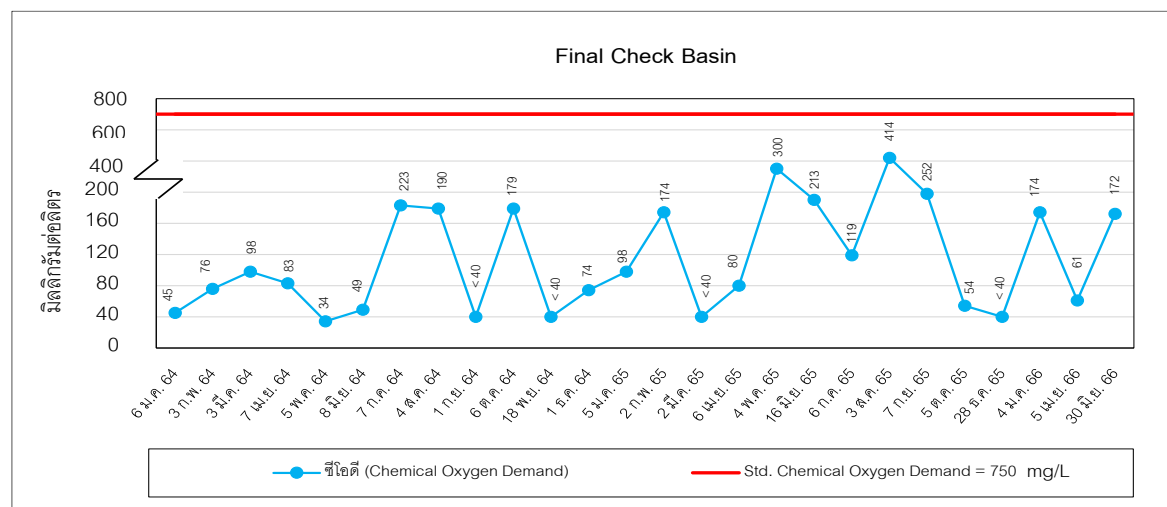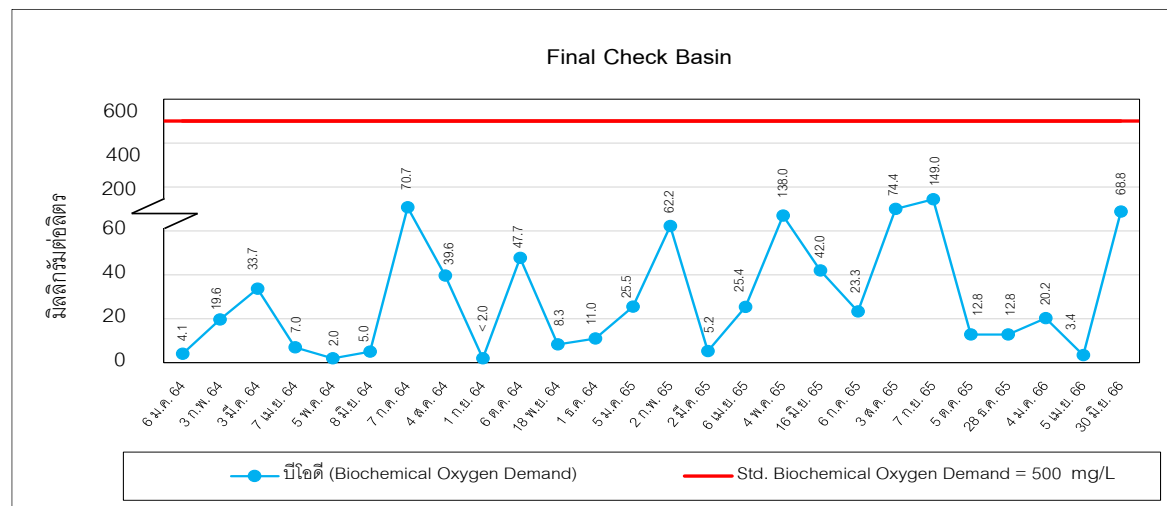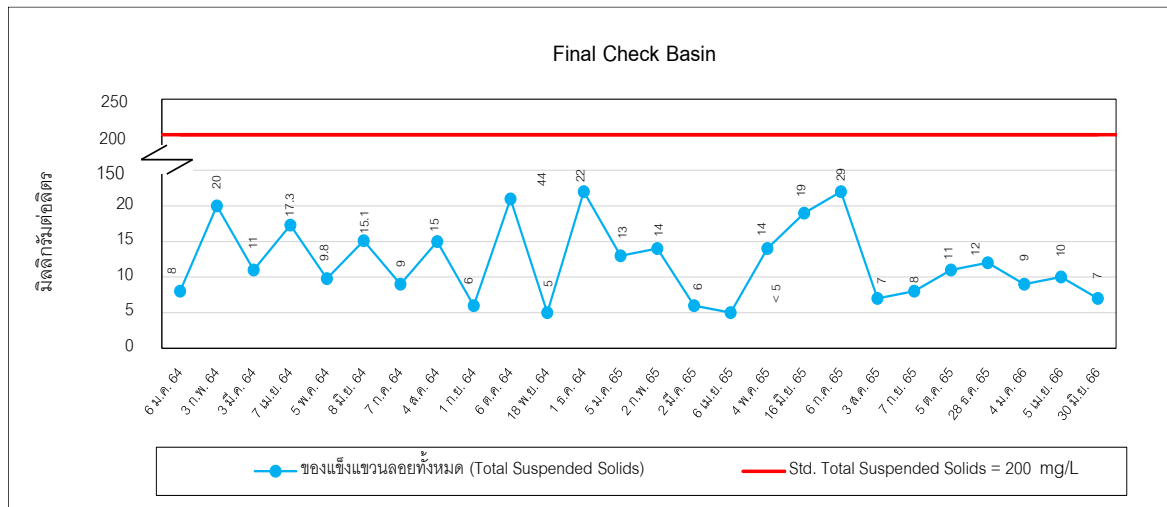




ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

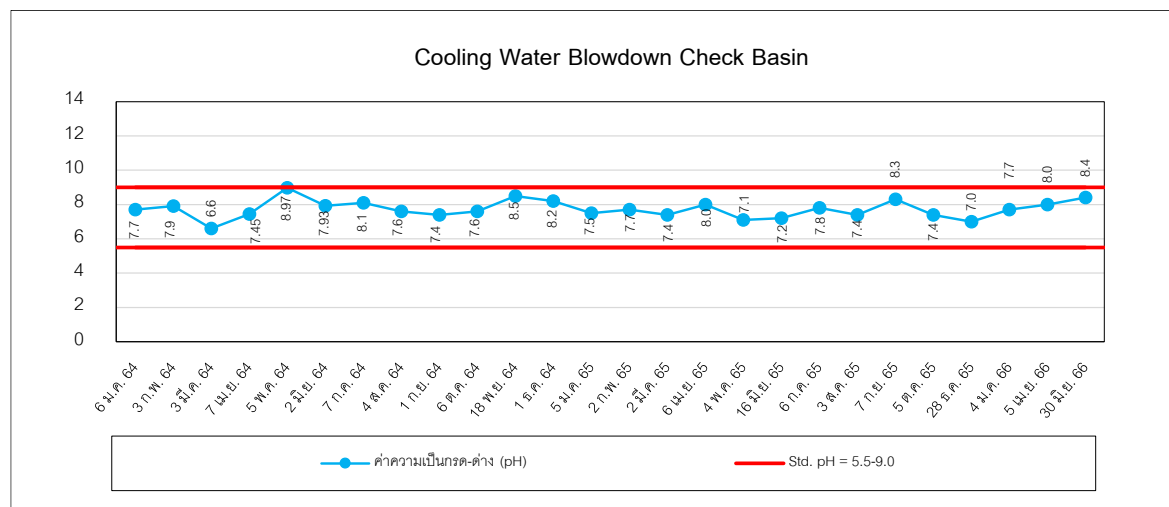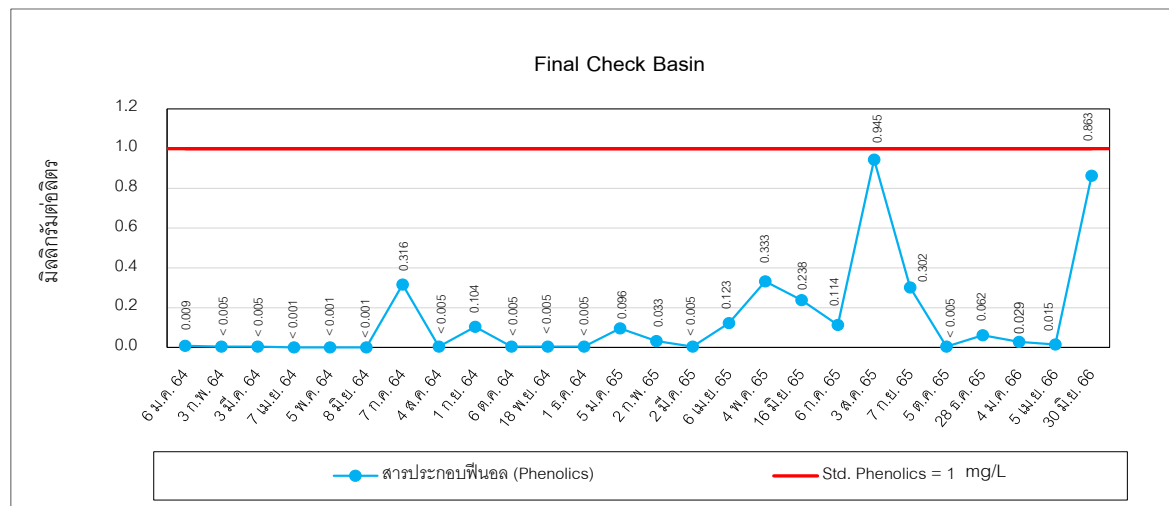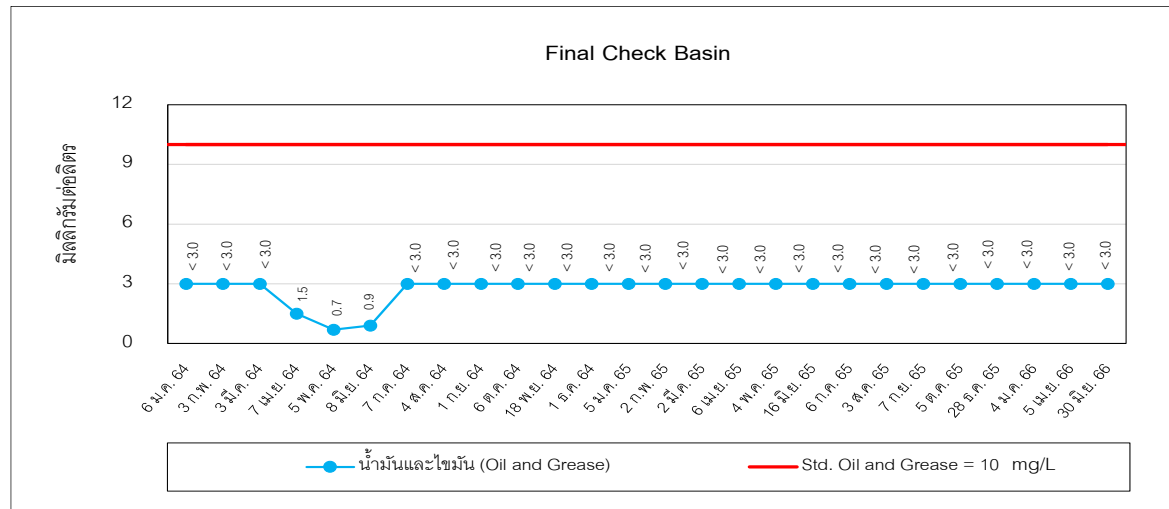


ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

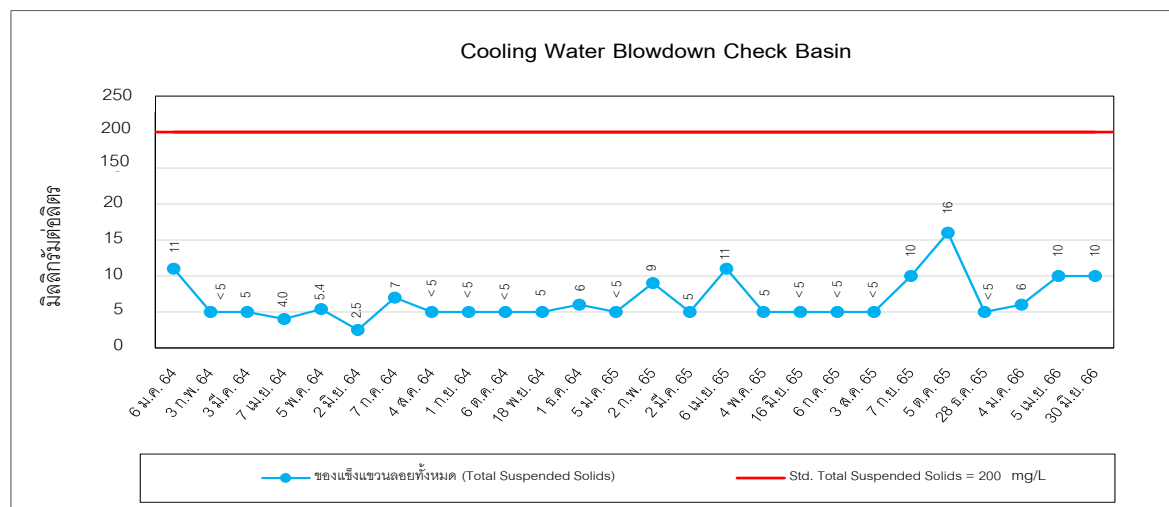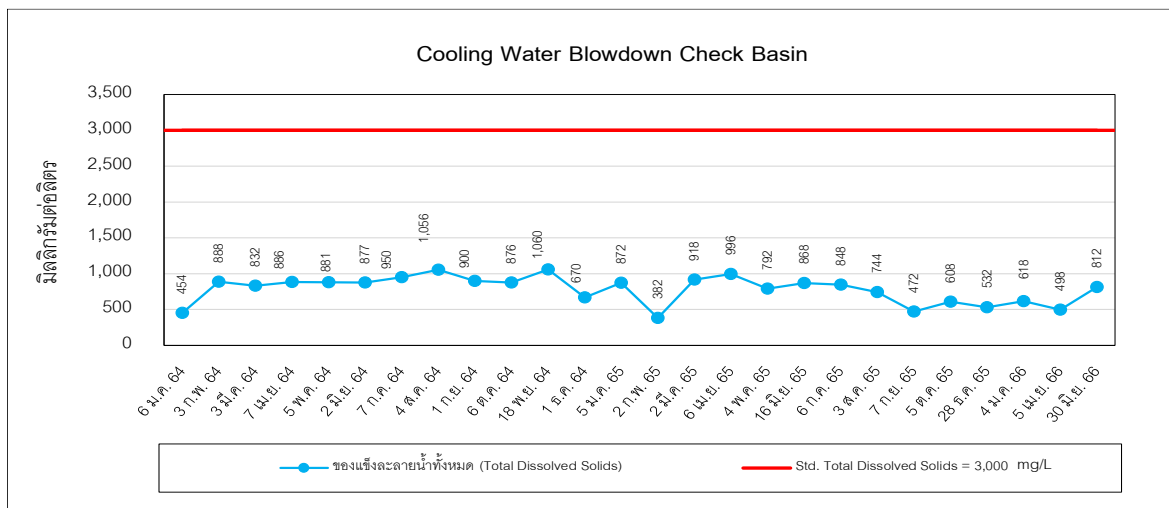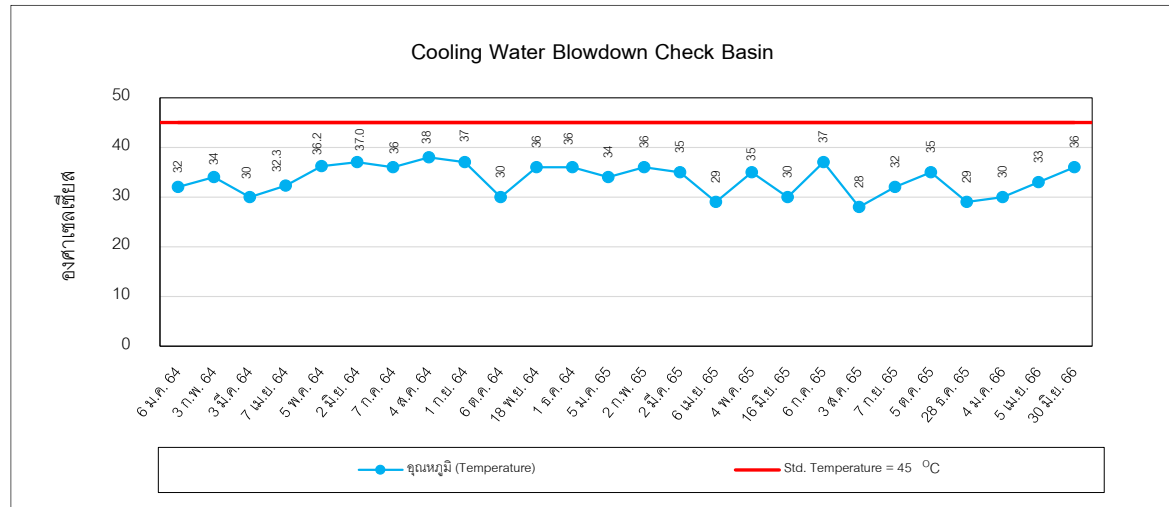




ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

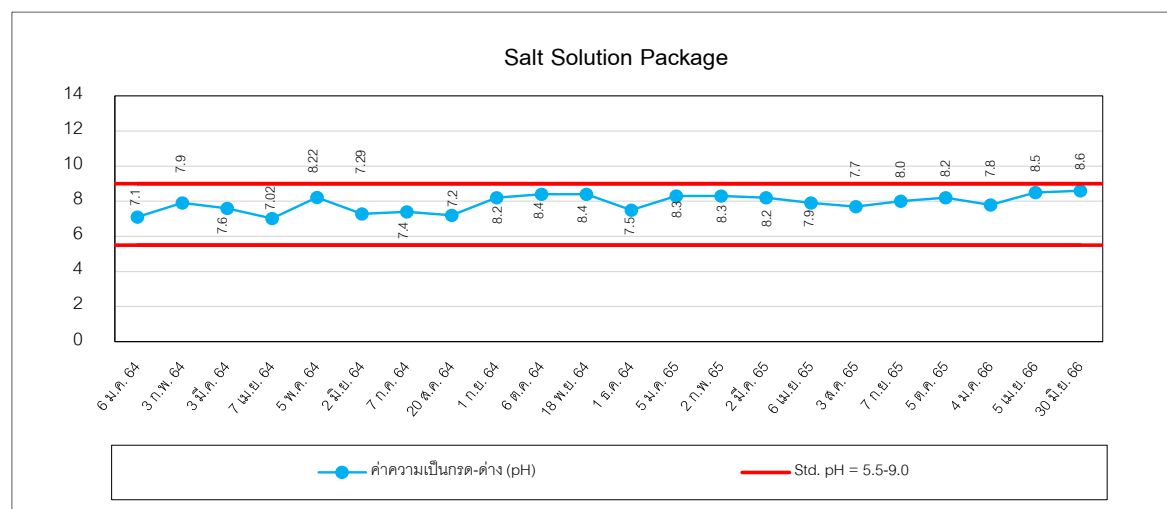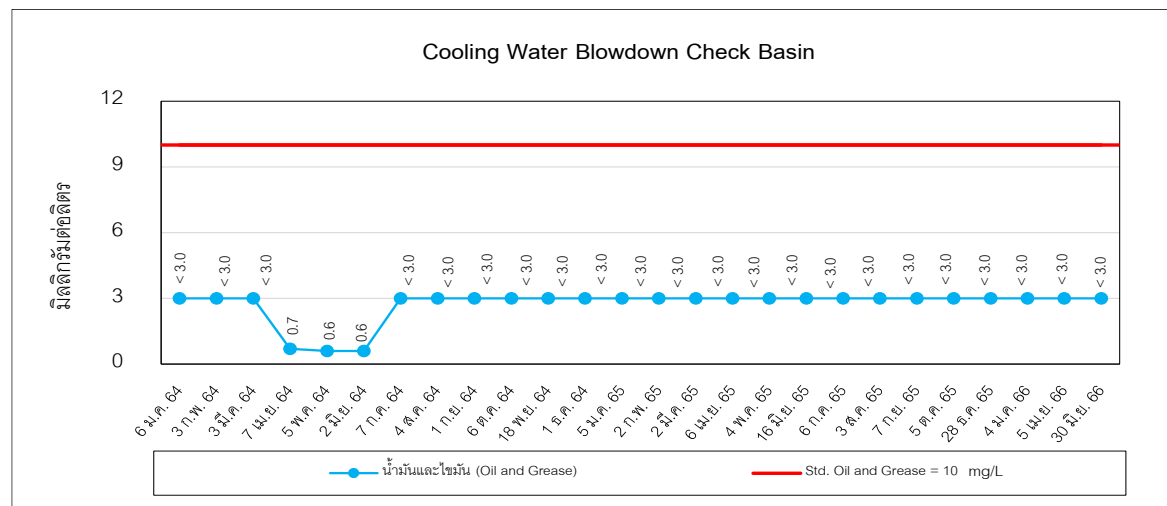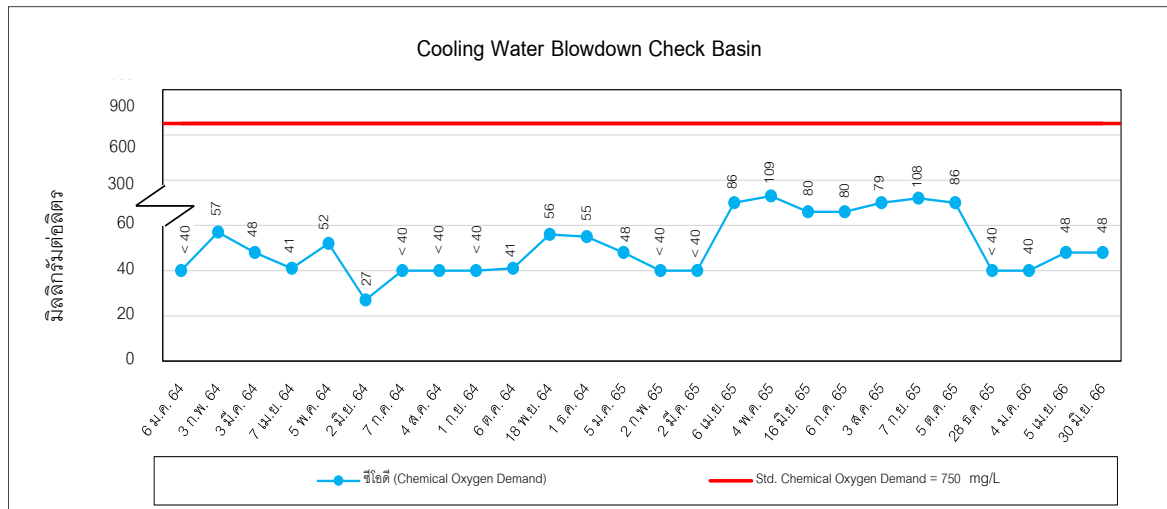


ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

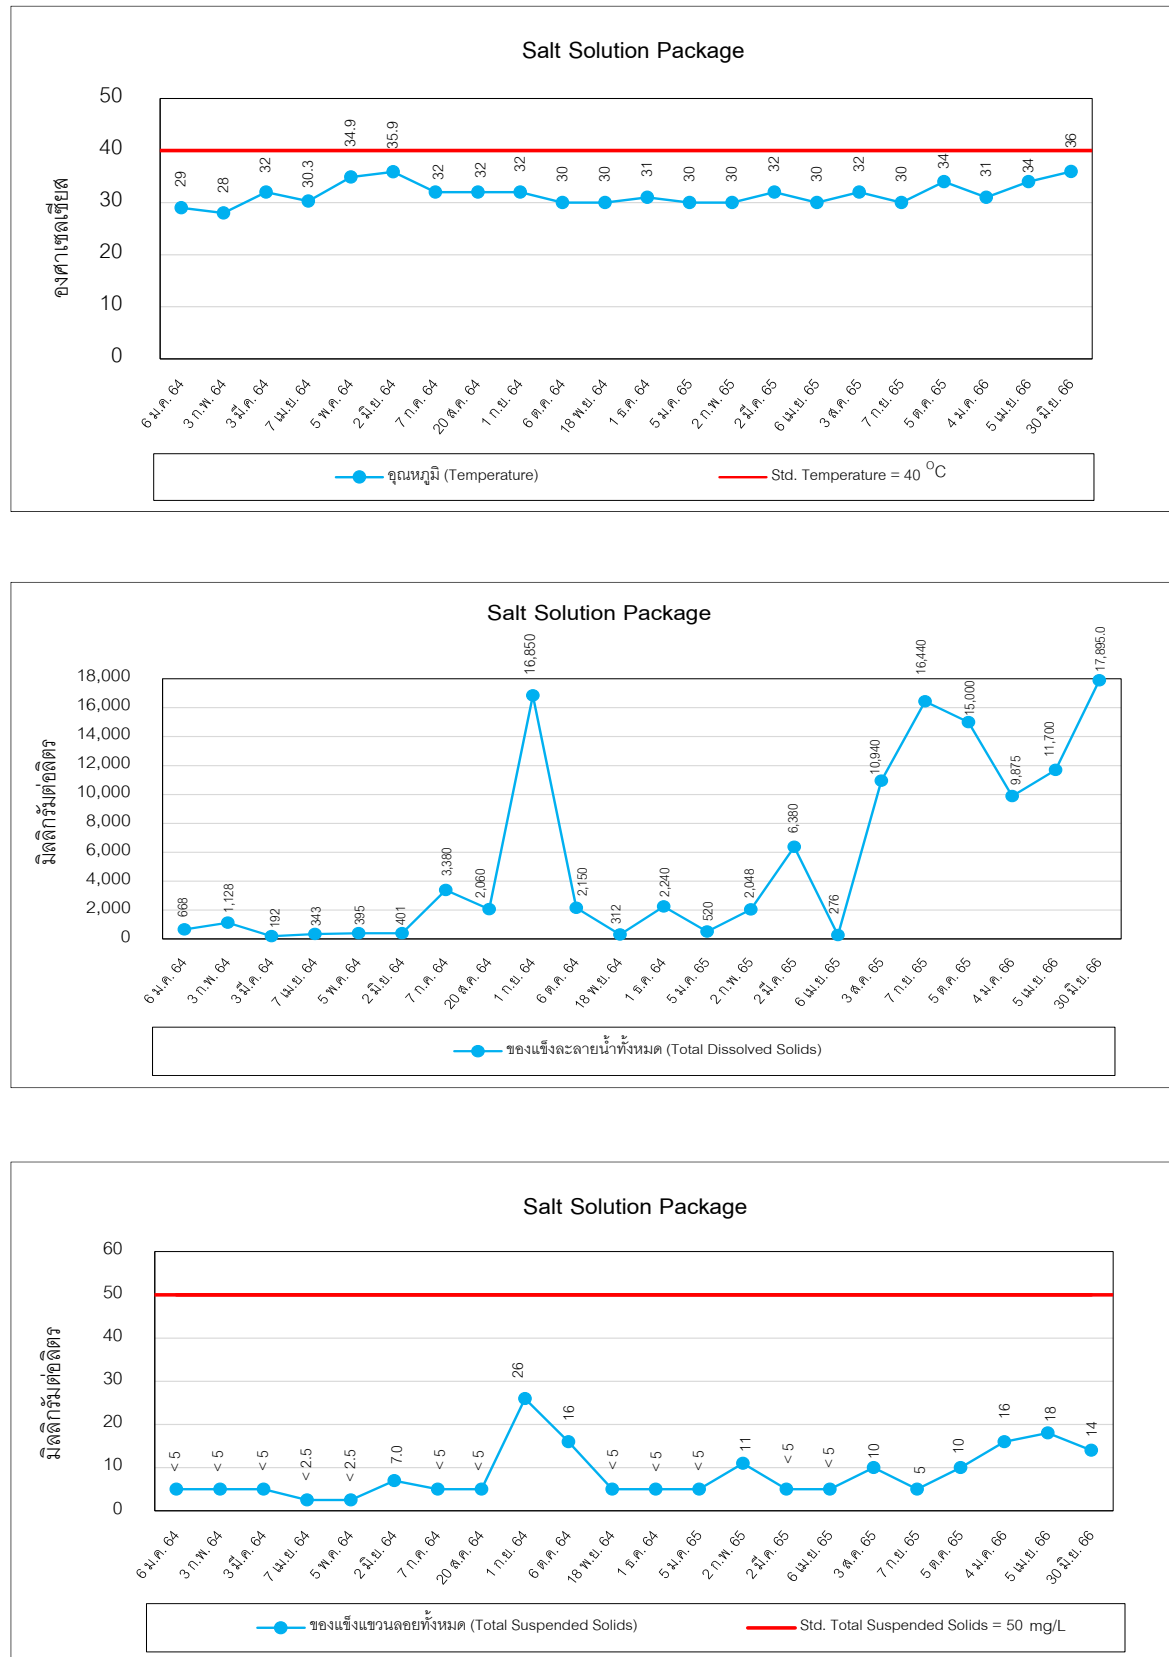

ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

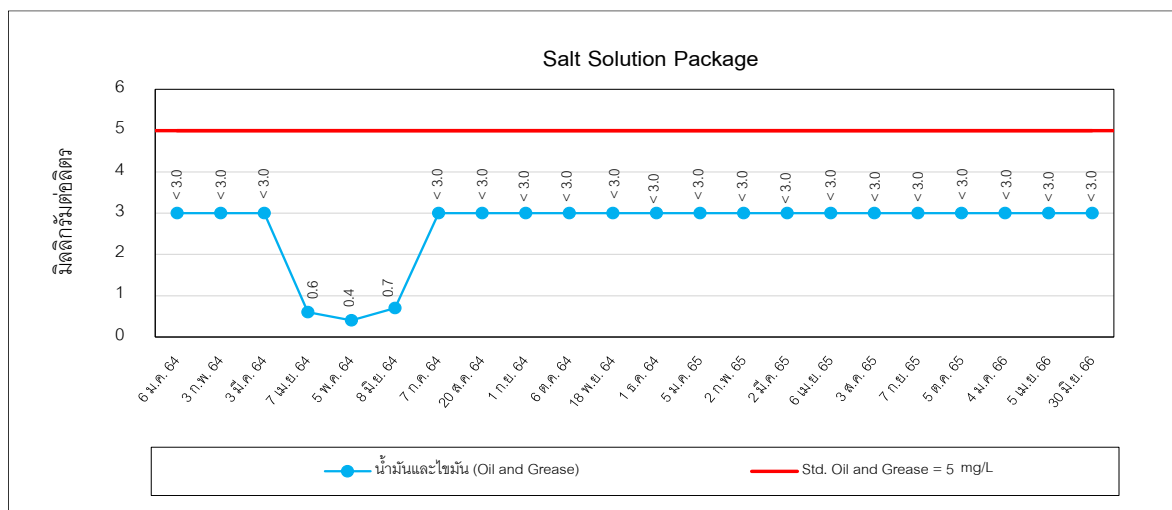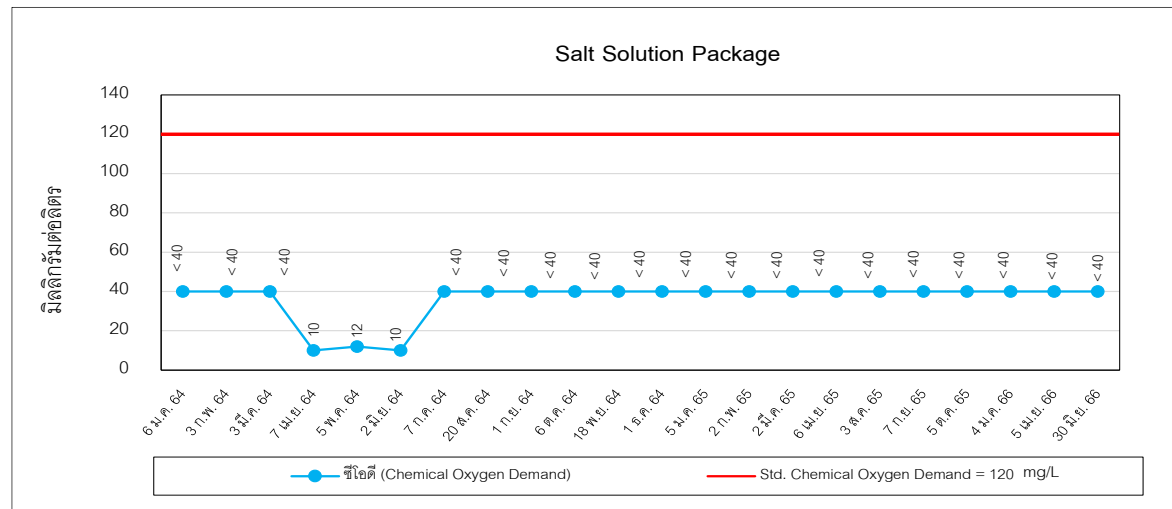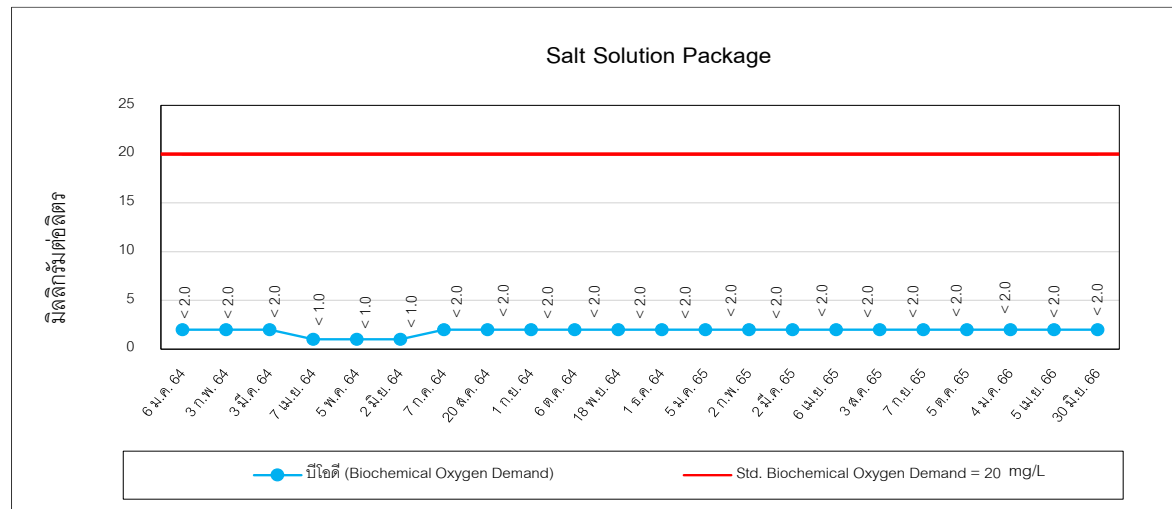

ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

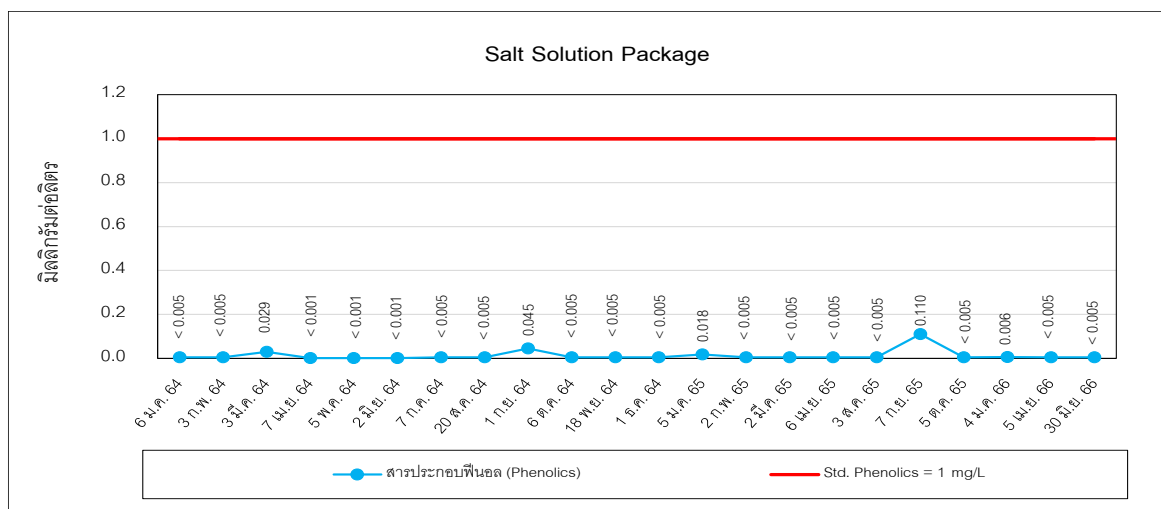

ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

4.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือ บริเวณ Final Check Basin บริเวณ Salt Solution Package และบริเวณ Cooling Water Blowdown Check Basin ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า ทุกรายการทดสอบ บริเวณ Final Check Basin และ Cooling Water Blowdown Check Basin มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (บ่อดักตะกอน) ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) สำหรับบริเวณ Salt Solution Package ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ที่กำหนดไว้

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 พบว่า

- บริเวณ Final Check Basin รายการทดสอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยกเว้น TDS TSS BOD และ COD มีแนวโน้มลดลงจากครั้งที่ผ่านมา
- บริเวณ Cooling Water Blowdown Check Basin ทุกรายการทดสอบมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมา ยกเว้น TDS TSS และ COD มีแนวโน้มลดลงจากครั้งที่ผ่านมา
- บริเวณ Salt Solution Package รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้น TDS และ TSS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วน Phenolic มีแนวโน้มลดลงจากครั้งที่ผ่านมา

4.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ของโครงการโรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 กำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง จำนวน 3 จุด คือ บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ และบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน แสดงดังภาพที่ 4.11 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 4.4 สำหรับปี 2566 จะดำเนินการตรวจวัดช่วงปลายปี จะรายงานให้ทราบต่อไป

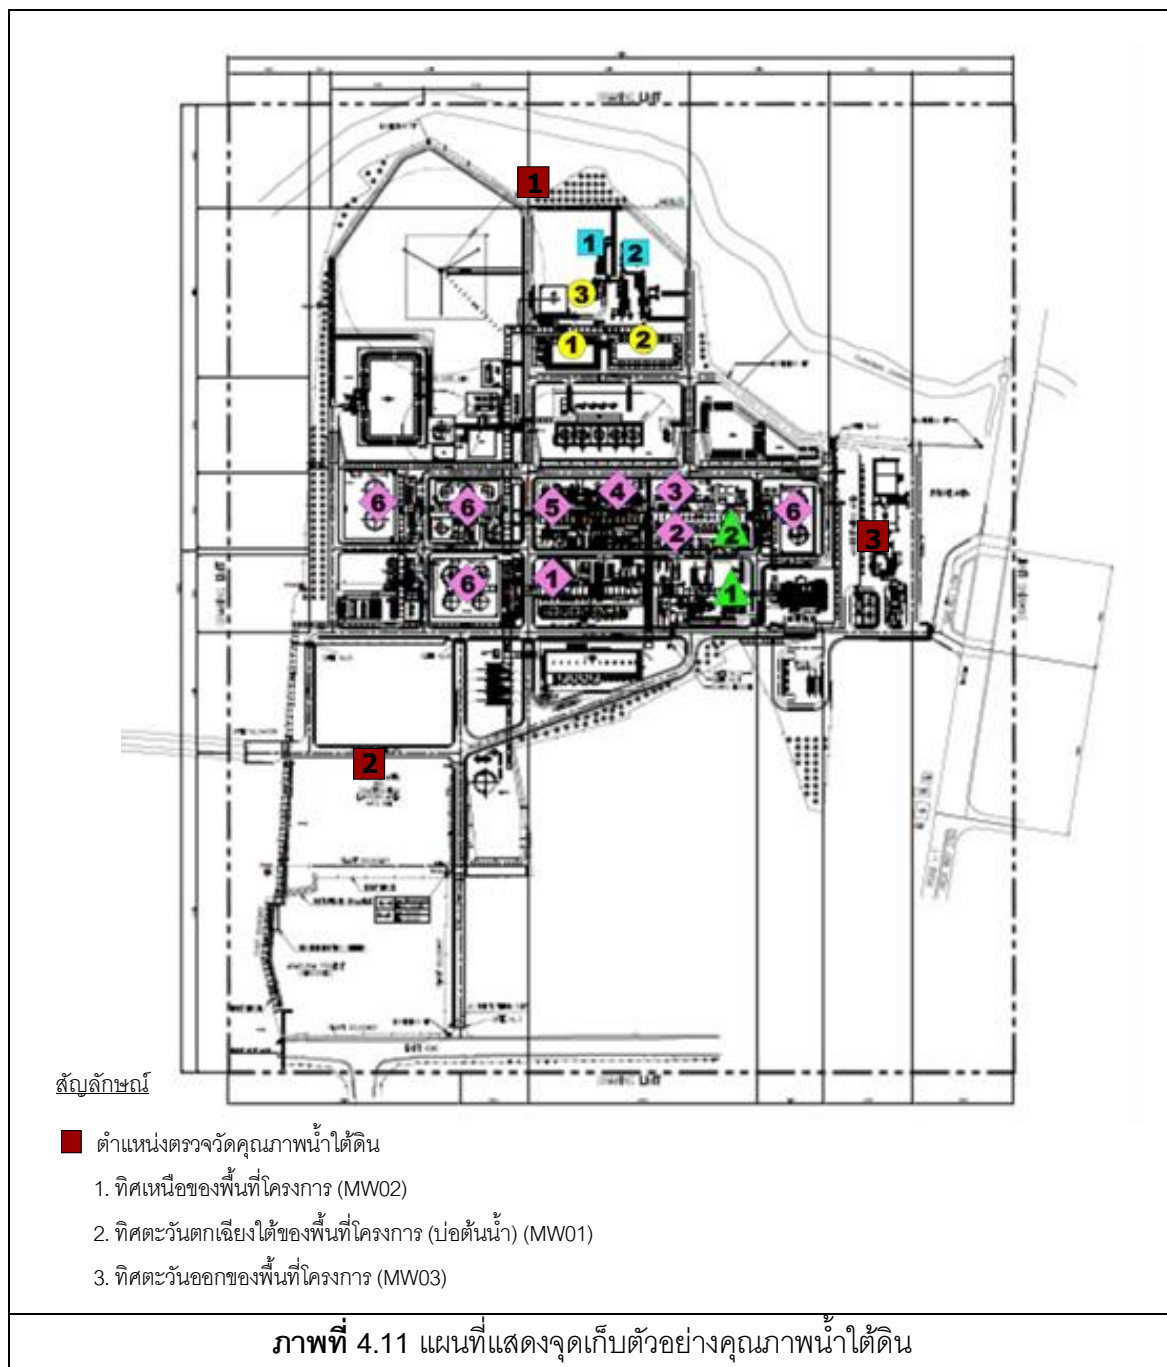

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน



ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (MW02)



ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ (บ่อดักน้ำ) (MW01)



ทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (MW03)

รูปที่ 4.4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ของโครงการโรงงานผลิตโพธิ์พินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือ บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ และบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แสดงดัง **ตารางที่ 4.10** และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินประจำปี พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2565 แสดงดัง **ตารางที่ 4.11** สำหรับปี พ.ศ. 2566 จะดำเนินการช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป

ตารางที่ 4.10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (MW02)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731228 UTM 1406508

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ (บ่อต้นน้ำ) (MW01)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0730877 UTM 1406047

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (MW03)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731433 UTM 1406036

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์ วันที่ 1 มิ.ย. 65			มาตรฐาน
		บริเวณทิศเหนือ ของพื้นที่โครงการ (MW02)	บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของพื้นที่โครงการ (บ่อต้นน้ำ) (MW01)	บริเวณทิศตะวันออก ของพื้นที่โครงการ (MW03)	
pH	-	6.9	6.5	6.8	*
Acetone	mg/L	ND	0.002	ND	230
Ethylbenzene	mg/L	ND	ND	ND	2.0
Total Petroleum (TPH)					
- TPH C5-C8	mg/L	ND	ND	ND	1.4
- TPH C>8-C16	mg/L	ND	ND	ND	1.7
- TPH C>16-C35	mg/L	ND	ND	ND	0.1

หมายเหตุ : ND หมายถึง Not Detected [MDL of Acetone = < 0.001 mg/l, Ethylbenzene = < 0.0002 mg/l, Total Petroleum (TPH) (TPH C5-C8 = < 0.003 mg/l, TPH C>8-C16 = < 0.025 mg/l, TPH C>16-C35 = < 0.050 mg/l)]

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

* ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

ตารางที่ 4.11 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2565

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (MW02)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731228 UTM 1406508

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ (บ่อน้ำ) (MW01)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0730877 UTM 1406047

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (MW03)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731433 UTM 1406036

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์						มาตรฐาน
		บริเวณทิศเหนือ ของพื้นที่โครงการ (MW02)		บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของพื้นที่โครงการ (บ่อน้ำ) (MW01)		บริเวณทิศตะวันออก ของพื้นที่โครงการ (MW03)		
		ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565	ปี พ.ศ. 2564	ปี พ.ศ. 2565	
pH	-	6.91	6.9	6.80	6.5	6.73	6.8	*
Acetone	mg/L	< 0.0005	ND	< 0.0005	0.002	< 0.0005	ND	230
Ethylbenzene	mg/L	< 0.0005	ND	< 0.0005	ND	< 0.0005	ND	2.0
Total Petroleum (TPH)								
- TPH C5-C8	mg/L	< 0.0005	ND	< 0.0005	ND	< 0.0005	ND	1.4
- TPH C>8-C16	mg/L	< 0.01	ND	< 0.01	ND	< 0.01	ND	1.7
- TPH C>16-C35	mg/L	< 0.01	ND	< 0.01	ND	< 0.01	ND	0.1

หมายเหตุ : 1. ND หมายถึง Not Detected [MDL of Acetone = < 0.001 mg/l, Ethylbenzene = < 0.0002 mg/l, Total Petroleum (TPH) -TPH C5-C8 = < 0.003 mg/l, TPH C>8-C16 = < 0.025 mg/l, TPH C>16-C35 = < 0.050 mg/l]

2. ผลประจำปี พ.ศ. 2564 ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

* ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2


4.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ของโครงการโรงงานผลิตโพพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือ บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ และบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ดำเนินการตรวจวัดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรฐานลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 สำหรับปี พ.ศ. 2566 จะดำเนินการช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2565 พบว่า รายการทดสอบบริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (MW02) บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ (MW01) และบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (MW03) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา

4.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือ บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ และบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ โดยมาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดทุก 3 ปี ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน แสดงดัง **ภาพที่ 4.12** และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน แสดงดัง **รูปที่ 4.5** และมีแผนดำเนินการตรวจวัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2567

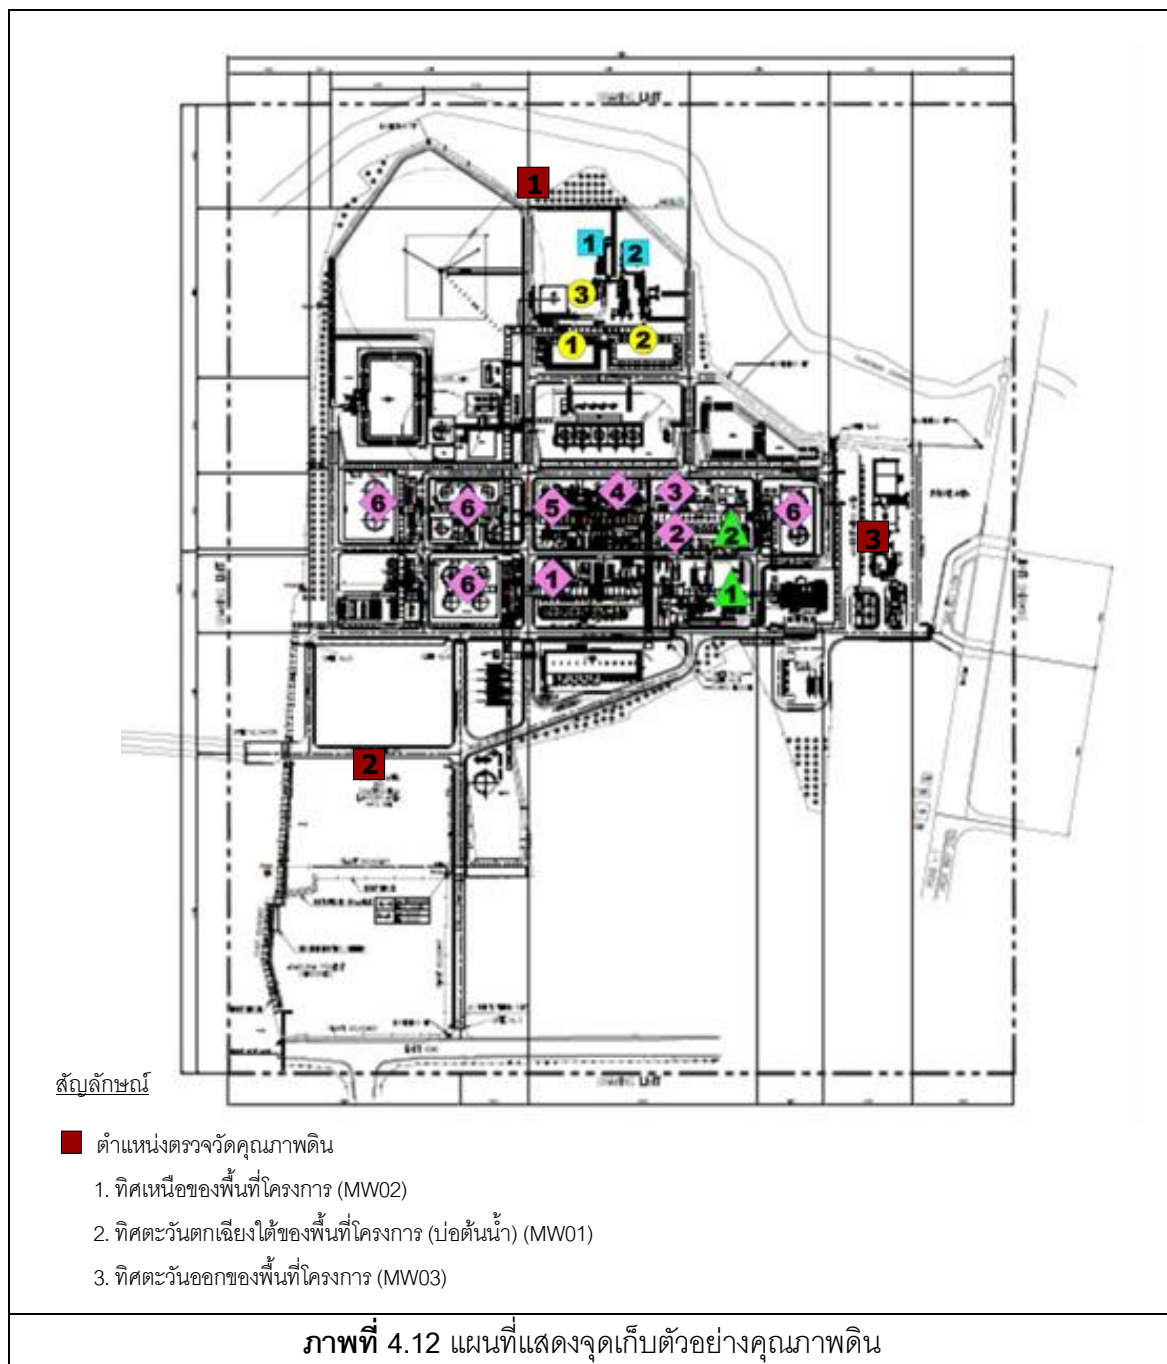

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน



ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (MW02)



ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ (บ่อดักน้ำ) (MW01)



ทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (MW03)

รูปที่ 4.5 การเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน

4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือ บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ และบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แสดงดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (MW02)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731233 UTM 1406501

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ (บ่อน้ำ) (MW01)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0730875 UTM 1406049

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (MW03)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 47P 0731435 UTM 1406039

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์ วันที่ 25 มิ.ย. 64			มาตรฐาน	
		บริเวณทิศเหนือ ของพื้นที่โครงการ (MW02)	บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของพื้นที่โครงการ (บ่อน้ำ) (MW01)	บริเวณทิศตะวันออก ของพื้นที่โครงการ (MW03)	(1)	(2)
pH	-	6.76	6.93	6.59	-	-
Acetone	mg/kg	< 0.005	< 0.005	< 0.005	1,000	-
Ethylbenzene	mg/kg	< 0.001	< 0.001	< 0.001	230	19,350
Total Petroleum (TPH)						
- TPH C5-C8	mg/kg	< 0.001	< 0.001	< 0.001	25	-
- TPH C>8-C16	mg/kg	< 0.1	< 0.1	< 0.1	25	-
- TPH C>16-C35	mg/kg	< 0.1	< 0.1	< 0.1	8.0	-

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยบริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

4.4.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ของโครงการโรงงานผลิตโพพิลีนออกไซด์ บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือ บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ และบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรฐานลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564

4.5 คมนาคม


มาตรการกำหนดให้โครงการจัดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ รวมถึงสาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำตลอดช่วงดำเนินการ โดยในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่พบอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการและเส้นทางการขนส่ง รายละเอียดแสดงดัง **ภาคผนวก 71ข**

มาตรการกำหนดให้โครงการจัดบันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอดช่วงดำเนินการ โดยรายละเอียดแสดงดัง **ภาคผนวก 72ข**

4.6 การตรวจวัดระดับเสียง

4.6.1 การตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

การตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก แผนที่จุดตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน แสดงดังภาพที่ 4.13 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน แสดงดังรูปที่ 4.6

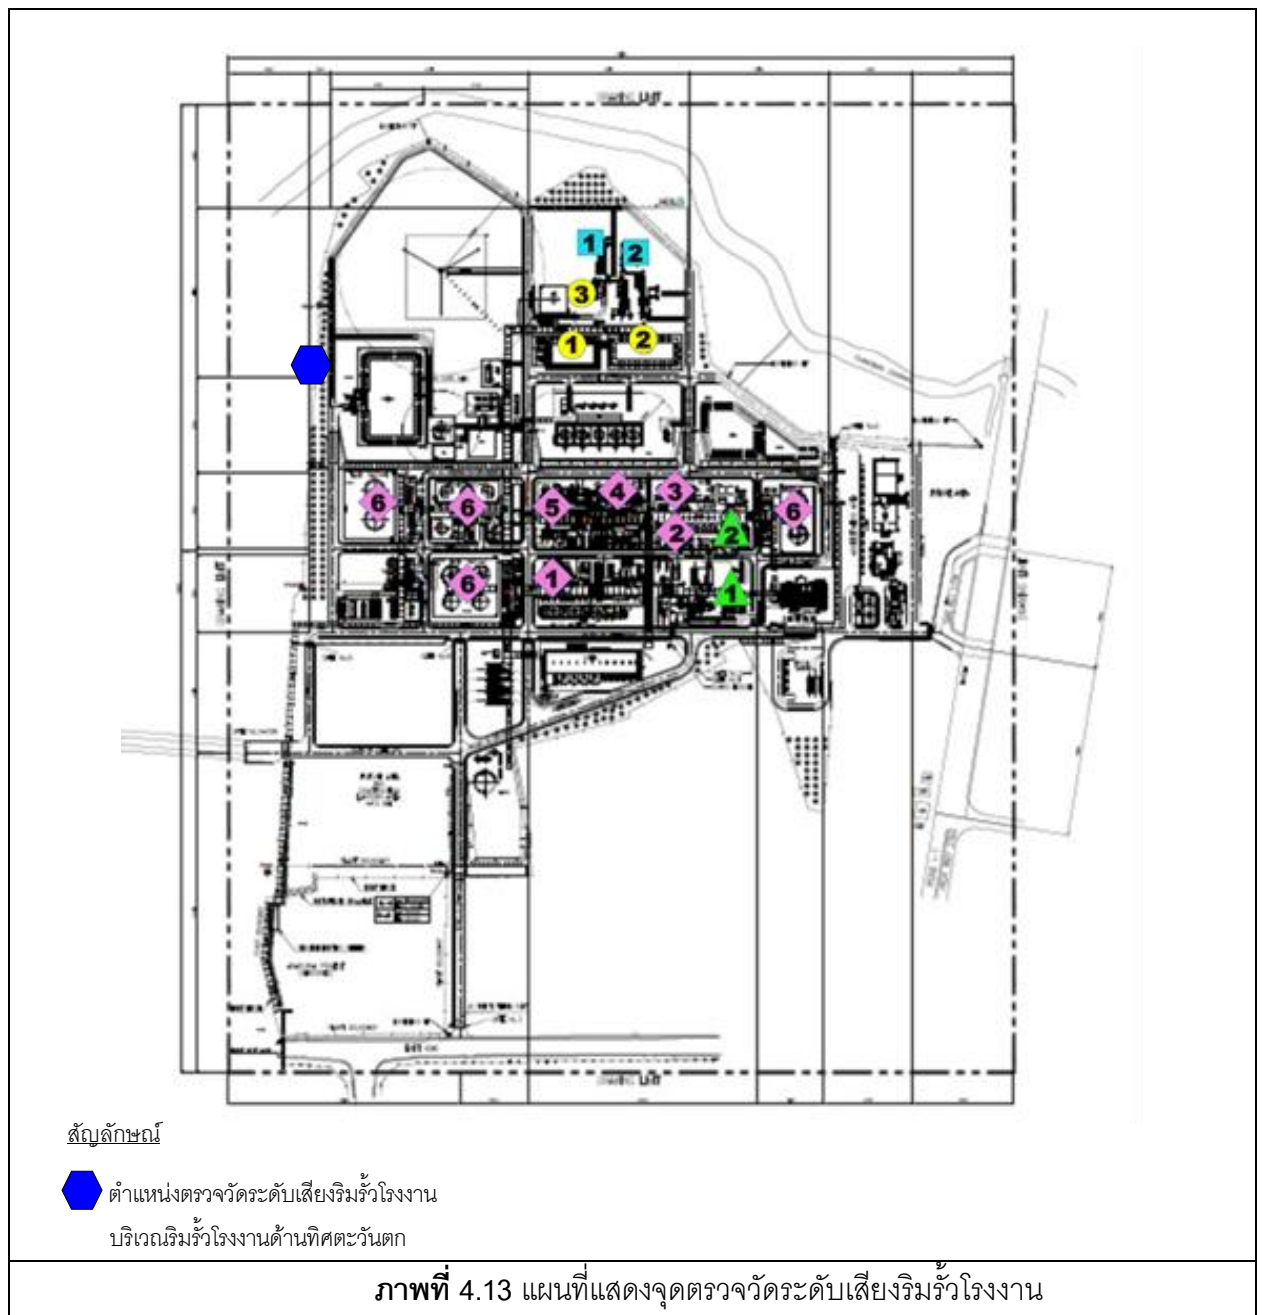

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน



รูปที่ 4.6 การตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน บริเวณ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก

4.6.1.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการโรงงานผลิตโพธิ์พินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน 2566 แสดงดังตารางที่ 4.13 และผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนโรงงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโฟรฟิล์นอกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งพิกัดของสถานี 47P 0731073 1406581

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120946

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 19 ตุลาคม 2565 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. 35/1065

เวลา	ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก [dB(A)]											
	5-6 เม.ย. 66			6-7 เม.ย. 66			7-8 เม.ย. 66			8-9 เม.ย. 66		
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀
13:00 - 14:00	61.1	67.4	60.1	61.0	72.5	60.0	59.7	63.6	59.0	61.4	71.4	60.3
14:00 - 15:00	62.3	80.6	59.8	61.1	70.9	60.1	59.0	69.8	58.2	61.6	68.3	60.6
15:00 - 16:00	60.5	65.6	59.5	61.1	65.9	60.1	60.6	64.8	59.9	61.6	70.5	60.5
16:00 - 17:00	61.3	70.1	60.4	60.7	66.3	59.7	60.6	73.1	59.9	61.4	67.4	60.4
17:00 - 18:00	60.9	65.0	60.1	61.3	74.0	60.3	61.3	65.0	60.5	61.8	66.1	60.8
18:00 - 19:00	61.0	65.9	60.1	61.2	75.6	60.2	60.8	66.7	60.3	61.9	66.7	60.9
19:00 - 20:00	60.6	65.4	59.7	61.0	63.6	60.2	60.9	64.9	60.5	61.4	65.2	60.6
20:00 - 21:00	60.5	76.1	59.5	60.5	67.0	59.7	60.4	66.2	59.9	61.0	66.1	60.4
21:00 - 22:00	60.5	64.2	59.6	60.4	63.8	59.6	60.9	64.4	60.3	61.1	65.0	60.5
22:00 - 23:00	60.7	65.4	59.7	60.4	64.7	59.5	60.9	69.7	60.3	60.9	68.8	60.3
23:00 - 00:00	60.6	65.2	59.6	60.9	65.6	59.9	61.2	65.1	60.7	61.1	66.3	60.2
00:00 - 01:00	61.0	66.6	60.0	61.1	67.6	60.0	61.7	67.2	60.8	61.3	64.9	60.4
01:00 - 02:00	61.2	65.3	60.2	60.9	65.4	59.9	61.2	65.4	60.4	61.2	65.2	60.4
02:00 - 03:00	61.0	66.9	60.2	60.6	64.0	59.8	61.2	66.6	60.4	61.1	65.6	60.3
03:00 - 04:00	60.9	65.3	60.0	60.8	63.5	60.0	61.5	67.3	60.6	61.2	64.7	60.3
04:00 - 05:00	60.7	65.3	59.8	61.0	66.7	60.1	61.6	65.7	60.6	61.0	66.7	60.1
05:00 - 06:00	60.8	65.3	60.0	61.4	67.5	60.4	61.8	67.8	60.8	61.1	65.9	60.3
06:00 - 07:00	60.7	67.7	59.8	61.2	69.6	60.2	61.5	66.0	60.5	61.2	65.8	60.5
07:00 - 08:00	60.5	64.2	59.7	61.1	66.8	60.2	61.3	73.5	60.4	60.4	64.5	59.7
08:00 - 09:00	60.5	64.1	59.6	61.5	67.7	60.5	61.0	66.4	60.2	60.6	65.5	59.7
09:00 - 10:00	60.5	65.4	59.6	61.8	67.7	60.8	61.2	73.4	60.3	60.4	64.6	59.5
10:00 - 11:00	60.7	70.1	59.7	63.3	90.2	61.6	61.1	70.2	60.2	61.0	67.8	60.0
11:00 - 12:00	60.5	65.2	59.5	61.2	74.0	60.3	61.1	67.7	60.0	61.0	68.8	60.0
12:00 - 13:00	60.8	65.9	59.7	60.3	64.4	59.6	61.2	67.1	60.2	61.2	67.1	60.2
L _{eq} 24 hr.	60.8	-	-	61.1	-	-	61.0	-	-	61.2	-	-
L _{dn}	67.3	-	-	67.4	-	-	67.7	-	-	67.5	-	-
L _{max}	-	80.6	-	-	90.2	-	-	73.5	-	-	71.4	-
มาตรฐาน ^{(1),(2)}	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-

ตารางที่ 4.13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนโรงงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโฟรฟิล์นออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ตำแหน่งพิกัดของสถานี 47P 0731073 1406581

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120946

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 19 ตุลาคม 2565 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. 35/1065

เวลา	ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก [dB(A)]								
	9-10 เม.ย. 66			10-11 เม.ย. 66			11-12 เม.ย. 66		
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀
13:00 - 14:00	61.4	67.6	60.3	60.7	75.3	59.8	60.5	65.9	59.5
14:00 - 15:00	61.5	67.6	60.5	60.9	65.4	59.9	60.2	65.4	59.3
15:00 - 16:00	61.9	70.2	61.0	60.9	74.1	60.0	60.5	67.5	59.6
16:00 - 17:00	61.9	69.5	60.9	61.1	73.3	60.2	60.5	65.6	59.7
17:00 - 18:00	61.9	70.5	60.9	61.0	70.1	60.1	60.6	64.7	59.6
18:00 - 19:00	61.9	68.0	60.9	60.9	66.2	60.0	60.6	65.0	59.8
19:00 - 20:00	61.7	70.4	60.8	61.1	65.8	60.1	60.2	65.0	59.4
20:00 - 21:00	61.3	64.6	60.5	60.9	64.9	60.0	60.3	65.3	59.4
21:00 - 22:00	61.3	65.6	60.5	60.9	64.9	60.0	60.2	63.7	59.3
22:00 - 23:00	61.0	66.2	60.1	60.9	65.0	60.0	60.9	66.2	60.0
23:00 - 00:00	60.9	64.1	60.1	60.8	65.0	60.0	61.0	65.2	60.0
00:00 - 01:00	61.1	64.3	60.2	61.1	65.5	60.3	61.1	67.0	60.2
01:00 - 02:00	61.1	64.7	60.3	61.1	64.1	60.3	60.7	64.7	60.0
02:00 - 03:00	60.8	63.8	60.1	61.1	65.1	60.3	60.8	65.2	59.9
03:00 - 04:00	61.0	64.7	60.2	61.0	65.5	60.2	61.0	64.7	60.0
04:00 - 05:00	61.0	64.3	60.2	61.0	65.0	60.2	60.8	66.9	59.9
05:00 - 06:00	60.9	66.1	60.1	61.0	66.6	60.2	60.8	66.8	59.9
06:00 - 07:00	60.8	71.3	60.1	60.9	65.1	60.2	60.2	70.6	59.4
07:00 - 08:00	60.7	69.2	59.9	60.6	66.4	59.7	60.0	68.5	59.2
08:00 - 09:00	62.1	66.3	61.4	59.8	64.6	58.9	61.4	65.6	60.7
09:00 - 10:00	62.1	74.6	61.4	60.1	75.3	59.1	61.2	73.9	60.5
10:00 - 11:00	62.4	66.5	61.5	60.6	72.0	59.7	61.1	65.2	60.2
11:00 - 12:00	61.0	66.0	60.1	60.5	65.6	59.6	61.2	66.1	60.3
12:00 - 13:00	60.3	64.6	59.4	60.3	64.1	59.4	60.8	76.3	59.8
L _{eq} 24 hr.	61.4	-	-	60.8	-	-	60.7	-	-
L _{dn}	67.5	-	-	67.4	-	-	67.2	-	-
L _{max}	-	74.6	-	-	75.3	-	-	76.3	-
มาตรฐาน ^{(1),(2)}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

- มาตรฐาน** : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
- (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
- ชื่อผู้ตรวจวัด** : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
- ชื่อผู้บันทึก** : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
- ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม** : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
- ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด** : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด
- ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม** : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์ **เลขทะเบียนผู้ควบคุม** : ว-003-ค-2183
- เบอร์โทรศัพท์** : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2


ตารางที่ 4.14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566


วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัด [dB(A)]			
	L _{eq} 24 hr.	L _{max}	L _{dn}	L ₉₀
5-12 พฤษภาคม 2564	58.8-60.9	76.3-95.9	65.1-69.4	54.6-64.0
19-26 พฤศจิกายน 2564	59.9-61.1	73.5-84.2	65.8-66.7	55.7-61.0
5-12 กุมภาพันธ์ 2565	57.5-59.3	69.7-79.6	63.8-65.8	52.9-59.6
5-12 ตุลาคม 2565	57.7-59.1	69.0-79.4	63.0-65.8	53.4-60.1
5-12 เมษายน 2566	60.7-61.4	71.4-90.2	67.2-67.7	58.2-61.1
มาตรฐาน^{(1),(2)}	70	115	-	-

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

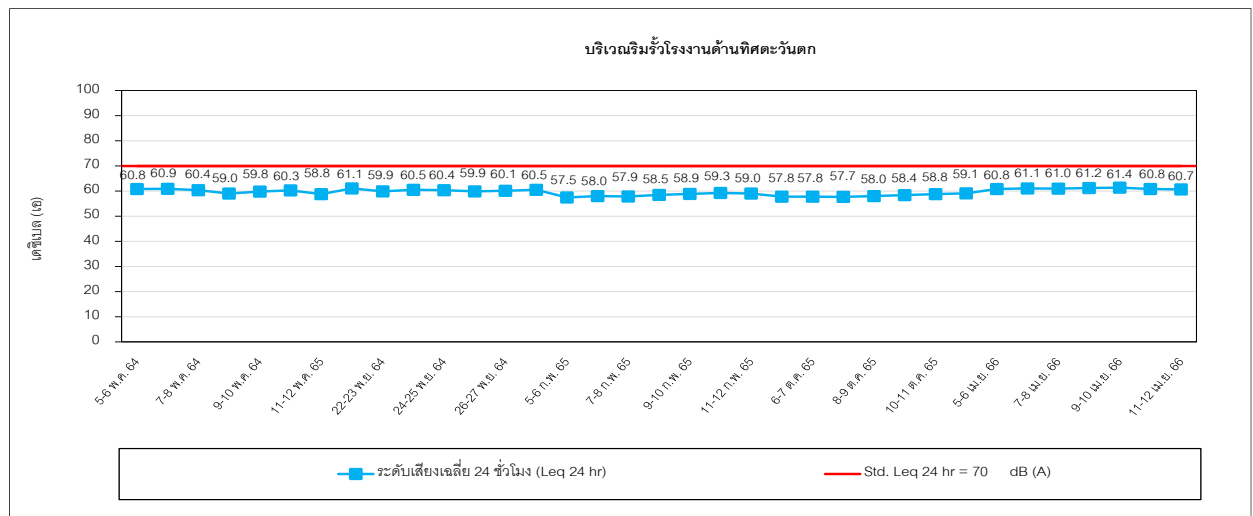

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.)

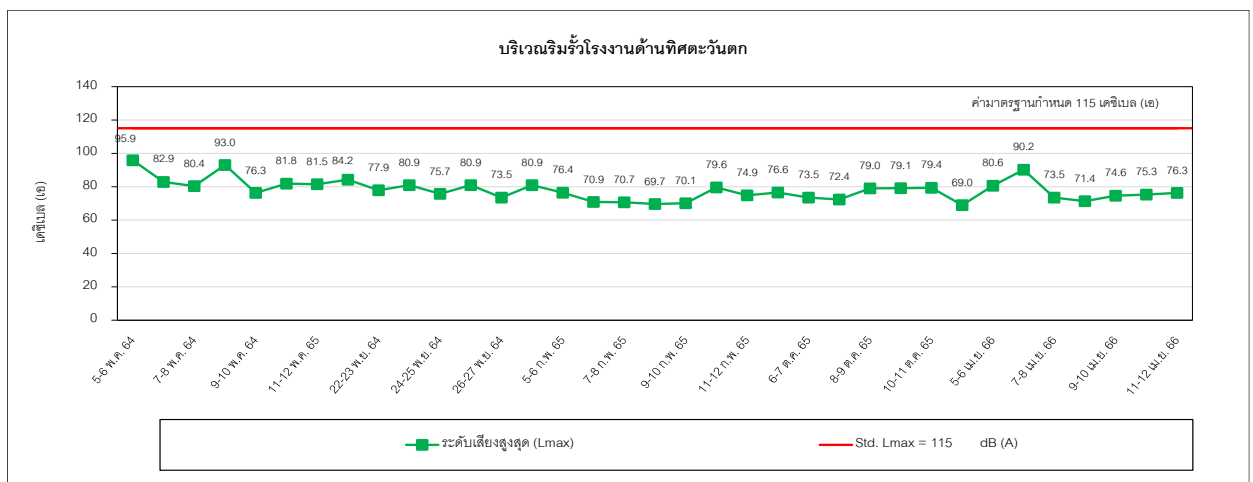


ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})

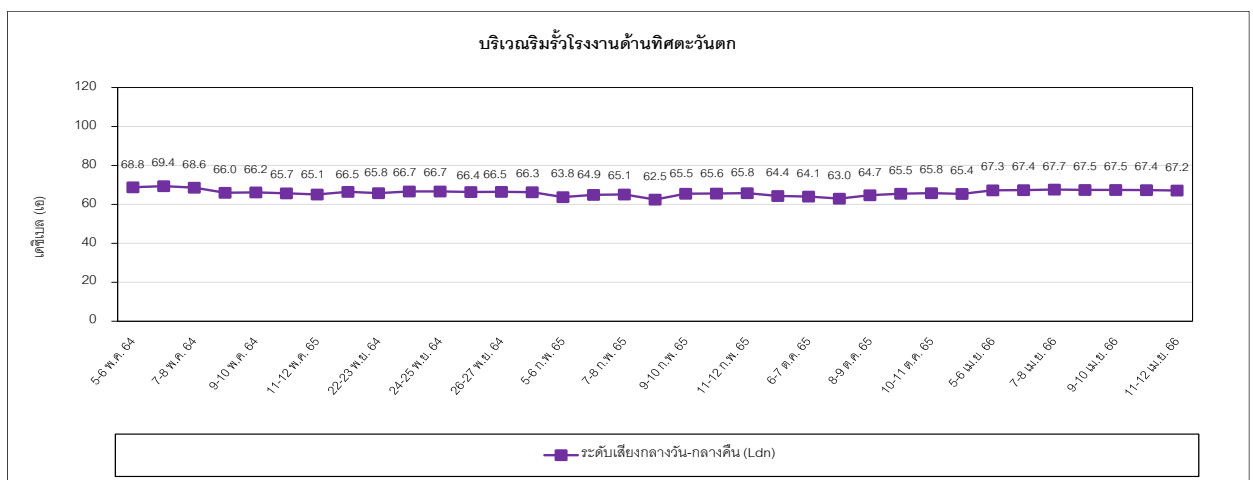

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn})

ภาพที่ 4.14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

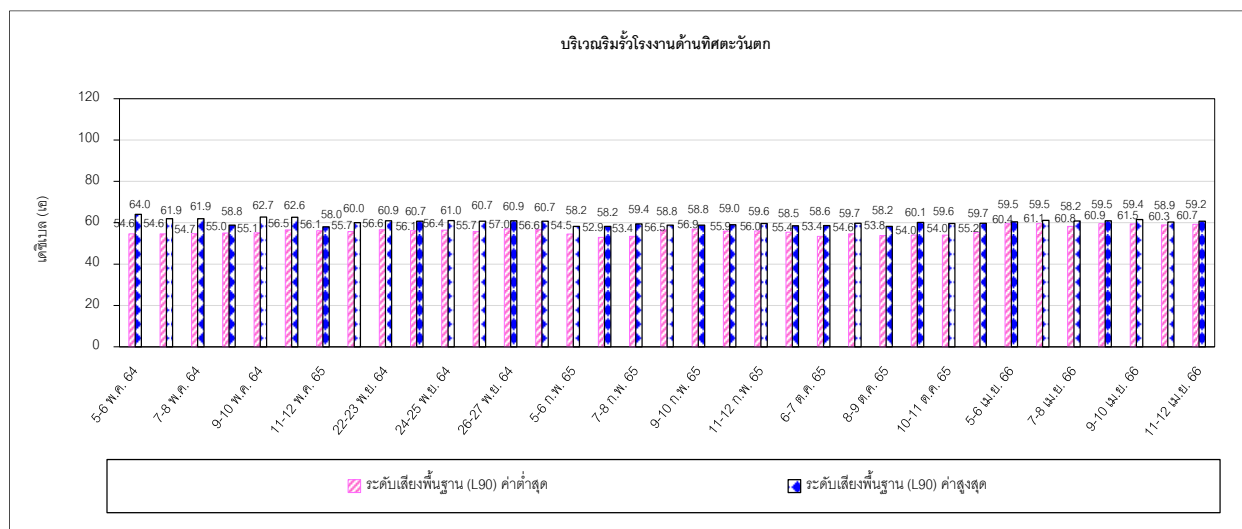

ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})

ภาพที่ 4.14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน (ต่อ)

4.6.1.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 5-12 เมษายน 2566 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 สำหรับค่าระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่วนระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4.7 การจัดการกากของเสีย

มาตรการกำหนดให้โครงการจัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงงาน และสัดส่วนปริมาณกากของเสียที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) และที่ส่งไปกำจัด พร้อมสำเนาเอกสารส่งกำจัด โดยรวบรวมข้อมูลและสรุปผลปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น จำนวน 29.60 ตัน ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste) จำนวน 2.23 ตัน ของเสียอันตราย (Hazardous waste) จำนวน 3,558.98 ตัน และของเสียนำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) จำนวน 3,556.44 ตัน สำหรับสัดส่วนปริมาณกากของเสียที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) คิดเป็น 99.93 % รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.15 และภาคผนวก 27ข


ตารางที่ 4.15 ปริมาณกากของเสีย ประจำเดือนเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เดือน	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
มกราคม	5.92	1.47	748.08	748.08
กุมภาพันธ์	5.92	-	34.76	34.76
มีนาคม	5.92	-	33.99	31.45
เมษายน	-	-	1,310.09	1,310.09
พฤษภาคม	5.92	-	3.78	3.78
มิถุนายน	5.92	0.76	1,428.28	1,428.28
รวมทั้งหมด	29.60	2.23	3,558.98	3,556.44

4.8 การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.8.1 คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 6 สถานี ได้แก่ Oxidation Section, Epoxidation Section, C3/PO Purification Section, Hydrogenation Section, PO Purification Section และ Tank Farm แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน แสดงดังภาพที่ 4.15 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน แสดงดังรูปที่ 4.7

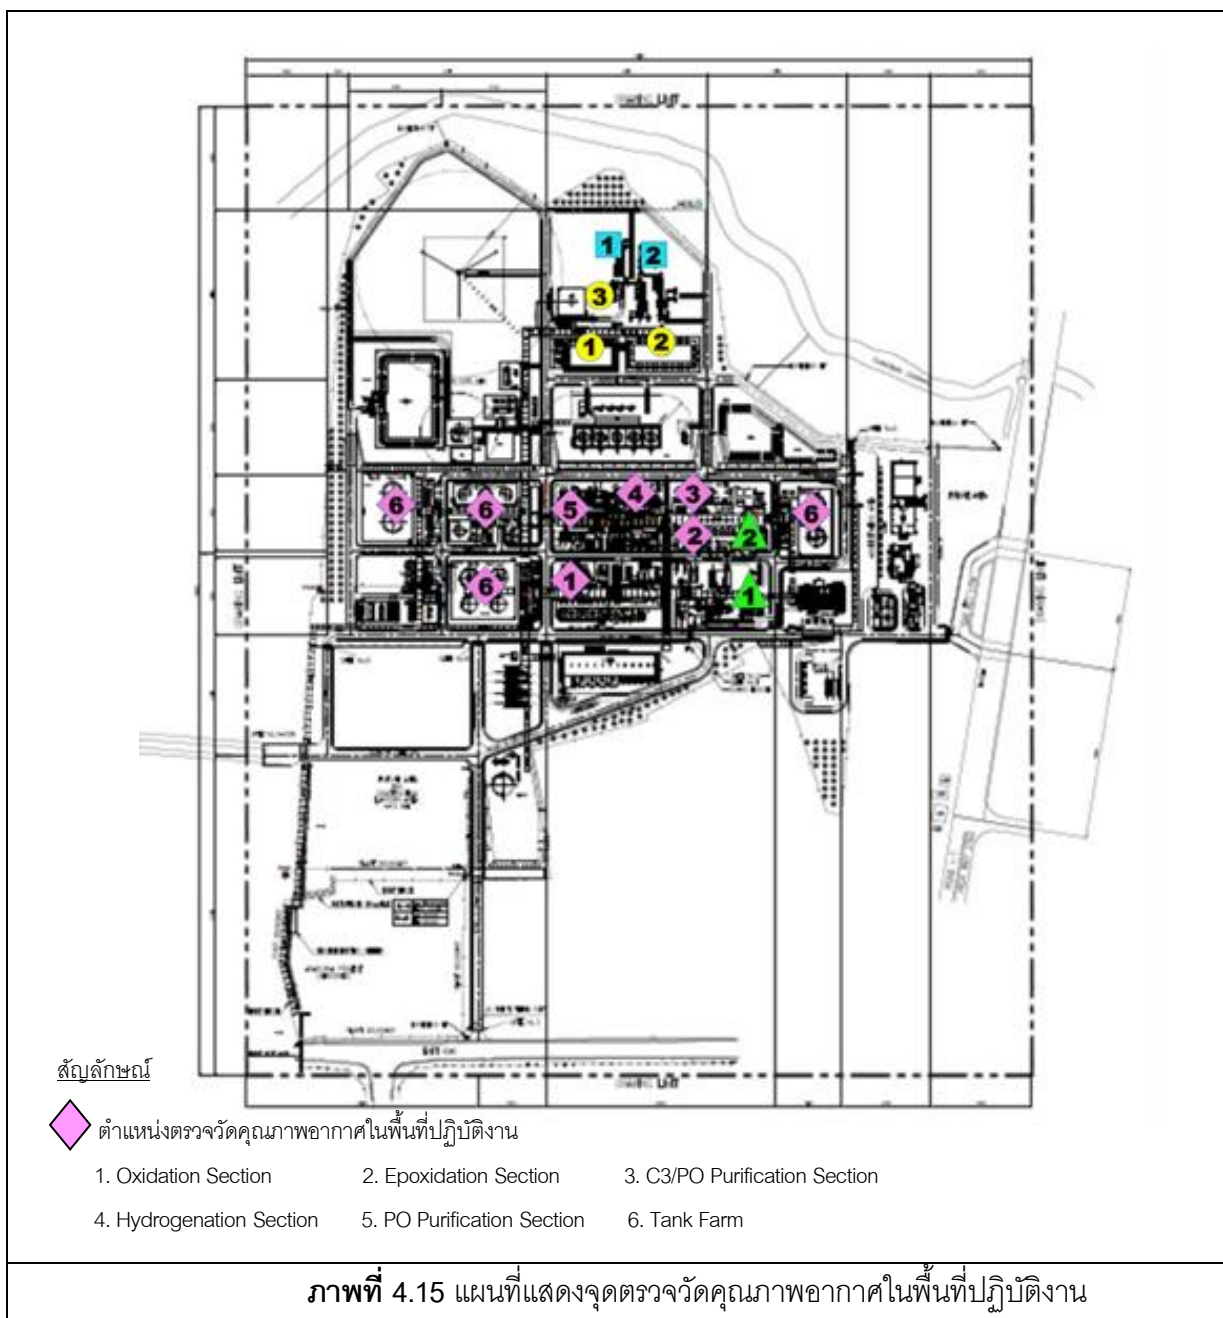

รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน



Oxidation Section



Epoxidation Section



C3/PO Purification Section




Hydrogenation Section



PO Purification Section

รูปที่ 4.7 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ต่อ)

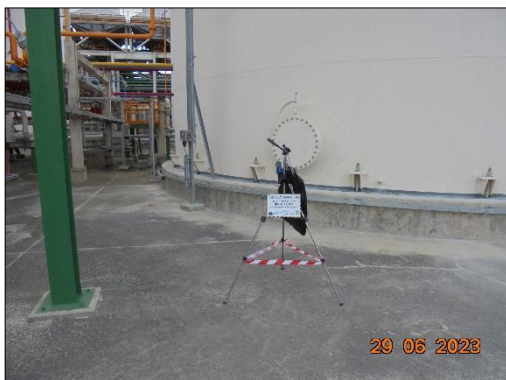

Tank yard 1



Tank yard 2



Tank yard 3



Tank yard 4

Tank Farm

รูปที่ 4.7 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ต่อ)

4.8.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 6 สถานี ได้แก่ Oxidation Section, Epoxidation Section, C3/PO Purification Section, Hydrogenation Section, PO Purification Section และ Tank Farm ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 12 เมษายน 2566 และ 29 มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 4.16 และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด

ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

จุดตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
Oxidation Section	12 เม.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	29 มิ.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
Epoxidation Section	12 เม.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	29 มิ.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	12 เม.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	29 มิ.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	12 เม.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	29 มิ.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
C3/PO Purification Section	12 เม.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	29 มิ.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	12 เม.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	29 มิ.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	12 เม.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	29 มิ.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
Hydrogenation Section	12 เม.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	29 มิ.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
PO Purification Section	12 เม.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	29 มิ.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	12 เม.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	29 มิ.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
Tank Farm - Tank yard 1	12 เม.ย. 66	Total VOCs	ppm	1.73	-
	29 มิ.ย. 66	Total VOCs	ppm	2.25	-
- Tank yard 2	12 เม.ย. 66	Total VOCs	ppm	1.96	-
	29 มิ.ย. 66	Total VOCs	ppm	2.45	-
- Tank yard 3	12 เม.ย. 66	Total VOCs	ppm	1.40	-
	29 มิ.ย. 66	Total VOCs	ppm	2.15	-
- Tank yard 4	12 เม.ย. 66	Total VOCs	ppm	1.57	-
	29 มิ.ย. 66	Total VOCs	ppm	2.38	-

หมายเหตุ	: 1. ND = Non detected [Method Detection Limit of Propylene Oxide = < 0.05 ppm] 2. รายการทดสอบ Propylene Oxide และ Total VOCs วิเคราะห์โดยบริษัท ซีคอป จำกัด
มาตรฐาน	: ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก	: นายสุทธา สองธินันท์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ : 0201-03-2564-0008
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นายกะวีร์ สุทธทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์	: บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ : 0202-03-2564-0005
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ตารางที่ 4.17 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

จุดตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
Oxidation Section	9 ก.พ. 64	Cumene	ppm	< 0.73	50
	7 พ.ค. 64	Cumene	ppm	0.187	50
	24 ส.ค. 64	Cumene	ppm	< 0.15	50
	23 พ.ย. 64	Cumene	ppm	< 0.15	50
	30 เม.ย. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	10 มิ.ย. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	25 ส.ค. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	26 ธ.ค. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	12 เม.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	29 มิ.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
Epoxidation Section	9 ก.พ. 64	Cumene	ppm	< 0.73	50
	7 พ.ค. 64	Cumene	ppm	< 0.020	50
	24 ส.ค. 64	Cumene	ppm	< 0.15	50
	23 พ.ย. 64	Cumene	ppm	< 0.15	50
	30 เม.ย. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	10 มิ.ย. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	25 ส.ค. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	26 ธ.ค. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	12 เม.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	29 มิ.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	9 ก.พ. 64	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	7 พ.ค. 64	Acetone	ppm	< 0.0017	1,000
	24 ส.ค. 64	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	23 พ.ย. 64	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	30 เม.ย. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	10 มิ.ย. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	25 ส.ค. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	26 ธ.ค. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	12 เม.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	29 มิ.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000

ตารางที่ 4.17 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (ต่อ)

จุดตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
Epoxidation Section (ต่อ)	9 ก.พ. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	7 พ.ค. 64	Propylene Oxide	ppm	< 0.13	100
	24 ส.ค. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	23 พ.ย. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	30 เม.ย. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	10 มิ.ย. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	25 ส.ค. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	26 ธ.ค. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	12 เม.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	29 มิ.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
C3/PO Purification Section	9 ก.พ. 64	Cumene	ppm	< 0.73	50
	7 พ.ค. 64	Cumene	ppm	< 0.020	50
	24 ส.ค. 64	Cumene	ppm	< 0.15	50
	23 พ.ย. 64	Cumene	ppm	< 0.15	50
	30 เม.ย. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	10 มิ.ย. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	25 ส.ค. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	26 ธ.ค. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	12 เม.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	29 มิ.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	9 ก.พ. 64	Acetone	Ppm	< 5.54	1,000
	7 พ.ค. 64	Acetone	ppm	0.0017	1,000
	24 ส.ค. 64	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	23 พ.ย. 64	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	30 เม.ย. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	10 มิ.ย. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	25 ส.ค. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	26 ธ.ค. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	12 เม.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	29 มิ.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000

ตารางที่ 4.17 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (ต่อ)

จุดตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
C3/PO Purification Section (ต่อ)	9 ก.พ. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	7 พ.ค. 64	Propylene Oxide	ppm	< 0.13	100
	24 ส.ค. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	23 พ.ย. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	30 เม.ย. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	10 มิ.ย. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	25 ส.ค. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	26 ธ.ค. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	12 เม.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	29 มิ.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
Hydrogenation Section	9 ก.พ. 64	Cumene	ppm	< 0.73	50
	7 พ.ค. 64	Cumene	ppm	< 0.020	50
	24 ส.ค. 64	Cumene	ppm	< 0.15	50
	23 พ.ย. 64	Cumene	ppm	< 0.15	50
	30 เม.ย. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	10 มิ.ย. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	25 ส.ค. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	26 ธ.ค. 65	Cumene	ppm	< 0.15	50
	12 เม.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
	29 มิ.ย. 66	Cumene	ppm	< 0.15	50
PO Purification Section	9 ก.พ. 64	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	7 พ.ค. 64	Acetone	ppm	< 0.0017	1,000
	24 ส.ค. 64	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	23 พ.ย. 64	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	30 เม.ย. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	10 มิ.ย. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	25 ส.ค. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	26 ธ.ค. 65	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	12 เม.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000
	29 มิ.ย. 66	Acetone	ppm	< 5.54	1,000

ตารางที่ 4.17 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (ต่อ)

จุดตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
PO Purification Section (ต่อ)	9 ก.พ. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	7 พ.ค. 64	Propylene Oxide	ppm	< 0.13	100
	24 ส.ค. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	23 พ.ย. 64	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	30 เม.ย. 65	Propylene Oxide	ppm	0.31	100
	10 มิ.ย. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	25 ส.ค. 65	Propylene Oxide	ppm	0.25	100
	26 ธ.ค. 65	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	12 เม.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
	29 มิ.ย. 66	Propylene Oxide	ppm	ND	100
Tank Farm - Tank yard 1	31 มี.ค. 64	Total VOCs	ppm	6.93	-
	7 พ.ค. 64	Total VOCs	ppm	2.57	-
	24 ส.ค. 64	Total VOCs	ppm	1.13	-
	23 พ.ย. 64	Total VOCs	ppm	3.87	-
	30 เม.ย. 65	Total VOCs	ppm	3.48	-
	10 มิ.ย. 65	Total VOCs	ppm	2.27	-
	25 ส.ค. 65	Total VOCs	ppm	1.96	-
	26 ธ.ค. 65	Total VOCs	ppm	2.66	-
	12 เม.ย. 66	Total VOCs	ppm	1.73	-
	29 มิ.ย. 66	Total VOCs	ppm	2.25	-
Tank yard 2	31 มี.ค. 64	Total VOCs	ppm	6.57	-
	7 พ.ค. 64	Total VOCs	ppm	1.46	-
	24 ส.ค. 64	Total VOCs	ppm	1.16	-
	23 พ.ย. 64	Total VOCs	ppm	2.71	-
	30 เม.ย. 65	Total VOCs	ppm	1.89	-
	10 มิ.ย. 65	Total VOCs	ppm	6.33	-
	25 ส.ค. 65	Total VOCs	ppm	2.03	-
	26 ธ.ค. 65	Total VOCs	ppm	4.04	-
	12 เม.ย. 66	Total VOCs	ppm	1.96	-
	29 มิ.ย. 66	Total VOCs	ppm	2.45	-




ตารางที่ 4.17 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (ต่อ)


จุดตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
Tank Farm - Tank yard 3	31 มี.ค. 64	Total VOCs	ppm	5.13	-
	7 พ.ค. 64	Total VOCs	ppm	4.86	-
	24 ส.ค. 64	Total VOCs	ppm	1.37	-
	23 พ.ย. 64	Total VOCs	ppm	2.96	-
	30 เม.ย. 65	Total VOCs	ppm	3.27	-
	10 มิ.ย. 65	Total VOCs	ppm	3.03	-
	25 ส.ค. 65	Total VOCs	ppm	1.72	-
	26 ธ.ค. 65	Total VOCs	ppm	3.37	-
	12 เม.ย. 66	Total VOCs	ppm	1.40	-
	29 มิ.ย. 66	Total VOCs	ppm	2.15	-
- Tank yard 4	31 มี.ค. 64	Total VOCs	ppm	8.97	-
	7 พ.ค. 64	Total VOCs	ppm	2.43	-
	24 ส.ค. 64	Total VOCs	ppm	1.57	-
	23 พ.ย. 64	Total VOCs	ppm	2.61	-
	30 เม.ย. 65	Total VOCs	ppm	4.15	-
	10 มิ.ย. 65	Total VOCs	ppm	2.79	-
	25 ส.ค. 65	Total VOCs	ppm	1.92	-
	26 ธ.ค. 65	Total VOCs	ppm	2.50	-
	12 เม.ย. 66	Total VOCs	ppm	1.57	-
	29 มิ.ย. 66	Total VOCs	ppm	2.38	-

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

หมายเหตุ : 1. ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/2564 (พ.ค. 64) ตรวจวัดและวิเคราะห์โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
2. ND = Non detected [Method Detection Limit of Propylene Oxide = < 0.05 ppm]

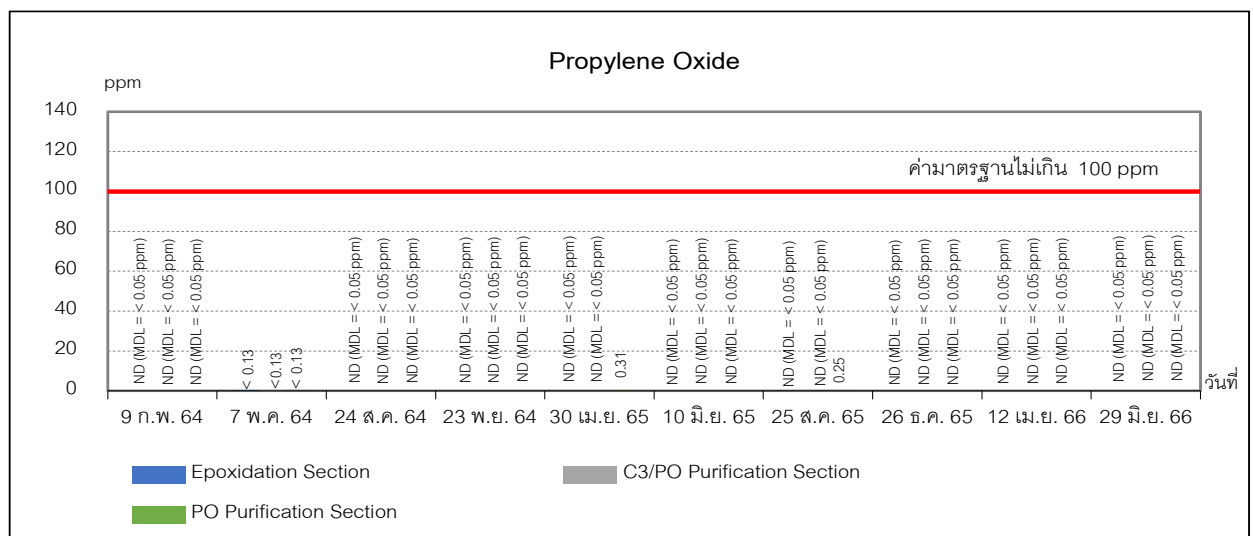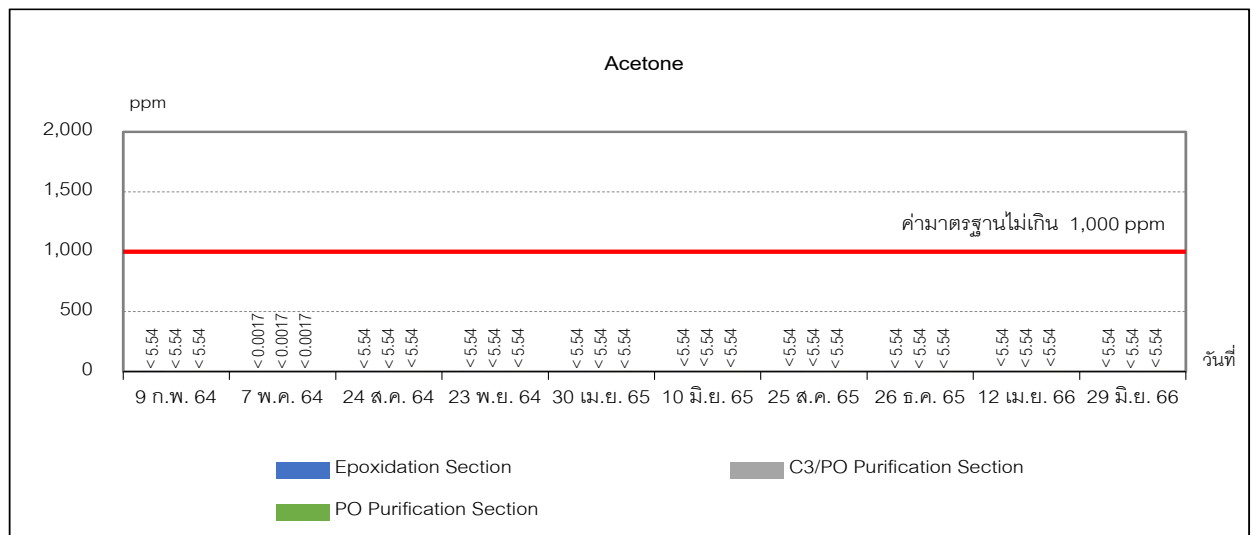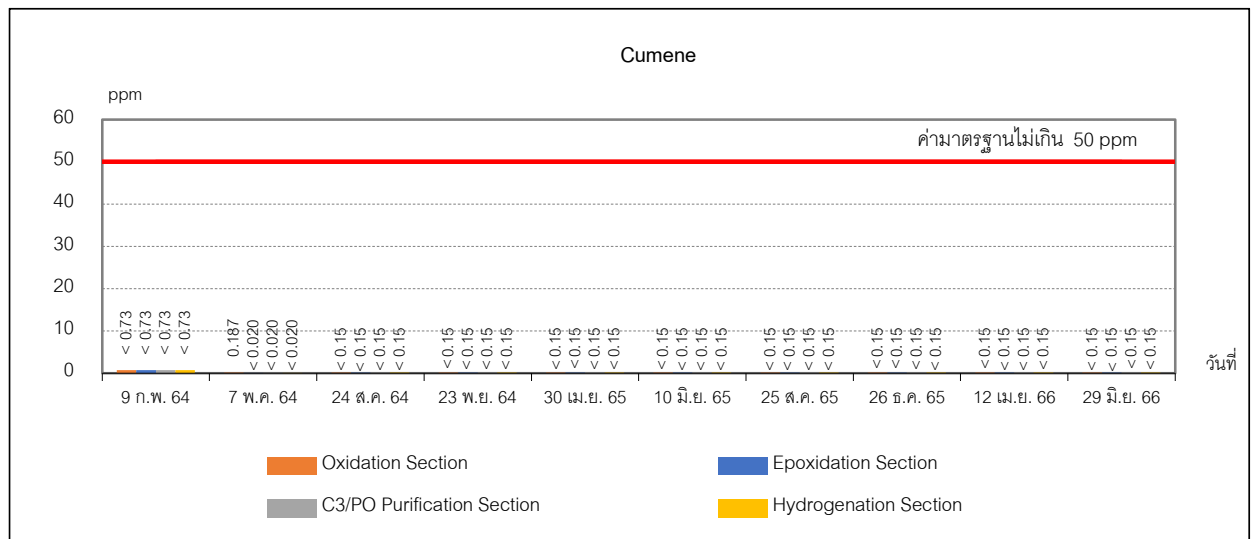

ภาพที่ 4.16 กราฟผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

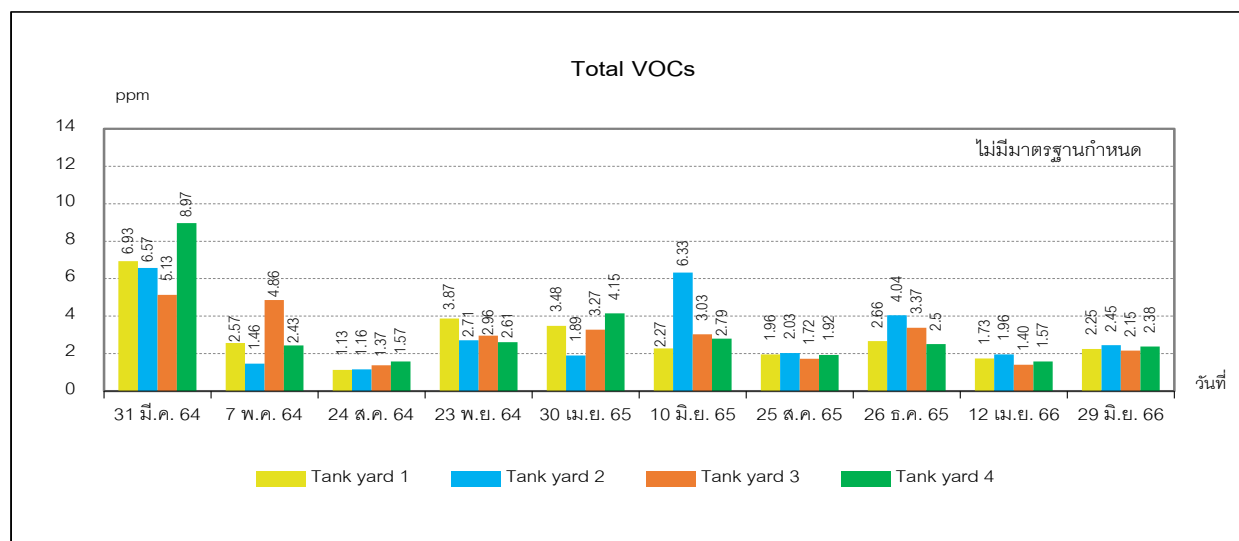

ภาพที่ 4.16 กราฟผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ต่อ)

4.8.1.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 6 สถานี ได้แก่ Oxidation Section, Epoxidation Section, C3/PO Purification Section, Hydrogenation Section, PO Purification Section และ Tank Farm ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 12 เมษายน 2566 และ 29 มิถุนายน 2566 พบว่า ปริมาณสารคิวมีน (Cumene) อะซีโตน (Acetone) และโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 สำหรับสารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs) ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 พบว่า ส่วนใหญ่ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้น สารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs) มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงไม่คงที่จากครั้งที่ผ่านมา

4.8.2 คุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล

การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 บริเวณพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในกระบวนการผลิต รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล แสดงดังรูปที่ 4.8

รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล



คุณธีระเดช แสงเดช



คุณชัยพฤกษ์ วิริญโท



คุณเจริญพงษ์ เกษไธ



คุณฐิติกร เทิงสูงเนิน



คุณนวกาศย์ แสงสุรินทร์

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในกระบวนการผลิต (ครั้งที่ 1/2566)

รูปที่ 4.8 การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล



คุณสกลภัค คำภาพงษ์



คุณจตุรงค์ แสงกระจ่าง



คุณนรากร สุดสายตา



คุณภาณุวัฒน์ อินนังแท่น



คุณเจริญพงษ์ เกตุไธ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในกระบวนการผลิต (ครั้งที่ 2/2566)

รูปที่ 4.8 การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล

4.8.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 บริเวณพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในกระบวนการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จำนวน 10 คน ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2566 และ 29 มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 4.18 และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.18 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล

วันที่เก็บตัวอย่าง	จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด (ppm)	มาตรฐาน (ppm)
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในกระบวนการผลิต					
12 เม.ย. 66	คุณธีระเดช แสงเดช	Propylene Oxide	ppm	ND	100
12 เม.ย. 66	คุณชัยพฤษ์ วัชรวิทย์	Propylene Oxide	ppm	ND	100
12 เม.ย. 66	คุณเจริญพงษ์ เกษไช	Propylene Oxide	ppm	ND	100
12 เม.ย. 66	คุณฐิติกร เทิงสูงเนิน	Propylene Oxide	ppm	ND	100
12 เม.ย. 66	คุณนวมภาคย์ แสงสุรินทร์	Propylene Oxide	ppm	ND	100
29 มิ.ย. 66	คุณสกลภัค คำภาพงษ์	Propylene Oxide	ppm	ND	100
29 มิ.ย. 66	คุณจตุรงค์ แสงกระจ่าง	Propylene Oxide	ppm	ND	100
29 มิ.ย. 66	คุณนารากร สูดสายตา	Propylene Oxide	ppm	ND	100
29 มิ.ย. 66	คุณภาณุวัฒน์ อินนังแท่น	Propylene Oxide	ppm	ND	100
29 มิ.ย. 66	คุณเจริญพงษ์ เกตุไธ	Propylene Oxide	ppm	0.17	100

หมายเหตุ : ND = Non detected [Method Detection Limit of Propylene Oxide = < 0.05 ppm]

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายสุทธา สองธนนัย

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาว์ฒน์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ : 0201-03-2564-0008

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ : บริษัท ซีคอบ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ : 0201-03-2565-0034


เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600, 0-2959-3535

ตารางที่ 4.19 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล
เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

จุดตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ppm)	มาตรฐาน (ppm)
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ในกระบวนการผลิต	ม.ค.-มี.ย. 64	Propylene Oxide	ND - < 0.13	100
	ก.ค.-ธ.ค. 64	Propylene Oxide	ND - 6.48	100
	ม.ค.-มี.ย. 65	Propylene Oxide	ND	100
	ก.ค.-ธ.ค. 65	Propylene Oxide	ND - 0.25	100
	ม.ค.-มี.ย. 66	Propylene Oxide	ND - 0.17	100

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

หมายเหตุ : 1. ผลตรวจวัดครั้งที่ 1/2564 ตรวจวัดและวิเคราะห์โดย บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
2. ND = Non detected [Method Detection Limit of Propylene Oxide = < 0.05 ppm]

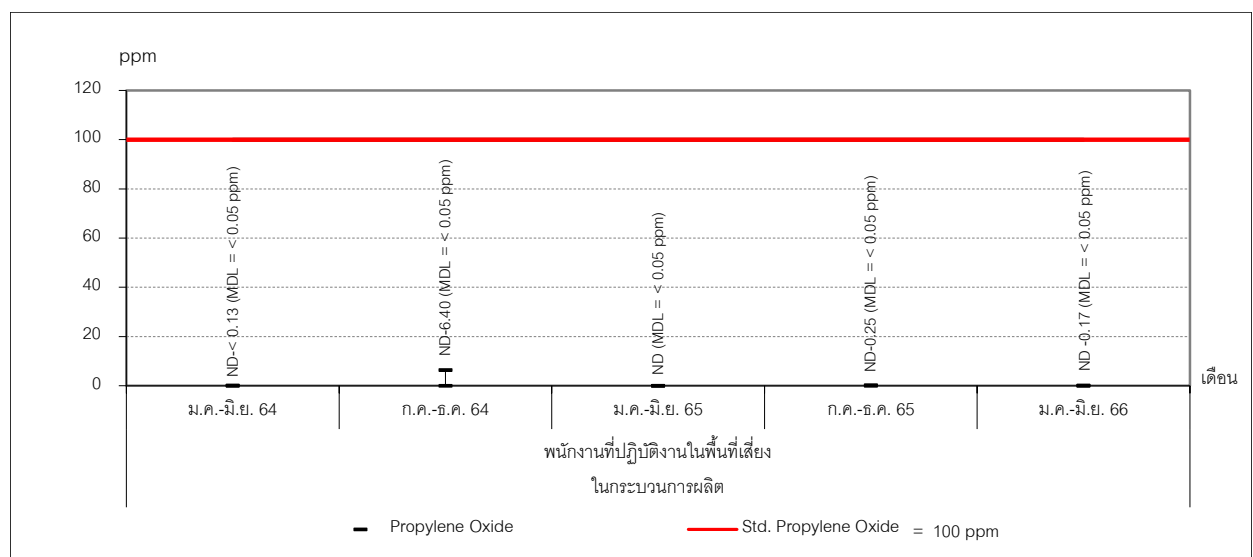

ภาพที่ 4.17 กราฟผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล

4.8.2.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล


ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตัวบุคคล ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 บริเวณพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในกระบวนการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2566 และ 29 มิถุนายน 2566 จำนวน 10 ท่าน พบว่า ปริมาณสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 พบว่าผลการตรวจวัดมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งที่ผ่านมา

4.8.3 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

4.8.3.1 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน

การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณ Air Compressors และบริเวณ C3 Recycle Compressors แผนที่จุดตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงานดังภาพที่ 4.18 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน แสดงดังรูปที่ 4.9

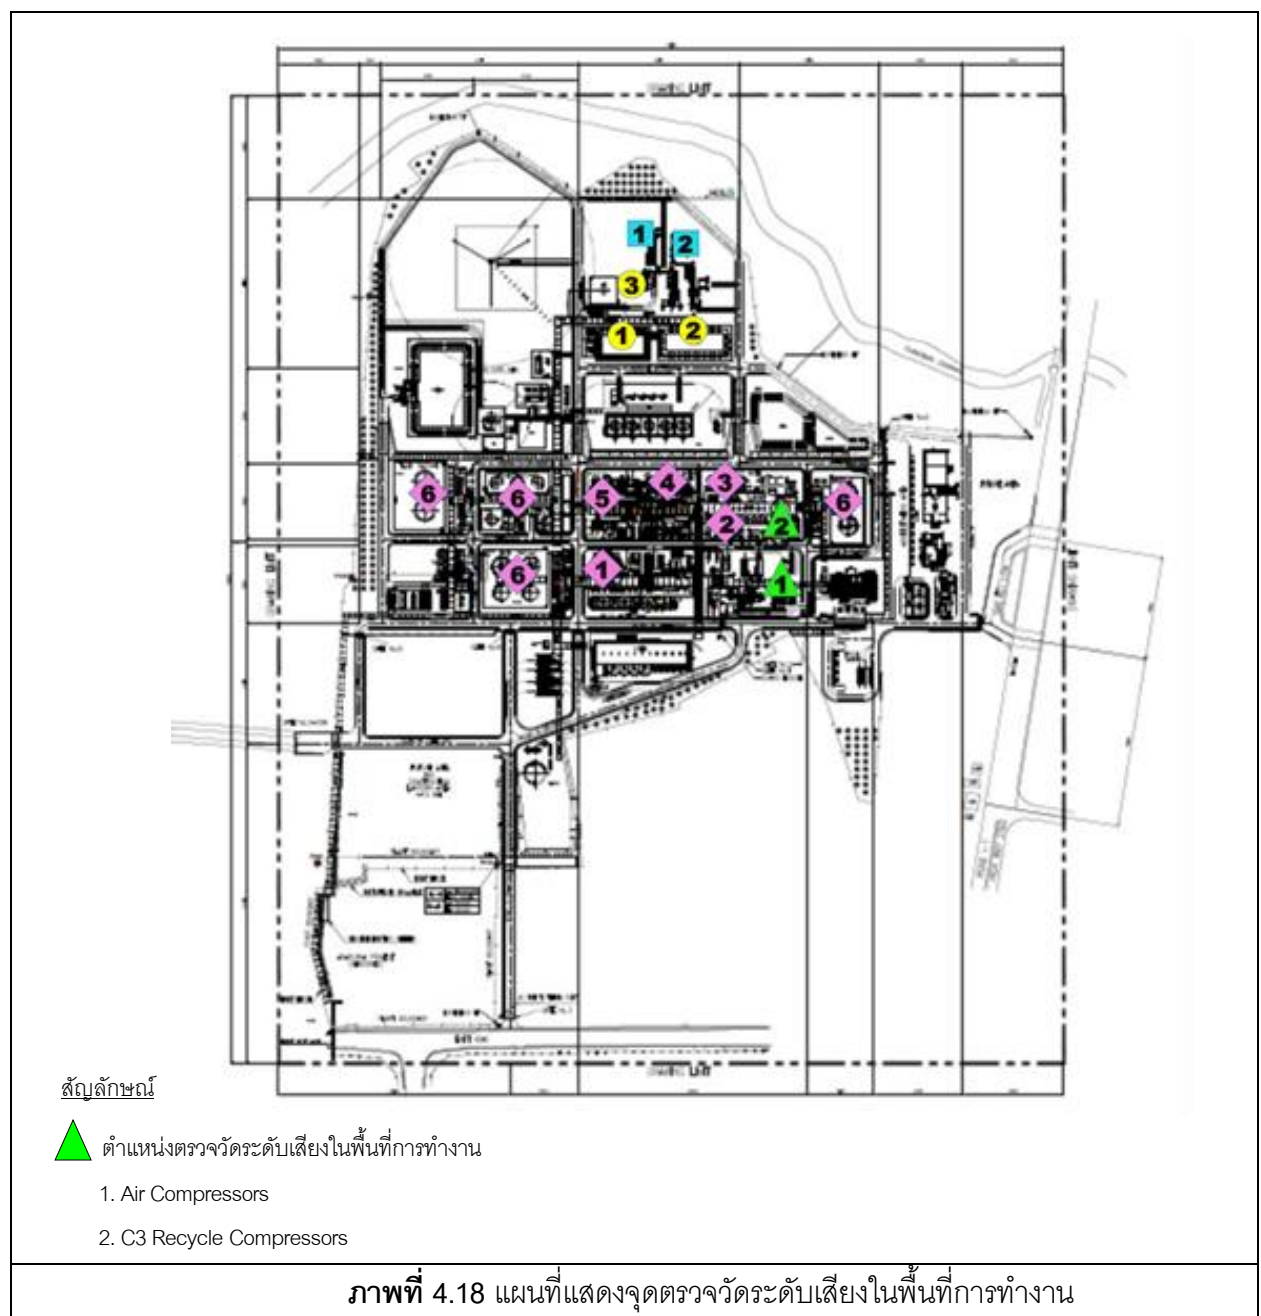

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน



Air Compressors



C3 Recycle Compressors

รูปที่ 4.9 การตรวจวัดระดับระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน

4.8.3.1.1 ผลการตรวจวัดระดับระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ของโครงการ โรงงานผลิตโพธิ์หินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณ Air Compressors และบริเวณ C3 Recycle Compressors ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 12 เมษายน 2566 แสดงดังตารางที่ 4.20 และผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.20 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโพพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00322755

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 19 ตุลาคม 2565 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. 35/1065

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดเสียง [dB(A)]	
	Air Compressors	
	12 เม.ย. 66	
	L_{eq}	L_{max}
09:10-10:10	86.2	89.0
10:10-11:10	86.3	89.2
11:10-12:10	86.1	88.3
12:10-13:10	85.8	88.5
13:10-14:10	85.2	88.0
14:10-15:10	85.5	88.0
15:10-16:10	85.7	106.9
16:10-17:10	62.9	67.6
17:10-18:10	63.0	65.1
18:10-19:10	66.6	95.0
19:10-20:10	71.9	95.7
20:10-21:10	70.3	95.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr.)	83.6	-
ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	-	106.9
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ⁽¹⁾	-	115
มาตรฐาน ⁽²⁾	87	140

ตารางที่ 4.20 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ต่อ)

โครงการโรงงานผลิตโฟรฟลินออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00322750

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 19 ตุลาคม 2565 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. 35/1065

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดเสียง [dB(A)]	
	C3 Recycle Compressors	
	12 เม.ย. 66	
	L_{eq}	L_{max}
09:15-10:15	88.3	88.8
10:15-11:15	88.3	88.9
11:15-12:15	88.3	93.2
12:15-13:15	88.3	89.0
13:15-14:15	88.3	89.0
14:15-15:15	88.3	88.9
15:15-16:15	87.0	105.6
16:15-17:15	62.4	67.9
17:15-18:15	62.6	66.5
18:15-19:15	68.6	98.0
19:15-20:15	73.0	97.1
20:15-21:15	71.0	97.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr.)	85.8	-
ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	-	105.6
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ⁽¹⁾	-	115
มาตรฐาน ⁽²⁾	87	140

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นางสาวศวิตา กิตติเนาวรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาว์ฒน์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ : 0403-03-2564-0009

และวิเคราะห์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2


ตารางที่ 4.21 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566


จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
		L _{eq} 12 hr.	L _{max}
บริเวณ Air Compressors	17 ก.พ. 64	85.6	102.4
	24 ส.ค. 64	84.2	86.6
	18 ก.พ. 65	84.8	88.5
	26 ส.ค. 65	84.2	89.0
	12 เม.ย. 66	83.6	106.9
บริเวณ C3 Recycle Compressors	17 ก.พ. 64	84.4	86.5
	24 ส.ค. 64	84.3	85.7
	18 ก.พ. 65	84.4	87.4
	26 ส.ค. 65	84.6	90.4
	12 เม.ย. 66	85.8	105.6
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ⁽¹⁾		-	115
มาตรฐาน ⁽²⁾		87	140

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

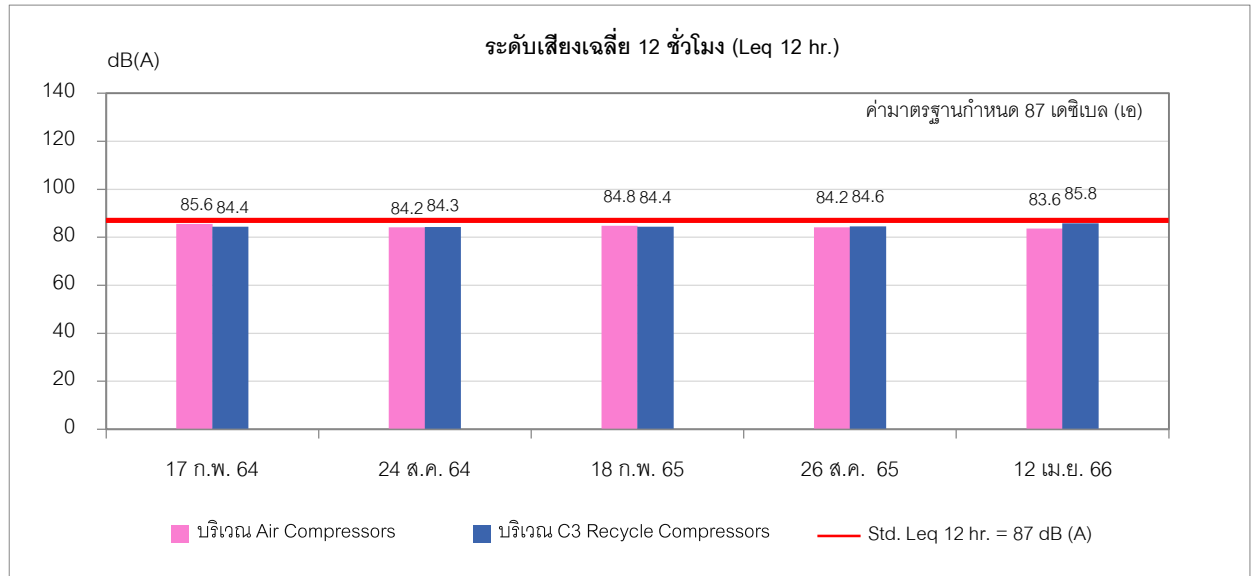

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr.)

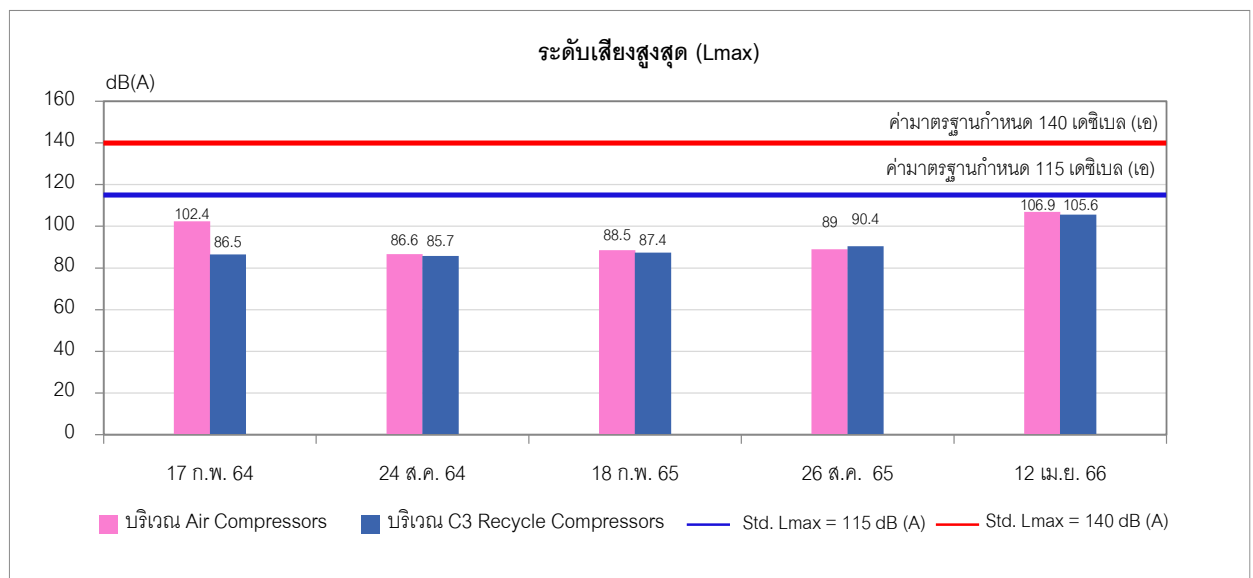

ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})

ภาพที่ 4.19 กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

4.8.3.1.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณ Air Compressors และบริเวณ C3 Recycle Compressors ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 12 เมษายน 2566 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr.) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่จากครั้งที่ผ่านมา

4.8.3.2 ระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose)

การตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 โดยทำการตรวจวัดที่พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดัง รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน แสดงดังรูปที่ 4.10

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose)



คุณธีระเดช แสงเดช




คุณภัทรพล นุ่มนัม




คุณวีระวร อรรถสังข์



คุณวัฒน์ชัย สุวรรณเมฆ

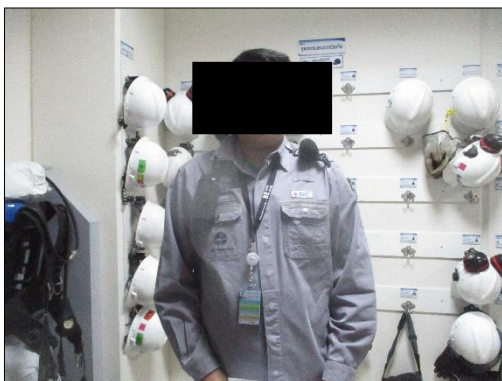

คุณอรรถโกวิท สิงห์โตทอง

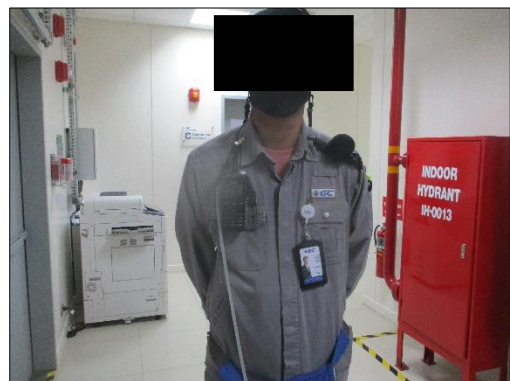


คุณนวกาศย์ แสงสุรินทร์

รูปที่ 4.10 การตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose)



คุณสรยุทธ์ วิลังคะ

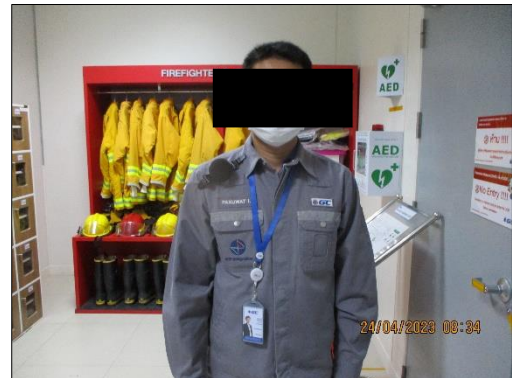

คุณภานุวัฒน์ อินนังแท่น



คุณอิทธิคม แก้วพวง



คุณสกลศักดิ์ คำภาพงษ์



คุณจตุรงค์ แสงกระจ่าง



คุณนรากร สูดสายตา

รูปที่ 4.10 การตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) (ต่อ)

4.8.3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 โดยทำการตรวจวัดที่พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดัง จำนวน 12 ท่าน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 12-26 เมษายน 2566 แสดงดังตารางที่ 4.22 และผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 4.23

ตารางที่ 4.22 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus/Dose Badge/RC110A S/N 73967
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 114.00 dB(A)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : on site cal.
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 12 มกราคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 185789

ลำดับ	วันที่ตรวจวัด	ชื่อจุดตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
			Noise Dose (%)	Time Weighted Average 12 hr.	Time Weighted Average 8 hr.	L _{max} 12 hr.
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift A						
1	12 เม.ย. 66	คุณธีระเดช แสงเดช	10.00	73.2	75.0	90.4
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift B						
1	18 เม.ย. 66	คุณภัทรพล นุ่มนัม	1.80	65.8	67.6	88.9
2	26 เม.ย. 66	คุณวีระวร อรรคสังข์	23.00	76.9	78.6	101.8
3	18 เม.ย. 66	คุณวัฒน์ชัย สุวรรณเมฆ	74.00	81.9	83.7	98.4
4	18 เม.ย. 66	คุณอรรถโกวิท สิงห์โตทอง	31.20	78.2	79.9	95.1
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift C						
1	12 เม.ย. 66	คุณนงนาคย์ แสงสุรินทร์	9.00	72.8	74.5	87.5
2	19 เม.ย. 66	คุณสรายุทธ์ วิลังคะ	0.90	62.8	64.5	88.0
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift D						
1	24 เม.ย. 66	คุณภาณุวัฒน์ อินนังแท่น	0.07	51.7	53.5	76.8
2	24 เม.ย. 66	คุณอิศริคม แก้วพวง	0.25	57.2	59.0	76.8
3	24 เม.ย. 66	คุณสกลภัค คำภาพงษ์	12.40	74.2	75.9	94.3
4	24 เม.ย. 66	คุณจตุรงค์ แสงกระจ่าง	70.70	81.7	83.5	97.3
5	24 เม.ย. 66	คุณนรากร สุตสายตา	0.08	52.3	54.0	75.9
มาตรฐาน			100 ⁽¹⁾	83 ⁽²⁾	85 ⁽²⁾	115 ⁽³⁾

มาตรฐาน	:	(1) National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
	:	(2) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
	:	(3) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก	:	นายวัฒนา โคตรหล้า
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	:	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
และวิเคราะห์	:	ใบอนุญาตเลขที่ : 0403-03-2564-0009
เบอร์โทรศัพท์	:	0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ตารางที่ 4.23 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose)


เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ชื่อจุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
		Noise Dose (%)	Time Weighted Average 12 hr.	Time Weighted Average 8 hr.	L _{max} 12 hr.
พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift A	ม.ค.-มี.ย. 64	11.00	73.7	75.4	88.5
	ก.ค.-ธ.ค. 64	13.20-85.40	74.4-82.6	76.2-84.3	92.8-100.8
	ม.ค.-มี.ย. 65	29.72-90.10	78.0-82.8	79.7-84.5	104.3-112.8
	ก.ค.-ธ.ค. 65	0.18-20.94	55.8-76.4	57.6-78.2	77.7-113.0
	ม.ค.-มี.ย. 66	10.00	73.2	75.0	90.4
พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift B	ม.ค.-มี.ย. 64	6.00-55.00	71.0-80.6	72.8-81.4	89.8-94.9
	ก.ค.-ธ.ค. 64	2.60-90.10	67.4-82.8	69.1-84.5	85.3-100.3
	ม.ค.-มี.ย. 65	18.44-66.12	75.9-81.4	77.7-83.2	110.2-113.6
	ก.ค.-ธ.ค. 65	1.20-48.00	64.0-80.1	65.8-81.8	84.4-98.3
	ม.ค.-มี.ย. 66	1.80-74.00	65.8-81.9	67.6-83.7	88.9-101.8
พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift C	ม.ค.-มี.ย. 64	12.00-63.00	74.0-81.2	75.8-83.0	88.6-97.3
	ก.ค.-ธ.ค. 64	5.60-53.70	70.7-80.5	72.5-82.3	91.0-94.5
	ม.ค.-มี.ย. 65	8.51-30.14	72.5-78.0	74.3-79.8	111.3-113.2
	ก.ค.-ธ.ค. 65	0.08-7.00	52.3-71.7	54.0-73.5	74.1-92.2
	ม.ค.-มี.ย. 66	0.90-9.00	62.8-72.8	64.5-74.5	87.5-88.0
พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift D	ม.ค.-มี.ย. 64	7.00-64.00	71.7-81.3	73.5-83.1	88.3-102.0
	ก.ค.-ธ.ค. 64	13.60-70.90	74.6-81.7	76.3-83.5	89.5-94.3
	ม.ค.-มี.ย. 65	8.69-90.34	72.6-82.8	74.4-84.6	112.3-114.5
	ก.ค.-ธ.ค. 65	0.10-87.90	53.2-82.7	55.0-84.4	80.7-95.9
	ม.ค.-มี.ย. 66	0.07-70.70	51.7-81.7	53.5-83.5	75.9-97.3
มาตรฐาน		100 ⁽¹⁾	83 ⁽²⁾	85 ⁽²⁾	115 ⁽³⁾


มาตรฐาน : ⁽¹⁾ National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998

⁽²⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

⁽³⁾ กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

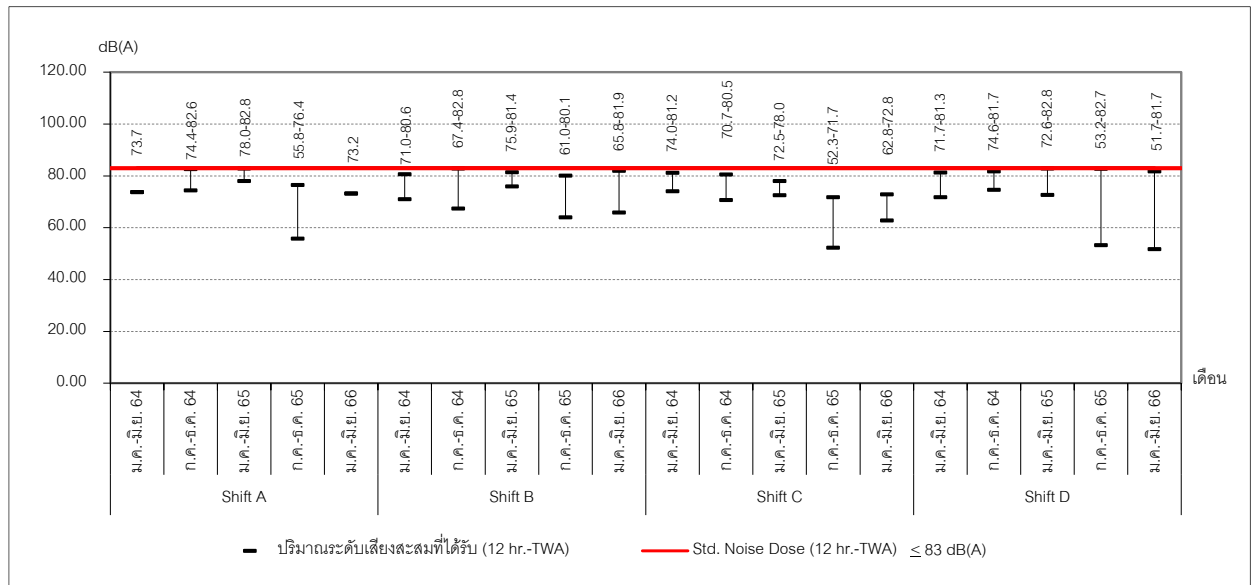

ระดับเสียงสะสมที่ได้รับ (12 hr.-TWA)

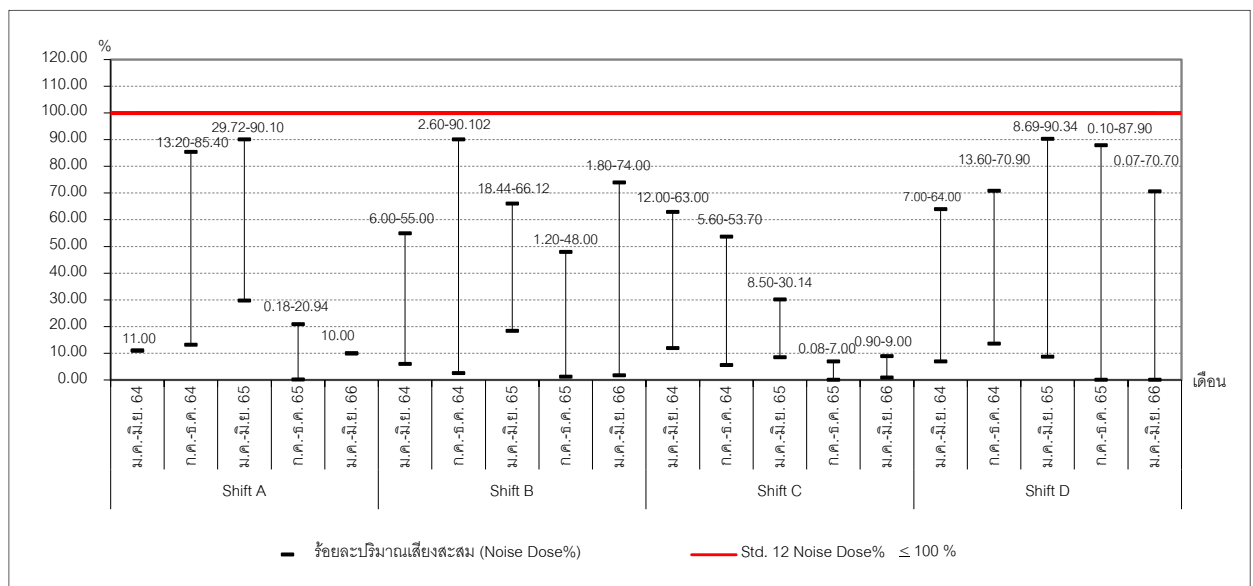

ร้อยละปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose%)

ภาพที่ 4.20 กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose)

4.8.3.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose)

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ของโครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19 โดยทำการตรวจวัดที่พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดัง จำนวน 12 ท่าน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 12-26 เมษายน 2566 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยสะสมที่ตัวพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr.) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ (Dose) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998

เปรียบเทียบผลตรวจวัดระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) พบว่า

- พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift A ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dose) มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผ่าน
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift B ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dose) มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผ่าน
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift C ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dose) มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผ่าน
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน Shift D ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dose) มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผ่าน

4.8.3.3 แผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)

มาตรการกำหนดให้โครงการมีการจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) ภายใน 1 ปี หลังจากโครงการเริ่มดำเนินการ และทำการทบทวนทุกๆ 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลให้เสียงในพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยครั้งล่าสุดดำเนินการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2564 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 70ข

4.8.4 การตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

มาตรการกำหนดให้โครงการมีการตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป และสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งตรวจก่อนเริ่มปฏิบัติงานในโรงงาน (พนักงานใหม่) รายละเอียดดังนี้

1. ตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป

- ตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง สภาพทั่วไปของตา หู คอ จมูก และปอด
- เอกซเรย์ทรวงอก
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจไขมันในเลือด
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นด้านอาชีวอนามัย

2. ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง

- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
- ตรวจอะซิโตนในปัสสาวะ
- ตรวจ Mandelic acid และ Phenylglyoxylic acid ในปัสสาวะ

โครงการกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มเข้าทำงาน (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่มีการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน) และกำหนดให้พนักงานตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป ปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2565 (ภาคผนวก 68ข) สำหรับปี พ.ศ. 2566 มีแผนดำเนินการช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป และดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง โดยปี พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการในวันที่ 23-29 มีนาคม 2566 โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างแพทย์วินิจฉัย จะรายงานให้ทราบต่อไป (ภาคผนวก 66ข)

4.8.5 รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและจากการทำงานรวมถึงวิธีการแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ

มาตรการกำหนดให้โครงการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและจากการทำงานรวมถึงวิธีการแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำตลอดช่วงดำเนินการ โดยในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ไม่พบอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวก 71ข)

4.9 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

มาตรการกำหนดให้โครงการทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมและสถานะการเปลี่ยนแปลง ปัญหา และความต้องการระดับครัวเรือน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชนพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับ จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงแผนการกระจายตัวในการเก็บข้อมูล เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยได้ดำเนินการสำรวจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมครั้งล่าสุดในระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 (ภาคผนวก 38ข) สำหรับปี พ.ศ. 2566 จะดำเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566 รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป

มาตรการกำหนดให้โครงการมีการบันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูล การร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไข ปัญหา และมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ไว้ทุกครั้งเป็นประจำทุกปีละ 1 ครั้ง โดยในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการยังไม่ได้รับเรื่อง ร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ หรือหน่วยงานภายนอกแต่อย่างใด

นอกจากนี้โครงการจะมีการสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลจากแผนงานชุมชนสัมพันธ์ แผนงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประเมินผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมช่วงที่ ผ่านมาโดยพิจารณาในแง่สัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นและประโยชน์จากการดำเนินโครงการขั้นต้นทั้งในแง่ของ Output และ Outcome ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามโครงการหรือมาตรการเดิมถึงความเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการปรับปรุงแผนงาน ของโครงการในอนาคต ตามที่มาตรการกำหนดเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง
