

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ออกัส
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส เป็นผู้จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออกัส
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาวชญน ศิระยรรยง  ผู้จัดการอาคารชุด
นายวีระ มัคควิน  หัวหน้าช่างอาคาร
นายทิมพร มียะภาณี  ฝ่ายวิศวกรรม

ลงชื่อ  ผู้ลงนาม

(นายวีรพล ประจำดี)

(ผู้ทำหน้าที่แทนนิติบุคคลอาคารชุด ออกัส)

รายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ออกัส(ช่วงเปิดดำเนินการ)
เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖

- ๑ : ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดออกัส
(การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาคารชุดออกัส เลขที่อ้างอิง ๙๕๑๘)
- ๒ : สถานที่ตั้ง: ซอยเจริญกรุง๘๐ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร
- ๓ : จัดทำโดย : นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส
- ๔ : โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส.๑๐๐๙.๕/๑๑๘๕๙
: เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
- ๕ : โครงการได้นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย
: เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ทั้งนี้รายละเอียดและกิจกรรมในโครงการ,ประวัติความเป็นมาในการทำจัดทำรายงาน

ได้เสนอเนื้อหารายละเอียดในรายงานบทที่ ๑ (บทนำทั้งหมดแล้ว)

ပုဒ် ၁

august
←→
ပုဒ်

august



1.รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ อาคารชุดออกัส
2. สถานที่ตั้งโครงการ ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุดออกัส
4. รายละเอียดโครงการ


1.1.1)ลักษณะ/ประเภทโครงการ

โครงการอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องชุดอาศัยรวมทั้งสิ้น 406 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย 404 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 2 ห้อง เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทบางขนาด (พ.ศ.2537)

ปัจจุบันโครงการได้เปิดดำเนินการแล้ว มีผู้พักอาศัยที่อยู่ประจำประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด (ห้องพักทั้งหมด 404 ห้องชุด เข้าอยู่ 406 ห้องชุด แบ่งเป็นอยู่เอง 243 ห้องชุด และเช่า 163 ห้องชุด) โดยนิติบุคคลอาคารชุด ออกัส เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่เจ้าของร่วมสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความต้องการต่าง ๆ เกี่ยวกับการอยู่อาศัย รวมทั้งทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัย

august

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

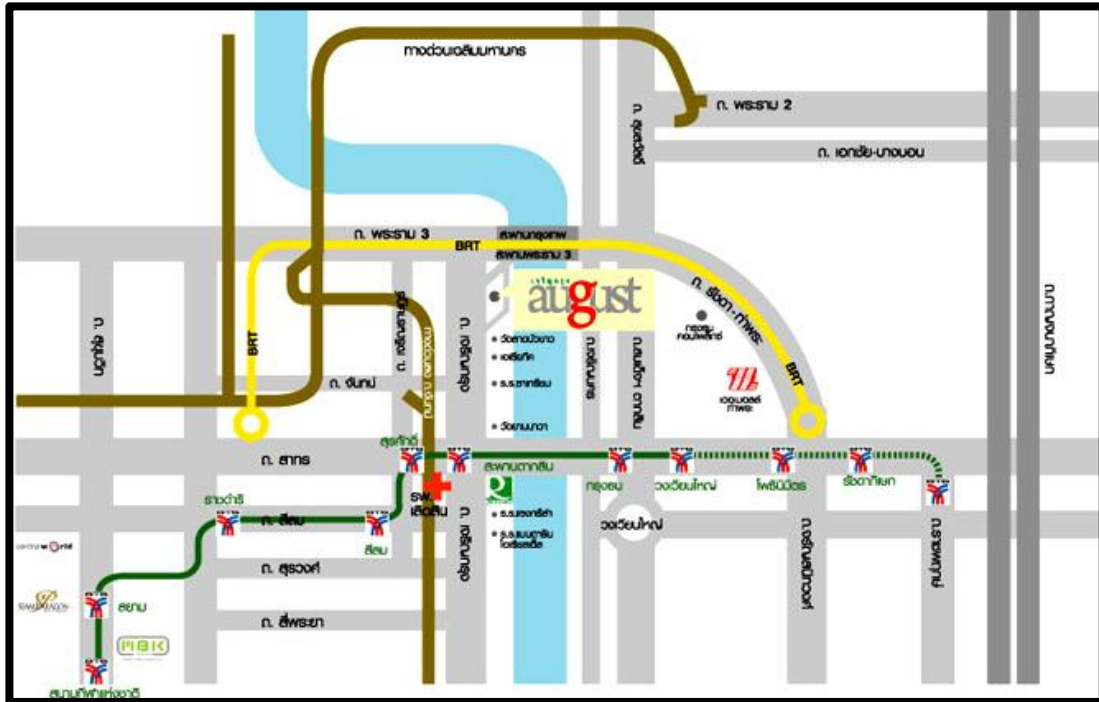

1.1.2) พื้นที่โครงการ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	พื้นที่ว่าง กว้างประมาณ 20 เมตร ถัดไปเป็นซอยเจริญกรุง 80 กว้างประมาณ 6 เมตร วิทยาลัยวิชาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเลื่อยจักรแสงทอง (ร้าง)
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ ถัดไปเป็นร้านเด็กฮวดแหบ รถยนต์ และอพาร์ทเมนต์ (ให้เช่า) สูง 3 ชั้น สุขทวีอาร์ทเมนต์ และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	โกดังสินค้าของโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง คลองสาธารณะ ประโยชน์ บ้านพักอาศัย เลขที่ 136 136/1-4 และบริษัท อู่ศุภเลิศการช่าง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	พื้นที่ว่างกว้างประมาณ 20 เมตร ซอยเจริญกรุง 80 กว้าง 6 เมตร ถัดไปเป็น โกดังสินค้าธนาคารกรุงไทย บ้านพักอาศัย 5 หลัง คลองสาธารณะประโยชน์ และอาคารพาณิชย์ (ร้าง)

2. กิจกรรมในโครงการ

➤ การบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีชนิด Activated Sludge

➤ ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นแบบระบบแยก (Separated system) โดยส่วนแรกจะเป็นการระบายน้ำฝน จากตัวอาคารที่ระบายลงสู่ท่อในแนวดิ่ง และไหลสู่ท่อระบายน้ำรอบโครงการ ส่วนที่สองจะเป็นท่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง

➤ การจัดการด้านการจราจรภายในโครงการ

โครงการได้จัดไว้สำหรับจอดรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้จำนวนสูงสุด 587 ช่องจอดรถ (ผู้พักอาศัยในโครงการปัจจุบัน ร้อยละ 43.96) และได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายการจราจรภายในโครงการ พร้อมทั้งจัด สร้างทางเข้า-ออก และจัดทิศทางจราจรภายในโครงการให้เป็นทิศทางเดียวในชั่วโมงเร่งด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรภายในโครงการ

3.ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดออกัส จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินการโครงการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)เลขที่อ้างอิง 9518 ที่ผ่านพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่กำหนดให้ โครงการต้องจัดส่งรายงานติดตามตรวจสอบฯ 2 ครั้งต่อปีคือภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของ เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน)

4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้โครงการต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามดัชนี คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้งจากโครงการ ระบบระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย น้ำใช้และการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ แตกต่างกันดังนี้

1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 1 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
2. ติดตามตรวจสอบจำนวนรถที่มีอยู่และเพิ่มขึ้นในโครงการเป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง
3. ตรวจสอบระบบส่งน้ำรวม และถังเก็บ เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง 3 เดือน/ครั้ง
5. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 3 เดือน/ครั้ง
6. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ 6 เดือน/ครั้ง
7. ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และดาฝ้าอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆสัปดาห์
8. จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง
9. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาลาม 2 เครื่องไว้บริเวณห้องเครื่องโดยมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
