

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการแอร์โร เฟลส (ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล 3 เฟส 3) ตั้งอยู่ที่ 34/1016 ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 10 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 1-0-9 ไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่พักอาศัยและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคโดยออกแบบให้มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ซึ่งประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 212 ห้อง และที่จอดรถพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักอาศัย

โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009/168 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 (ดังภาพผนวก ก) กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุดแอร์โรเฟลส ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแอร์โร เฟลส (ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล 3 เฟส 3) (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และถ่ายภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการแอร์โร เฟลส

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำใช้ระบบการระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย ระบบการจราจร ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบไฟฟ้า

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแอโรโด เทล (เพิ่มเติม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล 3 เฟส 3) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ส่งเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน	ดัชนีชี้ตรวจวัด - การวัดค่าเสียง - ความเร็ว - ช่วงเวลาจราจร ความถี่ - ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกผู้โดยสาร	- ตรวจสอบการบรรทุกผู้โดยสาร ซึ่งดำเนินการให้ในมาตรการลดผลกระทบหรือไม่	✓ - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ในช่วงระยะก่อสร้าง	-	-
2. คุณภาพน้ำ	ดัชนีชี้ตรวจวัด - BOD - SS - pH - Fecal Coliform Bact. - Oil & Grease - Residual Chlorine ความถี่ - ทุก 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย และจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดค่าแล้วของโครงการมาทำการตรวจวิเคราะห์	✓ - ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ จำนวน 2 จุด คือ น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย ในความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ตามพารามิเตอร์ที่กำหนด	-	ผลการตรวจวิเคราะห์ ดังตัวอย่างที่ 3.5.3 ภาคผนวก ค-1 ผล การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทิ้ง-น้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแอโร เทล (เพิ่มเติม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรภัยโคโมโดเทล 3 เฟส 3) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	ดัชนีชี้วัดรวมวัด - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ความถี่ - ปีที่ 1 ทุกๆ 3 เดือน - ปีที่ 2 ทุกๆ 4 เดือน - ปีต่อไปทุกๆ 6 เดือน	- ตรวจประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	✓ - ปัจจุบันทางโครงการมีได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ประจำโครงการเพื่อดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำสม่ำเสมอ แต่มีการจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตารางที่ 4-3	-
3. แหล่งน้ำใช้	ดัชนีชี้วัดรวมวัด - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) - การรั่วซึมหรือแตก ความถี่ - ปีที่ 1 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุกๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุกๆ 4 เดือน	- ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น เครื่องสูบน้ำ วาล์ว หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบท่อประปามีรอยรั่ว แตก ยุบตันหรือไม่ หากพบต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนเปลี่ยนโดยทันที	✓ - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา โดยการตรวจสอบ ติดตาม ซ่อมบำรุง เป็นประจำเพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพ	-	ภาพที่ 2.2-4 ระบบน้ำใช้
4. ระบบการระบายน้ำ	ดัชนีชี้วัดรวมวัด - การไหลของน้ำ ความถี่ - ทุกๆ 6 เดือน ดัชนีชี้วัดรวมวัด - การรั่วซึมหรือแตก ความถี่ - ทุกๆ 6 เดือน	- จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ (Manhole) ของโครงการ - ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในโครงการทุกๆ 6 เดือน หากมีรอยรั่วแตก หรือชำรุดต้องทำการแก้ไขโดยทันที	✓ - ทางโครงการแนะนำให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อพักน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากพบการแตกหัก ชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ทั้งนี้การตรวจสอบท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณดินตะกอนหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำ	-	-

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมโร เทล (เพิ่มเติม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิคมอุตสาหกรรม 3 เฟส 3) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การจัดการขยะมูลฝอย	ดัชนีชี้วัดรายวัน - การสุ่มกรอง แยก หรือคัดแยกขยะ ความถี่ - ทุกๆ 1 เดือน	- ตรวจสอบถังขยะส่วนกลางประจำแต่ละชั้น และถังขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ สามีการหมุนเวียนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไข	✓ - หางโครงการได้มอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดอาคารเป็นคู่ และตรวจสอบความสะอาดในการรองรับขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไปเป็นประจำทุกวัน ซึ่งหากพบว่าถังขยะชำรุด จะแจ้งให้บุคคลทำความสะอาดแก้ไข	-	-
	ดัชนีชี้วัดรายวัน - ปริมาณขยะ ความถี่ - ทุกวัน	- ตรวจสอบการคัดแยกขยะของขยะตามถังขยะรวมและห้องพักขยะรวมที่มีการคัดแยกขยะต้องรีบแจ้งให้พนักงานทำความสะอาดเมื่อเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ	✓ - สำนักรับงานเขตตอนเมืองจะเข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจำทุก 2 วัน/ครั้ง แต่หากปริมาณขยะมีจำนวนมากเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เข้ามาเก็บเร็วขึ้น	-	ภาพที่ 2.2-6 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
6. ระบบการจราจร	ดัชนีชี้วัดรายวัน - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความถี่ - ทุกๆ 1 เดือน	- ตรวจสอบตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	✓ - เจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบใช้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเป็นประจำ	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบไฟฟ้า
	ดัชนีชี้วัดรายวัน - ความถี่ ความถี่ - ทุกๆ 1 เดือน	- ตรวจสอบตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางจราจร ป้ายแสดงทางเข้า-ออก เป็นต้น	✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบการจราจร สัญญาณจราจรเป็นประจำ	-	-
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย	ดัชนีชี้วัดรายวัน - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ความถี่ - ทุก 2 ครั้ง/ปี	- ตรวจสอบความพร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้นของอาคารพักอาศัย	✓ - โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้และอยู่เสมอเป็นประจำทุกวัน หากพบว่าการชำรุด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งให้บุคคลจิตอาสาเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาทันที	-	ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแอโร เทล (เพิ่มเติม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล 3 เฟส 3) (ระยะดำเนินงาน)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. ไฟฟ้า	ดัชนีที่ตรวจวัด - การใช้งานหรือการชำรุด ความถี่ - ทุกๆ 1 เดือน	- ตรวจสอบไฟส่องสว่างตามแนวทางเดินในอาคาร และส่วนบริการสาธารณชนในจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจสอบสายไฟฟ้าในจุดต่างๆ	✓ ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการเป็นประจำ	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบไฟฟ้า

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแอร์โร เฟลส (ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล 3 เฟส 3) ได้มีการกำหนดให้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณน้ำทิ้งหลังการบำบัด ในความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวัดดังนี้ บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid ;SS) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (fecal coliform Bact.) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และคลอรีน (Residual Chlorine)

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการแอร์โร เฟลส (ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล 3 เฟส 3) ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอพารามิเตอร์ ตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการการตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำทิ้งหลังการบำบัด	- BOD - Total Suspended Solid - pH - Fecal Coliform Bacteria - Fat Oil & Grease - Residual Chlorine	- 5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method - Total Suspended Solids Dried At 103-105 oC - Electrometric Method - Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure - Soxhlet-Extraction Method - DPD Colorimetric Method	30/06/66	APHA-AWWA-WEF Edition 23 rd ed,2017

3.5.3 คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งหลังการบำบัด)

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแอร์โร เฟลส กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย 4 เดือน/ครั้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณน้ำทิ้งหลังการบำบัด ในพารามิเตอร์ บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Total Suspended Solid) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (fecal coliform) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และคลอรีน (Residual Chlorine) อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โครงการจึงกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด ดังภาพที่ 3.5.3-1 ได้แก่ บริเวณน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณน้ำหลังการบำบัด ในความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ดังตารางที่ 3.5.3-1

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย


จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณน้ำหลังการบำบัด พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)



จุดที่ 1 น้ำที่ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย



จุดที่ 2 น้ำที่ขอยกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

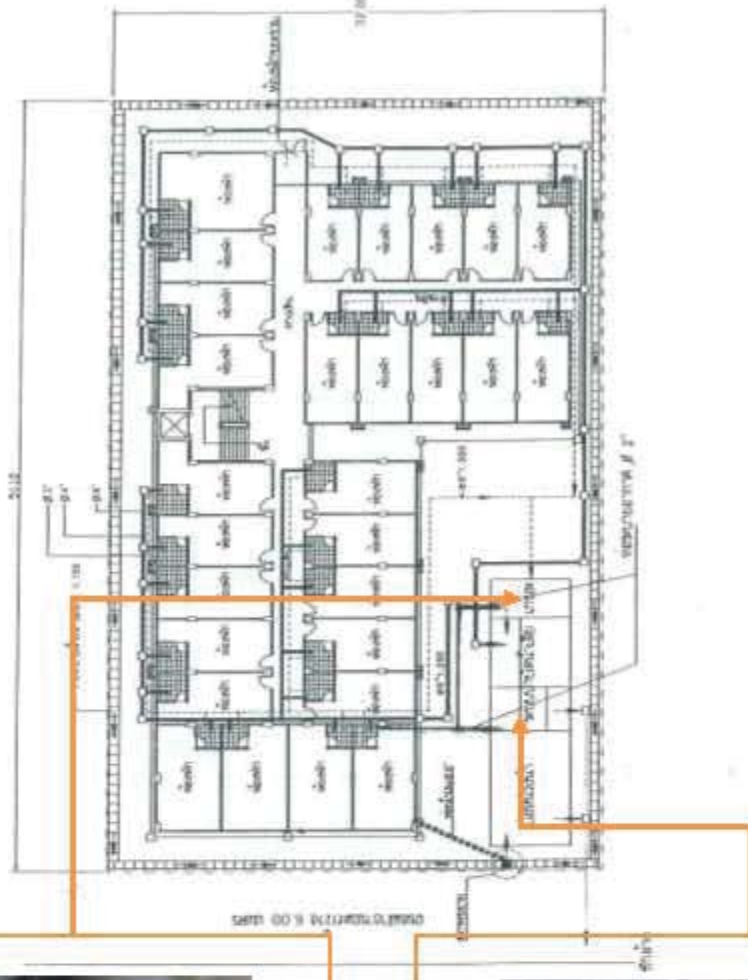

ภาพที่ 3.5.3-1 เก็บน้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์					
		pH	BOD (mg/L)	Residual Chlorine (mg/L)	Total Suspended solid (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Collform Bacteria (MPN/100mL)
น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	30/06/66	7.4	146	0.01	768	20	35000000
น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	30/06/66	7.5	7	0.01	<10	<2	13000
มาตรฐาน		5.0-9.0	≤30	-	≤40	≤20	-

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์
ผู้วิเคราะห์



เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณน้ำก่อนเข้าระบบ
บำบัดน้ำเสีย และบริเวณน้ำหลังการบำบัด พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด (ประเภท ข)

ตารางที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย


จุดเก็บตัวอย่าง	รับ/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์					
		pH	BOD (mg/L)	Residual Chlorine (mg/L)	Total Suspended solid (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Collform Bacteria (MPN/100mL)
น้ำก่อนส่งระบบบำบัดน้ำเสีย	30/11/64	7.6	135	0.02	1460	135	49000000
	08/12/64	7.5	142	<0.01	1392	102	33000000
	26/04/65	8.2	148	0.05	1925	151	49000000
	22/08/65	7.5	357	<0.01	1791	109	78000
	27/12/65	7.8	159	0.04	9789	93	33000000
	30/06/66	7.4	146	0.01	768	20	35000000
น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	30/11/64	7.5	6	0.01	<10	<2	24000
	08/12/64	7.1	5	<0.01	<10	<2	24000
	26/04/65	8.1	<4	0.03	<10	<2	2000
	22/08/65	7.5	4	<0.01	<10	<2	4500
	27/12/65	8.0	6	0.03	<10	<2	1300
	30/06/66	7.5	7	0.01	<10	<2	13000
มาตรฐาน		5.0-9.0	≤30	-	≤40	≤20	-

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)



ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดแลวิเคราะห์
ผู้วิเคราะห์





ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ในปี พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน

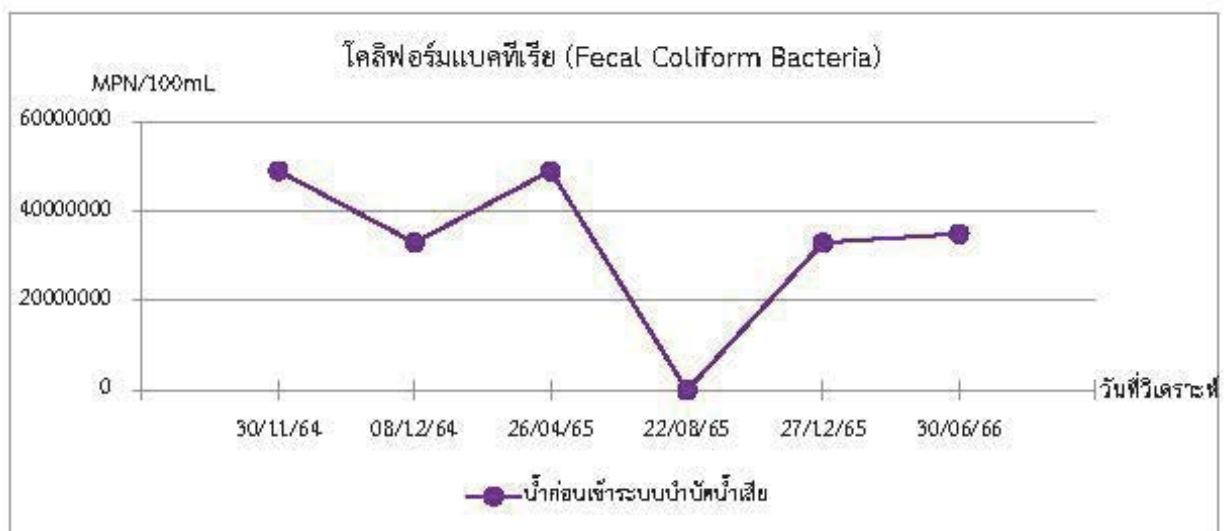

ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ในปี พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน

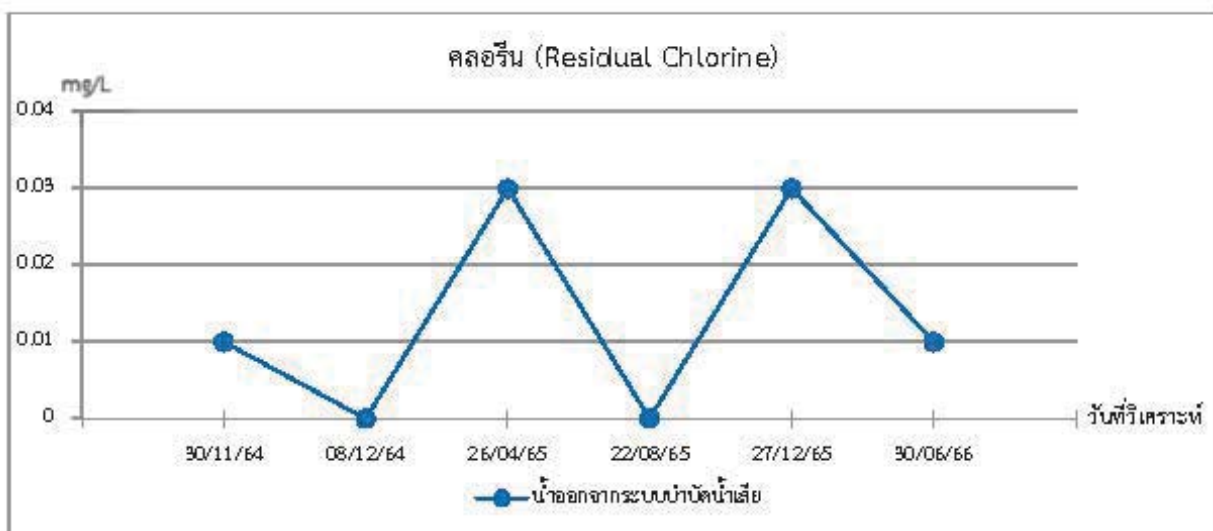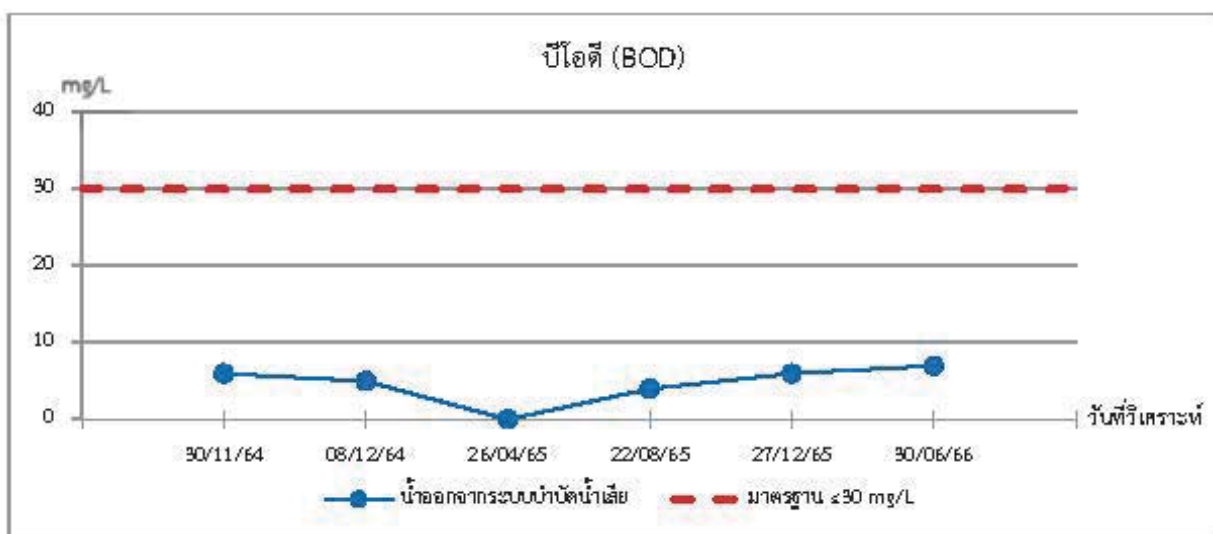

ภาพที่ 3.5.3-3 กราฟเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ส่งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ในปี พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน

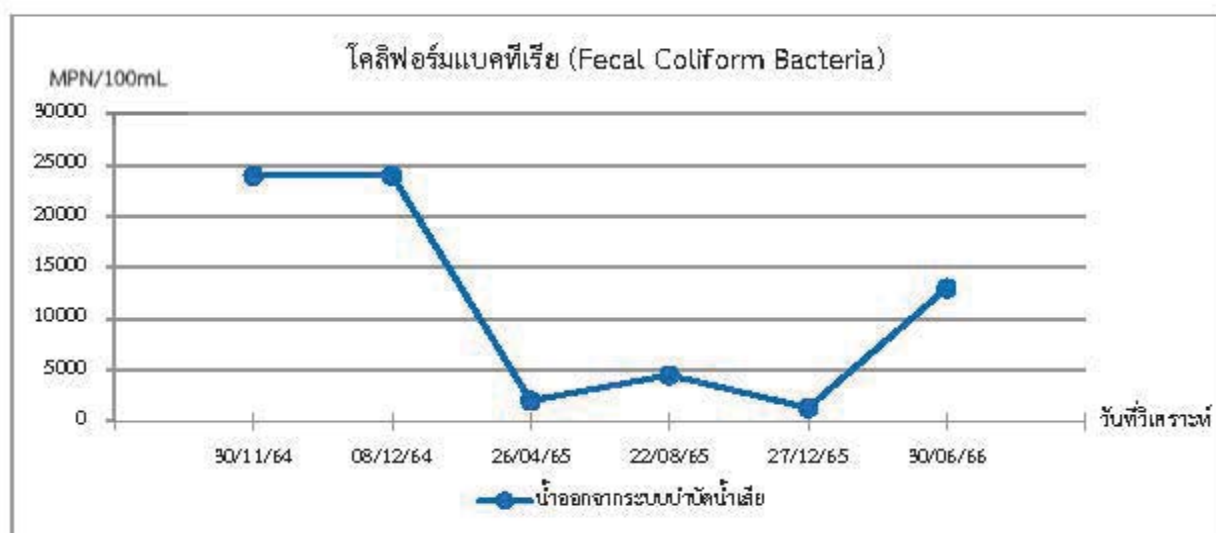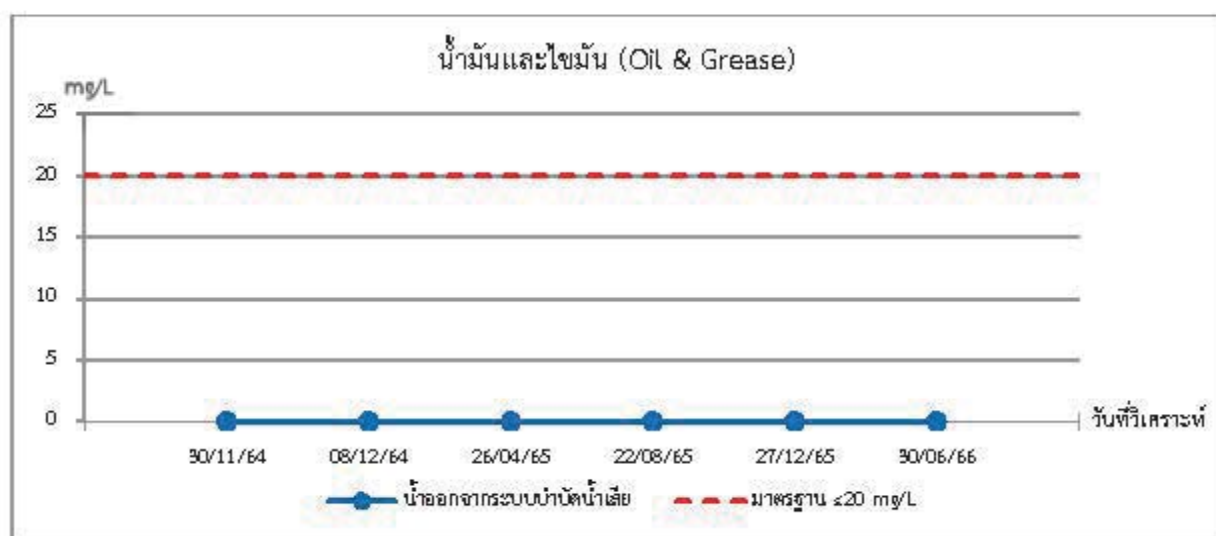

ภาพที่ 3.5.3-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งนํ้าออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ในปี พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน
