

### บทที่ 3

## ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การโยกย้ายถิ่นฐาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ “ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์” มีแนวโน้มเติบโตตามสัดส่วนที่แปรผันตรง ทั้งนี้โครงการ The Cloud เป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้างต้น พัฒนาโดย บริษัท ตรง จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยเกษตรสิน 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารชุด สูง 20 ชั้น 2 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร โดยอาคารมีความสูง 62.77 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นหน้าไฟทางอากาศ) มีจำนวนห้องพักอาศัย 161 ห้อง และมีจำนวนที่จอดรถยนต์ 41 คัน และพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นขนาด 627 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 10,749 ตารางเมตร โดยจะก่อสร้างบนพื้นที่ดินขนาด 1 ไร่ 52 ตารางวา หรือ 1,808 ตารางเมตร โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009.5/864 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 (ภาคผนวก ก) ทั้งนี้ ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทางโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

### 3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุน และการวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Cloud

### 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ซึ่งประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศ/ดินและการชะล้างพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียง ทรัพยากรน้ำ การใช้น้ำ คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า การจราจร การป้องกันอัคคีภัย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพและการท่องเที่ยว สรรพมูลทรัพย์ และผลกระทบทางสุขภาพ

### 3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม                        | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                          | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                                          | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. สภาพภูมิประเทศ/<br>ดินและการชะล้าง<br>พังทลาย | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ตรวจสอบสภาพรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มี<br>สภาพดีอยู่เสมอ<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                     | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ                                                     | ✓<br>- พนักงานทำความสะอาด พนักงานสวน และช่างเทคนิคประจำอาคาร รับหน้าที่<br>ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว<br>ดำเนินไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ทั้งนี้หากพบว่ารั้วบริเวณที่ตน<br>ปฏิบัติงานเกิดความเสียหาย พนักงานฯ จะดำเนินการจำกัดการเข้าถึง (กันเขต-<br>แจ้งเตือน) และแจ้งต่อนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อจัดสรรทรัพยากรสำหรับ<br>ซ่อมแซม/ทดแทน ต่อไปอนึ่งนับแต่เปิดดำเนินการโครงการมาความเสียหายต่อรั้ว<br>โดยรอบยังไม่เกิดขึ้น ปัจจุบันยังคงมีสภาพสมบูรณ์ดี | -                             | -                                                             |
|                                                  | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของ<br>โครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ                                                     | ✓<br>- โครงการมอบหมายให้พนักงานส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็น “ผู้ดูแลสวน” โดย<br>กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือกิจกรรมใดที่มี<br>วัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ ไม้พุ่ม และหญ้า<br>ภายในพื้นที่โครงการ จะได้รับการปฏิบัติ อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการ<br>ดำเนินการในทุกวัน                                                                                                                                                                                             | -                             | ภาพที่ 2.2-1 การบริหาร<br>จัดการพื้นที่สีเขียว และ<br>การดูแล |
| 2. คุณภาพอากาศ                                   | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ความเร็วของรถยนต์แล่นเข้า-ออกพื้นที่<br>โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ           | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ถนนโดยรอบพื้นที่โครง-<br>การ                                                 | ✓<br>- ความเร็วในการสัญจรภายในพื้นที่โครงการจะถูกควบคุมด้วยป้ายจำกัด<br>ความเร็ว (20 กิโลเมตร/ชั่วโมง) และลักษณะทางสัญจรเป็นหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                             | ภาพที่ 2.2-4 การบริหาร<br>จัดการระบบจราจร                     |
|                                                  | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะ<br>จอดรถ” และความสมบูรณ์ของป้าย<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ           | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่อง-<br>ยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่<br>จอดรถยนต์ของโครงการ | ✓<br>- ป้ายที่ให้ความหมายในการยุติการสันดาปเครื่องยนต์ได้รับการติดตั้งใน<br>บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้พนักงานทำความ<br>สะอาดจะทำหน้าที่ในการดูแลให้ลบเลือนต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                             | ภาพที่ 2.2-4 การบริหาร<br>จัดการระบบจราจร                     |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                              | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2. คุณภาพอากาศ<br>(ต่อ)   | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ<br><b>ความถี่</b><br>- ทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ                             | ✓                                                                                                                                                               | - โครงการมอบหมายให้พนักงานส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็น “ผู้ดูแลสวน” โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือกิจกรรมใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ ไม้พุ่ม และหญ้าภายในพื้นที่โครงการ จะได้รับการปฏิบัติ อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการในทุกวัน          | -                             | ภาพที่ 2.2-1 การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และการดูแล |
|                           | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง<br>- ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง<br>- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในเวลา 1 ชั่วโมง<br>- ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ในเวลา 24 ชั่วโมง<br>- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง<br>- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง<br><b>ความถี่</b><br>- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ และรายงานผลการตรวจวัดต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมืองพัทยา ทุก 6 เดือน | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- กำหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 สถานี คือ 1) พื้นที่โครงการ | ✕                                                                                                                                                               | - ไม่ปรากฏการตรวจวัดคุณภาพอากาศในระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาศักยภาพของโครงการซึ่งเป็นเพียงอาคารชุดพักอาศัย ไม่มีกิจกรรมที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในระดับที่เกินกว่าปกติ มาตรการฯ ดังกล่าวจัดถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมต่อบริบทโครงการ | ตารางที่ 4.3                  | -                                                     |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                              | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. เสียง                  | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)<br>- ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง)<br>- ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)<br><b>ความถี่</b><br>- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ<br>และรายงานผลการตรวจวัดต่อ สำนักงาน<br>นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม และเมืองพัทยา ทุก 6 เดือน | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- กำหนดสถานีตรวจวัดเสียง<br>จำนวน 1 สถานี คือ<br>1) พื้นที่โครงการ | ✕                                                                                                                                                               | - ไม่ปรากฏการตรวจวัดระดับเสียง ในระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง<br>มิถุนายน 2566 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาศักยภาพของโครงการซึ่งเป็นเพียงอาคาร<br>ชุดพักอาศัย ไม่มีกิจกรรมที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดระดับเสียงใน<br>ระดับที่เกินกว่าปกติ มาตรการฯ ดังกล่าวจัดถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่<br>เหมาะสมต่อบริบทโครงการ | ตารางที่ 4.3                  | -                                                                                           |
|                           | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                               | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- บริเวณป้อมยาม                                                    | ✓                                                                                                                                                               | - กล้องรับฟังความคิดเห็นได้รับการติดตั้งภายในพื้นที่โครงการเป็นที่<br>เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากโครงการไม่มีป้อมยามภายนอกอาคาร จึงย้าย<br>จุดติดตั้งมาเป็นภายในอาคารชั้นที่ 1 ใกล้กับจุดประชาสัมพันธ์ และจุดรักษา<br>ความปลอดภัย                                                                           | -                             | ภาพที่ 2.2-2 การบริหาร<br>จัดการด้านสังคม                                                   |
| 4. ทรัพยากรน้ำ            | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                 | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                         | ✓                                                                                                                                                               | - ปัจจุบันโครงการ The Cloud อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท<br>ดับเบิลยูเอเอ็ม.รุ่งเรือง แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์<br>ทางด้านการบริหาร และการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งมี<br>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารดูแลระบบสาธารณูปโภค<br>และระบบสุขาภิบาลเป็นอย่างดี       | -                             | ภาคผนวก ค-4 Check<br>Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ<br>การดูแลระบบสาธารณูป-<br>โภค และระบบสุขาภิบาล |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                             | บริเวณที่ตรวจวัด                            | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. ทรัพยากรน้ำ<br>(ต่อ)   | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ระบบระบายน้ำต้องไม่อุดตัน<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                                                      | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ระบบระบายน้ำ   | ✓<br>- ผู้พัฒนาโครงการได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ช่างเทคนิคประจำอาคารจะมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซึ่งหากพบกว่ามีความผิดปกติจะเร่งดำเนินการแก้ไข-ซ่อมแซม โดยทันที นอกจากนี้โครงการกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำ ทุกๆ 30 วัน เป็นเหตุให้นับแต่เปิดดำเนินโครงการมาปัญหาน้ำท่วมขังภายในโครงการจึงยังไม่เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                             | ภาพที่ 2.2-10 การบริหารจัดการระบบระบายน้ำ                                                                               |
| 5. การใช้น้ำ              | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ระบบท่อจ่ายน้ำ | ✓<br>- โครงการจัดให้ช่างเทคนิคประจำอาคารทำหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบประปาของโครงการ ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบเส้นท่อ และระบบจ่ายน้ำประปา สำหรับระบบเส้นท่อนั้นโครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาแบบ “การบำรุงรักษาภายหลังเกิดเหตุขัดข้อง” เนื่องจากท่อจ่ายน้ำประปาเป็นระบบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร มีขนาดของระบบที่กว้างขวาง และถูกก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง “การบำรุงรักษาภายหลังเกิดเหตุขัดข้อง” จึงมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้การทราบถึงเหตุขัดข้องของระบบเส้นท่อสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจสอบแรงดัน เรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัย พนักงาน หรือแม้แต่ผู้รับเหมา ส่วนระบบจ่ายน้ำประปานั้น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องจักรที่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโครงการจึงจัดให้มีการบำรุงรักษาแบบ “การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน” เป็นหลัก กล่าวคือระบบดังกล่าวมุ่งเน้นให้ทำการซ่อมแซมก่อนที่ระบบจะเสียหายหรือขัดข้องซึ่งสามารถกระทำผ่าน Check Sheet และแผนการบำรุงรักษา เป็นหลัก ทั้งนี้การบำรุงรักษาใดก็ตามเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามี ความไม่สมบูรณ์โครงการจะดำเนินการ ซ่อมแซมโดยทันที | -                             | ภาคผนวก ค-4 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล ภาพที่ 2.2-8 การบริหารจัดการระบบน้ำใช้ |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 5. การใช้น้ำ (ต่อ)        | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- สี (Colour), Pt-Co unit<br>- รส (Taste)<br>- กลิ่น (Odour)<br>- ความขุ่น (Turbidity), NTU<br>- ความเป็นกรด-ด่าง (PH range)<br>- ปริมาณเหล็กทั้งหมด<br>- ความกระด้างของน้ำ<br>- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)<br>- อีโคไล (E.coli)<br><b>ความถี่</b><br>- ทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้น<br>ดาดฟ้า การปนเปื้อนของ<br>มลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจ<br>มีผลต่อสุขภาพของผู้พัก<br>อาศัย | ✓<br>- โครงการได้จัดให้มีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการดัง<br>ภาพที่ 3.5.5-1 การเก็บตัวอย่างน้ำใช้ โดยประกอบไปด้วยพารามิเตอร์<br>และความถี่ตามมาตรการกำหนด ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลทาง<br>ห้องปฏิบัติการ พบว่าคุณภาพน้ำใช้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน โดย<br>อ้างอิงเกณฑ์คุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาค (อ้างอิงกรมการอนามัยโลก)<br>ผลดังตารางที่ 3.5.5-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ | -                             | ภาคผนวก ง-1 ผลการ<br>วิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ |
|                           | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- แซลโมเนลลา (Salmonella)<br>- ล้างทำความสะอาด<br><b>ความถี่</b><br>- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                     | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้น<br>ดาดฟ้า การปนเปื้อนของ<br>มลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจ<br>มีผลต่อสุขภาพของผู้พัก<br>อาศัย | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                            |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                                | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. คุณภาพน้ำทิ้ง          | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ความเป็นกรดและด่าง (PH)<br>- บีโอดี (BOD)<br>- สารแขวนลอย (Suspended Solids)<br>- ซัลไฟด์ (Sulfide)<br>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)<br>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)<br>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)<br>- ทีเคเอ็น (TKN)<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- บริเวณบ่อดักคุณภาพน้ำทิ้ง<br>ก่อนและหลังออกจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย | ✓<br>- ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 โครงการได้มอบให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโดยมีจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อดักคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในพารามิเตอร์ และความถี่ตาม มาตรการฯ กำหนด ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่าพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) โดยผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5.6-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง อนึ่ง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะเข้าสู่ระบบรวบรวม น้ำเสียของเมืองพัทยา โดยมีปลายทางที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นเหตุให้ผลกระทบต่อชุมชนยังคงอยู่ในระดับต่ำ | -                             | ภาคผนวก ง-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย                                                                                       |
|                           | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย<br><b>ความถี่</b><br>- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ                     | ✓<br>- เครื่องจักรที่มีใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสีย จะได้รับการตรวจสอบความผิดปกติโดยช่างเทคนิคประจำอาคารอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสอบดังกล่าวจะยึดตาม Check Sheet และประสานสัมผัสทั้ง 5 เป็นหลัก โดยในกรณีที่พบความผิดปกติ ช่างฯ จะพิจารณาขนาดของปัญหา หากมีขนาดเล็กและช่างฯ สามารถซ่อมแซมเองได้ ก็จะดำเนินการทันที แต่ในกรณีที่ปัญหามีขนาดใหญ่ก็จะให้ผู้รับเหมาภายนอกเข้ามาแก้ไข โดยขณะนั้นช่างฯ จะกันเขตจำกัดการเข้าถึง และแก้ไขเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                             | ภาคผนวก ค-4 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล ภาพที่ 2.2-9 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม         | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                              | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                                                            | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6. คุณภาพน้ำทิ้ง<br>(ต่อ)         | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำเสีย<br><b>ความถี่</b><br>- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ<br>และรายงานผลต่อ สำนักงานนโยบายและ<br>แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ<br>เมืองพัทยา เดือนละ 1 ครั้ง                             | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบ<br>โครงการ และบ่อดักมูลฝอย<br>บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบาย<br>น้ำสาธารณะ | ✓<br>- ผู้พัฒนาโครงการได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ช่วง<br>เทคนิคประจำอาคารจะมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรเป็นประจำ<br>อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติจะเร่งดำเนินการแก้ไข-<br>ซ่อมแซม โดยทันที นอกจากนี้โครงการกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาด<br>ท่อ/รางระบายน้ำ ทุกๆ 30 วัน เป็นเหตุให้นับแต่เปิดดำเนินโครงการมา<br>ปัญหาน้ำท่วมขังภายในโครงการจึงยังไม่เกิดขึ้น                            | -                             | ภาพที่ 2.2-10 การบริ-<br>หารจัดการระบบระบาย<br>น้ำ |
|                                   | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ พร้อมแจ้งหน่วยงาน<br>เข้ามาสูบล้าง<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                          | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- บ่อเกรอะ                                                                                       | ✓<br>- โดยปกติการสูบล้างจะพิจารณาจากปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจริงเป็น<br>หลัก ทั้งนี้ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 โครงการยังไม่มี<br>การสูบล้างในส่วนถังเก็บตะกอนแต่อย่างใด                                                                                                                                                                                                                                                      | -                             | -                                                  |
| 7. คุณภาพน้ำในถัง<br>เก็บน้ำสำรอง | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- สี (Colour), Pt-Co unit<br>- รส (Taste)<br>- กลิ่น (Odour)<br>- ความขุ่น (Turbidity), NTU<br>- ความเป็นกรด-ด่าง (PH range)<br>- ปริมาณเหล็กทั้งหมด<br>- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform<br>Bacteria)<br>- ความกระด้าง | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ถังเก็บน้ำใต้ดิน<br>- ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า                                                     | ✓<br>- โครงการได้จัดให้มีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการดัง<br><b>ภาพที่ 3.5.5-1 การเก็บตัวอย่างน้ำใช้</b> โดยประกอบไปด้วยพารามิเตอร์<br>และความถี่ตามมาตรการกำหนด ทั้งนี้ ผลการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล<br>ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตาม<br>มาตรฐาน โดยอ้างอิงเกณฑ์คุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาค (อ้างอิง<br>กรมการอนามัยโลก) ผลดัง <b>ตารางที่ 3.5.5-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้</b> | -                             | ภาคผนวก ง-1 ผลการ<br>วิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้         |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม               | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                       | บริเวณที่ตรวจวัด                                            | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. คุณภาพน้ำในถัง<br>เก็บน้ำสำรอง (ต่อ) | - อีโคไล (E.coli)<br><b>ความถี่</b><br>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                               |
| 8. การระบายน้ำ<br>และป้องกันน้ำท่วม     | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- การอุดตันหรือตันเขิน<br><b>ความถี่</b><br>- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลังฤดูฝน<br>ตลอดระยะดำเนินการ                                           | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ท่อระบายน้ำของโครงการ          | ✓                                                                                                                                                               | - ช่างเทคนิคประจำอาคารจะมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในระบบระบายน้ำเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซึ่งหากพบกว่ามีความผิดปกติจะเร่งดำเนินการแก้ไข-ซ่อมแซม โดยทันที นอกจากนี้โครงการกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำ ทุกๆ 30 วัน เป็นเหตุให้นับแต่เปิดดำเนินการมาปัญหาน้ำท่วมขังภายในโครงการจึงยังไม่เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                             | ภาพที่ 2.2-10 การบริหารจัดการระบบระบายน้ำ                                                                                     |
|                                         | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- การแตกรั่วหรือชำรุด หากพบว่าการแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว<br><b>ความถี่</b><br>- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ท่อระบายน้ำบ่อกักน้ำของโครงการ | ✓                                                                                                                                                               | - โครงการจัดให้ช่างเทคนิคประจำอาคารทำหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อระบายน้ำ และบ่อกักน้ำของโครงการ ซึ่งระบบดังกล่าวโครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาแบบ “การบำรุงรักษาภายหลังเกิดเหตุขัดข้อง” เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำ และบ่อกักน้ำเป็นระบบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร มีขนาดของระบบที่กว้างขวาง และถูกก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง “การบำรุงรักษาภายหลังเกิดเหตุขัดข้อง” จึงมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้การทราบถึงเหตุขัดข้องของระบบเส้นท่อสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจสอบแรงดัน (ของเครื่องปั้มน้ำออก) เรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัย พนักงาน ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีความไม่สมบูรณ์โครงการจะดำเนินการ ซ่อมแซมโดยทันที | -                             | ภาพที่ 2.2-10 การบริหารจัดการระบบระบายน้ำ<br>ภาคผนวก ค-4 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                  | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                                        | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 9. การจัดการมูลฝอย        | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย<br>- ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย<br>- สภาพทั่วไป (การชำรุด)<br>- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย<br>- หอพักมูลฝอยประจำชั้น<br>และหอพักรวมมูลฝอย      | ✓<br>- ภายหลังจากพนักงานทำความสะอาดทำการคัดแยกและขนย้ายขยะภายในห้องพักขยะประจำชั้นเพื่อนำมายังพื้นที่เก็บขยะของเมืองพัทยา พนักงานทำความสะอาดของโครงการจะตรวจเช็คถังขยะเสมอทุกครั้ง หากพบมีรายรั่วหรือแตก พนักงานทำความสะอาดจะแจ้งต่อฝ่ายนิติฯ เพื่อทำการจัดซื้อมาเปลี่ยนทดแทนโดยทันที                                                                                                                                                                                                                                          | -                             | ภาพที่ 2.2-11 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย                     |
| 10. การใช้ไฟฟ้า           | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ             | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ                     | ✓<br>- ในเบื้องต้นพนักงานทำความสะอาดจะเป็นผู้ตรวจสอบสภาพทั่วไปของโคมไฟส่องสว่าง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ทั้งนี้ในกรณีที่พบความเสียหายจนอาจเป็นอันตราย พนักงานทำความสะอาดจะแจ้งไปยังช่างเทคนิคประจำอาคารโดยเร็ว อนึ่งโครงการมีหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับเปลี่ยนทดแทนทันที                                                                                                                                                                                                        | -                             | ภาพที่ 2.2-5 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน |
| 11. การจราจร              | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ระบบส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ถนนและบริเวณทางเข้า-ออก<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                                               | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ถนนและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | ✓<br>- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่จอดรถ และพื้นที่โดยรอบได้รับการติดตั้งมาตั้งแต่แรกเริ่มโครงการ โดยลักษณะการติดตั้งดังกล่าวยังคงเพียงพอต่อการดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยในการเข้า-ออก และการสัญจรของรถยนต์ ทั้งนี้ในเบื้องต้นพนักงานทำความสะอาดจะเป็นผู้ตรวจสอบสภาพทั่วไปของโคมไฟส่องสว่าง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ทั้งนี้ในกรณีที่พบความเสียหาย พนักงานทำความสะอาดจะแจ้งไปยังช่างเทคนิคประจำอาคารโดยเร็ว อนึ่งโครงการมีหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับเปลี่ยนทดแทนทันที | -                             | ภาพที่ 2.2-4 การบริหารจัดการระบบจราจร                      |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                    | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                          | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. การจราจร (ต่อ)        | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ ถ้าชำรุดให้รีบซ่อมแซม<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ           | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้ายแสดงทางเข้า-ออก | ✓<br>- โครงการมีเจ้าหน้าที่หลายๆ ส่วนที่ปฏิบัติในพื้นที่ลานจอดรถ ถนน และบริเวณอื่นที่เป็นที่ตั้งของป้าย และสัญลักษณ์จราจร ทั้งนี้นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หลักของตนแล้ว การตรวจสอบความเสียหาย หรือความไม่สมบูรณ์ของป้าย และสัญลักษณ์จราจร ในบริเวณที่ตนปฏิบัติงาน ก็เป็นอีกหน้าที่ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ทั้งนี้หากพบความเสียหายให้ดำเนินการแจ้งต่อนิติบุคคลฯ เพื่อจัดสรรทรัพยากรในการซ่อมแซมต่อไป | -                             | ภาพที่ 2.2-4 การบริหารจัดการระบบจราจร                                                                                                                    |
|                           | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- จำนวนที่จอดรถยนต์ 41 คัน<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                                       | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้คือ 41 คัน               | ✓<br>- โครงการมีพื้นที่จอดรถยนต์รวม 41 คัน โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานพื้นที่จอดรถ 21 คัน และมีบางส่วนใช้งานเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งเมื่อห้กลับแล้วพบว่าปัจจุบันพื้นที่จอดรถของโครงการยังคงเพียงพอต่อการใช้งาน                                                                                                                                                                                  | -                             | ภาพที่ 2.2-4 การบริหารจัดการระบบจราจร                                                                                                                    |
| 12. การป้องกันอัคคีภัย    | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร<br><b>ความถี่</b><br>- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร                         | ✓<br>- ช่างเทคนิคประจำอาคาร รับหน้าที่ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ โดยความถี่ของการตรวจสอบแต่ละอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ระบุในคู่มือผู้ผลิตเป็นขั้นต่ำ แต่อย่างน้อยจะมีการดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบความเสียหายต่างๆ จะแจ้งให้หน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อทำการซ่อมแซมโดยเร็ว                               | -                             | ภาคผนวก ค-4 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล<br>ภาพที่ 2.2-3 การบริหารจัดการด้านอัคคีภัย ความปลอดภัย และการสาธารณสุข |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม    | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                     | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                         | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- การซ้อมอพยพหนีไฟ<br><b>ความถี่</b><br>- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ                                  | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- การซ้อมอพยพหนีไฟ                                            | ✓                                                                                                                                                               | - โครงการมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดดำเนินการวันที่ 29 กันยายน 2565                                                                                                                                                                                                            | -                             | ภาคผนวก ค-7 เอกสารรับรองการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ภาพที่ 2.2-3 การบริหารจัดการด้านอัคคีภัยฯ |
| 13. สภาพเศรษฐกิจและสังคม     | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- สภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                         | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร                   | ✓                                                                                                                                                               | - ช่างเทคนิคประจำอาคารรับหน้าที่ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกล้อง CCTV เป็นประจำทุกวัน ผ่านหน้าจอควบคุมกล้อง CCTV ทั้งนี้เมื่อปรากฏว่ามีสัญญาณขาดหาย หรือไม่มีการบันทึกภาพ ช่างฯ จะติดต่อไปยังหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านนี้โดยตรงเข้ามาตรวจสอบ และแก้ไข                                            | -                             | ภาพที่ 2.2-3 การบริหารจัดการด้านอัคคีภัย ความปลอดภัย และการสาธารณสุข                         |
| 14. สุขภาพและการท่องเที่ยว   | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ | ✓                                                                                                                                                               | - โครงการมอบหมายให้พนักงานส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็น “ผู้ดูแลสวน” โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือกิจกรรมใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ ไม้พุ่ม และหญ้าภายในพื้นที่โครงการ จะได้รับการปฏิบัติ อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการในความถี่ทุกวัน             | -                             | ภาพที่ 2.2-1 การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และการดูแล                                        |
| 15. สระว่ายน้ำ               | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- รั้วหรือกำแพง และบริเวณของสระว่ายน้ำ<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                            | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- สถานที่ตั้ง                                                 | ✓                                                                                                                                                               | - ความสมบูรณ์ของสระว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็น รั้วรอบสระ พื้นรอบสระ ตัวสระ และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ประกอบจะได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานทำความสะอาดที่ปฏิบัติงานประจำชั้นนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่พบความเสียหายพนักงานฯ จะแจ้งต่อผู้รับผิดชอบโดยทันที พร้อมจำกัดการเข้าถึง และยุติการใช้งานสระหากความเสียหายนั้นมีขนาดใหญ่ | -                             | ภาพที่ 2.2-7 การบริหารจัดการสระว่ายน้ำ                                                       |
|                              | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- บริเวณสระว่ายน้ำ<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                                                | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- สระว่ายน้ำและ อาคารประกอบ                                   | ✓                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                              |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 15. สระว่ายน้ำ (ต่อ)      | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ค่าความเป็นกรดและด่าง (PH)<br>- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)<br><b>ความถี่</b><br>- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จุดลึก 1 จุด และจุดตื้น 1 จุด ขณะที่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ และเป็นบริเวณที่คนไปใช้มากที่สุด | ⊙<br>- ปัจจุบันโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในพารามิเตอร์ค่าความเป็นกรดและด่าง (PH) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ในความถี่วันละ 1 ครั้ง และกระทำใน 1 จุดตรวจวัด ทั้งนี้ด้วยเพราะโครงการมีการใช้งานสระเพียงความลึกเดียว ประกอบกับจำนวนผู้ใช้งานสระว่ายน้ำยังคงอยู่ในระดับต่ำ การตรวจวัดเพียง 1 ครั้ง ก็เพียงพอต่อการบำรุงรักษา และควบคุมคุณภาพน้ำ                                                                                                                                           | ตารางที่ 4.3                  | ภาคผนวก ง-4 ผลการตรวจวัด pH และ Cl2 สระว่ายน้ำ |
|                           | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น(Combined Chlorine)<br>- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)<br>- ความกระด้าง (Calcium Hardness)<br>- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)<br>- คลอไรด์ (Chloride)<br>- แอมโมเนีย (Ammonia)<br>- ไนเตรท (Nitrate)<br>- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)<br>- ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)<br>- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จุดลึก 1 จุด และจุดตื้น 1 จุด ขณะที่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ และเป็นบริเวณที่คนไปใช้มากที่สุด | ✓<br>- ปัจจุบันโครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในพารามิเตอร์ และความถี่ตามที่มาตรการฯ กำหนด ครอบคลุมพื้นที่บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ (ภาพที่ 3.5.7-1 การเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ) ซึ่งผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง | -                             | ภาคผนวก ง-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                         | บริเวณที่ตรวจวัด                                  | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. สระว่ายน้ำ (ต่อ)      | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ความชำรุดเสียหาย<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                    | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- พื้นผิวของสระว่ายน้ำ | ✓                                                                                                                                                               | - ความสมบูรณ์ของสระว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็น รั่วรอบสระ พื้นรอบสระ ตัวสระ และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ประกอบจะได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานทำความสะอาดที่ปฏิบัติงานประจำชั้นนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่พบความเสียหาย พนักงานฯ จะแจ้งต่อผู้รับผิดชอบโดยทันที พร้อมจำกัดการเข้าถึง และยุติการใช้งานสระหากความเสียหายนั้นมีขนาดใหญ่                                                                                                                                                 | -                             | ภาพที่ 2.2-7 การบริหารจัดการสระว่ายน้ำ                                                                                           |
|                           | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิต<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ        | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- อุปกรณ์ช่วยชีวิต     | ●                                                                                                                                                               | - กิจกรรมที่มาตรการฯ อ้างถึงเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งปัจจุบันโครงการไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                             | -                                                                                                                                |
| 16. ผลกระทบทาง<br>สุขภาพ  | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- พื้นที่โครงการ       | ✓                                                                                                                                                               | - เครื่องจักรที่มีใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสีย จะได้รับการตรวจสอบความผิดปกติโดยช่างเทคนิคประจำอาคารอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสอบดังกล่าวจะยึดตาม Check Sheet และประสานสัมผัสทั้ง 5 เป็นหลัก โดยในกรณีที่พบความผิดปกติ ช่างฯ จะพิจารณาขนาดของปัญหา หากมีขนาดเล็กและช่างฯ สามารถซ่อมแซมเองได้ ก็จะดำเนินการทันที แต่ในกรณีที่ปัญหามีขนาดใหญ่ก็จะให้ผู้รับเหมาภายนอกเข้ามาแก้ไข โดยขณะนั้น ช่างฯ จะกั้นเขตจำกัดการเข้าถึง และแก้ไขเบื้องต้น เพื่อรอการซ่อมแซม | -                             | ภาคผนวก ค-4 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล<br>ภาพที่ 2.2-9 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม      | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                           | บริเวณที่ตรวจวัด                            | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. ผลกระทบทาง<br>สุขภาพ (ต่อ) | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- ฝุ่นละอองจากการขับขี่ยานยนต์ของผู้พักอาศัย<br>ในโครงการ<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                               | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- พื้นที่โครงการ | ✓                                                                                                                                                               | - การจราจรภายในพื้นที่โครงการถูกควบคุมด้วยระเบียบการพักอาศัย<br>ข้อกำหนดนิติบุคคลอาคารชุด ป้าย และสัญลักษณ์จราจรต่างๆ หากในกรณี<br>ที่พบว่าผู้พักอาศัยขับขี่ยานยนต์ที่มีลักษณะละเมิด นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะ<br>บังคับใช้บทลงโทษตามที่ระบุไว้ อันเป็นเหตุให้สามารถมั่นใจได้ว่าปัญหาฝุ่น<br>ละอองจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ | -                             | ภาคผนวก ค-1 ระเบียบ<br>การพักอาศัยนิติบุคคล<br>อาคารชุด The Cloud<br>Condominium<br>ภาคผนวก ค-2 ข้อบังคับ<br>ของนิติบุคคลอาคารชุด<br>"เดอะคลาวด์ คอนโดมิ-<br>เนียม"<br>ภาพที่ 2.2-4 การบริหาร<br>จัดการระบบจราจร |
|                                | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- เสียงจากการสัญจรภายในโครงการ<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ                                                                                                                                          | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- พื้นที่โครงการ | ✓                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- สุขภาพพนักงาน<br>1. โรคระบบทางเดินหายใจ<br>2. โรคระบบทางเดินอาหาร<br>3. โรคผิวหนัง<br>4. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค<br>5. โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค<br><b>ความถี่</b><br>- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- พื้นที่โครงการ | ✓                                                                                                                                                               | - ปัจจุบันโครงการเข้าสู่ระยะดำเนินการอย่างสมบูรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                             | ภาคผนวก ข-1 หนังสือ<br>สำคัญนิติบุคคลอาคาร<br>ชุด<br>ภาคผนวก ข-2 หนังสือ<br>สำคัญการขออนุญาต/<br>รับรอง การก่อสร้าง<br>ดัดแปลง เคลื่อนย้าย<br>อาคาร                                                              |

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cloud (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>สิ่งแวดล้อม      | ดัชนีตรวจวัด/ความถี่                                                                                | บริเวณที่ตรวจวัด                            | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◉ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 16. ผลกระทบทาง<br>สุขภาพ (ต่อ) | <b>ดัชนีตรวจวัด</b><br>- อุบัติเหตุต่างๆและอัตรากาย<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ | <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b><br>- พื้นที่โครงการ | ✓                                                                                                                                                               | - ในกรณีที่มีอุบัติเหตุที่เกิดภายในพื้นที่ส่วนกลาง โครงการจะมีการบันทึกพร้อมทั้งหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 ภายในพื้นที่โครงการไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ | -                             | -             |

### 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cloud ได้กำหนดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายการตรวจวัด ดังนี้

1) **คุณภาพอากาศ** กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่าง และตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 สถานี คือ พื้นที่โครงการ ในความถี่ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ โดยให้ทำการตรวจวัดในพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง

2) **เสียง** กำหนดให้โครงการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 1 สถานี คือ พื้นที่โครงการ ในความถี่ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ โดยให้ทำการตรวจวัดในพารามิเตอร์ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง) และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)

3) **การใช้น้ำ/คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง** กำหนดให้โครงการต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ จำนวน 2 ความถี่ ได้แก่ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง และความถี่ 6 เดือน/ครั้ง ใน 2 สถานีตรวจวัด ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า โดยมีพารามิเตอร์ที่ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง สำหรับพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วยสี (Colour), Pt-Co unit รส (Taste) กลิ่น (Odour) ความขุ่น (Turbidity), NTU ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) และ อีโคไล (E.coli)

(2) ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง สำหรับพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด คือ แซลโมเนลลา (Salmonella)

4) **คุณภาพน้ำทิ้ง** กำหนดให้โครงการต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วย ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) และ ทีเคเอ็น (TKN)

5) **คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ** กำหนดให้โครงการต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 ความถี่ ได้แก่ความถี่วันละ 2 ครั้ง และความถี่เดือน 1 ครั้ง ใน 2 สถานีตรวจวัด ได้แก่ จุดลึก และจุดตื้น โดยมีพารามิเตอร์ที่ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ความถี่วันละ 2 ครั้ง ขณะที่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ และเป็นบริเวณที่คนไปใช้มากที่สุดสำหรับพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดประกอบด้วยค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine)

(2) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ สำหรับพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดประกอบด้วยคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้าง (Calcium Hardness) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) คลอไรด์ (Chloride) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรท (Nitrate) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

### 3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการ The Cloud ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานราชการ ซึ่งในกรณีที่ตัวอย่างที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ จะทำการเก็บด้วยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพ ก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

| รายการการตรวจวัด                       | ดัชนีการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                            | วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์                                                                                                                                   | วันที่ตรวจวัด        | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 คุณภาพอากาศ                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CO ในเวลา 1 ชั่วโมง</li> <li>- HC ในเวลา 1 ชั่วโมง</li> <li>- NOx ในเวลา 1 ชั่วโมง</li> <li>- SOx ในเวลา 24 ชั่วโมง</li> <li>- PM10 ในเวลา 24 ชั่วโมง</li> <li>- TSP ในเวลา 24 ชั่วโมง</li> </ul> | ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566                                                                                               |                      |                                    |
| 2 เสียง                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lmax เฉลี่ย 24 ชั่วโมง</li> <li>- Leq 24 ชั่วโมง</li> <li>- Ldn</li> </ul>                                                                                                                        | ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566                                                                                               |                      |                                    |
| 3 การใช้น้ำ/คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colour, Pt-Co unit</li> <li>- Taste</li> <li>- Odour</li> <li>- Turbidity, NTU</li> <li>- pH range</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Platinum-cobalt</li> <li>-</li> <li>- Threshold</li> <li>- Nephelometric</li> <li>- Electrometric Method</li> </ul> | 24/03/66<br>16/06/66 | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd, 2017 |

ตารางที่ 3.5.2-1 (ต่อ) ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

| รายการการตรวจวัด                             | - ดัชนีการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                       | วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วันที่ตรวจวัด                                                        | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3 การใช้น้ำ/คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง (ต่อ) | - ปริมาณเหล็กทั้งหมด<br>- ความกระด้างของน้ำ<br>- Total Coliform Bacteria<br>- E.coli                                                                                                                                                                                    | - Phenanthroline<br>- Titration<br>- Standard Total Coliform Fermentation<br>- Other Escherichia coli Procedures                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd, 2017 |
|                                              | - <i>Salmonella</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Membrane Filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16/06/66                                                             |                                    |
| 4) คุณภาพน้ำทิ้ง                             | - pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- Sulfide<br>- Total Dissolved Solids<br>- Settleable Solids<br>- Fat Oil and Grease<br>- TKN                                                                                                                                    | - Electrometric Method<br>- 5 Day BOD Test, Azide Modification<br>- APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 D<br>- Iodometric<br>- Dried at 103-105 °C<br>- Volumetric<br>- APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 5520 D<br>- APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-NorgB, NH <sub>3</sub> C  | 31/01/66<br>28/02/66<br>27/03/66<br>26/04/66<br>18/05/66<br>08/06/66 | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd, 2017 |
| 5) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ                     | - pH*<br>- Free chlorine*                                                                                                                                                                                                                                               | - pH Test Kit<br>- Chlorine Test Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกวัน                                                               | -                                  |
|                                              | - Combined Chlorine<br>- Alkalinity<br>- Calcium Hardness<br>- Cyanuric Acid<br>- Chloride<br>- Ammonia<br>- Nitrate<br>- Total Coliform Bacteria<br>- Fecal Coliform<br>- <i>Escherichia coli</i><br>- <i>Staphylococcus aureus</i><br>- <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | - Calculation<br>- Titration<br>- EDTA Titrimetric<br>- Photometric<br>- APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-CL- B<br>- Titrimetric<br>- Brucine<br>- Standard Total Coliform Fermentation<br>- Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure<br>- Other Escherichia coli Procedures<br>- Membrane Filter<br>- Membrane Filter | 31/01/66<br>28/02/66<br>27/03/66<br>26/04/66<br>18/05/66<br>08/06/66 | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd, 2017 |

**3.5.3 คุณภาพอากาศ** ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cloud กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่าง และตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 สถานี คือ พื้นที่โครงการ ในความถี่ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ โดยให้ทำการตรวจวัดในพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 โครงการไม่มีการตรวจวัดแต่อย่างใด อนึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพของโครงการซึ่งเป็นเพียงอาคารชุดพักอาศัย ไม่มีกิจกรรมที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในระดับที่เกินกว่าปกติ มาตรการฯ ดังกล่าวจัดถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมต่อบริบทโครงการ

**3.5.4 เสียง** ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cloud กำหนดให้โครงการต้องตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 1 สถานี คือ พื้นที่โครงการ ในความถี่ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ โดยให้ทำการตรวจวัดในพารามิเตอร์ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง) และค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 โครงการไม่มีการตรวจวัดแต่อย่างใด อนึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพของโครงการซึ่งเป็นเพียงอาคารชุดพักอาศัย ไม่มีกิจกรรมที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดระดับเสียงในระดับที่เกินกว่าปกติ มาตรการฯ ดังกล่าวจัดถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมต่อบริบทโครงการ

### 3.5.5 การใช้น้ำ/คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cloud กำหนดให้โครงการต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ใน 2 สถานีตรวจวัด ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ซึ่งกระทำใน 2 ความถี่ ประกอบด้วยความถี่ 3 เดือน/ครั้ง และความถี่ 6 เดือน/ครั้ง โดยความถี่แรกจะตรวจวิเคราะห์ในพารามิเตอร์ สี (Colour), Pt-Co unit รส (Taste) กลิ่น (Odour) ความขุ่น (Turbidity), NTU ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) และ อีโคไล (E.coli) สำหรับความถี่ที่สอง ตรวจวิเคราะห์ในพารามิเตอร์แซลโมเนลลา (*Salmonella*) เท่านั้น ปัจจุบันโครงการมีสถานะการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ “ปฏิบัติ” โดยโครงการกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า โดยมีความถี่ และพารามิเตอร์เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด ซึ่งการเก็บตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.5.5-1 และผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าแสดงดังตารางที่ 3.5.5-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

### สรุปผลการตรวจการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่าทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ทุกสถานีตรวจวัด ทุกความถี่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก)



บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน



บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า


ภาพที่ 3.5.5-1 การเก็บตัวอย่างน้ำใช้

ตารางที่ 3.5.5-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

| จุดเก็บตัวอย่าง      | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                 |                     |                       |                                            |             |                                      |                     |                             |
|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                      |              | pH                 | Turbidity (NTU) | Colour (Pt-Co Unit) | Odour                 | Total hardness as CaCO <sub>3</sub> (mg/l) | Iron (mg/l) | Total Coliform bacteria (MPN/100 ml) | E coli (MPN/100 ml) | Salmonella spp. (in 100 mL) |
| ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า | 24/03/66     | 7.7                | 0.66            | <1.0                | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | 48                                         | 0.01        | ไม่พบ                                | ไม่พบ               | -                           |
|                      | 16/06/66     | 7.7                | 0.46            | 2.1                 | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | 70                                         | <0.01       | ไม่พบ                                | ไม่พบ               | ไม่พบ                       |
| ต่ำสุด-สูงสุด        |              | 7.7                | 0.46-0.66       | <1.0-2.1            | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | 48-70                                      | <0.01-0.01  | ไม่พบ                                | ไม่พบ               | ไม่พบ                       |
| ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน | 24/03/66     | 7.7                | 0.82            | 1.1                 | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | 48                                         | 0.12        | ไม่พบ                                | ไม่พบ               | -                           |
|                      | 16/06/66     | 7.8                | 0.58            | 2.9                 | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | 52                                         | 0.05        | ไม่พบ                                | ไม่พบ               | ไม่พบ                       |
| ต่ำสุด-สูงสุด        |              | 7.7-7.8            | 0.58-0.82       | 1.1-2.9             | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | 48-52                                      | 0.05-0.12   | ไม่พบ                                | ไม่พบ               | ไม่พบ                       |
| มาตรฐาน              |              | 6.5-8.5            | 4               | 15                  | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ | 300                                        | 0.3         | ไม่พบ                                | ไม่พบ               | ไม่พบ                       |

หมายเหตุ : อ้างอิงตามคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก :  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ :  
ผู้วิเคราะห์ :



### 3.5.6 คุณภาพน้ำทิ้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cloud กำหนดให้โครงการต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดจำนวน 2 สถานี คือ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วยความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN) ปัจจุบันโครงการมีสถานะการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ “ปฏิบัติ” โดยโครงการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในพารามิเตอร์ ความถี่ ตามที่มาตรการกำหนด ซึ่งการเก็บตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.5.6-1 ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าดังตารางที่ 3.5.6-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

#### สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) เว้นแต่ค่า BOD และ TKN มีค่าเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ด้วยโครงการได้มีการระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา ทำให้ปัจจุบันปัญหาคูณภาพน้ำเกินมาตรฐานมิใช่ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ อย่างไรก็ตามผู้จัดทำรายงานขอเสนอให้มีการควบคุมระบบบำบัดตามแนวทางแก้ไขแยกตามพารามิเตอร์ดังนี้

บีโอดี (BOD) สามารถลดลงได้โดยการสนับสนุนปัจจัยการเติบโตของจุลินทรีย์ (MLSS) ภายในระบบบำบัดน้ำเสียให้สมดุลกับปริมาณอาหาร (BOD) โดยการควบคุมการ Returned Sludge เป็นหลัก ทั้งนี้สามารถพิจารณาการควบคุมได้จากค่า F/M ratio ที่ควรอยู่ที่ 0.23-0.25 วัน (แล้วแต่ระบบ) และ MLSS อยู่ที่ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร

$$\text{อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์} = \frac{\text{อัตราการไหลของน้ำเสีย (ลิตร/วัน)} \times \text{BOD}_5 \text{ (มก./ล.)}}{\text{ปริมาตรถังเติมอากาศ (ลิตร)} \times \text{MLSS (มก./ล.)}}$$

สมการอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ (F/M Ratio)

ทีเคเอ็น (TKN) สามารถลดลงได้โดยการสนับสนุนปัจจัยการเติบโตของจุลินทรีย์ 2 ชนิด ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชัน (เปลี่ยน TKN ให้เป็นสารอื่น) ได้แก่ *Nitrosomonas* และ *Nitrobacter* โดยปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแอมโมเนีย (NH<sub>3</sub>) และสารอินทรีย์ไนโตรเจน (Organic nitrogen) ให้เป็น Nitrite (NO<sub>2</sub>) และ Nitrate (NO<sub>3</sub>) ทั้งนี้ผู้จัดทำรายงานขอเสนอแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น โดยปรับค่าการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด ดังต่อไปนี้ 1. ควบคุมอายุสลัดจ์ ให้อยู่ระหว่าง 3-5 วัน 2. ปรับ pH ให้อยู่ในสภาพเป็นกลาง และ 3. ตรวจสอบ/ควบคุมค่าออกซิเจนละลายน้ำให้อยู่ระหว่าง 2-3 mg/L



Jun 8, 2023 15:11:45




Jun 8, 2023 15:11:36

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำทิ้งก่อนบำบัด)



Jun 8, 2023 15:16:50

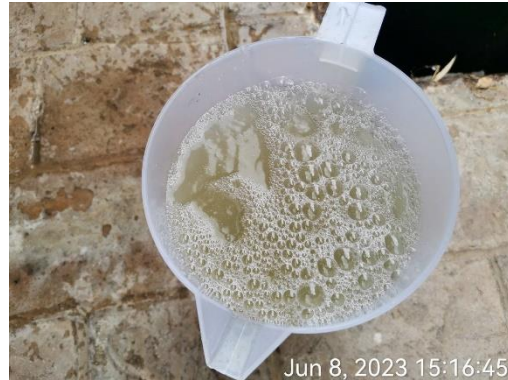

Jun 8, 2023 15:16:45

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังจากออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำทิ้งหลังบำบัด)


ภาพที่ 3.5.6-1 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

### ตารางที่ 3.5.6-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

| จุดเก็บตัวอย่าง                                                              | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |            |                         |                               |                          |                         |                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                              |              | pH                 | BOD (mg/L) | Suspended Solids (mg/L) | Total Dissolved Solids (mg/L) | Settleable Solids (mL/L) | Fat Oil & Grease (mg/L) | Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) | Sulfide (mg/L) |
| บริเวณบ่อดักคุณภาพน้ำ<br>ทั้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำ<br>เสีย (น้ำทิ้งก่อนบำบัด) | 31/01/66     | 7.6                | 122        | 30                      | 380                           | <0.1                     | 7                       | 90                             | 3.4            |
|                                                                              | 28/02/66     | 7.6                | 121        | 30                      | 382                           | <0.1                     | 10                      | 88                             | 7.9            |
|                                                                              | 27/03/66     | 7.6                | 121        | 32                      | 386                           | <0.1                     | 7                       | 95                             | 6.6            |
|                                                                              | 26/04/66     | 7.6                | 108        | 26                      | 342                           | <0.1                     | 6                       | 93                             | 4.4            |
|                                                                              | 18/05/66     | 7.5                | 107        | 142                     | 488                           | 1.5                      | 11                      | 97                             | 2.6            |
|                                                                              | 08/06/66     | 7.9                | 43         | 16                      | 376                           | <0.1                     | <2                      | 78                             | 6.6            |
| ต่ำสุด-สูงสุด                                                                |              | 7.5-7.9            | 43-122     | 16-142                  | 342-488                       | <0.1-1.5                 | <2-11                   | 78-97                          | 2.6-7.9        |
| บริเวณบ่อดักคุณภาพน้ำ<br>หลังออกจากระบบบำบัดน้ำ<br>เสีย (น้ำทิ้งหลังบำบัด)   | 31/01/66     | 7.7                | 91         | 26                      | 404                           | <0.1                     | 4                       | 85                             | <0.10          |
|                                                                              | 28/02/66     | 7.6                | 91         | 26                      | 406                           | <0.1                     | 8                       | 92                             | <0.10          |
|                                                                              | 27/03/66     | 7.6                | 95         | 27                      | 404                           | <0.1                     | <2                      | 90                             | <0.10          |
|                                                                              | 26/04/66     | 7.7                | 69         | 14                      | 374                           | <0.1                     | <2                      | 88                             | <0.10          |
|                                                                              | 18/05/66     | 7.6                | 80         | 30                      | 442                           | 0.5                      | 3                       | 95                             | <0.10          |
|                                                                              | 08/06/66     | 7.8                | 31         | 10                      | 360                           | <0.1                     | <2                      | 84                             | <0.10          |
| ต่ำสุด-สูงสุด                                                                |              | 7.6-7.8            | 31-95      | 10-30                   | 360-442                       | <0.1-0.5                 | <2-8                    | 84-95                          | <0.10          |
| มาตรฐาน                                                                      |              | 5.0-9.0            | <30        | <40                     | <500                          | <0.5                     | <20                     | <35                            | <1.0           |


หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง :  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ :  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ :  
 ผู้วิเคราะห์ :




### 3.5.7 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cloud กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำใน 2 สถานีตรวจวัด ได้แก่ จุดลึก และ จุดตื้น โดยแยกเป็นความถี่จำนวน 2 ความถี่ คือ 1. ความถี่วันละ 2 ครั้ง (ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine)) และ 2. ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง (ตรวจวิเคราะห์คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้าง (Calcium Hardness) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) คลอไรด์ (Chloride) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรท (Nitrate) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa))

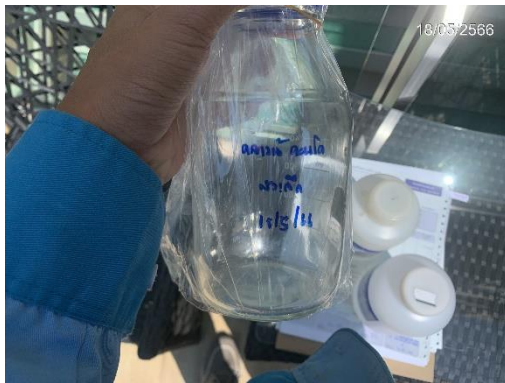

การเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำจุดลึก

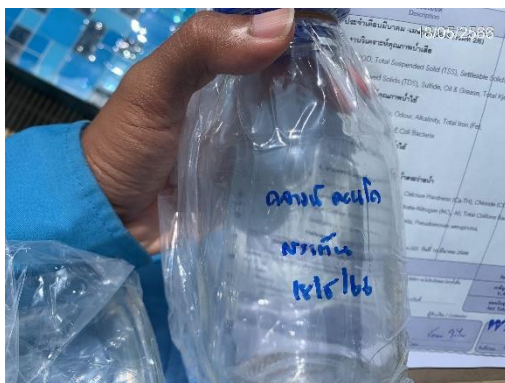

การเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำจุดตื้น

ภาพที่ 3.5.7-1 การเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ

#### 1) ความถี่วันละ 2 ครั้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cloud กำหนดให้โครงการต้องมีการเก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ จำนวน 2 จุด เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง สำหรับพารามิเตอร์ที่กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) ปัจจุบันโครงการมีสถานะการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ “ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ” โดยโครงการมีการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ pH Test Kit และ Chlorine Test Kit และมีความถี่วันละ 1 ครั้ง (ทั้งนี้ด้วยเพราะโครงการมีการใช้งานสระเพียงความลึกเดียว) ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง แสดงดังภาคผนวก ง-4 ผลการตรวจวัด pH และ Cl<sub>2</sub> สระว่ายน้ำ



ภาพที่ 3.5.7-2 การตรวจวัด pH และ  $\text{Cl}_2$  สระว่ายน้ำ

## 2) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cloud กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ จำนวน 2 จุด (จุดลึก และจุดตื้น) ในความถี่เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับพารามิเตอร์ที่กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์ได้แก่ คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้าง (Calcium Hardness) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) คลอไรด์ (Chloride) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรท (Nitrate) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ปัจจุบันโครงการมีสถานะการปฏิบัติตามเกณฑ์ “ปฏิบัติ” โดยโครงการได้มีการตรวจวิเคราะห์ในพารามิเตอร์ และความถี่ตามที่มาตรการกำหนด ซึ่งแสดงดังภาพที่ 3.5.7-1 ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าดังตารางที่ 3.5.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง

### สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตามความถี่ปีละ 1 ครั้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในพารามิเตอร์คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้าง (Calcium Hardness) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) คลอไรด์ (Chloride) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรท (Nitrate) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง พบว่าพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 3.5.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง

| จุดเก็บตัวอย่าง | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                          |                      |                 |                |                |                         |                  |                  |                            |                             |                                 |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                 |              | Alkalinity (mg/L)  | Combined Chlorine (mg/L) | Cyanuric acid (mg/L) | Chloride (mg/L) | Nitrate (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Calcium Hardness (mg/L) | TCB (MPN/100 mL) | FCB (MPN/100 mL) | <i>E.coli</i> (MPN/100 mL) | <i>S.aureus</i> (in 100 mL) | <i>P.aeruginosa</i> (in 100 mL) |
| บริเวณส่วนลึก   | 31/01/66     | <1                 | 0.04                     | 196                  | 348             | 8.6            | 0.14           | 159                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 28/02/66     | <1                 | 0.14                     | 197                  | 435             | 8.0            | 0.14           | 211                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 27/03/66     | <1                 | 0.09                     | 196                  | 439             | 13.0           | <0.10          | 157                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 26/04/66     | <1                 | 0.30                     | 197                  | 411             | 12.0           | <0.10          | 145                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 18/05/66     | <1                 | 2.60                     | 198                  | 225             | 6.3            | <0.10          | 568                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 08/06/66     | <1                 | 0.07                     | 198                  | 247             | 5.8            | <0.10          | 136                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
| ต่ำสุด-สูงสุด   |              | <1                 | 0.04-2.60                | 196-198              | 225-439         | 5.8-13.0       | <0.10-0.14     | 136-568                 | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
| บริเวณส่วนตื้น  | 31/01/66     | <1                 | 0.03                     | 195                  | 389             | 7.4            | 0.14           | 175                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 28/02/66     | <1                 | 0.16                     | 196                  | 339             | 6.6            | <0.10          | 165                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 27/03/66     | <1                 | 0.08                     | 194                  | 432             | 10.0           | <0.10          | 157                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 26/04/66     | <1                 | 0.10                     | 198                  | 504             | 10.0           | <0.10          | 148                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 18/05/66     | <1                 | 1.00                     | 198                  | 178             | 6.1            | <0.10          | 172                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
|                 | 08/06/66     | <1                 | 0.06                     | 198                  | 238             | 4.7            | <0.10          | 156                     | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
| ต่ำสุด-สูงสุด   |              | <1                 | 0.03-1.00                | 194-198              | 178-504         | 4.7-10.0       | <0.10-0.14     | 148-175                 | <1.1             | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |
| มาตรฐาน         |              | 80-100             | 0.5-1.0                  | 30-60                | <600            | -              | <20            | 250-600                 | <10              | ตรวจไม่พบ        | ตรวจไม่พบ                  | ตรวจไม่พบ                   | ตรวจไม่พบ                       |

หมายเหตุ : อ้างอิงตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
