

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ซิลค์บุรี (Silk Buri Hotel) ตั้งอยู่ถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยโครงการเป็นการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารจากเดิมอาคารชุดพักอาศัย เป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น สูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น จำนวน 62 ห้อง ดำเนินการบนพื้นที่รวม 1-0-10.5 ไร่ หรือ 1,642.00 ตารางเมตร ภายหลังโครงการได้รับผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับอนุญาตปรับปรุงอาคารจากเมืองพัทยา โครงการมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ทส 1010.5/6428 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และต้องนำส่งรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทุก ๆ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง

ดังนั้น นายธนต์ ศรีดิษฐ์กูร ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษารายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร และบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเดินสำรวจตรวจสอบพื้นที่โครงการในระยะปรับปรุงโครงการ (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2566) สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะปรับปรุง (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2566)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม				
ทางกายภาพ				
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1.ดูแลบริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	✓	- มีการดูแลบริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ดูรูปที่ 3-1 ประกอบ)	-
	2.ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ รวมทั้งระบุชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ	◆	-	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุงอาคารเสร็จแล้ว
	3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการปรับปรุง หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาทันทันที	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-2 ประกอบ) หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาทันทันที ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด	-

✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1.มีวัสดุปิด (Mesh sheet) ปิดกัน ตลอดแนวด้านข้างและความสูง ของบริเวณที่มีการปรับปรุงโครงการ 2.ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการรบกวน ลงบนถนน 3.ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ปรับปรุงหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า และ เย็น 4.เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้ มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 5.จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดินทราย ที่ตกหล่น อยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่สะอาดโดยทันที 6.การกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ต้องทำในพื้นที่ที่คลุม ผ้าหรือในหีบห่อที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	◆ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - โครงการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ ก่อสร้างเพื่อป้องกันการรบกวนลงบนถนน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณ พื้นที่ปรับปรุงหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง - เศษวัสดุที่เหลือใช้ ไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้า งาน โดยโครงการจัดให้มีรถมารับไปกำจัด - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอย กวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ ข้างเคียงโครงการ - กิจกรรมการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดมลภาวะ จะ กระทำภายในอาคารเท่านั้น	- ปัจจุบัน โครงการปรับปรุงอาคาร เสร็จแล้ว - - - - -

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
2) มลพิษทางอากาศ	1.ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	✓	- โครงการไม่มีการติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	-
	2.หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	✓	- โครงการตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-
	3.จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ปรับปรุง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างภายนอกโครงการ ไม่ให้เกิดกีดขวางกีดขวางกีดขวาง และภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	✓	- โครงการมีป้ายจำกัดความเร็วติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดความเร็วและควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-
	มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 1.ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 1x0.5 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในระยะเวลาปรับปรุงโครงการ และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการปรับปรุงในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เห็นได้อย่างชัดเจน	◆	-	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุงอาคารเสร็จแล้ว

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
	ชื่อโครงการ	พื้นที่ติดมาตรการ		
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	ชื่อโครงการ ซิลค์บุรี (Silk Buri Hotel) เจ้าของโครงการ นายต้นตี่ ศรีดิษฐ์ ประเภท อาคารโรงแรม ขนาดโครงการ อาคารสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร บริษัทรับเหมาก่อสร้าง.....ตั้งแต่.....ถึง..... ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุง 7 เดือน ตั้งแต่.....ถึง..... เวลาก่อสร้างประจำวัน 8.00-17.00 น. ชื่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการปรับปรุง เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงานราชการที่ควบคุมการปรับปรุง เมืองพัทยา (หน่วยงานอนุญาต) เบอร์โทรศัพท์ มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่..... ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบเลขที่.....			
	2.โครงการจัดให้มีการจัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่บ้านติดโครงการ ก่อนดำเนินการปรับปรุงอาคารโครงการ		◆	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว
	3.จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความ สั่นสะเทือนจากการปรับปรุง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถ ตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว		✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-2 ประกอบ) หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดย

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	4. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดย ระบุสาเหตุ และเวลา	✓	พื้นที่ ท่งนี้ ปัจจุบัน โครงการยังไม่เริ่มเรื่องร้องเรียน แต่อย่างใด - ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น	-
	มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ปรับปรุง 1.ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ปรับปรุง	✓	- โครงการกำกับให้ผู้รับเหมาโครงการดูแล คนงานให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด และ ระมัดระวัง โดยไม่ให้เปิดน้ำทิ้งไว้บริเวณพื้นที่ ปรับปรุงโครงการ	-
	2.ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ปรับปรุง	✓	- โครงการได้กำหนดให้มีการเก็บกองวัสดุที่อาจ ก่อให้เกิดฝุ่น โดยปิดคลุมอย่างมิดชิด	-
	มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1.ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	✓	- โครงการมีการใช้อุปกรณ์ในการปรับปรุงที่ ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	-
	2.จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	✓	- โครงการจัดให้มีน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นที่ เพียงพอ	-

✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	3. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	◆	-	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว จึงไม่มีกิจกรรม ขนส่งวัสดุก่อสร้าง
	4. จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	✓	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณพื้นที่ โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอด ระยะเวลาที่มีการปรับปรุง	-
	มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย 1. ละเว้นการเผาวัสดุและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ปรับปรุง	✓	- ภายในพื้นที่โครงการ ไม่มีการเผาวัสดุและ แนววัสดุก่อสร้าง	-
	มาตรการเฉพาะด้านการปรับปรุง 1. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีต เปียกก่อน	✓	- โครงการหลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต และหาก ต้องทำ จะทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน	-
	2. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ปรับปรุงจะนำเข้ามาโดย บรรจุในภาชนะที่มีมิดชิด	✓	- โครงการเลือกใช้การเทปูนสำเร็จรูปเป็นส่วน ใหญ่ ทั้งนี้ การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ โครงการ โครงการจะนำเข้ามาโดยบรรจุใน ภาชนะมิดชิด	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
2) ผลพิพาททางอากาศ (ต่อ)	3. ในกรณีที่ต้องใช้ปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้ แล้วต้องเก็บในถุงหิมาติด	✓	- กรณีที่ต้องใช้ปริมาณน้อย โครงการจะแกะ ถุงมาใช้ หลังจากใช้แล้วจะเก็บในถุงหิมาติด (ดู รูปที่ 3-3 ประกอบ)
1.3 ระดับเสียง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาปรับปรุงโครงการ เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงการ และติดตามร้องเรียนความคิดเห็น ที่บริเวณ ป้อมยาม พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของ [REDACTED] (เจ้าของโครงการ) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบ ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบจากการปรับปรุงโครงการ และ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-2 ประกอบ) หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดย ทันที ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่อย่างใด
	2. กำหนดระยะเวลาปรับปรุงโครงการสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิด เสียงดังตามเวลา ดังนี้ - กำหนดระยะเวลาปรับปรุงอาคาร สำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง ดัง เช่น งานขุดเจาะ งานรื้อถอน งานตกแต่งและเก็บงาน เป็นต้น ใน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการปรับปรุงที่ ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น.	✓	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาโครงการ ดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนด หากมีกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการเกินจากเวลาที่กำหนด โครงการ จะมีแจ้งเตือนผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบอย่าง น้อย 3 วัน ปัจจุบันโครงการยังไม่เคยทำงานเกิน เวลาที่กำหนด

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 9.00-17.00 น. จะเป็นกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานขุดเจาะ งานตักแต่งและเก็บ งาน แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา กำหนดเป็นครั้งคราว ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้ง ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลง พื้นที่แจ้ง ตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำกิจกรรมก่อสร้าง	✓ 3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ในพื้นที่ โครงการด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบ ด้านเสียงต่อชุมชน ✓ 4. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดับ เครื่องหรือเบาคือเครื่องลงระหว่างการพัก	- เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้งานในช่วงปรับปรุง จะอยู่ ภายในพื้นที่โครงการ ห่างจากบ้านพักอาศัย ข้างเคียง - -

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	5.ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	✓ - โครงการมีการกำกับให้ผู้รับเหมาคอยควบคุม คนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย ข้างเคียง	-
	6.ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียง ดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	◆ -	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว จึงไม่มีกิจกรรม การใช้รถบรรทุกขนส่งวัสดุ
	7.จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงาน ก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	✓ - โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจน จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด	-
	8.มาตรการในการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างจัดให้มีการ ลดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิด เสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็น เวลานานติดต่อกัน	✓ - โครงการจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน คนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียง ดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการ สัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	9.กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังเกิน เกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs	✓	- ผู้รับเหมาก่อสร้างให้คนงานก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติ งานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs	-
	10.ในกิจกรรมปรับปรุงช่วงรื้อถอน จัดทำผนังกันเสียงโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่ โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดิน ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผนังกัน เสียงได้อีก 25 dB(A)	✓	- โครงการได้จัดทำผนังกันเสียงโดยรอบพื้นที่ โครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม ปรับปรุงช่วงรื้อถอน (ดูรูปที่ 3-4 ประกอบ)	-
	10. ในกิจกรรมปรับปรุงช่วงรื้อถอน จะมีผนังของอาคารอยู่ห่างจาก พื้นที่กิจกรรมประมาณ 0.5 เมตร เป็นเสมือนผนังกันเสียง เมื่อเสียง ผ่านผนังอาคารสามารถลดเสียงลงได้ 34 dB(A) และจัดทำผนังกัน เสียงโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 3.2 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการติดตั้งที่แนวเขตที่ดิน ซึ่งสามารถลดระดับ เสียงผ่านผนังกันเสียงได้อีก 25 dB(A)	✓	- โครงการได้จัดทำผนังกันเสียงโดยรอบพื้นที่ โครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม ปรับปรุงช่วงรื้อถอน (ดูรูปที่ 3-4 ประกอบ)	-
	11. ในกิจกรรมปรับปรุงช่วงขุดเจาะ จัดทำผนังกันเสียงโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 3.2 เมตร โดยรอบพื้นที่ โครงการติดตั้งที่แนวเขตที่ดิน ซึ่งสามารถลดระดับเสียงเมื่อผ่านผนัง กันเสียงได้ 25 dB(A) และจัดทำผนังกันเสียงโดยใช้วัสดุ Metal	✓	- โครงการได้จัดทำผนังกันเสียงโดยรอบพื้นที่ โครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม ปรับปรุงช่วงรื้อถอน (ดูรูปที่ 3-4 ประกอบ)	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	Sheet หมายเลข 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 3.2 เมตร โดยติดตั้งห่างจากจุด กำเนิดเสียง 0.5 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผนังกันเสียงได้ อีก 25 dB(A) 12. ในกิจกรรมปรับปรุงช่วงตกแต่งและเก็บงาน จะมีผนังของอาคาร อยู่ห่างจากพื้นที่กิจกรรมประมาณ 0.5 เมตร เป็นเสมือนผนังกันเสียง เมื่อเสียงผ่านผนังอาคารสามารถลดเสียงลงได้ 34 dB(A) และจัดทำ ผนังกันเสียงโดยใช้วัสดุ Metal Sheet หมายเลข 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 3.2 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดิน ซึ่งสามารถลด ระดับเสียงผ่านผนังกันเสียงได้อีก 25 dB(A)	✓	- ในกิจกรรมปรับปรุงช่วงตกแต่งและเก็บงาน โครงการใช้ผนังของอาคารเป็นเสมือนผนังกันเสียง (รูปที่ 3-5 ประกอบ)
1.4 ความสั่นสะเทือน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดระยะปรับปรุงโครงการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของโครงการ และติดตั้งกล่องรับความถี่ สั่นงาน พร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายธนัตถ์ ศุภติ อังกูร (เจ้าของโครงการ) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบ ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบจากการปรับปรุงโครงการ และ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุง (รูปที่ 3-2 ประกอบ) หากพบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดย ทันที ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่อย่างใด

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.4 ความเสี่ยงสะท้อน (ต่อ)	2.กำหนดระยะเวลาปรับปรุงโครงการสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ สิ้นสะท้อนตามเวลา ดังนี้ - กำหนดระยะเวลาปรับปรุงอาคาร สำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ความสิ้นสะท้อน เช่น งานขุดเจาะ งานรื้อถอน งานตกแต่งและเก็บ งาน เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. แต่หากมี กิจกรรมการปรับปรุงต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด ให้ ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิด ป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 9.00-17.00 น. จะเป็นกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดความสิ้นสะท้อน เช่น งานขุดเจาะ งานรื้อถอน งานตกแต่ง และเก็บงาน แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกิน ช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้ง ตามบ้านและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำกิจกรรมก่อสร้าง	✓ - โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาโครงการ ดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนด หากมีกิจกรรม ที่ต้องดำเนินงานเกินจากเวลาที่กำหนด โครงการ จะมีการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบอย่าง น้อย 3 วัน ปัจจุบันโครงการยังไม่เคยทำงานเกิน เวลาที่กำหนด	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.4 ความเสี่ยงสะท้อน (ต่อ)	3. ก่อนปรับปรุงโครงการผู้รับเหมานำต้องทำการสำรวจสภาพ รั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนดำเนินการปรับปรุงอาคารโครงการ เพื่อเป็นการยืนยันและกำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการ โดยไม่ส่งผล กระทบต่ออาคารข้างเคียง	◆	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว
	4. จัดจ้างผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ปรับปรุงให้ชัดเจน	✓	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจน จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด
	5. ให้มีการแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ติดไว้ บริเวณพื้นที่โครงการตลอดระยะก่อสร้าง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ โดยรอบพื้นที่โครงการสามารถเห็นได้ชัดเจน	◆	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.5 ทรัพยากรแหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำผิวดิน	1.โครงการได้มีการจัดห้องน้ำภายในอาคารสำหรับคนงาน โดยมี แม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ 2.ประสานงานให้เมืองพัทยา สืบตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบ บำบัดน้ำเสียแล้วนำไปกำจัดเป็นประจำ	✓ -	- - หากเริ่มดำเนินการเปิดใช้อาคาร ควรประสานให้เมืองพัทยามาสุบ ตะกอนส่วนเกินก่อน และควรมีการ ทดสอบระบบบำบัดก่อนเปิดใช้ ระบบบำบัด
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพ น้ำใต้ดิน	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพ น้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดการปนเปื้อนด้านอุทกวิทยาและ คุณภาพน้ำใต้ดิน	✓	-
1.7 สภาพธรณีวิทยาและ แผ่นดินไหว	1.จัดให้มีแผนผังประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิด แผ่นดินไหวให้สำนักงานวิเสศแพร่กับคนงานก่อสร้าง 2.ติดตามข่าว สถานการณ์ คำแนะนำ ค่าเตือนต่างๆ จากทาง ราชการอย่างต่อเนื่อง	✓ ✓	- -

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว



ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
1.8 ทรัพยากรดินและการ พังทลายของดิน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการปรับปรุง หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่จะเกิดจากการปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-2 ประกอบ) หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดย ทันที ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่อย่างใด	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านชีวภาพ	2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก	✓ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความ สั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	✓ - โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบต่อการสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความ สั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้ใช้น้ำ	1. กำจัดให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	✓	- โครงการจัดให้ผู้รับเหมากำชับให้คนงานใช้น้ำ อย่างประหยัด
	2. ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อ หากพบให้รีบแก้ไขโดยด่วน	✓	- โครงการมีการตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบ ท่อ หากพบ จะมีการแก้ไขโดยทันที
	3. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอกับความต้องการ	✓	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้สำหรับคนงาน (ดูรูปที่ 3-7 ประกอบ)
	1. โครงการจัดห้องน้ำภายในอาคารสำหรับคนงาน โดยมีแม่บ้านคอย ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ (ดูรูปที่ 3-6 ประกอบ)	✓	- จัดให้มีห้องน้ำภายในอาคารสำหรับคนงาน โดย มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำให้ สะอาดอยู่เสมอ (ดูรูปที่ 3-6 ประกอบ)
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	2. สูบตะกอนส่วนเกินทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะปรับปรุงโครงการ โดย ประสานงานกับเมืองพัทยาในการสูบน้ำแต่ละครั้งของโครงการ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป	-	- หากเริ่มดำเนินการเปิดใช้อาคาร ควรประสานให้เมืองพัทยามา ตะกอนส่วนเกินก่อน และควรมีการ ทดสอบระบบบำบัดก่อนเปิดใช้ ระบบบำบัด

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1.หมั่นตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ซึ่งเป็นสาเหตุ ให้เกิดการอุดตัน เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	✓	- โครงการมีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ของระบบ ระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน	-
3.4 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	1. จัดหาถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 4 ถัง โดยแบ่งเป็น ประเภทละ 1 ถัง ซึ่งเป็นภาชนะรองรับที่ไม่มีการรั่วซึม พร้อมพั้งฝา ปิดป้องกันน้ำฝนและการสกลินเหม็น 2. กำชับให้คนงานที่มูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด 3. ติดตามประสานงานให้เมืองพัทยาเข้ามาเข้าไปกำจัดตามหลัก สุขาภิบาล ไม่ให้มีผลเสียต่อกอง 4. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีพบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน 5. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่กองเศษวัสดุจากการรื้อถอน ไม่ปล่อยให้ ทิ้งกระจายหลายจุด เพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยต่อการ	✓	- โครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอย จำนวน 4 ถัง วาง ไว้ในพื้นที่ที่ปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-8 ประกอบ) - ผู้รับเหมาได้กำชับให้คนงานที่มูลฝอยลงใน ภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด - ปัจจุบัน เมืองพัทยาได้เข้ามาจัดการเก็บมูลฝอยไป กำจัดตามหลักสุขาภิบาล - โครงการมีการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับ มูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลง และสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็น แหล่งอาหาร - ผู้รับเหมาจัดพื้นที่กองเศษวัสดุจากการรื้อถอน ไม่ปล่อยให้ทิ้งกระจายหลายจุด	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
3.4 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	จัดเก็บ และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ สำหรับเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้อีก 6. มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณ มากพอ โครงการจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดหลังการปรับปรุงโครงการเสร็จ เรียบร้อย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	✓	- มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวม ไว้ หลังการปรับปรุงโครงการเสร็จเรียบร้อย โครงการจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดตามหลัก สุขาภิบาลต่อไป (ดูรูปที่ 3-9 ประกอบ)	-
	7. สำหรับเศษวัสดุที่ไม่สามารถนำใช้ประโยชน์ได้แล้ว โครงการจะจัด จ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไป กำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	✓	- เศษวัสดุที่ไม่สามารถนำใช้ประโยชน์ได้แล้ว จะเก็บ รวบรวมไว้ หลังการปรับปรุงโครงการเสร็จ เรียบร้อย โครงการจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดตาม หลักสุขาภิบาลต่อไป (ดูรูปที่ 3-10 ประกอบ)	-
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	1. กำจัดให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	✓	- โครงการมีการกำกับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด - โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		เสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย (ดูรูปที่ 3-11 ประกอบ)	
3.6 ความปลอดภัยและ การป้องกันอัคคีภัย	1.การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 2.ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน	✓ - โครงการได้มีการเดินสายไฟภายในพื้นที่ ก่อสร้างอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามหลักวิชาการ	-
	3.จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและที่เก็บกอง วัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	✓ - โครงการได้กำชับผู้รับเหมามหาทุนคนงานสูบบุหรี่ ในขณะที่ปฏิบัติงาน และหากต้องการสูบบุหรี่ โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ อยู่บริเวณชั้นที่ 1 ด้านนอกอาคาร (ดูรูปที่ 3-12 ประกอบ)	-
	4. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 3 ระยะ ได้แก่ 4.1 ระยะก่อนเกิดภัย 4.1.1 แผนการการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและจัดตั้งเหตุของการเกิดเพลิง ไหม้ และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	✓ - โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีใน พื้นที่ปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-13 ประกอบ)	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
3.6 ความปลอดภัยและ การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	รวมทั้งการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ความพร้อมใน การใช้งานอยู่เสมอ 4.1.2 แผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรวม เป็นการอบรมให้ความรู้กับคนงานก่อสร้าง ทั้งในเชิงป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 4.1.3 แผนการณรงค์ เพื่อให้คนงานก่อสร้างตื่นตัวและตระหนักในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโครงการ รวมทั้งให้คนงานก่อสร้างได้มีความรู้ที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยเป็นการสร้าง ความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย 4.2 ระยะขณะเกิดภัย 4.2.1 แผนการดับเพลิง เป็นการระบุตำแหน่ง หน้าที่ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในการแจ้งเหตุ การส่งการ การเข้าระงับ เหตุการณ์ การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก โดยอาจ จัดทำแผนเป็น 2 แผน ได้แก่ แผนการดับเพลิงช่วงกลางวัน และ แผนการดับเพลิงช่วงกลางคืน		

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
3.6 ความปลอดภัยและ การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	4.2.2 แผนการอพยพหนีไฟ เป็นการกำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในขั้นตอน การ อพยพหนีไฟ เช่น ผู้นำทางหนีไฟ หน่วยตรวจสอบจำนวนคนที่จุด รวมพล หน่วยช่วยชีวิต และประสานงานรถฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น 4.3 ระยะเวลาหลังเกิดภัย เป็นการบริหารจัดการหลังอัคคีภัยสิ้นสุดลง แล้ว ประกอบด้วย การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ การสำรวจ ความเสียหาย การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุด นัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง การช่วยชีวิตและชุดค้นหาผู้เสียชีวิต การ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต การประเมินความ เสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์ การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย การปรับปรุงแก้ไขปัญหา		
3.7 การคมนาคม	1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ให้กับรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก และปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร	✓	- - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า-ออก จากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก และปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร (ดูรูปที่ 3-14 ประกอบ)

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
3.7 การคมนาคม (ต่อ)	2.ควบคุมนำหนักบรรทุกทุกตามพิกัด ไม่ให้เกิน 21 ตัน และจำกัด ความเร็วของรถ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ผู้ขับ รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และ ข้อบัญญัติความระมัดระวังเป็นพิเศษ	✓	-
	3.ขนส่งเฉพาะในช่วงเวลา 09:00-15:00 น. หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยใกล้เคียง และชุมชนที่ใช้เป็น เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง	◆	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว จึงไม่มีกิจกรรม การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
	4.กำหนดจัดทำป้ายผ้าหรือไวรลระบุชื่อโครงการ และผู้รับเหมา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ที่รถขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้	◆	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว จึงไม่มีกิจกรรม การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 การประเมิน ผล กระทบด้านสุขภาพเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1.จัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบทราบแผนการ ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นปรับปรุงโครงการ โดย ประสานงานกับผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 2.ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะปรับปรุงโครงการ และ ข้อความแสดงการขออภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการ ปรับปรุง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	◆	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว
		◆	- ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.1 การประเมินผล กระทบด้านสุขภาพชุมชน สังคมและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	3.ให้ทันข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นหากกำหนดเป็นมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีการร้องเรียนขณะ ดำเนินการปรับปรุงจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที 4.ให้มีการแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้ ไว้บริเวณพื้นที่โครงการตลอดระยะปรับปรุงให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ โดยรอบพื้นที่โครงการสามารถเห็นได้ชัดเจน 5.ออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ปรับปรุง อาทิเช่น ห้ามขาย ยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของ คนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวน บุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณีเพื่อความปลอดภัย หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้าม ทำลาย เคลื่อนย้ายตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัรับเหมาทุก กรณี ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมย เกิดขึ้นต้องถูกดำเนินคดี 6.จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความปลอดภัยในการปรับปรุง พร้อมชี้แจงใน เรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	✓ - ปัจจุบัน โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่ อย่างใด ◆ - ✓ - โครงการให้ผู้รับเหมากำชับคนงานให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ปรับปรุง อย่างเคร่งครัด ✓ - ผู้รับเหมาจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ ปรับปรุง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ คนงานทราบ	- - ปัจจุบัน โครงการได้ปรับปรุง อาคารเสร็จแล้ว -

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.1 การประเมินผล กระทบด้านสุขภาพเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	7. ว่าจ้างคนงานที่ต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็น พาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคโควิดโรค เป็นต้น	✓ - โครงการว่าจ้างคนงานในพื้นที่ ที่ถูกต้องตาม กฎหมาย เพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคโควิดโรค เป็นต้น	-
	8. จ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อลดการอพยพโยกย้ายแรงงานและเป็นการ สร้างงาน สร้างรายได้และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	✓ - โครงการมีการจ้างแรงงานคนในพื้นที่และแวก ใกล้เคียง	-
	9. ไม่ให้มีการค้าสินค้าของคนงานในพื้นที่ปรับปรุงโดยเด็ดขาด	✓ - โครงการมีการจ้างแรงงานคนในละแวก ใกล้เคียง ดังนั้น จึงไม่มีการค้าสินค้าของคนงาน ในพื้นที่ปรับปรุงโครงการ	-
	10. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อ ความเดือดร้อนต่อผู้อยู่ข้างเคียง	✓ - มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	-
	11. ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด	✓ - ภายในพื้นที่โครงการ ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็น พาหะนำโรคทุกชนิด	-
	12. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน โดยจัด ให้สิบลบรถบรรทุกมารับไปกำจัด	✓ - ไม่มีการกองเศษวัสดุที่เหลือใช้ ไว้ที่หน้างาน โดย จัดให้สิบลบรถบรรทุกมารับไปกำจัด	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.1 การประเมินผล กระทบด้านสุขภาพเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	13.จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน หวาย ที่ตกหล่น อยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	✓	- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลบริเวณพื้นที่ ปรับปรุงโครงการ ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาที่มีการปรับปรุง	-
	14.จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องค้นหา สาเหตุและแก้ไขปัญหาทันที	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-2 ประกอบ) หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดย ทันที ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่อย่างใด	-
	15.ตรวจสอบสภาพภายนอกของรั้วบดปล่อยเป็นประจําสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันแมลงและสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีพบว่าภายนอกของรั้วบดปล่อยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนภายนอกใหม่ใช้แทน	✓	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพภายนอกของรั้วรับ บดปล่อยเป็นประจําสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลง และสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็น แหล่งอาหาร	-
	16.กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างไว้เป็น สัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำ กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับ	✓	-โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้าง เก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม	-

✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายความว่า กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.2 อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ)	3.ควบคุมดูแลและสอดคล้องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่จำเป็น	✓ - โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาคอย ควบคุมดูแลและสอดคล้องการใช้ไฟฟ้าและ จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	-
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข	1.จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขอนามัยตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น 2.ตรวจสอบสภาพคนงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลัง รับเข้าทำงาน 3.ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เช่น ผ้าปิดจมูก ให้คนงานสวมใส่ขณะทำงานในบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่น ละออง 4.ในกรณีที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกัน ต้องให้คนงานที่ทำงานใน บริเวณดังกล่าวมีชั่วโมงการทำงานไม่เกินที่กำหนด 5.ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือ สำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน	✓ - โครงการได้มีการอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขอนามัยตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น - - ผู้รับเหมาจัดเตรียมผ้าปิดจมูกให้คนงานสวมใส่ ขณะที่ทำงานในบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง - ผู้รับเหมาจัดให้คนงานทำงานไม่เกินชั่วโมง ที่กำหนด ในกรณีที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกัน - โครงการได้กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับ ป้องกันแรงสั่นสะเทือน	- - โครงการว่าจ้างคนงานในพื้นที่ ใกล้เคียง จำนวนประมาณ 10 คน ซึ่งน้อยมาก ซึ่งคนงานทั้งหมดมี สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งระยะเวลา ปรับปรุงอาคารค่อนข้างสั้น - - -

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข (ต่อ)	6.ตรวจตราการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความ สั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	✓	- โครงการกำกับให้ผู้รับเหมาตรวจตราการ ทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความ สั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด
	<u>โรคระบบทางเดินหายใจ</u> 1.ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วย ผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน ให้มิดชิด	✓	- โครงการได้กำหนดให้มีการเก็บกองวัสดุที่อาจ ก่อให้เกิดฝุ่น โดยปิดคลุมอย่างมิดชิด
	2.จัดให้มีหมวกกป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง และหมวกกกันฝุ่นละออง เป็นต้น	✓	- โครงการจัดให้มีหมวกกป้องกันสารเคมีที่มีกลิ่น รุนแรง สำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ ใช้สารเคมี และหมวกกกันฝุ่นละออง เป็นต้น
	3.เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง	✓	- โครงการได้จัดให้มีการเลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่น ไม่รุนแรง
	<u>โรคไข้เลือดออก</u> 1.จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ปรับปรุง โครงการ คั่วและปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อ ป้องกันยุงมาวางไข่ ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่ อย่างแจกัน ถังเก็บน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	✓	- โครงการจัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ
	2.ควรแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงยาวในการปฏิบัติงาน	✓	- คนงานในพื้นที่ปรับปรุงโครงการ แต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงยาวในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข (ต่อ)	3.ฉีดสเปรย์หรือพ่นยากันยุง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก	✓	- โครงการได้ให้คนงานฉีดสเปรย์หรือพ่นยากันยุง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก
	โรคอุจจาระร่วง 1.จัดให้มีการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุง หรือรับประทานอาหาร	✓	- โครงการกำชับให้คนงานมีการล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่ และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุง หรือ รับประทานอาหาร
	2.เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดสุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทาน อาหารที่สุกๆ ดิบๆ	✓	- โครงการมีการอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ใน การดูแลสุขภาพของตนเอง เลือกรับประทานอาหาร ที่สะอาดสุกใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ
	3.ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดพักงาน จนกว่าจะหายเจ็บป่วย	✓	- โครงการมีการกำหนดให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วย อาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดพักงานจนกว่าจะ หายเจ็บป่วย
	โรคพิษสุนัขบ้า 1.ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ปรับปรุงโครงการ	✓	- ภายในพื้นที่ปรับปรุงโครงการ ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ แต่อย่างใด

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข (ต่อ)	2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยดุร้ายทั้งภายใน และภายนอกโครงการ	✓	- ผู้รับเหมามีการกำหนดกฎระเบียบให้คนงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงที่มีนิสัย ดุร้ายทั้งภายในและภายนอกโครงการ
	โรคลมแดด 1.จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ โดยจัดเตรียมห้องเป็นสัดส่วน	✓	- โครงการจัดให้มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงานใน บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ
	2.ให้คนงานที่ทำงานกลางแดดมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง	✓	- โครงการให้คนงานที่ทำงานกลางแดดมีเวลาหยุด พัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง
	3.ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดพักงาน จนกว่าจะหายเจ็บป่วย	✓	- โครงการมีการกำหนดให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วย อาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดพักงานจนกว่าจะ หายเจ็บป่วย
	โรคมะเร็งจากควันบุหรี่ 1.จัดหาพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่	✓	- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาห้ามคนงานสูบบุหรี่ ในขณะที่ปฏิบัติงาน และหากต้องการสูบบุหรี่ โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ อยู่บริเวณชั้นที่ 1 ด้านนอกอาคาร (ดูรูปที่ 3-12 ประกอบ)

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข (ต่อ)	2. จัดให้มีเวลาพักเบรกการทำงาน เพื่อความผ่อนคลายสำหรับ คนงานในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ	✓	- โครงการจัดให้มีเวลาพักเบรกระหว่างการทำงาน เพื่อผ่อนคลายสำหรับคนงานในพื้นที่ปรับปรุง โครงการ
	โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค 1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการเพื่อ ป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	✓	- โครงการมีการดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการเพื่อป้องกันการ เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
	2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอและดูแลความสะอาด ไม่ให้มีมูลฝอยล้นถังเพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรคระบาด เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ	✓	- โครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอย จำนวน 4 ถัง วาง ไว้ภายในพื้นที่ปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-8 ประกอบ) และจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดไม่ให้มี มูลฝอยล้นถังถึงเพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค ระบาด
	3. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ปรับปรุงโครงการ	✓	- ภายในพื้นที่ปรับปรุงโครงการ ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ แต่อย่างใด
อุบัติเหตุต่างๆ 1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย		✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า-ออก โครงการ (ดูรูปที่ 3-14 ประกอบ)

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ

✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข (ต่อ)	2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น แวนตานิริย หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ เป็นต้น	✓	- ผู้รับเหมามีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคล เช่น แวนตานิริย หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ เป็นต้น
	3. ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	✓	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาคอยควบคุมดูแล และตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่จำเป็น
	<u>ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ความเครียด ความวิตกกังวล ความ หวาดกลัว</u>		
	1. ไม่ทำกิจกรรมการปรับปรุงโครงการที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เวลาพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยโดยรอบ	✓	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา ห้ามคนงานทำ กิจกรรมการปรับปรุงโครงการที่ก่อให้เกิดเสียง ดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยโดยรอบ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ซึ่งเสียงพื้นที่ โครงการเป็นระยะๆ ตลอดจนปรับปรุงโครงการ เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโดยตรง	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบ ผู้พักอาศัยซึ่งเสียงพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบจากการปรับปรุงโครงการ และ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุง (ดูรูปที่ 3-2 ประกอบ) หากพบว่ามีความร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หรือแก้ไขปัญหาที่พบโดย

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว




ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ		ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข
				พื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่อย่างใด	
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข (ต่อ)	3.ดูแลรักษาความสะอาดของระบบระบายน้ำ ไม่ให้หน้าท่วมขังหรือ มีเศษมูลฝอยตกค้างสะสมทำให้เกิดกลิ่นรบกวน		✓	- โครงการได้จัดให้มีดูแลรักษาความสะอาดของ ระบบระบายน้ำ ไม่ให้หน้าท่วมขัง	
	4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้ที่ อยู่อาศัยใกล้เคียงโครงการ		✓	- โครงการได้จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอย ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อน รำคาญต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงโครงการ	
4.4 ทัศนียภาพและ สุนทรียภาพ	1. ดูแลพื้นที่โครงการระยะปรับปรุงโครงการ ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย		✓	- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลบริเวณพื้นที่ ปรับปรุงโครงการ ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ตลอดจนระยะเวลาที่มีการปรับปรุง (ดูรูป ที่ 3-1 ประกอบ)	-
4.5 การดับบั้งแสงและ การดับบั้งทิศทางลม	-		-	-	-
4.6 การสื่อสารและการ บดบังคลื่นวิทยุ โทรศัพท์	-		-	-	-

หมายเหตุ ✓ หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการฯ
✗ หมายถึง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
◆ หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว



รูปที่ 3-1 บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

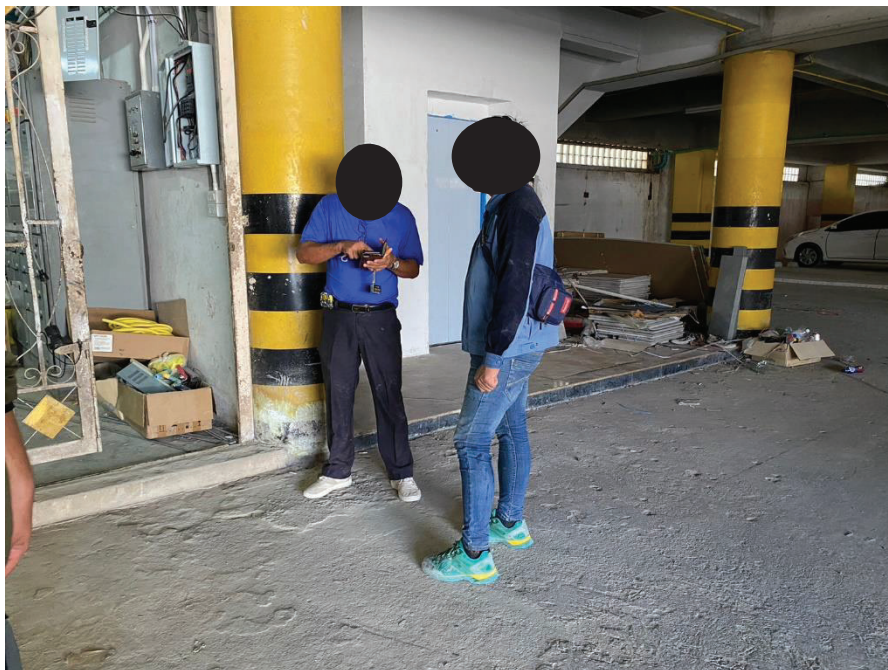

รูปที่ 3-2 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 3-3 กรณีที่ต้องใช้ปูนปริมาณน้อย จะกะถุงมาใช้ แล้วจะเก็บในถุงให้มิดชิด



รูปที่ 3-4 ผนังโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-5 ผนังกันเสียงในกิจกรรมปรับปรุงช่วงตกแต่งและเก็บงาน



รูปที่ 3-6 ห้องน้ำชั่วคราวสำหรับคนงาน



รูปที่ 3-7 ถังสำรองน้ำใช้สำหรับคนงาน



รูปที่ 3-8 ถังมูลฝอยจำนวน 4 ถัง วางไว้ในพื้นที่ปรับปรุง




รูปที่ 3-9 มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้



รูปที่ 3-10 เศษวัสดุที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว จะเก็บรวบรวมไว้




รูปที่ 3-11 มีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

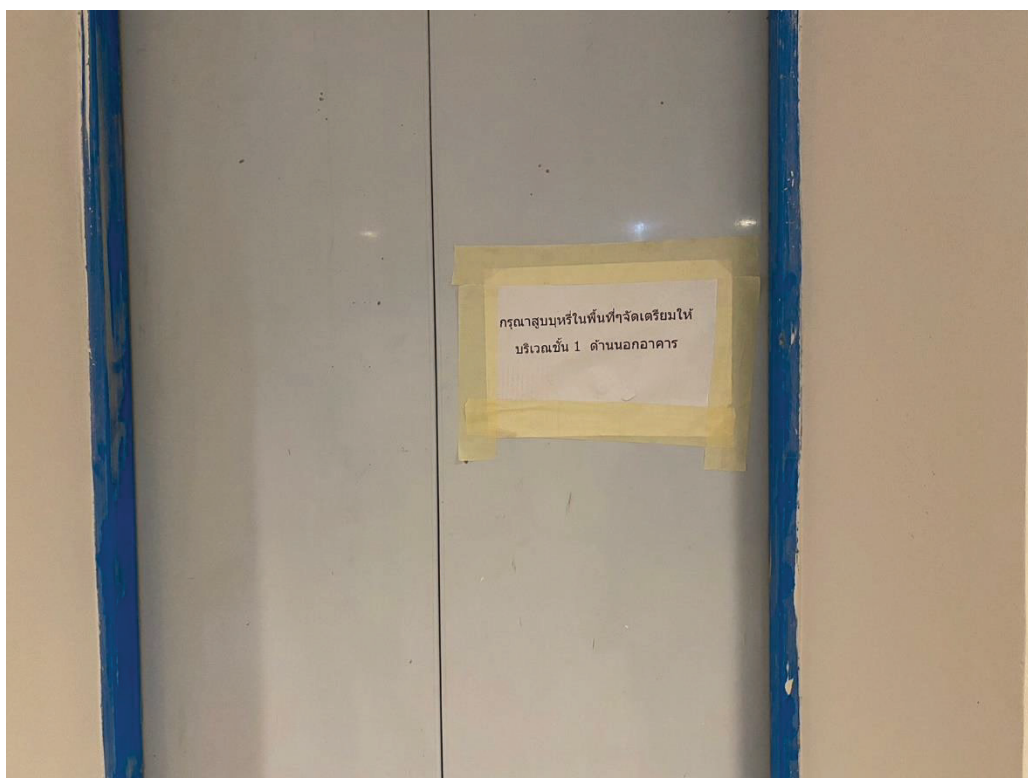

รูปที่ 3-12 ป้ายจัดให้มีพื้นที่สับหรือบริเวณชั้น 1 ด้านนอกอาคาร



รูปที่ 3-13 ถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ปรับปรุง

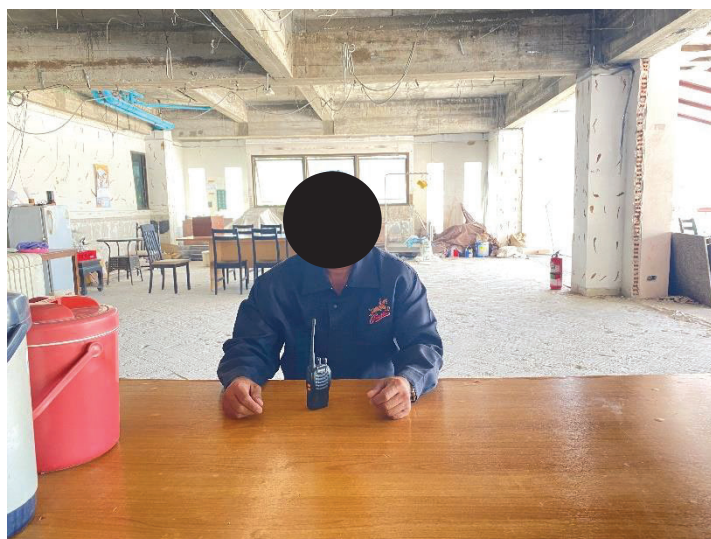

รูปที่ 3-14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



รูปที่ 3-15 เครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น
