

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) ของบริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) ของบริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 แสดงดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) ตั้งอยู่ที่ถนนสรวังค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โครงการประกอบด้วยอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 22 ชั้น ความสูง 103.95 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 399 ห้อง จำนวน 1 อาคาร และอาคาร B ซึ่งเป็นอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นห้องเครื่องใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 22.55 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นคาเฟ่) จำนวน 1 อาคาร โดยโครงการออกแบบให้มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร A และอาคาร B จำนวน 1 แห่ง บริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร A และชั้นที่ 3 ของอาคาร B ซึ่งในการพัฒนาโครงการ บริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ได้เช่าที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 5220 เลขที่ดิน 885 มีพื้นที่ดินเช่าตามสัญญา 3-0-32 ไร่ หรือ 4,928 ตารางเมตรจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ไท-ไท วิศวกรจำกัด ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อย่างเคร่งครัด	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด อย่างเคร่งครัด	-	-
	2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการและให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงาน โยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	- กรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการเพื่อทราบ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทีมผู้บริหารผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- กรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการเพื่อทราบ</p> <p>- เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการจะแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการ หรือนิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที	-	-
2. การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ	1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการบริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนสรวังค์ และถนนมเหล็ก เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) ซึ่งโครงการประกอบด้วยอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารโรงแรมขนาดความสูง 22 ชั้น ความสูง 103.95 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 399 ห้อง	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายรายละเอียดโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมทั้งระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้งเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และกล่องรับเรื่องร้องเรียน	-	- ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	จำนวน 1 อาคาร และอาคาร B ซึ่งเป็นอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นห้องเครื่องใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 22.55 เมตร (ความสูงซึ่งเป็นอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 8 ชั้น และวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 1 อาคาร โดยโครงการออกแบบให้มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร A และอาคาร B จำนวน 1 แห่ง บริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร A และชั้นที่ 3 ของอาคาร B โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งทราบก่อนที่มีการก่อสร้างและเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วง พร้อมทั้งระบุอย่างน้อยดังนี้ 1.1) ชื่อโครงการ 1.2) เจ้าของโครงการ 1.3) ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ 1.4) สถาปนิกโครงการ 1.6) ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 1.7) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.8) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 1.9) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายรายละเอียดโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมทั้งระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ สถาปนิกโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้งเบอร์โทรติดต่อ ผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และกล่องรับเรื่องร้องเรียน	-	- ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีการติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนสรวังค์ และถนนมเหล็กฯ ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>2.1) ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.2) รายละเอียด/ ฟังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.3) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย</p> <p>2.4) ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักและช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ</p>	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง กล้องรับเรื่องร้องเรียนและแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีประกันความเสียหายที่ครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ซึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหาย โครงการจะเข้าแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 3,13 และภาคผนวกที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>3) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>3.1) ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>3.2) รายละเอียด/ ฝั่งรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>3.3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน ใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p>	<p>- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยจัดส่งเอกสารทั้งรายละเอียดโครงการ ฝั่งการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนในการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีที่เกิดความเสียหาย ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่บ้านพักอาศัยและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	-	- ดังภาพที่ 3, 9, 13 และภาคผนวกที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>4.1) ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>4.2) รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>4.3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน ใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p>	<p>- โครงการติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแสดงตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารใบอนุญาตการก่อสร้าง และกล่องรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีประกันความเสียหายที่ครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ซึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายโครงการจะเข้าแก้ไขโดยทันที</p>	-	- ดังภาพที่ 3, 9, 13 และภาคผนวกที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สตรีทส์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลต์ แอนด์ โซเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

[illegible]

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ	3. จัดทำ Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบเขตที่ดินโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง อย่างเป็นสัดส่วน และติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดป้ายขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 1-2
1.2 คุณภาพอากาศ	1. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1) ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 2) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดอย่างน้อยทุก 7 วัน 3) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราช บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดวางวัสดุอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมเศษวัสดุเหลือใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง โดยจะไม่มีการกองวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราช บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็นประจำทุกวัน	- - -	- ดังภาพที่ 19 - ดังภาพที่ 19 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2. มาตรการด้านการขนส่งและใช้เครื่องจักร</p> <p>1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราช เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นลงบน ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</p> <p>2) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง และเครื่องจักรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>3) ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>3. มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>- ห้ามไม่ให้มีการเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุใดๆ เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด</p>	<p>- ปัจจุบันไม่มีรถบรรทุกขนดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราช เข้ามายังพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์และเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำชับคนงานไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมามีให้มีการเผาขยะและวัสดุ ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p>	- - - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สурวงค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	4. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1) โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวันและหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่อากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะหยุดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน (PM2.5) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลงานขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่พื้นที่โครงการงานตัด เาะ เจียร ขัดแต่งผิวคอนกรีต หรือที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและหากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างโครงการชั่วคราว โครงการต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดงดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและให้ดำเนินกิจกรรมอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเท่านั้น	- โครงการมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ หากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เกินค่ามาตรฐานโครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2) กรณีที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุดก่อสร้าง หรือขอความร่วมมือใดๆ โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนย้ายเศษวัสดุหรือถอนออกจากพื้นที่โครงการ การทาบ ตัด เเจะสกัด ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	- หากหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทันที	-	-
	3) ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) รอบนอกคลุมถึงชั้นสูงสุด โดยรอบอาคารแต่ละอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	- โครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งได้รื้อถอน Mesh Sheet ปิดคลุมรอบอาคารออกทั้งหมดแล้ว	-	-
	4) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่าที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้างภายในบริเวณโครงการอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 19
	5) จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณการหล่นคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคนิคการก่อสร้างเป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อลดปริมาณการหล่นคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	6) การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ ที่คลุมผ้าใบหรือในพื้นที่ที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	- โครงการได้กำชับคนงานที่ทำการก่อสร้างทุกคน หากมีการ ทำกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะ จะต้องดำเนินการในพื้นที่ ที่มีผนังปิดกั้น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิด จากการทำกิจกรรมนั้นๆ ออกจากสู่ภายนอก	-	- ดังภาพที่ 33
	7) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น วันละ 2 ครั้ง ทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาวเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อม ทั้งกวาดฝุ่นละออง และตะกอนภายหลังการฉีดพรมน้ำ เพื่อ ป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำ และการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	- โครงการจัดให้มีคนงานฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือ บริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น วันละ 2 ครั้ง ทุกวัน และเพิ่มความถี่ใน การฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาว พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดและขุดลอก ตะกอนบ่อพักน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	8) จัดให้มีการระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณแนวรั้ว ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก รวมทั้งบริเวณ โครงสร้างอาคาร ซึ่งจะขยับขึ้นตามความสูงของชั้นนั้นๆ และหัน หัวระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำเข้าหา Mesh Sheet เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละออง โดยมีความถี่ในการเปิด สเปรย์น้ำไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/วัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำงานที่ ทำให้เกิดฝุ่นละออง น้ำที่ผ่านการระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำแล้ว จะตกลงสู่พื้นด้านล่างเข้าสู่ระบบระบายน้ำของโครงการต่อไป	- ปัจจุบันโครงการได้รื้อถอนระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่น บริเวณแนวรั้วด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศ ตะวันตกออกทั้งหมดแล้ว เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำรั้ว ถาวรของโครงการ ขณะอยู่ในช่วงงานโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>5. มาตรการด้านการขุดดิน</p> <p>1) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลาโดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทรายที่ตกหล่นอยู่นอกรั้วพื้นที่ โครงการและถนนสุวรรณศรีและถนนมหะศักดิ์ ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวัน ตลอดจนบริเวณที่นำดินไปปรับถมจนกว่าการดำเนินการขนส่งดินจะแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และในกรณีที่มีเศษดินเปียกร่วงหล่นต้องใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดทันที</p>	<p>- โครงการกำหนดให้ประตูทางเข้า-ออกโครงการต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง และจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย ตลอดการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำและความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย ตลอดการก่อสร้าง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 8 และภาพที่ 15</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3) กำหนดให้มีมาตรการล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ โดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาด ล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติด กับล้อรถ	- ปัจจุบัน โครงการจัดทำถนนในพื้นที่โครงการเป็นถนน คอนกรีตทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีกิจกรรมการล้างล้อรถก่อน ออกจากพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 20
	4) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณภายใน พื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลน ในช่วงฝนตก	- ปัจจุบัน โครงการได้เทคอนกรีตโดยทั่วบริเวณโครงการแล้ว เสร็จ	-	- ดังภาพที่ 20

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง	1. กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเจาะเสาเข็มการก่อสร้างฐานรากงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ให้อนุญาต แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการทำงานใดๆ	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังในวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ในช่วง 08.00-18.00 น. และหยุดทำงานในวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากโครงการมีการทำงานล่วงเวลาจะแจ้งให้บ้านข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเริ่มดำเนินการ	-	- ดังภาพที่ 21
	2. ในช่วงก่อสร้างฐานรากจัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>3. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</p> <p>4. ช่วงงานขึ้นโครงสร้างรวมงานระบบสาธารณูปโภคและงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคารจอร์จกำหนดให้การทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องอยู่ห่างจากแนวอาคารเข้าไปไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร</p> <p>5. กำหนดให้มีการติดตั้งผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตรในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ซึ่งเสียงที่ลดลงเมื่อทะลุผ่านผ้าใบกันเสียง จะใช้เท่ากับ 15.4dB (A) หรือ Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร(หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ซึ่งเสียงที่ลดลงเมื่อทะลุผ่าน Metal Sheet จะใช้เท่ากับ 25 dB(A)รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) ช่วงงานขึ้นโครงสร้างรวมงานระบบสาธารณูปโภค</p> <p>- ด้านทิศเหนือ ติดตั้งผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตรในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 20 ของ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เสียงดังในเวลาเดียวกัน</p> <p>- โครงการกำหนดให้การทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องอยู่ห่างจากแนวอาคารเข้าไปไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร</p> <p>- ปัจจุบันโครงการติดตั้งผนังจริงของอาคารโดยรอบครบทุกด้านและได้รื้อถอนผ้าใบกันเสียงออก ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการกำหนดให้ประกอบกิจกรรมด้านในของอาคารเท่านั้น</p>	- - -	- ดังภาคผนวกที่ 6 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>ของอาคาร A และชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้าของอาคาร B</p> <p>- ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 19 ของอาคาร A และตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้าของอาคาร B</p> <p>- ด้านทิศใต้ ติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A และชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้าของอาคาร B</p> <p>- ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งผ้าใบกันเสียง(Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐานตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A</p> <p>2) ช่วงงานขึ้นโครงสร้าง รวมงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการติดตั้งผนังจริงของอาคารโดยรอบครบทุกด้าน และได้รื้อถอนผ้าใบกันเสียงออก ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการกำหนดให้ประกอบกิจกรรมด้านในของอาคารเท่านั้น</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านทิศเหนือ ติดตั้งผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 20 ของอาคาร A และชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้าของอาคาร B - ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A และตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้าของอาคาร B - ด้านทิศใต้ ติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A และชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้าของอาคาร B 	- ปัจจุบันโครงการติดตั้งผนังจริงของอาคารโดยรอบครบทุกด้าน และได้รื้อถอนผ้าใบกันเสียงออก ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการกำหนดให้ประกอบกิจกรรมด้านในของอาคารเท่านั้น	-	-

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สวิสส์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลต์ แอนด์ โซเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>- ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐานตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 21 ของอาคาร A</p> <p>3) ช่วงงานตกแต่งภายในและภายนอกด้านทิศเหนือ ติดตั้งผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตรในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 16 ของอาคาร A และชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้าของอาคาร B</p> <p>-ด้านทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้าของอาคาร B</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการติดตั้งผนังจริงของอาคารโดยรอบครบทุกด้าน และได้รื้อถอนผ้าใบกันเสียงออก ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการกำหนดให้ประกอบกิจกรรมด้านในของอาคารเท่านั้น</p> <p>- ปัจจุบันโครงการติดตั้งผนังจริงของอาคารโดยรอบครบทุกด้าน และได้รื้อถอนผ้าใบกันเสียงออก ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการกำหนดให้ประกอบกิจกรรมด้านในของอาคารเท่านั้น</p>	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/ อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>- ด้านทิศตะวันตก ติดตั้งผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตรในบริเวณที่ทำให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นดาดฟ้า ของอาคาร A</p> <p>6. หลีกเลี่ยงการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>7. พิจารณาใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนในระดับต่ำ</p> <p>8. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบາเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>9. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>11. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องชนิดที่มีอัตราเร็วเกินไป</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และวิศวกรคอยกำชับคนงานให้หลีกเลี่ยงการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>- โครงการจะพิจารณาใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนในระดับต่ำ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ดับเครื่องทุกครั้งในขณะที่ไม่ได้ใช้งานผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีและดูแลสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับ คนงานไม่ให้เครื่องจักรหรือเครื่องชนิดที่มีอัตราเร็วเกินไป</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 5-6</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 6</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	12. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวน ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- โครงการคอยกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 7
	13. ผู้รับเหมาต้องเข้มงวดต่อการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลด การเกิดเสียงดัง เช่น การตัด การจัดหาวัสดุที่เหมาะสม เพื่อ ป้องกันการกระแทกของวัสดุที่อาจเกิดเสียงดัง	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับตัดเจียร วัสดุก่อสร้างใน พื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงจากการตัดเจียร วัสดุ ก่อสร้างออกสู่ภายนอก	-	- ดังภาพที่ 33
	14. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการวิศวกรผู้ ควบคุมงานก่อสร้างต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่ง ให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการ โยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง	- โครงการจัดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างคอยกำชับ ผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการ โยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดัง	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	15. ในการเทดินต้องไม่ให้กระเบาะเททำขยะกระแทกกระเบาะข้าง ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงาน ให้ระวังการเทดินอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดเสียง ดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	16. ไม่เร่งเครื่องยนต์ของรถขนส่งให้เกิดเสียงดังรบกวน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงาน ไม่เร่งเครื่องยนต์ของรถขนส่งให้เกิดเสียงดังรบกวนผ่าน กิจกรรม Morning Talk	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์	1. ก่อนก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 เดือน ผู้รับเหมา ต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงทุกด้าน โดยให้มีวิศวกรเข้าสำรวจถ่ายภาพ สภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารเดิมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการ จะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพ เดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้นทั้งนี้โครงการจำทำประกันภัยก่อสร้างให้ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินภายในโครงการและภายนอกโครงการโดยหากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะเข้าไปให้ตรวจสอบพร้อมกับแจ้งบริษัทประกันให้ทราบและดำเนินการแก้ไขให้ได้อย่างเร่งด่วนให้กลับสู่สภาพเดิมหรือได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นตามที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของอาคารข้างเคียงทั้งนี้ ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ที่โครงการได้โดยตรง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งข้อมูลข่าวสารบ้านข้างเคียงก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจบ้านข้างเคียงก่อนเริ่มการก่อสร้าง ร่วมกับบริษัทประกันภัย โดยหากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะเข้าไปให้ตรวจสอบพร้อมกับแจ้งบริษัทประกันให้ทราบ	-	- ดังภาคผนวกที่ 8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	2. กำหนดช่วงเวลาการทำงาน ที่ก่อให้เกิดความ สัมพันธ์ เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก งาน โครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00- 18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำ ความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้าง ออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมี กิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (สัปดาห์ ละไม่เกิน 3 วัน) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่ อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน รวมทั้ง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้ให้อนุญาต แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการทำงานใด ๆ	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 08.00-18.00 น. และหยุดทำงานในวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัต ฤกษ์ ทั้งนี้หากโครงการมีการทำงานล่วงเวลาโครงการจะแจ้งให้ บ้านข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเริ่มดำเนินการ ตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 21

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	3. ก่อสร้างโดยใช้เสาเข็มเจาะเพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ อยู่ใกล้เคียง	- ขณะอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	4. จัดให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงทำเสาเข็มแถวนอก สุด ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ หากมีผลกระทบต่อบ้าน/อาคารข้างเคียงต้องหาแนวทาง เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อให้ความสัมพันธ์ลดลง ทันที	- ขณะอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	5. จัดให้มีการปูแผ่นเหล็ก (Platform) เพื่อลดแรงสั่น สะเทือนจากการเดินรถภายในพื้นที่โครงการที่มีระดับพื้น ต่างกัน	- ปัจจุบัน โครงการได้ทำการเทคอนกรีตโดยรอบโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 20
	6. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุม การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	-	- ดังภาพผนวกที่ 5
	7. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการได้ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างให้ไม่ เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	8. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อเหตุการณ์ไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์ โดย แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้า พื้นที่โครงการและแจกบ้านพักอาศัย/อาคาร และสถานที่ สำคัญที่อยู่ในระยะรัศมี 100 เมตร	- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความ เสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการทำให้ เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย ใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้ทันที พร้อมทั้งแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
	9. โครงการจะทำประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและ ครอบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอด ระยะเวลาการก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้มีการทำ ประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัย บุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนโครงการ แล้วเสร็จ	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
1.5 การพังทลายของดิน	1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการจะทำหนังสือไปยัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร เพื่อเสนอความประสงค์ ขอติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าความเอียงตัวของอาคาร (TILT METER) เพื่อตรวจวัดค่าระหว่างก่อสร้าง รวมถึงสำรวจ สภาพอาคารโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงผลกระทบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแผนงานและรายละเอียด การก่อสร้าง รวมถึงสำรวจสภาพอาคารโดยทั่วไปก่อน ดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงผลกระทบ	-	- ดังภาคผนวกที่ 8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	<p>2. จัดให้มี Sheet Pile ที่ความลึกประมาณ 16 เมตรและทำค้ำยันเหล็ก (Bracing) รอบแนวอาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน</p> <p>3. ในช่วงการถอน Sheet Pile โครงการต้องดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน</p> <p>4. กำหนดช่วงเวลาการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลชั้นใต้ดิน โดยจะดำเนินการเฉพาะวันจันทร์ถึงเสาร์ช่วงเวลา 08.00-17.30 น.</p> <p>5. จัดให้ มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อเหตุการณ์ไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์ โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและแจกบ้านพักอาศัย/อาคาร และสถานที่สำคัญที่อยู่ในระยะรัศมี 100 เมตร</p>	<p>- ขณะที่โครงการอยู่ในช่วงงานฐานรากโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งขณะที่โครงการอยู่ในช่วงการถอน Sheet Pile โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งขณะที่โครงการอยู่ในช่วงการถอน Sheet Pile โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อกู้คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที พร้อมทั้งแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 13</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	6. บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด จะต้องดูแลพื้นที่โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบ ไม่ให้มีการพังทลายของดิน รุกล้ำพื้นที่ข้างเคียง 7. โครงการจะทำประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิศวกรในการควบคุมงานและดูแลพื้นที่โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบ - โครงการจัดให้มีการทำประกันภัยประเภท Contractors All Risks (CAR) ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตและครอบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ	- -	- ดังภาคผนวกที่ 5-6 - ดังภาคผนวกที่ 13
1.6 คุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 15 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 200 คน 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้รวม 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอต่อจำนวนคนงาน - โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย (ชั่วคราว) ไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ก่อนระบายออกสู่สาธารณะ	- -	- ดังภาพที่ 17 - ดังภาพที่ 23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<p>3. ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอเชียเวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบน้ำจากส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>4. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. หากบริเวณพื้นที่ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพ มาช่วยกำจัดกลิ่น</p>	<p>- โครงการประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาสูบน้ำจากส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเป็นประจำ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- หากบริเวณพื้นที่ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดเป็นประจำ</p>	- - -	- - -
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์				
3.1 น้ำใช้	1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 15 ลูกบาศก์เมตร/ วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน)	- โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อจำนวน คนงาน	-	- ดังภาพที่ 25
	2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	-
3.2 น้ำเสีย	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.6 เรื่องคุณภาพน้ำอย่าง เคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เรื่องคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.2 น้ำเสีย (ต่อ) 3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	2. จัดให้มีการใช้น้ำฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาดับกลิ่น สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำคนงาน 3. การรื้อถอนห้องส้วมของคนงานภายหลังการก่อสร้าง แล้วเสร็จ โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมารื้อย้ายถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปที่ติดตั้งโดยก่อนรื้อย้ายต้องประสานรถสูบ สิ่งปฏิกูลจากสำนักงานเขตบางรักมาสูบลบทิ้งในถัง ดังกล่าวออกทั้งหมด จากนั้นล้างทำความสะอาดถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป โดยใช้วิธีเติมน้ำลงในถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปและสูบลบออกหลายๆ ครั้งก่อนนำไปขายให้กับ แหล่งรับซื้อ อาทิเช่น บริษัทอินทรี อีโคไซเคิล จำกัด และ บริษัท ช. อโยธยารื้อถอน และก่อสร้าง จำกัด เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีการใช้น้ำฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาดับกลิ่น สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำคนงาน - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายในซึ่งยังไม่มี การรื้อถอนห้องส้วมคนงานออก ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	-	-
	1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว ความกว้าง 0.4 เมตร และความลาดเอียง 1:200 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รวบรวม น้ำเข้าสู่บ่อดักตะกอนดินเพื่อให้เศษดิน ตกตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน สรวังค์	- โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำถาวร รอบโครงการ ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จโครงการ จะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)	2. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่น บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียงโดยในกรณีที่มีเศษดิน เปื้อยตกหล่นต้องทำความสะอาดใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาด โดยทันที	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมการขุดดิน ทราช เข้า- ออกในพื้นที่โครงการ จึงไม่มีเศษดิน ทราช ตกหล่น บริเวณถนนด้านหน้าโครงการ	-	-
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง 1) มูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนุรรับกำจัดได้แก่ เศษวัสดุ จากการก่อสร้างประเภทคอนกรีต 272.8 ตันกำหนดให้ผู้รับเหมา ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนุร โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดและเก็บ หลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอย ฯ	- โครงการจัดให้มีถังขยะรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดป้ายให้แยกขยะอย่างถูกวิธี ทั้งนี้โครงการได้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับขยะไปกำจัดอย่างถูก วิธีต่อไป	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	2) มูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับกำจัดได้แก่ กระเบื้อง ฝ้าเพดาน เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ อลูมิเนียมและอื่นๆ จากการก่อสร้าง 545.6 ตัน กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดภายนอกโครงการยังแหล่งรับซื้อ อาทิเช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัท ช. อโยธยารีโอตอน และก่อสร้าง จำกัด เป็นต้น เพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเอกชนให้เข้ามาเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	-	-
	3) มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ได้แก่ เหล็ก ไม้พลาสติก แก้ว/กระจก และทรายจากการก่อสร้าง 367.6 ตัน ผู้รับเหมา จะนำไปใช้งานอื่นที่เหมาะสมต่อไป	- มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมานำไปใช้งานอื่นที่เหมาะสมต่อไป สำหรับขยะมูลฝอยทั่วไปโครงการได้ประสานงานไปยังสำนักงานเขตเข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	-
	4) จัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตรจำนวน 4 ถัง ตั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยซึ่งจะมีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า "ถังมูลฝอยอันตราย" โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติก ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ	- โครงการจัดให้มีถังขยะรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดป้ายให้แยกขยะอย่างถูกวิธี ทั้งนี้โครงการได้ประสานไปยังสำนักงานเขตเข้ามาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป	-	- ดังภาพที่ 14
	5) โครงการจะประสานให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต อาทิเช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัท ช. อโยธยารีโอตอน และก่อสร้าง จำกัด มารับไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเอกชนให้เข้ามาเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)	2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง 1) จัดให้ถังรองรับมูลฝอยไว้ในพื้นที่โครงการขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง ได้แก่ ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 2 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และถังขยะมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถัง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางรักมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป 2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอย และกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 4) หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบต่อด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น 5) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที	- โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยประจำพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานรวบรวมขยะไปไว้ยังถังของสำนักงานเขตบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อสะดวกต่อการเก็บขนของเจ้าหน้าที่ - โครงการกำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ผ่านกิจกรรม Morning Talk - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอย และกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด - ปัจจุบันโครงการในพื้นที่โครงการยังไม่มีปัญหาด้านกลิ่นรบกวนจากมูลฝอย ทั้งนี้หากโครงการเกิดปัญหาดังกล่าวโครงการจะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยการควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ	- - - - -	- ดังภาพที่ 14 - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 ระบบไฟฟ้า	- กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	-
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	1. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ 1) โครงการต้องห้ามจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น 2) โครงการต้องติดป้ายบริเวณพื้นที่โครงการดังนี้ (2.1) ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่ เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน (2.2) จัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือ "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ หรือคิดไฟ " หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวัน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการติดป้ายแสดงเขตก่อสร้าง และป้ายเตือนความปลอดภัยไว้บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการอย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีพื้นที่ในการสูบบุหรี่ พร้อมทั้งจัดทำมีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ พร้อมทั้งติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรองรับหากเกิดเหตุเพลิงไหม้	- - -	- ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 16 - ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 4 - ดังภาพที่ 11-12 และภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างโดย แบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม (3.1) ในช่วงทำฐานราก ต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 10 ปอนด์ ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ถัง/ระยะ 23 เมตร (3.2) ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งจะต้องติดตั้ง ถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ภายในอาคาร A จำนวนอย่าง น้อย 4 ถัง/ชั้น และอาคาร B จำนวนอย่างน้อย 3 ถัง/ชั้น	- โครงการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่โครงการที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัย ตรวจสอบถังดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 11
	4) ติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- โครงการได้ติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิงไว้บริเวณที่ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	-	- ดังภาพที่ 11
	5) กำหนดมาตรการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดโดย แยกที่พักคนงานออกจากพื้นที่ก่อสร้างติดป้ายห้าม ประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง อาทิ ประกอบอาหารจุดเทียน เพื่อป้องกันการเกิด เพลิงไหม้	- โครงการจัดให้มีที่พักระหว่างคนงาน พร้อมทั้งกำหนดให้ หัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ประกอบกิจกรรม ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 29

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>6) กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน</p> <p>7) จัดให้มีพื้นที่วางวัตถุกันไฟ หรือสารเคมีให้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายเตือนอย่างชัดเจน</p> <p>8) เก็บรวบรวม คัดแยกมูลฝอยหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย และนำไปกำจัดภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>9) ไม่ใช้ชุดสายพ่วงต่อพ่วงกันหลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้าจะเกินขนาดพิกัดที่กำหนด ทำให้เกิดความร้อนสูง และเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>10) จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในบริเวณปลอดภัยโดยเฉพาะ แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ กาว และถังก๊าซควรเก็บให้ห่างจากจุดที่มีประกายไฟ หรือมีการเชื่อมต่อโลหะ เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดทำให้เกิดเพลิงไหม้</p>	<p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ พร้อมทั้งติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรองรับหากเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุไวไฟ พร้อมติดป้ายเตือนไว้บริเวณพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งขยะลงในภาชนะที่เตรียมไว้ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งตู้จ่ายไฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ กาว และถังก๊าซ พร้อมทั้งติดป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 11-12 และภาพที่ 24</p> <p>- ดังภาพที่ 16</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 34</p> <p>- ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 36</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>11) ห้ามทาสี หรือพ่นสีบริเวณที่มีการเชื่อมต่อโลหะเนื่องจากประกายไฟจะทำปฏิกิริยากับทินเนอร์ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้</p> <p>12) จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า และป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ทำให้เกิดเพลิงไหม้</p> <p>13) ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติในงานก่อสร้าง</p> <p>14) กรณีที่มีการเชื่อมต่อโลหะในพื้นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีที่กำบังสะเก็ดไฟ หรือนำผ้ากันไฟมาคลุมวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นใส่ทำให้เกิดเพลิงไหม้</p> <p>15) การทำงานที่มีประกายไฟ และความร้อนใกล้เคียงวัสดุที่อาจติดไฟได้ ต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงตามจำนวนและชนิดที่เหมาะสมที่จะสามารถดับเพลิงได้ทันที</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ระมัดระวังกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ พร้อมทั้งติดป้ายเตือน</p> <p>- โครงการจัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งติดป้ายเตือน</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติในงานก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการไม่มีกิจกรรมการเชื่อมต่อโลหะในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงตามจำนวนและชนิดที่เหมาะสมที่จะสามารถดับเพลิงได้ทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 4</p> <p>- ดังภาพที่ 26</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 11</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>16) ห้ามเทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน้ำหรือท่อระบายสิ่งโสโครกอื่นๆ</p> <p>17) ก่อนเลิกงานจะต้องตัดสวิทช์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกจุด</p> <p>18) โครงการต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคารโดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจนและต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุเครื่องจักรหรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟและทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร</p> <p>2. กำหนดให้มีมาตรการเตือนอัคคีภัยดังนี้</p> <p>- จัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ โดยติดตั้งลำโพงกระจายเสียงที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานห้ามเทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน้ำหรือท่อระบายสิ่งโสโครกอื่นๆ ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสวิทช์ไฟฟ้าทุกจุดก่อนเลิกงานทุกครั้ง พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตรายไว้บริเวณพื้นที่ต่างๆ อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในอาคาร โดยจะแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคาร หน้าโถงลิฟต์ ให้เห็นชัดเจน</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ตามจุดต่างๆ ของอาคารอย่างทั่วถึง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฯ ฉบับถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 37</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการได้โดยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุรวงศ์ และถนนมเหล็ก</p> <p>2. จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่ โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งสินค้า และวัสดุก่อสร้าง และไม่จอดรถขนส่งสินค้าและรถอื่นๆ นอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด</p> <p>3. ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางบนถนนสุรวงศ์ และถนนมเหล็ก โดยผู้รับเหมาต้องใช้วิธีประสานกับหน่วยงานจำหน่ายคอนกรีต รวมถึงคนขับรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปทุกคันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสารเพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถจากโรงผลิตโดยให้ออกสลับกันไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ที่พื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับแผนส่งคอนกรีตให้สัมพันธ์กันมากที่สุด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการได้โดยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุรวงศ์ และถนนมเหล็ก</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถไว้ภายในโครงการเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถของผู้ที่เข้ามาติดต่อ และขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยไม่ให้จอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 15</p> <p>- ดังภาพที่ 15 และภาพที่ 22</p> <p>- ดังภาพที่ 15</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	<p>4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งคนและวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งคนได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งคน</p> <p>5. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการฯและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ</p> <p>6. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการฯและลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการฯอย่างชัดเจน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีรถบรรทุกขนส่งคน ส่งคน เข้า-ออกบริเวณพื้นที่โครงการ ขณะที่มีการใช้รถบรรทุกโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>- จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งติดป้ายบอกทิศทางเข้า-ออก ของโครงการฯอย่างชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 5</p> <p>- ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 18</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	7. ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ ในระหว่างการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในระหว่างการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 5
	8. รักษาปรับปรุงถนนบริเวณที่ใช้ในการเข้า-ออกช่วงก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด โดยหากพบว่าหากผิวจราจรเกิดการชำรุดหรือเสื่อมสภาพทางผู้รับเหมาต้องรีบแก้ไขผิวถนนให้คงอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบ หากพบว่าหากผิวจราจรเกิดการชำรุดหรือเสื่อมสภาพทางโครงการจะรีบแก้ไขทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 6
	9. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 10. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. สำหรับรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	- ปัจจุบันโครงการไม่มีรถบรรทุกเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ ขณะอยู่ในช่วงงานที่มีการใช้รถบรรทุก โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สวิส) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลต์ แอนด์ โซเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

[illegible]

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับ-ความคิดเห็นที่ป้อมขาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p> <p>3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ใกล้เคียงไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ก่อสร้าง</p> <p>4. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) และการสร้างสรรคคุณค่าเพื่อสังคม (Creating Shared Value : CSV) ของโครงการ โดยประสานกับทางสำนักงานเขตบางรัก และภาคส่วนต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างน้อยปีละ 4 กิจกรรม อาทิเช่น</p> <p>1) กิจกรรมการดูแลชุมชน : โครงการจะจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตรบริเวณ โดยรอบ โครงการเพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองและมลพิษทางเสียงสำหรับผู้อยู่อาศัย</p>	<p>- โครงการจัดให้มีบ้านพักสำหรับคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนข้างเคียง โดยการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบๆโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองและมลพิษทางเสียงสำหรับผู้อยู่อาศัย</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 14</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	2) การบริหารด้านการจราจรประสานงานกับหน่วยงาน ราชการ โครงการจะประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และลดปัญหาด้าน การจราจรติดขัด 5. จัดให้ มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อ บุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อเหตุการณ์ไม่ จำกัดจำนวนเหตุการณ์ โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและแจก บ้านพักอาศัย/อาคาร และสถานที่สำคัญที่อยู่ในระยะรัศมี 100 เมตร	- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความ เสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำ ให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย ใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการ แก้ไขปัญหาทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 13
4.2 ผลกระทบทางสังคม	1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณแนวรั้วด้าน ที่ติดกับถนนสรวังค์ และถนนมเหล็กขั้วรายละเอียดดังระบุ ไว้ในตารางที่ 1 ข้อ 2.การประชาสัมพันธ์โครงการและ เผยแพร่มาตรการโครงการ ข้อย่อย 1) และ 2) ทุกประการ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณแนวรั้วด้านที่ติด กับถนนสรวังค์ และถนนมเหล็กขั้ว โดยระบุรายละเอียดตาม มาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยการ จัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้</p> <p>2.1) ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>2.2) รายละเอียด/ ฟังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชย เยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน ใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข โทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์การติดตั้งกล่องรับ ความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ สำนักงานโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมวลชน สัมพันธ์ เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้าง และข้อมูลการติดต่อ ผู้รับเหมา พร้อมทั้งติดตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของ มาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง แสดงกรรมกรรมประกันภัย และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	-	- ดังภาพที่ 9,13 และ ภาคผนวกที่ 4, 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	3. 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ใกล้เคียง ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ประ โยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ก่อสร้าง	- โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการตามที่มาตรการกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีบ้านพักสำหรับคนงานอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 34
	4. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการเด็ดขาด แต่ทั้งนี้จะมีคนงานประมาณ 2-3 คน ที่ทำหน้าที่ควบคุมสโตร์เวลากลางคืน นอกจากนี้ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เกิน 2 คน ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง	-	-
	5. หากคนงานเกิดการทะเลาะวิวาท หรือสร้างความรำคาญใจต่อข้างเคียง เจ้าของโครงการจะดักเตือนผู้รับเหมา ให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบไว้เพื่อให้คนงานได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	6. ตรวจสอบสารเสพติดคนงานทุก 2 สัปดาห์ ร่วมกับบริษัท ผู้รับเหมา พร้อมทั้งบันทึกผล	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบสาร เสพติดคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 6 และภาพผนวกที่ 14
	7. สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ สวัสดิการของประชาชน โครงการได้จัดให้มีระบบรักษา ความปลอดภัยภายในโครงการ ดังนี้ - จัดให้มีคนงานประมาณ 2-3 คน ที่ทำหน้าที่ควบคุม สโตร์เวลากลางคืน นอกจากนี้ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยไม่เกิน 2 คน ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน พื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วบริเวณแนวรั้ว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุม กล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ เรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของโครงการอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด(CCTV) ทั่วบริเวณแนวรั้ว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- -	- ดังภาพที่ 15 - ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>- โครงการกำหนดระเบียบปฏิบัติของพนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง</p> <p>1. พิจารณาเลือกพนักงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก</p> <p>2. กรณีรับคนงานต่างด้าวต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง</p> <p>3. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้</p>	<p>- โครงการจัดให้กฎระเบียบของโครงการ พร้อมกำชับให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการพิจารณาเลือกพนักงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก</p>	-	- ดังภาพที่ 7
		- โครงการจัดให้มีการคัดเลือกแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเท่านั้น พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
		- โครงการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเท่านั้น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบประวัติคนงาน	-	- ดังภาคผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	4. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสิทธิเสรีภาพขูดปฏิบัติงานพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	- โครงการจัดให้มีชุดคนงาน โดยระบุสิทธิเสรีภาพขูดปฏิบัติงานพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	-	- ดังภาพที่ 28
	1. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. กำหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว)	- โครงการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกตรวจสอบประวัติคนงาน	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	3. กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ซึ่งมีแผนการจัดกิจกรรมรอบระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566	-	-
	4. โครงการต้องดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบ จัดระเบียบรวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน	-	- ดังภาพที่ 29

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สурวงค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	5. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยระดับชุมชน ใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ	- โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จโครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	6. กำหนดให้มีมาตรการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ ก่อนและหลังการรื้อถอนห้องส้วมคนงาน ดังนี้ 1) กำจัดหนู โดยวิธีวางกาวดักหรือใช้สารเคมี 2) ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณห้องส้วม โดยฉีดพ่นภายหลังที่คนงานออกไปหมดแล้ว 3) กำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่มีน้ำท่วมขังอันจะก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 4) ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบห้องส้วมคนงาน ก่อนและภายหลังรื้อถอนโดยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรค	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมการฉีดพ่นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณบ้านพักคนงาน เป็นประจำ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ก่อนรื้อถอนและเมื่อรื้อถอนแล้วเสร็จทันที 5) ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดยาฆ่าเชื้อโรคหลังแล้วเสร็จทันที 1. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่โครงการเด็ดขาด 2. จัดให้มีคนงานประมาณ 2-3 คน ที่ทำหน้าที่ควบคุมสัปดาห์เวลา กลางคืน นอกจากนี้ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เกิน 2 คน ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วบริเวณแนวรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมการฉีดพ่นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณบ้านพักคนงานเป็นประจำ - โครงการจัดให้มีบ้านพักสำหรับคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วบริเวณแนวรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- - - -	- - ดังภาพผนวกที่ 14 - ดังภาพที่ 36 - ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม(ต่อ)	4. จัดให้มีแสงสว่างเท่าที่จำเป็นต่อการมองเห็นและไม่หันทิศทางของแหล่งกำเนิดแสงส่องเข้ามายังทิศที่ชุมชนตั้งอยู่เด็ดขาด ทั้งนี้ หากมีได้มีกิจกรรมใด ๆ โครงการจะดับแสงไฟลงและไม่เปิดค้างไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงแก้ไขหากเกิดข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนเท่าที่จำเป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และไม่หันทิศทางของแหล่งกำเนิดแสงส่องเข้ามายังทิศที่ชุมชนตั้งอยู่ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อคอยตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงแก้ไขหากเกิดข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 30
	5. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	- โครงการพิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	-	-
	6. กรณีรับคนงานต่างด้าวต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีการคัดเลือกแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเท่านั้น พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	7. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้	- โครงการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจสอบประวัติคนงาน	-	- ดังภาคผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>8. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสิทธิเสรีภาพของแรงงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของวัด อาทิเช่น ทอดกฐิน และผ้าป่าให้กับวัดใกล้เคียงบริเวณโครงการ (ในระหว่างการก่อสร้าง) เป็นต้น</p>	- โครงการจัดให้มีชุดคนงาน โดยระบุสิทธิเสรีภาพของแรงงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	-	- ดังภาพที่ 28
		-โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-
		- โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำกิจกรรมร่วมกับพื้นที่ข้างเคียง เช่น วัด และโรงเรียน ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจท้องถิ่น	-	-	-	-
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข				
1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ (1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.2 เรื่อง คุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.3 เรื่อง เสียงอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.4 เรื่อง ความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด - โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไอแสบี จำกัด เข้ามาตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในระหว่างช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไอแสบี จำกัด เข้ามาตรวจวัดระดับเสียง ในระหว่างช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่าผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไอแสบี จำกัด เข้ามาตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในระหว่างช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - ดังภาคผนวกที่ 19 - ดังภาคผนวกที่ 19 - ดังภาคผนวกที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ (1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	1. จัดทำรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้าม มิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความ ปลอดภัยในการทำงาน อาทิเช่น 1) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 2) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 3) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการ ทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552	- โครงการการจัดให้มีรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร รอบ พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดป้ายเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลควบคุมการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพที่ 1 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ (1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	4) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งไม่มีเครื่องจักรอยู่ในโครงการแล้ว	-	-
	5) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอกพ.ศ. 2553	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	6) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ.2553	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งไม่มีเครื่องจักรอยู่ในโครงการแล้ว	-	-
	7) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรปั้นฉนวน และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งไม่มีเครื่องจักรอยู่ในโครงการแล้ว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ (1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (ต่อ)	8) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ ปั้นจั่น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่ง ไม่มีเครื่องจักรอยู่ในโครงการแล้ว	-	-
	9) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนด รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลควบคุมการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	10) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับ ปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่น พ.ศ. 2554	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลควบคุมการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ (1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ)	11) กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลควบคุมการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	12) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านค้ำยันให้มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีแผนคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	- ดังภาคผนวกที่ 9
	3. ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) รอบนอกคลุมถึงชั้นสูงสุด โดยรอบอาคารแต่ละอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งได้รื้อถอน Mesh Sheet ออกทั้งหมดแล้ว	-	-
	4. กำหนดให้ใช้เครนเป็นแบบพับแขนได้และแขนของเครนจะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้นไม่ล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งไม่มีเครื่องจักรอยู่ในโครงการแล้ว ขณะอยู่ในช่วงงานที่มีการใช้เครื่องจักรได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	5. การติดตั้งเครนจะต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรองรวมทั้งวิศวกรควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการอบรม ก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น		-	-

(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สวิสส์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลต์ แอนด์ โซเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<p>4.4 ผลกระทบด้าน</p> <p>สาธารณสุข</p> <p>1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ</p>	<p>6. จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้เครนที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านงานยกควบคุมตลอดเวลาที่มีการทำงานยก รวมถึงจัดทำแผนการยกก่อนการทำงาน</p> <p>7. ขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยก จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร</p> <p>8. ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพของการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยกและต้องทดลองควบคุมโดยไม่มี Load</p> <p>9. ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องการจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งไม่มีเครื่องจักรอยู่ในโครงการแล้ว ขณะอยู่ในช่วงงานที่มีการใช้เครื่องจักรได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- หากมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงโครงการจะหยุดกิจกรรมทันที และแจ้งวิศวกรให้ทราบเพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที ซึ่งในปัจจุบันโครงการยังไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ (2) บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ)	1. จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานจำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนและกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง	-	-
	2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคนงานเท่านั้น	-	-
	3. มีกฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจตรา และควบคุมกฎระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงและคนงานอื่นที่อยู่ร่วมกัน อาทิเช่น ห้ามดื่มสุรา/เสพและจำหน่ายยาเสพติด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามส่งเสียง ฝังรบกวนผู้พักอาศัยอื่น เช่น เปิดเครื่องเสียงเสียงดังเกินไป และห้ามคนงานออกจากบ้านพักยามวิกาลเวลา 23.00-07.00 น. (ยกเว้นกรณี ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง) เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคอยดูแลและ กำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 29 และ ภาพผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ (2) บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ)	4. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานตาม มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงาน ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) โดยมีข้อกำหนด อาทิเช่น - จัดให้มีห้องพักคนงาน ตามจำนวนคนงาน โดยคิด อัตราคนงาน จำนวน 2 คน/1 ห้อง - จัดให้มีแสงสว่างเท่าที่จำเป็นต่อการมองเห็นและไม่ หันทิศทางของแหล่งกำเนิดแสงส่องเข้ามายังทิศที่ชุมชน ตั้งอยู่เด็ดขาด ทั้งนี้ หากมิได้มีกิจกรรมใดๆอยู่นอก โครงการฯ จะดับแสงไฟลงและไม่เปิดค้างไวพร้อมทั้ง ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอและ ปรับปรุงแก้ไขหากเกิดข้อร้องเรียนจากชุมชน - ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่าง น้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างบ้านพักคนงานตาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง	1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่น มาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีต ที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ ต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาค ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน ที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับ ปริมาณฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจ 2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น 3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น วันละ 2 ครั้ง ทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาวเพื่อลดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่น พร้อมทั้งกวาดฝุ่นละออง และตะกอนภายหลังการ ฉีดพรมน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำ และการฟุ้ง กระจายอีกครั้ง 4. จัดให้มีการระบบพ่นกันฝุ่นบริเวณแนวรั้วด้านทิศเหนือทิศ ตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก รวมทั้งบริเวณโครงสร้าง อาคารซึ่งจะขยับขึ้นตามความสูงนั้นๆ และหันหัวระบบพ่น ละอองสเปรย์น้ำเข้าหา Mesh Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การดักจับฝุ่นละออง โดยมีความถี่ในการเปิดสเปรย์น้ำ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอบรมคนงานก่อน เข้าทำงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน - โครงการกำชับผู้รับเหมาให้เปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น - ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงสิ้นสุดระยะการก่อสร้าง ขณะอยู่ ในช่วงงานที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- - -	- ดังภาคผนวกที่ 6 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<p>4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข</p> <p>2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)</p>	<p>ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/วัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำงานที่ ทำให้เกิดฝุ่นละออง น้ำที่ผ่านกระบวนบำบัดของเสีย น้ำแล้วจะตกลงสู่พื้นด้านล่างเข้าสู่ระบบระบายน้ำของ โครงการต่อไป</p> <p>5. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE) ให้ กับ พนักงาน ขณะ ปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>2. กำหนดให้คนงานที่ได้รับเสียงเกิน 85 dB (A) ใช้ อุปกรณ์ลดเสียง ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear muff) ที่มีค่า NRR= 30 dB(A) และ $NRR_{adj} = 22.5 \text{ dB(A)}$ ลดระดับเสียงที่ สัมผัสในหูลงได้ = 15.5 dB(A) รวมทั้งกำหนดเครื่องจักร เพื่อให้คนงานสัมผัสเสียงดังได้ไม่เกินกว่าระยะเวลาการ ทำงานซึ่งอยู่ใกล้ค่าที่กฎหมายกำหนด ดังนี้</p> <p>1.1) เดือนที่ 1-3 มีกิจกรรม การก่อสร้างจากงานฐาน ราก ซึ่งกำหนดระยะเวลาการทำงานได้ดังนี้</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงสิ้นสุดระยะการก่อสร้าง ขณะอยู่ ในช่วงงานที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างให้ไม่ เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุก ครั้งที่ปฏิบัติงาน</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุก ครั้งที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 6</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 27, 36</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 27</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
	<p>(1) กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียวระยะ 1-7 เมตร จะสามารถทำงานได้ 4.49 - 8 ชั่วโมง/วัน โดยต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>(2) กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิดระยะ 2-13 เมตร สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>1.2) เดือนที่ 4-16 มีกิจกรรมการก่อสร้างจากงานขึ้นโครงสร้างอาคาร รวมงานระบบ ซึ่งกำหนดระยะเวลาการทำงานได้ดังนี้</p> <p>(1) กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียวระยะ 1-7 เมตร จะสามารถทำงานได้ 5.66 -8 ชั่วโมง/วัน โดยต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>(2) กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิดระยะ 2-8 เมตร สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>ตกแต่งภายในซึ่งกำหนดระยะเวลาการทำงานได้ ดังนี้</p>	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้งปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 27, 36

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>1.3) เดือนที่ 17-27 มีกิจกรรมการก่อสร้างจากงานขึ้น โครงสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค และงาน</p> <p>(1) กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว - ระยะ 1-7 เมตร จะสามารถทำงานได้ 5.66 -8 ชั่วโมง/วันโดยต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>(2) กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด - ระยะ 2-9 เมตร สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วันโดย ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>1.4) เดือนที่ 28-30 มีกิจกรรมงานตกแต่งภายในซึ่งกำหนด ระยะเวลาการทำงานได้ดังนี้</p> <p>(1) กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว - ระยะ 1-3 เมตร จะสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>(2) กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด - ระยะ 2-4 เมตร สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง</p>	<p>- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมกำชับให้สวมใส่ขณะ ปฏิบัติงานทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</p>	-	- ดังภาพที่ 27, 36

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	3. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	-
	4. กำชับให้พนักงานสวมใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะอยู่ในช่วงงานที่มีกิจกรรมที่มีเสียงดัง โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	5. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ เช่น กรณีที่คนงานทำงานในที่ที่มีระดับเสียงดังครบตามชั่วโมงการทำงานที่กำหนด หัวหน้าคนงานจะต้องหมุนเวียนคนงานไปปฏิบัติงาน ณ บริเวณอื่น เป็นต้น	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ พร้อมกับการสับเปลี่ยนคนงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	- ขณะที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการกำชับผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำ พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	7. คัดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงาน บริเวณที่มีเสียงดัง 1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน 1) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ 2) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้ม เครื่องมือ 3) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ 4) โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะการใช้งานที่ เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะอยู่ ในช่วงงานที่มีกิจกรรมที่มีเสียงดัง โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมการขุดเจาะ หรือกิจกรรมที่ต้อง ใช้เครื่องขุดเจาะ ทั้งนี้ขณะที่โครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วง งานที่มีกิจกรรมการขุดเจาะ โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนด	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล 1) กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงาน กับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็น อันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาที ต่อการทำงานช่วงเวลา 2 ชั่วโมง 2) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้วัสดุทำเบาะที่ นั่งสำหรับรถขุดเจาะ	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความ เสี่ยงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดระยะเวลาทำงานของ คนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสี่ยงที่คนงานก่อสร้างจะ ได้รับ พร้อมกับการสับเปลี่ยนคนงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
		- ปัจจุบัน โครงการไม่มีกิจกรรมการขุดเจาะ หรือกิจกรรมที่ต้อง ใช้เครื่องขุดเจาะ ทั้งนี้ขณะที่โครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วง งานที่มีกิจกรรมการขุดเจาะ โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนด	-	-
		- โครงการจัดให้มีการคัดเลือกแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเท่านั้น พร้อมทั้งกำกับ คนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	1. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรกแต่ใน กรณีที่ไม่สามารถหาคนงานที่เป็นคนไทยได้ต้องเลือก คนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา ทำงาน และต้องมีใบรับรองผ่านการตรวจโรคจากแพทย์ 2. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การ ดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจัดอบรมและให้ คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	3. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 4. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความ สะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายใน ห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์ 5. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสียสิ่ง ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 6. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหา การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 7. อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้า ตรวจสอบพื้นที่ กรณีที่พบว่า มีโรคระบาดที่เกิดจาก คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลความเรียบร้อย พร้อมทั้ง กำกับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลความเรียบร้อย พร้อมทั้ง กำกับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ถังขยะ และระบบบำบัด น้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิด แหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ - โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลความเรียบร้อย พร้อมทั้ง กำกับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - โครงการกำกับผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของ รัฐในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ กรณีที่พบว่า มีโรคระบาดที่เกิดจาก คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- - - - -	- ดังภาพที่ 29 - ดังภาพที่ 29 - ดังภาพที่ 14, 23 และภาพที่ 25 - ดังภาพที่ 29 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	<p>8. โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) หากพบว่ามีการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้แล้ว โครงการจะจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ให้กับคนงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อกับโรคดังกล่าว</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ</p> <p>3) จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผ่อนคลายกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 และ 2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับจะมีผลยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย แล้วกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ทางโครงการจึงยึดถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด และหากมีคนงานได้เป็นโรคโควิด 19 ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป</p>	-	- ดังภาพผนวกที่ 24

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวงศ์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<p>4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข</p> <p>2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)</p>	<p>4) จัดให้มีพื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ</p> <p>5) กำชับให้คนงานก่อสร้างสวมหน้ากากอนามัย ก่อน เข้าพื้นที่โครงการ</p> <p>6) ควบคุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนงานในการทำงาน</p> <p>7) จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่พัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน</p> <p>8) ควบคุมเชื้อทำความสะอาดรถรับ-ส่งคนงานโดยเน้น จุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ</p> <p>9) จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากาก อนามัยหรือกระดาษทิชชู</p>			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<p>4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข</p> <p>2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)</p>	<p>10) หากพบคนงานก่อสร้างมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ผู้รับเหมาพาไปพบแพทย์โดยทันที</p> <p>11) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดโดยมี การจัดเก็บและทำบันทึกประวัติคนงานก่อสร้างใน โครงการ</p> <p>1. โครงการจะจัดทำผังบุคลากรด้านความปลอดภัยประจำ โครงการ โดยในผังจะแสดงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัยและ ผังบุคลากรประจำหน่วยงานก่อสร้างพร้อมทั้งหน้าที่ (Job Description) เพื่อวางแผนงานด้านบริหารงานความ ปลอดภัยและสุขภาพพร้อมทั้งระบุหน้าที่และความ รับผิดชอบของบุคลากร</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการทำฝั้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้ รับอนุญาต เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัยและผังบุคลากร ประจำหน่วยงานก่อสร้างพร้อมทั้งหน้าที่ (Job Description) เพื่อ วางแผนงานด้านบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพพร้อมทั้ง ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 6-7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สурวงค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	2. โครงการจะต้องอบรมพนักงานทุกระดับทั้งก่อนเข้า ทำงานขณะทำงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องความ ปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยต่อสุขภาพและทรัพย์สินของหน่วยงานดังนี้ 2.1) จัดให้มีการอบรมพนักงานก่อนเข้ามาเป็นนัก งานในหน่วยงานก่อสร้าง (Safety Orientation) ซึ่งจะ ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำตัว เช่น หมวก แวนตา และเข็มขัดนิรภัยการติดบัตรผ่านเข้า-ออก หน่วยงานก่อสร้างการเข้าร่วม Morning Talk เพื่อให้ พนักงานใหม่ได้เข้าใจกฎระเบียบในการรักษาความ ปลอดภัยและสุขภาพประจำหน่วยงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดอบรมพนักงานทุกระดับทั้ง ก่อนเข้าทำงานขณะทำงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องความ ปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม Morning Talk ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สурวงค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	2.3) จัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุกๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมการประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ของโครงการ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงความปลอดภัย อุบัติเหตุหรือความเสี่ยงของอุบัติเหตุ (Incident, Accident) การก่อสร้างที่สำคัญๆ และมีความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) พร้อมทั้งเสนอวิธีการก่อสร้างที่เสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยง (Construction Method)	- โครงการจัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุก ๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมการประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ของโครงการ	-	-
	2.4) จัดให้มีการเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมกันเดินตรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความสะอาดสุขอนามัย ความปลอดภัยประจำหน่วยงานและกำหนดให้แก้ไขในด้านต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความสะอาดสุขอนามัย ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข 2) ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	2.5) จัดให้มีการเสนอวิธีการก่อสร้างเพื่อวิเคราะห์ความ เสี่ยงฝ่ายก่อสร้างจะต้องเสนอแผน ของการก่อสร้างและ แผนวิเคราะห์ความเสี่ยง (Construction Method & Risk Assessment) ให้ฝ่ายความปลอดภัยพิจารณาเพื่อกำหนด วิธีการก่อสร้างให้ปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มทำงานก่อสร้างจริง - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3 ข้อ 2) เรื่องอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมิน ความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลา ทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสี่ยงที่คนงาน ก่อสร้างจะได้รับ ทั้งนี้โครงการมีการสับเปลี่ยนคนงาน ตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด - โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาคผนวกที่ 6 -
5. การรับเรื่องร้องเรียนและ การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบ	1. จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณแนวรั้วด้าน ที่ติดกับถนนสรวังค์ และถนนมเหล็ก รายละเอียดดังระบุ ไว้ในตารางที่ 1 ข้อ 2.การประชาสัมพันธ์โครงการและ เผยแพร่มาตรการโครงการ ข้อย่อย 1) และ 2) ทุกประการ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณแนวรั้วด้านที่ติด กับถนนสรวังค์ และถนนมเหล็ก โดยระบุรายละเอียดตาม มาตรการที่กำหนด	- -	- ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
5. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>2.1) ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง</p> <p>2.2) รายละเอียด/ ฟังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.3) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน ใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p>	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแจ้งแผนการก่อสร้าง และข้อมูลการติดต่อผู้รับเหมา พร้อมทั้งติดตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง แสดงกรมธรรม์ประกันภัย และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มการบันทึกเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 3, 9, 13 และภาคผนวกที่ 13, 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
5. การรับเรื่องร้องเรียนและ การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบ (ต่อ)	3. เมื่อเริ่มมีการก่อสร้าง จะต้องการจัดทำรายละเอียดผังขั้นตอน การประสานงานเรื่องร้องเรียนทั้งในช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิด ดำเนินการเสนอต่อสำนักงานเขตบางรัก 4. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไข ผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับ โครงการ โดยโครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการ ก่อสร้างก่อน โดยที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัท ผู้รับเหมาจึงดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัท ประกันภัยภายหลัง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานเรื่อง ร้องเรียนต่อสำนักงานเขตบางรัก ซึ่งในรอบระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ยังไม่พบว่ามีกรร้องเรียน - โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครอง ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่การก่อสร้าง โครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหา สาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นทันที	- -	- - ดังภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
5. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	5. โครงการกำหนดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเยียวยาในช่วงก่อสร้าง เป็นจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)	- โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
	6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อเหตุการณ์ไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์ โดยแสดงสำเนาตารางกรรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและแจกบ้านพักอาศัย/อาคาร และสถานที่สำคัญที่อยู่ในระยะรัศมี 100 เมตร	- โครงการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
5. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	7. กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดการตัดสินใจร่วมกัน ในการกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรม แต่ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบและไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	8. โครงการต้องถอดบทเรียนเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมต่อไปในกรณีที่มาตรการเดิมที่เคยกำหนดไว้ไม่สามารถป้องกันผลกระทบได้	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	9. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) การสร้างสัจจะคุณค่าเพื่อสังคม (Creating Shared Value : CSV) ของโครงการ โดยประสานกับทางสำนักงานเขตบางรัก และภาคส่วนต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอย่างน้อยปีละ 4 กิจกรรม อาทิเช่น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนข้างเคียง โดยการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบ ๆ โครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สูรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
5. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	1) กิจกรรมการดูแลชุมชน : โครงการจะจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองและมลพิษทางเสียงสำหรับผู้อยู่อาศัย	- โครงการการจัดให้มีรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดป้ายเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 1
	2) การบริหารด้านการจราจรประสานงานกับหน่วยงานราชการ : โครงการจะประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และลดปัญหาด้านการจราจรติดขัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 15
	3) การขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบโครงการโครงการจัดให้มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบโครงการ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	- โครงการมีแผนจะดำเนินการจัดทำ การขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบโครงการในรอบถัดไป ซึ่งหากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	4) การปรับปรุงทางเท้าบริเวณโดยรอบโครงการโครงการจัดให้มีการปรับปรุงทางเท้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีความสะอาด สำหรับทางการเดินเท้าของคนในชุมชน	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong
(โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6. การด้านทานการเกิด แผ่นดินไหว	1. ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตาม กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 โดย ในการออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการออกแบบอาคารให้สามารถ รองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับ น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่ รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	-	- ดังภาคผนวกที่ 25
	2. ในการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อให้สามารถรองรับ แผ่นดินไหวใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ ซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการออกแบบอาคาร ด้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของกรม โยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1302) โดยได้รับการ ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของ โครงสร้างโดย นายวสิน ภูมิณี ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ วย. 2261	- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการออกแบบโครงสร้างอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิง พลศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการออกแบบ อาคารด้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของกรม โยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1302)	-	- ดังภาคผนวกที่ 25

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



ภาพที่ 1 รั้ว Metal Sheet



ภาพที่ 2 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



ภาพที่ 4 ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ




ภาพที่ 5 สัญลักษณ์ไฟกระพริบ



ภาพที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็ว


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สурวงค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

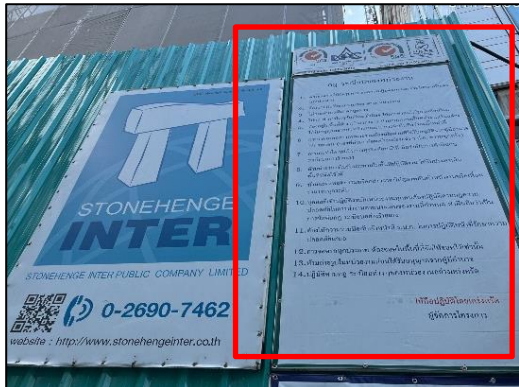

ภาพที่ 7 กฎระเบียบพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 8 ประตูทางเข้า-ออกปิดทึบ

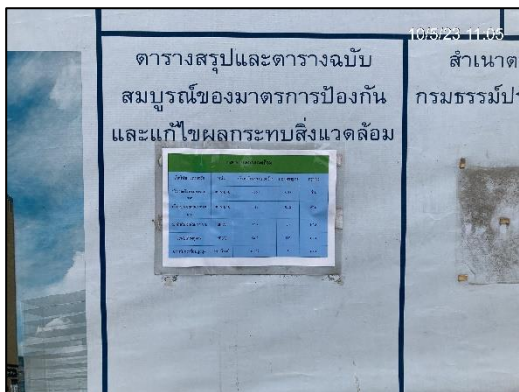

ภาพที่ 9 ติดตารางมาตรการฯ ไว้หน้าโครงการ



ภาพที่ 10 กล้องวงจรปิด

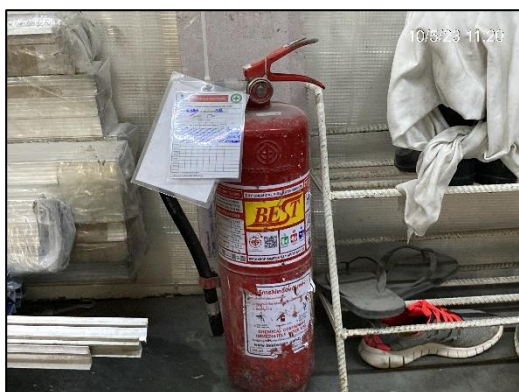

ภาพที่ 11 ถังดับเพลิง และป้ายแนะนำการการใช้อุปกรณ์




ภาพที่ 12 พื้นที่สูบบุหรี่




ภาพที่ 13 กล่องรับเรื่องร้อง

ภาพที่ 14 ถังรองรับมูลฝอย

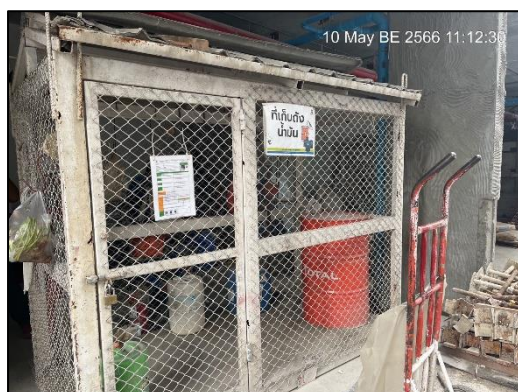

ภาพที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพที่ 16 พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ

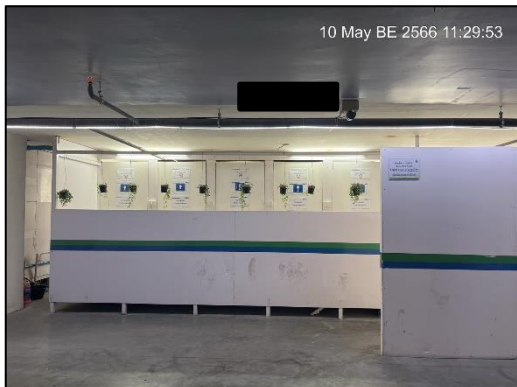

ภาพที่ 17 ห้องน้ำ ห้องส้วม



ภาพที่ 18 ป้ายแสดงทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 19 พื้นที่กองวัสดุก่อสร้างมีผ้าปิดคลุม

ภาพที่ 20 พื้นคอนกรีตบริเวณพื้นที่โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>ภาพที่ 21 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการทำงาน</p>	<p>ภาพที่ 22 พื้นที่จอดรถบริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 23 ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 24 ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่</p>
	
<p>ภาพที่ 25 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>ภาพที่ 26 ตู้ไฟฟ้า</p>

	
<p>ภาพที่ 27 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	
	
<p>ภาพที่ 27 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>ภาพที่ 28 ชุดฟอร์มพนักงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 29 หัวหน้าคนงาน</p>	



ภาพที่ 30 ไฟฟ้าส่องสว่าง



ภาพที่ 31 แขนของเครน (BOOM)
อยู่ภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 32 ลิฟต์



ภาพที่ 33 พื้นที่คัดเจียร

โครงการ แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ สุรวงศ์				
แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน 1/2566				
ดัชนีที่สมควรตรวจวัด	หน่วย	บริเวณโครงการก่อสร้าง	ค่ามาตรฐาน	สรุปผล
ปริมาณฝุ่นละอองรวม : TSP	มก./ลบ.ม.	0.172	0.33	ผ่าน
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก	มก./ลบ.ม.	0.034	0.12	ผ่าน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	dB(A)	61.6	70	ผ่าน
ระดับเสียงสูงสุด	dB(A)	95.8	115	ผ่าน
แรงสั่นสะเทือนสูงสุด	มม./วินาที	0.122	5	ผ่าน

ภาพที่ 34 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด

SVNTEC		เป้าหมาย "อุบัติเหตุศูนย์รวมรถต้องไม่มี"	
เริ่มงานวันที่ 11 เดือน 10 พ.ศ. 2566	กำหนดการงานเสร็จวันที่ 11 เดือน 10 พ.ศ. 2566	เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลังกงานเสร็จสิ้น	วันที่ 11 เดือน 10 พ.ศ. 2566
จำนวนวันนับตั้งแต่วันที่ขึ้นรถขึ้นรถจนจบงานเสร็จสิ้น			
เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุขึ้นรถจนจบงาน			
สถิติการทำงานไม่ได้ชั่วคราว - ทดสอบระบบ - ทำ - สรุปผลวันที่ 11			

ภาพที่ 35 ป้ายสถิติความปลอดภัย



ภาพที่ 36 สวิตช์วัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง



ภาพที่ 37 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า
