

ภาคผนวก ก2

หนังสือนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายนพ.ศ. 2566



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : Cn224/66 วันที่รับรายงาน : 25 กรกฎาคม 2566
ชื่อโครงการ : เดอะ ไลน์ จตุจักร หมอชิต (ชื่อเดิม ABSTRACS JJ PARK PHAHONYOTHIN)
เจ้าของโครงการ : บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1009.5/7095 วันที่เห็นชอบ : 5 สิงหาคม 2554
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน 2566 เขต : จตุจักร
ระยะโครงการ : ดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดทำรายงาน : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้ส่ง : ปิยวรรณ เบอร์โทรผู้ส่ง : 088-2116549

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน
นางสาววิศรา ทองคำ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้รับรองการรับรายงาน
นางสาววรรณท สุภาภรณ์ชัยสิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการรับรองการนำส่งรายงานฯ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2203-2953 อีเมล : pc2.bma@gmail.com



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต

เลขที่ 988 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ที่ 001 / 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11198

ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เล่ม
2) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อตกลงแนบข้อดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต ของบริษัท บีทีเอส แอสเสรี โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562) กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตจตุจักร เพื่อบรรณส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต ของบริษัท บีทีเอส แอสเสรี โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอส่งให้ กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานอนุญาตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับเอกสารแล้ว

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต

ที่ 002 / 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009.5/11198
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เล่ม
2) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกการลงพื้นที่ จำนวน 1 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต ของบริษัท บีทีเอส แอสเสรี โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562) กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตจตุจักร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต ของบริษัท บีทีเอส แอสเสรี โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอส่งให้สำนักงานเขตจตุจักรในฐานะหน่วยงานอนุญาตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาว สาลินี สงสงษ์)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต



๒๔ ก.ค. ๒๕๖๖

โปรดเก็บส่วนนี้ไว้
เป็นหลักฐาน



<https://linktr.ee/BMAMonitoring>

ติดตามสถานะการจัดส่งรายงาน

หมายเหตุ : ๑ เอกสารนี้เป็นเพียงการยื่นคำร้องขอส่งรายงาน Monitor เท่านั้น (ไม่ใช่ ใบรับรองการตรวจรับรายงาน)

๒. ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ตาม QR Code) เท่านั้น

๓. โปรดเก็บหลักฐานส่วนนี้ไว้ เพื่อนำมาติดต่อรับใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ ภายใน ๓-๑๔ วัน นับจากวัน เวลา ที่ยื่นใบคำขอ

- ☐ A กรุงเทพฯใต้ (เฉพาะเขตปทุมวัน, บางรัก, สาทร, คลองเตย และวัฒนา)
- ☐ B กรุงเทพฯกลาง (และเขตบางนา, สวนหลวง)
- ☐ C กรุงเทพฯเหนือ, กรุงเทพมหานครใต้ (และเขตพระโขนง)
- ☐ D กรุงเทพฯตะวันออก, กรุงเทพมหานครเหนือ (และเขตยานนาวา, บางคอแหลม)

ชื่อโครงการ .

.....

วันที่ยื่น .

เวลา

รหัสรับเรื่อง .

ผู้รับเรื่อง

ภาคผนวก ก3
เอกสารตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
Preventive Maintenance /
เอกสารตรวจสอบการทำงาน
ของเครื่องจักรภายในโครงการ

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00000S00010-RE/GEN-0001	1. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : GEN	3. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน WO-001/03/2023	5. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/01/2023	ชื่อผู้ควบคุม
ชื่ออาคาร 10101/06 วิทยาลัยการอาชีพวังน้อย	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง)
		ดี	มีปัญหา	
	ตรวจสอบความพร้อม			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 45.0 ลิตร	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
5	ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่	✓		
6	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบค่าแรงดัน MANUAL START	✓		
8	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
9	ตรวจสอบค่าแรงดันแรงดัน	✓		
10	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
11	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
12	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
13	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
14	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
15	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
1	เวลา START 14.00 STOP 14.10 น.	✓		
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 58 °C	✓		
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น 58 °C	✓		
4	ความถี่แรงดัน 1500 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	✓		
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น PSI	✓		
7	จำนวนชั่วโมงทำงาน START 14.09 STOP 14.09 HOUR	✓		
	ตรวจสอบค่า OPC			
1	แรงดัน R.S. 120 VOLT	✓		
2	ความถี่ 50 HZ	✓		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00000S00010-RE/GEN-0001	1. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : GEN	3. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน WO-001/03/2023	5. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 05/01/2023	ชื่อผู้ควบคุม
ชื่ออาคาร	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง)
		ดี	มีปัญหา	
3	ตรวจสอบ R.S. 120 VOLT	✓		
4	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
5	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดัน	✓		
6	จำนวนชั่วโมงทำงาน START STOP HOUR	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติตามเครื่องวัด

2. ปฏิบัติตามเครื่องวัด (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W	รวมชื่อ
รหัส	1
เลขที่ใบงาน	3
วันที่ปฏิบัติงาน	5
วันที่ปฏิบัติงาน	6
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ (ถ้ามีระบุที่ น. : คณ)
		ค	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบเชื้อเพลิง.....ดี	/			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	/			
4	ตรวจสอบระดับน้ำยาพลา	/			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายของ BATTERY	-			
7	ตรวจสอบสวิตช์ไฟฉุกเฉิน	/			
8	ตรวจสอบสวิตช์เบรกมือ	/			
9	ตรวจสอบสวิตช์เกียร์	/			
10	ตรวจสอบสวิตช์ PUMP	/			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบลม PUMP	/			
	หุ้มสายไฟด้วยท่อพลาสติก.....ดี	/			
	วัดแรงดันลมยาง.....PSI	/			
	ความถี่รอบ.....RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	/			
	แรงดันเข้าปั๊มเชื้อเพลิง.....PSI	/			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....F	/			
	แอมป์กระแส.....AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดประจุไฟฟ้า BATTERY	/			
2	ตรวจสอบสวิตช์ไฟฉุกเฉิน	/			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบลม PSV	/			

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานเชียงใหม่ Jocky Pump - ประจักษ์ปนา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ถาวรจวงเซ็ค Fire Pump - ประจำสถานี

รหัส : FP/J-P-W	
รหัส : TL-J-081-17Z00D0S00074.FP/J-P-0001 :	
JP-1	
(เสร็จ)ใบงาน WO-003032/2023	
วันที่ปิดบัญชี 05/01/2023	
จำนวนรายการ	1
วันที่ปิดบัญชี	3
	4
	6
รวมค่า:	สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

รหัสงาน : FPF/RP-W	รหัส : TL-001+RootZ1D8US001175+FPF/RP-0	รายละเอียดงานกับปฏิบัติงาน
เครื่องใช้ : FPF Electric Motor	002 : FPF Electric Motor	1
เลขที่ใบงาน : WO-004/03/2023	WO-004/03/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/04/2023		4
		6
ชื่อสมาชิก : 1๐๗.1๑๗ ๑๓๗๑๑๑-๗๑๑๑๑๑		ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบ : ระบุ)
		สภาพเรียบร้อย		รายการเสีย	
		ก	ข		
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คลักษณะภายนอกของ MOTOR				
2	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ MOTOR				
3	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ PUMP				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP				
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมวงจร CONTROL				
2	ตรวจเช็คชุดการ FUSE CONTROL				
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH				
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD AND SET POINT AMP				
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL				
6	ตรวจสอบค่า H SHOW				
7	ตรวจสอบค่าแรงดัน R.S. V.T. VOLT				
8	ตรวจสอบค่าแรงดัน R.S. V.T. VOLT				
9	ตรวจสอบค่าแรงดัน CONTROL				

СМЕРЬ

บ้านเกิดเมืองนอน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ (ใช้กระดาษ A4, ๕๐๐)
		ดี	แก้ไข	ฮาวเลียม	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง.....ดี	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY				
6	ตรวจสอบค่าความดันอากาศของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่อง	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	✓			
9	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	✓			
10	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP	✓			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเบรก PUMP	✓			
	น้ำมันเครื่อง.....PSI	✓			
	น้ำมันเครื่อง.....PSI	✓			
	ความดัน.....RPM	✓			
	น้ำมันเครื่อง.....PSI	✓			
	น้ำมันเครื่อง.....PSI	✓			
	อุณหภูมิ.....F	✓			
	น้ำมันเครื่อง.....AMP	✓			
	น้ำมันเครื่อง.....ม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			

PLUS +

บริษัท พลัส พริอเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1200D00S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-06/03/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 12/01/2023	5
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/		
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/		
6	ตรวจสอบค่าความดันน้ำประปา BATTERY	/		
7	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	/		
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิด	/		
9	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	/		
10	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	/		
11	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	/		
12	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	/		
13	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	/		
14	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	/		
15	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	/		
1	เวลา START 14.30 STOP 14.30	/		
2	อุณหภูมิในตู้เครื่องกำเนิด 22.53 F	/		
3	อุณหภูมิในตู้เครื่องกำเนิด 22.53 F	/		
4	ความเร็วรอบ 1800 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	/		
6	แรงดันน้ำดับเพลิง PSI	/		
7	ค่าแรงดันน้ำ START 0.4 STOP 0.4 HOUR	/		
1	ค่าแรงดัน R.S. 3.19 S.T. 3.19 R.R. 3.19 VOLT	/		
2	ความถี่ 50 HZ	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พริอเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1200D00S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-06/03/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 12/01/2023	5
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	มีปัญหา	
3	ตรวจสอบ R.S. 3.19 S.T. 3.19 AMP	/		
4	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำ	/		
5	ตรวจสอบ BATTERY AMP	/		
6	ค่าแรงดันน้ำ START 3.7 STOP 3.7 HOUR	/		

หมายเหตุ

- ตรวจเช็ค 12/1/23

ผู้เขียนรายงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานเครื่องเรือ

2. ผู้ปฏิบัติงานเครื่องแม่เหล็ก (CM)

รหัสงาน : FFP/JF-W	
รหัส TL-JJ-001-1ZD0C0S08014-FF/JF-0001 : JP-1	
เลขที่งาน WC-00803/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน 12/01/2023	
ชื่อตัวงาน [redacted]	รหัสตัวงาน [redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ตรวจพบ		ยังไม่พบ	
		ใช่	ไม่		
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คลมระบบอากาศ MOTOR	/			
2	ตรวจเช็คสภาพน้ำมัน MOTOR	/			
3	ตรวจเช็คสภาพถังเก็บ PUMP	/			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้าถัง.....PSI				
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คระบบควบคุม MOTOR	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD SET.....AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจเช็คค่า SHOW	/			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R.S.H. S.T. H.O. R. H. VOLT	/			
8	ตรวจเช็คกระแส R.L. S. S. I. T. AMP	/			
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	/			

CHAMBLISS

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (C/F)

WC-008/03/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FP/FRP-W	
รหัส	TL-JJ001-Roch/Z3 D005001176-FP/FRP-Q
เลขคั่นงาน	002 : FRP Electric Motor
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-009/03/2023
	12/01/2023
ชื่ออาคาร	103 บสข อู่ยก โขงระเือยดี
ชื่อสถานที่	อู่ยก โขงระเือยดี
รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	1 2 3 4 5 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (เพิ่มเติมข้อบกพร่อง, ฯลฯ)
		สี	ผ่าน	สภาพเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง.....ดี	-			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหม้อต้มน้ำมัน.....ดี	-			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....ดี	-			
4	ตรวจสอบสายพาน.....ดี	-			
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่.....ดี	-			
6	ตรวจสอบค่าความดันลมยางของ BATTERY	-			
7	ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย.....ดี	-			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย.....ดี	-			
9	ตรวจสอบท่ออากาศไอน้ำ.....ดี	-			
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	/			
11	ตรวจสอบการสตาร์ทเครื่องยนต์	/			
12	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	-			
13	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและ PUMP	-			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	-			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	-			
	ความเร็วรอบ.....RPM	-			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	-			
	แรงดันน้ำในระบบ.....PSI	-			
	อุณหภูมิในสอยบิน.....F	-			
	แอมป์ไฟ.....AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	-			
	CONTROL				
1.	ตรวจสอบชุดจ่ายไฟฟ้า BATTERY	-			
2	ตรวจสอบชุดไฟฟ้าหลัก	-			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	-			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและส่งส่งข้อมูลให้วิศวกร (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การตรวจรับ Jockey Pump - บริษัท ปตท.

รหัสงาน : FPI/P-W

รหัส : TL-LJ-001-R007231D00S00117S-FPI/P-00

ชื่อ : JP-RUOF

เลขที่ใบงาน : WO-01003/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 12/01/2023

ชื่อวิศวกร : วิศวกร - บมจ.ปตท.

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. [Redacted]

3. [Redacted]

5. [Redacted]

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีข้อบกพร่อง: 60)
		ผลการตรวจเช็ค		จำนวนใบ	
		ดี	บกพร่อง		
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ PSI	✓			
6	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ PSI	✓			
7	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ CHECK VALVE	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ OVER LOAD SET AMP	✓			
5	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ R-S.....S-T.....Y-R.....VOLT	✓			
8	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ R.....S.....T.....Y.....AMP	✓			
9	ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ CONTROL	✓			

หน้า ๒

วันที่ ๑๒/๐๑/๒๕๖๖

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและส่งส่งข้อมูลให้วิศวกร (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเทคเกอร์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย Generator - ประจักษ์โกน

รหัส : RE/GEN-W	รหัส : TL-JJ-001-1Z00000300010-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : GEN	เลขที่ใบงาน : WO-01/03/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 19/01/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 19/01/2023
ชื่ออาคาร : เสาไฟฟ้า 10KV- ต.หนองบัว	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีระบุค่า/ข้อ)
		ดี	เสีย	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
14	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
15	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
1	เวลา START 15.00 STOP 15.20	/		
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น 32.53 F	/		
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 22.53 F	/		
4	ความเร็วรอบ 1300 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 1.5 PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น 1.5 PSI	/		
7	จำนวนการทำงาน START 04 STOP 04.3 HOUR	/		
1	แรงดัน R.S. 3.17 S.T. 3.18 I.R. 3.19 VOLT	/		
2	ความถี่ 50 HZ	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเทคเกอร์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย Generator - ประจักษ์โกน

รหัส : RE/GEN-W	รหัส : TL-JJ-001-1Z00000300010-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน : GEN	เลขที่ใบงาน : WO-01/03/2023
วันที่ปฏิบัติงาน : 19/01/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 19/01/2023
ชื่ออาคาร : เสาไฟฟ้า 10KV- ต.หนองบัว	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีระบุค่า/ข้อ)
		ดี	เสีย	
3	ตรวจสอบ R.S. 3.17 S.T. 3.18 I.R. 3.19 AMP	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
6	จำนวนการทำงาน START 27 STOP 27.7 HOUR	/		

หมายเหตุ

- ตรวจเช็ค 19/1/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสิ่งที่ต้องปฏิบัติงาน (CM)

บริษัท ผลิต หรือเพอร์ที่ จำกัด
ทางหลวงชัยค Jocky Pump - ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท พัสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตลาดทองแดง F&B Pump - ประจักษ์ปราชญ์

รหัสงาน : FP/JP-W	รหัส : TL-JJ-001-1/2200000S00014-FP/JP-0001 :	ชื่อผู้ควบคุมงาน
	JP-1	
เลขที่ใบงาน	WO-013032/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน	19/01/2023	
ผู้ตรวจงาน		

รหัสงาน : FRP/FRP-W	รายละเอียด
รหัส	1
เครื่องจักร	3
วันที่ปฏิบัติงาน	4
วันที่ปฏิบัติงาน	6
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ข้อบกพร่อง, ฯลฯ)
		สี	แปด	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ PSI			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำ PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET 1.3 AMP	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของ R-S 1.3 AMP	/		
8	ตรวจสอบการทำงานของ R-S 1.3 AMP	/		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		

КОНДРАТОВ

- 19/1/23

บันทึกการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CMT)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ข้อบกพร่อง : ถ้ามี)
		ดี	ไม่โอเค	รายการแก้ไข	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ขึ้นเครื่อง.....ดี/ว	-			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	-			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	-			
4	ตรวจเช็คสายพาน	-			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	-			
6	ตรวจเช็คค่าความต่างแรงดันของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรก	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	-			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำเย็น	-			
10	ตรวจเช็คตัวปั๊มน้ำ PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	-			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	-			
13	ตรวจเช็คค่าความดันของเครื่องเบรกและ PUMP	-			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	-			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	-			
	ตรวจวัดรอบ.....RPM	-			
	แรงดันน้ำเข้าเครื่องหลัง.....PSI	-			
	แรงดันน้ำเข้าเครื่องสี่.....PSI	-			
	อุณหภูมิไม่หล่อเย็น.....F	-			
	แอมป์เครื่อง.....AMP	-			
	ตัวโมฆะการทำงาน.....จน.	-			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดจลาจล BATTERY	-			
2	ตรวจเช็คสวิตช์เครื่อง	-			
3	ตรวจเช็คค่าการทำงานของเบรก PRV	-			

วันที่ 19/1/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบงาน (CM)

WO-01403/2023 Page 2 of 2

PLUS +

บริษัท พลัส ฟรอมเพอร์รี่ จำกัด
อาคารโรงงาน Jockey Pump - พระราม 9

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อช่างซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย
รหัส : TL-001-R001Z81000S001175-FP/JP-Q0	1
รหัส : JP-ROOF	3
เลขที่ใบงาน : WO-015/03/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 19/01/2023	5
ชื่ออาคาร : โรงน้ำประปา จักรวรรดิ - พระราม 9	ชื่อผู้ควบคุมงาน : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	ไม่ดี	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR และ ปั๊ม PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรล	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของโอเวอร์โหลด ค่าที่ตั้ง SET AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรล	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S S-T T-R VOLT	✓		
8	ตรวจสอบแรงดัน R-S S-T T-R AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรล	✓		

หมายเหตุ

- ตรวจพบว่าเครื่องทำงานปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบงาน (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-018/03/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 28/01/2023	B
ชื่ออาคาร : เอลิวิเตอร์ 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น - อาคาร 1	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	มีปัญหา	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า			
5	วัดแรงดัน BATTERY.....AMP			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR			

หมายเหตุ

ก๊วยเต๋อ 26/1/23

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วส่งข้อมูลให้ช่างแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-018/03/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 28/01/2023	6
ชื่ออาคาร : เอลิวิเตอร์ 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น - อาคาร 1	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	มีปัญหา	
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า			
1	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	/		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
3	วัดแรงดัน BATTERY.....AMP	/		
4	ชั่วโมงการทำงาน	/		
5	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
6	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
7	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
8	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
9	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
10	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
11	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
12	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
13	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
14	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
15	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
1	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	/		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
3	วัดแรงดัน BATTERY.....AMP	/		
4	ชั่วโมงการทำงาน	/		
5	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
6	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
7	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
1	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	/		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจสอบ Fire Pump - ประจำปี

รหัสงาน : FPI/FRP-W	
รหัส	TL-JJ-001-1Z0000000014-FPI/FRP-0001 :
เลขที่ใบงาน	FRP WO-019/03/2323
วันที่ปฏิบัติงาน	28/01/2023
ชื่ออาคาร	เดอะมอลล์ รัชดาภิเษก- อยุธยา

1	2	3	4	5	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง)
		ดี	ไม่/ข้อบกพร่อง	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....2.3.3.....PSI	/		
	วัดแรงดันน้ำออก.....12.5.....PSI	/		
	ความเร็วรอบ.....2100 RPM	/		
	ระดับน้ำในถังเก็บ.....60 PSI	/		
	ระดับน้ำในถังเก็บ.....60 PSI	/		
	อุณหภูมิถังเก็บ.....17.5.....F	/		
	อุณหภูมิถังเก็บ.....AMP	/		
	ความเร็วรอบทำงาน.....77.4.....RPM	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	/		
2	ตรวจสอบชุดควบคุม	/		
3	ตรวจสอบชุดควบคุม PRV	/		

หน้า 2

หน้า 2

หน้า 2

หน้า 2

หน้า 2

หน้า 2

PLUS +

บริษัท พลัส ฟร็องเพอส์ จำกัด
ตราเครื่องหมาย Jacky Pump - ประจักษ์ตรา

รหัสงาน : FPJP-W
รหัส : TLJJ-001-120000000014.FPJP-0001 :
JP-1
เลขที่ใบงาน WO-02003/2023
วันที่ปฏิบัติงาน 26/01/2023

รายละเอียดงาน

5

6

ชื่ออาคาร 100 ปี บริษัท อยุธยา

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (กรณีตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	เสีย	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	/		

หมายเหตุ

- 26/1/23

บริษัท พลัส ฟร็องเพอส์ จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-02003/2023 Page 1 of 1

PLUS +

บริษัท พลัส ฟร็องเพอส์ จำกัด
ตราเครื่องหมาย Fire Pump - ประจักษ์ตรา

รหัสงาน : FFRP-W
รหัส : TLJJ-001-R001Z81D00S001175-FRPP-0
002 : FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน WO-02103/2023
วันที่ปฏิบัติงาน 26/01/2023

รายละเอียดงาน

1

2

3

4

5

6

ชื่ออาคาร 100 ปี บริษัท อยุธยา

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (กรณีตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	เสีย	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ENGINE	/		

วันที่ ๒๖/๑/๒๓

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีมเพอรัล จำกัด
อาคารตึก Jocky Pump - โรงหล่อเหล็ก

รหัสงาน : FPA/P-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-Rooftop00001175-FPA/P-00	1 [REDACTED] 2
เลขที่งาน : 02-JP-ROOF	3 [REDACTED] 4
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-02103/2023	5 [REDACTED] 6
ชื่ออาคาร : อาคาร [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุมงาน : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	ไม่ดี	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	-		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-		
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
2	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
3	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
4	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
6	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
8	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		

หน้า ๒

- หน้า ๒๑ ในสัญญา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ (CM)

บริษัท พัส พรีเพอร์ตี จำกัด
 ตารางวงเงิน Credit Limit - ประจำปี ๒๕๖๓

PLUS +

บริษัท พลัส กรุ๊ปเพอร์ฟิแม้นซ์ จำกัด
 ตารางวงเช็ต GigaSlot - ประสิทธิภาพ

[illegible]

รหัสงาน : RE/GEN-W	
รหัส : TL-JJ-001-1ZND00S0010-RE/GEN-0001 : GEN	
เลขที่ใบงาน WO-023032023	
วันที่ปฏิบัติงาน 02/02/2023	
ชื่ออาคาร	หอประชุม - อาคาร ๖
ชื่อผู้ควบคุม	[Redacted]
รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	1 2 3 4 5 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ (ค่าผิดปกติ; ก.ม)
		ที่	บันทึก	รายการ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง <u>140</u> ลิตร	/			
2	ตรวจระดับน้ำในแบตเตอรี่	/			
3	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ของ BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
8	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	/			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/			
10	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	/			
11	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	/			
12	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	/			
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์	/			
14	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์	/			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของเครื่องยนต์	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	เวลา START <u>15.20</u> STOP <u>15.20</u> น.	/			
2	อุณหภูมิเครื่องยนต์ <u>32.53</u> °F	/			
3	อุณหภูมิเครื่องยนต์ <u>32.53</u> °F	/			
4	ความเร็วรอบ <u>1500</u> RPM	/			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง <u>—</u> PSI	/			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง <u>—</u> PSI	/			
7	ชั่วโมงการทำงาน START <u>02.5</u> STOP <u>02.5</u> HOUR	/			
	ตรวจเช็ค GPC				
1	วัดแรงดัน R.S. <u>31.9</u> S.T. <u>34.3</u> T.R. <u>3.9</u> VOLT	/			
2	อุณหภูมิ <u>50</u> °F	/			

ЗАДАЧА

2/2/23

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

7. 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CIM)

วันที่ 2/02/23

บริษัท ฟอส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PLUS +

การไฟฟระส่วน Fine Pump - บริษัท

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

1. บริษัท ฟอส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2. บริษัท ฟอส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1

3

6

รหัสงาน : FFRP-W

รหัส : TL-11001-1Z0000000014-FFRFP-0001 :

FRP

เลขที่ใบงาน : WO-024032023

วันที่เปิด : 02/02/2023

ชื่ออาคาร : อาคาร 100 ปี บริษัท ฟอส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (กรณีพบข้อบกพร่อง)
		ดี	ไม่ผ่าน	ดำเนินการแก้ไข	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	/			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจสอบสายพาน	/			
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่	/			
6	ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	/			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	/			
8	ตรวจสอบสภาพท่อส่งน้ำ	/			
9	ตรวจสอบสภาพท่อส่งน้ำ	/			
10	ตรวจสอบระดับน้ำ	/			
11	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	/			
12	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL STOP	/			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	/			
	วัดแรงดันไฟฟ้า 233 PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก 120 PSI	/			
	ความเร็วรอบ 2400 RPM	/			
	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 10 PSI	/			
	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 60 PSI	/			
	อุณหภูมิของน้ำ 175 F	/			
	แอมป์ 175 AMP	/			
	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 19.5 ซม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	/			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	/			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	/			

รหัสงาน : FP/JP-W

รหัส : TL-J-001-1Z0000000014-FPJP-0001 : JP-1

เลขที่ใบงาน : WO-0203/2023

วันที่เปิด : 02/02/2023

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1

3

5

6

ชื่ออาคาร

อาคาร 100 ปี บริษัทฯ - อาคาร 100 ปี

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
6	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
8	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		

หมายเหตุ

- ทำบวช 2/2/23

ผู้ตรวจสอบ

1. ผู้ปฏิบัติงาน

2. ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖

ผู้เขียนเอกสาร

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูลไปยัง (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ความตกลง Jocky Pump - พระตำหนัก

รหัสงาน : FP/IP-W	รายชื่อ
รหัส : TL-J-001-Rooftop-D00S001175-FP/IP-00	1
เลขที่ใบงาน : WO-027/03/2023	3
วันที่เปิด : 02/02/2023	5
ชื่ออาคาร : อาคาร ๑๒๓๔๕๖๗๘๙	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี-ลง:ชื่อ)
		ดี	บกพร่อง	รายการแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	-			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	-			
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	-			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	-			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	-			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	-			
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET AMP	-			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	-			
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า R.S. S.T. T.R. VOLT	-			
8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า R.S. S.T. T.R. AMP	-			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			

หมายเหตุ

- 4.7.6. 4.7.6. 4.7.6

ผู้เขียนเอกสาร

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูลไปยัง (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-028/03/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 09/02/2023	5
ชื่ออาคาร เวิลด์ไฮสปีด วิสาหกิจฯ - หาดใหญ่	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : ๕๓)
		สี	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบเครื่องเบส			
2	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง 40%	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้เย็น	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/		
6	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/		
7	ตรวจสอบระดับความถี่ของ BATTERY	/		
8	ตรวจสอบระดับ MANUAL START	/		
9	ตรวจสอบสภาพเครื่องเบส	/		
10	ตรวจสอบระดับระบบระบายความร้อน	/		
11	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
12	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
13	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
14	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
15	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
1	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
2	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
3	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
4	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
5	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
6	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
7	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
1	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
2	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-028/03/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 09/02/2023	5
ชื่ออาคาร เวิลด์ไฮสปีด วิสาหกิจฯ - หาดใหญ่	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : ๕๓)
		สี	หมายเหตุ	
3	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
4	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
5	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		
6	ตรวจสอบระดับความถี่ของ	/		

วันที่ตรวจเช็ค 9/2/23

ผู้เขียนผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ที่	แก้ไข	ดำเนินการ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....10.....ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นน้ำลง.....	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น.....	/			
4	ตรวจเช็คสับเกา.....	/			
5	ตรวจเช็ควิทยุ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างสายของ BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรค	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศดี	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศดี	/			
10	ตรวจเช็คหัวฉีด PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบบความชื้น	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเบรคและ PUMP	/			
	หุ้มน้ำมันเชื้อ.....23.3.....PSI	/			
	หุ้มน้ำมันเชื้อ.....125.....PSI	/			
	ความถี่รอบ.....2400.....RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....60.....PSI	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....60.....PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....125.....F	/			
	แอมป์ไฟ.....AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน.....17.9.....ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดสาย BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คหัวฉีดเบรค	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	/			

รหัสงาน : FP/JP-W	รหัสพนักงานที่ปฏิบัติงาน				
รหัส	TL-J-001-1/20000500014-FP/JP-0001 :	1			
	JP-1				
เลขที่งาน	WO-0301032023	3	4		
วันที่ปฏิบัติงาน	08/02/2023	5			
ชื่ออาจารย์	นายวิชาญ วัฒนศิริกุล - วิชาญ วิชาญ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (ถ้าตรวจได้ ; ต่อ)
		ก	ข	ค	ง	
	MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คขั้วต่อมอเตอร์และ MOTOR	/				
2	ตรวจเช็คมอเตอร์ตัวอื่น MOTOR	/				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ปั๊ม PUMP	/				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/				
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI					
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI					
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/				
	CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำอัตโนมัติ CONTROL	/				
2	ตรวจเช็คสายไฟ FUSE CONTROL					
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/				
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD สำหรับ SET.....AMP	/				
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	/				
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/				
7	ตรวจเช็คกระแส R-S-T.....VOLT	/				
8	ตรวจเช็คกระแส R.....AMP	/				
9	ตรวจเช็คค่าไฟ CONTROL	/				

ABSTRACT

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ/ วิทยาลัย

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WC-030/03/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัส	1	รูปถ่ายเอกสารที่ปฏิบัติงาน
	TL-J01-FRP-Z81D08S001175-FP/FRP-Q		
	002 : FRP Electric Motor	3	
	เลขที่ทำงาน WO-031/03/2023	4	
	วันปฏิบัติงาน 09/02/2023	5	
ชื่ออาคาร	ชื่อสถานที่ - ๓๑๖๗๗		
	เลขที่อาคาร - ๓๑๖๗๗		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจข้อใด : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
	ENGINE				
1	ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ดี				
2	ตรวจระดับน้ำหม้อน้ำ.....ดี				
3	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น.....ดี				
4	ตรวจระดับน้ำมัน.....ดี				
5	ตรวจระดับน้ำหม้อน้ำ.....ดี				
6	ตรวจเช็คความถี่การทำงานของ BATTERY				
7	ตรวจเช็คสายพานเครื่องยนต์				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย				
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย				
10	ตรวจเช็คเครื่อง PUMP				
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START				
12	ตรวจเช็คระบบประปาความดัน				
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องฉีดน้ำ PUMP				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI				
	วัดความเร็วรอบ.....RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....PSI				
	อุณหภูมิในหม้อน้ำ.....F				
	แอมป์กระแส.....AMP				
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดประปา BATTERY				
2	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV				

WC-030/03/2023 Page 1 of 1

9/2/23

සමස්ත ප්‍රකාශන මණ්ඩලය

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 การตลาดเชิง Jockey Pump - ประสิทธิภาพ

รหัสงาน : FP/JP-W	
รหัส TL-U004-Rod/ZB1D09800117S-FP/JP-00	
02 : JP-ROOF	
เลขที่ใบงาน WO-032/DXZU23	
วันที่ปฏิบัติงาน 09/02/2023	
ชื่ออาคาร ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	ชื่อผู้ควบคุมงาน นายสมชาย หอมทิพย์

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน; งด)
		ดี	มีปัญหา	รอการแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ MOTOR	-			
2	ตรวจสอบการติดตั้งของ MOTOR	-			
3	ตรวจสอบการติดตั้งของ PUMP	-			
4	ตรวจสอบการติดตั้งของ MOTOR และ PUMP	-			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า.....PSI	-			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	-			
7	ตรวจสอบการติดตั้งของ CHECK VALVE	-			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ CONTROL	-			
2	ตรวจสอบการติดตั้ง FUSE CONTROL	-			
3	ตรวจสอบการติดตั้ง PRESSURE SWITCH	-			
4	ตรวจสอบการติดตั้ง OVER LOAD ที่ SET AMP	-			
5	ตรวจสอบการติดตั้งของ CONTROL	-			
6	ตรวจสอบการติดตั้ง SHOW	-			
7	ตรวจสอบการติดตั้ง R.S.....S.T.....T.R.....VOLT	-			
8	ตรวจสอบการติดตั้ง R.....S.....T.....AMP	-			
9	ตรวจสอบการติดตั้ง CONTROL	-			

References

- was der Betrieb von

บันทึกการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานตามสัญญาซื้อขาย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบถึงที่ตลิ่งนกวิทยิก (CMI)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีอเพอรัลส์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00D03500010-RE/GEN-0001	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : GEN	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-0330/2023	5 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : อาคารโรงไฟฟ้า- โรงผลิต	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง)
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบค่าแรงดัน	/		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
3	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
4	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
5	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
6	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
7	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
8	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
9	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
10	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
11	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
12	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
13	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
14	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
15	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	/		
1	เวลา START 15.20 STOP 15.20	/		
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32.53 F	/		
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32.53 F	/		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเครื่อง PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันเครื่อง PSI	/		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 15.20 STOP 15.20 HOUR	/		
1	ค่าแรงดัน R.S. 3.99 VOLT	/		
2	ความถี่ 50 HZ	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีอเพอรัลส์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00D03500010-RE/GEN-0001	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : GEN	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-0330/2023	5 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : อาคารโรงไฟฟ้า- โรงผลิต	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง)
		ดี	มีปัญหา	
3	ค่าแรงดัน R.S. 3.99 AMP	/		
4	ค่าแรงดันไฟฟ้าห้องเครื่อง	/		
5	ค่าแรงดันไฟฟ้าห้องเครื่อง AMP	/		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 15.20 STOP 15.20 HOUR	/		

หมายเหตุ

วันที่ตรวจ 16/2/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FPI/FRP-W

รหัส : TL-JJ-0014-1Z00006S00014-FPI/FRP-0001 :

รหัสงาน : FRP

เลขที่ใบงาน : WO-034/03/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 16/02/2023

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. [REDACTED]

3. [REDACTED]

5. [REDACTED]

ชื่ออาคาร : [REDACTED]

ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีพบข้อบกพร่อง)
		ดู	แก้ไข	จัดการ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...OK...ดี	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสายพาน BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คความแรงของสายพาน BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องปั่น	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศ	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศ	/			
10	ตรวจเช็คสายพาน PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบควบคุม	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องดับเพลิง PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำดับเพลิง...23.5...PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำดับเพลิง...25...PSI	/			
	ความเร็วรอบ...2400 RPM	/			
	แรงดันน้ำดับเพลิง...10...PSI	/			
	แรงดันน้ำดับเพลิง...12...PSI	/			
	อุณหภูมิของน้ำดับเพลิง...17.5...F	/			
	แอมป์...AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงานของ...17.9...ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสายพาน BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสายพาน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/			

หน้า 1 จาก 2

วันที่ตรวจเช็ค : 16/2/23

ผู้ปฏิบัติงาน : [REDACTED]

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องดับเพลิง (C/F)

บริษัท พัส หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตลาดทราเช็ค Jacky Pump - ประจวบคีรีขันธ์

Number	Unit
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

เพื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำศัพท์วลี: ๕๖)
		สี	แก้ไข	อาทใหม่	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบเช็คมอเตอร์และปั๊ม MOTOR	/			
2	ตรวจสอบเช็คมอเตอร์ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบเช็คปั๊ม PUMP	/			
4	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำ PSI	/			
6	ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำ PSI	/			
7	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบเช็คแผงควบคุม CONTROL	/			
2	ตรวจสอบเช็คฟิวส์ CONTROL	/			
3	ตรวจสอบเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจสอบเช็ค OVER LOAD SET: 1.3 AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจสอบเช็คไฟ SHOW	/			
7	ตรวจสอบเช็คแรงดัน PS: 1.5 VOLT	/			
8	ตรวจสอบเช็คแรงดัน PS: 1.5 VOLT	/			
9	ตรวจสอบเช็คแผง CONTROL	/			

DISCUSSION

အသံအသွယ်အသွယ်အသွယ်

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

บริษัท พัลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำรงตรางชื่อกับ Puma - ประจําต้ปดาม

1
3
5

ชื่ออาคาร
อาคารเฉลิม
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อผู้ควบคุมอาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ (ถ้ามีระบุให้ : ด้ข)
		จุด	รายการ		
			พื้นที่	รายการ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบพาน	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คความกว้างทางของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพแท่งขบด	/			
8	ตรวจเช็คท่อทางสโคค	✓			
9	ตรวจเช็คท่อทางสโคค	✓			
10	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบบยกหัวเรือ	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของแท่งขบดและ PUMP	✓			
	วัดระดับน้ำเชื้อ.....PSI	✓			
	วัดระดับน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำออกเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....F	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดจลาจล BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังเรือ	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			

16/02/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสิ่งที่ต้องทำอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรถไฟฟ้า Jockey Pump - ประตูน้ำ

รหัสงาน : FPI/JP-W

รหัส : TL-JJ-001-Road/Z81D00S001175-FPI/JP-00

เลขที่ใบงาน : WO-037/03/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 18/02/2023

ชื่ออาคาร : อาคารจอดรถ - อาคารจอดรถ

ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1	[REDACTED]
3	4
5	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่พบ)
		ดี	มีปัญหา	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-		
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	-		
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	-		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	-		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	-		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	-		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุมไฟฟ้า CONTROL	-		
2	ตรวจสอบชุดควบคุม FUSE CONTROL	-		
3	ตรวจสอบชุดควบคุม PRESSURE SWITCH	-		
4	ตรวจสอบชุดควบคุม OVER LOAD ที่ SET AMP	-		
5	ตรวจสอบชุดควบคุม CONTROL	-		
6	ตรวจสอบชุดควบคุม SHOW	-		
7	ตรวจสอบชุดควบคุม R-S.....S-T.....I.R.....VOLT	-		
8	ตรวจสอบชุดควบคุม R.....S.....I.....AMP	-		
9	ตรวจสอบชุดควบคุม CONTROL	-		

หมายเหตุ

นาย วิชาญ วิชาญ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสิ่งที่ต้องทำอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟเพอร์มีย์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - บริษัทพลัส

รหัสงาน : RE/GEN-JW	รหัส : TL-JJ-001-1Z00000000010-RE/GEN-0001	รายงานชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : WO-038/03/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 23/02/2023	1
ชื่ออาคาร : ๑๐๗๖/๒๐๗-๑๐๗๖/๒๐๗	ชื่อผู้ควบคุม	3
		5
		6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้งให้ทราบ)
		สี	รายการ	
1	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
14	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
15	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	/		
1	เวลา START 13.00 STOP 13.40	/		
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32.5°C	/		
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32.5°C	/		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
5	แรงดันไฟฟ้าห้องเครื่อง PSI	/		
6	แรงดันไฟฟ้าห้องเครื่อง PSI	/		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 13.40 STOP 14.00 HOUR	/		
1	แรงดันไฟฟ้าห้องเครื่อง 31.9 V	/		
2	ความเร็วรอบ 900 RPM	/		

บริษัท พลัส พรีฟเพอร์มีย์ จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัส : TL-JJ-001-1/200D0S00010-RE/GEN-0001		1	
เลขที่ใบงาน : GEN		3	
วันที่ปฏิบัติงาน WO-04/03/2023		5	6
วันที่ปฏิบัติงาน 02/03/2023			
ชื่ออาคาร	หอประชุม - อาคาร 1	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีพบข้อบกพร่อง)
		สี	รายการ	
	ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
14	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
15	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัส : TL-JJ-001-1/200D0S00010-RE/GEN-0001		1	
เลขที่ใบงาน : GEN		3	
วันที่ปฏิบัติงาน WO-04/03/2023		5	6
วันที่ปฏิบัติงาน 02/03/2023			
ชื่ออาคาร	หอประชุม - อาคาร 1	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีพบข้อบกพร่อง)
		สี	รายการ	
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		

วันที่ตรวจเช็ค 2/3/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจสอบ Fire Pump - ประจักษ์ตา

รหัสงาน : FPI/FRP-W

รหัส : TL-JJ001-1Z000000014-FPI/FRP-0001 :

FRP

เลขที่ใบงาน WO-046/03/2023

วันที่ปฏิบัติงาน 02/03/2023

ชื่ออาคาร โรงแรมภูเก็ต ซิตี้ ภูเก็ต - เขตภูเก็ต

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1

3

5

พิจารณา 2 / 03 / 23

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-046/03/2023 Page 2 of 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีค่าผิดปกติ)
		ก	ข	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง... 82.5 ลิตร	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำ	/		
	วัดแรงดันน้ำเข้า 2.55 PSI	/		
	วัดแรงดันน้ำออก 12.0 PSI	/		
	ความเร็วรอบ 1400 RPM	/		
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง 10 PSI	/		
	แรงดันน้ำออกเชื้อเพลิง 10 PSI	/		
	อุณหภูมิเครื่องยนต์ 175 F	/		
	แอมป์มอเตอร์ 18 AMP	/		
	ชั่วโมงการทำงาน 18 ชม.	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบระดับน้ำ BATTERY	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำ BATTERY	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำ BATTERY	/		

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Jody Pump - ประจำปี

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J-001-1Z0000000014-PP/JP-0001 :	1
เลขที่ใบงาน : WO-047032023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 02/03/2023	5
ชื่ออาคาร : อาคาร 1 - อาคาร 1	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
6	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
8	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		

หมายเหตุ

2/3/23

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและส่งคืนเครื่อง (CM)

วันที่ ๒๖-๓-๒๕๖๔ ๒/3/23

บริษัท พอส ฟรอนท์ จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งเอกสาร (CM)

PLUS +

บริษัท พอส ฟรอนท์ จำกัด
การตรวจสอบ Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/JP-W	รวม	1	2
รหัส : TL-JJ-001-R004Z81D08S00117S-FP/JP-00	1		
เลขที่ใบงาน : 02 : JP-ROOF	3		4
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-048/03/2023	5		6
ชื่ออาคาร : เสาไฟฟ้าแรงดัน ๑๑๕KV - เขตเมือง	ชื่อผู้ควบคุมงาน		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	ไม่ดี	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-		
2	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ MOTOR	-		
3	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ PUMP	-		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	-		
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	-		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	-		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
2	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ FUSE CONTROL	-		
3	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ PRESSURE SWITCH	-		
4	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ OVER LOAD SET AMP	-		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
6	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ SHOW	-		
7	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ R.S. S.T. T.R. VOLT	-		
8	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ R. S. S. T. AMP	-		
9	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ CONTROL	-		

หมายเหตุ

- เสาไฟฟ้าแรงดัน ๑๑๕KV - เขตเมือง

บริษัท พอส ฟรอนท์ จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งเอกสาร (CM)

บริษัท พลัส เพอร์ฟอร์ม จำกัด
 ต.บางหวะใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

PLUS + SNTD

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำรงตำแหน่ง Director - ประธานฝ่าย

ชื่อสถานที่ : RE/GEN-W	
รหัส TL-UJ-001-1Z00D08S00010-RE/GEN-0001 : GEN	รูปถ่ายหน้าและหลัง [redacted]
เลขที่ใบงาน WO-05003/2023	1
วันปฏิบัติงาน 09/03/2023	3 4
	5 6
ผู้ดำเนินการ	[redacted] ใบตรวจวัด : ๑๙๓๕๖๗๘

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบข้อผิดพลาด)
		ที่	เมื่อ	อาการ	
	ตรวจเช็คเคเบิลแบตเตอรี่				
1	ระดับน้ำเป็นขี้นแข็ง 1.80 ลิตร		/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำเบรค		/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น		/		
4	ตรวจเช็คสายพาน		/		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY		/		
6	ตรวจสอบค่าความถี่ของแบตเตอรี่		/		
7	ตรวจสอบระบบ MANUAL START		/		
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์		/		
9	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน		/		
10	ตรวจสอบช่องอากาศพัด		/		
11	ตรวจสอบสวิตช์ของสายไฟ		/		
12	ตรวจสอบอุปกรณ์เบรค		/		
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตู้เครื่อง		/		
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS		/		
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของตู้ ATS		/		
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเบรค				
1	เวลา START 15.00 STOP 15.20 น.	/			
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32.53 °C	/			
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32.53 °C	/			
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/			
5	แรงดันน้ำมันเบรค PSI				
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น PSI				
7	ชั่วโมงทำงาน START 06.00 STOP 06.40 HOUR	/			
	ตรวจสอบ GPC				
1	วัดเบรค RS 39.9 S.T. 39.9 I.P. 39.9 VOLT	/			
2	ความถี่ 50.0 HZ	/			

အသံအသွယ်အသွယ်အသွယ်

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

9/03/23

WO-090403/2023 Page 2 of 2

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาธารณรัฐจีน (Taiwan) - Jocky Pump - กระจกใสปลา

บริษัท พัสส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตารางรายสัปดาห์ Fire Pump - ประจำสัปดาห์

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		สี	บันทึก	รายการ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	/			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	/			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ PSI	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก PSI	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD H ₀ SET AMP	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจเช็คค่า SHOW	/			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R.S. H ₀ S ₀ T ₀ VOLT	/			
8	ตรวจเช็คแรงดัน R ₀ S ₀ T ₀ AMP	/			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	/			

EXERCISES

1874

9/3/23

အသံကွက်/အသံကွက်

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-052/03/2023 Page 1 of 1

ชื่ออาคาร	หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น				
วันที่เปิด	09/03/2023				
เลขที่ใบงาน	WO-053032023				
ชื่อผู้สอน	นางสาวสมใจ นามะ				
ชื่อผู้เรียน	นางสาวสมใจ นามะ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	บกพร่อง	รายการ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบโช้คอัพทั้ง.....คัน	-			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	-			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	-			
4	ตรวจเช็คสภาพ	-			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	-			
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างหัวของ BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	-			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศ	-			
9	ตรวจเช็คสภาพไทม์มิ่ง	-			
10	ตรวจเช็คหัวฉีด PUMP	-			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	-			
12	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	-			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊ม PUMP	-			
	ไฟเบรกมือ.....PSI	-			
	ไฟเบรกเท้า.....PSI	-			
	ความเร็วรอบ.....RPM	-			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	-			
	แรงดันน้ำหล่อเย็น.....PSI	-			
	อุณหภูมิไทม์มิ่ง.....F	-			
	แอมป์.....AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	-			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ BATTERY	-			
2	ตรวจเช็คหัวฉีด	-			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	-			

สุวิมล หนู 9/3/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนสิ่งที่ต้องทำยังมี (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
อาคารตราช้าง Jockey Pump - ประตูช้างเผือก

รหัสงาน : FP/JP-W	รูปถ่าย
รหัส : TL-U001-R007B1D00S001175-FP/JP-00	1
ชื่อ : JP-ROOF	3
เลขที่ใบงาน : WO-05403/2023	4
วันปฏิบัติงาน : 09/03/2023	5
ชื่ออาคาร : อาคารตราช้าง - ประตูช้างเผือก	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี: รหัส: ๕๗)
		ผลการตรวจเช็ค		รายการ	
		สี	บันทึก		
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	-			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-			
5	ตรวจสอบการทำงานของ PSI	-			
6	ตรวจสอบการทำงานของ PSI	-			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	-			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	-			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	-			
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET AMP	-			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	-			
7	ตรวจสอบการทำงานของ R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	-			
8	ตรวจสอบการทำงานของ R.....S.....T.....AMP	-			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			

หน้า 2

- หน้า 2 ปิดท้ายเอกสาร

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนสิ่งที่ต้องทำยังมี (CM)

PLUS +

บริษัท พลัง พรีพเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำบ้าน

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1700000500010-RE/GEN-0001	1
รหัส : GEN	3
เลขที่ใบงาน : WO-055/03/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 16/03/2023	5
ชื่ออาคาร : โครงการบ้านเดี่ยว 100 ตร.ม.	6
ชื่อผู้ตรวจ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ; ระบุ)
		สี	รายการ	
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/		
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 11.5 ลิตร	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/		
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/		
6	ตรวจสอบระดับความดันแรงดัน BATTERY	/		
7	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	/		
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องยัด	/		
9	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	/		
10	ตรวจสอบสวิตช์อากาศอัตโนมัติ	/		
11	ตรวจสอบสวิตช์อากาศฉุกเฉิน	/		
12	ตรวจสอบสวิตช์ฉุกเฉิน	/		
13	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย	/		
14	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย ATS	/		
15	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย TIMER ของ ATS	/		
	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย	/		
1	เวลา START 13.00 STOP 13.10	/		
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32.9 °C	/		
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32.9 °C	/		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง PSI	/		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 13.00 STOP 13.10 HOUR	/		
	ตรวจสอบ GPC	/		
1	อุณหภูมิ R.S. 29.3 °C T.R. 39.3 °C VOLT	/		
2	ความถี่ 50 HZ	/		

PLUS +

บริษัท พลัง พรีพเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำบ้าน

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1700000500010-RE/GEN-0001	1
รหัส : GEN	3
เลขที่ใบงาน : WO-055/03/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 16/03/2023	5
ชื่ออาคาร : โครงการบ้านเดี่ยว 100 ตร.ม.	6
ชื่อผู้ตรวจ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ; ระบุ)
		สี	รายการ	
3	วัดกระแส R... S... T... AMP	/		
4	ตรวจสอบสวิตช์ฉุกเฉิน	/		
5	ไฟชาร์จ BATTERY... AMP	/		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 13.00 STOP 13.10 HOUR	/		

หมายเหตุ

กิจกรรม 16/03/23

ผู้เขียนรายงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Jody Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FRPJP-W	รายงานชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JU-001-1Z00000500014-FPJP-0001 :	1
เลขที่ใบงาน : JP-1	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-05/03/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 18/02/2023	6
ชื่ออาคาร : เสาเข็มเหล็ก จักรเย็บผ้า - ตม.ระยอง	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีขอส่งให้ : 60)
		สี	อักษร	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR และ PUMP	/		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	/		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....4.40 PSI	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD ค่าที่ SET.....3 AMP	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	/		
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า R.S.P. 1.5-4.0 T. 2.0 VOLT	/		
8	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก R.S.P. 1.5-2.0 T. 2.0 AMP	/		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		

หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค 16/03/23

ผู้ปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

2. ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๓

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
อาคารจตุรพักตรพิมาน Jody Pump - บริเวณใต้ถุน

รหัสงาน : FPI/P-W	รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-M-001-Rooftop005001175-FPI/P-00	1
สถานที่ : JP-ROOF	3
เลขที่ใบงาน : WO-059003/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 16/03/2023	5
ชื่ออาคาร : อาคาร ๑ - ๓ - ๔ - ๕ - ๖	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	ผิดปกติ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	-		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า.....PSI	-		
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า.....PSI	-		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	-		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	-		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	-		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET.....AMP	-		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	-		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	-		
8	ตรวจสอบแรงดัน R.....S.....T.....AMP	-		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		

หมายเหตุ

- ตรวจเช็คแล้ว พบว่า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส ฟรอนท์ทรี จำกัด
ตราทไฟร์ไฟท์ Fire Pump - บริษัทพลัส

รหัสงาน : FPI/FRP-W	รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-Rack/21DMS00117S-FPI/FRP-0	1
ชื่อ : FRP Electric Motor	3
เลขที่ใบงาน : WO-048/03/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 02/03/2023	5
ชื่ออาคาร : โรงรถบริษัท จีเอทีทรี - ๑๐๐๐๐๐	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีขอแก้ไข)
		สี	รายการ	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	-		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	-		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	-		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	-		
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	-		
6	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น BATTERY	-		
7	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	-		
8	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	-		
9	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	-		
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น PUMP	-		
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น MANUAL START	-		
12	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	-		
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น PUMP	-		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....PSI	-		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....PSI	-		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....RPM	-		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....PSI	-		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....PSI	-		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....F	-		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....AMP	-		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....	-		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	-		
2	ตรวจสอบแบตเตอรี่	-		
3	ตรวจสอบแบตเตอรี่ PRV	-		

วันที่ 2/03/23

บริษัท พลัส ฟรอนท์ทรี จำกัด

1. บริษัท พลัส ฟรอนท์ทรี จำกัด

2. บริษัท พลัส ฟรอนท์ทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตราจวงรวงรี Generator - ประจำสัปดาห์

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ดำเนินการโดย Global - ประจักษ์ปัทม์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัสพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-001-1Z00000S00010-RE/GEN-0001	1
: GEN	2
เลขที่ใบงาน WO-08103/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน 23/03/2023	5
ชื่ออาคาร 71-33	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (กรณีตรวจไม่ผ่าน)
		ที่	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเครื่อง 40...ดีกรี	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเพลา	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คความถี่การทำงานของ BATTERY	-			ไม่มีเกจวัด
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อน	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อน	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
	ตรวจเช็คสภาพระบบเครื่องยนต์				
1	เวลา START 0.05 STOP 18.04	✓			
2	อุณหภูมิใบพัดเมื่อเริ่ม 31°C	✓			
3	อุณหภูมิใบพัดเมื่อ 53°C	✓			
4	ความเร็วรอบ 1600 RPM	✓			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	-			ไม่มีเกจวัด
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6 PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงานของ START 96.16 HOUR	✓			
	ตรวจเช็ค GFC				
1	แรงดัน RS 101 ST 103 TR 104 VOLT	✓			
2	ความถี่ 50 Hz	✓			

Introduction

- ✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน : FR/FRP-W		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัส	TL-JJ001-1Z00000500014-FP/FRP-0001 :	1	
เลขที่ใบงาน	FRP WO-062032023	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	23/03/2023	5	6
ชื่ออาคาร	TL-JJ	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีพบข้อบกพร่อง)
		ค	แม็กซ์	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....380 ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คค่าความดันไฟฟ้าของ BATTERY	-		ไม่มีการวัด
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร	✓		
8	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
12	ตรวจเช็คระบบควบคุมการเดิน	✓		
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบน้ำและ PUMP	✓		
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....99.6 PSI	✓		
	วัดแรงดันน้ำออก.....99.6 PSI	✓		
	ความเร็วรอบ.....4400 RPM	✓		
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI	-		6.5/10.10
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI	✓		
	อุณหภูมิน้ำดับเพลิง.....130.8 F	✓		
	แอมป์.....0.5 AMP	✓		
	ความเร็วรอบ.....10.4 รอบ	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คชุดชุดชุด PRIV			

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราหอยเชลล์ Jockey Pump - ประจำสำนักงาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 การทวงเรอ Fire Pump - ประสงค์ให้

รหัสงาน : FP/JP-W	รูปถ่ายพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส	1
เลขที่ใบงาน	3
วันปฏิบัติงาน	5
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

รหัสงาน : FRP/FRP-W	
รหัส	TL-JJ-001-FRP/281D05001175-FRP/FRP-Q
เลขที่ใบงาน	002 : FRP Electric Motor
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-064/03/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	23/03/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร ๑๑ - ๑๑๑๑๑๑๑๑
ชื่อพนักงาน	นายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ชื่อผู้ควบคุม	นายชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ข้อควรระวัง ฯลฯ)
		ผู้	บันทึก	รายการ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI 915	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI 150	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI 915	✓			
8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI 150	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			

VERBODEN

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จตามร้อยละ
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : 6.0)
		สี	น้ำ	สภาพ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง.....สี	—			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	—			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	—			
4	ตรวจเช็คสายพาน	—			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	—			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	—			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรค	—			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	—			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	—			
10	ตรวจเช็คหัวฉีด PUMP	—			
11	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ MANUAL START	—			
12	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ MANUAL START	—			
13	ตรวจเช็คการกรองของเครื่องเบรค PUMP	—			
	หัวเบรคน้ำเข้า.....PSI	—			
	หัวเบรคน้ำออก.....PSI	—			
	การไหลของ.....RPM	—			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	—			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....PSI	—			
	อุณหภูมิในท่อเย็น.....F	—			
	แอมป์.....AMP	—			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	—			
	CONTROL	—			
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	—			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรค	—			
3	ตรวจเช็คการกรองของเครื่อง PRV	—			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานแสวงหาความร่วมมือ

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

WO-084/03/2023 Page 2 of 2

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ที่	วันที่	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพน้ำมัน MOTOR	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพน้ำมัน PUMP	✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ PSI	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน PSI	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดควบคุม CONTROL	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจเช็ค OVER LOAD SET AMP	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S-T I-R-VOLT	✓		
8	ตรวจเช็คแรงดัน R-S-T I-AMP	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	✓		

EXHIBIT

ଜଣେ ଶ୍ରମିକ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด
การตรวจสอบ Generator - ประจำโรง

รหัสงาน : REGEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00000500010-REGEN-0001	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : GEN	3 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-182052023	5 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 30/03/2023	
ชื่ออาคาร : TL-33	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีกรณีพิเศษ)
		ดี	ยังไม่ดี	
	ตรวจสอบเครื่องวัด			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 405 ลิตร			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน			
5	ตรวจสอบระดับน้ำแบตเตอรี่			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
14	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
15	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่			
1	START STOP 15:04 STOP 15:08			
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 31 F			
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 53 F			
4	อุณหภูมิห้องเครื่อง 1500 RPM			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.6 PSI			
7	ชั่วโมงการทำงาน START STOP 36.8 HOUR			
	ตรวจสอบ GPC			
1	ระดับน้ำในแบตเตอรี่ R.S. 24V 54V 14V			
2	ความถี่ 50 HZ			

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส ฟร้อมเพอร์มิต จำกัด
การตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FPI/JP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z000001S00014-FPI/JP-0001 : JP-1	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-164052023	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 30/03/2023	5 [REDACTED]
ชื่ออาคาร TL-33	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ากรณมี: ๕๐)
		ดี	บกพร่อง	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
2	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
3	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
4	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
5	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
6	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
7	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
2	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
3	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
4	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
5	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
6	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
7	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
8	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		
9	ตรวจสอบสวิตช์และสายมอเตอร์ MOTOR	/		

หมายเหตุ

บริษัท พลัส ฟร้อมเพอร์มิต จำกัด

1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หน้า 1 จาก 2

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท บลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจอยคีย์ Jocky Pump - ปะจันใต้

รหัสงาน: FPJP-W

รหัส: TL-UJ-001-RodZB1D06S001175-FPJP-00

รหัส: JP-ROOF

รหัส: WO-165052023

วันที่: 30/03/2023

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1
3
5
6

ชื่ออาคาร: TL-33

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรระบุ: คม)
		ดี	ยังไม่ดี	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—		
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR line PUMP			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR PSI	—		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR PSI	—		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	—		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	—		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	—		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET BET.....AMP	—		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	—		
7	ตรวจสอบการทำงานของ R-S.....S-F.....T-R.....VOLT	—		
8	ตรวจสอบการทำงานของ R-S.....S-F.....T-R.....AMP	—		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		

หน้า 2 จาก 2

แผนผังอาคาร

หน้า 1 จาก 2

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด
การตรวจสอบ Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : GEN	1
วันที่ปฏิบัติงาน WO-01/05/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน 08/04/2023	5
ชื่ออาคาร TL-33	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง : ระบุ)
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 401 ลิตร	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นหล่อเลี้ยง	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำแบตเตอรี่	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
14	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
16	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
17	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
18	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
19	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
20	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
21	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
22	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
23	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
24	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
25	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
26	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
27	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
28	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
29	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
30	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด
การตรวจสอบ Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : GEN	1
วันที่ปฏิบัติงาน WO-01/05/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน 08/04/2023	5
ชื่ออาคาร TL-33	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง : ระบุ)
		ดี	มีปัญหา	
3	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำประปา	✓		

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องจักร (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W

TL~JJ-001-1Z0000S00014-FP/FRP-0001:

१२३

เลขที่ใบงาน WO-017/05/2023

2019-10-20

05/04/2023 14:07:11

รายละเอียดงานตั้งแต่ได้งาน

•

2

52

5

ข้อสำคัญ

17-21

ข้อมูลพื้นฐาน

นันทนาการ

1. ปกัณฑ์งานเสด็จเยือนร้อย

๖ ๖ สิทธิสงวนแห่งพระราชอำนาจ

WO-01705/2023 Page 2 of 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ใช้กรรไกรตัด : ๑๗)
		ดี	แก้ไข	ออกการเช็ค	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง.....S21.....ดี	/			
2	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง.....	/			
3	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง.....	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน.....	/			
5	ตรวจเช็คสายพาน BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง.....	/			
8	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง.....	/			
9	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง.....	/			
10	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง PUMP	/			
11	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง.....	/			
13	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อนเครื่อง.....PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....2.1.....PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก.....2.3.....PSI	/			
	ความถี่รอบ.....2421.....RPM	/			
	แรงดันน้ำขับเคลื่อนเครื่อง.....6.1.....PSI	-			
	แรงดันน้ำขับเคลื่อนเครื่อง.....6.2.....PSI	/			
	อุณหภูมิไอน้ำ.....F	/			
	แอมป์.....0.9.....AMP	/			
	จำนวนการทำงาน.....18.7.....ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY				
2	ตรวจเช็คสายขับเคลื่อน				
3	ตรวจเช็คสายขับเคลื่อนเครื่อง PRV				

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ที จำกัด
สาธารณารวชิก Jockey Pump - ประจำสปีด

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ถาวรกรรณเณล Fire Pump - ประจักษ์ปารณ์

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TL-JJ-001-1Z000CGS00014-FP/JP-0001 :	1
JP-1	3
เลขที่ใบงาน WO-018/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 08/04/2023	5
ชื่ออาคาร TL-33	6
	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ (ถ้ามีระบุ:๑๑)
		ดี	ปกติ	อาจสงสัย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คลมระบบอากาศ MOTOR	/			
2	ตรวจเช็คสภาพหัวปั๊ม MOTOR	/			
3	ตรวจเช็คสภาพหัวปั๊ม PUMP	/			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI ๑19	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI ๑27	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุม CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คชุดฟิวส์ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD 44 SET.....AMP 11	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S-T 380V, 3-1 380V, 3-2 380V, 3-3 380V	/			
8	ตรวจเช็คกระแส R-L-S 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	/			
9	ตรวจเช็คสภาพ CONTROL	/			

EXAMPLE

အိမ်ထောင်ရေးအကျိုးအမြတ်

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-018/05/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : FPF/RP-W	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023	วันที่ส่งใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023
วันที่ : 15/05/2023	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023	วันที่ส่งใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023
เลขที่ใบแจ้งหนี้ : FPF/RP-W-01905/2023	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023	วันที่ส่งใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023
วันที่ส่งใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023	วันที่ออกใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023	วันที่ส่งใบแจ้งหนี้ : 15/05/2023

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ: ข้อ)
		สี	บันทึก	รายการ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ดี	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อต้มน้ำมัน	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คกำลังความถี่ของสายพานของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอกลับ	✓			
10	ตรวจเช็คหัวปั๊ม PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คความสมบูรณ์สายพาน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำกลับเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำหม้อต้มน้ำมัน.....F	✓			
	แรงดันน้ำหล่อเย็น.....AMP	✓			
	ความเร็วรอบ.....รอบ	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสายพาน BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานของชุด PRV	✓			

EXAMPLE

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบเอกสาร (CM)

PLUS 4

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Jockey Pump - บริเวณโถง

รหัสงาน : FP/JP-W

รหัส : TL-JJ-001-Rod/ZB1D00S001175-FP/JP-00

เลขที่งาน : WO-020/05/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 06/04/2023

งานซ่อมบำรุงทั่วไป

1

3

5

ชื่ออาคาร : TL-93

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีโปรดใส่)
		สี	แก๊ส	สภาพเรียบร้อย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP				
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	—			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	—			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE CONTROL	—			
1	ตรวจสอบชุดควบคุม CONTROL	—			
2	ตรวจสอบชุด FUSE CONTROL	—			
3	ตรวจสอบชุด PRESSURE SWITCH	—			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่า SET.....AMP	—			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—			
6	ตรวจสอบชุด SHOW	—			
7	ตรวจสอบชุด R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	—			
8	ตรวจสอบชุด R.....S.....T.....AMP	—			
9	ตรวจสอบชุด CONTROL	—			

หมายเหตุ

คน/ชั่วโมง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบเอกสาร (CM)

PLUS +

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงาน
รหัส : TL-JA-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-02/05/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 13/04/2023	6
ชื่ออาคาร : TL-27	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (กรณีตรวจพบ : งด)
		ดี	มีปัญหา	
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน			
1	น้ำมันดีเซลในถังสำรอง 94% ...			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน			
5	ตรวจสอบระดับน้ำ BATTERY			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ MANUAL START			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
14	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
15	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ BATTERY			
1	เวลา START... 15.00 STOP 15.05 น.			
2	อุณหภูมิในตู้ BATTERY ... 33°C ...			
3	อุณหภูมิในตู้ BATTERY ... 54°C ...			
4	ความเร็วรอบ ... 1500 RPM			
5	แรงดันในตู้ BATTERY ... PSI			
6	แรงดันในตู้ BATTERY ... PSI			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 15.00 STOP 15.05 HOUR			
	ตรวจสอบ GFC			
1	แรงดัน RS 240 V.T.R. 240 VOLT			
2	ความถี่ 60 HZ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทางหลวงพิเศษ Fire Pump - ฝั่งซ้ายฝั่งน้ำ

PLUS 4

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J-001-1Z0000000014.FP/FRP-0001 :	1
รหัส : FRP	3
รหัส : WO-0220052023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 13/04/2023	6
ชื่ออาคาร : 7L-99	ชื่อผู้ทำ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	บกพร่อง	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คค่าความดันของระบบ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพสายไฟ	✓		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
10	ตรวจเช็คค่าแรงดัน PUMP	✓		
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
12	ตรวจเช็คระบบควบคุมการไหล	✓		
13	ตรวจเช็คการไหลของน้ำจากถังเก็บน้ำและ PUMP	✓		
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
	แรงดันน้ำที่เข้าเครื่อง.....PSI	✓		
	แรงดันน้ำที่ออก.....PSI	✓		
	อุณหภูมิของน้ำ.....F	✓		
	แอมป์.....AMP	✓		
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดรีเลย์ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คสายดิน	✓		
3	ตรวจเช็คการไหลของน้ำจาก PUMP	✓		

หน้า 2 ของ 2

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

รหัสงาน : FPIJP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1200000000014-FPIJP-0001 : JP-1	1 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-023005/2023	3 4
วันที่ปฏิบัติงาน : 13/04/2023	5 6
ชื่ออาคาร : TL-33	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ข้อ)
		สี	เมทิน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำจากถัง MOTOR	/		
2	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
3	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
4	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR และ PUMP	/		
5	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR และ PUMP	/		
6	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR และ PUMP	/		
7	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR และ PUMP	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
2	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
3	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
4	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
5	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
6	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
7	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
2	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
3	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
4	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
5	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
6	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
7	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
8	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		
9	ตรวจสอบถังเก็บน้ำจากถัง MOTOR	/		

หมายเหตุ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน : FP/JP- W	
รหัส TL-AJ001-RoofZS IDWS001175-FP/JP-QD	
เลขตำแหน่ง 02 : JP -ROOF	
วันที่ปฏิบัติงาน WO-02/09/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน 13/04/2023	
ชื่ออาคาร TJ-JJ	
ชื่อผู้สำรวจ [REDACTED]	
รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 [REDACTED] 3 [REDACTED] 4 5 [REDACTED] 6	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจได้; ถ้าไม่ได้)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ MOTOR	-		
2	ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ MOTOR	-		
3	ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ PUMP	-		
4	ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ MOTOR และ PUMP			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง.....PSI	-		
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง.....PSI	-		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE CONTROL			
1	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง CONTROL	-		
2	ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ FUSE CONTROL	-		
3	ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ PRESSURE SWITCH	-		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่า SET.....AMP	-		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
6	ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ SHOW	-		
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง R-S.....S.T.....T.R.....VOLT	-		
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง R-S.....S.T.....T.R.....AMP	-		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		

WISCONSIN

12/12/2020

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ภารกิจงานแม่เหล็กโลกและลม

2. ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องหนึ่งซึ่งต้องแยกต่างหาก (CMT)

รหัสงาน : REGEN-W		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัส	TL-JJ-001-1/200000500010-RE/GEN-0001	1	
เลขที่ใบงาน	: GEN	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-026/05/2023	5	
ชื่ออาคาร	20/04/2023	6	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ: ระบุ)
		ดี	แก้ไข	
3	วัดแรงดัน R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน			
5	วัดแรงดัน BATTERY.....AMP			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จจนถึงขั้นต้องแจ้งช่าง (CM)

WO-026/05/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FP/FRP-W		รายชื่อพนักงาน	
รหัส	TL-JJ-001-1/200000500014-FP/FRP-0001 :	1	
เลขที่ใบงาน	FRP	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-027/05/2023	5	
ชื่ออาคาร	20/04/2023	6	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ: ระบุ)
		ดี	แก้ไข	ถ้าแก้ไข	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร				
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น				
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหมั่น				
4	ตรวจเช็คสวิตช์				
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY				
6	ตรวจเช็คค่าความถี่แรงดันของ BATTERY				
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย				
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย				
10	ตรวจเช็คสวิตช์เริ่ม PUMP				
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START				
12	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
13	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและ PUMP				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อลื่น.....F				
	แอมแปร์.....AMP				
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY				
2	ตรวจเช็คสวิตช์แจ้งเตือน				
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV				

ผู้ควบคุมงานติดตั้ง
1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูลเบื้องต้น (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเทคชั่นส์ จำกัด
การตรวจสอบ Jockey Pump - ประสิทธิภาพ

รหัสงาน : FFP/JP-W		รายชื่อพนักงาน	
รหัส	TL-JJ-001-1Z0000S00014-FFP/JP-0001 :	1	
เลขที่ใบงาน	JP-1	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-028/05/2023	4	
วันที่ปฏิบัติงาน	20/04/2023	5	
ชื่ออาคาร	71-20	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/		
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/		
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	/		
4	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และปั๊ม MOTOR และ PUMP	/		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 9.15 PSI	/		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำ 9.15 PSI	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว CHECK VALVE	/		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุม CONTROL	/		
2	ตรวจสอบฟิวส์ FUSE CONTROL	/		
3	ตรวจสอบสวิตช์ PRESSURE SWITCH	/		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD SET ... AMP	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/		
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	/		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S 34.5 VOLT	/		
8	ตรวจสอบแรงดัน R-L 34.5 VOLT	/		
9	ตรวจสอบชุดควบคุม CONTROL	/		

หน้า ๑

ผู้ควบคุมงานติดตั้ง

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูลเบื้องต้น (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FRP/FRP-W	
รหัส	TL-JJ-001-R004731 D00S001175-FR/FRP-0
เครื่องใช้ในงาน	002 : FRP Electric Motor
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-029/05/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	20/04/2023
ชื่ออาคาร	TL-JJ

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1	
3	
5	
6	

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีพบข้อบกพร่อง)
		สี	รายการ	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คค่าความแรงแรงดันของ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
8	ตรวจเช็คฉนวนหุ้มท่อ	✓		
9	ตรวจเช็คท่อจ่ายน้ำเชื้อเพลิง	✓		
10	ตรวจเช็คตัวถัง PUMP	✓		
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
13	ตรวจเช็คการทำงานของฟังก์ชันและ PUMP	✓		
	หัดเริ่มต้นปั๊ม.....PSI	✓		
	หัดเร่งดันน้ำออก.....PSI	✓		
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓		
	แรงดันน้ำหล่อลื่น.....PSI	✓		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	✓		
	แอมป์.....AMP	✓		
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คจุดจ่ายน้ำ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		

PLUS +

บริษัท พลัส พว็พเพอส์ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Jody Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FPJP-W	รหัส	รายงาน
TL-JJ-001-Rev023 ID005001176-FPJP-00	02 : JP-ROOF	WD-03005/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	20/04/2023	
ชื่ออาคาร	TL-33	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	บันทึก	
1	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และปั๊ม	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
8	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน P-Switch.....T-R.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบแรงดัน R-Switch.....T-R.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

หมายเหตุ

ดูแผนผังอาคาร

ผู้เขียนรายงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องเครื่อง

2. ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องเครื่อง (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พว็พเพอส์ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส	รายงาน
TL-JJ-001-1Z00000500010-RE/GEN-0001	01 : GEN	WD-03005/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	27/04/2023	
ชื่ออาคาร	TL-33	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	บันทึก	
1	ตรวจสอบการทำงานของ			
1	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
14	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
15	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓		

รหัสงาน : RE/GEN-W		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
วันที่	TL-JJ-001-1/200000000010-RE/GEN-0001	1	
เลขที่ใบงาน	WO-034/05/2023	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	27/04/2023	5	6
ชื่ออาคาร	TL-22	ชื่อผู้	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	บกพร่อง	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจเช็คในสเกลการทำงาน			
5	วัดแรงดัน BATTERY.....AMP			
6	อ่านค่าการทำงาน START.....STOP.....HOUR			

หมายเหตุ

ผู้เขียนผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : FRP/FRP-W		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
วันที่	TL-JJ-001-R04/281 DOUS001175-FRP/FRP-0	1	
เลขที่ใบงาน	WO-037/05/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	27/04/2023	5	6
ชื่ออาคาร	TL-22	ชื่อผู้	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	บกพร่อง	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจเช็คน้ำมัน	✓		
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓		
6	ตรวจสอบค่าความแรงดันของ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบสภาพเพลาเครื่องยนต์	✓		
8	ตรวจสอบข้อต่อทาสี	✓		
9	ตรวจสอบข้อต่อท่อไอเสีย	✓		
10	ตรวจสอบหัวปั๊ม PUMP	✓		
11	ตรวจสอบ MANUAL START	✓		
12	ตรวจสอบระบบการทำงาน	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓		
	วัดแรงดันเข้า.....PSI	✓		
	วัดแรงดันออก.....PSI	✓		
	ความเร็วรอบ.....2451 RPM	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓		
	แรงดันน้ำหล่อเย็น.....PSI	✓		
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....F	✓		
	แอมป์.....0.3 AMP	✓		
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบค่าแบตเตอรี่	✓		
2	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓		
3	ตรวจสอบค่าการทำงานของ PRV	✓		

หน้า ๒

หน้า ๒

หน้า ๒

หน้า ๒

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การทางรถไฟ Jockey Pump - โปรดใช้ให้

รหัส	TL-JJ-001-1/20000500014.FPJ/JP-0001 :	งานซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำ
เลขที่ใบงาน	WO-038/05/2023	1
วันที่ปฏิบัติงาน	27/04/2023	3
ผู้จัดทำ	PL-22	5
ผู้ตรวจสอบ		4
ผู้รับงาน		6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ข้อบกพร่อง/ค่า)
		ดี	เสีย	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันมอเตอร์	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบสถานะของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบสถานะ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบสถานะ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบค่า HIGH SHOW	✓		
7	ตรวจสอบค่าแรงดัน R-S-T.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบค่าแรงดัน R-S-T.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบค่าแรงดัน CONTROL	✓		

หน้า ๒

หน้า ๒

หน้า ๒

หน้า ๒

PLUS +

บริษัท พลัส ฟรียูทเพอร์รี่ จำกัด
 การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TL-JJ-001-1/200000S00014-FP/FRP-0001 :	1	2
เลขที่ใบงาน	FRP WO-035/05/2023	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	27/04/2023	5	6
ชื่ออาคาร		ชื่อคิว	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้: ๑๓)
		สี	รายการ	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง.....ลิตร	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
3	ตรวจสอบน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบสถานะ	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบค่าแรงดันกำลังแรงดัน BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องดับเพลิง	✓		
8	ตรวจสอบค่าแรงดันอากาศ	✓		
9	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำดับเพลิง	✓		
10	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP	✓		
11	ตรวจสอบค่าแรงดัน MANUAL START	✓		
12	ตรวจสอบค่าแรงดันระบบควบคุม	✓		
13	ตรวจสอบค่าแรงดันกำลังแรงดันเครื่องดับเพลิงและ PUMP	✓		
	ค่าแรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI	✓		
	ค่าแรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI	✓		
	ค่าแรงดัน.....RPM	✓		
	ค่าแรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI	✓		
	ค่าแรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI	✓		
	อุณหภูมิค่าแรงดัน.....F	✓		
	อุณหภูมิค่าแรงดัน.....AMP	✓		
	รู้ในภาพการทำงาน.....ม.	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบค่าแรงดัน BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่อง	✓		
3	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่อง PRV	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูล (CM)

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J-001-Roof281005001175-FP/JP-00	1
เลขที่ใบงาน : WO-038052023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 27/04/2023	5
ชื่ออาคาร : TL-01	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรระบุ; ๕๓)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ RS-1-T-R-VOLT	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ R-S-T-AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

หมายเหตุ

ผู้เขียนรายงาน: [ลายเซ็น]

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ห้องเครื่อง (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J-001-1200000500010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : WO-001105/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 04/05/2023	5
ชื่ออาคาร : TL-01	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรระบุ; ๕๓)
		สี	รายการ	
	ตรวจสอบเครื่องเบต			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	34.6...ลิตร	
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MANUAL START	✓		
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องเบต	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตู้เครื่อง	✓		
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓		
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓		
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเบต			
1	เวลา START	✓	13:35...STOP 13:39...น.	
2	อุณหภูมิเครื่องเบต	✓	50...°C	
3	อุณหภูมิเครื่องเบต	✓	50...°C	
4	ความเร็วรอบ	✓	1500...RPM	
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	2.3...PSI	
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	2.3...PSI	
7	ชั่วโมงการทำงาน START...STOP	✓	38.9...HOUR	
	ตรวจสอบค่า CPC			
1	ตรวจสอบค่า RS...S-T-R	✓	244...VOLT	
2	ค่าไฟ	✓	50...HZ	

✓ 3
10.02.23

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตราวงศราชเจ็ด Generator - ประสงค์ปัทม

บริษัท ฟิส ฟวอเพอร์มิต จำกัด
 ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J1-001-1/20000500010-RE/GEN-0001	1 [REDACTED]
ชื่อ : GEN	2 [REDACTED]
เลขที่ในงาน : WD-001/05/2023	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 04/05/2023	4 [REDACTED]
	5 [REDACTED]
	6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร : 4L-22	ชื่อผู้ตรวจ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	ชำรุด	
3	แบตเตอรี่ R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจเช็คไฟส่องสว่างหน้า			
5	โซ่ชาร์จ BATTERY..... AMP			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR			

WU

หน้าวัดหลวงบ้าน

1. พื้นที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปกติทำงานแล้วหาวิธีหาบั้งที่ต่องนกฯ ๒๕๖๓ (CM)

WD-001/05/2023 Page 2 of 2

รหัสงาน : FR/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส	1
เลขที่ในงาน	3
วันที่ปฏิบัติงาน	5
	6
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม
	TL-33

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบความผิดปกติ)
		สี	น้ำมัน	รายการเช็ค	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเครื่องยนต์.....ดี	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำยวหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คถังน้ำมัน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างไฟแช็ค BATTERY	-			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรค	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำมัน	/			
10	ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมัน PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบบความดัน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเบรคและ PUMP	/			
	หัวเบรคน้ำมันเข้า.....PSI	/			
	หัวเบรคคั่นได้ออก.....PSI	/			
	ความแรงรอบ.....RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	-			
	อุณหภูมิไทรสเตอร์.....F	/			
	แอมป์ไฟ.....AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดสาย BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRY	/			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กองการช่าง Jocky Pump - ประจำฝ่าย

รหัสงาน : FP/JP-W

รหัส : TL-JJ-001-WZ0000000014-FP/JP-0001 :

JP-1

เลขที่ใบงาน : WO-003/05/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 04/05/2023

ชื่ออาคาร

TL-JJ

ชื่อผู้ควบคุม

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1

3

5

4

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : CM)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR			
2	ตรวจสอบค่าแรงดัน MOTOR			
3	ตรวจสอบค่าแรงดัน PUMP			
4	ตรวจสอบค่าแรงดัน MOTOR และ PUMP			
5	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำเข้า.....PSI			
6	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำออก.....PSI			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE			
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL			
2	ตรวจสอบค่าแรงดัน FUSE CONTROL			
3	ตรวจสอบค่าแรงดัน PRESSURE SWITCH			
4	ตรวจสอบค่าแรงดัน OVER LOAD SET.....AMP			
5	ตรวจสอบค่าแรงดันของ CONTROL			
6	ตรวจสอบค่าแรงดัน SHOW			
7	ตรวจสอบค่าแรงดัน R.S.T. 16.5 T.R. 14 VOLT			
8	ตรวจสอบค่าแรงดัน R.S.T. 16.5 T.R. 14 VOLT			
9	ตรวจสอบค่าแรงดัน CONTROL			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำเครื่อง

รหัสงาน : FPI/JP-W	งานรื้อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-RWD281D00S/01175-FPI/JP-00	1
เลขที่ใบงาน : JP-ROOF	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-005/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 04/05/2023	5
ชื่ออาคาร : PL-WJ	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ระบุ)
		สี	รายการเสีย	
1	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR use PUMP	—		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR use PSI	—		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR use PSI	—		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR use CHECK VALVE	—		
CONTROL				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
8	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	—		

หมายเหตุ

ไม่พบข้อบกพร่อง

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จงานที่ส่งมอบไปยัง (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำเครื่อง

รหัสงาน : RE/GEN-W	งานรื้อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-005/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 11/05/2023	5
ชื่ออาคาร : PL-WJ	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ระบุ)
		สี	รายการเสีย	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
8	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
10	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
11	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
12	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
13	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
14	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
15	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	—		
1	เวลา START 12:05 STOP 12:10	—		
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32 F	—		
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 32 F	—		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	—		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6 PSI	—		
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6 PSI	—		
7	จำนวนชั่วโมงทำงาน START 12:10 STOP 12:15 HOUR	—		
ตรวจเช็ค CPC				
1	แรงดัน RS 344 S.T. 344 T.R 344 VOLT	—		
2	ความเร็วรอบ 1500 RPM	—		

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TL-JJ-001-1720000000010-RE/GEN-0001	รหัสชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : GEN	เลขที่ใบงาน : WO-006/06/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 11/05/2023
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรใส่ : กค)
		ดี	บกพร่อง	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า			
5	ตรวจสอบ BATTERY.....AMP			
6	ชั่วโมงทำงาน START.....STOP.....HOUR			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. อุปกรณ์งานเสร็จเรียบร้อย

2. อุปกรณ์งานเสร็จพร้อมส่งห้องเก็บของ (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัส : TL-JJ-001-1720000000014-FP/FRP-0001	รหัสชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : FRP	เลขที่ใบงาน : WO-007/06/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 11/05/2023
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรใส่ : กค)
		ดี	บกพร่อง	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น			
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น			
4	ตรวจสอบสายพาน			
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY			
6	ตรวจสอบค่าความดันแรงดันของ BATTERY			
7	ตรวจสอบสัญญาณเครื่องเบรก			
8	ตรวจสอบไฟสถานะไฟดับ			
9	ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ			
10	ตรวจสอบเครื่อง PUMP			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START			
12	ตรวจสอบเครื่องระบบควบคุมความดัน			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเบรก PUMP			
	ไฟแรงดันไฟฟ้า.....PSI			
	ไฟแรงดันน้ำออก.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....RPM			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....F			
	แอมป์.....AMP			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.			
	CONTROL			
1	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY			
2	ตรวจสอบสัญญาณเครื่องเบรก			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP			

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/JP-W	งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
รหัส : TL-J-001-1/200005000014-FP/JP-0001 :	1
JP-1	3
เลขที่งาน : WO-008/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 11/05/2023	5
ชื่ออาคาร : TL-99	ชื่อผู้ตรวจ : 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	สภาพ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S-T.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบกระแส R.....S.....T.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบสภาพ CONTROL	✓		

หน้างาน

หน้างาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อช่าง
รหัส : TL-JJ-001-Room/281D008001175-FP/FRP-0	1
เลขที่ใบงาน : 002 : FRP Electric Motor	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-08/05/2023	4
วันที่ปิดใบ : 11/05/2023	5
ชื่ออาคาร : 7L-9J	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีกรณีสืบค้น)
		ดี	แก้ไข	ฮยากรับ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	-			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	-			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	-			
4	ตรวจสอบสภาพ	-			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	-			
6	ตรวจสอบการทำงานของระบบของ BATTERY	-			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบลม	-			
8	ตรวจสอบสภาพสายพาน	-			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	-			
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	-			
11	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	-			
12	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	-			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	-			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	-			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	-			
	ความเร็วรอบ.....RPM	-			
	แรงดันน้ำเข้าเครื่องสูบลม.....PSI	-			
	แรงดันน้ำออกเครื่องสูบลม.....PSI	-			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	-			
	แอมป์.....AMP	-			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	-			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	-			
2	ตรวจสอบการทำงานของ	-			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	-			

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
การตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/JUP-W	รายชื่อช่าง
รหัส : TL-JJ-001-170000001175-FP/JUP-00	1
เลขที่ใบงาน : WO-0100052023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 11/05/2023	5
ชื่ออาคาร : 22-22	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง)
		ดี	มีปัญหา	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบสีผสมระบบยก Motor	✓		
2	ตรวจสอบสีผสมถังเก็บ Motor	✓		
3	ตรวจสอบสีผสมตัวเรือน PUMP	✓		
4	ตรวจสอบสีการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบสีแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบสีแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบสีการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบสีสภาพ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบสี PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบสีค่า OVER LOAD ค่า SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบสีการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบสีไฟ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบสีแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบสีกระแส R.....S.....T.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบสีการควบคุมตู้ CONTROL	✓		

หมายเหตุ

พบไม่พบ

ผู้เขียนผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อช่าง
รหัส : TL-JJ-001-170000000010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : WO-0110052023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 18/05/2023	5
ชื่ออาคาร : 1002 โถง 2 ชั้น 3	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีพบข้อบกพร่อง; ถ้ามี)
		ดี	มีทั้ง	มีปัญหา	
	ตรวจสอบเครื่องปั่นไฟ	✓			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 3.6 ลิตร	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบสายพาน	✓			
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของระบบแบตเตอรี่	✓			
7	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องปั่นไฟ	✓			
9	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันอากาศ	✓			
11	ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรล	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรลในตู้ควบคุมเครื่องปั่นไฟ	✓			
14	ตรวจสอบการทำงานของ ATS	✓			
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั่นไฟ					
1	เวลา START 12.09 STOP 12.06 น.	✓			
2	อุณหภูมิในตู้คอนโทรล 30 °C	✓			
3	อุณหภูมิในตู้คอนโทรล 57 °C	✓			
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	✓			
5	แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่องปั่นไฟ 160 PSI	✓			
6	แรงดันไฟฟ้าในตู้คอนโทรล 160 PSI	✓			
7	ชั่วโมงการทำงานของ START 12.09 STOP 12.06 HOUR	✓			
ตรวจสอบชุด GPC					
1	แรงดัน R-S 249 S-T 249 T-R 249 VOLT	✓			
2	ความถี่ 60 HZ	✓			

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเทคเพอร์รี่ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำฉบับที่

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-12000000S0010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 18/05/2023	5
ชื่ออาคาร : TL-99	6
ชื่อผู้ตรวจ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คม)
		สี	เมทริกซ์	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน			
5	วัดค่า BATTERY..... AMP			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....-HOUR			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยซึ่งต้องแก้ไขจุด (CM)

WO-01/05/2023 Page 2 of 2

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเทคเพอร์รี่ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำฉบับที่

รหัสงาน : FPRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-12000000S0014-FPRP-0001	1
เลขที่ใบงาน : FRP	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 18/05/2023	5
ชื่ออาคาร : TL-99	6
ชื่อผู้ตรวจ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คม)
		สี	เมทริกซ์	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คการหมุนเวียนเชื้อเพลิง.....ลิตร			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น			
4	ตรวจเช็คสายพาน			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY			
6	ตรวจเช็คค่าความต่างแรงดันของ BATTERY			
7	ตรวจเช็คสภาพท่อเครื่องยนต์			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย			
10	ตรวจเช็คเครื่อง PUMP			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องส่งและ PUMP			
	ค่าแรงดันน้ำเข้า.....PSI			
	ค่าแรงดันน้ำออก.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....RPM			
	แรงดันน้ำในระบบหล่อเย็น.....PSI			
	แรงดันน้ำในระบบหล่อเย็น.....PSI			
	อุณหภูมิในห้องเครื่อง.....F			
	แอมป์.....AMP			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.			
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดพลาท BATTERY			
2	ตรวจเช็คชุดหัวฉีดดับเพลิง			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV			

รหัสงาน : FPUJ-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J-001-1200000000014-FPUJ-W-0001 :	1
JP-1	3
เลขสำเนา : WO-013/05/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 18/05/2023	6
ชื่ออาคาร : TL-001	ชื่อผู้ควบคุม :

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : 50)
		ดี	บกพร่อง	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการเดินเครื่อง MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่า SET AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน RS-232C VOLT	✓		
8	ตรวจสอบค่าแรงดัน PSI	✓		
9	ตรวจสอบค่าแรงดัน AMP	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนกระทั่งต้องแก้ไข (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนกระทั่งต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : FFI/FRP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส TL-JJ-001-R00128-ID005001175-FFI/FRP-0	1
002 : FRP Electric Motor	3
เลขที่ใบงาน WO-014/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 18/05/2023	5
ชื่ออาคาร PL-99	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ: ๕๓)
		ที่	ภายใน	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ดี	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบค่าความดันน้ำประปาของ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องเบรก	✓		
8	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
9	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
10	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
11	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
12	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
13	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ	✓		
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
	แรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
	แรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
	อุณหภูมิห้องเครื่อง.....F	✓		
	แอมป์.....AMP	✓		
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการชาร์จ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบการชาร์จ BATTERY	✓		
3	ตรวจสอบการชาร์จ BATTERY	✓		

รหัสงาน : FFI/JP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส TL-JJ-001-R00128-ID005001175-FFI/JP-00	1
02 : JP-RGOF	3
เลขที่ใบงาน WO-015/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 18/05/2023	5
ชื่ออาคาร PL-99	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ: ๕๓)
		ที่	ภายใน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบค่าความดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบค่าความดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบค่าความดันน้ำในถัง CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ OVER LOAD ค่าที่ SET ๓๐ AMP	✓		
5	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ R-S-T.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ R-S-T.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบค่าความดันน้ำ CONTROL	✓		

หน้า 1 จาก 1

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อผู้ตรวจเช็ค
รหัส : TL-JJ-001-1/200D00S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-15/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 25/05/2023	5
ชื่ออาคาร TL-99	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	มีปัญหา	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมัน			
5	ไม่ตรวจ BATTERY.....AMP			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR			

หมายเหตุ

ผู้ปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อผู้ตรวจเช็ค
รหัส : TL-JJ-001-1/200D00S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-15/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 25/05/2023	5
ชื่ออาคาร TL-99	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	มีปัญหา	
	ตรวจสอบระดับน้ำ			
1	ระดับน้ำในถังน้ำมัน.....ลิตร			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
4	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
5	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
13	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
14	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
15	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
	ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมัน			
1	เวลา START.....STOP.....HOUR			
2	อุณหภูมิของน้ำมัน.....°C			
3	อุณหภูมิของน้ำมัน.....°C			
4	อุณหภูมิของน้ำมัน.....°C			
5	อุณหภูมิของน้ำมัน.....°C			
6	อุณหภูมิของน้ำมัน.....°C			
7	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR			
	ตรวจสอบ GPC			
1	วัดแรงดัน R.S.....S.T.....VOLT			
2	วัดแรงดัน.....HZ			

PLUS +

บริษัท ปลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตราดาวแดง Fire Pump - ประสิทธิภาพ

Material: FP/FRP-W

TLJJ-001-Root/Z81D00S001176-FP/FRP-0

002 : FRP Electric Motor

เลขที่ใบงาน WO-160/05/2023

วันพฤหัสบดี 25/05/2023

ข้อมูลทาง
TZ-211

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1

८३

5

শুভম্ভাবনা

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีควรบันทึก, /ข้อ)
		สี	น้ำใส	อาการอื่น	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ดี	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจเช็คความแข็งแรงของแบตเตอรี่	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คกล่องอากาศ	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
10	ตรวจเช็คหัวฉีด PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....PSI	✓			
	จุดประกายหัวฉีด.....F	✓			
	แอมปีแอร์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสายพาน BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวชี้แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การวางระบบ Jocky Pump - ประตูน้ำท่าเรือ

รหัสงาน : FP/J/P-W	รายชื่อช่าง
รหัส : TL-JJ-001-Rev02/191005001175-FP/J/P-00	1
ชื่อ : JP-ROOF	3
เลขที่ใบงาน : WO-16/105/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 25/05/2023	6

หน้าที่ยื่นเอกสาร

หน้าที่ยื่นเอกสาร

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	บกพร่อง	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR use PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ R.S.T. I.P. VOLT	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ R.S.T. I.P. AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

หน้าที่ยื่นเอกสาร

หน้าที่ยื่นเอกสาร

หน้าที่ยื่นเอกสาร

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00D00S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-001/06/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 01/06/2023	5
ชื่ออาคาร TL-JJ	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คม)
		ค	น	
1	ตรวจสอบระดับเชื้อเพลิง 40.0 ลิตร			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
4	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY			
6	ตรวจสอบค่าความถี่ของเครื่อง BATTERY			ไม่พบค่า
7	ตรวจสอบระดับ MANUAL START			
8	ตรวจสอบระดับเชื้อเพลิง			
9	ตรวจสอบระดับระบบควบคุม			
10	ตรวจสอบระดับความถี่			
11	ตรวจสอบระดับความถี่			
12	ตรวจสอบระดับความถี่			
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ควบคุมที่เครื่อง			
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ATS			
15	ตรวจสอบค่าการทำงานของ TIMER ของเครื่อง			
1	เวลา START 10:10 STOP 10:20			
2	อุณหภูมิในตู้เครื่อง 30°C			
3	อุณหภูมิในตู้เครื่อง 41°C			
4	ความเร็วรอบ 1499 RPM			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI			
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น PSI			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 07:00 STOP 07:00 HOUR			
	ค่าแรงดัน GPC			
1	แรงดัน R-S 345V S-T 345V T-R 345V VOLT			
2	ความถี่ 50 HZ			

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอเมอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00D00S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-001/06/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน 01/06/2023	6
ชื่ออาคาร TL-JJ	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คม)
		ค	น	
3	วัดกระแส R S T AMP			
4	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน			
5	ตรวจสอบ BATTERY AMP			
6	ชั่วโมงการทำงาน START 32:00 STOP 32:00 HOUR			

หมายเหตุ

1. ปฏิบัติตามคู่มือ

2. ปฏิบัติตามคู่มือ

หน้า 1 ของ 2

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พื้ฟพอร์ดี จำกัด
การตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/JP-W	
รหัส	TL-M-001-Rooftop/281005001175-FP/JP-00
เลขที่ใบงาน	02 : JP-ROOF
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-005/08/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	01/08/2023
ชื่อผู้ตรวจ	71-33

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ: ข้อ)
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD ที่ SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบแรงดัน R.....S.....T.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

หน้า 2 ของ 2

หน้า 1 ของ 2

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS +

บริษัท พลัง พรีฟอรัล จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ001-1Z0000050010-RE/GEN-0001	1 .
รหัส : GEN	3
รหัส : WO-008/06/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/06/2023	6
ชื่ออาคาร : TL-33	ชื่อผู้ตรวจ :

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คม)
		ดี	มีปัญหา	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจสอบค่าแรงดันการทำงาน			
5	วัดแรงดันแบตเตอรี่.....AMP			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR			

หมายเหตุ

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องพร้อม

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องพร้อม

PLUS +

บริษัท พลัง พรีฟอรัล จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ001-1Z0000050010-RE/GEN-0001	1
รหัส : GEN	3
รหัส : WO-008/06/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/06/2023	6
ชื่ออาคาร : TL-33	ชื่อผู้ตรวจ :

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : คม)
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
5	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
6	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
7	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
8	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
9	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
12	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
14	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
15	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
1	เวลา START 09.00 STOP 09.15 ม.			
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 90 °C			
3	อุณหภูมิอากาศ 42 °C			
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI			
6	แรงดันน้ำหล่อเย็น PSI			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 09.00 STOP 09.15 HOUR			
1	ตรวจสอบ GPC			
2	วัดแรงดัน R-S 99.3 S-T 99.3 T-R 99.3 VOLT			
2	ความถี่ 60 HZ			

บริษัท พสพ รีโอเอเซอร์วิส จำกัด
ตลาดนางเลิ้ง ซอย 11/11 ถนน - ประชาสัมพันธ์

รหัส : TL-JJ-001-1/Z00000S00014-FP/FRP-0001 :
FRP
เลขที่ใบงาน WO-007/05/2023
วันที่ปฏิบัติงาน 08/08/2023

— 57 —

ស្ថាប័ន

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ให้กรณีน : 60)
		ดี	มีปัญหา	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง..... <u>OK</u> ลิตร			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ.....			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น.....			
4	ตรวจสอบสภาพ.....			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY			
6	ตรวจสอบค่าความถี่การทำงานของ BATTERY			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องหนั			
8	ตรวจสอบสภาพท่อไอดี			
9	ตรวจสอบสภาพท่อไอเสีย			
10	ตรวจสอบสภาพปั๊ม PUMP			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START			
12	ตรวจสอบระบบระบบการพ่น			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP			
	วัดแรงดันน้ำ..... <u>220</u> PSI			
	วัดแรงดันไอน้ำ..... <u>235</u> PSI			
	ความเร็วรอบ..... <u>9500</u> RPM			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง..... <u>1.0</u> PSI			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น..... <u>6.5</u> PSI			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น..... <u>.....</u> F			
	แอมป์..... <u>.....</u> AMP			
	ชั่วโมงการทำงาน..... <u>18.9</u> ชม.			
	CONTROL			
1	ตรวจสอบสภาพถัง BATTERY			
2	ตรวจสอบสายไฟถัง			
3	ตรวจสอบการสับเบรกชุด PRV			

பெரியகலாச்சாலை

1. ภารกิจงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

บริษัท สยามไฮดรอสแตติก จำกัด
1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งเอกสาร (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ Jody Pump - รัชดาภิเษก

รหัสโครงการ : FP/JP-W	รายละเอียดงาน : 1. ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิก
รหัส : TL-001-R06/281008001175-FP/JP-00	2. ติดตั้งถังเก็บน้ำ
ชื่อ : JP-ROOF	3. ติดตั้งถังเก็บน้ำ
เลขที่ใบงาน : WO-010/06/2023	4. ติดตั้งถังเก็บน้ำ
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/06/2023	5. ติดตั้งถังเก็บน้ำ
ชื่ออาคาร : TL-33	ชื่อผู้ควบคุม : [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีข้อบกพร่อง)
		ก	ข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และปั๊ม MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรล CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของโอเวอร์โหลด SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรล CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R.S. & S.T. I-R.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบแรงดัน R.S. & S.T. I-R.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของคอนโทรล CONTROL	✓		

หน้า 2

บริษัท สยามไฮดรอสแตติก จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งเอกสาร (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด
การทบทวนเชิง Generator - ประจําปีปกติ

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1/20000000010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-01/05/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 15/06/2023	5
ชื่ออาคาร TL-03	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	มีปัญหา	
	ตรวจเช็คเครื่องยัด			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 27.5 ลิตร			
2	ค่าแรงเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น			
4	ตรวจเช็คสายพาน			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY			
6	ตรวจเช็คค่าความต้านทานของ BATTERY			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START			
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดัน			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ทำงาน			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS			
15	ตรวจเช็คการกำหนดของ TIMER ของอุปกรณ์			
1	เวลา START 16.00 STOP 14.30			
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 99.0 °C			
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 48.0 °C			
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 1 PSI			
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.9 PSI			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 14.30 STOP 14.37 HOUR			
	การเช็ค OPC			
1	วัดแรงดัน RS 399.5 V ST 399.5 V T-R 399 VOLT			
2	ความถี่ 50 HZ			

PLUS +

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด
การทบทวนเชิง Generator - ประจําปีปกติ

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1/20000000010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-01/06/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 15/06/2023	6
ชื่ออาคาร TL-33	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	มีปัญหา	
3	วัดแรงดัน R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน			
5	วัดแรงดัน BATTERY.....AMP			
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ไม่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ไม่ปฏิบัติงานเสร็จจนถึงห้องปฏิบัติงาน (CM)

รหัสงาน : FPI/FRP-W		รายชื่อช่างเทคนิคประจำเครื่อง	
รหัส	TL-M001-R001Z81C00S001176-FPI/FRP-0	1	
เลขที่ใบงาน	002 : FRP Electric Motor	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-014/08/2023	5	
วันที่ปฏิบัติงาน	15/08/2023	6	
ชื่ออาคาร	TL-33	ชื่อผู้ควบคุมงาน	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (รหัสเครื่อง: 60)
		ดี	ผิดปกติ	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ดี	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจเช็คสวิตช์	/		
5	ตรวจเช็คสาย BATTERY	/		
6	ตรวจเช็คความแรงสายพ่วงของ BATTERY	/		
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/		
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/		
10	ตรวจเช็คถังดับเพลิง PUMP	/		
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/		
12	ตรวจเช็คระบบควบคุมความเร็วรอบ	/		
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	/		
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	/		
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	/		
	ความเร็วรอบ.....RPM	/		
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง.....PSI	/		
	แรงดันน้ำออกเครื่อง.....PSI	/		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	/		
	แอมป์.....AMP	/		
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คสาย BATTERY	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์เครื่อง	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/		

บริษัท พลัส อีพ็อเพอร์ตี จำกัด
 ทางหลวงรัช Fire Pump - ประจวบคีรีขันธ์

วัสดุ : FP/FRP-W

รหัส TLJJ-001-1/Z00000S00014-FP/FP-0001 ;

FRP

เลขที่ใบพิน WO-012/08/2023

วันที่ 15/08/2023

ชื่ออาคาร

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1

5

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจได้/ไม่ได้)
		สี	นิ้ว	อาการอื่น	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คความดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....5.0.....ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คหัวเทียนหัวจ่ายของ BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/			
8	ตรวจเช็คหัวฉีดหัวจ่าย	/			
9	ตรวจเช็คหัวฉีดหัวจ่าย	/			
10	ตรวจเช็คหัวจ่าย PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	/			
	หัวเร่งลมเข้า.....PSI	/			
	หัวเร่งลมเข้าของ.....PSI	/			
	ความถี่รอบ.....RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F	/			
	แอมป์สตร.....AMP	/			
	หัวปั๊มทำงาน.....PSI	/			
	CONTROL	/			
1	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คหัวเทียน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/			

PLUS +

บริษัท พัสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การขอราคา Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

संलग्न : फ़ॉर्म-ए

รหัส TL-JJ-001-Rod/281D00S00175-FP/JP-00

02:JP-ROOF

เลขที่ใบงบท WO-015/05/2023

วันที่ปฏิบัติงาน 15/08/2023

ชื่อยา TL-25

รายชื่อพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน

2

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติ: ๕๐๐)
		ดี	มีปัญหา	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบลักษณะภายนอก MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบฉนวนหุ้มสาย MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบฉนวนหุ้มสาย PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำอีกจุด.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ในตู้ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบฉนวน FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

CONCLUSION

บันทึกผลตรวจทางปัสสาวะ

1. ปกป้องงานเกษตรหรือภัยอันตราย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สารบรรณ Jody Pump - ประจักษ์ปกาศ์

รหัสงาน : FPI/P-W	งานซ่อมบำรุงงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1/20000000014-FPI/P-0001 :	1
JP-1	3
เลขที่ใบงาน WO-013/06/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน 19/06/2023	6
ชื่ออาคาร TL - 33	ชื่อผู้

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ข้อบกพร่อง, ฯลฯ)
		ดี	ไม่ใช่	อย่างไร	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/			
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	/			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	/			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
2	ตรวจสอบฟิวส์ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ที่ SET.....AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจสอบ SHOW	/			
7	ตรวจสอบแรงดัน R.S. 3.0 S.T. 3.0 T. 3.0	/			
8	ตรวจสอบกระแส R.S. 3.0 S.T. 3.0 T. 3.0 AMP	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			

หน้า ๑

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : FP/JP-W	
รหัส	TL-JJ-001-1Z0000080014-FP/JP-0001 :
เลขที่ใบงาน	JP-1
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-018/06/2323
วันที่ปฏิบัติงาน	22/06/2023
ชื่ออาคาร	TL-JJ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีขอแก้ไข : คม)
		ค	อาการเสีย		
			แก้ไข		
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการเดินของมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....2.60.....PSI	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดต่อภายใน CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่า SET.....13.5 AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S 37.5 V.T.R. 37.5 VOLT	✓			
8	ตรวจสอบค่าแรงดัน R.X.C. s...จ. 2 .T. 8 .AMP	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ CONTROL	✓			

ผู้เขียนเอกสาร

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งช่างซ่อมเครื่อง (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W	
รหัส	TL-JJ-001-R00231 D00S001175-FP/FRP-0
เลขที่ใบงาน	WO-019/06/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	22/06/2023
ชื่ออาคาร	TL-JJ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีกรณ: 60)
		ที่	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
2	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
3	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
4	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
5	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
6	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
7	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
8	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
9	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
10	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
11	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
12	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
13	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	-			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท.....ลิตร	-		</	

หน้างานปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเทนท์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ Jockey Pump - ประตูน้ำ

รหัสงาน : FP/PJP-W

รหัส : TL-JJ-001-Rev/281D00S001175-FP/JJP-00

เลขที่ใบงาน : 02-JP-HOOF

วันที่ปฏิบัติงาน : WO-020/06/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 22/06/2023

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1

3

5

6

ชื่ออาคาร

7-55

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุม MOTOR CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบชุดควบคุม FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบชุดควบคุม PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบชุดควบคุม OVER LOAD SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบชุดควบคุม SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....T.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบชุดควบคุม CONTROL	✓		

หมายเหตุ

1. ตรวจไม่พบปัญหา

หน้างานปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
ช่างตรวจเช็ค Generator - ประจำพื้นที่

รหัสงาน : RE/GEN-W	
รหัส	TL-JJ-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน	: GEN
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-016/06/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	22/06/2023
ชื่ออาคาร	7L-33
ชื่อผู้ตรวจ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ก	ข	
	ตรวจสอบเครื่อง			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 400	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
14	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
1	เวลา START 10.00 STOP 10.10	✓		
2	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง 30° F	✓		
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 47° F	✓		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.8 PSI	✓		
6	แรงดันน้ำดับเพลิง 6.8 PSI	✓		
7	รับผลการทำงาน START 10.10 STOP 10.10 HOUR	✓		
1	ตรวจสอบ GFC	✓		
1	ตรวจสอบ R.S. 398 S.T. 399 T-R 397 VOLT	✓		
2	ความถี่ 50.0 HZ	✓		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
ช่างตรวจเช็ค Generator - ประจำพื้นที่

รหัสงาน : RE/GEN-W	
รหัส	TL-JJ-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน	: GEN
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-016/06/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	22/06/2023
ชื่ออาคาร	7L-33
ชื่อผู้ตรวจ	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ก	ข	
3	วัดอุณหภูมิ R.....S.....T.....AMP	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓		
5	วัดแรงดัน BATTERY.....AMP	✓		
6	รับผลการทำงาน START 10.10 STOP 10.10 HOUR	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยต้องแก้ไขอีก (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตาขวางวงจรีต Jocky Pump - ประจักษ์ศิลปาคม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สารพชรวงษ์ Fine Pump - ประจักษ์ปัทนะ

รหัสงาน : FPI/PJ-4W	
รหัส TL-M-001-1ZD0D0S00014-FPI/PJ-0001 :	
JP-1	
เลขที่ใบงาน WO-026008/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน 23กย๖2023	
ชื่ออาจารย์ ทล-จย	รายนามผู้สอน 1 3 5 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ที่	วันที่	สถานะ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR				
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR				
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP				
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP				
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ PSI				
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำ PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL				
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL				
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH				
4	ตรวจสอบ OVER LOAD SET 11.5 AMP				
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL				
6	ตรวจสอบ SHOW				
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S-VOLTS 230V				
8	ตรวจสอบแรงดัน R-S-VOLTS 7.9 AMP				
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL				

WILEY

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัสงาน : FP/FRP-W
รหัส : TL-JJ-001-Roc/Z3100S001175-FRFP-0	รหัส : TL-JJ-001-Roc/Z3100S001175-FRFP-0	รหัส : TL-JJ-001-Roc/Z3100S001175-FRFP-0
ชนิด : FRP Electric Motor	ชนิด : FRP Electric Motor	ชนิด : FRP Electric Motor
เลขที่งาน : WO-027/06/2023	เลขที่งาน : WO-027/06/2023	เลขที่งาน : WO-027/06/2023
วันที่เปิดรับ : 23/08/2023	วันที่เปิดรับ : 23/08/2023	วันที่เปิดรับ : 23/08/2023
ชื่ออาคาร : TL-55	ชื่ออาคาร : TL-55	ชื่ออาคาร : TL-55

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีหรือข้อบกพร่อง)
		ที่	วันที่	รายการ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง.....ลิตร	—			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	—			
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาฉีด	—			
4	ตรวจสอบสภาพ	—			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	—			
6	ตรวจสอบค่าความถี่จำเพาะของ BATTERY	—			
7	ตรวจสอบสภาพของเข็มวัด	—			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	—			
9	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	—			
10	ตรวจสอบสัญญาณ PUMP	—			
11	ตรวจสอบ MANUAL START	—			
12	ตรวจสอบระบบควบคุม	—			
13	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและ PUMP	—			
	หัวฉีดน้ำมัน.....PSI	—			
	หัวฉีดน้ำยาฉีด.....PSI	—			
	ความเร็วรอบ.....RPM	—			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	—			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....PSI	—			
	อุณหภูมิไอน้ำมัน.....F	—			
	แอมป์.....AMP	—			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	—			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสัญญาณ BATTERY	—			
2	ตรวจสอบสัญญาณเตือน	—			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	—			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จจนถึงห้องเครื่อง (CM)

PLUS +

บริษัท พลัง พริทเพอร์มิตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : REGEN-W	รหัส : TL-J-001-120000050010-REGEN-0001	รวมเช็กลบลงเมื่อมีดังนี้
เลขที่ใบงาน : GEN	WO-024/06/2023	1 2
วันที่ปฏิบัติงาน : 28/06/2023		3 4
		5 6
ชื่ออาคาร : T2-55	ชื่อผู้ควบคุม :	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (สำหรับข้อ 4, 5, 6)
		ดี	บกพร่อง	
1	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง ... 40.0 ลิตร	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำยา	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำยา BATTERY	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
14	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
15	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
1	เวลา START ... 10.00 STOP ... 10.40 น.	/		
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง ... 70.5 °C	/		
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง ... 47.5 °C	/		
4	ความเร็วรอบ ... 1800 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ... PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น ... PSI	/		
7	ชั่วโมงการทำงาน START ... 11:00 STOP ... 11:00 HOUR	/		
1	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังของ BATTERY	/		

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัสผู้ควบคุม
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000GS00010-RE/GEN-0001	
เลขผู้保管 : GEN	1
WO-024/06/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน 29/08/2023	5
	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ (ถ้ามีหรือข้อบกพร่อง)
		ดี	ไม่ดี	
3	วัดแรงดัน R.....S.....T.....AMP			
4	ตรวจเช็คโคมไฟรถทำงาน			
5	วัดไฟฟ้า BATTERY.....AMP			
8	ตั้งไมเตอร์ทำงาน START..... <u>17</u> STOP..... <u>21</u> HOUR			

CHALLENGE

ผู้บัญชาการกองทัพบก

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานประจำโครงการ
รหัส	1
เลขที่ใบงาน	3
วันที่ปฏิบัติงาน	5
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : งด)
		สี	บันทึก	ตรวจเช็ค	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง..... <u>850</u> ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อไอน้ำ	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างทางของ BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องย่นแต่ละ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า..... <u>2.5</u> PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก..... <u>2.5</u> PSI	/			
	ความเร็วรอบ..... <u>3400</u> RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง..... <u>6.0</u> PSI	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น..... <u>6-7</u> PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น..... <u>75</u> F	/			
	แอมป์โดย..... <u>0.32</u> AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน..... <u>1940</u> ชม.	/			
	CONTROL	/			
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ PRV	/			

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งเอกสาร (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ Jocky Pump - ฝั่งซ้ายฝั่ง

PLUS +

รหัสงาน : FPI/P-W	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J-001-RooF/281D09001175-FPI/P-00	1
เลขที่ใบงาน : 02 : JP-ROOF	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-025082023	5
วันที่ปฏิบัติงาน : 28/05/2023	4
	6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	—		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	—		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	—		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	—		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	—		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	—		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	—		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่าที่ SET AMP	—		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	—		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....T.R.....VOLT	—		
8	ตรวจสอบแรงดัน R.....S.....T.....AMP	—		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งเอกสาร (CM)

รายละเอียด : FP/JP-W		รายละเอียด : Jockey Pump	
รหัส	TL-JJ-001-Roc428-1005001175-FP/JP-00	รหัส	TL-JJ-001-1Z00000500010-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน	02 : JP-ROOF WO-02007/2023	เลขที่ใบงาน	WO-01607/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	27/07/2023	วันที่ปฏิบัติงาน	27/07/2023
ชื่ออาคาร	TL-33	ชื่ออาคาร	TL-33

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (กรณีพบข้อบกพร่อง)
		ก	ข	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MOTOR	-		
2	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ MOTOR	-		
3	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	-		
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PSI	-		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	-		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	-		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET AMP	-		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ R.S. 240V	-		
8	ตรวจสอบการทำงานของ R.S. 240V	-		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

หมายเหตุ

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

รายละเอียด : RE/GEN-W		รายละเอียด : Generator	
รหัส	TL-JJ-001-1Z00000500010-RE/GEN-0001	รหัส	TL-JJ-001-1Z00000500010-RE/GEN-0001
เลขที่ใบงาน	WO-01607/2023	เลขที่ใบงาน	WO-01607/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	27/07/2023	วันที่ปฏิบัติงาน	27/07/2023
ชื่ออาคาร	TL-33	ชื่ออาคาร	TL-33

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (กรณีพบข้อบกพร่อง)
		ก	ข	
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
2	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
3	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
4	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
5	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
6	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ BATTERY	-		
7	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ MANUAL START	✓		
8	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
9	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
10	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
11	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
12	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
13	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
14	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
15	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ			
1	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
2	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
3	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
4	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
5	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
6	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
7	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ			
1	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		
2	ตรวจสอบสวิตช์การทำงานของ	✓		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : REGEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00000S00010-REGEN-0001	1 [REDACTED] 2
เลขที่ใบงาน : GEN	3 [REDACTED] 4
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01807/2023	5 [REDACTED] 6
ชื่ออาคาร : TL-W	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	เสีย	
3	วัดกระแส R.....S.....T.....AMP	✓		
4	ตรวจสอบไฟเตือนการทำงาน	✓		
5	โหลด BATTERY.....AMP	✓		
8	อ่านค่าการทำงาน START.....STOP.....HOUR	✓		

รวมรวม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อบกพร่อง (CM)

งานประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z00000500010-RE/GEN-0001	1 [REDACTED]
เครื่องที่ใช้งาน : GEN	3 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01/10/2023	5 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 2007/2023	6 [REDACTED]
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม
TL-33	[REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : ก.ค)
		สี	รายการ	
	ตรวจสอบเครื่อง			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 390	/		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
5	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
6	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
7	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
8	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
9	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
12	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
14	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
15	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		
1	เวลา START 15:40 STOP 16:00	/		
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 30 °C	/		
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 40 °C	/		
4	ความเร็วรอบ 1200 RPM	/		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.8 PSI	/		
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น 6.8 PSI	/		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 15:40 STOP 16:00	/		
	ตรวจสอบ GFC	/		
1	ตรวจสอบ R-S 299 S-T 299 T-R 299	/		
2	ความถี่ 50.0 HZ	/		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

บริษัท เทคส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทางหลวงเห็กไฟ Pump - ประจักษ์ศิลปาคม

รหัสงาน : FP/FRP-W

954 TL-JJ-001-1/200D00S00014-FP/FRP-0001:

FRP

WO-012/07/2023

20/07/2023

1983

TL-55

အခြေခံအားဖြည့်ဆည်းပေးရန်

๑. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	บันทึก	รายการ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง.....liters	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหม้อไอน้ำ	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบค่าความถี่สัญญาณ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจสอบสภาพท่อ	✓			
9	ตรวจสอบสภาพท่อ	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมัน PUMP	✓			
11	ตรวจสอบเครื่องยนต์ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบเครื่องยนต์ MANUAL START	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ PUMP	✓			
	อุณหภูมิในถัง.....PSI	✓			
	อุณหภูมิในถัง.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	ระดับน้ำในถัง.....PSI	✓			
	ระดับน้ำในถัง.....PSI	✓			
	อุณหภูมิในถัง.....F	✓			
	อุณหภูมิในถัง.....AMP	✓			
	อุณหภูมิในถัง.....	✓			
	อุณหภูมิในถัง.....	✓			
	CONTROL	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเซนเทอส์ จำกัด
การตรวจเช็ค Jody Pump - ประจำปีที่

รหัสงาน : FP/JP-W	รหัส	รายงานโดยช่างประจำตัว
TL-JJ001-1200000000014-FP/JP-0001 :	1	
JP-1	3	
เลขที่ใบงาน WO-01307/2023	4	
วันที่ปฏิบัติงาน 20/07/2023	5	
ชื่ออาคาร TL-33	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 9.15 PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก 9.20 PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD SET 11.5 AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า R.S. 40 PSI T. 40 PSI	✓		
8	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก R.S. 40 PSI T. 40 PSI	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ต้องแก้ไข (CU)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเซนเทอส์ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำปีที่

รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัส	รายงานโดยช่างประจำตัว
TL-JJ001-R00720000000175-FP/FRP-0	1	
D02 : FRP Electric Motor	3	
เลขที่ใบงาน WO-01407/2023	4	
วันที่ปฏิบัติงาน 20/07/2023	5	
ชื่ออาคาร TL-33	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	รายการ	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	✓		
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓		
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓		
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
	แรงดันไฟฟ้า.....PSI	✓		
	แรงดันไฟฟ้า.....PSI	✓		
	อุณหภูมิ.....F	✓		
	แอมแปร์.....AMP	✓		
	ค่าโมเมนต์.....NM	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓		

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

PLUS +

บริษัท พลิัส พรีมียมส์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ Jody Pump - ประตูน้ำ

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J-001-Rod/ZB1D00S001175-FP/JP-00	1
ชื่อ : JP-ROOF	3
เลขที่งาน : WO-01407/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 20/07/2023	5
ชื่ออาคาร : 7-55	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ (ถ้ามีข้อบกพร่อง)
		ที่	แก้ไข	ดำเนินการ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	-			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	-			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	-			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ.....PSI	-			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำ.....PSI	-			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	-			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	-			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	-			
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET.....AMP	-			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	-			
7	ตรวจสอบแรงดัน RS.....S-I.....T-R.....VOLT	-			
8	ตรวจสอบแรงดัน RS.....S-I.....T-R.....AMP	-			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	-			

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

PLUS +

บริษัท พลิัส พรีเทคโพรตี จำกัด
สำนักงานเครื่อง Generator - บ้านลำโพง

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-006/07/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 13/07/2023	5
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : ข้อ)
		สี	รายการ	
3	ตรวจสอบ R.....S.....T.....AMP	✓		
4	ตรวจสอบค่าแรงดันการทำงาน	✓		
5	Isertia BATTERY..... AMP	✓		
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....2.3.....HOUR	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและส่งข้อมูล (CM)

PLUS +

บริษัท พลิัส พรีเทคโพรตี จำกัด
สำนักงานเครื่อง Generator - บ้านลำโพง

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1Z0000000010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน WO-006/07/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 13/07/2023	5
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรแจ้ง : ข้อ)
		สี	รายการ	
1	ตรวจสอบเครื่องหลัก	✓		
2	ระบบป้องกันเครื่องหลัก 990...Hz	✓		
3	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
4	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
5	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
6	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
7	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
8	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
9	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
10	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
11	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
12	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
13	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
14	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
15	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
1	เวลา START 14.00 STOP 14.30	✓		
2	อุณหภูมิเครื่องหลัก 33.....F	✓		
3	อุณหภูมิเครื่องหลัก 13.....F	✓		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเครื่อง PSI	✓		
6	แรงดันน้ำมันเครื่อง 6.3.....PSI	✓		
7	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....2.3.....HOUR	✓		
1	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันเครื่องหลัก	✓		

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (CM)

WC-009/07/2023 Page 2 of 2

รหัสผ่าน : FP/JP-W	
รหัส	TL-JJ-401-RodZB1CD05901175-FP/JP-00
เลขที่ใบงาน	02 : JP-ROOF
วันที่ปฏิบัติงาน	WD-01/06/2023
	13/07/2023
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ให้กรอกใน : ๕๐๒)
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR AND PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันอากาศ.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบค่า FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่า SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบค่า SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบกระแส R.....S.....T.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

BRANDOLINI

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จรายงานถึงผู้ต้องงาน (CMH)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเซพเตอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TL-JJ-001-1200D00S0010-RE/GEN-0001	รายงานผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : WO-001/07/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 06/07/2023	1 2 3 4 5 6
ชื่ออาคาร : 106.เค.เค. อีทีกูฟ-ชมรม	ชื่อผู้ควบคุม :	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ผิดปกติ, ผิด)
		ดี	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบเครื่อง	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
14	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
1	เวลา START 10:00 STOP 10:10	✓		
2	อุณหภูมิเครื่องยนต์ 93 F			
3	อุณหภูมิเครื่องยนต์ 63 F			
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 1.2 PSI			
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 1.2 PSI			
7	ชั่วโมงการทำงาน START 10:00 STOP 10:10 HOUR			
1	แรงดัน R.S. 120V S.T. 120V T.R. 120V VOLT			
2	ความถี่ 50 HZ			

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเซพเตอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W	รหัส : TL-JJ-001-1200D00S0010-RE/GEN-0001	รายงานผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน : WO-001/07/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 06/07/2023	1 2 3 4 5 6
ชื่ออาคาร : 106.เค.เค. อีทีกูฟ-ชมรม	ชื่อผู้ควบคุม :	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ผิดปกติ, ผิด)
		ดี	ผิดปกติ	
3	วัดกระแส R.....S.....T..... AMP			
4	ตรวจสอบระดับน้ำ			
5	ตรวจสอบระดับน้ำ			
6	ชั่วโมงการทำงาน START 09:00 STOP 09:00 HOUR			

บริษัท พลัส พรีเซพเตอร์ จำกัด

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W

715 TL-JJ-001-1/200000S00014-FP/FP-0001:

599

เลขที่ใบงาน WO-002/07/2023

วันที่ ๐๖/๐๗/๒๐๒๓

noPrimer

ข้อดีความค

77-55

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

1. ปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-00207/2023 Page 2 of 2

ลำดับ	รายการ	ส	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรบันทึก)
			บันทึก	รายการ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง... 5.0 ลิตร	/			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจสอบสายพาน	/			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจสอบค่าความถี่การทำงานของ BATTERY	-			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	/			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/			
9	ตรวจสอบสายพานพานท้าย	/			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมัน PUMP	/			
11	ตรวจสอบระดับน้ำมัน MANUAL START	/			
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันระบบหล่อเย็น	/			
13	ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า..... PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก..... PSI	/			
	ความเร็วรอบ..... RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง..... PSI	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น..... PSI	/			
	อุณหภูมิพัดลมหล่อเย็น..... F	/			
	แอมป์กระแส..... AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน..... ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ BATTERY	/			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	/			
3	ตรวจสอบการทำงานของระบบ PRV	/			

บริษัท พัสต พรีฟอเมอร์รี่ จำกัด
 ทางหลวงจีน Jockey Pump - ประจักษ์

บริษัท พลัส เทคเนอโลยี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FPI/P-PW	รหัส : TL-J4-001-1/2000D00S00014-FPI/P-0001 : JP-1	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
เลขที่ใบงาน	WO-000307/2023	5
วันที่ปฏิบัติงาน	06/07/2023	3
		4
		5
		6
ชื่ออาคาร	72-33	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ : ระบุ)
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ (MOTOR) PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ 0.15 PSI	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันอากาศ 0.50 PSI	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของวาล์ว CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะของ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD สำหรับ SET 2 AMP	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S-E-T 0.9 VOLT	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R 0.9 A	✓			
9	ตรวจเช็คค่าของ CONTROL	✓			

CHAPTER 1

บันทึกผลตรวจสุขภาพ

1. ภารกิจงานเสด็จเยือน

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จมอบสิ่งของที่ส่งมอบ (CM)

รหัสงาน : FPI/FRP-W	รหัสงาน : FPI/FRP-W
รหัส : TL-J4001-RodZM/D06S001176-FPI/FRP-Q	รหัส : TL-J4001-RodZM/D06S001176-FPI/FRP-Q
เลขที่ใบงาน : 002 : FRP Electric Motor	เลขที่ใบงาน : 002 : FRP Electric Motor
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-004/07/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : WO-004/07/2023
ชื่ออาคาร : TL-33	ชื่ออาคาร : TL-33
ชื่อผู้ควบคุมงาน : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุมงาน : [REDACTED]
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : [REDACTED]	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีข้อบกพร่อง : คย)
		สี	น้ำเขียว	อากาศเย็น	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง.....สีฟ้า	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างตู้ล้าง	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหมึก	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบระดับความดันน้ำประปาของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องแม่	✓			
8	ตรวจสอบระดับอากาศในตู้	✓			
9	ตรวจสอบระดับอากาศในตู้	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้ PUMP	✓			
11	ตรวจสอบระดับ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องของตู้แม่และ PUMP	✓			
	ระดับน้ำในตู้.....PSI	✓			
	ระดับน้ำในตู้แม่.....PSI	✓			
	ความดัน.....RPM	✓			
	ระดับน้ำในตู้แม่.....PSI	✓			
	ระดับน้ำในตู้แม่.....PSI	✓			
	อุณหภูมิ.....F	✓			
	อุณหภูมิ.....AMP	✓			
	จำนวนการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบระดับน้ำ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แม่	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำในตู้แม่ PUV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนถัดไป (CM)

PLUS +

บริษัท สหชัย หรือเอสซี จำกัด
โครงการเจ็ดวัน Jody Pump - ปรังสีใต้

รหัสงาน : FP/JP-W	งานซ่อมบำรุงระบบ
รหัส : TL-JJ-001-Koel/261D005001175-FP/JP-00	1
02 : JP-ROOF	3
เลขที่ใบงาน WJ-005007/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 06/07/2023	5
ชื่อรายการ TL-33	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	เสีย	รายการแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD 44 SET AMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....T.R.....VOLT	✓			
8	ตรวจสอบแรงดัน R-S.....T.R.....AMP	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			

WJ-00310

WJ-00310

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนถัดไป (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีมเทคส์ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำปี

รหัสงาน : FP/FRP-W		รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน	
รหัส	TL-JJ-001-1Z0000800014-FP/FRP-0001 :	1	2
รหัส	FRP	3	4
รหัส	WO-017082023	5	6
วันที่ปฏิบัติงาน	24/08/2023		
ชื่ออาคาร	ตู้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (กรณีตรวจไม่ผ่าน)
		สี	รายการ	
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 15.5 ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	✓		
10	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MANUAL START	✓		
12	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓		
13	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓		
	วัดแรงดันน้ำเข้า 0 PSI	✓		
	วัดแรงดันน้ำออก 30 PSI	✓		
	ความเร็วรอบ 2400 RPM	✓		
	แรงดันน้ำดับเพลิง 60 PSI	✓		
	แรงดันน้ำดับเพลิง 60 PSI	✓		
	อุณหภูมิห้อง 60 F	✓		
	แอมแปร์ 1.5 AMP	✓		
	ชั่วโมงการทำงาน 12 ชั่วโมง	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คการทำงานของ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓		

รหัสงาน : PP/JP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-U-001-RooFZB1D00S001175-PP/JP-00	1 2
02 : JP-ROOF	3 4
เลขที่ใบงาน : WO-02008/2023	5 6
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/08/2023	
ชื่ออาคาร : 106 / โรงแรมโรสฮิลล์	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรใส่ : คม)
		ผ่าน	ตกงาน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันมอเตอร์ MOTOR	—		
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	—		
5	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง PSI	—		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	—		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	—		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบเช็คชุดควบคุม CONTORL	—		
2	ตรวจสอบเช็คฟิวส์ CONTROL	—		
3	ตรวจสอบเช็ค PRESSURE SWITCH	—		
4	ตรวจสอบเช็ค OVER LOAD ค่า SET.....AMP	—		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
6	ตรวจสอบเช็ค SHOW	—		
7	ตรวจสอบเช็คระดับ R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	—		
8	ตรวจสอบเช็คระดับ R.....S.....I.....AMP	—		
9	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ CONTROL	✓		

หมายเหตุ

1. ใบปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1. ใบปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ใบปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-U-001-1/20000S0001D-RE/GEN-0001	1 2
GEN	3 4
เลขที่ใบงาน : WO-01808/2023	5 6
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/08/2023	
ชื่ออาคาร : 106 / โรงแรมโรสฮิลล์	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรใส่ : คม)
		ผ่าน	ตกงาน	
	ตรวจสอบเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ...HZ.....ลิตร	✓		
2	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
3	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
4	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
5	ตรวจสอบเช็คสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบเช็คสภาพแบตเตอรี่	—		
7	ตรวจสอบเช็ค MANUAL START	✓		
8	ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓		
9	ตรวจสอบเช็คระบบเบรกความถี่	✓		
10	ตรวจสอบเช็คความถี่	✓		
11	ตรวจสอบเช็คความถี่	✓		
12	ตรวจสอบเช็คความถี่	✓		
13	ตรวจสอบเช็คสภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓		
14	ตรวจสอบเช็คสภาพการทำงานของ ATS	✓		
15	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
	ตรวจสอบเช็คการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
1	เวลา START ...STOP ...HZ.....ม.	✓		
2	อุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิง ...°C.....°F	✓		
3	อุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิง ...°C.....°F	✓		
4	ตรวจสอบเช็ค ...RPM	✓		
5	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ...PSI	✓		
6	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ...PSI	✓		
7	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ START ...STOP ...HOUR	✓		
	ตรวจสอบเช็ค GPC			
1	ตรวจสอบเช็ค R-S ...-S-T ...-R ...VOLT			
2	ตรวจสอบเช็ค ...HZ			

PLUS +

บริษัท พลัง หรือเพอร์ส จำกัด
โครงการโรงผลิต Generator - ปรังสีน้ำท่า

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-128000060010-RE/GEN-0001	1 [REDACTED] 2
เลขที่ใบงาน : GEN	3 [REDACTED] 4
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01/08/2023	5 [REDACTED] 6
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/08/2023	
ชื่ออาคาร : (6) โรงผลิตพลังงาน	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	รายการ	
3	วัดกระแส R.....S.....I.....AMP	✓		
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓		
5	วัดค่าแรงดันไฟฟ้า	✓		
6	ดำเนินการทำงาน START.....STOP.....HOUR	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัง หรือเพอร์ส จำกัด
โครงการโรงผลิต Jacky Pump - ปรังสีน้ำท่า

รหัสงาน : PJ/P-W	รายชื่อผู้ควบคุม
รหัส : TL-JJ-001-120000050010-PJ/P-0001	1 [REDACTED] 2
เลขที่ใบงาน : PJ-1	3 [REDACTED] 4
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01/08/2023	5 [REDACTED] 6
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/08/2023	
ชื่ออาคาร : (6) โรงผลิตพลังงาน	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR AND PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า.....PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า.....PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบชุดควบคุม FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบชุด PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบชุด OVER LOAD ที่ SET.....AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบชุด SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S-T.....VOLT	✓		
8	ตรวจสอบกระแส R-S-T.....AMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CM)

บริษัท พลัส ฟิล์ม เทอร์โมฟิล์ม จำกัด
ดำรงตระเวนเซ็ท Fire Pump - ประจักษ์โดย

CCUW 000176 11/18/01

34

8 50

ชื่อผู้รายงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ (ถ้ามี: ๑๖)
		ก	ข	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓		
2	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาแบตเตอรี่	✓		
4	ตรวจสอบลมยาง	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบค่าความจุไฟฟ้าของ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓		
8	ตรวจสอบอุณหภูมิ	✓		
9	ตรวจสอบสภาพปั๊ม	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
11	ตรวจสอบ MANUAL START	✓		
12	ตรวจสอบระบบเบรก	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม PUMP	✓		
	วัดแรงดันน้ำ.....PSI	✓		
	วัดแรงดันลม.....PSI	✓		
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
	แรงดันน้ำในระบบ.....PSI	✓		
	แรงดันน้ำในระบบ.....PSI	✓		
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....F	✓		
	แอมป์.....AMP	✓		
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการชาร์จ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PCV	✓		

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W		งานซ่อมบำรุงตามรอบปฏิบัติงาน	
รหัส	TL-U-001-1Z00D00S00010-RE/GEN-0001	1	
เลขที่ใบงาน	WO-01/03/2023	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	17/08/2023	5	
ชื่ออาคาร	100/105 อาคาร 105-105-105	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อลื่น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
6	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
8	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
9	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
12	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
13	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
14	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓		
1	เวลา START...STOP...HOUR	✓		
2	อุณหภูมิในเครื่อง...°C	✓		
3	อุณหภูมิในเครื่อง...°C	✓		
4	ความเร็วรอบ...RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...PSI	✓		
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...PSI	✓		
7	ชั่วโมงการทำงาน START...STOP...HOUR	✓		
1	การชาร์จ GPC	✓		
2	การชาร์จ RS...VOLT	✓		

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : RE/GEN-W		งานซ่อมบำรุงตามรอบปฏิบัติงาน	
รหัส	TL-U-001-1Z00D00S00010-RE/GEN-0001	1	
เลขที่ใบงาน	WO-01/08/2023	3	
วันที่ปฏิบัติงาน	17/08/2023	5	
ชื่ออาคาร	100/105 อาคาร 105-105-105	ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		สี	หมายเหตุ	
3	วัดกระแส R...S...T...AMP	✓		
4	ตรวจสอบค่าไฟแสดงการทำงาน	✓		
5	ตรวจสอบ BATTERY...AMP	✓		
6	ชั่วโมงการทำงาน START...STOP...HOUR	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นทั้งเครื่อง (CM)

บริษัท พลัส ทริอเพอร์รี่ จำกัด
 ธารารังหลวงเจ็ด Jacky Pump - ประจักษ์ปทุม

บริษัท พัลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพารวเจอร์ Fire Pump - ประจักษ์ป๋าน

รหัสงาน : FP/JUP-W	
รหัส : TL-JJ-001-1IZ00D00S00014-FP/JUP-0001 :	
JUP-1	1
เลขสำเนา : WO-0130892023	3
วันที่รับใช้ : 17/08/2023	5
	6
ชื่ออาคาร : บต./ค.วัดกัลยาณมิตร-บางพลี	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED]

รหัสงาน : FP/FRP-W	รหัสงาน : FP/FRP-W
รหัส	รหัส
TL-J-001-Rod281D00S001175-FP/FRP-Q	TL-J-001-Rod281D00S001175-FP/FRP-Q
002 : FRP Electric Motor	002 : FRP Electric Motor
เลขที่ใบรวม	เลขที่ใบรวม
WO-014408/2023	WO-014408/2023
วันที่ปฏิบัติงาน	วันที่ปฏิบัติงาน
17/08/2023	17/08/2023
ชื่อสถานที่	ชื่อสถานที่
100/101 อู่ซ่อมรถ - มอช.จก	100/101 อู่ซ่อมรถ - มอช.จก

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ผลการตรวจ		ความเห็น	
		ดี	ไม่		
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	/			
2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ PUMP	/			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า.....PSI	/			
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า.....PSI	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
2	ตรวจสอบสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจสอบ PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจสอบ OVER LOAD SET 11.5 AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจสอบ MATH SHOW	/			
7	ตรวจสอบแรงดัน R.S.....VOLT	/			
8	ตรวจสอบแรงดัน R.T.....AMP	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			

НАПИСАНИ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

WD-013/08/2023 Page 1 of 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีข้อบกพร่อง: ระบุ)
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง.....ดี	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำเบรค.....	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น.....	✓			
4	ตรวจเช็คลมยาง.....	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY.....	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความดันลมยางของ BATTERY.....	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์.....	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ไฟ.....	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์เบรค.....	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ PUMP.....	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START.....	✓			
12	ตรวจเช็คระบบเบรค.....	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP.....	✓			
	วัดแรงดันน้ำ.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	เบรคมือ.....PSI	✓			
	เบรคเท้า.....PSI	✓			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....F	✓			
	แอมป์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY.....	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเบรค.....	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV.....	✓			

ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ใบปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ใบปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนส่งถึงห้องปฏิบัติการ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเซนส์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ Jockey Pump - ประตูน้ำ

หน้างาน : FP/JP-W	รายชื่อช่างที่ลงมือปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ001-Roo/2B1D00S001176-FP/JP-00	1
เลขที่ใบงาน : 02-JP-ROOF	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-015/08/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 17/08/2023	5
ชื่ออาคาร : No. 15 อาคาร 15 - 15	ชื่อผู้ควบคุม :

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	ไม่ผ่าน	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP		✓	
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ PSI	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD SET AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ R.S. S.T. T.R. VOLT	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ R. S. I. AMP	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		

หน้าหน้า

1. ใบปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ใบปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ใบปฏิบัติงานแล้วเสร็จจนส่งถึงห้องปฏิบัติการ (CM)

PLUS +

บริษัท พริตทเพอร์รี่ จำกัด
ช่างตรวจเช็ค Generator - ประจำช่าง

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-UJ-001-1Z00000500010-RE/GEN-0001	1
เครื่อง : GEN	3
เลขที่ใบงาน WO-008/08/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 10/08/2023	5
ชื่ออาคาร 1001 1001 1001 1001 1001 1001	6
ชื่อผู้ควบคุมงาน	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีรหัส; 50)
		ดี	มีปัญหา	
1	ตรวจสอบเครื่อง	✓		
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 32.0 ลิตร	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเลี้ยง	✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
7	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ BATTERY	✓		
8	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ MANUAL START	✓		
9	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ	✓		
10	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ	✓		
11	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ	✓		
12	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ	✓		
13	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ	✓		
14	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ	✓		
15	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ	✓		
1	เวลา START 14.08 STOP 14.10	✓		
2	อุณหภูมิห้องเครื่อง 83.9 F	✓		
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง 83.9 F	✓		
4	ความเร็วรอบ 1500 RPM	✓		
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI	✓		
6	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง PSI	✓		
7	ชั่วโมงการทำงาน START 14.10 STOP 14.10 HOUR	✓		
1	ตรวจสอบ GPC	✓		
2	ตรวจสอบ R.S. 500 T 500 VOLT	✓		
3	ตรวจสอบ 500 KZ	✓		

PLUS +

บริษัท พริตทเพอร์รี่ จำกัด
ช่างตรวจเช็ค Generator - ประจำช่าง

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-UJ-001-1Z00000500010-RE/GEN-0001	1
เครื่อง : GEN	3
เลขที่ใบงาน WO-008/08/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน 10/08/2023	5
ชื่ออาคาร 1001 1001 1001 1001 1001 1001	6
ชื่อผู้ควบคุมงาน	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีรหัส; 50)
		ดี	มีปัญหา	
3	ตรวจสอบ R.S. 500 T 500 AMP	✓		
4	ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของ	✓		
5	ตรวจสอบ BATTERY 12 AMP	✓		
6	ชั่วโมงการทำงาน START 14.10 STOP 14.10 HOUR	✓		

หมายเหตุ

ผู้เขียนเอกสาร

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พาวเวอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Jokey Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FP/JP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
วันที่ : TL-J-001-1200D00300014-FP/JP-0001 : JP-1	1
เลขที่ใบงาน : WO-008/08/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/08/2023	5
ชื่อรายการ : 72-77	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : ก.ย)
		ดี	มีปัญหา	อย่างไร้ปัญหา	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบชื่อและขนาดมอเตอร์ MOTOR	/			
2	ตรวจสอบชื่อและกำลังของ MOTOR	/			
3	ตรวจสอบชื่อและกำลังของ PUMP	/			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจสอบชื่อและกำลังปั้มน้ำ.....PSI	/			
6	ตรวจสอบชื่อและกำลังของ.....PSI	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	/			
CONTROL					
1	ตรวจสอบชื่อและขนาดในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจสอบชื่อและขนาด FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจสอบชื่อและ PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจสอบชื่อและ OVER LOAD ค่าที่ SET $1\frac{1}{2}$ AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	/			
7	ตรวจสอบชื่อและแรงดัน R.S.....S.....T.P.....VOLT	/			
8	ตรวจสอบชื่อและแรงดัน S.....S.....T.....AMP	/			
9	ตรวจสอบชื่อและค่าในตู้ CONTROL	/			

รวมรวม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จส่งข้อมูลเข้าระบบ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พาวเวอร์ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

รหัสงาน : FFP/FP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
วันที่ : TL-J-001-1200D00300014-FFP/FP-0001 : FRP	1
เลขที่ใบงาน : WO-007/08/2023	3
วันที่ปฏิบัติงาน : 10/08/2023	5
ชื่อรายการ : 72-77	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ได้ : ระบุ)
		ผลการตรวจเช็ค		รายการอื่น	
		ดี	มีปัญหา		
ENGINE					
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
12	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์.....ดี	/			

PLUS +

บริษัท พลัง พรีมียมส์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ Jody Pump - พระราม 9

รหัสงาน : FP/JP-W	รหัส : [REDACTED]
รหัส : TL-J-001-Rom/281D0500175-FP/JP-00	
รหัส : JP-ROOF	
รหัส : WO-01008/2023	
วันที่ : 10/08/2023	
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	MOTOR & PUMP			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		

หน้า 1

หน้า 1

หน้า 1

หน้า 1

หน้า 1

รหัสงาน : FPM/JP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-ROOF/2310080001175-FPM/JP-00	1
เครื่องแบบ : JP-ROOF	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-005/08/2023	6
ชื่ออาคาร : 7L-7J	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		สี	รายการ	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—		
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	—		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	—		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	—		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	—		
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	—		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
3	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
4	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
6	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
8	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		
9	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	—		

นางสาว
นางสาว

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-1200000000010-RE/GEN-0001	1
เครื่องแบบ : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-001/08/2023	5
ชื่ออาคาร : 7L-7J	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		สี	รายการ	
	ตรวจสอบการทำงานของ			
1	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
3	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
4	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
5	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
6	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
7	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
8	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
9	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
10	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
11	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
12	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
13	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
14	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
15	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
1	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
3	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
4	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
5	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
6	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
7	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
1	ตรวจสอบการทำงานของ	—		
2	ตรวจสอบการทำงานของ	—		

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเพอแรนท์ จำกัด
การตรวจเช็ค Generator - ประจำหน่วย

รหัสงาน : RE/GEN-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-U-001-1200000S00010-RE/GEN-0001	1
เลขที่ใบงาน : GEN	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-01/08/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 03/08/2023	5
ชื่ออาคาร : TL-JJ	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรใส่: ข้อ)
		สี	รายการ	
3	วัดกระแส R S.....T.....AMP	—	รายการ	
4	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓	รายการ	
5	ไฟฟ้า BATTERY.....AMP	—	รายการ	
6	ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR	✓	รายการ	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อบกพร่อง (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พรีเพอแรนท์ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำหน่วย

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-U-001-1200000S00014-FP/FRP-0001	1
เลขที่ใบงาน : FRP	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-02/08/2023	4
วันที่ปฏิบัติงาน : 03/08/2023	5
ชื่ออาคาร : TL-JJ	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีควรใส่: ข้อ)
		สี	รายการ	
	ENGINE			
1	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง 850	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเลี้ยง	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเลี้ยง	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓		
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	✓		
6	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำประปา BATTERY	—		
7	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำ	✓		
8	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำ	✓		
9	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำ	✓		
10	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำ	✓		
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
12	ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ PUMP	✓		
	วัดแรงดันน้ำเข้า 290 PSI	✓		
	วัดแรงดันน้ำออก 125 PSI	✓		
	ความเร็วรอบ 2100 RPM	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 10 PSI	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง PSI	✓		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเลี้ยง 19 F	✓		
	แอมแปร์ 040.0 AMP	✓		
	ชั่วโมงการทำงาน 1.9 ชม.	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบแบตเตอรี่ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันน้ำ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ PRV	✓		

บริษัท พรีมียม เทคโนโลยี จำกัด

1. บริษัทงานวิศวกรรมเครื่องกล (CM)

2. บริษัทงานวิศวกรรมเครื่องกล (CM)

PLUS

บริษัท พรีมียม เทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ Jocky Pump - ประตูท่าช้าง

รหัสงาน : FP/P-JW

รหัส : TL-M-001-1/200000000014-FP/P-0001 :

รหัส : JP-1

เลขที่ใบงาน : WO-002/002/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 03/09/2023

ชื่ออาคาร : 7L-33

รายละเอียดงานแก้ไขงาน

1

3

5

4

6

ชื่อช่าง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ดี	ไม่ดี	
	MOTOR & PUMP			
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓		
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า PSI	✓		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก PSI	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ CHECK VALVE	✓		
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ FUSE CONTROL	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ PRESSURE SWITCH	✓		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD SET AMP	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓		
6	ตรวจสอบไฟ SHOW	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน R-S VOLT	✓		
8	ตรวจสอบแรงดัน R-T VOLT	✓		
9	ตรวจสอบแรงดัน S-T VOLT	✓		

หน้า ๒

บริษัท พรีมียม เทคโนโลยี จำกัด

1. บริษัทงานวิศวกรรมเครื่องกล

2. บริษัทงานวิศวกรรมเครื่องกล (CM)

รหัสงานFP/FRP-W

รหัสเครื่องจักรFRP

เลขที่ใบงานPM230900015

วันที่ปฏิบัติงาน15/09/2023

ชื่ออาคารและ ไลน์ จักรวรรดิผลิต | 1 | ส่วนกลาง | ไบร่ญ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกการเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจุ่มน้ำ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
1	ตรวจเช็คท่อจ่ายอากาศโดยดี	✓			
2	ตรวจเช็คสลับทวน	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์รีเลย์ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คระบบจ่ายแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจเช็คความดันจ่ายทางของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องแรงดันและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำขึ้นข้อเพลิง.....70....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....235....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....194....ชม.				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง.....PSI				
	แอมป์เตอร์.....0.3....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำออก.....115....PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น.....60....F				
	ความเร็วรอบ.....2400....RPM				
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อเย็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกการเสีย	
12	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นข้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นข้อเพลิง.....830....ลิตร				
13	ตรวจเช็คท่ออากาศโดยดี	✓			

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน
1. ช่างควบคุม ภาณุวิชิต

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

- รายละเอียด -
- สถานที่
- จำนวน
- การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมทั้งต้องแก้ไข (CW)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM23090035
วันที่ปฏิบัติงาน	29/09/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ ไบท์ จูเลียท พลอซิด 1 ส่วนกลาง ไบร่าญ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระบบเบรคขึ้นลิ้ง	✓			
	ตรวจเช็คระบบบันไดขึ้นลิ้ง...820...ลิตร				
4	ตรวจเช็คท่ออากาศใต้ลิ้ง	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศใต้ลิ้ง	✓			
6	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คความกว้างจานของ BATTERY		✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...230...PSI				
	ความเร็วรอบ...2400...RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก...150...PSI				
	แอมป์มอเตอร์...แอมป์				
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...60...F				
	ชั่วโมงการทำงาน...19.5...ชม.				
	แรงดันน้ำในท่อลิ้ง...PSI				
	แรงดันน้ำในลิ้งลิ้ง...60...PSI				
10	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
Signature					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวลิ้งลิ้ง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจาวลิ้ง BATTERY	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1. รณกร ภูมิศรี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สภาพ

ความดัน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (Cv)

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM23090014

วันที่เก็บผล15/09/2023

ชื่ออาคารเดอะไฮด์ อลูมิเนียม ออโต้ | ส่วนกลาง | โรงผล | โรงผล | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....25V.....แอมป์			
2	วัดกระแส	✓		
	R.....0.....แอมป์			
	S.....0.....แอมป์			
	T.....0.....แอมป์			
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓		
4	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START.....-.....ชม.			
	STOP.....-.....ชม.			
6	วัดแรงดัน	✓		
	P-S.....397.....โวลต์			
	S-T.....398.....โวลต์			
	T-Q.....398.....โวลต์			
1	ตรวจเช็คหอยอากาศไอ	✓		
2	ตรวจเช็คค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คหอยอากาศไอ	✓		
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....390.....ลิตร			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเตือนเครื่อง	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ห้องเครื่อง	✓		
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
10	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องย่น	✓		
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
15	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START.....38.....ชม.			
	STOP.....-.....ชม.			
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....6.8 bar.....PSI			
3	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
4	เวลา	✓		
	STOP.....15:00.....น.			
	START.....18:40.....น.			
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....30 C.....F			
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....41 C.....F			
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....-.....PSI			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อคุณ สรรวิชัย

ชื่อคุณ สุธรรม

หมายเหตุ

- ✓ ขยอณัณยัต
- ✓ สยพต
- ✓ สยบรณั
- ✓ กรณณัณยพต

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสาร (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรงตรงตรง GEN - สยดพ

รหัสงาน RE/GENW

รหัสเครื่องจักร GEN

เลขที่ใบงาน PM230900039

วันที่ปฏิบัติงาน 29/09/2023

ชื่ออาคาร เดอะ ไลน์ จตุจักร หนองจอก | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	การเดินเครื่องจักร			
1	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น.....37.....F			
2	เวลา	✓		
	STOP 08:55.....น.			
	START.....08:40.....น.			
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	STOP.....ชม.			
	START.....3B.....ชม.			
4	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น.....6.7.....F			
5	แรงดันน้ำในห้องเย็น	✓		
	แรงดันน้ำในห้องเย็น.....6.7.....PSI			
6	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
7	แรงดันน้ำในห้องเย็น		✓	
	แรงดันน้ำในห้องเย็น.....PSI			
	การเดินเครื่องจักร			
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	STOP.....ชม.			
	START.....3B.....ชม.			
2	ไฟฟ้า BATTERY	✓		
	ไฟฟ้า BATTERY.....27.....แอมป์			
3	การเดินเครื่องจักร	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	รายการ	
	T.....แอมป์			
	S.....มิลลิ			
	R.....แอมป์			
4	วัดแรงดัน	✓		
	T-A.....397.....โวลต์			
	R-S.....398.....โวลต์			
	S-T.....398.....โวลต์			
5	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
	ตรวจเช็คไฟเบรก			
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
2	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
3	ตรวจเช็คระบบเบรกความดัน	✓		
4	ตรวจเช็คค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓		
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์เบรก	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
8	ตรวจเช็คท่ออากาศในมือ	✓		
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....380.....ลิตร			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
15	ตรวจเช็คระบบ	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. รณเดช กุลมณี

ชื่อตัวบน/ตรวจสอบ

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PMZ30900011
วันที่ปฏิบัติงาน	15/09/2023
ชื่ออาคาร	และ โซน จุลจักร นมฉิล 1 ส่วนกลาง ไบรณ ไบรณ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T...396...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
	RS...397...โวลต์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
4	ตรวจเช็คจุดอุณหภูมิ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...11.7...แอมป์				
8	ตรวจเช็คการไหล	✓			
	R...8.0...แอมป์				
	T...8.6...แอมป์				
	S...7.6...แอมป์				
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...265...PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			

รวมเขียนงานที่ปฏิบัติงาน

1. เขียนแผน แก้ไขปั๊ม

เขียนแผน

เขียนแผน

รวมเขียนแผน

เขียนแผน

เขียนแผน

รวมเขียนแผน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

รหัสงานFF/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM230900038

วันที่ปฏิบัติงาน29/09/2023

ชื่ออาคารเดอะ อินน์ จัตุจักร พาร์ค | 1 | ส่วนกลาง | ไบรณ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI			
2	ตรวจเช็คผลการเดินรอบ MOTOR	✓		
3	ตรวจเช็คผลการทำงานของ PUMP	✓		
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....265.....PSI			
5	ตรวจเช็คหีบห่อระบบภายนอก MOTOR	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
2	ตรวจเช็คผลการดู Control	✓		
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓		
	S.T.....394.....โวลต์			
	T-R.....395.....โวลต์			
	R-S.....396.....โวลต์			
4	ตรวจเช็คจุดภายในตู้ Control	✓		
5	ตรวจเช็คการเบส	✓		
	S.....82.....แอมป์			
	T.....79.....แอมป์			
	R.....80.....แอมป์			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....11.8.....แอมป์			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓		
8	ตรวจหอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.นายอ. กุศลศรี

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

นายอ. กุศลศรี

รายละเอียด

สภาพ

ค่าแรง

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (C/W)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM230900012
วันที่ปฏิบัติงาน	15/09/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โฮม จูนิเออร์ หนึ่งตึก 44 ศาลา ไม่ระบุ ไร่สุข Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
2	ตรวจเช็คชุดมอเตอร์ Control	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...4.5...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				
	S-T...0...โวลต์				
6	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
2	ตรวจเช็คหีบหมอบระบายอากาศ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...0...PSI				
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP		✓		

รวมสิ่งที่พบทั้งหมดไม่ผิดปกติ
1 ชั่วโมง เสร็จเรียบร้อย

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ
.....

- หมายเหตุ
- รายละเอียด
 - สรุป
 - คำแนะนำ
 - การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-QOOF

เลขที่ใบงานPM4230900040

วันที่ปฏิบัติงาน29/09/2023

ชื่ออาคารและ โถง ชลประทานตึก 44 | ศาลา | ไบรณ | ไบรณ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ต้องการเพิ่ม	
1	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....4.4.....แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน				
	S-T.....โวลต์				
	T-A.....โวลต์				
	A-S.....โวลต์				
7	ตรวจสอบค่ากระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
8	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
1	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำย้อน.....PSI				
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ต้องการเพิ่ม	
5	ตรวจสอบหัดพร้อมระบบยกภาค MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Motor และ Pump		✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ระยอง ฤทธิศรี

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

รายละเอียด

สรุปผล

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงานFP/FRP-W

รหัสเครื่องจักรFRP

เลขที่ใบงานPM231000005

วันที่ปฏิบัติงาน06/10/2023

ชื่ออาคารเดอะ ไบน์ จูเลียท หนึ่งซึก | 1 | ส่วนกลาง | ไบรณ | ไบรณ | pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ได้	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบชุดชุดเครื่องสูบลม	✓			
1	ตรวจสอบชุดเครื่องสูบลม PUMP	✓			
2	ตรวจสอบชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบชุดระบบควบคุมอัตโนมัติ	✓			
4	ตรวจสอบชุดสายพาน	✓			
5	ตรวจสอบชุดสายพานส่งน้ำของ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบชุดสายพานส่งน้ำของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมีขึ้นหรือลดลง...60...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...19.5...ชม.				
	วัดแรงดันน้ำออก...125...PSI				
	แรงดันน้ำเข้าท่อขึ้น...PSI				
	แอมป์มอเตอร์...แอมป์				
	อุณหภูมิใบพัดขึ้น...70...F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...225...PSI				
	ความเร็วรอบ...2400...RPM				
7	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจสอบชุดสับไฟฟ้าหลัก	✓			
9	ตรวจสอบชุดสภาพเครื่องสูบลม	✓			
10	ตรวจสอบชุดระบบน้ำเข้าท่อขึ้น	✓			
11	ตรวจสอบชุดระบบน้ำเข้าท่อลง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ได้	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบการทำงานของชุด...820...ลิตร				
12	ตรวจสอบชุดชุดเครื่องสูบลม	✓			
13	ตรวจสอบชุดชุดเครื่องสูบลม	✓			

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. เรืองเดช อุดมศรี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลขชุด

รายละเอียด ตรวจสอบระบบระบบจ่ายน้ำ

สถานที่

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

วันที่เกิดเหตุการณ์

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งมอบงานให้ช่าง (CM)

รหัสงานFP/FRP-W

รหัสเครื่องจักรFRP

เลขที่ใบงานPM231.000014

วันที่ปฏิบัติงาน20/10/2023

ชื่ออาคารเดอะ โกลด์ จัตุจักร หมอชิต | 1 | ส่วนกลาง | โบนะปู | โนะปู | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คตัวปั๊มระบบ	✓		
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...850...ลิตร			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
5	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
6	ตรวจเช็คความดันแรงดันของ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0.4...แอมป์			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...61...PSI			
	วัดแรงดันน้ำมัน...231...PSI			
	ความเร็วรอบ...2400...RPM			
	ชั่วโมงการทำงาน...19.3...ชม.			
	วัดแรงดันน้ำมัน...125...PSI			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์...60...F			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
10	ตรวจเช็คตัวรีไซเคิล PUMP	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
11	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓		
12	ตรวจเช็คระดับแรงดันของแบตเตอรี่	✓		
13	ตรวจเช็คชุดชาร์จ	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ตรวจเช็คตัวรีไซเคิล

ชื่อผู้ตรวจเช็ค/ผู้ตรวจ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ทดสอบระบบประจุไฟฟ้า
.....
.....
.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งต่อช่างอีก (CM)

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FRP

เลขที่ใบงาน

PM231.000034

วันที่ปฏิบัติงาน

27/10/2023

ชื่ออาคาร

เดอะ โกลด์ จูเลียต มอเตอร์ | 1 | ลานกลาง | โมระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	บกพร่อง	
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องผสม PUMP	✓		
	แอมมิเตอร์.....27.....ฮอลบี			
	ความเร็วรอบ.....1950.....RPM			
	วัดแรงดันน้ำออก.....80.....PSI			
	อุณหภูมิในตัวเครื่อง.....180.....F			
	ชั่วโมงการทำงาน.....38.....ชม.			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....50.....PSI			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....50.....PSI			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....80.....PSI			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
8	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....520.....ลิตร			
12	ตรวจเช็คตัวรับ PUMP	✓		
13	ตรวจเช็คความสว่างแสงไฟของ BATTERY	✓		

plus+

บริษัท พหลฯ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด FRP- อู่ปลา

รหัสงาน
รหัสเครื่องจักร
เลขที่ใบงาน
วันที่ปฏิบัติงาน
ชื่ออาคาร

FPFRP-W
FRP Electric Motor
PM231000003
06/10/2023
และ ไลน์ จุกู้กร หมอชิต 44 | ซดหท่า | ไบรญ | ไบรญ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการเสีย	
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำขึ้นถังหลัง	✓			
	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำขึ้นถังหลัง.....ลิตร				
5	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
10	ตรวจเช็คค่าความแรงดันของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของระบบระบายน้ำและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	แอมป์.....แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน.....182...ชม.				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....70...PSI				
	ความเร็วรอบ.....1480...RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก.....70...PSI				
	อุณหภูมิห้องเย็น.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	Compt				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวถังหม้อต้ม	✓			
2	ตรวจเช็คพลาซมา BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ PRV	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
1.ตรวจดู อุปกรณ์
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คระบบประจุไฟฟ้า
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จตรวจพบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM240100001

วันที่ปฏิบัติงาน05/01/2024

ชื่ออาคารตอม 3-สํานัก จํานัก มอชิต | 1 | ส่วนกลาง | ไบรณ | ไบรณ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ดูไม่มีการทำงาน	✓		
	START.....ชม.			
	STOP.....ชม.			
2	ความถี่รอบ	✓		
	ความถี่รอบ.....1499.....RPM			
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
4	เวลา	✓		
	START.....0925.....น.			
	STOP.....0935.....น.			
5	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น.....30.....F			
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....61.....F			
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI			
1	วัดแรงดัน	✓		
	R-S.....398.....โวลต์			
	S-T.....399.....โวลต์			
	T-R.....398.....โวลต์			
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
3	ดูไม่มีการทำงาน	✓		

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1.ประทีป สิงห์

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจ

หมายเลข

- รายละเอียดปกติ
- สถานะ
- ตำแหน่ง
- การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ (CAI)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการที่พัก JP - สันกำแพง

รหัสงาน FP/JP-W

รหัสเครื่องจักร JP-1

เลขที่ใบงาน PM231000004

วันที่ปฏิบัติงาน 06/10/2023

ชื่อวิศวกร และ ไลน์ วิศวกร หมอชิต | 1 | สันกำแพง | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....225....PSI			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....11.4....แอมป์			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓		
	S-T.....398....โวลต์			
	T-R.....397....โวลต์			
	R-S.....399....โวลต์			
7	ตรวจเช็คกระแส	✓		
	T.....5.0....แอมป์			
	R.....5.0....แอมป์			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	S....8.1....แอมป์				
8	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นายสม งามศรี

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ

นายสม

รายละเอียด ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

ขนาด

ค่าแรง

รายการอื่นๆ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ไม่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด
ต.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ

รหัสงาน FJ/JP-W

รหัสเครื่องจักร JP-1

เลขที่ใบงาน PM23100013

วันที่ปฏิบัติงาน 20/10/2023

ชื่ออาคาร ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ | 1 | ส่วนกลาง | โรงรถ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ	✓			
	S....0....แอมป์				
	R....0....แอมป์				
	T....0....แอมป์				
2	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
3	ตรวจสอบการสับเปลี่ยนของ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า Slow	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	R-S....399....โวลต์				
	T-R....399....โวลต์				
	S-T....398....โวลต์				
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set....11.4....แอมป์				
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า....0....PSI				
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก....270....PSI				
4	ตรวจสอบสภาพตัวรับ PUMP	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบจุด JP - ลับดาว

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM231000031
วันที่ปฏิบัติงาน	27/10/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส จักรก หนองจอก 1 ส่วนกลาง โน้ตบุ้ ปั้มบู้ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓		
2	ตรวจเช็คจุดยกย่นตู้ Control	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓		
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓		
	S.T....398...โวลต์			
	T.R....401...โวลต์			
	R.S....402...โวลต์			
6	ตรวจเช็คกระแส	✓		
	T....07 B...แอมป์			
	R....08.7...แอมป์			
	S....08.1...แอมป์			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....แอมป์			
1	ตรวจเช็คพัฒนระบบขยายภาค MOTOR	✓		
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
6	ตรวจเช็คพัฒนระบบขยายภาค MOTOR	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ย่น MOTOR	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.เช็คไฟ แก้วลิ้น

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า

สภาพ

ส่วนหน้า

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำไข	
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงาน Check Valve	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร เครื่อง

ชื่อส่วนที่ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

สถานะ

คำแนะนำ

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีพเพอรัล จำกัด
ทางตรวจเช็ค FRP - สังกา

รหัสงาน	FF/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM23110002
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2023
ชื่ออาคาร	เคส ไลน์ จุลจักร หนอชิต 1 ส่วนล่าง โนระบุ โนระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำไข	
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คระบบประปาความดัน	✓		
4	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง PUMP	✓		
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง.....PSI			
	ผู้ไม่กรทำงาน.....จน			
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง.....PSI			
	แอมป์.....แอมป์			
	แรงดันน้ำออก.....PSI			
	อุณหภูมิ.....F			
	แรงดันน้ำเข้า.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....RPM			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓		
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
11	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		
12	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเครื่อง	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเครื่อง.....PSI			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PAV	✓			
3	ตรวจเช็คถังรับแรงดัน	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ชีวฟิล์ม แก้วใส

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

- ☒ ระบบยึด
- ☒ ถังน้ำ
- ☒ ถังน้ำ
- ☒ ถังน้ำ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คชุดจุ่มวาท BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		
3	ตรวจเช็คลัดวงจรเบรคดับ	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
: ชัยวัฒน์ แก้ววิเชียร

ชื่อตัวแบบ/เครื่องเชื่อม

หมายเหตุ
รายละเอียด -
อุปกรณ์ -
คำแนะนำ -
การบันทึกผล -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ไม่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วหนังสือแนกเข้า (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัดตั้ง FRP - ลำไทร

รหัสงาน	PD/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM231100011
วันที่ปฏิบัติงาน	17/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ จัตุจักร หน่อจืด 1 ส่วนกลาง โปรง โปรง Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		
2	ตรวจเช็คลัดวงจรเบรคดับ	✓		
3	ตรวจเช็คชุดจุ่มวาท BATTERY	✓		
1	ตรวจเช็คระบบเบรคดับ	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำถังเก็บ	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร	✓		
4	ตรวจเช็คท่ออากาศดีเซล	✓		
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
6	ตรวจเช็คค่าความกว้างของ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเชื่อมและ PUMP	✓		
	แอมป์เครื่อง.....แอมป์			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....60... PSI			
	ความเร็วรอบ.....19700.....RPM			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....60.....PSI			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....235.....PSI			
	วัดแรงดันน้ำออก.....235.....PSI			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
9	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....820.....ลิตร			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศดีเซล	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ยกเว้น	
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. วัตถุประสงค์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ผู้แนะนำ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ลิ้นคทา

รหัสงาน	FR/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM231100016
วันที่ปฏิบัติงาน	20/11/2023
ชื่อวิศวกร	และ โฉม จุฬารัตน หนะขิด 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ยกเว้น	
1	ตรวจเช็คสภาพงาน	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความถี่การทำงานของ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....850.....ลิตร				
7	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระดับระบบความดัน	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องวัดและ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ.....2550.....RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน.....198.....ชม.				
	แรงดันน้ำในท่อหลัง.....PSI				
	แรงดันน้ำในท่อหลัง.....55.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....230.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....110.....PSI				
	อุณหภูมิในท่อ.....150.....F				
	แอมป์มอเตอร์.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องวัด	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
1	ตรวจเช็คระดับแรงดัน	✓		
2	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ประสิทธิ์ ลิ้มใจ

ชื่อตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- สายนก
- กำแพงแก้ว
- กำแพงเมืองเก่า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่จบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ลิ้นดาว

รหัสงาน	FRP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM231100005
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2023
ชื่ออาคาร	เคหะ โกลด์ จตุจักร นมสด 44 ต.พหลฯ ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
5	ตรวจเช็คระบบระบบควบคุม	✓		
6	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำแรงดันสูง	✓		
	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำเชื่อมเหล็ก.....ลิตร			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
8	ตรวจเช็คค่าความดันภายในของ BATTERY	✓		
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
12	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....F			
	ความดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....PSI			
	อุณหภูมิการทำงาน.....°C			
	ความเร็วรอบ.....RPM			
	แอมป์.....แอมป์			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PAV	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			

รายชื่อช่างประจำศูนย์บริการ

1. ช่างซ่อม แบตเตอรี่

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

รายละเอียด ตำแหน่ง/กะ/ชื่อ

สถานะ

ทักษะ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/M)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรมพรอเจ็ค FRP - สิบดาว

รหัสงาน	FR/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM231100018
วันที่ปฏิบัติงาน	24/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จัตุจักร หมอชิต 44 คาเฟ่ โดมสุ โดมสุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PAV	✓			
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังเชื้อเพลิง.....ลิตร				
4	ตรวจเช็คท่ออากาศต่อเชื้อเพลิง	✓			
5	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำมัน	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศต่อ	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	แอมป์มอเตอร์.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำมัน.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....F			
12	ตรวจสอบเครื่อง MANUAL START	✓		
13	ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำหล่อเย็น	✓		

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ชื่อผู้จัดทำ : นายวิเศษ

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่าง

หมายเหตุ

รายละเอียด : ทดสอบระบบจ่ายน้ำ

ปัญหา : ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเครื่องสูบน้ำมีปัญหา

คำแนะนำ : -

การแก้ไข : -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟเฟอรั จํากัด
โครงการติดตั้ง FRP - อู่ใต้

รหัสงาน	FRP-FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM231100007
วันที่ปฏิบัติงาน	10/11/2023
ชื่ออาคาร	เคหะ โน้ต จุฬาร หนองใต้ 44 ต.พม่า อ.ระยอง จ.ระยอง Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓		
3	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓		
	VALVE			
1	ตรวจสอบชุดวาล์ว PUMP	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓		
	เอมิเตอร์.....มิลลิ			
	แรงดันน้ำในท่อส่ง.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....RPM			
	ระดับการทำงาน.....มม.			
	วัดแรงดันน้ำ.....PSI			
	แรงดันน้ำในท่อส่ง.....PSI			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F			
3	ตรวจสอบชุดสวิตช์	✓		
4	ตรวจสอบชุดมอเตอร์	✓		
5	ตรวจสอบชุดมอเตอร์สำรอง	✓		
6	ตรวจสอบชุดมอเตอร์สำรอง	✓		
7	ตรวจสอบชุดมอเตอร์สำรอง	✓		
8	ตรวจสอบชุดมอเตอร์สำรอง	✓		
9	ตรวจสอบชุดมอเตอร์สำรอง	✓		
10	ตรวจสอบชุดมอเตอร์สำรอง	✓		
	ตรวจสอบชุดมอเตอร์สำรอง.....ลิตร			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความดันแรงดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
1. ช่างซ่อม เครื่องปั๊มน้ำ

ชื่อหัวหน้าช่างซ่อม

หมายเลข
รายละเอียด
สถานที่
จำนวน
การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด FFP - ลับดาว

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FR Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM23110012
วันที่ปฏิบัติงาน	17/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จักรพรรดิ 44 ศาลา โน้ตบุ๊ค โน้ตบุ๊ค Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ PRV		✓		
2	ตรวจเช็คระดับแรงดัน		✓		
3	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY		✓		
4	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY		✓		
5	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY		✓		
6	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY		✓		
7	ตรวจเช็คชุดวาล์ว		✓		
8	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY		✓		
9	ตรวจเช็คชุดวาล์ว MANUAL START		✓		
10	ตรวจเช็คชุดวาล์ว PUMP		✓		
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบน้ำและ PUMP		✓		
	แรงดันน้ำที่ออก.....PSI				
	แรงดันน้ำที่เข้า.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....RPM				
	อุณหภูมิที่เข้า.....F				
	แรงดันน้ำที่เข้า.....PSI				
	แรงดันน้ำที่ออก.....PSI				
	แรงดันน้ำที่เข้า.....PSI				
	แรงดันน้ำที่ออก.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	ข้อมูลการทำงาน.....จน			
12	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น		✓	
13	ตรวจสอบสภาพเครื่องขาด		✓	

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อพนักงาน

ชื่อตำแหน่ง/ตัวรถ

หมายเหตุ

รายละเอียด

รายละเอียด

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - สิบดาว

รหัสงาน RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร GEN
เลขที่ใบงาน PM231100004
วันที่ปฏิบัติงาน 03/11/2023
ชื่ออาคาร เดอะ โสม จักร นอน 1 | ส่วนกลาง | โน้ต | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓		
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓		
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ความเร็วรอบ	✓		
5	เวลา	✓		
	STOP.....16:53.....น.			
	START.....16:50.....น.			
6	ข้อมูลการทำงาน	✓		
	STOP 38.....ชม.			
	START.....ชม.			
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
1	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓		
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....27.....แอมป์			
3	ข้อมูลการทำงาน	✓		
	STOP 38.....ชม.			
	START.....ชม.			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	
4	วัดแรงดัน	✓		
	RS.....398.....โวลต์			
	S-T.....399.....โวลต์			
	T-R.....399.....โวลต์			
5	วัดกระแส	✓		
	R.....แอมป์			
	T.....แอมป์			
	S.....แอมป์			
6	ตรวจถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
	ตรวจค่าความถี่ของ			
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓		
3	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....380.....ลิตร			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อต้ม	✓		
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
10	ตรวจเช็คค่าความต้านแรงดันของ BATTERY	✓		
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓		
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
13	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมเครื่อง	✓		
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM23110009
วันที่ปฏิบัติงาน	10/11/2023
ชื่ออาคาร	หอ โหล่ จุฬาร พมอติ 1 ส่วนกลาง โหล่ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....370...ลิตร			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์เกนเนอเรเตอร์	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ห้องเครื่อง	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ชุด ATS	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพเคเบิล	✓		
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
15	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓		
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....35...°F			
2	ระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓		
	ระดับน้ำมันหล่อเย็น.....6.7...PSI			
3	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500...RPM			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0...PSI			
5	เวลา	✓		
	STOP.....15.04...น.			
	START.....15.00...น.			
6	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น.....30...°F			
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START.....38...ชม.			
	STOP.....ชม.			
1	ความเร็ว	✓		
	ความเร็ว.....50...HZ			
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START.....38...ชม.			
	STOP.....ชม.			
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....26...แอมป์			
5	รีดามเบ	✓		
	R.....แอมป์			
	T.....แอมป์			
	S.....แอมป์			
6	วัดแรงดัน	✓		
	R-S.....398...โวลต์			
	S-T.....399...โวลต์			
	T-R.....397...โวลต์			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
1.ชื่อ.....นามสกุล.....
.....
.....
ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจ
.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- ภาพ
- คำแนะนำ
- หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบข้อผิดพลาด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด GEN - สืบค้า

รหัสงาน RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร GEN
เลขที่ใบงาน PM231100015
วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2023
ชื่ออาคาร เดอะ โกลด์ จักรก หนองหิน 1 | ส่วนกลาง | โถงรูป | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	อาจมีปัญหา	
1	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
2	ช่วงเวลาที่ทำงาน	✓		
	START.....14.20.....ชม.			
	STOP.....14.50.....ชม.			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....12.....แอมป์			
4	วัดกระแส	✓		
	R.....0.....แอมป์			
	T.....0.....แอมป์			
	S.....0.....แอมป์			
5	วัดแรงดัน	✓		
	R-S.....398.....โวลต์			
	T-R.....398.....โวลต์			
	S-T.....398.....โวลต์			
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....30.....F			
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....56.....PSI			
3	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....56....PSI			
5	เวลา	✓		
	START.....14.20.....น.			
	STOP.....14.50.....น.			
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....30.....°F			
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START.....14.20.....น.			
	STOP.....14.50.....น.			
ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน				
1	ตรวจเช็คความสว่างจากของ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ ATS	✓		
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....380.....ลิตร			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TOWER TIMER ของชุด ATS	✓		
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด	✓		
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ห้องเครื่อง	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรก	✓		
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
13	ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่น	✓		
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไปดี	✓		
15	ตรวจเช็คท่ออากาศปล่อย	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.วิฑูรย์ ศรีรุ่ง

ชื่อควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด
สภาพ
ตำแหน่ง
หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลบันทึก (CM)

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM23110017

วันที่ปฏิบัติงาน24/11/2023

ชื่ออาคารเคาะ โถง จุฬาร หน่อชิต 1 | ส่วนล่าง | โถงรูป | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....30.5.....F				
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....ชม.				
	STOP.....ชม.				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
5	เวลา	✓			
	STOP.....11:10...น.				
	START.....11:00...น.				
6	อุณหภูมิอากาศรอบข้าง	✓			
	อุณหภูมิอากาศรอบข้าง.....38.....F				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....350...ลิตร				
2	ตรวจเช็คอุปกรณ์แก๊สเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศปล่อย	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ประทีป ธิโต

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หน้าพบ

- รายละเอียด -
- ลักษณะ -
- ตำแหน่ง -
- รายละเอียด -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/O)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค JP - สังกะ

รหัสงาน FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร JP-1
เลขที่ใบงาน PM231100003
วันที่ปฏิบัติงาน 03/11/2023
ชื่ออาคาร เดอะไนน์ จตุจักร หนองจอก 1 | ส่วนกลาง | ไบร่ย์ | ไบร่ย์ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเสีย	
	Shift				
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจเช็คจุดยกถังน้ำ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....1.1d.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
7	ตรวจเช็คเบ้าดิน	✓			
	ST.....401.....โวลต์				
	TR.....398.....โวลต์				
	PS.....399.....โวลต์				
8	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S.....0.8.....แอมป์				
	R.....0.9.....แอมป์				
	T.....0.9.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
	ACT.....0.0.....				
1	ตรวจเช็คพัฒนาสถานะภายนอก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....270.....PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
7	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้ควบคุม แก้ววิเชียร

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สถานที่

จำนวน

การแก้ไข

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☐

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ผ่าน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์มัส จำกัด
ตรวจสอบเช็ค JP - ลิฟท์

รหัสงาน	PP/P-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM23110006
วันที่ปฏิบัติงาน	10/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ อพาร์ทเมนท์ 1 ส่วนกลาง โน้ตบุ๊ค Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่า Set.....11.4.....แอมป์			
4	ตรวจสอบค่า Full Control	✓		
5	ตรวจสอบค่า Show	✓		
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	S-T.....398.....โวลต์			
	T-R.....398.....โวลต์			
	R-S.....400.....โวลต์			
7	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T.....7.6.....แอมป์			
	R.....7.8.....แอมป์			
	S.....8.3.....แอมป์			
8	ตรวจสอบค่าแรงดัน Full Control	✓		
9	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓		
1	ตรวจสอบค่าแรงดันของ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบค่าแรงดันของ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบค่าแรงดันของ MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบค่าแรงดันของ	✓		
	ตรวจสอบค่าแรงดันของ.....270.....PSI			
5	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายละเอียด -
- หมายเหตุ -
- คำแนะนำ -
- หมายเหตุ -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติแจ้ง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
6	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันออก	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดูด.....PSI			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.วิศวกร ศิริรัง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นายณนต

รายละเอียด

สภาพ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติใช้ก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำรงตรวจเช็ค JP - ปั๊มน้ำ

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM231100020
วันที่ปฏิบัติงาน	24/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โสม จัตุจักร หนองจอก 1 ส่วนกลาง โบนะรุ ปั๊มน้ำ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันออก	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดูด.....PSI			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเข้า	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเข้า.....PSI			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
7	ตรวจเช็คพัฒนระบบระบายอากาศ MOTOR	✓		
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....แอมป์			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓		
	S-T.....399...โวลต์			
	T-R.....397...โวลต์			
	R-S.....400...โวลต์			
3	ตรวจเช็คกระแส	✓		
	T.....7.8...แอมป์			
	R.....8.7...แอมป์			
	S.....8.1...แอมป์			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
7	ตรวจสอบสถานะ Control	✓		
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
9	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ไปรษณีย์ ไลน์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- ปริมาณ
- คุณภาพ
- การเก็บรักษา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ต้องแก้ไข (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด JP - ซันดาวน์

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM231100019
วันที่ปฏิบัติงาน	24/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จูนิเออร์ ทาวน์ 04 ซาดทาวน์ โน้ตบุ้ญ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....แอมป์			
4	ตรวจสอบสถานะ Control	✓		
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
	S-T.....โวลต์			
	T-R.....โวลต์			
	R-S.....โวลต์			
7	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T.....แอมป์			
	R.....แอมป์			
	S.....แอมป์			
8	ตรวจสอบจุดควบคุม Control	✓		
9	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓		
1	ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบสถานะปั๊มน้ำ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบสถานะตัวเชื่อม MOTOR	✓		
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำถัง.....PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			

รายละเอียดงานที่ไปปฏิบัติงาน

1.จับดินสอ แก้วสีชมพู

ชื่อผู้ควบคุมฝ่ายตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ทดสอบประจำสัปดาห์

สถานที่ ปีงบประมาณเมืองจันทราพลาซาด

ตำแหน่ง

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสาร (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตรวจสอบระบบ JP - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/JPW
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM231100001
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จูนิการ์ หมอชิต 64 ตลาดเก่า โมรปุ โมรปุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	อาการเสีย	
	ตรวจสอบระบบ JP-ROOF				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....1.4.....แอมป์				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	S-T.....โวลต์				
	T-R.....โวลต์				
	R-S.....โวลต์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ.....PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
 1. ชัยวัฒน์ แก้ววิเชียร

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ
 รายละเอียด แหล่งที่มา
 ส่วนชุด
 ตำแหน่ง
 การปฏิบัติงาน -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 อาคารพารกิต JP - สีเทา

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM231100008
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จตุจักร หนองจอก 44 ลาดพร้าว โนนสุข Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set.....แอมป์			
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
5	ตรวจสอบค่า Slow	✓		
6	ตรวจสอบระดับ	✓		
	S-T.....โวลต์			
	T-R.....โวลต์			
	R-S.....โวลต์			
7	ตรวจสอบกระแส	✓		
	T.....แอมป์			
	R.....แอมป์			
	S.....แอมป์			
8	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		
9	ตรวจสอบค่าความดัน Control	✓		
1	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓		
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓		
3	ตรวจสอบตัวเซ็นเซอร์	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำออก.....PSI			
4	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า.....PSI			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาหารเสีย	
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างไฟฟ้า 2. ช่างประปา

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ไข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ (CAH)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบระบบ JP - ปั๊มน้ำ

รหัสงาน	FP/JP-W
พื้นที่ติดตั้ง	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM23110014
วันที่ปฏิบัติงาน	17/11/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลฟ์ จัตุรัส หอซิด 44 ศาลา โน้ต โน้ต Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาหารเสีย	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PSI	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve		✓	
7	ตรวจเช็คสวิตช์น้ำเจ้า		✓	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเจ้า.....PSI			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- อื่นๆ
- คำแนะนำ
- การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดีต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
	แรงดันน้ำมันหม้อต้ม.....PSI			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ปะจับ ลิงไฟ

.....

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด บันทึก

สายพัด

ถังขยะน้ำ

ภาชนะกักขยะ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ดำเนินธุรกิจ FRP - ลิงไฟ

รหัสงาน	FRP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP
เลขที่ใบงาน	PM231200016
วันที่ปฏิบัติงาน	22/12/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จัตุรัส หนองจอก 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	บันทึก	
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหม้อต้ม	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
4	ตรวจเช็คระบบปั๊มฉีดล้างถัง	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิงถัง.....830.....ลิตร			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศดีด	✓		
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
11	ตรวจเช็คค่าความถี่การทำงานของ BATTERY	✓		
12	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องดับเพลิงและ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
	หัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....215.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....1900.....RPM			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI			
	ชั่วโมงการทำงานของ.....19.....ชม.			
	แอมป์เตอร์.....14.....แอมป์			
	หัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....230.....PSI			
	อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น.....125.....F			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓		
2	ตรวจเช็คชุดขั้ว BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ประทีป สิงโต

ชื่อส่วนงาน/ตรวจสอบ

รวมผล

รายละเอียด ผสมแบบประจำสัปดาห์

ผู้พบ

ผู้พบ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลกลับอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
11	ตรวจเช็คค่าความดันของ BATTERY	✓		
12	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ยศชัย ลีจิต

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

ขั้นตอน ตรวจเช็คระบบ

คำแนะนำ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งข้อมูลให้ช่าง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
สารโรงผลิต FRP - ลับเตา

รหัสงาน	FR/FR-PAV
วันที่เพื่อจัดการ	FRP
เลขที่ใบงาน	PM231200033
วันที่ปฏิบัติงาน	29/12/2023
ชื่ออาคาร	โซน โกลด์ อุตสาหกรรม 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓		
3	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		
4	ตรวจเช็คค่าความดันของ BATTERY	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓		
	ดูใบผลการพิมพ์...200...mm			
	อุณหภูมิในท่อเย็น...70...°F			
	แรงดันในระบบท่อเย็น... 70...PSI			
	แอมป์มอเตอร์.....แอมป์			
	แรงดันไฟฟ้าในเครื่อง.....PSI			
	วัดแรงดันในท่อ...225...PSI			
	ความเร็วรอบ...2400...RPM			
	วัดแรงดันน้ำออก...125...PSI			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
7	ตรวจเช็คระดับน้ำท่อเย็น	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
10	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...810...ลิตร			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓		
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓		
13	ตรวจเช็คสเปก	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบค่าการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ระนอง กุลมณี

ชื่อส่วน/ทีมตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบสายไฟฟ้า

สถานะ

คำแนะนำ

หมายเหตุตรวจสอบ ตรวจสอบสายไฟฟ้า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
โครงการจัด GEN - สันติภาพ

รหัสงาน	RE/GEN-W
พื้นที่เครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM231200017
วันที่ปฏิบัติงาน	22/12/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โกลด์ จูนิการ์ หน่อชิล 1 ส่วนกลาง โน้ตบุ้ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	แก้ไข	อาการเสีย	
การวัดแรงดัน					
1	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
2	ตรวจสอบค่าแรงดันการทำงานของ	✓			
3	ค่าแรงดันทำงาน	✓			
	STOP.....จน.				
	START.....จน.				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY แอมป์				
5	วัดแรงดัน	✓			
	S-T.....398.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
	R-S.....398.....โวลต์				
6	วัดกระแส	✓			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
การวัดค่าแรงดันรอบ					
1	ค่าแรงดันทำงาน	✓			
	START 39.....จน.				
	STOP.....จน.				
2	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ.....1500.....RPM				
3	เวลา	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
	START.....1.1.8.....น.			
	STOP.....1.1.23.....น.			
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F			
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F			
ตรวจสอบการบำรุงรักษา				
1	ตรวจสอบความว่างจากของ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ด้านเครื่อง	✓		
3	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....480.....ลิตร			
4	ตรวจสอบการระบายอากาศ	✓		
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ATS	✓		
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องเชื่อม	✓		
7	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
9	ตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่อง	✓		
10	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ	✓		
13	ตรวจสอบระดับแรงดันความดัน	✓		
14	ตรวจสอบการระบายน้ำ	✓		
15	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1.ประทีป ลีโต

ชื่อควบคุมตรวจสอบ

รหัสงาน	RE/GEN-W
วันที่เครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM231200001
วันที่ปฏิบัติงาน	01/12/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ ไฮน์ อลูมิเนียมฮอลล์ 1 ส่วนล่าง ไม่ระบุ (Generator Room)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อาการเสีย	
1	ความเร็ว 50...HZ	✓			
2	อุณหภูมิการทำงาน	✓			
	STOP.....ชม.				
	START.....ชม.				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
4	วัดกระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
5	วัดแรงดัน	✓			
	R-S.....398...โวลต์				
	T-R.....399...โวลต์				
	S-T.....398...โวลต์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	การแจ้งเตือน				
1	ตรวจเช็คพิกัดอากาศปิด	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....390...ลิตร				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
4	ตรวจเช็คอุปกรณ์กันน้ำเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์นำไฟฟ้าและตู้เครื่อง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ประทีป มีใจ

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รวมอะไหล่ เคื่องแรงดันสูง/สวิตช์/สวิตช์

ฐาน

ตำแหน่ง

ภาพ/รูปถ่าย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
ตรวจสอบ GEN - ลับเต

รหัสงาน RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร GEN
เลขที่ใบงาน PM23120008
วันที่ปฏิบัติงาน 08/12/2023
ชื่ออาคาร คณะ โสภ วิทยาลัย | 1 | ส่วนกลาง | โรงปุ๋ย | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ยังไม่ดี	
	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร			
1	ดูใบการทำงาน	✓		
	START.....39.....น.			
	STOP.....น.			
2	ดูอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	ดูอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F			
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI			
4	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
6	เวลา	✓		
	STOP.....14.35.....น.			
	START.....14.30.....น.			
7	ดูอุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	ดูอุณหภูมิห้องเย็น.....F			
	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร			
1	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	✓		
2	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	✓		
3	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	✓		
4	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	✓		
5	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	✓		
6	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	✓		

หมายเลข

รายละเอียด: เลขประจำสินค้า บกคค

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓		
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓		
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบรก	✓		
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
13	ตรวจเช็คระบบเบรกความดัน	✓		
14	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓		
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...380...ลิตร			
	ตรวจเช็คตู้ ATS			
1	ความถี่	✓		
	ความถี่...50...HZ			
2	ตรวจเช็คค่าในสวิตช์การทำงาน	✓		
3	ชิ้นไม่มีการทำงาน	✓		
	STOP.....จน.			
	START.....จน.			
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์			
5	ไฟกระแส	✓		
	R....398...แอมป์			
	T....399...แอมป์			
	S....398...แอมป์			
6	วัดแรงดัน	✓		
	R-S....397...โวลต์			
	T-R....398...โวลต์			
	S-T....399...โวลต์			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ประทีป นิลโต

ชื่อควบคุมการตรวจเช็ค

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ปฏิบัติงานPM231200013

วันที่ปฏิบัติงาน15/12/2023

ชื่ออาคารและ ไลน์ จูจิ๋วร พมอติ | 1. ส่วนกลาง | ไนเรข | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
1	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	STOP.....จน.				
	START.....39.....จน.				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
3	วัดกระแส	✓			
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✓			
	R-S.....โวลต์				
	S-T.....โวลต์				
	T-R.....โวลต์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความดันสถานะของ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอส์	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอส์	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....38.....ลิตร				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
3	เวลา	✓			
	STOP.....14.20.....น.				
	START.....14.00.....น.				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....49.....F				
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....40.....PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....30.....F				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....39.....ชม.				
	STOP.....จน.				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ประทีป ใจดี

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบโดย
ฝ่าย ตรวจสอบระบบ
ลักษณะ
การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ซัน จำกัด
ตรวจสอบเครื่อง GEN - สปีด

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM23120037
วันที่ปฏิบัติงาน	29/12/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ ไฮป์ จักรพรรดิ 1 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
	การตรวจเช็คเครื่อง GEN			
1	อุณหภูมิห้องเครื่อง	✓		
	อุณหภูมิห้องเครื่อง...40...F			
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START...39...ชม.			
	STOP...ชม.			
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...35...F			
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...PSI			
5	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...1500...RPM			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...PSI			
7	เวลา	✓		
	START...14:20...น.			
	STOP...14:40...น.			
	การตรวจเช็คแบตเตอรี่			
1	ตรวจเช็คพลาตาคา	✓		
2	ตรวจเช็คค่าความจาง่ายของ BATTERY	✓		
3	ตรวจเช็คพลาตาคาที่เชื่อม	✓		
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
5	ระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓		
	ระดับน้ำในแบตเตอรี่...37.0...ลิตร			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมเครื่อง	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ขึ้นเครื่อง	✓		
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
11	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓		
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด	✓		
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓		
15	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
	ตรวจเช็ค GP			
1	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓		
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START.....39.....ชม			
	STOP.....ชม			
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์			
5	วัดกระแส	✓		
	R.....แอมป์			
	T.....แอมป์			
	S.....แอมป์			
6	วัดแรงดัน	✓		
	R-S.....398.....โวลต์			
	S-T.....398.....โวลต์			
	T-R.....399.....โวลต์			

ฉบับนี้จัดทำจนจบ/ปฏิบัติงาน

1.ระบอง อุดมศรี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คความถี่

ยี่ห้อ

จำนวน

แบบฉบับเดิม ตรวจเช็คความถี่

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พอใจ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด
โครงการตรวจเช็ค JP - ลิปคัท

รหัสงานFP/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM231200002

วันที่ปฏิบัติงาน01/12/2023

ชื่ออาคารเคอเอ โบลด์ จตุจักร ทยอติค | 1 | ส่วนกลาง | ไบรณ | ไบรณ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็ค OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....12.8.....แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Manual Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Auto Show	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T 399.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
	R-S.....400.....โวลต์				
7	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T.....8.0.....แอมป์				
	R.....8.1.....แอมป์				
	S.....8.7.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
	ค่าที่ Set.....1.2.....โวลต์				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....230.....PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็คท่อระบบอากาศ MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

ไประทีป ลีได้

ผู้ดูแลระบบตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คเครื่องที่มีประจุไฟฟ้าดับปกติ

หมายเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไขข้อผิดพลาด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงานFP/P-W

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM231200010

วันที่ปฏิบัติงาน08/12/2023

ชื่ออาคารและ โยง จตุจักร นนทบุรี | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	ผ่าน/ยังไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	✓		
2	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓		
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
ค่าที่ Set.....12.....แอมป์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓		
T-R.....403.....โวลต์				
R-S.....405.....โวลต์				
S-T.....403.....โวลต์				
8	ตรวจสอบการส	✓		
S.....8.3.....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	ผ่าน/ยังไม่ผ่าน	
R.....8.0.....แอมป์				
T.....7.8.....แอมป์				
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
1. ประชุม สืบค้น

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ
อย่างไร
ถ้าพบ
การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

รหัสงานFD/JP-W

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM23120012

วันที่ปฏิบัติงาน15/12/2023

ชื่ออาคารเดอะ โบลด์ จัตุจักร หนองจอก 1 | ส่วนกลาง | โถงสุขุมวิท (Pump Room)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
1	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน	✓		
	T...8.0...แอมป์			
	S...8.1...แอมป์			
	R...8.0...แอมป์			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓		
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Control	✓		
4	ตรวจสอบค่า High Pressure Show	✓		
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓		
	ค่าที่ Set...11.5...แอมป์			
7	ตรวจสอบค่า Pressure Switch	✓		
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Control	✓		
9	ตรวจสอบค่า High Pressure	✓		
	ST...397...โวลต์			
	TR...397...โวลต์			
	RS...399...โวลต์			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓		
3	ตรวจสอบค่า High Pressure	✓		
	ตรวจสอบค่า High Pressure...215...PSI			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓		
	ตรวจสอบการทำงานของ Motor...230...PSI			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ประจักษ์ สอนดี

ชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตรวจสอบการทำงานของ Motor

อุปกรณ์

ค่าแรง

การแก้ไข

วันที่ปฏิบัติงาน

✓

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□

2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CMO)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราชพรพริต JP - ลับคาฬ

รหัสงาน

FR/JP-W

รหัสเครื่องจักร

JP-1

เลขที่ใบงาน

PM231200019

วันที่ปฏิบัติงาน

22/12/2023

ชื่ออาคาร

หอโรงสูบน้ำ อาคาร 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเย็น	
1	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะของ...230...PSI	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะของ...215...PSI	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
14	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
15	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
16	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
17	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
18	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
19	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
20	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
21	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
22	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
23	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
24	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
25	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
26	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
27	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
28	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
29	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
30	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
31	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
32	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
33	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
34	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
35	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
36	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
37	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
38	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
39	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
40	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
41	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
42	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
43	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
44	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
45	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
46	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
47	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
48	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
49	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
50	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
51	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
52	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
53	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
54	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
55	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
56	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
57	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
58	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
59	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
60	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
61	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
62	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
63	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
64	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
65	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
66	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
67	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
68	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
69	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
70	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
71	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
72	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
73	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
74	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
75	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
76	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
77	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
78	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
79	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
80	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
81	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
82	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
83	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
84	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
85	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
86	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
87	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
88	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
89	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
90	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
91	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
92	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
93	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
94	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
95	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
96	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
97	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
98	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
99	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			
100	ตรวจเช็คสถานะของ	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
ประกอบ ดังนี้

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด เพื่อบันทึกประวัติการทำงาน
.....
.....
.....
.....
.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมจ่าย (CM)

รหัสงานFD/PAW

รหัสเครื่องจักรJP-1

เลขที่ใบงานPM23120039

วันที่ปฏิบัติงาน29/12/2023

ชื่ออาคารเดอะ โกลด์ จูบิลี พาร์ค | 1 | ส่วนกลาง | โบลิ่ง | โหล่ง | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบชุดกลไกตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบเกาท์น้ำในห้อง Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...11.3...แอมป์				
6	ตรวจสอบการแล	✓			
	R...8.1...แอมป์				
	S...8.0...แอมป์				
	T...8.0...แอมป์				
7	ตรวจสอบลิโกล Show	✓			
8	ตรวจสอบคัมเบร้น	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
	INVERTER PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบระดับน้ำออก.....PSI				
7	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า.....PSI				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ อุปกรณ์

ชื่อตัวงาน/ชุดตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ

สภาพ

ที่พบ

การแก้ไข

วันที่ผลตรวจ

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/PAW
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM23120005
วันที่ปฏิบัติงาน	01/12/2023
ชื่ออาคาร	หอ โหล่ จัตุรัส หอศิลป์ 44 ต.พหลฯ ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบสภาพตัวรีด MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor base Pump	✓			
4	ตรวจสอบระดับของระบบไฮดรอลิก MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตัวรีด PUMP	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก.....PSI				
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก.....PSI	✓			
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set.....แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบเช็คชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			
6	ตรวจสอบเช็คชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจสอบเช็คไฟ Show		✓		
8	ตรวจสอบเช็คแรงดัน		✓		
S-T.....โวลต์					
T-A.....โวลต์					
A-S.....โวลต์					
9	ตรวจสอบเช็คการเบส		✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเสีย	
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
1. ประทีป ลีนิล

รายชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด นอกวันและเวลาจำกัด
อุปกรณ์
ผู้ปฏิบัติงาน คือช่างจากโรงงานและแกน
การปฏิบัติงาน เปลี่ยนน้ำมัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☒ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค JP - ลิ้นชัก

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM23120009
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ วิลล่า จัตุจักร หนองจอก 44 ศาลา ไบรอน ไบรอน Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำ PSI				
4	ตรวจสอบระดับน้ำ PSI	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำ PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set.....แอมป์				
3	ตรวจสอบค่าของ Control	✓			
4	ตรวจสอบค่า Snow	✓			
5	ตรวจสอบค่าอื่น	✓			
	Set.....โวลต์				
	T-R.....โวลต์				
	R-S.....โวลต์				
6	ตรวจสอบการส	✓			
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
9	ตรวจสอบชุดสภาพ Fuse Control	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน
1. วิศวกร ลิ้ม

ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
ตรวจสอบเพื่อหาจุด
สาเหตุ
ที่พบ
การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการแก้ไข
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/M)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM23120014
วันที่ปฏิบัติงาน	15/12/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ ไลน์ ซุ้ดาร์ หนองจอก 44 ศาลาพัก ไม่ระบุ ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ผลการตรวจเช็ค		อาการเสีย	
		ใช่	ไม่ใช่		
COMPLAINT					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Control	✓			
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
6	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบเครื่องขึ้น	✓			
	T-R.....โวลต์				
	R-S.....โวลต์				
	S-T.....โวลต์				
9	ตรวจสอบกระแส	✓			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
1	ตรวจสอบที่ลมระบบอากาศ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบสภาพถังเก็บ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสภาพถังเก็บ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	อาการเสีย	
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....PSI				
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....PSI				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ประเมิน ลับดาห์

ชื่อผู้ควบคุมงาน: ผู้ตรวจระบบ

หมายเหตุ

รายละเอียด: ทดสอบประจุไฟฟ้า

สถานะ

ผู้ควบคุมงาน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ เปรียบเทียบแรงดันน้ำเข้า

☐ เปรียบเทียบแรงดันน้ำออก (CM)

รหัสงาน	FP/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM231200018
วันที่ปฏิบัติงาน	22/12/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ โลบ์ จัตุจักร นอยด์ 44 ภาคหัท ไนระ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	ออกการเสีย	
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....				
5	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
	AS.....				
	TR.....				
	ST.....				
8	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
	S.....				
	T.....				
	R.....				
9	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	ออกการเสีย	
6	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor	✓			
	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor.....PSI				
7	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ชื่อ นามสกุล

ชื่อ นามสกุล/ตำแหน่ง

นามสกุล

รายชื่อพนักงาน/ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย แต่ต้องแก้ไข (CA)

รหัสงาน	FR/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM23120038
วันที่ปฏิบัติงาน	29/12/2023
ชื่ออาคาร	เดอะ ไฮส์ ซุซัน พาร์ค 44 ศาลา ไม้ระแนง Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คท่ออากาศลิฟต์	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศลิฟต์	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของระบบลิฟต์และ PUMP	✓			
	หัดประคบน้ำหัว...80...PSI				
	หัดประคบน้ำหัว...80...PSI				
	ดูอนุภาคน้ำหล่อเย็น.....F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	อุณหภูมิการทำงาน.....ชม.				
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....PSI				
	แอมป์มอเตอร์.....แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....1480.....RPM				
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องแยก	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร				
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คลิฟต์ PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความแรงของ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่โอเค	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คลิฟต์แรงดัน	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รายชื่อช่างช่างที่ปฏิบัติงาน

ประกอบ คุณศรี

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คทาสีถัง

ยานยนต์ ตรวจเช็คทาสีถัง

ผู้แนะนำ

การแก้ไขข้อบกพร่อง ตรวจเช็คทาสีถัง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย


☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

ภาคผนวก ก4
เอกสารสรุปการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) (ทส.2)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวงจตุรัส จอมพล เขตอำเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๑๑๑๑๑ มีนิติบุคคล-
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด โดย สหภาพจตุจักร โอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๑๑๑๑ ออกให้

ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

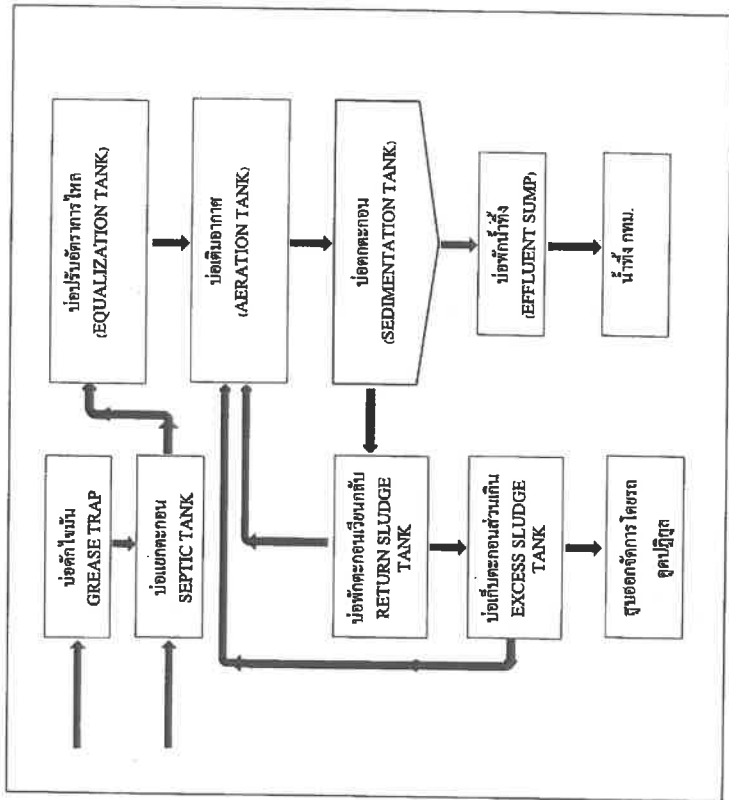

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวงจตุรัส จอมพล เขตอำเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๑๑๑๑๑ มี
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด โอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๑๑๑๑ ออกให้โดย สหภาพจตุจักร โอนอนุญาตเลขที่

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(.....) นางสาวลาสิณี สงสัย
(.....) นายธนกร เกื้อทวน ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมอชิต
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมอชิต
ใบอนุญาตเลขที่ หมอชิต
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกแยะได้ชัดเจน (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องสูบน้ำ เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลม อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระยะทางน้ำทิ้งของ กทม.

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมามา


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 ม.ค. 66	12	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ม.ค. 66	12	229.00	183.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ม.ค. 66	11	139.00	111.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ม.ค. 66	11	202.00	161.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ม.ค. 66	12	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ม.ค. 66	12	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ม.ค. 66	11	76.00	60.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ม.ค. 66	12	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ม.ค. 66	11	235.00	188.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ม.ค. 66	11	236.00	188.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ม.ค. 66	12	241.00	192.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ม.ค. 66	11	233.00	186.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 ม.ค. 66	12	227.00	181.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 ม.ค. 66	12	246.00	196.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31 ม.ค. 66	11	227.00	181.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ม.ค. 66	17	89.00	71.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 ม.ค. 66	11	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 ม.ค. 66	11	310.00	248.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 ม.ค. 66	12	154.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 ม.ค. 66	12	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 ม.ค. 66	12	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 ม.ค. 66	11	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 ม.ค. 66	12	114.00	91.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 ม.ค. 66	12	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 ม.ค. 66	11	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 ม.ค. 66	9	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 ม.ค. 66	12	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 ม.ค. 66	11	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 ม.ค. 66	12	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 ม.ค. 66	11	109.00	87.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 ม.ค. 66	12	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล ออมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๕-๑๑๑๐ โทรสาร - มีนิติบุคคล
อาคารชุด เดอะไดโน จตุจักร-นนทบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ออการชุด เดอะไดโน จตุจักร-นนทบุรี เป็นผู้นำเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สาขาสถาบัน นมดอย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

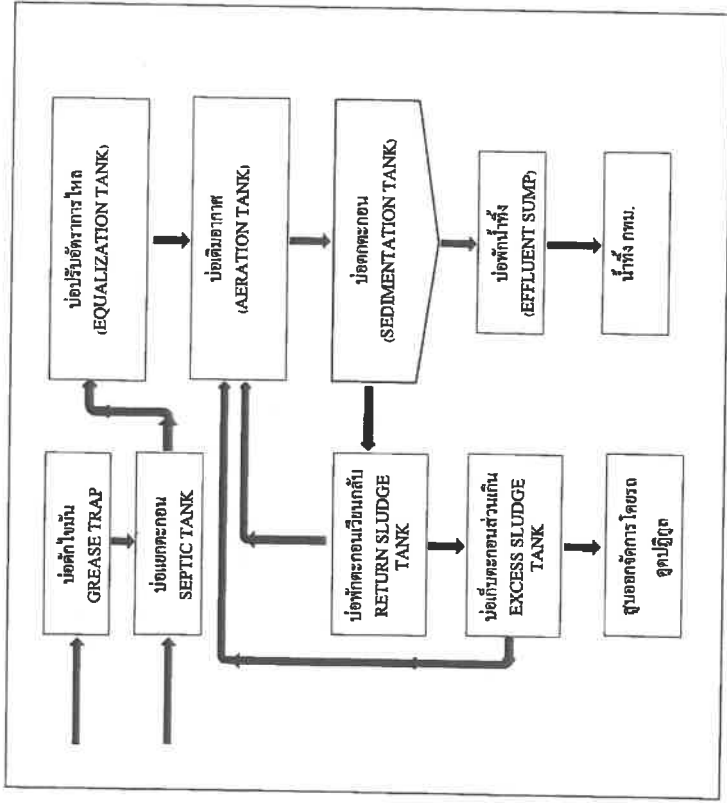

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลและสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
(นางสาวธนาธิป สงสิงห์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายสมเกียรติ เกื้อพาน) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอย
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอย
ออกให้โดย

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่นำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 ก.พ. 66	12	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ก.พ. 66	12	229.00	183.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ก.พ. 66	11	139.00	111.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ก.พ. 66	11	202.00	161.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ก.พ. 66	12	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ก.พ. 66	12	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ก.พ. 66	11	76.00	60.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ก.พ. 66	12	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ก.พ. 66	11	235.00	188.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ก.พ. 66	11	236.00	188.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ก.พ. 66	12	241.00	192.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ก.พ. 66	11	233.00	186.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 66	17	89.00	71.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 ก.พ. 66	11	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 ก.พ. 66	11	310.00	248.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 ก.พ. 66	12	154.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 ก.พ. 66	12	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 ก.พ. 66	12	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 ก.พ. 66	11	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 ก.พ. 66	12	114.00	91.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 ก.พ. 66	12	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 ก.พ. 66	11	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 ก.พ. 66	9	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 ก.พ. 66	12	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 ก.พ. 66	11	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 ก.พ. 66	12	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 ก.พ. 66	11	109.00	87.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 ก.พ. 66	12	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบบันทึกการประเมินผลและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ คือเลขที่ 988 หมู่ที่ ๑ ชอย
ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล ออมพล เขตอำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ มีใบอนุญาต
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด โดย สหภาพจตุจักร หนองอายุ ๑๓๒๗๓ ออกให้

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

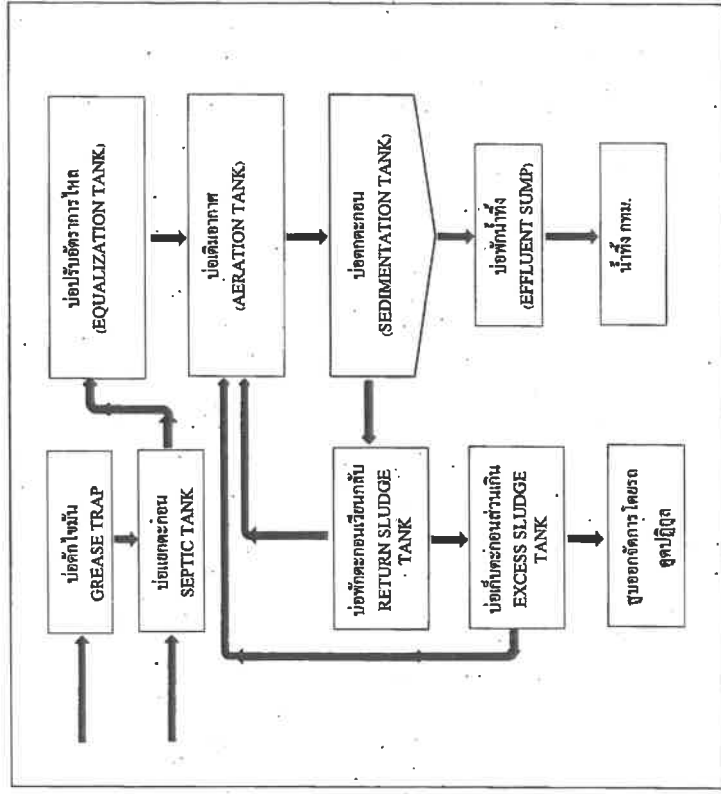

ได้จัดทำเป็นสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
2. ในการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับทราบ
(.....) ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) นางสาว..... ส่งสัย..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....) เกื้อทาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ หนองอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หนองอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ๖๖๖
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร ๖
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ไปรษณีย์
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สหกรณ์การเกษตร หนองคาย

ในการยื่นขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสุวิมล สลักศรี) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสมชาย ก้อยทวน) หนองคาย

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖๖ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ออกให้โดย หนองคาย

(นายสมชาย ก้อยทวน) หนองคาย

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖๖ หนองคาย

ออกให้โดย หนองคาย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกไว้แล้ว (Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ๖ ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลำโพง อื่น ๆ (ระบุ) ๖ ชั่วโมง/วัน

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองคาย

(๕) วิธีการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 947
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5218.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4174.40
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องสูบลำโพง เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 - อื่น ๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดต้องเปลี่ยนอะไหล่

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตาม
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						รวมบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ	เครื่องเติม อากาศ	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี	เครื่องสูบ ตะกอน	อื่นๆ (ระบุ)				
													ปกติ/ผิดปกติ			
17 มี.ค. 66	29	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18 มี.ค. 66	27	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
19 มี.ค. 66	28	249.00	199.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
20 มี.ค. 66	29	171.00	136.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
21 มี.ค. 66	38	201.00	160.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
22 มี.ค. 66	39	137.00	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
23 มี.ค. 66	39	194.00	155.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
24 มี.ค. 66	27	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
25 มี.ค. 66	39	141.00	112.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
26 มี.ค. 66	34	151.00	120.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
27 มี.ค. 66	32	143.00	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
28 มี.ค. 66	37	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
29 มี.ค. 66	34	132.00	105.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
30 มี.ค. 66	35	131.00	104.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
31 มี.ค. 66	36	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ	เครื่องเติม อากาศ	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี	เครื่องสูบ ตะกอน	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 มี.ค. 66	22	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
2 มี.ค. 66	22	149.00	119.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
3 มี.ค. 66	31	126.00	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
4 มี.ค. 66	29	121.00	96.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
5 มี.ค. 66	30	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
6 มี.ค. 66	28	139.00	111.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
7 มี.ค. 66	29	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
8 มี.ค. 66	29	215.00	172.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
9 มี.ค. 66	28	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
10 มี.ค. 66	28	185.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
11 มี.ค. 66	30	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
12 มี.ค. 66	27	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
13 มี.ค. 66	27	197.00	157.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
14 มี.ค. 66	28	197.00	157.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
15 มี.ค. 66	28	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
16 มี.ค. 66	28	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		

แบบบันทึกการยดและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ๓๐๒
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มีใบอนุญาต
 อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภทอาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
 โดย สภาอุตสาหกรรม หมดอย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

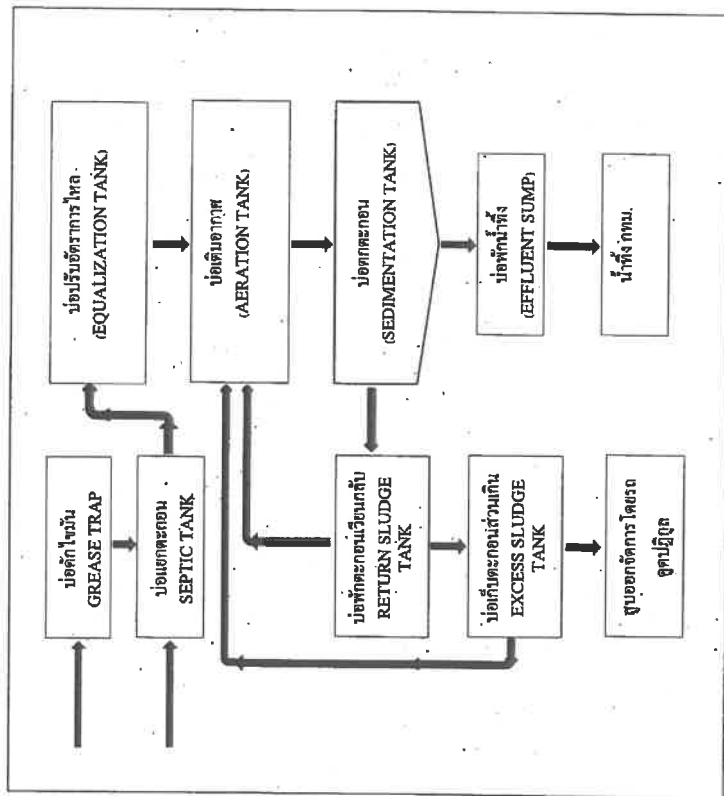

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 (.....) เจ้าของบริษัทผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) ผู้จัดการ
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอย
 ออกให้โดย..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอย
 ออกให้โดย.....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17 เม.ย. 66	37	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18 เม.ย. 66	37	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
19 เม.ย. 66	35	133.00	106.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
20 เม.ย. 66	37	37.00	29.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
21 เม.ย. 66	37	43.00	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
22 เม.ย. 66	28	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
23 เม.ย. 66	35	234.00	187.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
24 เม.ย. 66	37	241.00	192.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
25 เม.ย. 66	38	233.00	186.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
26 เม.ย. 66	28	180.00	144.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
27 เม.ย. 66	43	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
28 เม.ย. 66	30	185.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
29 เม.ย. 66	29	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
30 เม.ย. 66	32	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 เม.ย. 66	34	149.00	119.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 เม.ย. 66	30	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 เม.ย. 66	40	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 เม.ย. 66	33	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 เม.ย. 66	34	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 เม.ย. 66	36	127.00	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 เม.ย. 66	37	214.00	171.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 เม.ย. 66	36	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 เม.ย. 66	37	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 เม.ย. 66	36	143.00	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 เม.ย. 66	37	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 เม.ย. 66	37	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 เม.ย. 66	37	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 เม.ย. 66	37	140.00	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 เม.ย. 66	38	83.00	66.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 เม.ย. 66	36	136.00	108.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ๑๐๒
 ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มีนิติบุคคล
 อาตารชูด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภทอาหารแช่แข็ง โดย นายจตุจักร หนองคาย 13273 ออกให้

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

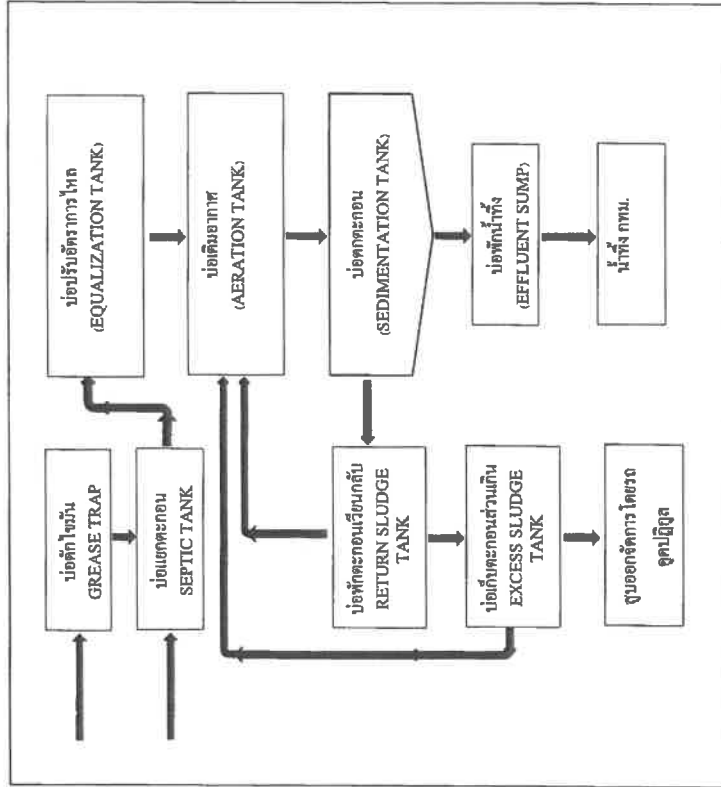

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับทราบ
 (.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) นางสาวสลิณี สลึงค์
 (.....) นายธนภัทร เกื้อทาน
 ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย
 ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย
 ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอากรอุตสาหกรรม โฉนดที่ดิน จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาศรัยชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สานักจตุจักร หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติ

..... พลังแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) นางสาวสินี ธงสิทธิ์

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย หมดอายุ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย หมดอายุ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกที่เวดัลส์สไลด์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

แบบไปต่อเอง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องผสมสารเคมี

เครื่องสูบลม อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . หรือระบายน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน 896.00
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6447.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5157.60
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผลิตปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ผลิตปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ผลิตปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ผลิตปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผลิตปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลมตะกอน ☒ 64 ปกติ ผลิตปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ปกติ ผลิตปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยฯ

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ขอบเขต หรือไม่ปฏิบัติตามหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17 พ.ค. 66	27	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18 พ.ค. 66	26	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
19 พ.ค. 66	27	233.00	186.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
20 พ.ค. 66	26	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
21 พ.ค. 66	27	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
22 พ.ค. 66	27	223.00	178.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
23 พ.ค. 66	27	227.00	181.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
24 พ.ค. 66	26	109.00	87.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
25 พ.ค. 66	23	140.00	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
26 พ.ค. 66	31	222.00	177.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
27 พ.ค. 66	39	285.00	228.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
28 พ.ค. 66	34	290.00	232.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
29 พ.ค. 66	31	217.00	173.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
30 พ.ค. 66	33	224.00	179.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
31 พ.ค. 66	33	225.00	180.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ค. 66	26	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 พ.ค. 66	29	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 พ.ค. 66	29	205.00	164.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 พ.ค. 66	29	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 พ.ค. 66	28	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 พ.ค. 66	30	202.00	161.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 พ.ค. 66	28	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 พ.ค. 66	30	220.00	176.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 พ.ค. 66	29	208.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 พ.ค. 66	29	221.00	176.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 พ.ค. 66	31	248.00	198.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 พ.ค. 66	29	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 พ.ค. 66	28	181.00	144.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 พ.ค. 66	30	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 พ.ค. 66	28	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 พ.ค. 66	26	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบบันทึกการรายงานและเฝ้าระวังของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร - มีนิติบุคคล -
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด เป็นผู้ออกเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สว.จตุจักร หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

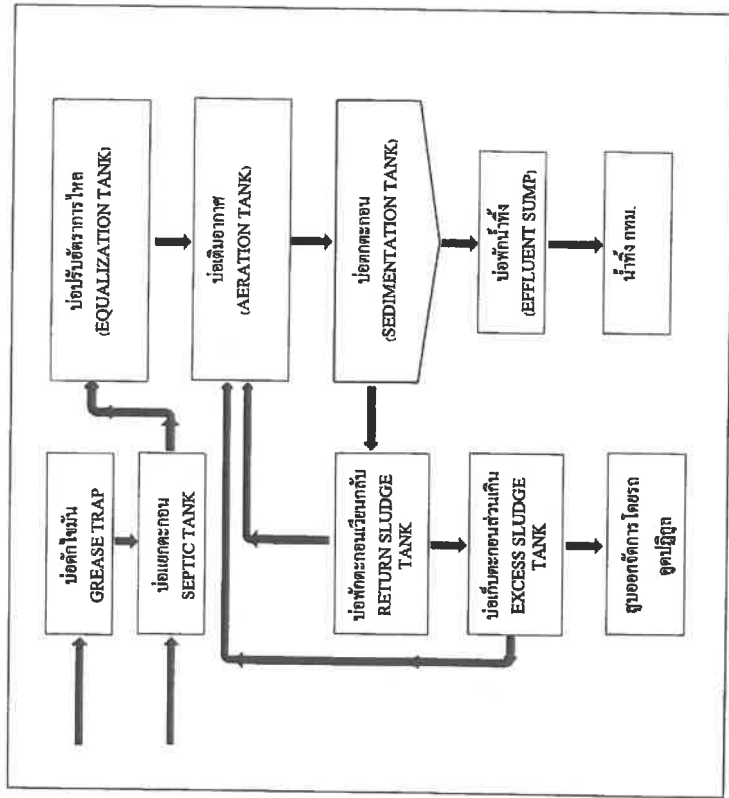

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลและสถิติและข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(นางสาวสุภาวดี สิงห์ชัย) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายสมภาร เกื้อทาน) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ จักรเย็บผ้าที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๓ ชอย
 ถนน พหลโยธิน แขวงสามล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร มี
 นิติบุคคลจากชุด โดยได้ จตุจักร-หมอนิจ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อากาศชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๑๓๒๗๓ ออกให้โดย สาขางจตุจักร หมออายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและควบคุมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(.....) นางสาวลลิตา สดงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....) นายสมานพร เกอหวาน
 ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอวกีแวนติสสตีส์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ☐ ชั่วคราว

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องผสมสารเคมี

เครื่องสูบลูบกลอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปล่อยระบายน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน ๑๒๗๗.๐๐
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๗๘๐๔.๐๐
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๖๒๔๓.๒๐
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทูลกัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๐.๐๐
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องลูบกลอน ☒ ๖๔ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.) ๐.๐๐

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์จำกัดกำลังปริมาณผู้ช่วยระบบบำบัดน้ำเสีย

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ปฏิบัติตามที่หรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีครหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 ธ.ค. 66	21	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ธ.ค. 66	21	204.00	163.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ธ.ค. 66	20	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ธ.ค. 66	20	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ธ.ค. 66	20	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ธ.ค. 66	21	137.00	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ธ.ค. 66	21	142.00	113.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ธ.ค. 66	20	128.00	102.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ธ.ค. 66	32	132.00	105.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ธ.ค. 66	32	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ธ.ค. 66	33	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ธ.ค. 66	33	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 ธ.ค. 66	28	111.00	88.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 ธ.ค. 66	31	133.00	106.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ/ สูตรหรือ กลไก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ธ.ค. 66	32	213.00	170.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 ธ.ค. 66	32	197.00	157.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 ธ.ค. 66	35	230.00	184.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 ธ.ค. 66	32	201.00	160.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 ธ.ค. 66	33	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 ธ.ค. 66	31	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 ธ.ค. 66	34	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 ธ.ค. 66	31	119.00	95.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 ธ.ค. 66	32	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 ธ.ค. 66	30	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 ธ.ค. 66	29	171.00	136.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 ธ.ค. 66	27	180.00	144.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 ธ.ค. 66	21	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 ธ.ค. 66	24	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 ธ.ค. 66	19	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 ธ.ค. 66	20	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

๕) วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการฯ


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีดหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ	เครื่องเติม อากาศ	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี	เครื่องสูบ ตะกอน	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17 ก.ค. 66	4	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18 ก.ค. 66	4	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19 ก.ค. 66	4	145.00	116.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20 ก.ค. 66	4	118.00	94.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21 ก.ค. 66	15	157.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22 ก.ค. 66	17	137.00	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23 ก.ค. 66	15	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24 ก.ค. 66	17	154.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25 ก.ค. 66	16	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26 ก.ค. 66	16	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27 ก.ค. 66	15	143.00	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28 ก.ค. 66	13	145.00	116.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29 ก.ค. 66	14	157.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30 ก.ค. 66	13	106.00	84.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
31 ก.ค. 66	14	129.00	103.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีดหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ	เครื่องเติม อากาศ	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี	เครื่องสูบ ตะกอน	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1 ก.ค. 66	30	126.00	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
2 ก.ค. 66	30	123.00	98.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
3 ก.ค. 66	31	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
4 ก.ค. 66	32	148.00	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
5 ก.ค. 66	29	137.00	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
6 ก.ค. 66	31	140.00	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
7 ก.ค. 66	29	133.00	106.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
8 ก.ค. 66	30	133.00	106.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
9 ก.ค. 66	29	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
10 ก.ค. 66	36	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
11 ก.ค. 66	22	98.00	78.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
12 ก.ค. 66	31	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
13 ก.ค. 66	29	136.00	108.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
14 ก.ค. 66	21	105.00	84.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
15 ก.ค. 66	13	110.00	88.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
16 ก.ค. 66	13	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มีใบอนุญาต
 อุตสาหกรรม เลขที่ ๒๒๒ จดอักษรหมอลือ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภทอุตสาหกรรม โดย หนาอายุ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
 ตั้งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

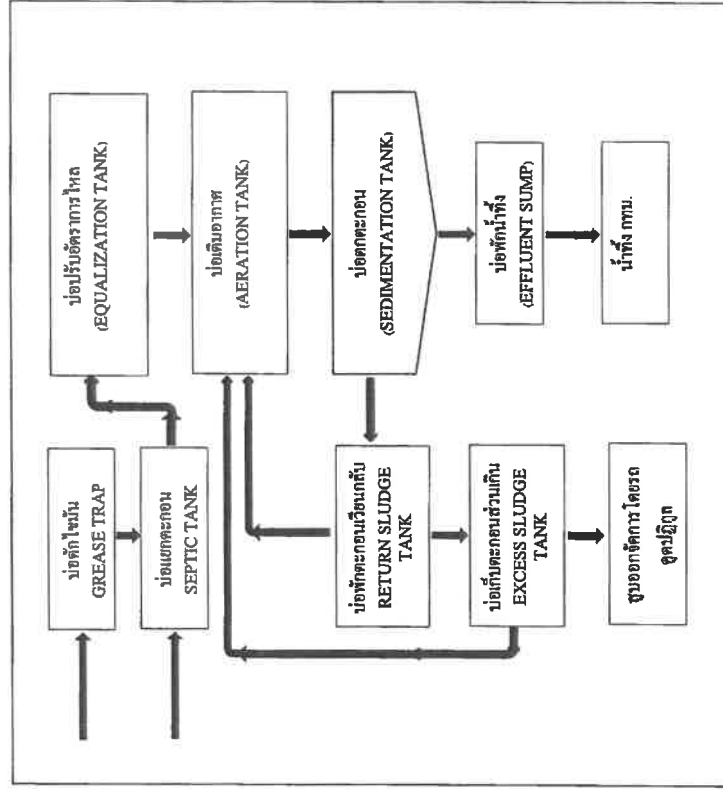

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกลดติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่า ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 (หนาสถาเลสิน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หนาอายุ
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หนาอายุ
 ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๘ หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล จอมพล จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๕-๘๘๓๐ โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-พมอชิด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ไปอนุญาติเลขที่
 (ถ้ามี) 132273 ออกให้โดย สาขาสตงจักร หมายเลข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นางสาวสุวิมล)

(..... นายวิวัฒน์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่)

ออกให้โดย หมายเลข

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย หมายเลข

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยก/ไม่แยก (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

..... เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

..... เครื่องสูบลม อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำทิ้งของ กทม.

(๕) วิธีการตรวจสอบที่ได้ขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 924.00
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5065.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4052.00
 (๔) ปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระบบทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☒ 64 ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.) 0.00
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดต้องเรียกผู้รับจ้างซ่อมแซมทันที

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 ส.ค. 66	20	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ส.ค. 66	20	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ส.ค. 66	20	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ส.ค. 66	17	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ส.ค. 66	21	241.00	192.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ส.ค. 66	19	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ส.ค. 66	19	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ส.ค. 66	21	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ส.ค. 66	18	147.00	117.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ส.ค. 66	20	121.00	96.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ส.ค. 66	19	141.00	112.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ส.ค. 66	20	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 ส.ค. 66	19	148.00	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 ส.ค. 66	18	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31 ส.ค. 66	23	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ส.ค. 66	14	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 ส.ค. 66	14	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 ส.ค. 66	14	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 ส.ค. 66	22	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 ส.ค. 66	22	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 ส.ค. 66	22	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 ส.ค. 66	22	193.00	154.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 ส.ค. 66	21	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 ส.ค. 66	28	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 ส.ค. 66	18	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 ส.ค. 66	23	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 ส.ค. 66	20	164.00	131.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 ส.ค. 66	18	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 ส.ค. 66	19	128.00	102.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 ส.ค. 66	18	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 ส.ค. 66	20	131.00	104.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	


แบบ พ.๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑ - ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวงสามเณร จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร - มีนิติบุคคล
อาคารชุด เดอะไฮส์ จตุจักร-พมอริต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุด โดย เจ้าของอาคารชุด เป็นอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สาขาจตุจักร หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

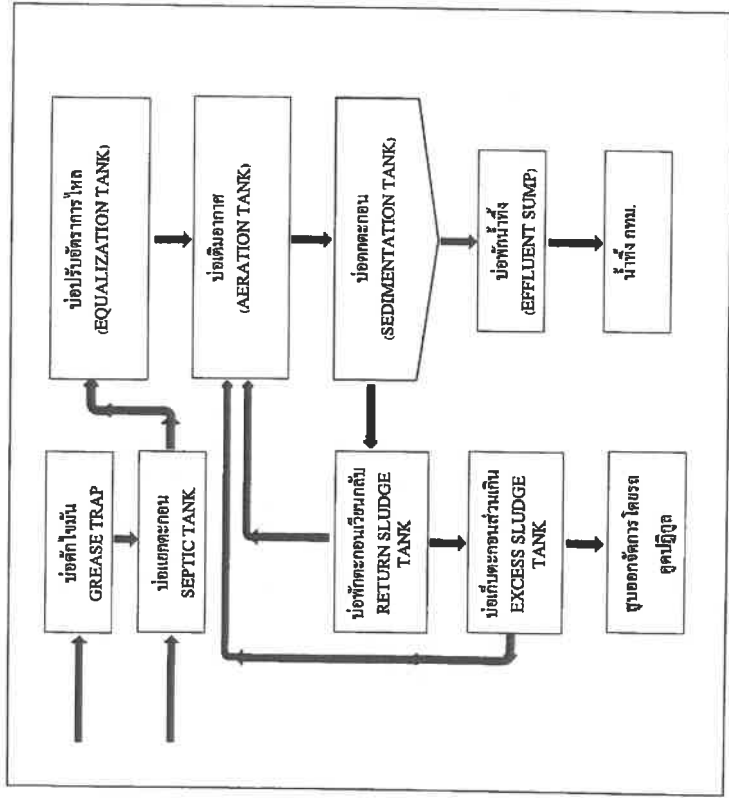

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(นางสาวสาธิตี สงสัย) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายอนุวัตร เกื้อทาน) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด จัดเก็บสถิติ ข้อมูล ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การปล่อย ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลิมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 ก.ย. 66	37	226.00	180.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ก.ย. 66	39	248.00	198.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ก.ย. 66	37	256.00	204.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ก.ย. 66	24	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ก.ย. 66	22	230.00	184.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ก.ย. 66	26	243.00	194.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ก.ย. 66	31	229.00	183.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ก.ย. 66	35	247.00	197.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ก.ย. 66	31	231.00	184.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ก.ย. 66	32	236.00	188.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ก.ย. 66	32	234.00	187.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ก.ย. 66	27	205.00	164.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 ก.ย. 66	26	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 ก.ย. 66	22	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การปล่อย ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลิมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 ก.ย. 66	23	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
2 ก.ย. 66	19	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
3 ก.ย. 66	10	219.00	175.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
4 ก.ย. 66	18	208.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
5 ก.ย. 66	15	175.00	140.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
6 ก.ย. 66	27	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
7 ก.ย. 66	38	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
8 ก.ย. 66	31	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
9 ก.ย. 66	30	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
10 ก.ย. 66	52	223.00	178.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
11 ก.ย. 66	28	193.00	154.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
12 ก.ย. 66	28	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
13 ก.ย. 66	30	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
14 ก.ย. 66	32	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
15 ก.ย. 66	30	226.00	180.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
16 ก.ย. 66	36	226.00	180.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๑๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร มีนิติบุคคล-
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-ห้วยซิด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทอุตสาหกรรม โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง (ถ้ามี) ๑๓๒๗๓ ออกให้
โดย สาขาจตุจักร หมายเลข
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

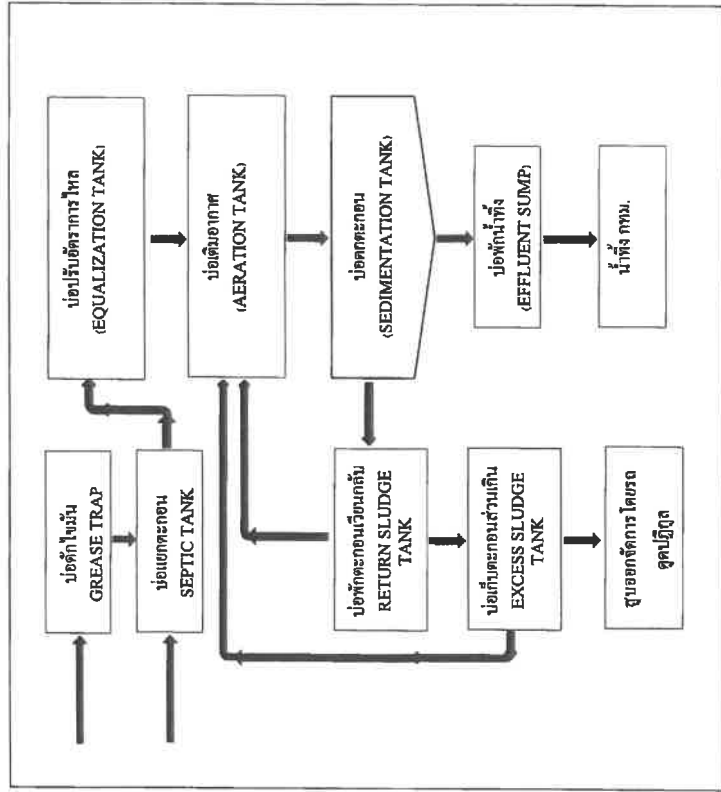

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลสรายเดือน

ขอรับรอง จะปฏิบัติตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้โดย หมายเลข
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๐๘๘ หมู่ที่ ๓๐๖ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวงสามล ออมพล เขตอำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาชญากรรม โดยได้จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาชญากรรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) นางสาว..... (.....)
 (.....) นาย..... (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....) นาย..... (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ พมดอย
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ พมดอย
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอวกีเวตีสลัตต์ (Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

..... เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

..... เครื่องสูบลูบตะกอน (.....)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) ปล่อยน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๙๓๖.๐๐
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๙๒๗๔.๐๐
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๙๑๗๐.๐๐
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๐.๐๐
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ๖๔ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๐.๐๐
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องดูด ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 ต.ค. 66	14	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ต.ค. 66	27	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ต.ค. 66	30	217.00	173.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ต.ค. 66	29	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ต.ค. 66	28	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ต.ค. 66	9	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ต.ค. 66	0	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ต.ค. 66	0	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ต.ค. 66	1	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ต.ค. 66	2	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ต.ค. 66	14	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ต.ค. 66	2	172.00	137.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 ต.ค. 66	0	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 ต.ค. 66	0	219.00	175.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31 ต.ค. 66	0	181.00	144.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องดูด ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ต.ค. 66	31	172.00	137.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 ต.ค. 66	25	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 ต.ค. 66	35	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 ต.ค. 66	23	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 ต.ค. 66	25	210.00	168.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 ต.ค. 66	28	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 ต.ค. 66	29	223.00	178.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 ต.ค. 66	28	223.00	178.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 ต.ค. 66	28	205.00	164.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 ต.ค. 66	27	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 ต.ค. 66	29	233.00	186.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 ต.ค. 66	19	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 ต.ค. 66	14	214.00	171.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 ต.ค. 66	15	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 ต.ค. 66	20	203.00	162.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 ต.ค. 66	14	193.00	154.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร มีใบอนุญาต:
 อากาศชุด เตอะไลน์ จตุจักร-นนทบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภท อากาศชุด โดย นายจตุจักร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
 โดย นายจตุจักร หมดยุค

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

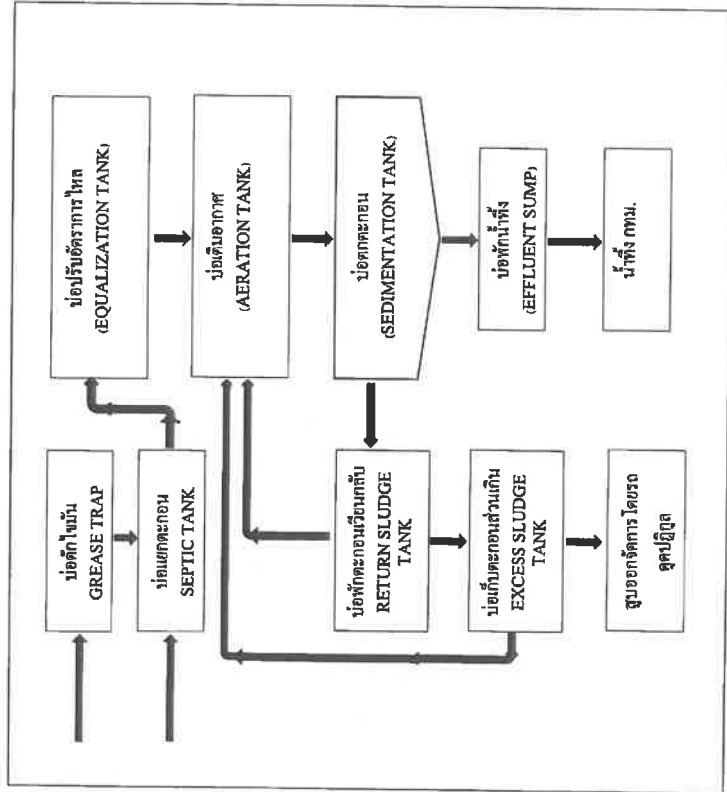

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการนี้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้อาศัยสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 (... นายสุภาวสิทธิ์ สวัสดิ์ชัย) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (... นายสุภาวสิทธิ์ สวัสดิ์ชัย) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (... นายสุภาวสิทธิ์ สวัสดิ์ชัย) หมดยุค
 ออกให้โดย หมดยุค
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (... หมดยุค)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค
 ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวงคำบิล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(.....) นางสาวสวลินี สดลัมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) นายธนภัทร เกื้อทาน ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายความว่า
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายความว่า
 ออกให้โดย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายความว่า
 ออกให้โดย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายความว่า
 ออกให้โดย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายความว่า
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย นอกเหนือจากที่แจ้ง (Advanced Sited Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลม อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระบายน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีการที่จะก่อนให้เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดทำผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 15.00
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8224.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7672.60
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัทธิภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังเปลี่ยนผู้ซ่อมแซมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำไป กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 พ.ย. 66	0	154.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 พ.ย. 66	0	141.00	112.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 พ.ย. 66	0	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 พ.ย. 66	0	233.00	186.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 พ.ย. 66	0	216.00	172.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 พ.ย. 66	0	227.00	181.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 พ.ย. 66	1	219.00	175.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 พ.ย. 66	0	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 พ.ย. 66	0	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 พ.ย. 66	0	191.00	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 พ.ย. 66	7	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 พ.ย. 66	0	104.00	83.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 พ.ย. 66	5	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 พ.ย. 66	0	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำไป กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ย. 66	0	185.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 พ.ย. 66	0	213.00	170.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 พ.ย. 66	0	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 พ.ย. 66	0	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 พ.ย. 66	0	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 พ.ย. 66	0	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 พ.ย. 66	0	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 พ.ย. 66	0	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 พ.ย. 66	0	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 พ.ย. 66	0	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 พ.ย. 66	0	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 พ.ย. 66	0	175.00	140.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 พ.ย. 66	0	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 พ.ย. 66	1	223.00	178.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 พ.ย. 66	0	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 พ.ย. 66	0	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน หมู่ ๑๒๖ เขตอำเภอ จังหวัด
โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร มีนิติบุคคล
อาคารชุด คอนโดไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุด โดยสัญญาเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย นายจตุจักร หมตอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

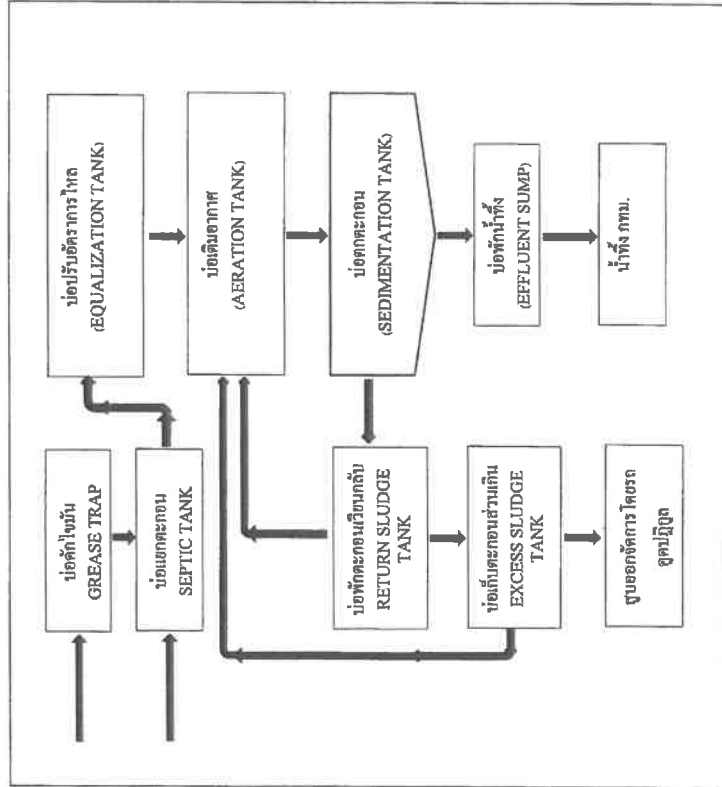

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าความบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....นางสาวสาธิตี นงส์นุ.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายธนกร เกื้อพาน.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ จัวยุสละที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๓๐๖
ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๑-๑๑๑๑ โทรสาร ๑๑๑
นิติบุคคลถูกตรวจสอบ โดย โสณกุล จตุจักร-หมอยุติ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม ในอนุญาตเลขที่
(ด้าน) ๑๑๑๑ ออกให้โดย สภาอุตสาหกรรม ทมอยุธยา

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของบริษัทผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นางสาวสุวิมล สลักศรี)
(..... นายสมชาย เกตุตัน) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมอชิต
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอชิต
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกชีวเคมี (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง

□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

□ เครื่องสูบลม □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ

□ เครื่องกวนผสมสารเคมี

□ เครื่องสูบลม □ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๓๘๙.๐๐
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๗๕๓๕.๐๐
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๗๒๘๐.๕๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๐.๐๐
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☒ ๕๔ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.) ๐.๐๐

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์สำคัญที่ชำรุดเสียหาย

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การปล่อย โพ๊ทัสของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีครหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเดิม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 ธ.ค. 66	7	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ธ.ค. 66	8	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ธ.ค. 66	9	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ธ.ค. 66	11	180.00	144.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ธ.ค. 66	8	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ธ.ค. 66	8	126.00	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ธ.ค. 66	6	143.00	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ธ.ค. 66	10	120.00	96.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ธ.ค. 66	7	123.00	98.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ธ.ค. 66	9	117.00	93.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ธ.ค. 66	8	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ธ.ค. 66	10	204.00	163.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 ธ.ค. 66	8	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 ธ.ค. 66	10	140.00	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31 ธ.ค. 66	8	149.00	119.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช่ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีครหรือ กิโกลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเดิม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ธ.ค. 66	1	118.00	94.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 ธ.ค. 66	7	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 ธ.ค. 66	8	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 ธ.ค. 66	11	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 ธ.ค. 66	11	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 ธ.ค. 66	27	151.00	120.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 ธ.ค. 66	19	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 ธ.ค. 66	19	191.00	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 ธ.ค. 66	8	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 ธ.ค. 66	4	201.00	160.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 ธ.ค. 66	3	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 ธ.ค. 66	4	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 ธ.ค. 66	2	172.00	137.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 ธ.ค. 66	3	111.00	88.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 ธ.ค. 66	4	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 ธ.ค. 66	0	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
