

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)
ระยะดำเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
เลขที่ 7/317 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3803-6307 โทรสาร 0-3803-6308



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2760-3000 โทรสาร 0-2760-3197 www.alsglobal.com



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)
ระยะดำเนินการ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
เลขที่ 7/317 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3803-6307 โทรสาร 0-3803-6308



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2760-3000 โทรสาร 0-2760-3197 www.alsglobal.com



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่เลขที่ 7/317 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.
(✓) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายสุพจน์ สลามเต๊ะ		ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นายเดช ช้างชน		ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นายสุรียา สอนแก้ว		ผู้จัดการอาวุโส
นางศิวารรณ ใจบุญ		ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวยุพาพร จันทรเปล่ง)



ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)
2. สถานที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 7/317 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3803-6307 โทรสาร 0-3803-6308
Email :
5. จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.7/4371
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.7/7074
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.7/4371
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-1
1.3 ขอบเขตของการจัดทำรายงาน	1-2
1.4 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.4.1 ที่ตั้งและขนาดโครงการ	1-2
1.4.2 ลักษณะการใช้ที่ดินภายในโครงการ	1-2
1.4.3 องค์ประกอบของหน่วยผลิตไฟฟ้า	1-4
1.4.4 ผลิตภัณฑ์	1-4
1.4.5 เชื้อเพลิงและสารเคมี	1-5
1.4.6 กระบวนการผลิต	1-5
1.4.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	1-8
1.4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1-10
1.5 มลพิษและการควบคุม	1-14
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 บทนำ	3-1
3.2 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ	3-2
3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.2.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-5

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 3 (ต่อ)	หน้า
3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-8
3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-10
3.4.1 คุณภาพอากาศจากปล่อง	3-10
3.4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-17
3.4.3 ความเร็วและทิศทางลม	3-51
3.4.4 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-60
3.4.5 ระดับเสียงในบรรยากาศ	3-69
3.4.6 ระดับเสียงรบกวน	3-76
3.4.7 การจัดการกากของเสีย	3-79
3.4.8 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	3-80
3.4.9 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน	3-81
3.4.10 ระดับเสียงในสถานประกอบการ	3-81
3.4.11 ระดับความร้อนในสถานประกอบการ	3-90
3.4.12 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	3-93
3.4.13 มวลชนสัมพันธ์	3-93
3.4.14 สุขภาพอนามัยของประชาชน	3-94
3.4.15 สุนทรียภาพ	3-94
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4-1	แสดงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โครงการ 1-2
1.4-2	แสดงการใช้น้ำแต่ละประเภทของโครงการ 1-9
2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 2-2
3.2-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด 3-2
3.2-2	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-6
3.4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 3-12
3.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม ปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 3-13
3.4-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 3-21
3.4-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 3-25
3.4-5	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาบยางพร (GPS 47P 0731364, 1437020) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 3-53
3.4-6	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแก (GPS 47P 0724074, 1439002) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 3-54
3.4-7	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี (GPS 47P 0725723, 1440249) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 3-55

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.4-8 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) (GPS 47P 0728521, 1438948) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566	3-56
3.4-9 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร (GPS 47P 0725768, 1434353) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566	3-57
3.4-10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-61
3.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-63
3.4-12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-70
3.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-71
3.4-14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-77
3.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-78
3.4-16 สรุปรีมาณการกักของเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-80
3.4-17 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ บริเวณ Gas Turbine Generator ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-83
3.4-18 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ บริเวณ Air Compressor (ABPR 2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-84
3.4-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ บริเวณ Steam Turbine (ST 20) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-85
3.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-86
3.4-21 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2566	3-91
3.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-91
4.2-1 สรุปรูปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	4-2

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.4-1	แสดงพื้นที่ที่ตั้งโครงการ	1-3
3.4-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อ อุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-15
3.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-41
3.4-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-43
3.4-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-45
3.4-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-47
3.4-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-49
3.4-7	ผังแสดงความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566	3-58
3.4-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-66
3.4-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโครงการทางด้าน ทิศตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-74
3.4-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-75
3.4-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-79
3.4-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-88
3.4-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-92

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.2-1	การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ	2-102
2.2-2	กล้องและเบอร์โทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียน	2-102
2.2-3	อุปกรณ์ Burner ในระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO _x	2-103
2.2-4	ระบบ CEMs	2-103
2.2-5	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) บำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค บริโภค ของพนักงาน	2-103
2.2-6	ร่างระบายน้ำคอนกรีต	2-104
2.2-7	บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน	2-104
2.2-8	เครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ บริเวณ Water Retention Pit	2-104
2.2-9	ระบบระบายน้ำฝนของโครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมฯ	2-105
2.2-10	ฐานคอนกรีตลดแรงสั่นสะเทือน	2-105
2.2-11	อาคารครอบเครื่องจักร	2-105
2.2-12	อุปกรณ์ลดเสียง (Silencer)	2-105
2.2-13	ประตูกระจกกันเสียง สำหรับห้องควบคุม	2-105
2.2-14	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรอง	2-106
2.2-15	การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน	2-106
2.2-16	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	2-106
2.2-17	ป้ายควบคุมความเร็วในพื้นที่โครงการ	2-106
2.2-18	ถังขยะในพื้นที่โครงการ	2-107
2.2-19	กระดาษ Reuse	2-107
2.2-20	อาคารเก็บรวบรวมขยะ	2-107
2.2-21	พื้นที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมี	2-107
2.2-22	ป้ายเตือนพื้นที่อันตรายบริเวณต่างๆ	2-108
2.2-23	ระบบตรวจสอบ ตรวจจับและสัญญาณเตือนภัย	2-109
2.2-24	อุปกรณ์ดับเพลิง	2-109
2.2-25	พาหนะสำรองเพื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	2-110
2.2-26	บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	2-110
2.2-27	รั้วตาข่าย	2-110

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2.2-28	ระบบท่อ By pass และระบบวาล์วสำรอง	2-110
2.2-29	ปล่องระบายก๊าซ Blow down stack	2-110
2.2-30	อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผง	2-110
2.2-31	ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Transformer Protection)	2-110
2.2-32	อุปกรณ์ลดความเสี่ยงจากการระเบิดของเครื่องจักร	2-111
2.2-33	การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้แทนชุมชนและ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2-112
2.2-34	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	2-112
2.2-35	เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้	2-112
3.4-1	การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-11
3.4-2	การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-20
3.4-3	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-60
3.4-4	การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-70
3.4-5	การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม ปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	3-82
3.4-6	การตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม ปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2566	3-90

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ขนาด 142.1 เมกะวัตต์ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด ตามเอกสารในภาคผนวก ก) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 23.95 ไร่ (38,320 ตารางเมตร) ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เป็นโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยก่อนดำเนินการดังกล่าว บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณา และได้รับหนังสือเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.7/7074 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 และต่อมาได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) เพื่อพิจารณา และได้รับหนังสือเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.7/4371 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 (ภาคผนวก ก) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและกำหนดให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring) ของโครงการ
- 2) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3) เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว พร้อมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตของการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น จะประกอบไปด้วย

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งใช้ประกอบผลการดำเนินการ โดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้นำรายงานผลดังกล่าวมาผนวกเข้าไว้ในรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว โดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดทั้งหมด และข้อมูลของโครงการในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.4 รายละเอียดโครงการ

1.4.1 ที่ตั้งและขนาดโครงการ

บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบตาพุด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีบริเวณรอบพื้นที่โครงการติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ (รูปที่ 1.4-1)

- ทิศเหนือ ติดกับ บริษัท นิฮอน พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด
- ทิศใต้ ติดกับ ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
- ทิศตะวันออก ติดกับ บริษัท นิปปอน คอนโบ (ประเทศไทย) จำกัด
- ทิศตะวันตก ติดกับ บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด

1.4.2 ลักษณะการใช้ที่ดินภายในโครงการ

พื้นที่โครงการขนาด 23.95 ไร่ (38,320 ตารางเมตร) มีรายละเอียดดังตารางที่ 1.4-1

ตารางที่ 1.4-1 แสดงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โครงการ

การใช้พื้นที่	ตารางเมตร	ร้อยละ
1. พื้นที่อาคารสำนักงาน	1,500	3.91
2. พื้นที่กระบวนการผลิต	7,400	19.31
3. พื้นที่สาธารณูปโภค	14,550	37.97
4. ถนนและพื้นที่ว่าง	9,647	25.17
5. พื้นที่สีเขียว	5,223	13.63
รวม	38,320	100

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), พฤษภาคม 2557



รูปที่ 1.4-1 แสดงพื้นที่ตั้งโครงการ

การออกแบบจัดวางผังอาคารและเครื่องจักรของโครงการได้คำนึงถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรมและความปลอดภัยประกอบกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นสำคัญ โดยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ (Gas Turbine และ Steam Turbine) จะถูกติดตั้งไว้ในอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องจักรไว้ในระดับหนึ่ง ส่วนหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ได้ถูกออกแบบให้อยู่ภายนอกอาคาร นอกจากนี้ จากกำหนดตำแหน่งของปล่องระบายอากาศ ได้คำนึงถึงทิศทางลมหลักในพื้นที่ที่จะส่งผลให้มลสารเกิดการกระจายตัวในบรรยากาศได้ดีที่สุดเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับการออกแบบอาคารหอหล่อเย็น ซึ่งอาศัยกระแสลมที่พัดผ่านช่วยให้การระบายความร้อนบริเวณหอหล่อเย็นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4.3 องค์ประกอบของหน่วยผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมของโครงการ มีองค์ประกอบของหน่วยผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) ซึ่งเป็นกังหันก๊าซอุตสาหกรรมแบบ Dry Low NOx จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งติดตั้งระบบทำความเย็น (Chiller) โดยในกรณีเดินเครื่อง Chiller จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 50 เมกะวัตต์ และในกรณีไม่เดินเครื่อง Chiller จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 44.9 เมกะวัตต์
- เครื่องผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator : STG) ชนิด 2 ระดับความดัน จำนวน 1 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 42.1 เมกะวัตต์

1.4.4 ผลិតภัณฑ์

1) พลังไฟฟ้า

โครงการสามารถผลิตพลังไฟฟ้าได้สูงสุด (Gross Power) 139.1 เมกะวัตต์ และมีค่าการออกแบบสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ได้ออกแบบไว้ที่ขนาด 142.1 เมกะวัตต์

2) ไอน้ำ

เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG) สามารถผลิตไอน้ำไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำความดัน 2 ระดับ ดังนี้

- ไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam) ขนาด 76.9 บาร์ อุณหภูมิ 514.5 องศาเซลเซียส โดย HRSG แต่ละเครื่อง มีอัตราการผลิตไอน้ำสูงสุดประมาณ 64.57 ตันต่อชั่วโมง
- ไอน้ำความดันต่ำ (Low Pressure Steam) ขนาด 7.65 บาร์ อุณหภูมิ 241.8 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการผลิตไอน้ำสูงสุดประมาณ 12.11 ตันต่อชั่วโมง

ไอน้ำทั้ง 2 ระดับความดัน จะถูกส่งผ่านเข้าสู่เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยแยกเป็น 2 วงจร คือ วงจรไอน้ำความดันสูงและวงจรไอน้ำความดันต่ำ พลังงานความร้อนจากไอน้ำจะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ ทั้งนี้ ไอน้ำที่ผ่านกังหันไอน้ำจะมีความดันลดลง ซึ่งโครงการมีการแยกไอน้ำขนาดความดัน 21.01 บาร์ อุณหภูมิ 224.9 องศาเซลเซียส ออกจากวงจรไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam) ปริมาณสูงสุด 30 ตันต่อชั่วโมง ส่งผ่านระบบท่อจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าไอน้ำของโครงการ

1.4.5 เชื้อเพลิงและสารเคมี

1) เชื้อเพลิง

โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยไม่มีการสำรองเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลไว้ในพื้นที่โครงการเพื่อเดินระบบแต่อย่างใด เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งมีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความมั่นคงสูง ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงสุดกรณีเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต (Full Load) อัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 1.01 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง

2) สารเคมีและสารเติมแต่ง

- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์, โซเดียมไฮโปคลอไรด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโพลีเมอร์
- ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ประกอบด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก, สารป้องกันการเกิดตะกรัน, สารฆ่าเชื้อไบโอไซด์ และโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์
- ระบบผลิตไอน้ำ ประกอบด้วย แอมมีน, ไตรโซเดียมฟอสเฟต และสารกำจัดออกซิเจน
- ระบบหล่อเย็น ประกอบด้วย โซเดียมไฮโปคลอไรด์, กรดซัลฟูริก, สารป้องกันการกัดกร่อน และสารป้องกันการเกิดตะกรัน

1.4.6 กระบวนการผลิต

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีระบบการทำงานร่วมกัน 2 ระบบ คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันก๊าซ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ำ โดยมีการนำพลังงานความร้อนจากก๊าซร้อนที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าที่เครื่องกังหันก๊าซไปใช้ในการต้มน้ำที่เครื่องผลิตไอน้ำ และใช้น้ำในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำเพื่อผลิตพลังงานได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นการใช้ประโยชน์ไม่ให้ความร้อนสูญเปล่าไปในบรรยากาศ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญของโครงการ สามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator ; GTG)

กระบวนการผลิตที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน เริ่มต้นจากการกรองอากาศด้วยเครื่องกรองอากาศ (Air Filter) ผ่านเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ (Chiller) และเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ตามลำดับ ก่อนส่งต่อไปยังห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ภายในห้องเผาไหม้มีช่องป้อนเชื้อเพลิง มีลักษณะเป็นหัวฉีดในลักษณะกระจาย (Spray) แบบ Dry Low NO_x Combustor เมื่อมีการจุดระเบิดและเชื้อเพลิงติดไฟจะเกิดปฏิกิริยาการสันดาป มีอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส ได้ก๊าซร้อนมีความดันและการขยายตัวสูง ส่งออกจากห้องเผาไหม้ไปขับเคลื่อนชุดใบพัดอีกชุดหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเพลาร่วมกันกับเครื่องอัดอากาศให้หมุน เรียกว่า เครื่องกังหัน (Gas Turbine) นำการถ่ายเทพลังงานด้วยการหมุนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปจุดเพลารอเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ให้หมุนจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ส่วนก๊าซร้อนเสีย (Exhaust Gas) ที่มีความดันและอุณหภูมิพอเพียงสามารถส่งไปใช้เป็นแหล่งพลังงานที่เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG) เพื่อผลิตไอน้ำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในขั้นตอนต่อไป

2) เครื่องผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generators ; HRSG)

เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG) เป็นหม้อกำเนิดไอน้ำซึ่งออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการใช้ความร้อนของก๊าซเสียจากเครื่องกังหันก๊าซ (GTG) เป็นแหล่งพลังงาน เรียกว่า Heat Recovery Steam Generator (HRSG) ทั้งนี้ HRSG ที่ใช้ในโครงการมี 2 เครื่องเป็นชนิด Horizontal Flow ติดตั้งภายนอกอาคาร สามารถผลิตไอน้ำความดัน 2 ระดับ คือ ไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam) และไอน้ำความดันต่ำ (Low Pressure Steam)

หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง ภายในติดตั้งชุดท่อเหล็กทนความร้อนสูงหลายชุดเป็นทางผ่านของก๊าซร้อน (Gas Duct) จากเครื่องกังหันก๊าซที่ปล่อยเข้ามาใน HRSG เกิดการถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำและไอน้ำภายในท่อกับก๊าซร้อนที่อยู่ภายนอก ซึ่งชุดท่อภายในหม้อน้ำสามารถจำแนกได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย Economizer, Evaporator และ Super Heater

(1) แผงท่อรับความร้อน (Economizer) เป็นชุดท่อให้ความร้อนแก่น้ำที่มาจากระบบ (Feed Water) คือน้ำที่ได้จากการกลั่นตัวของไอน้ำผสมกับน้ำที่เดิมเข้าไปในระบบที่เครื่องควบแน่น

(2) เครื่องผลิตไอน้ำ (Evaporator) เป็นชุดท่อให้ความร้อนแก่น้ำที่ผ่านมาจาก Economizer ทางด้านล่างของตัวเครื่องแยกไอน้ำ (Boiler Drum) ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาระดับน้ำในชุดท่อไว้ไม่ให้แห้งเป็นไอน้ำทั้งหมดเนื่องจากชุดท่อไม่สามารถทนความร้อนที่สูงมาก ดังนั้นภายในท่อจึงคงสภาพน้ำผสมไอน้ำวนเวียนอยู่ในท่อเครื่องผลิตไอน้ำและไหลกลับมาสู่หม้อน้ำ (Drum) เพื่อแยกน้ำและไอน้ำออกจากกัน โดยไอน้ำจะถูกส่งเข้าเครื่องทวีความร้อน (Super Heater) ผลิตไอน้ำยิ่งยวดหรือไอดง (Superheated Steam) ส่งไปขับเคลื่อนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนน้ำจะถูกหมุนเวียนเข้าสู่หม้อน้ำอีกครั้ง

(3) เครื่องทวีความร้อน (Super Heater) มีหน้าที่ผลิตไอน้ำยิ่งยวด ลักษณะเป็นชุดท่อที่แขวนไว้ภายในหม้อน้ำ ปลายแต่ละด้านต่อกับท่อรวมที่เรียกว่า Header โดยด้านหนึ่งของ Header จะยึดต่อเข้ากับหม้อต้มไอน้ำ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะไม่ยึดติดตายตัวเพื่อการขยายตัวเมื่อท่อร้อน และส่งไอน้ำต่อไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ ทั้งนี้ Super Heater แบ่งออกเป็น 2 วงจร คือ ไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam) ขนาด 76.9 บาร์ และไอน้ำความดันต่ำ (Low Pressure Steam) ขนาด 8.31 บาร์ ซึ่งจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า

3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generators ; STG)

โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 42.1 เมกะวัตต์ เป็นแบบ Multi-Shaft, Combine Cylinder HP&LP ติดตั้งไว้ภายในอาคาร ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนจากไอน้ำให้เป็นพลังงานกล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ตามระดับความดันที่ใช้ คือ High Pressure (HP) และ Low Pressure (LP)

การทำงานเริ่มจากไอน้ำความดันสูง (HP) และไอน้ำความดันต่ำ (LP) จาก HRSG จะถูกส่งผ่าน Control Valve เพื่อควบคุมปริมาณไอน้ำไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ไอน้ำที่ผ่านออกจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำจะถูกส่งมาควบแน่นที่หน่วยควบแน่น (Condenser) ทำให้มีแรงดันและอุณหภูมิลดลงจนกลั่นตัวเป็นน้ำ เรียกว่า คอนเดนเสท เช่นเดียวกับคอนเดนเสทอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในเส้นทางที่ส่งจำหน่ายไอน้ำไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าไอน้ำ คอนเดนเสททั้งหมดจะถูกรวบรวมส่งเข้าสู่ถังพักน้ำร้อน และส่งเข้าสู่ถัง

Deaerator เพื่อกำจัดออกซิเจนในน้ำก่อนส่งเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ำ โดยใช้เป็นน้ำป้อนและน้ำชดเชยในหม้อไอน้ำ (Make up) อีกครั้ง

4) เครื่องควบแน่น (Condenser)

เครื่องควบแน่นของโครงการ มีจำนวน 1 เครื่อง เป็นแบบ Surface Condenser, Horizontal Single Shell ทำหน้าที่ควบแน่นไอน้ำที่ออกมาจาก STG (Steam Turbine Generator) โดยการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความร้อนกับน้ำเย็นที่ส่งมาจากหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ภายในเส้นท่อ ทำให้อไอน้ำภายนอกเส้นท่อเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำ และหมุนเวียนส่งกลับเข้าสู่เครื่องกำเนิดไอน้ำ (HRSG) ต่อไป

ทั้งนี้ น้ำจากหอหล่อเย็น เมื่อผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่เครื่องควบแน่นแล้วจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส จะถูกส่งกลับไปยังหอหล่อเย็นเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ จากนั้นจึงหมุนเวียนกลับไปแลกเปลี่ยนความร้อนที่เครื่องควบแน่นต่อไป ระบบระบายน้ำแบบนี้ เรียกว่า ระบบระบายน้ำแบบวงจรปิด (Closed Cycle System)

5) หอหล่อเย็น (Cooling Tower)

โครงการมีหอหล่อเย็น แบบ Induce Draft Counter Flow Cooling Tower ลักษณะโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ส่วนทางกับกระแสน้ำที่จะลดอุณหภูมิซึ่งถูกฉีดเป็นฝอยลงมาจากด้านบน และลงสู่อ่างเก็บน้ำด้านล่าง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โครงการมีการหมุนเวียนน้ำในระบบหลายรอบ ทำให้ความชื้นและความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำหมุนเวียนมีความเข้มข้นขึ้น จึงต้องมีระบายน้ำบางส่วนทิ้งไป (Cooling Water Blowdown) เพื่อควบคุมคุณภาพที่หมุนเวียน นอกจากนี้ น้ำส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปในระบบ (Evaporation Loss และ Drift Loss) ดังนั้น จึงมีการเติมน้ำเข้ามาทดแทนน้ำที่สูญเสียไปดังกล่าว เรียกว่า Makeup Water

6) ระบบควบคุมและอุปกรณ์ (Control System and Instrument)

โครงการมีห้องควบคุมส่วนกลาง (Central Control Room : CCR) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า ในส่วนของการสั่งเดินเครื่อง (Start Up) การเพิ่มและลดกำลังการผลิต (Load and Unload) การหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) ตลอดจนทำการตรวจวัด ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การผลิตต่างๆ การเชื่อมโยงระบบควบคุมระหว่างโรงไฟฟ้าโดยใช้ระบบควบคุมชนิด Distributed Control System (DCS)

7) ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการโดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Force Oil, Force Air Cooled (OFAC) ซึ่งไม่มีการใช้สาร PCB ในหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนี้

- หม้อแปลงไฟฟ้า 3 ชุด สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก 11 kV ให้เพิ่มเป็น 115 kV สำหรับจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.

- หม้อแปลงไฟฟ้า 2 ชุด สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 115 kV เป็น 22 kV สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
- Auxiliary transformer จำนวน 1 ชุด สำหรับเลี้ยงระบบต่างๆ ในโครงการ

1.4.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1) ระบบน้ำใช้

โครงการจะรับน้ำดิบ (Raw Water) มาจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) โดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด (Amata Water) ซึ่งเป็นผู้ดูแลในการบริหารจัดการและจัดส่งน้ำดิบให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในนิคมฯ ผ่านระบบท่อสำหรับการจัดการน้ำใช้ของโครงการ ทางนิคมฯ สามารถรับน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำดิบและส่งให้โครงการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินเครื่องของโครงการ พบว่า การเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักร (เดินเครื่อง Chiller) และผลิตไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง เป็นกรณีที่มีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด โดยมีอัตราการใช้น้ำ เท่ากับ 436.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

สำหรับระบบผลิตน้ำใช้ของโครงการใช้ร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) มี 3 ระบบ ประกอบด้วย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น (Pre-Treatment System, Clarifier) ระบบกรองน้ำ (Multimedia Filtration, MMF) และระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุแบบ Reverse Osmosis และ Mixed Bed มีรายละเอียดดังนี้

(1) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น (Pre-Treatment System, Clarifier)

โครงการมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น เป็นระบบตกตะกอน 1 ชุด สำหรับชดเชยในระบบหล่อเย็น และจะจ่ายให้ระบบน้ำที่ใช้ในโครงการ กำลังการผลิตสูงสุด 600 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยจะถูกส่งไปยัง Cooling Tower ของโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม (ABPR1) ปริมาณ 173.24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และใช้ในโครงการ ดังนี้

- ถังเก็บน้ำเพื่อใช้ในหอหล่อเย็น (Cooling Water Makeup Tank) ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการมีความต้องการน้ำใช้ในหอหล่อเย็นของโครงการสูงสุดประมาณ 151.86 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ส่งไปผลิตยังหน่วยผลิตน้ำประปาแบบ Multimedia Filtration สูงสุดประมาณ 92.78 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

(2) ระบบผลิตน้ำกรอง (Multimedia Filtration, MMF)

โครงการมีระบบกรองเป็นแบบ Multimedia Filter ประกอบด้วย สารกรองทรายขนาดต่างๆ และแอนทราไซด์ มีกำลังการผลิตสูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการใช้น้ำกรองสูงสุด 90.78 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในความสามารถของระบบผลิตน้ำกรอง ส่วนที่เหลือเป็นน้ำทิ้งที่ออกจากระบบ 2.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ โดยน้ำที่ออกจากระบบ เรียกว่า น้ำกรอง (Filtered Water) จะถูกส่งไปยัง 2 ส่วน คือ

- ถังเก็บน้ำในโรงงาน (Service Water Storage Tank) ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้งานทั่วไปในโรงงาน และอีกส่วนหนึ่งเป็นน้ำดับเพลิง สำหรับโครงการ 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม (ABPR1) 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รวมปริมาณน้ำใช้สูงสุด 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ส่งไปผลิตยังหน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ สูงสุด 88.18 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

(3) ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization System)

ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุของโครงการ ใช้เทคโนโลยี Reverse Osmosis (RO) และ Mixed Bed (MB) มีกำลังการผลิตสูงสุด 64.10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งจะส่งไปยังโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม (ABPR1) ปริมาณ 32.05 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และใช้ภายในโครงการ ปริมาณ 32.05 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ที่ผลิตได้จะเก็บไว้ในถังเก็บน้ำ (Demineralized Water Tanks) ความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้เป็นน้ำชดเชยในหน่วยผลิตไอน้ำ (Boiler Makeup Water) ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการใช้น้ำปราศจากแร่ธาตุสูงสุด 88.18 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในความสามารถของระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งมีขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

สำหรับปริมาณการใช้น้ำของโครงการ กรณีเดินระบบเต็มกำลังการผลิตและจำหน่ายไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งเป็นกรณีที่โครงการมีการใช้น้ำดิบสูงสุด โครงการมีการใช้น้ำแต่ละประเภทดังแสดงในตารางที่ 1.4-2

ตารางที่ 1.4-2 แสดงการใช้น้ำแต่ละประเภทของโครงการ

รายละเอียด	การใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
ความต้องการใช้น้ำดิบ	436.46
แหล่งน้ำใช้	บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
กำลังการผลิตสูงสุดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	600
การใช้น้ำกรอง (ส่งไปยังระบบผลิตน้ำประปาแบบ MMF)	92.78
น้ำชดเชยในหอหล่อเย็น (Cooling Water Makeup)	325.10 ^{1/}
ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ	88.18
น้ำใช้ทั่วไป ได้แก่ น้ำใช้ทั่วไปในสำนักงานและน้ำใช้ทั่วไปในพื้นที่ส่วนผลิต	2.00 ^{2/}
กำลังการผลิตสูงสุดระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ	90
การใช้น้ำปราศจากแร่ธาตุ ผลิตไอน้ำและชดเชยในหม้อไอน้ำ	32.05

หมายเหตุ : ^{1/} ส่งไปยัง Cooling Tower ของ ABPR1 ปริมาณ 173.24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

ใช้ภายในโครงการ ปริมาณ 151.86 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

^{2/} ส่งไปยัง ABPR1 ปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

ใช้ภายในโครงการ ปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

ที่มา : บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด, 2557

2) ระบบไฟฟ้า

โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการผลิตของโครงการเอง แต่ในกรณีฉุกเฉินที่โครงการไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ หรือกรณีที่โครงการหยุดดำเนินการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และช่วงเปิดการผลิต (Start up) ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 4.6 เมกะวัตต์ ไฟฟ้าส่วนนี้โครงการจะเชื่อมต่อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์

3) ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่โครงการ สามารถจำแนกตามประเภทการใช้งานของพื้นที่ 2 ลักษณะ ดังนี้

(1) น้ำฝนที่ตกบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนน้ำมัน

พื้นที่ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนคราบน้ำมัน ได้แก่ บริเวณพื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า ส่วนเครื่องจักรในการผลิตอื่นๆ ที่อาจมีการหกรั่วไหลของน้ำมันในระหว่างการซ่อมบำรุงได้ถูกติดตั้งไว้ภายในอาคารจึงปลอดภัยจากการปนเปื้อนของน้ำฝน อย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่ที่ไม่สามารถอยู่ในอาคารได้ โครงการได้ติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัว U โดยรอบบริเวณพื้นที่ส่วนที่ผลิตทั้งหมด เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าวในช่วง 15 นาทีแรกเข้าสู่บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำก่อนระบายน้ำ ซึ่งไม่มีน้ำมันปนเปื้อนระบายไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ตามลำดับ โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด

(2) น้ำฝนที่ตกบนพื้นที่ทั่วไปซึ่งไม่มีการปนเปื้อน

ระบบระบายน้ำฝนไม่ปนเปื้อน ถูกออกแบบเป็นรางระบายน้ำรูปตัวยู “U” ที่มีตะแกรงเหล็กปิดด้านบน วางขนานไปกับขอบถนนภายในพื้นที่โครงการโดยรอบ และเชื่อมต่อไปยังรางระบายน้ำฝนส่วนกลางของนิคมฯ เพื่อระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำของนิคมฯ ต่อไป

1.4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การบริหารความปลอดภัย

- (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (2) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ 3 ระดับ ดังนี้
 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(3) นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน

(4) แผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกิดศักยภาพสูงสุด

2) การติดตามตรวจสอบ วัดผล และเฝ้าระวังการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) การตรวจความปลอดภัย

โครงการได้จัดทำโครงการสำรวจอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตรายที่พบ เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

(2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน

การเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในสภาวะการทำงานปกติและการทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย โดยทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง ปริมาณฝุ่นละออง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

(3) การตรวจสุขภาพพนักงาน

โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันขั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านชีวเวชศาสตร์ โดยดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนบรรจุเข้าทำงาน และตรวจต่อเนื่องอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

3) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

โครงการได้กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามลักษณะของงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ โครงการได้มีการจัดทำป้ายเตือน รมรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมทั้งมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มีจำนวนเพียงพอต่อพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย

4) การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ

(1) น้ำดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วม

โครงการได้จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาด และห้องน้ำห้องส้วมที่มีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับพนักงานของโครงการ

(2) การปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล

โครงการได้จัดสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ได้ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของแต่ละบุคคล สำหรับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงเวลาทำงาน โครงการได้จัดให้มีห้องรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ โครงการจะได้ทำความตกลงเพื่อส่งลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลที่เปิด 24 ชั่วโมงแทนการจัดให้มีแพทย์ประจำเพื่อตรวจรักษาภายในโรงงาน

5) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(1) แนวทางปฏิบัติทั่วไป

- ต้องศึกษาขั้นตอนการทำงานทั้งหมดให้รับทราบ และเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ
- ต้องศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงาน
- ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด
- ต้องสำรวจ ตรวจเช็ค สภาพความพร้อมต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
- ต้องทำการรายงานให้หัวหน้าทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และรีบไปทำการปฐมพยาบาลโดยเร็ว
- ห้ามใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
- ห้ามปฏิบัติงานโดยที่ไม่ใช้หน้าที่โดยเด็ดขาด
- ห้ามขับซิ่งรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานในอาคารโรงงานโดยเด็ดขาด
- ห้ามดื่ม เสพ สิ่งของมึนเมา หรือพกพาเข้ามาในโรงงานโดยเด็ดขาด
- ห้ามกระทำการใดๆ ในพื้นที่อันตรายก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด พื้นที่อันตรายดังกล่าว ได้แก่
 - Switch Yard สถานีไฟฟ้าแรงสูง/ห้องหม้อแปลง
 - สถานีวัดและควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ
 - งานที่สูงเกิน 2 เมตร
 - งานที่อับอากาศ หมายถึง ที่ซึ่งมีทางเข้า-ออกจำกัด มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ได้แก่ อุโมงค์ บ่อ หลุม ท่อระบบดูดฝุ่น/ควัน แท็งก์ ที่มีลักษณะที่เป็นงานเชื่อม ตัดแก๊ส หรืองานที่ทำให้เกิดควันมากๆ
- บริเวณที่มีวัตถุไวไฟ เช่น ที่เก็บน้ำมัน สถานีก๊าซ และอาคารพัสดุ

(2) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานเฉพาะเรื่อง

- กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้า
- กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับเครื่องจักร
- กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือ

- กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อม ไฟฟ้า แก๊ส
- กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง
- กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่อับอากาศ
- กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานชุด

(3) ระบบการอนุญาตเข้าพื้นที่โครงการ

การเข้าพื้นที่โครงการนั้น ผู้ที่มาติดต่อจะต้องแลกบัตรทุกครั้งที่จะเข้าพื้นที่โครงการ โดยผู้ที่มาติดต่อต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเรื่องความปลอดภัย ซึ่งจะต้องสวมหมวก แว่นตา และรองเท้านิรภัยทุกครั้ง ก่อนเข้าโรงงาน

6) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

(1) การเตรียมพื้นที่รอบอาคาร โครงการได้จัดให้มีทางเข้า/ออก ที่สะดวก โดยถนนซึ่งเป็นทางเข้า/ออกของโครงการ มีความกว้างประมาณ 5-6 เมตร และสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างสะดวกเนื่องจากโครงการได้ออกแบบให้มีถนนโดยรอบตามแนวรั้วโครงการ รวมทั้ง ออกแบบช่องเปิดเข้า/ออกอาคารตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และกริ่งสัญญาณไฟไหม้ (Fire Alarm) โดยมีการติดตั้งในจุดต่างๆ ทั้งในบริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณพื้นที่ส่วนผลิต

(3) เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง โครงการมีการติดตั้งระบบดับเพลิง ตามชนิดและขนาดที่เหมาะสม

(4) ระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง

- น้ำสำรองดับเพลิง
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump)
- หัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายในอาคาร
- ตู้เก็บสายฉีดดับเพลิงและอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet)
- หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Nozzles)
- หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Connection)
- อุปกรณ์ลดแรงดัน (Pressure Regulating Devices)

(5) การทดสอบระบบดับเพลิง

โครงการจะจัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

1.5 มลพิษและการควบคุม

1) มลพิษทางอากาศ

แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GT) ซึ่งก๊าซร้อนจะถูกส่งเข้าเครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG) เพื่อนำความร้อนที่เหลือมาใช้ต้มน้ำ และระบายออกที่ปล่องระบายอากาศของ HRSG ทั้งนี้ โครงการได้เลือกใช้เชื้อเพลิงคุณภาพสูง คือ ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ซึ่งก๊าซธรรมชาติจัดเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เนื่องจากมีซัลเฟอร์และเถ้าเป็นองค์ประกอบในปริมาณต่ำ ดังนั้น จึงมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และฝุ่นละออง (TSP) ที่เกิดจากเชื้อเพลิงเป็นหลักในปริมาณที่ต่ำด้วย นอกจากนี้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูง สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการออกแบบระบบเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง ประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และสารไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด (UHC) และฝุ่นละอองเกิดขึ้นในปริมาณที่ต่ำด้วย ดังนั้น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมดจึงมีไม่มากนักที่เกิดขึ้นจากโครงการ อย่างไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิการเผาไหม้สูง ย่อมส่งผลให้เกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Thermal NO_x) เกิดขึ้นสูงตามไปด้วย ดังนั้น จึงกล่าวสรุปได้ว่า มลสารหลักที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโครงการ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO_x Burner สำหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนกรณีที่เกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนกรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีการควบคุมระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ

2) มลพิษทางเสียง

โครงการได้กำหนดให้อุปกรณ์ทุกชนิด มีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ในแนวนอนและสูงจากพื้นที่ 1.2 เมตร ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำหรับแหล่งเสียงดังที่สำคัญ ประกอบด้วย

- เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG)
- หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG)
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (STG) และเครื่องควบแน่น (Condenser)
- หอหล่อเย็น (Cooling Tower)

ทางโครงการมีการควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียง ดังนี้

(1) การลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด

- การจัดวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย
- การออกแบบอาคารและระบบการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือนอันเป็นจุดกำเนิดของเสียงดัง
- การกำหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง

- การติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียง เช่น Insulation บริเวณ Main Steam Line และ Hot Reheat Line

(2) การลดระดับเสียงที่ตัวนำ/ส่งผ่านเสียง

- การกำหนดให้อาคารปิดคลุมเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงตั้งไว้ภายใน อาทิเช่น GT และ ST จะได้รับการติดตั้งอยู่ในพื้นที่ปิด จะสามารถจำกัดระดับเสียงได้ในระดับหนึ่ง
- พื้นที่ที่ระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ไม่ควรมีพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังและพิจารณาติดตั้งกระจกกันเสียง สำหรับห้องควบคุมที่มีพนักงานประจำในพื้นที่ส่วนผลิต

(3) การป้องกันผู้รับเสียง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการในพื้นที่ส่วนการผลิตนั้นโดยทั่วไปตลอดระยะเวลาการทำงาน ต่อวันจะปฏิบัติอยู่เฉพาะภายในห้องควบคุม (Control Room) เป็นส่วนใหญ่ กรณีที่มีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เป็นครั้งคราว ทางโครงการได้จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง รวมทั้งมีระบบการติดป้ายเตือนให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff)

3) น้ำเสียและการจัดการ

น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 45.7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยการจัดการน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ สามารถจำแนกตามลักษณะการบำบัดขั้นต้น ดังนี้

(1) น้ำเสียทั่วไปในอาคารสำนักงาน

โครงการมีพนักงานจำนวน 30 คน คาดว่าจะมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันประมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งน้ำเสียส่วนนี้จะได้รับการบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้มีค่าเป็นไปตาม มาตรฐานก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งและระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตามลำดับ

(2) น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต

โครงการมีน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตสูงสุด ประมาณ 65.82 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งน้ำเสียส่วนนี้ จะได้รับการบำบัดขั้นต้นก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง และตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเกณฑ์นิคมฯ ก่อนระบายสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ประกอบด้วย

(ก) น้ำเสียจากหอหล่อเย็น

โครงการมีการระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นรวม 41.94 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยระบายสู่ บ่อพักน้ำทิ้ง รวมกับน้ำทิ้งจากส่วนอื่นๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเกณฑ์นิคมฯ ก่อนระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตามลำดับต่อไป

(ข) น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

โครงการมีการระบายน้ำทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำรวม 23.88 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ประกอบด้วย น้ำระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ำใส (ถังตกตะกอน) ปริมาณ 18.58 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง การล้างยอนของระบบผลิตน้ำกรอง ปริมาณ 2.60 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ระบบชั้นกรองในระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ปริมาณ 1.10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และน้ำทิ้งจากการฟื้นฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ปริมาณ 1.60 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โครงการจะรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ จำเป็นต้องปรับค่า pH ของน้ำเสียให้เป็นกลางด้วยสารเคมีในบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Neutralization Basin) ก่อนระบายรวมกับน้ำเสียอื่นๆ ในบ่อพักน้ำทิ้ง

(2) น้ำเสียที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน ประกอบด้วย

- น้ำเสียจากการซ่อมบำรุงหรือการล้างทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ และทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

- น้ำฝนที่ตกลงในบริเวณพื้นที่ผลิตทั้งหมดในช่วง 15 นาทีแรก ประมาณ 322 ลูกบาศก์เมตร โดยกรณีที่ฝนตกในพื้นที่ดังกล่าว น้ำฝนมีโอกาสสัมผัสกับอุปกรณ์และเครื่องจักรโดยตรงอาจเกิดการชะล้างและปนเปื้อนน้ำมัน โครงการจึงได้จัดทำรางรวบรวมน้ำฝนที่อาจเกิดการปนเปื้อนน้ำมันดังกล่าวไปบำบัดเบื้องต้น

น้ำปนเปื้อนน้ำมันข้างต้นจะผ่านการบำบัดเบื้องต้นที่บ่อดักน้ำมัน (Oil Separator) ที่มีอยู่ในแต่ละบริเวณ เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสียก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง และส่งเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ต่อไปตามลำดับ

4) การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานของโครงการ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

(1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำออกนอกบริเวณโรงงาน ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป จากสำนักงานและการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษกระดาษ เศษวัสดุเหลือใช้และเศษอาหาร มูลฝอยดังกล่าวในส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทางโครงการมีนโยบายในการนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนที่เหลือหลังจากการคัดแยก ณ จุดกำเนิด แล้วโครงการจะจัดหาภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิดวางไว้ในบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยทุกวันจะรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดใส่ถุงพลาสติกสีดำนัดปากถุงมิดชิดและเก็บขนไปไว้บริเวณ ณ จุดเก็บขน ติดต่อนักขนถ่ายขยะเข้ามาทำการเก็บขน พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร หรือติดต่อนักขนถ่ายขยะที่ทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เป็นผู้ว่าจ้างให้เข้ามาบริหารจัดการเป็นผู้เก็บขนไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป

(2) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ถือเป็นของเสียอันตราย (Non Hazardous Wastes) ได้แก่ กากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ซึ่งต้องมีการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื้นที่โรงงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีองค์ประกอบใดของกากของเสียที่เข้าข่ายเป็นของเสียอันตราย (Hazardous Waste Material) ประกอบด้วย

- วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ถือเป็นของเสียอันตราย ชนิดมีมูลค่า

โครงการจะทำการคัดแยกวัสดุประเภทที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษเหล็ก และเศษชิ้นส่วนเครื่องจักรจากการซ่อมบำรุง ไว้ในบริเวณอาคาร จัดเก็บของเสียและติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมาทำการเก็บขนไปทำการคัดแยกและจำหน่ายต่อไป

- วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ถือเป็นของเสียอันตราย ชนิดไม่มีมูลค่า

- ตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ ถึงปรับสภาพน้ำทิ้ง ป่อพักน้ำทิ้ง หอหล่อเย็นและการล้างหม้อไอน้ำ โครงการจะรวบรวมไว้ภายในกระบะเหล็ก เพื่อรอการขนส่งไปกำจัดโดยการใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์ต่อไป

- เเรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ถ่านกัมมันต์ที่ใช้จนแล้ว และซิลิกาเจลที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการจะรวบรวมไว้ภายในอาคารจัดเก็บของเสีย ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่ เพื่อรอส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ มาทำการเก็บขนไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป

- ไส้กรองอากาศของ Gas Turbine จะรวบรวมให้บริษัทที่รับซื้อของเก่านำไปกำจัดหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนที่อาจจะเป็นอันตราย เช่น ไฟเบอร์กลาสจะให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป

(3) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย (Hazardous Wastes) ได้แก่ กากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่งมีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นของเสียอันตราย (Hazardous Waste Material) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ซึ่งต้องมีการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื้นที่โรงงาน รวมทั้ง แจ้งรายละเอียดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่ดำเนินการจัดการภายใน และที่ขนออกไปกำจัดภายนอกตามแบบ รง.6 ภายใน 30 ธันวาคมของทุกปี ประกอบด้วย

- น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ น้ำมันใช้แล้วจากการล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ งานกลึง ตะไบ และเจียร รวมทั้ง คราบน้ำมันจากถังแยกน้ำ-น้ำมัน โครงการจะรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรที่มีฝาปิดมิดชิด และจัดเก็บไว้บริเวณลานถัง เพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัดต่อไป

- บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมี วัสดุดูดซับ ถูมือ เศษผ้า ที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน จากงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมทั้งฉนวนกันความร้อนโครงการจะรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรที่มีฝาปิดมิดชิด และจัดเก็บไว้บริเวณอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัดต่อไป

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายซึ่งใช้ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว และบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว มาผนวกไว้ร่วมกับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	-	-
	2. นำรายละเอียด มาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และปรับปรุงระบบ และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ	- โครงการมีการนำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง ในการจัดจ้างผู้รับเหมาซึ่งได้กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมผู้รับเหมา ซึ่งโครงการมีกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามก่อนเริ่มปฏิบัติงานได้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข-1 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุม ผู้รับเหมา
	3. บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องในสภาพที่ใช้งานได้เป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง	- โครงการมีการบำรุงรักษา ดูแลการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง	-	ภาคผนวก ข-2 แผนการตรวจสอบ สภาพและบำรุงรักษา ดูแลการทำงานของ ระบบหล่อเย็น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์วกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกฎบัตรมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 5. ในกรณีที่เจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าของโครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้	- หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัดระยอง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	-	-
		- ปัจจุบันโครงการดำเนินการตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จะทำการแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณาตามขั้นตอนดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยะอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	* หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดทะเบียนให้ไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ * หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	6. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลดี-ผลเสียของโครงการ เพื่อสร้างผลกรดำเนินการตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ให้ชุมชนรับทราบโดยมีเอกสารแสดงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด บริเวณจุดติดต่อสอบถามของหน่วยงานราชการ เช่น อบต.มาบยางพร อบต.ปอวิน และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)	-	ภาคผนวก ข-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ และ ภาพที่ 2.2-1 การประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ
	7. หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชน ต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที	- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ยังไม่มีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลของชุมชน หากชุมชนมีข้อวิตกกังวลต่อการดำเนินการใดโครงการ ทางโครงการได้จัดทำแผนการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเร่งหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข และชี้แจงให้กับชุมชนรับทราบ รวมทั้ง ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมประสานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของชุมชน	-	ภาคผนวก ข-4 แผนขั้นตอนการรับ เรื่องร้องเรียน และ ภาพที่ 2.2-2 กล่องและเบอร์ โทรศัพท์รับเรื่อง ร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	8. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ต้องเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน	- ทางโครงการมีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่อนายงานที่ เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน	-	ภาคผนวก ข-5 สำเนาจดหมายนำส่ง รายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ
	9. เมื่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าภาระระบบสายส่งทางอากาศ ข้างต้นมีค่าต่ำกว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้ง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว	- ปัจจุบันโครงการดำเนินการผลิตตามแผนรายเดือนตาม สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หากโครงการ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady Stage) พบว่าภาระระบบสายส่งทางอากาศข้างต้นมีค่าต่ำกว่า ทางโครงการจะยึดค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ 1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ	1. ควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่ระบาย ออกจากปล่องระบายอากาศของหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG Stack) ของโครงการให้เป็นไปตามค่าควบคุม ดังนี้ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) มีค่าไม่เกิน 60 พีพีเอ็ม - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) มีค่าไม่เกิน 15 พีพีเอ็ม - ฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศ ส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมี ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) ร้อยละ 7	- โครงการมีการควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทาง อากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของหน่วยผลิต ไอน้ำ (HRSG Stack) ของโครงการให้เป็นไปตามที่มาตรการ กำหนด จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย อากาศของหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG Stack) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กำหนดใน EIA ดังนี้ <u>ปล่อง HRSG 21</u> - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) มีค่าเท่ากับ 20.3 ppm - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) มีค่าน้อยกว่า 0.5 ppm - ฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าน้อยกว่า 0.5 mg/m ³ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าน้อยกว่า 1.0 ppm <u>ปล่อง HRSG 22</u> - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) มีค่าเท่ากับ 26.0 ppm - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) มีค่าน้อยกว่า 0.5 ppm - ฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าน้อยกว่า 0.5 mg/m ³ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าน้อยกว่า 1.0 ppm	-	ภาคผนวก ค-1 ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ อากาศจากปล่อง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	2. ควบคุมค่าอัตราการระบายรวมของสารมลพิษทางอากาศที่ ระบายออกจากปล่องระบายอากาศแต่ละชนิด ให้อยู่ในค่า อัตราการระบายรวมที่ทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะจัดสรร ดังนี้ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่าไม่เกิน 1,804.03 กิโลกรัม/วัน - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่าไม่เกิน 627.26 กิโลกรัม/ วัน - ผุนละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เกิน 639 กิโลกรัม/วัน	- โครงการมีการควบคุมค่าอัตราการระบายของสารมลพิษทาง อากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศแต่ละชนิด ให้อยู่ ในค่าอัตราการระบายรวมที่ทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะจัด สรรจากผลการตรวจวัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดใน EIA ดังนี้ ปล่อง HRSG 21 - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่าเท่ากับ 139 Kg/Day - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่าน้อยกว่า 11.54 Kg/Day - ผุนละอองรวม (TSP) มีค่าน้อยกว่า 4.44 Kg/Day - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าน้อยกว่า 9.8 Kg/Day ปล่อง HRSG 22 - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่าเท่ากับ 211 Kg/Day - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่าน้อยกว่า 11.92 Kg/Day - ผุนละอองรวม (TSP) มีค่าน้อยกว่า 4.58 Kg/Day - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าน้อยกว่า 10.1 Kg/Day	-	ภาคผนวก ค-1 ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ อากาศจากปล่อง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	3. จัดให้มีการติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO _x Combustor สำหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน กรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติ	- โครงการมีการติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO _x สำหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน กรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติ	-	ภาพที่ 2.2-3 อุปกรณ์ Burner ใน ระบบหัวฉีดเผาไหม้ แบบ Dry Low NO _x
	4. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ ดำเนินงและวิธีติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ U.S.EPA. เสนอแนะ รวมทั้ง มีการควบคุมคุณภาพระบบ (CEMs Quality Assurance) โดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพระบบ (CEMs Quality Assurance) โดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีการสอบเทียบ โดยบริษัท เพทโร-อินสตรูเมนต์ จำกัด โดยตรวจสอบครั้งสุดท้าย HRSG 21 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และ HRSG 22 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566	-	ภาคผนวก ข-6 เอกสารสอบเทียบ ระบบ CEMs ภาคผนวก ข-7 บันทึกผล CEMs ภาคผนวก ข-8 แผนการเดินเครื่อง CEMs และ ภาพที่ 2.2-4 ระบบ CEMs

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	5. ดัชนีที่ตรวจวัดสำหรับ CEMS ที่ติดตั้ง ประกอบด้วย ก๊าซ ออกซิเจน (O ₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดประกอบด้วย ก๊าซออกซิเจน (O ₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	-	ภาพที่ 2.2-4 ระบบ CEMS
	6. การตั้งค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติของ CEMS โดย กำหนดระดับ Alarm ที่ร้อยละ 90 ของค่าควบคุม	- โครงการมีการตั้งค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติของ CEMS ที่ร้อยละ 90 ของค่าควบคุมตามที่กำหนดไว้ใน EIA ดังนี้ No _x ค่า H Alarm 54.0 ppm, ค่า HH Alarm 60.0 ppm SO ₂ ค่า H Alarm 14.0 ppm, ค่า HH Alarm 15.0 ppm CO ค่า H Alarm 90.0 ppm, ค่า HH Alarm 100.0 ppm TSP ค่า H Alarm 9.0 ppm, ค่า HH Alarm 10.0 ppm	-	-
	7. บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดย บันทึกสาเหตุระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและ แก้ไขในแต่ละครั้ง	- โครงการมีการบันทึกสถิติ CEMS ในช่วงเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้หากพบกรณีที่มีค่าสูงเกินกว่าค่า ควบคุม ทางโครงการจะทำการบันทึกสาเหตุระยะเวลาที่ ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ และแก้ไขต่อไป	-	ภาคผนวก ข-7 บันทึกผล CEMS ภาคผนวก ข-8 แผนการเดินเครื่อง CEMs

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	8. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและควบคุมการระบาย มลสารที่ระบายออกทางปล่องระบายอากาศของโครงการ โดยเฉพาะก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมิให้สูงเกินกว่าค่า ควบคุมตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ดังแสดงในรูปที่ 1 สรุป ได้ดังนี้ (ก) กรณีที่ 1 ในสภาวะปกติ การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงใน Gas Turbine ซึ่ง ได้ถูกออกแบบการเผาไหม้เป็นแบบ Dry Low NO _x Design ซึ่งปกติแล้วจะมีการระบายก๊าซออกไซด์ของ ไนโตรเจนไม่เกินค่าควบคุม คือ ไม่สูงเกินกว่า 60 พีพีเอ็ม โครงการสามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมการ เผาไหม้ได้จาก DCS ซึ่งในปกติ Control Room Operator จะทำการตรวจสอบค่าการระบายที่ DCS (Distributed Control System) ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อระบบมีการ แจ้งเตือน (Alarm) ที่ระดับความเข้มข้น NO _x เท่ากับ 90% ของค่าควบคุม แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ปกติ	- โครงการมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและ ควบคุมการระบายมลสารที่ระบายออกทางปล่องระบาย อากาศของโครงการ โดยเฉพาะก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มิให้สูงเกินกว่าค่าควบคุมตลอดระยะเวลาดำเนินงานตาม ระเบียบปฏิบัติ	-	ภาคผนวก ข-9 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการมลพิษ ทางอากาศ และวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมระบบ มลภาวะทางอากาศ Emission Control

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	(ข) กรณีที่ 2 ในสภาวะที่มีการแจ้งเตือน (CEMs Alarm) กรณีที่มีการแจ้งเตือนระดับความเข้มข้น NO_x ที่ 90% ของค่าควบคุมให้ดำเนินการดังนี้ ก)Control Room Operator ทำการตรวจสอบ Emission ที่ DCS ข)ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องว่ามี การเปลี่ยนแปลงจากสภาพการผลิตปกติหรือไม่ โดยสิ่งที่ จะต้องตรวจสอบ เช่น Load ลดลงกว่าจากปกติ หรือไม่ Gas Heating Value เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ฯลฯ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติ หรือกรณีพบว่ามีส่วนผิดปกติจากคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้ติดต่อทาง ปตท. ค)ถ้ากระบวนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง ให้แจ้งฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าพบความผิดปกติ ให้ดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติ ถ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพปกติให้แจ้ง Operations เพื่อตรวจติดตามต่อไป			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	ก) ถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีการแจ้งเตือนที่ 90% ของค่าควบคุมอย่างต่อเนื่อง ให้แจ้ง Operations Manager เพื่อลด Load ตามความจำเป็นและความ เหมาะสม โดยพยายามควบคุมค่า NO_x ไม่ให้เกินค่า ควบคุม จ) ทำการตรวจสอบโดยทำตามขั้นตอนที่ (ก)-(ง) ใหม่ จนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ (ค) กรณีที่ 3 กรณีค่าที่ตรวจวัดมีแนวโน้มที่จะสูงเกินกว่า ค่าที่ควบคุม เมื่อ Operator ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนในกรณี ที่ 2 แล้ว ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และค่า NO_x ที่อ่านได้จาก CEMS มีแนวโน้มที่จะสูงเกินกว่าค่า ควบคุม ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้ น) Shift Supervisor จะเป็นผู้แจ้ง Operator Manager และ Maintenance Manager รับทราบ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยong) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	ข) ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องว่ามีกร เปลี่ยนแปลงจากสภาพการผลิตปกติหรือไม่ โดยสิ่ง จะต้องตรวจสอบ เช่น Load ลดลงกว่าจากปกติ หรือไม่ Gas Heating Value เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ฯลฯ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการแก้ไขกลับ สู่สภาพปกติ หรือกรณีพบว่ามีความผิดปกติ ก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้ติดต่อทาง ปตท. ค) แจ้ง Maintenance เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CEMS ระบบ Dry Low NO_x ถ้าความ ผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัด หรือเกิดจากระบบ CEMS Fail/Error ให้ Operation และ Maintenance สอบสวนหาสาเหตุและหาวิธีแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้ เรียก CEMS Service Provider เข้ามาทำการแก้ไข			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตรา การระบายมลพิษ ทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	ง) ถ้ามีการตรวจสอบในส่วนของการกระบวนการผลิตและ ส่วนของ Maintenance แล้วพบว่ายังสูงอยู่ให้ทำการ ลด Load โดยทำการทดสอบการเปลี่ยนแปลงการ จ่าย Load ดังนี้ * ทดสอบโดยการลด Load ของ Gas Turbine แล้ว ดูว่า Emission ลดลงหรือไม่ * กรณีที่เดิน Load ของ Gas Turbine ต่ำแล้ว ทำให้ Emission สูงให้ทดลองเพิ่ม Load ของ Gas Turbine จนกรณีไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณี ให้แจ้ง Operations Manager และ Power Plant Manager เพื่อพิจารณา Shutdown เพื่อทำการแก้ไขระบบ เผาไหม้ตามความเหมาะสมต่อไป			
	9. บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดย บันทึกสาเหตุระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและ แก้ไขในแต่ละครั้ง	- โครงการมีการบันทึกสถิติ CEMS ในช่วงเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้หากพบกรณีที่มีค่าสูงเกินกว่าค่า ควบคุม ทางโครงการจะทำการบันทึกสาเหตุระยะเวลาที่ ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ และแก้ไขต่อไป	-	ภาคผนวก ข-7 บันทึกผล CEMS ภาคผนวก ข-8 แผนการเดินเครื่อง CEMs

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดิเตค บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 การควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง	1. โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยไม่มีการใช้เชื้อเพลิงสำรองอื่นๆทดแทน	- ทางโครงการมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว โดยไม่มีการใช้เชื้อเพลิงสำรองอื่นๆทดแทน	-	-
1.3 การจัดการมลพิษทางอากาศ	1. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ	- ทางโครงการมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และหาโครงการมีผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ 1 ท่าน คือ คุณเทววรรณ จิตต์เจียรนัย เลขทะเบียน 120-50-00001 เอกสารการขึ้นทะเบียนหมอดำยวันที่ 19 เม.ย. 2567	-	ภาคผนวก ข-10 เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
	2. กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง สำหรับการบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที	- โครงการมีจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที	-	ภาคผนวก ข-11 อะไหล่สำรองสำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
	3. กำหนดแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการป้องกันเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานของระบบ	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนตรวจสอบและซ่อมบำรุงรายปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อยู่เสมอ และเป็นการทำงานร่วมกันเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานของระบบ	-	ภาคผนวก ข-12 แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ 2.1 การใช้ น้ำ	1. พิจารณาหมุนเวียนหรือเพิ่มจำนวนรอบการหมุนเวียนน้ำใน ระบบหล่อเย็นน้ำ (Cooling Tower) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น	- ทางโครงการพิจารณาหมุนเวียนหรือเพิ่มจำนวนรอบการ หมุนเวียนน้ำในระบบหล่อเย็นน้ำ (Cooling Tower) ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ตามคุณภาพน้ำที่ได้รับการจัดสรรจากนิคม อุตสาหกรรมฯ ซึ่งปัจจุบันโครงการมีการหมุนเวียนน้ำประมาณ 3-5 รอบ เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น	-	-
	2. การใช้ น้ำทิ้งหลังบำบัดที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Recycled or Reclaimed Water) เป็นแหล่งน้ำที่เติมเข้าระบบหล่อเย็น ทดแทนน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	- ทางโครงการให้นำน้ำทิ้งหลังบำบัดที่ผ่านการใช้งานแล้ว ตามที่ ได้รับการจัดสรรจากนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นแหล่งน้ำที่เติมเข้า ระบบหล่อเย็นทดแทนน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	-	-
2.2 การจัด การ น้ำเสีย	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับแบบที่มีประสิทธิภาพใน การบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน ทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบาย ลงสู่ระบบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะจีดี	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน ทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบาย ลงสู่ระบบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะจีดี (ระยอง)	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับ (Septic Tank) บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภค บริโภคของพนักงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	2. จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ทั่วไปกับน้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อนของน้ำมัน เพื่อรวบรวมไปบำบัดขั้นต้นที่บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำ ก่อนระบายน้ำซึ่งไม่มีน้ำมันปนเปื้อน ระบายไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ และระบายออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ตามลำดับ โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด	- โครงการจัดให้มีระบบระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ทั่วไปกับน้ำมันในพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อนของน้ำมัน เพื่อรวบรวมไปบำบัดขั้นต้นที่บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน ก่อนระบายน้ำที่แยกน้ำมัน ออกแล้วไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ และระบายออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ตามลำดับ โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด	-	ภาพที่ 2.2-6 วางระบายน้ำคอนกรีต และ ภาพที่ 2.2-7 บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน
	3. กำหนดแผนตรวจสอบคราบไขมัน ในบ่อแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	- โครงการได้มีการตรวจสอบคราบไขมันในบ่อ Oil Separator เป็นประจำ และบำรุงรักษาให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ข-13 บันทึกการตรวจสอบ คราบไขมัน-น้ำมัน
	4. น้ำทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการ รวบรวมส่งสู่อุปกรณ์น้ำทิ้ง เพื่อตรวจสอบลักษณะสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด ลักษณะสมบัติน้ำเสียจากโรงงานที่ยอมให้ระบายระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย, 2542) ก่อนระบายสู่ระบบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป	- น้ำทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการระบายส่งสู่อุปกรณ์น้ำทิ้ง และมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	-	ภาคผนวก ค-4 ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	5. ควบคุมลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่ Water Retention Pit ก่อนที่จะระบายเข้าสู่ระบบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โดยควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)	- ทางโครงการมีการควบคุมลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่ Water Retention Pit ก่อนที่จะระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) รวมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ บริเวณ Water Retention Pit โดยตรวจวัดพารามิเตอร์ ได้แก่ pH, Temperature และ Conductivity	-	ภาพที่ 2.2-8 เครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ บริเวณ Water Retention Pit
	6. พิจารณานำน้ำจากบ่อกักน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันทางโครงการได้มีการนำน้ำ Blow down จาก Cooling Tower กลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้เพื่อลดปริมาณน้ำที่ลงสู่บ่อกักน้ำทิ้ง	-	ภาพผนวก ข-14 หนังสือแจ้งรับทราบ การนำน้ำทิ้งบางส่วน กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการรดน้ำต้นไม้ ในโครงการ
	7. จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแล การจัดการน้ำเสียของโครงการ	- ทางโครงการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ำเสียของโครงการ 1 ท่าน คือ คุณบุญบุษ อรุณเรือ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดิเต บิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	8. ก่อนมีโครงการส่วนขยาย ทำการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำทิ้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำทิ้งให้เพียงพอไม่น้อยกว่า 1 วัน ขนาด 1,370 ลูกบาศก์เมตร)	- เนื่องจากโครงการยังไม่มีการติดตั้ง Chiller เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตตามที่กำหนดไว้ใน EIA จึงยังไม่มีกรปรับปรุงขนาดบ่อบำบัดน้ำทิ้งเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว ปัจจุบันโครงการมีบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับน้ำทิ้ง	-	-
2.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1. จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนโดยการแยกน้ำฝนและน้ำฝนปนเปื้อนออกจากกัน	- โครงการจัดสร้างระบบระบายน้ำฝนโดยการแยกน้ำฝนและน้ำฝนปนเปื้อนออกจากกัน	-	ภาพที่ 2.2-6 วางระบายน้ำคอนกรีต
	2. น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ทั่วไปจะระบายลงสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำฝนของโครงการซึ่งเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)	- โครงการมีการระบายน้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ทั่วไปลงสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำฝนของโครงการซึ่งเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)	-	ภาพที่ 2.2-6 วางระบายน้ำคอนกรีต ภาพที่ 2.2-9 ระบบระบายน้ำฝนของโครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรม
	3. น้ำทิ้งและน้ำฝนที่ปนเปื้อนที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น จะถูกระบายไปสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	- โครงการมีการระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนที่ปนเปื้อนที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นไปสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.3 การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	4. กำหนดให้มีแผนการตรวจสอบภายในโรงงานระบายน้ำของ โครงการ และมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	- ทางโครงการ จัดให้มีรายงานแบบคอนกรีตภายในพื้นที่ โครงการมีการตรวจสอบระบายน้ำอยู่เสมอ และมีการขุดลอก ตะกอน หากพบว่าส่งผลต่อเส้นทางระบายน้ำ	-	ภาคผนวก ข-15 เอกสารตรวจสอบ การทำความสะอาด ทางระบายน้ำ
3. เสียง	1. การออกแบบอาคารและระบบการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือน อันเป็นจุดกำเนิดของเสียงดัง	- โครงการมีการออกแบบอาคารและระบบการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือนอันเป็นจุดกำเนิดของเสียงดัง	-	ภาพที่ 2.2-10 ฐานคอนกรีตลด แรงสั่นสะเทือน
	2. กำหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดัง	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนตรวจสอบและซ่อมบำรุงรายปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดัง	-	ภาคผนวก ข-12 แผนการตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิง ป้องกันเครื่องจักร
	3. การกำหนดให้มีอาคารปิดคลุมเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิด เสียงดังไว้ภายใน อาทิเช่น เครื่องกังหันก๊าซและเครื่องกังหัน ไอน้ำ	- ทางโครงการมีการติดตั้งอาคารครอบเครื่องจักร ติดตั้งอุปกรณ์ ลดระดับเสียง (Silencer) และฐานคอนกรีตลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อลดระดับเสียง สำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ)	-	ภาพที่ 2.2-10 ฐานคอนกรีตลด แรงสั่นสะเทือน ภาพที่ 2.2-11 อาคารครอบเครื่องจักร และภาพที่ 2.2-12 อุปกรณ์ลดเสียง (Silencer)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกฎปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ)	4. พื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ไม่ควรมีพนักงาน ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง และพิจารณาติดตั้งประตู กระจกกันเสียง สำหรับห้องควบคุมที่มีพนักงานประจำใน พื้นที่ส่วนการผลิต	- โครงการกำหนดให้บริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ไม่มีพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในพื้นที่ โดย โครงการจัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสียงดัง สำหรับพนักงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว และ จัดทำป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมทั้งพิจารณาติดตั้งประตูกระจกกันเสียง สำหรับห้องควบคุม ที่มีพนักงานประจำในพื้นที่ส่วนการผลิต	-	ภาคผนวก ข-16 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาต ทำงาน (Permit to work)
	5. พื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) จัดให้มีระบบ การขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสียงดัง รวมทั้งมีระบบการติด ป้ายเตือนให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ก่อนเข้าพื้นที่			ภาคผนวก ข-17 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง โครงการอนุรักษ์ สมรรถภาพการได้ยิน และภาพที่ 2.2-13 ประตูกระจกกันเสียง สำหรับห้องควบคุม
	6. จัดทำ Noise contour บริเวณพื้นที่โครงการ ภายหลังเปิด ดำเนินงานแล้ว	- ทางโครงการได้จัดทำ Noise Contour บริเวณพื้นที่โครงการ แล้วครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564	-	ภาคผนวก ข-18 Noise Contour Map

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ)	7. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ	- ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหู สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) และมีอุปกรณ์สำรองไว้อย่างเพียงพอ	-	ภาพที่ 2.2-14 อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล สำรอง และภาพที่ 2.2-15 การสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลของพนักงาน
	8. ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และจัดให้มีแนวป้องกันเสียงบริเวณพื้นที่ทำงานที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ซึ่งมีการปฏิบัติงานประจำในพื้นที่	- ทางโครงการมีการติดตั้งอาคารครอบเครื่องจักร Silencer และฐานคอนกรีตลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และจัดให้มีแนวป้องกันเสียงบริเวณพื้นที่ทำงานที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ)	-	ภาพที่ 2.2-10 ฐานคอนกรีตลด แรงสั่นสะเทือน ภาพที่ 2.2-11 อาคารครอบเครื่องจักร และภาพที่ 2.2-12 อุปกรณ์ลดเสียง (Silencer)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ)	9. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้า กรณีที่มีกิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การทดลองเดินเครื่องการหยุดซ่อมบำรุง เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ถ้าหากมีกิจกรรมดังกล่าวทางโครงการจะมีการแจ้งชุมชนให้ทราบล่วงหน้ารวมทั้งมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน	-	ภาพที่ 2.2-2 กล่องและเบอร์โทรศัพท์ที่รับเรื่องร้องเรียน
4. การคมนาคมขนส่ง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2. กำหนดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม.	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	-	ภาพที่ 2.2-16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	3. อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการติดป้ายควบคุมความเร็วในพื้นที่ไม่เกิน 20 กม./ชม. - โครงการได้มีการจัดการอบรมพนักงานขับรถ รวมถึงกำหนดให้บริษัทรับจ้างช่วง มีการอบรมการขับอย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ	-	ภาพที่ 2.2-17 ป้ายควบคุมความเร็วในพื้นที่โครงการ ภาคผนวก ข-19 คู่มือ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และเอกสารการฝึกอบรมพนักงานขับรถ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	4. หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเข้า-ออกพื้นที่ โครงการในช่วงเร่งด่วนเพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด	- โครงการจัดให้มีการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเข้า-ออก พื้นที่โครงการโดยหลีกเลี่ยงช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเวลา 06.00 น.- 09.00 น. และเวลา 16.00 น.-18.00 น. เพื่อลดสภาพการจราจร ติดขัด	-	ภาคผนวก ข-20 ข้อกำหนดมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม สำหรับ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
	5. กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามกฎหมายกำหนด	- โครงการกำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามที่ กฎหมายกำหนด	-	ภาคผนวก ข-21 เอกสารควบคุมน้ำหนัก รถในการขนส่ง
	6. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง	- โครงการจัดให้มีการขนส่งโดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลา ที่มีการจราจรคับคั่ง	-	ภาคผนวก ข-20 ข้อกำหนดมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม สำหรับ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
	7. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องได้รับการตรวจสอบสภาพตามที่กฎหมายกำหนดโดย ตรวจสอบจาก พรบ. และใบต่อภาษีรถยนต์	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1. จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)	- โครงการมีการระบายน้ำฝนในพื้นที่โครงการโดยมีการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)	-	ภาพที่ 2.2-6 ร่างระบายน้ำคอนกรีต
	2. กำหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ำของโครงการ และมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	- ทางโครงการ จัดให้มีรางระบายน้ำแบบคอนกรีตภายในพื้นที่โครงการมีการตรวจสอบรางระบายน้ำ และการขุดลอกตะกอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบว่าส่งผลต่อเส้นทางระบายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-9 ระบบระบายน้ำฝนของโครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมฯ
	3. จัดให้มีรางระบายรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าวในช่วง 15 นาทีแรกเข้าสู่บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำซึ่งไม่มีน้ำมันก่อนระบายน้ำทิ้งของโครงการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของนิคมฯ ก่อนระบายลงสู่ระบบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ต่อไป	- จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ทั่วไปกับน้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันเข้าสู่บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำก่อนระบายน้ำทิ้งที่มีน้ำมันปนเปื้อนไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมฯ	-	ภาพที่ 2.2-7 บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. ภาวะของเสีย	1. จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย่างเพียงพอ และติดต่อบริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS) มาทำการเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย่างเพียงพอ และติดต่อบริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS) มาทำการเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก ข-22 แบบตอบกลับการ รายงานสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย และ ภาพที่ 2.2-18 ถึงขยะในพื้นที่โครงการ
	2. คัดแยกขยะและนำส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- โครงการมีการคัดแยกขยะและนำส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กระดาษเสียหน้าเดียว ใช้ในส่วนงาน สำหรับเศษเหล็ก แก้ว พลาสติก จะติดต่อบริษัทในส่วนจำกัด บุญจง รีไซเคิล มาทำการเก็บขนไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 ได้มีการกำหนดประเภทของขยะดังกล่าวให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ประโยชน์	-	ภาพที่ 2.2-19 กระดาษ Reuse

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. อากาศของเสีย (ต่อ)	3. ขณะที่เหลือซึ่งไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้แล้ว ให้รวบรวมเพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่รับกำจัดมาทำการเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- โครงการทำการรวบรวมขยะที่เหลือซึ่งไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้แล้ว โดยบริษัท อีสเทิร์น ซิเบอร์ เอ็นไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด และทำการเก็บขนโดยบริษัท เวลท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS)	-	ภาคผนวก ข-22 แบบตอบกลับการ รายงานสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย
	4. น้ำมันที่เสื่อมสภาพหรือน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ และคราบน้ำมันจากถังแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator) และรวบรวมเก็บไว้ในถังขนาด 200 ลิตร เพื่อส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทางโครงการไม่มีการส่งกำจัดน้ำมันที่เสื่อมสภาพหรือน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วที่เสื่อมสภาพจากงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องยนต์	-	ภาคผนวก ข-23 เอกสารบันทึก การจัดเก็บ น้ำมันหล่อลื่นเก่า
	5. บันทึกขนิດ/ปริมาณอากาศของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่าย/กำจัด	- โครงการมีการบันทึกขนิດ ปริมาณอากาศของเสียที่เกิดขึ้น ปริมาณอากาศของเสียที่ขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ และระบุแหล่งที่ส่งกำจัด	-	ภาคผนวก ข-24 บันทึกขนิດ/ปริมาณ อากาศของเสียที่เกิดขึ้น ภายในโครงการ และภาคผนวก ข-25 ใบกำกับการขนส่งวัสดุ ที่ไม่ใช่แล้ว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลาแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. กากของเสีย (ต่อ)	6. ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนำของเสียอันตรายออกพื้นที่โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 หนังสือแจ้งผลเลขที่ อก. 6501-13258 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2565 ถึง 5 กันยายน 2566 และเลขที่ อก. 6601-13977 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2567	- โครงการมีการขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนำของเสียอันตรายออกพื้นที่โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 หนังสือแจ้งผลเลขที่ อก. 6501-13258 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2565 ถึง 5 กันยายน 2566 และเลขที่ อก. 6601-13977 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2567	-	ภาคผนวก ข-26 ใบอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
	7. จัดให้มีสถานที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีตเพื่อจัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย โดยแยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน	- โครงการมีอาคารเก็บขยะเพื่อรวบรวมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัดต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-20 อาคารเก็บรวบรวมขยะ
	1. ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมายแรงงานอื่นๆ เกี่ยวกับความเป็นปัจจุบัน	- โครงการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมายแรงงานอื่นๆ เกี่ยวกับ	-	-
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกำหนด อาทิ การประชุม การสำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกำหนด	-	ภาคผนวก ข-27 เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	3. กำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกิดศักยภาพสูงสุดในเรื่องต่างๆ เช่น - แผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยง - แผนการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พนักงาน - แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน - แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย - แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย - แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกิดศักยภาพสูงสุด	-	ภาคผนวก ข-28 แผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในสภาวะการทำงานปกติและสถานที่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม	- ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในสภาวะการทำงานปกติและการทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้ง กำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม	-	ภาคผนวก ข-28 แผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยong) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	5. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะงาน อาทิ - การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี - กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย - การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน - การป้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟฟ้า - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน	- ทางโครงการจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้ - อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” วันที่ 18 กันยายน 2566 - อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR” วันที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 และวันที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 - อบรมหลักสูตร “ดับเพลิงขั้นรุนแรงและอพยพหนีไฟประจำปี” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - อบรมหลักสูตร “โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” วันที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2566	-	ภาคผนวก ข-29 เอกสารการอบรม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	6. จัดให้มีระบบการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต บริเวณใกล้กับจุดที่จะใช้งาน และภายในอาคารเก็บสารเคมี รวมทั้งมีการติดป้ายบอกอย่างชัดเจน รายละเอียดการขนส่ง การจัดเก็บ และมาตรการความปลอดภัย ดังนี้ 1) การขนส่งและการจัดเก็บ สารเคมีดังกล่าวข้างต้นจะขนส่งเข้าสู่โครงการด้วย รถบรรทุก โดยในการลำเลียงสารเคมีเข้าสู่โครงการนั้นจะ ทำการประสานงานกับบริษัทผู้ขายก่อนนำเข้าสู่โครงการ ทุกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมและลดโอกาสเสี่ยงที่รถ ขนส่งต้องจอดรอการขนถ่ายในพื้นที่โครงการโดยไม่จำเป็น 2) การจัดการภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้จนแล้ว ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้จนแล้วโครงการจะส่งกลับ บริษัทผู้จำหน่ายทั้งหมดหรือการส่งกำจัดโดยหน่วยงาน ภายนอกที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม	- ทางโครงการมีพื้นที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต บริเวณใกล้กับจุดที่จะใช้งาน และภายในอาคารเก็บสารเคมี รวมทั้งมีการติดป้ายบอกอย่างชัดเจน	-	ภาพที่ 2.2-21 พื้นที่เก็บวัตถุดิบและ สารเคมี

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	3) การจัดการด้านความปลอดภัย ทางด้านการควบคุมสารเคมีหกกันและรั่วไหลได้กำหนดเป็น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) สรุปได้ดังนี้ (ก) การรับสารเคมี เมื่อรวบรวมทุกสารเคมีที่ขนส่งโดยบริษัทผู้ขายที่มีสัญญาขาย กับบริษัท ทางเจ้าหน้าที่เคมีต้องดำเนินการตรวจสอบ รถบรรทุกที่ใช้บรรทุกว่าได้รับอนุญาตถูกต้องในการขนย้าย สารเคมีอันตรายหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ออกใบแจ้งเตือนการ ขนส่งสารเคมีไปยังบริษัทผู้ขาย ถ้าออกไปเดือน 3 ครั้ง แล้ว ยังไม่ถูกต้องให้งดรับสินค้า (ข) การตรวจสอบ Specification ของสารเคมี เจ้าหน้าที่เคมีตรวจสอบ Certificate of Analysis (COA) ที่ ส่งมา กับสารเคมีนั้นๆ (ค) การจัดเก็บสารเคมี ก) อาคารพัสดุต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อให้มีการ ไหลเวียนถ่ายเททางอากาศ และจัดให้มีชั้นวางสูงจากพื้น เพื่อป้องกันความชื้น			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกฎปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อากาศอันมีและ ความปลอดภัย (ต่อ)	ข) จัดทำ Chemical list (เรียงลำดับตามตัวอักษร) แสดงรายการและอันตรายของสารเคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ ค) รวบรวมและจัดทำแฟ้มเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของสารเคมีแต่ละชนิดตาม Chemical list ง) คัดแยกสารเคมีออกเป็นประเภทต่างๆ โดยศึกษาคุณสมบัติจาก MSDS เช่น - ประเภทที่ติดรอน มีค่า pH <2 หรือ >12.5 - ประเภทไวไฟ มี Flash point ต่ำกว่า 60 °F (15 °C) - ประเภทไวต่อปฏิกิริยา สามารถทำปฏิกิริยาได้อย่างรุนแรงรวดเร็ว เมื่อผสมกับน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดก๊าซพิษ ครันหรือไอพิษขึ้นได้ - ประเภทเป็นพิษ เป็นสารประกอบของโลหะหนักต่างๆ หรือเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นต้น จ) แยกเก็บสารเคมีตามประเภทที่แบ่งไว้ โดยยึดหลัก First in-First out ฉ) จัดทำผังแสดง Location ในการเก็บสารเคมีแต่ละประเภท รวมทั้งระบุใน Chemical list (FEI-007-01)			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	ข) ในการถ่ายเทสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ระบุไว้ใน MSDS ของสารเคมีชนิดนั้นๆ โดยอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานที่ต้องใช้คือ Goggles (แว่นตานิรภัย) และ Chemical Gloves (ถุงมือป้องกันสารเคมี) - เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีและอยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุดเสียหาย - ถ่ายเทสารเคมีอย่างระมัดระวัง เช่น ถ่ายเทในภาชนะรับหรือในกรณีของสารเคมีที่ระเหย เกิดเป็นไอ/ควัน (Fume) ได้ง่ายให้ทำการถ่ายเทในตู้ดูดควัน (Fume hood) - ในระหว่างการถ่ายเทสารเคมี ถ้ามีการทรา่วไหลให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด - ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสสารเคมีให้ปฏิบัติตามมาตรการปฐมพยาบาลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของสารเคมีนั้นๆ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	ข) ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ภายในอาคาร ฅ) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคาร อย่างเพียงพอ (ง) การเคลื่อนย้ายสารเคมี เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีไปใช้งาน หัวหน้าแผนกผลิตและ เจ้าหน้าที่ผลิตที่เกี่ยวข้องต้องระมัดระวังไม่ให้สารเคมีมีการหก รั่วไหล โดยต้องตรวจสอบภาชนะบรรจุและสภาพพื้นที่ในการ รับต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เมื่อมีการทกล้น รั่วไหลให้ดำเนินการ ตามการควบคุมการหกรั่วไหลของสารเคมีขณะจัดเก็บและ ขณะใช้งานและหัวหน้าแผนกผลิตตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่กักเก็บ ก่อนและหลังการใช้งาน (จ) การใช้สารเคมี ผู้ใช้สารเคมีต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีเพื่อป้องกันอันตราย จากสารเคมีตามการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ ตามที่กล่าวไว้ใน MSDS			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	(จ) การแก้ไขป้องกัน การหล่น รั่วไหลและการแก้ไขใน กรณีบรรทุกสารเคมีคว่ำ หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามวิธีการควบคุมการหล่นของสารเคมีที่ จัดการขณะใช้งานหรือตาม MSDS			
	7. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและ เหมาะสมกับประเภทงานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น	- ทางโครงการมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กับพนักงานและให้เหมาะสมกับประเภทงาน เช่น แว่นตา นิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น	-	ภาพที่ 2.2-14 อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล สำรอง และ ภาพที่ 2.2-15 การสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลของพนักงาน
	8. จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ พนักงานได้	- ทางโครงการมีการจัดทำป้ายเตือน ในบริเวณที่อาจก่อให้เกิด อันตรายต่อพนักงานได้	-	ภาพที่ 2.2-22 ป้ายเตือนพื้นที่อันตราย บริเวณต่างๆ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	9. ติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยแก่พนักงานในการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- ทางโครงการมีการติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติเพื่อเตือนภัยแก่พนักงานในการพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	ภาพที่ 2.2-23 ระบบตรวจสอบตรวจจับและสัญญาณเตือนภัย
	10. จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน	- ทางโครงการจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงานในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน	-	ภาคผนวก ข-16ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การขออนุญาตทำงาน (Permit to work)
	11. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณต่างๆ ของโครงการอย่างเพียงพอในจำนวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน NFPA กำหนดไว้	- ทางโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณต่างๆ ของโครงการอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน NFPA กำหนดไว้	-	ภาคผนวก ข-30การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA และภาพที่ 2.2-24 อุปกรณ์ดับเพลิง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	12. มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รับผิดชอบโดยวิศวกรวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้ไม่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น	- ทางโครงการมีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้ไม่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น	-	-
	13. จัดให้มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการและทำการซ้อมแผนฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินที่ห้องส่งไอน้ำรั่วไหล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีก๊าซไฟรั่วไหล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินหม้อไอน้ำทำงานผิดปกติ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเกิดเหตุอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	-	ภาคผนวก ข-31 แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ ภาคผนวก ข-32 รายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อากาศอันมีและ ความปลอดภัย (ต่อ)	14. จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนฉุกเฉินต่างๆ ในปี พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี้ - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินหนีท่อส่ง ไอน้ำรั่วไหล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินหนีสารเคมีหก รั่วไหล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินหนีก๊าซไวไฟ รั่วไหล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินหนีหม้อไอน้ำ ทำงานผิดปกติ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 - แผนเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินหนีเกิดเหตุอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	-	ภาคผนวก ข-31 แผนปฏิบัติการกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน และ ภาคผนวก ข-32 รายงานการฝึกซ้อม แผนฉุกเฉิน
	15. กำหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่างๆ อย่างสม่ำเสมออย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการมีการจัดทำการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน โรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2566 ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566	-	ภาคผนวก ข-33 รายงานการ ตรวจสอบความ ปลอดภัยระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อากาศ ความปลอดภัย (ต่อ)	16. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงาน โดยดำเนินการตรวจสอบ ทั่วไปก่อนบรรจุเข้าทำงาน และตรวจสอบต่อเนื่องอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพของพนักงาน โดยดำเนินการ ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปก่อนบรรจุเข้าทำงาน และตรวจสอบต่อเนื่อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2566 ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ ในวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยพรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก	-	ภาคผนวก ข-34 รายงานสรุปผลการตรวจ สุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566
	17. กำหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่เกิด อุบัติเหตุหรือเกิดความผิดปกติต่อสุขภาพของพนักงานที่ทำงาน ส่วนการผลิต	- ทางโครงการกำหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานใน กรณีที่ตรวจพบหรือเกิดความผิดปกติต่อสุขภาพของพนักงาน ที่ทำงานส่วนการผลิต รวมทั้งมีระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การ ตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง และระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเฝ้าระวังและการตรวจวัด	-	ภาคผนวก ข-35 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานตามปัจจัยเสี่ยง และภาคผนวก ข-36 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การเฝ้าระวังและการ ตรวจวัด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. อากาศ ความปลอดภัย (ต่อ)	18. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดำเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ	- ทางโครงการมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ไม่พบอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดทำแบบฟอร์มบันทึกสถิติอุบัติเหตุ	-	ภาคผนวก ข-37 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
	19. จัดให้มีระบบจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตบริเวณใกล้กับจุดที่จะใช้งานและภายในอาคารเก็บสารเคมี รวมทั้งมีการติดป้ายบอกอย่างชัดเจน	- ทางโครงการมีพื้นที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตบริเวณใกล้กับจุดที่จะใช้งาน และภายในอาคารเก็บสารเคมี รวมทั้งมีการติดป้ายบอกอย่างชัดเจน	-	ภาพที่ 2.2-21 พื้นที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมี
	20. จัดเตรียมพาหนะสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันที	- ทางโครงการจัดเตรียมพาหนะสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	-	ภาพที่ 2.2-25 พาหนะสำรองเพื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
	21. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำโปสเตอร์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น	- ทางโครงการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการจัดการ Early detection for a safety workplace, โครงการ Safety awareness permit to work system, โครงการ Good Health Good Life Project และการจัดการ Symbiosis Concept for Sustainable Waste Management	-	ภาคผนวก ข-38 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ความปลอดภัยและภาพที่ 2.2-26 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
				ข้อมูลข่าวสาร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์ม (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติงานด้านอันตรายร้ายแรง	1. ทำการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายร้ายแรง โดยอ้างอิงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนงานการบ่งชี้อันตราย และการประเมินความเสี่ยง ตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	-	ภาคผนวก ข-39 ระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ภาคผนวก ข-40 เอกสารการชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	2. มาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ยึดตามมาตรฐาน ASME B 31.8 และ B 31 G รวมทั้ง NACE RP-0169 ที่นำมาปฏิบัติในโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากท่อขนส่ง ดังนี้ 1) การเฝ้าระวังท่อขนส่ง (Right of way surveillance) สำรวจพื้นที่วางท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง 2) การสำรวจรอยรั่ว (Leak survey) * สำรวจรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง * ตรวจสอบสภาพของ Insulation Joint/Flange ว่ามีการรั่วหรือลัดวงจรหรือไม่ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง 3) การบำรุงรักษาระบบป้องกันการลุกไหม้ ตรวจสอบการสีก้อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณข้อต่อ หรือบริเวณที่ก๊าซมีความเร็วสูง และกรณีที่เกิดการลุกไหม้ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ASME B31 G และ ASME B31.8 เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ASME 31.8 และ B 31G รวมทั้ง NACE RP-0169 ที่นำมาปฏิบัติในโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากท่อขนส่ง ซึ่งมีการตรวจสอบครั้งล่าสุดในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยบริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด	-	ภาคผนวก ข-41 รายงานการตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุของสถานีควบคุมบริเวณ Metering /Gate station 1) ล้อมรั้วตาข่ายโดยรอบพื้นที่สูงประมาณ 3 เมตร และมีประตูทางเข้า 2 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปขโมย หรือทำอันตรายต่อระบบควบคุม 2) มีระบบท่อ By pass และระบบวาล์วสำรองในกรณีเกิดความบกพร่องของท่อเส้นหลัก 3) ติดตั้งปล่องระบายก๊าซ (Blow down stack) เพื่อระบายก๊าซที่ค้างในเส้นท่อออกสู่บรรยากาศกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 4) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) ขนาด 15 กก. จำนวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งไว้ในที่สะดวกต่อการใช้งาน และมีป้ายบอกให้เห็นชัดเจน 5) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุมเป็นประจำทุกสัปดาห์	- โครงการมีการล้อมรั้วตาข่ายโดยรอบพื้นที่สูงประมาณ 3 เมตร และมีประตูทางเข้า 2 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปขโมย หรือทำอันตรายต่อระบบควบคุม - โครงการมีระบบท่อ By pass และระบบวาล์วสำรองในกรณีเกิดความบกพร่องของท่อเส้นหลัก - โครงการมีการติดตั้งปล่องระบายก๊าซ (Blow down stack) เพื่อระบายก๊าซที่ค้างในเส้นท่อออกสู่บรรยากาศกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน - โครงการมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) โดยติดตั้งไว้ในที่สะดวกต่อการใช้งาน และมีป้ายบอกให้เห็นชัดเจน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการตรวจตราแนวท่อและสถานีควบคุมเป็นประจำ	-	ภาพที่ 2.2-27 รั้วตาข่าย ภาพที่ 2.2-28 ระบบท่อ By pass และระบบวาล์วสำรอง ภาพที่ 2.2-29 ปล่องระบายก๊าซ Blow down stack ภาพที่ 2.2-30 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผง -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาลูกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกฎปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	4. การกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิดของเครื่องจักร 1) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น * จัดให้มีระบบป้องกันทางไฟฟ้า (relay) ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า * จัดให้มีระบบป้องกันพร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือนเตือนอันตรายที่ระดับต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น GT, ST, HRSG ฯลฯ ในกรณีฉุกเฉิน 2) จัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ 3) จัดให้มีการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานจริง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น * จัดให้มีระบบป้องกันทางไฟฟ้า (relay) ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า * จัดให้มีระบบป้องกันพร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือนอันตรายที่ระดับระบบเชื้อเพลิง และหยุดการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น GT, ST, HRSG ฯลฯ ในกรณีฉุกเฉิน - โครงการมีการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ - โครงการจัดให้มีการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานจริง	-	ภาพที่ 2.2-31 ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Transformer Protection)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาลูกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการ ด้านอันตราย ร้ายแรง (ต่อ)	4) จัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ ถูกต้องและปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ การตรวจ อุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไข ข้อขัดข้องต่างๆ	- ทางโครงการมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ การ ตรวจอุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไข ข้อขัดข้องต่างๆ	-	ภาคผนวก ข-42 หนังสือเห็นชอบในการ ตรวจสอบภายในหม้อ น้ำทุกระยะเวลา 3 ปี ภาคผนวก ข-43 เอกสารรับรองความ ปลอดภัยของหม้อไอน้ำ ภาคผนวก ข-44 วิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัยในการใช้ หม้อไอน้ำ ภาคผนวก ข-12 แผนการตรวจสอบและ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักร
	5) จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาประจำปีของอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ผู้ผลิตกำหนดเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนตรวจสอบและซ่อมบำรุงรายปี ของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการ ด้านอันตราย ร้ายแรง (ต่อ)	5. ด้านการออกแบบและการดำเนินการช่วงดำเนินการของหม้อไอน้ำ 1) ด้านวิศวกรรม * หม้อไอน้ำทำการออกแบบตามมาตรฐาน American Society of Mechanical Engineers (ASME) * ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อไอน้ำ * ติดตั้งลิ้นนิรภัย (Safety Valve) * ติดตั้งอุปกรณ์แสดงระดับน้ำ เช่น หลอดแก้ว แท่งแก้วแถบแม่เหล็ก เป็นต้น * ติดตั้งลิ้นกันกลับ (Check Valve หรือ Non Return Valve) * ติดตั้งมาตรการณ์วัดความดันไอน้ำ (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge) * ติดตั้งลิ้นระบายได้หม้อไอน้ำ (Blow down Valve) * ติดตั้งจนวนวนกันความร้อน * ติดตั้งลิ้นจ่ายไอน้ำ * ติดตั้งเครื่องควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ * ติดตั้งสวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Switch) * ติดตั้งมาตรการวัดอุณหภูมิปลายปล่อง * ติดตั้งบันไดและทางเดินสำหรับหม้อไอน้ำ	- โครงการมีการออกแบบหม้อไอน้ำตามหลักวิศวกรรม - และมีการตรวจสอบหม้อไอน้ำโดยวิศวกรตรวจสอบ โดยครั้งล่าสุด หม้อไอน้ำ หมายเลข HRSRG 21 และ หมายเลข HRSRG 22 ตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566	-	ภาคนวท ข-43 เอกสารรับรองความ ปลอดภัยของหม้อไอน้ำ และ ภาพที่ 2.2-32 อุปกรณ์ลดความเสี่ยง จากการระเบิดของ เครื่องจักร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการ ด้านอันตราย ร้ายแรง (ต่อ)	2) ด้านการจัดการ * ตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ * ทำการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน - โดยการควบคุมของวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกร * ใช้ระบบ DCS ในการควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ ในกรณีที่ระบบควบคุมการทำงานมีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจากระดับน้ำในหม้อไอน้ำสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดหรือแรงดันไอน้ำสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดจะจัดระบบเชื้อเพลิงและหตุระบบหม้อไอน้ำทันที	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่ผ่านการอบรมหลักสูตร และมีการตรวจสอบหม้อไอน้ำโดยวิศวกร	-	ภาคผนวก ข-45 เอกสารผู้ควบคุม หม้อไอน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการ ด้านอันตราย ร้ายแรง (ต่อ)	3) การดูแลหม้อไอน้ำ * จัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อไอน้ำ * แสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในบริเวณที่ติดตั้งหม้อไอน้ำ * จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อไอน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อไอน้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม * จัดให้มีการตรวจสอบหม้อไอน้ำโดยวิศวกรตรวจสอบทดสอบหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง * จัดให้มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบหม้อไอน้ำการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหว่างการใช้งานตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดและจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ	- ทางโครงการจัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อไอน้ำ พร้อมด้วยวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อไอน้ำ - ทางโครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อไอน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อไอน้ำ - ทางโครงการได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต่อการตรวจสอบ 1 ครั้ง เอกสารเลขที่ อก. 0312/4651 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 - ทางโครงการมีการตรวจสอบหม้อไอน้ำโดยวิศวกรตรวจสอบ โดยครั้งล่าสุด หม้อไอน้ำ หมายเลข HRSG 21 และหมายเลข HRSG 22 ตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566	-	ภาคผนวก ข-45 เอกสารผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ ภาคผนวก ข-45 เอกสารผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ ภาคผนวก ข-42 หนังสือเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำ ทุกระยะเวลา 3 ปี และภาคผนวก ข-43 เอกสารรับรองความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์ม (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง (ต่อ)	* ทำการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำและในระบบหม้อไอน้ำตามความถี่ที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำให้เหมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องกันการกัดกร่อนหรือตะกอนของหม้อไอน้ำ * จัดทำแผนงานการตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและดำเนินการบำรุงรักษาระยะเวลาที่กำหนด * จัดทำระเบียบการควบคุมหม้อไอน้ำและจัดฝึกอบรมพนักงานควบคุม * ทำการตรวจสอบ Safety Release Valve โดยการ Manual Blow เป็นประจำทุกสัปดาห์ * ทำการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการมีการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำและในระบบหม้อไอน้ำตามที่ผู้ออกแบบกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบหม้อไอน้ำด้วยแล้ว - มีการจัดทำแบบการตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - ทางโครงการมีการจัดทำระเบียบการควบคุมหม้อไอน้ำและจัดฝึกอบรมพนักงานควบคุม - ทางโครงการมีการทำการตรวจสอบ Safety Release Valve โดยการ Manual Blow เป็นประจำทุกสัปดาห์ - ทางโครงการมีการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สภาวะฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำทำงานผิดปกติ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566	-	ภาคผนวก ข-42 หนังสือเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อไอน้ำทุกระยะเวลา 3 ปี ภาคผนวก ข-12 แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร - - ภาคผนวก ข-32 รายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการ ด้านอันตราย ร้ายแรง (ต่อ)	4) การซ่อมแซมหม้อไอน้ำ * จัดให้มีวิศวกรควบคุมการซ่อมแซมหรือหน่วยรับรอง วิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำควบคุมดูแลการซ่อมแซม หรือดัดแปลงหม้อไอน้ำ * ภายหลังการซ่อมแซมหรือดัดแปลงหม้อไอน้ำต้องจัด ให้มีการตรวจสอบและทดสอบภายใต้การควบคุม ดูแลของหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำหรือ วิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำ * จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซม ดัดแปลง และผลการตรวจสอบหลังการซ่อมแซมและดัดแปลง ไปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน หลังจาก ซ่อมแซม และดัดแปลงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการซ่อมหม้อไอน้ำ ซึ่งจัดให้ มีการตรวจสอบและทดสอบภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วย รับรองวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำ หรือวิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. แผนปฏิบัติการ ด้านอันตราย ร้ายแรง (ต่อ)	5) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆ เช่น * มีการอบรมและซ้อมซ้อมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิดอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง * มีการตรวจสอบหม้อไอน้ำและมีการทดสอบอัตโนมัติ	- ทางโครงการมีการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน กรณี หม้อไอน้ำทำงานผิดปกติ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 - ทางโครงการมีการตรวจสอบหม้อไอน้ำและมีการทดสอบ อัตโนมัติ โดยครั้งล่าสุดหม้อไอน้ำ หมายเลข HRSRG 21 และ หมายเลข HRSRG 22 ตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 - ทางโครงการมีแผนการประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ท้องถิ่นเพื่อบันทึกสถิติด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วย หรือโรคที่ อาจเกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบของโครงการ ต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2566 ได้ ดำเนินการรวบรวมแล้ว	-	ภาคผนวก ข-32 รายงานการฝึกซ้อม แผนฉุกเฉิน ภาคผนวก ข-43 เอกสารรับรองความ ปลอดภัยของหม้อไอน้ำ
9. แผนปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุข	1. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นเกี่ยวกับ การบันทึกสถิติด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วย หรือโรคที่อาจ เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบของโครงการต่อ ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ		-	ภาคผนวก ข-46 บันทึกสถิติด้านสุขภาพ ของชุมชนรอบโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. แผนปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุข (ต่อ)	2. สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม การฟื้นฟูป้องกันและดูแลรักษา เช่น การให้เงินทุน และการให้ความรู้ เป็นต้น	- โครงการให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้าน ส่งเสริมการฟื้นฟู ป้องกันและดูแลรักษา โดยการจัดกิจกรรมให้ ความรู้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	-	ภาคผนวก ข-47 แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566
	3. สนับสนุนโครงการชุมชน ที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อคนในชุมชน เช่น จัดหา อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นต้น	- โครงการให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่หน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพประชาชนโดย การเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่	-	ภาคผนวก ข-48 การจัดกิจกรรมมวลชน สัมพันธ์
	4. จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากร ให้พร้อมสำหรับการปฐมพยาบาล	- ทางโครงการมีการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน ครั้งล่าสุดในปี 2566 วันที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 และวันที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566	-	ภาคผนวก ข-49 การอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้น
	5. ให้ความรู้กับพนักงานในการป้องกันโรคติดต่อ และ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	- โครงการมีการให้ความรู้กับพนักงานในการป้องกันโรคติดต่อ และ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพพนักงาน	-	ภาคผนวก ข-50 เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
	1. พิจารณารับสมัครแรงงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ เข้าทำงานเป็น ลำดับแรก	- ทางโครงการมีนโยบายในการพิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มี คุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการเข้าทำงานซึ่ง ปัจจุบันโครงการมีจำนวนพนักงานในท้องถิ่น 7 คน คิดเป็น 21.88% ของพนักงานทั้งหมด	-	ภาคผนวก ข-51 พนักงานในท้องถิ่น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยะ) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามโอกาส และความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง อาทิเช่น - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมภายใน ท้องถิ่น รวมทั้ง งานเทศกาลต่างๆ เช่น งานทอดกฐิน งาน ทอดผ้าป่าสามัคคี - การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข - การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและการกีฬา	- ทางโครงการได้จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือตามโอกาสและความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ ด้านการศึกษา * วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยใน เครือข่ายท้องถิ่น บริษัท อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยะ) 2 เข้าร่วมรับตราพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565 โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดพิจิตร รวม จำนวน 30 โรงเรียน * วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ กลุ่ม โรงไฟฟ้า อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยะ) 2 ร่วมสนับสนุน งบประมาณ พร้อมมอบน้ำดื่ม ปี.กริม จำนวน 840 ขวด เนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี และพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9	-	ภาคผนวก ข-47 แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 และ ภาคผนวก ข-48 การจัดกิจกรรมมวลชน สัมพันธ์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์ม (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 15 กันยายน 2566 นำโดยคุณรุ่งฤดี คงเสื่อ ผู้จัดการแผนก บริหารอาวุโส กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เปิด โครงการปลูกผัก แบ่งปันสุข โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หน้า ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เชิง ปฏิบัติการให้แก่แก่นักเรียนบ้านห้วยไผ่ไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดรายจ่ายในการ จัดซื้ออาหาร และเพิ่มรายได้ในการบริหารจัดการอาหารกลางวันของ โรงเรียน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและ กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ทั้งยังมีการมอบ ทุนการศึกษาจากพี่ๆ น้องๆ จิตอาสากลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ที่ร่วมกันสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ รวม จำนวน 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท ถ้วน) เพื่อมอบให้แก่เด็กที่เรียนดีและมีฐานะยากจนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาลูกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) (Local Trainer) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการฯ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ “กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยา ประจำปี 2566 เพื่อถ่ายทอดแนววิธีการสอนโดยเน้นการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนในเครือข่าย ทั้งยังเป็นส่วน หนึ่งในการผลักดัน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีกรดำเนินการจัดอบรมที่โรงแรมฮอติเดย์อินน์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เปิดโครงการ ABPR อาสา สร้างสุขปี 2 (แบ่งสุข ปันน้ำใจ เพื่อน้องบ้านหนองตอ) โดยจัดพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองตอ ตำบลจันทิก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการศึกษา มอบ อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้การสอน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุง ระบบไฟ จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และเพื่อ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาจาก พี่ๆ น้องๆ จิ จิตอาสากลุ่ม โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ที่ร่วมกันสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆรวมจำนวน 30 ทุน เป็นเงิน ทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่เด็กที่เรียนดี และมีฐานะยากจน		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) (Local Trainer) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการฯ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อถ่ายทอดแนว วิธีการสอน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนในเครือข่าย ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ โดยจัดอบรมที่บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3,4 จำกัด * วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล เรารักมกบยางพร ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านมกบยางพร - จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและร่วมสมทบทุนในการต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมกบยางพร		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	ด้านการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ * วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสัมพันธ์ กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) และผู้นำชุมชนตำบลชะเมาผู้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่ตำบลชะเมาผู้ อาเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากนั้นแล้วทางเราได้มอบของใช้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลชะเมาผู้ด้วย * วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ตัวแทนผู้บริหาร พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ วัดประชา รัฐ สร้างสุข ของมหาเถรสมาคมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางบูรณาการความร่วมมือร่วมกันกับส่วนราชการ/หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และภาคีความร่วมมือระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์กลางชุมชนภายใต้โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5ส ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาลูกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 25 กันยายน 2566 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และมอบ น้ำดื่ม บี.กริม จำนวน 360 ขวด เนื่องในโครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ คนระยองร่วมใจลดใช้พลังงาน ณ หน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัด ระยอง โดยเป็นการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ภายในงานมีบูธนิทรรศการให้ความรู้และ นวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานทางเลือก รวมถึงบูธ เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนด้าน ความรู้ และอุปกรณ์จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเพื่อนำไปใช้ใน กระบวนการผลิต * วันที่ 27 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมงานเกษียณอายุราชการคุณ สามารถ อุดม คุณครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เนา (เพชร-เพียน อนุสรณ์) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 3 ตุลาคม 2566 พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “100 ล้านซีซี โลหิตชาวอมตะ เพื่อสภากาชาดไทย” ครั้งที่ 32 กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ จุดรับบริจาคโลหิต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เดินทางไป อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการโรงงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้นิคมฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน * วันที่ 6 ตุลาคม 2566 พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมพิธิมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและปฎิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยนายจำเนียร กิติ์ ที่ปูลูล นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความสามัคคีในชุมชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาจำนวน 124 คน จากนั้นได้ร่วมปฎิญาณตนและร่วมปลูกต้นไม้ของไร จำนวน 250 ต้นเพื่อเสริมความมงคลในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันนวมินทรมหาราช) ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 ตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง พร้อมมอบน้ำดื่ม บี.กริม จำนวน 360 ขวด เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย * วันที่ 12 ตุลาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ภาษาชนบทเรียนแผนปฏิบัติการที่ดีความสำเร็จ ตามโครงการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีความสำเร็จการจัดการอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี 100% ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ณ โรงแรมโกลเด้นคิตตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จึงมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมสนับสุนนน้ำดื่มให้กับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอนิคมพัฒนาที่ 8 และศูนย์ คำรณธรรมอำเภอนิคมพัฒนาเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยจะมีการดำเนินการตั้งด่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง * วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมคาราวาอมตะสร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2566 กับบริษัท อมตะ จีดี ระยอง จำกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยมีการออกหน่วยให้ บริการขั้นพื้นฐานและกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการฟรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับชุมชน และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ชุมชน อาทิ บริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ บริการตัดผม บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจกรรมสันทนาการ และอื่นๆ ซึ่งภายในกิจกรรมเจ้าหน้าที่พนักงานของกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้อาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 29 ธันวาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอเนินคมพัฒนา จังหวัดระยอง <u>ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน</u> * วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปลูกป่าชุมชน) บริเวณสวนป่ารัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม * วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้เข้าร่วม “กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ณ บริเวณกลุ่มบริหารทรัพยากรประมงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติโดยรอบนิคม โดยปล่อยปลา 200,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 150,000 ตัว		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นำโดยคุณธีรเดช หรณพ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่ารักโลก ปี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนบ้านวังตาลหม่อน ตำบลบายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวม 300 ต้น ภายในกิจกรรมมีการลงนามข้อตกลง (MOU) การดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบายางพร นำโดยคุณอภิชาติ เงินท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบายางพร ในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วย ขอขอบคุณผู้ประกอบการ, หน่วยงานราชการ, สมาชิกในชุมชนทุกท่านและขอขอบคุณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ที่มอบกล้าไม้ยืนต้นในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย * วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านข้างอ่างเก็บน้ำ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 1,000 ต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์วกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2. (ต่อ)	* วันที่ 20 ธันวาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จัดการประชุม คณะกรรมการร่วมประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 สถานที่บริษัท อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3, 4 จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชุม และชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการ ดำเนินงานด้านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ด้านวัฒนธรรมประเพณี * วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมสนับสนุนงบประมาณพร้อมมอบน้ำดื่ม ปี.กริม จำนวน 1,800 ขวด เนื่องในโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลบางพรหม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กรังการีการบริหารส่วนตำบลบางพรหม ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยสืบไป * วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน พร้อมมอบน้ำดื่ม จำนวน 960 ขวด และเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน รุ่ง ปิ่น” เพื่อการกุศล ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ศาลาส่งสุข หอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงและนำรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดไปจัดซื้อชุดถังออกซิเจนช่วย หายใจให้กับผู้ป่วย/ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนตำบลพนานิคม		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยะอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกฎปิตตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	3. การจัดให้ตัวแทนหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับ อำเภอ และระดับท้องถิ่น รวมถึงผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของโครงการเพื่อให้รับทราบ การทำงาน ข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจต่อ มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เมื่อได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการ	- ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชม การดำเนินโครงการ เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ กำหนด โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มี ผู้ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	-	-
	4. กำหนดรายละเอียดแนวทางความรับผิดชอบต่อชุมชน โดย ควรจะระบุไว้ในระเบียบการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนใน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดตลอดอายุการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ภายหลังการ จัดตั้งคณะกรรมการ กำหนดให้มีการประชุมรายงานผล ความคืบหน้าเป็นระยะๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ กำหนด ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกัน	- โครงการได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเกี่ยวกับระเบียบ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งจัดการ ประชุมโดย สกพ. อย่างสม่ำเสมอ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาลูกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	5. จัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ เข้าพบปะพูดคุย และสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีทีมงานที่ดูแลงานด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อ เข้าพบปะผู้นำชุมชน และร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์กับ ทางชุมชน รวมทั้งยังมีคณะกรรมการร่วมประสานงานเพื่อ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ และเพื่อลดผลกระทบที่ จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน	-	ภาคผนวก ข-52 เอกสารการแต่งตั้ง คณะทำงานมวลชน สัมพันธ์
	6. การรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 4 * ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการให้ชุมชนโดยรอบ ได้รับทราบ โดยเฉพาะขั้นตอนและช่องทางทางการรับเรื่อง ร้องเรียนของโครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการให้ ชุมชนโดยรอบได้รับทราบผ่านทางผู้นำชุมชน และกิจกรรม ด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยเฉพาะขั้นตอนและช่องทางทางการรับ เรื่องร้องเรียนของโครงการ และได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม ประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นกร ประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชนเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนทุก 6 เดือน รวมทั้งได้เข้า ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า กับ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ และชุมชนที่ เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน การรับฟังความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจต่อชุมชน	-	ภาคผนวก ข-4 แผนขั้นตอนการรับ เรื่องร้องเรียน และ ภาพที่ 2.2-2 กล่องและเบอร์ โทรศัพท์รับเรื่อง ร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	* กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตาม การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน * บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการและการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว โดยสรุปเสนอผู้บริหารทุกปี	- จัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน - ปัจจุบันในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่พบ ข้อร้องเรียนจากชุมชน	-	-
	7. จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินการตามแผน พร้อมกับ สรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งเพื่อใช้ทบทวนการทำแผน มวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและผล สูงสุด	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินการ ตามแผน พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งเพื่อใช้ ทบทวนการทำแผนมวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไป	-	ภาคผนวก ข-47 แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 และ ภาคผนวก ข-48 การจัดกิจกรรมมวลชน สัมพันธ์
	8. จัดให้มีการรณรงค์ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์เป็นการดำเนินการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยการนำเสนอข้อมูลและความเห็นของโครงการเป็น ระยะๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ โครงการเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการ มากยิ่งขึ้น	- ทางโครงการมีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นการ ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไปยัง สื่อมวลชนท้องถิ่น ทุก 6 เดือน และชุมชนที่เกี่ยวข้องเป็น ประจำทุก 1 ปี ซึ่งผ่านทางคณะกรรมการร่วมประสานเพื่อ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอข้อมูลและ ความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจ	-	ภาคผนวก ข-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยะ) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกฎปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	9. การส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้กับ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ศึกษาภายในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อติดประกาศ หนังสือแจ้งให้ทราบข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชน อาทิเช่น ข่าวสารการรับสมัครงาน การจัดการเรื่อง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคืบหน้าของปัญหาต่างๆ ข้อมูล ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบ โดย การจัดประกาศหรือผ่านการประชุมประจำเดือนของชุมชน	- ทางโครงการได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้สื่อประเภท ต่างๆ เช่น ใบปลิว เอกสารแผ่นพับ เพื่อแจกจ่ายให้กับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งผ่านคณะกรรมการร่วมประสานเพื่อการ พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวก ข-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ และ ภาพที่ 2.2-2 กล่องและบอร์ดโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียน
	10. การส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โครงการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ชี้แจงข้อ ซักถามและสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจต่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมของโครงการตามความเหมาะสมหรือเมื่อได้รับ การร้องขอ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการยังไม่ได้ รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางพรให้เข้าร่วม ประชุมประจำเดือน เนื่องจากไม่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โรงไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมประสานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นงาน ประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ทุก 6 เดือน โดยจัดประชุม ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยะ) 3, 4 จำกัด	-	ภาคผนวก ข-53 เอกสารการแต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อการ พัฒนาชุมชนและ สิ่งแวดล้อม และ รายงานการประชุม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	11. ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งบังคับใช้ในโครงการ	- ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการกำหนด โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มีผู้ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	-	-
	12. จัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก	- ทางโครงการมีนโยบายในการพิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการเข้าทำงานซึ่งปัจจุบันโครงการมีจำนวนพนักงานในท้องถิ่น 7 คน คิดเป็น 21.88% ของพนักงานทั้งหมด	-	ภาคผนวก ข-51 พนักงานในท้องถิ่น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกฎปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	13. โครงการมีนโยบายให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประสานงาน เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกับโครงการ โรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี หรือตามดุลพินิจของกรรมการส่วนใหญ่ ที่ได้รับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ให้ พิจารณาสรรหาจากความร่วมมือในหลายภาคส่วน ด้วยความเต็มใจที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าต้องการให้มี คณะกรรมการในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การติดตามผลการ ดำเนินการของโครงการ และแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง โครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ โดยมีโครงสร้างและ อำนาจหน้าที่ ดังนี้	- โครงการมีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประสานงาน เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกับโครงการ โรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด และมีการประชุมคณะกรรมการ ร่วมประสานงานฯ ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดประชุม ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3, 4 จำกัด	-	ภาคผนวก ข-53 เอกสารการแต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อการ พัฒนาชุมชนและ สิ่งแวดล้อม และ รายงานการประชุม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดิเตค บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	1)โครงการและองค์ประกอบคณะกรรมการฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนหลายฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนจากโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้แทน ท้องถิ่นขององค์กรจัดตั้งทางสังคม จำนวนรวม 24 คน ประกอบด้วย 1.1) ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 14 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ที่ได้รับการคัดเลือกหรือ แต่งตั้งมาจากประชาชนในชุมชน อาทิ ชาวบ้านทั่วไป ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์กรทางสังคมในชุมชน และผู้ที่ ได้รับความนับถือในชุมชน 1.2) ตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ส่วนที่เหลือให้ ประกอบด้วย - ตัวแทนจากผู้นำและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น หมายถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกชุมชน และผู้แทนนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้ง โครงการ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยong) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกาปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	2.2) วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน) กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่างๆ เหตุฉุกเฉิน หรือมีความ จำเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ 3) หน้าที่ของคณะกรรมการฯ 3.1) กรณีการดำเนินงานปกติ ก) รับทราบแผนการดำเนินงานของโครงการ และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหรือ มาตรการที่ควรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันหรือ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ข) ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผลการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ค) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจัยที่เป็น ข้อวิตกกังวลหรือความสนใจของชุมชน ง) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนามาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับ ชุมชน อันเนื่องจากการดำเนินงานของโครงการ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	3.2) วาระพิเศษ (กรณีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน) ให้มีการประชุมวาระพิเศษทุกครั้งที่มีการร้องเรียนถึงความ เสียหายอันเกิดกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรใดๆ และรวมถึง ทรัพย์สินของบุคคล นิติบุคคล องค์กรใดๆ นั้น และทรัพย์สิน ของส่วนรวมด้วย อันเนื่องมาจากการก่อสร้างและการ ดำเนินการผลิตของโครงการ ก)กรณีที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบจากโครงการในกรณีที่ได้รับ ฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อเรียกร้องใดๆ นั้น เป็นความรับผิดชอบของโครงการ - ให้คณะกรรมการฯ เสนอแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนเพื่อ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที - นำเสนอหาข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย โดย มติดังกล่าวจะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากโครงการรับ ฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อร้องเรียนนั้น เป็นความรับผิดชอบของโครงการโครงการต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ชำต้น รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) ซึ่งให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ ทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับความเสี่ยงหายหรือสูญ หายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใดๆ ซึ่งกรมธรรม์จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัย ธรรมชาติและอุบัติเหตุทุกชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัย ภายนอก (External Factor) และเกิดขึ้นในลักษณะ ทันทีทันใด (Sudden) และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ได้ (Unforeseen) เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ พายุ และผลกระทบของบุคคลภายนอกไว้ ทั้งหมดโดยเฉพาะในส่วนของความเสียหายที่จะเกิด ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 โดยกำหนดวงเงิน ความรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เพื่อให้ ความคุ้มครองต่อผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการยินดีเข้าไปดูแลช่วยเหลือชดเชยค่าเสียหาย			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	ในระหว่างการพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ทางโครงการจะเข้ามาดูแล และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทางโครงการ โดยการเยียวยาเบื้องต้นทั้งด้านชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างในช่วงก่อนที่ ทางกรรมสิทธิ์จะกันภัยเข้ามาดูแล ข)กรณีไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจน กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถหาข้อยุติ ได้ ให้คณะกรรมการฯ นัดประชุมวาระพิเศษ พิจารณา คัดแยกและแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยความ เห็นชอบของโครงการ ประกอบด้วย คณะบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 5 คน และ ไม่เกิน 9 คน มีลักษณะดังนี้ - ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ หรือกิจกรรมในเรื่องนั้นๆ - มีได้เป็นข้าราชการ สมาชิกนิติรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ต้องเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของทุกภาคส่วน ว่ามีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตามกรณีการร้องเรียนหรือลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ด้านสุขภาพ ด้านเกษตรกรรม ด้านชุมชน และสังคม ด้านการชดเชย เป็นต้น คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีหน้าที่วินิจฉัยผลกระทบ ทำการตรวจสอบ และพิสูจน์หาสาเหตุข้อร้องเรียน ปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ในแต่ละด้านตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน - กรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจชี้แจงต่อผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อมีความเห็นตรงกันให้จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	- กรณีที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีหน้าที่เสนอแนวทางการชดเชยความเสียหาย รวมทั้ง การเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการด้วยความยืดหยุ่น สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงข้อได้แย้งของทุกฝ่าย ตลอดจนผลกระทบในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุจนกว่าจะได้ข้อยุติข้างต้น			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)	14. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและ ต่างๆ ของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในท้องถิ่น รวมทั้งงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า สามัคคี - การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข - การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและการกีฬา เช่น มอบทุน การศึกษา บริจาคอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น - งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาค ตามที่ได้รับร้องขอ	- โครงการได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตาม ความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ผู้นำ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดย แบ่งกิจกรรมดังนี้ ด้านการศึกษา * วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยใน เครือข่ายท้องถิ่น บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมรับตราพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565 โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวม จำนวน 30 โรงเรียน	-	ภาคผนวก ข-47 แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 และ ภาคผนวก ข-48 การจัดกิจกรรมมวลชน สัมพันธ์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมสนับสนุนงบประมาณ พร้อมมอบน้ำดื่ม ปี.กริม จำนวน 840 ขวด เนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 * วันที่ 15 กันยายน 2566 นำโดยคุณรุ่งฤดี คงเสื่อ ผู้จัดการแผนกบริหารอาวุโส กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เปิดโครงการปลูกผัก แบ่งปันสุข โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เผ่า ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่แก่นักเรียนบ้านห้วยไผ่เผ่าได้มีความรู้ ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดรายจ่ายในการจัดซื้ออาหาร และเพิ่มรายได้ในการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาจากพี่ๆ น้องๆ จิตอาสากลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ที่ร่วมกันสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ รวมจำนวน 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่เด็กที่เรียนดี และมีฐานะยากจนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) และวิทยาการเครือข่ายท้องถิ่น กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) (Local Trainer) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการฯ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ “กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” อย่างยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ประจำปี 2566 เพื่อถ่ายทอดแนววิธีการสอนโดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนในเครือข่าย ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมี การดำเนินการจัดอบรมที่โรงเรียนอัสสัมชัญอินทร์ จันทบุรีระยอง เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาลูกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปิกริม เพาเวอร์ (ระยอง) เปิดโครงการ ABPR อาสาสร้างสุขปี 2 (แบ่งสุข ปันน้ำใจ เพื่อน้องบ้านหนองดอ) โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองดอ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการศึกษา มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปิกริม เพาเวอร์ (ระยอง) ทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาจาก พี่ๆ น้องๆ จัดอาสากลุ่ม โรงไฟฟ้า อมตะ ปิกริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมกันสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ รวมจำนวน 30 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่เด็กที่เรียนดีและมีฐานะยากจน		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) และวิทยาการเครือข่ายท้องถิ่น กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) (Local Trainer) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการฯ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อถ่ายทอดแนว วิธีการสอน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนในเครือข่าย ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยจัดอบรมที่บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3,4 จำกัด * วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล เรายักษ์มาบยางพร ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร - จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและร่วมสมทบทุนในการต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมาบยางพร		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		ด้านการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ * วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) และผู้นำชุมชนตำบลชะเมาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่ตำบลชะเมาฯ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และอาการป่วย นอกเหนือจากนั้นแล้วทางเราได้มอบของใช้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลชะเมาฯด้วย * วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ตัวแทนผู้บริหาร พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ วัตถุประสงค์ สร้างสุข ของมหาเถรสมาคมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางบูรณาการความร่วมมือร่วมกันกับส่วนราชการ/หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และภาคีความร่วมมือระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์กลางชุมชนภายใต้โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5ส ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 25 กันยายน 2566 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่ม โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และมอบน้ำดื่ม บี.กริม จำนวน 360 ขวด เนื่องในโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมใจลดใช้พลังงาน ณ หน้าหอประชุม ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยเป็นการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ในการตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ภายในงานมีปฐมนิเทศ การให้ความรู้และนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานและพลังงาน ทางเลือก รวมถึงบูธเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนต่างๆ ที่ได้รับ การสนับสนุนด้านความรู้ และอุปกรณ์จากสำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต * วันที่ 27 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมงานเกษียณอายุราชการคุณ สามารถ ยุคม คุณครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เนา (เพื่อชร- เพี้ยน อนุสรณ์) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 3 ตุลาคม 2566 พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “100 ล้านซีซี โลहितชาวอมตะเพื่อสภากาชาดไทย” ครั้งที่ 32 กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ จุดรับบริจาคโลหิต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการโรงงาน และหน่วยงานต่างๆภายในนิคมฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน * วันที่ 6 ตุลาคม 2566 พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมพิชิตอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและปฏิบัติงานตนเป็นพลเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยนายจำเนียร กิติ์ ที่ปฎูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความสามัคคีในชุมชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาจำนวน 124 คน จากนั้นได้ร่วมปฏิญาณตนและร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้นเพื่อเสริมความมงคลในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันนวมินทร มหาราช) ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 ตำบลพนานิคม จังหวัดระยอง พร้อมมอบน้ำดื่ม บี.กริม จำนวน 360 ขวด เพื่อ บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย * วันที่ 12 ตุลาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมการสัมมนาการประเมินคุณภาพตัวชี้วัดถอด บทเรียนความสำเร็จ ตามโครงการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี ความสำเร็จการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100% ของ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ณ โรงแรมโกลเด้นจดี ระยอง จังหวัด ระยอง ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จึงมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อน อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ เพื่อ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมสนับสุนน้ำดื่มให้กับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอานิคมพัฒนาที่ 8 และศูนย์ ดำรงธรรมอำเภอานิคมพัฒนาเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยจะมีการดำเนินการตั้งด่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอานิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอานิคมพัฒนา จังหวัดระยอง * วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2566 กับบริษัท อมตะ ชีตส์ ระยอง จำกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยมีการออกหน่วยให้ บริการขึ้นพื้นฐานและกิจกรรมต่างๆให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการฟรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับชุมชน และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ชุมชน อาทิ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการตัดผม บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจกรรมสันทนาการ และอื่นๆ ซึ่งภายในกิจกรรมเจ้าหน้าที่พนักงานของกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้อาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 29 ธันวาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอเนินขามพัฒนา จังหวัดระยอง ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน * วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปลูกป่าชุมชน) บริเวณสวนป่ารัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม * วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้เข้าร่วม “กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง บริเวณกลุ่มบริหารทรัพยากรประมงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติโดยรอบนิคม โดยปล่อยปลา 200,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 150,000 ตัว		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นำโดยคุณธีรเดช พรหมพ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการปลูกป่ารักโลก ปี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวและสร้างอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่ ชุมชนบ้านวังตาลหม่อน ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง จำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวม 300 ต้น ภายในกิจกรรมมีการลง นามข้อตกลง (MOU) การดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลมายางพร นำโดยคุณอภิชาติ เงินท่วม นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลมายางพรในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วย ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการ, หน่วยงานราชการ, สมาชิกในชุมชนทุกท่านและ ขอขอบคุณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ที่มอบกล้า ไม้ยืนต้นในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย * วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านข้างอ่างเก็บน้ำ 2 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง จำนวน 1,000 ต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 20 ธันวาคม 2566 กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมประสานงานเพื่อการ พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 สถานที่บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3, 4 จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุม และชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผล การดำเนินงานด้านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 <u>ด้านวัฒนธรรมประเพณี</u> * วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมสนับสนุนงบประมาณพร้อม มอบน้ำดื่ม บี.กริม จำนวน 1,800 ขวด เนื่องในโครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาดำบยายางพร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยายางพร ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. แผนปฏิบัติการ ด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (ต่อ)		* วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ที่มวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) เป็นตัวแทนมอบงบประมาณ สนับสนุน พร้อมมอบน้ำดื่ม จำนวน 960 ขวด และเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” เพื่อการกุศล ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการประเพณีลอย กระทง ประจำปี 2566 ณ ศาลาส์ร่างสุข ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและนำรายได้จากการจัด กิจกรรมทั้งหมดไปจัดซื้อชุดถังออกซิเจนช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย/ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนตำบลพนานิคม		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. แผนปฏิบัติการ ด้านมวลชน สัมพันธ์และ การมีส่วนร่วม	1. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลดี-ผลเสียของโครงการ เพื่อสร้าง ผลการดำเนินการตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้าง ความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการตลอดอายุ การดำเนินโครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ให้ชุมชน รับทราบโดยมีเอกสารแสดงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของ โครงการผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด บริเวณจุดติดต่อสอบถาม ของหน่วยงานราชการ เช่น อบต.มาบตาพุด อบต.บ่อวิน และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)	-	ภาคผนวก ข-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ และ ภาพที่ 2.2-1 การประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ
	2. กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึก เป็นรายงานไว้ด้วย	- กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชน ทางโครงการจะเร่งหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข และชี้แจงให้กับชุมชนรับทราบ รวมทั้ง ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมประสานเพื่อการพัฒนาชุมชนและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาและลด ข้อวิตกกังวลของชุมชน	-	ภาคผนวก ข-4 แผนขั้นตอนการรับ เรื่องร้องเรียน และ ภาพที่ 2.2-2 กล่องและเบอร์ โทรศัพท์รับเรื่อง ร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ ปี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. แผนปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม (ต่อ)	3. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เห็นสภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพื่อคลายความวิตกกังวลของชุมชน	- ทางโครงการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร	-	-
	4. ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทั่วไป รวมทั้งความรู้และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	- โครงการมีการประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทั่วไปรวมทั้งความรู้และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	-	ภาคผนวก ข-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ และ ภาพที่ 2.2-1 การประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ
	5. มีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ โดยต้องนำข้อเสนอแนะกลับมามีวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและวางแผนในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	- โครงการจัดให้มีทีมงานที่ดูแลงานด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเข้าพบปะผู้นำชุมชน และร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์กับทางชุมชน รวมทั้งยังมีคณะกรรมการร่วมประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ และเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน	-	ภาคผนวก ข-52 เอกสารการแต่งตั้ง คณะทำงานมวลชนสัมพันธ์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. แผนปฏิบัติการ ด้านมวลชน สัมพันธ์และ การมีส่วนร่วม (ต่อ)	6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกับ ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น ใบปลิว ขนาด A3 จำนวน 50 ใบ เพื่อติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ ที่ทำการผู้นำชุมชน และป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เอกสารแผ่นพับ ขนาด A4 จำนวน 500 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจทั่วไป และการกระจายเสียง ตามหอกระจายเสียงในชุมชน ซึ่งคณะทำงานต้องมีการ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการเพื่อลดความวิตกกังวลจากชุมชน รวมทั้งรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกของชุมชนและมีเจ้าหน้าที่ของ โครงการปรับปรุงเพื่อนำกลับวางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขจากข้อเสนอแนะของชุมชน	- ทางโครงการได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้สื่อประเภท ต่างๆ เช่น ใบปลิว เอกสารแผ่นพับ เพื่อแจกจ่ายให้กับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งผ่านคณะกรรมการร่วมประสานเพื่อการ พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวก ข-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ และ ภาพที่ 2.2-1 การประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อยตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. แผนปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์และมีส่วนร่วม (ต่อ)	7. จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ประจำปี โดยมีกรอบแผนงานหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และด้านศาสนา โดยดำเนินการตามแผน พร้อมกับสรุปผลการทำงานทุกครั้งเพื่อใช้บทวนการทำงานทำแผนมวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	- ทางโครงการมีการจัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ประจำปี โดยมีกรอบแผนงานหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน ด้านศาสนา และด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน	-	ภาคผนวก ข-47 แผนมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2566 และ ภาคผนวก ข-48 การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
	8. จัดให้มีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ้น	- ทางโครงการมีการจัดให้มีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น	-	
	9. ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งบังคับใช้ในโครงการ	- ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งบังคับใช้ในโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของกรปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. แผนปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์และมีส่วนร่วม (ต่อ)	10. นำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและการแปรผลที่ชาวบ้านสามารถเข้าใจภายในบริเวณศูนย์รวมของชุมชนโดยประสานงานผ่านผู้นำชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาเป็นประจำทุก 6 เดือน	- มีการนำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานท้องถิ่น และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้แทนชุมชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยจัดประชุมครั้งล่าสุด ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3, 4 จำกัด	-	ภาคผนวก ข-53 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม และรายงานการประชุม และ ภาพที่ 2.2-33 การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้แทนชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์ม (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. แผนปฏิบัติการ ด้านมวลชน สัมพันธ์และ การมีส่วนร่วม (ต่อ)	11. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ ทางด้านการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย ให้ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในชุมชน ใกล้เคียงรอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	- โครงการมีจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ โครงการ ทางด้านการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย ให้ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในชุมชน ใกล้เคียงรอบ	-	-
12. สุนทรียภาพและ การท่องเที่ยว	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงเพื่อเป็นแนวบังสายตา เช่น โอ๊คอินเดีย สนประติพจน์ ประดู่ เป็นต้น มีการแทรกด้วย ไม้พุ่มต่างระดับ เช่น โกสน โมก แก้ว เข็ม เป็นต้น พื้นที่ว่าง ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าจัดเป็นพื้นที่สันทนาการและสวนหย่อม	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 4,600 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ข-54 Lay Out พื้นที่สีเขียว ของโครงการ และภาพที่ 2.2-34 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ความ สมบูรณ์อยู่เสมอ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวอยู่เสมอ โดยได้ ว่าจ้างบริษัท พี.เอส. การ์เด็น จำกัด ดูแลรักษาสวนหญ้า และต้นไม้เป็นประจำทุกวันจันทร์-วันเสาร์	-	ภาคผนวก ข-55 สัญญาจ้างผู้รับเหมา ในการดูแลพื้นที่สีเขียว และ ภาพที่ 2.2-35 เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้



ภาพที่ 2.2-1 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ



ภาพที่ 2.2-2 กล่องและเบอร์โทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 2.2-3 อุปกรณ์ Burner ในระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO_x



ภาพที่ 2.2-4 ระบบ CEMs



ภาพที่ 2.2-5 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) บำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค บริโภคของพนักงาน



ภาพที่ 2.2-6 รางระบายน้ำคอนกรีต



ภาพที่ 2.2-7 บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน



pH Meter



Thermometer



Conductivity Meter

ภาพที่ 2.2-8 เครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ บริเวณ Water Retention Pit



ภาพที่ 2.2-9 ระบบระบายน้ำฝนของโครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมฯ



ภาพที่ 2.2-10 ฐานคอนกรีตลดแรงสั่นสะเทือน



ภาพที่ 2.2-11 อาคารครอบเครื่องจักร



ภาพที่ 2.2-12 อุปกรณ์ลดเสียง (Silencer)



ภาพที่ 2.2-13 ประตูกั้นเสียงสำหรับห้องควบคุม



ภาพที่ 2.2-14 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรอง



ภาพที่ 2.2-15 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลของพนักงาน



ภาพที่ 2.2-16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 2.2-17 ป้ายควบคุมความเร็วในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.2-18 ถังขยะในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.2-19 กระดาษ Reuse

ภาพที่ 2.2-20 อาคารเก็บรวบรวมขยะ



ภาพที่ 2.2-21 พื้นที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 2.2-22 ป้ายเตือนพื้นที่อันตรายบริเวณต่างๆ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 2.2-23 ระบบตรวจสอบ ตรวจจับและสัญญาณเตือนภัย



ภาพที่ 2.2-24 อุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 2.2-25 พาหนะสำรองเพื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



ภาพที่ 2.2-26 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร



ภาพที่ 2.2-27 รั้วตาข่าย



ภาพที่ 2.2-28 ระบบท่อ Bypass และระบบวาล์วสำรอง



ภาพที่ 2.2-29 ปล่องระบายก๊าซ Blow down stack



ภาพที่ 2.2-30 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผง



ภาพที่ 2.2-31 ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Transformer Protection)



HRSG Insulator



Level Drum Alarm and Emergency Trip



HP Drum Pressure Indicator



LP Steam Outlet Pressure



LP Drum Level Indicator



LP Drum Level Indicator (Sight Glass)



Safety Valve LP Outlet Steam



Safety Valve LP Drum

ภาพที่ 2.2-32 อุปกรณ์ลดความเสี่ยงจากการระเบิดของเครื่องจักร



ภาพที่ 2.2-33 การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้แทนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภาพที่ 2.2-34 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพที่ 2.2-35 เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 บทนำ

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับการเห็นชอบแล้วจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มอบหมายให้ บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

- 1) คุณภาพอากาศจากปล่อง
- 2) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- 3) ความเร็วลมและทิศทางลม
- 4) คุณภาพน้ำทิ้ง
- 5) ระดับเสียงในบรรยากาศ
- 6) ระดับเสียงรบกวน
- 7) การจัดการกากของเสีย
- 8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
 - ตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน (Leq 8 hrs)
 - ตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ
 - บันทึกสถิติอุบัติเหตุภายในโครงการ
- 9) มวลชนสัมพันธ์
 - บันทึกปัญหาข้อร้องเรียน
 - สืบรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม
- 10) สุขภาพอนามัยของประชาชน
- 11) สุนทรียภาพ

3.2 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ได้วางแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

รายการ	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ความถี่/ระยะเวลา
1 คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (ปล่องหม้อไอน้ำ)	- ค่าความเข้มข้นมลสารที่ระบายออก • ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) • ฝุ่นละอองรวม (TSP) • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - อุณหภูมิ - ปริมาณออกซิเจน - ความเร็วก๊าซ - รูปแบบการเดินเครื่องและกำลังการผลิต ขณะทำการตรวจวัด - คำนวนผลการตรวจวัดในรูปแบบอัตราภาระโดยรวม (Total Loading) เพื่อเปรียบเทียบกับค่าอัตราการระบายที่ได้รับอนุญาตจากนิคมฯ	- ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) จำนวน 2 ปล่อง	- ปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานผลให้อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง % excess air เท่ากับ 50% oxygen เท่ากับ 7
1.2 การตรวจวัดคุณภาพจากปล่องด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติสำหรับค่าที่ตรวจวัด ได้แก่	- ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) - ก๊าซออกซิเจน (O_2)	- ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) จำนวน 2 ปล่อง	- ตลอดเวลา

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

รายการ	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่/ระยะเวลา
1.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - ทิศทางและความเร็วลม	จุดตรวจวัด 5 จุด (รูปที่ 2) ได้แก่ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร - ชุมชนบ้านโป่งสะแก - โรงเรียนสวนกุหลาบฯ - บ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) - โรงเรียนบ้านภูไทร	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยทำการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
2. คุณภาพน้ำ	ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดดังนี้ - อัตราการไหล - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ - บีโอดี (BOD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน - คลอรีนอิสระ	- บ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง
3. ระดับเสียง	- ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับการรบกวน (เมื่อเปิดดำเนินการและมีการร้องเรียนเรื่องเสียงดัง)	- ริมรั้วโครงการ ทางด้านทิศตะวันออก - ชุมชนที่มีการร้องเรียน หรือชุมชนตัวแทนกรณีไม่ได้รับการรบกวน	- ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 5 วันต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุด
4. กากของเสีย	- บันทึกชนิดปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการ ภายในพื้นที่โครงการ		- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยสรุปในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

รายการ	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ความถี่/ระยะเวลา
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(1) ตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน - ตรวจร่างกายทั่วไป - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - เอกซเรย์ปอด - สมรรถภาพการได้ยิน - สมรรถภาพการมองเห็น	- พนักงานใหม่ทุกคนและการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในการพิจารณาของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด	- ปีละ 1 ครั้ง
	(2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน (Leq 8 hr.) - จัดทำ Noise Contour - ตรวจวัดความร้อน (WBGT °C)	- บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) อาทิ Gas Turbine Generator, Air Compressor และ Steam Turbine Generator - บริเวณพื้นที่โครงการ - หม้อไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 4 ครั้ง - หลังเปิดดำเนินโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง
	(3) รายงานอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน - สาเหตุ - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - ผลต่อสุขภาพพนักงาน - ความเสียหาย/สูญเสีย - การแก้ไขปัญหา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ รายงานปีละ 1 ครั้ง
	(4) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง
(ส่วนขยาย) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

รายการ	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ความถี่/ระยะเวลา
6. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ ความคิดเห็นตัวแทน ครุว์เรือน รวมทั้ง ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมชุมชนที่ เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ ดำเนินโครงการ	- ชุมชนโดยรอบภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ และ ครอบคลุมชุมชนที่เก็บตัวอย่าง ดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และรายงานปีละ 1 ครั้ง
7. มวลชนสัมพันธ์	- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง การ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่ได้รับ - สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ได้รับ	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชน โดยรอบ	- ปีละ 1 ครั้ง
8. สุขภาพอนามัยของประชาชน	- รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของ ประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่อาจได้รับ ผลกระทบและศึกษาวิเคราะห์	- ชุมชนโดยรอบ สัมพันธ์กับจุด ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	- ปีละ 1 ครั้ง
9. สุนทรียภาพ	- ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ

หมายเหตุ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด มอบหมายให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการ
ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2557.

3.2.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง
(ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ทางบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดหรือวิธีที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2-2

ตารางที่ 3.2-2 วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์	อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด	วิธีการอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศจากปล่อง - Carbon Monoxide - Oxides of Nitrogen - Sulfur dioxide - Total Suspended Particulate	Sampling Bag/Air Sampling Train/ CO Analyzer Absorbing Solution/Air Sampling Train/ Spectrophotometer Absorbing Solution/Air Sampling Train/ Titration Filter/Isokinetic Stack Sampling/ Analytical Balance	US EPA, Method 10 US EPA, Method 7 US EPA, Method 6 US EPA, Method 5
2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - Total Suspended Particulate - Particulate matter as PM 10 - Nitrogen Dioxide - Sulfur Dioxide	Filter/High-Volume Air Sample/ Analytical Balance Filter/High-Volume Air Sample/ Analytical Balance Nitrogen Dioxide Analyzer Sulfur Dioxide Analyzer	US EPA 40 CFR Part 50, Appendix B US EPA 40 CFR Part 50, Appendix J US EPA 40 CFR Part 50, Appendix F (Chemiluminescence) US EPA, Method Part 53 and 58
3. ความเร็วและทิศทางลม	Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method	Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method
4. คุณภาพน้ำทิ้ง - pH - Temperature - Flow Rate - Residual Free Chlorine	Electrometric Method Field Method Flow meter, Analyzed by Client DPD Ferrous Titrimetric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500 - H (B) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2550 B Flow meter, Analyzed by Client Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500-Cl (F)

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์	อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด	วิธีการอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) - BOD (5 days at 20 Degree C) - COD - Total Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Oil & Grease	5 - day BOD test Close Reflux, Colorimetric Method Dried at 103-105 degree C/ Gravimetric Method Dried at 180 degree C/ Gravimetric Method Partition Gravimetric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5210 B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5520 B
5. ระดับเสียงในบรรยากาศ - Leq 24 hrs และ L90	Integrate Sound Level Meter	ISO 1996/1 และ ISO 1996/2
6. ระดับเสียงรบกวน - ค่าระดับการรบกวน	Integrate Sound Level Meter	ISO 1996/1
7. ระดับเสียงในสถานประกอบการ - Leq 8 hrs	Integrate Sound Level Meter	ISO 1996/1 และ ISO 1996/2
8. ระดับความร้อนในสถานประกอบการ - Heat Stress	Wet Bulb Globe Temperature	Department Labour Protection and Welfare (B.E.2561)

3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ

1) คุณภาพอากาศจากปล่อง

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สังกะสี หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 113 ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547

2) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39 ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552

3) คุณภาพน้ำทิ้ง

- ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

4) ระดับเสียงในบรรยากาศ

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2540
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11 ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549

5) ระดับเสียงรบกวน

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 11 ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549

5) ระดับเสียงรบกวน (ต่อ)

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 98 ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 313 ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียง 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 1 ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554

6) ระดับเสียงในสถานประกอบการ

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 138 ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546

7) ระดับความร้อนในสถานประกอบการ

- กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ.2561) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 57 ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 7 ง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ซึ่งดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.4.1 คุณภาพอากาศจากปล่อง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละอองรวม และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) จำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 21 (GPS 47P 0729830, 1434608) และปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 22 (GPS 47P 0729853, 1434614) ซึ่งการเก็บตัวอย่าง แสดงดังภาพที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 21 และปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 22 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องที่ปริมาณออกซิเจน ร้อยละ 7 มีปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 20.3 และ 26.0 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าน้อยกว่า 0.5 ส่วนในล้านส่วน ทั้งสองสถานี ปริมาณฝุ่นละอองรวม มีค่าน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งสองสถานี และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ มีค่าน้อยกว่า 1.0 ส่วนในล้านส่วน ทั้งสองสถานี เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่อง ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

สำหรับอัตราการระบายรวมมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่อง (Emission Rate) จำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 21 และปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 22 ที่ปริมาณออกซิเจน ณ สภาวะขณะตรวจวัด พบว่า ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 139 และ 211 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าน้อยกว่า 11.54 และน้อยกว่า 11.92 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ ฝุ่นละอองรวม มีค่าน้อยกว่า 4.44 และน้อยกว่า 4.58 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ มีค่าน้อยกว่า 9.8 และน้อยกว่า 10.1 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พบว่า Total Loading มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว



ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 21
(GPS 47P 0728635, 1436038)



ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 22
(GPS 47P 0728631, 1436071)

ภาพที่ 3.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)
ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)
ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัด				มาตรฐาน ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}	มาตรฐาน ^{3/}
		ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ		ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ				
		(HRSG) 21	(HRSG) 22	(HRSG) 21	(HRSG) 22			
		(GPS 47P 0728635, 1436038)	(GPS 47P 0728631, 1436071)	(GPS 47P 0728635, 1436038)	(GPS 47P 0728631, 1436071)			
		19 ก.ย. 66	19 ก.ย. 66	19 ก.ย. 66	19 ก.ย. 66			
ข้อมูลทั่วไปของปล่องระบาย								
เส้นผ่านศูนย์กลาง	m	2.90	2.90	-	-	-	-	-
ความสูงของปล่อง	m	45.0	45.0	-	-	-	-	-
ลักษณะปากปล่อง	-	Circle	Circle	-	-	-	-	-
อุณหภูมิ	°C	102	101	-	-	-	-	-
ความเร็วก๊าซ	m/s	21.4	22.1	-	-	-	-	-
อัตราการไหล	Nm³/hr	369,902	382,058	-	-	-	-	-
ออกซิเจน	%	15.2	14.4	-	-	-	-	-
ความชื้น	%	7.29	7.41	-	-	-	-	-
กระบวนการ	-	Combustion	Combustion	-	-	-	-	-
เชื้อเพลิง	-	Natural Gas	Natural Gas	-	-	-	-	-
พารามิเตอร์								
Carbon Monoxide	ppm	7% O ₂	15.2% O ₂	7% O ₂	14.4% O ₂	-	690	-
	Kg/day	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-
Oxides of Nitrogen	ppm	20.3	8.32	26.0	12.16	120	200	60
	Kg/day	-	139	-	211	-	-	1,804.03
Sulfur dioxide	ppm	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	20	60	15
	Kg/day	-	<11.54	-	<11.92	-	-	627.26
Total Suspended Particulate	mg/m³	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	60	320	40
	Kg/day	-	<4.44	-	<4.58	-	-	639

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

^{3/} ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่อง ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

หมายเหตุ : - กรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ระบบปิด ค่ารวมผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือ มีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง	นายวรารุณ พับพา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นายเดช ช่างชน ทะเบียนเลขที่ ว-323-ค-9442
ชื่อผู้วิเคราะห์	นางสาวธนิศา กุลสุริวงศ์ ทะเบียนเลขที่ ว-323-จ-9447
เบอร์โทรศัพท์	0-3304-8555

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-2 และรูปที่ 3.4-1 สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ตารางที่ 3.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด		มาตรฐาน ¹	มาตรฐาน ²	มาตรฐาน ³
		ปล่อง HRSG 21	ปล่อง HRSG 22			
Total Suspended Particulate (mg/m ³)	19 มี.ค. 64	<0.5	<0.5	60	320	40
	16 พ.ย. 64	<0.5	<0.5			
	10 มี.ค. 65	<0.5	<0.5			
	16, 21 พ.ย. 65	<0.5	<0.5			
	22 มี.ค. 66	<0.5	<0.5			
	19 ก.ย. 66	<0.5	<0.5			
Sulfur dioxide (ppm)	19 มี.ค. 64	<0.5	<0.5	20	60	15
	16 พ.ย. 64	<0.5	<0.5			
	10 มี.ค. 65	<0.5	<0.5			
	16, 21 พ.ย. 65	<0.5	<0.5			
	22 มี.ค. 66	<0.5	<0.5			
	19 ก.ย. 66	<0.5	<0.5			

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง
(ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566



ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด		มาตรฐาน ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}	มาตรฐาน ^{3/}
		ปล่อง HRSG 21	ปล่อง HRSG 22			
Oxides of Nitrogen (ppm)	19 มี.ค. 64	23.3	25.9	120	200	60
	16 พ.ย. 64	14.2	19.7			
	10 มี.ค. 65	18.8	21.4			
	16, 21 พ.ย. 65	12.2	30.8			
	22 มี.ค. 66	3.81	13.7			
	19 ก.ย. 66	20.3	26.0			
Carbon Monoxide (ppm)	19 มี.ค. 64	2.1	2.3	-	690	-
	16 พ.ย. 64	<1.0	<1.0			
	10 มี.ค. 65	<1.0	<1.0			
	16, 21 พ.ย. 65	<1.0	<1.0			
	22 มี.ค. 66	<1.0	<1.0			
	19 ก.ย. 66	<1.0	<1.0			

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สังกะสี หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547


^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

^{3/} ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่อง ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

หมายเหตุ : - กรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ระบบปิด คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

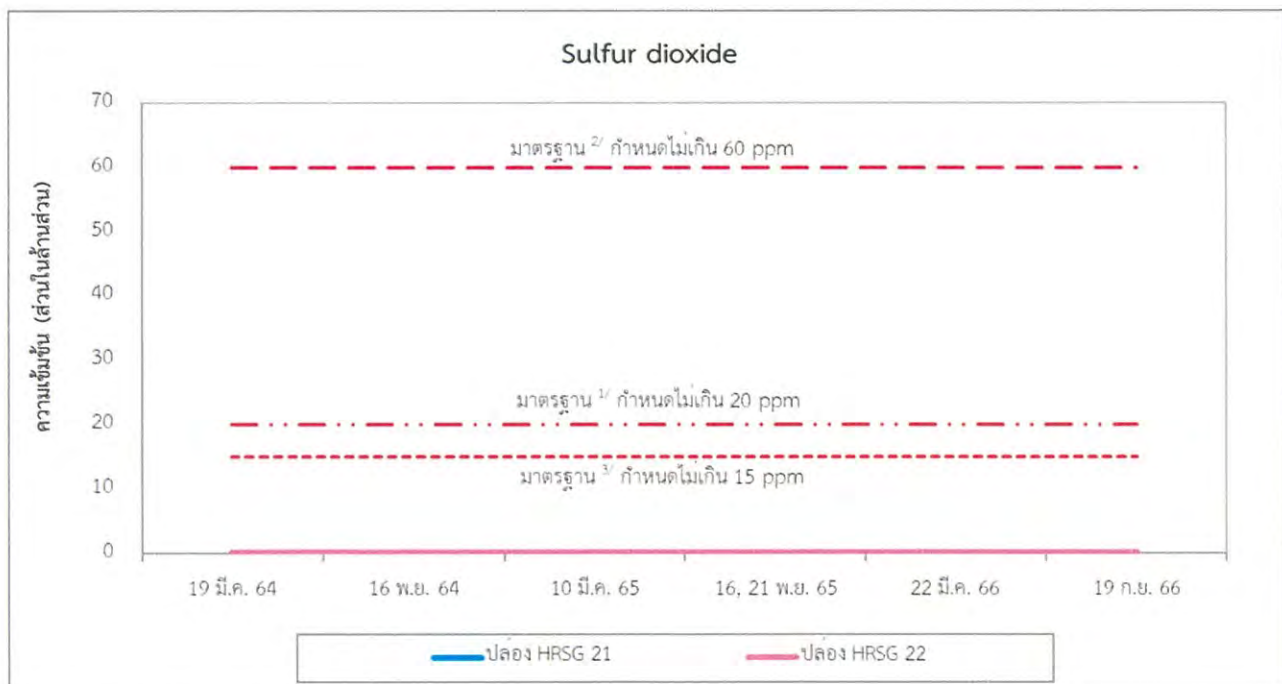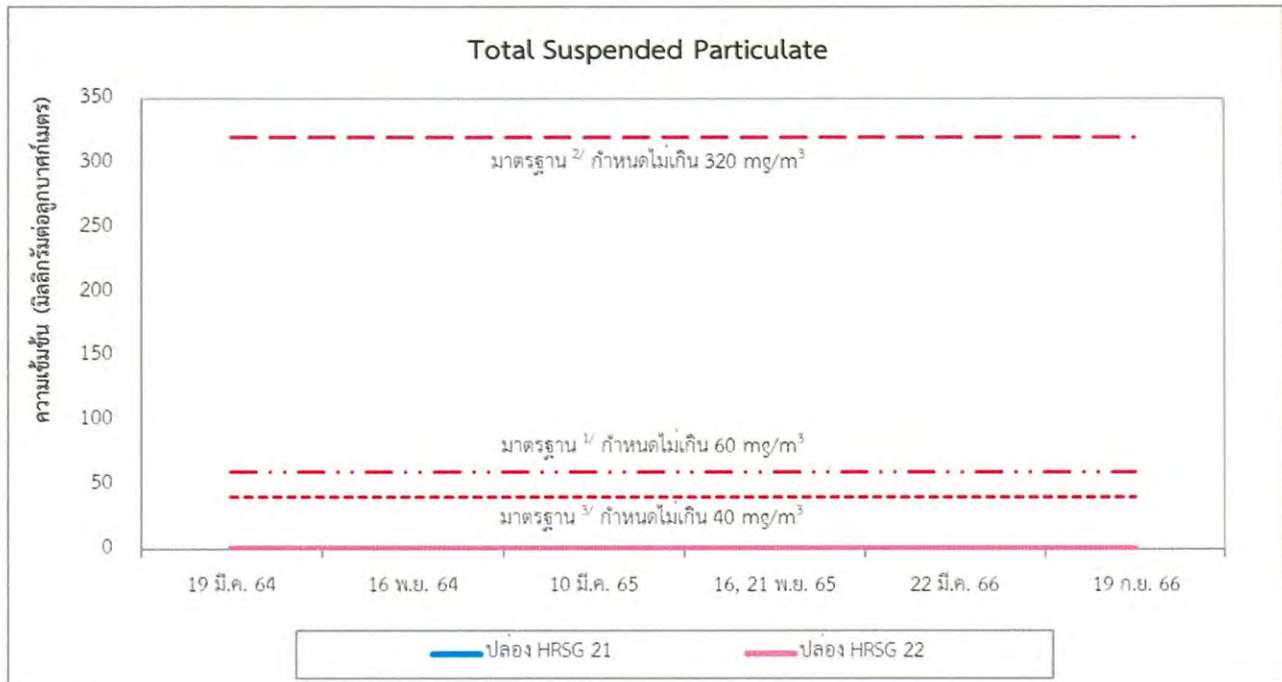

รูปที่ 3.4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

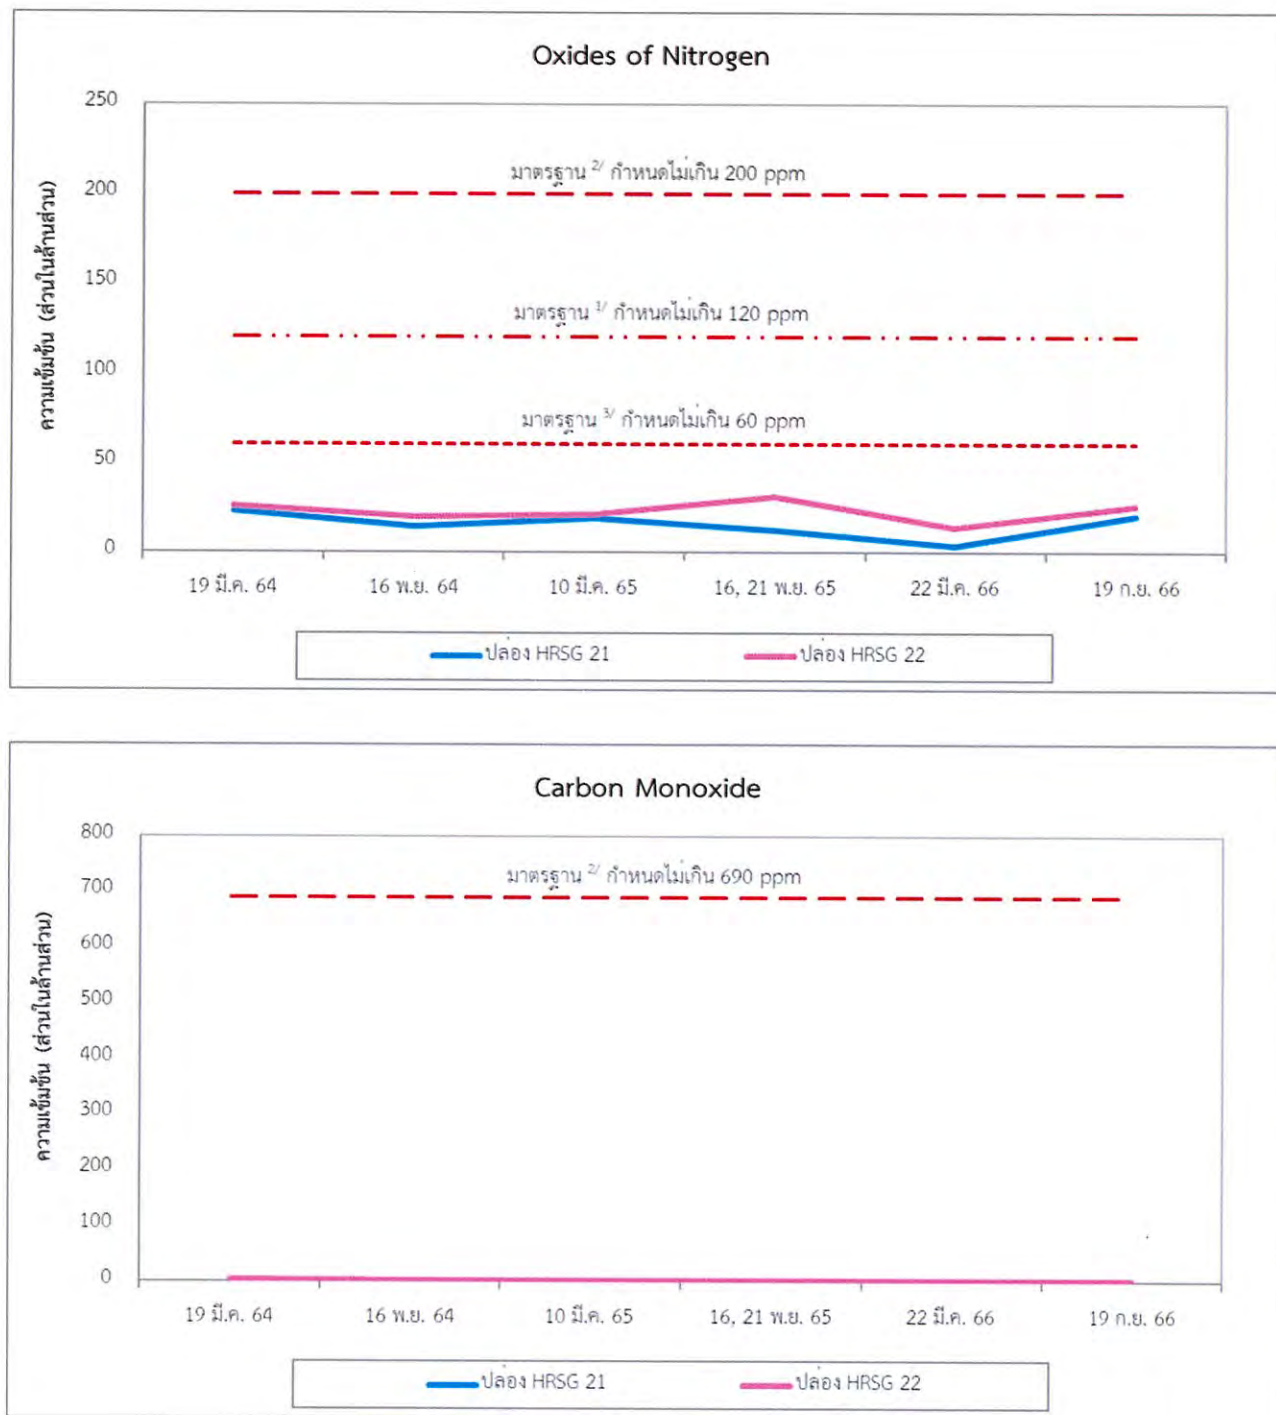

รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3.4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัด จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแกต บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) และบริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร ปีละ 2 ครั้ง / ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โดยทำการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง และ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแกต บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) และบริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร แสดงดังตารางที่ 3.4-3 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

➤ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ในช่วง 0.058-0.284 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.142 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.006 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.005 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.006-0.010 ส่วนในล้านส่วน

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในช่วงวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยใกล้กับบริเวณจุดตรวจวัดมีการก่อสร้างถนนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ประกอบกับการสัญจรของรถยนต์บริเวณดังกล่าวทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้

➤ชุมชนบ้านโป่งสะแก

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแก ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ในช่วง 0.034-0.087 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในช่วง 0.019-0.032 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.007 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.006 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.007-0.011 ส่วนในล้านส่วน

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแก ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

➤โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ในช่วง 0.052-0.122 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในช่วง 0.023-0.073 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.006 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.004 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.007-0.022 ส่วนในล้านส่วน

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

➤ บ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.125 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในช่วง 0.019-0.044 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.004 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.002-0.003 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.013 ส่วนในล้านส่วน

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

➤ โรงเรียนบ้านภูไทร

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าอยู่ในช่วง 0.037-0.219 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.077 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.005 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.004 ส่วนในล้านส่วน ทุกวันที่ตรวจวัด และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.028 ส่วนในล้านส่วน

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร



ชุมชนบ้านโป่งสะแก



โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี



บ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว)



โรงเรียนบ้านกุไทร

ภาพที่ 3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ

ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						รายงานกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)		
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร	18-19 กันยายน 2566	0.135	0.047	0.004	0.004	0.008	0.005	การสัญจรของรถ และการก่อสร้างถนน
	19-20 กันยายน 2566	0.284	0.142*	0.006	0.005	0.008	0.005	
	20-21 กันยายน 2566	0.243	0.106	0.005	0.005	0.009	0.004	
	21-22 กันยายน 2566	0.058	0.030	0.005	0.005	0.006	0.005	
	22-23 กันยายน 2566	0.242	0.103	0.005	0.005	0.010	0.006	
	23-24 กันยายน 2566	0.116	0.061	0.005	0.005	0.010	0.005	
	24-25 กันยายน 2566	0.111	0.057	0.005	0.005	0.009	0.004	
2. ชุมชนบ้านโป่งสะแก	18-19 กันยายน 2566	0.060	0.024	0.005	0.004	0.009	0.006	การสัญจรของรถ
	19-20 กันยายน 2566	0.074	0.024	0.005	0.004	0.008	0.005	
	20-21 กันยายน 2566	0.034	0.026	0.005	0.005	0.010	0.005	
	21-22 กันยายน 2566	0.053	0.019	0.006	0.005	0.007	0.006	
	22-23 กันยายน 2566	0.087	0.025	0.006	0.006	0.011	0.007	
	23-24 กันยายน 2566	0.069	0.032	0.007	0.006	0.011	0.006	
	24-25 กันยายน 2566	0.065	0.026	0.006	0.005	0.010	0.005	
มาตรฐาน		0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.30 ^{2/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{3/}	-	

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-4 และรูปที่ 3.4-2 ถึงรูปที่ 3.4-6 สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแกต บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบฯ บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) และบริเวณโรงเรียนบ้านกุไทร มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในช่วงวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในช่วงวันที่ 15-16, 19-20 และ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2566 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร และปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริเวณโรงเรียนบ้านกุไทร ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยใกล้กับบริเวณจุดตรวจวัดมีการก่อสร้างถนน ประกอบกับการสัญจรของรถยนต์บริเวณดังกล่าวทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้

ตารางที่ 3.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร	18-19 มีนาคม 2564	0.022	0.016	<0.001	<0.001	0.009	0.003
	19-20 มีนาคม 2564	0.086	0.054	<0.001	<0.001	0.010	0.003
	20-21 มีนาคม 2564	0.079	0.043	<0.001	<0.001	0.005	0.003
	21-22 มีนาคม 2564	0.081	0.044	<0.001	<0.001	0.007	0.003
	22-23 มีนาคม 2564	0.114	0.058	<0.001	<0.001	0.007	0.003
	23-24 มีนาคม 2564	0.108	0.066	0.002	<0.001	0.004	0.002
	24-25 มีนาคม 2564	0.115	0.074	0.003	0.001	0.014	0.004
	16-17 พฤศจิกายน 2564	0.175	0.073	0.001	0.001	0.042	0.011
	17-18 พฤศจิกายน 2564	0.116	0.066	0.002	0.001	0.004	0.002
	18-19 พฤศจิกายน 2564	0.117	0.066	0.002	0.001	0.069	0.015
	19-20 พฤศจิกายน 2564	0.155	0.087	0.001	0.001	0.046	0.023
	20-21 พฤศจิกายน 2564	0.100	0.061	0.002	0.001	0.053	0.019
	21-22 พฤศจิกายน 2564	0.139	0.074	0.002	0.001	0.033	0.008
	22-23 พฤศจิกายน 2564	0.111	0.065	0.002	0.001	0.015	0.004
	มาตรฐาน	0.33 ^{1v}	0.12 ^{1v}	0.30 ^{2v}	0.12 ^{1v}	0.17 ^{3v}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร (ต่อ)	9-10 มีนาคม 2565	0.073	0.063	0.004	0.003	0.019	0.011
	10-11 มีนาคม 2565	0.053	0.039	0.004	0.003	0.014	0.008
	11-12 มีนาคม 2565	0.089	0.052	0.003	0.003	0.014	0.009
	12-13 มีนาคม 2565	0.085	0.043	0.003	0.003	0.012	0.007
	13-14 มีนาคม 2565	0.137	0.075	0.004	0.002	0.014	0.009
	14-15 มีนาคม 2565	0.057	0.026	0.006	0.002	0.010	0.006
	15-16 มีนาคม 2565	0.057	0.034	0.004	0.003	0.009	0.006
	15-16 พฤศจิกายน 2565	0.291	0.146*	0.002	0.002	0.010	0.004
	16-17 พฤศจิกายน 2565	0.241	0.116	0.002	0.002	0.008	0.005
	17-18 พฤศจิกายน 2565	0.208	0.116	0.002	0.002	0.011	0.003
	18-19 พฤศจิกายน 2565	0.169	0.106	0.002	0.002	0.004	0.002
	19-20 พฤศจิกายน 2565	0.340*	0.182*	0.002	0.002	0.008	0.004
มาตรฐาน	20-21 พฤศจิกายน 2565	0.140	0.070	0.002	0.002	0.005	0.003
	21-22 พฤศจิกายน 2565	0.320	0.205*	0.002	0.002	0.011	0.006
		0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.30 ^{2/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{3/}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร (ต่อ)	21-22 มีนาคม 2566	0.106	0.022	0.003	0.002	0.004	0.004
	22-23 มีนาคม 2566	0.098	0.022	0.002	0.002	0.004	0.004
	23-24 มีนาคม 2566	0.122	0.022	0.002	0.002	0.007	0.004
	24-25 มีนาคม 2566	0.105	0.023	0.002	0.002	0.008	0.005
	25-26 มีนาคม 2566	0.109	0.021	0.002	0.002	0.008	0.005
	26-27 มีนาคม 2566	0.129	0.027	0.002	0.002	0.004	0.004
	27-28 มีนาคม 2566	0.136	0.025	0.002	0.002	0.005	0.003
	18-19 กันยายน 2566	0.135	0.047	0.004	0.004	0.008	0.005
	19-20 กันยายน 2566	0.284	0.142*	0.006	0.005	0.008	0.005
	20-21 กันยายน 2566	0.243	0.106	0.005	0.005	0.009	0.004
	21-22 กันยายน 2566	0.058	0.030	0.005	0.005	0.006	0.005
	22-23 กันยายน 2566	0.242	0.103	0.005	0.005	0.010	0.006
	23-24 กันยายน 2566	0.116	0.061	0.005	0.005	0.010	0.005
	24-25 กันยายน 2566	0.111	0.057	0.005	0.005	0.009	0.004
มาตรฐาน		0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.30 ^{2/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{3/}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO₂ (ppm)		NO₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ชุมชนบ้านโป่งสะแก	18-19 มีนาคม 2564	0.134	0.073	0.005	0.004	0.012	0.004
	19-20 มีนาคม 2564	0.100	0.059	0.005	0.004	0.020	0.004
	20-21 มีนาคม 2564	0.105	0.046	0.004	0.004	0.024	0.010
	21-22 มีนาคม 2564	0.118	0.049	0.008	0.004	0.023	0.011
	22-23 มีนาคม 2564	0.142	0.062	0.005	0.004	0.008	0.004
	23-24 มีนาคม 2564	0.141	0.067	0.006	0.005	0.010	0.005
	24-25 มีนาคม 2564	0.149	0.073	0.005	0.004	0.019	0.009
	16-17 พฤศจิกายน 2564	0.073	0.032	0.003	0.002	0.019	0.008
มาตรฐาน	17-18 พฤศจิกายน 2564	0.098	0.036	0.002	0.002	0.028	0.011
	18-19 พฤศจิกายน 2564	0.092	0.040	0.002	0.001	0.012	0.008
	19-20 พฤศจิกายน 2564	0.092	0.035	0.002	0.001	0.017	0.007
	20-21 พฤศจิกายน 2564	0.078	0.036	0.002	0.001	0.024	0.008
	21-22 พฤศจิกายน 2564	0.075	0.035	0.002	0.001	0.017	0.006
	22-23 พฤศจิกายน 2564	0.091	0.043	0.002	0.001	0.016	0.006
		0.33 ^v	0.12 ^v	0.30 ^{2v}	0.12 ^v	0.17 ^{3v}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ชุมชนบ้านโป่งสะแก (ต่อ)	9-10 มีนาคม 2565	0.108	0.041	0.002	0.001	0.024	0.005
	10-11 มีนาคม 2565	0.064	0.027	0.001	<0.001	0.022	0.006
	11-12 มีนาคม 2565	0.086	0.035	0.002	0.001	0.022	0.003
	12-13 มีนาคม 2565	0.069	0.028	0.002	0.001	0.006	0.003
	13-14 มีนาคม 2565	0.089	0.041	0.002	<0.001	0.005	0.002
	14-15 มีนาคม 2565	0.066	0.023	0.002	<0.001	0.006	0.002
	15-16 มีนาคม 2565	0.042	0.010	0.002	<0.001	0.012	0.005
	15-16 พฤศจิกายน 2565	0.090	0.049	0.002	0.002	0.003	0.003
	16-17 พฤศจิกายน 2565	0.077	0.040	0.003	0.002	0.006	0.003
	17-18 พฤศจิกายน 2565	0.071	0.033	0.002	0.002	0.026	0.008
	18-19 พฤศจิกายน 2565	0.053	0.029	0.003	0.002	0.024	0.013
มาตรฐาน	19-20 พฤศจิกายน 2565	0.062	0.034	0.003	0.003	0.028	0.011
	20-21 พฤศจิกายน 2565	0.045	0.028	0.003	0.003	0.014	0.006
	21-22 พฤศจิกายน 2565	0.089	0.048	0.003	0.003	0.014	0.008
		0.33 ^u	0.12 ^v	0.30 ^z	0.12 ^v	0.17 ^z	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อยตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ชุมชนบ้านโป่งสะแก (ต่อ)	21-22 มีนาคม 2566	0.037	0.019	0.003	0.002	0.010	0.003
	22-23 มีนาคม 2566	0.061	0.017	0.003	0.002	0.004	0.002
	23-24 มีนาคม 2566	0.078	0.021	0.002	0.002	0.003	0.002
	24-25 มีนาคม 2566	0.077	0.020	0.002	0.002	0.006	0.003
	25-26 มีนาคม 2566	0.070	0.018	0.002	0.002	0.010	0.006
	26-27 มีนาคม 2566	0.076	0.021	0.002	0.002	0.005	0.003
	27-28 มีนาคม 2566	0.097	0.024	0.002	0.002	0.008	0.003
	18-19 กันยายน 2566	0.060	0.024	0.005	0.004	0.009	0.006
	19-20 กันยายน 2566	0.074	0.024	0.005	0.004	0.008	0.005
	20-21 กันยายน 2566	0.034	0.026	0.005	0.005	0.010	0.005
	21-22 กันยายน 2566	0.053	0.019	0.006	0.005	0.007	0.006
	22-23 กันยายน 2566	0.087	0.025	0.006	0.006	0.011	0.007
	23-24 กันยายน 2566	0.069	0.032	0.007	0.006	0.011	0.006
	24-25 กันยายน 2566	0.065	0.026	0.006	0.005	0.010	0.005
มาตรฐาน		0.33 ^ว	0.12 ^ว	0.30 ^ข	0.12 ^ข	0.17 ^ข	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. โรงเรียนสวนกุหลาบฯ	18-19 มีนาคม 2564	0.109	0.065	0.002	0.001	0.005	0.002
	19-20 มีนาคม 2564	0.113	0.063	0.002	0.001	0.009	0.003
	20-21 มีนาคม 2564	0.082	0.048	0.002	0.001	0.008	0.003
	21-22 มีนาคม 2564	0.100	0.051	0.006	0.002	0.005	0.002
	22-23 มีนาคม 2564	0.109	0.069	0.003	0.001	0.011	0.004
	23-24 มีนาคม 2564	0.117	0.073	0.004	0.002	0.026	0.005
	24-25 มีนาคม 2564	0.142	0.084	0.003	0.002	0.028	0.006
	16-17 พฤศจิกายน 2564	0.030	0.016	0.002	0.001	0.013	0.003
	17-18 พฤศจิกายน 2564	0.043	0.024	0.002	0.001	0.031	0.005
	18-19 พฤศจิกายน 2564	0.040	0.020	0.001	<0.001	0.030	0.009
	19-20 พฤศจิกายน 2564	0.072	0.041	0.001	<0.001	0.034	0.008
	20-21 พฤศจิกายน 2564	0.080	0.037	0.002	0.001	0.032	0.011
	21-22 พฤศจิกายน 2564	0.066	0.034	0.003	0.002	0.046	0.015
	22-23 พฤศจิกายน 2564	0.072	0.042	0.003	0.001	0.035	0.013
	มาตรฐาน	0.33 ^{1v}	0.12 ^{1v}	0.30 ^{2v}	0.12 ^{1v}	0.17 ^{3v}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. โรงเรียนสวนกุหลาบฯ (ต่อ)	9-10 มีนาคม 2565	0.061	0.032	0.007	0.006	0.011	0.005
	10-11 มีนาคม 2565	0.050	0.025	0.006	0.005	0.008	0.005
	11-12 มีนาคม 2565	0.062	0.031	0.006	0.005	0.005	0.003
	12-13 มีนาคม 2565	0.057	0.029	0.007	0.006	0.018	0.004
	13-14 มีนาคม 2565	0.069	0.043	0.012	0.006	0.013	0.007
	14-15 มีนาคม 2565	0.057	0.024	0.010	0.006	0.026	0.006
	15-16 มีนาคม 2565	0.038	0.018	0.006	0.006	0.008	0.005
	15-16 พฤศจิกายน 2565	0.115	0.057	0.002	0.001	0.011	0.006
	16-17 พฤศจิกายน 2565	0.097	0.056	0.002	0.002	0.008	0.004
	17-18 พฤศจิกายน 2565	0.073	0.042	0.002	0.002	0.010	0.004
	18-19 พฤศจิกายน 2565	0.074	0.041	0.002	0.002	0.006	0.004
	19-20 พฤศจิกายน 2565	0.067	0.038	0.002	0.002	0.008	0.005
มาตรฐาน	20-21 พฤศจิกายน 2565	0.055	0.027	0.002	0.002	0.007	0.004
	21-22 พฤศจิกายน 2565	0.070	0.044	0.002	0.002	0.010	0.004
		0.33 ^u	0.12 ^u	0.30 ^u	0.12 ^u	0.17 ^u	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. โรงเรียนสวนกุหลาบฯ (ต่อ)	21-22 มีนาคม 2566	0.070	0.018	0.003	0.003	0.002	0.002
	22-23 มีนาคม 2566	0.058	0.016	0.004	0.003	0.003	0.002
	23-24 มีนาคม 2566	0.060	0.017	0.003	0.003	0.003	0.002
	24-25 มีนาคม 2566	0.071	0.020	0.003	0.003	0.003	0.003
	25-26 มีนาคม 2566	0.074	0.022	0.003	0.003	0.003	0.003
	26-27 มีนาคม 2566	0.064	0.020	0.003	0.003	0.019	0.003
	27-28 มีนาคม 2566	0.085	0.024	0.004	0.003	0.003	0.002
	18-19 กันยายน 2566	0.072	0.026	0.004	0.004	0.016	0.007
	19-20 กันยายน 2566	0.105	0.041	0.005	0.004	0.007	0.004
	20-21 กันยายน 2566	0.096	0.032	0.006	0.004	0.008	0.004
	21-22 กันยายน 2566	0.052	0.023	0.005	0.004	0.014	0.008
	22-23 กันยายน 2566	0.122	0.073	0.005	0.004	0.012	0.006
	23-24 กันยายน 2566	0.075	0.036	0.005	0.004	0.008	0.005
	24-25 กันยายน 2566	0.063	0.032	0.003	0.003	0.022	0.007
	มาตรฐาน	0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.30 ^{2/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{3/}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
4. บ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว)	18-19 มีนาคม 2564	0.113	0.074	0.002	<0.001	0.012	0.004
	19-20 มีนาคม 2564	0.090	0.057	0.002	<0.001	0.011	0.005
	20-21 มีนาคม 2564	0.110	0.055	0.004	0.002	0.019	0.006
	21-22 มีนาคม 2564	0.120	0.060	0.003	0.003	0.010	0.004
	22-23 มีนาคม 2564	0.119	0.089	0.003	0.002	0.019	0.007
	23-24 มีนาคม 2564	0.135	0.086	0.003	0.002	0.008	0.004
	24-25 มีนาคม 2564	0.147	0.096	0.003	0.001	0.010	0.003
	16-17 พฤศจิกายน 2564	0.071	0.055	0.001	<0.001	0.008	0.004
	17-18 พฤศจิกายน 2564	0.078	0.050	<0.001	<0.001	0.035	0.008
	18-19 พฤศจิกายน 2564	0.073	0.042	0.001	<0.001	0.020	0.008
	19-20 พฤศจิกายน 2564	0.137	0.070	0.002	<0.001	0.022	0.009
	20-21 พฤศจิกายน 2564	0.103	0.071	0.002	0.001	0.020	0.007
	21-22 พฤศจิกายน 2564	0.083	0.056	0.002	<0.001	0.015	0.006
	22-23 พฤศจิกายน 2564	0.087	0.053	0.002	0.001	0.023	0.006
มาตรฐาน		0.33 ^u	0.12 ^u	0.30 ^u	0.12 ^u	0.17 ^u	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
4. บ้านห้วยปราบ (ซอยห้วยแก้ว) (ต่อ)	9-10 มีนาคม 2565	0.140	0.066	0.004	0.004	0.025	0.011
	10-11 มีนาคม 2565	0.106	0.049	0.004	0.004	0.018	0.012
	11-12 มีนาคม 2565	0.117	0.053	0.006	0.004	0.023	0.010
	12-13 มีนาคม 2565	0.106	0.047	0.004	0.004	0.028	0.013
	13-14 มีนาคม 2565	0.129	0.059	0.006	0.004	0.016	0.010
	14-15 มีนาคม 2565	0.076	0.033	0.008	0.004	0.014	0.010
	15-16 มีนาคม 2565	0.065	0.028	0.004	0.004	0.030	0.014
	15-16 พฤศจิกายน 2565	0.159	0.046	0.002	0.002	0.006	0.004
	16-17 พฤศจิกายน 2565	0.124	0.043	0.003	0.002	0.008	0.004
	17-18 พฤศจิกายน 2565	0.115	0.043	0.003	0.002	0.004	0.003
	18-19 พฤศจิกายน 2565	0.125	0.050	0.003	0.002	0.004	0.003
	19-20 พฤศจิกายน 2565	0.153	0.056	0.002	0.002	0.004	0.003
มาตรฐาน	20-21 พฤศจิกายน 2565	0.074	0.032	0.002	0.002	0.003	0.003
	21-22 พฤศจิกายน 2565	0.195	0.069	0.002	0.002	0.004	0.003
		0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.30 ^{2/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{3/}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
4. บ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) (ต่อ)	21-22 มีนาคม 2566	0.067	0.022	0.006	0.002	0.007	0.004
	22-23 มีนาคม 2566	0.111	0.028	0.003	0.001	0.008	0.004
	23-24 มีนาคม 2566	0.117	0.029	0.009	0.003	0.013	0.006
	24-25 มีนาคม 2566	0.096	0.026	0.002	0.001	0.005	0.003
	25-26 มีนาคม 2566	0.079	0.016	0.003	0.002	0.005	0.003
	26-27 มีนาคม 2566	0.065	0.016	0.005	0.002	0.013	0.004
	27-28 มีนาคม 2566	0.094	0.024	0.002	0.002	0.005	0.003
	18-19 กันยายน 2566	0.078	0.033	0.004	0.003	0.010	0.005
	19-20 กันยายน 2566	0.125	0.038	0.004	0.003	0.013	0.006
	20-21 กันยายน 2566	0.030	0.019	0.003	0.003	0.008	0.005
	21-22 กันยายน 2566	0.063	0.026	0.003	0.003	0.007	0.004
	22-23 กันยายน 2566	0.107	0.037	0.003	0.002	0.005	0.004
	23-24 กันยายน 2566	0.107	0.044	0.003	0.002	0.006	0.004
	24-25 กันยายน 2566	0.098	0.036	0.003	0.002	0.005	0.004
	มาตรฐาน	0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.30 ^{2/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{3/}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท ยมตะ ปี.กัม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m³)	PM-10 (mg/m³)	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
5. โรงเรียนบ้านกุไทร	18-19 มีนาคม 2564	0.139	0.056	0.006	0.005	0.030	0.010
	19-20 มีนาคม 2564	0.159	0.061	0.004	0.002	0.024	0.007
	20-21 มีนาคม 2564	0.154	0.062	0.003	0.002	0.021	0.007
	21-22 มีนาคม 2564	0.146	0.055	0.003	0.002	0.025	0.007
	22-23 มีนาคม 2564	0.140	0.056	0.002	0.002	0.017	0.007
	23-24 มีนาคม 2564	0.147	0.066	0.002	0.002	0.011	0.006
	24-25 มีนาคม 2564	0.200	0.079	0.002	0.002	0.029	0.009
	16-17 พฤศจิกายน 2564	0.061	0.020	0.001	0.001	0.002	0.002
	17-18 พฤศจิกายน 2564	0.141	0.041	0.002	0.001	0.002	0.002
	18-19 พฤศจิกายน 2564	0.085	0.028	0.001	0.001	0.002	0.002
	19-20 พฤศจิกายน 2564	0.083	0.033	0.003	0.002	0.010	0.003
	20-21 พฤศจิกายน 2564	0.107	0.041	0.002	0.002	0.007	0.003
	21-22 พฤศจิกายน 2564	0.084	0.035	0.001	0.001	0.010	0.004
	22-23 พฤศจิกายน 2564	0.144	0.048	0.001	0.001	0.006	0.003
	มาตรฐาน	0.33 ^{1v}	0.12 ^{1v}	0.30 ^{2v}	0.12 ^{1v}	0.17 ^{3v}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566


สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
5. โรงเรียนบ้านคูไทร (ต่อ)	9-10 มีนาคม 2565	0.179	0.083	0.003	0.002	0.010	0.006
	10-11 มีนาคม 2565	0.198	0.063	0.003	0.002	0.010	0.005
	11-12 มีนาคม 2565	0.157	0.053	0.005	0.001	0.014	0.006
	12-13 มีนาคม 2565	0.101	0.040	0.004	0.002	0.007	0.003
	13-14 มีนาคม 2565	0.193	0.075	0.003	0.003	0.010	0.005
	14-15 มีนาคม 2565	0.188	0.054	0.003	0.003	0.008	0.004
	15-16 มีนาคม 2565	0.157	0.054	0.003	0.002	0.006	0.003
	15-16 พฤศจิกายน 2565	0.469*	0.216*	0.002	0.002	0.006	0.002
	16-17 พฤศจิกายน 2565	0.058	0.035	0.002	0.002	0.003	0.002
	17-18 พฤศจิกายน 2565	0.066	0.036	0.002	0.002	0.004	0.002
	18-19 พฤศจิกายน 2565	0.097	0.056	0.002	0.002	0.014	0.003
	19-20 พฤศจิกายน 2565	0.089	0.063	0.002	0.002	0.006	0.003
	20-21 พฤศจิกายน 2565	0.035	0.024	0.002	0.002	0.003	0.002
	21-22 พฤศจิกายน 2565	0.054	0.036	0.002	0.002	0.005	0.002
	มาตรฐาน	0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.30 ^{2/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{3/}	-

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		TSP (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	PM-10 (mg/m ³) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (ppm)	
				เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
5. โรงเรียนบ้านคูไทร (ต่อ)	21-22 มีนาคม 2566	0.129	0.060	0.002	0.002	0.003	0.002
	22-23 มีนาคม 2566	0.211	0.045	0.002	0.002	0.003	0.003
	23-24 มีนาคม 2566	0.277	0.060	0.002	0.002	0.004	0.003
	24-25 มีนาคม 2566	0.320	0.064	0.002	0.002	0.003	0.003
	25-26 มีนาคม 2566	0.226	0.046	0.002	0.002	0.004	0.003
	26-27 มีนาคม 2566	0.249	0.045	0.002	0.002	0.019	0.003
	27-28 มีนาคม 2566	0.287	0.056	0.002	0.002	0.003	0.003
	18-19 กันยายน 2566	0.037	0.014	0.004	0.004	0.016	0.005
	19-20 กันยายน 2566	0.109	0.040	0.004	0.004	0.028	0.004
	20-21 กันยายน 2566	0.125	0.038	0.004	0.004	0.004	0.003
	21-22 กันยายน 2566	0.048	0.022	0.004	0.004	0.003	0.002
	22-23 กันยายน 2566	0.219	0.077	0.004	0.004	0.014	0.004
	23-24 กันยายน 2566	0.092	0.038	0.004	0.004	0.006	0.003
	24-25 กันยายน 2566	0.042	0.022	0.005	0.004	0.003	0.003
	มาตรฐาน	0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.30 ^{2/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{3/}	-

- มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป


หมายเหตุ : * มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

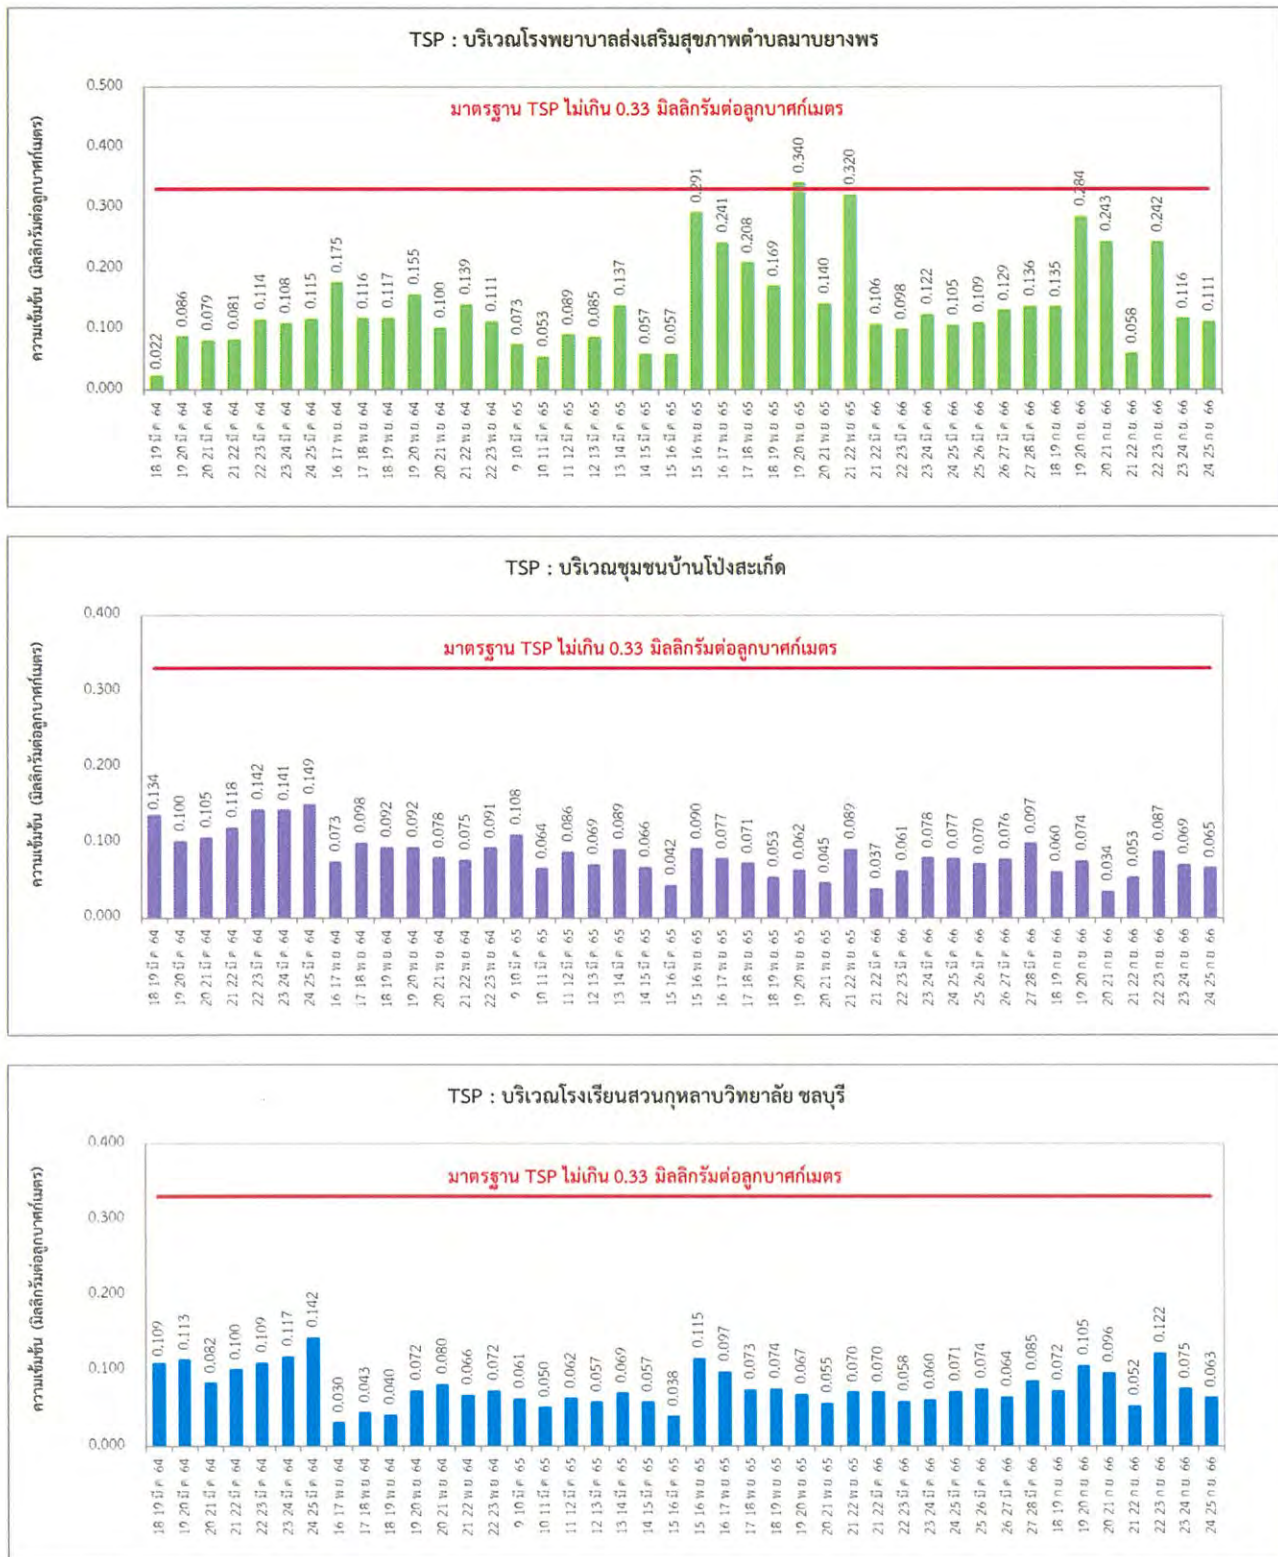

รูปที่ 3.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง


ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

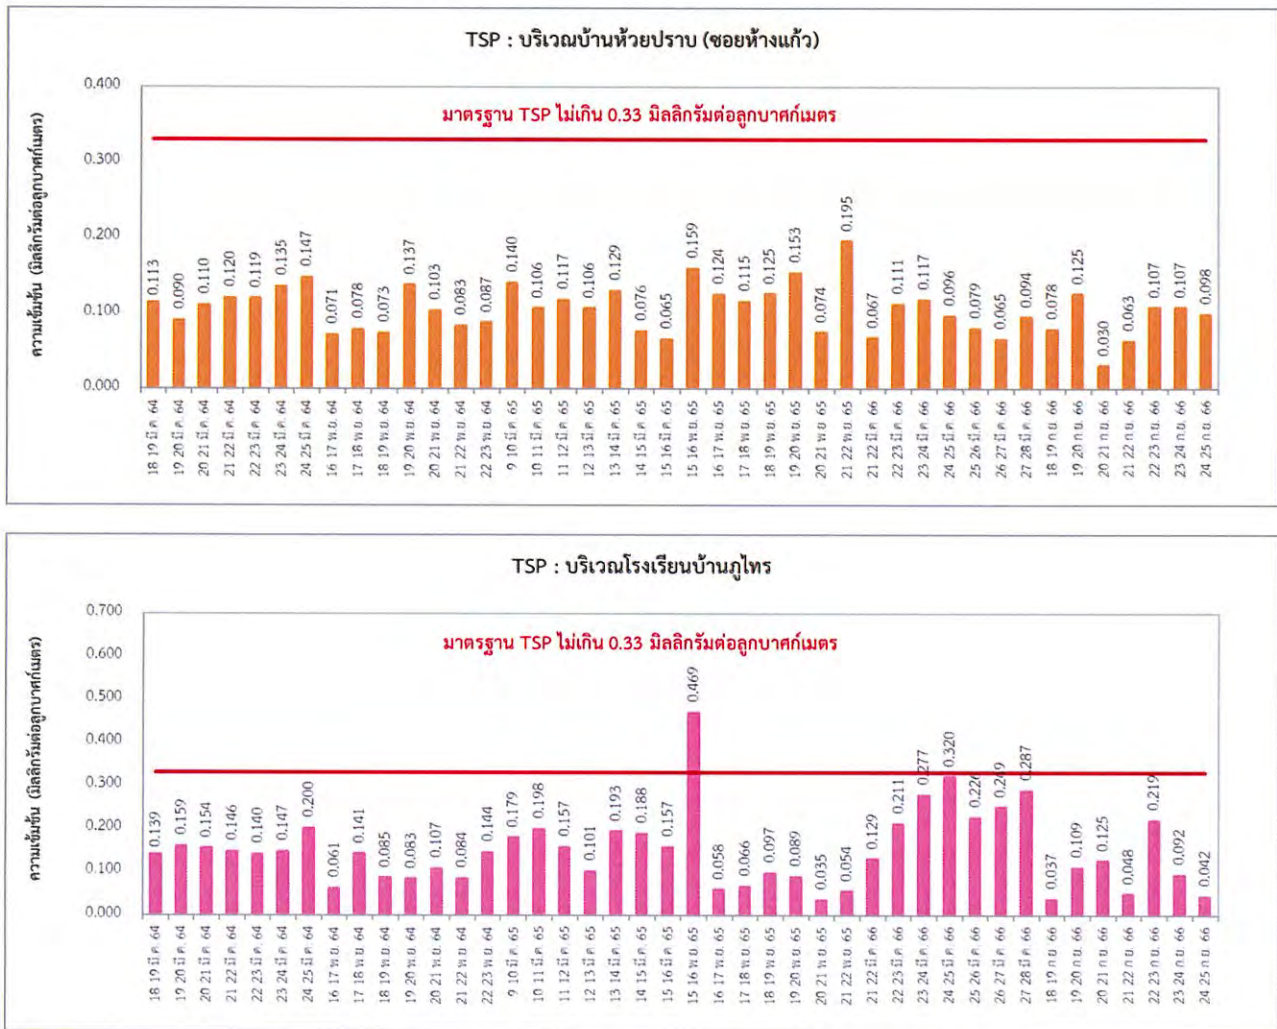



รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

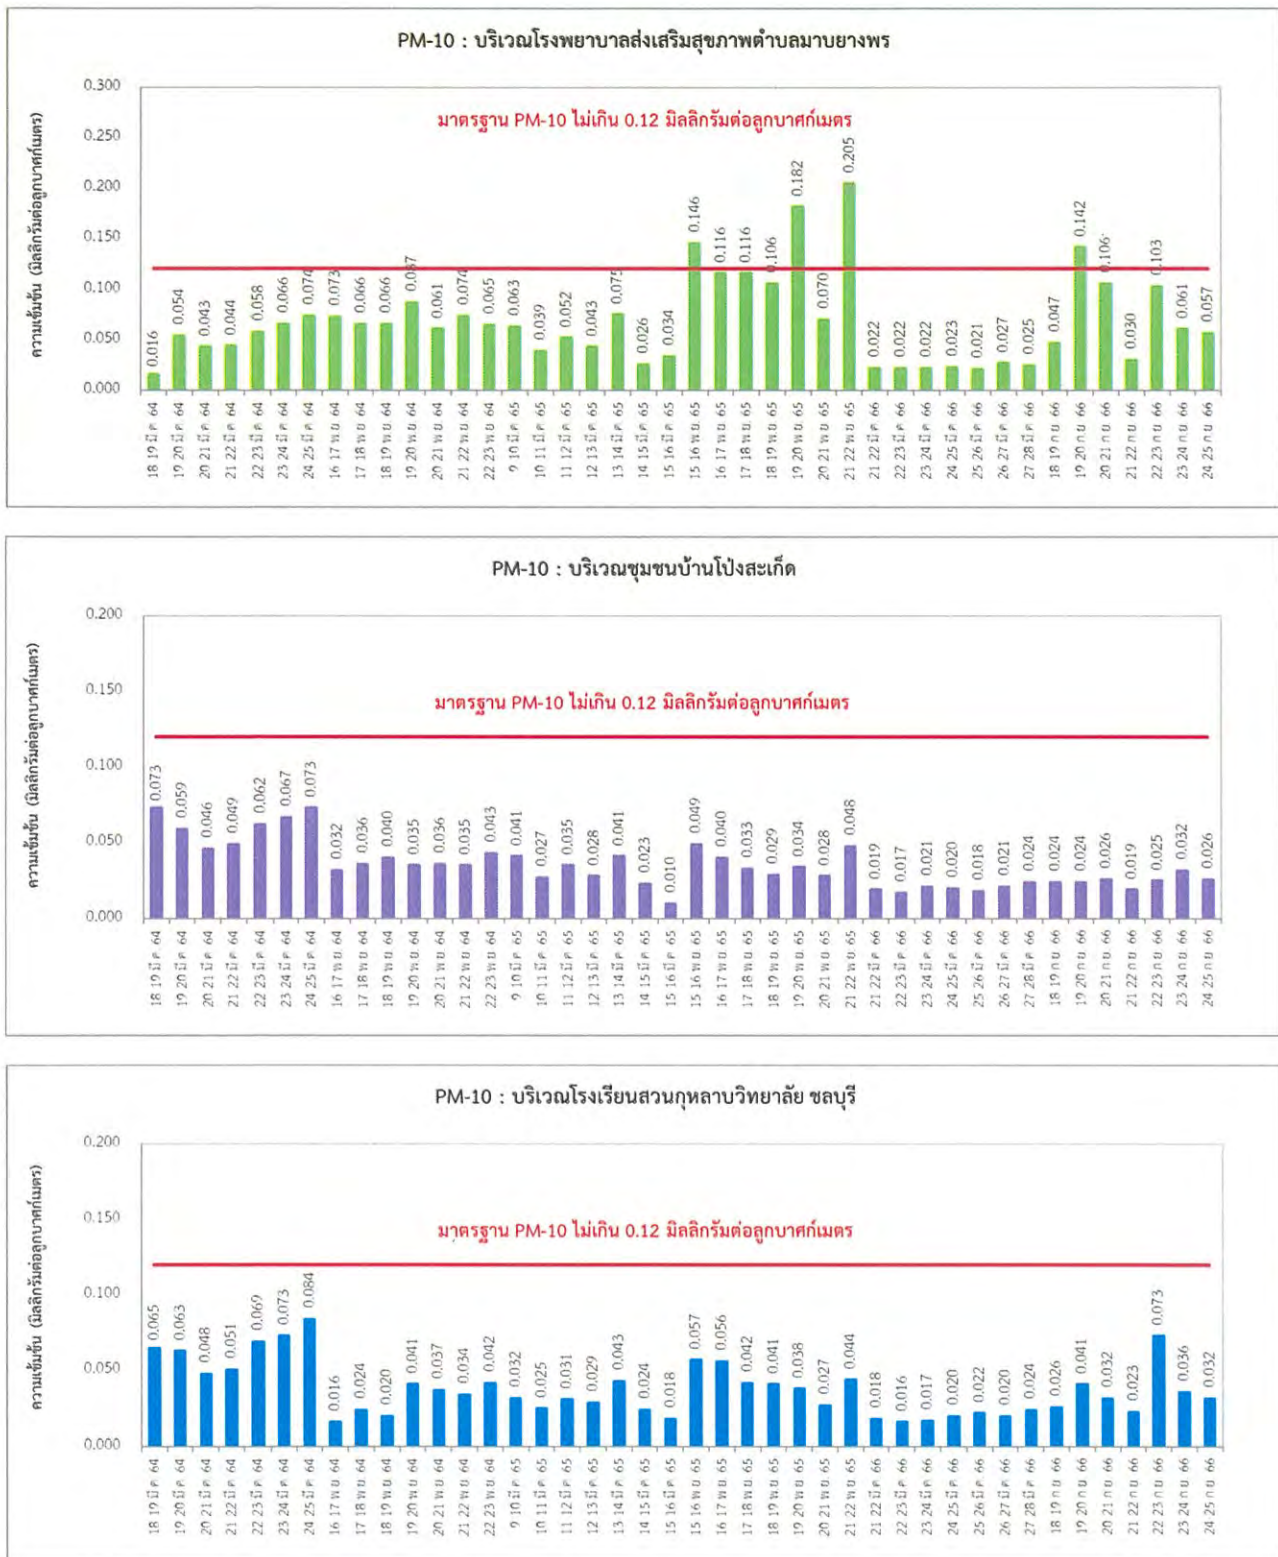


รูปที่ 3.4-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

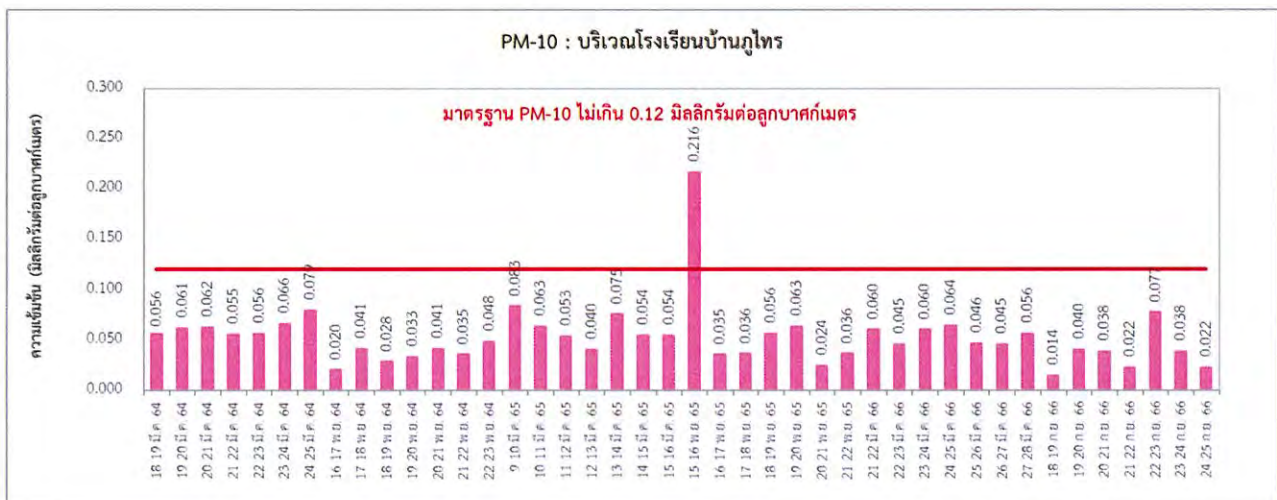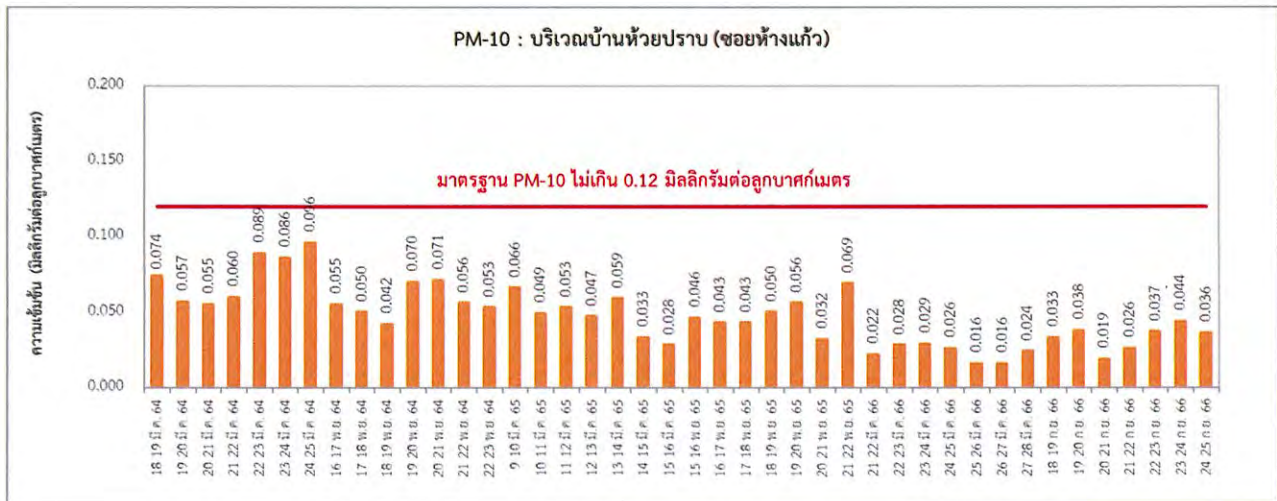


รูปที่ 3.4-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

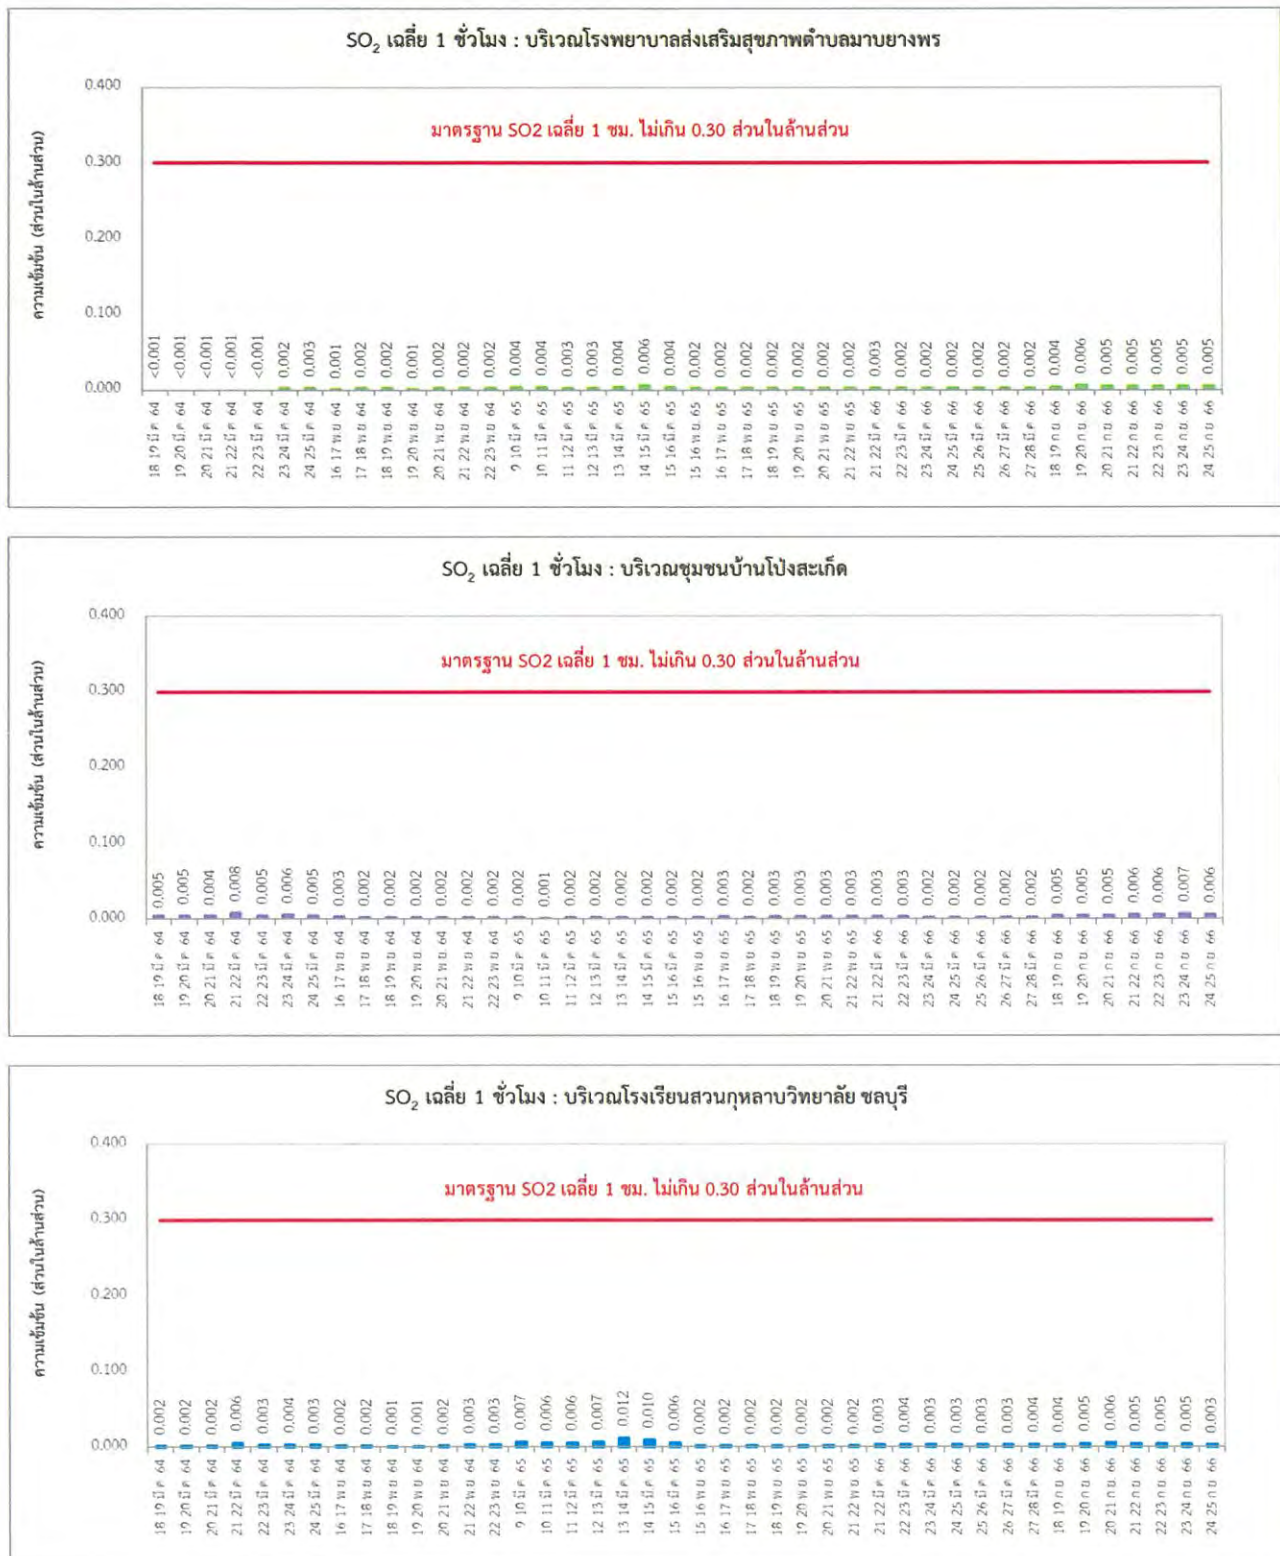


รูปที่ 3.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

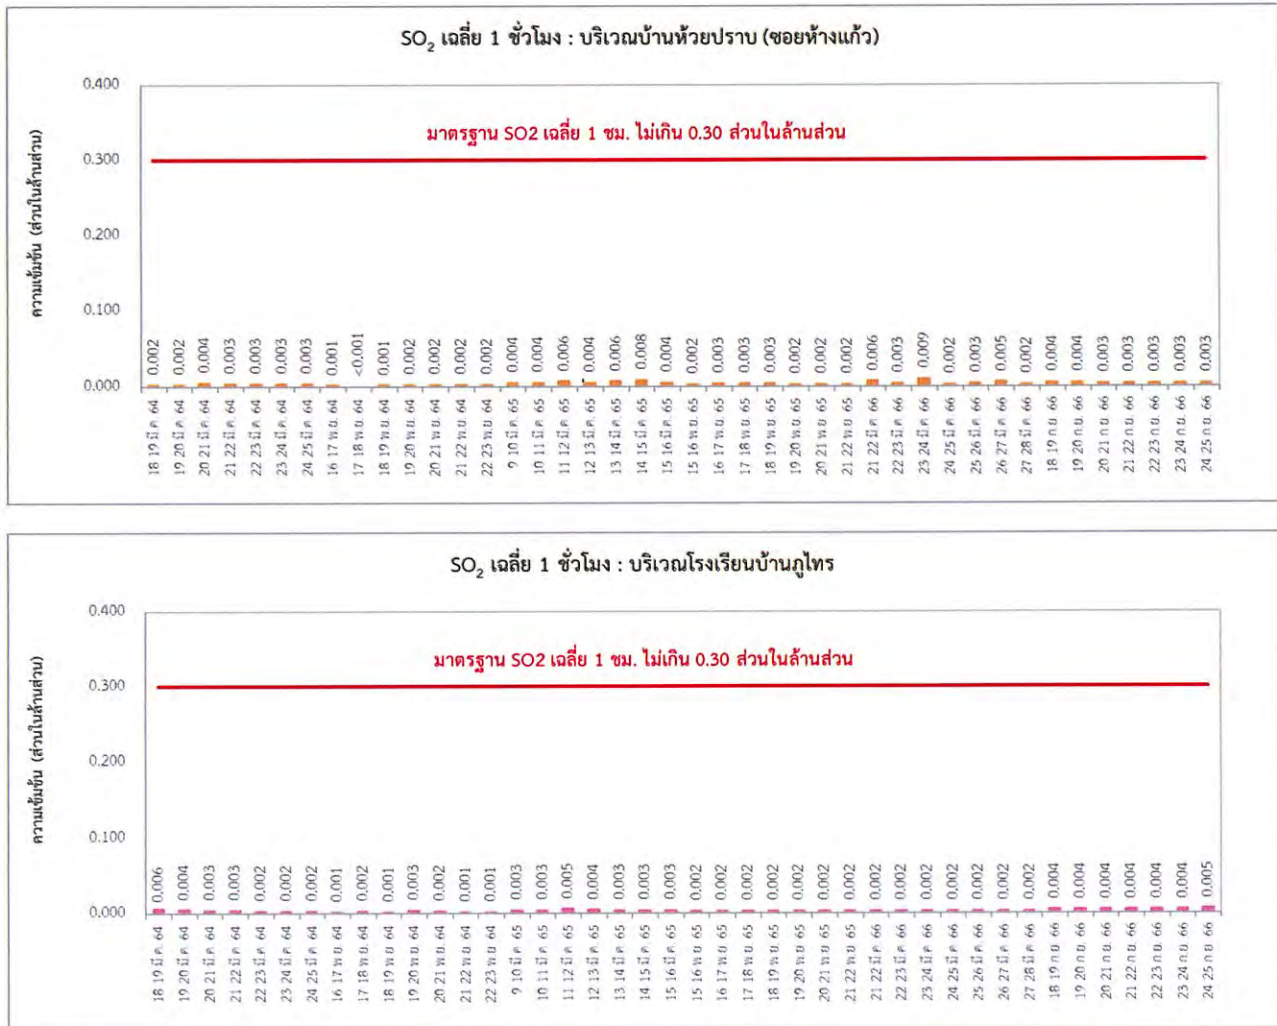

รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

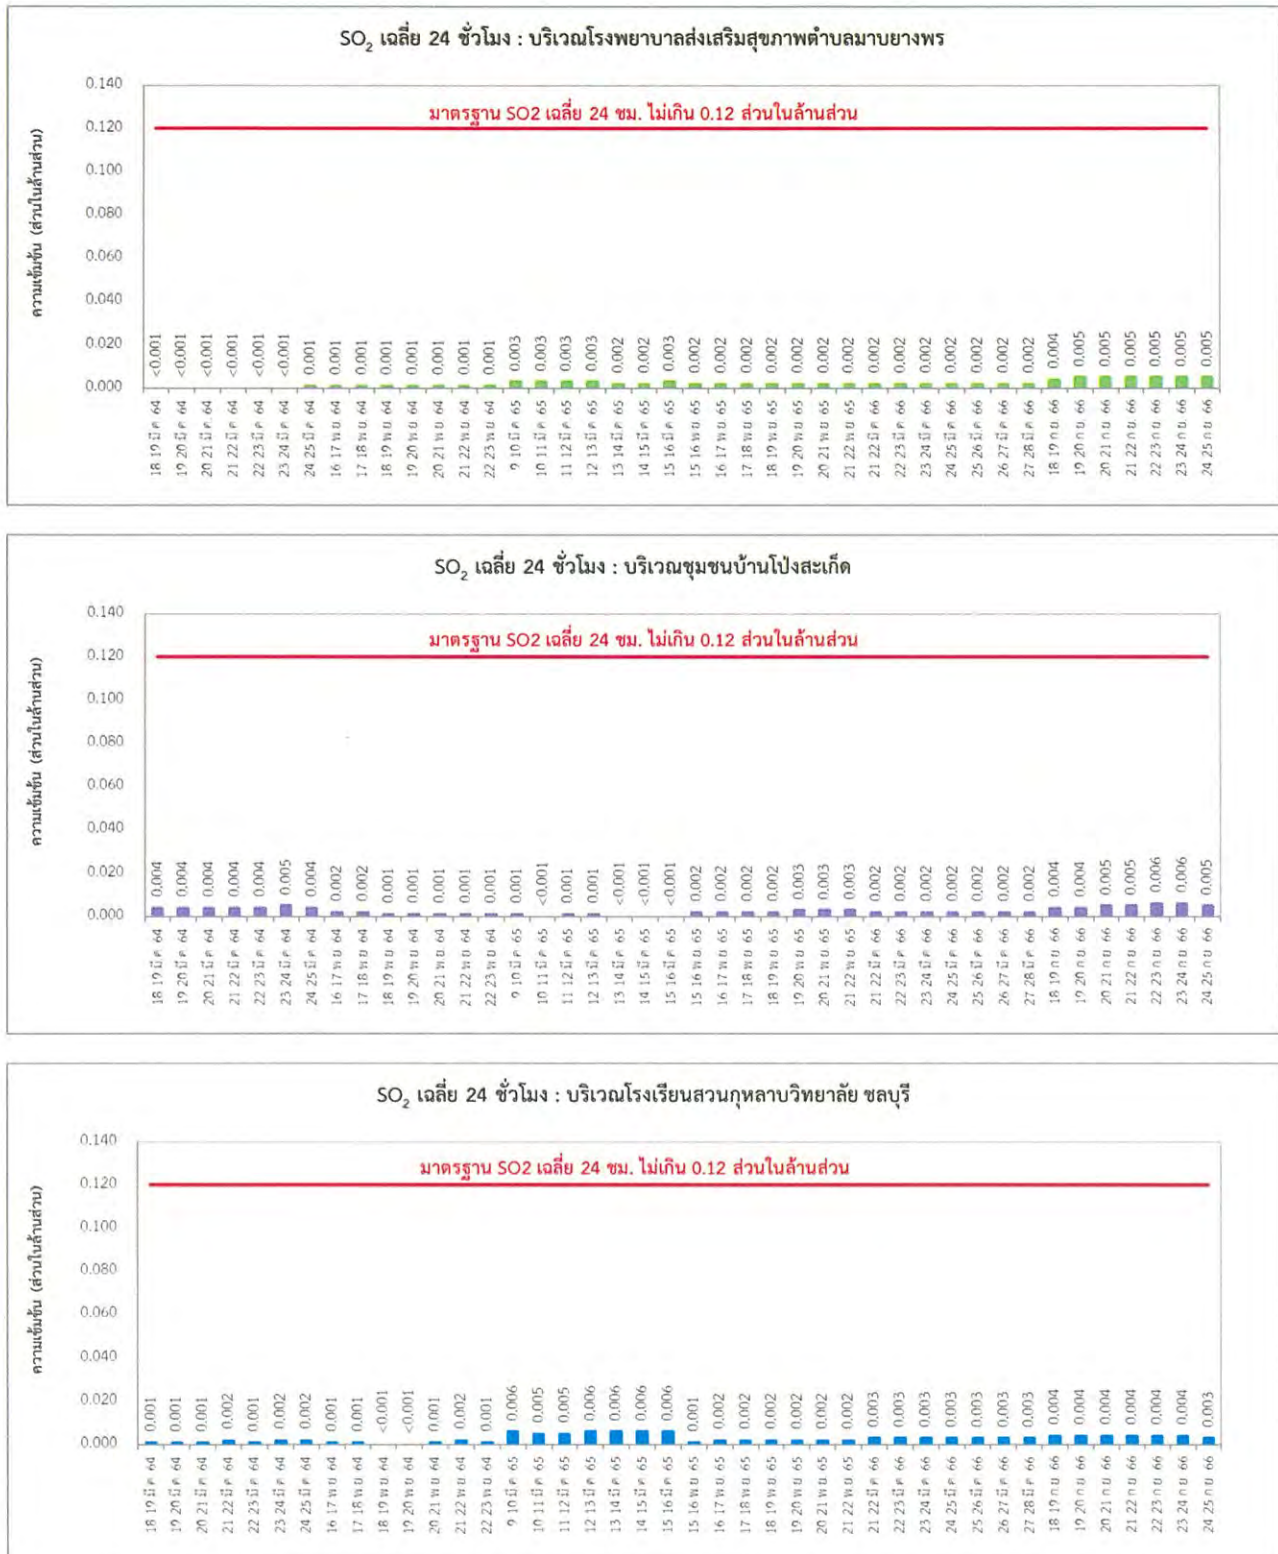


รูปที่ 3.4-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566




รูปที่ 3.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

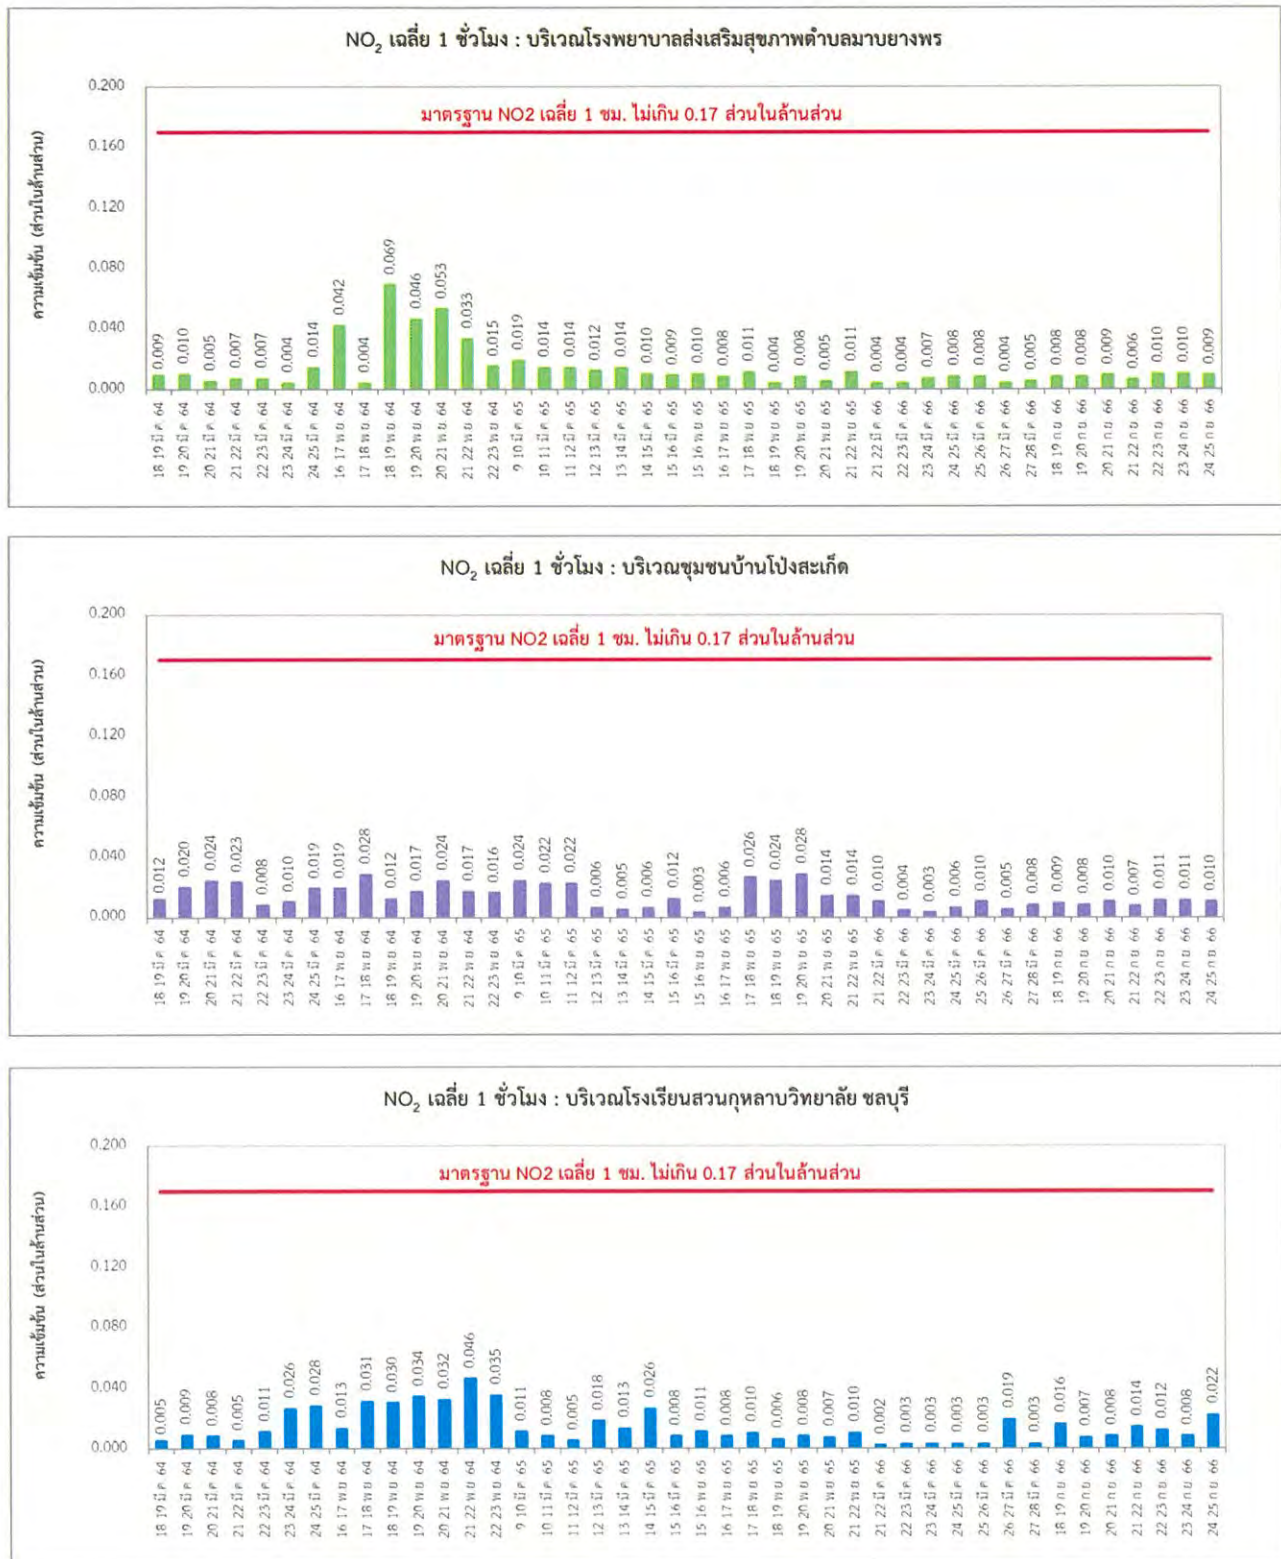

รูปที่ 3.4-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

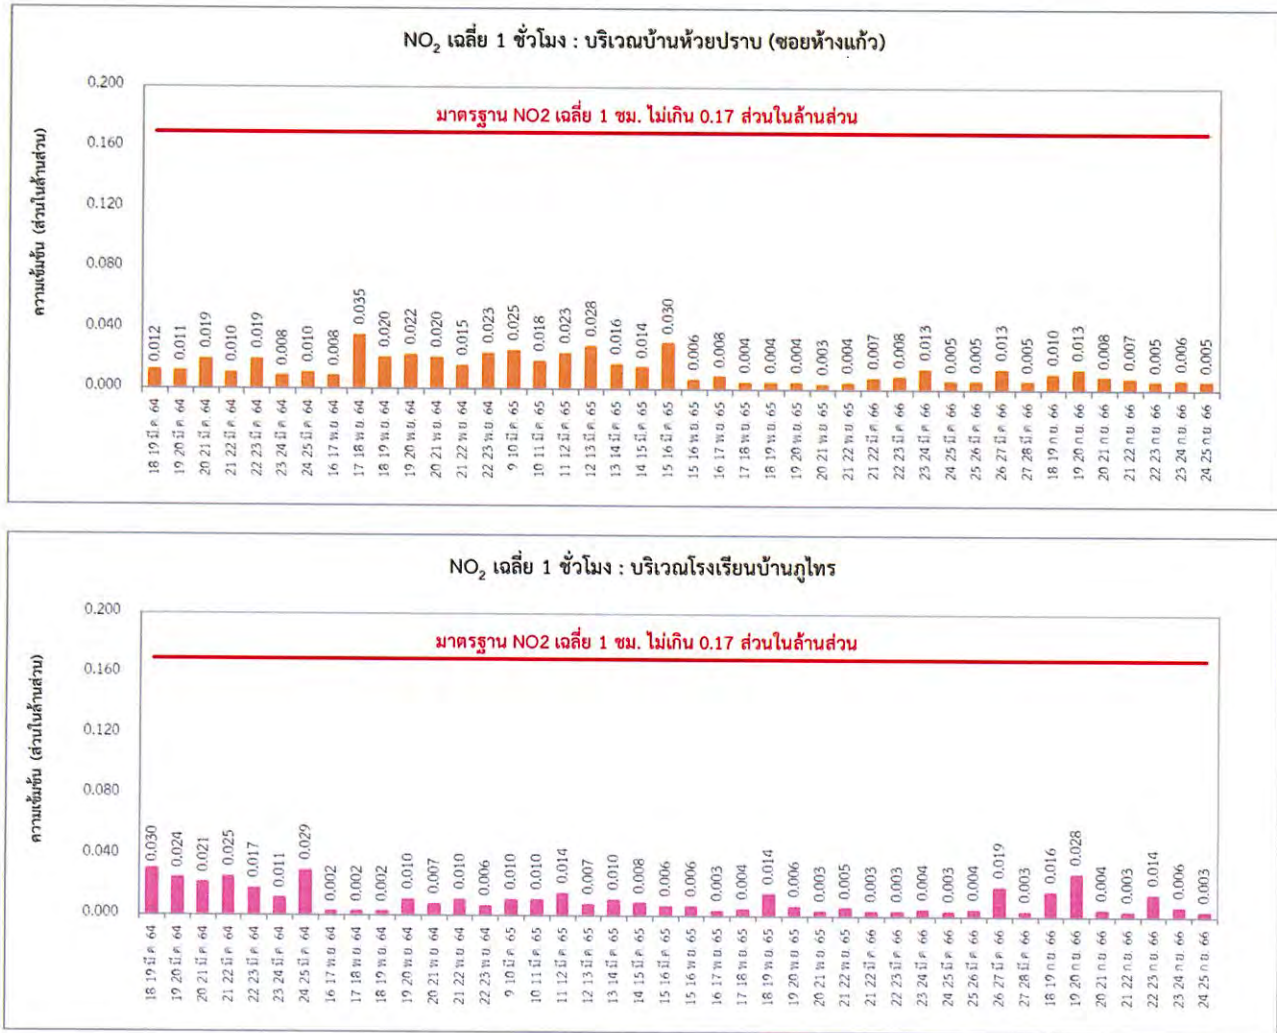

รูปที่ 3.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3.4.3 ความเร็วและทิศทางลม

การติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัด จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแก บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) และบริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร ปีละ 2 ครั้ง / ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 ผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3.4-5 ถึง ตารางที่ 3.4-9 และรูปที่ 3.4-7 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

➤ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร

จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศเหนือ โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง $<0.3-5.5$ เมตรต่อวินาที สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร และเมื่อพิจารณาจากปริมาณมลสารที่ตรวจวัด ได้จากปล่องระบายของโครงการ พบว่า มีค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ปริมาณมลสารที่ตรวจพบบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดำเนินการ ของโครงการโดยตรง

➤ ชุมชนบ้านโป่งสะแก

จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแก ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ รองลงมาเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง $<0.3-5.5$ เมตรต่อวินาที สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของชุมชนบ้านโป่งสะแก และเมื่อพิจารณาจากปริมาณมลสารที่ตรวจวัดได้จากปล่องระบายของ โครงการ พบว่า มีค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าปริมาณมลสารที่ตรวจพบ บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแก ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของโครงการโดยตรง

➤ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ระหว่าง วันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศเหนือ รองลงมาเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออก โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง $<0.3-5.5$ เมตรต่อวินาที สำหรับพื้นที่ โครงการตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และเมื่อพิจารณาจากปริมาณมลสารที่ ตรวจวัดได้จากปล่องระบายของโครงการ พบว่า มีค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น จึงอาจ กล่าวได้ว่าปริมาณมลสารที่ตรวจพบบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดำเนินการ ของโครงการโดยตรง






➤ บ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว)



จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตก โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง $<0.3-5.5$ เมตรต่อวินาที สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากปริมาณมลสารที่ตรวจวัดได้จากปล่องระบายของโครงการ พบว่า มีค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าปริมาณมลสารที่ตรวจพบบริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของโครงการโดยตรง

➤ โรงเรียนบ้านภูไทร

จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ ร่องลงมาเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศเหนือ โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง $0.3-5.5$ เมตรต่อวินาที สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของโรงเรียนบ้านภูไทร และเมื่อพิจารณาจากปริมาณมลสารที่ตรวจวัดได้จากปล่องระบายของโครงการ พบว่า มีค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าปริมาณมลสารที่ตรวจพบบริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของโครงการโดยตรง








ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร
(GPS 47P 0731364, 1437020) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566


เวลา	18-19 ก.ย. 66		19-20 ก.ย. 66		20-21 ก.ย. 66		21-22 ก.ย. 66		22-23 ก.ย. 66		23-24 ก.ย. 66		24-25 ก.ย. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
15.00-16.00	1.5	S	1.5	NNW	0.7	ESE	0.7	NNW	0.8	NW	2.4	N	2.8	NE
16.00-17.00	0.7	S	1.1	NNW	0.0	-	0.8	NNE	0.8	NW	2.2	N	2.2	NE
17.00-18.00	1.0	S	1.4	N	1.4	N	0.7	N	0.4	S	2.8	NW	2.1	NE
18.00-19.00	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.2	-	2.8	NW	3.3	NE
19.00-20.00	0.8	SSW	0.8	N	1.3	S	0.7	S	0.6	WSW	2.9	NW	1.6	NE
20.00-21.00	0.8	SSW	0.0	-	0.4	NNW	2.4	S	0.3	SW	2.4	NW	2.3	E
21.00-22.00	1.2	SSW	1.6	N	0.9	N	2.3	NW	2.0	NNW	0.3	NW	0.5	SW
22.00-23.00	0.1	-	0.5	N	0.2	-	0.6	NW	1.0	ESE	2.8	NW	0.3	SSW
23.00-00.00	0.2	-	0.0	-	1.7	W	0.2	-	0.6	WNW	2.2	NW	0.2	-
00.00-01.00	0.7	SSW	0.7	NW	1.1	NW	0.1	-	0.4	WNW	0.5	NW	0.1	-
01.00-02.00	0.0	-	0.8	NW	0.8	NW	0.5	NNW	0.6	NW	0.3	NW	0.4	NW
02.00-03.00	0.2	-	0.8	NW	1.1	WNW	0.0	-	0.7	NW	1.7	NW	0.4	SSE
03.00-04.00	0.4	SSW	0.7	NW	0.6	ENE	0.8	NNW	1.3	NW	0.9	NW	0.5	S
04.00-05.00	0.9	SSW	0.7	N	1.2	N	1.5	NNW	1.4	NW	1.3	NW	0.4	S
05.00-06.00	1.2	SSW	1.3	NW	1.3	N	0.7	N	1.7	NW	1.3	NW	1.6	E
06.00-07.00	2.5	N	2.0	NNW	3.0	N	1.8	N	1.8	NW	1.5	NW	2.5	S
07.00-08.00	2.9	N	3.0	N	3.4	SE	1.2	N	0.9	NW	0.2	-	1.6	S
08.00-09.00	2.8	SW	0.6	N	2.2	NW	3.6	N	1.3	SSE	1.4	WNW	4.0	N
09.00-10.00	3.1	NW	3.0	NW	2.1	N	2.5	NNW	2.0	S	3.0	NNW	2.2	WNW
10.00-11.00	1.3	NNW	1.7	NW	1.0	N	1.3	NW	2.0	SSW	1.8	WNW	2.1	WSW
11.00-12.00	0.7	NE	1.9	SW	1.3	N	1.2	NW	1.3	N	4.0	WNW	2.0	NW
12.00-13.00	1.3	N	2.9	N	1.6	N	2.7	NNW	1.5	SW	2.6	NNW	3.4	NW
13.00-14.00	1.6	NNW	1.7	NW	0.6	NNE	1.9	N	1.9	WSW	2.9	S	1.3	SW
14.00-15.00	1.5	WNW	1.8	NNW	2.1	WSW	1.2	WSW	2.7	N	2.7	SSW	1.5	SSW
หน่วย	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-
ผังลม (Wind Rose)														

WS(m/s)	
	≥ 10.0
	8.0-10.0
	5.5-8.0
	3.3-5.5
	1.7-3.3
	0.3-1.7
	Calms

ตารางที่ 3.4-6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแก

(GPS 47P 0724074, 1439002) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566





เวลา	18-19 ก.ย. 66		19-20 ก.ย. 66		20-21 ก.ย. 66		21-22 ก.ย. 66		22-23 ก.ย. 66		23-24 ก.ย. 66		24-25 ก.ย. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11.00-12.00	2.0	SE	0.7	SE	1.9	N	1.3	NW	1.2	W	1.3	SSW	4.0	NNW
12.00-13.00	3.4	S	1.3	NNW	2.9	NNE	1.6	NNW	2.7	NE	1.5	WSW	2.6	SSW
13.00-14.00	1.3	SE	1.6	WNW	1.7	WSW	0.6	SW	1.9	W	1.9	NE	2.9	ENE
14.00-15.00	1.5	SE	1.5	NNW	1.8	S	2.1	S	1.2	WSW	2.7	NNE	2.7	ESE
15.00-16.00	1.5	SSW	1.5	NNE	0.7	SE	0.7	E	0.8	SSW	2.4	NNE	2.8	ESE
16.00-17.00	0.7	SSW	1.1	NW	0.0	-	0.8	NNE	0.8	S	2.2	NNE	2.2	ESE
17.00-18.00	1.0	SSW	1.4	N	1.4	SSW	0.7	ESE	0.4	S	2.8	SE	2.1	SSE
18.00-19.00	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.2	-	2.8	S	3.3	S
19.00-20.00	0.8	SSW	0.8	N	1.3	E	0.7	S	0.6	SSW	2.9	SE	1.6	SSE
20.00-21.00	0.8	SSW	0.0	-	0.4	SSW	2.4	WNW	0.3	ENE	2.4	S	2.3	SSE
21.00-22.00	1.2	SSW	1.6	SW	0.9	SSW	2.3	N	2.0	NE	0.3	S	0.5	S
22.00-23.00	0.1	-	0.5	SW	0.2	-	0.6	E	1.0	NNW	2.8	S	0.3	S
23.00-00.00	0.2	-	0.0	-	1.7	WSW	0.2	-	0.6	NNW	2.2	S	0.2	-
00.00-01.00	0.7	SSW	0.7	N	1.1	WNW	0.1	-	0.4	S	0.5	S	0.1	-
01.00-02.00	0.0	-	0.8	N	0.8	NNE	0.5	NNE	0.6	S	0.3	S	0.4	S
02.00-03.00	0.2	-	0.8	N	1.1	NW	0.0	-	0.7	S	1.7	S	0.4	S
03.00-04.00	0.4	SSW	0.7	NNW	0.6	NNW	0.8	N	1.3	S	0.9	S	0.5	S
04.00-05.00	0.9	NNW	0.7	NNW	1.2	NNW	1.5	NE	1.4	S	1.3	S	0.4	S
05.00-06.00	1.2	N	1.3	N	1.3	NNW	0.7	E	1.7	SSE	1.3	S	1.6	SSW
06.00-07.00	2.5	NNE	2.0	NNW	3.0	NNW	1.8	SE	1.8	SE	1.5	SE	2.5	SE
07.00-08.00	2.9	NNE	3.0	NNW	3.4	NNW	1.2	NW	0.9	SE	0.2	-	1.6	ESE
08.00-09.00	2.8	WSW	0.6	NNW	2.2	W	3.6	NNE	1.3	SE	1.4	WSW	1.0	ENE
09.00-10.00	3.1	N	3.0	N	2.1	NNW	2.5	NNW	2.0	SE	3.0	ESE	0.9	ENE
10.00-11.00	1.3	NNW	1.7	NNW	1.0	SW	1.3	N	2.0	SW	1.8	SW	2.1	E
หน่วย	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-
ผังลม (Wind Rose)														

WS(m/s)	
	≥ 10.0
	8.0-10.0
	5.5-8.0
	3.3-5.5
	1.7-3.3
	0.3-1.7
	Calms

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี







(GPS 47P 0725723, 1440249) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566

เวลา	18-19 ก.ย. 66		19-20 ก.ย. 66		20-21 ก.ย. 66		21-22 ก.ย. 66		22-23 ก.ย. 66		23-24 ก.ย. 66		24-25 ก.ย. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12.00-13.00	2.0	SSW	1.6	NNW	1.9	NNW	1.9	SE	1.1	NW	2.1	SW	0.9	NW
13.00-14.00	1.5	S	1.2	NNW	1.8	W	1.4	S	1.6	NW	3.6	ESE	3.4	SSW
14.00-15.00	0.7	NW	1.4	W	2.8	NNW	1.1	NNW	2.0	WSW	1.8	N	2.1	S
15.00-16.00	1.7	SSW	0.9	N	2.0	WSW	1.5	WSW	3.9	SW	2.2	NE	4.2	W
16.00-17.00	0.9	ESE	1.0	N	3.5	E	2.9	ENE	1.3	W	3.5	NNW	1.6	E
17.00-18.00	0.5	SE	3.0	NNW	2.8	NE	2.4	NE	1.4	SW	1.1	S	0.9	NE
18.00-19.00	0.0	-	2.9	NNW	3.6	SE	0.6	N	0.7	SW	1.8	SSE	3.0	ENE
19.00-20.00	1.9	SSW	2.1	NNW	1.8	ESE	0.7	SE	0.4	SW	1.1	E	2.0	ENE
20.00-21.00	1.0	SW	1.3	NNW	1.4	ESE	0.6	E	0.3	NNE	1.6	S	2.4	NE
21.00-22.00	1.4	E	0.8	NNW	0.2	-	2.3	NNW	0.9	NE	1.0	SE	1.9	ESE
22.00-23.00	1.8	E	1.7	NNW	0.3	ESE	0.8	W	0.2	-	1.0	SE	0.7	E
23.00-00.00	1.9	E	1.4	SW	0.0	-	0.0	-	1.9	SW	0.7	SE	0.1	-
00.00-01.00	0.0	-	0.3	SW	0.0	-	0.5	WNW	0.3	SSW	0.5	SE	0.3	E
01.00-02.00	0.2	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.3	WNW	0.0	-	0.3	E
02.00-03.00	0.3	E	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	0.3	SE	0.1	-
03.00-04.00	0.2	-	0.0	-	0.2	-	0.8	WNW	0.4	WNW	1.0	SE	0.0	-
04.00-05.00	0.2	-	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.4	WNW	1.3	NE	0.0	-
05.00-06.00	0.4	E	0.2	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.3	NE	0.0	-
06.00-07.00	0.4	E	0.3	W	0.0	-	0.3	ENE	0.0	-	2.0	NE	0.0	-
07.00-08.00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.9	NE	0.3	N	0.0	-	0.2	-
08.00-09.00	0.0	-	0.1	-	0.4	NW	0.5	SSW	0.1	-	0.1	-	0.5	SW
09.00-10.00	1.9	NNW	0.7	NNW	0.3	NNW	0.4	WSW	1.0	SSE	2.3	SW	0.1	-
10.00-11.00	2.1	SW	2.4	W	0.5	WSW	2.1	SSE	2.9	S	2.6	WSW	0.6	NW
11.00-12.00	2.1	WSW	3.2	N	0.1	-	1.4	SSE	3.8	S	3.5	WNW	0.5	WNW
หน่วย	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-
ผังลม (Wind Rose)														

WS(m/s)	
	≥ 10.0
	8.0-10.0
	5.5-8.0
	3.3-5.5
	1.7-3.3
	0.3-1.7
	Calms

ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห่างแก้ว)






(GPS 47P 0728521, 1438948) ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566


เวลา	18-19 ก.ย. 66		19-20 ก.ย. 66		20-21 ก.ย. 66		21-22 ก.ย. 66		22-23 ก.ย. 66		23-24 ก.ย. 66		24-25 ก.ย. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
13.00-14.00	0.5	E	0.6	NNW	0.8	SE	1.9	SW	1.8	SSW	1.9	NNW	1.0	WNW
14.00-15.00	1.6	ESE	1.9	NNE	1.7	S	0.9	SSW	0.9	SW	0.1	-	2.0	NNE
15.00-16.00	0.6	ESE	0.1	-	0.9	ESE	1.5	NNE	1.1	SSW	2.8	NW	1.3	NNE
16.00-17.00	0.3	SE	1.0	WNW	1.8	NNE	0.9	NNE	2.3	S	3.0	NW	0.5	SSE
17.00-18.00	0.7	S	0.1	-	0.7	S	1.5	NNE	1.6	S	3.4	NE	0.6	SSW
18.00-19.00	1.2	SE	0.5	WSW	1.5	S	1.2	E	2.5	SSE	1.6	SSE	0.4	S
19.00-20.00	0.7	ESE	0.4	WSW	1.0	NE	1.0	NNW	2.4	NE	2.8	N	0.2	-
20.00-21.00	0.1	-	0.1	-	0.6	NNE	0.2	-	3.0	NNE	3.0	ESE	0.1	-
21.00-22.00	0.2	-	0.3	SSE	1.5	NNE	0.8	SW	4.2	N	1.2	ESE	0.5	ESE
22.00-23.00	0.3	ESE	0.2	-	0.6	SW	0.6	SW	1.6	WSW	1.6	ESE	0.6	N
23.00-00.00	0.4	ESE	0.2	-	0.8	NNW	0.2	-	1.4	WSW	0.8	ESE	1.2	N
00.00-01.00	0.1	-	0.1	-	0.3	WSW	0.4	WSW	2.3	S	1.2	NW	0.8	W
01.00-02.00	0.2	-	0.3	S	0.1	-	0.0	-	0.5	WSW	1.4	NW	0.8	W
02.00-03.00	0.1	-	0.2	-	0.3	NNE	0.3	NW	0.8	N	0.6	NW	1.2	NNE
03.00-04.00	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.4	N	0.4	SW	0.5	NW	0.9	N
04.00-05.00	0.1	-	0.5	SW	0.4	NW	0.1	-	1.0	N	0.1	-	0.4	N
05.00-06.00	0.1	-	0.6	N	0.1	-	0.2	-	0.6	NNW	0.2	-	0.6	N
06.00-07.00	0.2	-	0.2	-	0.0	-	0.2	-	0.4	NE	0.3	SSE	1.7	SSE
07.00-08.00	1.0	WNW	1.0	N	0.3	SW	0.9	SSE	0.8	SE	0.4	S	0.5	SW
08.00-09.00	0.1	-	0.9	WSW	0.7	W	1.2	S	1.4	ESE	0.2	-	0.2	-
09.00-10.00	0.1	-	0.4	WSW	0.6	SW	1.0	SW	2.7	SW	1.2	WSW	0.4	SW
10.00-11.00	0.2	-	0.8	NW	1.2	NW	0.5	WSW	1.1	S	1.6	S	0.1	-
11.00-12.00	0.3	NNW	0.6	NNW	1.0	WSW	0.3	NNE	0.1	-	2.0	W	0.6	WSW
12.00-13.00	1.0	WSW	1.8	N	1.1	W	1.0	S	1.7	SW	1.1	E	0.2	-
หน่วย	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-
ผังลม (Wind Rose)														


WS(m/s)	
	≥ 10.0
	8.0-10.0
	5.5-8.0
	3.3-5.5
	1.7-3.3
	0.3-1.7
	Calms

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.4-9 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร (GPS 47P 0725768, 1434353)
ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566


เวลา	18-19 ก.ย. 66		19-20 ก.ย. 66		20-21 ก.ย. 66		21-22 ก.ย. 66		22-23 ก.ย. 66		23-24 ก.ย. 66		24-25 ก.ย. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10.00-11.00	2.0	N	2.2	WNW	3.0	ENE	0.9	WNW	0.6	S	0.5	WSW	0.5	SW
11.00-12.00	1.3	SSE	3.2	ENE	0.3	N	2.3	NNW	0.5	WNW	0.4	SW	1.1	W
12.00-13.00	2.5	SSW	1.2	W	2.0	WNW	1.5	WNW	0.7	WSW	0.7	S	1.1	SE
13.00-14.00	2.5	SSE	1.0	NW	0.8	SSW	2.3	SSW	0.9	WNW	0.5	NNE	0.5	WNW
14.00-15.00	3.1	SSE	1.2	NNE	0.3	SW	2.6	SSE	0.8	WNW	1.5	NNE	1.6	SSE
15.00-16.00	1.9	SSE	0.3	N	1.4	NNE	0.7	N	1.5	SW	1.1	ENE	1.9	SSE
16.00-17.00	2.9	SW	1.6	N	1.0	N	1.5	ENE	2.1	NNW	1.2	N	1.1	SSE
17.00-18.00	1.8	WSW	1.1	N	1.0	NW	1.1	NNE	1.2	SW	1.5	SE	2.4	SSE
18.00-19.00	2.1	SSE	1.1	NNW	1.7	ESE	1.3	SSE	1.1	SSW	1.1	SE	1.3	SSE
19.00-20.00	1.1	SSE	0.8	NNW	1.9	N	2.5	N	0.5	NE	1.3	SE	1.0	SSE
20.00-21.00	1.5	SSE	0.8	WSW	0.8	NW	0.9	NNW	0.6	NE	2.5	SE	0.9	SSE
21.00-22.00	0.5	SSE	0.9	WSW	0.5	WSW	0.7	NW	0.8	N	0.5	SE	1.4	SSE
22.00-23.00	0.8	SSE	0.5	NW	1.0	NNW	0.6	NW	0.5	N	1.5	SE	1.9	SSE
23.00-00.00	0.6	SSE	0.7	NNW	1.2	NNW	1.3	NNW	0.8	N	0.7	SE	1.3	SSE
00.00-01.00	0.4	SSE	0.4	N	0.5	SSE	0.8	NW	0.8	SW	0.9	SE	1.0	SSE
01.00-02.00	0.7	SSE	0.5	N	0.6	S	0.5	NNW	0.9	NW	0.5	SE	0.6	NW
02.00-03.00	0.6	SSE	0.6	NW	0.8	N	0.6	NE	0.9	NW	0.4	NNW	0.9	NW
03.00-04.00	0.8	SSE	0.7	NW	0.7	NW	1.0	N	0.7	N	0.8	N	1.1	NW
04.00-05.00	0.5	N	0.4	NW	1.1	NNE	0.9	N	0.9	N	0.7	N	0.6	NW
05.00-06.00	0.9	ENE	0.5	NNW	1.5	N	1.4	N	1.2	NNW	1.3	NNW	0.5	ESE
06.00-07.00	1.5	NNE	1.9	NE	1.3	NE	0.5	ENE	0.5	SW	1.1	NE	0.7	SE
07.00-08.00	1.4	NW	1.4	NNE	0.8	NNW	0.6	ENE	0.6	NE	0.6	S	0.5	S
08.00-09.00	3.5	ENE	0.8	NE	0.6	NW	1.1	S	0.4	SW	0.6	NW	0.9	SE
09.00-10.00	2.1	NW	1.7	NE	0.5	NW	1.3	NNE	0.8	SW	1.0	SSW	1.3	ESE
หน่วย	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-	m/s	-
ผังลม (Wind Rose)														

WS(m/s)	
	≥ 10.0
	8.0-10.0
	5.5-8.0
	3.3-5.5
	1.7-3.3
	0.3-1.7
	Calms

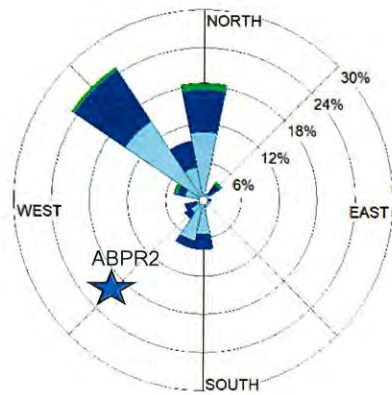


WS(m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	3.57
1.7-3.3	30.95
0.3-1.7	55.36
Calms	10.12

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร (GPS 47P 0731364, 1437020)

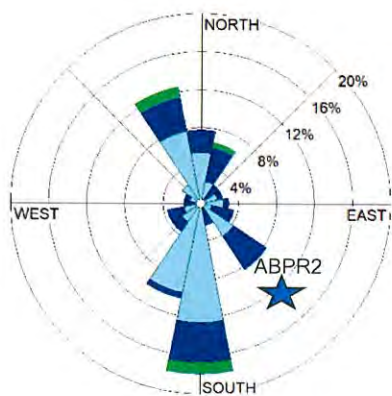

WS(m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	2.98
1.7-3.3	30.36
0.3-1.7	56.55
Calms	10.12


บริเวณชุมชนบ้านโป่งสะแก (GPS 47P 0724074, 1439002)

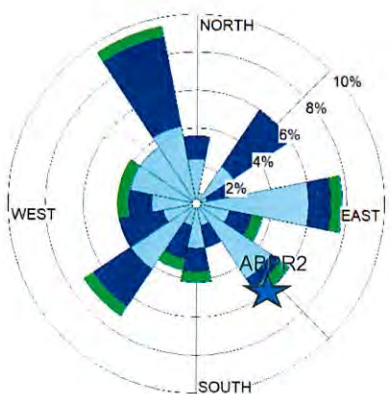


WS(m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	5.36
1.7-3.3	24.41
0.3-1.7	42.86
Calms	27.38

บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี (GPS 47P 0725723, 1440249)

รูปที่ 3.4-7 แสดงความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566

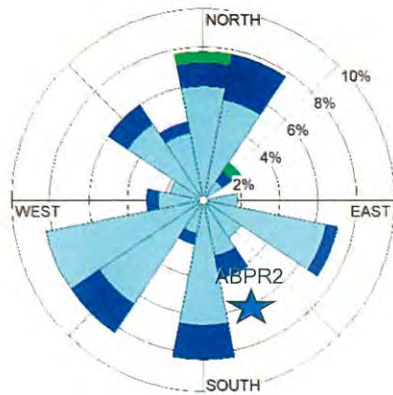

บริเวณบ้านห้วยปราบ (ซอยห้างแก้ว) (GPS 47P 0728521, 1438948)

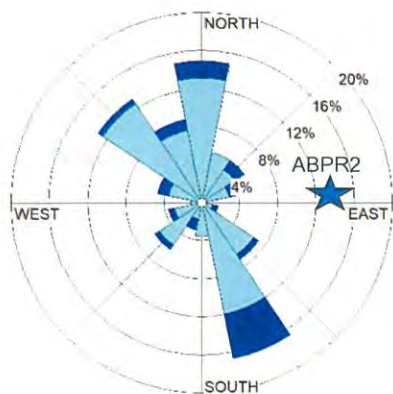

บริเวณโรงเรียนบ้านภูไท (GPS 47P 0725768, 1434353)

รูปที่ 3.4-7 (ต่อ) ผังแสดงความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน พ.ศ. 2566

3.4.4 คุณภาพน้ำทิ้ง

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งนั้น มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ทำตรวจวัด ได้แก่ อัตราการไหล ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ บีโอดี (BOD) ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน และคลอรีนอิสระ แสดงดังภาพที่ 3.4-3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.8-8.2 อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วง 31.0-32.4 องศาเซลเซียส บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง <2 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกครั้งที่ตรวจวัด ซีโอดี (COD) มีค่าอยู่ในช่วง 34-64 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าอยู่ในช่วง <5-21 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าอยู่ในช่วง 1,520-2,240 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมัน มีค่าเท่ากับ <3 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกครั้งที่ตรวจวัด และคลอรีนอิสระ มีค่าอยู่ในช่วง <0.1-0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-10

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพน้ำทิ้ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับอัตราการไหล มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.025 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม



บ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ

ภาพที่ 3.4-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-11 และรูปที่ 3.4-8 สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการฯ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้น ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากคุณภาพน้ำที่รับจากนิคมฯ บางช่วงจะมีค่าของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ค่อนข้างสูง ส่งผลให้น้ำที่ผ่านระบบหล่อเย็นน้ำ (Cooling Tower) ของโครงการมีค่าสูง และมีบางช่วงที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งหลังจากที่ตรวจพบโครงการได้ทำการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งโดยวิธีการปรับลดรอบการใช้น้ำในระบบหล่อเย็นน้ำ เพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์										
สถานีที่ตรวจ วิเคราะห์	วันที่เก็บ ตัวอย่าง	Flow Rate** (m³/s)	pH	Temperature (°C)	Free Chorine (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	Total Suspended Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)
บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง ของโครงการ	11 ก.ค. 65	0.022	8.0	31.1	0.2	2	42	25	2,020	<3*
	8 ส.ค. 65	0.025	7.9	29.2	<0.1*	<2*	50	14	2,210	<3*
	12 ก.ย. 65	0.024	8.0	31.0	0.2	<2*	48	20	1,780	<3*
	10 ต.ค. 65	0.023	7.7	30.5	<0.1*	<2*	52	8	2,660	<3*
	7 พ.ย. 65	0.025	7.8	30.9	<0.1*	<2*	56	66	2,050	<3*
	12 ธ.ค. 65	0.024	7.7	31.5	<0.1*	<2*	47	21	2,100	<3*
	9 ม.ค. 66	0.025	7.6	28.2	<0.1*	<2.0*	29	9	1,800	<3*
	13 ก.พ. 66	0.025	7.6	29.9	<0.1*	<2.0*	38	11	2,100	<3*
	13 มี.ค. 66	0.025	7.8	31.2	<0.1*	<2.0*	42	7	2,080	<3*
	10 เม.ย. 66	0.025	7.9	32.8	<0.1*	<2.0*	37	15	2,380	<3*
	9 พ.ค. 66	0.024	7.8	33.7	<0.1*	<2.0*	44	11	2,250	<3*
	12 มิ.ย. 66	0.024	8.0	32.9	0.2	<2.0*	25	7	1,800	<3*
	17 ก.ค. 66	0.024	7.8	32.4	0.4	<2.0*	34	21	2,090	<3*
	7 ส.ค. 66	0.025	7.8	32.0	<0.1*	<2.0*	49	12	1,780	<3*
	11 ก.ย. 66	0.024	8.2	31.0	<0.1*	<2.0*	47	<5*	2,200	<3*
	9 ต.ค. 66	0.025	7.8	31.2	<0.1*	<2.0*	45	8	1,520	<3*
	13 พ.ย. 66	0.025	7.9	31.6	<0.1*	<2.0*	43	8	2,140	<3*
	11 ธ.ค. 66	0.025	8.1	31.4	0.2	<2.0*	64	6	2,240	<3*
มาตรฐาน		-	5.5-9.0	≤45	≤1	≤500	≤750	≤200	≤3,000	≤10

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ลักษณะตัวอย่าง ; ใส่เสียง ตะกอนเล็กน้อย


- ตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

* = ค่า Detection Limit

** ตรวจวัดโดย บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด




*** มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

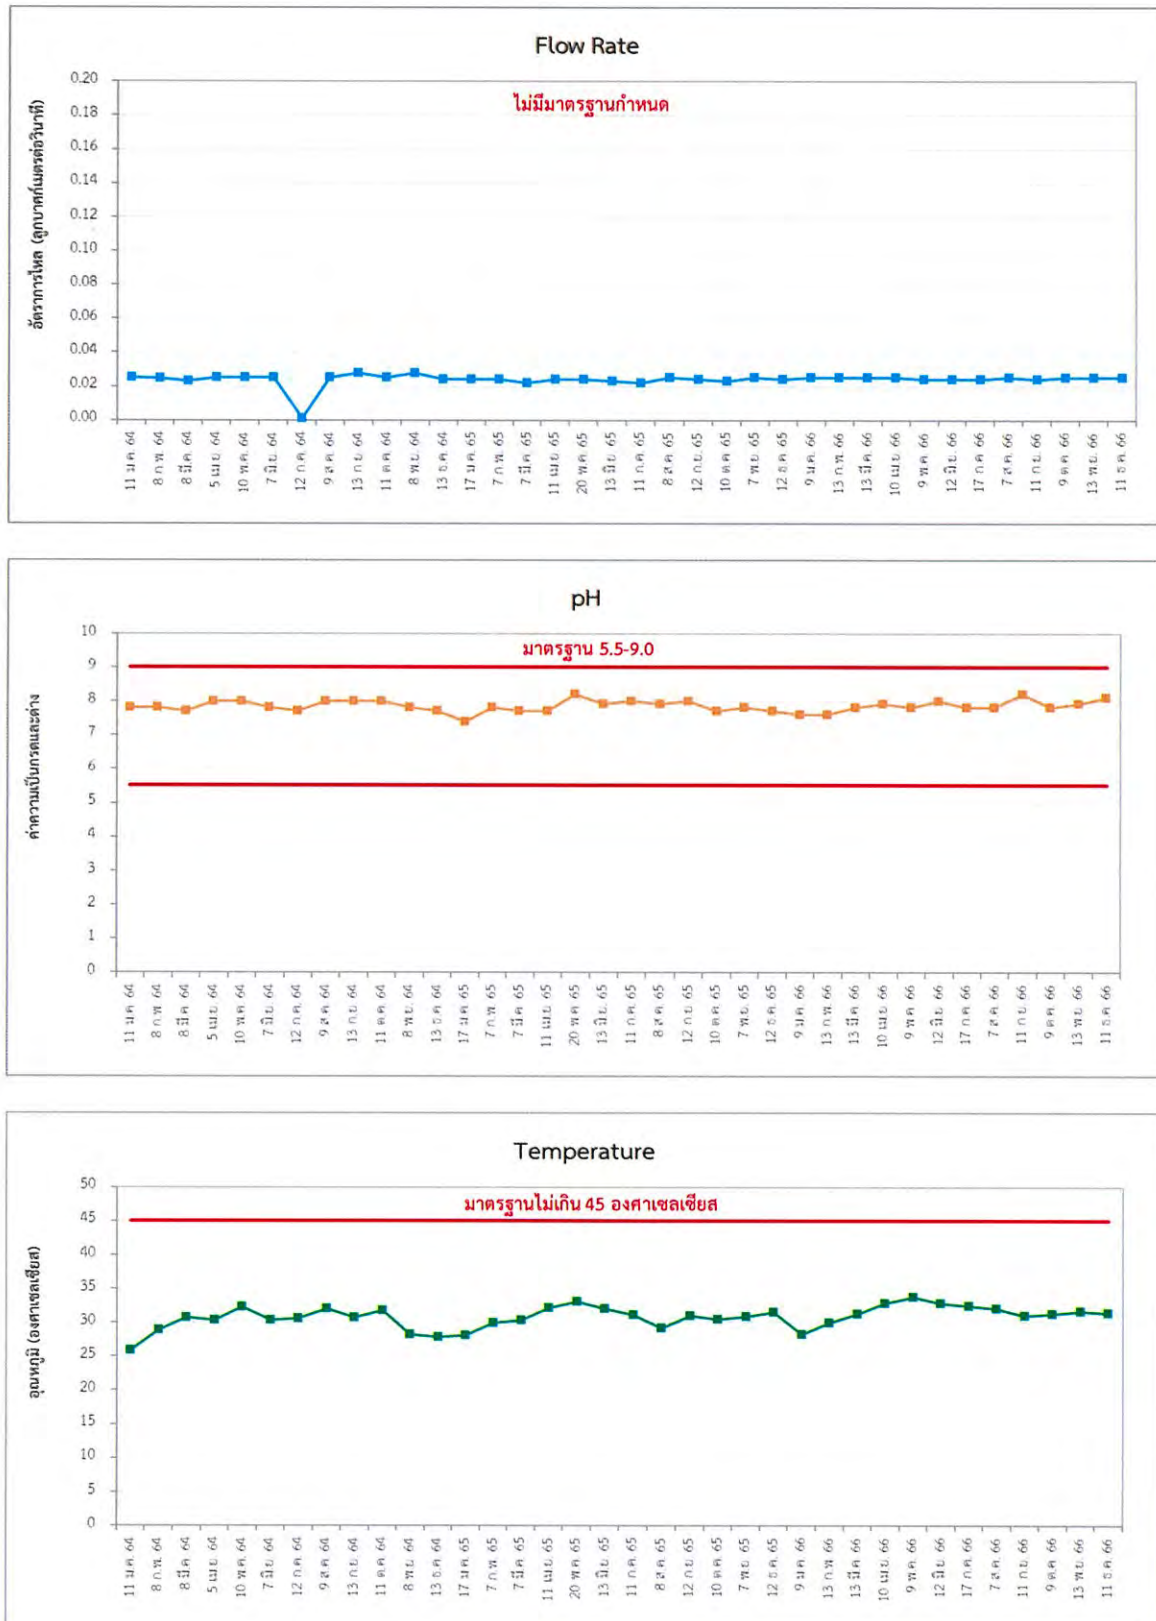


รูปที่ 3.4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

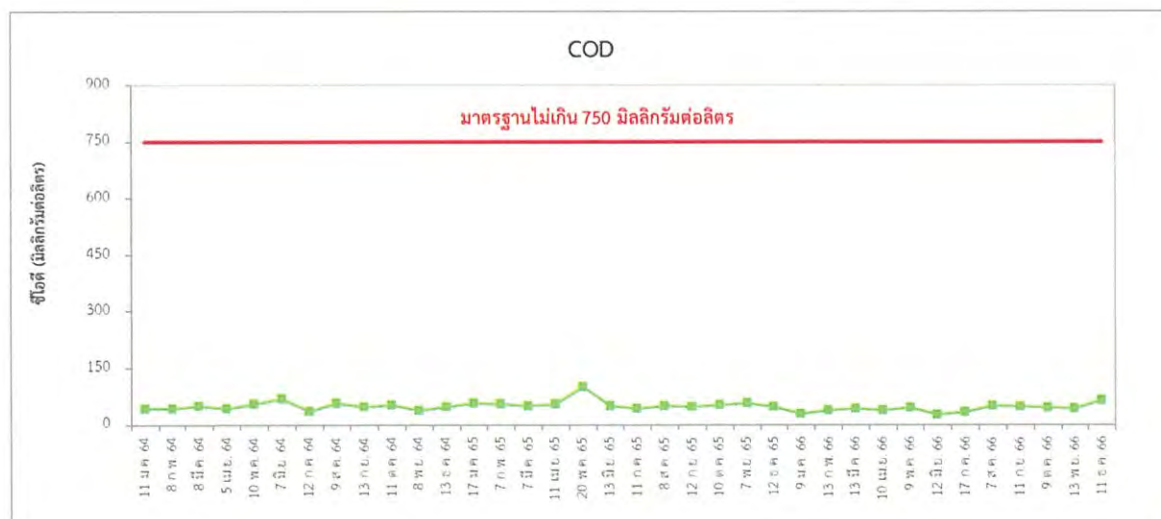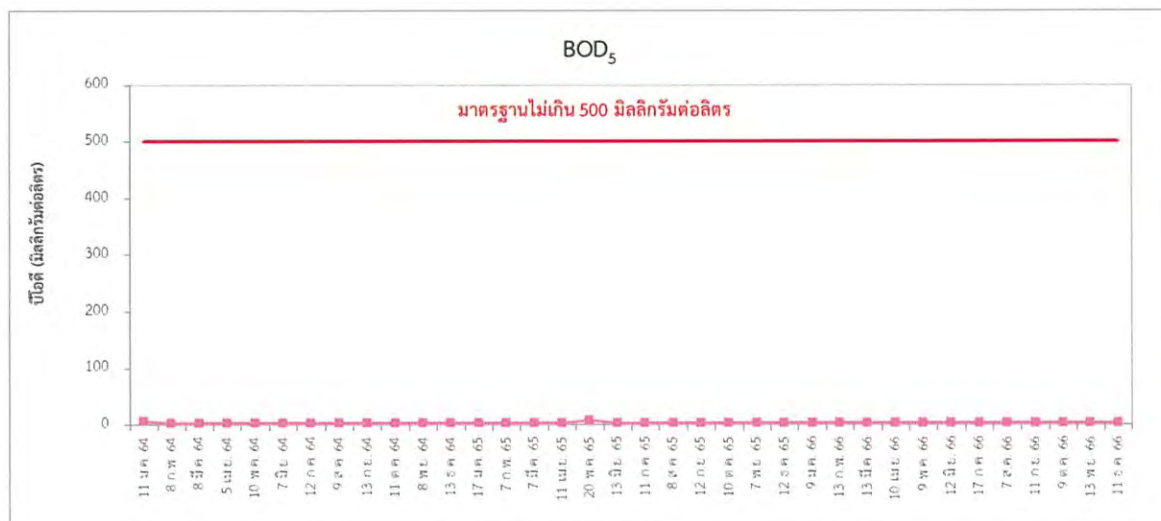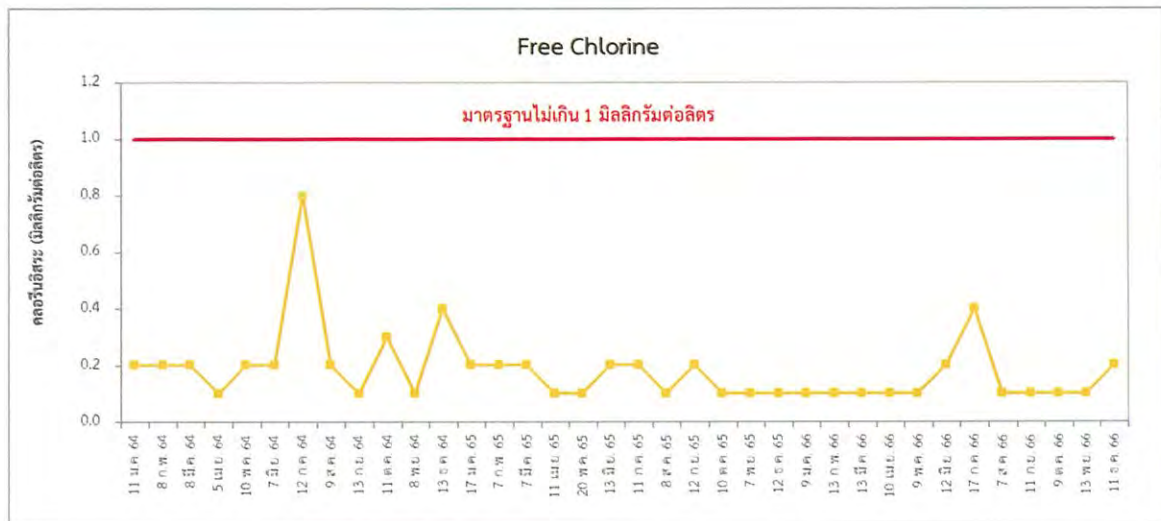

รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งของโครงการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

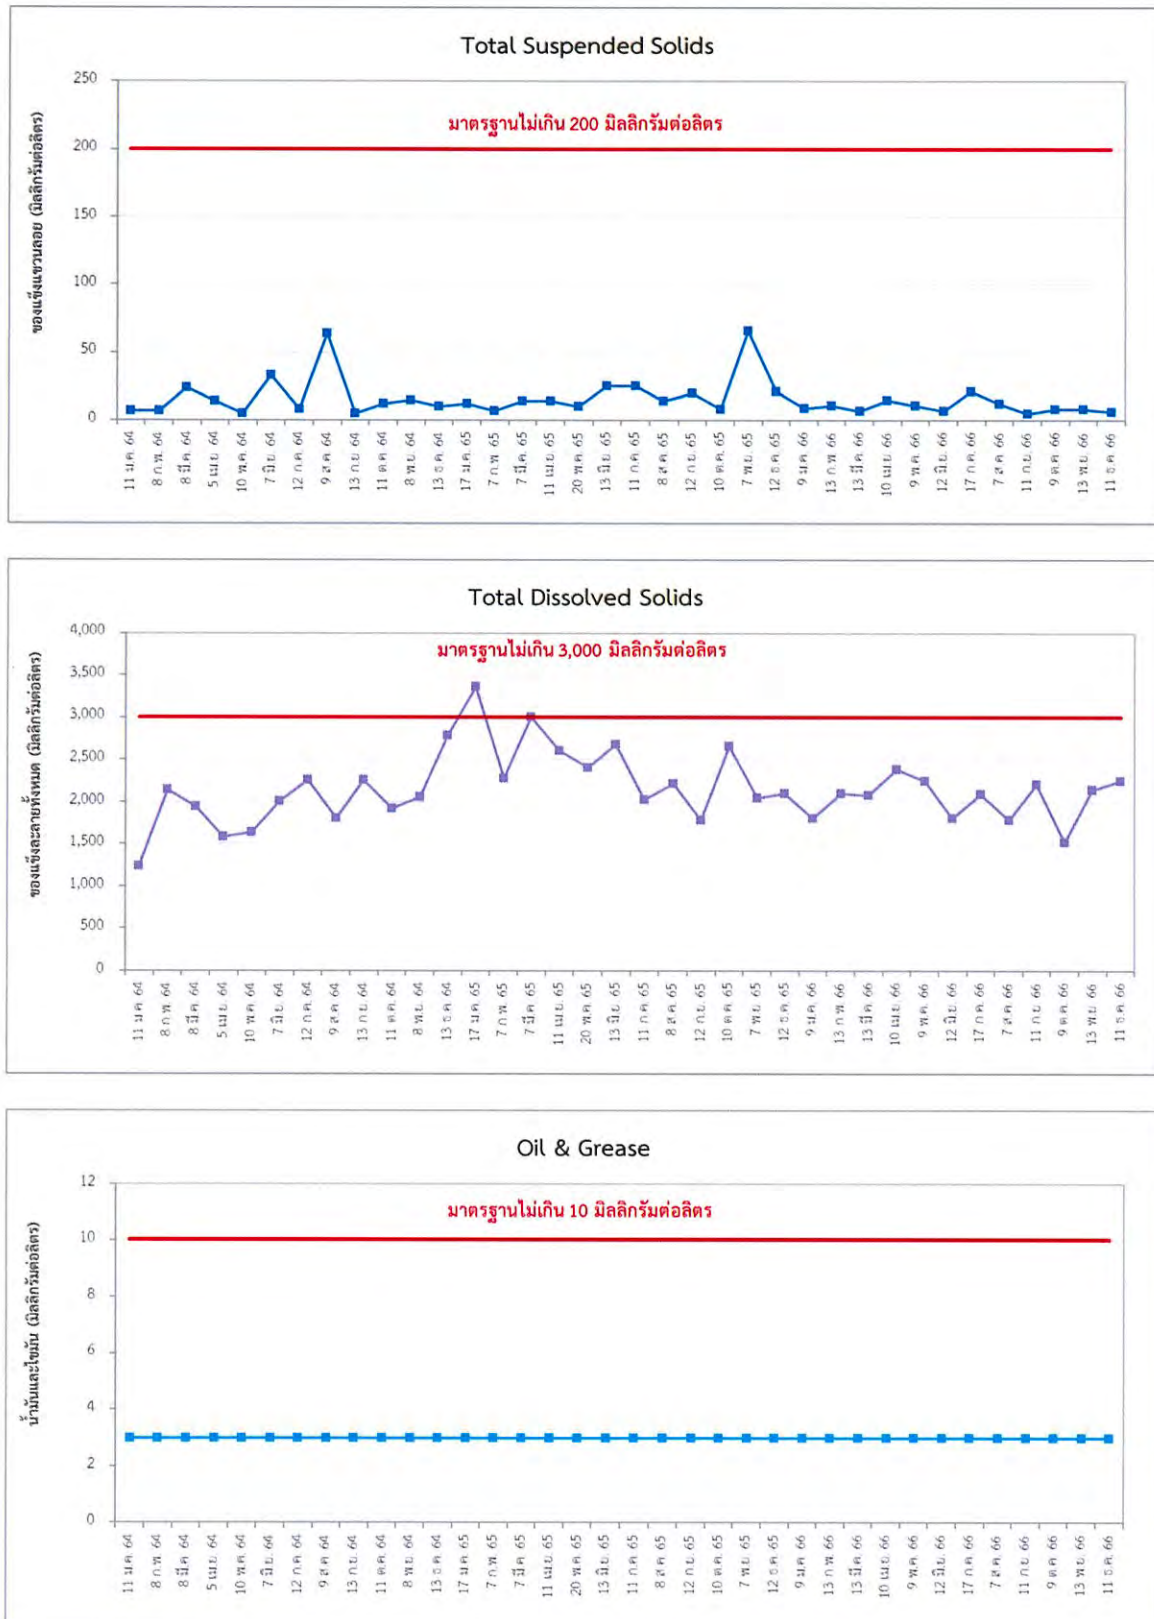

รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3.4.5 ระดับเสียงในบรรยากาศ

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก และตรวจวัดระดับการรบกวนบริเวณชุมชนที่มีการร้องเรียน และชุมชนตัวแทนกรณีไม่ได้รับการรบกวน โดยทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง แสดงดังภาพที่ 3.4-4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 3.4-12 สามารถสรุปได้ดังนี้

➤ ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs) มีค่าอยู่ในช่วง 57.5-70.3 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 88.4-112.5 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) มีค่าอยู่ในช่วง 50.9-67.9 เดซิเบล(เอ)

เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก ที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้น ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs) ในช่วงวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเนื่องจากในช่วงเวลา 16.00-21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการจัดกิจกรรมสันหนาทและการใช้เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเสียง สำหรับระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ

➤ รพ.สต. มาบยางพร

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hrs) มีค่าอยู่ในช่วง 53.6-60.3 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 78.1-82.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) มีค่าอยู่ในช่วง 40.6-60.3 เดซิเบล(เอ)

เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ รพ.สต. มาบยางพร ที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการ

รบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว สำหรับระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ



ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก



รพ.สต. มาบยางพร

ภาพที่ 3.4-4 การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)
ช่วงดำเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.4-12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ทำการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))			
		Leq 1 hr	Leq 24 hrs	Lmax	L90
ริมรั้วโครงการทางด้าน ทิศตะวันออก	18-19 กันยายน 2566	54.6-64.3	59.3	90.0	51.4-56.9
	19-20 กันยายน 2566	54.2-62.7	57.5	88.4	50.9-54.9
	20-21 กันยายน 2566	54.9-64.4	59.0	91.1	51.9-56.7
	21-22 กันยายน 2566	54.8-79.7	67.7	112.5	52.1-62.7
	22-23 กันยายน 2566	55.6-78.9	70.3*	91.8	52.9-67.9
รพ.สต. มาบยางพร	18-19 กันยายน 2566	47.3-68.4	60.3	81.5	43.2-60.3
	19-20 กันยายน 2566	46.4-61.5	54.9	78.1	42.5-50.9
	20-21 กันยายน 2566	45.8-61.0	53.6	81.2	42.0-57.3
	21-22 กันยายน 2566	44.2-65.1	58.1	82.0	42.6-58.3
	22-23 กันยายน 2566	42.2-64.6	57.3	80.9	40.6-59.9
มาตรฐาน ^{[1][2]}		-	≤70.0	≤115.0	-

มาตรฐาน : ^[1] มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

^[2] มาตรฐานกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : - ข้อมูลระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง ดูในภาคผนวก ค ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

* มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง	นายณัฐกานต์ วงศ์อินทร์อยู่ และนายณนพชัย อุปถัมภ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นายสุพจน์ สลามเต๊ะ
ชื่อผู้วิเคราะห์	นางสาวธนิศา กุลสุริวงค์
เบอร์โทรศัพท์	0-3304-8555

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก และบริเวณ รพ.สต. มาบยางพร ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-13 และรูปที่ 3.4-9 ถึงรูปที่ 3.4-10 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ยกเว้น ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก ในช่วงวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด เนื่องจากในช่วงเวลา 16.00-21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการจัดกิจกรรม สันทนาการและมีการใช้เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเสียง

ตารางที่ 3.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))			
		Leq 1 hr	Leq 24 hrs	Lmax	L90
บริเวณริมรั้วโรงงานด้าน ทิศตะวันออก	18-19 มี.ค. 64	57.4-61.0	59.4	82.6	56.2-58.6
	19-20 มี.ค. 64	57.8-61.1	59.3	82.8	56.4-59.0
	20-21 มี.ค. 64	58.0-60.4	59.3	77.2	56.3-59.1
	21-22 มี.ค. 64	57.4-66.6	60.2	81.3	55.9-60.0
	22-23 มี.ค. 64	57.1-71.0	61.0	89.3	56.0-58.9
	16-17 พ.ย. 64	55.7-59.7	57.7	88.5	54.3-57.1
	17-18 พ.ย. 64	56.2-63.8	58.0	86.4	54.8-57.2
	18-19 พ.ย. 64	56.1-65.6	59.9	84.3	54.6-56.7
	19-20 พ.ย. 64	58.1-69.2	62.0	103.0	55.3-58.8
	20-21 พ.ย. 64	56.5-63.4	59.5	88.3	55.1-58.3
มาตรฐาน ^{[1][2]}		-	≤70.0	≤115.0	-

ตารางที่ 3.4-13 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))			
		Leq 1 hr	Leq 24 hrs	Lmax	L90
บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (ต่อ)	9-10 มี.ค. 65	56.8-67.3	60.4	80.5	55.7-58.5
	10-11 มี.ค. 65	56.9-65.4	59.7	79.1	55.3-59.5
	11-12 มี.ค. 65	56.3-71.5	61.7	85.9	55.0-58.3
	12-13 มี.ค. 65	56.3-60.7	58.4	79.6	55.3-58.4
	13-14 มี.ค. 65	56.9-61.7	58.6	76.2	55.9-59.1
	15-16 พ.ย. 65	55.2-64.3	57.5	87.8	54.0-56.2
	16-17 พ.ย. 65	55.4-70.0	61.0	98.7	54.0-59.5
	17-18 พ.ย. 65	55.4-66.7	58.3	85.5	54.0-56.9
	18-19 พ.ย. 65	55.0-59.7	57.1	85.5	53.6-56.6
	19-20 พ.ย. 65	53.9-59.1	56.3	90.3	52.5-55.5
	21-22 มี.ค. 66	58.6-62.0	60.4	85.4	56.8-59.8
	22-23 มี.ค. 66	58.3-62.9	60.7	88.6	56.3-60.0
	23-24 มี.ค. 66	59.7-63.3	61.5	89.2	57.7-60.3
	24-25 มี.ค. 66	60.0-62.4	61.6	87.6	58.0-60.7
	25-26 มี.ค. 66	60.1-62.4	61.6	85.2	58.1-60.9
	18-19 ก.ย. 66	54.6-64.3	59.3	90.0	51.4-56.9
	19-20 ก.ย. 66	54.2-62.7	57.5	88.4	50.9-54.9
	20-21 ก.ย. 66	54.9-64.4	59.0	91.1	51.9-56.7
	21-22 ก.ย. 66	54.8-79.7	67.7	112.5	52.1-62.7
	22-23 ก.ย. 66	55.6-78.9	70.3*	91.8	52.9-67.9
บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร	18-19 มี.ค. 64	43.4-58.5	53.6	81.9	38.8-57.7
	19-20 มี.ค. 64	46.5-58.6	53.5	75.9	43.6-54.0
	20-21 มี.ค. 64	47.6-58.1	53.6	74.0	44.0-54.2
	21-22 มี.ค. 64	44.6-66.5	57.4	79.6	42.0-63.9
	22-23 มี.ค. 64	46.2-57.2	52.6	74.2	43.4-53.5
	16-17 พ.ย. 64	49.2-57.0	52.4	100.6	47.3-51.7
	17-18 พ.ย. 64	48.9-53.7	51.2	82.4	47.3-50.7
	18-19 พ.ย. 64	50.9-54.7	52.6	79.4	48.3-52.9
	19-20 พ.ย. 64	44.9-57.6	53.1	79.4	40.4-55.9
	20-21 พ.ย. 64	49.2-59.5	55.1	75.4	45.5-55.6
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		-	≤70.0	≤115.0	-

ตารางที่ 3.4-13 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566




สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))			
		Leq 1 hr	Leq 24 hrs	Lmax	L90
บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร (ต่อ)	9-10 มี.ค. 65	48.3-58.8	53.2	88.3	45.2-50.9
	10-11 มี.ค. 65	38.3-51.9	45.4	73.9	34.5-44.5
	11-12 มี.ค. 65	47.9-58.3	52.9	87.8	44.7-50.5
	12-13 มี.ค. 65	53.3-58.5	55.5	81.7	47.6-55.3
	13-14 มี.ค. 65	50.5-56.1	53.9	79.5	46.2-52.5
	15-16 พ.ย. 65	48.8-64.5	58.6	80.8	44.3-62.0
	16-17 พ.ย. 65	47.0-56.7	51.4	74.2	43.7-48.9
	17-18 พ.ย. 65	45.4-53.4	49.9	72.9	43.3-48.2
	18-19 พ.ย. 65	49.0-65.0	56.7	77.6	44.7-64.0
	19-20 พ.ย. 65	46.7-64.8	56.8	74.1	42.3-60.3
	21-22 มี.ค. 66	48.6-57.0	53.2	88.2	46.6-51.8
	22-23 มี.ค. 66	48.4-56.1	52.2	79.6	44.6-52.3
	23-24 มี.ค. 66	48.2-57.4	52.7	82.4	46.0-53.0
	24-25 มี.ค. 66	48.8-55.8	52.6	81.7	46.1-51.2
	25-26 มี.ค. 66	49.7-57.3	53.0	77.2	46.7-52.3
	18-19 ก.ย. 66	47.3-68.4	60.3	81.5	43.2-60.3
	19-20 ก.ย. 66	46.4-61.5	54.9	78.1	42.5-50.9
	20-21 ก.ย. 66	45.8-61.0	53.6	81.2	42.0-57.3
	21-22 ก.ย. 66	44.2-65.1	58.1	82.0	42.6-58.3
	22-23 ก.ย. 66	42.2-64.6	57.3	80.9	40.6-59.9
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		-	≤70.0	≤115.0	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540




⁽²⁾ มาตรฐานกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : * มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

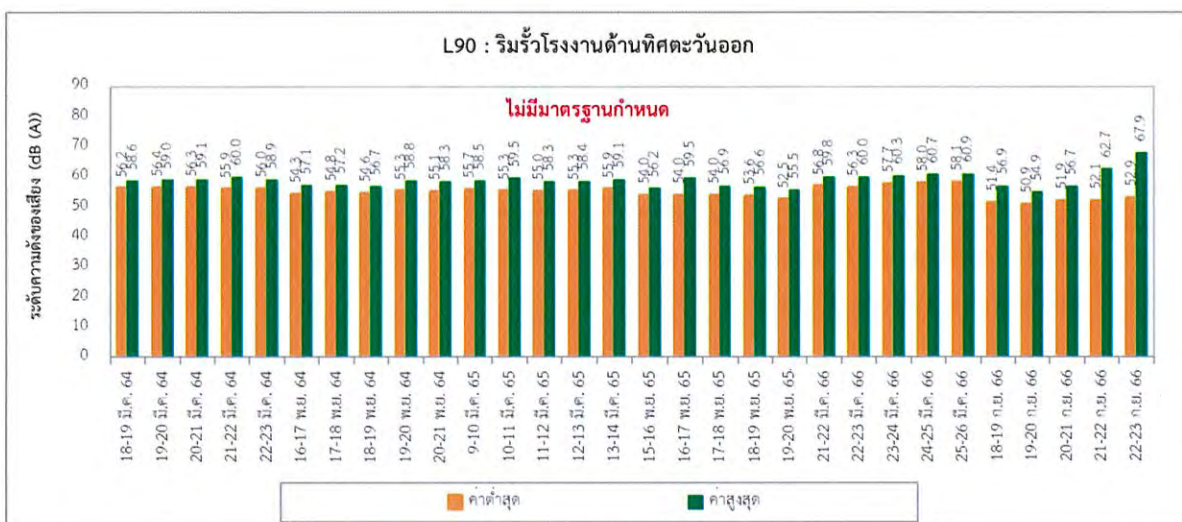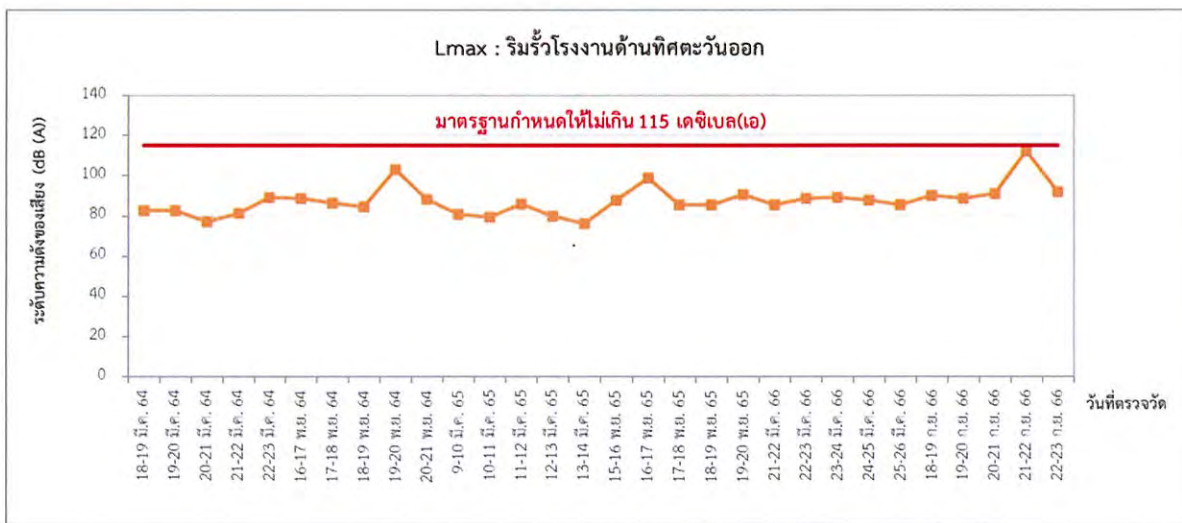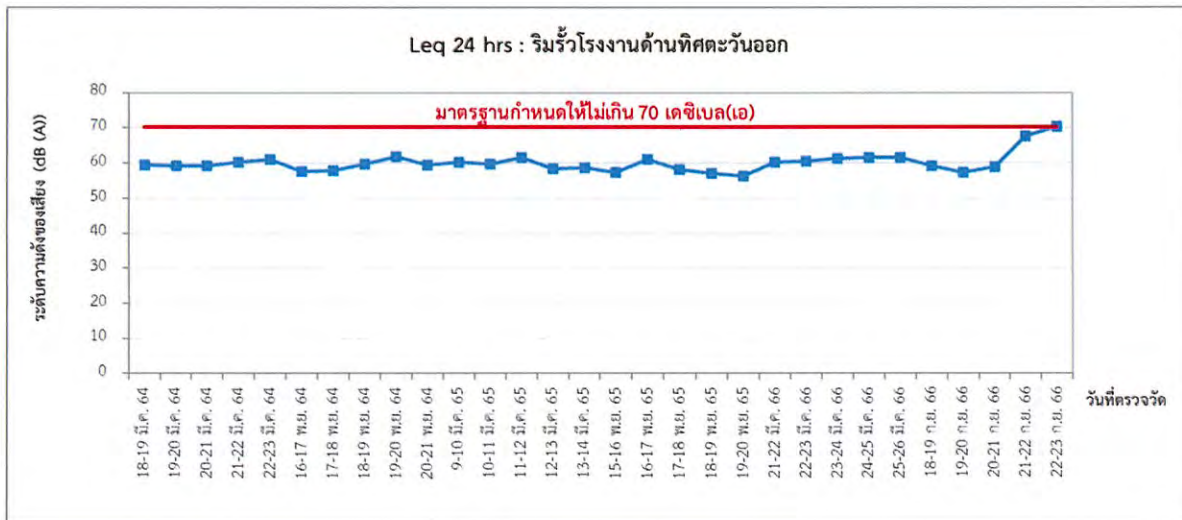

รูปที่ 3.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณร่มรั่วโครงการทางด้านทิศตะวันออก
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

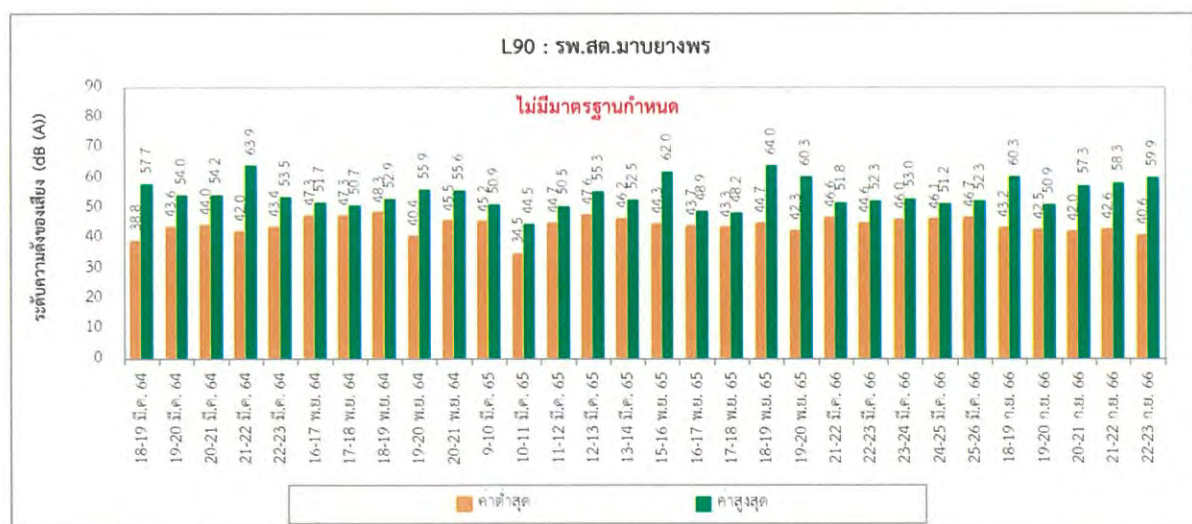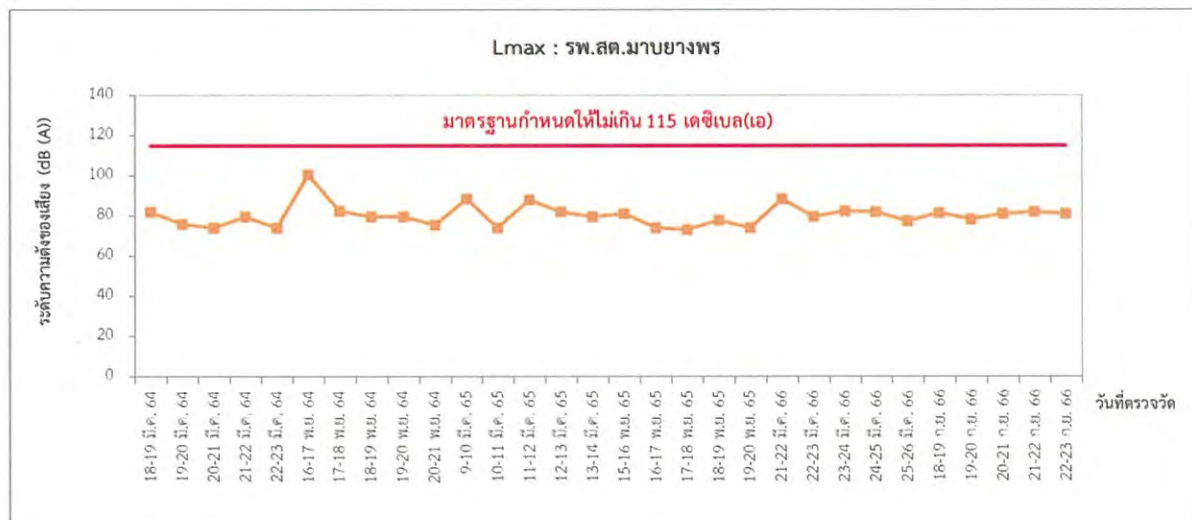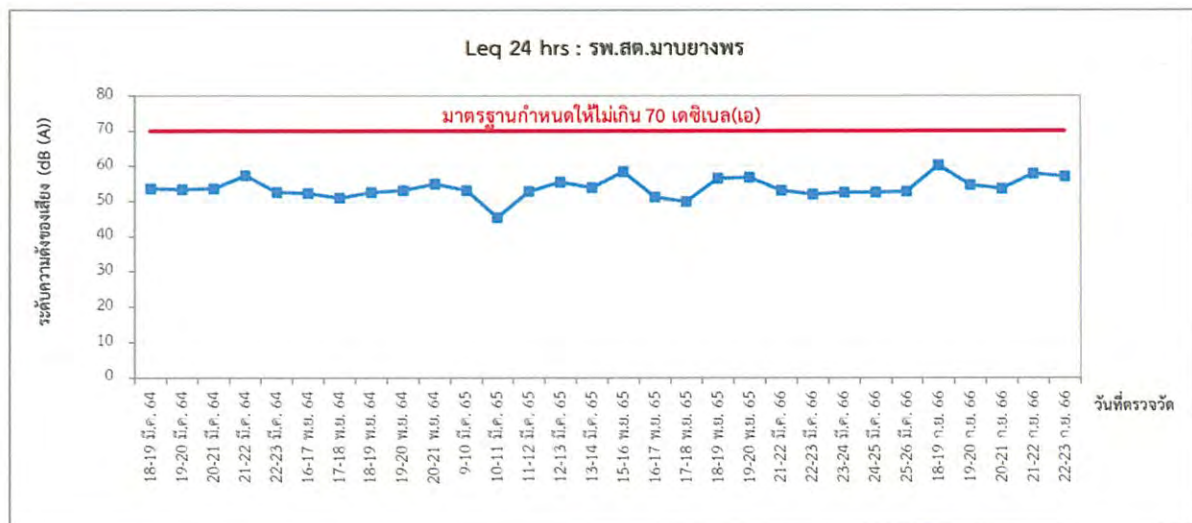

รูปที่ 3.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร

ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3.4.6 ระดับเสียงรบกวน

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณชุมชนที่มีการร้องเรียน และชุมชนตัวแทนกรณีไม่ได้รับการรบกวน โดยทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 3.4-14 เมื่อนำค่าระดับเสียงรบกวนมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ที่กำหนดให้ค่าระดับการรบกวนมีค่าได้ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) เป็นระดับเดียวกันกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 โดยการคำนวณค่าระดับการรบกวนตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียง 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 พบว่าค่าระดับเสียงรบกวน มีค่าอยู่ในช่วง -11.9 ถึง 29.7 เดซิเบล (เอ) โดยระดับการรบกวนส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานกำหนด ยกเว้น ในบางช่วงเวลาที่ค่าระดับการรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยช่วงเวลาที่ค่าระดับการรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลางวัน อาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงจุดตรวจวัด ประกอบกับเสียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมในชุมชนและการคมนาคม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาก่อนดำเนินโครงการ ซึ่งจุดตรวจวัดระดับเสียงรบกวนตั้งอยู่บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร เป็นเขตชุมชนพักอาศัย มีหอพัก ร้านค้า ร้านอาหาร และตลาด อย่างไรก็ตามโครงการมีการเฝ้าระวังเสียงจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีมาตรการในการลดระดับทางเสียง ดังนี้

- โครงการมีการติดตั้งอาคารครอบเครื่องจักร Silencer และฐานคอนกรีตลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อลดระดับเสียง สำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ)
- โครงการมีการตรวจสอบดูแลเครื่องจักร โดยใช้น้ำมันหล่อลื่น จารบีใส่เครื่องจักร เพื่อลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร

จากมาตรการลดระดับเสียงดังกล่าวทำให้ระดับเสียงบางส่วนจากกระบวนการผลิตถูกดูดซับไว้ สำหรับการประเมินระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 3.4-14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))
		ค่าระดับการรบกวน (ต่ำสุด/สูงสุด)
บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร	18-19 กันยายน 2566	-9.5 / 25.5*
	19-20 กันยายน 2566	-9.8 / 19.9*
	20-21 กันยายน 2566	-10.3 / 7.3
	21-22 กันยายน 2566	-11.9 / 29.7*
	22-23 กันยายน 2566	-11.4 / 29.2*
มาตรฐาน		≤10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : - รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ดูในภาคผนวก ค ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

* มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ผลการตรวจวัดระดับเสียงระดับเสียงรบกวน บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-15 และรูปที่ 3.4-11 พบว่า ค่าระดับการรบกวนส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ค่าระดับการรบกวนมีค่าได้ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)

ตารางที่ 3.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))
		ค่าระดับการรบกวน (ต่ำสุด/สูงสุด)
บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร	18-19 มี.ค. 64	-12.0 / 18.5*
	19-20 มี.ค. 64	-10.7 / 15.6*
	20-21 มี.ค. 64	-10.8 / 12.6*
	21-22 มี.ค. 64	-10.1 / 29.7*
	22-23 มี.ค. 64	-10.3 / 14.9*
	16-17 พ.ย. 64	-9.2 / 8.8
	17-18 พ.ย. 64	-10.3 / 12.6*
	18-19 พ.ย. 64	-8.2 / 8.5
	19-20 พ.ย. 64	-10.6 / 15.3*
	20-21 พ.ย. 64	-10.0 / 19.0*
	9-10 มี.ค. 65	-10.9 / 20.5*
	10-11 มี.ค. 65	-20.9 / 2.8
	11-12 มี.ค. 65	-11.3 / 20.0*
	12-13 มี.ค. 65	-5.9 / 14.3*
	13-14 มี.ค. 65	-8.7 / 12.5*
	15-16 พ.ย. 65	-10.4 / 24.3*
	16-17 พ.ย. 65	-12.2 / 14.9*
	17-18 พ.ย. 65	-13.8 / 5.0
	18-19 พ.ย. 65	-10.2 / 19.9*
	19-20 พ.ย. 65	-9.1 / 14.4*
	21-22 มี.ค. 66	-10.6 / 11.3*
	22-23 มี.ค. 66	-10.5 / 11.3*
	23-24 มี.ค. 66	-10.9 / 16.4*
	24-25 มี.ค. 66	-9.1 / 10.9*
	25-26 มี.ค. 66	-9.3 / 11.3*
	18-19 ก.ย. 66	-9.5 / 25.5*
	19-20 ก.ย. 66	-9.8 / 19.9*
	20-21 ก.ย. 66	-10.3 / 7.3
	21-22 ก.ย. 66	-11.9 / 29.7*
	22-23 ก.ย. 66	-11.4 / 29.2*
มาตรฐาน		≤10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : * มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



รูปที่ 3.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3.4.7 การจัดการกากของเสีย

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการบันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของโครงการ ภายในพื้นที่โครงการ โดยบันทึกตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยสรุปในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน

2) ผลการดำเนินการ

ทางโครงการได้ทำการบันทึกปริมาณ และการจัดการของเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 3,610 กิโลกรัม ปริมาณของเสียทั่วไป 184,537 กิโลกรัม ปริมาณของเสียอันตราย 763 กิโลกรัม และปริมาณของเสียรีไซเคิล 1,081 กิโลกรัม รวมปริมาณของเสียทั้งหมด 189,991 กิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 3.4-16 และภาคผนวก ข-24

ตารางที่ 3.4-16 สรุปปริมาณการกักเก็บของเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

เดือน	ปริมาณของเสีย (กิโลกรัม)				
	มูลฝอย	ของเสียทั่วไป	ของเสียอันตราย	รีไซเคิล	รวม
กรกฎาคม	560	55,828	107	0	56,495
สิงหาคม	600	21,905	0	1,081	23,586
กันยายน	630	17,655	0	0	18,285
ตุลาคม	630	38,583	407	0	39,620
พฤศจิกายน	560	30,985	0	0	31,545
ธันวาคม	630	19,581	249	0	20,460
รวม	3,610	184,537	763	1,081	189,991

หมายเหตุ : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

3.4.8 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นตัวแทน ครุฑเรือน รวมทั้ง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง

2) ผลการดำเนินการ

โครงการดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นตัวแทน ครุฑเรือน รวมทั้ง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยดำเนินการสำรวจครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังเอกสารภาคผนวก ข-56

3.4.9 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี โดยทำการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน และสมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น

2) ผลการดำเนินการ

โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุก 1 ปี โดยปี 2566 ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานในวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย ฟรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก รายละเอียดตั้งเอกสารภาคผนวก ข-34

3.4.10 ระดับเสียงในสถานประกอบการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ บริเวณเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs) ปีละ 4 ครั้ง และกำหนดให้จัดทำ Noise Contour บริเวณพื้นที่โครงการ หลังเปิดดำเนินโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ จำนวน 3 สถานี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยจุดตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.4-5 และผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3.4-17 ถึงตารางที่ 3.4-19 สามารถสรุปได้ดังนี้

➤ บริเวณ Gas Turbine Generator

จากการตรวจวัดในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณ Gas Turbine Generator (GT 21) มีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงเท่ากับ 77.6 และ 78.5 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ

➤ บริเวณ Air Compressor (ABPR 2)

จากการตรวจวัดในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณ Air Compressor (ABPR 2) มีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงเท่ากับ 78.6 และ 81.6 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ

➤ บริเวณ Steam Turbine (ST 20)

จากการตรวจวัดในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า บริเวณ Steam Turbine (ST 20) มีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงเท่ากับ 75.6 และ 78.4 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ

เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs) มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 พบว่า ระดับเสียงในสถานประกอบการ ทุกสถานที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



Gas Turbine Generator (GT 21)



Air Compressor (ABPR 2)



Steam Turbine (ST 20)

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566



Gas Turbine Generator (GT 21)



Air Compressor (ABPR 2)



Steam Turbine (ST 20)

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ภาพที่ 3.4-5 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางที่ 3.4-17 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ บริเวณ Gas Turbine Generator ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))		ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
	Gas Turbine Generator (GT 21)			Gas Turbine Generator (GT 21)	
	8 กันยายน 2566			4 ธันวาคม 2566	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax
08.30-09.30 น.	77.8	79.5	09.00-10.00 น.	76.6	81.9
09.30-10.30 น.	77.9	79.5	10.00-11.00 น.	76.8	77.9
10.30-11.30 น.	77.8	79.7	11.00-12.00 น.	76.9	78.0
11.30-12.30 น.	77.6	79.2	12.00-13.00 น.	82.1	93.1
12.30-13.30 น.	77.1	78.4	13.00-14.00 น.	77.4	80.4
13.30-14.30 น.	77.5	84.3	14.00-15.00 น.	77.4	81.7
14.30-15.30 น.	77.4	78.9	15.00-16.00 น.	77.3	79.1
15.30-16.30 น.	77.5	78.8	16.00-17.00 น.	79.9	84.2
Leq 8 hrs (dB(A))	77.6		Leq 8 hrs (dB(A))	78.5	
Lmax (dB(A))	84.3		Lmax (dB(A))	93.1	
Standard of Leq 8 hrs (dB(A))	90		Standard of Leq 8 hrs (dB(A))	90	
Standard of Lmax (dB(A))	140		Standard of Lmax (dB(A))	140	

หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ตารางที่ 3.4-18 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ บริเวณ Air Compressor (ABPR 2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))		ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
	8 กันยายน 2566			4 ธันวาคม 2566	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax
08.30-09.30 น.	79.4	85.4	09.00-10.00 น.	76.9	84.0
09.30-10.30 น.	78.6	83.7	10.00-11.00 น.	76.9	87.8
10.30-11.30 น.	78.8	86.6	11.00-12.00 น.	76.9	80.0
11.30-12.30 น.	78.7	84.9	12.00-13.00 น.	87.0	98.1
12.30-13.30 น.	78.3	83.9	13.00-14.00 น.	78.0	82.0
13.30-14.30 น.	78.3	86.1	14.00-15.00 น.	78.1	81.4
14.30-15.30 น.	78.5	86.7	15.00-16.00 น.	79.0	96.1
15.30-16.30 น.	78.3	83.6	16.00-17.00 น.	84.9	96.0
Leq 8 hrs (dB(A))	78.6		Leq 8 hrs (dB(A))	81.6	
Lmax (dB(A))	86.7		Lmax (dB(A))	98.1	
Standard of Leq 8 hrs (dB(A))	90		Standard of Leq 8 hrs (dB(A))	90	
Standard of Lmax (dB(A))	140		Standard of Lmax (dB(A))	140	

หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ตารางที่ 3.4-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ บริเวณ Steam Turbine (ST 20) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))		ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
	8 กันยายน 2566			4 ธันวาคม 2566	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax
08.30-09.30 น.	75.8	78.1	09.00-10.00 น.	75.0	77.9
09.30-10.30 น.	75.6	78.9	10.00-11.00 น.	75.2	78.0
10.30-11.30 น.	75.7	78.9	11.00-12.00 น.	75.3	77.6
11.30-12.30 น.	75.4	78.4	12.00-13.00 น.	84.1	89.5
12.30-13.30 น.	75.5	78.3	13.00-14.00 น.	76.7	80.3
13.30-14.30 น.	75.9	80.2	14.00-15.00 น.	76.7	80.2
14.30-15.30 น.	75.5	78.5	15.00-16.00 น.	77.0	81.3
15.30-16.30 น.	75.4	79.7	16.00-17.00 น.	77.6	81.9
Leq 8 hrs (dB(A))	75.6		Leq 8 hrs (dB(A))	78.4	
Lmax (dB(A))	80.2		Lmax (dB(A))	89.5	
Standard of Leq 8 hrs (dB(A))	90		Standard of Leq 8 hrs (dB(A))	90	
Standard of Lmax (dB(A))	140		Standard of Lmax (dB(A))	140	

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม

บริษัท เอแอลเอส แล็บอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง

นายสันติ ชัยชนะ และนายพีรพัฒน์ ก้าคำ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

ชื่อผู้วิเคราะห์

นางสาวธนิดา กุลสุริวงศ์

เบอร์โทรศัพท์

0-3304-8555

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 แสดงดังตารางที่ 3.4-20 และรูปที่ 3.4-12 พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



ตารางที่ 3.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		Leq 8 hrs.	Lmax
บริเวณ Gas Turbine Generator 21	19 มี.ค. 64	77.4	95.7
	14 ก.ย. 64	75.6	78.9
	10 มิ.ย. 65	77.6	81.2
	12 ธ.ค. 65	75.9	79.4
	8 ก.ย. 66	77.6	84.3
	4 ธ.ค. 66	78.5	93.1
บริเวณ Gas Turbine Generator 22	15 มิ.ย. 63	78.5	94.3
	14 ธ.ค. 63	77.9	88.0
	8 มิ.ย. 64	78.6	81.4
	8 ธ.ค. 64	77.0	96.2
	9 มี.ค. 65	80.1	89.9
	5 ก.ย. 65	76.3	85.5
	9 มี.ค. 66	78.1	87.3
	9 มิ.ย. 66	77.7	91.1
บริเวณ Air Compressor (ABPR 2)	19 มี.ค. 64	82.2	100.8
	8 มิ.ย. 64	79.2	85.9
	14 ก.ย. 64	78.8	85.4
	8 ธ.ค. 64	81.9	99.9
	9 มี.ค. 65	80.6	101.6
	10 มิ.ย. 65	78.0	90.6
	5 ก.ย. 65	82.2	99.9
	12 ธ.ค. 65	80.4	88.3
	9 มี.ค. 66	78.6	85.6
	9 มิ.ย. 66	79.4	89.5
	8 ก.ย. 66	78.6	86.7
	4 ธ.ค. 66	81.6	98.1
มาตรฐาน		≤90.0	≤140.0

ตารางที่ 3.4-20 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))	
		Leq 8 hrs.	Lmax
บริเวณ Steam Turbine (ST 20)	19 มี.ค. 64	75.7	88.2
	8 มิ.ย. 64	73.4	77.5
	14 ก.ย. 64	73.4	78.1
	8 ธ.ค. 64	76.1	88.1
	9 มี.ค. 65	74.5	78.9
	10 มิ.ย. 65	73.8	86.7
	5 ก.ย. 65	76.2	89.2
	12 ธ.ค. 65	80.9	83.9
	9 มี.ค. 66	75.5	84.4
	9 มิ.ย. 66	79.2	96.0
	8 ก.ย. 66	75.6	80.2
	4 ธ.ค. 66	78.4	89.5
มาตรฐาน		≤90.0	≤140.0

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

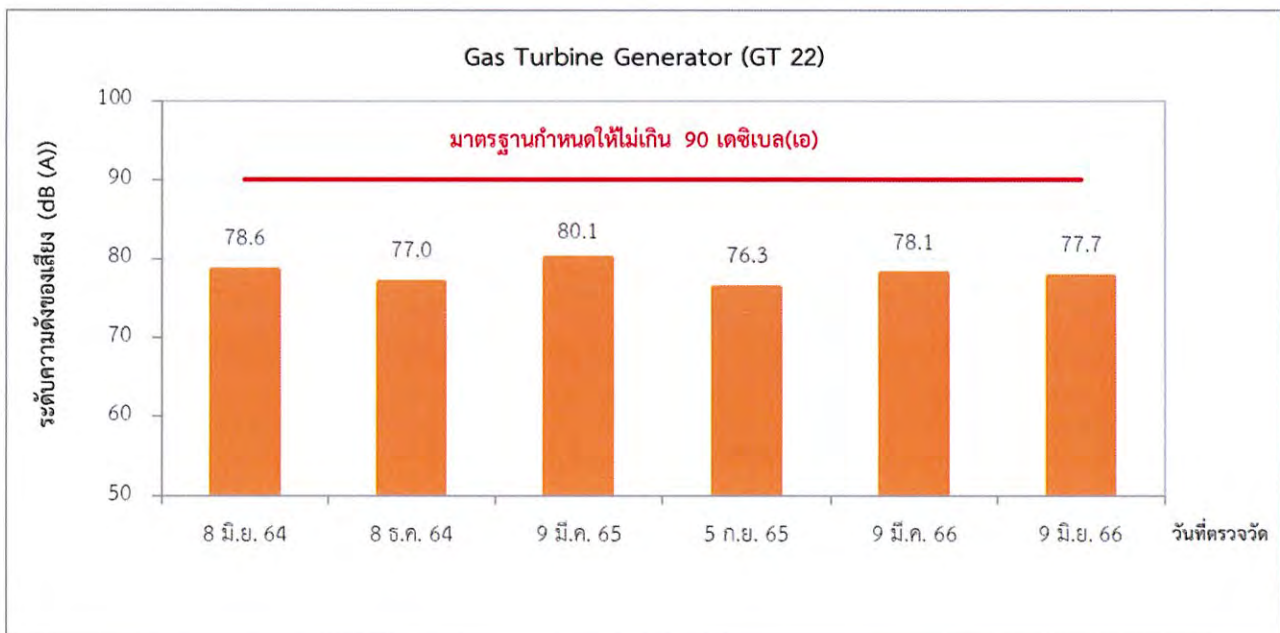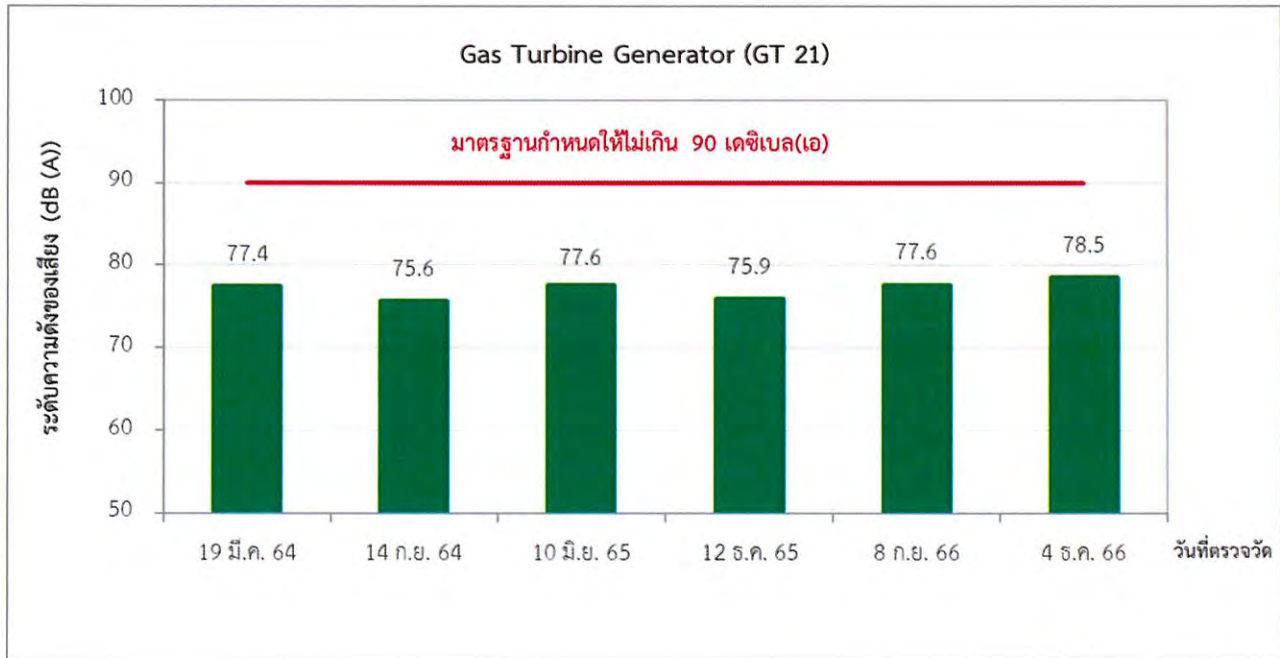

รูปที่ 3.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566



รูปที่ 3.4-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3) สรุป Noise Contour

มาตรการกำหนดให้จัดทำ Noise Contour บริเวณพื้นที่โครงการ หลังเปิดดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยโครงการได้จัดทำ Noise Contour ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังภาคผนวก ข-18

3.4.11 ระดับความร้อนในสถานประกอบการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ จำนวน 2 สถานี บริเวณหม้อไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ จำนวน 2 สถานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยจุดตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.4-6 และผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-21 สามารถสรุปได้ดังนี้

- บริเวณหม้อไอน้ำ พบว่า ผลการตรวจวัดความร้อนในที่ทำงาน มีค่าเท่ากับ 31.2 องศาเซลเซียส
- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พบว่า ผลการตรวจวัดความร้อนในที่ทำงาน มีค่าเท่ากับ 32.3 องศาเซลเซียส

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดมาตรฐานระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบูลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) ไว้ 3 ระดับ ตามความหนักเบาของงาน ได้แก่ ลักษณะงานเบา ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส ลักษณะงานปานกลาง ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส และลักษณะงานหนัก ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส จากการตรวจวัด พบว่า ทุกสถานที่ทำการตรวจวัดระดับความร้อน มีลักษณะงานเป็นงานเบา และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด





หม้อไอน้ำ



เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ภาพที่ 3.4-6 การตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย)
ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2566

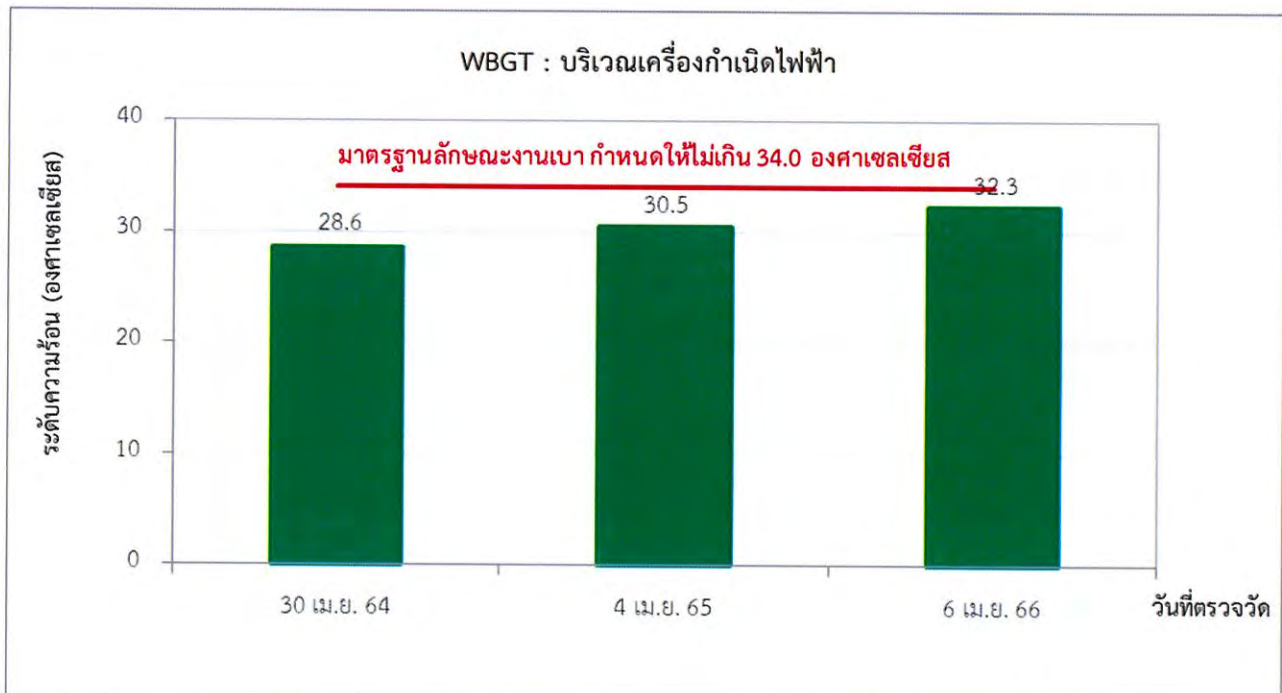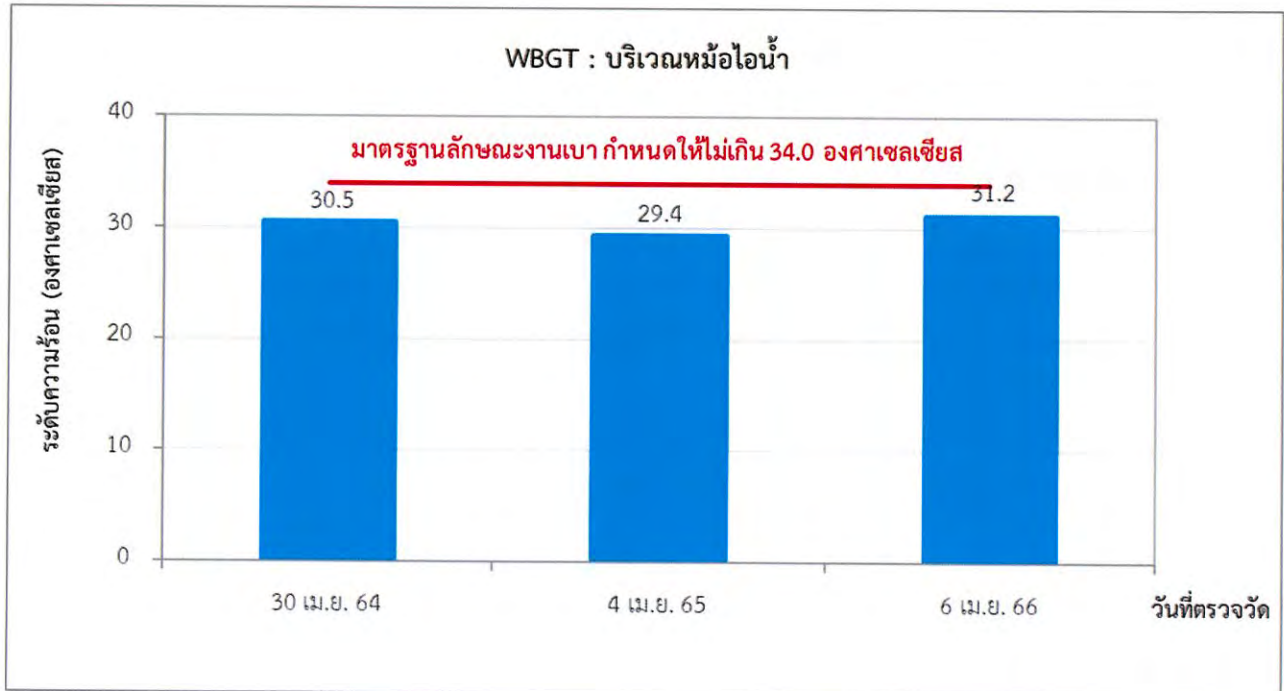

รูปที่ 3.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3.4.12 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ สภาพการเสียหาย/สูญเสีย และการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ทุกครั้งที่มียุบัติเหตุ

2) ผลการดำเนินการ

ทางโครงการมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ไม่พบอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน รายละเอียดตั้งเอกสารภาคผนวก ข-37

3.4.13 มวลชนสัมพันธ์

1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้บันทึกข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบอันเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ พร้อมสรุปผลการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ให้ทำการทบทวนถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำเป็นประจำ โดยรวบรวมสรุปปีละ 1 ครั้ง

- มาตรการกำหนดให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือน รวมทั้งผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ปีละ 1 ครั้ง

2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการบันทึกข้อร้องเรียนจากภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ มีการประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน หากพบเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินการโครงการจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไข จากการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่พบปัญหาข้อร้องเรียน

- โครงการมีการดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดตั้งเอกสารภาคผนวก ข-56

3.4.14 สุขภาพอนามัยของประชาชน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ และศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ ชุมชนโดยรอบสัมพันธ์กับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยรวบรวมสรุปปีละ 1 ครั้ง

2) ผลการดำเนินการ

ทางโครงการมีการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบและศึกษาวิเคราะห์ชุมชนโดยรอบสัมพันธ์กับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยในปี 2566 ได้ดำเนินการรวบรวมไว้แล้ว รายละเอียดดังเอกสารภาคผนวก ข-46

3.4.15 สุนทรียภาพ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ

2) ผลการดำเนินการ

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตและสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยได้ว่าจ้างบริษัท พี.เอส. การ์เด็น จำกัด ดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้เป็นประจำทุกวันจันทร์-วันเสาร์ รายละเอียดดังเอกสารภาคผนวก ข-55

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการดำเนินการครบถ้วนและได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาลูกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
1. คุณภาพอากาศ จากปล่อง	● ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 21	- NO _x as NO ₂ at 7% O ₂ - Total Loading - SO ₂ at 7% O ₂ - Total Loading - TSP at 7% O ₂ - Total Loading - CO at 7% O ₂	2 ครั้ง/ปี	- 20.3 ppm - 139 Kg/day - <0.5 ppm - <11.54 Kg/day - <0.5 mg/m ³ - <4.44 Kg/day - <1.0 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด
	● ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 22	- NO _x as NO ₂ at 7% O ₂ - Total Loading - SO ₂ at 7% O ₂ - Total Loading - TSP at 7% O ₂ - Total Loading - CO at 7% O ₂	2 ครั้ง/ปี	- 26.0 ppm - 211 Kg/day - <0.5 ppm - <11.92 Kg/day - <0.5 mg/m ³ - <4.58 Kg/day - <1.0 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
2.คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ	● โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร	- NO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 24 ชม. - TSP เฉลี่ย 24 ชม. - PM-10 เฉลี่ย 24 ชม.	2 ครั้ง/ปี	- 0.006-0.010 ppm - 0.004-0.006 ppm - 0.004-0.005 ppm - 0.058-0.284 mg/m ³ - 0.030-0.142 mg/m ³	- ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในช่วงวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่มี ค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยใกล้เคียงบริเวณจุดตรวจวัดมี การก่อสร้างถนนบริเวณด้านหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มายางพร ประกอบกับการสัญจร ของรถยนต์บริเวณดังกล่าวทำให้เกิด การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ในบรรยากาศได้
	● ชุมชนบ้านโป่งสะแก	- NO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 24 ชม. - TSP เฉลี่ย 24 ชม. - PM-10 เฉลี่ย 24 ชม.	2 ครั้ง/ปี	- 0.007-0.011 ppm - 0.005-0.007 ppm - 0.004-0.006 ppm - 0.034-0.087 mg/m ³ - 0.019-0.032 mg/m ³	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
2. คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ (ต่อ)	● โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี	- NO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 24 ชม. - TSP เฉลี่ย 24 ชม. - PM-10 เฉลี่ย 24 ชม.	2 ครั้ง/ปี	- 0.007-0.022 ppm - 0.003-0.006 ppm - 0.003-0.004 ppm - 0.052-0.122 mg/m ³ - 0.023-0.073 mg/m ³	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด
	● บ้านห้วยปราบ (ซอยข้างแก้ว)	- NO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 24 ชม. - TSP เฉลี่ย 24 ชม. - PM-10 เฉลี่ย 24 ชม.	2 ครั้ง/ปี	- 0.005-0.013 ppm - 0.003-0.004 ppm - 0.002-0.003 ppm - 0.030-0.125 mg/m ³ - 0.019-0.044 mg/m ³	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด
	● โรงเรียนบ้านภูไทร	- NO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 1 ชม. - SO ₂ เฉลี่ย 24 ชม. - TSP เฉลี่ย 24 ชม. - PM-10 เฉลี่ย 24 ชม.	2 ครั้ง/ปี	- 0.003-0.028 ppm - 0.004-0.005 ppm - 0.004 ppm ทุกวันที่ทำการตรวจวัด - 0.037-0.219 mg/m ³ - 0.014-0.077 mg/m ³	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
3. ความเร็วและทิศทางลม	● โรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร	- WS/WD	2 ครั้ง/ปี	- ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รองลงมาเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศเหนือ โดยมีความเร็วลม อยู่ในช่วง <0.3-5.5 เมตรต่อวินาที	-
	● ชุมชนบ้านโป่งสะแก	- WS/WD	2 ครั้ง/ปี	- ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ รองลงมาเป็นลมที่ พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนมาทางทิศเหนือ โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง <0.3-5.5 เมตรต่อวินาที	-
	● โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย ชลบุรี	- WS/WD	2 ครั้ง/ปี	- ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก่อนมาทางทิศเหนือ รองลงมาเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศ ตะวันออก โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง <0.3-5.5 เมตร ต่อวินาที	-
	● บ้านห้วยปราบ (ซอยข้างแก้ว)	- WS/WD	2 ครั้ง/ปี	- ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียง ใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อนมาทางทิศตะวันตก โดยมี ความเร็วลมอยู่ในช่วง <0.3-5.5 เมตรต่อวินาที	-
	● โรงเรียนบ้านคูไทร	- WS/WD	2 ครั้ง/ปี	- ส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนมาทางทิศใต้ รองลงมาเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศ เหนือ โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.3-5.5 เมตรต่อวินาที	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
3. คุณภาพน้ำทิ้ง	● บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ	- Flow rate - pH - Temperature - Free Chlorine - BOD ₅ - COD - TSS - TDS - Oil & Grease	1 ครั้ง/เดือน	- 0.024-0.025 m ³ /s - 7.8-8.2 - 31.0-32.4 °C - <0.1-0.4 mg/l - <2 mg/l ทุกครั้งที่ตรวจวัด - 34-64 mg/l - <5-21 mg/l - 1,520-2,240 mg/l - <3 mg/l ทุกครั้งที่ตรวจวัด	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
4. ระดับเสียงในบรรยากาศ	● รั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก	- Leq 24 hrs - Lmax - L90	2 ครั้ง/ปี	- 57.5-70.3 dB(A) - 88.4-112.5 dB(A) - 50.9-67.9 dB(A)	- ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้น ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ในช่วงวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด เนื่องจากในช่วงเวลา 16.00-21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการจัดกิจกรรมเล่นดนตรี และมีการใช้เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเสียง

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
4. ระดับเสียงใน บรรยากาศ (ต่อ)	● รพ.สต. มาบยางพร	- Leq 24 hrs - Lmax - L90	2 ครั้ง/ปี	- 53.6-60.3 dB(A) - 78.1-82.0 dB(A) - 40.6-60.3 dB(A)	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
5. ระดับเสียงรบกวน	● รพ.สต. มาบยางพร	- ค่าระดับการ รบกวน	2 ครั้ง/ปี	- -11.9 ถึง 29.7 dB(A)	- ระดับการรบกวนส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ในบางช่วงเวลาที่มีค่าระดับการรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด โดยช่วงเวลาที่ค่าระดับการรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลางวัน อาจมีสาเหตุมา จากกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงจุดตรวจวัด ประกอบ กับเสียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมในชุมชนและการคมนาคม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาก่อนดำเนินโครงการ ซึ่งจุด ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนตั้งอยู่บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร เป็นเขตชุมชนพักอาศัย มีหอพัก ร้านค้า ร้านอาหาร และตลาด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
6. การจัดการกากของเสีย	● ภายในพื้นที่โครงการ	- บันทึกปริมาณและ การจัดการกากของเสีย ของโครงการ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	- โครงการได้ทำการบันทึกปริมาณ และ การจัดการของเสียของโครงการ ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 3,610 กิโลกรัม ปริมาณของเสียทั่วไป 184,537 กิโลกรัม ปริมาณของเสียอันตราย 763 กิโลกรัม และปริมาณของเสียรีไซเคิล 1,081 กิโลกรัม รวมปริมาณของเสีย ทั้งหมด 189,991 กิโลกรัม	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์วกะเหรี่ยง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
7.สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	ชุมชนโดยรอบภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และครอบครัวชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อม	สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความความคิดเห็น ตัวแทน ครีวเรือน รวมทั้ง ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบครัวชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง/ปี	โครงการดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นตัวแทน ครีวเรือน รวมทั้ง ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ภายในามี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยดำเนินการสำรวจครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังเอกสาร ภาคผนวก ข-56	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
8. การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน	พนักงานใหม่ทุกคนและการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในการพิจารณาของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด	- ตรวจร่างกายทั่วไป - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - เอกซเรย์ปอด - สมรรถภาพการได้ยิน - สมรรถภาพการมองเห็น	1 ครั้ง/ปี	โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุก 1 ปี โดยดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานครั้งล่าสุดในวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย ฟรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก รายละเอียดดังเอกสารภาคผนวก ข-34	-
	Gas Turbine Generator	- Leq 8 hrs.	4 ครั้ง/ปี	- 77.6 และ 78.5 dB(A)	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
	Air Compressor (ABPR 2)	- Leq 8 hrs.	4 ครั้ง/ปี	- 78.6 และ 81.6 dB(A)	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
	Steam Turbine (ST 20)	- Leq 8 hrs.	4 ครั้ง/ปี	- 75.6 และ 78.4 dB(A)	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
	บริเวณพื้นที่โครงการ	- Noise Contour	หลังเปิดดำเนินโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง	- โครงการได้จัดทำ Noise Contour ครึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังภาคผนวก ข-18	-
9. ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน					

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
10. ระดับความร้อนใน สถานประกอบการ	● หม้อไอน้ำ	- WBGT	1 ครั้ง/ปี	- 31.2 °C	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด
	● เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- WBGT	1 ครั้ง/ปี	- 32.3 °C	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด
11. บันทึกสถิติการเกิด อุบัติเหตุ	● ภายในพื้นที่โครงการ	- สาเหตุ - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - ผลต่อสุขภาพพนักงาน - ความเสียหาย/สูญเสีย - การแก้ไขปัญหา	ทุกครั้งที่เกิด อุบัติเหตุ รายงานปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการ ทำงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ไม่พบอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน รายละเอียดเอกสารภาคผนวก ข-37	-
12. มลพิษสัมผัสพื้นที่	● ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนโดยรอบ	- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียน ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชน โดยรอบ รวมทั้ง การ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่ ได้รับ	1 ครั้ง/ปี	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่พบ ปัญหาร้องเรียน	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) ช่วงดำเนินการ
ของบริษัท อดตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
13. สุขภาพอนามัยของ ประชาชน	ชุมชนโดยรอบ สัมผัสพื้นที่กับจุด ตรวจวัดคุณภาพ อากาศ	รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณ ที่อาจได้รับผลกระทบและ ศึกษาวิเคราะห์	1 ครั้ง/ปี	โครงการมีการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน ที่อยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบและศึกษา วิเคราะห์ชุมชนโดยรอบสัมผัสพื้นที่กับจุดตรวจวัดคุณภาพ อากาศ โดยในปี 2566 ได้ดำเนินการรวบรวมไว้แล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารภาคผนวก ข-46	-
14. สุนทรียภาพ	พื้นที่โครงการ	ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของ โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่ เสมอ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและดูแล บำรุงรักษาด้านไม้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตและ สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยได้ว่าจ้างบริษัท พี.เอส. การ์ด จำกัด ดูแลรักษาสวนหญ้าและต้นไม้เป็นประจำทุกวัน จันทร์-วันเสาร์ รายละเอียดตั้งเอกสารภาคผนวก ข-55	-
