

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery)
ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd. Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: (662) 939-4370-72, Fax: (662) 513-4221, E-mail: sale@spscon.com., www.spscon.com



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 .


7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd. Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel: (662) 939-4370-72, Fax: (662) 513-4221, E-mail: sale@spscon.com, www.spscon.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงกลั่นน้ำมัน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มกราคม 2567

หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวธนกร มะลิสาร	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม	
นายพีระ เดชอุดม	นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล	นักวิชาการด้านคุณภาพอากาศ	
นางสาวเขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
นางสาวเกศรินทร์ ขวัญจิตร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

- | | |
|---|---|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) |
| 2. สถานที่ตั้ง | เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| 4. สถานที่ติดต่อ | เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-611333 |
| 5. จัดทำโดย | บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| | ครั้งที่ 1 หนังสือเห็นชอบเลขที่ วว 0804/13083 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 |
| | ครั้งที่ 2 หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.9/14418 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 |
| | ครั้งที่ 3 หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/14020 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 |
| | ครั้งที่ 4 หนังสือเห็นชอบเลขที่ รย 0034(2)/5499 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 |
| 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 | |
| 8. รายละเอียดโครงการ | แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานส่วนที่ 1 บทนำ |

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	IV
สารบัญภาพ	V
สารบัญตาราง	VII
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 สถานะโครงการปัจจุบัน	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3.1 ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.3.2 วัตถุประสงค์	1-6
1.3.3 ผลกระทบ	1-6
1.3.4 การขนส่งและการเก็บกักผลิตภัณฑ์	1-6
1.3.5 กระบวนการผลิต	1-7
1.3.6 ระบบสาธารณูปโภค (Utilities System)	1-9
1.3.7 มลพิษและการจัดการ	1-10
1.3.8 เสี่ยง	1-16
1.3.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1-16
1.3.10 การรับเรื่องร้องเรียน	1-17
1.3.11 พื้นที่สีเขียว	1-17
1.4 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-18
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 คุณภาพอากาศ	3-9
3.2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-9
3.2.1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	3-28
3.2.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs	3-41
3.2.3 คุณภาพน้ำ	3-42
3.2.3.1 คุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและฝนปนเปื้อน	3-42
3.2.3.2 คุณภาพน้ำฝน (Storm Water)	3-58
3.2.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-62
3.2.5 คุณภาพดิน	3-64
3.2.6 ระดับเสียงในบรรยากาศ	3-65
3.2.7 การจัดการกากของเสีย	3-71
3.2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-72
3.2.8.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน	3-72
3.2.8.1.1 ความร้อนในสถานที่ทำงาน	3-72
3.2.8.1.2 ระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน	3-74
3.2.8.1.3 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน	3-76
3.2.8.1.4 ระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน	3-81
3.2.8.1.5 จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง	3-83
3.2.8.1.6 คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน	3-84
3.2.9 สถิติอุบัติเหตุ	3-94
3.2.10 การตรวจสอบสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	3-94
3.2.11 สังคม-เศรษฐกิจ	3-95
3.2.11.1 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม	3-95
3.2.11.2 การประเมินผลสรุปการดำเนินงานแผนงานชุมชนสัมพันธ์	3-95
3.2.11.3 การบันทึกข้อร้องเรียน	3-96
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	4-1
4.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 2 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.3.1-1 ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.3.1-2 พื้นที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อโดยรอบ (ฝั่งทิศใต้ของสุขุมวิท)	1-4
1.3.1-3 พื้นที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อโดยรอบ (ฝั่งทิศเหนือของสุขุมวิท)	1-5
3.2.1.1-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วและทิศทางลม	3-11
3.2.1-1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-20
3.2.1.2-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	3-30
3.2.3-2-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-35
3.2.4.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-50
3.2.4.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ เขตประกอบการไออาร์พีซี (SRU CPI Outlet) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-54
3.2.4.2-1 กราฟสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน (Open Ditch) ก่อนระบายลงสู่รางระบาย น้ำฝนรวมของเขตประกอบการไออาร์พีซี ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-60
3.2.5-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน	3-66
3.2.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-70
3.2.8.1.3-1 แสดงตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน	3-77
3.2.8.1.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-80
3.2.8.1.6-1 แสดงตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ	3-85
3.2.8.1.6-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-92

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.2-1	ปล่อง ADU2, Heater A (41B001A) และ ADU2, Heater B (41B001B)	2-56
2.2-2	ปล่อง SRU1 Incinerator Stack	2-56
2.2-3	ระบบ CEMs ที่ปล่อง ADU2, Heater A (41B001A) และ ADU2, Heater B (41B001B)	2-56
2.2-4	ระบบ CEMs ที่ปล่อง SRU1 Incinerator	2-56
2.2-5	อุปกรณ์อะไหล่สำรองระบบกำจัดมลพิษและกักมันที่ฝ่าย Maintenance ส่วนกลาง	2-56
2.2-6	บ่อกักน้ำเสีย CPI (ADU)	2-57
2.2-7	บ่อกักน้ำเสีย IAF (ADU)	2-57
2.2-8	บ่อกักน้ำเสีย DAF (SRU)	2-57
2.2-9	บ่อตรวจสอบน้ำเสีย	2-57
2.2-10	รางระบายน้ำฝน	2-57
2.2-11	บ่อ Collection Pond	2-58
2.2-12	บ่อกักน้ำ Retention Pond	2-58
2.2-13	บ่อกักน้ำฝน	2-58
2.2-14	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ CPI ของโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP)	2-58
2.2-15	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2	2-58
2.2-16	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3	2-58
2.2-17	Slop Oil Tank เพื่อรวมคราบน้ำมันจากบ่อกักน้ำเสีย CPI/IAF	2-58
2.2-18	ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด	2-58
2.2-19	รถขนส่งกากของเสียที่มีการติดตั้งระบบ GPS	2-59
2.2-20	พื้นที่อาคารจัดเก็บกากของเสีย	2-59
2.2-21	Control Room	2-59
2.2-22	การติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียง (Silencer)	2-59
2.2-23	การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันริมรั้วเพื่อลดระดับเสียง	2-60
2.2-24	ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง	2-60
2.2-25	พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	2-60
2.2-26	พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ	2-60
2.2-27	ป้ายชื่อบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ บริเวณรถที่ใช้ในการขนส่ง	2-60
2.2-28	อุปกรณ์ดับเพลิง (ADU)	2-61
2.2-29	อุปกรณ์ดับเพลิง (SRU)	2-61
2.2-30	รถดับเพลิง	2-62
2.2-31	แหล่งน้ำดับ	2-62
2.2-32	H ₂ S Gas Detector	2-62
2.2-33	Hydrocarbon Gas Detector	2-62
2.2-34	ห้องพยาบาลและบุคลากรประจำห้องพยาบาล	2-63

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2.2-35	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	2-63
2.2-36	รถพยาบาล	2-63
2.2-37	ระบบ Distributed Control System	2-63
2.2-38	ระบบ Double Safety Relief Valve	2-63
2.2-39	ระบบ Inter Lock System	2-64
2.2-40	คันคอนกรีตรอบถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	2-64
2.2-41	ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC)	2-64
2.2-42	วาล์วระบายความดัน (Pressure Relief Valve)	2-64
2.2-43	พื้นที่สีเขียว	2-64
2.2-44	แผนผังพื้นที่สีเขียว	2-65
2.2-45	การเข้าติดตามตรวจสอบของ Third Party	2-65

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.4-1	รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1-19
1.4-2	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566	1-26
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566	2-2
3.2-1	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566	3-2
3.2.1.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-9
3.2.1.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-12
3.2.1.1-3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-14
3.2.1.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง	3-28
3.2.1.2-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	3-31
3.2.1.2-3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-33
3.2.3.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-42
3.2.3.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-44
3.2.3.1-3	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-46
3.2.3.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน	3-58
3.2.3.2-2	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน	3-59
3.2.3.2-3	สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-59
3.2.4.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์น้ำใต้ดิน	3-62
3.2.4.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-63
3.2.5.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพดิน	3-64
3.2.6-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ระดับเสียงในบรรยากาศ	3-65
3.2.6-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ	3-67
3.2.6-3	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-68
3.2.8.1.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน	3-72
3.2.8.1.1-2	ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน	3-73
3.2.8.1.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน	3-74
3.2.8.1.2-2	ผลระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน	3-75

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.2.8.1.3-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
3.2.8.1.3-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
3.2.8.1.3-3	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566
3.2.8.1.4-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ระดับเสียง ที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
3.2.8.1.4-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
3.2.8.1.6-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน
3.2.8.1.6-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน
3.2.8.1.6-3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery Plant) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน ข3-49-1/43 รย (เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)) (ตั้งเอกสารแนบที่ 1 ในภาคผนวกที่ 1) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีจุดประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของประเทศไทยต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีกำลังการผลิต 180,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งที่ผ่านมาโรงงานได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาด้านโครงการอุตสาหกรรม ดังนี้

1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery Plant) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)) ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ วว 0804/13083 20 พฤศจิกายน 2544

2) รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.9/14418 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพื่อรองรับโรงแยกคอนเดนเสทมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมด มีการโอนย้ายหน่วยเสริมการผลิตที่มีอยู่เดิม ได้แก่ หน่วย SWS2 ARU1 และ SRU1 ที่มีการเดินเครื่องเมื่อปี 2539 และการขอปรับลดค่าอัตราการระบายมลสารของโครงการ เพื่อใช้สำหรับโครงการพัฒนาอื่นๆ ในเขตประกอบการฯ นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการจัดการช่วงเวลา และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

3) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.8/14020 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

4) รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 3) ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือเลขที่ รย 0034(2)/5499 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยการทบทวนตำแหน่งปล่อง เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง ความเร็วก๊าซ และอัตราการไหลของก๊าซของเตาให้ความร้อนของหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (DHT) (เอกสารแนบที่ 2 ในภาคผนวกที่ 1)

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้โรงงานยึดถือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและความถี่ในการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ทางบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้เป็นรายงานครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

1.2 สถานะโครงการปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ มีปริมาณรวมประมาณ 7.02 ล้านตัน/ปี (21,286 ตัน/วัน) ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้ในกระบวนการผลิตนี้ ได้แก่ แนฟทา (Naphtha) และดีเซล (Diesel)

1.3 รายละเอียดโครงการ

1.3.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery Plant : REFY) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 225 ถนนสุขุมวิท หมู่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่โครงการทั้งหมด 165.025 ไร่ แสดงดังรูปที่ 1.3.1-1 ถึง 1.3.1-3 ประกอบด้วย 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ตั้งโครงการฝั่งทิศใต้ถนนสุขุมวิท และพื้นที่ตั้งโครงการฝั่งทิศเหนือสุขุมวิท โดยแต่ละส่วนของพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้

- **พื้นที่ตั้งโครงการฝั่งทิศใต้ถนนสุขุมวิท**

พื้นที่ส่วนการผลิตและอาคารควบคุม

ทิศเหนือ	ติดกับ	พื้นที่ว่างเปล่าของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทิศใต้	ติดกับ	พื้นที่โรงแยกคอนเดนเสทของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันออก	ติดกับ	พื้นที่คลังเก็บเม็ดพลาสติกของกลุ่มโรงงานไออาร์พีซี
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ถนนในเขตประกอบการฯ ซึ่งถัดไปเป็นคลองชลประทาน (คลองระบายน้ำสาย 2)

พื้นที่ส่วนลานถัง (บริเวณ Tank Farm 2)

ทิศเหนือ	ติดกับ	สถานที่จ่ายน้ำมัน (RYD)
ทิศใต้	ติดกับ	คลองกันน้ำ
ทิศตะวันออก	ติดกับ	พื้นที่ว่าง ถัดไปเป็นคลองชลประทาน (คลองระบายน้ำสาย 2)
ทิศตะวันตก	ติดกับ	แนวกันชนของเขตประกอบการฯ


พื้นที่ส่วนเสริมการผลิต


ทิศเหนือ	ติดกับ	บริษัท IRPC POLYOL
ทิศใต้	ติดกับ	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 (WWTP4)
ทิศตะวันออก	ติดกับ	โรงงานผลิตเอทิลีน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ถนนในเขตประกอบการฯ ซึ่งถัดไปเป็นคลองชลประทาน (คลองระบายน้ำสาย 2)

- **พื้นที่ตั้งโครงการฝั่งทิศเหนือสุขุมวิท**

พื้นที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Manufacturing Unit; HMU)

ทิศเหนือ	ติดกับ	โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP)
ทิศใต้	ติดกับ	โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP)
ทิศตะวันออก	ติดกับ	โรงงานผลิตเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (EBSM)
ทิศตะวันตก	ติดกับ	โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP)



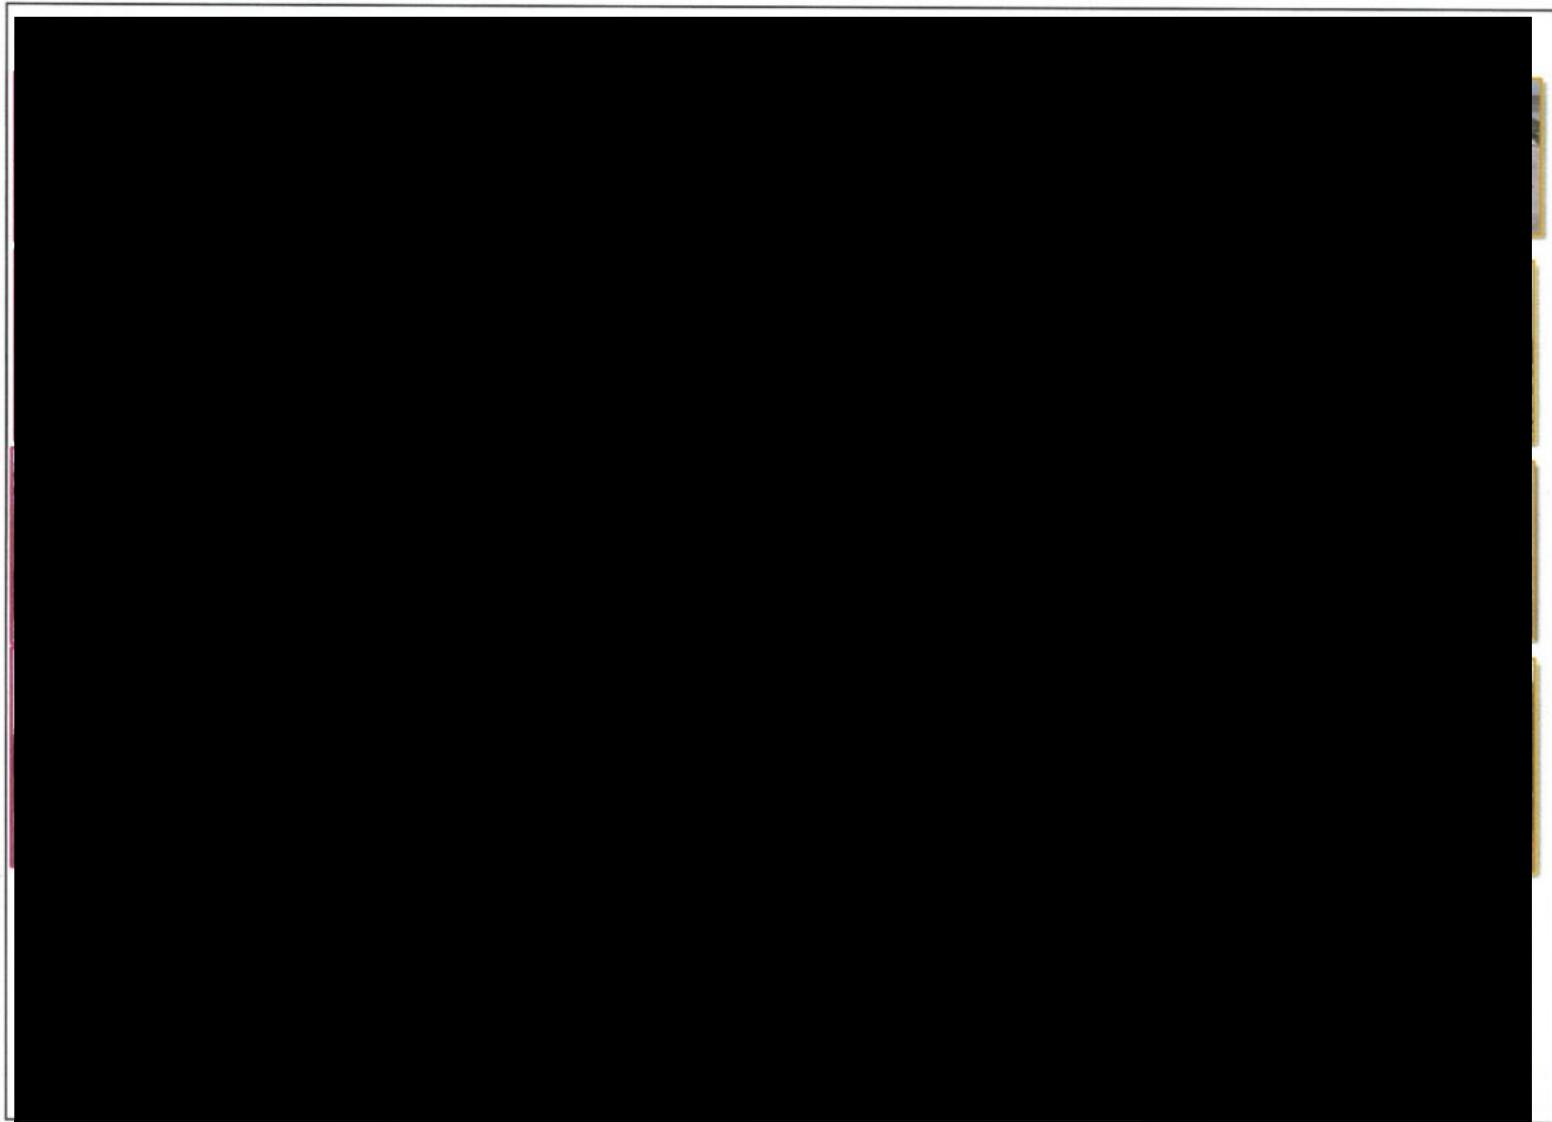

รูปที่ 1.3.1-2 พื้นที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อโดยรอบ (ฝั่งทิศใต้ถนนสุขุมวิท)



รูปที่ 1.3.1-3 พื้นที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อโดยรอบ (ฝั่งทิศเหนือถนนสุขุมวิท)

1.3.2 วัตถุดิบ

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ วัตถุดิบที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน คือ น้ำมันดิบ (Crude Oil) ชนิด Arabian Mixed (AM) โดยมีอัตราการใช้น้ำมันดิบเท่ากับ 165,000 บาร์เรล/วัน (22,975 ตัน/วัน) หรือ 7.5 ล้านตัน/ปี น้ำมันดีเซลจากโรงงานแยกคอนเดนเสท 1,974 ตัน/วัน โดยการขนส่งวัตถุดิบจะขนส่งผ่านทางเรือ IRPC เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยนำมาเก็บไว้ในส่วนถังกักเก็บน้ำมันดิบ (Crude Tank) ภายในส่วนลานถังที่ 2 (Tank Farm 2) และก๊าซไฮโดรเจน โดยจะรับก๊าซไฮโดรเจนบริสุทธิ์มาจากหน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) และจากโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่นผ่านทางท่อขนส่ง และวัตถุดิบที่ใช้ในหน่วยผลิต (HMU) ที่จะติดตั้งใหม่ คือ ก๊าซธรรมชาติ (หรือปิโตรเลียม) (ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU ไม่แล้วเสร็จ)

นอกจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยังมีการใช้สารเคมีอื่นๆ ได้แก่ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) สารลดแรงตึงผิว (D-emulsifier) สารป้องกันการกัดกร่อน (Corrosive) และสารยับยั้ง (Inhibitor) เป็นต้น

1.3.3 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ มีปริมาณรวมประมาณ 223,975 บาร์เรล/วัน (24,894 ตัน/วัน) หรือ 8.2 ล้านตัน/ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลัก โดยได้มาจากกระบวนการผลิตสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกเป็น 2 หน่วย คือ หน่วยกระบวนการกลั่นแบบบรรยากาศ (Atmospheric Distillation Unit : ADU2) ซึ่งใช้วิธีแยกความแตกต่างของจุดเดือดที่ความดันบรรยากาศทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ (Intermediate) ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม (LPG) แนฟทาเบา (Light Naphtha) แนฟทาหนัก (Heavy Naphtha) น้ำมันก๊าด (Kerosene) น้ำมันดีเซลเบา (Light Gas Oil) น้ำมันดีเซลหนัก (Heavy Gas Oil) และน้ำมันเตา (Atmospheric Residue: AR หรือ Atmospheric Tower Bottom : ATB) หน่วยกระบวนการ Diesel Unit (DHT) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ในกระบวนการผลิตนี้ ได้แก่ แนฟทา (Naphtha) และดีเซลมาตรฐานยูโร 4 (Diesel) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ กัมมะถันเหลว มีปริมาณรวมประมาณ 26,014.3 ตัน/ปี หรือ 9.4 ล้านตัน/ปี

โครงการดำเนินการผลิตวันละ 24 ชั่วโมง และมีจำนวนวันดำเนินการประมาณ 330 วัน/ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยส่วนใหญ่จะถูกขนถ่ายผ่านระบบท่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม IRPC และผลิตภัณฑ์บางส่วนจะจำหน่ายภายในประเทศ โดยนำไปเก็บกักไว้ในถังเก็บก่อนส่งจำหน่าย

1.3.4 การขนส่งและการเก็บกักผลิตภัณฑ์

การขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการจะถูกส่งผ่านระบบท่อมามากักเก็บไว้ที่ถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริเวณ Tank Farm 2 ของเขตประกอบการฯ โดยส่วนใหญ่จะถูกขนถ่ายผ่านระบบท่อไปยังโรงงานต่างๆ ภายในกลุ่มโออาร์พีซี และจะมีบางส่วนที่ส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศทั้งทางบกและทางเรือ โดยมีแนวท่อต่อจากถังเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละถังไปยังหัวจ่ายผลิตภัณฑ์ (Loading Arm) ณ สถานีขนถ่ายทางบก จากนั้นให้รถบรรทุกผลิตภัณฑ์ (Loading Truck) เข้ามารับผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ส่วนผลิต หรือลานถัง เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยในการควบคุม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการขนถ่ายทางบก ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม และดีเซล โดยมีอัตราการขนส่งประมาณ 10-12 เที่ยว/วัน และในการขนถ่ายทางเรือจะขนถ่ายจากบริเวณส่วนลานถังไปยังท่าเรือผ่านระบบท่อที่ใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์จากลานถังไปยังท่าเทียบเรือโออาร์พีซี โดยมีอัตราการขนส่งประมาณ 2-4 เที่ยว/เดือน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขนถ่ายผ่านทางเรือ ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันดีเซล และแนฟทา

1.3.5 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตโดยรวมเริ่มจากนำน้ำมันดิบ (Crude Oil) มากลั่นแยกในหอกลั่นแบบบรรยากาศ (ADU2) ผลิตภัณฑ์จากยอดหอกลั่น ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม (LPG) และแนฟทาเบา (LN) โดยก๊าซหุงต้มจะถูกส่งไปปรับปรุงคุณภาพยังหน่วยเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซ (GCU2) เพื่อแยกก๊าซเชื้อเพลิงออก จากนั้นจึงส่งต่อไปยังหน่วยกำจัดกำมะถันจากก๊าซหุงต้ม (LSU2) เพื่อกำจัดกำมะถัน และส่งต่อไปยังหน่วยเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซ (GCU2) เพื่อแยกก๊าซโพรเพน และบิวเทนออกจากกัน

ส่วนผลิตภัณฑ์ข้างหอกลั่นส่วนบน ได้แก่ แนฟทาหนัก (HN) แลแนฟทาเบา (LN) ที่ได้จากยอดหอกลั่น จะถูกส่งไปเป็นวัตถุดิบของโรงงานผลิตเอทิลีน หรือส่งไปยังหน่วย NHTU ผลิตภัณฑ์ข้างหอกลั่นส่วนบนอีกส่วนหนึ่ง คือน้ำมันก๊าด (Kerosene) จะส่งต่อไปยังหน่วยปรับปรุงน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าดด้วยไฮโดรเจนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ข้างหอกลั่นส่วนกลาง ได้แก่ น้ำมันดีเซลเบา (Light Gas Oil : LGO) และน้ำมันดีเซลหนัก (Heavy Gas Oil : HGO) จะถูกส่งไปยังหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (Diesel Hydro treating Unit : DHT) ซึ่งจากหน่วยนี้จะได้ แนฟทา (Naphtha) และน้ำมันดีเซล (High Speed Diesel) เป็นผลิตภัณฑ์และส่งไปเก็บกักในถังเก็บต่อไป

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกันหอกลั่น ได้แก่ Atmospheric Bottom Product (ATB) จะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นของโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น

ในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันของโครงการ ประกอบด้วยหน่วยผลิตต่างๆ ดังนี้

1) หน่วยหอกลั่นแบบบรรยากาศ (Atmospheric Distillation Unit : ADU2)

เป็นหน่วยการกลั่นแยกน้ำมันดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพในหน่วยผลิตอื่นที่อยู่ลำดับต่อไป โดยมีกำลังการผลิต 165,000 เป็น 180,000 บาร์เรล/วัน

2) หน่วยเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซ (Gas Concentration Unit : GCU2)

ผลิตภัณฑ์ LPG ที่ผ่านกระบวนการจากหน่วยปรับเสถียรแนฟทาใน ADU2 จะถูกส่งเข้าหอกลั่นแยกอีเทน (Deethanizer) โดยผลิตภัณฑ์ที่จะกลั่นแยกได้ทางยอดหอ คือ ก๊าซเชื้อเพลิง (Sour Fuel Gas) และได้ผลิตภัณฑ์ LPG ซึ่งเป็นของเหลวออกทางด้านล่างของหอกลั่น ผลิตภัณฑ์ LPG ที่ได้จะถูกป้อนเข้าสู่หน่วยกำจัดกำมะถันจากก๊าซหุงต้ม (LSU2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพจากนั้นจะส่งเข้าสู่หน่วยแยก LPG (LPG Splitter) ซึ่งจะได้โพรเพน (C₃ LPG) ออกทางด้านบน (ยอด) ของหอกลั่น และได้บิวเทน (C₄ LPG) ออกทางด้านล่างของหอกลั่น

3) หน่วยกำจัดกำมะถันจากก๊าซหุงต้ม (LPG Sweetening Unit : LSU2)

เป็นหน่วยกำจัดกำมะถันทั้งที่อยู่ในรูปของไฮโดรเจนซัลไฟด์ และเมอร์แคปแทนซัลเฟอร์ (Mercaptan Sulfur RSH) ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ LPG (Sour LPG)

4) หน่วยกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซล (Diesel Hydrotreating Unit : DHT)

หน้าที่หลักของหน่วยผลิตนี้ คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลที่ได้จากข้างหอกลั่นของหน่วย ADU2 โดยใช้ไฮโดรเจนให้ปริมาณของซัลเฟอร์และไนโตรเจนที่เจือปนอยู่มีค่าตรงตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด

5) หน่วยแยกก๊าซกรด (Sour Water Stripping Unit : SWS)

หน่วยแยกก๊าซกรดของโครงการ จำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยแยกก๊าซกรดที่ 2 (SWS 2), หน่วยแยกก๊าซกรดที่ 3 (SWS 3) และหน่วยแยกก๊าซกรดที่ 4 (SWS 4) ทำหน้าที่ในการกำจัดสารปนเปื้อน ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S), และแอมโมเนีย (NH_3) ในน้ำ (Sour Water) (ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้างหน่วยแยกก๊าซกรดที่ 4 (SWS 4) ไม่แล้วเสร็จ)

ตามปกติภายในเครื่องควบแน่นที่ติดตั้งอยู่บนยอดหอกลั่นต่างๆ ในกระบวนการผลิต สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

5.1) ส่วนที่อยู่สถานะก๊าซซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนที่ต้องการแยกออกจากยอดหอกลั่น ผลิตภัณฑ์ส่วนนี้จะถูกส่งต่อไปดำเนินการในหน่วยผลิตอื่นๆ ตามกระบวนการผลิต

5.2) ส่วนที่อยู่ในสถานะของเหลวที่ถูกควบแน่น ผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้จะถูกนำกลับไปกลั่นใหม่ (Reflux) ในหอกลั่นเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น

5.3) ส่วนที่อยู่ใต้ของเหลว ผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้จะเรียกว่า Sour Water ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนีย

น้ำปนเปื้อนก๊าซกรดดังกล่าวจะถูกรวบรวมและส่งไปกำจัดแยกสารปนเปื้อนออกที่หน่วยแยกก๊าซกรด โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการกำจัด ดังต่อไปนี้

น้ำปนเปื้อนก๊าซกรดทั้งหมดที่ได้รับจากกระบวนการผลิตจากโครงการต่างๆ ของโครงการนี้จะมาจากหน่วย ADU2, DHT, ARU2, SRU2, ARU1 และ SRU1 จะถูกส่งมารวบรวมไว้ที่ Sour Water Drum ก่อนป้อนเข้าสู่หอสกัดแยก (Sour Water Stripper) ที่อุณหภูมิ 91 องศาเซลเซียส ความดัน $1.6 \text{ kg/cm}^2\text{g}$ โดยน้ำปนเปื้อนจะถูกป้อนเข้าทางยอดหอ ในขณะที่ไอน้ำความดันต่ำจะถูกป้อนเข้าทางด้านล่างเพื่อให้เกิดการไหลสวนทางกัน ซึ่งจะทำให้เกิดขั้นตอนการสกัดแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนียออกมาในรูปของก๊าซกรด (Sour Gas or Acid Gas) ออกจากส่วนบนของหอก่อนส่งไปบำบัดยังหน่วย Sulfur Recovery Unit (SRU) ต่อไป ส่วนน้ำที่ไหลสวนทางผ่านไอน้ำจะกลายเป็น Stripped Water ออกจากกันหอ ก่อนนำส่วนหนึ่งกลับไปใช้ล้างเกลือใน Desalter ของ ADU2 และใช้ที่ Desalter ของโรงแยกคอนเดนเสท แล้วส่วนที่เหลือจะส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

6) หน่วย Amine Regeneration Unit : ARU

หน้าที่หลักของหน่วยผลิตนี้ คือ การบำบัดสารละลายเอมีนที่ผ่านการใช้งานในการดักจับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในหน่วยผลิตต่างๆ ของกระบวนการผลิตจากโครงการ (หน่วย GCU2, LSU2 และ DHT) จนกลายเป็นสารละลายเอมีนที่มีการปนเปื้อน (Rich Amine) ให้กลายเป็นสารละลายเอมีนบริสุทธิ์ (Lean Amine) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดย ARU1 และ ARU2 มีความสามารถในการรับ Rich Amine มาบำบัดได้หน่วยละ 172 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และประสิทธิภาพในการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เท่ากับร้อยละ 99 เช่นเดียวกันกับการดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน SWS เอมีนที่มีการปนเปื้อนจะถูกทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยการใช้ไอน้ำในการให้ความร้อนจนกระทั่งไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ละลายอยู่ระเหยกลายเป็นก๊าซออกทางด้านบนของ Regenerator ก๊าซที่มีการปนเปื้อนดังกล่าวจะถูกส่งไปบำบัดที่หน่วย Sulfur Recovery Unit ในขณะที่เอมีนที่ผ่านการบำบัด (Lean Amine) จะออกทางด้านล่างของหอก่อนถูกส่งกลับไปใช้งานในกระบวนการผลิตต่อไป

อย่างไรก็ตามโครงการจะขอยกเลิกหน่วยบำบัดสารละลายเอมีนปนเปื้อนหน่วยที่ 2 (ARU 2) ที่ขอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เดิม เนื่องจากหน่วยบำบัดสารละลายเอมีนปนเปื้อนหน่วยที่ 1 (ARU 1) ที่มีในปัจจุบันได้ออกแบบไว้ครอบคลุมกำลังการผลิต เพื่อรองรับปริมาณกำมะถันที่แยกได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำแล้ว

7) หน่วยนำกำมะถันกลับคืน (Sulfur Recovery Unit : SRU)

หน้าที่หลักของหน่วยผลิตนี้ คือ การทำหน้าที่ในการดึงกำมะถันออกจากก๊าซกรดที่ได้รับมาจาก SWS และ ARU โดยก๊าซกรดดังกล่าวจะถูกส่งเข้า Separator และ Scrubber Column เพื่อทำการแยกล้างปนเปื้อนปะปนก่อนที่จะส่งไปยัง Thermal Reactor เพื่อทำปฏิกิริยาการเผาไหม้ (Combustion) กับอากาศ (Claus Reaction)

8) หน่วยกำจัดก๊าซกรด (Tait Gas Treating Unit : TGTU)

หน้าที่หลักของหน่วยผลิตนี้ คือ การทำหน้าทีในการเปลี่ยนสารประกอบซัลเฟอร์ที่เหลือจาก SRU โดยการเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) เพื่อทำปฏิกิริยาให้อยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยก๊าซกรดดังกล่าวจะถูกส่งเข้า Absorber ซึ่งมีหน้าที่กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ใน Feed Gas หลังจากนั้น treated gas ที่ผ่านการบำบัดจะถูกส่งต่อไปยัง Incinerator ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศต่อไป

9) พื้นที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Manufacturing Unit; HMU)

ทำหน้าที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนบริสุทธิ์ (ตั้งแต่ร้อยละ 99.9 โดยปริมาตรขึ้นไป) ที่กำลังการผลิตสูงสุด 40,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (87.85 ตัน/วัน) เพื่อส่งไปใช้ที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (DHT) (หน่วยผลิตที่ขอติดตั้งเพิ่มเติมในการขยายกำลังการผลิตครั้งนี้) และส่งไปยังโรงแยกคอนเดนเสท และโรงงานแปรสภาพไบน์แก๊สออยล์ ในกรณีที่หน่วยผลิตไฮโดรเจนที่มีอยู่เกิดขัดข้อง (ส่งเฉพาะกรณีฉุกเฉินไม่ต่อเนื่อง) (ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU ไม่แล้วเสร็จ)

1.3.6 ระบบสาธารณูปโภค (Utilities System)

1) น้ำใช้ (Water Supply)

โครงการรับน้ำใช้มาจากระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของเขตประกอบการฯ ผ่านทางระบบท่อ โดยน้ำที่ใช้ในช่วงดำเนินการของโครงการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำใช้สำหรับพนักงาน (น้ำประปา) น้ำใช้ในกระบวนการผลิต (น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)), น้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ (Water) และน้ำป้อนหม้อผลิตไอน้ำ (Boiler Feed Water) น้ำใช้สำหรับระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (น้ำที่ผ่านการกรอง (Filtered Water)) และน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) และน้ำล้างพื้น (น้ำประปา)

2) ไอน้ำ

ไอน้ำที่จะใช้ในโครงการได้มาจากหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของ ไออาร์พีซี ซึ่งไอน้ำที่โครงการใช้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

2.1) ไอน้ำความดันปานกลาง (Medium Pressure Steam) มีความดัน 12 บาร์ ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ถูกนำไปใช้สำหรับหน่วยการผลิต ADU2 และ DHT

2.2) ไอน้ำความดันต่ำ (Low Pressure Steam) มีความดัน 3.5 บาร์ ที่อุณหภูมิ 177 องศาเซลเซียส ถูกนำไปใช้สำหรับหน่วยการผลิต ADU2, GCU2, DHT, ARU และ SWS

โดยไอน้ำที่ผ่านการใช้งานและกลั่นตัวเป็นน้ำแล้วจะถูกรวบรวมเก็บไว้ในถังเก็บ (Drum) เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพ โดยการกรองผ่านถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) กับแคทไอออน (Cation) และ Mixed Bed Filter จากนั้นนำไปลดปริมาณอากาศลงด้วย Deaerator ซึ่งน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วจะถูกส่งกลับไปผลิตเป็นไอน้ำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

3) ไฟฟ้า (Electricity)

โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในอัตราไม่เกินกว่า 15 เมกะวัตต์ โดยรับมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (PW & CHP) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 278 เมกะวัตต์ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของส่วนการผลิตของโครงการในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5 เมกะวัตต์ (ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้างหน่วยผลิต DHT ไม่แล้วเสร็จ)

นอกจากนี้ ทางไออาร์พีซี ยังเชื่อมโยงสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมี Uninterrupting Power System (UPS) สำหรับเก็บกำลังไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟฟ้าในกรณี Shut Down ซึ่งมีปริมาณเพียงพอที่สามารถให้ระบบทั้งหมด ใช้ได้นานอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

4) เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงที่ใช้ในการให้ความร้อนสำหรับโครงการ จะถูกใช้ใน Heater ของหน่วยการผลิต ADU2 และ DHT ได้แก่ Fuel Oil และ Fuel Gas ที่อัตราส่วน 60:40 ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ใน Incinerator ของหน่วยผลิต SRU จะใช้ Fuel Gas เป็นเชื้อเพลิง

5) ระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower)

โครงการจะทำการติดตั้งหอหล่อเย็น จำนวน 3 ชุด (Cell) ขนาดชุดละ 2,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่ว่างของเขตประกอบการฝั่งทิศใต้ถนนสุขุมวิท โดยมีปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียนในระบบจากหอหล่อเย็นที่ติดตั้งใหม่ประมาณ 126,152 ลูกบาศก์เมตร/วัน

6) ระบบไอน้ำ (Steam)

โครงการมีการใช้ระบบไอน้ำ 4 ระดับ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ ไอน้ำความดันสูงยิ่งยวด, ไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam), ไอน้ำระดับปานกลางและไอน้ำความดันต่ำ

7) ระบบไนโตรเจน (Nitrogen Distribution System)

โครงการจะใช้ในการรักษาความดันในภายในถังหรืออุปกรณ์ (N₂ Blanket) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองในถังออกสู่บรรยากาศ และใช้ขับไล่สารไฮโดรคาร์บอนในกระบวนการผลิตไปยังหอเผา (Flare)

8) ระบบอากาศสำหรับอุปกรณ์ควบคุม

โครงการจะรับระบบอากาศที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์มาจากระบบสารธรรมชาติของเขตประกอบการฯ เพื่อนำมาใช้งานที่หน่วยผลิตและหน่วยเสริมการผลิต

9) ระบบออกซิเจน

โครงการจะรับก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์จากระบบออกซิเจนของเขตประกอบการฯ ผ่านทางระบบท่อ

10) ระบบหอเผาทิ้ง

หอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดิน โครงการจะใช้ร่วมกันกับโรงงานแปรรูปสภาพคอนเดนเสท และโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออกไซด์ ซึ่งจะมีท่อแยกจากแต่ละโรงงานส่งมาที่หอเผา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Hydrocarbon Flare และ Acid Flare สำหรับหน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) จะใช้หอเผาทิ้งร่วมกับโครงการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) (ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU ไม่แล้วเสร็จ)

1.3.7 มลพิษและการจัดการ

1) มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ Heater ของหน่วยการผลิต ADU2, DHT และจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงใน Incinerator ของ SRU และ HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack) โดยแต่ละแหล่งก่อให้เกิดสารมลพิษ ดังนี้

- มลพิษทางอากาศในรูปของก๊าซ SO₂, NO_x และ TSP

1.1) Heater ของหน่วย ADU2 (Heater A&B) ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) โดยควบคุมให้มีความเข้มข้นที่ไม่เกิน 119 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 420 และ 180 หนึ่งส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ สารมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะถูกปล่อยผ่านปล่อง 2 ปล่อง โดยแต่ละปล่องมีความสูง 58 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.63 เมตร อัตราการไหลรวมของแต่ละปล่องเท่ากับ 60,753 ลูกบาศก์เมตรปกติ/ชั่วโมง และอุณหภูมิก๊าซที่ปล่อยออกเท่ากับ 253 องศาเซลเซียส

มีการติดตั้งระบบ CEMs เพื่อทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้น SO_2 , NO_x และฝุ่นละออง ที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งค่าระดับการเตือนไว้ที่ 2 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 (High) : $\text{SO}_2 = 192$ ppm, $\text{NO}_x = 160$ ppm, TSP = 92 mg/Nm^3 2) ระดับที่ 2 (High High) : $\text{SO}_2 = 420$ ppm, $\text{NO}_x = 180$ ppm, TSP = 115 mg/Nm^3 (หมายเหตุ : ความเข้มข้นของ SO_2 และ NO_x รายงานที่ 7% O_2)

1.2) Heater ของหน่วย DHT ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) โดยควบคุมให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 48 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 48 และ 30 หนึ่งส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ และถูกปล่อยผ่านปล่องที่มีความสูง 53 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.40 เมตร จำนวน 1 ปล่อง อัตราการไหลรวมเท่ากับ 46,433 ลูกบาศก์เมตรปกติ/ชั่วโมง และอุณหภูมิก๊าซที่ปล่อยออกเท่ากับ 189 องศาเซลเซียส

1.3) Incinerator ของหน่วย SRU ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) โดยควบคุมให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 494 และ 62 หนึ่งส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ สารมลพิษที่เกิดขึ้นจะถูกปล่อยผ่านปล่องที่ระดับความสูง 60 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.15 เมตร อุณหภูมิก๊าซที่ปล่อยออก 142 องศาเซลเซียส

มีการติดตั้งระบบ CEMs เพื่อทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้น SO_2 , NO_x และฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งค่าระดับการเตือนไว้ที่ 2 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 (High) : $\text{SO}_2 = 300$ ppm, $\text{NO}_x = 50$ ppm 2) ระดับที่ 2 (High High) : $\text{SO}_2 = 420$ ppm, $\text{NO}_x = 55$ ppm (หมายเหตุ: ความเข้มข้นของ SO_2 และ NO_x รายงานที่ 7% O_2)

1.4) HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack) ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) โดยควบคุมให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 20.6 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 39.6 และ 39.6 หนึ่งส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ สารมลพิษที่เกิดขึ้นจะถูกปล่อยผ่านปล่องที่ระดับความสูง 60 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.15 เมตร อุณหภูมิก๊าซที่ปล่อยออก 142 องศาเซลเซียส (ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU ไม่แล้วเสร็จ)

1.5) ในกรณีของก๊าซส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ ซึ่งถูกระบายจาก Safety Valve และ Control Valve ของเครื่องควบแน่นและหากลั่นต่างๆ อาทิ ในหน่วย ADU2 เป็นต้น ก๊าซส่วนเกินเหล่านี้จะถูกรวบรวมและส่งไปเผาที่หอเผา (Flare) ใหม่ที่มีความสูง 150 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 64 นิ้ว มีความสามารถในการเผา 1,000 ตัน/ชั่วโมง อยู่ในบริเวณลานถัง ซึ่งเป็นหอเผาที่ใช้ฐานร่วมกันกับโรงงานแยกคอนเดนเสทและดีซีซี โดยใช้ท่อแยกกันแต่มีโครงสร้างชุดเดียวกัน ในกรณีเหตุฉุกเฉิน นอกเหนือจากสารมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตตามปกติแล้วจะมีการระบายก๊าซจากอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในกรณี Shut Down ซึ่งก๊าซจากกระบวนการผลิตที่ยังค้างอยู่ในระบบจะถูกระบายออกจากวาล์วนิรภัยบนยอดหากลั่น เครื่องควบแน่น (Condenser) และ Knock Out Drum ต่างๆ ก๊าซที่ระบายออกในกรณีฉุกเฉินนี้ จะถูกรวบรวมแล้วส่งไปเผาที่หอเผาดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน

- มลพิษทางอากาศในรูปของไอโลหะหนัก

1.1) Heater ของหน่วย ADU2 (Heater A&B) ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) โดยในการเดินเครื่องปกติ ADU2 Heater จะมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงในรูปของ Fuel Gas (FG) : Fuel Oil-40 : 60 ซึ่งอัตราการใช้เชื้อเพลิงในรูป FG ในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 40 ตันต่อวัน โดยได้มาจากก๊าซ LPG จากกระบวนการผลิตของโครงการผสมกับ LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จากส่วนการผลิตต่างๆ โดยปริมาณปรอทใน FG ที่ใช้มีความเข้มข้นประมาณ 348.3 ส่วนในพันล้านส่วน และปริมาณตะกั่วใน FG ที่ใช้มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.0 หนึ่งส่วนในล้านส่วน

1.2) Heater ของหน่วย DHT ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) ในการเดินเครื่องปกติ DHT Heater มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงในรูปของ FG ประมาณ 1 ตันต่อวัน และ FO ประมาณ 47 ตันต่อวัน โดยเชื้อเพลิงในรูป FG ได้มาจาก LPG จากกระบวนการผลิตของโครงการผสมกับ LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จากส่วนการผลิตต่างๆ โดยปริมาณปรอทใน FG ที่ใช้มีค่าความเข้มข้นประมาณ 348.3 ส่วนในพันล้านส่วน และปริมาณตะกั่วใน FG ที่ใช้มีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 0.0 หนึ่งในล้านส่วน

1.3) Incinerator ของหน่วย SRU ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) ในการเดินเครื่องปกติ SRU1 Incinerator และ SRU2 Incinerator จะมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงในรูปของ FG รวมประมาณ 21 ตันต่อวัน โดยได้มาจากก๊าซ LPG จากกระบวนการผลิตของโครงการผสมกับ LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จากส่วนการผลิตต่างๆ โดยปริมาณปรอทใน FG ที่ใช้มีค่าความเข้มข้นประมาณ 348.3 ส่วนในพันล้านส่วน และปริมาณตะกั่วใน FG ที่ใช้มีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 0.0 หนึ่งในล้านส่วน

- มลพิษทางอากาศจากสารอินทรีย์

มลพิษทางอากาศในรูปของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สามารถเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การทำงานของส่วนเสริมการผลิต และการกักเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการ ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึง ปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เกิดขึ้น โครงการจึงได้มีการจัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดสารอินทรีย์ (VOC Inventory)

ในพื้นที่ส่วนการผลิต ส่วนเสริมการผลิต และส่วนลานถัง โดยมีการพิจารณาครอบคลุม 6 แหล่งกำเนิด หลักๆ คือ จากการรั่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitives) จากการเผาไหม้ (Combustion) จากระบบเผาทิ้ง (Flare) จากการขนถ่ายเพื่อการค้า (Transportation and Marketing) จากถังเก็บสารเคมี (Storage Tank) และ จากระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant)

2) มลพิษทางน้ำ

2.1) แหล่งกำเนิดน้ำเสียและปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ น้ำเสียจากการอุปโภค ของพนักงานและอาคารสำนักงาน น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต และน้ำฝนปนเปื้อนภายในพื้นที่ โครงการ ซึ่งปริมาณและวิธีจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้

(2.1.1) น้ำเสียจากการอุปโภคของพนักงานและอาคารสำนักงาน

น้ำเสียจากการอุปโภคของพนักงานและอาคารสำนักงาน มีปริมาณรวมประมาณ 1,568 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยการจัดการน้ำเสียจากการอุปโภคของพนักงานและอาคารสำนักงานภายหลังขยายฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามที่ตั้งของโครงการ ดังนี้

- น้ำเสียจากการอุปโภคของพนักงานและอาคารสำนักงานฝั่งทิศใต้ถนนสุขุมวิท จะทำการบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs) ก่อนส่งไปบ่อบำบัด และส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง แห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

- น้ำเสียจากการอุปโภคของพนักงานและอาคารสำนักงานฝั่งเหนือถนนสุขุมวิท (พื้นที่ ติดตั้งหน่วยผลิตไฮโดรเจน) จะส่งเข้าถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs) และระบบบำบัดแบบ CPI ของโรงงานผลิตน้ำมัน หล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) เพื่อทำการบำบัดขั้นต้นก่อนส่งน้ำเสียดังกล่าวไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง แห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

(2.1.2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ฝั่งทิศใต้ถนนสุขุมวิท) ได้แก่

- น้ำเสียที่เกิดแบบต่อเนื่อง

- น้ำปนเปื้อนก๊าซกรด (Sour Water) จากหน่วย ADU2, ARU, SRU และ DHT จะถูกส่งไปที่หน่วย SWS เพื่อกำจัด Sour Gas (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) และแอมโมเนีย (NH_3) โดยน้ำ Sour Water ที่ผ่านการกำจัดก๊าซกรดแล้ว (Stripped Water) จะส่งไปกลับใช้งานในโครงการ ได้แก่ ส่งกลับไปใช้ในการล้างเกลือที่ Desalter Unit ของหน่วย ADU2 และส่งไปใช้ที่หน่วย DHT

- น้ำที่ผ่านการบำบัด (Stripped Water) ส่งกลับไปใช้ในหน่วย ADU2 (Desalter) , หน่วย DHT, โรงงานคอนเดนเสท, โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ

- น้ำระบายทิ้งจากหอผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown)

สำหรับน้ำทิ้งที่เกิดจากการหล่อเย็นเครื่องจักรในรูปของ Cooling Water Blowdown ยังไม่มีน้ำส่วนนี้เกิดขึ้น เนื่องจากโครงการไม่ได้มีหอหล่อเย็น โดยโครงการจะรับน้ำหล่อเย็น (Cooling Water Supply) มาจากเขตประกอบการฯ มาใช้งานและส่งน้ำ (Cooling Water Return) กลับไปยังเขตประกอบการฯ โครงการจะทำการติดตั้งหอหล่อเย็นเพิ่มอีกจำนวน 3 ชุด ซึ่งจะส่งผลให้มีการระบายน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นของโครงการ และจะรวบรวมลงบ่อพัก (Sump) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ กรณีที่คุณภาพน้ำทิ้ง (ค่า TDS) มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดจะรวบรวมไปยังระบบระบายน้ำฝนที่ไม่มีการปนเปื้อน แล้วรวบรวมลงสู่บ่อรองรับของเขตประกอบการฯ (Collection Pond) และส่งต่อไปยังบ่อพัก (Retention Pond) ก่อนระบายลงสู่คลองกันปึกที่เชื่อมต่อกับทะเลต่อไป กรณีคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานกำหนดจะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

- Desalter Wastewater จากหน่วย ADU2 ที่มีการปนเปื้อนน้ำมันและเกลือบางส่วน มีปริมาณ 1,456.8 ลูกบาศก์เมตร วัน ซึ่งจะถูกระบายเข้าสู่ระบบบำบัดแบบ และ IAF เพื่อแยกสารแขวนลอยและน้ำมันออกก่อนส่งเข้าสู่บ่อตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมัน ซึ่งถ้ามีปริมาณน้ำมันมากกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งกลับไปบ่อบำบัดน้ำและน้ำมัน (บ่อ ADU2) เพื่อทำการบำบัด ก่อนส่งน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ต่อไป โดยน้ำมันที่แยกได้จะส่งไปเก็บไว้ที่ Slop Oil Tank เพื่อนำไปกลั่นใหม่ต่อไป

- น้ำเสียที่เกิดแบบไม่ต่อเนื่อง

- น้ำล้างย้อน (Back Wash) ระบบทรายกรองที่ใช้ในหน่วย LSU2 จะถูกส่งไปบำบัดโดยระบบบำบัดแบบ IAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

- น้ำล้างย้อนหอหล่อเย็น (Cooling Water Backwash) ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝน แล้วลงสู่บ่อรองรับของเขตประกอบการฯ (Collection Pond) และส่งต่อไปยังบ่อพัก (Retention Pond) จำนวน 4 บ่อต่อเนื่องกัน ก่อนระบายลงสู่คลองกันปึกที่เชื่อมต่อกับทะเลต่อไป

- น้ำล้างย้อน (Back Wash) ระบบทรายกรองที่ใช้ในหน่วย LSU2 จะถูกส่งไปบำบัดโดยระบบบำบัดแบบ IAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

- น้ำเสียจากกิจกรรมการล้างพื้น เป็นน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน (Oily Water) จะรวบรวมลงสู่บ่อบำบัดน้ำและน้ำมันของแต่ละพื้นที่เพื่อทำการบำบัดขั้นต้นก่อนส่งไปที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ฝั่งทิศเหนือถนนสุขุมวิท) (พื้นที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน) ได้แก่

- น้ำเสียที่เกิดแบบต่อเนื่อง
 - น้ำระบายทิ้งจากระบบผลิตไอน้ำ (Boiler Blowdown) จะถูกส่งเข้าสู่บ่อ Blowdown Water Sump ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ
- น้ำเสียที่เกิดแบบไม่ต่อเนื่อง
 - น้ำล้างพื้นจากหน่วย HMU จะรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมันก่อนส่งไปยังบ่อดักน้ำมันและระบบบำบัดแบบ CPI ของโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) เพื่อทำการบำบัดขั้นต้นก่อนส่งน้ำเสียดังกล่าวไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป (ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU ไม่แล้วเสร็จ)

(2.1.3) น้ำฝนปนเปื้อน

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ฝั่งทิศใต้ถนนสุขุมวิท) ได้แก่ หน่วย SWS2&3&4, ARUI, SRU1 และ TGTU โครงการจะรวบรวมไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมัน ก่อนเข้าสู่ระบบ CPI และ DAF ตามลำดับ และเข้าสู่บ่อตรวจสอบแล้วจึงระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ฝั่งทิศเหนือถนนสุขุมวิท) น้ำฝนปนเปื้อน จะถูกระบายลงบ่อรับน้ำฝนในพื้นที่ ก่อนส่งเข้าบ่อดักน้ำมันและระบบบำบัดแบบ CPI ของโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) เพื่อทำการบำบัดเบื้องต้น และส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

2.2) ระบบบำบัดน้ำเสียและความสามารถในการรองรับ

2.2.1) Sour Water Stripping Unit (SWS)

ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสีย (Sour Water) ที่มี HS และ NH_3 ผสมอยู่ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ โดยใช้ไอน้ำเพื่อแยก H_2S และ NH_4 ออกมาในรูปก๊าซ หน่วยดังกล่าวประกอบด้วยหอดัง (Packed Column) และถังพักน้ำ (Storage Tank)

ลักษณะการทำงานของ Sour Water Stripping Unit โดยการผ่านไอน้ำเข้าทางด้านล่างของหอดัง ส่วนน้ำเสีย (Sour Water) จะไหลเข้าด้านบนของหอดังภายในหอดังจะมี Packings ต่างๆ บรรจุอยู่เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัส และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกำจัด H_2S และ NH_3 ในสถานะที่เป็นของเหลว (Liquid Phase) จะทำปฏิกิริยากันได้ สารประกอบ Ammonium hydrosulphide (NH_4SH) ซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีเป็นสารละลายเกลืออยู่กันถึง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดส่วนนี้ (Stripping Water) จะระบายเข้าสู่ Desalter Unit และ CPI Unit เพื่อแยกเกลือและน้ำมันออกอีกครั้ง โดยการทำงานของ Desalter จะแยกเกลือออกโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Electrostatic) ส่วน H_2S และ NH_3 ในสถานะที่เป็นก๊าซ (Sour Gas) จะถูกระบายออกทางด้านบนของหอดัง

2.2.2) Corrugated Plate Interception (CPI)

เป็นหน่วยบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมันผสมอยู่ ทำหน้าที่แยกน้ำมัน (Oil) และสารแขวนลอย (Suspended Solids) ออกจากน้ำทิ้ง โดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นของน้ำมันและน้ำ น้ำทิ้งที่ออกจาก CPI จะ ส่งเข้า IAF ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป ส่วนเศษน้ำมัน (Stop Oil) ที่แยกออกมาจะเก็บรวบรวมไว้ในถัง Stop Oil Tank เพื่อนำกลับไปกลั่นใหม่

2.2.3) Induced Air Floatation Separators (IAF)

เป็นระบบที่ใช้แยกสารแขวนลอย (Suspended Solid) และน้ำมัน (Oil) ออกจากน้ำที่ผ่านระบบ CPI ของส่วนการผลิต โดยการผสมน้ำกับฟองอากาศที่มีขนาดประมาณ 700 ถึง 1,500 ไมครอน โดยการใช้อุปกรณ์สร้างฟองอากาศ เมื่อฟองอากาศลอยตัวขึ้นมาจะพาสารแขวนลอยที่สัมผัสกับอากาศขึ้นสู่ผิวน้ำ โดยระบบ IAF ใช้หลักการเหนี่ยวนำฟองอากาศขึ้นมา ซึ่งนิยมใช้กับสารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) ต่ำ หรือใช้แยกพวกไขมัน น้ำมัน ออกจากน้ำทั้ง ใช้หลักการอัดอากาศ

2.2.4) Dissolved Air Floation Separator (DAF)

เป็นระบบที่ใช้แยกสารแขวนลอย (Suspended Solid) และน้ำมัน (Oil) ออกจากน้ำผ่านระบบ CPI ของส่วนเสริมการผลิต โดยการผสมน้ำกับฟองอากาศที่มีขนาดประมาณ 30 ถึง 100 ไมครอน ที่เกิดจากการอัดอากาศ เมื่อฟองอากาศลอยตัวขึ้นมาจะพาสารแขวนลอยที่สัมผัสกับอากาศขึ้นสู่ผิวน้ำ โดยระบบ DAF ใช้หลักการเหนี่ยวนำฟองอากาศขึ้นมา ซึ่งนิยมใช้กับสารแขวนลอยที่ตกตะกอนยากมีความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) ต่ำ หรือใช้แยกพวกไขมัน น้ำมัน ออกจากน้ำทั้ง ใช้หลักการอัดอากาศ

3) กากของเสีย

กากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากสำนักงาน กากของเสียจากกระบวนการผลิตและกากตะกอน/คราบน้ำมันจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของปริมาณและการจัดการ ดังนี้

3.1) ขยะมูลฝอยจากอาคารสำนักงาน

มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากพนักงานจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในถังขนาด 240 ลิตร เพื่อรอรถเก็บมูลฝอยของทางหน่วยงานท้องถิ่นมารับไปกำจัดต่อไป

3.2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต/เสริมการผลิต

กากของเสียจากกระบวนการผลิต/เสริมการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย ตัวเร่งปฏิกิริยาเสื่อมสภาพ Activated Carbon เสื่อมสภาพ Spent Caustic และทรายกองที่ใช้ในหน่วย LSU2 โดยมีรายละเอียดของปริมาณและการจัดการดังนี้

- ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพจากหน่วย DHT (Co-Mo บน Al_2O_3 และ NiMox/ Al_2O_3) ทำการรวบรวมใส่ Drum ที่ปิดมิดชิด จากหน่วย SRU (Activated Alumina) และหน่วย HMU (CoMox or NiMox, Pre-Reforming and Steam ประเภทนิเกิล และ (CuO/ZnO) ทำการรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดแล้วส่งไปกำจัดยังบริษัทที่รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการหรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานปูนซีเมนต์ต่อไป

- Activated Carbon ที่เสื่อมสภาพจากหน่วย ARU และ HMU (ZnO , Na_2O และสารดูดซับประเภทโมเลกุลาทิป) ทำการรวบรวมใส่ Jumbo Bag แล้วส่งไปกำจัดยังบริษัทที่รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ

- Spent Caustic จาก Caustic Prewash Tower และ Extractor ของหน่วย LSU2 ทำการรวบรวมแล้วส่งกำจัดภายนอกโดยหน่วยงานที่รับอนุญาตจากทางราชการโดยไม่มีการเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่โครงการ

- ทรายกรองที่ใช้ในหน่วย LSU2 ทำการรวบรวมใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วส่งกำจัดภายนอกโดยหน่วยงานที่รับอนุญาตจากทางราชการโดยไม่มีการเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่โครงการ

3.3) กากตะกอนและคราบน้ำมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย

คราบน้ำมันจากบ่อแยกน้ำและน้ำมัน และจาก CPI และ IAF ทำการรวบรวมใส่ Stop Oil Tank ขนาด 4,100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง เพื่อนำกลับไปทำการกลั่นใหม่ สำหรับกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะอยู่ภายใต้การดำเนินการของเขตประกอบการฯ

1.3.8 เสียง

แหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดระดับเสียงดังที่สำคัญของโครงการ ได้แก่ การทำงานของ Pump และ Compressor ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังประมาณ 85-115 dB (A) ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากแหล่งกำเนิด อย่างไรก็ตามโครงการมีการปิดครอบอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการลดระดับเสียงที่จะเกิดขึ้น สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น Ear Plug และ Ear Muff ให้แก่พนักงาน รวมทั้งมีการตรวจสภาพการทำงาน of อุปกรณ์ ดังกล่าวเป็นอย่างดีสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับเสียงเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักร

นอกจากนี้ทางโครงการได้การจัดทำแผนผังระดับความดังของเสียง (Noise Contour) และทบทวนทุกๆ 3 ปี และตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน เพื่อนำการดำเนินงานเหล่านี้มาจัดทำ "มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน" เพื่อลดโอกาสที่พนักงานจะสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องจากการทำงาน

1.3.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วไป

โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment ; PPE) ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ โดยมีการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตราย เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี (รวมทั้งพนักงานที่เข้าใหม่ และพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง) พร้อมทั้งมีสถานพยาบาลเบื้องต้นภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งรถสำรองสำหรับรับส่ง ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลได้ทันที

2) การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ โดยมีการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตราย เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

3) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

บริษัทฯ มีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินส่วนกลางขึ้นเพื่อให้เป็นเกณฑ์เดียวกันสำหรับโรงงานต่างๆ ในเครือของบริษัทฯ โดยแบ่งแผนปฏิบัติการฉุกเฉินตามความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

3.1) ระดับ 1A (เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน) หมายถึง เหตุภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี สามารถควบคุมได้ด้วยบุคลากรและอุปกรณ์การระงับเหตุภาวะฉุกเฉินภายในพื้นที่ หรือทีมระงับเหตุภาวะฉุกเฉินโรงงาน และทีมสนับสนุนของโรงงานบางส่วน

3.2) ระดับ 1B (เหตุฉุกเฉินระดับเขตประกอบการฯ) หมายถึง เหตุภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ซึ่งผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุในขณะนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงไม่สามารถระงับเหตุได้โดยพื้นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมระงับเหตุภาวะฉุกเฉินโรงงาน และทีมสนับสนุนของโรงงานเต็มรูปแบบ

3.3) ระดับ 3 (เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด) หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถระงับเหตุได้โดยทรัพยากรของเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกระดับจังหวัดระยอง

3.4) ระดับ 4 (เหตุฉุกเฉินระดับประเทศ/ต่างประเทศ) หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถระงับเหตุได้โดยทรัพยากรของเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี และหน่วยงานภายนอกระดับ จังหวัดระยอง โดยเหตุฉุกเฉินมีโอกาสขยายใหญ่ ซึ่งต้องระดมความช่วยเหลือทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ระดับประเทศ/ต่างประเทศ

4) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

4.1) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน

โครงการติดตั้งระบบเหตุแจ้งฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซธรรมชาติรั่วไหล และอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย หากเกิดเพลิงไหม้หรือก๊าซรั่วไหลบริเวณใด อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซธรรมชาติแบบอัตโนมัติบริเวณนั้นจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม และห้องควบคุมส่วนกลาง เพื่อให้ดำเนินการแจ้งเหตุเตือนภัยทำงาน ทั้งนี้ เพื่ออพยพพนักงานออกจากพื้นที่เพลิงไหม้ได้อย่างทันที่ พร้อมทั้งสั่งให้หน่วยผจญเพลิงเข้าระงับเหตุโดยทันที

4.2) ระบบระงับอัคคีภัย

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ ของโครงการอ้างอิงตามมาตรฐานของ National Fire Protection Authority (NFPA) เป็นหลัก โดยที่ระบบระงับอัคคีภัยต่างๆ ที่ติดตั้งในโครงการ มีดังนี้

- วาล์วน้ำดับเพลิงระบบเปิดแบบอัตโนมัติ จำนวน 17 ชุด
- วาล์วน้ำดับเพลิงระบบเปิดแบบ Manual จำนวน 19 ชุด
- หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Water Monitor) จำนวน 40 ชุด
- ถังโฟมดับเพลิงเคลื่อนที่ จำนวน 14 ชุด
- ถังดับเพลิงชนิดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 34 ชุด
- ถังดับเพลิงเคมี จำนวน 125 ชุด
- ระบบดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด
- ระบบดับเพลิงก๊าซเฉื่อย จำนวน 4 ชุด
- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ จำนวน 73 ชุด

5) ระบบการตรวจจับก๊าซ (Gas Detector)

โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดก๊าซบริเวณต่างๆ โดยรอบพื้นที่ส่วนการผลิต และส่วนเสริมการผลิต โดยอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) และอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซที่เผาไหม้ได้ (Combustible Gas) ซึ่งอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) จะมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของโครงการ ทั้งพื้นที่ส่วนการผลิตและพื้นที่ส่วนเสริมการผลิต เพื่อตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (H_2S)

1.3.10 การรับเรื่องร้องเรียน

โครงการได้ตระหนักถึงเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกผ่านทางศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center : ECC) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับผลกระทบจากโครงการได้แจ้งข้อร้องเรียนไปยังเขตประกอบการฯ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผลกระทบที่เกิดขึ้น สำหรับแนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้หลายวิธี เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ การแจ้งผ่านพนักงานฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ พื้นที่ การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น

1.3.11 พื้นที่สีเขียว

การจัดพื้นที่สีเขียวของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทไม้โตเร็ว เช่น ต้นสน พืชตระกูลปาล์มและหมาก ยี่โถ กุหลาบเตา ฯลฯ และจัดสวนหย่อมตามมุมตึกและโดยรอบโรงงานตามความเหมาะสม โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ

1.4 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการศึกษาโครงการ สามารถแบ่งได้ดังนี้

- การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทที่ปรึกษา จะทำการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
- การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดและผลการตรวจวัด ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ แสดง ได้ดังตารางที่ 1.4-1
- การจัดทำรายงาน ทางบริษัทที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง และนำเสนอรายงานต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป แสดงได้ดัง ตารางที่ 1.4-2

ตารางที่ 1.4-1 รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	หมายเหตุ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 	ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนวัดปลวกเหตุ - โรงเรียนบ้านหนองจอก (เดิมชื่อโรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก - โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง - โรงเรียนวัดเขาพระบาท 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง ครึ่งละ 7 วันต่อเนื่อง โดยตรวจวัดในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 	-
	<ul style="list-style-type: none"> - เบนซีน (Benzene) 	ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนวัดปลวกเหตุ - โรงเรียนบ้านหนองจอก (เดิมชื่อโรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือน (24 ชั่วโมงต่อเนื่อง) 	ยังไม่มีผลการดำเนินการตรวจวัดเนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างของหน่วยผลิตที่เกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จ
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) - ฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ตะกั่ว (Pb) -ปรอท (Hg) 	<ul style="list-style-type: none"> - ADU2 Heater (A&B) - DHT Heater - SRU Incinerator Stack - HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 	สำหรับ DHT Heater และ HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack) ยังไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs	<ul style="list-style-type: none"> - CEMs 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ CEMs ของ ADU2 Heater A, ADU2 Heater B และ SRU Incinerator 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง 	-

ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	หมายเหตุ
2. คุณภาพน้ำ 2.1 น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำฝนปนเปื้อน	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ปริมาณบีโอดี (BOD₅) - ปริมาณซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil) - ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide as H₂S) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005) - บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ 17T035) - บริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลัง Discharge 09P402 A/B ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการ - บริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลังออกจากหน่วย SWS ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการ 	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลัง Discharge B2909P402 A/B ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ และบริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลังออกจากหน่วย SWS ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ยังไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
2.2 คุณภาพน้ำฝน (Storm Water)	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ปริมาณซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil) 	- บริเวณรางระบายน้ำฝนก่อนลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	- เดือนละ 1 ครั้ง (ช่วงฝนตก)	-
3. คุณภาพน้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - สารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ TPH (C₅-C₈) TPH (C_{>8}-C₁₆) TPH (C_{>16}-C₃₅) - โลหะหนัก 	ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - จุดเหนือน้ำ (Up gradient) (RF-G(U)) - จุดท้ายน้ำ (Down-gradient) (RF-G(D)) 	- ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด	- ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด

ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	หมายเหตุ
4. คุณภาพดิน	<ul style="list-style-type: none"> - สารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ TPH (C₅-C₈) TPH (C₈-C₁₆) TPH (C₁₆-C₃₅) - โลหะหนัก 	ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - จุดเหนือน้ำ (Up gradient) (RF-G(U)) - จุดท้ายน้ำ (Down-gradient) (RF-G(D)) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 ปี หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 	โครงการดำเนินการล่าสุดเมื่อ ปี 2564
5. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L₉₀) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนวัดปลวกเกตุ - วัดเนินพุทรา - หมู่ 1 บ้านตะพงใน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 	-
6. การจัดการกากของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุสัดส่วนและประเภทกากของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (reuse/recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด - จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่งและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการและแนบสำเนาการได้รับอนุญาตส่งกำจัดกากของเสียประกอบไว้ในรายงานด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลทุก 6 เดือน 	-

ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	หมายเหตุ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
7.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน				
7.1.1 ความร้อน	- WBGT	- หน่วยกลั่นแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU2)	- ปีละ 1 ครั้ง (โดยตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี)	-
7.1.2 แสงสว่างในสถานที่ทำงาน	- Light Intensity	- Control Room	- ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง	-
7.1.3 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	- ภายในโรงงาน	- ปีละ 2 ครั้ง	-
7.1.4 ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน	- Noise Dose	- พนักงานทุกคนที่สัมผัสเสียงดัง	- ปีละ 2 ครั้ง	-
7.1.5 จัดทำ Noise Contour Map	- Noise Contour	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 3 ปี	-
7.1.6 ตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	- บริเวณหน่วย SWS (SWS 2, 3 และ 4) - บริเวณหน่วย ARU - บริเวณหน่วย SRU - บริเวณหน่วย TGTU	- ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	-
7.2 สถิติอุบัติเหตุ	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ สาเหตุ ระดับความรุนแรง การแก้ไข และกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	- ภายในโครงการ	- ทุกเดือนและรวบรวมผลและเสนอทุกๆ 6 เดือน	-

ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	หมายเหตุ
<p>7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>7.3 การตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์</p> <p>7.3.1 ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ถ่ายภาพรังสีทรวงอกฟิล์มใหญ่ - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจการทำงานของตับ - ตรวจการทำงานของไต - ตรวจความจุของปอดและ X-ray ปอด - สมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - สมรรถภาพปอด - ตรวจตามรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่จะเข้าทำงาน หรือตามการสัมผัส/เกี่ยวข้องกับสารเคมี 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ตกลงเข้าทำงาน 	-

ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	หมายเหตุ
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมและภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว รวมถึงให้สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูลประกอบให้ครบถ้วน - ประเมินผลสรุปผลการดำเนินงานและจากแผนงานชุมชนสัมพันธ์ แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นและประโยชน์จากการดำเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่กลุ่มเป้าหมายชุมชนที่ได้รับ รวมทั้งให้ประเมินประสิทธิภาพ/ความเหมาะสมของแผนงาน/กิจกรรมและเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมในอนาคต 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตรหรือมากกว่า ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง 	-

ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	หมายเหตุ
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียน พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง	- พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน	-

หมายเหตุ : สำหรับบริเวณ DHT Heater และ บริเวณ HMU ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ตารางที่ 1.4-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ปี 2566											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป - โรงเรียนวัดปลวกเกิด - โรงเรียนบ้านหนองจอก (โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) - รพ.สต. บ้านหนองจอก (สถานีอนามัยหนองจอก) - โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง - โรงเรียนวัดเขาพระบาท - โรงเรียนวัดปลวกเกิด - โรงเรียนบ้านหนองจอก (โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) - รพ.สต. บ้านหนองจอก (สถานีอนามัยหนองจอก)	- ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง โดยตรวจวัดในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด												
	- เบนซีน (Benzene)	- ทุกเดือน (24 ชั่วโมงต่อเนื่อง)	ยังไม่มีผลการดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างตามมาตรการใหม่ ยังไม่แล้วเสร็จ											
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด - ADU2 Heater (A&B) - DHT Heater - SRU Incinerator Stack - HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack)	- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ตะกั่ว (Pb) -ปรอท (Hg)	- ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ												
1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs - ระบบ CEMs ของ ADU2 Heater A, ADU2 Heater B และ SRU Incinerator	- CEMs	- ปีละ 1 ครั้ง												

ตารางที่ 1.4-2 (ต่อ)

รายละเอียด	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ปี 2566											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2. คุณภาพน้ำ ^{1/}														
2.1 น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำฝนปนเปื้อน	<ul style="list-style-type: none">- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)- อุณหภูมิ (Temperature)- ปริมาณบีโอดี (BOD₅)- ปริมาณซีโอดี (COD)- ของแข็งแขวนลอย (SS)- ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)- ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide as H₂S)	- เดือนละ 1 ครั้ง												
<ul style="list-style-type: none">- บริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อดำรงคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005)- บริเวณบ่อดำรงคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ 17T035)- บริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลัง Discharge 09P402 A/B ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการ- บริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลังออกจากหน่วย SWS ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการ														
2.2 คุณภาพน้ำฝน (Storm Water)	<ul style="list-style-type: none">- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)- อุณหภูมิ (Temperature)- ปริมาณซีโอดี (COD)- ของแข็งแขวนลอย (SS)- ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	- เดือนละ 1 ครั้ง (ช่วงฝนตก)												
<ul style="list-style-type: none">- บริเวณรางระบายน้ำฝนก่อนลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี														

ตารางที่ 1.4-2 (ต่อ)

รายละเอียด	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ปี 2566											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
3. คุณภาพน้ำใต้ดิน ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ - จุดเหนือน้ำ (Up gradient) (RF-G(U)) - จุดท้ายน้ำ (Down-gradient) (RF-G(D))	- TPH (C ₅ -C ₈) - TPH (C _{>8} -C ₁₆) - TPH (C _{>16} -C ₃₅) - โลหะหนัก	- ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด												
4. คุณภาพดิน ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ - จุดเหนือน้ำ (Up gradient) (RF-G(U)) - จุดท้ายน้ำ (Down-gradient) (RF-G(D))	- TPH (C ₅ -C ₈) - TPH (C _{>8} -C ₁₆) - TPH (C _{>16} -C ₃₅) - โลหะหนัก	- ทุก 3 ปี หรือตามที่หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ตรวจวัดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2564 จะดำเนินการอีกครั้งในปี 2567											
5. ระดับเสียง ^{2/} - โรงเรียนวัดปลวกเกตุ - วัดเนินพุทรา - หมู่ 1 บ้านตะพงใน	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) - ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง												
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 7.1.1 ความร้อน - หน่วยกลั่นแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU2)	- WBGT	- ปีละ 1 ครั้ง (โดยตรวจวัดในเดือน ที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี)												
7.1.2 แสงสว่างในสถานที่ทำงาน - Control Room	- Light Intensity	- ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง												
7.1.3 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน - ภายในโรงงาน	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	- ปีละ 2 ครั้ง												

ตารางที่ 1.4-2 (ต่อ)



รายละเอียด	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ปี 2566											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย														
7.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน														
7.1.4 ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน - พนักงานทุกคนที่สัมผัสเสียงดัง	- Noise Dose	- ปีละ 2 ครั้ง												
7.1.5 จัดทำ Noise Contour Map - พื้นที่โครงการ	- Noise Contour	- ทุกๆ 3 ปี	ทำการตรวจวัดทุกๆ 3 ปี											
7.1.6 ตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ - บริเวณหน่วย SWS (SWS 2, 3 และ 4) - บริเวณหน่วย ARU - บริเวณหน่วย SRU - บริเวณหน่วย TGTU	- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	- ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน												
7.2 สถิติอุบัติเหตุ	- ภายในโครงการ	- ทุกเดือนและรวบรวมผลและเสนอทุกๆ 6 เดือน												

ตารางที่ 1.4-2 (ต่อ)

รายละเอียด	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ปี 2566											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
7.3 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 7.3.1 ตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มงาน	- ถ่ายภาพรังสีทรวงอกฟิล์มใหญ่ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจสอบการทำงานของตับ - ตรวจสอบการทำงานของไต - ตรวจสอบความจุของปอด และ X-ray ปอด สมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย - ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน - สมรรถภาพปอด - ตรวจสอบรายการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่จะเข้าทำงาน หรือตามการสัมผัส/เกี่ยวข้องกับสารเคมี	- ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ตกลงเข้าทำงาน												
7.3.2 ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี - พนักงานทุกคน	- ถ่ายภาพรังสีทรวงอกฟิล์มใหญ่ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจสอบการทำงานของตับ - ตรวจสอบการทำงานของไต - ตรวจสอบความจุของปอด และ X-ray ปอด - สมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย - ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน	- ปีละ 1 ครั้ง												
- พนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง	- ตรวจสอบสาร t,t muconic acid ในปัสสาวะ (เป็น Biomaker ของสารเบนซีน)													

ตารางที่ 1.4-2 (ต่อ)

รายละเอียด	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ปี 2566											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
8. สังคม-เศรษฐกิจ	- สํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมและภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่อ่อนไหวโดยรอบผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว รวมถึงให้สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนการกระจายตัวในการเก็บข้อมูลประกอบให้ครบถ้วน	- รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน												
	- ประเมินผลสรุปผลการดำเนินงานและจากแผนงานชุมชนสัมพันธ์ แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นและประโยชน์จากการดำเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่กลุ่มเป้าหมายชุมชนที่ได้รับ รวมทั้งให้ประเมินประสิทธิภาพ/ความเหมาะสมของแผนงาน/กิจกรรมและเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมในอนาคต													
	- บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง													

- หมายเหตุ :
- :  แผนการดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด (Measure Plan)
 - :  การดำเนินการของโครงการ (Actual)
 - : * สำหรับบริเวณ DHT Heater และบริเวณ HMU ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
 - : 1/ คุณภาพน้ำบริเวณบริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลัง Discharge B2909P402 A/B ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ และบริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลังออกจากหน่วย SWS ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ยังไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
 - : 2/ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศตามข้อกำหนด ในมาตรการแนบท้ายหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.9/14418 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากมาตรการฉบับใหม่แนบท้ายหนังสือเห็นชอบที่ รย 0034(2)/5499 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ยังคงอยู่ในระยะก่อสร้าง ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการจะดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการฉบับใหม่ที่กำหนด

การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ทางบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 2.2-1 และภาพที่ 2.2-1 ถึง 2.2-45

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจสอบ : 7 พฤศจิกายน 2566

ผู้นำตรวจสอบ : คุณชยวรรณ วิสาชะ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเขมรินทร์ ธีรรัฐเศรษฐ์

นางสาวเกศรินทร์ ขวัญจิตร

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
1. มาตรการทั่วไป	1.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 3) อย่างเคร่งครัด	-	เอกสารแนบที่ 2 ในภาคผนวกที่ 1
	1.2 เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากพบผลการติดตามตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ยังไม่พบแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด	-	-
	1.3 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่พบเหตุการณ์ที่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากพบว่ามีโครงการฯ ทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน และแจ้ง สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อไป	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1.4 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและความถี่ในการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ สผ. ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งนี้ เป็นรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566	-	เอกสารแนบที่ 3 ในภาคผนวกที่ 1
	1.5 ในกรณีที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากเดิมที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจาก สผ. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ รย 0034(2)5499 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และปัจจุบันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ยึดถือปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ทั้งนี้หากโครงการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บริษัทฯ จะแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต่อไป	-	เอกสารแนบที่ 2 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย				
	1.6 สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยอื่นของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำสรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยอื่นของโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 4 ในภาคผนวกที่ 1
	1.7 ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ให้แจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยหน่วยงานกลาง (Third Party)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ รวมถึงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของ สผ. ทุก 6 เดือน	-	ภาพที่ 2.2-45
	1.8 เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักรและมีสถานะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า อัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	- พื้นที่โครงการ	- หากโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักรและมีสถานะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วก่อให้เกิดอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้ สผ. ทราบ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1.9 หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	- พื้นที่โครงการ	- ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในทันที	-	-
	1.10 ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย	- พื้นที่โครงการ	- จากผลการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไว้	-	รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3
	1.11 ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไขและทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน	- พื้นที่โครงการ	- หากเกิดกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการ มีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ โครงการจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าว อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ผลการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไว้	-	รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3
	1.12 กำหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด	- บริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ	- โครงการมีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขณะทำการตรวจวัด	-	รายละเอียดแสดงในบทที่ 3
	1.13 กำหนดให้โครงการแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทราบ ก่อนการหยุดการผลิต เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-startup)	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการมีการหยุดเดินเครื่องจักร เมื่อวันที่ 24-27 กันยายน และ 3, 11-14 ธันวาคม 2566	-	เอกสารแนบที่ 5 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1.14 ให้ทบทวนเหตุการณ์อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการทบทวนเหตุการณ์อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	-	เอกสารแนบที่ 6 ในภาคผนวกที่ 1
	1.15 จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งแวดล้อมกับฐานข้อมูล	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งแวดล้อมกับฐานข้อมูลสุขภาพ	-	เอกสารแนบที่ 7 ในภาคผนวกที่ 1
	1.16 กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวัน) ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังจากที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ 1) กรณีที่พนักงาน หรือ ผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทำงาน 2) กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินการกิจการต่อไปให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานไว้ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการไม่มีผู้รับเหมารายเดือน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวันจึงไม่มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้รับเหมา	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1.17 กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำ และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการเพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้แนวทางการตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำ และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการเพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล	-	เอกสารแนบที่ 8 ในภาคผนวกที่ 1
2. คุณภาพอากาศ	2.1 ควบคุมการระบายมลสารทางอากาศของทุกปล่องไม่ให้เกินค่าที่กำหนด (คำนวณที่สภาวะออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ 7 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะแห้ง ความดัน 1 บรรยากาศ ดังนี้ 1) ปล่องระบายของหน่วยกลั่นแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU 2) - ปล่อง ADU2 Heater A ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 180 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 5.72 กรัม/วินาที ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO _x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 420 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 18.55 กรัม/วินาที ฝุ่นละออง (TSP) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 119 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * อัตราการระบายไม่เกิน 2.01 กรัม/วินาที	- ADU2 Heater A - ADU2 Heater B	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 การระบายมลสารทางอากาศของปล่อง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ADU2, Heater A (41B001A) ตรวจวัดวันที่ 17 ตุลาคม 2566 NO _x มีค่าเท่ากับ 30 ppm อัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 1.85 g/s SO _x มีค่าน้อยกว่า 0.1 ppm อัตราการระบาย มีค่าน้อยกว่า 0.008 g/s TSP มีค่าเท่ากับ 11 mg/m ³ อัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 0.370 g/s	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่อง ADU2 Heater B ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 180 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 5.72 กรัม/วินาที ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 420 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 18.55 กรัม/วินาที ฝุ่นละออง (TSP) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 119 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * อัตราการระบายไม่เกิน 2.01 กรัม/วินาที 		<p>ADU2, Heater B (41B001B) ตรวจวัดวันที่ 17 ตุลาคม 2566</p> <p>NO_x มีค่าเท่ากับ 25 ppm อัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 1.64 g/s</p> <p>SO_x มีค่าเท่ากับ 2.8 ppm อัตราการระบาย มีค่าน้อยกว่า 0.251 g/s</p> <p>TSP มีค่าเท่ากับ 3.9 mg/m³ อัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 0.134 g/s</p>	-	-
	<p>2) ปล่องระบายของหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (DHT) (DHT Heater)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 0.59 กรัม/วินาที - ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 48 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 1.32 กรัม/วินาที ฝุ่นละออง (TSP) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 48 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * อัตราการระบายไม่เกิน 0.50 กรัม/วินาที 	- 3) DHT Heater	- ปล่องระบายของหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (DHT) (DHT Heater) ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3) ปล่องระบายของหน่วยกำจัดกำมะถัน (SRU) (SRU Incinerator) - กรณีดำเนินการปกติ (Normal Operation) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 62 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 0.509 กรัม/วินาที ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO _x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 494 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 5.646 กรัม/วินาที ฝุ่นละออง (TSP) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * อัตราการระบายไม่เกิน 0.524 กรัม/วินาที	- SRU Incinerator	SRU Incinerator Stack ตรวจวัดวันที่ 18 ตุลาคม 2566 NO _x มีค่าเท่ากับ 9 ppm อัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 0.260 g/s SO _x มีค่าเท่ากับ 56 ppm อัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 1.93 g/s TSP มีค่าเท่ากับ 20 mg/m ³ อัตราการระบาย มีค่าเท่ากับ 0.261 g/s	-	-
	4) ปล่องระบายของหน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) (Steam Reformer Flue Gas Stack) - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 39.6 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 2.82 กรัม/วินาที - ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO _x) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 39.6 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบายไม่เกิน 3.92 กรัม/วินาที ฝุ่นละออง (TSP) * ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 20.6 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * อัตราการระบายไม่เกิน 0.78 กรัม/วินาที	- HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack)	- ปล่องระบายของหน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) (Steam Reformer Flue Gas Stack) ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัด เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2.2 อัตราการระบายส่วนที่เหลือภายหลังทำการปรับลดตามหลักการ 80:20 ได้แก่ NO _x 2.4248 กรัม/วินาที, SO ₂ 10.1632 กรัม/วินาที และ TSP 0.2768 กรัม/วินาที โครงการจะมอบให้โครงการโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (VGOHT & DCC Plant) ดังนี้ = NO _x 0.7067 กรัม/วินาที = SO ₂ 10.632 กรัม/วินาที = TSP 0.2768 กรัม/วินาที โดยอัตราการระบายส่วนที่เหลือ คือ NO _x 1.7181 กรัม/วินาที จะมอบให้เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีเป็นผู้บริหารจัดการอัตราการระบายมลสารทางอากาศในภาพรวมของพื้นที่	- พื้นที่โครงการและโครงการโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (VGOHT & DCC Plant) โครงการพัฒนาต่างๆ ในเขตประกอบการฯ	- โครงการมีการควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศของโครงการไม่ให้เกินค่ากำหนด โดยอัตราการระบายส่วนที่เหลือภายหลังทำการปรับลดตามหลักการ 80:20 โครงการจะมอบให้โครงการโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (VGOHT & DCC Plant) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีเป็นผู้บริหารจัดการอัตราการระบายมลสารทางอากาศในภาพรวมของพื้นที่	-	-
	2.3 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษของโครงการ	- ADU2 Heater (A&B), DHT Heater	- โครงการใช้น้ำมันเตาที่มีปริมาณกำมะถันต่ำ และได้นำมาใช้ร่วมกับ Fuel Gas ซึ่งเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษของโครงการ และมีการควบคุมค่าความเข้มข้นที่ปลายปล่องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด	-	เอกสารแนบที่ 9 ในภาคผนวกที่ 1
	2.4 จัดให้มีการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขระบบกำจัดมลพิษทันทีที่พบว่าระบบดังกล่าวขัดข้องจนทำให้ปริมาณมลพิษ ได้แก่ SO ₂ , NO _x และฝุ่นละอองสูงเกินกว่าค่าควบคุมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากไม่สามารถซ่อมแซม/แก้ไขให้แล้วเสร็จ โครงการต้องหยุดผลิตส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทันที	- ADU2 Heater (A&B), DHT Heater, SRU Incinerator และ Steam Reformer	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ระบบกำจัดมลพิษไม่เกิดเหตุการณ์ขัดข้อง อย่างไรก็ตาม หากระบบดังกล่าวเกิดการขัดข้อง โครงการจะตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขระบบกำจัดมลพิษทันที	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2.5 ในพื้นที่ส่วนการผลิตกำหนดให้มีการติดตั้งระบบ CEMs ที่ปล่อง ADU2 Heater A และ ADU2 Heater B (ใช้ CEMs ชุดเดียวกัน) โดยทำการชักตัวอย่างและอ่านค่าที่ Analyzer โดยใช้วิธี Time Sharing ของแต่ละปล่องทุก 15 นาที เวียนไปเรื่อยๆ เพื่อทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้น SO ₂ , NO _x และฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งระดับการเตือนไว้ที่ 2 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 (High) : SO ₂ = 192 ppm, NO _x = 160 ppm, TSP = 92 mg/Nm ³ 2) ระดับที่ 2 (High High) : SO ₂ = 420 ppm, NO _x = 180 ppm, TSP = 115 mg/Nm ³ (หมายเหตุ : ความเข้มข้นของ SO ₂ และ NO _x รายงานที่ 7% O ₂)	- ADU2 Heater (A&B) Stack	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งระบบ CEMs ที่ปล่อง ADU2 Heater A (41B001A) และ ADU2 Heater B (41B001B) เพื่อทำการตรวจวัดค่า ความเข้มข้น SO ₂ , NO _x และฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งค่าการเตือน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 (High) และ ระดับที่ 2 (High High) ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2.2-1 และ 2.2-2
	2.6 ในกรณีที่เกิดการแจ้งเตือนของ CEMs ของปล่อง ADU2 Heater A และ/หรือ ADU2 Heater B ที่ระดับที่ 1 (High) เนื่องจาก 1) SO ₂ และฝุ่นละอองสูงกว่าค่าที่กำหนด-พนักงานควบคุมจะทำการปรับลดสัดส่วนของ Fuel Oil ลง และใช้ Fuel Gas เพิ่มขึ้น แล้วทำการตรวจสอบคุณสมบัติของ Fuel Oil ว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพื่อวางแผนการใช้ให้เหมาะสม 2) SO ₂ สูงเกินกว่าค่าที่กำหนดเพียงค่าเดียว-พนักงานควบคุมจะตรวจสอบอัตราการไหลของเอมีนที่เข้า Amine Absorber ว่าต่ำกว่าปกติหรือไม่ ถ้าต่ำให้ประสานงานกับส่วนเสริมการผลิตเพื่อส่งจ่ายเอมีนเพิ่มเติม 3) NO _x สูงเกินกว่าค่าที่กำหนด-พนักงานควบคุมจะทำการปรับลดสัดส่วนของ Fuel Oil ลง และใช้ Fuel Gas เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งแจ้งให้ทางหน่วยงานเทคโนโลยีตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Fire Heater เนื่องจาก Fire Heater ของโครงการเป็นแบบ Low NO _x Burner	- ADU2 Heater (A&B) Stack	- กรณีที่เกิดการแจ้งเตือนของ CEMs ของปล่อง ADU2 Heater A (41B001A) และ/หรือ ADU2 Heater B (41B001B) ที่ระดับที่ 1 (High) โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการในกรณีที่เกิดการแจ้งเตือนของ CEMs อย่างไรก็ตามหากค่าความเข้มข้นของ SO ₂ NO _x และ/หรือฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในระดับที่ 2 (High High) และโครงการไม่สามารถแก้ไขได้ โครงการจะทำการลดกำลังการผลิตลง เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ตรวจวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป	-	เอกสารแนบที่ 10 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	โครงการจะทำการแก้ไขภายในในระยะเวลาเร็วที่สุด ทั้งนี้ในกรณีที่แนวโน้มของค่า SO ₂ NO _x และ/หรือฝุ่นละอองยังคงมีค่าเพิ่มขึ้น พนักงานควบคุมจะทำการปรับลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าเตา หากค่าตรวจวัดยังคงเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับการแจ้งเตือนในระดับที่ 2 (High High) และทางโครงการไม่สามารถแก้ไขได้ ทางโครงการจะทำการลดกำลังการผลิตลงเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ตรวจวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป				
	2.7 ในพื้นที่ส่วนเสริมการผลิตกำหนดให้มีการติดตั้งระบบ CEMS ที่ปล่องSRU Incinerator เพื่อทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ SO ₂ และ NO _x ที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งค่าระดับการเตือนไว้ที่ 2 ระดับ <ul style="list-style-type: none"> - ระดับที่ 1 (High) : SO₂ = 300 ppm. NO_x = 50 ppm - ระดับที่ 2 (High High) : SO₂ = 450 ppm. NO_x = 55 ppm (หมายเหตุ : ความเข้มข้นของ SO ₂ และ NO _x รายงานที่ 7% O ₂)	- SRU Incinerator Stack	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งระบบ CEMS ที่ปล่อง SRU Incinerator Stack เพื่อทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้น SO ₂ , NO _x ที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งค่าการเตือน 2 ระดับ ตามมาตรการกำหนด	-	ภาพที่ 2.2-3 และ 2.2-4

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2.8 ในกรณีที่เกิดการแจ้งเตือนของ CEMs ของปล่อง SRU Incinerator ที่ระดับ 1 (High) พนักงานควบคุมจะต้องทำการตรวจสอบสภาวะการทำงานของหน่วย SRU ทันที โดยปรับลดปริมาณอากาศ (Air) ที่เข้าทำปฏิกิริยากับ H ₂ S ที่หน่วย SRU ให้มีค่าลดน้อยลง เพื่อให้ค่าอัตราส่วนของ H ₂ S:SO ₂ ที่ตรวจวัดได้โดยเครื่องตรวจวัดอัตราส่วนของ H ₂ S:SO ₂ ของ Line Tail Gas SRU ที่ไป TGTU มีค่าอยู่ระหว่าง 5-8 และให้ปรับอัตราการไหลของเอมีนที่ใช้ในการดักจับก๊าซกรดเพิ่มขึ้น พร้อมตรวจสอบปริมาณของ H ₂ ที่ควบคุมที่ TGTU ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5-2% ซึ่งถ้าต่ำกว่าค่านี้ให้ทำการป้อน H ₂ เข้าไปในระบบ ซึ่งถ้าสามารถปรับการเดินเครื่องของระบบให้อยู่ในสภาวะควบคุมที่ได้กำหนดมานี้ ค่าความเข้มข้นของ SO ₂ และ NO _x จะกลับเข้าสู่ค่าการเดินเครื่องปกติ แต่ในกรณีที่ค่าความเข้มข้นของ SO ₂ และ/หรือ NO _x เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในระดับที่ 2 (High High) และทางโครงการไม่สามารถแก้ไขได้จะมีการแจ้งไปยังผู้จัดการแผนก เพื่อให้มีการแจ้งทุกโรงงานที่มีการส่ง Sour Water มายังโครงการให้ทราบว่าจะทางโครงการจะหยุดหน่วยผลิต SWS ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยโครงการมีถังเก็บ Sour Water ที่สามารถเก็บน้ำได้ 1 วัน หากโครงการไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 1 วันจะประสานงานให้โรงงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณการส่งน้ำ Sour Water มายังโครงการ	- SRU Incinerator Stack	- กรณีที่เกิดการแจ้งเตือนของ CEMs ของ SRU Incinerator Stack ที่ระดับที่ 1 (High) โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ค่าความเข้มข้นของ SO ₂ และ/หรือ NO _x เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในระดับที่ 2 (High High) และโครงการไม่สามารถแก้ไขได้ จะมีการแจ้งไปยังผู้จัดการแผนกเพื่อให้มีการแจ้งทุกโรงงานที่มีการส่ง Sour Water มายังโครงการให้ทราบว่าจะทางโครงการจะหยุดหน่วยผลิต SWS ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยโครงการมีถังเก็บ Sour Water ที่สามารถเก็บน้ำได้ 1 วัน หากโครงการไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 1 วัน จะประสานงานให้โรงงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณการส่งน้ำ Sour Water มายังโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 10 ในภาคผนวกที่ 1
	2.9 จัดให้มีการสอบเทียบระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด	- ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs)	- โครงการได้มีการสอบเทียบระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด	-	เอกสารแนบที่ 11 ในภาคผนวกที่ 1
	2.10 หากพบว่าการระบายมลสารที่เกิดขึ้นจากโครงการสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทางโครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 การระบายมลสารของโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หากพบว่าการระบายมลสารสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	ภาคผนวกที่ 3
	2.11 บำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามที่กำหนดไว้ในแผนการบำรุงรักษาเครื่องเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan)	- เครื่องมือ/อุปกรณ์ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- โครงการจัดให้มีแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามที่กำหนดไว้ในแผนการบำรุงรักษาเครื่องเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan)	-	เอกสารแนบที่ 12 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2.12 จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบควบคุมมลสารทางอากาศ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์	- เครื่องมือ/อุปกรณ์ ของระบบบำบัด มลพิษทางอากาศ	- โครงการจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบควบคุมมลสารทางอากาศ เพื่อป้องกันความ เสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือการ เสื่อมสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์	-	เอกสารแนบที่ 12 ในภาคผนวกที่ 1
	2.13 จัดให้มีผู้ควบคุมระบบมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมการทำงานของระบบควบคุมและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา	- ระบบกักจัด มลพิษและกักจัด กัมมันตของ โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อ ควบคุมการทำงานของระบบควบคุมและระบบบำบัดมลพิษ ทางอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา	-	เอกสารแนบที่ 13 ในภาคผนวกที่ 1
	2.14 จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบกักจัดมลพิษ และกักจัดให้มีปริมาณเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อระบบ กักจัดขัดข้องได้ทันที	- ระบบกักจัด มลพิษและกักจัด กัมมันตของ โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ไว้ที่ฝ่าย Maintenance ส่วนกลางอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมได้ทันทีเมื่อ ระบบกักจัดมลพิษขัดข้อง	-	ภาพที่ 2.2-5
	2.15 มาตรการการจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 1) จัดทำแผนป้องกัน/ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่ง กำเนิด (Fugitive Source) ได้แก่ ปั๊ม (Pumps) เครื่องอัดอากาศ (Compressor) อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสมของเหลว (Agitators หรือ Mixers) วาล์ว (Valves) ท่อส่งปลายเปิด (Open-Ended Lines) ข้อต่อหรือหน้าแปลน (Connectors หรือ Flanges) อุปกรณ์ลด ความดัน (Pressure Relief Devices) และจุดเก็บตัวอย่างสารเคมี (Sampling Connections)	- พื้นที่โครงการ และถังเก็บของ โครงการ	- โครงการมีแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan) แผนป้องกัน/ควบคุมการรั่วไหลของสารอินทรีย์ ในการ ป้องกันหรือควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจาก แหล่งกำเนิด โดยหากพบการรั่วซึมหรือพบความผิดปกติใดๆ จะดำเนินการซ่อมแซมทันที ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการตรวจวัด การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Fugitive) ตามแบบ รายงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด และจัดส่งให้กรม โรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน	-	เอกสารแนบที่ 14 ในภาคผนวกที่ 1
	2) จัดทำข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ที่มา จากแหล่งกำเนิดของโครงการ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางของ U.S. EPA ทั้งนี้ การประเมินการรั่วซึมจากแหล่งกำเนิดให้ดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการ หลังจากนั้นให้ดำเนินการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	- พื้นที่โครงการ และถังเก็บของ โครงการ	- โครงการได้จัดทำข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหย VOCs Inventory ตามแนวทางของ U.S. EPA ในช่วงเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว	-	เอกสารแนบที่ 14 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3) กำหนดให้มีการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ทำการตรวจวัดข้อต่อหรือหน้าแปลน วาล์วก๊าซ วาล์วของเหลว ท่อส่งปลายเปิด ปิ๊มสำหรับของเหลว เครื่องอัดอากาศ อุปกรณ์ลดความดันสำหรับก๊าซ อุปกรณ์ลดความดันสำหรับของเหลว จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี อุปกรณ์ที่ใช้กวนหรือผสมของเหลว เป็นต้น	- พื้นที่โครงการและถังเก็บของโครงการ	- โครงการได้มีการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว	-	เอกสารแนบที่ 14 ในภาคผนวกที่ 1
	4) กำหนดค่าควบคุมปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากทุกอุปกรณ์ไว้ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน	- พื้นที่โครงการและถังเก็บของโครงการ	- โครงการได้กำหนดค่าควบคุมปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากทุกอุปกรณ์ไว้ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน	-	
	5) ป้องกันการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์การผลิตโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีการป้องกันการรั่วซึม ดังนี้ - เลือกใช้ปิ๊มที่มีระบบป้องกันการรั่วไหล 2 ชั้น (Double Mechanical Seal) หรือเลือกใช้ปิ๊มชนิด Canned Pump ปิ๊มที่มีระบบป้องกันการรั่วไหล 2 ชั้น (Double Mechanical Seal หรืออุปกรณ์อื่นที่เทียบเท่า) สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับสารเบนซินในส่วนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ในหน่วย ADU2 และหน่วย DHT - ออกแบบระบบท่อให้มีการต่อหรือมีประเก็นให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะลดโอกาสที่สารอินทรีย์จะรั่วไหลออกมาตามรอยต่อของประเก็น หากจำเป็นจะต้องมีทางโครงการจะเลือกใช้วิธีหรือประเก็นให้เหมาะสมกับสารอินทรีย์และสภาวะของระบบนั้นๆ	- พื้นที่โครงการและถังเก็บของโครงการ	- โครงการได้มีการเลือกใช้ใช้อุปกรณ์ที่มีการป้องกันการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์การผลิต	-	
	6) หากพบการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยที่อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำการปรับปรุงในจุดที่ผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ดังนี้	- พื้นที่โครงการและถังเก็บของโครงการ	- หากพบการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยที่อุปกรณ์ต่างๆ ทางโครงการจะทำการปรับปรุงในจุดที่ผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - หากผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์เกินจากเกณฑ์ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยของอุปกรณ์ที่กำหนดให้ทำการปรับเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ตัวที่ไม่มีการรั่วซึมหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ให้เสร็จภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ตรวจพบเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วให้ตรวจซ้ำและผลการตรวจวัดซ้ำต้องไม่เกินจากเกณฑ์ที่กำหนด - อุปกรณ์ลดความดัน (Pressure Relief Devices) ให้ซ่อมแซมเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หรือให้ต่อเข้ากับระบบบำบัดมลพิษ - หากไม่สามารถซ่อมแซมตามที่กำหนดไว้ ให้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการลดการรั่วซึม โดยระบุเหตุผลและระยะเวลาที่สามารถซ่อมแซมได้ให้ชัดเจน แล้วรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ภายใน 30 วัน นับจากการตรวจพบจุดรั่วซึมแต่ละจุด 				
	7) ติดตั้ง Dome Roof ที่ถังเก็บแนฟทา (69T080A) ถังเก็บ Slop Oil (69T011C/D) และเปลี่ยนชุดกันรั่วของถังเก็บน้ำมันดิบ (69T080C/D) จากชนิด Rim Seal Vapor mounted เป็นชนิด Liquid Mounted เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่จะระบายออกจากถังเก็บ	- พื้นที่โครงการและถังเก็บของโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง Dome Roof ที่ถังเก็บแนฟทาและถังเก็บ Slop Oil และเปลี่ยนชุดกันรั่วของถังเก็บน้ำมันดิบ เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่จะระบายออกจากถังเก็บ	-	-
	8) N ₂ Blanket ที่ถังเก็บ น้ำมัน ดีเซล เบา (LGO) (69T086A/B) ถังเก็บน้ำมันดีเซลและแก๊สออยล์ (69T067A/B และ 69T006A/B) เพื่อลดโอโระเหย	- พื้นที่โครงการและถังเก็บของโครงการ	- โครงการมี N ₂ Blanket ที่ถังเก็บ น้ำมัน ดีเซล เบา (LGO) (69T086A/B) ถังเก็บน้ำมันดีเซลและแก๊สออยล์	-	-
	9) ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นระบบปิด ประกอบด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบ CPI ของหน่วย ADU2 และหน่วย SRU	- พื้นที่โครงการและถังเก็บของโครงการ	- โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบปิด ประกอบด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบ CPI ของหน่วย ADU2 และหน่วย SRU	-	ภาพที่ 2.2-6
	10) จัดให้มีการกักเก็บกัมมะถันเหลวในถังกักเก็บใต้ดินระบบปิดที่มีระบบดูด (Ejector) โดยก๊าซภายในบ่อจะถูกส่งไปเผากำจัดที่เตาเผา (Incinerator) ดังนั้น จึงไม่มีโอโระเหยจากก๊าซหลุดถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยตรง และจัดให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของถังทุกๆ 4 ปี ตามแผนงานของโครงการ	- พื้นที่โครงการและถังเก็บของโครงการ	- โครงการมีการกักเก็บกัมมะถันเหลวในถังกักเก็บใต้ดินระบบปิดที่มีระบบดูด (Ejector) และมีการตรวจสอบความแข็งแรงของถังทุกๆ 4 ปี ตามแผนงานของโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2.16 โครงการต้องมีการแจ้งคำอรรถาการระบายนมลสารของโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบฯ ในรายงานฯ ไปยังเขตประกอบการฯ เพื่อให้เขตประกอบการฯ ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการระบายนมลสารทางอากาศของโรงกลั่นน้ำมันให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	- พื้นที่โครงการ	- เขตประกอบการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานในการตรวจวัดอรรถาการระบายนมลสารให้กับโครงการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการระบายนมลสารทางอากาศของโรงกลั่นน้ำมันให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	-	-
	2.17 จัดให้มีหอเผาทั้งพื้นดินระบบปิด (Enclosed Ground Flare) จำนวน 1 หอ ที่มีความสามารถในการรองรับก๊าซที่ระบายนมาจากกระบวนการผลิตกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ (Emergency) สูงสุด (Maximum Flare Load) 220 ตัน/ชั่วโมง เพื่อใช้งานร่วมกับหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) จำนวน 1 หอ ความสามารถในการเผากำจัดก๊าซสูงสุด 1,352 ตัน/ชั่วโมง โดยปริมาณก๊าซที่ระบายนมาจากกระบวนการผลิตสูงสุดที่ส่งมายังหอเผาทั้งระดับพื้นดินระบบปิดจะเกิดจากกรณีไฟฟ้าดับ (Power Failure) สำหรับการออกแบบหอเผาทั้งระดับพื้นดินระบบปิดกำหนดให้มีการออกแบบตามมาตรฐาน APIRP 520, APISTD 521, APISTD 526, APISTD 537 และ APISTD 2000 และกำหนดให้มีการติดตั้ง Thermocouple และ Ionization Detector เพื่อทำการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อแสดงถึงการติดไฟของ Pilot ของหอเผา	- ระบบหอเผาทั้งระดับพื้นดินระบบปิด (EGF)	- โครงการมีหอเผาทั้งพื้นดินระบบปิด (Enclosed Ground Flare) จำนวน 1 หอ ที่มีความสามารถในการรองรับก๊าซที่ระบายนมาจากกระบวนการผลิตกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ (Emergency) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงยังไม่มีการระบายก๊าซออกจากหอเผา	-	เอกสารแนบที่ 15 ในภาคผนวกที่ 1
	2.18 กำหนดให้มีการเปลี่ยนชนิดหัวเผา (Burner) ของหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) ให้สามารถรองรับก๊าซที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ส่งมาเผากำจัดสูงสุด 1,352 ตัน/ชั่วโมง	- หอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare)	- โครงการได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนชนิดหัวเผา (Burner) ของหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare)	-	-
	2.19 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของหอเผาทั้งระดับพื้นดินระบบปิด และหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน โดยควบคุมปริมาณของก๊าซที่จะส่งมาเผากำจัดให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของหอเผา เพื่อให้เกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์เพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่นและควันดำ	- ระบบหอเผาทั้งระดับพื้นดินระบบปิด (EGF) และหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare)	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของหอเผาทั้งระดับพื้นดินระบบปิด และหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน โดยควบคุมปริมาณของก๊าซที่จะส่งมาเผากำจัดให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของหอเผา เพื่อให้เกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์เพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่นและควันดำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหอเผาทั้งพื้นดินระบบปิด (Enclosed Ground Flare) จึงยังไม่มีการระบายก๊าซออกจากหอเผา	-	-
	2.20 จัดให้มีแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan) สำหรับระบบหอเผาทั้งระดับพื้นดินระบบปิด	- ระบบหอเผาทั้งระดับพื้นดินระบบปิด (EGF)	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หอเผาทั้งพื้นดินระบบปิด (Enclosed Ground Flare) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2.21 กรณีที่โครงการมีการระบายก๊าซออกไปยังหอเผา (กรณี Emergency) โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยที่ดูแลหอเผาหลังจากการระบายก๊าซเพื่อแจ้งสาเหตุของการระบายก๊าซ และในกรณีที่หอเผาขัดข้องจนไม่สามารถรับก๊าซได้ หน่วยงานที่ดูแลหอเผาจะแจ้งไปยังโครงการต่างๆ เพื่อหยุดการผลิต	- ระบบหอเผาทั้งระดับพื้นดิน ระบบปิด (EGF) และหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare)	- หากโครงการมีการระบายก๊าซออกไปยังหอเผาในกรณีฉุกเฉิน โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยที่ดูแลหอเผาหลังจากการระบายก๊าซเพื่อแจ้งสาเหตุของการระบายก๊าซ และในกรณีที่หอเผาขัดข้องจนไม่สามารถรับก๊าซได้ หน่วยงานที่ดูแลหอเผาจะแจ้งไปยังโครงการต่างๆ เพื่อหยุดการผลิต	-	
3. คุณภาพน้ำ	3.1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในพื้นที่ส่วนการผลิตประกอบด้วย บ่อพักน้ำเสีย (บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน), CPI และ IAF พร้อมทั้งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในพื้นที่ส่วนเสริมการผลิต ประกอบด้วย บ่อพักน้ำเสีย (บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน), CPI และ DAF เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโครงการก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการ ไออาร์พีซี	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในพื้นที่ส่วนการผลิตประกอบด้วยบ่อแยกน้ำ-น้ำมัน บ่อพักน้ำเสีย CPI และ IAF พร้อมทั้งมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในพื้นที่ส่วนเสริมการผลิตประกอบด้วย บ่อพักน้ำเสีย CPI และ DAF เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโครงการก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการไออาร์พีซี	-	ภาพที่ 2.2-6 ถึง 2.2-9
	1) น้ำเสียจากพนักงานและอาคารสำนักงาน - น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ฝังใต้ถนนสุขุมวิท) ปริมาณประมาณ 4.256 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะทำการบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs) ก่อนส่งไปบ่อพักขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร และส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการดำเนินงานของโครงการ (ฝังใต้ถนนสุขุมวิท) ก่อนจะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ	-	ภาพที่ 2.2-15
	- น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ (ฝังเหนือถนนสุขุมวิท) (พื้นที่ติดตั้งหน่วยผลิตไฮโดรเจน) ปริมาณประมาณ 0.448 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะส่งเข้าถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs) และระบบบำบัดแบบ CPI ของโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) เพื่อทำการบำบัดขั้นต้นก่อนส่งน้ำเสียดังกล่าวไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พื้นที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างจึงยังไม่มีน้ำเสียจากการดำเนินงานของโครงการเข้าสู่ระบบบำบัด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (SATs) และระบบบำบัดแบบ CPI ของโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) เพื่อทำการบำบัดเบื้องต้นก่อนส่งน้ำเสียดังกล่าวไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ	-	ภาพที่ 2.2-14 และ 2.2-16

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<p>2) น้ำเสียจากหน่วยผลิตและระบบเสริมการผลิต</p> <p>2.1 น้ำเสียที่มีลักษณะการระบายแบบต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำปนเปื้อนก๊าซกรด (Sour Water) <ul style="list-style-type: none"> * จากกระบวนการผลิตของโครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) จากหน่วย ARU และหน่วย SRU ปริมาณประมาณ 57.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (2.4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) (2) จากหน่วย ADU2 ปริมาณประมาณ 895.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (37.3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) (3) จากหน่วย DHT ปริมาณประมาณ 321.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (13.4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) <p>จะส่งไปปรับปรุงคุณภาพยังหน่วยแยกก๊าซกรดที่ 2, 3 และ 4 (SWS 2&2&4) ของโครงการ เพื่อแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) และแอมโมเนีย (NH₃) ซึ่งมีความสามารถในการบำบัดรวม 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน (150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) โดยน้ำที่ผ่านการแยกก๊าซกรดออกแล้ว (Stripped Water) ส่วนหนึ่งจะนำกลับไปใช้ล้างเกลือที่หน่วยกลั่นแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU 2) และบางส่วนจะส่งไปโรงแยกคอนเดนเสทและโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์แล้วจึงระบายน้ำส่วนที่เหลือเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป</p>	- พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำปนเปื้อนก๊าซกรด (Sour Water) จากหน่วย ARU, SRU, ADU2 และ DHT จะส่งไปปรับปรุงคุณภาพยังหน่วยแยกก๊าซกรดที่ 2, 3 และ 4 (SWS2&3&4) เพื่อแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) และแอมโมเนีย (NH₃) โดยน้ำที่ผ่านการแยกก๊าซกรดออกแล้ว (Stripped Water) ส่วนหนึ่งจะนำกลับไปใช้ล้างเกลือที่หน่วยกลั่นแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU 2) และบางส่วนจะส่งไปโรงแยกคอนเดนเสทและโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์แล้วจึงระบายน้ำส่วนที่เหลือเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หน่วยแยกก๊าซกรดที่ 4 (SWS4) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด 	-	ภาพที่ 2.2-15 และรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3
	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำระบายทิ้งจากหอผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) ปริมาณประมาณ 480 ลูกบาศก์เมตร/วัน (24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) จะรวบรวมลงบ่อพัก (Sump) ขนาดความจุ 180 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพ กรณีที่คุณภาพน้ำทิ้ง (ค่า TDS) มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดจะรวบรวมไปยังระบบระบายน้ำฝนที่ไม่มีการปนเปื้อน แล้วรวบรวมลงสู่บ่อรองรับของเขตประกอบการฯ (Collection Pond) และส่งต่อไปยังบ่อพัก (Retention Pond) ก่อนระบายลงสู่คลองกันปึกที่เชื่อมต่อกับทะเลต่อไป กรณีคุณภาพน้ำไม่ได้ตามค่ามาตรฐานกำหนดจะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ 	- พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำระบายทิ้งจากหอผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) จะรวบรวมลงบ่อพัก (Sump) เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไปยังระบบระบายน้ำฝนที่ไม่มีการปนเปื้อน แล้วรวบรวมลงสู่บ่อรองรับของเขตประกอบการฯ (Collection Pond) และบ่อพัก (Retention Pond) ต่อไป 	-	ภาพที่ 2.2-11 ถึง 2.2-12

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- Desaller Wastewater จากหน่วย ADU 2 ปริมาณ ประมาณ 1,456.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน (60.7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) จะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดแบบ CPI และ IAF เพื่อทำการบำบัดเบื้องต้น แล้วจึงส่งเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพขนาด 132 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ประกอบด้วย บ่อพักน้ำเสีย CPI และ IAF เพื่อบำบัดน้ำ Desaller Wastewater เบื้องต้น แล้วจึงส่งเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-6 ถึง 2.2-9 และ 2.2-15
	- น้ำ Stripped Water จากหน่วย SWS 2, 3 และ 4 ปริมาณประมาณ 3,355.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่งไปยังส่วนต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ส่งกลับไปใช้ที่หน่วย ADU 2 (Desaller) ของโครงการ 712.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน • ส่งกลับไปใช้ที่หน่วย DHT ของโครงการ 156 ลูกบาศก์เมตร/วัน • ส่งกลับไปโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ 91.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน • ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ 2,395.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน 	- พื้นที่โครงการ	- น้ำ Stripped Water ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพจากหน่วย SWS 2, 3 และ 4 จะถูกส่งน้ำกลับไปใช้ที่หน่วย ADU2, หน่วย DHT, โรงงานแปรรูปสภาพ คอมไบน์แก๊สออยล์ และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หน่วยแยกก๊าซกรดที่ 4 (SWS4) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	- น้ำระบายทิ้งจากระบบผลิตไอน้ำ (Boiler Blowdown) ที่เกิดจากหน่วย HMU ของโครงการ ปริมาณประมาณ 19,176 ลูกบาศก์เมตร/วัน (0.799 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) จะถูกส่งเข้าสู่บ่อ Blowdown Water Sump ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พื้นที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) อยู่ในระหว่างก่อสร้างจึงยังไม่มีน้ำระบายทิ้งจากระบบผลิตไอน้ำเข้าสู่บ่อ Blowdown Water Sump หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	2.2 น้ำเสียที่มีลักษณะการระบายแบบไม่ต่อเนื่อง - น้ำล้างย้อน (Back Wash) ระบบทรายกรองจากหน่วย LSU 2 (เกิดไม่ต่อเนื่อง เกิดขึ้น 2 ปี/ครั้ง) ปริมาณประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะรวบรวมและส่งเข้าระบบบำบัดแบบ IAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- น้ำล้างย้อน (Back Wash) ของโครงการจะรวบรวมและส่งเข้าระบบบำบัดแบบ IAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-7 และ 2.2-15

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- น้ำล้างย้อนท่อหล่อเย็น (Cooling Water Back Wash) (เกิดไม่ต่อเนื่อง เกิดขึ้น 1 ครั้ง/สัปดาห์) ปริมาณประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายไปที่ระบบระบายน้ำฝนแล้วลงสู่บ่อรองรับของเขตประกอบการฯ (Collection Pond) และส่งต่อไปยังบ่อพัก (Retention Pond) จำนวน 4 บ่อ ต่อเนื่องกัน ก่อนระบายลงสู่คลองกันปึกที่เชื่อมต่อกับทะเลต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- น้ำล้างย้อนท่อหล่อเย็น (Cooling Water Back Wash) ของโครงการจะระบายไปที่ระบบระบายน้ำฝนแล้วลงสู่บ่อรองรับของเขตประกอบการฯ (Collection Pond) และส่งต่อไปยังบ่อพัก (Retention Pond)	-	ภาพที่ 2.2-11 ถึง 2.2-12
	- น้ำเสียจากกิจกรรมการล้างพื้น เป็นน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน (Oily Water) (เกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมการล้างถังหรืออุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น (เกิดไม่ต่อเนื่อง) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> หน่วย ADU 2, LSU 2 และ GCU 2 ปริมาณประมาณ 24 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย ADU2 ขนาด 1,830 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ IAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- น้ำเสียจากกิจกรรมการล้างพื้นของหน่วยการผลิต ADU2, LSU2 และ GCU2 จะรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย ADU2 ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ IAF เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแล้วส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพและระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-6 ถึง 2.2-9 และ 2.2-15
	<ul style="list-style-type: none"> หน่วย DHT ปริมาณสูงสุดประมาณ 24 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย DHT ขนาด 20.77 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ IAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หน่วย DHT อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> หน่วย SRU, SWS2, SWS3, ARU และ TGTU ปริมาณประมาณ 24 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย SRU ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ DAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- น้ำเสียจากกิจกรรมการล้างพื้นของหน่วยเสริมการผลิต หน่วย SRU, SWS2, SWS3, ARU และ TGTU จะรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย SRU ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ DAF เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแล้วส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพและระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-6, ภาพที่ 2.2-8 ถึง 2.2-9 และภาพที่ 2.2-15

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> หน่วย SWS4 ปริมาณประมาณ 24 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย SWS4 ขนาด 24.48 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ DAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หน่วยแยกก๊าซกรดที่ 4 (SWS4) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> หน่วย HMU ปริมาณประมาณ 24 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย HMU ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งไปยังบ่อดักน้ำมันและระบบบำบัดแบบ CPI ของโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) เพื่อทำการบำบัดขั้นต้นก่อนส่งน้ำเสียดังกล่าวไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หน่วย DHT อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงทำให้ไม่มีน้ำเสียจากกิจกรรมล้างพื้นระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	
	<ul style="list-style-type: none"> น้ำฝนปนเปื้อนที่ตกในพื้นที่กระบวนการผลิตและส่วนเสริมการผลิต 15 นาที่แรก ซึ่งเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> น้ำฝนที่ตกในพื้นที่กระบวนการผลิต 15 นาที่แรกของหน่วย ADU2, GCU2 และ LSU2 ปริมาณสูงสุดประมาณ 295.99 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมเข้าบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย ADU2 ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ IAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพ ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- น้ำฝนปนเปื้อนจากหน่วยการผลิต ADU2, GCU2 และ LSU2 จะถูกรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมัน ADU2 ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ IAF เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแล้วส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในน้ำทิ้ง และระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-6 ถึง 2.2-9 และ 2.2-15
	<ul style="list-style-type: none"> น้ำฝนที่ตกในพื้นที่กระบวนการผลิต 15 นาที่แรกของหน่วย DHT ปริมาณสูงสุดประมาณ 340.47 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมเข้าบ่อร์บน้ำฝนของหน่วย DHT ขนาด 359.10 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ IAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพของหน่วย ADU2 ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พื้นที่หน่วย DHT อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ่อร์บน้ำฝนของหน่วย DHT หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ส่วนเสริมการผลิต 15 นาที่แรกของหน่วย SWS2&3, ARU, SRU และ TGTU ปริมาณสูงสุดประมาณ 149.11 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมเข้าบ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย SRU ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ DAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพของหน่วย SRU ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- น้ำฝนปนเปื้อนจากหน่วยเสริมการผลิต SWS2&3, ARU, SRU และ TGTU จะถูกรวบรวมรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำและน้ำมัน SRU ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ DAF เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแล้วส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพ SRU เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในน้ำทิ้ง และระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-6, 2.2-8 ถึง 2.2-9, 2.2-15
	<ul style="list-style-type: none"> น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ส่วนเสริมการผลิต 15 นาที่แรก ของหน่วย SWS4 ปริมาณสูงสุดประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมเข้าบ่อรับน้ำฝนของหน่วย SWS4 ขนาด 76.50 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ DAF และบ่อตรวจสอบคุณภาพของหน่วย SRU ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- น้ำฝนปนเปื้อนจากหน่วยเสริมการผลิต SWS4 จะถูกรวบรวมเข้าบ่อรับน้ำฝนของหน่วย SWS4 ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดแบบ CPI และ DAF เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแล้วส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพ SRU เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในน้ำทิ้ง และระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป ซึ่งหน่วยการผลิต SWS4 อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจึงยังไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้น	-	
	<ul style="list-style-type: none"> น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ส่วนการผลิต 15 นาที่แรก ของหน่วย HMU ปริมาณสูงสุดประมาณ 308.76 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง จะรวบรวมเข้าบ่อรับน้ำฝนของหน่วย HMU ขนาด 313.92 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งไปยังบ่อดักน้ำมันและระบบบำบัดแบบ CPI ของโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) เพื่อทำการบำบัดขั้นต้นก่อนส่งน้ำเสียดังกล่าวไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป 	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 บ่อรับน้ำฝนของหน่วย HMU อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	ภาพที่ 2.2-14 และ 2.2-16
	3.2 ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบ CPI และ IAF ของหน่วย ADU2 ให้สามารถรองรับน้ำเสียได้สูงสุด 125 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยทำการปรับปรุงระบบ CPI และติดตั้งระบบ Flocculation เพื่อช่วยให้การตกตะกอนของอนุภาคของแข็ง (Solid) มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	- ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบ CPI และ IAF ของหน่วย ADU 2	- โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบ CPI และ IAF ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้สูงสุด 125 ลูกบาศก์เมตร/วัน	-	ภาพที่ 2.2-6 ถึง 2.2-7

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	3.3 จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำในพื้นที่ส่วนการผลิตของ ADU2, GCU2, LSU2 ขนาด 1,830 ลูกบาศก์เมตร (บ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย ADU2) และในพื้นที่ส่วนการผลิตของหน่วย DHT ขนาด 359.1 ลูกบาศก์เมตร (บ่อบำบัดน้ำของหน่วย DHT) เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนปนเปื้อนที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าวได้ทั้งหมด โดยน้ำฝนปนเปื้อนดังกล่าวจะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดแบบ CPI (ความสามารถในการบำบัด 125 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) และระบบ IAF (ความสามารถในการบำบัด 125 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) ด้วยอัตราการไหล 43 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อทำการบำบัดเบื้องต้น แล้วจึงส่งเข้าสู่บ่อบำบัดตรวจสอบคุณภาพขนาด 132 ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในน้ำทั้งด้วยเครื่อง Oil Content Analyzer ซึ่งในกรณีที่ตรวจวัดแล้วพบว่าปริมาณน้ำมันปนเปื้อนไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป แต่ในกรณีที่ตรวจวัดแล้วพบว่าปริมาณน้ำมันในน้ำทั้งหมดมากกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งกลับไปที่บ่อ ADU2 เพื่อทำการบำบัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง สำหรับน้ำฝนที่ไม่ปนเปื้อนจะไหลไปตามรางระบายซึ่งเชื่อมต่อกับรางระบายน้ำฝนของกลุ่มโรงงานไออาร์พีซีและระบายลงสู่บ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Retention Pond) ต่อไป	- พื้นที่ส่วนการผลิตของโครงการ	- โครงการมีบ่อบำบัดน้ำฝนเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ส่วนการผลิตของ ADU2, GCU2, LSU2 และ DHT (บ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย ADU2 และบ่อบำบัดน้ำฝนของหน่วย DHT) โดยน้ำฝนปนเปื้อนดังกล่าวจะส่งเข้าสู่ CPI และ IAF เพื่อทำการบำบัดเบื้องต้นแล้วส่งต่อไปยังบ่อบำบัดตรวจสอบเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในน้ำทิ้ง ซึ่งการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำฝนจะตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (ในช่วงฝนตก) โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไออาร์พีซีมีปริมาณน้ำมันปนเปื้อนไม่เกิน 20 มก./ล.	-	รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3
	3.4 จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำในพื้นที่ส่วนเสริมการผลิต SWS2&3, ARU, SRU และ TGTU ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร (บ่อแยกน้ำและน้ำมันของหน่วย SRU) และในพื้นที่ของหน่วย SWS4 ขนาด 76.5 ลูกบาศก์เมตร (บ่อบำบัดน้ำฝนของหน่วย SWS4) เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนปนเปื้อนที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าวได้ทั้งหมด โดยน้ำฝนดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบบำบัดแบบ CPI (ความสามารถในการบำบัด 39 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) และระบบบำบัดแบบ DAF ขนาด 47.73 ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำการบำบัดเบื้องต้น แล้วจึงส่งเข้าสู่บ่อบำบัดตรวจสอบคุณภาพขนาด 12.98 ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในน้ำทิ้ง ซึ่งในกรณีที่ตรวจวัดแล้วพบว่า มีปริมาณน้ำมันปนเปื้อนไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป แต่ในกรณีที่ตรวจแล้วพบว่าปริมาณน้ำมันในน้ำทั้งหมดมากกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไปที่บ่อ SRU เพื่อทำการบำบัดใหม่อีกครั้ง	- พื้นที่ส่วนการผลิตของโครงการ	- โครงการมีบ่อบำบัดน้ำฝนในพื้นที่ส่วนเสริมการผลิต SWS2&3, ARU, SRU และ TGTU บ่อบำบัดน้ำและน้ำมันของหน่วย SRU และบ่อบำบัดน้ำฝนของหน่วย SWS4 โดยน้ำฝนดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบบำบัดแบบ CPI และ DAF เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแล้วส่งต่อไปยังบ่อบำบัดตรวจสอบเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในน้ำทิ้ง อย่างไรก็ตาม หากพบว่าคุณภาพน้ำมีปริมาณน้ำมันปนเปื้อนเกิน 20 มก./ล. โครงการจะนำกลับไปที่บ่อบำบัดใหม่ที่บ่อ SRU จนมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด จากนั้นจึงส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หน่วยแยกก๊าซกรดที่ 4 (SWS4) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	ภาพที่ 2.2-6 ถึง 2.2-13 และ 2.2-15

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	3.5 จัดให้มีบ่อกักน้ำฝนในพื้นที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) ขนาด 313.92 ลูกบาศก์เมตร (บ่อ HMU) เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนบนพื้นที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าวได้ทั้งหมด โดยน้ำฝนดังกล่าวจะส่งเข้าบ่อดักน้ำมันขนาด 813 ลูกบาศก์เมตร และระบบบำบัดแบบ CPI (ความสามารถในการบำบัด 36 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) ของโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) เพื่อทำการบำบัดเบื้องต้น และส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	- พื้นที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) ของโครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 บ่อกักน้ำฝนในพื้นที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	3.6 กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ออกจากหน่วยบำบัดโดยโครงการ (Internal Check) เพื่อควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนดก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ ดังนี้ 1) บริเวณ Discharge 42P028A/B/C ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD ₅) ค่าซีโอดี (COD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2) บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพของหน่วย SRU (ขนาด 12.98 ลูกบาศก์เมตร) ตรวจวัดปริมาณน้ำมัน (Oil Content) เมื่อจะมีการระบายน้ำออกเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2	- ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ	- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในบริเวณ Discharge 42P028A/B/C และบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพของหน่วย SRU เมื่อมีการระบายน้ำออกเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 เพื่อให้มีน้ำมีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนดก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามมาตรฐานน้ำเสียที่ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ	-	เอกสารแนบที่ 16 ในภาคผนวกที่ 1
	3.7 จัดให้มี TDS Online Analyzer จำนวน 1 ชุด เพื่อตรวจวัดค่า TDS ของน้ำ Cooling Water Blowdown ภายในบ่อ (Cooling Water Blowdown Sump) ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร หากค่า TDS มีค่าสูงถึงค่าเผื่อระวังของโครงการ (High Alarm) คือ 2,300 มิลลิกรัม/ลิตร เครื่อง TDS Online จะส่งสัญญาณเตือน (Alarm) ไปยังห้องควบคุม โดยพนักงานจะตรวจสอบกิจกรรมไหลดสารเคมี และส่งน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	- Cooling Water Blowdown Sump	- โครงการมี TDS Online Analyzer เพื่อตรวจวัดค่า TDS ของน้ำ Cooling Water Blowdown ภายในบ่อ Cooling Water Blowdown Sump หากค่า TDS มีค่าสูงถึงค่าเผื่อระวังเครื่อง TDS Online จะส่งสัญญาณเตือนไปยังห้องควบคุม โดยพนักงานจะตรวจสอบกิจกรรมไหลดสารเคมี และส่งน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	3.8 จัดให้มี COD Online Analyzer จำนวน 1 ชุด เพื่อตรวจวัดค่า COD ของน้ำ Boiler Blowdown จากหน่วย HMU ภายในบ่อ (Blowdown Water Sump) ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร หากค่า COD มีค่าสูงถึงค่าเฝ้าระวังของโครงการ (High Alarm) คือ 1,130 มิลลิกรัม/ลิตร เครื่อง COD Online จะส่งสัญญาณเตือน (Alarm) ไปยังห้องควบคุม โดยพนักงานจะตรวจสอบกิจกรรมไหลตลิ่งและเคมี และทำการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับ Analyzer และประสานกับเจ้าหน้าที่ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ ว่าสามารถรับได้หรือไม่ ก่อนจะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ไม่สามารถรับน้ำส่วนนี้ไปบำบัดได้ โครงการจะหยุดการระบายน้ำทิ้ง Boiler Blowdown และติดต่อให้หน่วยงานภายนอกมาสูบไปบำบัดต่อไป	- Blowdown Water Sump บริเวณหน่วย HMU	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หน่วยผลิตไฮโดรเจน (HMU) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการติดตั้ง COD Online Analyzer เพื่อตรวจวัดค่า COD ของน้ำ Boiler Blowdown ตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	3.9 ควบคุมให้คุณภาพน้ำเสียที่ปล่อยออก (Effluent) จากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการให้ได้ตามเกณฑ์น้ำเสียที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ที่กำหนดไว้เบื้องต้น ดังนี้ 1) น้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย ADU2 - pH มีค่าอยู่ในช่วง 5-10 - SS มีค่าไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/ลิตร - BOD ₅ มีค่าไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร - COD มีค่าไม่เกิน 750 มิลลิกรัม/ลิตร - Oil & Grease มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2) น้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU - pH มีค่าอยู่ในช่วง 5-10 - SS มีค่าไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/ลิตร - BOD ₅ มีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร - COD มีค่าไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร - Oil & Grease มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	- ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ	- โครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้ได้ตามมาตรฐานน้ำเสียที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด ทั้งนี้ ทางโครงการได้นำน้ำทิ้งส่งไปบำบัดใหม่จนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-14 และรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	3) น้ำ Stripped Water ที่ออกจากหน่วย SWS - pH มีค่าอยู่ในช่วง 5-10 - SS มีค่าไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/ลิตร - BOD ₅ มีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร - COD มีค่าไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร - Oil & Grease มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้หากเขตประกอบการฯ มีการปรับเปลี่ยนค่าควบคุมคุณภาพน้ำเสีย โครงการจะปฏิบัติตามค่าควบคุมใหม่				
	3.10 น้ำเสียหลังผ่านการบำบัดเบื้องต้นจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของเขตประกอบการฯ ซึ่งเป็นระบบบำบัดแบบ Activated Sludge โดยในกรณีที่คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดเบื้องต้นของโครงการมีคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง โครงการจะต้องนำไปบำบัดใหม่จนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการมีการส่งน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดเบื้องต้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ (WWT2 และ WWT3) ของ IRPC อย่างไรก็ตามหากพบว่าคุณภาพน้ำไม่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โครงการจะนำกลับไปบำบัดใหม่จนมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด	-	ภาพที่ 2.2-15 และ 2.2-16
	3.11 เขตประกอบการฯ กำหนดให้มีการควบคุม และตรวจสอบน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (WWTP2) ของเขตประกอบการ	- โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560	-	-
	3.12 เขตประกอบการฯ จัดให้มีการนำน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการไออาร์พีซีไปรดต้นไม้ สนามหญ้า พื้นที่สีเขียว หรือนำกลับไปใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้ง	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (WWTP2) ของเขตประกอบการ	- เขตประกอบการฯ ได้มีการระบายน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานลงสู่ทะเล โดยการดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว	-	-
	3.13 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่เสมอ	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่เสมอ	-	เอกสารแนบที่ 13 ในภาคผนวกที่ 1
4. คุณภาพน้ำใต้ดิน	4.1 กำหนดให้จัดทำทิศทางไหลของน้ำใต้ดินภาคสนามให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการส่วนขยายในครั้งที่ 3	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจะดำเนินการจัดทำทิศทางไหลของน้ำใต้ดินให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการในส่วนขยาย	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	5.1 จัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำฝนของกลุ่มโรงงานฯ และระบายลงสู่บ่อกักน้ำต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีรางระบายน้ำฝนภายในโรงกลั่นเชื่อมต่อกับรางระบายน้ำฝนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ	-	ภาพที่ 2.2-10
	5.2 จัดให้มีการขุดลอกรางระบายน้ำฝนเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการขุดลอกรางระบายน้ำฝนตามแผนการขุดลอกรางระบายน้ำฝนเป็นประจำทุกปี	-	เอกสารแนบที่ 56 ในภาคผนวกที่ 1
6. การจัดการกากของเสีย	6.1 ดำเนินการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการให้ส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ให้บริการรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือตามวิธีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาต	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 โดยของเสียที่เกิดขึ้นโครงการให้ส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	-
	6.2 จัดแบ่งกากของเสียเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กากของเสียอันตราย และกากของเสียไม่อันตราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) กากของเสียอันตราย 1.1) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งาน - ตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานประเภทนิกเกิลโมลิบดีนัม/อะลูมิเนียมออกไซด์จากหน่วย DHT 430.18 ตัน/3 ปี	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดีนัม/อะลูมิเนียมออกไซด์ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างส่วนการผลิต DHT ดังนั้น จึงยังไม่มี Spent Catalyst เกิดขึ้น	-	-
	- ตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานประเภท Activated Alumina จากหน่วย SRU 18 ตัน/4 ปี	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการไม่มีการส่งตัวเร่งปฏิกิริยา Activated Alumina ที่เสื่อมสภาพ ไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	เอกสารแนบที่ 18 ในภาคผนวกที่ 1
	- ตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานประเภทโคบอลต์โมลิบดีนัม/อะลูมิเนียมออกไซด์ จากหน่วย TGTU 8.06 ลูกบาศก์เมตร/4 ปี	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการไม่มีการส่งตัวเร่งปฏิกิริยา โคบอลต์โมลิบดีนัม/อะลูมิเนียมออกไซด์ ที่เสื่อมสภาพ ไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	เอกสารแนบที่ 18 ในภาคผนวกที่ 1
	- ตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานประเภทโคบอลต์โมลิบดีนัมหรือนิกเกิลโมลิบดีนัม จากหน่วย HMU 47 ลูกบาศก์เมตร/4 ปี	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์โมลิบดีนัม/อะลูมิเนียมออกไซด์ เนื่องจากโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU	-	-
	- ตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานประเภทนิกเกิลจากหน่วย HMU (Pre-Reforming and Steam Reforming) 19.38 ลูกบาศก์เมตร/4 ปี	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล เนื่องจากโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
6. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)	- ตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานประเภทคอปเปอร์ออกไซด์/สังกะสีออกไซด์ จากหน่วย HMU 15.5 ลูกบาศก์เมตร/4 ปี ตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานจะส่งไปกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์/สังกะสีออกไซด์ เนื่องจากโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU	-	
	1.2) สารดูดซับที่หมดอายุการใช้งาน - Activated Garbon ที่เสื่อมสภาพจากหน่วย ARU 12 ตัน/4 ปี	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการไม่มีการส่ง Activate Carbon ที่เสื่อมสภาพไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	เอกสารแนบที่ 17 และ 18 ในภาคผนวกที่ 1
	- สารดูดซับกัมมะถันประเภท (ZnO) จากหน่วย HMU 28 ลูกบาศก์เมตร/ปี	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้สารดูดซับกัมมะถันประเภท ZnO เนื่องจากโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU	-	-
	- สารดูดซับคลอไรด์ประเภท (Na ₂ O) จากหน่วย HMU 9 ลูกบาศก์เมตร/4 ปี	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้สารดูดซับคลอไรด์ประเภท Na ₂ O เนื่องจากโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างหน่วย HMU	-	-
	- สารดูดซับประเภทโมเลกุลาร์ซีฟ จากหน่วย HMU 350 ลูกบาศก์เมตร/10 ปี สารดูดซับที่หมดอายุการใช้งานจะส่งไปกำจัดยังหน่วยงานกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้สารดูดซับประเภทโมเลกุลาร์ซีฟ เนื่องจากโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างหน่วย HMU	-	-
	1.3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Spent Caustic) จาก Caustic Prewash Tower และ Extractor ของหน่วย LSU2 ปริมาณรวม 5 ลูกบาศก์เมตร/เดือน จะถูกรวบรวมลงถังเก็บ (63T004) บริเวณลานถังของโครงการโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออกไซด์ก่อนจะส่งไปกำจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการมีการส่ง โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ผ่านการใช้งานแล้วจาก Caustic Prewash Tower และจาก Extractor ของหน่วย LSU2 รวบรวมลงถังเก็บ 63T004 บริเวณลานถังของโครงการโรงงานแปรรูปสภาพคอมไบน์แก๊สออกไซด์ก่อนจะส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	เอกสารแนบที่ 17 และ 18 ในภาคผนวกที่ 1
	1.4) ทรายกรองที่ถ่ายออกเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ LSU2 ปริมาณ 20 กิโลกรัม/4 ปี จะส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการไม่มีการส่ง ทรายกรองจากหน่วย LSU2 ไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	-
	1.5) คราบน้ำมันจากบ่อแยกน้ำมัน CPI และ IAF ปริมาณ 24.23 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวบรวมใส่ Slop Oil Tank ขนาด 4,100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง เพื่อนำกลับไปทำการกลั่นใหม่	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการมีการรวบรวม คราบน้ำมันจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น CPI และ IAF ไว้ใน Slop Oil Tank เพื่อนำกลับไปกลั่นใหม่	-	ภาพที่ 2.2-17

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
6. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)	1.6) กากตะกอนน้ำมัน (Sludge Oil) จากบ่อแยกน้ำมัน CPI และ IAF ปริมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/ปี ส่งไปกำจัดเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการมีการส่งกากตะกอนน้ำมันจากบ่อแยกน้ำมัน CPI และ IAF ไปกำจัดยังบริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ		เอกสารแนบที่ 17 และ 18 ในภาคผนวกที่ 1
	1.7) ของเสียที่เกิดจากงานซ่อมบำรุงหรือเสื่อมสภาพเงื่อนไขจากการทำงาน - กำมะถันปนเปื้อน (Dirty Sulfur) จากงานหยุดการผลิต (Shutdown) หน่วย SRU 7 ตัน/ปี	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการมีกำมะถันปนเปื้อน ที่เสื่อมสภาพไปกำจัดยังบริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	เอกสารแนบที่ 17 และ 18 ในภาคผนวกที่ 1
	- ตัวกรอง (Filter) จากหน่วย DHT และหน่วย TGTU 2 ตัน/ปี	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการไม่มีการส่งตัวกรองจากหน่วย TGTU ที่เสื่อมสภาพไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	-
	- ถุงกรอง (Filterbag) จากหน่วย DHT และหน่วย ARU 5 ตัน/ปี	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการไม่มีการส่งถุงกรองจากหน่วย ARU ที่เสื่อมสภาพไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	-
	- เอมินที่ผ่านการใช้งานแล้ว จากหน่วย TGTU 25 ลูกบาศก์เมตร/ปี	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการมีการส่งเอมินที่ผ่านการใช้งานแล้วจากหน่วย TGTU ไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	เอกสารแนบที่ 17 และ 18 ในภาคผนวกที่ 1
	- ฟอลย์หุ้มห่อหล่อเย็น (Foil pack Cooling Tower) 35 ตัน/10 ปี กำมะถันปนเปื้อนจะส่งไปกำจัดในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย สำหรับตัวกรอง ถุงกรอง และเอมินที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการไม่มีการส่งฟอลย์หุ้มห่อหล่อเย็น ไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	-
	2) กากของเสียไม่อันตราย - กากของเสียจากกิจกรรมประจำวันพนักงานประมาณ 67.2 กิโลกรัม/วัน จะทำการเก็บรวบรวมและคัดแยก โดยจัดให้มีถังเก็บที่มีขนาดเพียงพอเหมาะสมพร้อมฝาปิดมิดชิดเพื่อรวบรวมมูลฝอยจากอาคารสำนักงานให้หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดรวมถึงจัดสร้างพื้นที่รวบรวมของเสีย เพื่อเก็บรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประจำวันของพนักงานพร้อมทั้งประสานงานให้เทศบาลตำบลเชิงเนินดำเนินการรับไปกำจัดต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-18 และเอกสารแนบที่ 19 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
6. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)	6.3 รวบรวมกากตะกอนส่วนเกิน และคราบน้ำมันจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น CPI และ IAF ไว้ใน Slop Oil Tank เพื่อนำกลับไปกลั่นใหม่	- ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ	- โครงการได้รวบรวมกากตะกอนและคราบน้ำมันจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น CPI และ IAF ไว้ใน Slop Oil Tank เพื่อนำกลับไปกลั่นใหม่	-	ภาพที่ 2.2-16
	6.4 กากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการต้องมีการเก็บรวบรวมเพื่อส่งไปกำจัดโดยรถขนส่งกากของเสียจากจุดเก็บรวบรวมออกนอกเขตประกอบการฯ ต้องติดตั้งระบบ GPS และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังเขตประกอบการฯ	- รถขนส่งกากของเสียที่ขนส่งออกนอกเขตประกอบการฯ	- โครงการมีการเก็บรวบรวมกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อส่งไปกำจัดนอกเขตประกอบการฯ โดยรถขนส่งกากของเสียที่มีการติดตั้งระบบ GPS และการติดเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง เรื่องร้องเรียนมายังเขตประกอบการฯ	-	ภาพที่ 2.2-19 และเอกสารแนบที่ 20 ในภาคผนวกที่ 1
	6.5 จัดให้มีการคัดแยกขยะและมีการจัดการที่เหมาะสม เช่น ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เป็นต้น โดยรวบรวมเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการการคัดแยกขยะและมีการจัดการที่เหมาะสม โดยรวบรวมและจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	ภาพที่ 2.2-18
	6.6 จัดเตรียมภาชนะแยกตามประเภทของขยะมูลฝอย พร้อมทั้งติดตั้งฉลากแยกประเภทมูลฝอยที่ภาชนะ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีการแยกประเภทของขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ	-	ภาพที่ 2.2-18
	6.7 จัดให้มีพื้นที่จัดเตรียมกากของเสียเป็นอาคารจัดเก็บที่เป็นพื้นซีเมนต์ที่มีหลังคาปิดคลุมมิดชิด รวมทั้งจัดแบ่งพื้นที่ตามประเภทของของเสียและจัดให้มีคันกัน (Bund) ล้อมรอบพื้นที่จัดเก็บกากของเสีย เพื่อรวบรวมน้ำฝนในพื้นที่ลานจัดเก็บกากของเสีย สำหรับพื้นที่ภายในอาคารจัดเก็บของเสียจะมีรางรวบรวมสารเคมีหกรั่วไหล และน้ำเสียจากการทำความสะอาดอาคาร เพื่อรวบรวมไปยังบ่อรวมน้ำฝนบนเนิน และส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียแบบ CPI และส่งไปยังเขตประกอบการฯต่อไป รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการปฏิบัติงานภายในบริเวณอาคารจัดเก็บของเสีย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บกากของเสียที่เป็นอาคารที่มีหลังคาปิดคลุมมิดชิดและจัดให้มีคันกัน Bund ล้อมรอบพื้นที่จัดเก็บกากของเสีย	-	ภาพที่ 2.2-18 และ 2.2-20
7. เสียง	7.1 จัดให้มีห้องควบคุมเพื่อป้องกันการสัมผัสเสียงดังแก่พนักงาน	- พื้นที่ส่วนการผลิตและส่วนเสริมการผลิต	- โครงการมีห้องควบคุมเครื่องจักร (Control Room) เพื่อป้องกันการสัมผัสเสียงดังแก่พนักงาน	-	ภาพที่ 2.2-21
	7.2 จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหาก หรือในห้องปิด โดยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้รับการบำรุง ดูแลรักษาตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังจากเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ	- พื้นที่ส่วนการผลิตและส่วนเสริมการผลิต	- โครงการมีการแยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหาก และทำการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ตลอดเวลา ตามแผนการตรวจสอบบำรุง เพื่อลดระดับเสียง พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ลดระดับเสียง เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	-	ภาพที่ 2.2-22

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
7. เสียง (ต่อ)	7.3 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันด้านทิศตะวันตกระหว่างพื้นที่ลานถังของโออาร์พีซีกับชุมชนภายนอกบริเวณริมรั้วเป็นแนวยาว เพื่อช่วยลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้น	- ตลอดแนวรั้วของพื้นที่ลานถังของเขตประกอบการฯ	- โครงการมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ระหว่างลานถังกับชุมชนภายนอกเพื่อเป็นแนวป้องกันช่วยลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นจากพื้นที่โครงการ	-	ภาพที่ 2.2-23
	7.4 พิจารณาควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด โดยเลือกเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีระดับเสียงดังไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) หรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง ทั้งนี้หากพบระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบล(เอ) ขึ้นไป ให้ติดตั้งเตีอนเพื่อกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีเสียงดัง และควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงดัง อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งเตีอนในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A) พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	-	ภาพที่ 2.2-24 ถึง 2.2-25
	7.5 กำหนดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน เพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันลดเสียงดังตามแผน Preventive Maintenance	-	เอกสารแนบที่ 12 ในภาคผนวกที่ 1
8. การคมนาคม	8.1 จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการขนถ่ายด้านความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานขับรถ และพนักงาน ขนถ่ายก่อนเข้าทำงานเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน และมีการตรวจสอบเสฟติตี้ของพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ	-	เอกสารแนบที่ 21 ในภาคผนวกที่ 1
	8.2 ตรวจสอบเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนใช้งาน เช่น ระบบเบรก เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบเช็คสภาพรถ เช่น ระบบเบรก ทุกครั้งก่อนใช้งาน	-	เอกสารแนบที่ 22 ในภาคผนวกที่ 1
	8.3 หลีกเลี่ยงการขนส่งขณะช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง ได้แก่ ช่วงเวลา 07.30-08.30 น. และ 16.30-17.30 น. และช่วงพักผ่อนของชุมชนรอบข้าง ได้แก่ 19.00-04.00 น.	- เส้นทางขนส่งในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการมีการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาคับคั่ง และใช้ถนนเลี่ยงเมืองที่ไม่ผ่านชุมชน เพื่อลดการรบกวนต่อการจราจรภายในเมืองและชุมชนรอบข้าง	-	-
	8.4 ใช้เส้นทางสาย 36 เลี่ยงเมืองแทนการวิ่งผ่านถนนใหญ่เข้าเมือง	- เส้นทางขนส่งในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการได้กำหนดให้ใช้เส้นทาง 36 เลี่ยงเมืองแทนการวิ่งผ่านถนนใหญ่ เข้าเมือง	-	-
	8.5 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการ และมีประจำอยู่ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา	-	ภาพที่ 2.2-26

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
8. การคมนาคม (ต่อ)	8.6 การขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ต้องควบคุมให้บริษัทผู้ขนส่งจัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งและข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) พร้อมทั้งติดชื่อสารเคมี รายละเอียดความเป็นพิษ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ รวมทั้งจัดให้มีคู่มือการระงับอุบัติเหตุจากวัตถุอันตรายซึ่งระบุขั้นตอนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานขับรถ	- รถที่ใช้ในการขนส่งของโครงการ	- โครงการได้ให้บริษัทขนส่งติดตั้งป้ายชื่อบริษัท ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) และเบอร์โทรศัพท์ให้กับรถที่ใช้ในการขนส่งของโครงการ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังเขตประกอบการฯ	-	ภาพที่ 2.2-27
	8.7 ควบคุมน้ำหนักในการบรรทุกไม่ให้เกินความสามารถสูงสุดในการบรรทุกและไม่เกินกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวการจราจร	- รถที่ใช้ในการขนส่งของโครงการ	- โครงการมีการควบคุมน้ำหนักในการบรรทุกไม่ให้เกินความสามารถสูงสุดในการบรรทุกและไม่เกินกฎหมายกำหนด	-	
	8.8 คัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ	- รถที่ใช้ในการขนส่งของโครงการ	- โครงการมีการคัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ	-	ภาพที่ 2.2-19
	8.9 ติดป้ายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อดูแลเงินลงบนรถขนส่งสารเคมีและผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	- รถที่ใช้ในการขนส่งของโครงการ	- โครงการได้ติดป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อดูแลเงินลงบนรถขนส่งสารเคมีและผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังเขตประกอบการฯ	-	ภาพที่ 2.2-27
9. สังคม-เศรษฐกิจ	9.1 พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีนโยบายในการพิจารณาจัดจ้างคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับตำแหน่งงานเป็นพนักงานของโครงการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พนักงานของโครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) เป็นพนักงานท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน 21 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84%	-	เอกสารแนบที่ 23 ในภาคผนวกที่ 1
	9.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบๆ โครงการ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยชุมชน และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีกับโครงการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่นขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีกับโครงการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ (การทำเค้กกล้วยธัญพืชไร้แป้ง, งานปีใหม่), กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 9 วัด, กิจกรรมปลูกป่าเพื่อชุมชน และกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ วัดบ้านดอน เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1
	9.3 จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของชุมชนรอบๆ โครงการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทางเขตประกอบการฯ จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่อยู่รอบเขตประกอบการฯ เป็นประจำทุกปี	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
9. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	9.4 จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อมูลของโครงการให้ชุมชนใกล้เคียงประชาชนทั่วไป และบริษัทข้างเคียงที่อยู่ในเขตประกอบการฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามแผนงานของโครงการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการบริษัทข้างเคียงที่อยู่ในเขตประกอบการฯ	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปทราบ โดยการติดต่อเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท	-	เอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1
	9.5 ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับเขตฯ ตามแผนประชาสัมพันธ์ของเขตประกอบการฯ ดังนี้ 1) กิจกรรมให้ความรู้ (Education Activities) - จัดทำเอกสารเผยแพร่ และสื่อสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุท้องถิ่น จดหมายข่าว แผ่นพับ สไลด์ และเอกสารอื่นๆ เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่	- โครงการมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการแจกให้กับตัวแทนชุมชน เพื่อกระจายข่าวสารให้กับชุมชนใกล้เคียง และประชาชนทั่วไปทราบ โดยการติดต่อเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท	-	เอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1
	- จัดกิจกรรมร่วมกับเขตประกอบการฯ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน และการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน		- โครงการได้จัดกิจกรรมร่วมกับเขตประกอบการฯ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน และการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน	-	เอกสารแนบที่ 25 ในภาคผนวกที่ 1
	- เชิญกลุ่มบุคคลเป้าหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงงาน ชมกระบวนการผลิต การป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม ระบบป้องกันมลภาวะ และอุบัติเหตุต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		- โครงการมีการเชิญกลุ่มบุคคลเป้าหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงงาน ชมกระบวนการผลิต การป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม ระบบป้องกันมลภาวะ และอุบัติเหตุต่างๆ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงานเรื่องกระบวนการผลิตภาพรวมโรงกลั่นน้ำมัน ไออาร์พีซี โดยผู้เข้าร่วมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ทั้งยังมีกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ข้างเคียง เข้าร่วมเพื่อสานเสวนาถาม-ตอบปัญหาคลายข้อกังวลใจ เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 25 ในภาคผนวกที่ 1
	- เสนอความรู้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การป้องกันอันตราย และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น		- โครงการปฏิบัติตามมาตรการโดยนำเสนอข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ผู้แทนหน่วยราชการ ผู้แทนชุมชน และประชาชนทราบ	-	เอกสารแนบที่ 25 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
9. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	- จัดให้มีบุคลากรออกเผยแพร่ โดยการบรรยายตามสถานศึกษา และสมาคมต่างๆ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่	- โครงการมีบุคลากรดำเนินการ โดยการบรรยายตามสถานศึกษาและสมาคมต่างๆ	-	-
	- สนับสนุน และร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี		- โครงการได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	-	-
	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและข่าวสารบริษัทฯ ผ่านระบบ TV-LED Display รอบเขตประกอบการฯ		- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและข่าวสารผ่านระบบ TV-LED Display รอบเขตประกอบการฯ	-	-
	- พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เหตุฉุกเฉิน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านระบบแอปพลิเคชัน ส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีได้รับรู้ข่าวสาร		- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เหตุฉุกเฉิน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีได้รับรู้ข่าวสาร	-	-
	2) กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Activities) - ร่วมมือกับราชการ และประชาชนในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น และการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม		- โครงการให้ความร่วมมือกับราชการ และประชาชนในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น และการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม เช่น โครงการหัวใจอาสาหมั่นต้นกล้าปลูกป่าเพื่อชุมชน กิจกรรมสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนนรอบอาคาร รพสต. บ้านดอน เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1
	- ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น		- ทางเขตประกอบการฯ จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่อยู่รอบ เขตประกอบการฯ เป็นประจำทุกปี	-	เอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1
	- จัดให้มีบุคลากรประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มบุคคลต่างๆ อีกทั้งรับทราบปัญหา รวมทั้งการร้องทุกข์ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น		- โครงการมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น	-	ภาพที่ 2.2-41
	- จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตรวจรักษาสุขภาพอนามัยให้ชาวบ้านในชุมชนบริเวณโดยรอบ		- โครงการได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดระยองตรวจรักษาสุขภาพอนามัยให้ชาวบ้านในชุมชนบริเวณโดยรอบเป็นประจำ	-	เอกสารแนบที่ 26 ในภาคผนวกที่ 1
	- สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดระยอง กิจกรรมแม่และเด็กการรณรงค์ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุข ร่วมงานกาชาด		- โครงการได้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ (การทำเค้กกล้วยธัญพืชไร้แป้ง, งานปีใหม่), กิจกรรมปลูกป่าเพื่อชุมชน เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
9. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	- สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับท้องถิ่น	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่	- โครงการได้สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ ร่วมกับท้องถิ่นเช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 9 วัด เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1
	- สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		- โครงการได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ร่วมกับท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเผยแพร่และเรียนรู้ศิลปการแสดงหนังใหญ่ วัดบ้านดอน เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1
	9.6 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและภายนอกโรงงาน และขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือร้องเรียนโดยตรงกับโครงการ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนรับทราบ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำผังขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและภายนอกโครงการ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือร้องเรียนโดยตรงกับโครงการ เป็นต้น	-	ภาพที่ 2.2-41 และเอกสารแนบที่ 27 ในภาคผนวกที่ 1
	9.7 เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ซึ่งพื้นที่โดยรอบมีชุมชนอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มาก และมีประสิทธิภาพในการทำงานจึงให้ร่วมกับเขตประกอบการฯ ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคม เขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (คพอ.) หรือคณะกรรมการพหุภาคี เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการชดเชยเยียวยา ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาคราชการ และตัวแทนภาคเอกชน โดยมีสัดส่วนผู้แทนชุมชนที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร หรือตำแหน่งผู้นำชุมชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบคณะทำงานฯ ในระยะต้นกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดยให้จบวาระชุดปัจจุบันก่อน จึงจะเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งเป็น 3 ปี) และดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ คณะกรรมการฯ อาจพ้นสภาพเมื่อตาย ลาออก ย้ายภูมิลำเนา (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีตัวแทนของโครงการตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) และขาดคุณสมบัติ	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- โครงการได้ร่วมกับเขตประกอบการไออาร์พีซีในการจัดตั้งคณะกรรมการ พหุภาคี เพื่อร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน เสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการชดเชยเยียวยา โดยในปี 2566 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566	-	เอกสารแนบที่ 28 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
9. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>ของคณะกรรมการฯ หากมีกรรมการท่านใดพ้นสภาพตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการท่านใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยคณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประสานงานและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนของชุมชนอันเนื่องมาจากดำเนินงานของโครงการฯ/กลุ่มบริษัท 3) พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น 5) ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่องให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม 6) จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 7) พิจารณาจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการฯ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบชั่วคราวให้เหมาะสมกับชุมชน 8) พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ 9) จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้/การดูงาน ภายใน 6 เดือน หลังจากจัดตั้งและทุก 2 ปี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่หรือตามความเหมาะสม <p>องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนมวลชนสัมพันธ์</p>				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	10.1 จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ 1) การพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2) รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน 3) ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4) สำนักรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น 5) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 6) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 7) การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสำรัวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ	-	เอกสารแนบที่ 29 ถึง 32 ในภาคผนวกที่ 1
	10.2 จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ลดเสียงเป็นที่ครอบหู ปลั๊กอุดหู เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้งาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับงาน รวมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้งานและมีการอบรมการใช้เพื่อใช้ได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-25 และ เอกสารแนบที่ 31 ในภาคผนวกที่ 1
	10.3 กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบให้มีการใช้อย่างถูกต้องและกำหนดวิธีปฏิบัติ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการกำกับให้พนักงานพนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	-	ภาพที่ 2.2-25
	10.4 กำหนดเขตพื้นที่ที่ต้องมีการสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายจากเสียงดัง และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังในเขตพื้นที่ดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดเขตพื้นที่ที่มีเสียงดัง โดยทำการติดป้ายเตือน และ กำหนดให้พนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าวสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง	-	ภาพที่ 2.2-24
	10.5 จัดให้มีห้องควบคุมเครื่องจักร (Control Room) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังแก่คนงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีห้องควบคุมเครื่องจักร (Control Room) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังแก่คนงาน	-	ภาพที่ 2.2-21
	10.6 จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) เพื่อลดโอกาสที่พนักงานจะสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องจากการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) เพื่อลดโอกาสที่พนักงานจะสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องจากการทำงาน	-	เอกสารแนบที่ 33 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	10.7 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการมีการออกแบบตามมาตรฐานของ NFPA ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) วาล์วน้ำดับเพลิงระบบเปิดแบบอัตโนมัติ (Automatic Deluge Valve) จำนวน 17 ชุด 2) วาล์วน้ำดับเพลิงระบบเปิดแบบ Manual (Manual Deluge Valve) จำนวน 19 ชุด 3) หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Water Monitor) จำนวน 40 ชุด 4) อุปกรณ์ตรวจเพลิงไหม้ <ul style="list-style-type: none"> - Heat Detector จำนวน 42 ชุด - Smoke Detector จำนวน 97 ชุด 5) ถังโฟมดับเพลิงเคลื่อนที่ (Portable Mobile Foam) ขนาด 120 ลิตร จำนวน 14 ถัง 6) หัวน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 30 ชุด 7) ถังดับเพลิงชนิดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ Portable Fire Extinguishers) จำนวน 34 ถัง 8) ถังดับเพลิงเคมี <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด 9 กิโลกรัม จำนวน 125 ถัง - ขนาด 56 กิโลกรัม จำนวน 33 ถัง 9) ระบบดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ Fire Extinguishing System) จำนวน 1 ชุด 10) ระบบดับเพลิงก๊าซเฉื่อย (Inergen Fire Extinguishing System) จำนวน 1 ชุด 11) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point) จำนวน 73 ชุด 	- พื้นที่โครงการและเขตประกอบการฯ	- โครงการมีการจัดเตรียมระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ โดยออกแบบตามมาตรฐานของ NFPA	-	ภาพที่ 2.2-28 ถึง 2.2-30 และเอกสารแนบที่ 34 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>12) แหล่งน้ำดับเพลิง (Fired Water Supply) ใช้ร่วมกับเขตประกอบการฯ แบ่งตามพื้นที่ตั้งโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เขตประกอบการฯ ฝั่งทิศใต้ของถนนสุขุมวิท (ฝั่งติดทะเล) (พื้นที่โรงกลั่นฯ) <ul style="list-style-type: none"> * ถังเก็บน้ำขนาด 25,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง * ถังเก็บน้ำอาคารคลังสินค้า ขนาด 1,050 ลูกบาศก์เมตร * บ่อเก็บน้ำ WH 40 ขนาด 1,050 ลูกบาศก์เมตร * น้ำทะเล ปริมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตร - เขตประกอบการฯ ฝั่งทิศเหนือของถนนสุขุมวิท (พื้นที่หน่วย HMU) <ul style="list-style-type: none"> * บ่อน้ำ Reservoir 1 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร * บ่อน้ำ Reservoir 2 0.7 ล้านลูกบาศก์เมตร * บ่อน้ำ Reservoir 3 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร * บ่อน้ำ Reservoir 4 1.0 ล้านลูกบาศก์เมตร * บ่อน้ำ Reservoir 5 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร <p>ระบบน้ำดับเพลิงของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทั้ง 2 ฝั่ง ไม่ได้มีการเชื่อมถึงกัน แต่สามารถใช้รดดับเพลิงทำการบรรทุกน้ำดับเพลิงเข้าทำการสนับสนุนการดับเพลิงได้</p>				
	<p>10.8 มีการติดตั้งระบบ Gas Detector ในพื้นที่ส่วนการผลิต และเสริมการผลิต โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ H₂S Gas Detector และ Hydrocarbon Gas Detector</p> <p>1) H₂S Gas Detector : มีการติดตั้งที่ส่วนการผลิตและที่ส่วนเสริมการผลิต ปัจจุบันมี 31 ภายหลังขยายฯ จะติดตั้งเพิ่มจากเดิมอย่างน้อย 30 ชุด บริเวณหน่วย ADU2, DHT, ARU, SWS4, HMU และ Cooling Tower โดยมีการตั้งค่าเตือนไว้ที่ 2 ระดับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - High : 5 ppm - High High : 20 ppm 	- พื้นที่ส่วนการผลิตและส่วนเสริมการผลิต	- โครงการมีการติดตั้งระบบ Gas Detector ในพื้นที่ส่วนการผลิต และเสริม การผลิต โดยจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ H ₂ S Gas Detector และ Hydrocarbon Gas Detector โดยมีการตั้งค่าการเตือน 2 ระดับ คือ High และ High High ตามมาตรการกำหนด และกรณีที่เกิดการเตือนของ Gas Detector ที่ระดับที่ 1 (High) โครงการจะปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของแต่ละกรณีที่เกิดขึ้น	-	ภาพที่ 2.2-32 ถึง 2.2-33 และเอกสารแนบที่ 40 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>2) Hydrocarbon Gas Detector : มีการติดตั้งที่ส่วนการผลิตและที่ส่วนเสริมการผลิต ปัจจุบันมี 117 ชุด ภายหลังขยายฯ จะติดตั้งเพิ่มจากเดิมอย่างน้อย 100 ชุด บริเวณหน่วย ADU2, DHT, SWS4, HMU และ Cooling Tower โดยมีการตั้งค่าการเตือนไว้ที่ 2 ระดับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - High : 20% LEL - High High : 40% LEL <p>ในกรณีที่เกิดการเตือนของ Gas Detector ที่ระดับที่ 1 (High) พนักงานที่ห้องควบคุมจะแจ้งให้พนักงานที่หน่วยงานตรวจสอบ และแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดการ Alarm โดยพนักงานที่หน่วยงานจะมีการสวมอุปกรณ์ที่เหมาะสมเข้าไปพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดแบบมือถือ ทำการตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดการ Alarm โดยในกรณีที่พนักงานที่หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเกิดการแจ้งเตือนระดับที่ 2 (High High) พนักงานที่ห้องควบคุมจะหยุดหน่วยผลิตที่ทำให้เกิดการ Alarm แล้วแจ้งให้ทาง Maintenance เข้าแก้ไขระบบต่อไป ทั้งนี้หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้พิจารณาเข้าสู่เหตุฉุกเฉินระดับโรงงานต่อไป</p>				
	10.9 จัดให้มีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้น	-	เอกสารแนบที่ 31 ในภาคผนวกที่ 1
	10.10 จัดให้มีเครือข่ายติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานราชการ โรงงานใกล้เคียงสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ทำการจัดตั้งเครือข่ายติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานราชการ และโรงงานใกล้เคียงพื้นที่โครงการสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	
	10.11 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่างๆ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น จัดทำ วารสารความปลอดภัยประจำเดือน (Safety News) แผ่นพับความปลอดภัย จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัย แสดงไว้ใน Intranet จัดสัปดาห์ความปลอดภัย (ภายในบริษัท) เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 32 ในภาคผนวกที่ 1
	10.12 จัดให้มีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ และรถพยาบาลสำหรับส่งต่อผู้ป่วย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ และรถพยาบาลสำหรับส่งต่อผู้ป่วยในรายที่มีอาการรุนแรง	-	ภาพที่ 2.2-34 ถึง 2.2-35

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	10.13 กำหนดให้ทางโครงการจัดทำแผนความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของทางโครงการให้แก่ผู้รับเหมาทราบ และให้มีการประสานงานกันระหว่างโครงการและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องขณะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำแผนความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของทางโครงการให้แก่ผู้รับเหมาทราบ และมีการประสานงานกันระหว่างโครงการ และผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง	-	เอกสารแนบที่ 35 ในภาคผนวกที่ 1
	10.14 ให้มีการจัดทำการศึกษาอันตรายและประเมินความเสี่ยง โดยเลือกงานที่คนงานอาจจะประสบอุบัติเหตุได้สูง โดยการให้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) แบ่งขั้นตอนการทำงาน 2) ศึกษาอันตรายหรืออุบัติเหตุที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน 3) หาวิธีการแก้ไขอันตรายหรืออุบัติเหตุที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำ Job Safety Analysis ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มกระบวนการผลิต โดยรวบรวมและจัดทำเป็นไฟล์และมีรูปแบบการนำเสนอเป็นรูปภาพ ส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยมีหัวข้อสำคัญๆ เช่น ขั้นตอนการทำงานอันตรายที่เกิดขึ้นรวมทั้งข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 37 และ 38 ในภาคผนวกที่ 1
	10.15 ในช่วงเริ่มดำเนินการผลิตหากผลิตภัณฑ์ของโครงการที่ผลิตได้ยังไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่กระบวนการจนกว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะได้มาตรฐาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน จะนำมากลับใหม่จนกว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะได้มาตรฐาน	-	-
	10.16 ในช่วงหยุดดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นของเหลวที่ผลิตได้จะถูกส่งผ่านท่อเข้าสู่ถังเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ส่วนที่ยังคงค้างอยู่ในท่อระหว่างกระบวนการผลิตให้ส่งเข้าสู่ถัง Day Tank เพื่อรอกกลับเข้าสู่กระบวนการและในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซที่ยังคงค้างหรือหลงเหลืออยู่ตามท่อให้ส่งไปเผายัง Flare ทั้งหมด	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงหยุดดำเนินการผลิตระยะสั้น ผลิตภัณฑ์จะถูกนำกลับเข้าสู่ระบบใหม่ ส่วนในระยะยาว เช่น ช่วง Shut Down หรือ Maintenance จะส่งกลับไปยัง Slop Oil Tank ที่ฝังอยู่ใต้ดินแล้วนำมากลับใหม่	-	-
	10.17 กำหนดให้มีมาตรการจัดการรั่วไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโครงการ โดยในกรณีที่เกิดการรั่วไหลในปริมาณที่สามารถรวบรวมกลับไปได้ ให้ทำการสูบน้ำกลับไปยังถัง Day Tank และส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิต ส่วนในกรณีที่มีการรั่วไหลมากให้พิจารณาปลด หรือ หยุดดำเนินการผลิตจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการกำหนดแผนฉุกเฉินสารเคมี หรือน้ำมันหกรั่วไหล โดยกำหนดวิธีระงับเหตุการณ์ Clean up ขั้นตอนการกำจัดของเสีย และมีการฝึกซ้อมจากส่วนกลางอยู่เสมอ	-	เอกสารแนบที่ 35 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	10.18 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินประกอบด้วย 1) การจัดเตรียม การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินประจำแต่ละพื้นที่ที่กำหนดให้หน่วยงานฝ่ายผลิต และฝ่ายซ่อมบำรุงแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ในการเตือนภัยอุปกรณ์แจ้งเหตุและระงับเหตุภาวะฉุกเฉิน และมีหน่วยงานความปลอดภัยจะให้คำปรึกษาในการปฏิบัติที่เหมาะสมส่วนอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินของเขตประกอบการฯ และระดับเพลิง กำหนดให้หน่วยงานดับเพลิงเป็นผู้ดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ในการเตือนภัยอุปกรณ์ แจ้งเหตุและระงับเหตุภาวะฉุกเฉิน และมีหน่วยงานความปลอดภัยจะให้คำปรึกษาในการปฏิบัติที่เหมาะสม ส่วนอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินของ เขตประกอบการฯ และระดับเพลิง กำหนดให้หน่วยงานดับเพลิง เป็นผู้ดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา	-	เอกสารแนบที่ 39 และ 40 ในภาคผนวกที่ 1
	2) การจัดเตรียมกำลังคน และการฝึกซ้อม การปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ในด้านการระงับเหตุฉุกเฉินกำหนดให้หน่วยงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน และหน่วยงานดับเพลิงเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อม เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินจึงจัดให้มีการเตรียมพร้อมและซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) จัดทำแผนในการซ้อมฉุกเฉิน (YEARLY PLANER) ในการซ้อมแผนฉุกเฉินของ แต่ละพื้นที่ ซึ่งจะจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนปีที่จะดำเนินการ - แผนกเจ้าของพื้นที่จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาแนวทางในการซ้อมแผนฉุกเฉิน - แต่ละแผนกดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินตามกำหนดการ โดยขั้นตอนในการซ้อมนั้นให้อ้างอิงตาม Instruction Manual (IM) แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินประจำพื้นที่ ยกเว้นกรณี EF2 ขึ้นไปให้อ้างอิงตาม Procedure Manual (PM) แผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ หรือการระเบิด และ EG2 ให้อ้างอิงตาม PM สารเคมีอันตรายรั่วไหล และหากไม่สามารถซ้อมตามกำหนดได้ ให้แผนกที่ไม่สามารถซ้อมได้ ออก POSTPONE ตามแบบฟอร์มมาที่ ECC	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมกำลังคน และการฝึกซ้อม การปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินตลอดจนการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ในด้านการระงับเหตุฉุกเฉินกำหนดให้หน่วยงานควบคุมภาวะฉุกเฉินและหน่วยงานดับเพลิงเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อม	-	เอกสารแนบที่ 36 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) จะสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ้อมแผนฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ และประสานงานติดตามผลในการแก้ไขปัญหา และทำสรุปผลปัญหาที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว นำไปเป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงแผนฉุกเฉินต่อไป - สำหรับปัญหาที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที จะนำเสนอหน่วยงานที่ต้องรับไปดำเนินการแก้ไขในที่ประชุมหลังซ้อมและหากพบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำ อีกหน่วยงาน ECC จะนำปัญหาสรุปเพื่อรายงานให้ต้นสังกัดของปัญหาทราบ และหากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการปรับปรุงจะนำเข้าพิจารณาใน MANAGEMENT REVIEW ต่อไป 				
	<p>10.19 จัดให้มีแผนฉุกเฉิน ประกอบด้วย แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิด แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีอันตรายรั่วไหล แผนฉุกเฉินกรณีรั่วไหล และแผนฉุกเฉินกรณีน้ำมันหกรั่วไหลลงทะเล โดยแบ่งระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินเป็น 4 ระดับ ดังนี้</p> <p>1) ระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ และสามารถควบคุมได้โดยบุคลากร และอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่หรือทีมระงับเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์สนับสนุนบางส่วนจากส่วนกลาง</p> <p>2) ระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ซึ่งผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ (OC) ในขณะนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง ไม่สามารถควบคุมได้โดยพื้นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมระงับเหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์สนับสนุนบางส่วนจากส่วนกลางเต็มรูปแบบ</p>	- พื้นที่โครงการ	- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการจะปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 36 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>3) ระดับ 3 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถระงับเหตุได้ โดยทรัพยากรของ บริษัท ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกของภาครัฐระดับท้องถิ่น/อำเภอ และจังหวัด รวมถึงเอกชน เช่น กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. กลุ่ม EMAG เป็นต้น</p> <p>4) ระดับ 4 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถระงับเหตุได้ โดยทรัพยากรของ บริษัท ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกระดับ ประเทศ/ต่างประเทศ</p>				
	<p>10.20 จัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงงานเป็นระยะๆ โดยแบ่งออกเป็น</p> <p>1) การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 ดำเนินการภายในพื้นที่โครงการ ปีละ 4 ครั้ง ในลักษณะของการซ้อมสลับกะหมุนเวียนจนครบทั้ง 4 ครั้ง</p> <p>2) การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของกลุ่มโรงงานไออาร์พีซี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนของแต่ละโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ที่จะเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน</p> <p>3) การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 ดำเนินการร่วมกับจังหวัด โดยความถี่ในการซ้อมขึ้นอยู่กับทางจังหวัดกำหนด</p>	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโรงงาน IRPC และมีกำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีเป็นประจำทุกปี โดยปี 2566 ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามแผนการซ้อมแผนฉุกเฉินของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	เอกสารแนบที่ 36 ในภาคผนวกที่ 1
	<p>10.21 การฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>- เมื่อเหตุฉุกเฉินเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้สั่งการภาวะฉุกเฉินจะต้องจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ซึ่งจะต้องส่งถึงผู้เกี่ยวข้องภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะต้องมีการจัดตั้งทีมวิเคราะห์เหตุฉุกเฉิน</p>	- พื้นที่โครงการ	- หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้เรียบร้อยแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กลับสู่สภาพปกติ ทั้งในด้านการบาดเจ็บเสียชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตลอดจนถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งนี้ควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจว่าพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่สภาวะการทำงานปกติได้หรือไม่ - แผนฟื้นฟูสภาพจิตพนักงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของพนักงานที่ต้องเข้ารับเหตุ รวมทั้งครอบครัวของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีขั้นตอนการฟื้นฟูดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ส่วนพนักงานสัมพันธ์ระยะของของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์ที่บริษัทฯ ได้มอบหมายมีการดำเนินการดังนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ฉุกเฉิน และได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบสภาพร่างกาย จิตใจ และให้พนักงานได้รับการพักผ่อนพร้อมทั้งให้มีการดูแลรักษาจากแพทย์ • ส่วนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลระยะของของบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการแผนกผู้ได้รับบาดเจ็บ และส่วนกิจการเพื่อสังคมมีการดำเนินการ ดังนี้ ครอบครัวของพนักงานหรือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ หรือตายจากเหตุฉุกเฉินจะได้รับการประสานงานดูแล ชี้แจงทำความเข้าใจแสดงความเสียใจ และรับผิดชอบอย่างจริงจังให้เหมาะสมกับความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเป็นไปตามหลักของกฎหมาย และตามนโยบายของบริษัทฯ 				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ส่วนกิจการเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยแพทย์ที่บริษัทฯ ได้มอบหมายมีการดำเนินการดังนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสภาพร่างกาย จิตใจ พร้อมทั้งให้มีการดูแลรักษาจากแพทย์ตามความเหมาะสม - สำหรับของเสียเชื้อเพลิงแข็ง (SOLID WASTE) ที่ยังเผาไหม้ไม่หมด หลังจากตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจะต้องเก็บรวบรวม และดำเนินการกำจัดตาม E7020-1001 : WASTE AND SCRAP MANAGEMENT - สำหรับของเสียเชื้อเพลิงเหลว (LIQUID WASTE) ที่ยังเผาไหม้ไม่หมด หลังจากตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจะต้องเก็บรวบรวม และดำเนินการกำจัดตาม E7020-1001 : WASTE AND SCRAP MANAGEMENT - น้ำเสียที่ออกมาจากการควบคุมภาวะฉุกเฉินมีขั้นตอนการจัดการคือ พนักงานแผนกบำบัดกากและน้ำเสียเป็นผู้แจ้งต่อผู้ควบคุม ECC หากพบคราบสารเคมีที่ RETENTION POND แล้วผู้ควบคุม ECC แจ้งต่อผู้อำนวยการ ภาวะฉุกเฉินเพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่แผนก GASS (ซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการของเสียในเขตประกอบการฯ) ไปตักคราบสารเคมีแล้วขนย้ายไปเก็บยังพื้นที่ที่เหมาะสม และเจ้าหน้าที่แผนกสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำในการกำจัดสารเคมีดังกล่าว ตาม PM E7020-1001 : WASTE AND SCRAP MANAGEMENT หรือกรณีน้ำเสียให้ส่งไปบำบัดต่อไป 				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
11. ผลกระทบด้านอันตรายร้ายแรง	11.1 มีระบบ Distributed Control System (DCS) สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ	- พื้นที่ส่วนการผลิต	- โครงการมีการควบคุมการทำงาน โดยใช้ระบบ DCS	-	ภาพที่ 2.2-39
	11.2 มีระบบ Double Safety Relief Value ที่ท่อ Outlet จากยอดหอกลั่นทุกหอเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการทำงานของวาล์วนิรภัย (ในกรณีที่ตัวหนึ่งไม่ยอมเปิดระบายอีกตัวหนึ่งจะทำงานแทน)	- Outlet Pipe จากยอดหอกลั่น	- โครงการมีการติดตั้งระบบ Double Safety Relief Valve ที่ท่อ Outlet จากยอดหอกลั่นทุกหอ โดยจะมีวาล์ว ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป กรณีที่วาล์วตัวหนึ่ง ไม่ทำงาน อีกตัวหนึ่งจะทำงานแทน	-	ภาพที่ 2.2-41
	11.3 ออกแบบและติดตั้งระบบหยุดการผลิตกรณีฉุกเฉินอย่างปลอดภัย (Safe Emergency Shutdown System) และ ระบบ Safety Interlocking System	- อุปกรณ์ที่มีการควบคุมความดัน	- โครงการได้ติดตั้งระบบ Safety Interlocking System เพื่อใช้ในการหยุดการผลิตกรณีฉุกเฉินอย่างปลอดภัย	-	ภาพที่ 2.2-41
	11.4 จัดสร้างคันคอนกรีตรอบถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถเก็บกักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กรณีที่เกิดการรั่วไหลได้ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยออกแบบให้สามารถรองรับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ กรณีที่เกิดการหก/รั่วไหลให้เพียงพอสำหรับการรองรับปริมาณของสารของถังที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละบริเวณ	- ถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	- โครงการมีการสร้างคันคอนกรีตรอบถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ยึดตามมาตรฐานของ NFPA ซึ่งสามารถเก็บกักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กรณีที่เกิดการรั่วไหลได้	-	ภาพที่ 2.2-42
	11.5 ไม่อนุญาตให้มีรถเข้าออกในพื้นที่ส่วนการผลิตของโครงการ โดยในการเข้าสู่ภายในพื้นที่ส่วนการผลิตของผู้มาติดต่อและ/หรือพนักงานขับรถต่างๆ จะต้องมีการทำ Work Permit	- พื้นที่ส่วนการผลิต	- โครงการมีระบบ Work Permit เพื่อควบคุมรถที่จะเข้าสู่พื้นที่ส่วนการผลิตของโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 41 ในภาคผนวกที่ 1
	11.6 จัดทำ Safety/Traffic Regulation	- พื้นที่ส่วนการผลิต	- โครงการมีการจัดทำ Safety/Traffic Regulation	-	เอกสารแนบที่ 42 ในภาคผนวกที่ 1
	11.7 มีมาตรการ Preventive Maintenance เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์เตือน-ชี้วัด Record, Check และ Alarm ต่างๆ (ที่มีโอกาส Fault ได้) อย่างสม่ำเสมอ	- เครื่องชี้วัดทางอุณหภูมิ ระดับและความดันต่างๆ	- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เตือน-ชี้วัด Record, Check และ Alarm ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	-	เอกสารแนบที่ 40 ในภาคผนวกที่ 1
	11.8 กำหนดให้จัดทำรายการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดแนวทางในระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 เพื่อยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 5 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ประเมินความเสี่ยง และมีการทบทวนตามกฎหมายทุก 5 ปี โดยครั้งล่าสุดได้ส่งผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565	-	เอกสารแนบที่ 37 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
11. ผลกระทบด้าน อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	11.1 มาตรการลดผลกระทบในพื้นที่กระบวนการผลิต				
	1) จัดทำ Pre Startup Safety Review (PSSR) ก่อนที่จะเริ่มเดินโรงงาน (Plant Startup)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำแผนด้านความปลอดภัย Pre Startup Safety Review (PSSR) ก่อนที่จะเริ่มเดินโรงงาน (Plant Startup)	-	เอกสารแนบที่ 43 ในภาคผนวกที่ 1
	2) ติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหล ความดันและอุณหภูมิ (Flow Rate/Pressure/Temperature Indicator) พร้อมระบบ Interlock และ Shutdown System ในหน่วยการผลิตที่ทำงานอัตโนมัติร่วมกับระบบควบคุม (DCS) เพื่อคอยตรวจสอบระดับอัตราการไหล ความดันและอุณหภูมิตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้สถานะของการปฏิบัติงานและสามารถควบคุมให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมและปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหล ความดันและอุณหภูมิ พร้อมทั้งระบบ Interlock และ Shutdown System ในหน่วยการผลิตที่ทำงานอัตโนมัติร่วมกับระบบควบคุม (DCS) เพื่อคอยตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมและปลอดภัย	-	ภาพที่ 2.2-21 และ 2.2-32
	3) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซจะต้องส่งไปแสดงที่แผงควบคุม (ก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ) โดยสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับภายในห้องควบคุมการผลิต และศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินของ IRPC	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ โดยจะส่งสัญญาณไปแสดงที่แผงควบคุมภายในห้องควบคุมการผลิต และศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินของ IRPC	-	ภาพที่ 2.2-32, 2.2-33 และ 2.2-41
	4) ติดตั้งอุปกรณ์วาล์วตัดแยกระบบ ได้แก่ Manual Isolation Valve หรือ Emergency Isolation Valve เพื่อให้สามารถตัดแยกระบบและลดปริมาณของสารไฮโดรคาร์บอนที่รั่วไหล	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์วาล์วตัดแยกระบบเพื่อให้สามารถตัดแยกระบบและลดปริมาณของสารไฮโดรคาร์บอนที่รั่วไหล	-	ภาพที่ 2.2-32
	5) ระบบปั๊มที่ใช้ในการสูบน้ำ (Pump Transfer) สามารถสั่งหยุดได้จากระบบ DCS	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีระบบปั๊มที่ใช้ในการสูบน้ำที่สามารถสั่งหยุดได้จากระบบ DCS	-	ภาพที่ 2.2-37
	6) ติดตั้งระบบ Interlock และ Shutdown System ในหน่วยการผลิตกรณีเกิดสารไฮโดรคาร์บอนรั่วไหล	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งระบบ Safety Interlocking System เพื่อใช้ในการหยุดการผลิตฉุกเฉินอย่างปลอดภัย กรณีเกิดสารไฮโดรคาร์บอนรั่วไหล	-	ภาพที่ 2.2-39
	7) ติดตั้งวาล์วระบายความดัน (Pressure Relief Valve) ในกระบวนการผลิตไปยังหอเผาที่ระดับพื้นดินระบบปิด (Enclosed Ground Flare)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งวาล์วระบายความดัน (Pressure Relief Valve) ในกระบวนการผลิตไปยังหอเผาที่ระดับพื้นดินระบบปิด (Enclosed Ground Flare)	-	ภาพที่ 2.2-38

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
11. ผลกระทบด้าน อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	8) จัดให้มีระบบการสเปรย์น้ำจากหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Water Hydrant) ในพื้นที่กระบวนการผลิต	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีระบบการสเปรย์น้ำจากหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Water Hydrant) ในพื้นที่กระบวนการผลิต	-	ภาพที่ 2.2-28 ถึง 2.2-29
	9) จัดให้มีเครื่องระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ควบคุมในกรณีไฟฟ้าดับ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์ควบคุมในกรณีไฟฟ้าดับ	-	
	10) ใช้วัสดุทนไฟสำหรับทุกโครงสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดไฟ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดให้ใช้วัสดุความทนไฟสำหรับโครงสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดไฟ	-	
	11) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ก่อนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะที่ไม่ปลอดภัย	-	เอกสารแนบที่ 37 ในภาคผนวกที่ 1
	12) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสภาวะการผลิต เช่น ความดัน และอุณหภูมิ เป็นต้น ที่มีประสิทธิภาพดีเพื่อใช้ในการควบคุมสภาวะการผลิตให้เป็นไปตามค่าที่กำหนด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสภาวะการผลิต เพื่อใช้ในการควบคุม การผลิตให้เป็นไปตามค่าที่กำหนด	-	
	11.2 มาตรการลดผลกระทบบริเวณท่อขนส่ง				
	1) จัดทำป้ายเตือนตลอดแนวท่อส่งของโครงการ	- ท่อขนส่งของโครงการ	- โครงการได้จัดทำป้ายเตือนตลอดแนวท่อขนส่งของโครงการ	-	
	2) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพระบบท่อทุกเส้นตลอดแนวท่อขนส่งของโครงการ หากตรวจสอบพบจุดที่สงสัยว่ามีการรั่วไหลทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งหน่วยซ่อมบำรุงทันที	- ท่อขนส่งของโครงการ	- โครงการได้มีการตรวจสอบระบบท่อขนส่งของโครงการ หากตรวจพบการรั่วไหล โครงการจะดำเนินการแจ้งหน่วยซ่อมบำรุงทันที	-	เอกสารแนบที่ 44 ในภาคผนวกที่ 1
	3) จัดให้มี Flow Meter เพื่อวัดอัตราการไหลของสารในท่อ ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงได้จากห้องควบคุม หากเกิดการรั่วไหล	- ท่อขนส่งของโครงการ	- โครงการได้มี Flow Meter เพื่อวัดอัตราการไหลของสารในท่อ ซึ่งใช้ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงได้จากห้องควบคุม หากเกิดการรั่วไหล	-	ภาพที่ 2.2-21
	4) ติดตั้งอุปกรณ์วาล์วตัดแยกระบบ ได้แก่ Manual Isolation Valve หรือ Emergency Isolation Valve เพื่อให้สามารถตัดแยกระบบและลดปริมาณของสารไฮโดรคาร์บอนที่รั่วไหล	- ท่อขนส่งของโครงการ	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์วาล์วตัดแยกระบบเพื่อให้สามารถตัดแยกระบบและลดปริมาณของสารไฮโดรคาร์บอนที่รั่วไหล	-	ภาพที่ 2.2-32
	5) ระบบปั๊มที่ใช้ในการสูบน้ำ (Pump Transfer) สามารถสั่งหยุดได้จากระบบ DCS	- ท่อขนส่งของโครงการ	- โครงการมีระบบปั๊มที่ใช้ในการสูบน้ำที่สามารถสั่งหยุดได้จากระบบ DCS	-	ภาพที่ 2.2-37

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
11. ผลกระทบด้าน อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	6) ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินมีการรั่วไหลของสารเคมี เพลิงไหม้ หรือการระเบิด หากพบว่าเป็นระบบท่อ-ส่งของโครงการ จะประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบทันที และเข้าสู่แผนการควบคุมภาวะฉุกเฉิน	- ท่อขนส่งของโครงการ	- ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล เพลิงไหม้ หรือการระเบิด โครงการจะประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที และจะปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน	-	เอกสารแนบที่ 35 ในภาคผนวกที่ 1
	7) จัดให้มีการวางท่อในพื้นที่เฉพาะที่มีความเหมาะสม ห่างจากโอกาสเกิดความเสียหายจากแรงกระแทก และมีโครงสร้างที่สามารถรองรับระบบท่อไม่ให้มีผลกระทบจากการขยายตัวหรือหดตัว อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือน้ำหนักที่เกิดจากตัวท่อ	- ท่อขนส่งของโครงการ	- โครงการได้วางระบบท่อขนส่งในพื้นที่ที่เหมาะสม และมีโครงสร้างที่สามารถรองรับระบบท่อไม่ให้มีผลกระทบจากการขยายตัวหรือหดตัว อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือน้ำหนักที่เกิดจากตัวท่อ	-	
	8) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพโครงสร้าง ความแข็งแรงของท่อขนส่ง (Inspection) ตามแผนงานที่กำหนดเพื่อหาความสึกกร่อนของท่อขนส่ง โดยหากพบว่ามีความสึกกร่อน (Corrosion Allowable) ถึงค่าที่กำหนดจะดำเนินการซ่อมบำรุงทันที	- ท่อขนส่งของโครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบโครงสร้าง ความแข็งแรงของท่อขนส่ง (Inspection) ตามแผนงานที่กำหนดหากพบว่ามีความสึกกร่อน (Corrosion Allowable) ถึงค่าที่กำหนดโครงการจะดำเนินการซ่อมบำรุงทันที	-	เอกสารแนบที่ 44 ในภาคผนวกที่ 1
	9) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป บริเวณแนวเส้นท่อนับขึ้นวางท่อ (Common Pipe Rack) และอุโมงค์ท่อ (Bo Culvert) โดยเขตประกอบการ	- ท่อขนส่งของโครงการ	- ทางเขตประกอบการฯ ได้มีการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของบริเวณแนวเส้นท่อนับขึ้นวางท่อ (Common Pipe Rack) และอุโมงค์ท่อ (Bo Culvert)	-	เอกสารแนบที่ 44 ในภาคผนวกที่ 1
	11.3 มาตรการในช่วงการหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำรุง (Shutdown/Turnaround) 1) จัดให้มีวิธีปฏิบัติงาน (Procedure) ในการหยุดอุปกรณ์หน่วยผลิตแต่ละหน่วยอย่างปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีวิธีปฏิบัติงาน (Procedure) ในการหยุดอุปกรณ์หน่วยผลิตแต่ละหน่วยอย่างปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง	-	
	2) กำหนดระบบตรวจสอบและระบบ Safety Interlock เพื่อหยุดการผลิตอย่างปลอดภัยของแต่ละหน่วย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีระบบตรวจสอบและระบบ Safety Interlock เพื่อหยุดการผลิตอย่างปลอดภัยของแต่ละหน่วย และเอกสารแนบที่	-	ภาพที่ 2.2-39 12 ในภาคผนวกที่ 1
	3) จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานให้มีความเข้าใจขั้นตอนการหยุดการผลิตอย่างสมบูรณ์	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานให้มีความเข้าใจขั้นตอนของการหยุดการผลิตอย่างสมบูรณ์	-	เอกสารแนบที่ 31 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
11. ผลกระทบด้าน อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	4) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติสำหรับงานแต่ละประเภทในการซ่อมบำรุง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า งานประเภทที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) การใช้ก๊าซในงานติดตั้ง งานเชื่อม เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีระเบียบปฏิบัติสำหรับงานแต่ละประเภทในการซ่อมบำรุง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้างานประเภทที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) การใช้ก๊าซในงานติดตั้ง เชื่อม เป็นต้น	-	เอกสารแนบที่ 41 ในภาคผนวกที่ 1
	5) คนงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงซ่อมบำรุงภายในพื้นที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผ่านการทดสอบก่อนเข้าทำงานเพื่อให้ทราบและเข้าใจกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานและมีการทดสอบก่อนเข้าทำงานกับคนงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงซ่อมบำรุงภายในพื้นที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) เพื่อให้ทราบและเข้าใจกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน	-	เอกสารแนบที่ 31 ในภาคผนวกที่ 1
	6) จัดให้มีระเบียบควบคุมผู้รับเหมาและบริษัทรับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ในช่วงการซ่อมบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้ผู้รับเหมาเจ้าของพื้นที่ และผู้ควบคุมงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ใช้ในทางปฏิบัติ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีระเบียบควบคุมผู้รับเหมาและบริษัทรับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ในช่วงการซ่อมบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้ผู้รับเหมาเจ้าของพื้นที่และผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ใช้ในการปฏิบัติ	-	เอกสารแนบที่ 45 ในภาคผนวกที่ 1
	11.4 มาตรการในช่วงเริ่มต้นการผลิตใหม่ (Startup)				
	1) จัดให้มีการฝึกและอบรมให้กับพนักงานควบคุมและพนักงานซ่อมบำรุงให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยผลิต	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการฝึกและอบรมให้กับพนักงานควบคุมและพนักงานซ่อมบำรุงให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยผลิต	-	เอกสารแนบที่ 31 ในภาคผนวกที่ 1
	2) จัดเตรียมเอกสารวิธีปฏิบัติงาน และทำการปรับปรุงเอกสารวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมเอกสารวิธีปฏิบัติงาน และทำการปรับปรุงให้เหมาะสม	-	เอกสารแนบที่ 43 ในภาคผนวกที่ 1
	3) จัดให้แผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และทำการปรับปรุงแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินให้เหมาะสม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และทำการปรับปรุงให้เหมาะสม	-	-
	4) ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตใหม่ หรือปรับปรุงหน่วยการผลิตเดิมจะต้องมีการปรับแก้ไข Process & Instrument Diagram (P&ID) ใหม่	- พื้นที่โครงการ	- กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตใหม่หรือปรับปรุงหน่วยผลิตเดิมทางโครงการจะทำการอัปเดต Process & Instrument Diagram (P&ID) ใหม่	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
11. ผลกระทบด้าน อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	5) ก่อนที่จะเริ่มเดินการผลิตใหม่ภายหลังจากการหยุดซ่อมบำรุง พนักงานต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ และหน่วย ผลิตตาม Pre-startup Safety Review (PSSR) Checklist ก่อนที่จะเริ่มเดินโรงงาน (Plant Start up)	- พื้นที่โครงการ	- กรณีที่มีหยุดซ่อมบำรุง โครงการกำหนดให้พนักงานมีการ ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่แต่ละหน่วยผลิตก่อนที่จะ เริ่มเดินการผลิตใหม่ตาม Pre-startup Safety Review (PSSR) Checklist ก่อนที่จะเริ่มเดินโรงงาน (Plant Start up)	-	เอกสารแนบที่ 43 ในภาคผนวกที่ 1
	11.5 อุบัติเหตุ				
	1) จัดทำแผนการให้ข้อมูลแก่ชุมชนเรื่องการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน และจัดทำระบบการสื่อสารร่วมกับผู้นำชุมชน	- ชุมชนในบริเวณ พื้นที่ศึกษา	- โครงการมีแผนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุภายใน โรงงาน และได้จัดทำระบบการสื่อสารร่วมกับผู้นำชุมชน	-	-
	2) ร่วมมือกับโรงงานอื่นๆ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และชุมชนในการจัดทำและอบรมแผนฉุกเฉินส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชนให้สามารถรับมือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เบื้องต้น	- หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- โครงการได้ร่วมมือกับโรงงานในเขตประกอบการฯ และชุมชน ในการอบรมแผนฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ให้สามารถ รับมือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้เบื้องต้น	-	-
	3) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย ของโครงการ	- ชุมชนและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- โครงการได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรการ ความปลอดภัยของโครงการ	-	-
	4) กำหนดให้มีแผนในการฟื้นฟูหลังจากทำการระงับเหตุฉุกเฉินเสร็จสิ้น การจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และการป้องกันการเกิด เหตุซ้ำ โดยการสอบสวนจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาทำการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น	- พื้นที่โรงงาน และพื้นที่ได้รับ ผลกระทบจาก เหตุฉุกเฉินของ โครงการ	- โครงการมีแผนฟื้นฟูหลังระงับเหตุฉุกเฉิน การจัดทำรายงาน เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการ สอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	-	เอกสารแนบที่ 35 ในภาคผนวกที่ 1
	11.6 การชดเชยค่าเสียหาย				
	1) จัดทำประกันภัยประเภทกรมธรรม์ความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอก เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการ ดำเนินงานของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำประกันภัยประเภทกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 46 ในภาคผนวกที่ 1
	2) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/ผู้เสียหาย สามารถแจ้ง ไปยังบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือพนักงานฝ่าย ปกครองของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ได้ทันที โดยหากมีผลกระทบอันมีสาเหตุมาจากการดำเนินการโครงการ โรงกลั่นน้ำมัน ชุมชนตามที่ได้ศึกษาไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โครงการจะให้การดูแลและรับผิดชอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจนถึง ที่สุด	- บุคคลที่ได้รับ ผลกระทบจาก เหตุฉุกเฉินของ โครงการ	- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียหายสามารถ แจ้งไปยังบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยสามารถติดต่อได้ ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center : ECC) ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองของ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ได้ทันที และหาก พบว่าผลกระทบมีสาเหตุมาจากการดำเนินการโครงการ โรงกลั่น น้ำมัน ชุมชนตามที่ได้ศึกษาไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม กรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โครงการจะดูแล และรับผิดชอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจนถึงที่สุด	-	ภาพที่ 2.2-41

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
12. สุขภาพ	12.1 จัดส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (SDS) (ในปีแรกที่เปิดดำเนินการ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากเดิม) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ เช่น ช่องทางติดต่อโครงการ เป็นต้น ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนทางด้านสุขภาพ และเป็นฐานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่อไป	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- โครงการแจ้งข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (SDS) และข้อมูลอื่น ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพ และเป็นฐานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่อไป	-	เอกสารแนบที่ 47 ในภาคผนวกที่ 1
	12.2 เผยแพร่รายละเอียดโครงการรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อลดความกังวลใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ	- ชุมชนรอบโรงงาน	- โครงการมีการเผยแพร่รายละเอียดโครงการรวมทั้งข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อลดความกังวลใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 24 และ 25 ในภาคผนวกที่ 1
	12.3 สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านการส่งเสริม พินฟู ป้องกันและการดูแลสุขภาพ	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- โครงการได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านการส่งเสริม พินฟู ป้องกันและการดูแลสุขภาพ	-	เอกสารแนบที่ 26 ในภาคผนวกที่ 1
	12.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานและการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พร้อมทั้งระบุอายุงานของพนักงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และการตรวจสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง โดยในปี 2566 โครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการระหว่างวันที่ 23 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ระหว่างวันที่ 1-27 มิถุนายน 2566 และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2566	-	เอกสารแนบที่ 48 และ 49 ในภาคผนวกที่ 1
	12.5 หากผลการตรวจสุขภาพพนักงาน พบว่า พนักงานมีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้มีการตรวจซ้ำโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติ จากนั้นกำหนดให้มีการดูแลรักษา และให้ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การสูญเสียสมรรถภาพการได้อินทางกายและจิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีผลการตรวจความผิดปกติให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติซ้ำ เช่น การหมุนเวียน การทำงาน เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจะส่งตัวพนักงานที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพผิดปกติไปตรวจซ้ำ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติ จากนั้นจะมีการดูแลรักษาตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป	-	เอกสารแนบที่ 48 และ 49 ในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและการแก้ไข	หลักฐานและเอกสารประกอบ
12. สุขภาพ (ต่อ)	12.6 การเตรียมตัวของพนักงานที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ผู้ทำการคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผลให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผลของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2561 หรือเป็นไปตามกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องฯ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้พนักงานที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ปฏิบัติตามแนวทางทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผลของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2561	-	-
	12.7 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพรวมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาล แพทย์ที่ทำการตรวจวัดเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด และวันที่เข้ารับการตรวจวัด ทั้งนี้หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจวัดต้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพที่ระบุชื่อสถานพยาบาล แพทย์ที่ทำการตรวจวัด เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด และวันที่เข้ารับการตรวจวัด ซึ่งหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจวัดเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง	-	-
	12.8 จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการปฐมพยาบาล	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการปฐมพยาบาล	-	-
	12.9 ให้ความรู้กับพนักงานในการป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงจัดหาภูมิคุ้มกันโรคให้กับพนักงาน	- พื้นที่โครงการและสถานพยาบาลที่กำหนด	- โครงการได้ให้ความรู้พนักงานในการป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงจัดหาภูมิคุ้มกันโรคให้กับพนักงาน	-	-
	12.10 จัดหาสถานพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อลดความแออัดของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- โครงการมีสถานพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อลดความแออัดของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	-	ภาพที่ 2.2-34 ถึง 2.2-36
	12.11 สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในด้านส่งเสริมการฟื้นฟูป้องกัน หรือดูแลรักษา	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- โครงการได้สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในด้านส่งเสริมการฟื้นฟูป้องกัน หรือดูแลรักษา	-	เอกสารแนบที่ 26 ในภาคผนวกที่ 1
	12.12 บริษัทจัดให้มีแพทย์เข้ามาประจำในพื้นที่กลุ่มโรงงาน IRPC อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- เขตประกอบการไออาร์พีซีได้จัดให้มีแพทย์เข้ามาประจำในพื้นที่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง	-	ภาพที่ 2.2-34
13. พื้นที่สีเขียว	13.1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่ในพื้นที่ของเขตประกอบการไออาร์พีซี ประมาณ 8.375 ไร่ 13,400 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.07 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 165,025 ไร่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นแนวป้องกันฝุ่นและเสียง โดยโครงการจะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้มีสภาพตลอดเวลา	- ภายในพื้นที่เขตประกอบการฯ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่ในพื้นที่ของเขตประกอบการไออาร์พีซีประมาณ 8.375 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.07 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นแนวป้องกันฝุ่นและเสียง โดยโครงการจะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้มีสภาพตลอดเวลา	-	ภาพที่ 2.2-43 ถึง 2.2-44
	13.2 กำหนดแผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว และมาตรการการปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีต้นไม้ตายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุง รักษาพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ ของเขตประกอบการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ เช่น การรดน้ำต้นไม้ พรุนดิน ใส่ปุ๋ย ฉีดยากำจัดวัชพืชและแมลง เป็นต้น ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็วที่สุด	- ภายในพื้นที่เขตประกอบการฯ	- โครงการมีแผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ ของเขตประกอบการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ	-	เอกสารแนบที่ 50 ในภาคผนวกที่ 1




ภาพที่ 2.2-1 ปล่อง ADU2, Heater A (41B001A)
และ ADU2, Heater B (41B001B)



ภาพที่ 2.2-2 ปล่อง SRU1 Incinerator Stack

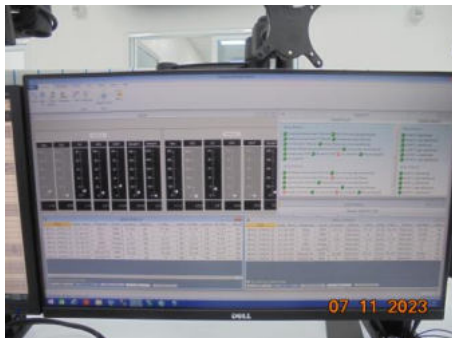

ภาพที่ 2.2-3 ระบบ CEMs ที่ปล่อง ADU2, Heater A
(41B001A) และ ADU2, Heater B (41B001B)

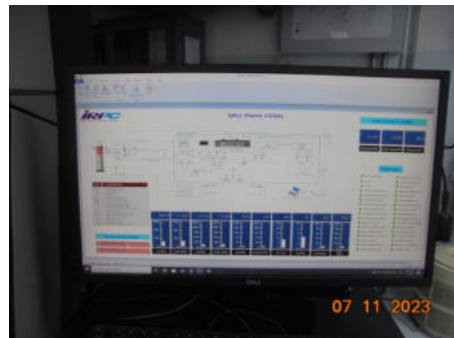

ภาพที่ 2.2-4 ระบบ CEMs ที่ปล่อง SRU1 Incinerator



ภาพที่ 2.2-5 อุปกรณ์อะไหล่สำรองระบบกำจัดมลพิษ และกำมะถันที่ฝ่าย Maintenance



หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-6 บ่อพักน้ำเสีย CPI



ภาพที่ 2.2-7 บ่อพักน้ำเสีย IAF หน่วย ADU



ภาพที่ 2.2-8 บ่อพักน้ำเสีย DAF หน่วย SRU



หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-9 บ่อตรวจสอบน้ำเสีย




หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-10 รางระบายน้ำฝน

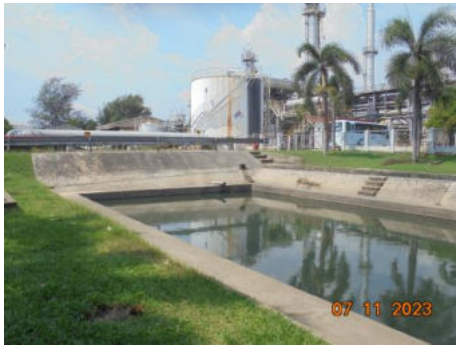

ภาพที่ 2.2-11 บ่อ Collection Pond



ภาพที่ 2.2-12 บ่อพักน้ำ Retention Pond



ภาพที่ 2.2-13 บ่อพักน้ำฝน



ภาพที่ 2.2-14 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ CPI
ของโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP)



ภาพที่ 2.2-15 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2



ภาพที่ 2.2-16 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3



ภาพที่ 2.2-17 Slop Oil Tank เพื่อรวมคราบน้ำมัน
จากบ่อพักน้ำเสีย CPI/IAF



ภาพที่ 2.2-18 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด




ภาพที่ 2.2-19 รถขนส่งกากของเสียที่มีการติดตั้งระบบ GPS



ภาพที่ 2.2-20 พื้นที่อาคารจัดเก็บกากของเสีย



หน่วย ADU

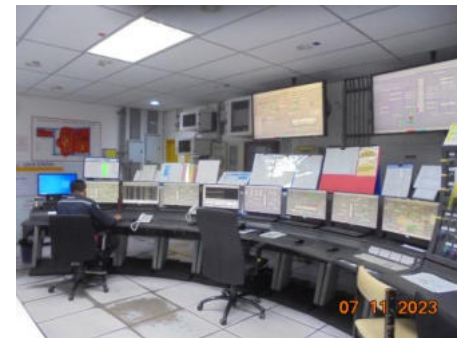

หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-21 Control Room



หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-22 การติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียง (Silencer)



ภาพที่ 2.2-23 การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันรั้วเพื่อลดระดับเสียง



หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-24 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง



หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-25 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



ภาพที่ 2.2-26 พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า -ออกโครงการ



ภาพที่ 2.2-27 ป้ายชื่อบริษัท และเบอร์โทรศัพท์
บริเวณรถที่ใช้ในการขนส่ง




ภาพที่ 2.2-28 อุปกรณ์ดับเพลิง (ADU)



ภาพที่ 2.2-29 อุปกรณ์ดับเพลิง (SRU)



ภาพที่ 2.2-30 รถดับเพลิง

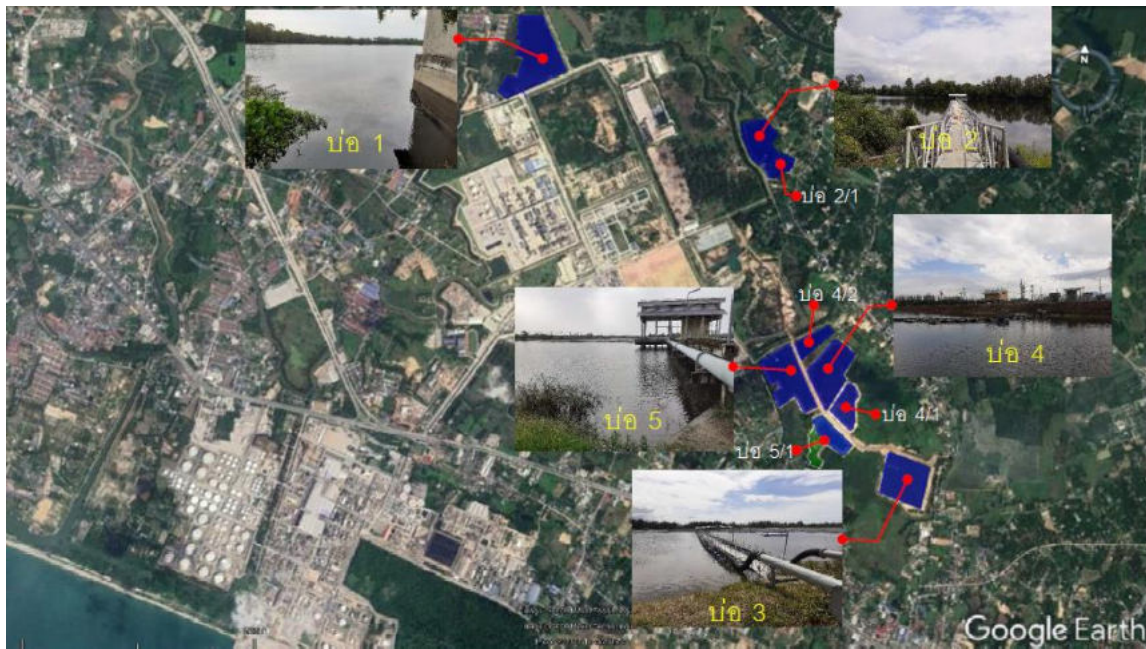

ภาพที่ 2.2-31 แหล่งน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 2.2-32 H₂S Gas Detector



ภาพที่ 2.2-33 Hydrocarbon Gas Detector



ภาพที่ 2.2-34 ห้องพยาบาลและบุคลากรประจำห้องพยาบาล




ภาพที่ 2.2-35 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ภาพที่ 2.2-36 รถพยาบาล

ภาพที่ 2.2-37 ระบบ Distributed Control System

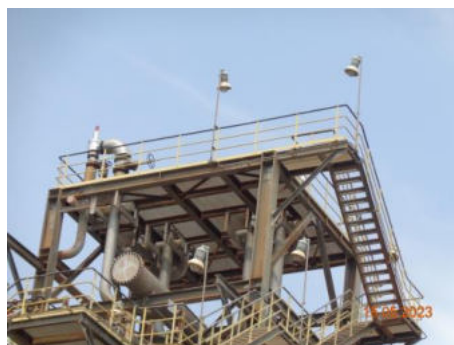

ภาพที่ 2.2-38 ระบบ Double Safety Relief Value



หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-39 ระบบ Inter Lock System




หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-40 คั่นคอนกรีตรอบถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

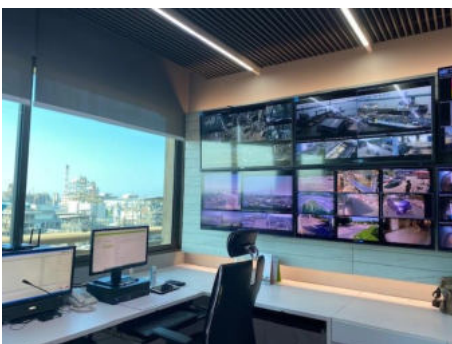

ภาพที่ 2.2-41 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC)



ภาพที่ 2.2-42 วาล์วระบายความดัน (Pressure Relief Valve)



หน่วย ADU



หน่วย SRU

ภาพที่ 2.2-43 พื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 2.2-44 แผนผังพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 2.2-45 การเข้าติดตามตรวจสอบของ Third Party

บทที่ 3

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินงาน

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs
- คุณภาพน้ำ
 - น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำฝนปนเปื้อน
 - คุณภาพน้ำฝน
- คุณภาพน้ำใต้ดิน
- คุณภาพดิน
- ระดับเสียงในบรรยากาศ
- การจัดการกากของเสีย
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - ระดับความร้อน
 - ระดับความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน
 - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
 - ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
 - จัดทำเส้นระดับเสียง
 - คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน
- สถิติอุบัติเหตุ
- การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
- สังคมและเศรษฐกิจ

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 แสดงดังตารางที่ 3.2-1

สำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ และคุณภาพน้ำทิ้ง โดยใช้ห้องปฏิบัติการของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ซึ่งได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-223 ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 2 อย่างไรก็ตามบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีแผนการว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกรายการซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมงบประมาณและวางแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	<ul style="list-style-type: none"> ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 	ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> โรงเรียนวัดปลวกเหตุ โรงเรียนบ้านหนองจอก (วงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง โรงเรียนวัดเขาพระบาท 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง โดยตรวจวัดในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เมื่อวันที่ 17-24 ตุลาคม 2566 พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 	-
	<ul style="list-style-type: none"> เบนซีน (Benzene) 	ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> โรงเรียนวัดปลวกเหตุ โรงเรียนบ้านหนองจอก (วงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกเดือน (24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง) 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการตรวจวัดเบนซีน (Benzene) ยังไม่มีการดำเนินการตรวจวัดเนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างของหน่วยผลิตที่เกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จ 	-
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	<ul style="list-style-type: none"> ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) 	<ul style="list-style-type: none"> ADU2 Heater (A&B) DHT Heater SRU Incinerator Stack HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack) 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง เมื่อวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2566 พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs	- CEMs	- ระบบ CEMs ของ ADU2 Heater A, ADU2 Heater B และ SRU Incinerator	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs เมื่อวันที่ 26-27, 30-31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566	
2. คุณภาพน้ำ 2.1 น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำฝนปนเปื้อน	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ปริมาณบีโอดี (BOD ₅) - ปริมาณซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil) - ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide as H ₂ S)	- บริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005) - บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ 17T035) - บริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลัง Discharge 09P402 A/B ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ - บริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลังออกจากหน่วย SWS ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-
2.2 คุณภาพน้ำฝน (Storm Water)	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ปริมาณซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	- บริเวณรางระบายน้ำฝนก่อนลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	- เดือนละ 1 ครั้ง (ช่วงฝนตก)	- โครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
3. คุณภาพน้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - สารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ TPH (C₅-C₈) TPH (C₈-C₁₆) TPH (C_{>16}-C₃₅) - โลหะหนัก 	ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - จุดเหนือน้ำ (Up gradient) (RF-G(U)) - จุดท้ายน้ำ (Down-gradient) (RF-G(D)) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินจำนวน 2 สถานี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้งตามความถี่ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. คุณภาพดิน	<ul style="list-style-type: none"> - สารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ TPH (C₅-C₈) TPH (C₈-C₁₆) TPH (C_{>16}-C₃₅) - โลหะหนัก 	ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - จุดเหนือน้ำ (Up gradient) (RF-G(U)) - จุดท้ายน้ำ (Down-gradient) (RF-G(D)) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 ปี หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพดินทุก 3 ปี หรือตามที่หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยดำเนินการล่าสุดไป เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 	-
5. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L₉₀) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนวัดปลวกเกตุ - วัดเนินพุทรา - หมู่ 1 บ้านตะพงโน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศจำนวน 2 สถานี เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 	-
6. การจัดการกากของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุสัดส่วนและประเภทกากของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (reuse/recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด - จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการและแนบสำเนาการได้รับอนุญาตส่งกำจัดกากของเสียประกอบไว้ในรายงานด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการทำการบันทึกข้อมูล ชนิด, คุณสมบัติ, ปริมาณ, การเก็บรวบรวม, การจัดส่งและการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 17 และ 51 ในภาคผนวกที่ 1 	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 7.1.1 ความร้อน	- WBGT	- หน่วยกัลนแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU2)	- ปีละ 1 ครั้ง (โดยตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี)	- โครงการมีการตรวจวัดระดับความร้อน จำนวน 2 สถานี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-
7.1.2 แสงสว่างในสถานที่ทำงาน	- Light Intensity	- Control Room	- ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจวัดแสงสว่าง บริเวณ Control Room เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-
7.1.3 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	- ภายในโรงงาน	- ปีละ 2 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-
7.1.4 ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน	- Noise Dose (TWA)	- พนักงานทุกคนที่สัมผัสเสียงดัง	- ปีละ 2 ครั้ง	- โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล บริเวณพื้นที่ ADU2 และ SRU เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-
7.1.5 จัดทำ Noise Contour Map	- Noise Contour	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 3 ปี และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง	- โครงการมีการจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 และ 15 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 52	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
7.1.6 ตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	- บริเวณหน่วย SWS (SWS 2, 3 และ 4) - บริเวณหน่วย ARU - บริเวณหน่วย SRU - บริเวณหน่วย TGTU	- ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จำนวน 4 สถานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม และ 21 พฤศจิกายน 2566 พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-
7.2 สถิติอุบัติเหตุ	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการสาเหตุ ระดับความรุนแรง การแก้ไข และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	- ภายในโครงการ	- ทุกเดือนและรวบรวมผลและเสนอทุกๆ 6 เดือน	- โครงการได้ทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รายละเอียดตั้งเอกสารแนบที่ 53 ในภาคผนวกที่ 1	-
7.3 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 7.3.1 ตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มงาน	- ถ่ายภาพรังสีทรวงอกฟิล์มใหญ่ - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจการทำงานของตับ - ตรวจการทำงานของไต - ตรวจความจุของปอด และ X-ray ปอด - สมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - สมรรถภาพปอด - ตรวจตามรายการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่จะเข้าทำงาน หรือตามการสัมผัส/เกี่ยวข้องกับสารเคมี	- พนักงานใหม่	- ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ตกลงเข้าทำงาน	- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ทุกครั้ง ที่เข้ารับทำงาน รายละเอียดตั้งเอกสารแนบที่ 48 ในภาคผนวกที่ 1	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
7.3.2 ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> - ถ่ายภาพรังสีทรวงอกฟิล์มใหญ่ - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจการทำงานของตับ - ตรวจการทำงานของไต - ตรวจความจุของปอด และ X-ray ปอด - สมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 	- พนักงานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2566 มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทั่วไปโดยแพทย์ เมื่อวันที่ 1-27 มิถุนายน 2566 รายละเอียดแนบที่ 49	
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจหาสาร t,t muconic acid ในปัสสาวะ (เป็น Biomaker ของสารเบนซีน) 	- พนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง	- ปีละ 1 ครั้ง		
8. สังคม-เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว รวมถึงให้สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูลประกอบให้ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร หรือมากกว่า ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่สำคัญต่างๆ และกลุ่มประมง เป็นต้น 	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 ได้ดำเนินการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2566 รายละเอียดตั้งเอกสารแนบที่ 54	

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
8. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	- ประเมินผลสรุปผลการดำเนินงานและจากแผนงานชุมชนสัมพันธ์แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นและประโยชน์จากการดำเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่กลุ่มเป้าหมายชุมชนที่ได้รับ รวมทั้งให้ประเมินประสิทธิภาพ/ความเหมาะสมของแผนงาน/กิจกรรมและเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมในอนาคต			- โครงการมีการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 24	
	- บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลการร้องเรียนพร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง	- พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- รวบรวมผลและเสนอแนะทุก 6 เดือน	- โครงการบันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและดำเนินการแก้ปัญหาตามที่กำหนดเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำทุกครั้ง พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นจากโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 27	

หมายเหตุ : - สำหรับบริเวณ DHT Heater และ HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack) ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

3.2.1 คุณภาพอากาศ

3.2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปีละ 2 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง จำนวน 5 สถานี ได้แก่ โรงเรียนวัดปลวกเกิด โรงเรียนบ้านหนองจอก (โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง และโรงเรียนวัดเขาพระบาท โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด ดังนี้ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และ เบนซีน (Benzene) ตรวจวัดทุกเดือน ตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง และได้ทำการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมพร้อมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.1.1-1 สำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.1.1-1

ตารางที่ 3.2.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
Total Suspended Particulate	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method	U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B
PM ₁₀	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method	U.S. EPA 076
Nitrogen Dioxide	NO/NO ₂ /NO _x -Analyzer	Chemiluminescence Method	U.S. EPA RFNA-1194-099
Sulfur Dioxide	SO ₂ -Analyzer	UV Fluorescence Method	U.S. EPA EQSA-0495-100
Benzene	Canister Sampling	Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method	-
Wind Speed & Wind Direction	Wind Vane Anemometer	Wind Speed & Wind Direction Sensor	-

2) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2566 มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.2.1.1-2 และผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3

สำหรับผลการตรวจวัดของเบนซีน (Benzene) ในทุกเดือน ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างของหน่วยผลิตที่เกี่ยวข้องยังไม่แล้วเสร็จ

3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกิด พบว่า TSP มีค่าอยู่ในช่วง 0.026-0.060 mg/m³, PM₁₀ มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.041 mg/m³, SO₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.002-0.003 ppm, SO₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 0.002-0.013 ppm, NO₂ มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.056 ppm และผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศเหนือ (N) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ (NNE)

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองจอก (โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) พบว่า TSP มีค่าอยู่ในช่วง 0.026-0.043 mg/m³, PM₁₀ มีค่าอยู่ในช่วง 0.025 - 0.050 mg/m³, SO₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.004 ppm ทุกวันที่ทำการตรวจวัด, SO₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.006 ppm, NO₂ มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.012 ppm และผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก (ENE) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศใต้ (S)

บริเวณ รพ.สต. บ้านหนองจอก พบว่า TSP มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.057 mg/m³, PM₁₀ มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.039 mg/m³, SO₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.005 ppm ทุกวันที่ทำการตรวจวัด, SO₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.006 ppm, NO₂ มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.005 ppm และผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศเหนือ (N) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ (NNE)

บริเวณโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง พบว่า SO₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0029-0.0035 ppm, SO₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 0.0038-0.0047 ppm, NO₂ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0236-0.0299 ppm และผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก (ENE) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก (E)

บริเวณวัดเขาพระบาท พบว่า SO₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0029-0.0032 ppm, SO₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 0.0032-0.0038 ppm, NO₂ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0262-0.0289 ppm และผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศใต้ (S)

เมื่อนำค่า SO₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง, PM₁₀ และ TSP มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด

เมื่อนำค่า NO₂ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด

เมื่อนำค่า SO₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด

3.2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2.1.1-3 และรูปที่ 3.2.1.1-2 พบว่า TSP, PM₁₀ และ SO₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด

สำหรับ SO₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด

และ NO₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด



รูปที่ 3.2.1.1-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วและทิศทางลม

ตารางที่ 3.2.1.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สถานีตรวจวัด	วันที่ เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP ^{**/**} (mg/m ³)	PM ₁₀ ^{**/**} (mg/m ³)	SO ₂ ^{**/**} (ppm)		NO ₂ ^{*(1 hr) **/**} (ppm)
				Max 1 hr	24 hr	
บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ	17-18 ต.ค. 66	0.040	0.030	0.002	0.002	0.027
	18-19 ต.ค. 66	0.030	0.025	0.004	0.002	0.031
	19-20 ต.ค. 66	0.030	0.038	0.008	0.002	0.056
	20-21 ต.ค. 66	0.060	0.041	0.013	0.003	0.031
	21-22 ต.ค. 66	0.036	0.026	0.003	0.002	0.016
	22-23 ต.ค. 66	0.026	0.021	0.012	0.003	0.021
	23-24 ต.ค. 66	0.041	0.024	0.004	0.002	0.025
บริเวณโรงเรียนบ้านหนองจอก (โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์)	17-18 ต.ค. 66	0.028	0.039	0.006	0.004	0.009
	18-19 ต.ค. 66	0.040	0.032	0.005	0.004	0.012
	19-20 ต.ค. 66	0.043	0.050	0.005	0.004	0.009
	20-21 ต.ค. 66	0.040	0.047	0.005	0.004	0.007
	21-22 ต.ค. 66	0.026	0.031	0.004	0.004	0.005
	22-23 ต.ค. 66	0.028	0.025	0.004	0.004	0.006
	23-24 ต.ค. 66	0.030	0.035	0.004	0.004	0.007
บริเวณ รพ.สต. บ้านหนองจอก	17-18 ต.ค. 66	0.057	0.039	0.005	0.005	0.004
	18-19 ต.ค. 66	0.056	0.028	0.005	0.005	0.004
	19-20 ต.ค. 66	0.030	0.034	0.005	0.005	0.005
	20-21 ต.ค. 66	0.028	0.036	0.005	0.005	0.004
	21-22 ต.ค. 66	0.024	0.025	0.005	0.005	0.004
	22-23 ต.ค. 66	0.027	0.021	0.005	0.005	0.003
	23-24 ต.ค. 66	0.029	0.027	0.006	0.005	0.004
โรงเรียนวัดเขาส่าเกาทอง	17-18 ต.ค. 66	-	-	0.0042	0.0032	0.0298
	18-19 ต.ค. 66	-	-	0.0046	0.0035	0.0280
	19-20 ต.ค. 66	-	-	0.0044	0.0033	0.0297
	20-21 ต.ค. 66	-	-	0.0041	0.0033	0.0286
	21-22 ต.ค. 66	-	-	0.0047	0.0031	0.0236
	22-23 ต.ค. 66	-	-	0.0041	0.0030	0.0299
	23-24 ต.ค. 66	-	-	0.0038	0.0029	0.0291
โรงเรียนวัดเขาพระบาท	17-18 ต.ค. 66	-	-	0.0035	0.0032	0.0266
	18-19 ต.ค. 66	-	-	0.0033	0.0030	0.0262
	19-20 ต.ค. 66	-	-	0.0038	0.0031	0.0279
	20-21 ต.ค. 66	-	-	0.0033	0.0031	0.0280
	21-22 ต.ค. 66	-	-	0.0034	0.0031	0.0289
	22-23 ต.ค. 66	-	-	0.0032	0.0029	0.0280
	23-24 ต.ค. 66	-	-	0.0033	0.0030	0.0271
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.30 ^[2]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[3]

- มาตรฐาน^[1] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- มาตรฐาน^[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
- มาตรฐาน^[3] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- หมายเหตุ : * = ค่าที่รายงานในตารางเป็นค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (Maximum) ของช่วงวันที่ตรวจวัด
24 ชั่วโมง

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม**	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	0-2939-4370-72
บริษัทตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม***	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์	0-3861-1333

ตารางที่ 3.2.1.1-3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (1 hr)* (ppm)
				Max 1 hr	24 hr	
บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ	10-11 พ.ค. 64	0.043	0.023	0.003	0.009	0.018
	11-12 พ.ค. 64	0.046	0.015	0.003	0.010	0.014
	12-13 พ.ค. 64	0.073	0.016	0.003	0.014	0.018
	13-14 พ.ค. 64	0.056	0.016	0.002	0.006	0.012
	14-15 พ.ค. 64	0.060	0.012	0.003	0.018	0.013
	15-16 พ.ค. 64	0.050	0.012	0.001	0.002	0.014
	16-17 พ.ค. 64	0.062	0.018	0.001	0.003	0.008
	08-09 พ.ย. 64	0.038	0.036	0.003	0.002	0.012
	09-10 พ.ย. 64	0.035	0.030	0.006	0.002	0.014
	10-11 พ.ย. 64	0.039	0.031	0.008	0.003	0.013
	11-12 พ.ย. 64	0.032	0.047	0.005	0.002	0.015
	12-13 พ.ย. 64	0.033	0.034	0.004	0.002	0.014
	13-14 พ.ย. 64	0.045	0.029	0.005	0.002	0.014
	14-15 พ.ย. 64	0.057	0.027	0.002	0.002	0.013
	20-21 พ.ค. 65	0.032	0.015	0.005	0.002	0.011
	21-22 พ.ค. 65	0.026	0.014	0.010	0.003	0.009
	22-23 พ.ค. 65	0.041	0.015	0.002	0.002	0.009
	23-24 พ.ค. 65	0.037	0.013	0.003	0.001	0.010
	24-25 พ.ค. 65	0.027	0.020	0.005	0.002	0.011
	25-26 พ.ค. 65	0.023	0.019	0.003	0.002	0.011
	26-27 พ.ค. 65	0.029	0.015	0.001	0.001	0.006
	21-22 พ.ย. 65	0.032	0.025	0.004	0.002	0.018
	22-23 พ.ย. 65	0.038	0.039	0.005	0.002	0.021
	23-24 พ.ย. 65	0.041	0.033	0.005	0.002	0.014
	24-25 พ.ย. 65	0.056	0.011	0.002	0.001	0.012
	25-26 พ.ย. 65	0.036	0.015	0.002	0.001	0.014
	26-27 พ.ย. 65	0.035	0.023	0.008	0.002	0.015
	27-28 พ.ย. 65	0.030	0.019	0.004	0.001	0.018
	16-17 พ.ค. 66	0.045	0.035	0.018	0.003	0.013
	17-18 พ.ค. 66	0.045	0.032	0.039	0.010	0.013
	18-19 พ.ค. 66	0.058	0.033	0.044	0.016	0.012
	19-20 พ.ค. 66	0.061	0.037	0.052	0.010	0.013
	20-21 พ.ค. 66	0.054	0.037	0.056	0.010	0.017
	21-22 พ.ค. 66	0.053	0.034	0.058	0.011	0.014
	22-23 พ.ค. 66	0.039	0.031	0.073	0.015	0.012
	17-18 ต.ค. 66	0.040	0.030	0.002	0.002	0.027
	18-19 ต.ค. 66	0.030	0.025	0.004	0.002	0.031
	19-20 ต.ค. 66	0.030	0.038	0.008	0.002	0.056
	20-21 ต.ค. 66	0.060	0.041	0.013	0.003	0.031
	21-22 ต.ค. 66	0.036	0.026	0.003	0.002	0.016
	22-23 ต.ค. 66	0.026	0.021	0.012	0.003	0.021
	23-24 ต.ค. 66	0.030	0.024	0.004	0.002	0.025
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^[1]	0.041	ไม่เกิน 0.30 ^[2]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[3]

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (1 hr)* (ppm)
				Max 1 hr	24 hr	
บริเวณโรงเรียนบ้านหนองจอก (โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์)	10-11 พ.ค. 64	0.064	0.031	0.003	0.003	0.026
	11-12 พ.ค. 64	0.054	0.019	0.003	0.003	0.001
	12-13 พ.ค. 64	0.057	0.023	0.003	0.003	0.001
	13-14 พ.ค. 64	0.040	0.015	0.003	0.003	0.001
	14-15 พ.ค. 64	0.060	0.044	0.003	0.003	0.001
	15-16 พ.ค. 64	0.042	0.018	0.003	0.003	0.001
	16-17 พ.ค. 64	0.045	0.022	0.003	0.003	0.001
	08-09 พ.ย. 64	0.036	0.029	0.006	0.005	0.004
	09-10 พ.ย. 64	0.034	0.020	0.006	0.006	0.005
	10-11 พ.ย. 64	0.047	0.020	0.006	0.005	0.005
	11-12 พ.ย. 64	0.040	0.025	0.006	0.005	0.005
	12-13 พ.ย. 64	0.048	0.021	0.005	0.005	0.005
	13-14 พ.ย. 64	0.056	0.021	0.005	0.005	0.005
	14-15 พ.ย. 64	0.045	0.021	0.006	0.005	0.006
	20-21 พ.ค. 65	0.032	0.015	0.0060	0.0044	0.0265
	21-22 พ.ค. 65	0.029	0.019	0.0062	0.0046	0.0286
	22-23 พ.ค. 65	0.031	0.013	0.0060	0.0045	0.0270
	23-24 พ.ค. 65	0.027	0.010	0.0059	0.0046	0.0268
	24-25 พ.ค. 65	0.030	0.012	0.0057	0.0047	0.0250
	25-26 พ.ค. 65	0.033	0.014	0.0061	0.0049	0.0298
	26-27 พ.ค. 65	0.040	0.023	0.0057	0.0045	0.0275
	21-22 พ.ย. 65	0.062	0.030	0.0063	0.0044	0.0294
	22-23 พ.ย. 65	0.055	0.027	0.0064	0.0048	0.0284
	23-24 พ.ย. 65	0.068	0.035	0.0057	0.0046	0.0278
	24-25 พ.ย. 65	0.041	0.019	0.0061	0.0049	0.0264
	25-26 พ.ย. 65	0.047	0.021	0.0063	0.0051	0.0266
	26-27 พ.ย. 65	0.038	0.017	0.0061	0.0049	0.0295
	27-28 พ.ย. 65	0.034	0.016	0.0060	0.0046	0.0271
	16-17 พ.ค. 66	0.039	0.047	0.002	0.002	0.019
	17-18 พ.ค. 66	0.025	0.040	0.002	0.002	0.016
	18-19 พ.ค. 66	0.042	0.043	0.002	0.002	0.036
	19-20 พ.ค. 66	0.060	0.040	0.002	0.002	0.014
	20-21 พ.ค. 66	0.047	0.052	0.002	0.002	0.019
	21-22 พ.ค. 66	0.038	0.090	0.002	0.002	0.009
	22-23 พ.ค. 66	0.076	0.007	0.002	0.002	0.016
	17-18 ต.ค. 66	0.028	0.039	0.006	0.004	0.009
	18-19 ต.ค. 66	0.040	0.032	0.005	0.004	0.012
	19-20 ต.ค. 66	0.043	0.050	0.005	0.004	0.009
	20-21 ต.ค. 66	0.040	0.047	0.005	0.004	0.007
	21-22 ต.ค. 66	0.026	0.031	0.004	0.004	0.005
	22-23 ต.ค. 66	0.028	0.025	0.004	0.004	0.006
	23-24 ต.ค. 66	0.030	0.035	0.004	0.004	0.007
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.30 ^[2]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[3]

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (1 hr)* (ppm)
				Max 1 hr	24 hr	
บริเวณ รพ.สต. บ้านหนองจอก	10-11 พ.ค. 64	0.049	0.023	0.004	0.004	0.005
	11-12 พ.ค. 64	0.052	0.026	0.004	0.004	0.006
	12-13 พ.ค. 64	0.059	0.018	0.004	0.004	0.010
	13-14 พ.ค. 64	0.038	0.012	0.004	0.004	0.004
	14-15 พ.ค. 64	0.044	0.012	0.004	0.004	0.004
	15-16 พ.ค. 64	0.041	0.012	0.004	0.004	0.010
	16-17 พ.ค. 64	0.047	0.011	0.004	0.004	0.005
	08-09 พ.ย. 64	0.029	0.022	0.008	0.008	0.003
	09-10 พ.ย. 64	0.028	0.017	0.008	0.008	0.005
	10-11 พ.ย. 64	0.030	0.018	0.008	0.008	0.003
	11-12 พ.ย. 64	0.031	0.030	0.008	0.008	0.004
	12-13 พ.ย. 64	0.046	0.022	0.008	0.008	0.002
	13-14 พ.ย. 64	0.045	0.026	0.008	0.008	0.003
	14-15 พ.ย. 64	0.033	0.024	0.008	0.008	0.003
	20-21 พ.ค. 65	0.025	0.028	0.014	0.014	0.001
	21-22 พ.ค. 65	0.021	0.020	0.014	0.014	0.001
	22-23 พ.ค. 65	0.028	0.031	0.014	0.014	0.001
	23-24 พ.ค. 65	0.027	0.023	0.014	0.014	0.001
	24-25 พ.ค. 65	0.025	0.040	0.014	0.014	0.001
	25-26 พ.ค. 65	0.020	0.040	0.014	0.014	0.001
	26-27 พ.ค. 65	0.027	0.032	0.015	0.014	0.001
	21-22 พ.ย. 65	0.036	0.048	0.004	0.004	0.001
	22-23 พ.ย. 65	0.040	0.030	0.004	0.004	0.001
	23-24 พ.ย. 65	0.026	0.034	0.004	0.004	0.001
	24-25 พ.ย. 65	0.023	0.021	0.004	0.004	0.001
	25-26 พ.ย. 65	0.024	0.017	0.004	0.004	0.001
	26-27 พ.ย. 65	0.031	0.024	0.006	0.004	0.001
	27-28 พ.ย. 65	0.029	0.023	0.004	0.004	0.001
	16-17 พ.ค. 66	0.039	0.047	0.002	0.002	0.019
	17-18 พ.ค. 66	0.025	0.040	0.002	0.002	0.016
	18-19 พ.ค. 66	0.042	0.043	0.002	0.002	0.036
	19-20 พ.ค. 66	0.060	0.040	0.002	0.002	0.014
	20-21 พ.ค. 66	0.047	0.052	0.002	0.002	0.019
	21-22 พ.ค. 66	0.038	0.090	0.002	0.002	0.009
	22-23 พ.ค. 66	0.076	0.007	0.002	0.002	0.016
	17-18 ต.ค. 66	0.057	0.039	0.005	0.005	0.004
	18-19 ต.ค. 66	0.056	0.028	0.005	0.005	0.004
	19-20 ต.ค. 66	0.030	0.034	0.005	0.005	0.005
	20-21 ต.ค. 66	0.028	0.036	0.005	0.005	0.004
	21-22 ต.ค. 66	0.024	0.025	0.005	0.005	0.004
	22-23 ต.ค. 66	0.027	0.021	0.005	0.005	0.003
	23-24 ต.ค. 66	0.029	0.027	0.006	0.005	0.004
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.30 ^[2]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[3]




ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (1 hr)* (ppm)
				Max 1 hr	24 hr	
โรงเรียนวัดเขาสีภาพทอง	10-11 พ.ค. 64	-	-	0.0066	0.0053	0.0192
	11-12 พ.ค. 64	-	-	0.0061	0.0049	0.0265
	12-13 พ.ค. 64	-	-	0.0063	0.0050	0.0253
	13-14 พ.ค. 64	-	-	0.0061	0.0047	0.0229
	14-15 พ.ค. 64	-	-	0.0059	0.0045	0.0224
	15-16 พ.ค. 64	-	-	0.0062	0.0047	0.0238
	16-17 พ.ค. 64	-	-	0.0064	0.0051	0.0257
	08-09 พ.ย. 64	-	-	0.002	<0.001	0.005
	09-10 พ.ย. 64	-	-	0.001	<0.001	0.003
	10-11 พ.ย. 64	-	-	0.002	<0.001	0.006
	11-12 พ.ย. 64	-	-	0.001	<0.001	0.009
	12-13 พ.ย. 64	-	-	0.001	<0.001	0.002
	13-14 พ.ย. 64	-	-	0.002	0.001	0.005
	14-15 พ.ย. 64	-	-	0.002	0.001	0.006
	20-21 พ.ค. 65	-	-	0.0062	0.0047	0.0268
	21-22 พ.ค. 65	-	-	0.0065	0.0049	0.0271
	22-23 พ.ค. 65	-	-	0.0064	0.0048	0.0292
	23-24 พ.ค. 65	-	-	0.0063	0.0050	0.0298
	24-25 พ.ค. 65	-	-	0.0060	0.0048	0.0253
	25-26 พ.ค. 65	-	-	0.0064	0.0047	0.0280
	26-27 พ.ค. 65	-	-	0.0067	0.0052	0.0263
	21-22 พ.ย. 65	-	-	0.002	0.001	0.014
	22-23 พ.ย. 65	-	-	0.001	0.001	0.014
	23-24 พ.ย. 65	-	-	0.001	0.001	0.008
	24-25 พ.ย. 65	-	-	0.001	0.001	0.012
	25-26 พ.ย. 65	-	-	0.001	0.001	0.012
	26-27 พ.ย. 65	-	-	0.001	0.001	0.013
	27-28 พ.ย. 65	-	-	0.001	0.001	0.007
	16-17 พ.ค. 66	-	-	0.0042	0.0032	0.0260
	17-18 พ.ค. 66	-	-	0.0040	0.0032	0.0230
	18-19 พ.ค. 66	-	-	0.0039	0.0032	0.0250
	19-20 พ.ค. 66	-	-	0.0040	0.0030	0.0246
	20-21 พ.ค. 66	-	-	0.0041	0.0033	0.0263
	21-22 พ.ค. 66	-	-	0.0043	0.0031	0.0240
	22-23 พ.ค. 66	-	-	0.0039	0.0031	0.0264
	17-18 ต.ค. 66	-	-	0.0042	0.0032	0.0298
	18-19 ต.ค. 66	-	-	0.0046	0.0035	0.0280
	19-20 ต.ค. 66	-	-	0.0044	0.0033	0.0297
	20-21 ต.ค. 66	-	-	0.0041	0.0033	0.0286
	21-22 ต.ค. 66	-	-	0.0047	0.0031	0.0236
	22-23 ต.ค. 66	-	-	0.0041	0.0030	0.0299
	23-24 ต.ค. 66	-	-	0.0038	0.0029	0.0291
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.30 ^[2]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[3]

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ)



สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)		NO ₂ (1 hr)* (ppm)
				Max 1 hr	24 hr	
โรงเรียนวัดเขาพระบาท	10-11 พ.ค. 64	-	-	0.0059	0.0046	0.0193
	11-12 พ.ค. 64	-	-	0.0061	0.0048	0.0199
	12-13 พ.ค. 64	-	-	0.0056	0.0044	0.0172
	13-14 พ.ค. 64	-	-	0.0060	0.0043	0.0196
	14-15 พ.ค. 64	-	-	0.0058	0.0047	0.0191
	15-16 พ.ค. 64	-	-	0.0062	0.0045	0.0207
	16-17 พ.ค. 64	-	-	0.0057	0.0043	0.0196
	08-09 พ.ย. 64	-	-	0.006	0.002	0.019
	09-10 พ.ย. 64	-	-	0.011	0.003	0.011
	10-11 พ.ย. 64	-	-	0.010	0.004	0.008
	11-12 พ.ย. 64	-	-	0.015	0.006	0.012
	12-13 พ.ย. 64	-	-	0.005	0.002	0.007
	13-14 พ.ย. 64	-	-	0.007	0.003	0.008
	14-15 พ.ย. 64	-	-	0.006	0.003	0.011
	20-21 พ.ค. 65	-	-	0.0062	0.0047	0.0246
	21-22 พ.ค. 65	-	-	0.0064	0.0048	0.0236
	22-23 พ.ค. 65	-	-	0.0060	0.0046	0.0242
	23-24 พ.ค. 65	-	-	0.0058	0.0047	0.0241
	24-25 พ.ค. 65	-	-	0.0059	0.0045	0.0258
	25-26 พ.ค. 65	-	-	0.0057	0.0044	0.0265
	26-27 พ.ค. 65	-	-	0.0061	0.0046	0.0259
	21-22 พ.ย. 65	-	-	0.002	0.001	0.032
	22-23 พ.ย. 65	-	-	0.002	0.002	0.018
	23-24 พ.ย. 65	-	-	0.002	0.002	0.008
	24-25 พ.ย. 65	-	-	0.002	0.002	0.018
	25-26 พ.ย. 65	-	-	0.002	0.002	0.013
	26-27 พ.ย. 65	-	-	0.002	0.002	0.010
	27-28 พ.ย. 65	-	-	0.002	0.002	0.022
	16-17 พ.ค. 66	-	-	0.0042	0.0032	0.0260
	17-18 พ.ค. 66	-	-	0.0040	0.0032	0.0230
	18-19 พ.ค. 66	-	-	0.0039	0.0032	0.0250
	19-20 พ.ค. 66	-	-	0.0040	0.0030	0.0246
	20-21 พ.ค. 66	-	-	0.0041	0.0033	0.0263
	21-22 พ.ค. 66	-	-	0.0043	0.0031	0.0240
	22-23 พ.ค. 66	-	-	0.0039	0.0031	0.0264
	17-18 ต.ค. 66	-	-	0.0035	0.0032	0.0266
	18-19 ต.ค. 66	-	-	0.0033	0.0030	0.0262
	19-20 ต.ค. 66	-	-	0.0038	0.0031	0.0279
	20-21 ต.ค. 66	-	-	0.0033	0.0031	0.0280
	21-22 ต.ค. 66	-	-	0.0034	0.0031	0.0289
	22-23 ต.ค. 66	-	-	0.0032	0.0029	0.0280
	23-24 ต.ค. 66	-	-	0.0033	0.0030	0.0271
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.30 ^[2]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[3]

- มาตรฐาน^[1] :** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- มาตรฐาน^[2] :** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
- มาตรฐาน^[3] :** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- หมายเหตุ :** * = ค่าที่รายงานในตารางเป็นค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (Maximum) ของช่วงวันที่ตรวจวัด
24 ชั่วโมง

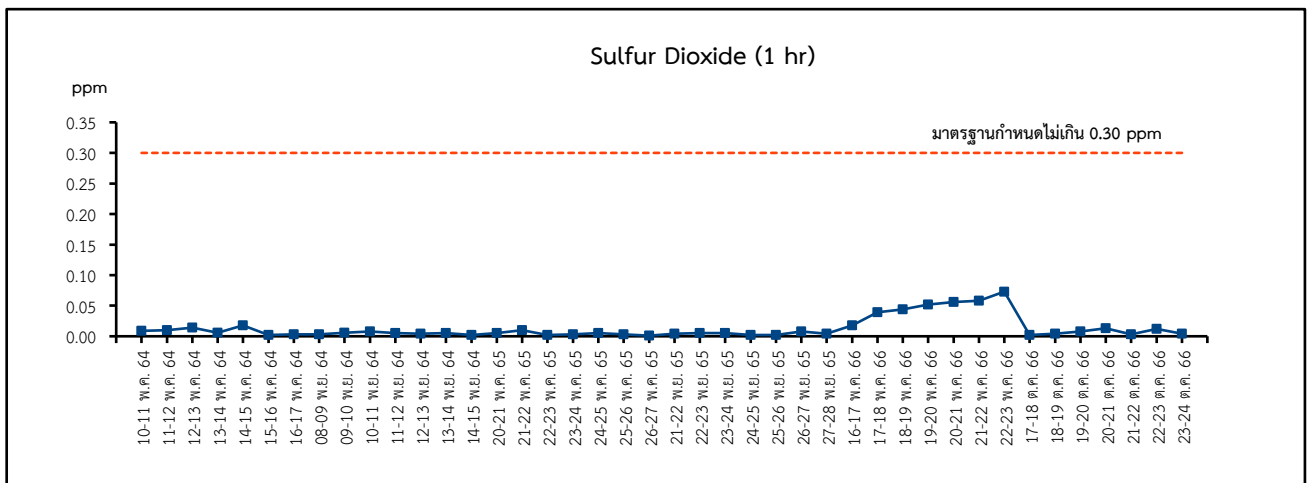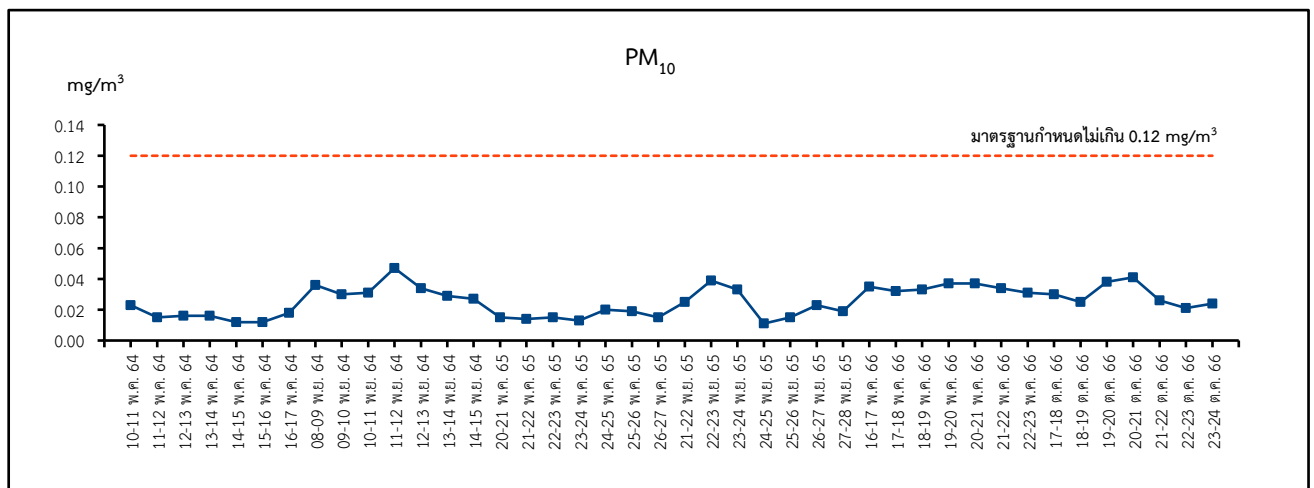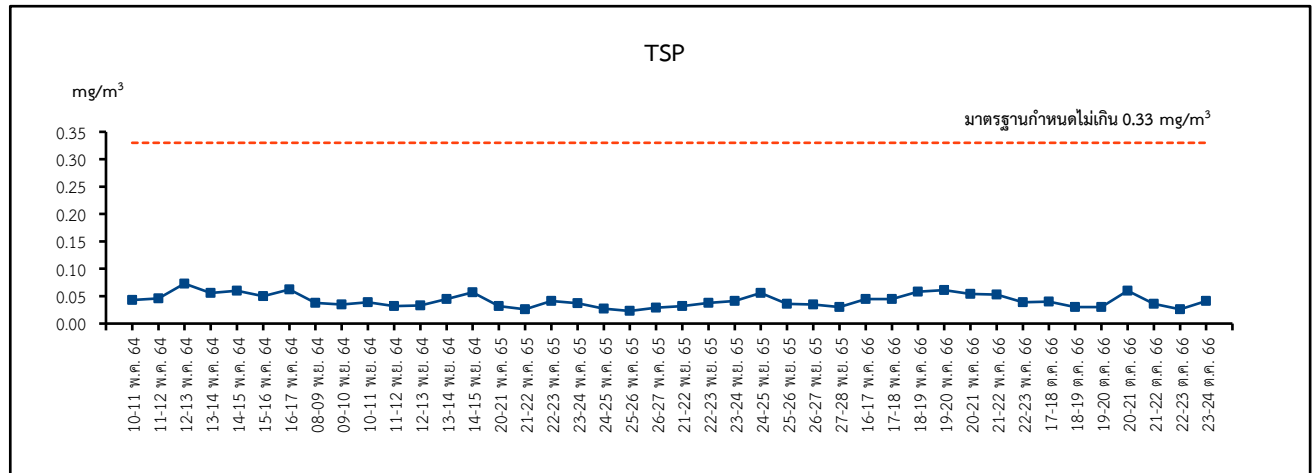




บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ

รูปที่ 3.2.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

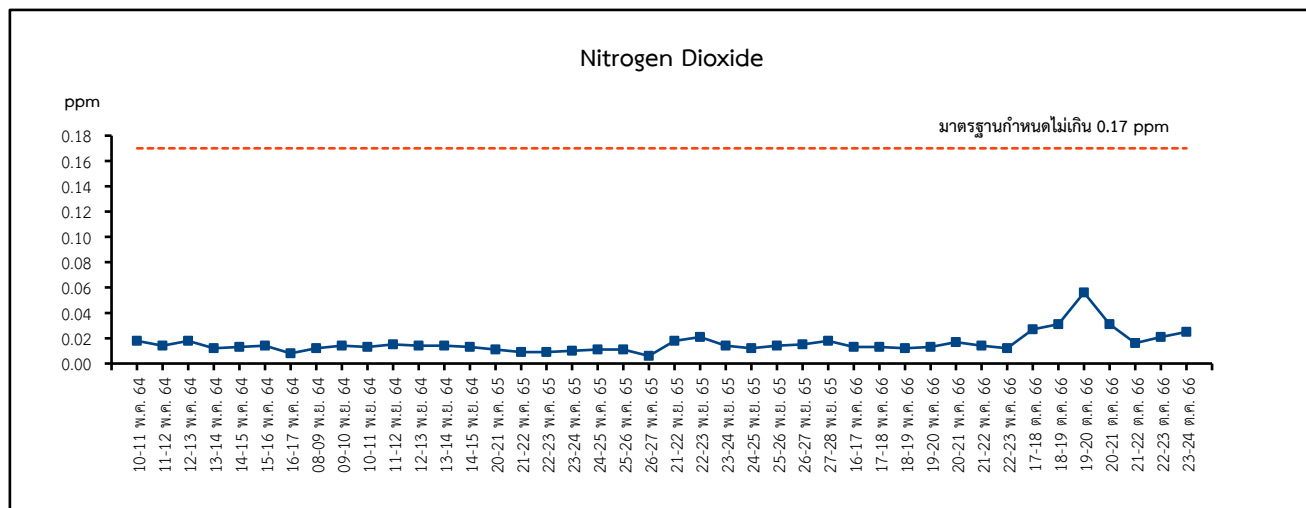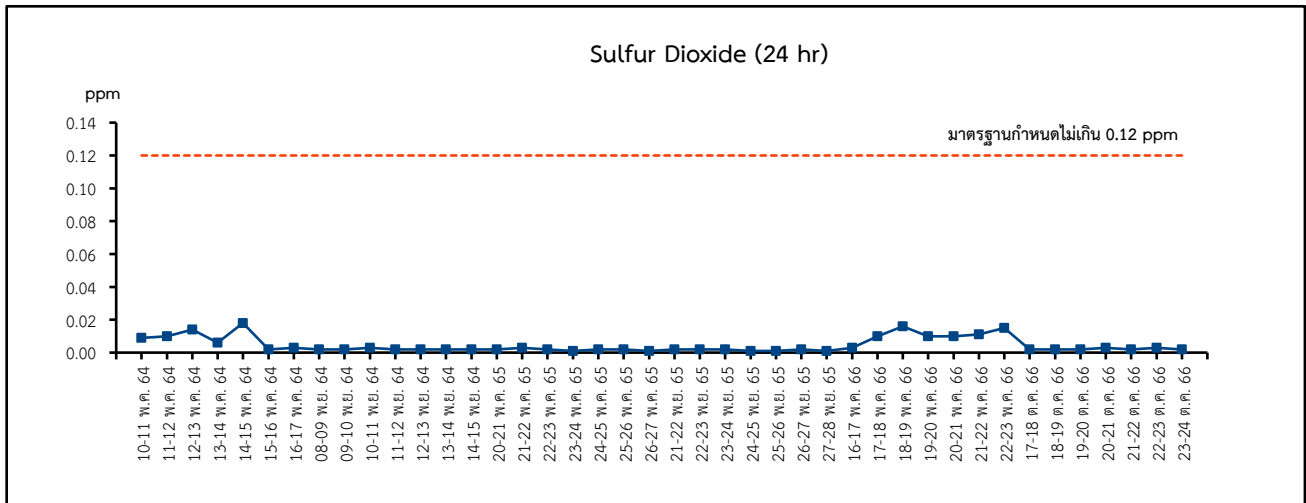



บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ (ต่อ)

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ)

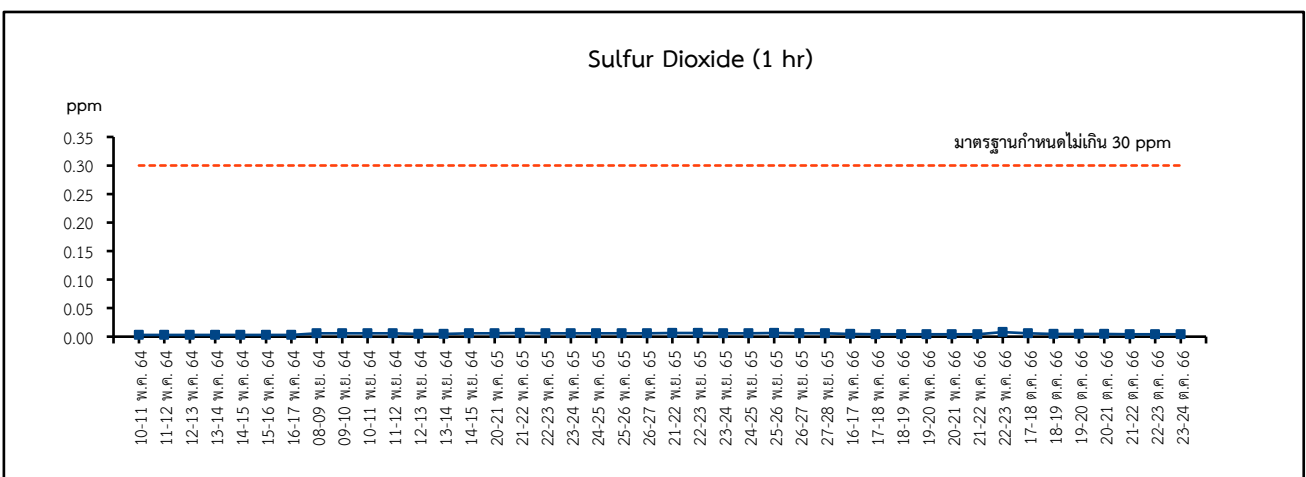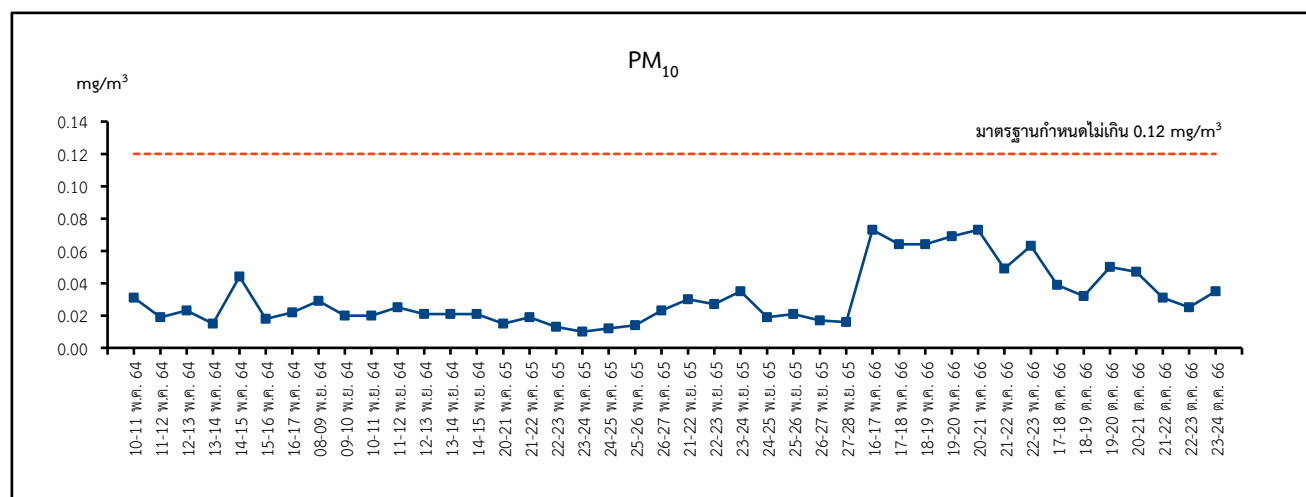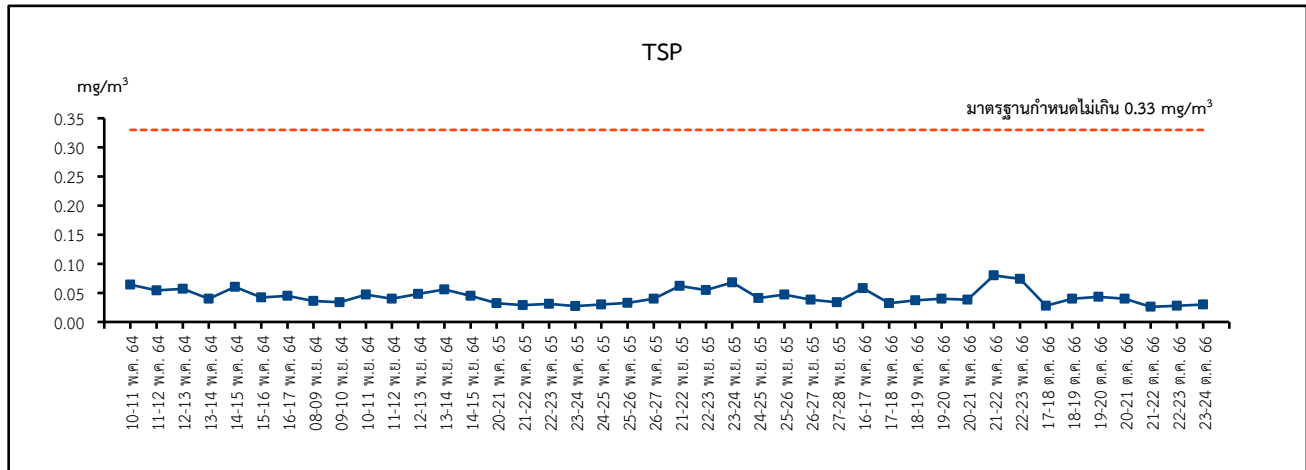




บริเวณโรงเรียนบ้านหนองจอก (โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์)

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ)

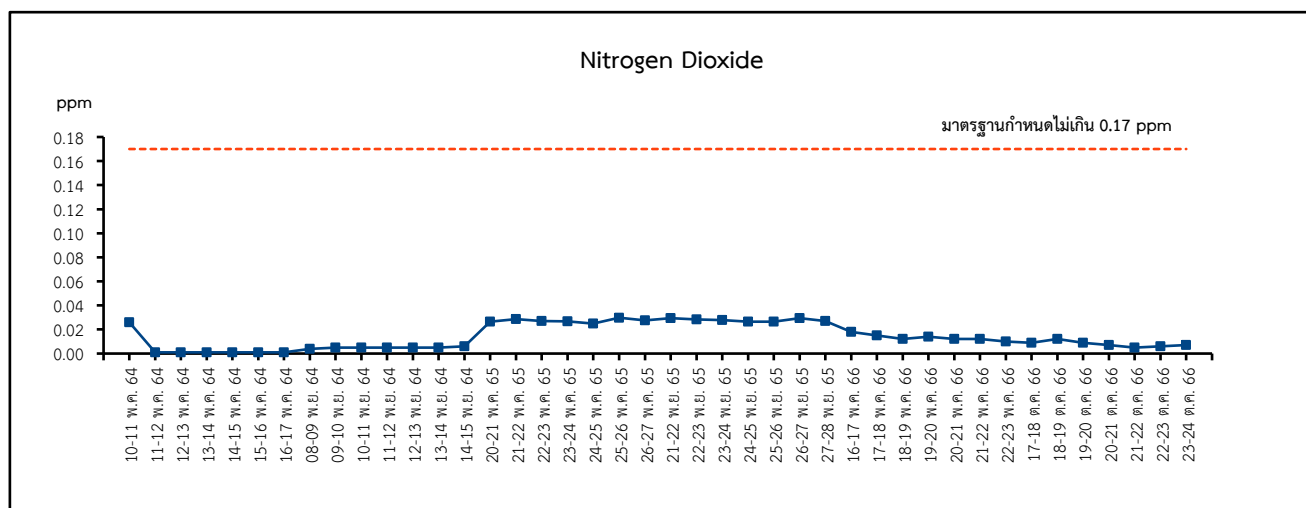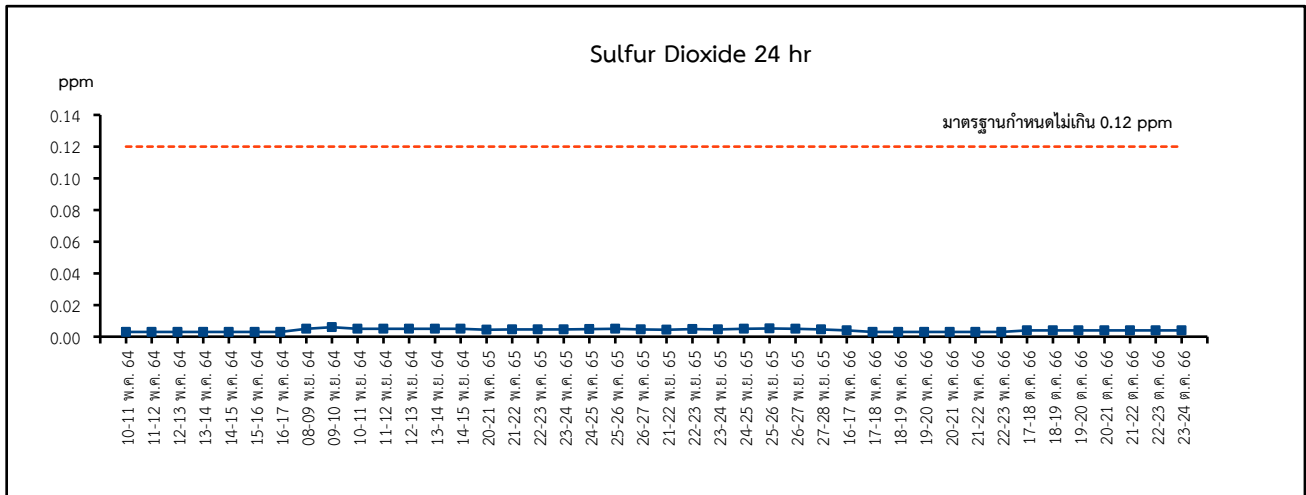



บริเวณโรงเรียนบ้านหนองจอก (โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์) (ต่อ)

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ)

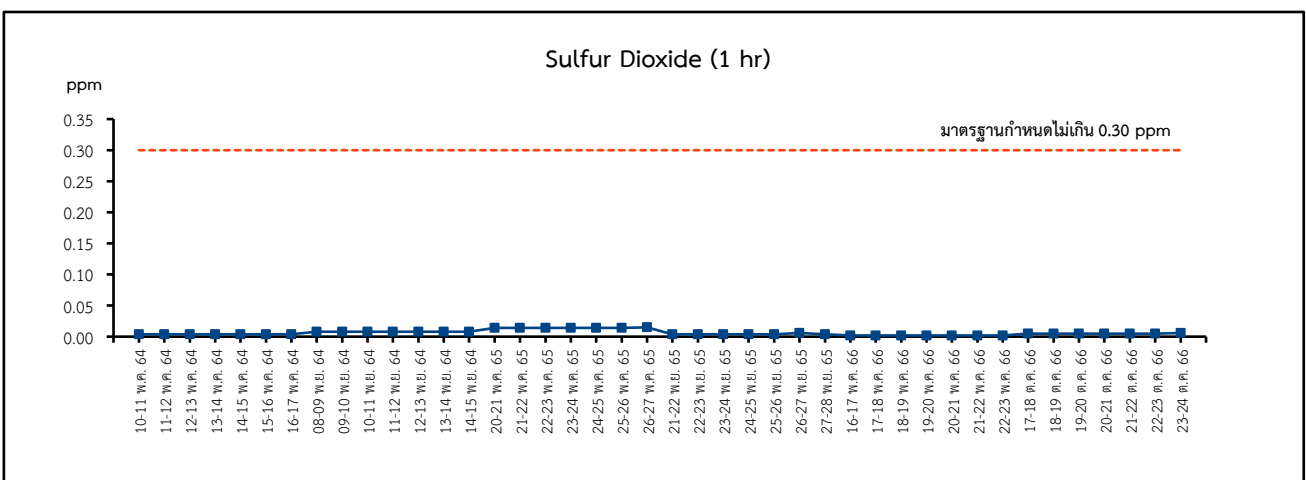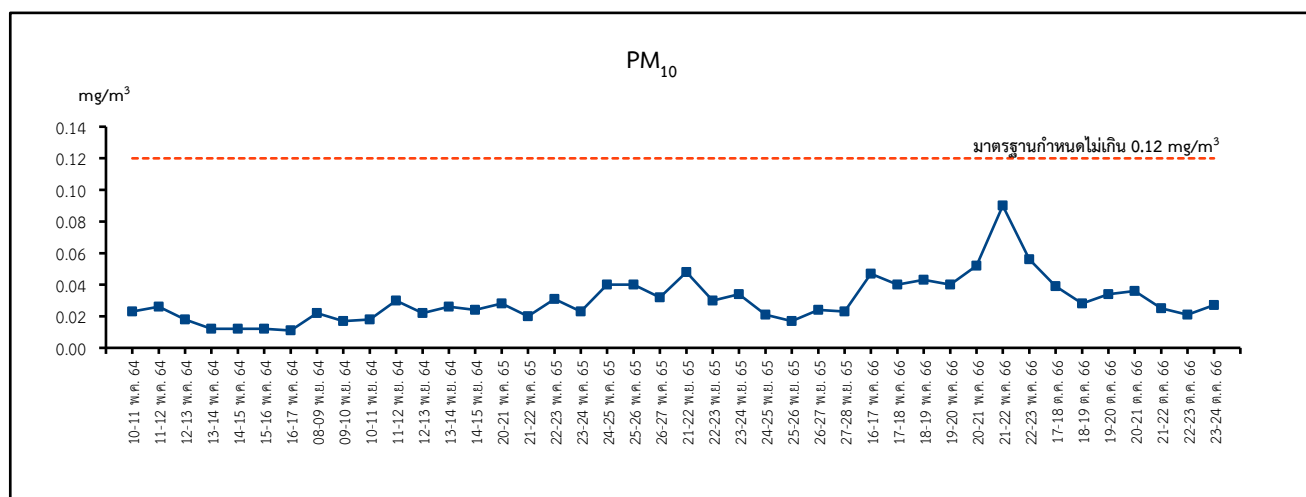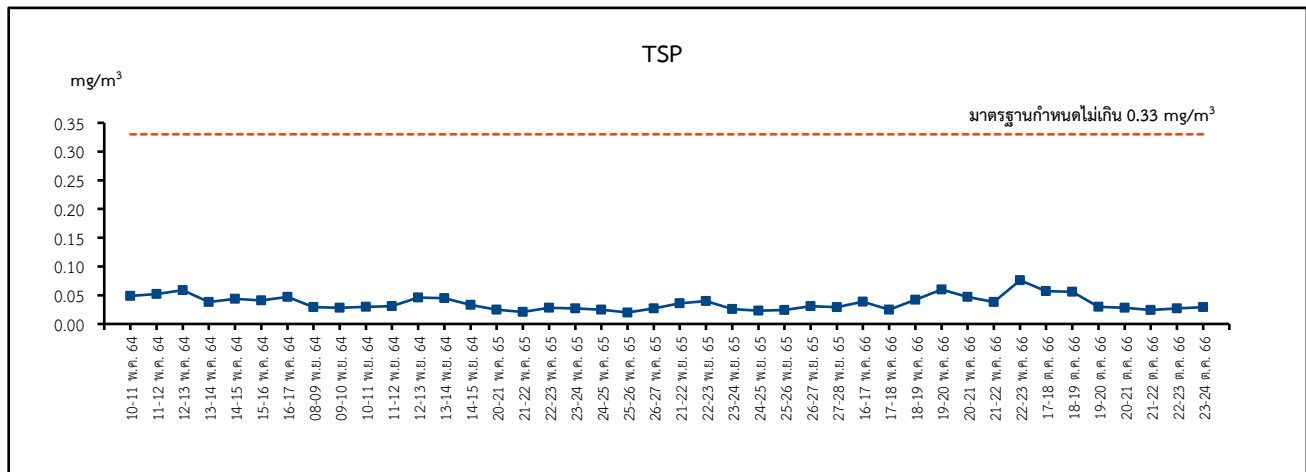




บริเวณ รพ.สต. บ้านหนองจอก

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ)

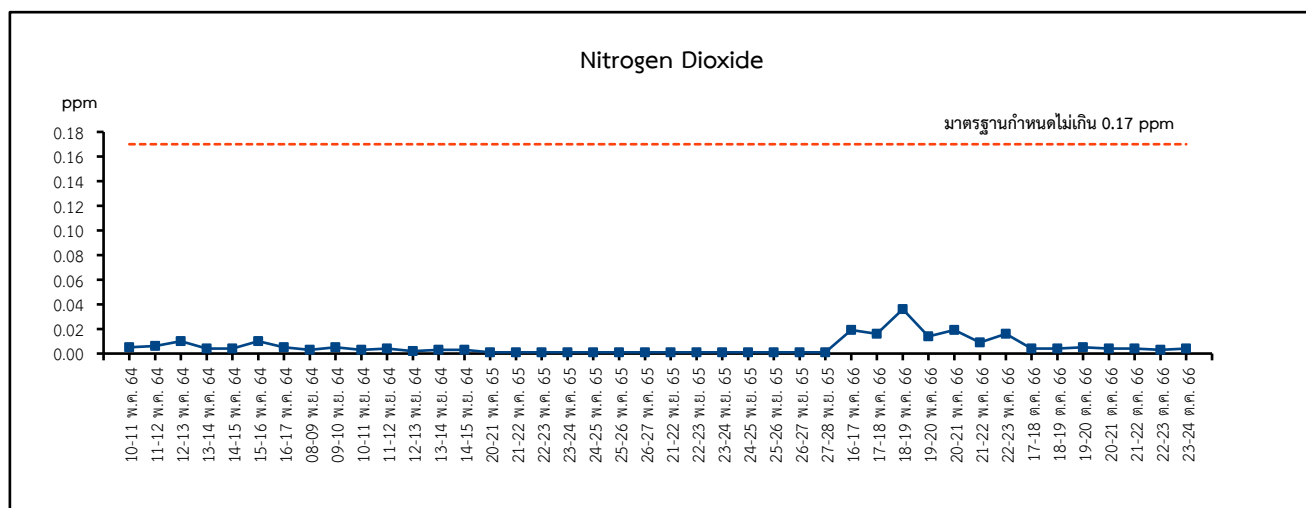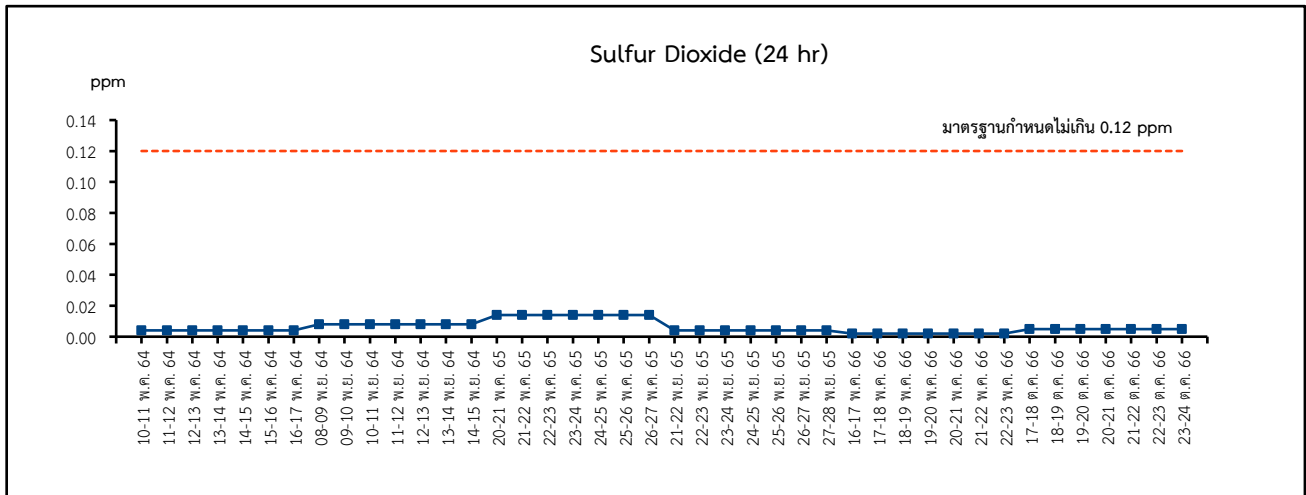




บริเวณ รพ.สต. บ้านหนองจอก (ต่อ)

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ)

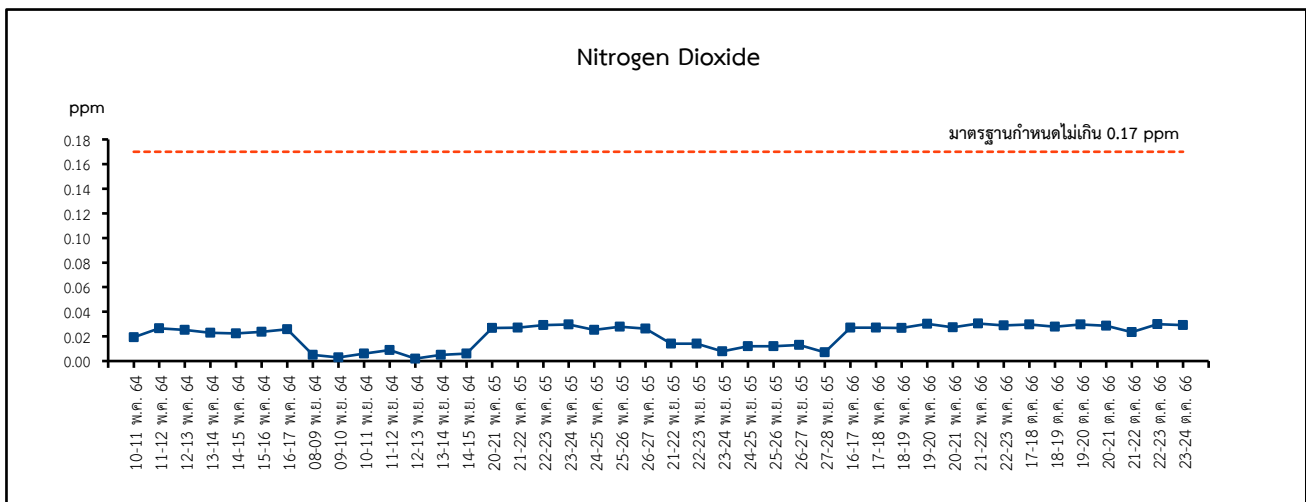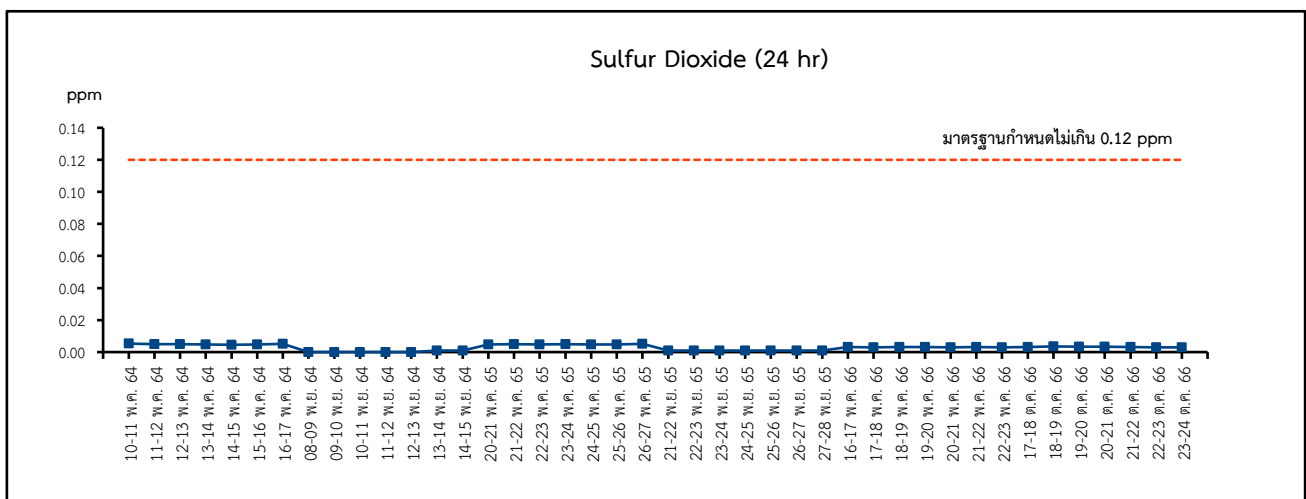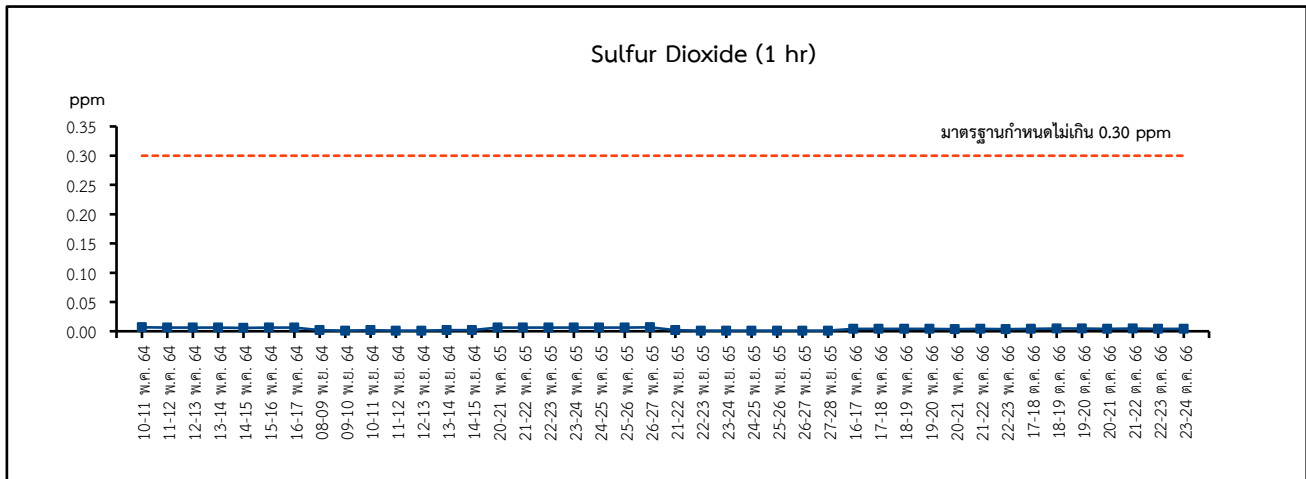

โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ)

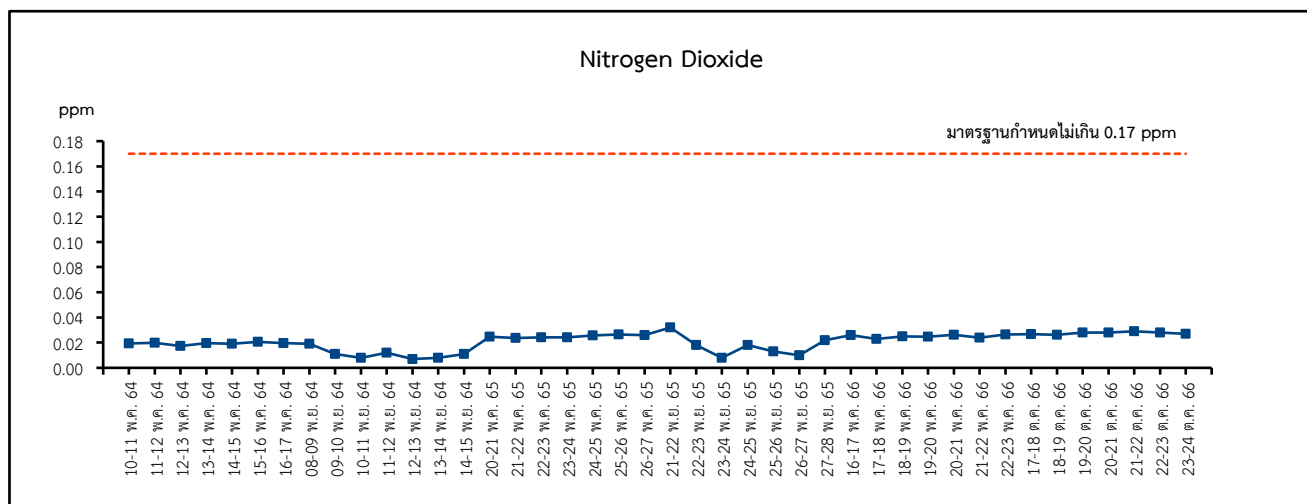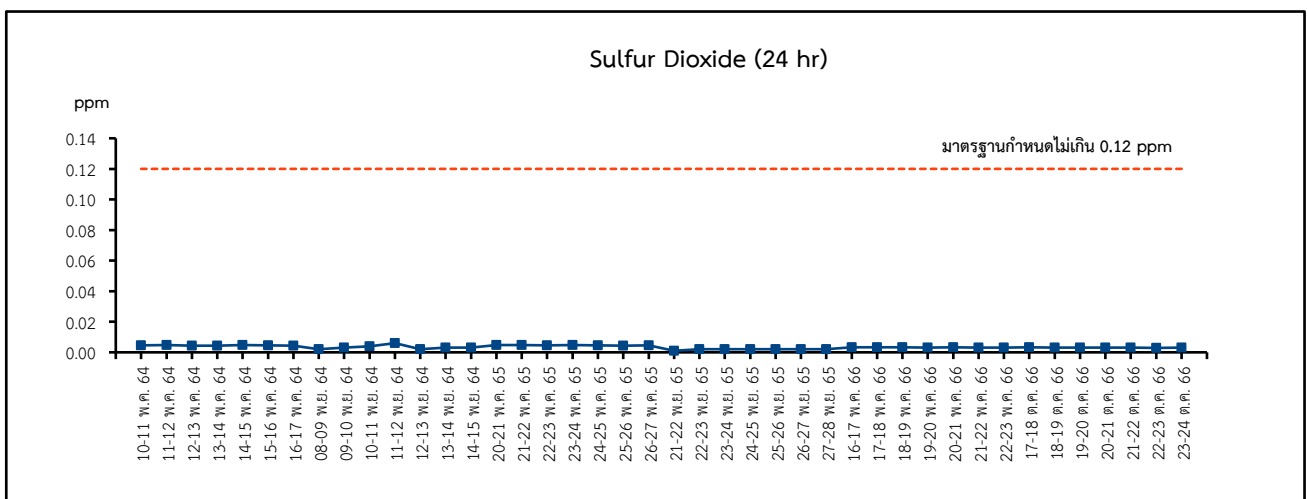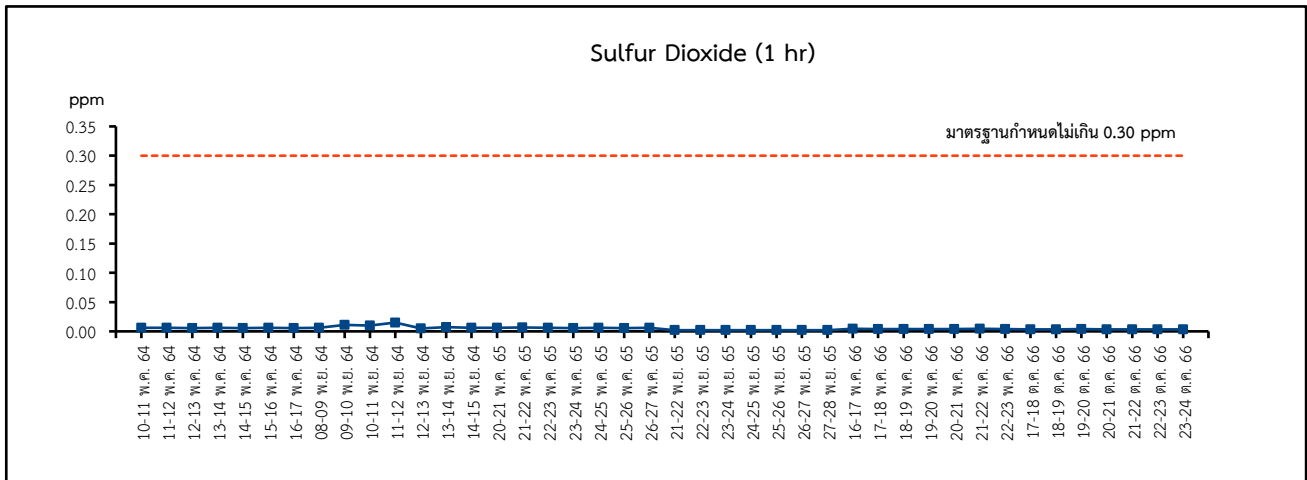

โรงเรียนวัดเขาพระบาท

รูปที่ 3.2.1-2 (ต่อ)

3.2.1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง จำนวน 5 ปล่อง ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ บริเวณ ADU Heater จำนวน 2 ปล่อง บริเวณ DHT Heater จำนวน 1 ปล่อง บริเวณ SRU Incinerator จำนวน 1 ปล่อง และบริเวณ HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack) จำนวน 1 ปล่อง โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ตะกั่ว (Pb) และปรอท (Hg) ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.1.2-1 สำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.1.2-1

ตารางที่ 3.2.1.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศจากปล่อง

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
Total Suspended Particulate	Isokinetic	Gravimetric Method	U.S. EPA Method 5
Sulfur Dioxide	Midget Impinger	Titrimetric Method	U.S. EPA Method 6
Oxide of Nitrogen	Vacuum Flask	Colorimetric Method	U.S. EPA Method 7
Carbon Monoxide	Gas Bag	Non-Dispersive Infrared Detection Method	U.S. EPA Method 10
Lead	Isokinetic	ICP Method	U.S. EPA Method 12
Mercury	Isokinetic	Colorimetric Method	U.S. EPA Method 29
Hydrogen sulfide	Midget Impinger	Titrimetric Method	U.S. EPA Method 11

2) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง จำนวน 3 ปล่อง เมื่อวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2566 มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.2.1.2-2 และผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3

สำหรับปล่อง DHT Heater และปล่อง HMU (Steam Reformer Flue Gas Stack) ยังไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ADU2 Heater A และปล่อง ADU2 Heater B ซึ่งใช้เชื้อเพลิง Fuel Gas และ Fuel Oil พบว่า TSP, NO_x , SO_2 , CO, Pb และ Hg มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553


ส่วนปล่อง SRU Incinerator ซึ่งใช้ Fuel Gas เป็นเชื้อเพลิง พบว่า NO_x , SO_2 , CO และ H_2S มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553

สำหรับค่า TSP บริเวณปล่อง SRU Incinerator ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวยังไม่กำหนดค่าไว้เพื่อควบคุม

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA พบว่า ค่าความเข้มข้นและอัตราการระบายมีค่าอยู่ในค่าควบคุมที่กำหนดทุกสถานที่ทำการตรวจวัด

3.2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง ADU2 Heater A, ปล่อง ADU2 Heater B และปล่อง SRU Incinerator ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2.1.2-3 และรูปที่ 3.2.1.2-2 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 และมาตรฐานตามเงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ทุกสถานที่ทำการตรวจวัด

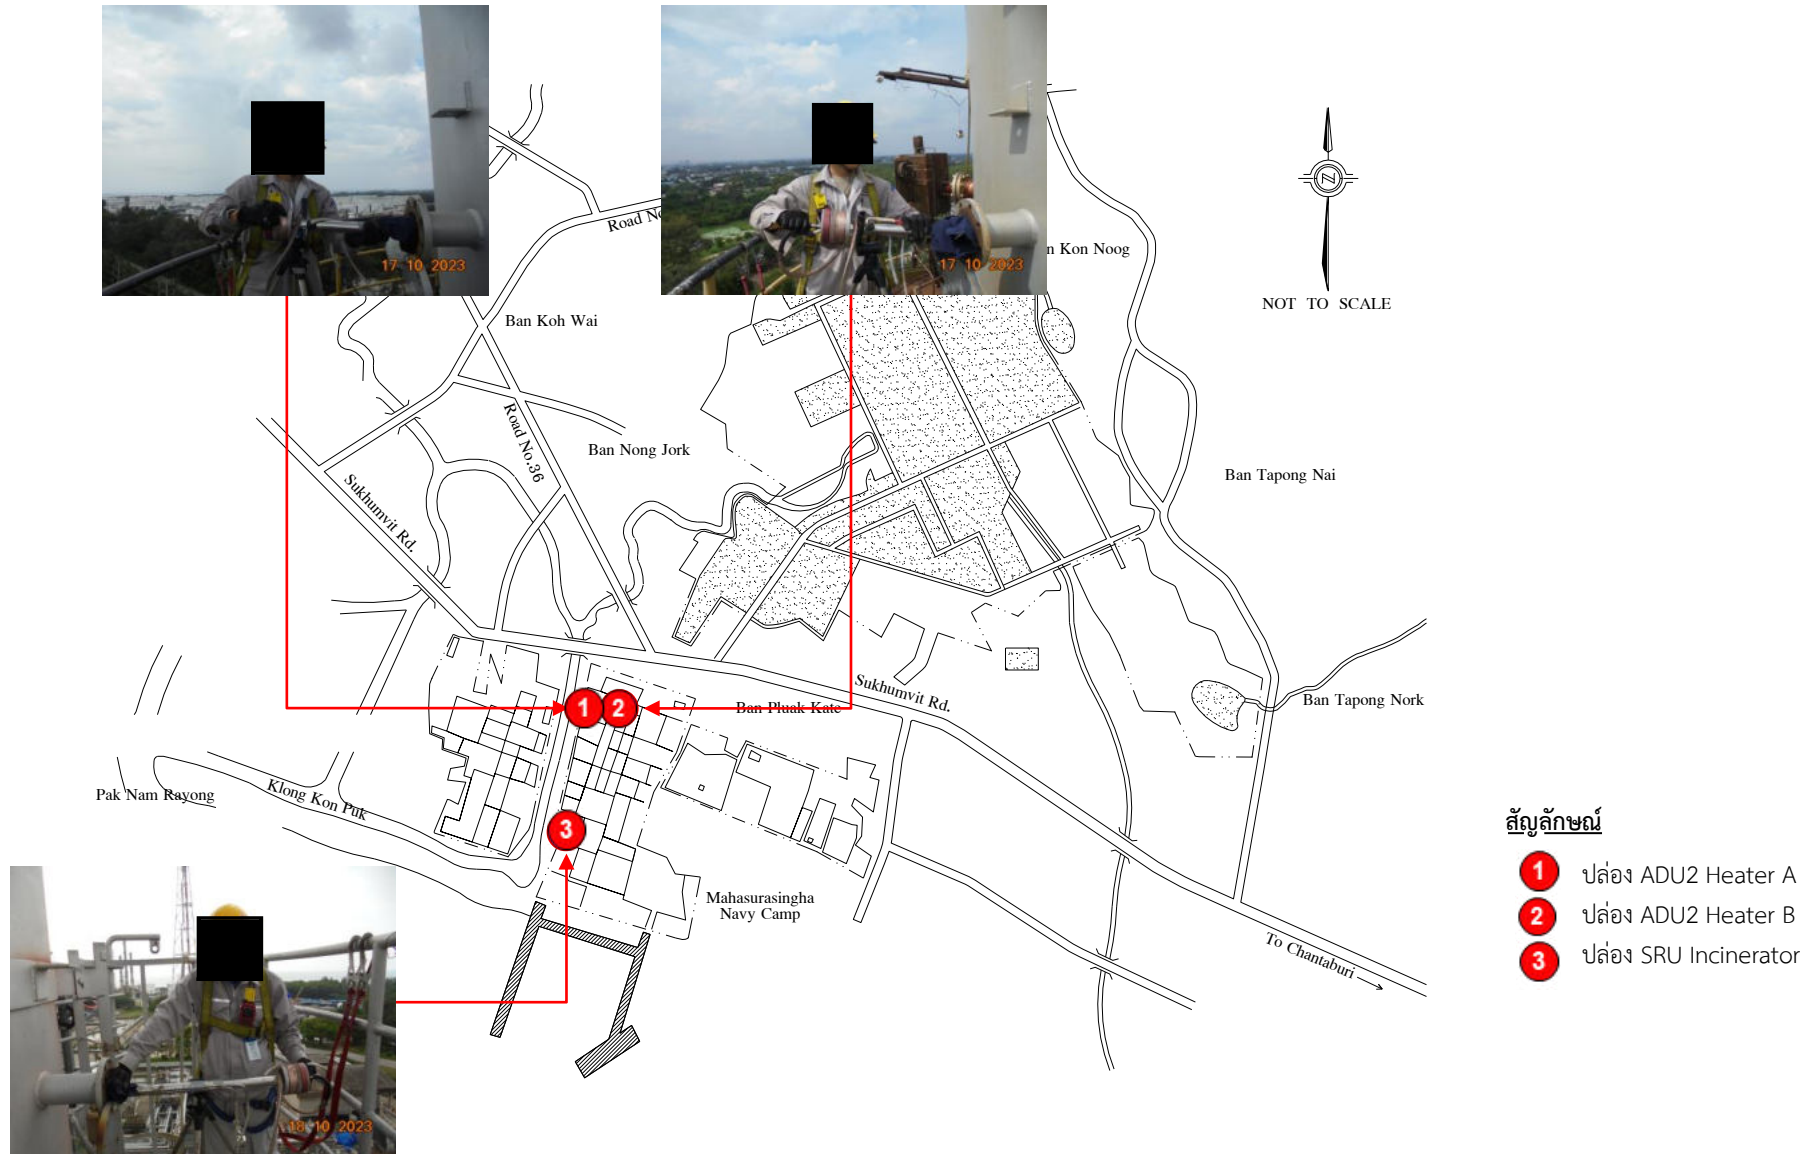

รูปที่ 3.2.1.2-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

ตารางที่ 3.2.1.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

ชื่อปล่อง	วัน/เดือน/ปี	ความสูงปล่อง (ม.)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.)	ผลการตรวจวัด							มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]		ชนิดเชื้อเพลิง
				ความเร็วก๊าซ (m/s)	อัตราไหลก๊าซ (m ³ /s)	อุณหภูมิ (°C)	%Actual Oxygen	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความเข้มข้น	อัตราการระบาย (g/s)		ความเข้มข้น	อัตราการระบาย (g/s)	
ปล่อง ADU2 Heater A (0750808E, 1400573N)	17/10/66	57.5	270	12.19	30.803	320	5.9	TSP	11 mg/m ³	0.370	240 mg/m ³	119 mg/m ³	2.01	Fuel Gas+ Fuel Oil
								NO _x	30 ppm	1.85	200 ppm	180 ppm	5.72	
								SO ₂	<0.1 ppm	<0.008	950 ppm	420 ppm	18.55	
								CO	5.6 ppm	0.212	690 ppm	-	-	
								Pb	0.0257 mg/m ³	<0.001	5 mg/m ³	-	-	
								Hg	0.0006 mg/m ³	<0.001	2.4 mg/m ³	-	-	
ปล่อง ADU2 Heater B (0750808E, 1400578N)	17/10/66	57.5	270	11.87	29.085	330	4.3	TSP	3.9 mg/m ³	0.134	240 mg/m ³	119 mg/m ³	2.01	Fuel Gas+ Fuel Oil
								NO _x	25 ppm	1.64	200 ppm	180 ppm	5.72	
								SO ₂	2.8 ppm	0.251	950 ppm	420 ppm	18.55	
								CO	4.9 ppm	0.193	690 ppm	-	-	
								Pb	0.0069 mg/m ³	<0.001	5 mg/m ³	-	-	
								Hg	0.0003 mg/m ³	<0.001	2.4 mg/m ³	-	-	
ปล่อง SRU Incinerator (0750479E, 1399563N)	18/10/66	60.0	220	8.84	15.372	300	8.9	TSP	20 mg/m ³	0.261	-	120 mg/m ³	0.524	Fuel Gas
								NO _x	10 ppm	0.260	200 ppm	62 ppm	0.509	
								SO ₂	56 ppm	1.93	500 ppm	494 ppm	5.646	
								CO	62 ppm	0.951	690 ppm	-	-	
								H ₂ S	3 ppm	0.064	60 ppm	-	-	

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 (ที่ 7% O₂)

มาตรฐาน^[2] : มาตรฐานตามเงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (หนังสือเห็นชอบเลขที่ รย. 0034(2)5499 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) (ที่ 7% O₂)

หมายเหตุ : Flow Rate (Qsd) และปริมาณมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง




บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2939-4370-7

ตารางที่ 3.2.1.2-3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566




ช่วงที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						
	TSP (mg/m ³)	NO _x (ppm)	SO ₂ (ppm)	CO (ppm)	Pb (mg/m ³)	Hg (mg/m ³)	H ₂ S (ppm)
ปล่อง ADU2 Heater A							
ม.ค.-มี.ย. 64	3.0	21	<0.1	-	-	-	-
ก.ค.-ธ.ค. 64	7.6	34	<0.1	-	-	-	-
ม.ค.-มี.ย. 65	8.4	37	1.1	-	-	-	-
ก.ค.-ธ.ค. 65	5.3	24	<0.1	-	-	-	-
ม.ค.-มี.ย. 66	8.8	41	1.2	3.9	0.0193	0.0089	-
ก.ค.-ธ.ค. 66	11	30	<0.1	5.6	0.0257	0.0006	-
ค่าควบคุมตาม EIA ^[1]	119	200	420	-	-	-	-
ค่าควบคุมตาม EIA ^[2]	119	180	420	-	-	-	-
มาตรฐาน	240	200	950	690	5	2.4	-
ปล่อง ADU2 Heater B							
ม.ค.-มี.ย. 64	2.7	26	<0.1	-	-	-	-
ก.ค.-ธ.ค. 64	8.2	42	<0.1	-	-	-	-
ม.ค.-มี.ย. 65	3.5	25	3.3	-	-	-	-
ก.ค.-ธ.ค. 65	7.1	17	<0.1	-	-	-	-
ม.ค.-มี.ย. 66	5.8	22	1.0	3.9	0.0126	0.0008	-
ก.ค.-ธ.ค. 66	3.9	25	2.8	4.9	0.0069	0.0003	-
ค่าควบคุมตาม EIA ^[1]	119	200	420	-	-	-	-
ค่าควบคุมตาม EIA ^[2]	119	180	420	-	-	-	-
มาตรฐาน	240	200	950	690	5	2.4	-
ปล่อง SRU Incinerator							
ม.ค.-มี.ย. 64	2.4	5	30	-	-	-	-
ก.ค.-ธ.ค. 64	2.4	6	31	-	-	-	-
ม.ค.-มี.ย. 65	2.1	15	61	-	-	-	-
ก.ค.-ธ.ค. 65	18	6	95	-	-	-	-
ม.ค.-มี.ย. 66	13	11	50	33	-	-	<1
ก.ค.-ธ.ค. 66	20	10	56	62	-	-	3
ค่าควบคุมตาม EIA ^[1]	120	62	500	-	-	-	-
ค่าควบคุมตาม EIA ^[2]	120	62	494	-	-	-	-
มาตรฐาน	-	200	500	690	-	-	60

- ค่าควบคุมตาม EIA^[1]** : มาตรฐานตามเงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
(หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.9/14418 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556)
- ค่าควบคุมตาม EIA^[2]** : มาตรฐานตามเงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
(หนังสือเห็นชอบเลขที่ รย. 0034(2)5499 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)
- มาตรฐาน** : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553
- หมายเหตุ** : ปริมาณมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ที่สถานะอากาศแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจนร้อยละ
- : CO, Pb, Hg และ H₂S ดำเนินการตรวจวัดครั้งแรกในปี 2566 ตามมาตรการกำหนด

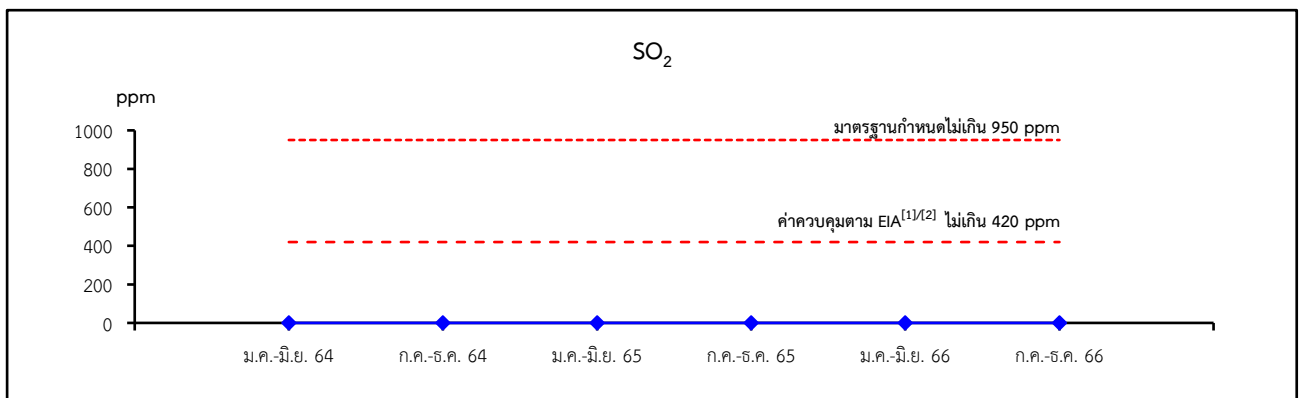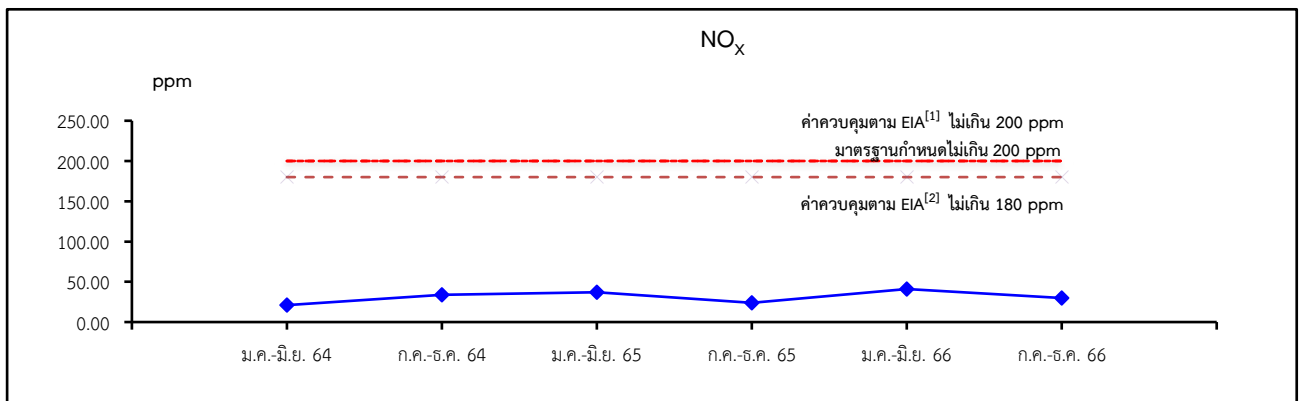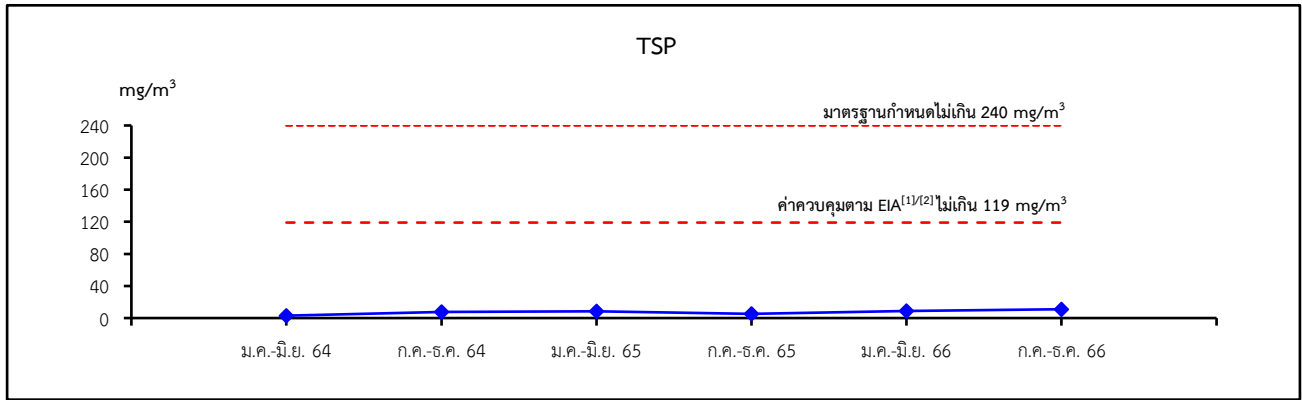




ปล่อง ADU 2 Heater A

รูปที่ 3.2.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

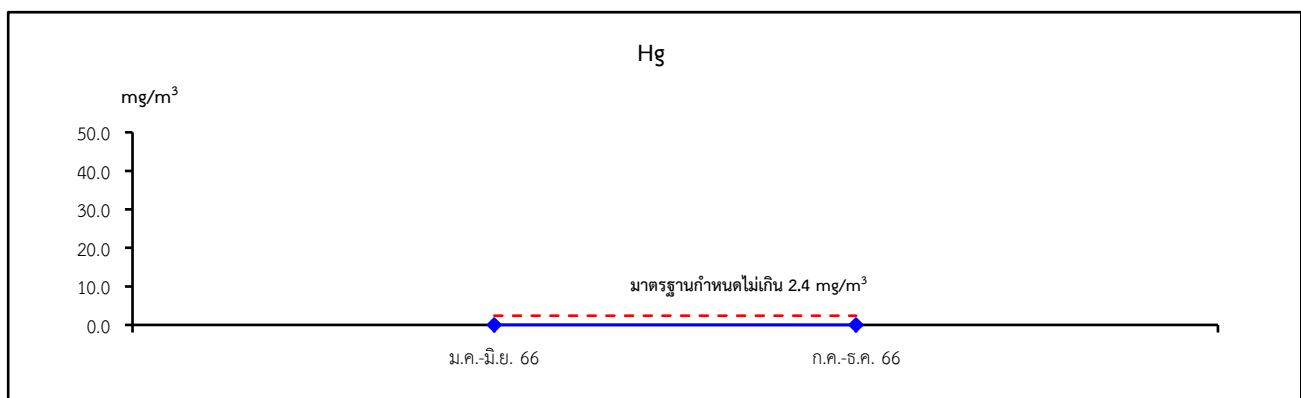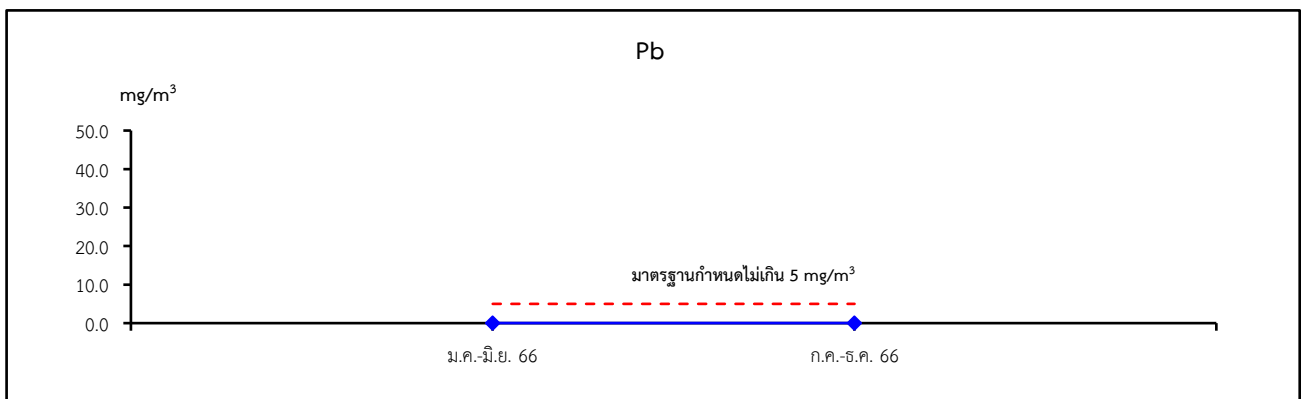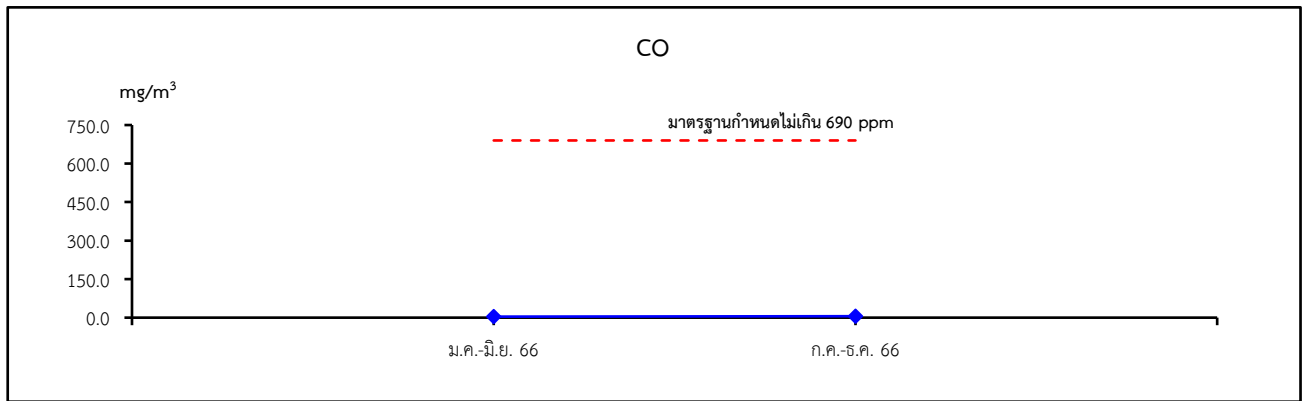




ปล่อง ADU 2 Heater A (ต่อ)

รูปที่ 3.2.3-2 (ต่อ)

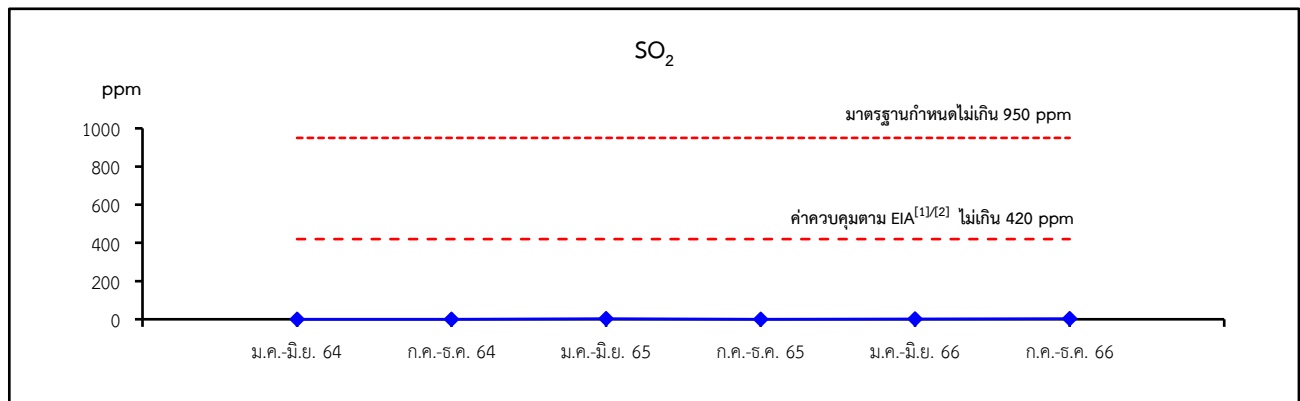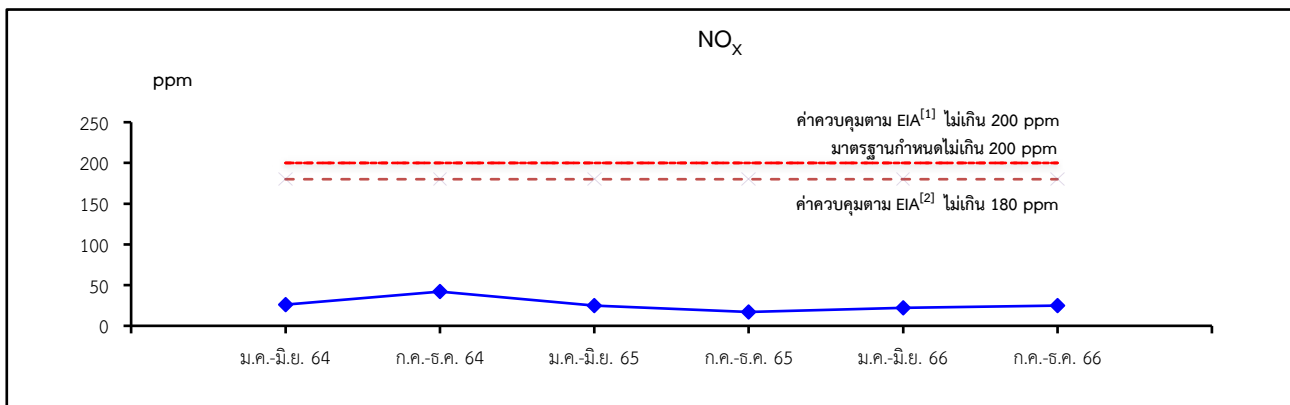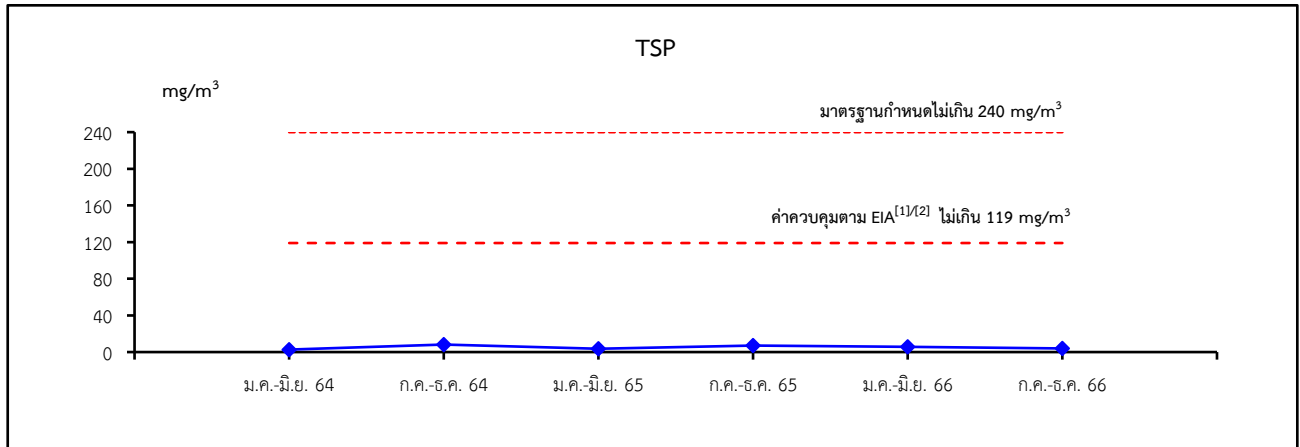




ปล่อง ADU 2 Heater B

รูปที่ 3.2.3-2 (ต่อ)

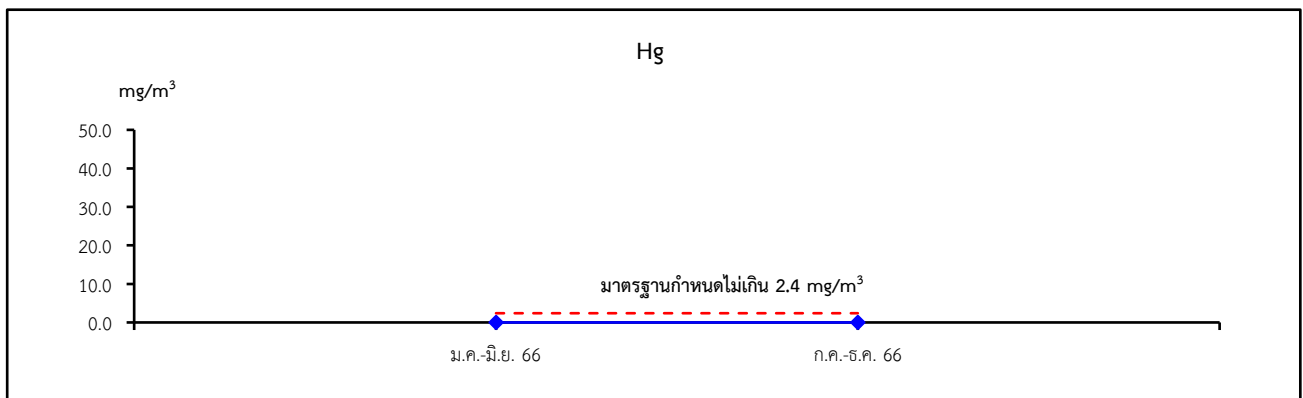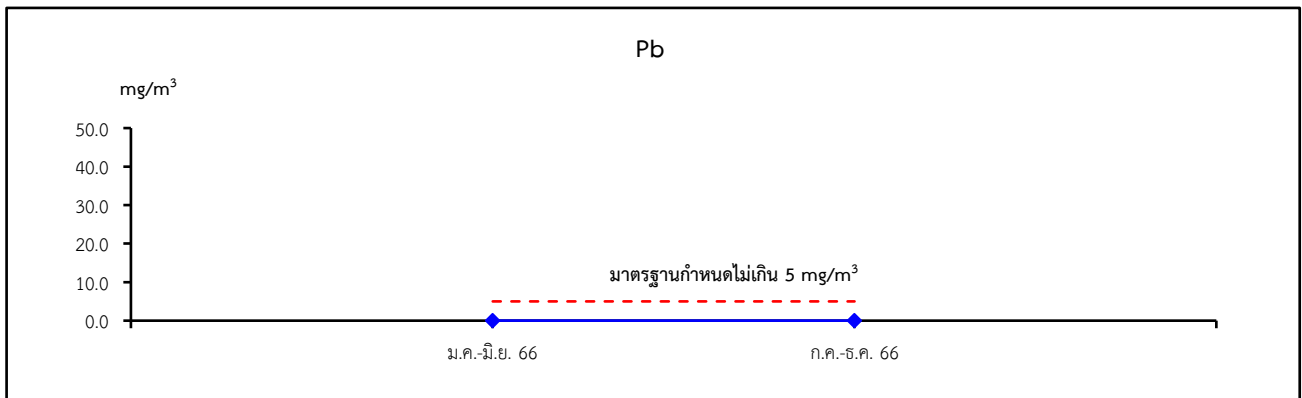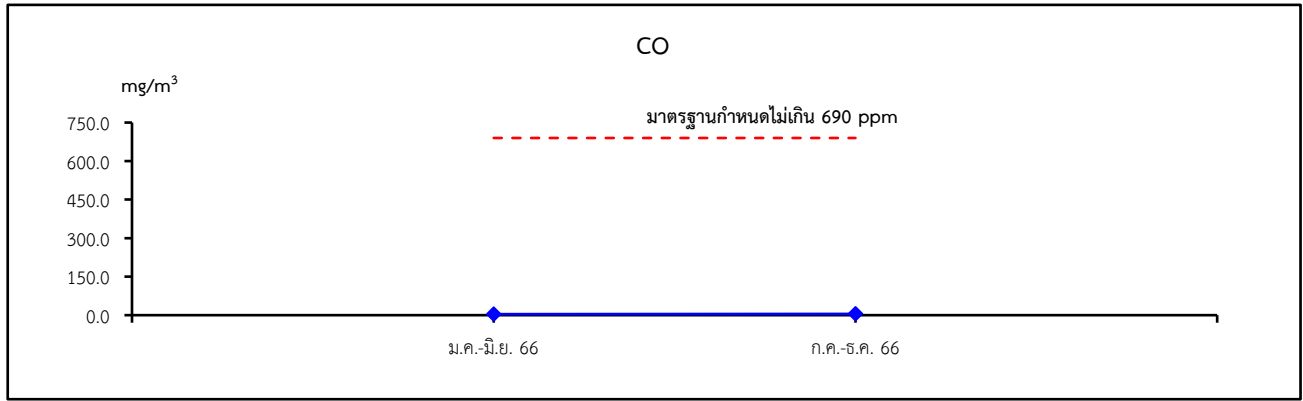

ปล่อง ADU 2 Heater B (ต่อ)



รูปที่ 3.2.3-2 (ต่อ)

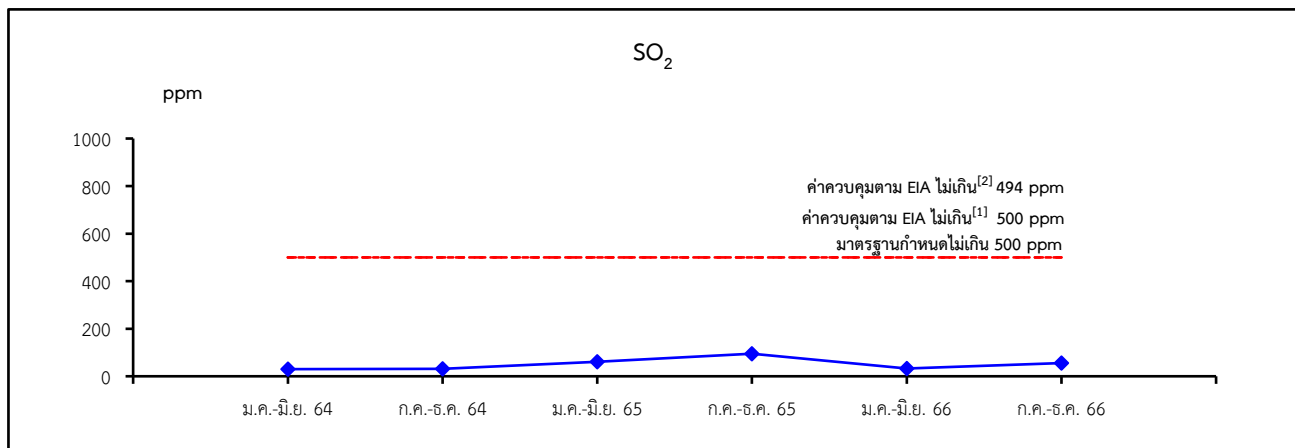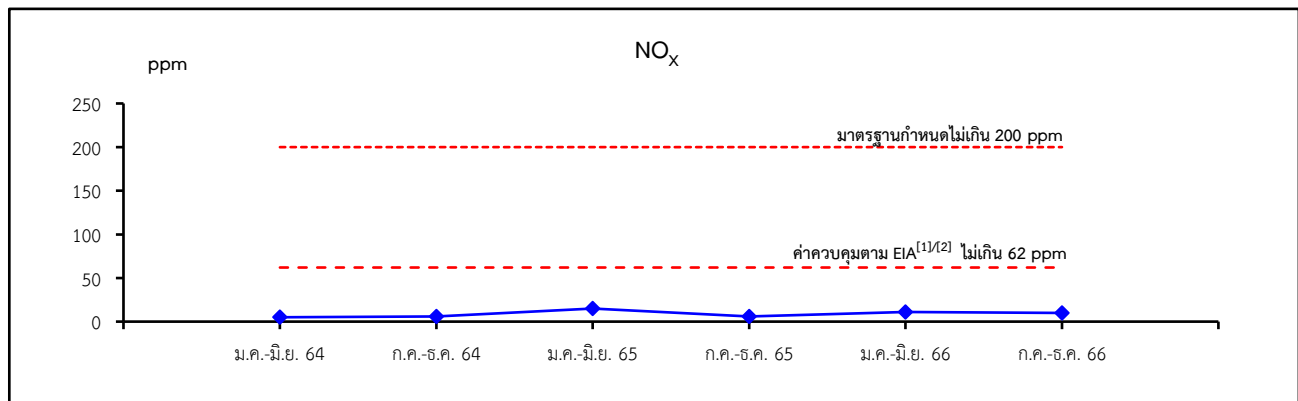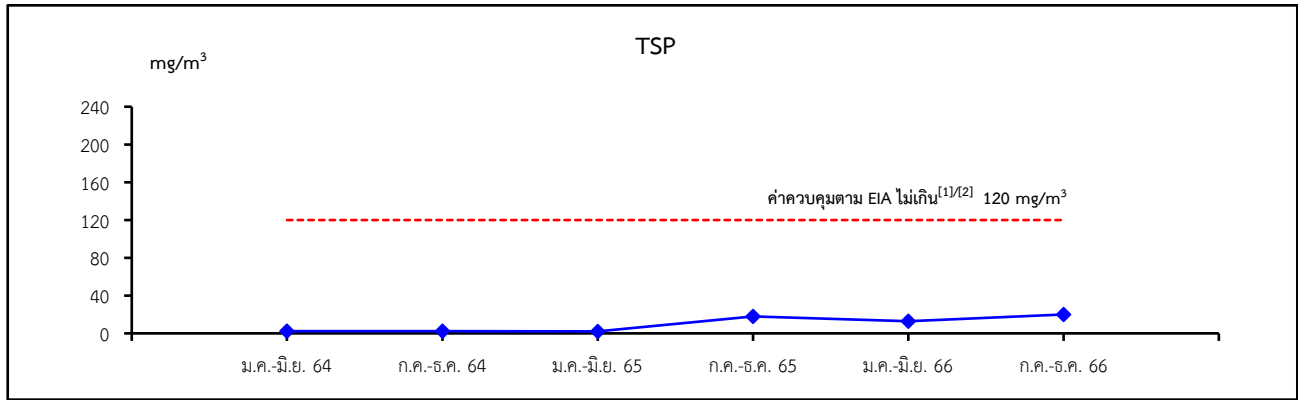

ปล่อง SRU Incinerator

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553

รูปที่ 3.2.3-2 (ต่อ)

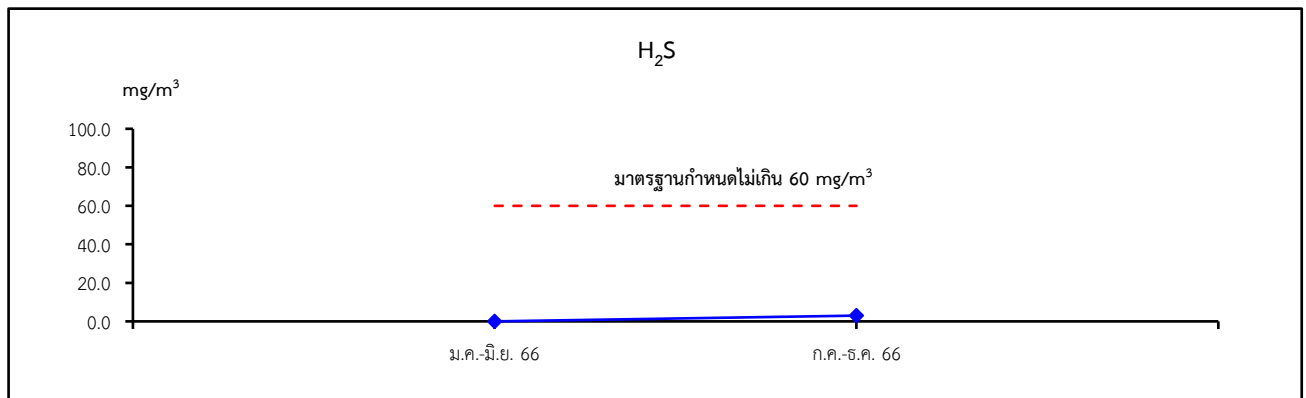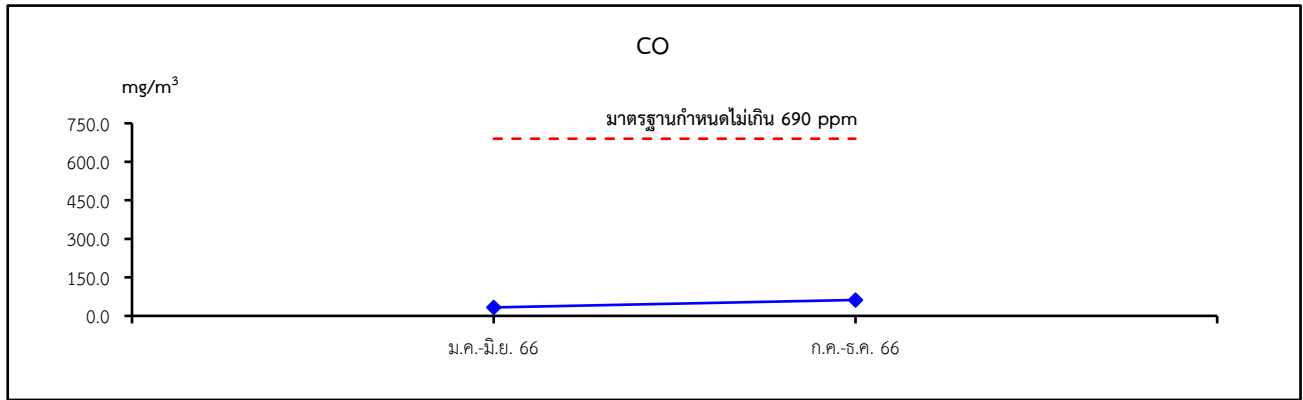

ปล่อง SRU Incinerator (ต่อ)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553

รูปที่ 3.2.3-2 (ต่อ)

3.2.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ CEMs ปีละ 1 ครั้ง โดย Thrid Party ได้แก่ บริเวณ ADU Heater จำนวน 2 ปล่อง และบริเวณ SRU Incinerator จำนวน 1 ปล่อง

2) ผลการตรวจวัด

จากการทำการตรวจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ CEMs ปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2566 โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 26-27, 30-31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 55 ในภาคผนวกที่ 1

3.2.3 คุณภาพน้ำ

3.2.3.1 คุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำฝนปนเปื้อน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จำนวน 4 สถานี เดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ บริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005) บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ 17T035) บริเวณ ท่อน้ำ Stripped Water หลัง Discharge B2909P402 A/B และบริเวณท่อน้ำ Stripped Water ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ pH, Temperature, COD, BOD₅, Total Suspended Solids (TSS), Grease & Oil และ Hydrogen Sulfide ดำเนินการตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3.1-1 สำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.3.1-1

ตารางที่ 3.2.3.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
pH	Grab Sampling	Electrometric Method (SM : 4500-H+ B)	APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition, 2017
Temperature	Grab Sampling	Laboratory and Field Method (SM : 2550 B)	
COD	Grab Sampling	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM : 5220D)	
BOD	Grab Sampling	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method (SM : 4500-O ₂ G, 5210 B)	
Total Suspended Solids	Grab Sampling	Dried at 103-105 °C (SM : 2540 Solids D)	
Grease & Oil	Grab Sampling	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (SM : 5520 B)	
Hydrogen Sulfide	Grab Sampling	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM : 4500S ₂ F)	

2) ผลการตรวจวัด

จากการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำฝนปนเปื้อน จำนวน 4 สถานี ในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 มีผลการตรวจวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.2.2.1-2 และผลการวิเคราะห์ในภาคผนวกที่ 3

สำหรับบริเวณท่อน้ำ Stripped Water หลัง Discharge B2909P402 A/B และบริเวณท่อน้ำ Stripped Water ก่อนส่งไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ยังไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005) และบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ 17T035) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานที่ยอมรับให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการ ทั้งนี้ ทางโครงการได้นำน้ำทิ้งส่งไปบำบัดใหม่จนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

สำหรับค่า H_2S เกณฑ์ดังกล่าวยังไม่กำหนดค่าไว้เพื่อควบคุม

3.2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากการติดตามตรวจสอบน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำฝนปนเปื้อน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2.3.1-3 และรูปที่ 3.2.3.1-2 ถึง รูปที่ 3.2.3.1-3 บริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005) และบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ 17T035) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานที่ยอมรับให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขต ทั้งนี้ ทางโครงการได้นำน้ำทิ้งส่งไปบำบัดใหม่จนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ของเขตประกอบการฯ ต่อไป

สำหรับค่า H_2S เกณฑ์ดังกล่าวยังไม่กำหนดค่าไว้เพื่อควบคุม

ตารางที่ 3.2.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์						
	บริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005)						
	Temperature (°C)	pH	TSS (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	Hydrogen Sulfide (mg/L)
3 ก.ค. 66	36.7	7.48	8.20	45.90	78.4	4.60	0.08
2 ส.ค. 66	36.8	7.29	4.40	110.20	136.8	2.00	0.16
4 ก.ย. 66	35.7	6.51	ND	35.50	112.1	4.20	0.51
2 ต.ค. 66	35.7	6.66	9.60	62.80	114.1	2.80	0.34
6 พ.ย. 66	35.6	7.60	7.20	35.00	157.5	4.00	0.01
6 ธ.ค. 66	35.7	7.17	5.12	68.80	222.8	2.80	0.03
ค่าต่ำสุด	35.6	6.51	ND	35.00	78.4	2.00	0.01
ค่าสูงสุด	36.8	7.60	9.60	110.20	222.8	4.60	0.51
ค่าควบคุม	-	5.00-10.00	ไม่เกิน 90	ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 750	ไม่เกิน 20	-

ค่าควบคุม : เกณฑ์คุณภาพน้ำเสียจากโรงงานที่ยอมรับให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ของเขตประกอบการ

หมายเหตุ : ND = Non Detectable (Lower than MDL)

TSS : MDL = 2.5 mg/L, Grease & Oil : MDL = 1.4 mg/L

ตารางที่ 3.2.3.1-1 (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์						
	บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ17T035)						
	Temperature (°C)	pH	TSS (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	Hydrogen Sulfide (mg/L)
3 ก.ค. 66	32.3	8.86	3.90	65.00	353.2	ND	0.07
3 ส.ค. 66	34.2	7.37	ND	13.23	42.8	ND	0.15
4 ก.ย. 66	35.4	9.21	14.00	77.80	172.8	13.20	0.26
3 ต.ค. 66	35.4	6.56	ND	18.85	23.1	ND	0.40
6 พ.ย. 66	34.9	7.85	3.62	17.90	52.4	1.60	0.12
6 ธ.ค. 66	34.2	7.54	14.40	773.00	1785.1	8.60	0.19
ค่าต่ำสุด	32.3	6.56	ND	13.23	23.1	ND	0.07
ค่าสูงสุด	35.4	9.21	14.40	773.00	1785.1	13.20	0.40
ค่าควบคุม	-	5.00-10.00	ไม่เกิน 90	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 3,000	ไม่เกิน 20	-

ค่าควบคุม : TSS : MDL = 2.5 mg/L

หมายเหตุ : ND = Non Detectable (Lower than MDL)

Grease & Oil : MDL = 1.4 mg/Lws

ตารางที่ 3.2.3.1-3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์						
	บริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005)						
	Temperature (°C)	pH	TSS (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	Hydrogen Sulfide (mg/L)
ม.ค. 64	35.8	7.72	4.40	63.50	80.3	ND	1.25
ก.พ. 64	37.8	7.14	4.90	64.00	44.6	<1.93	0.96
มี.ค. 64	35.4	8.06	14.20	18.80	116.9	10.00	1.93
เม.ย. 64	38.7	7.92	11.80	39.43	62.9	6.80	1.55
พ.ค. 64	36.9	7.40	14.00	127.00	171.8	9.00	0.26
มิ.ย. 64	36.7	7.21	11.07	48.33	120.6	7.20	0.07
ก.ค. 64	36.3	7.08	6.11	184.00	64.4	7.00	0.21
ส.ค. 64	35.1	6.92	3.80	7.80	53.0	<1.93	0.13
ก.ย. 64	30.8	7.57	11.20	64.00	63.7	10.00	0.11
ต.ค. 64	35.7	6.81	3.10	14.90	43.3	4.40	0.04
พ.ย. 64	38.1	6.72	4.90	8.60	146.7	5.60	0.54
ธ.ค. 64	35.6	7.17	6.30	41.50	87.0	6.60	0.51
ม.ค. 65	38.6	6.48	4.60	95.0	107.4	10.80	1.42
ก.พ. 65	36.7	8.24	19.67	92.0	91.8	5.00	0.21
มี.ค. 65	35.9	7.30	10.80	122.00	211.6	5.00	0.03
เม.ย. 65	37.6	7.02	7.75	146.40	614.8	5.40	11.00
พ.ค. 65	35.6	6.75	16.29	83.00	336.0	1.80	0.82
มิ.ย. 65	38.6	7.12	4.88	48.10	155.6	ND	0.75
ก.ค. 65	37.6	7.35	ND	91.60	128.4	5.00	0.85
ส.ค. 65	34.6	8.24	29.60	57.20	160.3	ND	0.88
ก.ย. 65	33.0	6.93	ND	110.67	168.5	2.20	0.95
ต.ค. 65	34.5	7.84	8.20	81.80	108.3	3.40	0.37
พ.ย. 65*	-	-	-	-	-	-	-
ธ.ค. 65	35.6	6.75	6.60	6.55	52.8	ND	0.45
ม.ค. 66	29.6	7.01	ND	37.55	45.2	5.00	1.43
ก.พ. 66	29.8	7.42	8.90	49.60	102.5	1.40	0.49
มี.ค. 66	30.9	7.50	8.80	60.00	98.3	1.40	0.56
เม.ย. 66	32.8	8.08	3.10	48.00	137.4	ND	0.78
พ.ค. 66	35.6	7.31	ND	48.00	126.0	ND	0.68
มิ.ย. 66	32.7	6.92	7.29	109.50	185.9	1.40	0.97
ม.ค. 66	29.6	7.01	ND	37.55	45.2	5.00	1.43
ค่าควบคุม	-	5.00-10.00	ไม่เกิน 90	ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 750	ไม่เกิน 20	-

ตารางที่ 3.2.3.1-3 (ต่อ)


วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์						
	บริเวณ Discharge 42P028A/B/C หลังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ของหน่วย ADU2 ของโครงการ (บ่อ 42T005)						
	Temperature (°C)	pH	TSS (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	Hydrogen Sulfide (mg/L)
ก.ค. 66	36.7	7.48	8.20	45.90	78.4	4.60	0.08
ส.ค. 66	36.8	7.29	4.40	110.20	136.8	2.00	0.16
ก.ย. 66	35.7	6.51	ND	35.50	112.1	4.20	0.51
ต.ค. 66	35.7	6.66	9.60	62.80	114.1	2.80	0.34
6 พ.ย. 66	35.6	7.60	7.20	35.00	157.5	4.00	0.01
6 ธ.ค. 66	35.7	7.17	5.12	68.80	222.8	2.80	0.03
ค่าควบคุม	-	5.00-10.00	ไม่เกิน 90	ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 750	ไม่เกิน 20	-

ตารางที่ 3.2.3.1-3 (ต่อ)



วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์						
	บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ17T035)						
	Temperature (°C)	pH	SS (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	Hydrogen Sulfide (mg/L)
ม.ค. 64	35.7	8.51	13.33	13.30	33.4	<1.93	1.04
ก.พ. 64	31.5	7.89	7.67	53.20	246.8	<1.93	1.02
มี.ค. 64	31.9	9.46	4.20	186.00	988.8	43.80	1.02
เม.ย. 64	35.7	6.83	8.10	442.00	696.5	5.60	1.48
พ.ค. 64	34.5	6.99	ND	618.00	702.7	2.40	0.17
มิ.ย. 64	36.5	8.40	17.80	134.33	144.6	6.00	0.07
ก.ค. 64	36.8	7.13	7.88	39.80	22.7	3.00	0.28
ส.ค. 64	30.4	7.61	12.86	100.60	287.7	2.20	0.08
ก.ย. 64	34.6	9.44	22.40	171.00	204.4	15.20	0.18
ต.ค. 64	34.5	6.94	5.50	194.00	230.6	3.00	0.11
พ.ย. 64	36.7	8.94	11.87	110.60	135.5	3.20	0.10
ธ.ค. 64	29.9	9.88	11.80	25.60	129.6	3.00	0.09
ม.ค. 65	32.8	7.33	16.49	142.00	171.3	7.40	0.21
ก.พ. 65	34.1	8.30	4.40	7.25	46.5	2.00	0.17
มี.ค. 65	30.5	12.64	6.43	2.24	62.9	ND	0.04
เม.ย. 65	35.8	8.89	9.25	10.44	128.1	<1.93	1.40
พ.ค. 65	34.1	7.88	11.20	21.30	209.2	ND	0.25
มิ.ย. 65	34.5	6.70	3.60	40.60	77.3	2.00	0.85
ก.ค. 65	35.6	7.89	ND	125.40	130.2	ND	0.21
ส.ค. 65	30.1	8.04	6.40	65.20	136.2	ND	2.12
ก.ย. 65	29.9	7.35	4.20	37.00	87.7	ND	0.14
ต.ค. 65	34.1	12.18	43.33	90.14	243.0	ND	0.31
พ.ย. 65*	-	-	-	-	-	-	-
ธ.ค. 65	34.3	7.44	8.80	7.50	86.4	ND	0.35
ม.ค. 66	31.5	7.18	10.33	14.18	82.6	ND	0.1
ก.พ. 66	30.8	8.24	3.20	23.67	164.6	ND	0.98
มี.ค. 66	30.1	7.82	7.60	340.50	159.6	ND	0.69
เม.ย. 66	32.5	7.60	4.13	59.50	76.9	1.40	0.11
พ.ค. 66	33.0	7.17	4.80	140.00	216.2	ND	0.04
มิ.ย. 66	32.7	7.49	6.71	222.00	334.1	ND	0.38
ค่าควบคุม	-	5.00-10.00	ไม่เกิน 90	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 3,000	ไม่เกิน 20	-

ตารางที่ 3.2.3.1-3 (ต่อ)



วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์						
	บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของหน่วย SRU ของโครงการ (SRU DAF Outlet) (บ่อ17T035)						
	Temperature (°C)	pH	SS (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)	Hydrogen Sulfide (mg/L)
ก.ค. 66	32.3	8.86	3.90	65.00	353.2	ND	0.07
ส.ค. 66	34.2	7.37	ND	13.23	42.8	ND	0.15
ก.ย. 66	35.4	9.21	14.00	77.80	172.8	13.20	0.26
ต.ค. 66	35.4	6.56	ND	18.85	23.1	ND	0.40
6 พ.ย. 66	34.9	7.85	3.62	17.90	52.4	1.60	0.12
6 ธ.ค. 66	34.2	7.54	14.40	773.00	1785.1	8.60	0.19
ค่าควบคุม	-	5.00-10.00	ไม่เกิน 90	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 3,000	ไม่เกิน 20	-

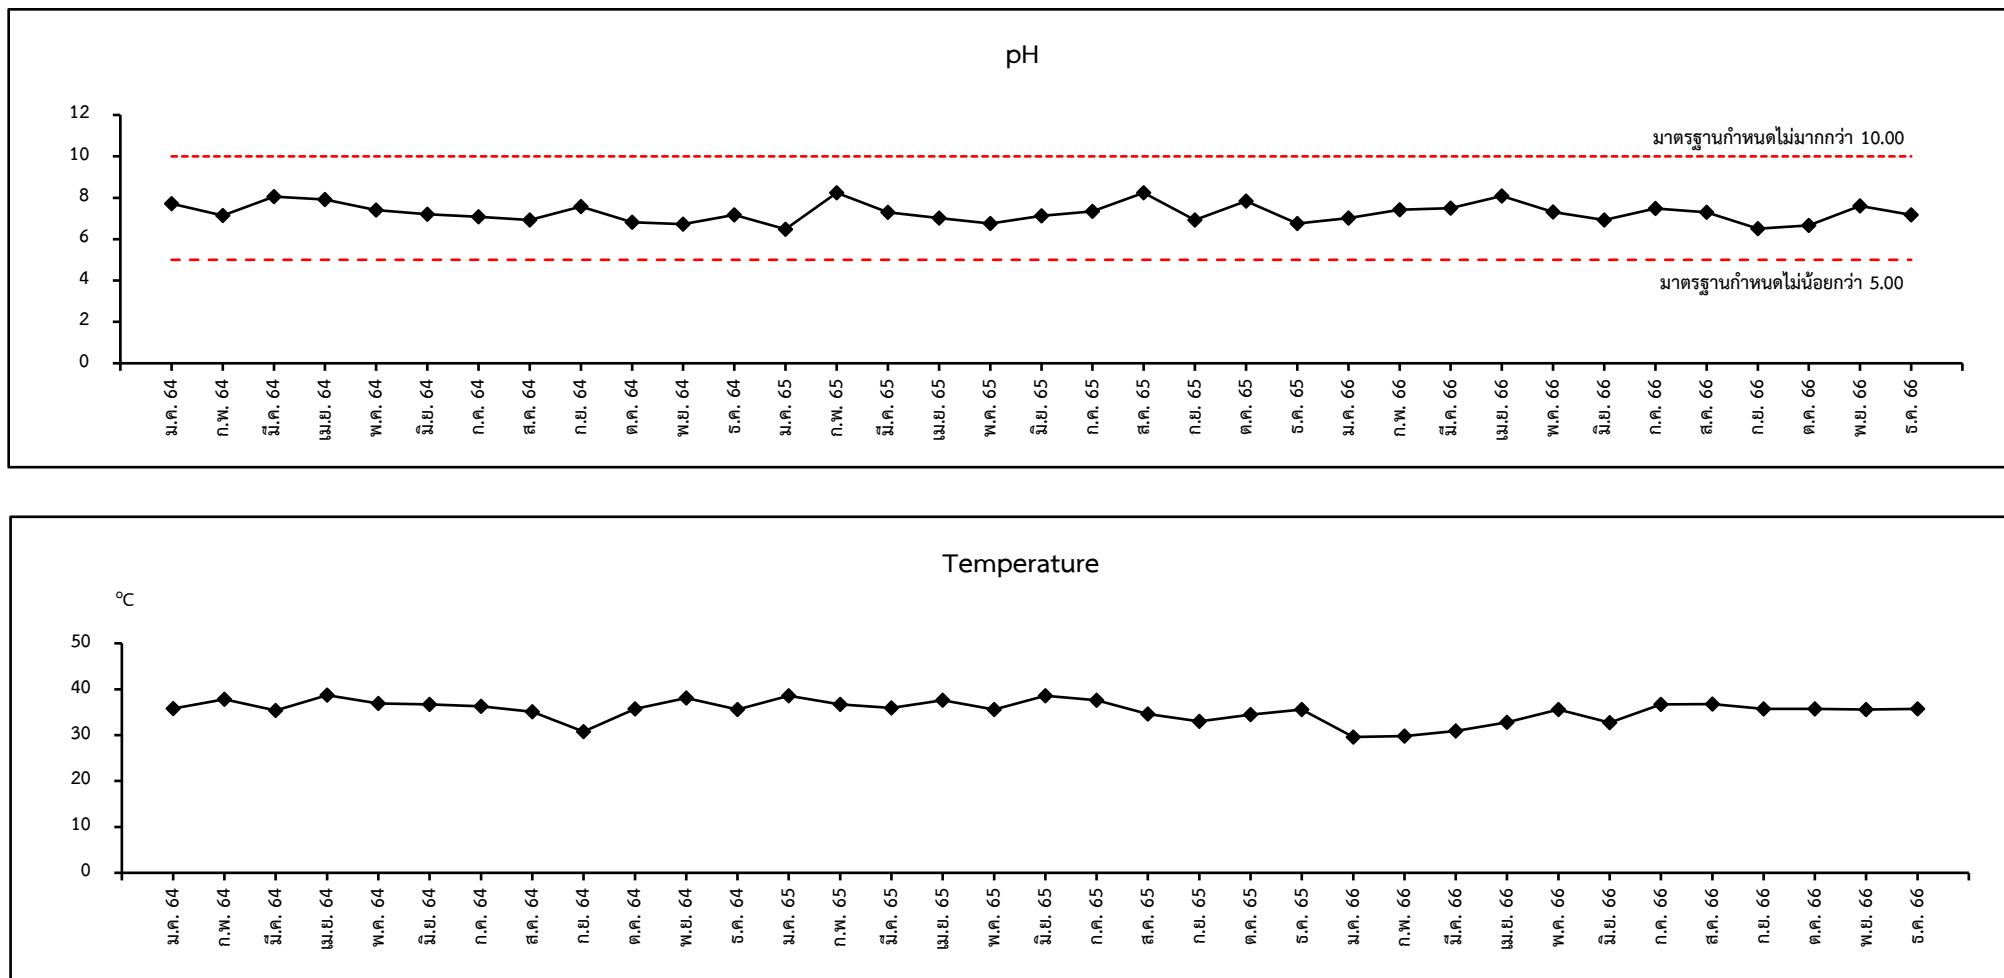


รูปที่ 3.2.4.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการไออาร์พีซี (ADU2 IAF Outlet) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

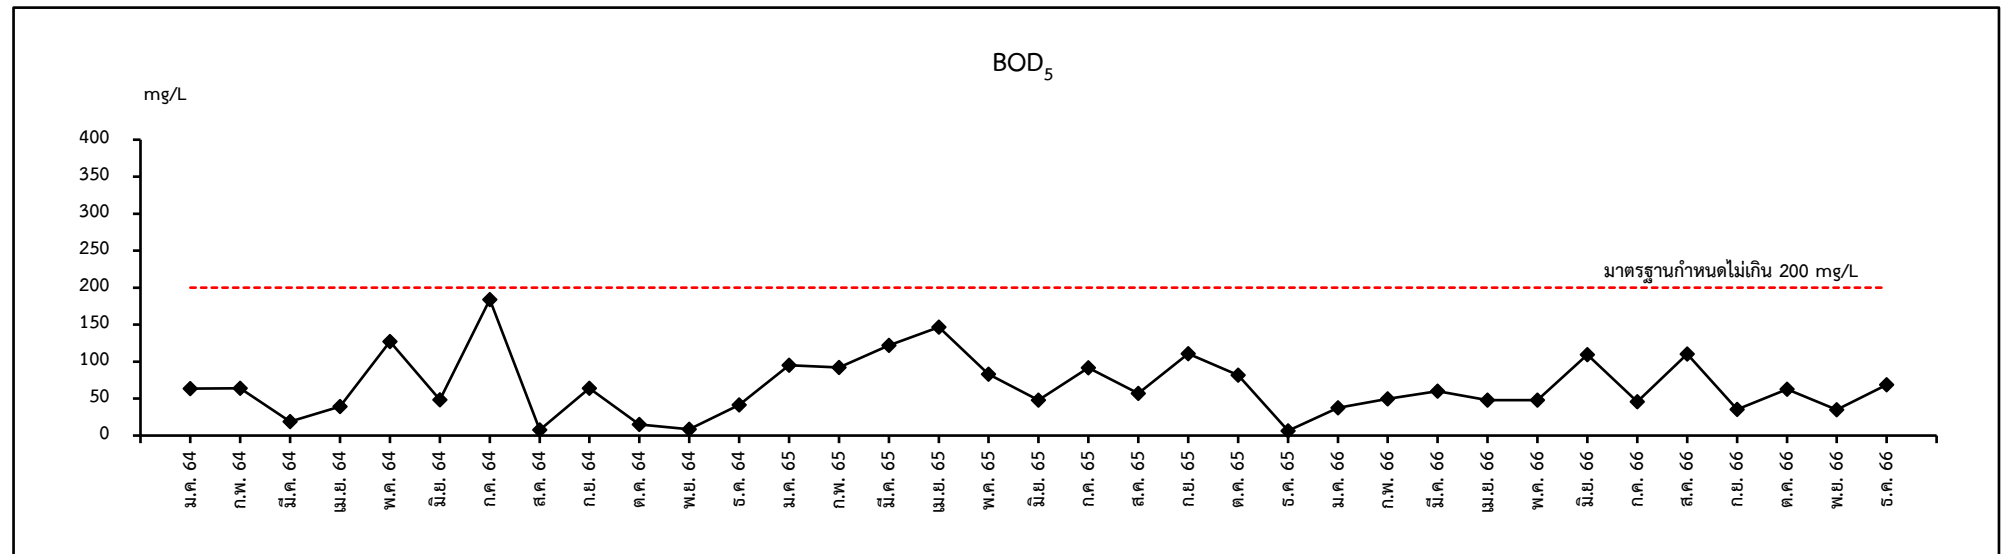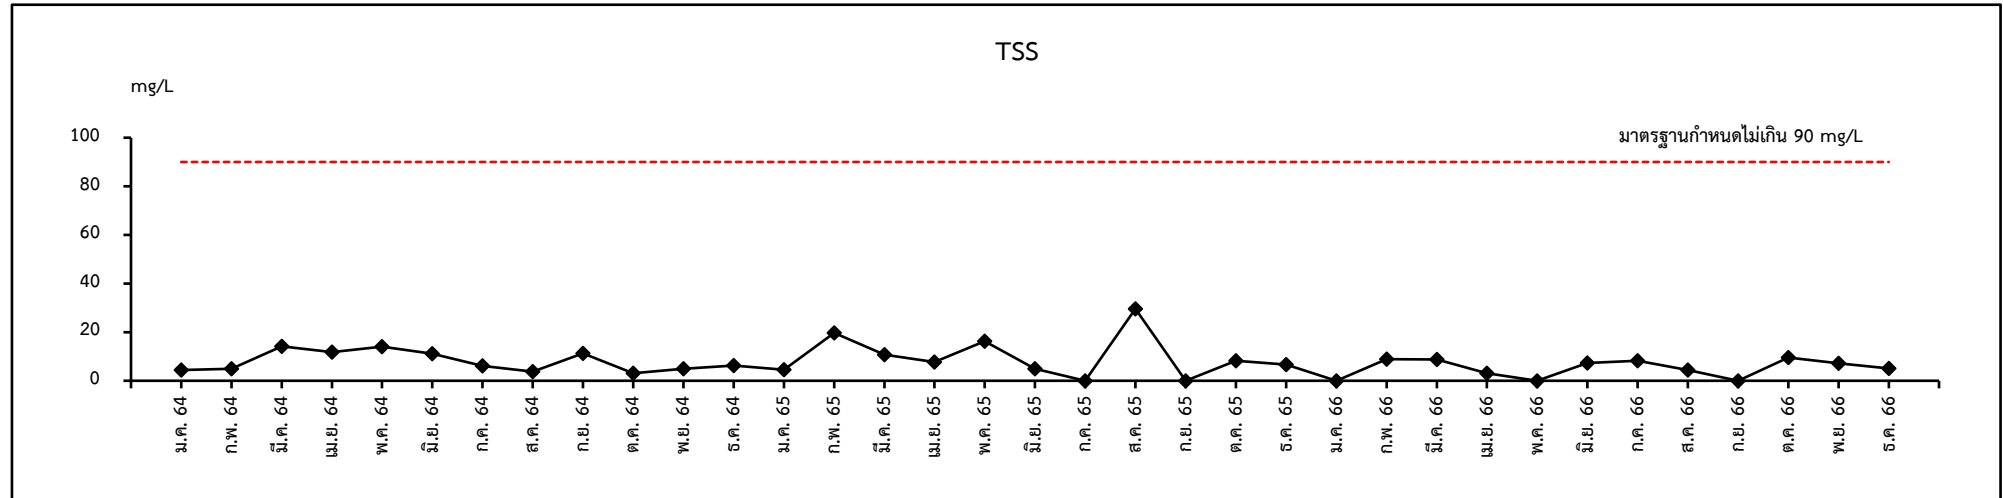


รูปที่ 3.2.4.1-2 (ต่อ)

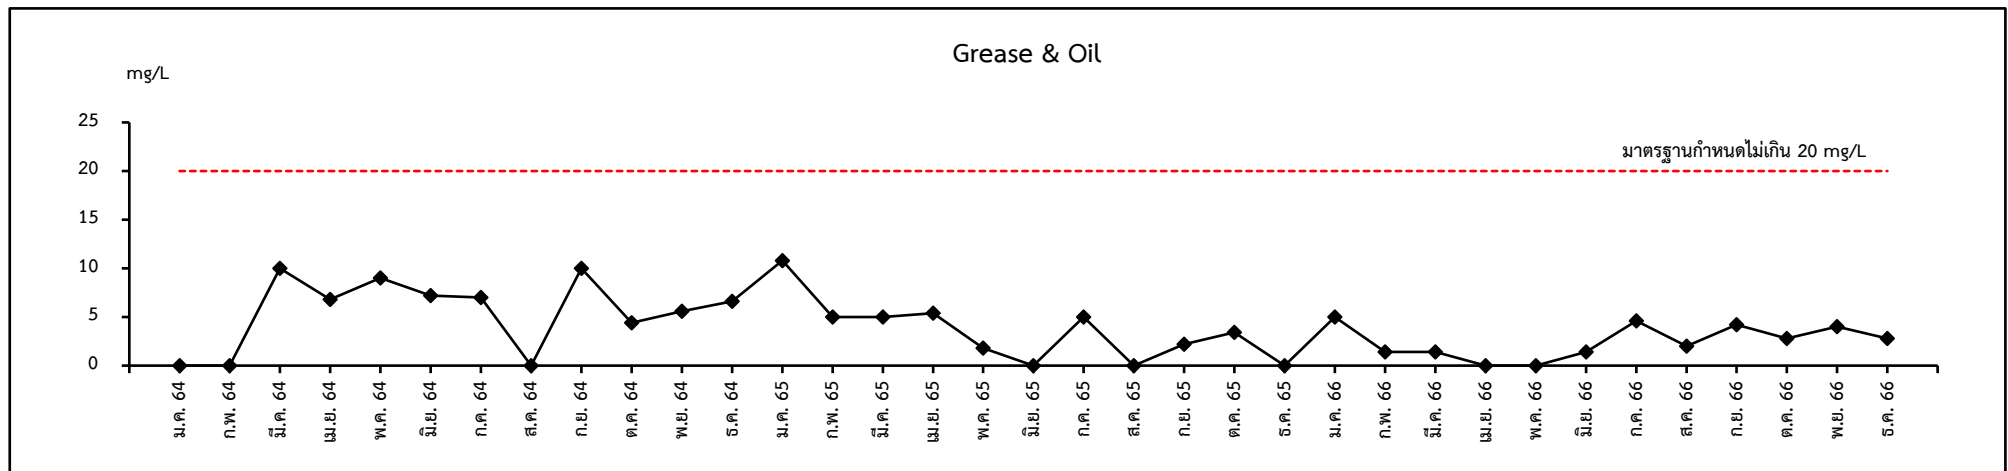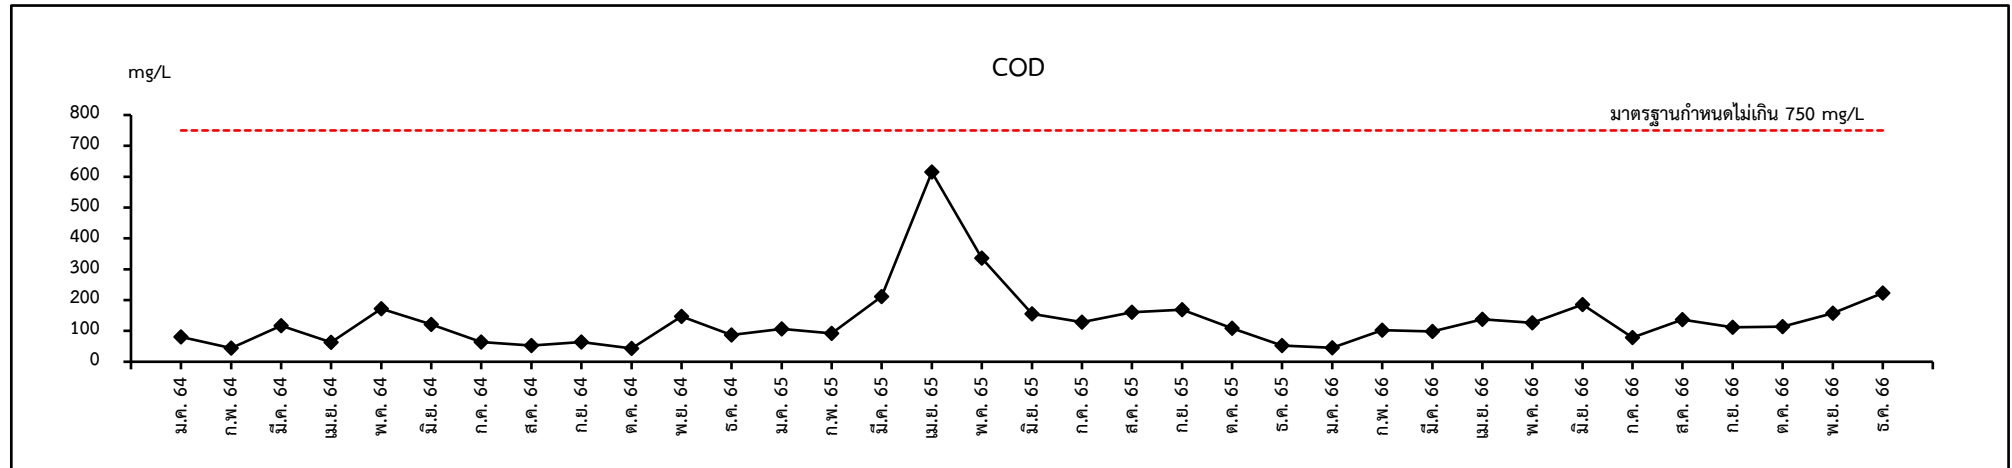



รูปที่ 3.2.4.1-2 (ต่อ)

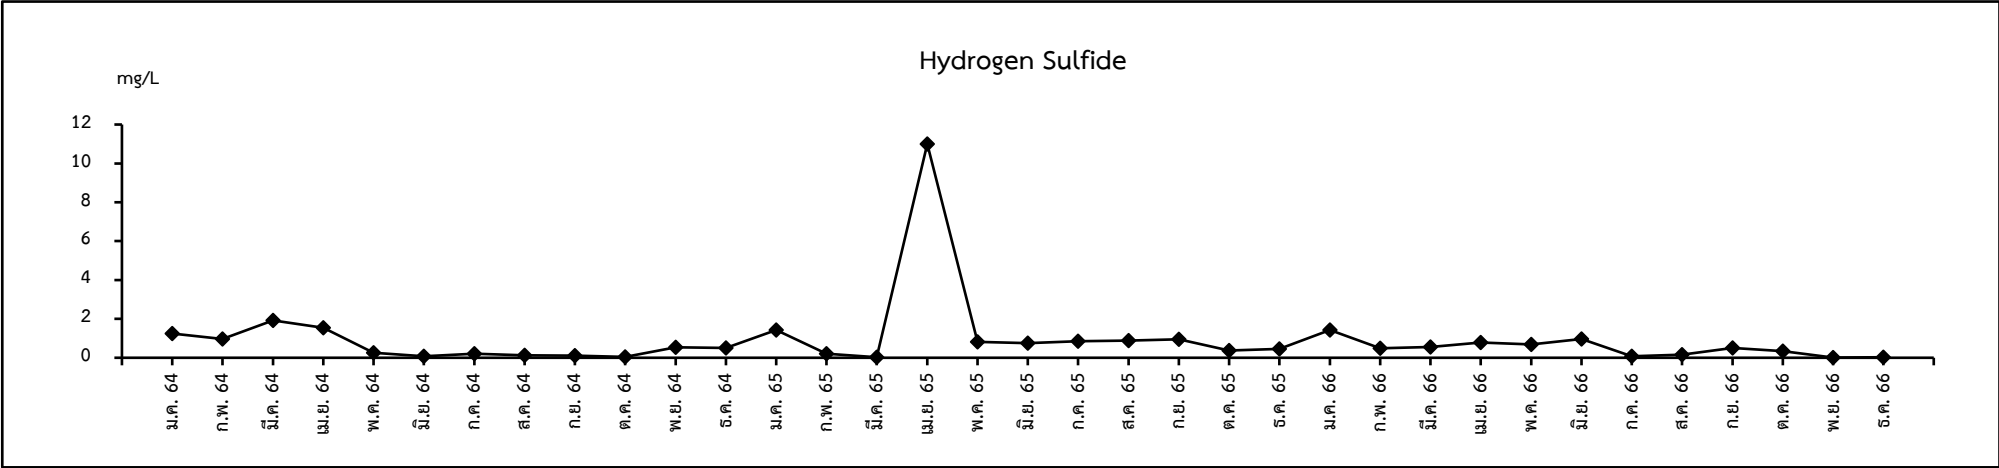



รูปที่ 3.2.4.1-2 (ต่อ)

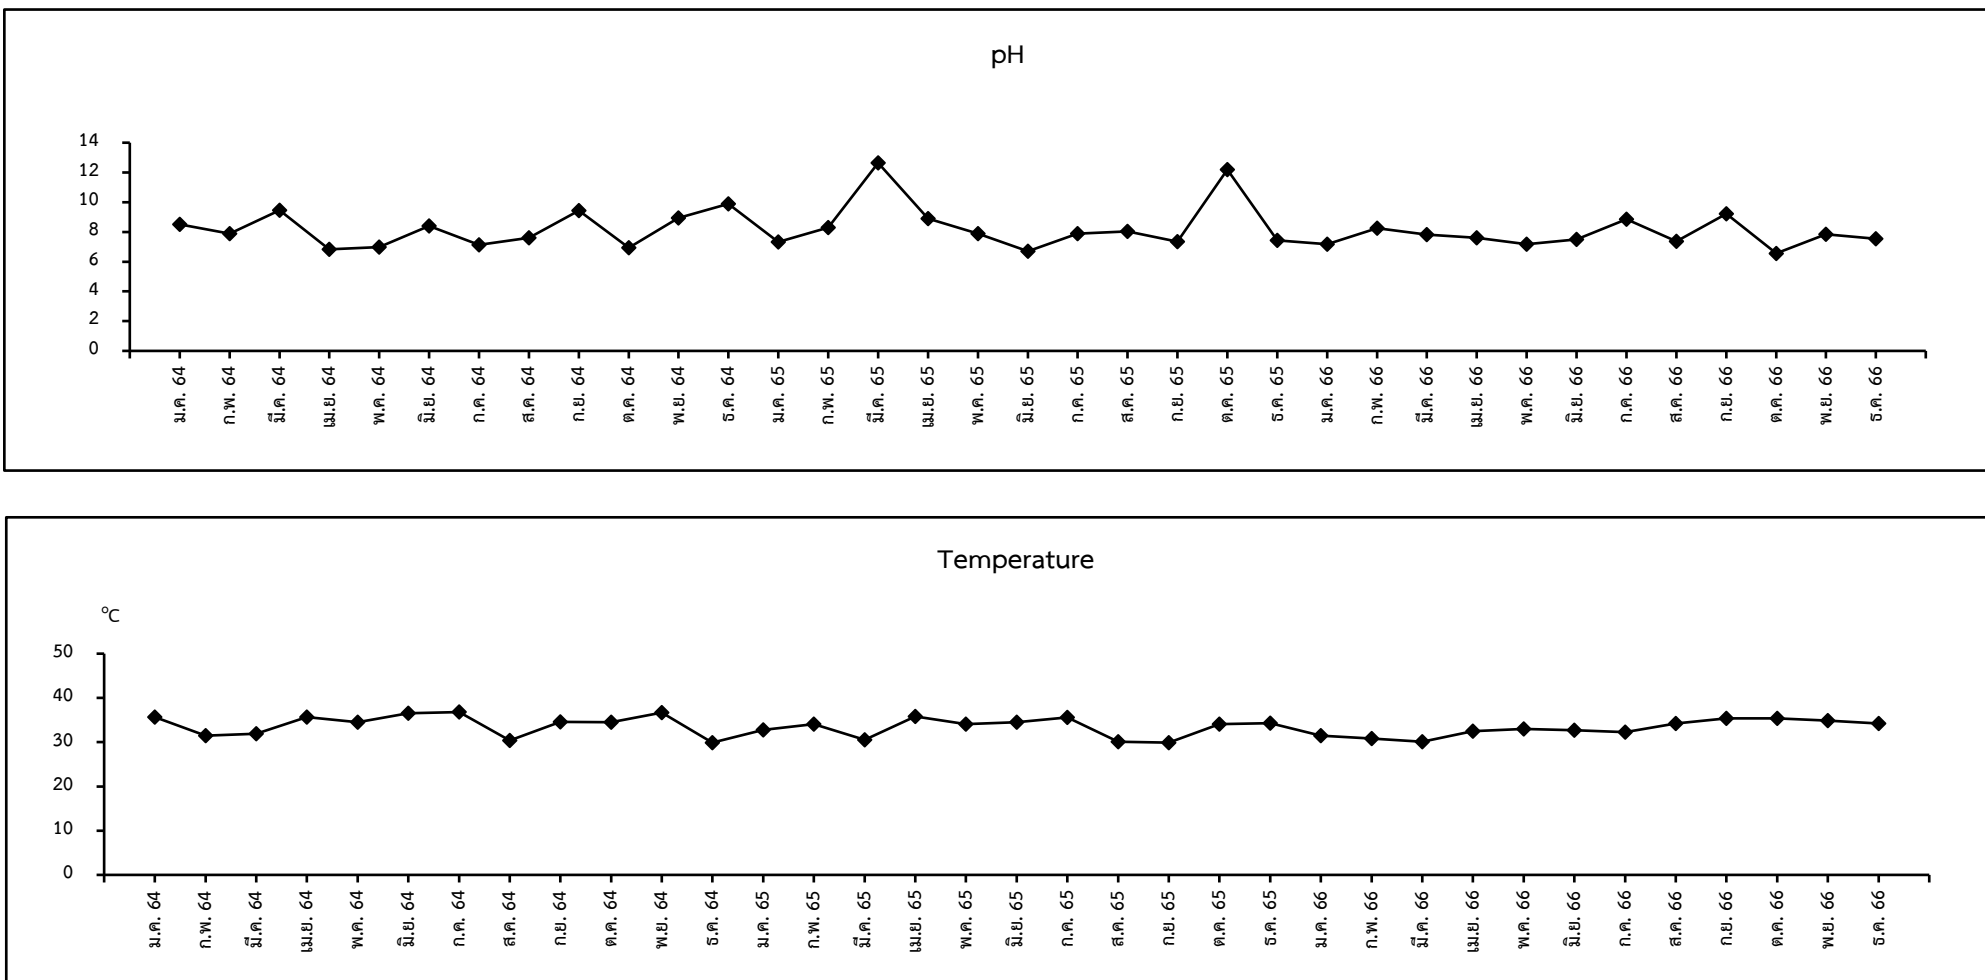


รูปที่ 3.2.4.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการไออาร์พีซี (SRU CPI Outlet) ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

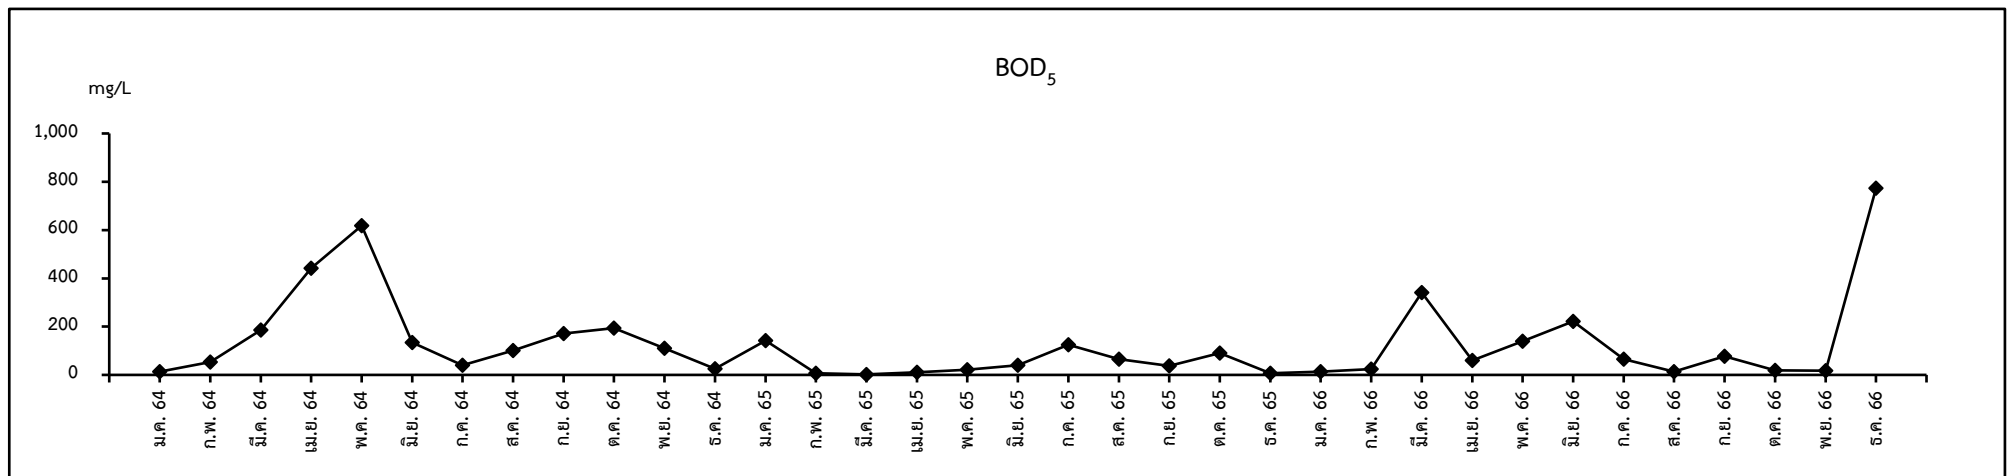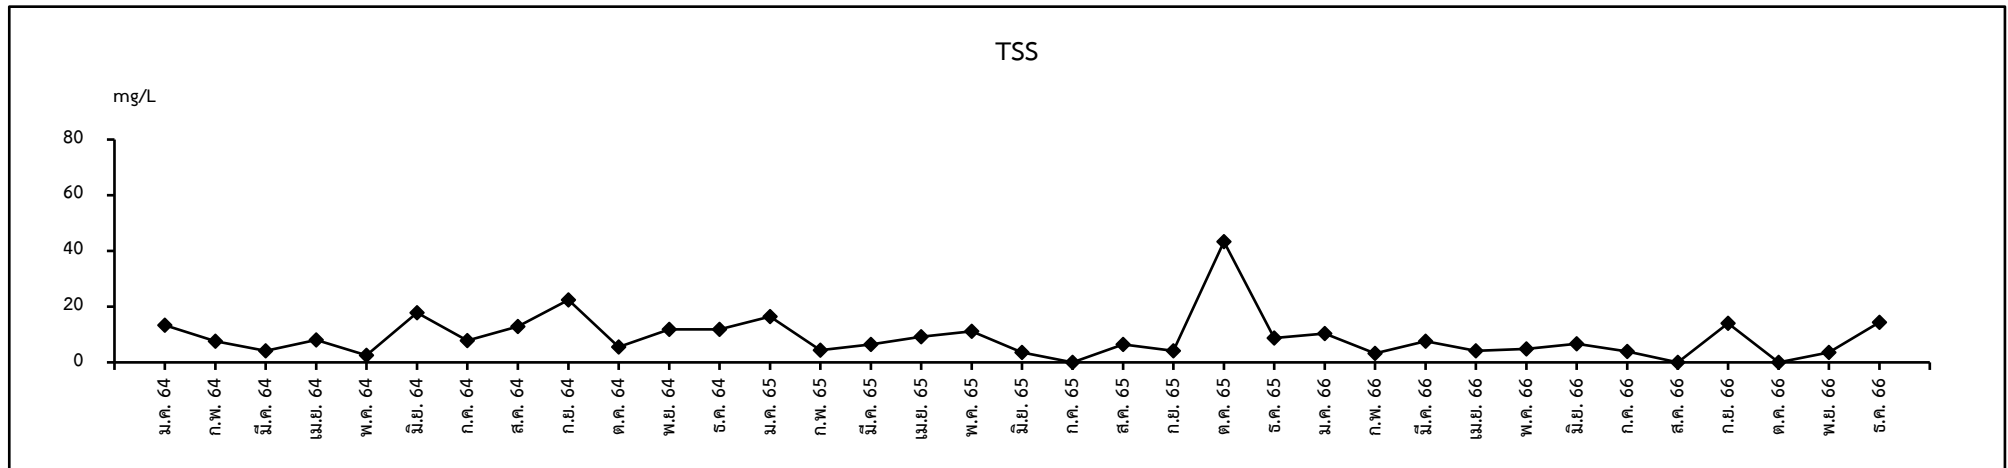

รูปที่ 3.2.4.1-3 (ต่อ)

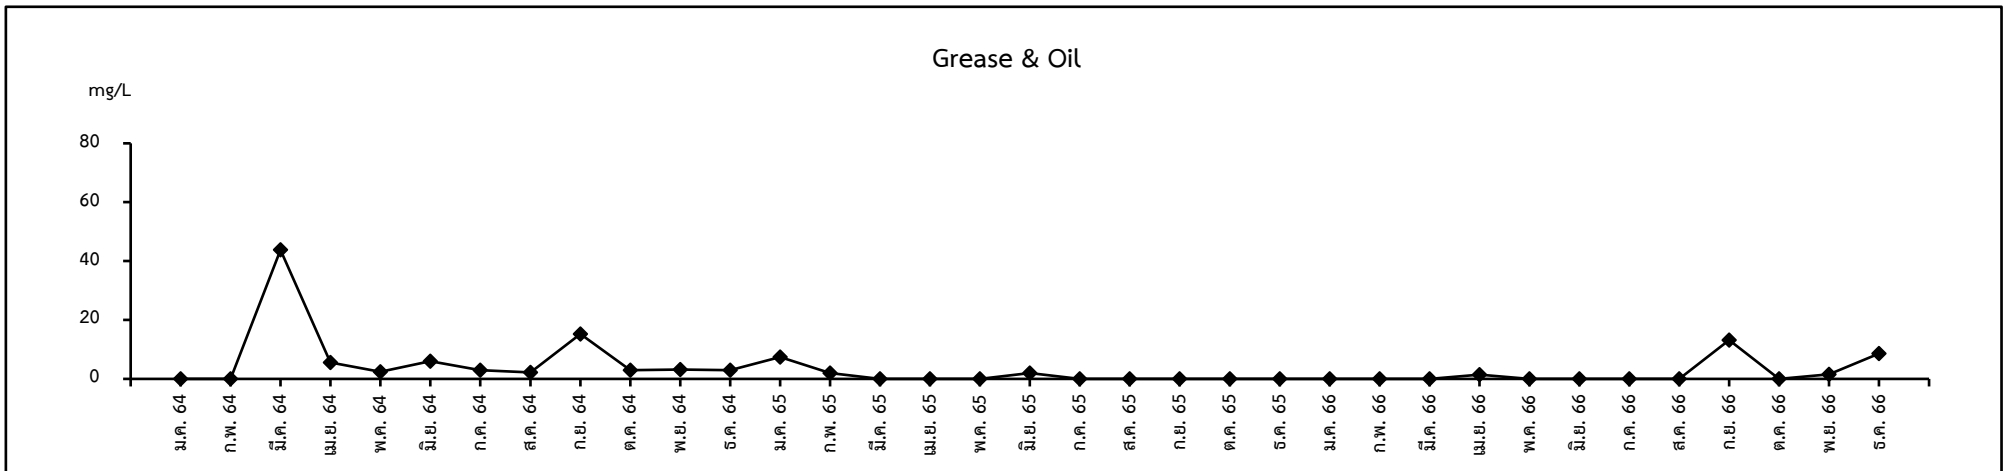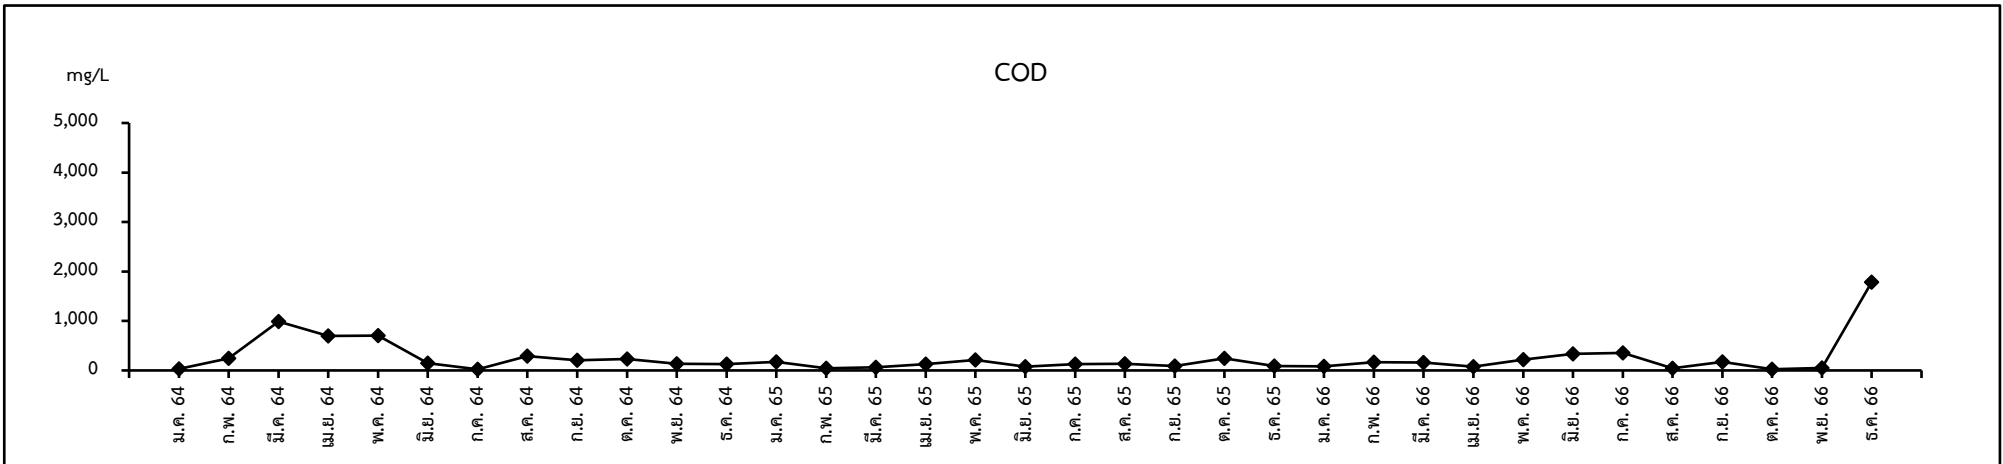

รูปที่ 3.2.4.1-3 (ต่อ)

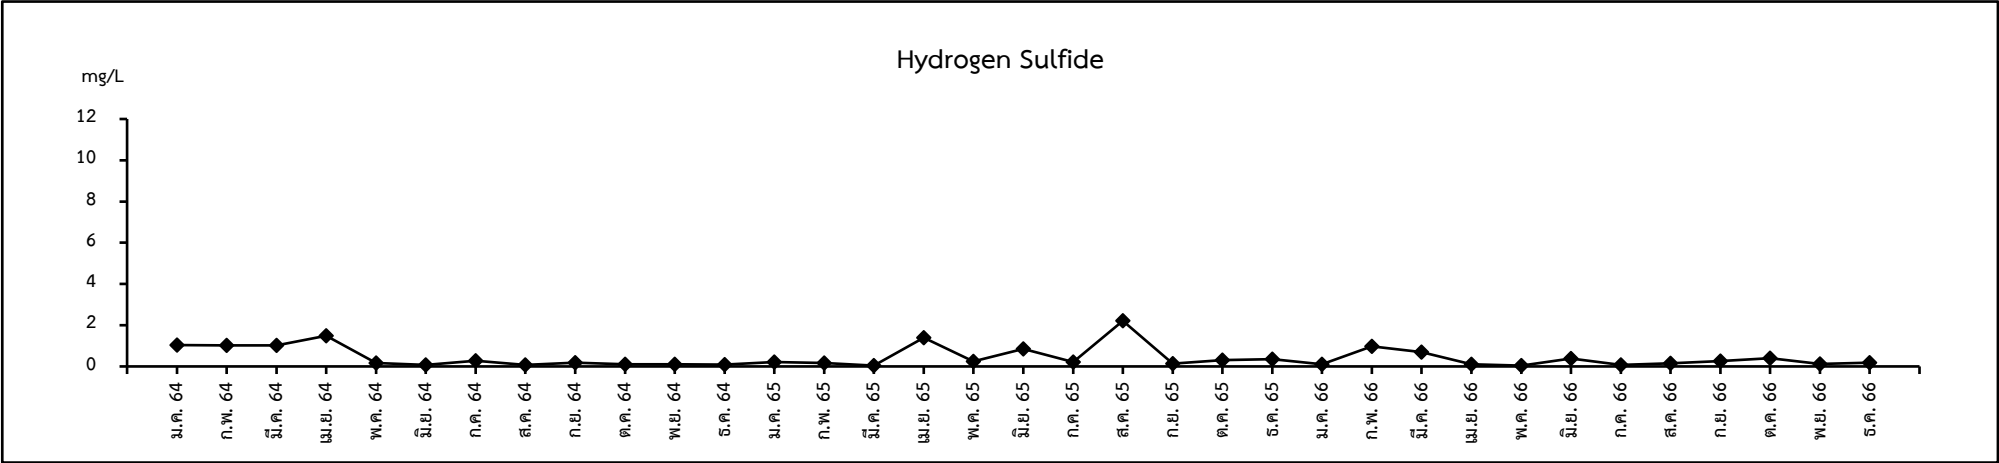

รูปที่ 3.2.4.1-3 (ต่อ)

3.2.3.2 คุณภาพน้ำฝน (Storm Water)

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน บริเวณรางระบายน้ำฝน (Open Ditch) ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของเขตประกอบการไออาร์พีซี เดือนละ 1 ครั้ง (ช่วงฝนตก) โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, Temperature, COD, Total Suspended Solids (TSS) และ Grease & Oil ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3.2-1

ตารางที่ 3.2.3.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
pH	Grab Sampling	Electrometric Method (SM : 4500-H+ B)	APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition, 2017
Temperature	Grab Sampling	Laboratory and Field Method (SM : 2550 B)	
COD	Grab Sampling	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM : 5220D)	
Total Suspended Solids	Grab Sampling	Dried at 103-105 °C (SM : 2540 Solids D)	
Grease & Oil	Grab Sampling	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (SM : 5520 B)	

2) ผลการตรวจวัด

จากการเก็บตัวอย่างน้ำฝน บริเวณรางระบายน้ำฝน (Open Ditch) ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของเขตประกอบการไออาร์พีซี เดือนละ 1 ครั้ง (ช่วงฝนตก) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 มีผลการตรวจวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 3.2.2.2-2 และผลการวิเคราะห์ในภาคผนวกที่ 3

3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน บริเวณรางระบายน้ำฝน (Open Ditch) ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของเขตประกอบการไออาร์พีซี พบว่า ทุกดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

3.2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำฝน บริเวณรางระบายน้ำฝน (Open Ditch) ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของเขตประกอบการไออาร์พีซี ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3.2-2 และรูปที่ 3.2.3.2-1 เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 3.2.2.2-2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์				
	บริเวณรางระบายน้ำฝน (Open Ditch) ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนรวม ของเขตประกอบการไออาร์พีซี				
	pH	Temperature (°C)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)
24 ก.ค. 66	6.72	25.9	5.60	97.9	1.40
มาตรฐาน ^{[1][2]}	5.5-9.0	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 120	ไม่เกิน 5

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน
พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559




ตารางที่ 3.2.2.2-3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์				
	บริเวณรางระบายน้ำฝน (Open Ditch) ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนรวม ของเขตประกอบการไออาร์พีซี				
	pH	Temperature (°C)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	Grease & Oil (mg/L)
16 ส.ค. 64	7.63	35.8	<2.50	19.6	<1.93
14 ก.ค. 65	7.19	34.2	3.38	64.5	ND
24 ก.ค. 66	6.72	25.9	5.60	97.9	1.40
มาตรฐาน ^{[1][2]}	5.5-9.0	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 120	ไม่เกิน 5



มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน
พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : ND = Non Detectable (Lower than MDL)
Grease & Oil : MDL = 1.40 mg/L

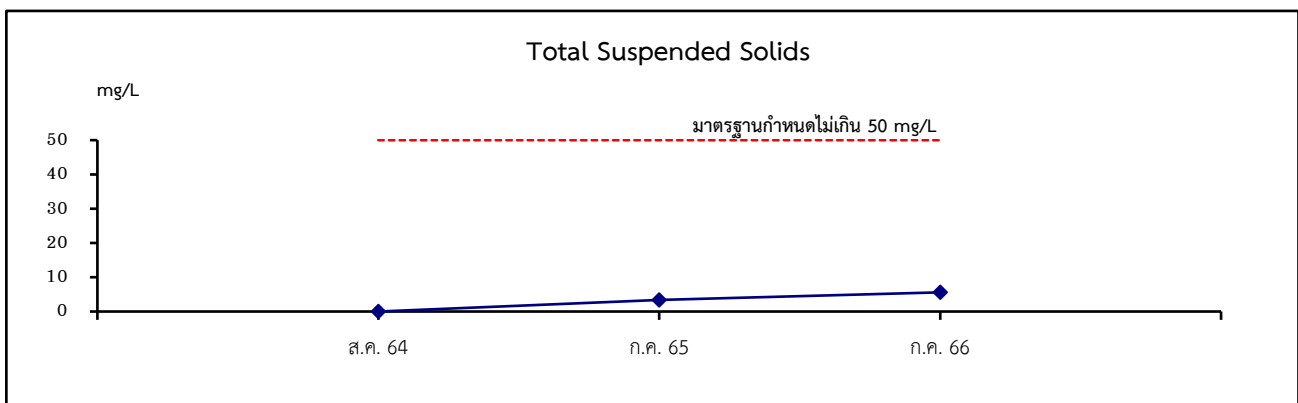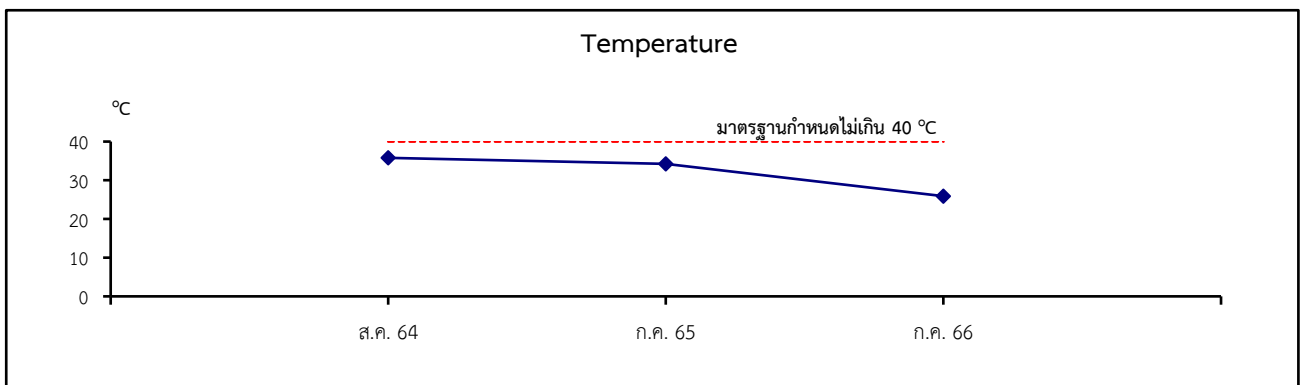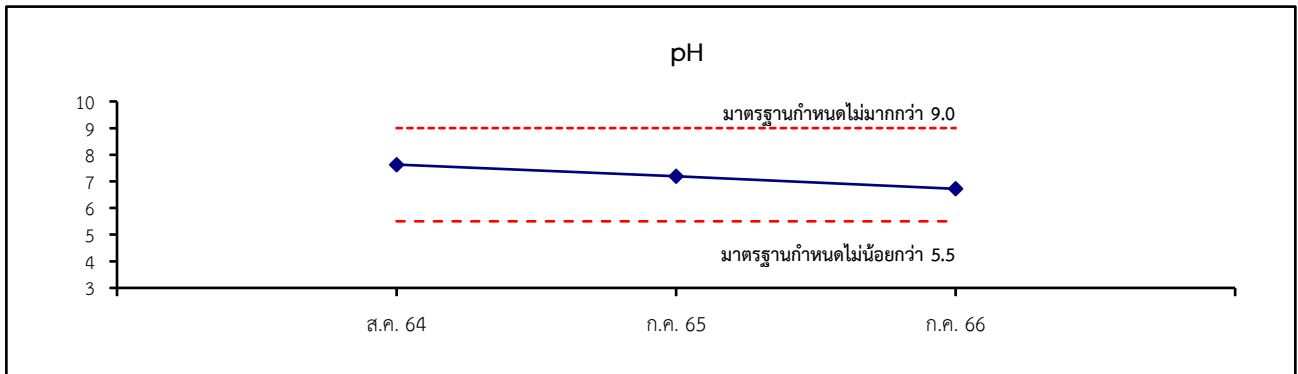

รูปที่ 3.2.4.2-1 กราฟสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน (Open Ditch)
ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของเขตประกอบการไออาร์พีซี ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

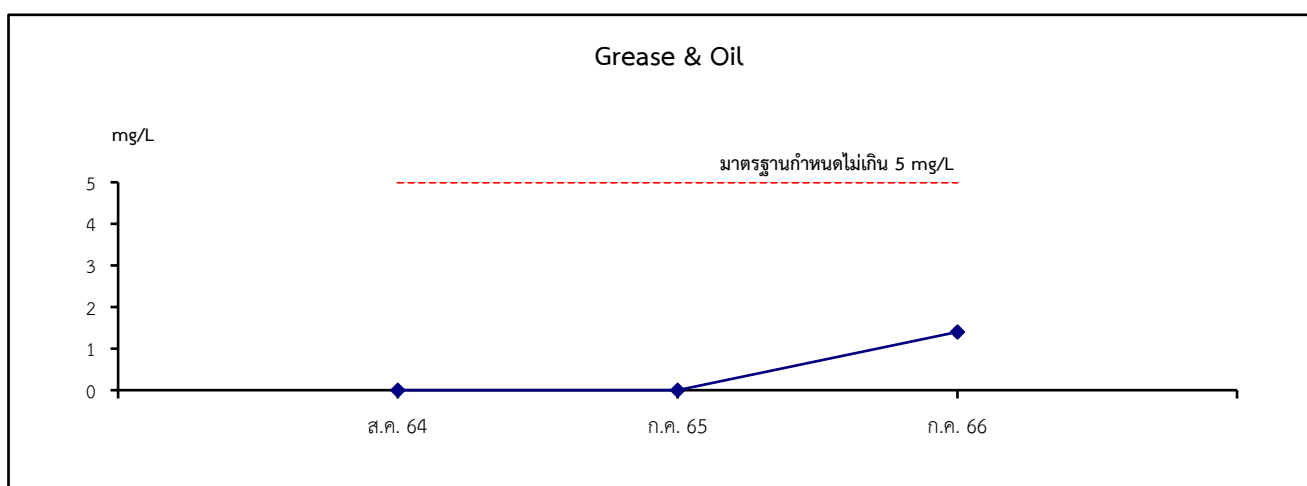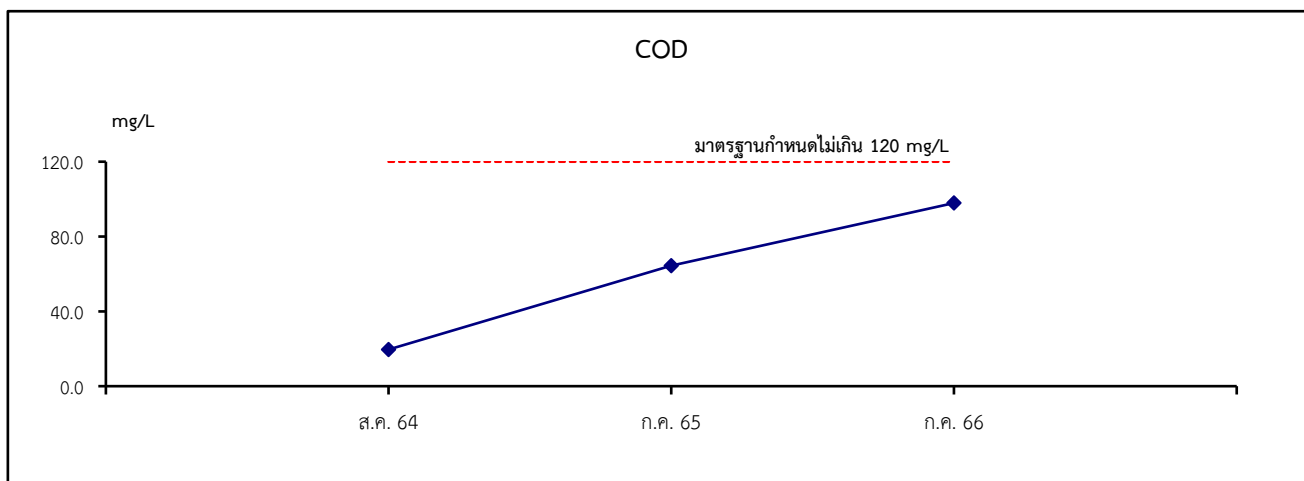

รูปที่ 3.2.4.2-1 (ต่อ)

3.2.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณจุดเหนือน้ำ (Up-gradient) 1 จุด และบริเวณจุดท้ายน้ำ (Down-gradient) 1 จุด มีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ สารอินทรีย์ระเหย ได้แก่ TPH (C₅-C₈), TPH (C₈-C₁₆), TPH (C₁₆-C₃₅) และโลหะหนัก ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ติ่ง จำกัด ปัจจุบันโครงการไม่มีการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำใต้ดิน เนื่องจากโครงการไม่มีกิจกรรมที่ใช้โลหะหนักในกระบวนการผลิต ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.4-1-1

ทั้งนี้ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตามความถี่ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ตารางที่ 3.2.4-1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำใต้ดิน

รายการตรวจวิเคราะห์	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
TPH (C ₅ -C ₈)	Grab Sampling	Purge and Trap Capillary-Column, Gas Chromatographic Method (U.S. EPA Method 5030C & 8015D)	APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition, 2017
TPH (C ₈ -C ₁₆)	Grab Sampling	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, (U.S. EPA Method 5030C & 8015D)	
TPH (C ₁₆ -C ₃₅)	Grab Sampling	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, (U.S. EPA Method 5030C & 8015D)	

2) ผลการตรวจวิเคราะห์

จากการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มีผลการตรวจวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.2.4-2 และได้ทำการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ในรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งถัดไปจะดำเนินการตรวจวัดในปี 2567

3) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์

3.1) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 1 ต้นน้ำ (RF-G(U)) และบริเวณบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จุดที่ 2 ปลายน้ำ (RF-G(D)) พบว่า TPH (C₅-C₈), TPH (C₈-C₁₆) และ TPH (C₁₆-C₃₅) ทั้งสามสถานีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการทดสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3.2.4.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวิเคราะห์ (mg/L)		ค่ามาตรฐาน
	จุดที่ 1 ต้นน้ำ (RF-G(U))	จุดที่ 2 ปลายน้ำ (RF-G(D))	
	26/05/66	26/05/66	
TPH (C ₅ -C ₈)	<0.00004	<0.00004	1.4
TPH (C ₈ -C ₁₆)	<0.00024	<0.00024	1.7
TPH (C ₁₆ -C ₃₅)	<0.00024	<0.00024	0.1

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการทดสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 02-939-4370

3.2.5 คุณภาพดิน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ทุก 3 ปี หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณจุดเหนือน้ำ (Up-gradient) 1 จุด และบริเวณจุดท้ายน้ำ (Down-gradient) 1 จุด มีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ สารอินทรีย์ระเหย ได้แก่ TPH (C₅-C₈), TPH (C₈-C₁₆), TPH (C₁₆-C₃₅) และโลหะหนัก ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ลิง จำกัด ปัจจุบันโครงการไม่มีการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดิน เนื่องจากโครงการไม่มีกิจกรรมที่ใช้โลหะหนักในกระบวนการผลิต ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.5.1-1 สำหรับตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง

ตารางที่ 3.2.5.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพดิน

รายการตรวจวิเคราะห์	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
TPH (C ₅ -C ₈)	Grab Sampling	Purge and Trap Capillary-Column, Gas Chromatographic Method (U.S. EPA Method 5030C & 8015D)	APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition, 2017
TPH (C ₈ -C ₁₆)	Grab Sampling	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, (U.S. EPA Method 5030C & 8015D)	
TPH (C ₁₆ -C ₃₅)	Grab Sampling	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, (U.S. EPA Method 5030C & 8015D)	

2) ผลการตรวจวิเคราะห์

ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพดิน ทุก 3 ปี หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยดำเนินการล่าสุดไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และได้ทำการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ในรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งถัดไปจะดำเนินการตรวจวัดในปี 2567

3.2.6 ระดับเสียงในบรรยากาศ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ บริเวณวัดเนินพุทรา และบริเวณหมู่ 1 บ้านตะพงใน โดยมีดัชนีตรวจวัด คือ L_{eq} 24 hr ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.6-1 สำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.6-1

ตารางที่ 3.2.6-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ระดับเสียงในบรรยากาศ

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
L_{eq} 24 hr	Integrated Sound Level Meter	Integrated Sound Level Meter	ISO 1996

2) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานีเมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.2.6-2 และผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 1

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามข้อกำหนดในมาตรการแนบท้ายหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.9/14418 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากมาตรการฉบับใหม่แนบท้ายหนังสือเห็นชอบที่ รย 0034(2)/5499 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ยังคงอยู่ในระยะก่อสร้าง ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรการฉบับใหม่ที่กำหนด


3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณสวนรัชมังคลาภิเษก และบริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ พบว่า L_{eq} 24 hr มีค่าอยู่ในช่วง 52.3-56.8 dB(A) และ 64.9-66.1 dB(A) ตามลำดับ เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ L_{eq} 24 hr มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งสองสถานียังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3.2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2.5-3 และรูปที่ 3.2.5-2 พบว่า L_{eq} 24 hr มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปทุกครั้งที่ตรวจวัด

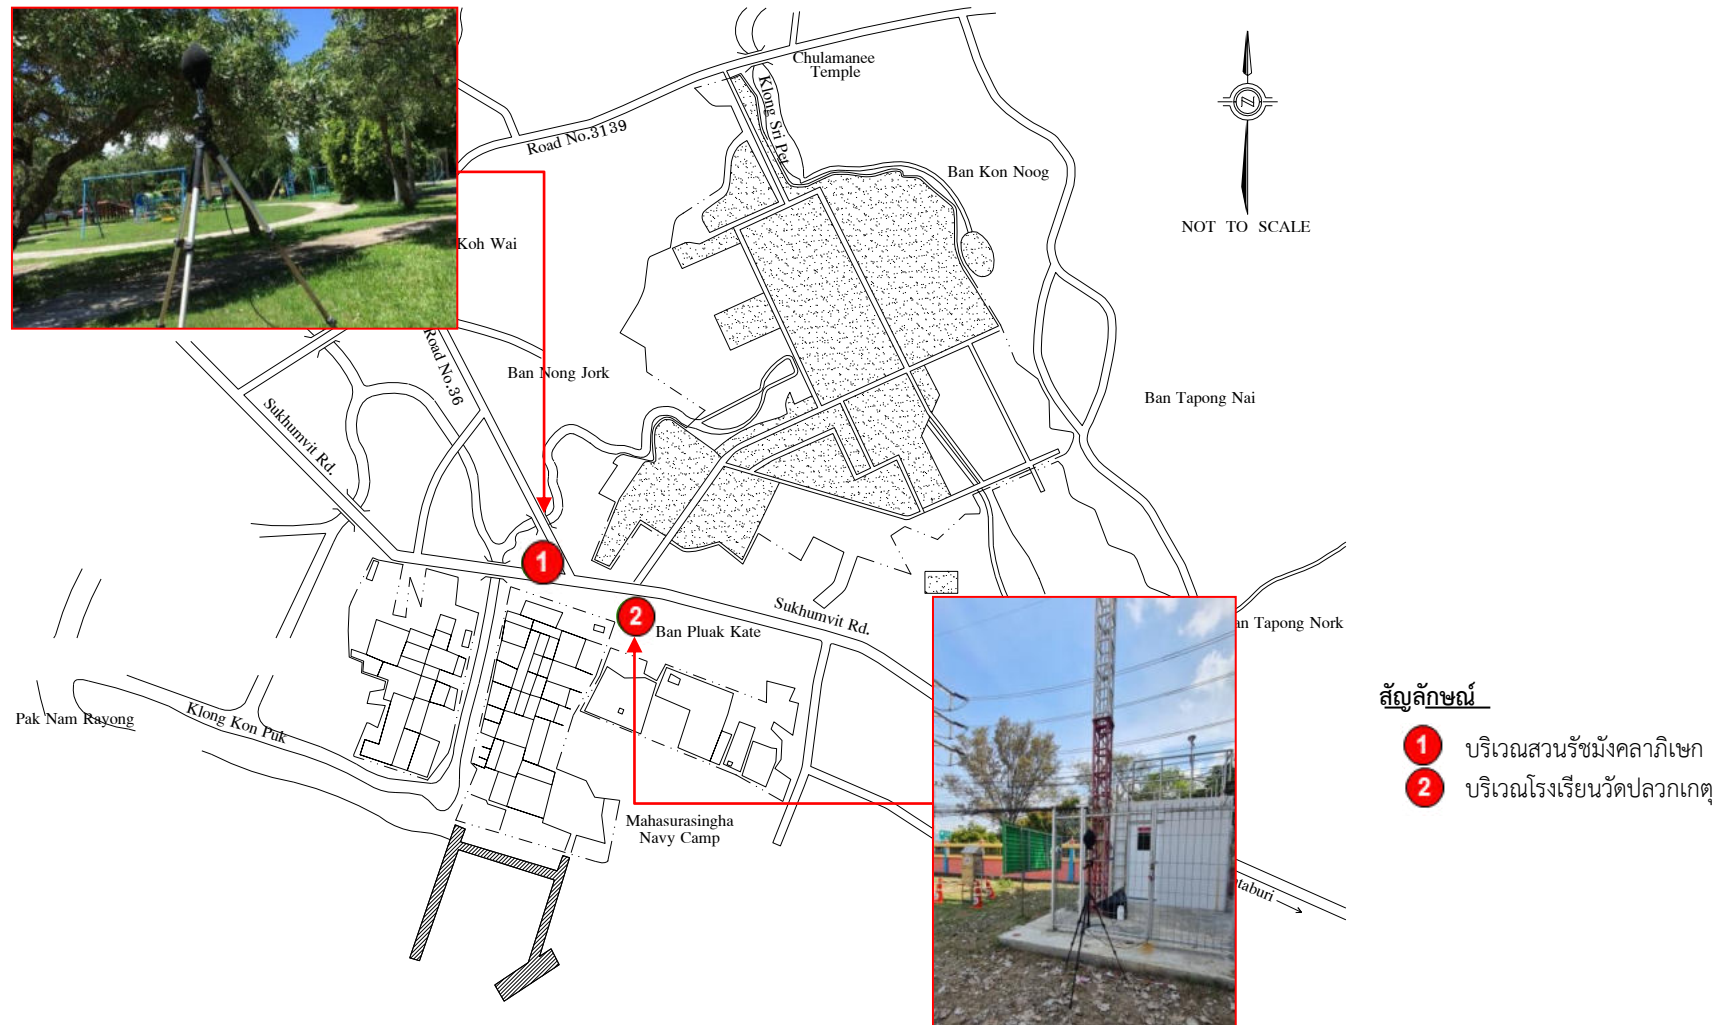

รูปที่ 3.2.5-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน

ตารางที่ 3.2.6-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]
		L_{eq} 24 hr
บริเวณสวนรัชมิ่งคลาสิก	17 ต.ค. 66	56.8
	18 ต.ค. 66	52.3
	19 ต.ค. 66	52.8
บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ	17 ต.ค. 66	65.8
	18 ต.ค. 66	66.1
	19 ต.ค. 66	64.9
มาตรฐาน		ไม่เกิน 70

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ 0-3861-1333

ตารางที่ 3.2.6-3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]
		L_{eq} 24 hr
บริเวณสวนรัชมิ่งคลาสิก	19 พ.ค. 64	61.2
	20 พ.ค. 64	63.1
	21 พ.ค. 64	60.2
	1 พ.ย. 64	59.4
	2 พ.ย. 64	59.2
	3 พ.ย. 64	59.0
	18 พ.ค. 65	56.1
	19 พ.ค. 65	56.1
	20 พ.ค. 65	56.6
	17 พ.ย. 65	54.1
	18 พ.ย. 65	53.2
	19 พ.ย. 65	52.8
	13 พ.ค. 66	50.5
	14 พ.ค. 66	49.6
	15 พ.ค. 66	53.6
	17 ต.ค. 66	56.8
	18 ต.ค. 66	52.3
	19 ต.ค. 66	52.8
มาตรฐาน		ไม่เกิน 70.0


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


ตารางที่ 3.2.6-3 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]
		L_{eq} 24 hr
บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกิด	7 พ.ค. 64	63.1
	8 พ.ค. 64	58.8
	9 พ.ค. 64	58.6
	16 พ.ย. 64	59.8
	17 พ.ย. 64	60.6
	18 พ.ย. 64	60.4
	19 พ.ค. 65	58.1
	20 พ.ค. 65	58.4
	21 พ.ค. 65	56.1
	21 พ.ย. 65	66.0
	22 พ.ย. 65	65.8
	23 พ.ย. 65	65.8
	11 พ.ค. 66	64.3
	12 พ.ค. 66	65.5
	13 พ.ค. 66	64.7
	17 ต.ค. 66	65.8
	18 ต.ค. 66	66.1
	19 ต.ค. 66	64.9
มาตรฐาน		ไม่เกิน 70.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

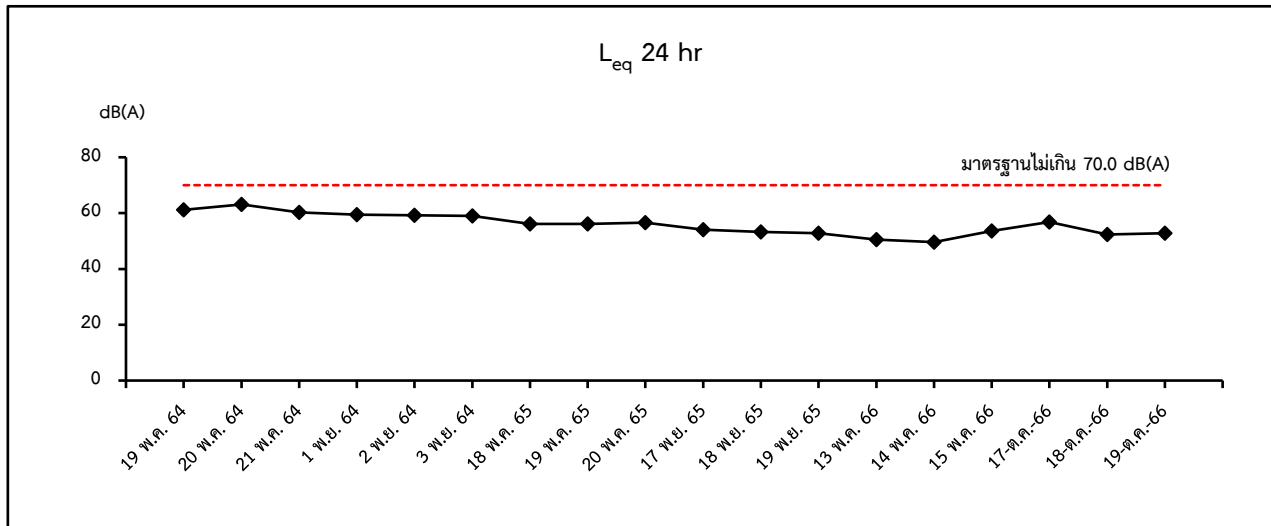

บริเวณสวนรัชมังคลาภิเษก

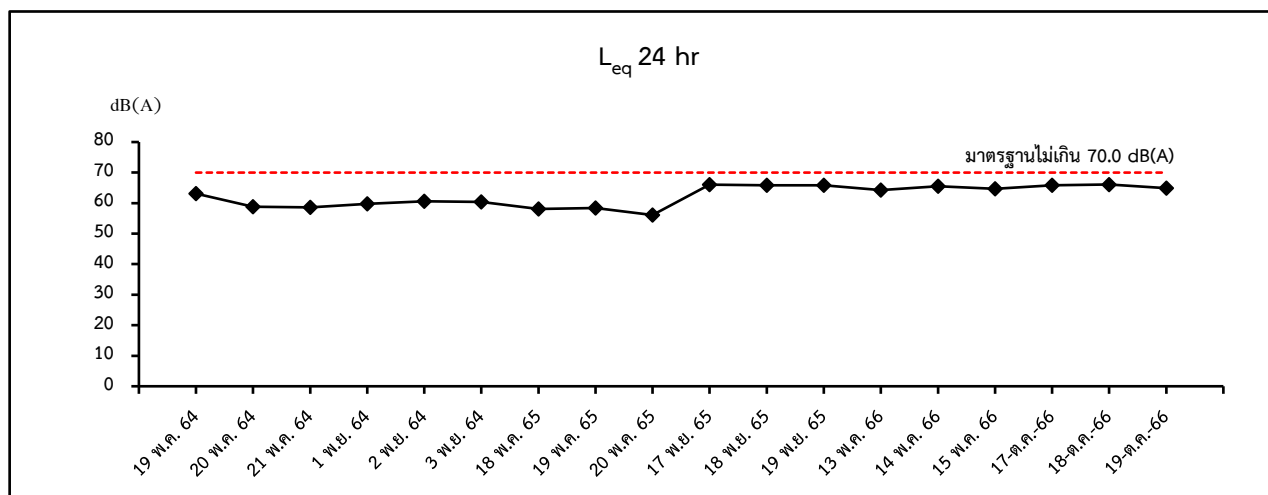

บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รูปที่ 3.2.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3.2.7 การจัดการกากของเสีย

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้บันทึกข้อมูล ชนิด, คุณสมบัติ, ปริมาณ, การเก็บรวบรวม, การจัดส่งและการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ รายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน

2) ผลการดำเนินการ

โครงการมีการบันทึกข้อมูล ชนิด, คุณสมบัติ, ปริมาณ, การเก็บรวบรวม, การจัดส่งและการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 17 และ 51

3.2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.2.8.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

3.2.8.1.1 ความร้อนในสถานที่ทำงาน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน ปีละ 1 ครั้ง (โดยตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี) บริเวณหน่วยกลั่นแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU2) มีดัชนีตรวจวัด คือ ระดับความร้อน (WBGT) ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ลิง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.1-1 สำหรับตำแหน่งการตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 3.2.8.1.1-1

ตารางที่ 3.2.8.1.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
WBGT	Wet-Bulb Globe Temperature Meter	Wet-Bulb Globe Temperature Meter	ACGIH

2) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน บริเวณหน่วยกลั่นแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU2) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.1-2 และได้ทำการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ในรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งถัดไปจะดำเนินการตรวจวัดในปี 2567

3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน บริเวณหน่วยกลั่นแบบบรรยากาศที่ 2 (ADU2) เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับความร้อน (WBGT) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่กำหนดให้ WBGT มีค่าได้ไม่เกิน 34 dB(A) สำหรับลักษณะงานเบา พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานที่ทำการตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.8.1.1-2 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลตรวจวัดระดับความร้อน
			อุณหภูมิ WBGT (°C)
Fire Heater 41B001 A/B (ชั้นบน)	18/04/66	งานเบา	31.2
Fire Heater 41B001 A/B (ชั้นล่าง)	18/04/66	งานเบา	30.9
ค่ามาตรฐาน ^{[1]/[2]}			ไม่เกิน 34.0

ค่ามาตรฐาน^[1] : กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ค่ามาตรฐาน^[2] : กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง พ.ศ. 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2559

บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-939-4370

3.2.8.1.2 ระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน ปีละ 1 ครั้ง บริเวณห้องควบคุม (Control Room) มีดัชนีตรวจวัด คือ ระดับความเข้มของแสงสว่าง (Light) ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.2-1 สำหรับตำแหน่งการตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 3.2.8.1.2-1

ตารางที่ 3.2.8.1.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
Light	Lux Meter	Lux Meter	-

2) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน บริเวณห้องควบคุม (Control Room) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.2-2 และได้ทำการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ในรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งถัดไปจะดำเนินการตรวจวัดในปี 2567

3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

จากผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน บริเวณห้องควบคุม (Control Room) พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 3.2.8.1.2-2 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงในสถานที่ทำงาน

สถานที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน
บริเวณ CCR Room			
โต๊ะทำงานพนักงานแผนก READ กะ A/B/C/D	24/02/66	736	400-500
โต๊ะทำงานพนักงานแผนก READ กะ A/B/C/D	24/02/66	788	400-500
โต๊ะทำงานพนักงานแผนก READ กะ A/B/C/D	24/02/66	787	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS			
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	762	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	556	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	604	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	632	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	621	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	694	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	816	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	520	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	596	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	606	400-500
บริเวณโต๊ะควบคุม DCS	24/02/66	602	400-500
บริเวณสำนักงาน			
บริเวณโต๊ะทำงานสำนักงาน	24/02/66	605	400-500
บริเวณโต๊ะทำงานสำนักงาน	24/02/66	584	400-500

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 02-939-4370

3.2.8.1.3 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน บริเวณภายในพื้นที่โรงงาน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr) ดำเนินการตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.3-1 สำหรับตำแหน่งการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.8.1.3-1

ตารางที่ 3.2.8.1.3-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
L_{eq} 8 hr	Integrated Sound Level Meter	Integrated Sound Level Meter	ISO 11202

2) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.3-2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3


3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน บริเวณภายในพื้นที่โรงงาน พบว่า L_{eq} 8 hr มีค่าเท่ากับ 84.8 dB(A) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ตาม บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่พนักงานจะเข้าไปปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวไม่เกิน ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการจัดเตรียม Ear Plugs และ Ear Muffs ให้พนักงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา และเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทางโรงงานได้กำชับให้พนักงานที่มีการสัมผัสกับเสียงดังใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ทางโรงงานจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

3.2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน บริเวณภายในพื้นที่โรงงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.3-3 และรูปที่ 3.2.8.1.3-2 พบว่า L_{eq} 8 hr มีค่าอยู่ในช่วง 81.3-84.9 dB(A) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

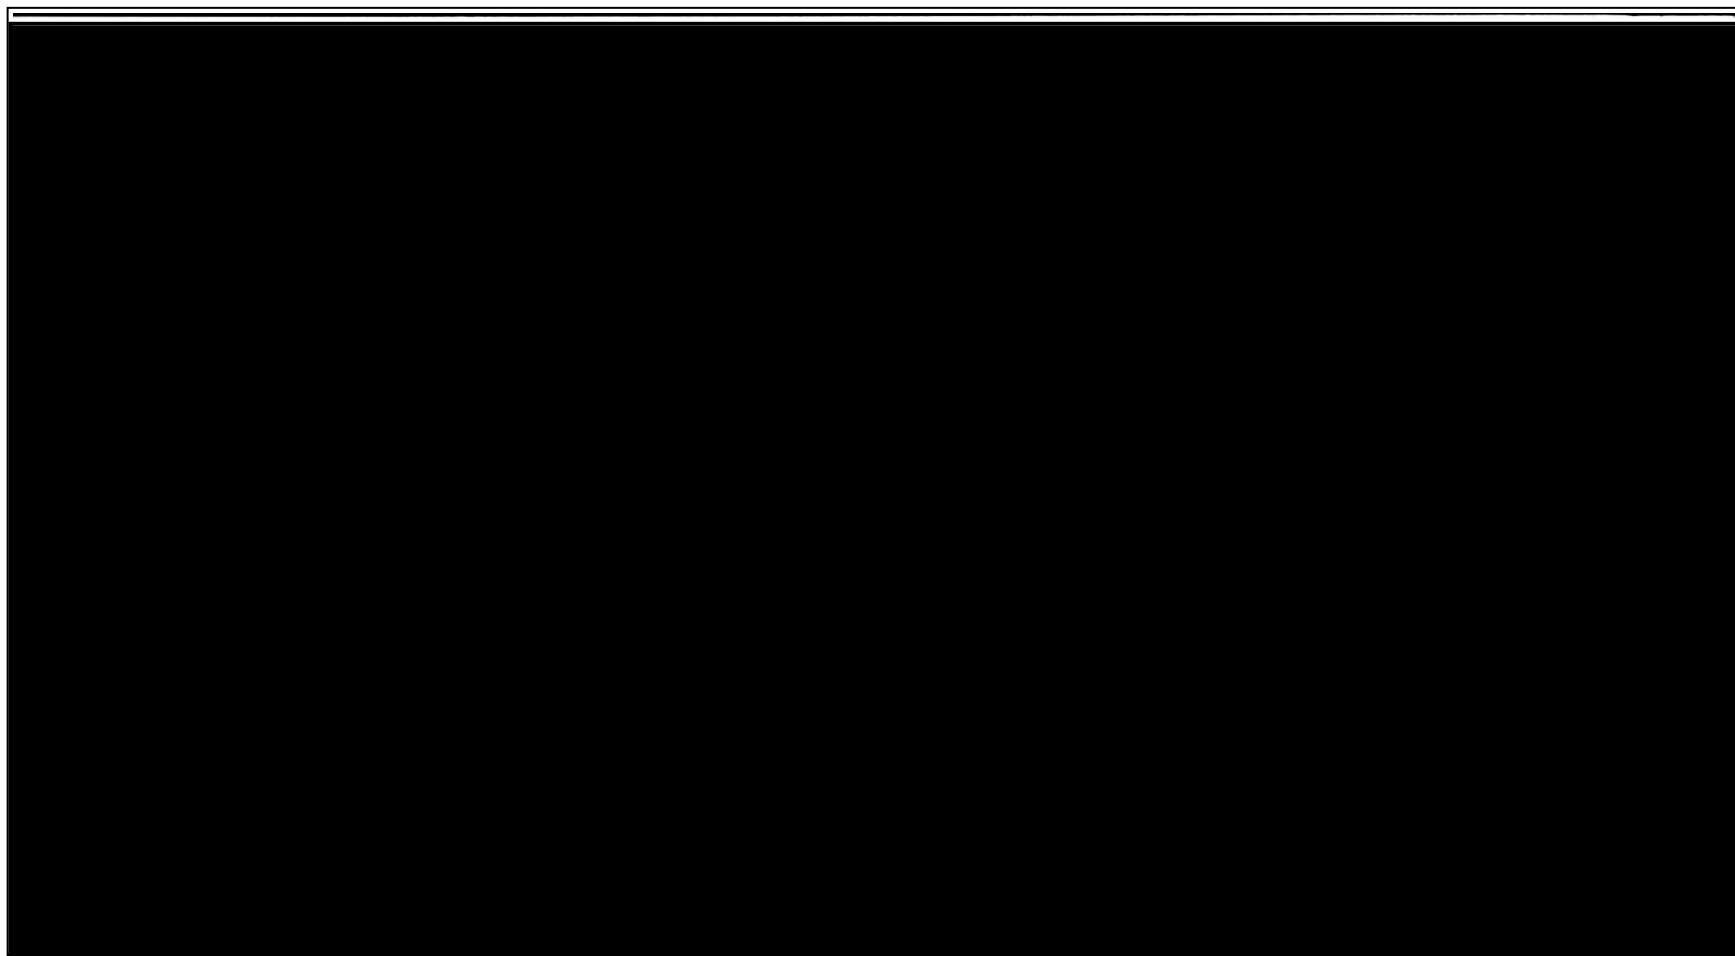

สัญลักษณ์



บริเวณ Compressor

รูปที่ 3.2.8.1.3-1 แสดงตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน

ตารางที่ 3.2.8.1.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]
		L_{eq} 8 hr
บริเวณ Compressor	08 พ.ย. 66	84.8
มาตรฐาน		ไม่เกิน 90

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ลิง เซอร์วิส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ 0-2939-4370-72

ตารางที่ 3.2.8.1.3-3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]
		L_{eq} 8 hr
บริเวณ Compressor	15 ก.พ. 64	82.8
	12 พ.ค. 64	81.8
	20 ส.ค. 64	84.0
	10 พ.ย. 64	83.7
	21 ม.ค. 65	82.7
	21 เม.ย. 65	81.3
	21 ก.ค. 65	81.3
	24 พ.ย. 65	84.9
	17 เม.ย. 66	83.8
	08 พ.ย. 66	84.8
มาตรฐาน		ไม่เกิน 90

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

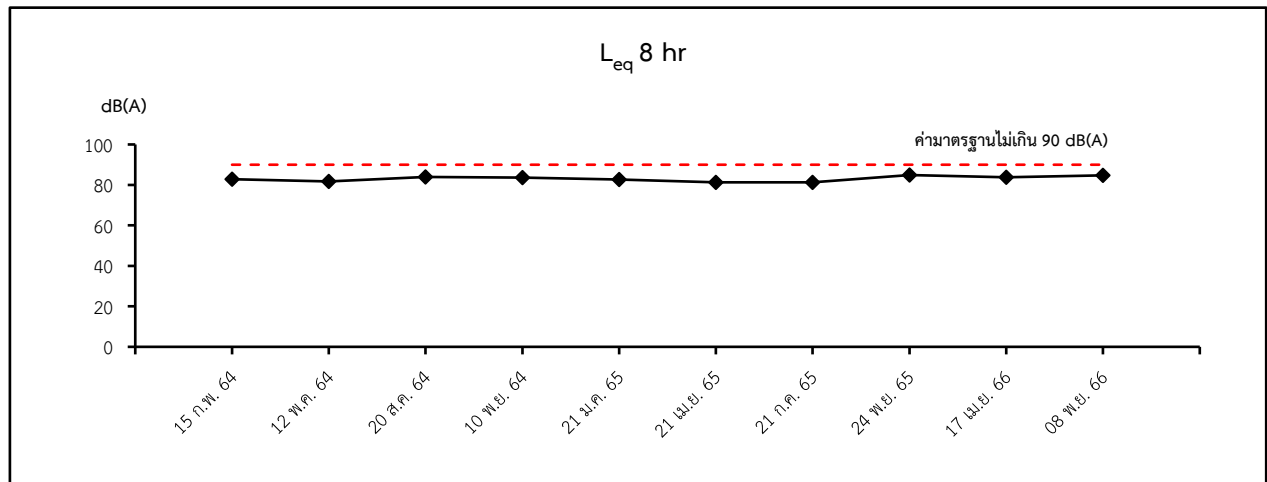

บริเวณ Compressor

รูปที่ 3.2.8.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

3.2.8.1.4 ระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน โดยการติดตั้งเครื่อง Noise Dosimeter ที่ตัวพนักงานเพื่อให้ทราบค่าระดับการสัมผัสเสียงที่พนักงานได้รับตลอดช่วงเวลาทำงาน ปีละ 2 ครั้ง โดยมีดัชนีตรวจวัดคือ กลุ่มพนักงานทุกคนที่สัมผัสเสียงดัง ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.4-1

ตารางที่ 3.2.8.1.4-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
TWA	Noise Dose Meter	Noise Dose Meter	-

2) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2566 มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.4-2 และผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3

3) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน บริเวณพื้นที่ READ (ADU2) (การกลั่นน้ำมัน 2) และบริเวณพื้นที่ RESR (SRU) (ผลิตกำมะถัน) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ TWA มีค่าไม่เกิน 85 dB(A) พบว่า ทุกสถานที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 3.2.8.1.4-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]
		TWA
READ(ADU2)(การกลั่นน้ำมัน 2)		
Shift Sup.	08/11/66	79.3
LTO.	08/11/66	82.6
Boardman	08/11/66	58.0
Operator	08/11/66	83.3
RESR(SRU)(ผลิตภัณฑ์)		
Shift Sup.	09/11/66	76.3
LTO.	09/11/66	82.9
Boardman	09/11/66	58.3
Boardman outside	09/11/66	79.7
Unit 48-I	09/11/66	78.7
SWS2/ARU	09/11/66	84.8
SWS3/TGTU	09/11/66	81.5
มาตรฐาน		ไม่เกิน 85.0

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-2939-4370-72

3.2.8.1.5 จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ที่มีเสียงดัง ทุก 3 ปี และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงในบริเวณภายในพื้นที่โครงการ

2) ผลการดำเนินการ

ทางโครงการได้จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ที่มีเสียงดัง ทุก 3 ปี หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการล่าสุดไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังเอกสารแนบที่ 52

3.2.8.1.6 คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณหน่วย SWS บริเวณหน่วย ARU บริเวณหน่วย SRU บริเวณหน่วย TGTU โดยมีดัชนีตรวจวัด คือ Hydrogen Sulfide ดำเนินการตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.6-1 สำหรับตำแหน่งการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.8.1.6-2

ตารางที่ 3.2.8.1.6-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
Hydrogen Sulfide	Personal Pump	Ion Chromatographic Method	NIOSH 6013

2) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน จำนวน 4 สถานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม และ 21 พฤศจิกายน 2566 มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.2.8.1.6-2 และผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3


3) สรุปผลการตรวจวัด

3.1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน จำนวน 4 สถานี พบว่า Hydrogen Sulfide มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน) และมาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด

3.2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2.8.1.6-3 และรูปที่ 3.2.8.1.6-2 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน) และมาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA) ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด




สัญลักษณ์



บริเวณ SWS2 & ARU1 (16P002)

รูปที่ 3.2.8.1.6-1 แสดงตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ




บริเวณ SRU2 (Loading)

รูปที่ 3.2.8.1.6-1 (ต่อ)

สัญลักษณ์



บริเวณ SWS3 (44P004A/B)



รูปที่ 3.2.8.1.6-1 (ต่อ)

สัญลักษณ์



บริเวณ TGTU (GC Gas Analyzer)



รูปที่ 3.2.8.1.6-1 (ต่อ)

ตารางที่ 3.2.8.1.6-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
		ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ppm)
บริเวณ SWS2 & ARU1	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
บริเวณ SWS3	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
บริเวณ SRU1	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
บริเวณ SRU2	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
บริเวณ TGTU	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
มาตรฐาน		20 ^[1] /1 ^[2]

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)
มาตรฐาน^[2] : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2939-4370-72


ตารางที่ 3.2.8.1.6-3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
		ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ppm)
บริเวณ SWS2 & ARU1	26 ส.ค. 64	<0.01
	11 พ.ย. 64	<0.01
	17 ก.พ. 65	0.01
	24 พ.ค. 65	<0.01
	3 ส.ค. 65	<0.01
	24 พ.ย. 65	<0.01
	20 ม.ค. 66	<0.01
	7 มิ.ย. 66	<0.014
	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
บริเวณ SWS3	26 ส.ค. 64	<0.01
	11 พ.ย. 64	<0.01
	17 ก.พ. 65	<0.01
	24 พ.ค. 65	<0.01
	3 ส.ค. 65	<0.01
	24 พ.ย. 65	<0.01
	20 ม.ค. 66	<0.01
	7 มิ.ย. 66	<0.014
	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
บริเวณ SRU1	26 ส.ค. 64	<0.01
	11 พ.ย. 64	<0.01
	17 ก.พ. 65	<0.01
	24 พ.ค. 65	<0.01
	3 ส.ค. 65	<0.01
	24 พ.ย. 65	<0.01
	20 ม.ค. 66	<0.01
	7 มิ.ย. 66	<0.014
	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
บริเวณ SRU2	26 ส.ค. 64	<0.01
	11 พ.ย. 64	<0.01
	17 ก.พ. 65	0.01
	24 พ.ค. 65	<0.01
	3 ส.ค. 65	<0.01
	24 พ.ย. 65	<0.01
	20 ม.ค. 66	<0.01
	7 มิ.ย. 66	<0.014
	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014


ตารางที่ 3.2.8.1.6-3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
		ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ppm)
บริเวณ TGTU	26 ส.ค. 64	<0.01
	11 พ.ย. 64	<0.01
	17 ก.พ. 65	<0.01
	24 พ.ค. 65	<0.01
	3 ส.ค. 65	<0.01
	24 พ.ย. 65	<0.01
	20 ม.ค. 66	<0.01
	7 มิ.ย. 66	<0.014
	23 ส.ค. 66	<0.014
	21 พ.ย. 66	<0.014
มาตรฐาน		20 ^[1] /1 ^[2]


- มาตรฐาน^[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)
- มาตรฐาน^[2] : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)

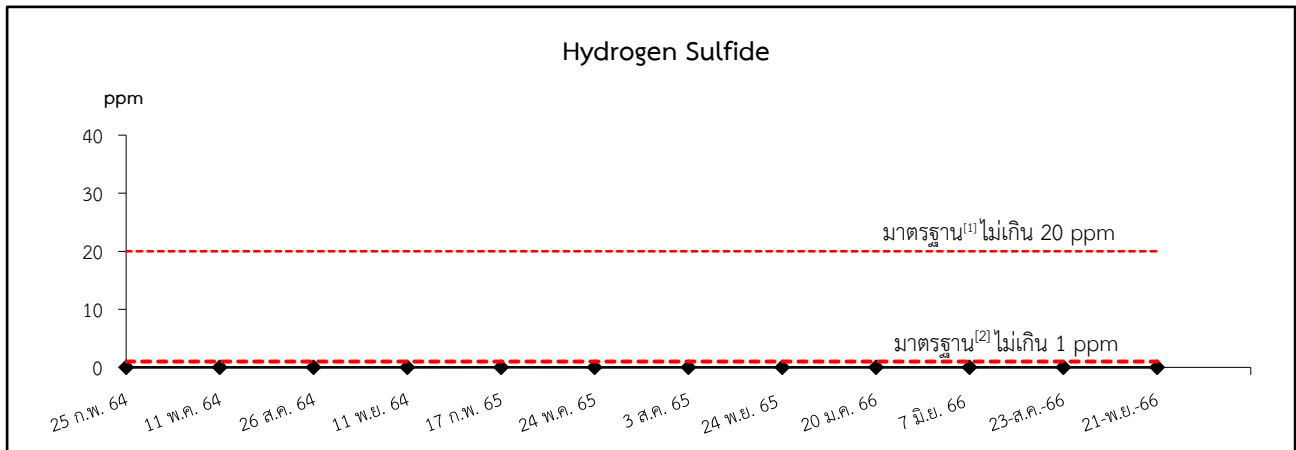

บริเวณ SWS2 & ARU1

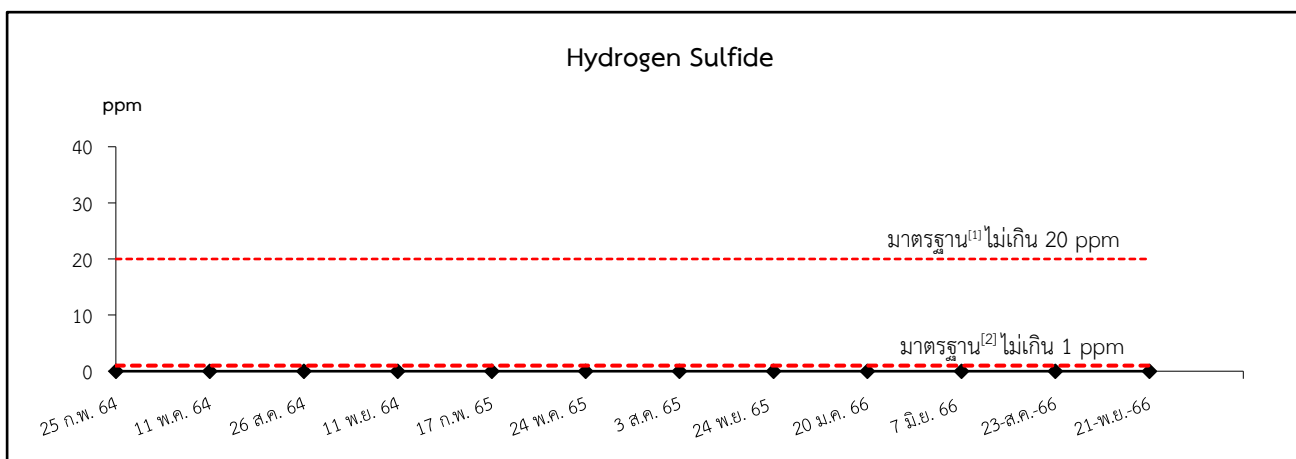


บริเวณ SWS3

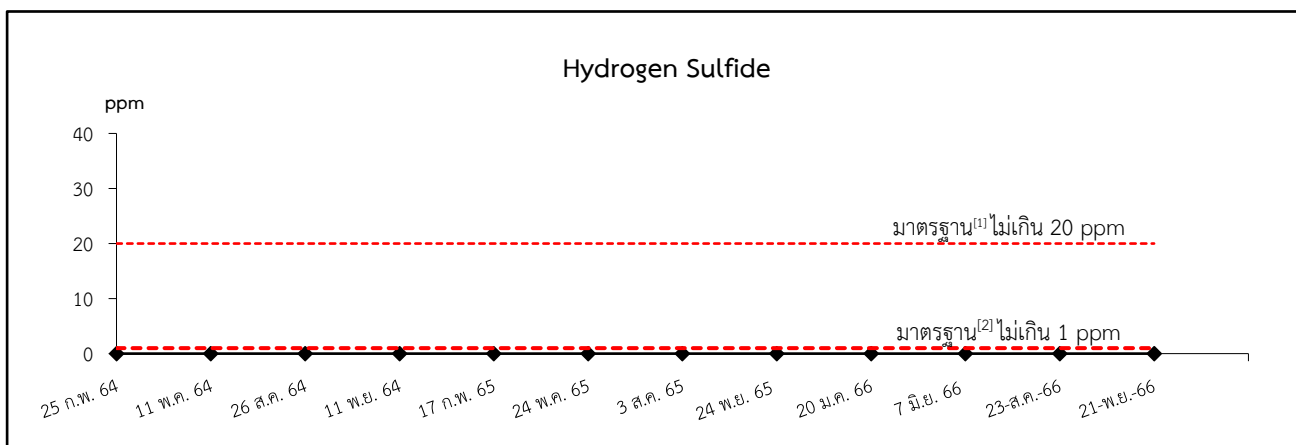


บริเวณ SRU1

รูปที่ 3.2.8.6-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

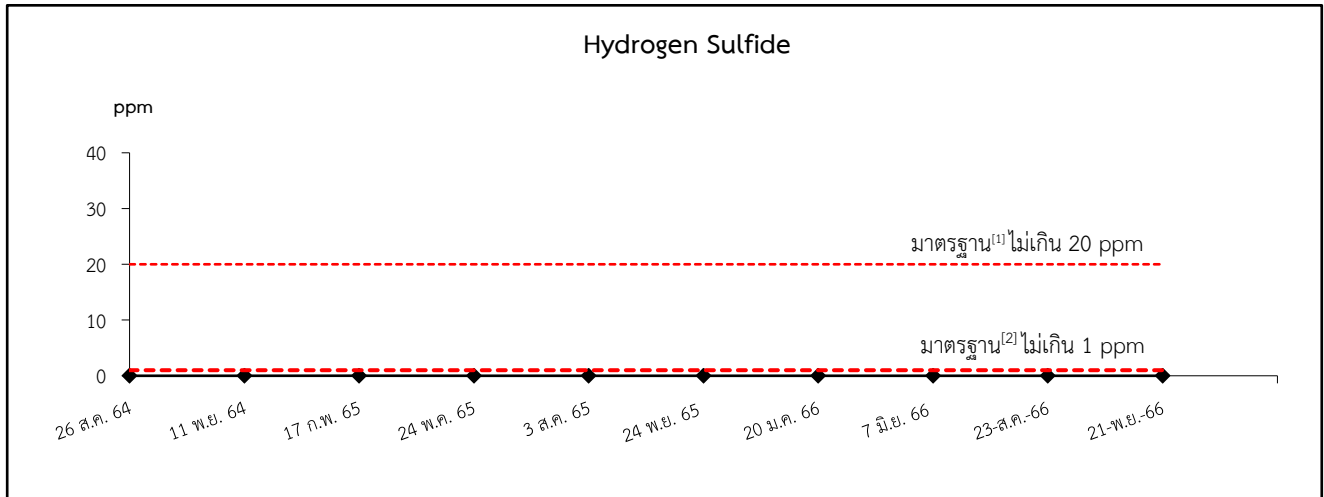

บริเวณ SRU2

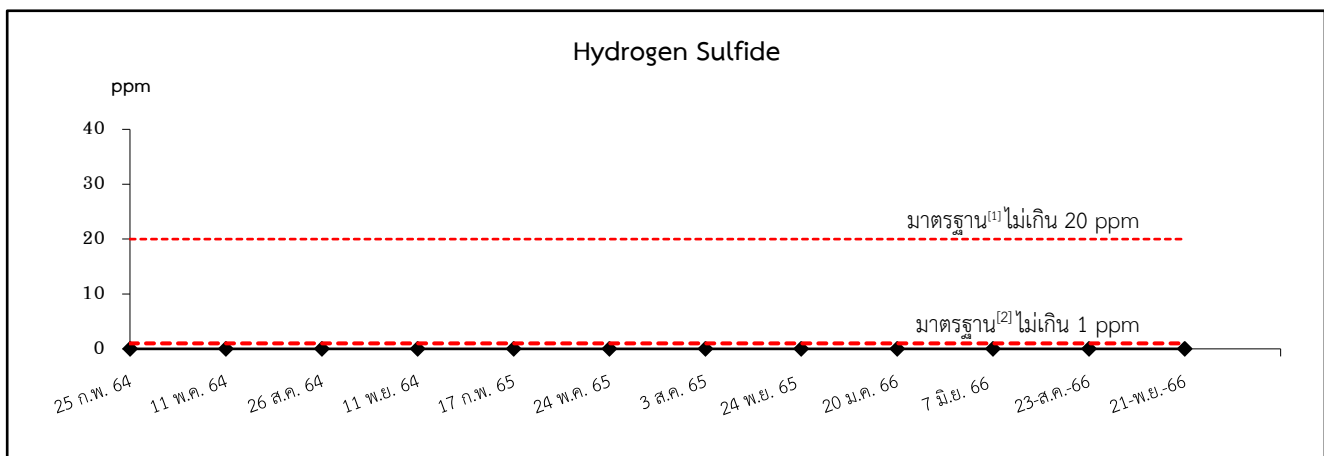

บริเวณ TGTU

- มาตรฐาน^[1]** : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)
- มาตรฐาน^[2]** : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)

รูปที่ 3.2.8.6-2 (ต่อ)

3.2.9 สถิติอุบัติเหตุ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้จัดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ สาเหตุ ระดับความรุนแรง การแก้ไข และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ทุกเดือนและรวบรวมผลและเสนอทุกๆ 6 เดือน

2) ผลการดำเนินการ

โครงการได้ทำการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ระดับความรุนแรง การแก้ไข และมาตรการ เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ดังเอกสารแนบที่ 53 ในภาคผนวกที่ 1

3.2.10 การตรวจสอบสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

3.2.10.1 การตรวจสอบสุขภาพ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ ประกอบด้วย ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป, ถ่ายภาพรังสีทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-Ray Large Film), ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram), ตรวจตาบอดสี, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC), ตรวจประสิทธิภาพของตับ (SGOT & SGPT, ALP), ตรวจประสิทธิภาพของไต (BUN, Creatinine, GFR), ทดสอบสมรรถภาพมองเห็น (Occupational Vision Test) และตรวจตามรายการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่จะเข้าทำงานหรือตามการสัมผัส/เกี่ยวข้องกับสารเคมี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกลงรับเข้าทำงาน

กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี สำหรับพนักงานทุกคน ประกอบด้วย ตรวจร่างกายทั่วไป (Physical Examination), ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป โดยแพทย์ (Physical Exam), ถ่ายภาพรังสีทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-Ray Large Film), ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC), ตรวจประสิทธิภาพของตับ (SGOT & SGPT, ALP) และตรวจประสิทธิภาพของไต (BUN, Creatinine, GFR) ปีละ 1 ครั้ง และสำหรับพนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตในระดับปฏิบัติงาน และพนักงานควบคุมกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ตรวจสอบสมรรถภาพปอด, ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน, ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น, การตรวจทางชีวภาพเพื่อตรวจการได้รับสารเคมีตรวจ t,t-muconic Acid ปัสสาวะ สำหรับสารเบนซีน ปีละ 1 ครั้ง

2) ผลการดำเนินการ

โครงการได้ดำเนินการให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ทุกครั้งที่มีการตกลงรับเข้าทำงาน และดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ เมื่อวันที่ 1-27 มิถุนายน 2566 และตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2566 ดังเอกสารแนบที่ 48 และ 49 ในภาคผนวกที่ 1

3.2.11 สังคม-เศรษฐกิจ

3.2.11.1 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมและการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบโครงการ พื้นที่อ่อนไหว รวมถึงให้สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูลประกอบให้ครบถ้วนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร หรือมากกว่าจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มประมงและกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถาน-พยาบาล โบราณสถานศาสนสถาน และโรงเรียนศูนย์กลางหรือสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น ปีละ 1 ครั้ง

2) ผลการดำเนินการ

โครงการจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 ได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 ดังเอกสารแนบที่ 54 ในภาคผนวกที่ 1

3.2.11.2 การประเมินผลสรุปการดำเนินงานแผนงานชุมชนสัมพันธ์

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ประเมินผลสรุปการดำเนินงานและจากแผนงานชุมชนสัมพันธ์ แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ/หรือแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นและประโยชน์จากการดำเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่กลุ่มเป้าหมายชุมชนที่ได้รับ รวมทั้งให้ประเมินประสิทธิภาพ/ความเหมาะสมของแผนงาน/กิจกรรมและเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมในอนาคต ในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร หรือมากกว่าจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มประมงและกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถาน-พยาบาล โบราณสถานศาสนสถาน และโรงเรียนศูนย์กลางหรือสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น ปีละ 1 ครั้ง

2) ผลการดำเนินการ

โครงการมีการจัดทำแผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสารแนบที่ 24 ในภาคผนวกที่ 1

3.2.11.3 การบันทึกข้อร้องเรียน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลการร้องเรียน พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง ในบริเวณพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลและเสนอทุกๆ 6 เดือน

2) ผลการดำเนินการ

โครงการได้ทำการบันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลการร้องเรียน พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาและมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง โดยในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ดังเอกสารแนบที่ 27 ในภาคผนวกที่ 1

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ทางโครงการมีการดำเนินงานตามมาตรการในด้านต่างๆ ได้แก่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดระดับเสียง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs คุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำใต้ดิน คุณภาพดิน ระดับเสียงในบรรยากาศ การจัดการของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน และด้านสังคม-เศรษฐกิจ

4.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดระดับ คุณภาพน้ำคุณภาพน้ำใต้ดิน ระดับเสียงในบรรยากาศ การจัดการของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า ผลการตรวจวัดทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
