


ภาคผนวก ข

เอกสารการแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข-1

เอกสารขั้นตอนงานเตรียมพื้นที่และดิน
(Method Statement for Earthwork)



	7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT	 
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		CPP-CPPB-CPECC JOINT VENTURE

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT

DOCUMENT NO. : PR.C5-95-2004.01-3700-012

DOCUMENT TITLE : METHOD STATEMENT FOR EARTHWORK

Document Code: PR / Document Class: Z

EPC Contract No. PTT.TEC./2/305/64				PTT Project No. 2004.01						Total Pages: 11				
Attachment No.	1													
No. of Pages	1													
O1	18/02/2022	Issued for Review												
Rev.	Date	Revision Status	Written		Checked		Approved		PM					



TABLE OF CONTENTS

1 GENERAL	4
1.1 PURPOSE OF THIS DOCUMENT PROJECT BRIEF INTRODUCTION	4
1.2 DEFINITIONS	4
1.3 PROJECT BRIEF INTRODUCTION	5
2 SAFETY, HEALTH AND SECURITY	5
3 ENVIRONMENT CONTROL	5
4 EQUIPMENT AND MANPOWER	6
5 MAP TRANSPORT SOIL FROM BORROW PIT TO GSP7	7
5.1 MAE NUM KHU BORROW PIT	7
5.2 BUNG THONG STOCK SOIL AREA	8
5.3 MOK MUNG MUANG BORROW PIT	9
6 DETAIL OF METHOD	10
7 ATTACHMENT	11

ภาคผนวก ข-2

บันทึกการฉีดพรมน้ำในโครงการ

 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (7 th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)			 CPP-CPPB-CPECC Joint Venture	
บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)						
เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : ผฉ. 9191 (ระยอง), 72-1587 (ระยอง), 83-4498 (ระยอง)						
บริษัท (Company): CCC-JV / Sinohydro		เดือน (Month): มกราคม (January)			ปี (Year): 2567 (2024)	
วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 6.00 pm	2 times		Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 6.00 pm	2 times		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 9.30 pm	3 times		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 9.00 pm	3 times		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 9.00 pm	3 times		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 9.30 pm	3 times		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.30 pm	3 times		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 9.30 pm	4 times		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.30 pm	4 times		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	4 times		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.30 pm	4 times		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 12.00 pm	4 times		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.50 pm	4 times		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	4 times		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	4 times		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	4 times		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
31	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	4 times		Safety Supervisor

ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector):

ตำแหน่ง (Position): CCC-JV Environmental Specialist

 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		<div>โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7</div> <div>(7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)</div> <div>บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)</div>			 CPP-CPPB-CPECC Joint Venture	
เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : ผฉ 9191 (ระยอง), 72-1587 (ระยอง), 83-4498 (ระยอง)						
บริษัท (Company): CCC-JV / Sinohydro		เดือน (Month): กุมภาพันธ์ (February)			ปี (Year): 2567 (2024)	
วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	4 times	<div></div>	Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 8.00 pm	4 times		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.30 pm	4 times		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 9.00 pm	4 times		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 8.00 pm	4 times		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	4 times		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.30 pm	4 times		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 6.30 pm	4 times		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 9.00 pm	4 times		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	4 times		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	4 times		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.50 pm	2 times		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.30 pm	2 times		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	2 times		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 9.00 pm	2 times		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 10.00 pm	2 times		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 9.00 pm	2 times		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.50 pm	4 times		Safety Supervisor

เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : 72-1587 (ระยอง), 3ฉท4593 (กทม.)

บริษัท (Company): CCC-JV / Sinohydro เดือน (Month): มีนาคม (March) ปี (Year): 2567 (2024)

วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.00 pm	3 times	<div></div>	Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 8.00 pm	3 times		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 6.00 pm	3 times		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 9.00 pm	3 times		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 9.00 pm	3 times		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.30 pm	3 times		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 9.00 pm	3 times		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 6.30 pm	3 times		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	Rain (8.00 - 9.00 am) 0 time	1.00 – 11.30 pm	1 time		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 9.00 pm	3 times		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	Rain (10.00 - 12.50 am) 0 time	1.00 – 10.30 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.30 pm	1 time		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.00 pm	3 times		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 10.30 pm	3 times		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	3 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.50 pm	3 times		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.50 pm	3 times		Safety Supervisor
31	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 6.30 pm	3 times		Safety Supervisor

 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (7 th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)			 CPP-CPPB-CPECC Joint Venture	
บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)						
เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : 3ฉมท4593 (กทผ.)						
บริษัท (Company): CCC-JV / Sinohydro		เดือน (Month): เมษายน (April)		ปี (Year): 2567 (2024)		
วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 10.40 pm	2 times		Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.30 pm	2 times		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	2 times		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	2 times		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.30 pm	2 times		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	2 times		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	3 times		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	2 times		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.30 pm	2 times		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 10.00 pm	2 times		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 9.00 pm	2 times		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 9.30 pm	2 times		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 9.00 pm	2 times		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	3 times		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.30 pm	2 times		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 9.00 pm	2 times		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.00 pm	2 times		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.30 pm	2 times		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 10.00 pm	2 times		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 9.30 pm	2 times		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 10.30 pm	2 times		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	2 times		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	5 times		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 10.30 pm	2 times		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.30 pm	3 times		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 12.00 pm	4 times		Safety Supervisor

ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector):

ตำแหน่ง (Position): CCC-JV Environmental Specialist

เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : 3ฉมท4593 (กทม.)

บริษัท (Company): CCC-JV / Sinohydro เดือน (Month): พฤษภาคม (May) ปี (Year): 2567 (2024)

วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 10.46 pm	2 times	<div></div>	Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 10.30 pm	2 times		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.07 pm	2 times		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.38 pm	2 times		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.34 pm	2 times		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.20 pm	1 time		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	Rain (7.30 am - 9.05 am.)	1.00 – 11.30 pm	Rain (1.10 - 3.00 pm.)		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 6.00 pm	No work		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	1 time		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	Rain (5.00 - 6.44 am.)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.10 pm	1 time		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	Heavy Rain (3.00 - 8.30 am.)	1.00 – 10.50 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 11.30 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	1 time		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	2 times		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	Heavy Rain (0.40 - 1.50 am.)	1.00 – 12.08 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 11.20 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.00 pm	1 time		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	Heavy Rain (3.00 - 6.30 am.)	1.00 – 10.10 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	Rain (4.00 - 9.20 am.)	1.00 – 11.00 pm	Rain (8.05 - 9.15 pm.)		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 11.30 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	Heavy Rain (5.00 - 12.40 am.)	1.00 – 11.23 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	Heavy Rain (1.00 - 3.30 am.)	1.00 – 10.30 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	Rain (3.00 - 4.30 am.)	1.00 – 11.00 pm	Heavy Rain (7.00 - 9.00 pm.)		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 11.20 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.50 pm	1 time		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 11.10 pm	1 time		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.40 pm	2 times		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	2 times	1.00 – 11.55 pm	Rain (10.00 - 11.10 pm.) 1 time		Safety Supervisor
31	8.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.05 pm	Heavy Rain (10.20 pm. - 5.20 am.)		Safety Supervisor

 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (7 th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)			 CPP-CPPB-CPECC Joint Venture	
บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)						
เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : ผข6801 (ระยอง), 3คณห4593 (กทม.), 83-6311 (ระยอง)						
บริษัท (Company): CCC-JV / Sinohydro		เดือน (Month): มิถุนายน (June)		ปี (Year): 2567 (2024)		
วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
2	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
3	1.00 – 12.00 am	Rain (7.20 - 9.00 am.)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
4	1.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
5	1.00 – 12.00 am	Rain (4.00 - 6.00 am.)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
6	1.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
7	1.00 – 12.00 am	Rain (3.30 - 5.20 am.)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
8	1.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
9	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
10	1.00 – 12.00 am	Rain (5.20 - 7.10 am.)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
11	1.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
12	1.00 – 12.00 am	Rain (1.00 - 5.10 am.)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
13	1.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
14	1.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
15	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
16	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
17	1.00 – 12.00 am	Rain (1.00 - 2.30 am.)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
18	1.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
19	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
20	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
21	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
22	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
23	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
24	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
25	1.00 – 12.00 am	Rain (8.40 - 9.40 am.)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
26	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
27	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	1 time		Safety Supervisor
28	1.00 – 12.00 am	1 time	1.00 – 12.00 pm	2 times		Safety Supervisor
29	1.00 – 12.00 am	Rain (9.00 - 11.20 am.)	1.00 – 12.00 pm	Rain (14.00 - 16.20 pm.)		Safety Supervisor
30	1.00 – 12.00 am	0 time (Soil wet)	1.00 – 12.00 pm	0 time (Soil wet)		Safety Supervisor
					Safety Supervisor	

ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector):

ตำแหน่ง (Position): CCC-JV Environmental Specialist


ภาคผนวก ข-3

เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักร



เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักร

เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

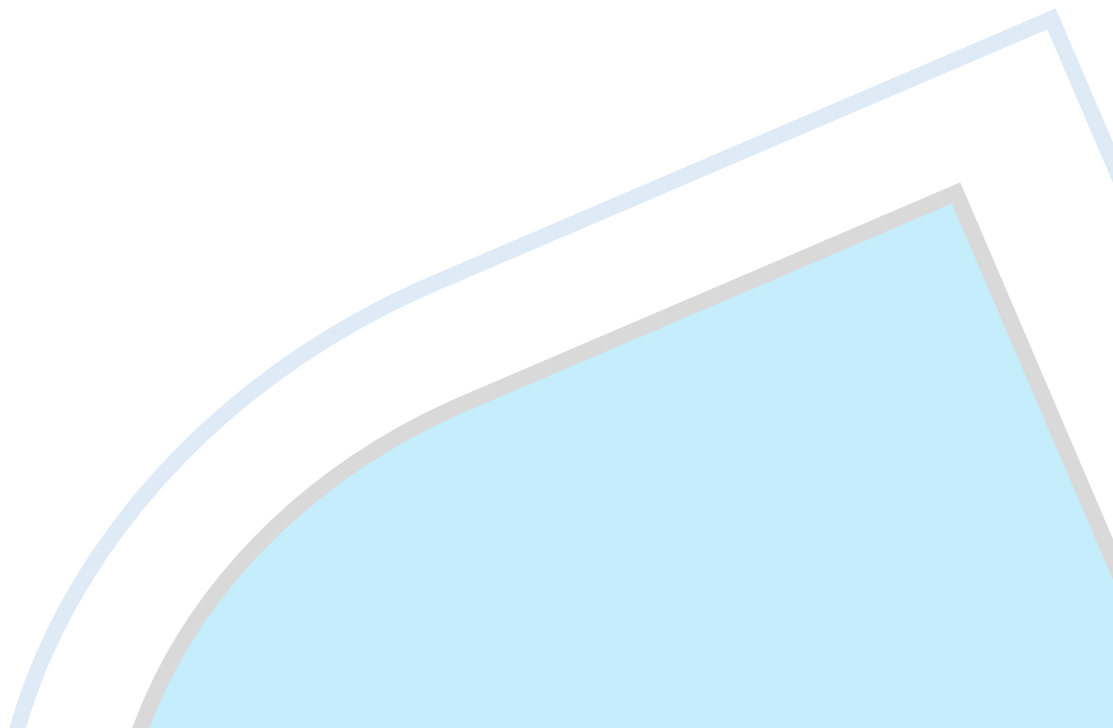






บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

设备/工具检验记录

DDV

Inspected By (ผู้ตรวจ) 检验人: _____ ()

CC-5V 2317124

		GENERATOR INSPECTION ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
Contract No. : PTT.TEC./2/305/64			Form No.: F-SHE-017		Date : 29-2-24
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)					
Report No. :					
Machine Owner : เจ้าของเครื่องจักร CPP-2			Operator : ผู้ควบคุม		
Type/Model : ชนิด/รุ่นเครื่องจักร GENAPTOR			Registration No. : ทะเบียนเครื่องจักร 002		
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ 29-2-24			Expire Date : วันที่สิ้นสุด 31-3-24		
Work Location : สถานที่ทำงาน GSP #7					
No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOT OK	N/A	
1	Overall structure are safe โครงสร้างทั้งหมดของเครื่องจักรมีความปลอดภัยมั่นคง	✓			
2	All control bottoms and switches are in good shape and usable ปุ่มและสวิตช์ควบคุมมีสภาพดีและใช้งานได้	✓			
3	Emergency switch is in place สวิตช์ฉุกเฉินอยู่ที่ตำแหน่งเดิม	✓			
4	Distribution point is in good shape and usable จุดแจกจ่ายอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้	✓			
5	Equipped with groundable connection point มีจุดเชื่อมต่อสายดิน	✓			
6	All cable are in good shape สายไฟทุกสายมีสภาพดี	✓			
7	Fire extinguisher available ติดตั้งถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	✓			
8	Lifting point or tow point is safe ห่วงสำหรับยกมีความแข็งแรงปลอดภัย	✓			
9	Engine has no clack , no leak เครื่องยนต์มีเสียงดังปกติ , ไม่มีรั่วซึม	✓			
10	Fuel oil Full or Empty, no leak ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มหรือไมเต็ม , ไม่มีรั่วไหล	✓			
11	Engine oil normal indicator, no leak ระดับน้ำเครื่องปกติ , ไม่มีรั่วไหล	✓			
12	Water coolant Full level , no leak ระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องปกติ , ไม่มีรั่วไหล	✓			
Inspect By ตรวจเช็คโดย		Name: [Redacted]			
Position ตำแหน่ง		Safety			
Date วันที่		29/2/24			
Signature					





บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

设备/工具检验记录

STRR

Inspected By (ผู้ตรวจ) 检验人: _____ (*Bye*)

	WELDING MACHINE INSPECTION ตรวจสอบเครื่องเชื่อม		
Contract No.: PTT.TEC./2/305/64		Forn No.:F-SHE-018	Date : 23-มี.ค.-24
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)			
Report No. :			
Machine Owner : เจ้าของเครื่องจักร STRR		Operator : ผู้ควบคุม	
Type/Model : ชนิด/รุ่นเครื่องจักร		Registration No. : ทะเบียนเครื่องจักร	
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ 23/3/2024		Expire Date : วันที่สิ้นสุด 30/6/2024	
Work Location : สถานที่ทำงาน Storage Tank			

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Engine Condition (Oil leak) (การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง)	✓			
2	Termination/Power110/220V Outlet Socket Plug (ปลั๊กเสียบ)	✓			
3	Spark Arrestor & Exhaust System (ระบบไอเสีย)	✓			
4	Incoming Cables (สายไฟที่เข้าเครื่อง)	✓			
5	Outgoing Welding Cables etc. (สายไฟที่ออกจากเครื่อง)	✓			
6	Earth leakage breaker (สวิตช์ตัดต่อป้องกันไฟรั่ว)	✓			
7	Grounding (สายดิน)	✓			
8	Cable Terminals (ขั้วต่อสายเชื่อมกับเครื่องเชื่อม)	✓			
9	Earth holder (ตัวยึดลงดิน)	✓			
10	Welding Holder (ตัวยึดหลอดเชื่อม)	✓			
11	Protective glass and glove (หน้ากากป้องกัน)	✓			
12	Extinguisher (ถังดับเพลิง)	✓			
13	Hot work permit (ใบอนุญาตให้ทำงานที่ต้องใช้ความร้อนและประกายไฟ)	✓			

Inspect By ตรวจเช็คโดย	N [Redacted]
Position ตำแหน่ง	Safety Officer (Tech)
Date วันที่	23/3/2024
Signature	[Redacted]



		EQUIPMENT & TOOL INSPECTION ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า		 CCC-JV	
Contract No. : PTT.TEC./2/305/64			Form No.: F-SHE-019		Date : 23-มี.ค.-24
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)					
Report No. : STRR-G-					
Equipment Type : <input checked="" type="radio"/> Grinder <input type="radio"/> Hand Saw <input type="radio"/> Cutter Bench Saw <input type="radio"/> Control Panal Board ชนิดอุปกรณ์ <input type="radio"/> Hand Drills <input type="radio"/> Bench Drills <input type="radio"/> Main Switch Board <input type="radio"/> Distribution Board <input type="radio"/> Water Pump <input type="radio"/> Extention Cable <input type="radio"/> Air Compressor <input type="radio"/> Power Plug					
Owner : บริษัท STRR			Model : รุ่น หินเจียร์ 4 นิ้ว		
Work Location : สถานที่ทำงาน GSP7 (Storage Tank)			Serial / Reg. No. : เลขหมาย/ทะเบียน -		
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ 23/3/2024			Expire Date : วันที่สิ้นสุด 30/6/2024		

NO. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Lead Cables (สายไฟ)	/			
2	Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)	/			
3	Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสดรง)	/			
4	Guard (Rotating prats) (การ์ดครอบ)	/			
5	Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)	/			
6	Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	/			
7	Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	/			
8	Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...				

Name of Inspector / ชื่อผู้ตรวจ :	
Signature of Inspector/ลายเซ็นผู้ตรวจ :	
Inspection Date / วันที่ตรวจ :	23/3/2024
Expiry Date / วันหมดอายุ :	30/6/2024
Approved by / อนุมัติให้ใช้โดย :	
Recommendation :	



		EQUIPMENT & TOOL INSPECTION ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Contract No. : PTT.TEC./2/305/64			Form No.: F-SHE-019		Date : 23-มี.ค.-24
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)					
Report No. : STRR-G					
Equipment Type :		<input type="radio"/> Grinder	<input type="radio"/> Hand Saw	<input type="radio"/> Cutter Bench Saw	<input type="radio"/> Control Panel Board
ชนิดอุปกรณ์		<input type="radio"/> Hand Drills	<input type="radio"/> Bench Drills	<input type="radio"/> Main Switch Board	<input type="radio"/> Distribution Board
		<input type="radio"/> Water Pump	<input type="radio"/> Extension Cable	<input type="radio"/> Air Compressor	<input type="radio"/> Power Plug
Owner : บริษัท STRR			Model : รุ่น เครื่องแก๊ส		
Work Location : สถานที่ทำงาน GSP7 (Storage Tank)			Serial / Reg. No. : เลขหมาย/ทะเบียน -		
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ 23/3/2024			Expire Date : วันที่สิ้นสุด 30/6/2024		

NO. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Lead Cables (สายไฟ)	/			
2	Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)	/			
3	Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสดรง)	/			
4	Guard (Rotating prats) (การ์ดครอบ)	/			
5	Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)	/			
6	Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	/			
7	Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	/			
8	Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...				



Name of Inspector / ชื่อผู้ตรวจ :	
Signature of Inspector/ลายเซ็นผู้ตรวจ :	
Inspection Date / วันที่ตรวจ :	23/3/2024
Expiry Date / วันหมดอายุ :	30/6/2024
Approved by / อนุมัติให้ใช้โดย :	
Recommendation :	




เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักร



เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักรและรถบรรทุก




		TOOL / EQUIPMENT INSPECTION REQUEST / RECORD บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร 设备/工具检验记录					
COMPANY (บริษัท) 公司: _____ STRR _____							
No. 序号	Type of Equipment/Tool (ชนิดของเครื่องมือ) 设备工具类别	Ref./Serial No. (หมายเลขอ้างอิง) 序列号	Inspect Date (วันตรวจ) 检验日期	Expiry Date (วันหมดอายุ) 有效期	Operator Name (ชื่อคนขับหรือผู้ควบคุม) 运营商名称		
1	TORQUE SO 814	C-80	5/1/2024	30/4/2024	[REDACTED]		

Inspected By (ผู้ตรวจ) 检验人: _____
 ()

(Page 1 of 1)

	MOBILE CRANE INSPECTION CHECK LIST ตรวจสอบรถเครน/รถยก-เขียน	 CCC-IV
Contract No. : PTT.TEC./2/305/64	Form No.: P-SHE-016	Date : 11 / 10 / 2024
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)		
Report No. : STRR-02		
Machine Owner : เจ้าของบริษัท 8726	Operator : [Redacted]	
Type/Model : รถ/รุ่นเครนรถ 670 4005 870 4005 K3020	Registration : ทะเบียนรถเครน 72-719 827	
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ 11 / 10 / 2024	Expire Date : วันที่สิ้นสุด 30 / 10 / 2024	
Work Location : สถานที่ทำงาน GSP7 (Storage Tank)		

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Outriggers & Blocking (Extend property)/ขาตั้ง, แผ่นรองขา, อุปกรณ์ช่วยเคลื่อน)	/			
2	Anti Block Device (บนล้อคัมกับ)	/			
3	Slewing Alarm (สัญญาณเตือนรอบวง)	/			
4	Reversing Alarm with Flashing Light (ไฟเตือนหลัง, สัญรัวไลฟ)	/			
5	Boom Angle Indicator (สัญญาณเตือนมุมของBoom)	/			
6	Overheat Cut-out / Alarm System (สัญญาณเตือนน้ำมันเกิน)	/			
7	Fire Extinguisher in cab (ถังดับเพลิงต้องอยู่ในรถ)	/			
8	Slings / Wire Condition (สภาพของสลิง, สลึงรถ, สลึงดึง)	/			
9	Crane Hook with Safety Latch (สภาพของhook และสลักกัมสลึงหลัง)	/			
10	Tyres Condition (สภาพของยาง)	/			
11	Out Rigger (ขาตั้งเครน)	/			
12	Brake System (ระบบเบรค)	/			
13	Standing Area (สภาพพื้นที่ตั้งเครน)	/			
14	Exhaust & Noise (ควันและเสียง)	/			
15	Stopper (หัวตอกสลึง)	/			
16	Operator Qualification (ใบรับรองความสามารถในการขับ)	/			

Inspect By : นาย [Redacted]	
Position : Safety Officer (Tech)	
Date : 11-10-24	
Signature : [Redacted]	

D.S.V.
INSPECTION CO., LTD.
www.dsvinspection.com

บริษัท ดี.เอส.วี. อินสเปคชั่น จำกัด
D.S.V. INSPECTION CO., LTD.

๒๐/

ป.๒

แบบการทดสอบการติดตั้งชิ้นส่วนเมื่อติดตั้งเสร็จ บันทึกผลการปฏิบัติงาน และ
ตัวประกอบและอุปกรณ์ของบันทึกฉบับนี้

เลขที่ 01375/66
TRUCK CRANE 00 TON
SANY STC806 SN.TC4000HC300
ทะเบียน 73-7928 ยานวิ 80.80/1
สำรวจวันที่ 17/11/2566 พอดยวันที่ 18/03/2567

๑. การทดสอบการติดตั้ง

☐ (ก) การทดสอบตามข้อ ๕๑

☒ บันทึกผลการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีที่บันทึกผลการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีที่บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ บันทึกผลการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนการใช้งานใหม่ บันทึกนี้ใช้สำหรับประมวลผลการกำหนด

☐ ประมวลผลการรวม ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป

ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกปลอดภัยของผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

☒ ประมวลต่อครั้ง

ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกปลอดภัยของผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

☐ ประมวลอื่นๆ รวม ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป

ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกปลอดภัยของผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ตัน

☐ (ข) การทดสอบตัวประกอบและอุปกรณ์ของบันทึกฉบับนี้

(๒.๑) ประเภท ☐ ชุดอุปกรณ์ ☐ ชิ้นๆ รวม

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ ขึ้นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกปลอดภัยของผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกปลอดภัยของผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกปลอดภัยของผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง


(๒.๒) ประเภทต่อครั้ง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☒ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ ขึ้นๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกปลอดภัยของผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๑ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกปลอดภัยของผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๑ ตันขึ้นไป ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง



D.S.V. INSPECTION CO., LTD.

บริษัท ดี.เอส.วี. อินспекชัน จำกัด

D.S.V. INSPECTION CO., LTD.

ปจ.๒

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบด้วยประตอมอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท ป.ทีเอสพี โปรดักส์ จำกัด.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล.....002553900474.....

ประเภทกิจการ.....

ชื่อช่างผู้ทำการแทน.....

สถานประกอบการตั้งอยู่ที่.....291/25 หมู่ที่ 5.....ต.หนอง.....

แขวง/ตำบล.....หนองจาน.....สภ.จก.อ.....ก.วิชัย.....

จังหวัด.....ชลบุรี.....20230.....โพธิ์ทอง.....

สถานประกอบการมีพื้นที่จำนวน.....เฮกเตอร์.....เป็นเครื่องใช้.....

ทำการทดสอบเมื่อวันที่.....17 พฤศจิกายน 2566.....ขณะทดสอบยื่นขึ้นใช้งานอยู่ที่.....WORK SHOP D.S.V.....

ชื่อ-สกุล ของผู้บันทึกขึ้นต้น

(๑).....ตามเอกสารแนบ.....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ
(๒).....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ
(๓).....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้บันทึกขึ้นต้น

(๑).....ตามเอกสารแนบ.....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ
(๒).....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ
(๓).....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมอาคาร

(๑).....ตามเอกสารแนบ.....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ
(๒).....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ
(๓).....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้งาน

(๑).....ตามเอกสารแนบ.....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ
(๒).....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ
(๓).....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการยอมรับ (มีหลักฐานแสดง)	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการยอมรับ

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้จำหน่ายมอบแบบขึ้นต้น

ชื่อ: ☒ ชื่อผู้ผลิตผู้สร้าง.....SANY.....

☐ ชื่อวิศวกรผู้จำหน่ายมอบแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต).....

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม.....

ที่ตั้ง.....SANY.....เลขทะเบียนอาชญากรรม (จากหน่วยงานของรัฐ).....73-7928 ชลบุรี.....

ประเทศ.....CHINA.....ปีผลิต.....2018.....หมายเลขเครื่อง.....

รุ่น.....SANY TC4080BK020.....ขนาดเครื่องยกกิโลกรัม.....กิโลวัตต์เบรนท์

มาตรฐาน (จีน).....JIS.....ผู้รับแจ้งผู้จำหน่าย (จีน).....

ชื่อ.....



บริษัท ดี.เอส.วี. อินสเปกชั่น จำกัด
D.S.V. INSPECTION CO.,LTD.

หน้า ๒

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรวิศวกรรม ได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบอย่างถี่ถ้วน ตามรายละเอียดของข้อกำหนดและคู่มือการใช้งานไว้ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะให้บริการต่อไปได้โดยไม่ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูง และพร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวทันที

ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ วันที่

วิศวกรที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๘ เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ วันที่ 17/11/2566



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐/ก ระบุชื่อผู้ประกอบการ

..... วันที่ 17/11/2566

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร

..... วันที่ 17/11/2566

นางสาวจันทนา ประจักษ์กุล วิศวกร



D.S.V. INSPECTION CO.,LTD.
INSPECTION & LOADTEST
ทะเบียนอนุญาตเลขที่ 0215550003684

CUSTOMER	บริษัท ปรีชาภัณฑ์ ไรต์ลิ่ง จำกัด	CERTIFICATE NO.	01375/66
CRANE TYPE	TRUCK CRANE	CAPACITY	80 TON.
ทะเบียน	73-7928 ซบ.ปรีชา NO.80/1	SERIAL NO	TA40808K3020
CHECK PLACE	WORK SHOP D.S.V.	BRAND / MODEL	SANY STC800S

PICTURE OF LOAD TEST



HOLDING BRAKE RECORD

Working Radius	MAIN BOOM	Test Weight (t)	Max Weight (t)	% of test (%)	MEASURING DATA (m.)		
					0 (minute)	10 (minute)	15 (minute)
11 m.	25.2 m.	18.1 t	18.1 t	100%	35 cm	35 cm	35 cm

STATIC TEST RESULT

ITEM	Load Test Ton.	HOISTING	
		No Load	With Load
Lifting boom Up-Down	18.1 t	OK	OK
Swing boom Left Right		OK	OK
Extend boom		OK	-
Retract boom		OK	-

Notes : PASS FOR INSPECTION AND LOAD TEST TRUCK CRANE 80 TON

CHECK BY	[Signature]	Date of Load Testing :	17-Nov-2023
		Date of Expired :	16-Feb-2024

D.S.V. INSPECTION CO., LTD.

รายงานการเก็บข้อมูลการเสียนายของรถเครนส่วนรับน้ำหนัก

ข้อมูลการตรวจสอบ : บริษัท ดี.เอส.วี. อินสเปกชั่น จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ : นายวิฑูรย์ ประเสริฐศรี

ข้อมูลของเครื่องจักร : บริษัท ปรีชาภัณฑ์ ไรต์ลิ่ง จำกัด
LOCATION : WORK SHOP D.S.V.
ทะเบียน : 73-7928 ซบ.ปรีชา NO.80/1
วันที่ตรวจสอบ : 17 พฤศจิกายน 2566

การคำนวณของน้ำหนักของรถเครน : 200/65 มม.

การคำนวณของน้ำหนักของรถเครน : 190/78 มม.

15.4.2 การคำนวณของน้ำหนักของรถเครนส่วนรับน้ำหนัก : 5

15.4.3 การคำนวณของน้ำหนักของรถเครนส่วนรับน้ำหนัก : 10

ข้อมูลวันที่	การคำนวณของรถเครน (มม.)	การคำนวณของรถเครน (มม.)
Spec.	200/65	190/78
ข้อมูลการตรวจสอบครั้งล่าสุด	200/65	190/78
ข้อมูลการตรวจสอบครั้งล่าสุด	200/65	190/78
% การเปลี่ยนแปลง	0	0
ค่ามาตรฐาน	ไม่เกิน 5%	ไม่เกิน 10%
ผลการตรวจสอบ	Accept	Accept
(Accept, Unaccept)	/	/



บริษัท ดี.เอส.วี. อินสเปกชั่น จำกัด
D.S.V. INSPECTION CO.,LTD.



17/11/2566

การตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง				
บริษัท : Sinohydro	ชนิดของเครื่องจักร : Boom lift			
ผู้ควบคุม : [Redacted]	วันที่ตรวจสอบ : 28/2/24	วันที่ตรวจพบข้อบกพร่อง : [Redacted]		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างกระเช้า และราวกันตกมีความแข็งแรงมั่นคง	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. มีจัดเก็บน้ำมันไฮดรอลิก และท่อส่งน้ำมัน ไม่มีการรั่วซึม	<input checked="" type="checkbox"/>			
3. กระบอกลิฟต์ไฮดรอลิก ไม่พังงอ หรือมีการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/>			
4. สภาพสายไฟ สิ่งที่ไม่เสี่ยงคุณภาพจุดต่อสายไฟถูกต้อง และติดตั้งสายรัดเข็มขัดนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			
5. ระดับน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น แบตเตอรี่ น้ำกลั่นระบบไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/>			
6. เครื่องหดร สัญญาณขอไฟออโต้ ไฟหมุน ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ระบบเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>			
7. การขับเคลื่อน การหมุนของตัวกระเช้า การยกหมุนขึ้น-ลง การรีดพุ่ม	<input checked="" type="checkbox"/>			
8. ปุ่มควบคุม และมาตรวัด คือมีภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
9. ปุ่มควบคุม และสวิทช์ต่างๆ ด้านไฟฟ้า และใช้งานได้อย่างถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/>			
10. ตรวจสอบสภาพล้อยาง แก้วยาง และเบรกล้อ	<input checked="" type="checkbox"/>			
11. ผู้ควบคุมกระเช้า ต้องผ่านการอบรมและติดตั้งใบอนุญาตถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/>			
ตรวจสอบโดย : [Redacted]	วันที่ : 28/2/24			
อนุมัติโดย : [Redacted]	วันที่ : 28/2/24			

SP-OSH-04F13

เอกสารรับรองการตรวจสอบรถกระเช้า (คจ.1)

TELESCOPIC BOOM LIFT

DINGLI BA20ERT

S/N BAE2000021H0426 CAP. 230 KGS.

บริษัท ไฮริชอน คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ตรวจสอบ : 27 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจสอบครั้งต่อไป : 27 กุมภาพันธ์ 2568

TELESCOPIC BOOM LIFT คจ.1
DINGLI BA20ERT
S/N BAE2000021H0426 CAP. 230 KGS.

TELESCOPIC BOOM LIFT คจ.1
DINGLI BA20ERT
S/N BAE2000021H0426 CAP. 230 KGS.

แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
ตามประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
ข้อมูลผู้ครอบครองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

ผู้ครอบครองมีข้อมูล... บริษัท ไฮริชอน คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด... เจ้าของผู้ครอบครอง
ที่อยู่ เลขที่ 808/3 หมู่ 5 ต.ระยอง อ.ระยอง จ.ระยอง...
ข้อมูลผู้ครอบครองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

ข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกตามใบกำกับภาษี... รายละเอียดการใช้งาน...
เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างและประเภท... เครื่องจักรใช้งานขึ้นที่สูง...

ชื่อ... DINGLI รุ่น... BA20ERT ปีผลิต... 2021
หมายเลขเครื่องจักร... BAE2000021H0426 หมายเลขทะเบียน...
สร้างโดย... DINGLI ประเทศ... CHINA ตามมาตรฐาน(ถ้ามี)...

☒ มีผู้มีการใช้งาน หรือรายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานได้ทั้งหมด
☐ ไม่มีการใช้งาน หรือรายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานได้ทั้งหมด

ผู้รับจ้างผู้ใช้งาน(ถ้ามี) : **[Redacted]** ที่...
☒ เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลการดำเนินการ
ข้าพเจ้า...
ตำแหน่ง...
สถานที่ทำงาน...
ข้อมูล...

☒ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องจักรกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตหรือถูกพักใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการทดสอบเครื่องจักร เลขที่ 1601-01-2565-0090

ระดับ... ๓... วันที่... ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗...
☒ เครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

รายการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้รับการดำเนินการแก้ไขตามรายการที่ระบุไว้ทั้งหมด...
งานให้สามารถใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อไปได้และปลอดภัย

☒ เครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

ขอรับรองว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ใช้ในการทำงานก่อสร้างนี้ ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบ และอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

โดยมีวันครบกำหนดการตรวจสอบประจำปีครั้งต่อไปในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ) **[Redacted]** (ลงชื่อ) **[Redacted]**

วันที่รับรอง 27 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รับรอง

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างและประเภท... เครื่องจักรใช้งานขึ้นที่สูง...

๑. หมวดโครงสร้าง
๑.๑ การติดตั้งโครงสร้างหลัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๒ ฐานของเครื่องจักร ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๓ โครงสร้างส่วนบน ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๔ สภาพส่วนบน ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๕ สภาพของชิ้นส่วน ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๖ สภาพของชิ้นส่วน ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๗ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๘ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๙ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๑๐ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๑๑ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๑๒ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๑๓ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๑๔ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๑๕ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๑๖ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๑๗ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๑๘ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๑๙ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๒๐ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๒๑ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๒๒ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๒๓ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๒๔ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๒๕ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๒๖ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๒๗ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๒๘ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๒๙ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๓๐ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

๑.๓๑ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม
๑.๓๒ มีน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม ☐ ไม่ดีเยี่ยม

ลงชื่อ **[Redacted]** วิศวกรผู้ตรวจสอบ

๓. หมวดไฟฟ้า

- ๓.๑ ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ☒ ดีเยี่ยม
๓.๒ ระบบควบคุมการทำงาน ☒ ดีเยี่ยม
๓.๓ ระบบควบคุมมือ ☒ ดีเยี่ยม
๓.๔ สภาพของแผงวงจรควบคุม ☒ ดีเยี่ยม
๓.๕ อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า ☒ ดีเยี่ยม
๓.๖ สภาพแบตเตอรี่ไฟฟ้า ☒ ดีเยี่ยม
๓.๗ สภาพหลอดไฟรั่ว และอุปกรณ์อื่น ☒ ดีเยี่ยม
๓.๘ อื่นๆ ☒ ดีเยี่ยม

๔. หมวดความปลอดภัย
๔.๑ สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร ☒ ดีเยี่ยม
๔.๒ สภาพพื้นกันลื่น ☒ ดีเยี่ยม
๔.๓ ราวจับ ☒ ดีเยี่ยม
๔.๔ ราวจับลูก ☒ ดีเยี่ยม
๔.๕ แถบกันวัตถุตกหล่นระดับพื้น ☒ ดีเยี่ยม
๔.๖ เครื่องป้องกันอันตรายจากวัตถุตกหล่น ☒ ดีเยี่ยม
ของรถจักร ☒ ดีเยี่ยม

- ๔.๗ เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนเคลื่อนไหว ☒ ดีเยี่ยม
ของเครื่องจักร ☒ ดีเยี่ยม
๔.๘ เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็น ☒ ดีเยี่ยม
ของวัตถุเนื่องจากการทำงาน ☒ ดีเยี่ยม

- ๔.๙ ระบบควบคุมทิศทางการทำงาน ☒ ดีเยี่ยม
๔.๑๐ ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน) ☒ ดีเยี่ยม
๔.๑๑ อุปกรณ์สำหรับป้องกันการลื่นไหลขณะจอด ☒ ดีเยี่ยม

- ๔.๑๒ แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก ☒ ดีเยี่ยม
๔.๑๓ สวิตช์ฉุกเฉิน ☒ ดีเยี่ยม
๔.๑๔ สัญญาณเตือนอันตรายขณะทำงาน ☒ ดีเยี่ยม
๔.๑๕ สัญญาณแสดงระดับความดันการทำงาน ☒ ดีเยี่ยม

- ๔.๑๖ รูปภาพการให้สัญญาณมือในการสื่อสาร ☒ ดีเยี่ยม
๔.๑๗ กลไกการกดปุ่มหยุดการทำงาน (Limit Switches) ☒ ดีเยี่ยม
๔.๑๘ กลไกการกดปุ่มหยุดการทำงาน ☒ ดีเยี่ยม
๔.๑๙ เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานสำหรับบริเวณ ☒ ดีเยี่ยม
ที่มีการใช้เครื่องจักร

- ๔.๒๐ ระบบสายดิน ☒ ดีเยี่ยม
๔.๒๑ ระบบสายล่อฟ้า ☒ ดีเยี่ยม
๔.๒๒ อื่นๆ ☒ ดีเยี่ยม

- ☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม

- ☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม

- ☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม

- ☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม

- ☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม

- ☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม

- ☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม
☐ ไม่ดีเยี่ยม

ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ


รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
๕. หมวดอื่นๆ.....

หมายเหตุและคำแนะนำ

- ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน และ การดูแลรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัย
- ความหมายสัญลักษณ์
☒ หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง
☒ หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน
☒ หมายถึง ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สามารถระบุได้

ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

ภาพการตรวจสอบและทดสอบ

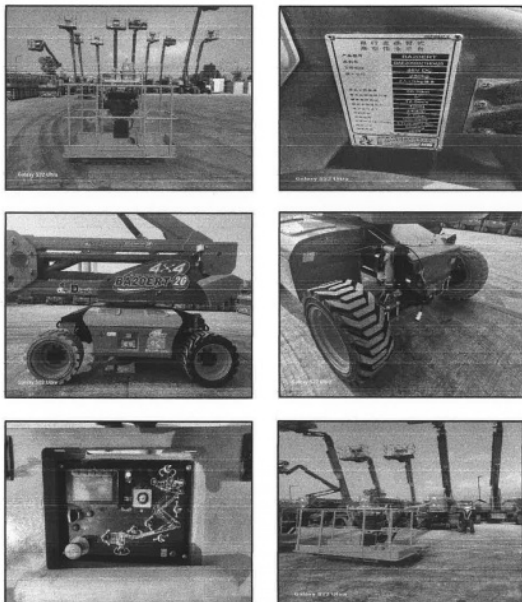

ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

บริษัท ไชริชอน คอ.....
วันที่ 27 ก.พ. 2567 - 27 ก.พ. 2568



ลงชื่อ.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

TELESCOPIC BOOM LIFT ๓.1
DINGLI BA20RT
S/N BA2000021H0426 CAP.230 KGS.



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนใบขึ้นใช้ในการทดสอบเครื่องจักร

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ขึ้นทะเบียน

เลขที่ใบขึ้นทะเบียน ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖
ที่อยู่วิทยา: หมู่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เป็นบุคคลผู้มีใบสำคัญขึ้นทะเบียนเครื่องจักร และดำเนินการขึ้นทะเบียนเครื่องจักร
กำหนดมาตรฐานในการใช้เครื่องจักร และดำเนินการขึ้นทะเบียนเครื่องจักร
ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ขึ้นกับ และขึ้นกับ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖
เครื่องจักร เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องจักร และขึ้นกับ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖
และขึ้นกับ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖ และขึ้นกับ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖
เครื่องจักร เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องจักร และขึ้นกับ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖
เครื่องจักร เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องจักร และขึ้นกับ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญ เลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑-๐๖๒๖๕๐๑๐๖

ตรวจสอบทดสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ตรวจสอบทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 13 สิงหาคม 2567



ตรวจสอบทดสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ตรวจสอบทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 13 สิงหาคม 2567

	MOBILE CRANE INSPECTION CHECK LIST ตรวจรถขุดรถเครน/รถยก-เคลื่อนย้าย	
Contract No.: PTT.TEC/2/305/64	Form No.: F-SHE-016	Date: 13-6-67
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)		
Report No.:		
Machine Owner: 10051014	Operator: [Redacted]	
Type/Model: TR-500M-35	Registration No.: 71-9030	
Inspection Date: 15-6-67	Expire Date: 15-9-67	
Work Location: GSP7		

No.	CHECK LIST	CONDITION			REMARK
		OK	NOK	N/A	
1	Outriggers & Blocking (Extend properly) (ขาตั้ง, แผ่นรองขา, อุปกรณ์ช่วยเสริม)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Anti Block Device (เบรกป้องกันการถอย)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Slewing Alarm (สัญญาณเตือนขณะหมุน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Reversing Alarm with Flashing Light (ไฟเตือนกลับ, สัญญาณไฟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Boom Angle Indicator (สัญญาณเตือนมุมของ Boom)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Overhaul Cut-out / Alarm System (สัญญาณเตือนน้ำมันเกิน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Fire Extinguisher in cab (มีถังดับเพลิงอยู่ในรถ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Slings / Wire Condition (สายสลิง, สายเคเบิล)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Crane Hook with Safety Latch (ตะขอของ Hook และสลิงกับสลิง)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Tyres Condition (สภาพของยาง)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Out Rigger (ขาตั้งเสริม)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Brake System (ระบบเบรก)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Standing Area (สภาพพื้นที่ยืนคน)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Exhaust & Noise (ท่อไอเสียและเสียง)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Stopper (ตัวหยุดล้อ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Operator Qualification (ใบรับรองความสามารถในการขับขี่)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Inspect By: [Redacted]	Picture of Equipment:
Inspect Date: 15-6-67	
Date: 15-6-67	
Signature: [Redacted]	

บริษัท เกียร์นารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด TAX ID : 0215560002729 R50-60
1/49 หมู่ 1 ต. เมือง จ. ระยอง 21000 ROUGH TERRAIN CRANE
CEARNARA ENGINEERING Tel. 089-5738595 E-Mail : gearnara.gne@gmail.com 71 9030 สมุทรปราการ

เอกสารรับรองการตรวจสอบทดสอบตามแบบ ปจ.2

ROUGH TERRAIN CRANE BRAND TADANO

MODEL TR500M-3,S/N:581927,71-9030 สมุทรปราการ

GNE-TCR-2024-056 (R50-60)

บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด



ตรวจสอบทดสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ตรวจสอบทดสอบครั้งต่อไปวันที่ 13 สิงหาคม 2567

บริษัท เกียร์นารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด TAX ID : 0215560002729 R50-60
1/49 หมู่ 1 ต. เมือง จ. ระยอง 21000 ROUGH TERRAIN CRANE
CEARNARA ENGINEERING Tel. 089-5738595 E-Mail : gearnara.gne@gmail.com 71 9030 สมุทรปราการ

แบบการทดสอบการติดตั้งขึ้นเมื่อติดตั้งเสร็จ ขึ้นขึ้นที่มีการดูแลรักษา
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

๑. การทดสอบการติดตั้ง

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ ขึ้นขึ้นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีที่ขึ้นขึ้นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีที่ขึ้นขึ้นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน หรือมีการเปลี่ยนโครงสร้าง หรือมีการเปลี่ยนโครงสร้าง

☐ ขึ้นขึ้นที่มีการใช้งานตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ขึ้นขึ้นที่มีการใช้งานตามข้อกำหนด

☐ ประเมินตามข้อกำหนด ตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป

ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกของรถตามที่มีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☐ ประเมินตามข้อกำหนด

ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกของรถตามที่มีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☐ ประเมินตามข้อกำหนด

ขนาดพื้นที่น้ำหนักยกของรถตามที่มีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☒ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเมินตามข้อกำหนด

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน


การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน

การทดสอบการติดตั้งเมื่อวัน



GNE
GEARMA ENGINEERING

บริษัท เกียร์มา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด TAX ID : 0215560002729
1/49 หมู่ 1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
E-Mail : gearma.gne@gmail.com

R50-60
ROUGH TERRAIN CRANE
71-9030 สมุทรปราการ

- บ -

๑๕.๓.๓) รายการติดตั้งใบขึ้นใบอนุญาตฯ ๑๕ : ๑ หรือคิดตาม _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๕.๔) สภาพคาน

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของคาน

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๕.๔.๒) การถ่วงของคานปกติของคาน ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๕.๔.๓) การสั่นหรือหวั่นของคาน ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๕.๔.๔) ใบมีดหน้าหลังใบมีดของคานแตกหรือร้าว

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๕.๔.๕) ใบมีดหน้าหรือหลังใบมีดของคานขาด

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๕.๔.๖) มีกุญแจล็อกกับสลักเกลียวของคาน (Safety Latch)

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๖) ความตึงของสาย (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ มม. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor)

เท่ากับ _____ 5 _____ ปลอดภัยเกิน _____ = (เตือนภัย)

๑๖.๒) ในกรณีของสลักเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้น

เกลียวร่วมกัน

หรือตามที่มีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๗) ตัวสลักเกลียว (Standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ (Safety Factor)

เท่ากับ _____ ปลอดภัยเกิน _____ = (เตือนภัย)

๑๗.๒) เส้นลวดหรือสลักเกลียวน้อยกว่า ๒ เส้น ในหัวของสลักเกลียว

หรือตามที่มีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☐ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____


๑๘) สภาพลวดสลัก


๑๘.๑) ตัวสลักเกลียวยื่นไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____

๑๘.๒) ไม่มีการขาด ถูกกัดกร่อน แตกเปื่อย หรือหัก


☒ เชื้อเพลิง ☐ ไม่เชื้อเพลิง (ระบุ) _____





GNE
GEARMA ENGINEERING

ทดสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567



GNIE
GEARINARA ENGINEERING

บริษัท เกียร์นารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด TAX ID : 0215560002729
 1/49 หมู่ 1 ต.เจ็ดพระอ เมือง จ.ระยอง 21000
 Tel : 089-5738595 E-Mail : gearinara.gnie@gmail.com

R50-60
 ROUGH TERRAIN CRANE
 71 9030 สัญพราชากร

- ๗ -

๑๘๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๘๘.๔) ไม่ถูกต้องว่าบริเวณปลายหรือบริเวณบนมากจนเห็นชัดเจน

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๘๘.๕) ไม่ถูกต้องว่าร่องตำลงมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๘๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ขึ้นหรือลงได้ติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๐) มีป้ายบอกทิศทางน้ำหนักยกไว้ที่พื้นขึ้น และอาจห้อยตะขอ (Hook Block)

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๑) ตารางแสดงลักษณะน้ำหนักยก (Load Chart) ติดไว้บนบริเวณที่ผู้ใช้งานขึ้นขึ้นไม่ได้ชัดเจน

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้งานใช้สัญญาณในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพื้นขึ้น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๓) เครื่องส่งและเครื่องรับงานไม่ได้ติดตั้งไว้บนพื้นขึ้น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๔) ระบบความปลอดภัย"

๑๙๔.๑) Anti two block devices

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๔.๒) Boom backstop devices

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๔.๓) Swing radius warning devices

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๔.๔) Boom Angle indicator

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๔.๕) ขึ้นๆ (ระบุ) _____

☐ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____


๑๙๕) ขาขึ้นพื้น (Outriggers)"

☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

๑๙๖) ระบบวัดความเร็ว (รถคาน้ำหรือรถเครื่อจะวัดความเร็ว)


☒ ใช่ร้อยละ
 ☐ ไม่ใช่ร้อยละ (ระบุ) _____

หมดเขตเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567



GNIE
GEARINARA ENGINEERING

1/49 หมู่ 1 ต.เจ็ดพระอ เมือง จ.ระยอง 21000
 Tel : 089-5738595 E-Mail : gearinara.gnie@gmail.com



GNE
GEIAMA

บริษัท เกียรมา เ็นจิ้นเนียริ่ง จำกัด TAX ID : 0215560002729 R50-60
 1/89 หมู่ 1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ROUGH TERRAIN CRANE
 Tel.:089 5738595 E-Mail : geiama.gne@gmail.com 71 9030 สุพรรณบุรี

- ๔ -

๒๖) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
 น้ำหนักที่ใช้ทดสอบยก ระบุ Counter weight น้ำหนัก 22.8 ตัน
 เครื่องมือวัด ระบุ เวอร์มิเนีย และคัลลิเบร วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม ระบุ Visual testing
 อื่นๆ ระบุ _____

๒๗) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))
 ๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่า จอกลัดน้ำหนักยกสูงสุดและค่าสูงสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ยังไม่เกินตามแรงดัดค้ำ น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด
☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____


๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้ใช้งานแล้ว
 ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๑-๑.๒ เท่าของน้ำหนักที่ใช้ใช้งานจริงสูงสุด แต่ยังไม่เกินตามตาราง แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด


<input checked="" type="checkbox"/> ตามตาราง <u>3</u> เดือน/ปี	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> เหตุการณ์ใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> หรือการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

๒๘) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))
 ๒๘.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 75% load chart ตัน จีระยะ _____
 ๒๘.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน จีระยะ _____
 ๒๘.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน จีระยะ _____
 ๒๘.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน จีระยะ _____

๒๙) กรณีมีรายการตรวจสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและผลการใช้งานของผู้ใช้หรือวิศวกรกำหนด
 (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

ทดสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567





GNE
GEIAMA ENGINEERING CO., LTD.

ผู้ตรวจสอบ (นายโกมลพร) (นางสาวพร)

[illegible]

R50-60
ROUGH TERRAIN CRANE
71-9030 800/551-5555


วันที่ 14 กรกฎาคม 25

R50-60
ROUGH TERRAIN CRANE
71-9030 www.jscorp.com



ภาคผนวก ข-4

จดหมายแจ้งแผนงานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
แก่ชุมชนโดยรอบ



ที่ 80001878 / 141 / 2566

21 กันยายน 2566


เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ได้รับเอกสารแล้ว วันที่ 29 ก.ย. 66
ลงชื่อ.....

ที่ 80001878 / 142 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

รับแล้ว
22 ก.ย. 2566

18.13 26-



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001878 / 143 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001878 / 144 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานชุมชนคากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 145 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานชุมชนกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่
16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 146 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่
16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้า
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 147 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองเตาควน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่
16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 148 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กเตาควน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่
16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 149 / 2566


21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่
16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 150 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุทธา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่
16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 151 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกลุ่มสะพานเมืองสุซาคา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้รขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 152 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านคาวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น


ในการนี้ ปตท. ใ้รขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 153 / 2566

21 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- วันที่ 30 ก.ย. 2566 ลงวันที่
16 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็มสำหรับ Pipe rack และ Foundation ของ
อุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 1314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001878 / 056 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่
21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ได้รับเอกสาร

ลงชื่อ.....

ผู้รับเอกสาร

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001878 / 057 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่
21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

รับแล้ว
13 มี.ค. 2567

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001878 / 058 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 แล้วนั้น


ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001878 / 059 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานชุมชนคากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้าง โรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878 / 060 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานชุมชนกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้รขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณถึง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878 / 061 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้รขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณถึง

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878 / 062 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตลาด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่
21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878 / 063 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่
21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 064 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่
21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 065 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่
21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



ที่ 80001878 / 066 / 2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกลุ่มสะพานเมืองสุขาวิ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้รขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง ครบครัน และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552



ที่ 80001878 / 067 / 2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000
โทรสาร : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND.
Tel : +66 (0) 2537-2000
Fax : +66 (0) 2537-3498-9
www.pttpic.com

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้รขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง ครบครัน และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

10 มี.ค.



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 2000 ต่อ 11314
โทรสาร 02 537 1552

ที่ 80001878 / 068 / 2567

12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกขยายฯ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม Pipe Rack ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- วันที่ 31 มี.ค. 2567 ลงวันที่
21 กันยายน 2566 แล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ได้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรงานคอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่าง
เคร่งครัด และได้มอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-
6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



ที่ 80001878/116/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านคากวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานคอกเสาเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการควบคุมเสียงและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระทัยนายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

30 พ.ค. 2567

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/117/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกลุ่มสะพานเมืองสุซาดา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานคอกเสาเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการควบคุมเสียงและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระทัยนายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/118/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุทธา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานคอกเสาเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระทัยให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/119/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานคอกเสาเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระทัยให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/120/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขอขยระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการทำงานดอกเส้าเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 - 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/121/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขอขยระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น


เนื่องด้วยการทำงานดอกเส้าเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 - 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988





ที่ 80001878/122/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเสี้ยว

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกยอซา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานดอกเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการทำงานดอกเสี้ยวดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567- วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขออภัยมายังนายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/123/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเสี้ยว

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตกวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานดอกเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการทำงานดอกเสี้ยวดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567- วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขออภัยมายังนายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/124/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานดอกเส้าเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้ง ขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระทัยให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูล ในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/125/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กคากวน-อ่าวประจู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานดอกเส้าเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้ง ขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระทัยให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูล ในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/126/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม

เรียน ประธานชุมชนกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานดอกเส้าเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 - 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้าง โรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/127/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานดอกเส้าเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานดอกเส้าเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 - 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้าง โรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/128/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานได้แจ้งดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567- วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

เนื่องด้วยการดำเนินงานคอกเสาเข็มดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ในกรณีนี้ ปตท. จึงใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานคอกเสาเข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 – 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขออภัยให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988

ได้รับเอกสารแล้ว เมื่อวันที่ 30 พค 67
ลงชื่อ.....ผู้รับเอกสาร



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/133/2567

5 มิถุนายน 2567


เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/134/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/135/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมควบคุมมลพิษแห่งประทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]
หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988

๗ มิ.ย. ๖๗



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/136/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมควบคุมมลพิษแห่งประทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]
หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988

รับแล้ว
01 มิ.ย. 2567



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/137/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988

ได้รับเอกสารเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 67
ลงชื่อ.....ผู้รับเอกสาร



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/138/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน พนักงานจังหวัดระยอง

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



11/6/67



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/139/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/140/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/141/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกยายา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบบทยานายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/142/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบบทยานายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/143/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/144/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกลุ่มสะพานเมืองสุขา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/145/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุทธา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบบทยานให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/146/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินการทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบบทยานให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/147/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

เรียน ประธานชุมชนกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระทัยให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/148/2567

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

เรียน ประธานชุมชนดากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระทัยให้นายอภิรักษ์ ปานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-6983330 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



ที่ 80001878/149/2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatachak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

6 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ซึ่งตามแผนงานจะมีการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดระบบท่อก๊าซภายในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งระยะเวลาการดำเนินงานทำความสะอาดระบบท่อก๊าซดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 - 19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ ทั้งนี้ ปตท. ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมของประเทศไทย หมายเลขใบอนุญาต ปตท. 001/2561-2567 เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7


โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



๗ มิ.ย. ๖๗

ภาคผนวก ข-5

แผนการก่อสร้างโครงการ

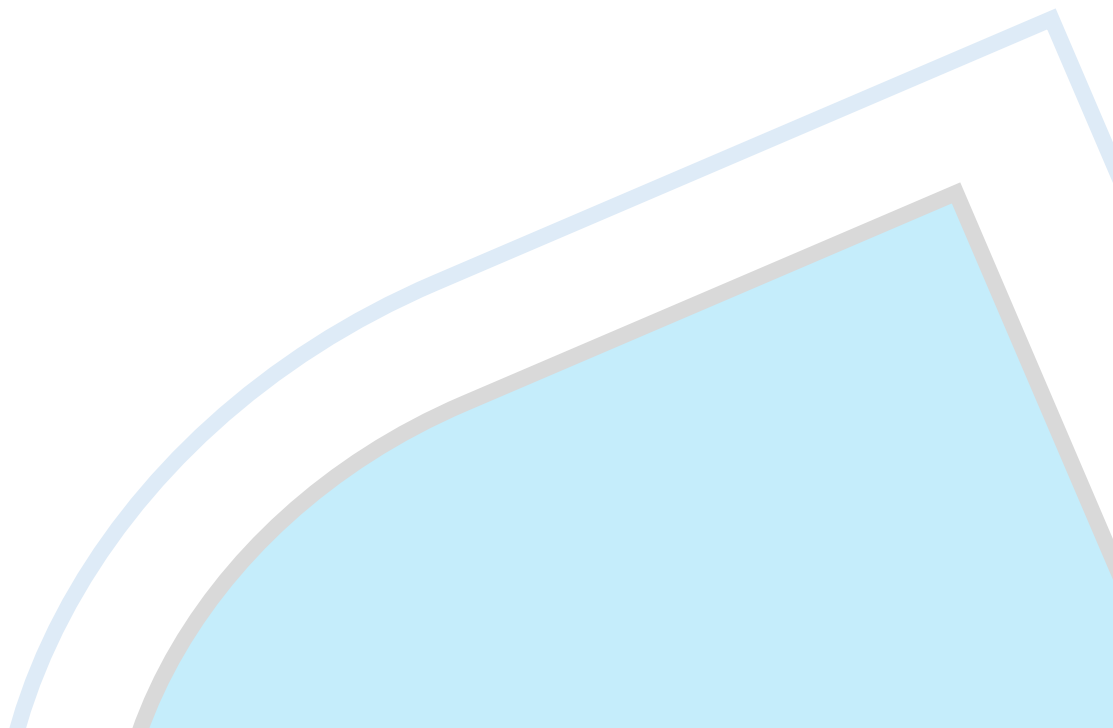




Piling Schedule during March – August 2024

No.	Piling schedule	Start (month)	Finish (month)	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24
1	PIPE RACK R700, R800, R900 and Retention Pond	01 March,24	31 May,24							
2	ENCLOSED FLARE & WWTU AREA CABLE TRENCH AND DITCH	10 June,24	30 August,24							
3	FIREFIGHTING WATER CABLE TRENCH AND DITCH	01 June,24	20 July,24							
4	ZLD PACKAGE	25 June,24	30 July,24							
5	DIKE WALL OF SPHERE TANK	20 July,24	30 August,24							
6	RTO PACKAGE	01 August,24	30 August,24							



ภาคผนวก ข-6

เอกสารคู่มือการป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้าง
(Noise Prevention Procedure)

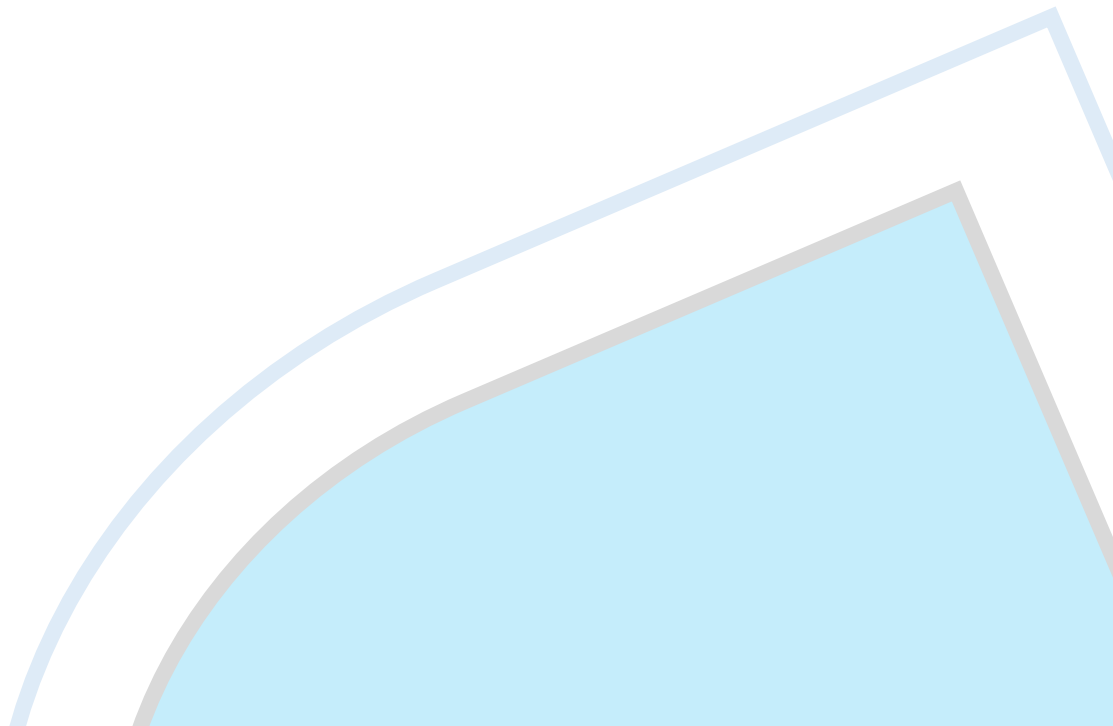

	7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT	
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		CPP-CPPB-CPECC JOINT VENTURE

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT

DOCUMENT NO. : PR.S1-91-2004.01-3700-003

DOCUMENT TITLE : NOISE PREVENTION PROCEDURE

Document Code: PR / Document Class: Z

EPC Contract No. PTT.TEC./2/305/64			PTT Project No. 2004.01				Total Pages: 27			
Attachment No.	A	B								
No. of Pages	3	6								
F1	25/03/2022	Issued for Construction								
O1	02/03/2022	Issued for Review	Cheewin S.	Somkiat Usaram	Wang Guochen	Shan Xudong				
Rev.	Date	Revision Status	Written	Checked	Approved	PM				



7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT
NOISE PREVENTION PROCEDURE




TABLE OF CONTENTS

1 GENERAL	3
1.1 Introduction	3
1.2 Purpose	3
1.3 Scope	3
1.4 References. (International, Local law, PTT and Main contractor document)	4
2 ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS	5
2.1 Abbreviations	5
2.2 Definitions	5
3 RESPONSIBILITIES	7
3.1 CCC-JV's Project Manager/ Site Manager	7
3.2 CCC-JV's Construction Manager	7
3.3 CCC-JV's Safety, Health & Environment Manager (SHE Mgr.)	8
3.4 SHE Officer	8
3.5 Environmental specialist and Environmental officer	8
3.6 Warehouse / Store Supervisor	9
3.7 All Subcontractor	9
3.8 Land Liaison Officer / CR officer	10
4 NOISE LEVEL LIMIT / NOISE CRITERIA	11
5 EFFECTS OF NOISE INJURY	12
6 EXECUTION	12
6.1 Determination	12
6.2 Hazard Identification	13
6.3 Environmental impact prevention and correction measures in the EIA	13
6.4 Noise Prevention and Control Method	14
6.5 Safety Warning Signs	17
7 APPENDICES	18

ภาคผนวก ข-7

ตัวอย่างใบเสร็จสุบกํ่าจัดสิ่งปฏิกูล



บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด

44 ถนนหน้าดง ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
แฟกซ์ 038-694-556
Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com



THONGTHAWIL SERVICE CO., LTD.

44 HUANAMTOK ROAD, T. NUENPRA,
A. MUANG RAYONG, RAYONG 21150
TEL. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
FAX. 038-694-556
Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com

- รับบริการ - กำจัดสิ่งปฏิกูล
- น้ำอุปโภคและบริโภค
- ให้เช่า ห้องสุขาชนิดเคลื่อนที่
- ให้เช่า รถบรรทุกติดเครน

- SERVICE OFFERED: - SEWAGE PUMP
- WATER SUPPLY
- PORTABLE TOILET RENTAL
- CRANE RENTAL

**ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0215538001782

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

นามลูกค้า/Customer **กิจการร่วมค้า ซีพีพี-ซีพีพี-ซีพีเอสซี (สำนักงานใหญ่)**
ที่อยู่/Address **555 อาคารรสา ทาวเวอร์ อาคาร 1 ชั้น 16 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900**
โทร./Tel. **เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000458761**
อ้างอิง/Reference

เลขที่/No. **HS6702027**
วันที่/Date **02/02/67**
เครดิต/Credit Term **วัน**
ครบกำหนด/Due Date **02/02/67**
รหัสลูกค้า/Customer Code **ซ022**

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการและเก็บขนสิ่งปฏิกูล	6.00	ลบ.ม.	400.00	2,400.00
2	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	6.00	ลบ.ม.	500.00	3,000.00
หมายเหตุ/Remarks SO6702055				รวมเงิน/Sub Total	5,400.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat 7.00%	378.00
ห้าพันเจ็ดร้อย (เจ็ดสิบแปดบาทถ้วน).				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total	5,778.00

รับสินค้าและบริการตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้องและอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ
We received the products/services as mentioned above correctly and in good condition.

โปรดส่งจ่ายเช็คในนามของ "บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด" เท่านั้น
การชำระเงินด้วยเช็ค จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
Please make payment to "Thongthawil Service Co., Ltd." only.
Payment by cheque not valid until the cheque has been honored.

ชำระโดย/Payment By

- ☐ เงินสด/Cash.....
☐ เช็คธนาคาร/Cheque.....สาขา/Bank Branch.....
เลขที่/Cheque Number.....
ลงวันที่/Dated.....จำนวนเงิน/Amount.....
☐ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/Withholding Tax.....

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ
Checked By

วันที่/Date **2/2/67**

ผู้รับสินค้า/ผู้รับบริการ/ผู้รับวางมัด
Received By

วันที่/Date

ผู้ส่งสินค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้วางมัด
Delivered By

วันที่/Date

ผู้รับเงิน
Collector By

วันที่/Date **2/2/67**

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

วันที่/Date **2/2/67**

บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด

44 ถนนหัวน้ำตก ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
แฟกซ์ 038-694-556

Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com

รับบริการ - กำจัดสิ่งปฏิกูล
- น้ำอุปโภคและบริโภค
- ให้เช่า ห้องสุขาชนิดเคลื่อนที่
- ให้เช่า รถบรรทุกติดเครน



THONGTHAWIL SERVICE CO., LTD

44 HUANAMTOK ROAD, T. NUENPRA,
A. MUANG RAYONG, RAYONG 21150
TEL. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
FAX. 038-694-556

Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com

SERVICE OFFERED: - SEWAGE PUMP
- WATER SUPPLY
- PORTABLE TOILET RENTA
- CRANE RENTAL

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0215538001782

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

นามลูกค้า/Customer กิจการร่วมค้า ซีพีพี-ซีพีพี-ซีพีอีซีซี (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่/Address 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ อาคาร1 ชั้น16 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./Tel. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000458761
อ้างอิง/Reference

เลขที่/No. HS6703013
วันที่/Date 01/03/67
เครดิต/Credit Term วัน
ครบกำหนด/Due Date 01/03/67
รหัสลูกค้า/Customer Code ๓022

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการและเก็บขนสิ่งปฏิกูล	4.00	ลบ.ม.	400.00	1,600.00
2	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	4.00	ลบ.ม.	500.00	2,000.00
หมายเหตุ/Remarks SO6703032				รวมเงิน/Sub Total	3,600.00
(สามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน).				ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat 7.00%	252.00
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total	3,852.00

ได้รับสินค้าและบริการตามที่แจ้งข้างบนนี้ถูกต้องและอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ
I have received the products/services as mentioned above correctly and in good condition.

โปรดส่งจ่ายเช็คในนามของ "บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด" เท่านั้น
การชำระเงินด้วยเช็ค จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
Please make payment to "Thongthawil Service Co., Ltd." only.
Payment by cheque not valid until the cheque has been honored.

ชำระโดย/Payment By

- ☐ เงินสด/Cash
☐ เช็คธนาคาร/Cheque สาขา/Bank Branch
เลขที่/Cheque Number
ลงวันที่/Dated... จำนวนเงิน/Amount
☐ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/Withholding Tax

ผู้รับเงิน/ผู้รับเช็ค
Checked By

วันที่/Date

ผู้รับสินค้า/ผู้รับบริการ/ผู้รับวางบิล
Received By
วันที่/Date

ผู้ส่งสินค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้วางบิล
Delivered By
วันที่/Date

Collector By
วันที่/Date

Authorized Signature
วันที่/Date

บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด

44 ถนนหัวน้ำตก ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
แฟกซ์ 038-694-556

Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com

- รับบริการ - กำจัดสิ่งปฏิกูล
- น้ำอุปโภคและบริโภคน้ำ
- ให้เช่า ห้องสุขาชนิดเคลื่อนที่
- ให้เช่า รถบรรทุกติดเครน



THONGTHAWIL SERVICE CO., LTD.

44 HUANAMTOK ROAD, T. NUENPRA,
A. MUANG RAYONG, RAYONG 21150
TEL. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
FAX. 038-694-556

Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com

- SERVICE OFFERED: - SEWAGE PUMP
- WATER SUPPLY
- PORTABLE TOILET RENTAL
- CRANE RENTAL

**ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE**

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0215538001782

ต้นฉบับ

นามลูกค้า/Customer กิจการร่วมค้า ซีพีพี-ซีพีพี-ซีพีอีซีซี (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่/Address 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ อาคาร1 ชั้น16 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./Tel. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000458761
อ้างอิง/Reference

เลขที่/No. HS6704026
วันที่/Date 01/04/67
เครดิต/Credit Term วัน
ครบกำหนด/Due Date 01/04/67
รหัสลูกค้า/Customer Code ซอ22

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการและเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล	6.00	ลบ.ม.	400.00	2,400.00
2	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	6.00	ลบ.ม.	500.00	3,000.00
หมายเหตุ/Remarks SO6704017					รวมเงิน/Sub Total 5,400.00
ห้าพันเจ็ดร้อย (เจ็ดสิบแปดบาทถ้วน).					ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat 7.00% 378.00
					จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total 5,778.00

ได้รับสินค้าและบริการตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ
I have received the products/services as mentioned above correctly and in good condition.

โปรดส่งจ่ายเช็คในนามของ "บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด" เท่านั้น
การชำระเงินด้วยเช็ค จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
Please make payment to "Thongthawil Service Co., Ltd." only.
Payment by cheque not valid until the cheque has been honored.

ชำระโดย/Payment By

- ☐ เงินสด/Cash
☐ เช็คธนาคาร/Cheque สาขา/Bank Branch
เลขที่/Cheque Number
ลงวันที่/Dated จำนวนเงิน/Amount
☐ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/Withholding Tax

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ
Checked By

วันที่/Date

14/4

ผู้รับสินค้า/ผู้รับบริการ/ผู้รับวางบิล
Received By

วันที่/Date

ผู้ส่งสินค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้วางบิล
Delivered By

วันที่/Date

ผู้เก็บเงิน/Collector By

วันที่/Date

14/4

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

วันที่/Date

14/4

บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด

14 ถนนหัวน้ำตก ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
แฟกซ์ 038-694-556
Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com



THONGTHAWIL SERVICE CO., LTD.

44 HUANAMTOK ROAD, T. NUENPRA,
A. MUANG RAYONG, RAYONG 21150
TEL. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
FAX. 038-694-556
Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com

- รับบริการ - กู้จัดสิ่งปลูก
- นำอุปโภคและบริโภค
- ให้เช่า ห้องสุขาชนิดเคลื่อนที่
- ให้เช่า รถบรรทุกหกล้อ

- SERVICE OFFERED: - SEWAGE PUMP
- WATER SUPPLY
- PORTABLE TOILET RENTAL
- CRANE RENTAL

**ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215538001782	สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่	ต้นฉบับ
นามลูกค้า/Customer กิจการร่วมค้า ซีพีพี-ซีพีพี-ซีพีอีซีซี (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่/Address 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ อาคาร1 ชั้น16 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/Tel. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000458761 อ้างอิง/Reference		
เลขที่/No. HS6706044 วันที่/Date 03/06/67 เครดิต/Credit Term วัน ครบกำหนด/Due Date 03/06/67 รหัสลูกค้า/Customer Code T022		

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการและเก็บขนสิ่งปลูก	2.00	ลบ.ม.	400.00	800.00
2	ค่ากำจัดสิ่งปลูก	2.00	ลบ.ม.	500.00	1,000.00
หมายเหตุ/Remarks SO6706060 หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน.					รวมเงิน/Sub Total 1,800.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat 7.00% 126.00 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total 1,926.00

ได้รับสินค้าและบริการตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้องและอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ I have received the products/services as mentioned above correctly and in good condition. โปรดส่งจ่ายเช็คในนามของ “บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด” เท่านั้น การชำระเงินด้วยเช็ค จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว Please make payment to “Thongthawil Service Co., Ltd.” only. Payment by cheque not valid until the cheque has been honored.	ชำระโดย/Payment By <input type="radio"/> เงินสด/Cash <input checked="" type="radio"/> เช็คธนาคาร/Cheque สาขา/Bank Branch เลขที่/Cheque Number ลงวันที่/Dated จำนวนเงิน/Amount <input type="radio"/> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/Withholding Tax <div style="text-align:right"> ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ วันที่/Date 3/6/67 Checked By </div>
ผู้รับสินค้า/ผู้รับบริการ/ผู้รับวางบิล Received By วันที่/Date / /	ผู้ส่งสินค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้วางบิล Delivered By วันที่/Date / /
ผู้รับเงิน Collector By วันที่/Date 3/6/67	ผู้มอบเงิน/ลงนาม Authorized Signature วันที่/Date 3/6/67
