

4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ ดังนั้น การนำเสนอรายงานฯ ในครั้งนี้ บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ในเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2567 ผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบับ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2567

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งดั่งรายละเอียดต่อไปนี้

1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียกำหนดพารามิเตอร์ไว้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง

บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ
บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง	pH	เดือนละ 1 ครั้ง
	BOD	เดือนละ 1 ครั้ง
	SS	เดือนละ 1 ครั้ง
	Oil&Grease	เดือนละ 1 ครั้ง
	TKN	เดือนละ 1 ครั้ง
	Sulfide	เดือนละ 1 ครั้ง
	TDS	เดือนละ 1 ครั้ง
	Settleable Solids	เดือนละ 1 ครั้ง

ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการ เก็บตัวอย่างน้ำทั้ง โดยบริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด และ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการบริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัดเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งที่ได้ตรวจวัดผ่านมาแล้ว เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2567 ทาง บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมผลและสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าวและเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำทั้งในการตรวจทดสอบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งอาคาร ข.


2.การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ กำหนดพารามิเตอร์ไว้ดัง ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์วิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่
สระว่ายน้ำ	pH	ปีละ 1 ครั้ง
	Free Chlorine	ปีละ 1 ครั้ง
	Combine Chlorine	ปีละ 1 ครั้ง
	Calcium Hardness	ปีละ 1 ครั้ง
	Cyanuric acid	ปีละ 1 ครั้ง
	Chloride	ปีละ 1 ครั้ง
	Ammonia	ปีละ 1 ครั้ง
	Nitrate	ปีละ 1 ครั้ง
	E.Coli	ปีละ 1 ครั้ง
	Pseudomonas aeruginosa	ปีละ 1 ครั้ง
	Streptococcus aureus	ปีละ 1 ครั้ง
	Total Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง
	Fecal Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง

ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง โดยบริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด และ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการบริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัดเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ได้ตรวจวัดผ่านมาแล้ว เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2567 ทาง บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมผลและสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าวและเปรียบเทียบคุณภาพน้ำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน (20 มกราคม 2560)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ พรีเมียว (Premio) เดิม พอร์ช (Porch) ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

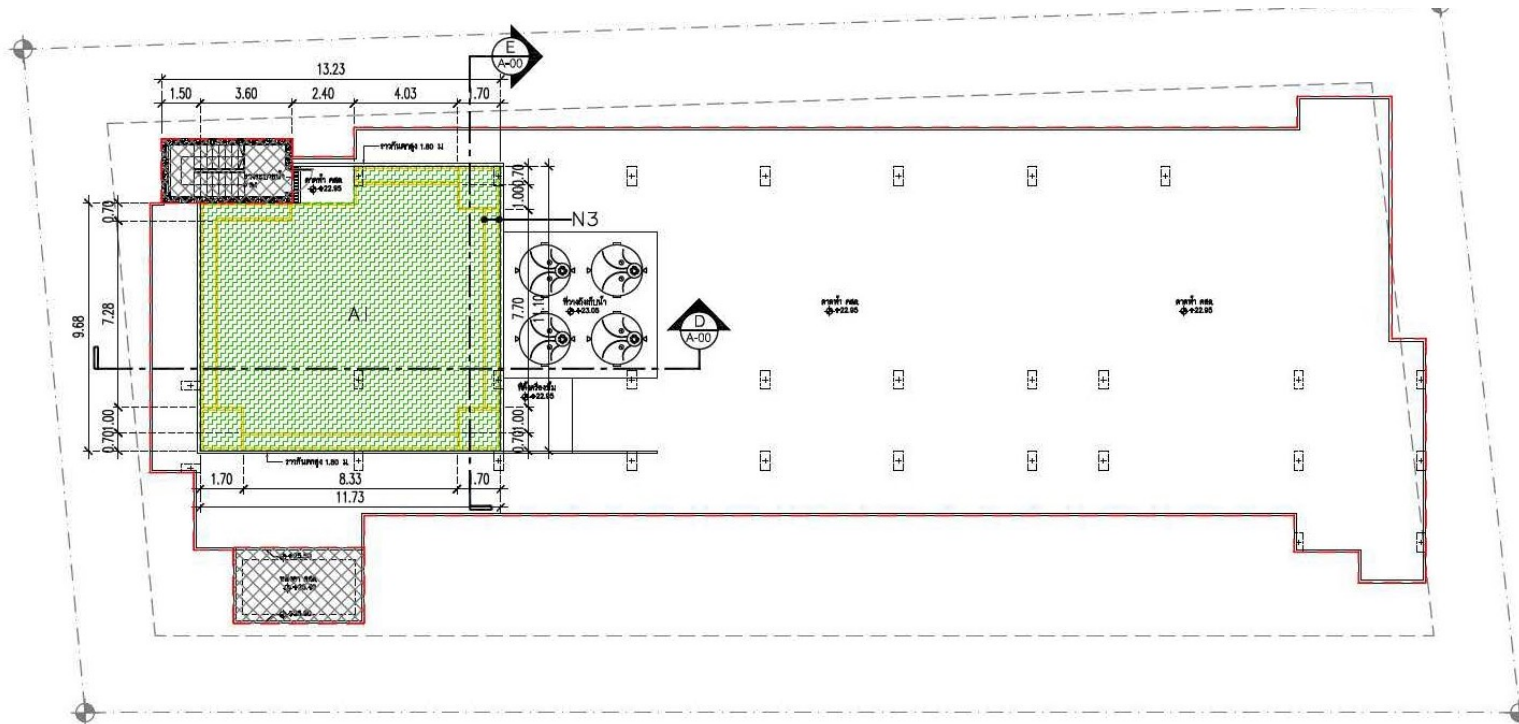

ตารางแสดงจำนวนพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ EIA ชั้นคาตฟ้า		
สัญลักษณ์	พื้นที่	พื้นที่สีเขียว (ตารางเมตร)
	A1	113.07
	รวมพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ EIA	113.07

ตารางแสดงจำนวนพื้นที่สีเขียวที่ไม่นับตามเกณฑ์ EIA ชั้นคาตฟ้า		
สัญลักษณ์	พื้นที่	พื้นที่สีเขียว (ตารางเมตร)
	N3 พื้นที่สีเขียวที่ซ้อนทับกับพื้นที่คาตฟ้าแข็ง (Hardscape)	8.53
	รวมพื้นที่สีเขียว ที่ไม่นับตามเกณฑ์ EIA	8.53

ภาพที่ 8 ผังพื้นที่สีเขียวชั้นคาตฟ้า
