

4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ ดังนั้นการนำเสนอรายงานฯ ในครั้งนี้ บริษัท วิมน์คอนส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ ในเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 ผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบับ มกราคม ถึง มิถุนายน 2567

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้


- 1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ที่บ่อปรับสมดุล และบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง กำหนด พารามิเตอร์ไว้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


| พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ จุดน้ำระบายออกจากโครงการ | ความถี่ในการตรวจสอบ | เดือนที่ตรวจสอบ |
|--|---------------------|--------------------------|
| pH | เดือนละ 1 ครั้ง | มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 |
| BOD | เดือนละ 1 ครั้ง | มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 |
| SS | เดือนละ 1 ครั้ง | มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 |
| TDS | เดือนละ 1 ครั้ง | มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 |
| Settleable Solids | เดือนละ 1 ครั้ง | มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 |
| Oil&Grease | เดือนละ 1 ครั้ง | มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 |
| TKN | เดือนละ 1 ครั้ง | มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 |
| Sulfide | เดือนละ 1 ครั้ง | มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 |

- 2) การตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ พารามิเตอร์ได้แก่ ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) , ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) , ก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) โดยบริษัท วิมน์คอนส์ จำกัด ครั้งนี้ดำเนินการในเดือน มิถุนายน 2567

ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูเออี จำกัด เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ที่ได้ตรวจวัดผ่านมาแล้ว เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 ทาง บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมผลและสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าว และเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำทิ้งในการตรวจทดสอบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.



ภาพที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ

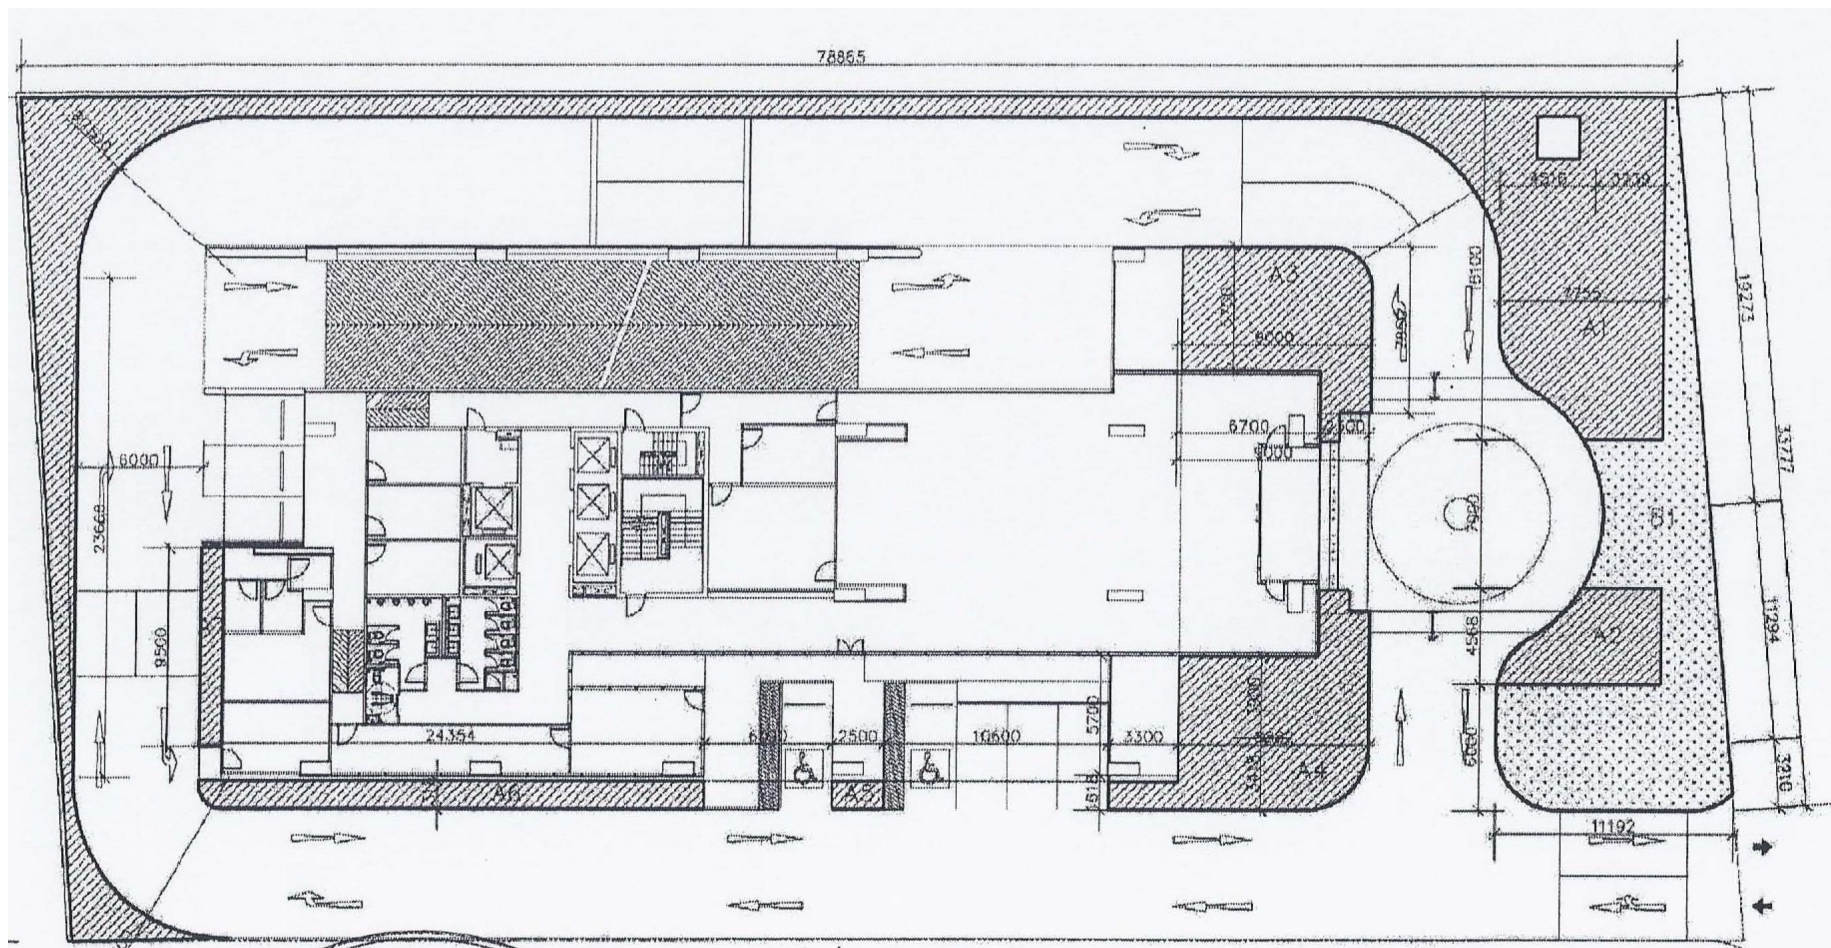

ภาพที่ 3 ผังพื้นที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ
