

## บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 3

### ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 การดำเนินงาน

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ประกอบด้วย นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางน้ำ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการสวะย่น้ำ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร การใช้ที่ดิน และพื้นที่สีเขียว ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขภาพ/สาธารณสุข และสุนทรียภาพและทัศนียภาพ

#### 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ ของบริษัท 196 จำกัด ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม               | พื้นที่ดำเนินการ   | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ความถี่ในการตรวจสอบ                     | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                       | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>1. คุณภาพน้ำ</b><br>- คุณภาพน้ำทิ้ง<br>(หลังการบำบัด) | - บ่อตรวจคุณภาพน้ำ | - pH<br>(ค่าระหว่าง 5-9)<br>- BOD <sub>5</sub><br>(ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร)<br>- Suspended Solid<br>(ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร)<br>- Sulfide<br>(ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร)<br>- Total Dissolved Solids<br>(ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร)<br>- Settleable Solids<br>(ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร)<br>- Fat Oil and Grease<br>(ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร)<br>- TKN<br>(ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร)<br>- ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม<br>ทั้งหมด<br>(ไม่เกิน 4,000 MPN ต่อ 100<br>มิลลิตร) | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะดำเนินการ | - โครงการมีการตรวจวิเคราะห์<br>คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด<br>รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.1 | -                           | เอกสาร 4-1    |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม              | พื้นที่ดำเนินการ            | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความถี่ในการตรวจสอบ                     | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. คุณภาพน้ำ (ต่อ)<br>- คุณภาพน้ำทิ้ง<br>(หลังการบำบัด) | - บ่อตรวจคุณภาพน้ำ<br>(ต่อ) | - โครงการต้องตรวจคุณภาพน้ำ<br>หลังการบำบัดให้มีค่าเป็นไป<br>ตามมาตรฐานที่กำหนดทุก<br>พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                          | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะดำเนินการ | - โครงการมีการตรวจวิเคราะห์<br>คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด<br>รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.1                                    | -                           | เอกสาร 4-1    |
| 2. น้ำใช้                                               | - เส้นท่อประปา              | - การแตกหรือรั่วซึมของท่อ<br>ประปา                                                                                                                                                                                                                                                        | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึม<br>ของท่อประปาภายในพื้นที่โครงการ<br>ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ | -                           | -             |
|                                                         | - ถังเก็บน้ำใต้ดิน          | - โครงสร้างของถังเก็บน้ำชั้นใต้<br>ดินและชั้นดาดฟ้า รอยแตกร้าว<br>เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ<br>มลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผล<br>ต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ<br>- สภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทา<br>เคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี<br>ไม่หลุดร่อน<br>- การทำความสะอาดถังเก็บน้ำ<br>สำรองของโครงการ | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ     | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใต้<br>ดินภายในพื้นที่โครงการให้พร้อมใช้<br>งานอยู่เสมอ         | -                           | -             |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                              | พื้นที่ดำเนินการ | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความถี่ในการตรวจสอบ             | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 3. การจัดการสระว่ายน้ำ<br>- โครงการสร้างและความ<br>ปลอดภัยของสระว่ายน้ำ | - สระว่ายน้ำ     | - สภาพโครงการสร้างสระว่ายน้ำ<br>พื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือ<br>รอยรั่วซึม<br>- ป้ายบอกความลึกของสระว่าย<br>น้ำ<br>- หลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอ<br>ทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ<br>- อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อน<br>ลงสระว่ายน้ำที่ล้างเท้า ห้อง<br>เปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่<br>วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับ<br>ผู้ใช้บริการ<br>- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้<br>ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณ<br>สระว่ายน้ำ<br>- ความสะอาดห้องน้ำและห้อง<br>ส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำ<br>- ตรวจสอบการเลือกใช้กระเบื้อง<br>ขนาดมาตรฐานของสระว่ายน้ำ | - ทุกวัน ตลอด ระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง<br>และความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ<br>ภายในพื้นที่โครงการให้พร้อมใช้งาน<br>อยู่เสมอ | -                           | -             |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                | พื้นที่ดำเนินการ | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                                                                                      | ความถี่ในการตรวจสอบ            | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                                                          | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 3. การจัดการสระว่ายน้ำ<br>(ต่อ)<br>- โครงการสร้างและความ<br>ปลอดภัยของสระว่ายน้ำ<br>(ต่อ) | - สระว่ายน้ำ     | <b>กรณีที่เกิดเบี่ยงแตก ร้าว หรือ<br/>หลุด</b><br>- จุดที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด<br>นั้นให้เป็นจุดอันตราย แสดง<br>ตำแหน่งให้ชัดเจน เช่น ทู่นลอย<br>เป็นต้น และป้ายว่ายน้ำเข้าไป<br>บริเวณนั้น | - ทุกวัน ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง<br>และความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ<br>ภายในพื้นที่โครงการให้พร้อมใช้งาน<br>อยู่เสมอ | -                           | -             |
| - อุบัติเหตุจากการจมน้ำ                                                                   | - สระว่ายน้ำ     | 1. ระดับความลึกหรือเลขบอกตัว<br>ระดับความลึกที่สามารถ<br>มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีสระ<br>ว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5<br>เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดง<br>ความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย<br>3 ระยะ      | - ทุกวัน ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการมีการติดป้ายบอกความลึก<br>ของสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้<br>ชัดเจน                                                                   | -                           | -             |
|                                                                                           |                  | 2. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้<br>- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน                                                                                                                              | - ทุกวัน ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต<br>ประจำสระว่ายน้ำ ที่สามารถ<br>มองเห็นได้ชัดเจนและนำมาใช้ได้<br>ทันที                                        | -                           | -             |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                               | พื้นที่ดำเนินการ | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ความถี่ในการตรวจสอบ            | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                   | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>3. การจัดการสระว่ายน้ำ</b><br><b>(ต่อ)</b><br>- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ<br><b>(ต่อ)</b> | - สระว่ายน้ำ     | - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย<br>ผูกเอาไว้กับเชือก ยาวไม่น้อย<br>กว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ<br>อย่างน้อย 2 อัน<br>- ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมี<br>ความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม.<br>น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน<br>และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึก<br>ของสระว่ายน้ำ<br>- เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่<br>และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด<br>- ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐม<br>พยาบาลที่พร้อมใช้งานได้<br>ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ<br>และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด | - ทุกวัน ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต<br>ประจำสระว่ายน้ำ ที่สามารถ<br>มองเห็นได้ชัดเจนและนำมาใช้ได้<br>ทันที | -                           | -             |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          | พื้นที่ดำเนินการ | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความถี่ในการตรวจสอบ                                                        | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 3. การจัดการสระว่ายน้ำ<br>(ต่อ)<br>- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ<br>(ต่อ) | - สระว่ายน้ำ     | 3. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ<br>บุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น<br>โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ<br>เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด<br>เหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้<br>หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิด<br>ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ<br>สถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้<br>ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน<br>อยู่เสมอ | - ทุกวัน ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ                                             | - โครงการอยู่ระหว่างการเตรียม<br>ป้ายแสดงเบอร์ฉุกเฉินต่างๆ ใน<br>บริเวณสระว่ายน้ำ                                     | -                           | -             |
| - คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ<br>ระบบเกลือ                                | - สระว่ายน้ำ     | - ใส่ สะอาด ไม่มีเศษขยะหรือเศษ<br>ใบไม้ในสระว่ายน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                | - วันละ 2 ครั้งในช่วง<br>ก่อนเปิดและหลังปิด<br>บริการตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความ<br>สะอาดสระว่ายน้ำและตรวจค่า pH<br>วันละ 2 ครั้งในช่วงก่อนเปิดและ<br>หลังปิดบริการ | -                           | -             |
|                                                                     |                  | - ความเป็นกรด - ด่าง (pH)<br>- ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย<br>(Coliform Bacteria)<br>- ค่าแบคทีเรีย <i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Streptococcus aureus</i> ,<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                                                                          | - ทุกวัน<br>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ                            | - โครงการมีการตรวจวิเคราะห์<br>คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ<br>รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.2                                  | -                           | เอกสาร 4-2    |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                    | พื้นที่ดำเนินการ                                                        | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                                                                                                       | ความถี่ในการตรวจสอบ                  | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 3. การจัดการสระว่ายน้ำ<br>(ต่อ)<br>- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ<br>ระบบเกลือ (ต่อ) | - สระว่ายน้ำ                                                            | - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)<br>- ความกระด้าง (Calcium hardness)<br>- กรดไซยานูริก (Cyanuric acid)<br>- แอมโมเนีย (Ammonia)<br>- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)<br>- เฟคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) | - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการจะมีการตรวจวิเคราะห์ ค่า<br>ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความ<br>กระด้าง (Calcium hardness),<br>กรดไซยานูริก (Cyanuric acid),<br>แอมโมเนีย (Ammonia), โคลิฟอร์ม<br>ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)<br>และเฟคัลโคลิฟอร์ม (Fecal<br>Coliform) ในช่วงปลายปี 2567 | -                           | -             |
|                                                                               |                                                                         | - ค่าแบคทีเรีย <i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Streptococcus aureus</i> ,<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                                                                         | - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการจะมีการตรวจวิเคราะห์ค่า<br>แบคทีเรีย <i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Streptococcus aureus</i> ,<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i> ในช่วง<br>ปลายปี 2567                                                                                                        | -                           | -             |
| 4. มูลฝอย                                                                     | - บริเวณห้องพักมูล<br>ฝอยประจำชั้นและ<br>ห้องพักมูลฝอยรวม<br>ของโครงการ | - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง<br>- ความสะอาด                                                                                                                                                                                | - ทุกๆ วัน ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ     | - โครงการได้ติดต่อประสานงานไปยัง<br>เมืองพัทยาเพื่อเข้ามาเก็บขนมูลฝอย<br>ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลพร้อม<br>ทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด<br>ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและ<br>ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ                                                                 | -                           | -             |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ดำเนินการ                                                 | ดัชนีตรวจวัด                                           | ความถี่ในการตรวจสอบ                                                                        | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                                                                           | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 4. มูลฝอย (ต่อ)                            | - แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงาน<br>เกี่ยวกับการคัดแยกและ<br>เก็บขนมูลฝอย | - ตรวจสอบสุขภาพประจำปี                                 | - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ<br>ดำเนินการ                                                       | - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพ<br>ประจำปี และมีการอบรมความรู้<br>ด้านสุขภาพอนามัยและความ<br>ปลอดภัยจากการทำงานให้แก่<br>พนักงานของโครงการ                     | -                           | -             |
| 5. ระบบป้องกันอัคคีภัย                     | 1. อุปกรณ์ในระบบ<br>ป้องกันและสัญญาณ<br>เตือนอัคคีภัย            | - สภาพพร้อมใช้งาน                                      | - ตรวจสอบประสิทธิภาพ<br>ของอุปกรณ์ระบบ<br>ดับเพลิงประจำทุก 6<br>เดือนตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ<br>ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย<br>ภายในพื้นที่โครงการให้พร้อมใช้งาน<br>อยู่เสมอ                | -                           | -             |
|                                            | 2. ระบบจ่ายไฟฟ้า<br>สำรอง                                        | - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา<br>และมีสภาพพร้อมใช้งาน |                                                                                            | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า<br>สำรองภายในพื้นที่โครงการให้<br>พร้อมใช้งานอยู่เสมอ                                            | -                           | -             |
|                                            | 3. ป้ายและเครื่องหมาย<br>แสดงการหนีไฟและ<br>แผนผังเส้นทางหนีไฟ   | - สภาพดีมองเห็นชัดเจนและไม่<br>ลบลือน                  |                                                                                            | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ ตรวจสอบป้าย และ<br>เครื่องหมายแสดงการหนีไฟและ<br>แผนผังเส้นทางหนีไฟภายใน<br>พื้นที่โครงการให้พร้อมใช้งานอยู่<br>เสมอ | -                           | -             |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ดำเนินการ                                                                                                                                                      | ดัชนีตรวจวัด       | ความถี่ในการตรวจสอบ                                                                        | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 5. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)               | 4. อุปกรณ์ดับเพลิง<br>- เครื่องดับเพลิงแบบ<br>หิ้วได้<br>- หัวรับน้ำดับเพลิง<br>- ถังเก็บน้ำใช้และน้ำ<br>ดับเพลิง<br>- สายฉีดน้ำดับเพลิง<br>และตู้เก็บสายฉีด<br>(FHC) | - สภาพพร้อมใช้งาน  | - ตรวจสอบประสิทธิภาพ<br>ของอุปกรณ์ระบบ<br>ดับเพลิงประจำทุก 6<br>เดือนตลอดระยะ<br>ดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง<br>ภายในพื้นที่โครงการให้พร้อมใช้งาน<br>อยู่เสมอ                                                                                                                                                                    | -                           | -             |
|                                            | 5. บันไดหนีไฟ และ<br>เส้นทางในการหนีไฟ                                                                                                                                | - ไม่มีสิ่งกีดขวาง |                                                                                            | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟ<br>และเส้นทางในการหนีไฟให้มีสิ่ง<br>กีดขวาง                                                                                                                                                                        | -                           | -             |
| 6. การจราจร                                | - ป้ายสัญญาณจราจร<br>ต่างๆ ในโครงการ                                                                                                                                  | - สภาพพร้อมใช้งาน  | - ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอด<br>ระยะดำเนินการ                                                  | - โครงการอยู่ระหว่างจัดเตรียมป้าย<br>สัญญาณจราจรบริเวณพื้นที่<br>โครงการ อย่างไรก็ตามโครงการมี<br>การทำเครื่องหมายช่องจราจร และ<br>เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบน<br>พื้นถนน เพื่อให้การเคลื่อนตัวของ<br>รถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-<br>ออกโครงการสามารถทำได้อย่าง<br>สะดวกและปลอดภัย | -                           | -             |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ดำเนินการ                                                                                                                        | ดัชนีตรวจวัด                                                            | ความถี่ในการตรวจสอบ                 | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                              | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย               | พื้นที่โครงการ<br>- กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุงซ่อมแซม เช่น การทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ | - ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณปรับปรุง/ซ่อมแซม<br>- ไม่มีสิ่งกีดขวาง  | - ตลอดระยะดำเนินการ                 | - โครงการจะดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนกรณีภายในโครงการมีการปรับปรุงซ่อมแซม                                            | -                           | -             |
| 8. การระบายน้ำ                             | - รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ                                                                                                    | - รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ                                    | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปาภายในพื้นที่โครงการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ | -                           | -             |
| 9. ระบบระบายอากาศ                          | - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู                                                                                          | - ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง                                             | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่บริเวณช่องระบายอากาศ                   | -                           | -             |
| 10. ทัศนียภาพและภูมิทัศน์                  | - การเจริญเติบโตของต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ                                                                                     | - การเติบโตของต้นไม้<br>- ความชุ่มชื้นของพื้นที่ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวอย่างสม่ำเสมอ                                                      | -                           | -             |

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ดำเนินการ                                                                                               | ดัชนีตรวจวัด                 | ความถี่ในการตรวจสอบ                     | รายละเอียดการดำเนินงาน                                                                                    | ปัญหาอุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 11. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์<br>พลังงาน   | - จัดให้เจ้าหน้าที่จด<br>บันทึกสถิติการใช้<br>ไฟฟ้าทุกเดือน<br>ประชาสัมพันธ์ให้กับ<br>ผู้พักอาศัยใน<br>โครงการ | - สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่บันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าของ<br>โครงการ                           | -                           | -             |
|                                            | - ตรวจสอบการทำงานของ<br>ระบบไฟฟ้า<br>อุปกรณ์ส่องสว่างและ<br>สายไฟฟ้า                                           | - สภาพการใช้งาน/ชำรุด        | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะดำเนินการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบการทำงานของ<br>ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ส่องสว่างและ<br>สายไฟฟ้า | -                           | -             |

### 3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง


#### 1. การดำเนินการ

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะดำเนินการ จำนวน 1 จุด ได้แก่ บ่อตรวคุณภาพน้ำ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เดือนละ 1 ครั้งมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, BOD, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, TKN, Sulfide, Grease & Oil และ Total Coliform Bacteria (TCB) มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งดังตารางที่ 3.2.1-1 สำหรับภาพการเก็บตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.2.1-1

ตารางที่ 3.2.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิวิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

| รายการตรวจวัด                   | วิธีเก็บตัวอย่าง | วิวิธีวิเคราะห์                                                                                | มาตรฐานวิวิธีวิเคราะห์                       |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - pH                            | Grab Sampling    | Eletrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B.)                                                   | APHA-AWWA-WEF 24 <sup>th</sup> Edition, 2023 |
| - BOD                           | Grab Sampling    | 5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)                                      |                                              |
| - Total Suspended Solids        | Grab Sampling    | Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)                                           |                                              |
| - Total Dissolved Solids        | Grab Sampling    | Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C                                                     |                                              |
| - Settleable Solids             | Grab Sampling    | Settleable Solids (2540 F.)                                                                    |                                              |
| - TKN                           | Grab Sampling    | Macro-Kjeldhl Method (4500-N <sub>org</sub> B.) & Titrimetric Method (4500-NH <sub>3</sub> C.) |                                              |
| - Sulfide                       | Grab Sampling    | Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> F.)                                                    |                                              |
| - Grease & Oil                  | Grab Sampling    | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)                                          |                                              |
| - Total Coliform Bacteria (TCB) | Grab Sampling    | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)                                                 |                                              |

มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในครั้งนี้ ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.)

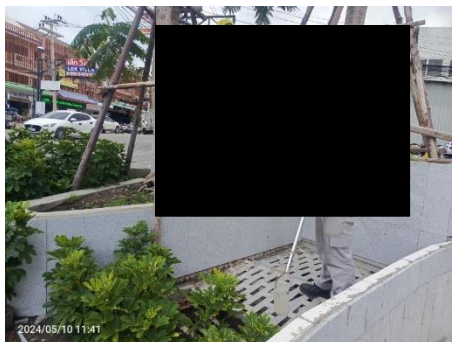

บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 3.2.1-1 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

## 2. ผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2.1-2 และไปรายงานผลการวิเคราะห์ในภาคผนวกที่ 4




## 3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.) พบว่า ดัชนีที่ทำการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น Total Suspended Solids และ Settleable Solids ในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567




| จุดเก็บตัวอย่าง     | วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | ผลการตรวจวิเคราะห์ |               |               |                                |                   |               |               |                        |                     |
|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|
|                     |                        | pH                 | TSS<br>(mg/L) | TDS<br>(mg/L) | Settleable<br>Solids<br>(mL/L) | Sulfide<br>(mg/L) | BOD<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Grease & Oil<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) |
| บ่อตรวจคุณภาพน้ำ    | 25 ม.ค. 67             | 6.84               | 5.9           | 384           | <0.1                           | <0.06             | 4             | 2.6           | <2                     | 3,300               |
|                     | 9 ก.พ. 67              | 6.24               | 6.2           | 264           | <0.1                           | <0.06             | 2             | 2.6           | <2                     | 2,200               |
|                     | 5 มี.ค. 67             | 7.39               | 14.0          | 348           | <0.1                           | <0.06             | 8             | 7.1           | <2                     | 24,000              |
|                     | 2 เม.ย. 67             | 6.91               | 7.8           | 340           | <0.1                           | <0.06             | 9             | 12            | <2                     | 3,300               |
|                     | 10 พ.ค. 67             | 7.58               | 53.5          | 220           | 0.6                            | 0.10              | 18            | 24            | 2                      | 7,900               |
|                     | 20 มิ.ย. 67            | 7.04               | 28.0          | 204           | 0.4                            | 0.37              | 15            | 34            | 6                      | >160,000            |
| ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด |                        | 6.24-7.58          | 5.9-28.0      | 204-384       | <0.1-0.6                       | <0.06-0.37        | 2-18          | 2.6-34        | <2-6                   | 2,200 ถึง >160,000  |
| ค่ามาตรฐาน          |                        | 5-9                | ไม่เกิน 30    | ไม่เกิน 500   | ไม่เกิน 0.5                    | ไม่เกิน 1.0       | ไม่เกิน 20    | ไม่เกิน 35    | ไม่เกิน 20             | -                   |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.)

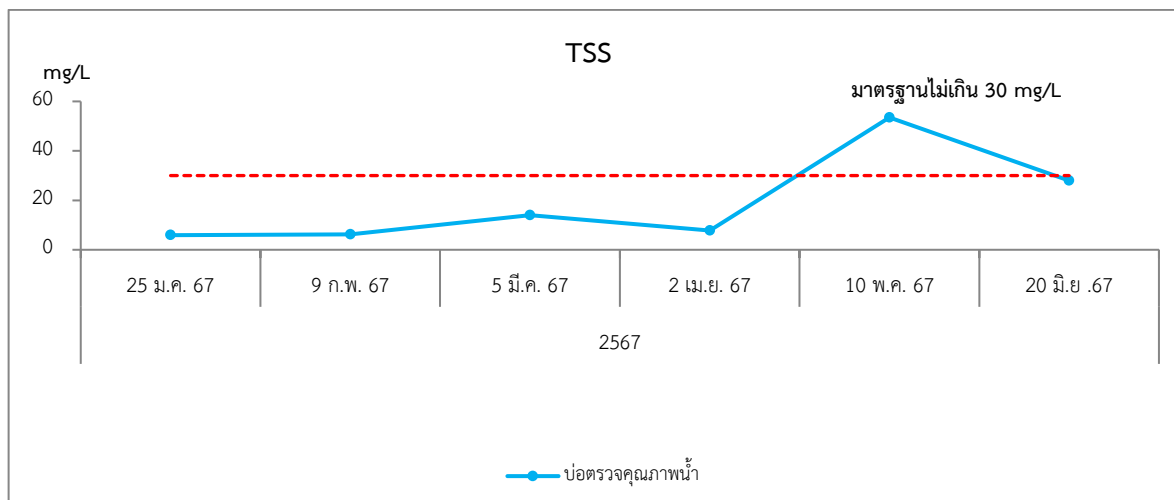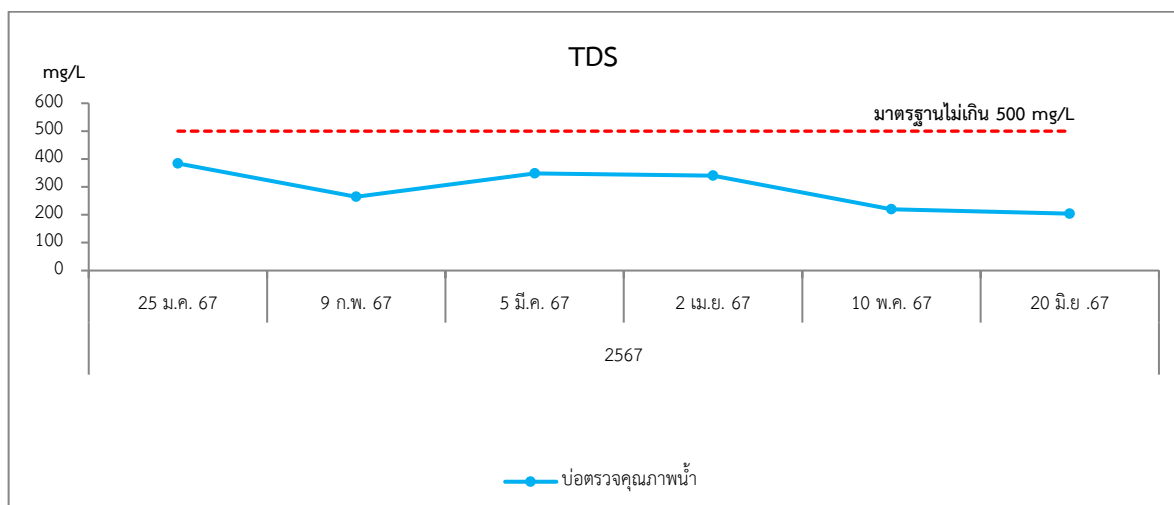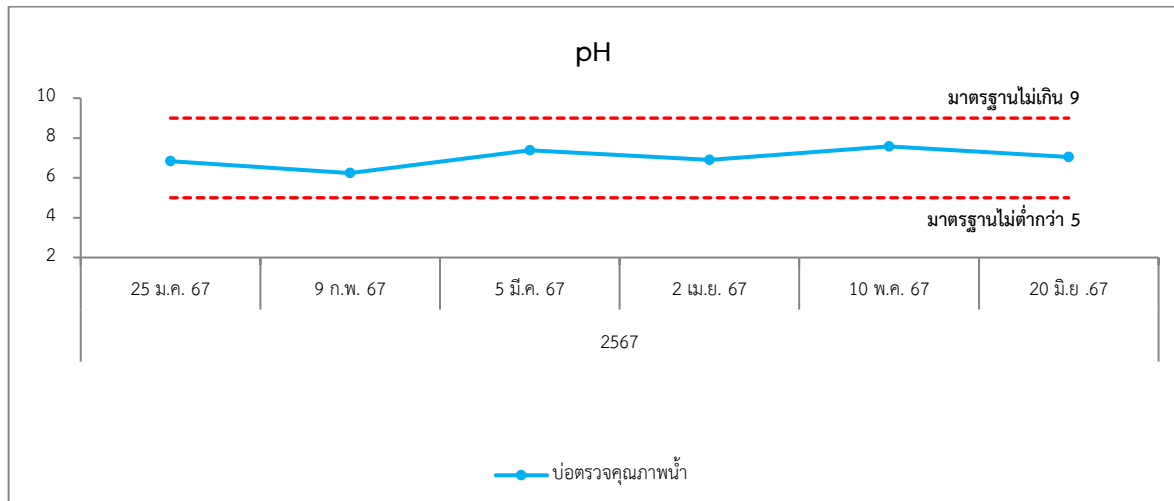




**มาตรฐาน :** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.)

รูปที่ 3.2.1-1 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

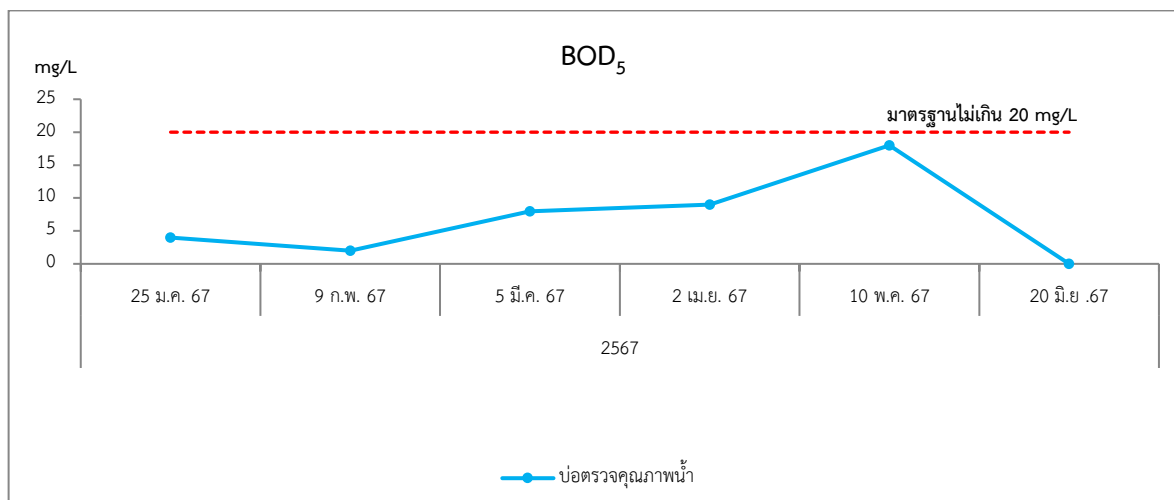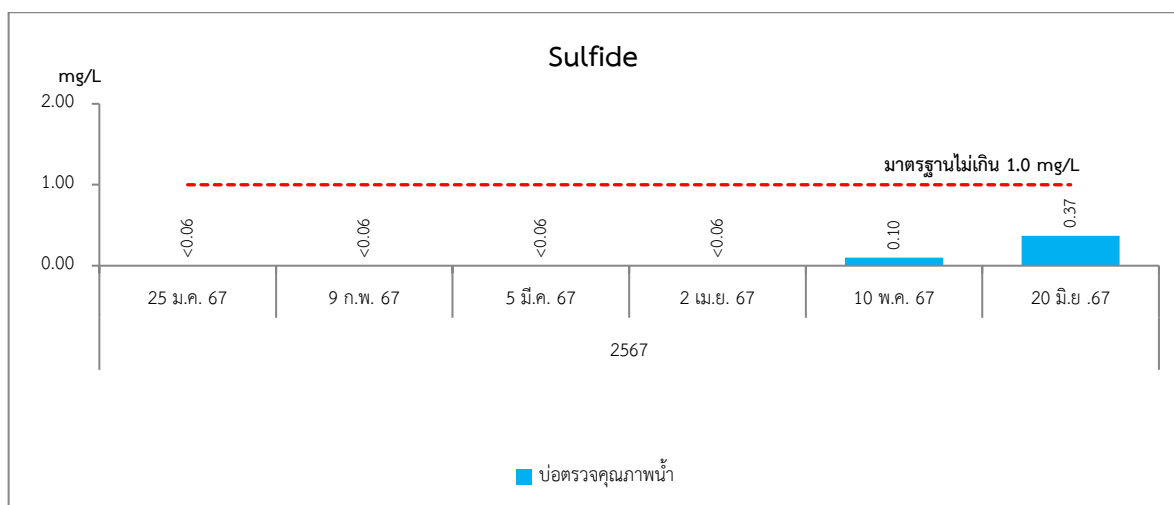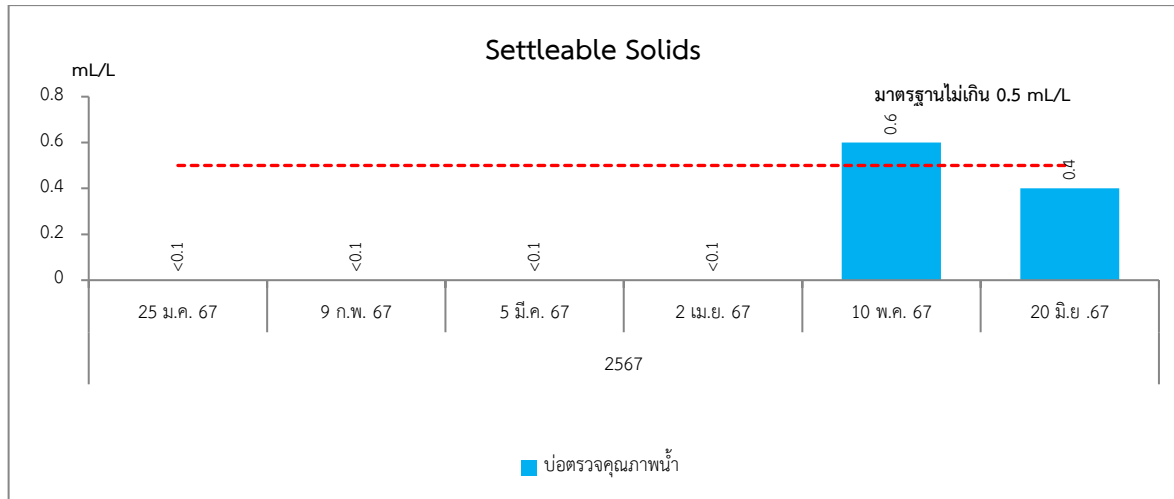

**มาตรฐาน :** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.)

รูปที่ 3.2.1-1 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

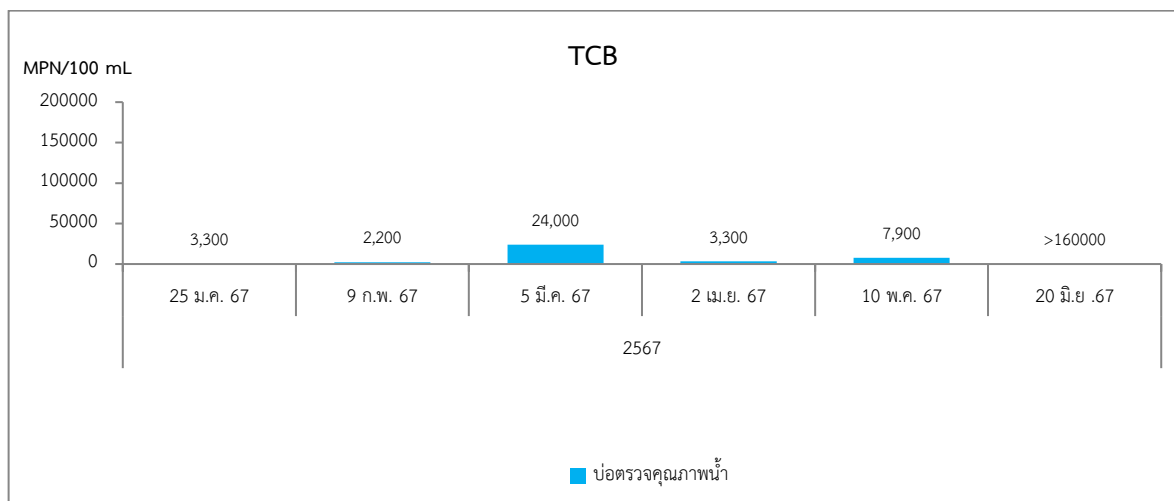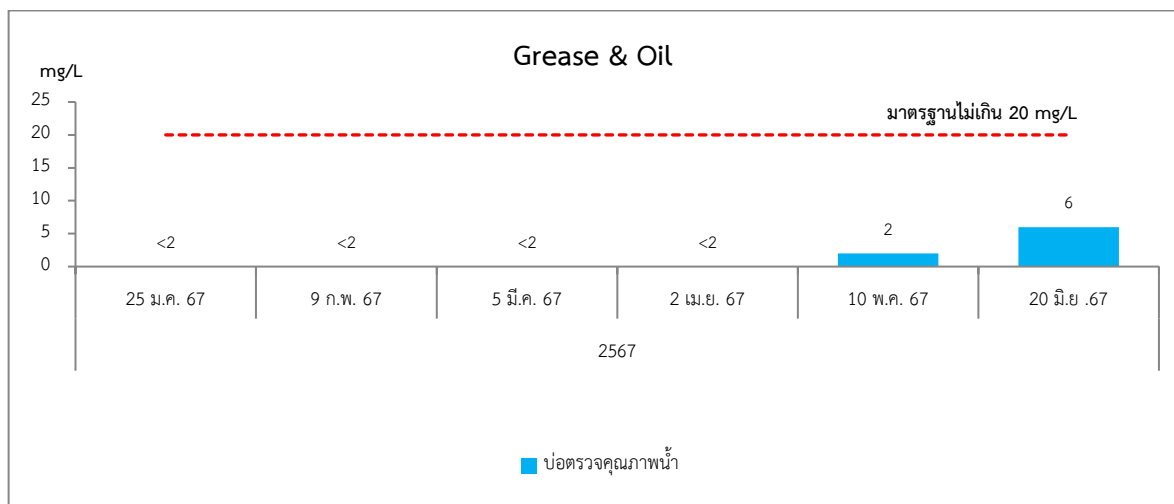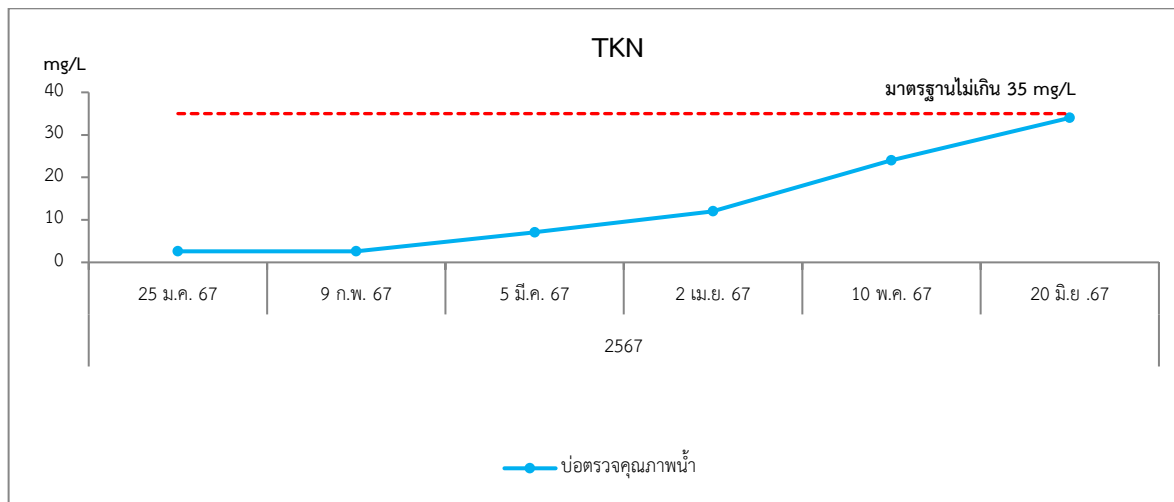

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.)

รูปที่ 3.2.1-1 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

## 3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ


### 1. การดำเนินการ

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำตื้น และบริเวณน้ำลึก มีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, Total Coliform Bacteria (TCB), Fecal Coliform Bacteria (FCB) และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa*) มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำดังตารางที่ 3.2.2-1 สำหรับภาพการเก็บตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.2.2-1


ตารางที่ 3.2.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

| รายการตรวจวัด                   | วิธีเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์                                  | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                         |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - pH                            | Grab Sampling    | Eletrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B.)   | APHA-AWWA-WEF 24 <sup>th</sup> Edition, 2023 |
| - Total Coliform Bacteria (TCB) | Grab Sampling    | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.) |                                              |
| - Fecal Coliform Bacteria (FCB) | Grab Sampling    | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F.) |                                              |
| - <i>Escherichia coli</i>       | Grab Sampling    | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F.) |                                              |
| - <i>Staphylococcus aureus</i>  | Grab Sampling    | Membrane Filter Technique (9213 B.)            |                                              |
| - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | Grab Sampling    | Membrane Filter Technique (9213 E.)            |                                              |

มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในครั้งนี้ ได้แก่ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

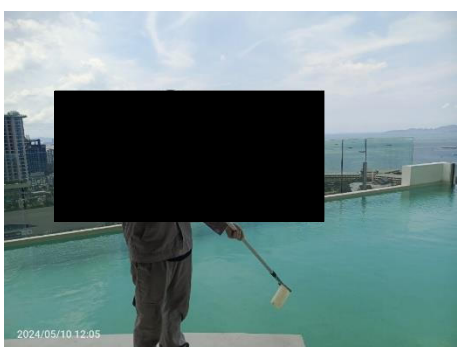

บริเวณน้ำตื้น

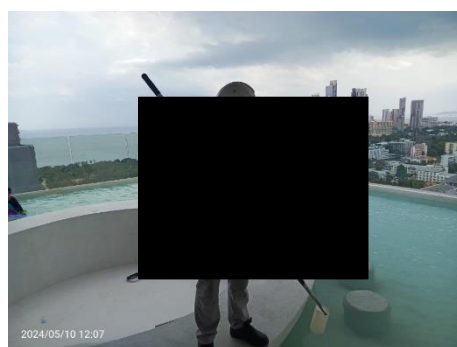

บริเวณน้ำลึก

ภาพที่ 3.2.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ

## 2. ผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำตื้น และบริเวณน้ำลึก ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2.2-2 และใบรายงานผลการวิเคราะห์ในภาคผนวกที่ 4



## 3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง บริเวณน้ำตื้น และบริเวณน้ำลึก ในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 3.2.2-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567

| จุดเก็บตัวอย่าง     | วันที่เก็บตัวอย่าง | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                     |                     |                                         |                                              |                                               |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     |                    | pH                 | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) | <i>Escherichia coli</i><br>(MPN/100 mL) | <i>Staphylococcus aureus</i><br>(per 100 mL) | <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br>(per 100 mL) |
| 1. บริเวณน้ำตื้น    | 2 เม.ย. 67         | 7.27               | <1.1                | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |
|                     | 10 พ.ค. 67         | 7.27               | <1.1                | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |
|                     | 20 มิ.ย. 67        | 6.97               | <1.1                | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |
| ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด |                    | 6.97-7.27          | <1.1                | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |
| 2. บริเวณน้ำลึก     | 2 เม.ย. 67         | 7.48               | <1.1                | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |
|                     | 10 พ.ค. 67         | 7.27               | <1.1                | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |
|                     | 20 มิ.ย. 67        | 6.86               | <1.1                | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |
| ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด |                    | 6.86-7.48          | <1.1                | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |
| ค่ามาตรฐาน          |                    | 7.2-8.4            | น้อยกว่า 10         | ตรวจไม่พบ           | ตรวจไม่พบ                               | ตรวจไม่พบ                                    | ตรวจไม่พบ                                     |



มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

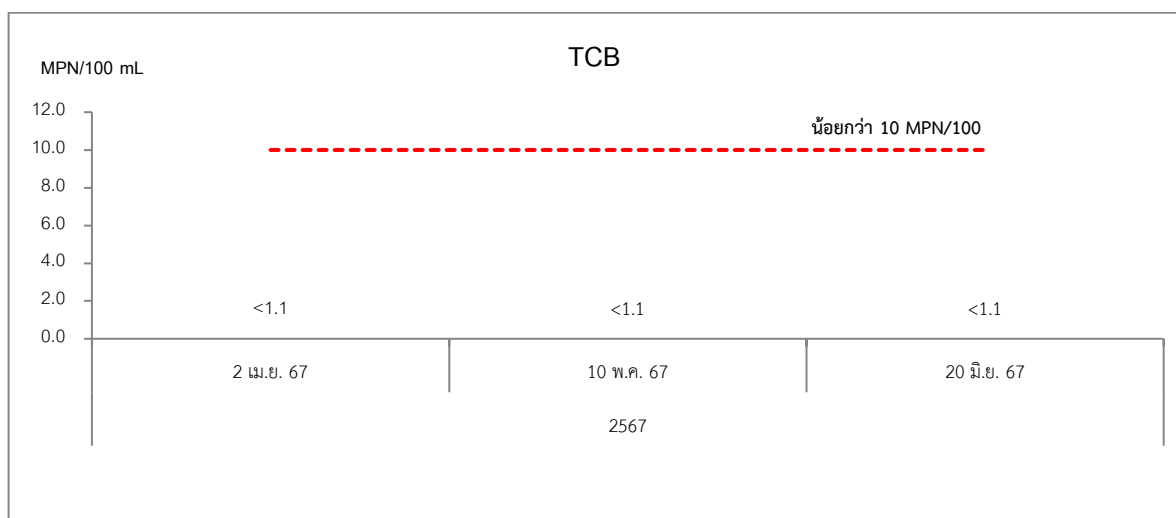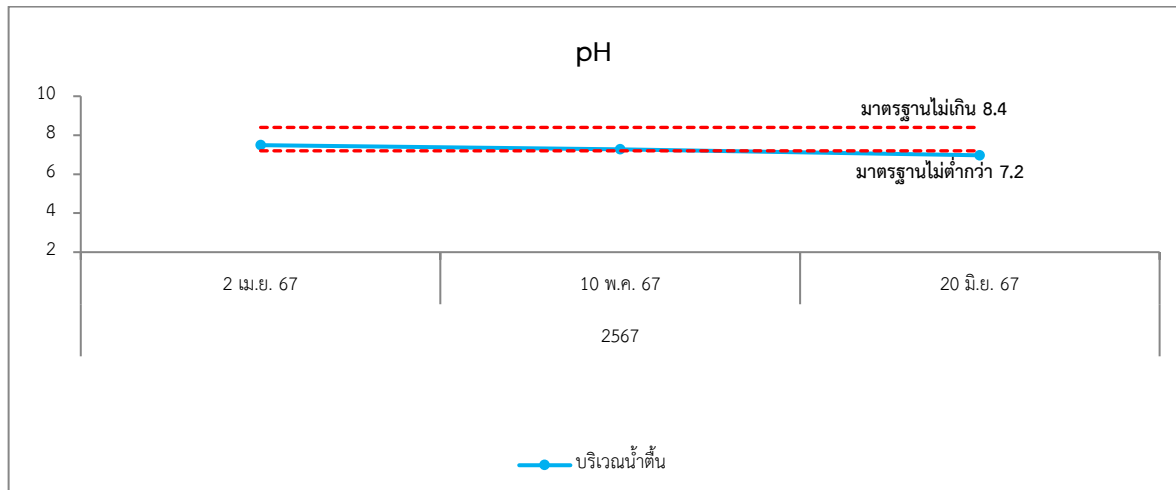

### บริเวณน้ำต้น

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

### รูปที่ 3.2.2-1 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

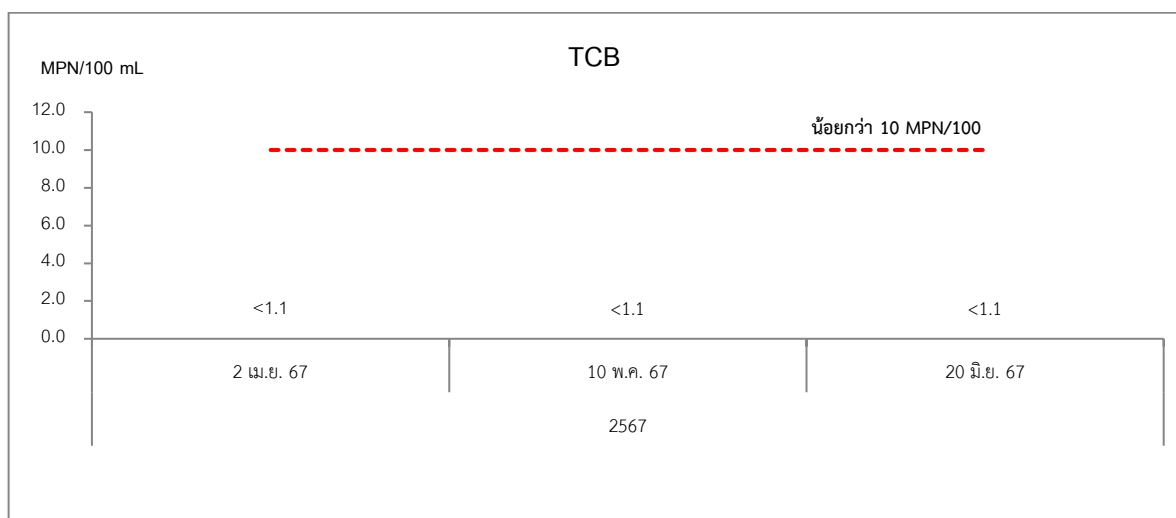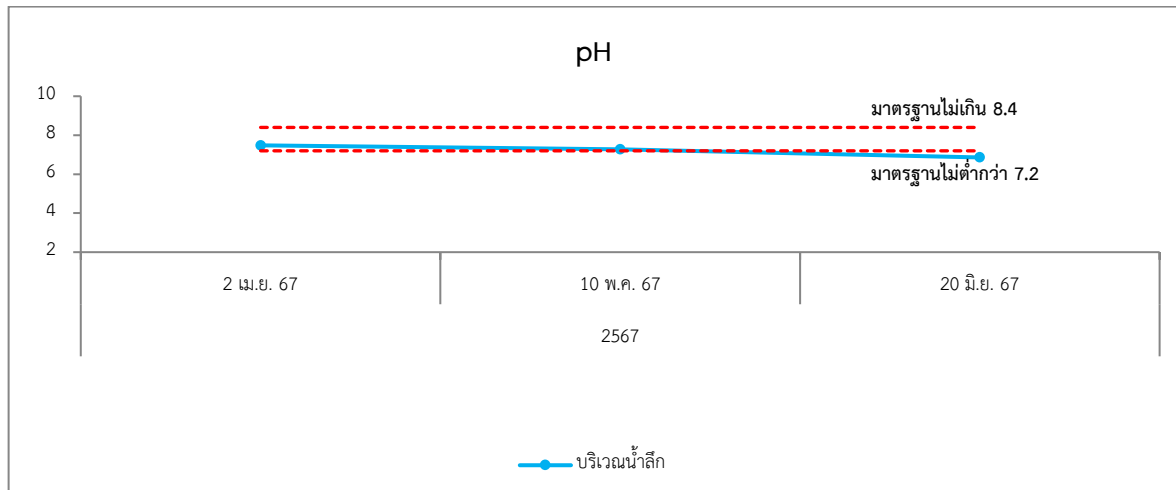

### บริเวณน้ำลึก

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

### รูปที่ 3.2.2-1 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
