

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1010.5/4244 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ
 - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
 - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
 - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

- 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ
- 2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1010.5/4244 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565
โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ทรัพยากรทางกายภาพ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป 1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วโครงการ ด้านที่ติดกับถนนพระรามที่ 4 และถนนสุรวงศ์ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 1) ชื่อโครงการ 2) เจ้าของโครงการ 3) ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 4) ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 7) สถาปนิกโครงการ 8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์	- บริเวณพื้นที่โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการโดยแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โดยสรุป ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) แผนงานการก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้างพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส. 1010.5/4244 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565) ตารางสรุปมาตรการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย	-	- ภาคผนวก 1ก หนังสือแจ้งการก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารตามมาตรการ 39 ทวิ - ภาคผนวก 2ก สำเนาหนังสือเห็นชอบโครงการ - ภาคผนวก 3ก สำเนาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ - ภาคผนวก 28ข สำเนากรมธรรม์ประกันภัย - รูปที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ) 9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส 1010.5/4244 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565) 11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 14) ผังรับเรื่องร้องเรียน 15) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน 16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก 18) ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น		ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหายผังรับเรื่องร้องเรียน ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ) 2. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็ม รวมถึงระบุช่วงเวลาที่เจาะเสาเข็มให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงและเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยแจ้งกำหนดแผนการก่อสร้างของโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์แจ้งให้ทางพื้นที่ติดโครงการและผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการรัศมี 100 เมตรทราบอีกด้วย	-	- รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้างเพื่อแจ้งแผนงานและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุมงานก่อสร้าง - ภาคผนวก 1 ข เอกสารแจ้งแผนการเจาะเสาเข็มต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. ติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน 2. ควบคุมและก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบ แปลนที่ได้ออกแบบไว้ 3. กำหนดเขตก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเข้า พื้นที่ก่อสร้างซึ่งอาจได้รับอันตรายได้ 4. จัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อมีการปรับระดับพื้นดินภายในโครงการสูงกว่า พื้นที่ภายนอกโครงการ เพื่อเป็นแนวกันดินพังทลาย จากโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการติดป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างภายใน โครงการอย่างชัดเจน - โครงการได้ควบคุมและก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุม การเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็น ช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคทาง โครงการไม่มีกิจกรรมการปรับระดับพื้นดิน อย่างไรก็ตามโครงการจะจัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อมีการปรับระดับพื้นดินภายใน โครงการสูงกว่าพื้นที่ภายนอกโครงการ เพื่อเป็นแนวกัน ดินพังทลายจากโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- - - -	- รูปที่ 1 ป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ - ภาคผนวก 2 ข แบบแปลนการ ก่อสร้างโครงการ - รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.2 การเกิดแผ่นดินไหว ออกแบบโครงสร้างอาคารโครงการให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว ซึ่งในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อดำเนินงานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศดังกล่าว	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศตามการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อดำเนินงานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ 1. ล้อมรั้วทึบชั่วคราวโดยใช้ Steel Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการล้อมรั้วทึบชั่วคราวโดยใช้ Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	- รูปที่ 3 รั้ว Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2. ติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบอาคาร โครงการตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง 3. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกัน การร่วงหล่นลงบนถนนสาธารณะ และป้องกันการ ฟุ้งกระจาย 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิด ฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากใน แต่ละวันที่ปริมาณฝุ่นมากซึ่งจะพิจารณาตามความ เหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไปเพื่อลดการฟุ้ง กระจายฝุ่นละออง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการดำเนินการติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟ ลาม) โดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 31 เพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการได้จัดให้มีการใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน สาธารณะ และป้องกันการฟุ้งกระจาย - โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือ บริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างความถี่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย ทั้งนี้ได้มีการ พิจารณาตามความเหมาะสม และตามสภาพหน้างานถ้า มีฝุ่นละอองมากขึ้น จะมีการปรับเพิ่มความถี่ในการ ฉีดพรมน้ำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- - -	- รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 5 รถบรรทุกปิด คลุมด้วยผ้าใบ - รูปที่ 6 การฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5. จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทรายเป็นที่ตกหล่น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที โดยต้องระวังไม่ให้เศษตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 6. จัดให้มีหัวสเปรย์ (Spray Nozzles) ติดตั้งอยู่ระหว่างตัวอาคารและ Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยติดตั้งที่ตำแหน่งของชั้นที่กำลังก่อสร้าง และขยับขึ้นไปตามการก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งรั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยกำหนดให้เปิดในช่วงเวลา 09.00, 11.00, 14.00 และ 16.00 น. โดยเปิดครั้งละ 10-15 นาที ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงขั้นตอนการติดตั้งกระจกภายนอกอาคาร (Curtain Wall) แล้วเสร็จ จึงจะหยุดพ่นสเปรย์ละอองน้ำดังกล่าว	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทรายเป็นที่ตกหล่น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที และไม่ให้เศษตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการจัดให้มีการติดตั้งหัวสเปรย์ (Spray Nozzles) รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยกำหนดให้เปิดในช่วงเวลา 09.00, 11.00, 14.00 และ 16.00 น. โดยเปิดครั้งละ 30 นาที เพื่อป้องกันฝุ่นจากการก่อสร้างกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- -	- รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ - รูปที่ 8 หัวสเปรย์ (Spray Nozzles)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 7. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดโดยการฉีดน้ำล้าง ล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากโครงการ	-	- รูปที่ 9 การทำ ความสะอาดล้อ รถบรรทุก
8. บริเวณทางเข้า-ออก ให้ปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจาก เศษหินดิน หวาย หรือฝุ่น ตกค้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการปิดทึบบริเวณทางเข้า-ออก ของพื้นที่ ก่อสร้างตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหินดิน หวาย หรือฝุ่น	-	- รูปที่ 10 การปิดทึบ ทางเข้า-ออกของ พื้นที่ ก่อ ส รั ้าง โครงการ
9. กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างในเขตพื้นที่ชุมชน ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ ชม.	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีการกำชับพนักงานขับรถผ่านกิจกรรม Safety Talk ให้ควบคุมความเร็วของยานพาหนะ ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ในเขตพื้นที่ชุมชน และมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะไว้ บริเวณโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคหน้าพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	-	- รูปที่ 45 Safety Talk - รูปที่ 11 ป้ายจำกัด ควา ม เร็ว ข อง ยานพาหนะ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 10. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองวัสดุ เท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วจะปิดหน้าดินด้วย คอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ ทันทีที่ไม่มีจำเป็นต้องทำงาน ที่ผิวพื้น 11. ในการกองเศษวัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่โครงการ ให้ปิดหรือ คลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 12. เศษวัสดุที่เหลือใช้จะไม่มีการกองหรือเก็บไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 13. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือ กึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองวัสดุชั่วคราว ที่ปิดคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดเพื่อรอให้รถบรรทุก มารับไปกำจัดต่อไป - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองวัสดุชั่วคราว ที่ปิดคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดเพื่อรอให้รถบรรทุก มารับไปกำจัดต่อไป - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองวัสดุชั่วคราว ที่ปิดคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดเพื่อรอให้รถบรรทุก มารับไปกำจัดต่อไป - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ซึ่ง ไม่มีการหล่อคอนกรีตภายในพื้นที่โครงการ โดยทาง โครงการได้มีการจัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็น ระบบสำเร็จรูป เช่น มีการใช้คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ในการก่อสร้าง	- - - -	- รูปที่ 12 พื้นที่สำหรับ กองวัสดุชั่วคราว - รูปที่ 12 พื้นที่สำหรับ กองวัสดุชั่วคราว - รูปที่ 12 พื้นที่สำหรับ กองวัสดุชั่วคราว - รูปที่ 14 คอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 14. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ดิน และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลด การเกิดมลพิษ 15. ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ปฏิบัติงาน 16. ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ กรณีที่พบว่าสภาพเสื่อมลง ต้องเปลี่ยนใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานดั้งเดิม	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดิน และอื่นๆ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ - โครงการไม่มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ ไม่ปฏิบัติงาน - โครงการจัดให้มีการดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- - -	- ภาคผนวก 3 ข เอกสารตรวจสอบ เครื่องยนต์ของรถ ที่ใช้ในการขนส่ง วัสดุก่อสร้าง ดิน และอื่น ๆ - - ภาคผนวก 4 ข เอกสารตรวจสอบ เครื่องจักรกลที่ ใช้ในการก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 17. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้สามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกเดือน 18. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วง เสาเข็มและฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงาน ก่อสร้างอื่น เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้างตามรอบการตรวจสอบของเครื่องจักรให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกเดือน - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการ อยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โดยโครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถ มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- -	- ภาคผนวก 4 ข เอกสารตรวจสอบ เครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้าง - รูปที่ 13 ป้าย ประชาสัมพันธ์ แสดงผลการ ตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 19. ติดตามรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในแต่ละวัน หาก พบว่า มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่โครงการเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทันที ได้แก่ งานเสาเข็มงานฐานราก งานที่ใช้เครื่องจักรและ ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และงานตัด เเจาะ เจียรนัย ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จนกว่าค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกิน ค่ามาตรฐานจึงจะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวต่อไป และ ในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือใดๆ โครงการ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการติดตามรายงานคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในแต่ละวัน หากพบว่า มีค่าความ เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่โครงการเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดฝุ่น ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทันที จนกว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกินค่ามาตรฐานจึงจะ ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวต่อไป และหาก หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือใดๆ โครงการ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศิลปเจียร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1) บริเวณทางเข้า-ออก ให้ปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจาก เศษหินดิน หวายหรือฝุ่น ตกค้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ 2) จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือ กึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อย ที่สุด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการปิดทึบบริเวณทางเข้า-ออก ของพื้นที่ ก่อสร้างตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหินดิน หวาย หรือฝุ่น - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ซึ่งไม่มีการหล่อคอนกรีตภายในพื้นที่โครงการ โดย ทางโครงการได้มีการจัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็น ระบบสำเร็จรูป เช่น มีการใช้คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ในการก่อสร้าง	- -	- รูปที่ 10 การปิดทึบ ทางเข้า-ออกของพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ -
มาตรการด้านการจัดการของเสีย 1) จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน หวาย ที่ตกหล่นบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษ ดินเปือกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และ กวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที โดยต้องระวังไม่ให้เศษ ตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) เศษวัสดุที่เหลือใช้จะไม่มีการกองหรือเก็บไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน หวาย ที่ตก หล่น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปือกตกหล่นจะทำความสะอาดโดย ใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที และไม่ ให้เศษตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองวัสดุชั่วคราว ที่ปิดคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดเพื่อรอให้รถบรรทุก มารับไปกำจัดต่อไป	- -	- รูปที่ 7 พนักงานทำ ความสะอาดบริเวณ พื้นที่โครงการ - รูปที่ 12 พื้นที่สำหรับ กองวัสดุชั่วคราว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน 1) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิด ฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตาม ความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไปเพื่อลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ความถี่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาตามความเหมาะสม และ ตามสภาพหน้างาน ถ้ามีฝุ่นละอองมากขึ้นจะมีการ ปรับเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำเพื่อลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 6 การฉีด พรมน้ำบริเวณ พื้นที่ ก่อ ส ราง โครงการ
มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง 1) จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่ง สำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็น ช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ซึ่งไม่มี การหล่อคอนกรีตภายในพื้นที่โครงการ โดยทาง โครงการได้มีการจัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบ สำเร็จรูป เช่น มีการใช้คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ในการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง (ต่อ) 2) ติดตามรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในแต่ละวัน หากพบว่า มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่โครงการเกินกว่าค่า มาตรฐานจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจทำให้เกิด ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทันที ได้แก่ งานเสาเข็มงานฐานราก งานที่ใช้เครื่องจักรและ ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและงานตัด เเจาะ เจียรนัย ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จนกว่าค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกินค่า มาตรฐานจึงจะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวต่อไป และ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือใดๆ โครงการ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการติดตามรายงานคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในแต่ละวัน หากพบว่า มีค่าความ เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่โครงการเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทันที จนกว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกินค่ามาตรฐานจึงจะดำเนินการ กิจกรรมดังกล่าวต่อไป และหากหน่วยงานของรัฐ ขอความร่วมมือใดๆ โครงการจะปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน 1) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ 2) กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตพื้นที่ชุมชน ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 3) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดินและอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากโครงการ - โครงการจัดให้มีการกำกับพนักงานขับรถผ่านกิจกรรม Safety Talk ให้ควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ในเขตพื้นที่ชุมชนและมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะไว้บริเวณโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดินและอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	- - -	- รูปที่ 9 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก - รูปที่ 45 Safety Talk - รูปที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะ - ภาคผนวก 3ข เอกสารตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างดิน และอื่น ๆ

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน 4) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไปเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 5) จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ติดตั้งอยู่ระหว่างตัวอาคารและ Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยติดตั้งที่ตำแหน่งของชั้นที่กำลังก่อสร้าง และขยับขึ้นไปตามการก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นสูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งหัวชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างความถี่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งในช่วงเช้าและบ่าย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาตามความเหมาะสมและตามสภาพหน้างาน ถ้ามีฝุ่นละอองมากขึ้นจะมีการปรับเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการจัดให้มีการติดตั้งหัวสเปรย์ (Spray Nozzles) ที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยกำหนดให้เปิดในช่วงเวลา 09.00, 11.00, 14.00 และ 16.00 น. โดยเปิดครั้งละ 30 นาที เพื่อป้องกันฝุ่นจากการก่อสร้างกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	-	- รูปที่ 6 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - รูปที่ 8 หัวสเปรย์ (Spray Nozzles)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง 1) จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงในชั้นตอมก่อสร้างแต่ละช่วง ดังนี้ - ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างทุกด้านของโครงการ (ติดตั้งไว้ที่แนวรั้วของโครงการ) โดยใช้ Steel Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ขนาดความสูง 6 เมตร สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 dB(A)	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างทุกด้านของโครงการโดยใช้ Steel Sheet โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค	-	- รูปที่ 3 รั้ว Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศิลปะ จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) - ช่วงงานโครงสร้างอาคารและงานระบบสาธารณูปโภค (เดือนที่ 12-14) ในช่วงขึ้นงานโครงสร้าง บริเวณรั้วโครงการ ติดตั้งกำแพงกันเสียง ได้แก่ Steel Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 6.0 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A) และเมื่อขึ้นโครงสร้างจัดให้มีผนังกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ • ด้านทิศเหนือ เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 32 ติดตั้งผนังกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย Steel Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 0.50 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A)		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร และสาธารณูปโภค โดยจัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคาร และสาธารณูปโภคทางโครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh Sheet แบบกันเสียงได้และมีการติดตั้งผนังคอนกรีต ซึ่งสามารถลดเสียงได้	-	- รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 14 คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) - ด้านทิศตะวันออก เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 2 ถึงระดับชั้นที่ 32 ติดตั้งผนังกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย Steel Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิกรัม (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 0.50 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A) - ด้านทิศตะวันตก เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 32 ติดตั้งผนังกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย Steel Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 1.00 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A)		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh Sheet แบบกันเสียงได้และมีการติดตั้งผนังคอนกรีต ซึ่งสามารถลดเสียงได้ - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh Sheet แบบกันเสียงได้และมีการติดตั้งผนังคอนกรีต ซึ่งสามารถลดเสียงได้	-	- รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 14 คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concerte) - รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 14 คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concerte)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) - ช่วงงานโครงสร้างอาคารและงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่ง (เดือนที่ 15-32) ในช่วงนี้ บริเวณชั้นที่มี การก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่ผนังอาคารเรียบร้อยแล้ว งานที่ เกิดขึ้นจะเริ่มเป็นการตกแต่ง จึงจัดพื้นที่เฉพาะในการทำ กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมี ผนังอาคารเป็นผนังกันเสียงปิดกันเสียงทุกทิศทาง สามารถ ลดเสียงเมื่อผนังกันเสียงได้ 36 dB(A) สำหรับตำแหน่ง ของผนังอาคารที่มีช่องเปิดจะจัดให้มีผนังกันเสียงแบบ เคลื่อนย้ายได้ ได้แก่		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh Sheet แบบกัน เสียงได้และมีการติดตั้งผนังคอนกรีต ซึ่งสามารถลด เสียงได้ และเมื่อขึ้นช่วงงานตกแต่งทางโครงการจะจัด พื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง โดยจะจัดให้มีผนังอาคารเป็นผนังกันเสียงที่ปิดกัน เสียงทุกทิศทาง	-	- รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 14 คอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concerte)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) - ด้านทิศเหนือ เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 2 ถึงระดับชั้นที่ 32 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ได้แก่ Steel Sheet ความหนา ไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 1.00 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A) - ด้านทิศตะวันออก เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 32 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ได้แก่ Steel Sheet ความหนา ไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 0.50 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A)		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh Sheet แบบกันเสียงได้และมีการติดตั้งผนังคอนกรีต ซึ่งสามารถลดเสียงได้ - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh Sheet แบบกันเสียงได้และมีการติดตั้งผนังคอนกรีต ซึ่งสามารถลดเสียงได้	- -	- รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 14 คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concerte) - รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 14 คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concerte)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) - ด้านทิศตะวันตก เมื่อขึ้นโครงสร้างชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 32 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ได้แก่ Steel Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ความสูง 2.0 เมตร ห่างจากตัวอาคาร 0.50 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 18 dB(A) ทั้งนี้ให้ติดตั้งไว้จนกว่าจะทำผนังล้อมรอบชั้นนั้น ๆ แล้วเสร็จแล้วจึงนำออกได้ - ช่วงงานตกแต่งฯ จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารแล้ว ซึ่งผนังอาคารคอนกรีต (Light Concrete) จะเสมือนเป็นผนังกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่งสามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 36 เดซิเบล (เอ)		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคทางโครงการจัดให้มีการติดตั้ง Mesh Sheet แบบกันเสียงได้และมีการติดตั้งผนังคอนกรีต ซึ่งสามารถลดเสียงได้ - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคซึ่งทางโครงการได้มีการติดตั้งผนังคอนกรีต	- -	- รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) - รูปที่ 14 คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concerte) -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) 2) ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณใกล้เคียงกัน 3) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างพัก 4) ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง 5) จัดให้มีห้องเก็บเสียงในการตัด การเจียรกระเบื้องและวัสดุต่าง ๆ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการพิจารณาใช้เครื่องจักรเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อลดระดับเสียงและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างพัก - โครงการจัดให้ผู้รับเหมา มีการกำชับคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง - โครงการจัดให้มี ห้องเก็บเสียงในการตัด การเจียรกระเบื้อง และวัสดุต่าง ๆ ตามมาตรการกำหนด	- - - -	- - - - รูปที่ 15 ห้องเก็บเสียงในการตัด การเจียรกระเบื้อง และวัสดุต่างๆ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) 6) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. และหยุดก่อสร้างในวัน อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ ต่อเนื่อง และเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทคอนกรีต เป็นต้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/ สัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. และกิจกรรมที่ ก่อสร้างเกินเวลาจะไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงและความ สั่นสะเทือน ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และต้องได้รับอนุญาต จากหน่วยงานอนุญาต (สำนักงานเขตบางรัก) โดยยื่น ขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และหยุด ก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการมีกิจกรรมการก่อสร้าง หลังช่วงเวลา 17.00 น. แต่ไม่เกิน 20.00 น. โดยมีการแจ้งต่อ ผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน และ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตบางรัก	-	- ภาคผนวก 29 ข เอกสารแจ้งผู้พัก อาศัยข้างเคียงใน การก่อสร้างหลัง ช่วงเวลา 17.00 น.

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) 7) จัดให้มีที่จอดรถขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และอยู่ห่างจากพื้นที่ข้างเคียง เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 8) ในการขนถ่ายดินและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเข้าสู่หรือออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด 9) ผู้รับเหมาต้องกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ควบคุมความเร็วในการขับขี่ในเขตพื้นที่ชุมชนไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง - โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมในการขนถ่ายดินและวัสดุอุปกรณ์ที่เข้าหรือออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการกำชับพนักงานขับรถผ่านกิจกรรม Safety Talk ให้ควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ในเขตพื้นที่ชุมชน และมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะไว้บริเวณโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- - -	- รูปที่ 16 พื้นที่จอดรถ - - รูปที่ 45 Safety Talk

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.4 เสียง (ต่อ) 10) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วงเสาเข็มและฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- ภายใน พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โดยโครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	-	- รูปที่ 13 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
11) มาตรการฯ สำหรับโรงแรม เดอะ รอยา สุรวงศ์-กรุงเทพ - โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมา วางแผนในการกำหนดตำแหน่งที่จอดรถปั๊มคอนกรีต ให้อยู่ห่างจากพื้นที่โรงแรม เดอะ รอยา สุรวงศ์-กรุงเทพ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	- ภายใน พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถปั๊มคอนกรีตในพื้นที่โครงการและมีการเข้าพื้นที่จอดรถบริเวณวัดหัวลำโพง	-	- รูปที่ 16 พื้นที่จอดรถ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน 1) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วง เวลา 08.00-18.00 น. และหยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) เช่น การ เทคอนกรีต เป็นต้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. และกิจกรรมที่ก่อสร้างเกิน เวลาจะไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานอนุญาต (สำนักงานเขตบางรัก) โดยยื่นขอ อนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และ หยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการมีกิจกรรมการก่อสร้าง หลังช่วงเวลา 17.00 น. แต่ไม่เกิน 20.00 น. โดยมีการแจ้งต่อ ผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน และได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตบางรัก	-	- ภาคผนวก 29 ข เอกสารแจ้งผู้พัก อาศัยข้างเคียงใน การก่อสร้างหลัง ช่วงเวลา 17.00 น.

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 2) จัดให้มีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	- ภาคผนวก 21 ข เอกสารแต่งตั้งวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้าง
3) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	-	-
4) ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็ม รวมถึงระบุช่วงเวลาที่เจาะเสาเข็มให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงและเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็ม รวมถึงระบุช่วงเวลาที่เจาะเสาเข็มให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้างเพื่อแจ้งแผนงานและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุมงานก่อสร้าง - ภาคผนวก 1 ข เอกสาร แจ้งแผนการเจาะเสาเข็มต่อผู้พักอาศัยที่อยู่พื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้าน สังคมศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ของโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงระยะก่อสร้างจนกว่าจะถึงระยะเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้หลากหลาย เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือสื่อ ทางสังคมต่างๆ ได้แก่ ตั้งกลุ่มไลน์ เปิดช่องรับเรื่อง ร้องเรียนใน Facebook ของบริษัท เป็นต้น		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำที่ มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ของโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงระยะก่อสร้างจนกว่าจะถึงระยะ เปิดดำเนินการ ซึ่งทางโครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ ลงชุมชนรับเรื่องร้องเรียนเป็นประจำทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ หลากหลายและจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสาร จัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชน สัมพันธ์ - ภาคผนวก 27 ข เอกสาร Organize Chart - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์ม รับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติ การกรณีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกัน ภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล ภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 6) สำรวจ/ถ่ายรูปสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อน ก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงที่ติดโครงการ โดยรอบ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ ค่าซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว ในกรณีที่ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปถ่ายรูปสภาพ ของอาคารที่อยู่ติดกับโครงการก่อนจะมีการก่อสร้างหาก เจ้าของอาคารไม่ประสงค์จะให้เข้าไปถ่ายรูปเป็นหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแจ้งให้เจ้าของ โครงการทราบต่อไป	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการสำรวจ/ถ่ายรูปสภาพรั้ว กำแพง บ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพัก อาศัย/อาคารข้างเคียงที่ติดโครงการโดยรอบ ก่อนและหลังการก่อสร้างไว้เป็นหลักฐานเพื่อ รับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว	-	- ภาคผนวก 22 ข เอกสารในการ สำรวจสภาพรั้ว กำแพงบ้านและ ตัวอาคารก่อน ก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 7) เจ้าของโครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 8) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานผ่านกิจกรรม Safety Talk โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 45 Safety Talk
			-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 9) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยออกแบบจัดระยะ เครื่องจักรเครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือน ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 10) โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้ บริเวณ ด้านหน้าโครงการในที่ที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงสามารถ มองเห็นได้ง่าย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีการวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักรเครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชน ให้มากที่สุด - โครงการจัดให้มีรายละเอียดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการในที่ที่ผู้พักอาศัย ข้างเคียงสามารถมองเห็นได้ง่าย	- -	- - รูปที่ 17 ป้ายรายละเอียด มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 11) ติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงที่ติดพื้นที่โครงการโดยรอบ หากมีความเสียหายจากการทำเสาเข็มและการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยการตรวจรับงานการซ่อมแซมจะต้องมีตัวแทนของเจ้าของโครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงที่ติดพื้นที่โครงการโดยรอบ หากมีความเสียหายจากการทำเสาเข็มและการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียงประจำสัปดาห์ (มวลชนสัมพันธ์) - ภาคผนวก 6ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบต่อตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 12) จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน วิศวกรรม เมื่อมีการแจ้งเหตุจากผู้ได้รับความเสียหาย และพิสูจน์ได้ว่ามีผลกระทบมาจากโครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรในการ ประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง โครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคาร ที่แตกร้าวทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ มาตรฐานวิศวกรรม ซึ่งระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรม การก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้ง เจ้าหน้าที่มวลชน สัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณี มีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความ รับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 13) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ในช่วงเสาเข็มและฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน 14) กำหนดแผนปฏิบัติการในกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชนในเรื่องความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเจาะเสาเข็มของโครงการให้เป็นแบบระบบประกันภัย ดังนี้	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โดยโครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	-	- รูปที่ 13 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) - กำหนดให้ผู้รับเหมาหลักจัดทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการรื้อถอน และก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องมีวงเงินเอาประกันภัยต่อครั้งไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งไปสิ้นสุดถึงวันที่เปิดใช้อาคาร ในกรณีที่เกิดความเสียหายให้โครงการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลของปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด		- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาหลักจัดทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการรื้อถอน และก่อสร้างอาคารโดยจะต้องมีวงเงินเอาประกันภัยต่อครั้งไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งไปสิ้นสุดถึงวันที่เปิดใช้อาคาร ในกรณีที่เกิดความเสียหายให้โครงการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลของปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) - ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยระบุชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาก่อสร้างชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน ชื่อหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ โดยในเอกสารจะระบุชื่อผู้รับเรื่องซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และกำหนดเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน โดยสามารถดำเนินเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนดังกล่าวตามแผนรับข้อร้องเรียน		- โครงการจัดให้มีป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยระบุชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาก่อสร้างชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน ชื่อหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหาย และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ		- ภาคผนวก 9 หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก - รูปที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - รูปที่ 18 กล้องรับเสียงร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 15) ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ โดยแสดงเวลาที่เริ่มงานจนกระทั่งสิ้นสุดงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไว้ที่ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถมองเห็นและรับทราบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ และหากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่มีการประเมินไว้ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับที่ประเมินไว้ต่อไป	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีประกาศระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ โดยแสดงเวลาที่เริ่มงานจนกระทั่งสิ้นสุดงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้ที่ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถมองเห็นและรับทราบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ และในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด	-	- ภา ค ผนวก 15 ข แผนงานการก่อสร้างโครงการ - รูปที่ 19 ป้ายประกาศ ระยะเวลาในการ ก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 16) โครงการจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนของ บ้าน/อาคารข้างเคียง และผู้แทนโครงการในการประสาน การแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการต่อบ้าน/อาคาร ข้างเคียง ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกัน ได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากดำเนินการดังกล่าว มีค่าใช้จ่าย เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ โดยโครงการ มีแผนจะทำการจัดตั้งคณะกรรมการหากพบข้อ ร้องเรียน	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้ง เจ้าหน้าที่มวชน สัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณี มีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัย ความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 17) ดำเนินการชี้แจงบ้าน/อาคารข้างเคียงโดยรอบในระยะ ก่อสร้างช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก เพื่อชี้แจงค่า ความสั่นสะเทือนให้บ้าน/อาคารข้างเคียงได้รับทราบ และ กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนทุกวันช่วงทำ เสาเข็มและฐานราก โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่ทำการเจาะเสาเข็ม หากมีการเจาะ เสาเข็มที่ใกล้บ้านข้างเคียง ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่แนวรั้ว ด้านบ้าน/อาคารพักอาศัยที่ใกล้กับเสาเข็มโดยต้องรายงานผล ทุกสัปดาห์ สำหรับรายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จะติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ บริเวณ ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยโดยรอบสามารถ มองเห็น และรับทราบถึงผลกระทบแรงสั่นสะเทือนของ โครงการได้ และหากผลการตรวจวัดมีค่าเกินไปจากที่มีการ ประเมินไว้ โครงการจะหยุดการทำงานที่เกิดความสั่นสะเทือน เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาโดยทันที		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการชี้แจงบ้านหรืออาคาร ข้างเคียงโดยรอบในระยะก่อสร้างเพื่อชี้แจงค่าความ สั่นสะเทือนให้บ้านหรืออาคารข้างเคียงได้รับทราบ และปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและ สาธารณูปโภค โดยโครงการจัดให้มีป้าย ประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด	-	- รูปที่ 13 ป้ายประชา สัมพันธ์แสดงผลการ ตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม - รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่ เข้าพบบ้านข้างเคียง ประจำสัปดาห์ (มวลชนสัมพันธ์)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 18) จัดให้มีเงินสำรองเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้นก่อนการเคลมประกัน จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายให้ในเบื้องต้น ร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประกันภัยประเมินไว้ โดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยก่อน และโครงการจะเร่งติดตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยให้ต่อไป ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกับโครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีเงินสำรองเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้นก่อนการเคลมประกัน จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะสำรองจ่ายค่าเสียหายให้ในเบื้องต้น ร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประกันภัยประเมินไว้ โดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยก่อน และโครงการจะเร่งติดตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยให้ต่อไป ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกับโครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน 1) การขุดดินเพื่อวางฐานรากและการก่อสร้างงานระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ โครงการจะติดตั้งกำแพงพิงเหล็กชั่วคราว (Sheet Pile) ป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน 2) จัดให้มีระบบค้ำยัน และระบบป้องกันดินพังด้วย Sheet Pile โดยรอบบริเวณก่อสร้างอาคารเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้างโดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการได้ดำเนินการวางฐานรากและก่อสร้างงานระบบที่ฝังอยู่ใต้ดินเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งระบบค้ำยันและระบบป้องกันดินพังด้วย Sheet Pile ตามมาตรการกำหนด - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการจัดให้มีระบบค้ำยัน และระบบป้องกันดินพังด้วย Sheet Pile โดยรอบบริเวณก่อสร้างอาคาร ตามมาตรการกำหนด	- -	- -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน 3) กำหนดให้ผู้รับเหมาหลักจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการรื้อถอน และก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องมีวงเงินเอาประกันภัยต่อครั้งไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งไปสิ้นสุดถึงวันที่เปิดใช้อาคาร ในกรณีที่เกิดความเสียหายให้โครงการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติของปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด		- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาหลักจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการรื้อถอน และก่อสร้างอาคารโดยจะต้องมีวงเงินเอาประกันภัยต่อครั้งไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งไปสิ้นสุดถึงวันที่เปิดใช้อาคาร ในกรณีที่เกิดความเสียหายให้โครงการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติของปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	-	- ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ) 4) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 5) ปริมาณดินขุดที่เหลือ โครงการจะดำเนินการจัดส่งไปยัง พื้นที่ที่โครงการฯ กำหนดไว้ 6) จัดให้มีการเก็บกองดินภายในโครงการในบริเวณที่ เหมาะสมและไม่กีดขวางทางเข้า-ออก ของรถที่จะ เข้า-ออกโครงการ 7) การกองดินในพื้นที่โครงการ ต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บ ในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างหรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม		- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพ ของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดส่งปริมาณดิน ที่ขุดเหลือ ในพื้นที่ที่อนุญาตให้ทิ้งดิน ซึ่งปัจจุบัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงาน โครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการไม่มี กิจกรรมที่ต้องขนดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทาง โครงการไม่มีกิจกรรมที่ต้องขนดินออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทาง โครงการไม่มีกิจกรรมที่ต้องขนดินออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง	- - - -	- ภาคผนวก 21 ข เอกสารแต่งตั้ง วิศวกร ดูแลและ ควบคุมการก่อสร้าง - ภาคผนวก 23 ข เอกสารอนุญาตให้ ทิ้งดิน - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ) 8) ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และดำเนินการควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถป้องกัน อาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้มีความปลอดภัย 9) จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่ออาคาร/ที่ดินข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		- โครงการดำเนินการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรฐานและสามารถป้องกันอาคารที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการให้มีความปลอดภัย - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคารที่ดินข้างเคียง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจาก กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	- -	- - รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่เข้าพบ บ้านข้างเคียงประจำสัปดาห์ (มวลชนสัมพันธ์) - ภาคผนวก 6ข เอกสาร จัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชน สัมพันธ์ - ภาคผนวก 7ข แบบฟอร์ม รับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8ข แผนปฏิบัติ การกรณีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9ข หลักประกัน ภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล ภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ) 10) ผู้รับเหมาต้องเสนอขั้นตอนการทำงานและรายการ คำนวณเพื่อขออนุมัติจากวิศวกรควบคุมงาน 11) ก่อนทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านวิศวกรรมหรือสังคมศาสตร์เข้าไปแจ้งต่อผู้พัก อาศัยที่อยู่ติดกับโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่อ อาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนิน โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที		- โครงการจัดให้ผู้รับเหมาต้องเสนอขั้นตอนการทำงานและ รายการคำนวณเพื่อขออนุมัติจากวิศวกรควบคุมงาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการล่วงหน้าอย่าง น้อย 7 วัน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้างซึ่งสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	- -	- - รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่เข้าพบ บ้านข้างเคียงประจำสัปดาห์ (มวลชนสัมพันธ์) - ภาคผนวก 6ข เอกสาร จัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชน สัมพันธ์ - ภาคผนวก 7ข แบบฟอร์ม รับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8ข แผนปฏิบัติ การกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9ข หลักประกัน ภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล ภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ) 12) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน ชื่อหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่นพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ประจำสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ	- ภายใน พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน ชื่อหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่นพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ประจำสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภา ค ผน ว ก 6 ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ - ภา ค ผน ว ก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภา ค ผน ว ก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ) พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ โดยในเอกสารจะระบุชื่อผู้รับเรื่อง ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และกำหนดเวลาในการดำเนินการชดเชยให้ชัดเจนโดยสามารถดำเนินเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนดังกล่าวตามแผนรับข้อร้องเรียน				- ภาพผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก - รูปที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - รูปที่ 18 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ) 13) สำรวจ/ถ่ายรูป สภาพทั่วไป กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อน การก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงที่ติด โครงการโดยรอบ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการ แตกร้าว จากการก่อสร้างโครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจ/ถ่ายรูป สภาพทั่วไป กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนการก่อสร้างของ บ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงที่ติดโครงการ โดยรอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิด การแตกร้าวจากการก่อสร้างโครงการ โดยระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียน จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้ง เจ้าหน้าที่มวชน สัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณี มีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัย ความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก - รูปที่ 18 กล้องรับ เรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ) 14) การดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเจรจาตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด		- โครงการจัดให้มีแผนในการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายกับโครงการ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.7 คุณภาพน้ำผิวดิน 1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง 400 คน จำนวน อย่างน้อย 20 ห้อง (อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน) 2) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างโดยติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ แบบ Septic- Aerobic Filter Tank ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด โดยมีค่าบีโอดี ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มก./ลิตร และค่าสารแขวนลอยออกจากระบบ 30 มก./ลิตร ก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนน สาธารณะด้านหน้าของโครงการต่อไป 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมอยู่เสมอ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการ อยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โดยจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 30 ห้อง สำหรับคนงาน ก่อสร้าง 600 คน - โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิด เติมอากาศ แบบ Septic-Aerobic Filter Tank ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน และควบคุมค่าสาร แขวนลอยออกจากระบบ 30 มก./ลิตร ก่อนระบาย น้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้า ของโครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ห้องส้วมภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำ	- - -	- รูปที่ 20 ห้องส้วมแบบ ถอดประกอบ (Knock Down) - รูปที่ 21 ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ - รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาความสะอาด ห้องส้วม

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ) 1.7 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 4) จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อพักน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ ด้านหน้าของโครงการต่อไป 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพัก และชุดลอกอย่างสม่ำเสมอ 6) หากบริเวณพื้นที่ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างของ โครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้อง จัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็น ช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการ จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อพักน้ำ พร้อมทั้งติดตั้ง ตะแกรงดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอน ดินในบ่อพักและชุดลอกอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่า ปริมาณตะกอนสูงจะดำเนินการชุดลอกทันที - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่มีผลกระทบด้านกลิ่นรบกวนในบริเวณพื้นที่ ห้องส้วมภายในโครงการ	-	- รูปที่ 24 ตะแกรงดัก ขยะ ก่อนระบาย ลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ - รูปที่ 23 ท่อระบาย น้ำชั่วคราว - รูปที่ 25 บ่อพักน้ำ - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ - กำจัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ การพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการมีการกำจัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ การพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด ผ่านกิจกรรม Safety Talk ทุกวันในช่วงเวลาเช้า	-	- รูปที่ 45 Safety Talk
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้ 1) กำจัดให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 3) หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบให้รีบแก้ไขทันที	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการมีการกำจัดให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านกิจกรรม Safety Talk และได้จัดให้มีป้ายณรงค์การใช้น้ำ - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างจำนวนทั้งหมด 6 ถัง โดยแต่ละถังมีความจุ 5,000 ลิตร - โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบจุดรั่วซึมบริเวณเส้นท่อภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	- - -	- รูปที่ 26 ป้ายณรงค์การใช้น้ำ - รูปที่ 45 Safety Talk - รูปที่ 27 ถังสำรองน้ำใช้ -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 การบำบัดน้ำเสีย 1) กำจัดให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพน้ำอย่าง เคร่งครัด 2) กำหนดให้ผู้รับเหมา ใช้ห้องส้วมแบบถอดประกอบ (Knock Down) ด้านล่างติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และในการรื้อถอนกำหนดให้นำเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อ ถอนห้องส้วมสำหรับคนงานกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ก่อสร้าง ต่อไป ได้แก่ เหล็ก ไม้และอลูมิเนียม โถส้วม สายไฟ วงกบ และบานประตู สำหรับการรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ประสานให้รถสูบล้างของหน่วยงาน ราชการเข้ามาสูบล้างของออกจากถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปแล้วจึงทำการรื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ ก่อสร้างต่อไปและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามเดิม	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการกำจัดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด ผ่านกิจกรรม Safety Talk - โครงการจัดให้มีห้องส้วมแบบถอดประกอบ (Knock Down) ด้านล่างติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไว้ สำหรับคนงาน	- -	- รูปที่ 45 Safety Talk - รูปที่ 20 ห้องส้วม แบบถอดประกอบ (Knock Down)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3) ในกรณีที่ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีการแตกชำรุดเสียหาย โดยก่อนชุดถังบำบัดน้ำเสียขึ้นมานั้น จะต้องแจ้ง สำนักงานเขตหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาสูบ ตะกอนภายในถังออกให้หมดก่อนดำเนินการรื้อย้าย และ ตัวถังบำบัดน้ำเสีย จะนำไปดำเนินการติดตั้งในพื้นที่อื่น ต่อไป	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่พบ ถังบำบัดน้ำเสียมีการแตกชำรุดเสียหาย หากเกิด การชำรุดทางโครงการจะแจ้งสำนักงานเขตหรือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาสูบตะกอนภายในถัง ออกให้หมดก่อนดำเนินการรื้อย้าย	-	-
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 1) จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวสำหรับระบายน้ำฝนและ น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง แล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำเพื่อตกตะกอนดินก่อนระบาย น้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ต่อไป	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเสียลงสู่บ่อพักน้ำ พร้อมทั้ง ติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ	-	- รูปที่ 23 ท่อระบาย น้ำชั่วคราว - รูปที่ 24 ตะแกรงดัก ขยะ ก่อนระบาย ลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ - รูปที่ 25 บ่อพักน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 2) จัดให้มีบ่อดักดินจากการล้างล้อรถบรรทุก เพื่อ ตกตะกอนดินจากการล้างล้อรถ ก่อนระบายออกสู่ทาง ระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อดัก และชุดลอกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งไม่ให้มีเศษวัสดุ หรือสิ่งของร่วงลงไปกีดขวางการระบายน้ำและการ ตกตะกอน เพื่อให้บ่อดักน้ำสามารถตกตะกอนดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะก่อสร้างโครงการ 4) จัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อมีการปรับระดับพื้นดินภายในโครงการสูงกว่าพื้นที่ ภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการระบายน้ำไปยังพื้นที่ ข้างเคียง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีบ่อดักดินจากการล้างล้อรถบรรทุก เพื่อตกตะกอนดินจากการล้างล้อรถ ก่อนระบายออก สู่ทางระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอน ดินและเศษวัสดุต่างๆ บริเวณบ่อดักเป็นประจำทุกวัน - โครงการมีแผนจะจัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อมีการปรับระดับพื้นดินภายใน โครงการสูงกว่าพื้นที่ภายนอกโครงการ เพื่อป้องกัน การระบายน้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มี กิจกรรมปรับระดับพื้นดิน	- - -	- รูปที่ 28 บ่อดักดิน จากการล้างล้อ รถบรรทุก - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 5) ในระยะก่อสร้าง โครงการจะประสานกับสำนักงานเขตบางรัก เพื่อขออนุญาตขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ภายใน พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการไม่มี กิจกรรมการขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้า โครงการ หากมีการดำเนินการโครงการจะประสานงานกับ สำนักงานเขตบางรักในการขออนุญาตขุดลอกท่อระบายน้ำ สาธารณะบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามมาตรการ กำหนด	-	-
3.4 การจัดการมูลฝอย 1) ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น ไม้แบบ เหล็กเส้น ยิปซัม บอร์ด เศษแก้ว และกระจก เป็นต้น ให้พิจารณานำกลับมาใช้ ประโยชน์ภายในพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น วัสดุเหล็กหรือไม้แบบ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 2) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างที่ ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษ คอนกรีต และผนังอิฐมวลเบา ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจาก การก่อสร้างอ่อนนุชของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตาม เงื่อนไขของศูนย์ฯ และในส่วนของมูลฝอยจากการก่อสร้าง ชนิดอื่นที่ไม่อยู่ในขอบเขตการกำจัดของโรงกำจัดและแปรรูป มูลฝอยจากการก่อสร้างอ่อนนุช โครงการจะประสานไปยัง หน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัดต่อไป	- ภายใน พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ - ภายใน พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วง งานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการ ยังไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะภายในพื้นที่การก่อสร้าง โครงการ - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วง งานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการ ยังไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะภายในพื้นที่การก่อสร้าง โครงการ	- -	- -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 3) มูลฝอยคนงานก่อสร้าง 1.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 19 ถัง แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 8 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป จำนวน 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) จำนวน 5 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 3 ถัง วางไว้บริเวณที่พักและรวบรวมมูลฝอยทั้งหมด เพื่อให้สำนักงานเขตบางรักมารับไปกำจัดต่อไป โดยไม่มีการตกค้างก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและแพร่กระจายเชื้อโรค 4) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับอย่างเคร่งครัด		- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยมีรถเก็บมูลฝอยของสำนักเขตบางรักมารับไปกำจัดต่อไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีการตกค้างของมูลฝอยที่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน - โครงการจัดให้มีการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับอย่างเคร่งครัด	- -	- รูปที่ 29 ถังรองรับมูลฝอย - ภาคผนวก 10 ข เอกสารส่งกำจัดมูลฝอย -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 5) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ 6) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในภาพที่ติดอยู่เสมอ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพที่ชำรุดต้องเปลี่ยนทันที 7) กำหนดให้ผู้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัด ต้องใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนพื้นจราจรรวมทั้งควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และมีความระมัดระวัง 8) จัดให้มีถังขนาด 120 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงพร้อมติดป้าย “ถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” โดยให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตมารับไปกำจัด		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะภายในพื้นที่การก่อสร้างโครงการ - โครงการมีการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในภาพที่ติดอยู่เสมอ - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค จึงยังไม่มีเศษวัสดุในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีถังขนาด 120 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงพร้อมติดป้าย “ถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว”	- - - -	- รูปที่ 29 ถังรองรับมูลฝอย - - - รูปที่ 30 ถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 9) บริเวณพื้นที่ทิ้งดินส่วนเกินจากการก่อสร้างโครงการ ต้อง จัดให้มีรั้ว Metal Sheet ขนาดความสูง 3 เมตร และ ชุดร่องระบายน้ำด้วยขนาดความกว้าง 0.3 เมตร ความลึก 0.5 เมตร ตลอดแนวฝั่งที่ติดคลองชลใหญ่ 10) ในการทิ้งดินบริเวณจุดทิ้งดินส่วนเกินจากการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่าว อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด 11) มาตรการฯ การจัดการดินส่วนเกินจากการทำฐานราก และเสาเข็มเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ขุดมาทิ้งผลกระทบ ต่อบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่ทิ้งดินส่วนเกินจากการก่อสร้าง โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ไม่มีกิจกรรมที่ต้องเก็บกองดินไว้ในโครงการ - โครงการจัดให้มีพื้นที่ทิ้งดินส่วนเกินจากการก่อสร้าง โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ไม่มีกิจกรรมที่ต้องเก็บกองดินไว้ในโครงการ - โครงการจัดให้มีพื้นที่ทิ้งดินส่วนเกินจากการก่อสร้าง โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ไม่มีกิจกรรมที่ต้องเก็บกองดินไว้ในโครงการ	- - -	- ภาคผนวก 23 ข เอกสารอนุญาตให้ ทิ้งดิน - ภาคผนวก 23 ข เอกสารอนุญาตให้ ทิ้งดิน - ภาคผนวก 23 ข เอกสารอนุญาต ให้ทิ้งดิน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 11.1 บริเวณพื้นที่ที่ดินส่วนเกินจากการก่อสร้างโครงการ ต้องมีแนวกันชนอยู่ห่างจากขอบเขตที่ดิน 10 เมตร โดยจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ขนาดความสูง 3 เมตร และชุดร่องระบายน้ำตัวยู ขนาดความกว้าง 0.3 เมตร ความลึก 0.5 เมตร ตลอดแนวฝั่งที่ติดคลองขนาดใหญ่ 11.2 ในการที่ดินบริเวณจุดที่ดินส่วนเกินจากการก่อสร้าง โครงการ ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรม ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด 11.3 ต้องจัดให้มีการระบายน้ำในสถานที่ที่ดินเพียงพอ ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น		- โครงการจัดให้มีพื้นที่ที่ดินส่วนเกินจากการก่อสร้าง โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ไม่มีกิจกรรมที่ต้องเก็บกองดินไว้ในโครงการ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับที่ดินส่วนเกินจากการ ก่อสร้างและมีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่าว อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง - โครงการจัดให้มีการระบายน้ำในสถานที่ที่ดินที่เพียงพอ ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดิน ที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น	- - -	- ภาคผนวก 23ข เอกสารอนุญาต ให้ที่ดิน - ภาคผนวก 23ข เอกสารอนุญาต ให้ที่ดิน -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 11.4 ผู้รับเหมาต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 11.5 ผู้รับเหมาต้องดำเนินการถมดินให้ถูกต้องและต้อง ควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติ ตามที่พระราชบัญญัติ การขุดและถมดินกำหนด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการกักขังให้ผู้รับเหมาแจ้งการถมดินต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนด - โครงการมีการกักขังให้ผู้รับเหมาดำเนินการถมดิน ให้ถูกต้องและให้ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติการ ขุดและถมดินกำหนด	-	-
3.5 ระบบไฟฟ้า 1) กักขังคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหัวหน้า คนงานต้องให้คำแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2) การจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการกักขังคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัดผ่านการติดป้ายประหยัดไฟและกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน - โครงการจัดให้มีการจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม กฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีช่างและวิศวกร ผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล	-	- รูปที่ 31 ป้าย ประหยัดไฟ - รูปที่ 45 Safety Talk -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศิลปเจียร จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 3) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการปฏิบัติ/ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารโดยใช้หลอดไฟ ประหยัดพลังงาน (LED) 4) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการจัดให้มีการติดตั้งแสงสว่างในอาคารโดยใช้ หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) - โครงการจัดให้มีหลอดไฟที่ส่องสว่างไว้บริเวณ ด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบโครงการ	- -	- รูปที่ 32 หลอดไฟ ประหยัดพลังงาน (LED) ภายในอาคาร - รูปที่ 33 หลอดไฟ บริเวณด้านหน้า โครงการ
3.6 การคมนาคม 1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างและรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัท ผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พัก อาศัยใกล้เคียงและผู้สัญจร โดยใช้เส้นทางร่วมกับ รถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับ ผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน จากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่ง คนงาน		- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้าง ของรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง โดยระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการไม่มีการใช้ รถในการรับ-ส่งคนงาน	-	- รูปที่ 34 ป้าย ประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้าง ของรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การคมนาคม (ต่อ) 2) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการ เข้า-ออก โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนใน ระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ อย่างปลอดภัย 3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก สะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถ เข้า-ออก โครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวาง การจราจรบนถนนพระรามที่ 4 และถนนสาธารณะอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญรถยนต์ที่ สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดง ทิศทางการเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่เข้า-ออกโครงการ และให้ความสำคัญรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะ เป็นหลัก	- -	- รูปที่ 1 ป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ - รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การคมนาคม (ต่อ) 4) ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือ รับ-ส่งคนงาน บนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ และ ถนนอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 5) ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบ และป้ายการจราจร ชั่วคราว บริเวณทาง เข้า-ออก โครงการให้สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งในช่วงเวลากลางวันและ กลางคืน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถเพื่อขนส่งดินไว้ในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการโดยห้ามไม่ให้จอดรถริมถนนด้านหน้า โครงการโดยเด็ดขาด และคนงานมีการเดินทางมา ทำงานโดยรถส่วนตัวจึงไม่มีรถรับส่งคนงานบนถนน บริเวณด้านหน้าโครงการ - โครงการมีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบ และป้ายจราจรชั่วคราว ไว้บริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 16 พื้นที่จอด รถ - รูปที่ 35 ไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การคมนาคม (ต่อ) 6) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับ รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 7) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ของ บริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิด การชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน 8) จัดการให้ใช้ผ้าคลุมที่มิดชิด สำหรับรถบรรทุกดินหิน ทรายเพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและควบคุม น้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัดที่กฎหมายกำหนดอย่าง เคร่งครัด - โครงการมีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและ เครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอตามรอบของการ ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วง งานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ไม่มีการ บรรทุกดิน หิน ทราย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- - -	- - ภาคผนวก 3 ข เอกสารตรวจสอบ เครื่องยนต์ของรถ ที่ใช้ในการขนส่ง วัสดุก่อสร้างดิน และอื่น ๆ - ภาคผนวก 4 ข เอกสารตรวจสอบ เครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การคมนาคม (ต่อ) 9) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างตามข้อบังคับ พนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยรถบรรทุก 6 ล้อ วิ่งในเวลา 09.00-16.00 น. และ 20.00-06.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ วิ่งในเวลา 10.00-15.00 น. และ 21.00-06.00 น. เว้น วันหยุดราชการ ซึ่งอยู่นอกเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงาน ตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณ โครงการได้ แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใน ตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนมาจอด ไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้นไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถเพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนในช่วงเวลาพักผ่อนต่อ พื้นที่ข้างเคียง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการขนส่งดินและวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างตามข้อบังคับพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งรีบ และตาม เวลาที่มาตรการกำหนด ระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่พบข้อร้องเรียน ด้านเสียงดังรบกวน	-	- ภาคผนวก 5 ข ข้อปฏิบัติด้าน กฎจราจรสำหรับ พนักงานขนส่ง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การคมนาคม (ต่อ) 10) จัดพื้นที่สำหรับรถคอนกรีต และรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการไม่ให้จอดเป็นแถวคอยบนถนนพระรามที่ 4 และถนนสาธารณะอื่นๆ 11) ก่อนมีการก่อสร้างโครงการจะต้องไปสำรวจถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ ก่อนเริ่มทำงาน และถ้าถนนเสียหายระหว่างการก่อสร้างโครงการจะประสานกับสำนักงานเขตบางรัก ในการดำเนินการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 12) จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกลงบนบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปียงตกลงบนจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดทั้งนี้หากมีเหตุทำให้ต้นไม้เกิดการเสียหาย ก็จะมีการแจ้งโครงการให้รีบทราบ ซึ่งโครงการจะมีการแก้ไข	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบัสคอนกรีตในพื้นที่โครงการและมีการเข้าพื้นที่จอดรถบริเวณวัดหัวลำโพง - โครงการจัดให้มีการสำรวจถนนบริเวณด้านหน้าโครงการก่อนมีการก่อสร้างโครงการ และถ้าถนนเสียหายระหว่างการก่อสร้างโครงการจะประสานกับสำนักงานเขตบางรักในการดำเนินการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ไม่พบความเสียหายของถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ - โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกลงบนบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และพื้นที่ข้างเคียง	- - -	- รูปที่ 16 พื้นที่จอดรถ - ภาคผนวก 31 ข เอกสารในการสำรวจถนนก่อนการก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ - รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การคมนาคม (ต่อ) 13) จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินโดยใช้ น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก 14) กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันของผู้รับเหมาจะต้องติดป้าย ไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และที่ด้านหลังของรถระบุชื่อ ผู้รับเหมา ชื่อโครงการและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งดังกล่าวติดต่อ หรือแจ้งเหตุ 15) ให้รถบรรทุกทุกคันจากโครงการเมื่อนำดินไปทิ้งยังพื้นที่ทิ้ง ดินแล้ว ให้ฉีดล้างล้อรถด้วยปั๊มฉีดแรงดันสูงก่อนจะนำรถ ขึ้นบนผิวการจราจรและให้เจ้าหน้าที่คอยกวาดเก็บเศษ หิน เศษดินที่ติดตามล้อรถดังกล่าวที่ตกเกลื่อนกลาดบน พื้นผิวการจราจร	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดล้อ รถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินร่วงหล่นบนพื้นถนน - โครงการจัดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างทุกคันของ ผู้รับเหมาติดป้ายรายละเอียดไว้ที่ด้านข้างทั้งสอง ด้านและด้านหลังตามมาตรการกำหนด โดยระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่มีการขนส่ง วัสดุก่อสร้าง - โครงการมีการเปลี่ยนพื้นที่ทิ้งดินและได้แจ้งกับ หน่วยงานอนุญาตเพื่อทราบ รวมถึงได้รับอนุญาต และยินยอมจากเจ้าของที่ดินเพื่อทิ้งดินส่วนเกินจาก การก่อสร้าง โดยไม่ได้นำไปทิ้งที่จุดกำหนดในมาตรการ	- - -	- รูปที่ 9 การทำความสะอาด ล้อรถบรรทุก - รูปที่ 34 ป้าย ประชาสัมพันธ์ บริเวณ ด้านข้างของรถขนส่ง ดิน วัสดุก่อสร้าง - ภาคผนวก 23 ข เอกสารอนุญาตให้ ทิ้งดิน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การป้องกันอัคคีภัย 1) โครงการต้องห้ามจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างเว้นแต่เก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น 2) โครงการต้องติดป้ายบริเวณพื้นที่โครงการดังนี้ - ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่ เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน - จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในการทำงานเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการไม่มีการจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการได้จัดให้มีป้ายแสดงถึงเขตการก่อสร้างรอบบริเวณพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีป้ายเตือนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยไว้หน้าพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน ได้แก่ ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการจุดติดไฟในพื้นที่โครงการ	- - -	- - รูปที่ 36 ป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้าง - รูปที่ 37 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 3) ปฏิบัติตามมาตรการฯ การจัดเตรียมระบบดับเพลิง ตามที่กำหนดในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 4) โครงการต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคารโดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ บริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ เครื่องจักรหรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามมาตรการกำหนด - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค หากถึงช่วงงานโครงสร้างและตกแต่งอาคารแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟตามมาตรการกำหนด	- -	- ภาคผนวก 20 ข เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย - รูปที่ 38 ถังดับเพลิงเคมี -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 5) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ถัง/จุด และเมื่อก่อสร้างขึ้นโครงสร้างอาคารไปจนถึงติดตั้งสาธารณูปโภคและตกแต่งแล้วเสร็จ ต้องจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้บริเวณบันไดของอาคาร จำนวน 1 ถัง/ชั้น ตลอดระยะดำเนินการก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ และเมื่อขึ้นโครงสร้างชั้น 10, 20 แล้วเสร็จ จัดให้มีจุดสำหรับวางถังดับเพลิงจำนวน 5 ถังต่อจุด เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อเพลิงไหม้และกรณีมีการทำงานแล้วมีประกายไฟ โครงการจะจัดให้มีจุดสำหรับวางถังดับเพลิง จำนวน 1 ถัง เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อเพลิงไหม้	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอย่างเพียงพอตามมาตรการกำหนด	-	- รูปที่ 38 ถังดับเพลิงเคมี

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศิลปเจียร จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 6) ในการติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง 7) โครงการต้องจัดให้มีเครื่องแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินทั่วถึงกันทั้งอาคาร 8) จัดให้มีการตรวจตราพื้นที่อาคารในช่วงก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นดิน 1.40 เมตร พร้อมป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิงและจัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค หากถึงช่วงงานโครงสร้างและตกแต่งอาคารแล้วทางโครงการจะดำเนินการจัดให้มีเครื่องแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินทั่วถึงกันทั้งอาคาร - โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจตราบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวันทำงาน	- - -	- ภาคผนวก 20 ข เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย - รูปที่ 38 ถังดับเพลิงเคมี - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติให้ผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ/พื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการ/สถานที่สำคัญที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาได้รับทราบ	- พื้นที่ระยะประชิดพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการพื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ก่อนการก่อสร้าง ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้างเพื่อแจ้งแผนงานและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุมงานก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 2. จัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการความกว้าง ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ (บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับ ถนนพระรามที่ 4 และด้านที่ติดกับถนนสุขุมวิท) ให้เห็นอย่าง ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้		- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า โครงการโดยแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ชื่อ โครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการและ ขนาดพื้นที่โดยสรุป ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) แผนงานการก่อสร้าง เลขที่ ใบอนุญาตก่อสร้าง สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุม การก่อสร้างพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการพร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส. 1010.5/4244 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565) ตารางสรุปมาตรการและตาราง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบ และสำเนาทารางกรรมธรรม์ ประกันภัย	-	- ภาคผนวก 1ก หนังสือ แจ้งการก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตาม มาตรการ 39 ทวิ - ภาคผนวก 2ก สำเนา หนังสือเห็นชอบโครงการ - ภาคผนวก 3ก สำเนา หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ - ภาคผนวก 28 สำเนา กรรมธรรม์ประกันภัย - รูปที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 2.1 ชื่อโครงการ 2.2 เจ้าของโครงการ 2.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 2.4 ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 2.5 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 2.6 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 2.7 สถาปนิกโครงการ 2.8 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 2.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 2.10 เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ที่ ทส 1010.5/4244 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565)				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 2.11 ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 2.12 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 2.13 ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความ เสียหาย 2.14 ผังรับเรื่องร้องเรียน 2.15 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน 2.16 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 2.17 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง และฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก 2.18 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศิลปเจียร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มวลชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงระยะก่อสร้างจนกว่าจะถึงระยะเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้หลากหลาย เช่น กล้องรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือสื่อทางสังคมต่างๆ ได้แก่ ตั้งกลุ่มไลน์ เปิดช่องรับเรื่องร้องเรียนใน Facebook ของบริษัท เป็นต้น	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มวลชนสัมพันธ์ประจำที่มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของโครงการฯ โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงระยะก่อสร้างจนกว่าจะถึงระยะเปิดดำเนินการ ซึ่งทางโครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ลงชุมชนรับเรื่องร้องเรียนเป็นประจำทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้หลากหลายและจัดให้มีกล้องรับเรื่องร้องเรียนโดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่ที่มวลชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก - รูปที่ 18 กล้องรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 4. บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง 5. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. และหยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทคอนกรีต เป็นต้น ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. และกิจกรรมที่ก่อสร้างเกินเวลาจะไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต (สำนักงานเขตบางรัก) โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทางบริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด มีการกำกับควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และหยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภคทางโครงการมีกิจกรรมการก่อสร้างหลังช่วงเวลา 17.00 น. แต่ไม่เกิน 20.00 น. โดยมีการแจ้งต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน และได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตบางรัก	- -	- ภาคผนวก 29 ข เอกสารแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงในการก่อสร้างหลังช่วงเวลา 17.00 น.

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 6. สำรวจ/ถ่ายรูปสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงที่ติดโครงการโดยรอบ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว ในกรณีที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปถ่ายรูปสภาพของอาคารที่อยู่ติดกับโครงการก่อนจะมีการก่อสร้าง หากเจ้าของอาคารไม่ประสงค์จะให้เข้าไปถ่ายรูปเป็นหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการมีการสำรวจ/ถ่ายรูปสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงที่ติดโครงการโดยรอบก่อนและหลังการก่อสร้างไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 7. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง โดยโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้กับบ้าน/อาคารพื้นที่ติดโครงการ และบ้าน/อาคารที่พักอาศัยโดยรอบรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พร้อมหนังสือนำส่ง หากไม่พบเจ้าของบ้าน ให้จัดส่งทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์	- ภายในพื้นที่ ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยแจ้งกำหนดแผนการก่อสร้างของโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์แจ้งให้ทางพื้นที่ติดโครงการและผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการรัศมี 100 เมตรทราบอีกด้วย	-	- รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้างเพื่อแจ้งแผนงานและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุมงานก่อสร้าง - ภาพผนวก 1 ข เอกสารแจ้งแผนการเจาะเสาเข็มต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 7.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไป แจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ ใกล้เคียงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยแจ้ง กำหนดแผนการก่อสร้างของโครงการและหมายเลข โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้กลุ่ม พื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่ง เอกสารผ่านไปรษณีย์แจ้งให้ทางพื้นที่ติดโครงการ และผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการรัศมี 100 เมตร ทราบอีกด้วย และมีการติดรายละเอียดไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับ โครงการก่อนการ ก่อสร้างเพื่อแจ้ง แผนงานและให้ หมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่คุม งานก่อสร้าง - ภาพผนวก 1 ข เอกสารแจ้ง แผนการเสาเข็มต่อ ผู้พักอาศัยที่อยู่ติด พื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 7.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการ ชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และมีรายละเอียด ขั้นตอนในการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณี เกิดความเสียหาย โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรม การก่อสร้างของโครงการ	-	- ภา ค ผน ว ก 6 ข เอ ก ส าร จั ด ตั ง เจ้าหน้าที่ยื่นขอ สัมพันธ - ภา ค ผน ว ก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน - ภา ค ผน ว ก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณี มีข้อร้องเรียน - ภา ค ผน ว ก 9 ข หลักประกันภัยความ รับ ผิด ข อบ ต าม ก ฎ หมาย ต่ อ ชี วิ ต ร่างกายและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 7.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ แอล ะ แอ ป พลี เคชั่นไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้แก่ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดที่ติดไว้บริเวณป้ายด้านหน้าโครงการ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภา ค ผน ว ก 6 ข เอก ส าร จั ด ตั ง เจ้าหน้าทีมวลงนสัมพันธ์ - ภา ค ผน ว ก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภา ค ผน ว ก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภา ค ผน ว ก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศิลปเจียร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 8. กำชับให้คนงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 9. กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนในแต่ละขั้นตอน โดยหลังจากมีผู้เสียหายแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องดำเนินการตรวจสอบบันทึก และรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยปัญหาที่แก้ไขได้ทันที โครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ทันที และแจ้งรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทันที โครงการจะมีการดำเนินการชดเชยความเสียหาย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีการกำชับให้คนงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีแผนการสำหรับรับเรื่องร้องเรียนหากมีผู้เสียหายแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	- -	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) การชดเชยความเสียหายเบื้องต้นโดยเจ้าของโครงการ : ในระหว่างรอขั้นการสำรวจความเสียหายและพิจารณาค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยที่โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันความเสียหายไว้ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนหรือชดเชยความเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายก่อน (วงเงินสำรองจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)) โดยแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้เสียหายภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้นร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประกันภัยประเมินไว้ โดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยก่อน และโครงการจะเร่งติดตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยให้ต่อไป		- โครงการได้มีการจัดทำ กรมธรรม์ประกันความเสียหายไว้ ซึ่งมี (วงเงินสำรองจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)) โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก - ภาคผนวก 28ข สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) • การชดเชยความเสียหายเบื้องต้นโดยบริษัทประกันภัย : - เจ้าของโครงการได้จัดทำประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนื่องจากการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอนอาคารในวงเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยจะประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันความเสียหายไว้ทันที		- โครงการได้จัดทำประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนื่องจากการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอนอาคารในวงเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)	-	- ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - กรณีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยระดับข้อพิพาทระหว่างกันเองได้ จะใช้วิธีตั้งตัวแทนจาก 3 ฝ่าย คือ ตัวแทนโครงการ ตัวแทนผู้เสียหาย และตัวแทนบริษัทประกันภัย เพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ยและสำรวจความเสียหาย โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับความร้องเรียนเป็นเอกสาร และบริษัทประกันภัยจะต้องพิจารณาค่าสินไหม และดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม หลังจากได้รับเอกสารร้องเรียน		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบต่อตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) • การกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดซ้ำ : เจ้าของโครงการทำสรุปข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ประชุมทบทวน โดยผู้ควบคุมงานร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำทุก 3 เดือน		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- ภาคผนวก 6 ข เอกสารจัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 7 ข แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก 8 ข แผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียน - ภาคผนวก 9 ข หลักประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 10. กำหนดให้มีมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ดังนี้ 10.1 ร่วมสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนตามความเหมาะสม 10.2 จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ ไอทีโอ จุฬา-สีลม (IDEO CHULA-SILOM) โดยประสานงานกับสำนักงานเขตบางรัก และภาคส่วนต่างๆ โดยมีโครงการที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างได้แก่		- ปัจจุบันโครงการมีการสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานของโครงการร่วมบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา - ปัจจุบันโครงการมีการสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานของโครงการร่วมบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา	-	- ภาคผนวก 11 ข เอกสารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) - ภาคผนวก 11 ข เอกสารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 10.2.1 ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด - โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณ หน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 10.2.2 ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับ ตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการ ในช่วงการจราจรคับขันเร่งด่วน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างโดยรอบของโครงการอย่างสม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเข้าร่วมจัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงการจราจรเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถบริเวณด้านหน้าโครงการ	- -	- รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่โครงการ - รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 10.2.3 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน - โครงการจะประสานกับสำนักงานเขตบางรักในการขออนุญาตขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้อาคาร เพื่อฟื้นฟูสภาพการระบายน้ำและคืนสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ หากมีการดำเนินการโครงการจะทำการประสานงานกับสำนักงานเขตบางรักในการขออนุญาตขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามมาตรการกำหนด - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ หากมีการดำเนินการโครงการจะทำการประสานงานกับสำนักงานเขตบางรักในการขออนุญาตขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามมาตรการกำหนด	- -	- -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 11. นำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นในการประมูลงานก่อสร้างของโครงการ 12. โครงการกำหนดให้มีการแจ้งเตือนผู้รับเหมาก่อสร้าง หากไม่ดำเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ หากมีการทำผิดซ้ำ กำหนดให้มีค่าปรับหรือบทลงโทษ		- โครงการมีการแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบถึงมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นอย่างเคร่งครัดก่อนเริ่มการก่อสร้าง - โครงการมีการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากมีการทำผิดทางโครงการจะพิจารณาปรับและบทลงโทษตามความเหมาะสมของความเสียหายที่เกิดขึ้น	- -	- - ภาคผนวก 12 ข บทลงโทษผู้กระทำความผิด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข 4.2.1 ผลกระทบต่อคนงาน - ผลกระทบด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง • โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ 1. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น และคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ได้รับ ฝุ่นละออง เช่น กิจกรรมการขุดเปิดหน้าดินและ ทำฐานราก มลสารจากเครื่องจักรกล และจาก กิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการทำงาน ในบริเวณที่เป็นพื้นที่อับชื้นการระบายอากาศไม่ดีเป็น ระยะเวลานาน	- พื้นที่ ก่อ ส ราง โครงการ (คนงาน ก่อสร้าง)	- โครงการจัดให้มีหน้ากากอนามัยไว้สำหรับคนงานใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 41 อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล (PPE)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป 3. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน ให้มิดชิด 4. รักษาความสะอาดบริเวณด้านทางเข้า-ออก โครงการไม่ให้มีเศษดิน และทราย ตกค้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ความถี่วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาตามความเหมาะสม และตามสภาพหน้างาน ถ้ามีฝุ่นละอองมากขึ้นจะมีการเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองวัสดุที่เหลือใช้อย่างมิดชิดตามมาตรการกำหนด - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณด้านทางเข้า-ออก โครงการเป็นประจำ	- - -	- รูปที่ 6 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - รูปที่ 12 พื้นที่สำหรับกองวัสดุชั่วคราว - รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 5. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้น ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน 7. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะ กระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ • โรคลมแดด 1. จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้น้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับ คนงาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็น ช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โครงการ จัดให้มีการติดตั้ง Meah Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบอาคารซึ่งอากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องทำงาน ในบริเวณที่ปิดทึบ - โครงการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและ สิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ - โครงการมีการจัดที่พักผ่อนที่มีหลังคาบังแดด และจัดน้ำดื่มไว้สำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- - - -	- รูปที่ 4 Meah Sheet (แบบกันไฟลาม) - - - รูปที่ 40 ที่พักผ่อน ที่ นั่ง รั บ ปร ะ ทาน อาหาร และน้ำดื่ม สำหรับคนงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2. ให้คนงานที่ทำงานกลางแดดมีเวลาหยุดพัก หรือทำงาน สลับหน้าที่ทำงานในร่ม 3. ให้คนงานที่เจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุด งานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย • โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหนะนำโรคของคนงาน 1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและ หลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการจัดเวลาในการทำงานให้คนงานที่ทำงาน กลางแดดมีเวลาหยุดพักในช่วงเที่ยงของทุกวันทำงาน - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่มี คนงานที่เจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ อย่างไรก็ตาม หากพบคนงานที่เจ็บป่วยด้วยอาการดังกล่าวจะ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า ทำงานทุกครั้ง และมีการตรวจสอบสุขภาพหลังรับเข้าทำงาน เป็นประจำทุกปี	- - -	- - - ภาคผนวก 13ข ผลการตรวจ สุขภาพของ พนักงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2. จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงาน อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถึงรองรับมูลฝอยฯลฯ ให้มีจำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3.อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคที่เกิดจาก คนเป็นพาหะนำโรค • โรคที่เกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 1. มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความ สั่นสะเทือน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้แก่ คนงานตามคุณภาพมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - โครงการจัดให้มีการให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกัน โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค ผ่านกิจกรรม Safety Talk	- -	- รูปที่ 20 ห้องส้วม แบบถอดประกอบ (Knock Down) - รูปที่ 29 ถึงรองรับ มูลฝอย - รูปที่ 40 ที่พักผ่อน และน้ำดื่มสำหรับ คนงาน - รูปที่ 45 Safety Talk

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ก่อสร้างเสาเข็ม โดยใช้เสาเข็มเจาะ ซึ่งจะก่อให้เกิด การสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเสาเข็ม ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการสั่นสะเทือน (Non-Vibration Bored Pile) ในช่วงงานเสาเข็มและ ฐานราก โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธณูปโภค	-	-
2) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเสาเข็ม ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการสั่นสะเทือน (Non-Vibration Bored Pile) ในช่วงงานเสาเข็มและ ฐานราก โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธณูปโภค	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล 1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2) ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะควรบุที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกัน ความสั่นสะเทือน 3) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายในระหว่างทำงาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่น สะเทือน - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ทางโครงการจึงไม่มีการใช้รถขุดเจาะในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการมีการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนพื้นที่ที่ต้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง ชัดเจนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้พนักงาน รับทราบและปฏิบัติตาม	- - -	- รูปที่ 41 อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล (PPE) - - รูปที่ 37 ป้ายเตือน ด้านความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) โรคติดต่อร้ายแรง <u>สำหรับผู้ประกอบการ/นายจ้างให้มีมาตรการตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยมีมาตรการที่สำคัญดังนี้</u> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่คนงานก่อสร้าง และจัดให้มีสบู่เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง 2. จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่คนงานก่อสร้างผ่านกิจกรรม Safety Talk และแอลกอฮอล์ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง - โครงการมีการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นและเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ	-	- รูปที่ 44 ที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือจุดบริการแอลกอฮอล์ - รูปที่ 45 Safty Talk -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 3. กำหนดให้คนงานก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานภายในพื้นที่ ก่อสร้างใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 4. จัดหาหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และอุปกรณ์ ป้องกันให้เพียงพอแก่คนงาน 5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ ทั้งในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และที่พักคนงาน 6. จัดที่นั่งรับประทานอาหารในแคมป์ หรือสถานที่ก่อสร้าง ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการกำกับให้คนงานก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทำงาน ภายในพื้นที่ก่อสร้างใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ทั้งนี้ทางโครงการมีการยึด ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการเพื่อกรณีฉุกเฉินที่พนักงาน ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย - โครงการจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการอย่างทั่วถึงและ เพียงพอต่อจำนวนคนงาน - โครงการจัดให้มีที่นั่งรับประทานอาหารภายใน สถานที่ก่อสร้างและปฏิบัติตามแนวทางด้าน สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	- - - -	- - รูปที่ 41 อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล (PPE) - รูปที่ 44 ที่ล้างมือ พร้อมสบู่หรือจุด บริการแอลกอฮอล์ - รูปที่ 40 ที่พักผ่อน ที่นั่งรับประทาน อาหาร และน้ำดื่ม สำหรับคนงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 7. การรับ-ส่ง คนงาน ควรจำกัดจำนวนคนในรถไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการพูดคุยตลอดระยะเวลา การเดินทาง ไม่ควรแหวะระหว่างทาง และไม่ควร รับประทานอาหารระหว่างเดินทาง 8. จัดหาสื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อ COVID-19 ด้วยภาษาที่คนงานเข้าใจได้ และ ให้มีจุดประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ที่ชัดเจน		- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงาน โครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค คนงานเดินทาง โดยรถส่วนตัว - โครงการจัดให้มีการให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ผ่านกิจกรรม Safety Talk เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มงาน และ กำชับให้คนงานยึดปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อย่างเคร่งครัด	- -	- - ภาคผนวก 14 ข เอกสารการอบรม คนงาน เรื่องวิธีการ ป้องกันโรคที่เกิด จากคนเป็นพาหะ นำโรค - รูปที่ 45 Safety Talk

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 9. ให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน จัดให้มี Safety Talk กับ คนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติ ตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 อย่างสม่ำเสมอ 10. เตรียมวางแผนการปฏิบัติและทำความเข้าใจกับคนงาน กรณีที่มีการยืนยันว่าพบผู้ป่วย เช่น - การโยกย้ายคนงานที่ไม่ป่วย เพื่อลดการสัมผัสกับผู้ป่วย สำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง รวมถึงครอบครัวของผู้สัมผัส เสี่ยงสูง จะถูกแยกไปกักตัว		- โครงการจัดให้มี Safety Talk ให้ความรู้กับคนงาน เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ช่วงก่อนเข้า งานทุกวัน - โครงการจัดให้มีแผนรองรับกรณีที่มีการยืนยันว่าพบผู้ป่วย โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการ ยังไม่มีการพบผู้ป่วยภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ - โครงการจัดให้มีแผนรองรับกรณีที่มีการยืนยันว่าพบผู้ป่วย โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการ ยังไม่มีการพบผู้ป่วยภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	- - -	- รูปที่ 45 Safety Talk - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) - จัดระบบรองรับการดำรงชีวิตประจำวันในระหว่างการกักตัวคนงาน หรือกรณีที่มีการปิดพื้นที่แคมป์ เช่น การจัดหาอาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวันของคนงาน เป็นต้น - การจำกัดการเดินทางเข้า-ออกจากแคมป์ หรือที่พัก - การปิดพื้นที่แคมป์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการควบคุมโรค หรือเพื่อการรักษาพยาบาล - ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในการควบคุมโรค หรือเพื่อการรักษาพยาบาล		- โครงการจัดให้มีแผนระบบรองรับการดำรงชีวิตประจำวันในกรณีที่พบผู้ป่วยและต้องมีการกักตัว โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มี การพบผู้ป่วยภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ - โครงการมีการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกจากแคมป์ - โครงการมีแผนในการปิดพื้นที่แคมป์หากกรณีพบผู้ป่วย โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มี การพบผู้ป่วยภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ - โครงการมีแผนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หากพบผู้ป่วยในพื้นที่โครงการ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มี การพบผู้ป่วยภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	- - - -	- - - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 11. ควบคุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนงานในการทำงาน 12. จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ที่พัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน 13. ควบคุมเชื้อทำความสะอาดรถรับ-ส่งคนงาน โดยเน้นจุด สัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 14. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อทิ้งหน้ากากอนามัย หรือกระดาษทิชชู		- โครงการควบคุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนงานในการทำงานตามความเหมาะสมของสภาพหน้างาน - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้คนงานทุกคนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีการใช้รถรับ-ส่งคนงาน โดยคนงานเดินทางโดยรถส่วนตัวทั้งหมด - โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยสีแดงที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อทิ้งหน้ากากอนามัย หรือกระดาษทิชชูไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- - - -	- - รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ - - รูปที่ 30 ถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 15. หากพบคนงานก่อสร้างมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ผู้รับเหมาพาไปพบแพทย์โดยทันที 16. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดเก็บและทำบันทึกประวัติคนงานก่อสร้างในโครงการ 17. กรณีที่มีวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ให้โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับคนงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง 18. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่พบผู้ป่วย แต่ทางโครงการยังคงมีการเฝ้าระวังอยู่เสมอ - โครงการมีการจัดเก็บและทำบันทึกประวัติคนงานก่อสร้างในโครงการ - คนงานก่อสร้างทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ก่อนการเข้าทำงาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ	- - - -	- - ภาคผนวก 24ข แบบบันทึกประวัติคนงานก่อสร้าง - ภาคผนวก 25ข เอกสารการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ของคนงานก่อนการรับเข้าทำงาน - ภาคผนวก 16ข เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 19. หากมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีความเสี่ยงติดโรคติดต่อ COVID-19 เมื่อกลับมาถึง ประเทศไทยให้ไปตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังตาม ระเบียบประกาศ และมาตรการตามที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด 20. หากตรวจพบว่าคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อ COVID-19 ไม่ว่าจะได้รับ การตรวจคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อ ถูกแยกกักหรือกักกันตัว จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมา ปฏิบัติงานได้ให้ผู้รับเหมาแจ้งพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีความเสี่ยงติดโรคติดต่อ COVID-19 โดยถ้าหากมี ทางโครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการ ยังไม่มีตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยง ที่จะเกิดโรคติดต่อ COVID-19	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 21. หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ COVID-19 ให้ไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และแจ้งให้โครงการทราบ เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเร็ว 22. หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกักตัวไว้ที่ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด 23. ผู้รับเหมาต้องอนุญาตให้คนงานใช้สิทธิลาป่วยตามกฎหมาย หรือตามที่ตกลงกัน กรณีที่คนงานมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ COVID-19 จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มีกรพบคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อ COVID-19 - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มีกรพบคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อ COVID-19 - โครงการอนุญาตให้คนงานใช้สิทธิลาป่วยตามกฎหมาย กรณีที่คนงานมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ COVID-19 จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่พบคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อ COVID-19	- - -	- - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) <u>สำหรับคนงานและบุคคลในครอบครัว</u> 1. ให้ทำความสะอาดห้องพัก และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในที่พัก และเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศเป็นประจำทุกวัน 2. ที่อาบน้ำรวมไม่ควรรวมกลุ่มอาบน้ำพร้อมกัน ควรใช้อุปกรณ์อาบน้ำส่วนตัว เช่น ชันน้ำ สบู่ เป็นต้น 3. ให้ทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม กลอน ลูกบิดประตู อ่างล้างมือ และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อน หรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ สวิตช์ไฟ ฯลฯ ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ		- โครงการกำชับให้คนงานทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด - โครงการกำชับให้คนงานทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อน อย่างสม่ำเสมอ	- - -	- - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 4. ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งขณะปฏิบัติงานและอยู่ในที่พัก ไม่นำมือมาสัมผัส ใบหน้า ตา จมูก และปาก โดยไม่จำเป็น 5. การทำอาหารต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อน หยิบจับอาหาร ไม่กินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม และ ควรแยกของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อน เป็นต้น 6. ไม่ไปในสถานที่แออัด หรือที่รวมกันของคนหมู่มาก เช่น ตลาด หรือร้านค้า เป็นต้น 7.งดกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่ม การกิน การดื่ม ในช่วงเวลาเลิกงาน หรือวันหยุด 8. ให้สังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดการ ปฏิบัติงาน และแจ้งหัวหน้างานหรือนายจ้างทราบ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- โครงการกักขังให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาทั้งขณะปฏิบัติงานและอยู่ในที่พัก - โครงการกักขังให้คนงานล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อน หยิบจับอาหาร ไม่กินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม และควรแยก ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อน - โครงการกักขังให้คนงานไม่ไปในสถานที่แออัด หรือที่ รวมกันของคนหมู่มาก - โครงการกักขังให้คนงานงดกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการ รวมกลุ่ม การกิน การดื่มในช่วงเวลาเลิกงาน หรือวันหยุด อย่างเคร่งครัด - โครงการกักขังให้คนงานสังเกตตนเองและบุคคลใน ครอบครัวเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคติดต่อ COVID-19	- - - - -	- รูปที่ 41 อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล (PPE) - - - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อ คนงานก่อสร้าง • ผลกระทบต่อคนงานในด้านฝุ่นละออง		- โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างสวมใส่สวมหน้ากากอนามัย ที่สามารถกันฝุ่นละอองได้ ตลอดเวลาทั้งขณะปฏิบัติงานและ อยู่ในที่พัก - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงาน โครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ซึ่งภายในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่มีกิจกรรมการเปิดหน้าดิน - โครงการมีการให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับวิธีการใช้และ การบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรม Safety Talk เป็นประจำ	- - -	- รูปที่ 41 อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล (PPE) - - รูปที่ 45 Safety Talk

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงาน - กำหนดให้มีมาตรการชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงาน ดังนี้ - กรณีที่คนงานทำงานในช่วงงานเสาเข็มฐานรากที่ห่างจากเครื่องจักร ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 0.3, 2.9 และ 6.9 ชั่วโมง/วัน ตามลำดับ - กรณีที่คนงานทำงานในช่วงงานการขึ้นโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคที่ห่างจากเครื่องจักร ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 0.3, 2.9 และ 6.9 ชั่วโมง/วัน ตามลำดับ		- โครงการกำหนดให้มีมาตรการชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงานตามมาตรการกำหนด - โครงการจัดให้คนงานทำงานในช่วงงานเสาเข็มฐานรากที่ห่างจากเครื่องจักร ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 0.3, 2.9 และ 6.9 ชั่วโมง/วัน ตามลำดับ - ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค หากถึงช่วงการขึ้นโครงสร้างอาคารแล้ว โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- - -	- - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) - กรณีที่คนงานทำงานในช่วงงานตกแต่งภายในและภายนอก และการเก็บทำความสะอาดที่ห่างจากเครื่องจักร ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 0.4, 3.4 และ 8.2 ชั่วโมง/วันตามลำดับ - กรณีที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกัน ให้มีชั่วโมงการทำงานระหว่าง 0.3-8.2 ชั่วโมงต่อวัน แล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับเสียง (ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91ก ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559)		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค หากถึงช่วงงานตกแต่งภายในแล้ว โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - โครงการจัดให้มีชั่วโมงการทำงานระหว่าง 0.3-8.2 ชั่วโมงต่อวัน แล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับเสียง โดยปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่มีเครื่องจักรที่ทำงานพร้อมกันจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2. กำหนดให้มีมาตรการชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงสำหรับคนงาน 3. จัดให้มีอุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ได้แก่ ปลั๊กอุดหูชนิดโฟมมีสายแบบ 3M (1100/1110) (หรือเทียบเท่า) ที่มีค่าอัตราลดเสียง (NRR) ไม่ต่ำกว่า 29 ให้กับคนงาน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 4. วางแผนการก่อสร้างและการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขที่ต้นกำเนิดของเสียง หรือทางผ่านของเสียงก่อน เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมาย		- โครงการกำหนดให้คนงานทำงานในช่วงงานเสาเข็มฐานรากที่ห่างจากเครื่องจักร ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 0.3, 2.9 และ 6.9 ชั่วโมง/วันตามลำดับ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ได้แก่ ปลั๊กอุดหูชนิดโฟมมีสายให้กับคนงาน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง - โครงการจัดให้มีการวางแผนก่อสร้างและการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขที่ต้นกำเนิดของเสียง โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	- - -	- รูปที่ 41 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 5. จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงาน ที่ทำงานกับเครื่องจักรทุกคน และจำนวนสำรองเพื่อ ทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และติดป้ายเตือนบริเวณ ที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มี เสียงดัง 6. จัดให้มีกระจกปิดมิดชิดที่ Cabin ของ Tower Crane หากชำรุดต้องปรับปรุงซ่อมให้เรียบร้อย 7. กำหนดระเบียบปฏิบัติให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลด ระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อ คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรทุกคน และจำนวนสำรอง เพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และมีการติดป้ายเตือน บริเวณที่มีเสียงดังให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไว้ บริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - โครงการจัดให้มีกระจกปิดมิดชิดที่ Cabin ของ Tower Crane ตามมาตรการกำหนด - โครงการมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- - -	- - รูปที่ 42 การติดตั้ง กระจกบริเวณ Cabin ของ Tower Crane - รูปที่ 41 อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล (PPE)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อคนงาน - ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร - ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือ ถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน - ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะควรบุที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน - กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาที ต่อการทำงานล่วงหน้า 2 ชั่วโมง		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เป็นช่วงงานโครงสร้างอาคารและสาธารณูปโภค โดยทางโครงการจัดให้มีการใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักรในช่วงงานเสาเข็มและฐานรากเรียบร้อยแล้ว - โครงการจัดให้มีถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน - โครงการจัดให้มีที่นั่งที่บุด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือน - โครงการจัดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการจัดให้มีเวลาการทำงานตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.	- - - -	- - รูปที่ 41 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) - - รูปที่ 41 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) - ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงาน - จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างถูกวิธี - ติดป้ายป้ายสัญลักษณ์เตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) เพื่อควบคุม/ดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง และควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด		- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างถูกวิธีผ่านกิจกรรม Safety Talk - โครงการจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์เตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไว้บริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการอย่างชัดเจน - โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง และควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	- - -	- รูปที่ 45 Safety Talk - รูปที่ 41 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) - ภาคผนวก 16 ข เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 4. จัดให้มีบริษัทผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างที่มี คุณภาพและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 5. โครงการต้องดำเนินการบริหารจัดการด้านความ ปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงาน ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 6. จัดเก็บสารเคมีให้เป็นระเบียบและอย่าให้ขวาง ทางเดิน		- โครงการกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างที่มี คุณภาพและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการก่อสร้างก่อนเข้างานเป็นประจำทุกวัน ผ่านกิจกรรม Safety Talk - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็นระเบียบ	- - -	- - รูปที่ 45 Safety Talk - รูปที่ 43 พื้นที่ จัดเก็บสารเคมี

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 7. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป 8. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการมีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - โครงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง และหลอดไฟ ในเวลากลางคืน บริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- -	- ภาคผนวก 17 ข บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดซ้ำ - รูปที่ 46 ป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง - รูปที่ 33 หลอดไฟบริเวณด้านหน้าโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 9. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกร เครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตาม ระดับที่กำหนดไว้ 10. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 11. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง		- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ ของทาวเวอร์เครน ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงาน กำหนดโดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพควบคุม - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อน นำมาใช้งานโดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพควบคุม - โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลโดยมีเครื่องมือและ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ทำงาน ก่อสร้าง	- - -	- ภาคผนวก 18 ข เอกสารตรวจสอบ ส่วนประกอบของ อุปกรณ์ Tower Crane - ภาคผนวก 4 ข เอกสารตรวจสอบ เครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้าง - รูปที่ 47 ห้องปฐม พยาบาล และ เครื่องมืออุปกรณ์ การรักษาพยาบาล เบื้องต้น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 12. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 13. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากาก กันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 14. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 15. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการ เข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงมาตรการรักษาความ ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานอย่างเคร่งครัด - โครงการมีการควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้า และมีการจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- - - -	- รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย - รูปที่ 41 อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล (PPE) - ภาพผนวก 19ข คู่มือ รักษาความปลอดภัย ในการก่อสร้าง - รูปที่ 38 ถังดับเพลิง เคมี

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 4.2.2 ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง - ผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ • โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ - กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด • โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน - กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระดับเสียงอย่างเคร่งครัด • โรคผิวหนัง - กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด		- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการด้านระดับเสียงอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- - -	- - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) ผลกระทบต่อจิตใจ - โครงการต้องกำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 1. ล้อมรั้วทึบชั่วคราว โดยใช้ Steel Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2. ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง		- โครงการมีการกำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีการล้อมรั้วทึบชั่วคราว โดยใช้ Steel Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง - โครงการมีการกำกับผู้รับเหมาให้ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- - -	- - รูปที่ 3 รั้ว Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จุฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 3. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครนตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างทั้ง 4 ด้าน โดยกล้องวงจรปิดต้องใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครนตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการคอยสอดส่องดูแลโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 25 จุด โดยกล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง	- - - -	- รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ภาพผนวก 18 ข เอกสารตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ Tower Crane - รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - รูปที่ 48 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) - ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อโครงสร้างระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. - ดำเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่โครงสร้างและการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. ทั้งนี้หากบริษัทฯ ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการให้บริการ และ/หรือโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า บริษัทฯ จะแจ้งให้ รฟม. ทราบโดยทันที และจะดำเนินการแก้ไขตามแนวทางที่ผ่านความเห็นชอบของ รฟม. โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขทั้งหมด		- โครงการมีการควบคุมการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่โครงสร้างและการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่พบความเสียหายต่อโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า	-	- ภาคผนวก 19 ข คู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 ความเป็นส่วนตัว 1. ติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 3. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการเด็ดขาด แต่ทั้งนี้จะมีคนงานไม่เกิน 5 คน ที่ทำหน้าที่ควบคุมสโตรเวลากลางคืน นอกจากนี้จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เกิน 2 คน ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ		- โครงการจัดให้มีการติดป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไว้บริเวณประตูด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด - โครงการได้จัดให้มีคนงานที่ทำหน้าที่ควบคุมสโตรเวลากลางคืน จำนวน 2 คน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน (กะกลางวันและกลางคืน)	- - -	- รูปที่ 48 ป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลเจอร จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.3 ความเป็นส่วนตัว (ต่อ) 4. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท ห้ามซื้อ-ขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครอง ห้ามส่งเสียงดังเกินความจำเป็น โดยเฉพาะหลังเวลา 22.00 น. ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น พิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามลักขโมย ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต 5. จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง 6. กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน และดำเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน		- โครงการจัดให้มีการออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท ห้ามซื้อ-ขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครอง ห้ามส่งเสียงดังเกินความจำเป็น โดยเฉพาะหลังเวลา 22.00 น. ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามลักขโมย ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต - โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง - โครงการมีการกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน	- - -	- ภาคผนวก 26 ข เอกสารกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในพื้นที่ก่อสร้าง - - ภาคผนวก 12 ข บทลงโทษผู้กระทำความผิด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.4 การก่อสร้างสระว่ายน้ำ - สระว่ายน้ำของโครงการก่อสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมผ่านไม่ได้ มีลักษณะเป็นผนังเรียบพร้อมระบบวางระบายน้ำล้น 4.5 การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม - โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลมต่อพื้นที่ข้างเคียง		- ปัจจุบันระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทางโครงการยังไม่มีมีการก่อสร้างสระว่ายน้ำ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงช่วงงานที่ต้องก่อสร้างสระว่ายน้ำ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย ณ วันที่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลมสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	-
			-	- ภาคผนวก 1 ข เอกสารแจ้ง แผนการเจาะ เสาเชื่อมต่อผู้พัก อาศัยที่อยู่ติด พื้นที่โครงการ


ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.5 การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม (ต่อ) โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลมให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับ บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula) (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.6 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ - โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท เอทีซี-เจวี 27 จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างและสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด		- โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย ณ วันที่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- ภาคผนวก 1 ข เอกสารแจ้งแผนการเจาะเสาเชื่อมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

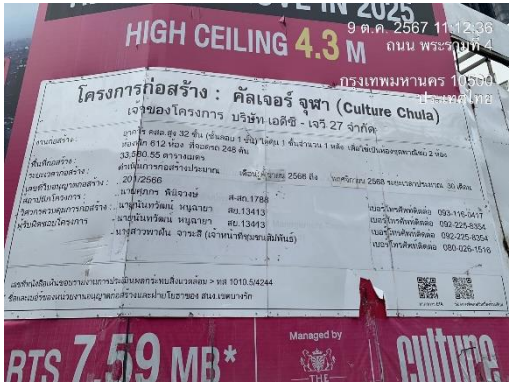มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ	
สภาพภูมิประเทศ	
 รูปที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	 รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คุณภาพอากาศ	
 รูปที่ 3 รื้อ Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	 รูปที่ 3 รื้อ Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
 รูปที่ 3 รื้อ Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	 รูปที่ 3 รื้อ Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
รูปที่ 3 รื้อ Steel Sheet รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)

คุณภาพอากาศ



รูปที่ 4 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม)



รูปที่ 5 รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ

รูปที่ 6 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)

คุณภาพอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 8 หัวสเปรย์ (Spray Nozzles)

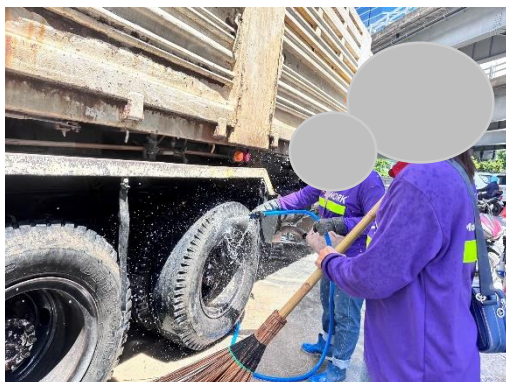

รูปที่ 9 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก

รูปที่ 10 การปิดทึบทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)

คุณภาพอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะ



รูปที่ 12 พื้นที่สำหรับกองวัสดุชั่วคราว

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)

คุณภาพอากาศ (ต่อ)



สิ่งเฝ้าระวัง	ค่า	ค่ามาตรฐาน	สรุปผล
ปริมาณฝุ่นละอองรวม : TSP	0.23	0.330	ผ่าน
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM 10	0.12	0.120	ผ่าน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	66	70	ผ่าน
ระดับเสียงสูงสุด	97	115	ผ่าน
ระดับเสียงสูงสุด : PPV	4	5	ผ่าน

รูปที่ 13 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสียง



รูปที่ 14 คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)



รูปที่ 15 ห้องเก็บเสียงในการตัด การเจียรกระเบื้อง และวัสดุต่างๆ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)

เสียง (ต่อ)



รูปที่ 15 ห้องเก็บเสียงในการตัด การเจียรกระเบื้อง และวัสดุต่างๆ (ต่อ)



รูปที่ 16 พื้นที่จอดรถ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)	
ความสิ้นเสีย	
 รูปที่ 17 ป้ายรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 รูปที่ 18 กล้องรับเสียงร้องเรียน
 รูปที่ 19 ป้ายประกาศระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)

คุณภาพน้ำผิวดิน



รูปที่ 20 ห้องส้วมแบบถอดประกอบ (Knock Down)



รูปที่ 21 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)

คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 23 ท่อระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 24 ตะแกรงดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ



รูปที่ 25 บ่อพักน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

น้ำใช้



รูปที่ 26 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำ



รูปที่ 27 ถังสำรองน้ำใช้

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม



รูปที่ 28 ปอดักดินจากการล้างล้อรถบรรทุก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)

การจัดการมูลฝอย



รูปที่ 29 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 30 ถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)

ระบบไฟฟ้า



9 ธ.ค. 2024 14:35:11
24-30 ถนน สุรวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10500
ประเทศไทย

รูปที่ 31 ป้ายประหยัดไฟ



9 ต.ค. 2567 11:21:06
894 ถนน พระรามที่ 4
กรุงเทพมหานคร 10500
ประเทศไทย



9 ต.ค. 2567 11:09:09
894/3 ถนน พระรามที่ 4
กรุงเทพมหานคร 10500
ประเทศไทย



9 ต.ค. 2567 11:08:10
894/7 ถนน พระรามที่ 4
กรุงเทพมหานคร 10500
ประเทศไทย



9 ต.ค. 2567 11:08:14
894/7 ถนน พระรามที่ 4
กรุงเทพมหานคร 10500
ประเทศไทย

รูปที่ 32 หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) ภายในอาคาร

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)

ระบบไฟฟ้า (ต่อ)



รูปที่ 32 หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) ภายในอาคาร (ต่อ)



รูปที่ 33 หลอดไฟบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)

การคมนาคม





รูปที่ 34 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งสินค้า วัสดุก่อสร้าง

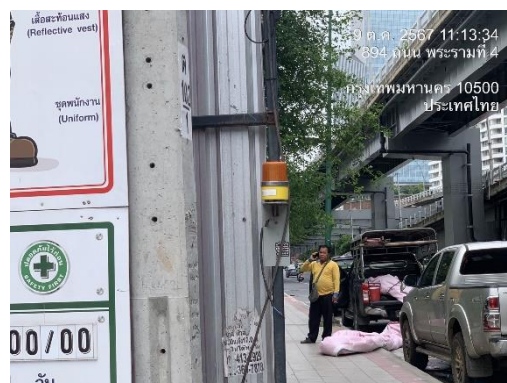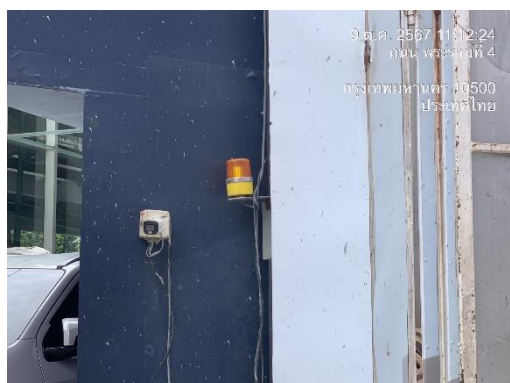

รูปที่ 35 ไฟกระพริบบริเวณทาง เข้า-ออก โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

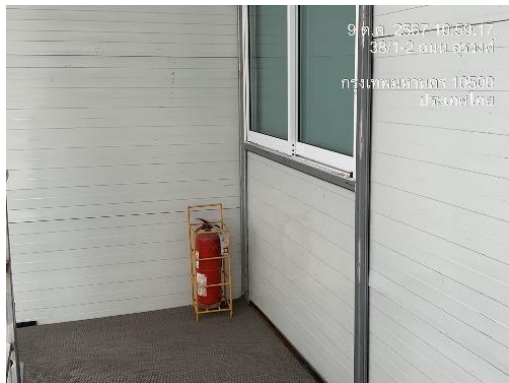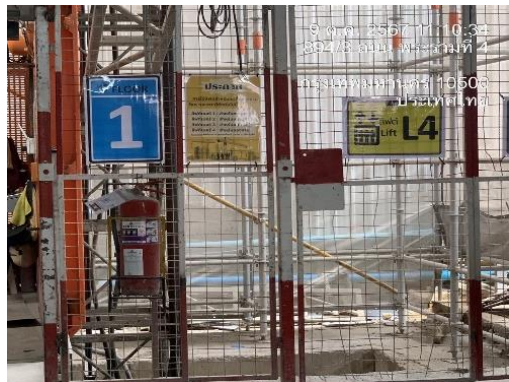คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)	
การป้องกันอัคคีภัย	
	
รูปที่ 36 ป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้าง	รูปที่ 37 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย
	
	
รูปที่ 38 ถังดับเพลิงเคมี	




รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	
	
	
	
	
รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้างเพื่อแจ้งแผนงานและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุมงานก่อสร้าง	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

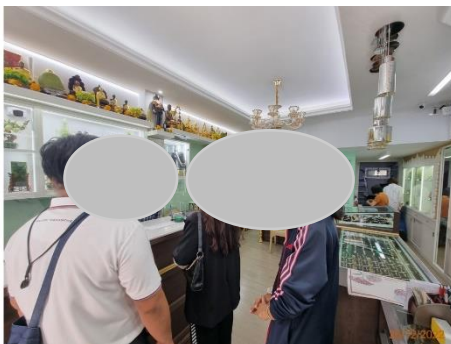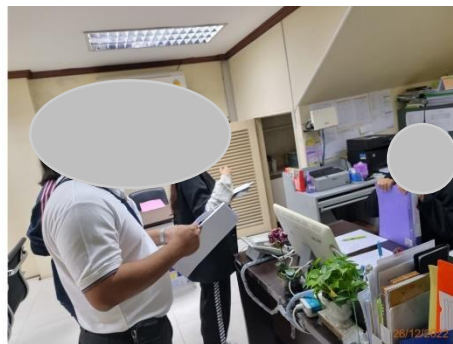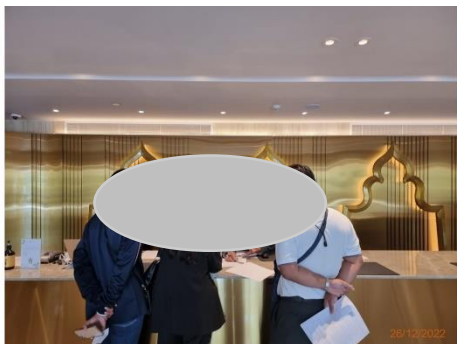

รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้างเพื่อแจ้งแผนงานและ
ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ทีมงานก่อสร้าง (ต่อ)

การสาธารณสุข



รูปที่ 40 ที่พักผ่อน ที่นั่งรับประทานอาหาร และน้ำดื่มสำหรับคนงาน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

การสาธารณสุข (ต่อ)



รูปที่ 40 ที่พักผ่อน ที่นั่งรับประทานอาหาร และน้ำดื่มสำหรับคนงาน (ต่อ)



รูปที่ 41 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

การสาธารณสุข (ต่อ)



รูปที่ 42 การติดตั้งกระจาก บริเวณ Cabin ของ Towet Crane

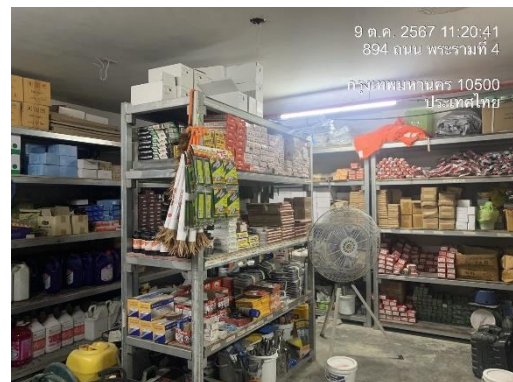

รูปที่ 43 พื้นที่จัดเก็บสารเคมี




รูปที่ 44 ที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือจุดบริการแอลกอฮอล์

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

การสาธารณสุข (ต่อ)

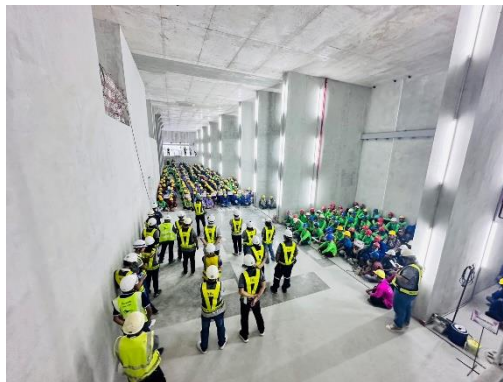

รูปที่ 45 Safety Talk



รูปที่ 46 ป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

การสาธารณสุข (ต่อ)



รูปที่ 47 ห้องปฐมพยาบาล และเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

การสาธารณสุข (ต่อ)



รูปที่ 48 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ




รูปที่ 49 ป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

การสาธารณสุข (ต่อ)

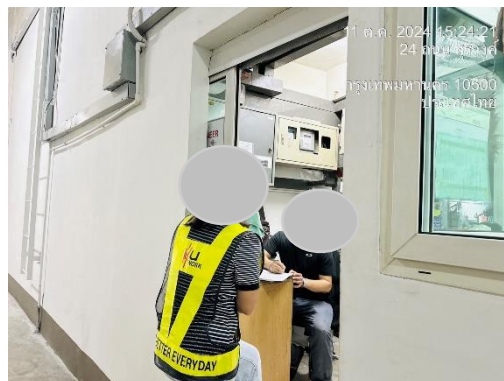

รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียงประจำสัปดาห์ (มวลงชนสัมพันธ์)
