


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567

THE
KEY

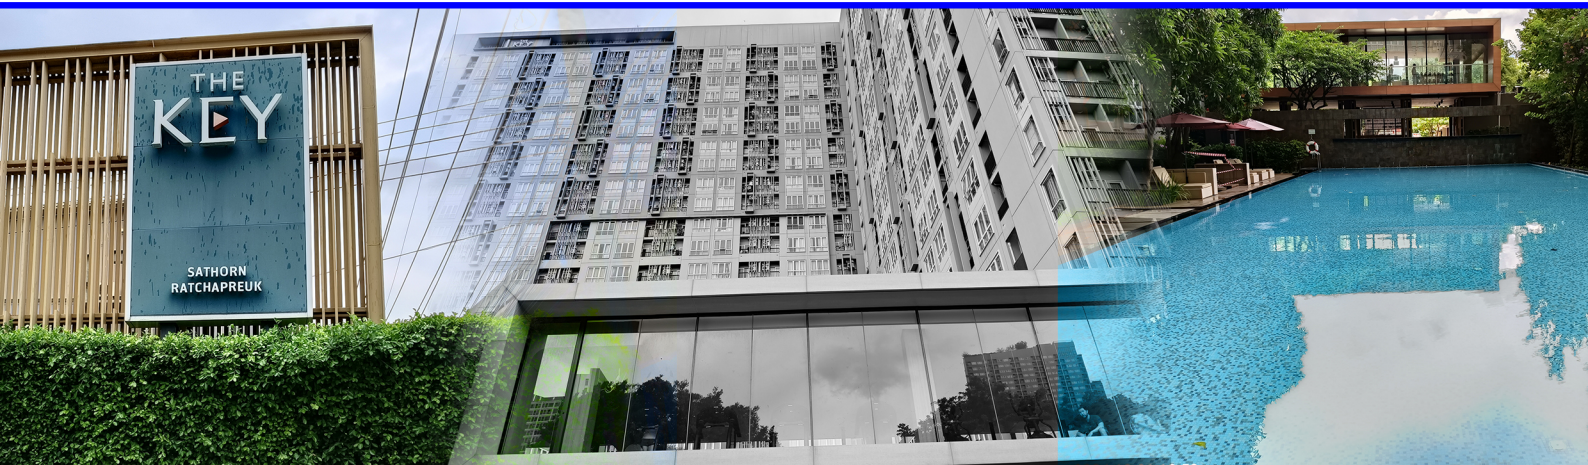

THE
KEY
SATHORN RATCHAPRUEK

โครงการ The Key สาทร-ราชพฤกษ์
เจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ สาทร – ราชพฤกษ์
ที่ตั้ง 33 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-4573911-2

มกราคม 2568



จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
1/94 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 035-800593, 035-226382-3 โทรสาร : 035-800594



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : 5ก039/67-2 วันที่รับรายงาน : 22 มกราคม 2568
ชื่อโครงการ : The Key สาทร-ราชพฤกษ์
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดีย์ สาทร-ราชพฤกษ์
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1009.5/10556 วันที่เห็นชอบ : 22 ตุลาคม 2555
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เขต : จอมทอง
ระยะโครงการ : เปิดดำเนินการ ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลากำหนด ผู้จัดทำรายงาน : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ผู้ส่ง : [REDACTED] เบอร์โทรผู้ส่ง : [REDACTED]

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ.....

ผู้รับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการรับรองการนำส่งรายงานเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2203-2953 อีเมล : pc2.bma@gmail.com

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการเขตจอมทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ
ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ชุด (รายงาน 1 ฉบับ แผ่น CD 1 แผ่น)

ตามที่ โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 33 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส
1009.5/10556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงาน
อนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ สาทร – ราชพฤกษ์ ได้ว่าจ้าง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567
แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นิติ

โดยบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

มีนายสุชาติ ม่วงศรีจันทร์

เป็นผู้กระทำการในฐานะ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

23/1/68

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์

วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 33 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ สาทร – ราชพฤกษ์ ฉบับประจำเดือน


- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567
() อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน


ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง



นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์**

1. ชื่อโครงการ : โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 33 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ สาทร – ราชพฤกษ์
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 33 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02 457 3911-2
5. จัดทำโดย : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/10556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ครึ่งสุดท้าย : ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 ระยะดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
8. หน่วยงานอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
9. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้นจำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักอาศัย จำนวน 834 ห้อง ร้านค้า 2 ร้าน
 - ขนาดพื้นที่โครงการ : พื้นที่โครงการขนาด 7 - 2 - 57.5 ไร่ (12,230 ตารางเมตร)
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - การบำบัดน้ำเสีย : โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจะแยกส่วนการบำบัดออกเป็น อาคาร A และอาคาร Bเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศตะกอนเวียนกลับแบบยืดเวลา (Extended Aeration Activated Sludge (A/S) โดยอาคาร A สามารถ รองรับน้ำเสียได้ 373 ลบ.ม./วัน อาคาร B สามารถรองรับน้ำเสียได้ 64 ลบ.ม./วัน อาคาร C และ อาคาร D ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง สามารถรองรับน้ำเสียสูงสุด 5.0 และ 1.0 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ โดยจัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทน และ Aerosol แต่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้
 - อื่นๆ : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 1

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	V
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ	
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-4
1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-56
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-9
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ข	เอกสารจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ฉ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.2-1	ที่ตั้งและ การเดินทางเข้าถึงโครงการ
1.2-2	สภาพปัจจุบัน
1.3.2-1	ผังบริเวณโครงการและ ระยะถอยร่นของโครงการ
1.3.3-1	ผังแสดงเส้นทางการจราจรภายในโครงการและเส้นทางสำหรับให้คนเดินภายในโครงการ
1.3.3-2	ระบบการจราจรและที่จอดรถภายในโครงการปัจจุบัน
1.3.4-1	ระบบน้ำใช้ในโครงการ ปัจจุบัน
1.3.5-1	ระบบไฟฟ้าของโครงการ ปัจจุบัน
1.3.6-1	จุดรวมคนเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้
1.3.6-2	ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการในปัจจุบัน
1.3.7-1	แสดงท่อรวบรวมน้ำเสียและตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
1.3.7-2	แบบขยายและรูปตัดระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A
1.3.7-3	แบบขยายและรูปตัดระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B
1.3.7-4	ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอาคาร A
1.3.7-5	ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอาคาร B
1.3.7-6	แบบขยายรูปตัดระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C และ อาคาร D
1.3.7-7	ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย อาคาร C และ อาคาร D
1.3.7-8	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในปัจจุบัน
1.3.8-1	การระบายน้ำฝนและทิศทางการไหลของน้ำภายในโครงการ และที่ตั้งบ่อน้ำของโครงการ
1.3.9-1	ตำแหน่งห้องพักขยะรวมของโครงการ จุดจอดรถและเส้นทางการเดินทางขยะภายในโครงการ
1.3.9-2	การจัดการขยะของโครงการในปัจจุบัน
1.3.11-1	ผังพื้นที่สีเขียวโครงการ
1.3.11-2	ผังพื้นที่สีเขียวปัจจุบันของโครงการ
1.3.12-1	สรวายน้ำของโครงการในปัจจุบัน
2-1	พื้นที่ว่างตามระยะถอยร่นที่โครงการกำหนดไว้ในรายงาน EIA (ภาพ ณ วันที่ 07/05/67)
2-2	พื้นที่สีเขียวรอบโครงการ (ภาพ ณ วันที่ 07/05/67)
2-3	ตัวอาคารและการเลือกใช้กระจกตัดแสงเพื่อลดการสะท้อนแสง
2-4	การติดตั้งม่านภายในห้องพักเพื่อลดแสงอาทิตย์ที่จะเข้ามา

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2-5	ลูกบ้านปลูกต้นไม้ที่ระเบียง	2-37
2-6	ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน	2-37
2-7	ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ	2-38
2-8	ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.	2-38
2-9	ล้างทำความสะอาดถนนรอบโครงการ	2-38
2-10	อาคารจอดรถและ พัฒลมระบายอากาศภายในอาคารจอดรถ	2-39
2-11	รั้วรอบโครงการ	2-40
2-12	ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารต่าง ๆ และ ระบบกำจัด aerosol และ มีเทน	2-41
2-13	เจ้าหน้าที่ตักไขมัน และสูบล้างท่อส่วนเกิน	2-42
2-14	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	2-42
2-15	เจ้าหน้าที่ดูแลคลองตาม่วง และ ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์	2-42
2-16	เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว รอบโครงการ	2-42
2-17	สภาพลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ภายในโครงการ (ภาพเมื่อวันที่ 07/05/67)	2-43
2-18	ลูกศรบอกเส้นทางการเดินรถภายในโครงการ และทางเท้าแยกจากถนนให้ลูกบ้านใช้เดิน	2-43
2-19	ไม้กั้นสำหรับรถเข้าออกภายในโครงการห่างจากถนนหน้าโครงการ	2-43
2-20	เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเวลาเข้าออก	2-43
2-21	เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเวลาเข้าออก	2-44
2-22	อุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ประหยัดน้ำ	2-44
2-23	การรณรงค์ประหยัดน้ำ	2-44
2-24	ตรวจสอบเส้นท่อประปาการรั่วซึม	2-44
2-25	การอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ	2-45
2-26	การจัดการขยะภายในโครงการ	2-45
2-27	ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคสิ่งของให้เด็กที่ขาดโอกาส	2-47
2-28	ป้ายรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงโถส้วม	2-48
2-29	บ่อน้ำของโครงการ	2-48
2-30	การทำความสะอาดรางระบายน้ำ	2-48
2-31	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2-48
2-32	การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ	2-51

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2-33	มาตรการป้องกันด้านอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม	2-53
2-34	ห้องอ่านหนังสือ,ห้องประชุมและห้องฟิตเนต ส่วนกลางที่โครงการจัดไว้ให้	2-53
2-35	กล่องรับฟังความคิดเห็นภายในโครงการ	2-54
3.5.1-1	จุดเก็บน้ำตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำการบำบัดน้ำเสีย	3-9
3.5.3-1	การเก็บน้ำตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน	3-11
3.5.3-2	กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำแหล่งรองรับน้ำสาธารณะคลองตาม่วงย้อนหลัง	3-17
3.5.3-3	กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำแหล่งรองรับน้ำสาธารณะ ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ ย้อนหลัง	3-21
3.5.4-1	การเก็บน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	3-24
3.5.4-2	กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียอาคาร ย้อนหลัง	3-45

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3.2-1	การประมาณจำนวนประชากรของโครงการ	1-9
1.3.3-1	การจัดที่จอดรถของโครงการ	1-10
1.3.4-1	แสดงความจุของถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคาแต่ละอาคาร	1-14
1.3.4-2	สรุปปริมาณน้ำใช้และการสำรองน้ำของโครงการ	1-15
1.3.7-1	รายละเอียดปริมาณน้ำเสียแต่ละอาคาร	1-28
1.4.1-1	แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-56
1.4.2-1	แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)	1-57
2.2-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.4-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key สาทร – ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)	3-3
3.5.2-1	ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-10
3.5.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งรองรับน้ำสาธารณะจุดระบายน้ำทิ้ง	3-12
3.5.3-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งรองรับน้ำสาธารณะจุดระบายน้ำทิ้ง ย้อนหลัง	3-14
3.5.4-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย อาคาร A	3-25
3.5.4-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย อาคาร B	3-26
3.5.4-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	3-27
3.5.4-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย อาคาร A ย้อนหลัง	3-29
3.5.4-5	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย อาคาร B ย้อนหลัง	3-34
3.5.4-6	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อาคาร A+C ย้อนหลัง	3-39
3.5.4-7	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อาคาร B+D ย้อนหลัง	3-42
4-1	มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1
4-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ	4-2
4-3	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ	4-3
