
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีซีซีซีแอล อโศก จำกัด เป็นผู้พัฒนา โครงการอาคารชุดพักอาศัยวิลล่า อโศก ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดวิลล่า อโศก เข้ามาบริหารจัดการแล้ว โครงการอาคารชุดพักอาศัยวิลล่า อโศก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 42 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีจำนวนชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 525 ห้อง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1588 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา หรือ 6,860 ตารางเมตรโดยโครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ทส.1009.5/1050 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 (ภาคผนวก ก) โดยหนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุดวิลล่า อโศก ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยวิลล่า อโศก (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัยวิลล่า อโศก

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน้ำ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยวิลล่า อโศก (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ดัชนีที่ตรวจวัด - ปริมาณขยะและสภาพห้องพักขยะ ความถี่ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่มีปริมาณขยะตกค้าง	✓ - มีพนักงานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและทำความสะอาด บริเวณห้องพัสดุอยู่ประจำชั้นและห้องพัสดุอยู่รวมของโครงการทุกวัน	-	ภาพที่ 2.2-9 การจัดการมูลฝอย
2. คุณภาพน้ำ	ดัชนีที่ตรวจวัด - pH, BOD, Suspended Solids, Oil & Grease, คลอรีนตกค้าง, ฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อัตราการไหลของน้ำเสีย ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง	- น้ำเสียเข้าระบบบำบัด - น้ำเสียออกระบบบำบัด - บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ	✓ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 3 จุด คือ น้ำเสียเข้าระบบบำบัด น้ำเสียออกระบบบำบัด และบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ โดยมีพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Oil & Grease, Residues Chlorine และ Fecal Coliform Bacteria เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้มาตรฐานอ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พ.ศ. 2567 และสำหรับการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำเสียทางโครงการได้มีการบันทึกลงในแบบรายงานทส.1 แล้ว	-	ภาพผนวก ง-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ดัชนีที่ตรวจวัด - รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ	✓ - มีช่างประจำโครงการดูแลตรวจสอบท่อ/รางระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่ามีอาการชำรุดเสียหายจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ปกติ พร้อมทั้งมีการสังเกตการณ์ระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ และเศษสิ่งสกปรกในระบอบระบายน้ำ หากพบว่ามีอาการอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที	-	ภาพที่ 2.2-10 การระบายน้ำ

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยวิลล่า อโศก (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	ดัชนีที่ตรวจวัด - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ความถี่ - 2 ครั้ง/ปี	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	✓ - มีช่างประจำโครงการดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพระบบป้องกันอัคคีภัย อย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ภาคผนวก ค-1 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล
	ดัชนีที่ตรวจวัด - อบรมการใช้อุปกรณ์และซ้อมการอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ความถี่ - ปีละ 1 ครั้ง	- จัดให้มีการอบรมวิธี การใช้ อุปกรณ์ระบบอัคคีภัย	✓ - มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งได้มีการติดป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงติดไว้ที่ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกจุด	-	ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ดัชนีที่ตรวจวัด - มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สำนักนิติบุคคล ความถี่ - ตลอดระยะดำเนินการ	-	✓ - หากชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการจริง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานนิติบุคคล ชั้น 1 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติวิธี	-	ภาพที่ 2.2-13 สำนักงานนิติบุคคลฯ

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย วิลล่า อโศก ได้มีการกำหนดให้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

คุณภาพน้ำทิ้ง โดยมีจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำออกจากระบบของอาคาร และบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะ และพารามิเตอร์ทั้งหมด 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid) น้ำมันไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residues Chlorine) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) และอัตราการไหลของน้ำเสีย (Flow rate) โดยเก็บตัวอย่างเดือนแรกของการเดินระบบ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการอาคารชุดพักอาศัย วิลล่า อโศก ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3.5.2-1

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการการตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	- pH	- Electrometric	15/07/67	APHA-AWWA-WEF Edition 23 rd ed, 2017
- น้ำเสียเข้าระบบบำบัด	- BOD	- Membrane Electrode	15/08/67	
- น้ำเสียออกระบบบำบัด	- Suspended Solid	- Dried at 103-105 °C	10/09/67	
- บ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อน	- Oil & Grease	- Soxhlet Extraction Method	10/10/67	
ระบายออกท่อระบายน้ำ	- Residues Chlorine	- Colorimetric	12/11/67	
สาธารณะ	- Fecal Coliform	- Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	12/12/67	


3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย วิลล่า อโศก กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำทิ้ง โดยมีจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำออกจากระบบของอาคาร และบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะ และมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Oil & Grease, Residues Chlorine, Fecal Coliform Bacteria และ Flow rate โดยเก็บตัวอย่างเดือนแรกของการเดินระบบ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โครงการจึงได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 3 จุด คือ น้ำเสียเข้าระบบบำบัด น้ำเสียออกระบบบำบัด และบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะ (ภาพที่ 3.5.3-1) โดยมีพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมด 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Oil & Grease, Residues Chlorine และ Fecal Coliform Bacteria ที่ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ โดยผลการตรวจวัดเป็น ดังตารางที่ 3.5.3-1 สำหรับอัตราการไหลของน้ำเสีย ทางโครงการได้จัดบันทึกลงในแบบรายงานทส.1 ดังภาคผนวก ค-6

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง


จากการเก็บตัวอย่างน้ำเสียออกระบบบำบัด และบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะ พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พ.ศ. 2567 ยกเว้น ค่า BOD ในบางเดือน อนึ่ง ให้ทางโครงการหมั่นทำความสะอาดท่อระบายน้ำฝนรอบๆ อาคาร เพื่อลดการเกิดตะกอนแขวนลอย และสิ่งสกปรกที่อยู่ในระบบระบายน้ำ

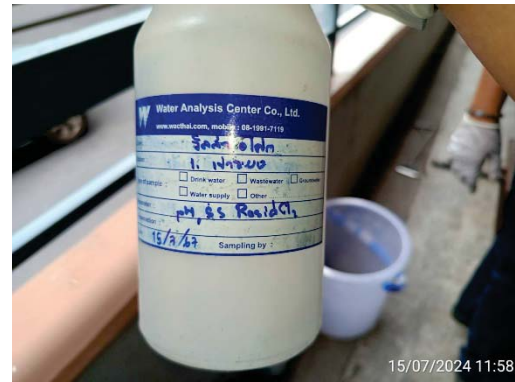

น้ำเสียเข้าระบบบำบัด



น้ำเสียออกระบบบำบัด

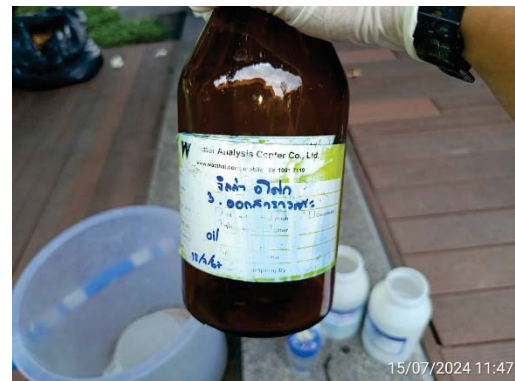

บ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะ

ภาพที่ 3.5.3-1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์					
		pH	BOD (mg/L)	Residues Chlorine (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	FCB (MPN/100 mL)
น้ำเสียเข้าระบบบำบัด	15/07/67	7.9	130	0.01	137	45	790,000
	15/08/67	7.5	44	0.03	77	9	54,000,000
	10/09/67	7.7	58	0.03	64	7	1,300,000
	10/10/67	7.6	98	0.02	72	12	350,000
	12/11/67	7.6	75	0.04	53	7	5,400,000
	12/12/67	7.8	98	0.03	30	<2	3,500,000
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		7.5-7.9	44-130	0.01-0.04	30-137	<2-45	350,000-54,000,000
น้ำเสียออกระบบบำบัด	15/07/67	8	19	0.01	30	2	170,000
	15/08/67	7.7	8	0.03	<10	<2	11,000
	10/09/67	7.9	16	0.03	<10	<2	70,000
	10/10/67	7.6	20	0.02	15	<2	240,000
	12/11/67	7.5	19	0.04	25	<2	23,000
	12/12/67	7.6	26	0.03	18	<2	23,000
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		7.5-8	8-26	0.01-0.04	<10-30	<2-2	11,000-240,000
บ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อน ระบายออกท่อระบายน้ำ สาธารณะ	15/07/67	8	14	0.01	30	<2	45,000
	15/08/67	7.7	<4	0.03	<10	<2	79,000
	10/09/67	7.9	13	0.03	<10	<2	130,000
	10/10/67	7.7	17	0.02	<10	<2	130,000
	12/11/67	7.6	13	0.03	18	<2	130,000
	12/12/67	7.6	18	0.02	14	<2	49,000
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		7.6-8	<4-18	0.01-0.03	<10-30	<2	45,000-130,000
มาตรฐาน		5.5-9.0	≤20	-	≤30	≤20	-

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พ.ศ. 2567

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายกฤษณะ ธรรมชัย	เลขทะเบียน	: ว-190-จ-0029
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางนิรมล ผดุงสงฆ์	เลขทะเบียน	: ว-190-ค-0001
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์	: บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด	เบอร์โทรศัพท์	: 035-800593
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวอรรณณ สี่ใต้	เลขทะเบียน	: ว-190-จ-0007

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จากการเก็บตัวอย่างน้ำเสียออกระบบบำบัด
และจุดระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์					
		pH	BOD (mg/L)	Residues Chlorine (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	FCB (mg/L)
น้ำเสียเข้าระบบบำบัด	04/01/67	7.8	114	<0.01	406	57	1,300,000
	07/02/67	7.7	103	<0.01	57	11	35,000,000
	04/03/67	7.9	114	<0.01	28	9	16,000,000
	02/04/67	8	302	0.01	336	83	24,000,000
	06/05/67	7.6	103	0.03	88	17	5,400,000
	14/06/67	7.6	197	0.01	157	72	790,000
	15/07/67	7.9	130	0.01	137	45	790,000
	15/08/67	7.5	44	0.03	77	9	54,000,000
	10/09/67	7.7	58	0.03	64	7	1,300,000
	10/10/67	7.6	98	0.02	72	12	350,000
	12/11/67	7.6	75	0.04	53	7	5,400,000
	12/12/67	7.8	98	0.03	30	<2	3,500,000
น้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	04/01/67	7.8	50	<0.01	<10	<2	230,000
	07/02/67	7.7	26	<0.01	25	<2	490,000
	04/03/67	7.6	29	<0.01	18	<2	45,000
	02/04/67	8	29	0.01	26	5	170,000
	06/05/67	7.7	27	0.02	21	4	4,000
	14/06/67	7.6	118	0.01	92	10	45,000
	15/07/67	8	19	0.01	30	2	170,000
	15/08/67	7.7	8	0.03	<10	<2	11,000
	10/09/67	7.9	16	0.03	<10	<2	70,000
	10/10/67	7.6	20	0.02	15	<2	240,000




ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์					
		pH	BOD (mg/L)	Residues Chlorine (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	FCB (mg/L)
น้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	12/11/67	7.5	19	0.04	25	<2	23,000
	12/12/67	7.6	26	0.03	18	<2	23,000
	31/01/65	8	15	0.03	22	3	17,000
บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกท่อ ระบายน้ำสาธารณะ	26/02/65	7.9	8	0.03	<10	<2	23,000
	19/03/65	8	22	0.05	30	6	790,000
	25/04/65	8.1	36	0.04	16	<2	7,800
	19/05/65	7.7	16	<0.01	14	<2	130,000
	14/06/65	7.9	5	<0.01	<10	<2	7,800
	08/07/65	7.8	8	<0.01	<10	<2	68,000
	05/08/65	7.8	13	0.03	<10	<2	7,800
	05/09/65	7.9	18	<0.01	<10	<2	7,600
	05/10/65	7.7	20	0.02	16	<2	13,000
	25/11/65	8	6	0.05	<10	<2	4,500
	28/12/65	8.1	8	0.02	<10	<2	200
	17/01/66	7.9	8	0.01	<10	<2	13,000
	08/02/66	7.9	18	0.01	<10	<2	130,000
	10/03/66	8.1	14	0.03	<10	<2	7,800
	07/04/66	8	8	0.02	<10	<2	23,000
	08/05/66	8	16	0.02	10	<2	230,000
	12/06/66	8	13	0.02	11	<2	200
	10/07/66	7.5	20	0.01	13	<2	9,200
	08/08/66	8	17	0.02	<10	<2	17,000




ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์					
		pH	BOD (mg/L)	Residues Chlorine (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	FCB (mg/L)
บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกท่อ ระบายน้ำสาธารณะ (ต่อ)	05/09/66	7.9	13	<0.01	<10	<2	13,000
	03/10/66	8.1	14	0.01	<10	<2	33,000
	14/11/66	7.9	18	0.01	12	<2	49,000
	08/12/66	8.2	17	0.03	<0.10	<2	4,500
	04/01/67	7.9	17	<0.01	<10	<2	13,000
	07/02/67	8	17	<0.01	15	<2	23,000
	04/03/67	7.8	20	<0.01	12	<2	2,000
	02/04/67	7.9	17	0.01	10	<2	110,000
	06/05/67	7.6	25	0.01	18	<2	7,000
	14/06/67	7.6	38	0.01	16	<2	33,000
	15/07/67	8	14	0.01	30	<2	45,000
	15/08/67	7.7	<4	0.03	<10	<2	79,000
	10/09/67	7.9	13	0.03	<10	<2	130,000
	10/10/67	7.7	17	0.02	<10	<2	130,000
	12/11/67	7.6	13	0.03	18	<2	130,000
	12/12/67	7.6	18	0.02	14	<2	49,000
มาตรฐาน		5.5-9.0	≤20	≤1.0	≤30	≤20	-




หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พ.ศ. 2567

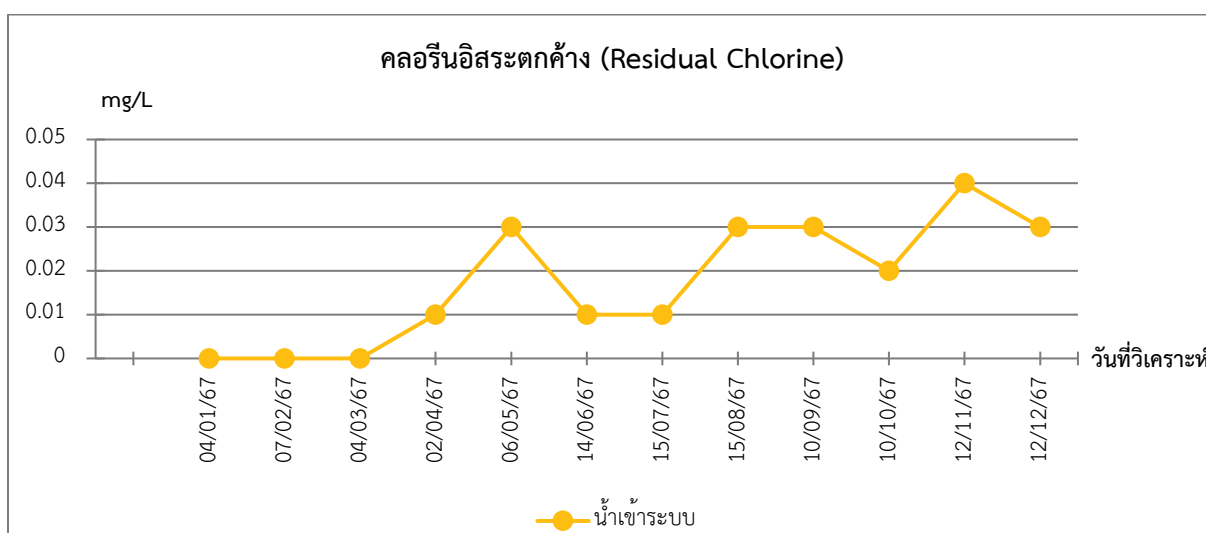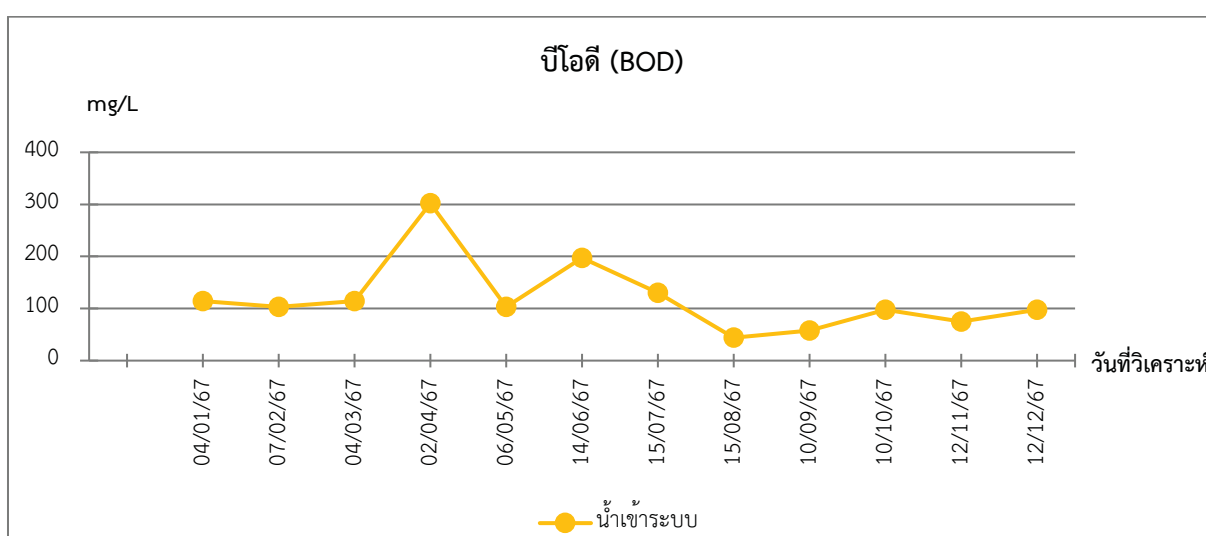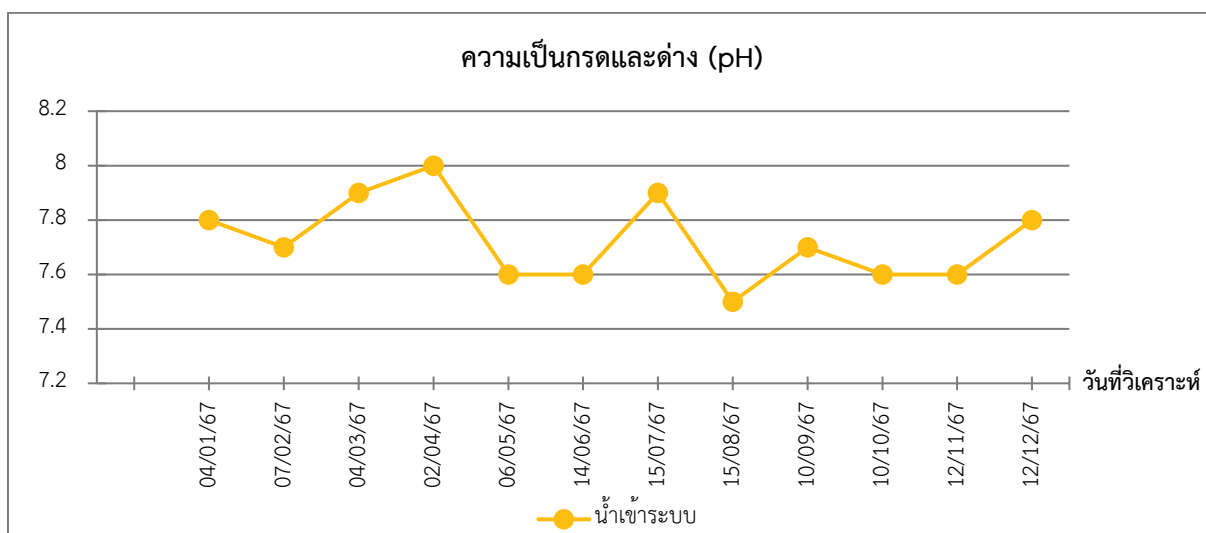




ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำเข้าจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในปี พ.ศ. 2567

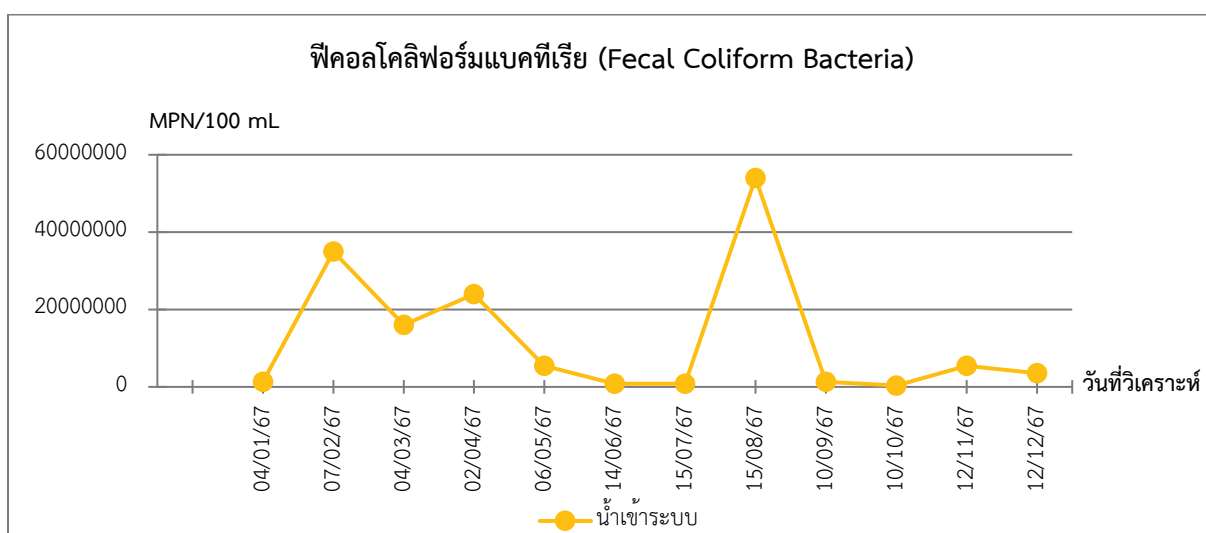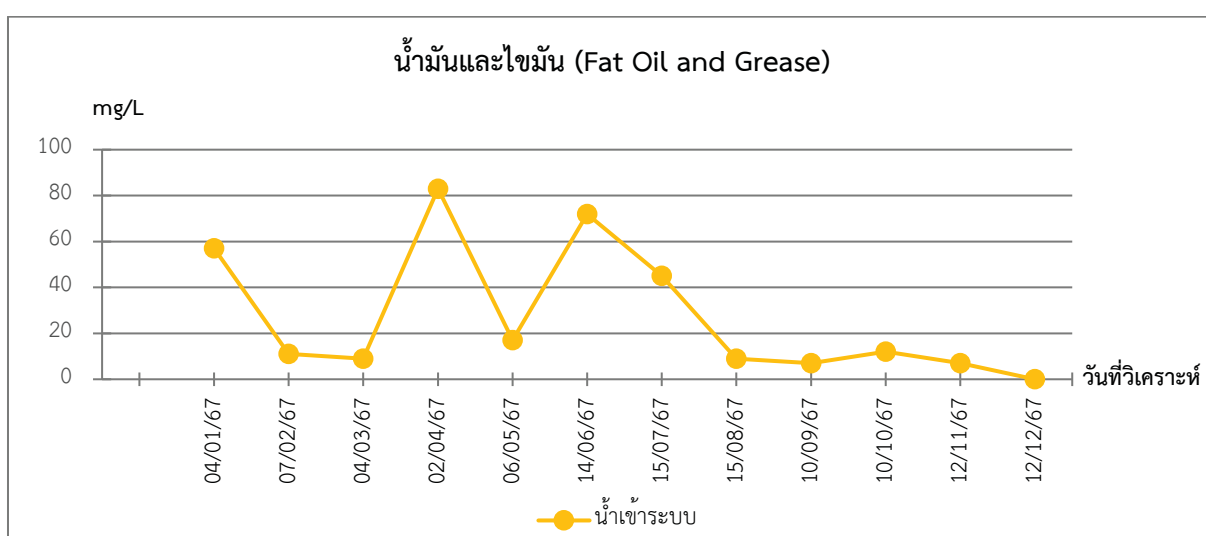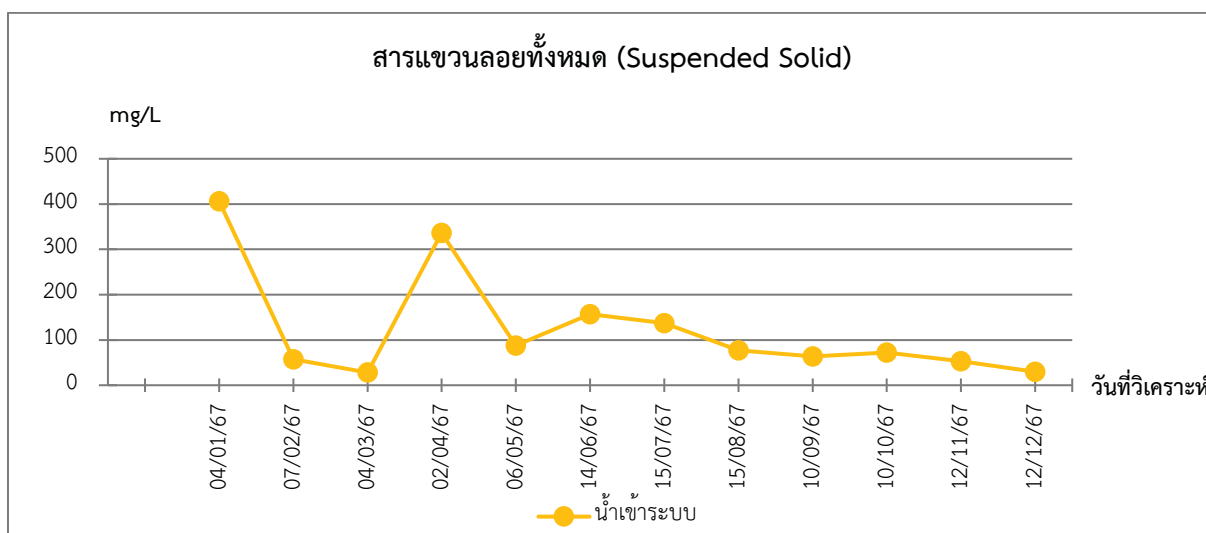

ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำเข้าจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ในปี พ.ศ. 2567

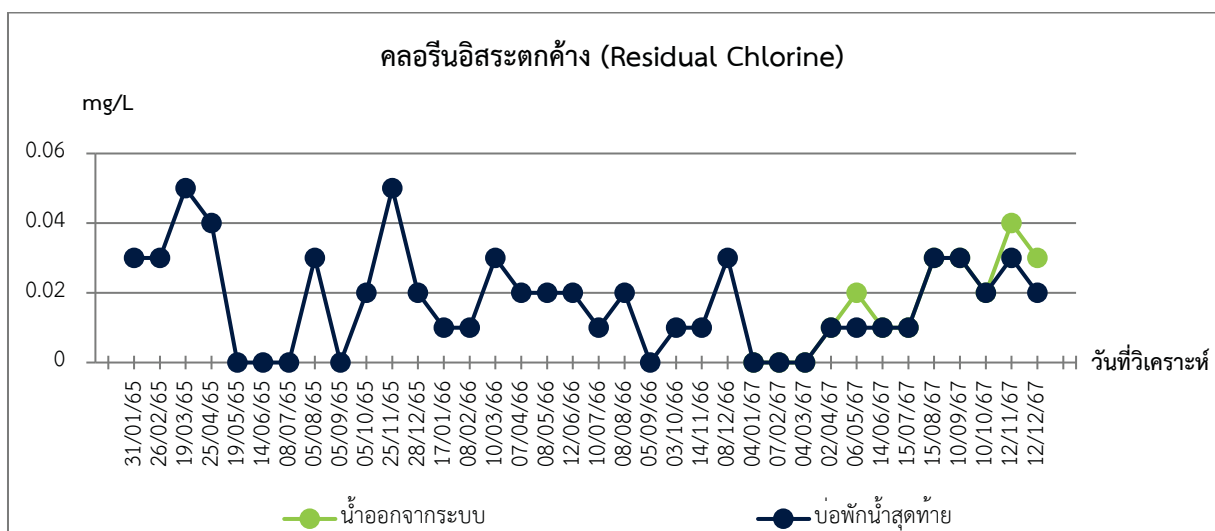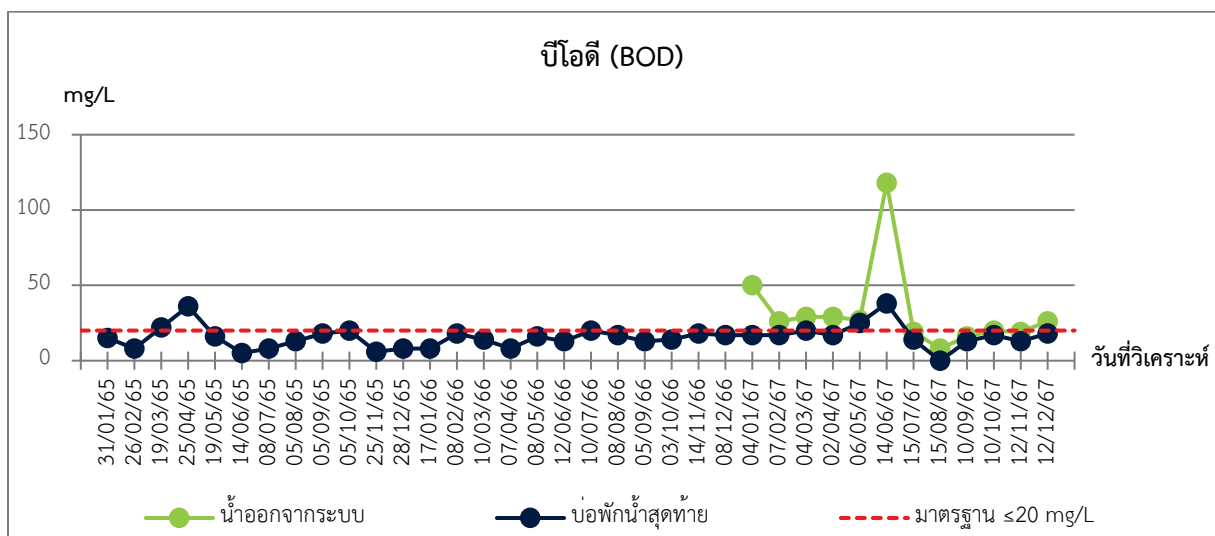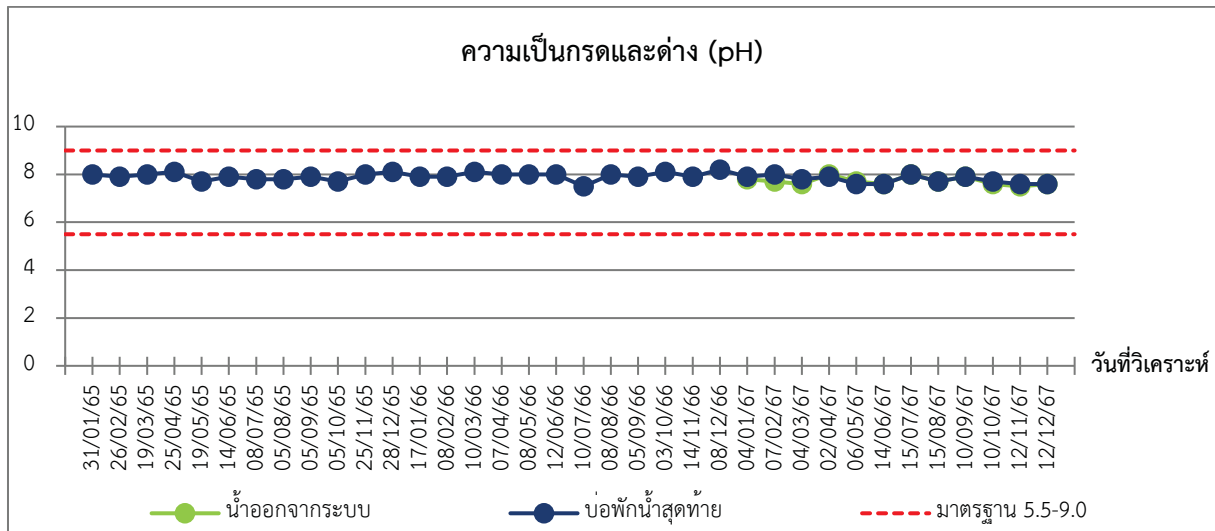

ภาพที่ 3.5.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และ บ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2565 ถึง ปัจจุบัน

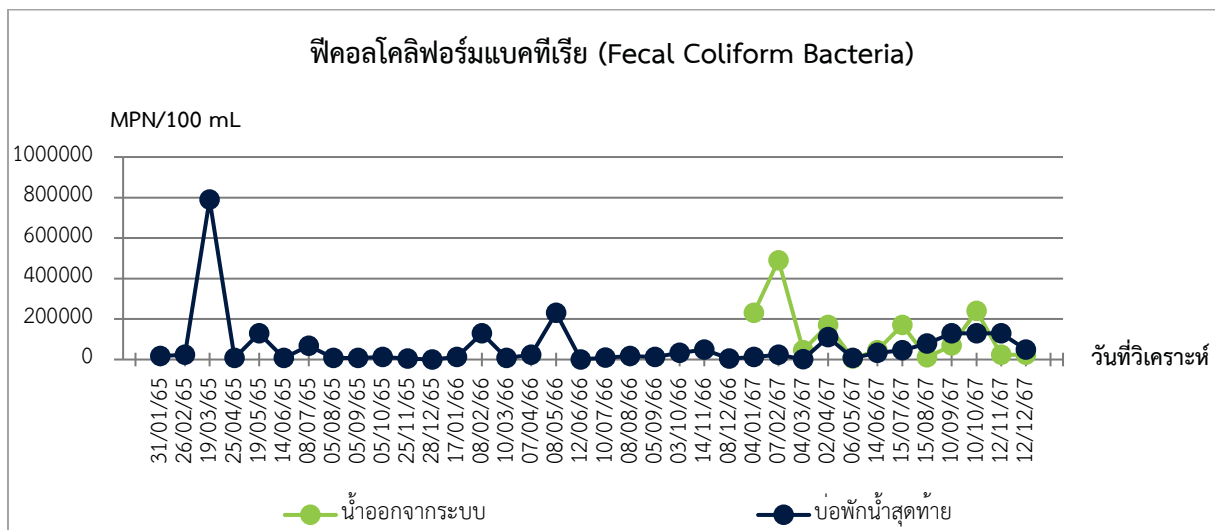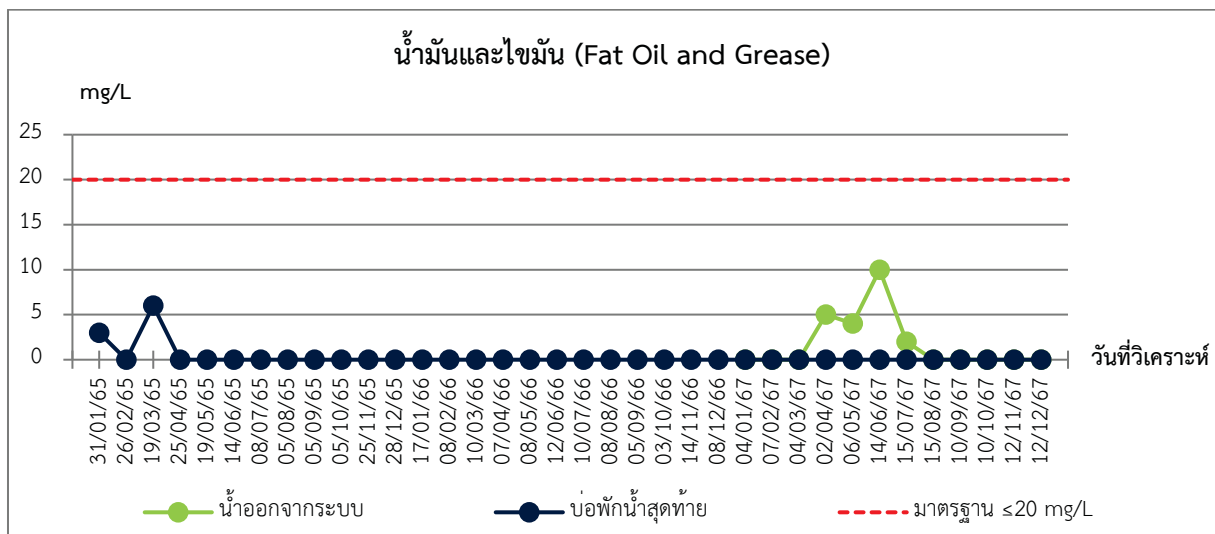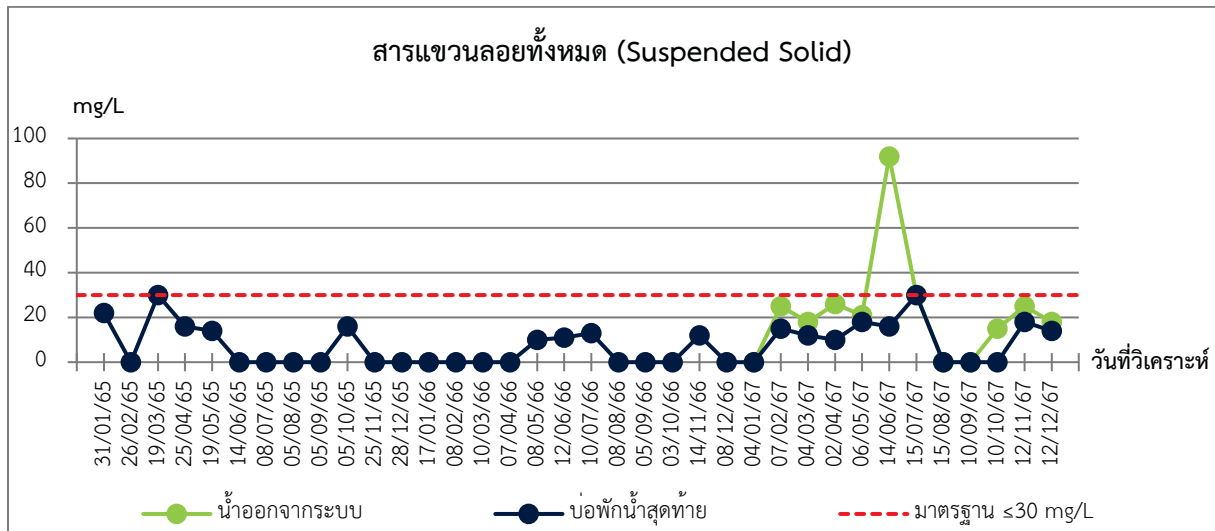

ภาพที่ 3.5.3-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด
น้ำเสีย และบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2565 ถึง ปัจจุบัน
