

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ

จากการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการและสภาพทั่วไปโดยรอบโครงการพบว่าผู้เข้าอยู่อาศัยเต็มโครงการแล้ว และทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 มีผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพน้ำผิวดิน/การ บำบัดน้ำเสีย	1) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ	- มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	 ระบบบำบัดน้ำเสีย
	2) สุ่มตะกอนในบ่อเก็บกักตะกอนอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง	- มีการสุ่มตะกอนออกจากบ่อเก็บกักตะกอน จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบริเวณจุด ปล่อยน้ำจากถังเติมคลอรีน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลัง ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า SS เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ก	ไม่มี	ภาคผนวก ก
	3) ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ และควรดักไขมันออกจากบ่อเป็น ประจำอย่างน้อยวันเว้นวัน โดยดักใส่ถุงแล้ว นำไปทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บ ขนมูลฝอยของเทศบาลนครลำปางมาดำเนินการ เก็บขนไปกำจัดต่อไป	- มีการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบบ่อดัก ไขมัน พร้อมทั้งดักไขมันออกจากบ่ออย่าง สม่ำเสมอผ่านเสียงตามสาย โดยไขมันที่ดัก ออกจะนำไปใส่ถุงแล้วนำไปทิ้งยังภาชนะ รองรับมูลฝอยเพื่อให้เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัด	ไม่มี	 ลำโพงกระจายเสียง

ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพน้ำผิวดิน/การ บำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	4) นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้หรือสนามหญ้าในบริเวณพื้นที่ โครงการ	- จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีการนำ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ ใหม่	- ให้เจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้นว่า ควรนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำหรือไม่ อย่างไร	-
	5) โครงการต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบ่อดักไขมันให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยจัดให้รองรับน้ำเสียจาก ห้องครัวก่อนไหลเข้าถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ	- มีการปรับตำแหน่งของบ่อดักไขมันให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยจัดให้ รองรับน้ำเสียจากห้องครัวก่อนไหลเข้า ถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ ตามที่ มาตรการกำหนด	ไม่มี	-
	6) ต้องจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สำหรับบำบัด น้ำเสียขั้นต้นจากโรงเรียนอนุบาล โดยขนาดและ ประสิทธิภาพของถังบำบัดน้ำเสียเป็นแบบถังเกรอะ- ถังกรองไร้อากาศที่มีปริมาตรของถังเกรอะรวมไม่น้อย กว่า 8.0 ลบ.ม. และถังกรองไร้อากาศรวมไม่น้อยกว่า 5.0 ลบ.ม. ซึ่งจะสามารถบำบัดน้ำเสียซึ่งมีค่าบีโอดี 250 มก./ล. ให้เหลือ 90 มก./ล. ได้	- ยังไม่มีการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล	ไม่มี	-
2. คุณภาพน้ำใต้ดิน	1) ห้ามมิให้มีการเทกองมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินที่ อยู่ใกล้เคียง	- จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีการ เทกองมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง	ไม่มี	

ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. การระบายน้ำ	1) ตรวจสอบ ดูแล และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ ระบายน้ำเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลขุดลอกท่อ ระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ท่อระบาย น้ำยังสามารถระบายน้ำได้ดี และไม่มี การอุดตัน	ไม่มี	 ท่อระบายน้ำ
	2) ตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำให้มี สภาพดีอยู่เสมอ	- จากการตรวจสอบพบว่า ฝาบ่อพักท่อ ระบายน้ำในโครงการยังอยู่ในสภาพดี	ไม่มี	 ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
	3) นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุด เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้หรือสวนสาธารณะ ภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณการระบายน้ำออก นอกพื้นที่โครงการ	- จากการตรวจสอบ ไม่มีการนำน้ำเสีย ที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่	ให้เจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้นว่าควร นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำหรือไม่อย่างไร	-


ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. การระบายน้ำ (ต่อ)	4) ควรติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการขุดลอก คูระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037 ซึ่ง เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- มีการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037 บริเวณด้านหน้าโครงการ และ ได้มีการปรับเปลี่ยนคูระบายน้ำริมทาง บริเวณด้านหน้าโครงการให้เป็นท่อ ระบายน้ำสาธารณะ จึงยังไม่มี การประสานงานกับเทศบาลเมือง ลำปาง ให้เข้ามาทำการขุดลอกคูระบายน้ำริม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037 ซึ่ง เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ	ไม่มี	-
	5) ตรวจสอบระดับตะกอนในเส้นท่อและบ่อหน่วงน้ำ ทุกสัปดาห์ ถ้ามีมากจนเป็นปัญหาให้ทำการขุดลอก หรือ สูดออก ในกรณีที่ไม่มีปัญหามาก ควรสูบ ออกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลท่อและบ่อ หน่วงน้ำภายในพื้นที่โครงการ จากการ ตรวจสอบพบว่าบริเวณโดยรอบและ ภายในบ่อหน่วงน้ำอยู่ในสภาพดี	ไม่มี	 บ่อหน่วงน้ำ
	6) โครงการควรพิจารณาปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยขยายขนาดท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจาก เดิม หรือปรับเปลี่ยนความลาดชันของท้องท่อ ระบายน้ำให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ รองรับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น	- ไม่มีการขยายขนาดท่อระบายน้ำให้ ใหญ่ขึ้น หรือปรับเปลี่ยนความลาดชัน ของท่อระบายน้ำ จากการตรวจสอบยัง ไม่มีปัญหาด้านระบบระบายน้ำ	ไม่มี	 ท่อระบายน้ำ

ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. การระบายน้ำ (ต่อ)	7) โครงการจะต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำปริมาตรกักเก็บไม่น้อยกว่า 1,639 ลบ.ม. รวมทั้งจะต้องมีการควบคุมการระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการในอัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมก่อนมีโครงการตลอดจนควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ความสะอาด คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ	- มีบ่อหน่วงน้ำ และมีการควบคุมการระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการในอัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมก่อนมีโครงการ	ไม่มี	 บ่อหน่วงน้ำ
4. การจัดการมูลฝอย	1) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดีไม่แตกชำรุดเสียหาย และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการให้ทั่วถึง โดยจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 80 ลิตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 155 ใบ ซึ่งจะสามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ประมาณ 2 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของ เทศบาลนครลำปางมาเก็บขนไปกำจัดให้วันเว้นวัน	- มีการแจกถุงดำให้แก่ผู้พักอาศัยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเคหะชุมชนลำปางกับเทศบาลนครลำปาง โดยนำขยะที่จะทิ้งใส่ลงในถุงดำและมัดให้เรียบร้อย แล้วนำไปทิ้งบริเวณเป็นที่พักขยะด้านข้างโครงการที่กรรมการชุมชนจัดไว้ โดยเทศบาลนครลำปางจะเข้ามาดำเนินการเก็บขนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี	ไม่มี	  ถังดำรองรับมูลฝอย  ถังรองรับขยะหน้าบ้านพัก

ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยของโครงการอยู่เสมอ หากพบว่าแตกชำรุดหรือรั่วซึม จะต้องทำการปรับปรุง หรือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข	- ผู้บริหารดูแลโครงการได้ลดจำนวนถังรองรับมูลฝอยสาธารณะลง และเปลี่ยนเป็นการแจกถุงดำให้ผู้พักอาศัยแต่ละหน่วย ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	ไม่มี	 ถุงดำรองรับมูลฝอย
	3) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนภายในพื้นที่โครงการดำเนินการรวบรวมมูลฝอยของบ้านตนเอง ให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดการแยกประเภทมูลฝอยแบบเปียกและแบบแห้ง ก่อตั้งถังลงภาชนะรองรับมูลฝอย สำหรับมูลฝอยประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ ควรแยกออกมาส่งขายให้กับคนรับซื้อของเหลือใช้ เพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอย	- จากการตรวจสอบ พบว่ามี การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนภายในพื้นที่โครงการดำเนินการรวบรวมมูลฝอยของบ้านตนเองให้ถูกสุขลักษณะผ่านเสียงตามสาย	ไม่มี	 ลำโพงกระจายเสียง
	4) สำรวจปริมาณมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบว่ามีปริมาณมากขึ้นควรเพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ และติดตามให้รถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปางมาเก็บขนไปกำจัดเป็นประจำวันเว้นวันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งปริมาณตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสียด้วย	- ไม่มีการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยภายในโครงการ แต่จากการตรวจสอบ ไม่พบขยะตกค้างภายในพื้นที่โครงการ เนื่องจากเทศบาลนครลำปางเข้ามาเก็บขนเป็นประจำทุกวันเว้นวัน และยังไม่มี การสูบน้ำตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสียเนื่องจากมีปริมาณน้อย	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การจราจรและการ คมนาคมขนส่ง	1) ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ ป้ายเตือนว่าเป็นเขต ชุมชนให้ลดความเร็ว กระจกโค้งนูน และ อุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็นชัดเจนตรงจุดที่ เป็นเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก สันนูน ขวางถนน และบริเวณอื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมทั้ง สัญญาณจราจรต่างๆ ให้ชัดเจนตามความ เหมาะสม	- มีการติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ เข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ กระจก โค้งนูน สันนูนขวางถนนภายในโครงการ จากการตรวจสอบ พบว่าสันนูนชะลอ ความเร็วและกระจกโค้งนูนอยู่ในสภาพ ชำรุด	- ควรดำเนินการปรับปรุงกระจก โค้งนูนให้อยู่ในสภาพดี	 ป้ายจำกัดความเร็ว
	2) ทำสันนูนขวางถนนเป็นระยะๆ เพื่อช่วยลด ความเร็วของรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการ และ ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งภายในพื้นที่ โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม	- มีการทำสันนูนขวางถนนเป็นระยะๆ ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กม./ชม แต่จากการตรวจสอบพบว่า สัน นูนชะลอความเร็วอยู่ในสภาพชำรุด	- ควรดำเนินการปรับปรุงสันนูน ชะลอความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี	 กระจกโค้งนูน
6. เศรษฐกิจ-สังคม	1) ต้องดำเนินการตามมาตรการด้านต่างๆ อย่าง เคร่งครัดเพื่อลดปัญหาการขัดแย้งกับชุมชน	- มีการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดำเนินการของ สำนักงานเคหะชุมชนที่ผ่านมาไม่ก่อให้เกิด ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน	ไม่มี	-
	2) ร่วมกิจกรรมด้านสังคมและงานประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น	- มีการจัดกิจกรรมด้านสังคม งานประเพณี ต่างๆ ของท้องถิ่น เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1) โครงการต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงและสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้และเพื่อให้มีความเหมาะสมและเพียงพอตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กล่าวคือ บ้านทุกแบบทุกหลังของโครงการ ซึ่งได้แก่ บ้านแถวชั้นเดียวแบบ RH6B และ RH6C บ้านแถวสองชั้นแบบ TH6 D3 และบ้านแฝดสองชั้นแบบ SD D3 ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 1 เครื่อง โดยชนิดและขนาดเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้เลือกติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ - เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำอัดความดัน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร - เครื่องดับเพลิงชนิดกรด-โซดา ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร - เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร	- มีเสียงตามสายกระจายข่าวสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประกาศเตือนภัยต่างๆ ให้ผู้พักอาศัยในชุมชนได้ทราบ และมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาดความจุ 4 กก. และสัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบกริ่งให้แก่บ้านพักแต่ละหน่วยภายในโครงการ โดยติดตั้งถังเคมีดับเพลิงให้ส่วนบนสุดของถังเคมีดับเพลิงอยู่สูงจากระดับพื้นอาคาร 1.5 เมตร ในบริเวณที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย	ไม่มี	 ถังดับเพลิง  ลำโพงกระจายเสียง

ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3 กก. - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3 กก. - เครื่องดับเพลิงชนิดเฮลอน (HALON 1211) ขนาดไม่เกิน 3 กก. โดยการติดตั้งเครื่องดับเพลิงต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องอยู่สูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 ม. ในที่สามารถมองเห็นและอ่านคำแนะนำการใช้ได้ชัดเจน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย - อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทำงาน - อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้หนีไฟ		ไม่มี	


ตารางที่ 2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	2) ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือของระบบไฟฟ้าและ ป้องกันอัคคีภัยให้มีสภาพดี และพร้อมจะใช้งาน ได้ตลอดเวลา หากพบว่าการชำรุดเสียหายให้รีบ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า และป้องกันอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ โครงการอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	-
	3) กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติ หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากพบเหตุผิดปกติใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรม เกิดอัคคีภัย ฯลฯ ให้รีบดำเนินการช่วยเหลือใน ขั้นต้น หรือติดต่อขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที	- เคหะชุมชนลำปางได้มีการจัดโครงการ อาสาสมัครตำรวจชุมชนโดยร่วมมือ กับ สภ.เมืองลำปาง เพื่อทำหน้าที่เป็น สายตรวจดูแลความปลอดภัยภายใน โครงการทั้งในภาคกลางวันและกลางคืน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	1) คุณภาพน้ำจากบริเวณบ่อพัก สุดท้ายก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียรวม	- pH - Biochemical Oxygen Demand - Total Suspended Solids - Oil & Grease - Total Kjeldahl Nitrogen - Residual Chlorine - Fecal Coliform Bacteria	- ทุกๆ 4 เดือนภายใน 1 ปี	- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบริเวณบ่อพักสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 แสดงรายละเอียดดังบทที่ 4
	2) บริเวณจุดปล่อยน้ำจากถังเติม คลอรีน	- pH - Biochemical Oxygen Demand - Total Suspended Solids - Oil & Grease - Total Kjeldahl Nitrogen - Residual Chlorine - Fecal Coliform Bacteria	- ทุกๆ 4 เดือนภายใน 1 ปี	- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบริเวณบริเวณจุดปล่อยน้ำจากถัง เติมคลอรีน เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 แสดงรายละเอียด ดังบทที่ 4

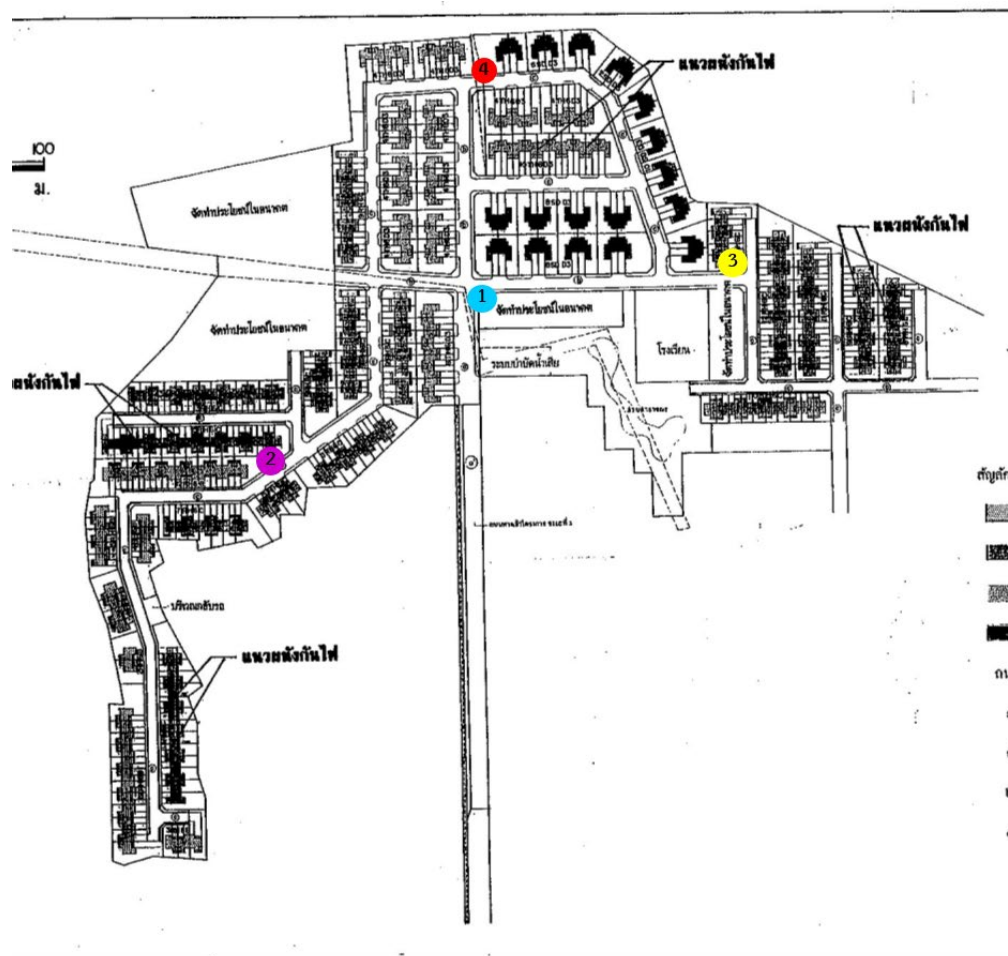

- สัญลักษณ์**
- 1 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จุดที่ 1
 - 2 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จุดที่ 2
 - 3 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จุดที่ 3
 - 4 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จุดที่ 4

รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
