



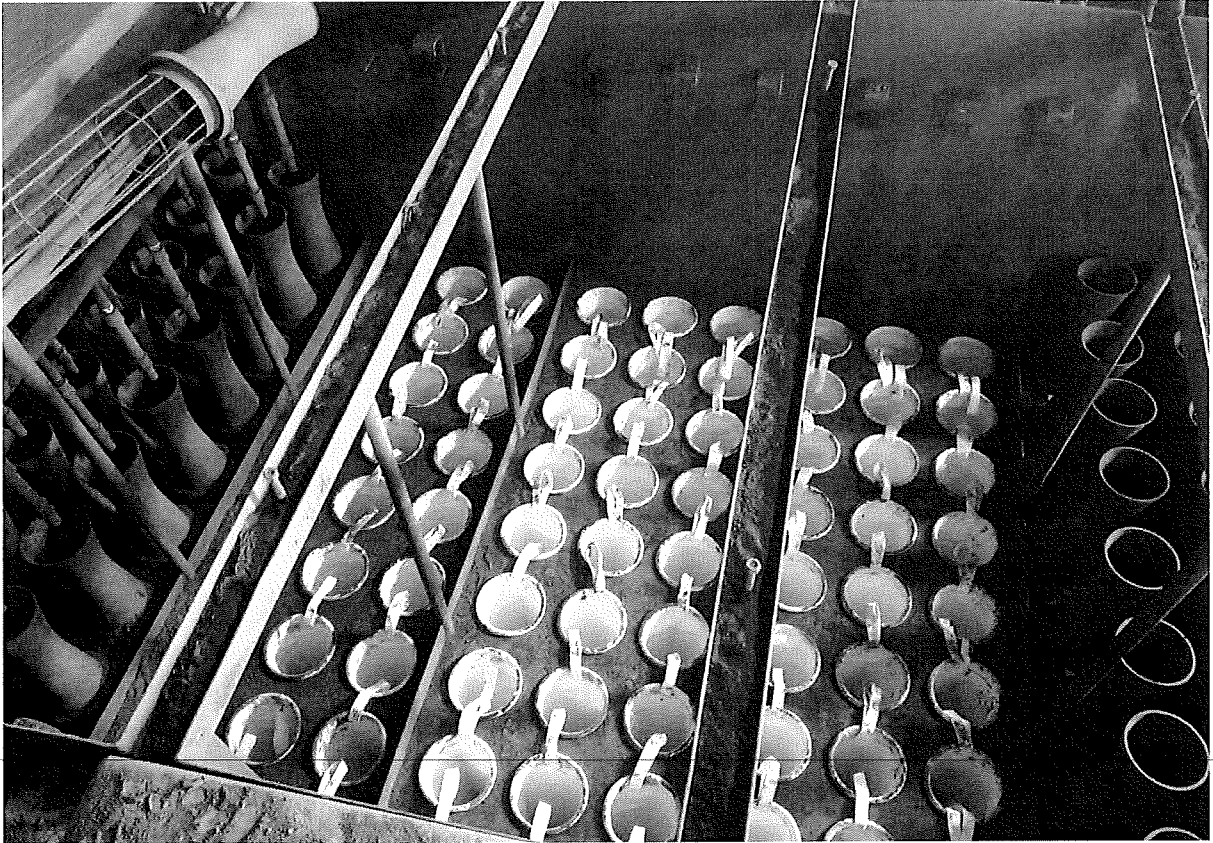


เอกสารแนบที่ 2.1

Daily Check Sheet Fume Plant



	PM WORK ORDER (F8-NO)		Rev. 6	PAGE : 1 OF 2
	WO NO : 6100103030	SCHEDULED DATE : 17-12-2024-15-02-2025		RESPONSE : MPM
EQUIPMENT : SS1-SP-FUM-FUM-13-015-002 Bag filter			STATUS : Y	
PM NO : 49FUMY-BHX35		A RP ถุงกรองฝุ่น Fume Plant แถวที่ 13		INTERVAL : 18 Month
JOB PLAN : 49RME018		A RP ถุงกรองฝุ่น Fume Plant แถวที่ 13		PLANT STATUS : N
DATE : 14/2/68	TIME START : 10:00	DATE : 14/2/68	TIME FINISH : 18:00	
 อะไหล่ / วัสดุ		 เครื่องมือ / อุปกรณ์		
1. FILTER BAG FUME PLANT Stock 4906100110020		1. ประแจปากตาย เบอร์ 13, 19, 24 4. เชือก		
จำนวน 324 ใบ		2. ไชควงแบน 5. ไฟแสงสว่าง		
		3. ประแจคอมม่า		
+ การเตรียมงานก่อนเริ่มปฏิบัติ		+ ข้อปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน		
1. ติดต่อผู้รับเหมา 2. เบิกถุงกรองฝุ่นจากพัสดุมาเตรียมไว้ที่ Bag House 3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์		1. ต้องใส่ถุงกรองฝุ่นขณะปฏิบัติงาน 2. สวมแว่นกันฝุ่น 3. แจ้ง OP หน่วยงานก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 4. Off Switch , Valve พร้อมแขวนป้าย/ นำป้ายออกเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ 5. ก่อนปฏิบัติงานศึกษาและทบทวนเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน		
+ ข้อควรระวังในการทำงาน และ ปัญหาที่เคยเกิด				
- ระวังถุงกรองฝุ่นและเศษวัสดุร่วงลง screw conveyor				
ขั้นตอน	รายละเอียด	ผล	หมายเหตุ	
1	Stop Main Fan ทั้ง 3 ตัว แขนงป้ายห้าม ON	/		
2	Stop Screw Conveyer แถวที่ เปลี่ยนถุง	/		
3	Stop ลมล้างถุงกรองฝุ่น	/		
4	เปิดฝา Chamber แถวที่เปลี่ยน	/		
5	ถอดท่อลมล้างถุงกรองฝุ่น	/		
6	ถอดถุงกรองเก่าออก	/		
7	ทำความสะอาดภายในช่องที่จะใส่ถุงกรองฝุ่น	/		
8	ทำความสะอาดลวดตะแกรงของกรงไถ่ทุกอัน	/		
9	นำถุงกรองฝุ่นใหม่ใส่	/		
10	ประกอบท่อลมล้างถุงกรองฝุ่น จัดแนวท่อให้เหมาะสม	/		
11	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดปิดฝา Chamber	/		
12	รอ Test หลังเริ่มใช้งาน อ่านค่า Pressure Drop หลังใช้งานนาน 15 นาที , 30 นาที , 1 ชั่วโมง	/		
13	รอ Test หลังเริ่มใช้งาน สังเกตการรั่วของลมที่ฝา Chamber	/		
14	รอ Test หลังเริ่มใช้งาน ตรวจสอบฝุ่นที่ออกจาก Stack	/		
ทำเครื่องหมาย “✓” = ปกติ, ปฏิบัติแล้ว “×” = ผิดปกติ, ขาด “⊗” = แก้ไขสิ่งผิดปกติแล้ว “-” = ไม่ได้ปฏิบัติ อื่น ๆ : บันทึกค่าที่วัดได้				



Daily Check Sheet FUME plant SAPCODE-D4000007

หน่วยงาน MS วันที่ต้องดำเนินการ Sunday, April 13, 2025 00:00

สถานที่/เครื่อง SYSMP-SP-FUM-FUM-15-005-007 CEMS Monitor

ช่วงดำเนินการ Saturday, April 12, 2025 00:00 ถึง Monday, April 14, 2025 00:00

รูปแบบ 1 Days จำนวนวันที่ยอมรับได้ +/- 1

ปิดงานโดย วิชาญศักดิ์ พรหมคุณ เวลา Sunday, April 13, 2025 08:00

Daily check sheet FUME plant

FUME

Static pressure P1

463

Static pressure P2

444

Static pressure P3

362

Static pressure P4

270

Static pressure P5

323

Static pressure P6

100

Static pressure P7

85

Static pressure P8

88

Static pressure P9

90

Static pressure P10a

261

Static pressure P10b

191

Static pressure P11

118

Static pressure P12

125

Static pressure P13

157

Static pressure P14

1

Static pressure P15

2

Static pressure delta[P4-P6]

250

Static pressure delta[P5-P6]

145

ปริมาณฝุ่นปล่อง stack CEMs

1

สภาพฝุ่นในอาคาร (รูปภาพ)



1000025422

Attach File

Choose Files

No file chosen

comment

Cancel

Save

Daily Check Sheet FUME plant SAPCODE-D4000007

หน่วยงาน MS วันที่ต้องดำเนินการ Monday, May 26, 2025 00:00

สถานที่/เครื่อง SYSMP-SP-FUM-FUM-15-005-007 CEMS Monitor

ช่วงดำเนินการ Sunday, May 25, 2025 00:00 ถึง Tuesday, May 27, 2025 00:00

รูปแบบ 1 Days จำนวนวันที่ยอมรับได้ +/- 1

ปัดงานโดย วิชาญศักดิ์ พรหมคุณ เวลา Monday, May 26, 2025 08:00

Daily check sheet FUME plant

FUME

Static pressure P1

491

Static pressure P2

468

Static pressure P3

374

Static pressure P4

304

Static pressure P5

324

Static pressure P6

130

Static pressure P7

102

Static pressure P8

104

Static pressure P9

38

Static pressure P10a

298

Static pressure P10b

110

Static pressure P11

144

Static pressure P12

21

Static pressure P13

159

Static pressure P14

1

Static pressure P15

1

Static pressure delta(P4-P6]

280

Static pressure delta(P5-P6]

147

ปริมาณฝุ่นปล่อง stack CEMs

10

สภาพฝุ่นในอาคาร (รูปภาพ)



1000026720

Attach File

Choose Files

No file chosen

comment

Cancel

Save

Daily Check Sheet FUME plant SAPCODE-D4000007

หน่วยงาน MS วันที่ต้องดำเนินการ Sunday, June 15, 2025 00:00

สถานที่/เครื่อง SYSMP-SP-FUM-FUM-15-005-007 CEMS Monitor

ช่วงดำเนินการ Saturday, June 14, 2025 00:00 ถึง Monday, June 16, 2025 00:00

รูปแบบ 1 Days จำนวนวันที่ยอมรับได้ +/- 1

ปิดงานโดย พงษ์พันธ์ วัชรดีลก เวลา Sunday, June 15, 2025 03:15

Daily check sheet FUME plant

FUME

Static pressure P1

487

Static pressure P2

487

Static pressure P3

401

Static pressure P4

328

Static pressure P5

340

Static pressure P6

145

Static pressure P7

118

Static pressure P8

111

Static pressure P9

110

Static pressure P10a

314

Static pressure P10b

172

Static pressure P11

154

Static pressure P12

99

Static pressure P13

169

Static pressure P14

1

Static pressure P15

1

Static pressure delta(P4-P6)

123

Static pressure delta(P5-P6)

157

ปริมาณฝุ่นปล่อย stack CEMs

16

สภาพฝุ่นในอาคาร (รูปภาพ)



64390

Attach File

Choose Files

No file chosen

comment

Cancel

Save
