

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 นิติบุคคลหมู่จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.โซแอนติฟิค จำกัด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.5/4035 ลงวันที่ 02 พฤษภาคม 2554 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของโครงการในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. แหล่งน้ำใช้				
- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 16)
2. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป	ตรวจสอบห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอถ้ามีการผูกרון หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอถ้ามีการผูกרון หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	
- ขยะตกค้าง	ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักขยะรวม และห้องรองรับขยะแต่ละแปลงที่ดินโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักขยะรวม และห้องรองรับขยะแต่ละแปลงที่ดินโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 22)

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. การป้องกันอัคคีภัย				
- ความพร้อมในการใช้งานของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงตลอดจนการรั่วไหล การบดบังตำแหน่ง ที่ติดตั้ง	ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงทั้ง 6 จุดให้ใช้งานได้ดีเสมอ และตรวจตราไม่ให้มีกีดสิ่งขวางหรือบดบังหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในแต่ละจุด	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงทั้ง 6 จุด ให้ใช้งานได้ดีเสมอ	
4. การระบายน้ำ				
- เศษขยะ และตะกอนดินทราย	- ตรวจสอบบ่อพัก, ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อสาธารณะ	ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อพัก, ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อสาธารณะ	ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 27)
- การทำงานของประตูเปิด-ปิดระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ	ตรวจสอบบ่อหน่วงน้ำ และอาคารควบคุม	เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงฤดูฝน	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อหน่วงน้ำ และอาคารควบคุม	ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 28)

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
5. คุณภาพน้ำ				
- pH - BOD5 - SS, Settable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Oil & Grease	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของระบบ บำบัดน้ำเสีย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด อย่างเคร่งครัด	ภาคผนวก ข
- pH - BOD5 - SS - Total Coliform B., Fecal Coliform B.	ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองรางโพธิ์ และคลองมอญบริเวณพื้นที่จุดน้ำทิ้งของ โครงการ	ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด อย่างเคร่งครัด	ภาคผนวก ข
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ เสีย	ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการ ทำงานทั่วไปของระบบฯ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของ ระบบฯ	ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 6)

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
6. ทัศนียภาพ				
- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที	- เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที	ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)
- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้	ทำการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก	ปีละ 1 ครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก	ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ดำเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำทิ้ง	
ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
pH at 25 °C	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)
Biochemical Oxygen Demand	5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification Method (4500-O C)
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)
Total Dissolved Solids	Dried at 180°C (2540 C)
Oil & Grease	Partition-Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	Macro- Kjeldahl Method (4500-N _{org} B)
Sulfide	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)
Settleable Solids	Imhoff Cone Method (2540 F)
Fecal Coliform Bacteria	Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure using Endo Media (9222 B)
Total Coliform Bacteria	Standard Total Coliform Fermentation Technique (9221 B)

3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ของนิติบุคคลหมู่จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-3 ดังนี้

ตารางที่ 3-3 ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทศ 90 ของนิตบุคคหลหมุ้จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทศ 90
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด (พ.ศ.2568)					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ระยะดำเนินการ 1.คุณภาพน้ำทิ้ง 1) น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 1 2) น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 2	pH Biochemical Oxygen Demand Total Suspended Solids Total Dissolved Solids Oil & Grease Total Kjeldahl Nitrogen Sulfide Settleable Solids	เดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓
← ระยะดำเนินการ →								
2.คุณภาพน้ำผิวดิน 1) คลองรางโพธิ์ 2) คลองมอญ	pH Biochemical Oxygen Demand Total Suspended Solids Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria	ทุก 3 เดือน	-	✓	-	-	✓	-

3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 1 และบริเวณน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen และ Oil & Grease, Total ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/01/2568	10/02/2568	19/03/2568	30/04/2568	28/05/2568	25/06/2568	
pH at 25 °C	-	7.8	7.7	8.0	7.3	7.0	7.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	19.4	18.7	7.3	23.1	24.1	9.8	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	339	408	308	418	972	582	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	2.2	<1.0	1.3	1.6	5.8	11.2	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

⁽¹⁾ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนที่ 161(ง) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/01/2568	10/02/2568	19/03/2568	30/04/2568	28/05/2568	25/06/2568	
pH at 25 °C	-	7.8	7.7	7.9	7.3	7.6	8.2	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	16.4	17.0	7.0	16.0	8.5	8.3	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	314	320	351	370	326	326	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	1.8	<1.0	1.0	1.4	0.8	7.2	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

⁽¹⁾ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนที่ 161(ง) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface water Quality)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface water Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ คลองรางโพธิ์และคลองมอญ ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจวัดทุก 3 เดือน โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface water Quality) บริเวณคลองรางโพธิ์ ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

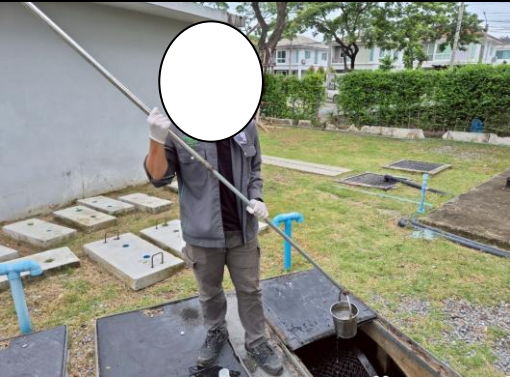
ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำผิวดิน		มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง		
		10/02/2568	28/05/2568	
pH at 25 °C	-	7.3	7.1	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.2	11.4	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	23	<10	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	9,300	110,000	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	230	<3	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำผิวดิน
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน หมวด 2 ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
(แหล่งน้ำประเภทที่ 2) ลงวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

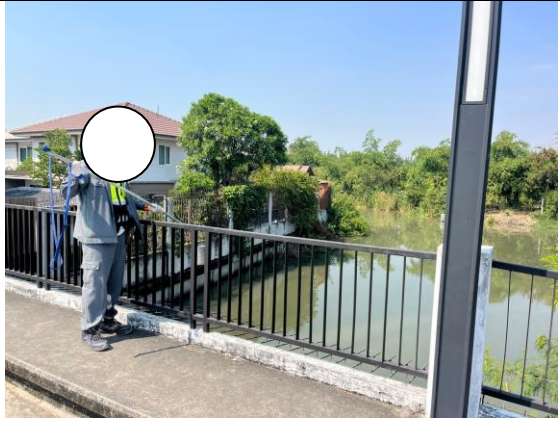
ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface water Quality) บริเวณคลองมอญ ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำผิวดิน		มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง		
		10/02/2568	28/05/2568	
pH at 25 °C	-	7.3	6.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	23.5	8.6	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	21	<10	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	430	15,000	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำผิวดิน
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน หมวด 2 ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
(แหล่งน้ำประเภทที่ 2) ลงวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

	
เดือนมกราคม พ.ศ.2568	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568
	
เดือนมีนาคม พ.ศ.2568	เดือนเมษายน พ.ศ.2568
	
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568	เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568
บริเวณน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 1	
รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568	

	
เดือนมกราคม พ.ศ.2568	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568
	
เดือนมีนาคม พ.ศ.2568	เดือนเมษายน พ.ศ.2568
	
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568	เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568
บริเวณน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 2	
รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษธรลดา ปรชาอุทศ 90 ระหว่งเดือนมกราคม - มถุนายน พ.ศ.2568	

	
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568	เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568
บริเวณคลองรางโพธิ์	
รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568	

	
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568	เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568
บริเวณคลองมอญ	
รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของโครงการ จัดสรรที่ดิน พฤษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568	
