

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

บริษัท ธาธาฤทธิ์ จำกัด

ตั้งอยู่ 322 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568



จัดทำโดย บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ที่ตั้ง เลขที่ 59/45 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  
โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

1. ชื่อโครงการ โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต  
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง -
2. สถานที่ตั้ง 322 ถนนพระบาร์มี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ธาราภูรี จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 322 ถนนพระบาร์มี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
โทรสาร 076 681 789 e-mail eng\_co@thenaturephuket.com
5. จัดทำโดย บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ 21 เมษายน 2562
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ ฉบับ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568
8. รายละเอียดโครงการ (โดยสรุป)
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ
  - ขนาดพื้นที่โครงการ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11,209.20 ตารางเมตรกิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
  - การบำบัดน้ำเสีย โครงการได้มีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น และได้มีการเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อทำการบำบัดต่อไปน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำมารดน้ำต้นไม้ พื้นที่สีเขียวในโครงการ
  - การระบายน้ำ โครงการได้มีการแยกการระบายน้ำ ประกอบด้วยการระบายน้ำเสีย และการระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำในโครงการ
  - การจัดการขยะมูลฝอย โครงการจัดให้มีถังขยะที่สามารถรองรับปริมาณขยะเพียงพอต่อการรองรับขยะที่จะเกิดขึ้นในแต่วัน โดยจัดวางถังขยะภายในบริเวณโครงการตามจุดต่างๆ ในส่วนสำนักงาน และห้องพัก และจัดทำห้องพักขยะรวม ซึ่งแยกเป็นห้องพักขยะเปียก-ขยะแห้ง จำนวน 2 ห้อง และโครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยจะเข้ามาเก็บขนขยะวันละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
  - อื่นๆ ไม่มี

\* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่เสนอไว้



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

วันที่ 14 มกราคม 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด เป็นผู้จัดทำหนังสือรับรอง  
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาณูรี จำกัด ตั้งอยู่ที่ 322  
ถนนพระรามที่ ๖ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ฉบับเดือน


- ( ) มกราคม – มิถุนายน 2568
- (✓) กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
- ( ) อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน


ลายมือชื่อ


ตำแหน่ง





หนังสือรับรองบริษัท บริษัท ธาราภูรี จำกัด

---











หนังสือรับรองบริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด


---

ที่ E10091221070282



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง






ที่ E10091221070282

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง



กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสำคัญธุรกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม ([www.dobd.go.th](http://www.dobd.go.th)) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

3/12

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Enabling Digital  
Transformation




หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

4/12



( นายพมูบ สอนเม และ นางเพ็ญนภา จันทระเพชญ์ )

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

5/12

( นายพณภูมิ สอนงาม และ นางสาวเพ็ญนภา จันทระเพชญ์ )

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
สู่ยุคดิจิทัล  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

6/12

( นายพมูข สอนเม และ นางเพ็ญนภา จันทระเพญ )

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

7/12



กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

8/12

## กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:28:29-0700

9/12

## กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวล้ำนำธุรกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล


Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

10/12



กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Transformation  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

11/12

กรรมการบริษัท ฯ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก๊วนลำนำนารุทกิจ  
ลุ่มดงเจ๊กา

Leading Business  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร  
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารทราบหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้  
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง


Ref:E6810091221070282

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-12-01 T11:29:29-0700

12/12

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ รร.๒)

---



หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานจากสำนักงานนโยบาย  
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

---





ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕ ๖ ๙ ๕๖

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต  
ของบริษัท ธาราบุรี จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๔๕๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาราบุรี จำกัด ต้องยึดถือ  
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ  
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ทางหลวง  
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนกลาง-หาดราไวย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภท  
โรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๓๐๐ ห้อง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาราบุรี จำกัด ต้องยึดถือ  
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว โดยให้บริษัท ธาราบุรี จำกัด เจ้าของ  
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ต ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ต ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอัญญาพร ไกรพานนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด เป็นโครงการประกอบกิจการประเภท โรงแรม จำนวน 300 ห้องพัก ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 1460 มีขนาดเนื้อที่ดิน 7-0-2.30 ไร่ หรือคิดเป็น 11,209.20 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ตอนกลาง-หาดราไวย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภายในโครงการ ประกอบด้วยอาคารห้องพักสูง 3-4 ชั้น จำนวน 10 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ตำนศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ ชัยพรศิริกุล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด



เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวศุภรัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด






1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



เดือน มีนาคม 2560

  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวจุฑารัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราปฐรี จำกัด



เดือน มีนาคม 2560

  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ท เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ช่วงดำเนินการ

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม               | บริเวณที่ตรวจสอบ                | พารามิเตอร์                | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                     | ความถี่ในการตรวจวัด                 | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ   |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. การเกิดแผ่นดินไหวและการเกิดสึนามิ | - บริเวณที่ติดตั้งแผนที่พื้นที่ | - สภาพการใช้งาน            | - ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณโครงการ                                                                     | - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ    | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด |
|                                      | - ภายในโครงการ                  | - การซ่อมแซมอพยพ           | - ตรวจสอบการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ                                        | - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ    | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด |
| 2. คุณภาพอากาศ                       | - บริเวณพื้นที่โครงการ          | - ฝุ่นละอองรวม (TSP)       | - ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวลุ่ม (High Volume Air Sampler)  | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด |
|                                      |                                 | - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) | - ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโวลุ่ม (High Volume Air Sampler) | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                             | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                               | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. คุณภาพน้ำทะเล       | - หาดกะหลิม      | - ความเป็นกรดต่าง<br>- ขอบแข็งละลายน้ำ<br>- ความเค็ม<br>- ไนเตรท-ไนโตรเจน<br>- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน<br>- ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส<br>- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)<br>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด<br>- ฟิคอลโคลิฟอร์ม | - วิธี pH meter<br>-<br>- วิธี Dried ที่ 103-105 °C<br>- วิธี Electrometric<br>- วิธี Cadmium Reduction<br>- วิธี Distillation Nesslerization<br>- วิธี Ascorbic acid<br>- วิธี Azid Modification<br>- วิธี Technique (MPN) 10 Tube<br>- วิธี Fecal Coliform Test (ECMedium) | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด |



เดือน มีนาคม 2560 นายโสธร ด้านศิริกุล (นางสาวจุฑารัตน์ จิระพงษ์ตระกูล) เดือน มีนาคม 2560 นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว  
 (นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวจุฑารัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ชาราฎรี จำกัด  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม                         | บริเวณที่ตรวจสอบ                                    | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                        | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. คุณภาพคลอง<br>สาธารณประโยชน์<br>สิ่งแวดล้อม | - คลอง<br>สาธารณประโยชน์<br>บริเวณโครงการ           | - ความเป็นกรดต่าง<br>- อุณหภูมิ<br>- ไนเตรท-ไนโตรเจน<br>- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน<br>- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)<br>- ค่าบีโอดี (BOD)<br>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด<br>- ฟิคอลโคลิฟอร์ม | - วิธี pH meter<br>- วิธี Fild Method<br>- วิธี Cadmium Reduction<br>- วิธี Distillation Nesslerization<br>- วิธี Azid Modification<br>- วิธี Azid Modification at 5 days<br>- วิธี Technique (MPN) 10 Tube<br>- วิธี Fecal Coliform Test<br>(ECMedium) | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด |
| 5. การคมนาคม<br>ขนส่ง                          | - บริเวณทางเข้า-<br>ออกโครงการ                      | - การอำนวยความสะดวก                                                                                                                                                                | - ตรวจสอบการกีดขวางการจราจร<br>และการอำนวยความสะดวกในการ<br>เข้าออกโครงการ                                                                                                                                                                              | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด                                                                                                                                                                                              |
|                                                | - บริเวณทางเข้า-<br>ออกถนน<br>สาธารณะและไหล่<br>ทาง | - สภาพการใช้งาน                                                                                                                                                                    | - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ<br>เครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้าม<br>จอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มี<br>สภาพพร้อมใช้งาน                                                                                                                                              | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด                                                                                                                                                                                              |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                               | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ   |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5. การใช้น้ำ           | - เส้นท่อน้ำใช้                                | - สภาพการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ                                                                                       | - บริษัท ชาราบุรี จำกัด |
|                        | - บริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว | - การตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางกายภาพ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ สี</li> <li>■ ความขุ่น</li> <li>■ ความเป็นกรด-ด่าง</li> </ul> </li> <li>- ทางเคมี                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด</li> <li>■ เหล็ก</li> <li>■ แมงกานีส</li> <li>■ ทองแดง</li> <li>■ สังกะสี</li> <li>■ ซัลเฟต</li> <li>■ คลอไรด์</li> <li>■ ฟลูออไรด์</li> <li>■ ไนเตรด</li> <li>■ ความกระด้างทั้งหมด</li> </ul> </li> </ul> | - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณก๊อกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว <ul style="list-style-type: none"> <li>■ วิธี Visual Comparison Method</li> <li>■ วิธี Nephelometric Method</li> <li>■ วิธี Electrometric Method</li> <li>■ วิธี Calculation Method</li> <li>■ วิธี Phenanthroline Method</li> <li>■ วิธี Persulfate Method</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame)</li> <li>■ วิธี Turbidimetric Method</li> <li>■ วิธี Argentometric Method</li> <li>■ วิธี Alizarin Photometric Method</li> <li>■ วิธี Cadmium Reduction Method</li> <li>■ วิธี EDTA Titrimetric Method</li> </ul> | - ทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง กรณีที่มีการใช้น้ำซื้อจากเอกชน | - บริษัท ชาราบุรี จำกัด |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ        | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ                                                                                      |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การใช้น้ำ<br>(ต่อ)  |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สารพิษ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ปรอท</li> <li>■ตะกั่ว</li> <li>■สารหนู</li> <li>■โครเมียม</li> <li>■แคดเมียม</li> </ul> </li> <li>- ทางจุลชีววิทยา <ul style="list-style-type: none"> <li>■โคลิฟอร์มแบคทีเรีย</li> <li>■อี.โคไล</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Furnace)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Furnace)</li> <li>■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Furnace)</li> <li>■ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique (MPN)</li> <li>■ E.coli Test (Rapid Test)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|                        | - ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ | - สภาพการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                          | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด                                                                                    |
|                        | - ระบบกรอง              | - สภาพการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ดูแลและทำความสะอาดระบบกรองและการล้างย้อน (Back wash) หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                          | - บริษัท ธาราบุรี จำกัด                                                                                    |
| 7. การจัดการน้ำเสีย    | - ระบบบำบัดน้ำเสีย      | - บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี</li> <li>- แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลเมืองป่าตองและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด</li> <li>- บริษัท ธาราบุรี จำกัด</li> </ul> |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ตานศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม    | บริเวณที่ตรวจสอบ                                        | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ความถี่ในการตรวจวัด              | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 7. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) | - บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ | - การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความเป็นกรดด่าง</li> <li>■ บีโอดี</li> <li>■ ปริมาณสารแขวนลอย</li> <li>■ ชัลไฟด์</li> <li>■ ปริมาณสารละลาย</li> <li>■ ปริมาณตะกอนหนัก</li> <li>■ น้ำมันและไขมัน</li> <li>■ ทีเคเอ็น</li> <li>■ โคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด</li> </ul> | - ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pH meter</li> <li>■ วิธี Azide Modification</li> <li>■ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)</li> <li>■ วิธี Titrate</li> <li>■ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง</li> <li>■ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)</li> <li>■ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย</li> <li>■ วิธี Kjeldahl</li> <li>■ วิธี Multiple-tube fermentation technique</li> </ul> | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ชารารูรี จำกัด |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชารารูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                    | พารามิเตอร์                                 | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                                                                             | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                   | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8. การระบายน้ำ         | - ท่อระบายน้ำของโครงการ                                             | - การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ                | - ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ                                                                                                                                    | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                      | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด                               |
|                        | - เครื่องสูบน้ำ                                                     | - อัตราการสูบ                               | - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ                                                                                                                                          | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                      | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด                               |
|                        | - ท่อระบายน้ำของโครงการ                                             | - ปริมาณตะกอน                               | - ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ                                                                                                                                       | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                      | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด                               |
| 9. การจัดการมูลฝอย     | - ห้องพักขยะ                                                        | - สภาพของถังขยะ<br><br>- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง | - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ<br><br>- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม                                         | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br><br>- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                            | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br><br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด |
| 10. การป้องกันอัคคีภัย | - บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | - สภาพการใช้งาน                             | - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที<br><br>- ทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หากพบว่าเครื่องขัดข้องทำการซ่อมบำรุงทันที | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต<br><br>- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด<br><br>- บริษัท ชาราฎรี จำกัด |
| 11. สุขภาพ             | - เครื่องปรับอากาศ                                                  | - ความสะอาด                                 | - ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ                                                                                                                           | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                   | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด                               |
|                        | - บริเวณพื้นที่โครงการ                                              | - การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลาย    | - ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย                                                                                                                               | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                      | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด                               |
|                        | - บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ                                  | - พื้นที่สีเขียว                            | - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ                                                                                                         | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                      | - บริษัท ชาราฎรี จำกัด                               |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชาราฎรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม        | บริเวณที่ตรวจสอบ                   | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                 | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | - ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)                                                                                                                                                                                | - ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - บริษัท ชาราบุรี จำกัด                                                                                                                                                                                              |
| 13. สระว่ายน้ำ                | - สระว่ายน้ำของโครงการ             | - ความเป็นกรดต่าง<br>- คลอรีนอิสระคงเหลือ<br>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น<br>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด<br>- ฟีคอลโคลิฟอร์ม<br>- ค่าความเป็นด่าง<br>- ความกระด้าง<br>- กรดไซยาไนด์<br>- คลอไรด์<br>- แอมโมเนีย | - วิธี pH meter<br>- วิธี DPD colorimetric method<br>- วิธี DPD colorimetric method<br>- วิธี Technique (MPN) 10 Tube<br>- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)<br>- วิธี Titration Method<br>- วิธี EDTA Titrimetric Method<br>- วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)<br>- วิธี Argentometric Method<br>- วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method | - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท ชาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราบุรี จำกัด<br>- บริษัท ชาราบุรี จำกัด |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                                                   | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. สระว่ายน้ำ (ต่อ)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ</li> <li>- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไนเตรท</li> <li>- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)</li> <li>- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</li> <li>- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น</li> <li>- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ</li> <li>- ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ</li> <li>- บ้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ</li> <li>- อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธี Cadmium Reduction Method</li> <li>- วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique</li> <li>- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</li> <li>- การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใช้งาน</li> <li>- ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที</li> <li>- ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง</li> <li>- ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลื่น</li> <li>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ชารามูรี จำกัด</li> <li>- บริษัท ชารามูรี จำกัด</li> <li>- บริษัท ชารามูรี จำกัด</li> <li>- บริษัท ชารามูรี จำกัด</li> <li>- บริษัท ชารามูรี จำกัด</li> <li>- บริษัท ชารามูรี จำกัด</li> <li>- บริษัท ชารามูรี จำกัด</li> <li>- บริษัท ชารามูรี จำกัด</li> </ul> |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชารามูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

บริษัท ธาราภูรี จำกัด  
322 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต 83150

จัดทำโดย  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด  
ที่ตั้ง เลขที่ 59/45 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

## บทสรุปผู้บริหาร

### บทที่ 1 บทนำ

|     |                                              |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 1.1 | ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน        | 1-1 |
| 1.2 | รายละเอียดโครงการโดยสรุป                     | 1-3 |
| 1.3 | ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ              | 1-3 |
| 1.4 | รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ               | 1-4 |
| 1.5 | จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ                    | 1-4 |
| 1.6 | รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ | 1-5 |

### บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

|     |                                          |     |
|-----|------------------------------------------|-----|
| 2.1 | การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1 |
|-----|------------------------------------------|-----|

### 3. บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

|       |                                     |      |
|-------|-------------------------------------|------|
| 3.1   | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ           | 3-3  |
| 3.1.1 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง       | 3-4  |
| 3.1.2 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ | 3-10 |
| 3.1.3 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้        | 3-14 |
| 3.1.4 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล       | 3-17 |
| 3.1.5 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง       | 3-19 |
| 3.2   | มาตรการด้านอื่นๆ                    | 3-20 |

### 4. บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

|     |                                           |     |
|-----|-------------------------------------------|-----|
| 4.1 | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด   | 4-1 |
| 4.2 | สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ | 4-2 |
| 4.3 | สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้        | 4-3 |
| 4.4 | สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล       | 4-3 |
| 4.5 | สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง       | 4-3 |
| 4.6 | มาตรการด้านอื่นๆ                          | 4-4 |



## สารบัญตาราง

| ตารางที่                                                                        | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1                                                                             |      |
| สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                |      |
| โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาราภูรี จำกัด                        |      |
| ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                                                | 2-2  |
| 3.1                                                                             |      |
| แผนการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568                                      | 3-1  |
| 3.2                                                                             |      |
| รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                     | 3-2  |
| 3.3                                                                             |      |
| วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ                                                  | 3-3  |
| 3.4                                                                             |      |
| รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                         | 3-3  |
| 3.5                                                                             |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำปีเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568   | 3-5  |
| 3.6                                                                             |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568        | 3-6  |
| 3.7                                                                             |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำปีเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568     | 3-11 |
| 3.8                                                                             |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568          | 3-12 |
| 3.9                                                                             |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำปี 2565-2567)                       | 3-13 |
| 3.10                                                                            |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำปี 2568)                            | 3-13 |
| 3.11                                                                            |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง ประจำปีเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568 | 3-15 |
| 3.12                                                                            |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568      | 3-16 |
| 3.13                                                                            |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ประจำปีเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568           | 3-17 |
| 3.14                                                                            |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                | 3-18 |
| 3.15                                                                            |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง ประจำปีเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568           | 3-19 |
| 3.16                                                                            |      |
| ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                | 3-20 |

## สารบัญรูป

| รูปที่                                                              | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1 ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ                                        | 1-2  |
| 1.2 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1           | 1-8  |
| 1.3 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-2           | 1-9  |
| 1.4 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-3           | 1-10 |
| 1.5 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-4 และ WWT-5 | 1-11 |
| 2.1 พื้นที่สีเขียว                                                  | 2-35 |
| 2.2 บ่อหน่วงน้ำ                                                     | 2-36 |
| 2.3 กำแพงกันดิน                                                     | 2-36 |
| 2.4 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ                                            | 2-36 |
| 2.5 บันไดหนีไฟ                                                      | 2-37 |
| 2.6 แผ่นพับ/คู่มือ ให้ความรู้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                    | 2-37 |
| 2.7 ป้ายดับเครื่องยนต์                                              | 2-38 |
| 2.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง                           | 2-38 |
| 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                | 2-38 |
| 2.10 ตะแกรงดักขยะ                                                   | 2-39 |
| 2.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                                    | 2-39 |
| 2.12 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า – ออก                                | 2-39 |
| 2.13 ที่จอดรถในโครงการ                                              | 2-40 |
| 2.14 ป้ายชื่อโครงการ                                                | 2-40 |
| 2.15 ถังเก็บน้ำใช้                                                  | 2-40 |
| 2.16 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ                                             | 2-41 |
| 2.17 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ                                    | 2-41 |
| 2.18 มิเตอร์น้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น                          | 2-41 |
| 2.19 ห้องพักขยะรวม                                                  | 2-42 |
| 2.20 ถังขยะในห้องพัก                                                | 2-42 |
| 2.21 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 kVA                                   | 2-43 |
| 2.22 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1,000 kVA                         | 2-43 |
| 2.23 อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน                                 | 2-43 |
| 2.24 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน                                | 2-44 |
| 2.25 ใช้อีเอ็มนาฬิกานั่งอาคาร                                       | 2-44 |
| 2.26 จุลรวมพลภายในโครงการ                                           | 2-44 |
| 2.27 ชุดดับเพลิง และถังดับเพลิงชนิดมือถือ                           | 2-45 |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่ |                                                  | หน้า |
|--------|--------------------------------------------------|------|
| 2.28   | อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้                         | 2-45 |
| 2.29   | อุปกรณ์ตรวจจับควัน และสปริงเกอร์ดับเพลิง         | 2-45 |
| 2.30   | หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร                     | 2-46 |
| 2.31   | ระบบท่อน้ำดับเพลิง และถังเก็บน้ำดับเพลิง         | 2-46 |
| 2.32   | แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control)                | 2-46 |
| 2.33   | ป้ายแสดงงวิธีการใช้งาน                           | 2-47 |
| 2.34   | ระบบโทรศัพท์วงจรปิด                              | 2-47 |
| 2.35   | ประกาศเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน                       | 2-47 |
| 2.36   | กล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น                   | 2-48 |
| 2.37   | ถังขยะรอบๆพื้นที่โครงการ                         | 2-48 |
| 2.38   | ที่จอดรถคนพิการ                                  | 2-48 |
| 2.39   | ป้ายแสดงความลึกสระว่ายน้ำ และกฎระเบียบสระว่ายน้ำ | 2-49 |
| 2.40   | อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ                 | 2-49 |
| 2.41   | รางระบายน้ำฝน และที่ล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ำ      | 2-49 |
| 2.42   | ป้ายเตือนใช้น้ำผ่านการบำบัด                      | 2-50 |
| 2.43   | ภาพโดยรวมของโครงการ                              | 2-50 |
| 3.1    | แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำหลังผ่านการบำบัด           | 3-4  |
| 3.2    | แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ                 | 3-10 |
| 3.3    | แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำใช้ผ่านการกรอง             | 3-14 |
| 3.4    | แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล                       | 3-17 |
| 3.5    | แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำคลอง                       | 3-19 |

## สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า                                                                              |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1    | กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำผ่านการบำบัด                         | 3-7 |
| 3.2    | กราฟแสดงปริมาณค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD <sub>5</sub> ) ของน้ำผ่านการบำบัด | 3-7 |
| 3.3    | กราฟแสดงปริมาณค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของน้ำผ่านการบำบัด                       | 3-7 |
| 3.4    | กราฟแสดงปริมาณค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ของน้ำผ่านการบำบัด                   | 3-8 |
| 3.5    | กราฟแสดงปริมาณค่าตะกอนหนัก (Settleable Solid) ของน้ำผ่านการบำบัด                  | 3-8 |
| 3.6    | กราฟแสดงปริมาณค่าซัลไฟด์ (sulfide) ของน้ำผ่านการบำบัด                             | 3-8 |
| 3.7    | กราฟแสดงปริมาณค่าน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil) ของน้ำผ่านการบำบัด                 | 3-9 |
| 3.8    | กราฟแสดงปริมาณค่าไนโตรเจนรวม (TKN) ของน้ำผ่านการบำบัด                             | 3-9 |
| 3.9    | กราฟแสดงปริมาณค่าแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ของน้ำผ่านการบำบัด        | 3-9 |

## ภาคผนวก

|            |    |                                                                                                                                                 |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาคผนวกที่ | 1  | มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                                                                                     |
| ภาคผนวกที่ | 2  | ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                             |
| ภาคผนวกที่ | 3  | เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน                                                                                                   |
| ภาคผนวกที่ | 4  | เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ                                                                                                   |
| ภาคผนวกที่ | 5  | มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                                                                  |
| ภาคผนวกที่ | 6  | แผนการรับมือภัยพิบัติสึนามิ                                                                                                                     |
| ภาคผนวกที่ | 7  | Checklist อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                                                                                        |
| ภาคผนวกที่ | 8  | ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย<br>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                                                                     |
| ภาคผนวกที่ | 9  | จำนวนพนักงานโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต                                                                                                          |
| ภาคผนวกที่ | 10 | ใบเสร็จค่าขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                                                                                                    |
| ภาคผนวกที่ | 11 | ใบเสร็จค่าสูบล้างสิ่งปฏิกูล/ไขมัน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                                                                                |
| ภาคผนวกที่ | 12 | ใบอนุญาตดำเนินการกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                                              |
| ภาคผนวกที่ | 13 | แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ<br>ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1) ประจำเดือนกรกฎาคม-<br>ธันวาคม 2568 |
| ภาคผนวกที่ | 14 | กิจกรรมเพื่อสังคม                                                                                                                               |
| ภาคผนวกที่ | 15 | รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568                                                                                        |

บทสรุปผู้บริหาร

---

## บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัทธาตุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า ทางโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ได้ดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 1) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดของ โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาตุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567) กำหนด ทั้งนี้ ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่ได้กำหนดค่าแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แต่ทางโครงการมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำผ่านการบำบัดทุกครั้งก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้

#### ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้อมทั้งตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป
- ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
- กรณีนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ควรจะจัดทำป้ายติดที่ท่อจ่ายน้ำผ่านการบำบัดสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้ชัดเจน แยกจากท่อน้ำประปา เพื่อป้องกันการนำผ่านการบำบัดไปใช้แทนน้ำประปา
- สุ่มตะกอนจากถังเกรอะ – ถังกรองไร้อากาศของโครงการทุกถัง เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้นให้สามารถบำบัดได้ตามที่ออกแบบไว้
- ตรวจสอบและบันทึกปริมาณน้ำใช้ภายในโรงแรม เพื่อเป็นสถิติพื้นฐานในการควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยให้การควบคุมระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ควรสังเกตสี และลักษณะของตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งควรจะเป็นสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาล และต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแต่จะมีกลิ่นอับคล้ายดิน ตรวจสอบระดับชั้นของตะกอนของบ่อเติมอากาศ ควบคุมค่า SV<sub>30</sub> มีค่าประมาณ 200 -300 ml/l
- ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen :DO) ภายในบ่อเติมอากาศต้องควบคุมค่า DO ให้มีค่ามากกว่า 2.0 mg/l ในกรณีที่ค่า DO ต่ำกว่า 2.0 mg/l แสดงว่าออกซิเจนภายในบ่อมีค่าน้อยและอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของเชื้อจุลินทรีย์ได้ ให้ทำการแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้
  1. เปิดเครื่องเติมอากาศทุกตัวพร้อมกัน เพื่อให้สามารถจ่ายอากาศได้อย่างเพียงพอ
  2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ เช่น สภาพของใบพัดมอเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่

3. ตรวจสอบกำลังวัตต์ของมอเตอร์ในการกระจายอากาศมีเพียงพอในการกวนผสม (Mixing) เชื้อจุลินทรีย์ในระบบ และการถ่ายเทอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งถ้าหากตรวจสอบแล้วไม่เพียงพอ จะต้องมีการติดตั้ง เครื่องจักรในการเติมอากาศเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการอากาศที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน ว่าเพียงพอในการรองรับน้ำเสียในปัจจุบันหรือไม่

## 2) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

### ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำเดือน)

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาตุรี จำกัด จำนวน 1 จุด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ กำหนด

### ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำปี)

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำปี 2568 ของโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาตุรี จำกัด จำนวน 1 จุด ประจำปี 2568 โครงการมีการตรวจวิเคราะห์ ฯ ในเดือนตุลาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ กำหนด ยกเว้น ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) และค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ที่มีค่าไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

### ข้อเสนอแนะ

- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ กำหนด ดังนี้ โครงการมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบของสระว่ายน้ำ ต้องสะอาด และไม่มีคราบตะไคร่น้ำ
- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างเท้า และเก็บรองเท้าบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ
- โครงการมีป้ายแสดงข้อบังคับของผู้ใช้บริการ ติดให้เห็นชัดเจน อย่างน้อย มีสาระสำคัญ ดังนี้
  - 1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ
  - 2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง
  - 3) ห้ามผู้เป็นโรคตาแดง ผื่นหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ใช้สระว่ายน้ำ
  - 4) กำหนดเวลาเปิด - ปิด สระว่ายน้ำ
- โครงการมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH ) ในสระว่ายน้ำ โดยให้มีปริมาณคลอรีน อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 7.2 – 8.4
- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและปริมาณสารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



### 3) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรองของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาตุไร จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567 กำหนด

#### ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ทำความสะอาดคราบตะกอนในเส้นท่อเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
- ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรในการเติมสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรคของน้ำใช้ภายในโรงแรม ยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่
- ควรมีการตรวจสอบว่า มีพนักงานหรือลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรม มีอาการเจ็บป่วย/ปวดท้อง เนื่องจากน้ำใช้ภายในโรงแรมหรือไม่
- ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงแรมเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องต่อไป

### 4) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทะเล

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาตุไร จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง) กำหนด ยกเว้น ค่าฟอสเฟต (Phosphate) ค่าไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) และค่าแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (TCB) ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด

#### ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรติดตามคุณภาพน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

### 5) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองของโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาตุไร จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ) กำหนด ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO), แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) และค่าแบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

## 6) มาตรการด้านอื่นๆ

### สภาพภูมิประเทศ

โครงการมีการตรวจสอบสภาพภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไป ระบบระบายน้ำของโครงการ ท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ความแข็งแรงของกำแพงกันดินอย่างครบถ้วน

### ทรัพยากรดิน

โครงการมีการตรวจสอบสภาพดินไม้และพืชคลุมดินให้มีสภาพดี พื้นที่โล่งว่างภายในโครงการ ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วง ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการอย่างครบถ้วน

### สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

โครงการได้มีการกำหนดความเร็วรถโดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง การใช้รถกอล์ฟรับส่งผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ การปลูกพืชที่ลดปริมาณฝุ่นละออง การก่อกองขยะที่ทิศทางแสงแดดและเกิดเงาอาคารบดบัง

### ทรัพยากรน้ำ

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัด ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ำออกจากโครงการ และมีการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ

### ทรัพยากรชีวภาพ

โครงการตรวจสอบการนำต้นไม้เดิมมาปลูก การระบายน้ำผ่านการบำบัดออกจากโครงการอย่างครบถ้วน

### การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบแผนการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนมาใช้กรณีที่มีการขาดแคลนน้ำ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและแก้ไขปัญหาหน้าใช้ประจำโครงการอย่างครบถ้วน

### การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบ มีบ่อดักไขมันสำหรับห้องครัว มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีการสำรองอุปกรณ์กรว๊วใช้ในกรณีท่อไหลของระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย การเกิดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดที่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย การกำจัดไขมันไปไว้ที่ห้องพักขยะเปียก

### การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบจำนวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ที่พักมูลฝอยรวมให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้าน การคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะเสร็จแล้วและท่อระบายน้ำผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม การจัดการที่จอดรถ การอำนวยความสะดวกแก่ขนขยะ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอันตราย การเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย การจัดส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างครบถ้วน

### การไฟฟ้า

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้งานและการชำรุดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตั้งม่านริมระเบียง การปลูกต้นไม้บดบังแสงแดด การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การติดฉนวนกันความร้อนเข้าสู่อาคาร อย่างครบถ้วน

### การคมนาคม

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การติดกระจกนูนตามจุดเลี้ยว การติดตั้งระบบส่องสว่าง การจัดเจ้าหน้าที่จราจร ที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด การจัดการที่จอดรถคนพิการภายในโครงการ การจัดการที่จอดรถของโครงการ การจัดการรับส่งนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ อย่างครบถ้วน

### การระบายอากาศ

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ การทำความสะอาดถาดรองน้ำหยดจากคอยล์เย็น การทำงานของระบบปรับอากาศ ระยะเวลาการล้างทำความสะอาดห่อระบายความร้อนชั้นตอนและวิธีการล้างทำความสะอาดห่อระบายความร้อน การแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ ทิศทางการระบายของปล่อง อย่างครบถ้วน

### การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

โครงการได้มีการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงภายในโครงการ

### สภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

โครงการมีการตรวจสอบการรับพนักงานในท้องถิ่นเข้ามาทำงาน และการฝึกอบรมการสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนโดยเรื่องร้องเรียนของชุมชนโดยรอบและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวิชาชีพให้กับพนักงาน การให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อย่างครบถ้วน

### การสาธารณสุข

โครงการมีการตรวจสอบการดูแลระบบสาธารณสุขภายในโครงการ การจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือปฐมพยาบาลพร้อมรับส่งฉุกเฉิน อย่างครบถ้วน

### อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ

โครงการมีการตรวจสอบ เรื่องการจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิและความร่วมมือในการซักซ้อมกับหน่วยงานท้องถิ่น เส้นทางอพยพหนีภัยสึนามิ ไปยังจุดปลอดภัย การกำหนดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการหนีภัยสึนามิ

### ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามกำหนด การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติม ในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุอัคคีภัย ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งแปลนแสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยการ ตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล

ความรู้ความเข้าใจและผลการซักซ้อมตำแหน่งจุดรวมพลและความถี่ของการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง ความกว้างของถนนด้านทิศเหนือของโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

#### สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณของต้นไม้ที่กำหนดไว้ในรายงาน และการเจริญเติบโตของต้นไม้ การนำต้นไม้มาปลูกไว้ในพื้นที่โครงการ การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน ตรวจสอบสี และการกะเทาะออกของสีผนังอาคาร

บทที่ 1

บทนำ

## บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ชาราฎี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

บริษัท ชาราฎี จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์ เลขทะเบียน ว-176 ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการของโครงการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อนำเสนอมาตรการที่เปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 1.1 ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ

## 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป

### 1.2.1 ข้อมูลทั่วไป

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ        | โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต                                                                       |
| เจ้าของโครงการ     | บริษัท ธาตุภูมิ จำกัด                                                                                    |
| ที่ตั้งโครงการ     | 322 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต                                                      |
| ประเภทโครงการ      | โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักผ่อนตากอากาศ                                             |
| ขนาดพื้นที่โครงการ | เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11,209.20 ตารางเมตร                                                                |
| ทิศเหนือ           | ติดกับพื้นที่ ที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม)                                                    |
| ทิศใต้             | ติดกับพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนกลาง – หาดราไวย์ กว้าง 20.00 เมตร (รวมเขตทางหลวง)                   |
| ทิศตะวันออก        | ซอยพระบารมี 8 กว้าง 9.30 เมตร (รวมเขตทาง)                                                                |
| ทิศตะวันตก         | ติดกับพื้นที่ ที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) และคลองสาธารณะประโยชน์กว้างประมาณ 3.90 – 5.80 เมตร |

## 1.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ

### 1.3.1 ประเภทและขนาดของโครงการ

โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม โดยจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทขอและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 10 อาคาร มีห้องพักสูง 4 ชั้น มีชั้นใต้ดิน มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น จำนวน 300 ห้องพัก

### 1.3.2 รูปแบบอาคาร

รูปแบบอาคารของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้

#### 1) ลักษณะตัวของอาคาร

รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบร่วมสมัย (Contemporary) ผสมผสานกับรูปแบบและรายละเอียดของวัฒนธรรมพื้นถิ่น เน้นความเรียบง่าย การออกแบบอาคารจะกำหนดความสูงของแต่ละอาคารให้ลดหลั่นแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ เพื่อสร้างความโปร่งและลดความรู้สึกหนาแน่นของโครงการรวมทั้งออกแบบห้องพักเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด จัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติโดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่งประกอบกับจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย อีกทั้งยังจัดให้มีสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้พักผ่อนและทำกิจกรรมขณะเข้าพักภายในโครงการ

#### 2) วัสดุของตัวอาคาร

ผนังภายนอกของอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีการออกแบบอาคารให้มีสีเทา สีน้ำตาลอ่อน และสีขาว เพื่อให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ผนังระเบียงห้องพักให้เป็นกระจกสีเขียวตัดแสงมีช่องเปิดบานเลื่อนกระจก รวาระเบียงกันตกของห้องพักทำด้วยเหล็ก สำหรับวัสดุหลักของโครงการ คือ คอนกรีต กระจก และอลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปและขนย้ายได้ง่าย



### 3) การจัดการภูมิสถาปัตยกรรม

การจัดการภูมิสถาปัตยกรรมมีทั้งส่วนที่เป็นภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์นุ่ม (Softscape) โดยแนวความคิดการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพื้นผิวของทางเดินบริเวณอาคาร ส่วนแนวความคิดการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมไม่ส่วนของ Softscape นั้นเน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นเสาสเก ต้นจิกทะเล ต้นลีลาวดี ต้นหมากเขียว และต้นกระทิง และไม้พุ่ม ได้แก่ กล้วยาณน้อย กล้วยาณเลเชีย หน้าน้ำพุ รักทะเล พลับพลึงหนู จั๋งจีน ไทรเกาหลี เฟิร์นฮาวาย ฯลฯ เป็นต้น

#### 1.4 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน เลขที่ 159 จำนวน 1 ฉบับ มีขนาดพื้นที่ 7-0-2.30 ไร่ หรือคิดเป็น 11,209.20 ตารางเมตร ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธาตุราษฎร์ จำกัด

สำหรับการใช้พื้นที่ของทุกอาคารในโครงการ แยกเป็นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคารพื้นที่ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 18,225.65 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นถนน ที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,716.29 ตารางเมตร

สรุปการใช้พื้นที่โครงการ

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| ขนาดพื้นที่ดินโครงการทั้งหมด     | 11,209.20 | ตารางเมตร |
| ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด | 4,492.91  | ตารางเมตร |
| ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด         | 19,085.43 | ตารางเมตร |
| ขนาดพื้นที่ว่างทั้งหมด           | 6,716.29  | ตารางเมตร |
| ขนาดพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด     | 2,706.26  | ตารางเมตร |

#### 1.5 จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ

โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 300ห้องพัก มีจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุด 600 คน (คิดจำนวนผู้พักอาศัย 2 คน/ห้องพัก)

|                          |   |           |         |
|--------------------------|---|-----------|---------|
| จำนวนผู้พักอาศัย         | = | 2         | คน      |
| จำนวนผู้พักอาศัยทั้งสิ้น | = | 300       | ห้องพัก |
| ผู้พักอาศัยภายในโครงการ  | = | 2 x 300คน |         |
|                          | = | 600       | คน      |

ดังนั้น ผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 600 คน นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจำได้แก่ แม่บ้าน คนสวน และยามรักษาความปลอดภัย รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน โดยพนักงานทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยในโครงการ ดังนั้น รวมจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานประจำในโครงการทั้งสิ้น 650 คน

#### 1.6 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ

##### 1.6.1 การใช้น้ำ

##### 1) ปริมาณน้ำใช้

ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์และอื่นๆ ปริมาณน้ำใช้ในโครงการ ประมาณ 281.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการใช้น้ำสูงสุดเท่ากับ 26.39 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

## 2) แหล่งน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำ

โครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานประปาภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้ของโครงการและซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง โดยมีแนวท่อประปาของโครงการต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำด้วยท่อน้ำขนาด 4 นิ้ว เข้ากักเก็บในถังน้ำใต้ดิน ปริมาตร 637 ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชน มีแนวท่อของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับหัวรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำขนาด 4x2.5x2.5 นิ้ว เข้ากักเก็บในถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 255 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นปั๊มเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตร 765 ลูกบาศก์เมตร โดยมีส่วนที่นำมาใช้เป็นน้ำใช้อุปโภคบริโภคปริมาตร 637 ลูกบาศก์เมตร และส่วนที่เป็นน้ำสำรองดับเพลิงปริมาตร 128 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 ชุด มีอัตราการสูบน้ำ 90 แกลลอน/นาที่ จำนวน 1 ชุด และ 200 แกลลอน/นาที่ จำนวน 2 ชุด สูบน้ำเพื่อแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆของแต่ละอาคาร รวมปริมาตรกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคของโครงการทั้งสิ้น 892 ลูกบาศก์เมตร

## 3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้

รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมีดังนี้

1. ถังเติมคลอรีน (Chlorine Feed) เพื่อกรองสนิมและเหล็กให้ตกตะกอนในเบื้องต้น
  2. ถังโพลิเมอร์ (Polymer Feed) เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้าง (Coagulation) และรวมตัวของเม็ดตะกอนขนาดเล็ก (Flocculation)
  3. ถังกรองทราย (Multimedia Sand Filter) เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ตะกอนและสารแขวนลอยต่างๆ
  4. ถังกรองคาร์บอน (Carbon Filter) เพื่อกรองสารละลายที่มีสี กลิ่น และสารเคมีต่างๆ
  5. ถังกำจัดความกระด้าง (Softener Filter) เพื่อช่วยทำให้น้ำที่นำมาผ่านการกรองน้ำได้น้ำที่ใสสะอาด ลดความกระด้างของน้ำ ไม่มีสี คลอรีน และยังช่วยกำจัด ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียมอีกด้วย
- ดังนั้น น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน ที่ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพจะมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในกระบวนการสาธารณูปโภคต่อไป

## 4) การสำรองน้ำใช้ของโครงการ

โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตร 255 ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตร 765 ลูกบาศก์เมตร โดยมีส่วนที่นำมาใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคปริมาตร 637 ลูกบาศก์เมตร และส่วนที่เป็นน้ำสำรองดับเพลิงปริมาตร 128 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บน้ำใช้อุปโภคบริโภคของโครงการ เท่ากับ 892 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ได้มากกว่า 3 วัน

|                                |   |              |           |
|--------------------------------|---|--------------|-----------|
| ปริมาตรกักเก็บน้ำใช้ของโครงการ | = | 892          | ลบ.ม.     |
| ความต้องการใช้น้ำภายในโครงการ  | = | 281.52       | ลบ.ม./วัน |
| ความสามารถสำรองน้ำไว้ใช้       | = | 892 / 281.52 |           |
|                                | = | 3.17         | วัน       |
| หรือมากกว่า                    | = | 3            | วัน       |

ดังนั้น ความสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ภายในโครงการมากกว่า 3 วัน

### 1.6.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

## 1) ปริมาณน้ำเสีย

เมื่อเปิดดำเนินการโครงการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 222.30 ลบ.ม./วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้

## 2) ระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process) จำนวน 4 ชุด (WWT-1 WWT-2, WWT-4 และ WWT-5) ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน Aeration Activated Sludge : Membrane Bioreactor) จำนวน 1 ชุด (WWT-3) และถังตกไขมัน จำนวน 2 ชุด (GT-1 และ GT-2) เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆในโครงการ โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำ ดังนี้

1. อาคาร B1 และอาคาร B2 จัดให้มีบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 2 จุด ก่อนสูบน้ำด้วยปั๊ม จำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-1 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 44.07 ลบ.ม./วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 60 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD<sub>๕</sub> 250 มก./ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มก./ล และถังตกไขมัน (GT-1) จำนวน 2 ชุด ปริมาตร 12.00 ลบ.ม. และสามารถรองรับน้ำเสียได้ 12.00 ลบ.ม.

2. อาคาร B3 และอาคาร B4 จัดให้มีบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 1 จุด ก่อนสูบน้ำด้วยปั๊ม จำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-2 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 36.60 ลบ.ม./วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 40 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD<sub>๕</sub> 250 มก./ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มก./ล

3. อาคาร B5 และอาคาร B10 จัดให้มีบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 1 จุด ก่อนสูบน้ำด้วยปั๊ม จำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-5 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 46.80 ลบ.ม./วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD<sub>๕</sub> 250 มก./ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มก./ล


4. อาคาร B6 และอาคาร B7 จัดให้มีบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 1 จุด ก่อนสูบน้ำด้วยปั๊ม จำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-3 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 40.80 ลบ.ม./วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD<sub>๕</sub> 250 มก./ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มก./ล

5. อาคาร B8 และอาคาร B9 จัดให้มีบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 1 จุด ก่อนสูบน้ำด้วยปั๊ม จำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-4 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 48.60 ลบ.ม./วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลบ.ม./วัน ปริมาณ BOD<sub>๕</sub> 250 มก./ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มก./ล.


โครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักทั้งหมดทุกชั้นในอาคารหลายหลังรวมทั้งสิ้น 300 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ค่า BOD<sub>ออก</sub> ไม่เกิน 20 มล./ล. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.81 ลบ.ม./วัน มีค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มล./ล. (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดค่า BOD<sub>ออก</sub> ไม่เกิน 20 มล./ล.) ปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจขึ้นต่อพนักงานและผู้ใช้บริการสัมผัสน้ำทิ้ง โครงการจึงได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็น

ชนิดท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 324.75 ลบ.ม./วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดิน ดินร่วนปนดินทราย 10 มล./ชม.) โครงการสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด (Zero Discharge)


ในช่วงฤดูในโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 64.95 ลบ.ม./วัน (20 % ของหน้าแล้ง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 134.86 ลบ.ม. โครงการจะระบายออกจากถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จากนั้นจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ

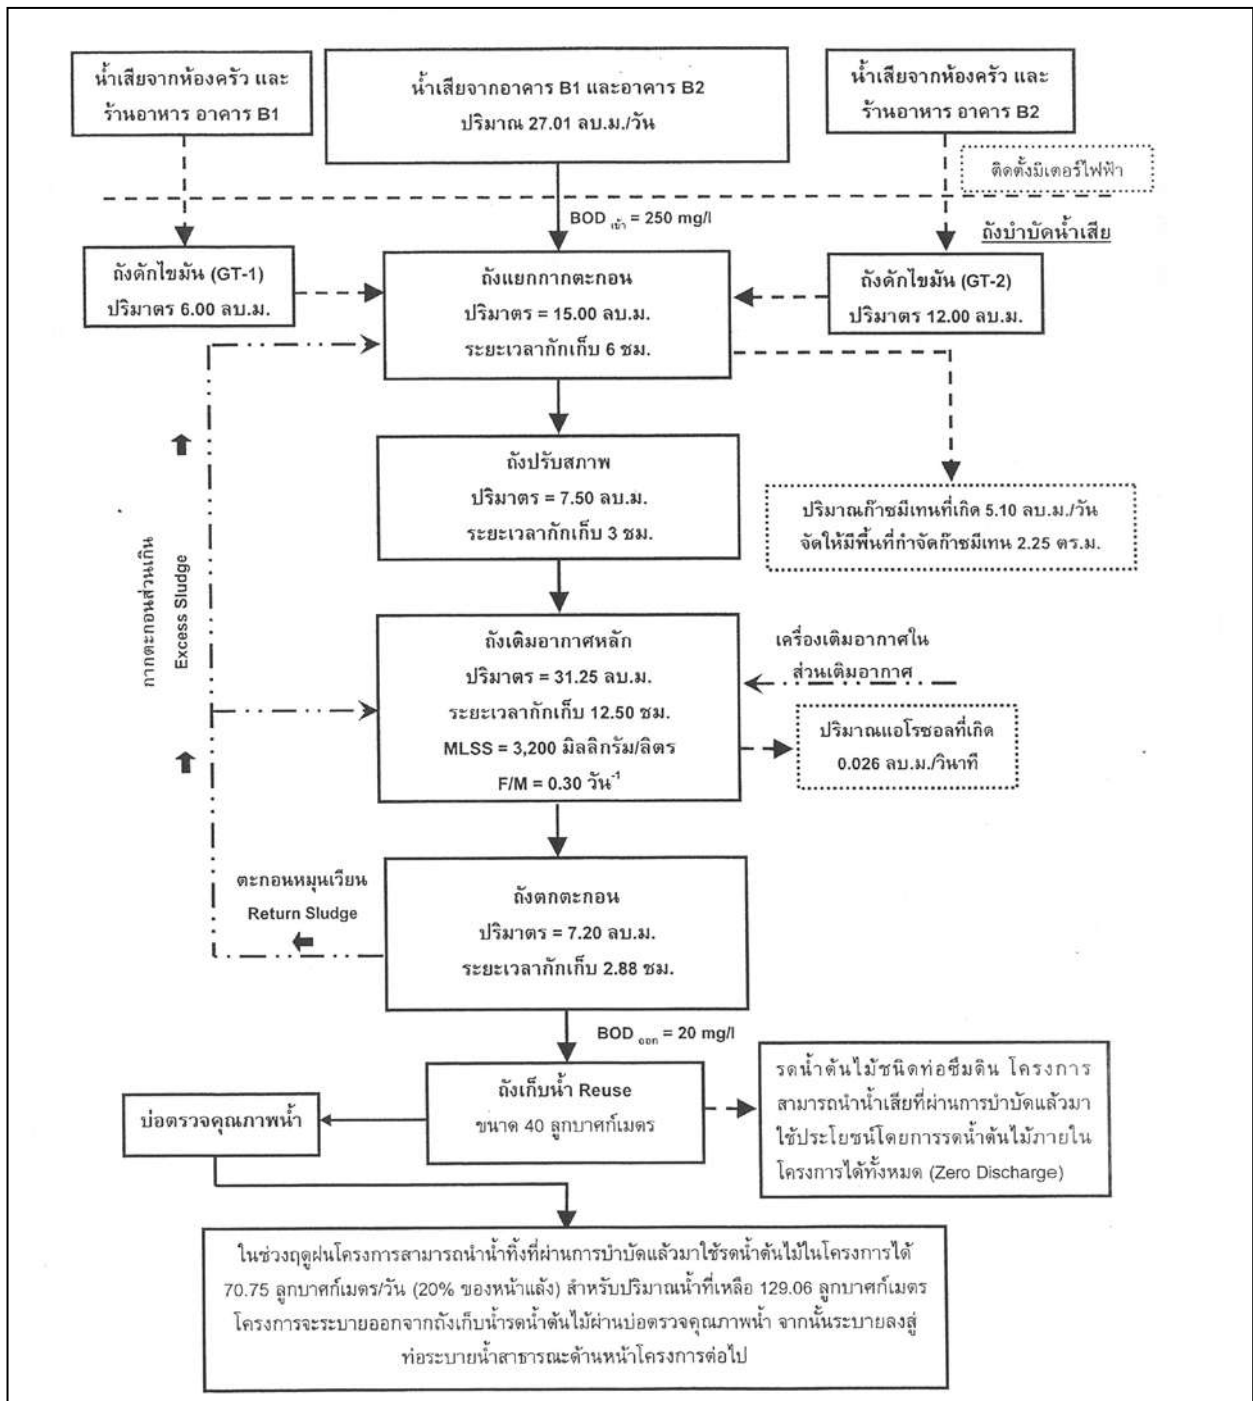


รูปที่ 1.2 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1

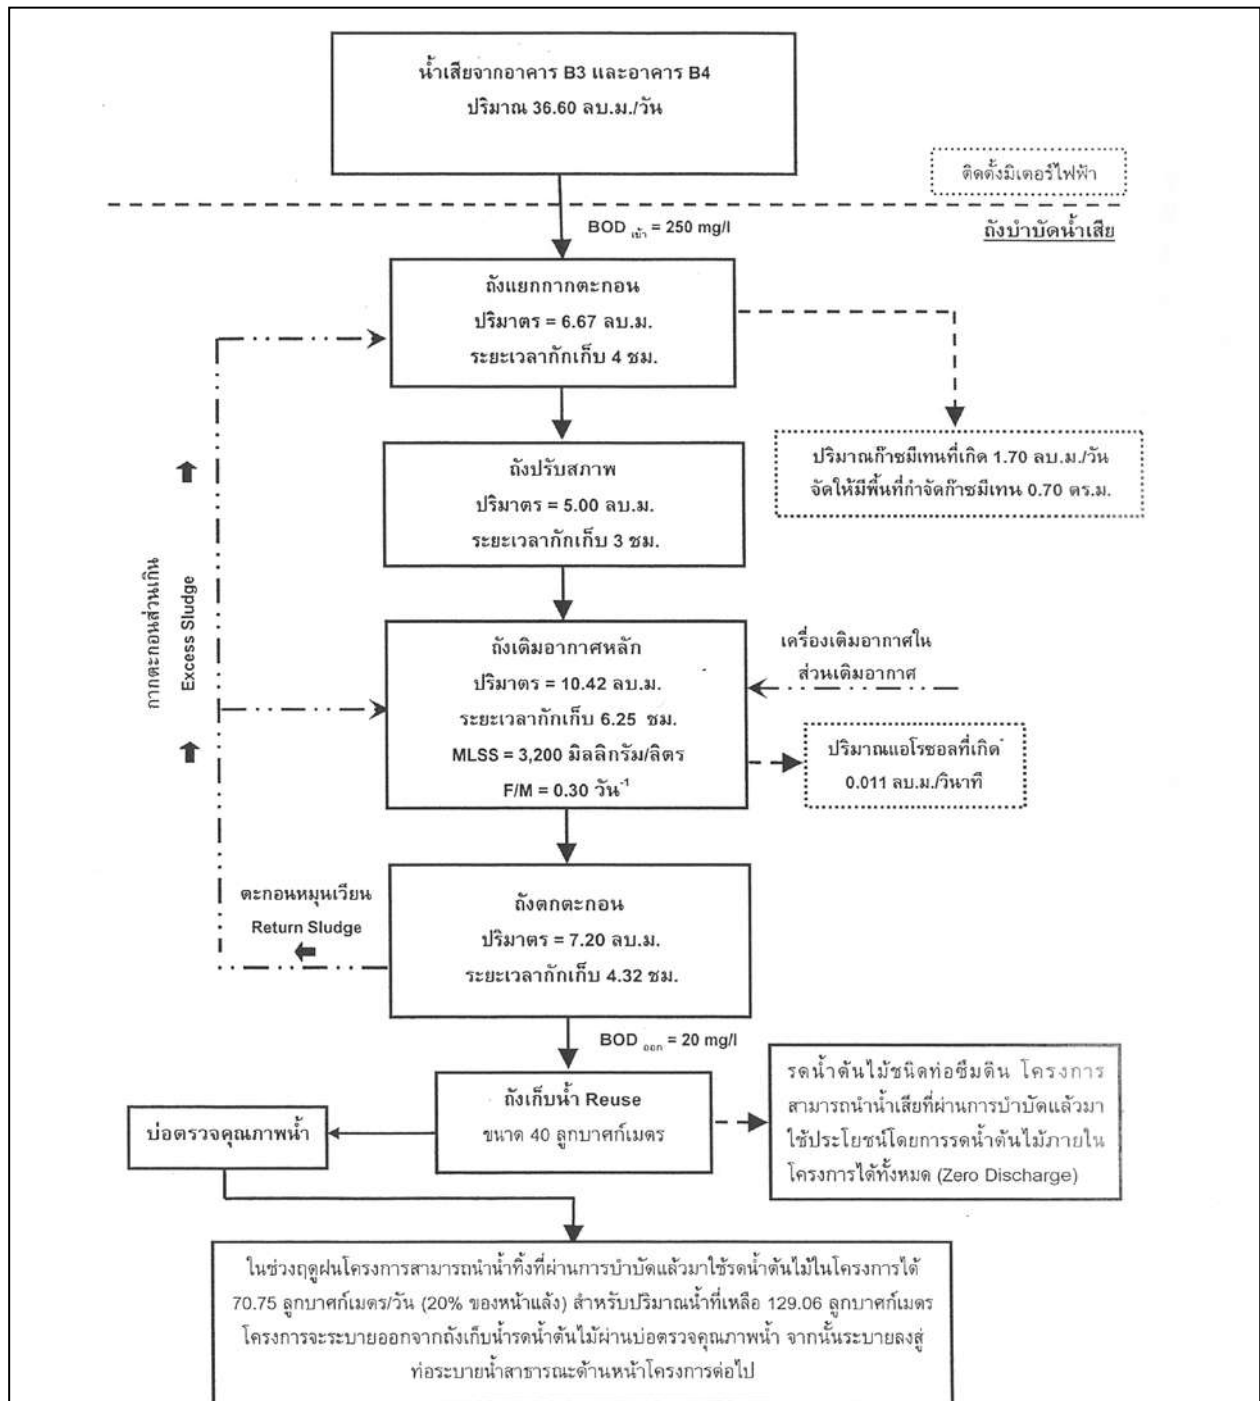

รูปที่ 1.3 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-2

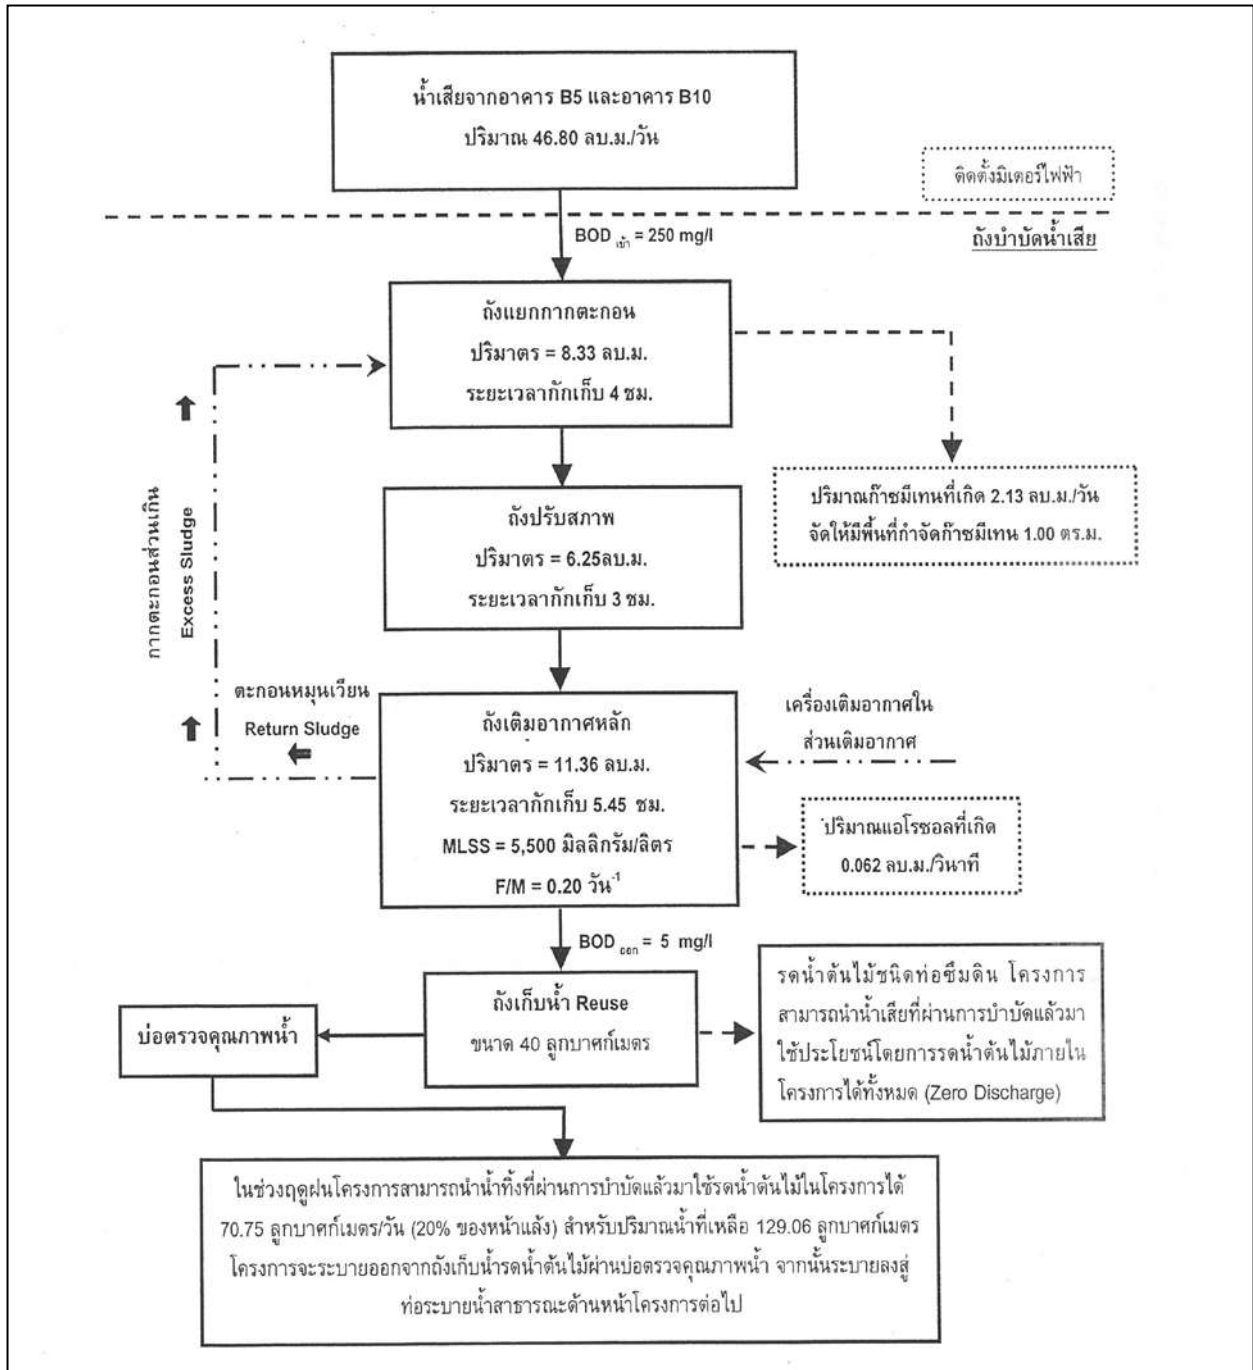

รูปที่ 1.4 แสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-3

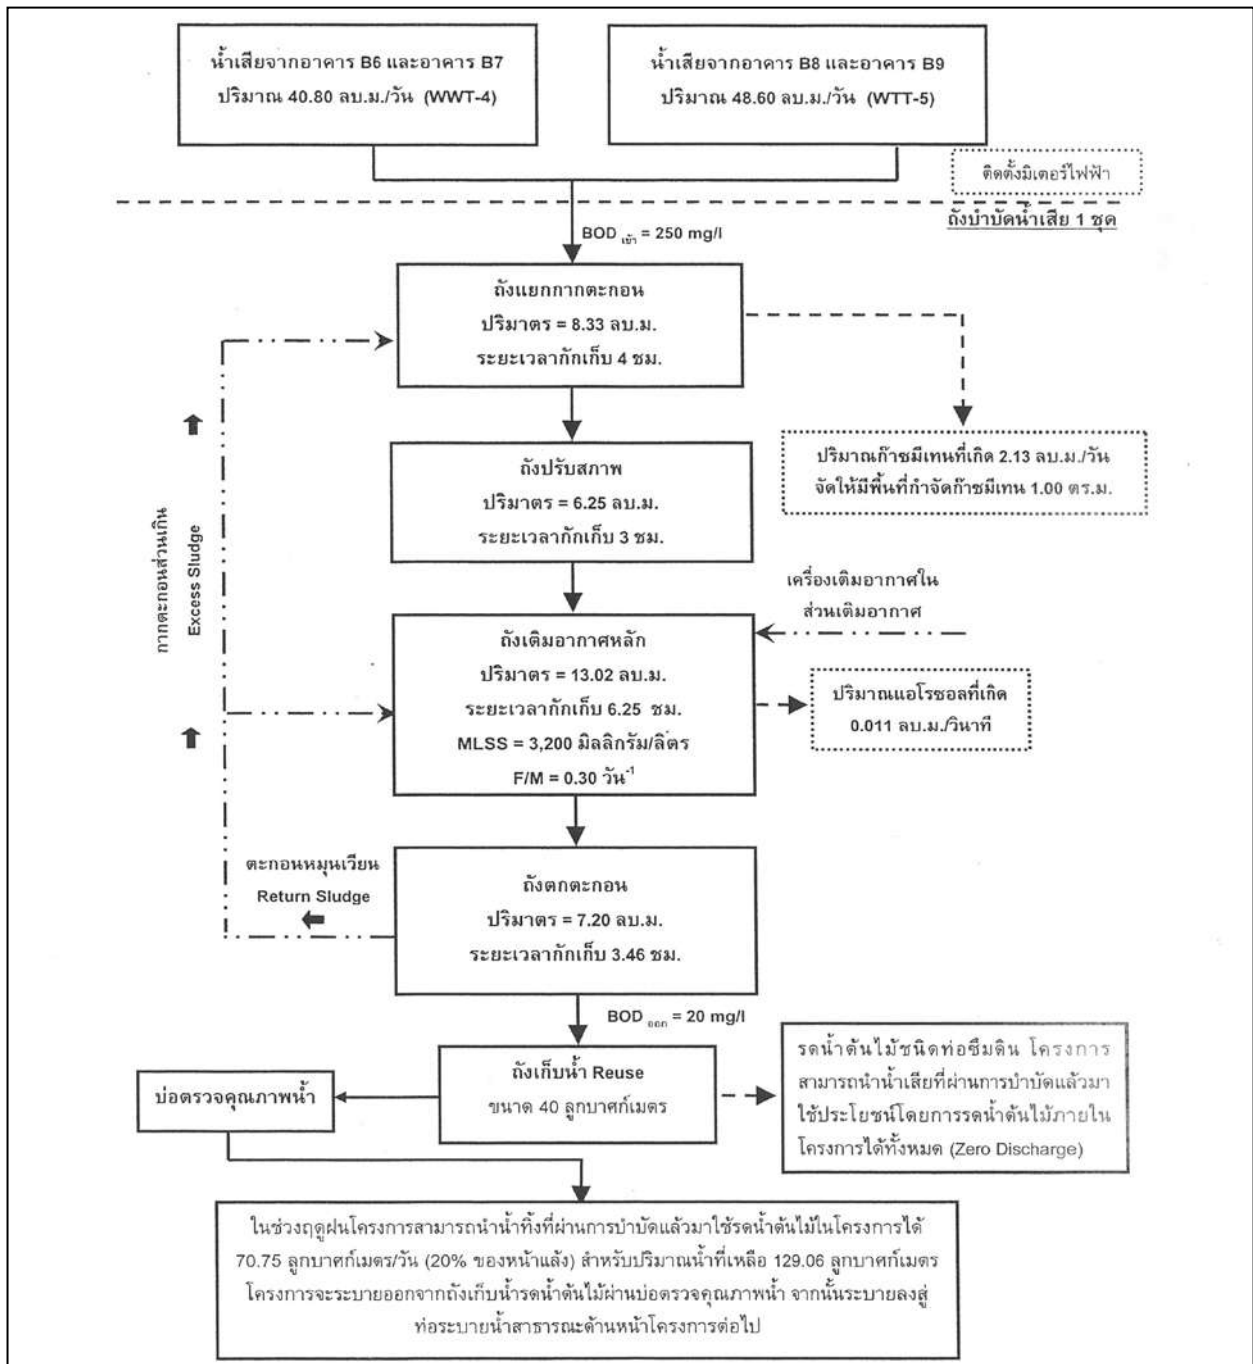

รูปที่ 1.5 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-4 และWWT-5



### 3) การกำจัดตะกอนส่วนเกิน

ถึงบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ และถึงบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน ได้ออกแบบให้มีส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน ซึ่งสามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นานประมาณ 30 วัน ดังนั้น เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าว โครงการจะขอรับบริการรถสูบน้ำของเทศบาลเมืองป่าตอง มาสูบน้ำไปกำจัดต่อไป

สำหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตักกากไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเป็นประจำ โดยจัดให้มีถังดักไขมัน จำนวน 2 ถัง ติดตั้งอยู่บริเวณอาคาร B1 มีความจุ 6 ลบ.ม. และบริเวณอาคาร B2 มีความจุ 12 ลบ.ม. ซึ่งโครงการจะจัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายการผลทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษรองที่กันกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ถุงดำ จากนั้นไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้โครงการจะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ

### 4) วิธีการกำจัดละอองน้ำและก๊าซมีเทน

วิธีการกำจัดละอองน้ำและก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียของโครงการ และวิธีการควบคุมการกำจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

1. การกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดจากอากาศในถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1, WWT-2, WWT-3, WWT4 และ WWT-5 มีปริมาณละอองน้ำที่เกิดขึ้นประมาณ 0.026 ลบ.ม./วินาที, 0.011 ลบ.ม./วินาที, 0.062 ลบ.ม./วินาที, 0.011 ลบ.ม./วินาที และ 0.011 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ซึ่งโครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยการบำบัดด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon จะติดตั้งปลายท่อเป็นลักษณะกระบอกบรรจุถ่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (พื้นที่หน้าตัด 0.031 ตร.ม.) นาว 0.50 ม. เพื่อการกรองอากาศและดูดซับละอองน้ำ โดยการเปลี่ยนถ่านใหม่ทุกๆ 2 เดือน

2. การกำจัดก๊าซมีเทน(CH<sub>4</sub>) โครงการได้เลือกการกำจัดก๊าซมีเทนโดยใช้วิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) โดยโครงการเลือกใช้ปุ๋ยที่สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ที่มีปริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตรตารางเมตร/วัน

### 5) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.81 ลบ.ม./วัน มีค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มล./ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดค่า BOD<sub>ออก</sub> ไม่เกิน 20 มก./ลิตร) ปล่องลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้ให้บริการสัมผัสน้ำทิ้ง โครงการจึงได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นชนิดท่อน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 324.75 ลบ.ม./วัน (คิดอัตราการซึมของดิน (ดินทรายปนดินร่วน) 10 มม./ชม.) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด (Zero Discharge)

### 1.6.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1) การระบายน้ำเสีย

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.81 ลบ.ม./วัน มีค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มล./ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดค่า BOD<sub>ออก</sub> ไม่เกิน 20 มก./ลิตร) ปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้ใช้บริการสัมผัสน้ำทิ้ง โครงการจึงได้ออกแบบท่อร่น้ำต้นไม้เป็นชนิดท่อน้ำซึมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 324.75 ลบ.ม./วัน (คิดอัตราการซึมของดิน (ดินทรายปนดินร่วน) 10 มม./ชม.) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการร่น้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด (Zero Discharge)

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ 64.95 ลบ.ม./วัน (20 % ของหน้าแล้ง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 134.86 ลบ.ม. โครงการจะระบายออกจากถังเก็บน้ำต้นไม้ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จากนั้นระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ

#### 2) การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม

สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนที่ไหลจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้าง x ความลึก : 0.40x0.70 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ถึง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

สำหรับพื้นที่การรับน้ำฝนของโครงการเป็น 4 โซน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โซนที่ 1 มีพื้นที่ 3,127.20 ตร.ม. ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.030 ลบ.ม./วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.067 ลบ.ม./วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 66.60 ลบ.ม. โครงการออกแบบบ่อหน่วงน้ำ มีปริมาตร 67 ลบ.ม. สำหรับน้ำฝนของพื้นที่โซนที่ 1 ทั้งหมด จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ จะถูกจัดการระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร จำนวน 1 ท่อ มีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.025 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.030 ลบ.ม./วินาที) ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 0.025ลบ.ม./วินาที แรงดัน 5 เมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับสูบน้ำกรณีน้ำค้างกันบ่อหน่วงน้ำเพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

โซนที่ 2 มีพื้นที่ 1,780 ตร.ม. ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.1019 ลบ.ม./วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.040 ลบ.ม./วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 37.80 ลบ.ม. โครงการออกแบบบ่อหน่วงน้ำ มีปริมาตร 48 ลบ.ม. สำหรับน้ำฝนของพื้นที่โซนที่ 2 ทั้งหมด จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ จะถูกจัดการระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร จำนวน 1 ท่อ มีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.014 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.019 ลบ.ม./วินาที) ทั้งนี้

โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 0.014 ลบ.ม./วินาที แรงดัน 5 เมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับสูบน้ำกรณีน้ำค้างกันบ่อหนองน้ำเพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

โซนที่ 3 มีพื้นที่ 3,560 ตร.ม. ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.037 ลบ.ม./วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.075 ลบ.ม./วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 68.40 ลบ.ม. โครงการออกแบบบ่อหนองน้ำ มีปริมาตร 74.90 ลบ.ม. สำหรับน้ำฝนของพื้นที่โซนที่ 3 ทั้งหมด จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ จะถูกจัดการระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 เมตร จำนวน 1 ท่อ มีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.031 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.037 ลบ.ม./วินาที) ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 0.031 ลบ.ม./วินาที แรงดัน 5 เมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับสูบน้ำกรณีน้ำค้างกันบ่อหนองน้ำเพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ

โซนที่ 4 มีพื้นที่ 2,742 ตร.ม. ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.030 ลบ.ม./วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.055 ลบ.ม./วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 45 ลบ.ม. โครงการออกแบบบ่อหนองน้ำ มีปริมาตร 52.50 ลบ.ม. สำหรับน้ำฝนของพื้นที่โซนที่ 4 ทั้งหมด จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ จะถูกจัดการระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร จำนวน 1 ท่อ มีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.021 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.030 ลบ.ม./วินาที) ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 0.021 ลบ.ม./วินาที แรงดัน 5 เมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับสูบน้ำกรณีน้ำค้างกันบ่อหนองน้ำเพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ

สำหรับการพัฒนาตะกอนดินลงสู่บ่อหนองน้ำโครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ

#### 1.6.4 การจัดการมูลฝอย

##### 1) ปริมาณขยะมูลฝอย

การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการโดยอ้างอิงแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550)

##### 2) การจัดการมูลฝอย

โครงการจะจัดถังรองรับมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ส่วนในห้องสำนักงานจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น โถงต้อนรับ ร้านอาหารและห้องประชุม เป็นต้น จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล

การจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณห้องพักขยะรีไซเคิล โดยโครงการรวบรวมใส่ถุงดำ ซึ่งขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า

สำหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมอันตรายไว้ในห้องพักขยะอันตราย โครงการจัดให้มีถังขยะอันตรายโดยข้างถังระบุไว้ว่า “ขยะอันตราย” ภายในถังรองรับด้วยถุงดำ โดยในขณะที่ปฏิบัติงานกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว เมื่อมีปริมาณมากพอแล้ว

จะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตนำไปกำจัดต่อไป และโครงการจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน

ขยะอินทรีย์ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น แม่บ้านจะรวบรวมขยะอินทรีย์ จากถังขยะอินทรีย์บริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น มายังห้องพักขยะอินทรีย์ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่นเพื่อให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยต่อไป

### 3) ห้องพักขยะรวมของโครงการ

ห้องพักขยะมูลฝอยรวมอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร B2 โดยโครงการได้ออกแบบให้อาคารห้องพักขยะรวมมีประตูและพื้นที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด ทั้งนี้ห้องพักขยะแบ่งออกเป็น 4 ห้อง เพื่อรองรับขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล

**ปริมาณขยะอินทรีย์คิดเป็น 64 % ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด**

$$\begin{aligned}\text{ปริมาณขยะอินทรีย์} &= 0.64 \times 1,950 \\ &= 1,248 \text{ ลิตร/วัน} \\ \text{หรือ} &= 1.25 \text{ ลบ.ม./วัน}\end{aligned}$$

**ปริมาณขยะแห้ง คิดเป็น 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด**

$$\begin{aligned}\text{ปริมาณขยะแห้ง} &= 0.03 \times 1,950 \\ &= 58.50 \text{ ลิตร/วัน} \\ \text{หรือ} &= 0.06 \text{ ลบ.ม./วัน}\end{aligned}$$

**ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเป็น 30% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด**

$$\begin{aligned}\text{ปริมาณขยะรีไซเคิล} &= 0.30 \times 1,950 \\ &= 585 \text{ ลิตร/วัน} \\ \text{หรือ} &= 0.59 \text{ ลบ.ม./วัน}\end{aligned}$$

**ปริมาณขยะอันตราย คิดเป็น 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด**

$$\begin{aligned}\text{ปริมาณขยะอันตราย} &= 0.03 \times 1,950 \\ &= 58.50 \text{ ลิตร/วัน} \\ \text{หรือ} &= 0.06 \text{ ลบ.ม./วัน}\end{aligned}$$

ห้องพักขยะอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 11.88 ตรม. สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 11.88 ลบ.ม. (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 ม.)

ห้องพักขยะแห้ง มีขนาดพื้นที่ 3.80 ตรม. สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 3.80 ลบ.ม. (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 ม.)

ห้องพักขยะอันตราย มีขนาดพื้นที่ 4.5 ตรม. สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 4.50 ลบ.ม. (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 ม.)

ห้องพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 5.0 ตรม. สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 5.0 ลบ.ม.  
(ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 ม.)

ดังนั้น ห้องพักขยะรวมของโครงการจึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 25.18 ลบ.ม.

#### 4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ำชะขยะ

##### ความสามารถในการรองรับขยะอินทรีย์

ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะอินทรีย์ของโครงการ = 11.88 ตรม.

กำหนดความสูงของกองขยะ = 1.0 ตรม.

ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะอินทรีย์ของโครงการ  
=  $11.88 \times 1.0$   
= 11.88 ลบ.ม.

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะอินทรีย์จะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะเปียกที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะอินทรีย์ = 1.25 ลบ.ม.  
=  $3 \times 1.25$   
= 3.75 ลบ.ม.

ดังนั้น ห้องพักขยะอินทรีย์ของโครงการ 11.88 ลบ.ม. สามารถรองรับปริมาณขยะอินทรีย์ของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (3.75 ลบ.ม.) ได้อย่างเพียงพอ

##### ความสามารถในการรองรับขยะแห้ง

ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะแห้งของโครงการ = 3.80 ตรม.

กำหนดความสูงของกองขยะ = 1.0 ตรม.

ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะแห้งของโครงการ  
=  $3.80 \times 1.0$   
= 3.80 ลบ.ม.

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะแห้งจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะแห้งที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะแห้ง = 0.06 ลบ.ม.  
=  $3 \times 0.06$   
= 0.18 ลบ.ม.

ดังนั้น ห้องพักขยะแห้งของโครงการ 3.80 ลบ.ม. สามารถรองรับปริมาณขยะแห้งของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (0.18 ลบ.ม.) ได้อย่างเพียงพอ

##### ความสามารถในการรองรับขยะอันตราย

ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะอันตรายของโครงการ = 4.50 ตรม.

กำหนดความสูงของกองขยะ = 1.0 ตรม.

ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะอันตรายของโครงการ

$$= 4.50 \times 1.0$$

$$= 4.50 \text{ ลบ.ม.}$$

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะอันตรายจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้น

$$\text{ปริมาณขยะอันตราย} = 0.06 \text{ ลบ.ม.}$$

$$= 3 \times 0.06$$

$$= 0.18 \text{ ลบ.ม.}$$

ดังนั้น ห้องพักขยะอันตรายของโครงการ 4.50 ลบ.ม. สามารถรองรับปริมาณขยะอันตรายของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (0.18 ลบ.ม.) ได้อย่างเพียงพอ

ความสามารถในการรองรับขยะรีไซเคิล

$$\text{ขนาดพื้นที่ห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงการ} = 5.0 \text{ ตรม.}$$

$$\text{กำหนดความสูงของกองขยะ} = 1.0 \text{ ตรม.}$$

ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงการ

$$= 5.0 \times 1.0$$

$$= 5.0 \text{ ลบ.ม.}$$

กำหนดให้ขนาดของห้องพักขยะรีไซเคิลจะต้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ของปริมาณขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้น

$$\text{ปริมาณขยะรีไซเคิล} = 0.59 \text{ ลบ.ม.}$$

$$= 3 \times 0.59$$

$$= 1.77 \text{ ลบ.ม.}$$

ดังนั้น ห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงการ 5.0 ลบ.ม. สามารถรองรับปริมาณขยะรีไซเคิลของโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (1.77 ลบ.ม.) ได้อย่างเพียงพอ

ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ

$$\text{ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการ} = 1,950 \text{ ลิตร/วัน}$$

$$\text{หรือ} = 1,950 \text{ ลบ.ม./วัน}$$

$$\text{หรือ} = 650 \text{ กล./วัน}$$

$$\text{ปริมาตรกักเก็บขยะของโครงการ} = 11.88 + 3.8 + 4.5$$

$$= 25.18 \text{ ลบ.ม./วัน}$$

$$\text{ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ} = 25.18/1.950$$

$$= 12.91 \text{ วัน}$$

$$\text{ประมาณ} = 12 \text{ วัน}$$

ดังนั้น โครงการสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 12 วัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ที่กำหนดให้กรณีที่มีสถานที่พักมูลฝอยต้องสามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน

เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปรวบรวม

ไว้ที่ห้องพักขยะรวม สำหรับน้ำชะขยะที่อาจขึ้นจากอาคารห้องพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ โดยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดก็จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเช่นกัน

### 1.6.5 ไฟฟ้า

โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าป่าตอง ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้

#### 1) ระบบไฟฟ้าปกติ

โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 1,500 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้าจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคาร B2 โดยตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตั้งอยู่ห่างจากผนังที่ใกล้ที่สุดของอาคาร B2 โดยตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตั้งอยู่ห่างจากผนังที่ใกล้ที่สุดของอาคาร B2 ประมาณ 3.01 เมตร และ 3.04 เมตร ตามลำดับ และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละลูก ประมาณ 2.99 เมตร

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (วัดจากสายฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด สำหรับผนังด้านเปิดของอาคาร) ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 ซม. เป็นต้น และโครงการเลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึง ได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งบริเวณดังกล่าว ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

#### 2) ระบบไฟฟ้าสำรอง

ในกรณีที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าป่าตอง ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 1,000 kVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้าของอาคาร B2 ชั้นที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่างเพียงพอ

### 1.6.6 การอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ และผู้ใช้บริการภายในโครงการ

### 1.6.7 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้

#### 1) ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทั้งหมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจสอบคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ วงจรทดสอบการทำงาน วงจรป้องกันระบบ วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสถานะปกติ และสถานะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด แบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้ควบคุมแผง จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้า ชั้นที่ 3 ของอาคาร B2

- อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญาณ (Graphic Annunciator Board :AAN) เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อดูจุดเกิดเหตุภายนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถบอกตำแหน่งในการเข้าไประงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญาณจะนิยมแสดงแผนผังของอาคารนั้น ๆ และแสดงโซนหรือจุดของอุปกรณ์ตรวจจับตามตำแหน่งที่ออกแบบไว้ โดยโครงการจะติดตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้า ชั้นที่ 3 ของอาคาร B2

- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดัง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มือกด (Push) และมือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์มีกุญแจไข เปิดฝาค้นคว้าให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือไขว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ โถงต้อนรับ ร้านอาหารภายใน โถงทางเดิน โถงบันได โถงลิฟท์ เป็นต้น

- โทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉิน (Fire Phone Jack : FP) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือคนในอาคารในเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง โดยโครงการจะติดตั้งโทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉินไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั้งบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ โถงต้อนรับ ร้านอาหารภายใน โถงทางเดิน โถงบันได โถงลิฟท์ เป็นต้น

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Phone Electric เหมาะสำหรับการใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่มาก Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทำให้ตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของทุกอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ

- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการตรวจจับจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความร้อนภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อมีอุณหภูมิถึงขีดจำกัดที่



กำหนด แล้วจึงส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณห้องครัวของอาคาร B1 ร้านอาหารภายในของอาคาร B1 ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำในห้องพัก เป็นต้น

## 2) ระบบดับเพลิง

- ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิง ยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และถึงดับเพลิงแบบมือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณบันไดหนีไฟ

- ถังดับเพลิงมือถือชนิด ABC (Fire Extinguisher) โครงการเลือกใช้ถังดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งทุกชั้นของอาคาร (ยกเว้นชั้นใต้ดิน) ติดตั้งชั้นละ 1 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน

- หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็นชนิดสวมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 2 หัว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 x 2.50 x 2.50 นิ้ว เพื่อส่งต่อไปยังระบบดับเพลิง

- ระบบท่อน้ำดับเพลิงและการสำรองน้ำดับเพลิง ประกอบด้วยท่อเย็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ/อาคาร เป็นระบบท่อเปียกโดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตรกักเก็บ 128 ลบ.ม. นำมาใช้สำรองดับเพลิงเพื่อส่งต่อไปยังแต่ละอาคาร ใช้ระบบดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Diesel Fire Pump) อัตราการสูบ 750 แกลลอน/นาทีก แรงดันน้ำ 125 เมตร และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขนาด 15 แกลลอน/นาทีก แรงดันน้ำ 135 เมตร ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถมาใช้สำรองดับเพลิงได้ 45 นาที ก่อนที่รถดับเพลิงจะเข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้

## 3) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และป้ายทางออกฉุกเฉิน

โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และสามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชัดเจนในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หลอดไฟ Halogen ขนาด 2 x 55 W. พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติโดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชม. ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคารซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ บันไดหนีไฟ ห้องครัว ห้องไฟฟ้า ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้องผู้บริหาร ห้องฝ่ายขายและการตลาด ห้องจัดเลี้ยง และที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคาร B3 เป็นต้น

- โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนาน 2 ชม. ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน และหน้าบันไดของทุกชั้นทุกอาคารครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ

#### 4) บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ

โครงการได้จัดให้มีบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟของอาคาร มีรายละเอียดดังนี้

##### อาคาร B 1

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 2.00 เมตร มีชานพัก 2.00 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.275 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 0.90 เมตร มีชานพัก 1.05 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร

##### อาคาร B 2

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.45-1.60 เมตร มีชานพัก 1.60 เมตร ลูกตั้ง 0.158 เมตร และลูกนอน 0.27-0.28 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.50 เมตร มีชานพัก 1.60 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร

##### อาคาร B 3- อาคาร 5

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.75 เมตร มีชานพัก 1.625 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.275 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพัก 1.025 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.275 เมตร

##### อาคาร B 6- อาคาร B9

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.60 เมตร มีชานพัก 1.175 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.275 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพัก 1.00 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.275 เมตร

##### อาคาร B 10

- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.60 เมตร มีชานพัก 1.375 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.275 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น มีความกว้าง 1.00 เมตร มีชานพัก 1.00 เมตร ลูกตั้ง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.275 เมตร

#### 5) ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น – ลง และตำแหน่งชั้นอาคาร

ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น – ลง และตำแหน่งชั้นอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร โดยติดตั้งบริเวณโถงทางเดินแต่ละชั้นของทุกอาคาร

#### 6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรงเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชั้นหลังคา และติดตั้งสายดินที่ชั้นที่ 1 ของทุกอาคารทั่วทั้งโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวนำล่อฟ้า รัศมีครอบคลุมตัวอาคาร ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูงที่สุดของโครงการ เพื่อให้รัศมีการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด
2. สายดิน เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8" x 10 ฟังลิกลงในดิน และมีค่าความต้านทานของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม

3. สายตัวนำลงดิน ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายดินตัวนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้ามาตรฐาน ตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ

#### 7) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล

โครงการจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง มาฝึกอบรมเป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง บริเวณทางเดินในแต่ละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในอาคารที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ให้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันไดมายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

โครงการจัดให้มีจุดรวมพล 3 จุด ได้แก่

จุดรวมพลที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร B3 มีพื้นที่ 88.88 ตรม.

จุดรวมพลที่ 2 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร B1 และอาคาร B2 มีพื้นที่ 48.63 ตรม.

จุดรวมพลที่ 3 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร B7 และอาคาร B8 มีพื้นที่ 48.63 ตรม.

รวมพื้นที่จุดรวมพลรวมทั้งสิ้น 186.14 ตรม. คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยในโครงการเท่ากับ 0.29 ตรม./คน หรือ 3.49 คน/ตรม. เมื่อคิดผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุด 650 คน (รวมพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดฯ

#### 1.6.8 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

โครงการได้ออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้พิการ และคนชรา เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

#### 1.6.9 ระบบปรับอากาศ

##### 1) ระบบปรับอากาศ

โครงการมีติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งนี้มีจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นประมาณ 591 ตัน

##### 2) การระบายอากาศ

โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล ดังนี้

- การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องพักที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู และหน้าต่าง โดยโครงการได้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ

- การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ

- การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับสภาวะอากาศ ได้มีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับสภาวะอากาศออกไป

#### 1.6.10 การรักษาความปลอดภัย

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชม. การทำงานจะแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. และผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆอาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า – ออกของโครงการ

นอกจากนี้โครงการจะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการมีการติดตั้งภายนอกอาคารจำนวน 31 จุด กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ บริเวณทางเข้า – ออก บริเวณถนนภายในโครงการและถนนภายนอกโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต

#### 1.6.11 การจัดการส้วมและร้านอาหาร

##### 1. การจัดการส้วม

โครงการจัดให้มีส้วมภายในห้องพักชั้นที่ 1 อยู่บริเวณระเบียงอาคารห้องพัก B7 ถึงอาคาร B9 (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.00 เมตร) และส้วมในส่วนกลางอยู่บริเวณอาคาร B3 และอาคาร B6 ถึงอาคาร B10 รวมทั้งสิ้น 6 ส้วม (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.00 เมตร) โดยส้วมภายในโครงการจะให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมประกอบกิจการส้วมของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการส้วมหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550

##### 2. การจัดการร้านอาหาร

โครงการจัดให้มีร้านอาหารบริเวณอาคาร B1 ชั้นที่ 2 และอาคาร B2 ชั้นที่ 1-2 โดยโครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารในโครงการ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2546 นอกจากนี้ร้านอาหารในโครงการจะสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Test) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยตำแหน่งสถานที่รับประมาณอาหาร เตรียมอาหาร ปิ้งอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นมากกว่า 60 ซม. ไม่เตรียมอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องในห้องน้ำ ห้องส้วม นอกจากนี้จะใช้สารปรุงแต่งที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

#### 1.6.12 การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ 2,706.26 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 4.16 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่โครงการ 650 คน) โดยจัดบริเวณชั้นล่างทั้งหมด และเป็นไวน์ตันดั้งเดิมจำนวน 94 ต้น ได้แก่ ต้นไทร ต้นยางพารา ต้นมะฮอกกานี

ต้นสะตอ เป็นต้น และปลูกไม้ยืนต้นใหม่ 333 ต้น มีพื้นที่ไม้ยืนต้นรวมทั้งหมด 2,618.37 ตารางเมตร นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีการปลูกไม้พุ่มภายในโครงการ เช่น หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย เป็นต้น

### 1.6.13 ถนนและที่จอดรถของโครงการ

ทางเข้า – ออก ของโครงการ มีจำนวน 3 จุด บริเวณติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ตอนกลาง – หาดราไวย์ จำนวน 1 จุด มีความกว้างของทางเข้า – ออก 6.04 เมตร เคนรถสองทิศทาง และบริเวณติดกับซอยพระบารมี 8 จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 มีความกว้างของทางเข้า – ออก 12.90 เมตร เคนรถสองทิศทาง และจุดที่ 2 มีความกว้างของทางเข้า – ออก 6.11 เมตร เคนรถสองทิศทาง โดยที่จอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการทั้งหมดเป็นที่จอดรถภายนอกอาคาร จำนวน 23 คัน และที่จอดรถภายในอาคาร จำนวน 18 คัน รวมที่จอดรถทั้งสิ้น 41 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 1 คัน) โดยลักษณะที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.50 เมตร และความยาว 5.00 เมตร

นอกจากนี้โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน มีความกว้าง 3.00 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และจัดให้มีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.50 เมตร

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ 322 ถนนพระบาร์มี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานเลขที่ ทส. 1009.5/4695 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำ
- คุณภาพชีวิต
- ระบบการป้องกันอัคคีภัย
- อื่น ๆ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาภูเก็ต จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาตุไร จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 26.30 ของพื้นที่โครงการ</p> <p>2. น้ำฝนจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้าง x ความ ลึก : 0.40 x 0.70 เมตร ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ ก่อนลงสู่บ่อหนองน้ำ จำนวน 4 บ่อ ปริมาตร 67 ลบ.ม. 48 ลบ.ม. 74.90 ลบ.ม. และ 52.50 ลบ.ม. โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อหนองน้ำ จะปล่อยออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ในโครงการไม่มีน้ำฝนซึ่งในโครงการ (รูปที่ 2.2)</p> <p>3. จัดให้มีกำแพงกันดินที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตามแนวนอนในโครงการ ขนาดความสูงของกำแพงกันดินมี 6 แบบ ได้แก่ ความสูงเท่ากับ 1.00 เมตร 1.50 เมตร 2.00 เมตร 2.50 เมตร 3.00 เมตร 3.50 เมตร และ 4.00 เมตร ตามลำดับ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน</p> | <p>- โครงการมีพื้นที่สีเขียวในโครงการ ประมาณ ร้อยละ 35 ของพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.1)</p> <p>- โครงการจะลงสู่บ่อหนองน้ำของโครงการ จำนวน 1 บ่อ และลงสู่รางระบายน้ำจากนั้นจะปล่อยออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ในโครงการไม่มีน้ำฝนซึ่งในโครงการ (รูปที่ 2.2)</p> <p>- โครงการได้สร้างกำแพงกันดินตามที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตามแนวนอนในโครงการ ซึ่งขนาดความสูงมี 6 แบบ ได้แก่ ความสูงเท่ากับ 1.00 เมตร 1.50 เมตร 2.00 เมตร 2.50 เมตร 3.00 เมตร 3.50 เมตร และ 4.00 เมตร ตามลำดับ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน (รูปที่ 2.3)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |



ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</p> <p>1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ</p> <p>1. จัดให้มีเส้นทางอพยพหนีภัยไปยังจุดรวมพลติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</p> <p>2. จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการชุมนุม</p> <p>3. เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดแผ่นดินไหวได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้ง</p> <p>4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย</p> <p>5. ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์</p> <p>6. โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ</p> | <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางหนีภัยไปยังจุดรวมพลไว้บริเวณทางเดินในโครงการ และหลังประตูในห้องพักทุกห้อง (รูปที่ 2.4)</p> <p>- โครงการได้จัดเส้นทางหนีไฟในโครงการไว้ภายในบริเวณโครงการ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการชุมนุม (รูปที่ 2.5)</p> <p>- โครงการมีการเตรียมพร้อม และรับฟังข่าวสารแจ้งเตือนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฯ โครงการจะประสานงานกับหน่วยงานเทศบาลเมืองปาดอง เพื่อทำการช่วยเหลือ อพยพผู้อยู่อาศัยในโครงการ</p> <p>- โครงการได้ทำแผ่นพับ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย ติดไว้ที่หน้าลิอบบี้ และคู่มือกฎระเบียบในห้องพัก (รูปที่ 2.6)</p> <p>- โครงการได้ติดตามข่าวสาร ประกาศ เป็นจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์</p> <p>- โครงการได้ทำแผ่นพับ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย ติดไว้ที่หน้าลิอบบี้ และคู่มือกฎระเบียบในห้องพัก</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</p> <p>1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ)</p> <p>7. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ หรือ หากจังหวัดจัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>8. หากเกิดธรณีพิบัติภัย โครงการจะดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย ดังนี้</p> <p>8.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อกดปุ่มสัญญาณเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>8.2 พนักงานเคาะประตูห้องพักแต่ละห้องและตรวจสอบว่ามีผู้พักอาศัยอยู่หรือไม่</p> <p>9. พนักงานอยู่ประจำตามจุดต่างๆ เพื่อนำทางผู้พักอาศัยไปยังจุดรวมพล</p> | <p>- โครงการมีการซ้อมอพยพหนีไฟฯ เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 โครงการมีการฝึกซ้อมในเดือนมิถุนายน 2568 กับหน่วยงานเทศบาลเมืองคลองแห (ภาคผนวกที่ 15)</p> <p>- เมื่อเกิดธรณีพิบัติภัย โครงการจะดำเนินการช่วยเหลือผู้พักอาศัยและพนักงานตามแผนอพยพ มีเจ้าหน้าที่กดปุ่มสัญญาณเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการทราบอย่างทั่วถึง พนักงานจะเคาะประตูห้องพักแต่ละห้องเพื่อตรวจสอบผู้พักอาศัยอยู่หรือไม่ เพื่อนำทางผู้พักอาศัย พนักงานไปยังจุดรวมพล เมื่อเหตุการณ์สงบจะมีการประเมินความเสียหาย และแจ้งขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปาดองต่อไป</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b><br><b>1.4 คุณภาพอากาศ</b><br>1. ติดป้ายให้ผู้ใช้บริการดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย<br>2. จัดพื้นที่สีเขียวขนาด 2,948.11 ตารางเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อช่วยลดดูดซับมลสารที่เกิดจากพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ<br>3. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว | - โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย (รูปที่ 2.7)<br>- โครงการได้มีการปลูกไม้พันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ และมีคนสวนทำหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดดูดซับมลสารที่เกิดจากพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ<br>- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณทางเข้าที่จอดรถของโครงการ (รูปที่ 2.8) | - ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b><br><b>1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน</b><br>1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง<br>2. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ<br>3. ปลุกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นหมาก ต้นไทร ต้นตีนเป็ด ต้นจิก<br>เศรษฐี ต้นจิกทะเล ต้นพาชานโตส ต้นขานาง ต้นหลิว และต้นลีลาวดี เป็นรั้วกัน<br>เสียงโดยรอบโครงการ                                                 | - โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณ<br>ทางเข้าที่จอดรถของโครงการ<br>- โครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ใน<br>โครงการ<br>- โครงการได้มีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นมะพร้าว ต้นหมาก ต้นไทร ต้น<br>ตีนเป็ด ต้นจิกเศรษฐี ต้นจิกทะเล ต้นพาชานโตส ต้นขานาง ต้นหลิว และ<br>ต้นลีลาวดี เป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ                | - ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา |
| <b>2. ทรัพยากรชีวภาพ</b><br><b>2.1 นิเวศวิทยาทางบก</b><br><b>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ</b><br>1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับจำนวน 4 ชุด<br>ได้แก่ ขนาด 60 ลบ.ม./วัน ขนาด 40 ลบ.ม./วัน ขนาด 50 ลบ.ม./วัน และขนาด 50<br>ลบ.ม./วัน ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน จำนวน 1 ชุด<br>ขนาด 50 ลบ.ม./วัน และถังดักไขมันจำนวน 2 ชุด เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน<br>ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก | - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียน<br>กลับจำนวน 4 ชุด ได้แก่ ขนาด 60 ลบ.ม./วัน ขนาด 40 ลบ.ม./วัน ขนาด<br>50 ลบ.ม./วัน และขนาด 50 ลบ.ม./วัน ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยง<br>ตะกอนแบบใช้เมมเบรน จำนวน 1 ชุด ขนาด 50 ลบ.ม./วัน และถังดักไขมัน<br>จำนวน 3 ชุด เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง<br>จากอาคารประเภท ก (รูปที่ 2.9) | - ไม่พบปัญหา                                 |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. ทรัพยากรชีวภาพ (ต่อ)</p> <p>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>3. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของแต่ละอาคาร ปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง โดยจะนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรด น้ำแบบท่อซึมดิน</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบำบัดน้ำเสียดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</p> <p>5. โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นต้นไม้ยืนต้น ประมาณ 433 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำ เสียได้</p> | <p>- โครงการมีแผนช่างเป็นผู้ดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และมีการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่แผนช่างที่ดูแลรับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ</p> <p>- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด จะปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse จำนวน 1 ถัง โดยจะนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และมีการเชื่อมต่อปล่อยลงสู่ลำ รางสาธารณะ</p> <p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>- โครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ ประมาณมาก กว่า 433 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ได้</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. ทรัพยากรชีวภาพ (ต่อ)</p> <p>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)</p> <p>6. จัดให้มีท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้าง x ความลึก : 0.40 x 0.70 เมตร ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ ก่อนลงสู่บ่อหนึ่งน้ำ จำนวน 4 บ่อ ปริมาตร 67 ลบ.ม. 48 ลบ.ม. 74.9 ลบ.ม. และ 52.5 ลบ.ม. โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อหนึ่งน้ำ จะระบายลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>7. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>8. ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ</p> <p>9. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหากพบว่าการชำรุดต้องแก้ไขทันที</p> | <p>- โครงการมีบ่อหนึ่งน้ำ จำนวน 1 บ่อ ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝน โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อหนึ่งน้ำ จะระบายลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>- โครงการมีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำฝน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ (รูปที่ 2.10)</p> <p>- โครงการมีแผนช่างเป็นผู้ดูแล ตรวจสอบ ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหากพบว่าการชำรุด เสียหาย จะดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมทันที</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b><br>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน<br>3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน<br>3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558<br>3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553<br>3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | -การใช้ประโยชน์ของที่ดินของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ไม่พบปัญหา                                 |
| <b>3.2 การคมนาคมขนส่ง</b><br>1. จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการจราจร – ออกภายในพื้นที่โครงการ<br>2. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ<br>3. ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า – ออกพื้นที่โครงการโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า – ออกตลอดเวลา                                                                                                                                                                                  | - โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการจราจร – ออก โครงการ แต่ทั้งนี้โครงการได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกรถเข้า – ออก ตลอด 24 ชั่วโมง (รูปที่ 2.11)<br>- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 30 กม./ชม. ที่บริเวณทางเข้าโครงการ<br>- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า – ออกตลอด 24 ชั่วโมง | - ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาธาภูเก็ต จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)</p> <p>4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ</p> <p>5. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 50 คัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจรภายในโครงการ</p> <p>6. ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า – ออก และบริเวณไหล่ทางเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร</p> <p>7. ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> | <p>- โครงการมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า – ออก โครงการ และทางจราจรภายในโครงการ(รูปที่ 2.12)</p> <p>- โครงการมีที่จอดรถยนต์ จำนวน 50 คัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดรถกีดขวางเส้นทางการจราจรภายในโครงการ (รูปที่ 2.13)</p> <p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลสอดส่อง ไม่ให้มีการจอดรถบริเวณไหล่ทาง และบริเวณทางเข้า – โครงการ เพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการจราจร</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายชื่อโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย (รูปที่ 2.14)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |



ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.3 การใช้น้ำ</p> <p>1. ถึงเก็บน้ำสำรองที่รวบรวมปริมาตรน้ำที่กักเก็บไว้ในโครงการทั้งหมด 892 ลบ.ม. ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 3 วัน</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน</p> <p>3. รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>4. ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันทีนอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย</p> | <p>- โครงการมีถังเก็บน้ำใช้ของโครงการมีทั้งหมด 2 บ่อ ความจุรวม 750 คิว ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 3 วัน (รูปที่ 2.15)</p> <p>- เนื่องโครงการเพิ่งดำเนินเปิดโครงการ ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ แต่ทั้งนี้โครงการมีแผนทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุกๆ 6 เดือน</p> <p>- โครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งส่วนห้องน้ำผู้เข้าพัก และห้องน้ำพนักงาน และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันประหยัดน้ำ (รูปที่ 2.16 - 17)</p> <p>- โครงการได้มีแผนช่างเป็นผู้ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งหากพบการชำรุด หรือเสียหายจะดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมทันที</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาตุไร จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม</p> <p>1. จัดให้มีท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้าง x ความลึก : 0.40 x 0.70 เมตร ผ่านบ่อกักเป็นระยะๆ ก่อนลงสู่บ่อบำบัดน้ำ จำนวน 4 บ่อ ปริมาตร 67 ลบ.ม. 48 ลบ.ม. 74.9 ลบ.ม. และ 52.5 ลบ.ม. โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อบำบัดน้ำ จะระบายออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>2. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อกักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>3. ออกแบบให้มีบ่อกักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ</p> <p>4. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที</p> | <p>- โครงการมีบ่อบำบัดน้ำ จำนวน 1 บ่อ ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝน โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อบำบัดน้ำ จะระบายลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>- โครงการมีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำฝน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ</p> <p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบ ดูแลระบบระบายน้ำของโครงการ ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีการตรวจสอบดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งหากพบการชำรุด เสียหาย จะดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.5 การจัดการน้ำเสีย</p> <p>1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 60 ลบ.ม./วัน ขนาด 40 ลบ.ม./วัน ขนาด 50 ลบ.ม./วัน และขนาด 50 ลบ.ม./วัน ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน จำนวน 1 ชุด ขนาด 50 ลบ.ม./วัน และถังดักไขมันจำนวน 2 ชุด เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก</p> <p>2. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของแต่ละอาคารปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง โดยจะนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดน้ำแบบท่อซึมดิน</p> <p>3. ติดตั้งมิเตอร์น้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา</p> <p>4. จัดให้มีพนักงานดูแลบ่อดักไขมัน โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ โดยกากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปจากแห่งก่อน รวบรวมให้เทศบาลเมืองป่าตองไปกำจัดต่อไป</p> | <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 60 ลบ.ม./วัน ขนาด 40 ลบ.ม./วัน ขนาด 50 ลบ.ม./วัน และขนาด 50 ลบ.ม./วัน ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน จำนวน 1 ชุด ขนาด 50 ลบ.ม./วัน และถังดักไขมันจำนวน 3 ชุด เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก</p> <p>- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด จะปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse จำนวน 1 ถัง โดยจะนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และมีการเชื่อมต่อปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งมิเตอร์น้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา (รูปที่ 18)</p> <p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างดูแลบ่อดักไขมัน โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 3 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ และใช้บริการรถดูดไขมันของเอกชนไปกำจัดต่อไป</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำเมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวทางโครงการจะประสานงานให้เทศบาลเมืองปาดองมาสุบไปกำจัดต่อไป</p> <p>8. โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 433 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างตรวจและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ และมีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</li> <li>- โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำเมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวทางโครงการจะใช้บริการรถสูบกากตะกอนของเอกชนมาสุบไปกำจัดต่อไป</li> <li>- โครงการมีการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น โดยรอบพื้นที่โครงการประมาณมากกว่า 433 ต้น ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้ และมีคนสวนดูแลและปลูกเพิ่มอยู่เสมอ</li> </ul> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาธาบุรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>1. ออกแบบให้อาคารห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ</p> <p>2. จัดตั้งรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้องรวมทั้งพื้นที่ส่วนกลาง</p> <p>3. จัดให้มีห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 4 ห้อง เพื่อรองรับขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 12 วัน เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป</p> <p>4. กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจูลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวมของโครงการ</p> <p>5. ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ</p> | <p>- ห้องพักขยะรวมของโครงการเป็นระบบปิด มีประตูและเป็นพื้นที่ที่มิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ (รูปที่ 2.19)</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง (รูปที่ 2.20)</p> <p>- ห้องพักขยะรวมของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ห้อง แยกเป็นห้องพักขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 12 วัน และทางโครงการได้ใช้บริการรถเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองป่าตองมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p> <p>- โครงการมีแผนแม่บ้านรวบรวม คัดแยกขยะจากจุดกำเนิดลงถุงดำพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย จากนั้นนำไปรวบรวมที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ จากนั้นรถเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนขยะ แม่บ้านจะทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง</p> <p>- หลังรถเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองป่าตองมาเก็บขนขยะ แม่บ้านจะทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>6. การเก็บขนขยะเปียก – ขยะแห้ง ให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรเก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง</p> <p>7. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย</p> <p>8. ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด</p>                                                                                                                                 | <p>- โครงการได้มีการแยกขยะเปียก – ขยะแห้งตรงจุดกำเนิดก่อนรวบรวมที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ</p> <p>- โครงการได้ติดประชาสัมพันธ์ทั้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น</p> <p>- ห้องพักขยะรวมของโครงการเป็นระบบปิด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |
| <p>3.7 ไฟฟ้า</p> <p>1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 1,500 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของอาคาร</p> <p>2. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1,000 kVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้าของอาคาร B2 ชั้นที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ</p> | <p>- โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 1,500 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของอาคาร (รูปที่ 2.20)</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1,000 kVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้าของอาคาร B2 ชั้นที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ (รูปที่ 2.21)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)</p> <p>3. ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร</p> <p>4. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556</p> <p>5. หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>6. ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>7. เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00 – 06.00 น.</p> <p>8. เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง</p> | <p>- โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556</p> <p>- ตำแหน่งที่ตั้งของหม้อแปลงอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>- มีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>- โครงการมีแผนควบคุมระบบเปิด – ปิดไฟฟ้าส่วนกลาง ที่เวลา 18.00 – 06.00 น.</p> <p>- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอด T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น และมีการดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืนไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง (รูปที่ 2.23)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)</p> <p>9. บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ</p> <p>10. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>11. อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ</p> <p>12. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>13. จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างน้อยลง</p> <p>14. เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน</p> | <p>- โครงการมีแผนช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เช่น เช็ดหลอดไฟ เป็นต้น</p> <p>- โครงการมีแผนช่างคอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วน กลาง ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการมีแผนอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคน และมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน</p> <p>- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (รูปที่ 2.24)</p> <p>- โครงการมีแผนช่างทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่ เสมอ</p> <p>- โครงการเลือกใช้สีผนังอาคารเป็นสีอ่อน สะท้อนแสงและกันความร้อน และเพื่อลดการดูดกลืนความร้อน (รูปที่ 2.25)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |



ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>3.8 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1. จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>2. ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น</p> <p>3. จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>4. จัดให้มีจุดรวมพล 5 จุด พื้นที่ 88.88 ตารางเมตร, 48.63 ตารางเมตร, 48.63 ตารางเมตร และ 36.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 270.77 ตารางเมตร</p> <p>5. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รูปที่ 2.27 – 2.30)</li> <li>- โครงการมีแผนกช่างตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกๆ 1 เดือน (รูปที่ 2.33)</li> <li>- โครงการมีการซ้อมอพยพหนีไฟฯ เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 โครงการมีการฝึกซ้อมในเดือนมิถุนายน 2568 กับหน่วยงานเทศบาลเมืองคลองแห (ภาคผนวกที่ 15)</li> <li>- โครงการจัดให้จุดรวมพลภายในโครงการ 1 จุด ซึ่งเพียงพอต่อการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ (รูปที่ 2.26)</li> <li>- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่พบปัญหา</li> <li>- ไม่พบปัญหา</li> <li>- ไม่พบปัญหา</li> <li>- ไม่พบปัญหา</li> <li>- ไม่พบปัญหา</li> </ul> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b><br><b>3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b><br>6. ติดป้ายแสดงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดตั้งทุกจุด<br>7.<br>8. จัดทำผังเส้นทางทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวม ดิดไว้บริเวณทาง เดิน<br>ในอาคาร<br>9. มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่<br>10. จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย                                                                      | - โครงการได้ติดตั้งป้ายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดตั้ง<br>ทุกจุด<br>- โครงการได้ติดตั้งผังเส้นทางทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล บริเวณ<br>ทางเดินในอาคารและหลังประตูในห้องพักทุกห้อง<br>- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยพร้อมกำหนด<br>บทบาทหน้าที่<br>- โครงการมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย                                                                                                        | - ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา |
| <b>3.9 การระบายอากาศ และความชื้น</b><br>1. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน<br>การทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค<br>2. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ<br>3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นต์ทั้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถ<br>สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง<br>4. จัดให้มีไม้ย่นตันภายในโครงการให้มากที่สุดเพื่อลดความร้อนจากการ<br>ระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ | - โครงการมีแผนช่างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อ<br>โรค<br>- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ<br>- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องย่นต์บริเวณที่จอดรถ ที่<br>สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง<br>- โครงการได้มีการปลูกพันธุ์ไม้ย่นตันรอบๆบริเวณอาคารทั้งโครงการ<br>เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ | - ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา<br>- ไม่พบปัญหา |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4. คุณภาพชีวิต</b></p> <p>4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>1. จะพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด</li> <li>— กรณีสถานที่เข้า - ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>— ห้ามเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขยะหรือของต่างๆออกไปนอกกระเบียงห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปุน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ำทิ้งโดยสุ่มเสี่ยงโดยเด็ดขาด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้พิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเข้าทำงานก่อน จำนวนพนักงานที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 90 คน</li> <li>- โครงการมีฝ่ายประชาสัมพันธ์คอยติดตามและประชาสัมพันธ์รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- โครงการได้จัดทำคู่มือกฎระเบียบในการเข้าพัก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบการด้านความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ กฎระเบียบการจราจร การนำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พัก และด้านอื่นๆ เป็นไปตามมาตรการกำหนดไว้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่พบปัญหา</li> <li>- ไม่พบปัญหา</li> <li>- ไม่พบปัญหา</li> </ul> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b>4. คุณภาพชีวิต</b></p> <p>4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ห้ามกระทำการตีดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผังระเบียบหรือส่วนใดภายในห้องพัก</li> <li>— ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</li> <li>— ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจราจร การนำรถเข้า – ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด</li> <li>— ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพัก และไว้ในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น</li> </ul> | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                  |
| <p>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชม. หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชม. หากพบเหตุผิดปกติจะดำเนินการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัยทันที</p> | - ไม่พบปัญหา                       |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)</b></p> <p>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>2. จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชม.</p> <p>3. จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) รวมจำนวน 31 จุด ติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ</p> <p>4. ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย</p> <p>5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถนำมาใช้งานได้ทันที</p> <p>6. จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุ เหตุรุนแรง</p> <p>7. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้</p> | <p>- โครงการมีพนักงานอยู่ประจำตลอด 24 ชม.เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 300 กว่าจุด ติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2.34)</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย (รูปที่ 2.35)</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถนำมาใช้งานได้ทันที</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุ เหตุรุนแรง (รูปที่ 2.36)</p> <p>- โครงการมีแผนช่างตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ให้สามารถใช้งานได้</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)</p> <p>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>8. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย</p> <p>9. กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากนั้นรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- โครงการมีแผนช่างตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย</p> <p>- โครงการมีแผนแม่บ้านทำความสะอาดถังขยะและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจากนั้นรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |
| <p>4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ และการจัดการร้านอาหาร</p> <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไขสระว่ายน้ำ</u></p> <p>1. ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม</p> <p>2. สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ</p> <p>3. โครงสร้างของสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย</p> <p>4. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง</p> <p>5. จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย</p> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขสระว่ายน้ำ ดังนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำทั้ง 4 จุด อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม สระว่ายน้ำมีการยกระดับสูงจากพื้นถนนของโครงการ โครงสร้างสระสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุมีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำได้ผนังเรียบ มีรางระบายน้ำล้นที่แข็งแรง ไม่เป็นสนิม มีพื้นที่ว่างสำหรับทาง เดินรอบสระน้ำ พื้นไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย มีระบบแสงสว่างทั้งบริเวณสระว่ายน้ำ และมีอ่างล้างมือล้างเท้าและสระล้างตัวก่อนลงสระ และมีการเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ</p> <p>(รูปที่ 2.39 – 2.41)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                     |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไขสระว่ายน้ำ (ต่อ)</u></p> <p>6. จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</p> <p>7. จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้าสำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ</p> <p>8. จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระและที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ</p>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ</u></p> <p>1. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>2. รักษาความสะอาดพื้นที่โครงการโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>3. จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</p> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ ดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและประกาศเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างทำความสะอาดพื้นที่รอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างกรณีมีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการ และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ เช่นห่วงยางช่วยชีวิตไม้ช่วยชีวิต</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</li> <li>จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น</li> </ol>                                                                                                                                                                           | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ตามมาตรการ ฯ กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |
| <p><u>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความเป็นกรดต่าง คลอรีนอิสระคงเหลือและคลอรีนที่ร่วมกับสารอื่นวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟิคอลโคลิฟอร์มทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>ตรวจสอบความเป็นกรด - ด่าง ความกระด้าง กรดไซยาไนด์ คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์ หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ol> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำ ดังนี้ โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างทำการตรวจสอบวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง และค่าคลอรีนที่ร่วมกับสารอื่นวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดให้บริการ และโครงการได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ กับบริษัท เช้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด (ภาคผนวกที่ 6)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |



ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ร้านอาหาร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดอร่อย (Clean Food Good Test) ของกระทรวงสาธารณสุข</li> <li>2. จัดตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร บำรุงอาหาร และสถานประกอบการ จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม</li> <li>3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหารเครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</li> </ol> | <p>- โครงการมีแผนเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดอร่อย (Clean Food Good Test) ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ทั้งนี้โครงการได้มีการจัดระเบียบสถานที่รับประทานอาหาร ปรุงอาหารที่สะอาด เรียบร้อย และจัดเป็นสัดส่วน และมีการใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวง รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข โรคระบบทางเดินหายใจ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ</li> <li>จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย</li> <li>จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อช่วยลดดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</li> <li>จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</li> </ol> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขโรคระบบทางเดินหายใจ ดังนี้โครงการมีการล้างทำความสะอาดถาดรองน้ำเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ โครงการออกแบบอาคารให้มีการถ่ายเทอากาศ โดยให้มีช่องเปิดต่างๆเช่นประตู หน้าต่าง มีระเบียง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนน และมีการกวาดถนนทุกวัน มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วก่อนเข้าโครงการ เพื่อช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ รวมถึงมีการปลูกเพิ่มในบริเวณที่ว่างเพื่อช่วยในการดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะ</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปิดห้องขยะให้สนิท เพื่อไม่ให้ยุงไปวางไข่</li> <li>2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</li> <li>3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดส้วมและห้องอาบน้ำ</li> <li>5. ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขโรคที่เกิดจากแมลงสาบเป็นพาหะ ดังนี้ ห้องพักขยะรวมเป็นแบบระบบปิด และมีการดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักขยะทั้งในอาคารและนอกอาคาร โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องอาบน้ำและห้องส้วมส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน มีและการฉีดพ่นกำจัดแมลงเป็นประจำทุกเดือน</p>                                                                                                                                                     | - ไม่พบปัญหา                       |
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปิดห้องขยะให้</li> <li>2. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ</li> <li>3. จัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำงานฉีดพ่นยา ในกรณีโรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ</li> <li>4. เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆเช่น ขวด ไฟ กระป๋อง หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</li> <li>5. บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น</li> <li>6. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</li> </ol> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค ดังนี้ มีการปิดปากภาชนะเพื่อป้องกันยุงวางไข่ และมีการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นประจำ และเก็บขนทำลายสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และมีการว่าจ้างให้บริษัทเอกชน เข้ามาฉีดพ่นแมลงเป็นประจำทุกเดือน ในส่วนของพื้นที่สีเขียว มีการตัด ตกแต่ง ไม่ให้เกิดมูมอับ ในส่วนของรางระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ ได้มีการขุดลอกเป็นประจำเพื่อป้องกันน้ำขัง และเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี</p> | - ไม่พบปัญหา                       |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาราบุรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข โรคฉี่หนู</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบน้ำซึมดิน</li> <li>2. ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถของผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย</li> <li>3. จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</li> <li>4. จำกัดความเร็วรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</li> </ol> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขโรคฉี่หนู ดังนี้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ โครงการได้ออกแบบเป็นระบบท่อและมีป้ายเตือน “Recycle Water” มีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ ในบริเวณพื้นที่จอดรถ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้ามาในพื้นที่โครงการและจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบโครงการ เพื่อช่วยในการดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข โรคเครียด ซึ่งจะไปสู่โรคนอนไม่หลับ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</li> <li>2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</li> <li>3. จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการมากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ</li> <li>4. จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างฝั่งของโครงการ</li> <li>5. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,429.62 ตารางเมตร (ร้อยละ 22.34 ของพื้นที่โครงการ)</li> <li>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้เข้าพัก</li> </ol> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข โรคเครียด ซึ่งจะไปสู่โรคนอนไม่หลับ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท ดังนี้ โครงการมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ มีการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถ ในตำแหน่งที่สามารถมองได้ชัดเจน มีการปลูกไม้ยืนต้นรอบรั้วโครงการและพื้นที่ว่างของโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโครงการ มีประมาณ 50 % ของพื้นที่ทั้งหมด และมีคนสวนเป็นผู้ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>มาตรการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ</b></p> <p>1. จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แบบฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522</p> <p>2. ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น/อุปกรณ์นั้น</p> <p>3. จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานในโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>4. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</p> <p>5. ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด</p> <p>6. จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</p> <p>7. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่</p> | <p>- โครงการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- มีการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- โครงการมีการซ้อมอพยพหนีไฟฯ เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 โครงการมีการฝึกซ้อมในเดือนมิถุนายน 2568 กับหน่วยงานเทศบาลเมืองคลองแห (ภาคผนวกที่ 15)</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- มีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิงและการใช้ตู้ FHC อย่างชัดเจนทุกจุด</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งผังเส้นทางอพยพหนีไฟฯ บริเวณอาคาร และหลังประตูห้องพัก</p> <p>- มีการจัดตั้งคณะป้องกันอัคคีภัยพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ และมีการกำหนดแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>มาตรการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ (ต่อ)</p> <p>8. จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย</p> <p>9. จัดให้มีระบบจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>10. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>11. ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา</p> <p>12. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจร ให้เพียงพอ</p> <p>13. ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่ชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>14. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดตั้งคณะป้องกันอัคคีภัยพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ และมี การกำหนดแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ</li> <li>- โครงการมีระบบจราจรที่ปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกรถเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 30 กม./ชม. บริเวณทางเข้าที่จอดรถของโครงการ</li> <li>- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการจราจรบริเวณเข้า-ออก โครงการตลอดเวลา</li> <li>- มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจร ภายในโครงการอย่างเพียงพอ</li> <li>- โครงการยังไม่ได้ทำลูกศรแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกโครงการ แต่ ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกรถเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชม.</li> <li>- มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง บริเวณโถงส่วนกลาง ห้องน้ำส่วนกลาง บันได ทางเดินภายในอาคารทุกวัน</li> </ul> | <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> <p>- ไม่พบปัญหา</p> |

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของบริษัท ธาณูรี จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และประสิทธิภาพของการดำเนินการ                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>มาตรการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ (ต่อ)</p> <p>15. จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องชุดทุกห้อง ซึ่งจะมีความแข็งแรง และทนทานไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง – ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>- ระเบียงของห้องชุดทุกห้องมีลักษณะเป็นเหล็กกล่องพ่นสี มีความสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่ง มีความแข็งแรง และทนทานไม่แตกหักง่าย</p>                             | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |
| <p>4.5 ทศนิยภาพ</p> <p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>- โครงการมีการปลูกไม้พันธุ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น ต้นมะพร้าว เป็นต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |
| <p>4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม</p> <p>1. จัดให้มีการแจ้งให้กับผู้บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่าหากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงแดดและลมสามารถแจ้งหรือหารือกับทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p> <p>2. หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมต่อบ้านอยู่อาศัย หรือพื้นที่อ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการและในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย หาข้อตกลงกันไม่ได้ให้จัดมีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกันประกอบด้วยผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท ธาณูรี จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลเมืองป่าตอง)</p> | <p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากโครงการ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียน</p>    | <p>- ไม่พบปัญหา</p>                |



## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว


## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.2 บ่อหนองน้ำ





รูปที่ 2.3 กำแพงกันดิน

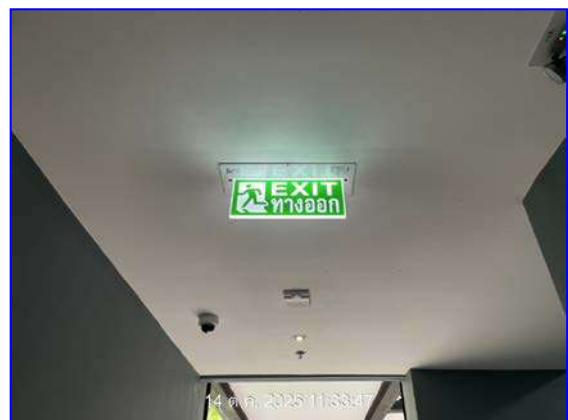




รูปที่ 2.4 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

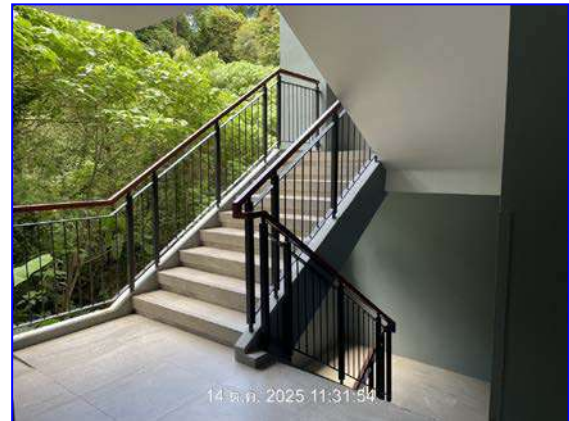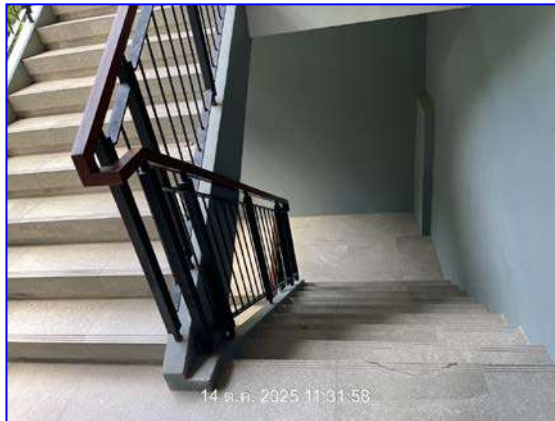

รูปที่ 2.5 บันไดหนีไฟ

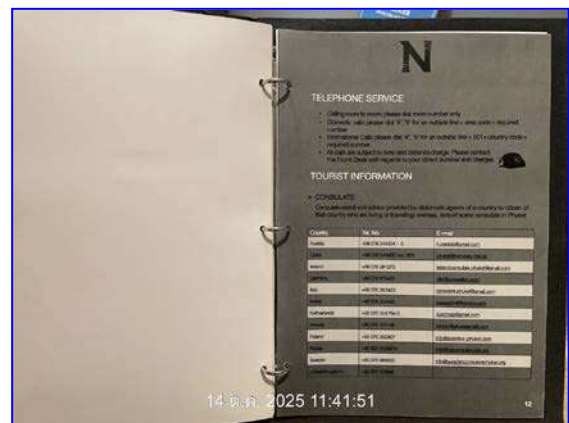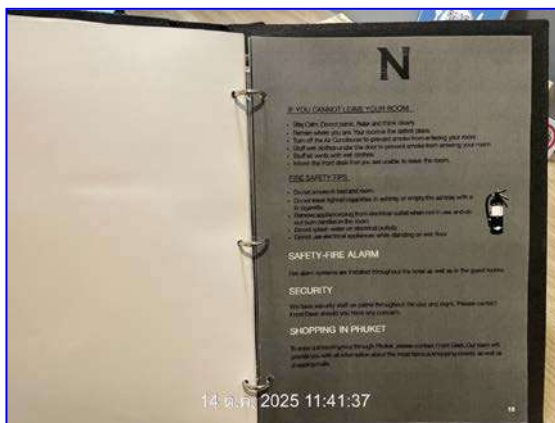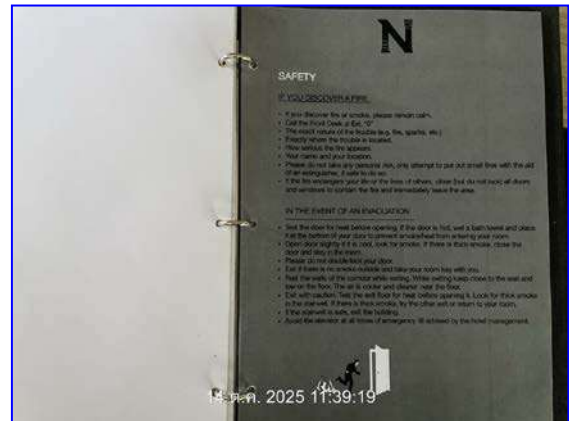

รูปที่ 2.6 แผ่นพับ/คู่มือ ให้ความรู้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.7 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปที่ 2.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.10 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 2.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 2.12 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า – ออก

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.13 ที่จอดรถในโครงการ

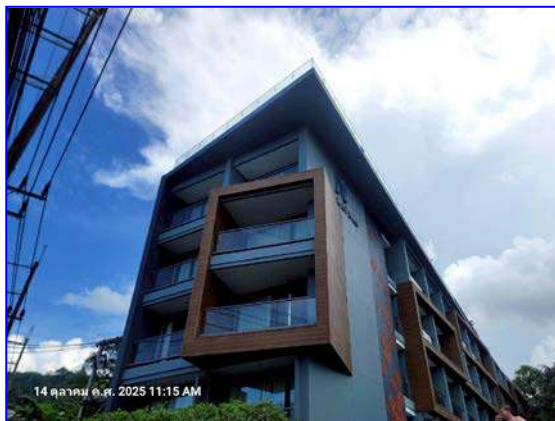

รูปที่ 2.14 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2.15 ถังเก็บน้ำใช้



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.16 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 2.17 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 2.18 มิเตอร์น้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น

## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

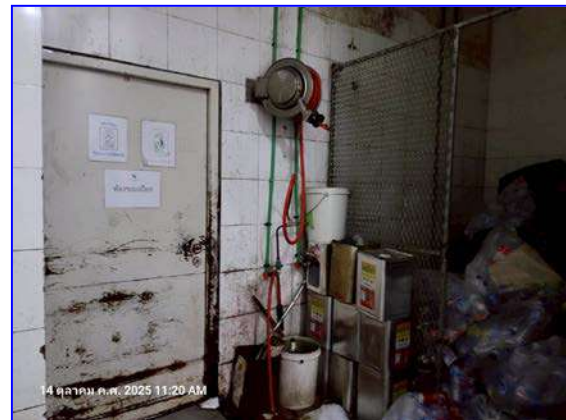

รูปที่ 2.19 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 2.20 ถังขยะในห้องพัก





## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.21 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 kVA



รูปที่ 2.22 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1,000 kVA

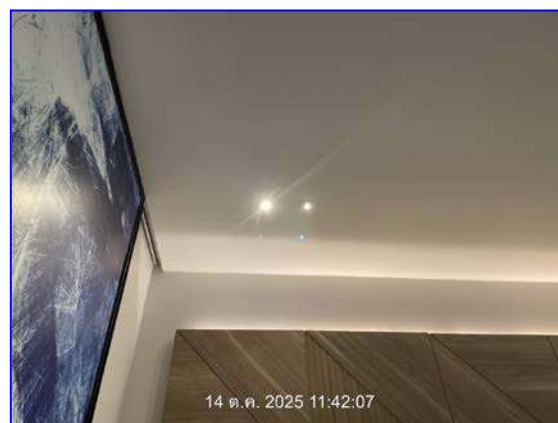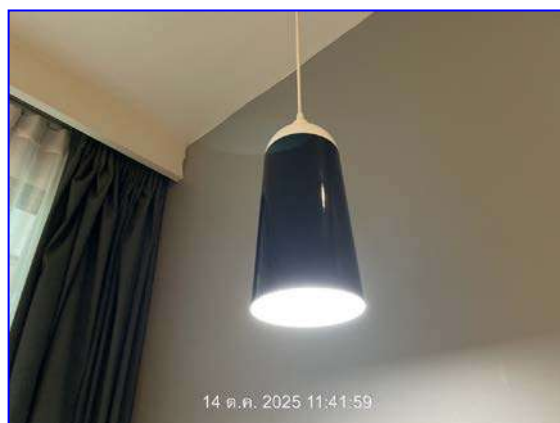


รูปที่ 2.23 อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน

## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.24 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน

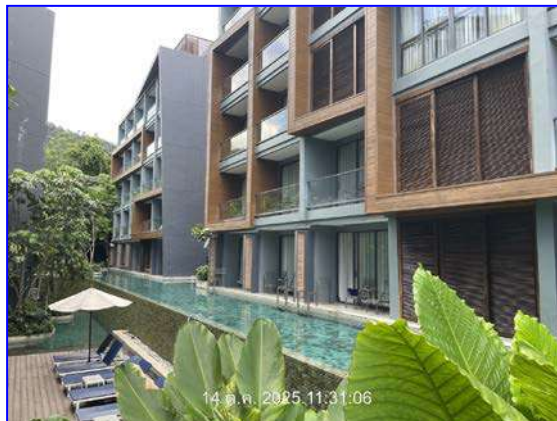


รูปที่ .25 ใช้สีอ่อนทาผนังอาคาร



รูปที่ 2.26 จุดรวมพลภายในโครงการ

## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

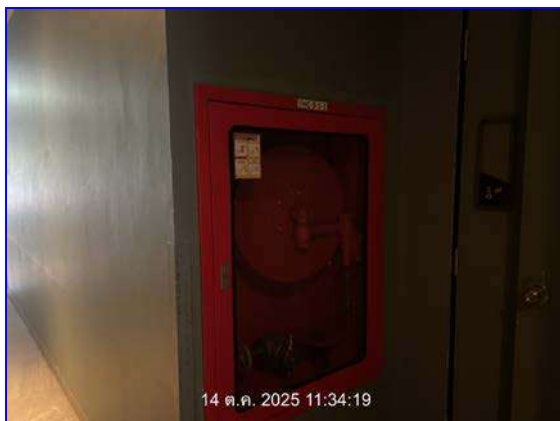

รูปที่ 2.27 ชุดตู้ดับเพลิง และถังดับเพลิงชนิดมือถือ



รูปที่ 2.28 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ 2.29 อุปกรณ์ตรวจจับควัน และสปริงเกอร์ดับเพลิง



## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.30 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร



รูปที่ 2.31 ระบบท่อน้ำดับเพลิง และถังเก็บน้ำดับเพลิง




รูปที่ 2.32 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control)


## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.33 ป้ายแสดงงวิธีใช้งาน

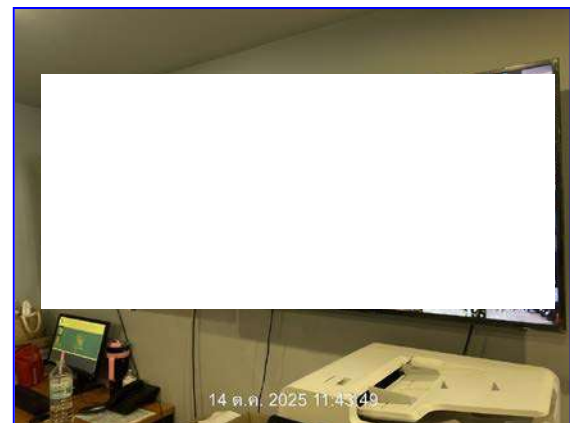

รูปที่ 2.34 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

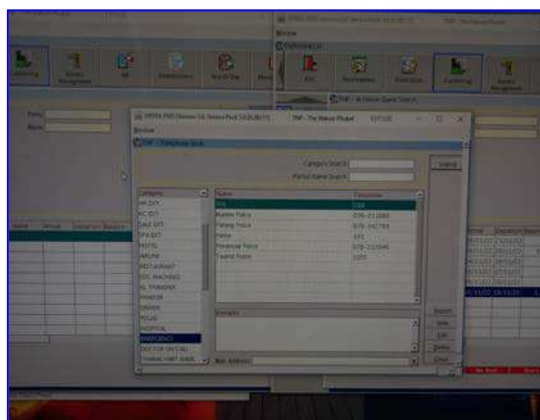


รูปที่ 2.35 ประกาศเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.36 กล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

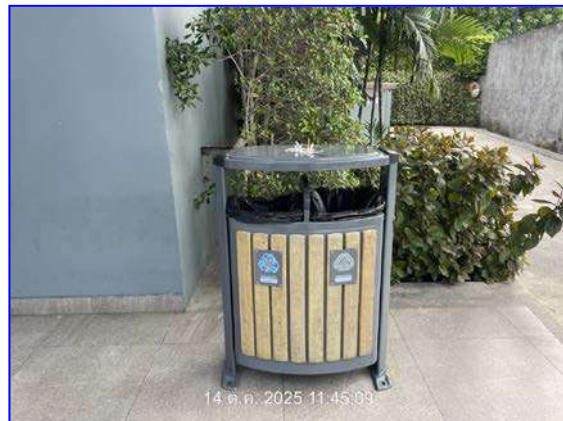


รูปที่ 2.37 ถังขยะรอบๆพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.38 ที่จอดรถคนพิการ



## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

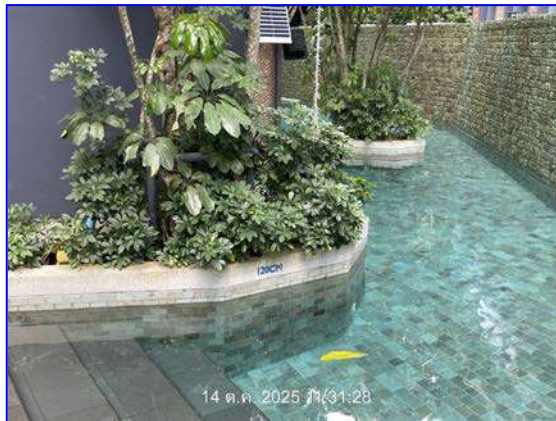

รูปที่ 2.39 ป้ายแสดงความลึกสระว่ายน้ำ และกฎระเบียบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2.40 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2.41 รางระบายน้ำล้น และที่ล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ำ

## รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



รูปที่ 2.42 ป้ายเตือนใช้น้ำผ่านการบำบัด



รูปที่ 43 ภาพโดยรวมของโครงการ



ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### บทที่ 3

#### ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ธาณูรี จำกัดได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านโครงการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำ
- การระบายน้ำ
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
- อื่นๆ ได้แก่ การกำจัดขยะมูลฝอย

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาณูรี จำกัด มีรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แผนการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต  
บริษัท ธาณูรี จำกัด

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                | จุดเก็บตัวอย่าง                        | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|----------------------------------|----------------------------------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1. คุณภาพน้ำผ่าน<br>การบำบัด     | - น้ำหลังผ่านการบำบัด                  | -    | -    | /     | /     | /    | /     | /    | /    | /    | /    | /    | /    |
| 2. คุณภาพน้ำทะเล                 | - หาดกะหลิม                            | -    | -    | -     | -     | -    | /     | -    | -    | -    | -    | -    | /    |
| 3. คุณภาพคลอง<br>สาธารณะประโยชน์ | - คลองสาธารณะประโยชน์<br>บริเวณโครงการ | -    | -    | -     | -     | -    | /     | -    | -    | -    | -    | -    | /    |
| 4. คุณภาพน้ำใช้                  | - น้ำผ่านการกรอง                       | -    | -    | -     | -     | -    | /     | -    | -    | -    | -    | -    | /    |
| 5. คุณภาพสระว่ายน้ำ              | - สระว่ายน้ำ                           | -    | -    | /     | /     | /    | /     | /    | /    | /    | /    | /    | /    |
|                                  | - สระว่ายน้ำ (ชุดใหญ่)                 | -    | -    | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | /    |

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                       | จุดเก็บตัวอย่าง                            | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์                                                                                          | วันที่ดำเนินการ  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. คุณภาพน้ำ<br>- คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด | - น้ำผ่านการบำบัด                          | - pH, BOD <sub>5</sub> , SS, S <sup>2-</sup> , TDS, Settleable Solids, G&O, TKN, TCB                                                                                                                                                                                                 | Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 <sup>th</sup> Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF | ก.ค.-ธ.ค. 68     |
| 2. คุณภาพน้ำทะเล                        | - หาดกะหลิม                                | - pH, TDS, Salinity, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , NH <sub>3</sub> -N, PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , TCB, FCB                                                                                                                                                                     | Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 <sup>th</sup> Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF | พ.ค. และ พ.ย. 68 |
| 3. คุณภาพคลอง<br>สาธารณะประโยชน์        | - คลองสาธารณะ<br>ประโยชน์บริเวณ<br>โครงการ | - pH, Temperature, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , NH <sub>3</sub> -N, DO, BOD, TCB, FCB                                                                                                                                                                                              | Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 <sup>th</sup> Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF | พ.ค. และ พ.ย. 68 |
| 4. น้ำใช้                               | - น้ำใช้                                   | - <u>ทางกายภาพ</u><br>Color, Turbidity, pH<br>- <u>ทางเคมี</u><br>TDS, FE, Mn, Cu, Zn, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , Cl <sup>-</sup> , F <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Hardness<br>- <u>สารพิษ</u><br>Hg, Pb, As, Cr, Cd<br>- <u>ทางจุลชีววิทยา</u><br>TCB, E-Coli | Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 <sup>th</sup> Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF | พ.ค. และ พ.ย. 68 |
| 5. สระว่ายน้ำ                           | - สระว่ายน้ำ                               | - TCB, FCB                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 <sup>th</sup> Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF | ก.ค.-ธ.ค. 68     |
|                                         |                                            | - pH, Hardness, Cyanuric acid, NH <sub>3</sub> -N, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                                    | Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 <sup>th</sup> Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF | ต.ค. 68          |

### 3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24<sup>th</sup> Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.3 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

| วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้                                                                                                            |
| 1. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (Oil & Grease) ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วขนาด 1,000 mL                                                                                                    |
| 2. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Sterile Technique                                                                    |
| 3. ตัวอย่างวิเคราะห์หาพารามิเตอร์อื่นๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 mL                                                                                                           |
| ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับค่า พารามิเตอร์บางค่า จะตรวจวัดที่ภาคสนาม ได้แก่ pH, DO, Temperature และ Flow Rate |

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

| ลำดับที่ | ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | วิธีการตรวจวิเคราะห์                      |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | pH at 25°C                   | Electrometric Method                      |
| 2        | Biochemical Oxygen Demand    | 5-Day BOD Test, Azide modification Method |
| 3.1.1 3  | Total Suspended Solids       | Dried at 103-105 °C                       |
| 4        | Sulfide                      | Iodometric                                |
| 5        | Settleable Solids            | Volumetric                                |
| 6        | Total Dissolved Solids       | Dried at 103-105 °C                       |
| 7        | Grease & Oil                 | Partition-Gravimetric                     |
| 8        | Total Kjeldahl Nitrogen      | Macro-Kjeldahl                            |
| 9        | Salinity                     | Electrical Conductivity                   |
| 10       | Nitrate-Nitrogen             | Cadmium Reduction Method                  |
| 11       | Phosphate                    | Ascorbic Acid Method                      |
| 12       | Dissolved Oxygen             | DO Metric                                 |
| 13       | Temperature                  | Laboratory and Field Method               |
| 14       | Ammonia Nitrogen             | Distillation and Titrimetric Method       |
| 15       | Color                        | Spectrophotometric                        |
| 16       | Turbidity                    | Nephelometric Method                      |
| 17       | Iron                         | Phenanthroline Method                     |
| 18       | Manganese                    | Persulfate Method                         |
| 19       | Copper                       | Direct Aspiration-AAS Method              |
| 20       | Zinc                         | ICP-AES Method                            |

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ)

| ลำดับที่ | ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | วิธีการตรวจวิเคราะห์                |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 21       | Sulfate                      | Turbidimetric Method                |
| 22       | Chloride                     | Argentometric Method                |
| 23       | Fluoride                     | SPADNS Method                       |
| 24       | Nitrate                      | Cadmium Reduction Method            |
| 25       | Hardness                     | EDTA Titrimetric                    |
| 26       | Mercury                      | Cold Vapor Technique-AAS Method     |
| 27       | Lead                         | Direct Aspiration-AAS Method        |
| 28       | Arsenic                      | Hydride Generation-AAS Method       |
| 29       | Chromium                     | Direct Aspiration - AAS             |
| 30       | Cadmium                      | ICP-AES Method                      |
| 31       | Cyanuric acid                | Photometric method                  |
| 32       | Ammonia                      | Distillation and Titrimetric Method |
| 33       | Total Coliform Bacteria      | MPN Test                            |
| 34       | Fecal Coliform Bacteria      | MPN Test                            |
| 35       | E.Coli                       | MPN Test                            |
| 36       | S.aureus                     | APHA. 22 <sup>nd</sup> ed:2012      |
| 37       | P.aeruginosa                 | APHA. 22 <sup>nd</sup> ed:2012      |

### 3.1.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาบุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงดังรูปที่ 3.1

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผ่านการบำบัด



รูปที่ 3.1 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด

### 3.1.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาตุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.5 – 3.6

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568

| วันที่<br>เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ |                            |               |                                               |               |                             |               |               |                     |
|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                            | pH          | BOD <sub>5</sub><br>(mg/L) | TSS<br>(mg/L) | S <sup>2-</sup><br>(mg/L as S <sup>2-</sup> ) | TDS<br>(mg/L) | Settleable<br>Solids (mL/L) | G&O<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) |
| ม.ค. 65                    | 6.97        | 13.4                       | 11.0          | ND                                            | 298           | ND                          | ND            | 8.19          | 3,500               |
| ก.พ. 65                    | 6.93        | 44.0*                      | 43.0*         | < 5.0                                         | 1,114         | ND                          | 2.0           | 20.86         | 460,000             |
| มี.ค. 65                   | 6.66        | 7.8                        | 21.0          | ND                                            | 980           | ND                          | 3.0           | 10.50         | 160,000             |
| เม.ย. 65                   | 6.88        | 21.0*                      | 39.0*         | 2.34*                                         | 560           | 0.2                         | ND            | 32.00         | 1,600,000           |
| พ.ค. 65                    | 6.77        | 24.0*                      | 31.0*         | ND                                            | 586           | 0.1                         | ND            | 29.00         | 540,000             |
| มิ.ย. 65                   | 6.91        | 15.0                       | 35.0*         | 0.57                                          | 536           | ND                          | 6.0           | 14.00         | 920,000             |
| ก.ค. 65                    | 6.98        | 21.0*                      | 35.0*         | 0.28                                          | 562           | 0.1                         | 4.0           | 18.11         | 540,000             |
| ส.ค. 65                    | 6.71        | 6.0                        | 18.0          | ND                                            | 314           | ND                          | ND            | 8.40          | 92,000              |
| ก.ย. 65                    | 6.58        | 7.4                        | 26.0          | ND                                            | 386           | ND                          | 4.0           | 10.15         | 350,000             |
| ต.ค. 65                    | 6.72        | 10.0                       | 22.0          | 0.21                                          | 236           | ND                          | ND            | 8.96          | 92,000              |
| พ.ย. 65                    | 6.71        | 8.0                        | 21.0          | 0.24                                          | 499           | ND                          | ND            | 9.24          | 920,000             |
| ธ.ค. 65                    | 6.88        | 18.0                       | 24.0          | 0.64                                          | 248           | 0.1                         | 2.0           | 13.02         | 350,000             |
| ม.ค. 66                    | 7.02        | 10.0                       | 22.0          | ND                                            | 374           | ND                          | 2.0           | 12.11         | 540,000             |
| ก.พ. 66                    | 6.88        | 20.0                       | 24.0          | ND                                            | 406           | ND                          | 9.0           | 17.0          | 3,500,000           |
| มี.ค. 66                   | 7.02        | 19.0                       | 29.0          | 0.50                                          | 778           | ND                          | ND            | 28.0          | 1,100               |
| เม.ย. 66                   | 6.85        | 13.0                       | 26.0          | 0.46                                          | 702           | 0.1                         | 6.0           | 16.0          | 92,000              |
| พ.ค. 66                    | 6.96        | 17.0                       | 24.0          | ND                                            | 660           | 0.5                         | ND            | 20.0          | 1,700               |
| มิ.ย. 66                   | 6.61        | 9.0                        | 19.0          | ND                                            | 1,138         | ND                          | ND            | 19.0          | 1,600               |
| ก.ค. 66                    | 6.86        | 1.0                        | 5.0           | 0.14                                          | 518           | ND                          | ND            | 11.0          | 4,600               |
| ส.ค. 66                    | 6.51        | 10.0                       | 16.0          | ND                                            | 290           | ND                          | ND            | 16.52         | 54,000              |
| ก.ย. 66                    | 6.82        | 12.2                       | 19.0          | 0.4                                           | 239           | 0.4                         | ND            | 13.0          | 920,000             |
| ต.ค. 66                    | 7.00        | 16.0                       | 23.0          | 0.07                                          | 246           | 0.1                         | ND            | 15.0          | 240,000             |
| พ.ย. 66                    | 7.13        | 20.0                       | 29.0          | 0.47                                          | 380           | 0.2                         | 6.0           | 21.0          | 2,400,000           |
| ธ.ค. 66                    | 7.24        | 31.0                       | 43.0          | 0.80                                          | 238           | 0.1                         | 4.0           | 28.0          | 1,600,000           |
| ม.ค. 67                    | 7.26        | 74.0*                      | 36.0*         | 1.60*                                         | 320           | 0.5                         | 12.0          | 30.00         | 1,600,000           |
| ก.พ. 67                    | 6.98        | 1.4                        | 17.0          | 0.27                                          | 422           | ND                          | ND            | 12.00         | 27                  |
| มี.ค. 67                   | 8.81        | 18.0                       | 49.0*         | 0.73                                          | 501           | 3.0*                        | 3.0           | 20.00         | 40,000              |
| เม.ย. 67                   | 7.10        | 33.0*                      | 36.0*         | 1.93*                                         | 1,610         | 0.1                         | 4.0           | 25.00         | 920                 |
| พ.ค. 67                    | 6.78        | 15.0                       | 22.0          | 0.40                                          | 1756          | ND                          | ND            | 18.00         | 54,000              |
| มิ.ย. 67                   | 7.14        | 10.0                       | 29.0          | 0.07                                          | 884           | ND                          | 4.0           | 20.00         | 350,000             |
| มาตรฐาน                    | 5.5-9.0     | ≤ 20                       | ≤ 30          | ≤ 1                                           | ≤1,000        | -                           | ≤ 20          | ≤ 35          | -                   |

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม 2565- มิถุนายน 2568 (ต่อ)

| วันที่<br>เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ |                            |               |                                               |               |                             |               |               |                     |
|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                            | pH          | BOD <sub>5</sub><br>(mg/L) | TSS<br>(mg/L) | S <sup>2-</sup><br>(mg/L as S <sup>2-</sup> ) | TDS<br>(mg/L) | Settleable<br>Solids (mL/L) | G&O<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) |
| ก.ค. 67                    | 7.51        | 9.0                        | 21.0          | ND                                            | 396           | 0.1                         | ND            | 24.0          | 540                 |
| ส.ค. 67                    | 7.01        | 10.0                       | 26.0          | ND                                            | 367           | 0.1                         | ND            | 28.0          | 540                 |
| ก.ย. 67                    | 6.80        | 3.0                        | 14.0          | ND                                            | 860           | ND                          | ND            | 12.00         | ND                  |
| ต.ค. 67                    | 6.86        | 11.0                       | 15.0          | ND                                            | 192           | ND                          | ND            | 18.00         | 540,000             |
| พ.ย. 67                    | 7.41        | 20.0                       | 24.0          | 0.07                                          | 430           | 0.1                         | 2.0           | 25.00         | 700                 |
| ธ.ค. 67                    | 7.24        | 14.0                       | 15.0          | ND                                            | 228           | ND                          | 4.0           | 20.00         | 5,400               |
| ม.ค. 68                    | 7.64        | 13.0                       | 27.0          | 0.60                                          | 454           | ND                          | 2.0           | 22.00         | 24,000              |
| ก.พ. 68                    | 7.89        | 11.0                       | 26.0          | 0.60                                          | 536           | 0.1                         | ND            | 16.73         | 110                 |
| มี.ค. 68                   | 6.98        | 19.0                       | 20.0          | 0.13                                          | 306           | ND                          | 2.0           | 16.94         | 92,000              |
| เม.ย. 68                   | 7.00        | 19.0                       | 25.0          | 0.53                                          | 384           | ND                          | 2.0           | 33.31         | 1,600,000           |
| พ.ค. 68                    | 6.89        | 10.0                       | 16.0          | 0.07                                          | 350           | ND                          | ND            | 12.67         | 1,100,000           |
| มิ.ย. 68                   | 7.06        | 8.0                        | 17.0          | 0.20                                          | 208           | 0.1                         | ND            | 5.53          | 16,000              |
| มาตรฐาน                    | 5.5-9.0     | ≤ 20                       | ≤ 30          | ≤ 1                                           | ≤1,000        | -                           | ≤ 20          | ≤ 35          | -                   |

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| วันที่<br>เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ |                            |               |                                               |               |                             |               |               |                     |
|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                            | pH          | BOD <sub>5</sub><br>(mg/L) | TSS<br>(mg/L) | S <sup>2-</sup><br>(mg/L as S <sup>2-</sup> ) | TDS<br>(mg/L) | Settleable<br>Solids (mL/L) | G&O<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) |
| ก.ค. 68                    | 6.81        | 3.0                        | 20.0          | ND                                            | 254           | ND                          | ND            | 6.51          | 350                 |
| ส.ค. 68                    | 7.58        | 12.0                       | 9             | ND                                            | 298           | ND                          | ND            | 6.58          | 54,000              |
| ก.ย. 68                    | 7.35        | 11.0                       | 16            | ND                                            | 220           | ND                          | 3.0           | 3.00          | 160,000             |
| ต.ค. 68                    | 6.58        | 2.0                        | 8             | ND                                            | 242           | ND                          | ND            | 3.22          | 220                 |
| พ.ย. 68                    | 6.29        | 3.0                        | 7             | 0.13                                          | 304           | ND                          | ND            | 3.64          | 3,500               |
| ธ.ค. 68                    | 6.74        | 6.0                        | 10            | 0.20                                          | 226           | ND                          | ND            | 6.58          | 5,400               |
| มาตรฐาน                    | 5.5-9.0     | ≤ 20                       | ≤ 30          | ≤ 1                                           | ≤1,000        | -                           | ≤ 20          | ≤ 35          | -                   |

หมายเหตุ < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์,

ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ), \* ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.)

(เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567)

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ เลขทะเบียน : ว-176-จ-0006


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด เลขทะเบียน ว-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษุ สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670


### กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

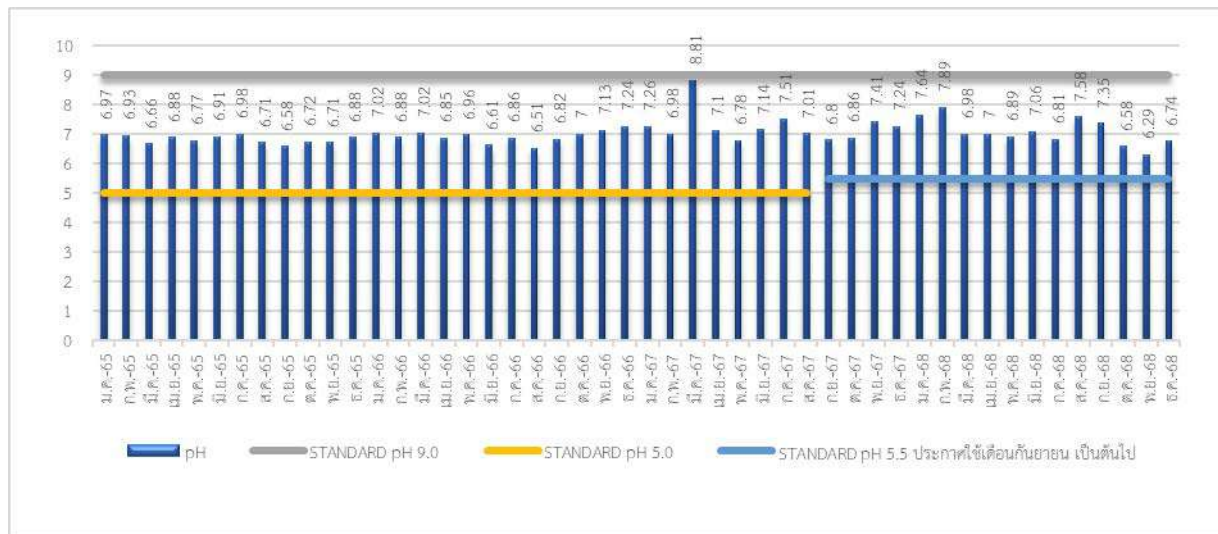

ภาพที่ 3.1 กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำผ่านการบำบัด

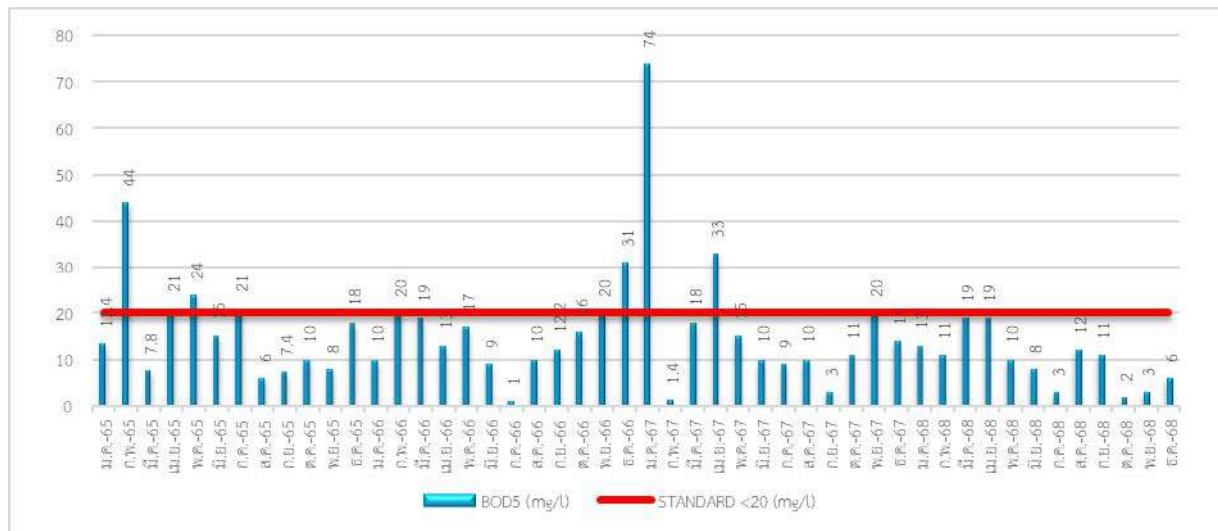


ภาพที่ 3.2 กราฟแสดงปริมาณค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD<sub>5</sub>) ของน้ำผ่านการบำบัด

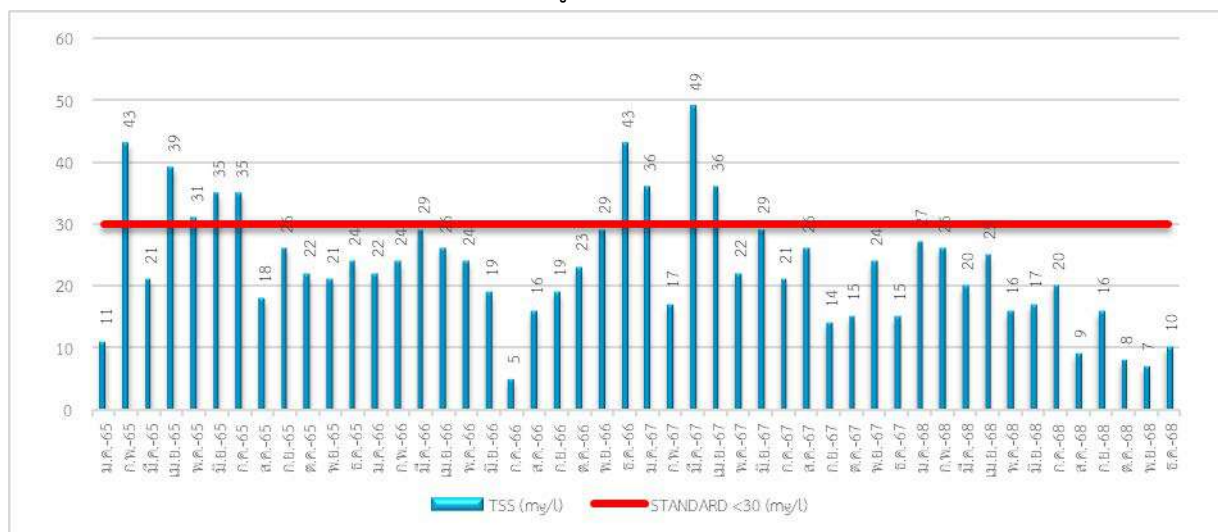


ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงปริมาณค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของน้ำผ่านการบำบัด




### กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด(ต่อ)

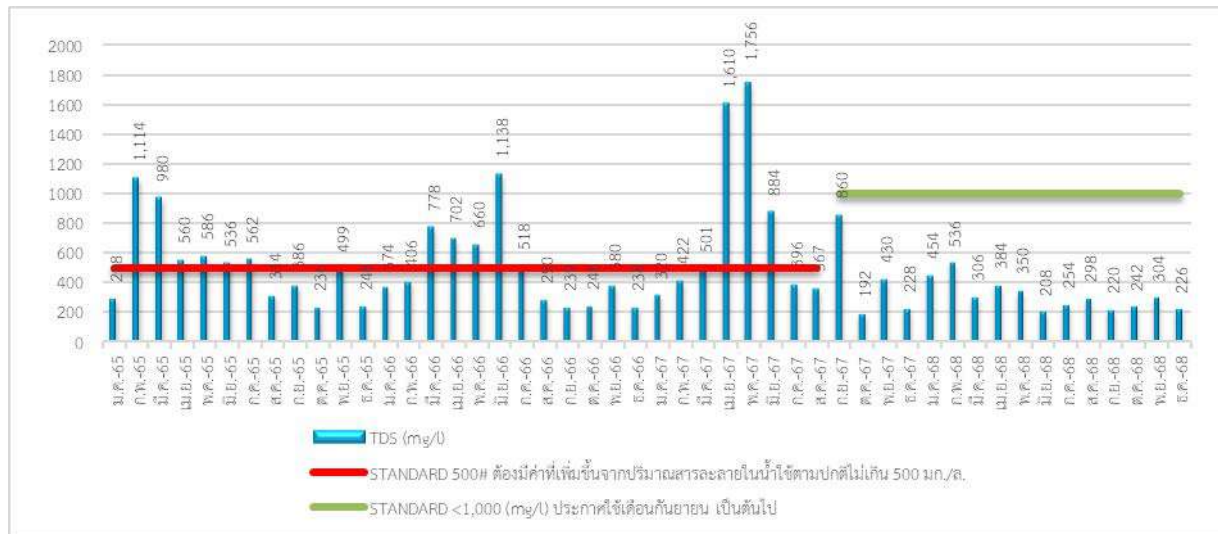

ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงปริมาณค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ของน้ำผ่านการบำบัด

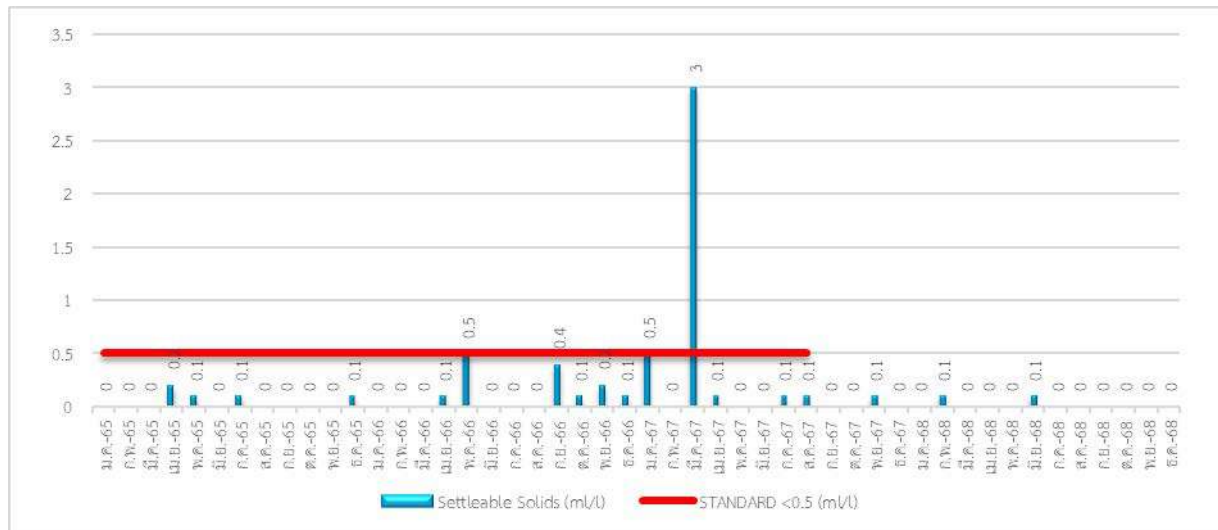


ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงปริมาณค่าตะกอนหนัก (Settleable Solid) ของน้ำผ่านการบำบัด

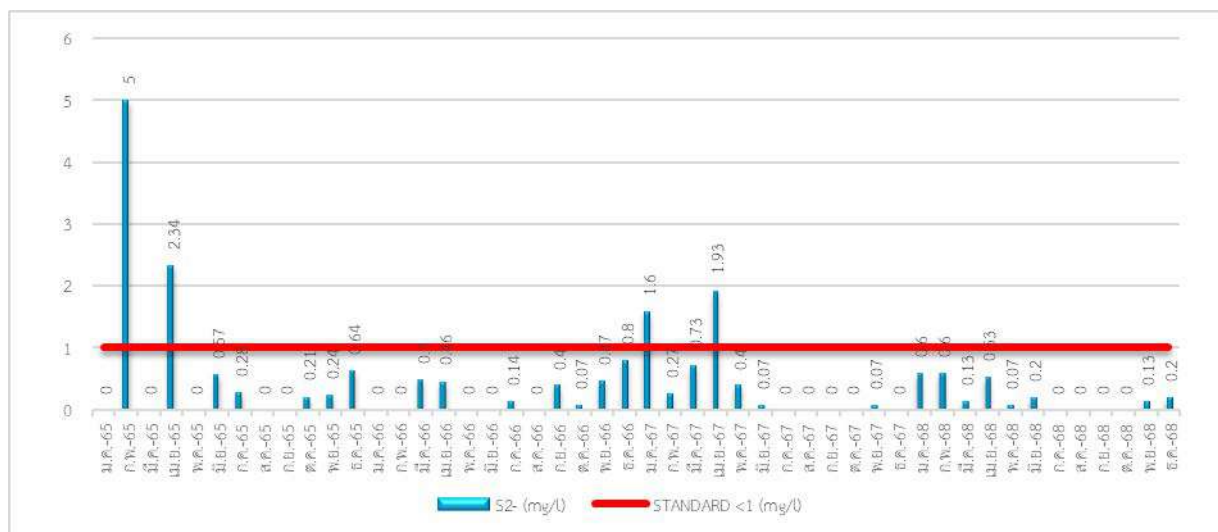


ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงปริมาณค่าซัลไฟด์ (sulfide) ของน้ำผ่านการบำบัด


### กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด(ต่อ)

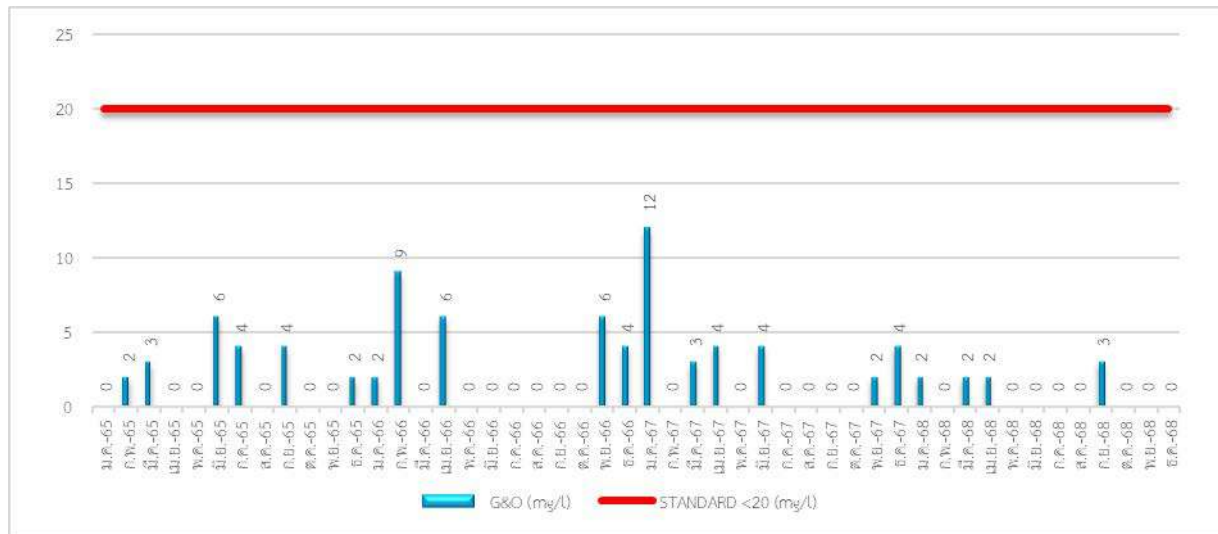

ภาพที่ 3.7 กราฟแสดงปริมาณค่าน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil) ของน้ำผ่านการบำบัด

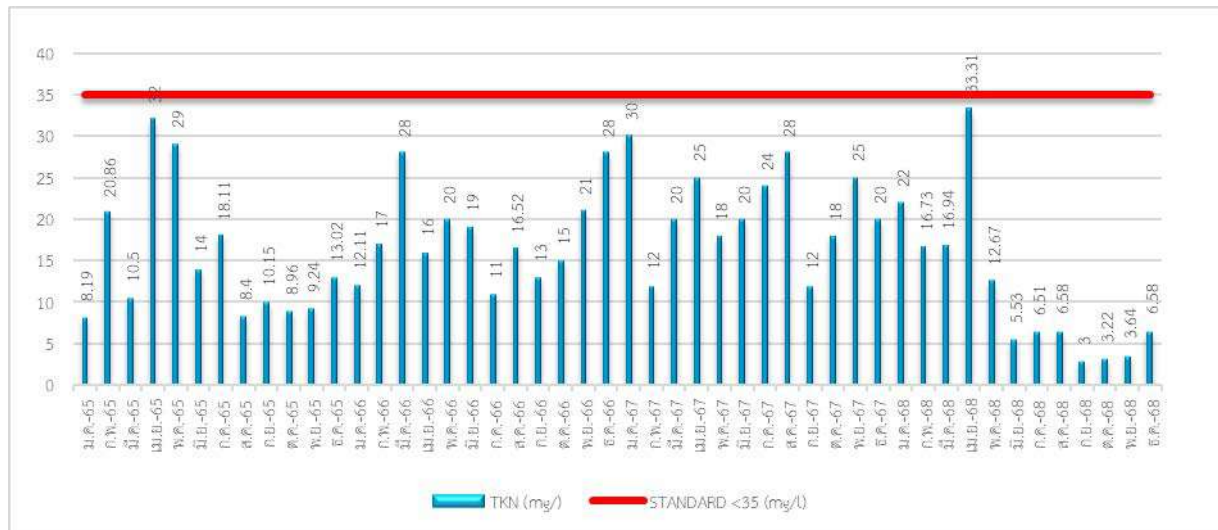

ภาพที่ 3.8 กราฟแสดงปริมาณค่าไนโตรเจนรวม (TKN) ของน้ำผ่านการบำบัด

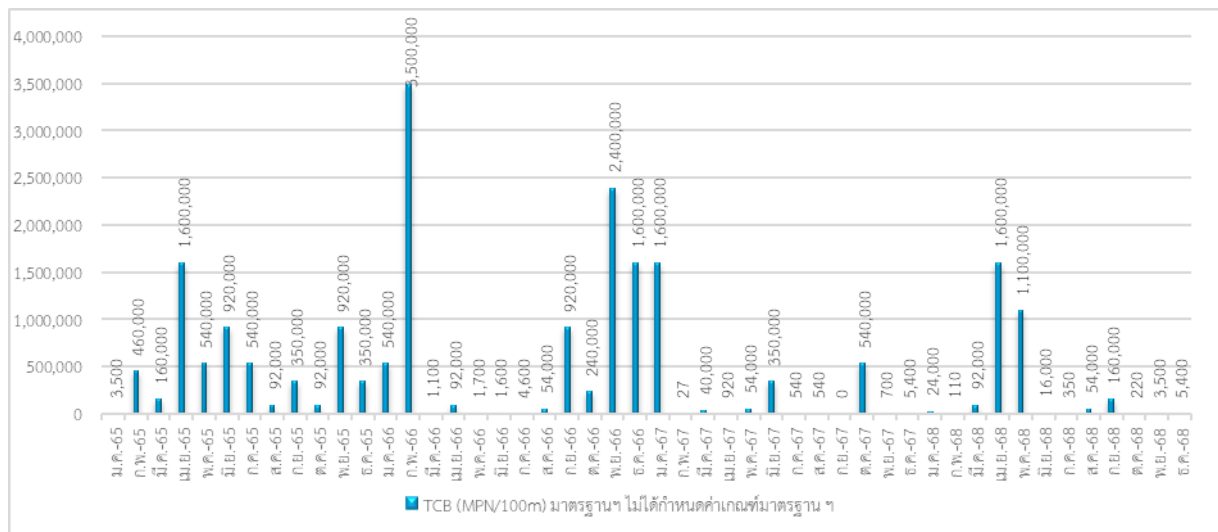

ภาพที่ 3.9 กราฟแสดงปริมาณค่าแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ของน้ำผ่านการบำบัด

### 3.1.1.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดของ โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาภูเก็ต จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567) กำหนด ทั้งนี้ ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่ได้กำหนดค่าแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แต่ทางโครงการมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำผ่านการบำบัดทุกครั้งก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้

### 3.1.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาภูเก็ต จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 1 จุด รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ แสดงดังรูปที่ 3.2

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 3.2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ

#### 3.1.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาภูเก็ต จำกัด จำนวน 1 จุด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.7-3.10

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568

| วันที่เก็บตัวอย่าง | รายการทดสอบ         |                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|
|                    | TCB<br>(MPN/100 mL) | <i>E - Coli</i><br>(MPN/100 mL) |
| ม.ค. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.พ. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| มี.ค. 65           | < 1.8               | < 1.8                           |
| เม.ย. 65           | < 1.8               | < 1.8                           |
| พ.ค. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| มิ.ย. 65           | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.ค. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ส.ค. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.ย. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ต.ค. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| พ.ย. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ธ.ค. 65            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ม.ค. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.พ. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| มี.ค. 66           | < 1.8               | < 1.8                           |
| เม.ย. 66           | < 1.8               | < 1.8                           |
| พ.ค. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| มิ.ย. 66           | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.ค. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ส.ค. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.ย. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ต.ค. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| พ.ย. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ธ.ค. 66            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ม.ค. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.พ. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| มี.ค. 67           | < 1.8               | < 1.8                           |
| เม.ย. 67           | < 1.8               | < 1.8                           |
| พ.ค. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| มิ.ย. 67           | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.ค. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ส.ค. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ก.ย. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ต.ค. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| พ.ย. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| ธ.ค. 67            | < 1.8               | < 1.8                           |
| มาตรฐาน            | ≤ 10                | ND                              |

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568 (ต่อ)

| วันที่เก็บตัวอย่าง | รายการทดสอบ         |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
|                    | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| ม.ค. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| ก.พ. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| มี.ค. 68           | < 1.8               | < 1.8               |
| เม.ย. 68           | < 1.8               | < 1.8               |
| พ.ค. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| มิ.ย. 68           | < 1.8               | < 1.8               |
| มาตรฐาน            | ≤ 10                | ND                  |

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| วันที่เก็บตัวอย่าง | รายการทดสอบ         |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
|                    | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| ก.ค. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| ส.ค. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| ก.ย. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| ต.ค. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| พ.ย. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| ธ.ค. 68            | < 1.8               | < 1.8               |
| มาตรฐาน            | ≤ 10                | ND                  |

หมายเหตุ < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์,  
TCB, FCB = < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ เลขทะเบียน : (ว-176-จ-0006)

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษุข สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670

### 3.1.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำเดือน)

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาบุรี จำกัด จำนวน 1 จุด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ สระว่ายน้ำ กำหนด

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำปี 2565-2567)

| วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ               |                    |                               |                               |                              |                           |                       |                              |                    |                     |                        |
|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
|                        | T-<br>Alkalinity<br>(ppm) | Chloride<br>(mg/L) | Ammonia<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Nitrate<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Calcium<br>Hardness<br>(ppm) | Cyanuric<br>acid<br>(ppm) | S.aureus<br>(/100 mL) | P.aeruginosa<br>(MPN/100 mL) | TCB<br>(MPN/100mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) | E-Coli<br>(MPN/100 mL) |
| ต.ค.65                 | 49.00                     | 1,226.43           | ND                            | 3.72                          | 116                          | ND                        | ND                    | <1.8                         | <1.8               | <1.8                | ND                     |
| ต.ค.66                 | 40.0*                     | 180.03             | ND                            | 10.14                         | 100*                         | 40                        | ND                    | <1.8                         | <1.8               | <1.8                | ND                     |
| ต.ค.67                 | 100                       | 1,091.86*          | ND                            | 0.93                          | 95.0*                        | 40.0                      | ND                    | <1.8                         | <1.8               | <1.8                | ND                     |
| มาตรฐาน                | 80-100                    | ≤ 600              | ≤ 20                          | ≤ 50                          | 250 - 600                    | 30 – 60                   | ND                    | ND                           | ≤ 10               | ND                  | ND                     |

ตารางที่ 3.10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำปี 2568)

| วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ               |                    |                               |                               |                              |                           |                       |                              |                    |                     |                        |
|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
|                        | T-<br>Alkalinity<br>(ppm) | Chloride<br>(mg/L) | Ammonia<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Nitrate<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Calcium<br>Hardness<br>(ppm) | Cyanuric<br>acid<br>(ppm) | S.aureus<br>(/100 mL) | P.aeruginosa<br>(MPN/100 mL) | TCB<br>(MPN/100mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) | E-Coli<br>(MPN/100 mL) |
| ต.ค.68                 | 90.0                      | 580.67             | ND                            | 1.31                          | 80.0*                        | 100*                      | ND                    | <1.8                         | <1.8               | <1.8                | ND                     |
| มาตรฐาน                | 80-100                    | ≤ 600              | ≤ 20                          | ≤ 50                          | 250 - 600                    | 30 – 60                   | ND                    | ND                           | ≤ 10               | ND                  | ND                     |

หมายเหตุ < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์, ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

TCB, FCB, P.aeruginosa = < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ เลขทะเบียน : (ว-176-จ-0006)  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช่าเหิรน์ไทยคอนสตรัคติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176  
 ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษณุ สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670

### 3.1.2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำปี )

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำปี 2568 ของโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาบุรี จำกัด จำนวน 1 จุด ประจำปี 2568 โครงการมีการตรวจวิเคราะห์ ฯ ในเดือนตุลาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ กำหนด ยกเว้น ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) และค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ที่มีค่าไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

### 3.1.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง ของโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาบุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ แสดงดังรูปที่ 3.3

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง



รูปที่ 3.3 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำใช้ผ่านการกรอง

#### 3.1.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง ของโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาธาบุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.11-3.12

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568

| วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ                                                       |                                      |                                    |                                    |                                        |                                       |                                       |                                          |                    |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                        | pH                                                                | TDS<br>(mg/L)                        | Chloride<br>(mg/L)                 | Apperance<br>Colour<br>(Pt.Co)     | Turbidity<br>(NTU)                     | Iron<br>(mg/L)                        | Manganese<br>(mg/L)                   | Hardness<br>(mg/L as CaCO <sub>3</sub> ) | Nitrate<br>(mg/L)  | Fluoride<br>(mg/L)    |
| เม.ย. 65               | 6.91                                                              | 518                                  | 226.43                             | 0.95                               | 0.42                                   | ND                                    | 0.17                                  | 260                                      | 0.76               | 1.42*                 |
| พ.ย. 65                | 6.84                                                              | 540                                  | 152.32                             | 1.56                               | 0.26                                   | 0.11                                  | 0.09                                  | 160                                      | 3.72               | 2.14*                 |
| เม.ย. 66               | 7.30                                                              | 332                                  | 111.85                             | 2.34                               | 0.33                                   | ND                                    | ND                                    | 208                                      | 0.33               | 0.39                  |
| ต.ค. 66                | 6.90                                                              | 280                                  | 66.53                              | 0.47                               | 0.99                                   | ND                                    | 0.05                                  | 106                                      | 7.44               | ND                    |
| เม.ย. 67               | 7.24                                                              | 2,010*                               | 694.82*                            | 0.69                               | 0.65                                   | 0.02                                  | 0.04                                  | 550                                      | 3.34               | 1.80*                 |
| ต.ค. 67                | 7.14                                                              | 218                                  | 70.19                              | 0.99                               | 0.97                                   | 0.08                                  | ND                                    | 106                                      | 4.83               | ND                    |
| เม.ย. 68               | 7.24                                                              | 192                                  | 66.29                              | 6.42                               | 3.43                                   | 0.06                                  | ND                                    | 82.0                                     | 8.73               | ND                    |
| มาตรฐาน                | 6.5-8.5                                                           | ≤ 600                                | ≤ 250                              | ≤ 15                               | ≤ 4                                    | ≤ 0.3                                 | ≤ 0.08                                | ≤ 300                                    | ≤ 50               | ≤ 0.7                 |
| วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | Sulfate <sup>1/</sup><br>(mg/L as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) | Copper <sup>1/</sup><br>(mg/L as Cu) | Zinc <sup>1/</sup><br>(mg/L as Zn) | Lead <sup>1/</sup><br>(mg/L as Pb) | Chromium <sup>1/</sup><br>(mg/L as Cr) | Cadmium <sup>1/</sup><br>(mg/L as Cd) | Arsenic <sup>1/</sup><br>(mg/L as As) | Mercury <sup>1/</sup><br>(mg/L as Hg)    | TCB<br>(in 100 mL) | E-coli<br>(in 100 mL) |
|                        |                                                                   |                                      |                                    |                                    |                                        |                                       |                                       |                                          |                    |                       |
| เม.ย. 65               | 112                                                               | ND                                   | 0.15                               | ND                                 | ND                                     | ND                                    | ND                                    | ND                                       | < 1.8              | ND                    |
| พ.ย. 65                | 48.0                                                              | ND                                   | 0.08                               | ND                                 | ND                                     | ND                                    | 0.0038                                | ND                                       | <1.8               | ND                    |
| เม.ย. 66               | 81.80                                                             | ND                                   | 0.11                               | ND                                 | ND                                     | ND                                    | 0.0051                                | ND                                       | < 1.8              | ND                    |
| ต.ค. 66                | 70.95                                                             | ND                                   | 0.04                               | ND                                 | ND                                     | ND                                    | ND                                    | ND                                       | < 1.8              | ND                    |
| เม.ย. 67               | 124                                                               | ND                                   | 0.09                               | ND                                 | ND                                     | ND                                    | 0.0019                                | ND                                       | < 1.8              | ND                    |
| ต.ค. 67                | 10.95                                                             | ND                                   | 0.04                               | ND                                 | ND                                     | ND                                    | ND                                    | ND                                       | < 1.8              | ND                    |
| เม.ย. 68               | 13.20                                                             | ND                                   | 0.04                               | ND                                 | ND                                     | ND                                    | ND                                    | ND                                       | <1.8               | ND                    |
| มาตรฐาน                | ≤ 250                                                             | ≤ 2                                  | ≤ 3                                | ≤ 0.01                             | ≤ 0.05                                 | ≤ 0.003                               | ≤ 0.01                                | ≤ 0.001                                  | ND                 | ND                    |



ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| รายการทดสอบ             | หน่วย                                 | วันที่เก็บตัวอย่าง<br>ต.ค. 68 | มาตรฐาน |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|
| pH at 25 <sup>0</sup> C | -                                     | 6.93                          | 6.5-8.5 |
| Total Dissolved Solids  | mg/L                                  | 202                           | ≤ 600   |
| Apparent Color          | Pt.Co                                 | ND                            | ≤ 15    |
| Manganese               | mg/L                                  | 0.02                          | ≤ 0.08  |
| Chloride                | mg/L                                  | 58.07                         | ≤ 250   |
| Turbidity               | NTU                                   | 0.79                          | ≤ 4     |
| Iron                    | mg/L                                  | 0.06                          | ≤ 0.3   |
| Hardness                | mg/L as CaCO <sub>3</sub>             | 70.0                          | ≤ 300   |
| Nitrate                 | mg/L                                  | 1.95                          | ≤ 50    |
| Fluoride                | mg/L                                  | ND                            | ≤ 0.7   |
| Sulfate <sup>1/</sup>   | mg/L as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | 21.50                         | ≤ 250   |
| Copper <sup>1/</sup>    | mg/L as Cu                            | ND                            | ≤ 2     |
| Zinc <sup>1/</sup>      | mg/L as Zn                            | 0.03                          | ≤ 3     |
| Lead <sup>1/</sup>      | mg/L as Pb                            | ND                            | ≤ 0.01  |
| Chromium <sup>1/</sup>  | mg/L as Cr                            | ND                            | ≤ 0.05  |
| Cadmium <sup>1/</sup>   | mg/L as Cd                            | ND                            | ≤ 0.003 |
| Arsenic <sup>1/</sup>   | mg/L as As                            | ND                            | ≤ 0.01  |
| Mercury <sup>1/</sup>   | mg/L as Hg                            | ND                            | ≤ 0.001 |
| Total coliform bacteria | in 100 mL                             | < 1.8                         | ND      |
| Escherichia Coli        | in 100 mL                             | ND                            | ND      |

หมายเหตุ < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์,

\* ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

<sup>1/</sup> ทดสอบโดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด : เลขทะเบียน ว-003

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑามาศ จุฑามาศ เลขทะเบียน : ว-176-จ-0006

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลตติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญญา จันทร์เพ็ญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษณุ สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670

### 3.1.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรองของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาณูรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2568 พบว่าคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567 กำหนด

### 3.1.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ของ โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาณูรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ แสดงดังรูปที่ 3.4

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล



รูปที่ 3.4 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล

#### 3.1.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาณูรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.13-3.14

ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568

| วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ |              |                                    |               |                                              |                                              |                   |                    |                                   |
|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                        | pH          | DO<br>(mg/L) | Phosphate<br>( $\mu\text{g-P/L}$ ) | TSS<br>(mg/L) | Nitrate<br>Nitrogen<br>( $\mu\text{g-N/L}$ ) | Ammonia<br>Nitrogen<br>( $\mu\text{g-N/L}$ ) | Salinity<br>(ppt) | TCB<br>(MPN/100mL) | FCB <sup>1/</sup><br>(CFU/100 mL) |
| พ.ค. 65                | 7.81        | 6.85         | 80.0*                              | 21.0          | 30.0                                         | ND                                           | 8.49              | 9,200*             | 1,300*                            |
| พ.ย. 65                | 7.58        | 6.89         | 30.0*                              | 19.0          | 450*                                         | ND                                           | 22.50             | 1,600*             | <1.0                              |
| พ.ค. 66                | 7.93        | 6.21         | 40.0*                              | 21.0          | 2,070*                                       | 1.4                                          | 20.02             | 140                | <1.0                              |
| พ.ย. 66                | 8.12        | 6.09         | ND                                 | 12.0          | 590*                                         | ND                                           | 13.40             | 350                | < 1.0                             |
| พ.ค. 67                | 7.89        | 5.20*        | 10.0                               | 9.0           | 1,960*                                       | ND                                           | 23.10             | 17.0               | 1.0                               |
| พ.ย. 67                | 7.57        | 5.81*        | ND                                 | 43.0          | 250*                                         | ND                                           | 22.60             | 3,500*             | 72.0*                             |
| พ.ค. 68                | 8.05        | 5.98*        | 980*                               | 18.0          | 890*                                         | ND                                           | 18.70             | 5,400*             | 41.0                              |
| มาตรฐาน                | 7.0-8.5     | $\geq 6$     | < 15                               | *             | $\leq 20$                                    | $\leq 100$                                   | $\Delta 10$       | $\leq 1,000$       | $\leq 70$                         |

### ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ |              |                                    |               |                                              |                                              |                   |                    |                                   |
|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                        | pH          | DO<br>(mg/L) | Phosphate<br>( $\mu\text{g-P/L}$ ) | TSS<br>(mg/L) | Nitrate<br>Nitrogen<br>( $\mu\text{g-N/L}$ ) | Ammonia<br>Nitrogen<br>( $\mu\text{g-N/L}$ ) | Salinity<br>(ppt) | TCB<br>(MPN/100mL) | FCB <sup>1/</sup><br>(CFU/100 mL) |
| พ.ย. 68                | 7.94        | 6.12         | 70.0*                              | 30            | 270*                                         | ND                                           | 19.10             | 1,700*             | 63.0                              |
| มาตรฐาน                | 7.0-8.5     | $\geq 6$     | $< 15$                             | *             | $\leq 20$                                    | $\leq 100$                                   | $\Delta 10$       | $\leq 1,000$       | $\leq 70$                         |

หมายเหตุ < = น้อยกว่า,  $\leq$  = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์,  
ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ), # ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด  
1) \* มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั้นๆ

$\Delta 10$  มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าต่ำสุด

<sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑามณี จุฑามาศย์ เลขทะเบียน : ว-176-จ-0006  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176  
ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษณุ สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001  
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670

#### 3.1.4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทะเล

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาราบุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง) กำหนด ยกเว้น ค่าฟอสเฟต (Phosphate) ค่าไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) และค่าแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (TCB) ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด

### 3.1.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง ของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาราบุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำ แสดงดังรูปที่ 3.5

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำคลอง



รูปที่ 3.5 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำคลอง

#### 3.1.5.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาราบุรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.15-3.16

ตารางที่ 3.15 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง ประจำเดือนมกราคม 2565-มิถุนายน 2568

| วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ |                            |                               |                               |              |                     |                    |                    |
|------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                        | pH          | BOD <sub>5</sub><br>(mg/L) | Ammonia<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Nitrate<br>Nitrogen<br>(mg/L) | DO<br>(mg/L) | Temperature<br>(°C) | TCB<br>(MPN/100mL) | FCB<br>(MPN/100mL) |
| พ.ค. 65                | 6.93        | 1.3                        | ND                            | 0.50                          | 4.60*        | 27                  | 28,000*            | 22,000*            |
| พ.ย. 65                | 7.22        | 1.5                        | ND                            | 0.70                          | 7.04         | 27.5                | 54,000*            | 7,000*             |
| พ.ค. 66                | 6.63        | 1.6                        | ND                            | 0.20                          | 5.07*        | 27.0                | 1,100              | 920                |
| พ.ย. 66                | 7.47        | 1.2                        | ND                            | 1.39                          | 6.12         | 29.8                | 17,000*            | 460                |
| มิ.ย. 67               | 7.20        | 0.9                        | ND                            | 1.26                          | 3.23*        | 32.0                | 1,600,000*         | 54,000*            |
| พ.ย. 67                | 7.79        | 2.0                        | ND                            | 0.82                          | 4.32*        | 29.0                | 46,000*            | 11,000*            |
| พ.ค. 68                | 7.29        | 1.2                        | ND                            | 0.45                          | 4.66*        | 29.0                | 700,000            | 220,000            |
| มาตรฐาน                | 5.0-9.0     | ≤ 1.5                      | ≤ 0.5                         | ≤ 5                           | ≥ 6.0        | -                   | ≤ 5,000            | ≤ 1,000            |

ตารางที่ 3.16 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการทดสอบ |                            |                               |                               |              |                     |                    |                    |
|------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                        | pH          | BOD <sub>5</sub><br>(mg/L) | Ammonia<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Nitrate<br>Nitrogen<br>(mg/L) | DO<br>(mg/L) | Temperature<br>(°C) | TCB<br>(MPN/100mL) | FCB<br>(MPN/100mL) |
| พ.ย. 68                | 6.68        | 0.3                        | ND                            | 0.12                          | 5.46*        | 30.0                | 54,000*            | 17,000*            |
| มาตรฐาน                | 5.0-9.0     | ≤ 1.5                      | ≤ 0.5                         | ≤ 5                           | ≥ 6.0        | -                   | ≤ 5,000            | ≤ 1,000            |

หมายเหตุ < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ),  
\* ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
(แหล่งน้ำประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ)

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ เลขทะเบียน : ว-176-จ-0006

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทรพิชญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษณุ สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670

### 3.1.5.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองของโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท  
ธราภูรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
(แหล่งน้ำประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ) กำหนด ยกเว้น ค่าออกซิเจน  
ละลายในน้ำ (DO), แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) และค่าแบคทีเรียชนิดฟิคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ที่มีค่าไม่  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

## 3.2 มาตรการด้านอื่นๆ

### สภาพภูมิประเทศ

โครงการมีการตรวจสอบสภาพภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไป ระบบระบายน้ำของโครงการ ท่อระบายน้ำฝนเข้า  
สู่บ่อหน่วง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ความแข็งแรงของกำแพงกันดินอย่างครบถ้วน

### ทรัพยากรดิน

โครงการมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้และพืชคลุมดินให้มีสภาพดี พื้นที่โล่งว่างภายในโครงการ  
ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วง ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการอย่างครบถ้วน

### สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

โครงการได้มีการกำหนดความเร็วรถโดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง การใช้รถ  
กอล์ฟรับส่งผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ การปลูกพืชที่ลดปริมาณฝุ่นละออง การก่อบดบังทิศทางแสงแดดและเกิดเงา  
อาคารบดบัง

### ทรัพยากรน้ำ

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัด ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ำออกจากโครงการ และมีการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ

### ทรัพยากรชีวภาพ

โครงการตรวจสอบการนำต้นไม้เดิมมาปลูก การระบายน้ำผ่านการบำบัดออกจากโครงการอย่างครบถ้วน

### การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบแผนการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนมาใช้กรณีที่มีการขาดแคลนน้ำ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและแก้ไขปัญหาน้ำใช้ประจำโครงการอย่างครบถ้วน

### การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบ มีบ่อดักไขมันสำหรับห้องครัว มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีการสำรองอุปกรณ์กรว๊วใช้ในกรณีที่อะไหล่ของระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย การเกิดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดที่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย การกำจัดไขมันไปไว้ที่ห้องพักขยะเปิดอก

### การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบจำนวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ที่พักมูลฝอยรวมให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้าน การคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะเสร็จแล้วและท่อระบายน้ำผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม การจัดการที่จอดรถ การอำนวยความสะดวกเก็บขนขยะ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอันตราย การเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย การจัดส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างครบถ้วน

### การไฟฟ้า

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้งานและการชำรุดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตั้งม่านริมระเบียง การปลูกต้นไม้บดบังแสงแดด การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การติดฉนวนกันความร้อนเข้าสู่อาคาร อย่างครบถ้วน

### การคมนาคม

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การติดกระจกนูนตามจุดเลี้ยว การติดตั้งระบบส่องสว่าง การจัดเจ้าหน้าที่จราจร ที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด การจัดการที่จอดรถคนพิการภายในโครงการ การจัดการที่จอดรถของโครงการ การจัดการรับส่งนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ อย่างครบถ้วน

### การระบายอากาศ

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ การทำความสะอาดถาดรองน้ำหยดจากคอยล์เย็น การทำงานของระบบปรับอากาศ

ระยะเวลาการล้างทำความสะอาดหระบายความร้อนขึ้นตอนและวิธีการล้างทำความสะอาดหระบายความร้อน การแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ ทิศทางการระบายของปล่อง อย่างครบถ้วน

#### การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

โครงการได้มีการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงภายในโครงการ

#### สภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

โครงการมีการตรวจสอบการรับพนักงานในท้องถิ่นเข้ามาทำงาน และการฝึกอบรมการสร้าง ความสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนโดยเรื่องร้องเรียนของชุมชนโดยรอบและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดฝึกอบรม ภาษาอังกฤษและวิชาชีพให้กับพนักงาน การให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อย่างครบถ้วน

#### การสาธารณสุข

โครงการมีการตรวจสอบการดูแลระบบสาธารณสุขปโภคภายในโครงการ การจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือปฐมพยาบาลพร้อมรถรับส่งฉุกเฉิน อย่างครบถ้วน

#### อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ

โครงการมีการตรวจสอบ เรื่องการจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิและความร่วมมือในการซักซ้อมกับหน่วยงานท้องถิ่น เส้นทางอพยพหนีภัยสึนามิ ไปยังจุดปลอดภัย การกำหนดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการหนีภัยสึนามิ

#### ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามกำหนด การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติม ในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุอัคคีภัย ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งแปลนแสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยการ ตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล ความรู้ความเข้าใจและผลการซักซ้อมตำแหน่งจุดรวมพลและความถี่ของการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง ความ กว้างของถนนด้านทิศเหนือของโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

#### สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณของต้นไม้ที่กำหนดไว้ในรายงาน และการเจริญเติบโตของต้นไม้ การนำต้นไม้มา ปลุกไว้ในพื้นที่โครงการ การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน ตรวจสอบสี และการกะเทาะออกของสีผนังอาคาร

บทที่ 4

---

บทสรุปและข้อเสนอแนะ



## บทที่ 4

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัทธาธาภูเก็ต จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า ทางโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ได้ดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

##### 4.1 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดของ โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัทธาธาภูเก็ต จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567) กำหนด ทั้งนี้ ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่ได้กำหนดค่าแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แต่ทางโครงการมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำผ่านการบำบัดทุกครั้งก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้

#### ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้อมทั้งตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป
- ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
- กรณีนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ควรจะจัดทำป้ายติดที่ท่อจ่ายน้ำผ่านการบำบัดสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้ชัดเจน แยกจากท่อน้ำประปา เพื่อป้องกันการนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้แทนน้ำประปา
- สุ่มตะกอนจากถังเกรอะ – ถังกรองไร้อากาศของโครงการทุกถัง เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้นให้สามารถบำบัดได้ตามที่ออกแบบไว้
- ตรวจสอบและบันทึกปริมาณน้ำใช้ภายในโรงแรม เพื่อเป็นสถิติพื้นฐานในการควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยให้การควบคุมระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ควรสังเกตสี และลักษณะของตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งควรจะเป็นสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาล และต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแต่จะมีกลิ่นอับคล้ายดิน ตรวจสอบระดับชั้นของตะกอนของบ่อเติมอากาศ ควบคุมค่า SV<sub>30</sub> มีค่าประมาณ 200 -300 ml/l
- ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen :DO) ภายในบ่อเติมอากาศต้องควบคุมค่า DO ให้มีค่ามากกว่า 2.0 mg/l ในกรณีที่ค่า DO ต่ำกว่า 2.0 mg/l แสดงว่าออกซิเจนภายในบ่อมีค่าน้อยและอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของเชื้อจุลินทรีย์ได้ ให้ทำการแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้
  1. เปิดเครื่องเติมอากาศทุกตัวพร้อมกัน เพื่อให้สามารถจ่ายอากาศได้อย่างเพียงพอ

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ เช่น สภาพของใบพัดมอเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่
3. ตรวจสอบกำลังวัตต์ของมอเตอร์ในการกระจายอากาศมีเพียงพอในการกวนผสม (Mixing) เชื้อจุลินทรีย์ในระบบ และการถ่ายเทอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งถ้าหากตรวจสอบแล้วไม่เพียงพอ จะต้องมีการติดตั้ง เครื่องจักรในการเติมอากาศเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการอากาศที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน ว่าเพียงพอในการรองรับน้ำเสียในปัจจุบันหรือไม่

## 4.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

### ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำเดือน)

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาราบุรี จำกัด จำนวน 1 จุด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ กำหนด

### ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ประจำปี)

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำปี 2568 ของโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาราบุรี จำกัด จำนวน 1 จุด ประจำปี 2568 โครงการมีการตรวจวิเคราะห์ ฯ ในเดือนตุลาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ กำหนด ยกเว้น ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) และค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ที่มีค่าไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

### ข้อเสนอแนะ

- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ กำหนด ดังนี้ โครงการมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบของสระว่ายน้ำ ต้องสะอาด และไม่มีคราบตะไคร่น้ำ
- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างเท้า และเก็บรองเท้าบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ
- โครงการมีป้ายแสดงข้อบังคับของผู้ใช้บริการ ติดให้เห็นชัดเจน อย่างน้อย มีสาระสำคัญ ดังนี้
  - 1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ
  - 2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง
  - 3) ห้ามผู้เป็นโรคตาแดง ผิวน้ำ หวัด หูเป็นน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ใช้สระว่ายน้ำ
  - 4) กำหนดเวลาเปิด - ปิด สระว่ายน้ำ
- โครงการมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH ) ในสระว่ายน้ำ โดยให้มีปริมาณคลอรีน อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 7.2 – 8.4
- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและปริมาณสารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรอง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านการกรองของโครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาณูรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567 กำหนด

##### ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ทำความสะอาดคราบตะกอนในเส้นท่อเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
- ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรในการเติมสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรคของน้ำใช้ภายในโรงแรม ยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่
- ควรมีการตรวจสอบว่า มีพนักงานหรือลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงแรม มีอาการเจ็บป่วย/ปวดท้อง เนื่องจากน้ำใช้ภายในโรงแรมหรือไม่
- ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงแรมเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องต่อไป

#### 4.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทะเล

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล โครงการ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาณูรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง) กำหนด ยกเว้น ค่าฟอสเฟต (Phosphate) ค่าไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) และค่าแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (TCB) ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด

##### ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรติดตามคุณภาพน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

#### 4.5 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองของโครงการโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต บริษัท ธาณูรี จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ) กำหนด ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO), แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) และค่าแบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

#### 4.6 มาตรการด้านอื่นๆ

##### สภาพภูมิประเทศ

โครงการมีการตรวจสอบสภาพภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไป ระบบระบายน้ำของโครงการ ท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ความแข็งแรงของกำแพงกันดินอย่างครบถ้วน

##### ทรัพยากรดิน

โครงการมีการตรวจสอบสภาพดินไม้และพืชคลุมดินให้มีสภาพดี พื้นที่โล่งว่างภายในโครงการ ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วง ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการอย่างครบถ้วน

##### สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

โครงการได้มีการกำหนดความเร็วรถโดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง การใช้รถกอล์ฟรับส่งผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ การปลูกพืชที่ลดปริมาณฝุ่นละออง การก่อกำบังทิศทางแสงแดดและเกิดเงาอาคารบดบัง

##### ทรัพยากรน้ำ

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัด ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ำออกจากโครงการ และมีการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ

##### ทรัพยากรชีวภาพ

โครงการตรวจสอบการนำต้นไม้เดิมมาปลูก การระบายน้ำผ่านการบำบัดออกจากโครงการอย่างครบถ้วน

##### การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบแผนการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนมาใช้กรณีที่มีการขาดแคลนน้ำ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด การนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและแก้ไขปัญหาหน้าใช้ประจำโครงการอย่างครบถ้วน

##### การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบ มีบ่อดักไขมันสำหรับห้องครัว มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีการสำรองอุปกรณ์กรว๊วใช้ในกรณีท่อไหลของระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย การเกิดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดที่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย การกำจัดไขมันไปไว้ที่ห้องพักขยะเปียก

##### การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการมีการตรวจสอบจำนวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ที่พักมูลฝอยรวมให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยของแม่บ้าน การคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะเสร็จแล้วและท่อระบายน้ำผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม การจัดการที่จอดรถ การอำนวยความสะดวกเก็บขนขยะ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษอันตราย การเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย การจัดส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างครบถ้วน

### การไฟฟ้า

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้งานและการชำรุดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตั้งม่านริมระเบียง การปลูกต้นไม้บดบังแสงแดด การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การติดฉนวนกันความร้อนเข้าสู่อาคาร อย่างครบถ้วน

### การคมนาคม

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การติดกระถางต้นไม้ตามจุดต่างๆ การติดตั้งระบบส่องสว่าง การจัดเจ้าหน้าที่จราจร ที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด การจัดการที่จอดรถคนพิการภายในโครงการ การจัดการที่จอดรถของโครงการ การจัดการรับส่งนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ อย่างครบถ้วน

### การระบายอากาศ

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ การทำความสะอาดถาดรองน้ำหยดจากคอยล์เย็น การทำงานของระบบปรับอากาศ ระยะเวลาการล้างทำความสะอาดหอระบายความร้อนชั้นตอนและวิธีการล้างทำความสะอาดหอระบายความร้อน การแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ ทิศทางการระบายของปล่อง อย่างครบถ้วน

### การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

โครงการได้มีการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงภายในโครงการ

### สภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

โครงการมีการตรวจสอบการรับพนักงานในท้องถิ่นเข้ามาทำงาน และการฝึกอบรมการสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนโดยเรื่องร้องเรียนของชุมชนโดยรอบและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวิชาชีพให้กับพนักงาน การให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อย่างครบถ้วน

### การสาธารณสุข

โครงการมีการตรวจสอบการดูแลระบบสาธารณสุขภายในโครงการ การจัดทำเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลพร้อมรับส่งฉุกเฉิน อย่างครบถ้วน

### อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ

โครงการมีการตรวจสอบ เรื่องการจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิและความร่วมมือในการซักซ้อมกับหน่วยงานท้องถิ่น เส้นทางอพยพหนีภัยสึนามิ ไปยังจุดปลอดภัย การกำหนดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการหนีภัยสึนามิ

### ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจัดทำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามกำหนด การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุอัคคีภัย ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งแปลนแสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยการตรวจสอบระบบสูบน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล

ความรู้ความเข้าใจและผลการซักซ้อมตำแหน่งจุดรวมพลและความถี่ของการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิง ความกว้างของถนนด้านทิศเหนือของโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

#### สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณของต้นไม้ที่กำหนดไว้ในรายงาน และการเจริญเติบโตของต้นไม้ การนำต้นไม้มาปลูกไว้ในพื้นที่โครงการ การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชน ตรวจสอบสี และการกะเทาะออกของสีผนังอาคาร

## ภาคผนวก

|            |    |                                                                                                                                                |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาคผนวกที่ | 1  | มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                                                                                    |
| ภาคผนวกที่ | 2  | ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                            |
| ภาคผนวกที่ | 3  | เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน                                                                                                  |
| ภาคผนวกที่ | 4  | เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ                                                                                                  |
| ภาคผนวกที่ | 5  | มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                                                                 |
| ภาคผนวกที่ | 6  | แผนการรับมือภัยพิบัติสึนามิ                                                                                                                    |
| ภาคผนวกที่ | 7  | Checklist อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                                                                                       |
| ภาคผนวกที่ | 8  | ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย<br>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                                                                    |
| ภาคผนวกที่ | 9  | จำนวนพนักงานโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต                                                                                                         |
| ภาคผนวกที่ | 10 | ใบเสร็จค่าขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                                                                                                   |
| ภาคผนวกที่ | 11 | ใบเสร็จค่าสูบล้างสิ่งปฏิกูล/ไขมัน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568                                                                               |
| ภาคผนวกที่ | 12 | ใบอนุญาตดำเนินการกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                                             |
| ภาคผนวกที่ | 13 | แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ<br>ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1)<br>ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 |
| ภาคผนวกที่ | 14 | กิจกรรมเพื่อสังคม                                                                                                                              |
| ภาคผนวกที่ | 15 | รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568                                                                                       |

## ภาคผนวกที่ 1

มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. ทรัพยากรกายภาพ<br>1.1 สภาพภูมิประเทศ     | โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ จากเดิมที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาไม่มีการใช้ประโยชน์ เปลี่ยนไปเป็นอาคารโรงแรม จำนวน 10 อาคาร พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค ที่จอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ และพื้นที่สีเขียว อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง และจัดภูมิสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่สีเขียวขนาด 2,948.11 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.30 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ | -                                        | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

โสธร ดำศิริกุล (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธاراบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม         | <p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 26.30 โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และ ไม้ยืนต้นปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดินได้ สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้างxความลึก : 0.40x0.70 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ถึง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ ก่อนลงสู่บ่อหนองน้ำ จำนวน 4 บ่อ ปริมาตร 67 ลูกบาศก์เมตร, 48 ลูกบาศก์เมตร, 74.90 ลูกบาศก์เมตร และ 52.50 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อหนองน้ำ จะปล่อยออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>สำหรับการพัฒนาตะกอนดินลงสู่บ่อหนองน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้น จึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด</p> | <p>(1) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 26.30 ของพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) น้ำฝนจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้างxความลึก : 0.40x0.70 เมตร ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ ก่อนลงสู่บ่อหนองน้ำ จำนวน 4 บ่อ ปริมาตร 67 ลูกบาศก์เมตร, 48 ลูกบาศก์เมตร, 74.90 ลูกบาศก์เมตร และ 52.50 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อหนองน้ำ จะปล่อยออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>(3) จัดให้มีกำแพงกันดินที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตามแนวกั้นภายในโครงการ ขนาดความสูงของกำแพงกันดินมี 6 แบบ ได้แก่ ความสูงเท่ากับ 1.00 เมตร, 1.50 เมตร, 2.00 เมตร, 2.50 เมตร, 3.00 เมตร, 3.50 เมตร และ 4.00 เมตร ตามลำดับ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน</p> | -                                      |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ           | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และการเกิด สึนามิ | <p>1) ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบบริเวณที่ตั้งโครงการมี ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นยุคควอเตอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ใน เขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือหากมีแผ่นดินไหว ในเขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ทำให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ ดีปรากฏความเสียหาย โดยเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่ามีความ เสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิติ แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในปี 2555 พบการ เกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาด รุนแรงที่สุด 4.3 ริคเตอร์</p> <p>จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริคเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทำให้เกิดการส่งถ่าย แรงสั่นสะเทือน และเป็น ตัวกระตุ้นให้แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิด แผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริคเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต</p> | <p>(1) จัดให้มีแผนผังเส้นทางอพยพหนีภัยไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</p> <p>(2) จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิด เหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็ สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุมนุม</p> <p>(3) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทา สาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการ อพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้ง</p> <p>(4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ ตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย</p> | <p>- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัย ไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พัก อาศัยและพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> |



เดือน มีนาคม 2560 โสภ อดิสร ศิริกานี จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศิริกานี จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ                | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ) | หลังจากนั้นมีแผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ช็อก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครั้ง รู้สึกได้ประมาณ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านลิพอน-บางขาม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง เสียหายเล็กน้อยกว่า 200 หลังคาเรือน ตำบลปากคลอก อำเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนก่ออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียวดำ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด (สำนักธรณีวิทยาสังแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในระดับ IV ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดแผ่นดินไหว มาตราวัดรุนแรงแผ่นดินไหวของเมอร์คัลลีที่ปรับปรุงแล้ว พบว่า ถ้าเกิดในเวลากลางวัน ผู้ที่อยู่ในอาคารจะรู้สึกได้แต่ผู้ที่ยอยู่นอกอาคาร มีผู้รู้สึกว่าการเกิดแผ่นดินไหวน้อยคน ถ้าเป็นตอนกลางคืนผู้ที่นอนหลับอยู่จะตกใจตื่น ถ้วยชามจะขยับหน้าต่าง ประตู จะสั่น ฝาผนังจะมีเสียงลั่น มีความรู้สึกคล้ายๆ กับรถยนต์บรรทุกของหนัก ชนอาคาร รถยนต์ที่จอดอยู่สั่นไหวสังเกตได้ชัดเจน (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) | (5) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์<br>(6) โครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหนภัยที่เกิดจากสึนามิให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ<br>(7) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>(8) หากเกิดธรณีพิบัติภัย โครงการจัดให้มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย ดังนี้<br>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อกดปุ่มส่งสัญญาณเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการทราบอย่างทั่วถึง<br>- พนักงานเคาะประตูห้องพักแต่ละห้องและตรวจสอบว่ามีผู้พักอาศัยอยู่หรือไม่<br>(9) พนักงานอยู่ประจำตามจุดต่างๆ เพื่อนำทางผู้พักอาศัยไปยังจุดรวมพล |                                        |



เดือน มีนาคม 2560 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธารามูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ               | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ) | <p>นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา เป็นระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตำแหน่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 18 กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการใช้เสาเข็มรับน้ำหนักอาคาร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p><b>2) การเกิดสึนามิ</b></p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา บริเวณที่สูงที่สุดของพื้นที่โครงการสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 18 เมตร และบริเวณที่ต่ำที่สุดของโครงการสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 3 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลถึงแนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด ประมาณ 46 เมตร และไกลสุดประมาณ 298 เมตร ได้รับผลกระทบจากสึนามิในปี 2547 และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิบริเวณโซน 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ จากการสอบถามประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ บริเวณพื้นที่โครงการมีน้ำทะเลเอ่อเข้ามาระดับพื้นถนน และโครงการตั้งอยู่ใกล้บริเวณจุดปลอดภัย คือ แนวเทือกเขานาคเกิด ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ</p> <p>ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเกิดสึนามิ จึงส่งผลกระทบในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีมาตรการในการป้องกัน และมีการซ้อมอพยพหนีภัย อีกทั้งโครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหลบภัยที่เกิดจากสึนามิให้แก่พนักงานของโครงการ รวมถึงได้เตรียมมาตรการหนีภัยสึนามิไว้รองรับ</p> |                                          |                                        |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธารามูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ               | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว<br>และการเกิดสึนามิ (ต่อ) | สำหรับแผนการดำเนินการของโครงการเกี่ยวกับการดำเนินการกรณี<br>เกิดธรณีพิบัติภัย ภายในโครงการเองก็ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อกดปุ่มส่งสัญญาณ<br>เมื่อเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในโครงการทราบอย่างทั่วถึง และพนักงานจะอยู่<br>ประจำตามจุดต่างๆ เพื่อนำทางผู้ใช้บริการไปยังจุดรวมพลของโครงการ<br>นอกจากนี้ มีการเตรียมมาตรการหนีภัยสึนามิไว้รองรับ โดยได้จัดที่หลบภัย<br>ชั่วคราวให้แก่ผู้ใช้บริการภายในโครงการ หากเกิดกรณีฉุกเฉินหนีไปยังจุด<br>ปลอดภัยที่ทางราชการกำหนดไว้ไม่ทัน โดยกำหนดไว้บริเวณชั้นที่ 3 ของอาคาร<br>(ความสูงจากพื้นดิน 10.45 เมตร) มีพื้นที่ทั้งหมดขนาด 1,404 ตารางเมตร<br>สามารถอพยพคนได้สูงสุดประมาณ 5,616 คน (คิดที่ 0.25 ตารางเมตร/คน หรือ<br>4 คน/ตารางเมตร) เมื่อคิดผู้มาใช้บริการในโครงการสูงสุด 3,300 คน (รวมจำนวน<br>พนักงาน) ซึ่งมีความเพียงพอ ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทาง<br>การอพยพหนีภัยไปยังจุดหลบภัยชั่วคราวภายในโครงการติดไว้บริเวณทางเดิน ผัง<br>เส้นทางอพยพไปยังพื้นที่หลบภัยชั่วคราวบนอาคาร ดังนั้น ความเสี่ยงจากการ<br>เกิดสึนามิจึงส่งผลกระทบในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีมาตรการใน<br>การป้องกัน และมีการซ้อมอพยพหนีภัย อีกทั้งโครงการจะมีการให้ความรู้ด้าน<br>การหลบภัยที่เกิดจากสึนามิให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ รวมถึงได้<br>เตรียมมาตรการหนีภัยสึนามิไว้รองรับ |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 โสม ชาญชัย นวรัตน์ จิตพวงจันทร์  
(นายโสม ชาญชัย นวรัตน์) (นางสาวศุภรัตน์ จิตพวงจันทร์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ                          | <p>มลพิษทางอากาศที่สำคัญในระยะดำเนินการ คือ ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษัทฯ ที่ปรึกษาได้คำนวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นโดยใช้แบบจำลอง Box Model ซึ่งการคำนวณหาปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษของโครงการในระยะดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> </ul> <p>จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.0551121 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)</p> | <p>(1) ติดป้ายให้ผู้ใช้บริการดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>(2) จัดพื้นที่สีเขียวขนาด 2,948.11 ตารางเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดระดับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul> |



เดือน มีนาคม 2560

นาย ไสกร ดำศิริกุล (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)<br/>จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.03543834 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)</li> <li>- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)<br/>จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.0291462 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป)</li> </ul> |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจวัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul> |



เดือน มีนาคม 2560 นาย โสธร ด่านศิริกุล (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)<br/>จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ พุ่งกระจายในพื้นที่ 0.50622 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)</li> <li>ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)<br/>จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์พุ่งกระจายในพื้นที่ 0.00569681 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544))</li> </ul> |                                          |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ตานศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                    | - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)<br>จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซไฮโดรคาร์บอนฟุ้งกระจายในพื้นที่ 1.7916622 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซไฮโดรคาร์บอนไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน              | เมื่อเปิดดำเนินการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ที่จะเกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรของรถที่เข้า-ออกภายในโครงการ แต่คาดว่าจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการเป็นการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบเงียบและต้องการความเป็นส่วนตัว ประกอบกับเสียงจากการจราจรเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นปกติประจำอยู่แล้วของสังคมเมือง และจากการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่บริเวณโครงการ ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 โดยบริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.1 dB(A) ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ | (1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง<br>(2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ<br>(3) ปลุกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นหมาก ต้นไทร ต้นต้นเป็ด ต้นจิกเศรษฐี ต้นจิกทะเล ต้นพาชานโตส ต้นชานาง ต้นหลิว และต้นลีลาวดีเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ | -                                      |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล คุณวิภา จิระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภรณ์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2. ทรัพยากรชีวภาพ<br>2.1 นิเวศวิทยาทางบก    | <p>เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่บริการท่องเที่ยว และพื้นที่อยู่อาศัย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้</p> <p><b>1) ทรัพยากรป่าไม้</b></p> <p>พื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา มีไม้เดิมที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นตาลประดับ ต้นหมากเขียว ต้นกล้วย ต้นไทรทอง ต้นเตยทะเล ต้นหมากผู้หมากเมีย ต้นมะขาม ต้นปาล์มพัด ต้นกระถิน ต้นเข็มเล็ก ต้นสวมน้อยปะแบ้ง ต้นตะแบก ต้นวาสนา ต้นกวนอิม ต้นสนแฉ่ง และต้นเตาร่าง ทั้งนี้ไม่พบไม้ยืนต้นชนิดที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด</p> <p><b>2) ทรัพยากรสัตว์บก</b></p> <p>สำหรับสิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ คางคกบ้าน อึ่งอ่างบ้าน ปาดบ้าน จิ้งจกน้ำ มวนแมงป่องน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ได้แก่ ตุ๊กแกบ้าน จิ้งเหลนบ้าน และกิ้งกือ นก (Birds) ได้แก่ นกกระจอกบ้าน นกกระจิบ นกเอี้ยงสาธิต และนกนางแอ่นบ้าน และแมลง ได้แก่ มด ตั๊กแตน และแมลงปอบ้าน ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์บก</p> | -                                            | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล ภริณี จิระพงษ์กุล เดือน มีนาคม 2560  
 (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์กุล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

[Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ                     | <p>จากการสำรวจระยะการครอบคลุมพื้นที่ในแนวปะการัง บริเวณหาดหน้าที่ตั้งโครงการเดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต (หาดกะหลิม) โดยทำการศึกษาสำรวจในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พบว่า ปะการังมีความเสื่อมโทรมมาก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยทราย รองลงมาคือเศษซากปะการัง หินและปะการังแข็ง ทั้งนี้ จากการสำรวจชนิดของปะการัง พบ ปะการังโขด (Porites spp.) เพียงชนิดเดียว สำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พบทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ ปลิงทะเล (Holothuria leucospilot) และ เม่นทะเล (Echinotrix calamaris) สำหรับประชากรปลาทะเล พบ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลาสร้อยหินคอดำ (Dascyllus reticulatus) และปลาหมูสีแก้มแดง (Lethrinus lentjan)</p> <p>ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้พบจำนวนชนิดและการครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและประชากรปลาทะเลค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากบริเวณแนวชายหาดหน้าที่ตั้งโครงการมีลักษณะเป็นทรายปนก้อนหินขนาดเล็ก มีโขดหินและซากแนวปะการังตายจำนวนมาก มีผลให้สิ่งมีชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยในปริมาณน้อย อันเนื่องมาจากมีความจำกัดในด้านของพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร ตลอดจนบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีกิจกรรมมากมายจึงมีผลให้ตะกอนต่างๆ ไหลลงสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีผลให้เกิดการทับถมของตะกอนปริมาณสูงเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมที่ค่อนข้างรุนแรงจนมีผลให้ตัวอ่อนปะการังไม่สามารถลงเกาะและก่อตัวเป็นแนวปะการังใหม่ได้เช่นกัน</p> | <p>(1) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเดิม อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถึงบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน จำนวน 1 ชุด ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก</p> | <p>- ตรวจวัด ความเป็นกรดต่างของแข็งละลายน้ำ ความเค็มในเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และพีคอลโคลิฟอร์ม บริเวณหาดกะหลิม ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจคุณภาพน้ำคลองสาธารณะประโยชน์ โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่าง อุณหภูมิ ในเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่าบีโอดี (BOD) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และพีคอลโคลิฟอร์ม ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ตันศิริกุล พงษ์พันธ์ จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ตันศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)               | <p>โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วันถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน จำนวน 1 ชุด ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD<sub>๕๐๐</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดค่า BOD<sub>๕๐๐</sub> ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 353.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราใช้น้ำของดิน (ดินร่วนปนทราย) 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด (Zero Discharge) สำหรับการระบายน้ำฝนโครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้างxความลึก : 0.40x0.70 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ถึง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ ก่อนลงสู่บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 4 บ่อ ปริมาตร 67 ลูกบาศก์เมตร, 48 ลูกบาศก์เมตร, 74.9 ลูกบาศก์เมตร และ 52.5 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อหน่วงน้ำ จะระบายออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> | <p>(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของแต่ละอาคาร ปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยจะนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดน้ำแบบท่อซึมดิน</p> <p>(3) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> |                                        |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)                  |                               | <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</p> <p>(5) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้น ประมาณ 433 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้</p> <p>(6) จัดให้มีท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้างx ความลึก : 0.40x0.70 เมตร ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ ก่อนลงสู่บ่อ หนองน้ำ จำนวน 4 บ่อ ปริมาตร 67 ลูกบาศก์เมตร, 48 ลูกบาศก์ เมตร, 74.9 ลูกบาศก์เมตร และ 52.5 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำฝนที่ ออกจากบ่อหนองน้ำ จะระบายออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้าน ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>(7) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>(8) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุด ระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ</p> <p>(9) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้อง แก้ไขทันที</p> |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล ศิริรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศิริรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ                                                                 | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b><br>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน<br>3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน | <p>จากการสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า บริเวณที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด พื้นที่ทะเล พื้นที่บริการท่องเที่ยว พื้นที่รกร้าง/ไม้พุ่ม ที่เหลือใช้ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ถนน พื้นที่โล่ง พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่สถานศึกษา และพื้นที่หาด ตามลำดับ</p> <p>สำหรับการใช้ที่ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จากการสำรวจภาคสนาม (พฤศจิกายน, 2559) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่บริการท่องเที่ยว และพื้นที่อยู่อาศัย ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเป็นโรงแรม จึงสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ</p> | -                                            | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ต้านศิริกุล) (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                     | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558                                                                           | พื้นที่บริเวณโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้กำหนดที่ดินบริเวณโครงการเป็น <b>ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 8.13</b> ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่า <b>การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                            | -                                          |
| 3.1.3 การประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 | จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า โครงการจัดอยู่ใน <b>บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8</b> ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553<br>ทั้งนี้จากการตรวจสอบระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลโดยเทศบาลเมืองป่าตอง และการสำรวจระยะห่างจากแนวชายฝั่งจริงภาคสนาม พบว่า พื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลถึงแนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุดประมาณ 46 เมตร และไกลที่สุดประมาณ 298 เมตร ดังนั้น พื้นที่โครงการจึงจัดอยู่ใน <b>บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3</b> ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า <b>การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว</b> | -                                            | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล สุวิมล จีระพงษ์ตระกูล เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุวิมล จีระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

[Signature]

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ                                                                                     | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย<br>กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.<br>2529) ออกตามความใน<br>พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br>พ.ศ. 2522 | จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎหมายฉบับที่ 15<br>(พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br>พ.ศ. 2522 โดยเทศบาลเมืองป่าตอง พบว่า พื้นที่โครงการจัด<br>อยู่ในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 4 ซึ่งเมื่อ<br>เปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตาม<br>กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน<br>พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พบว่า การใช้<br>ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว | -                                            | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 ไกร ช่างสีแก้ว บริษัท ช่างสีแก้ว  
(นายไสร ต่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การคมนาคมขนส่ง                          | <p>1) ความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออกโครงการ</p> <p>การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวก โดยทางรถยนต์ ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ 2 เส้นทาง ดังนี้</p> <p><u>เส้นทางที่ 1</u> จากวงเวียนป่าตองมุ่งหน้าไปกมลาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ตอนกลาง-หาดราไวย์ เป็นระยะทาง 600 เมตร พบซอยพระบารมี 8 ด้านขวา ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยพระบารมี 8 ขับตรงไปอีกประมาณ 20 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ</p> <p><u>เส้นทางที่ 2</u> จากภูเก็ตแฟนตาซีมุ่งหน้าไปหาดป่าตองตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ตอนกลาง-หาดราไวย์ เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร พบซอยพระบารมี 8 ด้านซ้าย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยพระบารมี 8 ขับตรงไปอีกประมาณ 20 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ</p> | <p>(1) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา</p> <p>(4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ</p> <p>(5) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 50 คัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางจราจรภายนอกโครงการ</p> <p>(6) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทางเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร</p> <p>(7) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> | <p>- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ</p> |



เดือน มีนาคม 2560

โสธร ด่านศิริกุล นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                    | <p>2) ความเพียงพอของที่จอดรถภายในโครงการ ทางเข้า-ออกของโครงการ มีจำนวน 3 จุด บริเวณติดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4030 ตอนกลาง-หาดราไวย์ จำนวน 1 จุด มีความกว้างของทางเข้า-ออก 6.04 เมตร เดินรถสองทิศทาง และบริเวณติดกับซอยพระบารมี 8 จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 มีความกว้างของทางเข้า-ออก 12.90 เมตร เดินรถสองทิศทาง และจุดที่ 2 มีความกว้างของทางเข้า-ออก 6.11 เมตร เดินรถสองทิศทาง โดยที่จอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการทั้งหมดเป็นที่จอดรถภายนอกอาคาร จำนวน 23 คัน และที่จอดรถภายในอาคาร จำนวน 18 คัน รวมที่จอดรถทั้งสิ้น 41 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 1 คัน) โดยลักษณะที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.50 เมตร และความยาว 5.00 เมตร</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน มีความกว้าง 3.00 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และจัดให้มีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.50 เมตร</p> <p>ในการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถของโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 300 ห้องพัก ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้รถของผู้ใช้บริการโรงแรม โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่มีขนาด กิจกรรม ในลักษณะเดียวกัน แสดงดังตารางที่ 4-46 ได้แก่ โรงแรม นิภา รีสอร์ท ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ 2.40 กิโลเมตร</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 นายโสธร ด้านศิริกุล (นางสาวสุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                    | <p>โรงแรม นิภา รีสอร์ท มีจำนวนห้องพัก 139 ห้องพัก มีรถที่จอดจริงในที่จอดรถ 5 คัน ซึ่งจากการสำรวจภาคสนามโรงแรม นิภา รีสอร์ท พบว่า การดำเนินการของโรงแรมที่ผ่านมา มีผู้เข้าพักหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน) จะมีผู้เข้าพักเป็นจำนวนมาก โดยจะแบ่งกลุ่มผู้เข้าพักออกเป็น 3 กลุ่ม</p> <p>1. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อผ่านบริษัทจัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) ซึ่งทางโรงแรมจะจัดส่งรถไปรับที่สนามบินหรือสถานที่นัดหมาย หรือทางจัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) นำมาส่งที่โรงแรม ด้วยรถบัส, รถตู้ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น</p> <p>2. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง และโดยสารทางเครื่องบิน/ยานพาหนะสาธารณะ ซึ่งทางโรงแรมจะจัดส่งรถไปรับที่สนามบินหรือสถานที่นัดหมาย</p> <p>3. กลุ่มผู้เข้าพักที่ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์</p> <p>ดังนั้น โครงการตัวอย่างได้แก่ โรงแรม นิภา รีสอร์ท จะมีการใช้ที่จอดรถประมาณร้อยละ 3.60 ของจำนวนห้องพัก (5 คัน จากจำนวนห้องพัก 139 ห้อง) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการจะมีความต้องการที่จอดรถ 11 คัน (ร้อยละ 3.60 ของจำนวนห้องพัก 300 ห้อง) ดังนั้น ที่จอดรถที่โครงการจัดให้มี จำนวน 50 คัน จึงมีความเพียงพอ</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 ศิริ ด่านศิริกุล นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                    | <p><b>3) ประเมินผลกระทบต่อการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ</b></p> <p>สภาพการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ตอนกลาง-หาดราไวย์ ในวันหยุด คือ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ส่วนใหญ่สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ได้แก่ ช่วงเวลา 07.01-08.00 น. และ 13.01-15.00 น. ยกเว้นช่วงเวลา 8.01-9.00 น. 11.01-12.00 น. และ 15.01-17.00 น. การจราจรยังคงคล่องตัว มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการหยุดจอด ช่วงเวลา 12.01-13.00 น. การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมีความเครียดขณะขับขี่ ช่วงเวลา 9.01-11.00 น. และ 18.01-19.00 น. การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง และช่วงเวลา 17.01-18.00 เกิดความล่าช้าบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยสำคัญ และวันธรรมดา คือ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ส่วนใหญ่สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ได้แก่ ช่วงเวลา 07.01-08.00 น. 10.01-11.00 น. และ 12.01-13.00 น. ยกเว้นช่วงเวลา 8.01-9.00 น. และ 13.01-15.00 น. การจราจรยังคงคล่องตัว มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการหยุดจอด ช่วงเวลา 11.01-12.00 น. และ 16.01-17.00 น. การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง ช่วงเวลา 9.01-10.00 น. และ 18.01-19.00 น. เกิดความล่าช้าบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยสำคัญ และช่วงเวลา 17.01-18.00 ขยับด้วยความเร็วต่ำมาก เนื่องจากการติดขัดที่จุดตัด มีการติดขัดเป็นขบวนยาว</p> <p>สภาพการจราจรบนซอยพระบารมี 8 ทั้งในวันหยุด คือ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 และวันธรรมดา คือ อังคารที่ 5 เมษายน 2559 สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

นาย โสธร ด่านศิริกุล (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 การใช้น้ำ                               | <p>1) ปริมาณการต้องการน้ำใช้ของโครงการ</p> <p>ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ปริมาณน้ำใช้ในโครงการ ประมาณ 281.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 26.39 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง</p> <p>2) แหล่งน้ำใช้ และระบบจ่ายน้ำ</p> <p>โครงการจะใช้น้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน ประปาภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง โดยมีแนวท่อประปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำด้วยท่อขนาด 4 นิ้ว เข้ากักเก็บในถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 637ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชน มีแนวท่อของโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับหัวรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำ ขนาด 4x2.5x2.5 นิ้ว เข้าเก็บกักในถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตร 255ลูกบาศก์เมตร จากนั้นปั๊มเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตร 765 ลูกบาศก์เมตร โดยมีส่วนที่นำมาใช้เป็นน้ำใช้อุปโภคบริโภคปริมาตร 637 ลูกบาศก์เมตร และส่วนที่เป็นน้ำสำรองดับเพลิงปริมาตร 128 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 ชุด</p> | <p>(1) ถังเก็บน้ำสำรองที่รวมปริมาตรน้ำที่กักเก็บไว้ในโครงการทั้งหมด 892 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 3 วัน</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน</p> <p>(3) รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>(4) ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบชำรุด ให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย</p> | <p>- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากถังเก็บน้ำดิบและบริเวณก๊อกน้ำใช้ผ่านการกรองของโครงการแล้ว กรณีที่ใช้น้ำซื้อ ทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ พารามิเตอร์ คือทางกายภาพ ได้แก่ สี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ทางเคมี ได้แก่ ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรต และความกระด้างทั้งหมด สารพิษ ได้แก่ ปะรอตตะกั่ว สารหนู โครเมียม และแคดเมียม ทางจุลชีววิทยา ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี.โคไล</p> |



เดือน มีนาคม 2560 โรส ดนัยพร สงธิ์ตัน จิระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)                         | <p>มีอัตราการสูบน้ำ 90 แกลลอน/นาที่ จำนวน 1 ชุด และ 200 แกลลอน/นาที่ จำนวน 2 ชุด สูบน้ำเพื่อแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร รวมปริมาตรกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของโครงการทั้งสิ้น 872 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้</b></p> <p>รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถังเติมคลอรีน (Chlorine Feed) เพื่อกรองสนิมและเหล็กให้ตกตะกอนในเบื้องต้น</li> <li>2. ถังเติมโพลิเมอร์ (Polymer Feed) เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้าง (Coagulation) และรวมตัวของเม็ดตะกอนขนาดเล็ก (Flocculation)</li> <li>3. ถังกรองทราย (Multimedia Sand Filter) เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ตะกอน และสารแขวนลอยต่างๆ</li> <li>4. ถังกรองคาร์บอน (Carbon Filter) เพื่อกรองสารละลายที่มีสี กลิ่น และสารเคมีต่างๆ</li> <li>5. ถังกำจัดความกระด้าง (Softener Filter) เพื่อช่วยทำให้น้ำที่นำมาผ่านการกรองนั้นได้น้ำที่ใสสะอาด ลดความกระด้างของน้ำ ไม่มีสี คลอรีน และยังช่วยกำจัด ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียมอีกด้วย</li> </ol> <p>ดังนั้น น้ำซื้อจากบรรทุกน้ำเอกชน ที่ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภาพเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในระบบสาธารณูปโภคต่อไป</p> |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ดูแลและทำความสะอาดถังกรองทรายและถังกรองถ่าน และการล้างย้อน (Back wash) หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)                         | <p><b>4) การสำรองน้ำใช้</b></p> <p>โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบใต้ดินปริมาตร 255 ลูกบาศก์เมตร ถึง ถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตร 765 ลูกบาศก์เมตร โดยมีส่วนที่นำมาใช้เป็นน้ำ ใช้อุปโภคบริโภคปริมาตร 637 ลูกบาศก์เมตร และส่วนที่เป็นน้ำสำรอง ดับเพลิงปริมาตร 128 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บน้ำใช้อุปโภค บริโภคของโครงการ เท่ากับ 892 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถ สำรองน้ำไว้ได้มากกว่า 3 วัน</p> <p>ถังเก็บน้ำดิบใต้ดินของโครงการเป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมี โครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงสร้าง อาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว บางส่วนจะอยู่ภายในถัง เก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทำให้เกิด การผุกร่อน ดังนั้น โครงการจะจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วย ไอโตร ซิล เพื่อป้องกันการร่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการ ป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน โครงการจะเลือกใช้ ไอโตร ซิล วัสดุกันซึมชนิด โพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือใช้น้ำ เป็นตัวทำละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ำยารองพื้น (Primer) ไม่มี อันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ใน สภาพผิวเปียกชื้น</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านไชย ภุชงค์ จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ด่านไชย) (นางสาวสุภารัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)                         | <p>อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระหว่างการก่อสร้างฐานรากของถังเก็บน้ำ อีกทั้งช่วงเปิดดำเนินการโครงการไม่ให้น้ำในถังเก็บน้ำสำรองปนเปื้อนและรั่วซึม นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการ สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดินจะมีช่องเปิด 2 ฝาทองขนาด 1.20x1.20 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือนได้</p> <p>ทั้งนี้คาดการณ์ว่าการใช้น้ำในช่วงดำเนินการของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานน้ำของชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 นาย โสธร ต่านศิริกุล (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม            | <p>ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) การระบายน้ำเสีย</p> <p>น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD<sub>๕</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดค่า BOD<sub>๕</sub> ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปล่องลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้ใช้บริการสัมผัสน้ำทิ้ง โครงการจึงได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นชนิดท่อน้ำซึมดิน โดยอัตราการซึมของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 324.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราซึมของดิน (ดินร่วนปนทราย) 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด (Zero Discharge)</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 64.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของน้ำแล้ง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 134.86 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะระบายออกจากถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จากนั้นระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป</p> | <p>(1) จัดให้มีท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้าง x ความลึก : 0.40x0.70 เมตร ผ่านบ่อพักเป็นระยะๆ ก่อนลงสู่บ่อท่อน้ำ จำนวน 4 บ่อ ปริมาตร 67 ลูกบาศก์เมตร, 48 ลูกบาศก์เมตร, 74.9 ลูกบาศก์เมตร และ 52.5 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำฝนที่ออกจากบ่อท่อน้ำ จะระบายออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการและท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>(2) ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>(3) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม<br>(ต่อ)   | <p>2) การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม</p> <p>สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้า และพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคาร ภายในโครงการจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร และวางระบายน้ำขนาดความกว้างxความลึก : 0.40x0.70 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ถึง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity)</p> <p>สำหรับพื้นที่การรับน้ำฝนของโครงการแยกเป็น 4 โซน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p><u>โซนที่ 1</u> มีพื้นที่ 3,127.20 ตารางเมตร ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.030 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.067 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 66.60 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหน่วงน้ำ มีปริมาตร 67ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำฝนของพื้นที่โซนที่ 1 ทั้งหมด จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ จะถูกจำกัดการระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร จำนวน 1 ท่อ มีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.030 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)</p> | (4) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องแก้ไขทันที |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล ศิริรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศิริรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม<br>(ต่อ)   | <p>ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 0.025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แรงดัน 5 เมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับสูบน้ำกรณีน้ำค้างกันบ่อหนองน้ำเพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>โซนที่ 2 มีพื้นที่ 1,780 ตารางเมตร ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.019 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.040 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 37.80 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหนองน้ำ มีปริมาตร 48 ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำฝนของพื้นที่โซนที่ 2 ทั้งหมด จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ จะถูกจำกัดการระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร จำนวน 1 ท่อ มีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.014 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.019 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 0.014 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แรงดัน 5 เมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับสูบน้ำกรณีน้ำค้างกันบ่อหนองน้ำเพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>โซนที่ 3 มีพื้นที่ 3,560 ตารางเมตร ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.037 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.075 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 68.40 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหนองน้ำ มีปริมาตร 74.90 ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำฝนของพื้นที่โซนที่ 3 ทั้งหมด จะระบายออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล พลิกิตน์ วิมลพชรกุล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภาวรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธاراภูมิ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม<br>(ต่อ)   | <p>จะถูกจำกัดการระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 เมตร จำนวน 1 ท่อ มีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.031 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.037 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 0.031 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แรงดัน 5 เมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับสูบน้ำกรณีน้ำค้างกันบ่อหนองน้ำเพื่อระบายออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ</p> <p>โซนที่ 4 มีพื้นที่ 2,742 ตารางเมตร ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.030 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.055 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการต้องกักเก็บไว้ 45 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหนองน้ำ มีปริมาตร 52.50 ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำฝนของพื้นที่โซนที่ 4 ทั้งหมด จะระบายออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ จะถูกจำกัดการระบายน้ำด้วยท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร จำนวน 1 ท่อ มีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.021 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.030 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำขนาด 0.021 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แรงดัน 5 เมตร จำนวน 2 ชุด สำหรับสูบน้ำกรณีน้ำค้างกันบ่อหนองน้ำเพื่อระบายออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ</p> <p>สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหนองน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

ไชย ด่านศิริกุล สุภาวดี จิระพงษ์ตระกูล

(นายไชย ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภาวดี จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธาราภูมิ จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การจัดการน้ำเสีย                        | <p><b>1) ปริมาณน้ำเสีย</b><br/>เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 222.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)</p> <p><b>2) ระบบบำบัดน้ำเสีย</b><br/>โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process) จำนวน 4 ชุด (WWT-1 WWT-2, WWT-4 และ WWT-5) ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน (Aeration Activated Sludge :Membrane Bioreactor) จำนวน 1 ชุด (WWT-3) และถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด (GT-1 และ GT-2) เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆ ในโครงการ โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย ดังนี้</p> <p><b>อาคาร B1 และอาคาร B2 :</b> จัดให้มีบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 2 จุด ก่อนสูบน้ำด้วยปั๊มจำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-1 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 44.07 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร และถังดักไขมัน (GT-1) จำนวน 2 ชุด ปริมาตร 12.00 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับน้ำเสียได้ 12.00 ลูกบาศก์เมตร</p> | <p>(1) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน จำนวน 1 ชุด ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก</p> <p>(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของแต่ละอาคาร ปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยจะนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดน้ำแบบท่อซึมดิน</p> | <p>- ตรวจสอบและจัดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลเมืองป่าตอง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> |



เดือน มีนาคม 2560 ไรร ดาษดิ พงษ์พันธ์ วังทอง  
(นายไสร ดาษศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                  | <p><b>อาคาร B3 และอาคาร B4 :</b> จัดให้มีบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 1 จุด ก่อนสูบน้ำด้วยปั๊มจำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-2 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 36.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถึงบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ <math>BOD_{เข้า}</math> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า <math>BOD_{ออก}</math> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p><b>อาคาร B5 และอาคาร B10 :</b> จัดให้มีบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 1 จุด ก่อนสูบน้ำด้วยปั๊มจำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-5 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 46.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถึงบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ <math>BOD_{เข้า}</math> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า <math>BOD_{ออก}</math> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> | <p>(3) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา</p> <p>(4) จัดให้มีพนักงานดูแลบ่อดักไขมันรวม โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ โดยกากไขมันที่ต้องกำจัดจะนำไปตากแห้งก่อน รวบรวมให้เทศบาลเมืองป่าตองนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>(5) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</p> | - ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ |



เดือน มีนาคม 2560

ไกรสร ช่างสี นางสาวสุภาวดี จิระพงษ์ตระกูล  
(นายไกรสร ช่างสี) (นางสาวสุภาวดี จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                  | <p><b>อาคาร B6 และอาคาร B7 :</b> จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด ก่อนสูบด้วยปั๊มจำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-3 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 40.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD<sub>เข้า</sub> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p><b>อาคาร B8 และอาคาร B9 :</b> จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด ก่อนสูบด้วยปั๊มจำนวน 2 ชุด/บ่อ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-4 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 48.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BOD<sub>เข้า</sub> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักพร้อมกันทุกชั้นในอาคารหลายหลังรวมทั้งสิ้น 300 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ค่า BOD<sub>ออก</sub> ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD<sub>ออก</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดค่า BOD<sub>ออก</sub> ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว</p> | <p>(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำเมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวทางโครงการจะประสานงานให้เทศบาลเมืองป่าตองมาสูบไปกำจัดต่อไป</p> <p>(8) โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 433 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้</p> |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 ไผ่ ชื่นใจ พงษ์ศิริ วิวัฒกิจมงคล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 ฟอส  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                  | <p>ทั้งนี้โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้ใช้บริการสัมผัสน้ำทิ้ง โครงการจึงได้ออกแบบท่อดำน้ำตันไม้เป็นชนิดท่อน้ำซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ำของดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 324.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราซึมน้ำของดิน (ดินร่วนปนทราย) 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด (Zero Discharge)</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ ได้ 64.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 134.86 ลูกบาศก์ เมตร โครงการจะระบายออกจากถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จากนั้นระบาย ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป</p> <p><b>3) การกำจัดตะกอนส่วนเกินและกากไขมัน</b></p> <p>ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ และถังบำบัดน้ำเสียแบบเติม อากาศเลี้ยงตะกอนแบบใช้เมมเบรน ได้ออกแบบให้มีส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน ซึ่งสามารถเก็บ ตะกอนส่วนเกินได้นานประมาณ 30 วัน ดังนั้น เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าว โครงการจะขอรับ บริการรถสูบน้ำของเทศบาลเมืองป่าตองมาสูบน้ำไปกำจัดต่อไป</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                  | <p>สำหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดักกากไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเป็นประจำ โดยจัดให้มีถังดักไขมัน จำนวน 2 ถัง ติดตั้งอยู่บริเวณอาคาร B1 มีความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร และบริเวณอาคาร B2 มีความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการจะจัดให้มีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยดักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึก รายงานผลทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษรองที่กันกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ถุงดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ห้องพัสดุขยะรวมของโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของบ่อดักไขมันมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>4) วิธีการกำจัดละอองน้ำและก๊าซมีเทน</b></p> <p>วิธีการกำจัดละอองน้ำและก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียของโครงการ และวิธีการควบคุมการกำจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>การกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดจากการเติมอากาศในถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1, WWT-2, WWT-3, WWT-4 และ WWT-5 มีปริมาณละอองน้ำที่เกิดขึ้นประมาณ 0.026 ลูกบาศก์เมตร/วินาที, 0.011 ลูกบาศก์เมตร/วินาที, 0.062 ลูกบาศก์เมตร/วินาที, 0.011 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ 0.011 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ตามลำดับ ซึ่งโครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยการบำบัดด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon จะติดที่ปลายท่อเป็นลักษณะกระบอกบรรจุถ่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (พื้นที่หน้าตัด 0.031 ตร.ม.) ยาว 0.50 เมตร เพื่อการกรองอากาศและดูดซับละอองน้ำ โดยการเปลี่ยนถ่านใหม่ทุก ๆ 2 เดือน</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                  | <p>การกำจัดก๊าซมีเทน (<math>CH_4</math>) โครงการได้เลือกการกำจัดก๊าซมีเทนโดยใช้วิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน(Mature Compost) โดยโครงการเลือกใช้ปุ๋ยที่สามารถกำจัดมีเทนได้ที่มีปริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตรตารางเมตร/วัน</p> <p>สำหรับปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นของระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-1 มีปริมาณก๊าซมีเทนเท่ากับ 5.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต้องการพื้นที่สีเขียวในการกำจัดก๊าซมีเทน 2.13 ตารางเมตร โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดเท่ากับ 2.25 ตารางเมตร ระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-2 มีปริมาณก๊าซมีเทนเท่ากับ 1.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต้องการพื้นที่สีเขียวในการกำจัดก๊าซมีเทน 0.70 ตารางเมตร โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดเท่ากับ 0.70 ตารางเมตร และระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-3, WWT-4 และ WWT-5 มีปริมาณก๊าซมีเทนเท่ากับ 2.13 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วัน ต้องการพื้นที่สีเขียวในการกำจัดก๊าซมีเทน 0.89 ตารางเมตร โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดเท่ากับ 1 ตารางเมตร/ชุด</p> <p>โครงการนำก๊าซมีเทนไปกำจัดด้วยวิธีการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินกลุ่มเมทาโนโทรฟ (Methanotroph) สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ที่มีปริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตร/ตารางเมตร/วัน</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                  | <p><b>5) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์</b></p> <p>น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 199.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD<sub>๑๐๐</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดค่า BOD<sub>๑๐๐</sub> ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปล่องลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ปริมาตร 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้ใช้บริการสัมผัสน้ำทิ้ง โครงการจึงได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นชนิดท่อน้ำซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ประมาณ 324.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราซึมน้ำของดิน (ดินร่วนปนทราย) 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการได้ทั้งหมด (Zero Discharge)</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 64.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 134.86 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะระบายออกจากถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จากนั้นระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป ดังนั้นผลกระทบด้านน้ำเสียจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การจัดการขยะมูลฝอย                      | <p><b>1) ปริมาณขยะมูลฝอย</b><br/>การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการ โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550)</p> <p>ปริมาณขยะที่คาดว่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุด (มีผู้พักอาศัยเต็มโครงการ) เท่ากับ 1,950 ลิตร/วัน หรือ 1.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 650 กิโลกรัม/วัน</p> <p><b>2) การจัดการขยะมูลฝอย</b><br/>โครงการจะจัดตั้งรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ส่วนในห้องสำนักงานจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น โถงต้อนรับ ร้านอาหารและห้องประชุม เป็นต้น จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล</p> <p>การจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณห้องพักขยะรีไซเคิล โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ ซึ่งขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว</p> | <p>(1) ออกแบบให้อาคารห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มีมิติชิด สามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด</p> <p>(2) จัดตั้งรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลาง</p> <p>(3) จัดให้มีห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 4 ห้อง เพื่อรองรับขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 12 วัน เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป</p> <p>(4) กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวมของโครงการ</p> | <p>- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)                | <p>กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า</p> <p>สำหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพักขยะอันตราย โครงการจัดให้มีถังขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุไว้ว่า "ขยะอันตราย" ภายในถังรองด้วยถุงดำ โดยในขณะปฏิบัติงาน กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป และโครงการจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557 ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง "โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต" เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน</p> <p>ส่วนขยะอินทรีย์ ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้นแม่บ้านจะรวบรวมขยะอินทรีย์ จากถังขยะอินทรีย์บริเวณห้องครัวและร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น มายังห้องพักขยะอินทรีย์ โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำพร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยต่อไป</p> | <p>(5) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ</p> <p>(6) การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและนำมาแยกภายหลัง</p> <p>(7) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย</p> <p>(8) ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด</p> |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 16/11/2560 นพรัตน์ จันทวงษ์กุล  
 (นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 16/11/2560 นพรัตน์ จันทวงษ์กุล  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)                | <p>3) อาคารห้องพักขยะรวมของโครงการ</p> <p>ห้องพักขยะมูลฝอยรวมอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน ของอาคาร B2 โดยโครงการได้ออกแบบให้อาคารห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่ที่มีดซิดสามารถป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 4 ห้อง เพื่อรองรับขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล</p> <p><u>ห้องพักขยะอินทรีย์</u> มีขนาดพื้นที่ 11.88 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 11.88 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)</p> <p><u>ห้องพักขยะแห้ง</u> มีขนาดพื้นที่ 3.80 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 3.80 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)</p> <p><u>ห้องพักขยะอันตราย</u> มีขนาดพื้นที่ 4.5 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 4.50 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)</p> <p><u>ห้องพักขยะรีไซเคิล</u> มีขนาดพื้นที่ 5.0 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 5.0 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.0 เมตร)</p> <p>ดังนั้น ห้องพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 25.18 ลูกบาศก์เมตร</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

นายโสธร ด้านศิริกุล (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์  
ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)                 | <p><b>4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ำ<br/>ขยะ</b></p> <p>โครงการสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 12 วัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ<br/>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ที่กำหนดให้<br/>กรณีที่มีสถานที่พักมูลฝอยต้องสามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองป่าตองให้<br/>เข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม<br/>พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม สำหรับน้ำ<br/>ขยะที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารห้องพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ<br/>เสียต่อไป นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะ<br/>รวมไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และล้างทำความสะอาด<br/>ห้องพักขยะรวมเป็นประจำ โดยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดก็จะถูก<br/>รวบรวมสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเช่นกัน</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 นายโสธร ด่านศิริกุล (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.6 การจัดการขยะมูลฝอย<br>(ต่อ)             | 5) ประเมินศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตอง<br>พื้นที่โครงการอยู่ในเขตการให้บริการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตอง ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลป่าตอง ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 124.71 ตัน/วัน มีรถเก็บขนมูลฝอยรวม 21 คัน แยกตามขนาดความจุของขยะ แบ่งเป็น รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 3.05 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 19 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกขยะ (รถดั้มเปอร์) ขนาดความจุ 0.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน (เทศบาลเมืองป่าตอง, 2559) สำหรับรถเก็บขนมูลฝอยที่ผ่านหน้าโครงการเป็นรถขนขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน เก็บขนขยะวันละ 2 ครั้ง คือ เวลา 22.00-01.00 น. และเวลา 02.00-6.00 น. ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.7 ไฟฟ้า                                   | <p>โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้</p> <p>1) ระบบไฟฟ้าปกติ</p> <p>โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 1,500 KVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้าจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคาร B2 โดยตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ตั้งอยู่ห่างจากผนังที่ใกล้ที่สุดของอาคาร B2 ประมาณ 3.01 เมตร และ 3.04 เมตร ตามลำดับ และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละลูก ประมาณ 2.99 เมตร</p> <p>การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (วัดจากสายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด สำหรับผนังด้านเปิดของอาคาร) ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เป็นต้น และโครงการได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าด้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV</p> | <p>(1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Oil Immerse Type Transformers) ขนาด 1,500 KVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร</p> <p>(2) จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้าของอาคาร B2 ชั้นที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ</p> <p>(3) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร</p> | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภาวรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)                             | <p>ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งบริเวณดังกล่าว ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p><b>2) ระบบไฟฟ้าสำรอง</b></p> <p>ในกรณีที่มีการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าป่าตอง ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1,000 kVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้าของอาคาร B2 ชั้นที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่างเพียงพอ</p> | <p>(4) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556</p> <p>(5) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>(6) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>(7) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.</p> <p>(8) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง</p> <p>(9) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ</p> <p>(10) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)                             | <p><b>3) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า</b><br/>โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลา ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนห้องไฟฟ้าจะปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องไฟฟ้าของโครงการ และมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ</p> <p><b>4) การประมาณการณค่าไฟฟ้า</b><br/>โครงการได้ประเมินค่าไฟฟ้าที่เกิดจากลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปริมาณค่าไฟฟ้าที่ใช้รวมทั้งสิ้นประมาณ 195,470.32 กิโลวัตต์/ปี คิดเป็นเงิน 512,132.24 บาท/ปี</p> <p><b>5) การอนุรักษ์พลังงาน</b><br/>เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการและผู้ใช้บริการภายในโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ</p> | <p>(11) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ</p> <p>(12) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>(13) จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และ โคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</p> <p>(14) เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความร้อน</p> | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 ศิริ ด่านศิริกุล ผู้จัดการ  
(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)                             | <p>(2) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องพักมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องพักได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป</p> <p>6) การประเมินอาคารโครงการเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552</p> <p>สำหรับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552</p> <p>ข้อ 2 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้</p> <p>(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม</p> <p>โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 10 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการจึงไม่เข้าข่ายตามกฎหมายฉบับดังกล่าว</p> |                                              | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 นายโสธร ด้านศิริกุล (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธاراบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย                      | <p>ในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้องกันอัคคีภัย ไว้โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ความเหมาะสมของตำแหน่งและความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และความสามารถในการให้บริการระงับอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p><b>1) ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ</b></p> <p>โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 10 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> | <p>(1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น</p> <p>(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>(4) จัดให้มีจุดรวมพลรวม 5 จุด พื้นที่ 88.88 ตารางเมตร, 48.63 ตารางเมตร, 48.63 ตารางเมตร, 48.63 ตารางเมตร และ 36.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 270.77 ตารางเมตร</p> | <p>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>- ทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่าเครื่องขัดข้องทำการซ่อมบำรุงทันที</p> |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของทุกอาคาร ติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณบันไดหนีไฟ</li> <li>• ถังดับเพลิงมือถือชนิด ABC (Fire Extinguisher) โครงการเลือกใช้ถังดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งทุกชั้นของทุกอาคาร (ยกเว้นชั้นใต้ดิน) ติดตั้งชั้นละ 1 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน<br/>การติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือ โครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงมือถือ สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>• หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 2 หัว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 x 2.50 x 2.50 นิ้ว เพื่อส่งต่อไปยังระบบดับเพลิง</li> </ul> | <p>(5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</p> <p>(6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด</p> <p>(7) จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</p> <p>(8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่</p> <p>(9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย</p> |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบท่อน้ำดับเพลิงและการสำรองน้ำดับเพลิง ประกอบด้วยท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ/อาคาร เป็นระบบท่อเปิกโดย รับน้ำจากถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตรเก็บกัก 128 ลูกบาศก์เมตร นำมาใช้สำรองดับเพลิงเพื่อส่งต่อไปยังแต่ละอาคาร ใช้ระบบ ดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Diesel Fire Pump) อัตราการสูบ 750 แกลลอน/นาที่ แรงดันน้ำ 125 เมตร และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขนาด 15 แกลลอน/นาที่ แรงดันน้ำ 135 เมตร ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย สามารถนำมาใช้สำรองดับเพลิงได้ 45 นาที ก่อนที่รถดับเพลิงจะเข้า มารับเหตุเพลิงไหม้</li> <li>- โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่ว บริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) เป็นส่วนควบคุม และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทั้งหมดจะ ประกอบด้วยวงจรตรวจสอบคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจร ทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะ ปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ำหรือ ไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียง แสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้า ชั้นที่ 3 ของอาคาร B2</li> </ul> </li> </ul> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล ผู้บังคับ จังหวัดภูเก็ต  
 (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (Graphic Annunciator Board : AAN) เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อจุดเกิดเหตุภายในอาคารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถบอกตำแหน่งในการเข้าไประงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์แจ้งสัญญาณจะนิยมแสดงแผนผังของอาคารนั้นๆ และแสดงโซนหรือจุดของอุปกรณ์ตรวจจับตามตำแหน่งที่ออกแบบไว้ โดยโครงการจะติดตั้งอยู่บริเวณห้องไฟฟ้า ชั้นที่ 3 ของอาคาร B2</li> <li>• อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมีกอด (Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดัง (Break Glass) ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการมีกอด (Push) และ มือดึงคันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝาค้นตำแหน่งตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ โถงต้อนรับ ร้านอาหารภายใน โถงทางเดิน โถงบันได โถงลิฟท์ เป็นต้น</li> <li>• โทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉิน (Fire Phone Jack: FP) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือคนในอาคารในเวลาเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง โดยโครงการจะติดตั้งโทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉินไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ โถงต้อนรับ ร้านอาหารภายใน โถงทางเดิน โถงบันได โถงลิฟท์ เป็นต้น</li> </ul> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะ<br/>สำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น<br/>Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อ<br/>มีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก<br/>Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสง<br/>ดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor<br/>ทำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์<br/>ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของทุกอาคาร ซึ่งครอบคลุม<br/>ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการ<br/>ตรวจจับจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความร้อนภายนอกในช่วงระยะเวลาที่<br/>กำหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดที่กำหนด แล้วจึงส่งสัญญาณไปยัง<br/>ตู้ควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณห้องครัวของอาคาร B1 ร้านอาหาร<br/>ภายในของอาคาร B1 ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำในห้องพัก เป็นต้น</li> </ul> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 ปิยะ ดอนใจ กมลสินี หวังพอ ไชยกุล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ Halogen ขนาด 2x55 W. พร้อมอุปกรณ์ตัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ บ้านใต้หลัก บ้านใต้หนีไฟ ห้องครัว ห้องไฟฟ้า ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้องผู้บริหาร ห้องฝ่ายขายและการตลาด ห้องจัดเลี้ยง และที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคาร B3 เป็นต้น</li> <li>4. แผนผังแบบแปลน และตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ</li> <li>• โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด</li> <li>• โครงการมีการจัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคารบริเวณชั้นล่างของอาคารจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของแต่ละอาคารไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก</li> </ul> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ตานศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <p>5. ระบบไฟส่องสว่างสำรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)</b> พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้า ในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ Halogen ขนาด 2x55 W. พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ บ้านใต้หลัก บ้านไดโนไฟ ห้องครัว ห้องไฟฟ้า ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้องผู้บริหาร ห้องฝ่ายขายและการตลาด ห้องจัดเลี้ยง และที่จอดรถ ชั้นใต้ดินของอาคาร B3 เป็นต้น</li> </ul> <p>6. สายล่อฟ้า</p> <p>โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชั้นหลังคา และติดตั้งสายดินที่ชั้น 1 ของทุกอาคารทั่วทั้งโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตัวนำล่อฟ้า (Air terminal) ) รัศมีครอบคลุมตัวอาคาร ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูงที่สุดของโครงการเพื่อให้รัศมีการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด</li> <li>2. สายดิน (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8" x 10 ฟังลิกลงไปในดิน และมีค่าความต้านทานของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม</li> <li>3. สายตัวนำลงดิน (Down conductor) ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ</li> </ol> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 6/11/2560 คุณธงชัย จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <p><b>2) ความเหมาะสมของตำแหน่ง ความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล</b></p> <p>โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปาดอง มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ จากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง บริเวณทางเดินใน แต่ละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในอาคารที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลง บันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไว้</p> <p>โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล 3 จุด ได้แก่</p> <p><u>จุดรวมพลที่ 1</u> อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร B3 มีพื้นที่ 88.88 ตารางเมตร</p> <p><u>จุดรวมพลที่ 2</u> อยู่ระหว่างอาคาร B1 และอาคาร B2 มีพื้นที่ 48.63 ตารางเมตร</p> <p><u>จุดรวมพลที่ 3</u> อยู่ระหว่างอาคาร B7 และอาคาร B8 มีพื้นที่ 48.63 ตารางเมตร</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <p>รวมพื้นที่จตุรรวมพลรวมทั้งสิ้น 186.14 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จตุรรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.29 ตารางเมตร/คน หรือ 3.49 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 650 คน (รวมพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยเส้นทางหนีภัย และพื้นที่จตุรรวมพลเป็นพื้นที่ที่จัดให้เป็นทางเดินและสนามหญ้า ผู้พักอาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สำหรับการอพยพคนจากจตุรรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้พักอาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสู่พื้นที่โครงการนั้น เป็นทางเดินบริเวณด้านหน้าโครงการ ใกล้กับทางเข้า-ออกของโครงการ ซึ่งจะไม่มีการก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้นจตุรรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ</p> <p>อย่างไรก็ตาม เส้นทางหนีภัยและจตุรรวมพลที่ซ้อนทับพื้นที่สีเขียว และในตำแหน่งที่ไม่มีบันไดขึ้นก็ไม่กีดขวางเส้นทางหนีภัยและจตุรรวมพล สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 6 มีนาคม 2560 ศิริรัตน์ จีระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศิริรัตน์ จีระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 6 มีนาคม 2560  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                | <p>3) ประเมินความสามารถในการให้บริการระงับอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยเทศบาลเมืองป่าตองจะมีรถยนต์สำหรับดับเพลิง จำนวน 4 คัน แยกตามขนาดความจุน้ำ 4,000 ลิตร จำนวน 3 คัน และขนาดความจุน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สำหรับบรรทุกน้ำมีจำนวน 6 คัน แยกตามขนาดความจุน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน 5 คัน และขนาดความจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถตรวจการณ์ 2 คัน รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ 1 คัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาลาม จำนวน 3 เครื่อง เครื่องเลื่อยยนต์ 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง และพนักงานดับเพลิงจำนวน 96 คน</p> <p>นอกจากนี้เทศบาลเมืองป่าตองยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรู้ความสามารถมาทำการอบรมอัคคีภัยและการฝึกซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองป่าตองอย่างนี้ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี</p> <p>สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 2.30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>อย่างไรก็ตาม กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ยังมีหน่วยงานใกล้เคียงที่ให้ความช่วยเหลือในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ เทศบาลเมืองกะทู้ และเทศบาลตำบลกะรน ดังนั้นผลกระทบด้านนี้จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 ไมล์ ด่านศิริกุล ผู้จัดการ  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.9 การระบายอากาศและ<br>ความร้อน            | <p>1) ระบบปรับอากาศ</p> <p>โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 591 ตัน</p> <p>2) การระบายอากาศ</p> <p>โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกลดังนี้</p> <p>การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น โดยโครงการได้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้</li> <li>▪ บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่มีอุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือการติดตั้งระบบปรับอากาศกรณีที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศที่อยู่ในระดับที่สบายยิ่งขึ้น</li> </ul> | <p>(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</p> <p>(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</p> <p>(3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>(4) จัดให้มีไม้ย่นต้นภายในโครงการให้มากที่สุดเพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ</p> | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล คุณวัชรณี พิเศษโสมกุล  
 (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภรณ์ จีระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.9 การระบายอากาศและ<br>ความร้อน (ต่อ)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีพัดลมระบายอากาศ หรืออุปกรณ์<br/>ขับเคลื่อนอากาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบาย<br/>อากาศ</li> <li>ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่าง ๆ ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง<br/>ห้องครัว ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร ห้องฝ่ายขายและการตลาด สำนักงาน<br/>ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล โถงต้อนรับ ร้านอาหารภายใน ห้องจัดเลี้ยง ห้อง<br/>ออกกำลังกาย ห้องฝ่ายบัญชี ห้องพยาบาล ห้องไอที ห้องฝ่ายวิศวกรรม ห้อง<br/>เก็บแบบก่อสร้างและสิ่งการอค์คิภัย ห้องน้ำรวม เป็นต้น</li> <li>ติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณห้องต่าง ๆ เพื่อระบายอากาศออก<br/>ภายนอกโดยตรง ได้แก่ ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องแม่บ้าน ห้องเตรียม<br/>อาหาร ห้องเก็บอุปกรณ์ เป็นต้น</li> <li>การระบายอากาศในกรณีที่มิระบบการปรับภาวะอากาศ ได้มีการนำอากาศ<br/>ภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับ<br/>ภาวะอากาศออกไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้</li> </ul> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวสุภาวดี จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธราภุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.9 การระบายอากาศและ<br>ความร้อน (ต่อ)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ห้องนอนแต่ละห้องพัก ห้องผู้บริหาร ห้องฝ่ายขายและการตลาด สำนักงาน ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้องฝ่ายบัญชี ห้องพยาบาล ห้องไอที ห้องฝ่ายวิศวกรรม ห้องเก็บแบบก่อสร้างและสิ่งการอศศิกัย และ โต๊ะต้อนรับ มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง/ตารางเมตร</li> <li>▪ ห้องออกกำลังกาย มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร</li> <li>▪ ห้องประชุม มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง/ตารางเมตร</li> <li>▪ ร้านอาหารภายใน ห้องจัดเลี้ยง และห้องน้ำรวม มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร</li> <li>▪ ห้องครัว มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง/ตารางเมตร</li> </ul> <p>ดังนั้น จึงส่งผลกระทบในระดับต่ำด้านการระบายอากาศ</p> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธราภุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.9 การระบายอากาศและ<br>ความร้อน (ต่อ)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ชั้นที่ 2</b> บริเวณห้องพัก โดยมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2.14-4.19 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร และห้องสำนักงาน โดยมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2.06-2.63 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร</li> <li>▪ <b>ชั้นที่ 3-5</b> บริเวณห้องพัก โดยมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2.14-5.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร</li> </ul> <p>ดังนั้น จึงส่งผลกระทบในระดับต่ำด้านการระบายอากาศ</p> |                                          |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

*โสธร ด่านศิริกุล*  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

*จุฬารัตน์ บุญแก้ว*  
(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ              | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>4. คุณภาพชีวิต</b><br><b>4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ</b> | <p>เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น เนื่องจากจะมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามาทำงานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานส่งผลกระทบด้านบวกต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ้างงานพนักงานไม่มาก โดยโครงการได้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน</p> <p>จากลักษณะของโครงการและข้อมูลจากการสำรวจด้านสังคมบริเวณโครงการและภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ได้นำเสนอในหัวข้อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในช่วงการดำเนินโครงการนั้น สามารถประเมินผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินโครงการต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลกระทบ ระดับความรุนแรง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้</p> | <p>(1) จะพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(3) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด</li> <li>- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ห้ามเหล้าหรือทั้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียบห้องพัก และห้ามทิ้งน้ำปุน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ่าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบายน้ำทั้งโกลุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด</li> </ul> | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)              | <p>ทั้งนี้ ผลกระทบตามตารางดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับผลการสำรวจทัศนคติของผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ โดยส่วนใหญ่มีความห่วงกังวลในระยะดำเนินการ ในเรื่องน้ำใช้ ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่อยู่โดยรอบ</p> <p>โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (รายละเอียดแสดงในบทที่ 5) ซึ่งโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยบรรเทาหรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการติดตามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดแสดงในบทที่ 6) เพื่อที่จะทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนที่มีอยู่เดิม</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามกระทำการติดตั้งพัมป์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก</li> <li>- ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</li> <li>- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น</li> </ul> | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ดำศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)              | <p>โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ในช่วงเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยประมาณ 600 คน นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจำ จำนวน 50 คน โดยพนักงานทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้ คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญมากนัก เนื่องจากในการบริหารจัดการโรงแรมจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จะต้องไม่นำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด</li> <li>- กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร ห้ามเผาหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพักและห้ามทิ้งน้ำปุน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย และน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งลงในท่อระบายน้ำทิ้งโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ท่อตัน</li> </ul> |                                              |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 โสม ดาเนี่ยล ภูธรินทร์ จิระพงษ์ตระกูล เดือน มีนาคม 2560  
(นายโสม ดาเนี่ยล ภูธรินทร์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

[Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามกระทำการติดตั้งพิมพ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่าง ผังระเบียบหรือส่วนใดภายนอกห้องพัก ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดจากภายนอกอาคาร ยกเว้น ป้ายบอกเลขที่ห้องพัก ชื่ออาคาร และป้ายสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการโครงการได้ดำเนินการไว้แล้ว</li> <li>- ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</li> <li>- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออกภายในโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการโครงการขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่องานต่างๆ นำรถเข้ามาจอดค้างคืน และจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญเสียต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกของสถานที่นำมาจอดทั้งสิ้น</li> <li>- ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักนำสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพัก และไว้ในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น</li> </ul> <p>ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการได้จัดให้มีมาตรการควบคุม และให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากข้อขัดแย้งและเสียงดัง ซึ่งจะรบกวนทั้งผู้ใช้บริการภายในโครงการเองและผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ</p> |                                          |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ตานศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธاراบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย               | เนื่องจากโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้อย่างเพียงพอ (รายละเอียดในหัวข้อ 4.3.3.8) และได้จัดให้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยคือ จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทำการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง จัดให้มีพื้นที่จัดรวมพลอยู่บริเวณที่เหมาะสมแก่การอพยพผู้จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 5 จุด มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 270.77 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จัดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.42 ตารางเมตร/คน หรือ 2.40 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 650 คน (รวมจำนวนพนักงาน) โครงการจัดให้มีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ | (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที<br>(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง<br>(3) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) รวมจำนวน 31 จุด ติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ<br>(4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย<br>(5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที | - ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature] (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>(ต่อ)      | <p>ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และจัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 2.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>สำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง มีสถานที่ให้บริการสาธารณสุข คือ โรงพยาบาล ป่าตอง จำนวน 1 แห่ง อยู่ห่างโครงการประมาณ 364 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>ส่วนความปลอดภัยด้านการจราจรในระยะดำเนินการ จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ ติดตั้งป้ายกั้นจัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุของผู้ที่อาศัยในโครงการ จอดกีดขวางเส้นทางการจราจร ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทาง ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> | <p>(6) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาล เบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง</p> <p>(7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี</p> <p>(8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย</p> <p>(9) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ทุกวัน หลังจากรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย</p> |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>(ต่อ)      | <p>1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ผลัดๆ โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ โครงการ บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ</p> <p>2) โครงการจะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการได้ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 31 จุด กระจายโดยรอบพื้นที่โครงการ บริเวณทางเข้า-ออก ที่จอดรถ บริเวณถนนภายในโครงการ และถนนภายนอกโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำ</p> |                                          |                                            |



เดือน มีนาคม 2560 ศิริ ดาเนติก นางรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภรณ์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ภูเก็ต  
ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ       | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ และ<br>การจัดการร้านอาหาร | <p>1) การจัดการสระว่ายน้ำ</p> <p>โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำภายในห้องพักชั้นที่ 1 อยู่บริเวณ<br/>ระเบียงอาคารห้องพัก B7 ถึงอาคาร B9 (ความลึกสูงสุดประมาณ<br/>1.00 เมตร) และสระว่ายน้ำส่วนกลางอยู่บริเวณอาคาร B3 และ<br/>อาคาร B6 ถึงอาคาร B10 รวมทั้งสิ้น 6 สระ (ความลึกสูงสุด<br/>ประมาณ 1.00 เมตร) โดยสระว่ายน้ำภายในโครงการจะ<br/>ให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยโครงการจะ<br/>ออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำของ<br/>โครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการ<br/>ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง<br/>เดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่<br/>1/2550 ซึ่งจะทำให้สระว่ายน้ำในโครงการได้มาตรฐานของ<br/>กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) สถานที่ตั้ง</p> <p>ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำของโครงการ ได้ออกแบบให้อยู่<br/>ห่างจากห้องพักขั้วรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระ<br/>ว่ายน้ำ อีกทั้งสระว่ายน้ำของโครงการจะยกระดับขึ้นสูงจากพื้น<br/>ถนนของโครงการ เพื่อป้องกันสัตว์ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้า<br/>มาในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไข สระว่ายน้ำ</p> <p>(1) ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำออกแบบให้อยู่ห่างจาก<br/>ห้องพักขั้วรวม</p> <p>(2) สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจาก<br/>พื้นถนนของโครงการ</p> <p>(3) โครงสร้างของสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริม<br/>เหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ชีมน้ำไม่ได้<br/>ผ่นเรียบ อยู่ในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย</p> <p>(4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่<br/>เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพ<br/>ดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</p> <p>(5) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระน้ำ ไม่<br/>ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย</p> <p>(6) จัดให้มีป้ายบอกความลึกและระดับบอความ<br/>ลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>(7) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระ<br/>ว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่าง คลอรีนอิสระ<br/>คงเหลือ คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น บริเวณ<br/>สระ ว่ายน้ำ ของ โครงการ<br/>วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ<br/>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด<br/>และค่าฟิคอลโคลิฟอร์ม บริเวณสระว่ายน้ำ<br/>ของโครงการ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา<br/>ดำเนินการ</li> <li>- ตรวจวัดค่า ค่าความเป็นด่าง ความ<br/>กระด้าง กรดไฮยาไนริก คลอไรด์<br/>แอมโมเนีย ในเตรท และจุลินทรีย์หรือตัว<br/>บ่งชี้ทำให้เกิดโรค (Escherichia coli,<br/>Staphylococcus aureus, Pseudomonas<br/>aeruginosa) บริเวณสระว่ายน้ำของ<br/>โครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา<br/>ดำเนินการ</li> <li>- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ดำศิริกุล ผู้จัดทำ  
(นายโสธร ดำศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด






ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 การจัดการส้วมและ<br>จัดการร้านอาหาร (ต่อ) | (2) การออกแบบและโครงสร้าง<br>การออกแบบส้วมจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยจะออกแบบโครงสร้างส้วมที่ทำได้ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย มีรางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดรอบส้วม ไม่เป็นสนิม แข็งแรงและไม่มีน้ำล้นออกจากราง โดยจะจัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณส้วม ในกรณีที่มีการเปิดใช้ส้วมในเวลากลางคืน นอกจากนี้บริเวณระเบียงทางเดินรอบส้วมจะเลือกใช้วัสดุที่ไม่ลื่น ไม่ลื่นชันน้ำ ทำความสะอาดง่าย และพื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดส้วม อีกทั้งโครงการ จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าส้วม จัดให้มีอ่างล้างมือ ล้างตัวก่อนลงส้วม และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณส้วม และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีการรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณส้วม | (8) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าส้วม<br>(9) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงส้วม และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณส้วมและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ<br><u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้ส้วม</u><br>(1) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน<br>(2) รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณส้วม<br>(3) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณส้วม ในกรณีที่มีการเปิดใช้ส้วมในเวลากลางคืน | - การตรวจนับจำนวนและตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบส้วม และพื้นผิวใต้ส้วม หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ตรวจสอบขอบสระและทางเดินรอบส้วมไม่ให้มีน้ำขัง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ<br>- ตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ใช้ส้วมให้มีสภาพดีไม่ลบเลือน<br>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณส้วม หากชำรุดให้แก้ไขทันที ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ |



เดือน มีนาคม 2560  นางสาวจุฑารัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวจุฑารัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560  (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ             | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ และการ<br>จัดการร้านอาหาร (ต่อ) | <p>(3) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ<br/>เจ้าของโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น อีกทั้งโครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่สำคัญดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>(4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี<br/>การจัดการสารเคมีและคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณสถานที่เก็บสารเคมี จะจัดให้มีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสารเคมีที่ใช้จะต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน</p> | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</p> <p>(1) ตรวจสอบความเป็นกรดต่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ และคลอรีนที่รวมกับสารอื่น วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(2) ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด และฟีคอล โคลิฟอร์ม ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>(3) ตรวจสอบค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไซยาไนด์ คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค ทุก 1 ปี ตลอดระยะดำเนินการ</p> |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

 ศ.ดร.วันจิราภรณ์ จิระพงษ์ตระกูล

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560



(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ             | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.3 การจัดการสระว่ายน้ำ และการ<br>จัดการร้านอาหาร (ต่อ) | <p>2) การจัดการร้านอาหาร</p> <p>โครงการจัดให้มีร้านอาหารบริเวณอาคาร B1 ชั้นที่ 2 และ อาคาร B2 ชั้นที่ 1-2 โดยโครงการจะดูแลและควบคุมร้านอาหารในโครงการ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2546 นอกจากนี้ ร้านอาหารในโครงการ จะสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหารเช้าอาหาร ประชุมอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม นอกจากนี้จะใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ร้านอาหาร</p> <p>(1) โครงการสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>(2) จัดตำแหน่งสถานที่รับประทานอาหารเช้าอาหาร ประชุมอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม</p> <p>(3) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p> |                                            |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ                                  | <p>การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นแนวทางในการศึกษา (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2550) ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)</p> <p><b>1) การกลั่นกรองในโครงการ (Screening)</b></p> <p>(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ</p> <p>โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารทั้งสิ้น จำนวน 10 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น จำนวน 300 ห้องพัก มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นทุกอาคาร เท่ากับ 19,323.28 ตารางเมตร โดยอาคารมีระดับความสูงที่สูงที่สุด 14.85 เมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 7-0-2.30 ไร่ หรือคิดเป็น 11,209.20 ตารางเมตร เพื่อรองรับความต้องการด้านที่พักที่เพิ่มสูงขึ้น และจากการศึกษา พบว่า กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์</p> <p>กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อการได้รับอันตราย</li> </ul> | -                                            | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด




ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                            | <p><b>2) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)</b></p> <p>ในการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสุขภาพแวดล้อม ในปัจจุบันของพื้นที่โครงการ (ข้อ 3.4.3 ในบทที่ 3) ข้อมูลสุขภาพปัจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p><b>3) การประเมินผลกระทบ (Assessment)</b></p> <p>จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ คือ โรงพยาบาลป่าตอง มีระยะห่างจากโครงการ ประมาณ 2.36 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลป่าตอง ระหว่าง ปี 2553-2557 พบว่า 5 อันดับแรก กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคเกี่ยวกับ ต่อไทรื้ออ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม โรคติดเชื้อ และปรสิต และโรคระบบไหลเวียนเลือด</p> | -                                            | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

  
 (นายโสธร ตานศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                            | <p>จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 17.54) พบว่า 5 อันดับแรก กลุ่มโรคหวัด/โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ โรคเกี่ยวกับหูด/ตา/ฟัน/กระดูก โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และโรคเกี่ยวกับเลือดลมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลป่าตอง</p> <p>ในช่วงที่เปิดดำเนินโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ สุขภาพของกลุ่มคนดังกล่าวจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้ ซึ่งสิ่งที่คุกคามสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมในสระว่ายน้ำ ตลอดจนอุบัติเหตุจากการหกหล่นหรือการจราจรบริเวณในโครงการ และสิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็นต้น สาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำรงชีวิตที่ต้องเผชิญมลภาวะต่างๆ อีกทั้งโครงการเป็นโรงแรม เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้ใช้บริการ ซึ่งการมีคนจำนวนมากมาอยู่รวมภายในอาคารเดียวกันอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญอีกด้วย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตเช่นกัน</p> <p>การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ</p> | -                                            | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย และ การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น</li> <li>- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบททีเรีย และปรสิต เป็นต้น</li> <li>- สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรำคาญ เป็นต้น</li> </ul> | -                                            | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

นายโสธร ด้านศิริกุล (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                            | <p>1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โรคภูมิแพ้</li> <li>▪ โรคหอบหืด</li> </ul> <p><u>สาเหตุการเกิดโรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การแพร่กระจายเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศ</li> <li>- มลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ จากการจราจร</li> <li>- การระบายอากาศไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการนำอากาศภายนอกเข้าไปในอาคารไม่เพียงพอ การกระจายและการผสมผสานอากาศภายในอาคารไม่พอเพียง อุณหภูมิและความชื้นสูงหรือไม่คงที่ระบบการกรองอากาศทำงานไม่มีประสิทธิภาพ</li> </ul> | <p>(1) ล้างทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>(3) ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>(5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>(6) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</p> | <p>- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ตำนศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราวารี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                            | <p>2. โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โรคระบบทางเดินอาหาร</li> <li>▪ โรคระบบลำไส้</li> <li>▪ โรคท้องเสีย</li> <li>▪ โรคผิวหนัง</li> <li>▪ โรคตับอักเสบ</li> </ul> <p><u>สาเหตุการเกิดโรค</u></p> <p>- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบชอบอยู่ตามขยะ ของเสีย</p> | <p>(1) ปิดห้องพักขยะให้สนิท</p> <p>(2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</p> <p>(3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ</p> <p>(5) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                       |
|                                             | <p>3. โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคกัด</li> <li>▪ โรคไข้มาลาเรีย เกิดจากยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะนำโรคกัด</li> <li>▪ โรคเท้าช้าง เกิดจากยุงลายเสือที่เป็นพาหะนำโรคกัด</li> <li>▪ โรคไข้สมองอักเสบ เกิดจากยุงรำคาญที่เป็นพาหะนำโรคกัด</li> </ul>                                                                       | <p>(1) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่</p> <p>(2) สำรองและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ</p> <p>(4) เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</p> <p>(5) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืด ๆ อับ ๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น</p> <p>(6) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน</p> | - ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ |



เดือน มีนาคม 2560 โสม ดาเลใจ ภูธรรัตน์ จิระพงษ์กุล  
 (นายโสม ดาเลใจ ภูธรรัตน์) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์กุล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราวารี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                         | <p>4. โรคผิวหนัง</p> <p><u>สาเหตุการเกิดโรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการสัมผัสกับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้</li> <li>- จากการแพ้สารเคมี มลพิษ และฝุ่น</li> </ul>                                                                                                                                                         | <p>(1) นำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบหยดซึมดิน</p> <p>(2) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>(3) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>(4) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</p>                                                                                                                   | -                                                                                                 |
|                                          | <p>5. โรคเครียด ซึ่งจะนำไปสู่โรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โรคนอนไม่หลับ</li> <li>▪ โรคแผลในกระเพาะอาหาร</li> <li>▪ โรคประสาท</li> </ul> <p><u>สาเหตุการเกิดโรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>- เกิดจากความร้อนของภูมิอากาศ และเครื่องปรับอากาศ</li> </ul> | <p>(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น การป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>(3) จัดให้มีไม้ย่นต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(4) จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ย่นต้นไม้ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ</p> <p>(5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,429.62 ตารางเมตร (ร้อยละ 22.34 ของพื้นที่โครงการ)</p> <p>(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</p> | - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                            | 6. อุบัติเหตุ<br>- การเกิดอัคคีภัย<br>- การจลาจล<br>- การพลัดตกจากที่สูง | (1) จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br>(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและรับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น<br>(3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง<br>(4) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ<br>(5) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด<br>(6) จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร<br>(7) จัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่<br>(8) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 ศิริ ดิษฐ์ ผู้จัดการ  
(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวสุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                            | 6. อุบัติเหตุ (ต่อ)           | (9) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ<br>(10) ติดตั้งป้ายกำจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการ<br>(11) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา<br>(12) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ<br>(13) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางการเดินทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย<br>(14) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ มีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้<br>(15) จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแรง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.5 ทัศนียภาพ                               | การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด พื้นที่ทะเล พื้นที่บริการท่องเที่ยว พื้นที่รกร้าง/ไม้พุ่ม ที่เหลือใช้ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ถนน พื้นที่โล่ง พื้นที่พาณิชย์กรรม พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่สถานศึกษา และพื้นที่หาด ตามลำดับ และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ในจังหวัดภูเก็ต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แต่อย่างใด | (1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ<br>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ดำศิริกุล นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ดำศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.5 ทัศนียภาพ                               | รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบร่วมสมัย (Contemporary) ผสมผสานกับรูปแบบและรายละเอียดของวัฒนธรรมพื้นถิ่น เน้นความเรียบง่าย การออกแบบอาคารจะกำหนดความสูงของแต่ละอาคารให้ลดหลั่นแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ เพื่อสร้างความโปร่งและลดความรู้สึกหนาแน่นของโครงการ รวมทั้งออกแบบห้องพักเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด จัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติโดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง ประกอบกับจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย อีกทั้งยังได้จัดให้มีสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้พักผ่อนและทำกิจกรรมขณะเข้าพักภายในโครงการ |                                              | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราภูรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)                         | <p>ผนังภายนอกของอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีการออกแบบอาคารให้มีสีเทา สีน้ำตาลอ่อน และสีขาว เพื่อให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ผนังระเบียงห้องพักออกแบบให้เป็นกระจกสีเขียวตัดแสงมีช่องเปิดบานเลื่อนกระจก รวาระเบียงกันตกของห้องพักทำด้วยเหล็ก สำหรับวัสดุหลักของโครงการ คือ คอนกรีต กระจก เหล็ก และอลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปและขนย้ายได้ง่าย</p> <p>การจัดภูมิสถาปัตยกรรมมีทั้งส่วนที่เป็นภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์นุ่ม (Softscape) โดยแนวความคิดการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพื้นผิวของทางเดินบริเวณอาคาร ส่วนแนวความคิดการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นั้นเน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นสาเก ต้นจิกทะเล ต้นลีลาวดี ต้นหมากเขียว และต้นกระดังงา และไม้พุ่ม ได้แก่ กล้วยน้ำว่น้อย หนุ่ยมาเลเซีย หนุ่ยน้ำพุ รักทะเล พลับพลึงหนู จั๋งจีน ไทรเกาหลี คนทีสอทะเล เฟิร์นฮาวาย ดอียดึงเทศ เดยหอม พัดนางชี และกระดุมทอง รวมทั้งรักษาไม้ยืนต้นเดิม ได้แก่ ต้นไทร ต้นยางพารา ต้นมะขอกกานี ต้นสะตอ ต้นตะแบก ต้นเพกา ต้นยอป่า ต้นมะขาม ต้นลำไย ต้นตะเคียน ต้นเตาร้าง ต้นมะพร้าว ต้นตาลประดับ และต้นหมากกอ เพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ ช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร ต้นไม้จะช่วยทอนสัดส่วนของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย</p> |                                              | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล นางสาวสุภรณ์ จิระพงษ์ตระกูล  
(นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวสุภรณ์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราภูรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)                         | โครงการเป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 10 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร คสล. สูง 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร ได้แก่ อาคาร B2 อาคาร คสล. สูง 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร B5, อาคาร B6 และ อาคาร B7 อาคาร คสล. สูง 4 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร B1 , อาคาร B3 และอาคาร B4 และอาคาร คสล.สูง 5 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร B8, อาคาร B9 และอาคาร B10 และเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า สภาพแวดล้อมพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่บริการท่องเที่ยว และพื้นที่อยู่อาศัย เมื่อพิจารณา สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วยอาคารที่สูง 1-5 ชั้น อยู่ ใกล้เคียงกับโครงการ ได้แก่ White Box Restaurant เป็นอาคารสูง 3 ชั้น Orchid Hotel&Spa Kalim Bay Phuket เป็นอาคารสูง 5 ชั้น และPrivilege Residences Kalim beach เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ดังนั้น อาคารของโครงการ ซึ่งมีความสูง 3-5 ชั้น จึงไม่โดดเด่นจากพื้นที่โดยรอบหากพิจารณาในมุมมองกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ให้ มากที่สุด เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้ ในการออกแบบอาคารจะเลือกใช้สี โทนอ่อน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก โดยในภาพรวมของ โครงการ จึงไม่มีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทัศนียภาพ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอยู่ใน ระดับต่ำ |                                              | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

โสภา ดาเนี่ย ผู้จัดการ  
(นายโสภา ดาเนี่ย) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว  
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม                  | <p><b>1) การบดบังแสง</b></p> <p>ปัจจุบันโครงการเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ทั้งนี้พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือติดกับที่ดินบุคคลอื่น (พื้นที่สำหรับเป็นที่จอดรถโครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต) ทิศใต้ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ตอนกลาง-หาดราไวย์ กว้าง 20.00 เมตร (รวมเขตทาง) ทิศตะวันออกติดกับซอยพระบารมี 8 กว้าง 10.00 เมตร (รวมเขตทาง) ทิศตะวันตกติดกับที่ดินที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) และคลองสาธารณะประโยชน์ กว้าง 3.90-5.80 เมตร ดังนั้นพื้นที่โครงการโดยรอบไม่มีอาคารอยู่อาศัย ทำให้เงาของอาคารไม่ส่งผลกระทบต่อข้างเคียง อย่างไรก็ตาม การบดบังของแสงแดดซึ่งจะสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้อยอยู่ภายในพื้นที่โครงการ โดยการบดบังแสงในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันเท่านั้น ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ และช่วงเวลาที่มีการใช้ประโยชน์แสงแดด ถือว่ามีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในระยะสั้น ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p><b>2) การบดบังทิศทางลม</b></p> <p>จากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2524-2553 (กรมอุตุนิยมวิทยา 2556) แสดงดังตารางที่ 4-54 พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออกและตะวันตก ส่วนลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงช่วงสั้นๆ ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล ความเร็วลมเฉลี่ยมีไม่มากนัก</p> | <p>(1) จัดให้มีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่า หากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศแสงแดดและลมสามารถแจ้งหรือหารือกับทางโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p> <p>(2) หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อบ้านอยู่อาศัย หรือพื้นที่อ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ และในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท ธาราบุรี จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลเมืองป่าตอง)</p> | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560 โสธร ด่านศิริกุล น.ส.จิราพร จิระพงษ์ตระกูล  
 (นายโสธร ด่านศิริกุล) (นางสาวจิราพร จิระพงษ์ตระกูล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560 [Signature]  
 (นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ของ บริษัท ธาราบุรี จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ<br>คุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม<br>(ต่อ)         | <p>จากข้อมูลความเร็วและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวอาคารของโครงการ สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี้</p> <p>(1) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตก คือ ที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) และคลองสาธารณะประโยชน์ กว้าง 3.90-5.80 เมตร</p> <p>(2) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนเมษายน ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ ซอยพระบารมี 8</p> <p>(3) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตก ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันออก คือ ซอยพระบารมี 8</p> <p>จากข้อมูลข้างต้น พบว่า โครงการมีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่ออาคารข้างเคียงเพียงเล็กน้อย และเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง ระยระนเพียงพอ ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทำให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกันนี้โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 433 ต้น เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้วย ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> |                                              | -                                          |



เดือน มีนาคม 2560

(นายโสธร ด้านศิริกุล) (นางสาวศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธาราบุรี จำกัด

เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด





## ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2.1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)



### TEST REPORT

|                    |                                                              |                                      |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| CUSTOMER           | : บริษัท ชาราบุรี จำกัด                                      |                                      |              |
| ADDRESS            | : 322 ถนนพระบรมมัย ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 |                                      |              |
| SAMPLING SOURCE    | : The Nature Phuket                                          | SAMPLE NO.                           | : 6807-016   |
| SAMPLING DATE      | : 01/07/2025                                                 | SAMPLING TIME                        | : 11.36 AM   |
| SAMPLING CONDITION | : ระบบบำบัดน้ำเสีย                                           | SAMPLING BY                          | : STC        |
| SAMPLING METHOD    | : GRAB                                                       | (MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-0-0006) |              |
| TESTED DATE        | : 01-10/07/2025                                              | RECEIVED DATE                        | : 01/07/2025 |
| FILE NAME          | : The Nature Phuket                                          | REPORTED DATE                        | : 11/07/2025 |

| PARAMETER               | UNIT | METHOD                                       | EFFLUENT | STANDARD  |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| pH at 25 °C             | -    | Electrometric Method                         | 6.81     | 5.5 - 9.0 |
| BOD <sub>5</sub>        | mg/l | 5-Day BOD Test,<br>Azide modification Method | 3.0      | ≤ 20      |
| Total Suspended Solids  | mg/l | Dried at 103-105 °C                          | 20.0     | ≤ 30      |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/l | Macro-Kjeldahl Method                        | 6.51     | ≤ 35      |
| Total Dissolved Solids  | mg/l | Dried at 180 °C                              | 254      | ≤ 1,000   |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล  
2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราบุรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระรามที่ ๕ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6807-016  
SAMPLING DATE : 01/07/2025 SAMPLING TIME : 11.36 AM  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-10/07/2025 RECEIVED DATE : 01/07/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 11/07/2025

| PARAMETER               | UNIT                    | METHOD                       | EFFLUENT | STANDARD |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------|
| Grease & Oil            | mg/l                    | Partition-Gravimetric Method | ND       | ≤ 20     |
| Sulfide                 | mg/l as S <sup>2-</sup> | Iodometric Method            | ND       | ≤ 1      |
| Settleable Solids       | ml/l                    | Volumetric Method            | ND       | -        |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 ml              | MPN Test Method              | 350      | -        |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล  
2. Container : normal [ PE 2.0 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7063-9 Fax : 0-7661-7570

Request No. W/6808-0002

Report No. W/6808-0002

### TEST REPORT

|                    |                                                                    |                                      |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| CUSTOMER           | : บริษัท สราภรณ์ จำกัด                                             |                                      |              |
| ADDRESS            | : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 |                                      |              |
| SAMPLING SOURCE    | : The Nature Phuket                                                | SAMPLE NO.                           | : 6808-0028  |
| SAMPLING DATE      | : 01/08/2025                                                       | SAMPLING TIME                        | : 01.14 PM   |
| SAMPLING CONDITION | : ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                 | SAMPLING BY                          | : STC        |
| SAMPLING METHOD    | : GRAB                                                             | (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-3-0006) |              |
| TESTED DATE        | : 01-16/08/2025                                                    | RECEIVED DATE                        | : 01/08/2025 |
| FILE NAME          | : The Nature Phuket                                                | REPORTED DATE                        | : 18/08/2025 |

| PARAMETER               | UNIT | METHOD                                       | EFFLUENT | STANDARD  |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| pH at 25 °C             | -    | Electrometric Method                         | 7.58     | 5.5 - 9.0 |
| BOD <sub>5</sub>        | mg/L | 5-Day BOD Test,<br>Azide modification Method | 12.0     | ≤ 20      |
| Total Suspended Solids  | mg/L | Dried at 103-105 °C (Part 2540D)             | 9        | ≤ 30      |
| Total Dissolved Solids  | mg/L | Dried at 180 °C (Part 2540C)                 | 298      | ≤ 1,000   |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L | Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method           | 6.58     | ≤ 35      |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ชุ่ม มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Ex

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราบุรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6808-0028  
SAMPLING DATE : 01/08/2025 SAMPLING TIME : 01.14 PM  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-16/08/2025 RECEIVED DATE : 01/08/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 18/08/2025

| PARAMETER               | UNIT                    | METHOD                                         | EFFLUENT | STANDARD |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| Grease & Oil            | mg/L                    | Liquid-Liquid,<br>Partition-Gravimetric Method | ND       | ≤ 20     |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | Iodometric Method                              | ND       | ≤ 1      |
| Settleable Solids       | mL/L                    | Volumetric Method                              | ND       | -        |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL              | MPN Test Method                                | 54,000   | -        |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**REMARK**

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7868-9 Fax : 0-7661-7170

Request No. 6809-0059

Report No. W 6809-0059

### TEST REPORT

|                    |                                                              |               |                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| CUSTOMER           | : บริษัท ธาราบุรี จำกัด                                      |               |                                      |
| ADDRESS            | : 322 ถนนพระบรมมี ตำบลปาดอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150 |               |                                      |
| SAMPLING SOURCE    | : The Nature Phuket                                          | SAMPLE NO.    | : 6809-0059                          |
| SAMPLING DATE      | : 01/09/2025                                                 | SAMPLING TIME | : 01.17 PM                           |
| SAMPLING CONDITION | : ระบบบำบัดน้ำเสีย                                           | SAMPLING BY   | : STC                                |
| SAMPLING METHOD    | : GRAB                                                       |               | (MS. JUTAPORN JUTAMAST 2-176-จ-0006) |
| TESTED DATE        | : 01-15/09/2025                                              | RECEIVED DATE | : 01/09/2025                         |
| FILE NAME          | : The Nature Phuket                                          | REPORTED DATE | : 15/09/2025                         |

| PARAMETER              | UNIT | METHOD                                         | EFFLUENT | STANDARD  |
|------------------------|------|------------------------------------------------|----------|-----------|
| pH at 25 °C            | -    | Electrometric Method                           | 7.35     | 5.5 - 9.0 |
| BOD <sub>5</sub>       | mg/L | 5-Day BOD Test,<br>Azide modification Method   | 11.0     | ≤ 20      |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C (Part 2540D)               | 16       | ≤ 30      |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C (Part 2540C)                   | 220      | ≤ 1,000   |
| Grease & Oil           | mg/L | Liquid-Liquid,<br>Partition-Gravimetric Method | 3.0      | ≤ 20      |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ปูน มีตะกอนแขวนลอยสีขาว

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ทารากูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมี ตำบลปาดอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6809-0059  
SAMPLING DATE : 01/09/2025 SAMPLING TIME : 01.17 PM  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-15/09/2025 RECEIVED DATE : 01/09/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 15/09/2025

| PARAMETER               | UNIT                    | METHOD                             | EFFLUENT | STANDARD |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L                    | Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method | 3.00     | ≤ 35     |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | Iodometric Method                  | ND       | ≤ 1      |
| Settleable Solids       | mL/L                    | Volumetric Method                  | ND       | -        |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL              | MPN Test Method                    | 160,000  | -        |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีขาว

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

|                    |                                                                    |                                      |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| CUSTOMER           | : บริษัท ชวราวุธ จำกัด                                             |                                      |              |
| ADDRESS            | : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 |                                      |              |
| SAMPLING SOURCE    | : The Nature Phuket                                                | SAMPLE NO.                           | : 6810-0041  |
| SAMPLING DATE      | : 01/10/2025                                                       | SAMPLING TIME                        | : 00.10 PM   |
| SAMPLING CONDITION | : ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                 | SAMPLING BY                          | : STC        |
| SAMPLING METHOD    | : GRAB                                                             | (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-3-0006) |              |
| TESTED DATE        | : 01-15/10/2025                                                    | RECEIVED DATE                        | : 01/10/2025 |
| FILE NAME          | : The Nature Phuket                                                | REPORTED DATE                        | : 16/10/2025 |

| PARAMETER              | UNIT | METHOD                                       | EFFLUENT | STANDARD  |
|------------------------|------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| pH at 25 °C            | -    | Electrometric Method                         | 6.58     | 5.5 - 9.0 |
| BOD <sub>5</sub>       | mg/L | 5-Day BOD Test,<br>Azide modification Method | 2.0      | ≤ 20      |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C (Part 2540D)             | 8        | ≤ 30      |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C (Part 2540C)                 | 242      | ≤ 1,000   |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนแขวนลอยสีขาว

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF. 24th ed., 2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราบุรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระรามที่ ๓ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6810-0041  
SAMPLING DATE : 01/10/2025 SAMPLING TIME : 00.10 PM  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-15/10/2025 RECEIVED DATE : 01/10/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 16/10/2025

| PARAMETER               | UNIT                    | METHOD                                         | EFFLUENT | STANDARD |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L                    | Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method             | 3.22     | ≤ 35     |
| Grease & Oil            | mg/L                    | Liquid-Liquid,<br>Partition-Gravimetric Method | ND       | ≤ 20     |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | Iodometric Method                              | ND       | ≤ 1      |
| Settleable Solids       | mL/L                    | Volumetric Method                              | ND       | -        |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL              | MPN Test Method                                | 220      | -        |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนแขวนลอยสีขาว

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





### TEST REPORT

|                              |                                                             |                                      |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| CUSTOMER                     | : บริษัท ชารนรี่ จำกัด                                      |                                      |              |
| ADDRESS                      | : 322 ถนนพระบรมมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 |                                      |              |
| SAMPLING SOURCE <sup>3</sup> | : The Nature Phuket                                         | SAMPLE NO.                           | : 6811-0072  |
| SAMPLING DATE <sup>3</sup>   | : 03/11/2025                                                | SAMPLING TIME <sup>3</sup>           | : 09.57 AM   |
| SAMPLING CONDITION           | : ระบบบำบัดน้ำเสีย                                          | SAMPLING BY <sup>3</sup>             | : STC        |
| SAMPLING METHOD <sup>3</sup> | : GRAB                                                      | (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-3-0006) |              |
| TESTED DATE                  | : 03-13/11/2025                                             | RECEIVED DATE                        | : 03/11/2025 |
| FILE NAME                    | : The Nature Phuket                                         | REPORTED DATE                        | : 14/11/2025 |

| PARAMETER                      | UNIT | METHOD                                       | EFFLUENT | STANDARD  |
|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| pH at 25 °C <sup>1)</sup>      | -    | Electrometric Method                         | 6.29     | 5.5 - 9.0 |
| BOD <sub>5</sub> <sup>1)</sup> | mg/L | 5-Day BOD Test,<br>Azide modification Method | 3.0      | ≤ 20      |
| Total Suspended Solids         | mg/L | Dried at 103-105 °C (Part 2540D)             | 7        | ≤ 30      |
| Total Dissolved Solids         | mg/L | Dried at 180 °C (Part 2540C)                 | 304      | ≤ 1,000   |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

#### STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

#### ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

#### REMARK

1. <sup>1)</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. <sup>2)</sup> : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ทราเวลริ จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระรามที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE<sup>3</sup> : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6811-0072  
SAMPLING DATE<sup>3</sup> : 03/11/2025 SAMPLING TIME<sup>3</sup> : 09.57 AM  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING BY<sup>3</sup> : STC  
SAMPLING METHOD<sup>3</sup> : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 03-13/11/2025 RECEIVED DATE : 03/11/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 14/11/2025

| PARAMETER                              | UNIT                    | METHOD                                         | EFFLUENT | STANDARD |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| Total Kjeldahl Nitrogen <sup>1</sup>   | mg/L                    | Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method             | 3.64     | ≤ 35     |
| Grease & Oil <sup>1</sup>              | mg/L                    | Liquid-Liquid,<br>Partition-Gravimetric Method | ND       | ≤ 20     |
| Sulfide <sup>1</sup>                   | mg/L as S <sup>2-</sup> | Iodometric Method                              | 0.13     | ≤ 1      |
| Settleable Solids <sup>1,2</sup>       | mL/L                    | Volumetric Method                              | ND       | -        |
| Total Coliform Bacteria <sup>1,2</sup> | MPN/100 mL              | MPN Test Method                                | 3,500    | -        |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**ANALYSIS METHOD** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition. 2023

**REMARK** 1.<sup>1</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2.<sup>2</sup> : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

3.<sup>3</sup> : Information received from customer

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทีรน์ไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel: 0-7661-7868-9 Fax: 0-7661-7277

Request No. 6812-0178

Report No. AT-12-0123

### TEST REPORT

|                              |                                                                    |                                      |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| CUSTOMER                     | : บริษัท ชาราบุรี จำกัด                                            |                                      |              |
| ADDRESS                      | : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 |                                      |              |
| SAMPLING SOURCE <sup>3</sup> | : The Nature Phuket                                                | SAMPLE NO.                           | : 6812-0178  |
| SAMPLING DATE <sup>3</sup>   | : 03/12/2025                                                       | SAMPLING TIME <sup>3</sup>           | : 11.40 AM   |
| SAMPLING CONDITION           | : ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                 | SAMPLING BY <sup>3</sup>             | : STC        |
| SAMPLING METHOD <sup>3</sup> | : GRAB                                                             | (MS. JUTAPORN JUTAMAST 2-176-0-0006) |              |
| TESTED DATE                  | : 03-12/12/2025                                                    | RECEIVED DATE                        | : 03/12/2025 |
| FILE NAME                    | : The Nature Phuket                                                | REPORTED DATE                        | : 13/12/2025 |

| PARAMETER                            | UNIT | METHOD                                       | EFFLUENT | STANDARD  |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| pH at 25 °C <sup>1</sup>             | -    | Electrometric Method                         | 6.74     | 5.5 - 9.0 |
| BOD <sub>5</sub> <sup>1</sup>        | mg/L | 5-Day BOD Test,<br>Azide modification Method | 6.0      | ≤ 20      |
| Total Suspended Solids               | mg/L | Dried at 103-105 °C (Part 2540D)             | 10       | ≤ 30      |
| Total Dissolved Solids               | mg/L | Dried at 180 °C (Part 2540C)                 | 226      | ≤ 1,000   |
| Total Kjeldahl Nitrogen <sup>1</sup> | mg/L | Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method           | 6.58     | ≤ 35      |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

#### STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

#### ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

#### REMARK

1. <sup>1</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2. <sup>2</sup> : Out of accredited scope of private analysis laboratories 2-176

3. <sup>3</sup> : Information received from customer

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชราบุรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE<sup>1</sup> : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6812-0178  
SAMPLING DATE<sup>1</sup> : 03/12/2025 SAMPLING TIME<sup>3</sup> : 11:40 AM  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING BY<sup>3</sup> : STC  
SAMPLING METHOD<sup>3</sup> : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 03-12/12/2025 RECEIVED DATE : 03/12/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 13/12/2025

| PARAMETER                              | UNIT                    | METHOD                                         | EFFLUENT | STANDARD |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| Grease & Oil <sup>1</sup>              | mg/L                    | Liquid-Liquid,<br>Partition-Gravimetric Method | ND       | ≤ 20     |
| Sulfide <sup>1</sup>                   | mg/L as S <sup>2-</sup> | Iodometric Method                              | 0.20     | ≤ 1      |
| Settleable Solids <sup>1,2</sup>       | mL/L                    | Volumetric Method                              | ND       | -        |
| Total Coliform Bacteria <sup>1,2</sup> | MPN/100 mL              | MPN Test Method                                | 5,400    | -        |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย

2. Container : normal [ PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L ]

**STANDARD**

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**ANALYSIS METHOD**

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

**REMARK**

1.<sup>1</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

2.<sup>2</sup> : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3.-176

3.<sup>3</sup> : Information received from customer

4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 2.2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (SWIMMING POOL)





TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชาราวัรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระรามที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6807-017  
SAMPLING DATE : 01/07/2025 SAMPLING TIME : 11.26 AM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-10/07/2025 RECEIVED DATE : 01/07/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 11/07/2025

| PARAMETER               | UNIT       | METHOD          | Swimming Pool<br>(Beach Pool) | STANDARD |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 ml | MPN Test Method | < 1.8                         | ≤ 10     |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 ml | MPN Test Method | < 1.8                         | ND       |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ใส 2. Container : normal [ G 0.5 L ]  
**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
**REMARK** 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชารานูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6808-0029  
SAMPLING DATE : 01/08/2025 SAMPLING TIME : 01.12 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-16/08/2025 RECEIVED DATE : 01/08/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 18/08/2025

| PARAMETER               | UNIT       | METHOD          | Swimming Pool | STANDARD |
|-------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|
|                         |            |                 | (Beach Pool)  |          |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | < 1.8         | ≤ 10     |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | < 1.8         | ND       |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : สี 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

3) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราทูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมราชินี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6809-0060  
SAMPLING DATE : 01/09/2025 SAMPLING TIME : 01.14 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-13/09/2025 RECEIVED DATE : 01/09/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 15/09/2025

| PARAMETER               | UNIT       | METHOD          | Swimming Pool | STANDARD |
|-------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|
|                         |            |                 | (Beach Pool)  |          |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | < 1.8         | ≤ 10     |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | < 1.8         | ND       |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ใต 2. Container : normal [ G 0.5 L ]  
**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023  
2) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
3) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราบุรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6810-0042  
SAMPLING DATE : 01/10/2025 SAMPLING TIME : 00.08 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-15/10/2025 RECEIVED DATE : 01/10/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 16/10/2025

| PARAMETER        | UNIT | METHOD                              | Swimming Pool | STANDARD  |
|------------------|------|-------------------------------------|---------------|-----------|
|                  |      |                                     | "Beach Pool"  |           |
| Chloride         | mg/L | Argentometric Method                | 580.67        | ≤ 600     |
| Ammonia Nitrogen | mg/L | Distillation and Titrimetric Method | ND            | ≤ 20      |
| Nitrate Nitrogen | mg/L | Cadmium Reduction Method            | 1.31          | ≤ 50      |
| T-Alkalinity     | ppm  | T-Alkalinity Test Strip             | 90.0          | 80 - 100  |
| Calcium Hardness | ppm  | Calcium Hardness Test Strip         | 80.0          | 250 - 600 |
| Cyanuric acid    | ppm  | Cyanuric Acid Test Strip            | 100           | 30 - 60   |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ( 2 bottles ), G 0.25 L ]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ดาราภูเก็ต จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6810-0042  
SAMPLING DATE : 01/10/2025 SAMPLING TIME : 00.08 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-15/10/2025 RECEIVED DATE : 01/10/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 16/10/2025

| PARAMETER                  | UNIT       | METHOD                          | Swimming Pool | STANDARD |
|----------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------|
|                            |            |                                 | "Beach Pool"  |          |
| Total Coliform Bacteria    | MPN/100 mL | MPN Test Method                 | < 1.8         | ≤ 10     |
| Fecal Coliform Bacteria    | MPN/100 mL | MPN Test Method                 | < 1.8         | ND       |
| E.Coli                     | MPN/100 mL | MPN Test Method                 | ND            | ND       |
| S.aureus <sup>1)</sup>     | /100 mL    | APHA. S.aureus [Part 9230 (C )] | ND            | ND       |
| P.aeruginosa <sup>1)</sup> | MPN/100 mL | P. Aeruginosa [Part 9213 (F )]  | < 1.8         | ND       |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ( 2 bottles ), G 0.25 L ]

**STANDARD**

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

**REMARK**

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA. AWWA & WEF, 24th ed., 2023
- 2) <sup>1)</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 3) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)
- 4) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
- 5) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoonorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7681-7668-9 Fax : 0-7681-7570

Report No. STC-0020

Report No. W-0811-0038

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชาราณูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6811-0073  
SAMPLING DATE : 03/11/2025 SAMPLING TIME : 09.54 AM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 03-13/11/2025 RECEIVED DATE : 03/11/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 14/11/2025

| PARAMETER               | UNIT       | METHOD          | Swimming Pool<br>(Beach Pool) | STANDARD |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | < 1.8                         | ≤ 10     |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | < 1.8                         | ND       |

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ใส 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

#### STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการกระจายน้ำ

#### ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

#### REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2. Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชารานูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมัย ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6812-0179  
SAMPLING DATE : 03/12/2025 SAMPLING TIME : 11.37 AM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 03-12/12/2025 RECEIVED DATE : 03/12/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 13/12/2025

| PARAMETER               | UNIT       | METHOD          | Swimming Pool | STANDARD |
|-------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|
|                         |            |                 | (Beach Pool)  |          |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | < 1.8         | ≤ 10     |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | < 1.8         | ND       |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ไส้ 2. Container : normal [ G 0.5 L ]  
**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
**ANALYSIS METHOD** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023  
**REMARK** 1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
2. Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

## ภาคผนวกที่ 2.3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ (WATER SUPPLY)



### TEST REPORT

|                    |                                                             |                                      |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| CUSTOMER           | : บริษัท ธาราบุรี จำกัด                                     |                                      |              |
| ADDRESS            | : 322 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 |                                      |              |
| SAMPLING SOURCE    | : The Nature Phuket                                         | SAMPLE NO.                           | : 6810-0043  |
| SAMPLING DATE      | : 01/10/2025                                                | SAMPLING TIME                        | : 00.05 PM   |
| SAMPLING CONDITION | : WATER                                                     | SAMPLING BY                          | : STC        |
| SAMPLING METHOD    | : GRAB                                                      | (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006) |              |
| TESTED DATE        | : 01-15/10/2025                                             | RECEIVED DATE                        | : 01/10/2025 |
| FILE NAME          | : The Nature Phuket                                         | REPORTED DATE                        | : 16/10/2025 |

| PARAMETER               | UNIT | METHOD                                   | น้ำใช้ผ่านการกรอง | STANDARD |
|-------------------------|------|------------------------------------------|-------------------|----------|
| pH at 25 <sup>0</sup> C | -    | Electrometric Method                     | 6.93              | 6.5-8.5  |
| Total Dissolved Solids  | mg/L | Dried at 180 <sup>0</sup> C (Part 2540C) | 202               | ≤ 600    |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ( 2 bottles ), G 0.25 L ]

**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราภูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6810-0043  
SAMPLING DATE : 01/10/2025 SAMPLING TIME : 00.05 PM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-15/10/2025 RECEIVED DATE : 01/10/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 16/10/2025

| PARAMETER      | UNIT                      | METHOD                    | น้ำใช้ผ่านการกรอง | STANDARD |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| Apparent Color | Pt.Co                     | Spectrophotometric Method | ND                | ≤ 15     |
| Manganese      | mg/L                      | Persulfate Method         | 0.02              | ≤ 0.08   |
| Chloride       | mg/L                      | Argentometric Method      | 58.07             | ≤ 250    |
| Turbidity      | NTU                       | Nephelometric Method      | 0.79              | ≤ 4      |
| Iron           | mg/L                      | Phenanthroline Method     | 0.06              | ≤ 0.3    |
| Hardness       | mg/L as CaCO <sub>3</sub> | EDTA Titrimetric Method   | 70.0              | ≤ 300    |
| Nitrate        | mg/L                      | Cadmium Reduction Method  | 1.95              | ≤ 50     |
| Fluoride       | mg/L                      | SPADNS Method             | ND                | ≤ 0.7    |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ( 2 bottles ), G 0.25 L ]

**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชาราฎี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6810-0043  
SAMPLING DATE : 01/10/2025 SAMPLING TIME : 00.05 PM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-15/10/2025 RECEIVED DATE : 01/10/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 16/10/2025

| PARAMETER              | UNIT                                  | METHOD                                       | น้ำใช้ผ่านการกรอง | STANDARD |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------|
| Sulfate <sup>1/</sup>  | mg/L as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | Turbidimetric Method                         | 21.50             | ≤ 250    |
| Copper <sup>1/</sup>   | mg/L as Cu                            | Digestion, Inductively coupled Plasma Method | ND                | ≤ 2      |
| Zinc <sup>1/</sup>     | mg/L as Zn                            | Digestion, Inductively coupled Plasma Method | 0.03              | ≤ 3      |
| Lead <sup>1/</sup>     | mg/L as Pb                            | Digestion, Inductively coupled Plasma Method | ND                | ≤ 0.01   |
| Chromium <sup>1/</sup> | mg/L as Cr                            | Digestion, Inductively coupled Plasma Method | ND                | ≤ 0.05   |
| Cadmium <sup>1/</sup>  | mg/L as Cd                            | Digestion, Inductively coupled Plasma Method | ND                | ≤ 0.003  |
| Arsenic <sup>1/</sup>  | mg/L as As                            | Continuous Hydride Generation/AAS Method     | ND                | ≤ 0.01   |
| Mercury <sup>1/</sup>  | mg/L as Hg                            | Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric   | ND                | ≤ 0.001  |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ( 2 bottles ), G 0.25 L ]

**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

**REMARK** 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023  
2) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด : เลขทะเบียน ว-003  
3) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราภูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6810-0043  
SAMPLING DATE : 01/10/2025 SAMPLING TIME : 00.05 PM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 01-15/10/2025 RECEIVED DATE : 01/10/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 16/10/2025

| PARAMETER               | UNIT      | METHOD          | น้ำใช้ผ่านการกรอง | STANDARD |
|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| Total coliform bacteria | in 100 mL | MPN Test Method | < 1.8             | ND       |
| Escherichia Coli        | in 100 mL | MPN Test Method | ND                | ND       |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ( 2 bottles ), G 0.25 L ]

**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

**REMARK**  
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
3) Total coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

## ภาคผนวกที่ 2.4

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล (SEA WATER)



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราภูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6811-0074  
SAMPLING DATE : 03/11/2025 SAMPLING TIME : 10.03 AM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)  
TESTED DATE : 03-13/11/2025 RECEIVED DATE : 03/11/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 14/11/2025

| PARAMETER              | UNIT | METHOD                           | SEA WATER | STANDARD  |
|------------------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| pH at 25 °C            | -    | Electrometric Method             | 7.94      | 7.0 - 8.5 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C (Part 2540D) | 30        | *         |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.25 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**ANALYSIS METHOD** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

**REMARK** 1. \* มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ของค่าเฉลี่ยนั้น ๆ

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราภิรติ จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6811-0074  
SAMPLING DATE : 03/11/2025 SAMPLING TIME : 10.03 AM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 03-13/11/2025 RECEIVED DATE : 03/11/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 14/11/2025

| PARAMETER        | UNIT              | METHOD                              | SEA WATER | STANDARD      |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Dissolved Oxygen | mg/L              | Membrane Electrode Method           | 6.12      | $\geq 6$      |
| Phosphate        | $\mu\text{g-P/L}$ | Ascorbic Acid Method                | 70.0      | $\leq 15$     |
| Nitrate Nitrogen | $\mu\text{g-N/L}$ | Cadmium Reduction Method            | 270       | $\leq 20$     |
| Ammonia Nitrogen | $\mu\text{g-N/L}$ | Distillation and Titrimetric Method | ND        | $\leq 100$    |
| Salinity         | ppt               | Electrical Conductivity Method      | 19.10     | $\Delta_{10}$ |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.25 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**ANALYSIS METHOD** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

**REMARK** 1.  $\Delta_{10}$  มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าต่ำสุด  
2. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชราภวี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6811-0074  
SAMPLING DATE : 03/11/2025 SAMPLING TIME : 10.03 AM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 03-13/11/2025 RECEIVED DATE : 03/11/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 14/11/2025

| PARAMETER                                | UNIT       | METHOD                          | SEA WATER | STANDARD |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------|
| Total Coliform Bacteria                  | MPN/100 mL | MPN Test Method                 | 1,700     | ≤ 1,000  |
| Fecal Coliform Bacteria <sup>/1</sup>    | CFU/100 mL | Thermololrant (Fecal) coliforms | 63.0      | ≤ 70     |
| Membrane Filter Procedure (Part 9222(D)) |            |                                 |           |          |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.25 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**ANALYSIS METHOD** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

**REMARK** 1. <sup>/1</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 2.5

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง



## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ชารานูรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมี ตำบลปาดอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6811-0075  
SAMPLING DATE : 03/11/2025 SAMPLING TIME : 09.59 AM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 2-176-จ-0006)  
TESTED DATE : 03-13/11/2025 RECEIVED DATE : 03/11/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 14/11/2025

| PARAMETER               | UNIT | METHOD                                | น้ำคลอง | STANDARD  |
|-------------------------|------|---------------------------------------|---------|-----------|
| pH at 25 <sup>0</sup> C | -    | Electrometric Method                  | 6.68    | 5.0 - 9.0 |
| BOD <sub>5</sub>        | mg/L | 5-Day BOD Test,<br>Azide modification | 0.3     | ≤ 1.5     |
| Temperature             | °C   | Laboratory and Field Method           | 30.0    | -         |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.25 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ)

**ANALYSIS METHOD** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

Exami

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราบุรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6811-0075  
SAMPLING DATE : 03/11/2025 SAMPLING TIME : 09.59 AM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 03-13/11/2025 RECEIVED DATE : 03/11/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 14/11/2025

| PARAMETER        | UNIT | METHOD                              | น้ำคลอง | STANDARD |
|------------------|------|-------------------------------------|---------|----------|
| Ammonia Nitrogen | mg/L | Distillation and Titrimetric Method | ND      | ≤ 0.5    |
| Nitrate Nitrogen | mg/L | Cadmium Reduction Method            | 0.12    | ≤ 5      |
| Dissolved Oxygen | mg/L | Membrane Electrode Method           | 5.46    | ≥ 6      |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.25 L ]  
**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ)  
**ANALYSIS METHOD** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023  
**REMARK** 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ธาราบุรี จำกัด  
ADDRESS : 322 ถนนพระบรมมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Nature Phuket SAMPLE NO. : 6811-0075  
SAMPLING DATE : 03/11/2025 SAMPLING TIME : 09.59 AM  
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 03-13/11/2025 RECEIVED DATE : 03/11/2025  
FILE NAME : The Nature Phuket REPORTED DATE : 14/11/2025

| PARAMETER               | UNIT       | METHOD          | น้ำคลอง | STANDARD     |
|-------------------------|------------|-----------------|---------|--------------|
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | 54,000  | $\leq 5,000$ |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | MPN Test Method | 17,000  | $\leq 1,000$ |

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L ]  
**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ)  
**ANALYSIS METHOD** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ภาคผนวกที่ 3

เอกสารชี้แนะทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗๕๖๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

อ้างถึง คำขอต่ออายุของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๗๖ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙/๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายพิมุข สอนมี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๑

๒) นายศิริพงศ์ พะสริ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๒

๓) นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๓

๔) นางสาวพรวิษา จินรัตน์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวกรรณิกา แก้วสามเขียว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาวจุฑาทิพย์ ชูถึง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาวปรีชญา หมุกแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๔

๕) นางสาวบุษยา ประกอบแสง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๕

๖) นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๖

๗) นางสาวกรรณนิการ์ ประทุมเพชร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๗

๘) นางสาวสุธาสินี ละเมาะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๘

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

h.

(นายณเรศวร์ ตรียางค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัคติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๗๖  
ที่ อก ๐๓๒๒/ ลงวันที่

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ  
น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ                  | วิธีวิเคราะห์                               |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Biochemical Oxygen Demand | 5-Day BOD Test, Azide Modification Method   |
| 2        | Chemical Oxygen Demand    | Closed Reflux, Titrimetric Method           |
| 3        | Oil & Grease              | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method |
| 4        | pH                        | Electrometric Method                        |
| 5        | Sulfide                   | Iodometric Method                           |
| 6        | Temperature               | Laboratory and Field Method                 |
| 7        | Total Dissolved Solids    | Dried at 180 °C                             |
| 8        | Total Kjeldahl Nitrogen   | Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method          |
| 9        | Total Suspended Solids    | Dried at 103-105 °C                         |

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed.  
Washington, DC: APHA, 2023.

นางสาว  
(นางสาว  
นักวิทยาศาสตร์

#### ภาคผนวกที่ 4

---

เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ





PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0024

## CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : V25-0477

CSR No. : 250252

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket  
83110

Equipment : pH Meter

Manufacturer : SI Analytics

Model : lab 845

Serial No. : 21021943

ID. No. : -

Resolution : 0.01 pH

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature :  $(25 \pm 3)^{\circ}\text{C}$

Relative Humidity :  $(55 \pm 15) \%$

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Alongkorn Chewaisarakul  
( Calibration Technician )

( / ) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager  
( ) MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.  
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE NO. : V25-0477

CSR No. : 250252

Page : 2 of 3

Equipment : pH Meter  
Manufacturer : SI Analytics  
Model : lab 845  
Serial No. : 21021943  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

## REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

| Instrument Type                   | Nominal Value/Model | Serial No. | Cert. No.       |            | Traceability |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| pH Calibration Standard           | 4.00                | 1027602    | 1027602         | 15-09-2025 | CPA Chem     |
| pH Calibration Standard           | 6.98                | 1027603    | 1027603         | 15-09-2025 | CPA Chem     |
| pH Calibration Standard           | 10.01               | 1027604    | 1027604         | 15-09-2025 | CPA Chem     |
| Temperature/Electrical Calibrator | MC2-TE              | 10548      | CAL0252-25P0013 | 26-01-2026 | RKT          |

## CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.117 based on direct measurement by using standard voltage calibrator

In-house method : CA.WI.11.117 based on direct measurement by using certified reference material (CRM)

## TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

CPA Chem : CPA chem Ltd. (ANAB Cert No. AR-1835)

RKT : Rockertek (Thailand) Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0069)

## CALIBRATION RESULTS :

Function : Electrical Measurement

| Applied Voltage<br>(mV) | pH meter Reading<br>(mV) | Correction<br>(mV) | Uncertainty<br>( ± mV ) | Coverage Factor<br>( k ) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 177.48                  | 178                      | -0.52              | 0.60                    | 2.00                     |
| 0.00                    | 1                        | -1.00              | 0.59                    | 2.00                     |
| -177.48                 | -177                     | -0.48              | 0.60                    | 2.00                     |

Function : Chemical Measurement

| Standard Buffer Solutions<br>(pH) | pH meter Reading<br>(pH) | Correction<br>(pH) | Uncertainty<br>( ± pH ) | Coverage Factor<br>( k ) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 4.007                             | 4.01                     | -0.003             | 0.013                   | 2.09                     |
| 6.976                             | 6.98                     | -0.004             | 0.019                   | 2.02                     |
| 10.010                            | 9.96                     | 0.050              | 0.058                   | 2.25                     |


Calibration curve - % off set - mV

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

COPY





CERTIFICATE No. : V25-0477

CSR No. : 250252

Page : 2 of 2

Equipment : pH Meter  
Manufacturer : SI Analytics  
Model : lab 845  
Serial No. : 21021943  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

**REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :**

| Instrument Type                 | Model | Serial No. | Cert. No.     | Due Date   | Traceability |
|---------------------------------|-------|------------|---------------|------------|--------------|
| Digital Thermometer with Sensor | 376   | 220608721  | SDTH-002/1124 | 14-11-2025 | PSE          |

**CALIBRATION METHOD :**

In-house method : CA.WI.11.180 comparison with standard thermometer

**TRACEABILITY :**

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit ( SI ) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

**CALIBRATION RESULTS : ( Cont.)**

( / ) Without Adjustment

( ) After Adjustment

| Cal Point | Standard Temperature | UUC Reading | Correction | Uncertainty |
|-----------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| (°C)      | (°C)                 | (°C)        | (°C)       | (±°C)       |
| 25        | 25.00                | 25.0        | 0.00       | 0.25        |

**COPY**


UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

--End--





PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



## CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0653

CSR No. : 250252

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket  
83110

Equipment : Hot Air Oven

Manufacturer : Binder

Model : FD56

Serial No. : 20210000003365

ID. No. : -

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

**COPY**

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat  
( Calibration Engineer )

APPROVED SIGNATORY

( / ) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager  
( ) MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.  
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T25-0653

CSR No. : 250252

Page : 2 of 4

Equipment : Hot Air Oven  
Manufacturer : Binder  
Model : FD56  
Serial No. : 20210000003365  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

| Instrument Type                 | Model   | Serial No.  | Cert. No.   | Due Date   | Traceability |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Digital Thermometer with Sensor | 34970 A | MY 44042662 | DAT003/0824 | 01-08-2025 | PSE          |

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021)


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit ( SI ) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

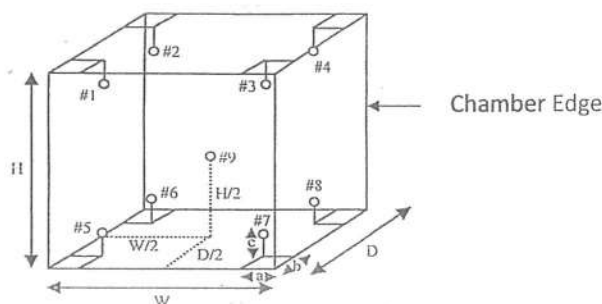

Dimension of the chamber :  $W \times H \times D = 40 \times 40 \times 33$  cm  
Sensor Installation :  $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$  cm

COPY

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .  
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.  
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.





CERTIFICATE NO. : T25-0653

CSR No. : 250252

Page : 3 of 4

Equipment : Hot Air Oven  
Manufacture : Binder  
Model : FD56  
Serial No. : 20210000003365  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

## CALIBRATION RESULTS : ( Cont.)

( / ) Without Adjustment

( ) After Adjustment

## Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the hot air oven and associates are reported in the manner as shown below

| Cal Point<br>(°C) | Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations |         |         |         |         |         |         |         |         | Uncertainty<br>( ± °C ) |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
|                   | #1                                                     | #2      | #3      | #4      | #5      | #6      | #7      | #8      | Ref. 9  |                         |
| 104               | 103.823                                                | 104.225 | 103.823 | 104.015 | 103.778 | 104.033 | 104.085 | 103.758 | 103.776 | 0.67                    |

## Hot Air Oven Performance Result

The performance of the hot air oven are reported as shown below

| Cal Point<br>(°C) | UUC<br>Setting<br>(°C) | UUC<br>Reading<br>(°C) | Chamber<br>Stability<br>( ± °C ) | Chamber<br>Uniformity<br>( ± °C ) | Overall<br>Variation<br>( ± °C ) |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 104               | 104                    | 104                    | 0.11                             | 0.49                              | 0.63                             |

COPY

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration of




CERTIFICATE NO. : T25-0653

CSR No. : 250252

Page : 4 of 4

### Report Graph

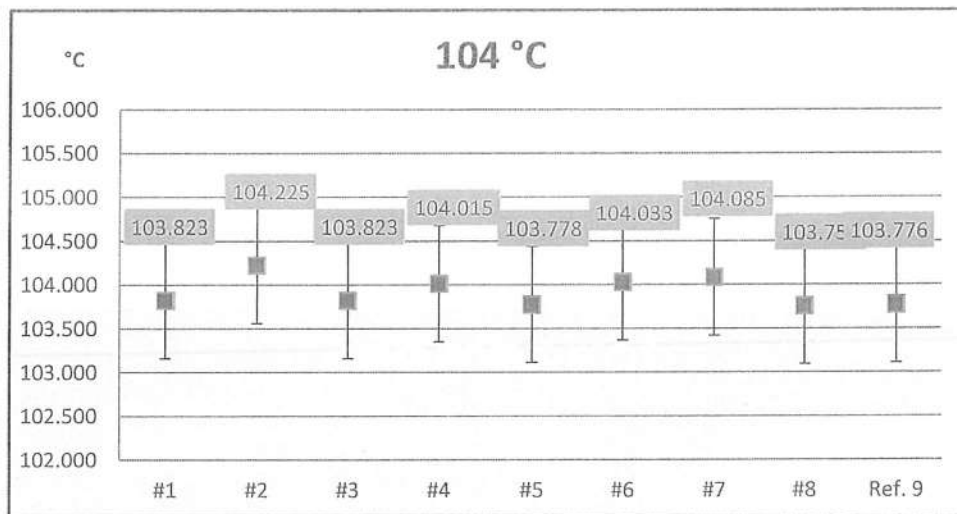

COPY

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration on

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9

## CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0654

CSR No. : 250252

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket  
83110

Equipment : COD Reactor

Manufacturer : Lovibond

Model : RD125

Serial No. : 0423/00542

ID. No. : -

Resolution : -

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature :  $(30 \pm 15) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity :  $(60 \pm 20) \%$

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 3-Mar-2025

**COPY**

APPROVED BY

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat  
( Calibration Engineer )

( / ) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager  
( ) MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.  
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : T25-0654

CSR No. : 250252

Page : 2 of 3

Equipment : COD Reactor  
Manufacturer : Lovibond  
Model : RD125  
Serial No. : 0423/00542  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

**REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :**

| Instrument Type                 | Model   | Serial No.  | Cert. No.   | Due Date   | Traceability |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Digital Thermometer with Sensor | 34970 A | MY 44042662 | DAT003/0824 | 02-08-2025 | PSE          |

**CALIBRATION METHOD :**

In-house method : CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 1994 (re-approved 2011)

**TRACEABILITY :**

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit ( SI ) through :


PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

**CALIBRATION RESULTS :**

Sensor Installation Diagram



**COPY**



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .  
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.  
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T25-0654

CSR No. : 250252

Page : 3 of 3

Equipment : COD Reactor  
Manufacture : Lovibond  
Model : RD125  
Serial No. : 0423/00542  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

## CALIBRATION RESULTS : ( Cont.)

( / ) Without Adjustment

( ) After Adjustment

## Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the COD Reactor and associates are reported in the manner as shown below

| Cal Point | Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations |         |         |         |         |         |         |         |         | Uncertainty |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| (°C)      | #1                                                     | #2      | #3      | #4      | #5      | #6      | #7      | #8      | #9      | ( ± °C )    |
| 150       | 151.299                                                | 147.200 | 147.791 | 148.604 | 150.268 | 149.030 | 149.150 | 148.082 | 151.746 | 0.18        |

| Cal Point | Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations |         |         |         |         |         |         |         |         | Uncertainty |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| (°C)      | #10                                                    | #11     | #12     | #13     | #14     | #15     | #16     | #17     | #18     | ( ± °C )    |
| 150       | 151.831                                                | 148.283 | 146.341 | 150.289 | 150.245 | 150.111 | 150.150 | 149.029 | 151.111 | 0.18        |

| Cal Point | Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations |         |         |         |         |         | Uncertainty |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| (°C)      | #19                                                    | #20     | #21     | #22     | #23     | #24     | ( ± °C )    |
| 150       | 149.287                                                | 150.834 | 148.796 | 149.018 | 151.437 | 151.266 | 0.18        |

COPY

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

-- End --





PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



## CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M25-0359

CSR No. : 250252

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket  
83110

Equipment : Electronic Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : PRACTUM224-1S

Serial No. : 0035106544

ID. No. : -

Capacity : 220 g

Resolution : 0.0001 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature :  $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity :  $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure :  $(1010 \pm 10)$  hPa

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

**COPY**

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea  
( Mechanical Supervisor )

( / ) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager  
( ) MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.  
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.021-161124 R.05



CERTIFICATE No. : M25-0359

CSR No. : 250252

Page : 2 of 3

Equipment : Electronic Balance  
Manufacturer : Sartorius  
Model : PRACTUM224-1S  
Serial No. : 0035106544  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

| Instrument Type     | Nominal Value | Serial No. | Cert. No. | Due Date   | Traceability |
|---------------------|---------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Standard Weight Set | 1 mg ~ 500 g  | -          | M2412021S | 02-12-2025 | TCS          |

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit ( SI ) through :

TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :

( / ) Without Adjustment ( ) After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MACHINE (N=10)

| Nominal Value ( g ) | Standard Deviation ( g ) |
|---------------------|--------------------------|
| 200                 | 0.00013                  |

COPY

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 100 g

| Position |         |          |          |          | Maximum Difference ( g ) |
|----------|---------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 1        | 2       | 3        | 4        | 5        |                          |
| 99.9999  | 99.9997 | 100.0001 | 100.0002 | 100.0001 | 0.0003                   |

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M25-0359

CSR No. : 250252

Page : 3 of 3

Equipment : Electronic Balance  
Manufacturer : Sartorius  
Model : PRACTUM224-1S  
Serial No. : 0035106544  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

## CALIBRATION RESULTS : ( Cont.)

( / ) Without Adjustment

( ) After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 100 g

| Nominal Value<br>( g ) | UUC* Reading<br>( g ) | Correction<br>( g ) |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 20                     | 20.0002               | -0.00020            |
| 40                     | 40.0001               | -0.00012            |
| 60                     | 60.0001               | -0.00007            |
| 80                     | 80.0001               | -0.00007            |
| 100                    | 100.0001              | -0.00001            |

## ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

| Nominal Value<br>( g ) | UUC* Reading<br>( g ) | Correction<br>( g ) | Uncertainty<br>( $\pm$ g ) | Coverage Factor<br>( k ) |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| * Unload               | 0.0000                | 0.00000             | 0.00031                    | 2.28                     |
| 0.01                   | 0.0100                | 0.00000             | 0.00031                    | 2.28                     |
| 0.05                   | 0.0500                | 0.00000             | 0.00031                    | 2.28                     |
| 0.1                    | 0.1001                | -0.00009            | 0.00031                    | 2.28                     |
| 0.5                    | 0.5001                | -0.00010            | 0.00032                    | 2.28                     |
| 1                      | 1.0001                | -0.00011            | 0.00032                    | 2.28                     |
| 2                      | 1.9997                | 0.00030             | 0.00032                    | 2.28                     |
| 5                      | 4.9998                | 0.00021             | 0.00032                    | 2.28                     |
| 10                     | 10.0000               | 0.00001             | 0.00032                    | 2.28                     |
| 20                     | 20.0001               | -0.00010            | 0.00031                    | 2.25                     |
| 40                     | 40.0000               | -0.00002            | 0.00032                    | 2.23                     |
| 60                     | 60.0001               | -0.00007            | 0.00032                    | 2.20                     |
| 80                     | 80.0000               | 0.00003             | 0.00033                    | 2.18                     |
| 100                    | 99.9999               | 0.00019             | 0.00033                    | 2.18                     |
| 120                    | 120.0000              | 0.00008             | 0.00034                    | 2.14                     |
| 140                    | 139.9999              | 0.00017             | 0.00036                    | 2.11                     |
| 160                    | 159.9999              | 0.00022             | 0.00037                    | 2.10                     |
| 180                    | 180.0000              | 0.00011             | 0.00039                    | 2.07                     |
| 200                    | 200.0001              | 0.00001             | 0.00039                    | 2.07                     |

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (\*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --

COPY



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sitranggroup.com , Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



## CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M25-0360

CSR No. : 250252

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket  
83110

Equipment : Electronic Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : PRACTUM2101-1S

Serial No. : 0033508410

ID. No. : -

Capacity : 2100 g

Resolution : 0.1 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature :  $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity :  $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure :  $(1010 \pm 10)$  hPa

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

**COPY**

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea  
( Mechanical Supervisor )

( ) MR. PI  
( ) MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.  
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .







CERTIFICATE No. : M25-0360

CSR No. : 250252

Page : 2 of 3

Equipment : Electronic Balance  
Manufacturer : Sartorius  
Model : PRACTUM2101-1S  
Serial No. : 0033508410  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

## REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

| Instrument Type     | Normal Value | Serial No. | Cert. No. | Due Date   | Traceability |
|---------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Standard Weight Set | 1 mg ~ 500 g | -          | M2412021S | 02-12-2025 | TCS          |

## CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022

## TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement

according to the International System of Unit ( SI ) through :

TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

## CALIBRATION RESULTS :


( / ) Without Adjustment ( ) After Adjustment

## DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MACHINE (N=10)

| Nominal Value ( g ) | Standard Deviation ( g ) |
|---------------------|--------------------------|
| 500                 | 0.12                     |

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 200 g

| Position |       |       |       |       | Maximum Difference ( g ) |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 1        | 2     | 3     | 4     | 5     |                          |
| 199.6    | 200.4 | 197.4 | 195.9 | 202.0 | 3.7                      |



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE NO. : M25-0360

CSR No. : 250252

Page : 3 of 3

Equipment : Electronic Balance  
Manufacturer : Sartorius  
Model : PRACTUM2101-1S  
Serial No. : 0033508410  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

**CALIBRATION RESULTS : ( Cont.)**

( / ) Without Adjustment

( ) After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 200 g

| Nominal Value<br>( g ) | UUC* Reading<br>( g ) | Correction<br>( g ) |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 40                     | 40.3                  | -0.30               |
| 80                     | 81.1                  | -1.10               |
| 120                    | 120.9                 | -0.90               |
| 160                    | 159.9                 | 0.10                |
| 200                    | 200.1                 | -0.10               |

**ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE**

| Nominal Value<br>( g ) | UUC* Reading<br>( g ) | Correction<br>( g ) | Uncertainty<br>( $\pm$ g ) | Coverage Factor<br>( k ) |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| * Unload               | 0.0                   | 0.00                | 0.28                       | 2.25                     |
| 1                      | 1.0                   | 0.00                | 0.28                       | 2.25                     |
| 2                      | 2.0                   | 0.00                | 0.28                       | 2.25                     |
| 5                      | 5.0                   | 0.00                | 0.28                       | 2.25                     |
| 10                     | 10.0                  | 0.00                | 0.28                       | 2.25                     |
| 50                     | 49.8                  | 0.20                | 0.28                       | 2.25                     |
| 100                    | 99.8                  | 0.20                | 0.28                       | 2.25                     |
| 150                    | 149.8                 | 0.20                | 0.28                       | 2.25                     |
| 200                    | 199.6                 | 0.40                | 0.28                       | 2.25                     |
| 250                    | 249.5                 | 0.50                | 0.28                       | 2.25                     |
| 300                    | 299.5                 | 0.50                | 0.28                       | 2.25                     |
| 350                    | 349.4                 | 0.60                | 0.28                       | 2.25                     |
| 400                    | 398.7                 | 1.30                | 0.28                       | 2.25                     |
| 450                    | 448.5                 | 1.50                | 0.28                       | 2.25                     |
| 500                    | 499.0                 | 1.00                | 0.28                       | 2.25                     |

**COPY**

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (\*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0024

## CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0655

CSR No. : 250252

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket  
83110

Equipment : Refrigerator

Manufacturer : SANDEN INTERCOOL

Model : SEA-0405

Serial No. : SEA0405-191200194

ID. No. : -

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature :  $(30 \pm 15) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity :  $(60 \pm 20) \%$

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

**COPY**

APPROVED BY

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat  
( Calibration Engineer )

( / ) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager  
( ) MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.  
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T25-0655

CSR No. : 250252

Page : 2 of 4

Equipment : Refrigerator  
Manufacturer : SANDEN INTERCOOL  
Model : SEA-0405  
Serial No. : SEA0405-191200194  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

| Instrument Type                 | Model   | Serial No.  | Cert. No.   | Due Date   | Traceability |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Digital Thermometer with Sensor | 34970 A | MY 44042662 | DAT003/0824 | 01-08-2025 | PSE          |

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021)


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

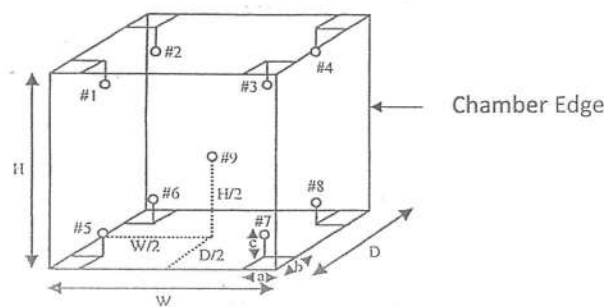

Dimension of the chamber :  $W \times H \times D = 53 \times 130 \times 43$  cm  
Sensor Installation :  $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$  cm

COPY

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .  
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.  
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE NO. : T25-0655

CSR No. : 250252

Page : 3 of 4

Equipment : Refrigerator  
Manufacture : SANDEN INTERCOOL  
Model : SEA-0405  
Serial No. : SEA0405-191200194  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

## CALIBRATION RESULTS : ( Cont.)

( / ) Without Adjustment

( ) After Adjustment

## Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the refrigerator and associates are reported in the manner as shown below

| Cal Point<br>(°C) | Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations |       |       |       |       |       |       |       |        | Uncertainty<br>( ± °C ) |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------------|
|                   | #1                                                     | #2    | #3    | #4    | #5    | #6    | #7    | #8    | Ref. 9 |                         |
| 4                 | 4.970                                                  | 4.632 | 4.119 | 3.822 | 4.508 | 4.076 | 4.555 | 4.308 | 4.126  | 1.4                     |

## Refrigerator Performance Result

The performance of the refrigerator are reported as shown below

| Cal Point<br>(°C) | UUC<br>Setting<br>(°C) | UUC<br>Reading<br>(°C) | Chamber<br>Stability<br>( ± °C ) | Chamber<br>Uniformity<br>( ± °C ) | Overall<br>Variation<br>( ± °C ) |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 4                 | 4                      | 4                      | 0.98                             | 1.6                               | 2.9                              |

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

COPY




CERTIFICATE NO. : T25-0655

CSR No. : 250252

Page : 4 of 4

### Report Graph

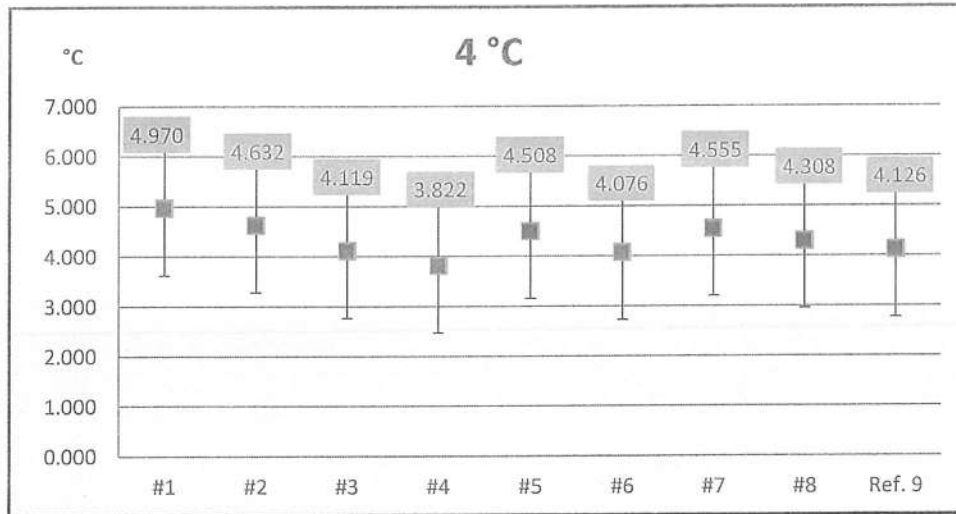

COPY

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --





PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0024

## CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0656

CSR No. : 250252

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket  
83110

Equipment : Incubator

Manufacturer : ACCUPLUS

Model : I250

Serial No. : 0408-0415-0034

ID. No. : -

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

COPY

APPROVED BY

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat  
( Calibration Engineer )

( / )  
( )

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.  
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T25-0656

CSR No. : 250252

Page : 2 of 4

Equipment : Incubator  
Manufacturer : ACCUPLUS  
Model : I250  
Serial No. : 0408-0415-0034  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

| Instrument Type                 | Model   | Serial No.  | Cert. No.   | Due Date   | Traceability |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Digital Thermometer with Sensor | 34970 A | MY 44042662 | DAT003/0824 | 01-08-2025 | PSE          |

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021)


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

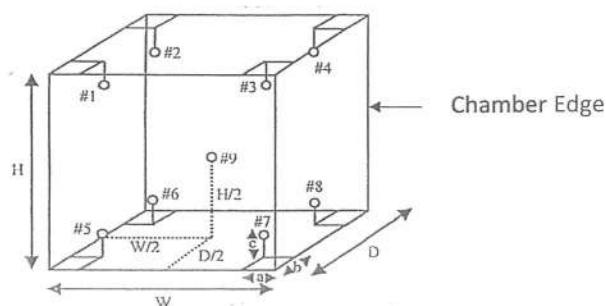

Dimension of the chamber :  $W \times H \times D = 78 \times 100 \times 45$  cm  
Sensor Installation :  $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$  cm

COPY

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .  
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.  
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T25-0656

CSR No. : 250252

Page : 3 of 4

Equipment : Incubator  
Manufacture : ACCUPLUS  
Model : I250  
Serial No. : 0408-0415-0034  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

## CALIBRATION RESULTS : ( Cont.)

( / ) Without Adjustment

( ) After Adjustment

## Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the incubator and associates are reported in the manner as shown below

| Cal Point<br>(°C) | Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations |        |        |        |        |        |        |        |        | Uncertainty<br>( ± °C ) |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
|                   | #1                                                     | #2     | #3     | #4     | #5     | #6     | #7     | #8     | Ref. 9 |                         |
| 20                | 20.204                                                 | 20.344 | 20.218 | 20.310 | 19.964 | 20.077 | 20.086 | 19.786 | 20.102 | 0.36                    |

## Incubator Performance Result

The performance of the incubator are reported as shown below

| Cal Point<br>(°C) | UUC<br>Setting<br>(°C) | UUC<br>Reading<br>(°C) | Chamber<br>Stability<br>( ± °C ) | Chamber<br>Uniformity<br>( ± °C ) | Overall<br>Variation<br>( ± °C ) |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 20                | 20                     | 20                     | 0.16                             | 0.47                              | 0.79                             |

COPY

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration




CERTIFICATE NO. : T25-0656

CSR No. : 250252

Page : 4 of 4

### Report Graph

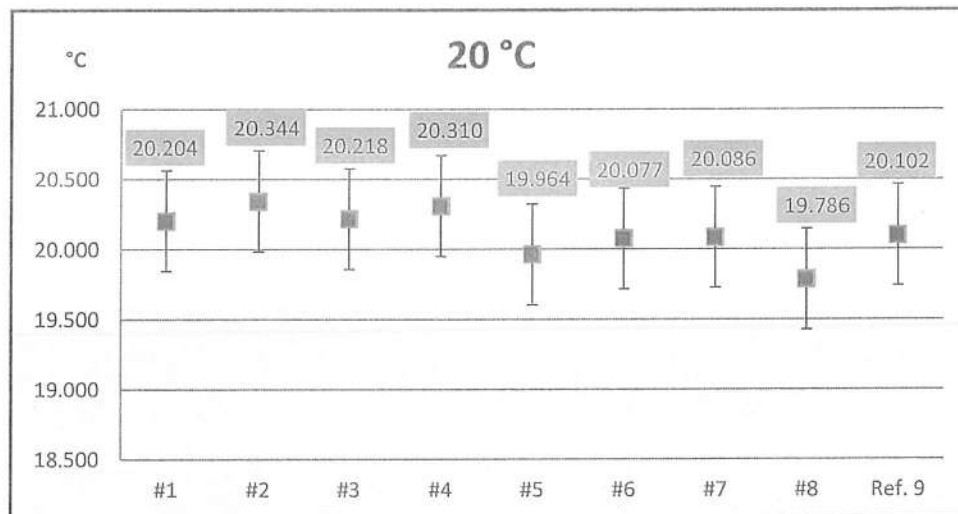

**COPY**

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0024

## CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T25-0657

CSR No. : 250252

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket  
83110

Equipment : Water Bath

Manufacturer : Memmert

Model : WNB 22

Serial No. : L522.1030

ID. No. : -

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 10) °C

Relative Humidity : (50 ± 20) %

Date of Received : 1-Mar-2025

Date of Calibration : 1-Mar-2025

Date of Issued : 4-Mar-2025

**COPY**

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Attapol Juntasurat  
( Calibration Engineer )

APPROVED SIGNATORY

( / ) MR. PIYAPONG RATTANAKAN / Calibration Manager  
( ) MR. BUNPOT SUWANNARAT / Technical Manager

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.  
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .







CERTIFICATE No. : T25-0657

CSR No. : 250252

Page : 2 of 4

Equipment : Water Bath  
Manufacturer : Memmert  
Model : WNB 22  
Serial No. : L522.1030  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Calibration : 1-Mar-2025

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

| Instrument Type                 | Model   | Serial No.  | Cert. No.    | Due Date   | Traceability |
|---------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Digital Thermometer with Sensor | 34970 A | MY 44042662 | DAT003W/0824 | 02-08-2025 | PSE          |

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.161 based on ASTM E715 : 80 (re-approved 2022)

TRACEABILITY :


This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit ( SI ) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

( / ) Without Adjustment ( ) After Adjustment

Sensor Installation Diagram



COPY

Dimension of the chamber :  $W \times H \times D = 35 \times 29 \times 22$  cm  
Sensor Installation :  $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$  cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T25-0657

CSR No. : 250252

Page : 3 of 4

Equipment : Water Bath  
Manufacture : Memmert  
Model : WNB 22  
Serial No. : L522.1030  
ID. No. : -  
Date of Received : 1-Mar-2025  
Date of Received : 1-Mar-2025

## CALIBRATION RESULTS : ( Cont.)

( / ) Without Adjustment

( ) After Adjustment

## Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the water bath and associates are reported in the manner as shown below

| Cal Point<br>(°C) | Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations |       |       |       |       | Uncertainty<br>( ± °C ) |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
|                   | #1                                                     | #2    | #3    | #4    | #5    |                         |
| 85                | 84.58                                                  | 84.80 | 84.57 | 84.60 | 84.77 | 0.35                    |
| 95                | 94.85                                                  | 95.05 | 94.85 | 95.08 | 95.15 | 0.44                    |

## Water Bath Performance Result

The performance of the water bath are reported as shown below

| Cal Point<br>(°C) | UUC<br>Setting<br>(°C) | UUC<br>Reading<br>(°C) | Water Bath<br>Stability<br>( ± °C ) | Water Bath<br>Uniformity<br>( ± °C ) | Overall<br>Variation<br>( ± °C ) |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 85                | 85.0                   | 85.0                   | 0.11                                | 0.26                                 | 0.40                             |
| 95                | 95.0                   | 95.0                   | 0.25                                | 0.37                                 | 0.69                             |

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

COPY :





CERTIFICATE NO. : T25-0657

CSR No. : 250252

Page : 4 of 4

### Report Graph

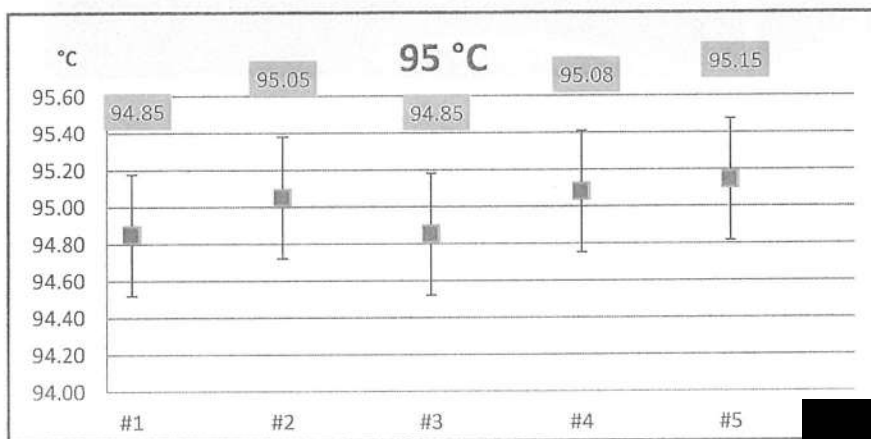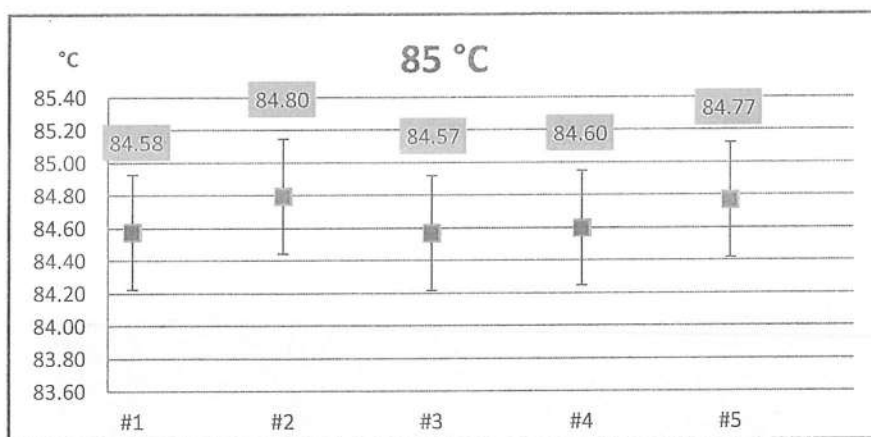

**COPY**

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --

# Certificate of Calibration

Number of Page(s)

1 of 3

**Certificate No.** BSCC-UV-081/25  
**Equipment** UV/Vis Spectrophotometer  
**Model** UV-1800  
**Manufacturer** SHIMADZU  
**Serial No.** A11635305233 CD  
**ID No.** UV-03  
**Date of receipt** 5 March 2025  
**Date of calibration** 5 March 2025  
**Date of issue** 7 March 2025

**Customer name** Southern Thai Consulting Co.,Ltd.

**Address** 59/45 Moo 5, Srisoontorn, Talang, Phuket 83110

**Temperature** (24.2-26.8) °C (On site)  
**Humidity** (54.6-64.0) %RH (On site)

**Equipment condition** Good Operation

**Calibration Location** Laboratory

**Calibration Procedure** In-house method WI-UV-702-01 based on ASTM E275-01

**Traceability** Wavelength Accuracy is traceable to certificate No. 118114 and 118119  
Photometric Accuracy is traceable to certificate No. 118970 and 119006  
Stray Light is traceable to certificate No. 118111  
The above certificate are traceable to SI unit through Starna Scientific Ltd.  
(UKAS accredited calibration laboratory NO. 0659)

**Calibrated by** Mr.Sarunkorn Pukaothong

**COPY**

Approved by



**Mr.Pannaphong Phanmekakul**  
Technical Manager

calibrated item(s) as mention in this report / certificate.  
The results are prohibited and also shall not be reproduced  
except in full, without written approval of the Bara Scientific Co., Ltd.



# Certificate of Calibration

Certificate No. **BSCC-UV-081/25**

Number of Page(s) **2 of 3**

## Calibration Results:

### 1.Wavelength Accuracy

| Certified Wavelength (nm) | UUC (nm) | Error (nm) | Uncertainty ( $\pm$ nm) |
|---------------------------|----------|------------|-------------------------|
| 360.89                    | 360.81   | -0.08      | 0.18                    |
| 418.53                    | 418.50   | -0.03      | 0.18                    |
| 513.39                    | 513.39   | 0.00       | 0.18                    |
| 572.99                    | 573.12   | 0.13       | 0.18                    |
| 879.41                    | 879.40   | -0.01      | 0.18                    |

### 2.Photometric Accuracy (UV)

| Wavelength (nm) | Certified Absorbance (A) | UUC (A) | Error (A) | Uncertainty ( $\pm$ A) |
|-----------------|--------------------------|---------|-----------|------------------------|
| 235             | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                    |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                    |
| 257             | 0.0000                   | 0.0001  | 0.0001    | 0.0075                 |
|                 | 0.8616                   | 0.8587  | -0.0029   | 0.0075                 |
| 313             | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                    |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                    |
| 350             | 0.0000                   | 0.0001  | 0.0001    | 0.0075                 |
|                 | 0.6393                   | 0.6382  | -0.0011   | 0.0075                 |

\*CNR = Customer not request

The above results are valid exclusively for the purpose of calibration / certificate.  
Advertising the report / Certificate and its content shall not be reproduced  
except in full, without written approval of the Bara Scientific Co., Ltd.



# Certificate of Calibration

Certificate No. **BSCC-UV-081/25**

Number of Page(s)

3 of 3

## Calibration Results:

### 3. Photometric Accuracy (Visible)

| Wavelength (nm) | Certified Absorbance (A) | UUC (A) | Error (A) | Uncertainty ( $\pm A$ ) |
|-----------------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| 420.0           | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
| 440.0           | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
| 465.0           | 0.0000                   | 0.0000  | 0.0000    | 0.0042                  |
|                 | 0.5188                   | 0.5186  | -0.0002   | 0.0042                  |
|                 | 0.6627                   | 0.6627  | 0.0000    | 0.0042                  |
|                 | 0.9424                   | 0.9425  | 0.0001    | 0.0042                  |
| 546.1           | 0.0000                   | 0.0000  | 0.0000    | 0.0042                  |
|                 | 0.5199                   | 0.5199  | 0.0000    | 0.0042                  |
|                 | 0.6989                   | 0.6988  | -0.0001   | 0.0042                  |
|                 | 0.9972                   | 0.9974  | 0.0002    | 0.0042                  |
| 590.0           | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
|                 | CNR                      | CNR     | CNR       | CNR                     |
| 635.0           | 0.0000                   | 0.0000  | 0.0000    | 0.0042                  |
|                 | 0.5611                   | 0.5614  | 0.0003    | 0.0042                  |
|                 | 0.7637                   | 0.7636  | -0.0001   | 0.0042                  |
|                 | 1.0942                   | 1.0944  | 0.0002    | 0.0042                  |

\*CNR = Customer not request

### 4. Stray Light\*

| Standard cut-off wavelength (nm) | Unit Under Calibration |                  |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
|                                  | Wavelength (nm)        | Transmission (%) |
| 201.15 $\pm$ 0.11nm              | 200.90                 | 0.9820           |

The Stray light transmission reference is less than 1.0%T and Stray light absorption is less than 0.05%T

\*Stray Light not NSC-ONSC Accredited.

The measurement uncertainty is base on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2

\*\*\*End of Certificate\*\*\*

The above results are valid exclusively for the calibrated item(s) as mention in this report / certificate.  
Advertising the report / Certificate and publicity of the results are prohibited and also shall not be reproduced  
except in full, without written approval of the Bara Scientific Co., Ltd.

CERT.No.: HS-W037F

Certificate of Calibration

Calibration Date : 18 Jun 25

Model : YSI Pro20i

Submitted by : SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

S/N : 23D101243

59/45 Moo 5 T.Srisoontorn, A.Talang Phuket 83110

Probe : -

S/N : -

ID NO. : -

Avg Room Temp 25 °C

Air Temp ref : S/N. F8065C26

Avg Water Temp 25 °C

Barometric ref : S/N. F8065C26

Air Pressure : 760.00 mmHg

Water Temp ref : -

Salinity : 0 ppt

ID NO. HS001

Technician : Kittipong M.

### Calibration Details

| Calibration Point     | 100% air sat.<br>(@25 °C, DO = 8.26 mg/l) | (status) | (status) |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| Measurement 1 (mg/l)  | 8.26                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 2 (mg/l)  | 8.26                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 3 (mg/l)  | 8.25                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 4 (mg/l)  | 8.25                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 5 (mg/l)  | 8.24                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 6 (mg/l)  | 8.24                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 7 (mg/l)  | 8.24                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 8 (mg/l)  | 8.25                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 9 (mg/l)  | 8.27                                      | (PASS)   | -        |
| Measurement 10 (mg/l) | 8.29                                      | (PASS)   | -        |

|                  |      |      |   |
|------------------|------|------|---|
| Mean Measurement | 8.25 | mg/l | - |
| Inaccuracy       | 0.01 | mg/l | - |

Overall Status (PASS)

### Manufacturer Specification

Accuracy = +/- 0.2 mg/l

1) This certificate is issued based on the result that are found as shown on date and place of test only.

2) The calibration procedure followed in accordance with Harikul Science Co., Ltd.

3) This result shall not be used for advertisement



Technician Signature

(Kittipong Maekwong)



Laboratory Manager

(Supreecha Sumaritam)

## ภาคผนวกที่ 5

มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย



แนวการจัดทำ  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐาน  
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๔

จัดทำโดย      เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ  
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

## คำนำ

โรงแรมเดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต ได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและมีความพร้อม สามารถระงับเหตุ รวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

โรงแรมเดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งเกิดทักษะในการปฏิบัติตลอดจนนำผลการ ประเมินฝึกซ้อมแผน ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบรองรับภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โรงแรมเดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต



## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

### หลักการและเหตุผล

ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ และให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบ กิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ ตามแนวทางการจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โดยสำนักความปลอดภัย แรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และจัดเก็บแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการ พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้จัดทำแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัยไว้ รายละเอียดแยกได้ ดังนี้

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการจัดทำมาตรการป้องกันและตรวจตรา และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
๒. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินจากอัคคีภัย
๓. เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุด
๔. เพื่อเป็นการฟื้นฟูที่เกิดเหตุให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
๕. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย

### แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

๑. แผนการตรวจตรา
๒. แผนการอบรม
๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
๔. แผนการดับเพลิง
๕. แผนอพยพหนีไฟ
๖. แผนบรรเทาทุกข์

## ๑. แผนการตรวจตรา

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของ การเกิดเพลิงไหม้ ต้องวิเคราะห์ สำรวจ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอัคคีภัย และ ต้องจัดหาวิธีการ อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน และระงับ แจ้งเตือนอัคคีภัยไว้อย่างเหมาะสม และเฝ้าระวังโดย กำหนดแผนการตรวจตราไว้ดังต่อไปนี้

| อาคาร | สารเชื้อเพลิง/สารไวไฟที่สะสมในพื้นที่และการจัดเก็บ               | จุดกำเนิดความร้อน/จุดเสี่ยงที่อาจเกิดไฟไหม้                        | อุปกรณ์ดับเพลิง                | ทางหนีไฟ                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ๑     | เอกสารจัดเก็บ เข้าแฟ้มใส่ในตู้, แก๊สหุงต้ม จัดเก็บในครัว,ห้องพัก | คอมพิวเตอรฺ์,โทรทัศน์,ห้องเก็บเอกสาร,ห้องครัว                      | ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง | บันไดใหญ่                       |
| ๒     | เอกสารเก็บบน ชั้นวาง , แก๊สหุงต้ม จัดเก็บในครัว                  | คอมพิวเตอรฺ์,โทรทัศน์,ห้องเก็บเอกสาร,ห้องครัว                      | ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง | ประตูด้านหลัง, บันไดวน          |
| ๓     | ห้องพัก                                                          | โทรทัศน์,ไดร์เป่าผม, เตาไรด                                        | ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง | ประตูกลาง, บันไดใหญ่, บันไดเล็ก |
| ๔     | เอกสารเก็บบน ชั้นวาง , ห้องพัก                                   | คอมพิวเตอรฺ์,โทรทัศน์,ไดร์เป่าผม, เตาไรด                           | ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง | ประตูกลาง, บันไดใหญ่, บันไดเล็ก |
| ๕     | แก๊สหุงต้ม จัดเก็บในครัว, ห้องพัก                                | คอมพิวเตอรฺ์,โทรทัศน์,ห้องเก็บเอกสาร,ห้องครัว, ไดร์เป่าผม , เตาไรด | ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง | ประตูกลาง, บันไดใหญ่, บันไดเล็ก |
| ๖     | ห้องพัก                                                          | โทรทัศน์,ไดร์เป่าผม , เตาไรด                                       | ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง | บันไดใหญ่, บันไดเล็ก            |
| ๗     | ห้องพัก                                                          | โทรทัศน์,ไดร์เป่าผม , เตาไรด                                       | ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง | บันไดใหญ่, บันไดเล็ก            |

| อาคาร | สารเชื้อเพลิง/สารไวไฟที่<br>สะสมในพื้นที่และการ<br>จัดเก็บ | จุดกำเนิดความร้อน/จุดเสี่ยงที่<br>อาจเกิดไฟไหม้ | อุปกรณ์<br>ดับเพลิง                   | ทางหนีไฟ                |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| ๘.๑   | ห้องพัก                                                    | โทรทัศน์, ไดร์เป่าผม , เตารีด                   | ถังดับเพลิง,<br>สายฉีดน้ำ<br>ดับเพลิง | บันไดใหญ่,<br>บันไดเล็ก |
| ๘.๒   | ห้องพัก                                                    | โทรทัศน์, ไดร์เป่าผม , เตารีด                   | ถังดับเพลิง,<br>สายฉีดน้ำ<br>ดับเพลิง | บันไดใหญ่,<br>บันไดเล็ก |
| ๙     | ห้องพัก                                                    | โทรทัศน์, ไดร์เป่าผม , เตารีด                   | ถังดับเพลิง,<br>สายฉีดน้ำ<br>ดับเพลิง | บันไดใหญ่,<br>บันไดเล็ก |

#### การตรวจตราประจำเดือน

อาคารสำนักงาน อาคารเก็บพัสดุ อาคารห้องพัก มอบหมายให้ ผู้จัดการประจำกะ (Duty Manager) เป็นผู้ตรวจตรา อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง


#### การตรวจตราอุปกรณ์เพื่อการระงับอัคคีภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควรดำเนินการตรวจตรา ดังนี้

๑. จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้
๒. การใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟ
๓. ของเสียดัดไฟง่าย
๔. เชื้อเพลิง
๕. แหล่งความร้อนต่างๆ
๖. อุปกรณ์ดับเพลิง
๗. ทางหนีไฟ

ทั้งนี้ควรจัดทำและปรับปรุง (Update) แผนผังทางหนีไฟ, บ้ายหนีไฟ, ถังดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, อุปกรณ์หนีไฟ ให้มีความพร้อมใช้งาน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบให้คปอ. ทราบทุกเดือน

การดำเนินการตามแผนการตรวจตรา

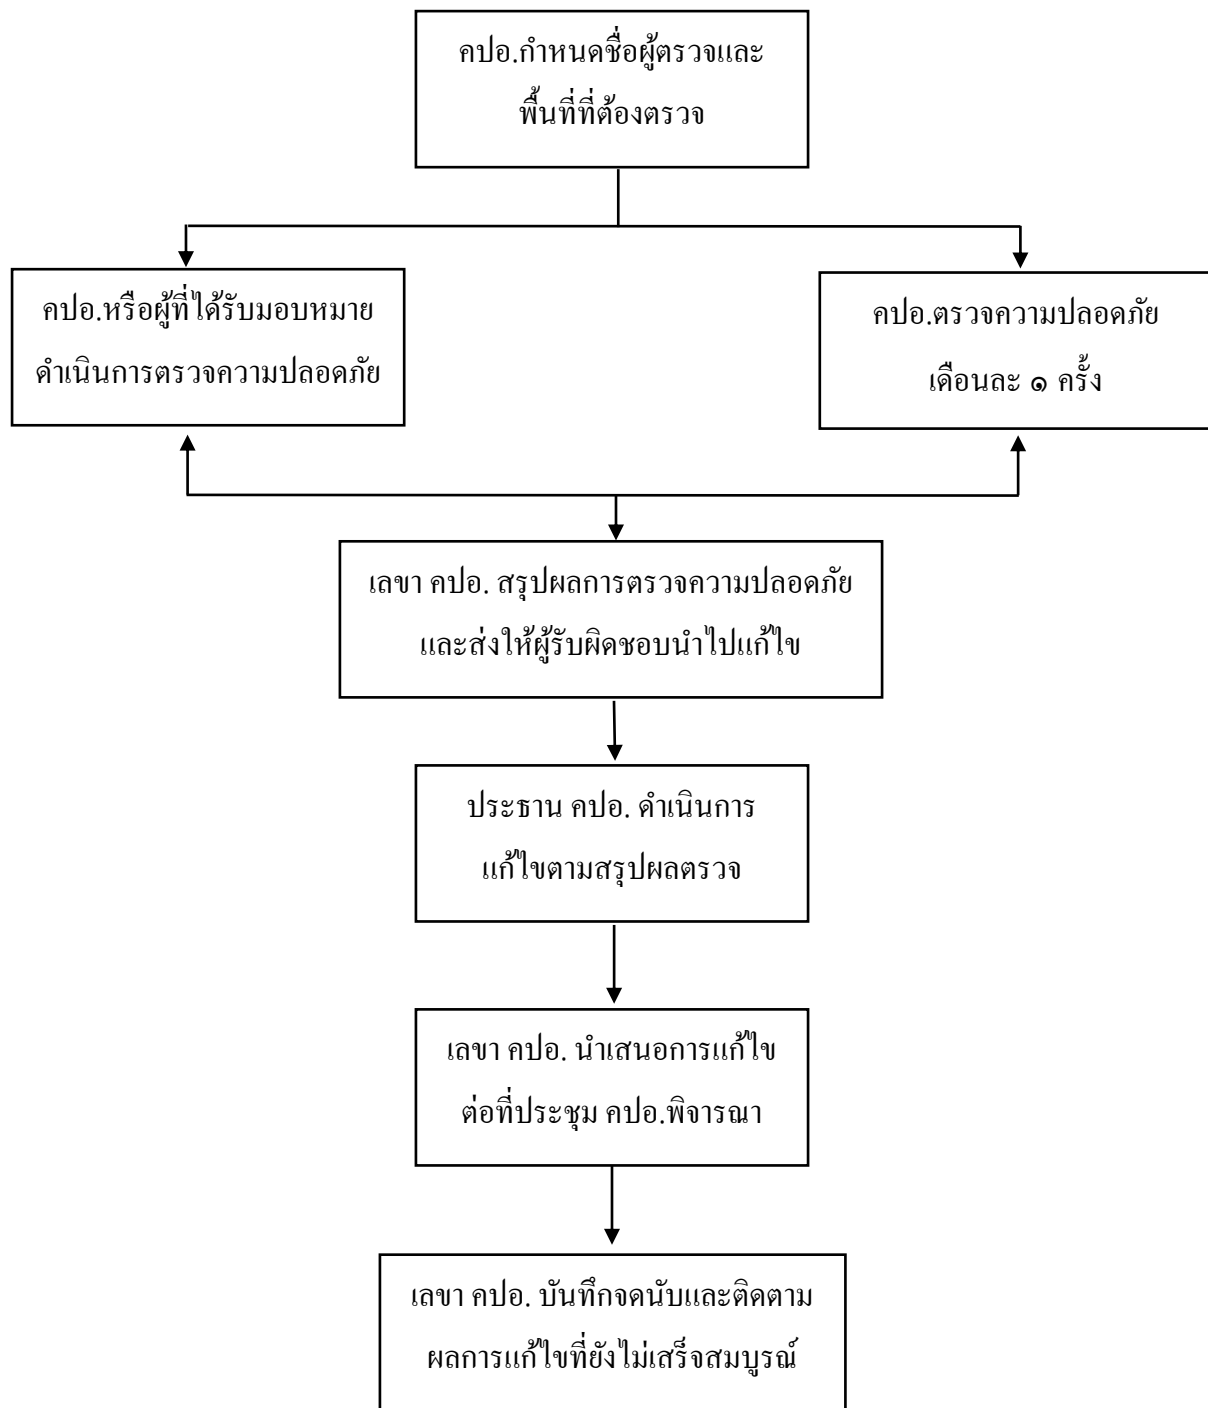

หมายเหตุ คปอ. หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

## ๒. แผนการอบรม

เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคาร และสถานที่นำมาซึ่งความสูญเสียต่อธุรกิจการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การผลิต การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน


### ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดทำในแผนการอบรม

- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

### ตัวอย่างของหลักสูตรที่ควรจัดทำในแผนการอบรม

- การปฐมพยาบาล
- การผายปอดและนวดหัวใจ

### แผนฝึกซ้อมดับเพลิง

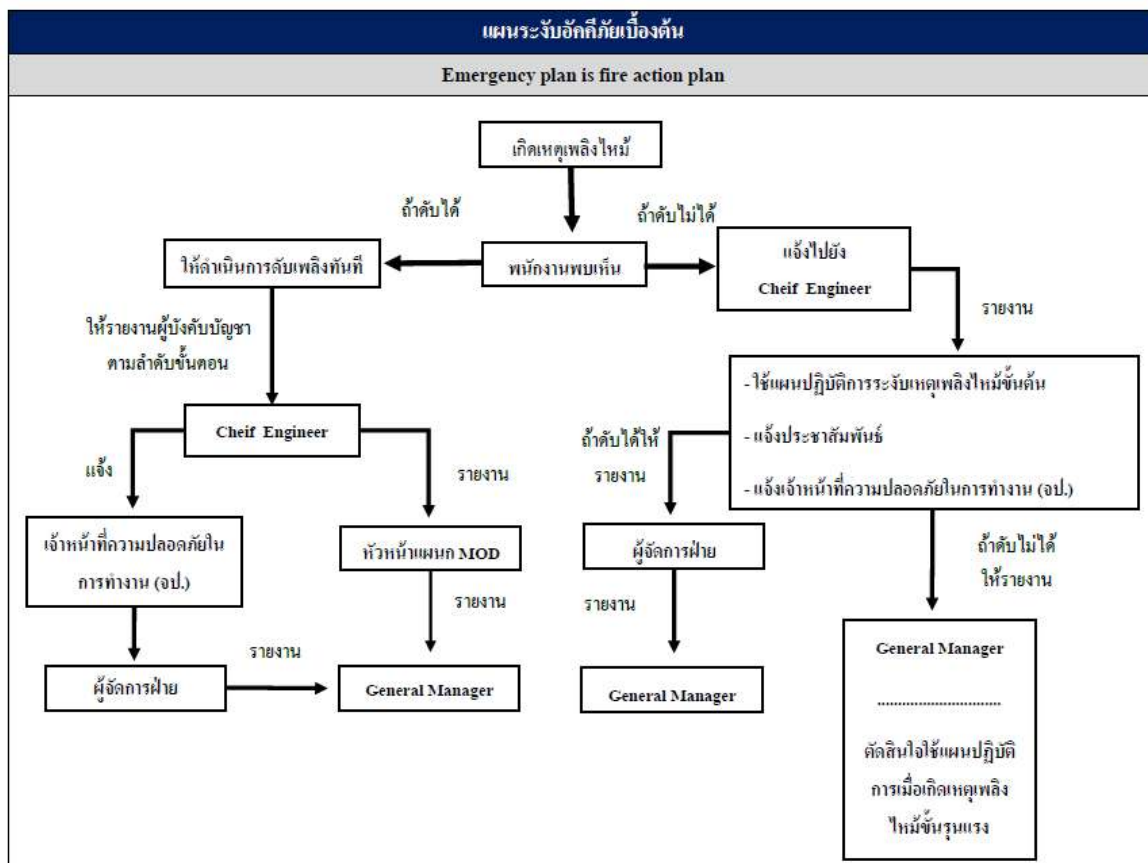



### ๓. แผนการณรงก์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการณรงก์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถาน ประกอบการ โดยเป็น การสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้เกิด ขึ้นกับพนักงานทุกระดับและ ลูกจ้าง โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดำเนินการณรงก์ ดังนี้


๑. จัดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า, ตู้ MDB ทุกเดือนกรณีมีตู้ MDB
๒. ตรวจสอบความปลอดภัย และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
๓. กำหนดมาตรการหรือระเบียบ ควบคุมผู้รับเหมา, Supplier, บุคคลภายนอก ที่จะ เข้ามา ทำงานในอาคารอย่างปลอดภัย
๔. ให้กรรมการชั้นตรวจสอบดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ดังนี้
  ๑. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานก่อนกลับบ้านทุกครั้ง
  ๒. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณอาคารสำนักงาน ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ให้
  ๓. จัดขยะ หรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ออกจากที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
  ๔. ห้ามจัดวางอุปกรณ์, สิ่งของ ทับสายไฟ, ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ
  ๕. ห้ามนำวัสดุ สิ่งของ, สารไวไฟ ใกล้ตู้ MDB, อุปกรณ์ทำความร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้า
  ๖. การทำงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (การเชื่อม, ตัด) ในอาคาร สำนักงาน ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
  ๗. ตรวจสอบสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ เช่น ตู้ MDB, จุดสูบบุหรี่
๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อความ ปลอดภัย ดังนี้
  ๑. ใช้มาตรการ 5 ส. ในสำนักงาน
  ๒. ตรวจสอบให้บุคคลภายนอก บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
  ๓. เผื่อระวังการก่อวินาศภัย บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
  ๔. พบสิ่งทีอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ให้รับรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

### ๔. แผนการดับเพลิง


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนด แผนการระงับ อัคคีภัย โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติผู้รับผิดชอบ และหน้าที่ในการปฏิบัติ โดยแบ่งแผน เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑. แผนระดับ(ระงับเหตุเมื่อพบเหตุ)
๒. แผนระดับ 2 (ระงับเหตุขั้นต้น)
๓. แผนระดับ 3 (ระงับเหตุขั้นรุนแรง)

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับ ๑ – ๒ – ๓

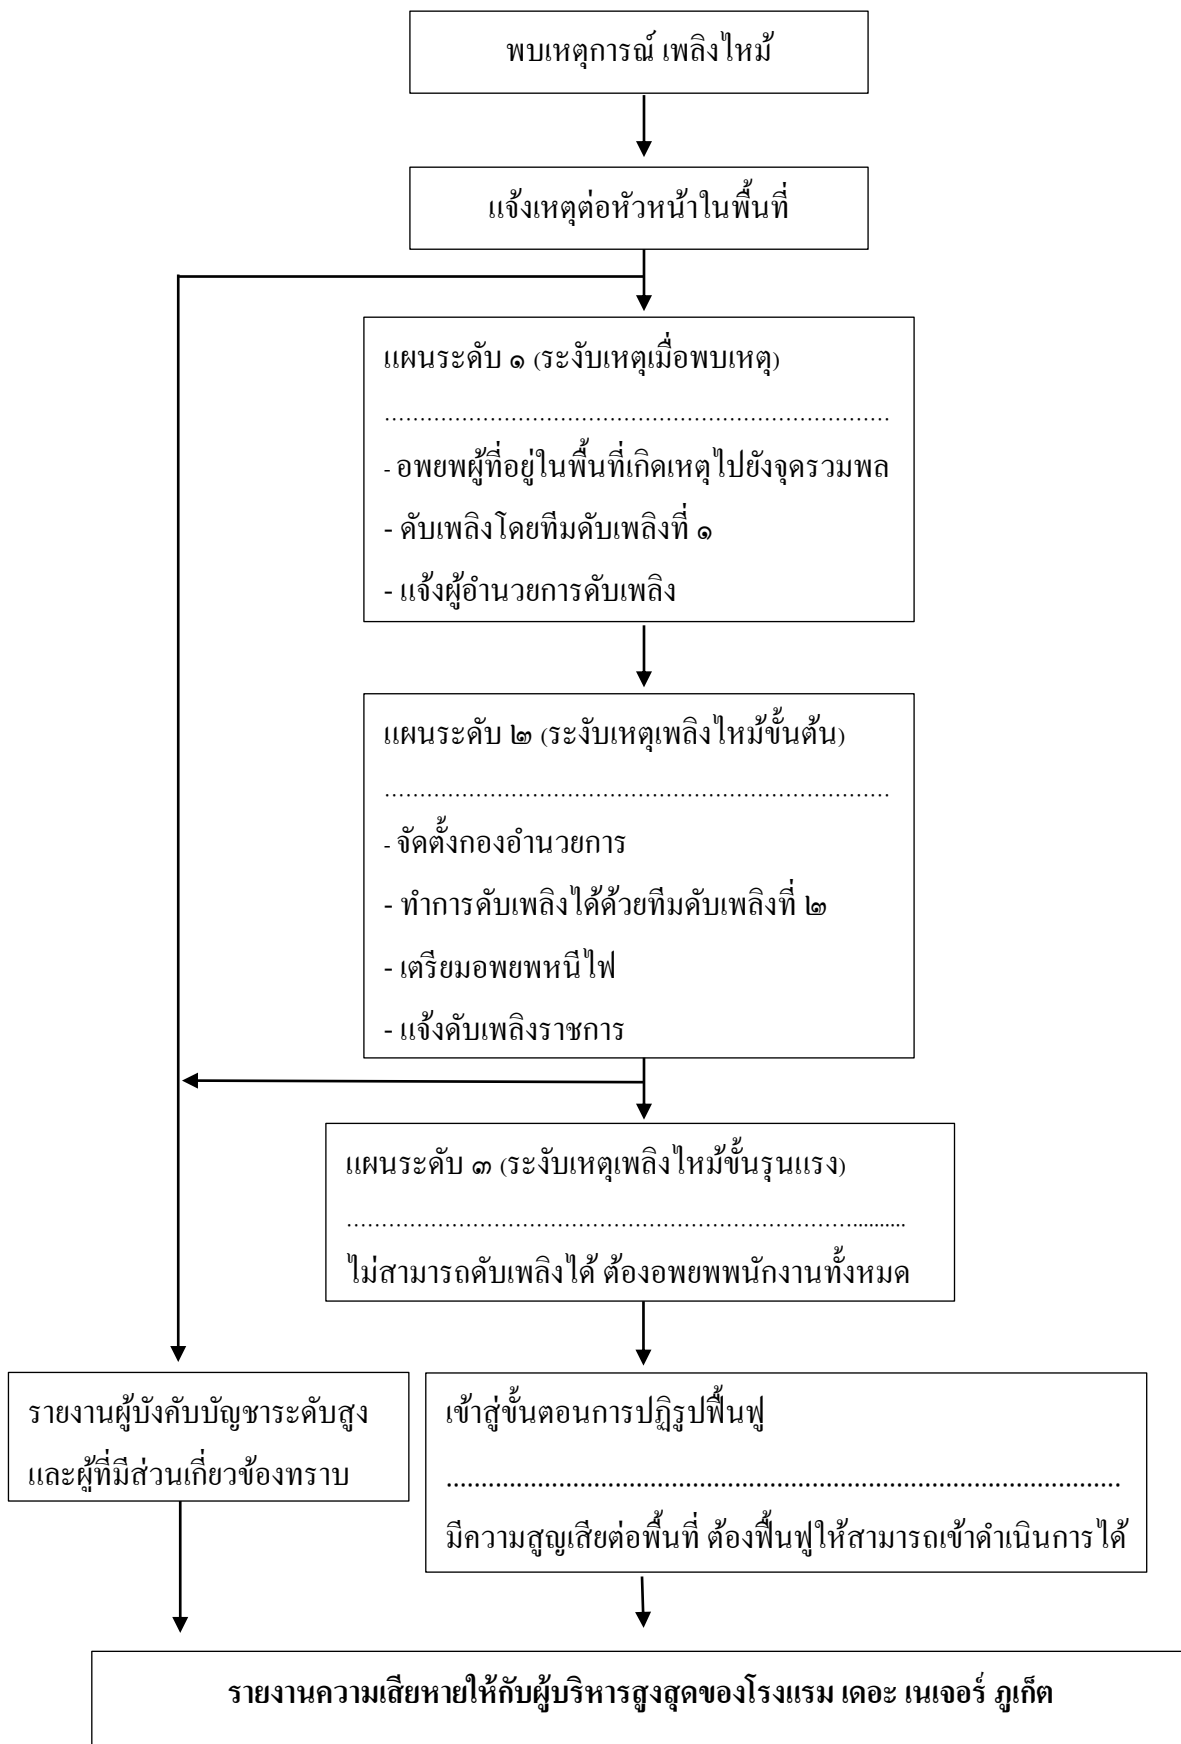

แผนระดับ ๑ (ระงับเหตุเมื่อพบเหตุ)

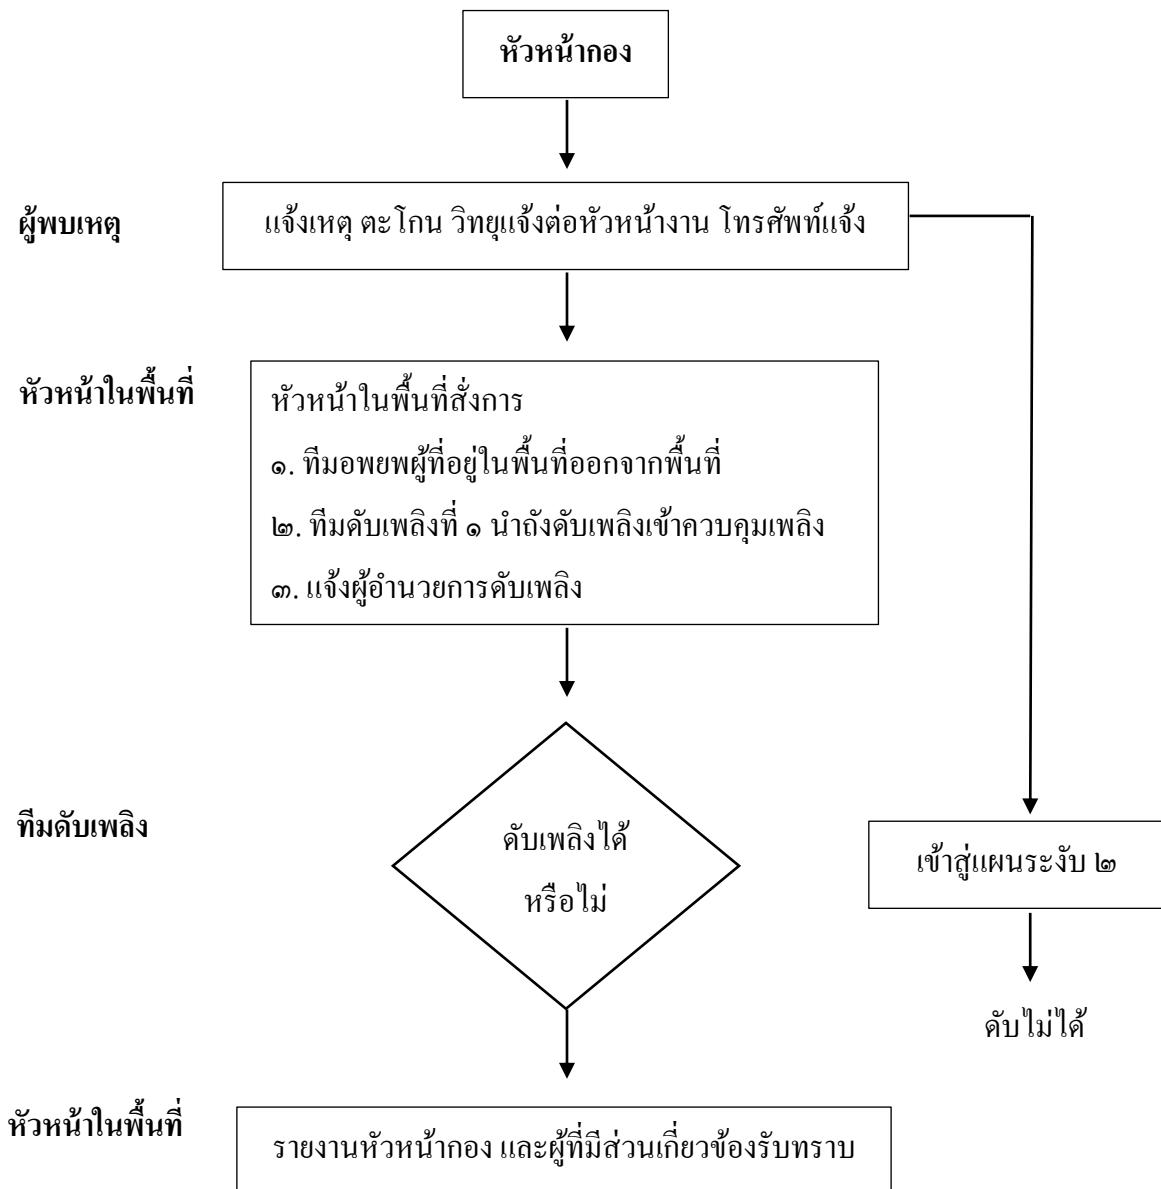

โครงสร้างทีมฉุกเฉินย่อยในพื้นที่


| อาคาร    | หัวหน้าพื้นที่                     | ทีมดับเพลิง                          | ทีมอพยพและค้นหา |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| ทุกอาคาร | หัวหน้าแผนกและ<br>ผู้จัดการประจำกะ | ทีมดับเพลิงที่ ๑<br>ทีมดับเพลิงที่ ๒ | ทีมอพยพที่ ๑    |

### หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

- ผู้พบเหตุ
  ๑. เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ให้รีบแจ้งหัวหน้าในพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
  ๒. ไปรวมกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ เตรียมอพยพ
- หัวหน้าในพื้นที่ (คุณสมบัติ ต้องเป็นระดับหัวหน้างาน มีความอาวุโสเป็นผู้นำ)
  ๑. ไปจุดเกิดเหตุและประเมินสถานการณ์
  ๒. แจ้งทีมนำอพยพให้อพยพบุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่องานไปจุดรวมพลทันที
  ๓. แจ้งทีมดับเพลิงนำถังดับเพลิงไปดับที่จุดเกิดเหตุทันที
- ผู้นำอพยพที่จะเกิดเหตุ (เสียงดัง พังซัด มีความอาวุโส)
  ๑. นำอุปกรณ์ในการอพยพ เช่น ไฟฉาย ธง แบบเชือกข้อ
  ๒. แจ้งให้พนักงานในพื้นที่เตรียมตัวหยุดการทำงานเก็บเอกสารสำคัญและเตรียมอพยพ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้
 

“ ข้าพเจ้า.....ชื่อ – นามสกุล.....เป็นผู้นำอพยพในพื้นที่ ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่.....ขอให้ทุกคนเก็บทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารสำคัญและให้อพยพตาม ข้าพเจ้าไปจุดรวมพลที่.....เดี๋ยวนี้ ”
  ๓. ให้นำผู้อพยพไปตามเส้นทางหนีไฟ หรือหากอพยพไปช่องทางบันไดปกติให้อพยพโดยเร็ว
  ๔. ถึงจุดรวมพลให้สำรวจรายชื่อให้ครบถ้วนหากพบผู้สูญหายให้รีบแจ้งเพื่อค้นหา
- ทีมดับเพลิง
  ๑. นำทีมดับเพลิงไปที่จุดเกิดเหตุโดยปฏิบัติดังนี้
    - ดึงสลักออกจากคันบีบ และจับปลายสายให้แน่น
    - กดคันบีบและฉีดไปยังฐานไฟและสายหัวฉีดซ้าย
    - ขวาทิ้งเพื่อคุมไฟ
  ๒. ระดมถังดับเพลิงจากจุดใกล้ที่สุดมาดับอย่างต่อเนื่อง

**แผนระดับ ๒ (ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น)**

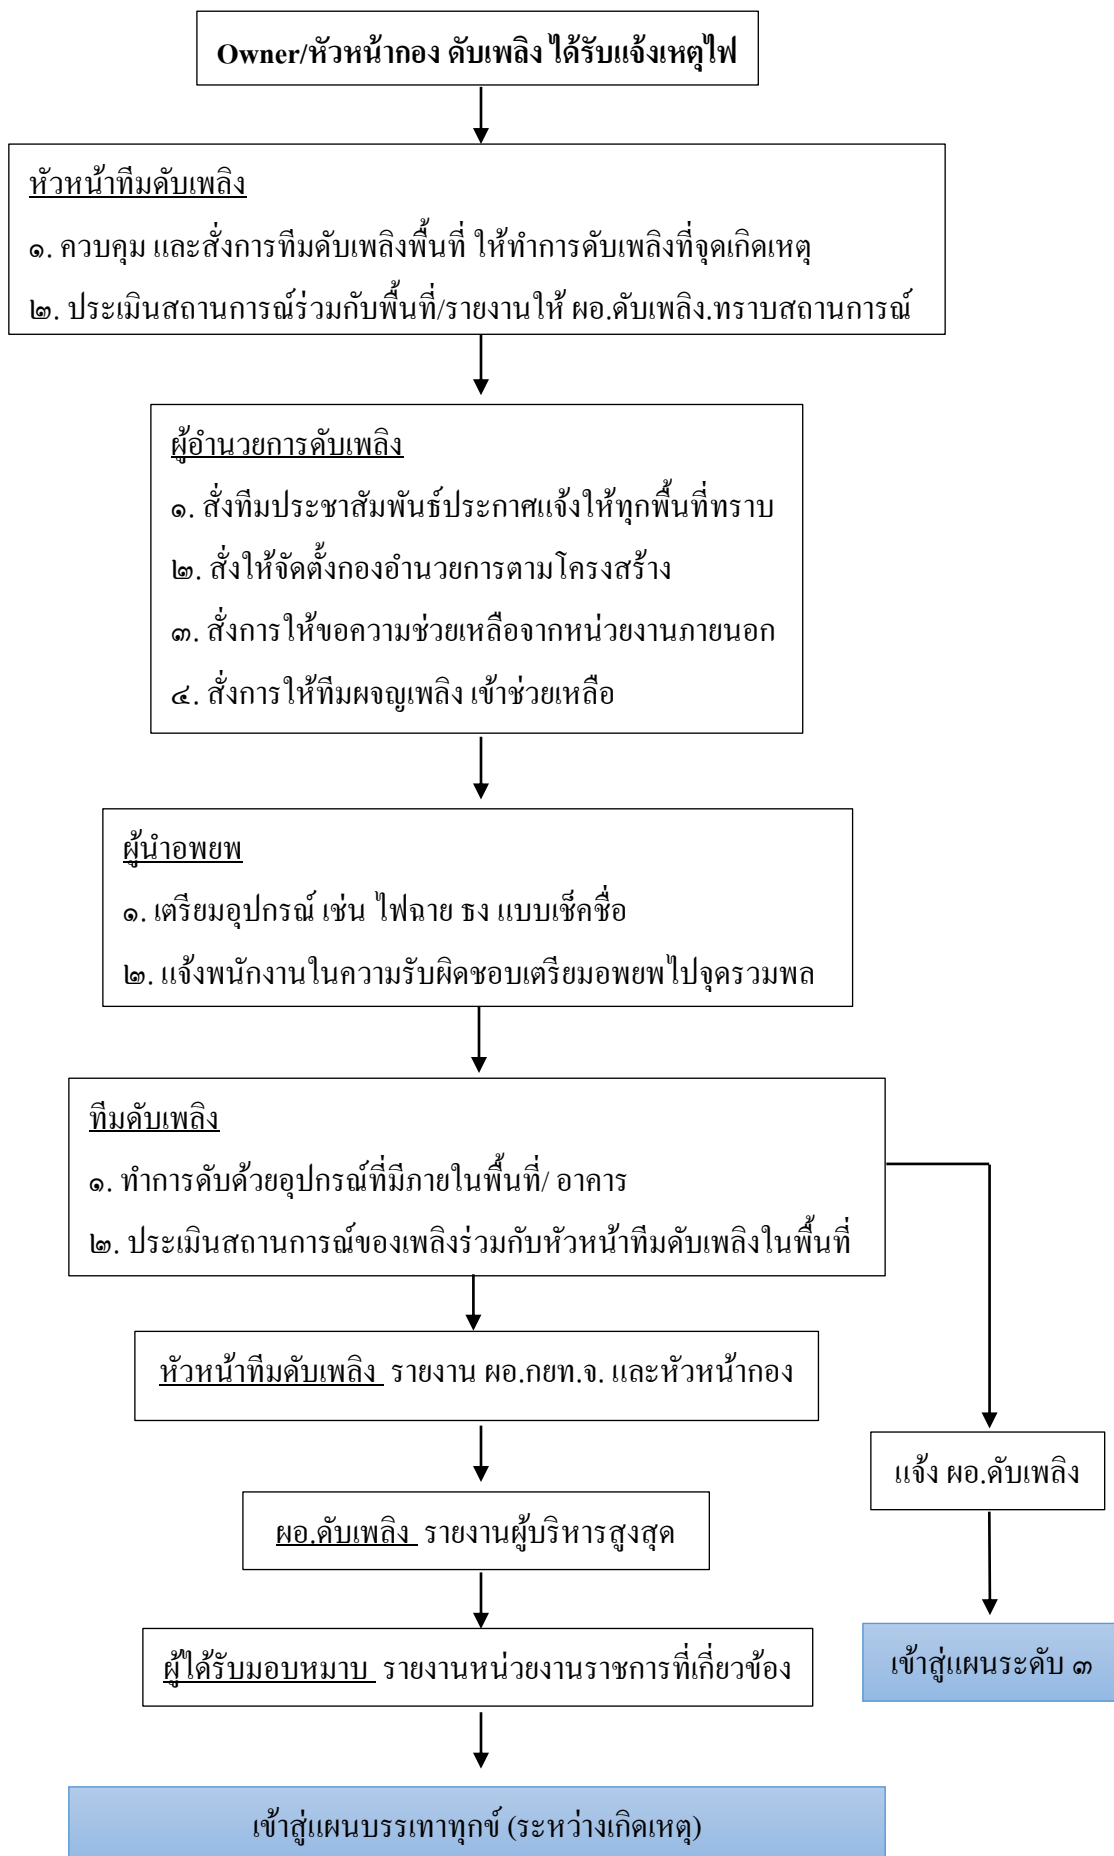



### หน้าที่ผู้รับผิดชอบ


- หัวหน้าในพื้นที่ (จุดเกิดเหตุ)
  ๑. รายงานสถานการณ์และรอรับคำสั่ง จากผู้อำนวยการดับเพลิง
  ๒. ซึ่งจุดเกิดเหตุให้ทีมดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง และถอนตัวไปยังจุดรวมพล
- ทีมดับเพลิง (จุดเกิดเหตุ)
  ๑. ระดมดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงไปยังจุดเกิดเหตุให้มากที่สุด
  ๒. เมื่อทีมดับเพลิงไปถึงพื้นที่แล้วให้ถอนตัวไปยังจุดรวมพล
- ผู้อำนวยการดับเพลิง
  ๑. รับทราบข้อมูลสั่งประกาศแจ้งให้ทุกพื้นที่ทราบ
  ๒. สั่งให้จัดตั้งกองอำนาจการตามโครงสร้าง
  ๓. ไปประจำกองอำนาจการ
  ๔. แจ้งผู้บริหารถึงสถานการณ์
  ๕. สั่งการให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
  ๖. สั่งการให้ทีมดับเพลิง เข้าช่วยเหลือ
- ทีมดับเพลิง
  ๑. เมื่อทราบเหตุให้รายงานตัวที่กองอำนาจการ/หัวหน้าในพื้นที่
  ๒. แต่งชุดคลุมและนำถังดับเพลิงที่ห้องเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุ
  ๓. ประเมินสถานการณ์ของเพลิง ร่วมกับหัวหน้าในพื้นที่ เพื่อขอใช้แผนระดับ 3
- ทีมสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
  ๑. ประกาศและประสานงานกับพื้นที่ต่างๆ ด้วยการโทรศัพท์
  ๒. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หน่วยงานราชการภายนอก ดำรวจดับเพลิง โดยประชาสัมพันธ์  
 .....(ชื่อผู้แจ้ง).....ขอรายงานให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่  
 .....ลักษณะอาคาร.....ชั้น ตั้งอยู่ที่.....ใกล้กับ.....  
 ..... ซอย.....ถนน.....เขต.....จังหวัด.....  
 .....ขอให้ จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย โปรดติดต่อกลับ  
 หมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง)
  ๓. การแจ้งขอรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยประชาสัมพันธ์ .....(ชื่อผู้แจ้ง).....ขอ  
 รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ .....ลักษณะอาคาร.....  
 ชั้น ตั้งอยู่ที่.....ใกล้กับ..... ซอย.....ถนน.....  
 .....เขต.....จังหวัด..... สถานการณ์ตอนนี้  
 เพลิงได้ลุกลามอย่างรุนแรง อาจจะมีผู้บาดเจ็บ ขอให้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินมาด้วย โปรด  
 ติดต่อกลับหมายเลข (เบอร์มือถือผู้แจ้ง)

■ ทีมดับเพลิง

๑. เมื่อรับทราบเหตุให้นำถังดับเพลิงทำการดับที่จุดเกิดเหตุ (ในกรณีที่อยู่ใกล้) หรือ กอง  
อำนาจการ
๒. ประเมินสถานการณ์ของเพลิงร่วมกับหัวหน้าชุดทีมผจญเพลิงขั้นต้น (หากดับไม่ได้ให้แจ้ง  
ผอ.ดับเพลิง ขออนุมัติอพยพ และใช้แผนระดับ 3)
๓. เมื่อได้ยืนยันสัญญาณอพยพให้ทำการอพยพไปยังจุดรวมพล

โครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์อำนาจการดับเพลิง แผนระดับ 3 (ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง)

ช่วงเวลาดำเนินการปกติ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (24 ชั่วโมง)

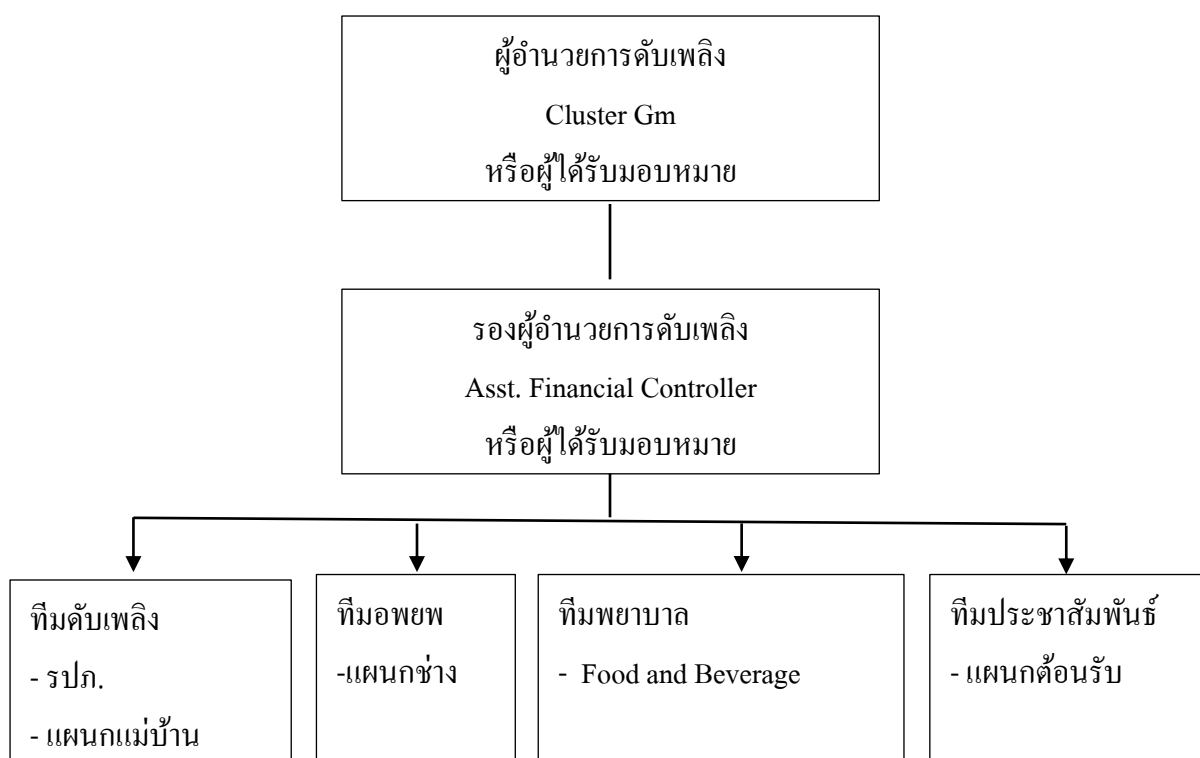

**แผนระดับ ๓ (ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง)**

หัวหน้าในพื้นที่  
และทีมดับเพลิง

เพลิงไหม้รุนแรงไม่สามารถดับเพลิงได้ โดยทีมดับเพลิง  
(จากแผนระดับ 2) และหัวหน้าในพื้นที่ ขออนุมัติ ผอ.  
ดับเพลิง ต่อไปนี้

- ๑.ขอใช้แผนอพยพหนีไฟ
- ๒.ขอให้ตัดไฟฟ้าเพื่อจะทำการฉีดน้ำดับเพลิง
- ๓.ขอให้ส่งทีมดับเพลิง เข้าดับเพลิง

ผู้อำนวยการ  
ดับเพลิง

๑. รับการรายงานตัวจากหน่วยงานต่างๆ ที่กองอำนาจการ
- ๒.สำรวจความพร้อมของกองอำนาจการและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรองรับ  
ผู้อพยพ
- ๓.สั่งการให้อพยพจากอาคาร โดยการกดสัญญาณแจ้งเหตุ
- ๔.สั่งการให้ตัดไฟฟ้า
- ๕.สั่งการให้ทีมดับเพลิง เข้าดับเพลิง
- ๖.สั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผน ระดับ 3 ตาม โครงสร้าง
- ๗.ให้รายงานข้อมูลสถานการณ์ต่อหัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ดับเพลิงท้องถิ่น

ผู้อำนวยการ  
ดับเพลิง

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานภายนอก  
จนสามารถดับเพลิงได้

**ผู้รับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตามโครงสร้าง (แผนระดับ ๓)**


| ตำแหน่ง            | ผู้รับผิดชอบ     |                  | อุปกรณ์                                                                                                                                                                                     | หน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ช่วงเวลาปกติ     | ช่วงกลางคืน      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๑. ผอ.ดับเพลิง     | Cluster Gm       | -                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสือ ผอ.ดับเพลิง</li> <li>- วิทยุ</li> <li>- แฟ้มอำนาจการและ แผนผังอาคาร (จุด จัดเก็บ ห้อง เจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัย</li> </ul>                      | ๑. รับรายงานและเช็คความพร้อม ของกองอำนาจการ<br>๒. อำนาจการและสั่ง การในการใช้แผนระดับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง<br>๓. สั่งการให้ขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานภายนอก<br>๔. สั่งการให้ทุกหน่วยงานหยุด หรือปฏิบัติการต่อสู้ไฟ<br>๕. ประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอกที่มาช่วยเหลือ<br>๖. รายงานสถานการณ์ต่อ ผู้บริหาร |
| ๒.รองผอ.ดับเพลิง   | Asst. FC         | ผู้จัดการประจำกะ | กรณีรักษาการแทน ผอ. ใช้อุปกรณ์ของ ผอ.ดับเพลิง ข้างต้น                                                                                                                                       | ๑. รักษาการแทน ผอ.ดับเพลิง (กรณีที่ ผอ.ดับเพลิง ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้<br>๒. ประสานงานกับผอ.ดับเพลิง                                                                                                                                                                                                    |
| ๓.ทีมดับเพลิง      | รปภ. ผลัดกลางวัน | รปภ. ผลัดกลางคืน | กรณีรักษาการแทน ผอ.ใช้อุปกรณ์ของ ผอ.ดับเพลิง ข้างต้น                                                                                                                                        | ๑. รักษาการแทน ผอ.ดับเพลิง (กรณีที่ ผอ.ดับเพลิง ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้<br>๒. ประสานงานกับ ผอ.ดับเพลิง                                                                                                                                                                                                   |
| ๔.ทีมพยาบาล        | FB               | FB               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระเป๋ายามาตรฐาน อุปกรณ์ทำแผล</li> <li>- ผ้ายืด ผือก่อน ยาทาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก</li> <li>- แถบจำแนก ผู้บาดเจ็บ (จุดจัดเก็บ ห้องพยาบาล)</li> </ul> | ๑. รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ<br>๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ<br>๓. จัดทำการปฐมพยาบาลให้ ผู้บาดเจ็บ(จัดลำดับความสำคัญ ของผู้เจ็บป่วย)<br>๔. ประสานงานทีมยานพาหนะ เพื่อนำและดูแลผู้ป่วยส่ง รพ.<br>๕. จดชื่อผู้บาดเจ็บที่นำส่ง รพ. รายงานหัวหน้าหน่วยอพยพทุกครั้ง                   |
| ๕.ทีมประชาสัมพันธ์ | FO               | FO               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระดานไวบอร์ด</li> <li>- วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ</li> <li>- เอกสารรายงาน ผอ. ดับเพลิง</li> </ul>                                               | ๑. รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง<br>๒. ประสานงานสั่งการโดยความ เห็นชอบของ ผอ.ดับเพลิง<br>๓. เป็นศูนย์รวมข้อมูลของทุก หน่วยงาน เพื่อรายงาน ผอ. ดับเพลิง                                                                                                                                                        |

## ๕. แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวน พนักงาน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดรวมพล, หน่วยปฐมพยาบาล และ ยานพาหนะ ฯลฯ

### แผนอพยพหนีไฟ

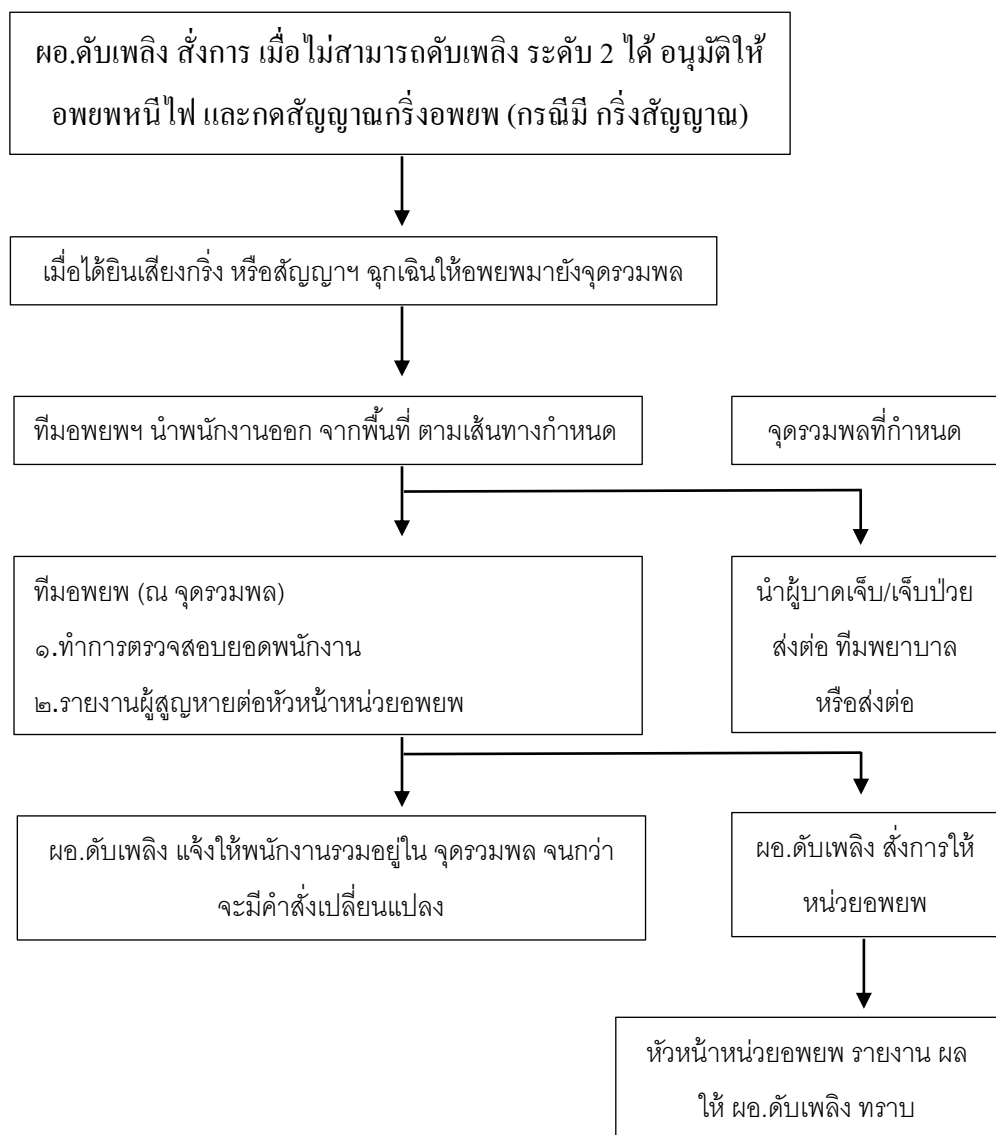



### วิธีปฏิบัติ

| หน้าที่รับผิดชอบของทีมควบคุมการอพยพ                                                                            | หน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. เมื่อรับทราบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งทุกคน ในพื้นที่จัดเก็บเตรียมอุปกรณ์ของสำคัญ                                 | เมื่อทราบเหตุเพลิงไหม้<br>- ควบคุมสติ<br>- วางอุปกรณ์ เช่น มีด, ไม้พาย หรือเก็บ อุปกรณ์ บนโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยรวมทั้งปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด<br>- เตรียมเอกสารของสำคัญให้พร้อม<br>- ทำตามคำแนะนำของผู้นำอพย                        |
| ๒. จัดเตรียมความเรียบร้อยของเส้นทางอพยพหนีไฟ                                                                   | เคลียร์สถานที่ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดิน และ ทางหนีไฟ                                                                                                                                                                                               |
| ๓. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการอพยพหนีไฟ<br>- ไฟฉาย<br>- ธงอพยพ<br>- แบบเช็คชื่อ                                     | หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้นำอพยพ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอพยพหนีไฟให้เรียบร้อย                                                                                                                                                                           |
| ๔. เมื่อได้รับสัญญาณให้อพยพ - นำทุกคนอพยพไปตามทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล - รอรับคำสั่งจาก หัวหน้าทีมควบคุมอพยพต่อไป | เมื่อได้รับสัญญาณอพยพ<br>- รีบเดินอย่างรวดเร็วตามผู้นำอพยพ<br>- อย่าวิ่ง หรือแตกแถวไปทำธุระอื่นเด็ดขาด<br>- รายงานตัวที่จุดรวมพล<br>- ถึงจุดรวมพลผู้นำอพยพทำการเช็คชื่อ และ รายงานหัวหน้าทีมควบคุมอพยพ<br>- ผู้นำอพยพควบคุมความสงบ และปลอดภัยพนักงาน |
| ๕. ปฏิบัติตามคำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง                                                                             | หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้นำอพยพรอฟังคำสั่งจากทีมอพยพ และค้นหา                                                                                                                                                                                            |

## ๖. แผนบรรเทาทุกข์

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

### ๑. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยข้อมูลสื่อสาร ทำการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐตามคำสั่งของ ผอ.ดับเพลิง

- สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองปาดอง เบอร์โทรศัพท์ 076 342 600
- โรงพยาบาลปาดอง เบอร์โทรศัพท์ 076 342 633
- แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เบอร์โทรศัพท์ 191, 199
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง เบอร์โทรศัพท์ 076 345 574
- สถานีตำรวจภูธรปาดอง เบอร์โทรศัพท์ 076 342 769
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง เบอร์โทรศัพท์ 076 345 574

### ๒. การสำรวจความเสียหาย

การเข้าสำรวจความเสียหายหลังจากเพลิงสงบ

### ๓. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง

การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง ณ จุดรวมพล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการ ดับเพลิง

### ๔. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต หรือผู้สูญหาย

การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต หรือผู้สูญหายโดยทีมผจญเพลิง และทีมค้นหาผู้สูญหาย ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. รับแจ้งผู้สูญหาย และรายงานหัวหน้าหน่วยอพยพ
๒. ทำการค้นหาผู้สูญหาย
๓. รายงานยอดผู้เสียหายแก่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเป็นระยะๆ
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าค้นหาผู้สูญหายอย่างละเอียดอีกครั้ง

### ๕. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต

๑. ผู้ประสบภัย/ผู้บาดเจ็บ ทีมอพยพพามายังจุดปลอดภัย แล้วนำส่งทีมพยาบาล เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือนำส่งโรงพยาบาลต่อไป และติดต่อแจ้งญาติให้ทราบ
๒. ทรัพย์สิน ทุกหน่วยงานทำการเก็บทรัพย์สิน, อุปกรณ์ที่สำคัญออกมาพร้อมกับ ทีมอพยพประจำพื้นที่ ทีมเคลื่อนย้ายวัสดุภายในทำการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน, อุปกรณ์, เครื่อง คอมพิวเตอร์ไปยังที่ปลอดภัย
๓. ผู้เสียชีวิต ทีมประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งยอด ผู้เสียชีวิต

### ๖. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ร่วมกับ ธุรการ, วิศวกร, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ตำรวจประเมินความเสียหายเบื้องต้น และรายงานผล ต่อ ผอ.ดับเพลิง

### ๗. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้งานขององค์กร สามารถดำเนินการได้ โดยเร็ว ที่สุด ผอ.ดับเพลิง สั่งดำเนินการตามแผนดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

### ๘. การปฏิรูปฟื้นฟู

การปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ การสรุปรายงานผลการประเมินจากทุกกรณีมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะแผนการณรงค์ป้องกันเหตุอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนการดับเพลิง (ระหว่างเกิดเหตุ) แผน บรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง โดยกำหนดให้มี โครงการฯ ดังนี้

๑. โครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัย และแนวทางการป้องกันใน รูปแบบ ต่างๆ แนวทางดำเนินการ

(๑.) ดำเนินการได้สวนหาสาเหตุตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรายงาน ได้สวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุ

(๒.) นำผลการได้สวนรายงานต่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๒. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย ผอ.ดับเพลิงสั่งให้หน่วยงานจัดหา และสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ หรือหน่วยงานประกันสังคมเพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เป็นต้น
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
๔. หน่วยงานหรืออาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ดำเนินการมิให้งานหยุดชะงัก
๕. ปรับปรุงแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

(๑.) ผอ.ดับเพลิง เรียกประชุมหน่วยงานเพื่อปรับปรุงแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้ดียิ่งขึ้น

(๒.) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ร่วมกันหารือปรับปรุง และเพิ่มเติมอุปกรณ์ในการป้องกัน และ ระงับอัคคีภัยให้ดียิ่งขึ้น

#### ๘. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก


| ประเภทหน่วยงาน                                                                                                                                           | เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ เหตุ อัคคีภัย ภายในพื้นที่/อาคาร                                                                                                                                                                                                                                                            | เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ เหตุ อัคคีภัยภายนอกข้างเคียง                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. หน่วยงานภายนอกที่อยู่ ใกล้เคียง เช่น<br>- สถานีไฟฟ้า<br>- โรงพยาบาล                                                                                   | ๑. ช่วยแจ้งตำรวจดับเพลิง<br>๒. ขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณ หน้าอาคาร เป็นจุดจอดรถ เป็นจุดวางทรัพย์สิน อุปกรณ์ ดับเพลิง                                                                                                                                                                                                  | ๑. จัดทีมดับเพลิง เข้าช่วย<br>๒. ช่วยแจ้งตำรวจดับเพลิง<br>๓. อนุญาตให้ใช้พื้นที่รวมพล |
| ๒. หน่วยงานภายนอกที่สามารถ ช่วยเหลือ โดยตรง เช่น<br>- ตำรวจดับเพลิง<br>- โรงพยาบาล<br>- สถานีตำรวจ<br>- หน่วยกู้ภัยเอกชน<br>- อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน | ๑. นำแผนดับเพลิงเราเข้าไป ปรีกษาเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยขอ Update เบอร์โทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือ<br>๒. ขอทราบแนวทางการปฏิบัติ ของตำรวจดับเพลิง เมื่อโทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือ<br>๓. ขอทราบระยะเวลาที่จะมาถึง โดยประมาณ นับแต่แจ้งเหตุ<br>๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ข้อมูลจำเป็นที่ ตำรวจดับเพลิงต้องการ เช่น แหล่งน้ำดับเพลิง |                                                                                       |

ภาคผนวกที่ 6

แผนการรับมือภัยพิบัติสึนามิ

**แผนการรับมือสึนามิ**

**Emergency plan is Tsunami Plan**

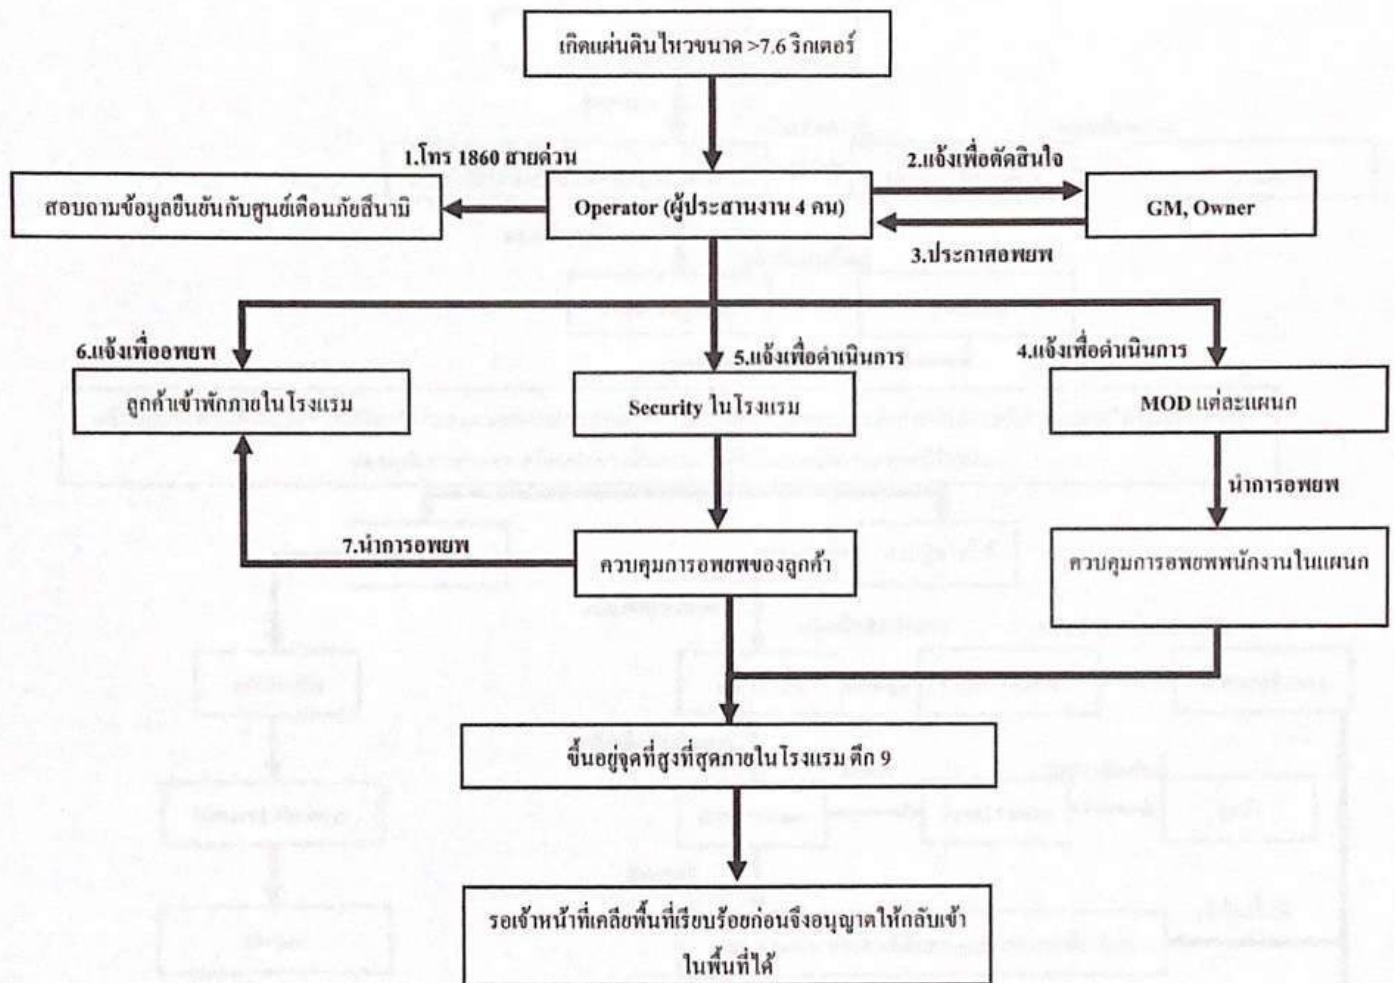

เบอร์โทรฉุกเฉินกรณีเกิดสึนามิ : สายด่วน โทร 199 เทศบาลป่าตอง โทร 076-342600, 076-211111

ลงชื่อ ปาริชาติ เชียรแก้ว ผู้จัดทำ  
(นางสาวปาริชาติ เชียรแก้ว)  
Safety officer

ลงชื่อ สุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้อนุมัติ  
(นางสาวสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
กรรมการผู้จัดการ



ภาคผนวกที่ 7

---

Checklist อุปกรณ์ดับเพลิง  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

# Fire Extinguisher Check list

กรกฎาคม

2025

| No      | Code          | ตึก | ชั้น | LOCATION                     | Tank | Pressure | Remark   |
|---------|---------------|-----|------|------------------------------|------|----------|----------|
| แจ้งแดง |               |     |      |                              |      |          |          |
| 1       | FE-DC - 2-B-2 | 1   | BM   | ข้างเครื่องสแกนนิ้ว          | /    | /        |          |
| 2       | FE-DC - 2-B-3 | 1   | BM   | หน้าห้อง HR                  | /    | /        |          |
| 3       | FE-DC - 1-1-1 | 1   | 1    | หน้าห้องน้ำคนพิการ           | /    | /        |          |
| 4       | FE-DC - 1-1-2 | 1   | 1    | สถานีแก้สครัวนิ้ว            | /    | /        |          |
| 5       | FE-DC - 1-1-3 | 1   | 1    | สถานีแก้สครัวนิ้ว            | /    | /        |          |
| 6       | FE-DC - 1-2-1 | 1   | 2    | หน้าห้องน้ำ ช-ญ              | /    | /        |          |
| 7       | FE-DC - 1-3-1 | 1   | 3    | หน้าห้อง 1301                | /    | /        |          |
| 8       | FE-DC - 1-4-1 | 1   | 4    | หน้าห้อง 1401                | /    | /        |          |
| 9       | FE-DC - 1-4-2 | 1   | 4    | หน้าห้อง M&E                 | /    | /        |          |
| 10      | FE-DC - 2-B-1 | 2   | BM   | ทางลงข้าง Gas station        | /    | /        |          |
| 11      | FE-DC-2-BM-1  | 2   | BM   | สถานีแก้สครัวเมน             | /    | /        |          |
| 12      | FE-DC-2-BM-2  | 2   | BM   | สถานีแก้สครัวเมน             | /    | /        |          |
| 13      | FE-DC-2-BM-3  | 2   | BM   | หน้าออฟฟิศแม่บ้าน            | /    | /        |          |
| 14      | FE-DC - 2-1-1 | 2   | 1    | หน้าลิฟท์โดยสาร              | /    | /        |          |
| 15      | FE-DC - 2-1-2 | 2   | 1    | นานา โถงบริการ               | /    | /        |          |
| 16      | FE-DC-2-2-1   | 2   | 2    | หน้าลิฟท์ PS                 | /    | /        |          |
| 17      | FE-DC - 3-B-1 | 3   | BM   | หน้าห้องไฟ                   | /    | /        |          |
| 18      | FE-DC - 3-1-1 | 3   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | อ่าวจิ๋ว |
| 19      | FE-DC - 3-2-1 | 3   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 20      | FE-DC - 3-3-1 | 3   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 21      | FE-DC - 3-4-1 | 3   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 22      | FE-DC - 4-B-1 | 4   | BM   | ออฟฟิศช่าง ห้อง fire control | /    | /        |          |
| 23      | FE-DC - 4-1-1 | 4   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 24      | FE-DC - 4-2-1 | 4   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 25      | FE-DC - 4-3-1 | 4   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 26      | FE-DC - 4-4-1 | 4   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 27      | FE-DC - 5-1-1 | 5   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 28      | FE-DC - 5-2-1 | 5   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 29      | FE-DC - 5-3-1 | 5   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 30      | FE-DC - 5-4-1 | 5   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 31      | FE-DC - 6-1-1 | 6   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 32      | FE-DC - 6-2-1 | 6   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 33      | FE-DC - 6-3-1 | 6   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 34      | FE-DC - 6-4-1 | 6   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 35      | FE-DC - 7-B-1 | 7   | BM   | ห้องสแป                      | /    | /        |          |
| 36      | FE-DC - 7-1-1 | 7   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 37      | FE-DC - 7-2-1 | 7   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 38      | FE-DC - 7-3-1 | 7   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |
| 39      | FE-DC - 7-4-1 | 7   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |          |



# Fire Extinguisher Check list

กรกฎาคม 2025

| No | Code            | ตึก | ชั้น | LOCATION   | Tank | Pressure | Remark |
|----|-----------------|-----|------|------------|------|----------|--------|
| 40 | FE-DC - 8-1-1   | 8/1 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 41 | FE-DC - 8/1-2-1 | 8/1 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 42 | FE-DC - 8/1-3-1 | 8/1 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 43 | FE-DC - 8/1-4-1 | 8/1 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 44 | FE-DC - 8/1-5-1 | 8/1 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 45 | FE-DC - 8/2-1-1 | 8/2 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 46 | FE-DC - 8/2-2-1 | 8/2 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 47 | FE-DC - 8/2-3-1 | 8/2 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 48 | FE-DC - 8/2-4-1 | 8/2 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 49 | FE-DC - 8/2-5-1 | 8/2 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 50 | FE-DC - 9-1-1   | 9   | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 51 | FE-DC - 9-1-2   | 9   | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 52 | FE-DC - 9-1-3   | 9   | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 53 | FE-DC - 9-1-4   | 9   | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 54 | FE-DC - 9-1-5   | 9   | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |

## ถังเขียว

|    |                    |   |    |                    |   |   |  |
|----|--------------------|---|----|--------------------|---|---|--|
| 1  | FE-Non CFC -1-1-2  | 1 | 1  | โต๊ะเบลบอย         | / | / |  |
| 2  | FE-Non CFC - 1-3-2 | 1 | 3  | ใกล้ห้อง 1306      | / | / |  |
| 3  | FE-Non CFC -2-2-2  | 2 | 2  | หน้าลิฟท์พนักงาน   | / | / |  |
| 4  | FE-Non CFC -2-2-3  | 2 | 2  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 5  | FE-Non CFC -2-3-1  | 2 | 3  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 6  | FE-Non CFC -2-3-2  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-1 | / | / |  |
| 7  | FE-Non CFC -2-3-3  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-2 | / | / |  |
| 8  | FE-Non CFC -2-3-4  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-1 | / | / |  |
| 9  | FE-Non CFC -2-3-5  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-2 | / | / |  |
| 10 | FE-Non CFC -2-3-6  | 2 | 3  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 11 | FE-Non CFC -7-5-2  | 7 | 5  | หน้าห้อง 7518      | / | / |  |
| 12 | FE-Non CFC -9-B-1  | 9 | BM | หน้าห้องปั๊ม       | / | / |  |
| 13 | FE-Non CFC -9-1-2  | 9 | 1  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 14 | FE-Non CFC - BP-1  | 1 | 1  | สระบึงพุท          | / | / |  |
| 15 | FE-Non CFC -JP-1   | 7 | 1  | สระจิ้งเกิ้ลพุท    | / | / |  |
| 16 | FE-Non CFC - SN-1  | 7 | 1  | หน้าห้องชานาขาย    | / | / |  |
| 17 | FE-Non CFC - SN-2  | 7 | 1  | หน้าห้องชานาหุง    | / | / |  |

## ถังเงิน

|   |                       |   |    |                             |   |   |  |
|---|-----------------------|---|----|-----------------------------|---|---|--|
| 1 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 1 | BM | Itaian Kitchen              | / | / |  |
| 2 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าเบเกอร์รี่ | / | / |  |
| 3 | FE-Non AR-AFFF -1-B-2 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าบุชเชอร์   | / | / |  |
| 4 | FE-Non CFC -1-B-1     | 5 | BM | Canteen                     | / | / |  |

Check by : จกช กิรติ์ โนบิต



# Fire Extinguisher Check list

สิงหาคม

2025

| No     | Code          | ตึก | ชั้น | LOCATION                     | Tank | Pressure | Remark |
|--------|---------------|-----|------|------------------------------|------|----------|--------|
| ถังแดง |               |     |      |                              |      |          |        |
| 1      | FE-DC - 2-B-2 | 1   | BM   | ข้างเครื่องสแกนนิ้ว          | /    | /        |        |
| 2      | FE-DC - 2-B-3 | 1   | BM   | หน้าห้อง HR                  | /    | /        |        |
| 3      | FE-DC - 1-1-1 | 1   | 1    | หน้าห้องน้ำคนพิการ           | /    | /        |        |
| 4      | FE-DC - 1-1-2 | 1   | 1    | สถานีเก็บสกรูนิ้ว            | /    | /        |        |
| 5      | FE-DC - 1-1-3 | 1   | 1    | สถานีเก็บสกรูนิ้ว            | /    | /        |        |
| 6      | FE-DC - 1-2-1 | 1   | 2    | หน้าห้องน้ำ ช-ญ              | /    | /        |        |
| 7      | FE-DC - 1-3-1 | 1   | 3    | หน้าห้อง 1301                | /    | /        |        |
| 8      | FE-DC - 1-4-1 | 1   | 4    | หน้าห้อง 1401                | /    | /        |        |
| 9      | FE-DC - 1-4-2 | 1   | 4    | หน้าห้อง M&E                 | /    | /        |        |
| 10     | FE-DC - 2-B-1 | 2   | BM   | ทางลงข้าง Gas station        | /    | /        |        |
| 11     | FE-DC-2-BM-1  | 2   | BM   | สถานีเก็บสกรูเมน             | /    | /        |        |
| 12     | FE-DC-2-BM-2  | 2   | BM   | สถานีเก็บสกรูเมน             | /    | /        |        |
| 13     | FE-DC-2-BM-3  | 2   | BM   | หน้าออฟฟิศแม่บ้าน            | /    | /        |        |
| 14     | FE-DC - 2-1-1 | 2   | 1    | หน้าลิฟท์โดยสาร              | /    | /        |        |
| 15     | FE-DC - 2-1-2 | 2   | 1    | นานา โถงบริการ               | /    | /        |        |
| 16     | FE-DC - 2-2-1 | 2   | 2    | หน้าลิฟท์ PS                 | /    | /        |        |
| 17     | FE-DC - 3-B-1 | 3   | BM   | หน้าห้องไฟ                   | /    | /        |        |
| 18     | FE-DC - 3-1-1 | 3   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | ถังแดง |
| 19     | FE-DC - 3-2-1 | 3   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 20     | FE-DC - 3-3-1 | 3   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 21     | FE-DC - 3-4-1 | 3   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 22     | FE-DC - 4-B-1 | 4   | BM   | ออฟฟิศช่าง ห้อง fire control | /    | /        |        |
| 23     | FE-DC - 4-1-1 | 4   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 24     | FE-DC - 4-2-1 | 4   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 25     | FE-DC - 4-3-1 | 4   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 26     | FE-DC - 4-4-1 | 4   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 27     | FE-DC - 5-1-1 | 5   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 28     | FE-DC - 5-2-1 | 5   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 29     | FE-DC - 5-3-1 | 5   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 30     | FE-DC - 5-4-1 | 5   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 31     | FE-DC - 6-1-1 | 6   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 32     | FE-DC - 6-2-1 | 6   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 33     | FE-DC - 6-3-1 | 6   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 34     | FE-DC - 6-4-1 | 6   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 35     | FE-DC - 7-B-1 | 7   | BM   | ห้องสเปา                     | /    | /        |        |
| 36     | FE-DC - 7-1-1 | 7   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 37     | FE-DC - 7-2-1 | 7   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 38     | FE-DC - 7-3-1 | 7   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 39     | FE-DC - 7-4-1 | 7   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |



# Fire Extinguisher Check list

สิงหาคม

2025

| No | Code            | ตึก | ชั้น | LOCATION   | Tank | Pressure | Remark |
|----|-----------------|-----|------|------------|------|----------|--------|
| 40 | FE-DC - 8-1-1   | 8/1 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 41 | FE-DC - 8/1-2-1 | 8/1 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 42 | FE-DC - 8/1-3-1 | 8/1 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 43 | FE-DC - 8/1-4-1 | 8/1 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 44 | FE-DC - 8/1-5-1 | 8/1 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 45 | FE-DC - 8/2-1-1 | 8/2 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 46 | FE-DC - 8/2-2-1 | 8/2 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 47 | FE-DC - 8/2-3-1 | 8/2 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 48 | FE-DC - 8/2-4-1 | 8/2 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 49 | FE-DC - 8/2-5-1 | 8/2 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 50 | FE-DC - 9-1-1   | 9   | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 51 | FE-DC - 9-1-2   | 9   | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 52 | FE-DC - 9-1-3   | 9   | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 53 | FE-DC - 9-1-4   | 9   | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 54 | FE-DC - 9-1-5   | 9   | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |

## ถึงเขียว

|    |                    |   |    |                    |   |   |  |
|----|--------------------|---|----|--------------------|---|---|--|
| 1  | FE-Non CFC -1-1-2  | 1 | 1  | โต๊ะเบลบอย         | / |   |  |
| 2  | FE-Non CFC - 1-3-2 | 1 | 3  | ใกล้ห้อง 1306      | / | / |  |
| 3  | FE-Non CFC -2-2-2  | 2 | 2  | หน้าลิฟท์พนักงาน   | / | / |  |
| 4  | FE-Non CFC -2-2-3  | 2 | 2  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 5  | FE-Non CFC -2-3-1  | 2 | 3  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 6  | FE-Non CFC -2-3-2  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-1 | / | / |  |
| 7  | FE-Non CFC -2-3-3  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-2 | / | / |  |
| 8  | FE-Non CFC -2-3-4  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-1 | / | / |  |
| 9  | FE-Non CFC -2-3-5  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-2 | / | / |  |
| 10 | FE-Non CFC -2-3-6  | 2 | 3  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 11 | FE-Non CFC -7-5-2  | 7 | 5  | หน้าห้อง 7518      | / | / |  |
| 12 | FE-Non CFC -9-B-1  | 9 | BM | หน้าห้องปั๊ม       | / | / |  |
| 13 | FE-Non CFC -9-1-2  | 9 | 1  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 14 | FE-Non CFC - BP-1  | 1 | 1  | สระบิษพุด          | / | / |  |
| 15 | FE-Non CFC -JP-1   | 7 | 1  | สระจิ้งเกิ้ลพุด    | / | / |  |
| 16 | FE-Non CFC - SN-1  | 7 | 1  | หน้าห้องชานาชา     | / | / |  |
| 17 | FE-Non CFC - SN-2  | 7 | 1  | หน้าห้องชานาชาหญิง | / | / |  |

## ถึงเงิน

|   |                       |   |    |                           |   |   |  |
|---|-----------------------|---|----|---------------------------|---|---|--|
| 1 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 1 | BM | Italian Kitchen           | / | / |  |
| 2 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าเบเกอร์  | / | / |  |
| 3 | FE-Non AR-AFFF -1-B-2 | 2 | BM | Main Kitchen หน้ามุขเซอร์ | / | / |  |
| 4 | FE-Non CFC -1-B-1     | 5 | BM | Canteen                   | / | / |  |

Check by : ศิริวัช โพธิ์



# Fire Extinguisher Check list

กันยายน

2025

| No     | Code          | ตึก | ชั้น | LOCATION                     | Tank | Pressure | Remark |
|--------|---------------|-----|------|------------------------------|------|----------|--------|
| ถึงแดง |               |     |      |                              |      |          |        |
| 1      | FE-DC - 2-B-2 | 1   | BM   | ข้างเครื่องสแกนนิ้ว          | /    | /        |        |
| 2      | FE-DC - 2-B-3 | 1   | BM   | หน้าห้อง HR                  | /    | /        |        |
| 3      | FE-DC - 1-1-1 | 1   | 1    | หน้าห้องน้ำคนพิการ           | /    | /        |        |
| 4      | FE-DC - 1-1-2 | 1   | 1    | สถานีแก๊สครัวนิ้ว            | /    | /        |        |
| 5      | FE-DC - 1-1-3 | 1   | 1    | สถานีแก๊สครัวนิ้ว            | /    | /        |        |
| 6      | FE-DC - 1-2-1 | 1   | 2    | หน้าห้องน้ำ ช-ญ              | /    | /        |        |
| 7      | FE-DC - 1-3-1 | 1   | 3    | หน้าห้อง 1301                | /    | /        |        |
| 8      | FE-DC - 1-4-1 | 1   | 4    | หน้าห้อง 1401                | /    | /        |        |
| 9      | FE-DC - 1-4-2 | 1   | 4    | หน้าห้อง M&E                 | /    | /        |        |
| 10     | FE-DC - 2-B-1 | 2   | BM   | ทางลงข้าง Gas station        | /    | /        |        |
| 11     | FE-DC-2-BM-1  | 2   | BM   | สถานีแก๊สครัวเมน             | /    | /        |        |
| 12     | FE-DC-2-BM-2  | 2   | BM   | สถานีแก๊สครัวเมน             | /    | /        |        |
| 13     | FE-DC-2-BM-3  | 2   | BM   | หน้าออฟฟิศแม่บ้าน            | /    | /        |        |
| 14     | FE-DC - 2-1-1 | 2   | 1    | หน้าลิฟท์โดยสาร              | /    | /        |        |
| 15     | FE-DC - 2-1-2 | 2   | 1    | นานา โถงบริการ               | /    | /        |        |
| 16     | FE-DC - 2-2-1 | 2   | 2    | หน้าลิฟท์ PS                 | /    | /        |        |
| 17     | FE-DC - 3-B-1 | 3   | BM   | หน้าห้องไฟ                   | /    | /        |        |
| 18     | FE-DC - 3-1-1 | 3   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | ถังน้ำ |
| 19     | FE-DC - 3-2-1 | 3   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 20     | FE-DC - 3-3-1 | 3   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 21     | FE-DC - 3-4-1 | 3   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 22     | FE-DC - 4-B-1 | 4   | BM   | ออฟฟิศช่าง ห้อง fire control | /    | /        |        |
| 23     | FE-DC - 4-1-1 | 4   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 24     | FE-DC - 4-2-1 | 4   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 25     | FE-DC - 4-3-1 | 4   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 26     | FE-DC - 4-4-1 | 4   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 27     | FE-DC - 5-1-1 | 5   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 28     | FE-DC - 5-2-1 | 5   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 29     | FE-DC - 5-3-1 | 5   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 30     | FE-DC - 5-4-1 | 5   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 31     | FE-DC - 6-1-1 | 6   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 32     | FE-DC - 6-2-1 | 6   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 33     | FE-DC - 6-3-1 | 6   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 34     | FE-DC - 6-4-1 | 6   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 35     | FE-DC - 7-B-1 | 7   | BM   | ห้องสลา                      | /    | /        |        |
| 36     | FE-DC - 7-1-1 | 7   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 37     | FE-DC - 7-2-1 | 7   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 38     | FE-DC - 7-3-1 | 7   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 39     | FE-DC - 7-4-1 | 7   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

2025

ถั่งเขี้ยว

ถังเงิน

Check by : .....



# Fire Extinguisher Check list

ดูแล้ว

2025

| No      | Code          | ตึก | ชั้น | LOCATION                     | Tank | Pressure | Remark |
|---------|---------------|-----|------|------------------------------|------|----------|--------|
| แจ้งแดง |               |     |      |                              |      |          |        |
| 1       | FE-DC - 2-B-2 | 1   | BM   | ข้างเครื่องสแกนนิ้ว          | /    | /        |        |
| 2       | FE-DC - 2-B-3 | 1   | BM   | หน้าห้อง HR                  | /    | /        |        |
| 3       | FE-DC - 1-1-1 | 1   | 1    | หน้าห้องน้ำคนพิการ           | /    | /        |        |
| 4       | FE-DC - 1-1-2 | 1   | 1    | สถานีแก๊สครัวนิ้ว            | /    | /        |        |
| 5       | FE-DC - 1-1-3 | 1   | 1    | สถานีแก๊สครัวนิ้ว            | /    | /        |        |
| 6       | FE-DC - 1-2-1 | 1   | 2    | หน้าห้องน้ำ ช-ญ              | /    | /        |        |
| 7       | FE-DC - 1-3-1 | 1   | 3    | หน้าห้อง 1301                | /    | /        |        |
| 8       | FE-DC - 1-4-1 | 1   | 4    | หน้าห้อง 1401                | /    | /        |        |
| 9       | FE-DC - 1-4-2 | 1   | 4    | หน้าห้อง M&E                 | /    | /        |        |
| 10      | FE-DC - 2-B-1 | 2   | BM   | ทางลงข้าง Gas station        | /    | /        |        |
| 11      | FE-DC-2-BM-1  | 2   | BM   | สถานีแก๊สครัวเมน             | /    | /        |        |
| 12      | FE-DC-2-BM-2  | 2   | BM   | สถานีแก๊สครัวเมน             | /    | /        |        |
| 13      | FE-DC-2-BM-3  | 2   | BM   | หน้าออฟฟิศแม่บ้าน            | /    | /        |        |
| 14      | FE-DC - 2-1-1 | 2   | 1    | หน้าลิฟท์โดยสาร              | /    | /        |        |
| 15      | FE-DC - 2-1-2 | 2   | 1    | นานา โถงบริการ               | /    | /        |        |
| 16      | FE-DC - 2-2-1 | 2   | 2    | หน้าลิฟท์ PS                 | /    | /        |        |
| 17      | FE-DC - 3-B-1 | 3   | BM   | หน้าห้องไฟ                   | /    | /        |        |
| 18      | FE-DC - 3-1-1 | 3   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | ดูแล้ว |
| 19      | FE-DC - 3-2-1 | 3   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 20      | FE-DC - 3-3-1 | 3   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 21      | FE-DC - 3-4-1 | 3   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 22      | FE-DC - 4-B-1 | 4   | BM   | ออฟฟิศข้าง ห้อง fire control | /    | /        |        |
| 23      | FE-DC - 4-1-1 | 4   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | ดูแล้ว |
| 24      | FE-DC - 4-2-1 | 4   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 25      | FE-DC - 4-3-1 | 4   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 26      | FE-DC - 4-4-1 | 4   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 27      | FE-DC - 5-1-1 | 5   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 28      | FE-DC - 5-2-1 | 5   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 29      | FE-DC - 5-3-1 | 5   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 30      | FE-DC - 5-4-1 | 5   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 31      | FE-DC - 6-1-1 | 6   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 32      | FE-DC - 6-2-1 | 6   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 33      | FE-DC - 6-3-1 | 6   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 34      | FE-DC - 6-4-1 | 6   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 35      | FE-DC - 7-B-1 | 7   | BM   | ห้องสเปา                     | /    | /        |        |
| 36      | FE-DC - 7-1-1 | 7   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 37      | FE-DC - 7-2-1 | 7   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 38      | FE-DC - 7-3-1 | 7   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 39      | FE-DC - 7-4-1 | 7   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |



# Fire Extinguisher Check list

ตุลาคม

2025

| No | Code            | ตึก | ชั้น | LOCATION   | Tank | Pressure | Remark |
|----|-----------------|-----|------|------------|------|----------|--------|
| 40 | FE-DC - 8-1-1   | 8/1 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 41 | FE-DC - 8/1-2-1 | 8/1 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 42 | FE-DC - 8/1-3-1 | 8/1 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 43 | FE-DC - 8/1-4-1 | 8/1 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 44 | FE-DC - 8/1-5-1 | 8/1 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 45 | FE-DC - 8/2-1-1 | 8/2 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 46 | FE-DC - 8/2-2-1 | 8/2 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 47 | FE-DC - 8/2-3-1 | 8/2 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 48 | FE-DC - 8/2-4-1 | 8/2 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 49 | FE-DC - 8/2-5-1 | 8/2 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 50 | FE-DC - 9-1-1   | 9   | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 51 | FE-DC - 9-1-2   | 9   | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 52 | FE-DC - 9-1-3   | 9   | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 53 | FE-DC - 9-1-4   | 9   | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 54 | FE-DC - 9-1-5   | 9   | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |

## ถังเขียว

|    |                    |   |    |                    |   |   |  |
|----|--------------------|---|----|--------------------|---|---|--|
| 1  | FE-Non CFC -1-1-2  | 1 | 1  | โต๊ะเบลบอย         | / | / |  |
| 2  | FE-Non CFC - 1-3-2 | 1 | 3  | ใกล้ห้อง 1306      | / | / |  |
| 3  | FE-Non CFC -2-2-2  | 2 | 2  | หน้าลิฟท์พนักงาน   | / | / |  |
| 4  | FE-Non CFC -2-2-3  | 2 | 2  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 5  | FE-Non CFC -2-3-1  | 2 | 3  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 6  | FE-Non CFC -2-3-2  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-1 | / | / |  |
| 7  | FE-Non CFC -2-3-3  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-2 | / | / |  |
| 8  | FE-Non CFC -2-3-4  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-1 | / | / |  |
| 9  | FE-Non CFC -2-3-5  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-2 | / | / |  |
| 10 | FE-Non CFC -2-3-6  | 2 | 3  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 11 | FE-Non CFC -7-5-2  | 7 | 5  | หน้าห้อง 7518      | / | / |  |
| 12 | FE-Non CFC -9-B-1  | 9 | BM | หน้าห้องปั๊ม       | / | / |  |
| 13 | FE-Non CFC -9-1-2  | 9 | 1  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 14 | FE-Non CFC - BP-1  | 1 | 1  | สระบึงพูล          | / | / |  |
| 15 | FE-Non CFC -JP-1   | 7 | 1  | สระจิ้งเกิ้ลพูล    | / | / |  |
| 16 | FE-Non CFC - SN-1  | 7 | 1  | หน้าห้องขานาชาย    | / | / |  |
| 17 | FE-Non CFC - SN-2  | 7 | 1  | หน้าห้องขานาหญิง   | / | / |  |

## ถังเงิน

|   |                       |   |    |                           |   |   |  |
|---|-----------------------|---|----|---------------------------|---|---|--|
| 1 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 1 | BM | Itaian Kitchen            | / | / |  |
| 2 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าเบเกอรี่ | / | / |  |
| 3 | FE-Non AR-AFFF -1-B-2 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าบุชเชอร์ | / | / |  |
| 4 | FE-Non CFC -1-B-1     | 5 | BM | Canteen                   | / | / |  |

Check by : นาย สหชัย โคตรคำ



# Fire Extinguisher Check list

พฤศจิกายน

2025

| No     | Code          | ตึก | ชั้น | LOCATION                     | Tank | Pressure | Remark |
|--------|---------------|-----|------|------------------------------|------|----------|--------|
| อังกฤษ |               |     |      |                              |      |          |        |
| 1      | FE-DC - 2-B-2 | 1   | BM   | ข้างเครื่องสแกนนิ้ว          | /    | /        |        |
| 2      | FE-DC - 2-B-3 | 1   | BM   | หน้าห้อง HR                  | /    | /        |        |
| 3      | FE-DC - 1-1-1 | 1   | 1    | หน้าห้องนำคนพิการ            | /    | /        |        |
| 4      | FE-DC - 1-1-2 | 1   | 1    | สถานีเก็บสกรีน               | /    | /        |        |
| 5      | FE-DC - 1-1-3 | 1   | 1    | สถานีเก็บสกรีน               | /    | /        |        |
| 6      | FE-DC - 1-2-1 | 1   | 2    | หน้าห้องน้ำ ช.ญ              | /    | /        |        |
| 7      | FE-DC - 1-3-1 | 1   | 3    | หน้าห้อง 1301                | /    | /        |        |
| 8      | FE-DC - 1-4-1 | 1   | 4    | หน้าห้อง 1401                | /    | /        |        |
| 9      | FE-DC - 1-4-2 | 1   | 4    | หน้าห้อง M&E                 | /    | /        |        |
| 10     | FE-DC - 2-B-1 | 2   | BM   | ทางลงข้าง Gas station        | /    | /        |        |
| 11     | FE-DC-2-BM-1  | 2   | BM   | สถานีเก็บสกรีน               | /    | /        |        |
| 12     | FE-DC-2-BM-2  | 2   | BM   | สถานีเก็บสกรีน               | /    | /        |        |
| 13     | FE-DC-2-BM-3  | 2   | BM   | หน้าออฟฟิศแม่บ้าน            | /    | /        |        |
| 14     | FE-DC - 2-1-1 | 2   | 1    | หน้าลิฟท์โดยสาร              | /    | /        |        |
| 15     | FE-DC - 2-1-2 | 2   | 1    | นานา โถงบริการ               | /    | /        |        |
| 16     | FE-DC - 2-2-1 | 2   | 2    | หน้าลิฟท์ PS                 | /    | /        |        |
| 17     | FE-DC - 3-B-1 | 3   | BM   | หน้าห้องไฟ                   | /    | /        |        |
| 18     | FE-DC - 3-1-1 | 3   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | ดูดี   |
| 19     | FE-DC - 3-2-1 | 3   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 20     | FE-DC - 3-3-1 | 3   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 21     | FE-DC - 3-4-1 | 3   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 22     | FE-DC - 4-B-1 | 4   | BM   | ออฟฟิศช่าง ห้อง fire control | /    | /        |        |
| 23     | FE-DC - 4-1-1 | 4   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | ดูดี   |
| 24     | FE-DC - 4-2-1 | 4   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 25     | FE-DC - 4-3-1 | 4   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 26     | FE-DC - 4-4-1 | 4   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 27     | FE-DC - 5-1-1 | 5   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 28     | FE-DC - 5-2-1 | 5   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 29     | FE-DC - 5-3-1 | 5   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 30     | FE-DC - 5-4-1 | 5   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 31     | FE-DC - 6-1-1 | 6   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 32     | FE-DC - 6-2-1 | 6   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 33     | FE-DC - 6-3-1 | 6   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 34     | FE-DC - 6-4-1 | 6   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 35     | FE-DC - 7-B-1 | 7   | BM   | ห้องสเปา                     | /    | /        |        |
| 36     | FE-DC - 7-1-1 | 7   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 37     | FE-DC - 7-2-1 | 7   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 38     | FE-DC - 7-3-1 | 7   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 39     | FE-DC - 7-4-1 | 7   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |



# Fire Extinguisher Check list

พฤศจิกายน

2025

| No | Code            | ตึก | ชั้น | LOCATION   | Tank | Pressure | Remark |
|----|-----------------|-----|------|------------|------|----------|--------|
| 40 | FE-DC - 8-1-1   | 8/1 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 41 | FE-DC - 8/1-2-1 | 8/1 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 42 | FE-DC - 8/1-3-1 | 8/1 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 43 | FE-DC - 8/1-4-1 | 8/1 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 44 | FE-DC - 8/1-5-1 | 8/1 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 45 | FE-DC - 8/2-1-1 | 8/2 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 46 | FE-DC - 8/2-2-1 | 8/2 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 47 | FE-DC - 8/2-3-1 | 8/2 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 48 | FE-DC - 8/2-4-1 | 8/2 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 49 | FE-DC - 8/2-5-1 | 8/2 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 50 | FE-DC - 9-1-1   | 9   | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 51 | FE-DC - 9-1-2   | 9   | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 52 | FE-DC - 9-1-3   | 9   | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 53 | FE-DC - 9-1-4   | 9   | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 54 | FE-DC - 9-1-5   | 9   | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |

## ถึงเขียว

|    |                    |   |    |                    |   |   |  |
|----|--------------------|---|----|--------------------|---|---|--|
| 1  | FE-Non CFC -1-1-2  | 1 | 1  | โต๊ะเบลบอย         | / | / |  |
| 2  | FE-Non CFC - 1-3-2 | 1 | 3  | ใกล้ห้อง 1306      | / | / |  |
| 3  | FE-Non CFC -2-2-2  | 2 | 2  | หน้าลิฟท์พนักงาน   | / | / |  |
| 4  | FE-Non CFC -2-2-3  | 2 | 2  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 5  | FE-Non CFC -2-3-1  | 2 | 3  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 6  | FE-Non CFC -2-3-2  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-1 | / | / |  |
| 7  | FE-Non CFC -2-3-3  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-2 | / | / |  |
| 8  | FE-Non CFC -2-3-4  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-1 | / | / |  |
| 9  | FE-Non CFC -2-3-5  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-2 | / | / |  |
| 10 | FE-Non CFC -2-3-6  | 2 | 3  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 11 | FE-Non CFC -7-5-2  | 7 | 5  | หน้าห้อง 7518      | / | / |  |
| 12 | FE-Non CFC -9-B-1  | 9 | BM | หน้าห้องปั๊ม       | / | / |  |
| 13 | FE-Non CFC -9-1-2  | 9 | 1  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 14 | FE-Non CFC - BP-1  | 1 | 1  | สระบึงพุท          | / | / |  |
| 15 | FE-Non CFC -JP-1   | 7 | 1  | สระจิ้งเกิ้ลพุท    | / | / |  |
| 16 | FE-Non CFC - SN-1  | 7 | 1  | หน้าห้องชานาชาย    | / | / |  |
| 17 | FE-Non CFC - SN-2  | 7 | 1  | หน้าห้องชานาหญิง   | / | / |  |

## ถึงเงิน

|   |                       |   |    |                             |   |   |  |
|---|-----------------------|---|----|-----------------------------|---|---|--|
| 1 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 1 | BM | Itaian Kitchen              | / | / |  |
| 2 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าเบเกอร์รี่ | / | / |  |
| 3 | FE-Non AR-AFFF -1-B-2 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าบุชเชอร์   | / | / |  |
| 4 | FE-Non CFC -1-B-1     | 5 | BM | Canteen                     | / | / |  |

Check by : นาย ธีรเดช คุ้มคำ



# Fire Extinguisher Check list

ธันวาคม

2025

| No     | Code          | ตึก | ชั้น | LOCATION                     | Tank | Pressure | Remark |
|--------|---------------|-----|------|------------------------------|------|----------|--------|
| ถังแดง |               |     |      |                              |      |          |        |
| 1      | FE-DC - 2-B-2 | 1   | BM   | ข้างเครื่องสแกนนิ้ว          | /    | /        |        |
| 2      | FE-DC - 2-B-3 | 1   | BM   | หน้าห้อง HR                  | /    | /        |        |
| 3      | FE-DC - 1-1-1 | 1   | 1    | หน้าห้องน้ำคนพิการ           | /    | /        |        |
| 4      | FE-DC - 1-1-2 | 1   | 1    | สถานีแก๊สครัวนิ้ว            | /    | /        |        |
| 5      | FE-DC - 1-1-3 | 1   | 1    | สถานีแก๊สครัวนิ้ว            | /    | /        |        |
| 6      | FE-DC - 1-2-1 | 1   | 2    | หน้าห้องน้ำ ช-ญ              | /    | /        |        |
| 7      | FE-DC - 1-3-1 | 1   | 3    | หน้าห้อง 1301                | /    | /        |        |
| 8      | FE-DC - 1-4-1 | 1   | 4    | หน้าห้อง 1401                | /    | /        |        |
| 9      | FE-DC - 1-4-2 | 1   | 4    | หน้าห้อง M&E                 | /    | /        |        |
| 10     | FE-DC - 2-B-1 | 2   | BM   | ทางลงข้าง Gas station        | /    | /        |        |
| 11     | FE-DC-2-BM-1  | 2   | BM   | สถานีแก๊สครัวเมน             | /    | /        |        |
| 12     | FE-DC-2-BM-2  | 2   | BM   | สถานีแก๊สครัวเมน             | /    | /        |        |
| 13     | FE-DC-2-BM-3  | 2   | BM   | หน้าออฟฟิศแม่บ้าน            | /    | /        |        |
| 14     | FE-DC - 2-1-1 | 2   | 1    | หน้าลิฟท์โดยสาร              | /    | /        |        |
| 15     | FE-DC - 2-1-2 | 2   | 1    | นานา โถงบริการ               | /    | /        |        |
| 16     | FE-DC - 2-2-1 | 2   | 2    | หน้าลิฟท์ PS                 | /    | /        |        |
| 17     | FE-DC - 3-B-1 | 3   | BM   | หน้าห้องไฟ                   | /    | /        |        |
| 18     | FE-DC - 3-1-1 | 3   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | ถังแดง |
| 19     | FE-DC - 3-2-1 | 3   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 20     | FE-DC - 3-3-1 | 3   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 21     | FE-DC - 3-4-1 | 3   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 22     | FE-DC - 4-B-1 | 4   | BM   | ออฟฟิศช่าง ห้อง fire control | /    | /        |        |
| 23     | FE-DC - 4-1-1 | 4   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        | ถังแดง |
| 24     | FE-DC - 4-2-1 | 4   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 25     | FE-DC - 4-3-1 | 4   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 26     | FE-DC - 4-4-1 | 4   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 27     | FE-DC - 5-1-1 | 5   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 28     | FE-DC - 5-2-1 | 5   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 29     | FE-DC - 5-3-1 | 5   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 30     | FE-DC - 5-4-1 | 5   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 31     | FE-DC - 6-1-1 | 6   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 32     | FE-DC - 6-2-1 | 6   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 33     | FE-DC - 6-3-1 | 6   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 34     | FE-DC - 6-4-1 | 6   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 35     | FE-DC - 7-B-1 | 7   | BM   | ห้องสแป                      | /    | /        |        |
| 36     | FE-DC - 7-1-1 | 7   | 1    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 37     | FE-DC - 7-2-1 | 7   | 2    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 38     | FE-DC - 7-3-1 | 7   | 3    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |
| 39     | FE-DC - 7-4-1 | 7   | 4    | บันไดหนีไฟ                   | /    | /        |        |



# Fire Extinguisher Check list

ธันวาคม 2025

| No | Code            | ตึก | ชั้น | LOCATION   | Tank | Pressure | Remark |
|----|-----------------|-----|------|------------|------|----------|--------|
| 40 | FE-DC - 8-1-1   | 8/1 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 41 | FE-DC - 8/1-2-1 | 8/1 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 42 | FE-DC - 8/1-3-1 | 8/1 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 43 | FE-DC - 8/1-4-1 | 8/1 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 44 | FE-DC - 8/1-5-1 | 8/1 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 45 | FE-DC - 8/2-1-1 | 8/2 | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 46 | FE-DC - 8/2-2-1 | 8/2 | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 47 | FE-DC - 8/2-3-1 | 8/2 | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 48 | FE-DC - 8/2-4-1 | 8/2 | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 49 | FE-DC - 8/2-5-1 | 8/2 | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 50 | FE-DC - 9-1-1   | 9   | 1    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 51 | FE-DC - 9-1-2   | 9   | 2    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 52 | FE-DC - 9-1-3   | 9   | 3    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 53 | FE-DC - 9-1-4   | 9   | 4    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |
| 54 | FE-DC - 9-1-5   | 9   | 5    | บันไดหนีไฟ | /    | /        |        |

## ถังเขียว

|    |                    |   |    |                    |   |   |  |
|----|--------------------|---|----|--------------------|---|---|--|
| 1  | FE-Non CFC -1-1-2  | 1 | 1  | โต๊ะเบลบอย         | / | / |  |
| 2  | FE-Non CFC - 1-3-2 | 1 | 3  | ใกล้ห้อง 1306      | / | / |  |
| 3  | FE-Non CFC -2-2-2  | 2 | 2  | หน้าลิฟท์พนักงาน   | / | / |  |
| 4  | FE-Non CFC -2-2-3  | 2 | 2  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 5  | FE-Non CFC -2-3-1  | 2 | 3  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 6  | FE-Non CFC -2-3-2  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-1 | / | / |  |
| 7  | FE-Non CFC -2-3-3  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า MDB-2 | / | / |  |
| 8  | FE-Non CFC -2-3-4  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-1 | / | / |  |
| 9  | FE-Non CFC -2-3-5  | 2 | 3  | ประตูทางเข้า Gen-2 | / | / |  |
| 10 | FE-Non CFC -2-3-6  | 2 | 3  | บันไดหนีไฟ         | / | / |  |
| 11 | FE-Non CFC -7-5-2  | 7 | 5  | หน้าห้อง 7518      | / | / |  |
| 12 | FE-Non CFC -9-B-1  | 9 | BM | หน้าห้องปั๊ม       | / | / |  |
| 13 | FE-Non CFC -9-1-2  | 9 | 1  | หน้าลิฟท์โดยสาร    | / | / |  |
| 14 | FE-Non CFC - BP-1  | 1 | 1  | สระบึงพุท          | / | / |  |
| 15 | FE-Non CFC -JP-1   | 7 | 1  | สระจิ้งเกิ้ลพุท    | / | / |  |
| 16 | FE-Non CFC - SN-1  | 7 | 1  | หน้าห้องขานาชาย    | / | / |  |
| 17 | FE-Non CFC - SN-2  | 7 | 1  | หน้าห้องขานาหญิง   | / | / |  |

## ถังเงิน

|   |                       |   |    |                           |   |   |  |
|---|-----------------------|---|----|---------------------------|---|---|--|
| 1 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 1 | BM | Itaian Kitchen            | / | / |  |
| 2 | FE-Non AR-AFFF -1-B-1 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าเบเกอรี่ | / | / |  |
| 3 | FE-Non AR-AFFF -1-B-2 | 2 | BM | Main Kitchen หน้าบุชเชอร์ | / | / |  |
| 4 | FE-Non CFC -1-B-1     | 5 | BM | Canteen                   | / | / |  |

Check by : นาย ธีรเดช ใจดี

## Fire Hose Cabinet Check list

**กรกฎาคม 2025**

| no | Code     | Building | Floor | LACATION              | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|----------|----------|-------|-----------------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |          |          |       |                       |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 1  | FH-1-B-1 | 1        | BM    | ข้างออฟฟิศ GM         | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 2  | FH-1-1-1 | 1        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 3  | FH-1-2-1 | 1        | 2     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 4  | FH-1-3-1 | 1        | 3     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 5  | FH-1-4-1 | 1        | 4     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 6  | FH-2-B-1 | 2        | BM    | ข้างออฟฟิศแม่บ้าน     | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 7  | FH-2-B-2 | 2        | BM    | ทางเข้าครัวเมน        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 8  | FH-2-1-1 | 2        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 9  | FH-2-2-1 | 2        | 2     | ข้างทางเข้าห้องประชุม | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 10 | FH-3-B-1 | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 11 | FH-3-1-1 | 3        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 12 | FH-3-2-1 | 3        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 13 | FH-3-3-1 | 3        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 14 | FH-3-4-1 | 3        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 15 | FH-4-B-1 | 4        | BM    | หน้าห้อง IT           | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 16 | FH-4-1-1 | 4        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 17 | FH-4-2-1 | 4        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 18 | FH-4-3-1 | 4        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 19 | FH-4-4-1 | 4        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 20 | FH-5-B-1 | 5        | BM    | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 21 | FH-5-1-1 | 5        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 22 | FH-5-2-1 | 5        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 23 | FH-5-3-1 | 5        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 24 | FH-5-4-1 | 5        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 25 | FH-6-1-1 | 6        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 26 | FH-6-2-1 | 6        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 27 | FH-6-3-1 | 6        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 28 | FH-6-4-1 | 6        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

| no | Code       | Building | Floor | LACATION     | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|------------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |            |          |       |              |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 29 | FH-7-B-1   | 7        | BM    | spa          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 30 | FH-7-1-1   | 7        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 31 | FH-7-2-1   | 7        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 32 | FH-7-3-1   | 7        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 33 | FH-7-4-1   | 7        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 34 | FH-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 35 | FH-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 36 | FH-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 37 | FH-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 38 | FH-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 39 | FH-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 40 | FH-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 41 | FH-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 42 | FH-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 43 | FH-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 44 | FH-9-1-1   | 9        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 45 | FH-9-2-1   | 9        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 46 | FH-9-3-1   | 9        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 47 | FH-9-4-1   | 9        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 48 | FH-9-5-1   | 9        | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |

Check by: mw photo harm

## Fire Hose Cabinet Check list

สิงหาคม 2025

| no | Code     | Building | Floor | LACATION              | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|----------|----------|-------|-----------------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |          |          |       |                       |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 1  | FH-1-B-1 | 1        | BM    | ข้างออฟฟิศ GM         | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 2  | FH-1-1-1 | 1        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 3  | FH-1-2-1 | 1        | 2     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 4  | FH-1-3-1 | 1        | 3     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 5  | FH-1-4-1 | 1        | 4     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 6  | FH-2-B-1 | 2        | BM    | ข้างออฟฟิศแม่บ้าน     | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 7  | FH-2-B-2 | 2        | BM    | ทางเข้าครัวเมน        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 8  | FH-2-1-1 | 2        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 9  | FH-2-2-1 | 2        | 2     | ข้างทางเข้าห้องประชุม | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 10 | FH-3-B-1 | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 11 | FH-3-1-1 | 3        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 12 | FH-3-2-1 | 3        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 13 | FH-3-3-1 | 3        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 14 | FH-3-4-1 | 3        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 15 | FH-4-B-1 | 4        | BM    | หน้าห้อง IT           | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 16 | FH-4-1-1 | 4        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 17 | FH-4-2-1 | 4        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 18 | FH-4-3-1 | 4        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 19 | FH-4-4-1 | 4        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 20 | FH-5-B-1 | 5        | BM    | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 21 | FH-5-1-1 | 5        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 22 | FH-5-2-1 | 5        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 23 | FH-5-3-1 | 5        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 24 | FH-5-4-1 | 5        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 25 | FH-6-1-1 | 6        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 26 | FH-6-2-1 | 6        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 27 | FH-6-3-1 | 6        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 28 | FH-6-4-1 | 6        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |



## Fire Hose Cabinet Check list

สิงหาคม 2025

| no | Code       | Building | Floor | LACATION     | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|------------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |            |          |       |              |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 29 | FH-7-B-1   | 7        | BM    | spa          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 30 | FH-7-1-1   | 7        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 31 | FH-7-2-1   | 7        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 32 | FH-7-3-1   | 7        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 33 | FH-7-4-1   | 7        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 34 | FH-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 35 | FH-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 36 | FH-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 37 | FH-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 38 | FH-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 39 | FH-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 40 | FH-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 41 | FH-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 42 | FH-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 43 | FH-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 44 | FH-9-1-1   | 9        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 45 | FH-9-2-1   | 9        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 46 | FH-9-3-1   | 9        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 47 | FH-9-4-1   | 9        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 48 | FH-9-5-1   | 9        | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |

Check by : นาย ชัยสิทธิ์ ใจดี

## Fire Hose Cabinet Check list

**กันยายน 2025**

| no | Code     | Building | Floor | LACATION              | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|----------|----------|-------|-----------------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |          |          |       |                       |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 1  | FH-1-B-1 | 1        | BM    | ข้างออฟฟิศ GM         | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 2  | FH-1-1-1 | 1        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 3  | FH-1-2-1 | 1        | 2     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 4  | FH-1-3-1 | 1        | 3     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 5  | FH-1-4-1 | 1        | 4     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 6  | FH-2-B-1 | 2        | BM    | ข้างออฟฟิศแม่บ้าน     | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 7  | FH-2-B-2 | 2        | BM    | ทางเข้าครัวเมน        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 8  | FH-2-1-1 | 2        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 9  | FH-2-2-1 | 2        | 2     | ข้างทางเข้าห้องประชุม | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 10 | FH-3-B-1 | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 11 | FH-3-1-1 | 3        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 12 | FH-3-2-1 | 3        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 13 | FH-3-3-1 | 3        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 14 | FH-3-4-1 | 3        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 15 | FH-4-B-1 | 4        | BM    | หน้าห้อง IT           | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 16 | FH-4-1-1 | 4        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 17 | FH-4-2-1 | 4        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 18 | FH-4-3-1 | 4        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 19 | FH-4-4-1 | 4        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 20 | FH-5-B-1 | 5        | BM    | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 21 | FH-5-1-1 | 5        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 22 | FH-5-2-1 | 5        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 23 | FH-5-3-1 | 5        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 24 | FH-5-4-1 | 5        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 25 | FH-6-1-1 | 6        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 26 | FH-6-2-1 | 6        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 27 | FH-6-3-1 | 6        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 28 | FH-6-4-1 | 6        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

| no | Code       | Building | Floor | LACATION     | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|------------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |            |          |       |              |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 29 | FH-7-B-1   | 7        | BM    | spa          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 30 | FH-7-1-1   | 7        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 31 | FH-7-2-1   | 7        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 32 | FH-7-3-1   | 7        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 33 | FH-7-4-1   | 7        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 34 | FH-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 35 | FH-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 36 | FH-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 37 | FH-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 38 | FH-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 39 | FH-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 40 | FH-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 41 | FH-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 42 | FH-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 43 | FH-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 44 | FH-9-1-1   | 9        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 45 | FH-9-2-1   | 9        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 46 | FH-9-3-1   | 9        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 47 | FH-9-4-1   | 9        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 48 | FH-9-5-1   | 9        | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |

Check by: xe Rishi Doshi

## Fire Hose Cabinet Check list

**ตุลาคม 2025**

| no | Code     | Building | Floor | LACATION              | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|----------|----------|-------|-----------------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |          |          |       |                       |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 1  | FH-1-B-1 | 1        | BM    | ข้างออฟฟิศ GM         | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 2  | FH-1-1-1 | 1        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 3  | FH-1-2-1 | 1        | 2     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 4  | FH-1-3-1 | 1        | 3     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 5  | FH-1-4-1 | 1        | 4     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 6  | FH-2-B-1 | 2        | BM    | ข้างออฟฟิศแม่บ้าน     | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 7  | FH-2-B-2 | 2        | BM    | ทางเข้าครัวเมน        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 8  | FH-2-1-1 | 2        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 9  | FH-2-2-1 | 2        | 2     | ข้างทางเข้าห้องประชุม | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 10 | FH-3-B-1 | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 11 | FH-3-1-1 | 3        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 12 | FH-3-2-1 | 3        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 13 | FH-3-3-1 | 3        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 14 | FH-3-4-1 | 3        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 15 | FH-4-B-1 | 4        | BM    | หน้าห้อง IT           | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 16 | FH-4-1-1 | 4        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 17 | FH-4-2-1 | 4        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 18 | FH-4-3-1 | 4        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 19 | FH-4-4-1 | 4        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 20 | FH-5-B-1 | 5        | BM    | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 21 | FH-5-1-1 | 5        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 22 | FH-5-2-1 | 5        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 23 | FH-5-3-1 | 5        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 24 | FH-5-4-1 | 5        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 25 | FH-6-1-1 | 6        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 26 | FH-6-2-1 | 6        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 27 | FH-6-3-1 | 6        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 28 | FH-6-4-1 | 6        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |



## Fire Hose Cabinet Check list

**ตุลาคม 2025**

| no | Code       | Building | Floor | LACATION     | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|------------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |            |          |       |              |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 29 | FH-7-B-1   | 7        | BM    | spa          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 30 | FH-7-1-1   | 7        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 31 | FH-7-2-1   | 7        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 32 | FH-7-3-1   | 7        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 33 | FH-7-4-1   | 7        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 34 | FH-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 35 | FH-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 36 | FH-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 37 | FH-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 38 | FH-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 39 | FH-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 40 | FH-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 41 | FH-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 42 | FH-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 43 | FH-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 44 | FH-9-1-1   | 9        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 45 | FH-9-2-1   | 9        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 46 | FH-9-3-1   | 9        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 47 | FH-9-4-1   | 9        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 48 | FH-9-5-1   | 9        | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |

Check by : me pake lachy



## Fire Hose Cabinet Check list

พฤศจิกายน 2025

| no | Code     | Building | Floor | LACATION              | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|----------|----------|-------|-----------------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |          |          |       |                       |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 1  | FH-1-B-1 | 1        | BM    | ข้างออฟฟิศ GM         | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 2  | FH-1-1-1 | 1        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 3  | FH-1-2-1 | 1        | 2     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 4  | FH-1-3-1 | 1        | 3     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 5  | FH-1-4-1 | 1        | 4     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 6  | FH-2-B-1 | 2        | BM    | ข้างออฟฟิศแม่บ้าน     | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 7  | FH-2-B-2 | 2        | BM    | ทางเข้าครัวเมน        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 8  | FH-2-1-1 | 2        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 9  | FH-2-2-1 | 2        | 2     | ข้างทางเข้าห้องประชุม | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 10 | FH-3-B-1 | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 11 | FH-3-1-1 | 3        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 12 | FH-3-2-1 | 3        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 13 | FH-3-3-1 | 3        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 14 | FH-3-4-1 | 3        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 15 | FH-4-B-1 | 4        | BM    | หน้าห้อง IT           | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 16 | FH-4-1-1 | 4        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 17 | FH-4-2-1 | 4        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 18 | FH-4-3-1 | 4        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 19 | FH-4-4-1 | 4        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 20 | FH-5-B-1 | 5        | BM    | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 21 | FH-5-1-1 | 5        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 22 | FH-5-2-1 | 5        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 23 | FH-5-3-1 | 5        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 24 | FH-5-4-1 | 5        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 25 | FH-6-1-1 | 6        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 26 | FH-6-2-1 | 6        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 27 | FH-6-3-1 | 6        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 28 | FH-6-4-1 | 6        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |

## Fire Hose Cabinet Check list

พฤศจิกายน 2025

| no | Code       | Building | Floor | LACATION     | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|------------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |            |          |       |              |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 29 | FH-7-B-1   | 7        | BM    | spa          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 30 | FH-7-1-1   | 7        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 31 | FH-7-2-1   | 7        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 32 | FH-7-3-1   | 7        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 33 | FH-7-4-1   | 7        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 34 | FH-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 35 | FH-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 36 | FH-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 37 | FH-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 38 | FH-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 39 | FH-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 40 | FH-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 41 | FH-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 42 | FH-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 43 | FH-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 44 | FH-9-1-1   | 9        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 45 | FH-9-2-1   | 9        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 46 | FH-9-3-1   | 9        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 47 | FH-9-4-1   | 9        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 48 | FH-9-5-1   | 9        | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |

Check by : Mr. Pichet Anon



## Fire Hose Cabinet Check list

ธันวาคม 2025

| no | Code     | Building | Floor | LACATION              | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|----------|----------|-------|-----------------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |          |          |       |                       |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 1  | FH-1-B-1 | 1        | BM    | ข้างออฟฟิศ GM         | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 2  | FH-1-1-1 | 1        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 3  | FH-1-2-1 | 1        | 2     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 4  | FH-1-3-1 | 1        | 3     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 5  | FH-1-4-1 | 1        | 4     | บันไดหนีไฟ            | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 6  | FH-2-B-1 | 2        | BM    | ข้างออฟฟิศแม่บ้าน     | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 7  | FH-2-B-2 | 2        | BM    | ทางเข้าครัวเมน        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 8  | FH-2-1-1 | 2        | 1     | ข้างห้องน้ำแชก        | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 9  | FH-2-2-1 | 2        | 2     | ข้างทางเข้าห้องประชุม | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 10 | FH-3-B-1 | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 11 | FH-3-1-1 | 3        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 12 | FH-3-2-1 | 3        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 13 | FH-3-3-1 | 3        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 14 | FH-3-4-1 | 3        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 15 | FH-4-B-1 | 4        | BM    | หน้าห้อง IT           | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 16 | FH-4-1-1 | 4        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 17 | FH-4-2-1 | 4        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 18 | FH-4-3-1 | 4        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 19 | FH-4-4-1 | 4        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 20 | FH-5-B-1 | 5        | BM    | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 21 | FH-5-1-1 | 5        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 22 | FH-5-2-1 | 5        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 23 | FH-5-3-1 | 5        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 24 | FH-5-4-1 | 5        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 25 | FH-6-1-1 | 6        | 1     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 26 | FH-6-2-1 | 6        | 2     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 27 | FH-6-3-1 | 6        | 3     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 28 | FH-6-4-1 | 6        | 4     | maid station          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |

## Fire Hose Cabinet Check list

ธันวาคม 2025

| no | Code       | Building | Floor | LACATION     | Hydrant | Hose Drill |            |         | Extinguisher |          | Remark |
|----|------------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------|--------|
|    |            |          |       |              |         | Piping     | Hose Drill | Testing | Tank         | Pressure |        |
| 29 | FH-7-B-1   | 7        | BM    | spa          | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 30 | FH-7-1-1   | 7        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 31 | FH-7-2-1   | 7        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 32 | FH-7-3-1   | 7        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 33 | FH-7-4-1   | 7        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 34 | FH-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 35 | FH-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 36 | FH-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 37 | FH-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 38 | FH-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 39 | FH-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 40 | FH-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 41 | FH-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 42 | FH-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 43 | FH-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 44 | FH-9-1-1   | 9        | 1     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 45 | FH-9-2-1   | 9        | 2     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 46 | FH-9-3-1   | 9        | 3     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 47 | FH-9-4-1   | 9        | 4     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |
| 48 | FH-9-5-1   | 9        | 5     | maid station | /       | /          | /          | /       | /            | /        |        |

Check by : Mr. Anurak Anant



# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

กรกฎาคม 2025

| no | Code       | Building | Floor | Location                         | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|------------|----------|-------|----------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 1  | ELC-1-1-1  | 1        | 1     | เสาข้างเคาเตอร์                  | /     | -/       | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 2  | ELC-1-1-2  | 1        | 1     | หน้าลิฟท์                        | /     | /        | ✓    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 3  | ELC-1-1-3  | 1        | 1     | ห้องนำชาย lobby                  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 4  | ELC-1-1-4  | 1        | 1     | ห้องนำคนพิการ                    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 5  | ELC-1-1-5  | 1        | 1     | ห้องนำหญิง lobby                 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 6  | ELC-1-1-6  | 1        | 1     | ผนังข้างบันได                    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 7  | ELC-1-2-1  | 1        | 2     | หน้าบันไดห้องอาหารนิว            | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 8  | ELC-1-2-2  | 1        | 2     | ห้องนำชายหน้าห้องอาหารนิว        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 9  | ELC-1-2-3  | 1        | 2     | ห้องนำหญิงหน้าห้องอาหารนิว       | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 10 | ELC-1-2-4  | 1        | 2     | หน้าลิฟท์                        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 11 | ELC-1-2-5  | 1        | 2     | หน้าห้อง bussiness               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 12 | ELC-1-3-1  | 1        | 3     | หน้าห้อง 1302                    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 13 | ELC-1-3-2  | 1        | 3     | หน้าบันได                        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 14 | ELC-1-3-3  | 1        | 3     | หน้าลิฟท์                        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 15 | ELC-1-3-4  | 1        | 3     | หน้าห้องไฟฟ้า                    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 16 | ELC-1-4-1  | 1        | 4     | หน้าห้อง 1402                    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 17 | ELC-1-4-2  | 1        | 4     | หน้าบันได                        | /     | /        | /    | /         | /            | ✓    | /    | /    |        |
| 18 | ELC-1-4-3  | 1        | 4     | หน้าลิฟท์                        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 19 | ELC-2-1-1  | 2        | 1     | ห้องอาหารนานา                    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 20 | ELC-2-1-2  | 2        | 1     | ห้องอาหารนานา                    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 21 | ELC-2-1-3  | 2        | 1     | ห้องอาหารนานา เหนือเคาเตอร์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 22 | ELC-2-1-4  | 2        | 1     | ห้องอาหารนานา เหนือไลน์พเฟด      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 23 | ELC-2-1-5  | 2        | 1     | หน้าห้องอาหารนานา เหนือตู้ C-BUS | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 24 | ELC-2-1-6  | 2        | 1     | หน้าห้องอาหารนานา ทางลงสระบัว    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 25 | ELC-2-1-7  | 2        | 1     | หน้าห้องอาหารนานา ฝั่งบันไดวน    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 26 | ELC-2-1-8  | 2        | 1     | ทางเดินไปห้องน้ำ                 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 27 | ELC-2-1-9  | 2        | 1     | ห้องนำชาย นานา                   | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 28 | ELC-2-1-10 | 2        | 1     | ห้องนำคนพิการ นานา               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 29 | ELC-2-1-11 | 2        | 1     | ห้องนำหญิง นานา                  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 30 | ELC-2-1-12 | 2        | 1     | หน้าประตูหนีไฟนานา               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 31 | ELC-2-2-1  | 2        | 2     | หน้าห้องนำชาย                    | /     | /        | ✓    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 32 | ELC-2-2-2  | 2        | 2     | หน้าห้องประชุมสภา                | /     | /        | ✓    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 33 | ELC-2-2-3  | 2        | 2     | ห้องประชุมสภา                    | /     | /        | ✓    | /         | /            | /    | /    | /    |        |



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

กรกฎาคม 2025

[illegible]



# Emergency Light check list -แบบฝังฟ้า

กรกฎาคม 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 66 | ELC-4-4-2   | 4        | 4     | หน้าห้อง 4403 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELC-4-4-3   | 4        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELC-5-1-1   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5108 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELC-5-1-2   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELC-5-1-3   | 5        | 1     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELC-5-2-1   | 5        | 2     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELC-5-2-2   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5204 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELC-5-2-3   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELC-5-3-1   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5308 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELC-5-3-2   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELC-5-3-3   | 5        | 3     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELC-5-4-1   | 5        | 4     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELC-5-4-2   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELC-5-4-3   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5406 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELC-6-1-1   | 6        | 1     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELC-6-1-2   | 6        | 1     | หน้าห้อง 6101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELC-6-2-1   | 6        | 2     | หน้าห้อง 6201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELC-6-2-2   | 6        | 2     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 84 | ELC-6-3-1   | 6        | 3     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 85 | ELC-6-3-2   | 6        | 3     | หน้าห้อง 6301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 86 | ELC-6-4-1   | 6        | 4     | หน้าห้อง 6401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 87 | ELC-6-4-2   | 6        | 4     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 88 | ELC-7-1-1   | 7        | 1     | หน้าห้องไฟฟ้า | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 89 | ELC-7-1-2   | 7        | 1     | หน้าห้อง 7101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 90 | ELC-7-2-1   | 7        | 2     | หน้าห้อง 7201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 91 | ELC-7-2-2   | 7        | 2     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92 | ELC-7-3-1   | 7        | 3     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93 | ELC-7-3-2   | 7        | 3     | หน้าห้อง 7301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94 | ELC-7-4-1   | 7        | 4     | หน้าห้อง 7401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95 | ELC-7-4-2   | 7        | 4     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96 | ELC-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97 | ELC-8/1-1-2 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8101 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |



# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

กรกฎาคม 2025

| no  | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 98  | ELC-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ELC-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8204 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ELC-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ELC-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ELC-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ELC-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ELC-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8504 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ELC-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8501 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ELC-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ELC-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ELC-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ELC-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208 | /     | /        | ✓    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ELC-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ELC-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ELC-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ELC-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ELC-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ELC-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ELC-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าลิฟท์     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ELC-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 118 | ELC-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าลิฟท์     | ✓     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 119 | ELC-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | ✓    | /    |        |
| 120 | ELC-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 121 | ELC-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 122 | ELC-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 123 | ELC-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 124 | ELC-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 125 | ELC-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By :  



**N**  
THE NATURE  
+ BECKET +

สิงหาคม 2025

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PROJECT •

สิงหาคม 2025

[illegible]



# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า


สิงหาคม 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 66 | ELC-4-4-2   | 4        | 4     | หน้าห้อง 4403 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELC-4-4-3   | 4        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELC-5-1-1   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5108 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELC-5-1-2   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELC-5-1-3   | 5        | 1     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELC-5-2-1   | 5        | 2     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELC-5-2-2   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5204 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELC-5-2-3   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELC-5-3-1   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5308 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELC-5-3-2   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELC-5-3-3   | 5        | 3     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELC-5-4-1   | 5        | 4     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELC-5-4-2   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELC-5-4-3   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5406 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELC-6-1-1   | 6        | 1     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELC-6-1-2   | 6        | 1     | หน้าห้อง 6101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELC-6-2-1   | 6        | 2     | หน้าห้อง 6201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELC-6-2-2   | 6        | 2     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 84 | ELC-6-3-1   | 6        | 3     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 85 | ELC-6-3-2   | 6        | 3     | หน้าห้อง 6301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 86 | ELC-6-4-1   | 6        | 4     | หน้าห้อง 6401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 87 | ELC-6-4-2   | 6        | 4     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 88 | ELC-7-1-1   | 7        | 1     | หน้าห้องไฟฟ้า | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 89 | ELC-7-1-2   | 7        | 1     | หน้าห้อง 7101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 90 | ELC-7-2-1   | 7        | 2     | หน้าห้อง 7201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 91 | ELC-7-2-2   | 7        | 2     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92 | ELC-7-3-1   | 7        | 3     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93 | ELC-7-3-2   | 7        | 3     | หน้าห้อง 7301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94 | ELC-7-4-1   | 7        | 4     | หน้าห้อง 7401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95 | ELC-7-4-2   | 7        | 4     | หน้าแปดตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96 | ELC-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97 | ELC-8/1-1-2 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8101 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

สิงหาคม 2025

| no  | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 98  | ELC-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ELC-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8204 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ELC-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ELC-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ELC-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ELC-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ELC-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8504 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ELC-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8501 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ELC-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ELC-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ELC-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ELC-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ELC-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ELC-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ELC-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ELC-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ELC-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ELC-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ELC-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าลิฟท์     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ELC-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 118 | ELC-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 119 | ELC-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 120 | ELC-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 121 | ELC-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 122 | ELC-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 123 | ELC-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 124 | ELC-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 125 | ELC-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By : 



**N**  
THE NATURE  
- JOURNAL -

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PLECE •

[illegible]

# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

กันยายน 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 66 | ELC-4-4-2   | 4        | 4     | หน้าห้อง 4403 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELC-4-4-3   | 4        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELC-5-1-1   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5108 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELC-5-1-2   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELC-5-1-3   | 5        | 1     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELC-5-2-1   | 5        | 2     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELC-5-2-2   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5204 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELC-5-2-3   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELC-5-3-1   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5308 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELC-5-3-2   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELC-5-3-3   | 5        | 3     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELC-5-4-1   | 5        | 4     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELC-5-4-2   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELC-5-4-3   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5406 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELC-6-1-1   | 6        | 1     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELC-6-1-2   | 6        | 1     | หน้าห้อง 6101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELC-6-2-1   | 6        | 2     | หน้าห้อง 6201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELC-6-2-2   | 6        | 2     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 84 | ELC-6-3-1   | 6        | 3     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 85 | ELC-6-3-2   | 6        | 3     | หน้าห้อง 6301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 86 | ELC-6-4-1   | 6        | 4     | หน้าห้อง 6401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 87 | ELC-6-4-2   | 6        | 4     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 88 | ELC-7-1-1   | 7        | 1     | หน้าห้องไฟฟ้า | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 89 | ELC-7-1-2   | 7        | 1     | หน้าห้อง 7101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 90 | ELC-7-2-1   | 7        | 2     | หน้าห้อง 7201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 91 | ELC-7-2-2   | 7        | 2     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92 | ELC-7-3-1   | 7        | 3     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93 | ELC-7-3-2   | 7        | 3     | หน้าห้อง 7301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94 | ELC-7-4-1   | 7        | 4     | หน้าห้อง 7401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95 | ELC-7-4-2   | 7        | 4     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96 | ELC-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97 | ELC-8/1-1-2 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8101 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |



# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

กันยายน 2025

| no  | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 98  | ELC-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ELC-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8204 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ELC-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ELC-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ELC-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ELC-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ELC-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8504 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ELC-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8501 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ELC-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ELC-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ELC-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ELC-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ELC-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ELC-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ELC-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ELC-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ELC-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ELC-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ELC-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าลิฟท์     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ELC-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 118 | ELC-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 119 | ELC-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 120 | ELC-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 121 | ELC-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 122 | ELC-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 123 | ELC-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 124 | ELC-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 125 | ELC-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By : นาย ชัยพร หวังดี

**N**  
THE NATURE  
• BUCKET •

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PROJECT •

[illegible]



## Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

ตุลาคม 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 66 | ELC-4-4-2   | 4        | 4     | หน้าห้อง 4403 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | X    |        |
| 67 | ELC-4-4-3   | 4        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELC-5-1-1   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5108 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELC-5-1-2   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELC-5-1-3   | 5        | 1     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELC-5-2-1   | 5        | 2     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELC-5-2-2   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5204 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELC-5-2-3   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELC-5-3-1   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5308 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELC-5-3-2   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELC-5-3-3   | 5        | 3     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELC-5-4-1   | 5        | 4     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELC-5-4-2   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELC-5-4-3   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5406 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELC-6-1-1   | 6        | 1     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELC-6-1-2   | 6        | 1     | หน้าห้อง 6101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELC-6-2-1   | 6        | 2     | หน้าห้อง 6201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELC-6-2-2   | 6        | 2     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 84 | ELC-6-3-1   | 6        | 3     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 85 | ELC-6-3-2   | 6        | 3     | หน้าห้อง 6301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 86 | ELC-6-4-1   | 6        | 4     | หน้าห้อง 6401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 87 | ELC-6-4-2   | 6        | 4     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 88 | ELC-7-1-1   | 7        | 1     | หน้าห้องไฟฟ้า | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 89 | ELC-7-1-2   | 7        | 1     | หน้าห้อง 7101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 90 | ELC-7-2-1   | 7        | 2     | หน้าห้อง 7201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 91 | ELC-7-2-2   | 7        | 2     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92 | ELC-7-3-1   | 7        | 3     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93 | ELC-7-3-2   | 7        | 3     | หน้าห้อง 7301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94 | ELC-7-4-1   | 7        | 4     | หน้าห้อง 7401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95 | ELC-7-4-2   | 7        | 4     | หน้าแปดตึก    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96 | ELC-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97 | ELC-8/1-1-2 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8101 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า



ตุลาคม 2025

| no  | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 98  | ELC-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ELC-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8204 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ELC-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ELC-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ELC-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ELC-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ELC-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8504 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ELC-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8501 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ELC-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ELC-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ELC-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ELC-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ELC-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ELC-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ELC-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ELC-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ELC-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ELC-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ELC-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าลิฟท์     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ELC-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 118 | ELC-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 119 | ELC-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 120 | ELC-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 121 | ELC-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 122 | ELC-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 123 | ELC-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 124 | ELC-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 125 | ELC-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By : นาง รุ่งโรจน์ ใจดี



**N**  
THE NATURE  
• PROJECT •

พฤษจิกาย 2025

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• FLUJET •

พฤษภาคม 2025

[illegible]



# Emergency Light check list -แบบฝังฟ้า

พฤศจิกายน 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 66 | ELC-4-4-2   | 4        | 4     | หน้าห้อง 4403 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | X    |        |
| 67 | ELC-4-4-3   | 4        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELC-5-1-1   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5108 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELC-5-1-2   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELC-5-1-3   | 5        | 1     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELC-5-2-1   | 5        | 2     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELC-5-2-2   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5204 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELC-5-2-3   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELC-5-3-1   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5308 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELC-5-3-2   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELC-5-3-3   | 5        | 3     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELC-5-4-1   | 5        | 4     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELC-5-4-2   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELC-5-4-3   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5406 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELC-6-1-1   | 6        | 1     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELC-6-1-2   | 6        | 1     | หน้าห้อง 6101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELC-6-2-1   | 6        | 2     | หน้าห้อง 6201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELC-6-2-2   | 6        | 2     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 84 | ELC-6-3-1   | 6        | 3     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 85 | ELC-6-3-2   | 6        | 3     | หน้าห้อง 6301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 86 | ELC-6-4-1   | 6        | 4     | หน้าห้อง 6401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 87 | ELC-6-4-2   | 6        | 4     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 88 | ELC-7-1-1   | 7        | 1     | หน้าห้องไฟฟ้า | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 89 | ELC-7-1-2   | 7        | 1     | หน้าห้อง 7101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 90 | ELC-7-2-1   | 7        | 2     | หน้าห้อง 7201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 91 | ELC-7-2-2   | 7        | 2     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92 | ELC-7-3-1   | 7        | 3     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93 | ELC-7-3-2   | 7        | 3     | หน้าห้อง 7301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94 | ELC-7-4-1   | 7        | 4     | หน้าห้อง 7401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95 | ELC-7-4-2   | 7        | 4     | หน้าแผนตึเมด  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96 | ELC-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97 | ELC-8/1-1-2 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8101 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

พฤศจิกายน 2025

| no  | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 98  | ELC-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ELC-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8204 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ELC-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ELC-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ELC-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ELC-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ELC-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8504 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ELC-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8501 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ELC-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ELC-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ELC-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ELC-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ELC-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ELC-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ELC-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ELC-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ELC-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ELC-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ELC-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าลิฟท์     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ELC-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 118 | ELC-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 119 | ELC-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 120 | ELC-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 121 | ELC-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 122 | ELC-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 123 | ELC-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 124 | ELC-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 125 | ELC-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By : นางสาว กิรชติ์ อินทร์



**N**  
THE NATURE  
• PHUKIT •

ธันวาคม 2025

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKIT •

[illegible]



# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

ธันวาคม 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 66 | ELC-4-4-2   | 4        | 4     | หน้าห้อง 4403 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | X    |        |
| 67 | ELC-4-4-3   | 4        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELC-5-1-1   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5108 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELC-5-1-2   | 5        | 1     | หน้าห้อง 5104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELC-5-1-3   | 5        | 1     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELC-5-2-1   | 5        | 2     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELC-5-2-2   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5204 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELC-5-2-3   | 5        | 2     | หน้าห้อง 5208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELC-5-3-1   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5308 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELC-5-3-2   | 5        | 3     | หน้าห้อง 5304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELC-5-3-3   | 5        | 3     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELC-5-4-1   | 5        | 4     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELC-5-4-2   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELC-5-4-3   | 5        | 4     | หน้าห้อง 5406 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELC-6-1-1   | 6        | 1     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELC-6-1-2   | 6        | 1     | หน้าห้อง 6101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELC-6-2-1   | 6        | 2     | หน้าห้อง 6201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELC-6-2-2   | 6        | 2     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 84 | ELC-6-3-1   | 6        | 3     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 85 | ELC-6-3-2   | 6        | 3     | หน้าห้อง 6301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 86 | ELC-6-4-1   | 6        | 4     | หน้าห้อง 6401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 87 | ELC-6-4-2   | 6        | 4     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 88 | ELC-7-1-1   | 7        | 1     | หน้าห้องไฟฟ้า | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 89 | ELC-7-1-2   | 7        | 1     | หน้าห้อง 7101 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 90 | ELC-7-2-1   | 7        | 2     | หน้าห้อง 7201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 91 | ELC-7-2-2   | 7        | 2     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92 | ELC-7-3-1   | 7        | 3     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93 | ELC-7-3-2   | 7        | 3     | หน้าห้อง 7301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94 | ELC-7-4-1   | 7        | 4     | หน้าห้อง 7401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95 | ELC-7-4-2   | 7        | 4     | หน้าแผนตึกเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96 | ELC-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8104 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97 | ELC-8/1-1-2 | 8/1      | 1     | หน้าห้อง 8101 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |



# Emergency Light check list -แบบฝังฝ้า

ธันวาคม 2025

| no  | Code        | Building | Floor | Location      | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|---------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 98  | ELC-8/1-2-1 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8201 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ELC-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าห้อง 8204 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ELC-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ELC-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าห้อง 8301 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ELC-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8401 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ELC-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าห้อง 8404 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ELC-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8504 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ELC-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าห้อง 8501 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ELC-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ELC-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ELC-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ELC-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ELC-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8304 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ELC-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ELC-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ELC-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ELC-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ELC-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ELC-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าลิฟท์     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ELC-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 118 | ELC-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 119 | ELC-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 120 | ELC-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 121 | ELC-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 122 | ELC-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 123 | ELC-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 124 | ELC-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าลิฟท์     | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 125 | ELC-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507 | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By : นาย สันติ โนนาน



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



## Emergency Light check list -แบบแขวนผนัง

กรกฎาคม 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location              | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 42 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 43 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดหนีไฟ        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 44 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 45 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดทางขึ้น      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 46 | ELW-3-1-1   | 3        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 47 | ELW-3-2-1   | 3        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 48 | ELW-3-3-1   | 3        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 49 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศช่าง        | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 50 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง AS Built         | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 51 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง fire control     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 52 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศเซฟ         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 53 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศ FB         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 54 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง IT               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 55 | ELW-4-1-1   | 4        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 56 | ELW-4-2-1   | 4        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 57 | ELW-4-3-1   | 4        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 58 | ELW-4-4-1   | 4        | 4     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 59 | ELW-5-BM-1  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนหิน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 60 | ELW-5-BM-2  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนหิน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 61 | ELW-5-BM-3  | 5        | BM    | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 62 | ELW-5-BM-4  | 5        | BM    | ห้องแคนหิน            | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 63 | ELW-5-BM-5  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์หญิง    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 64 | ELW-5-BM-6  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์ชาย     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 65 | ELW-5-BM-7  | 5        | BM    | หน้าห้องสล็อตเกอร์ชาย | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 66 | ELW-5-1-1   | 5        | 1     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELW-5-2-1   | 5        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELW-5-3-1   | 5        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELW-5-4-1   | 5        | 4     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELW-6-1-1   | 6        | 1     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELW-6-2-1   | 6        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELW-6-3-1   | 6        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELW-6-4-1   | 6        | 4     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELW-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELW-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELW-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELW-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELW-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | แผนตึกเมด             | X     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELW-9-1-1   | 9        | 1     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELW-9-2-1   | 9        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELW-9-3-1   | 9        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELW-9-4-1   | 9        | 4     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELW-9-5-1   | 9        | 5     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By :  



**N**  
THE NATUR  
• PHUKET •

[illegible]



# Emergency Light check list -แบบแขวนผนัง

สิงหาคม 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location              | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 42 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 43 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดหนีไฟ        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 44 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 45 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดทางขึ้น      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 46 | ELW-3-1-1   | 3        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 47 | ELW-3-2-1   | 3        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 48 | ELW-3-3-1   | 3        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 49 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศข้าง        | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 50 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง AS Built         | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 51 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง fire control     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 52 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศเซฟ         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 53 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศ FB         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 54 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง IT               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 55 | ELW-4-1-1   | 4        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 56 | ELW-4-2-1   | 4        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 57 | ELW-4-3-1   | 4        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 58 | ELW-4-4-1   | 4        | 4     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 59 | ELW-5-BM-1  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนทีน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 60 | ELW-5-BM-2  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนทีน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 61 | ELW-5-BM-3  | 5        | BM    | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 62 | ELW-5-BM-4  | 5        | BM    | ห้องแคนทีน            | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 63 | ELW-5-BM-5  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์หญิง    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 64 | ELW-5-BM-6  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์ชาย     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 65 | ELW-5-BM-7  | 5        | BM    | หน้าห้องสล็อตเกอร์ชาย | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 66 | ELW-5-1-1   | 5        | 1     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELW-5-2-1   | 5        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELW-5-3-1   | 5        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELW-5-4-1   | 5        | 4     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELW-6-1-1   | 6        | 1     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELW-6-2-1   | 6        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELW-6-3-1   | 6        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELW-6-4-1   | 6        | 4     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELW-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELW-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELW-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELW-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELW-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELW-9-1-1   | 9        | 1     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELW-9-2-1   | 9        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELW-9-3-1   | 9        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELW-9-4-1   | 9        | 4     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELW-9-5-1   | 9        | 5     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By :  



[illegible]



# Emergency Light check list -แบบแขวนผนัง

กันยายน 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location              | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 42 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 43 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดหนีไฟ        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 44 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 45 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดทางขึ้น      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 46 | ELW-3-1-1   | 3        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 47 | ELW-3-2-1   | 3        | 2     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 48 | ELW-3-3-1   | 3        | 3     | แปดตึก                | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 49 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศข้าง        | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 50 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง AS Built         | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 51 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง fire control     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 52 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศเซฟ         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 53 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศ FB         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 54 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง IT               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 55 | ELW-4-1-1   | 4        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 56 | ELW-4-2-1   | 4        | 2     | แปดตึก                | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 57 | ELW-4-3-1   | 4        | 3     | แปดตึก                | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 58 | ELW-4-4-1   | 4        | 4     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 59 | ELW-5-BM-1  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนทิน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 60 | ELW-5-BM-2  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนทิน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 61 | ELW-5-BM-3  | 5        | BM    | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 62 | ELW-5-BM-4  | 5        | BM    | ห้องแคนทิน            | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 63 | ELW-5-BM-5  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์หญิง    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 64 | ELW-5-BM-6  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์ชาย     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 65 | ELW-5-BM-7  | 5        | BM    | หน้าห้องสล็อตเกอร์ชาย | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 66 | ELW-5-1-1   | 5        | 1     | แปดตึก                | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELW-5-2-1   | 5        | 2     | แปดตึก                | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELW-5-3-1   | 5        | 3     | แปดตึก                | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELW-5-4-1   | 5        | 4     | แปดตึก                | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELW-6-1-1   | 6        | 1     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELW-6-2-1   | 6        | 2     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELW-6-3-1   | 6        | 3     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELW-6-4-1   | 6        | 4     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELW-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELW-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | แปดตึก                | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELW-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELW-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELW-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELW-9-1-1   | 9        | 1     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELW-9-2-1   | 9        | 2     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELW-9-3-1   | 9        | 3     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELW-9-4-1   | 9        | 4     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELW-9-5-1   | 9        | 5     | แปดตึก                | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By : *สสส* *กมล*



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



## Emergency Light check list -แบบแขวนผนัง

ตุลาคม 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location              | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 42 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 43 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดหนีไฟ        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 44 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 45 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดทางขึ้น      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 46 | ELW-3-1-1   | 3        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 47 | ELW-3-2-1   | 3        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 48 | ELW-3-3-1   | 3        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 49 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศข้าง        | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 50 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง AS Built         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 51 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง fire control     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 52 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศเซฟ         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 53 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศ FB         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 54 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง IT               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 55 | ELW-4-1-1   | 4        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 56 | ELW-4-2-1   | 4        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 57 | ELW-4-3-1   | 4        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 58 | ELW-4-4-1   | 4        | 4     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 59 | ELW-5-BM-1  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนหิน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 60 | ELW-5-BM-2  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนหิน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 61 | ELW-5-BM-3  | 5        | BM    | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 62 | ELW-5-BM-4  | 5        | BM    | ห้องแคนหิน            | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 63 | ELW-5-BM-5  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์หญิง    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 64 | ELW-5-BM-6  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์ชาย     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 65 | ELW-5-BM-7  | 5        | BM    | หน้าห้องสล็อตเกอร์ชาย | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 66 | ELW-5-1-1   | 5        | 1     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELW-5-2-1   | 5        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELW-5-3-1   | 5        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELW-5-4-1   | 5        | 4     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELW-6-1-1   | 6        | 1     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELW-6-2-1   | 6        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELW-6-3-1   | 6        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELW-6-4-1   | 6        | 4     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELW-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELW-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | แผนตึกเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELW-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELW-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELW-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELW-9-1-1   | 9        | 1     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELW-9-2-1   | 9        | 2     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELW-9-3-1   | 9        | 3     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELW-9-4-1   | 9        | 4     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELW-9-5-1   | 9        | 5     | แผนตึกเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By :





**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •


[illegible]



## Emergency Light check list -แบบแขวนผนัง

พฤศจิกายน 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location              | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 42 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 43 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดหนีไฟ        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 44 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 45 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดทางขึ้น      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 46 | ELW-3-1-1   | 3        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 47 | ELW-3-2-1   | 3        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 48 | ELW-3-3-1   | 3        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 49 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศข้าง        | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 50 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง AS Built         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 51 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง fire control     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 52 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศเซฟ         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 53 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศ FB         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 54 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง IT               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 55 | ELW-4-1-1   | 4        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 56 | ELW-4-2-1   | 4        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 57 | ELW-4-3-1   | 4        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 58 | ELW-4-4-1   | 4        | 4     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 59 | ELW-5-BM-1  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนหิน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 60 | ELW-5-BM-2  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนหิน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 61 | ELW-5-BM-3  | 5        | BM    | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 62 | ELW-5-BM-4  | 5        | BM    | ห้องแคนหิน            | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 63 | ELW-5-BM-5  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์หญิง    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 64 | ELW-5-BM-6  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์ชาย     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 65 | ELW-5-BM-7  | 5        | BM    | หน้าห้องสล็อตเกอร์ชาย | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 66 | ELW-5-1-1   | 5        | 1     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELW-5-2-1   | 5        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELW-5-3-1   | 5        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELW-5-4-1   | 5        | 4     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELW-6-1-1   | 6        | 1     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELW-6-2-1   | 6        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELW-6-3-1   | 6        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELW-6-4-1   | 6        | 4     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELW-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELW-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | แป้นดีเมด             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELW-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELW-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELW-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELW-9-1-1   | 9        | 1     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELW-9-2-1   | 9        | 2     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELW-9-3-1   | 9        | 3     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELW-9-4-1   | 9        | 4     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELW-9-5-1   | 9        | 5     | แป้นดีเมด             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By : 



**N**  
THE NATUR  
• PHUKET •

[illegible]



Emergency Light check list -แบบแขวนผนัง

ธันวาคม 2025

| no | Code        | Building | Floor | Location              | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|----|-------------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 42 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 43 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดหนีไฟ        | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 44 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | ลานจอดรถ              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 45 | ELW-3-BM-1  | 3        | BM    | หน้าบันไดทางขึ้น      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 46 | ELW-3-1-1   | 3        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 47 | ELW-3-2-1   | 3        | 2     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 48 | ELW-3-3-1   | 3        | 3     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 49 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศข้าง        | /     | X        | X    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 50 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง AS Built         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 51 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง fire control     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 52 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศเซฟ         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 53 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | หน้าออฟฟิศ FB         | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 54 | ELW-4-BM-1  | 4        | BM    | ห้อง IT               | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 55 | ELW-4-1-1   | 4        | 1     | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 56 | ELW-4-2-1   | 4        | 2     | แพนตีเมด              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 57 | ELW-4-3-1   | 4        | 3     | แพนตีเมด              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 58 | ELW-4-4-1   | 4        | 4     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 59 | ELW-5-BM-1  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนทีน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 60 | ELW-5-BM-2  | 5        | BM    | ทางเดินไปแคนทีน       | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 61 | ELW-5-BM-3  | 5        | BM    | ห้องไฟฟ้า             | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 62 | ELW-5-BM-4  | 5        | BM    | ห้องแคนทีน            | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 63 | ELW-5-BM-5  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์หญิง    | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 64 | ELW-5-BM-6  | 5        | BM    | ห้องสล็อตเกอร์ชาย     | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 65 | ELW-5-BM-7  | 5        | BM    | หน้าห้องสล็อตเกอร์ชาย | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 66 | ELW-5-1-1   | 5        | 1     | แพนตีเมด              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 67 | ELW-5-2-1   | 5        | 2     | แพนตีเมด              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 68 | ELW-5-3-1   | 5        | 3     | แพนตีเมด              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 69 | ELW-5-4-1   | 5        | 4     | แพนตีเมด              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 70 | ELW-6-1-1   | 6        | 1     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 71 | ELW-6-2-1   | 6        | 2     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 72 | ELW-6-3-1   | 6        | 3     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 73 | ELW-6-4-1   | 6        | 4     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 74 | ELW-8/1-1-1 | 8/1      | 1     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 75 | ELW-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | แพนตีเมด              | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 76 | ELW-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 77 | ELW-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 78 | ELW-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 79 | ELW-9-1-1   | 9        | 1     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 80 | ELW-9-2-1   | 9        | 2     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 81 | ELW-9-3-1   | 9        | 3     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 82 | ELW-9-4-1   | 9        | 4     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 83 | ELW-9-5-1   | 9        | 5     | แพนตีเมด              | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |

Check By : นางสาว กัญญา นิลนาค



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



**N**  
THE NATUR  
• PHUKET •

[illegible]

## Exit Sign Light Check list

กรกฎาคม 2025

| no  | Code        | Building | Floor | LACATION       | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|----------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 91  | ESL-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92  | ESL-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93  | ESL-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94  | ESL-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95  | ESL-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96  | ESL-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97  | ESL-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 98  | ESL-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ESL-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ESL-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ESL-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ESL-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8308  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ESL-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ESL-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ESL-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ESL-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ESL-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ESL-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9102  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ESL-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ESL-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9203  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ESL-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ESL-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ESL-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9303  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ESL-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9403  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ESL-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ESL-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9503  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ESL-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check by :  



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]

**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]

Check by : .....

**N**  
THE NATURAL  
• PHUKET •

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]

**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



## Exit Sign Light Check list

กันยายน 2025

| no  | Code        | Building | Floor | LACATION       | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|----------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 91  | ESL-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92  | ESL-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93  | ESL-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94  | ESL-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95  | ESL-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96  | ESL-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97  | ESL-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 98  | ESL-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ESL-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ESL-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ESL-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ESL-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8308  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ESL-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ESL-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ESL-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ESL-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ESL-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ESL-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9102  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ESL-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ESL-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9203  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ESL-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ESL-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ESL-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9303  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ESL-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9403  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ESL-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ESL-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9503  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ESL-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check by : .....

**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

ตุลาคม 2025

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

ตุลาคม 2025

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]

## Exit Sign Light Check list

ตุลาคม 2025

| no  | Code        | Building | Floor | LACATION       | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|----------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 91  | ESL-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92  | ESL-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93  | ESL-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94  | ESL-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95  | ESL-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96  | ESL-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97  | ESL-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 98  | ESL-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ESL-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ESL-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ESL-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ESL-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8308  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ESL-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ESL-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ESL-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ESL-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ESL-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ESL-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9102  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ESL-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ESL-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9203  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ESL-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ESL-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ESL-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9303  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ESL-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9403  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ESL-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ESL-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9503  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ESL-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check by : me ธิษะ คุ้ม



**N**  
THE NATUR  
• PHUKET •

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]

**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



# Exit Sign Light Check list

พฤศจิกายน 2025

| no  | Code        | Building | Floor | LACATION       | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|----------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 91  | ESL-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92  | ESL-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93  | ESL-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94  | ESL-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95  | ESL-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96  | ESL-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97  | ESL-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 98  | ESL-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ESL-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ESL-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ESL-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ESL-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8308  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ESL-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ESL-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ESL-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ESL-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ESL-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ESL-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9102  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ESL-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ESL-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9203  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ESL-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ESL-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ESL-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9303  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ESL-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9403  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ESL-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ESL-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9503  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ESL-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check by : .....

**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



**N**  
THE NATURE  
• PHUKET •

[illegible]



# Exit Sign Light Check list

ธันวาคม 2025


| no  | Code        | Building | Floor | LACATION       | power | recharge | test | auto test | display lamp | lamp | sign | body | Remark |
|-----|-------------|----------|-------|----------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
| 91  | ESL-8/1-2-2 | 8/1      | 2     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 92  | ESL-8/1-3-1 | 8/1      | 3     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 93  | ESL-8/1-3-2 | 8/1      | 3     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 94  | ESL-8/1-4-1 | 8/1      | 4     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 95  | ESL-8/1-4-2 | 8/1      | 4     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 96  | ESL-8/1-5-1 | 8/1      | 5     | หน้าแผ่นดินเมด | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 97  | ESL-8/1-5-2 | 8/1      | 5     | หน้าลิฟท์      | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 98  | ESL-8/2-1-1 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8108  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 99  | ESL-8/2-1-2 | 8/2      | 1     | หน้าห้อง 8105  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 100 | ESL-8/2-2-1 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8205  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 101 | ESL-8/2-2-2 | 8/2      | 2     | หน้าห้อง 8208  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 102 | ESL-8/2-3-1 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8308  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 103 | ESL-8/2-3-2 | 8/2      | 3     | หน้าห้อง 8305  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 104 | ESL-8/2-4-1 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8405  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 105 | ESL-8/2-4-2 | 8/2      | 4     | หน้าห้อง 8408  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 106 | ESL-8/2-5-1 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8508  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 107 | ESL-8/2-5-2 | 8/2      | 5     | หน้าห้อง 8505  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 108 | ESL-9-1-1   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9102  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 109 | ESL-9-1-2   | 9        | 1     | หน้าห้อง 9106  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 110 | ESL-9-2-1   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9203  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 111 | ESL-9-2-2   | 9        | 2     | หน้าห้อง 9207  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 112 | ESL-9-3-1   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9307  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 113 | ESL-9-3-2   | 9        | 3     | หน้าห้อง 9303  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 114 | ESL-9-4-1   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9403  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 115 | ESL-9-4-2   | 9        | 4     | หน้าห้อง 9407  | /     | X        | X    | X         | /            | /    | /    | /    |        |
| 116 | ESL-9-5-1   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9503  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |
| 117 | ESL-9-5-2   | 9        | 5     | หน้าห้อง 9507  | /     | /        | /    | /         | /            | /    | /    | /    |        |

Check by : *วศ สหะ โสภ*

## ภาคผนวกที่ 8

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



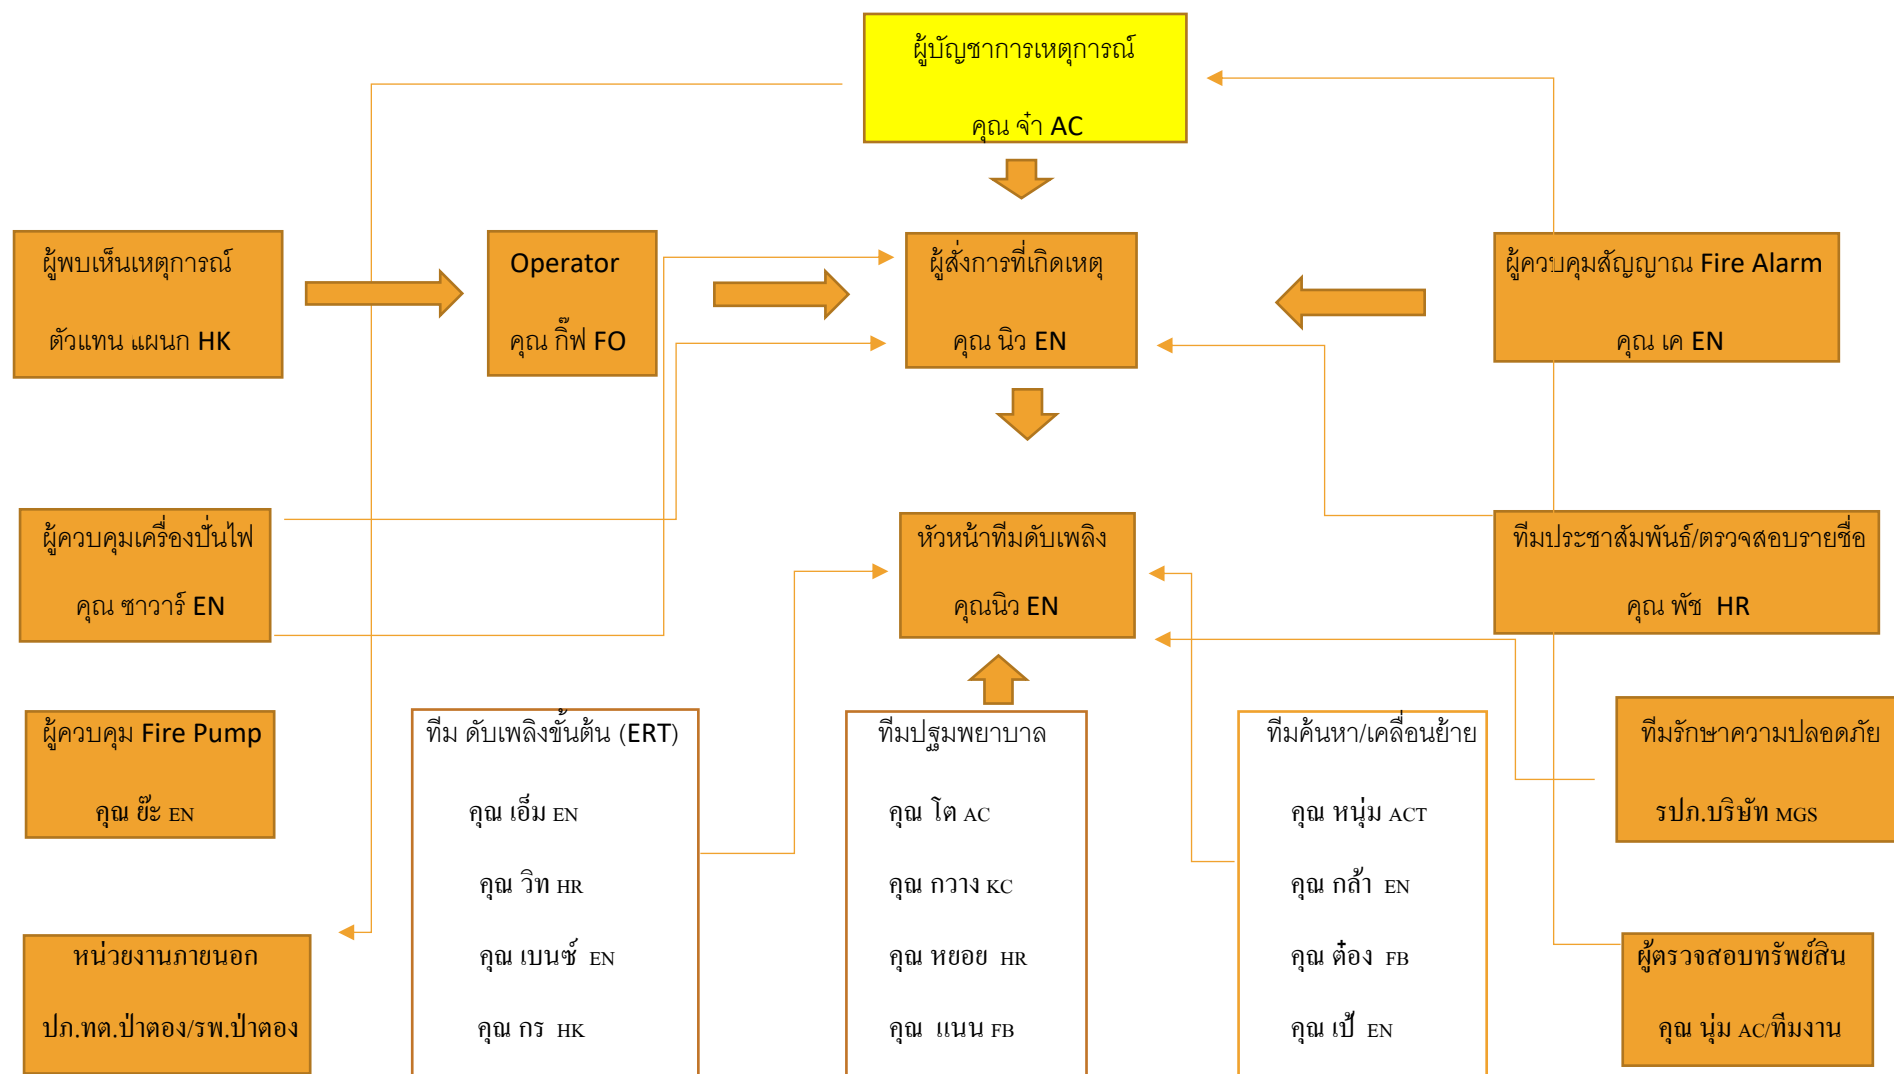

ภาคผนวกที่ 9

---

จำนวนพนักงานโรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

โรงแรมเดอะเนเจอร์ ภูเก็ต

จำนวนพนักงานภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต 86 คน

จำนวนพนักงานทั้งหมด 179 คน

บันทึก วันที่ 23/12/2025

ภาคผนวกที่ 10

---

ใบเสร็จค่าขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



## ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 128/68

เลขที่ 009

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง  
ได้รับเงินค่า เก็บ/หัก-หนี้ ๑๒๐๐ (ไม่หักเดือน ก.ค. 68)  
จาก บริษัท ช่างอู๋ จำกัด (จำกัดทุนไทย) (๒๒๐ พระราม ๖)  
เป็นเงิน 12,000 บาท - สตางค์  
(ตัวอักษร) พร้อมเงินยกพันบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 26 เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕ 68

ตำแหน่ง (นางสาวอาทิตย์ อิมปัดดี) ผู้รับเงิน  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

## ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 148/68

เลขที่ 010

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง  
ได้รับเงินค่า หักหนี้ ๑๒๐๐ (ไม่หักเดือน ก.ค. 68)  
จาก บริษัท ช่างอู๋ จำกัด (จำกัดทุนไทย) (๒๒๐ พระราม ๖)  
เป็นเงิน 3,000 บาท - สตางค์  
(ตัวอักษร) สามพันบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 26 เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕ 68

ตำแหน่ง (นางสาวอาทิตย์ อิมปัดดี) ผู้รับเงิน  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



เล่มที่ 109/68 เลขที่ 60

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04981/68  
วันที่ 4 กันยายน 2568

### เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

| ลำดับ                              | รายการ                                                          | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1                                  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 12,000.00       | ประจำเดือน ส.ค.68 |
|                                    | ที่อยู่ 322 ถ.พระบรมมัย ม. - ซ. - ถ. - ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต |                 |                   |
| รวมเงิน                            |                                                                 | 12,000.00       |                   |
| ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                                                                 |                 |                   |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวอาทิตย์ อินปากดี)

เจ้าพนักงานธุรการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาดอง  
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 2 กันยายน 2568

12,000.00 บาท

รวม : 12,000.00 บาท



เล่มที่ 109/๒๕ เลขที่ 61

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04982/68  
วันที่ 4 กันยายน 2568

เทศบาลเมืองปากทอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

| ลำดับ                    | รายการ                      | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1                        | ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย | 3,000.00        | ประจำเดือน ส.ค.68<br>322 ถ.พระบรมม |
| รวมเงิน                  |                             | 3,000.00        |                                    |
| ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน) |                             |                 |                                    |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวอาทิตา อินปากดี)  
เจ้าพนักงานธุรการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากทอง  
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 2 กันยายน 2568

3,000.00 บาท

รวม : 3,000.00 บาท



เล่มที่ 134/๖๘ เลขที่ 99

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06648/68

วันที่ 29 กันยายน 2568

### เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราบุรี จำกัด

| ลำดับ                              | รายการ                                                                     | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1                                  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                | 12,000.00       | ประจำเดือน<br>ก.ย.68 |
|                                    | ที่อยู่ 322 ถ.พระบรมมหาราชวัง ม.- ช.- ถ.- ต.ปทุมธานี อ.เกาะกู่<br>จ.ภูเก็ต |                 |                      |
| รวมเงิน                            |                                                                            | 12,000.00       |                      |
| ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                                                                            |                 |                      |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาววนิดา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี  
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 29 กันยายน 2568

: 12,000.00 บาท

รวม : 12,000.00 บาท





เล่มที่ 134/68 เลขที่ 100

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06649/68

วันที่ 29 กันยายน 2568

เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราภูรี จำกัด

| ลำดับ                    | รายการ                     | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ                               |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1                        | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 3,000.00        | ประจำเดือน<br>ก.ย.68<br>322 ถ.พระบารมี |
| รวมเงิน                  |                            | 3,000.00        |                                        |
| ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน) |                            |                 |                                        |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวธณิยา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาดอง  
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 29 กันยายน 2568

: 3,000.00 บาท

รวม : 3,000.00 บาท



เล่มที่ ๒๗/๔๙ เลขที่ 76

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00351/69

วันที่ 27 ตุลาคม 2568

### เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราบุรี จำกัด

| ลำดับ                              | รายการ                                                          | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1                                  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 12,000.00       | ประจำเดือน<br>ต.ค.68 |
|                                    | ที่อยู่ 322 ถ.พระบรมมัย ม.- ซ.- ถ.- ต.ปาดอง อ.กะทู้<br>จ.ภูเก็ต |                 |                      |
|                                    | รวมเงิน                                                         | 12,000.00       |                      |
| ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                                                                 |                 |                      |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวธัญญา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจังซีลอน : 12,000.00 บาท  
เลขที่ 43009186 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2568

รวม : 12,000.00 บาท



เล่มที่ 25/๕๙ เลขที่ 77

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00352/69

วันที่ 27 ตุลาคม 2568

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราบุรี จำกัด

| ลำดับ                    | รายการ                      | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ                               |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1                        | ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย | 3,000.00        | ประจำเดือน<br>ต.ค.68<br>322 ถ.พระบารมี |
| รวมเงิน                  |                             | 3,000.00        |                                        |
| ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน) |                             |                 |                                        |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวธณียา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เชื่อกธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจังซีลอน  
เลขที่ 43009186 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2568

: 3,000.00 บาท

รวม : 3,000.00 บาท



เล่มที่ 55/๒ เลขที่ 61

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03415/69

วันที่ 1 ธันวาคม 2568

เทศบาลเมืองปากทอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราบุรี จำกัด

| ลำดับ                              | รายการ                                                           | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1                                  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                      | 12,000.00       | ประจำเดือน<br>พ.ย. 68 |
|                                    | ที่อยู่ 322 ถ.พระบรมมัย ม.- ช.- ถ.- ต.ปากทอง อ.กะทู้<br>จ.ภูเก็ต |                 |                       |
|                                    | รวมเงิน                                                          | 12,000.00       |                       |
| ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                                                                  |                 |                       |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวธณิชา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากทอง  
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

: 12,000.00 บาท

รวม : 12,000.00 บาท





เล่มที่ ๕๕/๖๙ เลขที่ 62

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03416/69

วันที่ 1 ธันวาคม 2568

เทศบาลเมืองปากทอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราบุรี จำกัด

| ลำดับ                    | รายการ                      | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ                               |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1                        | ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย | 3,000.00        | ประจำเดือน<br>พ.ย.68<br>322 ถ.พระบารมี |
| รวมเงิน                  |                             | 3,000.00        |                                        |
| ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน) |                             |                 |                                        |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวธัญญา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากทอง  
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

: 3,000.00 บาท

รวม : 3,000.00 บาท



เล่มที่ 76/69 เลขที่ 54

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05385/69

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เทศบาลเมืองปากทอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธาราบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

| ลำดับ                              | รายการ                                                                  | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1                                  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                             | 12,000.00       | ประจำเดือน<br>ธ.ค.2568 |
|                                    | ที่อยู่ 322 ถนนพระบรมมหาราชวัง ม.- ช.- อ.- ต.ปากทอง อ.กะทู้<br>จ.ภูเก็ต |                 |                        |
|                                    | รวมเงิน                                                                 | 12,000.00       |                        |
| ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                                                                         |                 |                        |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวอณิชา กฤตศิลป์)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากทอง  
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 29 ธันวาคม 2568

: 12,000.00 บาท

รวม : 12,000.00 บาท





เล่มที่ 76/69 เลขที่ 55

## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05386/69

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท ธราวุธ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

| ลำดับ                    | รายการ                      | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ                                        |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1                        | ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย | 3,000.00        | ประจำเดือน<br>ธ.ค.2568<br>322 ถ.พระบรมมหาราชวัง |
| รวมเงิน                  |                             | 3,000.00        |                                                 |
| ตัวอักษร (สามพันบาทถ้วน) |                             |                 |                                                 |

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวธัญญา ฤกษ์ศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาดอง  
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 29 ธันวาคม 2568

: 3,000.00 บาท

รวม : 3,000.00 บาท

ภาคผนวกที่ 11

---

ใบเสร็จค่าสิ่งปลูกสร้าง/ไขมัน  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



ผู้มีอำนาจลงนาม



<sup>๒</sup> <sup>๐</sup>  
สมัครงาน



ผู้ชำนาญการ



ผู้มีอำนาจลงนาม



ใบอนุญาตดำเนินการกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย



## ใบอนุญาตดำเนินการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

เล่มที่....-.....เลขที่.....๒/๒๕๖๗.....

สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้

อนุญาตให้..บริษัท สุดาวรรณ เซฟติกเทคกิ้งคูลินนิ่งยูเก้ด จำกัด...อายุ...-.....ปี สัญชาติ...-.....  
เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.....-.....อยู่บ้านเลขที่.....๖๕/๔๐๘.....  
ตรอก/ซอย.....-..... ถนน.....-..... หมู่ที่..... ๒ .....  
ตำบล.....วิจิต.....อำเภอ.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....โทรศัพท์.....๐๘๑-๘๕๔๑๕๘๓.....  
ในนามนิติบุคคลชื่อ...บริษัท สุดาวรรณ เซฟติกเทคกิ้งคูลินนิ่งยูเก้ด.....ตั้งอยู่เลขที่...๖๕/๔๐๘...  
ตรอก/ซอย.....-..... ถนน.....-..... หมู่ที่.....๒.....ตำบล.....วิจิต.....  
อำเภอ.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต..... หมายเลขโทรศัพท์...๐๘๗-๔๗๒๐๒๔๗....  
เป็นผู้ดำเนินการ.....บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล.....ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้

ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกะทู้ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ถือปฏิบัติตามประกาศที่เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ประกาศกำหนดไว้

ออกให้ ณ วันที่.....๑๘.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

สิ้นอายุวันที่.....๑๗.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๘.....

(ลงชื่อ)..........

(นายวรรณยุทธ์ สุทธิกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

หมายเหตุ : -โปรดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต

- หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุในการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓๐ วัน



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ  
ระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                               |                                                                            |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               |                                          |                                   |                                      |                                                |                                                |                                          |                                        |                                                                                              |                                    | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br><br>(หน่วย / kW) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย (ลบ.<br>ม.) | การระบายน้ำ<br>ทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย /<br>ไม่ระบาย) (ลบ.<br>ม.) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ / ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                          |                                        | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |                                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมน้ำเสีย (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ /<br>ผิดปกติ) |                                                                                              |                                    |                         |
| 1/7/2568           | 279.20                                                                   | 174.50                                                                     | 139.60                                                               | 139.60                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 2/7/2568           | 236.32                                                                   | 147.70                                                                     | 118.16                                                               | 118.16                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 3/7/2568           | 263.81                                                                   | 164.88                                                                     | 131.90                                                               | 131.90                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 4/7/2568           | 268.66                                                                   | 167.91                                                                     | 134.33                                                               | 134.33                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 5/7/2568           | 283.55                                                                   | 177.22                                                                     | 141.78                                                               | 141.78                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 6/7/2568           | 254.59                                                                   | 159.12                                                                     | 127.30                                                               | 127.30                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 7/7/2568           | 264.51                                                                   | 165.32                                                                     | 132.26                                                               | 132.26                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 8/7/2568           | 214.00                                                                   | 133.75                                                                     | 107.00                                                               | 107.00                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 9/7/2568           | 245.97                                                                   | 153.73                                                                     | 122.98                                                               | 122.98                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 10/7/2568          | 288.85                                                                   | 180.53                                                                     | 144.42                                                               | 144.42                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 11/7/2568          | 233.74                                                                   | 146.09                                                                     | 116.87                                                               | 116.87                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 12/7/2568          | 251.01                                                                   | 156.88                                                                     | 125.50                                                               | 125.50                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 13/7/2568          | 286.69                                                                   | 179.18                                                                     | 143.34                                                               | 143.34                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 14/7/2568          | 264.66                                                                   | 165.41                                                                     | 132.33                                                               | 132.33                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 15/7/2568          | 236.75                                                                   | 147.97                                                                     | 118.38                                                               | 118.38                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 16/7/2568          | 197.33                                                                   | 123.33                                                                     | 98.66                                                                | 98.66                                                                           | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 17/7/2568          | 254.75                                                                   | 159.22                                                                     | 127.38                                                               | 127.38                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 18/7/2568          | 321.76                                                                   | 201.10                                                                     | 160.88                                                               | 160.88                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 19/7/2568          | 263.99                                                                   | 164.99                                                                     | 131.99                                                               | 131.99                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 20/7/2568          | 260.13                                                                   | 162.58                                                                     | 130.06                                                               | 130.06                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 21/7/2568          | 227.90                                                                   | 142.44                                                                     | 113.95                                                               | 113.95                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 22/7/2568          | 275.73                                                                   | 172.33                                                                     | 137.86                                                               | 137.86                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 23/7/2568          | 269.95                                                                   | 168.72                                                                     | 134.98                                                               | 134.98                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 24/7/2568          | 287.22                                                                   | 179.51                                                                     | 143.61                                                               | 143.61                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 25/7/2568          | 235.42                                                                   | 147.14                                                                     | 117.71                                                               | 117.71                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 26/7/2568          | 299.44                                                                   | 187.15                                                                     | 149.72                                                               | 149.72                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 27/7/2568          | 212.43                                                                   | 132.77                                                                     | 106.22                                                               | 106.22                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 28/7/2568          | 270.11                                                                   | 168.82                                                                     | 135.06                                                               | 135.06                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 29/7/2568          | 263.78                                                                   | 164.86                                                                     | 131.89                                                               | 131.89                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 30/7/2568          | 252.06                                                                   | 157.54                                                                     | 126.03                                                               | 126.03                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 31/7/2568          | 256.10                                                                   | 160.06                                                                     | 128.05                                                               | 128.05                                                                          | 0.25                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |



| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                               |                                                                                           |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               |                                          |                                   |                                      |                                                |                                                |                                    |                                        |                                                                                              |                                    | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br><br>(หน่วย / kW) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.)<br><br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย (ลบ.<br>ม.) | การระบายน้ำ<br>ทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย /<br>ไม่ระบาย) (ลบ.<br>ม.) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ / ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                    |                                        | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |                                                                          |                                                                                           |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมน้ำเสีย (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบลift<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ /<br>ผิดปกติ) |                                                                                              |                                    |                         |
| 1/8/2568           | 296.13                                                                   | 185.08                                                                                    | 148.06                                                               | 148.06                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 2/8/2568           | 231.50                                                                   | 144.69                                                                                    | 115.75                                                               | 115.75                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 3/8/2568           | 246.93                                                                   | 154.33                                                                                    | 123.46                                                               | 123.46                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 4/8/2568           | 250.86                                                                   | 156.79                                                                                    | 125.43                                                               | 125.43                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 5/8/2568           | 302.75                                                                   | 189.22                                                                                    | 151.38                                                               | 151.38                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 6/8/2568           | 269.20                                                                   | 168.25                                                                                    | 134.60                                                               | 134.60                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 7/8/2568           | 220.37                                                                   | 137.73                                                                                    | 110.18                                                               | 110.18                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 8/8/2568           | 243.47                                                                   | 152.17                                                                                    | 121.74                                                               | 121.74                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 9/8/2568           | 309.01                                                                   | 193.13                                                                                    | 154.50                                                               | 154.50                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 10/8/2568          | 254.42                                                                   | 159.01                                                                                    | 127.21                                                               | 127.21                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 11/8/2568          | 271.02                                                                   | 169.39                                                                                    | 135.51                                                               | 135.51                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 12/8/2568          | 262.28                                                                   | 163.92                                                                                    | 131.14                                                               | 131.14                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 13/8/2568          | 276.51                                                                   | 172.82                                                                                    | 138.26                                                               | 138.26                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 14/8/2568          | 251.31                                                                   | 157.07                                                                                    | 125.66                                                               | 125.66                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 15/8/2568          | 181.10                                                                   | 113.19                                                                                    | 90.55                                                                | 90.55                                                                           | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 16/8/2568          | 209.02                                                                   | 130.64                                                                                    | 104.51                                                               | 104.51                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 17/8/2568          | 240.99                                                                   | 150.62                                                                                    | 120.50                                                               | 120.50                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 18/8/2568          | 327.30                                                                   | 204.56                                                                                    | 163.65                                                               | 163.65                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 19/8/2568          | 229.57                                                                   | 143.48                                                                                    | 114.78                                                               | 114.78                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 20/8/2568          | 239.52                                                                   | 149.70                                                                                    | 119.76                                                               | 119.76                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 21/8/2568          | 253.46                                                                   | 158.41                                                                                    | 126.73                                                               | 126.73                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 22/8/2568          | 210.40                                                                   | 131.50                                                                                    | 105.20                                                               | 105.20                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 23/8/2568          | 222.13                                                                   | 138.83                                                                                    | 111.06                                                               | 111.06                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 24/8/2568          | 247.98                                                                   | 154.99                                                                                    | 123.99                                                               | 123.99                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 25/8/2568          | 208.86                                                                   | 130.54                                                                                    | 104.43                                                               | 104.43                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 26/8/2568          | 228.51                                                                   | 142.82                                                                                    | 114.26                                                               | 114.26                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 27/8/2568          | 252.00                                                                   | 157.50                                                                                    | 126.00                                                               | 126.00                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 28/8/2568          | 217.60                                                                   | 136.00                                                                                    | 108.80                                                               | 108.80                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 29/8/2568          | 217.01                                                                   | 135.63                                                                                    | 108.50                                                               | 108.50                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 30/8/2568          | 211.76                                                                   | 132.35                                                                                    | 105.88                                                               | 105.88                                                                          | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 31/8/2568          | 194.64                                                                   | 121.65                                                                                    | 97.32                                                                | 97.32                                                                           | 0.37                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                               | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                           |                                                                                       |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               |                                          |                                   |                                      |                                                |                                                |                                          |                                        |                                                                                              |                                    | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย / kW) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.)<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย (ลบ.<br>ม.) | การระบายน้ำ<br>ทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย /<br>ไม่ระบาย) (ลบ.<br>ม.) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ / ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                          |                                        | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |                                                                      |                                                                                       |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมน้ำเสีย (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ /<br>ผิดปกติ) |                                                                                              |                                    |                         |
| 1/9/2568           | 211.28                                                               | 132.05                                                                                | 105.64                                                               | 105.64                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 2/9/2568           | 240.66                                                               | 150.41                                                                                | 120.33                                                               | 120.33                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 3/9/2568           | 209.49                                                               | 130.93                                                                                | 104.74                                                               | 104.74                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 4/9/2568           | 179.62                                                               | 112.26                                                                                | 89.81                                                                | 89.81                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 5/9/2568           | 214.90                                                               | 134.31                                                                                | 107.45                                                               | 107.45                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 6/9/2568           | 231.26                                                               | 144.54                                                                                | 115.63                                                               | 115.63                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 7/9/2568           | 214.42                                                               | 134.01                                                                                | 107.21                                                               | 107.21                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 8/9/2568           | 226.27                                                               | 141.42                                                                                | 113.14                                                               | 113.14                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 9/9/2568           | 208.27                                                               | 130.17                                                                                | 104.14                                                               | 104.14                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 10/9/2568          | 239.65                                                               | 149.78                                                                                | 119.82                                                               | 119.82                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 11/9/2568          | 250.70                                                               | 156.69                                                                                | 125.35                                                               | 125.35                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 12/9/2568          | 237.47                                                               | 148.42                                                                                | 118.74                                                               | 118.74                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 13/9/2568          | 217.33                                                               | 135.83                                                                                | 108.66                                                               | 108.66                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 14/9/2568          | 196.38                                                               | 122.74                                                                                | 98.19                                                                | 98.19                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 15/9/2568          | 181.50                                                               | 113.44                                                                                | 90.75                                                                | 90.75                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 16/9/2568          | 192.80                                                               | 120.50                                                                                | 96.40                                                                | 96.40                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 17/9/2568          | 176.83                                                               | 110.52                                                                                | 88.42                                                                | 88.42                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 18/9/2568          | 181.74                                                               | 113.59                                                                                | 90.87                                                                | 90.87                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 19/9/2568          | 176.56                                                               | 110.35                                                                                | 88.28                                                                | 88.28                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 20/9/2568          | 423.57                                                               | 264.73                                                                                | 211.78                                                               | 211.78                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 21/9/2568          | 349.62                                                               | 218.51                                                                                | 174.81                                                               | 174.81                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 22/9/2568          | 263.73                                                               | 164.83                                                                                | 131.86                                                               | 131.86                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 23/9/2568          | 202.45                                                               | 126.53                                                                                | 101.22                                                               | 101.22                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 24/9/2568          | 218.22                                                               | 136.39                                                                                | 109.11                                                               | 109.11                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 25/9/2568          | 249.71                                                               | 156.07                                                                                | 124.86                                                               | 124.86                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 26/9/2568          | 186.99                                                               | 116.87                                                                                | 93.50                                                                | 93.50                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | 12                                                                                           | -                                  | วิทยา                   |
| 27/9/2568          | 208.83                                                               | 130.52                                                                                | 104.42                                                               | 104.42                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 28/9/2568          | 242.80                                                               | 151.75                                                                                | 121.40                                                               | 121.40                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 29/9/2568          | 163.01                                                               | 101.88                                                                                | 81.51                                                                | 81.51                                                                           | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 30/9/2568          | 219.63                                                               | 137.27                                                                                | 109.82                                                               | 109.82                                                                          | 0.33                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                               |                                                                            |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               |                                          |                                   |                                      |                                                |                                                |                                          |                                        |                                                                                              |                                    | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br><br>(หน่วย / kW) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย (ลบ.<br>ม.) | การระบายน้ำ<br>ทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย /<br>ไม่ระบาย) (ลบ.<br>ม.) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ / ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                          |                                        | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |                                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมน้ำเสีย (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ /<br>ผิดปกติ) |                                                                                              |                                    |                         |
| 1/10/2568          | 238.90                                                                   | 149.31                                                                     | 119.45                                                               | 119.45                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 2/10/2568          | 256.77                                                                   | 160.48                                                                     | 128.38                                                               | 128.38                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 3/10/2568          | 260.29                                                                   | 162.68                                                                     | 130.14                                                               | 130.14                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 4/10/2568          | 243.25                                                                   | 152.03                                                                     | 121.62                                                               | 121.62                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 5/10/2568          | 257.31                                                                   | 160.82                                                                     | 128.66                                                               | 128.66                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 6/10/2568          | 265.73                                                                   | 166.08                                                                     | 132.86                                                               | 132.86                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 7/10/2568          | 295.12                                                                   | 184.45                                                                     | 147.56                                                               | 147.56                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 8/10/2568          | 238.02                                                                   | 148.76                                                                     | 119.01                                                               | 119.01                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 9/10/2568          | 262.66                                                                   | 164.16                                                                     | 131.33                                                               | 131.33                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 10/10/2568         | 208.61                                                                   | 130.38                                                                     | 104.30                                                               | 104.30                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 11/10/2568         | 231.18                                                                   | 144.49                                                                     | 115.59                                                               | 115.59                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 12/10/2568         | 242.98                                                                   | 151.86                                                                     | 121.49                                                               | 121.49                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 13/10/2568         | 229.82                                                                   | 143.64                                                                     | 114.91                                                               | 114.91                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 14/10/2568         | 234.77                                                                   | 146.73                                                                     | 117.38                                                               | 117.38                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 15/10/2568         | 251.58                                                                   | 157.24                                                                     | 125.79                                                               | 125.79                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 16/10/2568         | 286.06                                                                   | 178.79                                                                     | 143.03                                                               | 143.03                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 17/10/2568         | 228.13                                                                   | 142.58                                                                     | 114.06                                                               | 114.06                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 18/10/2568         | 236.38                                                                   | 147.74                                                                     | 118.19                                                               | 118.19                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 19/10/2568         | 248.26                                                                   | 155.16                                                                     | 124.13                                                               | 124.13                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 20/10/2568         | 201.36                                                                   | 125.85                                                                     | 100.68                                                               | 100.68                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 21/10/2568         | 239.79                                                                   | 149.87                                                                     | 119.90                                                               | 119.90                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 22/10/2568         | 207.46                                                                   | 129.66                                                                     | 103.73                                                               | 103.73                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 23/10/2568         | 194.27                                                                   | 121.42                                                                     | 97.14                                                                | 97.14                                                                           | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 24/10/2568         | 241.42                                                                   | 150.89                                                                     | 120.71                                                               | 120.71                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 25/10/2568         | 229.54                                                                   | 143.46                                                                     | 114.77                                                               | 114.77                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 26/10/2568         | 230.99                                                                   | 144.37                                                                     | 115.50                                                               | 115.50                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 27/10/2568         | 252.77                                                                   | 157.98                                                                     | 126.38                                                               | 126.38                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 28/10/2568         | 247.06                                                                   | 154.41                                                                     | 123.53                                                               | 123.53                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 29/10/2568         | 246.82                                                                   | 154.26                                                                     | 123.41                                                               | 123.41                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 30/10/2568         | 233.54                                                                   | 145.96                                                                     | 116.77                                                               | 116.77                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |
| 31/10/2568         | 224.88                                                                   | 140.55                                                                     | 112.44                                                               | 112.44                                                                          | 0.35                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                     | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิทยา                   |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                           |                                                                            |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               |                                          |                                   |                                      |                                                |                                                |                           |                                        |                                                                                              |                                    | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย / kW) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย (ลบ.<br>ม.) | การระบายน้ำ<br>ทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย /<br>ไม่ระบาย) (ลบ.<br>ม.) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ / ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย              |                                   |                                      |                                                |                                                |                           |                                        | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |                                                                      |                                                                            |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมน้ำเสีย (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>/ ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ /<br>ผิดปกติ) |                                                                                              |                                    |                         |
| 1/11/2568          | 245.89                                                               | 153.68                                                                     | 122.94                                                               | 122.94                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 2/11/2568          | 242.18                                                               | 151.36                                                                     | 121.09                                                               | 121.09                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 3/11/2568          | 313.22                                                               | 195.76                                                                     | 156.61                                                               | 156.61                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 4/11/2568          | 275.55                                                               | 172.22                                                                     | 137.78                                                               | 137.78                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 5/11/2568          | 269.46                                                               | 168.41                                                                     | 134.73                                                               | 134.73                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 6/11/2568          | 218.22                                                               | 136.39                                                                     | 109.11                                                               | 109.11                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 7/11/2568          | 240.99                                                               | 150.62                                                                     | 120.50                                                               | 120.50                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 8/11/2568          | 273.07                                                               | 170.67                                                                     | 136.54                                                               | 136.54                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 9/11/2568          | 274.72                                                               | 171.70                                                                     | 137.36                                                               | 137.36                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 10/11/2568         | 252.94                                                               | 158.09                                                                     | 126.47                                                               | 126.47                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 11/11/2568         | 278.22                                                               | 173.89                                                                     | 139.11                                                               | 139.11                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | 18                                                                                           | -                                  | วิชา                    |
| 12/11/2568         | 260.48                                                               | 162.80                                                                     | 130.24                                                               | 130.24                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 13/11/2568         | 226.58                                                               | 141.61                                                                     | 113.29                                                               | 113.29                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 14/11/2568         | 291.12                                                               | 181.95                                                                     | 145.56                                                               | 145.56                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 15/11/2568         | 269.10                                                               | 168.19                                                                     | 134.55                                                               | 134.55                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 16/11/2568         | 263.07                                                               | 164.42                                                                     | 131.54                                                               | 131.54                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | 6                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 17/11/2568         | 248.91                                                               | 155.57                                                                     | 124.46                                                               | 124.46                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 18/11/2568         | 227.01                                                               | 141.88                                                                     | 113.50                                                               | 113.50                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 19/11/2568         | 221.73                                                               | 138.58                                                                     | 110.86                                                               | 110.86                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 20/11/2568         | 202.45                                                               | 126.53                                                                     | 101.22                                                               | 101.22                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 21/11/2568         | 218.88                                                               | 136.80                                                                     | 109.44                                                               | 109.44                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 22/11/2568         | 227.22                                                               | 142.01                                                                     | 113.61                                                               | 113.61                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 23/11/2568         | 289.50                                                               | 180.94                                                                     | 144.75                                                               | 144.75                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 24/11/2568         | 214.56                                                               | 134.10                                                                     | 107.28                                                               | 107.28                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 25/11/2568         | 218.82                                                               | 136.76                                                                     | 109.41                                                               | 109.41                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 26/11/2568         | 288.96                                                               | 180.60                                                                     | 144.48                                                               | 144.48                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 27/11/2568         | 265.98                                                               | 166.24                                                                     | 132.99                                                               | 132.99                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 28/11/2568         | 274.21                                                               | 171.38                                                                     | 137.10                                                               | 137.10                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 29/11/2568         | 268.00                                                               | 167.50                                                                     | 134.00                                                               | 134.00                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |
| 30/11/2568         | 241.71                                                               | 151.07                                                                     | 120.86                                                               | 120.86                                                                          | 0.32                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                      | -                                      | -                                                                                            | -                                  | วิชา                    |




| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                               |                                                                            |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               |                                          |                                   |                                      |                                                |                                                |                                           |                                        |                                                                                                  |                                        | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br><br>(หน่วย / kW) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย (ลบ.<br>ม.) | การระบายน้ำ<br>ทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย /<br>ไม่ระบาย) (ลบ.<br>ม.) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ / ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                           |                                        | ปริมาณตะกอน<br><br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br><br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |                                                                          |                                                                            |                                                                      |                                                                                 |                                                                                               | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมน้ำเสีย (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | เครื่องกวน /<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ / ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน (ปกติ<br>/ ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ /<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |                         |
| 1/12/2568          | 264.69                                                                   | 165.43                                                                     | 132.34                                                               | 132.34                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 2/12/2568          | 259.50                                                                   | 162.19                                                                     | 129.75                                                               | 129.75                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 3/12/2568          | 276.37                                                                   | 172.73                                                                     | 138.18                                                               | 138.18                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 4/12/2568          | 242.38                                                                   | 151.49                                                                     | 121.19                                                               | 121.19                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 5/12/2568          | 229.84                                                                   | 143.65                                                                     | 114.92                                                               | 114.92                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 6/12/2568          | 233.79                                                                   | 146.12                                                                     | 116.90                                                               | 116.90                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 7/12/2568          | 300.90                                                                   | 188.06                                                                     | 150.45                                                               | 150.45                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 8/12/2568          | 247.15                                                                   | 154.47                                                                     | 123.58                                                               | 123.58                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 9/12/2568          | 264.51                                                                   | 165.32                                                                     | 132.26                                                               | 132.26                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 10/12/2568         | 263.71                                                                   | 164.82                                                                     | 131.86                                                               | 131.86                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 11/12/2568         | 244.67                                                                   | 152.92                                                                     | 122.34                                                               | 122.34                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 12/12/2568         | 239.82                                                                   | 149.89                                                                     | 119.91                                                               | 119.91                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 13/12/2568         | 244.00                                                                   | 152.50                                                                     | 122.00                                                               | 122.00                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 14/12/2568         | 259.31                                                                   | 162.07                                                                     | 129.66                                                               | 129.66                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 15/12/2568         | 230.69                                                                   | 144.18                                                                     | 115.34                                                               | 115.34                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 16/12/2568         | 265.76                                                                   | 166.10                                                                     | 132.88                                                               | 132.88                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 17/12/2568         | 312.42                                                                   | 195.26                                                                     | 156.21                                                               | 156.21                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 18/12/2568         | 304.11                                                                   | 190.07                                                                     | 152.06                                                               | 152.06                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 19/12/2568         | 287.58                                                                   | 179.74                                                                     | 143.79                                                               | 143.79                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 20/12/2568         | 320.78                                                                   | 200.49                                                                     | 160.39                                                               | 160.39                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 21/12/2568         | 308.75                                                                   | 192.97                                                                     | 154.38                                                               | 154.38                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 22/12/2568         | 282.11                                                                   | 176.32                                                                     | 141.06                                                               | 141.06                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 23/12/2568         | 307.04                                                                   | 191.90                                                                     | 153.52                                                               | 153.52                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 24/12/2568         | 329.02                                                                   | 205.64                                                                     | 164.51                                                               | 164.51                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 25/12/2568         | 282.51                                                                   | 176.57                                                                     | 141.26                                                               | 141.26                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | 6                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 26/12/2568         | 328.08                                                                   | 205.05                                                                     | 164.04                                                               | 164.04                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 27/12/2568         | 316.19                                                                   | 197.62                                                                     | 158.10                                                               | 158.10                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 28/12/2568         | 292.02                                                                   | 182.51                                                                     | 146.01                                                               | 146.01                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 29/12/2568         | 290.48                                                                   | 181.55                                                                     | 145.24                                                               | 145.24                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |
| 30/12/2568         | 333.46                                                                   | 208.41                                                                     | 166.73                                                               | 166.73                                                                          | 0.29                                                                                          | ปกติ                                     | ปกติ                              | ปกติ                                 | -                                              | -                                              | ปกติ                                      | -                                      | -                                                                                                | -                                      | วิชา                    |

ภาคผนวกที่ 14


---

กิจกรรมเพื่อสังคม

# กิจกรรมเพื่อสังคม The Nature Phuket




วันที่ 29/11/2568 ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นให้พี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย






วันที่ 01/12/2568 The Nature Phuket ร่วมกับ สภาอากาศไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงแรมพันธมิตร



วันที่ 08/12/2568 ร่วมกิจกรรม CSR กับเทศบาลป่าตอง ช่วยกันทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำตกวังจืดอ่อน



ภาคผนวกที่ 15


---

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต...เทศบาลเมืองคลองแห

หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๒๘. หมดอายุวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๗๐








ឆ្នាំ ២០២២/២០២៣

ទំព័រ ១ នៃ ១





## เทศบาลเมืองคลองแห

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๒๘

ขอรับรองว่า

บริษัท ธาราบุรี จำกัด (โรงแรมเดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต)  
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๒ ถนนพระบรมมัย ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น  
ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓๖ คน  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๘



(นายอดิศักดิ์ ศรีมณี)

นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

## ภาพถ่าย ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2568

