

## บทที่ 2

### ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

#### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 107 (ซอยแบร์ริง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้

**ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ  | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                       |
| <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>                       | 1. ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้                                                     | 1.โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้                                                                                                              | -                            |    |
|                                                 | 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 270 ตร.ม (พื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยประมาณ) และดูแลให้สภาพดีอยู่เสมอ                  | 2. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 270 ตร.ม. และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งมีการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้ทุกสัปดาห์ หากพบว่าตายหรือเสื่อมโทรมจะปลูกทดแทนทันที | -                            |   |
| <b>1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน</b> | 1. จัดทำแนวรั้วคอนกรีตล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการพังทลายของดินออกสู่ภายนอก และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ | 1.โครงการได้จัดทำแนวรั้วคอนกรีตล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินออกสู่ภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบรั้วกำแพงให้มีสภาพดี                                                                   | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและ<br>การชะล้างพังทลาย<br>ของดิน (ต่อ) | 2. ปลูกต้นไม้จัดสวนและพืชคลุมดินในบริเวณ<br>พื้นที่ว่างและดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ                                                                                                    | 2. โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้จัดสวนและ<br>พืชคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่าง                                                                       | -                            |   |
| 1.3 แผ่นดินไหว                                         | 1. ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ใน<br>สภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิด<br>การเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที                                                                     | 1. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลส่วน<br>โครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่<br>ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหาย<br>จะรีบซ่อมแซมทันที       | -                            |   |
|                                                        | 2. จัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์<br>การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณ<br>โถงทางเดินทุกชั้น เพื่อเป็นการเตรียมความ<br>พร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้พักอาศัยใน<br>โครงการ | 2. โครงการมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์<br>และมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์<br>(Line) และ มีการรายงานเกี่ยวกับ<br>แผ่นดินไหวกับผู้บังคับบัญชา | -                            |  |
| 1.4 เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน                        | 1. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆที่ทำให้<br>เกิดเสียงรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับ<br>ผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชน                                                                  | 1. โครงการมีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำ<br>ใดๆที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน และสร้างความ<br>รำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชน                | -                            | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 คุณภาพอากาศ                                | 1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่<br>โครงการ และพื้นที่ชุมชน ให้มีความเร็วไม่เกิน<br>30 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                                                                                      | 1.โครงการมีการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว<br>ภายในโครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                                                                                                        | -                            |    |
|                                                | 2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ตามที่ได้ออกแบบ<br>ไว้ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่<br>เกิดจากรถยนต์ภายในโครงการ                                                                                                | 2. โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น<br>ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อช่วยดูดซับ<br>ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์<br>ภายในโครงการ                                                                       | -                            |    |
|                                                | 3. ติดป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ”<br>ในพื้นที่จอดรถของโครงการและกำชับให้<br>เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด                                                                                                | 3. โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์<br>“ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” และมี<br>เจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้ จอดรถติด<br>เครื่องยนต์                                                                              | -                            |   |
|                                                | 4. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม<br>กับสภาพจราจรภายนอกและจัดให้มีเจ้าหน้าที่<br>อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ<br>โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน (เช้า - เย็น) เพื่อลดการ<br>ระบายนมลสารทางอากาศจากการจราจร | 4. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระบบการจราจร<br>ภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร<br>ภายนอกและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก<br>บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ<br>โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน (เช้า - เย็น) | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.5 คุณภาพอากาศ<br>(ต่อ)                       | 5. จัดให้มีมาตรการชดเชยเบื้องต้น<br>เนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจากโครงการ<br>ในช่วงเปิดดำเนินการ โดยหลักเกณฑ์และ<br>เงื่อนไขในการชดเชยความเสียหายให้กับ<br>บุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ให้เป็นไปตาม<br>ข้อ ตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายกับ<br>การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ<br>- ชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับ<br>ผลกระทบดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข<br>ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความ<br>เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับการเคหะแห่งชาติ<br>ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ | 5. โครงการมีมาตรการการชดเชยเบื้องต้น<br>อันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจาก<br>โครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ โดย<br>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยความ<br>เสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ<br>ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ ตกลงระหว่างผู้ที่<br>ได้รับความเสียหายกับการเคหะแห่งชาติ ซึ่ง<br>เป็นผู้ดำเนินโครงการ<br>- โครงการมีการชดเชยความเสียหายให้กับ<br>บุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว<br>โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลง<br>ระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว<br>กับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ<br>โดยมีมาตรการชดเชยความเสียหายดังนี้ | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.6 การบดบังคลื่นวิทยุ/<br>โทรทัศน์            | <p>1. มาตรการทั่วไป</p> <p>1) ก่อนเปิดดำเนินการให้การเคหะแห่งชาติ<br/>ทำประชาสัมพันธ์โดยจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่<br/>รอบโครงการ รัศมี 40 เมตร ถึงวิธีการติดต่อ<br/>โครงการในกรณีที่เกิดการ<br/>รบกวนสัญญาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ<br/>ไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง</p> <p>2) กรณีไม่สามารถปรับแผงรับสัญญาณได้<br/>และจุดรับสัญญาณมีเพียง 1 จุดโครงการจะ<br/>พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทน<br/>แผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี<br/>เหมือนเดิม</p> <p>3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับ<br/>สัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคาร<br/>มีมากกว่า 1 จุดจะพิจารณาติดตั้งจานรับ<br/>สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณ โดย<br/>เพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ</p> | <p>1. โครงการดำเนินการตามมาตรการทั่วไป<br/>ดังนี้</p> <p>1) ก่อนเปิดดำเนินการให้การเคหะแห่งชาติ<br/>ทำประชาสัมพันธ์โดยจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่<br/>อยู่รอบโครงการ รัศมี 40 เมตร ถึงวิธีการ<br/>ติดต่อโครงการในกรณีที่เกิดการ<br/>รบกวนสัญญาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ<br/>ไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง</p> <p>2) กรณีไม่สามารถปรับแผงรับสัญญาณได้<br/>และจุดรับสัญญาณมีเพียง 1 จุดโครงการจะ<br/>พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทน<br/>แผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี<br/>เหมือนเดิม</p> <p>3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับ<br/>สัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคาร<br/>มีมากกว่า 1 จุดจะพิจารณาติดตั้งจานรับ<br/>สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณ โดย<br/>เพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ</p> | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6 การบดบังทัศนวิสัย/<br>โทรทัศน์ (ต่อ)       | 4) กรณีบ้านพักอาศัยมีงานดาวเทียมติดตั้งอยู่<br>แล้ว จะพิจารณาย้ายตำแหน่งติดตั้งจานรับ<br>สัญญาณดาวเทียมให้ใหม่ เพื่อให้สามารถรับ<br>สัญญาณได้ดีเหมือนเดิม                                                                     | 4) กรณีบ้านพักอาศัยมีงานดาวเทียมติด<br>ตั้งอยู่แล้ว จะพิจารณาย้ายตำแหน่งติดตั้ง<br>จานรับสัญญาณดาวเทียมให้ใหม่ เพื่อให้<br>สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม                                                                             | -                            | -                                                                                     |
| <b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b>         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                       |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพ<br>บนบก                     | 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ<br>ลดผลกระทบด้านทรัพยากรกายภาพและ<br>ด้านการจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำที่จะ<br>กล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.2 และ 3.3 อย่าง<br>เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร<br>ชีวภาพบริเวณใกล้เคียง | 1. โครงการจะดำเนินการตามมาตรการ<br>ป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร<br>กายภาพและด้านการจัดการน้ำเสียและการ<br>ระบายน้ำที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.2 และ<br>3.3 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ<br>ต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณใกล้เคียง | -                            |   |
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพ<br>ในน้ำ                    | 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลด<br>ผลกระทบด้านทรัพยากรกายภาพและด้าน<br>การจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำที่จะกล่าว<br>ต่อไปในหัวข้อ 3.2 และ 3.3 อย่างเคร่งครัด<br>เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ<br>บริเวณใกล้เคียง  | 1. โครงการจะดำเนินการตามมาตรการ<br>ป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร<br>กายภาพและด้านการจัดการน้ำเสียและการ<br>ระบายน้ำที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.2 และ<br>3.3 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ<br>ต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณใกล้เคียง | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                      |
| 3.1 การใช้น้ำ                                  | 1. ธารรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่าง<br>ประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา                                                                                                                                                                                                                        | 1. โครงการมีการธารรงค์ให้มีการใช้น้ำภายใน<br>โครงการอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้<br>น้ำประปา รวมทั้งมีการตรวจสอบระบบท่อจ่าย<br>น้ำประปาในด้านความสามารถด้านวิศวกรรม<br>ประปา (การรั่ว ซึม หรือแตก) หากพบเหตุ<br>บกพร่องจะดำเนินการแก้ไขทันที                                                                 | -                            |   |
|                                                | 2. จัดทำป้าย/แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์และ<br>แนะนำแนวทางในการประหยัดน้ำเพื่อธารรงค์ให้<br>ผู้พักอาศัยประหยัด                                                                                                                                                                                           | 2. โครงการมีการจัดทำป้าย และมีการ<br>ประชาสัมพันธ์และแนะนำแนวทางในการ<br>ประหยัดน้ำเพื่อธารรงค์ให้ผู้พักอาศัยประหยัด                                                                                                                                                                                             | -                            |  |
|                                                | 3. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำบน<br>ดาดฟ้า ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อสำรองน้ำใช้<br>ภายในโครงการอย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน ใน<br>กรณีที่การให้บริการน้ำของการประปานครหลวง<br>เกิดขัดข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>- ถังเก็บน้ำใต้ดิน : ขนาด 2.6x7.6x2.5 เมตร<br>ปริมาตรกักเก็บน้ำ 49.90 ลบ.ม. | 3. โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บ<br>น้ำบนดาดฟ้า ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อสำรอง<br>น้ำใช้ภายในโครงการอย่างเพียงพออย่างน้อย<br>1 วัน ในกรณีที่การให้บริการน้ำของการ<br>ประปานครหลวงเกิดขัดข้อง โดยมีรายละเอียด<br>ดังนี้<br>- ถังเก็บน้ำใต้ดิน : ขนาด 2.6x7.6x2.5 เมตร<br>ปริมาตรกักเก็บน้ำ 49.90 ลบ.ม. | -                            | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                    | - ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ขนาด3.4×3.6×2.1 เมตร ปริมาตรกักเก็บน้ำ 25.70 ลบ.ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า : ขนาด 3.4×3.6×2.1 เมตร ปริมาตรกักเก็บน้ำ 25.70 ลบ.ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                     |
|                                        | 4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามี การชำรุดให้รีบแก้ไขทันที                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         |  |
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย                   | 1. จัดให้มีบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Septic Anaerobic System) จำนวน 1 ชุด/อาคาร เพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้<br>- ถังดักไขมัน ปริมาตรกักเก็บ 1.02 ลบ.ม. โดยติดตั้งไว้จำนวน 1 ถัง/อาคาร<br>- ถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Septic Anaerobic System) จำนวน 1 ชุด/อาคาร มีขนาดรองรับน้ำเสีย 30 ลบ.ม./วัน/อาคาร | 1. โครงการจัดให้มีบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Septic Anaerobic System) จำนวน 1 ชุด/อาคาร เพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้<br>- ถังดักไขมัน ปริมาตรกักเก็บ 1.02 ลบ.ม. โดยติดตั้งไว้จำนวน 1 ถัง/อาคาร<br>- ถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Septic Anaerobic System) จำนวน 1 ชุด/อาคาร มีขนาดรองรับน้ำเสีย 30 ลบ.ม./วัน/อาคาร | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย<br>(ต่อ)                  | 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม Fixed Film Aeration System มีขนาดรองรับน้ำเสีย 200 ลบ.ม. /วัน ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิท 107 ต่อไป | 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม Fixed Film Aeration System มีขนาดรองรับน้ำเสีย 200 ลบ.ม. /วัน ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิท 107 ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีความถี่ในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่บริเวณบ่อตรวจสอบน้ำของแต่ละอาคาร (จุดก่อน - หลังผ่านการบำบัด และบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ) ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, TSS, TKN, Nitrate, Oil & Grease | -                            |   |

**ตารางที่ 2.1-1** ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย<br>(ต่อ)                  | 3. จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนออกจากส่วน<br>แยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม<br>ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษา<br>ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ ดังนี้<br>- ถึงกระโถนในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 ปี<br>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยสูบน้ำออก<br>ประมาณ 1/3 ของปริมาตรถัง<br>- ถึงกักเก็บตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย<br>รวม ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | 3. โครงการมีการสูบน้ำจากตะกอนออกจาก<br>ส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย<br>รวม ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษา<br>ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ ดังนี้<br>- ถึงกระโถนในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ<br>1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยสูบน้ำออก<br>ประมาณ 1/3 ของปริมาตรถัง<br>- ถึงกักเก็บตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียรวม<br>ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | -                            | -             |
|                                                | 4. กำหนดให้กำจัดกากไขมันออกจากถังดัก<br>ไขมันแต่ละถังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย<br>การตักเศษขยะและกากไขมันใส่ถุงดำ มัดปาก<br>ถุงให้แน่นสนิทก่อน นำไปทิ้งในถังขยะเปียก                                                                                                                                                                        | 4. โครงการมีการกำจัดกากไขมันออกจาก<br>ถังดักไขมันแต่ละถังอย่างน้อยสัปดาห์ละ<br>1 ครั้ง โดยการตักเศษขยะและกากไขมันใส่ถุง<br>ดำมัดปากถุงให้แน่นสนิทก่อน นำไปทิ้งในถัง<br>ขยะเปียก                                                                                                                                                                   | -                            | -             |
|                                                | 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญไว้<br>ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำ<br>เสียที่ติดตั้งไว้ให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีอยู่<br>ตลอดเวลา                                                                                                                                                                                            | 5. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ<br>ชำนาญไว้ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพระบบ<br>บำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งไว้ให้มีประสิทธิภาพการ<br>ทำงานดีอยู่ตลอดเวลา                                                                                                                                                                                      | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. การระบายน้ำและ<br>การป้องกันน้ำท่วม       | 1. ระบบระบายน้ำให้แยกท่อระบายน้ำทิ้งและ<br>ท่อระบายน้ำฝนออกจากกัน                                                                                                                                               | 1. โครงการได้ใช้ระบบระบายน้ำให้แยกท่อ<br>ระบายน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำฝนออก<br>จากกัน รวมทั้งตรวจสอบระบบเส้นท่อ<br>ระบายน้ำและบ่อกักน้ำ และต้องขุดลอก<br>อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการอุดตันหรือ<br>ดินเขิน                    | -                            |   |
|                                                | 2. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก<br>โครงการไม่ให้เกินสภาพระบายน้ำเดิม คือไม่<br>เกิน 0.131 ลบ.ม./วินาที โดยจัดให้มีบ่อน้ำ<br>น้ำ ปริมาตรกักเก็บ 230.33 ลบ.ม. เพื่อให้<br>สามารถหน่วงน้ำฝนส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ | 2. โครงการได้ควบคุมอัตราการระบายน้ำออก<br>จากโครงการไม่ให้เกินสภาพระบายน้ำเดิม<br>คือไม่เกิน 0.131 ลบ.ม./วินาที โดยจัดให้มี<br>บ่อน้ำน้ำ ปริมาตรกักเก็บ 230.33 ลบ.ม.<br>เพื่อให้สามารถหน่วงน้ำฝนส่วนเกินได้อย่าง<br>เพียงพอ | -                            |  |
|                                                | 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบ<br>ระบายน้ำ และระบบหน่วงน้ำที่ติดตั้งไว้<br>รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆให้มีสภาพดีพร้อม<br>ใช้งานอยู่ตลอดเวลา                                                         | 3. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและ<br>บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบหน่วง<br>น้ำที่ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆให้<br>มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ ตลอดเวลา                                                            | -                            | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ    | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                         | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. การระบายน้ำและ<br>การป้องกันน้ำท่วม<br>(ต่อ) | 4. จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำ อย่างน้อย 2<br>ครั้ง/ปี โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน<br>หรือพื้นที่ที่มีการอุดตันหรือต้นเขิน                                                                                                                                                                          | 4. โครงการมีการลอกท่อระบายน้ำ<br>โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน หรือพื้นที่<br>ที่มีการอุดตันหรือต้นเขิน                                                                                | -                                                                    |    |
| 3.4 การจัดการขยะ                                  | 1. จัดให้มีจุดวางถังขยะภายในโครงการ<br>จำนวน 6 จุด และตั้งวางถังขยะขนาด<br>240 ลิตร ที่มีความแข็งแรงทนทาน และ<br>มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 3 ถัง/จุด แยกเป็น<br>ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย<br>อย่างละ 1 ถัง โดยให้ติดป้ายที่มีข้อความ<br>“ถังขยะเปียก” “ถังขยะแห้ง” และ “ถังขยะ<br>อันตราย” | 1. โครงการได้จัดเตรียมจุดวางถังรองรับ<br>มูลฝอยไว้บริเวณด้านข้างของอาคารพักขยะ<br>ซึ่งเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากการใช้ถัง<br>ขยะจะไม่สะดวกต่อการเก็บขนมูลฝอยของ<br>อบต.สำโรง      | - โครงการควรประสานงาน<br>ให้อบต.สำโรงเพิ่มความถี่ใน<br>การเก็บมูลฝอย |   |
|                                                   | 2. ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือผู้พักอาศัย<br>และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ คัดแยกขยะแต่ละ<br>ประเภทใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อน<br>นำมาทิ้งในถังขยะแต่ละประเภท                                                                                                                                      | 2. โครงการมีการติดป้ายให้คำแนะนำและ<br>ขอความร่วมมือผู้พักอาศัย และพนักงาน<br>หรือเจ้าหน้าที่ คัดแยกขยะแต่ละประเภท<br>ใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อนนำมาทิ้งใน<br>ถังขยะแต่ละประเภท | -                                                                    |  |

**ตารางที่ 2.1-1** ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | 3. จัดให้มีอาคารพักขยะรวมภายในโครงการ<br>จำนวน 1 แห่ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สามารถรองรับขยะได้ 3 วัน | 3. โครงการมีอาคารพักขยะรวมภายใน<br>โครงการ แต่เนื่องจากวิธีการเก็บมูลฝอยของ<br>อบต.สำโรง เป็นรถตู้คอนเทนเนอร์จึงไม่สะดวก<br>ในการเก็บมูลฝอย โครงการจึงรวบรวมจัดให้มี<br>ที่พักมูลฝอยขยะบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ<br>เพื่อสะดวกต่อการเก็บมูลฝอยของอบต.สำโรง | -                            | <br><br> |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การจัดการขยะ<br>(ต่อ)                      | <p>4. อาคารพักขยะรวมควรแยกการกักเก็บขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย โดยจัดให้แบ่งอาคารพักขยะรวมเป็น 3 ห้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องพักขยะเปียก : ปริมาณขยะเปียก 2.034 ลบ.ม./วัน คิดปริมาตรกักเก็บอย่างน้อย 3 วัน เท่ากับ 6.102 ลบ.ม. ดังนั้นห้องพักขยะเปียกควรมีปริมาตรอย่างน้อย 6.2 ลบ.ม.</li> <li>- ห้องพักขยะแห้ง : ปริมาณขยะแห้ง 0.791 ลบ.ม./วัน คิดปริมาตรกักเก็บอย่างน้อย 3 วัน เท่ากับ 2.0373 ลบ.ม. ดังนั้นห้องพักขยะแห้งควรมีปริมาตรอย่างน้อย 2.4 ลบ.ม.</li> <li>- ห้องพักขยะอันตราย : ปริมาณขยะอันตราย 0.005 ลบ.ม./วัน คิดปริมาตรกักเก็บอย่างน้อย 3 วัน เท่ากับ 0.015 ลบ.ม. ดังนั้นห้องพักขยะเปียกควรมีปริมาตรอย่างน้อย 0.02 ลบ.ม.</li> </ul> | <p>4. โครงการมีอาคารพักขยะรวมภายในโครงการ แต่เนื่องจากวิธีการเก็บมูลฝอยของ อบต.สำโรง เป็นรถตู้คอนเทนเนอร์จึงไม่สะดวกในการเก็บมูลฝอย โครงการจึงรวบรวมจัดให้มีที่พักลมูลฝอยขยะบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ เพื่อสะดวกต่อการเก็บมูลฝอยของอบต.สำโรง</p> | -                            | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                         | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การจัดการขยะ<br>(ต่อ)                      | 5. ให้นักงานทำความสะอาดของโครงการ<br>ทำหน้าที่ทำความสะอาดจุดวางถังขยะและ<br>อาคารพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังการเก็บขน<br>ขยะ เพื่อให้จุดวางถังขยะมีความสะอาดและ<br>ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา และเพื่อป้องกัน<br>แมลงและกลิ่นเหม็นรบกวน | 5. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาด<br>จุดวางถังขยะ ภายหลังการเก็บขนขยะ<br>เพื่อให้จุดวางถังขยะมีความสะอาดและถูก<br>สุขลักษณะตลอดเวลา และเพื่อป้องกันแมลง<br>และกลิ่นเหม็นรบกวน       | - โครงการควรประสานงาน<br>ให้อบต.สำโรงเพิ่มความถี่ใน<br>การเก็บมูลฝอย |   |
|                                                | 6. จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ จุดวางถังและ<br>อาคารพักขยะรวม โดยการปลูกต้นไม้<br>ประดับหรือไม้ยืนต้นที่มีกลิ่นหอม เพื่อเพิ่มความ<br>สวยงามบดบังมุมมองจากภายนอก และลด<br>ผลกระทบด้านกลิ่นจากขยะ                                     | 6. โครงการได้จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ<br>จุดวางถัง แต่ไม่มีการปลูกต้นไม้ประดับ<br>หรือไม้ยืนต้นที่มีกลิ่นหอม เพื่อเพิ่มความ<br>สวยงามบดบังมุมมองจากภายนอก และลด<br>ผลกระทบด้านกลิ่นจากขยะ | -                                                                    |  |
|                                                | 7. รวบรวมน้ำเสียจากจุดวางถังขยะและ<br>อาคารพักขยะรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำเสีย เพื่อ<br>รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อ<br>บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง                                                           | 7. โครงการได้มีการรวบรวมน้ำเสียจากจุด<br>วางถังขยะ เข้าสู่ท่อระบายน้ำเสีย เพื่อ<br>รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อ<br>บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง                     | -                                                                    | -                                                                                    |


ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การใช้ไฟฟ้า                                | 1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน<br>การไฟฟ้าทุกประการ                                                                                                                 | 1. โครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้า<br>ตามมาตรฐานการไฟฟ้าทุกประการ                                                                                                                         | -                            |  |
|                                                | 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ การเดิน<br>สายไฟฟ้า รวมถึงการเดินสายสัญญาณทาง<br>ไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้<br>เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม<br>หลักวิชาการ | 2. มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการติดตั้ง<br>อุปกรณ์ การเดินสายไฟฟ้า รวมถึงการเดิน<br>สายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์<br>ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย<br>และถูกต้องตามหลักวิชาการ | -                            |                                                                                     |
|                                                | 3. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่<br>ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบชำรุดเสียหาย<br>ต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยน<br>อุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งาน                      | 3. มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์<br>และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหาก<br>พบชำรุดเสียหาย ต้องมีการซ่อมแซม<br>ให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่<br>ก่อนนำมาใช้งาน                 | -                            |                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การคมนาคมและการขนส่ง                       | 1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยและชะลอความเร็วรถโดยการติดตั้งสัญญาณจราจร ได้แก่ ป้ายหรือลูกศรแสดงทิศทางการจราจร บริเวณถนนหรือทางเดินรถ และลานจอดรถภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และสัญญาณที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | 1. โครงการได้ติดตั้งสัญญาณจราจรได้แก่ ป้ายหรือลูกศรแสดงทิศทางการจราจร บริเวณถนนหรือทางเดินรถ และลานจอดรถภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งป้ายชะลอความเร็ว ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. และไม่มีสัญญาณที่บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เนื่องจากตำแหน่งของทางเข้า - ออกอยู่ใกล้กับพื้นที่จอดรถ | -                            |    |
|                                                | 2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ อย่างน้อยจำนวน 56 คัน และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้จำนวนที่จอดรถลดลง                                                                                           | 2. โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ อย่างน้อยจำนวน 56 คัน และไม่มี การประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง ในบริเวณที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้จำนวนที่จอดรถลดลง                                                                                                            | -                            |                                                                                                                                                                         |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การคมนาคมและ<br>การขนส่ง (ต่อ)             | 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณ<br>ทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลาโดยเฉพาะใน<br>ชั่วโมงเร่งด่วน                                             | 3. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอย<br>อำนวยความสะดวก และจัดระบบ<br>การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ<br>ตลอดเวลาโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน                                                 | -                            | <br> |
| 3.7 การใช้ประโยชน์<br>ที่ดิน                   | 1. ดำเนินการตามแผน และผังภูมิสถาปัตยกรรม<br>รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ<br>บริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อ<br>ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1. โครงการมีการดำเนินการตามแผน และผัง<br>ภูมิ สถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้<br>ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้<br>ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | -                            | -                                                                                                                                                                          |
|                                                | 2. ห้ามก่อสร้างหรือการกระทำใดๆที่ทำให้เกิด<br>การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่<br>ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                       | 2. โครงการไม่มีการก่อสร้างหรือการกระทำ<br>ใดๆ ที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน<br>เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้อง                                                       | -                            | -                                                                                                                                                                          |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ               | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b>                                  |                                                                                                                  |                                                                                                         |                              |                                                                                      |
| <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม</b>                              |                                                                                                                  |                                                                                                         |                              |                                                                                      |
| <b>4.2 อาชีวอนามัย</b>                                       | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย<br>ภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง                                 | 1.โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ<br>ปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24<br>ชั่วโมง               | -                            |   |
| <b>4.3 สาธารณสุข</b>                                         |                                                                                                                  |                                                                                                         |                              |                                                                                      |
| <b>4.4 ความปลอดภัย<br/>สาธารณะและการ<br/>บรรเทาสาธารณภัย</b> | 1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และ<br>อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออกของ<br>โครงการตลอดเวลา                 | 1. โครงการจัดให้มีเวรยามรักษาความ<br>ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณ<br>ทางเข้า - ออกของโครงการตลอดเวลา | -                            |  |
|                                                              | 2. ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ ต้องควบคุม<br>การก่อสร้างและคุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้ได้<br>ตามมาตรฐานการก่อสร้าง | 2. โครงการมีการควบคุมการก่อสร้างและ<br>คุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน<br>การก่อสร้าง            | -                            | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย                         | <p>1. จัดให้มีระบบอัคคีภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ และ<br/>ครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ<br/>กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 47<br/>(พ.ศ.2540) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร<br/>พ.ศ.2522 ครบถ้วนทุกประการ ตามที่ออกแบบไว้<br/>ในรายละเอียดโครงการ ได้แก่</p> <p>1.1 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</p> <p>1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง<br/>ไหม้ ติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องบริเวณชั้นที่ 1 ของแต่<br/>ละอาคาร</p> <p>2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิง<br/>ไหม้ โดยเลือกใช้สัญญาณแบบกริ่ง (Fire<br/>Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน<br/>จำนวน 2 จุด/ชั้น</p> <p>3) อุปกรณ์แจ้งเหตุ</p> <p>3.1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ<br/>ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินคู่กับ Alarm Bell<br/>ในทุกชั้นของอาคาร 2 จุด/ชั้น</p> | <p>1. โครงการจัดให้มีระบบอัคคีภัยครอบคลุมทุก<br/>พื้นที่ และครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้อง คือกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)<br/>และฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตาม<br/>พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ครบถ้วนทุก<br/>ประการ ตามที่ออกแบบไว้ในรายละเอียด<br/>โครงการ ได้แก่</p> <p>1.1 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</p> <p>1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุ<br/>เพลิงไหม้ ติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่อง บริเวณชั้นที่ 1<br/>ของแต่ละอาคาร</p> <p>2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิง<br/>ไหม้ โดยเลือกใช้สัญญาณแบบกริ่ง (Fire<br/>Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน<br/>จำนวน 2 จุด/ชั้น</p> <p>3) อุปกรณ์แจ้งเหตุ</p> <p>3.1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ<br/>ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินคู่กับ Alarm<br/>Bell ในทุกชั้นของอาคาร 2 จุด/ชั้น</p> | -                            |    |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย<br>(ต่อ)                | <p>3.2) เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องที่ชั้น 1 ของแต่ละอาคาร พร้อมติดตั้งแผง Control ภายในแต่ละอาคาร</p> <p>1.2 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดกลาง 1 จุด/ชั้น</p> <p>1.3 บันไดหนีไฟ แต่ละอาคารมีจำนวน 1 บันได เป็นบันไดที่สามารถลงถึงชั้นพื้นดิน</p> <p>1.4 ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดไว้บริเวณทางเข้า-ออก สู่บันไดหนีไฟ และบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดกลางรวม 2 จุด/ชั้น</p> <p>1.5 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 2 ตัว บริเวณโถงทางเดินและบริเวณบันไดหนีไฟ ชั้นที่ 2-5 ติดตั้ง 3 ตัว/ชั้น</p> | <p>3.2) เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องที่ชั้น 1 ของแต่ละอาคารพร้อมติดตั้งแผง Control ภายในแต่ละอาคาร</p> <p>1.2 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดกลาง 1 จุด/ชั้น</p> <p>1.3 บันไดหนีไฟ แต่ละอาคารมีจำนวน 1 บันได เป็นบันไดที่สามารถลงถึงชั้นพื้นดิน</p> <p>1.4 ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดไว้บริเวณทางเข้า-ออก สู่บันไดหนีไฟ และบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดกลางรวม 2 จุด/ชั้น</p> <p>1.5 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 2 ตัว บริเวณโถงทางเดินและบริเวณบันไดหนีไฟ ชั้นที่ 2-5 ติดตั้ง 3 ตัว/ชั้น</p> | -                            |    |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                 | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย<br>(ต่อ)                | 2. จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด บริเวณ<br>สวนมีขนาดพื้นที่ 943.56 ตร.ม.เพื่อให้<br>สามารถรองรับคนในโครงการอย่างเพียงพอ<br>(1 ตร.ม./คน)                                                                                                      | 2. โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด<br>บริเวณสวนมีขนาดพื้นที่ 943.56 ตร.ม.<br>เพื่อให้สามารถรองรับคนในโครงการอย่าง<br>เพียงพอ (1 ตร.ม./คน)                                                                                                               | -                                                                                            |   |
|                                                | 3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ<br>1 ปี/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น<br>หากพบว่ามีปัญหาเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้<br>รีบดำเนินการแก้ไขทันที                                                                                   | 3. มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย<br>ทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น<br>หากพบว่ามีปัญหาเสียหาย หรือใช้การ<br>ไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที                                                                                             | -                                                                                            | -                                                                                    |
|                                                | 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้<br>ในบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้<br>จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที                                                                                                         | 4. โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้<br>อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่อุปกรณ์ติด<br>ตั้งอยู่                                                                                                                                                                   | -                                                                                            |  |
|                                                | 5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่<br>ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น<br>เส้นทางการหนีไฟ และจุดรวมพล โดยติดตั้ง<br>แบบแปลนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถ<br>มองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร เช่น<br>บริเวณหน้าโถงบันไดหลัก | 5. โครงการไม่มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผัง<br>แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ<br>ป้ายบอกชั้น เส้นทางการหนีไฟ และจุดรวม<br>พล โดยติดตั้งแบบแปลนผังดังกล่าวไว้ใน<br>ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละ<br>ชั้นของอาคาร เช่น บริเวณหน้าโถงบันไดหลัก | - ติดตั้งแบบแปลนแผนผัง<br>แสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง<br>อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆตามที่<br>มาตรฐานระบุ | -                                                                                    |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                      |

**ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย<br>(ต่อ)                | 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย<br>อำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้<br>รถดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณที่จุด<br>เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว                                                                                                                                       | 6. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ<br>ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและ<br>เคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน<br>ณ บริเวณที่จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว       | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 7. ประสานงานร่วมกับตำรวจจราจรท้องที่ใน<br>การช่วยจัดการจราจรให้รถดับเพลิงเข้า<br>ดับเพลิงได้ทันทั่วทั้งรวมถึงการนำคนเจ็บส่ง<br>โรงพยาบาล                                                                                                                                                  | 7. มีการประสานงานร่วมกับตำรวจจราจร<br>ท้องที่ในการช่วยจัดการจราจรให้รถดับเพลิง<br>เข้าดับเพลิงได้ทันทั่วทั้งรวมถึงการนำคนเจ็บ<br>ส่งโรงพยาบาล                   | -                            |  |
|                                                | 8. ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ ให้เข้ามา<br>อำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่าง<br>รวดเร็ว                                                                                                                                                                                              | 8. มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ ให้<br>เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้<br>อย่างรวดเร็ว                                                               | -                            | -                                                                                   |
|                                                | 9. จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุเพลิง<br>ไหม้ขึ้น โดยให้บุคลากรภายในโครงการรวมทั้ง<br>ผู้พักอาศัยทำการซ้อมอพยพเป็นประจำทุกๆ 6<br>เดือน พร้อมแจกเอกสารการป้องกันอัคคีภัย<br>และปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัย<br>ทุกห้องพร้อมติดไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ชั้น<br>ล่างของอาคาร | 9. โครงการได้ดำเนินการประสานงานกับ<br>อบต.ลำโรง จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิด<br>เหตุเพลิงไหม้ขึ้น โดยให้บุคลากรภายใน<br>โครงการรวมทั้งผู้พักอาศัยทำการซ้อมอพยพ | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย<br>(ต่อ)                | 10. ประสานงานกับการประปานครหลวง ในการขอติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงสาธารณะ ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรถดับเพลิงสามารถใช้น้ำจากแหล่งดังกล่าวเข้าช่วยเหลือดับเพลิงได้ทันที                                                                                                                                                                                                                      | 10. มีการประสานงานกับการประปานครหลวง ในการขอติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงสาธารณะ ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรถดับเพลิงสามารถใช้น้ำจากแหล่งดังกล่าวเข้าช่วยเหลือดับเพลิงได้ทันที                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                            |   |
| 4.6 การศึกษา                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                      |
| 4.7 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                      |
| 4.8 ทัศนียภาพและ<br>สุนทรียภาพ                 | 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ มีขนาดประมาณ 3,787.76 ตร.ม. โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นล่างภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด และแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อย 270 ตร.ม. โดยโครงการจะต้องดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และเพื่อให้มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย/พนักงาน 4.01 ตร.ม./คน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ | 1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ มีขนาดประมาณ 3,787.76 ตร.ม. โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นล่างภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด และแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อย 270 ตร.ม. โดยโครงการจะต้องดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และเพื่อให้มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย/พนักงาน 4.01 ตร.ม./คน นอกจากนั้น บริเวณพื้นที่สีเขียวของ โครงการยังจัดให้เป็นพื้นที่สันทนาการ เช่น สนามเด็กเล่น เป็นต้น | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนธันวาคม 2568 (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 ทัศนียภาพและ<br>สุนทรียภาพ (ต่อ)           | 2. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆ ภายใน<br>โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ<br>ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ | 2. โครงการมีการควบคุมดูแลอาคารและ<br>บริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพ<br>ดีและสวยงามอยู่เสมอ ตามแบบภูมิ<br>สถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ | -                            |  |
|                                                | 3. ให้ใช้วัสดุและโทนสีธรรมชาติ ในการตกแต่ง<br>และทาสีภายนอกตัวอาคาร                                                    | 3. โครงการเลือกใช้วัสดุและโทนสีธรรมชาติ<br>ในการตกแต่งและทาสีภายนอกตัวอาคาร                                                             | -                            |  |

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

| ประจำเดือนกรกฎาคม 2568                                                 |                                                                          |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                     | จุดตรวจวัด                                                               | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย | <b>จุดที่ 1</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 7 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 17 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 66.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 62.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) เท่ากับ 3.546 มิลลิกรัมต่อลิตร |
|                                                                        | <b>จุดที่ 2</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 7    | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 10.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 40.04 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ                      |
|                                                                        | <b>จุดที่ 3</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 36.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 46.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ                      |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนกรกฎาคม 2568                                                       |                                                                       |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                           | จุดตรวจวัด                                                            | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <b>จุดที่ 4</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 277.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 14.16 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
| 2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย                         | <b>จุดที่ 5</b><br>บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ        | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 18.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 22.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ   |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนสิงหาคม 2568                                                 |                                                                          |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                     | จุดตรวจวัด                                                               | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย | <b>จุดที่ 1</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 29.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 72.80 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
|                                                                        | <b>จุดที่ 2</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1    | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 64.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 64.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
|                                                                        | <b>จุดที่ 3</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 7 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 65.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 81.48 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนสิงหาคม 2568                                                       |                                                                       |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                           | จุดตรวจวัด                                                            | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <b>จุดที่ 4</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 7 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 28.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 44.52 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
| 2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย                         | <b>จุดที่ 5</b><br>บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ        | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 8.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 51.52 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ  |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนกันยายน 2568                                                 |                                                                          |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                     | จุดตรวจวัด                                                               | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย | <b>จุดที่ 1</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 74.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 80.08 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
|                                                                        | <b>จุดที่ 2</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2    | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 34.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 34.72 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
|                                                                        | <b>จุดที่ 3</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 6 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 67.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 82.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนกันยายน 2568                                                       |                                                                       |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                           | จุดตรวจวัด                                                            | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <b>จุดที่ 4</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 6 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 49.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 34.44 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
| 2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย                         | <b>จุดที่ 5</b><br>บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ        | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 78.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 33.88 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ  |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนตุลาคม 2568                                                  |                                                                          |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                     | จุดตรวจวัด                                                               | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย | <b>จุดที่ 1</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 26 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 40.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
|                                                                        | <b>จุดที่ 2</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3    | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 37.24 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ  |
|                                                                        | <b>จุดที่ 3</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 5 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 53 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 38.27 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ  |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนตุลาคม 2568                                                        |                                                                       |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                           | จุดตรวจวัด                                                            | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <b>จุดที่ 4</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 5 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 39 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 26.04 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
| 2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย                         | <b>จุดที่ 5</b><br>บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ        | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 26 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 22.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568                                               |                                                                          |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                     | จุดตรวจวัด                                                               | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย | <b>จุดที่ 1</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 4 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 98.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 44.24 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
|                                                                        | <b>จุดที่ 2</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 4    | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 42.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 34.16 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
|                                                                        | <b>จุดที่ 3</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 36.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 49.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568                                                     |                                                                       |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                           | จุดตรวจวัด                                                            | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <b>จุดที่ 4</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 24.00 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 8.08 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
| 2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย                         | <b>จุดที่ 5</b><br>บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ        | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 22.68 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ  |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนธันวาคม 2568                                                 |                                                                          |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                     | จุดตรวจวัด                                                               | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย | <b>จุดที่ 1</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 5 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 19.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 64.96 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ  |
|                                                                        | <b>จุดที่ 2</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 5    | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 26.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 60.48 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ  |
|                                                                        | <b>จุดที่ 3</b><br>จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 4 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 37.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 65.52 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |

**ตารางที่ 2.1-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

| ประจำเดือนธันวาคม 2568                                                       |                                                                       |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขตามมาตรการ                                                           | จุดตรวจวัด                                                            | ดัชนีตรวจวัด                                                                              | ความถี่         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <b>จุดที่ 4</b><br>จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 4 | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 28.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 60.76 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |
| 2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย                         | <b>จุดที่ 5</b><br>บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ        | - pH - BOD<br>- Total Suspended Solids<br>- Oil & Grease<br>- TKN<br>- Nitrate - Nitrogen | เดือนละ 1 ครั้ง | ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 38.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 63.84 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ |

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568

## 2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง แสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-8 ต่อไปนี้




รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2.2-2 ถนนภายในโครงการ




รูปที่ 2.2-3 หัวดับเพลิงภายในโครงการ

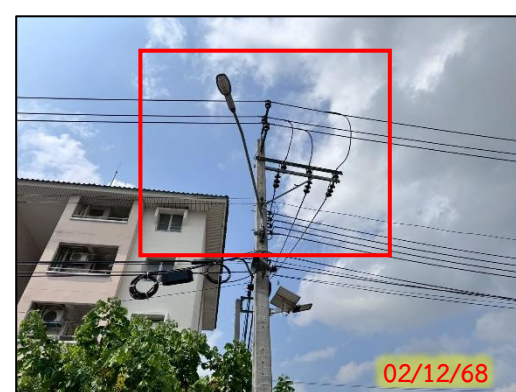

รูปที่ 2.2-4 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-5 บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ

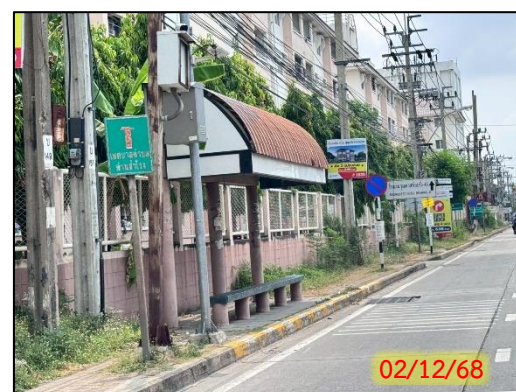

รูปที่ 2.2-6 จุตรอรรถสาธารณะหน้าโครงการ



รูปที่ 2.2-7 ลำโพงกระจายเสียงภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-8 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-8 ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568
