

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ SIAM ORIENTAL PLAZA ของบริษัท วอร์เรย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (รูปที่ 1.1-1) ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/3365 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 (ภาคผนวกที่ 1)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ได้รับใบรับแจ้งก่อสร้างอาคาร,ตัดแปลงอาคาร,รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ตามหนังสือเลขที่ 2/2559 (ภาคผนวกที่ 2) และวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โครงการได้รับใบรับรองการก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร (อ.6) เป็นอาคารค.ส.ล. สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักชุดอาศัยจำนวน 186 ห้อง ห้องชุดสำหรับใช้ประโยชน์เป็นสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 4 ห้อง จากเมืองพัทยา ตามหนังสือ เลขที่ 28/2560 (ภาคผนวกที่ 2)

วันที่ 24 มกราคม 2561 ได้รับอนุญาตจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด จากสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เป็น นิติบุคคลอาคารชุด สยาม โอเรียนทัล พลาซ่า ตามทะเบียนเลขที่ 3/2561 (ภาคผนวกที่ 2)

ภายหลังจากการจดทะเบียนฯ นิติบุคคลอาคารชุด สยาม โอเรียนทัล พลาซ่า มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ การเห็นชอบ โดยได้มอบหมายให้บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด เป็นบุคคลที่ 3 (Third Party) ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะดำเนินการ (เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568) และจัดทำเป็นรายงานฯ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตได้พิจารณา



ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ SIAM ORIENTAL PLAZA (รายงานฉบับสมบูรณ์),ตุลาคม 2558

รูปที่ 1.1-1 ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

1.2 รายละเอียดโครงการ

1) ที่ตั้งและลักษณะโครงการ

โครงการ SIAM ORIENTAL PLAZA ตั้งอยู่บริเวณถนนพระตำหนัก ซอย3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย (ดังรูปที่ 1.2-1) บนพื้นที่ 1-1-64 ไร่ หรือ 2,256 ตร.ม. ประกอบด้วย อาคารชุด ความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ห้องพักจำนวน 186 ห้อง ห้องชุดสำหรับใช้ประโยชน์เป็นสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์เพื่อเป็นร้านค้า จำนวน 8 ห้อง ห้องออกกำลังกาย 1 ห้อง และสระว่ายน้ำ 1 แห่ง ที่จอดรถยนต์จำนวน 45 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน

2) รายละเอียดโครงการโครงการ

- ระบบน้ำใช้

น้ำใช้ภายในโครงการได้รับการจ่ายมาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) คาดว่าจะมีปริมาณ การใช้น้ำตามจำนวนผู้ใช้และกิจกรรมการใช้น้ำประมาณ 138.47 ลบ.ม./วัน โดยโครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้บนชั้นดาดฟ้า จำนวน 8 ถัง ถึงถังละ 5.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตร 40.00 ลูกบาศก์เมตร และชั้นใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 380.00 ลูกบาศก์เมตร ภายในโครงการ ความจุ 420.00 ลบ.ม.ซึ่งสามารถสำรองน้ำได้นาน 3.03 วัน

- การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

น้ำเสียที่จะเกิดขึ้นจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และกิจกรรมการใช้น้ำอื่นๆ ภายในโครงการ คาดว่า จะมี ปริมาณ 107.62 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) โดยน้ำทิ้งจากห้องพักและส่วนอื่นๆ ของอาคารจะถูกรวบรวม ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารซึ่งได้มีการออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 110 ลบ./วัน

- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำโครงการได้ออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีขนาด 40 ลูกบาศก์เมตรเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำสาธารณะริมถนนพระตำหนัก ซอย3 มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำโดยเครื่องสูบน้ำ

- การจัดการมูลฝอย

ทางโครงการได้มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปประมาณ 1.245 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งทางโครงการได้ประสานให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล มาเก็บและนำไปกำจัดต่อไป

- ระบบไฟฟ้า

โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,247.27 KVA โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Oil Immersed ขนาด 1,250 kVA จำนวน 1 ชุด รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เข้าสู่โครงการผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงจ่าย

- ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งจากฟ้าผ่าตัวอาคารโดยตรง และระบบการต่อลงดิน (Grounding System) ซึ่งการติดตั้งจะยึดตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ระบบล่อฟ้า ประกอบไปด้วย ตัวล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำลงดินและหลังสายดิน

- ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการติดตั้งแผนควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือถือและกระดิ่งสัญญาณ เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจจับความร้อน ในส่วนของระบบป้องกันเพลิงไหม้ โครงการจัดให้มี ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง ระบบจ่ายไฟสำรอง พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ และจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุดบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

โครงการมีการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องพักโดยเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อระบายอากาศภายในอาคารสู่ภายนอก และดูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเพิ่มเข้ามา

- การจราจร

การเดินทางมายังพื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง การจราจรภายในโครงการเป็นแบบเดินรถได้ 2 ทิศทาง (Two-way Traffic) ถนนภายในโครงการกว้าง 7.40-8.00 เมตร มีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง เชื่อมต่อกับถนนพระตำหนักซอย3

- ระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยมีการรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และมีกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออก ส่วนบุคคลผ่านเข้าต้องมีการควบคุมโดยการแลกบัตรเข้า-ออก

- ระบบติดต่อสื่อสาร


โครงการได้ติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์รวม ประกอบด้วย จานดาวเทียมกระจายสัญญาณ และสายสัญญาณ โดยระบบดังกล่าวได้เตรียมเผื่อรองรับระบบเคเบิลทีวีของ UBC ด้วยเสาทีวีดิจิตอล

- การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

โครงการได้มีการจัดสรรน้ำเพื่อบริการแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยการดูแลคุณภาพน้ำรวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย และมีการจัดการสระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในสระให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล

- การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

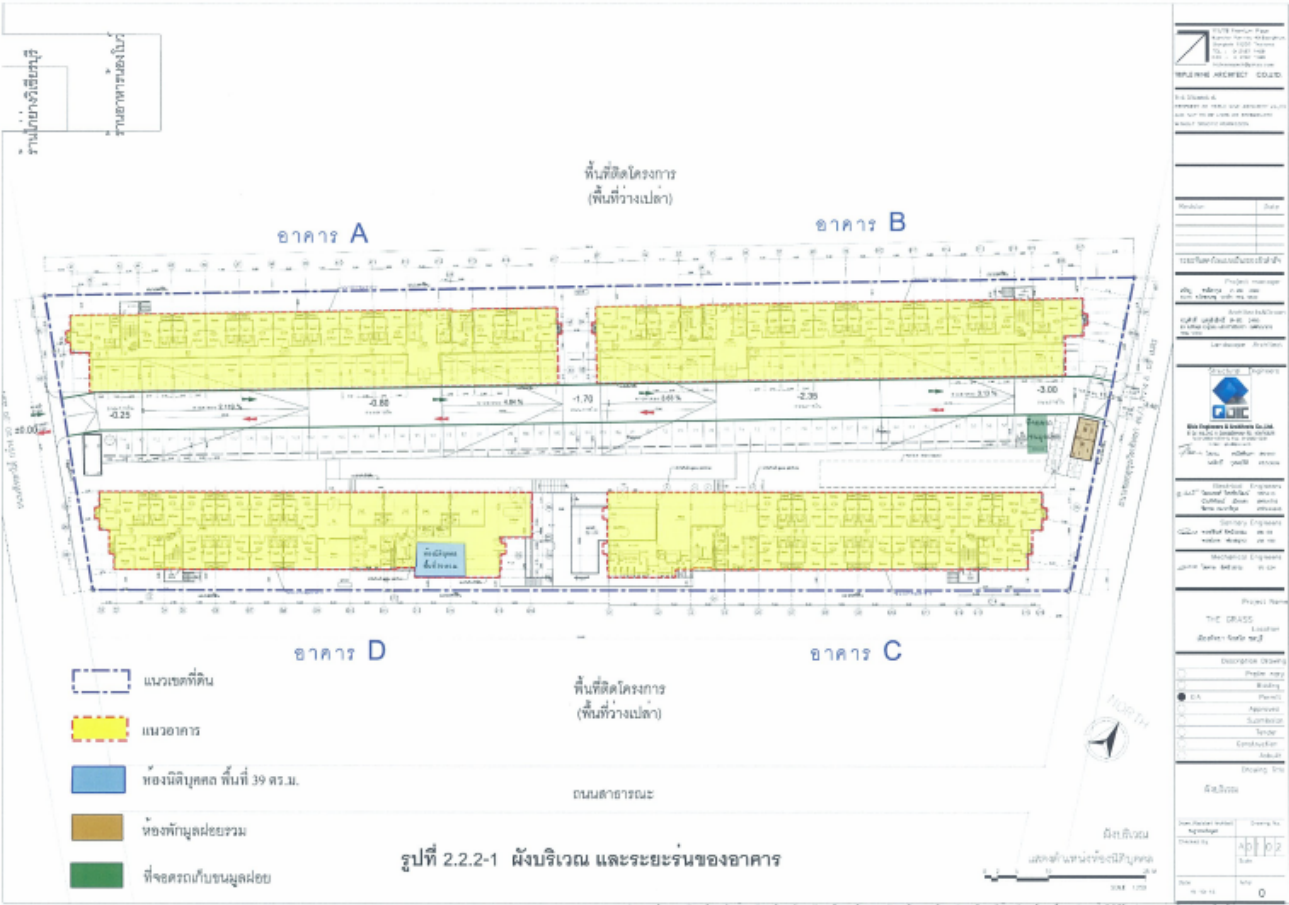

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ SIAM ORIENTAL PLAZA (รายงานฉบับสมบูรณ์),ตุลาคม 2558

รูปที่ 1.2-1 ผังบริเวณโครงการ

1.3 แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1) การตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ที่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือแผนที่กำหนดไว้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1

2) การตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ที่ได้รับความเห็นชอบ โดยสรุปเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาแนวโน้มของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1

3) การจัดทำรายงาน

บุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ นำเสนอต่อนิติบุคคลอาคารชุด สยาม โอเรียนทัล พลาซ่า เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตได้พิจารณา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1

ตารางที่ 1.3-1 แผนการดำเนินงานตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ โครงการ SIAM ORIENTAL PLAZA

การดำเนินงาน	ความถี่	แผนการดำเนินงาน											
		ปี 2568											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. สภาพภูมิประเทศ -พื้นที่ว่างโดยรอบอาคารของโครงการ -พื้นที่สีเขียวโครงการ	6เดือน/1ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ												
2. คุณภาพอากาศ -ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
3. การใช้น้ำ -เส้นท่อประปาการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
-การทำความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้	6 เดือน/ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
4. การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
-ตรวจสอบปริมาณไขมันหรือน้ำมัน	ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
-ตรวจสอบถังเก็บตะกอน	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
6. การระบายน้ำ -ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำ และบ่อดักมูลฝอยไม่ให้มีเศษมูลฝอยตกค้าง	6เดือน/1ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ												

-ชุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการและท่อรวบรวมน้ำ	6เดือน/1ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ												
การดำเนินงาน	ความถี่	แผนการดำเนินงาน											
		ปี 2568											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
7. การจัดการมูลฝอย													
-ถังรองรับมูลฝอยประจำห้อง ห้องพักมูลฝอยรวม และถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
8. การใช้ไฟฟ้า													
-ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
- หม้อแปลงไฟฟ้า	1 ครั้ง/ 6เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
9. ระบบป้องกันอัคคีภัย													
	1 ครั้ง/ 3เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
10. ระบบระบายอากาศ													
ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												
11. สาธารณสุขและสุขภาพ													

-คุณภาพสระว่ายน้ำ	1 ครั้ง/ สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา													
-กระเบื้องพื้นและผนังของสระว่ายน้ำ	ดำเนินการ													
-ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ														
-อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ														

หมายเหตุ : — แผนการดำเนินงาน (Plan), — ผลการดำเนินการ (Actual)

1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาโครงการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ครั้งล่าสุด เดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต

รายงานครั้งนี้ เป็นฉบับที่ 2/2568 (เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)
