

4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ ดังนั้น การนำเสนอรายงานในครั้งนี้ บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ในเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 ผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบับ เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งดั่งรายละเอียดต่อไปนี้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหลังจากออกจากระบบบำบัดน้ำเสียกำหนดพารามิเตอร์ไว้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง

พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง	ความถี่ในการตรวจสอบ	เดือนที่ตรวจสอบ
pH	เดือนละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568
BOD	เดือนละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568
SS	เดือนละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568
Oil&Grease	เดือนละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568
TKN	เดือนละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568
Sulfide	เดือนละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568
Total Coliform Bacteria	เดือนละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568
Residual Chlorine	เดือนละ 1 ครั้ง	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการ เก็บตัวอย่างน้ำทั้ง และ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการ บริษัท วิศกรรมเคมี จำกัดเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งที่ได้ตรวจวัดผ่านมาแล้ว เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 ทาง บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมผลและสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าวและเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำทั้งในการตรวจทดสอบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งอาคาร ข.


**มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำดังรายละเอียดต่อไปนี้**

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำน้ำกำหนดพารามิเตอร์ไว้ดังตารางที่ 2

พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ (Parameter Swimming Pool) : pH , Calcium Hardness , Free Chlorine ,
Combine Chlorine , Total Coliform Bacteria , Fecal Coliform Bacteria

ตารางที่ 2 จุดที่ตรวจสอบน้ำสระว่ายน้ำ


เดือนที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ สระว่ายน้ำ	ความถี่ในการตรวจสอบ	จุดที่ตรวจสอบ
กรกฎาคม 2568	Parameter Swimming Pool	เดือนละ 1 ครั้ง	Main pool Pool Villa
สิงหาคม 2568	Parameter Swimming Pool	เดือนละ 1 ครั้ง	Main pool Pool Villa
กันยายน 2568	Parameter Swimming Pool	เดือนละ 1 ครั้ง	Main pool Pool Villa
ตุลาคม 2568	Parameter Swimming Pool	เดือนละ 1 ครั้ง	Main pool Pool Villa
พฤศจิกายน 2568	Parameter Swimming Pool	เดือนละ 1 ครั้ง	Main pool Pool Villa
ธันวาคม 2568	Parameter Swimming Pool	เดือนละ 1 ครั้ง	Main pool Pool Villa

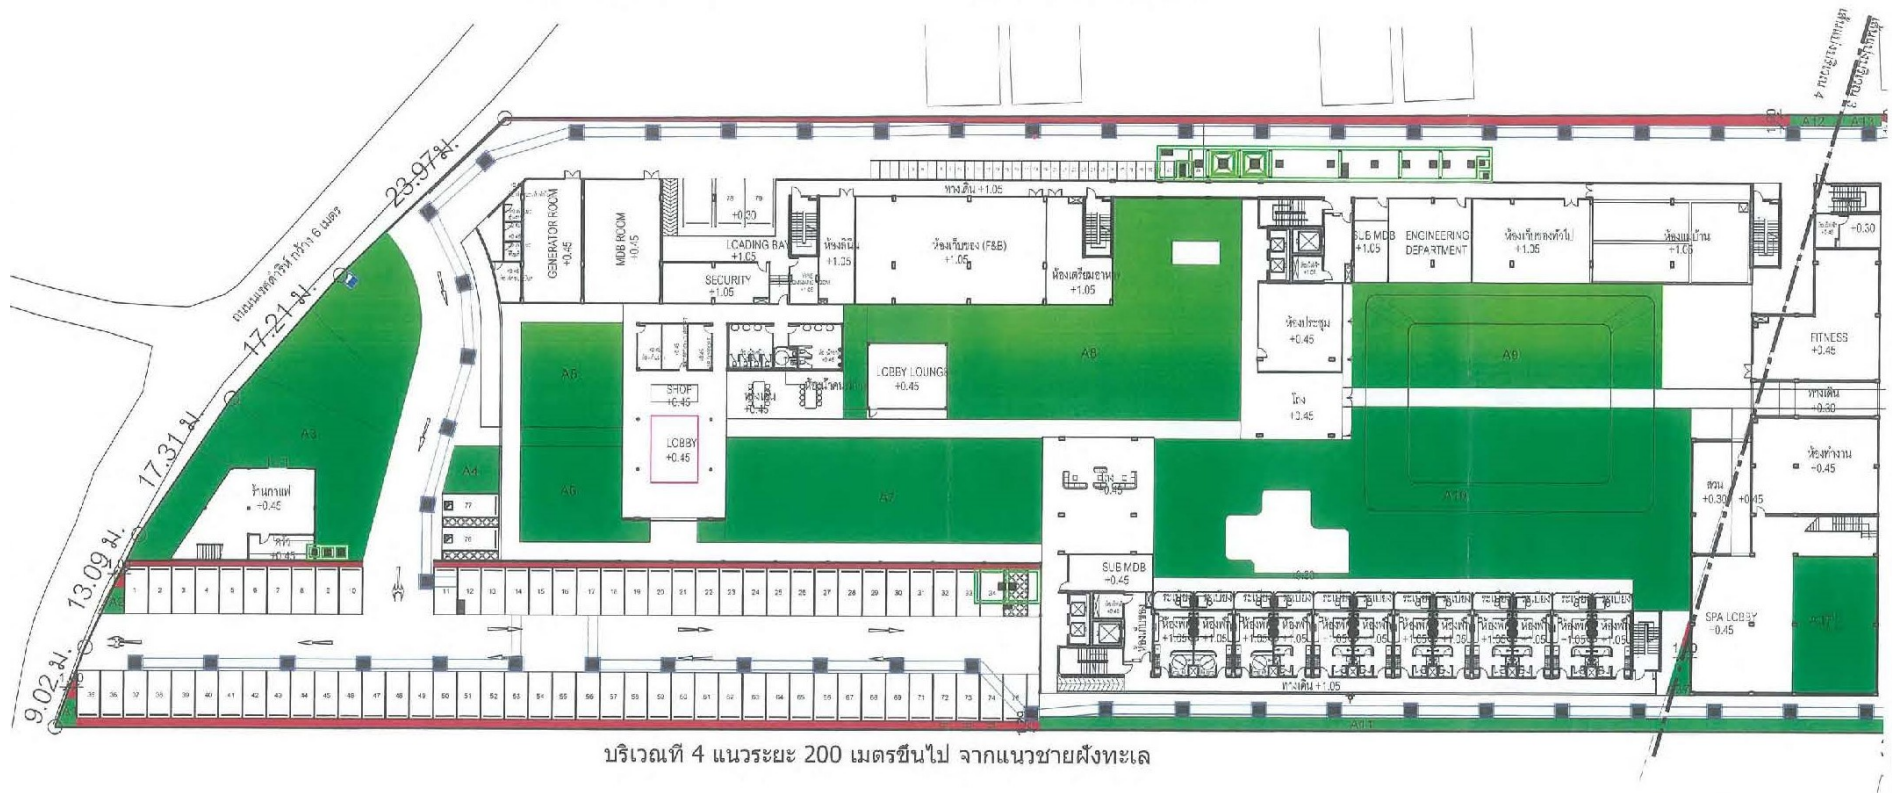

ภาพที่ 2 ผังบริเวณพื้นที่สีเขียวโครงการ(1)



ภาพที่ 3 ผังบริเวณพื้นที่สีเขียวโครงการ(2)

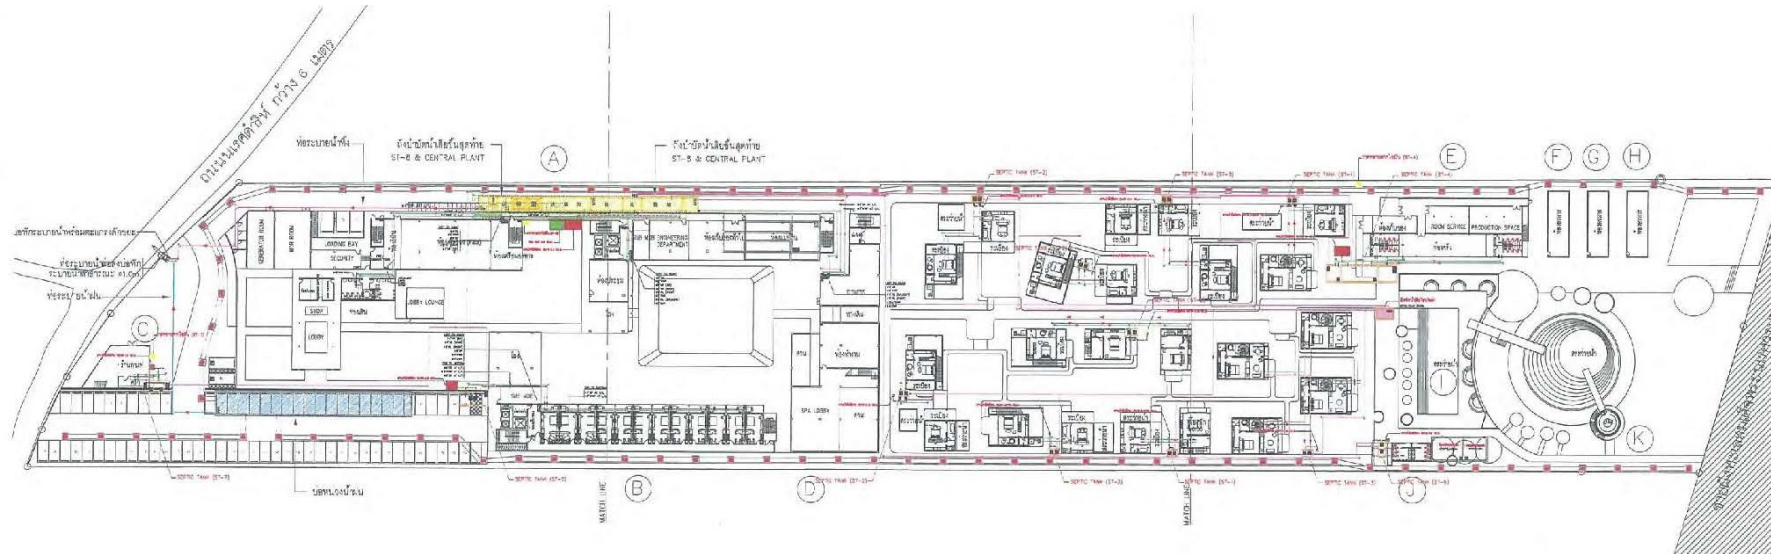

ภาพที่ 4 ผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
