

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2569 สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 2.1-1

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรมชลประทาน ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่เสนอในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 - 1.1) สภาพภูมิประเทศ
 - 1.2) ลักษณะภูมิอากาศ
 - 1.3) คุณภาพอากาศ
 - 1.4) ทรัพยากรดิน
 - 1.5) ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
 - 1.6) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
 - 1.7) ทรัพยากรธรณี
 - 1.8) เสียงและความสั่นสะเทือน
 - 1.9) ตะกอน
 - 1.10) การชะล้างพังทลายของดิน
 - 1.11) อุทกวิทยาน้ำผิวดิน
 - 1.12) คุณภาพน้ำผิวดิน
 - 1.13) อุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดิน
 - 1.14) คุณภาพน้ำใต้ดิน
 - 1.15) พื้นที่ชุ่มน้ำ
 - 1.16) พื้นที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิทัศน์
- 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
 - 2.1) ป่าไม้
 - 2.2) สถานภาพการบุกรุกทำลายป่า
 - 2.3) สัตว์ป่า
 - 2.4) สิ่งมีชีวิตในน้ำ
 - 2.5) ระบบนิเวศของพื้นที่
- 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 - 3.1) ระบบชลประทาน



- 3.2) เกษตรกรรมและปศุสัตว์
- 3.3) การใช้น้ำ
- 3.4) การบริหารการใช้น้ำ
- 3.5) การระบายน้ำและการบรรเทาอุทกภัย
- 3.6) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- 3.7) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- 3.8) การใช้ประโยชน์จากป่า
- 3.9) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี
- 3.10) โรงงานอุตสาหกรรม
- 3.11) พลังงานและไฟฟ้า
- 3.12) การคมนาคมขนส่ง
- 3.13) การจัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย
- 3.14) การจัดการลุ่มน้ำ
- 3.15) การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์กับนิเวศของพื้นที่
- 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
 - 4.1) เศรษฐกิจสังคม
 - 4.2) สุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข
 - 4.3) การท่องเที่ยว กีฬา แหล่งนันทนาการ และสุนทรียภาพ
 - 4.4) แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์
 - 4.5) การขุดเขยที่ดินและทรัพย์สิน

ขอบเขตการดำเนินการ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ประตุระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้สรุปรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดผลการดำเนินการได้ในตารางที่ 2.1-1 โดยประเมิน 5 ลักษณะ ดังนี้

- 1) ใช้เครื่องหมาย ● แทนผลการปฏิบัติตามมาตรการกรณีที่ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้ครบตามเงื่อนไข / ปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วน
- 2) ใช้เครื่องหมาย ◐ แทนผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้บางส่วนและมีบางส่วนที่ยังไม่ถึงเวลาต้องปฏิบัติ / ปฏิบัติตามมาตรการแต่ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
- 3) ใช้เครื่องหมาย ○ แทนผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ปฏิบัติแต่ในขณะประเมินยังไม่ถึงเวลาที่โครงการจะต้องปฏิบัติ / มาตรการที่กำหนดไว้ไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติในปัจจุบัน
- 4) ใช้เครื่องหมาย ⊗ แทนผลการปฏิบัติตามมาตรการในกรณีที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
- 5) ใช้เครื่องหมาย ⊖ แทนผลการปฏิบัติตามมาตรการในกรณีที่มาตรการที่กำหนดไว้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1) จำกัดพื้นที่ก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงการรบกวนพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้อง	●	1) กรมชลประทานดำเนินการกันเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการก่อสร้างในบ่อก่อสร้างเท่านั้น	 การกันเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
	2) กำหนดระยะเวลา และวางแผนการขุดเปิดหน้าดินในฤดูแล้ง เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน	●	2) กรมชลประทานดำเนินการขุดเปิดหน้าดินในฤดูแล้ง โดยหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม)	
	3) ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณหัวงาน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	○	3) การปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้น กรมชลประทานจะดำเนินการในที่สุดท้ายของการก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณเหนือประตูระบายน้ำ	 อาคารป้องกันการกัดเซาะ



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิ ประเทศ (ต่อ)	4) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณห้วยงาน และข้างเคียงให้กลมกลืนกับสภาพ ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสวยงาม	○	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยงาน กรม ชลประทานจะดำเนินการในที่สุดท้ายของ การก่อสร้าง	
1.2 ลักษณะ ภูมิอากาศ	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
1.3 คุณภาพ อากาศ	1) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ ถนนทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง	●	1) กรมชลประทานดำเนินการฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ ถนนทางเข้าออก พื้นที่ วันละ 2-3 ครั้ง หรือเมื่อสังเกตพบว่ามี ปริมาณฝุ่นละอองเกิดขึ้นและอาจกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ	 การฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน
	2) ปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขณะขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ทุกครั้ง	●	2) กรมชลประทานดำเนินการปิดคลุมผ้าใบ รถบรรทุกขณะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้ง	 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก

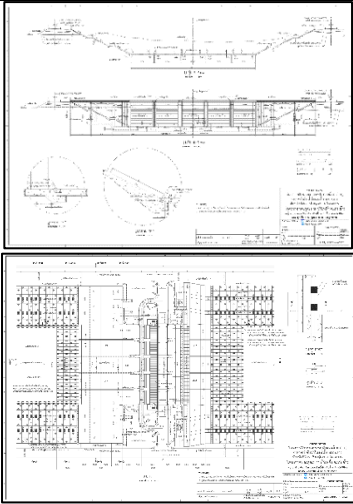


ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพ อากาศ (ต่อ)	3) มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ และยานพาหนะเป็นประจำ	●	3) กรมชลประทานกำหนดให้เจ้าหน้าที่ขับ รถมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ และยานพาหนะเป็นประจำ	
	4) จำกัดความเร็วของรถขนส่งให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดฝุ่นละอองจากการวิ่ง บนถนนที่ผ่านชุมชน และ ไม่เกิน 80 กม./ ชม. ในพื้นที่ทั่วไป	●	4) กรมชลประทานกำชับให้เจ้าหน้าที่ขับ รถบรรทุกมีการจำกัดความเร็วของรถบรรทุก วัสดุก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากการวิ่งบนถนนที่ผ่านชุมชนและกรม ชลประทานได้มีการประสานงานกับ หน่วยงานในท้องถิ่น และผู้นำชุมชนก่อนมี การขนส่งวัสดุเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมี การแจ้งจำนวนเที่ยวรถและเวลาในขนส่ง	 ติดป้ายจำกัดความเร็ว
	5) คนงานก่อสร้างต้องใส่หน้ากากป้องกัน ฝุ่นเป็นประจำ	●	5) กรมชลประทานกำชับให้คนงานก่อสร้างใส่ หมวก สวมถุงมือ และผ้าปิดหน้าเพื่อป้องกัน ฝุ่นเป็นประจำ	 คนงานก่อสร้างสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประจวบายนน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพ อากาศ (ต่อ)	6) ไม่ควรดำเนินการก่อสร้างเกินเวลา 18.00 น.	●	6) กรมชลประทานกำหนดให้ปฏิบัติงานและการ ก่อสร้าง เฉพาะช่วงเวลา 07.30-18.00 น. เท่านั้น	
1.4 ทรัพยากร ดิน	กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อลดปริมาณดินที่ถูกรบกวนจากการ ขุดหรือปรับพื้นที่ในการก่อสร้าง รวมถึง นำดินที่ขุดมาใช้ประโยชน์ในการ ก่อสร้าง	●	กรมชลประทานกำหนดขอบเขตพื้นที่ ก่อสร้างอย่างชัดเจน โดยดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะในพื้นที่ช่องลัดเท่านั้น และนำดินที่ขุด ทั้งหมดมาใช้ในการปรับถมพื้นที่บ่อก่อสร้าง การทำคันดินและทำนบดิน	 การนำดินมาใช้ปรับพื้นที่บ่อก่อสร้าง
1.5 ธรณีวิทยา และการเกิด แผ่นดินไหว	1) ทำการออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้ค่า PGA เท่ากับ 0.011 g เพื่อให้ ทนทานและปลอดภัยจากผลกระทบที่มา จากแผ่นดินไหว โดยการออกแบบได้คำนวณ ถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มีเสถียรภาพ ในการต้านทานการสั่นสะเทือนจาก แผ่นดินไหวตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง “กำหนด การรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทน ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550”	●	1) สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ได้ออกแบบ โครงการตามเกณฑ์มาตรฐานให้สามารถ รองรับการเกิดแผ่นดินไหว	 แบบฐานรากโครงการ



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประจวบายนน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.5 ธรณีวิทยา และการเกิด แผ่นดินไหว (ต่อ)	2) ออกแบบอาคารโครงสร้างให้คำนึงถึงรูปแบบการวิบัติของฐานรากในรูปแบบดังนี้ - ความมั่นคงต่อการพลิกคว่ำ (overturning) - ความมั่นคงต่อการเลื่อนไถล (sliding) - ความมั่นคงต่อการกดทับของอาคาร (bearing)	●	2) กรมชลประทานมีการเจาะสำรวจปฐพีกลศาสตร์ โครงการประจวบายนน้ำโพธิ์ประทับช้าง และมีการออกแบบอาคารโครงสร้างโดยคำนึงถึงรูปแบบการวิบัติของฐานราก	
	3) ขุดเปิดหน้าดิน โดยขุดลอกเฉพาะหน้าดินที่มีรากไม้และอินทรีย์สารออก ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร	●	3) กรมชลประทานได้ทำการขุดเปิดหน้าดิน โดยขุดลอกเฉพาะหน้าดินที่มีรากไม้และอินทรีย์สารออก ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดินและพัดพาลงสู่แหล่งน้ำ	
	4) กิจกรรมงานขุดดิน จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงหน้าแล้ง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และพัดพาลงสู่แหล่งน้ำ	●	4) กรมชลประทานดำเนินการขุดเปิดหน้าดินในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน	

การขุดเปิดหน้าดิน



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตูลำน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.6 วัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้าง	1) จัดทำแผนที่แหล่งวัสดุ (stockpile map) และปักป้ายประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน	●	1) กรมชลประทานได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่โครงการ	 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่โครงการ
	2) นำดินจากการขุดบ่อก่อสร้างมาใช้ ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ	●	2) กรมชลประทานได้นำดินจากการขุดบ่อ ก่อสร้างมาใช้ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ และปรับถมพื้นที่	
	3) ปรับปรุงแก้ไขดินที่กระจายตัว (Dispersive Soil) ให้เป็นดินไม่กระจาย ตัว (Non dispersive soil) อาจใช้กรวด ทรายที่มีอัตราละเอียดที่เหมาะสมแทน หรือ หาแหล่งดินที่มีคุณสมบัติไม่กระจายตัว ในบริเวณข้างเคียงเพื่อมาทดแทน	●	3) กรมชลประทานนำดินที่ขุดจากแหล่งวัสดุ มาใช้โดยผสมกับกรวดทรายและนำมาบดอัด ก่อนใช้ในการก่อสร้าง	
	4) ดำเนินการขุดดินให้เสร็จในช่วง หน้าแล้ง	●	4) กรมชลประทานดำเนินการขุดดินในช่วง หน้าแล้งเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการขุดดิน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำไฟฟ้าประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.6 วัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้าง (ต่อ)	5) จำกัดพื้นที่กองดินจากการขุดให้อยู่ใน พื้นที่ก่อสร้าง	●	5) กรมชลประทานดำเนินการจำกัดพื้นที่ กองดินจากการขุดให้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เท่านั้น	 จำกัดพื้นที่กองดินในพื้นที่ก่อสร้าง
	6) บดอัด ปรับถมดิน และฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละออง	●	6) กรมชลประทานดำเนินการบดอัดดิน ปรับถมดิน และฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง	 กิจกรรมงานบดอัด ปรับถมดิน
	7) ปลูกพืชคลุมดินภายหลังการก่อสร้าง แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการกัดเซาะ	○	7) ปัจจุบันกรมชลประทานอยู่ระหว่าง ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะ การปลูก พืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณหัวงานจะ ดำเนินการในที่สุดท้ายของการก่อสร้าง	
1.7 ทรัพยากร ธรณี	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.8 เสียงและ ความสั่นสะเทือน	1) จำกัดความเร็วของรถขนส่งให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. ที่ผ่านชุมชน และไม่เกิน 80 กม./ชม. ในพื้นที่ทั่วไป	●	1) กรมชลประทานกำหนดให้เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งวัสดุผ่านชุมชนในความเร็วที่ควบคุมไม่เกิน 30 กม./ชม. และไม่เกิน 80 กม./ชม. ในพื้นที่ทั่วไป	 ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถ
	2) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด	●	2) กรมชลประทานเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด	
	3) คนงานก่อสร้างต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) และทำงานไม่เกิน 8 ชม./วัน	●	3) กรมชลประทานมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน	 คนงานก่อสร้างใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
	4) ดำเนินการตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสอบสภาพรถ พ.ศ. 2555	●	4) กรมชลประทานมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างตรวจสอบสภาพรถตามประกาศกรมขนส่งทางบก อย่างเคร่งครัด	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.8 เสียงและ ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	5) ไม่ควรดำเนินการก่อสร้างเกินเวลา 18.00 น.	●	5) กรมชลประทานกำหนดให้ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง เฉพาะช่วงเวลา 07.30-18.00 น. เท่านั้น	
	6) ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผู้นำชุมชน และประชาชน ที่พักอาศัยใกล้พื้นที่ ก่อสร้างให้ทราบก่อนการก่อสร้างที่มี เสียงดังรบกวนหรือมีความสั่นสะเทือน เกิดขึ้น	●	6) กรมชลประทานดำเนินการ ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผู้นำชุมชนและ ประชาชนที่พักอาศัยใกล้พื้นที่ก่อสร้างให้ ทราบก่อนการก่อสร้างที่มีเสียงดังรบกวน หรือมีความสั่นสะเทือนล่วงหน้า 1-2 วัน แต่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจึงได้รับผลกระทบใน ด้านเสียงและความสั่นสะเทือนน้อย	 การประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดประชุมการมีส่วนร่วม ประชาชน



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.8 เสี่ยงและ ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)	7) จัดทำช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และกรณีมีการร้องเรียน ผู้ดำเนินการ ก่อสร้างต้องแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด	●	7) กรมชลประทาน มีช่องทางในการรับเรื่อง ร้องเรียน กรณีมีการร้องเรียนสามารถร้องเรียน ปัญหาได้ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และ สามารถแจ้งนายช่างซึ่งประจำอยู่ที่ทำการ ชั่วคราวที่งานก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวก ต่อราษฎร ที่เข้ามาแจ้งหรือร้องเรียนปัญหา ต่างๆ ปัจจุบันยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจาก ประชาชนเนื่องจากผลกระทบจากการก่อสร้าง แต่อย่างใด หากพบว่าในช่วงก่อสร้างโครงการ ได้รับข้อร้องเรียน กรมชลประทานจะดำเนินการ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อหาสาเหตุพร้อมทั้งแนว ทางการแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเร็ว เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่าง เคร่งครัดรายละเอียดตามหัวข้อ 5.1.1 แผนงาน เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้าน การป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหน้าที่ 5-3	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.9 ตะกอน	1) วางแผนก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงการขุด เปิดหน้าดินและงานฐานรากในฤดูฝน	●	1) กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างและขุด เปิดหน้าดินในฤดูแล้ง โดยหลีกเลี่ยงการ ก่อสร้างในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม)	
	2) จัดพื้นที่เทกองวัสดุก่อสร้างให้อยู่ใน พื้นที่ก่อสร้าง	●	2) กรมชลประทานดำเนินการจัดพื้นที่เทกอง วัสดุก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่บ่อก่อสร้างเท่านั้น	
	3) ก่อสร้างทางระบายน้ำฝน คันดิน หรือ บ่อดักตะกอนในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดัก เศษวัสดุดิน หิน ตะกอนไม่ให้ถูกชะล้าง ลงสู่ลำน้ำ	●	3) กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทาง ระบายน้ำฝน เพื่อดักเศษวัสดุดิน หิน ตะกอน ไม่ให้ถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำ	 ทางระบายน้ำฝน
1.10 การชะล้าง พังทลายของดิน	เปิดพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็น	●	กรมชลประทานดำเนินการเปิดพื้นที่ก่อสร้าง เท่าที่จำเป็นโดยหลีกเลี่ยงการก่อสร้างหรือ เปิดหน้าดินนอกเหนือจากพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ อีกทั้งกำชับให้โครงการดำเนิน กิจกรรมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ ชะล้างของหน้าดินให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน	 การเปิดพื้นที่ก่อสร้าง



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.11 อุทกวิทยา น้ำผิวดิน	กำหนดกิจกรรมก่อสร้างที่ดำเนินการ ในลำน้ำในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน	●	กรมชลประทานดำเนินการเปิดหน้าดินใน ฤดูแล้งเท่านั้น กิจกรรมการก่อสร้างประตุน ระบายน้ำดำเนินการในช่องลัดเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มีมีการก่อสร้างในลำน้ำเดิม	 ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง
1.12 คุณภาพ น้ำผิวดิน	1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างในฤดูฝน เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่ง น้ำ	●	1) กรมชลประทานดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้างในช่วงฤดู แล้งเท่านั้น เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน ลงสู่แหล่งน้ำ	
	2) ก่อสร้างคันดิน คุระบายน้ำ และบ่อดัก ตะกอนในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอน จากการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	○	2) กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างคันดิน และก่อสร้างในพื้นที่บ่อก่อสร้างเท่านั้น ไม่มี เศษวัสดุดิน หิน ตะกอนถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำ	
	3) ระมัดระวังการเติมน้ำมันเครื่องจักร ไม่ให้เกิดการหกรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ โดย ดำเนินการในพื้นที่เฉพาะที่เตรียมไว้	●	3) กรมชลประทานมีการเติมน้ำมันเครื่องจักร ดำเนินการในพื้นที่เฉพาะที่เตรียมไว้ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการหกรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ	 พื้นที่สำหรับการเติมน้ำมันเครื่องจักร



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.12 คุณภาพ น้ำผิวดิน (ต่อ)	4) จัดหาถังขยะให้เพียงพอและให้ หน่วยงานท้องถิ่นนำไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยห้ามคนงานทิ้งขยะ ลงสู่แหล่งน้ำผิวดินอย่างเด็ดขาด	●	4) กรมชลประทานดำเนินการจัดหาถังขยะ ให้เพียงพอและให้หน่วยงานท้องถิ่น (อบต.ไผ่ ท่าโพ) นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ถังขยะในพื้นที่โครงการ
	5) กรณีมีการปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำยม จะต้องแจ้งให้ผู้อาศัยด้านท้ายน้ำได้ รับทราบ เพื่อกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ เสียก่อน	●	5) ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ดำเนินการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น และได้ทำการปิดกั้น ลำน้ำเดิม จึงทำการยกบานประตุน้ำ เพื่อให้มีการไหลของน้ำในลำน้ำแม่น้ำยมได้ ตามปกติ พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้นำชุมชนให้ รับทราบแล้วเรียบร้อย	
	6) ดำเนินการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน	○	6) ภายหลังจากใช้พื้นที่ กรมชลประทาน ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่และปลูกพืช คลุมดินในปีสุดท้ายของระยะก่อสร้าง	
	7) ก่อสร้างที่พักคนงานและอาคาร สำนักงานโครงการให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร	●	7) กรมชลประทานได้จ้างแรงงานท้องถิ่น ซึ่งมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง จึงไม่มี การก่อสร้างที่พักคนงานในระยะ 50 เมตร จากแหล่งน้ำ	

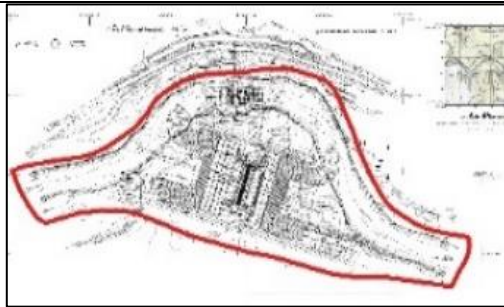


ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประจักษ์ชัยชลีชัยพัฒนา จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
1.12 คุณภาพ น้ำผิวดิน (ต่อ)	8) ติดตั้งระบบบำบัดชนิด On-site Treatment สำหรับสำนักงานและบ้านพักคนงาน	●	8) กรมชลประทานมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิด On-site Treatment สำหรับสำนักงาน	 ระบบบำบัดน้ำเสีย
1.13 อุทกธรณี วิทยาน้ำใต้ดิน	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
1.14 คุณภาพ น้ำใต้ดิน	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
1.15 พื้นที่ชุ่ม น้ำ	วางแผนการก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงการ ขุดเปิดหน้าดินและงานฐานรากในช่วงฤดู ฝน เพื่อลดการปนเปื้อนของดินตะกอน ในแหล่งน้ำ	●	กรมชลประทานดำเนินการวางแผนการ ก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงการขุดเปิดหน้าดิน และงานฐานรากในช่วงฤดูฝน และ ดำเนินการในบ่อก่อสร้างเท่านั้น เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อความชุ่มชื้นของแม่น้ำยม	
1.16 พื้นที่ สำคัญทาง ธรณีวิทยาและ ภูมิทัศน์	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ป่าไม้	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
2.2 สถานภาพ การบุกรุก ทำลายป่า	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
2.3 สัตว์ป่า	1) กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ ชัดเจน และควบคุมกิจกรรมก่อสร้าง ไม่ให้เกิดการรบกวนพฤติกรรมของสัตว์ป่า รวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการล่า และจับสัตว์ ป่า	●	กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างในเขต พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งบริเวณพื้นที่การ ก่อสร้างไม่ได้เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า จึงไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อแหล่งที่อยู่ อาศัยสัตว์ป่า รวมทั้งควบคุมไม่ให้คนงานมี การล่า และจับสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียง	 ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง
	2) ระมัดระวังกิจกรรมการก่อสร้างที่จะ กระทบต่อแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และ แหล่งทำรังวางไข่ และถิ่นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่า	●	กรมชลประทานระมัดระวังกิจกรรมการ ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อแหล่ง อาหาร แหล่งน้ำ และแหล่งทำรังวางไข่ และ ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ปัจจุบันไม่พบสัตว์ ป่าบริเวณพื้นที่โครงการ	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
2.4 สิ่งมีชีวิตใน น้ำ	1) ออกแบบให้มีการก่อสร้างทางผ่านปลาที่ ประตุน้ำ เพื่อให้ปลาบริเวณด้าน ท้ายน้ำสามารถขึ้นไปวางไข่และหากินในลำ น้ำตอนบนได้	●	1) กรมชลประทานมีการออกแบบทางผ่าน ปลาแบบขั้นบันได (over flow wire) ผสมกับ แบบอ็อก (pool type) ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งซ้าย ของประตุน้ำ โดยมีแผนที่จะก่อสร้างใน ปีงบประมาณพ.ศ. 2570	
	2) กิจกรรมการก่อสร้างควรดำเนินการ ในฤดูแล้ง เพื่อลดผลกระทบจากตะกอน ดินลงสู่แหล่งน้ำ	●	2) กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างในช่วง ฤดูแล้ง เพื่อลดผลกระทบจากตะกอนดินลงสู่ แหล่งน้ำ และดำเนินการในบ่อก่อสร้างใน ช่องลัดเท่านั้น ไม่มีการก่อสร้างในลำน้ำเดิม	
	3) ควบคุมที่พนักงานมิให้มีการถ่ายสิ่ง ปฏิกูลหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำยม โดยตรง	●	3) กรมชลประทานมีการสร้างห้องน้ำทั้ง บริเวณที่พนักงานและอาคารสำนักงานเป็น แบบระบบ onsite treatment พร้อมทั้งกำชับ ไม่ให้พนักงานระบายน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำยมโดยตรง	 การจัดให้มีห้องน้ำและระบบบำบัด
	4) ควบคุมคนงานมิให้มีจับสัตว์น้ำใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งในบริเวณห้วงงาน บริเวณเหนือห้วงงานและท้ายห้วงงาน เป็น ระยะทาง 1 กิโลเมตร	●	4) กรมชลประทานควบคุมไม่ให้คนงาน ก่อสร้างโครงการจับสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่ โครงการและบริเวณเหนือและท้ายห้วงงาน เพื่อ เป็นการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศที่จะ เกิดขึ้นกับทรัพยากรประมง และนิเวศทางน้ำ	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตูลำน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
2.4 สิ่งมีชีวิตใน น้ำ (ต่อ)	5) กรณีที่มีการก่อสร้างในลำน้ำต้องทำการ ผันน้ำและ/หรือเบี่ยงทางน้ำ เพื่อมิให้เกิด การปิดกั้นการไหลของน้ำ รวมทั้งการ อพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ	●	5) ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ดำเนินการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น และได้ทำการปิดกั้นลำน้ำ เดิม จึงทำการยกบานประตูระบายน้ำเพื่อให้ มีการไหลของน้ำในลำน้ำแม่ข่ายได้ตามปกติ	
2.5 ระบบนิเวศ ของพื้นที่	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 ระบบ ชลประทาน	1) จัดเตรียมแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ในช่วง ฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน- เมษายน) ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อย และระบาย น้ำให้ไหลผ่านด้านท้ายน้ำ	●	1) กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างในฤดู แล้ง เพื่อลดผลกระทบจากตะกอนดินลงสู่ แหล่งน้ำ	
	2) กรณีที่มีการก่อสร้างในลำน้ำต้องทำการ ผันน้ำหรือเบี่ยงทางน้ำ เพื่อให้มีการไหล ของน้ำในลำน้ำแม่ข่ายได้ตามปกติ	●	2) ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ดำเนินการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น และได้ทำการปิดกั้นลำน้ำ เดิม จึงทำการยกบานประตูระบายน้ำเพื่อให้ มีการไหลของน้ำในลำน้ำแม่ข่ายได้ตามปกติ	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประทุษระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
3.2 <u>เกษตรกรรม และปศุสัตว์</u>	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของพื้นที่ เกษตรกรรมที่ต้องสูญเสียที่ดินได้รับ ทราบก่อนการก่อสร้าง เพื่อให้เก็บเกี่ยว ผลผลิตล่วงหน้า พร้อมจ่ายค่าชดเชยที่ เหมาะสมและยุติธรรม	●	กรมชลประทานมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการ ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิต ล่วงหน้า พร้อมจ่ายค่าชดเชยผู้ที่ได้รับ ผลกระทบที่ดินถูกเขตชลประทาน จำนวน 23 แปลง โดยเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ จำนวน 10 แปลงจ่ายค่าชดเชยทั้งหมดแล้ว และที่ดินที่ไม่ มีเอกสารสิทธิ จำนวน 13 แปลง จ่ายค่า ทดแทนแล้วเสร็จเช่นกัน	 การประชุมสัมมนาก่อนการก่อสร้าง
3.3 <u>การใช้น้ำ</u>	ก่อสร้างบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อดักเศษวัสดุดิน หิน ตะกอน และอื่นๆ จากกิจกรรมการก่อสร้างไม่ให้ ถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำ	●	กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการ ภายในบ่อดักซึ่งอยู่ในช่องลัด ซึ่ง เปรียบเสมือนบ่อดักตะกอน จึงไม่มีเศษวัสดุ ดิน หิน และตะกอนถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำ	
3.4 <u>การบริหาร การใช้น้ำ</u>	กรมชลประทานจัดตั้งงบประมาณและ ประสานงานในการจัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความ พร้อมและวางแผนการบริหารการใช้น้ำ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละ กิจกรรมอย่างเหมาะสม	○	กรมชลประทานได้เตรียมงบประมาณสำหรับ การจัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำใน ปีสุดท้ายของระยะก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชน มีความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเมื่อ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
3.5 การระบาย น้ำและการ บรรเทาอุทกภัย	1) จัดเตรียมแผนการก่อสร้างในช่วงฤดู แล้ง	●	1) กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น	
	2) ทำช่องระบายน้ำให้ไหลผ่านพื้นที่ ก่อสร้างไปด้านท้ายน้ำเพื่อให้มีการไหล ของน้ำในลำน้ำได้ตามปกติ	●	2) ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ดำเนินการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น และได้ทำการปิดกั้นลำน้ำ เดิม จึงทำการยกบานประตูละบายน้ำเพื่อให้ มีการไหลของน้ำในลำน้ำแม่น้ำยมได้ตามปกติ	
	3) การก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม ควรก่อสร้างทีละครึ่งของลำน้ำ และทำ ช่องระบายน้ำให้ไหลผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ไปด้านท้ายน้ำ เพื่อให้มีการไหลของน้ำ ในลำน้ำได้ตามปกติ	●	3) ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ดำเนินการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น และได้ทำการปิดกั้นลำ น้ำเดิม จึงทำการยกบานประตูละบายน้ำ เพื่อให้มีการไหลของน้ำในลำน้ำแม่น้ำยมได้ ตามปกติ	
3.6 การประมง และการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ	1) ใช้มาตรการร่วมกับมาตรการลด ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และ สิ่งมีชีวิตในน้ำ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาค คุณภาพน้ำและตะกอนในน้ำ	●	1) กรมชลประทานมีการดำเนินการแผนการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามผลกระทบทาง คุณภาพน้ำที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และการใช้ ประโยชน์ของประชาชน โดยดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 5 จุดเก็บ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 และครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2569 รายงานผลตามหัวข้อ 5.2.2 แผนการ ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน หน้าที่ 5-233	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประจวบประจวบน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
3.6 การประมง และการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ (ต่อ)	2) ห้ามมิให้คนงานหรือประชาชนจับสัตว์ น้ำในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่โครงการด้วย เครื่องมือที่อยู่ในลักษณะเร่งการทำลาย สัตว์น้ำ เช่น การใช้ไฟฟ้าช็อต การเบ็ดเมา	●	2) กรมชลประทานมีการป้องกันไม่ให้ คนงานหรือประชาชนจับสัตว์น้ำด้วย เครื่องมือที่อยู่ในลักษณะเร่งการทำลาย สัตว์น้ำ หรือเครื่องมืออันตราย	
3.7 การใช้ ประโยชน์ที่ดิน	ควบคุมพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในขอบเขตที่ กำหนดไว้ และวางแผนรูปแบบการใช้ ที่ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด โดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด	●	การก่อสร้างดำเนินการในขอบเขตพื้นที่ โครงการเท่านั้นและมีการตรวจสอบสภาพการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน รายงานผลตาม แผนการ พัฒนาและป้องกันการเสื่อมโทรมของ คุณภาพดิน	 ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง
3.8 การใช้ ประโยชน์จาก ป่า	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
3.9 การใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรณี	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
3.10 โรงงาน อุตสาหกรรม	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
3.11 <u>พลังงาน และไฟฟ้า</u>	จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการ ก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมที่มีการใช้ ไฟฟ้าได้ในกรณีที่เกิดปัญหากระแสไฟฟ้า ตกหรือดับ	●	กรมชลประทานได้มีการเตรียมเครื่องปั่นไฟ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ใน กรณีที่เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ และในกรณีที่ประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก หรือดับ และมีความเร่งด่วนในการก่อสร้าง จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ประทับช้างให้ แก้ไขในทันที	 เครื่องปั่นไฟ
3.12 <u>การ คมนาคมขนส่ง</u>	1) ควบคุมการจราจรโดยใช้ป้าย จราจรและเครื่องหมายจราจรอย่าง ชัดเจน	●	1) กรมชลประทานมีการติดตั้งป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจรอย่างชัดเจน รวมถึง ป้ายควบคุมความเร็ว และป้ายเตือนตั้งแต่ ทางเข้าโครงการ	 ป้ายเตือนทางเข้าโครงการ



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
3.12 การ คมนาคมขนส่ง (ต่อ)	2) จัดทำป้ายแสดงแผนการก่อสร้าง กำหนดระยะเวลา และตำแหน่งที่ ก่อสร้างให้ชัดเจน	●	2) กรมชลประทานได้จัดทำป้ายแสดง แผนการก่อสร้าง กำหนดระยะเวลา และ ตำแหน่งที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	 ป้ายแสดงแผนการก่อสร้าง
	3) ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้ เพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน เวลากลางคืน	●	3) กรมชลประทานมีการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในเวลากลางคืน	 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่โครงการ
	4) การปรับปรุงและก่อสร้างถนนทดแทน ในพื้นที่ห้วงงาน จะต้องก่อสร้างทางเบียง เพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้	●	4) กรมชลประทานใช้ถนนเดิมในพื้นที่ สำหรับการคมนาคมขนส่ง โดยได้มีการ ปรับปรุงบดอัดถนนเดิมเพื่อให้ชาวบ้าน สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
3.12 การ คมนาคมขนส่ง (ต่อ)	5) ควบคุมความเร็วและน้ำหนักบรรทุก ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ความเร็ว ไม่เกิน 30 กม./ชม. ในบริเวณที่เป็น ชุมชน และความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ในพื้นที่ไกลจากชุมชน	●	5) กรมชลประทานกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ ขับรถขนส่งวัสดุผ่านชุมชนในความเร็วที่ ควบคุมไม่เกิน 30 กม./ชม. และไม่เกิน 80 กม./ชม ในพื้นที่ทั่วไป	 ป้ายควบคุมความเร็ว
	6) ฉีดพรมน้ำบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น ละอองฟุ้งกระจายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	●	6) กรมชลประทานดำเนินการฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าออก พื้นที่ วันละ 2-3 ครั้ง หรือเมื่อสังเกตพบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองเกิดขึ้นและอาจกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม	 รถฉีดพรมน้ำ



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
3.13 การ จัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และ ขยะมูลฝอย	จัดสร้างห้องส้วม (ระบบบ่อเกรอะ บ่อ ซึม) ที่ถูกสุขลักษณะและจัดเตรียม ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดอย่าง มิดชิด ให้กระจายตามบริเวณต่างๆ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประสาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้ามาจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป	●	กรมชลประทานมีการจัดสร้างห้องน้ำ บริเวณสำนักงานโครงการและจัดเตรียม ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดอย่าง มิดชิดกระจายตามบริเวณต่างๆ พร้อมทั้ง ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่เข้ามาจัดเก็บและนำไปกำจัด	 จัดสร้างห้องน้ำบริเวณสำนักงานโครงการ
3.14 การ จัดการลุ่มน้ำ	1) ใช้พื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด	●	1) กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น	
	2) การตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ได้ตัด เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น	●	2) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวกรมชลประทาน ตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ได้ตัดเฉพาะที่จำเป็น เท่านั้น	
	3) หลีกเลี่ยงการตั้งที่พักคนงานและลาน จอดรถ ที่เก็บอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง นอกพื้นที่ก่อสร้าง	●	3) อาคารสำนักงาน และที่จัดวางวัสดุ อุปกรณ์ถูกจัดวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เท่านั้น และกรมชลประทานได้จ้างแรงงาน ท้องถิ่น ซึ่งมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง จึงไม่มีการก่อสร้างที่พักคนงานในระยะ 50 เมตรจากแหล่งน้ำ	 ที่เก็บอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างในพื้นที่



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำไฟฟ้าประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
3.14 การ จัดการลุ่มน้ำ (ต่อ)	4) ทำบ่อดักตะกอนหรือคันดิน เพื่อ ป้องกันไม่ให้เศษวัสดุ ดิน หิน และ ตะกอนจากกิจกรรมก่อสร้างถูกชะล้างลง สู่ลำน้ำ	●	4) มีการทำบ่อดักตะกอนหรือคันดิน เพื่อ ป้องกันไม่ให้เศษวัสดุ ดิน หิน และตะกอน จากกิจกรรมก่อสร้างถูกชะล้างสู่ลำน้ำ	
	5) ภายหลังจากใช้พื้นที่ ต้องทำการปรับ สภาพพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน	○	5) ภายหลังจากใช้พื้นที่ กรมชลประทาน ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และปลูกพืช คลุมดินในที่สุดท้ายของระยะก่อสร้าง	
3.15 การใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์และ ปฏิสัมพันธ์กับ นิเวศของพื้นที่	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 เศรษฐกิจ และสังคม	1) จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับ ผลกระทบและดำเนินการจ่ายค่าชดเชย ที่ดินและทรัพย์สินให้แล้วเสร็จก่อนการ ก่อสร้าง	●	1) กรมชลประทานมีการประชุมสร้างความ เข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ และดำเนินการ จ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินแล้วเสร็จ	 การประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุนบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.1 เศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	2) จัดทำป้ายแสดงแผนการก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาและตำแหน่งสถานที่ ก่อสร้าง	●	2) กรมชลประทานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงแผนการก่อสร้างโครงการ กำหนด ระยะเวลา และแสดงป้ายไว้ในตำแหน่งพื้นที่ ก่อสร้างที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 ป้ายแผนการก่อสร้างโครงการ
	3) จัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดปัญหา ด้านสังคมและเป็นการสร้างรายได้ให้กับ ราษฎรในชุมชน	●	3) กรมชลประทานมีการจัดจ้างแรงงานใน ท้องถิ่น และนอกพื้นที่เพื่อลดปัญหาด้าน สังคมและเป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎร ในชุมชน	
	4) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างที่สร้าง ความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน เช่น ฉีด พรมน้ำบนถนนวันละ 2 ครั้ง ควบคุม ความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านชุมชน เป็นต้น	●	4) กรมชลประทานดำเนินการฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าออก พื้นที่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ขับรถควบคุมความเร็ว ของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านชุมชน	 การฉีดพรมน้ำบนถนน



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.1 เศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	5) ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง และ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้กับ ชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	●	5) กรมชลประทานมีแผนประชาสัมพันธ์ โครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการชี้แจงความก้าวหน้าของการ ดำเนินการให้กับชุมชนและที่ประชาชน สนใจรับทราบอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดัง หัวข้อที่ 5.1.1 แผนงานเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจด้านการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม หน้าที่ 5-3	
4.2 สุขภาพ อนามัยและการ บริการ สาธารณสุข	4.2.1 การศึกษาสิ่งคุกคามทางเคมี ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
	4.2.2 การศึกษาสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 1) กรมชลประทานประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้ดำเนินการ ดังนี้ - ตรวจสอบประวัติและตรวจสุขภาพ คนงานก่อนรับเข้าทำงาน - จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ถูกสุขลักษณะ	●	1) กรมชลประทานร่วมกับกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ และในปี 2569 ได้ดำเนินงานตามแผนป้องกัน และติดตามการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มีน้ำและ อาหารเป็นสื่อ รายละเอียดตามหัวข้อที่ 5.1.2 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวัง โรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ หน้าที่ 5-6	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพ อนามัยและการ บริการ สาธารณสุข (ต่อ)	2) กรมชลประทานประสานหน่วยงาน ด้านสุขภาพ ได้แก่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร ดำเนินการดังนี้ - จัดทำแผนป้องกันและติดตามการเฝ้า ระวังโรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ - จัดทำแผนป้องกันและติดตามการเฝ้า ระวังพาหะและโรคติดต่อนำโดยแมลง - จัดอบรมและให้ความรู้ด้านพฤติกรรม เสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจาย และติดเชื้อมโรคแก่คนงานก่อสร้าง	●	2) กรมชลประทานร่วมกับสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 3 ดำเนินการตามแผนป้องกัน และติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อ นำโดยแมลง โดยในปี 2569 มีการสำรวจยุงตัว เต็มวัยทั้งกลางวันและกลางคืน และวางกับดัก ไยยุง รายละเอียดตามหัวข้อที่ 5.1.3 แผน ป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและ โรคติดต่อนำโดยแมลง หน้าที่ 5-8	 กิจกรรมสำรวจยุงตัวเต็มวัยช่วงกลางวัน
	4.2.3 การศึกษาสังคม กรมชลประทานต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินงาน ก่อสร้างดำเนินการ ดังนี้ - จ้างแรงงานในท้องถิ่น - ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน การรักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อยของชุมชน - ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ	●	กรมชลประทานมีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเป็น ลำดับแรก ก่อนจะพิจารณากลุ่มแรงงานอื่น กรณี ที่มีความจำเป็นจัดจ้างแรงงานเพื่อการก่อสร้าง โครงการนอกเหนือจากแรงงานที่จำเป็นต้องใช้ ความสามารถเฉพาะทางหรือวิชาชีพเฉพาะทาง และร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการ รักษาความปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ โครงการและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ชุมชนต่อโครงการ	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพ อนามัยและการ บริการ สาธารณสุข (ต่อ)	4.2.4 การศึกษาสิ่งคุกคามทางกายศาสตร์ กรมชลประทานต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินงาน ก่อสร้าง มีการดำเนินงาน ดังนี้ - ให้ความรู้ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประจำอยู่ ในพื้นที่ก่อสร้าง และประสานกับสถาน พยาบาลใกล้เคียงเพื่อส่งต่อในกรณีเกิด อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน - ให้ความรู้ และรณรงค์ให้มีการทำงานด้วย ท่าทางที่เหมาะสม และตรวจตราความ ปลอดภัยในการทำงาน	●	กรมชลประทานมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน และมีการตรวจตราความปลอดภัย ในการทำงาน และจัดหาอุปกรณ์ในการปฐม พยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะ ประสานกับโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้างทันที	 การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
	4.2.5 การศึกษาสิ่งคุกคามทางสุขภาพจิต กรมชลประทานจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและลด ความกังวลใจให้กับประชาชนรวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ การพัฒนาโครงการ	●	กรมชลประทานมีการจัดประชาสัมพันธ์ โครงการในปี พ.ศ. 2564 ถึงปีพ.ศ. 2569 เพื่อ สร้างความเข้าใจและลดความกังวลใจให้กับ ประชาชน ตามหัวข้อที่ 5.1.1 แผนงาน เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 5-3	 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการ



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพ อนามัยและการ บริการ สาธารณสุข (ต่อ)	4.2.6 การศึกษาด้านสุขภาพอนามัย ทั่วไปของประชาชน 1) กรมชลประทานต้องกำหนดให้ผู้ ดำเนินงานก่อสร้าง มีการดำเนินการ ดังนี้ - ตรวจสอบประวัติและตรวจสุขภาพคนงาน ก่อนรับเข้าทำงาน - สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ อาหาร น้ำ และมีสุขนิสัยที่ดีในการใช้ส้วม และการกำจัดสิ่งปฏิกูล และการปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ และการกักเก็บน้ำ สำรองไว้ใช้ - จัดอบรมและให้ความรู้ด้านพฤติกรรม เสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจาย และติดเชื้อมโรคแก่คนงานก่อสร้าง	●	1) กรมชลประทานร่วมกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรดำเนินการตามแผน ป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ในปี 2569 ได้ดำเนินงานโดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการถ่ายทอดความรู้ ผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างประตุน้ำให้กับคนงาน ก่อสร้างและประชาชนบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดตามหัวข้อที่ 5.1.4 แผนป้องกัน และติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม หน้าที่ 5-11	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม การประชุม



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพ <u>อนามัยและการ</u> <u>บริการ</u> <u>สาธารณสุข (ต่อ)</u>	2) กรมชลประทานประสานหน่วยงาน ด้านสุขภาพ ได้แก่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร ดำเนินการดังนี้ - จัดทำแผนป้องกันและติดตามการเฝ้า ระวังโรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ - จัดทำแผนป้องกันและติดตามการเฝ้า ระวังพาหะและโรคติดต่อนำโดยแมลง	●	2) กรมชลประทานร่วมกับกองโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 โดยในปี 2569 มีการศึกษาการติดต่อของโรคใน อุจจาระของประชาชนในพื้นที่โครงการ และ สำรวจยุงตัวเต็มวัยทั้งกลางวันและกลางคืน และสำรวจลูกน้ำยุงลาย รายละเอียดตาม หัวข้อที่ 5.1.2 แผนป้องกันและติดตามการ เฝ้าระวังโรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ หน้าที่ 5-6 และ หัวข้อที่ 5.1.3 แผนป้องกัน และติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อ นำโดยแมลง หน้าที่ 5-8	 กิจกรรมจับยุง ตามแผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะ และโรคติดต่อนำโดยแมลง
	4.2.7 การศึกษาด้านภาวะโภชนาการ 1) กรมชลประทานดำเนินการ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน ได้รับทราบ เพื่อลดความวิตกกังวล	●	1) กรมชลประทานมีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อลดความวิตกกังวล ตามหัวข้อที่ 5.1.1 แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความ เข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 5-3	 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพ อนามัยและการ บริการ สาธารณสุข (ต่อ)	2) กรมชลประทานประสานหน่วยงานด้าน สุขภาพ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร จัดทำแผนงานเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	●	2) กรมชลประทานร่วมกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรดำเนินการในปี 2569 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการ ถ่ายทอดความรู้การป้องกันผลกระทบต่อ สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับ ประโยชน์ รายละเอียดตามหัวข้อที่ 5.1.4 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 5-11 ตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2564	 เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
	4.2.8 การศึกษาด้านการบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข กรมชลประทานต้องกำหนดให้ผู้ ดำเนินงานก่อสร้าง มีการดำเนินการ ดังนี้ - คัดกรองสุขภาพแรงงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน - จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ - รณรงค์ให้แรงงานใช้อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคล - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมให้แก่ คนงานก่อสร้าง	●	กรมชลประทานมีการคัดกรองสุขภาพ แรงงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีการก่อสร้างที่ พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ คนงานและ ผู้ควบคุมงานมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคล และจัดหาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เบื้องต้น	 ตู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประทุษระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพ <u>อนามัยและการ</u> <u>บริการ</u> <u>สาธารณสุข (ต่อ)</u>	4.2.9 การศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1) กรมชลประทานต้องควบคุมให้ผู้ ดำเนินงานก่อสร้าง มีการจัดการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัยให้ถูก สุขลักษณะมีระบบจัดการของเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูล การสร้างห้องส้วมที่ถูก สุขลักษณะและเพียงพอ (1 ห้องต่อคนงาน 15 คน)	●	1) ปัจจุบันพื้นที่ก่อสร้างห้วงงานได้ก่อสร้างที่ ห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ และมีระบบจัดการ ของเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูล การสร้างห้องส้วม ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ	 การจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
	2) กรมชลประทานประสานให้หน่วยงาน ด้านสุขภาพ เช่น สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล จัดบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมให้แก่ คนงาน รวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการ อุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียง	●	2) กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดหา น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่าง เพียงพอให้แก่คนงาน	 การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค
	3) กรมชลประทานประสานหน่วยงาน ด้านสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร จัดทำแผนป้องกันและ ติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	●	3) กรมชลประทานประสานให้ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดทำแผนป้องกัน และติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังหัวข้อที่ 5.1.4 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 5-11	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตุน้ำไฟฟ้าประตุน้ำช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.2 <u>สุขภาพ</u> <u>อนามัยและการ</u> <u>บริการ</u> <u>สาธารณสุข (ต่อ)</u>	4.2.10 การศึกษาด้านประชากรศาสตร์ กรมชลประทานต้องควบคุมให้ผู้ ดำเนินงานก่อสร้างทำการจ้างแรงงาน ท้องถิ่น เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงด้าน โครงสร้างประชากร และโรคที่เกี่ยวข้อง กับการย้ายถิ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ เพียงพอของการบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขให้แก่คนงาน	●	กรมชลประทานมีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง ประชากร และโรคที่เกี่ยวข้องกับการย้าย ถิ่น	
4.3 <u>การท่องเที่ยว</u> <u>กีฬา แหล่ง</u> <u>นันทนาการ และ</u> <u>สุนทรียภาพ</u>	ทำการฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัว งานและอาคารประกอบ และก่อสร้างให้ กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและความเป็น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น	○	กรมชลประทานจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหัวงานและอาคารประกอบในปี 2570 ตามแผนการฟื้นฟูและจัดภูมิทัศน์บริเวณหัว งานประตุน้ำไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว	
4.4 <u>แหล่ง</u> <u>โบราณสถาน</u> <u>แหล่งโบราณคดี</u> <u>และประวัติศาสตร์</u>	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการ ไม่มีโบราณสถาน	
4.5 <u>การชดเชย</u> <u>ที่ดินและ</u> <u>ทรัพย์สิน</u>	ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ราษฎรที่สูญเสีย ที่ดินและทรัพย์สินได้รับทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจ่ายค่าชดเชยในราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้	●	กรมชลประทานมีการประชาสัมพันธ์ โครงการ ให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับโครงการอย่างต่อเนื่องและมีการ จ่ายค่าชดเชยที่ดิน และทรัพย์สินในราคา ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้วเสร็จ โดยจ่าย	



ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตูลำน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	ผลการ ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ภาพประกอบ/ เอกสารอ้างอิง
4.5 การชดเชย ที่ดินและ ทรัพย์สิน (ต่อ)	- กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ จัดตั้ง คณะกรรมการ 3 ชุด เพื่อกำหนดอัตราค่า ทดแทนทรัพย์สิน ได้แก่ (1) คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทน ทรัพย์สิน (2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (3) คณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทน ทรัพย์สิน - กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ มีกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 อนุมัติให้กรม ชลประทานจ่ายค่าร้อยละที่ดินไม่มีเอกสาร สิทธิ มีคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทน ทรัพย์สินเพื่อการชดเชยที่ดินที่ถูกจัดขึ้นเป็น ทางการเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทน ทรัพย์สินและบุคคลที่จะได้รับค่าทดแทน		ค่าชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ดินถูกเขต ชลประทาน จำนวน 23 แปลง โดยเป็น ที่ดินมีเอกสารสิทธิ จำนวน 10 แปลงจ่าย ค่าชดเชยไปแล้วทั้งหมด และที่ดินที่ไม่มี เอกสารสิทธิ จำนวน 13 แปลง โดยจ่ายค่า ทดแทนเรียบร้อยแล้ว	
