

ชื่อโครงการ	โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 29/2539 (ประทานบัตรที่ 28617/15780)
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 6 ตำบลพุกแค อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ	175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้นที่ 8/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : (036) 240 700 ต่อ 130, 132
จัดทำโดย	บริษัท เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาก สผ. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/8873

โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย

คือรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 นำส่งให้กับหน่วยงานอนุญาตของ
โครงการฯ ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2569 ตามเอกสารเลขที่ รง. 012-2/69

รายละเอียดโครงการ ดังนี้



1.1 ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ ต่อสำนักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดสระบุรี และได้รับการจดทะเบียนเป็นคำขอประทานบัตรที่ 29/2539 (ประทานบัตร ที่ 28617/15780) หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 28617 มีเนื้อที่ 288-0-71 ไร่ โดยประทานบัตรมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และสิ้นอายุวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2575 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ วว 0804/8873 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 และกำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทุก 6 เดือน

ดังนั้นเพื่อตระหนักถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จึงมอบหมายให้ บริษัท เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-236 และได้รับรองมาตรฐานสากล มอก. 17025 : 2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานดังกล่าว และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรายงานฉบับล่าสุดที่ดำเนินการจัดส่งคือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)

1.2 ที่ตั้งโครงการ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลพุกแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7017 ระวาง 5138II ระหว่างเส้นกริดในแนวตั้ง 708000E-710000E (ตะวันออก) และเส้นกริดในแนวนอน 1623000N-1624000N (เหนือ) อยู่ในเขตที่ดินนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ทั้งหมด 288 ไร่ 71 ตารางวา พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบแสดงดังรูปที่ 1.2-1 โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้

ทิศเหนือของโครงการ	ติดกับ ที่ราบเชิงเขา และมีการปลูกพืชไร่
ทิศตะวันออกของโครงการ	ติดกับ ที่ราบเชิงเขา
ทิศตะวันตกของโครงการ	ติดกับ แนวเขาและที่ราบเชิงเขา
ทิศใต้ของโครงการ	ติดกับ แนวเขาและที่ราบเชิงเขา มีการประกอบกิจการบ่อลูกรัง

รูปที่ 1.2-1 แสดงที่ตั้งโครงการ

ที่มา : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1.3.1 ลักษณะโครงการ

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ ต่อสำนักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดสระบุรี และได้รับการจดทะเบียนเป็นคำขอประทานบัตรที่ 29/2539 (ประทานบัตรที่ 28617/15780) หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 28617 มีเนื้อที่ 288-0-71 ไร่ โดยประทานบัตรมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และสิ้นอายุวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2575

1.3.2 การทำเหมือง

การทำเหมืองแปลงนี้ มีแผนการทำเหมือง (ดังรูปที่ 1.3-1) และขั้นตอนการผลิต สรุปได้ดังนี้

การทำเหมืองแร่ : จะทำการเปิดหน้าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ จากบริเวณยอดของเนินเขาลงสู่พื้นที่ตอนล่าง (Open Cut) ในลักษณะขั้นบันได (Benching Method) เมื่อทำเหมืองจนเป็นที่ราบแล้ว จึงทำเหมืองต่อในลักษณะบ่อเหมือง (Open Pit) ลึก 5 เมตร โดยจะทำเหมืองเฉพาะในส่วนของหิน Shale และ Chert

ขั้นตอนการผลิต : เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของหินมีการแตกหักสูงมาก จึงทำให้ขั้นตอนการผลิตหินดินดานแบบง่าย ๆ โดยใช้รถแบ็คโฮขุดตักกลอกหน้าดินออก และใช้รถสิบล้อขนย้ายไปทิ้งในบริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน จากนั้นใช้รถแบ็คโฮขุดตักหินดินดานเช่นเดิม และใช้รถสิบล้อขนไปในส่วนสต็อกแร่ในบริเวณโรงงานได้เลย ขนาดของหินที่ขุดตักสามารถใช้ในกระบวนการผลิตปูนได้ ส่วนคุณภาพของหินสามารถนำไปผสมกับ Clay เพื่อเป็น Clay mix ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้ทันที ในขั้นตอนการผลิตหินดินดานไม่มีการใช้วัตถุระเบิดแต่ประการใด

การแต่งแร่ : ขนาดและคุณภาพของหินดินดานสามารถนำไปยังโรงงานและเข้าสู่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องแต่งแร่

1.3.3 กำลังการผลิตและผลิตภัณฑ์

อัตราการผลิตแร่หินดินดานของโครงการมีประมาณ 13,714 ตัน/เดือน หรือวันละประมาณ 457.13 ตัน ระยะเวลาการทำเหมืองตามอายุประทานบัตร เท่ากับ 25 ปี

ตารางที่ 1.3-1 กำลังการผลิตแร่หินดินดานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

อันดับ	เดือน	ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ (ตัน/เดือน)
1.	มกราคม	12,954
2.	กุมภาพันธ์	14,730
3.	มีนาคม	12,158
4.	เมษายน	15,032
5.	พฤษภาคม	8,332
6.	มิถุนายน	19,079
รวม		82,285
เฉลี่ย		13,714

ที่มา : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ; เดือนมิถุนายน 2569

1.3.4 เส้นทางคมนาคมขนส่ง

แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมือง ถูกลำเลียงไปยังโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของโครงการ โดยใช้ถนนลาดยางสายหนองหัว-หนองจาน ซอย 8 ด้านทิศตะวันออก ขนส่งไปทางทิศใต้แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยางสายพุแค – แก่งคอย จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลขที่ 1 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3034 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดยางไปจนถึงโรงงานผลิตปูนซีเมนต์


1.3.5 สิ่งก่อสร้างภายในโครงการ

ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2569) ทางโครงการยังไม่มีมีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 29/2539 (ประทานบัตรที่ 28617/15780) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

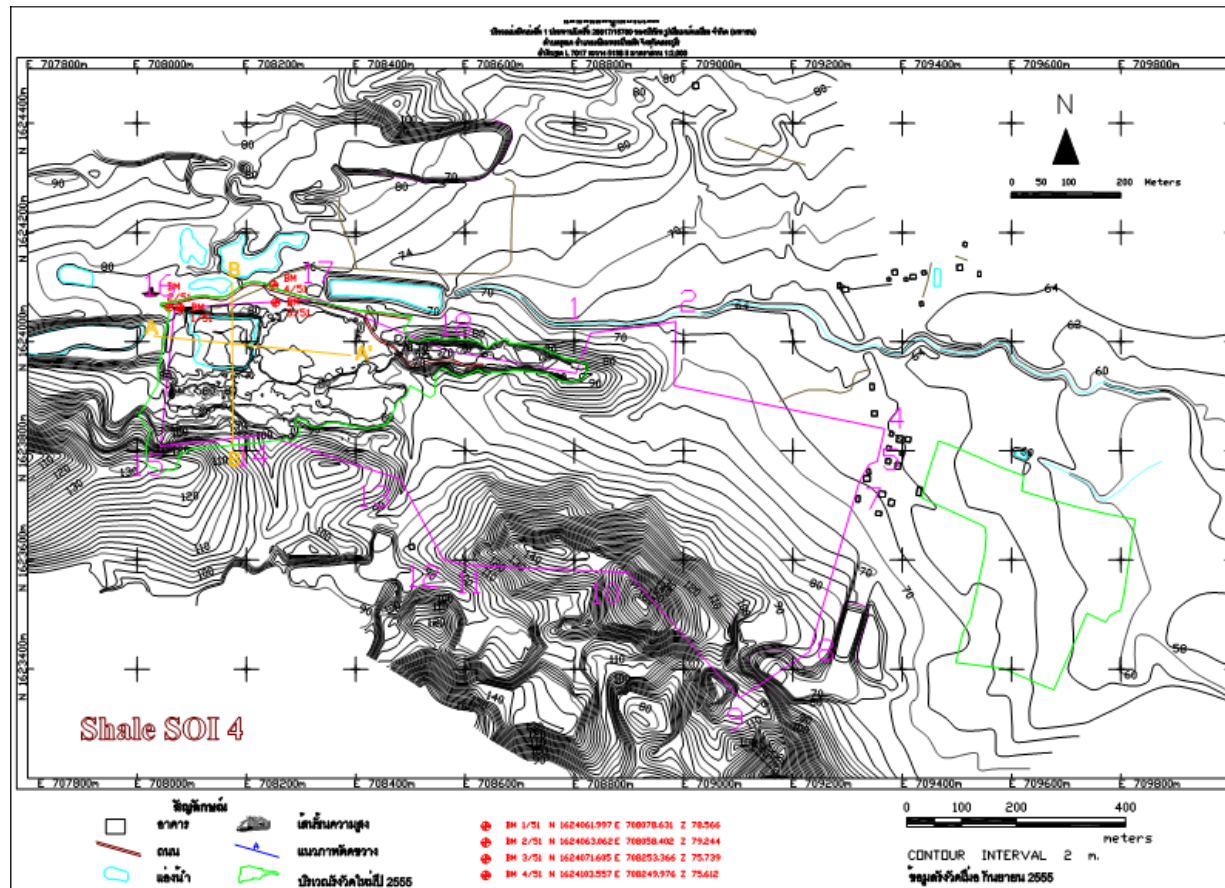

รูปที่ 1.3-1 แผนการทำเหมืองของโครงการ

ที่มา : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

1.4 สรุปการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ

การดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการเหมืองแร่หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 29/2539 (ประทานบัตรที่ 28617/15780) เทียบกับรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/8873 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 แสดงดังตารางที่ 1.4-1

ตารางที่ 1.4-1 สรุปการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ

รายละเอียด	EIA	ปัจจุบัน (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)
1. ลักษณะโครงการ	วิธีเหมืองหาบแบบชันบันได	วิธีเหมืองหาบแบบชันบันได
2. พื้นที่ทำเหมือง	288-0-71 ไร่	288-0-71 ไร่
3. ผลิตภัณฑ์	แร่หินดินดาน	แร่หินดินดาน
4. กำลังการผลิต	ประมาณ 100,000 ตัน/ปี หรือ วันละประมาณ 333 ตัน	ประมาณ 13,714 ตัน/เดือน หรือวันละ ประมาณ 457.13 ตัน

ที่มา : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ; เดือนมิถุนายน 2569

1.5 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.5-1 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 29/2539 (ประทานบัตรที่ 28617/15780) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด (พ.ศ. 2569)											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - วัดประสิทธิภาพ - วัดบ่อไครก - บ้านหนองตาปอ - วัดศรีวัง	- TSP - TSP, WS & WD - TSP - TSP	2 ครั้ง/ปี						●				○		
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป - วัดประสิทธิภาพ - วัดบ่อไครก - บ้านหนองตาปอ - วัดศรีวัง	- Leq 24 hr - Lmax - L90	2 ครั้ง/ปี						●				○		
3. คุณภาพน้ำผิวดิน - ห้วยหนองตาปอ	- pH - SS - DS - Total Hardness - Turbidity - Total Iron - Sulfate	2 ครั้ง/ปี						●				○		

หมายเหตุ ● : ดำเนินงานตามแผนตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่กำหนด

○ : แผนตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.5-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
คำขอประทานบัตรที่ 29/2539 (ประทานบัตรที่ 28617/15780) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด (พ.ศ. 2569)											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4. คุณภาพน้ำใต้ดิน - น้ำบาดาลบ้านหนองจาน - น้ำประปาบาดาลบ้านหนองตาปอ - น้ำบ่อต้นบ้านบ่อไทรก - น้ำบาดาลบ้านวังเลน	- pH - SS - DS - Total Hardness - Turbidity - Total Iron - Sulfate	2 ครั้ง/ปี						● ● ● ●				○ ○ ○ ○		

หมายเหตุ ● : ดำเนินงานตามแผนตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่กำหนด
 ○ : แผนตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
