

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ทิศทางและความเร็วลม

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ใน 2 บริเวณ ได้แก่ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก และวัดหนองแพบทักษิณาราม โดยตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัดในระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569 พร้อมการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออกซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงาน พบว่า ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาตรวจวัดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5-2.8 เมตรต่อวินาที และลมสงบคิดเป็นร้อยละ 0.00 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1-1 และภาคผนวก ง

บริเวณวัดหนองแพบทักษิณาราม พบว่า ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาตรวจวัดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0-3.0 เมตรต่อวินาที และลมสงบคิดเป็นร้อยละ 28.57 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1-2 และภาคผนวก ง

ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี


ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคोट จำกัด

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569

สถานีตรวจวัด บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (0731226E, 1403053N)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.5-1 m/s	1-2 m/s	2-3 m/s	3-4 m/s	4-6 m/s	More than 6 m/s	Total
N	0.0000	0.0060	0.0179	0.0000	0.0000	0.0000	0.0238
NNE	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0238
NE	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0238
ENE	0.0179	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0179
E	0.0417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0417
ESE	0.0060	0.0119	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0238
SE	0.0000	0.0298	0.0179	0.0000	0.0000	0.0000	0.0476
SSE	0.0000	0.0833	0.0655	0.0000	0.0000	0.0000	0.1488
S	0.0000	0.1012	0.1548	0.0000	0.0000	0.0000	0.2560
SSW	0.0000	0.1310	0.0595	0.0000	0.0000	0.0000	0.1905
SW	0.0000	0.0357	0.0893	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250
WSW	0.0000	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0119
W	0.0000	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0119
WNW	0.0000	0.0179	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0179
NW	0.0000	0.0179	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0179
NNW	0.0000	0.0119	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0179
CALM	0.0000						

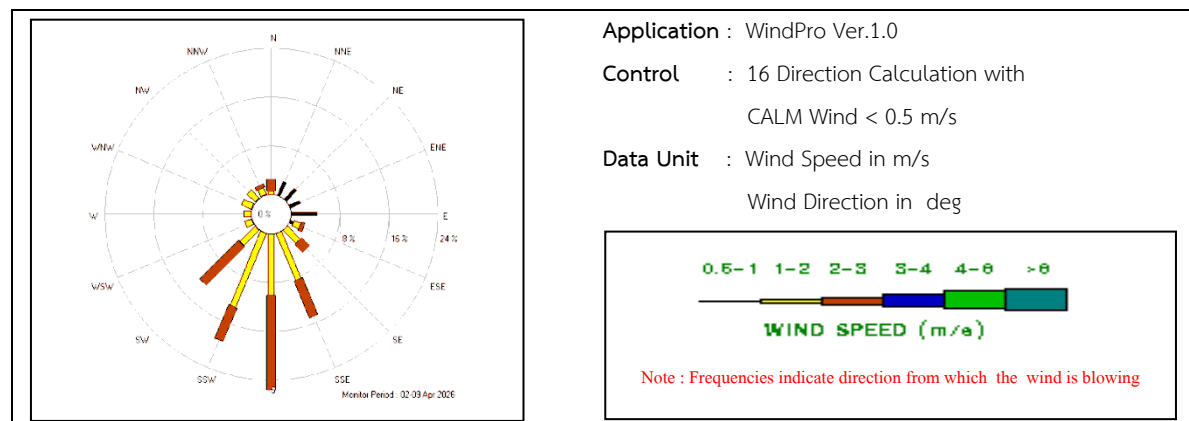

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้บันทึก : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคोट จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชาวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

สรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้

ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาตรวจวัดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5-2.8 เมตรต่อวินาที

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอก จำกัด

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569

สถานีตรวจวัด บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (0731226E, 1403053N)

เวลา	2-3 เมษายน 2569		3-4 เมษายน 2569		4-5 เมษายน 2569		5-6 เมษายน 2569	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
09:00 - 10:00	1.3	SW	1.3	WSW	1.2	SSW	2.0	S
10:00 - 11:00	0.5	NNE	2.0	N	2.3	SSW	2.2	S
11:00 - 12:00	1.3	SW	1.7	NW	2.5	SSW	2.4	S
12:00 - 13:00	0.8	ENE	1.1	S	2.4	S	2.3	S
13:00 - 14:00	0.6	ENE	0.8	ESE	2.5	S	2.3	S
14:00 - 15:00	0.7	E	1.2	SSE	2.4	S	2.3	S
15:00 - 16:00	0.8	E	1.2	S	2.3	S	2.1	S
16:00 - 17:00	1.0	SE	1.0	SSE	1.9	S	2.1	S
17:00 - 18:00	1.0	SE	1.3	SSW	2.0	S	2.0	SSE
18:00 - 19:00	2.0	N	1.7	NW	2.1	SSE	1.8	SE
19:00 - 20:00	0.6	NE	0.5	NNE	2.2	SSE	2.1	SSE
20:00 - 21:00	1.1	SE	1.4	WSW	2.2	SSE	2.1	SSE
21:00 - 22:00	1.5	W	1.3	SW	2.0	SSE	2.1	SSE
22:00 - 23:00	0.6	E	1.0	SE	1.7	SSW	1.9	SSE
23:00 - 24:00	0.6	E	0.5	NE	2.0	SSW	1.9	SSE
00:00 - 01:00	1.7	WNW	1.6	WNW	1.9	SSW	2.1	SSE
01:00 - 02:00	1.6	W	0.5	NNE	1.8	SSW	2.0	S
02:00 - 03:00	0.6	E	2.0	NNW	1.9	SSW	2.0	S
03:00 - 04:00	0.5	NNE	0.8	ENE	1.8	SW	2.0	SSW
04:00 - 05:00	0.8	E	1.8	NNW	1.7	SSW	1.9	SSW
05:00 - 06:00	1.9	N	0.7	E	1.9	SSW	2.0	SSW
06:00 - 07:00	0.5	NE	1.8	NW	1.6	SSW	2.1	SSW
07:00 - 08:00	0.7	NE	1.8	NNW	1.9	S	2.1	SW
08:00 - 09:00	1.5	WNW	2.0	N	1.9	S	2.0	SW
Wind Rose								

หมายเหตุ : ความเร็วและทิศทางลมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างช่วงเวลา 09:00-09:00 น.

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้บันทึก : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอก จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดโชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)




โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอป จำกัด

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569

สถานีตรวจวัด บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (0731226E, 1403053N)

เวลา	6-7 เมษายน 2569		7-8 เมษายน 2569		8-9 เมษายน 2569	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
09:00 - 10:00	2.3	SW	2.8	SW	2.0	S
10:00 - 11:00	2.6	SW	2.5	SW	2.2	S
11:00 - 12:00	2.4	S	2.6	SW	2.3	S
12:00 - 13:00	2.3	S	2.4	SW	2.3	S
13:00 - 14:00	2.3	S	2.4	SSW	2.4	S
14:00 - 15:00	2.2	S	2.1	S	2.1	SSW
15:00 - 16:00	2.1	SSW	2.1	SSW	2.3	S
16:00 - 17:00	2.1	SSE	1.9	SSW	1.8	S
17:00 - 18:00	2.2	SE	2.0	SE	1.6	SSW
18:00 - 19:00	2.3	ESE	1.8	ESE	1.6	SSE
19:00 - 20:00	2.3	SE	1.9	ESE	1.9	SSE
20:00 - 21:00	1.9	SSE	1.6	SSE	1.6	S
21:00 - 22:00	2.0	SSE	1.8	SSE	1.7	SSE
22:00 - 23:00	1.9	S	1.7	SSE	1.5	S
23:00 - 24:00	1.9	S	1.6	SSE	1.6	SSE
00:00 - 01:00	1.8	SSW	1.6	SSE	1.6	S
01:00 - 02:00	1.9	SSW	1.6	SSW	1.6	SSW
02:00 - 03:00	2.0	SW	1.5	SSW	1.6	SSW
03:00 - 04:00	2.0	SW	1.6	SSW	1.8	SSW
04:00 - 05:00	2.0	SW	1.7	SSW	1.9	S
05:00 - 06:00	2.1	SW	1.6	S	1.6	S
06:00 - 07:00	2.4	SW	1.7	SW	1.6	S
07:00 - 08:00	2.7	SW	1.8	SW	1.8	S
08:00 - 09:00	2.8	SW	1.8	SSW	1.9	S
Wind Rose						

หมายเหตุ : ความเร็วและทิศทางลมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างช่วงเวลา 09:00-09:00 น.

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้บันทึก : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอป จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.1-2 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose บริเวณวัดหนองแพปลักขนิมาราม

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี


ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคोट จำกัด

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569

สถานีตรวจวัด บริเวณวัดหนองแพปลักขนิมาราม (0729815E, 1403300N)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.5-1 m/s	1-2 m/s	2-3 m/s	3-4 m/s	4-6 m/s	More than 6 m/s	Total
N	0.0000	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0119
NNE	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060
NE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ENE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	0.0119	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0238
ESE	0.0119	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0179
SE	0.0000	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060
SSE	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060
S	0.0357	0.1071	0.0476	0.0000	0.0000	0.0000	0.1905
SSW	0.0298	0.0179	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0476
SW	0.0417	0.0357	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	0.1012
WSW	0.0238	0.0476	0.0417	0.0060	0.0000	0.0000	0.1190
W	0.0000	0.0000	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060
WNW	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060
NW	0.0476	0.0476	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0952
NNW	0.0238	0.0536	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0774
CALM	0.2857						

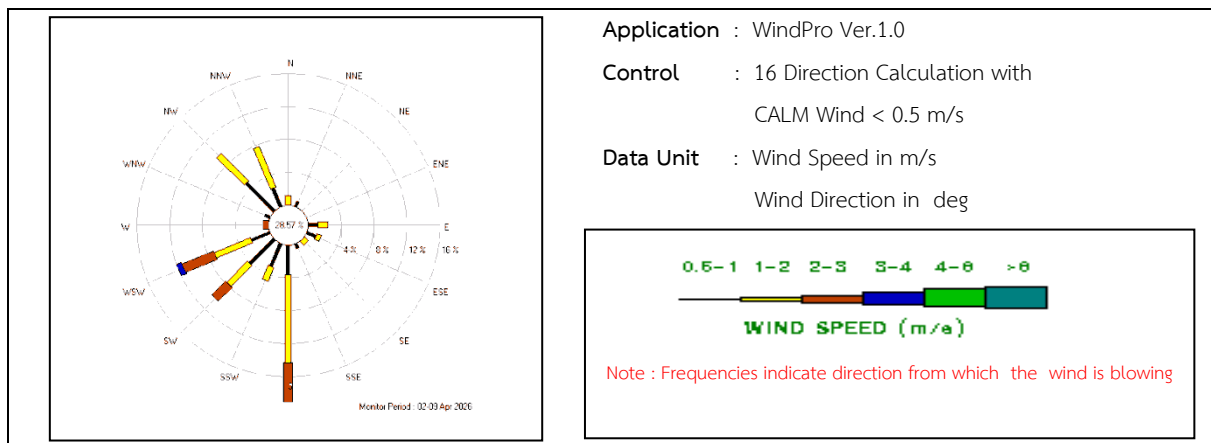

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิวนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้บันทึก : นายศิวนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคोट จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

สรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้

ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาตรวจวัดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0-3.0 เมตรต่อวินาที

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ)





โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569

สถานีตรวจวัด บริเวณวัดหนองแพทักษิณาราม (0729815E, 1403300N)

เวลา	2-3 เมษายน 2569		3-4 เมษายน 2569		4-5 เมษายน 2569		5-6 เมษายน 2569	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
11:00 - 12:00	1.2	E	1.5	WSW	1.8	WSW	2.2	SW
12:00 - 13:00	0.8	ESE	1.3	WSW	1.4	WSW	1.8	SW
13:00 - 14:00	0.8	NNE	1.1	SW	1.3	WSW	1.5	SSW
14:00 - 15:00	0.7	ESE	0.8	SW	0.9	WSW	1.4	SSW
15:00 - 16:00	1.3	E	0.6	NNW	0.6	SSW	0.7	SSW
16:00 - 17:00	1.4	ESE	1.7	NW	0.2	SW	0.3	SSW
17:00 - 18:00	0.3	SW	1.6	NW	0.3	WSW	0.1	SSW
18:00 - 19:00	0.3	WSW	1.3	NNW	0.0	E	0.1	SSW
19:00 - 20:00	0.2	SSW	1.6	NNW	0.0	NW	0.8	SW
20:00 - 21:00	0.2	E	1.5	NNW	0.3	W	0.4	SW
21:00 - 22:00	0.0	W	1.1	NW	0.4	WNW	0.1	SW
22:00 - 23:00	0.0	NNW	1.3	NNW	0.6	NW	0.1	SW
23:00 - 24:00	0.0	NW	1.4	NW	1.0	NW	0.0	SW
00:00 - 01:00	0.1	WNW	1.2	NW	1.1	NW	0.0	SW
01:00 - 02:00	0.4	WNW	0.9	NW	1.0	NNW	0.1	SE
02:00 - 03:00	0.7	NW	0.9	SSE	0.9	NW	0.1	NNW
03:00 - 04:00	0.6	NW	0.6	WSW	1.2	NNW	0.1	ESE
04:00 - 05:00	0.6	WNW	0.9	WSW	1.2	NNW	0.2	SSW
05:00 - 06:00	1.0	NW	0.2	SW	0.7	NNW	1.0	S
06:00 - 07:00	1.2	NNW	0.9	SW	1.2	SE	1.6	S
07:00 - 08:00	1.2	N	2.3	WSW	1.4	S	2.5	S
08:00 - 09:00	1.3	N	2.6	WSW	2.1	SW	2.6	S
09:00 - 10:00	1.4	NNW	1.8	WSW	2.4	SW	1.8	S
10:00 - 11:00	1.5	WSW	1.8	WSW	1.9	SW	1.8	S
Wind Rose								

หมายเหตุ : ความเร็วและทิศทางลมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างช่วงเวลา 11:00-11:00 น.

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้บันทึก : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดโชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ)




โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคोट จำกัด

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569

สถานีตรวจวัด บริเวณวัดหนองแพปลัดจินาราม (0729815E, 1403300N)

เวลา	6-7 เมษายน 2569		7-8 เมษายน 2569		8-9 เมษายน 2569	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
11:00 - 12:00	2.0	S	2.6	WSW	1.8	S
12:00 - 13:00	2.0	S	2.1	WSW	1.4	SW
13:00 - 14:00	1.9	S	1.8	SW	1.7	S
14:00 - 15:00	1.7	S	1.3	SW	1.3	S
15:00 - 16:00	1.4	S	0.8	SSW	1.4	S
16:00 - 17:00	0.8	S	0.4	SW	0.9	SSW
17:00 - 18:00	1.6	S	0.1	WSW	0.5	S
18:00 - 19:00	1.1	SSW	0.0	SW	0.8	SW
19:00 - 20:00	0.3	S	0.0	WSW	0.8	S
20:00 - 21:00	0.0	SSE	0.0	WSW	0.5	S
21:00 - 22:00	0.0	SSE	0.4	SW	0.8	WSW
22:00 - 23:00	0.0	NNW	0.3	SSW	0.0	SSE
23:00 - 24:00	0.3	NW	0.2	SSW	0.0	S
00:00 - 01:00	0.6	NW	0.7	SW	0.6	E
01:00 - 02:00	0.5	NNW	0.6	SW	0.6	E
02:00 - 03:00	0.6	NNW	0.5	SW	0.4	S
03:00 - 04:00	0.5	NW	0.3	SW	0.4	S
04:00 - 05:00	0.7	NW	0.4	SSE	1.2	S
05:00 - 06:00	0.3	NNW	0.9	S	0.7	S
06:00 - 07:00	0.7	SSW	1.7	S	1.3	S
07:00 - 08:00	2.1	WSW	2.1	S	2.3	W
08:00 - 09:00	2.4	WSW	1.8	S	2.5	WSW
09:00 - 10:00	2.4	SW	2.5	S	2.6	S
10:00 - 11:00	3.0	WSW	1.9	S	2.2	S
Wind Rose						

หมายเหตุ : ความเร็วและทิศทางลมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เริ่มจาก 11:00-11:00 น.

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้บันทึก : นายศิวะนนท์ กุลวงษ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคोट จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดโชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

4.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีน และฝุ่นละอองรวม ใน 2 บริเวณ คือ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก และวัดหนองแพบทักษิณาราม โดยทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศขณะทำการตรวจวัด

4.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569 พร้อมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามพารามิเตอร์ที่มาตรการฯ กำหนด ตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังแสดงในรูปที่ 4.2-1 ถึงรูปที่ 4.2-2 โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 4.2-1 และภาคผนวก ง

(1) เอทิลีน (Ethylene)

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของเอทิลีน (Ethylene) ในระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน พ.ศ.2569 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก	ND(<0.01)	ส่วนในล้านส่วน
------------------------------	-----------	----------------

วัดหนองแพบทักษิณาราม	ND(<0.01)	ส่วนในล้านส่วน
----------------------	-----------	----------------

สำหรับความเข้มข้นของเอทิลีนยังไม่มีข้อกำหนดค่ามาตรฐาน

(2) ฝุ่นละอองรวม (TSP)


ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก	0.034-0.047	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
------------------------------	-------------	--------------------------

วัดหนองแพบทักษิณาราม	0.018-0.025	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
----------------------	-------------	--------------------------

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.200 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

สำหรับสภาพลักษณะโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 บริเวณ ได้แก่ ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก และวัดหนองแพบทักษิณาราม พบว่า บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก พื้นที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณวัดหนองแพบทักษิณาราม พื้นที่ตั้งจุดตรวจวัดใกล้พื้นที่ลานจอดรถ ดังแสดงในรูปที่ 4.2-2

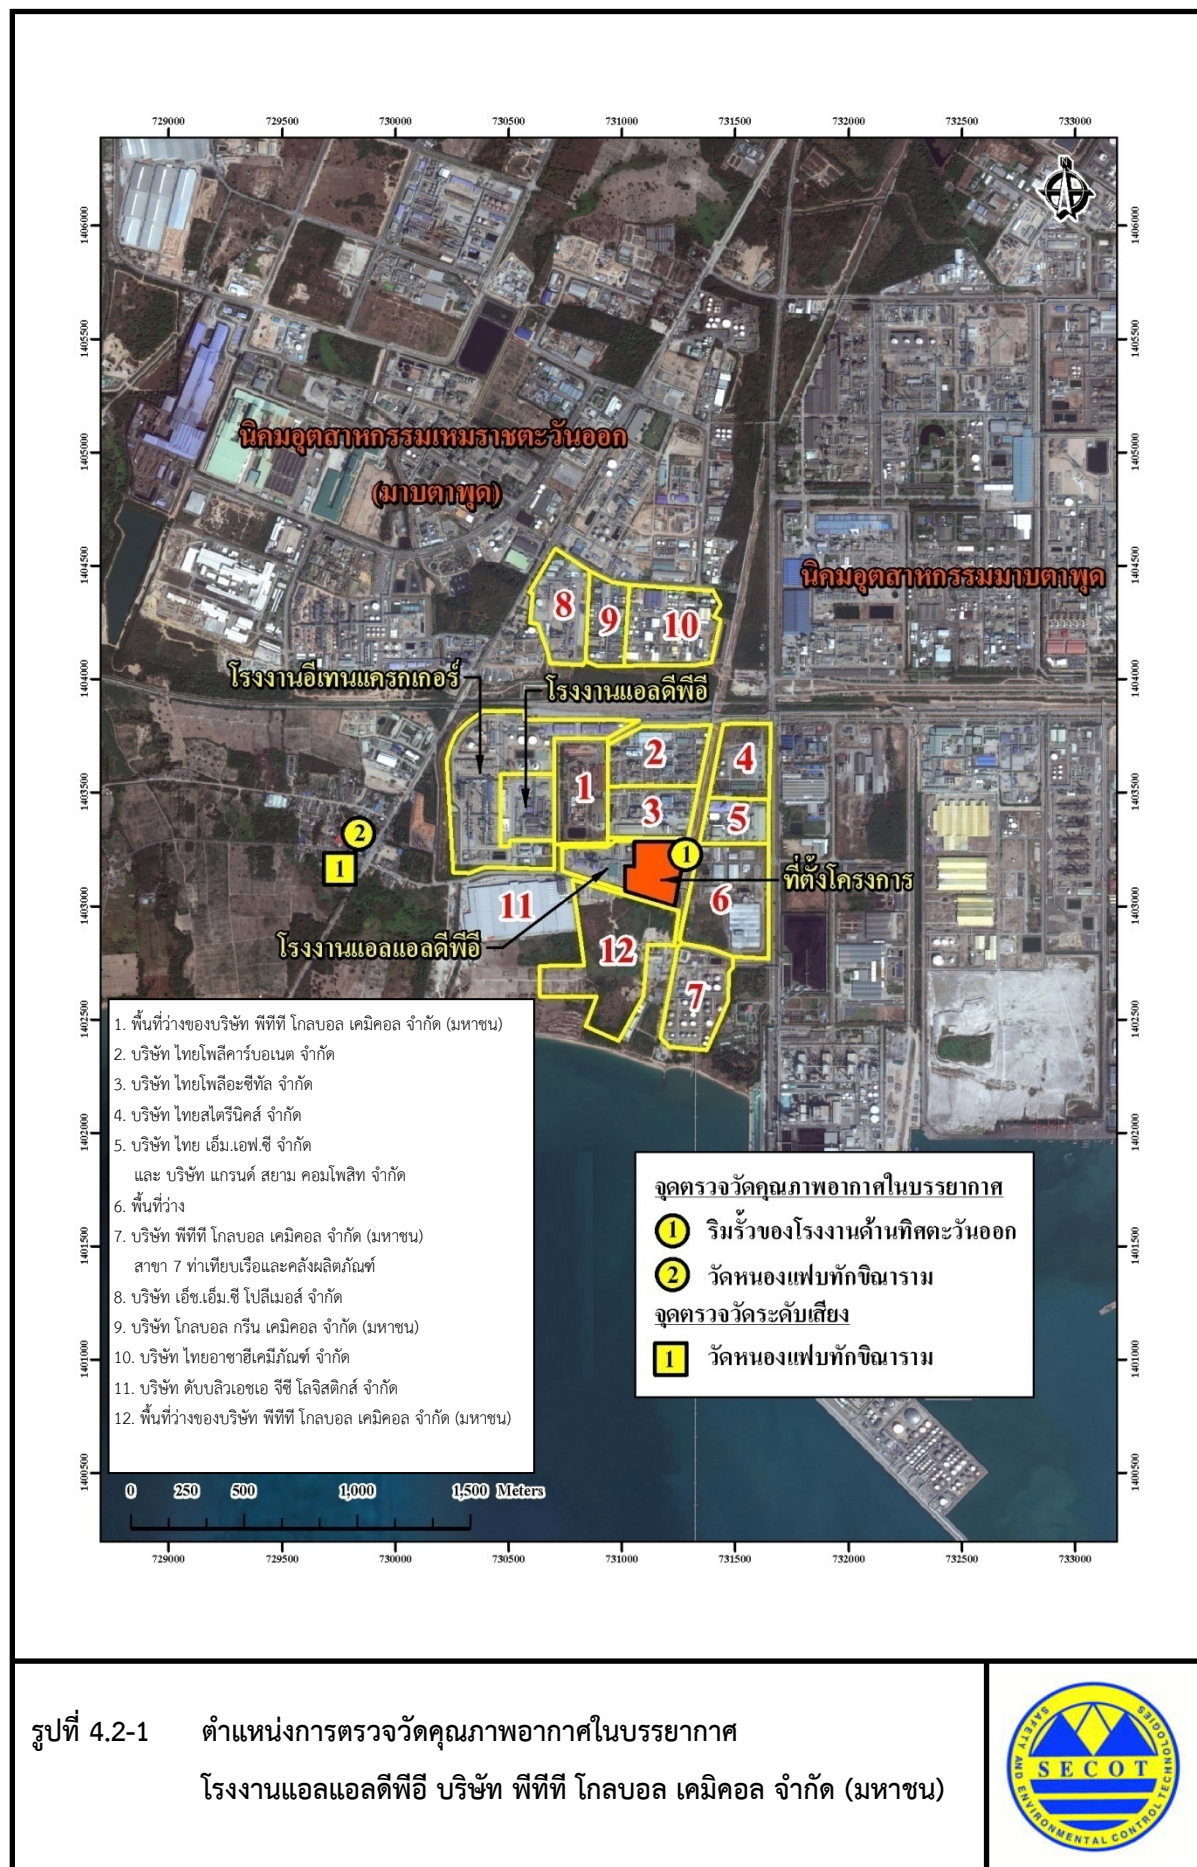



บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก




บริเวณวัดหนองแพบทักษิณาราม

รูปที่ 4.2-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)




ตารางที่ 4.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 จัดทำโดย บริษัท ซีคอท จำกัด ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569
 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 1. ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (0731226E, 1403053N)
 2. วัดหนองแพบทักษิณาราม (0729815E, 1403300N)

ตำแหน่ง	พิกัด		ระยะห่างจาก จุดกำเนิด (Km)	วัน/เดือน/ปี	พารามิเตอร์		Wind Rose	สภาพแวดล้อม
	X	Y			TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	Ethylene (ppm)		
ริมรั้วโรงงาน ด้านทิศ ตะวันออก	0731226	1403053	ภายในพื้นที่ โรงงาน	2-3 เม.ย. 69	0.036	ND(<0.01)		ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆเป็นส่วนใหญ่
			3-4 เม.ย. 69	0.047	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
			4-5 เม.ย. 69	0.036	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
			5-6 เม.ย. 69	0.034	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆส่วนใหญ่		
			6-7 เม.ย. 69	0.044	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
			7-8 เม.ย. 69	0.038	ND(<0.01)	ลมแรง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
			8-9 เม.ย. 69	0.035	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
ค่ามาตรฐาน				0.200 ^{1/}	-	-	-	

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569
 2. - หมายถึง ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ)

ตำแหน่ง	พิกัด		ระยะห่างจาก จุดกำเนิด (Km)	วัน/เดือน/ปี	พารามิเตอร์		Wind Rose	สภาพแวดล้อม
	X	Y			TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	Ethylene (ppm)		
วัดหนองแพ ทักษิณาราม	0729815	1403300	นอกพื้นที่	2-3 เม.ย. 69	0.018	ND(<0.01)		ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆเป็นส่วนมาก
			โรงงาน	3-4 เม.ย. 69	0.024	ND(<0.01)		ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน
			4-5 เม.ย. 69	0.024	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
			5-6 เม.ย. 69	0.023	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆส่วนมาก		
			6-7 เม.ย. 69	0.024	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
			7-8 เม.ย. 69	0.025	ND(<0.01)	ลมแรง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
			8-9 เม.ย. 69	0.020	ND(<0.01)	ลมปานกลาง อากาศร้อนจัด มีเมฆบางส่วน		
			ค่ามาตรฐาน					0.200 ^{1/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569
2. - หมายถึง ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิวนนท์ กุลวงษ์
 ชื่อผู้บันทึก : นายศิวนนท์ กุลวงษ์
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ / นางสาวนริสา ภูวสรณ์เพ็ญ
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท ซีคอฟ จำกัด
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา / นางสาวพรนภา บุตรธรรม / นางสาวสุดาพร สุนทร
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

4.2.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 ซึ่งดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีน และฝุ่นละอองรวม ใน 2 จุด ได้แก่ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก และวัดหนองแพบทักษิณาราม มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2-2 ถึงตารางที่ 4.2-3 และรูปที่ 4.2-3 ถึงรูปที่ 4.2-4 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด ส่วนค่าความเข้มข้นของเอทิลีนยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐาน เมื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการตรวจวัด พบว่า ฝุ่นละอองส่วนใหญ่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงขึ้นลงสลับกันไปและส่วนใหญ่ยังคงมีค่าอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับมาตรฐานกำหนด สำหรับเอทิลีนตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ตลอดช่วงการตรวจวัด

ตารางที่ 4.2-2 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

วันที่ตรวจวัด	ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	วัดหนองแฟบทักษิณาราม	ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก
17-18 ก.ค. 66	0.029	0.044
18-19 ก.ค. 66	0.021	0.035
19-20 ก.ค. 66	0.012	0.038
20-21 ก.ค. 66	0.016	0.029
21-22 ก.ค. 66	0.010	0.035
22-23 ก.ค. 66	0.015	0.041
23-24 ก.ค. 66	0.015	0.031
28-29 มี.ค. 67	0.055	0.048
29-30 มี.ค. 67	0.041	0.036
30-31 มี.ค. 67	0.026	0.046
31 มี.ค.-1 เม.ย. 67	0.027	0.039
1-2 เม.ย. 67	0.033	0.020
2-3 เม.ย. 67	0.040	0.032
3-4 เม.ย. 67	0.032	0.068
15-16 ส.ค. 67	0.024	0.024
16-17 ส.ค. 67	0.055	0.029
17-18 ส.ค. 67	0.027	0.019
18-19 ส.ค. 67	0.024	0.015
19-20 ส.ค. 67	0.021	0.019
20-21 ส.ค. 67	0.020	0.027
21-22 ส.ค. 67	0.026	0.020
ค่ามาตรฐาน	0.330 ^{1/}	

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547

ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	วัดหนองแฟบทักษิณาราม	ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก
11-12 มี.ค. 68	0.053	0.028
12-13 มี.ค. 68	0.054	0.026
13-14 มี.ค. 68	0.062	0.024
14-15 มี.ค. 68	0.029	0.024
15-16 มี.ค. 68	0.066	0.030
16-17 มี.ค. 68	0.062	0.021
17-18 มี.ค. 68	0.050	0.033
1-2 ก.ค. 68	0.032	0.040
2-3 ก.ค. 68	0.041	0.024
3-4 ก.ค. 68	0.046	0.026
4-5 ก.ค. 68	0.022	0.017
5-6 ก.ค. 68	0.019	0.017
6-7 ก.ค. 68	0.025	0.024
7-8 ก.ค. 68	0.021	0.027
2-3 เม.ย. 69	0.018	0.036
3-4 เม.ย. 69	0.024	0.047
4-5 เม.ย. 69	0.024	0.036
5-6 เม.ย. 69	0.023	0.034
6-7 เม.ย. 69	0.024	0.044
7-8 เม.ย. 69	0.025	0.038
8-9 เม.ย. 69	0.020	0.035
ค่ามาตรฐาน	0.330 ^{1/} / 0.200 ^{2/}	

- หมายเหตุ : 1.^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547
- 2.^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569 (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2569 เป็นต้นไป)

ตารางที่ 4.2-3 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีนในบรรยากาศ

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

วันที่ตรวจวัด	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ส่วนในล้านส่วน)	
	วัดหนองแฟบทักษิณาราม	ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก
17 ก.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)
18 ก.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)
19 ก.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)
20 ก.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)
21 ก.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)
22 ก.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)
23 ก.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)
28 มี.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
29 มี.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
30 มี.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
31 มี.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
1 เม.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
2 เม.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
3 เม.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
15 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
16 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
17 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
18 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
19 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
20 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
21 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)
ค่ามาตรฐาน	-	


หมายเหตุ : - ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.2-3 (ต่อ)


วันที่ตรวจวัด	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ส่วนในล้านส่วน)	
	วัดหนองแพปลัดขิมาราม	ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก
12 มี.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
13 มี.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
14 มี.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
15 มี.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
16 มี.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
17 มี.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
18 มี.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
1 ก.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
2 ก.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
3 ก.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
4 ก.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
5 ก.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
6 ก.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
7 ก.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)
2 เม.ย. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)
3 เม.ย. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)
4 เม.ย. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)
5 เม.ย. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)
6 เม.ย. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)
7 เม.ย. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)
8 เม.ย. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)
ค่ามาตรฐาน	-	

หมายเหตุ : - ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

รูปที่ 4.2-3 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

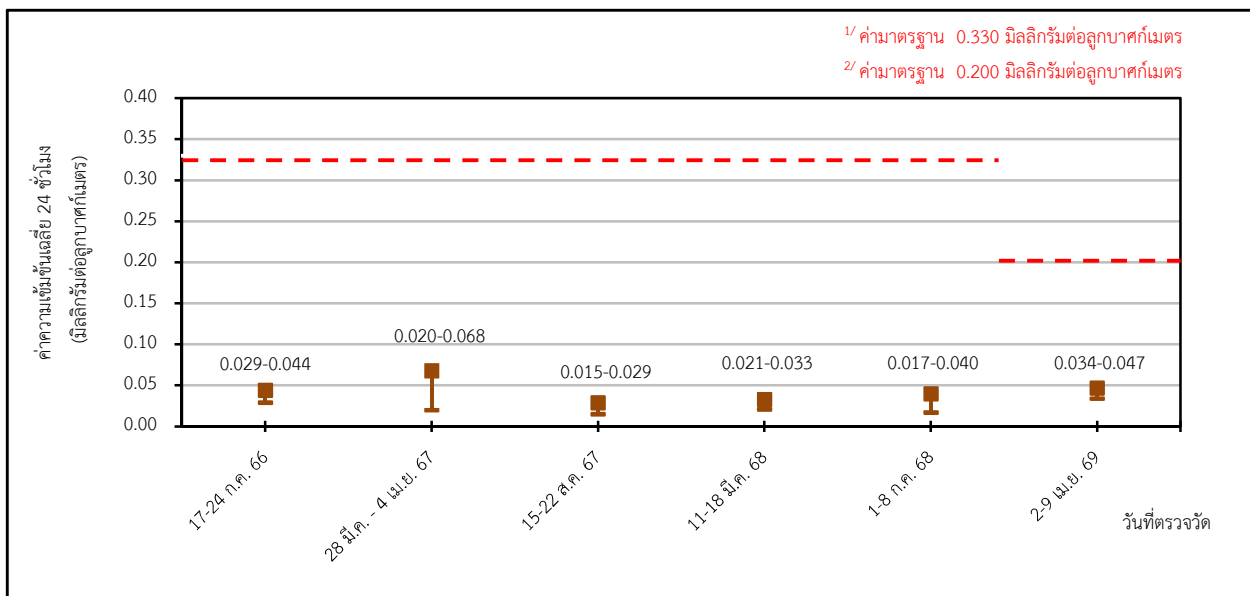

ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก

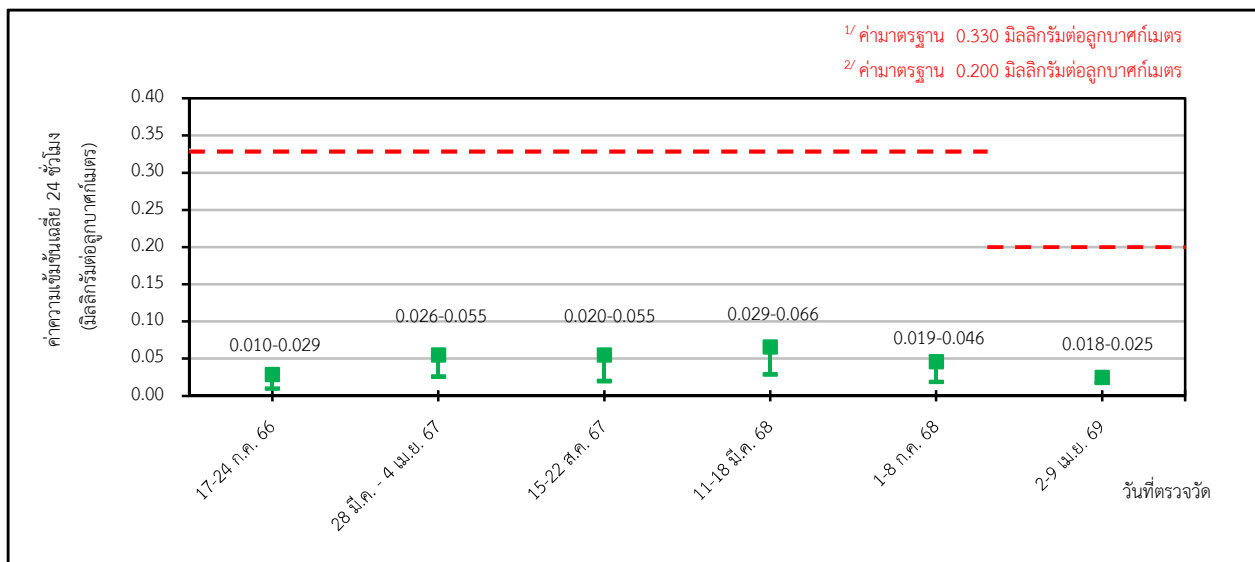

วัดหนองแพทบักขินาราม


- หมายเหตุ :
- 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547
 - 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569 (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป)

รูปที่ 4.2-4


ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีนในบรรยากาศ

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

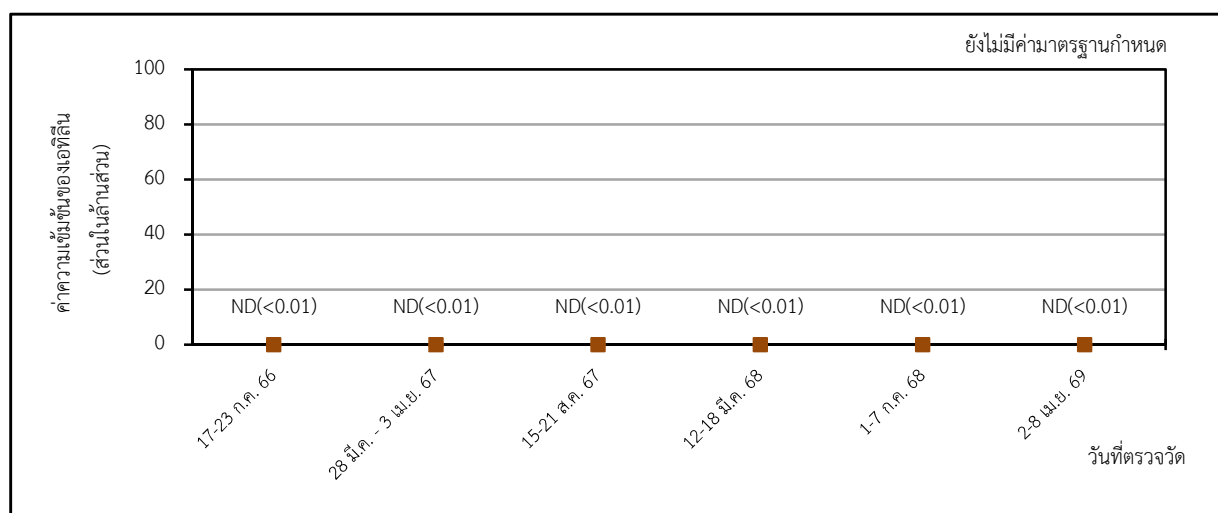

ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก

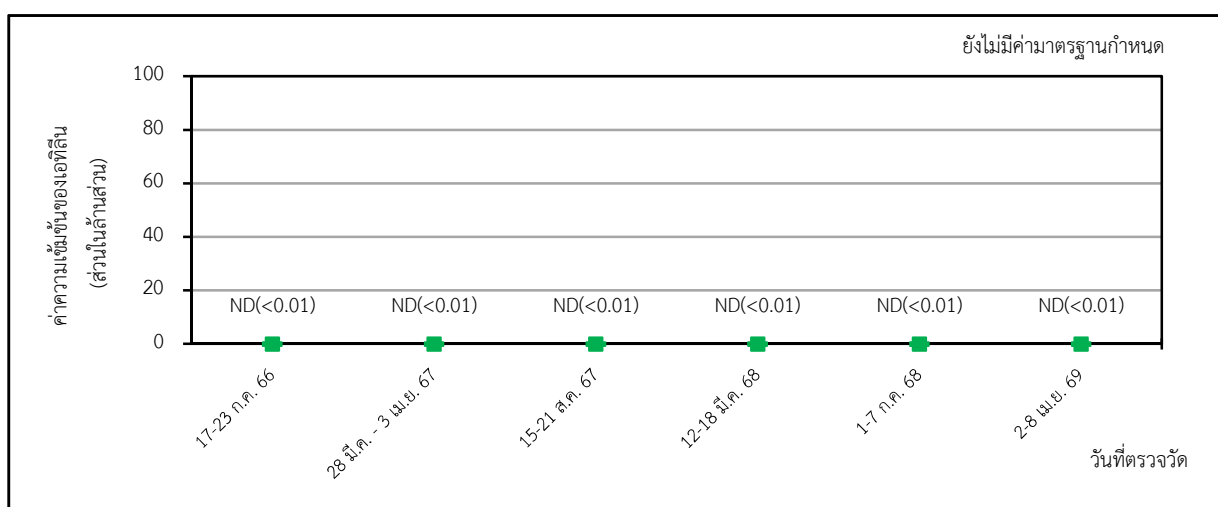

วัดหนองแพทักขิณาราม

หมายเหตุ : ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

4.3 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ


มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ปล่อง Centrifugal Dryer Stack 1 ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีน และฝุ่นละออง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ปล่อง Centrifugal Dryer ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2569 โดยบริษัท ซีคอต จำกัด โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีน และฝุ่นละออง พบว่าผลการตรวจวัด ณ ที่สภาวะมาตรฐาน (ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ออกซิเจนส่วนเกินสภาวะจริงและสภาวะแห้ง) ความเข้มข้นของเอทิลีน พบค่าเท่ากับ $ND(<0.01)$ ส่วนในล้านส่วน และฝุ่นละอองมีค่าเท่ากับ 19.92 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอัตราการระบายของเอทิลีน มีค่าน้อยกว่า 0.00002 กรัมต่อวินาที และฝุ่นละออง มีค่าเท่ากับ 0.032 กรัมต่อวินาที ตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศดังแสดงในรูปที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-2 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 4.3-1 และภาคผนวก ง

เมื่อนำค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ EIA กำหนด (ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 0.040 กรัมต่อวินาที) ส่วนค่าความเข้มข้นของเอทิลีนยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐาน

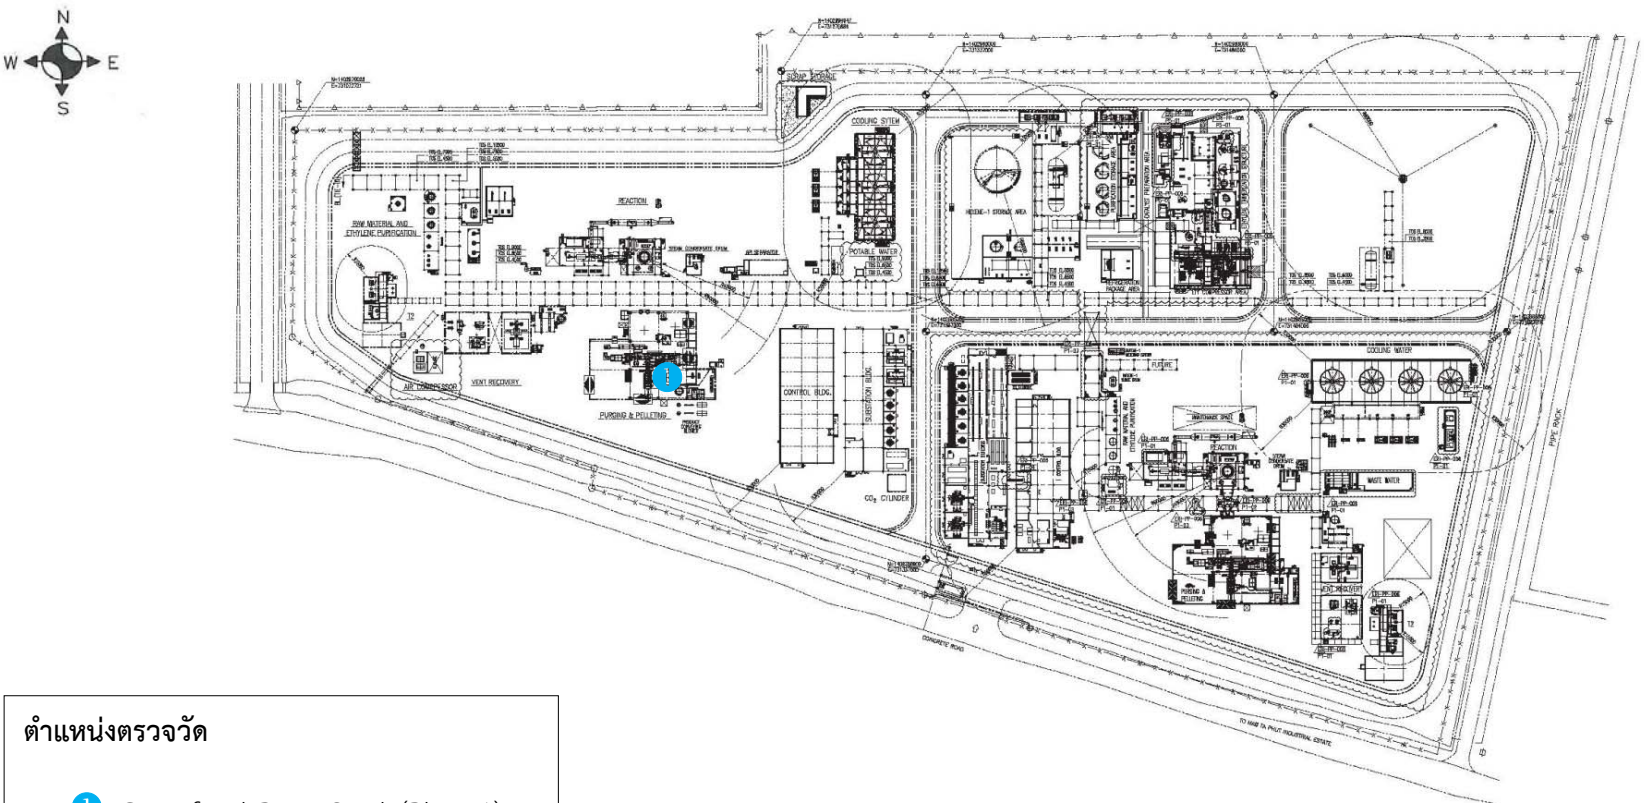

ตำแหน่งตรวจวัด

1 Centrifugal Dryer Stack (Plant 1)

รูปที่ 4.3-1 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



บริเวณปล่อง Centrifugal Dryer ของสายการผลิตที่ 1

รูปที่ 4.3-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ปล่อง Centrifugal Dryer สายการผลิตที่ 1

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี	ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
วันที่ตรวจวัด	วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2569
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	13:30-14:30 น.
ข้อมูลกระบวนการผลิต	ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง
ข้อมูลเชื้อเพลิง	
ชนิดของเชื้อเพลิง	ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง
ข้อมูลลักษณะของปล่อง	
ตำแหน่งพิกัด	730895E, 1403156N
ความสูงของปล่องจากระดับพื้นดิน	26.0 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด	0.6x0.48 เมตร
อุณหภูมิภายในปล่อง	51.0 องศาเซลเซียส
ความเร็วก๊าซภายในปล่อง	6.1 เมตรต่อวินาที
อัตราการไหล	96.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ^{1/}
ร้อยละของออกซิเจน	20.8
ร้อยละของความชื้น	5.2

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^{1/}	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละออง	มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	19.92	35 ^{2/} , 400 ^{3/}
	กรัม/วินาที	0.032	0.040 ^{2/}
เอทิลีน	ส่วนในล้านส่วน	ND(<0.01)	- ^{2/} , ^{3/}
	กรัม/วินาที	<0.00002	- ^{2/} , ^{3/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ออกซิเจนส่วนเกินสถานะจริง และสถานะแห้ง
 2. ^{2/} ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564
 3. ^{3/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 กรณีไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายรอมฎอน เหลี่ยมหมาด
 ชื่อผู้บันทึก : นายรอมฎอน เหลี่ยมหมาด
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนริสา ภูวสรพีชญ์
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอท จำกัด
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวพรนภา บุตรธรรม / นางสาวสุตาพร สุนทร
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0018 / -
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-9593600

4.3.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ปล่อง Centrifugal Dryer ของสายการผลิตที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 ซึ่งดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีน และฝุ่นละออง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3-2 ถึงตารางที่ 4.3-3 และรูปที่ 4.3-3 ถึงรูปที่ 4.3-4 โดยผลการตรวจวัด พบว่า ฝุ่นละอองมีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเอทิลีนยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด เมื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการตรวจวัด พบว่า เอทิลีนตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ตลอดช่วงการเปรียบเทียบข้อมูล สำหรับฝุ่นละอองมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงสลับกันไปตามกระบวนการเปลี่ยนเกรดการผลิตของผลิตภัณฑ์ ในขณะนั้น ซึ่งทางโครงการจัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศคอยติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินการตลอดเวลาแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีการจัดการคุณภาพอากาศจากปล่องให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการระบายมลพิษอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 4.3-2 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีนจากปล่องระบายอากาศ

ปล่อง Centrifugal Dryer สายการผลิตที่ 1

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

ปล่อง	วันที่ตรวจวัด	ความเข้มข้นของ Ethylene (ส่วนในล้านส่วน)	อัตราการระบาย (กรัม/วินาที)
Centrifugal Dryer	18 ก.ค. 66	ND(<0.01)	<0.00002
	29 มี.ค. 67	ND(<0.01)	<0.00002
	20 ส.ค. 67	ND(<0.01)	<0.00002
	14 มี.ค. 68	ND(<0.01)	<0.00002
	3 ก.ค. 68	ND(<0.01)	<0.00002
	8 เม.ย. 69	ND(<0.01)	<0.00002
ค่ามาตรฐาน		-	-

หมายเหตุ : - หมายถึง ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.3-3 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ

ปล่อง Centrifugal Dryer สายการผลิตที่ 1


โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569


ปล่อง	วันที่ตรวจวัด	ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (มก./ลบ.ม.)	อัตราการระบาย (กรัม/วินาที)
Centrifugal Dryer	18 ก.ค. 66	12.89	0.025
	29 มี.ค. 67	1.50	0.002
	20 ส.ค. 67	7.53	0.016
	14 มี.ค. 68	4.50	0.008
	3 ก.ค. 68	2.86	0.006
	8 เม.ย. 69	19.92	0.032
ค่ามาตรฐาน		35 ^{1/} , 400 ^{2/}	0.040 ^{1/}

- หมายเหตุ :
- ^{1/} ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564
 - ^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 (กรณีไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
 - ปริมาณฝุ่นละอองมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงสลับกันไปตามกระบวนการเปลี่ยนเกรดการผลิตของผลิตภัณฑ์ในขณะนั้น

รูปที่ 4.3-3 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นและอัตราการระเหยของเอทิลีน
จากปล่องระบายอากาศ ปล่อง Centrifugal Dryer สายการผลิตที่ 1
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

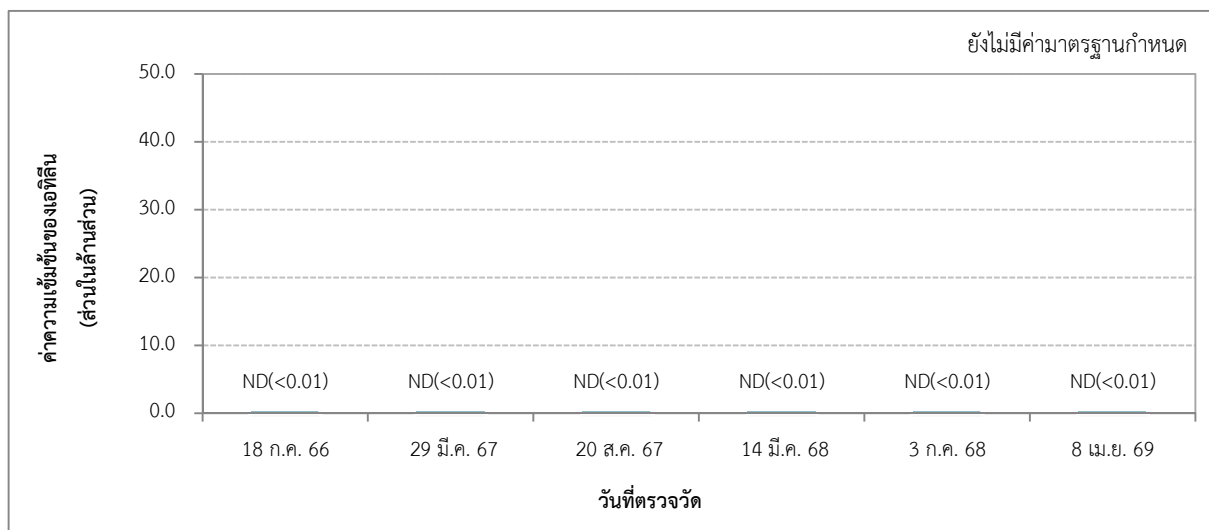


ความเข้มข้นของเอทิลีน

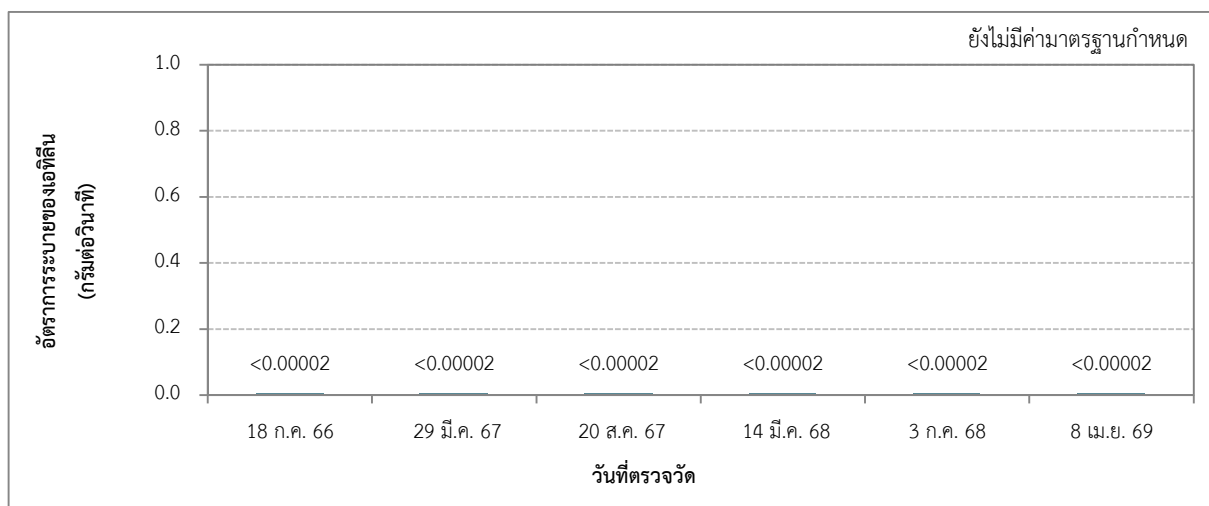


อัตราการระเหยของเอทิลีน

หมายเหตุ : ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

รูปที่ 4.3-4 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นและอัตราการระเหยของฝุ่นละออง
จากปล่องระบายอากาศ ปล่อง Centrifugal Dryer สายการผลิตที่ 1
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

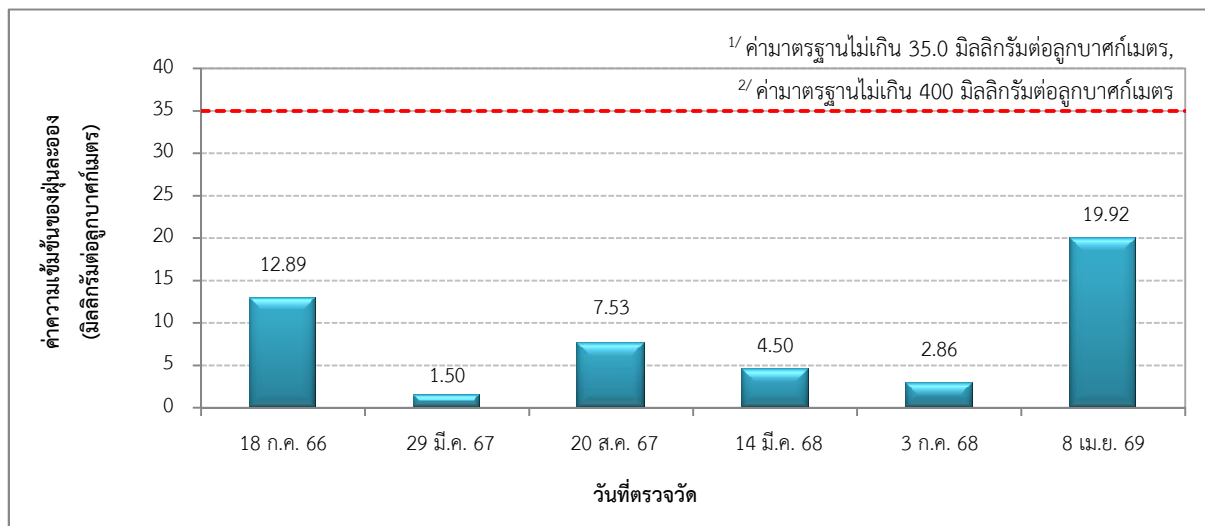

ความเข้มข้นของฝุ่นละออง

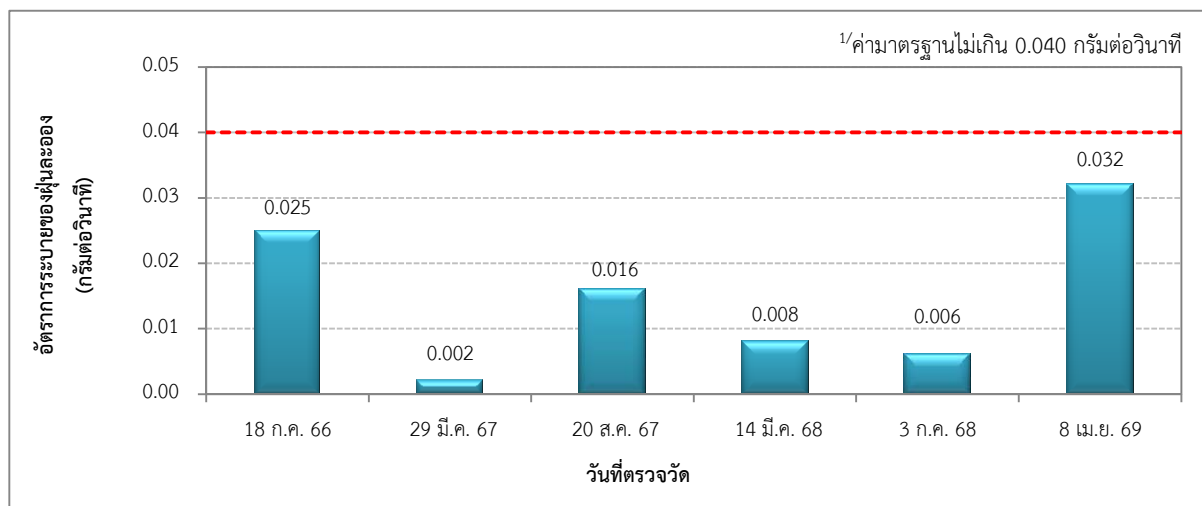

อัตราการระเหยของฝุ่นละออง

- หมายเหตุ :
- 1/ ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564
 - 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 (กรณีไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
 3. ปริมาณฝุ่นละอองมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงสลับกันไปตามกระบวนการเปลี่ยนเกรดการผลิตของผลิตภัณฑ์ ในขณะนั้น ซึ่งคุณสมบัติความแข็งแรงและการเสียดสีของเม็ดพลาสติกเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ

4.4 คุณภาพดิน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพดินจำนวน 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ่อสังเคราะห์การณ 4 (MW04) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเคราะห์การณ 5 (MW05) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเคราะห์การณ 6 (MW06) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) และบ่อสังเคราะห์การณ 7 (MW07) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) โดยดำเนินการตรวจวัดค่าปิโตรเลียม-ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (TPH(C5-C8), TPH(C>8-C16) และ TPH(C>16-C35)) ทุกๆ 3 ปี

4.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน

ประจำปี พ.ศ.2567

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินล่าสุดในวันที่ 22 มีนาคม วันที่ 16 พฤษภาคม และวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 จำนวน 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ่อสังเคราะห์การณ 4 (MW04) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเคราะห์การณ 5 (MW05) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเคราะห์การณ 6 (MW06) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) และบ่อสังเคราะห์การณ 7 (MW07) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) ตำแหน่งและภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพดินดังแสดงในรูปที่ 4.4-1 ถึงรูปที่ 4.4-2 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4-1 ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจวัดสรุปได้ดังนี้

- TPH (C5-C8) มีค่าเท่ากับ ND (<0.003) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในทุกจุดตรวจวัด
- TPH (C>8-C16) มีค่าเท่ากับ ND (<0.25) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในทุกจุดตรวจวัด
- TPH (C>16-C35) มีค่าเท่ากับ ND (<1.85) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในทุกจุดตรวจวัด

เมื่อนำผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการมีแผนจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพดินครั้งถัดไปเมื่อครบกำหนด 3 ปี ในปี พ.ศ.2570



บ่อสังเกตการณ์ 4 (ตำแหน่งเหนือน้ำ)



บ่อสังเกตการณ์ 5 (ตำแหน่งเหนือน้ำ)

รูปที่ 4.4-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพดิน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)





บ่อสังเกตการณ์ 6 (ตำแหน่งทำynnน้ำ)



บ่อสังเกตการณ์ 7 (ตำแหน่งทำynnน้ำ)

รูปที่ 4.4-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพดิน (ต่อ)

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคोट จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม, 16 พฤษภาคม และ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

1. บ่อสังเคราะห์การณ 4 (ตำแหน่งเหนือน้ำ) (0730810E, 1403260N)
2. บ่อสังเคราะห์การณ 5 (ตำแหน่งเหนือน้ำ) (0731198E, 1403284N)
3. บ่อสังเคราะห์การณ 6 (ตำแหน่งท้ายน้ำ) (0731136E, 1403058N)
4. บ่อสังเคราะห์การณ 7 (ตำแหน่งท้ายน้ำ) (0730895E, 1403136N)

พารามิเตอร์	หน่วย	จุดตรวจวัด				ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		บ่อสังเคราะห์การณ 4 (ตำแหน่งเหนือน้ำ)	บ่อสังเคราะห์การณ 5 (ตำแหน่งเหนือน้ำ)	บ่อสังเคราะห์การณ 6 (ตำแหน่งท้ายน้ำ)	บ่อสังเคราะห์การณ 7 (ตำแหน่งท้ายน้ำ)	
		21 มี.ย. 67	16 พ.ค. 67	22 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	
TPH (C5-C8)	mg/kg	ND(<0.003)	ND(<0.003)	ND(<0.003)	ND(<0.003)	≤25.0
TPH (C>8-C16)	mg/kg	ND(<0.25)	ND(<0.25)	ND(<0.25)	ND(<0.25)	≤25.0
TPH (C>16-C35)	mg/kg	ND(<1.85)	ND(<1.85)	ND(<1.85)	ND(<1.85)	≤8.0

หมายเหตุ : ^{1/}ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด :

นายวัชรกานต์ ประมาคะเต/ นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ/
นายอนิวัฒน์ พิมวันนา

ชื่อผู้บันทึก :

นายวัชรกานต์ ประมาคะเต/ นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ/
นายอนิวัฒน์ พิมวันนา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

นางอารยา ทิพรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม :

บริษัท ซีคोट จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ :

นางสาวสุตาพร สุนทร

เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ :

ว-239-จ-0001

เบอร์โทรศัพท์ :

02-959-3600

4.4.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพดิน

ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567

ผลการตรวจวัดคุณภาพดินของโรงงานแอลแอลดีพีอี ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567 จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อสังเคราะห์การัน 4 (MW04) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเคราะห์การัน 5 (MW05) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเคราะห์การัน 6 (MW06) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) และบ่อสังเคราะห์การัน 7 (MW07) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) ซึ่งดำเนินการตรวจวัดค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (TPH) ทุก 3 ปี ตามมาตรการกำหนด โดยจะครบกำหนดการตรวจวัดครั้งถัดไปในปี พ.ศ.2570 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-3 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพดินไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลการตรวจวัดพบว่า พบค่าความเข้มข้นของสารน้อยกว่าความสามารถของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะวิเคราะห์ได้ตลอดช่วงการเปรียบเทียบข้อมูลในทุกจุดตรวจวัด

ตารางที่ 4.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	TPH (C5-C8) (mg/kg)	TPH (C>8-C16) (mg/kg)	TPH (C>16-C35) (mg/kg)
บ่อสังเคราะห์ 4	30 เม.ย. 61	ND(<1.00)	ND(<1.00)	ND(<1.00)
	17 มี.ค. 64	ND(<0.003)	ND(<0.25)	ND(<1.85)
	21 มิ.ย. 67	ND(<0.003)	ND(<0.25)	ND(<1.85)
บ่อสังเคราะห์ 5	30 เม.ย. 61	ND(<1.00)	ND(<1.00)	ND(<1.00)
	18 มี.ค. 64	ND(<0.003)	ND(<0.25)	ND(<1.85)
	16 พ.ค. 67	ND(<0.003)	ND(<0.25)	ND(<1.85)
บ่อสังเคราะห์ 6	30 เม.ย. 61	ND(<1.00)	ND(<1.00)	ND(<1.00)
	18 มี.ค. 64	ND(<0.003)	ND(<0.25)	ND(<1.85)
	22 มี.ค. 67	ND(<0.003)	ND(<0.25)	ND(<1.85)
บ่อสังเคราะห์ 7	30 เม.ย. 61	ND(<1.00)	ND(<1.00)	ND(<1.00)
	17 มี.ค. 64	ND(<0.003)	ND(<0.25)	ND(<1.85)
	22 มี.ค. 67	ND(<0.003)	ND(<0.25)	ND(<1.85)
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		≤25.0	≤25.0	≤8.0

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน


การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ำใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

รูปที่ 4.4-3


ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2561-2567

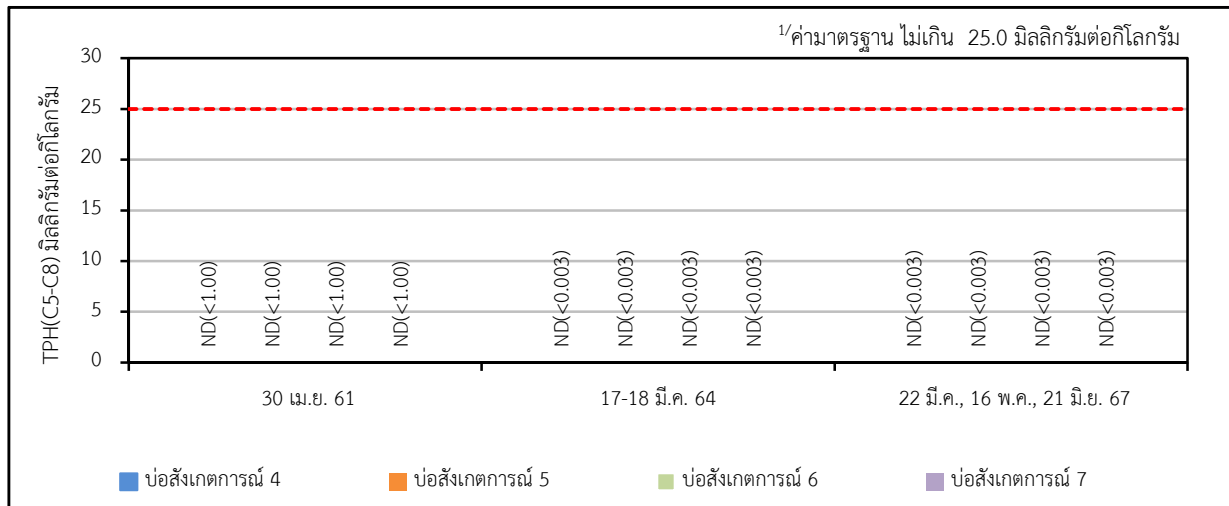


TPH (C5-C8)

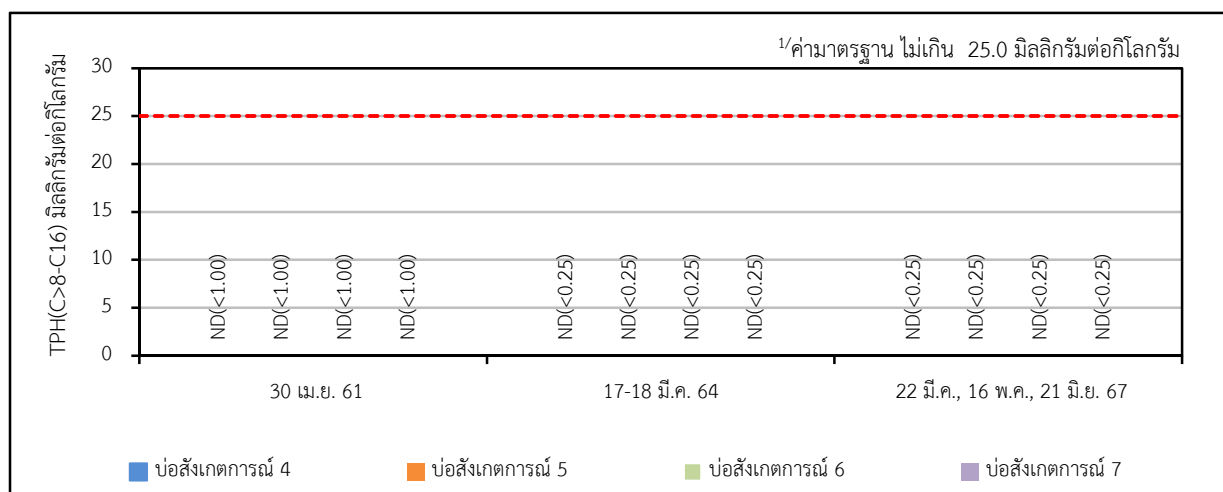

TPH (C>8-C16)

หมายเหตุ : 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

รูปที่ 4.4-3 (ต่อ)

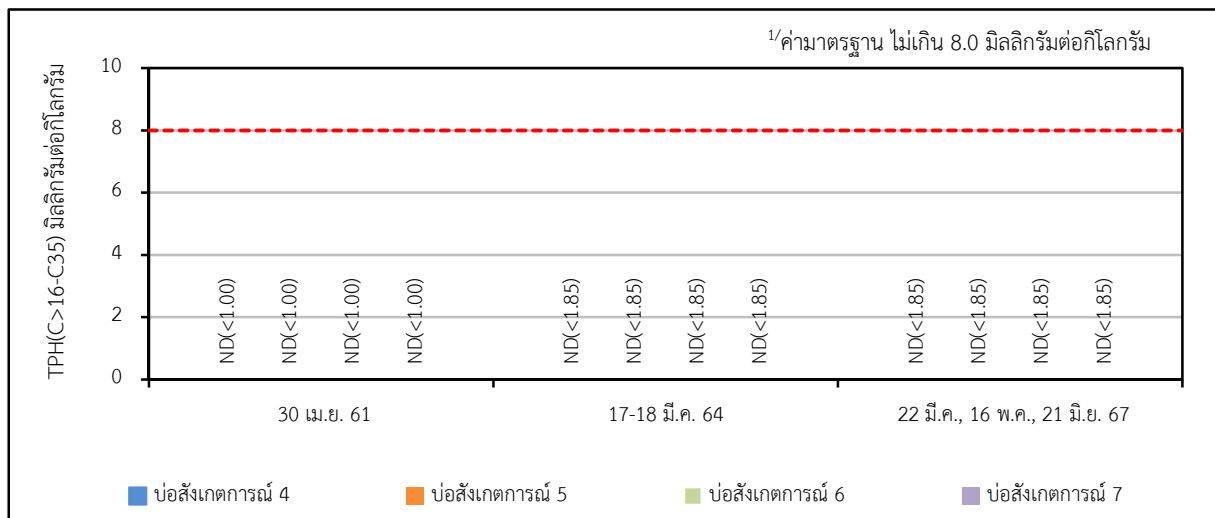

TPH (C>16-C35)

หมายเหตุ : 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

4.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจำนวน 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 4 (MW04) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเกตการณ์ 5 (MW05) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเกตการณ์ 6 (MW06) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) และบ่อสังเกตการณ์ 7 (MW07) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) โดยดำเนินการตรวจวัดค่าปิโตรเลียม-ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (TPH(C5-C8), TPH(C>8-C16) และ TPH(C>16-C35)) ปีละ 1 ครั้ง


4.5.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ประจำปี พ.ศ.2569

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัดตามพารามิเตอร์ที่มาตรการกำหนด ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2569 โดยทำการตรวจวัด 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 4 (MW04) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเกตการณ์ 5 (MW05) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเกตการณ์ 6 (MW06) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) และ บ่อสังเกตการณ์ 7 (MW07) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) ตำแหน่งและรูปถ่ายการตรวจวัดคุณภาพดินดังแสดงในรูปที่ 4.5-1 และรูปที่ 4.5-2 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5-1 ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจวัดสรุปได้ดังนี้

- TPH (C5-C8) มีค่าเท่ากับ ND (<0.003) มิลลิกรัมต่อลิตรในทุกจุดตรวจวัด
- TPH (C>8-C16) มีค่าเท่ากับ ND (<0.025) มิลลิกรัมต่อลิตรในทุกจุดตรวจวัด
- TPH (C>16-C35) มีค่าเท่ากับ ND (<0.050) มิลลิกรัมต่อลิตรในทุกจุดตรวจวัด

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

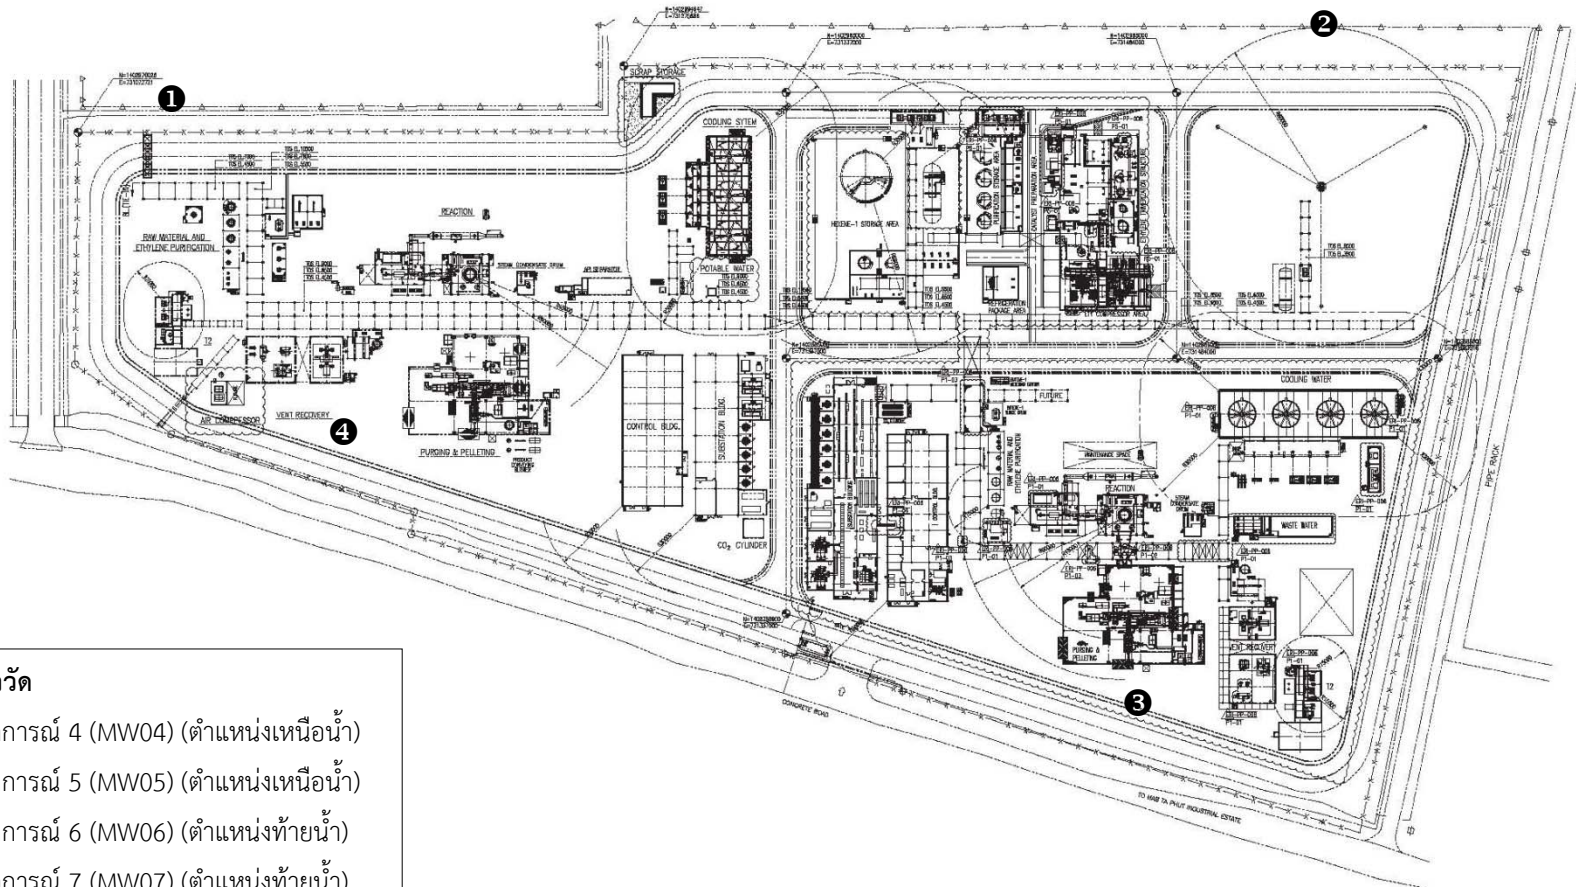

ตำแหน่งตรวจวัด

- ❶ บ่อสังเกตการณ์ 4 (MW04) (ตำแหน่งเหนือหน้า)
- ❷ บ่อสังเกตการณ์ 5 (MW05) (ตำแหน่งเหนือหน้า)
- ❸ บ่อสังเกตการณ์ 6 (MW06) (ตำแหน่งท้ายน้ำ)
- ❹ บ่อสังเกตการณ์ 7 (MW07) (ตำแหน่งท้ายน้ำ)

รูปที่ 4.5-1 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



บ่อสังเกตการณ์ 4 (ตำแหน่งเหนือน้ำ)



บ่อสังเกตการณ์ 5 (ตำแหน่งเหนือน้ำ)

รูปที่ 4.5-2

ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)





บ่อสังเกตการณ์ 6 (ตำแหน่งทำยนน้ำ)



บ่อสังเกตการณ์ 7 (ตำแหน่งทำยนน้ำ)

รูปที่ 4.5-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี	ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด	วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	1. บ่อสังเกตการณ์ 4 (ตำแหน่งเหนือน้ำ) (0730802E, 1403269N) 2. บ่อสังเกตการณ์ 5 (ตำแหน่งเหนือน้ำ) (0731193E, 1403297N) 3. บ่อสังเกตการณ์ 6 (ตำแหน่งท้ายน้ำ) (0731163E, 1403032N) 4. บ่อสังเกตการณ์ 7 (ตำแหน่งท้ายน้ำ) (0730909E, 1403113N)

พารามิเตอร์	หน่วย	จุดตรวจวัด				ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		บ่อสังเกตการณ์ 4 (ตำแหน่งเหนือน้ำ)	บ่อสังเกตการณ์ 5 (ตำแหน่งเหนือน้ำ)	บ่อสังเกตการณ์ 6 (ตำแหน่งท้ายน้ำ)	บ่อสังเกตการณ์ 7 (ตำแหน่งท้ายน้ำ)	
		20 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	
TPH (C5-C8)	mg/l	ND(<0.003)	ND(<0.003)	ND(<0.003)	ND(<0.003)	≤1.4
TPH (C>8-C16)	mg/l	ND(<0.025)	ND(<0.025)	ND(<0.025)	ND(<0.025)	≤1.7
TPH (C>16-C35)	mg/l	ND(<0.050)	ND(<0.050)	ND(<0.050)	ND(<0.050)	≤0.1

หมายเหตุ : ^{1/}ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ

ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเข็มชฎา อินทร์ศรี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุดาพร สุนทร

เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

4.5.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินของโรงงานแอลแอลดีพีอี ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569 โดยดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ใน 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 4 (MW04) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเกตการณ์ 5 (MW05) (ตำแหน่งเหนือน้ำ) บ่อสังเกตการณ์ 6 (MW06) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) และ บ่อสังเกตการณ์ 7 (MW07) (ตำแหน่งท้ายน้ำ) ซึ่งดำเนินการตรวจวัดค่าบีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (TPH) ปีละ 1 ครั้ง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5-2 และรูปที่ 4.5-3 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและ น้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

ตารางที่ 4.5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	TPH (C5-C8) (mg/l)	TPH (C>8-C16) (mg/l)	TPH (C>16-C35) (mg/l)
บ่อสังเกตการณ์ 4	22 มี.ค. 67	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
	25 มี.ค. 68	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
	20 มี.ค. 69	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
บ่อสังเกตการณ์ 5	22 มี.ค. 67	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
	25 มี.ค. 68	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
	20 มี.ค. 69	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
บ่อสังเกตการณ์ 6	22 มี.ค. 67	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
	25 มี.ค. 68	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
	20 มี.ค. 69	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
บ่อสังเกตการณ์ 7	22 มี.ค. 67	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
	25 มี.ค. 68	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
	20 มี.ค. 69	ND(<0.003)	ND(<0.025)	ND(<0.050)
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		≤1.4	≤1.7	≤0.1

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน


การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

รูปที่ 4.5-3


ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569

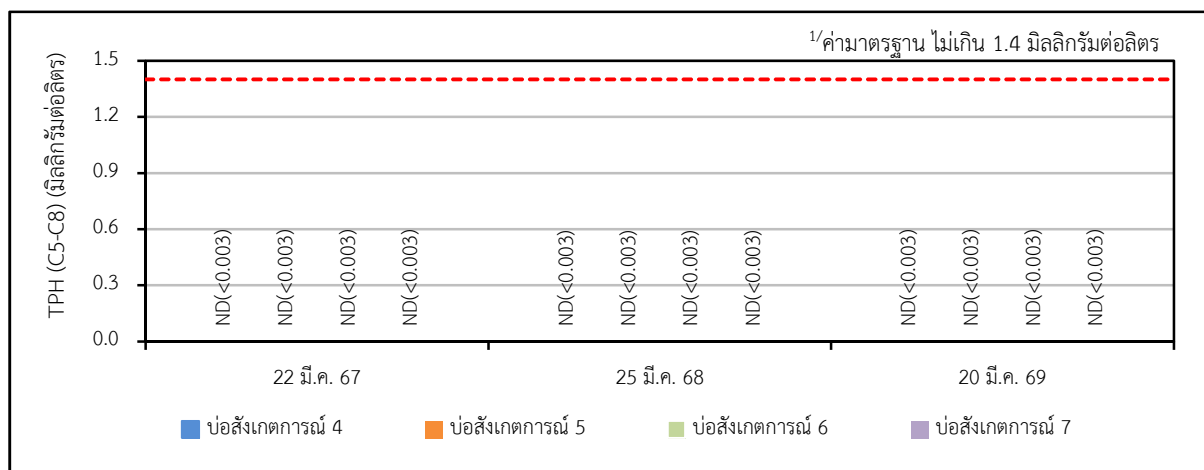


TPH (C5-C8)

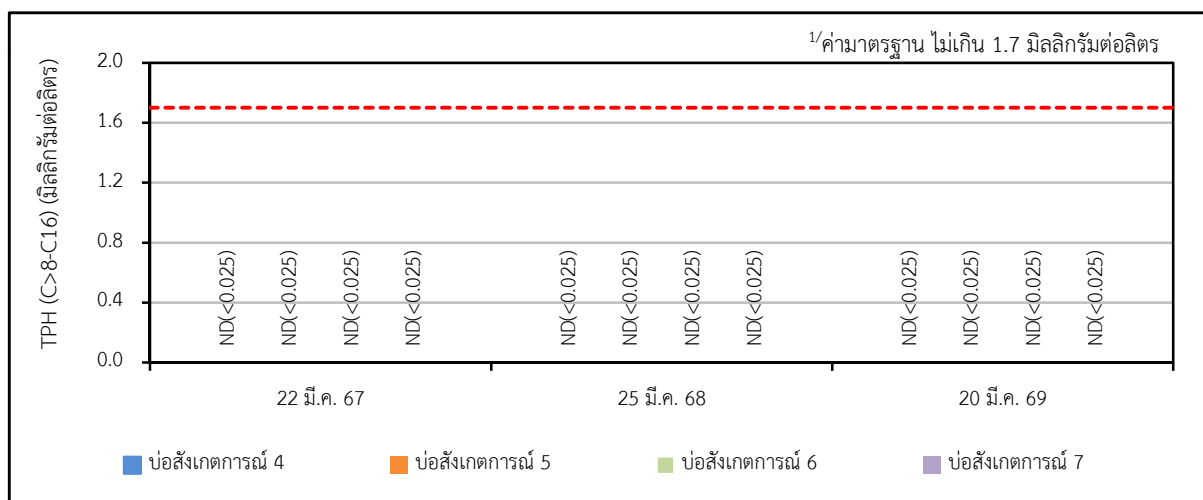

TPH (C>8-C16)

หมายเหตุ : 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

รูปที่ 4.5-3 (ต่อ)

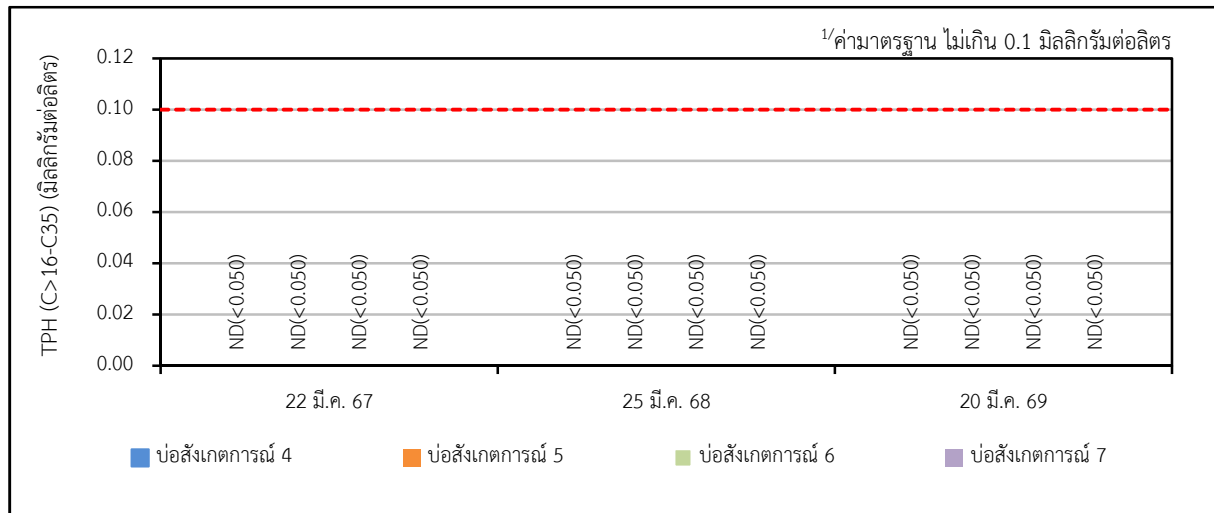

TPH (C>16-C35)

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

4.6 คุณภาพน้ำ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารสำนักงานและกระบวนการผลิต ได้แก่ บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 และน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น บริเวณจุด Drain Valve ของโรงงาน โดยดำเนินการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ซีโอดี (COD) บีโอดี (BOD₅) ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และสังกะสี (Zinc) ของบ่อ API เดือนละ 1 ครั้ง และตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซีโอดี (COD) บีโอดี (BOD₅) ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) สภาพการนำไฟฟ้า (Conductivity) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และสังกะสี (Zinc) จากน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น บริเวณจุด Drain Valve ของโรงงาน เดือนละ 1 ครั้ง

4.6.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ดำเนินการโดยบริษัท ซีคอท จำกัด (มหาชน) ตามพารามิเตอร์ที่ มาตรการกำหนด โดยทำการตรวจวัด 3 บริเวณ ได้แก่ บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 และบริเวณจุด Drain Valve ของโรงงาน ตำแหน่งการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้งดังแสดงในรูปที่ 4.6-1 และรูปที่ 4.6-2 สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งระหว่างเดือน มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6-1 ถึงตารางที่ 4.6-3 และภาคผนวก ง ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจวัดสรุปได้ดังนี้

(1) น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงานและกระบวนการผลิต

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียบริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอีสายการผลิตที่ 1 ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ความเป็นกรด-ด่าง	มีค่าอยู่ในช่วง	6.01-8.09	
- อุณหภูมิ	มีค่าอยู่ในช่วง	31.7-36.0	องศาเซลเซียส
- ซีโอดี	มีค่าอยู่ในช่วง	<15.00-27.47	มิลลิกรัมต่อลิตร
- บีโอดี	มีค่าอยู่ในช่วง	<1.0-1.6	มิลลิกรัมต่อลิตร

- ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด	มีค่าอยู่ในช่วง	<25-99	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน	มีค่าเท่ากับ	ND(<2.0)	มิลลิกรัมต่อลิตร
- สังกะสี	มีค่าอยู่ในช่วง	0.04-0.18	มิลลิกรัมต่อลิตร

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียบริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอีสายการผลิตที่ 2 ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ความเป็นกรด-ด่าง	มีค่าอยู่ในช่วง	6.55-8.42	
- อุณหภูมิ	มีค่าอยู่ในช่วง	32.7-35.5	องศาเซลเซียส
- ซีโอดี	มีค่าอยู่ในช่วง	<15.00-52.00	มิลลิกรัมต่อลิตร
- บีโอดี	มีค่าอยู่ในช่วง	<1.0-3.4	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด	มีค่าอยู่ในช่วง	64-148	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน	มีค่าเท่ากับ	ND(<2.0)	มิลลิกรัมต่อลิตร
- สังกะสี	มีค่าอยู่ในช่วง	0.04-0.34	มิลลิกรัมต่อลิตร


ทั้งนี้ น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน และกระบวนการผลิตของโรงงานจะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง (Final Check Basin) ของโรงงานอีเทนแครกกเกอร์ ก่อนระบายออกนอกโรงงานต่อไป เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

(2) น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) บริเวณจุด Drain Valve ของโรงงานแอลแอลดีพีอี ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ซึ่งทำการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ความเป็นกรด-ด่าง	มีค่าอยู่ในช่วง	6.10-7.23	
- ซีโอดี	มีค่าอยู่ในช่วง	<15.00-47.87	มิลลิกรัมต่อลิตร
- บีโอดี	มีค่าอยู่ในช่วง	<1.0-4.2	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด	มีค่าอยู่ในช่วง	476-830	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด	มีค่าอยู่ในช่วง	7.8-22	มิลลิกรัมต่อลิตร
- คลอรีนอิสระ	มีค่าอยู่ในช่วง	ND(<0.03)-0.73	มิลลิกรัมต่อลิตร
- สภาพการนำไฟฟ้า	มีค่าอยู่ในช่วง	925-1,312	ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน	มีค่าเท่ากับ	ND(<2.0)	มิลลิกรัมต่อลิตร
- สังกะสี	มีค่าอยู่ในช่วง	0.12-0.34	มิลลิกรัมต่อลิตร

น้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น บริเวณจุด Drain Valve ดังกล่าว จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง (Final Check Basin) ของโรงงานอีเทนแครกเกอร์ ก่อนระบายออกนอกโรงงานต่อไป เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น บริเวณ Drain Valve ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

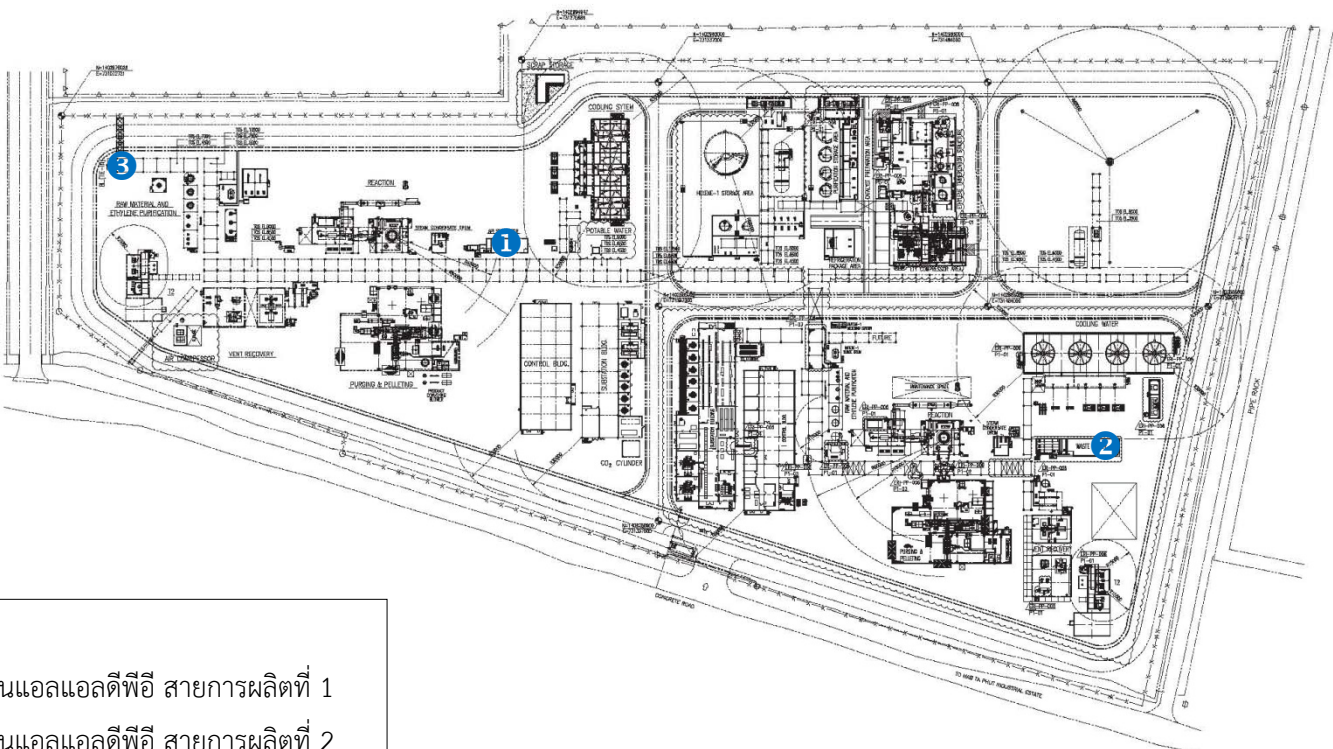

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

- ① บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1
- ② บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2
- ③ Drain Valve

รูปที่ 4.6-1 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



บริเวณบ่อ API
สายการผลิตที่ 1



บริเวณบ่อ API
สายการผลิตที่ 2



บริเวณจุด Drain Valve

รูปที่ 4.6-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอฟ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 (0730918E, 1403211N)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						
	pH	Temperature (°C)	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Zinc (mg/l)
ม.ค. 69	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18 ก.พ. 69	6.65	36.0	18.84	1.6	56	ND(<2.0)	0.18
2 มี.ค. 69	6.65	31.7	<15.00	1.4	44	ND(<2.0)	0.09
2 เม.ย. 69	7.25	34.4	<15.00	<1.0	52	ND(<2.0)	0.05
7 พ.ค. 69	6.01	33.5	<15.00	1.3	<25	ND(<2.0)	0.04
4 มิ.ย. 69	8.09	33.0	27.47	1.1	99	ND(<2.0)	0.15
ND (non-detectable)	<0.10	<0.5	<15.00	<1.0	<25	<2.0	<0.003
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	6.01-8.09	31.7-36.0	<15.00-27.47	<1.0-1.6	<25-99	ND(<2.0)	0.04-0.18
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤40	≤120	≤20	^{2/}	≤5.0	≤5.0

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

2. ^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

(โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร

บริเวณปากคลองบางเบิดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000) ซึ่งค่ามาตรฐาน TDS ในแต่ละเดือนของน้ำทิ้ง มีดังนี้

เดือนมกราคม มีค่าเท่ากับ 38,420 มิลลิกรัมต่อลิตร เดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเท่ากับ 39,080 มิลลิกรัมต่อลิตร

เดือนมีนาคม มีค่าเท่ากับ 39,300 มิลลิกรัมต่อลิตร เดือนเมษายน มีค่าเท่ากับ 38,660 มิลลิกรัมต่อลิตร

เดือนพฤษภาคม มีค่าเท่ากับ 38,960 มิลลิกรัมต่อลิตร เดือนมิถุนายน มีค่าเท่ากับ 39,340 มิลลิกรัมต่อลิตร

3. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุง ในเดือนมกราคม พ.ศ.2569

ชื่อผู้ตรวจวัด :

นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ / นายบวร ดีชัยยะ / นางสาวทิพย์สุดา วรรณการ /
นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก :

นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ / นายบวร ดีชัยยะ / นางสาวทิพย์สุดา วรรณการ /
นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

นางสาวเชมซุตา อินทร์ศรี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :

บริษัท ซีคอฟ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ :

นางสาวพรนภา บุตรธรรม

เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ :

ว-239-จ-0018

เบอร์โทรศัพท์ :

02-959-3600

ตารางที่ 4.6-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 (0731181E, 1403120N)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						
	pH	Temperature (°C)	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Zinc (mg/l)
8 ม.ค. 69	7.39	32.7	29.12	1.5	74	ND(<2.0)	0.27
18 ก.พ. 69	6.90	33.9	52.00	2.9	64	ND(<2.0)	0.34
2 มี.ค. 69	7.59	34.1	<15.00	3.4	96	ND(<2.0)	0.05
2 เม.ย. 69	7.11	34.9	<15.00	2.0	100	ND(<2.0)	0.07
7 พ.ค. 69	6.55	33.4	<15.00	1.8	148	ND(<2.0)	0.10
4 มิ.ย. 69	8.42	35.5	<15.00	<1.0	131	ND(<2.0)	0.04
ND (non-detectable)	<0.10	<0.5	<15.00	<1.0	<25	<2.0	<0.003
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	6.55-8.42	32.7-35.5	<15.00-52.00	<1.0-3.4	64-148	ND(<2.0)	0.04-0.34
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤40	≤120	≤20	^{2/}	≤5.0	≤5.0

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

2. ^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

(โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร

บริเวณปากคลองบางเบิดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000) ซึ่งค่ามาตรฐาน TDS ในแต่ละเดือนของน้ำทิ้ง มีดังนี้

เดือนมกราคม	มีค่าเท่ากับ 38,420 มิลลิกรัมต่อลิตร	เดือนกุมภาพันธ์	มีค่าเท่ากับ 39,080 มิลลิกรัมต่อลิตร
เดือนมีนาคม	มีค่าเท่ากับ 39,300 มิลลิกรัมต่อลิตร	เดือนเมษายน	มีค่าเท่ากับ 38,660 มิลลิกรัมต่อลิตร
เดือนพฤษภาคม	มีค่าเท่ากับ 38,960 มิลลิกรัมต่อลิตร	เดือนมิถุนายน	มีค่าเท่ากับ 39,340 มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ / นายบวร ดิษฐ์ยะ / นางสาวทิพย์สุดา วรรณการ / นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ / นายบวร ดิษฐ์ยะ / นางสาวทิพย์สุดา วรรณการ / นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเชมชุตตา อินทร์ศรี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวพรนภา บุตรธรรม

เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0018

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.6-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุด Drain Valve ของโรงงาน

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

จุด Drain Valve ของโรงงาน (0730871E, 1403130N)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด								
	pH	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	Free Chlorine (mg/L)	Conductivity (µS/cm)	Oil & Grease (mg/L)	Zinc (mg/L)
ม.ค. 69	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18 ก.พ. 69	6.75	15.82	3.8	830	18	0.14	986	ND(<2.0)	0.25
26 มี.ค. 69	7.22	<15.00	3.8	572	22	ND(<0.03)	1,060	ND(<2.0)	0.18
2 เม.ย. 69	7.23	23.54	4.2	476	20	0.23	1,312	ND(<2.0)	0.34
7 พ.ค. 69	6.10	19.84	1.4	686	12	0.73	1,103	ND(<2.0)	0.12
4 มิ.ย. 69	7.23	47.87	<1.0	554	7.8	0.10	925	ND(<2.0)	0.27
ND (non- detectable)	<0.10	<15.00	<1.0	<25	<2.5	<0.03	<1.0	<2.0	<0.003
ค่าต่ำสุด- ค่าสูงสุด	6.10- 7.23	<15.00- 47.87	<1.0- 4.2	476- 830	7.8- 22	ND(<0.03)- 0.73	925- 1,312	ND(<2.0)	0.12- 0.34
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤120	≤20	^{2/}	≤50	≤1.0	-	≤5.0	≤5.0

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

2. ^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

(โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร

บริเวณปากคลองบางเบิดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000) ซึ่งค่ามาตรฐาน TDS ในแต่ละเดือนของน้ำทิ้ง มีดังนี้

เดือนมกราคม มีค่าเท่ากับ 38,420 มิลลิกรัมต่อลิตร เดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเท่ากับ 39,080 มิลลิกรัมต่อลิตร

เดือนมีนาคม มีค่าเท่ากับ 39,300 มิลลิกรัมต่อลิตร เดือนเมษายน มีค่าเท่ากับ 38,660 มิลลิกรัมต่อลิตร

เดือนพฤษภาคม มีค่าเท่ากับ 38,960 มิลลิกรัมต่อลิตร เดือนมิถุนายน มีค่าเท่ากับ 39,340 มิลลิกรัมต่อลิตร

3. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุง ในเดือนมกราคม พ.ศ.2569

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ / นายบวร ดีชัยยะ / นางสาวทิพย์สุตา วรรณการ /
นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก : นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ / นายบวร ดีชัยยะ / นางสาวทิพย์สุตา วรรณการ /
นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเข็มชуда อินทร์ศรี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวพรนภา บุตรธรรม

เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0018

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

4.6.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ของโรงงานแอลแอลดีพีอี ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ใน 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 และน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น บริเวณจุด Drain Valve ของโรงงาน โดยน้ำทิ้งจากบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอีสายการผลิตที่ 1 และสายการผลิตที่ 2 ดำเนินการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ซีโอดี บีโอดี ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด น้ำมันและไขมัน และสังกะสี เดือนละ 1 ครั้ง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6-4 ถึงตารางที่ 4.6-5 และรูปที่ 4.6-3 ถึงรูปที่ 4.6-4 ซึ่งจะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง (Final Check Basin) ของโรงงานอีเทนแครกเกอร์ ก่อนระบายออกนอกโรงงานต่อไป พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2559

ส่วนคุณภาพน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น บริเวณจุด Drain Valve ของโรงงาน ซึ่งจะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง (Final Check Basin) ของโรงงานอีเทนแครกเกอร์ ก่อนระบายออกนอกโรงงานต่อไป พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ซีโอดี บีโอดี ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด คลอรีนอิสระ สภาพการนำไฟฟ้า น้ำมันและไขมัน และสังกะสี เดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6-6 และรูปที่ 4.6-5 ผลการตรวจวัด พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 ส่วนค่าสภาพการนำไฟฟ้ายังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐาน

ตารางที่ 4.6-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด						
	pH	Temperature (°C)	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Zinc (mg/l)
6 ก.ค. 66	6.90	36.6	44.21	9.0	68	ND(<0.5)	0.10
3 ส.ค. 66	6.98	37.2	<15.00	1.0	100	ND(<0.5)	0.10
7 ก.ย. 66	7.13	36.9	<15.00	3.3	92	ND(<0.5)	0.09
5 ต.ค. 66	7.02	34.0	<15.00	2.3	95	ND(<0.5)	0.16
2 พ.ย. 66	6.97	37.6	<15.00	4.8	51	ND(<0.5)	0.10
7 ธ.ค. 66	7.07	32.1	28.40	2.8	78	ND(<0.5)	0.11
18 ม.ค. 67	7.19	35.8	<15.00	<1.0	64	ND(<0.5)	0.07
1 ก.พ. 67	7.15	37.7	<15.00	<1.0	82	ND(<0.5)	0.10
6 มี.ค. 67	7.31	36.4	<15.00	<1.0	95	ND(<0.5)	0.10
4 เม.ย. 67	7.21	38.5	<15.00	2.4	101	ND(<0.5)	0.08
20 พ.ค. 67	7.03	32.8	<15.00	3.3	156	ND(<0.5)	0.10
6 มิ.ย. 67	7.70	38.3	<15.00	2.5	127	ND(<0.5)	0.13
18 ก.ค. 67	6.87	37.8	17.08	1.5	<50	ND(<0.5)	0.07
1 ส.ค. 67	7.59	38.1	<15.00	1.2	<50	ND(<0.5)	0.05
5 ก.ย. 67	7.10	34.3	<15.00	1.4	70	ND(<0.5)	0.07
3 ต.ค. 67	7.83	36.6	16.14	<1.0	77	ND(<0.5)	0.08
7 พ.ย. 67	7.42	34.2	<15.00	1.6	94	ND(<0.5)	0.07
4 ธ.ค. 67	7.77	35.0	19.91	1.1	73	ND(<0.5)	0.06
3 ม.ค. 68	6.87	35.0	<15.00	2.2	64	ND(<2.0)	0.04
6 ก.พ. 68	7.43	36.2	<15.00	1.3	66	ND(<2.0)	0.10
6 มี.ค. 68	7.59	36.3	<15.00	1.4	<25	ND(<2.0)	0.04
3 เม.ย. 68	7.60	35.7	17.50	1.5	50	ND(<2.0)	0.04
8 พ.ค. 68	6.90	35.3	36.17	1.7	72	ND(<2.0)	0.05
5 มิ.ย. 68	7.33	32.9	35.16	2.6	82	ND(<2.0)	0.08
เกณฑ์ควบคุม ^{1/}	5.5-9.0	≤40	≤120	≤20	^{2/}	≤5	≤5

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.25592. ^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจกค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบ็ดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ตารางที่ 4.6-4 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด						
	pH	Temperature (°C)	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Zinc (mg/l)
3 ก.ค. 68	7.07	34.0	28.61	1.8	68	ND(<2.0)	0.18
7 ส.ค. 68	7.02	36.8	<15.00	2.6	38	ND(<2.0)	0.09
4 ก.ย. 68	7.22	38.3	<15.00	2.4	74	ND(<2.0)	0.05
2 ต.ค. 68	7.24	31.2	31.82	1.7	38	ND(<2.0)	0.08
6 พ.ย. 68	6.56	38.6	23.54	3.0	76	ND(<2.0)	0.38
17 ธ.ค. 68	6.66	34.0	23.09	3.1	44	ND(<2.0)	0.03
ม.ค. 69	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18 ก.พ. 69	6.65	36.0	18.84	1.6	56	ND(<2.0)	0.18
2 มี.ค. 69	6.65	31.7	<15.00	1.4	44	ND(<2.0)	0.09
2 เม.ย. 69	7.25	34.4	<15.00	<1.0	52	ND(<2.0)	0.05
7 พ.ค. 69	6.01	33.5	<15.00	1.3	<25	ND(<2.0)	0.04
4 มิ.ย. 69	8.09	33.0	27.47	1.1	99	ND(<2.0)	0.15
เกณฑ์ควบคุม ^{1/}	5.5-9.0	≤40	≤120	≤20	^{2/}	≤5	≤5

- หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
2. ^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบ็ดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร)
3. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุงในเดือนมกราคม พ.ศ.2569

ตารางที่ 4.6-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด						
	pH	Temperature (°C)	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Zinc (mg/l)
6 ก.ค. 66	7.13	36.8	16.67	6.6	122	ND(<0.5)	0.19
3 ส.ค. 66	7.02	34.2	<15.00	4.8	75	ND(<0.5)	0.08
7 ก.ย. 66	7.30	33.4	<15.00	4.7	126	ND(<0.5)	0.08
5 ต.ค. 66	6.96	29.4	15.12	3.6	108	ND(<0.5)	0.17
2 พ.ย. 66	7.32	35.5	19.00	2.7	190	ND(<0.5)	0.17
25 ธ.ค. 66	8.83	31.3	17.64	1.8	108	ND(<0.5)	0.15
18 ม.ค. 67	7.16	34.3	20.79	1.5	123	ND(<0.5)	0.13
1 ก.พ. 67	7.22	36.6	<15.00	<1.0	75	ND(<0.5)	0.09
6 มี.ค. 67	7.23	35.3	<15.00	3.5	98	ND(<0.5)	0.10
4 เม.ย. 67	7.20	37.3	17.66	2.1	132	ND(<0.5)	0.10
2 พ.ค. 67	7.62	37.2	31.38	1.3	192	ND(<0.5)	0.12
6 มิ.ย. 67	7.49	34.6	<15.00	1.3	152	ND(<0.5)	0.22
4 ก.ค. 67	7.42	33.0	64.21	5.4	252	ND(<0.5)	0.14
1 ส.ค. 67	7.29	32.4	<15.00	<1.0	58	ND(<0.5)	0.12
5 ก.ย. 67	6.98	34.2	<15.00	3.8	82	ND(<0.5)	0.13
3 ต.ค. 67	7.34	33.2	24.22	1.1	62	ND(<0.5)	0.12
7 พ.ย. 67	7.77	32.9	<15.00	1.8	65	ND(<0.5)	0.12
4 ธ.ค. 67	7.71	29.9	34.14	2.2	144	ND(<0.5)	0.19
3 ม.ค. 68	6.98	32.2	<15.00	3.0	83	ND(<2.0)	0.11
6 ก.พ. 68	7.59	32.0	<15.00	3.7	110	ND(<2.0)	0.86
6 มี.ค. 68	7.74	34.4	<15.00	2.3	120	ND(<2.0)	0.11
3 เม.ย. 68	7.55	32.2	17.50	6.3	130	ND(<2.0)	0.37
8 พ.ค. 68	7.87	33.6	<15.00	4.7	116	ND(<2.0)	0.29
5 มิ.ย. 68	7.60	33.2	23.68	1.3	124	ND(<2.0)	0.10
เกณฑ์ควบคุม ^{1/}	5.5-9.0	≤40	≤120	≤20	^{2/}	≤5	≤5

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
 2. ^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบ็ดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ตารางที่ 4.6-5 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด						
	pH	Temperature (°C)	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Zinc (mg/l)
3 ก.ค. 68	7.51	32.0	58.72	3.1	98	ND(<2.0)	0.08
7 ส.ค. 68	7.03	35.3	27.68	4.6	344	ND(<2.0)	0.88
4 ก.ย. 68	7.52	35.6	30.85	3.0	92	ND(<2.0)	0.09
2 ต.ค. 68	7.11	32.9	17.02	1.6	70	ND(<2.0)	0.23
6 พ.ย. 68	6.89	34.6	<15.00	<1.0	79	ND(<2.0)	0.05
17 ธ.ค. 68	6.84	31.6	<15.00	1.0	117	ND(<2.0)	0.34
8 ม.ค. 69	7.39	32.7	29.12	1.5	74	ND(<2.0)	0.27
18 ก.พ. 69	6.90	33.9	52.00	2.9	64	ND(<2.0)	0.34
2 มี.ค. 69	7.59	34.1	<15.00	3.4	96	ND(<2.0)	0.05
2 เม.ย. 69	7.11	34.9	<15.00	2.0	100	ND(<2.0)	0.07
7 พ.ค. 69	6.55	33.4	<15.00	1.8	148	ND(<2.0)	0.10
4 มิ.ย. 69	8.42	35.5	<15.00	<1.0	131	ND(<2.0)	0.04
เกณฑ์ควบคุม ^{1/}	5.5-9.0	≤40	≤120	≤20	^{2/}	≤5	≤5

หมายเหตุ : 1.^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
 2.^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยน้ำทิ้งบริเวณ บ่อพักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบ็ดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ตารางที่ 4.6-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น บริเวณ Drain Valve ของโรงงาน
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด								
	pH	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	TSS (mg/l)	Free Chlorine (mg/l)	Conductivity (μS/cm)	Oil & Grease (mg/l)	Zn (mg/l)
6 ก.ค. 66	7.03	28.27	4.7	887	36	0.12	1,488	ND(<0.5)	0.46
3 ส.ค. 66	7.17	20.24	1.6	857	6	0.06	1,403	ND(<0.5)	0.64
7 ก.ย. 66	7.51	36.29	4.8	880	32	0.52	1,669	ND(<0.5)	0.56
5 ต.ค. 66	7.02	18.90	<1.0	689	7	ND(<0.03)	1,236	ND(<0.5)	0.56
2 พ.ย. 66	7.30	<15.00	1.2	851	6	ND(<0.03)	1,636	ND(<0.5)	0.62
7 ธ.ค. 66	7.58	<15.00	3.4	840	16	ND(<0.03)	1,403	ND(<0.5)	0.56
18 ม.ค. 67	7.13	17.08	3.6	808	6	0.05	1,310	ND(<0.5)	0.28
1 ก.พ. 67	7.24	20.80	1.8	814	5	0.12	1,332	ND(<0.5)	0.24
6 มี.ค. 67	6.96	<15.00	1.6	724	<5	0.09	1,173	ND(<0.5)	0.24
4 เม.ย. 67	7.45	17.66	1.1	909	<5	0.07	1,534	ND(<0.5)	0.16
20 พ.ค. 67	6.91	24.26	1.7	813	<5	ND(<0.03)	1,215	ND(<0.5)	0.16
6 มิ.ย. 67	7.15	17.57	1.6	845	<5	ND(<0.03)	1,344	ND(<0.50)	0.68
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤120	≤20	^{2/}	≤50	≤1.0	-	≤5.0	≤5.0

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
2. ^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบิดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ตารางที่ 4.6-6

(ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด								
	pH	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	TSS (mg/l)	Free Chlorine (mg/l)	Conductivity (µS/cm)	Oil & Grease (mg/l)	Zn (mg/l)
4 ก.ค. 67	7.44	33.16	2.3	102	8	0.06	240	ND(<0.5)	0.18
1 ส.ค. 67	7.10	34.33	1.4	926	8	0.14	1,381	ND(<0.5)	0.59
5 ก.ย. 67	7.40	<15.00	<1.0	798	<5	0.33	1,440	ND(<0.5)	0.42
3 ต.ค. 67	7.80	28.25	2.0	790	<5	0.09	1,354	ND(<0.5)	0.34
7 พ.ย. 67	7.45	<15.00	1.9	692	5	0.04	1,286	ND(<0.5)	0.54
4 ธ.ค. 67	7.13	17.07	1.9	799	6	0.34	1,488	ND(<0.5)	0.35
3 ม.ค. 68	7.27	17.85	3.6	807	8.0	0.25	1,160	ND(<2.0)	0.28
6 ก.พ. 68	7.41	<15.00	2.0	565	7.5	0.31	1,071	ND(<2.0)	0.26
6 มี.ค. 68	7.53	18.68	2.1	808	4.0	0.11	1,316	ND(<2.0)	0.11
3 เม.ย. 68	7.80	<15.00	1.4	498	4.4	0.03	730	ND(<2.0)	0.14
8 พ.ค. 68	6.89	<15.00	1.1	204	6.2	0.05	444	ND(<2.0)	0.15
5 มิ.ย. 68	7.13	<15.00	<1.0	754	4.0	0.17	948	ND(<2.0)	0.23
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤120	≤20	^{2/}	≤50	≤1.0	-	≤5.0	≤5.0

หมายเหตุ :

1./ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

2./ ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบิดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ตารางที่ 4.6-6 (ต่อ)


วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด								
	pH	COD (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	TDS (mg/l)	TSS (mg/l)	Free Chlorine (mg/l)	Conductivity (μS/cm)	Oil & Grease (mg/l)	Zn (mg/l)
3 ก.ค. 68	7.37	28.61	1.1	360	5.2	0.04	436	ND(<2.0)	0.15
7 ส.ค. 68	7.32	16.46	1.2	432	7.0	0.05	819	ND(<2.0)	0.27
4 ก.ย. 68	7.11	<15.00	<1.0	332	5.6	0.08	588	ND(<2.0)	0.12
2 ต.ค. 68	6.76	22.72	2.3	646	6.4	0.20	1,048	ND(<2.0)	0.40
6 พ.ย. 68	7.02	<15.00	1.2	675	7.2	0.18	1,154	ND(<2.0)	0.10
17 ธ.ค. 68	7.26	<15.00	1.5	764	7.6	ND(<0.03)	1,020	ND(<2.0)	0.22
ม.ค. 69	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18 ก.พ. 69	6.75	15.82	3.8	830	18	0.14	986	ND(<2.0)	0.25
26 มี.ค. 69	7.22	<15.00	3.8	572	22	ND(<0.03)	1,060	ND(<2.0)	0.18
2 เม.ย. 69	7.23	23.54	4.2	476	20	0.23	1,312	ND(<2.0)	0.34
7 พ.ค. 69	6.10	19.84	1.4	686	12	0.73	1,103	ND(<2.0)	0.12
4 มิ.ย. 69	7.23	47.87	<1.0	554	7.8	0.10	925	ND(<2.0)	0.27
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.5-9.0	≤120	≤20	^{2/}	≤50	≤1.0	-	≤5.0	≤5.0

- หมายเหตุ : 1.^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
- 2.^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบ็ดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร)
3. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุงในเดือนมกราคม พ.ศ.2569


รูปที่ 4.6-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพี สายการผลิตที่ 1

โรงงานแอลแอลดีพี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

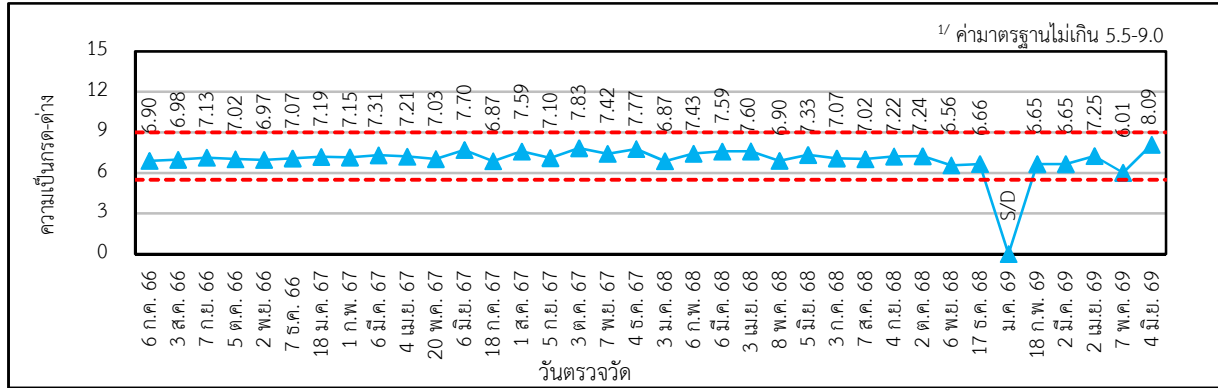

pH

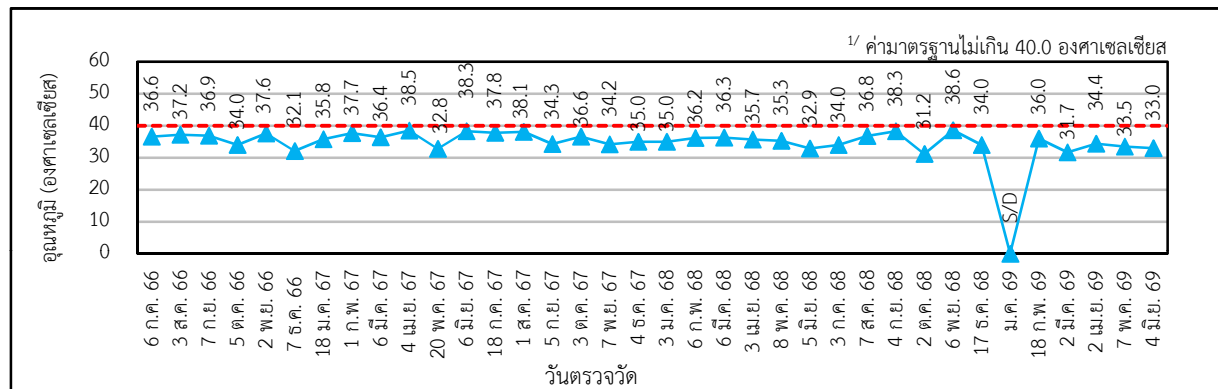

Temperature

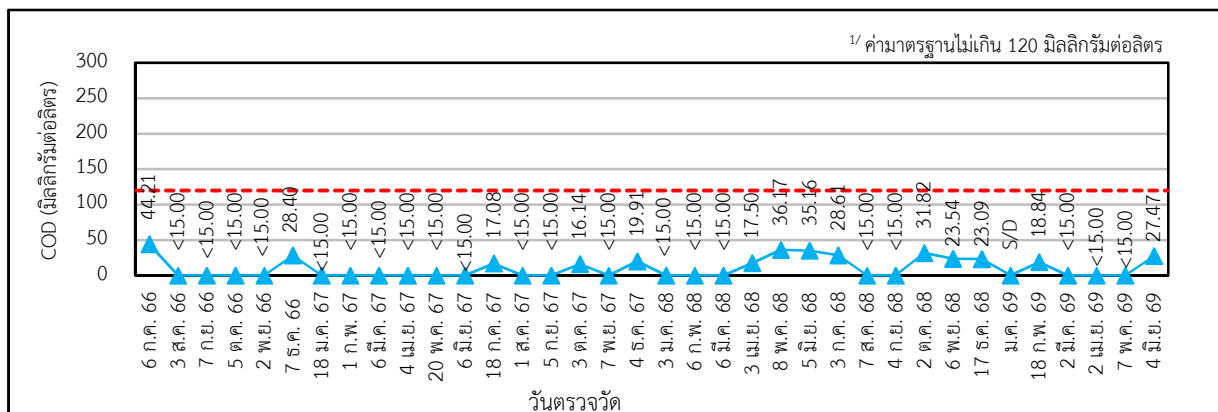



COD

หมายเหตุ : 1. ^{1/}ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559


2. ค่า COD มีแนวโน้มสูงขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เนื่องจากการระบายน้ำฝนบางส่วนที่สะสมภายในกระบวนการผลิต

3. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุงประจำปีในเดือนมกราคม พ.ศ.2569

รูปที่ 4.6-3 (ต่อ)

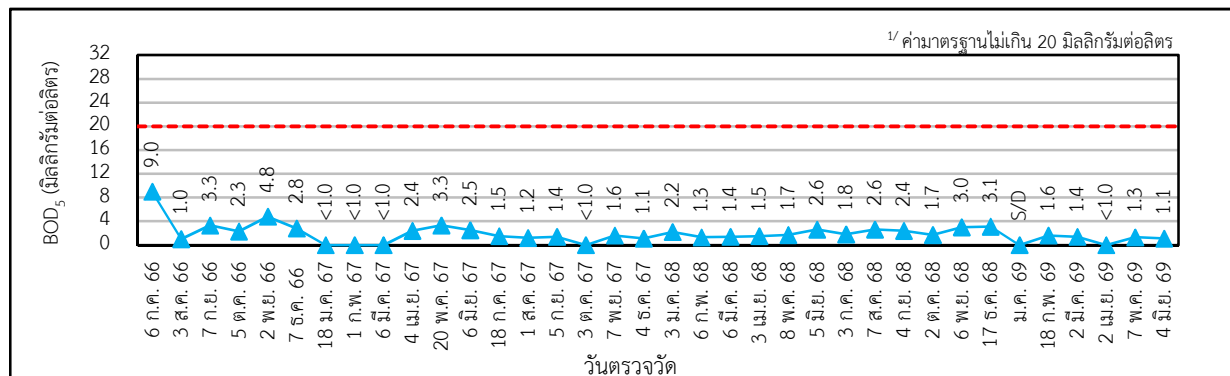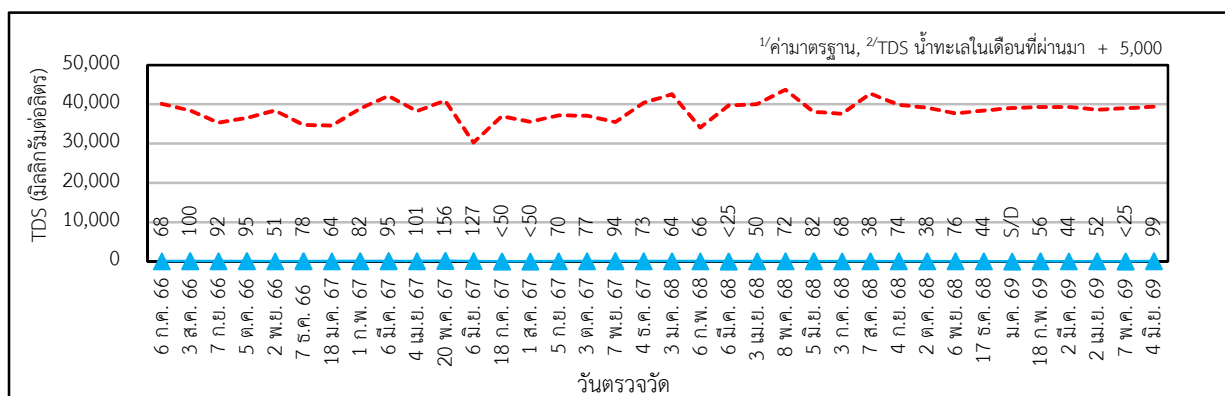BOD₅

TDS

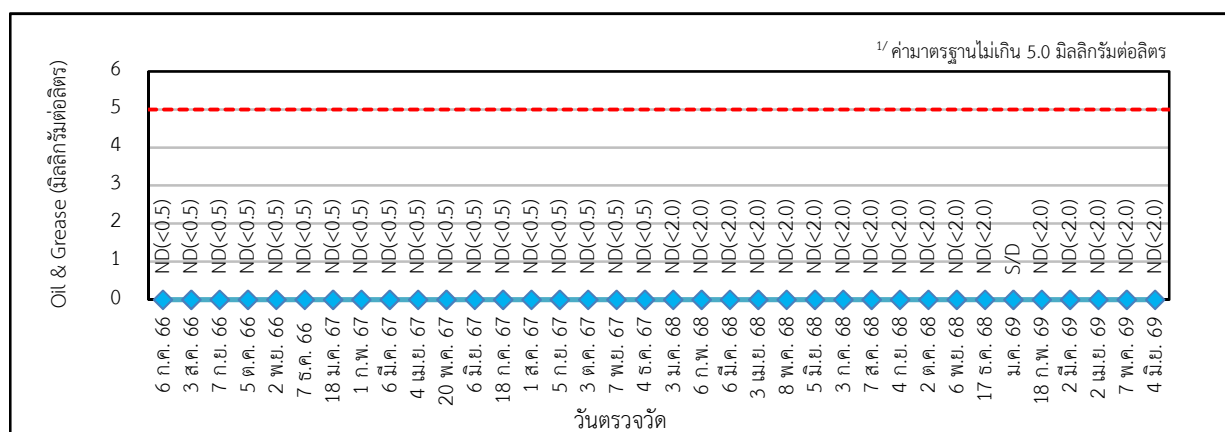

Oil & Grease


หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

2. ^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบ็ดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000

3. ค่า BOD₅ COD มีแนวโน้มสูงขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เนื่องจากมีการระบายน้ำฝนบางส่วนที่สะสมภายในกระบวนการผลิต

4. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุงในเดือนมกราคม พ.ศ.2569


รูปที่ 4.6-3 (ต่อ)

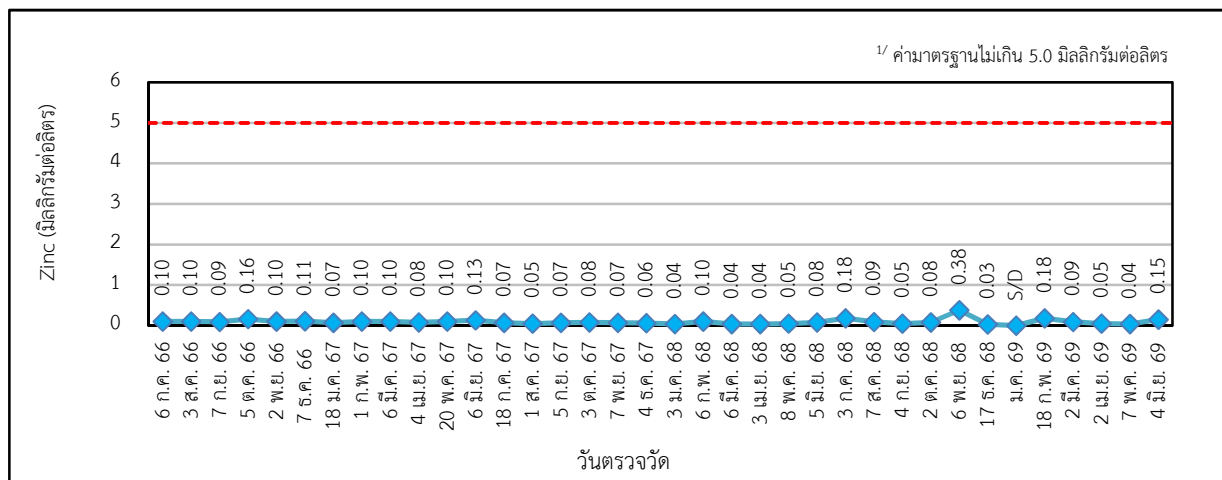

Zinc

หมายเหตุ : 1. ^{1/}ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
2. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุงในเดือนมกราคม พ.ศ.2569



รูปที่ 4.6-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อ API ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

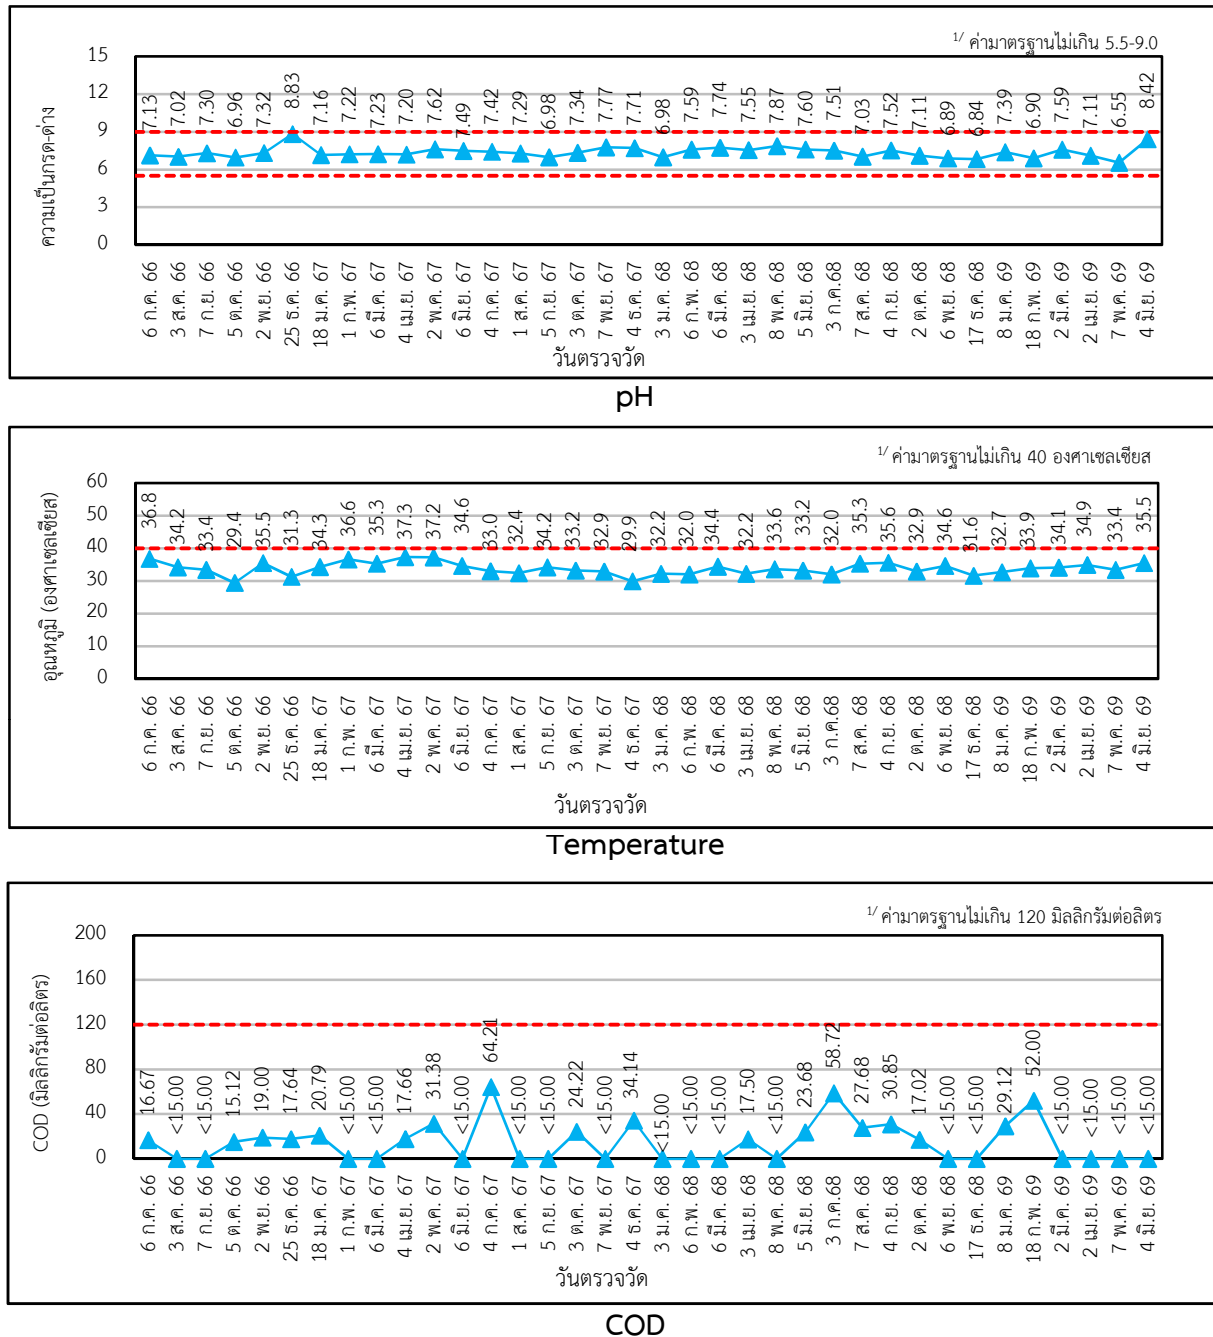


หมายเหตุ : 1. 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

- ค่า pH ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 มีแนวโน้มสูงเนื่องจากการ Low Level ขอบบ เมื่อทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสียหลังกิจกรรมซ่อมบำรุง ซึ่งอาจทำให้เป็นตัวอย่างของน้ำที่เกิดสะสมในก้นบ่อเป็นระยะเวลานานได้ โดยระหว่างนั้นไม่ได้มีการส่งน้ำเสียไปบ่อพักของโรงงานอีเทนแครกเกอร์แต่อย่างใด แต่โรงงานได้มีการควบคุมค่า pH ให้เป็นกลางจนสามารถปล่อยไปบ่อพักของโรงงานอีเทนแครกเกอร์ได้
- ค่า COD ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567 สูงเนื่องจากมีกิจกรรมล้างรางระบายน้ำฝนในพื้นที่กระบวนการผลิต

รูปที่ 4.6-4 (ต่อ)

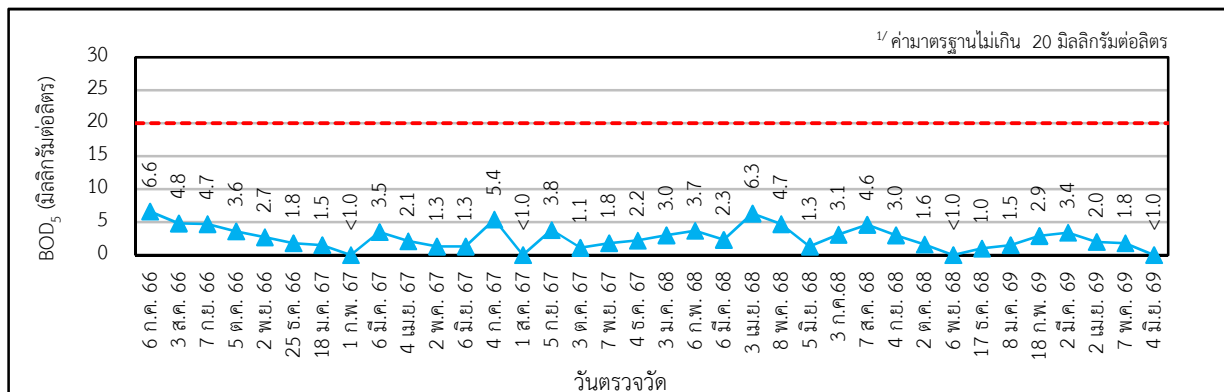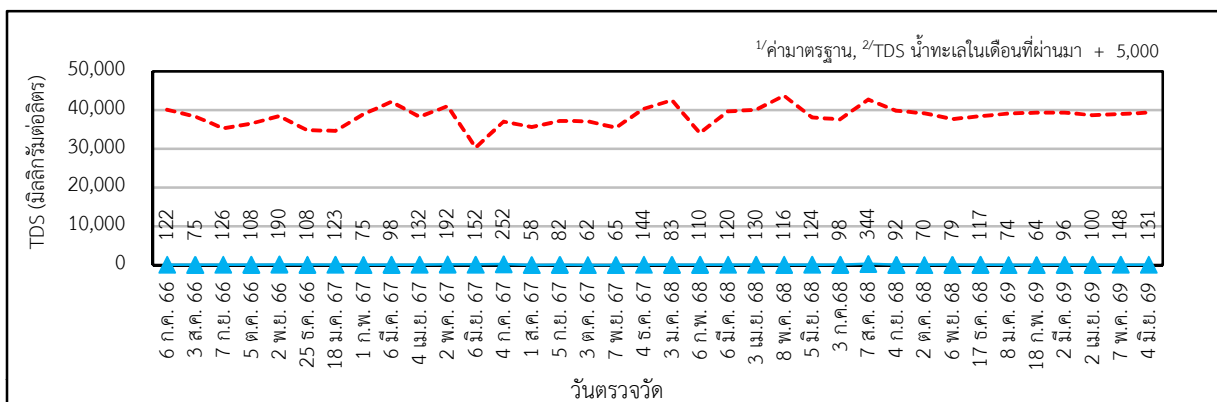BOD₅

TDS

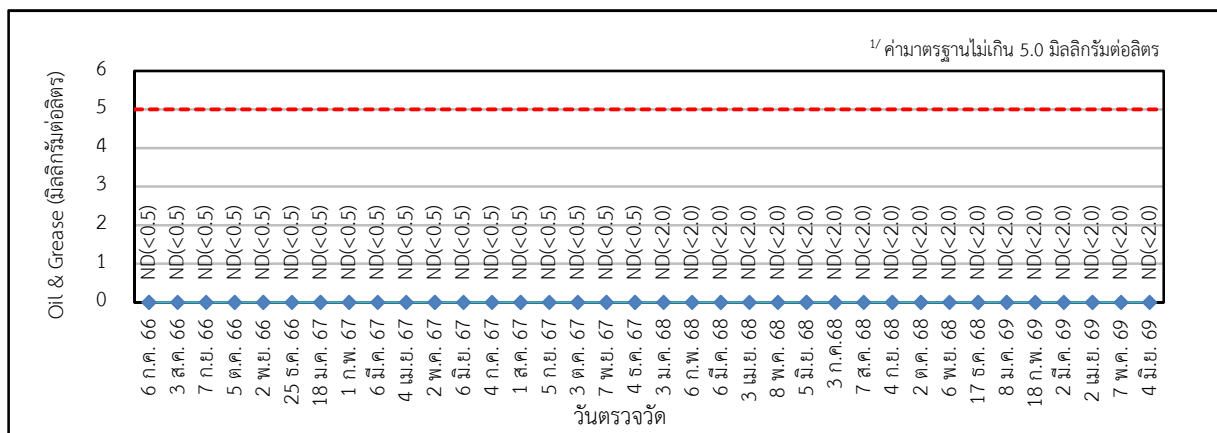


Oil & Grease

หมายเหตุ : 1.^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

2.^{2/} ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยน้ำทิ้งบริเวณ บ่อพักน้ำทิ้งจะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบ็ดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000)


รูปที่ 4.6-4 (ต่อ)

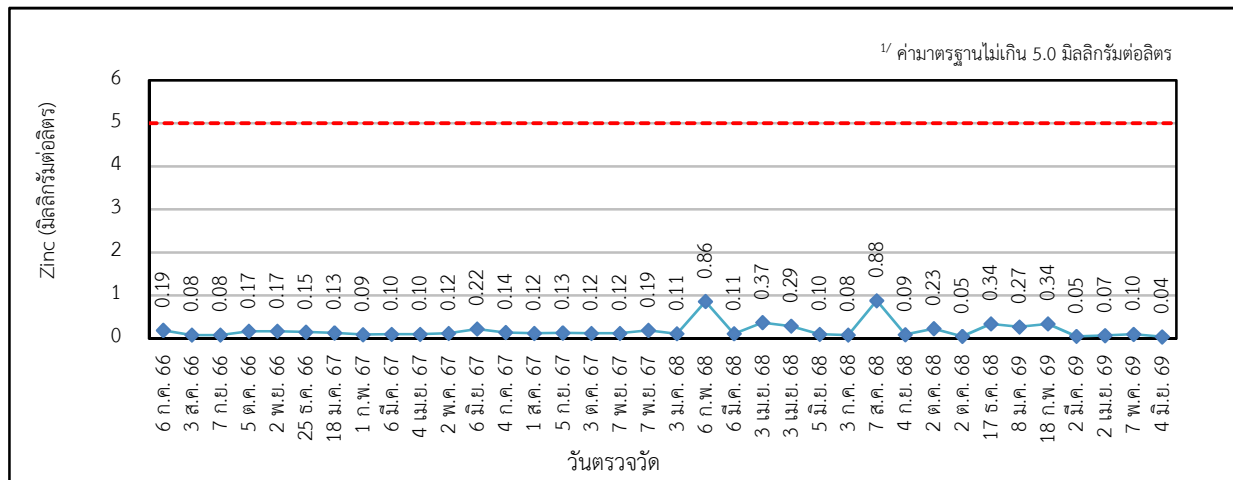


Zinc

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559


รูปที่ 4.6-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุด Drain Valve ของโรงงาน
โรงงานแอลแอลดีพี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

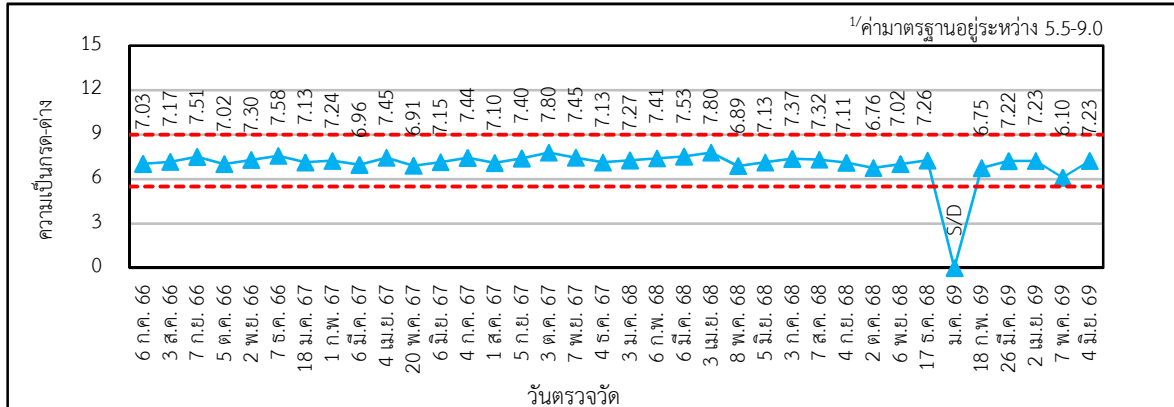

pH

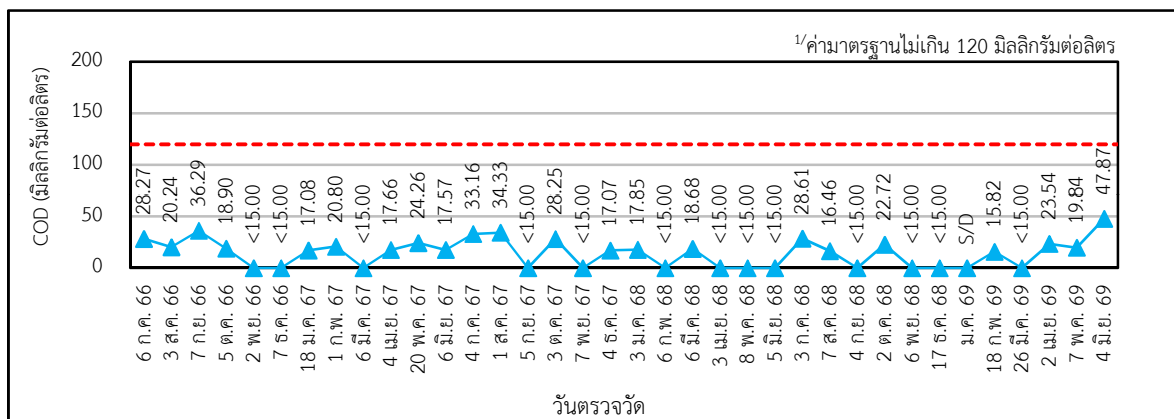


COD

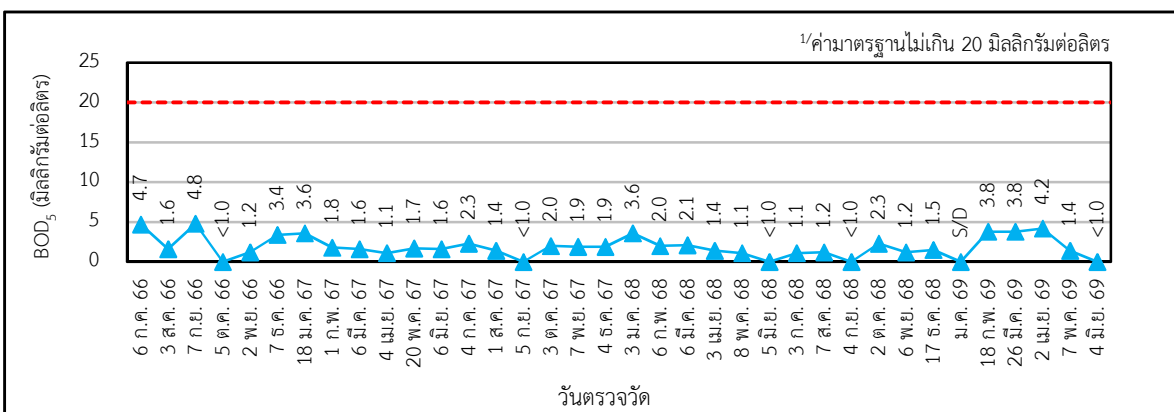BOD₅


หมายเหตุ : 1. / ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

2. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุงในเดือนมกราคม พ.ศ.2569


รูปที่ 4.6-5 (ต่อ)

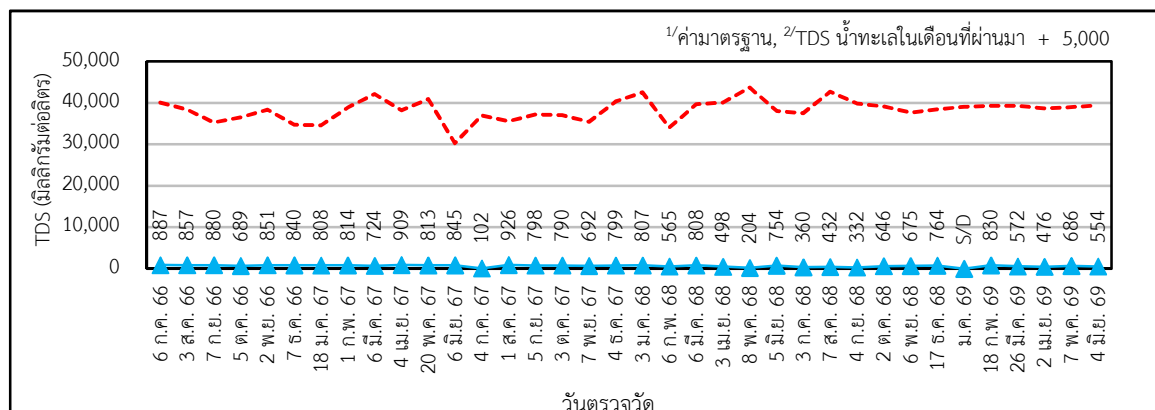

TDS

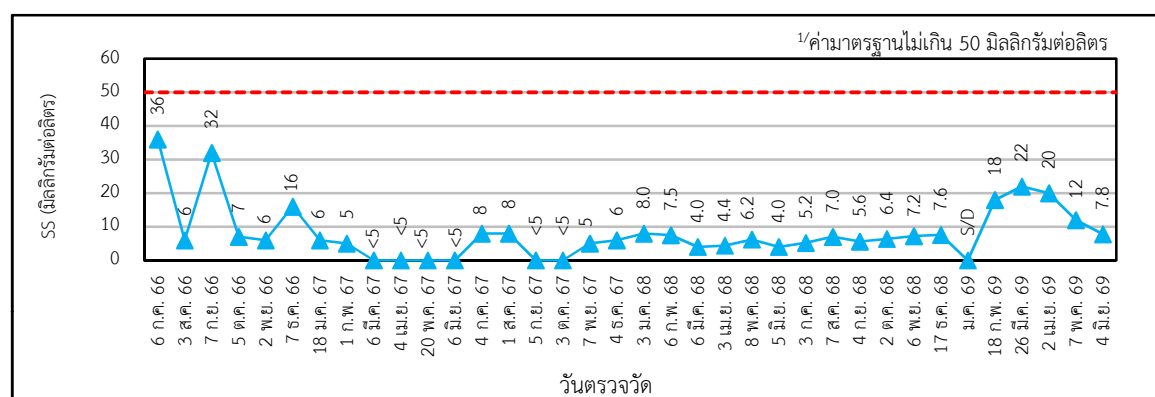


TSS

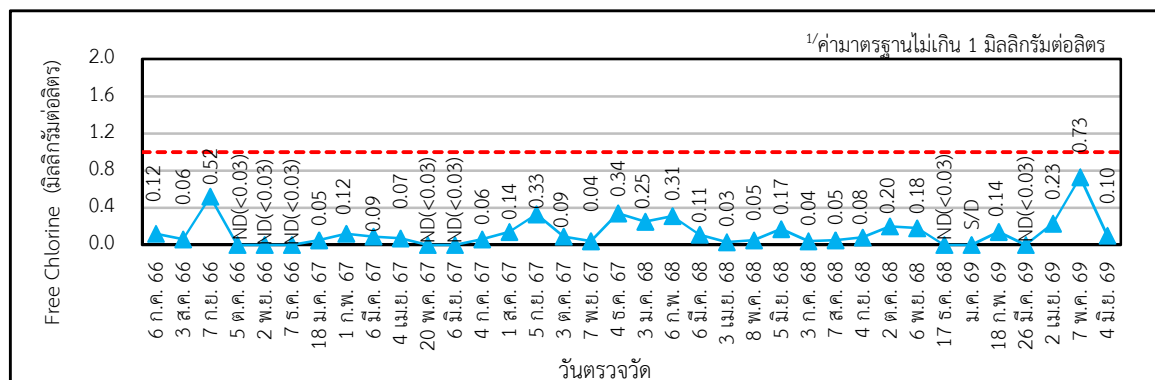


Free Chlorine

- หมายเหตุ : 1./ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
- 2./ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) จะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่อยู่ในแหล่งรองรับน้ำทิ้งไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยน้ำทิ้งบริเวณ บ่อพักน้ำที่จะนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มาจากค่า TDS ที่ระยะ 500 เมตร บริเวณปากคลองบางเบ็ดของเดือนที่ผ่านมา + 5,000)
3. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุงประจำปีในเดือนมกราคม พ.ศ.2569


รูปที่ 4.6-5 (ต่อ)

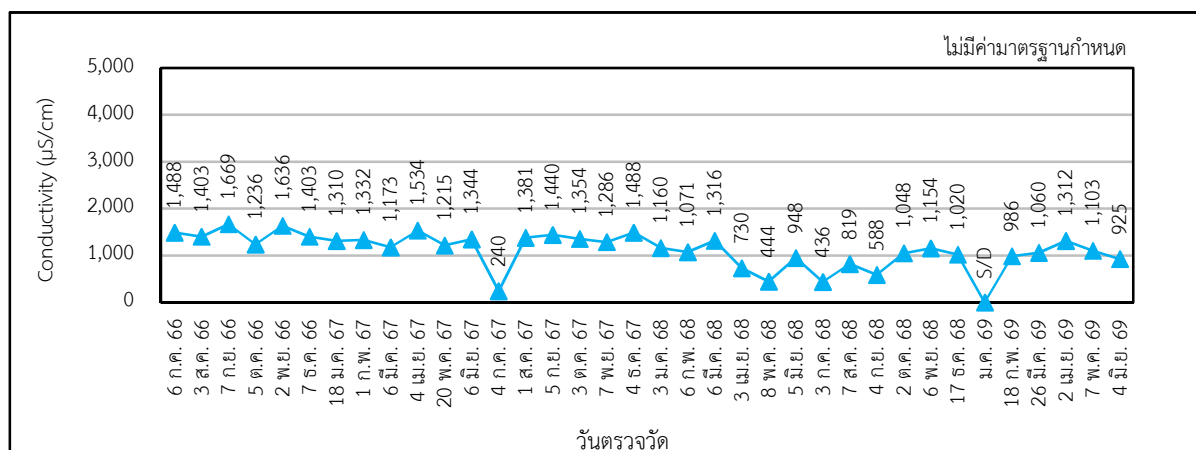

Conductivity

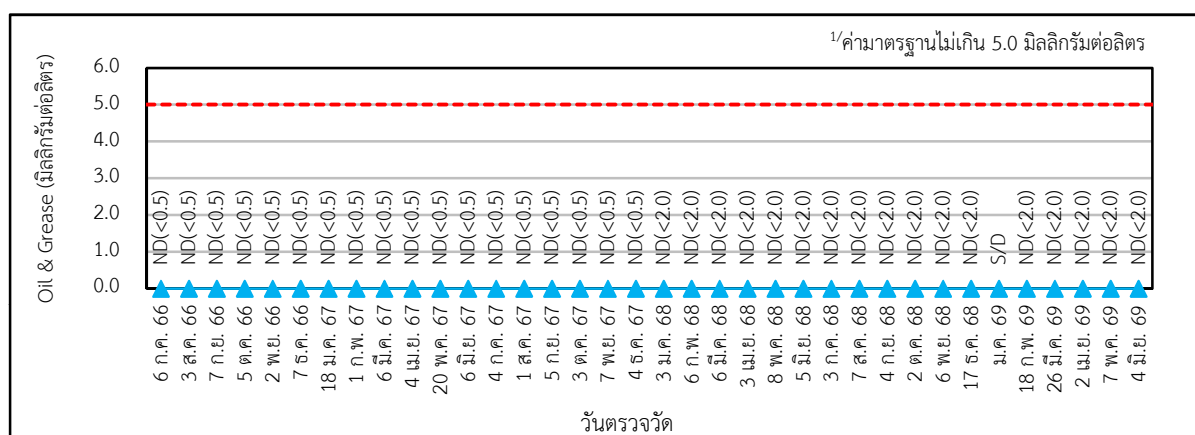

Oil & Grease

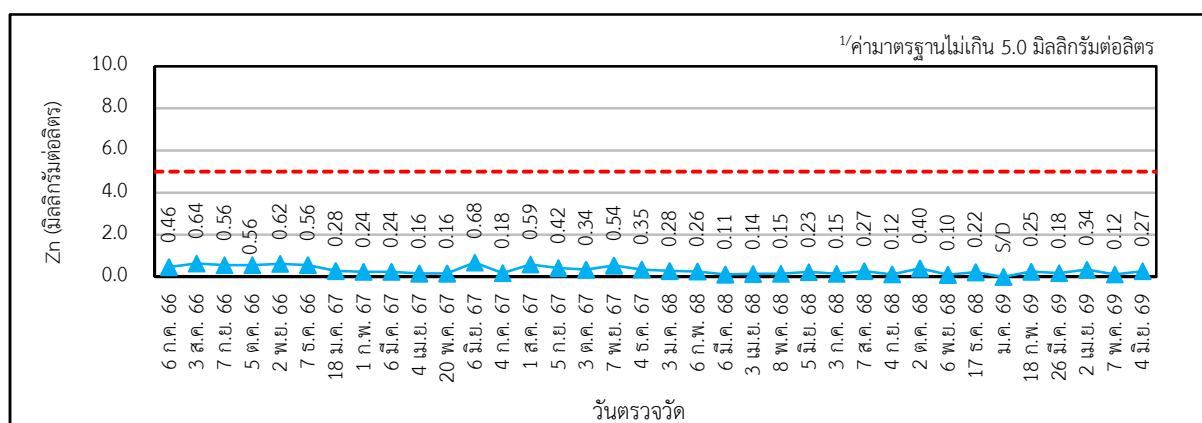

Zn

หมายเหตุ : 1. ^{1/}ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
 2. S/D : โรงงานหยุดซ่อมบำรุงประจำปีในเดือนมกราคม พ.ศ.2569

4.7 ระดับเสียงรบกวนโรงงาน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ในบริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง


4.7.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569 ในบริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ ตำแหน่งและภาพการตรวจวัด ดังแสดงในรูปที่ 4.7-1 ถึงรูปที่ 4.7-2 โดยมีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 4.7-1 และภาคผนวก ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	มีค่าอยู่ในช่วง	63.7-64.2	เดซิเบล(เอ)
ระดับเสียงพื้นฐาน	มีค่าอยู่ในช่วง	61.9-62.6	เดซิเบล(เอ)

เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ยังไม่ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐาน

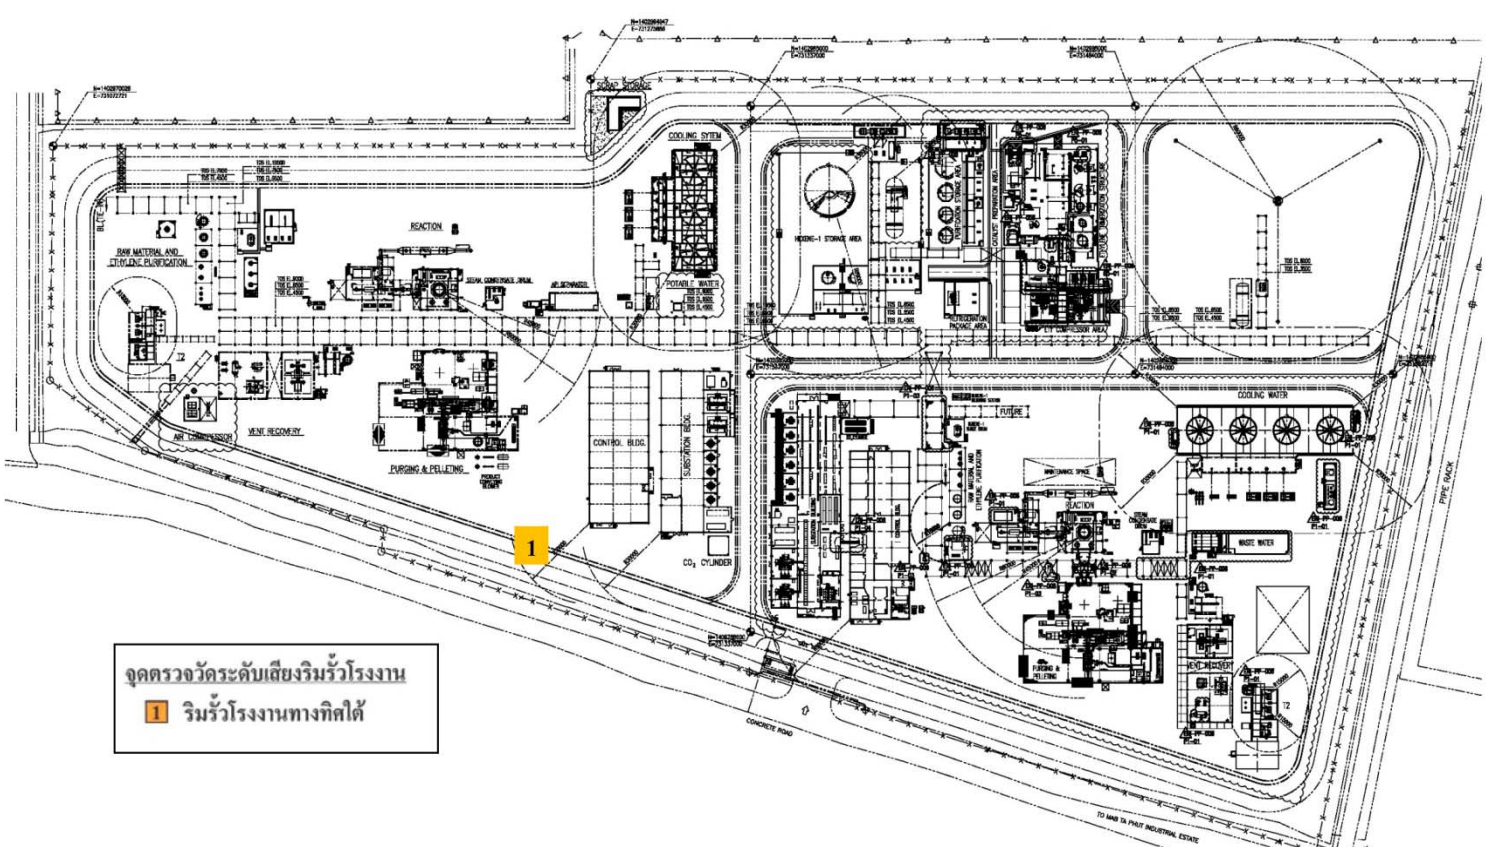

รูปที่ 4.7-1 ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



บริเวณรั้วโรงงานด้านทิศใต้

รูปที่ 4.7-2 ภาพการตรวจวัดระดับเสียงรั้วโรงงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4.7-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี	ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคोट จำกัด	ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (0730920E, 1403116N)
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)	: Cirrus CR162B / G302738
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Cirrus CR:515 / 97097
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A))	: 94.0
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A))	: 92.8 / 0.9
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: 14 ตุลาคม พ.ศ.2568
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: CR-515-2026-084

สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))		สภาพแวดล้อม
		Leq 24 hr	L ₉₀	
ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้	2-3 เม.ย. 68	64.0	62.6	อากาศร้อนจัด
	3-4 เม.ย. 68	64.2	62.3	มีเมฆบางส่วน
	4-5 เม.ย. 68	64.0	62.5	จุดตรวจวัด
	5-6 เม.ย. 68	63.7	62.1	ใกล้ถนน
	6-7 เม.ย. 68	63.9	62.1	มีรถวิ่งผ่าน
	7-8 เม.ย. 68	64.0	62.0	
	8-9 เม.ย. 68	64.1	61.9	
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		70.0	-	

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

2. - ค่ามาตรฐาน L₉₀ ยังไม่มีกำหนด

ชื่อผู้ตรวจวัด :	นายศิวนนท์ กุลวงษ์
ชื่อผู้บันทึก :	นายศิวนนท์ กุลวงษ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :	นางสาวปรีดา สมใจ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :	บริษัท ซีคोट จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ :	นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :	02-959-3600

ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ)

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคोट จำกัด

ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

: ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (0730920E, 1403116N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: Cirrus CR162B / G302738

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: Cirrus CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A))

: 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 92.8 / 0.9

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CR-515-2026-084

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))						
	2-3 เม.ย. 69	3-4 เม.ย. 69	4-5 เม.ย. 69	5-6 เม.ย. 69	6-7 เม.ย. 69	7-8 เม.ย. 69	8-9 เม.ย. 69
10:00 - 11:00	64.3	63.8	65.2	63.4	63.3	64.2	64.0
11:00 - 12:00	64.3	64.2	65.5	63.3	63.3	64.1	68.4
12:00 - 13:00	63.5	63.7	64.0	63.0	62.9	63.3	63.7
13:00 - 14:00	67.9	64.2	63.8	63.1	63.1	63.4	63.8
14:00 - 15:00	63.4	63.6	64.0	64.9	62.8	63.0	62.7
15:00 - 16:00	63.4	63.5	63.7	62.7	63.0	64.7	63.6
16:00 - 17:00	64.0	64.0	64.1	64.1	63.4	63.6	63.6
17:00 - 18:00	64.5	65.4	64.9	63.8	64.5	65.3	64.8
18:00 - 19:00	64.1	64.5	64.4	63.8	64.3	64.4	64.6
19:00 - 20:00	63.8	64.4	64.4	63.9	64.8	64.5	64.2
20:00 - 21:00	63.6	64.2	64.0	63.8	63.6	63.8	63.7
21:00 - 22:00	63.3	63.2	64.2	63.2	62.9	62.9	63.1
22:00 - 23:00	63.2	63.2	63.5	63.0	63.1	63.6	63.4
23:00 - 00:00	63.2	63.0	63.6	63.0	62.7	63.2	62.9
00:00 - 01:00	63.0	62.9	63.4	63.1	62.7	62.8	63.0
01:00 - 02:00	62.8	62.8	63.1	62.8	63.1	62.5	62.6
02:00 - 03:00	62.8	63.0	63.2	63.7	63.1	62.4	62.5
03:00 - 04:00	62.9	63.0	62.9	62.8	62.9	63.1	62.6
04:00 - 05:00	63.6	63.5	63.3	62.4	62.8	62.6	62.7
05:00 - 06:00	63.7	64.0	63.8	62.8	63.0	63.1	62.8
06:00 - 07:00	64.8	66.1	64.8	65.6	65.5	65.5	65.4
07:00 - 08:00	64.9	66.3	64.7	65.8	67.0	67.0	66.5
08:00 - 09:00	64.3	65.8	64.2	64.8	65.7	65.4	64.9
09:00 - 10:00	64.0	65.4	63.2	64.1	65.9	64.8	63.7
Leq(24) ^{1/}	64.0	64.2	64.0	63.7	63.9	64.0	64.1
Ldn	69.9	70.2	70.1	69.8	69.9	69.9	69.8
Lmax ^{2/}	83.0	91.3	89.1	97.5	89.0	93.7	87.0
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{3/}	70 dB(A)						
ค่ามาตรฐานสูงสุด ^{3/}	115 dB(A)						

หมายเหตุ :

- ^{1/} ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 10:00-10:00 น.
- ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 10:00-10:00 น.
- ^{3/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ)

เวลา	L ₉₀ (dB(A))						
	2-3 เม.ย. 69	3-4 เม.ย. 69	4-5 เม.ย. 69	5-6 เม.ย. 69	6-7 เม.ย. 69	7-8 เม.ย. 69	8-9 เม.ย. 69
10:00 - 11:00	63.0	62.1	63.7	62.0	62.0	62.1	61.8
11:00 - 12:00	62.7	61.9	63.3	61.9	61.8	61.9	61.9
12:00 - 13:00	62.2	61.4	62.6	61.7	61.6	61.5	61.7
13:00 - 14:00	62.4	61.9	62.4	61.7	61.5	61.3	61.4
14:00 - 15:00	62.2	61.7	62.1	61.5	61.4	61.1	61.0
15:00 - 16:00	62.1	61.5	62.4	61.5	61.7	61.5	61.4
16:00 - 17:00	62.4	61.7	62.5	61.7	61.8	62.0	61.8
17:00 - 18:00	62.7	62.3	62.8	62.4	62.1	62.3	61.7
18:00 - 19:00	62.6	62.2	62.5	62.5	62.4	62.4	62.5
19:00 - 20:00	62.5	62.1	62.5	62.5	62.3	62.3	62.3
20:00 - 21:00	62.6	62.4	62.5	62.5	62.1	62.2	62.3
21:00 - 22:00	62.7	62.3	62.7	62.1	62.1	62.0	62.2
22:00 - 23:00	62.7	62.2	62.7	62.1	62.1	62.1	62.0
23:00 - 00:00	62.6	62.1	62.9	62.2	61.8	62.1	62.0
00:00 - 01:00	62.5	62.0	62.8	62.0	61.7	62.0	62.2
01:00 - 02:00	62.2	61.9	62.3	62.1	61.9	61.9	61.9
02:00 - 03:00	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	61.8	61.8
03:00 - 04:00	62.3	62.2	62.1	62.0	62.3	62.0	61.9
04:00 - 05:00	62.6	62.6	62.2	61.8	62.1	61.8	61.8
05:00 - 06:00	62.6	62.7	62.1	61.9	62.0	62.1	61.9
06:00 - 07:00	63.0	63.1	62.4	62.4	62.2	62.5	62.4
07:00 - 08:00	63.0	63.3	62.3	62.4	62.7	62.4	62.5
08:00 - 09:00	63.1	63.7	62.2	62.4	62.5	62.1	62.1
09:00 - 10:00	63.1	63.8	62.1	62.3	63.2	62.1	61.9
L ₉₀ (avg) ^{1/}	62.6	62.3	62.5	62.1	62.1	62.0	61.9
ค่ามาตรฐาน	-						

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 10:00 - 10:00 น.
 2. - ค่ามาตรฐาน L₉₀ ยังไม่มีกำหนด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิวนนท์ กุลวงษ์
 ชื่อผู้บันทึก : นายศิวนนท์ กุลวงษ์
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอป จำกัด
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรรณชิตยา
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

4.7.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

การตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 ดำเนินการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr}$) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ในบริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ จำนวน 2 ครั้งต่อปี รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.7-2 และรูปที่ 4.7-3 โดยผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr}$) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด ส่วนค่าระดับเสียงพื้นฐานยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐาน และเมื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 4.7-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโรงงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียง (dB(A))	
		Leq 24 hr	L ₉₀
ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้	5-6 ต.ค. 66	62.8	60.2
	6-7 ต.ค. 66	62.4	59.8
	7-8 ต.ค. 66	62.1	59.8
	8-9 ต.ค. 66	62.4	59.9
	9-10 ต.ค. 66	62.4	59.9
	10-11 ต.ค. 66	62.5	60.2
	11-12 ต.ค. 66	63.6	60.3
	28-29 มี.ค. 67	63.5	59.6
	29-30 มี.ค. 67	62.7	59.1
	30-31 มี.ค. 67	63.3	59.1
	31 มี.ค. 67-1 เม.ย. 67	62.8	59.2
	1-2 เม.ย. 67	63.7	59.8
	2-3 เม.ย. 67	62.9	59.1
	3-4 เม.ย. 67	63.2	59.8
	15-16 ส.ค. 67	60.6	58.7
	16-17 ส.ค. 67	61.8	60.3
	17-18 ส.ค. 67	60.4	59.0
	18-19 ส.ค. 67	60.8	59.3
	19-20 ส.ค. 67	61.9	60.4
	20-21 ส.ค. 67	61.5	60.1
	21-22 ส.ค. 67	61.5	59.7
	11-12 มี.ค. 68	63.6	61.1
	12-13 มี.ค. 68	63.1	61.0
	13-14 มี.ค. 68	62.7	60.9
	14-15 มี.ค. 68	62.4	60.7
	15-16 มี.ค. 68	62.2	60.6
	16-17 มี.ค. 68	62.4	60.8
	17-18 มี.ค. 68	62.8	60.6
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		70	-


หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

ตารางที่ 4.7-2 (ต่อ)


ตำแหน่งที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียง (dB(A))	
		Leq 24 hr	L ₉₀
ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้	1-2 ก.ค. 68	63.1	61.1
	2-3 ก.ค. 68	63.2	60.9
	3-4 ก.ค. 68	62.7	60.6
	4-5 ก.ค. 68	62.5	60.6
	5-6 ก.ค. 68	62.2	60.6
	6-7 ก.ค. 68	62.1	60.5
	7-8 ก.ค. 68	62.4	60.4
	2-3 เม.ย. 69	64.0	62.6
	3-4 เม.ย. 69	64.2	62.3
	4-5 เม.ย. 69	64.0	62.5
	5-6 เม.ย. 69	63.7	62.1
	6-7 เม.ย. 69	63.9	62.1
	7-8 เม.ย. 69	64.0	62.0
	8-9 เม.ย. 69	64.1	61.9
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		70	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

รูปที่ 4.7-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

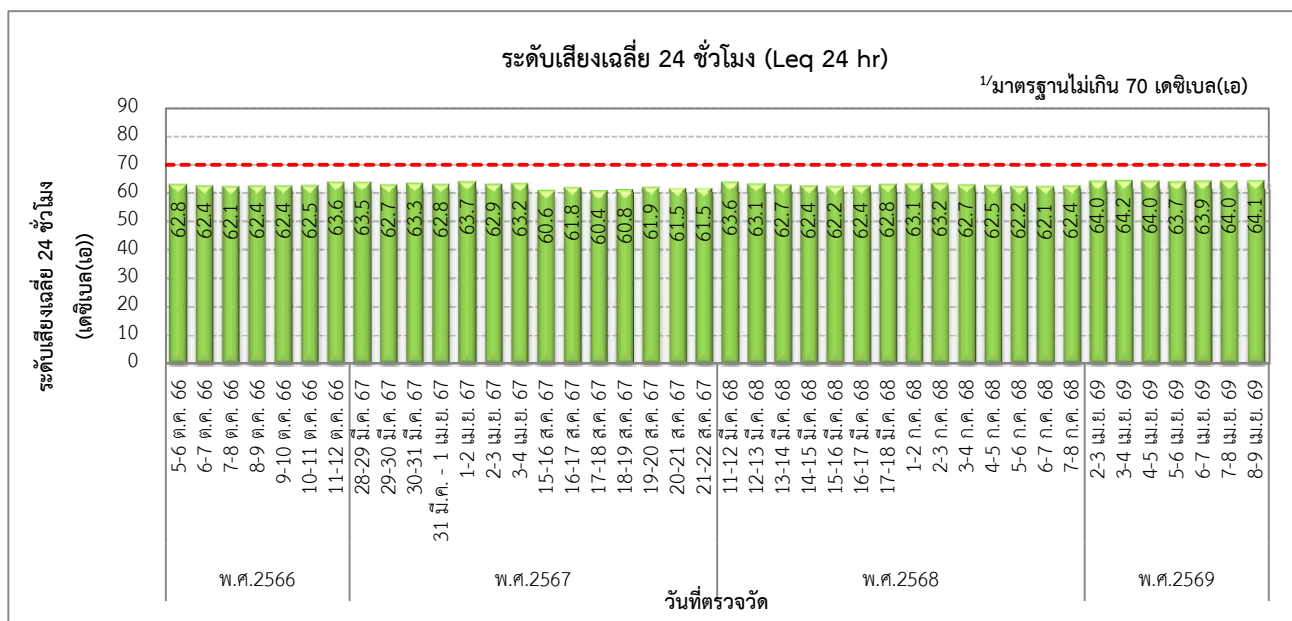

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)

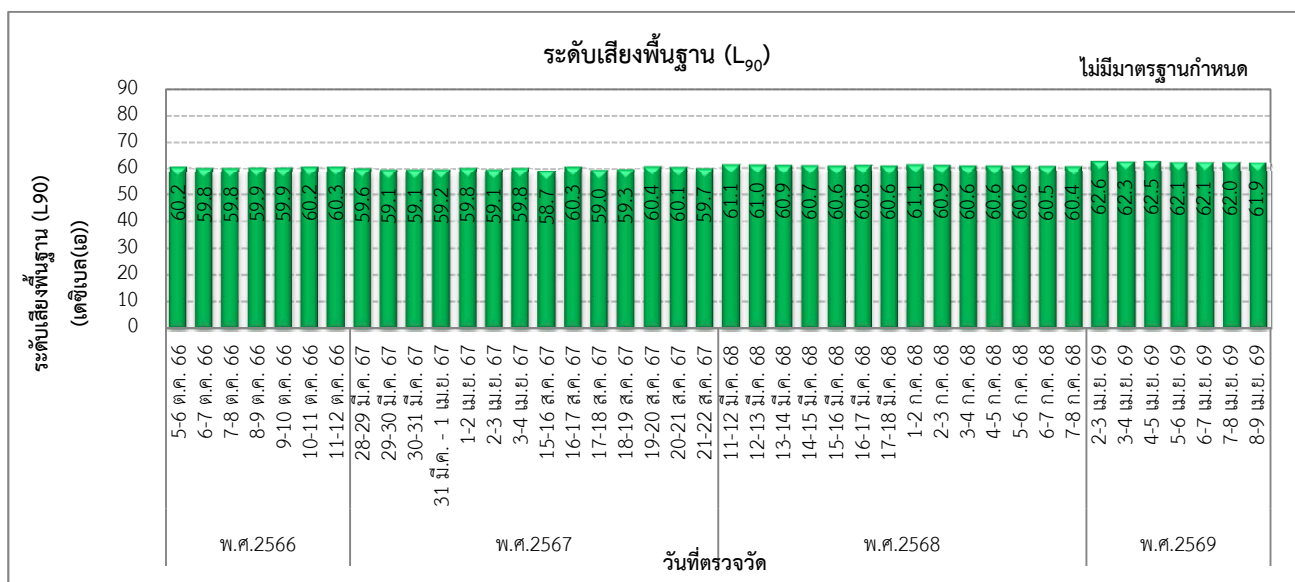

ระดับเสียงพื้นฐาน (L₉₀)

หมายเหตุ : ^{1/}ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

4.8 การจัดการกากของเสีย

มาตรการกำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงงาน และสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) และที่ส่งไปกำจัด พร้อมสำเนาเอกสารส่งกำจัด ทุก 6 เดือน

โรงงานแอลแอลดีพีอี มีการจัดการกากของเสียร่วมกับโรงงานอีเทนแครกเกอร์และโรงงานแอลดีพีอี โดยได้จัดทำรายงานสรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงงาน และสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไปรีไซเคิล และที่ส่งไปกำจัดร่วมกับโรงงานอีเทนแครกเกอร์ และโรงงานแอลดีพีอี โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 มีปริมาณของเสียรวมเกิดขึ้น 198.97 ตัน ประกอบด้วย ขยะมูลฝอย 13.03 ตัน วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่อันตราย) 104.06 ตัน และของเสียอันตราย 81.88 ตัน โดยมีปริมาณของเสียที่นำไปรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปปริมาณกากของเสียระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.8-1 โดยมีรายละเอียดหนังสือขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน ดังแสดงในภาคผนวก ข.27 ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งกากของเสีย ดังแสดงในภาคผนวก ข.28 และขั้นตอนการดำเนินการและการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังแสดงในภาคผนวก ข.29

ตารางที่ 4.8-1 ประเภทและปริมาณกากของเสีย
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ชนิด กากของเสีย	ปริมาณกากของเสีย (ตัน)							การจัดการของเสีย	
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ผู้รับกำจัด	วิธีการกำจัด
ขยะมูลฝอย	2.28	1.90	2.28	2.13	2.20	2.24	13.03	เทศบาลนครมาบตาพุด	-
ของเสียไม่อันตราย - เศษกระดาษ (รองบรรจุภัณฑ์, กล่องกระดาษ)	5.58	6.02	2.12	0	2.71	0	16.43	บริษัท สามศรีไชเคิล จำกัด	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
- ไม้พาเลท (สภาพดี)	5.41	4.24	0	0	11.37	0	21.02	บริษัท สามศรีไชเคิล จำกัด	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
- ไม้พาเลท (สภาพชำรุด)	0	0	1.11	0	4.42	0	5.53	บริษัท สามศรีไชเคิล จำกัด	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
- Lump polymer	0	7.71	6.28	0	0.89	0	14.88	บริษัท ดับเบิ้ล เอ็น พลาสติก จำกัด	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
- พลาสติกชนิดผง Powder แท่ง	0	9.76	6.09	0	14.40	0	30.25	บริษัท ดับเบิ้ล เอ็น พลาสติก จำกัด	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
- เศษถุงฟิล์ม	0	2.05	1.60	0	1.37	1.31	6.33	บริษัท ดับเบิ้ล เอ็น พลาสติก จำกัด	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
- เศษไม้ (ผูกฟัง)	0	3.26	6.04	0	0	0	9.30	บริษัท สามศรีไชเคิล จำกัด	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
- สแตนเลส	0	0	0.16	0	0	0	0.16	บริษัท สามศรีไชเคิล จำกัด	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
- โลหะหลายชนิดปะปนกัน	0	0	0.16	0	0	0	0.16	บริษัท สามศรีไชเคิล จำกัด	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
รวมปริมาณของเสียไม่อันตราย							104.06	-	

ตารางที่ 4.8-1 (ต่อ)

ชนิด กากของเสีย	ปริมาณกากของเสีย (ตัน)							การจัดการของเสีย	
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ผู้รับกำจัด	วิธีการกำจัด
ของเสียอันตราย									
- Contaminated Garbage	4.32	1.65	1.95	1.56	0	0	9.48	บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	เผาเพื่อเอาพลังงาน
- Catalyst in mineral oil	0	0	0	0.41	0	0	0.41	บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน)	เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
- Insulation	0	1.11	0	0	0.88	0	1.99	บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เป็นวัตถุดิบทดแทน
- ถังโลหะเปล่าขนาด 200 ลิตร	0	0	0	0	4.34	0	4.34	บริษัท สามศรีไชเคิล จำกัด	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
- บรรจุก๊าซปนเปื้อน IBCs	0	0	0.91	0	0	0	0.91	บริษัท สามศรีไชเคิล จำกัด	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
- Molecular Sieve and Support ball	0	21.72	28.44	5.08	0	0	55.24	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นวัตถุดิบทดแทน
- Polymer waste	0	6.76	0	0	2.75	0	9.51	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	ทำเชื้อเพลิงผสม
รวมปริมาณของเสียอันตราย							81.88	-	
รวมปริมาณของเสียทั้งหมด							198.97	-	

ที่มา : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

4.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.9.1 คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ ความเข้มข้นของเอทิลีน บิวทีน-1 เฮกซีน-1 ไอโซเพนเทน ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด และนอนมีเทนไฮโดรคาร์บอนภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 บริเวณ ได้แก่

- บริเวณหอดูดซับน้ำของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 (LLDPE Plant 1)
- บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 (LLDPE Plant 1)
- บริเวณหอดูดซับน้ำ โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 (LLDPE Plant 2)
- บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 (LLDPE Plant 2)

การตรวจวัดความเข้มข้นของเอทิลีน เฮกซีน-1 ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด และนอนมีเทนไฮโดรคาร์บอนภายในหน่วยผลิตเฮกซีน-1 (Hexene-1) จำนวน 1 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ Reaction Unit

4.9.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดต่อกับพื้นที่

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดต่อกับพื้นที่ ของโรงงานแอลแอลดีพีอี ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 โดยดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีน บิวทีน-1 เฮกซีน-1 ไอโซเพนเทน ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด และนอนมีเทนไฮโดรคาร์บอน ใน 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณหอดูดซับน้ำ และบริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริเวณหอดูดซับน้ำ และบริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 สำหรับบริเวณ Reaction Unit ของหน่วยผลิตเฮกซีน-1 ดำเนินการตรวจวัดเอทิลีน เฮกซีน-1 ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด และนอนมีเทนไฮโดรคาร์บอน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2569 โดยมีตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.9-1 ถึงรูปที่ 4.9-2 โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 4.9-1 และภาคผนวก ง

(1) บริเวณหอดูดซับน้ำของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณหอดูดซับน้ำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 สรุปได้ดังนี้

เอทิลีน	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไอโซเพนเทน	มีค่าเท่ากับ 0.13 และ ND(<0.02) ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ
บิวทีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
เฮกซีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด	มีค่าเท่ากับ 3.51 และ 5.10 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ
นอนมีเทนไฮโดรคาร์บอน	มีค่าเท่ากับ 0.06 และ 0.23 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

(2) บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณ Polymerization ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 สรุปได้ดังนี้

เอทิลีน	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไอโซเพนเทน	มีค่าเท่ากับ ND(<0.02) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
บิวทีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
เฮกซีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด	มีค่าเท่ากับ 3.38 และ 4.75 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ
นอนมีเทนไฮโดรคาร์บอน	มีค่าเท่ากับ 0.06 และ 0.12 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

(3) บริเวณหอดูดซับน้ำของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณหอดูดซับน้ำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 สรุปได้ดังนี้

เอทิลีน	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไอโซเพนเทน	มีค่าเท่ากับ ND(<0.02) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
บิวทีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
เฮกซีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด	มีค่าเท่ากับ 2.65 และ 4.62 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ
นอนมีเทนไฮโดรคาร์บอน	มีค่าเท่ากับ 0.05 และ 0.19 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

(4) บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณ Polymerization ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 สรุปได้ดังนี้


เอทิลีน	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไอโซเพนเทน	มีค่าเท่ากับ ND(<0.02) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
บิวทีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
เฮกซีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด	มีค่าเท่ากับ 2.81 และ 4.92 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ
นอนมีเทนไฮโดรคาร์บอน	มีค่าเท่ากับ 0.05 และ 0.20 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

(5) บริเวณ Reaction Unit ของหน่วยผลิตเฮกซีน-1

เนื่องจากหน่วย Reaction Unit (Hexene-1) มีการเดินหน่วยการผลิตเป็นบางช่วงเวลา ดังนั้นการตรวจวัดจึงขึ้นกับแผนการผลิต และโรงงานจะทำการตรวจวัดพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ให้ครบ 4 ครั้งต่อปี ตามมาตรการกำหนด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการบริเวณ Reaction Unit (Hexene-1) ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2569 สรุปได้ดังนี้

เอทิลีน	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
เฮกซีน-1	มีค่าเท่ากับ ND(<0.01) ส่วนในล้านส่วน ทั้งหมด
ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด	มีค่าเท่ากับ 2.96 และ 6.39 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ
นอนมีเทนไฮโดรคาร์บอน	มีค่าเท่ากับ 0.05 และ 0.61 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

เมื่อนำค่าผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ซึ่งกำหนดค่ามาตรฐานของเอทิลีนไว้ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน ไอโซเพนเทน ไว้ไม่เกิน 1,000 ส่วนในล้านส่วน เฮกซีน-1 ไว้ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน และค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดค่ามาตรฐานของบิวทีน-1 ไว้ไม่เกิน 250 ส่วนในล้านส่วน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ส่วนไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด และนอนมีเทนไฮโดรคาร์บอน ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

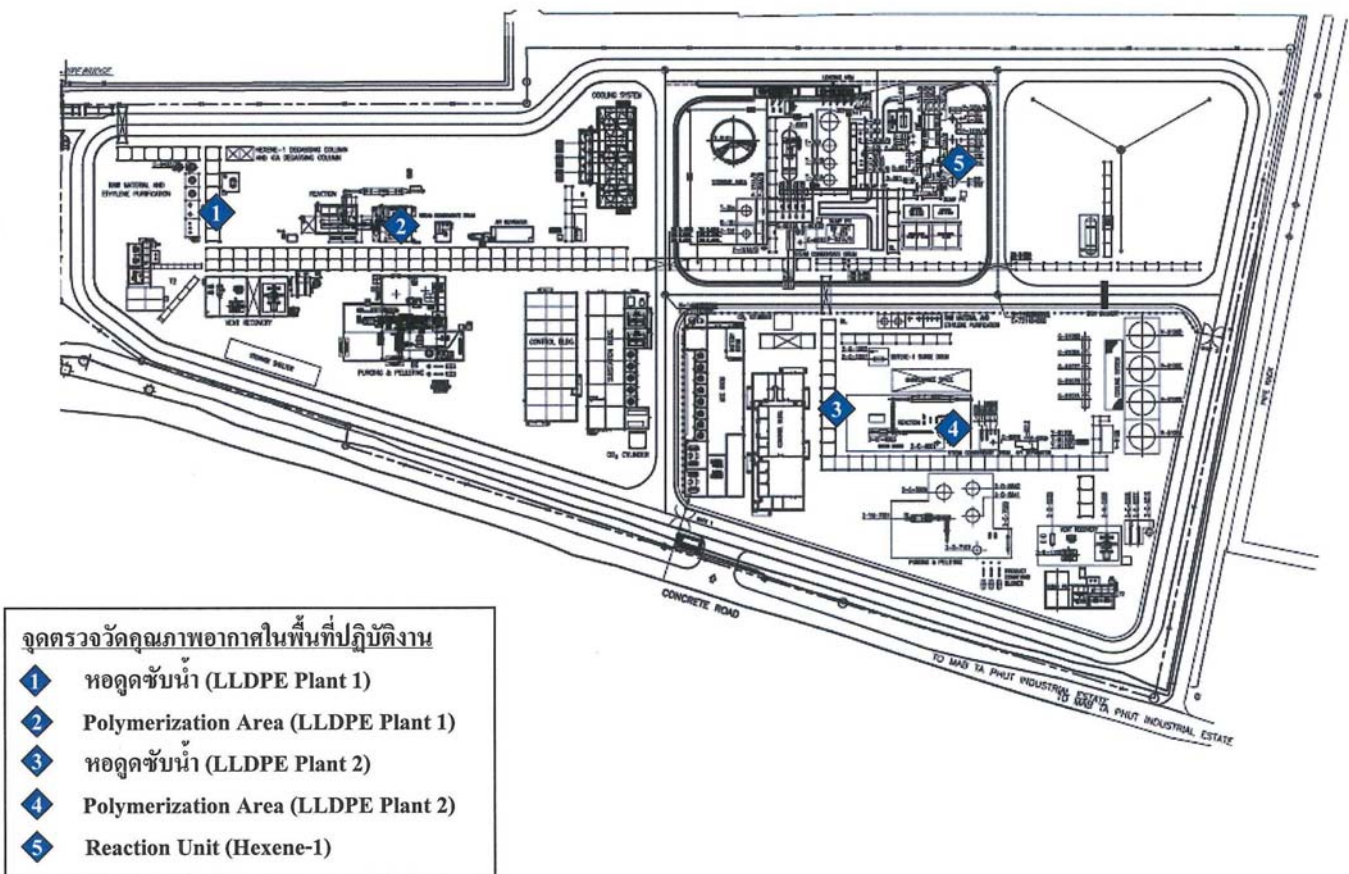

รูปที่ 4.9-1 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)





บริเวณหอดูดซับน้ำของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1



บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1

รูปที่ 4.9-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)





บริเวณหอดูดซับน้ำของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2



บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2

รูปที่ 4.9-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
(ต่อ)





บริเวณ Reaction Unit (Hexene-1)

รูปที่ 4.9-2 ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
(ต่อ)



ตารางที่ 4.9-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอบ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน
			18 ก.พ. 69	13 พ.ค. 69	
บริเวณหอดูดซับน้ำ (LLDPE 1)	Ethylene	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	200 ^{1/}
	Isopentane	ppm	0.13	ND(<0.02)	1,000 ^{1/}
	Butene-1	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	250 ^{2/}
	Hexene-1	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	50 ^{1/}
	THC	ppm	3.51	5.10	-
	Non-methane HC	ppm	0.06	0.23	-
บริเวณ Polymerization (LLDPE 1)	Ethylene	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	200 ^{1/}
	Isopentane	ppm	ND(<0.02)	ND (<0.02)	1,000 ^{1/}
	Butene-1	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	250 ^{2/}
	Hexene-1	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	50 ^{1/}
	THC	ppm	3.38	4.75	-
	Non-methane HC	ppm	0.06	0.12	-
บริเวณหอดูดซับน้ำ (LLDPE 2)	Ethylene	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	200 ^{1/}
	Isopentane	ppm	ND(<0.02)	ND (<0.02)	1,000 ^{1/}
	Butene-1	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	250 ^{1/, 2/}
	Hexene-1	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	50 ^{1/}
	THC	ppm	2.65	4.62	-
	Non-methane HC	ppm	0.05	0.19	-
บริเวณ Polymerization (LLDPE 2)	Ethylene	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	200 ^{1/}
	Isopentane	ppm	ND(<0.02)	ND (<0.02)	1,000 ^{1/}
	Butene-1	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	250 ^{2/}
	Hexene-1	ppm	ND(<0.01)	ND (<0.01)	50 ^{1/}
	THC	ppm	2.81	4.92	-
	Non-methane HC	ppm	0.05	0.20	-

- หมายเหตุ :
- ^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists : ACGIH
 - ^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560
 - หมายถึง ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.9-1 (ต่อ)

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน
			18 ก.พ. 69	5 มิ.ย. 69	
บริเวณ Reaction Unit (Hexene-1)	Ethylene	ppm	ND(<0.01)	ND(<0.01)	200 ^{1/}
	Hexene-1	ppm	ND(<0.01)	ND(<0.01)	50 ^{1/}
	THC	ppm	2.96	6.39	-
	Non-methane HC	ppm	0.05	0.61	-

- หมายเหตุ : 1.^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists : ACGIH
- 2.^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560
3. - หมายถึง ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด
4. บริเวณหน่วยการผลิต Reaction Unit (Hexene-1) ดำเนินการตรวจวัดเฉพาะในช่วงที่มีการเดินระบบของหน่วยผลิต Hexene-1

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

เลขที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัด : 0201-03-2565-0049

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนริสา ภูวสรเพ็ชญ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท ซีคอฟ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุดาพร สุนทร

เลขที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ : 0202-03-2565-0034

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600

4.9.1.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่ ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 ของโรงงานแอลแอลดีพีอี ซึ่งดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเอทิลีน บิวทีน-1 เฮกซีน-1 ไอโซเพนเทน ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด และนอมีเทนไฮโดรคาร์บอน ใน 5 บริเวณ ได้แก่ บริเวณหอดูดซับน้ำ และบริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 และบริเวณหอดูดซับน้ำ และบริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 และบริเวณ Reaction Unit (Hexene-1) ปีละ 4 ครั้ง พบว่ามีค่าเอทิลีน ไอโซเพนเทน เฮกซีน-1 และบิวทีน-1 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) และค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 ทั้งหมด สำหรับไฮโดรคาร์บอนรวม (THC) และนอมีเทนไฮโดรคาร์บอน (NMHC) ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9-2 ถึงตารางที่ 4.9-6 และรูปที่ 4.9-3 ถึงรูปที่ 4.9-5 เมื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการตรวจวัดส่วนใหญ่ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ ยกเว้นไฮโดรคาร์บอนรวม (THC) และนอมีเทนไฮโดรคาร์บอน (NMHC) พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ขึ้นลงสลับกันไปโดยเฉลี่ยแล้วไม่แตกต่างไปจากผลการตรวจวัดที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 4.9-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่
บริเวณหอดูดซับน้ำ

โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

ปีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)					
		Ethylene	Isopentane	Butene-1	Hexene-1	THC	Non-methane hydrocarbon
ปี พ.ศ.2566	4 ต.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	6.15	0.06
	24 พ.ย. 66 และ 25 ธ.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.62	0.75
ปี พ.ศ.2567	29 ก.พ. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.80	0.25
	7 มิ.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.29	0.06
	22 ส.ค. 67 และ 30 ก.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.87	0.21
	15 พ.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.17	0.44
ปี พ.ศ.2568	18 ก.พ. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.30	0.73
	27 พ.ค. 68	ND(<0.01)	0.22	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.84	0.17
	20 ส.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.61	0.14
	4 พ.ย. 68	ND(<0.01)	0.20	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.95	0.08
ปี พ.ศ.2569	18 ก.พ. 69	ND(<0.01)	0.13	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.51	0.06
	13 พ.ค. 69	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	5.10	0.23
มาตรฐาน		200 ^{1/}	1,000 ^{1/}	250 ^{2/}	50 ^{1/}	-	-

- หมายเหตุ :
- ^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
 - ^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560

ตารางที่ 4.9-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่

บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Polymerization

โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

ปีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)					
		Ethylene	Isopentane	Butene-1	Hexene-1	THC	Non-methane hydrocarbon
ปี พ.ศ.2566	4 ต.ค. 66	ND(<0.01)	0.12	ND(<0.01)	ND(<0.01)	6.53	2.28
	24 พ.ย. 66 และ	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.71	0.10
	25 ธ.ค. 66						
ปี พ.ศ.2567	29 ก.พ. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.66	0.32
	7 มี.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.32	0.05
	22 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.72	1.25
	15 พ.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.20	0.41
ปี พ.ศ.2568	18 ก.พ. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.64	0.85
	27 พ.ค. 68	ND(<0.01)	0.16	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.68	0.24
	20 ส.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.70	0.15
	4 พ.ย. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.50	0.09
ปี พ.ศ.2569	18 ก.พ. 69	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.38	0.06
	13 พ.ค. 69	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.75	0.12
มาตรฐาน		200 ^{1/}	1,000 ^{1/}	250 ^{2/}	50 ^{1/}	-	-

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)2. ^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560

**ตารางที่ 4.9-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่
บริเวณหอดูดซับน้ำ**

**โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569**

ปีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)					
		Ethylene	Isopentane	Butene-1	Hexene-1	THC	Non-methane hydrocarbon
ปี พ.ศ.2566	4 ต.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	6.93	0.08
	24 พ.ย. 66 และ 25 ธ.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.73	0.12
ปี พ.ศ.2567	29 ก.พ. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.93	0.54
	7 มี.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.19	0.05
	22 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.64	2.04
	15 พ.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.10	0.45
ปี พ.ศ.2568	18 ก.พ. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.18	0.51
	27 พ.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.54	0.11
	20 ส.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.73	0.12
	4 พ.ย. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.68	0.07
ปี พ.ศ.2569	18 ก.พ. 69	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.65	0.05
	13 พ.ค. 69	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.62	0.19
มาตรฐาน		200 ^{1/}	1,000 ^{1/}	250 ^{2/}	50 ^{1/}	-	-

- หมายเหตุ :
- ^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
 - ^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560

ตารางที่ 4.9-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่

บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Polymerization

โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

ปีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)					
		Ethylene	Isopentane	Butene-1	Hexene-1	THC	Non-methane hydrocarbon
ปี พ.ศ.2566	4 ต.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	5.80	0.09
	24 พ.ย. 66 และ 25 ธ.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	5.12	0.14
ปี พ.ศ.2567	29 ก.พ. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	5.00	0.47
	7 มิ.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.28	0.05
	22 ส.ค. 67 และ 30 ก.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.89	0.24
	15 พ.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.28	0.41
ปี พ.ศ.2568	18 ก.พ. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.82	0.91
	27 พ.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.12	0.09
	20 ส.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.86	0.32
	4 พ.ย. 68	ND(<0.01)	0.34	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.52	0.11
ปี พ.ศ.2569	18 ก.พ. 69	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.81	0.05
	13 พ.ค. 69	ND(<0.01)	ND(<0.02)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.92	0.20
มาตรฐาน		200 ^{1/}	1,000 ^{1/}	250 ^{2/}	50 ^{1/}	-	-

- หมายเหตุ :
- ^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
 - ^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560

ตารางที่ 4.9-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่

บริเวณ Reaction Unit (Hexene-1)


โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569


ปีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)			
		Ethylene	Hexene-1	THC	Non-methane hydrocarbon
ปี พ.ศ.2566	4 ต.ค. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)	6.38	0.88
	24 พ.ย. 66	ND(<0.01)	ND(<0.01)	5.06	0.14
ปี พ.ศ.2567	29 ก.พ. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)	4.91	0.41
	7 มี.ย. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.35	0.06
	22 ส.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)	11.50	4.30
	13 ธ.ค. 67	ND(<0.01)	ND(<0.01)	8.58	1.91
ปี พ.ศ.2568	18 ก.พ. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)	3.40	0.76
	15 ก.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)	7.43	2.84
	20 ส.ค. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)	5.27	0.91
	4 พ.ย. 68	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.71	0.09
ปี พ.ศ.2569	18 ก.พ. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)	2.96	0.05
	5 มี.ย. 69	ND(<0.01)	ND(<0.01)	6.39	0.61
มาตรฐาน		200 ^{1/}	50 ^{1/}	-	-

- หมายเหตุ :
- ^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
 - บริเวณหน่วยการผลิต Hexene-1 ดำเนินการตรวจวัดเฉพาะในช่วงที่มีการเดินระบบของหน่วยผลิต Hexene-1


รูปที่ 4.9-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งกับพื้นที่
โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

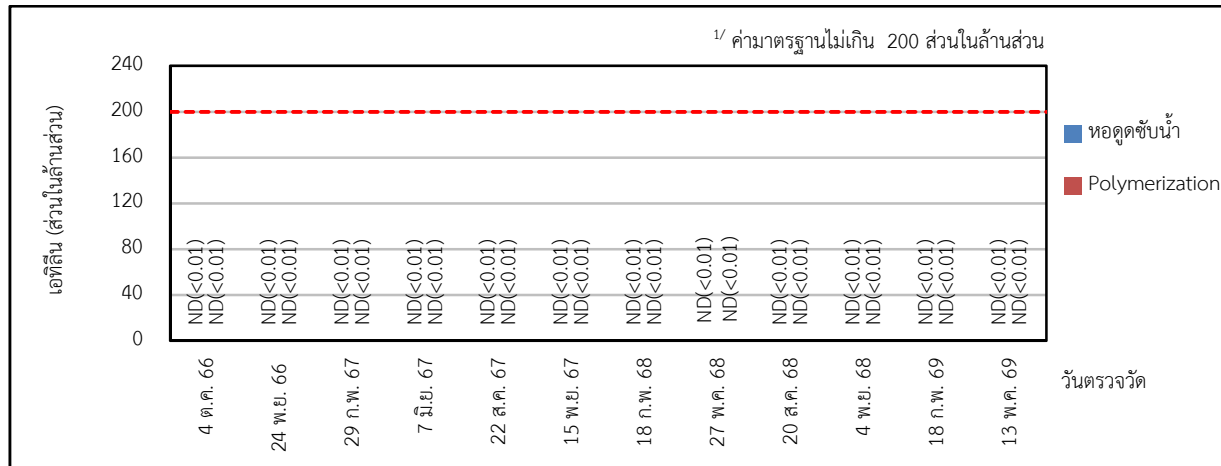

Ethylene

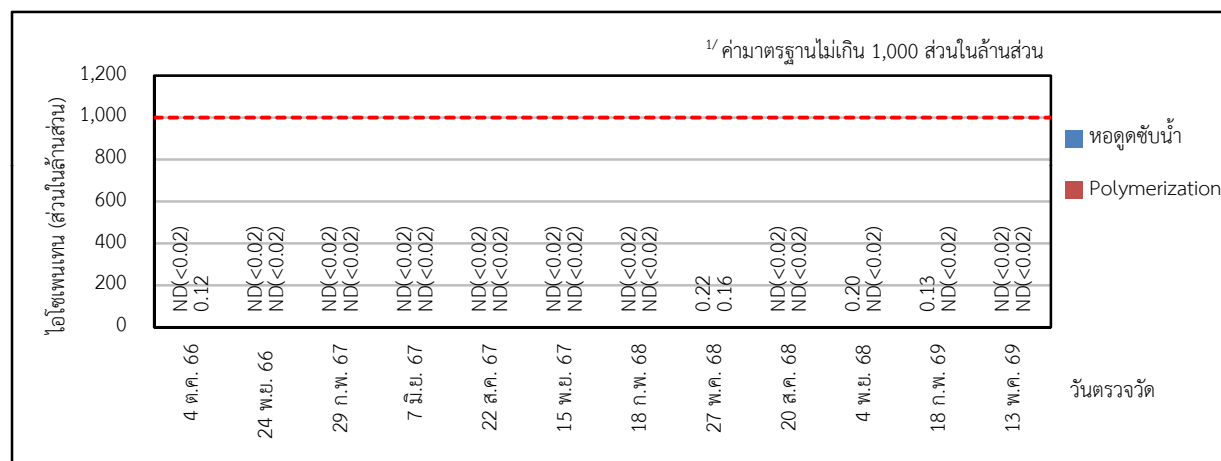

Isopentane

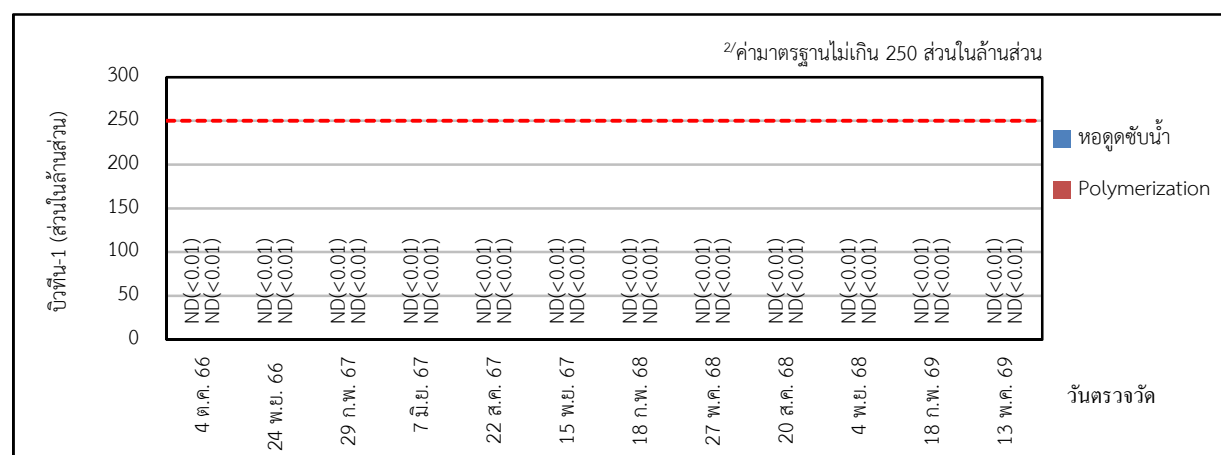


Butene-1

หมายเหตุ :


1. ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

2. ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560


รูปที่ 4.9-3 (ต่อ)

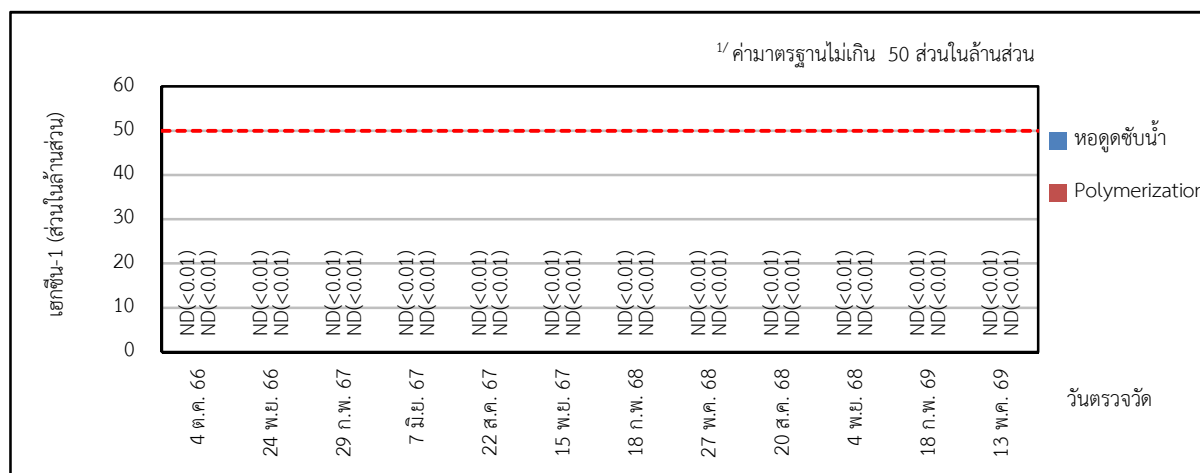

Hexene-1

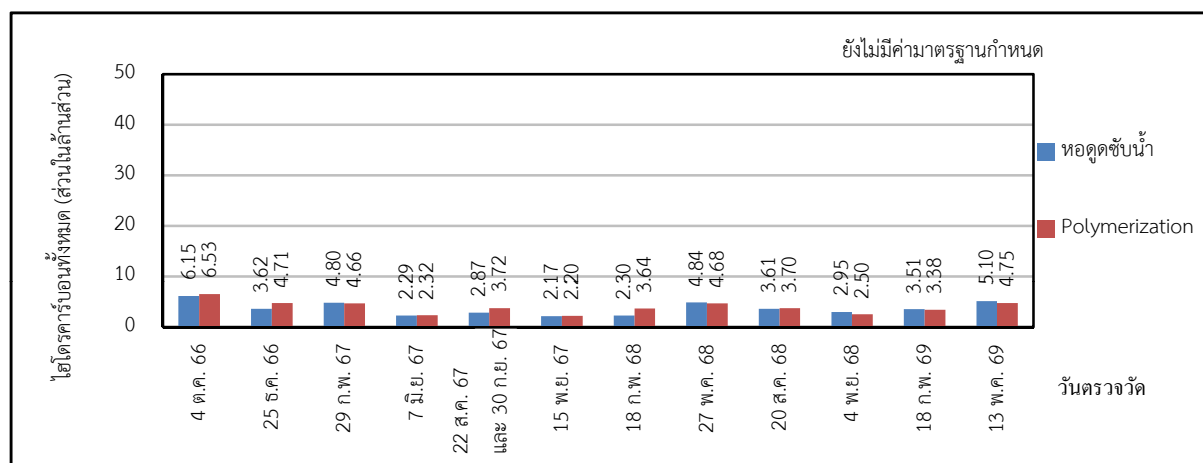

Total Hydrocarbon

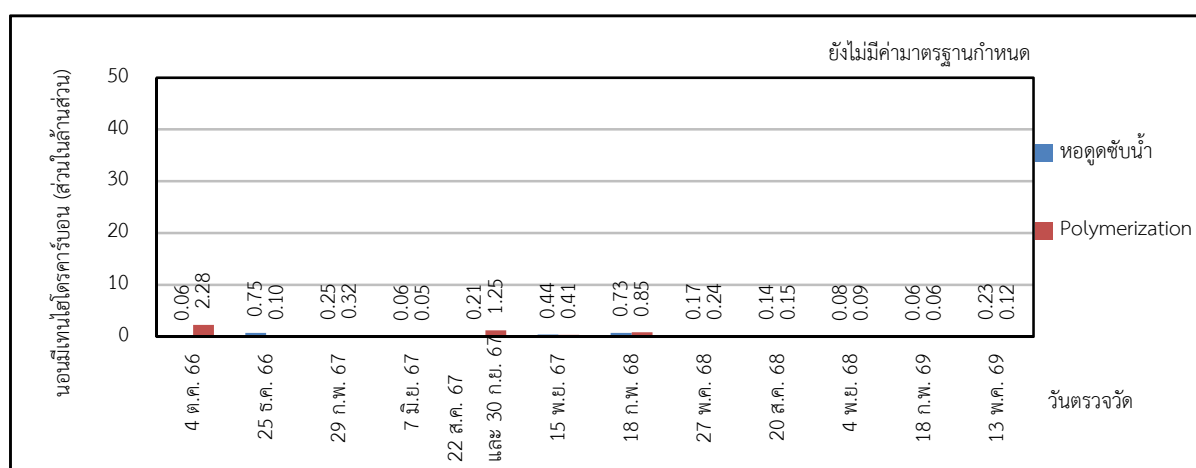


Non-methane Hydrocarbon


หมายเหตุ :

- ^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
- ผลการตรวจวัด Total Hydrocarbon และ Non-methane Hydrocarbon อาจมีค่าแปรผันตามกิจกรรมการเดินเครื่องบริเวณใกล้เคียง เช่น การโหลดสารเคมี, การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้พบค่าสูงขึ้นในช่วงเวลา


รูปที่ 4.9-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งพื้นที่
โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

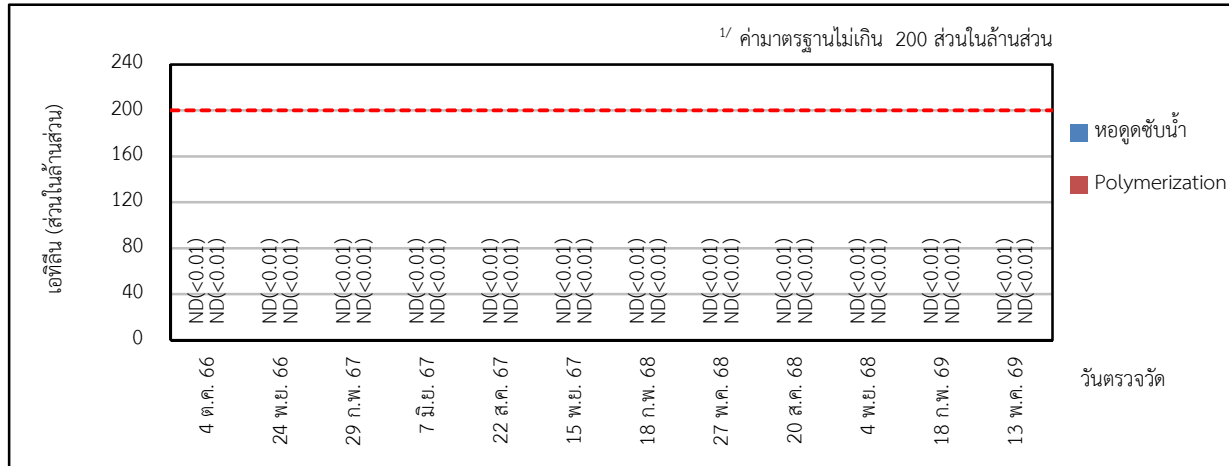

Ethylene

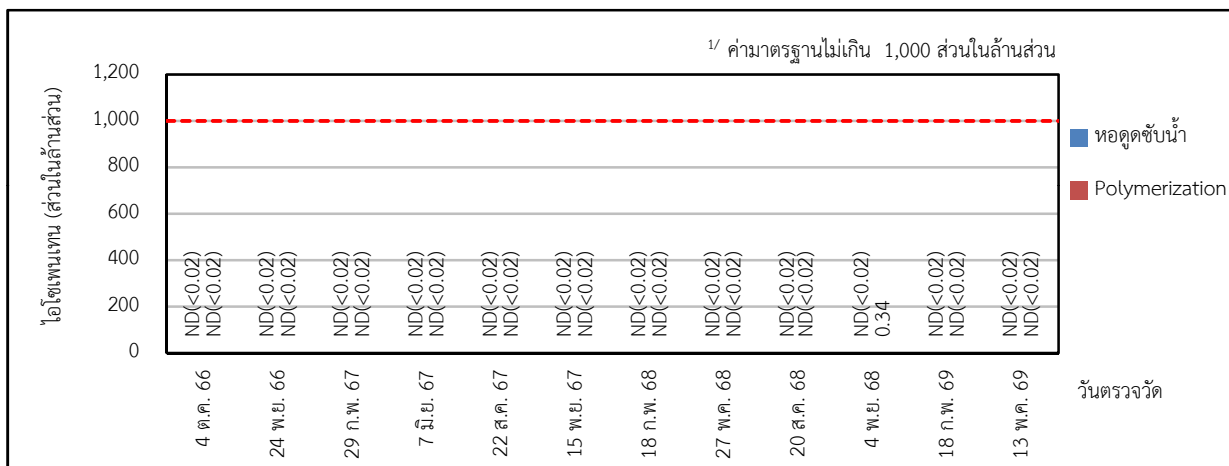

Isopentane

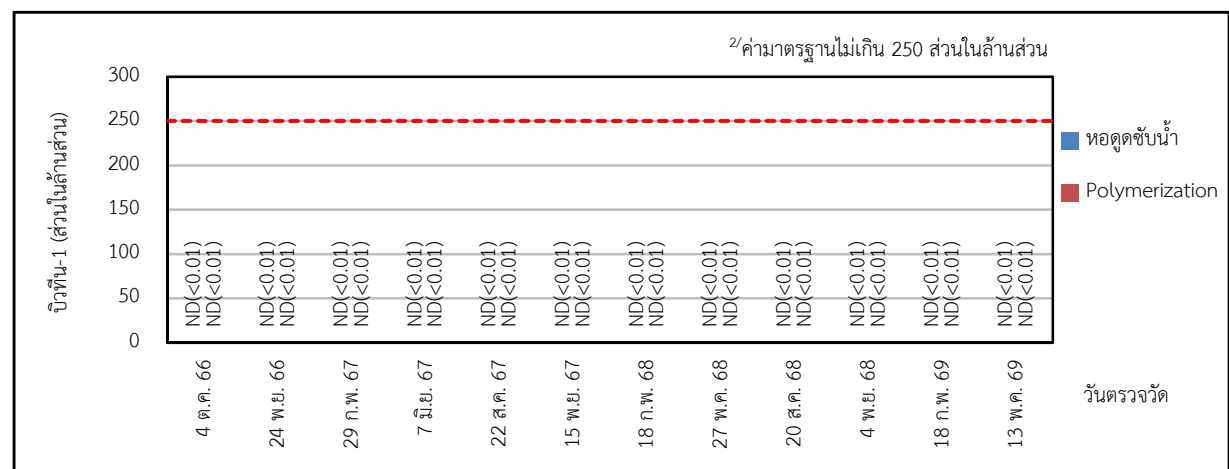


Butene-1


หมายเหตุ :

- 1/ ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
- 2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560


รูปที่ 4.9-4 (ต่อ)

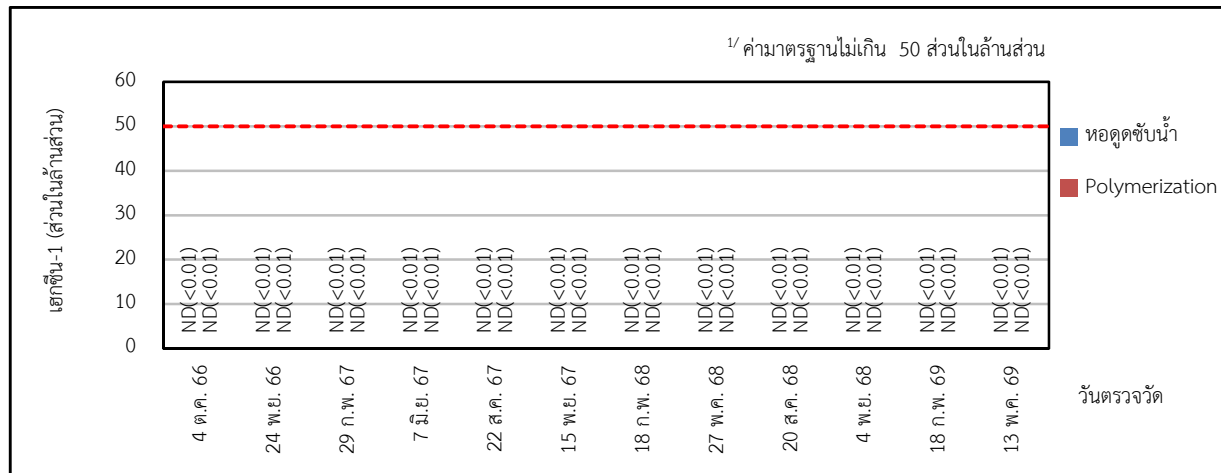

Hexene-1

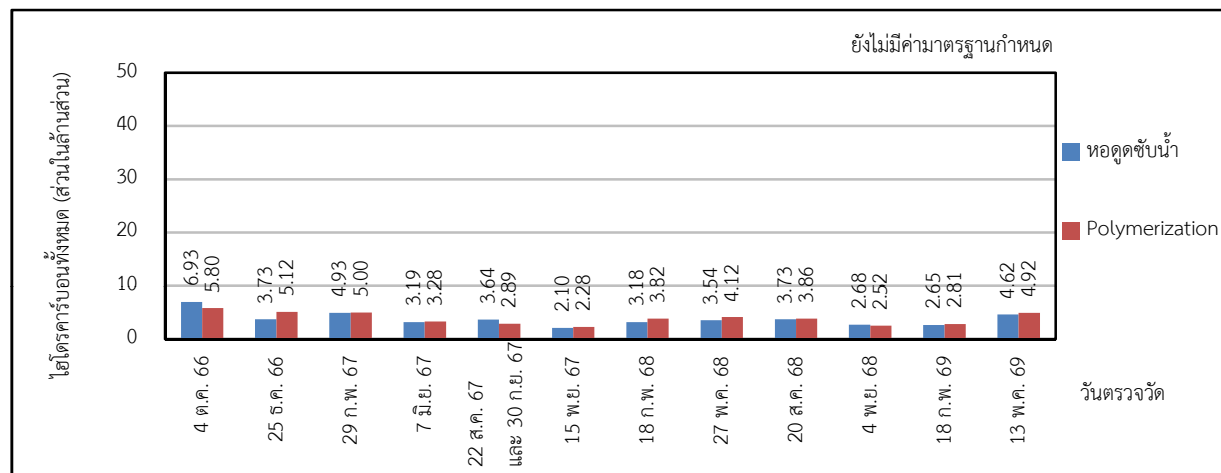

Total Hydrocarbon

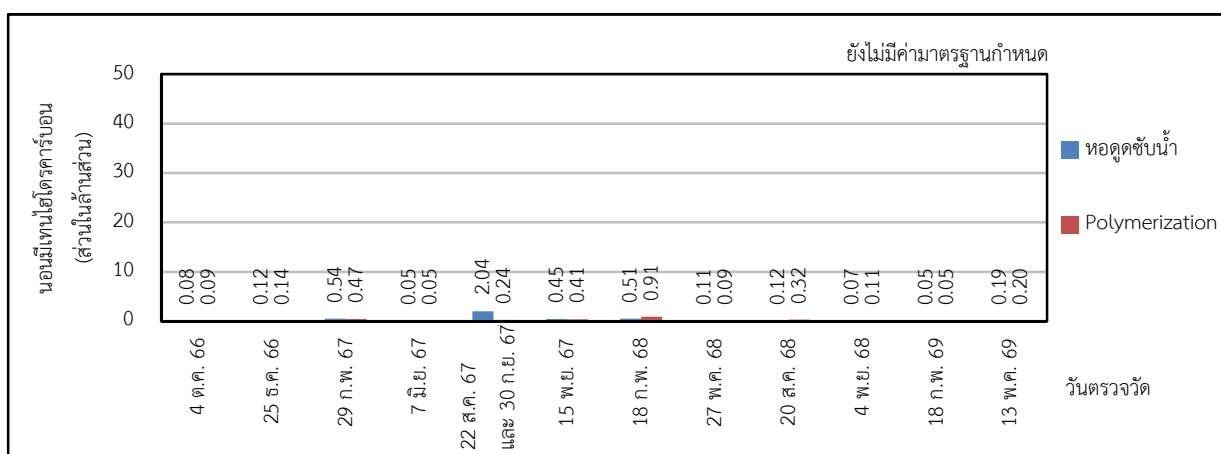

Non-methane Hydrocarbon

- หมายเหตุ :
- ^{1/} ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
 - ผลการตรวจวัด Total Hydrocarbon และ Non-methane Hydrocarbon อาจมีค่าแปรผันตามกิจกรรมการเดินเครื่องบริเวณใกล้เคียง เช่น การโหลดสารเคมี, การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้พบค่าสูงขึ้นในช่วงเวลา


รูปที่ 4.9-5

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตั้งพื้นที่


บริเวณ Reaction Unit (Hexene-1)

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

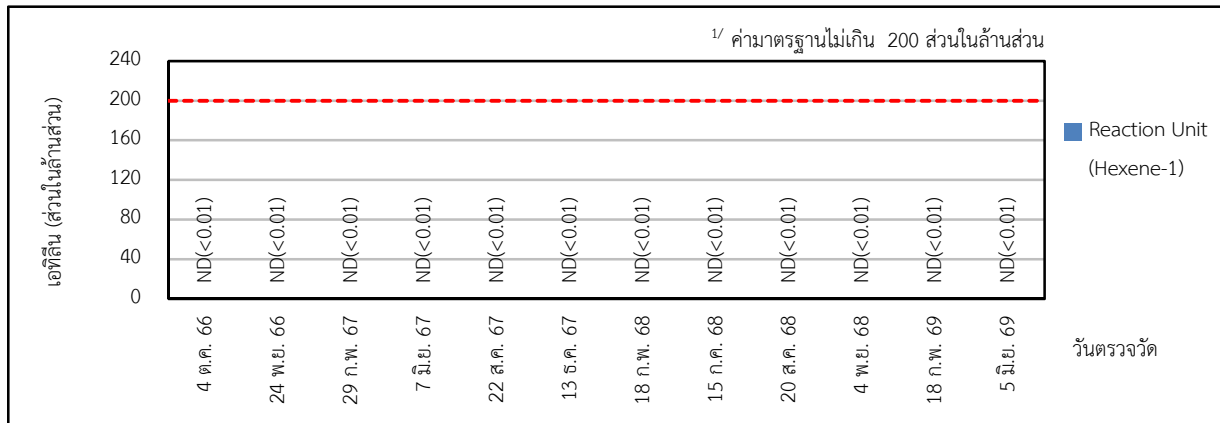

Ethylene

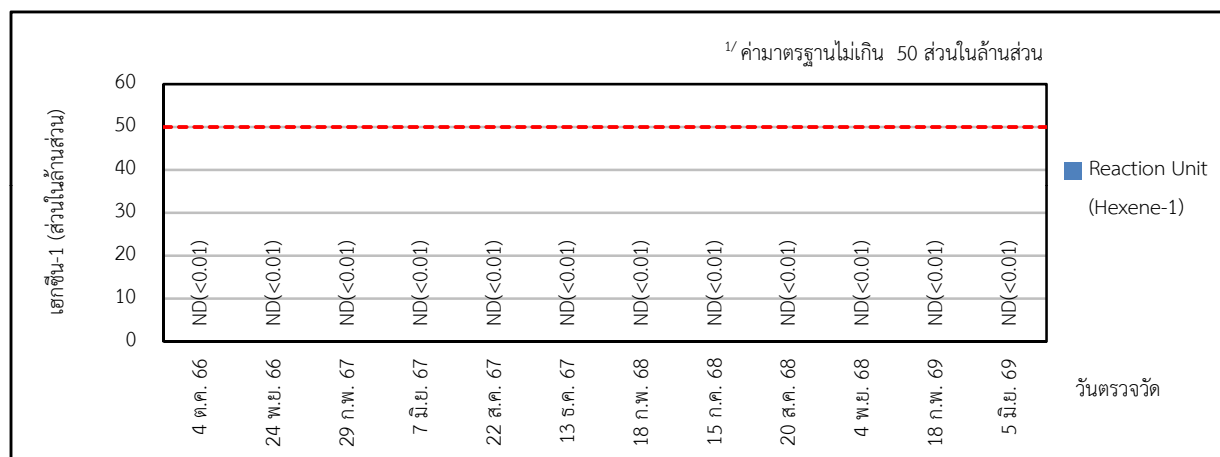


Hexene-1

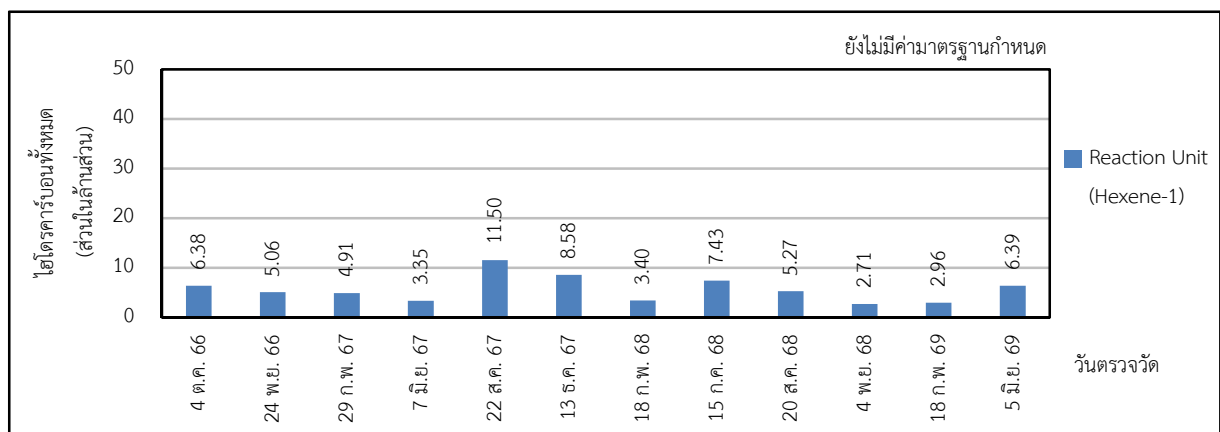

Total Hydrocarbon

- หมายเหตุ :
- 1/ ค่ามาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
 - บริเวณหน่วยการผลิต Hexene-1 ดำเนินการตรวจวัดเฉพาะในช่วงที่มีการเดินระบบของหน่วยผลิต Hexene-1
 - ผลการตรวจวัด Total Hydrocarbon และ Non-methane Hydrocarbon อาจมีค่าแปรผันตามกิจกรรมการเดินเครื่องบริเวณใกล้เคียง เช่น การโหลดสารเคมี, การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้พบค่าสูงขึ้นในบางช่วงเวลา

รูปที่ 4.9-5 (ต่อ)

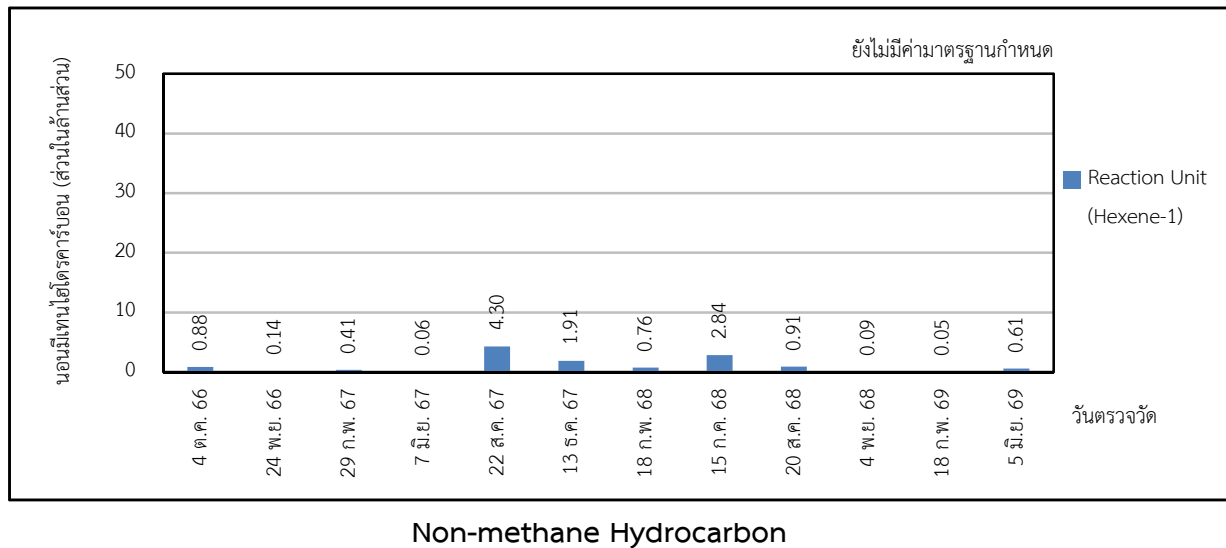

- หมายเหตุ :
1. Non-methane Hydrocarbon ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด
 2. บริเวณหน่วยการผลิต Hexene-1 ดำเนินการตรวจวัดเฉพาะในช่วงมีการเดินระบบของหน่วยผลิต Hexene-1
 3. ผลการตรวจวัด Total Hydrocarbon และ Non-methane Hydrocarbon อาจมีค่าแปรผันตามกิจกรรมการเดินเครื่องบริเวณใกล้เคียง เช่น การโหลดสารเคมี, การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้พบค่าสูงขึ้นในช่วงเวลา

4.9.2 คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตัวบุคคล (Personal Sampling)

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดสารเคมีแบบติดตัวบุคคล (Personal Sampling) ได้แก่ เบนซีน (Benzene) ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4.9.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตัวบุคคล (Personal Sampling) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตัวบุคคล ของโรงงานแอลแอลดีพีอี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัดสารเบนซีน (Benzene) จำนวน 1 ครั้ง โดยทำการสุ่มตรวจพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 และโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 จำนวน 4 คน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารเบนซีน พบค่าเท่ากับ ND(<0.04) ส่วนในล้านส่วน ในทุกคนที่ทำการตรวจวัด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 ที่กำหนด ความเข้มข้นของสารเบนซีนไว้ไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วน และรายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 4.9-7 และภาคผนวก ง

4.9.2.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตัวบุคคล (Personal Sampling) ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตัวบุคคล ได้แก่ เบนซีน (Benzene) ของโรงงานแอลแอลดีพีอี ในระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 พบว่ามีค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดความเข้มข้นของเบนซีนไว้ไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9-8 และ รูปที่ 4.9-6

ตารางที่ 4.9-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตัวบุคคล

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

เจ้าหน้าที่ ที่ทำการตรวจวัด	พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
สายการผลิตที่ 1 (LLDPE Plant1)					
พนักงานปฏิบัติการผลิต 1	Benzene	ppm	18 ก.พ. 69	ND(<0.04)	1
พนักงานปฏิบัติการผลิต 2	Benzene	ppm	18 ก.พ. 69	ND(<0.04)	1
สายการผลิตที่ 2 (LLDPE Plant2)					
พนักงานปฏิบัติการผลิต 3	Benzene	ppm	18 ก.พ. 69	ND(<0.04)	1
พนักงานปฏิบัติการผลิต 4	Benzene	ppm	18 ก.พ. 69	ND(<0.04)	1

หมายเหตุ : ^{1/}ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมี
อันตราย พ.ศ.2560

ชื่อผู้ตรวจวัด :

นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก :

นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

เลขที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัด :

0201-03-2565-0049

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

นางสาวนริสา ภูวสรเพ็ชญ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม :

บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ :

นางสาวสุดาพร สุนทร

เลขที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ :

0202-03-2565-0034

เบอร์โทรศัพท์ :

0-2959-3600

ตารางที่ 4.9-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตัวบุคคล

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเบนซิน (ppm)	
	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2
4 ต.ค. 66	ND(<0.04)	ND(<0.04)
29 ก.พ. 67	ND(<0.04)	ND(<0.04)
15 พ.ย. 67	ND(<0.04)	ND(<0.04)
18 ก.พ. 68	ND(<0.04)	ND(<0.04)
20 ส.ค. 68	ND(<0.04)	ND(<0.04)
18 ก.พ. 69	ND(<0.04)	ND(<0.04)
ค่ามาตรฐาน	1 ^{1/}	

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

พ.ศ.2560

รูปที่ 4.9-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบติดตัวบุคคล
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

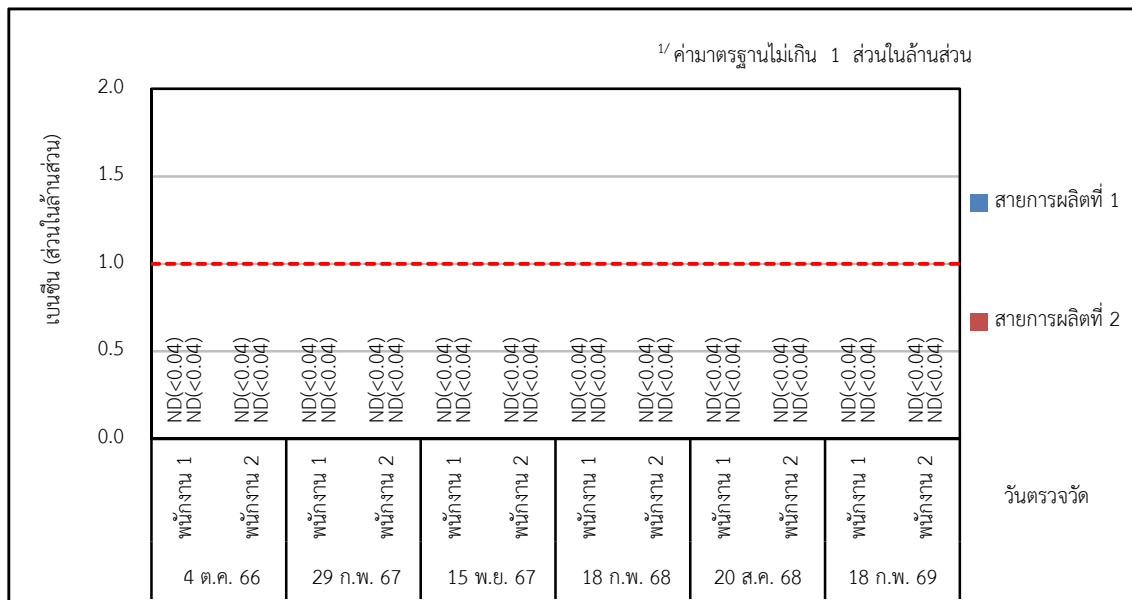

Benzene

หมายเหตุ : 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชัดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560

4.9.3 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน จำนวน 7 จุด ได้แก่ บริเวณ Control Room, Compressor Area, Extruder and Pellet Dryer ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริเวณ Control Room, Compressor Area, Extruder and Pellet Dryer ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 และบริเวณ Compressor Area ของหน่วยผลิตเฮกซีน-1 โดยมีความถี่ของการตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง

4.9.3.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

การตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) โดยบริษัท ซีคोट จำกัด โดยการตรวจวัดใน 6 บริเวณ ของโรงงานแอลแอลดีพีอีสายการผลิตที่ 1 และ 2 ได้แก่ บริเวณ Control room บริเวณ Compressor area และบริเวณ Extruder and pellet dryer ดำเนินการตรวจวัด 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 สำหรับบริเวณ Compressor Area ของหน่วยผลิตเฮกซีน-1 ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2569 ตำแหน่งและภาพการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.9-7 ถึงรูปที่ 4.9-8 โดยผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 4.9-9 ถึงตารางที่ 4.9-24 และภาคผนวก ง ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

โรงงานแอลแอลดีพีอีสายการผลิตที่ 1 (LLDPE Plant 1)

(1) บริเวณ Control room

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 มีค่าเท่ากับ 58.3 และ 59.7 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ

(2) บริเวณ Compressor area

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 มีค่าเท่ากับ 83.9 และ 83.4 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ

(3) บริเวณ Extruder and pellet dryer

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 มีค่าเท่ากับ 83.9 และ 84.3 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ

โรงงานแอลแอลดีพีอีสายการผลิตที่ 2 (LLDPE Plant 2)

(1) บริเวณ Control room

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 มีค่าเท่ากับ 60.7 และ 57.6 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ

(2) บริเวณ Compressor area

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 มีค่าเท่ากับ 80.0 และ 80.7 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ

(3) บริเวณ Extruder and pellet dryer

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569 มีค่าเท่ากับ 82.4 และ 84.6 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ

หน่วยผลิตเฮกซีน-1 (Hexene-1)


เนื่องจากหน่วยผลิตเฮกซีน-1 (Hexene-1) มีการเดินหน่วยการผลิตเป็นบางช่วงเวลา ดังนั้น การตรวจวัดจึงขึ้นกับแผนการผลิต และโรงงานจะทำการตรวจวัดทันทีที่สามารถดำเนินการได้ให้ครบ 4 ครั้งต่อปี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) บริเวณ Compressor area ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2569 มีค่าเท่ากับ 81.0 และ 82.1 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงในบริเวณสถานประกอบการ ตามค่าควบคุม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดค่าระดับเสียงที่ระยะห่าง 1 เมตร จากอุปกรณ์ไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) พบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่กำหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงาน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 87 เดซิเบล(เอ) พบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ ทางโรงงาน

ได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ มีการหมุนเวียนพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต การติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากเสียง กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกครั้งก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง กำหนดให้เฝ้าระวังระดับเสียงในกระบวนการผลิต และสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการอนุรักษ์การได้ยิน รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข.43

ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA) ไม่เกิน (เดซิเบล(เอ))	ระยะเวลาการทำงานที่ได้รับเสียงต่อวัน *	
	ชั่วโมง	นาที
82	16	-
83	12	42
84	10	5
85	8	-
86	6	21
87	5	2
88	4	-
89	3	11
90	2	31
91	2	-
92	1	35

หมายเหตุ : * อ้างอิงตามตารางมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561

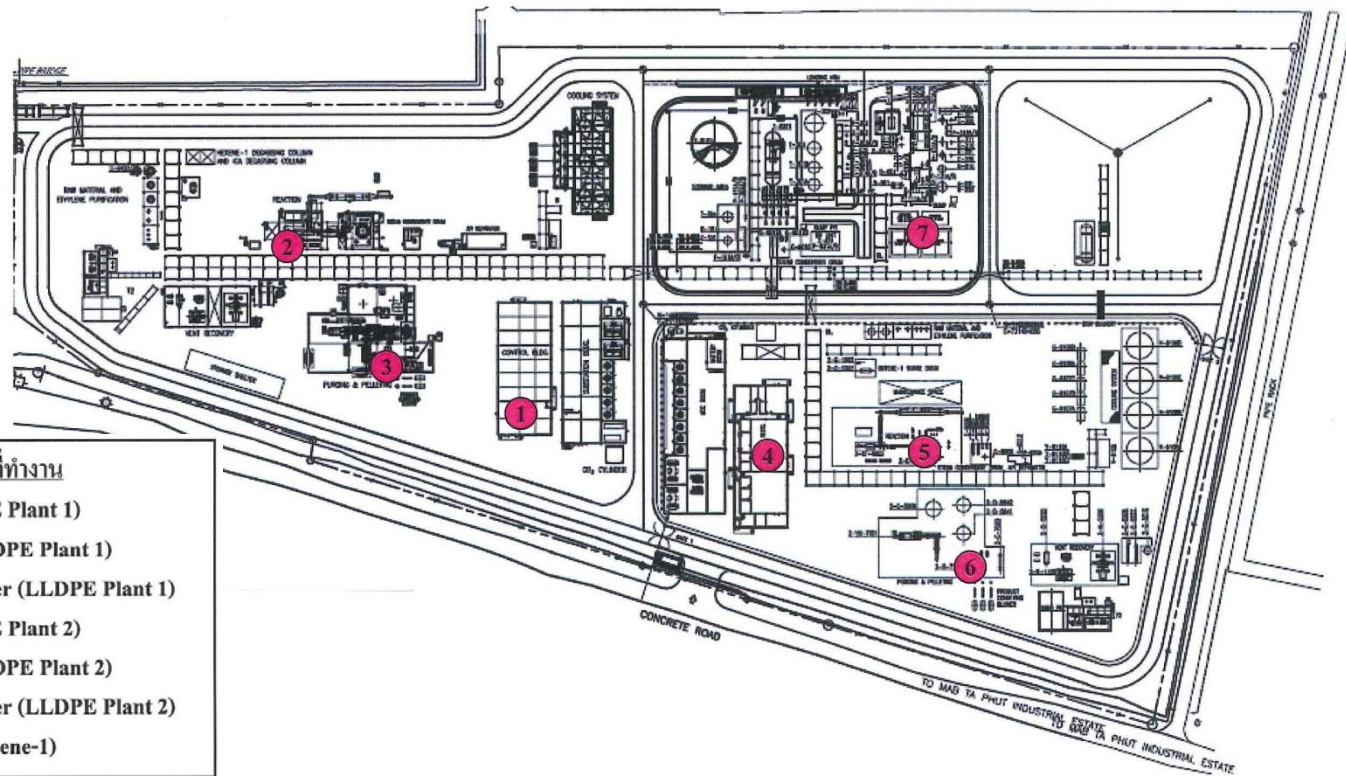

จุดตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

- ① Control Room (LLDPE Plant 1)
- ② Compressor Area (LLDPE Plant 1)
- ③ Extruder & Pellet Dryer (LLDPE Plant 1)
- ④ Control Room (LLDPE Plant 2)
- ⑤ Compressor Area (LLDPE Plant 2)
- ⑥ Extruder & Pellet Dryer (LLDPE Plant 2)
- ⑦ Compressor Area (Hexene-1)

รูปที่ 4.9-7 ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน
โรงงานแอลเอ็ดทีพี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)





บริเวณ Control room (LLDPE 1)



บริเวณ Compressor area (LLDPE 1)



บริเวณ Extruder and pellet dryer (LLDPE 1)

รูปที่ 4.9-8 ภาพการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)





บริเวณ Control room (LLDPE 2)



บริเวณ Compressor area (LLDPE 2)



บริเวณ Extruder and pellet dryer (LLDPE 2)

รูปที่ 4.9-8 ภาพการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
(ต่อ)





บริเวณ Compressor Area ของหน่วยผลิตเฮกซีน-1

รูปที่ 4.9-8 ภาพการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน
โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
(ต่อ)



ตารางที่ 4.9-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด :

1. Control room (LLDPE 1) (730952E, 1403136N)
2. Compressor area (LLDPE 1) (0730827E, 1403197N)
3. Extruder and pellet dryer (LLDPE 1) (073090E, 1403180N)
4. Control room (LLDPE 2) (731048E, 1403122N)
5. Compressor area (LLDPE 2) (0731175E, 1403107N)
6. Extruder and pellet dryer (LLDPE 2) (0731141E, 1403091N)
7. Compressor Area (Hexene-1) (0731125E, 1403203N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) :

1. SCARLET TECH ST-21D / 820725 (No.1)
2. SCARLET TECH ST-21D / 820728 (No.2)
3. SCARLET TECH ST-21D / 820723 (No.3)
4. SCARLET TECH ST-21D / 820729 (No.4)
5. SCARLET TECH ST-21D / 821078 (No.5)
6. SCARLET TECH ST-21D / 821080 (No.6)
7. SCARLET TECH ST-21D / 821079 (No.7)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : CIRRUS CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) :

Station 1. 93.8 / 0.0 Station 2. 93.8 / 0.0 Station 3. 93.8 / 0.0 Station 4. 93.8 / 0.0
Station 5. 93.8 / 0.0 Station 6. 93.8 / 0.0 Station 7. 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2602-0099-01

ตำแหน่งที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
Control room (LLDPE 1)	17 ก.พ. 69	58.3
Compressor area (LLDPE 1)	17 ก.พ. 69	83.9
Extruder and pellet dryer (LLDPE 1)	17 ก.พ. 69	83.9
Control room (LLDPE 2)	17 ก.พ. 69	60.7
Compressor area (LLDPE 2)	17 ก.พ. 69	80.0
Extruder and pellet dryer (LLDPE 2)	17 ก.พ. 69	82.4
Compressor Area (หน่วยผลิตเฮกซีน-1)	17 ก.พ. 69	81.0
ค่ามาตรฐาน		85.0 ^{1/} , 87.0 ^{2/}

หมายเหตุ : 1.^{1/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตาม
มาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
2.^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ : 0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนันทา ศิริพัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชาวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600

ตารางที่ 4.9-10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Control room (LLDPE 1) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Control room (LLDPE 1) (730952E, 1403136N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.): SCARLET TECH ST-21D / 820725 (No.1)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : CIRRUS CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2602-0099-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	17 ก.พ. 69
08:00-09:00	58.5
09:00-10:00	64.5
10:00-11:00	55.5
11:00-12:00	56.0
12:00-13:00	55.8
13:00-14:00	59.4
14:00-15:00	57.7
15:00-16:00	57.5
16:00-17:00	55.7
17:00-18:00	56.0
18:00-19:00	55.8
19:00-20:00	55.5
Leq(12) ^{1/}	58.3
Lmax ^{2/}	87.3
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์
การได้ยื่น

4. ^{4/} คำมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอต จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Compressor area (LLDPE 1) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ตำแหน่งพักตัวของสถานีตรวจวัด : Compressor area (LLDPE 1) (0730827E, 1403197N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : CARLET TECH ST-21D / 820728 (No.2)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : CIRRUS CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2602-0099-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	17 ก.พ. 69
08:00-09:00	83.8
09:00-10:00	84.0
10:00-11:00	84.1
11:00-12:00	84.1
12:00-13:00	83.9
13:00-14:00	83.8
14:00-15:00	83.8
15:00-16:00	83.8
16:00-17:00	83.7
17:00-18:00	84.0
18:00-19:00	84.3
19:00-20:00	83.9
Leq(12) ^{1/}	83.9
Lmax ^{2/}	94.2
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์
การได้ยื่น

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอต จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Extruder and pellet dryer (LLDPE 1) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Extruder and pellet dryer (LLDPE 1) (073090E, 1403180N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.): SCARLET TECH ST-21D / 820723 (No.3)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : CIRRUS CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2602-0099-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	17 ก.พ. 69
08:00-09:00	84.0
09:00-10:00	84.2
10:00-11:00	83.9
11:00-12:00	83.8
12:00-13:00	83.7
13:00-14:00	84.0
14:00-15:00	83.7
15:00-16:00	83.7
16:00-17:00	84.2
17:00-18:00	83.9
18:00-19:00	84.0
19:00-20:00	83.8
Leq(12) ^{1/}	83.9
Lmax ^{2/}	92.4
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการโครงการอนุรักษ์การได้ยื่น

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิรวุฒินานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอต จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Control room (LLDPE 2) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท ฟิทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Control room (LLDPE 2) (731048E, 1403122N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.): SCARLET TECH ST-21D / 820729 (No.4)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : CIRRUS CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2602-0099-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	17 ก.พ. 69
08:00-09:00	61.0
09:00-10:00	61.0
10:00-11:00	61.8
11:00-12:00	59.5
12:00-13:00	58.3
13:00-14:00	61.8
14:00-15:00	60.2
15:00-16:00	59.6
16:00-17:00	58.3
17:00-18:00	61.8
18:00-19:00	61.0
19:00-20:00	61.8
Leq(12) ^{1/}	60.7
Lmax ^{2/}	87.8
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์
การได้ยื่น

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอกท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Compressor area (LLDPE 2) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอบ จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Compressor area (LLDPE 2) (0731175E, 1403107N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET TECH ST-21D / 821078 (No.5)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : CIRRUS CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2602-0099-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	17 ก.พ. 69
08:00-09:00	80.0
09:00-10:00	80.1
10:00-11:00	80.1
11:00-12:00	80.1
12:00-13:00	80.1
13:00-14:00	80.0
14:00-15:00	80.0
15:00-16:00	79.9
16:00-17:00	80.0
17:00-18:00	80.1
18:00-19:00	80.0
19:00-20:00	80.1
Leq(12) ^{1/}	80.0
Lmax ^{2/}	96.1
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.25465. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอบ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดโชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-15 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Extruder and pellet dryer (LLDPE 2) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอบ จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Extruder and pellet dryer (LLDPE 2) (0731141E, 1403091N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET TECH ST-21D / 821080 (No.6)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : CIRRUS CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2602-0099-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	17 ก.พ. 69
08:00-09:00	82.2
09:00-10:00	82.3
10:00-11:00	82.3
11:00-12:00	82.5
12:00-13:00	82.4
13:00-14:00	82.5
14:00-15:00	82.6
15:00-16:00	82.4
16:00-17:00	82.4
17:00-18:00	82.5
18:00-19:00	82.6
19:00-20:00	82.5
Leq(12) ^{1/}	82.4
Lmax ^{2/}	96.6
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.25465. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอบ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดโชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Compressor Area (หน่วยผลิตเฮกซีน-1) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Compressor Area (หน่วยผลิตเฮกซีน-1) (0731125E, 1403203N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET TECH ST-21D / 821079 (No.7)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : CIRRUS CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2602-0099-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	17 ก.พ. 69
08:00-09:00	81.4
09:00-10:00	80.5
10:00-11:00	80.9
11:00-12:00	80.9
12:00-13:00	81.1
13:00-14:00	81.2
14:00-15:00	81.1
15:00-16:00	81.2
16:00-17:00	80.5
17:00-18:00	81.2
18:00-19:00	81.0
19:00-20:00	81.0
Leq(12) ^{1/}	81.0
Lmax ^{2/}	84.6
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. คำควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์
การได้ยื่น

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวฒินานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีโอ
 จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอบ จำกัด
 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด :
 1. Control room (LLDPE 1) (730952E, 1403136N)
 2. Compressor area (LLDPE 1) (0730827E, 1403197N)
 3. Extruder and pellet dryer (LLDPE 1) (073090E, 1403180N)
 4. Control room (LLDPE 2) (731048E, 1403122N)
 5. Compressor area (LLDPE 2) (0731175E, 1403107N)
 6. Extruder and pellet dryer (LLDPE 2) (0731141E, 1403091N)
 7. Compressor Area (Hexene-1) (0731125E, 1403203N)
 รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) :
 1. SCARLET TECH ST-21D / 821081 (No.1)
 2. SCARLET TECH ST-21D / 821078 (No.2)
 3. SCARLET TECH ST-21D / 820725 (No.3)
 4. SCARLET TECH ST-21D / 820729 (No.4)
 5. SCARLET TECH ST-21D / 821079 (No.5)
 6. SCARLET TECH ST-21D / 820731 (No.6)
 7. SCARLET TECH ST-21D / 820725 (No.1)
 รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515 / 97097
 ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 94.0 / 93.8
 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) :
 Station 1. 93.8 / 0.0 Station 2. 93.8 / 0.0 Station 3. 93.8 / 0.0 Station 4. 93.8 / 0.0
 Station 5. 93.8 / 0.0 Station 6. 93.8 / 0.0 Station 7. 94.0 / -0.2
 วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2605-0005-01,
 CAL-2606-0125-01

ตำแหน่งที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
Control room (LLDPE 1)	13 พ.ค. 69	59.7
Compressor area (LLDPE 1)	13 พ.ค. 69	83.4
Extruder and pellet dryer (LLDPE 1)	13 พ.ค. 69	84.3
Control room (LLDPE 2)	13 พ.ค. 69	57.6
Compressor area (LLDPE 2)	13 พ.ค. 69	80.7
Extruder and pellet dryer (LLDPE 2)	13 พ.ค. 69	84.6
Compressor Area (หน่วยผลิตเฮกซีน-1)	5 มิ.ย. 69	82.1
ค่ามาตรฐาน		85.0 ^{1/} , 87.0 ^{2/}

หมายเหตุ : 1.^{1/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตาม
มาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยีน
2.^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

ชื่อผู้ตรวจวัด :	นางสาววิระยา ปังฉิมบุรณ์ / นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว
ชื่อผู้บันทึก :	นางสาววิระยา ปังฉิมบุรณ์ / นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว
เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :	0403-03-2565-0048
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :	นางสาวสุนันทา ศิริภูณินานนท์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม :	บริษัท ซีคอฟ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ :	นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :	0-2959-3600

ตารางที่ 4.9-18 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Control room (LLDPE 1) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Control room (LLDPE 1) (730952E, 1403136N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.): SCARLET TECH ST-21D / 821081 (No.1)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2605-0005-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	13 พ.ค. 69
09:00-10:00	62.1
10:00-11:00	59.9
11:00-12:00	61.7
12:00-13:00	59.1
13:00-14:00	59.6
14:00-15:00	59.5
15:00-16:00	60.2
16:00-17:00	58.9
17:00-18:00	58.9
18:00-19:00	57.7
19:00-20:00	57.1
20:00-21:00	58.6
Leq(12) ^{1/}	59.7
Lmax ^{2/}	87.5
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09:00-21:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 09:00-21:00 น.

3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์
การได้ยื่น

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Compressor area (LLDPE 1) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Compressor area (LLDPE 1) (0730827E, 1403197N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : CARLET TECH ST-21D / 821078 (No.2)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2605-0005-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	13 พ.ค. 69
09:00-10:00	83.3
10:00-11:00	83.1
11:00-12:00	83.6
12:00-13:00	83.4
13:00-14:00	83.5
14:00-15:00	83.4
15:00-16:00	83.3
16:00-17:00	83.2
17:00-18:00	83.5
18:00-19:00	83.5
19:00-20:00	83.5
20:00-21:00	83.4
Leq(12) ^{1/}	83.4
Lmax ^{2/}	91.3
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09:00-21:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 09:00-21:00 น.

3. ^{3/} คำควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พิพาทเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์
การได้กิน

4. ^{4/} คำมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ

ชื่อผู้บันทึก : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวฒินานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอต จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-20 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Extruder and pellet dryer (LLDPE 1) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอบ จำกัด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Extruder and pellet dryer (LLDPE 1) (073090E, 1403180N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET TECH ST-21D / 820725 (No.3)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2605-0005-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	13 พ.ค. 69
09:00-10:00	84.6
10:00-11:00	84.9
11:00-12:00	84.1
12:00-13:00	84.3
13:00-14:00	84.5
14:00-15:00	84.3
15:00-16:00	84.4
16:00-17:00	84.6
17:00-18:00	84.2
18:00-19:00	84.4
19:00-20:00	83.5
20:00-21:00	84.2
Leq(12) ^{1/}	84.3
Lmax ^{2/}	102.6
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09:00-21:00 น.2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 09:00-21:00 น.3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.25465. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอบ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดโชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-21 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Control room (LLDPE 2) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Control room (LLDPE 2) (731048E, 1403122N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.): SCARLET TECH ST-21D / 820729 (No.4)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2605-0005-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	13 พ.ค. 69
08:00-09:00	58.6
09:00-10:00	58.9
10:00-11:00	58.4
11:00-12:00	58.5
12:00-13:00	55.5
13:00-14:00	60.4
14:00-15:00	59.4
15:00-16:00	55.1
16:00-17:00	55.4
17:00-18:00	55.4
18:00-19:00	55.1
19:00-20:00	55.6
Leq(12) ^{1/}	57.6
Lmax ^{2/}	82.6
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. ^{3/} คำควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พิพาทเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์
การได้กิน

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ

ชื่อผู้บันทึก : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอต จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-22 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Compressor area (LLDPE 2) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Compressor area (LLDPE 2) (0731175E, 1403107N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.): SCARLET TECH ST-21D / 821079 (No.5)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2605-0005-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	13 พ.ค. 69
08:00-09:00	82.0
09:00-10:00	80.5
10:00-11:00	81.0
11:00-12:00	80.6
12:00-13:00	80.5
13:00-14:00	80.6
14:00-15:00	80.5
15:00-16:00	80.2
16:00-17:00	80.5
17:00-18:00	80.8
18:00-19:00	80.4
19:00-20:00	80.8
Leq(12) ^{1/}	80.7
Lmax ^{2/}	109.6
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการโครงการอนุรักษ์การได้ยื่น

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอต จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-23 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Extruder and pellet dryer (LLDPE 2) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Extruder and pellet dryer (LLDPE 2) (0731141E, 1403091N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET TECH ST-21D / 820731 (No.6)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 93.8 / 0.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2605-0005-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	13 พ.ค. 69
08:00-09:00	84.6
09:00-10:00	84.7
10:00-11:00	84.9
11:00-12:00	84.8
12:00-13:00	84.6
13:00-14:00	84.7
14:00-15:00	84.8
15:00-16:00	84.6
16:00-17:00	84.3
17:00-18:00	84.6
18:00-19:00	84.5
19:00-20:00	84.6
Leq(12) ^{1/}	84.6
Lmax ^{2/}	102.4
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการโครงการอนุรักษ์
การได้ยื่น

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์

ชื่อผู้บันทึก : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอต จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริเวณ Compressor Area (หน่วยผลิตเฮกซีน-1) ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2569

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีคอต จำกัด

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : Compressor Area (หน่วยผลิตเฮกซีน-1) (0731125E, 1403203N)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET TECH ST-21D / 820725

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515 / 97097

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref / Calibration Eff dB(A)) : 94.0 / 93.8

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)) : 94.0 / -0.2

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 14 ตุลาคม พ.ศ.2568

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CAL-2606-0125-01

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
	5 มิ.ย. 69
08:00-09:00	82.1
09:00-10:00	82.3
10:00-11:00	82.2
11:00-12:00	82.0
12:00-13:00	82.0
13:00-14:00	82.0
14:00-15:00	82.0
15:00-16:00	82.1
16:00-17:00	82.2
17:00-18:00	82.2
18:00-19:00	82.0
19:00-20:00	82.0
Leq(12) ^{1/}	82.1
Lmax ^{2/}	89.8
ค่ามาตรฐาน 12 ชั่วโมง	85 ^{3/} , 87 ^{4/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด (Lmax)	115 ^{5/}
ค่ามาตรฐานสูงสุด	140 ^{4/}

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08:00-20:00 น.

2. ^{2/} ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 08:00-20:00 น.

3. ^{3/} ค่าควบคุมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการโครงการอนุรักษ์
การได้ยื่น

4. ^{4/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

5. ^{5/} ค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก : นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสนั่นหา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอต จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

4.9.3.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

การตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr) ดำเนินการตรวจวัดในสถานที่ทำงาน 7 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ Control room บริเวณ Compressor area และบริเวณ Extruder and pellet dryer ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 และสายการผลิตที่ 2 และบริเวณหน่วยการผลิตเฮกซีน 1 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.9-25 ถึงตารางที่ 4.9-27 และรูปที่ 4.9-9 ถึงรูปที่ 4.9-11 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับได้ในเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 87 เดซิเบล(เอ) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้ระดับเสียงจากอุปกรณ์ที่ระยะห่าง 1 เมตร ต้องไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางโรงงานได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง และให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังในบริเวณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สำหรับอุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล โรงงานเลือกใช้ที่ครอบหูลดเสียง ซึ่งมีค่า NRR เท่ากับ 25 ซึ่งสามารถลดเสียงลงร้อยละ 75 ของค่าการลดเสียงที่ระบุไว้บนฉลากหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากผลการตรวจวัดเสียงสะสมที่ลูกจ้างได้รับขณะปฏิบัติงานในหัวข้อ 4.9.4 ของพนักงานที่ได้เข้าปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต สายการผลิตที่ 1 มีค่าเท่ากับ 79.5-82.2 และสายการผลิตที่ 2 มีค่าเท่ากับ 77.0-82.8 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ โดยพนักงานจะได้รับเสียงดังขณะปฏิบัติงาน ลดลงจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังตลอดระยะเวลาทำงาน โดยมีค่า ระดับเสียงสะสมที่ลูกจ้างได้รับขณะปฏิบัติงานเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (TWA 12 hr) เมื่อใส่อุปกรณ์เท่ากับ 68.8-72.5 และ 74.2-81.7 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าโรงงานได้พิจารณาและกำหนดแนวทางการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบต่อพนักงานอย่างเพียงพอแล้ว

ตารางที่ 4.9-25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
Control room	3 ต.ค. 66	60.5
	24 พ.ย. 66	59.2
	28 ก.พ. 67	62.9
	7 มี.ย. 67	60.4
	28 ส.ค. 67	60.9
	15 พ.ย. 67	60.8
	26 ก.พ. 68	60.5
	27 พ.ค. 68	60.5
	20 ส.ค. 68	60.0
	4 พ.ย. 68	58.0
Compressor area	17 ก.พ. 69	58.3
	13 พ.ค. 69	59.7
	3 ต.ค. 66	83.0
	24 พ.ย. 66	82.4
	28 ก.พ. 67	84.1
	7 มี.ย. 67	82.0
	28 ส.ค. 67	84.7
	15 พ.ย. 67	84.2
	26 ก.พ. 68	83.7
	27 พ.ค. 68	84.6
	20 ส.ค. 68	84.3
	4 พ.ย. 68	83.4
	17 ก.พ. 69	83.9
	13 พ.ค. 69	83.4
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		85.0

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าควบคุมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ตารางที่ 4.9-25 (ต่อ)

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
Extruder and pellet dryer	3 ต.ค. 66	83.6
	24 พ.ย. 66	83.6
	28 ก.พ. 67	84.2
	7 มี.ย. 67	82.6
	28 ส.ค. 67	84.6
	15 พ.ย. 67	84.6
	26 ก.พ. 68	84.7
	27 พ.ค. 68	84.9
	20 ส.ค. 68	84.8
	4 พ.ย. 68	84.1
	17 ก.พ. 69	83.9
	13 พ.ค. 69	84.3
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		85.0

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าควบคุมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ตารางที่ 4.9-26 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
Control room	3 ต.ค. 66	60.7
	24 พ.ย. 66	59.0
	28 ก.พ. 67	58.5
	7 มี.ย. 67	60.6
	28 ส.ค. 67	59.3
	15 พ.ย. 67	59.2
	26 ก.พ. 68	61.1
	27 พ.ค. 68	60.1
	20 ส.ค. 68	58.3
	4 พ.ย. 68	58.1
	17 ก.พ. 69	60.7
	13 พ.ค. 69	57.6
Compressor area	3 ต.ค. 66	84.9
	24 พ.ย. 66	82.4
	29 ก.พ. 67	83.1
	7 มี.ย. 67	84.7
	28 ส.ค. 67	81.9
	15 พ.ย. 67	81.9
	26 ก.พ. 68	82.6
	27 พ.ค. 68	82.0
	20 ส.ค. 68	82.0
	4 พ.ย. 68	78.4
	17 ก.พ. 69	80.0
	13 พ.ค. 69	80.7
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		85.0

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าควบคุมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตาม
มาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ตารางที่ 4.9-26 (ต่อ)

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
Extruder and pellet dryer	3 ต.ค. 66	83.8
	24 พ.ย. 66	83.9
	29 ก.พ. 67	83.0
	7 มี.ย. 67	83.6
	28 ส.ค. 67	83.9
	15 พ.ย. 67	82.5
	26 ก.พ. 68	83.5
	27 พ.ค. 68	83.2
	20 ส.ค. 68	84.0
	4 พ.ย. 68	83.2
	17 ก.พ. 69	82.4
	13 พ.ค. 69	84.6
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		85.0

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าควบคุมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ตารางที่ 4.9-27 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

หน่วยการผลิตเฮกซีน-1

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569


จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
Compressor Area (Hexene-1)	3 ต.ค. 66	83.8
	24 พ.ย. 66	81.6
	28 ก.พ. 67	82.7
	7 มี.ย. 67	83.7
	28 ส.ค. 67	81.9
	13 ธ.ค. 67	83.4
	30 เม.ย. 68	83.6
	15 ก.ค. 68	81.8
	20 ส.ค. 68	83.3
	4 พ.ย. 68	83.7
	17 ก.พ. 69	81.0
	5 มี.ย. 69	82.1
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		85.0

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าควบคุมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

รูปที่ 4.9-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

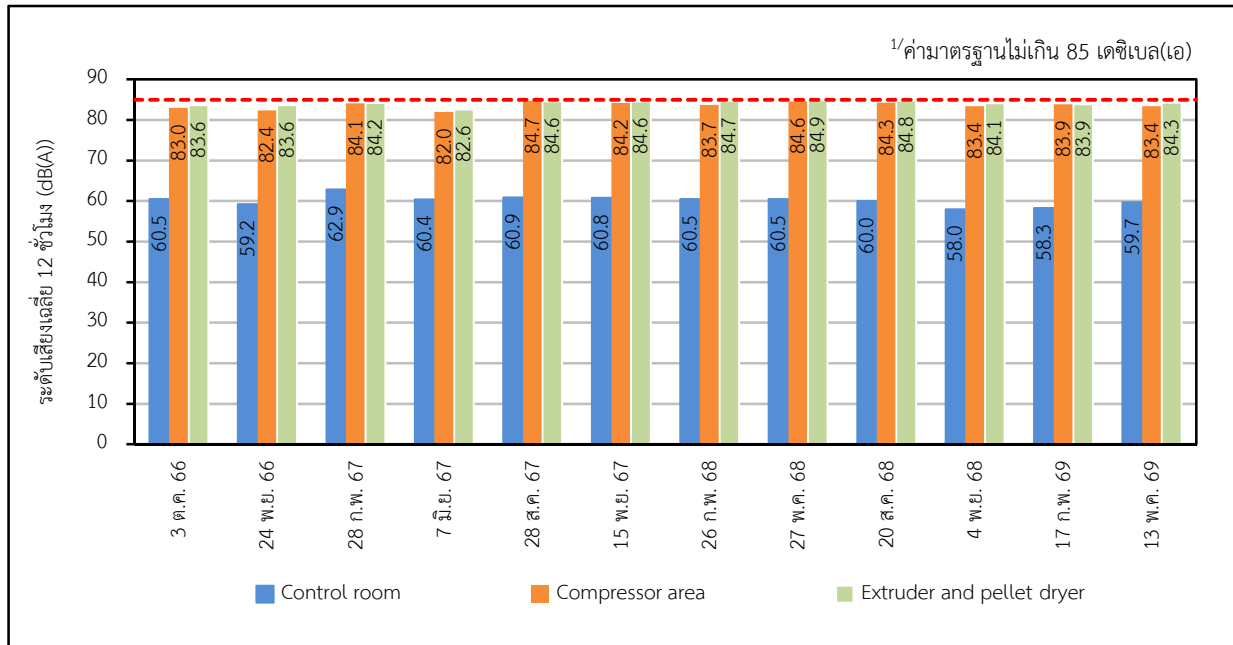


หมายเหตุ : 1/ ค่าควบคุมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

รูปที่ 4.9-10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

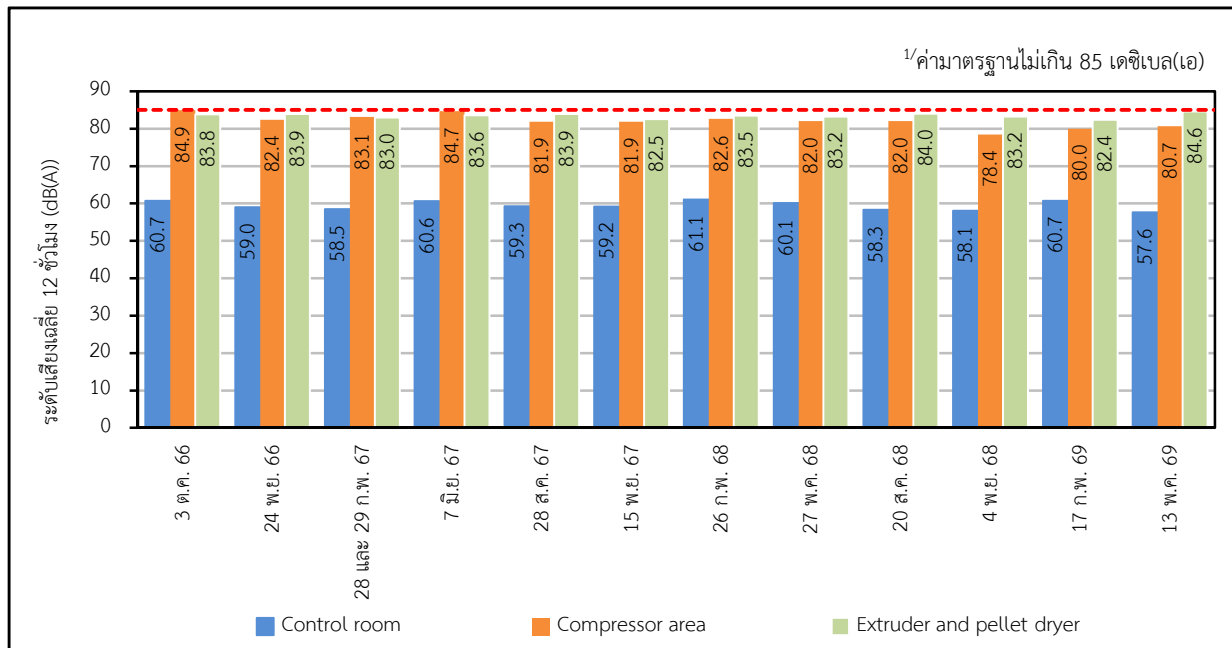


หมายเหตุ : 1/ ค่าควบคุมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

รูปที่ 4.9-11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

หน่วยผลิตเฮกซีน-1

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

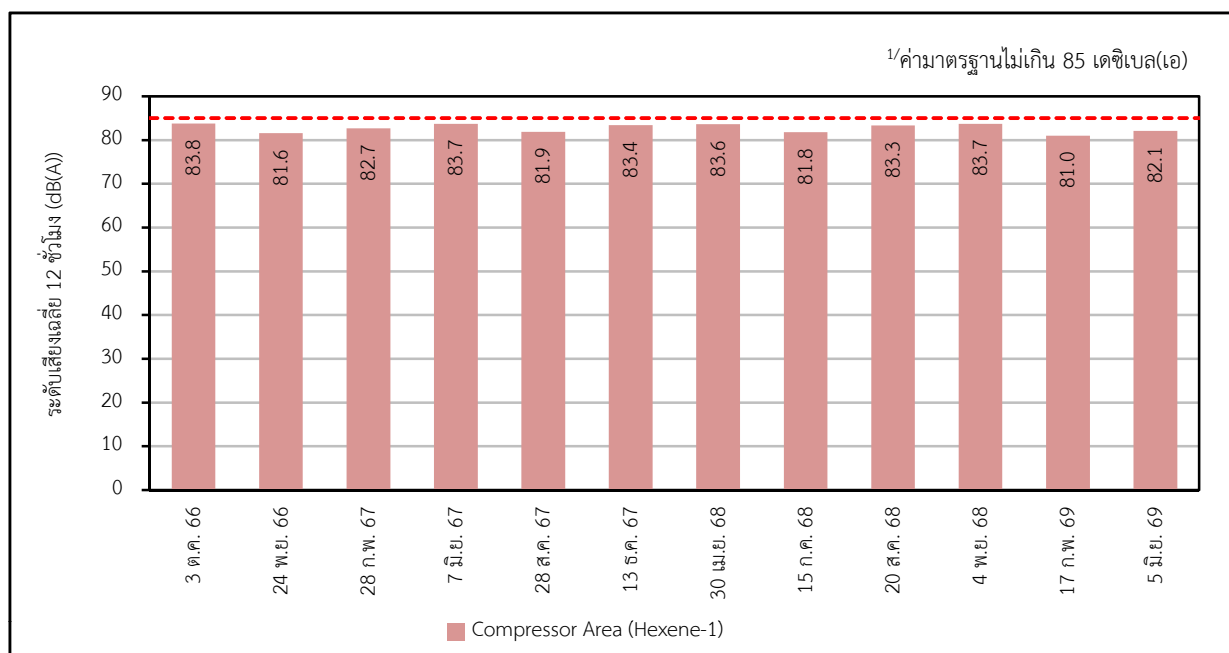

หมายเหตุ :

1/ ค่าควบคุมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พบค่าเกินเกณฑ์ควบคุมมีการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

4.9.4 ปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงและคำนวณระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (Time Weighted Average-TWA) โดยกลุ่มตรวจพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ กระบวนการผลิต ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

4.9.4.1 ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน (TWA) ดำเนินการโดยบริษัท ซีคोट จำกัด โดยติดตามตรวจวัดพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการผลิตของสายการผลิตที่ 1 และ 2 ในบริเวณ Compressor บริเวณ Extruder & Pellet Dryer บริเวณ Purification บริเวณ Reactor และบริเวณ Hexene-1 รวมทั้งหมด 5 พื้นที่ โดยในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ทำการสุ่มตรวจพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณกระบวนการผลิตของสายการผลิตที่ 1 และ 2 รวมจำนวน 9 คน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 พบว่า มีค่าระดับเสียงของพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต สายการผลิตที่ 1 อยู่ระหว่าง 79.5-82.2 เดซิเบล(เอ) และพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต สายการผลิตที่ 2 อยู่ระหว่าง 77.0-82.8 เดซิเบล(เอ) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9-28 และภาคผนวก ง

เมื่อพิจารณาปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้การทำงานวันละ 12 ชั่วโมง ระดับเสียงที่พนักงานได้รับติดต่อกันต้องไม่เกิน 83 เดซิเบล(เอ) พบว่า ระดับเสียงที่พนักงานได้รับทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากเสียงและกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกครั้งก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง

ตารางที่ 4.9-28 ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

พนักงานที่ทำการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	บริเวณ	ระดับความดังของเสียง (12 hr) (dB(A))	
			TWA	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 1	17 ก.พ. 69	Purification unit (LLDPE 1)	79.5	83.0
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 2	17 ก.พ. 69	Compressor (LLDPE 1)	80.2	
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 3	17 ก.พ. 69	Extruder & Pellet Dryer (LLDPE 1)	82.2	
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 4	17 ก.พ. 69	Reactor unit (LLDPE 1)	80.2	
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 5	17 ก.พ. 69	Reactor unit (LLDPE 2)	81.5	
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 6	17 ก.พ. 69	Extruder & Pellet Dryer (LLDPE 2)	82.8	
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 7	17 ก.พ. 69	Compressor (LLDPE 2)	79.7	
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 8	17 ก.พ. 69	Purification unit (LLDPE 2)	82.7	
พนักงานปฏิบัติงานการผลิต 9	17 ก.พ. 69	Hexene-1 unit (LLDPE 2)	77.0	

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561

ชื่อผู้ตรวจวัด :

นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

ชื่อผู้บันทึก :

นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว

เลขที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ :

0403-03-2565-0048

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนานนท์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม :

บริษัท ซีคอท จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ :

นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ :

0-2959-3600

4.9.4.2 สรุปผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่กระบวนการผลิตของสายการผลิตที่ 1 และ 2 บริเวณ Compressor บริเวณ Extruder & Pellet Dryer บริเวณ Purification บริเวณ Reactor และบริเวณ Hexene-1 รวมทั้งหมด 5 พื้นที่ ซึ่งผลการตรวจวัดในระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9-29 และรูปที่ 4.9-12

เมื่อพิจารณาปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงานในระหว่างปี พ.ศ.2566-2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้การทำงานวันละ 12 ชั่วโมง ระดับเสียงที่พนักงานได้รับติดต่อกันต้องไม่เกิน 83 เดซิเบล(เอ) พบว่า ระดับเสียงที่พนักงานได้รับมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ซึ่งในการปฏิบัติงานจริง พนักงานจะปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อกะ จึงทำให้ปริมาณการรับสัมผัสเสียงไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด (เปรียบเทียบกับ Noise exchange rate) ดังแสดงในตารางแนบท้าย

ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA) ไม่เกิน (เดซิเบล(เอ))	ระยะเวลาการทำงานที่ได้รับเสียงต่อวัน *	
	ชั่วโมง	นาที
82	16	-
83	12	42
84	10	5
85	8	-
86	6	21
87	5	2
88	4	-
89	3	11
90	2	31
91	2	-
92	1	35

หมายเหตุ : * ตารางมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561

สำหรับผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน (Noise Dose) ของพนักงาน ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9-28 ทั้งนี้จากผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินล่าสุด ประจำปี พ.ศ.2568 พบว่าพนักงานร้อยละ 94.67 อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ปกติร้อยละ 2.17 ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่าผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่เบี่ยงเบนนี้เป็นปัจจัยสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการผลิตเป็นหลักจึงไม่ได้รับสัมผัสเสียงจากการทำงานเป็นประจำ แต่อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานได้มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการอนุรักษ์การได้ยิน รายละเอียดดังแสดงภาคผนวก ข.43 นอกจากนี้ ทางโรงงานได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากเสียงและกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกครั้งก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง และมีการหมุนเวียนพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตที่สัมผัสเสียงดัง

ตารางที่ 4.9-29 ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569



สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับความดังของเสียง (12 hr), dB(A)	
		สายการผลิต 1	สายการผลิต 2
Compressor	3 ต.ค. 66	78.8	82.6
	28 ก.พ. 67	78.6	77.6
	22 ส.ค. และ 30 ก.ย. 67	77.8	79.2
	26 ก.พ. และ 30 เม.ย. 68	81.0	76.3
	17 ก.ย. 68	82.2	82.3
	17 ก.พ. 69	80.2	79.7
Extruder & Pellet Dryer	3 ต.ค. 66	77.1	80.2
	28 ก.พ. 67	81.3	81.8
	22 ส.ค. 67	81.2	82.1
	26 ก.พ. 68	78.8	82.6
	17 ก.ย. 68	82.7	81.9
	17 ก.พ. 69	82.2	82.8
Purification unit	3 และ 31 ต.ค. 66	76.7	82.9
	28 ก.พ. 67	81.9	79.4
	22 ส.ค. 67	80.8	78.5
	26 ก.พ. 68	79.7	80.1
	20 ส.ค. 68	82.6	78.4
	17 ก.พ. 69	79.5	82.7
Reactor unit	3 ต.ค. 66	80.6	81.1
	28 ก.พ. 67	82.5	82.2
	22 ส.ค. และ 30 ก.ย. 67	81.7	82.8
	26 ก.พ. 68	81.1	82.8
	20 ส.ค. และ 17 ก.ย. 68	82.3	80.9
	17 ก.พ. 69	80.2	81.5
Hexene-1 unit	3 ต.ค. 66		81.9
	28 ก.พ. 67		77.4
	22 ส.ค. 67		80.9
	30 เม.ย. 68		77.9
	20 ส.ค. 68		82.3
	17 ก.พ. 69		77.0
ค่ามาตรฐาน		83 ^{1/}	

- หมายเหตุ : 1. ^{1/}มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561 (ประกาศบังคับใช้ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป)
2. พื้นที่กระบวนการผลิต Hexene-1 Unit รับผิดชอบโดยสายการผลิตที่ 2 เท่านั้น จึงไม่มีการตรวจวัดที่พนักงานสายการผลิตที่ 1

รูปที่ 4.9-12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

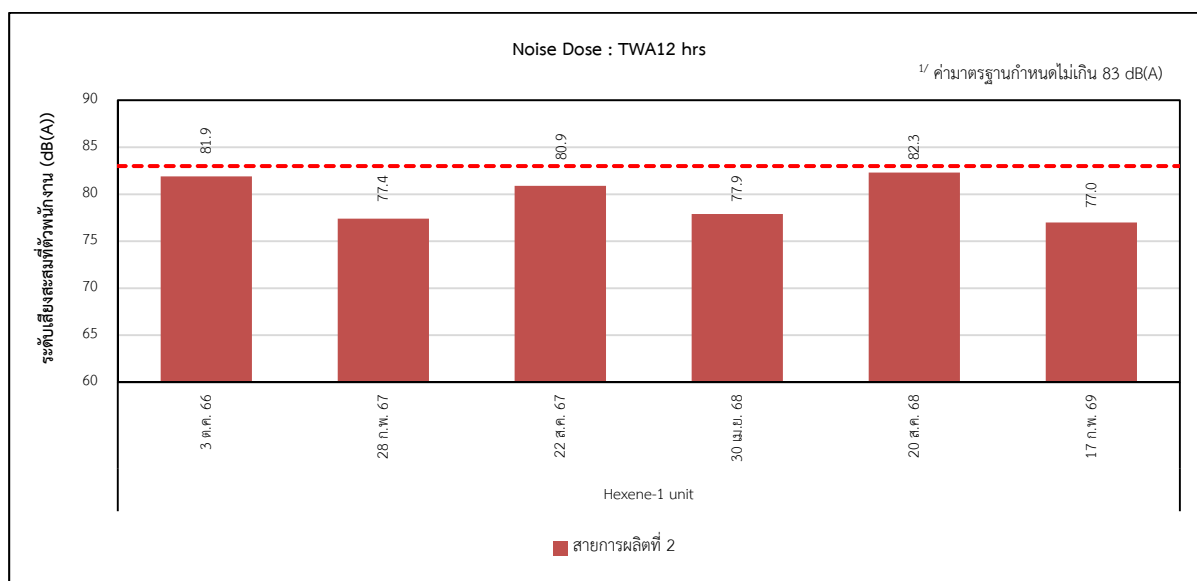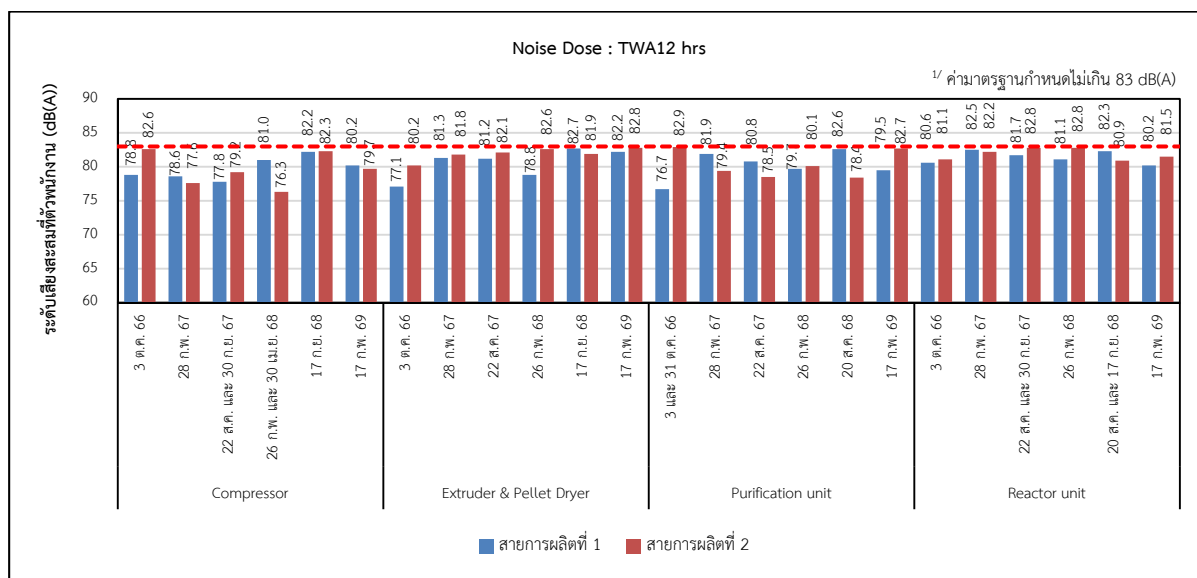

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561

4.9.5 การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำ Noise Contour Map บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิตของโรงงาน ทุกๆ 3 ปี และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงไป

โรงงานแอลแอลดีพีอี ได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง ทุกๆ 3 ปี โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 ในวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ.2566 พบค่าระดับเสียง อยู่ระหว่าง 60.2-91.8 เดซิเบล(เอ) โดยจะครบกำหนดตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงรอบถัดไปในปี พ.ศ.2569 ซึ่งมีแผนดำเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2569 สำหรับโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2567 พบค่าระดับเสียง อยู่ระหว่าง 59.0-88.1 เดซิเบล(เอ) และหน่วยผลิตเอ็กเซน-1 ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2567 พบค่าระดับเสียง อยู่ระหว่าง 61.5-87.1 เดซิเบล(เอ) โดยจะครบกำหนดตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงรอบถัดไปในปี พ.ศ.2570 รายละเอียดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ดังแสดงภาคผนวก ข.39 โดยบริเวณ Compressor area, Extruder and pellet dryer และหน่วยผลิตเอ็กเซน-1 ที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบล(เอ) ทางโรงงานกำหนดให้มีการติดตั้งป้ายเตือน และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ (ได้แก่ ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

4.9.6 ความร้อนภายในสถานที่ทำงาน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน จำนวน 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2 และบริเวณ Reaction Unit ของหน่วยผลิตเอทิลีน-1 ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนที่มีอากาศร้อนของปี

4.9.6.1 ผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน


ประจำปี พ.ศ.2569

การตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานที่ทำงาน ของโรงงานแอลแอลดีพีอี ประจำปี พ.ศ.2569 ดำเนินการตรวจวัดในบริเวณ Polymerization Area ของโรงงานแอลแอลดีพีอีสายการผลิตที่ 1 และสายการผลิตที่ 2 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2569 และบริเวณ Reaction Unit ของหน่วยผลิตเอทิลีน-1 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2569 พบว่ามีค่าระดับความร้อน (WBGT) เท่ากับ 29.9, 29.7 และ 30.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ได้กับค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง และภาพการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.9-13 ถึงรูปที่ 4.9-14 โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 4.9-30 ภาคผนวก ง

4.9.6.2 สรุปผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน

ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569

การตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569 บริเวณ Polymerization area ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1 และสายการผลิตที่ 2 และบริเวณ Reaction Unit ของหน่วยผลิตเอทิลีน-1 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการตรวจวัด พบว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.9-31 และรูปที่ 4.9-15

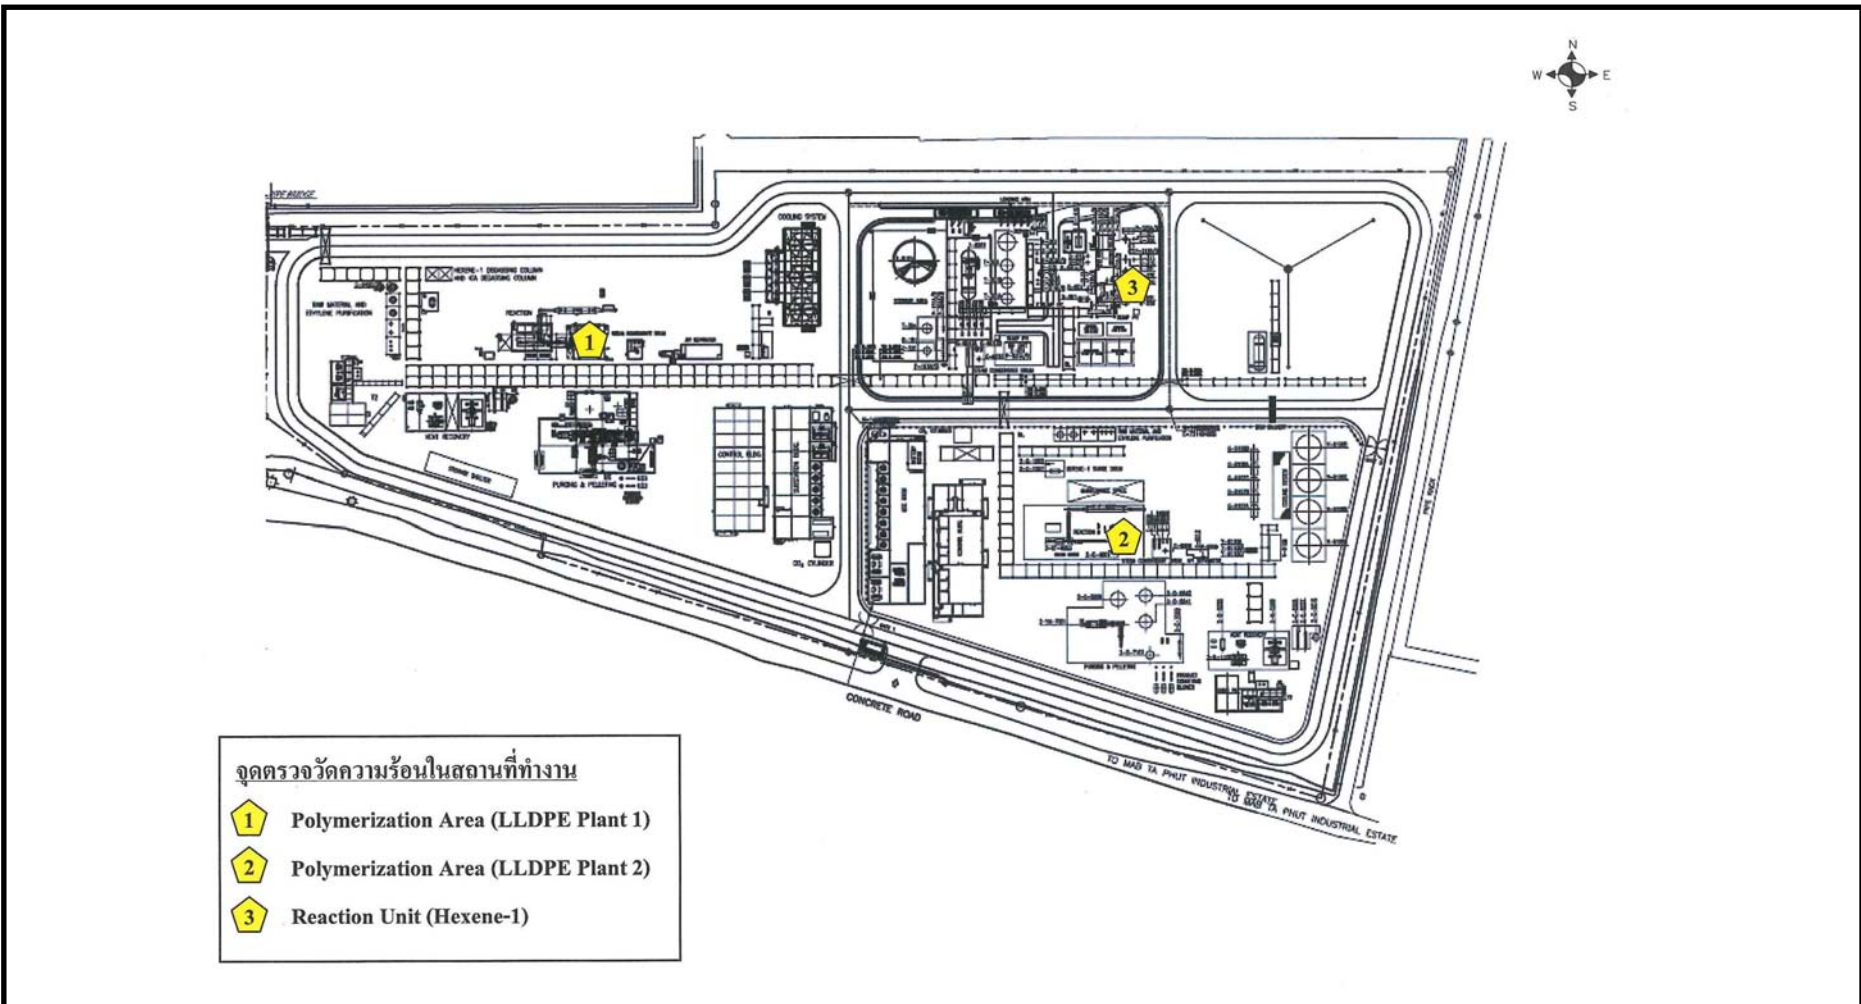

รูปที่ 4.9-13 ตำแหน่งการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน

โรงงานแอลเอลดทีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 1



บริเวณ Polymerization ของโรงงานแอลแอลดีพีอี สายการผลิตที่ 2



บริเวณ Reaction Unit ของหน่วยผลิตเอ็กซีน-1

รูปที่ 4.9-14 ภาพการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน
โรงงานแอลแอลดีพีอี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4.9-30 ผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน

โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีคอท จำกัด

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2569 และวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2569

บริเวณ ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา ตรวจวัด	ลักษณะ/ ประเภท ของงาน	อุณหภูมิ (°C)					ลักษณะ ของงาน	ค่ามาตรฐาน (WBGT) (°C)
			NWB	DB	GT	WBGT	WBGT Average		
Polymerization area (LLDPE Plant 1)	10:00-10:30	งานจัดบันทึกและ	28.4	32.5	32.8	29.7	29.9	งานเบา ทำงาน 25% พัก 75%	34.0 ^{1/}
	10:30-11:00	ตรวจสอบข้อมูล	28.5	32.9	33.1	29.8			
	11:00-11:30	เป็นครั้งคราว	28.8	33.0	33.3	30.1			
	11:30-12:00		29.0	32.3	32.5	30.0			
Polymerization area (LLDPE Plant 2)	10:00-10:30	งานจัดบันทึกและ	28.3	32.6	32.8	29.6	29.7	งานเบา ทำงาน 25% พัก 75%	34.0 ^{1/}
	10:30-11:00	ตรวจสอบข้อมูล	28.2	32.7	33.1	29.6			
	11:00-11:30	เป็นครั้งคราว	27.8	32.8	33.1	29.4			
	11:30-12:00		28.5	33.2	33.5	30.0			
Reaction Unit ของหน่วยผลิต เฮกซีน-1	10:00-10:30	งานจัดบันทึกและ	28.4	32.2	33.0	29.7	30.0	งานเบา ทำงาน 25% พัก 75%	34.0 ^{1/}
	10:30-11:00	ตรวจสอบข้อมูล	28.4	32.5	33.7	29.9			
	11:00-11:30	เป็นครั้งคราว	28.4	32.9	33.7	29.9			
	11:30-12:00		29.0	33.0	33.9	30.4			

- หมายเหตุ :
- ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559
- งานที่ลูกจ้างทำในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบัลโกลบ 34 องศาเซลเซียส
NWB = Natural Wet Bulb Temperature
DB = Dry-Bulb Temperature
GT = Globe Temperature
WBGT = Wet-Bulb Globe Temperature Index
 - ^{2/} °C ย่อมาจาก องศาเซลเซียส

ชื่อผู้ตรวจวัด : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์ / นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว
 ชื่อผู้บันทึก : นางสาววิระยา ปัจฉิมบุรณ์ / นายพงศ์ศิริ จักรแก้ว
 เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัด : 0401-03-2565-0048
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนันทา ศิริคุณานนท์
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซีคอท จำกัด
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์ วรเดขวิทยา
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600

ตารางที่ 4.9-31 ผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569


จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ระดับความร้อน (WBGT) (องศาเซลเซียส)
Polymerization area (LLDPE 1)	4 เม.ย. 67	29.5
	30 เม.ย. 68	29.9
	2 เม.ย. 69	29.9
Polymerization area (LLDPE 2)	4 เม.ย. 67	29.4
	30 เม.ย. 68	30.1
	2 เม.ย. 69	29.7
Reaction Unit (Hexene-1)	7 มิ.ย. 67	29.5
	30 เม.ย. 68	30.7
	5 มิ.ย. 69	30.0
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		34.0

- หมายเหตุ : 1.^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดบริหาร มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส
- 2.^{2/} บริเวณหน่วยการผลิต Hexene-1 ดำเนินการตรวจวัดเฉพาะในช่วงมีการเดินระบบของหน่วยผลิต Hexene-1


รูปที่ 4.9-15 ผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน

โรงงานแอลแอลดีพีอี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ระหว่างปี พ.ศ.2567-2569

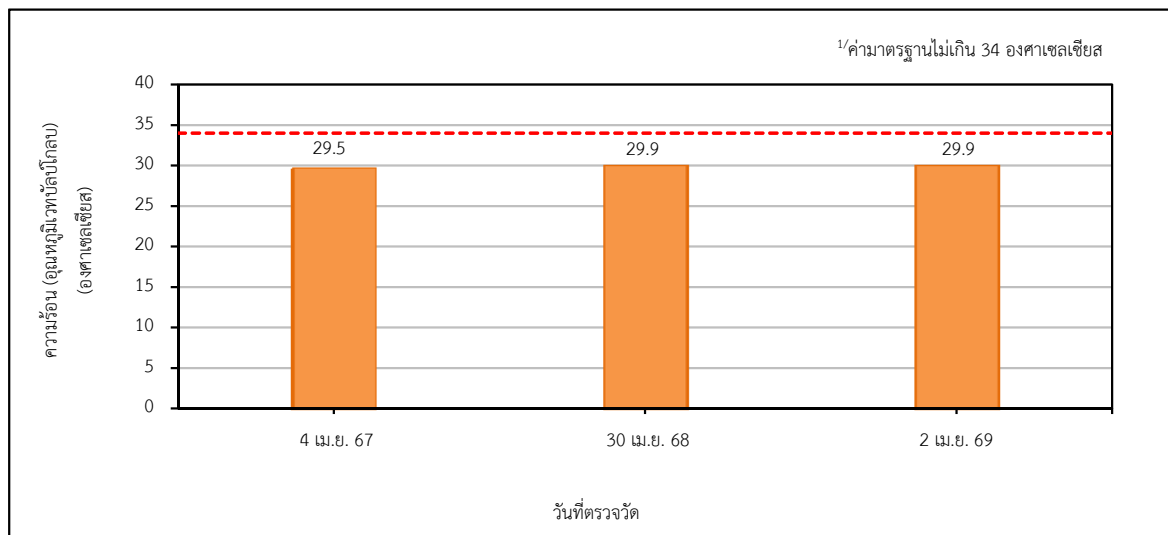

Polymerization area (LLDPE 1)

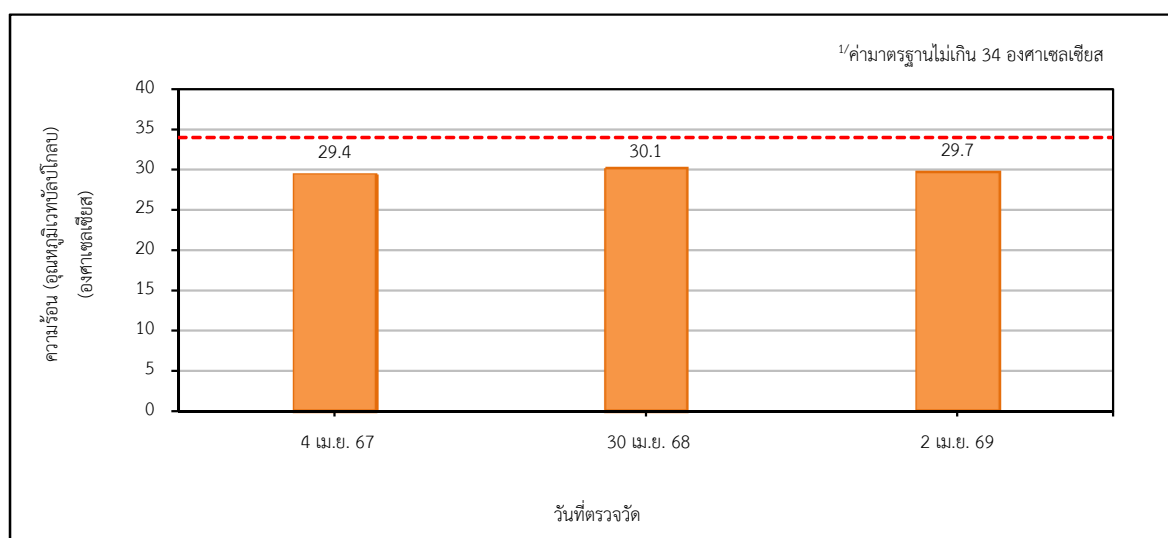


Polymerization area (LLDPE 2)

หมายเหตุ :

1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดบริหาร มาตรฐานในการและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส

รูปที่ 4.9-15 (ต่อ)

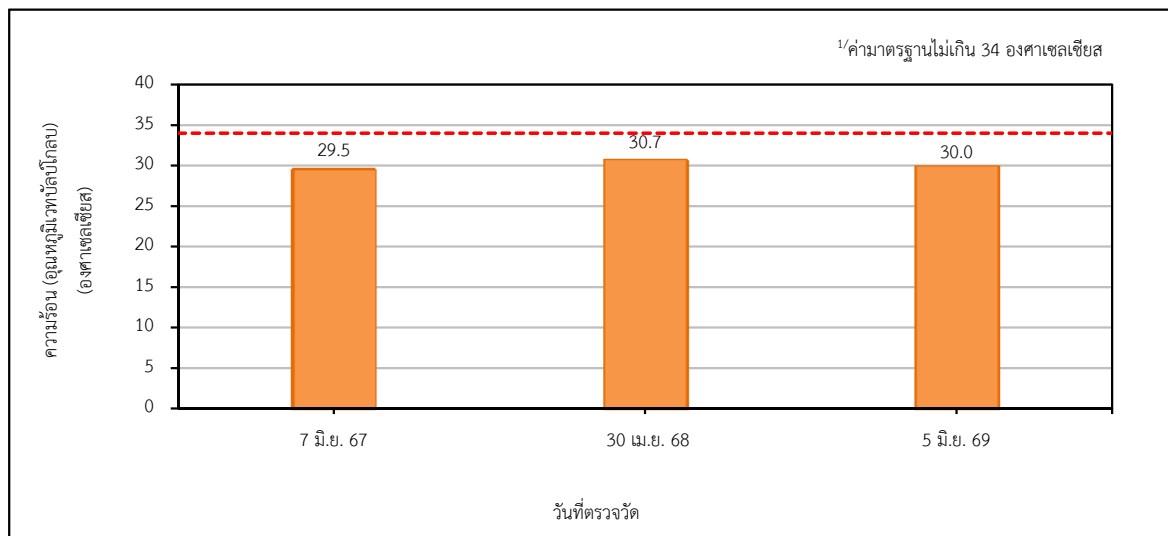

Reaction Unit (Hexene-1)

หมายเหตุ :

^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดบริหาร มาตรฐานในการและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส

4.9.7 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงานใหม่ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มงาน จากนั้น ตรวจสอบให้กับพนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ ความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง สภาพทั่วไปของตา หู คอ จมูก ปอด และช่องท้อง ดำเนินการ X-ray ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต ไขมันในเลือด การทำงานของตับ สภาพการมองเห็น สภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน รวมทั้งตรวจสอบสารเคมีในปัสสาวะของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการผลิต/ซ่อมบำรุง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานเนื่องจากพนักงานมีการหมุนเวียน/สลับการทำงานกับโรงงานอื่นๆ โดยดำเนินการตรวจ t,t Muconic Acid (ตรวจหาเบนซีน (Benzene)) ตรวจ 2,5 Hexanedione (ตรวจหาเฮกเซน (Hexane)) ตรวจ Hippuric Acid (ตรวจหาโทลูอีน (Toluene)) ตรวจ Mandelic Acid (ตรวจหาสไตรีน (Styrene)) และตรวจ Methyl Hippuric Acid (ตรวจหาไซลีน (Xylene))

โรงงานแอลแอลดีพีอี ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงานในโรงงาน และหลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยมีรายการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปประจำปี ได้แก่ ความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง สภาพทั่วไปของหู คอ จมูก ปอด และช่องท้อง การ X-ray ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต ไขมันในเลือด การทำงานของตับ สภาพการมองเห็น สภาพปอด การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน และตรวจสอบสารเคมีในปัสสาวะของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน

ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 โรงงานแอลแอลดีพีอี ไม่มีพนักงานเข้าใหม่แต่อย่างใด สำหรับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการตรวจสอบสุขภาพตามลักษณะงาน ประจำปี พ.ศ.2569 ดำเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเมษายน พ.ศ.2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวินิจฉัยจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และจะรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2569 โดยล่าสุดดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และตามลักษณะงาน ในเดือนเมษายน พ.ศ.2568 พบว่า ส่วนใหญ่ผลการตรวจสอบสุขภาพปกติ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.68

4.9.8 สถิติภาวะการเจ็บป่วย

มาตรการกำหนดให้รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดขึ้นในโรงงานและการทำงาน ปีละ 1 ครั้ง

โรงงานแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบันทึกสถิติภาวะการเจ็บป่วยของพนักงาน ที่เข้ารับการรักษายาบาล ณ ห้องปฐมพยาบาลภายในโรงงาน โดยในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 พบว่า ส่วนใหญ่จะเข้าไปรับการรักษาด้วยอาการของโรคทางเดินหายใจ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค.1

4.9.9 สถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและจากการทำงาน

มาตรการกำหนดให้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงาน รวมถึงวิธีการแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ โดยทำการสรุปข้อมูลทุก 6 เดือน

โรงงานแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิด และผลที่เกิดขึ้น พร้อมกับวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก ซึ่งในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้นแต่อย่างใด รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.52

4.9.10 เศรษฐกิจและสังคม

4.9.10.1 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม

มาตรการกำหนดให้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สภาพการเปลี่ยนแปลง ปัญหา และความต้องการระดับครัวเรือน และระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชนให้ครบถ้วน และแสดงแผนการกระจายตัวในการเก็บตัวอย่าง ปีละ 1 ครั้ง

โรงงานแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (มหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือน ประชาชนรอบพื้นที่โรงงานและชุมชนที่เก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ.2569 ดำเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2569 โดยจะนำเสนอผลการสำรวจในรายงานฉบับถัดไป ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2569

4.9.10.2 สรุปผลการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์

มาตรการกำหนดให้สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และ/หรือแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง

โรงงานแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลตามรอบกิจกรรม พร้อมทั้งการดำเนินการวิเคราะห์แก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม โดยในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 มีรายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข.33

4.9.10.3 การร้องทุกข์จากการดำเนินงานของโรงงาน

มาตรการกำหนดให้ทำการบันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการ และจัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลข้อร้องเรียนพร้อมผลดำเนินการแก้ไขปัญหา และมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง โดยทำการสรุปปีละ 1 ครั้ง

โรงงานแอลแอลดีพีอี ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ จากการดำเนินงานของโรงงาน พร้อมทั้งการดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของโรงงานอย่างเหมาะสม ซึ่งในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ จากการดำเนินการของโรงงานแต่อย่างใด รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข.34
