

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4)
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2569 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

เจ้าของโครงการ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 038-974-303



จัดทำโดย

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 19-21 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-678-1813


หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอนานนัง จังหวัดระยอง ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.
() อื่นๆ ระบุ

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายเทพสัน ยมนา		ผู้จัดการด้านเทคนิคและ ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นางสาวจารุณี แก้วดำ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวปัทมา จินดาโชติ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฏฐณิชา ทิพย์ทัศน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุพผา แสงนิล)

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และบริการด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)

1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน).....
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอน่าน จังหวัดน่าน.....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน).....
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอน่าน จังหวัดน่าน 21130.....
โทรศัพท์ 0-3897-4316 โทรสาร 0-3897-4500.....
E-mail -.....
5. จัดทำโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด.....
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดดังนี้
 - 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.7/5760
 - 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/7004
 - 3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามหนังสือเลขที่ สกพ 5502/8157
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้ายเมื่อ 29 มกราคม 2569.....
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานส่วนที่ 1 นหน้า.....

สารบัญ

หน้า

สารบัญ	I
สารบัญตาราง	VI
สารบัญรูป	VIII
สารบัญภาพถ่าย	IX

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	วัตถุประสงค์	1-2
1.3	ขอบเขตการดำเนินงาน	1-2
1.4	รายละเอียดโครงการฯ	1-2
1.4.1	ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.4.2	ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1-6
1.5	ผลิตภัณฑ์	1-8
1.6	เชื้อเพลิงและสารเคมี	1-9
1.6.1	เชื้อเพลิง	1-9
1.6.1	สารเคมีและสารเติมแต่ง	1-9
1.7	กระบวนการผลิต	1-12
1.7.1	เครื่องจักรและอุปกรณ์	1-12
1.7.2	ค่าการออกแบบโรงไฟฟ้า	1-16
1.8	สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต	1-16
1.8.1	ระบบน้ำใช้	1-16
1.8.2	ระบบไฟฟ้า	1-21
1.8.3	ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-21
1.9	การคมนาคมขนส่ง	1-21
1.10	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1-21
1.10.1	นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	1-21
1.10.2	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	1-22
1.10.3	แผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1-23
1.10.4	การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม	1-23

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ (ต่อ)

1.10.5	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	1-24
1.10.6	การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ	1-25
1.10.7	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	1-25
1.10.8	ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	1-26
1.10.9	แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	1-27
1.10.10	มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และการขนถ่ายสารเคมี	1-36
1.10.11	มาตรการในการกักเก็บและใช้งานแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ร้อยละ 25	1-40
1.10.12	มาตรการเกี่ยวกับการขนส่งและการใช้งานก๊าซธรรมชาติ	1-42
1.10.13	มาตรการเกี่ยวกับการใช้งานหม้อน้ำ	1-43
1.11	พื้นที่สีเขียว	1-44
1.12	อุตสาหกรรมสีเขียว	1-44

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1	วิธีการติดตามตรวจสอบ	2-1
2.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1	บทนำ	3-1
3.2	แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3	วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-9
3.4	มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-11
3.5	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-12
3.5.1	คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	3-12
3.5.2	ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS)	3-19
3.5.3	ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS)	3-19
3.5.4	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-19
3.5.5	คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ	3-31
3.5.6	ระดับเสียง	3-33
3.5.7	คุณภาพน้ำ	3-42
3.5.8	กากของเสีย	3-55

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

3.5.9	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-55
3.5.10	สาธารณสุข	3-66
3.5.11	สังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	3-66
3.5.12	สุนทรียภาพ	3-66

ส่วนที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1	สำเนาหนังสือเห็นชอบจากสม. และเงื่อนไข ที่โครงการต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 2	ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การอบรมและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา SSHE (SSHE Contractor Control and Training)
เอกสารแนบที่ 3	แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน
เอกสารแนบที่ 4	เอกสารรับรองเรื่องไม่มีข้อร้องเรียน
เอกสารแนบที่ 5	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568
เอกสารแนบที่ 6	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
เอกสารแนบที่ 7	ตัวอย่างผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
เอกสารแนบที่ 8	บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงเกินกว่าระดับ Warning และระดับ Alarm
เอกสารแนบที่ 9	สำเนาหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 10	ผลตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานระบบ CEMS (Audit CEMS) และ Action plan
เอกสารแนบที่ 11	หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
เอกสารแนบที่ 12	ตัวอย่างบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ
เอกสารแนบที่ 13	ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง Waste Management
เอกสารแนบที่ 14	ข้อกำหนดในการจัดจ้าง
เอกสารแนบที่ 15	การขออนุญาตจัดการของเสียออกภายนอกโครงการ (กอ.1)
เอกสารแนบที่ 16	บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกภายนอกพื้นที่โครงการ
เอกสารแนบที่ 17	เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
เอกสารแนบที่ 18	โครงการได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน GPSC
เอกสารแนบที่ 19	โครงการนำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนกลับมารดน้ำต้นไม้
เอกสารแนบที่ 20	แผนการขุดลอกตะกอน
เอกสารแนบที่ 21	ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการขนถ่ายสารเคมี (Chemical Unloading Control)
เอกสารแนบที่ 22	เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เอกสารแนบที่ 23	การประชุมคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.)
เอกสารแนบที่ 24	แผนการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์อัคคีภัยต่างๆ
เอกสารแนบที่ 25	ผลการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์อัคคีภัยต่างๆ
เอกสารแนบที่ 26	ระบบการขออนุญาตทำงาน
เอกสารแนบที่ 27	ตัวอย่างใบการขออนุญาตในการทำงาน (Work Permit)
เอกสารแนบที่ 28	ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
เอกสารแนบที่ 29	รายงานการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี พ.ศ. 2569
เอกสารแนบที่ 30	เอกสารการฝึกอบรมและดำเนินการตามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีภัณฑ์ (SDS)

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ (ต่อ)

เอกสารแนบที่ 31	แนวทางการปฏิบัติและการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เอกสารแนบที่ 32	สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการไตรภาคีนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
เอกสารแนบที่ 33	การซ่อมเหตุฉุกเฉินร่วมกันกับชุมชน
เอกสารแนบที่ 34	กรรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารแนบที่ 35	การตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อน้ำ
เอกสารแนบที่ 36	ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในการใช้หม้อน้ำ
เอกสารแนบที่ 37	การตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อน้ำประจำปี
เอกสารแนบที่ 38	ควบคุมหม้อน้ำ
เอกสารแนบที่ 39	จำนวนพนักงานในท้องถิ่น
เอกสารแนบที่ 40	แผนงานชุมชนสัมพันธ์ และการดำเนินการตามแผนชุมชนสัมพันธ์
เอกสารแนบที่ 41	การเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ
เอกสารแนบที่ 42	รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 43	แผนการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี 2569
เอกสารแนบที่ 44	บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
เอกสารแนบที่ 45	สถิติสภาวะการเจ็บป่วยของพนักงาน
เอกสารแนบที่ 46	รายงานการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสภาพการเปลี่ยนแปลง
เอกสารแนบที่ 47	คู่มือขับขี่ปลอดภัย (Safety Driving Manual)
เอกสารแนบที่ 48	แผนการฝึกอบรมและบันทึกการฝึกอบรม
เอกสารแนบที่ 49	การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
เอกสารแนบที่ 50	ตัวอย่างผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs)
เอกสารแนบที่ 51	สำเนาขอความอนุเคราะห์เชื่อมโยงอัตราการระบายมลพิษผ่านระบบ CEMs
เอกสารแนบที่ 52	นโยบายคุณภาพความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC
เอกสารแนบที่ 53	ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 54	การตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุมก๊าซ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ข	หนังสือรับรองมาตรฐานบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ภาคผนวก ค	สำเนาใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4-1	การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ 1-6
1.6-1	รายละเอียดการใช้สารเคมี 1-10
1.8-1	ลักษณะของน้ำปราศจากแร่ธาตุ 1-17
2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณสุขการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 2-2
3.2-1	แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการศูนย์ สาธารณสุขการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ประจำปี พ.ศ. 2569 3-2
3.3-1	รายละเอียดวิธีการเก็บและการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-9
3.5.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง HRSGs 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-15
3.5.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 3-17
3.5.4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการศูนย์สาธารณสุขการ แห่งที่ 4 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-22
3.5.4-2	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณวัดมาบชลุต ระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน พ.ศ.2569 3-24
3.5.4-3	ร้อยละของทิศทางและความเร็วลม บริเวณวัดมาบชลุต ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-26
3.5.4-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 3-27
3.5.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จากปล่อง HRSGs 1 3-32
3.5.5-2	ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จากปล่อง HRSGs 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 3-32
3.5.6-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569 3-35
3.5.6-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณบ้านสำนักมะม่วง ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569 3-37
3.5.6-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 3-39
3.5.7-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทิ้ง ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-45
3.5.7-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทิ้ง ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 3-45
3.5.7-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทิ้ง ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 3-46
3.5.7-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทิ้ง ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 3-48

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่	
3.5.9-1 ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน	3-57
3.5.9-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-59
3.5.9-3 ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose)	3-62
3.5.9-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-64
4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	4-2

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่

1.4-1	แสดงที่ตั้งโครงการและสภาพพื้นที่โดยรอบ	1-4
1.4-2	แสดงเส้นทางเข้า-ออก โครงการ	1-5
1.4-3	ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1-7
1.7-1	ผังองค์ประกอบของหน่วยผลิตไฟฟ้า	1-13
1.8-1	ผังสมดุลน้ำ (Water Balance) กรณีกำลังการผลิตสูงสุด	1-19
1.8-2	ผังสมดุลน้ำ (Water Balance) กรณีกำลังการผลิตปกติ	1-20
1.10.9-1	แผนภูมิบังคับบัญชาการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ณ สถานที่เกิดเหตุ	1-28
1.10.9-2	ผังการรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ และการติดต่อหน่วยงานภายนอก	1-31
1.10.10-1	แผนผังการควบคุมการขนถ่ายสารเคมีของโครงการ	1-39
2-1	แผนผัง Noise contour	2-71
3.5.1-1	แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	3-14
3.5.1-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-18
3.5.4-1	แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วและทิศทางลม	3-21
3.5.4-2	ผังลมบริเวณวัดมาบชลูด ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569	3-26
3.5.4-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-29
3.5.5-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จากปล่อง HRSGs 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-32
3.5.6-1	แสดงการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ	3-34
3.5.6-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-40
3.5.7-1	แสดงจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-44
3.5.7-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทิ้ง ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-50
3.5.7-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทิ้ง ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-53
3.5.9-1	แสดงการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน	3-58
3.5.9-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-59
3.5.9-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-65

สารบัญภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่	หน้า
2.1-1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	2-1
2.2-1 ปล่อง HRSGs	2-56
2.2-2 ระบบ CEMS จากปล่อง HRSGs 1	2-56
2.2-3 หน้าจอร์บบการเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	2-56
2.2-4 อุปกรณ์และอะไหล่สำรอง ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	2-56
2.2-5 ถังปรับสภาพน้ำ (Neutralization Tank)	2-57
2.2-6 ระบบรวบรวมน้ำที่อาจปนเปื้อนน้ำมัน	2-57
2.2-7 ถังแยกน้ำมัน (Oil-Water Separator)	2-57
2.2-8 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ	2-57
2.2-9 บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร	2-58
2.2-10 บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร	2-58
2.2-11 บ่อพักน้ำฉุกเฉินขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร	2-58
2.2-12 บ่อพักน้ำฉุกเฉินขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร	2-58
2.2-13 Silencer	2-58
2.2-14 สัญลักณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ)	2-58
2.2-15 ห้องควบคุม (Control room)	2-59
2.2-16 พนักงานที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน	2-59
2.2-17 การสำรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	2-59
2.2-18 การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-60
2.2-19 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ	2-60
2.2-20 สถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยและกากของเสีย	2-60
2.2-21 รางระบายน้ำฝนของโครงการ	2-60
2.2-22 บ่อหน่วงน้ำขนาด 2,880 ลูกบาศก์เมตร	2-61
2.2-23 สัญญาณเตือนภัยต่างๆ	2-61
2.2-24 ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	2-61
2.2-25 อุปกรณ์ดับเพลิง	2-62
2.2-26 พาหนะสำรองไว้ประจำเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	2-62
2.2-27 ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล	2-63
2.2-28 ห้องพยาบาล	2-63
2.2-29 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)	2-63
2.2-30 บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมี	2-64

สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)

ภาพถ่ายที่	หน้า
2.2-31	Dike ล้อมรอบถังเก็บสารเคมี
2.2-32	ถังกักเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว
2.2-33	เครื่องตรวจวัดการรั่วไหล (Ammonia Detector)
2.2-34	ป้ายเตือนที่รถบรรทุกทุกและพื้นที่ขนถ่ายขนถ่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว
2.2-35	ทางเดินบริเวณถังกักเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว
2.2-36	Full Face Gas Mask
2.2-37	Shut-off Valve บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Connection)
2.2-38	รั้วโดยรอบสถานีควบคุมก๊าซ
2.2-39	ระบบท่อและระบบวาล์วสำรอง
2.2-40	ท่อระบายก๊าซกรณีฉุกเฉิน
2.2-41	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
2.2-42	ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ที่ท่อ steam ของหม้อน้ำ
2.2-43	มาตรวัดระดับน้ำที่หม้อน้ำ
2.2-44	มาตรวัดความดันไอน้ำที่หม้อน้ำ
2.2-45	ฉนวนหุ้มเปลือกหม้อน้ำ
2.2-46	ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Relay) ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า
2.2-47	ระบบสัญญาณเตือนอันตราย
2.2-48	ระบบ Distributed Control System (DCS)
2.2-49	พื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการ
2.2-50	ป้ายเตือนห้ามก่อให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร
2.2-51	หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง (EMCC)
2.2-52	หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง (POMs)
2.2-53	ป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชน กรณีมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี
2.2-54	การเยี่ยมชมโครงการ
3.5.9-1	การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose)

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Complex) (ปัจจุบันได้โอนให้บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทุกครั้ง โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และขอแก้ไขมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) (ครั้งที่ 1) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จาก สผ. มีมติรับทราบตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/10639 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (เอกสารแนบที่ 1) โดยมีลำดับผลการพิจารณารายงานฯ ดังนี้

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.7/5760 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
3. การขอแก้ไขมาตรการในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) (ครั้งที่ 1) โดยขอแก้ไขหน่วยงานและจำนวนคณะกรรมการในโครงสร้างของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กกพ. ตามหนังสือเลขที่ สกพ 5502/8149 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และมีมติรับทราบจาก สผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/10639 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ดังนั้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งตระหนักถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงมอบอำนาจให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-010 (สาขากรุงเทพมหานคร) และ ว-197 (สาขาระยอง) และได้รับการรับรองความสามารถระบบ ISO/IEC 17025 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ โครงการได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Mitigation Measures) ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
- 2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring) ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
- 3) เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และนำเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้รับทราบการดำเนินการทุก 6 เดือน

1.3 ขอบเขตของการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น ประกอบไปด้วย

1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Mitigation Measures)

โครงการจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร/ภาพถ่ายต่าง ๆ ซึ่งใช้ประกอบผลการดำเนินการ และบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งนำเอกสาร/ภาพถ่าย มาผนวกเข้าไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Measures)

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของโครงการ ในด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)


1.4 รายละเอียดโครงการ

1.4.1 ที่ตั้งโครงการ


โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภายในพื้นที่กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Complex) ปัจจุบันได้โอนให้บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (รูปที่ 1.4-1) โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ โรงผลิตน้ำอุตสาหกรรมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		
และบริษัท เอเชีย ซิลิโคน มอนอเมอร์ จำกัด		
ทิศใต้	ติดกับ	พื้นที่ร่อนการพัฒนาของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันออก	ติดกับ	พื้นที่ร่อนการพัฒนาของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันตก	ติดกับ	โรงไฟฟ้าโกลว์โซลาร์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่โครงการ สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มุ่งหน้าพัตยาตามป้ายบอกทางหลัก ผ่านตรงไปจนกระทั่งถึงสามแยกใหญ่ทางหลวงหมายเลข 36 ตัดผ่านเรียกว่า แยกกระทิงลาย มีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไปพัตยาและให้เลี้ยวซ้ายไประยอง มุ่งหน้าไปจนถึงป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไปนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามทางหลวงหมายเลข 3191 จากนั้นตรงไปจนถึงสามแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ให้เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านฉางประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบป้ายแสดงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอเชียบริเวณถนนสุขุมวิท 12 หรือซอยมิตรประชาให้เลี้ยวซ้ายและวิ่งตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงสี่แยกจากนั้นให้เลี้ยวขวาจะพบบริษัท เอเชีย ซิลิโคน โมโนเมอร์ จำกัด อยู่ด้านซ้ายตรงไปเรื่อย ๆ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายหลัก (Main Road) ของนิคมฯ วิ่งตรงไปจะพบโรงไฟฟ้าโกลว์โซลาร์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด ก่อนถึงที่ตั้งโครงการ สำหรับเส้นทางการเข้า-ออก โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 1.4-2

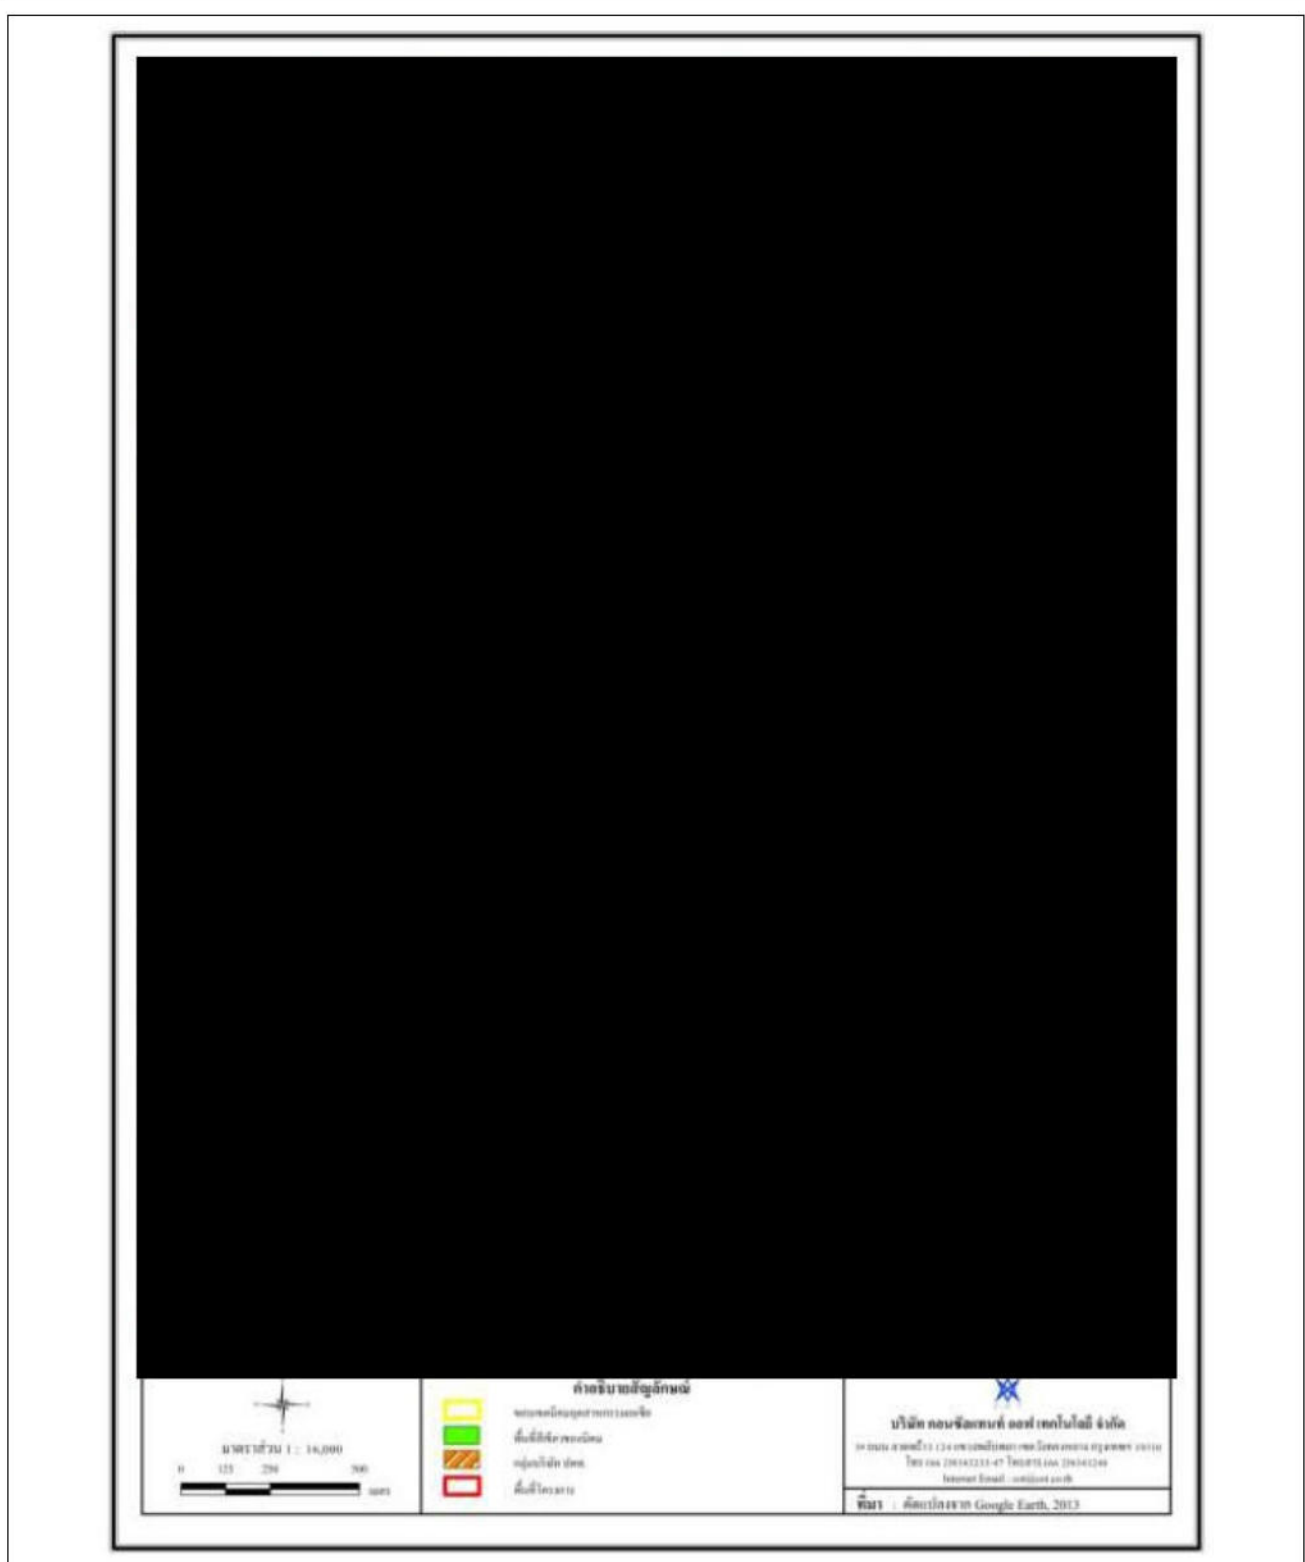

รูปที่ 1.4-1 แสดงที่ตั้งโครงการและสภาพพื้นที่โดยรอบ

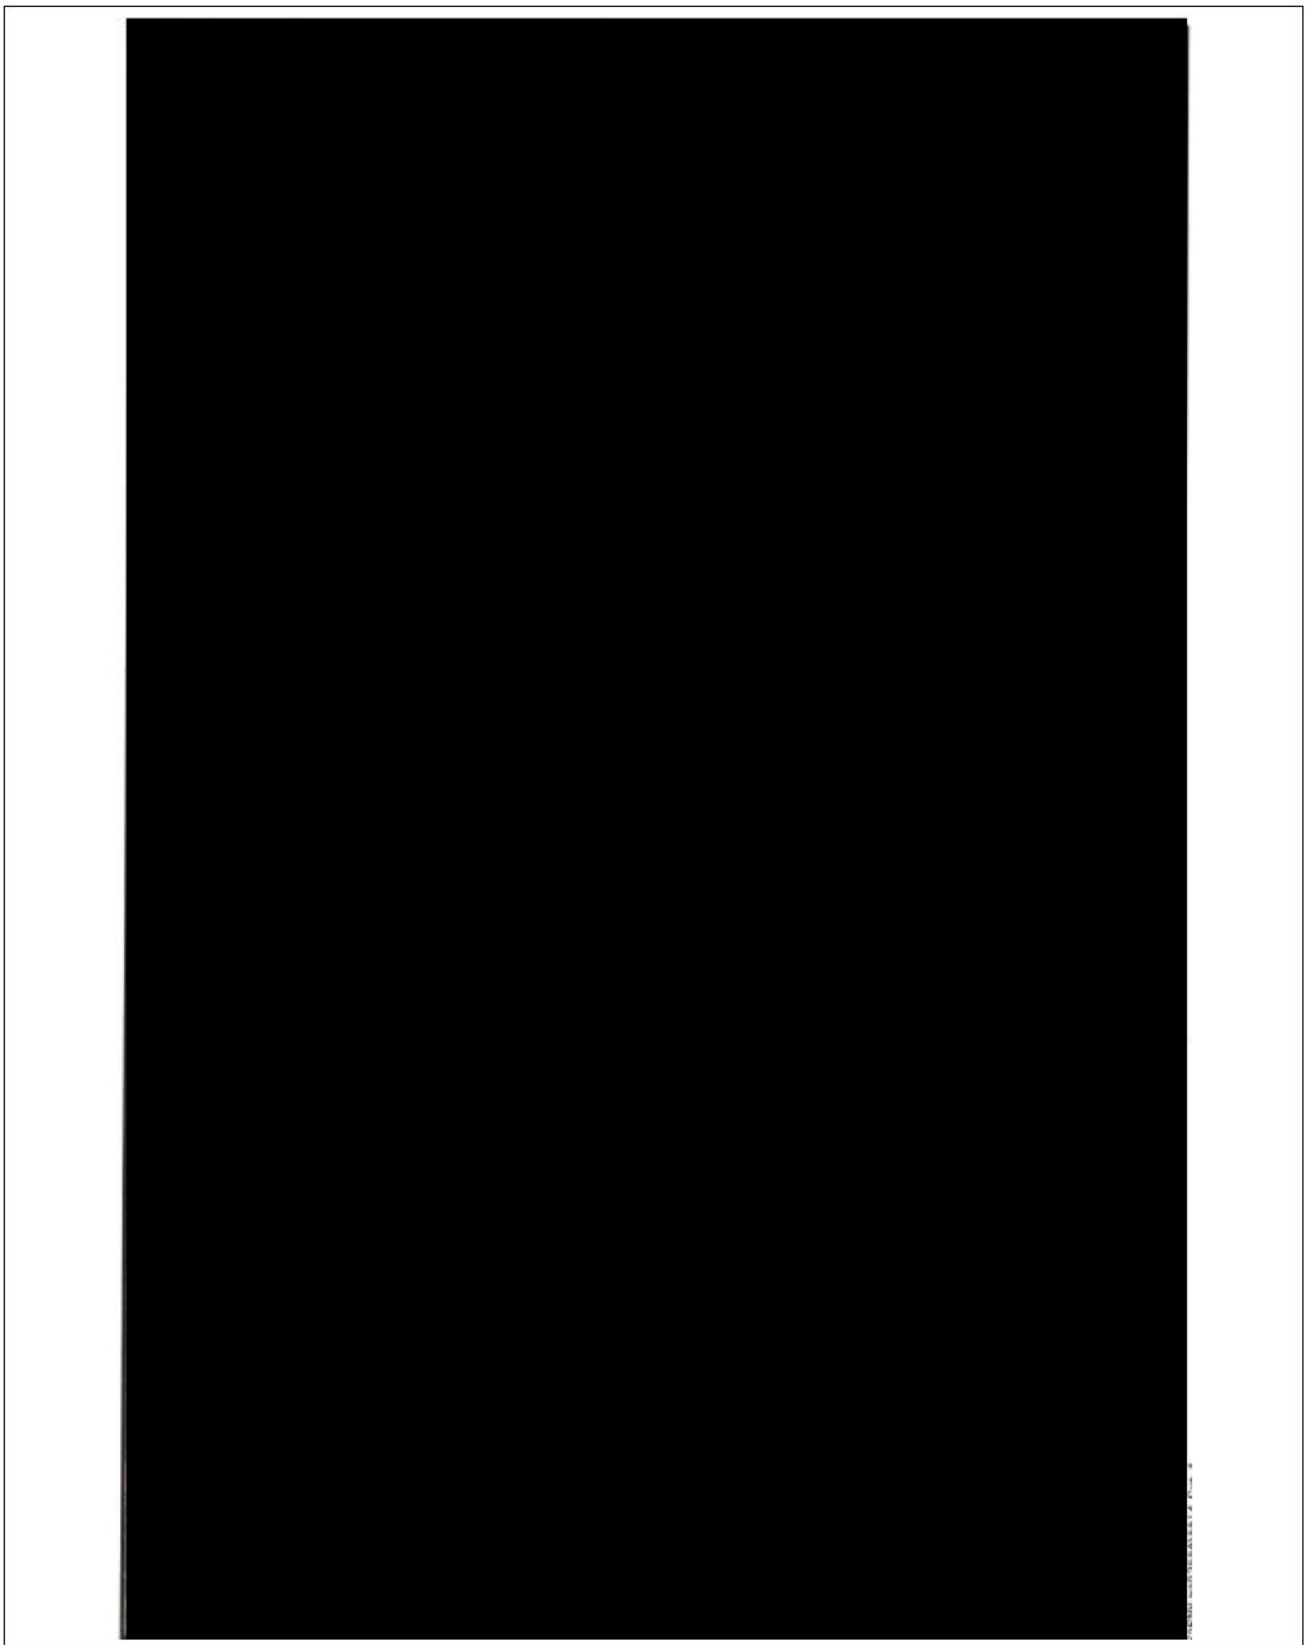

รูปที่ 1.4-2 แสดงเส้นทางเข้า-ออก โครงการ

1.4.2 ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) มีพื้นที่รวม 35-3-60.2 ไร่ ผังผังโครงการดังแสดงในรูปที่ 1.4-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตารางที่ 1.4-1 ซึ่งแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) ส่วนที่ 1 ขนาด 31-1-83.9 ไร่ เป็นพื้นที่ของโครงการ ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Combustion Gas Turbine Generator: CTG) จำนวน 6 ชุด หน่วยผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator: HRSG) จำนวน 6 ชุด หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator: STG) จำนวน 3 ชุด หอหล่อเย็น (Cooling Tower) จำนวน 3 ชุด และระบบควบคุมอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงาน อาทิ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า สายส่ง ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ จะอยู่ในห้องควบคุมส่วนกลาง (Central Control Room: CCR) ในอาคารสำนักงาน


2) ส่วนที่ 2 เป็นการเข้าพื้นที่ของโรงผลิตน้ำอุตสาหกรรมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวม 4-1-76.3 ไร่ ประกอบด้วย หน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุและหน่วยผลิตน้ำคอนเดนเสท สำหรับป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของโครงการและจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยผ่านระบบฐานรองท่อ (Pipe Rack)

ทั้งนี้ การจัดวางผังองค์ประกอบของโครงการได้คำนึงถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นสำคัญ

ตารางที่ 1.4-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ

การใช้ประโยชน์พื้นที่	ขนาดพื้นที่		ร้อยละ
	ไร่	ตร.ม.	
ส่วนที่ 1	31.46	50,335.60	87.63
- พื้นที่อาคารสำนักงาน	0.82	1,318	2.29
- พื้นที่กระบวนการผลิต	9.58	15,320	26.67
- พื้นที่สาธารณูปการ (บ่อหน่วงน้ำ (Retention Pond) และบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond))	5.36	8,576	14.93
- ถนนและพื้นที่ว่าง (รวมพื้นที่ Pipe Rack)	14.02	22,440.82	39.07
- พื้นที่สีเขียว	1.68	2,680.78	4.67
ส่วนที่ 2	4.44	7,105.20	12.37
- หน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุและหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำคอนเดนเสท	4.32	6,905.98	12.02
- พื้นที่สีเขียว	0.12	199.22	0.35
รวม	35.90	57,440.80	100

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน), 2562

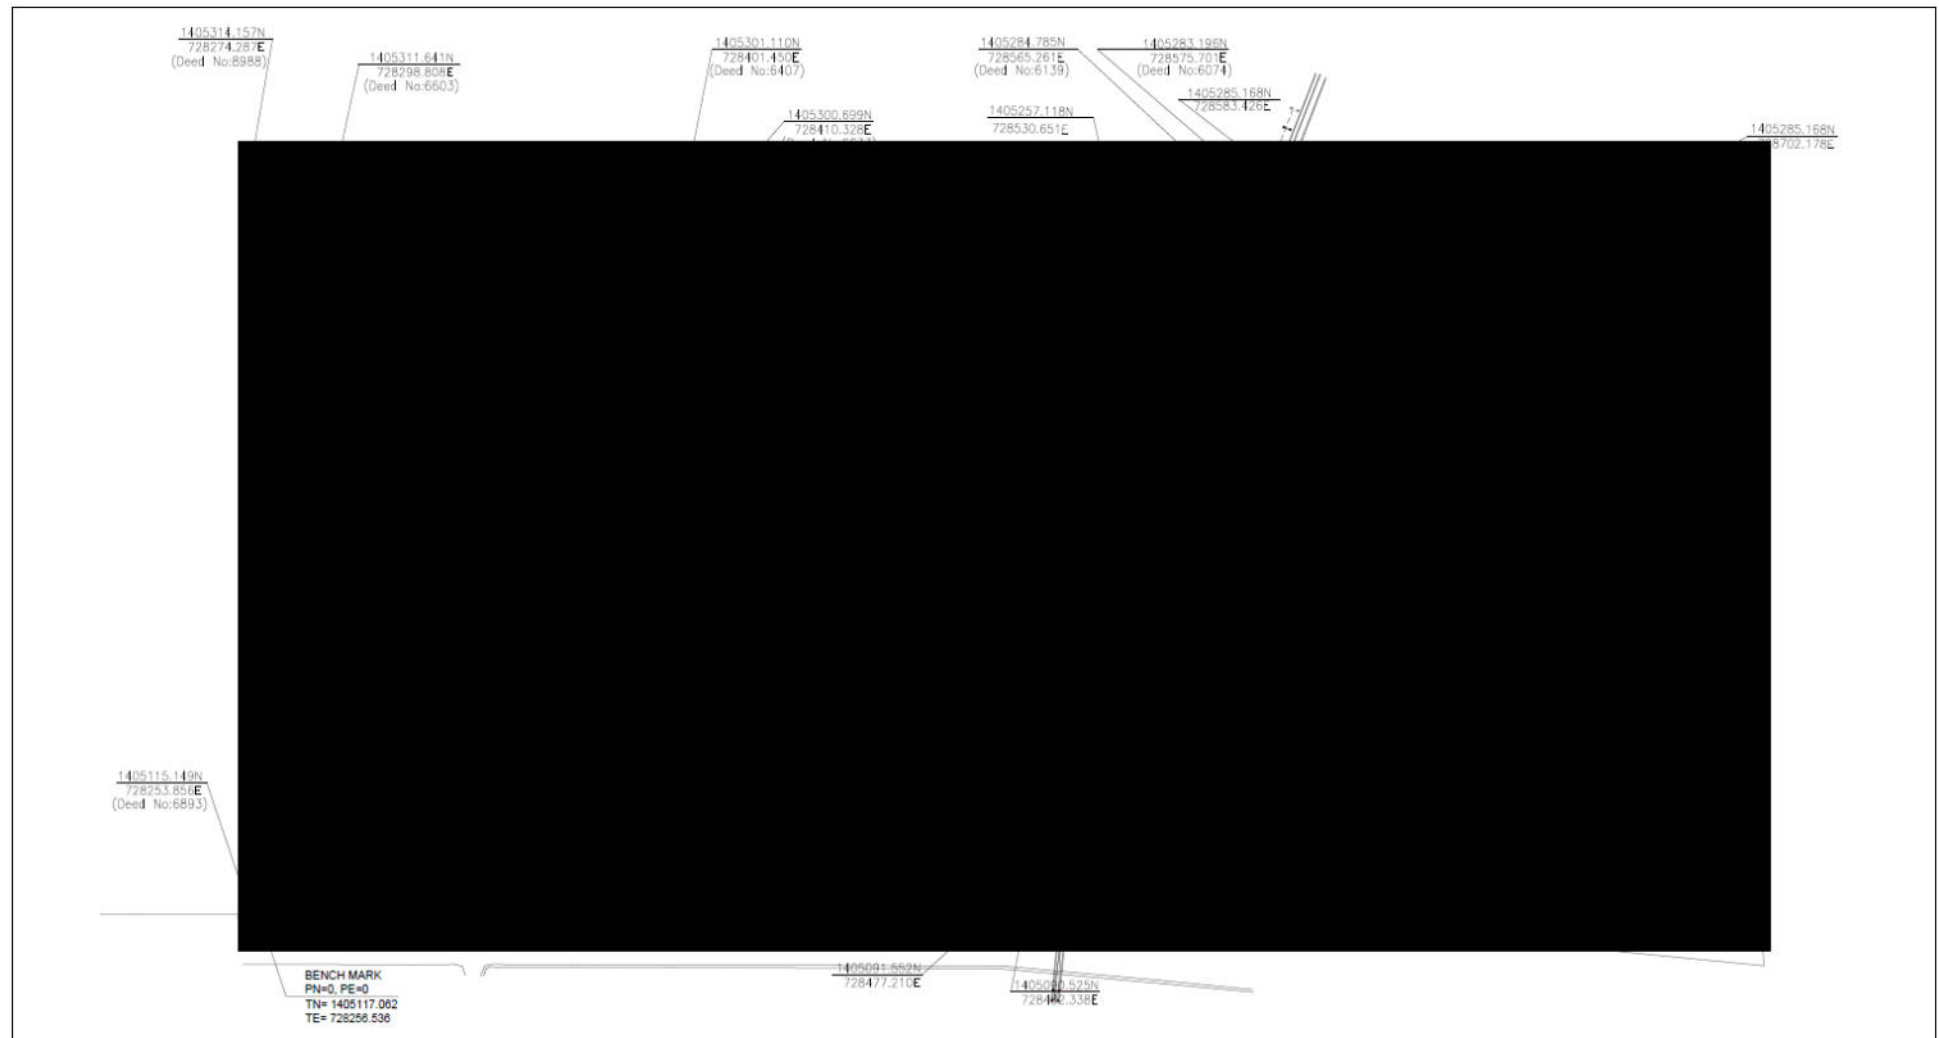

รูปที่ 1.4-3 ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.5 ผลผลิต

ผลผลิตหลักของโครงการ คือ ไฟฟ้า และไอน้ำ ส่วนน้ำปราศจากแร่ธาตุเป็นการผลิตเพื่อใช้งานในโครงการเป็นหลักบางส่วน จัดส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มบริษัท ปตท. ที่มีความต้องการใช้งาน

(1) กระแสไฟฟ้า

โครงการมีกำลังการผลิตสูงสุด (Gross Power Output) 392.01 เมกะวัตต์ ใช้ในการเดินเครื่องภายในโครงการ สูงสุดเท่ากับ 8.5 เมกะวัตต์ และไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 383.51 เมกะวัตต์ จะส่งผ่านสถานีไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าของโครงการ ได้แก่ โรงงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ปตท. ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกำลังการผลิตส่วนที่เหลือจากความต้องการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมจะจำหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

(2) ไอน้ำ

ไอน้ำที่โครงการผลิตได้เป็นไอน้ำแรงดันสูง (High Pressure Steam: HP) ขนาด 82.8 บาร์ อุณหภูมิ 527 องศาเซลเซียส โดยโครงการมี HRSG จำนวน 6 เครื่อง HRSG แต่ละเครื่องมีอัตราการผลิตไอน้ำสูงสุดประมาณ 141.2 ตัน/ชั่วโมง ไอน้ำจะนำไปผลิตไฟฟ้าที่เครื่องกังหันไอน้ำและมีการดึงไอน้ำไปจำหน่ายให้กับโรงงานต่าง ๆ ประมาณ 233.5 ตัน/ชั่วโมง เป็นไอน้ำที่ความดัน 49.5 บาร์ อุณหภูมิ 435 องศาเซลเซียส โดยประมาณ ผ่านระบบท่อไอน้ำซึ่งเป็นเหล็กกล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว พาดวางบน Pipe rack เข้าสู่โรงงานต่าง ๆ ทั้งนี้ หากลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประสงค์จะใช้ไอน้ำแรงดันปานกลางเพิ่มเติม โครงการสามารถผลิตเพิ่มได้โดยดึงไอน้ำบางส่วนออกจากเครื่องกังหันไอน้ำ ณ ตำแหน่งที่ให้แรงดันตามต้องการ (Steam Extraction) หรือการลดความดันไอน้ำแรงดันสูงลงมาก็ได้

ทั้งนี้ ไอน้ำที่ผ่านออกมาจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำจะถูกส่งมาควบแน่นที่หน่วยควบแน่น (Condenser) ได้เป็นน้ำคอนเดนเสทหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ ส่วนน้ำคอนเดนเสทที่เกิดจากไอน้ำที่มีแรงดันและอุณหภูมิลดลงจนกลั่นตัวเป็นหยดน้ำภายในเส้นท่อ ทั้งจากหน่วยผลิตไอน้ำและจากระบบท่อไอน้ำที่ส่งจำหน่ายกลุ่มลูกค้าของโครงการจะถูกรวบรวมส่งเข้าสู่ถังพักน้ำร้อน และส่งเข้าสู่ถัง Deaerator เพื่อกำจัดออกซิเจนในน้ำ ก่อนส่งเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ำ โดยใช้เป็นน้ำชดเชยในหม้อน้ำ (Makeup) และน้ำป้อนหม้อน้ำอีกครั้ง

(3) น้ำปราศจากแร่ธาตุ

ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุของโครงการมีกำลังการผลิตสูงสุด 560 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (140 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 4 ชุด) โดยมีถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง น้ำปราศจากแร่ธาตุที่เหลือจากการใช้งานในโครงการประมาณ 140.20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (กรณีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำสูงสุด) จะจำหน่ายให้โรงงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท ปตท. ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง โดยส่งผ่านทางท่อเหล็กสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 นิ้ว

1.6 เชื้อเพลิงและสารเคมี

1.6.1 เชื้อเพลิง

โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยไม่มีการสำรองเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลไว้ภายในพื้นที่โครงการเพื่อเดินระบบแต่อย่างใด เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซียมีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความมั่นคงสูง ซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบกับจากสถิติที่ผ่านมาของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่พบเหตุการณ์ขัดข้องจนไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าได้ โครงการจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น กรณีที่เกิดขัดข้องที่ระบบส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติขัดข้อง (เกิดอุบัติเหตุกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือมีภัยธรรมชาติที่รบกวนการส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โรงไฟฟ้า) ทำให้โครงการไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้นั้น โครงการจะปรับเปลี่ยนระบบโดยรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้ามาจ่ายให้กับกลุ่มลูกค้าภายในนิคมฯ จนกว่าระบบส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจะเข้าสู่สภาวะปกติ

1.6.2 สารเคมีและสารเติมแต่ง

สารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นสารเคมีสำหรับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมแก่การนำไปใช้งาน สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และสารเคมีที่ใช้ในระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) โดยมีรายละเอียด ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การขนส่ง วิธีการเก็บกัก และการใช้ประโยชน์สารเคมีแต่ละประเภท ดังแสดงในตารางที่ 1.6-1

ทั้งนี้ สารเคมีส่วนใหญ่จะกักเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่ใช้งาน โครงการได้กำหนดให้มีการจัดแบ่งพื้นที่และจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ตามคุณสมบัติ เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดปฏิกิริยา โดยเฉพาะกลุ่มวัตถุไวไฟซึ่งต้องแยกพื้นที่อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดเก็บ ดังนี้

- (1) จัดหาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งาน จัดเก็บไว้ในอาคารและมีแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดไว้ที่ภาชนะบรรจุทุกชนิด
- (2) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่จะนำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น
- (3) บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อให้มีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ
- (4) จัดเตรียม Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่รั่วไหลได้ทั้งหมด สำหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นจะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้ำ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้
- (5) ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร
- (6) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ

ตารางที่ 1.6-1 รายละเอียดการใช้สารเคมี

สารเคมี	ปริมาณการใช้ (ตัน/ปี)	ความถี่การขนส่ง* (เที่ยว/ปี)	แหล่งที่มา	การเก็บกัก	การใช้ประโยชน์
หน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water System)					
1. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) ความเข้มข้น 35%	2,000	96	ภายในประเทศ	ถังขนาด 21 ลบ.ม. @ 2 ชุด	- ใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำ
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) ความเข้มข้น 50%	1,000	96	ภายในประเทศ	ถังขนาด 15 ลบ.ม. @ 2 ชุด	- ใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำ
3. กรดซิตริก (Citric acid) ความเข้มข้น 50%	5	12	ภายในประเทศ	ถังขนาด 100 ลิตร	- ใช้เป็นสารทำความสะอาดเยื่อ Membrane
หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำคอนเดนเสท (Condensate Polisher) (ยังไม่มีหน่วยการผลิต)					
4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) ความเข้มข้น 50%	-	-	-	-	- ใช้เป็นสารทำความสะอาดอุปกรณ์กรองน้ำและ เกลือแร่
5. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) ความเข้มข้น 35%	-	-	-	-	- ใช้เป็นสารฆ่าจุลินทรีย์ในระบบกรองน้ำ
ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler System)					
6. Oxygen scavenger (Diethylhydroxylamine ความเข้มข้น 15-40% ผสมกับ Hydroquinone (1,4- benzenediol) ความเข้มข้น 1-5%	10.50	2	ภายในประเทศ	ถังขนาด 350 ลิตร	- ใช้เป็นสารกำจัดออกซิเจนชนิดอินทรีย์สารใน หม้อไอน้ำ
7. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide) ความเข้มข้น 30%	10.50	12	ภายในประเทศ	ถังขนาด 350 ลิตร	- ใช้เป็นสารป้องกันการกัดกร่อนในระบบคอนเดนเสท

ตารางที่ 1.6-1 (ต่อ) รายละเอียดการใช้สารเคมี

สารเคมี	ปริมาณการใช้ (ตัน/ปี)	ความถี่การขนส่ง* (เที่ยว/ปี)	แหล่งที่มา	การเก็บกัก	การใช้ประโยชน์
ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler System) (ต่อ)					
8. โซเดียมฟอสเฟต (Sodium phosphate) ความเข้มข้น 1-7%	94.00	12	ภายในประเทศ	ถังขนาด 240 ลิตร	- ใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในหม้อไอน้ำ
ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling water system)					
9. Flogard (corrosion inhibitor)	47.20	12	ภายในประเทศ	ถังขนาด 300 ลิตร	- ใช้เป็นสารยับยั้งการกัดกร่อน
10. Depositrol (scale inhibitor)	47.20	12	ภายในประเทศ	ถังขนาด 300 ลิตร	- ใช้เป็นสารยับยั้งการเกิดตะกรัน
11. Spectrus NX1100	5.00	4	ภายในประเทศ	-	- ใช้เป็นสารฆ่าจุลินทรีย์ในน้ำ
12. โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite) ความเข้มข้น 10%	216.00	24	ภายในประเทศ	ถังขนาด 4 ลบ.ม.	- ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำ
13. กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid) ความเข้มข้น 50%	6.00	12	ภายในประเทศ	ถังขนาด 2 ลบ.ม.	- ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำ
ระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบ SCR (Selective Catalytic Reduction)					
14. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide) ความเข้มข้น 25%	3,062	36	ภายในประเทศ	-	- ใช้ทำความสะอาด Compressor Blade Gas Turbine

หมายเหตุ : * ขนส่งโดยรถบรรทุก

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน), 2562

1.7 กระบวนการผลิต

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant ; CCPP) เป็นโรงไฟฟ้าที่มีระบบการทำงานร่วมกัน 2 ระบบ คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ำ โดยมีการนำพลังงานความร้อนจากก๊าซร้อนที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าที่เครื่องกังหันก๊าซไปใช้ในการต้มน้ำที่เครื่องผลิตไอน้ำ และใช้น้ำในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นการใช้ประโยชน์ไม่ให้ความร้อนสูญเสียไปในบรรยากาศ

1.7.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญ

เครื่องจักรหลักของโครงการสรุปได้ดังนี้


- 1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ขนาด 49.98 เมกะวัตต์ จำนวน 6 ชุด ซึ่งติดตั้งระบบทำความเย็น (Chiller) จำนวน 6 ชุด กรณีเดินเครื่อง Chiller มีกำลังการผลิต 392.01 เมกะวัตต์
- 2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ขนาดชุดละ 30.71 เมกะวัตต์ จำนวน 3 ชุด
- 3) เครื่องผลิตไอน้ำ ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง จำนวน 6 ชุด

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญในกระบวนการผลิตของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 1.7-1 สามารถสรุปรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละประเภทได้โดยสังเขป ดังนี้

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (Combustion Gas Turbine Generator; CTG)

กระบวนการผลิตที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน เริ่มต้นจากการกรองอากาศด้วยเครื่องกรองอากาศ (Air Filter) ผ่านเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ (Chiller) โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำเย็นซึ่งจะทำให้ปริมาณอากาศที่เข้ากังหันก๊าซเพิ่มขึ้นและส่งเข้าเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ตามลำดับ ก่อนส่งต่อไปยังห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ภายในห้องเผาไหม้มีช่องป้อนเชื้อเพลิง มีลักษณะเป็นหัวฉีดในลักษณะกระจาย (Spray) แบบ Dry Low NO_x Combustor เมื่อมีการจุดระเบิดและเชื้อเพลิงติดไฟจะเกิดปฏิกิริยาการสันดาป มีอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส ได้ก๊าซร้อนที่มีความดันและการขยายตัวสูงส่งออกจากห้องเผาไหม้ไปขับเคลื่อนชุดใบพัดอีกชุดหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเพลาเดียวกันกับเครื่องอัดอากาศให้หมุน เรียกว่า เครื่องกังหัน (Gas Turbine) นำการถ่ายเทพลังงานด้วยการหมุนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปจุดเพลาโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ให้หมุนจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ส่วนก๊าซร้อนเสีย (Exhaust Gas) ที่มีความดันและอุณหภูมิพอเพียงสามารถส่งไปใช้เป็นแหล่งพลังงานที่เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG) เพื่อผลิตไอน้ำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในขั้นตอนต่อไป

CTG รุ่น SGT-800 หรือ GE6B จำนวน 6 เครื่อง เป็นกังหันก๊าซอุตสาหกรรม (Heavy Duty Industrial) ชนิด Dry Low NO_x Combustor และ Selective Catalytic Reduction: SCR ซึ่งติดตั้งระบบทำความเย็น (Chiller) โดยในกรณีเดินเครื่อง Chiller จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 49.98 เมกะวัตต์ และในกรณีไม่เดินเครื่อง Chiller จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 42.34-43-79 เมกะวัตต์

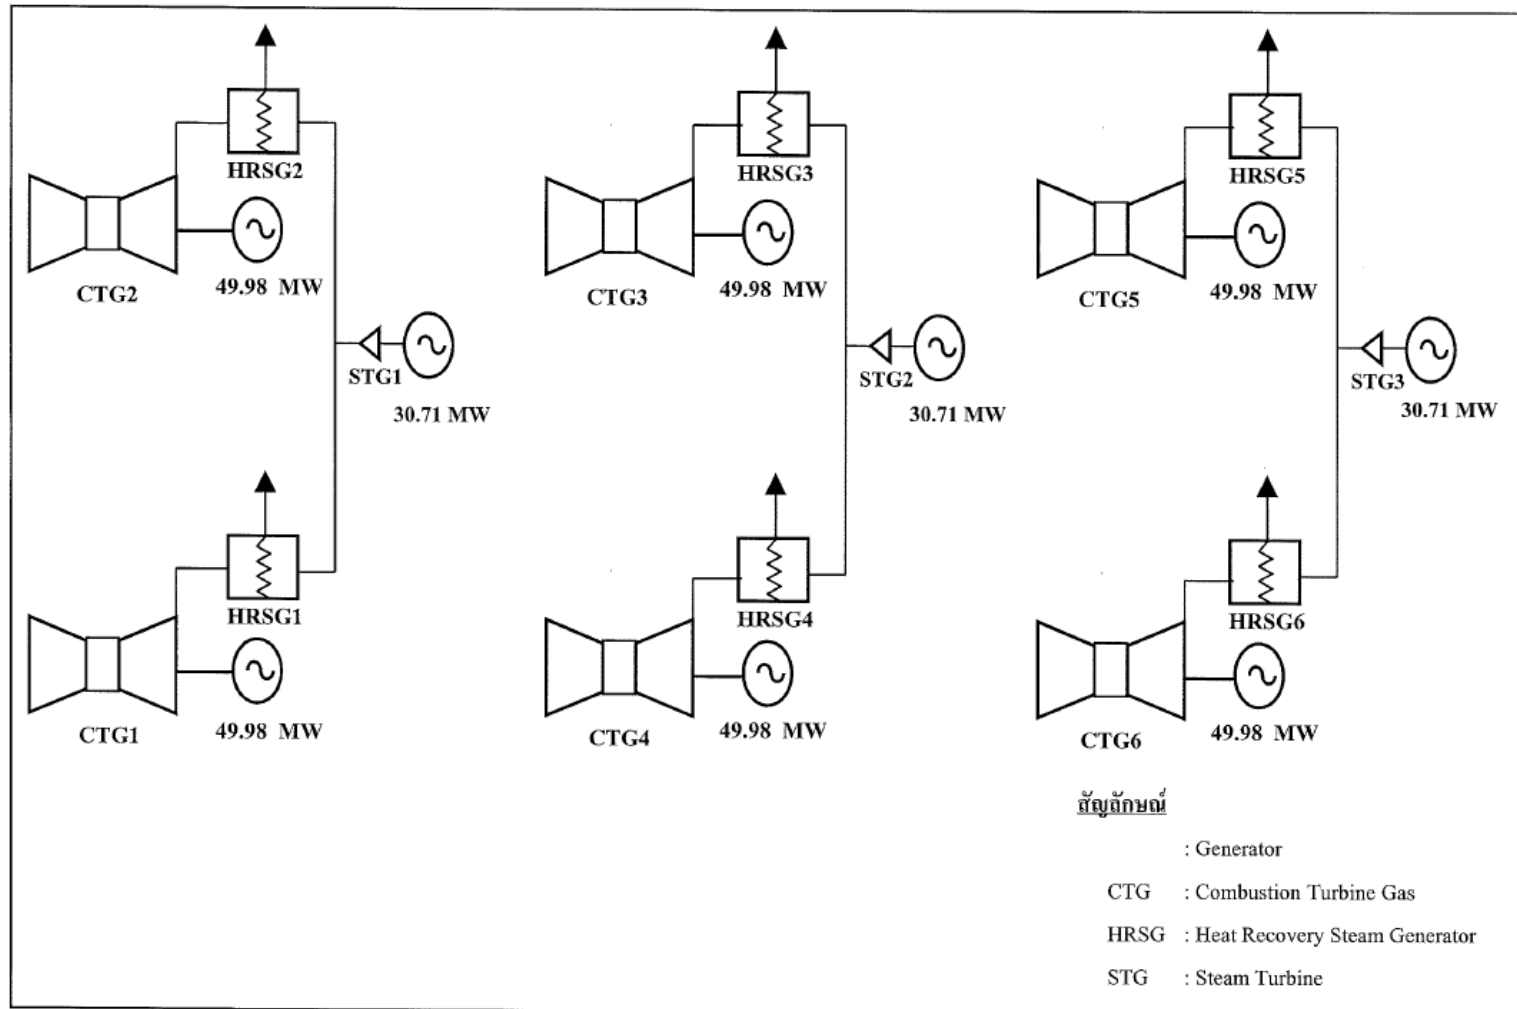

รูปที่ 1.7-1 ผังองค์ประกอบของหน่วยผลิตไฟฟ้า

(2) เครื่องผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generators; HRSG)

เครื่องผลิตไอน้ำของโครงการเป็นแบบ Supplementary Firing (หรือที่เรียก Duct Burner Firing) ซึ่งเป็นหม้อน้ำที่ออกแบบให้ใช้ความร้อนของก๊าซเสียจากเครื่องกังหันก๊าซ (CTG) มาเป็นแหล่งพลังงาน เรียกว่า Heat Recovery Steam Generator (HRSG) และสามารถใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ในหม้อน้ำเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไอน้ำ ทั้งนี้ HRSG ที่ใช้ในโครงการมี 6 เครื่อง เป็นชนิด Horizontal Flow ติดตั้งภายนอกอาคาร สามารถผลิตไอน้ำความดัน 2 ระดับ คือ ไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam) และไอน้ำความดันต่ำ (Low Pressure Steam)

หลักการทำงาน

หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) มีโครงสร้างหลักที่แข็งแรง ภายในติดตั้งชุดท่อเหล็กทนความร้อนสูงหลายชุด เป็นทางผ่านของก๊าซร้อน (Gas Duct) จากเครื่องกังหันก๊าซที่ปล่อยเข้ามาใน HRSG เกิดการถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำและไอน้ำภายในท่อ กับก๊าซร้อนที่อยู่ภายนอก ซึ่งชุดท่อภายในหม้อน้ำ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย Economizer, Evaporator และ Superheater

1) แผงท่อรับความร้อน (Economizer) เป็นชุดท่อให้ความร้อนแก่น้ำที่มาจากระบบ (Feed Water) คือน้ำที่ได้จากการกลั่นตัวของไอน้ำผสมกับน้ำที่เติมเข้าไปในระบบที่เครื่องควบแน่น

2) เครื่องผลิตไอน้ำ (Evaporator) เป็นชุดท่อให้ความร้อนแก่น้ำที่ผ่านมาจาก Economizer ทางด้านล่างของตัวเครื่องแยกไอน้ำ (Boiler Drum) ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาระดับน้ำในชุดท่อไว้ไม่ให้แห้งเป็นไอทั้งหมด เนื่องจากชุดท่อไม่สามารถทนความร้อนที่สูงมาก ดังนั้น ภายในท่อจึงคงสภาพน้ำผสมไอน้ำวนเวียนอยู่ในท่อเครื่องผลิต ไอน้ำและไหลกลับเข้าสู่หม้อน้ำ (Drum) เพื่อแยกน้ำและไอน้ำออกจากกัน โดยไอน้ำจะถูกส่งเข้าเครื่องทวิความร้อน (Superheater) ผลิตไอน้ำยิ่งยวดหรือไอดง (Superheated Steam) ส่งไปขับเคลื่อนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนน้ำจะถูกหมุนเวียนเข้าสู่หม้อน้ำอีกครั้ง

3) เครื่องทวิความร้อน (Superheater) มีหน้าที่ผลิตไอน้ำยิ่งยวด ลักษณะเป็นชุดท่อที่แขวนไว้ภายในหม้อน้ำ ปลายแต่ละด้านต่อกับท่อรวมที่เรียกว่า Header โดยด้านหนึ่งของ Header จะยึดต่อเข้ากับหม้อต้มไอน้ำ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะไม่ยึดติดตายตัวเพื่อการขยายตัวเมื่อท่อร้อนและส่งไอน้ำต่อไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ ทั้งนี้ Superheater แบ่งออกเป็น 2 วงจร คือ ไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam) ขนาด 82.81 บาร์ และไอน้ำความดันต่ำ (Low Pressure Steam) ขนาด 6.649 บาร์ ซึ่งจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator; STG)

โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 30.71 เมกะวัตต์ เป็นชนิด Condensing Extraction Type ติดตั้งไว้ในอาคาร

หลักการทำงาน

ไอน้ำความดันสูง (HP) และไอน้ำความดันต่ำ (LP) จาก HRSG จะถูกส่งผ่าน Control Valve เพื่อควบคุมปริมาณไอน้ำไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ไอน้ำที่ผ่านออกจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จะถูกส่งไปที่หน่วยควบแน่น (Condenser) ทำให้มีแรงดันและอุณหภูมิลดลงจนกลั่นตัวเป็นน้ำ เรียกว่า คอนเดนเสท ซึ่งน้ำคอนเดนเสทที่เกิดขึ้นในเส้นท่อจากหน่วยผลิตไฟฟ้าของโครงการทั้งหมด หรือรับมาจากลูกค้า จะถูกรวบรวมส่งเข้าสู่ถังพักน้ำร้อนเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนที่เหลืออยู่ผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อน และส่งเข้าสู่ถัง Deaerator เพื่อกำจัดออกซิเจนในน้ำ ก่อนส่งเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ำอีกครั้งและต่อไป กรณีที่มีน้ำคอนเดนเสทไม่เพียงพอในการผลิตไอน้ำ ก็จะใช้ น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) มาผ่านกระบวนการปรับแต่งคุณภาพ (Chemical Dosing) ให้เหมาะกับการใช้ในหม้อน้ำและป้อนชดเชย (Make up) เข้าในหม้อน้ำเพิ่มเติมเพื่อผลิตไอน้ำให้เพียงพอต่อไป

ในระหว่างการส่งผ่านไอน้ำความดันสูงเข้าไปยังเครื่องกังหันไอน้ำ เมื่อไอน้ำผ่านชุดกังหันแต่ละขั้นตอน แรงดันไอน้ำจะลดต่ำลงเป็นลำดับจนถึงการควบแน่นเป็นคอนเดนเสท อย่างไรก็ตามในระหว่างกระบวนการนี้ จะมีการดึงไอน้ำบางส่วนออกจากเครื่องกังหันไอน้ำ ณ ตำแหน่งที่ให้แรงดันตามต้องการ (Steam Extraction) เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าเป็นไอน้ำแรงดันปานกลาง หรือในบางกรณีก็สามารถใช้วิธีการลดความดันของไอน้ำแรงสูงลงมาเป็นไอน้ำแรงดันปานกลางส่งให้ลูกค้าก็ได้

(4) เครื่องควบแน่น (Condenser)

เครื่องควบแน่นของโครงการ มีจำนวน 3 เครื่อง เป็นแบบ Surface Condenser, Horizontal Single Shell ทำหน้าที่ควบแน่นไอน้ำที่ออกมาจาก STG (Steam Turbine Generator) โดยการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความร้อนกับน้ำเย็นที่ส่งมาจากหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ภายในเส้นท่อ ทำให้ไอน้ำภายนอกเส้นท่อเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำ และหมุนเวียนส่งกลับเข้าสู่เครื่องกำเนิดไอน้ำ (HRSG) ต่อไป

ทั้งนี้ น้ำจากหอหล่อเย็น เมื่อผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่เครื่องควบแน่นแล้ว จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประมาณ 10 องศาเซลเซียส จะถูกส่งกลับไปยังหอหล่อเย็นเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ จากนั้นจึงหมุนเวียนกลับไปแลกเปลี่ยนความร้อนที่เครื่องควบแน่นต่อไป ระบบระบายน้ำแบบนี้ เรียกว่า ระบบระบายน้ำแบบวงจรปิด (Closed Cycle System)

(5) ระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower System)

โครงการมีหอหล่อเย็น แบบ Induced Draft Counter Flow Cooling Tower ลักษณะโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ส่วนทางกับกระแสน้ำที่จะลดอุณหภูมิซึ่งถูกฉีดเป็นฝอยลงมาจากด้านบน และลงสู่อ่างเก็บน้ำด้านล่าง ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โครงการมีการหมุนเวียนน้ำในระบบหลายรอบทำให้ความขุ่นและความเข้มข้นของสารต่างๆ ในน้ำหมุนเวียนมีความเข้มข้นขึ้น จึงต้องมีระบายน้ำบางส่วนทิ้งไป (Cooling Water Blowdown) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำที่หมุนเวียน นอกจากนี้บางส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปในระบบ (Evaporation Loss และ Drift Loss) ดังนั้น จึงมีการเติมน้ำเข้ามาทดแทนน้ำที่สูญเสียไปดังกล่าว เรียกว่า Makeup Water

(6) ระบบควบคุมและอุปกรณ์ (Control System and Instrument)

โครงการมีห้องควบคุมส่วนกลาง (Central Control Room : CCR) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ภายในโรงไฟฟ้า ในส่วนของการสั่งเดินเครื่อง (Start Up) การเพิ่มและการลดกำลังการผลิต (Load and Unload) การหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) ตลอดจนทำการตรวจวัด ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ การเชื่อมโยงระบบควบคุมระหว่างโรงไฟฟ้าโดยใช้ระบบควบคุมชนิด Distributed Control System (DCS)

(7) ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการ โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Force Oil, Force Air Cooled (OFAF) ซึ่งไม่มีการใช้สาร PCB ในหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนี้

- 1) หม้อแปลงไฟฟ้า 5 ชุด สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก 11 kV ให้เพิ่มเป็น 115 kV สำหรับจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2) หม้อแปลงไฟฟ้า 5 ชุด สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 115 kV เป็น 22 kV สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้า
- 3) Auxiliary transformer จำนวน 2 ชุด สำหรับเลี้ยงระบบต่าง ๆ ในโครงการ

1.7.2 ค่าการออกแบบโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ามีเวลาในการเดินระบบประมาณ 8,760 ชั่วโมง/ปี การหยุดซ่อมและเดินเครื่องใหม่ในสภาวะปกติมีประมาณ 1 ครั้ง/ปี ซึ่งเท่ากับกับสภาวะฉุกเฉิน ระบบสามารถทำงานได้ถึงกำลังสูงสุดจนถึงขั้นผลิตในระดับกำลังสูงสุดของความสามารถของระบบ สำหรับแผนการบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้

1) เครื่องจักรกังหันก๊าซ (CTG) มีแผนการซ่อมบำรุงเป็นช่วงเวลาทุก ๆ 24,000 ชั่วโมง โดยทำการตรวจสอบระบบห้องเผาไหม้ ตรวจสอบเพลาระบบการส่งกำลัง ตรวจสอบความสมบูรณ์ชุดใบพัดของระบบอัดอากาศเย็นและอากาศก๊าซร้อน ตรวจสอบระบบการควบคุมจุดเชื้อเพลิง ตรวจสอบระบบการหล่อลื่น ตรวจสอบระบบการป้องกันภัยดับเพลิง ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซร้อน ทั้งนี้ ในช่วงซ่อมประจำปีจะทำการเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องกังหันก๊าซ เช่น ชุดรับเพลาชับการหมุน (Bearing) ชุดซีลกันการรั่วซึม เป็นต้น โดยเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้

2) เครื่องจักรกังหันไอน้ำ (STG) มีแผนการซ่อมบำรุงเป็นช่วงเวลาทุก ๆ 24,000 ชั่วโมง โดยทำการตรวจสอบวาล์วและอุปกรณ์ชุดใบพัดกังหันไอน้ำทั้งชุดอยู่กับที่และชุดหมุนตรวจสอบชุดเพลาส่งกำลัง ตรวจสอบชุดซีลกันการรั่วซึม ตรวจสอบระบบการหล่อลื่น พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่บางชุดของเครื่องกังหันไอน้ำ เช่น ชุดรับเพลาชับการหมุน (Bearing) ชุดซีลกันการรั่วซึม เป็นต้น โดยเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้

3) เครื่องจักรผลิตไอน้ำ (HRSG) มีแผนการซ่อมบำรุงเป็นช่วงเวลาทุก ๆ 24,000 ชั่วโมง โครงการจะจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของหม้อน้ำ โดยหยุดเดินเครื่องเพื่อตรวจสอบสภาพระบบท่อน้ำทั้งภายในและภายนอก ทดสอบสภาพการทำงานของวาล์วนิรภัยและทำการทดสอบแรงอัดด้วยน้ำ หรือหลังจากมีการซ่อมบำรุงหม้อน้ำทุกครั้ง โดยการทดสอบความปลอดภัยจะจัดให้มีสามัญวิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบหม้อน้ำตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

1.8 สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต

1.8.1 ระบบน้ำใช้

(1) แหล่งน้ำใช้

โครงการจะรับน้ำอุตสาหกรรม (Clarified Water) ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจากโรงผลิตน้ำอุตสาหกรรมของบริษัท จีซี เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่ทาง ปตท. ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการกับโรงงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาตั้งภายในพื้นที่กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Complex) โดยน้ำอุตสาหกรรม (Clarified Water) จะถูกส่งผ่านระบบท่อให้โครงการโดยตรง ปริมาณสูงสุด 755 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อนำไปพักไว้ที่บ่อพักน้ำอุตสาหกรรม (Clarified Water Tank) ของโครงการ ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ต่อไป

(2) ระบบผลิตน้ำใช้ในโครงการ

ระบบผลิตน้ำใช้ของโครงการมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำคอนเดนเสท (Condensate Polisher) มีรายละเอียดขั้นตอนการผลิตในแต่ละระบบ ดังนี้

1) ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)

น้ำอุตสาหกรรม (Clarified Water Tank) จะถูกส่งเข้าสู่ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 140 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 4 ชุด ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุที่โครงการเลือกใช้จะเป็นระบบ Reverse Osmosis (RO) + Electro Deionization (EDI) ซึ่งเป็นระบบกรองน้ำที่ทำให้น้ำที่ได้มาก่อนข้างมีความบริสุทธิ์สูง และเหมาะสมเป็นน้ำใช้ในหม้อน้ำ ทั้งนี้ คุณภาพที่ผลิตได้ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแผ่นกรอง ลักษณะสมบัติและเกณฑ์คุณภาพน้ำปราศจากแร่ธาตุที่โครงการผลิตได้

ดังแสดงในตารางที่ 1.8-1 จากนั้นน้ำปราศจากแร่ธาตุจะถูกส่งไปเก็บยังถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

2) หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำคอนเดนเสท (Condensate Polisher)

โครงการมีแผนที่จะนำน้ำคอนเดนเสทจากลูกค้ำกลับมาบำบัดและใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต โดยการติดตั้งหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำคอนเดนเสท (Condensate Polisher) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง กำลังการผลิตสูงสุดรวม 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ก่อนส่งเข้าไปไว้ในถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 1.8-1 ลักษณะของน้ำปราศจากแร่ธาตุ

พารามิเตอร์	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด
pH	-	5.5-7.0
conductivity	$\mu\text{S}/\text{cm}^2$	<0.6
Soluble silica	ppm	<0.02
Na	ppm	<0.01
Fe	ppm	<0.01
Cu	ppm	<0.002

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน), 2562

(3) ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ

โครงการใช้น้ำสูงสุดตามที่ได้รับการจัดสรรเท่ากันในทุกรูปแบบการเดินเครื่อง (ปริมาณ 755 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) รวมถึงมีการรับน้ำคอนเดนเสทจากลูกค้ำเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งกรณีกำลังการผลิตปกติเป็นกรณีที่โครงการไม่มีการรับน้ำคอนเดนเสทจากลูกค้ำ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1.8-1 ถึงรูปที่ 1.8-2

(ก) น้ำใช้สำหรับพนักงาน

ปริมาณการใช้น้ำรวม 0.07 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ได้แก่ น้ำใช้ทั่วไปในสำนักงาน และน้ำใช้ทั่วไปในกิจกรรมอื่น ๆ โดยน้ำใช้ทั่วไปในสำนักงานในช่วงดำเนินการของโครงการคาดว่าจะมีจำนวนพนักงานสูงสุด 40 คน (คิดที่อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร/คน-วัน)

(ข) น้ำหล่อเย็น

โครงการมีระบบหล่อเย็น 3 ชุด ขนาดชุดละ 5,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม น้ำใช้ในระบบหล่อเย็นสามารถหมุนเวียนได้ประมาณ 5 รอบ โดยจะทำให้ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ รวมทั้งความขุ่นในน้ำหล่อเย็นเข้มข้นขึ้น ประกอบกับน้ำบางส่วนระเหยสูญเสียไปในบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำหล่อเย็นในระบบจึงจำเป็นต้องระบายน้ำบางส่วนทิ้ง (Blowdown cooling) และต้องมีน้ำชดเชยเข้ามา (Make up water) ปริมาณการใช้น้ำสูงสุด 292.96 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งโครงการจะใช้น้ำจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของโรงผลิตน้ำอุตสาหกรรมของบริษัท จีซี เอสเตท จำกัด

(ค) น้ำใช้สำหรับหน่วยผลิตไอน้ำ

น้ำที่นำไปใช้สำหรับหน่วยผลิตไอน้ำเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุโดยเป็นการชดเชยน้ำส่วนที่ระเหยทิ้งและการสูญเสียในระบบ ปริมาณ 319.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

(ง) น้ำล้างทำความสะอาด

น้ำใช้สำหรับการล้างทำความสะอาดพื้นและเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ มีปริมาณ 0.93 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยจะใช้น้ำอุตสาหกรรม (Clarified Water) ที่ได้รับมาจากโรงผลิตน้ำอุตสาหกรรมของบริษัท จีซี เอสเตท จำกัด

(จ) น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง


น้ำสำรองดับเพลิงของโครงการจะใช้น้ำอุตสาหกรรมที่รับมาจากโรงผลิตน้ำของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่กักเก็บไว้ในถังพักน้ำ ขนาด 4,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง โดยจะสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงอย่างน้อย 30 นาที ปริมาณ 117 ลูกบาศก์เมตร

ผังสมดุลน้ำ (Water Balance) กรณีกำลังการผลิตสูงสุด



รูปที่ 1.8-1 ผังสมดุลน้ำ (Water Balance) กรณีกำลังการผลิตสูงสุด

ผังสมดุลน้ำ (Water Balance) กรณีกำลังการผลิตปกติ



รูปที่ 1.8-2 ผังสมดุลน้ำ (Water Balance) กรณีกำลังการผลิตปกติ

1.8.2 ระบบไฟฟ้า

โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการผลิตของโครงการเอง ยกเว้น กรณีฉุกเฉินที่โครงการไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ หรือกรณีที่โครงการหยุดดำเนินการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 15 เมกะวัตต์ ซึ่งจะรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์

1.8.3 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำของโครงการได้แยกระบบระบายน้ำฝนออกจากระบบระบายน้ำเสียอย่างชัดเจน ซึ่งแนวทางในการออกแบบระบบระบายน้ำฝนของโครงการจะพิจารณาจากพื้นที่การระบายน้ำฝนซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น้ำฝนไม่ปนเปื้อนและน้ำฝนที่อาจปนเปื้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) น้ำฝนที่ตกบนพื้นที่ทั่วไปซึ่งไม่มีการปนเปื้อน

น้ำฝนที่ตกบนพื้นที่ทั่วไปซึ่งไม่มีการปนเปื้อนโครงการได้ออกแบบวางระบายน้ำฝนเป็นรางระบายน้ำเปิดกว้าง 0.3-1.0 เมตร รอบพื้นที่อาคารต่าง ๆ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ไม่มีการปนเปื้อน ได้แก่ น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่หลังคาของอาคารต่าง ๆ ที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อนแล้วระบายเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำ ขนาด 2,880 ลูกบาศก์เมตร (โดยคิดจาก 80 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ 36 ไร่)

2) น้ำฝนตกบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนน้ำมัน

น้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนน้ำมัน เป็นน้ำฝนที่ตกลงในบริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตของโครงการที่ไม่มีหลังคาปกคลุม เช่น บริเวณพื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณเครื่องสูบน้ำและสารเคมี เป็นต้น มีพื้นที่ประมาณ 1,850 ตารางเมตร น้ำฝนดังกล่าวอาจชะล้างคราบน้ำมันที่ตกค้างอยู่ตามอุปกรณ์ต่าง ๆ คิดเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ดังกล่าว 48.6 ลูกบาศก์เมตร (มีระยะเวลาที่น้ำไหลจากบริเวณฝนตกมาสู่ถังแยกน้ำ-น้ำมัน ประมาณ 15 นาที)

1.9 การคมนาคมขนส่ง

จากลักษณะการดำเนินการของโครงการจะใช้การขนส่งวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบท่อเป็นหลัก ยกเว้นการขนส่งสารเคมี และการคมนาคมของพนักงาน ซึ่งจำนวนเที่ยวรถขนส่งสารเคมี และการคมนาคมของพนักงานในช่วงดำเนินการสูงสุด 4 เที่ยว/วัน

1.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.10.1 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- (1) มุ่งมั่นในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (2) ผลิตและจัดหาไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่มีปริมาณ คุณภาพ และการส่งมอบตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า

- (3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ

(4) กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ป้องกันมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยจากการทำงานที่เกิดขึ้นกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

(5) จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณ รวมถึงการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ

รายละเอียดดั่งเอกสารแนบที่ 52

1.10.2 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตาม “กฎกระทรวง เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565” ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมมาบังคับใช้ ซึ่งกฎกระทรวงฯ กำหนดให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ โดยอย่างน้อยโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังนี้

- 1) กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
- 2) เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
- 3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
- 4) กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย

(2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ดังนี้

- 1) กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- 2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นจากการทำงาน โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
- 3) จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยหรือหน่วยงาน แล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน
- 4) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- 5) ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
- 6) กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

7) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

8) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาลูกจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

10) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

(3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง มีหน้าที่ดังนี้

1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

4) ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

5) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

6) แนะนำ ฝึกสอน และอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

7) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

8) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง

9) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นที่นายจ้างมอบหมาย

1.10.3 แผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทางโครงการจะกำหนดแผนงานประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

1.10.4 การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(1) การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดให้ตรวจตราด้านความปลอดภัย

(2) การเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสภาวะการทำงานปกติและการทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย โดยทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมมาบังคับใช้

(3) โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือ แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดตาม “กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563” ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับพนักงานเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับกรณีที่ลักษณะหรือ สภาพของงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั้น มีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอื่น ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามระยะเวลานั้น และในกรณีที่จัดให้พนักงานเปลี่ยนงานและทำให้มีอันตรายต่อสุขภาพที่แตกต่างไปจากเดิม ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนงาน

1.10.5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามลักษณะของงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 ดังรายละเอียดในข้อ 3 มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization: ISO) มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards: EN) มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards: AS/NZS) มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards: JIS) มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The national Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH) มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) และมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association: NFPA) ให้มีความเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ลูกจ้างปฏิบัติ

1.10.6 การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ

โครงการได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็นตาม “กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548” ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2548 หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมมาบังคับใช้ดังนี้

(1) โครงการจะต้องจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งลิตรสำหรับลูกจ้างไม่เกินสี่สิบคน และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนึ่งสำหรับลูกจ้างทุก ๆ สี่สิบคน เศษของสี่สิบคนถ้าเกินยี่สิบคน ให้ถือเป็นสี่สิบคน และจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลสุขภาพความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน โดยให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกสำหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงและในกรณีที่มีลูกจ้างที่เป็นคนพิการ ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับคนพิการแยกไว้โดยเฉพาะ

(2) โครงการมีพนักงานมากกว่า 10 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 200 คน ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยา เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพออย่างน้อย 29 รายการ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ กิจการ พ.ศ. 2548

1.10.7 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(1) แนวทางปฏิบัติทั่วไป

- 1) ต้องศึกษาขั้นตอนการทำงานทั้งหมดให้รู้และเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ
- 2) ต้องศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน
- 3) ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด
- 4) ต้องสำรวจ ตรวจเช็ค สภาพความพร้อมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ
- 5) ต้องรายงานให้หัวหน้างานทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุและรีบปฐมพยาบาลโดยเร็ว
- 6) ห้ามใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
- 7) ห้ามปฏิบัติงานโดยที่ไม่ใช่น้ำที่โดยเด็ดขาด
- 8) ห้ามดื่ม เสพ สิ่งของมีเมา หรือพกพาเข้ามาในโรงงานโดยเด็ดขาด
- 9) ห้ามกระทำการใดๆ ในพื้นที่อันตรายก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
 - สถานีไฟฟ้าแรงสูง/ลานหม้อแปลงไฟฟ้า
 - งานที่สูงเกิน 2 เมตร (ที่ไม่มีรั้วกันโดยรอบที่มั่นคงและแข็งแรง)
 - งานในที่อับอากาศ ได้แก่ ท่อ ถัง บ่อ ที่มีช่องทางเข้าออกทางเดียว
 - งานเชื่อม ตัดแก๊ส หรืองานที่ทำให้เกิดควันมากๆ
 - บริเวณที่มีวัตถุไวไฟ เช่น บริเวณจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่น อาคารเก็บสารเคมี และ Gas Compressor เป็นต้น

(2) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานเฉพาะเรื่อง

- 1) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้า
- 2) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับเครื่องจักร
- 3) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือ
- 4) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อม ไฟฟ้า แก๊ส
- 5) กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง

(3) ระบบการอนุญาตเข้าพื้นที่โครงการ

การเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการนั้น ผู้ที่มาติดต่อจะต้องลงลายมือชื่อและรายละเอียดในใบรายงานการเข้า-ออก ตามที่โครงการกำหนด และต้องติดบัตรที่โครงการออกให้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่โครงการ โดยผู้ที่มาติดต่อต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่อง ความปลอดภัย

สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตทำงานในสถานที่อันตราย หรือทำงานในพื้นที่ที่กำหนดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่รุนแรง หรืออาจส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่นได้หาก ผู้ปฏิบัติไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือขาดความชำนาญเข้าไปปฏิบัติงาน ต้องมีระบบการขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด ดังนี้

- 1) แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมต่างๆ เช่น จำนวน คน ประวัติการทำงาน และขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น
- 2) บันทึกใบขออนุญาตปฏิบัติงาน WORK PERMIT ในพื้นที่อันตราย และปฏิบัติตามข้อกำหนด
- 3) ติดต่อขออนุญาตผู้จัดการส่วน วิศวกร หรือหัวหน้างานในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย แล้วติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ทราบ (ในกรณีวันหยุดหรือหลังเวลาทำงานปกติให้ติดต่อหัวหน้างาน) เพื่อให้ตรวจสอบความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน

1.10.8 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการมีระบบดับเพลิง ซึ่งมีการออกแบบและติดตั้งสอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ National Fire Protection Association (NFPA) และตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย มาตรฐาน รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

โดยระบบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

(1) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguishers)

โครงการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามความเหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้โครงการมีมาตรการในการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นประจำทุก 1 เดือน รวมทั้งมีการบันทึกผลการตรวจสอบ การเติม หรือการเปลี่ยนสารดับเพลิง

(2) ระบบท่อยืน (Standpipe System)

โครงการติดตั้งหัวฉีดและตู้สายฉีดน้ำครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการ โดยที่ระบบหัวฉีดน้ำเป็นระบบเปียก ปรับหัวฉีดน้ำชนิด Manual เป็นระบบท่อยืนที่ต่อกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้ Pressure Switch เป็นอุปกรณ์ควบคุม

(3) หัวรับน้ำดับเพลิง (Hydrant)

โครงการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงแบบเปียก (Wet Barrel) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร และมีขนาดของข้อต่อทางเข้าหัวดับเพลิงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และหัวน้ำออก 65 มิลลิเมตร พร้อมประตุน้ำจำนวน 2 ข้าง สำหรับหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงเป็นหัวต่อแบบสวมเร็ว (ตัวเมีย) พร้อมฝาครอบและโซ่ และมีระยะห่างระหว่างที่ดับเพลิงแต่ละหัวไม่เกิน 150 เมตร

(4) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)

โครงการติดตั้งหัวฉีดน้ำฝอยครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของพื้นที่ ได้แก่ ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ แบบเปียก และระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติแบบแห้ง (Delude Sprinkler System)

(5) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเพื่อส่งน้ำดับเพลิงและสร้างแรงดันน้ำให้กับระบบท่อเย็นและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงและระบบหัวกระจายน้ำ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ 3 ระบบ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Jockey Pump) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Motor Driven Fire Water Pump) และเครื่องสูบน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Driven Fire Water Pump) ซึ่งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีความสามารถในการจ่ายน้ำได้ 227.14 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่แรงดันขณะทำงานประมาณ 10 บาร์

(6) น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง


โครงการจะใช้น้ำอุตสาหกรรม (Clarified) ที่รับมาจากโรงผลิตน้ำอุตสาหกรรมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาเก็บกักไว้ในถัง Clarified ของโครงการ ขนาด 4,500 ลูกบาศก์เมตร สำหรับใช้เป็นน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งจ่ายน้ำดับเพลิงและสร้างแรงดันน้ำให้กับระบบท่อเย็นและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงและระบบหัวกระจายน้ำ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) สำหรับรายละเอียดเครื่องสูบน้ำแต่ละชนิด มีดังนี้

1) เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด 5.76 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง จำนวน 2 ชุด ติดตั้งเพื่อสูบน้ำทดแทนส่วนที่รั่วหรือส่วนที่ใช้ในการทดสอบ เครื่องสูบน้ำรักษาความดันจะทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้สวิทช์ที่ทำงานโดยอาศัยแรงดัน (Pressure Switch)

2) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) มีหน้าที่ส่งน้ำดับเพลิงให้แก่ระบบประจักษ์ภัยต่าง ๆ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 1 ชุด และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ดีเซล 1 ชุด ซึ่งมีความสามารถในการสูบน้ำด้วยอัตราการสูบน้ำที่ 227.14 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด หากเกิดเพลิงไหม้แล้วทำให้ระบบสปริงเกอร์ทำงานหรือ เมื่อมีการใช้น้ำในระบบทำให้ความดันในท่อต่ำลง ดังนั้น Pressure Switch จะส่งสัญญาณผ่านตู้ควบคุมเพื่อสั่งให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานได้อัตโนมัติ

1.10.9 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

แผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินจัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ โดยแผนงานดังกล่าวเป็นแผนป้องกันที่ดำเนินการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทและหน่วยงานภายนอก เพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินอันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้โดยจะกำหนดแผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สำหรับแผนภูมิบังคับบัญชาการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ณ สถานที่เกิดเหตุ ดังแสดงในรูปที่ 1.10.9-1 และ เอกสารแนบที่ 28

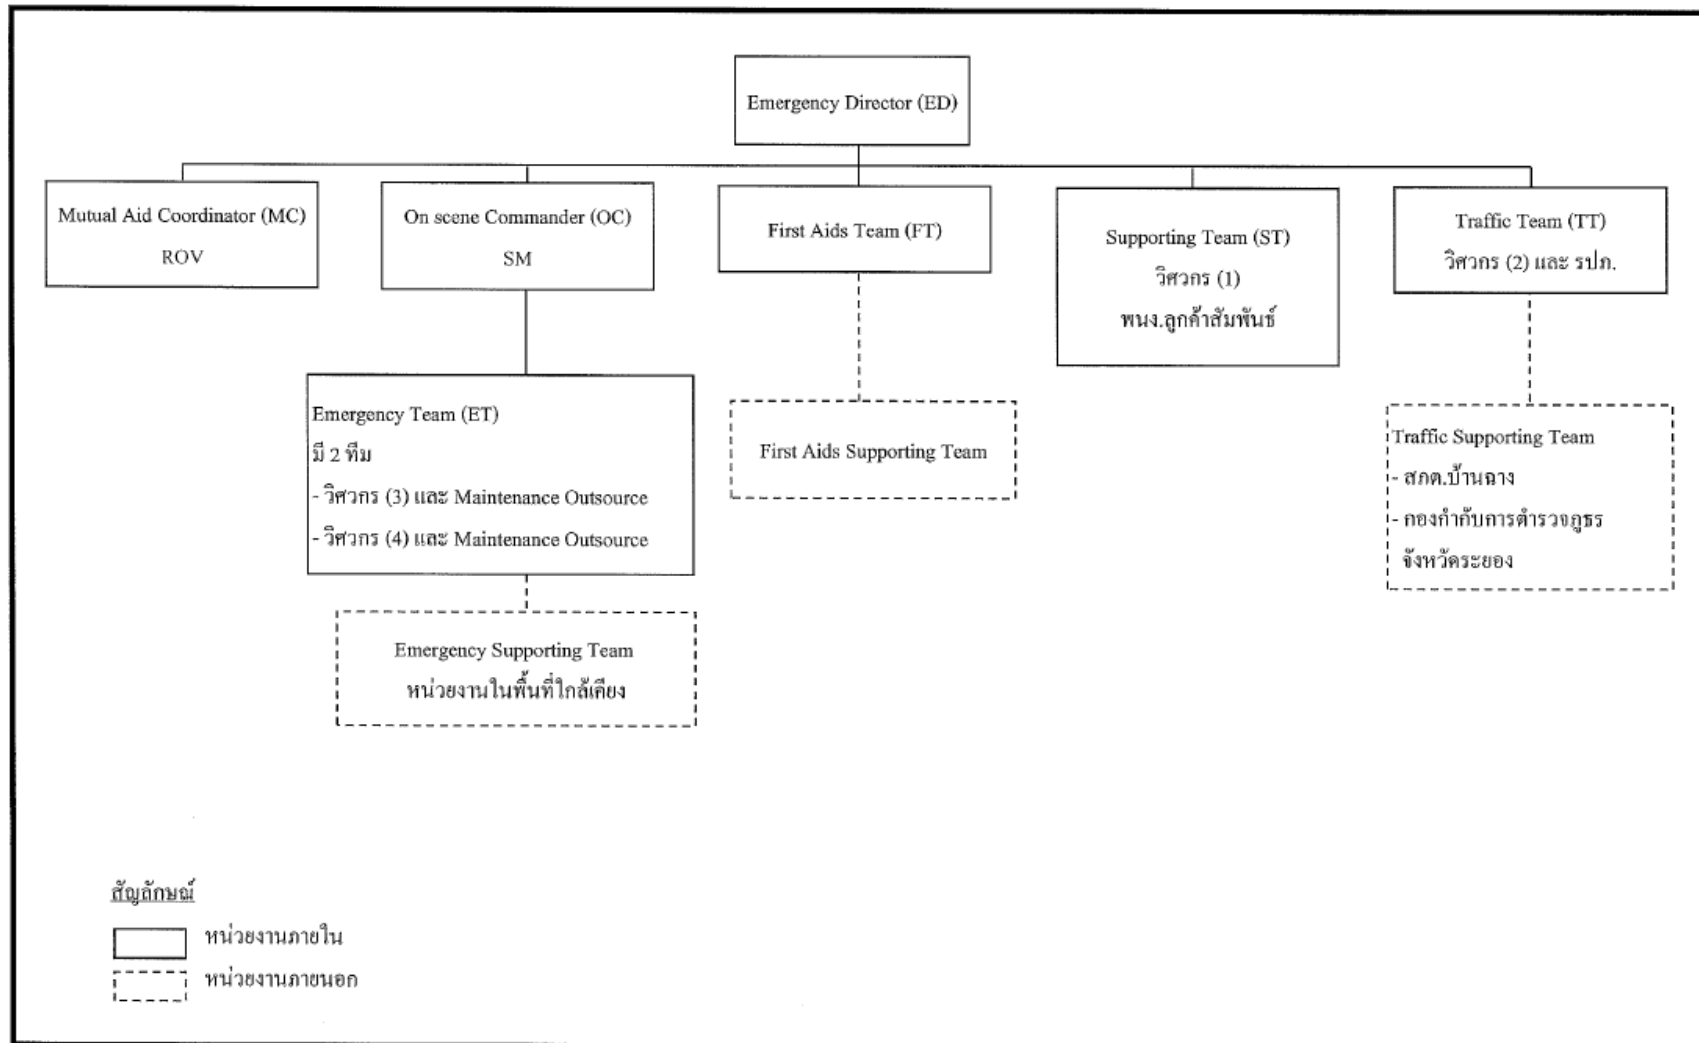

รูปที่ 1.10.9-1 แผนภูมิบังคับบัญชาการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ณ สถานที่เกิดเหตุ

(1) องค์กรตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสายการบังคับบัญชา

เพื่อให้เกิดการควบคุมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทางบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด จึงได้กำหนดแผนภูมิบังคับบัญชาการ ควบคุมภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งชุดปฏิบัติการขึ้นมาทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้

1) ชุดตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

มีหน้าที่ในการตัดแยกเชื้อเพลิง การควบคุมป้องกันความสูญเสียของอุปกรณ์ในโรงงาน การช่วยชีวิต และการควบคุมเพลิง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director : ED) และมีหน่วยงานต่าง ๆ รับหน้าที่ในการดำเนินการ ตามสถานที่เกิดเหตุดังนี้คือ

รายการดำเนินงาน	หน่วยงาน
1. การช่วยชีวิต	Operation
2. การควบคุมเพลิง	Operation
3. การควบคุมอุปกรณ์และตัดแยกเชื้อเพลิง	วิศวกรเทคนิค Operation

2) ชุดสนับสนุน

มีหน้าที่ในการควบคุมการจราจร การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยเหลือการปฐมพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วย การสนับสนุนในด้านวัสดุที่ใช้ในการควบคุมเพลิง การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือและช่าง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และมีฝ่ายต่าง ๆ รับหน้าที่ในการดำเนินการตามสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้คือ

รายการดำเนินงาน	หน่วยงาน
1. การควบคุมการจราจร	รปภ. และวิศวกรเทคนิค
2. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยเหลือ	รปภ. และ QSHE Officer
3. การปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย	เลขานุการ/QSHE Officer
4. การสนับสนุนในด้านวัสดุที่ใช้ในการควบคุมเพลิง (เช่น โฟม)	Operation
5. การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือและช่าง	วิศวกรเทคนิค
6. การสนับสนุนทางด้านกำลังพล	Operation/วิศวกรเทคนิค

3) ชุดอำนวยการ

มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการสั่งการของชุดตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สนับสนุนในการประสานงานระหว่างชุดปฏิบัติการต่าง ๆ และดำเนินการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก สนับสนุนด้านบริการยานพาหนะ ระบบสื่อสารข้อมูลทางด้านวิชาการ การอพยพ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบในการดำเนินการตามสถานที่เกิดเหตุดังนี้

รายการดำเนินงาน	หน่วยงาน
1. ตรวจสอบและติดตามการสั่งการของชุดตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	operation/วิศวกรเทคนิค
2. สนับสนุนในการติดต่อสื่อสารประสานงาน	รปภ.
3. สนับสนุนทางด้านวิชาการ	QSHE Officer
4. สนับสนุนทางด้านบริการและยานพาหนะ	ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหาร
5. การประชาสัมพันธ์	ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหาร
6. สนับสนุนด้านบริการให้กับพนักงาน	ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหาร
7. สนับสนุนด้านการเงิน	ส่วนบัญชีและการเงิน

(2) การควบคุมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

เพื่อให้การควบคุมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director : ED) เป็น ผู้รับผิดชอบในการประกาศภาวะฉุกเฉิน กำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน รวมถึงควบคุม และสั่งการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยผังการระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ และการติดต่อหน่วยงานภายนอกแสดงดังรูปที่ 1.10.9-2 ซึ่งได้กำหนดไว้เป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ

1) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 (Level 1)


เป็นภาวะฉุกเฉินซึ่งผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ไม่ขยายตัวลุกลามออกไป อาจมีหรือไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สามารถควบคุมได้เองด้วยอุปกรณ์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่และกำลังคนที่มีอยู่ในกะปฏิบัติการ โดยสั่งการให้ผู้ประสานงาน (Mutual Aid Coordinator: MC) แจ้งองค์กรตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ GPSC (Emergency Response Team: ERT) ทางระบบติดตามตัวเพื่อเตรียมความพร้อม

2) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 (Level 2)

เป็นภาวะฉุกเฉินซึ่งผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์รุนแรงหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกโดย ทันที หรือเป็นเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 ที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะที่ปลอดภัยได้ด้วยกำลังคนที่มีอยู่ในกะปฏิบัติการ โดยสั่งการให้ผู้ประสานงาน (MC) แจ้งองค์กรตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ GPSC (ERT) ทางระบบติดตามตัว เพื่อช่วยเหลือระงับเหตุการณ์ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

3) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 (Level 3)

เป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับที่ 2 ซึ่งผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก และไม่สามารถควบคุมได้จนต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งเข้าสู่แผนฉุกเฉินของจังหวัด โดยสั่งการไปยังผู้ประสานงาน (MC) ให้ทำการติดต่อขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด

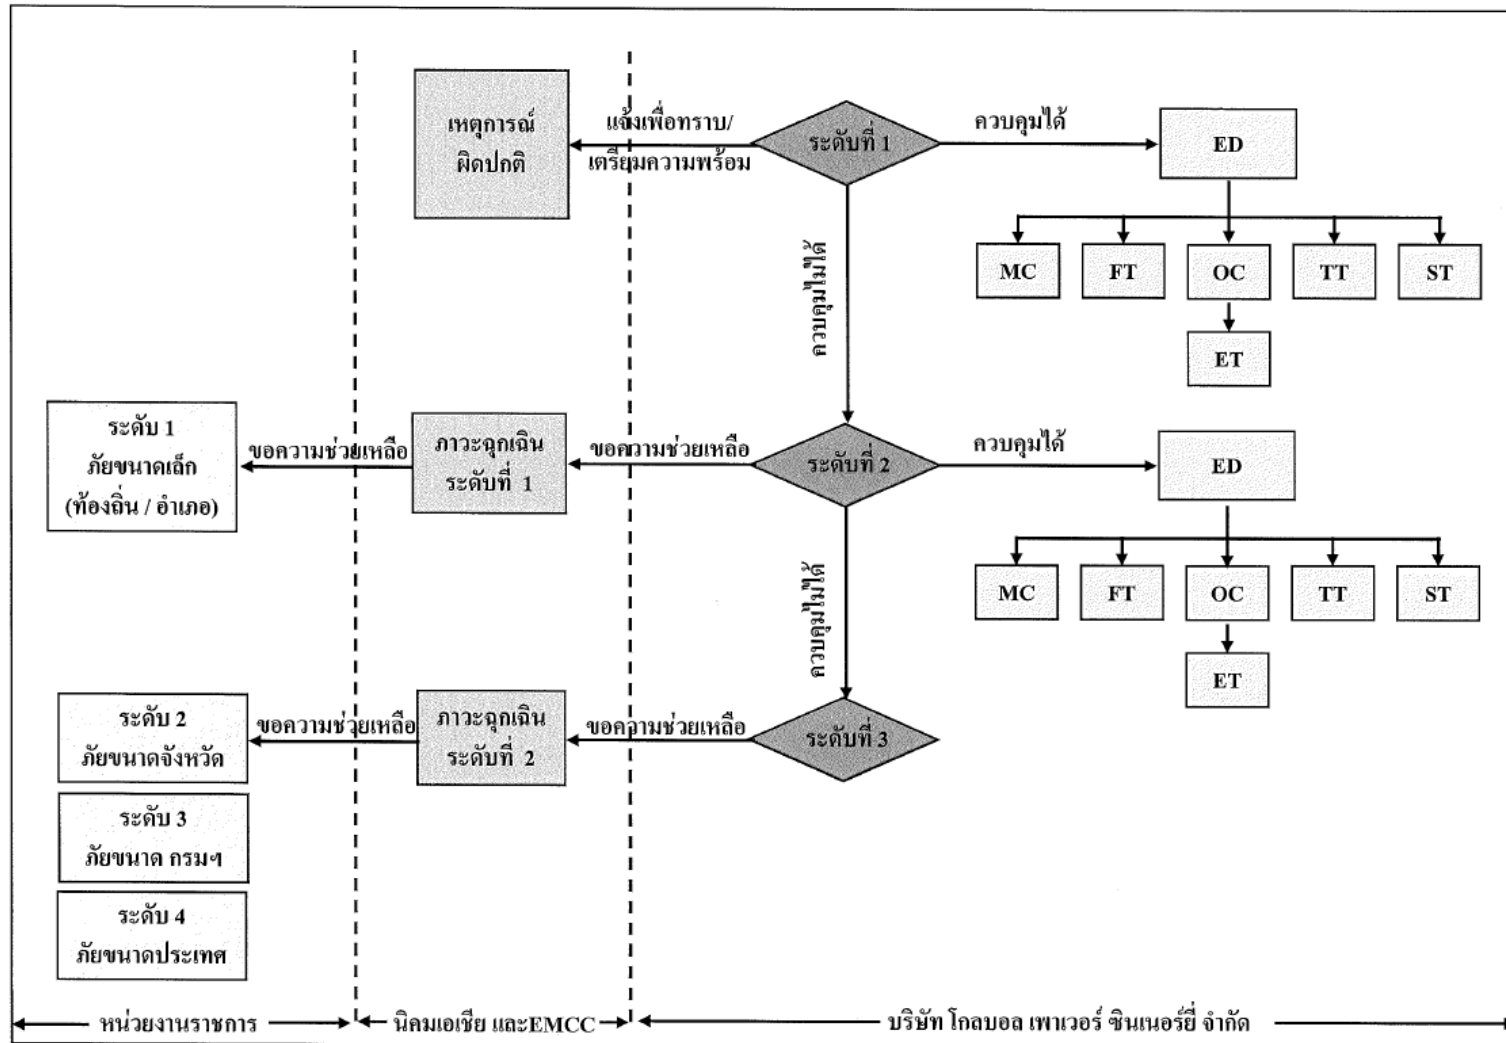

รูปที่ 1.10.9-2 ผังการระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ และการติดต่อหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกำลังขีดความสามารถของ กอ.ปพร. เมืองมาบตาพุด ที่จะควบคุมได้ จึงจัดให้มีแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในฐานะผู้อำนวยการกองอำนาจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดระยองทราบ เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินของจังหวัดระยองต่อไป

(3) แนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

1) การประกาศภาวะฉุกเฉิน

เมื่อผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) ที่ประจำบริเวณอาคารควบคุมการผลิต (CCB) ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ให้ประกาศข้อความทาง Public Address โดยระบุถึงระดับของแผนฉุกเฉิน และสถานที่ตั้ง Emergency Center และผู้ประสานงาน (MC) ประกาศแจ้งภาวะฉุกเฉินทางระบบติดตามตัว

2) การควบคุมเหตุฉุกเฉิน (Emergency Control) และแผนการตรวจตรา

(ก) การควบคุมเหตุฉุกเฉิน

ในการควบคุมจะต้องทำการลดหรือปิดกั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น เช่น ในกรณีของก๊าซรั่วจะต้องทำการปิดวาล์วที่ต้นทางของจุดที่รั่วหรือเปลี่ยนทิศทางหรือปิดกั้น การไหลของก๊าซมายังจุดที่รั่ว กรณีที่เป็นก๊าซพิษ (Toxic Gas) ต้องทำการควบคุมหรือสลากลุ่มก๊าซ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และชุมชน

(ข) แผนการตรวจตรา

ให้ QSHE Officer จัดทำแผนการตรวจตรา โดยแยกแยะวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงของเสีย ที่ติดไฟง่าย แหล่งความร้อน อุปกรณ์ดับเพลิงและผู้รับผิดชอบในการตรวจตรา พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจตราให้ผู้บริหารรับทราบ

3) การควบคุมความเสียหาย (Damage Control)

ป้องกันหรือควบคุมความเสียหายซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ฉุกเฉินให้น้อยที่สุด เช่น การฉีดยาลดอุณหภูมิรอบ ๆ โครงสร้างต่างๆ ในกรณีไฟไหม้ กรณีก๊าซพิษรั่ว (Toxic Gas) ต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ใกล้เคียง โดยต้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย

4) การช่วยชีวิต (Rescue)

ตรวจสอบจำนวนพนักงานในพื้นที่นั้นรวมถึงผู้มาติดต่อกับพนักงานผู้รับเหมา ตลอดจนผู้มาเยี่ยมชมว่าครบถ้วนหรือไม่ มีบุคคลดังกล่าวติดอยู่ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หรือไม่ และจัดทีมเข้าช่วยเหลือออกมาจากบริเวณที่เป็นอันตราย

5) การปฐมพยาบาล (First Aids) และแผนบรรเทาทุกข์

เลือกพื้นที่ที่ปลอดภัยในการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งถ้าสามารถเคลื่อนย้ายมายังจุดที่ปลอดภัยได้ก็ให้ย้ายมาทันที ในกรณีเคลื่อนย้ายไม่ได้จำเป็นต้องปฐมพยาบาลก่อนก็ให้เลือกจุดที่ปลอดภัยที่สุดโดยให้ผู้บังคับการที่จุดเกิดเหตุ (On Scene Commander: OC) เป็นผู้กำหนดจุดปฐมพยาบาล ให้ผู้ประสานงาน (MC) ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานจังหวัด สงเคราะห์จังหวัด โรงพยาบาล เป็นต้น พร้อมทั้งจัดการให้ผู้บาดเจ็บได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

6) การตรวจนับยอดพนักงานของแต่ละอาคาร

เมื่อประกาศภาวะฉุกเฉิน ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกลับไปรายงานตัวที่จุดรวมพล ให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายตรวจนับยอดพนักงานของฝ่ายตนเอง

7) การส่งมอบภารกิจ

เมื่อผู้ที่ทำหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กรตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมาถึงยังพื้นที่รับผิดชอบ ให้ผู้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ส่งมอบภารกิจตามลำดับอาวุโส เพื่อควบคุมภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบภารกิจจะต้องสรุปให้ทราบถึง

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตำแหน่ง และสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่
- รายละเอียดเกี่ยวกับคนเจ็บหรือคนที่ยังติดอยู่ในเหตุการณ์
- การปฏิบัติการที่กำลังดำเนินการอยู่
- ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- อื่น ๆ ที่สำคัญ

เมื่อส่งมอบภารกิจให้กับผู้ทำหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กรตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแล้ว ให้กลับไปทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

8) ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center)

GPSC ได้กำหนด Emergency Center ตามสถานที่ที่เกิดเหตุดังนี้

- อาคารอำนวยการ
- อาคารควบคุมการผลิต

โดยใน Emergency Center จะมีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ เพื่อประโยชน์ในการสั่งการ

9) ห้องผู้สื่อข่าว (Press Center) และห้องแถลงข่าว (Press Conference Room)

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสาร เหตุฉุกเฉินได้ตรงตามข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชนตลอดจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สื่อข่าวที่เข้ามาปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินจึงกำหนดให้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณสำหรับผู้สื่อข่าวปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประสานงาน (MC) ดังนี้

(ก) ห้องผู้สื่อข่าว (Press Center) ให้จัดห้องประชาสัมพันธ์ภายในอาคารสำนักงาน เป็นห้องผู้สื่อข่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนและส่งข่าว

(ข) ห้องแถลงข่าว (Press Conference Room) ให้จัดห้องประชุมเพื่อใช้แถลงข่าว โดยให้เจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัด ผู้ประสานงาน (MC) เป็นผู้ดูแลการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนประสานงานกับผู้สื่อข่าวและผู้แถลงข่าวในการรายงานถึงความคืบหน้าของสถานการณ์เป็นระยะ ๆ

10) การปฏิบัติกร่วมกับหน่วยงานภายนอก

หลังจากที่ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ได้ตัดสินใจว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ด้วยหน่วยงานใน GPSC แล้วก็จะสั่งการให้ผู้ประสานงาน (MC) ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งทีมช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งการของ GPSC ทั้งทีมดับเพลิง ทีมจราจรและปิดกั้น ทีมสนับสนุน และทีมปฐมพยาบาล ทั้งนี้ ประตูทางเข้า-ออกจะต้องไม่มีรถหรืออุปสรรคกีดขวางทางการจราจร

11) การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/ภายใน สามารถดำเนินการได้ 3 วิธีคือ

- โทรศัพท์
- วิทยู
- Intercom

(4) การอพยพ และแผนการอพยพ

ในภาวะฉุกเฉินที่มีความรุนแรงและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) สั่งการให้ทำการอพยพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามสถานที่เกิดเหตุดังนี้

1) กรณีเกิดไฟไหม้หรือระเบิด

ในภาวะฉุกเฉินที่มีความรุนแรงและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) สั่งการให้ทำการอพยพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องในโรงงาน ออกนอกพื้นที่โดยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) ในอาคารควบคุมการผลิตจะทำการประกาศแจ้งพนักงานให้มารวมตัวกันที่จุดรวมพลเพื่อรอการอพยพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(ก) การตรวจนับจำนวนพนักงาน (Head Count) ในแต่ละฝ่ายจะต้องมีตัวแทน รับผิดชอบในการตรวจนับยอดพนักงาน รวมถึง Contract Out หรือผู้มาติดต่อในความรับผิดชอบ แล้วรายงานผลการตรวจนับไปยัง Emergency Center

(ข) การอพยพและเส้นทางการอพยพ ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉินต้องประสานงานกับผู้บังคับการที่จุดเกิดเหตุ (OC) ในการพิจารณาถึงเส้นทางการอพยพ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารเป็นผู้จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการอพยพ

2) กรณีก๊าซพิษ (Toxic Gas) รั่วจากภายนอกและภายในโรงงาน

ในกรณีที่เกิดก๊าซพิษ (Toxic Gas) รั่วจากภายในโรงงาน หรือได้รับผลกระทบจาก ภายนอก ผู้ทำหน้าที่ผู้บังคับการที่จุดเกิดเหตุ (OC) ต้องประเมินสถานการณ์ถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานในบริษัทและแจ้งผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉินพิจารณาสั่งการ มีขั้นตอนดังนี้

(ก) ให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเข้าไปอยู่ภายในอาคาร ให้ทำการปิดประตูหน้าต่าง ช่องทางที่อากาศจากภายนอกสามารถเข้ามาได้ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีอยู่ หรือที่พนักงานดับเพลิงได้จัดมาให้ และทำการตรวจนับจำนวนพนักงาน (Head Count)

(ข) เมื่อเหตุการณ์รุนแรง และยืดเยื้อให้พิจารณาสั่งการอพยพพนักงานตามขั้นตอนการปฏิบัติ

(5) การยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

เมื่อภาวะฉุกเฉินได้สงบลงแล้วทีมดับเพลิง (Emergency Team : ET) จะเป็นผู้พิจารณาเสนอยกเลิกภาวะฉุกเฉินเป็นคนแรกแล้วรายงานให้ผู้บังคับการที่จุดเกิดเหตุ (OC) เมื่อผู้บังคับการที่จุดเกิดเหตุ (OC) ได้รับรายงานแล้วต้องพิจารณาอีกครั้งเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด แล้วแจ้งต่อผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ต่อไป ถ้าหากผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) เห็นว่าสถานการณ์เรียบร้อย จึงประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

ในส่วนผู้จัดการแผนปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) ที่อาคารควบคุมการผลิต (CCB) หลังจากได้รับคำสั่งยกเลิกภาวะฉุกเฉินจะประกาศทาง Public Address และผู้ประสานงาน (MC) ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินโดยทางระบบติดตามตัว

(6) การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว

ผู้มีอำนาจในการให้ข่าว GPSC มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้เท่านั้นที่มีหน้าที่ในการให้ข่าวหรือข้อมูลกับผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (PD) หรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงงานระยอง (ROV) หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกภาวะฉุกเฉิน (ED) สำหรับพนักงานอื่น ๆ จะสามารถให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกได้ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารได้ทำสรุปเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการตอบข้อซักถามจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารดูแลต้อนรับ สื่อมวลชนและพาไปยังห้องผู้สื่อข่าว อาคารสำนักงาน เมื่อสถานการณ์สงบและคลี่คลายแล้วจึงจะจัดให้มีการแถลงข่าวในห้องแถลงข่าว อาคารสำนักงาน ในลำดับต่อไป

(7) การเริ่มการผลิตหลังภาวะฉุกเฉิน และแผนฟื้นฟู

การจะเริ่มเดินเครื่องใหม่หลังภาวะฉุกเฉิน จะขึ้นอยู่กับความเสียหายของสถานที่เกิดเหตุ การทำความสะอาดโรงงาน การนำสิ่งของต่าง ๆ ออกจากโรงงาน การซ่อมแซม หรือเปลี่ยน เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือความต้องการที่จะสอบสวนพิสูจน์หลักฐาน การจะตัดสินใจเดินเครื่องใหม่ เป็นอำนาจของปฏิบัติการโรงงานระยอง (ROV) เมื่อได้รับข้อมูลและความเห็นจากผู้จัดการแผนปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) และวิศวกร

(8) การรายงานและการสอบสวน

การสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูนั้น จะมีด้วยกันหลายฝ่ายทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ซึ่งพอจะแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1) ภายนอก

- การสอบสวนของตำรวจ สภ.ต. บ้านฉาง
- การสอบสวนและตรวจสอบของบริษัทประกันภัย
- การสอบสวนและตรวจสอบของกองความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การสอบสวนและตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การสอบสวนและตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- การสอบสวนและตรวจสอบของสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- อื่น ๆ ที่อาจมี

2) ภายใน

- การจัดทำรายงาน "Plant Incident Report"
- การจัดทำรายงาน กรณีมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- การประเมินความสูญเสียเนื่องจาก "Business Interruption"

(9) แผนการฝึกอบรมและแผนการรณรงค์

1) แผนการฝึกอบรม

GPSC กำหนดหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเตรียมการรับสภาวะฉุกเฉินดังนี้

(ก) พนักงานที่ทำหน้าที่ดับเพลิงจะต้องได้รับการฝึกอบรม และทบทวนในแต่ละหัวข้อในหนึ่งปี ทั้งเรื่องทฤษฎีการเกิดไฟ การดับไฟ สารดับเพลิงชนิดต่าง ๆ แผนการดับเพลิง และเทคนิคต่าง ๆ จนถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยหายใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและจัดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ข) พนักงานอื่น ๆ ของ GPSC จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบความปลอดภัยใน GPSC และมีการทบทวนเนื้อหาและฝึกปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ค) ให้ QSHE Officer มีหน้าที่ประสานงานจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ง) ให้ QSHE Officer จัดการให้มีการอบรมด้านปฐมพยาบาลกับผู้ที่ทำหน้าที่ Rescue ในภาวะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2) แผนการรณรงค์

ให้ QSHE Officer ดำเนินการจัดทำแผนการรณรงค์เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น จัดทำ Lesson Learn, การจัดนิทรรศการ หรือดูงาน เป็นต้น

1.10.10 มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และการขนถ่ายสารเคมี

(1) แผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินจากการขนถ่ายสารเคมี

ในการควบคุมการขนถ่ายสารเคมีทางโครงการกำหนดเป็นระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการขนถ่ายสารเคมี ดังนี้

1) เมื่อรถขนส่งสารเคมีมาถึง GPSC พนักงานขับรถสารเคมีต้องติดต่อบริษัท ปรก. เป็นลำดับแรก เพื่อปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน

2) พนักงานความปลอดภัย ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(ก) ให้พนักงานขับรถขนส่งสารเคมีจอดรถด้านนอก GPSC โดยดูแลมิให้เกิดขวางการจราจร

(ข) ให้ติดต่อผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) ที่อาคารควบคุมการผลิต (CCB) เพื่อสอบถามและยืนยันความถูกต้องในการสั่งซื้อสารเคมี ดังนี้

ก) กรณีมีการสั่งซื้อสารเคมีจริง และสารเคมีที่จัดส่งนั้นถูกต้องตามการสั่งซื้อให้ Operator ออกมารับรถขนส่งสารเคมีเข้าไปยังบริเวณจุดขนถ่าย และดำเนินการตามข้อ (ค)

ข) กรณีไม่มีการสั่งซื้อ หรือมีการสั่งซื้อแต่มีการจัดส่งสารเคมีผิดประเภทให้พนักงานรักษาความปลอดภัย แจ้งพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีนำรถขนส่งสารเคมีกลับไป โดยที่จะไม่อนุญาตให้เข้ามาใน GPSC

(ค) Operator ตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพของสารเคมีจากผู้จัดจำหน่ายก่อนทำการขนถ่าย โดยดำเนินการดังนี้

ก) กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีเป็นไปตามที่กำหนด ให้ดำเนินการขนถ่ายสารเคมี โดยดำเนินการตามตั้งแต่ข้อ (ง)

ข) กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้หัวหน้ากะ (SS) พิจารณาในการตัดสินใจว่าจะรับสารเคมีนั้นไว้หรือไม่

- ถ้ารับให้ดำเนินการขนถ่ายสารเคมี โดยดำเนินการตามตั้งแต่ข้อ (ง)

- ถ้าไม่รับให้แจ้งพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีว่าจะไม่อนุญาตให้ขนถ่าย และให้นำรถขนส่งสารเคมีกลับออกไปจาก GPSC

(ง) การดำเนินการขนถ่ายสารเคมี

ก) Operator ดำเนินการ ดังนี้

- จัดเตรียมอุปกรณ์ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสารเคมีตามระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต

- จัดเตรียมด้านความปลอดภัย โดย

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการขนถ่ายสารเคมี

• ตรวจสอบความปลอดภัยตามแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการขน

ถ่ายสารเคมีโดยต้องปฏิบัติตามทุกข้อ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องมีการเตรียมมาตรการด้าน ความปลอดภัยอื่นทดแทน ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) ก่อน

ข) เมื่อมีการจัดเตรียมความปลอดภัยตามข้อ ก) เสร็จ ให้ Operator สื่อสารกับพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยต่าง ๆ และให้ operator และพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีลงชื่อในแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการขนถ่ายสารเคมีร่วมกัน

ค) เมื่อดำเนินการตามข้อ ก) และ ข) เสร็จ ให้เริ่มดำเนินการขนถ่ายสารเคมี

ง) เมื่อการขนถ่ายสารเคมีเสร็จสิ้นให้ Operator ดำเนินการหยุดการขนถ่ายสารเคมี แล้วแจ้งผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) และพนักงานรักษาความปลอดภัยทราบ

(จ) ให้พนักงานขับรถขนส่งสารเคมีนำรถขนส่งสารเคมีออกจากบริเวณจุดขนถ่าย และติดต่อป้อม รปภ. เพื่อปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในโรงงานก่อนออกนอก GPSC

(ฉ) เวลาที่อนุญาตให้มีการขนถ่ายสารเคมี คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-17.00 น. เท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการขนถ่ายสารเคมีตามเวลาที่กำหนดไว้นั้นให้ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) เป็นผู้พิจารณาถึงความจำเป็นในการขนถ่ายสารเคมี

3) แบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการขนถ่ายสารเคมี ให้จัดเก็บเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่มีการขนถ่ายสารเคมี โดยจัดเก็บไว้ที่อาคารควบคุมการผลิต (CCB) และให้ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิต (Shift Manager: SM) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ

4) การฝึกอบรม

เพื่อให้การดำเนินงานในการปฏิบัติงานการควบคุมการขนถ่ายสารเคมีเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้
ผู้เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรม และทบทวนความรู้เป็นประจำทุก ๆ 1 ปี โดยหลักสูตรที่อบรม มีดังนี้

- (ก) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
- (ข) การควบคุมการขนถ่ายสารเคมี
- (ค) การควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล


5) การทบทวนวิธีปฏิบัติงาน มีดังนี้

- (ก) การทบทวนตามระยะเวลาปกติ ดำเนินการทุก 1 ปี
- (ข) กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานต้องดำเนินการทบทวนทันที
- (ค) กรณีมีกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องออกมาบังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานต้อง
ดำเนินการทบทวนทันที
- (ง) กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานเห็นว่าต้องดำเนินการทบทวน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานมากขึ้น

แผนผังการควบคุมการขนถ่ายสารเคมีของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 1.10.10-1

(2) กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการขนถ่ายสารเคมี

- 1) ก่อนที่จะดำเนินการขนถ่ายสารเคมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสารเคมีจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย ได้แก่ หมวกนิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี กระบังหน้ากันสารเคมี แวนครอบตากันสารเคมี หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหยของ
สารเคมี รองเท้าบูทยางกันสารเคมี และถุงมือป้องกันสารเคมี
- 2) ตรวจสอบดูว่าท่อ ข้อต่อ สายยางขนถ่ายสารเคมี ถูกต้องตามชนิดของสารเคมีและอยู่ในสภาพปลอดภัย
พร้อมใช้งาน
- 3) ตรวจสอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างตัวฉุกเฉิน บริเวณจุดขนถ่ายสารเคมีให้พร้อมใช้งาน
- 4) จัดเตรียมเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่าย
สารเคมี
- 5) จัดเตรียมวัสดุป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี หรือวัสดุดูดซับสารเคมีให้พร้อมใช้งาน
- 6) จัดเตรียมสายยางน้ำ และต่อกับระบบน้ำให้พร้อมที่จะล้างทำความสะอาด เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือเกิดการรั่วไหลของสารเคมี
- 7) ติดตั้งป้ายเตือนและปิดกั้นบริเวณพื้นที่ขนถ่ายสารเคมี เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
- 8) ห้ามรับประทานอาหาร นอนหลับ และสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ขนถ่ายสารเคมี และขณะทำการขนถ่าย
สารเคมี

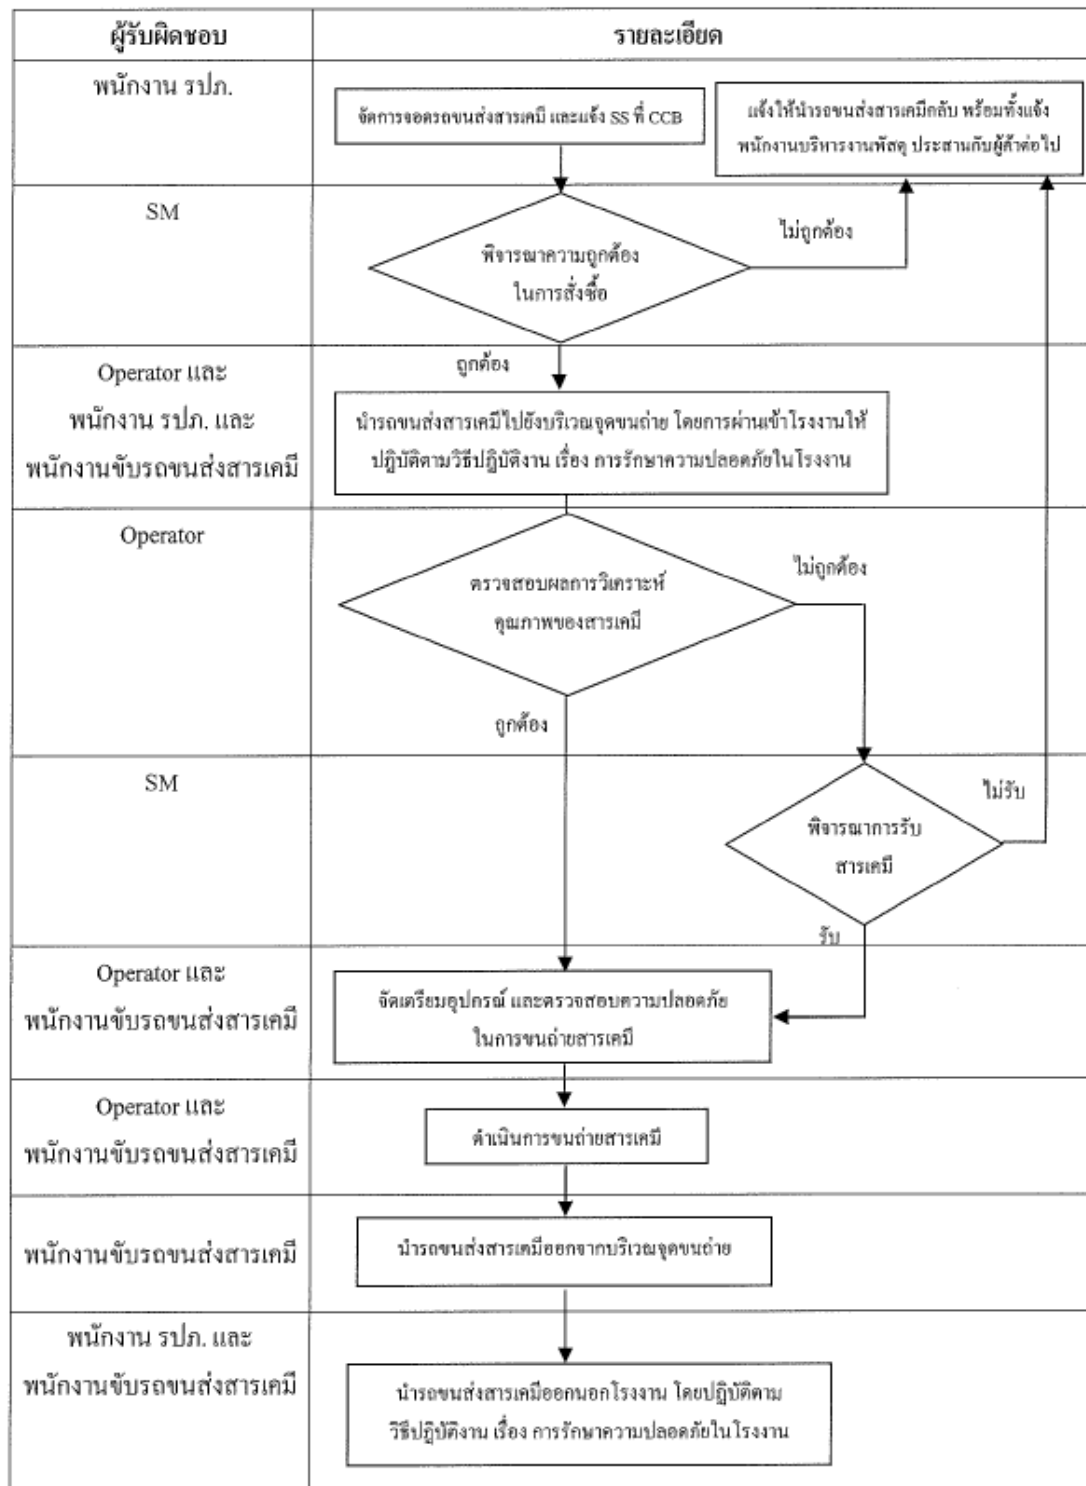

หมายเหตุ : CCB หมายถึง อาคารควบคุมการผลิต

SM หมายถึง ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิต

Operator หมายถึง พนักงานกะปฏิบัติการผลิต

รูปที่ 1.10.10-1 แผนผังการควบคุมการขนถ่ายสารเคมีของโครงการ

- 9) ถ้าไม่มีพนักงานฝ่ายผลิต GPSC ประจำการในบริเวณพื้นที่ขนถ่าย ห้ามทำการขนถ่ายโดยเด็ดขาด
- 10) ถ้าไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการขนถ่ายสารเคมีก่อนการขนถ่าย ห้ามทำการขนถ่ายโดยเด็ดขาด
- 11) ห้ามพนักงานขับรถขนส่งสารเคมี ขับรถขนส่งสารเคมีออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้และห้ามจอดรถในบริเวณอื่น ๆ ซึ่งมีใช้บริเวณสถานที่ที่จัดเก็บไว้ให้โดยเด็ดขาด
- 12) หลังจากทำการขนถ่ายสารเคมีเสร็จสิ้นพนักงานขับรถขนส่งสารเคมี และ พนักงานฝ่ายผลิต GPSC ต้องทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งอาจจะมีสารเคมีหกั่วไหล และตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีเหลือตกค้างในท่อ ข้อต่อ สายยางขนถ่ายสารเคมี

1.10.11 มาตรการในการกักเก็บและใช้งานแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ร้อยละ 25

(1) มาตรการในการเก็บรักษา/สถานที่เก็บ

- 1) เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
- 2) เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- 3) เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ

(2) มาตรการความปลอดภัยด้านถังเก็บ

- 1) ถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับถังเก็บ (Container Appurtenances) ต้องออกแบบให้สามารถทนแรงดันได้มากกว่าค่าความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition)
- 2) อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ร้อยละ 25 ต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- 3) บริเวณติดตั้งถังเก็บต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ (Fire Hazards) ในระยะที่เหมาะสม และถังเก็บควรตั้งอยู่ภายนอกอาคาร หรือหากตั้งในอาคารต้องมีการจัดเตรียมความเหมาะสมของพื้นที่ในการติดตั้งถังเก็บ
- 4) ถังเก็บต้องตั้งห่างจากบ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 50 ฟุต
- 5) บริเวณถังเก็บต้องดูแลไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟได้ (Ignitable Material) เช่น ขยะ เศษไม้ หรือหญ้าแห้ง ในบริเวณดังกล่าว
- 6) ติดตั้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Connection) ของถังเก็บทุกจุด (ยกเว้น Safety Relief Valve)
- 7) กักเก็บในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุทั้งหมดของถัง (ร้อยละ 15 เหลือไว้เพื่อการขยายตัว)
- 8) ถังเก็บออกแบบตามมาตรฐาน ASME “Boiler and Pressure Vessel Code”
- 9) จัดให้มีทางเข้าถึงถังเก็บอย่างสะดวก เพื่อใช้ในการเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 10) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการรั่วไหล (Ammonia Detector) บริเวณที่คาดว่าจะเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย เช่น บั้ม วาล์ว ข้อต่อ (Fitting)

(3) มาตรการความปลอดภัยบริเวณ Piping, Tubing และ Fitting

- 1) Piping, Tubing และ Fitting ทุกตัวต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- 2) Piping, Tubing และ Fitting ทุกตัว ต้องออกแบบให้สามารถทนแรงดันได้มากกว่า ค่าความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition)

(4) มาตรการด้านอุปกรณ์ป้องกันภัย

- 1) จัดให้มี Full Face Gas Mask อย่างน้อย 2 ชุด ในบริเวณตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
- 2) จัดให้มี Shower ติดตั้งไว้ในบริเวณถึงเก็บในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย
- 3) จัดให้มี Full Face Mask ไว้ในรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง

(5) มาตรการด้านการสูบล้าง

- 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการอบรม ดูแลตลอดระยะเวลาที่มีการสูบล้าง
- 2) การสูบล้างจะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
- 3) จัดให้มีวิธีปฏิบัติ (Procedure) ในการสูบล้าง
- 4) การสูบล้างต้องปฏิบัติในบริเวณพื้นที่ที่จัดไว้เหมาะสม
- 5) ปั๊ม (Pump) ที่ใช้ในการสูบล้าง ต้องมีความเหมาะสมกับแอมโมเนีย-ไฮดรอกไซด์เหลว ความเข้มข้นร้อยละ 25
- 6) ติดตั้ง Shut-off Valve ในบริเวณ Pump Connection
- 7) ติดป้ายเตือน (Caution Signs) ที่รถบรรทุก เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ขณะทำการ
- 8) ในกรณีพื้นที่ต่างระดับ ให้สอดหมอนหนุนป้องกันการเลื่อนไถลของรถ
- 9) ใส่เบรกและล็อคล้อรถบรรทุกก่อนทำการขนถ่าย
- 10) ป้องกันไม่ให้เกิดแรงกระแทกหรือความเสียหาย (Physical Damage) ต่อวาล์ว (Valve) เครื่องมือวัด (Regulating, Gaging) และอุปกรณ์อื่น ๆ ระหว่างการสูบล้าง

(6) มาตรการด้านการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน

- 1) จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เหลวร้อยละ 25 รั่วไหล
- 2) จัดให้มี Self-Contained Breathing Apparatus ไว้ใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉิน
- 3) จัดให้มีชุดป้องกันสารเคมี (Chemical Protective Clothing) ที่เหมาะสมไว้ใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉิน
- 4) จัดให้มีการระงับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
 - (ก)เพลิงไหม้ขนาดเล็ก (Small Fire)
 - ระงับเหตุด้วยเครื่องดับเพลิงชนิด Dry Chemical หรือ CO

(ข)เพลิงไหม้ขนาดใหญ่ (Large Fire)

- อพยพคนออกจากบริเวณเพลิงไหม้ อย่าเข้าไปบริเวณเพลิงไหม้โดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกัน
- ระวังเหตุด้วยการฉีดน้ำ (Water Spray) หมอกน้ำ (Fog) หรือโฟม (Regular Foam)
- ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ใกล้ถังเก็บ ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นถังจนกว่าเพลิงจะสงบ
- ห้ามฉีดน้ำโดยตรงไปยังตำแหน่งที่เกิดการรั่วไหล

(ค) การหก หรือรั่วไหล (Spill or Leak)

- อพยพผู้คนออกจากบริเวณอันตรายทันที
- สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี และ SCBA ก่อนเข้าระงับเหตุ
- ย้ายแหล่งที่มีความร้อนหรือประกายไฟออกให้หมด
- ห้ามเดินหรือสัมผัสกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลวร้อยละ 25 ที่หกรั่วไหล
- หยุดการรั่วไหล (Stop Leak) ถ้าทำได้ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยง
- จำกัด (Isolate) บริเวณที่เกิดรั่วไหล ป้องกันไม่ให้รั่วไหลลงทางน้ำ รางระบายน้ำ หรือพื้นที่อื่น

อากาศ (Confine Space)

- ห้ามฉีดน้ำโดยตรงไปยังตำแหน่งที่เกิดการรั่วไหลของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลวร้อยละ 25
- ฉีดละอองน้ำเพื่อจับไอระเหยของแอมโมเนีย และหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำไหลไปรวมกับแอมโมเนีย

ที่หกรั่วไหล

- ปิดกั้นพื้นที่จนกว่าไอระเหยจะเจือจางจนอยู่ในระดับปลอดภัย

1.10.12 มาตรการเกี่ยวกับการขนส่งและการใช้งานก๊าซธรรมชาติ

(1) จัดให้มีสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งมีการระบายอากาศได้ดี

(2) มาตรการลดความเสี่ยงกรณีว่าล่วควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ ทำงานล้มเหลว และในกรณีท่อรั่วไหล

(ก) ทำการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงหลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการแล้วเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม

- การเฝ้าระวังและตรวจสอบความผิดปกติของแนวท่อขนส่ง
- การบำรุงรักษาตามแผนงาน

(ข) การป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณสถานีควบคุม (Gas Metering Station)

- ล้อมรั้วโดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- มีระบบท่อและระบบวาล์วสำรองกรณีท่อหลักขัดข้อง
- ติดตั้งท่อระบายก๊าซที่ค้างในเส้นท่อออกสู่บรรยากาศกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการตรวจตราแนวท่อและสถานีควบคุมเป็นประจำทุกสัปดาห์

(ค) จัดให้มีแผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน อันอาจก่อให้เกิดอันตรายบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้ ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.10.13 มาตรการเกี่ยวกับการใช้งานหม้อน้ำ

(1) ด้านการออกแบบและการดำเนินการช่วงดำเนินการของหม้อน้ำ

1) ด้านวิศวกรรม

- หม้อน้ำทำการออกแบบตามมาตรฐาน American Society of Mechanical Engineers (ASME)
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ
- ติดตั้งลิ้นนิรภัย (Safety Valve)
- ติดตั้งอุปกรณ์แสดงระดับน้ำ เช่น หลอดแก้วแท่งแก้วแถบแม่เหล็ก เป็นต้น
- ติดตั้งลิ้นกันกลับ (Check Valve หรือ Non Return Valve)
- ติดตั้งมาตรวัดความดันไอน้ำ (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge)
- ติดตั้งลิ้นระบายได้หม้อน้ำ (Blow down Valve)
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ติดตั้งลิ้นจ่ายไอน้ำ
- ติดตั้งเครื่องควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ
- ติดตั้งสวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Switch)
- ติดตั้งมาตรวัดอุณหภูมิปลายปล่อง
- ติดตั้งบันไดและทางเดินบริเวณหม้อน้ำ

2) ด้านการจัดการ

- ตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
- ทำการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดยการควบคุมของวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร

- ใช้ระบบ DCS ในการควบคุมการทำงานของหม้อน้ำ ในกรณีที่ระบบควบคุมการทำงานมีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจากระดับน้ำในหม้อน้ำสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดหรือแรงดันไอน้ำสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดจะตัดระบบเชื้อเพลิงและหยุดระบบหม้อน้ำทันที

(2) การดูแลหม้อน้ำ

- 1) จัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ำ
- 2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ำตามหลักเกณฑ์

และวิธีการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3) จัดให้มีการตรวจสอบหม้อน้ำโดยวิศวกรตรวจสอบหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

4) จัดให้มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบหม้อน้ำ การตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการใช้งานตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดและจัดส่งให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

5) ทำการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อน้ำและในระบบหม้อน้ำตามความถี่ที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำให้เหมาะสม ต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องกันการกัดกร่อนหรือตะกอนของหม้อน้ำ

- 6) จัดทำแผนงานการตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและดำเนินการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด
- 7) จัดทำระเบียบการควบคุมหม้อน้ำและจัดฝึกอบรมพนักงานควบคุม
- 8) ทำการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) การซ่อมแซมหม้อน้ำ

- 1) จัดให้มีวิศวกรควบคุมการซ่อมแซมหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ ควบคุมดูแลการซ่อมแซมหรือดัดแปลงหม้อน้ำที่อาจมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของหม้อน้ำและความปลอดภัยในการใช้งาน
- 2) ภายหลังการซ่อมแซมหรือดัดแปลงหม้อน้ำที่อาจมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของหม้อน้ำและความปลอดภัยในการใช้งาน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหรือวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ
- 3) จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซม ดัดแปลงและผลการตรวจสอบหลังการซ่อมแซมและดัดแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของหม้อน้ำ และความปลอดภัยในการใช้งานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน หลังจากซ่อมแซมและดัดแปลงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.11 พื้นที่สีเขียว

โครงการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 2,880 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.02 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยจะจัดเป็นพื้นที่สนามหญ้า และทำการปลูกต้นไม้ตามแนวรอบพื้นที่โครงการ พันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย โอศกอินเดีย ลีลาวดี และแทรกด้วยไม้พุ่ม

1.12 อุตสาหกรรมสีเขียว

โครงการมีเป้าหมายในการดำเนินกิจการเพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 (GI3) ซึ่งหมายถึง โครงการมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

ปัจจุบันโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Complex) ปัจจุบันได้อนุญาตให้บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอนุญาต ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้รับทราบการดำเนินการทุก 6 เดือน โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สํารวจพื้นที่ และภาพถ่าย ซึ่งใช้ประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาผนวกไว้ร่วมกับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการฉบับนี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2569 ดังภาพถ่ายที่ 2.1-1

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงดังตารางที่ 2.2-1



ภาพถ่ายที่ 2.1-1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

☒ โครงการพลังงาน

สถานะโครงการ: กำลังการผลิตสูงสุดในปัจจุบัน กระแสไฟฟ้า 57.00 เมกกะวัตต์ ใช้น้ำ 151 ตัน/ชั่วโมง ใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 210 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
กำลังการผลิตสูงสุดตาม EIA กระแสไฟฟ้า 392.01 เมกกะวัตต์ ใช้น้ำ 900 ตัน/ชั่วโมง ใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 560 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
การดำเนินงาน: ☒ อัตราการผลิตอัตราปกติ กระแสไฟฟ้า 49.57 เมกกะวัตต์ ใช้น้ำ 71.04 ตัน/ชั่วโมง ใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 83.46 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ของโครงการ ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โครงการ	- โครงการนำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	เอกสารแนบที่ 1 สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
- นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ	พื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีการนำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	-	เอกสารแนบที่ 2 ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การอบรมและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาด้าน SSHE
- คัดเลือกบริษัทรับเหมาโดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบุเป็นข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่ได้รับคัดเลือกในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ	พื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โดยโครงการมีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของบริษัทผู้รับเหมา และมีการกำหนดเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ครอบคลุมกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการในสัญญาว่าจ้างทุกครั้ง	-	

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ) - จัดให้มีระเบียบควบคุมและประเมินบริษัทรับเหมาและ ผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่	พื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีกฎระเบียบในการควบคุมบริษัทรับเหมา และมีการประเมินผู้รับเหมาเป็นประจำในช่วงที่เข้ามา ทำงานในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีการฝึกอบรมและ ประเมินความรู้ผู้รับเหมาหลังการอบรม ผู้รับเหมาที่ผ่าน การประเมินจะจัดทำบัตรประจำตัวผู้รับเหมาตามระเบียบ การปฏิบัติงาน เรื่อง การอบรมและการควบคุมการทำงาน ของผู้รับเหมาด้าน SSHE โดยมีอายุบัตร 1 ปี นับจากวันที่ ผ่านการฝึกอบรมด้าน SSHE	-	เอกสารแนบที่ 2 ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การอบรมและการควบคุมการ ทำงานของผู้รับเหมาด้าน SSHE
- หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็น แนวโน้มปัญหา โครงการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการต้องแจ้งสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัด ระยองทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว	พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบและปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด และจากผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และส่วนใหญ่มีแนวโน้ม ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จึงกล่าวได้ว่าการ ดำเนินการของโครงการ ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับต่ำ - ในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา ซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางโครงการจะแจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	-	ภาคผนวก ก ผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ) - ในกรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ *หากหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานผู้รับอนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ	พื้นที่โครงการ	- กรณีที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ทางโครงการจะมีการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตก่อนดำเนินการทุกครั้ง โดยทางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และล่าสุดทางโครงการได้ขอแก้ไขมาตรการโดยขอแก้ข้อความที่ระบุในมาตรการจากนายอำเภอเมืองระยอง เป็นนายอำเภอบ้านฉาง และขอแก้ไขจำนวนคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นที่ระบุไม่สอดคล้องกัน โดยขอแก้ไขจากเดิมที่ระบุ 8 คน เป็น 7 คน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กกพ. ตามหนังสือเลขที่ สกพ 5502/8149 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และมีมติรับทราบจากสผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/10639 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563	-	เอกสารแนบที่ 1 สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ) - หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องและห่วงใยของชุมชน ต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที	พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ซึ่งการดำเนินการปัจจุบันของโครงการ พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีประเด็นปัญหา และข้อขัดข้องของชุมชนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตพบปัญหาเกิดขึ้นกับชุมชน ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วตามที่มาตรการกำหนด เพื่อลดความขัดแย้งของชุมชนกับการโครงการ อีกทั้ง ทางโครงการยังมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับฟังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น -โครงการจัดทำความคิดเห็นชุมชน เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม พ.ศ.2568 พบว่า จากการสำรวจความพึงพอใจต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ พบว่า จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มหน่วยงานราชการระบุว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวระบุว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 52.9 รองลงมา ระบุว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 47.1 กลุ่มผู้นำชุมชน (ระยะ 0-3 กิโลเมตร) ส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 43.6 รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 38.5 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 17.9	-	เอกสารแนบที่ 3 แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน เอกสารแนบที่ 4 เอกสารรับรองเรื่องไม่มีข้อร้องเรียน เอกสารแนบที่ 46 รายงานการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ คิดเห็นของประชาชนผู้นำ ชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสภาพการ เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องและห่วงใยของชุมชน ต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที	พื้นที่โครงการ	กลุ่มผู้นำชุมชน (ระยะมากกว่า 3-5 กิโลเมตร) ส่วนใหญ่ ระบุว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 51.0 รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 27.5 และ พึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 21.5 กลุ่มครัวเรือน (ระยะ 0-3 กิโลเมตร) ส่วนใหญ่ระบุว่า มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ร้อยละ 74.0 รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับ มาก ร้อยละ 19.3 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 6.7 และกลุ่มครัวเรือน (ระยะมากกว่า 3-5 กิโลเมตร) ส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ที่สุด ร้อยละ 55.3 รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 30.2 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 11.3 และมีความพึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ 3.2 สำหรับความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการ พบว่าจากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ใน กลุ่มหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ระบุว่าเชื่อมั่นสูง ร้อยละ 66.7 รองลงมา เชื่อมั่นพอสมควร (หากมีปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมหรืออุบัติเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทันที) ร้อยละ 33.3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวส่วนใหญ่ระบุว่าเชื่อมั่น พอสมควร		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องและห่วงใยของชุมชน ต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที	พื้นที่โครงการ	(หากมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติเหตุสามารถแก้ไข หรือควบคุมได้ทันที) ร้อยละ 58.8 รองลงมาเชื่อมั่นสูง ร้อย ละ 41.2 กลุ่มผู้นำชุมชน (ระยะ 0-3 กิโลเมตร) ระบุว่า เชื่อมั่นพอสมควร (หากมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ อุบัติเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทันที) ร้อยละ 100 กลุ่ม ผู้นำชุมชน (ระยะมากกว่า 3-5 กิโลเมตร) ระบุว่าเชื่อมั่น พอสมควร (หากมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติเหตุ สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทันที) ร้อยละ 100 กลุ่ม ครัวเรือน (ระยะ 0-3 กิโลเมตร) ส่วนใหญ่ ระบุว่าเชื่อมั่น พอสมควร (หากมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติเหตุ สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทันที) ร้อยละ 67.4 รองลงมา เชื่อมั่นสูง ร้อยละ 32.6 และกลุ่มครัวเรือน (ระยะมากกว่า 3-5 กิโลเมตร) ส่วนใหญ่ ระบุว่า เชื่อมั่นพอสมควร (หากมี ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติเหตุสามารถแก้ไขหรือ ควบคุมได้ทันที) ร้อยละ 65.5 รองลงมาเชื่อมั่นสูง ร้อยละ 34.5 - โครงการได้มีการทำหนังสือขอหารือประเด็นข้อร้องเรียน ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียน		

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ) - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ต้อง เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัด ระยอง โดยให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบ ทุก 6 เดือน	พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้สำนักงาน กกพ. และ กนอ. พร้อมทั้งจัดทำสำเนาเพื่อจัดส่งรายงานให้ สผ. และจังหวัดระยอง เพื่อหน่วยงานที่ให้การอนุญาตนำส่ง ต่อไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำ เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยล่าสุด จัดส่งรายงานฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569	-	เอกสารแนบที่ 5 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2568
- เมื่อโครงการดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทาง อากาศข้างต้นมีค่าที่ต่ำกว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว	พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการเปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว แต่การผลิตยังไม่เต็มกำลัง และมีสภาพการผลิตไม่คงตัว ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคง ตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทาง อากาศข้างต้น มีค่าต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ ทางโครงการจะ พิจารณาใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยเร็ว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ 1.1 การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศ (1) ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศของหน่วยผลิตไอน้ำทุกปล่องไม่ให้เกิดการระบายมลพิษโดยรวมที่ได้รับการจัดสรรอัตราการระบายมลพิษเป็นกลุ่มพื้นที่ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยแต่ละปล่องมีอัตราการระบายมลพิษ ดังนี้ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่าไม่เกิน 26.58 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 3 กรัม/วินาที - ฝุ่นละออง (TSP) มีค่าไม่เกิน 7.108 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 0.416 กรัมต่อวินาที - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่าไม่เกิน 1.66 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 0.255 กรัมต่อวินาที สำหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษดังกล่าวข้างต้นอ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) ร้อยละ 7	ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำชุดที่ 1-6 (HRSG#1-6)	- โครงการทำการตรวจวัด NO_x, TSP และ SO_2 จากปล่องของหน่วยผลิตที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ ปล่อง HRSGs 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ * HRSGs 1 (16 มี.ค. 69) NO_x @7%O_2= 20.27 ppm และ 2.166 g/sec TSP @7%O_2= 1.17 mg/Nm^3 และ 0.067 g/sec SO_2 @7%O_2= 0.81 ppm และ 0.120 g/sec สำหรับปล่อง HRSG#2-6 อยู่ในแผนการพัฒนาโครงการในอนาคต	-	ภาคผนวก ก ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ) (2) ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) โดย ติดตั้งระบบเผาไหม้แบบ Dry Low NO _x Combustor ของ เครื่องกังหันก๊าซทุกเครื่อง และระบบ SCR เพื่อควบคุม ปริมาณ NO ₂ ที่ระบายออกมา	เครื่องกังหันก๊าซ	- โครงการจัดให้มีระบบเผาไหม้แบบ Dry Low NO _x Combustor ของเครื่องกังหันก๊าซ และระบบ SCR ของ ปล่อง HRSGs 1 เพื่อควบคุมปริมาณ NO ₂ จากการ ดำเนินการของโครงการเรียบร้อยแล้ว สำหรับปล่อง HRSG#2-6 อยู่ในแผนการพัฒนาโครงการในอนาคต	-	เอกสารแนบที่ 6 แผนตรวจสอบและบำรุงรักษา เชิงป้องกัน เอกสารแนบที่ 7 ตัวอย่างผลการตรวจสอบและ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาพที่ 2.2-1 ปล่อง HRSGs
(3) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่าง ต่อเนื่อง (CEMS : Continuous Emission Monitoring System) ทุกปล่อง โดยตรวจวัด NO _x , SO ₂ , TSP, O ₂ และ CO	ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้ง 6 ปล่อง	- โครงการทำการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของหน่วยผลิตที่เปิด ดำเนินการแล้ว ได้แก่ ปล่อง HRSGs 1 เรียบร้อยแล้ว และ มีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) - นอกจากนี้โครงการมีการเชื่อมโยงสัญญาณต่อข้อมูลไปยัง ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMs) ตามที่กฎหมายกำหนด	-	เอกสารแนบที่ 50 ตัวอย่างผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศจาก ปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) เอกสารแนบที่ 51 สำเนาขอความอนุเคราะห์ เชื่อมโยงอัตราการระบาย มลพิษผ่านระบบ CEMS

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)		NO_x มีค่าอยู่ในช่วง 0-22.58 ppm SO₂ มีค่าอยู่ในช่วง 0-1.6 ppm TSP มีค่าอยู่ในช่วง 0-3.50 mg/m³ O₂ มีค่าอยู่ในช่วง 12.68-20.89% CO มีค่าอยู่ในช่วง 0-100 ppm		ภาพที่ 2.2-2 ระบบ CEMS ของปล่อง HRSGs 1 ภาพที่ 2.2-51 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อ ข้อมูลไปยังศูนย์เฝ้าระวังและ ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ภาพที่ 2.2-52 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อข้อมูล ไปยังระบบเฝ้าระวังและเตือน ภัยมลพิษระยะไกล (POMs)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง						
1.1 การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศ (ต่อ) (4) ติดตั้งระบบการเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเป็น 2 ระดับ 1)เมื่อความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) เท่ากับร้อยละ 90 ของค่าควบคุม เจ้าหน้าที่ต้องทำการวิเคราะห์สาเหตุและควบคุม แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังค่าการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ไม่ให้เกินค่าควบคุม 2)เมื่อค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) เท่ากับร้อยละ 95 ของค่าควบคุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลดกำลังการผลิต เพื่อควบคุมค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ไม่ให้เกินค่าควบคุมมาตรฐาน	ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้ง 6 ปล่อง	- โครงการทำการติดตั้งระบบการเตือน (Alarm) ของหน่วยผลิตที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ ปล่อง HRSGs 1 เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ไว้ 2 ระดับ ได้แก่ เท่ากับร้อยละ 90 ของค่าควบคุม และเท่ากับร้อยละ 95 ของค่าควบคุม เรียบร้อยแล้วดังนี้ <table><tr><th>ปล่อง</th><th>ค่าเตือนที่ร้อยละ 90</th><th>ค่าเตือนที่ร้อยละ 95</th></tr><tr><td>HRSG#1</td><td>23.92</td><td>25.25</td></tr></table> - สำหรับปล่อง HRSG#2-6 อยู่ในแผนการพัฒนาโครงการในอนาคต - หากโครงการพบค่าสูงเกินกว่าระดับ Warning กำหนดไว้ทางโครงการจะทำการตรวจสอบตามขั้นตอน ดังนี้ • ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำการตรวจสอบแนวโน้มของ NO_x และ O₂ ที่อ่านได้จาก CEMs โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นผิดจากการตรวจวัดหรือไม่	ปล่อง	ค่าเตือนที่ร้อยละ 90	ค่าเตือนที่ร้อยละ 95	HRSG#1	23.92	25.25	-	เอกสารแนบที่ 8 บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงเกินกว่าระดับ Warning และระดับ Alarm ภาพที่ 2.2-3 การติดตั้งระบบการเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
ปล่อง	ค่าเตือนที่ร้อยละ 90	ค่าเตือนที่ร้อยละ 95								
HRSG#1	23.92	25.25								

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)		- ติดต่อกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรณีคุณภาพก๊าซมี ปัญหา ผ่านทางสายด่วน (Hot Line) ตรวจสอบระบบ บำบัดมลพิษทางอากาศ หากพบว่าผิดปกติ ทางโครงการ จะดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CEMs หากพบ ความผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMs Fails/Error ทางโครงการจะดำเนินการหาสาเหตุและ วิธีการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ทางโครงการจะเรียก CEMs Service Provider เพื่อมาทำการแก้ไข โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ยังไม่พบว่ามีค่าสูงเกินกว่าระดับสัญญาณเตือนไว้		
(5) กำหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ SCR เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ระบบ SCR ชัดข้องและไม่สามารถ ทำงานได้	ระบบ SCR	- โครงการกำหนดให้มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง ระบบ SCR เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ระบบ SCR ชัดเจนและไม่สามารถทำงานได้	-	เอกสารแนบที่ 6 แผนตรวจสอบและบำรุง รักษา เชิงป้องกัน
(6) กรณีที่เกิดปัญหา SCR ชัดข้อง และไม่สามารถแก้ไขปัญหา ระบบ SCR ได้ในทุกกรณี โครงการจะหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) เพื่อทำการแก้ไขระบบดังกล่าวตามความ เหมาะสมต่อไป	ระบบ SCR	- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบปัญหา SCR ชัดข้อง	-	เอกสารแนบที่ 7 ตัวอย่างผลการตรวจสอบและ บำรุง รักษาเชิงป้องกัน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 การจัดการมลพิษทางอากาศ (1) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMS ไม่ให้เกินค่าควบคุมดังนี้ - ให้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบ เช่น แนวโน้มของมลสารที่อ่านได้จาก CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นผิดจากการตรวจวัดหรือไม่ - ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีสภาพปกติ - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CEMS ถ้าพบความผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMS Fails/Error ให้หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ให้เรียก CEMS Service Provider มาทำการแก้ไข - ตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อมบำรุงแล้วพบว่า ยังมีค่าสูงอยู่ให้ทำการลดกำลังการผลิตโดยทดสอบการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟฟ้าดังนี้ • ทดสอบโดยการลดกำลังการผลิตของเครื่องกังหันก๊าซ แล้วดูว่าค่าความเข้มข้นของมลสารลดลงหรือไม่ • กรณีเดินโหลดเครื่องกังหันก๊าซต่ำแล้วพบว่าความเข้มข้นของมลสารสูงให้ทดลองเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องกังหันก๊าซ	ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (CEMS)	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMS ไม่ให้เกินค่าควบคุม ได้แก่ ตรวจสอบแนวโน้มความผิดปกติของมลสารที่อ่านได้จาก CEMS ตรวจสอบการทำงานของระบบ CEMS และตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อมบำรุง เพื่อไม่ให้มีค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศสูง - หากโครงการพบค่าสูงเกินกว่าระดับ Warning กำหนดไว้ทางโครงการจะทำการตรวจสอบตามขั้นตอน ดังนี้ • ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น - ทำการตรวจสอบแนวโน้มของ NO _x และ O ₂ ที่อ่านได้จาก CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นผิดจากการตรวจวัดหรือไม่ • ติดต่อกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรณีคุณภาพก๊าซมีปัญหา ผ่านทางสายด่วน (Hot Line) ตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ หากพบว่าผิดปกติ ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที	-	เอกสารแนบที่ 8 บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าระดับ Warning และระดับ Alarm เอกสารแนบที่ 50 ตัวอย่างผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ภาพที่ 2.2-3 การติดตั้งระบบการเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) เอกสารแนบที่ 8 บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าระดับ Warning และระดับ Alarm เอกสารแนบที่ 50 ตัวอย่างผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 การจัดการมลพิษทางอากาศ (ต่อ) กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้แจ้งผู้มีอำนาจตัดสินใจ Shutdown เพื่อทำการแก้ไขระบบการเผาไหม้ หรือระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ตามความเหมาะสมต่อไป		ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CEMs หากพบความผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMs Fails/Error ทางโครงการจะดำเนินการหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ทางโครงการจะเรียก CEMs Service Provider เพื่อมาทำการแก้ไข โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ยังไม่พบว่ามีค่าสูงเกินกว่าระดับสัญญาณเตือนไว้		ภาพที่ 2.2-3 การติดตั้งระบบการเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
(2) บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง (ไม่รวมช่วง Start Up และ Shut Down) โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่ดำเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง	ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- โครงการได้ทำการบันทึกสถิติที่ CEMS ทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่ดำเนินการแต่ละครั้ง ที่พบว่าค่า NOx มีค่าสูงเกินค่าควบคุม ทางโครงการจะทำการตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ยังไม่พบว่ามีค่าสูงเกินกว่าระดับสัญญาณเตือนไว้	-	
(3) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ	ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ ตามหนังสือที่ อก 0313/4492	-	เอกสารแนบที่ 9 สำเนาหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 การจัดการมลพิษทางอากาศ (ต่อ) (4) กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที	ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์และอะไหล่สำรองสำหรับงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของโครงการรวมถึงระบบบำบัดมลพิษต่าง ๆ แล้ว	-	ภาพที่ 2.2-4 อุปกรณ์และอะไหล่สำรอง ของระบบบำบัดมลพิษ ทางอากาศ
(5) กำหนดแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ	ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	- โครงการได้กำหนดให้มีแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ	-	เอกสารแนบที่ 6 แผนตรวจสอบและบำรุง รักษาเชิงป้องกัน เอกสารแนบที่ 7 ตัวอย่างผลการตรวจสอบและ บำรุง รักษาเชิงป้องกัน
(6) ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS มีความถูกต้องแม่นยำ โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ U.S.EPA หรือวิธีที่หน่วยงานราชการกำหนด แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ - System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะการทบทวน (Review) และตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) การทำงานของ CEMS	CEMS	- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ System Audit ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และ Performance Audit โดยตรวจสอบความถูกต้องฯ ของ ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ก๊าซออกซิเจน (O ₂) ในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผลการทดสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามข้อกำหนด ซึ่งทางโครงการได้จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้วตั้งเอกสารอ้างอิง	-	เอกสารแนบที่ 10 ผลตรวจสอบความถูกต้อง ของการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) และ Action plan

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 การจัดการมลพิษทางอากาศ (ต่อ) - Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ของการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมิน ความสามารถเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัด NO _x , SO ₂ , TSP, CO และ O ₂ จาก CEMS เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการ เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง โดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานใน เวลาเดียวกันจากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า Relative Accuracy และนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ กำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง				
2. คุณภาพน้ำ (1) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นโครงการ จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการของนิคมฯ เอเชีย และประกาศ กอ. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ ระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคม อุตสาหกรรม	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก โครงการให้เป็นไปตามมาตรการของนิคมฯ เอเชีย และ ประกาศ กอ. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบาย น้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด	-	เอกสารแนบที่ 11 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการ ระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียส่วนกลางใน นิคมอุตสาหกรรม
(2) จัดให้มีถังปรับสภาพน้ำ (Neutralization Tank) เพื่อบำบัด น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน การล้างทำความสะอาดพื้น/ อุปกรณ์ จากหน่วยผลิตไอน้ำ (น้ำ Blowdown) และจาก หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำคอนเดนเสท ก่อนปล่อยออกจาก โครงการ	ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ	- มีการติดตั้งถังปรับสภาพน้ำ (Neutralization Tank) เพื่ บำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน การล้างทำความสะอาด พื้น/อุปกรณ์ จากหน่วยผลิตไอน้ำ (น้ำ Blowdown) และ จากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำคอนเดนเสท เรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2.2-5 ถังปรับสภาพน้ำ (Neutralization Tank)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) (3) จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำที่อาจจะปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัด ขั้นต้นยังถึงแยกน้ำมัน (Oil-Water Separator)	ภายในพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำที่อาจจะปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัด ขั้นต้นยังถึงแยกน้ำมัน (Oil-Water Separator) เรียบร้อย แล้ว	-	ภาพที่ 2.2-6 ระบบรวบรวมน้ำที่อาจ ปนเปื้อนน้ำมัน ภาพที่ 2.2-7 ถังแยกน้ำมัน (Oil-Water Separator)
(4) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ที่บ่อตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนเข้าบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมฯ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็น กรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า	บ่อตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้ง	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-	ภาพที่ 2.2-8 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ แบบอัตโนมัติ ภาพที่ 2.2-9 บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร
(5) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ที่บ่อตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อน เข้าบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ให้อยู่ ในมาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งส่วนที่ 2 (Holding Pond #2) ของนิคมฯ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็น กรด-ด่าง, อุณหภูมิ และค่าการนำไฟฟ้า	บ่อตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้ง	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-	เอกสารแนบที่ 12 ตัวอย่างบันทึกผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ภาพที่ 2.2-8 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ แบบอัตโนมัติ ภาพที่ 2.2-10 บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) (6) ควบคุมคุณภาพน้ำทั้งในส่วนที่ระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมฯ ในกรณีที่น้ำทิ้งที่ผ่านระบบปรับค่าพีเอช แต่ยังมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โครงการจะ ระบายน้ำส่วนที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ไปยังบ่อกักน้ำฉุกเฉิน ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบบำบัดซ้ำอีกครั้ง	บ่อกักน้ำฉุกเฉิน	- คุณภาพน้ำทั้งในส่วนที่ระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมฯ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตคุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด จะระบายน้ำไปยังบ่อกักน้ำฉุกเฉินขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบบำบัดซ้ำอีกครั้ง	-	ภาพที่ 2.2-11 บ่อกักน้ำฉุกเฉินขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร
(7) ควบคุมคุณภาพน้ำทั้งในส่วนที่ระบายเข้าบ่อกักน้ำทั้งส่วนที่ 2 (Holding Pond #2) ภายในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของนิคมฯ ในกรณีที่คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะระบายน้ำส่วนนี้เข้าสู่บ่อกักน้ำฉุกเฉินขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรอการนำไปบำบัดที่ระบบปรับค่า พีเอชของโครงการหรือส่งไปดำเนินการภายนอกโดย หน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต	บ่อกักน้ำฉุกเฉิน	- คุณภาพน้ำทั้งในส่วนที่ระบายเข้าบ่อกักน้ำ Holding Pond #2 ของนิคมฯ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไร ก็ตาม หากในอนาคตคุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด จะระบายน้ำไปยังบ่อกักน้ำฉุกเฉินขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบบำบัดซ้ำอีกครั้ง หรือส่งไป ดำเนินการภายนอกโดยหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต	-	ภาพที่ 2.2-12 บ่อกักน้ำฉุกเฉินขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร
3. เสียง (1) จัดทำ Noise contour บริเวณพื้นที่โครงการ ภายหลังเปิด ดำเนินการแล้วภายในปีแรก และดำเนินการซ้ำทุก 3 ปี	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำ Noise contour บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งตรวจวัดล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2568	-	รูปที่ 2-1 แผนผัง Noise contour
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงดัง เช่น Silencer เพื่อลดระดับเสียงขณะระบายความดันไอน้ำส่วนเกิน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มี Silencer ที่อุปกรณ์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด เสียงดังแล้ว	-	ภาพที่ 2.2-13 Silencer

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ) (3) จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ)	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) แล้ว	-	ภาพที่ 2.2-14 ป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ)
(4) ให้พนักงานทำงานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้พนักงานทำงานในห้องควบคุม (Control Room) ที่สามารถป้องกันเสียงดังเพื่อใช้ปฏิบัติงานควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์	-	ภาพที่ 2.2-15 Control Room
(5) การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) พนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน	ภายในพื้นที่โครงการ	- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้ง	-	ภาพที่ 2.2-16 พนักงานที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
(6) จัดและสำรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ไว้อย่างเพียงพอ	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการสำรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหู ไว้อย่างเพียงพอสำหรับพนักงาน	-	ภาพที่ 2.2-17 การสำรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(7) จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร	-	เอกสารแนบที่ 6 แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เอกสารแนบที่ 7 ตัวอย่างผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. เสี่ยง (ต่อ) (8) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้า กรณีที่มีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การทดลองเดินเครื่อง เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีติดป้ายการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าทุกครั้งที่มีกิจกรรมใดๆ ที่เกิดเสียงดัง ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหากเกิดเหตุดังกล่าวยขึ้น โครงการมีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งมีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีรถดับเพลิงและรถพยาบาลเข้าร่วมการซ้อม โดยโครงการได้มีการสื่อสารผ่านการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบและป้องกันความเข้าใจผิด	-	เอกสารแนบที่ 3 แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน เอกสารแนบที่ 29 รายงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2569 เอกสารแนบที่ 53 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภาพที่ 2.2-53 ป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชน กรณีมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การคมนาคมขนส่ง (1) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด	ภายในและภายนอก โครงการ	- โครงการได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ทุกระดับ ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยพิจารณาตาม กลุ่มเป้าหมายของพนักงานที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ โครงการจัดให้มีคู่มือขับขี่ปลอดภัย (Safety Driving Manual) เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด รวมทั้งมีการกำหนดให้พนักงานที่ต้องขับขี่รถ บริษัท จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน อุบัติเหตุ (Defensive Driving) อีกด้วย	-	ภาพที่ 2.2-18 การอบรมพนักงานด้าน อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย เอกสารแนบที่ 47 คู่มือขับขี่ปลอดภัย (Safety Driving Manual) เอกสารแนบที่ 48 แผนการฝึกอบรมและบันทึก การฝึกอบรม
(2) กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุก ตามกฎหมาย กำหนด (3) หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเข้า-ออก พื้นที่ โครงการในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการแจ้งไปยังพนักงานและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎ จราจรและระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ดังนี้ 1) จำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และภายในพื้นที่ชุมชนไม่เกิน 40 กม./ชม. 2) กำหนดจุดจอดรถบรรทุกรับ-ส่ง พนักงานที่ชัดเจนและไม่ เป็นจุดเดียวกับจุดจอดรถรับส่งของรถสาธารณะ เพื่อ หลีกเลี่ยงการติดเครื่องรอและไม่เป็นการกีดขวาง การจราจร	-	เอกสารแนบที่ 2 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การอบรมและการควบคุม การทำงานของผู้รับเหมา SSHE (SSHE Contractor Control and Training) เอกสารแนบที่ 14 ข้อกำหนดในการจัดจ้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		3) รถขนส่งวัสดุหิน สารเคมี เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านชุมชนในเวลาเร่งด่วน (เวลา 07.00-08.00 น. และ 17.00-18.00 น.) 4) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกของมากเกินไป โดยรถบริษัทและรถของผู้รับเหมาได้ติดหมายเลข โทรศัพท์เพื่อติดต่อกรณีแจ้งเหตุแล้ว		เอกสารแนบที่ 21 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การ ควบคุมการขนถ่ายสารเคมี (Chemical Unloading Control)
(4) จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน ขนถ่ายสารเคมี เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อน เริ่มปฏิบัติงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ทุกระดับ ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยพิจารณาตาม กลุ่มเป้าหมายของพนักงานที่มีความเหมาะสม เพื่อพนักงาน ขับรถของบริษัทจำหน่ายสารเคมีและพนักงานของ โครงการที่ปฏิบัติงานด้านการขนถ่ายสารเคมีได้ทราบ เกี่ยวกับข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ เรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2.2-18 การอบรมพนักงานด้าน อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย เอกสารแนบที่ 48 แผนการฝึกอบรมและบันทึก การฝึกอบรม
5. การจัดการกากของเสีย (1) การดำเนินการเกี่ยวกับกากของเสียที่เกิดขึ้นโครงการ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศการนิคม อุตสาหกรรมหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีประกาศ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมมาบังคับใช้	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 และ กฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ เช่น มีการขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงานตามแบบ กอ.1 และจัดทำเอกสารการจัดการ (Manifest form) ทุกครั้งที่มีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก พื้นที่ พร้อมแจ้งปริมาณการขนส่งตามประกาศที่กำหนด	-	เอกสารแนบที่ 13 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง Waste Management เอกสารแนบที่ 15 การขออนุญาตจัดการ ของเสียออกภายนอก โครงการ (กอ.1)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ) (2) จัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย่างเพียงพอก่อนติดต่อให้หน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตขนส่งนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้หน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตขนส่งนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป	-	ภาพที่ 2.2-19 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ
(3) กากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ทำการรวบรวมแยกประเภทก่อนส่งให้ศูนย์กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมนำไปกำจัดอย่างถูกต้องในลำดับต่อไปดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นอันตราย (ก) แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) จะถูกรวบรวมใส่ถุงดำปิดปากถุงมิดชิดเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป (ข) สารดูดความชื้น จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป (ค) เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแยกประเภท และมีอาคารเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขยะที่เกิดขึ้นจะถูกคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และส่งขายในกรณีที่น่าไปรีไซเคิลได้ ขยะทั่วไปจะถูกเก็บขนโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง สำหรับขยะอันตรายจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะที่เหมาะสมก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดต่อไป โดยของเสียที่เกิดขึ้น มีแนวทางจัดการดังนี้ • แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) จะถูกรวบรวมใส่ถุงดำปิดปากถุงมิดชิดเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป • สารดูดความชื้น จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป • เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	-	เอกสารแนบที่ 13 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง Waste Management เอกสารแนบที่ 15 การขออนุญาตจัดการของเสียออกภายนอกโครงการ (กอ.1) เอกสารแนบที่ 16 บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกภายนอกพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ) (ง) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพประเภท Metal Based (TiO₂) ที่ใช้ในระบบ SCR ซึ่งจะมีการเปลี่ยนทุก ๆ 5-7 ปี โดยจะรวบรวมเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป		ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพประเภท Metal Based (TiO₂) ที่ใช้ในระบบ SCR ซึ่งจะมีการเปลี่ยนทุก ๆ 5-7 ปี โดยจะรวบรวมเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป		
2) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นอันตราย (ก) น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้จนแล้วจากงานซ่อมบำรุงจะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป (ข) ขยะปนเปื้อนรวมภาชนะปนเปื้อน (น้ำมันหรือสารเคมี) จะถูกรวบรวมไว้ในถังสำหรับขยะปนเปื้อน เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป (ค) หลอดไฟใช้แล้ว จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป		- น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้จนแล้วจากงานซ่อมบำรุงจะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอขนส่งและกำจัดโดยบริษัท เจ เทคโนโลยี เวสต์ จำกัด (72080000125455) - ขยะปนเปื้อนรวมภาชนะปนเปื้อน (น้ำมันหรือสารเคมี) จะถูกรวบรวมไว้ในถังสำหรับขยะปนเปื้อน เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย ได้ขนส่งและกำจัด จำนวน 0.89 ตัน โดย บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455) - หลอดไฟใช้แล้ว จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย ได้ขนส่งและกำจัด จำนวน 0.03 ตันโดย บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)				
(4) คัดแยกขยะและนำส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีการคัดแยกขยะและนำส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	ภาพที่ 2.2-19 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ
(5) จัดให้มีสถานที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นที่คอนกรีตเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยและกากของเสีย โดยแยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการจัดให้มีอาคารเก็บกากของเสียที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นที่คอนกรีตเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยและกากของเสีย โดยแยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน	-	ภาพที่ 2.2-20 สถานที่เก็บขยะมูลฝอยและกากของเสีย
(6) บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่าย/กำจัด	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีพนักงานบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประจำโครงการ และจัดให้มีการบันทึกชนิด ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น ชนิดของภาชนะที่บรรจุ ลงในแบบฟอร์มบันทึกการส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกำจัด/บำบัด และจะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและขยะอันตรายที่ได้แจ้งขออนุญาตนำออกให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปี โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปรายละเอียดของเสียที่เกิดขึ้นในโครงการได้ ดังนี้ - ภาชนะปนเปื้อน จำนวน 0.09 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455) - ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0.27 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)	-	เอกสารแนบที่ 13 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง Waste Management เอกสารแนบที่ 15 การขออนุญาตจัดการของเสียออกภายนอกโครงการ (กอ.1) เอกสารแนบที่ 16 บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกภายนอกพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)		- หลอดไฟใช้แล้ว จำนวน 0.03 ตัน ขนส่งและกำจัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455) - ขยะปนเปื้อน จำนวน 0.8 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455) - น้ำปนเปื้อน จำนวน 3.82 ตัน ขนส่งและกำจัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455) - ขยะมูลฝอย จำนวน 20.27 ตัน ขนส่งและกำจัดโดย เทศบาลตำบลบ้านฉาง - แท่งกรองน้ำ จำนวน 6.09 ตัน ขนส่งและกำจัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455) - กากตะกอน จำนวน 28.5 ตัน ขนส่งและกำจัดโดย บริษัท ออแกนิค เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (10210020425628) - Air Filter จำนวน 1 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ) (7) ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนำของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่โครงการ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ดำเนินการขออนุญาตนำของเสียออกนอกโครงการ โดยได้ทำหนังสือขออนุญาตนำของเสียออกภายนอกโรงงาน (กอ.1) ตามที่กฎหมายกำหนด	-	เอกสารแนบที่ 15 การขออนุญาตจัดการของเสียออกภายนอกโครงการ (กอ.1)
(8) กำหนดเกณฑ์ การคัดเลือกผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรวมทั้งติดตั้ง GPS ที่รถขนส่งด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการดำเนินการจัดการกากของเสียอย่างเหมาะสม	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรวมทั้งติดตั้ง GPS ที่รถขนส่ง	-	เอกสารแนบที่ 17 เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
6. การใช้น้ำ (1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโครงการ เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพยายามนำน้ำที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณานำน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการมาใช้ในการรดพื้นที่สีเขียวด้วย	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนด โครงการได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน GPSC และจัดทำโครงการลดการสูญเสียจากระบบ RO เมื่อหยุดการทำงาน เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการการลดการใช้น้ำ การลดการสูญเสีย การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ	-	เอกสารแนบที่ 18 โครงการได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน GPSC เอกสารแนบที่ 19 โครงการนำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนกลับมารดน้ำต้นไม้
7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (1) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	โดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีระบบรางระบายน้ำฝนของโครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	-	ภาพที่ 2.2-21 รางระบายน้ำฝนของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) (2) กำหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ำ ของโครงการ และมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่าง สม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	รางระบายน้ำโดยรอบ พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในราง ระบายน้ำของโครงการ โดยดำเนินการล่าสุดในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2568	-	เอกสารแนบที่ 20 แผนการขุดลอกตะกอน
(3) รวบรวมน้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนไปยังถังแยกน้ำ-น้ำมัน เพื่อทำการแยกน้ำมันออกก่อนส่งไปบำบัดชั้นสุดท้ายยัง ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีระบบรวบรวมน้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนไป ยังถังแยกน้ำ-น้ำมัน เพื่อทำการแยกน้ำมันออกก่อนส่งไป บำบัดชั้นสุดท้ายยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคม อุตสาหกรรมเอเชีย	-	ภาพที่ 2.2-7 ถังแยกน้ำมัน (Oil-Water Separator)
(4) จัดสร้างบ่อหน่วงน้ำภายในพื้นที่โรงงาน โดยมีขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร/เนื้อที่ 1 ไร่ หรือประมาณ 2,880 ลูกบาศก์ เมตร ให้สามารถหน่วงน้ำได้ประมาณ 3 ชั่วโมง	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดสร้างบ่อหน่วงน้ำภายในพื้นที่โรงงาน ขนาด 2,880 ลูกบาศก์เมตร เรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2.2-22 บ่อหน่วงน้ำ ขนาด 2,880 ลูกบาศก์เมตร
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8.1 ความปลอดภัยทั่วไป (1) ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยหรือกฎหมายแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เป็นปัจจุบัน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่โครงการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	เอกสารแนบที่ 52 นโยบายคุณภาพความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC
(2) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับลักษณะงานและความเสี่ยง	ภายในพื้นที่โครงการ	พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยให้กับพนักงาน/ผู้รับเหมาอย่างเหมาะสม กับลักษณะงานและความเสี่ยง	-	เอกสารแนบที่ 53 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.1 ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) (2) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับลักษณะงานและความเสี่ยง	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่โครงการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงาน/ผู้รับเหมาอย่างเหมาะสม กับลักษณะงานและความเสี่ยง		เอกสารแนบที่ 48 แผนการฝึกอบรมและบันทึก การฝึกอบรม ภาพที่ 2.2-18 การอบรมพนักงานด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
(3) การขนส่ง จัดเก็บ และใช้งานสารเคมีในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการขนส่ง จัดเก็บ และใช้งานสารเคมีใน กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการขน ถ้ายสารเคมี	-	เอกสารแนบที่ 21 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การ ควบคุมการขนถ่ายสารเคมี (Chemical Unloading Control)
(4) จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อกำหนดตรวจสอบและดูแลงานด้านความปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลของโครงการ โดยมีการประชุมทุก ๆ เดือน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำโครงการ เพื่อกำหนด ตรวจสอบและดูแลงานด้านความปลอดภัยภายใต้การกำกับ ดูแลของโครงการ โดยมีการประชุมทุก ๆ เดือน	-	เอกสารแนบที่ 22 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย เอกสารแนบที่ 23 การประชุมคณะกรรมการด้าน อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.1 ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) (5) จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัย แบบอัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยแก่พนักงานในการเตรียมพร้อม ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ภายในโครงการ ให้มีความพร้อมใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	เอกสารแนบที่ 24 แผนการตรวจสอบสัญญาณ เตือนภัย และอุปกรณ์อัคคีภัย ต่างๆ เอกสารแนบที่ 25 ผลการตรวจสอบสัญญาณ เตือนภัย และอุปกรณ์อัคคีภัย ต่างๆ ภาพที่ 2.2-23 สัญญาณเตือนภัยต่างๆ
(6) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ พนักงานได้	ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่กระบวนการผลิตได้จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน	-	ภาพที่ 2.2-24 ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมาย หรือมาตรฐานสากลกำหนดไว้	ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการมีการจัดอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่าง เพียงพอและเหมาะสม	-	ภาพที่ 2.2-25 อุปกรณ์ดับเพลิง
(8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ และเหมาะสมกับประเภทงานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู/ ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการสำรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก ไว้อย่างเพียงพอสำหรับพนักงาน	-	ภาพที่ 2.2-17 การสำรองอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.1 ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) (9) จัดเตรียมพาหนะสำรองไว้ประจำเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ ทันทั่วทั้งที่	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดเตรียมพาหนะสำรองไว้ประจำเพื่อใช้ในกรณี ฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้งที่แล้ว	-	ภาพที่ 2.2-26 พาหนะสำรองไว้ประจำเพื่อใช้ ในกรณีฉุกเฉิน
(10) จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีมาตรการด้านความปลอดภัยโดยใช้ระบบการ ขออนุญาตเข้าทำงาน (Safe Work Permit) ตามระเบียบ การปฏิบัติงานเรื่อง Permit to work	-	เอกสารแนบที่ 26 ระบบการขออนุญาตทำงาน เอกสารแนบที่ 27 ตัวอย่างใบการขออนุญาตใน การทำงาน (Work Permit)
(11) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ โครงการ และแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน พื้นที่โครงการ แผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดตั้งทีมดับเพลิงไว้ใน แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินและอพยพเป็น ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2569 ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	-	เอกสารแนบที่ 28 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การ ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เอกสารแนบที่ 29 รายงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2569
(12) จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
(13) กำหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของ อุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 6 แผนการตรวจสอบบำรุงรักษา เชิงป้องกัน เอกสารแนบที่ 49 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และบริษัทไฟฟ้า
(14) จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะสำหรับ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฐมพยาบาล	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์สำหรับการปฐม พยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และมีบุคลากรเฉพาะสำหรับ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฐมพยาบาล และจัดให้มีรถฉุกเฉิน ประจำโครงการสำหรับรับ-ส่งผู้บาดเจ็บเจ็บป่วย ตลอดจน ชักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	ภาพที่ 2.2-26 พาหนะสำรองไว้ประจำเพื่อใช้ ในกรณีฉุกเฉิน ภาพที่ 2.2-27 ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ภาพที่ 2.2-28 ห้องพยาบาล
(15) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำโปสเตอร์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดกิจกรรมแจ้งข่าวสารด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	-	ภาพที่ 2.2-18 การอบรมพนักงานด้าน อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย เอกสารแนบที่ 48 แผนการฝึกอบรมและบันทึก การฝึกอบรม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.2 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี				
(1) จัดหาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งานจัดเก็บไว้ในอาคารและมีแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดไว้ที่ภาชนะบรรจุทุกชนิด	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งาน และมีแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดไว้ที่ภาชนะบรรจุทุกชนิด	-	ภาพที่ 2.2-29 ข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (SDS)
(2) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่จะนำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการแยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่จะนำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ	-	ภาพที่ 2.2-30 พื้นที่การจัดเก็บสารเคมี
(3) บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อให้มีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ	ภายในพื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่การจัดเก็บสารเคมี จะมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อให้มีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ	-	ภาพที่ 2.2-30 พื้นที่การจัดเก็บสารเคมี
(4) จัดเตรียม Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่รั่วไหลได้ทั้งหมด สำหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นจะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้ำอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้	ภายในพื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่การจัดเก็บสารเคมี จะมี Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่รั่วไหลได้ทั้งหมด	-	ภาพที่ 2.2-31 Dike ล้อมรอบถังเก็บสารเคมี
(5) ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร	ภายในพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีการติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในอาคารสารเคมี	-	ภาพที่ 2.2-53 ป้ายเตือนห้ามก่อให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
(6) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคาร อย่างเพียงพอ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการมีการจัดอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่าง เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาและ ตรวจสอบตามแผนที่กำหนดให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีสภาพดี ตลอดเวลา โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี และพร้อมสำหรับการ ใช้งาน	-	เอกสารแนบที่ 24 การตรวจสอบสัญญาณเตือน ภัย และอุปกรณ์อัคคีภัยต่างๆ เอกสารแนบที่ 25 ผลการตรวจสอบสัญญาณ เตือนภัย และอุปกรณ์อัคคีภัย ต่างๆ ภาพที่ 2.2-25 อุปกรณ์ดับเพลิง
(7) พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีจะต้องได้รับการ ฝึกอบรมและดำเนินการตามข้อมูลความปลอดภัยของสาร เคมีภัณฑ์ (MSDS) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตราย และ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของพนักงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับลักษณะงานและ ความเสี่ยงที่ปฏิบัติงาน	-	เอกสารแนบที่ 30 เอกสารการฝึกอบรมและ ดำเนินการตามข้อมูลความ ปลอดภัยของสารเคมีภัณฑ์ (SDS)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.3 มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เหลว (ก) มาตรการทั่วไป (1) กักเก็บในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุทั้งหมดของถัง (ร้อยละ 15 เหลือไว้เพื่อการขยายตัว)	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการกักเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลวในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุทั้งหมดของถัง	-	ภาพที่ 2.2-32 ถังกักเก็บแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์เหลว
(2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการรั่วไหล (Ammonia Detector) บริเวณที่คาดว่าจะเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย เช่น ปัม วาล์ว ข้อต่อ (Fitting)	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดการรั่วไหล (Ammonia Detector) บริเวณปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ (Fitting) เป็นต้น	-	ภาพที่ 2.2-33 Ammonia Detector
(3) ติดป้ายเตือน (Caution Signs) ที่รถบรรทุก เพื่อแจ้งเตือน ไม่ให้มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ขณะทำการขนถ่าย	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการติดป้ายเตือนที่รถบรรทุกและพื้นที่ขนถ่ายขนถ่าย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว	-	ภาพที่ 2.2-34 ป้ายเตือนที่รถบรรทุกและ พื้นที่ขนถ่ายขนถ่าย แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์เหลว
(4) จัดให้มีทางเข้าถึงถังเก็บอย่างสะดวก เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีเส้นทางเข้าถึงถังเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลวอย่าง สะดวก เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	ภาพที่ 2.2-35 ทางเดินบริเวณถังกักเก็บ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว
(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการอบรม ดูแลตลอด ระยะเวลาที่มีการสูบลำ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการ อบรม ดูแลตลอดระยะเวลาที่มีการสูบลำแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์เหลว	-	เอกสารแนบที่ 48 แผนการฝึกอบรมและบันทึก การฝึกอบรม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.3 มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เหลว (ต่อ) (6) จัดให้มี Full Face Gas Mask อย่างน้อย 2 ชุด ในบริเวณ ตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ข) มาตรการที่เกี่ยวกับถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับถัง (1) ถังเก็บออกแบบตามมาตรฐาน ASME “Boiler and Pressure Vessel Code”	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการได้จัดให้มี Full Face Gas Mask จำนวน 2 ชุด และสามารถนำไปใช้งานได้ตลอดเวลา - ถังเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว เป็นไปตามมาตรฐาน ASME “Boiler and Pressure Vessel Code”	- -	ภาพที่ 2.2-36 Full Face Gas Mask ภาพที่ 2.2-32 ถังกักเก็บแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์เหลว
(2) ถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับถังเก็บ (Container Appurtenances) ต้องออกแบบให้สามารถทนแรงดันได้ มากกว่าค่าความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition)	ภายในพื้นที่โครงการ	- ถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับถังเก็บ (Container Appurtenances) สามารถทนแรงดันได้มากกว่าค่าความ ดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition)	-	-
(3) อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ร้อยละ 25 ต้องทำจากวัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย	ภายในพื้นที่โครงการ	- อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ทั้งหมด ทำมาจากวัสดุที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ เกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย	-	-
(4) บริเวณติดตั้งถังเก็บต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Fire Hazards) และถังเก็บควรตั้งอยู่ภายนอกอาคาร หรือหากตั้ง ในอาคารต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ในการตั้งถังเก็บ โดยจะต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดในกฎหมาย	ภายในพื้นที่โครงการ	- ถังเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ตั้งอยู่ห่างจาก แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Fire Hazards) และเป็นไปตามมาตรฐาน ASME “Boiler and Pressure Vessel Code”	-	ภาพที่ 2.2-32 ถังกักเก็บแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์เหลว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.3 มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว (ต่อ) (5) บริเวณถังเก็บต้องดูแลไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟได้ (Ignitable Material) เช่น เศษไม้ หรือหญ้าแห้ง ในบริเวณดังกล่าว เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	- บริเวณโดยรอบถังเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ไม่พบวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น เศษไม้ หรือหญ้าแห้ง	-	ภาพที่ 2.2-32 ถังกักเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว
(6) ติดตั้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Connection) ของถังเก็บทุกจุด (ยกเว้น Safety Relief Valve)	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการติดตั้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Connection) ของถังเก็บทุกจุด	-	ภาพที่ 2.2-37 Shut-off Valve บริเวณ Connection
8.4 มาตรการด้านการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (1) จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการซ้อมแผนการปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และระดับ 2 เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2569 ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	-	เอกสารแนบที่ 28 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เอกสารแนบที่ 29 รายงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปีพ.ศ. 2569

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.4 มาตรการด้านการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (ต่อ) (3) กำหนดแผนการสื่อสารและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญในการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการได้กำหนดแผนการสื่อสารและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญในการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน	-	เอกสารแนบที่ 28 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันและระงับเหตุ ฉุกเฉิน เอกสารแนบที่ 31 แนวทางการปฏิบัติและการ สื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(4) ประสานงานระหว่างกลุ่มโรงงานหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข่าวสารและเหตุฉุกเฉินระหว่างโรงงานและชุมชน ให้เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพชัดเจน ถูกต้อง รวมทั้ง สร้างความเชื่อถือไว้วางใจจากชุมชน	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 4 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข่าวสารและเหตุฉุกเฉินระหว่างโรงงานและชุมชน	-	เอกสารแนบที่ 32 สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็น กรรมการในคณะกรรมการ ไตรภาคีนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย
(5) มีการซ้อมเหตุฉุกเฉินร่วมกันกับชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการได้มีการซ้อมเหตุฉุกเฉินร่วมกันกับชุมชน โดยแบ่งเป็นการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินของทางโครงการ ซึ่งมีการแจ้งไปยังชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการฝึกซ้อมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง	-	เอกสารแนบที่ 33 การซ้อมเหตุฉุกเฉินร่วมกัน กับชุมชน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.4 มาตรการด้านการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (ต่อ) (6) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ จากโครงการ และส่งผลกระทบต่อชุมชน โครงการมีประกันภัยให้ความคุ้มครองบุคคลที่ 3 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยการให้การดูแลรักษาพยาบาลและชดเชยแก่ผู้เสียหายทุกคนเท่าเทียมกันตามมาตรฐานของความคุ้มครอง	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการทำกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งครอบคลุมการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจากโรงงานต่อบุคคลที่ 3 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 34 กรมธรรม์ประกันภัย
9. อันตรายร้ายแรง (1) มาตรการลดความเสี่ยงกรณีว่าล่วควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการทำงานล้มเหลว และในกรณีท่อรั่ว 1)การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงหลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการแล้ว เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม (ก) การเฝ้าระวังและตรวจสอบความผิดปกติของแนวท่อส่ง (ข) การบำรุงรักษาตามแผนงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายร้ายแรง และมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณสถานีควบคุมก๊าซ พร้อมทั้งการตรวจสอบการรั่วไหลเป็นประจำทุกสัปดาห์ อีกทั้งยังมีการซ้อมแผนฉุกเฉินตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่อง	-	เอกสารแนบที่ 28 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันและระงับเหตุ ฉุกเฉิน
2)การป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณสถานีควบคุมก๊าซ (Gas Metering station) (ก) ล้อมรั้วโดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (ข) ระบบท่อและระบบวาล์วสำรองกรณีท่อหลักขัดข้อง		- ทางโครงการมีการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณสถานีควบคุมก๊าซ (Gas Metering station) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ * ล้อมรั้วโดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต * ระบบท่อและระบบวาล์วสำรองกรณีท่อหลักขัดข้อง		ภาพที่ 2.2-38 รั้วโดยรอบสถานีควบคุมก๊าซ ภาพที่ 2.2-39 ระบบท่อและระบบวาล์วสำรอง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. อันตรายร้ายแรง (ต่อ)				
(ค) ติดตั้งท่อระบายก๊าซที่ค้างในเส้นท่อออกสู่บรรยากาศ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน		* ติดตั้งท่อระบายก๊าซที่ค้างในเส้นท่อออกสู่บรรยากาศ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน		ภาพที่ 2.2-40 ท่อระบายก๊าซกรณีฉุกเฉิน
(ง) ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยติดตั้งไว้ในที่ ที่สะดวกต่อการใช้งานและมีป้ายบอกให้ชัดเจน		* ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยติดตั้งไว้ในที่ ที่สะดวกต่อการใช้งานและมีป้ายบอกให้ชัดเจน		ภาพที่ 2.2-41 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
3) จัดให้มีการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุมก๊าซเป็น ประจำทุกสัปดาห์		- มีการกำหนดให้ตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุมก๊าซ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบการรั่วไหล		เอกสารแนบที่ 54 การตรวจสอบแนวท่อและ สถานีควบคุมก๊าซ
(2) การกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิดของ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต 1) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น (ก) จัดให้มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ที่ท่อ steam ของ หม้อน้ำ (ข) จัดให้มีมาตรวัดระดับน้ำ พร้อมทั้งระบบสัญญาณ เตือนเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าขีดอันตรายที่หม้อน้ำ (ค) จัดให้มีมาตรวัดความดันไอน้ำ (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge) ที่หม้อน้ำ (ง) จัดให้มีฉนวนที่เหมาะสมหุ้มเปลือกหม้อน้ำและท่อที่ ร้อยทั้งหมด (จ) จัดให้มีระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Relay) ที่เครื่อง กำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ ดังนี้ * ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ที่ท่อ steam ของหม้อน้ำ * มาตรวัดระดับน้ำที่หม้อน้ำ * มาตรวัดความดันไอน้ำที่หม้อน้ำ * ฉนวนหุ้มเปลือกหม้อน้ำ * ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Relay) ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า * ระบบสัญญาณเตือนอันตราย	-	ภาพที่ 2.2-42 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ที่ท่อ Steam ของหม้อน้ำ ภาพที่ 2.2-43 มาตรวัดระดับน้ำที่หม้อน้ำ ภาพที่ 2.2-44 มาตรวัดความดันไอน้ำที่ หม้อน้ำ ภาพที่ 2.2-45 ฉนวนหุ้มเปลือกหม้อน้ำ ภาพที่ 2.2-46 ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Relay) ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) (ฉ) จัดให้มีระบบป้องกันพร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือน อันตรายที่จะตัดระบบเชื้อเพลิง และหยุดการทำงานของ เครื่องจักรต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เช่น GT, ST, HRSO เป็น ต้น ในกรณีฉุกเฉิน				ภาพที่ 2.2-47 ระบบสัญญาณเตือนอันตราย
2) ทำการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดย การควบคุมของวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกร		- มีการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานแล้ว โดย การควบคุมของวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกร	-	-
3) ใช้ระบบ Distributed Control System (DCS) ในการ ควบคุมการทำงานของหม้อน้ำ ในกรณีที่ระบบควบคุม การทำงานมีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจากระดับน้ำใน หม้อน้ำสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดหรือแรงดันไอน้ำสูง หรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดจะตัดระบบเชื้อเพลิงและหยุด ระบบหม้อน้ำทันที		- ทางโครงการใช้ระบบ Distributed Control System (DCS) ในการควบคุมการทำงานของหม้อน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-48 ระบบ Distributed Control System (DCS)
4) จัดให้มีการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่ หม้อน้ำและในระบบหม้อน้ำตามความถี่ที่ผู้ออกแบบ กำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมต่อการเดินเครื่อง และเป็นการป้องกันการกัดกร่อนหรือตะกอนของหม้อน้ำ		- ทางโครงการมีการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อน ป้อนเข้าสู่หม้อน้ำและในระบบหม้อน้ำ	-	เอกสารแนบที่ 35 การตรวจสอบลักษณะสมบัติ ของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) 5) จัดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ การตรวจอุปกรณ์ก่อนลง มือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ		- ทางโครงการมีการจัดทำวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ ปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ	-	เอกสารแนบที่ 36 ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติงานในการใช้ หม้อน้ำ
6) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อน้ำประจำปี และหลังจากมีการซ่อมบำรุงหม้อน้ำทุกครั้ง โดยวิศวกรที่ ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม		- โครงการได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยโครงการได้ ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยหม้อน้ำล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2568	-	เอกสารแนบที่ 37 การตรวจสอบความปลอดภัย ของหม้อน้ำประจำปี
7) จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาประจำปีของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ผลิตกำหนดเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย		- โครงการได้กำหนดให้มีแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ เสมอ	-	เอกสารแนบที่ 6 แผนตรวจสอบและบำรุง รักษาเชิงป้องกัน เอกสารแนบที่ 7 ตัวอย่างผลการตรวจสอบและ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
8) จัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำ		- โครงการมีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ ควบคุมหม้อน้ำประจำโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 38 ผู้ควบคุมหม้อน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. อันตรายร้ายแรง (ต่อ) 9) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน		- โครงการมีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ โครงการแล้ว	-	เอกสารแนบที่ 28 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันและระงับเหตุ ฉุกเฉิน
(3) จัดให้มีแผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อควบคุม สถานการณ์ฉุกเฉิน อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้ ตลอดจน การฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการซ้อมแผนการปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ระดับ 1 และระดับ 2 เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2569 ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	-	เอกสารแนบที่ 28 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันและระงับเหตุ ฉุกเฉิน เอกสารแนบที่ 29 รายงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2569
(4) พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะต้องได้รับ การฝึกอบรมอย่างเหมาะสมตามลักษณะงานและ ความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ที่ มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและลด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพนักงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับลักษณะงานและความ เสี่ยงที่ปฏิบัติงาน	-	ภาพที่ 2.2-18 การอบรมพนักงานด้าน อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย เอกสารแนบที่ 48 แผนการฝึกอบรมและบันทึก การฝึกอบรม

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. สังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (1) พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม ความต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก	ชุมชนใกล้เคียง	- ปัจจุบันทางโครงการมีพนักงานทั้งหมด 23 คน โดยมี พนักงานที่เป็นพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 14 คน หากใน กรณีที่โครงการมีการจ้างแรงงานเพิ่ม จะพิจารณาแรงงาน ในจังหวัดระยอง ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของ โครงการเป็นอันดับแรก	-	เอกสารแนบที่ 39 จำนวนพนักงานในท้องถิ่น
(2) จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบชุมชน เพื่อ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ โดยต้องนำข้อเสนอแนะกลับมามีวิเคราะห์และวางแผนใน การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน	ชุมชนใกล้เคียง	- ทางโครงการมีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบ ชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ พัฒนาโครงการ รวมทั้งจัดทำแผนชุมชนสัมพันธ์และ ดำเนินการตามแผน พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการดำเนินงานของโครงการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับชุมชนใกล้เคียง	-	เอกสารแนบที่ 40 แผนงานชุมชนสัมพันธ์ และ การดำเนินการตามแผน ชุมชนสัมพันธ์
(3) จัดทำแผนชุมชนสัมพันธ์และดำเนินการตามแผน พร้อมกับ สรุปผลการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อใช้ทบทวนการทำแผน ชุมชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด	ชุมชนใกล้เคียง			
(4) จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ และสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น	ชุมชนใกล้เคียง			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. สังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) (5) การรับเรื่องร้องเรียน (ก) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ (ข) กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตาม การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน ภายใน 7 วัน (ค) บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการและการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยสรุปเสนอผู้บริหารทุกปี	ชุมชนใกล้เคียง	- ทางโครงการมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสารด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (CP-SQM-07) ซึ่งมีการกำหนดช่องทาง การรับข้อร้องเรียนตลอดจนการติดตามข้อร้องเรียนไว้ใน ระเบียบการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยปัจจุบันไม่พบ ข้อร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแบบฟอร์มบันทึก ข้อร้องเรียน (รหัสเอกสาร CP- SQM-07)
(6) เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมการ ดำเนินงานของโครงการ	ชุมชนใกล้เคียง	- ทางโครงการยินดีให้ความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชนและ หน่วยงานที่มีความต้องการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีหน่วยงานจากการ นิคมอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ ตามโครงการธงขาวดาวเขียว	-	เอกสารแนบที่ 41 การเข้าเยี่ยมชมการ ดำเนินงานของโครงการ ภาพที่ 2.2-54 การเยี่ยมชมโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. สังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) (7) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี หรือตามดุลพินิจของ กรรมการส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาสรรหาความร่วมมือในหลายภาคส่วน ด้วยความเต็มใจ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร การติดตามผลการดำเนินการของโครงการ และแก้ไขปัญหาาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และ หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทน หลายฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน และ ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 28 คน ดังนี้ 1.1 ตัวแทนภาคประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ การได้มา ของตัวแทนเป็นการคัดเลือกหรือแต่งตั้งมาจาก ประชาชนในชุมชน อาทิ ชาวบ้านทั่วไป ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์กรทางสังคมในชุมชน และผู้ที่ได้รับความ นับถือในชุมชน จำนวน 16 คน ประกอบด้วย ตัวแทน จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 3 คน ตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง 8 คน และตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง 5 คน	ชุมชนใกล้เคียง	- ทางโครงการได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะ กรรมการฯ ตามหนังสือเลขที่ ออก 77/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยยังใช้คณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีก 1 วาระ ดังนี้ 1.1 ผู้แทนภาคราชการ (1) นายอำเภอบ้านฉาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (2) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด (3) ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (4) ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง (5) ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (6) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง (7) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (8) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง (9) ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด (10) ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านฉาง (11) ผู้แทนเทศบาลตำบลบ้านฉาง	-	เอกสารแนบที่ 32 สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็น กรรมการในคณะกรรมการ ไตรภาคีนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 ตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย - ตัวแทนจากผู้นำและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้แทนนายกเทศมนตรี หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด 1 คน ตัวแทนจากเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 คน ตัวแทนจากเทศบาลตำบลบ้านฉาง 1 คน และตัวแทนจากผู้นำชุมชน 1 คน - ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอที่กำกับดูแลด้านพลังงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุขจำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายอำเภอบ้านฉางหรือผู้ได้รับมอบหมาย 1 คน ตัวแทนหน่วยงานพลังงานจังหวัด 1 คน ตัวแทนหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 คน ตัวแทนหน่วยงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 1 คน ตัวแทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข 1 คน ตัวแทนหน่วยงานด้านการศึกษา/นักวิชาการ 1 คน และตัวแทนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 1 คน - ตัวแทนจากโครงการ จำนวน 1 คน	ชุมชนใกล้เคียง	(12) กำนันตำบลบ้านฉาง 1.2 ผู้แทนภาคประชาชน (1) ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 3 คน (2) ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน 8 คน (3) ผู้แทนจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน 5 คน 1.3 ผู้แทนโครงการ ผู้แทนโครงการศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 4 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	เอกสารแนบที่ 32 สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็น กรรมการในคณะกรรมการ ไตรภาคีนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. รูปแบบการประชุม 2.1 วาระปกติ (ก) การประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด		- ทางโครงการได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 4 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และโรงงานรอบนิคมฯ เพื่อติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	-	เอกสารแนบที่ 42 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน) กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ เหตุฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. หน้าที่ของคณะกรรมการฯ 3.1 กรณีการดำเนินงานปกติ (ก) รับทราบแผนการดำเนินงานของโครงการ และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหรือ มาตรการที่ควรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (ข) ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของโครงการ (ค) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจัยที่ เป็นข้อวิตกกังวลหรือความสนใจของชุมชน (ง) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชน อันเนื่องจากการ ดำเนินงานของโครงการ				
3.2 วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน) ให้มีการประชุมวาระพิเศษทุกครั้งที่มีการร้องเรียนถึง ความเสียหายอันเกิดกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรใด ๆ และรวมถึงทรัพย์สินของบุคคลนิติบุคคล องค์กรใด ๆ นั้น และทรัพย์สินของส่วนรวมด้วย อันเนื่องมาจากการ ดำเนินการผลิตของโครงการ				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
(ก) กรณีที่ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ ในกรณีที่รับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตาม ข้อเรียกร้องใด ๆ นั้น เป็นความรับผิดชอบของ โครงการ -ให้คณะกรรมการฯ เสนอแนวทางปฏิบัติเร่งด่วน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที -นำเสนอหาข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย โดยมติดังกล่าวจะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้หาก โครงการรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตาม ข้อร้องเรียนนั้นเป็นความผิดของโครงการโครงการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นข้างต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการประกัน การเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) ซึ่งให้ความ คุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับความเสียหาย หรือสูญหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มีได้ คาดหมายใด ๆ ซึ่งกรรมธรรมจะคุ้มครองความ เสียหายเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ ทุกชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
(External Factor) และเกิดขึ้นในลักษณะทันที ทันใด (Sudden) และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ได้ (Unforeseen) เช่น อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการกระทำของ บุคคลภายนอกไว้ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของ ความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ บุคคลที่ 3 โดย กำหนดวงเงินความรับผิดชอบต่อ การเกิดอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง เพื่อให้ความคุ้มครอง ต่อผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นใน พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการยินดีเข้าไปดูแล ช่วยเหลือชดเชย ค่าเสียหายฉุกเฉินในระหว่างการพิสูจน์ ทั้งนี้ ทางโครงการจะเข้ามาดูแลและรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาเบื้องต้นทั้งด้าน ชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อ ทรัพย์สินในช่วงก่อนที่ทางกรมธรรม์ประกันภัย เข้ามาดูแล				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
(ข) กรณีไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจน กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ หาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการฯ นัดประชุมวาระ พิเศษ พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงาน เฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของโครงการ ประกอบด้วย คณะบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 9 คน มีลักษณะดังนี้ - ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับ โครงการหรือกิจการในเรื่องนั้น ๆ - มิได้เป็นข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อย 3 คน - ต้องเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของทุกภาคส่วน ว่ามี คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามกรณีการร้องเรียนหรือ ลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ด้านสุขภาพ ด้านเกษตรกรรม ด้านชุมชนและสังคม ด้านการ ชดเชย เป็นต้น คณะทำงานเฉพาะกิจ มีหน้าที่วินิจฉัยผลกระทบ ทำการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุข้อ ร้องเรียน ปัญหาหรือผลกระทบต่าง ๆ ในแต่ละ ด้านตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับของทุก ภาคส่วน				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
(ค) กรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ ให้คณะทำงานเฉพาะกิจชี้แจงต่อผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อมีความเห็นตรงกันให้จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วม และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง (ง) กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ คณะทำงานเฉพาะกิจมีหน้าที่เสนอแนวทางการชดเชยความเสียหาย รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการด้วยความยืดหยุ่น สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงข้อได้เปรียบของทุกฝ่าย ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน หากโครงการรับฟังเป็นที่ยูติได้ว่าความเสียหายตามข้อ ร้องเรียนนั้นเป็นผลกระทบจากโครงการ โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นข้างต้น ตามหลักการกรณีที่ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ ทั้งนี้โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุจนกว่าจะได้ข้อยุติข้างต้น				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. สาธารณสุข (1) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม การฟื้นฟู ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพ (2) สนับสนุนโครงการชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรม นันทนาการเพื่อคนในชุมชน	ชุมชนใกล้เคียง ชุมชนใกล้เคียง	- ทางโครงการมีกิจกรรมที่สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม การฟื้นฟู ป้องกัน และดูแล รักษาสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการเพื่อคนในชุมชน	-	เอกสารแนบที่ 40 แผนงานชุมชนสัมพันธ์ และ การดำเนินการตามแผน ชุมชนสัมพันธ์
12. สุนทรียภาพ (1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5.02 ของพื้นที่โครงการ โดยให้พิจารณาพันธุ์ไม้และพื้นที่ที่จะปลูกรั้วให้เป็นไปตาม หลักการออกแบบภูมิสถาปัตย์และเป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถลด ปัญหามลพิษได้ เช่น กำหนดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทรงสูง เพื่อเป็นแนวคั่นบังสายตาบริเวณรั้วของโรงงาน โดยในการ ปลูกโครงการจะกำหนดระยะห่างระหว่างต้นไม้ประมาณ 2 เมตร เพื่อให้เรือนยอด สามารถบังสายตาบริเวณรั้วของ โรงงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับบริเวณพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ให้ พิจารณาพันธุ์ไม้ยืนต้นตามความเหมาะสมของพื้นที่และ แทรกด้วยไม้พุ่มที่เหมาะสม (2) ให้ดำเนินการปลูกไม้เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างและปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่ สีเขียวครบถ้วนตามมาตรการกำหนดเมื่อเปิดดำเนินการ (3) กรณีที่ต้นไม้ตายหรือเสียหายโครงการจะมีการปลูกทดแทน ภายใน 1 เดือน	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ ประกอบด้วย ต้นไม้ยืนต้นทรงสูง บริเวณรั้วพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่ สีเขียวเป็นตามที่มาตราการกำหนดไว้ และมีปลูกทดแทน เมื่อต้นไม้ตาย	-	ภาพที่ 2.2-49 พื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการ



ภาพที่ 2.2-1 ปล่อง HRSGs



ภาพที่ 2.2-2 ระบบ CEMS จากปล่อง HRSGs 1



ภาพที่ 2.2-3 หน้าจอระบบการเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)



ภาพที่ 2.2-4 อุปกรณ์และอะไหล่สำรอง ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ



ภาพที่ 2.2-5 ถังปรับสภาพน้ำ
(Neutralization Tank)



ภาพที่ 2.2-6 ระบบรวบรวมน้ำที่อาจปนเปื้อนน้ำมัน



ภาพที่ 2.2-7 ถังแยกน้ำมัน (Oil-Water Separator)



เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (Inspection Pit)
ก่อนเข้าบ่อพักน้ำทิ้งขนาด 320 ลบ.ม



เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (Inspection Pit)
ก่อนเข้าบ่อพักน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลบ.ม

ภาพที่ 2.2-8 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ




ภาพที่ 2.2-9 บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร



ภาพที่ 2.2-10 บ่อพักน้ำทิ้ง
ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร



ภาพที่ 2.2-11 บ่อพักน้ำอุกเฉินขนาด
320 ลูกบาศก์เมตร

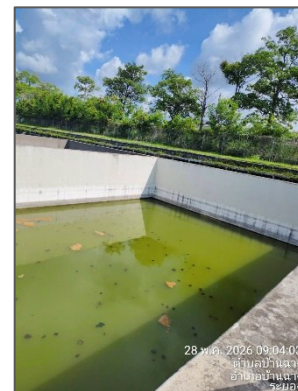


ภาพที่ 2.2-12 บ่อพักน้ำอุกเฉินขนาด
1,800 ลูกบาศก์เมตร



ภาพที่ 2.2-13 Silencer




ภาพที่ 2.2-14 ป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน
85 เดซิเบล (เอ)

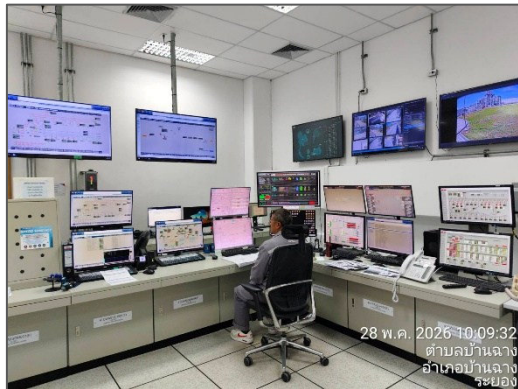


ภาพที่ 2.2-15 ห้องควบคุม (Control room)



ภาพที่ 2.2-16 พนักงานที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน



ภาพที่ 2.2-17 การสำรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

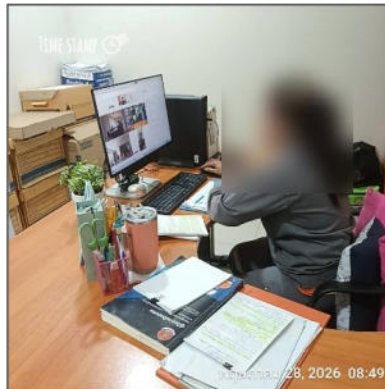

ภาพที่ 2.2-18 การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



ภาพที่ 2.2-19 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 2.2-20 สถานที่เก็บขยะมูลฝอยและกากของเสีย



ภาพที่ 2.2-21 รางระบายน้ำฝนของโครงการ



ภาพที่ 2.2-22 บ่อหน่วงน้ำ ขนาด 2,880 ลูกบาศก์เมตร

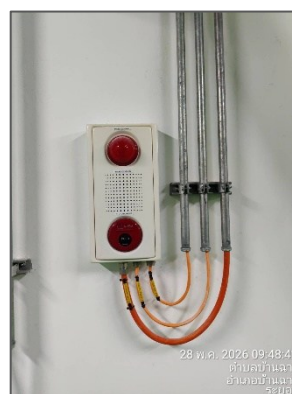

ภาพที่ 2.2-23 สัญญาณเตือนภัยต่างๆ



ภาพที่ 2.2-24 ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตราย




ภาพที่ 2.2-25 อุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 2.2-26 พาหนะสำรองไว้ประจำเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน



ภาพที่ 2.2-27 ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ภาพที่ 2.2-28 ห้องพยาบาล



ภาพที่ 2.2-29 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)



ภาพที่ 2.2-30 พื้นที่การจัดเก็บสารเคมี




ภาพที่ 2.2-31 Dike ล้อมรอบถังเก็บสารเคมี



ภาพที่ 2.2-32 ถังกักเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว



ภาพที่ 2.2-33 Ammonia Detector

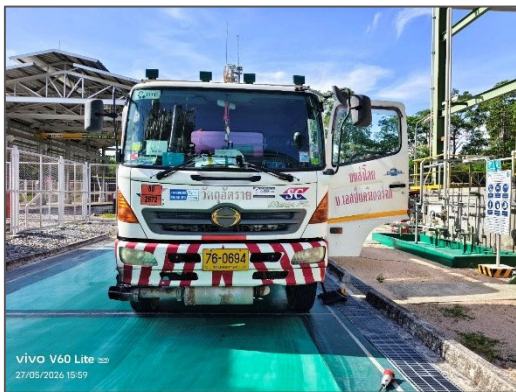

ภาพที่ 2.2-34 ป้ายเตือนที่รถบรรทุกและพื้นที่ขนถ่ายขนถ่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว



ภาพที่ 2.2-35 ทางเดินบริเวณถังกักเก็บแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว



ภาพที่ 2.2-36 Full Face Gas Mask



ภาพที่ 2.2-37 Shut-off Valve บริเวณ Connection




ภาพที่ 2.2-38 รั้วโดยรอบสถานีควบคุมก๊าซ



ภาพที่ 2.2-39 ระบบท่อและระบบบวาล์วสำรอง




ภาพที่ 2.2-40 ท่อระบายก๊าซกรณีฉุกเฉิน

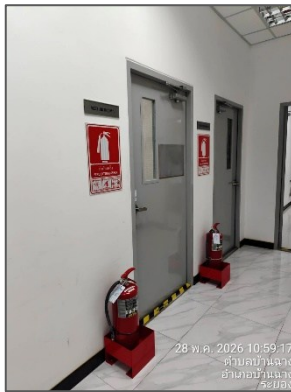

ภาพที่ 2.2-41 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง



ภาพที่ 2.2-42 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve)
ที่ท่อ steam ของหม้อน้ำ

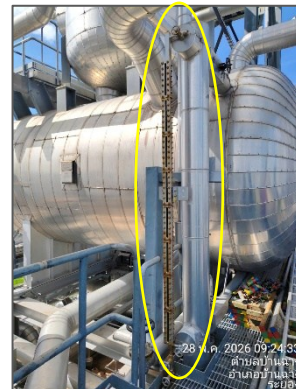

ภาพที่ 2.2-43 มาตรวัดระดับน้ำที่หม้อน้ำ



ภาพที่ 2.2-44 มาตรวัดความดันไอน้ำที่หม้อน้ำ



ภาพที่ 2.2-45 ฉนวนหุ้มเปลือกหม้อน้ำ




ภาพที่ 2.2-46 ระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Relay) ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า



ภาพที่ 2.2-47 ระบบสัญญาณเตือนอันตราย




ภาพที่ 2.2-48 ระบบ Distributed Control System (DCS)

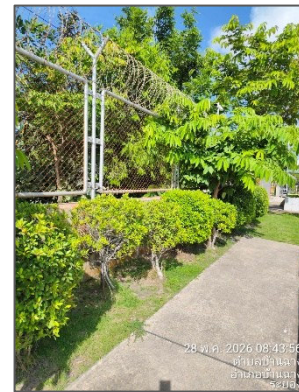


ภาพที่ 2.2-49 พื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการ



ภาพที่ 2.2-50 ป้ายเตือนห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ
ภายในอาคาร

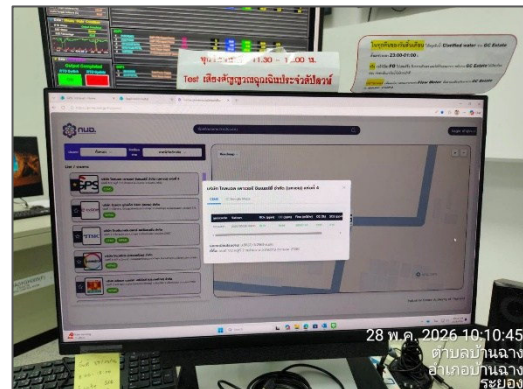

ภาพที่ 2.2-51 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

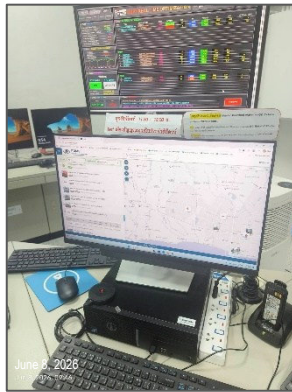


ภาพที่ 2.2-52 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS)



ภาพที่ 2.2-53 ป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชนกรณีมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี




ภาพที่ 2.2-54 การเยี่ยมชมโครงการ

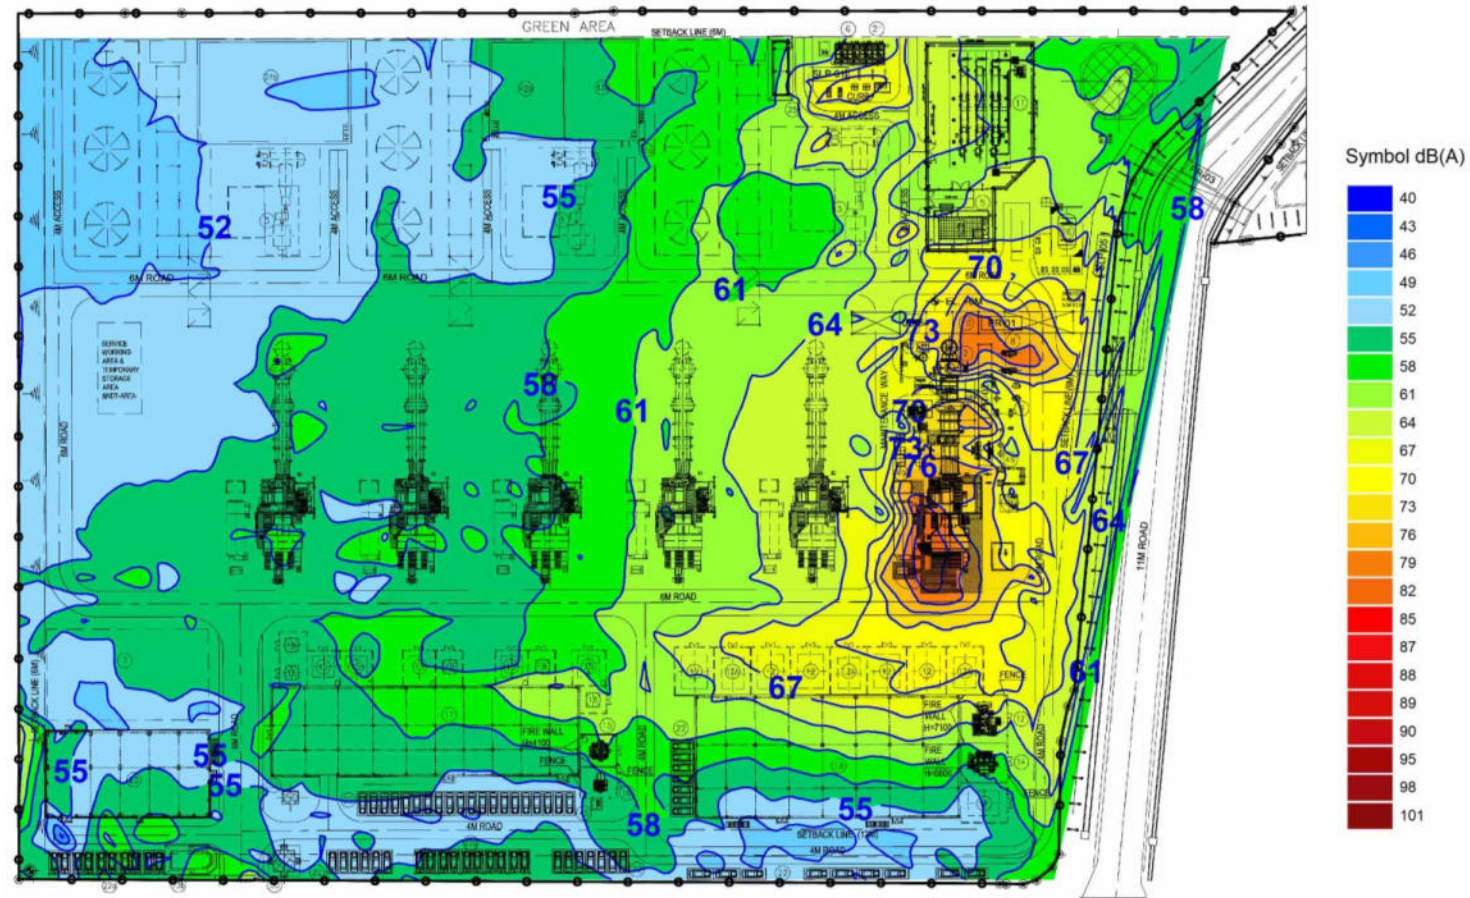

พื้นที่โครงการ_กระบวนการผลิต

รูปที่ 2-1 แผนผัง Noise contour

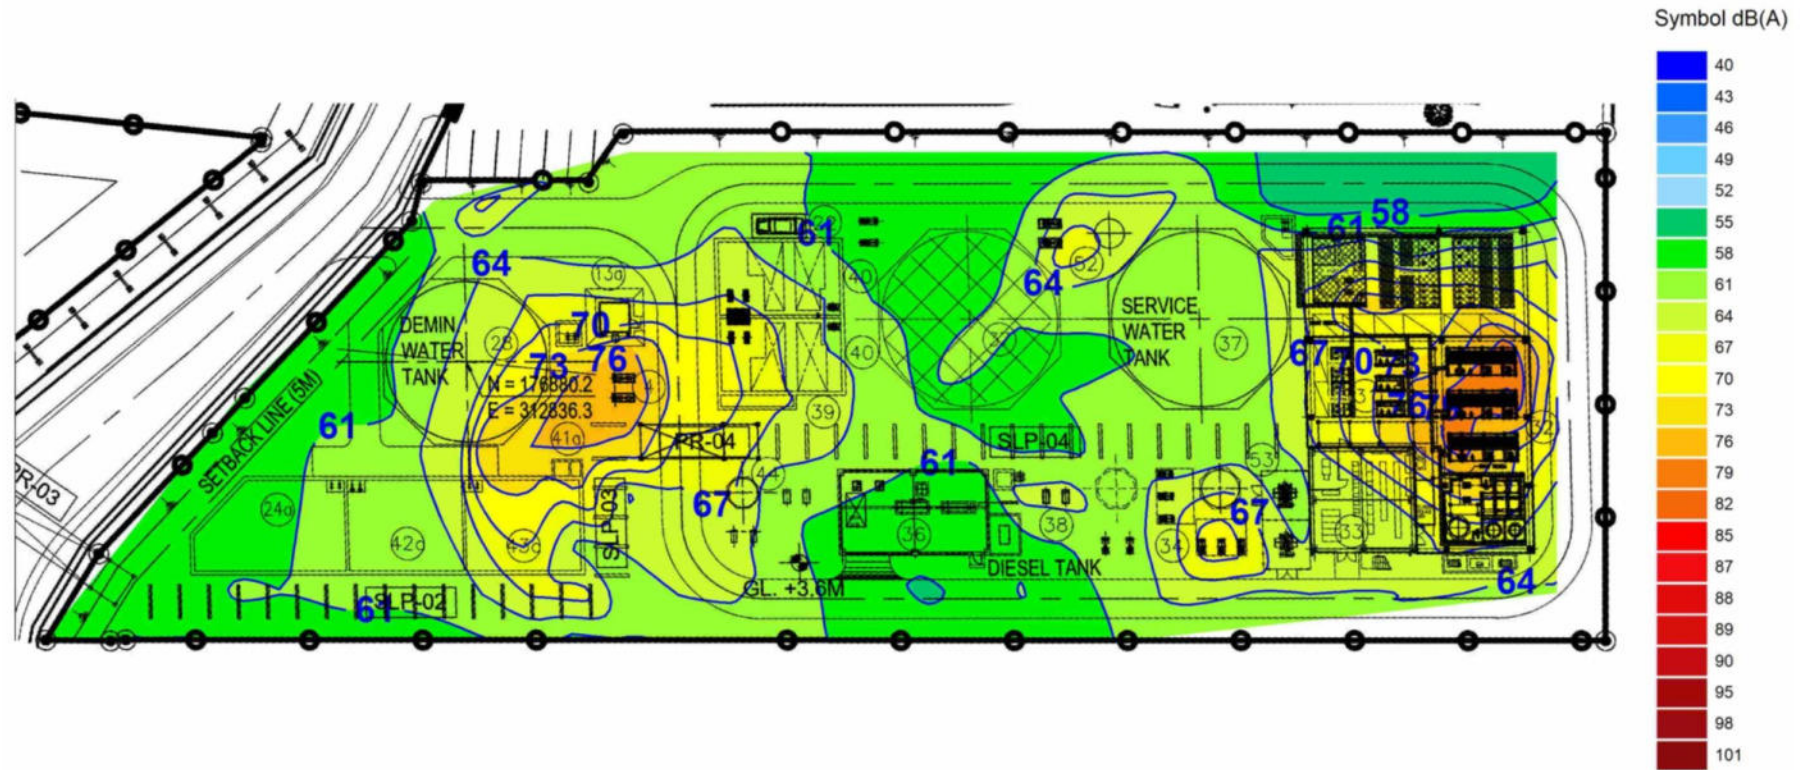

พื้นที่โครงการ_โรงบำบัดน้ำ

รูปที่ 2-1 (ต่อ) แผนผัง Noise contour

บทที่ 3

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 บทนำ

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดในบรรยากาศ และในสถานประกอบการ ระดับเสียงในบรรยากาศ ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน กากของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และดำเนินการด้านกากของเสีย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสังคม-เศรษฐกิจ โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบโครงการ

3.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการมอบหมายจากโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น รายละเอียดแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ประจำปี พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	พ.ศ. 2569											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.	คุณภาพอากาศ														
1.1	คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด - ปล่องระบายจาก HRSGs จำนวน 6 ปล่อง	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ช่วงเดียวกันกับ การตรวจวัดคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ			✓									
1.2	ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) - ปล่องระบายจาก HRSGs จำนวน 6 ปล่อง	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ - ฝุ่นละอองรวม - ก๊าซออกซิเจน	ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
1.3	ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการ ทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) - ปล่องระบายจาก HRSGs จำนวน 6 ปล่อง	- Audit CEMS	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง												

ตารางที่ 3.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ประจำปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ลำดับ	รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	พ.ศ. 2569											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. 1.4	คุณภาพอากาศ (ต่อ) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - วัดประชุมมิตรบำรุง - บ้านสำนักมะม่วง - วัดชาลูกหญ้า - วัดมาบชูด	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางลม (เลือกตรวจวัด 1 สถานี)	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง) ช่วงเดียวกันกับ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด			✓									
1.5	คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ - ปล่องระบายจาก HRSGs จำนวน 6 ปล่อง	- แอมโมเนีย	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)			✓									
2.	ระดับเสียง - บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ - บ้านสำนักมะม่วง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งวัน ทำการและวันหยุด			✓									

ตารางที่ 3.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ประจำปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ลำดับ	รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	พ.ศ. 2569											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
3.	คุณภาพน้ำ														
3.1	คุณภาพน้ำโดยวิธีการเก็บตัวอย่าง - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทั้งหมด 320 ลูกบาศก์เมตร	- อัตราการไหล - ความเป็นกรด-ด่าง - อุณหภูมิ - ออกซิเจนละลายน้ำ - บีโอดี - ของแข็งละลายทั้งหมด - น้ำมันและไขมัน - คลอรีนอิสระ	เดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3.2	ตรวจ Trihalomethane - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทั้งหมด 1,800 ลูกบาศก์เมตร	- Trihalomethane	เดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3.3	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อกักน้ำทั้งหมด 1,800 ลูกบาศก์เมตร	- ความเป็นกรด-ด่าง - อุณหภูมิ - ค่าการนำไฟฟ้า	ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

ตารางที่ 3.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ประจำปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ลำดับ	รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	พ.ศ. 2569											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
3.3	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร	- ความเป็นกรด-ด่าง - ค่าการนำไฟฟ้า	ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4.	กากของเสีย - แจ้งผลการจัดส่งกากของเสียอันตรายไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต - บันทึกชนิดปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการภายในพื้นที่โครงการ	บันทึกชนิด ปริมาณของกากของเสียอันตราย รวมทั้งวิธีการกำจัด	ตลอดช่วงดำเนินการ ทุก 6 เดือน และ รวบรวมข้อมูลปีละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5.	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย														
5.1	ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน - พนักงานทุกคน	- ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป *ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป *ตรวจ X-Ray ปอด	ก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง จากนั้นตรวจปีละ 1 ครั้ง												
	- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับสัมผัสเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)	- ตรวจสอบสุขภาพพิเศษ *ทดสอบการได้ยิน	ปีละ 1 ครั้ง												
	- พนักงานที่ทำงานเชื่อมหรือทำงานเกี่ยวข้องกับความร้อน	*ตรวจวัดสายตาและทดสอบการทำงาน ของปอด	ปีละ 1 ครั้ง												

ตารางที่ 3.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ประจำปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ลำดับ	รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	พ.ศ. 2569											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
5.2	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน - พื้นที่ส่วนการผลิตที่มีพนักงานปฏิบัติงาน ได้แก่ * บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ * เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ * บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ - พนักงานที่มีโอกาสสัมผัสเสียงดังต่อเนื่อง	- ความร้อนในสถานที่ทำงาน (Heat Stress Index ในรูป WBGT)	ปีละ 2 ครั้ง			✓									
		- ปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose)	ปีละ 2 ครั้ง			✓									
5.3	บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและการขนส่งเพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ - ภายในพื้นที่โครงการ	- สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ - ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - สภาพการเสียหาย/สูญเสีย - การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ - รายงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามแบบ จป.(ว)	ทุกครั้งที่มั่วอุบัติเหตุ												
				ดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง											

ตารางที่ 3.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ประจำปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ลำดับ	รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	พ.ศ. 2569											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6.	สาธารณสุข - ภายในพื้นที่โครงการ - ชุมชนใกล้เคียง	- รวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วย และ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี - รวบรวมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่โครงการให้ การสนับสนุนกับชุมชน	ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง												
7.	สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วม ของประชาชน - ภายในพื้นที่โครงการและชุมชน ใกล้เคียง - ชุมชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จาก ที่ตั้งโครงการ และชุมชนที่มีการเก็บ ตัวอย่างดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมของ โครงการ	- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ ชุมชนที่สัมพันธ์กับจุดตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดำเนินการแก้ไขและ ผลที่ได้รับและนำเสนอในรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทราบ - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ คิดเห็นของประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สภาพการเปลี่ยนแปลง	ทุก 6 เดือน ปีละ 1 ครั้ง						✓						

ตารางที่ 3.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) ประจำปี พ.ศ. 2569 (ต่อ)

ลำดับ	รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	พ.ศ. 2569											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
8.	สุนทรียภาพ - พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ และ สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดแล้ว



แผนการดำเนินการ

3.3 วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพารามิเตอร์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของพารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.3-1

ตารางที่ 3.3-1 รายละเอียดวิธีการเก็บและการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์	อุปกรณ์/วิธีการตรวจวิเคราะห์	วิธีการอ้างอิง
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย		
Oxides of Nitrogen	CEMs Emission Test	US EPA, Method 7E
Sulfur Dioxide	CEMs Emission Test	US EPA, Method 6C
Total Suspended Particulate	Isokinetic Stack Sampling Technique	United States Environmental Protection Agency, EPA Method 5
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ		
Nitrogen Dioxide	Nitrogen Dioxide Analyzer	US EPA Method Part 50 App. F (Chemiluminescence)
Sulfur Dioxide	Sulfur dioxide Analyzer	US EPA Method Part 53 and 58
Total Suspended Particulate	Filter/High-Volume Air Sample/ Analytical Balance	US EPA 40 CFR Part 50, Appendix B
Particulate matter as PM10	Filter/High-Volume Air Sample/ Analytical Balance	US EPA 40 CFR Part 50, Appendix J
Wind Speed and Wind Direction	Cup anemometers	Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method
คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ		
Ammonia	Absorbing Solution/ Air Sampling Train/ Spectrophotometer	In-house method based on Method of Air Sampling and Analysis, 401
ระดับเสียงในบรรยากาศ		
Leq 24 hrs., Lmax, L90, Ldn	Integrate Sound Level Meter	ISO1996-1 and 1996-2
คุณภาพน้ำ		
BOD (5 days at 20 Degree C)	5 - day BOD test	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

พารามิเตอร์	อุปกรณ์/วิธีการตรวจวิเคราะห์	วิธีการอ้างอิง
คุณภาพน้ำ (ต่อ) Dissolved Oxygen	Azide Modification	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-O (C)
Flow rate	Flow meter	Flow meter
Oil & Grease	Partition Gravimetric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B
pH at 25 degree C	Electrometric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)
Residual Free Chlorine	DPD Ferrous Titrimetric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Cl (F)
Total Dissolved Solids	Dried at 180 degree C/ Gravimetric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C
Temperature	Field Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2550 B
Bromoform	Purge and Trap Technique, GC/MSD	In-house method based on United States Environmental Protection Agency, EPA Method 5030 B and 8260 D
Chloroform		
Dibromochloromethane		
Bromodichloromethane		
Total Trihalomethanes		
ความร้อนในสถานที่ทำงาน Heat Stress Index (WBGT)	Wet Bulb Globe Temperature Meter	Department Labour Protection and Welfare (B.E.2561)
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลา ในการทำงาน Noise Dose, TWA	Noise Dosimeter	Department of Labour Protection and Welfare (B.E. 2561)

3.4 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ

1) คุณภาพอากาศจากปล่อง

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2566
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
- ค่ากำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1016.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

2) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569

3) ระดับเสียงในบรรยากาศ

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 25 มกราคม 2549

4) คุณภาพน้ำ

- ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

5) ความร้อนในสถานที่ทำงาน

- กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความร้อน
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565)

6) เสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose)

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565)

3.5 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.5.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่องระบายจาก HRSGs จำนวน 6 ปล่อง โดยตรวจวัดค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของหน่วยผลิตที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ ปล่อง HRSGs 1 โดยตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) ตามมาตรการกำหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.1-1 และรูปที่ 3.5.1-1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ปล่อง HRSGs 1

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง HRSGs 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 คำนวนที่ สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และสภาวะแห้ง) และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 (7% O_2) พบว่า ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO_2) มีค่าเท่ากับ 20.27 ส่วนในล้านส่วน อัตราการระบายเท่ากับ 2.166 กรัม/วินาที ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) มีค่าเท่ากับ 0.81 ส่วนในล้านส่วน อัตราการระบายเท่ากับ 0.120 กรัม/วินาที และฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่า 1.17 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราการระบาย 0.067 กรัม/วินาที

เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2566 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ความเข้มข้นก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) จากปล่อง HRSGs 1 มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณสุขการ แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พบว่า ความเข้มข้นและอัตราการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) จากปล่อง HRSGs 1 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่า เมื่อนำผลการตรวจวัดทั้งหมดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2566 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 และเปรียบเทียบกับค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณสุขการ แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1)

ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกพารามิเตอร์
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.1-2 และรูปที่ 3.5.1-2

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแนวโน้มของผลการตรวจวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่า ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และปริมาณฝุ่นละอองรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณก๊าซซอกไซด์ของไนโตรเจน มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่



รูปที่ 3.5.1-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

ตารางที่ 3.5.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง HRSGs 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด	:	47P 0728137E, 1405521N		
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง	:	16 มีนาคม พ.ศ. 2569		
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	:	12:01-12:30 น.		
ชนิดของเชื้อเพลิง	:	ก๊าซธรรมชาติ		
ลักษณะของปล่อง	-	ความสูงของปล่อง	60	เมตร
	-	เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด	3.30	เมตร
	-	อุณหภูมิภายในปล่อง	135.5	องศาเซลเซียส
	-	ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง	19.77	เมตร/วินาที
	-	อัตราการไหลของอากาศภายในปล่อง	403,637	ลบ.ม./ชม.
	-	ร้อยละของความชื้น	8.67	
	-	ร้อยละของก๊าซออกซิเจน	13.86	
	-	ร้อยละของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	4.31	

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน		อัตรา การระบายจริง (กรัม/วินาที)	เกณฑ์ อัตราการระบาย (กรัม/วินาที)
		Actual% O ₂	7% O ₂	DIW ^{1,2/}	EIA ^{3/}		
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	ppm	10.27	20.27	120	26.58	2.166	3.000
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ppm	0.41	0.81	20	1.66	0.120	0.255

หมายเหตุ : ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ที่มา : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2566

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

^{3/} ค่ากำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ตารางที่ 3.5.1-1 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด	:	47P 0728137E, 1405521N		
วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง	:	16 มีนาคม พ.ศ. 2569		
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	:	11:20-12:48 น.		
ชนิดของเชื้อเพลิง	:	ก๊าซธรรมชาติ		
ลักษณะของปล่อง	-	ความสูงของปล่อง	60	เมตร
	-	เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด	3.30	เมตร
	-	อุณหภูมิภายในปล่อง	135.5	องศาเซลเซียส
	-	ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง	19.77	เมตร/วินาที
	-	อัตราการไหลของอากาศภายในปล่อง	403,637	ลบ.ม./ชม.
	-	ร้อยละของความชื้น	8.67	
	-	ร้อยละของก๊าซออกซิเจน	13.86	
	-	ร้อยละของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	4.31	

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน		อัตรา การระบายจริง (กรัม/วินาที)	เกณฑ์ อัตราการระบาย (กรัม/วินาที)
		Actual% O ₂	7% O ₂	DIW ^{1,2/}	EIA ^{3/}		
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	mg/m ³	0.59	1.17	60	7.108	0.067	0.416

หมายเหตุ : ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ที่มา : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2566

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

^{3/} ค่ากำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ตารางที่ 3.5.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

พารามิเตอร์	ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน		อัตรา การระบายจริง (กรัม/วินาที)	เกณฑ์ อัตราการระบาย (กรัม/วินาที)
		Actual% O ₂	7% O ₂	DIW ^{1/}	EIA ^{2/}		
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) (ppm)	3 มี.ค. 66*	9.66	18.76	120	26.58	1.9868	3.000
	22 ก.ย. 66*	9.81	18.31			2.0882	
	27 มี.ค. 67*	9.96	19.01			1.9384	
	25 ก.ย. 67*	10.94	21.75			2.3484	
	11 มี.ค. 68*	9.84	19.67			2.0788	
	18 ส.ค. 68	10.78	21.95			2.173	
	16 มี.ค. 69	10.27	20.27			2.166	
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)	3 มี.ค. 66*	0.03	0.05	20	1.66	0.0081	0.255
	22 ก.ย. 66*	0.07	0.13			0.0203	
	27 มี.ค. 67*	0.08	0.15			0.0206	
	25 ก.ย. 67*	0.31	0.61			0.0912	
	11 มี.ค. 68*	0.15	0.30			0.0434	
	18 ส.ค. 68	0.20	0.40			0.055	
	16 มี.ค. 69	0.41	0.81			0.120	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) (mg/m ³)	3 มี.ค. 66*	<0.5	<0.5	60	7.108	<0.055	0.416
	22 ก.ย. 66*	<0.5	<0.5			<0.056	
	27 มี.ค. 67*	<0.5	<0.5			<0.052	
	25 ก.ย. 67*	<0.5	<0.5			<0.057	
	11 มี.ค. 68*	<0.5	<0.5			<0.056	
	18 ส.ค. 68	0.42	0.80			0.045	
	16 มี.ค. 69	0.59	1.17			0.067	




หมายเหตุ : ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

* ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 205 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2566

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

^{2/} คำกำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.7/7004 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

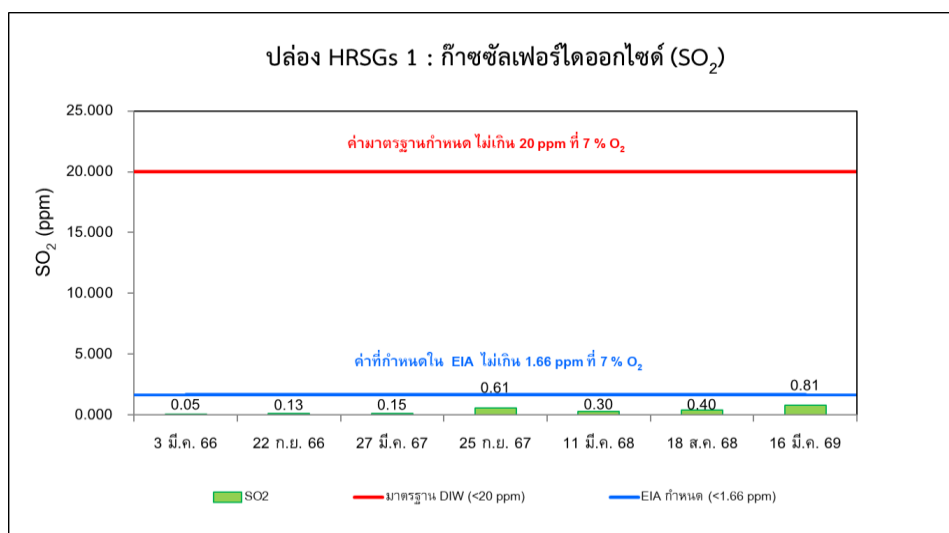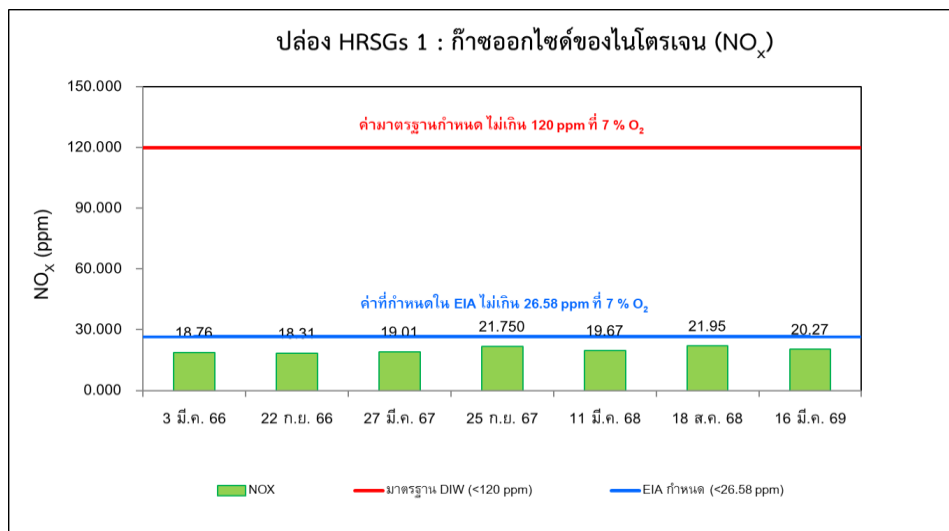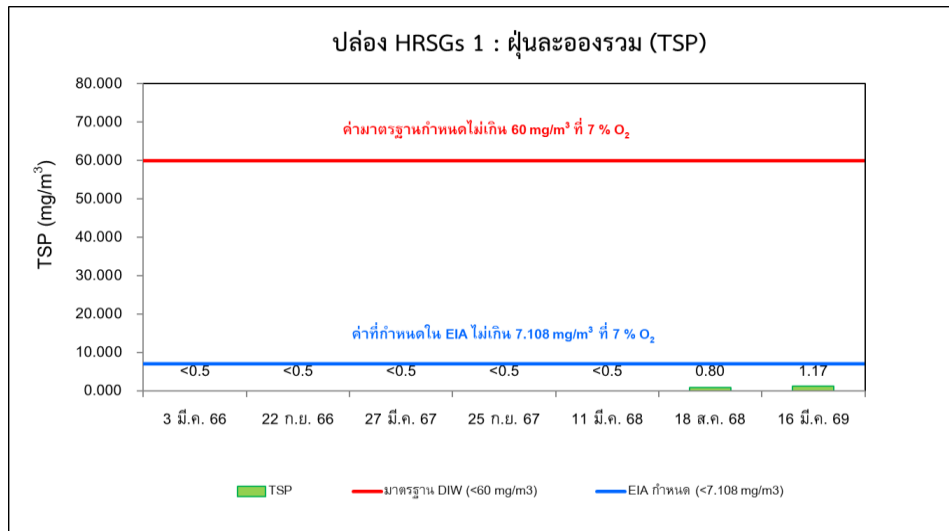

รูปที่ 3.5.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

3.5.2 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS)

มาตรการกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) ปล่องระบายจาก HRSGs จำนวน 6 ปล่อง ทั้งนี้โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของหน่วยผลิตที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ ปล่อง HRSGs 1 โดยตรวจวัดค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ฝุ่นละอองรวม และก๊าซออกซิเจน โดยตรวจวัดตลอดช่วงดำเนินการ มีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และเชื่อมโยงสัญญาณต่อข้อมูลไปยังระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMs) ตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบที่ 50 และเอกสารแนบที่ 51

3.5.3 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS)

มาตรการกำหนดให้มีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) ปล่องระบายจาก HRSGs จำนวน 6 ปล่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับในปี พ.ศ. 2569 ทางโครงการมีแผนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569

3.5.4 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดประชุมมิตรบำรุง บ้านสำนักมะม่วง วัดซากลูกหญ้า และวัดมาบชุลูต โดยตรวจวัดค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction) (เลือกตรวจวัด 1 สถานี) โดยตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) ช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569 สรุปผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.4-1 และแสดงดังรูปที่ 3.5.4-1 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

(1) วัดประชุมมิตรบำรุง

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดประชุมมิตรบำรุง พบว่า ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 49.5-77.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 22.1-46.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3.2-17.9 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.0-3.6 และ 1.6-2.1 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

(2) บ้านสำนักมะม่วง

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณบ้านสำนักมะม่วง พบว่า ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 41.8-68.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 21.2-40.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3.0-10.2 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.2-3.9 และ 2.0-2.5 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

(3) วัดขากลูกหญ้า

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดขากลูกหญ้า พบว่า ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 51.8-64.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 20.6-24.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3.0-14.0 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.1-3.9 และ 1.9-2.5 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

(4) วัดมาบชุลุด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดมาบชุลุด พบว่า ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 52.3-66.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 22.4-36.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3.9-15.1 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.0-3.5 และ 1.9-2.6 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ

เมื่อนำผลการตรวจวัดทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 120 ส่วนในล้านส่วน ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 100 และ 50 ส่วนในล้านส่วน พบว่า ผลการตรวจวัดทุกสถานีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด


ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (WS/WD)

สำหรับผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมที่ดำเนินการตรวจวัดบริเวณวัดมาบชุลุด ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569 พบว่า ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางทิศใต้ (SSE) คิดเป็นร้อยละ 11.31 ด้วยความเร็วลม 0.9-2.7 เมตร/วินาที รองลงมาเป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ (N) คิดเป็นร้อยละ 5.36 ด้วยความเร็วลม 0.9-2.7 เมตร/วินาที ส่วนลมสงบ คิดเป็นร้อยละ 49.40 แสดงดังตารางที่ 3.5.4-2 ถึงตารางที่ 3.5.4-3 และรูปที่ 3.5.4-2

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568 เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สำหรับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และปี พ.ศ. 2569 เมื่อนำผลการตรวจวัดทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดทุกสถานีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.4-4 และรูปที่ 3.5.4-3

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแนวโน้มของผลการตรวจวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

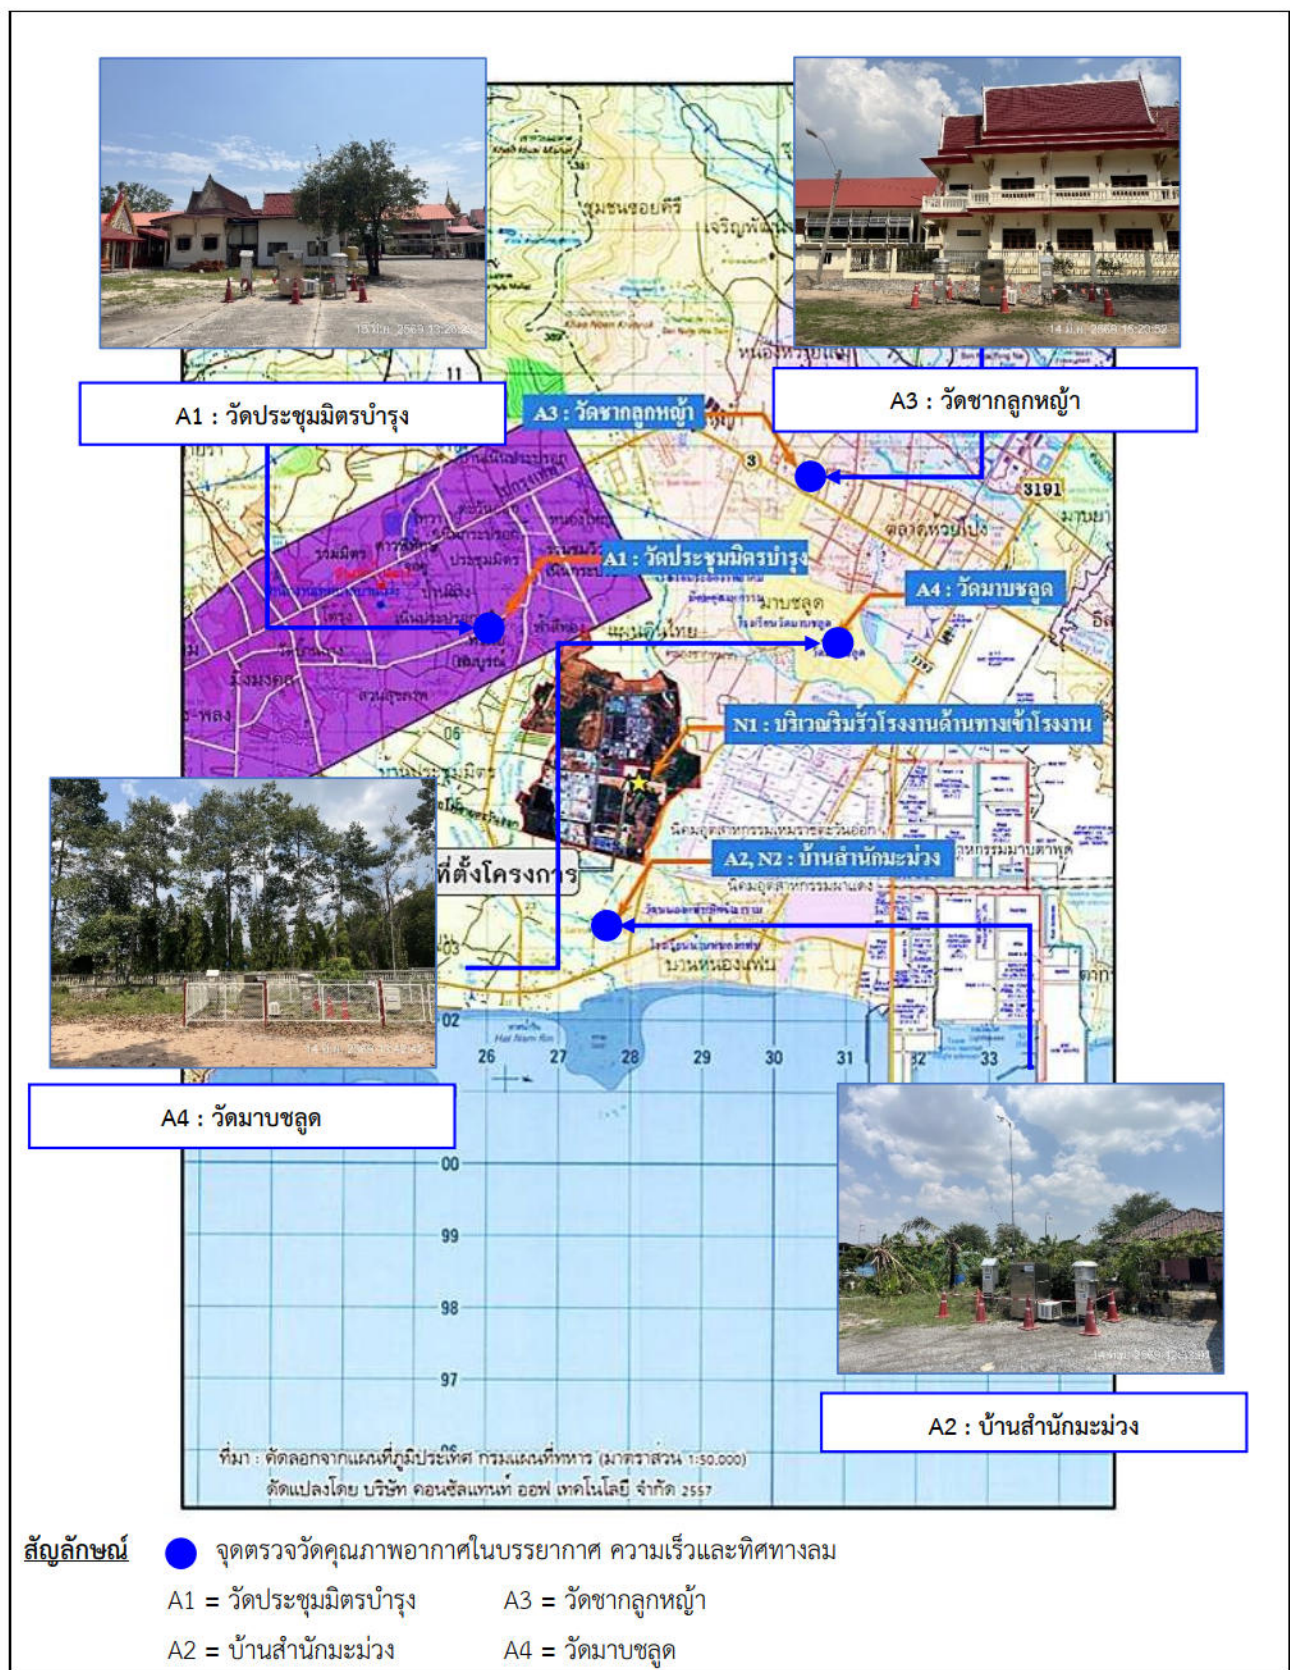

รูปที่ 3.5.4-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วและทิศทางลม

ตารางที่ 3.5.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	SO ₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	SO ₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)
1. วัดประชุมมิตรบำรุง (47P 0726443E, 1407365N)	12-13 มี.ค. 69	57.8	41.3	5.3-17.9	1.2-2.8	1.8
	13-14 มี.ค. 69	64.2	29.8	4.5-16.9	1.0-2.6	1.8
	14-15 มี.ค. 69	77.1	46.6	5.9-16.0	1.3-2.7	2.0
	15-16 มี.ค. 69	54.2	29.0	6.7-11.0	1.1-2.9	1.7
	16-17 มี.ค. 69	66.0	35.3	3.2-11.1	1.2-2.2	1.6
	17-18 มี.ค. 69	49.5	22.1	3.4-9.5	1.4-2.6	1.9
	18-19 มี.ค. 69	62.1	25.3	4.4-10.9	1.3-3.6	2.1
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		49.5-77.1	22.1-46.6	3.2-17.9	1.0-3.6	1.6-2.1
2. บ้านสำนักมะม่วง (47P 0728262E, 1403382N)	12-13 มี.ค. 69	61.4	40.4	4.8-9.5	1.4-3.6	2.5
	13-14 มี.ค. 69	60.6	36.2	3.5-8.8	1.3-3.5	2.5
	14-15 มี.ค. 69	68.9	35.6	4.6-10.0	1.2-3.6	2.4
	15-16 มี.ค. 69	62.9	28.9	3.1-9.8	1.4-3.6	2.3
	16-17 มี.ค. 69	53.2	30.9	4.5-10.2	1.5-3.9	2.4
	17-18 มี.ค. 69	41.8	21.2	4.0-7.8	1.3-2.9	2.0
	18-19 มี.ค. 69	42.7	21.9	3.0-9.5	1.5-3.6	2.5
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		41.8-68.9	21.2-40.4	3.0-10.2	1.2-3.9	2.0-2.5
มาตรฐาน ^{1/}		≤200	≤100	≤120	≤100	≤50

หมายเหตุ : - ข้อมูลตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงในภาคผนวก ก คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569

ตารางที่ 3.5.4-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	SO ₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	SO ₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)
3. วัดซากลูกหญ้า (47P 0730055E, 1409674N)	12-13 มี.ค. 69	57.3	24.3	4.3-14.0	1.2-3.7	2.2
	13-14 มี.ค. 69	57.3	20.6	4.5-12.0	1.1-3.3	2.0
	14-15 มี.ค. 69	51.8	23.7	4.1-8.0	1.4-3.4	2.2
	15-16 มี.ค. 69	56.4	21.6	4.1-6.7	1.1-2.8	1.9
	16-17 มี.ค. 69	57.1	21.9	3.0-10.9	1.3-3.9	2.2
	17-18 มี.ค. 69	64.5	22.1	3.0-12.6	1.4-2.7	1.9
	18-19 มี.ค. 69	59.0	21.3	5.5-12.3	1.4-3.9	2.5
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		51.8-64.5	20.6-24.3	3.0-14.0	1.1-3.9	1.9-2.5
4. วัดมาบขลุ่ย (47P 0730821E, 1407374N)	12-13 มี.ค. 69	58.6	23.6	4.1-9.2	1.0-3.2	2.2
	13-14 มี.ค. 69	61.3	31.3	5.0-15.1	1.0-3.4	2.2
	14-15 มี.ค. 69	60.0	22.4	3.9-7.9	1.3-3.4	2.3
	15-16 มี.ค. 69	52.3	24.7	5.4-10.8	1.2-3.5	2.6
	16-17 มี.ค. 69	58.6	24.3	4.3-12.1	1.2-3.1	2.3
	17-18 มี.ค. 69	66.6	25.9	4.5-11.1	1.4-2.7	2.0
	18-19 มี.ค. 69	57.7	36.9	4.9-11.6	1.3-2.7	1.9
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		52.3-66.6	22.4-36.9	3.9-15.1	1.0-3.5	1.9-2.6
มาตรฐาน ^{1/}		≤200	≤100	≤120	≤100	≤50

หมายเหตุ : - ข้อมูลตรวจวัดรายชั่วโมง แสดงในภาคผนวก ก คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569

ตารางที่ 3.5.4-2 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง บริเวณวัดมาบชลด

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

เวลา	บริเวณวัดมาบชลด (พิกัด UTM: 47P 730836E, 1407438N)							
	12-13 มี.ค. 69		13-14 มี.ค. 69		14-15 มี.ค. 69		15-16 มี.ค. 69	
	ความเร็ว (m/s)	ทิศทาง	ความเร็ว (m/s)	ทิศทาง	ความเร็ว (m/s)	ทิศทาง	ความเร็ว (m/s)	ทิศทาง
16:00-17:00	-	ลมสงบ	SE	2.2	SE	1.3	SSW	2.2
17:00-18:00	-	ลมสงบ	NW	4.9	SW	1.3	SW	1.3
18:00-19:00	-	ลมสงบ	N	2.7	SSW	1.3	SSW	0.9
19:00-20:00	-	ลมสงบ	NE	0.9	SW	0.9	-	ลมสงบ
20:00-21:00	-	ลมสงบ	E	1.3	WNW	0.9	SW	0.9
21:00-22:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	WSW	0.9
22:00-23:00	W	0.9	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
23:00-00:00	W	0.9	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	W	0.9
00:00-01:00	-	ลมสงบ	N	0.9	-	ลมสงบ	W	0.9
01:00-02:00	-	ลมสงบ	N	0.9	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
02:00-03:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
03:00-04:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	WNW	0.9	SSE	0.9
04:00-05:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	WNW	0.9	-	ลมสงบ
05:00-06:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
06:00-07:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
07:00-08:00	WNW	0.9	N	0.9	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
08:00-09:00	-	ลมสงบ	N	1.8	NW	0.9	-	ลมสงบ
09:00-10:00	NNE	0.9	N	1.8	NNE	0.9	-	ลมสงบ
10:00-11:00	NE	1.3	NE	1.3	NNE	1.3	-	ลมสงบ
11:00-12:00	E	1.8	NE	1.8	ENE	1.8	-	ลมสงบ
12:00-13:00	E	1.8	NE	1.3	SE	2.2	E	2.2
13:00-14:00	E	2.2	NW	1.8	SE	2.7	SW	1.3
14:00-15:00	E	4.0	SSE	1.8	SSE	2.7	WNW	1.3
15:00-16:00	ESE	3.1	SSE	1.8	SSE	2.2	-	ลมสงบ

หมายเหตุ : - m/s หมายถึง เมตรต่อวินาที


ตารางที่ 3.5.4-2 (ต่อ)

เวลา	บริเวณวัดมาบชลด (พิกัด UTM: 47P 730836E, 1407438N)					
	16-17 มี.ค. 69		17-18 มี.ค. 69		18-19 มี.ค. 69	
	ความเร็ว (m/s)	ทิศทาง	ความเร็ว (m/s)	ทิศทาง	ความเร็ว (m/s)	ทิศทาง
16:00-17:00	-	ลมสงบ	SSE	1.8	SSE	1.8
17:00-18:00	SSE	0.9	SSE	1.8	SSE	2.2
18:00-19:00	SW	0.9	SSE	0.9	SSE	1.3
19:00-20:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
20:00-21:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	SSE	1.3
21:00-22:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
22:00-23:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
23:00-00:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
00:00-01:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	W	0.9
01:00-02:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	WNW	0.9
02:00-03:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
03:00-04:00	-	ลมสงบ	NW	1.3	-	ลมสงบ
04:00-05:00	-	ลมสงบ	NW	0.9	-	ลมสงบ
05:00-06:00	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
06:00-07:00	E	2.7	-	ลมสงบ	WNW	0.9
07:00-08:00	NNE	2.2	-	ลมสงบ	WNW	0.9
08:00-09:00	N	1.8	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
09:00-10:00	N	1.3	-	ลมสงบ	-	ลมสงบ
10:00-11:00	N	0.9	-	ลมสงบ	SSE	1.8
11:00-12:00	SE	0.9	-	ลมสงบ	SE	1.8
12:00-13:00	SE	1.8	SE	1.8	SE	0.9
13:00-14:00	SSE	1.8	SSE	2.2	SE	0.9
14:00-15:00	SSE	2.2	SE	1.8	-	ลมสงบ
15:00-16:00	SSE	1.3	SSE	2.2	-	ลมสงบ

หมายเหตุ : - m/s หมายถึง เมตรต่อวินาที

ตารางที่ 3.5.4-3 ร้อยละของทิศทางและความเร็วลม บริเวณวัดมาบชลูด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ทิศทางลม ความเร็วลม	ร้อยละของความเร็วลม				
	0.5-1.0 m/s	1.1-2.0 m/s	2.1-3.0 m/s	3.1-4.0 m/s	>4.0 m/s
N	2.38	2.38	0.60	-	-
NNE	1.19	0.60	0.60	-	-
NE	0.60	2.38	-	-	-
ENE	-	0.60	-	-	-
E	-	1.79	1.79	0.60	-
ESE	-	-	-	0.60	-
SE	1.79	2.98	1.79	-	-
SSE	1.79	5.95	3.57	-	-
S	-	-	-	-	-
SSW	0.60	0.60	0.60	-	-
SW	1.79	1.79	-	-	-
WSW	0.60	-	-	-	-
W	2.98	-	-	-	-
WNW	4.17	0.60	-	-	-
NW	1.19	1.19	-	-	0.60
NNW	-	-	-	-	-
ลมสงบ	49.40				

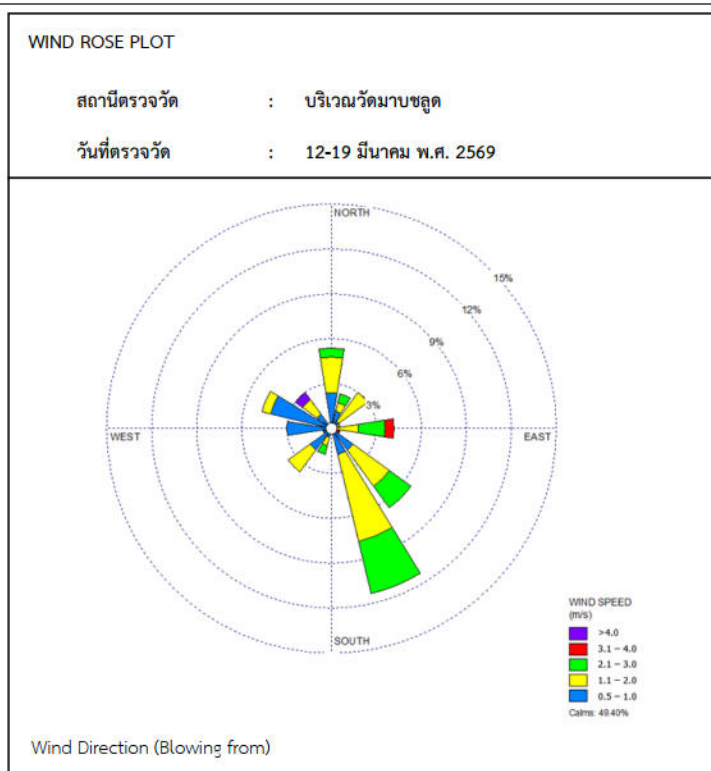

รูปที่ 3.5.4-2 ผังลมบริเวณวัดมาบชลูด ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3.5.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	SO ₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	SO ₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)
1. วัดประชุมมิตรบำรุง (47P 0726443E, 1407365N)	1-8 มี.ค. 66*	84.0-127.0	46.0-70.0	30.0-50.0	5.0-6.0	6.0
	19-26 ก.ย. 66*	21.0-42.0	14.0-25.0	4.0-11.0	2.0	2.0
	22-29 มี.ค. 67*	33.0-70.0	17.0-32.0	9.0-24.0	1.0-2.0	2.0-3.0
	24-ก.ย.-1 ต.ค. 67*	19.0-39.0	14.0-31.0	11.5-18.6	2.2-3.0	2.3-3.8
	9-16 มี.ค. 68*	24.0-58.0	15.0-34.0	6.2-16.3	2.7-2.9	3.0-3.7
	18-25 ส.ค. 68	35.0-46.0	16.0-23.0	11.0-13.0	4.0	2.0-3.0
	12-19 มี.ค. 69	49.5-77.1	22.1-46.6	3.2-17.9	1.0-3.6	1.6-2.1
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		19.0-127.0	14.0-70.0	3.2-50.0	1.0-6.0	1.6-6.0
2. บ้านสำนักมะม่วง (47P 0728262E, 1403382N)	1-8 มี.ค. 66*	106.0-159.0	40.0-91.0	2.0-19.0	3.0-4.0	4.0
	19-26 ก.ย. 66*	20.0-56.0	10.0-27.0	3.0-14.0	<1.0-1.0	1.0-2.0
	22-29 มี.ค. 67*	28.0-39.0	14.0-21.0	8.0-20.0	2.0-3.0	2.0-7.0
	24-ก.ย.-1 ต.ค. 67*	12.0-47.0	11.0-33.0	1.0-6.0	2.0-3.0	2.0-3.0
	9-16 มี.ค. 68*	26.0-66.0	10.0-30.0	2.0-15.0	2.0	2.0-3.0
	18-25 ส.ค. 68	36.0-50.0	15.0-26.0	5.0-30.0	4.0	2.0-3.0
	12-19 มี.ค. 69	41.8-68.9	21.2-40.4	3.0-10.2	1.2-3.9	2.0-2.5
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		19.0-159.0	10.0-91.0	1.0-30.0	<1.0-4.0	1.0-7.0
มาตรฐาน		$\leq 330^{1/}$	$\leq 120^{1/}$	$\leq 170^{2/}$	$\leq 300^{3/}$	$\leq 120^{1/}$
มาตรฐาน ^{4/}		≤ 200	≤ 100	≤ 120	≤ 100	≤ 50

หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท แอลแอลเอส แลบบอราทอรี กรู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544
^{4/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569

ตารางที่ 3.5.4-4 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	SO ₂ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	SO ₂ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)
3. วัดซากลูกหญ้า (47P 0730055E, 1409674N)	1-8 มี.ค. 66*	98.0-200.0	75.0-105.0	9.0-33.0	<1.0	<1.0-1.0
	19-26 ก.ย. 66*	27.0-92.0	19.0-36.0	11.0-20.0	3.0-4.0	3.0-6.0
	22-29 มี.ค. 67*	58.0-80.0	26.0-38.0	3.0-59.0	1.0-2.0	2.0-3.0
	24-ก.ย.-1 ต.ค. 67*	35.0-48.0	19.0-27.0	10.0-21.0	3.0	3.0-5.0
	9-16 มี.ค. 68*	30.0-60.0	20.0-35.0	5.0-20.0	2.0-3.0	3.0
	18-25 ส.ค. 68	40.0-55.0	19.0-31.0	12.0-14.0	5.0	3.0-4.0
	12-19 มี.ค. 69	51.8-64.5	20.6-24.3	3.0-14.0	1.1-3.9	1.9-2.5
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		27.0-200.0	19.0-105.0	3.0-59.0	<1.0-5.0	1.9-6.0
4. วัดมาบชลูด (47P 0730821E, 1407374N)	1-8 มี.ค. 66*	94.0-146.0	44.0-67.0	2.0-15.0	2.0	2.0
	19-26 ก.ย. 66*	25.0-68.0	15.0-35.0	6.0-10.0	1.0	1.0-2.0
	22-29 มี.ค. 67*	72.0-94.0	28.0-33.0	8.0-30.0	4.0-7.0	6.0-16.0
	24-ก.ย.-1 ต.ค. 67*	26.0-57.0	17.0-33.0	3.0-9.0	2.0-3.0	3.0
	9-16 มี.ค. 68*	24.0-69.0	16.0-39.0	9.0-17.0	2.0-3.0	3.0
	18-25 ส.ค. 68	34.0-49.0	14.0-29.0	7.0-14.0	4.0	2.0-3.0
	12-19 มี.ค. 69	52.3-66.6	22.4-36.9	3.9-15.1	1.0-3.5	1.9-2.6
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		24.0-146.0	14.0-67.0	2.0-30.0	1.0-7.0	1.0-16.0
มาตรฐาน		$\leq 330^{1/}$	$\leq 120^{1/}$	$\leq 170^{2/}$	$\leq 300^{3/}$	$\leq 120^{1/}$
มาตรฐาน ^{4/}		≤ 200	≤ 100	≤ 120	≤ 100	≤ 50



หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547



^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544


^{4/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569

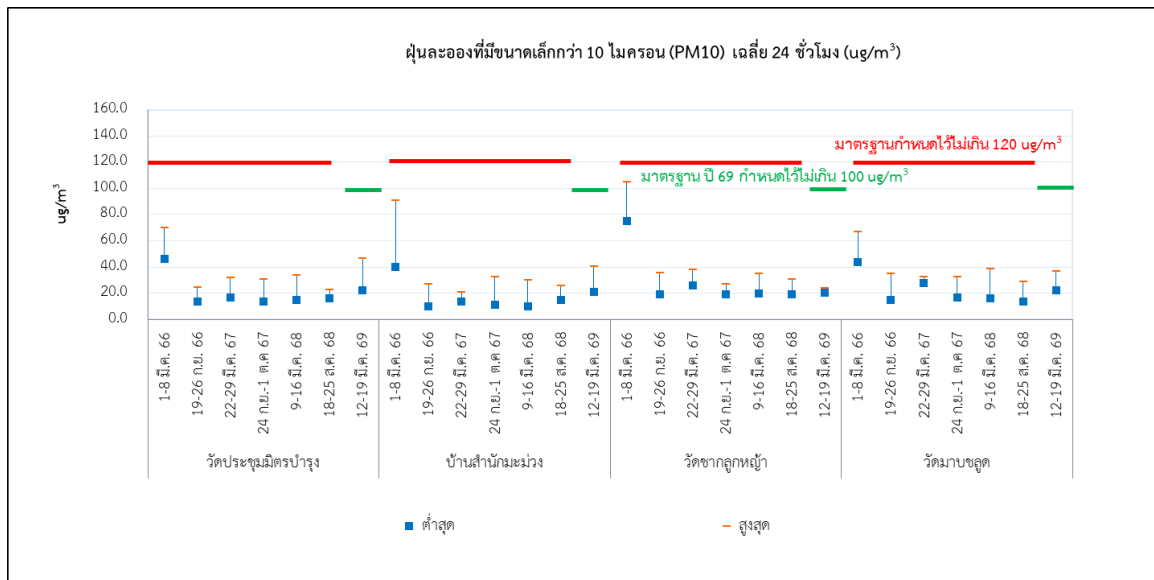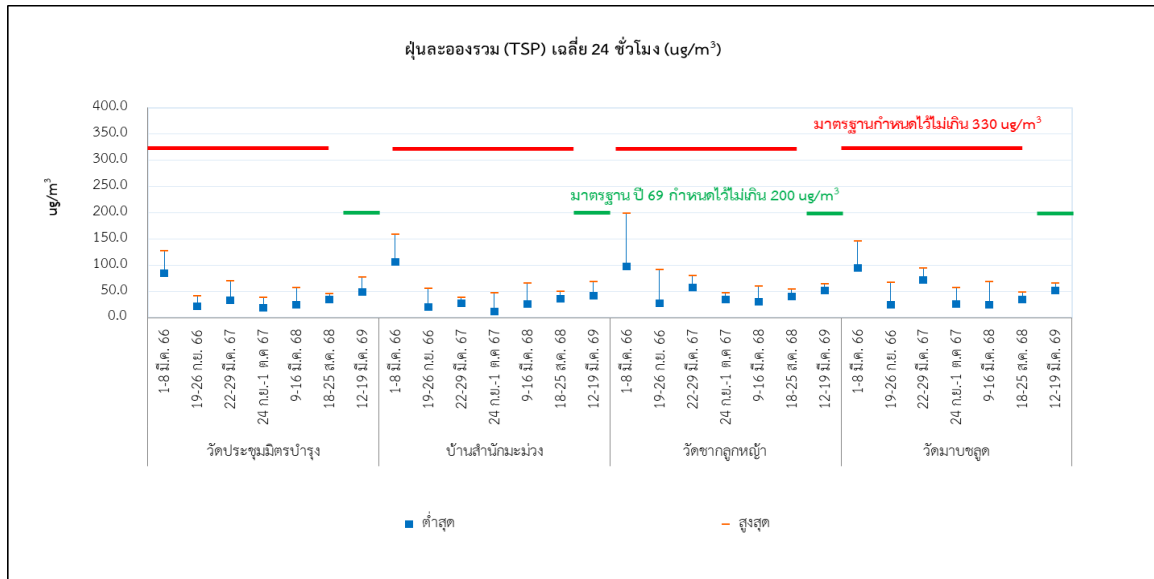

รูปที่ 3.5.4-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

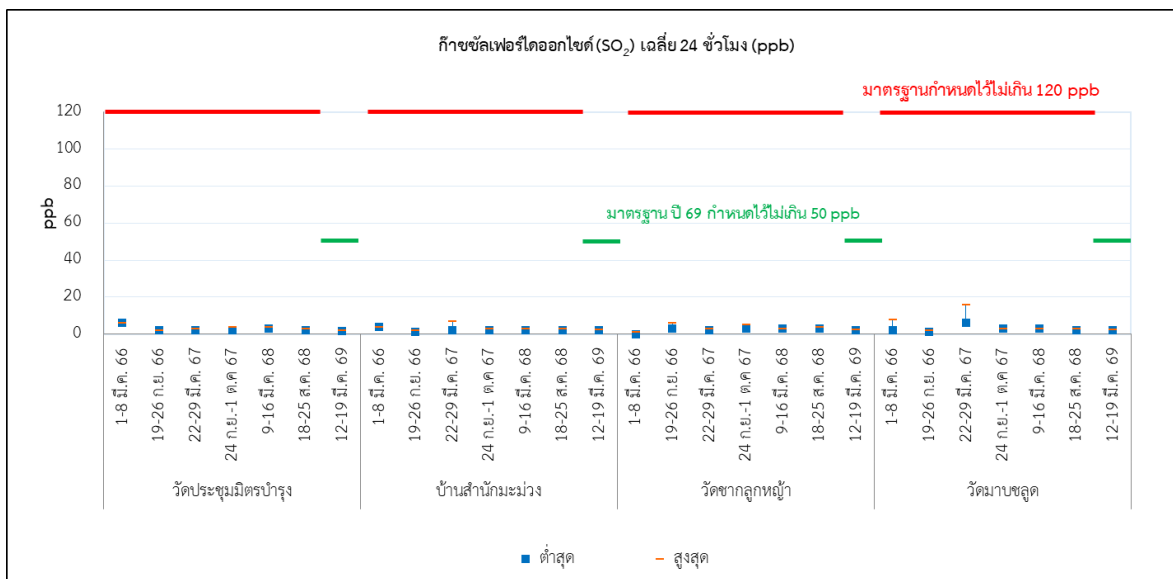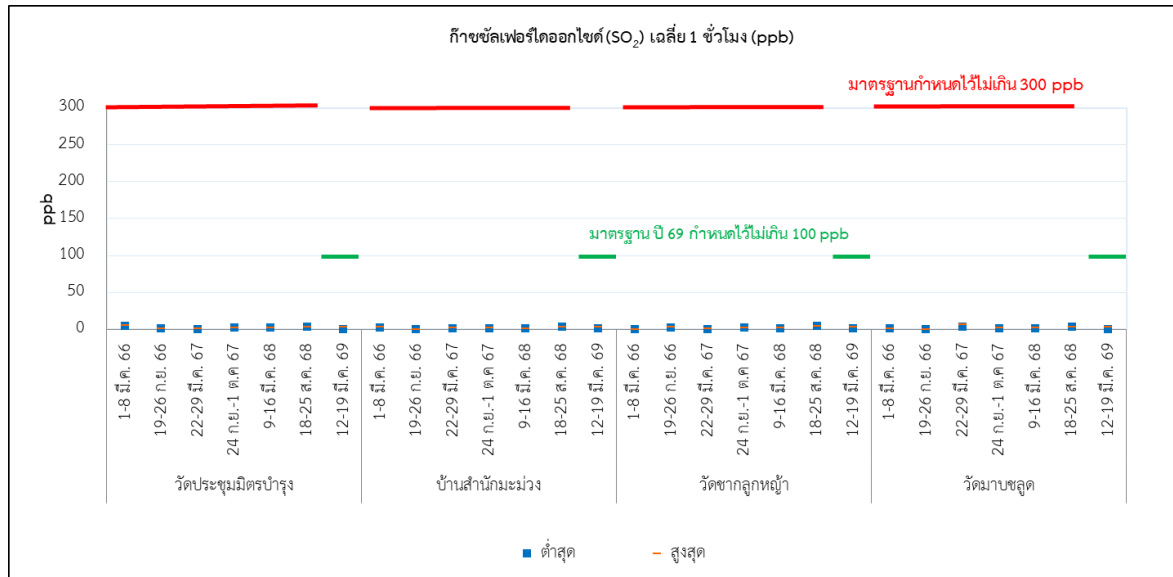

รูปที่ 3.5.4-3 (ต่อ)

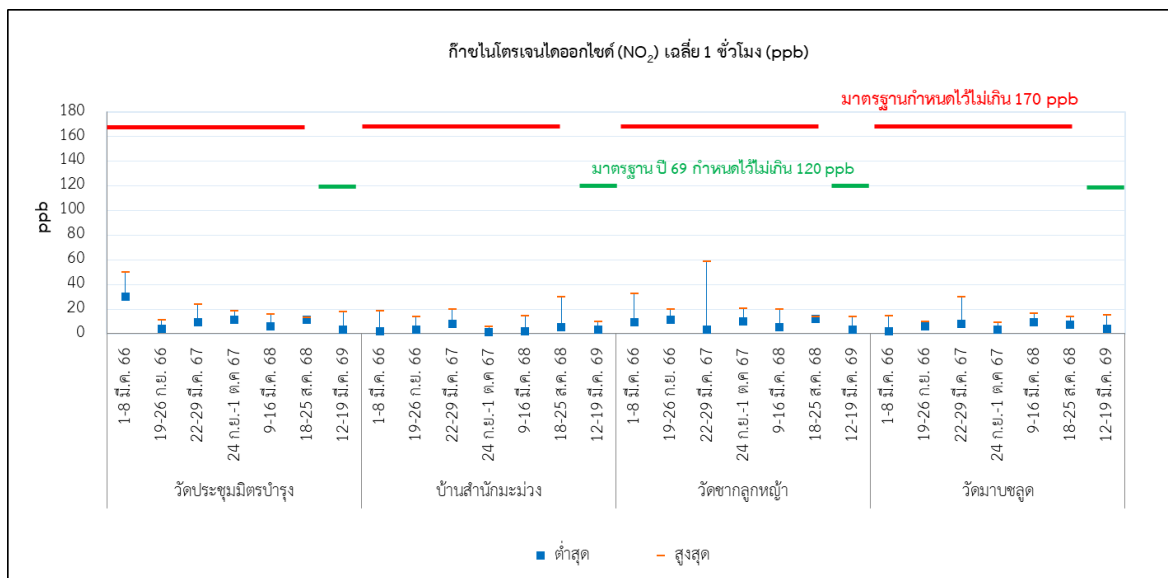

รูปที่ 3.5.4-3 (ต่อ)

3.5.5 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จากปล่องระบายจาก HRSGs จำนวน 6 ปล่อง โดยตรวจวัดค่าแอมโมเนีย ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จากปล่องของหน่วยผลิตที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ ปล่อง HRSGs 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 แสดงดังตารางที่ 3.5.5-1

จากการตรวจวัดค่าแอมโมเนียจากปล่อง HRSGs 1 พบว่า มีค่าน้อยกว่าค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้ (<0.0575 ส่วนในล้านส่วน (ppm)) สำหรับค่าแอมโมเนียจากปล่อง ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่า ค่าแอมโมเนียมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงดังตารางที่ 3.5.5-2 และรูปที่ 3.5.5-1


ตารางที่ 3.5.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จากปล่อง HRSGs 1

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
		แอมโมเนีย (ppm)
ปล่อง HRSGs 1	16 มี.ค. 69	N.D. (<0.0575)
มาตรฐาน		-

ตารางที่ 3.5.5-2 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จากปล่อง HRSGs 1
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
		แอมโมเนีย (ppm)
ปล่อง HRSGs 1	3 มี.ค. 66*	0.55
	22 ก.ย. 66*	1.31
	27 มี.ค. 67*	0.28
	25 ก.ย. 67*	0.48
	11 มี.ค. 68*	0.20
	18 ส.ค. 68	0.81
	16 มี.ค. 69	N.D. (<0.0575)
มาตรฐาน		-

หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

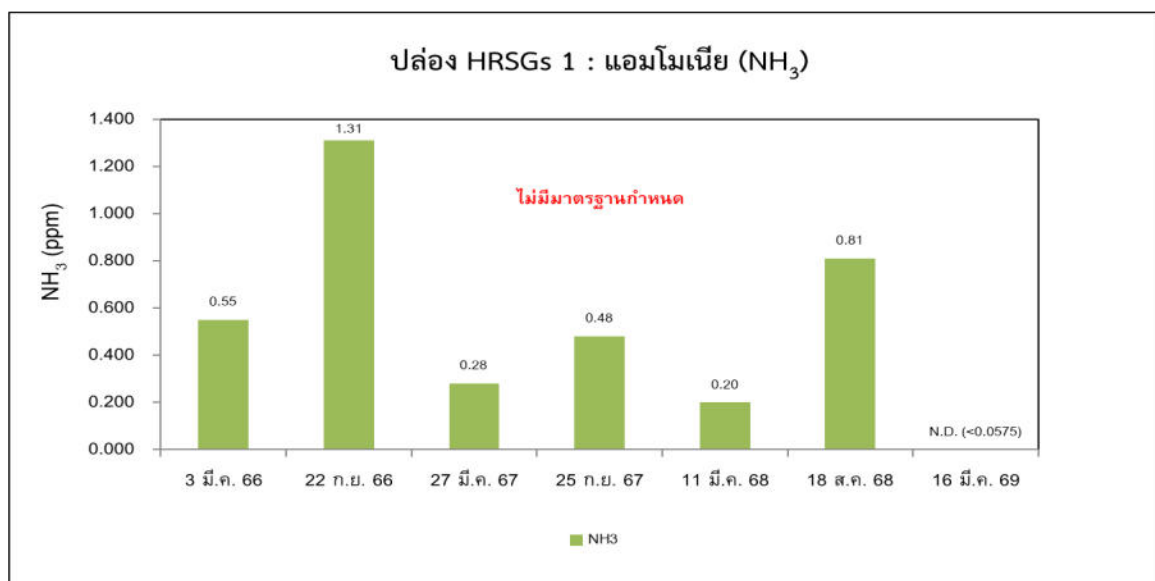

รูปที่ 3.5.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการจากปล่อง HRSGs 1
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

3.5.6 ระดับเสียง

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ และบริเวณบ้านสำนักมะม่วง โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) โดยตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุด

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569 แสดงดังรูปที่ 3.5.6-1 และผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.6-1 และตารางที่ 3.5.6-2

(1) บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ

จากการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569 พบว่า มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) มีค่าอยู่ในช่วง 56.8-60.9 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 90.0-96.9 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 49.6-53.8 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มีค่าอยู่ในช่วง 61.0-67.6 เดซิเบล (เอ)


(2) บริเวณบ้านสำนักมะม่วง

จากการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณบ้านสำนักมะม่วง ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569 พบว่า มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) มีค่าอยู่ในช่วง 48.3-53.6 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 80.3-88.3 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 44.6-49.7 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มีค่าอยู่ในช่วง 54.2-61.9 เดซิเบล (เอ)

ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 สำหรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

การเปรียบเทียบระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ และบริเวณบ้านสำนักมะม่วง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5.6-3 และรูปที่ 3.5.6-2 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 สำหรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ เมื่อพิจารณาแนวโน้มพบว่า มีแนวโน้มคงที่เช่นกัน

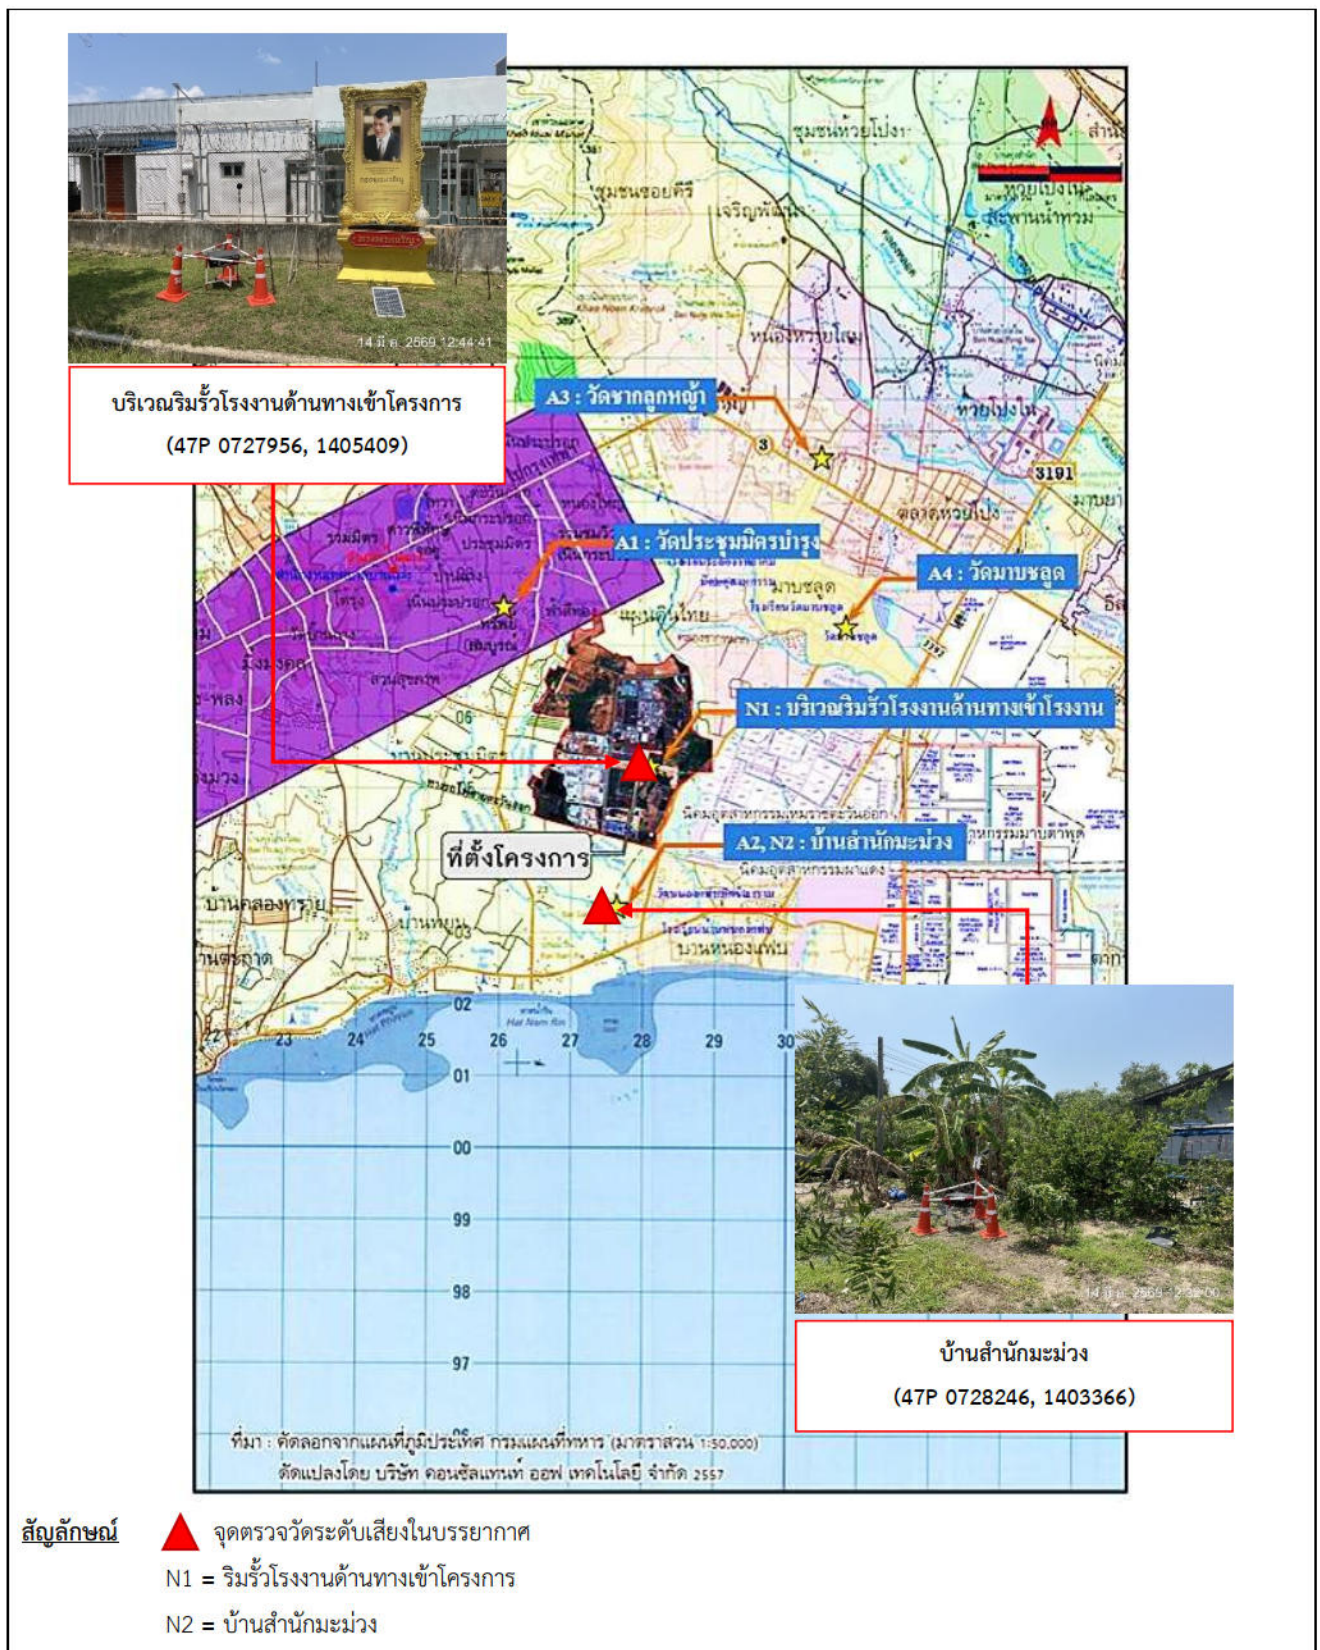

รูปที่ 3.5.6-1 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ

ตารางที่ 3.5.6-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ
ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: 47P 0727958E, 1405412N

เวลา	ผลการตรวจวัด [dB(A)]									มาตรฐาน ^{1/,2/}
	12-13 มี.ค. 69			13-14 มี.ค. 69			14-15 มี.ค. 69			
	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	
10:00-11:00	61.6	88.4	50.0	57.9	82.6	49.5	60.6	90.0	51.0	-
11:00-12:00	57.9	83.0	47.9	57.0	80.1	49.8	56.5	80.7	49.5	
12:00-13:00	58.6	86.6	48.0	62.9	94.1	52.1	59.3	84.4	51.9	
13:00-14:00	60.5	85.8	48.1	59.7	83.5	51.7	61.0	91.0	53.1	
14:00-15:00	58.5	84.9	49.0	58.5	75.3	52.6	60.4	85.2	52.4	
15:00-16:00	55.6	80.3	50.3	61.5	87.9	52.7	60.8	83.5	52.0	
16:00-17:00	58.0	91.6	50.7	60.7	80.0	53.0	60.4	88.2	52.4	
17:00-18:00	53.4	80.9	51.0	62.0	86.8	55.7	65.0	89.2	59.3	
18:00-19:00	52.9	66.8	51.7	60.9	89.4	51.1	61.6	84.0	53.6	
19:00-20:00	53.4	77.6	51.1	54.4	77.4	50.4	55.0	77.9	49.2	
20:00-21:00	59.1	79.5	51.2	54.4	81.5	49.6	54.5	75.0	52.8	
21:00-22:00	59.5	91.0	52.2	52.8	77.3	49.7	53.5	74.2	51.6	
22:00-23:00	61.2	94.1	51.5	53.4	79.7	49.8	51.5	69.5	49.9	
23:00-00:00	62.3	95.9	51.7	53.3	80.9	50.3	51.2	62.3	50.0	
00:00-01:00	60.5	82.3	53.3	50.3	59.2	49.6	50.8	65.2	49.8	
01:00-02:00	64.7	88.7	56.1	52.1	79.2	50.0	52.0	75.5	50.1	
02:00-03:00	61.7	85.3	52.0	51.4	65.6	50.5	51.5	67.8	50.1	
03:00-04:00	59.6	84.5	50.9	51.8	79.8	50.3	50.8	69.4	49.7	
04:00-05:00	58.8	86.4	51.5	57.4	78.3	53.2	58.8	79.1	52.4	
05:00-06:00	55.3	74.4	52.0	60.4	82.8	51.3	62.8	84.3	54.2	
06:00-07:00	54.9	76.4	51.3	59.1	85.4	50.9	61.5	93.1	51.1	
07:00-08:00	55.1	76.9	50.6	58.3	84.7	51.6	59.9	83.6	54.5	
08:00-09:00	59.6	83.3	51.2	60.6	93.0	51.7	58.1	80.3	52.2	
09:00-10:00	60.1	90.6	51.2	59.2	94.1	51.8	60.9	84.9	52.8	
Leq 24 hrs	59.4	-	-	58.5	-	-	59.3	-	-	70
Ldn	67.0	-	-	63.0	-	-	64.3	-	-	-
Lmax	-	95.9	-	-	94.1	-	-	93.1	-	115
L90	-	-	51.4	-	-	51.5	-	-	52.6	-

ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.5.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ
ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: 47P 0727958E, 1405412N

เวลา	ผลการตรวจวัด [dB(A)]												มาตรฐาน ^{1/,2/}
	15-16 มี.ค. 69			16-17 มี.ค. 69			17-18 มี.ค. 69			18-19 มี.ค. 69			
	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	
10:00-11:00	59.1	84.7	49.1	59.4	83.7	49.1	61.8	80.5	54.3	61.0	86.2	49.9	-
11:00-12:00	58.1	80.4	50.7	59.0	83.4	50.5	60.1	87.0	49.1	59.1	90.0	49.9	
12:00-13:00	59.8	82.9	52.3	60.0	83.7	52.7	58.5	77.7	51.4	56.8	76.0	49.7	
13:00-14:00	60.9	91.1	53.4	61.9	94.8	52.9	58.4	76.6	51.8	56.7	74.9	50.1	
14:00-15:00	62.1	90.3	52.7	60.4	85.8	52.5	60.3	86.3	52.1	58.6	84.6	50.4	
15:00-16:00	62.2	91.0	53.3	62.0	81.7	52.1	64.3	94.1	54.1	60.3	81.0	52.4	
16:00-17:00	62.7	82.6	53.9	64.4	94.4	52.4	59.9	82.4	53.2	58.2	80.7	51.5	
17:00-18:00	64.1	85.8	56.1	61.4	83.1	53.1	62.0	84.5	54.5	60.3	82.8	52.8	
18:00-19:00	63.6	96.9	53.7	58.5	79.3	51.3	59.2	79.2	52.1	57.5	77.5	50.4	
19:00-20:00	62.7	89.4	53.2	58.2	87.4	50.7	56.5	77.7	50.9	54.8	76.0	49.2	
20:00-21:00	60.6	89.1	53.0	54.9	79.2	51.0	53.3	79.6	49.2	51.6	77.9	47.5	
21:00-22:00	57.8	81.4	51.1	55.8	76.4	50.9	51.8	75.5	49.2	50.1	73.8	47.5	
22:00-23:00	52.7	75.8	49.9	57.9	73.0	51.2	52.4	76.6	49.1	50.7	74.9	47.4	
23:00-00:00	54.4	72.9	50.2	58.4	81.5	53.1	50.1	68.4	48.9	48.4	66.7	47.2	
00:00-01:00	50.8	59.6	49.7	58.6	72.7	53.6	50.2	65.6	49.1	48.5	63.9	47.4	
01:00-02:00	50.8	63.4	49.7	52.8	75.0	51.4	50.8	74.1	49.2	49.1	72.4	47.5	
02:00-03:00	50.6	64.1	49.7	51.8	60.0	51.1	51.6	81.3	49.3	49.9	79.6	47.6	
03:00-04:00	52.0	80.1	49.4	51.9	69.0	50.9	49.9	69.7	48.8	48.2	68.0	47.1	
04:00-05:00	62.4	86.2	56.0	56.3	81.3	52.2	54.9	78.8	50.0	53.2	77.1	48.3	
05:00-06:00	59.8	78.9	52.8	60.8	83.1	52.0	60.5	86.0	50.2	58.8	84.3	48.5	
06:00-07:00	60.8	89.6	55.1	68.9	87.1	62.9	59.5	81.7	51.3	57.8	80.0	49.6	
07:00-08:00	59.9	82.0	53.0	62.0	84.2	54.4	60.3	84.6	53.6	58.6	82.9	51.9	
08:00-09:00	61.1	87.6	51.7	62.9	87.7	55.0	59.8	83.4	50.7	58.1	81.7	49.0	
09:00-10:00	60.7	85.4	51.3	60.5	85.7	53.4	58.4	81.4	49.9	56.7	79.7	48.2	
Leq 24 hrs	60.3	-	-	60.9	-	-	58.7	-	-	56.8	-	-	70
Ldn	64.6	-	-	67.6	-	-	62.7	-	-	61.0	-	-	-
Lmax	-	96.9	-	-	94.8	-	-	94.1	-	-	90.0	-	115
L90	-	-	52.6	-	-	53.8	-	-	51.3	-	-	49.6	-

ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.5.6-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณบ้านสำนักมะม่วง

ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: 47P 0728253E, 1403369N

เวลา	ผลการตรวจวัด [dB(A)]									มาตรฐาน ^{1/2/}
	12-13 มี.ค. 69			13-14 มี.ค. 69			14-15 มี.ค. 69			
	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	
10:00-11:00	45.0	67.6	42.7	49.1	65.9	44.1	50.1	66.9	47.3	-
11:00-12:00	45.0	62.7	42.7	47.6	65.4	43.8	51.9	83.1	47.3	
12:00-13:00	47.0	67.4	42.6	48.3	68.1	44.1	50.4	75.5	46.8	
13:00-14:00	45.9	66.5	43.1	50.2	78.8	44.0	49.0	67.1	47.8	
14:00-15:00	45.9	63.6	43.6	45.5	63.2	44.0	49.6	69.5	47.7	
15:00-16:00	47.9	68.3	43.5	45.7	65.6	43.9	49.6	69.6	47.7	
16:00-17:00	46.7	67.4	43.7	45.7	72.0	44.0	48.7	61.2	47.7	
17:00-18:00	50.7	74.2	43.5	45.4	52.2	44.3	51.5	76.3	48.0	
18:00-19:00	49.3	78.1	43.1	46.1	63.7	45.2	49.6	66.2	47.8	
19:00-20:00	45.4	69.1	43.3	45.7	67.3	44.8	48.1	66.8	47.3	
20:00-21:00	45.4	64.9	43.4	45.6	63.7	44.8	48.6	63.1	47.9	
21:00-22:00	44.7	71.3	43.2	44.5	64.7	43.5	48.7	73.0	47.9	
22:00-23:00	44.7	66.4	43.4	43.7	54.6	42.9	48.7	66.2	48.2	
23:00-00:00	45.5	59.4	44.5	45.1	67.6	43.3	48.7	58.5	48.2	
00:00-01:00	45.0	66.6	44.0	64.1	81.2	59.6	48.7	64.4	48.3	
01:00-02:00	44.9	63.0	44.1	54.0	72.5	50.6	48.7	70.1	48.3	
02:00-03:00	44.4	64.0	43.3	54.7	66.1	52.1	48.7	66.8	48.2	
03:00-04:00	43.1	59.1	42.3	51.5	70.3	48.0	48.4	57.1	48.0	
04:00-05:00	43.3	56.6	42.3	49.3	69.2	45.0	48.5	65.5	48.0	
05:00-06:00	63.0	80.5	58.8	49.8	66.6	44.5	51.9	72.4	47.9	
06:00-07:00	55.6	73.1	49.9	48.7	68.9	45.4	56.3	80.8	49.0	
07:00-08:00	54.5	67.7	51.7	59.5	84.9	53.3	52.0	70.8	49.1	
08:00-09:00	51.0	66.8	48.2	54.8	81.2	51.3	50.3	69.7	48.3	
09:00-10:00	49.3	69.6	44.5	50.9	75.2	48.0	49.2	72.1	46.0	
Leq 24 hrs	51.8	-	-	53.6	-	-	50.3	-	-	70
Ldn	60.4	-	-	61.9	-	-	57.1	-	-	-
Lmax	-	80.5	-	-	84.9	-	-	83.1	-	115
L90	-	-	48.0	-	-	49.5	-	-	47.9	-

ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.5.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณบ้านสำนักมะม่วง
ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: 47P 0728253E, 1403369N

เวลา	ผลการตรวจวัด [dB(A)]												มาตรฐาน ^{1/2}
	15-16 มี.ค. 69			16-17 มี.ค. 69			17-18 มี.ค. 69			18-19 มี.ค. 69			
	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	Leq 1 hr	Lmax	L90	
10:00-11:00	50.9	70.4	47.6	53.7	73.6	51.1	50.4	67.2	45.4	48.5	65.5	45.9	-
11:00-12:00	49.2	67.8	47.5	53.4	76.9	50.7	48.9	66.7	45.1	50.8	81.7	45.9	
12:00-13:00	49.9	75.1	47.5	49.3	70.4	45.9	47.9	69.9	45.0	45.8	66.1	44.1	
13:00-14:00	50.9	69.0	47.3	48.3	67.4	44.6	48.6	75.0	45.1	47.4	70.0	43.8	
14:00-15:00	51.1	70.2	47.0	49.6	65.4	45.0	47.9	71.8	44.9	47.3	68.5	43.6	
15:00-16:00	53.4	78.6	47.4	47.8	71.9	45.0	50.0	68.4	45.2	47.1	69.6	44.0	
16:00-17:00	50.2	70.4	47.7	47.5	63.5	45.1	48.5	77.6	45.0	49.8	74.9	44.5	
17:00-18:00	49.1	65.9	47.5	55.3	75.4	45.2	49.0	71.0	45.2	50.0	82.5	45.1	
18:00-19:00	48.8	66.8	47.3	50.6	79.4	44.4	47.4	68.1	44.5	50.6	78.2	45.0	
19:00-20:00	48.1	59.8	47.1	46.7	70.4	44.6	46.1	65.6	44.7	46.8	67.1	44.5	
20:00-21:00	48.6	68.3	46.9	46.7	66.2	44.7	46.8	68.5	44.8	45.8	68.4	44.0	
21:00-22:00	47.4	63.0	46.8	46.0	72.6	44.5	46.3	70.8	45.1	45.4	62.7	43.8	
22:00-23:00	47.7	60.2	47.2	46.0	67.7	44.7	46.2	58.2	44.9	45.0	63.5	43.8	
23:00-00:00	48.0	59.6	47.4	46.8	60.7	45.8	46.5	59.7	45.3	45.3	63.0	44.1	
00:00-01:00	47.9	56.2	47.4	46.3	67.9	45.3	45.8	61.0	44.9	45.0	67.5	44.3	
01:00-02:00	47.9	57.3	47.5	46.2	64.3	45.4	63.0	81.7	59.5	45.1	58.0	44.4	
02:00-03:00	48.0	63.6	47.5	45.7	65.3	44.6	46.9	65.8	46.1	44.9	62.8	44.0	
03:00-04:00	48.0	55.4	47.5	44.4	60.4	43.6	46.5	54.6	45.8	44.8	62.6	44.1	
04:00-05:00	48.1	57.8	47.5	44.6	57.9	43.6	46.4	65.8	45.3	44.5	53.9	43.8	
05:00-06:00	49.6	66.4	47.4	64.3	81.8	60.1	51.0	70.2	45.1	50.8	74.0	44.0	
06:00-07:00	57.6	80.3	49.6	56.9	74.4	51.2	53.9	78.7	47.1	52.6	81.6	46.8	
07:00-08:00	58.2	79.1	53.4	55.8	69.0	53.0	57.9	83.5	51.4	51.8	88.3	46.5	
08:00-09:00	52.8	73.1	49.0	52.3	68.1	49.5	54.0	79.8	50.6	47.4	72.8	44.2	
09:00-10:00	51.9	72.1	48.1	50.6	70.9	45.8	49.5	73.8	46.7	47.3	71.5	43.9	
Leq 24 hrs	51.4	-	-	53.6	-	-	52.6	-	-	48.3	-	-	70
Ldn	57.4	-	-	61.8	-	-	60.7	-	-	54.2	-	-	-
Lmax	-	80.3	-	-	81.8	-	-	83.5	-	-	88.3	-	115
L90	-	-	48.1	-	-	49.7	-	-	48.9	-	-	44.6	-

ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548



ตารางที่ 3.5.6-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

สถานที่ทำการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
		Leq 24 hrs	Lmax	L90	Ldn
บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ	1-8 มี.ค. 66*	52.8-55.0	82.9-92.7	47.7-48.7	59.0-60.3
	19-26 ก.ย. 66*	52.9-66.1	84.7-107.1	48.4-49.6	59.2-66.8
	22-29 มี.ค. 67*	53.8-59.9	88.4-96.1	47.8-49.5	58.7-62.2
	24-ก.ย.-1 ต.ค. 67*	53.6-59.1	84.9-94.9	48.1-49.5	59.5-65.0
	9-16 มี.ค. 68*	53.8-57.6	86.4-99.5	48.1-49.7	59.7-63.5
	18-25 ส.ค. 68	54.8-61.1	87.8-108.5	48.4-50.4	59.5-64.0
	12-19 มี.ค. 69	56.8-60.9	90.0-96.9	49.6-53.8	61.0-67.6
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		52.8-66.1	82.9-108.5	47.7-50.4	58.7-66.8
บ้านสำนักมะม่วง	1-8 มี.ค. 66*	49.5-54.3	78.7-97.6	44.9-46.0	56.2-63.4
	19-26 ก.ย. 66*	48.3-66.5	80.0-114.3	44.7-48.4	54.2-67.1
	22-29 มี.ค. 67*	51.4-66.2	74.3-100.4	47.3-64.1	56.9-72.6
	24-ก.ย.-1 ต.ค. 67*	49.6-60.1	82.3-90.8	46.0-48.9	55.4-69.8
	9-16 มี.ค. 68*	50.5-57.0	82.1-100.0	46.2-49.9	56.8-64.0
	18-25 ส.ค. 68	47.3-56.5	75.3-102.0	44.7-46.3	53.1-61.4
	12-19 มี.ค. 69	48.3-53.6	80.3-88.3	44.6-49.7	54.2-61.9
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		47.3-66.5	74.3-114.3	44.7-64.1	53.1-72.6
มาตรฐาน ^{1/} และ ^{2/}		70	115	-	-



หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

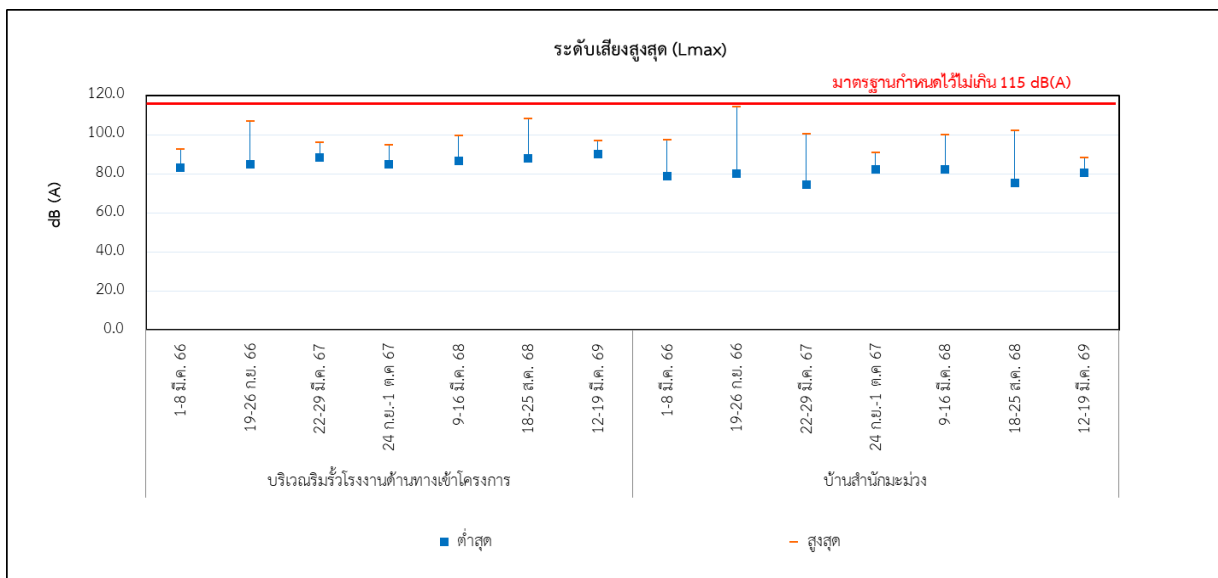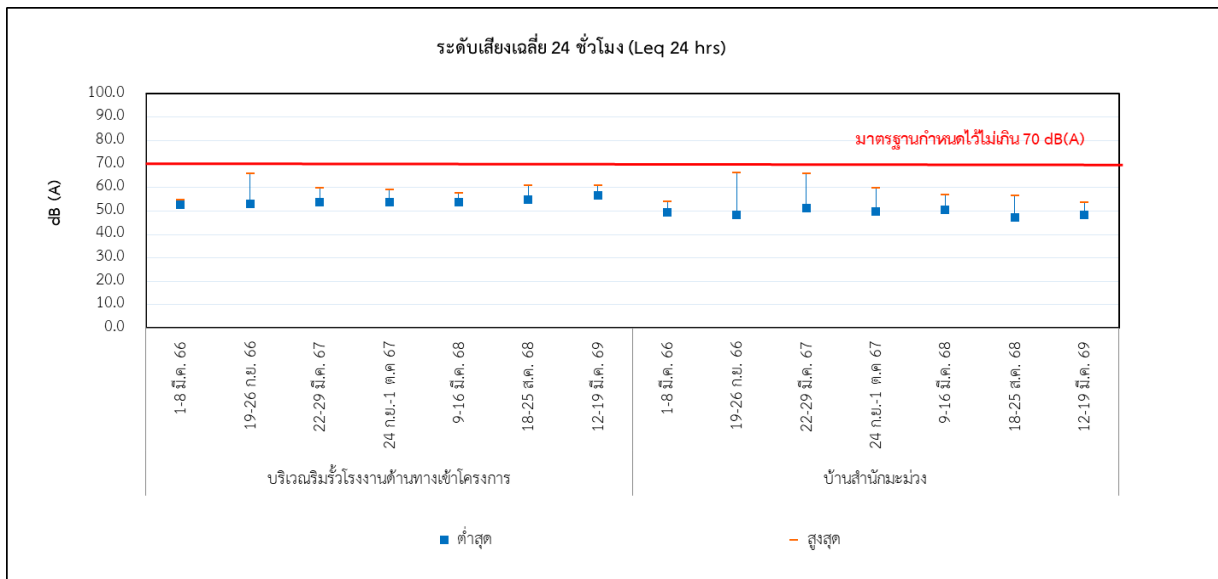

รูปที่ 3.5.6-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

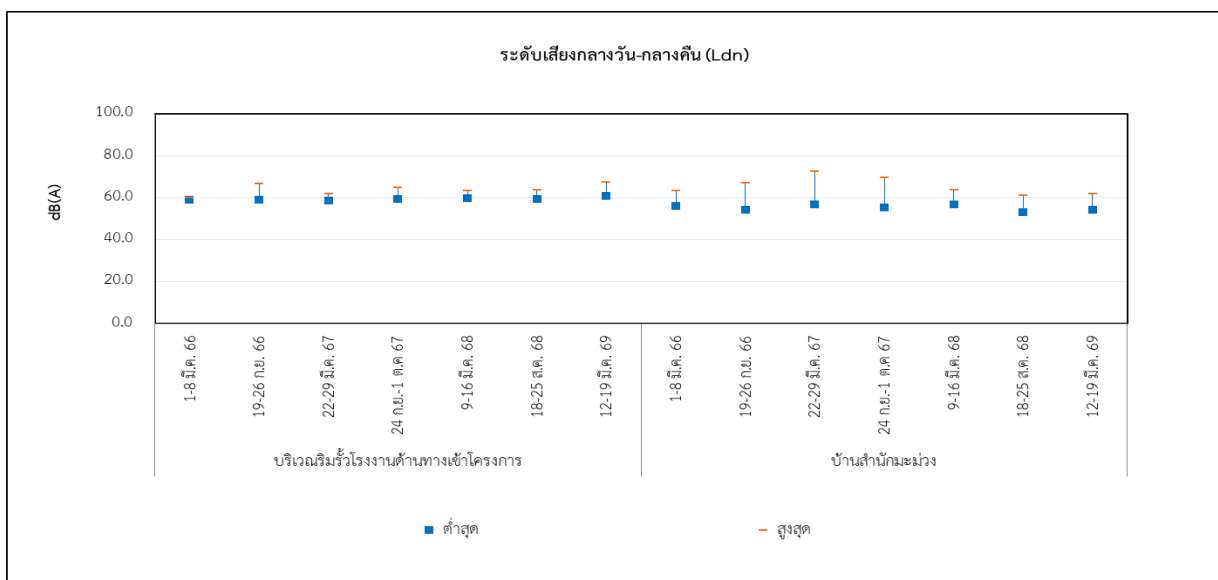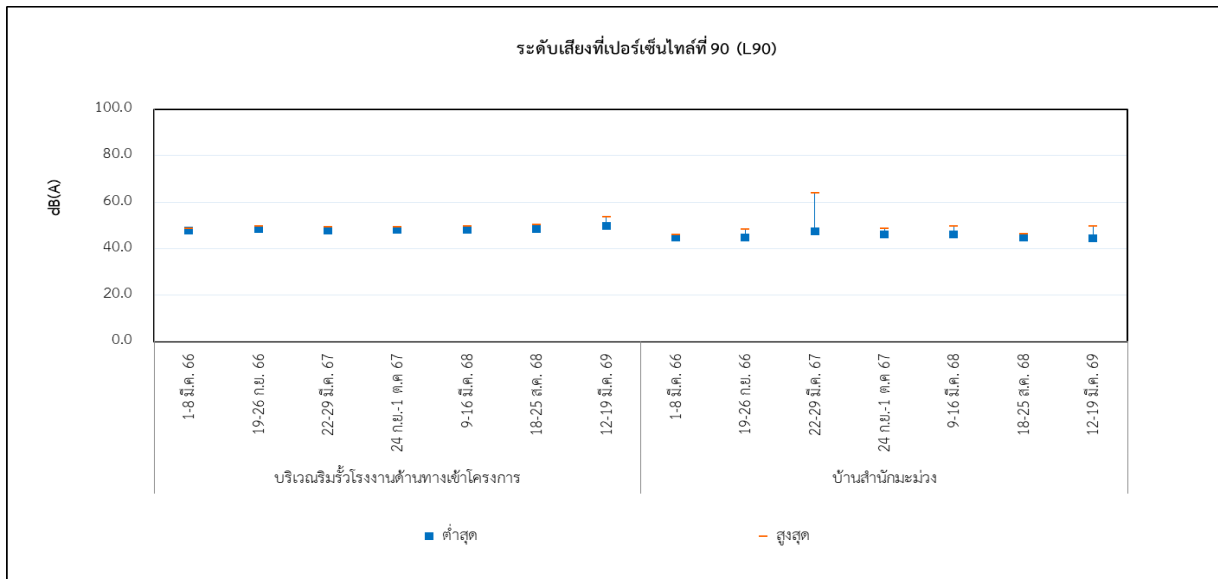

รูปที่ 3.5.6-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

3.5.7 คุณภาพน้ำ

(1) คุณภาพน้ำโดยวิธีการเก็บตัวอย่าง

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยวิธีการเก็บตัวอย่าง บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร โดยตรวจวิเคราะห์ค่าอัตราการไหล (Flow rate), ความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature), ออกซิเจนละลายน้ำ (DO), บีโอดี (BOD), ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) เดือนละ 1 ครั้ง

(2) ตรวจ Trihalomethane

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์ Trihalomethane บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร โดยตรวจวิเคราะห์ค่า Trihalomethane เดือนละ 1 ครั้ง

(3) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร โดยตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature) และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ตลอดช่วงดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร โดยตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ตลอดช่วงดำเนินการ

1) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดำเนินการตรวจวัด เป็นประจำทุกเดือน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5.7-1 ถึงตารางที่ 3.5.7-2 และรูปที่ 3.5.7-1

(1) คุณภาพน้ำโดยวิธีการเก็บตัวอย่าง

● บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยวิธีการเก็บตัวอย่าง บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร โดยตรวจวิเคราะห์ค่าอัตราการไหล (Flow rate), ความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature), ออกซิเจนละลายน้ำ (DO), บีโอดี (BOD), ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) เดือนละ 1 ครั้ง พบว่า อัตราการไหล (Flow rate) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0-15.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.4-7.9 อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าอยู่ในช่วง 25.10-31.7 องศาเซลเซียส ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีค่าอยู่ในช่วง 6.31-7.81 ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2-9 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) มีค่าอยู่ในช่วง 54-242 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตรทุกเดือน และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01-0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร

เมื่อนำผลตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม พบว่า ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกเดือน

(2) ตรวจ Trihalomethane

- **บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร**

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์ Trihalomethane บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร โดยตรวจวิเคราะห์ค่า Total Trihalomethane ซึ่งประกอบด้วยค่า Dibromochloromethane, Bromoform (Tribromomethane), Chloroform (Trichloromethane) และ Bromodichloromethane เดือนละ 1 ครั้ง พบว่าค่า Total Trihalomethane มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1-6 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่า Dibromochloromethane มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1-1 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่า Bromoform (Tribromomethane) มีค่าน้อยกว่า 1 ไมโครกรัมต่อลิตรทุกเดือน ค่า Chloroform (Trichloromethane) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1-6 ไมโครกรัมต่อลิตร และค่า Bromodichloromethane มีค่าน้อยกว่า 1 ไมโครกรัมต่อลิตรทุกเดือน

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ค่า Trihalomethane ไว้ ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่า Chloroform และ Total Trihalomethanes สูงกว่าเดือนอื่นๆ คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจาก Chloroform ซึ่งมาจากการมีปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำและปริมาณคลอรีนอิสระที่มากขึ้น ที่อาจเกิดจากการเติมคลอรีนเพื่อปรับสภาพน้ำ และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิ ที่สูงส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของสารไตรฮาโลมีเทนเช่นเดียวกัน แนวทางการแก้ไข คือ ควบคุมการเติมคลอรีนในน้ำในปริมาณที่เหมาะสม และดูแลตรวจสอบตะกอนไม่ให้เกิดการสะสมที่ก้นบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำดังกล่าว

(3) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร และบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ทางโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชียกำหนด และมีการรายงานค่าให้ทางนิคมฯ ทราบเป็นประจำทุกวัน แสดงดังเอกสารแนบที่ 12



รูปที่ 3.5.7-1 แสดงจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

**ตารางที่ 3.5.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้ง
ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ							
	Flow rate (m ³ /s)	pH	Temperature (°C)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	TDS (mg/L)	Oil&Grease (mg/L)	Free Chlorine (mg/L)
8 ม.ค. 69	15.0	7.9	25.10	6.31	8	242	<2	0.01
5 ก.พ. 69	0.0	7.4	27.15	7.81	2	54	<2	<0.01
5 มี.ค. 69	0.0	7.7	29.79	7.11	5	69	<2	0.06
20 เม.ย. 69	0.0	7.7	31.7	6.84	2	102	<2	0.04
7 พ.ค. 69	0.0	7.8	29.9	7.79	<2	110	<2	0.06
5 มิ.ย. 69	0.0	8.1	30.2	4.73	9	498	<2	0.08
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	0.0-15.0	7.4-7.9	25.10-31.7	6.31-7.81	<2-9	54-242	<2	<0.01-0.08
มาตรฐาน	-	5.5-9.0	≤45	-	≤500	≤3,000	≤10	≤1

ที่มา : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

**ตารางที่ 3.5.7-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้ง
ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ				
	Dibromochloromethane (µg/L)	Bromoform (µg/L)	Chloroform (µg/L)	Bromodichloromethane (µg/L)	Total Trihalomethanes (µg/L)
8 ม.ค. 69	1	<1	1	<1	2
5 ก.พ. 69	<1	<1	4	<1	4
5 มี.ค. 69	<1	<1	<1	<1	<1
30 เม.ย. 69	<1	<1	4	<1	4
7 พ.ค. 69	<1	<1	6	<1	6
5 มิ.ย. 69	<1	<1	4	<1	4
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	<1-1	<1	<1-6	<1	<1-6
มาตรฐาน	-	-	-	-	-

ที่มา : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ จากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด รายละเอียดผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 3.5.7-3 ถึงตารางที่ 3.5.7-4 และรูปที่ 3.5.7-2 ถึงรูปที่ 3.5.7-3

ตารางที่ 3.5.7-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ							
	Flow rate (m ³ /s)	pH	Temperature (°C)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	TDS (mg/L)	Oil&Grease (mg/L)	Free Chlorine (mg/L)
พ.ศ. 2566								
10 ม.ค. 66*	0.000	8.7	28.2	8.2	<2.0	344	<3	<0.1
14 ก.พ. 66*	0.000	7.6	31.7	8.6	<2.0	212	<3	<0.1
14 มี.ค. 66*	0.000	8.0	29.6	8.5	<2.0	45	<3	<0.1
11 เม.ย. 66*	0.000	8.2	34.8	8.3	<2.0	108	<3	<0.1
9 พ.ค. 66*	0.006	8.3	35.0	7.8	<2.0	52	<3	0.1
13 มิ.ย. 66*	0.000	7.2	31.4	5.3	<2.0	172	<3	<0.1
11 ก.ค. 66*	0.006	7.9	31.1	8.6	<2.0	120	<3	0.2
8 ส.ค. 66*	0.000	7.7	31.3	6.6	<2.0	116	<3	<0.1
12 ก.ย. 66*	0.004	8.0	31.1	7.7	<2.0	112	<3	<0.1
10 ต.ค. 66*	0.006	7.3	30.9	7.4	<2.0	860	<3	<0.1
14 พ.ย. 66*	0.000	7.7	31.9	7.3	<2.0	130	<3	<0.1
12 ธ.ค. 66*	0.000	7.4	30.7	9.0	<2.0	166	<3	0.2
พ.ศ. 2567								
9 ม.ค. 67*	0.000	7.7	31.8	8.1	<2.0	48	4	<0.1
13 ก.พ. 67*	0.000	7.7	31.9	9.4	<2.0	84	<3	<0.1
12 มี.ค. 67*	0.005	7.7	30.6	4.4	<2.0	138	<3	0.1
9 เม.ย. 67*	0.004	8.1	34.3	7.0	<2.0	222	<3	<0.1
14 พ.ค. 67*	0.000	7.7	33.8	7.6	<2.0	87	<3	<0.1
11 มิ.ย. 67*	0.000	7.4	30.8	8.1	<2.0	63	<3	<0.1
9 ก.ค. 67*	0.004	7.9	30.7	6.4	11.0	294	<3	<0.1
13 ส.ค. 67*	No Velocity	8.2	31.9	9.3	<2.0	152	<3	<0.1
11 ก.ย. 67*	No Velocity	8.6	31.8	8.9	<2.0	85	<3	<0.1
มาตรฐาน	-	5.5-9.0	≤45	-	≤500	≤3,000	≤10	≤1

หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลборาโทรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3.5.7-3 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ							
	Flow rate (m ³ /s)	pH	Temperature (°C)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	TDS (mg/L)	Oil&Grease (mg/L)	Free Chlorine (mg/L)
พ.ศ. 2567 (ต่อ)								
9 ต.ค. 67*	0.007	7.7	30.4	7.2	<2.0	90	<3	<0.1
13 พ.ย. 67*	0.004	7.2	30.3	4.8	5.0	304	<3	<0.1
11 ธ.ค. 67*	0.004	7.8	29.8	10.2	<2.0	106	<3	<0.1
พ.ศ. 2568								
8 ม.ค. 68*	No Velocity	7.9	28.1	5.8	<2	282	<3	<0.1
11 ก.พ. 68*	0.004	7.8	28.5	6.7	<2	342	<3	<0.1
12 มี.ค. 68*	0.004	7.9	30.6	7.5	10.6 ^{1/}	278	<3	<0.1
28 เม.ย. 68*	0.004	7.9	31.9	7.3	2	232	<3	<0.1
14 พ.ค. 68*	0.004	8.0	29.0	5.4	3.2	360	<3	<0.1
11 มิ.ย. 68*	0.014	8.5	30.7	9.7	7.6	354	<3	<0.1
9 ก.ค. 68	0.012	7.1	29.9	5.18	11	228	<2	0.02
4 ส.ค. 68	0.004	7.3	31.9	6.73	<2	77	<2	<0.01
9 ก.ย. 68	0.004	7.4	28.3	6.80	5	68	<2	<0.01
7 ต.ค. 68	0.004	7.4	30.4	7.05	3	<50	<2	<0.01
7 พ.ย. 68	0.004	8.0	28.4	9.60	3	57	<2	<0.01
2 ธ.ค. 68	0.000	8.2	29.1	7.30	<2	220	<2	<0.01
พ.ศ. 2569								
8 ม.ค. 69	15.0	7.9	25.10	6.31	8	242	<2	0.01
5 ก.พ. 69	0.0	7.4	27.15	7.81	2	54	<2	<0.01
5 มี.ค. 69	0.0	7.7	29.79	7.11	5	69	<2	0.06
20 เม.ย. 69	0.0	7.7	31.7	6.84	2	102	<2	0.04
7 พ.ค. 69	0.0	7.8	29.9	7.79	<2	110	<2	0.06
5 มิ.ย. 69	0.0	8.1	30.2	4.73	9	498	<2	0.08
มาตรฐาน	-	5.5-9.0	≤45	-	≤500	≤3,000	≤10	≤1

หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

^{1/} เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568

ที่มา : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

**ตารางที่ 3.5.7-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทิ้ง
ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569**

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ				
	Dibromochloromethane (µg/L)	Bromoform (µg/L)	Chloroform (µg/L)	Bromodichloromethane (µg/L)	Total Trihalomethanes (µg/L)
พ.ศ. 2566					
10 ม.ค. 66*	N.D.	N.D.	1.1	N.D.	1.1
14 ก.พ. 66*	1.2	N.D.	0.7	1.0	2.8
14 มี.ค. 66*	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
11 เม.ย. 66*	N.D.	N.D.	1.7	N.D.	1.7
9 พ.ค. 66*	N.D.	N.D.	1.7	N.D.	1.7
13 มิ.ย. 66*	N.D.	N.D.	2.2	N.D.	2.2
11 ก.ค. 66*	N.D.	N.D.	1.6	N.D.	1.6
8 ส.ค. 66*	N.D.	N.D.	1.7	N.D.	1.7
12 ก.ย. 66*	N.D.	N.D.	3.6	N.D.	3.6
10 ต.ค. 66*	N.D.	N.D.	1.8	N.D.	1.8
14 พ.ย. 66*	N.D.	N.D.	1.6	N.D.	1.6
12 ธ.ค. 66*	N.D.	N.D.	1.0	N.D.	<1
พ.ศ. 2567					
9 ม.ค. 67*	N.D.	N.D.	3.3	N.D.	3.3
13 ก.พ. 67*	0.8	N.D.	2.8	1.2	4.7
12 มี.ค. 67*	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
9 เม.ย. 67*	N.D.	N.D.	12.5	N.D.	12.5
14 พ.ค. 67*	N.D.	N.D.	5.7	N.D.	5.7
11 มิ.ย. 67*	N.D.	N.D.	4.4	N.D.	4.4
9 ก.ค. 67*	N.D.	N.D.	3.6	N.D.	3.6
13 ส.ค. 67*	4.9	N.D.	6.2	6.3	17.3
11 ก.ย. 67*	N.D.	N.D.	1.8	N.D.	1.8
9 ต.ค. 67*	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
13 พ.ย. 67*	N.D.	N.D.	2.6	N.D.	2.6
11 ธ.ค. 67*	N.D.	N.D.	2.2	N.D.	2.2
มาตรฐาน	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : N.D. (Not Detected) หมายถึง ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ที่มา : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

ตารางที่ 3.5.7-4 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ				
	Dibromochloromethane (µg/L)	Bromoform (µg/L)	Chloroform (µg/L)	Bromodichloromethane (µg/L)	Total Trihalomethanes (µg/L)
พ.ศ. 2568					
8 ม.ค. 68*	N.D.	N.D.	3.9	N.D.	3.9
11 ก.พ. 68*	N.D.	N.D.	3.6	N.D.	3.6
12 มี.ค. 68*	N.D.	N.D.	1.2	N.D.	1.2
28 เม.ย. 68*	N.D.	N.D.	17.2	N.D.	17.2
14 พ.ค. 68*	N.D.	N.D.	2.7	N.D.	2.7
11 มิ.ย. 68*	N.D.	N.D.	2.7	N.D.	2.7
9 ก.ค. 68	<1	<1	<1	<1	<1
4 ส.ค. 68	<1	<1	<1	<1	<1
9 ก.ย. 68	2	<1	7	<1	9
7 ต.ค. 68	<1	<1	<1	<1	<1
7 พ.ย. 68	<1	<1	<1	<1	<1
2 ธ.ค. 68	<1	<1	<1	<1	<1
พ.ศ. 2569					
8 ม.ค. 69	1	<1	1	<1	2
5 ก.พ. 69	<1	<1	4	<1	4
5 มี.ค. 69	<1	<1	<1	<1	<1
30 เม.ย. 69	<1	<1	4	<1	4
7 พ.ค. 69	<1	<1	6	<1	6
5 มิ.ย. 69	<1	<1	4	<1	4
มาตรฐาน	-	-	-	-	-




หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

- N.D. (Not Detected) หมายถึง ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ



ที่มา : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม




รูปที่ 3.5.7-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อกักน้ำทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

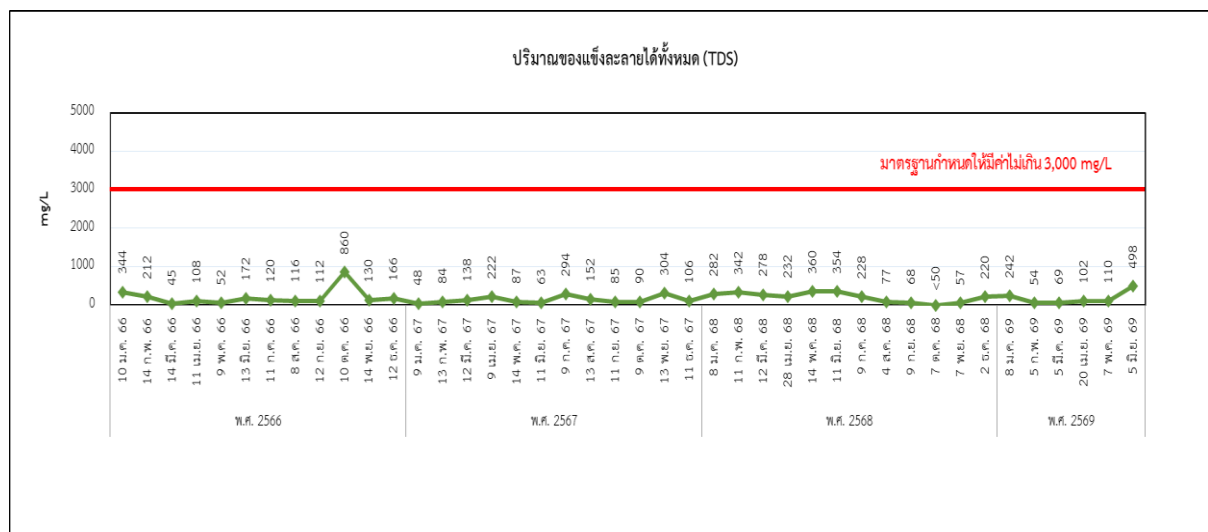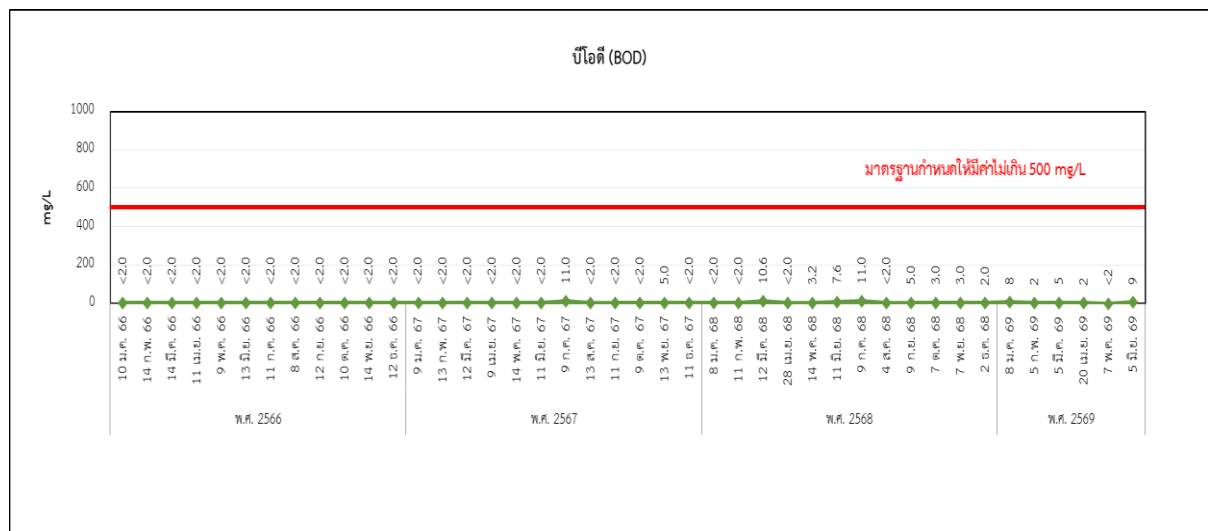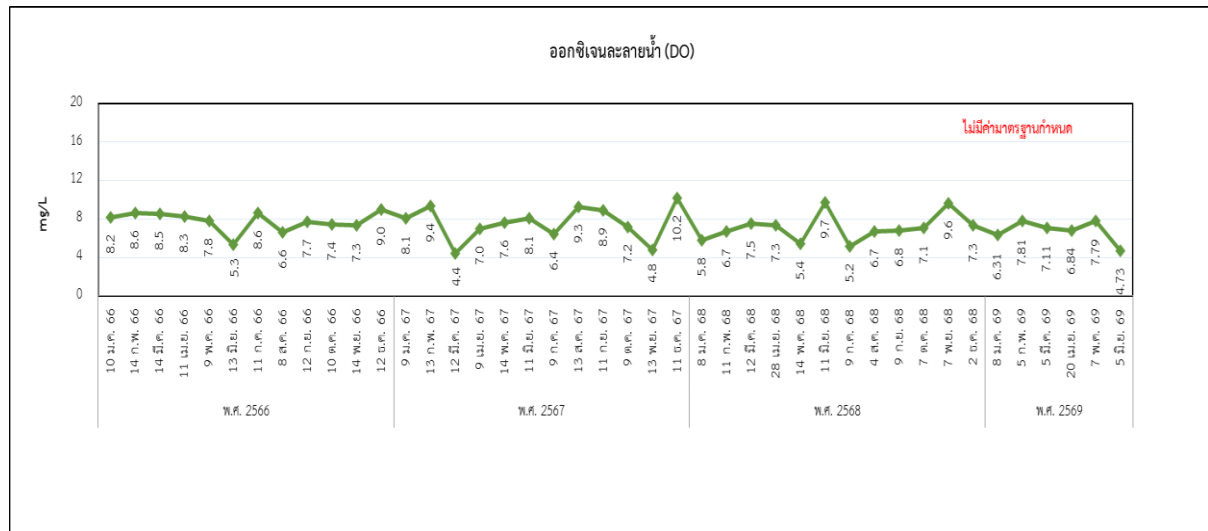

รูปที่ 3.5.7-2 (ต่อ)

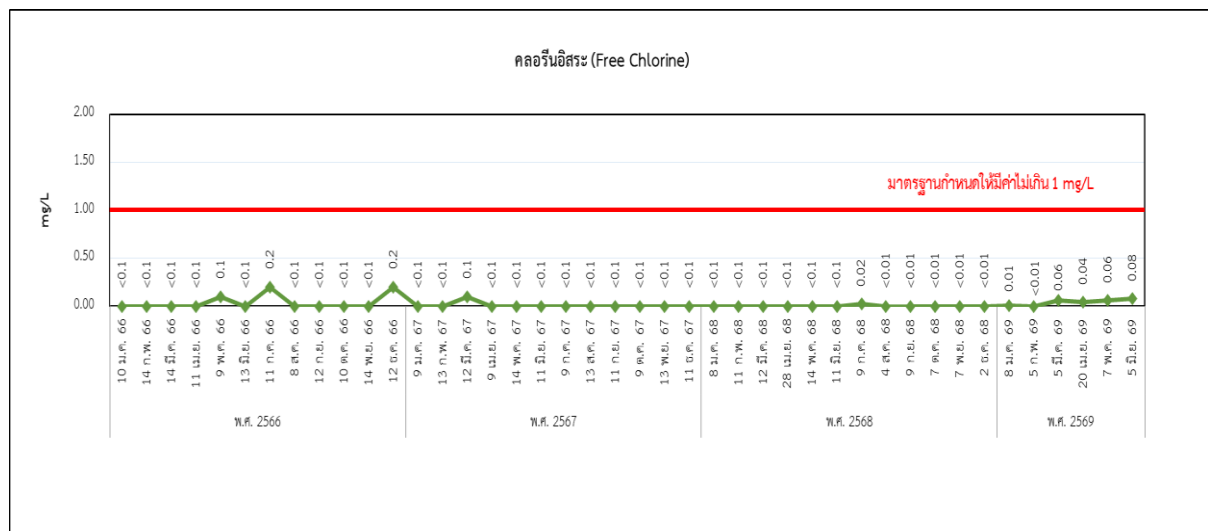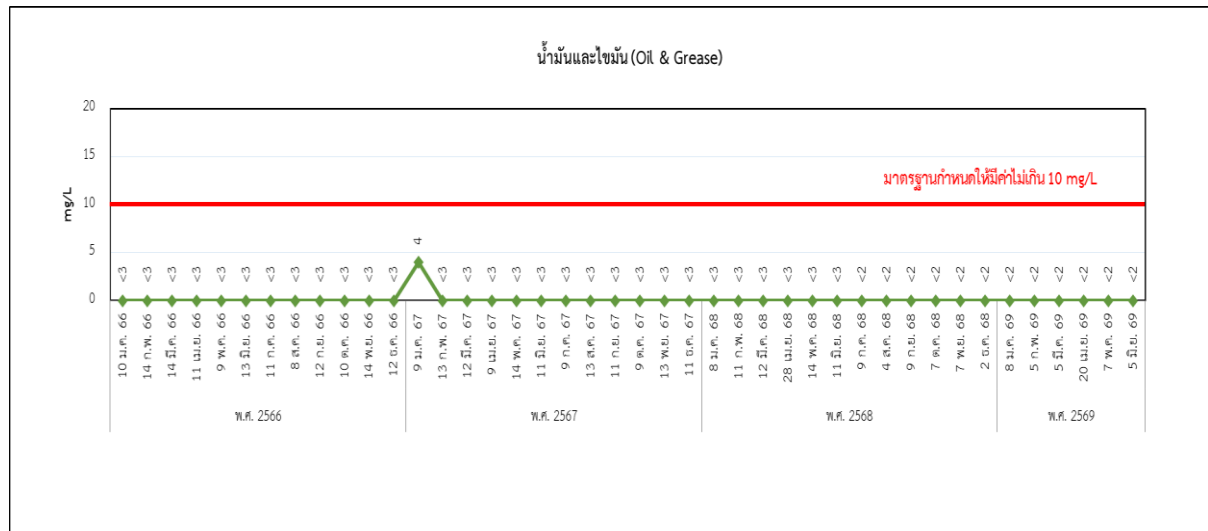

รูปที่ 3.5.7-2 (ต่อ)

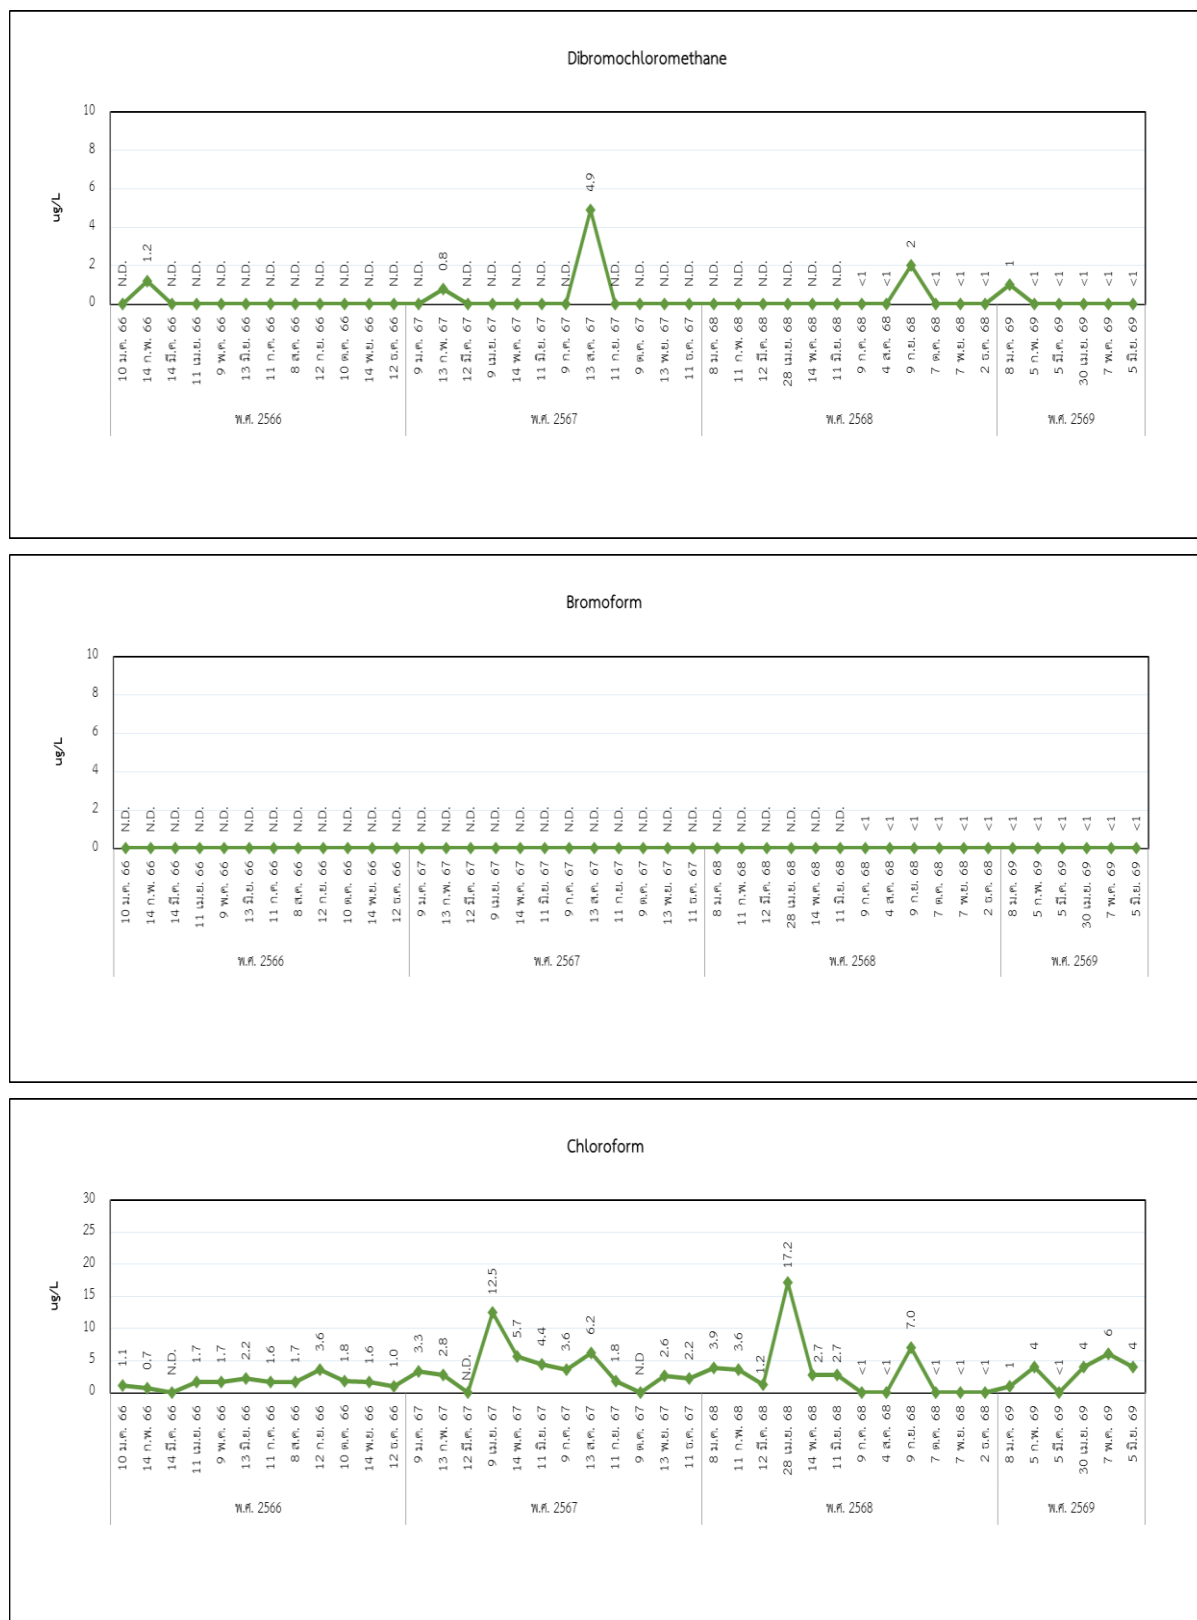

รูปที่ 3.5.7-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569



รูปที่ 3.5.7-3 (ต่อ)

3.5.8 กากของเสีย

มาตรการกำหนดให้มีการบันทึกชนิด ปริมาณ ของกากของเสียอันตรายรวมทั้งวิธีการกำจัด ของโครงการภายในพื้นที่โครงการ และแจ้งผลการจัดส่งกากของเสียอันตรายไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต โดยให้มีการบันทึกตลอดช่วงดำเนินการทุก 6 เดือน และรวบรวมข้อมูลปีละ 1 ครั้ง

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการมีการบันทึกบันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกภายนอกพื้นที่โครงการ (ดังเอกสารแนบที่ 16) และดำเนินการขออนุญาตนำของเสียออกนอกโครงการ โดยได้ทำหนังสือขออนุญาตนำของเสียออกภายนอกโรงงาน (กอ.1) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ดังเอกสารแนบที่ 15) ซึ่งในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการมีการขออนุญาตนำของเสียออกนอกโครงการ เพื่อขนส่งและกำจัด ได้แก่

- ขยะมูลฝอย จำนวน 20.27 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง
- แท่งกรองน้ำ จำนวน 6.09 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยอีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)
- กากตะกอน จำนวน 28.50 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท ออแกนิค เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (10210020425628)
- Air Filter จำนวน 1.00 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)
- ภาชนะปนเปื้อน จำนวน 0.09 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)
- ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 0.27 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)
- หลอดไฟใช้แล้ว จำนวน 0.03 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)
- ขยะปนเปื้อน จำนวน 0.80 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)
- น้ำปนเปื้อน จำนวน 3.82 ตัน ขนส่งและกำจัดโดยบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)

3.5.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1) ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน

- พนักงานทุกคน มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป และตรวจ X-Ray ปอด โดยให้มีการตรวจก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง จากนั้นตรวจปีละ 1 ครั้ง
- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับสัมผัสเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพิเศษ (ทดสอบการได้ยิน) โดยให้มีการตรวจปีละ 1 ครั้ง
- พนักงานที่ทำงานเชื่อม หรือทำงานเกี่ยวข้องกับความร้อน มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดสายตาและทดสอบการทำงานของปอด โดยให้มีการตรวจปีละ 1 ครั้ง

ทางโครงการทำการตรวจสอบสภาพพนักงานล่าสุดในช่วงวันที่ 9 มิถุนายน-15 กันยายน พ.ศ. 2568 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีผลการตรวจสอบสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยในปี พ.ศ. 2569 มีแผนการตรวจสอบสุขภาพในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม (ดังเอกสารแนบที่ 43) ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป

2) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

● ความร้อนในสถานที่ทำงาน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน (Heat Stress Index ในรูป WBGT) ของพื้นที่ส่วนการผลิตที่มีพนักงานปฏิบัติงาน ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ และบริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ โดยให้มีการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง

1) ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

การตรวจวัดระดับความร้อน (WBGT) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ และบริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ (ส่วนบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ ยังไม่มีการใช้งาน) โดยช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงตารางที่ 3.5.9-1 และรูปที่ 3.5.9-1

จากการตรวจวัดระดับความร้อนในบริเวณการทำงาน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความร้อน ซึ่งกำหนดมาตรฐานระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) ไว้ 3 ระดับ ตามความหนักเบาของงาน ได้แก่ ลักษณะงานเบา ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส ลักษณะงานปานกลาง ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส และลักษณะงานหนัก ต้องมีระดับความร้อนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส จากผลการตรวจวัดระดับความร้อน พบว่า บริเวณที่ทำการตรวจวัดเป็นลักษณะงานเบา และสถานที่ทำการตรวจวัดทั้ง 2 สถานี มีระดับความร้อนเฉลี่ยเวตบัลบ์โกลบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวกำหนด

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจวัดระดับความร้อนในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5.9-2 และรูปที่ 3.5.9-2 พบว่า ปริมาณความร้อนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความร้อน สำหรับลักษณะงานเบา ตลอดช่วงการตรวจวัด

ตารางที่ 3.5.9-1 ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน

สถานี	รายละเอียดงาน	วันที่ตรวจวัด	เวลาทำงาน (นาฬิกา)	ผลการตรวจวัด (°C)				WBGT (เฉลี่ย) (°C)	มาตรฐาน ^{1/} (°C)
				NWB	GT	DB	WBGT		
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (GTG)	จดบันทึกข้อมูล log sheet และเปิดปิดวาล์ว	7 พ.ค. 69	120	26.8	33.2	30.7	28.5	28.5	34.0
หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG)	จดบันทึกข้อมูล log sheet และเปิดปิดวาล์ว	7 พ.ค. 69	120	27.1	32.4	28.9	28.3	28.3	34.0


หมายเหตุ : - NWB (Natural Wet Bulb Temperature) หมายถึง อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ

- DB (Dry Bulb Temperature) หมายถึง อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

- GT (Globe Temperature) หมายถึง อุณหภูมิโกลบเทอร์โมมิเตอร์

- WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) หมายถึง อุณหภูมิเวตบัลล์โกลบ

ที่มา : ^{1/} กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

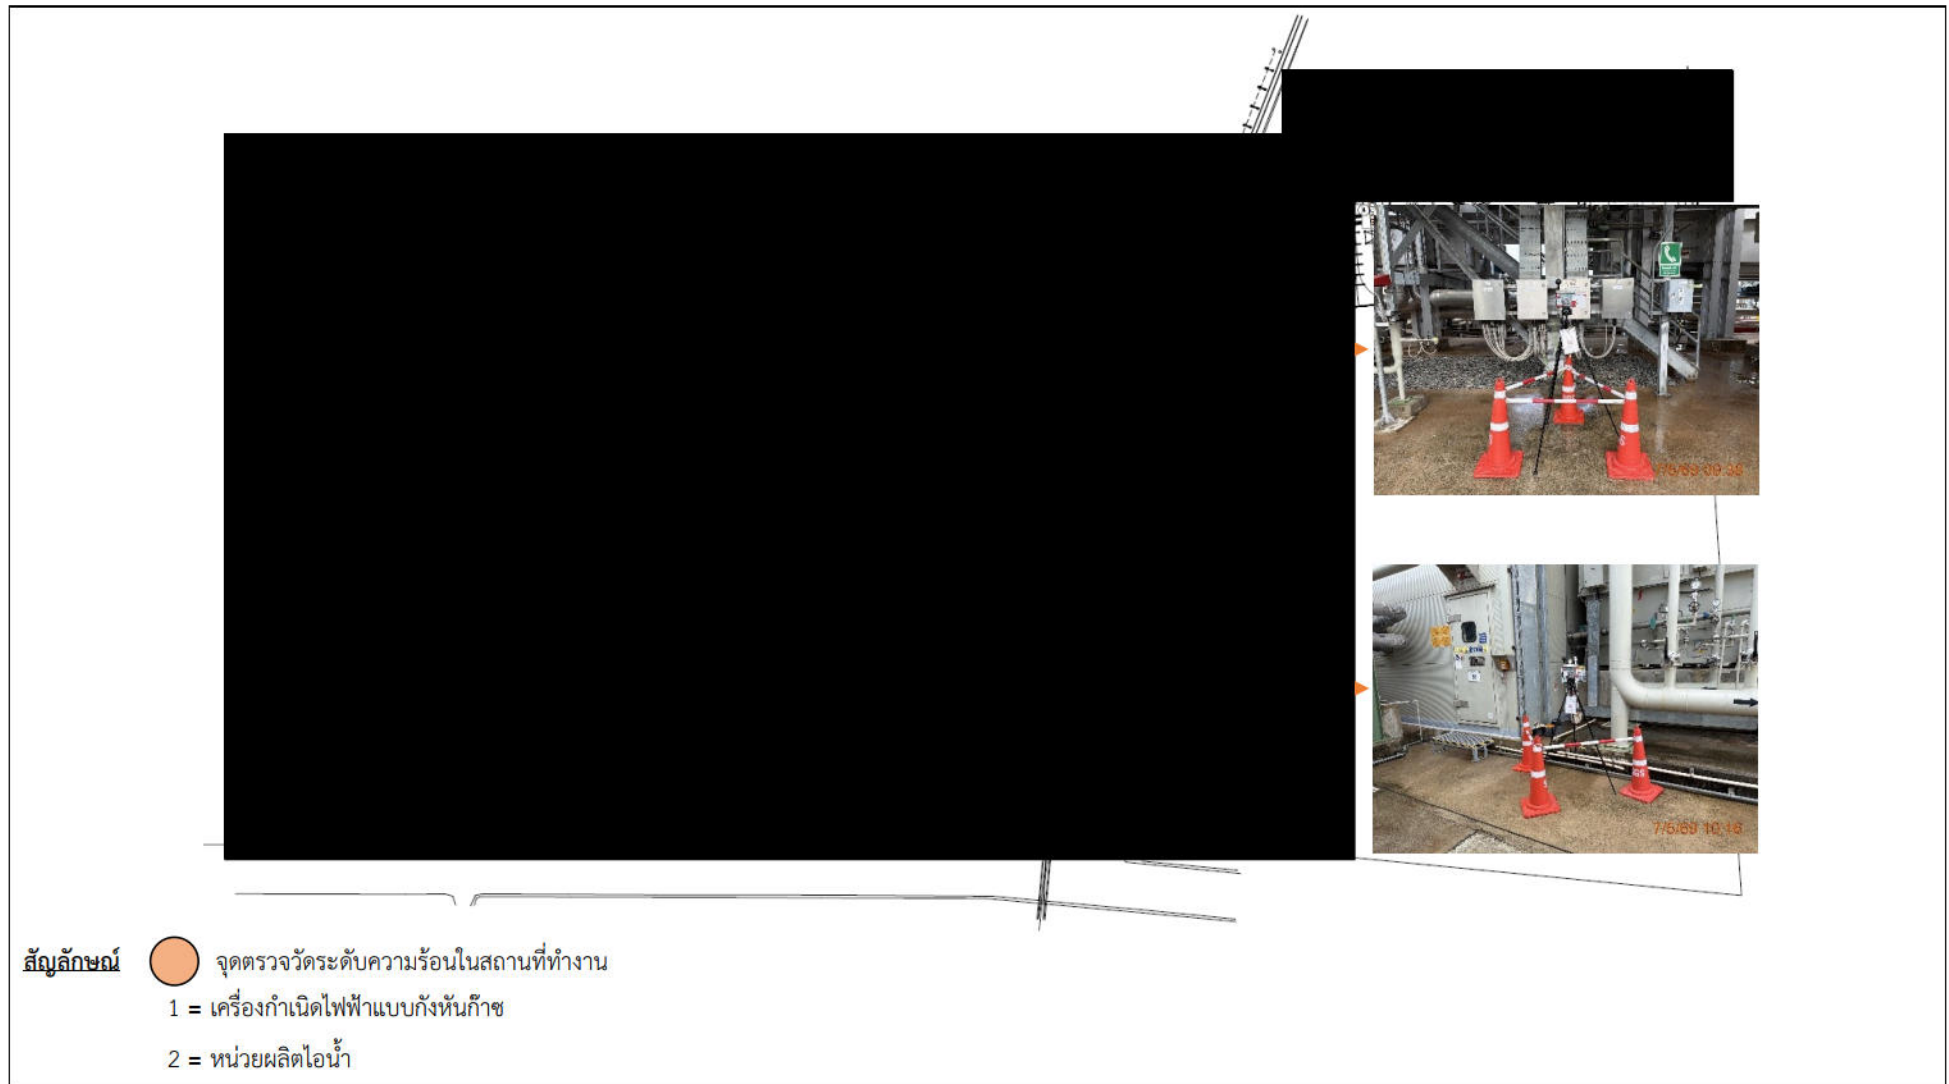

รูปที่ 3.5.9-1 แสดงการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน

ตารางที่ 3.5.9-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)				WBGT (เฉลี่ย) ^{1/} (°C)	มาตรฐาน (°C)
		NWB	GT	DB	WBGT		
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหัน ก๊าซ (GTG)	20 มี.ค. 66*	27.6	33.4	33.2	29.3	29.3	34.0
	18 ก.ย. 66*	26.9	33.8	33.1	28.9	28.9	
	18 มี.ค. 67*	27.1	35.1	33.9	29.4	29.4	
	24 ก.ย. 67*	27.3	33.9	32.9	29.2	29.2	
	26 มี.ค. 68*	27.6	34.2	33.4	29.5	29.5	
	13 ก.ย. 68	27.5	34.7	31.7	29.3	29.3	
	7 พ.ค. 69	26.8	33.2	30.7	28.5	28.5	
หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG)	20 มี.ค. 66*	27.1	32.6	32.4	28.7	28.7	34.0
	18 ก.ย. 66*	26.6	33.1	32.6	28.5	28.5	
	18 มี.ค. 67*	27.8	32.9	32.6	29.3	29.3	
	24 ก.ย. 67*	26.9	33.0	32.8	28.7	28.7	
	26 มี.ค. 68*	26.7	32.7	32.0	28.4	28.4	
	13 ก.ย. 68	26.7	32.5	30.7	28.3	28.3	
	7 พ.ค. 69	27.1	32.4	28.9	28.3	28.3	

หมายเหตุ : - NWB (Natural Wet Bulb Temperature) หมายถึง อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ


- DB (Dry Bulb Temperature) หมายถึง อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

- GT (Globe Temperature) หมายถึง อุณหภูมิโกลบเทอร์โมมิเตอร์

- WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) หมายถึง อุณหภูมิเวตบัลล์โกลบ

* ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : ^{1/} กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

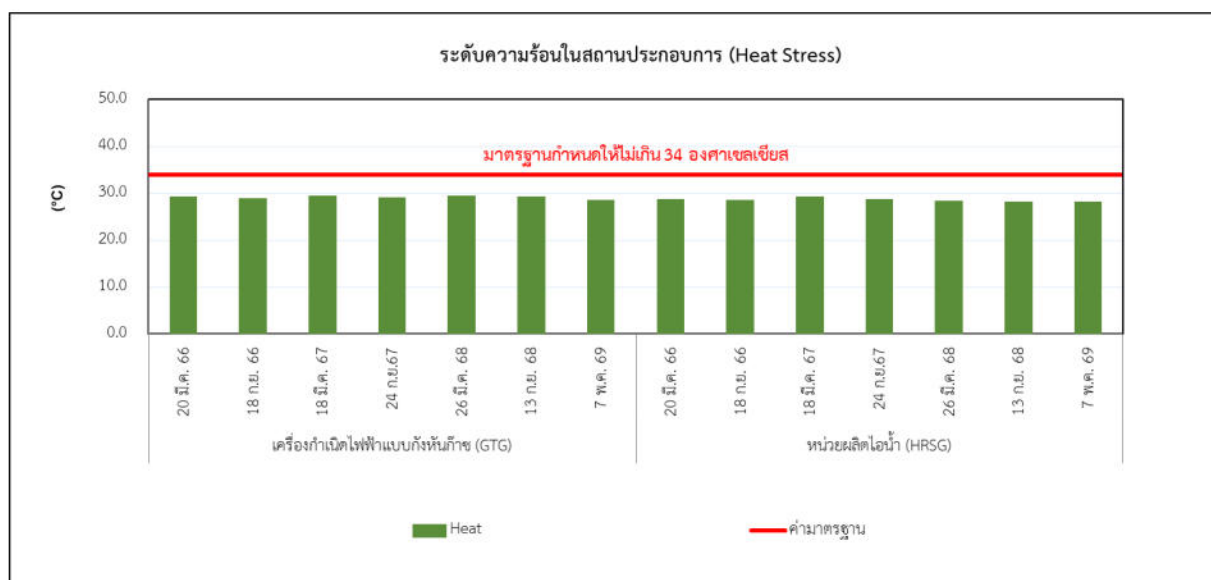

รูปที่ 3.5.9-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

- ปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose)

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) ของพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสเสียงดังต่อเนื่อง โดยให้มีการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง

1) ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569


การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) ของพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสเสียงดังต่อเนื่อง จำนวน 7 ท่าน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.5.9-1 และตารางที่ 3.5.9-3 จากการตรวจวัดระดับเสียงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงที่ตัวพนักงาน พบว่า

- พนักงานที่ปฏิบัติงาน บริเวณ CO#1
 - ระดับเสียงได้รับปริมาณเสียงสะสม มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2-0.4
 - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาในการทำงานอยู่ในช่วง 57.1-60.6 เดซิเบล (เอ)
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน บริเวณ FO#1
 - ระดับเสียงได้รับปริมาณเสียงสะสม มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 10.2-10.5
 - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาในการทำงานอยู่ในช่วง 75.1-75.2 เดซิเบล (เอ)
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน บริเวณ FO#2
 - ระดับเสียงได้รับปริมาณเสียงสะสม มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 17.6-29.9
 - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาในการทำงานอยู่ในช่วง 77.4-79.7 เดซิเบล (เอ)
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน บริเวณ Maintenance
 - ระดับเสียงได้รับปริมาณเสียงสะสม มีค่าร้อยละ 0.0
 - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาในการทำงานมีค่า 51.9 เดซิเบล (เอ)


เมื่อนำผลการตรวจวัดมาคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาในการทำงาน (TWA) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

ผลการติดตามตรวจวัดระดับปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5.9-4 และรูปที่ 3.5.9-3 เมื่อนำมาคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาในการทำงาน (TWA) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับการลดเสียงตลอดระยะเวลาทำงาน

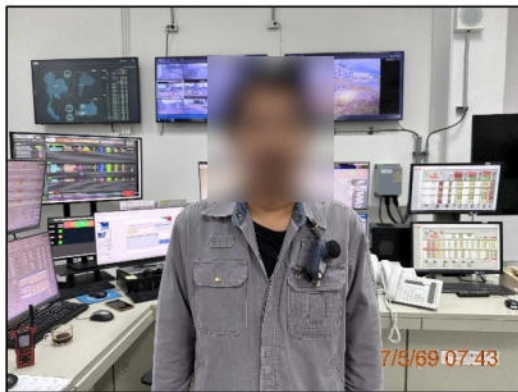

CO#1 (Day)

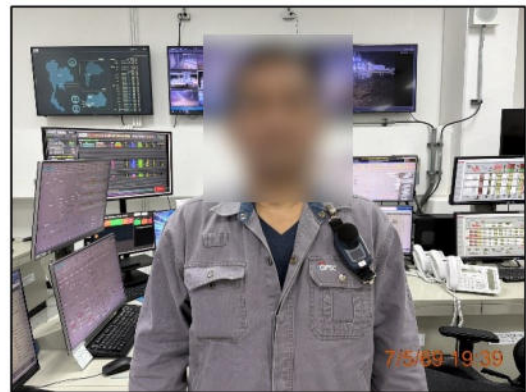


CO#1 (Night)



FO#1 (Day)




FO#1 (Night)

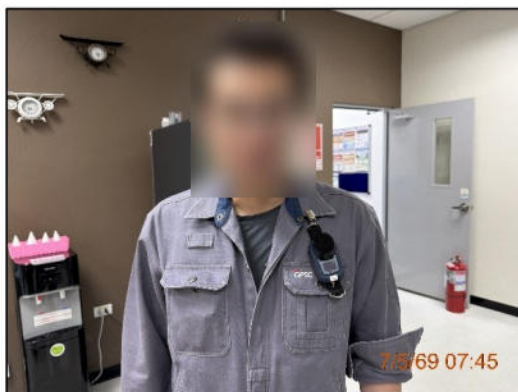

FO#2 (Day)



FO#2 (Night)

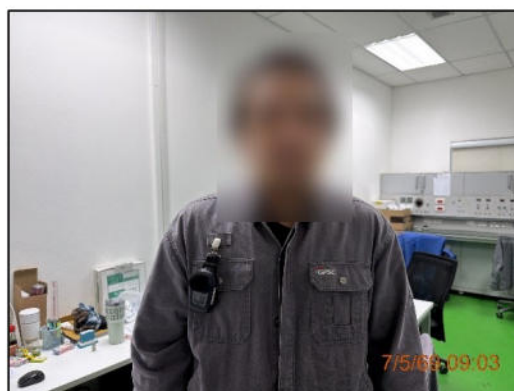

Maintenance (Day)

ภาพที่ 3.5.9-1 การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose)

ตารางที่ 3.5.9-3 ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose)

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
		ระดับเสียงสะสม (%)	ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลา การทำงาน (8 ชั่วโมง) (เดซิเบล (เอ))
CO#1 (Day)	7 พ.ค. 69	0.2	57.1
CO#1 (Night)	7 พ.ค. 69	0.4	60.6
FO#1 (Day)	7 พ.ค. 69	10.2	75.1
FO#1 (Night)	7 พ.ค. 69	10.5	75.2
FO#2 (Day)	7 พ.ค. 69	17.6	77.4
FO#2 (Night)	7 พ.ค. 69	29.9	79.7
Maintenance (Day)	7 พ.ค. 69	0.0	51.9
มาตรฐาน ^{1/2/}		-	85

ที่มา : ^{1/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

^{2/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565)

ตารางที่ 3.5.9-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
		ระดับเสียงสะสม (%)	ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (8 ชั่วโมง) (เดซิเบล (เอ))
CO#1 (Day)	20 มี.ค. 66*	2.5	69.0
	18 ก.ย. 66*	<1	64.8
	18 มี.ค. 67*	3.8	70.8
	24 ก.ย. 67*	<1	63.3
	25 มี.ค. 68*	<1	60.6
	19 ธ.ค. 68	1.2	78.0
	7 พ.ค. 69	0.2	57.1
CO#1 (Night)	20 มี.ค. 66*	<1	45.0
	18 ก.ย. 66*	1.1	65.5
	18 มี.ค. 67*	<1	49.8
	24 ก.ย. 67*	<1	49.9
	25 มี.ค. 68*	<1	39.8
	18 ธ.ค. 68	0.7	63.6
	7 พ.ค. 69	0.4	60.6
FO#1 (Day)	20 มี.ค. 66*	30.9	79.9
	18 ก.ย. 66*	13.8	76.4
	18 มี.ค. 67*	52.5	82.2
	24 ก.ย. 67*	5.4	72.3
	25 มี.ค. 68*	<1	62.7
	19 ธ.ค. 68	20.0	78.0
	7 พ.ค. 69	10.2	75.1
FO#1 (Night)	20 มี.ค. 66*	63.1	83.0
	18 ก.ย. 66*	4.3	71.3
	18 มี.ค. 67*	<1	60.9
	24 ก.ย. 67*	3.4	70.3
	25 มี.ค. 68*	31.6	80.0
	18 ธ.ค. 68	0.06	62.5
	7 พ.ค. 69	10.5	75.2
มาตรฐาน ^{1/2/}		-	85

หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : ^{1/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

^{2/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565)


ตารางที่ 3.5.9-4 (ต่อ)

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
		ระดับเสียงสะสม (%)	ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (8 ชั่วโมง) (เดซิเบล (เอ))
FO#2 (Day)	20 มี.ค. 66*	2.6	69.2
	18 ก.ย. 66*	1.9	67.7
	18 มี.ค. 67*	8.1	74.1
	24 ก.ย. 67*	12.6	76.0
	25 มี.ค. 68*	13.2	76.2
	19 ธ.ค. 68	11.0	75.4
	7 พ.ค. 69	17.6	77.4
FO#2 (Night)	20 มี.ค. 66*	30.2	79.8
	18 ก.ย. 66*	3.2	70.1
	18 มี.ค. 67*	4.2	71.2
	24 ก.ย. 67*	4.7	71.7
	25 มี.ค. 68*	<1	55.6
	18 ธ.ค. 68	0.5	62.4
	7 พ.ค. 69	29.9	79.7
มาตรฐาน ^{1/2/}		-	85

หมายเหตุ : * ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา : ^{1/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

^{2/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2565)

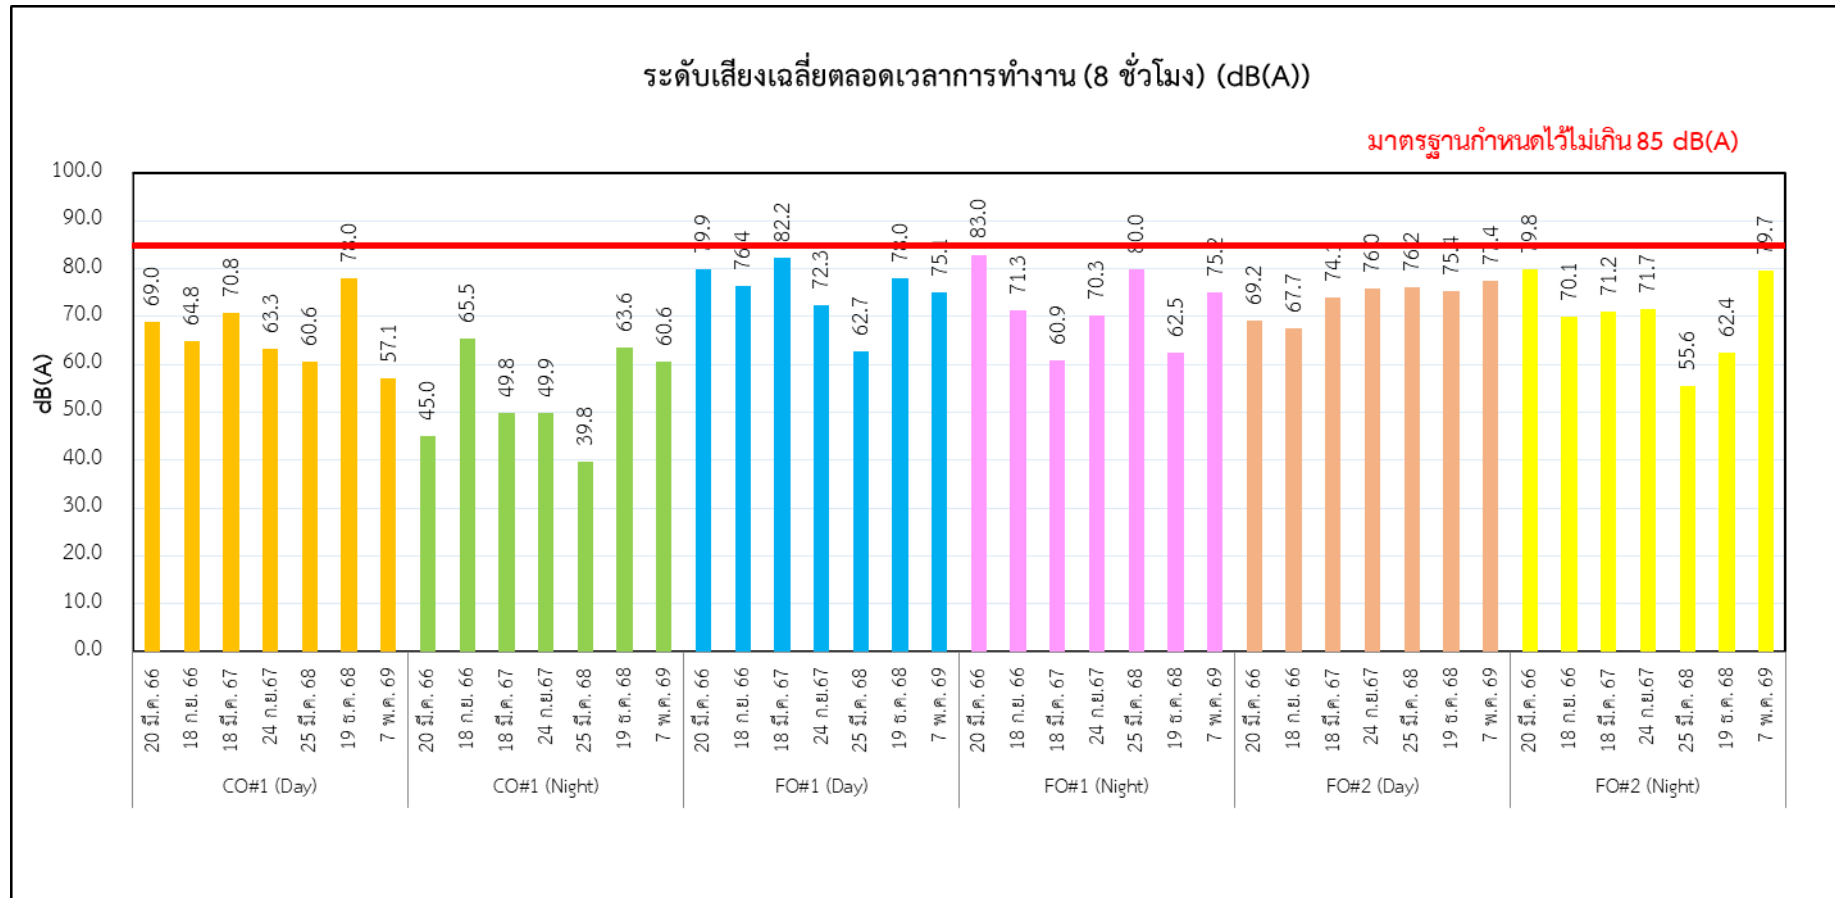

รูปที่ 3.5.9-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

3) บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและการขนส่ง เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ

มาตรการกำหนดให้มีการบันทึกสาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ สภาพการเสียหาย/สูญเสีย การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ และรายงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามแบบ จป.(ว) บริเวณภายในพื้นที่โครงการ โดยให้มีการบันทึกทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ

การดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางโครงการจะจัดทำการสอบสวนและดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบที่ 44

3.5.10 สาธารณสุข

มาตรการกำหนดให้มีการรวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วย และการตรวจสุขภาพประจำปี ภายในพื้นที่โครงการ โดยกำหนดให้มีการรวบรวม ปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้รวบรวมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่โครงการให้การสนับสนุนกับชุมชน บริเวณชุมชนใกล้เคียง ปีละ 1 ครั้ง

สำหรับในปี พ.ศ. 2569 โครงการจะรวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วย และการตรวจสุขภาพประจำปี ภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งรวบรวมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่โครงการให้การสนับสนุนกับชุมชน บริเวณชุมชนใกล้เคียง ในเดือนธันวาคม 2569

3.5.11 สังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) มาตรการกำหนดให้มีการบันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนที่สัมพันธ์กับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับและนำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง โดยให้มีการบันทึกตลอดระยะดำเนินการ รายงานผลทุก 6 เดือน

ทางโครงการมีการบันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ และมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน (ดังเอกสารแนบที่ 3) หากชุมชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ทั้งบริเวณภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนตามมาตรการกำหนด

2) มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสภาพการเปลี่ยนแปลง บริเวณชุมชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และชุมชนที่มีการเก็บตัวอย่างดินด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยให้มีการสำรวจ ปีละ 1 ครั้ง

สำหรับในปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผนดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569

3.5.12 สุนทรียภาพ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ และสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดช่วงดำเนินการ โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ ประกอบไปด้วยต้นไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณริมรั้วพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่สีเขียวเป็นตามที่มาตรการกำหนดไว้

บทที่ 4

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ช่วงดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า แนวโน้มของผลการตรวจวัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการให้ความสำคัญกับแนวโน้มผลการตรวจวัด และจะหาสาเหตุที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ช่วงดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปได้ดังตารางที่

4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	- ปล่องระบายจาก HRSGs	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- 20.27 ppm (2.166 g/s) - 0.81 ppm (0.120 g/s) - 1.17 mg/m ³ (0.067 g/s)	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
1.2 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS)	- ปล่องระบายจาก HRSGs	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ก๊าซออกซิเจน (O ₂)	ตลอดช่วงดำเนินการ	- ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) ของหน่วยผลิตที่เปิดดำเนินการแล้ว คือ ปล่อง HRSGs 1	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
1.3 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS)	- ปล่องระบายจาก HRSGs	- Audit CEMS	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) ได้แก่ System Audit และ Performance Audit	- ผลการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามข้อกำหนด
1.4 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- วัดประชุมมิตรบำรุง	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (1 hr) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (1 hr) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (24 hrs.) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) ช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	- 3.2-17.9 ppb - 1.0-3.6 ppb - 1.6-2.1 ppb - 49.5-77.1 ug/m ³ - 22.1-46.6 ug/m ³	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข	
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่			
1.4 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)	- บ้านสำนักมะม่วง	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (1 hr)	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง) ช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	- 3.0-10.2	ppb	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
		- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (1 hr)		- 1.2-3.9	ppb	
		- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (24 hrs.)		- 2.0-2.5	ppb	
		- ฝุ่นละอองรวม (TSP)		- 41.8-68.9	ug/m ³	
		- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)		- 21.2-40.4	ug/m ³	
	- วัดขากลูกหญ้า	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (1 hr)		- 3.0-14.0	ppb	
		- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (1 hr)		- 1.1-3.9	ppb	
		- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (24 hrs.)		- 1.9-2.5	ppb	
		- ฝุ่นละอองรวม (TSP)		- 51.8-64.5	ug/m ³	
		- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)		- 20.6-24.3	ug/m ³	
	- วัดมาบขลุ	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (1 hr)		- 3.9-15.1	ppb	
		- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (1 hr)		- 1.0-3.5	ppb	
		- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (24 hrs.)		- 1.9-2.6	ppb	
		- ฝุ่นละอองรวม (TSP)		- 52.3-66.6	ug/m ³	
		- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)		- 22.4-36.9	ug/m ³	
		- ความเร็วและทิศทางลม		- ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางทิศใต้ (SSE) คิดเป็นร้อยละ 11.31		

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
1.5 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ	- ปล่องระบายจาก HRSGs	- แอมโมเนีย	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)	- N.D. ppm (<0.0291)	-
2. ระดับเสียง	- รั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งวันทำการ และวันหยุด	- 56.8-60.9 dB (A) - 90.0-96.9 dB (A) - 49.6-53.8 dB (A) - 61.0-67.6 dB (A)	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- บ้านสำนักมะม่วง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)		- 48.3-53.6 dB (A) - 80.3-88.3 dB (A) - 44.6-49.7 dB (A) - 54.2-61.9 dB (A)	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
3. คุณภาพน้ำ 3.1 คุณภาพน้ำโดยวิธีการเก็บตัวอย่าง	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าบ่อพักน้ำทั้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร	- Flow rate - pH - Temperature - Dissolved Oxygen - BOD - TDS - Oil & Grease - Free Chlorine	เดือนละ 1 ครั้ง	- 0.0-15.0 m ³ /s - 7.4-7.9 - 25.10-31.7 °C - 6.31-7.81 mg/L - <2-9 mg/L - 54-242 mg/L - <2 mg/L - <0.01-0.08 mg/L	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
3.2 ตรวจ Trihalomethane	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนเข้าบ่อพักน้ำทั้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร	- Bromodichloromethane - Bromoform - Chloroform - Dibromochloromethane - Total Trihalomethanes		- <1 µg/L - <1 µg/L - <1-6 µg/L - <1-1 µg/L - <1-6 µg/L	- ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้
3.3 ติดตั้งเครื่องตรวจวัด คุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit) ก่อนเข้า บ่อพักน้ำทั้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร	- pH - Temperature - Conductivity	ตลอดช่วงดำเนินการ	- ทางโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ แบบอัตโนมัติ บริเวณบ่อพักน้ำทั้งขนาด 1,800 และ 320 ลูกบาศก์เมตร ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ที่ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย กำหนด ซึ่งมีการรายงานค่าให้ทางนิคมฯ ทราบเป็นประจำทุกวัน	- เป็นไปตามเกณฑ์ที่นิคม อุตสาหกรรมเอเชีย กำหนด
	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Inspection Pit) ก่อนเข้า บ่อพักน้ำทั้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร	- pH - Conductivity	ตลอดช่วงดำเนินการ		
4. กากของเสีย <u>ระยะดำเนินการ</u>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- บันทึกชนิด ปริมาณ ของกากของเสีย อันตรายรวมทั้งวิธีการการกำจัด - แจ้งผลการจัดส่งกากของเสียอันตรายไป กำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต	ตลอดช่วงดำเนินการ ทุก 6 เดือน และรวบรวม ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการได้มีการบันทึกข้อมูล ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และขออนุญาตนำ ของเสียออกนอกโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5.1 ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ระยะดำเนินการ	- พนักงานทุกคน	- ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป *ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป *ตรวจ X-Ray ปอด	ก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง จากนั้นตรวจปี ละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการทำการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ล่าสุดในช่วงระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน-15 กันยายน พ.ศ. 2568 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีผลการตรวจสอบสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ	-
	- พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับสัมผัสเสียงเกินกว่า 85 dB(A)	- ตรวจสอบสุขภาพพิเศษ * ทดสอบการได้ยิน	ปีละ 1 ครั้ง		
	- พนักงานที่ทำงานเชื่อมหรือทำงานเกี่ยวข้องกับความร้อน	* ตรวจวัดสายตาและทดสอบการทำงาน ของปอด	ปีละ 1 ครั้ง		
5.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ความร้อนในสถานที่ทำงาน	- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ	- WBGT	ปีละ 2 ครั้ง	- 28.5 °C	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ	- WBGT		- 28.3 °C	
	- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ	- WBGT		- ยังไม่มีการใช้งาน	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ		ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่			
5.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ) - ปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose)	- พนักงานที่มีโอกาสสัมผัสเสียงดังต่อเนื่อง - CO#1 (Day) - CO#1 (Night) - FO#1 (Day) - FO#1 (Night) - FO#2 (Day) - FO#2 (Night) - Maintenance (Day)	%Dose, TWA	ปีละ 2 ครั้ง	%Dose - 0.2 % - 0.4 % - 10.2 % - 10.5 % - 17.6 % - 29.9 % - 0.0 %	TWA - 57.1 dB(A) - 60.6 dB(A) - 75.1 dB(A) - 75.2 dB(A) - 77.4 dB(A) - 79.7 dB(A) - 51.9 dB(A)	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
5.3 บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและการขนส่ง เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ - ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - สภาพการเสียหาย/สูญเสีย - การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ - รายงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามแบบ จป.(ว)	ทุกครั้งที่มั่วอุบัติเหตุ	- การดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางโครงการจะจัดการสอบสวนและดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ		-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
6. สาธารณสุข	- ภายในพื้นที่โครงการ	- รวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วย และการตรวจสุขภาพประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานและรวบรวมสถิติแล้ว โดยพนักงานส่วนใหญ่มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ และทางโครงการมีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนใกล้เคียงโครงการอยู่เป็นประจำ โดยจัดทำร่วมกับกลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด	
7. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน <u>ระยะดำเนินการ</u>	- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง	- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนที่สัมพันธ์กับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดำเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับและ นำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	ทุก 6 เดือน	- ทางโครงการมีการบันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ และมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หากชุมชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ทั้งบริเวณภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง โดยระหว่างมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนตามมาตรการกำหนด	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
7. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) <u>ระยะดำเนินการ</u>	- ชุมชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และชุมชนที่มีการเก็บตัวอย่างดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสภาพการเปลี่ยนแปลง	ปีละ 1 ครั้ง	- สำหรับในปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผนดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2569	-
8. สุนทรียภาพ	- พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ และสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ ประกอบไปด้วยต้นไม้ยืนต้นทรงสูง บริเวณริมรั้วพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่สีเขียวเป็นตามที่มาตรการกำหนดไว้	-
