



ภาคผนวก ค

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ค-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
 ชื่อลูกค้า : สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
 ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
 สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีโรงเรียนหลวง
 ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 วันที่ชักตัวอย่าง : * ** *** **** *****
 เวลาที่ชักตัวอย่าง : * ** *** **** *****
 ผู้ชักตัวอย่าง : นายวรงค์ นนทจันทร์
 ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตน์พร ทำสะอาด
 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-21 มิถุนายน 2569
 วันที่ออกรายงานผล : 29 มิถุนายน 2569
 เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U056148
 เลขที่งาน : 2026-003436
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0001 - T26AN726-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีโรงเรียนหลวง				
			*	**	***	****	*****
			T26AN726-0001	T26AN726-0002	T26AN726-0003	T26AN726-0004	T26AN726-0005
ฝุ่นละอองรวม (TSP)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	90.1	69.5	81.6	72.0	82.0
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	49.4	43.0	44.1	38.0	42.7
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

* : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
 TSP, PM10 : ค่ารวมเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
 * : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569
 ** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569
 *** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569
 **** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569
 ***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศฤทัยมาศ)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
 ชื่อลูกค้า : สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
 ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
 สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนหลวง
 ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
 เวลาที่ตรวจวัด : *
 วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
 ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์
 วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
 วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
 เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053886
 เลขที่งาน : 2026-003436
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0001 - T26AN726-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	โรงเรียนหลวง									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN726-0001		T26AN726-0002		T26AN726-0003		T26AN726-0004		T26AN726-0005	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	2.24	-	1.91	-	2.13	-	1.96	-	1.72	-
08:00-09:00 น.	2.06	-	1.85	-	2.00	-	1.80	-	1.55	-
09:00-10:00 น.	1.98	-	1.97	-	1.92	-	1.67	-	1.54	-
10:00-11:00 น.	1.91	-	2.08	-	1.94	-	1.64	-	1.71	-
11:00-12:00 น.	1.94	-	2.10	-	1.98	-	1.70	-	1.88	-
12:00-13:00 น.	2.03	-	2.16	-	2.05	-	1.81	-	2.03	-
13:00-14:00 น.	2.17	-	2.21	-	2.14	-	1.93	-	2.08	-
14:00-15:00 น.	2.26	2.07	2.21	2.06	2.25	2.05	2.04	1.82	2.09	1.83
15:00-16:00 น.	2.35	-	2.28	-	2.31	-	2.18	-	2.06	-
16:00-17:00 น.	2.38	-	2.31	-	2.36	-	2.23	-	2.05	-
17:00-18:00 น.	2.35	-	2.30	-	2.44	-	2.21	-	2.08	-
18:00-19:00 น.	2.34	-	2.26	-	2.49	-	2.25	-	2.16	-
19:00-20:00 น.	2.25	-	2.27	-	2.53	-	2.26	-	2.25	-
20:00-21:00 น.	2.25	-	2.29	-	2.53	-	2.29	-	2.25	-
21:00-22:00 น.	2.15	-	2.20	-	2.43	-	2.22	-	2.23	-
22:00-23:00 น.	2.16	2.28	2.28	2.27	2.34	2.43	2.20	2.23	2.17	2.16
23:00-00:00 น.	2.11	-	2.22	-	2.16	-	2.10	-	2.10	-
00:00-01:00 น.	2.08	-	2.21	-	2.08	-	2.03	-	2.02	-
01:00-02:00 น.	2.08	-	2.20	-	2.02	-	1.95	-	1.97	-
02:00-03:00 น.	2.12	-	2.34	-	2.08	-	2.02	-	2.00	-
03:00-04:00 น.	2.20	-	2.41	-	2.22	-	2.10	-	2.16	-
04:00-05:00 น.	2.23	-	2.46	-	2.28	-	2.21	-	2.27	-
05:00-06:00 น.	2.20	-	2.40	-	2.27	-	2.21	-	2.28	-
06:00-07:00 น.	2.09	2.14	2.29	2.32	2.13	2.15	2.01	2.08	2.10	2.11

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนหลวง
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053889
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0001 - T26AN726-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่)				
	ภายในบริเวณโครงการ				
	โรงเรียนหลวง				
	13 - 14 มิถุนายน 2569	14 - 15 มิถุนายน 2569	15 - 16 มิถุนายน 2569	16 - 17 มิถุนายน 2569	17 - 18 มิถุนายน 2569
	T26AN726-0001	T26AN726-0002	T26AN726-0003	T26AN726-0004	T26AN726-0005
07:00-08:00 น.	18.5	17.4	18.4	18.9	19.1
08:00-09:00 น.	15.8	16.0	17.1	16.4	18.2
09:00-10:00 น.	12.7	13.3	16.0	14.2	15.4
10:00-11:00 น.	12.0	12.2	15.9	12.4	14.3
11:00-12:00 น.	12.5	12.0	15.3	13.5	14.1
12:00-13:00 น.	12.5	12.2	15.0	13.3	13.9
13:00-14:00 น.	13.0	14.4	15.8	15.0	14.9
14:00-15:00 น.	13.0	15.1	17.0	14.4	14.7
15:00-16:00 น.	15.0	17.2	17.7	15.2	16.3
16:00-17:00 น.	16.7	17.9	18.1	16.1	16.1
17:00-18:00 น.	17.2	19.1	17.7	17.2	16.6
18:00-19:00 น.	17.8	18.6	18.7	18.7	16.9
19:00-20:00 น.	17.3	19.1	18.7	18.7	18.0
20:00-21:00 น.	17.3	19.2	18.5	18.8	18.1
21:00-22:00 น.	17.0	19.1	17.5	17.4	18.5
22:00-23:00 น.	17.1	19.3	17.0	16.9	17.3
23:00-00:00 น.	16.9	18.4	16.4	17.1	16.1
00:00-01:00 น.	16.8	17.9	15.6	18.0	15.1
01:00-02:00 น.	17.6	18.5	15.4	18.0	14.1
02:00-03:00 น.	17.6	18.1	15.7	17.2	13.9
03:00-04:00 น.	17.6	18.5	16.6	17.0	13.1
04:00-05:00 น.	16.7	17.7	17.0	17.6	15.4
05:00-06:00 น.	17.7	19.0	18.6	18.8	16.9
06:00-07:00 น.	18.5	19.2	19.6	19.8	18.8

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนหลวง
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053892
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0001 - T26AN726-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่)				
	ภายในบริเวณโครงการ				
	โรงเรียนหลวง				
	13 - 14 มิถุนายน 2569	14 - 15 มิถุนายน 2569	15 - 16 มิถุนายน 2569	16 - 17 มิถุนายน 2569	17 - 18 มิถุนายน 2569
	T26AN726-0001	T26AN726-0002	T26AN726-0003	T26AN726-0004	T26AN726-0005
07:00-08:00 น.	1.31	1.08	0.87	0.85	0.90
08:00-09:00 น.	1.30	0.99	0.76	0.74	0.72
09:00-10:00 น.	1.24	0.94	0.71	0.67	0.66
10:00-11:00 น.	1.15	0.95	0.80	0.65	0.66
11:00-12:00 น.	1.01	0.97	0.98	0.70	0.72
12:00-13:00 น.	0.89	1.03	1.22	0.74	0.77
13:00-14:00 น.	0.89	1.10	1.36	0.90	0.91
14:00-15:00 น.	0.98	1.21	1.39	1.04	1.05
15:00-16:00 น.	1.17	1.36	1.34	1.15	1.22
16:00-17:00 น.	1.27	1.42	1.31	1.16	1.23
17:00-18:00 น.	1.38	1.46	1.23	1.16	1.23
18:00-19:00 น.	1.36	1.27	1.20	1.13	1.18
19:00-20:00 น.	1.33	1.09	1.16	1.02	1.17
20:00-21:00 น.	1.16	0.88	1.24	0.87	1.05
21:00-22:00 น.	1.02	0.82	1.25	0.79	0.93
22:00-23:00 น.	0.93	0.85	1.28	0.81	0.86
23:00-00:00 น.	0.94	0.92	1.21	0.89	0.90
00:00-01:00 น.	1.06	0.98	1.18	0.90	1.06
01:00-02:00 น.	1.16	0.89	1.18	0.92	1.25
02:00-03:00 น.	1.25	0.80	1.17	0.89	1.38
03:00-04:00 น.	1.22	0.76	1.11	0.97	1.35
04:00-05:00 น.	1.21	0.92	1.05	1.03	1.23
05:00-06:00 น.	1.18	1.04	1.01	1.12	1.07
06:00-07:00 น.	1.14	1.04	0.98	1.03	0.95

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนหอวัง
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053895
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0001 - T26AN726-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	โรงเรียนหอวัง									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN726-0001		T26AN726-0002		T26AN726-0003		T26AN726-0004		T26AN726-0005	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.1	SSW	2.3	SSE	1.5	WSW	2.3	S	2.3	S
08:00-09:00 น.	2.5	SW	2.4	S	1.8	WSW	1.9	S	2.7	S
09:00-10:00 น.	2.4	SW	2.0	SSE	2.1	SSW	2.4	S	2.6	S
10:00-11:00 น.	2.6	WSW	1.9	SW	2.0	W	2.2	SSW	2.1	S
11:00-12:00 น.	2.7	W	2.2	SSW	2.4	W	2.5	SW	1.8	SSE
12:00-13:00 น.	3.0	SW	2.6	S	1.8	SW	1.8	SW	2.0	S
13:00-14:00 น.	3.3	WSW	2.8	SSW	2.5	S	1.5	SW	2.2	S
14:00-15:00 น.	2.9	SW	2.2	S	2.0	SSW	2.0	SSW	1.7	SSE
15:00-16:00 น.	2.7	SW	1.9	SSW	1.9	S	2.3	SW	1.6	SSW
16:00-17:00 น.	2.6	SW	1.3	S	2.3	SSE	2.6	SSW	1.7	SW
17:00-18:00 น.	2.4	SSW	1.8	SSW	2.0	SSW	2.8	SSW	2.2	SSW
18:00-19:00 น.	2.3	SSW	1.4	S	1.8	S	2.9	S	2.0	WSW
19:00-20:00 น.	2.1	SSW	1.8	SE	1.6	SSW	3.2	SSW	1.9	SW
20:00-21:00 น.	2.0	SSW	1.4	SE	1.8	SW	3.0	SSW	2.1	SW
21:00-22:00 น.	2.2	S	1.8	SSE	1.3	WSW	2.8	S	1.5	S
22:00-23:00 น.	2.4	SSE	1.9	SSE	1.2	SW	2.6	SSE	2.2	SSW
23:00-00:00 น.	2.2	SSE	1.8	SSE	1.0	SSW	2.5	SSE	2.1	SSE
00:00-01:00 น.	2.1	SSE	2.4	SSE	0.9	S	2.7	S	1.5	SW
01:00-02:00 น.	2.0	S	2.1	SE	1.3	SSW	2.2	SSE	1.4	SSW
02:00-03:00 น.	1.6	SSE	1.9	SSE	1.6	S	2.0	S	2.0	S
03:00-04:00 น.	1.4	SSE	1.8	S	1.9	SSE	1.5	S	1.9	S
04:00-05:00 น.	1.2	S	2.0	SSW	2.3	SSE	1.8	SE	1.8	SSE
05:00-06:00 น.	1.8	SSE	2.1	WSW	2.7	SSE	1.3	SW	1.6	SSE
06:00-07:00 น.	2.1	SSE	1.6	WSW	2.1	SSE	1.5	S	1.9	S

(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปริชญาณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 18-21 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 29 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U056149
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0006 - T26AN726-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปริชญาณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร				
			* T26AN726-0006	** T26AN726-0007	*** T26AN726-0008	**** T26AN726-0009	***** T26AN726-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	33.0	26.9	32.8	38.4	29.0
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	18.5	15.3	19.2	22.5	16.0
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

* : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10

* : ค่าเฉลี่ยแบบรายชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชั้ตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569
** : ชั้ตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569
*** : ชั้ตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569
**** : ชั้ตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569
***** : ชั้ตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจนา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปริชญานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053887
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0006 - T26AN726-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปริชญานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN726-0006		T26AN726-0007		T26AN726-0008		T26AN726-0009		T26AN726-0010	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	2.05	-	1.94	-	2.05	-	1.98	-	1.84	-
08:00-09:00 น.	1.94	-	1.83	-	1.95	-	1.88	-	1.78	-
09:00-10:00 น.	1.92	-	1.74	-	1.82	-	1.77	-	1.72	-
10:00-11:00 น.	1.91	-	1.79	-	1.80	-	1.81	-	1.80	-
11:00-12:00 น.	1.91	-	1.86	-	1.79	-	1.85	-	1.87	-
12:00-13:00 น.	1.94	-	2.01	-	1.91	-	1.97	-	1.97	-
13:00-14:00 น.	2.02	-	2.06	-	1.99	-	2.10	-	2.04	-
14:00-15:00 น.	2.04	1.97	2.08	1.91	2.08	1.92	2.21	1.95	2.04	1.88
15:00-16:00 น.	2.06	-	2.08	-	2.06	-	2.24	-	2.10	-
16:00-17:00 น.	2.10	-	2.09	-	2.07	-	2.16	-	2.12	-
17:00-18:00 น.	2.16	-	2.13	-	2.04	-	2.07	-	2.10	-
18:00-19:00 น.	2.23	-	2.16	-	2.04	-	2.00	-	2.06	-
19:00-20:00 น.	2.25	-	2.19	-	1.96	-	2.01	-	2.01	-
20:00-21:00 น.	2.30	-	2.18	-	1.86	-	2.08	-	2.01	-
21:00-22:00 น.	2.23	-	2.16	-	1.78	-	2.12	-	1.97	-
22:00-23:00 น.	2.21	2.19	2.15	2.14	1.84	1.96	2.17	2.11	2.00	2.05
23:00-00:00 น.	2.21	-	2.11	-	1.89	-	2.20	-	2.05	-
00:00-01:00 น.	2.27	-	2.07	-	1.99	-	2.23	-	2.15	-
01:00-02:00 น.	2.28	-	2.04	-	2.01	-	2.20	-	2.20	-
02:00-03:00 น.	2.30	-	2.02	-	2.04	-	2.19	-	2.22	-
03:00-04:00 น.	2.35	-	2.04	-	2.13	-	2.16	-	2.25	-
04:00-05:00 น.	2.34	-	2.08	-	2.17	-	2.16	-	2.28	-
05:00-06:00 น.	2.25	-	2.16	-	2.20	-	2.08	-	2.28	-
06:00-07:00 น.	2.10	2.26	2.16	2.08	2.10	2.07	2.00	2.15	2.22	2.21

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปริชญานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : 10:00 *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053890
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0006 - T26AN726-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปริชญานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร				
	13 - 14 มิถุนายน 2569	14 - 15 มิถุนายน 2569	15 - 16 มิถุนายน 2569	16 - 17 มิถุนายน 2569	17 - 18 มิถุนายน 2569
	T26AN726-0006	T26AN726-0007	T26AN726-0008	T26AN726-0009	T26AN726-0010
07:00-08:00 น.	16.5	14.9	14.9	16.1	15.9
08:00-09:00 น.	16.0	12.8	13.3	15.0	14.2
09:00-10:00 น.	13.7	11.3	11.1	12.5	12.0
10:00-11:00 น.	12.3	10.4	9.6	12.6	11.4
11:00-12:00 น.	11.9	11.9	11.2	13.0	11.9
12:00-13:00 น.	12.0	11.7	11.8	12.6	12.5
13:00-14:00 น.	12.6	12.7	14.0	13.0	14.1
14:00-15:00 น.	12.3	12.0	14.2	13.5	13.9
15:00-16:00 น.	13.5	13.3	15.7	15.2	15.3
16:00-17:00 น.	14.0	15.2	16.0	16.3	16.1
17:00-18:00 น.	14.8	16.4	16.4	16.0	16.5
18:00-19:00 น.	15.0	16.4	16.1	15.6	16.2
19:00-20:00 น.	16.4	15.4	16.4	15.4	15.7
20:00-21:00 น.	16.2	14.4	16.3	15.5	15.4
21:00-22:00 น.	15.7	14.0	16.2	15.8	14.8
22:00-23:00 น.	13.7	14.3	15.1	14.5	14.1
23:00-00:00 น.	12.9	14.0	14.4	14.6	14.2
00:00-01:00 น.	13.2	15.5	14.5	14.1	14.0
01:00-02:00 น.	13.7	15.1	14.4	14.1	14.0
02:00-03:00 น.	14.2	14.8	13.1	13.6	14.3
03:00-04:00 น.	14.1	13.7	11.8	12.9	14.8
04:00-05:00 น.	14.3	14.2	12.4	13.3	15.6
05:00-06:00 น.	15.6	14.9	14.2	14.9	16.8
06:00-07:00 น.	15.9	16.0	16.9	16.6	16.2

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053893
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0006 - T26AN726-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)				
	ก๊าซพิษที่มีแนวโน้มอันตราย				
	วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร				
	13 - 14 มิถุนายน 2569	14 - 15 มิถุนายน 2569	15 - 16 มิถุนายน 2569	16 - 17 มิถุนายน 2569	17 - 18 มิถุนายน 2569
	T26AN726-0006	T26AN726-0007	T26AN726-0008	T26AN726-0009	T26AN726-0010
07:00-08:00 น.	1.22	0.86	0.93	1.01	0.94
08:00-09:00 น.	1.17	0.73	0.84	0.89	0.81
09:00-10:00 น.	1.11	0.69	0.73	0.78	0.72
10:00-11:00 น.	1.02	0.75	0.71	0.73	0.67
11:00-12:00 น.	0.98	0.81	0.87	0.83	0.72
12:00-13:00 น.	1.03	0.82	1.13	0.93	0.79
13:00-14:00 น.	1.17	0.85	1.35	1.03	0.86
14:00-15:00 น.	1.30	0.94	1.38	1.11	0.91
15:00-16:00 น.	1.43	1.08	1.30	1.20	1.07
16:00-17:00 น.	1.45	1.12	1.17	1.22	1.20
17:00-18:00 น.	1.43	1.10	1.07	1.22	1.36
18:00-19:00 น.	1.28	1.05	1.01	1.16	1.39
19:00-20:00 น.	1.12	1.10	1.03	1.17	1.49
20:00-21:00 น.	0.95	1.19	1.04	1.09	1.46
21:00-22:00 น.	0.85	1.26	1.06	1.06	1.36
22:00-23:00 น.	0.80	1.25	1.02	1.02	1.18
23:00-00:00 น.	0.83	1.27	0.96	1.04	1.08
00:00-01:00 น.	0.88	1.32	0.86	1.03	1.01
01:00-02:00 น.	0.96	1.44	0.77	1.02	1.03
02:00-03:00 น.	1.01	1.45	0.79	1.07	1.06
03:00-04:00 น.	1.06	1.33	0.88	1.12	1.06
04:00-05:00 น.	1.10	1.13	1.04	1.18	1.06
05:00-06:00 น.	1.10	1.00	1.10	1.15	1.02
06:00-07:00 น.	1.03	0.95	1.10	1.07	1.02

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1



- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053896
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0006 - T26AN726-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN726-0006		T26AN726-0007		T26AN726-0008		T26AN726-0009		T26AN726-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	1.1	SSW	1.0	WSW	1.1	SSE	2.5	SSE	2.1	S
08:00-09:00 น.	1.3	SW	1.9	SW	0.8	SSE	2.7	S	1.4	S
09:00-10:00 น.	1.6	SSW	2.7	SW	1.1	SSW	2.9	SSW	2.0	S
10:00-11:00 น.	1.8	WSW	2.8	SSE	1.3	SSE	3.1	S	1.7	S
11:00-12:00 น.	2.4	SW	2.9	SE	1.5	S	2.8	S	1.5	SSW
12:00-13:00 น.	1.8	WSW	2.7	S	1.9	S	2.5	S	1.4	WSW
13:00-14:00 น.	1.6	SW	2.5	SSE	2.0	SSW	2.1	SW	1.7	SW
14:00-15:00 น.	1.8	WSW	2.4	SE	1.8	S	2.2	WSW	1.6	SW
15:00-16:00 น.	2.8	W	2.1	SSE	1.9	SSW	1.6	WSW	1.4	SSW
16:00-17:00 น.	2.4	WSW	1.6	SW	1.7	S	1.8	S	1.1	SW
17:00-18:00 น.	2.5	SW	2.2	SSW	1.5	S	2.6	SSE	1.2	SW
18:00-19:00 น.	2.2	SW	1.7	SSW	1.7	SSW	2.5	SSE	1.3	SW
19:00-20:00 น.	2.3	SW	1.6	SW	1.2	S	2.2	S	1.5	SSW
20:00-21:00 น.	2.5	SW	2.1	SW	1.0	SSW	2.3	SSW	1.4	SSW
21:00-22:00 น.	2.7	SW	1.6	SW	1.2	SSE	2.2	SSW	1.3	SSW
22:00-23:00 น.	2.1	SW	2.0	SW	1.6	S	2.4	WSW	1.0	SSW
23:00-00:00 น.	2.0	WSW	1.9	SSW	1.3	SSW	2.5	SW	1.1	WSW
00:00-01:00 น.	2.3	SW	1.6	S	1.1	W	2.6	WSW	1.3	SW
01:00-02:00 น.	2.1	SW	2.1	S	0.8	SW	2.4	SSW	1.5	SSW
02:00-03:00 น.	1.7	SSW	1.8	SW	1.1	WSW	1.9	SSW	1.1	SW
03:00-04:00 น.	1.9	SSW	1.4	S	2.2	SW	1.5	SW	1.0	SW
04:00-05:00 น.	1.3	SSW	1.6	S	2.5	SW	2.2	WSW	1.2	WSW
05:00-06:00 น.	1.2	SW	1.1	S	2.7	S	2.0	SW	1.3	SW
06:00-07:00 น.	1.0	SW	0.9	SSE	2.6	SSW	1.8	S	1.5	WSW

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1



- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่วัดพระศรีมหาธาตุ : สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 18-21 มิถุนายน 2569
เวลาที่ส่งตัวอย่าง : * ** ** ** **
วันที่ออกรายงานผล : 29 มิถุนายน 2569
เวลาที่รับตัวอย่าง : * ** ** ** **
ผู้รับตัวอย่าง : นายวรงค์ นนทจันทร์
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U056150
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตวันพร ทวีสะอาด
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0011 - T26AN726-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ				
			*	**	***	****	*****
ฝุ่นละอองรวม (TSP)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	513	47.4	48.0	57.3	50.5
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	29.6	23.7	26.6	32.8	27.4
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

* : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

* : ค่าเฉลี่ยแบบรายชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้น 1 บรรยากาศ
* : ข้อมูลตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569
** : ข้อมูลตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569
*** : ข้อมูลตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569
**** : ข้อมูลตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569
***** : ข้อมูลตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจนา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่วัดพระศรีมหาธาตุ : สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ส่งตัวอย่าง : *
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เวลาที่รับตัวอย่าง : *
ผู้รับตัวอย่าง : นายวรงค์ นนทจันทร์
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053888
ผู้วิเคราะห์ : นายวรงค์ นนทจันทร์
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0011 - T26AN726-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	สถานีวัดไฟฟ้าบีทีเอสวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN726-0011	T26AN726-0012	T26AN726-0013	T26AN726-0014	T26AN726-0015	T26AN726-0016	T26AN726-0017	T26AN726-0018	T26AN726-0019	T26AN726-0020
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	2.02	-	1.83	-	2.05	-	2.29	-	1.90	-
08:00-09:00 น.	1.88	-	1.71	-	1.97	-	2.07	-	1.79	-
09:00-10:00 น.	1.79	-	1.62	-	1.89	-	1.89	-	1.80	-
10:00-11:00 น.	1.79	-	1.66	-	1.87	-	1.82	-	1.87	-
11:00-12:00 น.	1.85	-	1.80	-	1.88	-	1.81	-	2.00	-
12:00-13:00 น.	2.02	-	1.94	-	1.91	-	1.79	-	2.15	-
13:00-14:00 น.	2.20	-	2.12	-	2.01	-	1.89	-	2.29	-
14:00-15:00 น.	2.30	1.98	2.18	1.86	2.11	1.96	1.98	1.94	2.32	2.02
15:00-16:00 น.	2.32	-	2.25	-	2.24	-	2.13	-	2.37	-
16:00-17:00 น.	2.30	-	2.24	-	2.32	-	2.15	-	2.33	-
17:00-18:00 น.	2.30	-	2.28	-	2.36	-	2.16	-	2.35	-
18:00-19:00 น.	2.28	-	2.40	-	2.37	-	2.09	-	2.25	-
19:00-20:00 น.	2.22	-	2.48	-	2.28	-	1.99	-	2.20	-
20:00-21:00 น.	2.15	-	2.49	-	2.19	-	1.94	-	2.10	-
21:00-22:00 น.	2.06	-	2.45	-	2.09	-	1.91	-	2.12	-
22:00-23:00 น.	2.05	2.21	2.39	2.37	2.15	2.25	1.99	2.05	2.13	2.23
23:00-00:00 น.	2.06	-	2.36	-	2.31	-	2.02	-	2.16	-
00:00-01:00 น.	2.18	-	2.36	-	2.47	-	2.07	-	2.16	-
01:00-02:00 น.	2.25	-	2.34	-	2.56	-	2.12	-	2.16	-
02:00-03:00 น.	2.32	-	2.43	-	2.56	-	2.21	-	2.20	-
03:00-04:00 น.	2.33	-	2.40	-	2.56	-	2.32	-	2.21	-
04:00-05:00 น.	2.26	-	2.40	-	2.52	-	2.31	-	2.24	-
05:00-06:00 น.	2.13	-	2.28	-	2.50	-	2.26	-	2.14	-
06:00-07:00 น.	1.98	2.19	2.17	2.34	2.44	2.49	2.06	2.17	2.04	2.16

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
วิธีการตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053891
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0011 - T26AN726-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นล่างส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (N17)				
	13 - 14 มิถุนายน 2569	14 - 15 มิถุนายน 2569	15 - 16 มิถุนายน 2569	16 - 17 มิถุนายน 2569	17 - 18 มิถุนายน 2569
	T26AN726-0011	T26AN726-0012	T26AN726-0013	T26AN726-0014	T26AN726-0015
07:00-08:00 น.	17.5	17.8	18.9	17.9	18.9
08:00-09:00 น.	16.5	15.4	16.6	16.9	18.8
09:00-10:00 น.	13.9	13.7	15.0	15.9	17.3
10:00-11:00 น.	12.8	12.0	14.4	14.9	15.0
11:00-12:00 น.	12.9	12.5	14.9	14.0	14.2
12:00-13:00 น.	13.4	11.6	14.6	14.0	14.1
13:00-14:00 น.	15.1	12.6	15.9	14.6	15.5
14:00-15:00 น.	15.5	13.3	16.4	14.7	16.3
15:00-16:00 น.	17.6	15.7	18.2	16.3	17.8
16:00-17:00 น.	18.2	16.3	19.0	16.5	18.8
17:00-18:00 น.	17.8	17.1	19.8	16.6	19.2
18:00-19:00 น.	17.3	16.7	19.9	15.8	18.3
19:00-20:00 น.	17.8	16.3	19.7	16.8	18.0
20:00-21:00 น.	18.0	16.0	19.0	16.7	17.7
21:00-22:00 น.	17.8	15.7	18.9	15.6	17.6
22:00-23:00 น.	17.0	16.1	18.5	14.9	16.7
23:00-00:00 น.	17.4	15.6	19.9	14.5	16.6
00:00-01:00 น.	17.6	15.4	19.8	15.3	16.6
01:00-02:00 น.	18.7	14.6	20.4	16.1	16.3
02:00-03:00 น.	19.0	14.9	17.3	15.8	16.6
03:00-04:00 น.	18.9	14.4	16.0	16.1	16.5
04:00-05:00 น.	18.6	16.1	16.0	15.5	17.1
05:00-06:00 น.	19.1	17.8	18.2	17.0	17.4
06:00-07:00 น.	19.0	19.9	19.1	18.1	18.4

(นายศุภา บวรจโรจน์กิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (N17)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
วิธีการตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
เลขที่งาน : 2026-003436
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0011 - T26AN726-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นล่างส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (N17)				
	13 - 14 มิถุนายน 2569	14 - 15 มิถุนายน 2569	15 - 16 มิถุนายน 2569	16 - 17 มิถุนายน 2569	17 - 18 มิถุนายน 2569
	T26AN726-0011	T26AN726-0012	T26AN726-0013	T26AN726-0014	T26AN726-0015
07:00-08:00 น.	1.02	0.94	0.92	1.19	1.11
08:00-09:00 น.	0.88	0.78	0.81	1.11	1.06
09:00-10:00 น.	0.76	0.76	0.77	1.02	1.06
10:00-11:00 น.	0.76	0.91	0.83	0.95	0.97
11:00-12:00 น.	0.80	1.12	0.97	0.97	0.89
12:00-13:00 น.	0.82	1.22	1.10	1.00	0.88
13:00-14:00 น.	0.93	1.19	1.16	1.07	0.95
14:00-15:00 น.	1.05	1.12	1.20	1.19	1.13
15:00-16:00 น.	1.25	1.18	1.25	1.35	1.20
16:00-17:00 น.	1.30	1.26	1.30	1.44	1.27
17:00-18:00 น.	1.30	1.29	1.39	1.45	1.20
18:00-19:00 น.	1.16	1.24	1.39	1.43	1.16
19:00-20:00 น.	1.02	1.23	1.37	1.43	1.13
20:00-21:00 น.	0.83	1.25	1.17	1.43	1.17
21:00-22:00 น.	0.73	1.28	1.02	1.39	1.21
22:00-23:00 น.	0.71	1.22	0.89	1.30	1.19
23:00-00:00 น.	0.82	1.14	0.91	1.30	1.12
00:00-01:00 น.	0.98	1.00	0.92	1.25	1.00
01:00-02:00 น.	1.17	0.89	0.97	1.26	0.87
02:00-03:00 น.	1.24	0.90	0.94	1.13	0.81
03:00-04:00 น.	1.24	0.96	0.93	1.07	0.80
04:00-05:00 น.	1.24	1.10	0.93	1.01	0.95
05:00-06:00 น.	1.22	1.11	1.04	1.07	1.03
06:00-07:00 น.	1.12	1.07	1.14	1.07	1.06

(นายศุภา บวรจโรจน์กิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (N17)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053897
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN726-0011 - T26AN726-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (N17)									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN726-0011		T26AN726-0012		T26AN726-0013		T26AN726-0014		T26AN726-0015	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	1.1	SW	1.4	S	2.2	SW	2.3	S	2.1	S
08:00-09:00 น.	1.8	SW	1.4	SSW	2.8	SSW	2.0	S	1.8	SW
09:00-10:00 น.	1.5	SW	2.0	SW	2.6	S	2.5	W	1.5	SW
10:00-11:00 น.	2.3	SSW	2.2	SSW	2.6	SW	1.8	SSW	2.0	WSW
11:00-12:00 น.	2.0	SW	2.3	WSW	1.9	S	1.6	WSW	1.6	SW
12:00-13:00 น.	2.4	WSW	2.5	SW	2.4	SSW	1.8	W	1.7	SW
13:00-14:00 น.	2.8	SW	2.0	W	2.3	SSW	2.1	SW	2.0	S
14:00-15:00 น.	3.0	WSW	1.6	WSW	2.0	SSW	2.3	W	2.2	SSW
15:00-16:00 น.	2.8	SW	1.9	WSW	1.7	SSW	2.0	WSW	2.3	SW
16:00-17:00 น.	2.7	SW	2.0	SW	2.5	SSE	1.8	S	1.7	SW
17:00-18:00 น.	2.3	WSW	1.8	W	2.3	SSW	1.4	SSW	2.7	SSW
18:00-19:00 น.	2.7	SW	2.0	W	2.3	S	1.5	S	2.2	WSW
19:00-20:00 น.	2.6	SW	2.8	WSW	2.7	SSW	2.4	SSW	2.3	WSW
20:00-21:00 น.	2.4	SSW	2.6	SW	3.0	SSW	2.7	SW	2.9	WSW
21:00-22:00 น.	2.3	SSW	3.2	WSW	2.9	WSW	3.1	SW	2.6	WSW
22:00-23:00 น.	2.5	S	2.4	SW	2.7	W	2.2	WSW	1.8	W
23:00-00:00 น.	3.1	SSW	2.2	SW	2.5	WNW	2.4	S	2.2	SW
00:00-01:00 น.	2.7	SSW	2.1	WSW	2.4	W	2.8	SSW	2.1	W
01:00-02:00 น.	2.3	SSW	2.5	WSW	2.0	W	2.0	S	2.2	WNW
02:00-03:00 น.	2.4	SSW	2.2	SW	1.8	WSW	1.5	SSW	2.3	SW
03:00-04:00 น.	2.7	SW	2.0	S	1.6	W	2.1	SSE	2.1	SW
04:00-05:00 น.	2.4	SSW	1.9	S	1.7	WSW	1.9	S	2.4	WSW
05:00-06:00 น.	2.3	SSW	1.8	S	1.8	SW	1.6	S	2.7	SSW
06:00-07:00 น.	2.2	SW	2.0	SSW	2.1	WSW	1.7	SSW	2.6	S

(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่รับตัวอย่าง : สถานีรับขึ้น
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 8-14 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 17 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U051737
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0001 - T26AM469-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีรับขึ้น				
			*	**	***	****	*****
			T26AM469-0001	T26AM469-0002	T26AM469-0003	T26AM469-0004	T26AM469-0005
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021	69.7	53.6	72.1	70.1	80.2
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021	44.5	34.0	51.5	45.5	43.4
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

*

**

: ค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
: ค่าตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2569
: ค่าตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2569
: ค่าตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569
: ค่าตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2569
: ค่าตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจนา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	วันที่รับตัวอย่าง	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร	วันที่วิเคราะห์	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	วันที่ออกรายงานผล	: 11 มิถุนายน 2569
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U049744
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)	เลขที่งาน	: 2026-003436
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AM469-0001 - T26AM469-0005
วันที่ตรวจวัด	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION		
ผู้ตรวจวัด	: นายทรงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นส่วน)									
	ภายในโครงการโดยปกติ									
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)									
	30 - 31 พฤษภาคม 2569		31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569		1 - 2 มิถุนายน 2569		2 - 3 มิถุนายน 2569		3 - 4 มิถุนายน 2569	
	T26AM469-0001		T26AM469-0002		T26AM469-0003		T26AM469-0004		T26AM469-0005	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.98	-	1.94	-	1.96	-	2.08	-	1.86	-
08:00-09:00 น.	1.82	-	1.82	-	1.77	-	1.95	-	1.70	-
09:00-10:00 น.	1.71	-	1.77	-	1.67	-	1.92	-	1.65	-
10:00-11:00 น.	1.65	-	1.77	-	1.66	-	1.86	-	1.72	-
11:00-12:00 น.	1.66	-	1.82	-	1.77	-	1.88	-	1.75	-
12:00-13:00 น.	1.77	-	1.89	-	1.89	-	1.85	-	1.85	-
13:00-14:00 น.	1.84	-	1.98	-	2.09	-	1.95	-	1.96	-
14:00-15:00 น.	1.94	1.80	2.00	1.87	2.18	1.87	1.98	1.93	2.09	1.82
15:00-16:00 น.	1.99	-	1.99	-	2.26	-	2.09	-	2.15	-
16:00-17:00 น.	2.06	-	1.96	-	2.24	-	2.11	-	2.20	-
17:00-18:00 น.	2.16	-	1.96	-	2.28	-	2.10	-	2.19	-
18:00-19:00 น.	2.21	-	1.96	-	2.39	-	2.08	-	2.09	-
19:00-20:00 น.	2.21	-	1.96	-	2.46	-	2.05	-	1.95	-
20:00-21:00 น.	2.13	-	1.91	-	2.49	-	2.07	-	1.88	-
21:00-22:00 น.	2.07	-	1.87	-	2.44	-	2.03	-	1.87	-
22:00-23:00 น.	1.98	2.10	1.83	1.93	2.42	2.37	2.06	2.07	1.96	2.04
23:00-00:00 น.	1.87	-	1.85	-	2.38	-	2.10	-	2.06	-
00:00-01:00 น.	2.37	-	1.98	-	2.40	-	2.21	-	2.22	-
01:00-02:00 น.	2.31	-	2.12	-	2.34	-	2.22	-	2.23	-
02:00-03:00 น.	2.26	-	2.26	-	2.36	-	2.27	-	2.31	-
03:00-04:00 น.	2.25	-	2.35	-	2.33	-	2.33	-	2.38	-
04:00-05:00 น.	2.29	-	2.41	-	2.37	-	2.34	-	2.40	-
05:00-06:00 น.	2.26	-	2.38	-	2.32	-	2.26	-	2.34	-
06:00-07:00 น.	2.11	2.22	2.20	2.19	2.21	2.34	2.05	2.22	2.21	2.27

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	วันที่รับตัวอย่าง	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร	วันที่วิเคราะห์	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	วันที่ออกรายงานผล	: 11 มิถุนายน 2569
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U049747
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)	เลขที่งาน	: 2026-003436
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AM469-0001 - T26AM469-0005
วันที่ตรวจวัด	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: นายทรงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นส่วน)				
	ภายในโครงการโดยปกติ				
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)				
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	1 - 2 มิถุนายน 2569	2 - 3 มิถุนายน 2569	3 - 4 มิถุนายน 2569
	T26AM469-0001	T26AM469-0002	T26AM469-0003	T26AM469-0004	T26AM469-0005
07:00-08:00 น.	19.0	17.0	18.9	19.6	18.8
08:00-09:00 น.	16.8	16.2	18.2	18.2	17.4
09:00-10:00 น.	14.4	14.4	16.1	15.2	14.7
10:00-11:00 น.	12.7	13.7	15.0	13.3	14.2
11:00-12:00 น.	12.8	13.3	15.0	13.6	14.3
12:00-13:00 น.	12.5	13.7	14.8	14.3	15.2
13:00-14:00 น.	13.5	15.4	15.0	15.2	15.9
14:00-15:00 น.	13.5	16.1	14.1	13.9	15.4
15:00-16:00 น.	15.6	17.9	15.3	14.4	16.1
16:00-17:00 น.	16.6	18.4	15.5	16.1	15.9
17:00-18:00 น.	17.4	18.9	17.0	17.7	17.1
18:00-19:00 น.	17.8	18.3	18.4	18.6	17.2
19:00-20:00 น.	19.2	17.4	19.3	19.0	17.8
20:00-21:00 น.	19.6	16.9	19.0	19.7	18.2
21:00-22:00 น.	20.2	17.8	18.8	20.1	18.8
22:00-23:00 น.	20.5	18.0	18.6	19.0	18.3
23:00-00:00 น.	20.5	18.5	18.5	18.2	17.5
00:00-01:00 น.	20.7	17.1	17.7	17.0	16.0
01:00-02:00 น.	19.3	18.3	16.7	16.9	14.8
02:00-03:00 น.	18.3	17.4	16.6	16.1	13.7
03:00-04:00 น.	17.3	18.0	17.0	15.8	13.3
04:00-05:00 น.	16.6	16.8	17.6	15.4	15.3
05:00-06:00 น.	17.4	18.3	18.9	17.0	17.4
06:00-07:00 น.	18.0	18.2	20.1	18.9	18.7

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049750
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0001 - T26AM469-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)				
	ก๊าซมีเทนไฮโดรคาร์บอน				
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)				
	30 - 31 พฤษภาคม 2569 T26AM469-0001	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 T26AM469-0002	1 - 2 มิถุนายน 2569 T26AM469-0003	2 - 3 มิถุนายน 2569 T26AM469-0004	3 - 4 มิถุนายน 2569 T26AM469-0005
07:00-08:00 น.	1.04	1.03	1.11	1.30	0.94
08:00-09:00 น.	0.88	0.94	0.92	1.20	0.77
09:00-10:00 น.	0.76	0.84	0.84	1.03	0.59
10:00-11:00 น.	0.74	0.79	0.82	0.89	0.58
11:00-12:00 น.	0.86	0.76	0.81	0.83	0.66
12:00-13:00 น.	1.02	0.74	0.77	0.85	0.79
13:00-14:00 น.	1.16	0.91	0.78	0.95	0.86
14:00-15:00 น.	1.23	1.12	0.84	1.10	0.92
15:00-16:00 น.	1.23	1.41	0.89	1.25	1.04
16:00-17:00 น.	1.22	1.51	0.96	1.36	1.28
17:00-18:00 น.	1.29	1.51	1.06	1.40	1.47
18:00-19:00 น.	1.38	1.37	1.22	1.35	1.56
19:00-20:00 น.	1.50	1.22	1.29	1.31	1.49
20:00-21:00 น.	1.53	1.15	1.36	1.28	1.45
21:00-22:00 น.	1.46	1.15	1.35	1.34	1.36
22:00-23:00 น.	1.28	1.25	1.36	1.32	1.33
23:00-00:00 น.	1.19	1.28	1.30	1.28	1.28
00:00-01:00 น.	1.22	1.27	1.22	1.09	1.29
01:00-02:00 น.	1.36	1.21	1.26	0.98	1.30
02:00-03:00 น.	1.30	1.22	1.25	0.93	1.22
03:00-04:00 น.	1.17	1.36	1.28	1.01	1.21
04:00-05:00 น.	1.05	1.51	1.22	1.13	1.25
05:00-06:00 น.	1.07	1.53	1.24	1.15	1.28
06:00-07:00 น.	1.12	1.36	1.30	1.15	1.17

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049753
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0001 - T26AM469-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)									
	30 - 31 พฤษภาคม 2569 T26AM469-0001	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 T26AM469-0002	1 - 2 มิถุนายน 2569 T26AM469-0003	2 - 3 มิถุนายน 2569 T26AM469-0004	3 - 4 มิถุนายน 2569 T26AM469-0005					
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	1.9	SSW	1.9	W	2.6	SSE	2.4	SSE	0.9	SSW
08:00-09:00 น.	2.2	SSW	1.8	WSW	3.2	SSE	3.2	SSE	1.2	W
09:00-10:00 น.	2.5	WSW	3.2	SW	2.5	S	2.9	SSW	1.5	SW
10:00-11:00 น.	2.7	WSW	2.7	SW	2.4	S	2.8	S	1.8	SSW
11:00-12:00 น.	2.9	SSW	2.9	SSW	1.7	S	3.0	SSW	1.9	SW
12:00-13:00 น.	2.0	WSW	3.4	SW	1.5	SSW	2.7	SSW	1.5	WSW
13:00-14:00 น.	2.5	SW	2.6	S	1.2	SSW	2.4	SW	1.8	WSW
14:00-15:00 น.	1.3	SW	2.2	SW	1.6	SSW	1.8	SW	2.0	SW
15:00-16:00 น.	1.1	SSW	2.9	SSW	2.1	SW	1.1	S	2.3	SW
16:00-17:00 น.	1.3	SW	2.6	WSW	2.4	S	1.2	SSE	2.1	S
17:00-18:00 น.	1.4	WSW	3.0	SSW	2.5	SSE	1.4	S	1.6	SW
18:00-19:00 น.	1.2	WSW	3.1	SSE	3.0	SSE	2.7	S	1.8	S
19:00-20:00 น.	1.1	S	2.6	S	2.3	SW	2.8	S	2.3	S
20:00-21:00 น.	1.0	SSW	2.5	S	2.8	SW	2.9	SSW	2.0	S
21:00-22:00 น.	1.2	WSW	2.7	SSE	2.9	SW	2.4	SSE	1.9	S
22:00-23:00 น.	1.3	SSW	2.5	SSW	2.5	SSW	3.2	S	1.5	SSE
23:00-00:00 น.	1.0	SW	2.1	SSW	2.7	SSW	2.8	SW	1.6	SSW
00:00-01:00 น.	1.1	SSW	1.7	SE	3.3	SW	1.6	S	2.1	SSW
01:00-02:00 น.	1.3	S	1.5	SSE	2.2	S	1.8	SSW	1.8	SSW
02:00-03:00 น.	1.8	S	1.8	SE	2.3	S	1.5	S	1.6	S
03:00-04:00 น.	2.3	SW	2.3	SSE	2.4	SSE	1.4	SW	2.0	SSW
04:00-05:00 น.	2.2	SSW	2.5	SSE	2.2	SSW	1.2	SW	1.7	S
05:00-06:00 น.	1.6	WSW	2.9	SSE	2.5	SSE	1.1	SW	1.8	SSE
06:00-07:00 น.	2.7	SW	2.7	SE	2.0	SSE	1.0	SSW	1.9	SSE

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร	
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com	
สถานที่ขั้วสายอย่าง	: สถานีรัชโยธิน	
ชนิดขั้วสายอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง : 30 มิถุนายน 2569
วันที่ขั้วสายอย่าง	: * * * * *	วันที่วิเคราะห์ : 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569
เวลาที่ขั้วสายอย่าง	: * * * * *	วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
ผู้ขั้วสายอย่าง	: นายธีรยุทธ วนศิริ	เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U08550
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตนาธิพร พาสะอาด	เลขที่งาน : 2026-003436
		หมายเลขปฏิบัติการ : T26A0804-0001 - T26A0804-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีรับข้อมูล				
			*	**	***	****	*****
			T26A0804-0001	T26A0804-0002	T26A0804-0003	T26A0804-0004	T26A0804-0005
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	67.3	88.1	63.0	80.1	87.7
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	28.5	34.4	21.4	31.2	30.6
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

* : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อมที่จุดตรวจวัด 25 องค์การบริหารส่วนตำบล และควบคุม 1 บรรยายภาพ

** : ขีดจำกัดอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569

* : ขีดจำกัดอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2569

*** : ขีดจำกัดอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2569

**** : ขีดจำกัดอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2569

***** : ขีดจำกัดอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศภูวนาต)
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• เก็บคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1



- End of Analysis Report -



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		
ชื่อลูกค้า	สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร		
ที่อยู่	44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	สถานีบีทีเอสศรีบุญอิน (N11)		
ประเภทการตรวจวัด	อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด	25-30 มิถุนายน 2569	วันที่วิเคราะห์	25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	*	วันที่ออกรายงานผล	2 กรกฎาคม 2569
วิธีตรวจวัด	NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	2026-U058381
ผู้ตรวจวัด	นายธัชชฎาภรณ์ ยนศิริ	เลขที่งาน	2026-003436
		หมายเลขปฏิบัติการ	T26AC804-0001 - T26AC804-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในด้านส่วน)									
	ภาพถ่ายดาวเทียมแบบอัตโนมัติ									
	สถานีบีทีเอสเอ็มไอเอ็น (N11)									
	25 - 26 มิถุนายน 2569		26 - 27 มิถุนายน 2569		27 - 28 มิถุนายน 2569		28 - 29 มิถุนายน 2569		29 - 30 มิถุนายน 2569	
	T26A0804-0001		T26A0804-0002		T26A0804-0003		T26A0804-0004		T26A0804-0005	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.68	-	1.94	-	1.50	-	1.63	-	1.90	-
08:00-09:00 น.	1.55	-	1.69	-	1.22	-	1.45	-	1.80	-
09:00-10:00 น.	1.44	-	1.47	-	1.28	-	1.31	-	1.75	-
10:00-11:00 น.	1.42	-	1.41	-	1.30	-	1.28	-	1.74	-
11:00-12:00 น.	1.36	-	1.40	-	1.24	-	1.27	-	1.80	-
12:00-13:00 น.	1.38	-	1.53	-	1.45	-	1.36	-	1.93	-
13:00-14:00 น.	1.38	-	1.61	-	1.66	-	1.54	-	2.09	-
14:00-15:00 น.	1.42	1.45	1.74	1.60	1.81	1.43	1.77	1.45	2.22	1.90
15:00-16:00 น.	1.51	-	1.87	-	1.94	-	1.92	-	2.28	-
16:00-17:00 น.	1.61	-	1.99	-	2.01	-	1.98	-	2.27	-
17:00-18:00 น.	1.73	-	2.08	-	2.02	-	1.98	-	2.23	-
18:00-19:00 น.	1.85	-	2.10	-	1.97	-	1.99	-	2.19	-
19:00-20:00 น.	1.97	-	2.17	-	1.90	-	1.96	-	2.12	-
20:00-21:00 น.	2.02	-	2.19	-	1.80	-	1.85	-	1.96	-
21:00-22:00 น.	2.05	-	2.26	-	1.71	-	1.75	-	1.74	-
22:00-23:00 น.	2.10	1.86	2.29	2.12	1.61	1.87	1.63	1.88	1.56	2.04
23:00-00:00 น.	2.15	-	2.36	-	1.58	-	1.64	-	1.47	-
00:00-01:00 น.	2.21	-	2.32	-	1.53	-	1.67	-	1.48	-
01:00-02:00 น.	2.26	-	2.22	-	1.57	-	1.78	-	1.62	-
02:00-03:00 น.	2.34	-	2.18	-	1.71	-	1.91	-	1.82	-
03:00-04:00 น.	2.41	-	2.12	-	1.92	-	2.00	-	2.03	-
04:00-05:00 น.	2.46	-	2.06	-	2.06	-	2.05	-	2.18	-
05:00-06:00 น.	2.41	-	1.93	-	2.02	-	2.05	-	2.22	-
06:00-07:00 น.	2.23	2.31	1.74	2.12	1.86	1.78	1.99	1.89	2.13	1.87

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1

- End of Analysis Report -



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ
วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058384
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AO804-0001 - T26AO804-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นล่างส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)				
	25 - 26 มิถุนายน 2569	26 - 27 มิถุนายน 2569	27 - 28 มิถุนายน 2569	28 - 29 มิถุนายน 2569	29 - 30 มิถุนายน 2569
	T26AO804-0001	T26AO804-0002	T26AO804-0003	T26AO804-0004	T26AO804-0005
07:00-08:00 น.	19.8	18.0	19.6	21.6	19.9
08:00-09:00 น.	17.3	16.6	18.7	18.8	18.6
09:00-10:00 น.	15.2	13.5	16.1	15.5	16.1
10:00-11:00 น.	13.3	13.9	15.6	14.3	14.5
11:00-12:00 น.	12.9	13.3	15.4	14.0	14.1
12:00-13:00 น.	13.0	13.8	16.0	15.1	14.6
13:00-14:00 น.	14.4	14.7	16.2	16.4	15.9
14:00-15:00 น.	16.7	16.8	16.4	17.7	15.9
15:00-16:00 น.	19.7	18.3	16.9	18.8	18.5
16:00-17:00 น.	22.1	19.3	18.4	19.8	19.7
17:00-18:00 น.	21.6	20.2	18.6	20.2	21.1
18:00-19:00 น.	20.4	20.7	19.6	20.3	20.0
19:00-20:00 น.	20.2	21.8	18.9	20.6	20.4
20:00-21:00 น.	21.1	20.2	18.6	21.3	19.8
21:00-22:00 น.	22.2	19.8	19.4	22.1	20.0
22:00-23:00 น.	21.5	17.8	19.0	21.8	18.5
23:00-00:00 น.	20.8	17.4	19.3	21.4	18.5
00:00-01:00 น.	19.9	16.1	19.3	21.1	18.0
01:00-02:00 น.	19.6	16.1	20.6	20.2	17.2
02:00-03:00 น.	20.1	15.1	21.7	19.5	16.0
03:00-04:00 น.	20.1	14.8	21.0	18.4	14.3
04:00-05:00 น.	21.0	15.6	21.1	18.3	16.3
05:00-06:00 น.	20.6	18.1	21.9	19.3	17.4
06:00-07:00 น.	21.2	20.6	22.6	20.5	20.9

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

1/1

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ
วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058392
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AO804-0001 - T26AO804-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นล่างส่วน)				
	ก๊าซมีเทนไฮโดรคาร์บอน				
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)				
	25 - 26 มิถุนายน 2569	26 - 27 มิถุนายน 2569	27 - 28 มิถุนายน 2569	28 - 29 มิถุนายน 2569	29 - 30 มิถุนายน 2569
	T26AO804-0001	T26AO804-0002	T26AO804-0003	T26AO804-0004	T26AO804-0005
07:00-08:00 น.	1.35	1.02	1.05	1.17	1.03
08:00-09:00 น.	1.16	1.03	0.87	0.95	0.92
09:00-10:00 น.	0.92	1.01	0.80	0.84	0.81
10:00-11:00 น.	0.77	0.94	0.79	0.90	0.79
11:00-12:00 น.	0.72	0.91	0.80	1.05	0.76
12:00-13:00 น.	0.77	0.94	0.79	1.14	0.82
13:00-14:00 น.	0.89	1.07	0.89	1.16	0.93
14:00-15:00 น.	1.08	1.19	1.11	1.14	1.07
15:00-16:00 น.	1.26	1.34	1.40	1.16	1.20
16:00-17:00 น.	1.31	1.33	1.48	1.27	1.23
17:00-18:00 น.	1.29	1.36	1.36	1.31	1.32
18:00-19:00 น.	1.31	1.37	1.16	1.43	1.38
19:00-20:00 น.	1.30	1.47	1.07	1.42	1.40
20:00-21:00 น.	1.21	1.45	1.05	1.40	1.29
21:00-22:00 น.	1.00	1.34	1.04	1.19	1.22
22:00-23:00 น.	0.86	1.25	0.98	1.05	1.23
23:00-00:00 น.	0.85	1.27	0.92	0.90	1.33
00:00-01:00 น.	0.93	1.36	0.88	0.87	1.39
01:00-02:00 น.	1.01	1.40	0.87	0.81	1.38
02:00-03:00 น.	1.09	1.35	0.83	0.90	1.33
03:00-04:00 น.	1.13	1.30	0.83	1.06	1.20
04:00-05:00 น.	1.15	1.32	1.01	1.27	1.17
05:00-06:00 น.	1.09	1.35	1.25	1.30	1.18
06:00-07:00 น.	1.05	1.24	1.35	1.21	1.11

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

1/1

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต			
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร			
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com			
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)			
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป			
วันที่ตรวจวัด	: 25-30 มิถุนายน 2569			
เวลาที่ตรวจวัด	: *			
วิธีตรวจวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT			
ผู้ตรวจวัด	: นายธวัช งามศิริ			
	วันที่รับตัวอย่าง	: 25-30 มิถุนายน 2569		
	วันที่วิเคราะห์	: 25-30 มิถุนายน 2569		
	วันที่ออกรายงานผล	: 2 กรกฎาคม 2569		
	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U058400		
	เลขที่งาน	: 2026-003436		
	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26A0804-0001 - T26A0804-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)									
	25 - 26 มิถุนายน 2569		26 - 27 มิถุนายน 2569		27 - 28 มิถุนายน 2569		28 - 29 มิถุนายน 2569		29 - 30 มิถุนายน 2569	
	T26A0804-0001	T26A0804-0002	T26A0804-0003	T26A0804-0004	T26A0804-0005	T26A0804-0006	T26A0804-0007	T26A0804-0008	T26A0804-0009	T26A0804-0010
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	0.8	S	1.4	SSE	1.7	SSW	1.9	SSW	1.0	SW
08:00-09:00 น.	1.0	S	1.8	S	2.1	SW	1.6	S	0.7	W
09:00-10:00 น.	1.4	S	1.3	S	2.1	SSW	1.4	WSW	0.9	WSW
10:00-11:00 น.	1.7	SSW	1.3	S	2.1	SSW	1.0	SW	0.9	WSW
11:00-12:00 น.	2.0	SW	0.8	S	1.4	WSW	0.9	SW	1.1	WSW
12:00-13:00 น.	1.7	W	1.2	SSW	1.4	W	0.9	W	0.8	WSW
13:00-14:00 น.	1.3	WNW	1.0	S	1.3	WNW	1.0	SW	0.9	SW
14:00-15:00 น.	0.9	W	0.8	S	2.2	W	1.3	SW	1.1	WSW
15:00-16:00 น.	0.9	NW	0.7	SSE	1.7	SSW	1.4	WSW	1.4	SSW
16:00-17:00 น.	0.9	NW	1.0	SSW	1.4	SW	2.3	SSE	1.3	WSW
17:00-18:00 น.	1.0	WNW	1.2	SW	1.5	SW	2.0	S	1.1	SW
18:00-19:00 น.	1.0	W	1.5	SW	2.1	SSW	2.0	SSW	1.4	SW
19:00-20:00 น.	0.7	NW	1.7	WNW	1.9	WSW	2.0	SSW	1.2	SSE
20:00-21:00 น.	1.0	WSW	1.7	WNW	2.1	S	1.5	SSW	1.9	SSE
21:00-22:00 น.	0.8	W	2.3	NW	1.5	WSW	1.9	SW	1.4	SE
22:00-23:00 น.	1.0	W	2.3	WSW	2.1	S	1.9	WSW	1.7	SE
23:00-00:00 น.	1.1	WNW	1.8	W	2.0	SSW	1.3	SW	1.8	SSE
00:00-01:00 น.	1.1	W	2.2	WSW	1.8	S	1.6	SSW	2.0	SE
01:00-02:00 น.	1.2	SW	1.8	WSW	2.2	SSW	1.2	SW	1.7	ESE
02:00-03:00 น.	1.4	SW	1.6	WNW	1.5	SSE	1.2	SSW	1.7	S
03:00-04:00 น.	1.8	SW	2.3	WNW	1.6	S	0.9	SW	1.6	SSE
04:00-05:00 น.	1.8	SW	1.6	WNW	1.8	SSW	1.0	SW	2.3	SSE
05:00-06:00 น.	2.0	SW	1.4	SSW	1.8	SSW	0.9	SW	1.6	S
06:00-07:00 น.	1.4	SSW	2.3	SW	1.6	S	0.9	WSW	1.9	SW

(นายธวัช งามศิริ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต			
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร			
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com			
สถานที่ชักตัวอย่าง	: สถานีสายหยุด			
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป			
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***, ****, *****			
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***, ****, *****			
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายพรพงษ์ นนทจันทร์			
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตวันพร ท่าสะอาด			
	วันที่รับตัวอย่าง	: 8 มิถุนายน 2569		
	วันที่วิเคราะห์	: 8-14 มิถุนายน 2569		
	วันที่ออกรายงานผล	: 17 มิถุนายน 2569		
	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U051738		
	เลขที่งาน	: 2026-003436		
	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AM469-0006 - T26AM469-0010		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีสายหยุด				
			*	**	***	****	*****
			T26AM469-0006	T26AM469-0007	T26AM469-0008	T26AM469-0009	T26AM469-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	83.2	75.3	84.3	90.9	82.5
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	48.9	44.0	49.5	57.2	49.4
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

*

**

: ค่าเฉลี่ยของค่ามาตรฐานที่ต่อเนื่องกัน 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
: ชักตัวอย่างเป็นเวลา 10:00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2569
: ชักตัวอย่างเป็นเวลา 10:00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2569
: ชักตัวอย่างเป็นเวลา 10:00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569
: ชักตัวอย่างเป็นเวลา 10:00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2569
: ชักตัวอย่างเป็นเวลา 10:00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศภานุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายพรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049745
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0006 - T26AM469-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)									
	30 - 31 พฤษภาคม 2569		31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569		1 - 2 มิถุนายน 2569		2 - 3 มิถุนายน 2569		3 - 4 มิถุนายน 2569	
	T26AM469-0006		T26AM469-0007		T26AM469-0008		T26AM469-0009		T26AM469-0010	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.90	-	1.88	-	1.85	-	1.84	-	1.81	-
08:00-09:00 น.	1.80	-	1.71	-	1.68	-	1.75	-	1.70	-
09:00-10:00 น.	1.70	-	1.61	-	1.58	-	1.66	-	1.60	-
10:00-11:00 น.	1.67	-	1.65	-	1.56	-	1.67	-	1.66	-
11:00-12:00 น.	1.73	-	1.75	-	1.62	-	1.66	-	1.67	-
12:00-13:00 น.	1.92	-	1.89	-	1.75	-	1.70	-	1.81	-
13:00-14:00 น.	2.09	-	2.02	-	1.87	-	1.75	-	1.94	-
14:00-15:00 น.	2.18	1.87	2.09	1.83	2.02	1.74	1.79	1.73	2.09	1.79
15:00-16:00 น.	2.17	-	2.16	-	2.11	-	1.90	-	2.15	-
16:00-17:00 น.	2.13	-	2.19	-	2.17	-	1.90	-	2.11	-
17:00-18:00 น.	2.10	-	2.21	-	2.12	-	1.97	-	2.05	-
18:00-19:00 น.	2.10	-	2.18	-	2.08	-	1.97	-	1.95	-
19:00-20:00 น.	2.06	-	2.17	-	1.98	-	2.04	-	1.85	-
20:00-21:00 น.	2.06	-	2.11	-	1.97	-	2.03	-	1.77	-
21:00-22:00 น.	2.07	-	2.07	-	1.93	-	2.02	-	1.75	-
22:00-23:00 น.	2.07	2.10	2.04	2.14	1.95	2.04	2.02	1.98	1.80	1.93
23:00-00:00 น.	2.03	-	2.03	-	1.84	-	2.04	-	1.82	-
00:00-01:00 น.	1.94	-	2.06	-	1.77	-	2.12	-	1.95	-
01:00-02:00 น.	1.91	-	2.06	-	1.77	-	2.12	-	2.06	-
02:00-03:00 น.	1.90	-	2.13	-	1.87	-	2.13	-	2.10	-
03:00-04:00 น.	2.01	-	2.21	-	2.00	-	2.10	-	2.11	-
04:00-05:00 น.	2.07	-	2.28	-	2.09	-	2.15	-	2.20	-
05:00-06:00 น.	2.14	-	2.26	-	2.09	-	2.12	-	2.21	-
06:00-07:00 น.	2.03	2.00	2.08	2.14	2.00	1.93	2.02	2.10	2.15	2.07

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายพรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049748
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0006 - T26AM469-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)				
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	1 - 2 มิถุนายน 2569	2 - 3 มิถุนายน 2569	3 - 4 มิถุนายน 2569
	T26AM469-0006	T26AM469-0007	T26AM469-0008	T26AM469-0009	T26AM469-0010
07:00-08:00 น.	18.1	19.2	18.4	19.3	19.0
08:00-09:00 น.	16.9	17.2	17.1	18.1	18.3
09:00-10:00 น.	15.3	14.8	14.7	16.2	17.1
10:00-11:00 น.	14.1	13.2	13.5	15.4	15.5
11:00-12:00 น.	13.7	13.8	13.5	15.6	14.4
12:00-13:00 น.	12.9	13.7	13.1	14.6	13.1
13:00-14:00 น.	13.6	15.0	14.3	15.0	13.8
14:00-15:00 น.	13.1	15.5	13.7	15.5	13.6
15:00-16:00 น.	14.5	17.1	14.9	17.3	15.9
16:00-17:00 น.	16.7	18.1	15.3	17.3	16.8
17:00-18:00 น.	18.4	17.8	16.5	17.5	18.1
18:00-19:00 น.	19.2	18.5	17.9	17.0	18.6
19:00-20:00 น.	18.8	18.0	17.4	16.9	17.9
20:00-21:00 น.	17.6	17.7	16.8	17.8	18.4
21:00-22:00 น.	16.1	17.1	15.4	18.6	17.9
22:00-23:00 น.	15.2	17.0	16.0	18.6	18.3
23:00-00:00 น.	15.7	16.7	17.1	17.6	16.8
00:00-01:00 น.	16.9	17.1	17.7	17.9	16.6
01:00-02:00 น.	17.1	17.9	18.1	18.7	15.8
02:00-03:00 น.	17.4	19.9	16.7	18.8	16.3
03:00-04:00 น.	17.6	19.7	16.5	17.8	16.1
04:00-05:00 น.	18.3	19.1	15.9	16.6	16.9
05:00-06:00 น.	19.6	18.5	17.6	17.4	18.6
06:00-07:00 น.	19.4	19.3	18.8	18.0	20.2

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายวราพงษ์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049751
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0006 - T26AM469-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)				
	30 - 31 พฤษภาคม 2569 T26AM469-0006	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 T26AM469-0007	1 - 2 มิถุนายน 2569 T26AM469-0008	2 - 3 มิถุนายน 2569 T26AM469-0009	3 - 4 มิถุนายน 2569 T26AM469-0010
07:00-08:00 น.	0.82	0.90	0.87	0.88	0.86
08:00-09:00 น.	0.72	0.73	0.78	0.74	0.76
09:00-10:00 น.	0.64	0.68	0.69	0.74	0.69
10:00-11:00 น.	0.63	0.69	0.70	0.80	0.66
11:00-12:00 น.	0.68	0.78	0.75	0.80	0.67
12:00-13:00 น.	0.71	0.78	0.84	0.72	0.71
13:00-14:00 น.	0.77	0.89	0.93	0.78	0.82
14:00-15:00 น.	0.75	0.97	1.08	0.96	0.90
15:00-16:00 น.	0.74	1.15	1.29	1.30	1.01
16:00-17:00 น.	0.76	1.14	1.42	1.42	1.05
17:00-18:00 น.	0.88	1.07	1.42	1.36	1.09
18:00-19:00 น.	1.08	0.96	1.28	1.05	1.11
19:00-20:00 น.	1.22	0.94	1.21	0.87	1.18
20:00-21:00 น.	1.29	1.02	1.12	0.79	1.21
21:00-22:00 น.	1.18	1.15	1.13	0.90	1.25
22:00-23:00 น.	1.03	1.30	1.10	0.95	1.23
23:00-00:00 น.	0.88	1.33	1.08	0.98	1.21
00:00-01:00 น.	0.80	1.25	0.95	0.93	1.15
01:00-02:00 น.	0.82	1.12	0.81	0.89	1.08
02:00-03:00 น.	0.89	1.08	0.72	0.89	1.03
03:00-04:00 น.	1.00	1.10	0.79	0.91	1.00
04:00-05:00 น.	1.12	1.12	0.97	1.01	1.11
05:00-06:00 น.	1.17	1.06	1.12	1.02	1.14
06:00-07:00 น.	1.10	0.99	1.07	0.99	1.18

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายวราพงษ์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049754
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0006 - T26AM469-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)							
	30 - 31 พฤษภาคม 2569 T26AM469-0006	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 T26AM469-0007	1 - 2 มิถุนายน 2569 T26AM469-0008	2 - 3 มิถุนายน 2569 T26AM469-0009	3 - 4 มิถุนายน 2569 T26AM469-0010			
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	1.6	S	1.8	SE	2.7	SW	2.0	SSW
08:00-09:00 น.	1.7	SSE	2.3	SSE	2.2	W	1.9	S
09:00-10:00 น.	1.9	S	2.7	S	2.1	WNW	2.1	S
10:00-11:00 น.	2.2	SE	3.0	SSE	1.9	SW	2.0	SSW
11:00-12:00 น.	2.8	S	2.9	SSW	1.6	SW	2.3	SW
12:00-13:00 น.	2.9	S	3.1	SSW	1.7	SW	2.0	SW
13:00-14:00 น.	3.4	S	3.2	SW	2.5	S	1.9	S
14:00-15:00 น.	3.0	SSE	2.2	SSW	1.8	SE	1.8	S
15:00-16:00 น.	2.4	S	2.5	SSW	1.6	SSE	1.6	SSW
16:00-17:00 น.	2.6	SW	2.2	SW	1.9	SE	2.0	S
17:00-18:00 น.	2.2	SW	2.0	SW	2.1	SE	1.4	SSE
18:00-19:00 น.	2.3	SSW	1.4	SW	2.0	SE	1.5	S
19:00-20:00 น.	3.1	WSW	1.1	SW	2.1	SSE	1.7	SSE
20:00-21:00 น.	3.0	S	0.9	SW	2.0	S	1.8	S
21:00-22:00 น.	3.1	S	1.2	WSW	2.3	SSW	2.0	S
22:00-23:00 น.	2.7	S	1.1	SSW	2.0	SSW	1.7	S
23:00-00:00 น.	2.3	SSW	0.9	SW	1.7	SSW	2.0	S
00:00-01:00 น.	3.2	SSE	1.2	WSW	2.1	SW	1.8	SW
01:00-02:00 น.	2.4	SSW	1.4	SSW	2.2	WSW	2.3	SW
02:00-03:00 น.	2.5	S	1.5	SSW	1.9	SW	1.9	WSW
03:00-04:00 น.	2.1	SSE	2.1	S	1.3	SSW	1.5	SSW
04:00-05:00 น.	2.4	SSE	2.3	SSW	2.0	SSW	1.8	SSW
05:00-06:00 น.	1.8	SE	2.9	SSW	1.8	SSW	1.5	SW
06:00-07:00 น.	1.6	S	2.1	W	1.6	SW	1.4	S

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ซึบตัวอย่าง : สถานีสายหยุด
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ซึบตัวอย่าง : * , ** , *** , **** , *****
เวลาที่ซึบตัวอย่าง : * , ** , *** , **** , *****
ผู้ซึบตัวอย่าง : นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตวันพร ท่าสะอาด
วันที่รับตัวอย่าง : 30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058551
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AC804-0006 - T26AC804-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีสายหยุด				
			*	**	***	****	*****
			T26AC804-0006	T26AC804-0007	T26AC804-0008	T26AC804-0009	T26AC804-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	47.2	49.8	53.7	40.9	51.9
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	24.6	24.4	26.6	20.5	23.5
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569
** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2569
*** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2569
**** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2569
***** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
1/1

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่สี่สายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ
วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058382
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AC804-0006 - T26AC804-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	สถานีที่สี่สายหยุด (N19)									
	25 - 26 มิถุนายน 2569		26 - 27 มิถุนายน 2569		27 - 28 มิถุนายน 2569		28 - 29 มิถุนายน 2569		29 - 30 มิถุนายน 2569	
	T26AC804-0006		T26AC804-0007		T26AC804-0008		T26AC804-0009		T26AC804-0010	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	2.00	-	1.79	-	1.69	-	1.81	-	1.81	-
08:00-09:00 น.	1.74	-	1.64	-	1.57	-	1.64	-	1.57	-
09:00-10:00 น.	1.62	-	1.52	-	1.42	-	1.60	-	1.45	-
10:00-11:00 น.	1.58	-	1.51	-	1.40	-	1.60	-	1.49	-
11:00-12:00 น.	1.61	-	1.55	-	1.44	-	1.67	-	1.62	-
12:00-13:00 น.	1.63	-	1.65	-	1.55	-	1.76	-	1.80	-
13:00-14:00 น.	1.72	-	1.79	-	1.76	-	1.83	-	2.00	-
14:00-15:00 น.	1.79	1.71	1.91	1.67	1.89	1.59	1.85	1.72	2.08	1.73
15:00-16:00 น.	1.85	-	2.04	-	2.12	-	1.84	-	2.11	-
16:00-17:00 น.	1.87	-	2.08	-	2.19	-	1.85	-	2.09	-
17:00-18:00 น.	1.84	-	2.08	-	2.25	-	1.84	-	2.15	-
18:00-19:00 น.	1.83	-	2.05	-	2.11	-	1.83	-	2.19	-
19:00-20:00 น.	1.74	-	2.10	-	1.94	-	1.80	-	2.14	-
20:00-21:00 น.	1.69	-	2.13	-	1.79	-	1.88	-	2.01	-
21:00-22:00 น.	1.63	-	2.13	-	1.66	-	1.95	-	1.81	-
22:00-23:00 น.	1.60	1.76	2.10	2.09	1.60	1.96	2.05	1.88	1.64	2.02
23:00-00:00 น.	1.57	-	2.06	-	1.60	-	2.12	-	1.50	-
00:00-01:00 น.	1.55	-	1.99	-	1.62	-	2.14	-	1.42	-
01:00-02:00 น.	1.61	-	1.97	-	1.71	-	2.12	-	1.48	-
02:00-03:00 น.	1.69	-	1.98	-	1.79	-	2.11	-	1.62	-
03:00-04:00 น.	1.86	-	2.08	-	1.97	-	2.21	-	1.89	-
04:00-05:00 น.	1.95	-	2.05	-	2.07	-	2.30	-	2.09	-
05:00-06:00 น.	2.04	-	1.98	-	2.12	-	2.28	-	2.17	-
06:00-07:00 น.	1.95	1.78	1.85	1.99	1.98	1.86	2.10	2.17	2.09	1.78

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : วิทยาศาสตร์บรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายธัญญ์ วนศิริ
วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058387
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26A0804-0006 - T26A0804-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นผิว)				
	ภายในโครงรถโดยสาร				
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)				
	25 - 26 มิถุนายน 2569	26 - 27 มิถุนายน 2569	27 - 28 มิถุนายน 2569	28 - 29 มิถุนายน 2569	29 - 30 มิถุนายน 2569
	T26A0804-0006	T26A0804-0007	T26A0804-0008	T26A0804-0009	T26A0804-0010
07:00-08:00 น.	19.9	17.9	19.5	21.3	18.9
08:00-09:00 น.	18.4	16.8	18.5	19.3	15.5
09:00-10:00 น.	15.9	14.6	16.1	15.7	12.9
10:00-11:00 น.	14.8	13.2	15.1	14.7	12.7
11:00-12:00 น.	13.8	13.4	15.6	14.9	14.1
12:00-13:00 น.	12.8	13.0	16.4	14.9	14.1
13:00-14:00 น.	13.7	14.0	19.0	16.3	15.9
14:00-15:00 น.	14.8	14.6	20.7	17.4	16.2
15:00-16:00 น.	17.6	17.5	22.9	18.9	17.7
16:00-17:00 น.	20.0	18.4	22.6	20.2	19.2
17:00-18:00 น.	20.2	19.3	21.5	19.8	20.7
18:00-19:00 น.	20.3	19.8	21.1	20.4	20.9
19:00-20:00 น.	19.7	21.0	21.4	19.8	20.6
20:00-21:00 น.	19.7	21.7	21.1	19.8	20.1
21:00-22:00 น.	18.2	21.8	20.3	18.2	20.7
22:00-23:00 น.	17.4	21.0	19.2	17.7	21.0
23:00-00:00 น.	16.3	20.2	19.4	17.2	20.1
00:00-01:00 น.	15.8	18.5	19.7	17.1	18.5
01:00-02:00 น.	15.0	18.1	19.9	16.6	17.1
02:00-03:00 น.	15.9	18.2	19.8	16.0	16.2
03:00-04:00 น.	16.5	18.1	18.4	16.4	16.6
04:00-05:00 น.	18.2	19.3	18.1	16.8	18.2
05:00-06:00 น.	18.3	19.1	19.4	18.8	19.9
06:00-07:00 น.	19.2	20.9	22.0	20.8	21.9

(นายธัญญ์ วนศิริ)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
 ISO 14001:2015 CERTIFIED
 ISO 45001:2018 CERTIFIED

* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ใบรายงานผลการวิเคราะห์มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : วิทยาศาสตร์บรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายธัญญ์ วนศิริ
วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058395
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26A0804-0006 - T26A0804-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นผิว)				
	ภายในมิเตอร์ไฮโดรคาร์บอน				
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)				
	25 - 26 มิถุนายน 2569	26 - 27 มิถุนายน 2569	27 - 28 มิถุนายน 2569	28 - 29 มิถุนายน 2569	29 - 30 มิถุนายน 2569
	T26A0804-0006	T26A0804-0007	T26A0804-0008	T26A0804-0009	T26A0804-0010
07:00-08:00 น.	1.04	0.97	1.09	1.09	0.97
08:00-09:00 น.	0.89	0.81	1.04	0.90	0.92
09:00-10:00 น.	0.79	0.73	0.99	0.69	0.83
10:00-11:00 น.	0.70	0.76	0.97	0.64	0.75
11:00-12:00 น.	0.75	0.75	0.98	0.67	0.70
12:00-13:00 น.	0.79	0.76	1.06	0.78	0.74
13:00-14:00 น.	1.00	0.80	1.21	0.88	0.86
14:00-15:00 น.	1.11	0.92	1.34	1.04	1.05
15:00-16:00 น.	1.29	1.10	1.52	1.21	1.21
16:00-17:00 น.	1.23	1.27	1.54	1.36	1.31
17:00-18:00 น.	1.21	1.35	1.49	1.39	1.19
18:00-19:00 น.	1.05	1.33	1.25	1.42	1.07
19:00-20:00 น.	1.02	1.28	1.04	1.40	0.97
20:00-21:00 น.	0.95	1.20	0.88	1.35	0.97
21:00-22:00 น.	0.97	1.09	0.85	1.19	1.02
22:00-23:00 น.	0.91	0.97	0.86	1.10	1.09
23:00-00:00 น.	0.91	0.89	0.87	1.14	1.18
00:00-01:00 น.	0.90	0.86	0.83	1.25	1.13
01:00-02:00 น.	1.00	0.87	0.81	1.36	1.02
02:00-03:00 น.	1.10	0.93	0.81	1.37	0.93
03:00-04:00 น.	1.18	1.08	0.88	1.33	0.98
04:00-05:00 น.	1.30	1.23	1.04	1.28	1.14
05:00-06:00 น.	1.31	1.28	1.18	1.18	1.18
06:00-07:00 น.	1.23	1.19	1.25	1.10	1.11

(นายธัญญ์ วนศิริ)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
 ISO 14001:2015 CERTIFIED
 ISO 45001:2018 CERTIFIED

* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ใบรายงานผลการวิเคราะห์มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายอัษฎาธร ยนต์ศิริ
วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058402
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AO804-0006 - T26AO804-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)									
	25 - 26 มิถุนายน 2569		26 - 27 มิถุนายน 2569		27 - 28 มิถุนายน 2569		28 - 29 มิถุนายน 2569		29 - 30 มิถุนายน 2569	
	T26AO804-0006		T26AO804-0007		T26AO804-0008		T26AO804-0009		T26AO804-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	0.5	NW	0.8	W	0.6	NW	0.5	S	1.8	ESE
08:00-09:00 น.	0.9	S	0.6	W	0.7	SSE	0.8	S	1.4	SE
09:00-10:00 น.	1.4	ESE	1.1	S	0.7	S	1.1	SW	1.5	SE
10:00-11:00 น.	1.6	SSE	1.3	S	1.4	S	1.4	SSE	1.8	S
11:00-12:00 น.	1.5	SSE	1.1	NE	1.4	S	1.5	SE	1.6	SE
12:00-13:00 น.	1.6	S	1.2	NNE	1.2	SSW	1.4	ESE	1.6	S
13:00-14:00 น.	1.4	SSW	1.2	NE	1.3	S	1.3	ENE	2.5	SE
14:00-15:00 น.	1.5	S	1.3	S	1.3	SE	1.3	E	1.8	SSE
15:00-16:00 น.	1.5	S	1.2	SW	0.7	NW	1.2	ENE	2.0	SSE
16:00-17:00 น.	1.6	S	1.6	S	1.6	S	2.2	S	1.6	SW
17:00-18:00 น.	1.7	S	1.4	SSE	0.6	NNE	1.6	S	2.0	SSW
18:00-19:00 น.	2.0	SSW	0.8	SSE	0.9	WNW	1.1	S	1.8	SW
19:00-20:00 น.	1.6	SW	0.6	NNW	0.7	WNW	0.9	SSW	1.6	SSW
20:00-21:00 น.	1.1	S	0.9	SSW	0.7	NW	1.5	S	2.0	SSW
21:00-22:00 น.	0.9	W	0.9	S	0.8	SW	1.4	S	1.9	S
22:00-23:00 น.	0.7	WSW	0.5	SSW	0.6	SSW	0.5	SSW	2.2	SSE
23:00-00:00 น.	0.5	WSW	0.5	SW	0.5	SW	1.6	S	1.4	S
00:00-01:00 น.	0.8	WSW	0.5	SW	0.5	SW	2.2	SSE	1.5	SSE
01:00-02:00 น.	0.8	W	0.6	WSW	0.8	SW	2.1	S	0.8	SSE
02:00-03:00 น.	0.5	SW	0.5	SSW	0.5	SSW	2.1	S	1.1	SSW
03:00-04:00 น.	0.7	SW	0.8	WNW	0.5	SW	1.7	SSE	1.7	S
04:00-05:00 น.	0.9	WSW	0.5	W	0.5	SSW	2.2	SE	1.7	SSE
05:00-06:00 น.	0.8	WSW	0.6	WSW	0.5	SSW	1.7	SE	2.0	SE
06:00-07:00 น.	0.8	SW	0.5	SW	0.5	SW	2.0	SSE	1.9	SSE

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีสะพานใหม่
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายวรงค์ นนทจันทร์
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตนาพร ท่าสะอาด
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 8-14 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 17 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U051740
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0011 - T26AM469-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีสะพานใหม่				
			*	**	***	****	*****
			T26AM469-0011	T26AM469-0012	T26AM469-0013	T26AM469-0014	T26AM469-0015
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	82.5	63.8	78.4	60.5	80.1
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	49.1	38.4	46.3	39.1	41.6
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

*

**

: ค่าความเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
: ชักตัวอย่างเมื่อวันที่ 10:30 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2569
: ชักตัวอย่างเมื่อวันที่ 10:30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2569
: ชักตัวอย่างเมื่อวันที่ 10:30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569
: ชักตัวอย่างเมื่อวันที่ 10:30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2569
: ชักตัวอย่างเมื่อวันที่ 10:30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจนา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานจรรยาและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีทีเอสสะพานใหม่ (N20)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049746
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0011 - T26AM469-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	สถานีทีเอสสะพานใหม่ (N20)									
	30 - 31 พฤษภาคม 2569		31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569		1 - 2 มิถุนายน 2569		2 - 3 มิถุนายน 2569		3 - 4 มิถุนายน 2569	
	T26AM469-0011		T26AM469-0012		T26AM469-0013		T26AM469-0014		T26AM469-0015	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.84	-	1.74	-	1.78	-	1.74	-	1.83	-
08:00-09:00 น.	1.76	-	1.59	-	1.58	-	1.66	-	1.63	-
09:00-10:00 น.	1.69	-	1.53	-	1.42	-	1.59	-	1.55	-
10:00-11:00 น.	1.70	-	1.64	-	1.47	-	1.63	-	1.59	-
11:00-12:00 น.	1.72	-	1.85	-	1.54	-	1.73	-	1.65	-
12:00-13:00 น.	1.78	-	2.03	-	1.71	-	1.92	-	1.70	-
13:00-14:00 น.	1.87	-	2.16	-	1.83	-	2.10	-	1.81	-
14:00-15:00 น.	1.92	1.79	2.27	1.85	1.90	1.65	2.22	1.82	1.95	1.71
15:00-16:00 น.	2.01	-	2.32	-	2.00	-	2.29	-	2.03	-
16:00-17:00 น.	2.02	-	2.27	-	2.04	-	2.30	-	2.09	-
17:00-18:00 น.	2.04	-	2.18	-	2.08	-	2.26	-	2.07	-
18:00-19:00 น.	2.03	-	2.18	-	1.99	-	2.17	-	2.09	-
19:00-20:00 น.	1.99	-	2.26	-	1.90	-	2.09	-	2.05	-
20:00-21:00 น.	1.96	-	2.30	-	1.88	-	1.97	-	2.03	-
21:00-22:00 น.	1.88	-	2.29	-	1.93	-	1.87	-	1.99	-
22:00-23:00 น.	1.88	1.98	2.20	2.25	2.04	1.98	1.79	2.09	2.00	2.04
23:00-00:00 น.	1.96	-	2.12	-	2.10	-	1.73	-	2.00	-
00:00-01:00 น.	2.09	-	2.03	-	2.11	-	1.71	-	2.06	-
01:00-02:00 น.	2.20	-	2.04	-	2.08	-	1.73	-	2.07	-
02:00-03:00 น.	2.22	-	2.11	-	2.08	-	1.79	-	2.11	-
03:00-04:00 น.	2.20	-	2.19	-	2.14	-	1.90	-	2.16	-
04:00-05:00 น.	2.17	-	2.25	-	2.21	-	2.03	-	2.18	-
05:00-06:00 น.	2.10	-	2.20	-	2.11	-	2.11	-	2.17	-
06:00-07:00 น.	1.95	2.11	2.06	2.13	1.94	2.10	2.05	1.88	2.03	2.10

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานจรรยาและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีทีเอสสะพานใหม่ (N20)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049749
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0011 - T26AM469-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	สถานีทีเอสสะพานใหม่ (N20)				
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	1 - 2 มิถุนายน 2569	2 - 3 มิถุนายน 2569	3 - 4 มิถุนายน 2569
	T26AM469-0011	T26AM469-0012	T26AM469-0013	T26AM469-0014	T26AM469-0015
07:00-08:00 น.	15.7	18.3	19.2	19.2	18.9
08:00-09:00 น.	13.8	16.9	17.6	17.9	17.8
09:00-10:00 น.	12.3	16.0	14.5	15.5	15.0
10:00-11:00 น.	11.9	14.4	14.0	13.8	13.5
11:00-12:00 น.	13.3	14.8	14.0	14.5	13.2
12:00-13:00 น.	13.4	14.3	14.2	14.5	13.3
13:00-14:00 น.	14.7	16.3	14.6	16.3	15.1
14:00-15:00 น.	15.5	16.9	14.9	16.9	16.9
15:00-16:00 น.	17.1	19.2	16.5	18.6	19.7
16:00-17:00 น.	18.7	18.5	17.5	18.5	20.3
17:00-18:00 น.	17.9	18.3	17.7	19.7	20.8
18:00-19:00 น.	18.1	17.7	18.0	20.2	20.3
19:00-20:00 น.	18.2	18.5	17.5	19.5	21.1
20:00-21:00 น.	18.0	18.2	17.7	18.4	20.5
21:00-22:00 น.	17.3	18.0	17.0	17.4	21.3
22:00-23:00 น.	16.5	17.1	17.5	17.6	20.3
23:00-00:00 น.	17.3	17.1	17.1	17.5	20.8
00:00-01:00 น.	16.7	17.3	16.8	18.3	19.5
01:00-02:00 น.	16.0	17.1	16.0	18.7	18.7
02:00-03:00 น.	14.6	17.3	15.7	19.1	18.9
03:00-04:00 น.	14.4	16.6	16.1	19.8	20.0
04:00-05:00 น.	15.3	17.6	17.3	19.0	19.6
05:00-06:00 น.	17.5	18.3	18.4	18.5	19.3
06:00-07:00 น.	18.3	20.0	19.5	18.9	18.2

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049752
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0011 - T26AM469-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์คาร์บอน				
	สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)				
	30 - 31 พฤษภาคม 2569 T26AM469-0011	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 T26AM469-0012	1 - 2 มิถุนายน 2569 T26AM469-0013	2 - 3 มิถุนายน 2569 T26AM469-0014	3 - 4 มิถุนายน 2569 T26AM469-0015
07:00-08:00 น.	1.13	0.85	0.92	1.22	0.78
08:00-09:00 น.	1.00	0.80	0.82	1.07	0.67
09:00-10:00 น.	0.86	0.77	0.80	0.97	0.69
10:00-11:00 น.	0.78	0.77	0.80	0.87	0.75
11:00-12:00 น.	0.76	0.83	0.84	0.84	0.93
12:00-13:00 น.	0.85	0.97	0.84	0.86	1.03
13:00-14:00 น.	0.98	1.11	0.84	1.04	1.13
14:00-15:00 น.	1.11	1.20	0.94	1.24	1.09
15:00-16:00 น.	1.16	1.26	1.16	1.40	1.14
16:00-17:00 น.	1.20	1.27	1.32	1.36	1.20
17:00-18:00 น.	1.32	1.25	1.39	1.25	1.28
18:00-19:00 น.	1.41	1.20	1.33	1.06	1.25
19:00-20:00 น.	1.46	1.26	1.29	0.94	1.15
20:00-21:00 น.	1.34	1.26	1.16	0.85	1.04
21:00-22:00 น.	1.25	1.27	1.05	0.83	1.06
22:00-23:00 น.	1.14	1.20	0.92	0.88	1.14
23:00-00:00 น.	1.23	1.24	0.88	0.97	1.21
00:00-01:00 น.	1.36	1.36	0.89	1.04	1.15
01:00-02:00 น.	1.50	1.40	0.95	1.01	1.03
02:00-03:00 น.	1.45	1.35	1.02	0.91	0.97
03:00-04:00 น.	1.29	1.23	1.06	0.89	0.99
04:00-05:00 น.	1.14	1.19	1.13	0.95	1.08
05:00-06:00 น.	1.04	1.15	1.22	1.02	1.05
06:00-07:00 น.	0.95	1.03	1.26	0.93	0.97

(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049755
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM469-0011 - T26AM469-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)							
	30 - 31 พฤษภาคม 2569 T26AM469-0011	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 T26AM469-0012	1 - 2 มิถุนายน 2569 T26AM469-0013	2 - 3 มิถุนายน 2569 T26AM469-0014	3 - 4 มิถุนายน 2569 T26AM469-0015	30 - 31 พฤษภาคม 2569 T26AM469-0011	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 T26AM469-0012	1 - 2 มิถุนายน 2569 T26AM469-0013
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.0	S	1.7	S	1.4	SSE	2.0	SW
08:00-09:00 น.	1.8	SSW	1.5	SSW	1.1	SSW	1.7	SSW
09:00-10:00 น.	1.6	S	1.1	SSW	0.9	SSW	2.4	S
10:00-11:00 น.	2.0	SSE	1.5	SSE	1.2	SW	1.6	S
11:00-12:00 น.	1.5	S	1.4	ESE	1.0	S	2.0	SW
12:00-13:00 น.	1.6	SSE	1.8	SSE	1.5	SW	2.2	SW
13:00-14:00 น.	1.8	SSE	2.0	SE	1.6	WSW	1.9	SSW
14:00-15:00 น.	1.7	SE	2.4	S	1.9	WSW	1.7	SSW
15:00-16:00 น.	1.6	S	2.6	S	1.8	SW	2.1	SW
16:00-17:00 น.	1.5	SSE	2.0	SSE	2.0	W	1.7	SW
17:00-18:00 น.	2.0	SSE	2.3	S	1.5	WSW	1.4	W
18:00-19:00 น.	1.6	SSE	2.5	SSE	1.2	WSW	1.8	WSW
19:00-20:00 น.	2.1	S	2.3	SSE	1.1	SW	1.2	WSW
20:00-21:00 น.	2.4	SSW	2.1	SSW	1.6	S	1.3	SSW
21:00-22:00 น.	1.9	SSW	2.0	SSE	1.5	S	1.1	WSW
22:00-23:00 น.	2.1	SSW	1.6	S	2.4	S	1.4	SSW
23:00-00:00 น.	2.2	S	1.8	S	2.7	S	1.7	SW
00:00-01:00 น.	1.8	SSW	1.9	S	2.3	SSE	1.9	WSW
01:00-02:00 น.	1.7	SSE	2.3	S	1.6	S	1.6	WSW
02:00-03:00 น.	1.5	S	2.1	SSW	1.5	S	2.3	SW
03:00-04:00 น.	1.2	S	1.8	S	1.6	SSW	2.5	S
04:00-05:00 น.	1.5	S	1.6	S	1.9	SSW	2.1	SSW
05:00-06:00 น.	1.4	S	2.2	SSE	2.1	SSW	1.9	S
06:00-07:00 น.	1.6	SSW	1.5	SSE	2.2	SW	1.7	SSW

(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีสะพานใหม่
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : **, ***, ****, *****
เวลาที่ชักตัวอย่าง : **, ***, ****, *****
ผู้ชักตัวอย่าง : นายฉัตรฐาณ ยนต์ศิริ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058552
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AO804-0011 - T26AO804-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			สถานีสะพานใหม่				
			*	**	***	****	*****
			T26AO804-0011	T26AO804-0012	T26AO804-0013	T26AO804-0014	T26AO804-0015
ฝุ่นละอองรวม (TSP)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021	69.9	64.1	514	45.9	44.7
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021	45.7	45.8	34.9	32.0	314
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

* : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบสถิติฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• นำมาคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีที่สะพานใหม่ (N20)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION
ผู้ตรวจวัด : นายฉัตรฐาณ ยนต์ศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058383
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AO804-0011 - T26AO804-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	สถานีที่สะพานใหม่ (N20)									
	25 - 26 มิถุนายน 2569		26 - 27 มิถุนายน 2569		27 - 28 มิถุนายน 2569		28 - 29 มิถุนายน 2569		29 - 30 มิถุนายน 2569	
	T26AO804-0011		T26AO804-0012		T26AO804-0013		T26AO804-0014		T26AO804-0015	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	2.10	-	1.96	-	1.80	-	1.66	-	1.80	-
08:00-09:00 น.	1.84	-	1.76	-	1.58	-	1.40	-	1.61	-
09:00-10:00 น.	1.67	-	1.54	-	1.47	-	1.31	-	1.50	-
10:00-11:00 น.	1.61	-	1.44	-	1.46	-	1.33	-	1.48	-
11:00-12:00 น.	1.68	-	1.39	-	1.52	-	1.37	-	1.56	-
12:00-13:00 น.	1.80	-	1.45	-	1.65	-	1.50	-	1.69	-
13:00-14:00 น.	1.91	-	1.60	-	1.81	-	1.64	-	1.89	-
14:00-15:00 น.	2.04	1.83	1.74	1.61	1.93	1.65	1.76	1.50	2.04	1.70
15:00-16:00 น.	2.12	-	1.89	-	2.04	-	1.81	-	2.22	-
16:00-17:00 น.	2.19	-	2.02	-	2.13	-	1.82	-	2.24	-
17:00-18:00 น.	2.13	-	2.16	-	2.21	-	1.86	-	2.29	-
18:00-19:00 น.	2.10	-	2.24	-	2.24	-	1.90	-	2.32	-
19:00-20:00 น.	1.94	-	2.28	-	2.27	-	2.04	-	2.35	-
20:00-21:00 น.	1.74	-	2.26	-	2.31	-	2.07	-	2.38	-
21:00-22:00 น.	1.55	-	2.25	-	2.34	-	2.07	-	2.35	-
22:00-23:00 น.	1.50	1.91	2.26	2.17	2.33	2.23	2.01	1.95	2.33	2.31
23:00-00:00 น.	1.55	-	2.26	-	2.29	-	2.05	-	2.30	-
00:00-01:00 น.	1.67	-	2.24	-	2.29	-	2.11	-	2.26	-
01:00-02:00 น.	1.80	-	2.13	-	2.20	-	2.23	-	2.32	-
02:00-03:00 น.	1.99	-	2.12	-	2.18	-	2.28	-	2.29	-
03:00-04:00 น.	2.14	-	2.09	-	2.20	-	2.29	-	2.35	-
04:00-05:00 น.	2.23	-	2.15	-	2.23	-	2.18	-	2.29	-
05:00-06:00 น.	2.24	-	2.12	-	2.22	-	2.11	-	2.24	-
06:00-07:00 น.	2.16	1.97	2.00	2.14	1.97	2.20	1.96	2.15	2.04	2.26

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• นำมาคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ (N20)
ประเภทการตรวจวัด : ไลกาสโคปในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058390
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AO804-0011 - T26AO804-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นผิวส่วน)				
	ภายในโครงรถโดยสาร				
	สถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ (N20)				
	25 - 26 มิถุนายน 2569	26 - 27 มิถุนายน 2569	27 - 28 มิถุนายน 2569	28 - 29 มิถุนายน 2569	29 - 30 มิถุนายน 2569
	T26AO804-0011	T26AO804-0012	T26AO804-0013	T26AO804-0014	T26AO804-0015
07:00-08:00 น.	19.5	19.3	20.1	19.2	18.2
08:00-09:00 น.	17.5	18.9	18.4	16.5	16.8
09:00-10:00 น.	13.7	15.6	14.5	12.7	14.0
10:00-11:00 น.	12.9	14.6	13.4	12.5	12.7
11:00-12:00 น.	12.6	14.3	13.8	12.4	12.8
12:00-13:00 น.	13.1	14.9	15.0	12.9	13.4
13:00-14:00 น.	14.7	16.4	16.3	14.2	15.5
14:00-15:00 น.	15.4	16.9	17.1	15.5	15.5
15:00-16:00 น.	16.1	18.9	19.7	17.6	18.7
16:00-17:00 น.	16.2	19.5	20.4	18.6	19.6
17:00-18:00 น.	17.3	20.0	20.8	19.9	21.4
18:00-19:00 น.	19.0	19.2	20.4	19.6	21.2
19:00-20:00 น.	20.6	20.1	20.7	20.4	20.2
20:00-21:00 น.	20.5	19.4	21.4	19.3	20.1
21:00-22:00 น.	19.5	19.8	22.0	20.5	19.3
22:00-23:00 น.	18.2	18.2	21.8	19.8	20.1
23:00-00:00 น.	17.9	17.9	19.9	20.2	19.0
00:00-01:00 น.	17.9	17.2	18.9	18.8	19.8
01:00-02:00 น.	18.7	18.3	17.8	19.1	20.8
02:00-03:00 น.	18.6	18.6	17.8	17.8	24.1
03:00-04:00 น.	19.3	20.2	16.6	16.8	24.6
04:00-05:00 น.	19.6	20.3	18.1	16.2	24.0
05:00-06:00 น.	20.0	21.2	19.8	17.3	22.8
06:00-07:00 น.	20.9	21.6	21.9	19.3	22.5

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ (N20)
ประเภทการตรวจวัด : ไลกาสโคปในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 2 กรกฎาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U058397
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AO804-0011 - T26AO804-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในอากาศส่วน)				
	ภายในมีเนบไฮโดรคาร์บอน				
	สถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ (N20)				
	25 - 26 มิถุนายน 2569	26 - 27 มิถุนายน 2569	27 - 28 มิถุนายน 2569	28 - 29 มิถุนายน 2569	29 - 30 มิถุนายน 2569
	T26AO804-0011	T26AO804-0012	T26AO804-0013	T26AO804-0014	T26AO804-0015
07:00-08:00 น.	1.04	1.03	1.11	1.30	0.94
08:00-09:00 น.	0.88	0.94	0.92	1.20	0.77
09:00-10:00 น.	0.76	0.84	0.84	1.03	0.59
10:00-11:00 น.	0.74	0.79	0.82	0.89	0.58
11:00-12:00 น.	0.86	0.76	0.81	0.83	0.66
12:00-13:00 น.	1.02	0.74	0.77	0.85	0.79
13:00-14:00 น.	1.16	0.91	0.78	0.95	0.86
14:00-15:00 น.	1.23	1.12	0.84	1.10	0.92
15:00-16:00 น.	1.23	1.41	0.89	1.25	1.04
16:00-17:00 น.	1.22	1.51	0.96	1.36	1.28
17:00-18:00 น.	1.29	1.51	1.06	1.40	1.47
18:00-19:00 น.	1.38	1.37	1.22	1.35	1.56
19:00-20:00 น.	1.50	1.22	1.29	1.31	1.49
20:00-21:00 น.	1.53	1.15	1.36	1.28	1.45
21:00-22:00 น.	1.46	1.15	1.35	1.34	1.36
22:00-23:00 น.	1.28	1.25	1.36	1.32	1.33
23:00-00:00 น.	1.19	1.28	1.30	1.28	1.28
00:00-01:00 น.	1.22	1.27	1.22	1.09	1.29
01:00-02:00 น.	1.36	1.21	1.26	0.98	1.30
02:00-03:00 น.	1.30	1.22	1.25	0.93	1.22
03:00-04:00 น.	1.17	1.36	1.28	1.01	1.21
04:00-05:00 น.	1.05	1.51	1.22	1.13	1.25
05:00-06:00 น.	1.07	1.53	1.24	1.15	1.28
06:00-07:00 น.	1.12	1.36	1.30	1.15	1.17

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต			
ชื่อลูกค้า	: สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร			
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com			
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)			
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป			
วันที่ตรวจวัด	: 25-30 มิถุนายน 2569			
เวลาที่ตรวจวัด	: *			
วิธีตรวจวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT			
ผู้ตรวจวัด	: นายอัฐภาณุ ยนต์ศิริ			
	วันที่รับตัวอย่าง	: 25-30 มิถุนายน 2569		
	วันที่วิเคราะห์	: 25-30 มิถุนายน 2569		
	วันที่ออกรายงานผล	: 2 กรกฎาคม 2569		
	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U058405		
	เลขที่งาน	: 2026-003436		
	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26A0804-0011 - T26A0804-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)									
	25 - 26 มิถุนายน 2569		26 - 27 มิถุนายน 2569		27 - 28 มิถุนายน 2569		28 - 29 มิถุนายน 2569		29 - 30 มิถุนายน 2569	
	T26A0804-0011	T26A0804-0012	T26A0804-0013	T26A0804-0014	T26A0804-0015					
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	0.5	WNW	0.8	S	0.8	WNW	0.6	WNW	0.9	WNW
08:00-09:00 น.	0.6	WNW	0.9	SW	1.0	WNW	0.8	WNW	0.9	W
09:00-10:00 น.	0.9	NW	0.7	WSW	1.1	WNW	1.2	NW	1.3	WNW
10:00-11:00 น.	0.6	W	1.2	WNW	1.0	WNW	1.9	NW	1.9	NW
11:00-12:00 น.	0.9	WNW	1.2	WNW	1.3	WNW	1.8	NW	2.0	NW
12:00-13:00 น.	0.6	WSW	1.2	WNW	1.5	NW	1.6	WNW	2.1	NW
13:00-14:00 น.	0.6	WSW	1.1	WNW	1.3	WNW	1.9	NW	2.4	NW
14:00-15:00 น.	0.6	SW	1.6	NW	1.1	S	1.8	WNW	2.3	NW
15:00-16:00 น.	0.7	W	1.9	NW	1.0	ESE	1.8	NW	2.4	NW
16:00-17:00 น.	0.5	SW	2.3	WNW	1.3	SW	1.4	WSW	1.9	WNW
17:00-18:00 น.	0.6	SW	0.7	WSW	0.9	W	0.8	SW	0.9	WSW
18:00-19:00 น.	2.1	WNW	0.6	WSW	0.8	WNW	0.7	W	0.9	WSW
19:00-20:00 น.	1.8	WNW	0.9	SW	0.7	WNW	0.9	W	0.9	SW
20:00-21:00 น.	0.8	WNW	0.5	SW	0.8	WNW	0.6	W	0.5	W
21:00-22:00 น.	0.8	WNW	0.5	WSW	0.5	SSE	0.9	W	0.9	W
22:00-23:00 น.	0.9	W	0.7	W	0.9	SSW	0.8	W	0.8	WNW
23:00-00:00 น.	0.5	W	0.8	SSW	0.7	WSW	0.6	WNW	0.9	W
00:00-01:00 น.	0.7	S	0.8	SSW	0.6	WSW	0.8	WNW	0.5	WSW
01:00-02:00 น.	0.7	WSW	0.7	SE	0.7	SSW	0.8	WNW	0.5	WSW
02:00-03:00 น.	0.7	SW	0.6	ESE	0.6	W	0.8	WNW	0.9	W
03:00-04:00 น.	0.5	W	0.9	W	0.6	WNW	0.7	W	0.6	WNW
04:00-05:00 น.	0.7	SW	0.6	WSW	0.6	W	0.7	WNW	0.9	NW
05:00-06:00 น.	0.6	SW	0.9	S	0.7	WNW	0.6	W	1.5	NW
06:00-07:00 น.	0.8	S	0.5	SSW	0.8	WNW	0.6	W	0.8	WNW

(นายศิวา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1



- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต			
ชื่อลูกค้า	: สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร			
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com			
สถานที่ชักตัวอย่าง	: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)			
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป			
วันที่ชักตัวอย่าง	: *			
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *			
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายวรงค์ชน นพจินทร์			
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตวันพร ท่าสะอาด			
	วันที่รับตัวอย่าง	: 18 มิถุนายน 2569		
	วันที่วิเคราะห์	: 18-21 มิถุนายน 2569		
	วันที่ออกรายงานผล	: 29 มิถุนายน 2569		
	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U056545		
	เลขที่งาน	: 2026-003436		
	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AN736-0001 - T26AN736-0005		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช				
			(ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)				
			*	**	***	****	*****
			T26AN736-0001	T26AN736-0002	T26AN736-0003	T26AN736-0004	T26AN736-0005
ฝุ่นละอองรวม (TSP)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	102	67.2	51.9	44.1	52.9
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)*	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	42.8	30.6	28.1	25.9	28.3
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

* : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยงานรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10

* : จำนวนเฉลี่ยของสถานะมาตรฐานที่ลดหย่อน 25 องศาเซลเซียส และความชื้น 1 บรรยากาศ
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569
***** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2569

(นางสาวบุษกร เลิศภาคภักดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1



- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569 วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : * วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
วิธีตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053903
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN736-0001 - T26AN736-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN736-0001		T26AN736-0002		T26AN736-0003		T26AN736-0004		T26AN736-0005	
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	1.27	-	1.09	-	1.23	-	1.32	-	1.37	-
08:00-09:00 น.	1.14	-	1.02	-	1.09	-	1.16	-	1.28	-
09:00-10:00 น.	1.05	-	0.98	-	1.01	-	1.05	-	1.18	-
10:00-11:00 น.	1.05	-	1.01	-	1.00	-	1.01	-	1.12	-
11:00-12:00 น.	1.06	-	1.03	-	1.05	-	1.02	-	1.10	-
12:00-13:00 น.	1.11	-	1.11	-	1.12	-	1.05	-	1.13	-
13:00-14:00 น.	1.13	-	1.20	-	1.20	-	1.11	-	1.23	-
14:00-15:00 น.	1.17	1.12	1.28	1.09	1.24	1.12	1.20	1.12	1.30	1.21
15:00-16:00 น.	1.18	-	1.30	-	1.29	-	1.27	-	1.35	-
16:00-17:00 น.	1.24	-	1.33	-	1.34	-	1.31	-	1.36	-
17:00-18:00 น.	1.29	-	1.32	-	1.35	-	1.34	-	1.37	-
18:00-19:00 น.	1.40	-	1.36	-	1.36	-	1.36	-	1.42	-
19:00-20:00 น.	1.44	-	1.32	-	1.31	-	1.37	-	1.47	-
20:00-21:00 น.	1.49	-	1.28	-	1.26	-	1.38	-	1.51	-
21:00-22:00 น.	1.47	-	1.24	-	1.17	-	1.38	-	1.52	-
22:00-23:00 น.	1.47	1.37	1.23	1.30	1.12	1.28	1.36	1.35	1.49	1.44
23:00-00:00 น.	1.42	-	1.24	-	1.09	-	1.34	-	1.48	-
00:00-01:00 น.	1.32	-	1.25	-	1.10	-	1.31	-	1.43	-
01:00-02:00 น.	1.22	-	1.23	-	1.15	-	1.33	-	1.39	-
02:00-03:00 น.	1.20	-	1.24	-	1.24	-	1.36	-	1.37	-
03:00-04:00 น.	1.25	-	1.26	-	1.34	-	1.41	-	1.37	-
04:00-05:00 น.	1.29	-	1.32	-	1.45	-	1.43	-	1.37	-
05:00-06:00 น.	1.28	-	1.37	-	1.49	-	1.42	-	1.28	-
06:00-07:00 น.	1.20	1.27	1.33	1.28	1.46	1.29	1.43	1.38	1.22	1.36

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569 วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : * วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053905
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN736-0001 - T26AN736-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพันล้านส่วน)									
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์									
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN736-0001		T26AN736-0002		T26AN736-0003		T26AN736-0004		T26AN736-0005	
07:00-08:00 น.	18.3	18.7	19.7	19.4	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8
08:00-09:00 น.	15.5	17.2	16.9	16.8	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
09:00-10:00 น.	12.3	14.0	13.7	13.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
10:00-11:00 น.	10.3	12.8	13.1	11.5	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
11:00-12:00 น.	10.4	12.6	12.6	11.3	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
12:00-13:00 น.	10.0	12.6	12.8	10.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
13:00-14:00 น.	11.4	13.1	13.7	10.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
14:00-15:00 น.	13.5	13.3	14.8	11.4	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9
15:00-16:00 น.	16.3	16.1	16.8	14.4	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
16:00-17:00 น.	18.5	17.2	17.8	17.0	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
17:00-18:00 น.	18.0	17.9	18.8	17.4	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
18:00-19:00 น.	18.4	18.0	19.0	16.9	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
19:00-20:00 น.	18.5	19.6	18.9	16.9	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
20:00-21:00 น.	19.5	19.4	19.0	18.2	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
21:00-22:00 น.	20.0	17.3	17.7	18.4	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
22:00-23:00 น.	19.4	14.7	16.4	18.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
23:00-00:00 น.	17.9	14.4	15.1	18.3	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
00:00-01:00 น.	15.8	14.4	14.2	19.1	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
01:00-02:00 น.	14.8	14.6	14.9	18.7	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
02:00-03:00 น.	14.8	13.8	14.9	17.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
03:00-04:00 น.	14.5	13.1	16.4	16.5	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
04:00-05:00 น.	15.6	14.9	18.3	16.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
05:00-06:00 น.	17.0	18.2	19.8	17.0	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
06:00-07:00 น.	19.5	21.3	20.9	17.8	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569 วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : * วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
วิธีตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053907
ผู้ตรวจวัด : นายรพีพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN736-0001 - T26AN736-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)				
	ก๊าซมีเทนไฮโดรคาร์บอน				
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)				
	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN736-0001	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN736-0002	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN736-0003	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN736-0004	17 - 18 มิถุนายน 2569 T26AN736-0005
07:00-08:00 น.	0.83	0.91	0.93	0.93	0.89
08:00-09:00 น.	0.74	0.86	0.82	0.83	0.79
09:00-10:00 น.	0.70	0.78	0.77	0.79	0.78
10:00-11:00 น.	0.75	0.79	0.79	0.75	0.78
11:00-12:00 น.	0.80	0.77	0.86	0.69	0.78
12:00-13:00 น.	0.83	0.72	0.92	0.63	0.81
13:00-14:00 น.	0.94	0.66	0.96	0.65	0.88
14:00-15:00 น.	1.10	0.67	0.99	0.75	1.06
15:00-16:00 น.	1.29	0.74	1.13	0.96	1.27
16:00-17:00 น.	1.32	0.85	1.24	1.14	1.44
17:00-18:00 น.	1.27	1.00	1.30	1.25	1.41
18:00-19:00 น.	1.21	1.18	1.20	1.13	1.22
19:00-20:00 น.	1.25	1.33	1.08	0.96	1.03
20:00-21:00 น.	1.20	1.30	0.94	0.78	0.90
21:00-22:00 น.	1.19	1.15	0.88	0.73	0.84
22:00-23:00 น.	1.18	0.96	0.84	0.72	0.79
23:00-00:00 น.	1.30	0.89	0.84	0.75	0.76
00:00-01:00 น.	1.34	0.85	0.82	0.75	0.80
01:00-02:00 น.	1.34	0.82	0.81	0.76	0.82
02:00-03:00 น.	1.24	0.85	0.88	0.83	0.91
03:00-04:00 น.	1.06	0.95	0.99	0.99	0.91
04:00-05:00 น.	0.92	1.10	1.14	1.15	1.02
05:00-06:00 น.	0.87	1.15	1.17	1.19	1.04
06:00-07:00 น.	0.94	1.08	1.08	1.06	1.06

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1



- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569 วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : * วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053909
ผู้ตรวจวัด : นายรพีพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN736-0001 - T26AN736-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)									
	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN736-0001	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN736-0002	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN736-0003	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN736-0004	17 - 18 มิถุนายน 2569 T26AN736-0005					
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.3	W	1.8	W	1.8	SSW	2.3	W	2.3	W
08:00-09:00 น.	1.8	W	1.2	SW	1.6	WSW	2.9	W	1.6	W
09:00-10:00 น.	2.1	W	1.3	WSW	1.9	W	2.8	WNW	1.8	WNW
10:00-11:00 น.	2.4	WSW	0.8	SW	1.8	SW	2.4	WSW	2.0	WNW
11:00-12:00 น.	1.8	WSW	1.1	W	2.0	SW	2.3	WNW	1.9	WSW
12:00-13:00 น.	2.3	SW	1.4	W	1.5	SW	1.8	SW	1.6	WNW
13:00-14:00 น.	1.9	WSW	1.4	W	1.6	WSW	2.0	WSW	1.1	W
14:00-15:00 น.	2.3	SW	1.9	SW	2.3	WNW	2.0	SW	1.0	WNW
15:00-16:00 น.	1.7	SW	2.1	WSW	1.9	WNW	1.8	SW	1.2	WNW
16:00-17:00 น.	2.1	WSW	1.6	SW	1.9	WNW	2.0	SSW	1.2	W
17:00-18:00 น.	2.0	WSW	2.2	WSW	1.4	W	2.3	SW	1.3	WNW
18:00-19:00 น.	1.6	SW	2.0	W	1.4	WNW	2.0	SSW	1.3	WSW
19:00-20:00 น.	2.0	SSW	2.0	WSW	2.0	W	1.9	SSW	1.6	SW
20:00-21:00 น.	1.4	SW	2.2	WSW	2.0	SW	1.5	WSW	2.0	SSW
21:00-22:00 น.	1.7	WSW	2.2	WSW	2.1	SW	2.2	SW	1.9	W
22:00-23:00 น.	1.8	SSW	1.8	SW	1.6	WSW	1.5	W	1.9	WSW
23:00-00:00 น.	1.7	WSW	1.9	WSW	1.7	WSW	1.3	WSW	1.9	WNW
00:00-01:00 น.	1.6	WSW	1.5	SW	2.1	WSW	2.1	W	1.6	W
01:00-02:00 น.	1.8	WSW	2.1	W	1.5	WSW	2.1	WNW	1.5	WNW
02:00-03:00 น.	1.7	WSW	1.6	SW	1.6	SSW	2.3	WNW	0.8	W
03:00-04:00 น.	1.9	SSW	1.9	WSW	2.1	W	2.1	NW	0.8	WSW
04:00-05:00 น.	1.5	SW	2.0	SSW	1.5	W	1.9	WSW	0.8	WSW
05:00-06:00 น.	1.7	SW	2.0	SSW	2.3	WSW	2.2	WSW	0.7	SSW
06:00-07:00 น.	1.6	W	2.1	S	2.8	WNW	1.6	W	1.1	S

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1



- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถ)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
วันที่ขึ้นตัวอย่าง : * , ** , *** , **** , ***** วันที่วิเคราะห์ : 18-21 มิถุนายน 2569
เวลาที่ขึ้นตัวอย่าง : * , ** , *** , **** , ***** วันที่ออกรายงานผล : 29 มิถุนายน 2569
ผู้ขึ้นตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U056546
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจันทร์ ทำสะอาด เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN736-0006 - T26AN736-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			วัดเจริญธรรมาราม				
			(ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถ)				
			* T26AN736-0006	** T26AN736-0007	*** T26AN736-0008	**** T26AN736-0009	***** T26AN736-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	43.1	33.0	28.9	30.6	32.2
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	26.5	21.0	12.0	12.7	18.8
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
* : ขึ้นตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569
** : ขึ้นตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569
*** : ขึ้นตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569
**** : ขึ้นตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569
***** : ขึ้นตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2569

(นางสาววระกร เลิศภักดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถ)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569 วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : * วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
วิธีการตรวจวัด : NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053904
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN736-0006 - T26AN736-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)									
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์									
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถ)									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN736-0006	T26AN736-0007	T26AN736-0008	T26AN736-0009	T26AN736-0010	T26AN736-0006	T26AN736-0007	T26AN736-0008	T26AN736-0009	T26AN736-0010
	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR	CO 1 HR	CO 8 HR
07:00-08:00 น.	0.95	-	0.79	-	0.82	-	0.84	-	0.93	-
08:00-09:00 น.	0.84	-	0.73	-	0.75	-	0.78	-	0.91	-
09:00-10:00 น.	0.79	-	0.72	-	0.70	-	0.72	-	0.87	-
10:00-11:00 น.	0.77	-	0.75	-	0.69	-	0.71	-	0.85	-
11:00-12:00 น.	0.81	-	0.78	-	0.72	-	0.72	-	0.82	-
12:00-13:00 น.	0.85	-	0.83	-	0.77	-	0.78	-	0.82	-
13:00-14:00 น.	0.94	-	0.90	-	0.83	-	0.86	-	0.83	-
14:00-15:00 น.	1.00	0.87	0.98	0.81	0.88	0.77	0.95	0.80	0.84	0.86
15:00-16:00 น.	1.04	-	1.04	-	0.94	-	0.99	-	0.87	-
16:00-17:00 น.	1.07	-	1.07	-	0.96	-	1.01	-	0.90	-
17:00-18:00 น.	1.07	-	1.06	-	1.01	-	0.97	-	0.91	-
18:00-19:00 น.	1.13	-	1.05	-	1.01	-	0.99	-	0.88	-
19:00-20:00 น.	1.16	-	1.04	-	1.03	-	1.01	-	0.83	-
20:00-21:00 น.	1.18	-	1.03	-	1.02	-	1.05	-	0.80	-
21:00-22:00 น.	1.17	-	1.03	-	1.02	-	1.04	-	0.77	-
22:00-23:00 น.	1.12	1.12	1.00	1.04	1.01	1.00	1.02	1.01	0.80	0.85
23:00-00:00 น.	1.10	-	1.01	-	1.02	-	1.01	-	0.81	-
00:00-01:00 น.	1.08	-	0.98	-	1.01	-	1.01	-	0.84	-
01:00-02:00 น.	1.06	-	1.02	-	1.00	-	1.00	-	0.89	-
02:00-03:00 น.	1.06	-	1.02	-	0.98	-	1.01	-	0.94	-
03:00-04:00 น.	1.06	-	1.05	-	0.97	-	1.01	-	1.00	-
04:00-05:00 น.	1.06	-	1.05	-	0.98	-	1.02	-	1.05	-
05:00-06:00 น.	1.01	-	1.01	-	0.96	-	1.00	-	1.07	-
06:00-07:00 น.	0.91	1.04	0.92	1.01	0.92	0.98	0.97	1.00	1.02	0.95

(นายศิลาบรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053906
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN736-0006 - T26AN736-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)				
	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN736-0006	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN736-0007	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN736-0008	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN736-0009	17 - 18 มิถุนายน 2569 T26AN736-0010
07:00-08:00 น.	10.0	10.1	10.4	10.0	9.8
08:00-09:00 น.	8.1	8.4	8.8	8.9	8.3
09:00-10:00 น.	6.4	7.0	6.9	7.7	6.8
10:00-11:00 น.	6.0	5.9	6.1	7.4	6.3
11:00-12:00 น.	6.6	5.7	6.1	6.9	6.3
12:00-13:00 น.	6.7	6.1	6.0	6.9	6.3
13:00-14:00 น.	7.6	6.8	6.4	6.8	7.5
14:00-15:00 น.	7.6	7.5	6.6	6.9	7.8
15:00-16:00 น.	8.7	8.4	7.3	7.7	8.8
16:00-17:00 น.	7.5	8.8	7.9	8.1	8.3
17:00-18:00 น.	8.3	9.2	8.4	8.9	9.3
18:00-19:00 น.	9.4	9.2	9.0	9.5	9.6
19:00-20:00 น.	10.6	9.7	9.9	10.5	10.0
20:00-21:00 น.	8.4	9.6	10.2	10.6	9.7
21:00-22:00 น.	6.4	10.1	9.7	10.4	9.3
22:00-23:00 น.	9.4	10.1	9.0	10.3	9.2
23:00-00:00 น.	9.5	10.6	9.5	10.5	9.1
00:00-01:00 น.	9.2	10.1	9.9	10.6	8.8
01:00-02:00 น.	8.8	9.3	10.4	10.2	8.6
02:00-03:00 น.	8.4	9.0	10.5	10.3	8.2
03:00-04:00 น.	8.6	8.4	10.4	10.1	8.6
04:00-05:00 น.	9.0	9.4	10.1	9.9	8.7
05:00-06:00 น.	10.3	10.0	10.5	10.3	9.8
06:00-07:00 น.	10.5	11.3	10.6	10.8	10.7

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : FLAME IONIZATION DETECTOR
ผู้ตรวจวัด : นายวรงค์ นนทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053908
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN736-0006 - T26AN736-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในพื้นที่)				
	ก๊าซมีเทนไฮโดรคาร์บอน				
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)				
	13 - 14 มิถุนายน 2569 T26AN736-0006	14 - 15 มิถุนายน 2569 T26AN736-0007	15 - 16 มิถุนายน 2569 T26AN736-0008	16 - 17 มิถุนายน 2569 T26AN736-0009	17 - 18 มิถุนายน 2569 T26AN736-0010
07:00-08:00 น.	0.77	0.90	0.85	0.83	0.86
08:00-09:00 น.	0.70	0.87	0.87	0.70	0.86
09:00-10:00 น.	0.65	0.80	0.89	0.65	0.83
10:00-11:00 น.	0.65	0.76	0.85	0.64	0.71
11:00-12:00 น.	0.72	0.77	0.80	0.68	0.63
12:00-13:00 น.	0.81	0.85	0.79	0.74	0.67
13:00-14:00 น.	0.92	0.88	0.81	0.87	0.78
14:00-15:00 น.	0.98	0.88	0.83	0.96	0.84
15:00-16:00 น.	0.99	0.87	0.84	1.01	0.86
16:00-17:00 น.	0.96	0.86	0.85	0.95	0.87
17:00-18:00 น.	0.94	0.91	0.85	0.85	0.90
18:00-19:00 น.	1.00	0.96	0.84	0.78	0.90
19:00-20:00 น.	1.04	1.00	0.80	0.78	0.85
20:00-21:00 น.	1.00	0.96	0.80	0.82	0.80
21:00-22:00 น.	0.85	0.92	0.80	0.86	0.75
22:00-23:00 น.	0.73	0.89	0.80	0.86	0.81
23:00-00:00 น.	0.73	0.90	0.82	0.89	0.88
00:00-01:00 น.	0.81	0.85	0.81	0.91	0.97
01:00-02:00 น.	0.94	0.74	0.83	0.94	0.99
02:00-03:00 น.	0.96	0.67	0.83	0.92	0.95
03:00-04:00 น.	0.92	0.71	0.89	0.91	0.93
04:00-05:00 น.	0.85	0.82	0.93	0.92	0.93
05:00-06:00 น.	0.84	0.89	0.97	0.91	0.97
06:00-07:00 น.	0.87	0.87	0.92	0.87	0.93

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	วันที่รับตัวอย่าง	: 13-18 มิถุนายน 2569
ชื่อลูกค้า	: สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร	วันที่วิเคราะห์	: 13-18 มิถุนายน 2569
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	วันที่ออกรายงานผล	: 22 มิถุนายน 2569
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U053910
สถานที่ตรวจวัด	: วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)	เลขที่งาน	: 2026-003436
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AN736-0006 - T26AN736-0010
วันที่ตรวจวัด	: 13-18 มิถุนายน 2569		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT		
ผู้ตรวจวัด	: นายรพพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)									
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)									
	13 - 14 มิถุนายน 2569		14 - 15 มิถุนายน 2569		15 - 16 มิถุนายน 2569		16 - 17 มิถุนายน 2569		17 - 18 มิถุนายน 2569	
	T26AN736-0006		T26AN736-0007		T26AN736-0008		T26AN736-0009		T26AN736-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	0.8	SW	2.8	W	1.5	WNW	1.9	SW	1.5	SW
08:00-09:00 น.	0.9	SSW	2.1	SW	2.1	WNW	1.8	WSW	2.2	S
09:00-10:00 น.	0.8	SSW	1.6	WSW	1.9	SW	2.1	W	2.1	SW
10:00-11:00 น.	0.6	SW	1.1	SW	2.1	WSW	1.6	SW	2.4	SW
11:00-12:00 น.	0.9	S	0.8	WSW	1.8	W	1.4	SW	2.4	W
12:00-13:00 น.	1.1	S	1.1	WSW	2.0	SW	2.2	WSW	2.4	SW
13:00-14:00 น.	1.0	SSW	0.8	SW	1.7	WSW	1.9	W	2.3	SW
14:00-15:00 น.	1.1	SW	1.1	WSW	1.8	SW	1.5	WSW	2.3	SSW
15:00-16:00 น.	1.4	SSW	1.5	SSW	1.8	W	1.0	WSW	1.5	S
16:00-17:00 น.	1.8	SW	1.3	WSW	1.8	WSW	1.3	SSW	1.8	S
17:00-18:00 น.	1.5	SSW	1.8	WSW	2.0	SW	1.7	SW	1.3	SSW
18:00-19:00 น.	2.2	SW	1.6	WSW	3.1	WSW	1.5	S	1.1	WSW
19:00-20:00 น.	1.7	SSW	2.5	SW	2.1	SW	2.1	S	0.9	WSW
20:00-21:00 น.	2.6	WSW	2.4	WSW	2.0	SSW	2.1	SSW	0.9	WSW
21:00-22:00 น.	2.7	W	2.5	SSW	2.6	SSW	2.2	SSW	1.0	W
22:00-23:00 น.	3.0	WSW	2.8	SSW	1.7	SSW	2.0	SSW	1.1	SW
23:00-00:00 น.	2.2	WSW	2.6	SW	2.5	S	1.7	S	0.9	WSW
00:00-01:00 น.	3.0	SSW	3.1	SSW	2.4	SW	1.5	S	1.3	WSW
01:00-02:00 น.	2.7	W	2.2	S	2.4	S	1.9	SSW	1.7	WSW
02:00-03:00 น.	2.8	SSW	2.8	SSW	1.5	SSW	1.7	SSW	2.0	SW
03:00-04:00 น.	3.0	WSW	2.5	SW	2.0	S	1.5	S	1.6	WNW
04:00-05:00 น.	2.6	S	1.7	SW	1.6	S	1.7	S	1.6	WSW
05:00-06:00 น.	2.5	W	2.1	WSW	1.4	SSW	2.1	SW	1.6	W
06:00-07:00 น.	2.9	SW	2.1	W	1.7	SW	2.1	SSW	1.7	SW




(นายศิลา นรจจใจรักษ์)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ภาคผนวก ค-2

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
 ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
 ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
 สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนหลวง
 ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
 วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
 เวลาที่ตรวจวัด : *
 วิธีตรวจวัด : มาตรฐานระดับเสียง **
 ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
 วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
 เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053898
 เลขที่งาน : 2026-003436
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN728-0001 - T26AN728-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนหลวง		
	13 - 14 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	72.2	92.7	67.7
08:00-09:00 น.	72.7	92.5	68.0
09:00-10:00 น.	72.4	90.9	68.1
10:00-11:00 น.	72.5	93.4	68.1
11:00-12:00 น.	71.7	89.4	67.9
12:00-13:00 น.	71.9	91.6	68.0
13:00-14:00 น.	72.0	89.0	68.1
14:00-15:00 น.	72.9	91.3	68.6
15:00-16:00 น.	71.4	87.7	67.1
16:00-17:00 น.	71.7	89.8	67.5
17:00-18:00 น.	71.7	89.3	67.2
18:00-19:00 น.	71.9	92.1	66.8
19:00-20:00 น.	71.4	93.8	66.3
20:00-21:00 น.	71.7	95.0	64.4
21:00-22:00 น.	69.6	89.7	62.5
22:00-23:00 น.	69.6	88.9	61.8
23:00-00:00 น.	69.3	89.7	60.7
00:00-01:00 น.	68.8	86.7	59.7
01:00-02:00 น.	69.2	90.9	59.5
02:00-03:00 น.	70.7	90.0	62.2
03:00-04:00 น.	71.8	92.2	65.5
04:00-05:00 น.	71.5	89.6	66.1
05:00-06:00 น.	71.1	88.4	66.3
06:00-07:00 น.	71.5	90.9	65.6
L _{Aeq} 24 hours		71.4	
L _{Adn}		77.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนหลวง		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	71.3	87.7	67.2
08:00-09:00 น.	72.5	88.9	68.3
09:00-10:00 น.	72.8	88.6	68.8
10:00-11:00 น.	72.6	88.1	68.7
11:00-12:00 น.	71.8	87.8	68.1
12:00-13:00 น.	71.8	89.4	68.1
13:00-14:00 น.	72.4	87.1	68.2
14:00-15:00 น.	71.9	89.5	68.0
15:00-16:00 น.	72.1	91.2	67.9
16:00-17:00 น.	72.8	93.6	67.9
17:00-18:00 น.	72.8	96.0	67.4
18:00-19:00 น.	71.7	91.3	66.8
19:00-20:00 น.	71.5	89.5	65.8
20:00-21:00 น.	71.7	95.5	64.8
21:00-22:00 น.	69.7	91.9	63.3
22:00-23:00 น.	69.0	86.9	61.8
23:00-00:00 น.	69.0	88.9	60.6
00:00-01:00 น.	68.5	89.0	58.8
01:00-02:00 น.	68.9	88.2	59.1
02:00-03:00 น.	70.4	88.9	62.8
03:00-04:00 น.	71.7	91.5	65.4
04:00-05:00 น.	72.8	96.0	66.2
05:00-06:00 น.	71.5	89.7	65.4
06:00-07:00 น.	71.0	87.2	65.8
L _{Aeq} 24 hours		71.5	
L _{Adn}		77.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนหลวง		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0003		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	71.9	92.2	67.7
08:00-09:00 น.	71.2	90.8	67.5
09:00-10:00 น.	72.7	95.7	67.6
10:00-11:00 น.	71.4	88.4	67.4
11:00-12:00 น.	71.1	90.9	67.5
12:00-13:00 น.	71.1	91.5	67.1
13:00-14:00 น.	70.6	83.0	67.0
14:00-15:00 น.	70.8	90.9	65.9
15:00-16:00 น.	71.3	86.8	67.1
16:00-17:00 น.	71.9	91.9	67.0
17:00-18:00 น.	71.2	89.4	66.5
18:00-19:00 น.	71.7	92.7	66.3
19:00-20:00 น.	70.8	87.5	65.6
20:00-21:00 น.	71.0	93.9	64.5
21:00-22:00 น.	69.9	87.8	63.0
22:00-23:00 น.	69.3	87.3	61.1
23:00-00:00 น.	69.3	86.9	60.4
00:00-01:00 น.	70.1	88.9	60.3
01:00-02:00 น.	70.9	89.0	62.3
02:00-03:00 น.	71.2	88.0	64.9
03:00-04:00 น.	72.0	90.9	66.9
04:00-05:00 น.	71.1	92.4	65.7
05:00-06:00 น.	70.9	91.5	65.1
06:00-07:00 น.	71.1	87.6	65.9
L _{Aeq} 24 hours		71.1	
L _{Adn}		77.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนหลวง		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0004		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	72.0	89.8	68.1
08:00-09:00 น.	72.7	92.6	68.3
09:00-10:00 น.	72.7	91.0	68.6
10:00-11:00 น.	73.6	89.7	68.8
11:00-12:00 น.	73.4	86.6	69.0
12:00-13:00 น.	72.0	87.8	68.4
13:00-14:00 น.	72.5	91.1	68.2
14:00-15:00 น.	71.4	88.8	66.9
15:00-16:00 น.	71.7	90.1	66.7
16:00-17:00 น.	71.4	88.3	67.0
17:00-18:00 น.	71.6	92.2	66.8
18:00-19:00 น.	71.7	91.0	66.3
19:00-20:00 น.	70.1	87.0	64.9
20:00-21:00 น.	70.5	88.7	64.2
21:00-22:00 น.	70.1	89.5	62.5
22:00-23:00 น.	70.1	90.8	62.0
23:00-00:00 น.	70.3	94.3	61.5
00:00-01:00 น.	69.5	86.2	60.5
01:00-02:00 น.	71.5	92.8	61.6
02:00-03:00 น.	71.9	91.7	64.3
03:00-04:00 น.	72.7	93.3	67.0
04:00-05:00 น.	71.6	89.1	65.7
05:00-06:00 น.	70.7	88.5	65.6
06:00-07:00 น.	71.1	87.9	66.2
L _{Aeq} 24 hours		71.7	
L _{Adn}		77.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนหลวง		
	17 - 18 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0005		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	72.0	88.8	67.3
08:00-09:00 น.	71.8	89.9	67.7
09:00-10:00 น.	71.6	89.6	67.7
10:00-11:00 น.	71.6	88.8	67.8
11:00-12:00 น.	71.8	89.1	67.5
12:00-13:00 น.	71.5	91.0	67.4
13:00-14:00 น.	71.9	89.3	67.4
14:00-15:00 น.	71.9	92.2	67.5
15:00-16:00 น.	72.4	87.6	67.2
16:00-17:00 น.	73.0	90.9	67.8
17:00-18:00 น.	71.9	93.6	67.1
18:00-19:00 น.	71.1	90.4	66.4
19:00-20:00 น.	70.9	91.8	66.0
20:00-21:00 น.	71.3	91.9	65.1
21:00-22:00 น.	70.2	92.4	63.4
22:00-23:00 น.	69.9	89.8	61.9
23:00-00:00 น.	69.2	90.4	60.8
00:00-01:00 น.	68.4	85.6	58.8
01:00-02:00 น.	69.5	90.7	58.7
02:00-03:00 น.	70.7	89.0	62.9
03:00-04:00 น.	71.7	91.2	65.7
04:00-05:00 น.	71.5	88.9	66.3
05:00-06:00 น.	71.3	89.1	66.1
06:00-07:00 น.	71.9	91.0	66.1
L _{Aeq} 24 hours		71.3	
L _{Adn}		77.2	

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

(นายศิลา บรรจงใจวิเศษ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ในรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com

สถานที่ตรวจวัด : สถานีพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด : *

วิธีตรวจวัด : มาตราระดับเสียง **

ผู้ตรวจวัด : นายพรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569

วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569

เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053899

เลขที่งาน : 2026-003436

หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN728-0006 - T26AN728-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง		
	13 - 14 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0006		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.9	79.8	51.2
08:00-09:00 น.	61.3	86.7	50.0
09:00-10:00 น.	59.8	86.5	49.8
10:00-11:00 น.	58.1	78.5	49.0
11:00-12:00 น.	58.2	80.6	48.9
12:00-13:00 น.	58.6	79.6	48.4
13:00-14:00 น.	57.7	77.8	48.7
14:00-15:00 น.	58.5	81.9	48.8
15:00-16:00 น.	58.6	77.4	50.0
16:00-17:00 น.	58.5	77.6	49.8
17:00-18:00 น.	59.4	80.8	49.6
18:00-19:00 น.	60.0	77.6	49.4
19:00-20:00 น.	57.7	75.1	48.7
20:00-21:00 น.	57.5	76.5	49.4
21:00-22:00 น.	57.8	80.5	49.1
22:00-23:00 น.	56.1	75.4	48.1
23:00-00:00 น.	55.8	80.9	47.0
00:00-01:00 น.	56.1	77.6	46.4
01:00-02:00 น.	51.6	72.1	45.7
02:00-03:00 น.	54.2	74.4	44.5
03:00-04:00 น.	54.2	76.9	43.9
04:00-05:00 น.	56.4	75.6	45.1
05:00-06:00 น.	59.3	78.1	47.9
06:00-07:00 น.	60.8	85.1	49.7
L _{Aeq} 24 hours		58.2	
L _{Adn}		63.6	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีพัฒนาสุขภาพเขตเมือง		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.8	83.8	50.0
08:00-09:00 น.	60.4	83.8	50.1
09:00-10:00 น.	58.3	77.8	49.2
10:00-11:00 น.	58.0	79.5	48.7
11:00-12:00 น.	60.3	84.7	48.9
12:00-13:00 น.	58.8	80.4	48.5
13:00-14:00 น.	58.2	80.4	48.7
14:00-15:00 น.	60.2	81.1	49.5
15:00-16:00 น.	60.0	83.1	51.1
16:00-17:00 น.	59.1	79.7	48.6
17:00-18:00 น.	58.7	77.1	49.2
18:00-19:00 น.	59.1	77.5	49.6
19:00-20:00 น.	58.6	81.1	49.6
20:00-21:00 น.	57.9	77.7	49.2
21:00-22:00 น.	57.7	79.2	48.9
22:00-23:00 น.	54.9	74.1	47.8
23:00-00:00 น.	53.7	75.0	46.8
00:00-01:00 น.	56.6	78.8	45.6
01:00-02:00 น.	53.3	73.6	44.9
02:00-03:00 น.	55.2	73.5	44.2
03:00-04:00 น.	56.1	74.9	43.9
04:00-05:00 น.	58.6	78.1	45.5
05:00-06:00 น.	60.1	79.7	48.0
06:00-07:00 น.	59.0	81.9	48.9
L _{Aeq} 24 hours	58.5		
L _{Adn}	63.8		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีพัฒนาสุขภาพเขตเมือง		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.8	83.1	51.8
08:00-09:00 น.	61.0	87.6	51.1
09:00-10:00 น.	60.3	83.2	50.0
10:00-11:00 น.	59.5	81.7	49.0
11:00-12:00 น.	67.2	93.0	50.4
12:00-13:00 น.	64.7	93.3	52.1
13:00-14:00 น.	64.7	82.7	54.5
14:00-15:00 น.	60.0	81.6	51.2
15:00-16:00 น.	62.8	83.4	55.9
16:00-17:00 น.	62.0	81.8	52.0
17:00-18:00 น.	59.1	77.6	51.3
18:00-19:00 น.	59.6	77.6	51.1
19:00-20:00 น.	58.8	77.8	51.1
20:00-21:00 น.	59.0	79.4	51.2
21:00-22:00 น.	57.6	76.7	49.4
22:00-23:00 น.	55.2	75.5	48.1
23:00-00:00 น.	53.4	75.9	47.0
00:00-01:00 น.	54.4	77.6	46.8
01:00-02:00 น.	53.5	73.9	45.9
02:00-03:00 น.	54.5	75.7	45.6
03:00-04:00 น.	57.2	79.2	45.8
04:00-05:00 น.	59.6	80.9	49.0
05:00-06:00 น.	59.5	82.2	51.2
06:00-07:00 น.	59.8	88.2	49.9
L _{Aeq} 24 hours	60.8		
L _{Adn}	64.7		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีพัฒนาสุขภาพเขตเมือง		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.6	86.1	51.0
08:00-09:00 น.	60.4	81.3	50.4
09:00-10:00 น.	60.1	84.7	50.8
10:00-11:00 น.	59.3	80.3	49.6
11:00-12:00 น.	59.3	77.9	49.6
12:00-13:00 น.	59.5	79.3	49.3
13:00-14:00 น.	58.9	80.7	49.9
14:00-15:00 น.	58.9	78.1	49.8
15:00-16:00 น.	58.8	81.4	49.9
16:00-17:00 น.	58.5	76.7	50.0
17:00-18:00 น.	59.3	80.0	50.9
18:00-19:00 น.	60.8	79.7	52.2
19:00-20:00 น.	60.3	81.1	51.8
20:00-21:00 น.	58.5	77.2	51.7
21:00-22:00 น.	60.9	83.3	51.4
22:00-23:00 น.	56.8	79.3	49.8
23:00-00:00 น.	55.5	77.9	48.7
00:00-01:00 น.	56.1	83.7	48.0
01:00-02:00 น.	53.4	76.8	45.2
02:00-03:00 น.	55.2	78.6	44.4
03:00-04:00 น.	56.7	79.8	44.4
04:00-05:00 น.	59.5	78.2	48.1
05:00-06:00 น.	59.3	78.3	51.3
06:00-07:00 น.	61.0	82.4	53.2
L _{Aeq} 24 hours	59.0		
L _{Adn}	64.4		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีพัฒนาสุขภาพเขตเมือง		
	17 - 18 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.4	79.6	50.9
08:00-09:00 น.	59.9	81.9	51.0
09:00-10:00 น.	60.1	84.5	51.1
10:00-11:00 น.	61.8	84.2	52.3
11:00-12:00 น.	60.7	83.3	51.1
12:00-13:00 น.	61.1	85.1	50.7
13:00-14:00 น.	60.1	80.5	50.5
14:00-15:00 น.	59.6	79.0	50.0
15:00-16:00 น.	59.4	81.9	49.7
16:00-17:00 น.	59.2	81.5	49.7
17:00-18:00 น.	60.7	84.4	51.4
18:00-19:00 น.	61.3	81.9	51.7
19:00-20:00 น.	59.9	81.8	50.2
20:00-21:00 น.	58.8	78.6	50.6
21:00-22:00 น.	58.4	80.3	49.7
22:00-23:00 น.	58.1	80.6	48.8
23:00-00:00 น.	54.3	72.7	47.6
00:00-01:00 น.	57.0	80.2	47.3
01:00-02:00 น.	55.3	80.0	46.0
02:00-03:00 น.	56.6	78.4	46.0
03:00-04:00 น.	57.5	79.9	45.9
04:00-05:00 น.	57.4	77.1	46.9
05:00-06:00 น.	59.8	81.0	49.2
06:00-07:00 น.	61.6	84.1	50.8
L _{Aeq} 24 hours	59.5		
L _{Adn}	64.8		

หมายเหตุ :

- ** ISO 1996-2 : 2017
- ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
- ** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
- ** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
- ** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
- ** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำงาน การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำงาน พ.ศ. 2567

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงพยาบาลพุทธศาสตร์ และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569 วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : * วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
วิธีตรวจวัด : มาตรฐานระดับเสียง ** เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053900
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์ เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN728-0011 - T26AN728-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
	13 - 14 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	64.0	81.7	60.2
08:00-09:00 น.	63.9	80.8	60.7
09:00-10:00 น.	64.8	78.9	60.7
10:00-11:00 น.	65.0	81.1	60.5
11:00-12:00 น.	62.6	79.6	59.2
12:00-13:00 น.	62.9	77.2	59.3
13:00-14:00 น.	62.6	77.2	59.4
14:00-15:00 น.	62.4	77.8	59.2
15:00-16:00 น.	62.6	79.6	59.2
16:00-17:00 น.	64.1	81.1	59.5
17:00-18:00 น.	62.8	79.5	59.5
18:00-19:00 น.	64.5	81.9	59.6
19:00-20:00 น.	62.7	77.9	59.4
20:00-21:00 น.	62.7	80.1	59.0
21:00-22:00 น.	62.6	76.8	58.1
22:00-23:00 น.	64.5	77.5	54.9
23:00-00:00 น.	62.4	78.6	53.7
00:00-01:00 น.	64.4	78.1	53.0
01:00-02:00 น.	58.4	70.9	51.1
02:00-03:00 น.	58.3	72.2	50.7
03:00-04:00 น.	57.9	72.7	50.4
04:00-05:00 น.	58.0	73.8	53.2
05:00-06:00 น.	62.3	77.9	55.3
06:00-07:00 น.	62.2	85.4	57.8
L _{Aeq} 24 hours		62.9	
L _{Adn}		68.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	62.6	82.7	59.1
08:00-09:00 น.	62.9	81.8	59.7
09:00-10:00 น.	64.2	79.6	59.9
10:00-11:00 น.	64.3	76.5	59.5
11:00-12:00 น.	64.1	81.7	59.4
12:00-13:00 น.	65.5	87.3	60.3
13:00-14:00 น.	65.2	80.7	60.5
14:00-15:00 น.	63.1	79.1	60.1
15:00-16:00 น.	63.4	81.9	59.9
16:00-17:00 น.	63.2	77.3	59.9
17:00-18:00 น.	63.3	79.5	60.0
18:00-19:00 น.	63.9	78.0	60.0
19:00-20:00 น.	62.9	76.8	59.8
20:00-21:00 น.	62.5	75.8	59.4
21:00-22:00 น.	62.6	78.7	58.5
22:00-23:00 น.	62.4	77.5	55.6
23:00-00:00 น.	61.3	76.8	54.7
00:00-01:00 น.	60.1	76.1	54.0
01:00-02:00 น.	59.1	81.5	53.2
02:00-03:00 น.	56.8	76.0	52.1
03:00-04:00 น.	56.2	74.1	51.6
04:00-05:00 น.	58.2	78.1	53.7
05:00-06:00 น.	61.5	77.6	56.4
06:00-07:00 น.	62.1	83.2	58.5
L _{Aeq} 24 hours		62.7	
L _{Adn}		67.3	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	63.1	82.0	59.3
08:00-09:00 น.	63.8	83.2	60.1
09:00-10:00 น.	64.5	78.4	59.9
10:00-11:00 น.	64.3	81.1	60.1
11:00-12:00 น.	63.1	80.8	59.6
12:00-13:00 น.	62.9	79.0	59.4
13:00-14:00 น.	63.8	77.7	59.6
14:00-15:00 น.	62.6	77.3	59.3
15:00-16:00 น.	63.9	80.8	59.6
16:00-17:00 น.	63.2	79.1	60.0
17:00-18:00 น.	63.1	77.7	60.0
18:00-19:00 น.	63.8	81.1	59.8
19:00-20:00 น.	62.7	80.2	59.0
20:00-21:00 น.	62.6	80.2	58.9
21:00-22:00 น.	62.4	80.1	58.0
22:00-23:00 น.	62.3	80.5	56.1
23:00-00:00 น.	61.9	77.1	55.5
00:00-01:00 น.	61.7	79.5	54.1
01:00-02:00 น.	59.4	75.5	53.2
02:00-03:00 น.	57.8	75.2	54.0
03:00-04:00 น.	58.0	79.2	52.5
04:00-05:00 น.	58.4	72.0	55.0
05:00-06:00 น.	63.3	77.1	57.4
06:00-07:00 น.	64.6	90.4	59.5
L _{Aeq} 24 hours		62.7	
L _{Adn}		68.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	64.0	77.9	60.3
08:00-09:00 น.	63.8	79.0	60.2
09:00-10:00 น.	64.0	83.4	59.6
10:00-11:00 น.	63.8	80.9	59.5
11:00-12:00 น.	63.4	78.1	59.5
12:00-13:00 น.	63.3	78.6	59.4
13:00-14:00 น.	63.3	78.6	59.9
14:00-15:00 น.	63.8	78.8	59.9
15:00-16:00 น.	63.3	80.9	59.8
16:00-17:00 น.	63.2	77.8	59.8
17:00-18:00 น.	63.1	78.8	59.9
18:00-19:00 น.	64.5	80.4	59.6
19:00-20:00 น.	63.1	78.6	59.2
20:00-21:00 น.	63.2	80.0	59.4
21:00-22:00 น.	62.2	81.3	58.6
22:00-23:00 น.	63.1	80.1	56.7
23:00-00:00 น.	62.8	78.4	56.2
00:00-01:00 น.	61.1	81.6	57.0
01:00-02:00 น.	61.6	76.1	58.1
02:00-03:00 น.	60.7	73.7	57.6
03:00-04:00 น.	58.8	77.2	55.1
04:00-05:00 น.	59.7	75.9	56.3
05:00-06:00 น.	63.0	79.4	58.3
06:00-07:00 น.	64.3	88.7	60.1
L _{Aeq} 24 hours		63.0	
L _{Adn}		68.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วิทยาลัษพัทธศาสตร์ และปรัษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
	17 - 18 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	64.1	80.2	61.0
08:00-09:00 น.	64.6	80.1	61.1
09:00-10:00 น.	63.9	77.4	60.6
10:00-11:00 น.	64.0	79.2	60.8
11:00-12:00 น.	63.9	79.4	60.6
12:00-13:00 น.	65.5	82.1	61.0
13:00-14:00 น.	64.6	80.9	61.2
14:00-15:00 น.	63.9	78.7	60.9
15:00-16:00 น.	63.8	78.6	60.8
16:00-17:00 น.	63.7	77.0	60.9
17:00-18:00 น.	64.1	79.1	61.1
18:00-19:00 น.	64.4	78.9	60.9
19:00-20:00 น.	63.1	77.5	60.0
20:00-21:00 น.	63.3	79.8	59.7
21:00-22:00 น.	63.2	78.3	59.0
22:00-23:00 น.	63.8	79.6	56.7
23:00-00:00 น.	62.9	80.7	55.8
00:00-01:00 น.	62.0	78.7	55.4
01:00-02:00 น.	59.9	76.2	55.4
02:00-03:00 น.	59.2	75.3	55.3
03:00-04:00 น.	58.2	75.7	53.7
04:00-05:00 น.	59.2	77.4	55.3
05:00-06:00 น.	61.8	78.9	57.7
06:00-07:00 น.	63.4	81.3	59.5
L _{Aeq} 24 hours		63.3	
L _{Adn}		68.4	

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร		
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomacknight@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีรถไฟฟ้าพระศรีมหาธาตุ (N17)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด	: 13-18 มิถุนายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 มิถุนายน 2569
วิธีตรวจวัด	: มาตราระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U053901
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นันทจันทร์	เลขที่งาน	: 2026-003436
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AN728-0016 - T26AN728-0020

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีรถไฟฟ้าพระศรีมหาธาตุ (N17)		
	13 - 14 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	68.5	87.4	63.8
08:00-09:00 น.	69.2	89.7	65.0
09:00-10:00 น.	69.0	89.4	65.7
10:00-11:00 น.	68.6	85.7	65.0
11:00-12:00 น.	69.1	93.2	64.9
12:00-13:00 น.	68.3	86.6	64.6
13:00-14:00 น.	68.7	92.9	65.1
14:00-15:00 น.	68.6	86.2	64.8
15:00-16:00 น.	68.9	87.6	65.1
16:00-17:00 น.	68.7	86.9	64.7
17:00-18:00 น.	69.6	92.2	65.4
18:00-19:00 น.	70.2	91.3	65.7
19:00-20:00 น.	69.4	87.9	65.4
20:00-21:00 น.	69.4	91.8	64.9
21:00-22:00 น.	68.8	91.5	62.9
22:00-23:00 น.	66.3	87.9	59.4
23:00-00:00 น.	65.2	87.9	58.1
00:00-01:00 น.	64.0	83.6	56.9
01:00-02:00 น.	64.2	86.0	55.2
02:00-03:00 น.	62.4	82.7	55.3
03:00-04:00 น.	63.4	85.8	55.8
04:00-05:00 น.	65.8	88.7	58.8
05:00-06:00 น.	67.9	88.5	61.7
06:00-07:00 น.	68.1	87.3	64.0
L _{Aeq} 24 hours		68.0	
L _{Adn}		72.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	69.5	90.5	65.3
08:00-09:00 น.	69.6	90.2	65.3
09:00-10:00 น.	69.4	90.5	65.9
10:00-11:00 น.	69.1	91.0	65.3
11:00-12:00 น.	69.2	90.1	65.1
12:00-13:00 น.	68.9	87.1	64.6
13:00-14:00 น.	68.8	93.0	65.1
14:00-15:00 น.	68.8	86.0	65.2
15:00-16:00 น.	69.1	95.4	65.1
16:00-17:00 น.	68.9	84.9	65.3
17:00-18:00 น.	69.7	89.5	65.7
18:00-19:00 น.	68.6	85.8	64.6
19:00-20:00 น.	69.0	89.8	65.0
20:00-21:00 น.	69.2	92.6	65.2
21:00-22:00 น.	68.9	88.5	64.8
22:00-23:00 น.	68.3	88.9	63.6
23:00-00:00 น.	67.2	86.0	62.4
00:00-01:00 น.	67.2	92.2	61.5
01:00-02:00 น.	63.1	85.8	55.1
02:00-03:00 น.	62.6	83.3	54.4
03:00-04:00 น.	64.3	85.7	55.6
04:00-05:00 น.	66.8	90.1	59.2
05:00-06:00 น.	68.4	87.7	62.3
06:00-07:00 น.	69.3	85.3	65.0
L _{Aeq} 24 hours		68.4	
L _{Adn}		73.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	70.2	91.0	65.9
08:00-09:00 น.	69.9	87.1	66.3
09:00-10:00 น.	70.0	90.1	65.9
10:00-11:00 น.	69.8	91.4	65.5
11:00-12:00 น.	68.9	86.5	65.1
12:00-13:00 น.	69.1	89.5	65.1
13:00-14:00 น.	69.6	93.8	65.3
14:00-15:00 น.	69.6	92.0	65.0
15:00-16:00 น.	69.0	87.6	64.6
16:00-17:00 น.	69.1	88.7	64.7
17:00-18:00 น.	69.1	88.5	65.3
18:00-19:00 น.	68.7	87.1	64.9
19:00-20:00 น.	68.7	88.8	64.5
20:00-21:00 น.	69.1	88.5	64.7
21:00-22:00 น.	69.5	93.4	63.9
22:00-23:00 น.	67.1	85.6	60.5
23:00-00:00 น.	66.2	86.7	59.8
00:00-01:00 น.	66.0	87.0	59.2
01:00-02:00 น.	65.2	88.9	57.9
02:00-03:00 น.	65.1	84.3	57.1
03:00-04:00 น.	64.9	84.4	56.7
04:00-05:00 น.	67.5	87.0	60.1
05:00-06:00 น.	68.6	86.8	62.2
06:00-07:00 น.	68.8	90.0	64.3
L _{Aeq} 24 hours		68.6	
L _{Adn}		73.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีที่เอสวีตริตริมหาธาตุ (N17)		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0019		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	69.8	89.5	65.4
08:00-09:00 น.	69.9	88.8	65.6
09:00-10:00 น.	69.8	93.1	65.5
10:00-11:00 น.	69.3	87.2	65.2
11:00-12:00 น.	68.9	87.4	65.2
12:00-13:00 น.	69.3	88.7	65.2
13:00-14:00 น.	69.2	90.2	65.6
14:00-15:00 น.	69.2	90.4	65.5
15:00-16:00 น.	69.7	92.1	65.4
16:00-17:00 น.	69.2	88.6	65.5
17:00-18:00 น.	69.1	87.8	65.4
18:00-19:00 น.	69.8	87.8	65.9
19:00-20:00 น.	70.0	92.6	65.4
20:00-21:00 น.	69.6	90.6	65.3
21:00-22:00 น.	69.7	89.5	64.2
22:00-23:00 น.	67.1	85.9	62.6
23:00-00:00 น.	67.0	87.2	61.3
00:00-01:00 น.	66.4	85.7	61.1
01:00-02:00 น.	65.6	86.9	59.2
02:00-03:00 น.	64.7	84.8	58.0
03:00-04:00 น.	64.7	88.1	58.1
04:00-05:00 น.	66.5	86.1	60.3
05:00-06:00 น.	67.5	85.9	61.9
06:00-07:00 น.	68.7	89.2	63.3
L _{Aeq} 24 hours		68.6	
L _{Adn}		73.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีที่เอสวีตริตริมหาธาตุ (N17)		
	17 - 18 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	69.1	90.2	64.5
08:00-09:00 น.	69.5	89.8	65.4
09:00-10:00 น.	69.1	87.9	65.3
10:00-11:00 น.	69.0	87.6	65.4
11:00-12:00 น.	69.4	89.9	65.0
12:00-13:00 น.	68.8	87.7	64.5
13:00-14:00 น.	68.9	88.2	64.6
14:00-15:00 น.	69.4	91.5	64.7
15:00-16:00 น.	69.1	90.9	65.0
16:00-17:00 น.	68.9	86.9	64.9
17:00-18:00 น.	69.3	90.7	64.9
18:00-19:00 น.	68.8	87.4	64.8
19:00-20:00 น.	69.3	91.2	64.7
20:00-21:00 น.	68.6	87.2	64.5
21:00-22:00 น.	68.6	89.9	63.3
22:00-23:00 น.	65.9	88.7	59.7
23:00-00:00 น.	65.5	86.2	58.9
00:00-01:00 น.	65.9	87.4	59.0
01:00-02:00 น.	63.8	85.1	57.1
02:00-03:00 น.	63.3	84.2	56.5
03:00-04:00 น.	64.8	87.6	57.0
04:00-05:00 น.	66.7	88.0	59.8
05:00-06:00 น.	67.5	87.1	61.8
06:00-07:00 น.	69.0	89.5	63.3
L _{Aeq} 24 hours		68.2	
L _{Adn}		73.1	

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรฐานเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U053902
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AN728-0021 - T26AN728-0025

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์		
	13 - 14 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0021		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	68.4	86.1	64.7
08:00-09:00 น.	68.5	85.5	65.1
09:00-10:00 น.	69.4	87.7	65.7
10:00-11:00 น.	68.9	88.3	65.4
11:00-12:00 น.	68.5	85.1	65.1
12:00-13:00 น.	68.6	86.0	65.3
13:00-14:00 น.	69.3	87.6	65.4
14:00-15:00 น.	69.0	89.2	64.5
15:00-16:00 น.	68.4	85.1	64.8
16:00-17:00 น.	68.6	85.9	64.8
17:00-18:00 น.	68.9	84.5	64.9
18:00-19:00 น.	69.3	91.4	64.7
19:00-20:00 น.	68.4	86.4	64.2
20:00-21:00 น.	68.9	85.9	64.0
21:00-22:00 น.	67.6	86.0	63.1
22:00-23:00 น.	67.8	86.6	62.5
23:00-00:00 น.	67.3	90.7	61.4
00:00-01:00 น.	65.6	83.9	59.7
01:00-02:00 น.	64.6	82.2	57.9
02:00-03:00 น.	64.3	84.1	56.7
03:00-04:00 น.	63.9	82.7	56.9
04:00-05:00 น.	65.4	84.2	58.5
05:00-06:00 น.	66.1	79.1	61.0
06:00-07:00 น.	67.3	82.4	62.9
L _{Aeq} 24 hours		67.9	
L _{Adn}		72.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0022		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	68.7	84.1	65.0
08:00-09:00 น.	69.1	89.5	65.6
09:00-10:00 น.	69.9	85.4	66.1
10:00-11:00 น.	69.3	86.9	65.6
11:00-12:00 น.	69.1	85.8	65.5
12:00-13:00 น.	68.9	84.9	65.4
13:00-14:00 น.	69.7	88.1	65.5
14:00-15:00 น.	69.1	88.9	64.9
15:00-16:00 น.	68.2	84.6	64.5
16:00-17:00 น.	69.3	89.1	65.6
17:00-18:00 น.	69.2	90.5	64.7
18:00-19:00 น.	69.1	87.2	65.1
19:00-20:00 น.	68.3	82.5	64.6
20:00-21:00 น.	68.7	92.1	64.1
21:00-22:00 น.	68.1	86.4	63.6
22:00-23:00 น.	67.6	85.2	62.5
23:00-00:00 น.	66.7	87.7	61.1
00:00-01:00 น.	66.0	84.6	59.8
01:00-02:00 น.	65.0	82.8	58.6
02:00-03:00 น.	64.3	82.1	57.4
03:00-04:00 น.	64.6	84.2	57.2
04:00-05:00 น.	65.8	87.0	58.8
05:00-06:00 น.	66.5	83.6	61.2
06:00-07:00 น.	67.4	82.7	63.2
L _{Aeq} 24 hours		68.1	
L _{Adn}		73.1	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0023		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	69.2	86.7	65.9
08:00-09:00 น.	69.6	86.7	66.2
09:00-10:00 น.	70.0	89.1	66.7
10:00-11:00 น.	70.1	84.8	66.8
11:00-12:00 น.	69.2	82.3	66.3
12:00-13:00 น.	69.5	90.6	66.1
13:00-14:00 น.	69.6	85.4	66.1
14:00-15:00 น.	70.3	92.9	66.0
15:00-16:00 น.	69.3	85.7	65.8
16:00-17:00 น.	69.0	85.0	65.8
17:00-18:00 น.	69.4	85.9	65.9
18:00-19:00 น.	69.7	88.9	65.9
19:00-20:00 น.	69.3	87.0	65.7
20:00-21:00 น.	69.1	85.7	65.3
21:00-22:00 น.	68.7	84.2	64.6
22:00-23:00 น.	68.5	85.9	63.5
23:00-00:00 น.	67.6	85.2	62.4
00:00-01:00 น.	66.8	86.3	61.0
01:00-02:00 น.	65.9	84.3	59.5
02:00-03:00 น.	64.7	84.1	57.8
03:00-04:00 น.	64.8	80.5	58.7
04:00-05:00 น.	66.4	83.7	60.4
05:00-06:00 น.	67.2	84.9	62.7
06:00-07:00 น.	68.8	85.2	64.9
L _{Aeq} 24 hours		68.7	
L _{Adn}		73.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0024		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	70.1	87.3	66.6
08:00-09:00 น.	70.8	87.5	67.3
09:00-10:00 น.	71.1	87.1	67.8
10:00-11:00 น.	71.4	89.6	67.5
11:00-12:00 น.	70.8	87.2	67.6
12:00-13:00 น.	70.1	87.9	67.2
13:00-14:00 น.	70.4	83.6	67.3
14:00-15:00 น.	70.4	89.6	66.4
15:00-16:00 น.	70.2	88.6	66.1
16:00-17:00 น.	69.9	88.0	66.1
17:00-18:00 น.	69.0	86.9	65.3
18:00-19:00 น.	68.9	86.1	65.0
19:00-20:00 น.	67.9	85.1	63.7
20:00-21:00 น.	68.9	85.8	64.7
21:00-22:00 น.	68.3	84.6	64.0
22:00-23:00 น.	69.0	93.6	63.3
23:00-00:00 น.	67.4	87.4	62.5
00:00-01:00 น.	67.5	87.0	61.0
01:00-02:00 น.	65.8	84.4	59.3
02:00-03:00 น.	65.5	86.1	58.5
03:00-04:00 น.	65.6	84.1	58.9
04:00-05:00 น.	66.2	85.3	60.3
05:00-06:00 น.	67.9	84.8	63.7
06:00-07:00 น.	68.5	84.7	64.5
L _{Aeq} 24 hours		69.1	
L _{Adn}		74.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนโชนินมัสการเคราะห์		
	17 - 18 มิถุนายน 2569		
	T26AN728-0025		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	70.0	87.7	66.2
08:00-09:00 น.	69.7	86.2	66.3
09:00-10:00 น.	69.4	91.1	66.0
10:00-11:00 น.	69.9	87.0	66.4
11:00-12:00 น.	70.4	87.1	66.9
12:00-13:00 น.	69.5	85.6	66.2
13:00-14:00 น.	69.4	87.8	65.8
14:00-15:00 น.	70.0	86.0	65.9
15:00-16:00 น.	69.3	87.6	66.0
16:00-17:00 น.	69.6	89.8	65.5
17:00-18:00 น.	68.8	86.5	65.0
18:00-19:00 น.	68.4	88.7	63.9
19:00-20:00 น.	67.8	86.5	63.9
20:00-21:00 น.	68.6	86.2	64.2
21:00-22:00 น.	68.9	90.1	64.5
22:00-23:00 น.	68.3	88.3	63.3
23:00-00:00 น.	67.7	87.8	62.0
00:00-01:00 น.	66.0	81.8	60.2
01:00-02:00 น.	65.6	86.8	58.7
02:00-03:00 น.	65.4	85.3	58.6
03:00-04:00 น.	65.8	85.7	58.7
04:00-05:00 น.	66.3	82.8	60.1
05:00-06:00 น.	67.6	86.9	62.6
06:00-07:00 น.	68.6	87.4	64.1
L _{Aeq} 24 hours	68.6		
L _{Adn}	73.8		

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้รถระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-อุดค
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: *
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานเสียง **
ผู้ตรวจวัด	: นายพรพงษ์ นนทรินทร์
วันที่รับตัวอย่าง	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์	: 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล	: 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U049756
เลขที่งาน	: 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AM470-0001 - T26AM470-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	30 - 31 พฤษภาคม 2569		
	T26AM470-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	75.1	98.6	68.6
08:00-09:00 น.	73.8	92.3	68.5
09:00-10:00 น.	74.2	93.6	68.7
10:00-11:00 น.	73.9	94.2	68.1
11:00-12:00 น.	73.8	94.6	68.4
12:00-13:00 น.	73.8	94.4	68.6
13:00-14:00 น.	73.6	91.7	68.1
14:00-15:00 น.	75.1	99.0	68.2
15:00-16:00 น.	74.2	96.3	66.9
16:00-17:00 น.	72.3	92.8	67.6
17:00-18:00 น.	72.1	92.7	67.8
18:00-19:00 น.	72.3	91.3	67.5
19:00-20:00 น.	72.4	92.7	67.2
20:00-21:00 น.	73.9	93.9	67.8
21:00-22:00 น.	73.4	92.8	68.1
22:00-23:00 น.	73.3	91.5	68.3
23:00-00:00 น.	73.3	96.1	67.5
00:00-01:00 น.	73.2	94.5	66.7
01:00-02:00 น.	73.3	92.9	65.1
02:00-03:00 น.	71.9	94.9	63.5
03:00-04:00 น.	72.0	93.5	62.6
04:00-05:00 น.	73.0	93.6	64.3
05:00-06:00 น.	74.6	95.8	67.6
06:00-07:00 น.	74.8	97.2	68.6
L _{Aeq} 24 hours	73.6		
L _{Adn}	79.8		



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	74.4	95.2	68.2
08:00-09:00 น.	73.6	94.9	68.2
09:00-10:00 น.	73.4	93.4	68.0
10:00-11:00 น.	73.7	92.3	67.9
11:00-12:00 น.	72.9	92.8	67.6
12:00-13:00 น.	72.4	91.2	67.6
13:00-14:00 น.	73.7	96.5	67.6
14:00-15:00 น.	73.0	94.7	67.0
15:00-16:00 น.	73.2	99.0	67.0
16:00-17:00 น.	73.0	92.4	67.8
17:00-18:00 น.	72.8	91.7	67.9
18:00-19:00 น.	73.7	96.2	68.3
19:00-20:00 น.	73.9	99.5	67.4
20:00-21:00 น.	74.3	95.6	67.6
21:00-22:00 น.	73.0	90.8	67.5
22:00-23:00 น.	73.1	94.4	67.6
23:00-00:00 น.	72.4	90.9	66.7
00:00-01:00 น.	71.8	92.5	65.8
01:00-02:00 น.	74.8	95.4	66.8
02:00-03:00 น.	72.5	96.3	63.9
03:00-04:00 น.	71.8	95.9	62.4
04:00-05:00 น.	72.7	93.2	65.0
05:00-06:00 น.	74.0	94.8	67.5
06:00-07:00 น.	73.4	93.9	67.3
L _{Aeq} 24 hours	73.3		
L _{Adn}	79.5		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	1 - 2 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0003		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	75.4	99.6	68.4
08:00-09:00 น.	73.7	94.4	68.1
09:00-10:00 น.	75.0	101.7	67.6
10:00-11:00 น.	72.9	95.6	66.9
11:00-12:00 น.	72.5	98.1	66.9
12:00-13:00 น.	72.5	90.1	67.0
13:00-14:00 น.	72.6	92.7	67.0
14:00-15:00 น.	74.0	97.9	66.3
15:00-16:00 น.	72.8	91.0	68.7
16:00-17:00 น.	72.2	94.9	67.5
17:00-18:00 น.	73.1	91.2	67.4
18:00-19:00 น.	73.3	89.9	68.0
19:00-20:00 น.	73.1	95.2	67.4
20:00-21:00 น.	73.1	89.8	67.4
21:00-22:00 น.	72.8	89.8	67.1
22:00-23:00 น.	74.9	103.1	66.9
23:00-00:00 น.	74.2	101.5	66.1
00:00-01:00 น.	71.9	97.5	65.2
01:00-02:00 น.	74.1	101.8	64.1
02:00-03:00 น.	70.1	94.1	62.1
03:00-04:00 น.	71.2	94.1	61.4
04:00-05:00 น.	73.4	101.6	65.4
05:00-06:00 น.	73.6	92.3	66.9
06:00-07:00 น.	73.3	93.5	67.0
L _{Aeq} 24 hours	73.3		
L _{Adn}	79.6		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	2 - 3 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0004		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	74.9	96.5	69.2
08:00-09:00 น.	73.8	93.6	68.3
09:00-10:00 น.	73.5	92.3	67.9
10:00-11:00 น.	73.0	92.2	67.4
11:00-12:00 น.	73.4	94.7	67.7
12:00-13:00 น.	73.2	97.1	67.2
13:00-14:00 น.	72.7	92.5	66.4
14:00-15:00 น.	75.7	102.8	67.1
15:00-16:00 น.	74.8	97.2	65.6
16:00-17:00 น.	70.6	90.6	66.5
17:00-18:00 น.	71.1	91.1	66.9
18:00-19:00 น.	71.2	87.7	66.5
19:00-20:00 น.	71.7	89.1	67.0
20:00-21:00 น.	72.3	90.3	67.8
21:00-22:00 น.	72.8	91.5	67.5
22:00-23:00 น.	72.6	88.1	67.9
23:00-00:00 น.	73.4	97.1	67.7
00:00-01:00 น.	73.6	91.1	67.5
01:00-02:00 น.	73.5	95.6	64.9
02:00-03:00 น.	69.8	90.0	62.6
03:00-04:00 น.	70.9	90.1	62.2
04:00-05:00 น.	72.7	91.6	63.8
05:00-06:00 น.	74.2	96.0	66.7
06:00-07:00 น.	74.1	93.4	67.8
LAeq 24 hours	73.1		
LAdn	79.4		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	3 - 4 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0005		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	73.5	92.7	67.8
08:00-09:00 น.	73.0	94.2	67.5
09:00-10:00 น.	72.0	90.7	66.8
10:00-11:00 น.	72.5	89.5	67.1
11:00-12:00 น.	71.5	90.0	66.0
12:00-13:00 น.	71.1	88.0	66.1
13:00-14:00 น.	73.3	100.6	65.9
14:00-15:00 น.	71.6	93.3	65.5
15:00-16:00 น.	72.7	98.6	65.8
16:00-17:00 น.	72.6	91.9	67.3
17:00-18:00 น.	72.7	92.1	67.3
18:00-19:00 น.	73.6	96.4	67.9
19:00-20:00 น.	75.1	104.1	67.4
20:00-21:00 น.	72.9	92.9	67.4
21:00-22:00 น.	72.5	88.9	66.7
22:00-23:00 น.	72.5	96.0	66.7
23:00-00:00 น.	71.6	88.9	65.8
00:00-01:00 น.	71.0	91.9	64.8
01:00-02:00 น.	75.6	99.8	67.1
02:00-03:00 น.	71.1	91.0	62.9
03:00-04:00 น.	71.5	97.1	61.8
04:00-05:00 น.	72.3	91.7	65.3
05:00-06:00 น.	73.4	94.4	66.9
06:00-07:00 น.	71.5	86.5	65.4
LAeq 24 hours	72.7		
LAdn	79.0		

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือน

ที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		
ชื่อลูกค้า	สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร		
ที่อยู่	44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด	25-30 มิถุนายน 2569	วันที่วิเคราะห์	25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	*	วันที่ออกรายงานผล	2 กรกฎาคม 2569
วิธีตรวจวัด	มาตรฐานเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	2026-U058407
ผู้ตรวจวัด	นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ	เลขที่งาน	2026-003436
		หมายเลขปฏิบัติการ	T26AO805-0001 - T26AO805-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	25 - 26 มิถุนายน 2569		
	T26AO805-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	73.8	94.6	68.6
08:00-09:00 น.	76.4	99.6	70.2
09:00-10:00 น.	75.1	90.9	70.1
10:00-11:00 น.	75.5	92.2	70.5
11:00-12:00 น.	75.4	89.9	70.6
12:00-13:00 น.	74.8	94.5	69.2
13:00-14:00 น.	75.1	94.7	69.3
14:00-15:00 น.	75.2	94.3	69.6
15:00-16:00 น.	72.3	88.3	67.2
16:00-17:00 น.	71.9	87.9	67.4
17:00-18:00 น.	73.0	90.2	68.1
18:00-19:00 น.	75.8	94.9	69.1
19:00-20:00 น.	72.7	92.2	69.5
20:00-21:00 น.	73.7	85.6	69.8
21:00-22:00 น.	74.2	89.3	69.9
22:00-23:00 น.	75.8	98.8	70.2
23:00-00:00 น.	74.6	90.4	70.3
00:00-01:00 น.	73.2	88.6	68.0
01:00-02:00 น.	72.5	88.6	67.4
02:00-03:00 น.	73.6	93.4	66.9
03:00-04:00 น.	75.2	103.0	65.4
04:00-05:00 น.	72.3	92.4	62.7
05:00-06:00 น.	74.0	88.0	67.3
06:00-07:00 น.	75.9	93.0	69.6
L _{Aeq} 24 hours	74.4		
L _{Adn}	80.7		



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	26 - 27 มิถุนายน 2569		
	T26AO805-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	73.6	89.8	67.8
08:00-09:00 น.	72.0	93.8	67.4
09:00-10:00 น.	74.6	95.7	68.4
10:00-11:00 น.	73.7	89.4	69.0
11:00-12:00 น.	74.9	93.4	69.0
12:00-13:00 น.	75.5	91.6	69.7
13:00-14:00 น.	73.7	92.7	68.6
14:00-15:00 น.	71.9	85.4	66.8
15:00-16:00 น.	71.3	89.2	67.3
16:00-17:00 น.	76.7	101.0	68.3
17:00-18:00 น.	74.4	94.1	67.8
18:00-19:00 น.	72.6	88.4	67.8
19:00-20:00 น.	75.1	96.0	69.2
20:00-21:00 น.	74.3	92.6	70.0
21:00-22:00 น.	73.8	87.5	69.7
22:00-23:00 น.	75.9	92.8	71.0
23:00-00:00 น.	74.6	89.3	70.2
00:00-01:00 น.	75.5	90.5	71.2
01:00-02:00 น.	73.8	92.2	68.5
02:00-03:00 น.	72.1	93.9	65.7
03:00-04:00 น.	73.5	97.0	64.9
04:00-05:00 น.	74.5	97.8	66.8
05:00-06:00 น.	73.4	96.2	65.8
06:00-07:00 น.	73.8	97.0	65.8
L _{Aeq} 24 hours	74.2		
L _{Adn}	80.6		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	27 - 28 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0003		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	75.9	91.6	70.3
08:00-09:00 น.	74.5	96.3	69.1
09:00-10:00 น.	73.8	89.9	68.8
10:00-11:00 น.	73.2	90.7	67.8
11:00-12:00 น.	73.0	94.0	67.7
12:00-13:00 น.	72.5	90.6	67.1
13:00-14:00 น.	72.7	91.8	68.0
14:00-15:00 น.	73.2	88.8	68.4
15:00-16:00 น.	72.7	96.1	67.4
16:00-17:00 น.	72.7	89.4	67.4
17:00-18:00 น.	72.6	88.2	68.1
18:00-19:00 น.	73.2	94.3	68.5
19:00-20:00 น.	75.7	97.2	69.4
20:00-21:00 น.	75.3	90.4	69.7
21:00-22:00 น.	75.3	93.4	69.4
22:00-23:00 น.	76.1	102.0	68.8
23:00-00:00 น.	74.9	95.9	67.8
00:00-01:00 น.	73.0	91.8	66.1
01:00-02:00 น.	72.1	89.6	64.2
02:00-03:00 น.	72.7	94.5	62.2
03:00-04:00 น.	72.2	96.0	61.8
04:00-05:00 น.	73.6	91.3	64.5
05:00-06:00 น.	75.1	95.5	68.3
06:00-07:00 น.	75.7	94.0	69.6
LAeq 24 hours		74.0	
LAdn		80.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสรัชโยธิน (N11)		
	28 - 29 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0004		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	75.2	92.5	69.5
08:00-09:00 น.	74.4	91.5	68.9
09:00-10:00 น.	73.8	91.0	68.6
10:00-11:00 น.	74.0	92.4	67.5
11:00-12:00 น.	72.5	90.3	67.0
12:00-13:00 น.	72.2	91.4	67.6
13:00-14:00 น.	72.2	88.1	67.3
14:00-15:00 น.	74.4	99.0	67.7
15:00-16:00 น.	75.6	102.0	71.9
16:00-17:00 น.	73.3	88.8	68.7
17:00-18:00 น.	72.8	93.2	68.3
18:00-19:00 น.	72.9	93.1	68.1
19:00-20:00 น.	73.8	87.3	69.4
20:00-21:00 น.	74.5	92.2	69.8
21:00-22:00 น.	76.1	94.1	71.0
22:00-23:00 น.	76.0	96.1	70.4
23:00-00:00 น.	74.7	91.8	69.4
00:00-01:00 น.	74.2	87.8	68.3
01:00-02:00 น.	72.8	88.7	66.6
02:00-03:00 น.	71.3	89.5	64.8
03:00-04:00 น.	73.0	92.7	64.2
04:00-05:00 น.	74.9	94.3	67.5
05:00-06:00 น.	76.7	93.5	69.8
06:00-07:00 น.	74.7	93.7	68.4
LAeq 24 hours		74.2	
LAdn		80.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสราชโอรส (N11)		
	29 - 30 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0005		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	74.8	98.3	69.7
08:00-09:00 น.	74.1	93.6	69.4
09:00-10:00 น.	75.9	94.6	70.8
10:00-11:00 น.	75.7	95.4	69.9
11:00-12:00 น.	73.8	89.9	69.1
12:00-13:00 น.	76.8	102.2	70.4
13:00-14:00 น.	73.9	89.0	68.6
14:00-15:00 น.	73.4	87.8	68.2
15:00-16:00 น.	73.9	95.0	67.7
16:00-17:00 น.	72.8	91.2	68.1
17:00-18:00 น.	72.3	92.3	68.1
18:00-19:00 น.	73.2	91.2	68.6
19:00-20:00 น.	76.0	98.4	69.8
20:00-21:00 น.	74.5	96.0	69.1
21:00-22:00 น.	74.8	94.0	69.9
22:00-23:00 น.	73.5	91.0	68.6
23:00-00:00 น.	74.9	95.7	68.4
00:00-01:00 น.	72.8	92.6	67.1
01:00-02:00 น.	71.9	91.1	65.1
02:00-03:00 น.	71.0	89.5	63.1
03:00-04:00 น.	72.6	99.9	62.3
04:00-05:00 น.	74.8	98.7	66.9
05:00-06:00 น.	75.1	91.9	69.0
06:00-07:00 น.	74.8	92.0	69.8
LAeq 24 hours	74.3		
LAdn	80.3		

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ในรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 มีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรฐานระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นันทจันทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049757
เลขที่งาน : 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM470-0006 - T26AM470-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)		
	30 - 31 พฤษภาคม 2569		
	T26AM470-0006		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	75.3	94.7	70.5
08:00-09:00 น.	75.7	98.5	70.4
09:00-10:00 น.	74.5	91.7	70.0
10:00-11:00 น.	74.4	95.5	69.3
11:00-12:00 น.	75.1	100.0	69.5
12:00-13:00 น.	74.3	90.2	69.7
13:00-14:00 น.	75.4	102.5	69.9
14:00-15:00 น.	73.4	92.0	68.7
15:00-16:00 น.	74.3	91.5	69.7
16:00-17:00 น.	75.4	99.7	69.2
17:00-18:00 น.	75.6	96.9	70.2
18:00-19:00 น.	77.3	93.8	73.6
19:00-20:00 น.	75.1	93.8	70.3
20:00-21:00 น.	75.5	96.3	69.6
21:00-22:00 น.	75.7	97.4	69.9
22:00-23:00 น.	74.6	92.1	69.3
23:00-00:00 น.	74.0	93.3	68.4
00:00-01:00 น.	73.9	101.2	67.1
01:00-02:00 น.	73.0	95.0	65.9
02:00-03:00 น.	74.0	96.0	66.2
03:00-04:00 น.	73.1	93.8	65.3
04:00-05:00 น.	74.7	101.9	66.1
05:00-06:00 น.	76.1	101.9	68.1
06:00-07:00 น.	75.7	96.7	69.9
LAeq 24 hours	75.0		
LAdn	81.0		



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสายมุด (N19)		
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	76.2	92.5	71.7
08:00-09:00 น.	74.2	89.1	70.0
09:00-10:00 น.	74.4	95.0	69.9
10:00-11:00 น.	76.1	97.6	69.8
11:00-12:00 น.	74.9	97.6	70.1
12:00-13:00 น.	74.7	93.6	70.1
13:00-14:00 น.	74.8	94.1	69.9
14:00-15:00 น.	74.1	91.6	69.4
15:00-16:00 น.	75.4	99.7	69.7
16:00-17:00 น.	76.8	94.1	72.2
17:00-18:00 น.	75.6	96.8	70.2
18:00-19:00 น.	75.5	97.7	70.2
19:00-20:00 น.	76.3	96.6	70.3
20:00-21:00 น.	76.2	101.0	70.2
21:00-22:00 น.	77.0	99.7	70.1
22:00-23:00 น.	75.7	96.0	69.3
23:00-00:00 น.	74.3	95.6	67.7
00:00-01:00 น.	73.4	93.7	66.0
01:00-02:00 น.	73.0	99.2	63.8
02:00-03:00 น.	73.2	92.7	64.5
03:00-04:00 น.	72.4	89.4	64.9
04:00-05:00 น.	73.4	91.7	66.7
05:00-06:00 น.	74.6	93.8	69.5
06:00-07:00 น.	76.5	99.2	70.6
L _{Aeq} 24 hours		75.1	
L _{Adn}		80.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสายมุด (N19)		
	1 - 2 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	75.4	95.2	70.5
08:00-09:00 น.	75.8	97.8	70.8
09:00-10:00 น.	74.9	92.2	70.5
10:00-11:00 น.	74.7	94.2	70.0
11:00-12:00 น.	75.0	96.8	69.8
12:00-13:00 น.	74.7	92.4	70.1
13:00-14:00 น.	75.4	100.3	69.9
14:00-15:00 น.	74.3	92.3	69.6
15:00-16:00 น.	74.7	93.0	69.9
16:00-17:00 น.	75.6	99.5	69.8
17:00-18:00 น.	75.4	95.4	70.2
18:00-19:00 น.	76.6	94.3	72.1
19:00-20:00 น.	75.4	94.1	70.2
20:00-21:00 น.	76.1	98.4	70.2
21:00-22:00 น.	76.0	98.5	70.0
22:00-23:00 น.	75.6	96.1	69.7
23:00-00:00 น.	74.6	93.9	68.5
00:00-01:00 น.	74.4	97.5	67.3
01:00-02:00 น.	73.6	95.3	65.8
02:00-03:00 น.	73.9	95.8	65.5
03:00-04:00 น.	73.3	93.0	64.9
04:00-05:00 น.	74.3	96.8	66.0
05:00-06:00 น.	75.6	99.4	68.4
06:00-07:00 น.	75.5	94.1	70.3
L _{Aeq} 24 hours		75.1	
L _{Adn}		81.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสนามมฤค (N19)		
	2 - 3 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	76.3	94.9	71.1
08:00-09:00 น.	74.8	91.8	70.3
09:00-10:00 น.	74.3	94.7	69.7
10:00-11:00 น.	75.5	95.4	69.8
11:00-12:00 น.	74.7	95.7	69.5
12:00-13:00 น.	74.3	94.1	69.6
13:00-14:00 น.	75.1	97.6	69.6
14:00-15:00 น.	74.9	94.0	69.5
15:00-16:00 น.	75.7	99.6	69.7
16:00-17:00 น.	76.3	97.1	71.1
17:00-18:00 น.	76.4	99.3	70.3
18:00-19:00 น.	75.5	98.8	70.2
19:00-20:00 น.	76.0	95.7	70.1
20:00-21:00 น.	76.2	99.2	70.1
21:00-22:00 น.	76.3	99.2	69.9
22:00-23:00 น.	75.6	96.2	69.3
23:00-00:00 น.	74.9	95.2	68.3
00:00-01:00 น.	74.1	94.4	66.8
01:00-02:00 น.	73.3	95.9	64.9
02:00-03:00 น.	73.5	94.8	64.5
03:00-04:00 น.	72.8	93.0	64.4
04:00-05:00 น.	73.5	91.7	65.9
05:00-06:00 น.	74.7	94.3	68.4
06:00-07:00 น.	76.1	96.9	70.4
L _{Aeq} 24 hours		75.2	
L _{Adn}		81.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสนามมฤค (N19)		
	3 - 4 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	75.8	95.5	71.0
08:00-09:00 น.	76.0	97.9	70.9
09:00-10:00 น.	74.7	93.4	70.0
10:00-11:00 น.	74.8	97.2	69.4
11:00-12:00 น.	74.7	98.4	69.2
12:00-13:00 น.	75.0	94.9	69.8
13:00-14:00 น.	75.9	100.9	70.2
14:00-15:00 น.	74.8	94.2	70.0
15:00-16:00 น.	75.1	95.3	69.5
16:00-17:00 น.	75.3	99.9	69.1
17:00-18:00 น.	74.7	95.0	69.4
18:00-19:00 น.	75.7	92.2	71.3
19:00-20:00 น.	75.0	94.0	69.6
20:00-21:00 น.	75.6	98.6	69.6
21:00-22:00 น.	75.7	96.7	69.7
22:00-23:00 น.	74.9	95.1	69.2
23:00-00:00 น.	74.3	95.1	68.0
00:00-01:00 น.	74.1	98.1	66.8
01:00-02:00 น.	73.1	94.4	65.2
02:00-03:00 น.	73.7	95.2	65.1
03:00-04:00 น.	73.0	94.5	64.5
04:00-05:00 น.	73.9	99.6	65.3
05:00-06:00 น.	75.1	98.3	67.5
06:00-07:00 น.	75.5	95.4	69.8
L _{Aeq} 24 hours		74.9	
L _{Adn}		80.8	

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการพาหนะ การแต่งแ และ การประกอบโลหกรรม และ ความสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการใช้เครื่องจักร ในกิจกรรมการพาหนะ พ.ศ. 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		
ชื่อลูกค้า	สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร		
ที่อยู่	44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)		
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด	25-30 มิถุนายน 2569	วันที่วิเคราะห์	25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	*	วันที่ออกรายงานผล	2 กรกฎาคม 2569
วิธีตรวจวัด	มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	2026-U058409
ผู้ตรวจวัด	นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ	เลขที่งาน	2026-003436
		หมายเลขปฏิบัติการ	T26AO805-0006 - T26AO805-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)		
	25 - 26 มิถุนายน 2569		
	T26AO805-0006		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	74.0	92.3	69.4
08:00-09:00 น.	75.7	94.6	70.1
09:00-10:00 น.	74.8	98.7	69.0
10:00-11:00 น.	73.0	93.3	68.9
11:00-12:00 น.	73.9	97.5	68.6
12:00-13:00 น.	73.0	87.2	68.6
13:00-14:00 น.	73.0	88.1	68.3
14:00-15:00 น.	73.7	89.9	68.3
15:00-16:00 น.	74.0	96.4	67.7
16:00-17:00 น.	74.6	94.8	68.4
17:00-18:00 น.	74.1	97.2	68.5
18:00-19:00 น.	74.2	90.6	69.4
19:00-20:00 น.	74.9	94.2	69.6
20:00-21:00 น.	75.6	97.7	69.7
21:00-22:00 น.	73.5	91.3	69.4
22:00-23:00 น.	73.2	93.9	68.4
23:00-00:00 น.	73.6	91.9	67.5
00:00-01:00 น.	72.0	86.0	65.8
01:00-02:00 น.	71.0	86.5	63.3
02:00-03:00 น.	71.6	89.2	63.4
03:00-04:00 น.	72.6	96.1	62.9
04:00-05:00 น.	72.6	98.0	64.9
05:00-06:00 น.	73.0	95.0	66.7
06:00-07:00 น.	73.8	95.0	68.8
L _{Aeq} 24 hours	73.7		
L _{Adn}	79.3		



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสายหยุด (N19)		
	26 - 27 มิถุนายน 2569		
	T26AO805-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	73.7	87.3	69.6
08:00-09:00 น.	74.7	90.9	69.6
09:00-10:00 น.	74.1	90.6	69.3
10:00-11:00 น.	72.6	86.8	67.5
11:00-12:00 น.	72.9	90.5	68.5
12:00-13:00 น.	73.0	89.5	67.9
13:00-14:00 น.	72.5	98.0	66.9
14:00-15:00 น.	74.0	96.1	68.2
15:00-16:00 น.	74.6	95.6	68.2
16:00-17:00 น.	75.4	97.9	68.7
17:00-18:00 น.	73.6	88.6	68.8
18:00-19:00 น.	74.2	90.0	68.9
19:00-20:00 น.	74.1	91.0	68.8
20:00-21:00 น.	74.1	92.9	68.6
21:00-22:00 น.	74.6	95.9	68.3
22:00-23:00 น.	74.3	90.6	70.7
23:00-00:00 น.	72.1	85.3	67.0
00:00-01:00 น.	71.7	95.0	64.6
01:00-02:00 น.	70.8	89.2	62.7
02:00-03:00 น.	70.7	93.2	63.0
03:00-04:00 น.	71.9	93.1	64.0
04:00-05:00 น.	72.3	88.1	66.5
05:00-06:00 น.	72.8	86.5	68.6
06:00-07:00 น.	72.8	86.5	68.6
L _{Aeq} 24 hours	73.4		
L _{Adn}	79.0		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสามหมุด (N19)		
	27 - 28 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	74.3	92.5	69.4
08:00-09:00 น.	74.1	93.2	69.0
09:00-10:00 น.	73.5	92.1	68.6
10:00-11:00 น.	73.1	90.4	68.3
11:00-12:00 น.	73.1	89.0	68.6
12:00-13:00 น.	72.8	87.2	68.5
13:00-14:00 น.	72.3	92.2	67.4
14:00-15:00 น.	73.1	90.9	68.1
15:00-16:00 น.	73.4	87.7	68.4
16:00-17:00 น.	72.8	88.0	68.3
17:00-18:00 น.	73.8	90.6	68.9
18:00-19:00 น.	74.0	94.9	68.5
19:00-20:00 น.	74.8	93.9	68.5
20:00-21:00 น.	76.1	99.5	68.6
21:00-22:00 น.	74.2	92.3	68.7
22:00-23:00 น.	73.4	89.6	67.4
23:00-00:00 น.	74.2	94.5	67.8
00:00-01:00 น.	71.3	91.6	65.0
01:00-02:00 น.	69.9	84.7	62.6
02:00-03:00 น.	71.5	93.0	63.5
03:00-04:00 น.	70.5	86.8	63.4
04:00-05:00 น.	70.4	86.9	64.7
05:00-06:00 น.	72.6	86.0	67.7
06:00-07:00 น.	73.3	92.2	69.0
L _{Aeq} 24 hours		73.2	
L _{Adn}		78.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสามหมุด (N19)		
	28 - 29 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	74.9	90.0	70.5
08:00-09:00 น.	74.5	95.9	69.5
09:00-10:00 น.	74.2	97.2	68.9
10:00-11:00 น.	73.9	93.1	68.8
11:00-12:00 น.	75.0	99.0	68.8
12:00-13:00 น.	73.4	92.4	68.5
13:00-14:00 น.	73.6	89.2	68.7
14:00-15:00 น.	73.6	90.8	68.6
15:00-16:00 น.	73.8	95.4	68.1
16:00-17:00 น.	73.7	91.9	68.9
17:00-18:00 น.	75.4	97.8	69.7
18:00-19:00 น.	75.2	92.6	69.1
19:00-20:00 น.	74.6	89.4	71.8
20:00-21:00 น.	73.3	92.0	68.5
21:00-22:00 น.	73.2	89.1	69.2
22:00-23:00 น.	72.7	90.2	67.5
23:00-00:00 น.	72.4	88.6	67.0
00:00-01:00 น.	71.7	92.8	65.1
01:00-02:00 น.	70.9	87.6	62.6
02:00-03:00 น.	71.1	89.7	63.4
03:00-04:00 น.	70.5	84.6	63.2
04:00-05:00 น.	71.0	86.6	65.6
05:00-06:00 น.	73.7	92.3	67.8
06:00-07:00 น.	74.2	90.4	69.3
L _{Aeq} 24 hours		73.6	
L _{Adn}		79.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสามยอด (N19)		
	29 - 30 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0010		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	75.2	97.3	70.2
08:00-09:00 น.	74.3	93.5	69.6
09:00-10:00 น.	75.1	98.1	69.6
10:00-11:00 น.	72.7	91.5	68.2
11:00-12:00 น.	73.9	93.7	69.0
12:00-13:00 น.	73.8	88.1	69.5
13:00-14:00 น.	70.8	88.3	66.0
14:00-15:00 น.	72.1	89.1	66.9
15:00-16:00 น.	72.5	90.9	66.9
16:00-17:00 น.	72.8	90.5	67.5
17:00-18:00 น.	73.2	93.1	67.9
18:00-19:00 น.	73.0	91.7	67.9
19:00-20:00 น.	75.4	93.6	71.3
20:00-21:00 น.	74.9	97.6	68.2
21:00-22:00 น.	72.6	90.5	67.8
22:00-23:00 น.	71.5	90.0	66.1
23:00-00:00 น.	74.3	93.6	68.1
00:00-01:00 น.	71.6	88.7	65.3
01:00-02:00 น.	70.9	86.0	63.4
02:00-03:00 น.	71.5	91.0	63.4
03:00-04:00 น.	71.3	91.2	62.9
04:00-05:00 น.	70.4	91.4	63.7
05:00-06:00 น.	72.1	89.8	66.5
06:00-07:00 น.	73.9	93.9	69.2
LAeq 24 hours		73.2	
LAdn		78.8	

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
 ชื่อลูกค้า : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
 ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
 สถานที่ตรวจวัด : สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)
 ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
 วันที่ตรวจวัด : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
 เวลาที่ตรวจวัด : *
 วิธีตรวจวัด : มาตรฐานเสียง **
 ผู้ตรวจวัด : นายวรพงษ์ นนทรินทร์

วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569
 วันที่ออกรายงานผล : 11 มิถุนายน 2569
 เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U049758
 เลขที่งาน : 2026-003436
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM470-0011 - T26AM470-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)		
	30 - 31 พฤษภาคม 2569		
	T26AM470-0011		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	64.3	88.8	54.3
08:00-09:00 น.	62.5	88.6	54.2
09:00-10:00 น.	61.1	79.5	53.1
10:00-11:00 น.	61.5	81.3	53.6
11:00-12:00 น.	61.7	89.1	54.0
12:00-13:00 น.	63.9	77.9	55.4
13:00-14:00 น.	66.5	85.2	55.4
14:00-15:00 น.	60.7	78.4	53.6
15:00-16:00 น.	61.1	77.4	55.3
16:00-17:00 น.	66.1	88.9	54.3
17:00-18:00 น.	68.3	90.0	57.8
18:00-19:00 น.	67.1	83.5	58.1
19:00-20:00 น.	62.6	82.3	55.7
20:00-21:00 น.	63.0	83.7	55.4
21:00-22:00 น.	61.5	79.9	55.5
22:00-23:00 น.	60.7	78.7	55.9
23:00-00:00 น.	60.2	85.3	53.2
00:00-01:00 น.	59.3	76.6	55.0
01:00-02:00 น.	59.4	78.3	53.5
02:00-03:00 น.	57.7	74.3	52.2
03:00-04:00 น.	58.2	74.9	53.4
04:00-05:00 น.	60.6	89.2	52.8
05:00-06:00 น.	61.1	80.4	54.8
06:00-07:00 น.	64.0	82.2	55.6
LAeq 24 hours		63.1	
LAdn		67.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีที่เสาสระพานใหม่ (N20)		
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.9	79.1	54.4
08:00-09:00 น.	63.7	89.9	54.7
09:00-10:00 น.	61.3	79.4	53.2
10:00-11:00 น.	60.6	82.0	52.5
11:00-12:00 น.	60.7	80.0	52.3
12:00-13:00 น.	60.1	84.0	53.6
13:00-14:00 น.	64.9	90.1	54.9
14:00-15:00 น.	65.9	86.2	55.9
15:00-16:00 น.	61.3	79.7	53.7
16:00-17:00 น.	62.2	80.4	52.5
17:00-18:00 น.	63.1	80.3	54.7
18:00-19:00 น.	61.1	82.8	53.1
19:00-20:00 น.	61.3	79.7	53.3
20:00-21:00 น.	61.0	84.8	53.8
21:00-22:00 น.	60.9	90.2	53.6
22:00-23:00 น.	59.9	78.8	52.5
23:00-00:00 น.	58.3	79.9	50.7
00:00-01:00 น.	60.9	75.9	57.1
01:00-02:00 น.	58.0	79.2	50.7
02:00-03:00 น.	57.2	78.3	50.2
03:00-04:00 น.	59.4	83.4	51.3
04:00-05:00 น.	59.3	77.3	51.5
05:00-06:00 น.	60.8	83.1	53.3
06:00-07:00 น.	60.9	77.4	54.5
L _{Aeq} 24 hours		61.5	
L _{Adn}		66.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีที่เสาสระพานใหม่ (N20)		
	1 - 2 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.1	78.5	53.7
08:00-09:00 น.	59.4	76.9	53.4
09:00-10:00 น.	63.5	82.3	54.5
10:00-11:00 น.	61.0	79.0	52.5
11:00-12:00 น.	62.4	79.8	53.1
12:00-13:00 น.	60.8	80.8	52.7
13:00-14:00 น.	63.0	87.9	54.9
14:00-15:00 น.	61.3	79.1	53.8
15:00-16:00 น.	64.5	82.6	58.5
16:00-17:00 น.	66.5	87.2	57.1
17:00-18:00 น.	67.7	87.3	59.2
18:00-19:00 น.	67.4	85.5	58.5
19:00-20:00 น.	64.8	84.3	57.7
20:00-21:00 น.	65.4	86.0	57.4
21:00-22:00 น.	64.6	87.7	56.6
22:00-23:00 น.	63.6	84.5	57.5
23:00-00:00 น.	63.5	86.8	55.8
00:00-01:00 น.	62.9	84.1	56.8
01:00-02:00 น.	63.1	84.4	55.1
02:00-03:00 น.	61.4	80.4	54.6
03:00-04:00 น.	60.4	80.1	54.6
04:00-05:00 น.	61.1	85.6	54.0
05:00-06:00 น.	62.2	79.5	55.7
06:00-07:00 น.	64.9	89.2	57.2
L _{Aeq} 24 hours		63.8	
L _{Adn}		69.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีที่เอสสะพานใหม่ (N20)		
	2 - 3 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	65.8	89.3	56.2
08:00-09:00 น.	63.8	86.5	55.9
09:00-10:00 น.	63.7	83.2	55.3
10:00-11:00 น.	60.8	79.5	54.2
11:00-12:00 น.	63.5	87.0	54.1
12:00-13:00 น.	66.8	84.9	54.9
13:00-14:00 น.	65.8	84.8	54.8
14:00-15:00 น.	63.9	84.3	53.7
15:00-16:00 น.	60.3	78.2	53.9
16:00-17:00 น.	63.1	84.0	53.8
17:00-18:00 น.	65.2	86.6	55.6
18:00-19:00 น.	64.8	85.5	56.0
19:00-20:00 น.	61.1	82.4	54.0
20:00-21:00 น.	62.3	88.8	53.8
21:00-22:00 น.	60.6	80.9	53.7
22:00-23:00 น.	59.0	77.8	53.4
23:00-00:00 น.	59.9	83.9	52.6
00:00-01:00 น.	60.1	81.6	53.5
01:00-02:00 น.	59.8	80.8	51.6
02:00-03:00 น.	57.0	78.6	50.9
03:00-04:00 น.	58.1	79.0	52.4
04:00-05:00 น.	58.7	84.1	51.9
05:00-06:00 น.	59.6	80.8	53.4
06:00-07:00 น.	61.9	79.4	54.1
L _{Aeq} 24 hours		62.7	
L _{Adn}		66.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีที่เอสสะพานใหม่ (N20)		
	3 - 4 มิถุนายน 2569		
	T26AM470-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.3	80.3	53.9
08:00-09:00 น.	63.3	88.0	54.2
09:00-10:00 น.	62.2	83.3	53.5
10:00-11:00 น.	61.4	81.4	54.4
11:00-12:00 น.	62.5	80.0	53.6
12:00-13:00 น.	61.4	83.8	53.0
13:00-14:00 น.	63.2	88.0	53.7
14:00-15:00 น.	63.0	82.9	53.8
15:00-16:00 น.	61.1	80.6	53.2
16:00-17:00 น.	61.1	79.8	52.6
17:00-18:00 น.	61.6	79.1	53.9
18:00-19:00 น.	62.4	83.5	53.3
19:00-20:00 น.	61.7	81.0	52.7
20:00-21:00 น.	61.0	83.3	53.0
21:00-22:00 น.	62.2	87.9	52.5
22:00-23:00 น.	58.2	77.7	51.1
23:00-00:00 น.	57.9	80.9	50.1
00:00-01:00 น.	58.9	80.1	53.9
01:00-02:00 น.	58.8	85.0	51.0
02:00-03:00 น.	56.6	80.1	50.0
03:00-04:00 น.	58.0	82.0	51.3
04:00-05:00 น.	59.3	80.4	51.1
05:00-06:00 น.	59.3	79.5	52.6
06:00-07:00 น.	63.0	86.4	53.7
L _{Aeq} 24 hours		61.2	
L _{Adn}		66.2	

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการพาหนะ การแฉ่งแฉ่ง และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้เครื่องเปิด ในกิจกรรมการพาหนะ พ.ศ. 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		
ชื่อลูกค้า	สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร		
ที่อยู่	44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)		
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 25-30 มิถุนายน 2569
วันที่ตรวจวัด	: 25-30 มิถุนายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 25-30 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 2 กรกฎาคม 2569
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U058411
ผู้ตรวจวัด	: นายอัฐฐา วนศิริ	เลขที่งาน	: 2026-003436
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T26A0805-0011 - T26A0805-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)		
	25 - 26 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.6	81.4	53.6
08:00-09:00 น.	60.7	80.6	55.2
09:00-10:00 น.	61.1	80.0	53.9
10:00-11:00 น.	61.0	80.2	54.6
11:00-12:00 น.	65.5	84.9	53.9
12:00-13:00 น.	60.3	84.0	52.8
13:00-14:00 น.	57.3	73.3	53.2
14:00-15:00 น.	65.8	93.6	59.8
15:00-16:00 น.	64.9	84.8	59.5
16:00-17:00 น.	65.1	92.4	60.1
17:00-18:00 น.	65.4	82.1	61.3
18:00-19:00 น.	65.2	87.3	60.7
19:00-20:00 น.	66.7	86.5	61.1
20:00-21:00 น.	68.2	85.8	61.5
21:00-22:00 น.	67.4	96.8	62.4
22:00-23:00 น.	66.2	85.3	59.9
23:00-00:00 น.	62.8	81.7	57.6
00:00-01:00 น.	59.6	79.2	53.5
01:00-02:00 น.	59.3	77.9	53.4
02:00-03:00 น.	58.9	78.5	51.8
03:00-04:00 น.	57.2	77.4	51.2
04:00-05:00 น.	61.1	77.1	55.6
05:00-06:00 น.	57.0	70.6	51.2
06:00-07:00 น.	57.0	71.5	51.9
L _{Aeq} 24 hours		63.6	
L _{Adn}		68.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)		
	26 - 27 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.7	80.9	55.5
08:00-09:00 น.	60.6	81.3	53.6
09:00-10:00 น.	63.5	84.8	54.9
10:00-11:00 น.	60.1	78.1	53.4
11:00-12:00 น.	63.9	83.0	57.4
12:00-13:00 น.	67.7	87.9	61.3
13:00-14:00 น.	65.7	83.1	60.0
14:00-15:00 น.	67.0	84.9	60.7
15:00-16:00 น.	68.0	87.8	61.3
16:00-17:00 น.	67.9	83.7	61.8
17:00-18:00 น.	68.2	87.7	62.6
18:00-19:00 น.	68.0	85.7	62.2
19:00-20:00 น.	67.0	86.2	60.5
20:00-21:00 น.	66.0	86.7	58.8
21:00-22:00 น.	64.3	88.9	58.1
22:00-23:00 น.	61.9	83.4	56.0
23:00-00:00 น.	59.7	79.0	53.4
00:00-01:00 น.	57.6	74.5	50.7
01:00-02:00 น.	58.8	78.7	53.9
02:00-03:00 น.	57.4	74.9	52.7
03:00-04:00 น.	59.6	75.7	51.9
04:00-05:00 น.	58.3	76.4	52.7
05:00-06:00 น.	59.6	73.6	54.9
06:00-07:00 น.	58.9	75.0	53.8
L _{Aeq} 24 hours		64.5	
L _{Adn}		67.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีที่เอสสะพานใหม่ (N20)		
	27 - 28 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.1	81.5	54.5
08:00-09:00 น.	61.2	80.8	54.3
09:00-10:00 น.	64.4	87.3	54.2
10:00-11:00 น.	61.8	78.6	54.0
11:00-12:00 น.	60.7	85.2	53.1
12:00-13:00 น.	59.7	77.8	51.0
13:00-14:00 น.	59.9	78.0	52.5
14:00-15:00 น.	58.0	75.8	52.8
15:00-16:00 น.	59.0	77.2	52.2
16:00-17:00 น.	61.3	78.9	54.2
17:00-18:00 น.	62.4	82.0	53.2
18:00-19:00 น.	65.6	91.9	55.6
19:00-20:00 น.	65.9	88.3	58.3
20:00-21:00 น.	67.3	87.8	61.4
21:00-22:00 น.	68.6	87.3	64.5
22:00-23:00 น.	61.8	84.2	56.8
23:00-00:00 น.	62.0	84.4	55.4
00:00-01:00 น.	64.2	96.9	53.1
01:00-02:00 น.	61.1	97.6	52.0
02:00-03:00 น.	65.0	98.0	53.3
03:00-04:00 น.	58.6	74.6	52.9
04:00-05:00 น.	59.1	75.8	53.8
05:00-06:00 น.	59.4	76.9	53.7
06:00-07:00 น.	60.8	80.4	54.1
L _{Aeq} 24 hours		63.0	
L _{Adn}		68.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีที่เอสสะพานใหม่ (N20)		
	28 - 29 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.2	80.7	53.4
08:00-09:00 น.	61.4	81.4	54.4
09:00-10:00 น.	62.2	81.7	54.2
10:00-11:00 น.	61.0	79.2	53.6
11:00-12:00 น.	60.8	81.2	51.0
12:00-13:00 น.	56.4	73.0	51.3
13:00-14:00 น.	60.4	78.0	53.7
14:00-15:00 น.	61.1	85.7	52.6
15:00-16:00 น.	61.1	83.4	54.0
16:00-17:00 น.	59.9	77.9	53.8
17:00-18:00 น.	61.5	80.8	53.3
18:00-19:00 น.	64.7	88.1	58.3
19:00-20:00 น.	65.9	87.5	59.0
20:00-21:00 น.	64.8	87.6	60.1
21:00-22:00 น.	67.8	95.9	61.4
22:00-23:00 น.	61.0	78.3	56.0
23:00-00:00 น.	60.6	76.6	54.8
00:00-01:00 น.	59.6	84.0	52.2
01:00-02:00 น.	58.5	88.0	53.4
02:00-03:00 น.	57.4	88.9	51.5
03:00-04:00 น.	56.8	78.9	49.8
04:00-05:00 น.	58.7	75.7	52.1
05:00-06:00 น.	57.4	75.3	50.8
06:00-07:00 น.	57.5	72.9	51.7
L _{Aeq} 24 hours		61.7	
L _{Adn}		66.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีบีทีเอสสะพานใหม่ (N20)		
	29 - 30 มิถุนายน 2569		
	T26A0805-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.1	83.5	52.4
08:00-09:00 น.	59.4	78.6	52.7
09:00-10:00 น.	59.8	79.2	52.3
10:00-11:00 น.	59.9	83.1	52.8
11:00-12:00 น.	63.2	79.9	53.2
12:00-13:00 น.	61.9	83.1	52.6
13:00-14:00 น.	57.5	74.3	51.9
14:00-15:00 น.	61.9	84.0	56.1
15:00-16:00 น.	64.0	85.3	55.4
16:00-17:00 น.	68.4	91.3	62.6
17:00-18:00 น.	64.7	81.3	58.2
18:00-19:00 น.	62.4	83.3	56.7
19:00-20:00 น.	63.3	83.6	56.8
20:00-21:00 น.	63.3	81.4	57.0
21:00-22:00 น.	62.6	86.3	57.7
22:00-23:00 น.	61.7	83.8	55.1
23:00-00:00 น.	59.6	77.6	54.8
00:00-01:00 น.	58.0	77.2	52.0
01:00-02:00 น.	57.0	74.6	51.3
02:00-03:00 น.	57.0	75.2	51.1
03:00-04:00 น.	57.4	81.8	50.5
04:00-05:00 น.	59.6	77.2	53.7
05:00-06:00 น.	59.0	74.9	51.9
06:00-07:00 น.	57.0	71.5	51.9
L _{Aeq} 24 hours		61.8	
L _{Adn}		66.1	

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศกระทรวงการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• นำมาคิดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจมีข้อผิดพลาดได้

5/5

2026-U058411

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด	: 13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: *
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง **
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นันทจันทร์
วันที่รับตัวอย่าง	: 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์	: 13-18 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล	: 22 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U053911
เลขที่งาน	: 2026-003436
หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AN737-0001 - T26AN737-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)		
	13 - 14 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	66.8	88.3	59.1
08:00-09:00 น.	66.7	84.3	60.7
09:00-10:00 น.	67.0	85.3	62.0
10:00-11:00 น.	67.2	84.0	62.1
11:00-12:00 น.	65.6	85.5	61.4
12:00-13:00 น.	64.3	85.4	58.2
13:00-14:00 น.	64.4	78.1	59.0
14:00-15:00 น.	65.2	82.5	59.8
15:00-16:00 น.	65.2	83.5	59.4
16:00-17:00 น.	65.0	78.5	59.1
17:00-18:00 น.	65.7	84.6	60.2
18:00-19:00 น.	66.6	83.4	58.5
19:00-20:00 น.	65.8	82.7	59.2
20:00-21:00 น.	66.4	84.4	58.6
21:00-22:00 น.	66.1	85.4	58.7
22:00-23:00 น.	66.9	88.6	58.1
23:00-00:00 น.	66.0	86.0	56.9
00:00-01:00 น.	64.1	86.2	56.6
01:00-02:00 น.	63.4	83.6	54.3
02:00-03:00 น.	63.6	88.3	53.6
03:00-04:00 น.	62.9	82.4	54.1
04:00-05:00 น.	62.5	83.1	53.2
05:00-06:00 น.	63.3	85.3	53.3
06:00-07:00 น.	65.4	88.8	55.3
L _{Aeq} 24 hours		65.5	
L _{Adn}		71.1	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
ISO 45001:2018 CERTIFIED

• นำมาคิดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจมีข้อผิดพลาดได้

1/5



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	65.3	83.1	57.6
08:00-09:00 น.	66.1	85.6	58.7
09:00-10:00 น.	65.0	82.8	58.4
10:00-11:00 น.	64.9	85.7	58.5
11:00-12:00 น.	65.2	86.0	58.2
12:00-13:00 น.	64.9	87.4	56.9
13:00-14:00 น.	64.6	81.7	58.6
14:00-15:00 น.	66.1	90.1	58.6
15:00-16:00 น.	65.3	84.1	59.5
16:00-17:00 น.	65.7	86.0	58.0
17:00-18:00 น.	66.4	86.2	57.9
18:00-19:00 น.	65.2	84.3	59.0
19:00-20:00 น.	67.8	90.8	57.9
20:00-21:00 น.	65.2	82.9	57.1
21:00-22:00 น.	65.1	79.1	57.6
22:00-23:00 น.	65.0	80.0	56.4
23:00-00:00 น.	65.8	80.5	59.1
00:00-01:00 น.	61.8	79.0	54.5
01:00-02:00 น.	61.6	82.9	53.9
02:00-03:00 น.	60.5	76.8	53.4
03:00-04:00 น.	61.1	84.1	54.3
04:00-05:00 น.	62.3	77.2	55.3
05:00-06:00 น.	64.5	84.3	58.6
06:00-07:00 น.	66.3	81.5	60.5
L _{Aeq} 24 hours	65.0		
L _{Adn}	70.4		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0003		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	67.0	86.3	62.1
08:00-09:00 น.	67.5	88.4	62.2
09:00-10:00 น.	66.4	81.3	60.9
10:00-11:00 น.	64.6	79.9	60.3
11:00-12:00 น.	66.4	84.6	60.8
12:00-13:00 น.	64.8	81.7	58.3
13:00-14:00 น.	65.0	79.8	59.9
14:00-15:00 น.	65.9	82.1	60.7
15:00-16:00 น.	65.6	84.6	60.8
16:00-17:00 น.	65.7	79.6	60.5
17:00-18:00 น.	66.5	88.7	59.7
18:00-19:00 น.	67.2	85.4	61.5
19:00-20:00 น.	66.6	84.4	60.0
20:00-21:00 น.	66.0	83.8	60.2
21:00-22:00 น.	65.4	83.1	60.3
22:00-23:00 น.	66.1	86.1	58.4
23:00-00:00 น.	65.2	82.5	58.0
00:00-01:00 น.	63.6	85.9	56.5
01:00-02:00 น.	62.1	80.4	53.2
02:00-03:00 น.	61.9	76.7	53.9
03:00-04:00 น.	62.4	85.8	54.2
04:00-05:00 น.	62.6	86.1	54.6
05:00-06:00 น.	63.8	80.9	57.1
06:00-07:00 น.	66.0	83.5	60.2
L _{Aeq} 24 hours	65.5		
L _{Adn}	70.8		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0004		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	67.1	83.6	61.5
08:00-09:00 น.	67.2	80.5	62.0
09:00-10:00 น.	66.9	86.3	61.6
10:00-11:00 น.	65.2	79.3	61.0
11:00-12:00 น.	64.8	84.9	59.9
12:00-13:00 น.	64.0	80.3	59.2
13:00-14:00 น.	64.6	82.8	60.0
14:00-15:00 น.	66.0	83.8	60.8
15:00-16:00 น.	67.0	85.4	61.3
16:00-17:00 น.	67.9	86.9	61.7
17:00-18:00 น.	67.4	88.9	60.6
18:00-19:00 น.	67.0	88.0	60.2
19:00-20:00 น.	65.2	85.3	61.0
20:00-21:00 น.	66.2	86.3	59.3
21:00-22:00 น.	66.4	87.0	58.4
22:00-23:00 น.	65.2	83.7	57.8
23:00-00:00 น.	64.1	84.0	55.7
00:00-01:00 น.	62.5	82.7	54.0
01:00-02:00 น.	63.5	88.2	52.2
02:00-03:00 น.	62.2	84.3	52.6
03:00-04:00 น.	62.2	81.6	53.0
04:00-05:00 น.	64.4	87.1	55.3
05:00-06:00 น.	64.3	82.9	58.2
06:00-07:00 น.	66.0	84.0	60.1
L _{Aeq} 24 hours	65.6		
L _{Adn}	70.8		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช N21)		
	17 - 18 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0005		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	67.6	85.0	61.9
08:00-09:00 น.	68.1	89.1	61.4
09:00-10:00 น.	66.0	82.8	61.1
10:00-11:00 น.	66.0	88.7	60.7
11:00-12:00 น.	66.6	88.9	58.9
12:00-13:00 น.	64.2	90.6	59.2
13:00-14:00 น.	66.4	89.3	59.6
14:00-15:00 น.	65.5	84.6	60.2
15:00-16:00 น.	65.2	82.4	59.8
16:00-17:00 น.	65.9	83.0	59.9
17:00-18:00 น.	66.5	83.6	60.0
18:00-19:00 น.	67.2	89.8	59.4
19:00-20:00 น.	66.6	88.2	58.3
20:00-21:00 น.	65.8	84.9	58.1
21:00-22:00 น.	65.0	81.6	57.8
22:00-23:00 น.	64.6	89.0	55.5
23:00-00:00 น.	63.7	82.2	55.5
00:00-01:00 น.	62.0	81.4	53.9
01:00-02:00 น.	61.7	79.0	52.1
02:00-03:00 น.	61.9	84.2	51.5
03:00-04:00 น.	61.9	84.6	53.2
04:00-05:00 น.	62.0	79.3	55.1
05:00-06:00 น.	64.6	78.7	58.9
06:00-07:00 น.	65.7	83.3	60.5
L _{Aeq} 24 hours	65.4		
L _{Adn}	70.3		

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการดำเนินงาน การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		
ชื่อลูกค้า	สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร		
ที่อยู่	44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)		
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	13-18 มิถุนายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง	13-18 มิถุนายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	*	วันที่วิเคราะห์	13-18 มิถุนายน 2569
วิธีตรวจวัด	มาตรฐานระดับเสียง **	วันที่ออกรายงานผล	22 มิถุนายน 2569
ผู้ตรวจวัด	นายวรพงษ์ นนทจันทร์	เลขที่ใบรายงานผล	2026-U053912
		เลขที่งาน	2026-003436
		หมายเลขปฏิบัติการ	T26AN737-0006 - T26AN737-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)		
	13 - 14 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0006		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.2	85.1	49.7
08:00-09:00 น.	61.3	89.5	49.0
09:00-10:00 น.	59.9	85.0	50.2
10:00-11:00 น.	56.7	76.4	51.7
11:00-12:00 น.	57.3	78.5	50.4
12:00-13:00 น.	58.8	79.1	49.4
13:00-14:00 น.	56.8	79.5	48.6
14:00-15:00 น.	57.2	77.6	48.8
15:00-16:00 น.	59.2	76.7	49.9
16:00-17:00 น.	58.2	78.6	49.6
17:00-18:00 น.	60.7	91.7	49.9
18:00-19:00 น.	61.9	87.6	45.8
19:00-20:00 น.	48.9	75.2	45.2
20:00-21:00 น.	53.3	81.9	45.0
21:00-22:00 น.	54.3	78.4	45.2
22:00-23:00 น.	51.4	77.1	47.0
23:00-00:00 น.	51.8	79.9	47.1
00:00-01:00 น.	52.0	85.7	44.0
01:00-02:00 น.	51.4	82.7	43.2
02:00-03:00 น.	50.8	79.6	42.3
03:00-04:00 น.	53.3	77.9	42.2
04:00-05:00 น.	60.4	82.0	42.7
05:00-06:00 น.	60.3	80.3	49.5
06:00-07:00 น.	59.9	81.8	49.2
L _{Aeq} 24 hours		57.8	
L _{Adn}		63.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)		
	14 - 15 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.6	84.8	49.9
08:00-09:00 น.	55.6	76.0	50.6
09:00-10:00 น.	57.0	74.7	51.0
10:00-11:00 น.	57.5	90.6	49.0
11:00-12:00 น.	56.5	79.3	46.8
12:00-13:00 น.	56.3	78.7	46.6
13:00-14:00 น.	59.8	85.3	47.4
14:00-15:00 น.	57.8	78.2	49.6
15:00-16:00 น.	59.2	85.6	49.7
16:00-17:00 น.	58.7	78.1	48.6
17:00-18:00 น.	60.0	80.5	49.9
18:00-19:00 น.	60.0	80.7	49.5
19:00-20:00 น.	52.2	70.1	45.9
20:00-21:00 น.	51.0	76.4	45.0
21:00-22:00 น.	49.8	82.7	44.0
22:00-23:00 น.	52.2	82.0	42.5
23:00-00:00 น.	64.8	77.3	42.4
00:00-01:00 น.	60.4	75.6	45.3
01:00-02:00 น.	52.2	82.1	44.4
02:00-03:00 น.	50.7	76.6	47.3
03:00-04:00 น.	58.1	85.5	51.4
04:00-05:00 น.	59.1	84.0	46.5
05:00-06:00 น.	60.2	81.8	43.8
06:00-07:00 น.	61.0	83.8	50.8
L _{Aeq} 24 hours		58.5	
L _{Adn}		65.8	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)		
	15 - 16 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.4	83.7	50.1
08:00-09:00 น.	60.1	82.4	48.9
09:00-10:00 น.	58.8	83.2	47.6
10:00-11:00 น.	55.6	80.2	47.8
11:00-12:00 น.	57.6	80.0	48.8
12:00-13:00 น.	57.0	83.9	48.7
13:00-14:00 น.	55.5	73.9	48.4
14:00-15:00 น.	56.2	76.5	48.6
15:00-16:00 น.	57.3	82.1	48.6
16:00-17:00 น.	58.9	81.2	48.5
17:00-18:00 น.	60.1	83.1	48.9
18:00-19:00 น.	57.4	80.2	49.8
19:00-20:00 น.	60.4	85.9	47.1
20:00-21:00 น.	59.6	80.7	49.9
21:00-22:00 น.	52.9	77.2	46.8
22:00-23:00 น.	50.1	77.7	47.6
23:00-00:00 น.	53.5	83.7	49.0
00:00-01:00 น.	51.5	82.6	49.4
01:00-02:00 น.	50.3	70.4	49.2
02:00-03:00 น.	52.8	72.1	49.2
03:00-04:00 น.	59.4	82.0	49.2
04:00-05:00 น.	52.0	77.9	48.3
05:00-06:00 น.	60.2	82.2	48.2
06:00-07:00 น.	59.6	87.7	51.2
L _{Aeq} 24 hours	57.5		
L _{Adn}	62.9		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)		
	16 - 17 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.5	79.8	50.4
08:00-09:00 น.	60.7	82.0	50.1
09:00-10:00 น.	56.9	81.0	48.1
10:00-11:00 น.	55.7	74.7	48.2
11:00-12:00 น.	58.9	83.4	48.1
12:00-13:00 น.	56.5	82.1	47.6
13:00-14:00 น.	58.1	78.9	48.3
14:00-15:00 น.	57.3	78.4	48.2
15:00-16:00 น.	57.0	76.3	48.1
16:00-17:00 น.	61.7	78.7	48.6
17:00-18:00 น.	58.3	81.7	48.5
18:00-19:00 น.	59.3	76.8	51.7
19:00-20:00 น.	55.2	77.9	50.0
20:00-21:00 น.	51.1	78.9	48.2
21:00-22:00 น.	53.4	79.1	48.3
22:00-23:00 น.	55.6	79.2	48.4
23:00-00:00 น.	52.7	84.0	48.0
00:00-01:00 น.	50.4	78.1	47.2
01:00-02:00 น.	51.6	80.8	45.7
02:00-03:00 น.	53.8	80.1	45.7
03:00-04:00 น.	56.0	79.3	45.7
04:00-05:00 น.	53.2	78.3	47.1
05:00-06:00 น.	61.4	82.5	46.8
06:00-07:00 น.	59.8	83.8	50.7
L _{Aeq} 24 hours	57.4		
L _{Adn}	63.1		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงและการควบคุมการเดินรถ)		
	17 - 18 มิถุนายน 2569		
	T26AN737-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.9	79.3	50.8
08:00-09:00 น.	61.1	87.6	49.5
09:00-10:00 น.	66.5	91.8	48.7
10:00-11:00 น.	56.6	76.8	49.4
11:00-12:00 น.	57.0	80.2	48.7
12:00-13:00 น.	58.5	79.5	49.8
13:00-14:00 น.	59.0	79.4	50.3
14:00-15:00 น.	58.2	88.3	50.1
15:00-16:00 น.	61.6	79.8	52.1
16:00-17:00 น.	59.1	81.5	49.1
17:00-18:00 น.	62.7	83.0	49.6
18:00-19:00 น.	60.2	84.4	47.5
19:00-20:00 น.	51.7	77.2	46.9
20:00-21:00 น.	51.3	78.2	46.7
21:00-22:00 น.	50.8	79.1	46.5
22:00-23:00 น.	49.0	62.4	48.0
23:00-00:00 น.	49.8	72.0	46.7
00:00-01:00 น.	51.5	79.7	45.1
01:00-02:00 น.	49.6	72.3	44.8
02:00-03:00 น.	47.6	64.9	44.5
03:00-04:00 น.	59.3	86.0	44.5
04:00-05:00 น.	58.7	80.8	44.9
05:00-06:00 น.	57.9	79.9	47.7
06:00-07:00 น.	59.1	81.7	50.0
L _{Aeq} 24 hours	59.0		
L _{Adn}	63.2		

หมายเหตุ :

** ISO 1996-2 : 2017

** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง วิธีการคำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540

** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548


** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง จากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิด ในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567



(นายศิลา บรรจงไกรภักดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก ค-3

ผลวิเคราะห์การติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง






การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณโรงเรียนหอวัง ในปี พ.ศ. 2569

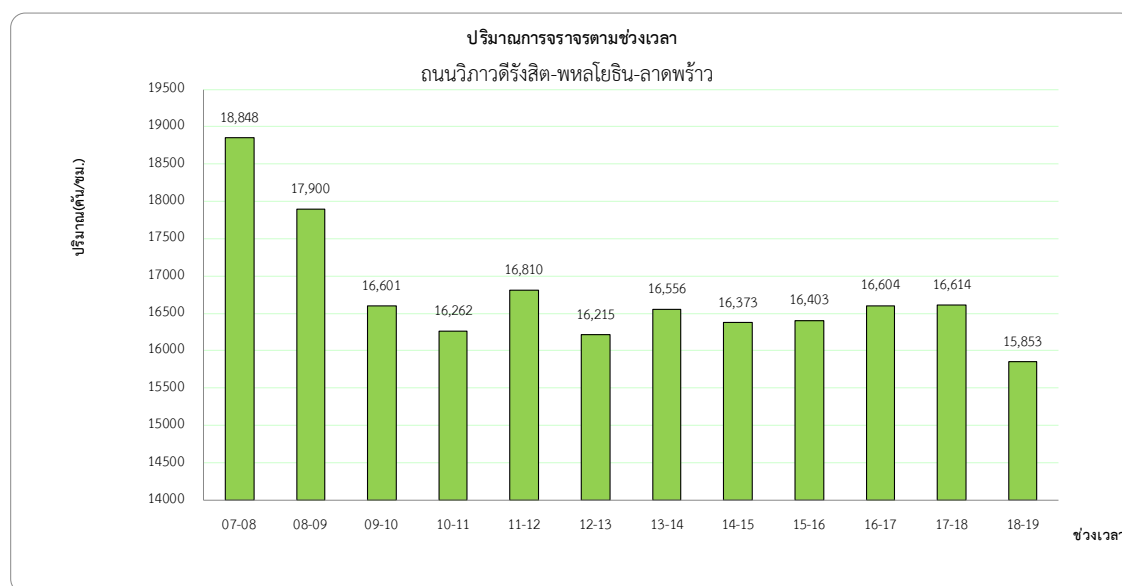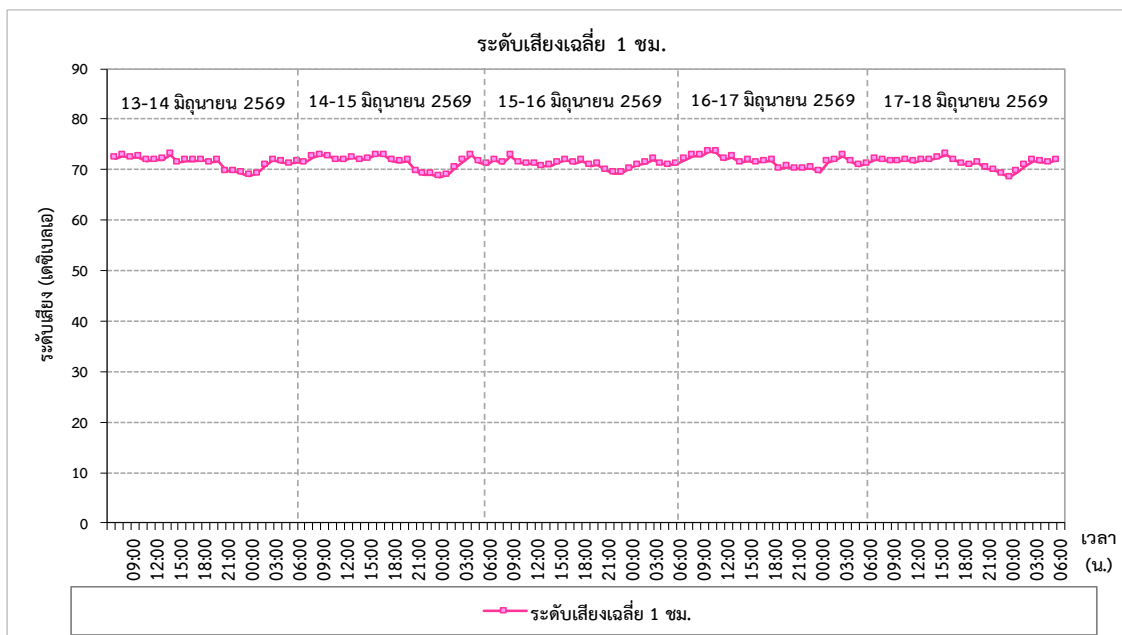

ที่มา : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2569

จากปริมาณจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต-พหลโยธิน-ลาดพร้าว ซึ่งพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงโมงเร่งด่วนเช้า (07:00-08:00) ที่ปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง โดยทั่วไปพบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 1\ hour}$) มีค่าใกล้เคียง 70 เดซิเบล และมากกว่า 70 เดซิเบลเอ ตลอดทั้งวัน ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 68.4-73.6 เดซิเบลเอ ดังนั้น ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่เกินมาตรฐานจึงมีสาเหตุหลักมาจากระดับเสียงจากจราจรบริเวณดังกล่าว




การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณสถานีรัชโยธิน ในปี พ.ศ. 2569

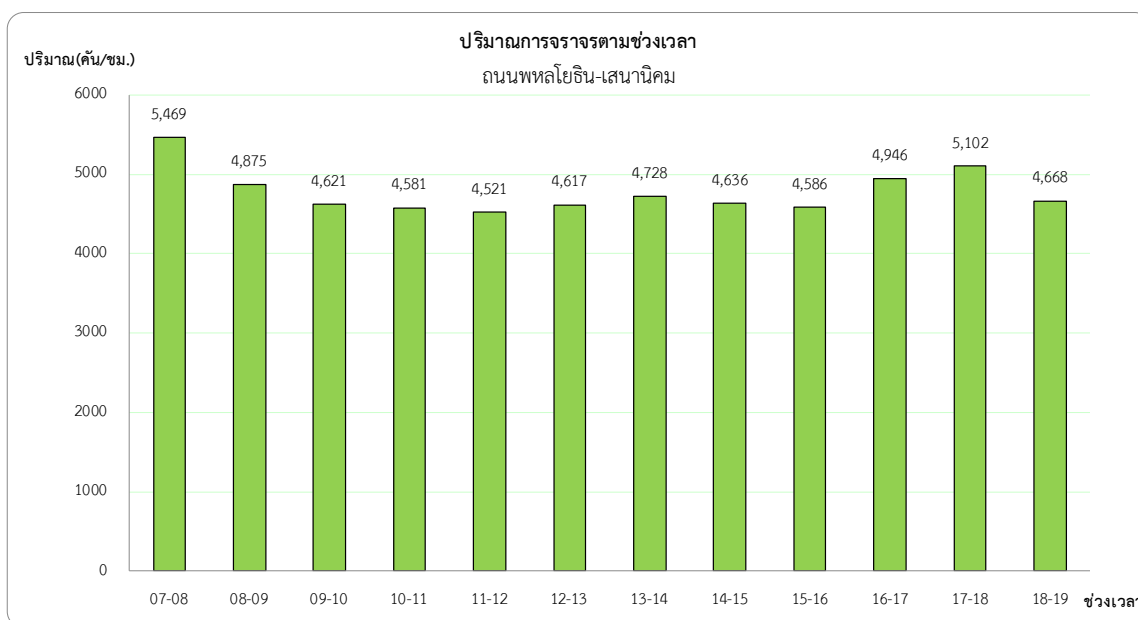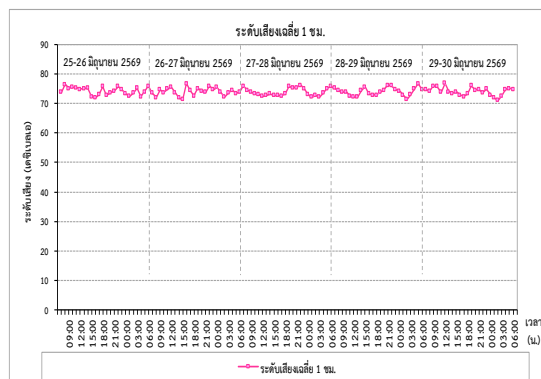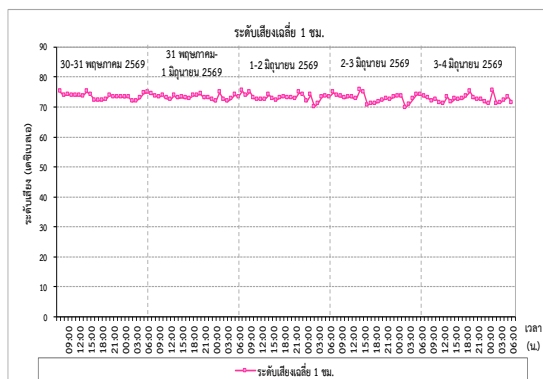

ที่มา : สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2569

จากปริมาณจราจรบริเวณถนนพหลโยธิน-เสนานิคม ซึ่งพบว่าปริมาณจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (07:00-08:00) และเย็น (16:00-19:00) ที่ปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง โดยทั่วไปพบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{Aeq,1\text{ hour}}$) มีค่ามากกว่า 70 เดซิเบลเอ ตลอดทั้งวัน ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 69.8-76.8 เดซิเบลเอ ดังนั้น ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่เกินมาตรฐานจึงมีสาเหตุหลักมาจากระดับเสียงจากจราจรบริเวณดังกล่าว

การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณสถานีสายหยุด ในปี พ.ศ. 2569

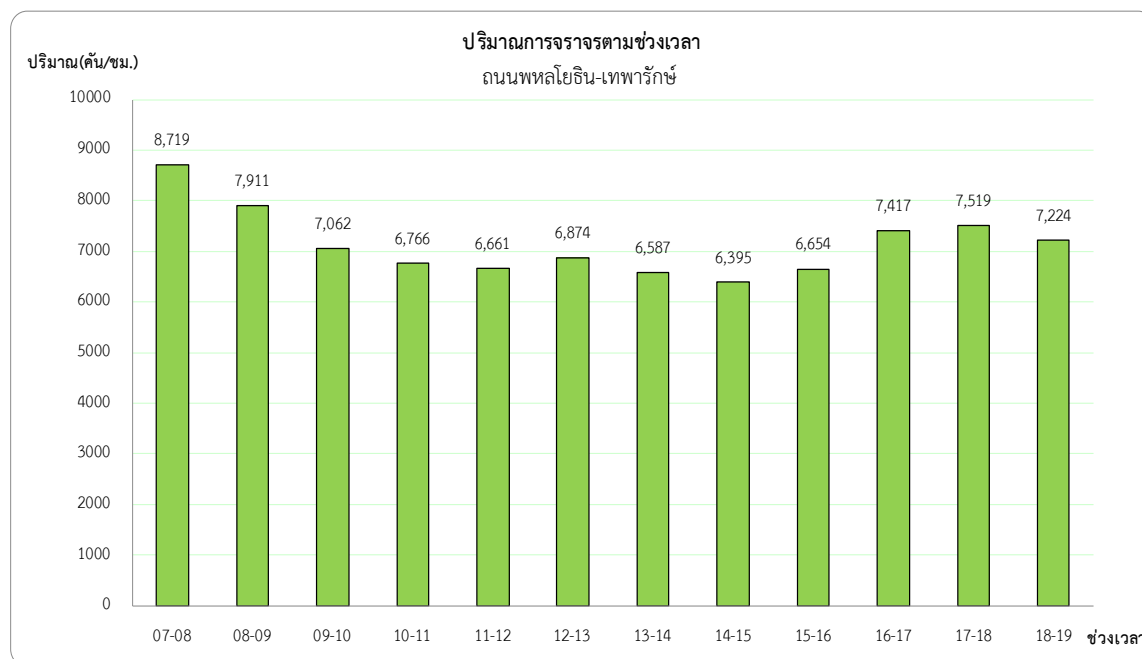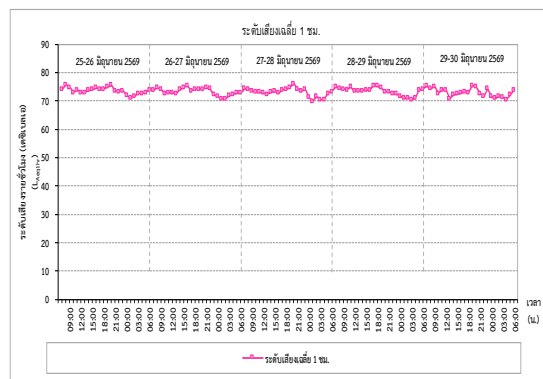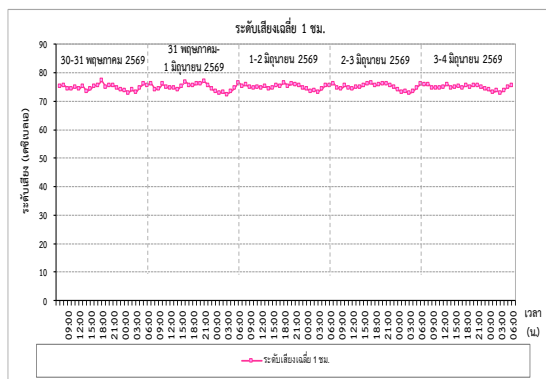


ที่มา : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2569

จากปริมาณจราจรบริเวณถนนพหลโยธิน-เทพารักษ์ ซึ่งพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (07:00-08:00) และเย็น (16:00-19:00) ที่ปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปพบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hour) มีค่ามากกว่า 70 เดซิเบลเอ ตลอดทั้งวัน ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 69.9-77.3 เดซิเบลเอ ดังนั้น ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่เกินมาตรฐานจึงมีสาเหตุหลักมาจากจากระดับเสียงจากจราจรบริเวณดังกล่าว

ภาคผนวก ค-4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการไฟฟ้าสายสี่เขียฯ ช่วงหมอนิด-สะพานใหม่-คูคต				
ชื่อลูกค้า	: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร				
ที่อยู่	: 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com				
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: บ่อพักน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถ				
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำทิ้ง	วันที่รับตัวอย่าง	: 29 พฤษภาคม 2569		
วันที่เก็บ	: 29 พฤษภาคม 2569	วันที่วิเคราะห์	: 29 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2569		
เวลาเก็บ	: 13:25 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 15 มิถุนายน 2569		
วิธีเก็บ	: จ้างเก็บ 1 ครั้ง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U050375		
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายวิรัช โมกแก้ว	เลขที่งาน	: 2026-003436		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวณภาพร ชื่นเกษม	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AL836-0001		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			น้ำทิ้ง T26AL836-0001			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	8.3 (32.2°C)	5.5-9.0	-	-
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.2	≤ 40	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O G	5.1	-	0.5	-
บีโอดี ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	2.8	≤ 20	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	< 5.0	≤ 50	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	298	≤ 3,000	-	25
น้ำมันและไขมัน ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 5	-	3
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	7,900	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a: อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b: อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c: รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 129 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559




(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ภาคผนวก ค-5

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองหกวา ก่อนจุดที่มีการระบายน้ำทิ้งจากศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถ
ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน วันที่รับตัวอย่าง : 29 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บ : 29 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 29 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บ : 14:10 น. วันที่ออกรายงานผล : 12 มิถุนายน 2569
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U050347
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวิรัช โภกแก้ว เลขที่งาน : 2026-003436
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวณภาพ ชื่นนุกุลย์ หมายเลขปฏิบัติการ : T26AL837-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย T26AL837-0001	ขีดจำกัดค่าสุด ของการ์ด	ค่าต่ำสุด ที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	8.1 (32.4°C)	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.4	-	-
ความลึก ^c	เมตร	DEPTH GAUGE	1.5	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	7.9	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	15.4	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	16.4	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	267	-	25
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	3
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็มต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	24,000	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน		เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ชื่อลูกค้า : สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-444-2953 อีเมล : tomadknight@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองหกวา หลังจุดที่มีการระบายน้ำทิ้งจากศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถ
ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน วันที่รับตัวอย่าง : 29 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บ : 29 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 29 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บ : 14:25 น. วันที่ออกรายงานผล : 12 มิถุนายน 2569
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U050348
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวิรัช โภกแก้ว เลขที่งาน : 2026-003436
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวณภาพ ชื่นนุกุลย์ หมายเลขปฏิบัติการ : T26AL837-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย T26AL837-0002	ขีดจำกัดค่าสุด ของการ์ด	ค่าต่ำสุด ที่สามารถวัดได้
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.8 (32.8°C)	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	32.8	-	-
ความลึก ^c	เมตร	DEPTH GAUGE	1.5	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	6.5	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	14.0	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	14.6	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	273	-	25
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	3
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็มต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	13,000	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน		เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

