

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 หนังสือเห็นชอบจาก สผ.
(ทส 1009.5/27232 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2568)
- ภาคผนวกที่ 2 ใบอนุญาตการก่อสร้าง (แบบ ขผ. 4)
- ภาคผนวกที่ 3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
- ภาคผนวกที่ 4 Lay Out Site + ตำแหน่งเครื่องจักร
- ภาคผนวกที่ 5 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร
- ภาคผนวกที่ 6 คู่มือความปลอดภัย
- ภาคผนวกที่ 7 กฎระเบียบภายในโครงการ
- ภาคผนวกที่ 8 เอกสารสำรวจบ้านข้างเคียง
- ภาคผนวกที่ 9 เอกสารบันทึกการทำงาน
- ภาคผนวกที่ 10 ใบอนุญาตผู้ควบคุมเครน
- ภาคผนวกที่ 11 แผนงานความปลอดภัย
- ภาคผนวกที่ 12 เบอร์ตัดต่อฉุกเฉิน
- ภาคผนวกที่ 13 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ภาคผนวกที่ 14 แผนงานการก่อสร้าง
- ภาคผนวกที่ 15 ชี้แจงผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ภาคผนวกที่ 16 เอกสารการขอใช้สถานที่
- ภาคผนวกที่ 17 ทะเบียนประวัติคนงาน
- ภาคผนวกที่ 18 Green List



ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 19 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 20 ผลการตรวจวัดควันดำ
- ภาคผนวกที่ 21 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
- ภาคผนวกที่ 22 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
- ภาคผนวกที่ 23 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวกที่ 24 กรมธรรม์ประกันภัย
- ภาคผนวกที่ 25 หลักฐานการส่งรายสัปดาห์ให้กับเขตหลักสี่
- ภาคผนวกที่ 26 แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม





ภาคผนวกที่ 1

หนังสือเห็นชอบจาก สผ.

(ทส 1009.5/27232 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2568)



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๗ ๒ ๓๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.๐๒/๖๘-๐๖๔
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๒/๕๔๔
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE
CHAENGWATTANA-LAKSI) ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอ็น. เอส.
คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย เซนส์
แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๒
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวน
ห้องชุดพักอาศัย ๓๒๘ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุม
ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE
CHAENGWATTANA-LAKSI) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง
แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป

และหากได้รับ...

และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๙๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
N.S. CONSULTANT CO., LTD.

TEL : 0-2944-6617

E-mail : ns_consult@hotmail.com, ns_consult@yahoo.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

126/196-197 (ZONE A) ซอธรามอินทรา 40
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230

126/196-197 (ZONE A) SOI RAM INTTRA 40, NUANCHAN,
BUENGRUM, BANGKOK

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 8581 วันที่ 30 มี.ย. 2563
เวลา 13.58 ได้รับ

ที่ ดล.๐๒/๖๘-๐๖๔

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่
(SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับหลัก

จำนวน ๖ ชุด

๓. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive)

จำนวน ๑ อัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับหลัก

๔. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ที่ ดล.๐๒/๖๘-๐๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ที่ ดล.๐๒/๖๘-๐๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การรับมอบอำนาจสำเร็จ ดังปรากฏในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ ๑๗/๒๕๖๕ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับจัดทำรายงานฯ โครงการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งมายังท่าน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๑ อัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. และ ๓. พร้อมกันนี้ บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการเสนอรายงานฯ ฉบับดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแล้ว ดังปรากฏในสำเนาหนังสือส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔. และ ๕. โดยบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบและยอมรับผลการประเมินผลกระทบและมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

๒๕

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ปรึกษาและออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม



สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ ๗๔๗๑	วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๑๔	ผู้รับ วัฒนา

ที่ กท ๑๑๐๒/๕๕๙

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดินและบริกรรมชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่
(SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/๑๕๐๒๕
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE
CHAENGWATTANA-LAKSI) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผล
การตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย
เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคาร
อยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๓๒๘ ห้อง เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำเสนอให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริกรรมชุมชน กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

กรุงเทพมหานครได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย เซนส์
แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
อย่างเคร่งครัด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทิพย์ จิรังประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eiabkk@gmail.com

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ตั้งอยู่ที่ ซอยแຈ้งวัฒนะ 10 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

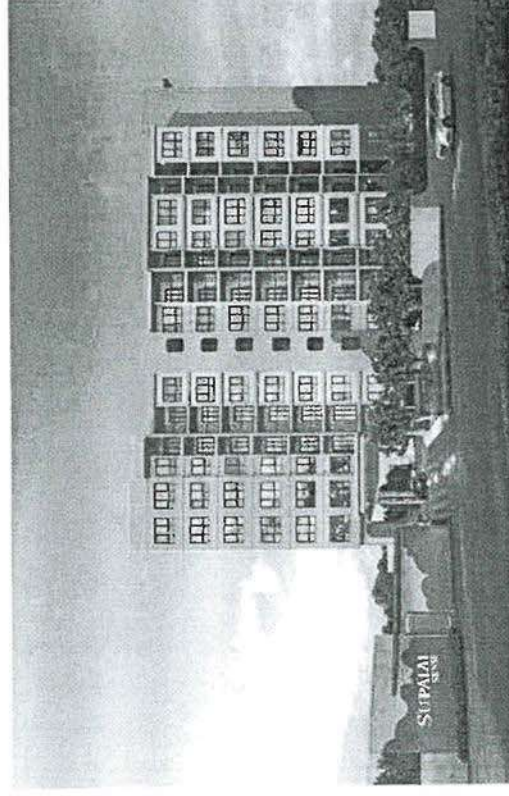

ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทรเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พิณพชร)


(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคลากรรวมเดาผู้สืบสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยแอ็งวัฒนะ 10 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภท อาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวน ห้องชุดรวม 328 ห้อง และอาคารห้องเครื่องสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ดำเนินการบนพื้นที่ 2-3-21.8 ไร่ (หรือ 4,487.2 ตารางเมตร) โดยที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ประเภทที่ดินของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ ได้แก่ ห้องออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำ จัดที่จอดรถยนต์จำนวน 132 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 17 คัน			
	1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาโครงการ ก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568



(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

(นางสุกัญญา ย่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการ สุภลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลารื้อถอน ก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบไปแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ อนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล- กระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลารื้อถอน ก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทรเจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการ ศุภลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	รับจัดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจัดแจ้งไว้ แจงให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาฯ (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
4.	เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับ เจ้าของสิทธิรายใหม่ (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ เจ้าของสิทธิรายใหม่ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาโครงการ ก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568



(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพิชิตา พินเพชร)

กรรมการผู้มีอำนาจนามบริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการ ศุภลัย เซนส์ จังหวัดพะเยา-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการ ไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักกฎหมายการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ดังกล่าวของเจ้าของโครงการ ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและ หน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด			
	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือราคาจากกิจกรรมการ ดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ใน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และ แจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ ก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการในระยะประชิดติดโครงการ และระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตหลักสี่ และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ	1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ ในการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI) ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวม 328 ห้อง และอาคารห้องเครื่องสูง 1 ชั้น	อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเริ่มการรื้อถอน และเปิดดำเนินการ	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด



ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แঙ্গวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	จำนวน 1 อาคาร ดำเนินการบนพื้นที่ 2-3-21.8 ไร่ (หรือ 4,487.2 ตารางเมตร) โดย ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบก่อนที่มีการก่อสร้าง และเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วง พร้อมทั้งระบุอย่างน้อย ดังนี้ 1) ชื่อโครงการ 2) เจ้าของโครงการ 3) ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 4) ระยะเวลาการก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดด้วยวันและเวลาการทำงาน 6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 7) สถาปนิกโครงการ 8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส..... ลงวันที่.....)			



ธันวาคม 2568

(นายกริชวิทย์ ทรัพย์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ศุภาลัย จำกัด

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการ สุภาลัย เซนส์ แঙ্গวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	11) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็น 12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 14) ผังรับเรื่องร้องเรียน 15) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน 16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง 18) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น			
	2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานแจ้งประจักษ์ และดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 1) เอกสารตารางสรุป และตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้บ้าน/อาคารข้างเคียงติดโครงการ และบ้าน/อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่	- อาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



วันทาคม 2568

วันทาคม 2568

CH QM

(นายวิช จันทรเจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พินพชร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการ สุภลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 7)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ 2) เอกสารรายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการขอเสนอแนะผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหายให้บ้าน/อาคารข้างเคียงติดโครงการ และบ้าน/อาคารในพื้นที่ รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ			

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตหลักสี่
ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่ส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แง้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.1 ภูมิประเทศ	ในการรื้อถอนพื้นที่คอนกรีตที่มีอยู่ภายในโครงการพื้นที่ 3,391.60 ตารางเมตร ความหนา 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตร 339.16 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง โดยโครงการจะนำคอนกรีตจากกรรื้อถอนมาถมพื้นที่โครงการในส่วนที่เป็นถนน (sub base) โดยไม่มีคอนกรีตรื้อถอนที่ต้องขนออกจากโครงการ อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดมาตรการฯ ดังนี้ - จัดให้มีการติดตั้งรั้วทึบกันฝุ่น (Metal Sheet) ที่ความสูง 6 เมตร และติดตั้ง Mesh Sheet เพิ่มอีก 2 เมตร ตามแนวเขตที่ดินของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1.2 ทรัพยากรดิน	-	-	-
1.3 ทรัพยากรน้ำ	-	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ	1. จัดให้มีการปูนบนทางเข้า-ออกภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ด้วยแอสฟัลต์ หรือ คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพสมบูรณ์ 2. รอยยนต์ตั้งแต่รถที่เข้า - ออก ในพื้นที่ก่อสร้างต้องลงทะเบียน Green List (6 ล้อ ขึ้นไป) และ Green List Plus (4 ล้อขึ้นไป) ยกเว้น รถ EURO 5, EURO 6, รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ (NGV) และ รถยนต์ไฟฟ้า (EV)	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินดา พิมพ์อร)

(นางสุกัญญา อุบัพพันศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักลี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดให้มีป้ายประกาศ โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัท รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมการก่อสร้าง หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง 4. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้างให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบ โดยแจ้งผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ติดไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อให้ชุมชนโดยรอบมั่นใจและร่วมตรวจสอบได้ว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เสนอไว้จริง ขณะเดียวกันผลการตรวจวัดต่างๆ ที่แจ้งให้ทราบจะช่วยเหลือข้อห่วงกังวลของชุมชนโดยรอบว่า ผลกระทบที่เคยห่วงกังวลนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว 5. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการและเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน โดยแต่งตั้งก่อนเริ่มรื้อถอนโครงการและครอบคลุมไปถึงระยะก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ 6. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนรื้อถอนพื้นที่คอนกรีต โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการโครงการ และโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการมีโครงการ ตั้งแต่เริ่มรื้อถอนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี และให้รับ		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แร้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการเจรจากับผู้ได้รับความเสียหายทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบ และบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) 8. กำหนดเวลาในการรื้อถอนโดยให้ทำงานในระยะเวลา 08.00-17.00 น. หยุดในวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 9. จัดพนักงานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งในช่วงเช้าก่อนเริ่มงาน และช่วงเย็นก่อนเลิกงานอีกครั้ง ทั้งนี้บริเวณที่จะทำการรื้อถอนนั้นคอนกรีตได้ฉีดพรมน้ำก่อนทุกครั้ง และหากพบว่ายังมีฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะทำการรื้อถอน ให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำเป็นทุก 1-2 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างาน 10. เศษวัสดุเหลือใช้ หุ่นคอนกรีตที่รื้อถอนออก ต้องไม่มีการเก็บกองไว้ภายในพื้นที่หน้างานเกินกว่า 3 วัน โดยต้องจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดยังแหล่งรองรับ เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและของเสียมีสภาพ 11. กำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุจากอาคารรื้อถอนหลีกเลี่ยงการขนส่งในระหว่างเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งระยะเวลา 09.00-15.00 น. และใช้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดไม่เกิน 6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 15 ตัน เพื่อลดผลกระทบจากการขนย้าย ต่อการจราจรภายนอก และจัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของเศษวัสดุรื้อถอนที่พ่นออกไป 12. จัดทำระบบบันทึกข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นและของจากอาคารรื้อถอน และระบุแนวทางแก้ไข ผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวได้เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ 13. กำหนดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างก่อนที่จะนำมาใช้งานไม่เกิน 3 เดือน หากเกินค่ามาตรฐานจะต้องปรับปรุงก่อนหรือห้ามนำมาใช้ในการ		



ธันวาคม 2563

(นายศรีชัย จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะย่อยโครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ก่อสร้าง และในระหว่างทำการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยการจัดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน 14. หากต้องการขอยกเว้นมาตรการเขตมลพิษค่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Low Emission Zone) จัดทำโดยกรุงเทพมหานคร สำหรับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป จะต้องทำการลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ผ่านทาง https://bit.ly/47RKOYy โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบัญชีสีเขียวประกอบการขอยกเว้นมาตรการเขตมลพิษค่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ากระบวนการบำรุงรักษา อาทิ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนไส้กรองอากาศ และการติดตั้งตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF) เป็นต้น 15. กำหนดมาตรการฯ ติดตั้งระบบตรวจวัดฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM2.5 มีรายละเอียด ดังนี้ 15.1 จัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐาน เป็นแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแสดงผลด้วยระบบ Real Time จำนวน 2 แห่ง บริเวณกลางพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณทิศเหนือติดถนนซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 (เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง) และให้ติดตามค่าที่ตรวจวัดจากเครื่องมือตรวจวัดแบบ Sensor และการแสดงผลแบบ Real Time และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการ เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลฝุ่น และมีป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโครงการ (อย่างน้อย 2 แห่ง) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีระดับค่าใกล้ค่ามาตรฐาน ให้ทีมงานสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย Safety Engineer และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ตรวจสอบหาสาเหตุและเร่งแก้ไขโดยทันที 15.2 กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยผู้รับผิดชอบอ่านผล และส่งการ คือ Safety Engineer ทั้งนี้ เมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใกล้กับเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ดังนี้		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ ศุภลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1) ผู้ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) : เมื่อค่าที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 33.75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานกำหนดไว้ที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม หรือพบทุนจำนวน/ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง และหามาตรการฯ ในการจัดการ 2) ผู้ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) : เมื่อค่าที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 0.108 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม หรือพบทุนจำนวน/ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง และหามาตรการฯ ในการจัดการ 3) ในการนี้พบว่าค่าฝุ่นจากเครื่องจักรวัดแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแสดงผลด้วยระบบ Real Time เท่ากับค่ามาตรฐานคือ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้ safety engineer สั่งการให้หยุดการทำงานชั่วคราว อย่างน้อย 30 นาที เพื่อเร่งหาสาเหตุและดูแลแนวโน้มของสถานการณ์ และเริ่มดำเนินการต่อไปได้เมื่อมีค่าลดลงต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 4) ให้มีการบันทึกกิจกรรมการก่อสร้าง และค่าจากการตรวจวัดอากาศ ด้วย Sensor ในแต่ละวันโดย Safety Engineer เพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน 5) กรณีที่การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีมาตรฐานมีค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างโครงการทำการทบทวน และปรับแผนกิจกรรมการก่อสร้างจากบันทึกกิจกรรมที่ Safety Engineer บันทึกไว้ เพื่อวางแผนไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต และจัดทำบันทึกในรายงานมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (monitor)		



ธันวาคม 2568

(นายสุริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา หินพวย)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลัสี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 5)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 เสียง และกลิ่นเสีย	1. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการและเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน โดยแต่งตั้งก่อนเริ่มรื้อถอนและครอบคลุมไปถึงระยะก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ 2. ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นที่โครงการโดยรอบอย่างน้อย 1 เดือนก่อนรื้อถอน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการโครงการ และโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการมีโครงการ ตั้งแต่เริ่มรื้อถอนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี และให้รับผิดชอบการเจรจากับผู้ได้รับความเสียหายทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบ และบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) 4. จัดให้มีการให้เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียงร่วมกับเจ้าของอาคารรวมทั้งถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการรื้อถอน 5. จำกัดระยะเวลาการรื้อถอนเวลา 08.00-17.00 น. และหยุดในวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 6. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดขึ้นจากการรื้อถอน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการตลอดระยะเวลา รื้อถอน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยเปิดตู้ทุกวัน หากพบเรื่องร้องเรียนให้เข้าไปเจรจาเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น และชดเชยค่าเสียหายให้ทันที	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้อำนวยการนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แง้วฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	7. กำหนดในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมามาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชุดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีอย่างเป็นธรรม หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน รื้อถอนเกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้ 8. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลด การปล่อยสารพิษ แรงสั่นสะเทือน และเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ 9. กำหนดเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 10. จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งเข้า-ออก โครงการไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และบนทางหลวงต้องไม่ เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 11. กำหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตขนาดไม่เกิน 6 ล้อ และบรรทุกน้ำหนัก รวมไม่เกิน 15 ตัน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด 12. กำหนดให้ติดตั้งกำแพงกันเสียง ชั้นที่ 1 เป็น แผ่น BLOXTEG (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ที่มีความสามารถลดระดับเสียงลงได้ 48.3 เดซิเบล (เอ) สูง 3 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิด 1.5 เมตร และกำแพงกันเสียง ชั้นที่ 2 เป็นแผงลึซึท ที่มีความสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 เดซิเบล (เอ) สูง 6 เมตร ที่ติดตั้งรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ		



จำนวน 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2568

(นางสาวปิธดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 7)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	13. กำหนดมาตรการฯ ติดตั้งระบบตรวจวัดเสียง มีรายละเอียด ดังนี้ 13.1 ให้โครงการติดตั้งเครื่องวัดที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบ Sensor วัดระดับความดังของเสียงแบบเรียลไทม์ ไว้บริเวณทิศเหนือของโครงการ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบอ่านผลและส่งการ คือ Safety Engineer โดยตั้งค่าเตือนแบบเรียลไทม์ (Warning Level) เมื่อระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะนั้นเท่ากับ 70 dB(A) ในช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 8.00-17.00 น. (8 ชั่วโมง) ดังนี้ (1) เมื่อระบบแจ้งเตือนการทำงานที่ระดับเสียงตรวจวัด 70 dB(A) ครั้งที่ 1 ให้ Safety Engineer แจ้งต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นผู้รับผิดชอบสั่งการให้พบพวนขึ้นขั้นตอนการทำงานก่อสร้าง โดยปรับลดกิจกรรมที่มีเสียงดัง ลดจำนวนอุปกรณ์การก่อสร้างลงบางส่วน รวมถึงให้ตรวจสอบตำแหน่งของกำแพงกันเสียงให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยดำเนินการภายในระยะเวลา 30 นาที และติดตามตรวจสอบระดับเสียงจาก Sensor วัดระดับความดังของเสียงแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง (2) หากระบบแจ้งเตือนทำงานที่ระดับเสียงตรวจวัด 70 dB(A) ครั้งที่ 2 แสดงว่าการแก้ไขปัญหานี้ทางต้นทางยังไม่เพียงพอ ให้ Safety Engineer แจ้งต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเพื่อหยุดกิจกรรมที่มีเสียงดังทันที และทำการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง ความสมบูรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงความเรียบร้อยของกำแพงกันเสียง โดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง และต้องติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 13.2 ให้มีการบันทึกกิจกรรมการก่อสร้าง และค่าจากการตรวจวัดอากาศ และเสียงด้วย Sensor ในแต่ละวัน โดย Safety Engineer เพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พัฒนพยุร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แง้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 8)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ในระดับที่เกินมาตรฐาน 13.3 กรณีที่การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียงด้วยวิธีมาตรฐานมีค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างโครงการทำการทบทวน และปรับแผนกิจกรรมการก่อสร้างจากบันทึกกิจกรรมที่ Safety Engineer บันทึกไว้ เพื่อวางแผนไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต 13.4 ให้ติดตั้งจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ เป็นการแสดงความสั่นสะเทือนจากเซ็นเซอร์ในพื้นที่โครงการ ที่กำหนดจุดตรวจวัดได้ จำนวน 1 จุด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการโดยกำหนดค่าการแจ้งเตือนเมื่อค่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 4.5 มิลลิเมตร/วินาที (90% ของค่ามาตรฐานสำหรับอาคารประเภทที่ 2 กำหนดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมหรือทบทวนจำนวน/ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ทำงานเพื่อตรวจสอบกิจกรรมการรื้อถอน และหามาตรการฯ ในการจัดการ 14. จัดให้มีมาตรการเชิงรุกด้านความสั่นสะเทือนในระยะรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม กับอาคารที่อยู่ในระยะประชิดพื้นที่โครงการ ดังนี้ 14.1 ก่อนดำเนินการรื้อถอน ให้โครงการจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าพบอาคารที่อยู่ในระยะประชิดเพื่อแจ้งรายละเอียดการรื้อถอน รวมถึงแผนการรื้อถอนให้อาคารโดยรอบทราบอย่างชัดเจน และต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบซึ่งสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และช่องทางการประสานงานต่างๆ ที่โครงการจัดให้มีเพื่อให้สามารถแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นได้ทันที		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพชร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ จังหวัดนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 9)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	14.2 อธิบายขั้นตอนการรื้อถอนพื้นที่คอนกรีตเดิมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทราบโดยมีการส่งเป็นเอกสารลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกเหนือจากการแสดงมาตรการฯ ไว้ทางช่องทาง Social Media ที่โครงการจัดไว้ 14.3 ให้ติดตั้งจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ เป็นการแสดงผลของความสัมพันธ์จากเซ็นเซอร์ในพื้นที่โครงการ ที่กำหนดจุดตรวจวัดได้ จำนวน 1 จุด ทางทิศตะวันออกของโครงการโดยกำหนดค่าการแจ้งเตือนเมื่อค่าความสัมพันธ์ที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 4.5 มิลลิเมตร/วินาที (90% ของค่ามาตรฐานสำหรับอาคารประเภทที่ 2 กำหนดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) ให้เจ้าหน้าที่โครงการทำหน้าที่เฝ้าระวังขณะรื้อถอนพื้นที่คอนกรีตแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมหรือพบพบพหุนาน/ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ทำงาน เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการรื้อถอน และหามาตรการฯ ในการจัดการ 15. จัดให้มีการบันทึกการทำงานในแต่ละวันของการทำงาน เพื่อตรวจสอบว่า ในกรณีวันที่ผล การตรวจวัดเกินค่ามาตรฐาน สอดคล้องกับกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรใด เพื่อจะได้วางแผนการทำงาน ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านเสียง อากาศ ความสั่นสะเทือน ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีกในอนาคต โดยผู้รับผิดชอบอ่านผลและสั่งการณ คือ Safety Engineer และจัดทำบันทึกในรายงานมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (monitor)		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ ศุภลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.6 ทรัพยากรน้ำ	- ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียที่ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรกจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ	-	-	-
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	-	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์	-	-	-
3.1 การใช้ไม้	- จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ในระยะเวลา รื้อถอนได้อย่างน้อย 1 วัน	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	1. จัดให้มีส่วนสำหรับคนงานจำนวน 5 ห้อง และอ่างล้างมือ 4 อ่าง และจัดให้มีห้องน้ำและอ่างล้างมือสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานจำนวน 1 ห้อง แยกจากห้องน้ำสำหรับคนงานบริเวณพื้นที่โครงการ (ตามมาตราฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีส่วนในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง) 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ มีประสิทธิภาพในการบำบัด	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568



(นายอภิสิทธิ์ จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพิณิดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แง้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 11)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ร้อยละ 92 โดยคุณภาพน้ำทั้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 1. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำที่ไหลบ่าหน้าดินลงปอดักตะกอน ก่อนสูบไปรดพื้นที่ก่อสร้าง ล้างอุปกรณ์ และล้างล้อรถ ส่วนที่เหลือจึงระบายออกนอกโครงการ 2. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะให้ติดตั้งตะแกรงดักขยะ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างรื้อถอน - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการรื้อถอนไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการนำไปขายหรือนำไปถมพื้นที่ก่อสร้างอื่น 2. ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมามาตรการเป็นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ประจำการอยู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างรื้อถอน - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	-	-	-
3.6 การระบายอากาศ	-	-	-
3.7 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร	1. ติดป้ายเตือน "โปรดระมัดระวังพื้นที่ก่อสร้าง" "ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก" ด้านหน้าโครงการ บริเวณที่มองเห็นชัดเจน 2. ปิดท้ายรถบรรทุกในขณะขนส่งวัสดุจากการรื้อถอน เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบไม่มีขีด และหลีกเลี่ยงการขนส่งในระยะชั่วโมงเร่งด่วน	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างรื้อถอน - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	
3.8 การสื่อสาร	-	-	
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	



จำนวน 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)


บุคลากรมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แง้วฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. มูลค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม			
4.2 การสาธารณสุข			
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	1. ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียงร่วมกับเจ้าของอาคาร รวมทั้งถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการรื้อถอน 2. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้พักอาศัยเกี่ยวกับพื้นที่โครงการโดยรอบก่อนรื้อถอน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการและโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ที่แต่งตั้งขึ้นมาก่อนเริ่มดำเนินการรื้อถอนเข้าเจรจากับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 3. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดขึ้นจากการรื้อถอน ไว้หน้าที่พื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการรื้อถอน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเปิดตู้ทุกวัน หากพบเรื่องร้องเรียนให้เข้าไปเจรจากับความเสียหายที่เกิดขึ้น และขอใช้ค่าเสียหายให้ทันที 4. การพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างต้องพิจารณาความสามารถการรักษามาสปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมารื้อถอนจะต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ	- คลอระยะเวลาการรื้อถอน - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	





ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568



(นายไตรย จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะร่อน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แง้วัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ทั้งนี้ จะดองกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ - กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ - การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 5. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือนและจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่มิเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ร่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 6. ให้ผู้รับเหมามาปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้โครงการควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 7. ให้ผู้รับเหมามอบชี้แจงมาตรการความปลอดภัยหรือจัดหาคู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ยิ่งขึ้น 8. ให้ผู้รับเหมากำหนดงานคอยรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กำลังร่อน รวมถึงการเก็บกองเศษสิ่งก่อสร้างที่ร่อนไม่ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 9. ให้มียานและเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 10. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดเพื่อการร่อนในพื้นที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการนั้นจะต้องจัดให้มีที่สำหรับการติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างภายในเขตที่ดินโครงการเท่านั้น		



จำนวน 2568

จำนวน 2568



(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพิตา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แฉงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 14)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 ที่ศัณียภาพ และ สุนทรียภาพ	1. ให้ดูแลจัดการบริเวณพื้นที่รื้อถอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 2. จัดให้มีแนวรั้ว สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ โดยใช้รั้ว metal sheet สีเขียว เพื่อป้องกันคน อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรื้อถอนพื้นที่รื้อถอนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนสาธารณะหน้า โครงการ และชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
4.5 การป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัย สาธารณะ	-	-	-
4.6 การบังคับแสงอาทิตย์ และการเปลี่ยนแปลง ของลม	-	-	-

หมายเหตุ :

1. บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตหลักสี่ ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำเสนอรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
2. ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด



ธันวาคม 2568

(นายกริช สันทรเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์ฟู)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ภูมิประเทศ	1. จัดให้มีการติดตั้งรั้วกับปูน (Metal Sheet) ที่ความสูง 6 เมตร และติดตั้ง Mesh Sheet เพิ่มอีก 2 เมตร ตามแนวเขตที่ดินของโครงการ 2. การขุดดินบริเวณพื้นที่โครงการให้เฉพาะที่จำเป็น โดยจำกัดเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น 3. การปรับสภาพพื้นที่ ตลอดจนก่อสร้างอาคาร การวางกองดิน กองวัสดุก่อสร้าง และกองเศษวัสดุก่อสร้าง ให้จำกัดเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 4. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1.2 ทรัพยากรดิน	1. ก่อนที่จะเตรียมปรับเกลี่ยพื้นที่ถมปรับดิน หรือขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำฐานรากของอาคารให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งและจัดให้มีการสำรวจสภาพทั่ว กำแพง สิ่งก่อสร้าง และอาณาบริเวณโดยรอบของอาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง ตลอดจนแนวเขตที่ดิน พร้อมถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยจะแจ้งกำหนดการเข้าสำรวจแก่บ้าน/อาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการล่วงหน้า โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อได้โดยตรง เมื่อบ้าน/อาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการดำเนินการ เจ้าของโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



วันทาคม 2568

(นายกริช จันทโรญสุข)

วันทาคม 2568

(นางสาวพินดา พันพชร)

(นางสุกัญญา อุพันฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แง้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของโครงการอย่างเคร่งครัด โดยในการก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้นจะต้องมีการตรวจสอบว่าแต่ละชั้นมีพื้นที่ และความสูงเท่าไร ซึ่งทำการตรวจสอบทุกช่วงชั้นก่อนที่จะทำการก่อสร้างอาคารในชั้นต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ และรับทราบเพื่อกำกับดูแลตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - จัดให้มีที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างคอยวางแผน และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของระยะต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง - ก่อนการก่อสร้างต้องมีการใช้กล้องสำรวจ (Total Station) ที่มีคุณภาพสูง ในการกำหนดพิกัดต่างๆ เพื่อให้การวัดระยะแนวตั้งและแนวราบมีความถูกต้องแม่นยำ โดยผู้รับเหมาดำเนินการตรวจสอบระยะต่างๆ ให้วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด - วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบผลงานขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ตำแหน่ง ขนาด ระยะต่างๆ ถูกต้องตามแบบแปลน และเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง - มีการตรวจสอบแนวอาคารตามแนวตั้งทุกชั้นที่มีการเทพื้น และก่อผนัง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง (อิงเลเซอร์) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก่อสร้างอาคารเคลื่อนจากระยะที่กำหนด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - การขุดดินบริเวณพื้นที่โครงการให้เฉพาะที่จำเป็น โดยจำกัดเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น - กำหนด Slope ของดินในบริเวณพื้นที่รับถมดินเท่ากับ 1:1.5 เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ข้างเคียง		

ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568

(นายอริช จันทระเจริญสุข)

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 2)

องค์ประกอบแหล่งสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	9. การขุดดินแต่ละวันให้ปริมาณสอดคล้องกับปริมาณดินที่จะขนออกนอกพื้นที่โครงการ 10. การกองวัสดุ เช่น หิน หวาย หรือดิน ในบริเวณใกล้ที่ขุดดิน ต้องกองห่างจากขอบบ่อพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้น้ำนองบ่อเสียหรือมีเศษวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขุดดิน 11. จัดให้มีพื้นที่เก็บกองดินรกรการปรับปรุง โดยเก็บกองดินสูงไม่เกิน 2 เมตร เพื่อนำดินไปปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ภูมิหลังงานเสาเข็ม บ่อเก็บน้ำใต้ดิน บ่อท่ว่งน้ำ และบ่อรับบำบัดน้ำเสีย ส่วนที่เหลือขนออกนอกโครงการ โดยบริเวณพื้นที่เก็บกองดินต้องไม่กีดขวางการจราจรภายในโครงการ พร้อมขุดระบายน้ำรอบบริเวณที่เก็บกองดินเพื่อรวบรวมน้ำฝนไหลลงน้ำดินที่พัดพาตะกอนให้ไหลลงสู่บ่อพักน้ำฝนชั่วคราว และมีวัสดุปิดคลุมพื้นที่เก็บกองดิน เพื่อป้องกันการพังกระจายของฝุ่น 12. กำหนดให้มีรั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกองดินไว้ตลอดเวลา จนกว่าจะนำดินไปถมกลับคืน พร้อมมีการฉีดพรมฝุ่นขณะเทกองดิน รวมถึงจัดให้มีคูระบายน้ำรอบกองดิน และรวบรวมไปยังระบบระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ เพื่อเข้าสู่บ่อตกตะกอน น้ำส่วนนี้หากจำเป็นจะต้องระบายออกนอกโครงการ จะต้องตกตะกอนไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 13. จัดให้มีโรงระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำไหลลงน้ำดินให้ไหลลงสู่บ่อพักน้ำฝนชั่วคราว น้ำส่วนนี้นำไปใช้ฉีดพรมดับฝุ่น กรณีจำเป็นจะต้องระบายออกให้ตกตะกอนไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 14. ห้ามไม่ให้ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการรบกวนสภาพแวดล้อมเขต โดยมีได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนและหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการ จะต้องมีการป้องกันการรบกวน และการเสริมความแข็งแรงของระบบป้องกันดินพังทลายก่อน พร้อมทั้งให้เตรียมการและขออนุญาตก่อนการปฏิบัติงาน		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทโรจทรัพย์)
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พิณพชร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักลี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	15. ห้ามกองวัสดุ จอัตรรถบรรทุกหนักๆ หรือกระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบๆ ปากบ่อเปิด เพราะจะเป็นผลให้ดินปากบ่อพังทลายลงมา 16. ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อดินที่เปิดปากหลุมไว้ โดยให้กองห่างจากปากหลุมได้เท่ากับระยะแขนของรถขุดดิน 17. โครงการต้องจัดให้มีวิศวกร/ผู้ควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 18. ทำประกันภัย “ประกันความเสียหายทุกชนิด” ตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารถือต้องทำประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร และแจ้งให้ เจ้าของบ้าน/อาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ ในกรณีที่ได้รับ ความเดือดร้อน/รำคาญ/ได้รับความเสียหาย ให้แจ้งโครงการได้ทันที และโครงการต้องหยุดดำเนินการและ เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที และดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 19. ก่อนเปิดดำเนินการโครงการ 1 เดือน ให้บำรุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่โครงการเพื่อ เตรียมพื้นที่จัดสวน มาตรการฯ บริเวณพื้นที่เก็บกองดินภายในพื้นที่โครงการ (1) กำหนดให้โครงการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบของ ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (2) ปริมาณดินขุดจากการทำฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดินที่รอกการนำไปใช้ในงานจัด สวนชั้นล่างและชั้นดาดฟ้า ต้องนำไปเก็บกองที่บริเวณกองดินชั่วคราวในโครงการ ทั้งนี้ ต้องจัดให้		



ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568



(นายทริช จันทร์เจริญสุข)


(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอยซ์ลัทเทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มีพื้นที่ในการเก็บกองดินภายในโครงการในบริเวณที่เหมาะสม โดยเก็บกองดินสูงไม่เกิน 2 เมตร และต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบน และด้านข้าง หรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม (3) จัดให้มีการขุดคุ้ยระบายน้ำชั่วคราวบริเวณรอบพื้นที่เก็บกองดิน และขุดเชื่อมระบายน้ำดังกล่าว กับบ่อดักตะกอนที่จัดไว้ เพื่อดักตะกอนดินที่อาจเกิดขึ้นก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ (4) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (5) เจ้าของโครงการจะต้องดูแลพื้นที่โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบ ไม่ให้มีการพังทลายของดิน รุกล้ำพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด มาตรการฯ สดผลกระทบทบต่อเส้นทางการขุดดินนอกพื้นที่โครงการ (1) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และจัดทาสีปิดคลุมรถให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง และรบกวนกลิ่นของดินที่ขนออกไป (2) จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งดินให้มีความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง U.S.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 (3) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากรถบรรทุก พร้อมจัดให้มีไม้วางคขวางเพื่อกวาดน้ำที่ล้างล้อรถเข้าสู่พื้นที่โครงการ ไม่ให้ไหลออกนอกโครงการ (4) กำหนดให้เจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุกปฏิบัติตามความระมัดระวัง คนขับรถอยู่ในสภาพที่		



วันทาคม 2568

(นายตรีช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

วันทาคม 2568

(นางสาวพินดา พิมพ์พร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์ เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	พร้อมในการขั้วที่ ไม่เสถียรของเนินมาหรือสารเสถียรก่อนขั้วبرد หรือในขณะขั้วبرد ไม่ประมาณในการขั้วที่ เพื่อช่วยเหลือขั้วที่ดินบนที่ถมถมและลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน มาตรการบริเวณแหล่งรองรับดินบนที่ถมถมที่โครงการ (ไปยังที่ดินของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริเวณ ด.ลำลูกกาคลอง 6 ต.ปิงคำหรือ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี) เจ้าของสถานที่ที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 หมวด 2 การถมดิน กำหนดมาตรการในการขุดดินบริเวณแหล่งรองรับดินบนที่ถมถมที่โครงการ ดังนี้ (1) กรณีการถมดินมีความสูงของเนินดินสูงกว่าระดับที่ดินเดิมเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกิน 2,000 ตารางเมตร กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างการถมดินนั้นต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด (2) การถมดินกำหนดเวลาในช่วงกลางวันเท่านั้น (8.00-17.00 น.) กรณีทำงานในช่วงเวลากลางคืน กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ (3) การถมดินในส่วนฐานของเนินดินกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องทำการถมดินให้ห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร (ในที่มี ราชชื่อวิศวกรที่จะทำการควบคุมการถมดิน จะระบุให้ได้หลังจากที่จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นต้นที่เรียบร้อยแล้ว)		



จำนวน 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

จำนวน 2568

(นางสาวพิชิตา พิมพ์พร)
(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แง้วพัฒนา-หลักลี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ กำหนดให้ผู้รับเหมามาติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมและด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดิน (5) ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้รับเหมามาดูตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ (6) กำหนดให้ผู้รับเหมากำหนดให้มีพื้นที่ตั้งเครื่องบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ถมดิน (7) เจ้าของโครงการต้องควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าของสถานที่ถมดินปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด มาตราการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ หากไม่มีการปฏิบัติตามจะระงับไม่ดำเนินการปรับปรุงโดยเด็ดขาด (8) กำหนดให้ถมดินให้ห่างจากแนวเขตที่ดินโดยรอบไม่น้อยกว่า 4 เมตร และกำหนดความลาดชันของดินที่ปรับถมไม่เกิน 28-30° พร้อมบดอัดดินให้แน่นในระดับ และคลุมด้วยตาข่ายดิน เพื่อลดการพังทลายของดิน และป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ข้างเคียง ในพื้นที่ หากกองทิ้งไว้เกิน 1 เดือน ให้ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดการชะล้างของตะกอนดินจากน้ำฝนไหลบ่าหน้าดิน (9) จัดให้มีคันกันดิน และวางระบายน้ำรอบแนวกองดิน และรวบรวมการระบายน้ำที่อาจจะมีการปนเปื้อน ตะกอนดิน หรือเศษหิน กรวด หินทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนมาโยงบดอัดตะกอน น้ำส่วนที่เหลือให้นำไปฉีดพรมฝุ่น และล้างล้อรถ หากมีเหลือและจำเป็นต้องระบายออกให้ทั่วไว้ในบ่อพักตะกอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ		



ธันวาคม 2568

(นายอภิสิทธิ์ จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์พัวร์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักลี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 7)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ธรณีวิทยา	(10) ให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกวาด น้ำเศษดิน หรือเศษหินออกจากพื้นที่ถนนโดยเร็ว ในกรณีพบว่ามีเศษหิน หรือเศษดินของโครงการตกหล่นบนพื้นถนน (11) จัดให้มีคนงานทำความสะอาดตลอดบริเวณพื้นที่นำดินไปถม โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากพื้นที่ถมดิน 1. การออกแบบและการคำนวณอาคารเพื่อรองรับการต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบโครงสร้างอาคาร เพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 2. ในระยะก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการดำเนินการโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของอาคารได้ออกแบบไว้ 3. จัดให้มีข้อควรระวังปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติตน เช่น แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว แผนการอพยพระหว่างกรเกิดแผ่นดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1.4 คุณภาพอากาศ	1. จัดให้มีการติดตั้งรั้วทึบกันฝุ่น (Metal Sheet) เพื่อป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุกระเจาออกนอกบริเวณที่มีความสูง 6 เมตร และติดตั้ง Mesh Sheet เพิ่ม อีก 2 เมตร 2. โครงการจะต้องจัดให้มีการติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามตลอดความสูงของอาคาร ความหนาไม่น้อยกว่า 270 gsm 3. จัดให้มีการรื้อถอนทางเข้า-ออกภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ด้วยแอสฟัลต์	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พิมพ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์การค้าสุภาลัย (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 8)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	หรือ คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพสมบูรณ์ 4. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐาน (แบบเรียลไทม์) และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการ เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลฝุ่น และมีป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโครงการ (อย่างน้อย 2 แห่ง) 5. รถยนต์ดีเซลที่เข้า - ออก ในพื้นที่ก่อสร้างต้องลงทะเบียน Green List (6 ล้อ ขึ้นไป) และ Green List Plus (4 ล้อขึ้นไป) ยกเว้น รถ EURO 5, EURO 6, รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ (NGV) และ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 6. ทำป้ายประกาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.6x4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 7. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาจากการก่อสร้าง และระบุนุ้ผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนเรียงดังกล่าว 8. จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา 9. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 10. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 11. ปิดรถบรรทุกที่บรรทุกดินในขณะขนเิ่มเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบปิดชิด		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พินพชร)

(นางสุกัญญา อุ่มพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 9)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน 13. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 14. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีควมเพียงพอ 15. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด 16. จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น 17. สะวนการระบายและเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 18. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น 19. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 20. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกขึ้นเสมอ 21. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีมิดชิด 22. กรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด 23. ในการขนส่งดิน วัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างและเศษวัสดุก่อสร้าง กำหนดให้ขนส่งนอกระยะเวลาเร่งด่วน เป็นระยะเวลา 10.00-15.00 น. และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากจำเป็นต้องขนส่งนอกระยะเวลาที่กำหนดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี 24. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 25. ใช้วัสดุปั่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง 26. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและรถขนดินให้มีความเร็วไม่เกิน 25			



ธันวาคม 2568

(นายวิรัช จันทน์เจริญสุข)

(นางสาวพินิตา พินพชร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลีกเลี่ยงการขนส่งในระยะเวลาเร่งด่วน 27. จัดหาผ้าใบ/วัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและรถบรรทุกหินให้มีชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก 28. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน 29. จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกันฝุ่นละอองอื่นที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งเศษออกจากอาคารลงสู่พื้นชั้นล่าง 30. ฉีดน้ำล้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ ทุกวัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสู่พื้นที่ข้างเคียง 31. จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถยนต์และรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ 32. ติดตั้งแผงกันตกรอบอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นต่อพื้นที่ข้างเคียง 33. ควบคุมและกำชับคนงานไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างทิ้งหลายช่วงหล่นออกนอกอาคาร 34. จัดให้มีรั้วชั่วคราว สูง 6 เมตร ตามแนวเขตที่ดินของโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 35. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงฐานรากและเสาเข็ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 36. กำหนดให้ติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละเดือน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.6x4.8 เมตร ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างที่ติดกับซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 37. โครงการต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อตามกฎหมายอาศัยชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล		



ธันวาคม 2568
 (นายกริช จันทร์เจริญสุข)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
 ธันวาคม 2568
 (นางสาวพินิดา พินพยุร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนต์ แง้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 11)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ภายนอกตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 38. คัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง ระยะเวลา ประมาณ 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับระยะฤดูร้อน และฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 39. คัดตั้งชุดหัวสเปรย์น้ำละอองฝอยที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ (ห้ามพ่นฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) และในระยะงานตกแต่งบนอาคารที่กำลังก่อสร้างให้ย้ายไปด้านหลังที่มีการก่อสร้าง กำหนดเป็นระยะเวลาประมาณ 8.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (สเปรย์น้ำให้เหมาะสมต่อสภาพฝุ่นที่มี) 40. คัดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 41. กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยจะเพิ่มผู้รับผิดชอบอ่านผลและสั่งการ คือ Safety Engineer ทั้งนี้ เมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใกล้กับเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ดังนี้ 41.1 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) : เมื่อค่าที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 33.75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานกำหนดไว้ที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม หรือพบทวนจำนวน/ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง และหามาตรการฯ ในการจัดการ 41.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) : เมื่อค่าที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 0.108 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม หรือพบทวนจำนวน/ชนิด		



ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568



(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พิมพ์ยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์ เซนต์ เจมส์ แสงวัฒนา-ลักส์ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKS)
ของ บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน) (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ของเครื่องจักรที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง และหามาตรการฯ ในการจัดการ 42. มาตรการฯ ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 42.1 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแสดงผลด้วยระบบ Real Time จำนวน 2 จุด บริเวณกลางพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณทิศเหนือติดถนนซอยแสงวัฒนะ 10 แยก 2 (เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง) โดยกำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน ระบบ sensor จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบอ่านผลและสั่งการ คือ Safety Engineer ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและเร่งแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้ ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อหลังจากค่าอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังที่ตั้งไว้ 42.2 จัดให้มีการแสดงผลการตรวจวัดค่าฝุ่นจาก Real Time Sensor 2 ช่องทาง คือ ติดไว้บริเวณหน้าโครงการ และผ่านช่องทาง Social Media คือ Website ของโครงการ 42.3 ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ โดยแสดงค่าของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ โดยกำหนดค่าตั้งเตือนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) อยู่ที่ 33.75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐาน PM_{2.5} เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) เพื่อเฝ้าระวัง และหากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) มีค่าเข้าใกล้ค่าตั้งเตือน โครงการจะต้องหาสาเหตุแก้ไขผลกระทบโดยการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) อาทิ เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง สั่งให้หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดซ้ำต่อไป		



ธันวาคม 2568

(นายวิรัช จันทะเจริญสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

Q.M.

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แง้วฒณะ-หลักสี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	42.4 ในกรณีที่พบว่าค่าฝุ่นจากเครื่องวัดแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแสดงผลด้วยระบบ Real Time เท่ากับค่ามาตรฐานคือ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้ safety engineer สั่งการให้หยุดการทำงานชั่วคราว อย่างน้อย 30 นาที เพื่อเร่งทาสีและดูแลแนวโน้มของสถานการณ์ และเริ่มดำเนินการต่อไปได้เมื่อมีค่าลดลงต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 42.5 ให้มีการบันทึกกิจกรรมการก่อสร้าง และค่าจากการตรวจวัดอากาศ ด้วย Sensor ในแต่ละวัน โดย Safety Engineer เพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน 42.6 กรณีที่การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีมาตรฐานมีค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างโครงการทำการทบทวน และปรับปรุงแผนกิจกรรมการก่อสร้างจากบันทึกกิจกรรมที่ Safety Engineer บันทึกไว้ เพื่อวางแผนไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต และจัดทำบันทึกในรายงานมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (monitor) 42.7 จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่า และควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 42.8 โครงการจะติดตามข่าวสาร ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร (สถานีตรวจวัด สำนักงานเขตหลักสี่) หากพบว่า ความเข้มข้นของฝุ่นมีค่าเกินมาตรฐานที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) อาทิ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัด-		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พันธุ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไลฟ์เซ็นเตอร์-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศูนย์การค้า (มหาชน) (ต่อ 14)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เจียร์กระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนตที่ใช้ดีเซล เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในระดับสูงซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม และในกรณีที่มีหน่วยงานราชการขอความร่วมมือใดๆ โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 42.9 กำหนดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างก่อนที่จะนำมาใช้งานไม่เกิน 3 เดือน หากเกินค่ามาตรฐานจะต้องปรับปรุงก่อนหรือหามาใช้นำมาใช้ในการก่อสร้าง และในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยการวัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 42.10 หากต้องการขอยกเว้นมาตรการเขตมลพิษต่ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Low Emission Zone) จัดทำโดยกรุงเทพมหานคร สำหรับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป จะต้องทำการลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ผ่านทาง https://bit.ly/47RKOYy โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบัญชีสีเขียวประกอบการขอยกเว้นมาตรการเขตมลพิษต่ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ากระบวนการบำรุงรักษา อาทิ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนไส้กรองอากาศ และการติดตั้งตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF) เป็นต้น 42.11 จัดให้มีบริษัทควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และนำมาตรการในรายงานระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมารับมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงานก่อนสร้างของโครงการ 42.12 กำหนดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ณ จุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริเวณทางเข้า-ออกของรถบรรทุก บริเวณกองเศษวัสดุก่อสร้าง		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์การค้า (มหาชน) จำกัด

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา หันพวย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แอ่งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 15)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	และถนนภายในโครงการ เพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างรั้วกั้นก่อนออกจากพื้นที่ การคลุมกองวัสดุให้มิดชิด และการฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง โดยภาพจากกล้องจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องและนำมาใช้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน หากพบข้อบกพร่องจะมีการแจ้งเตือนและปรับปรุงทันที 42.13 จัดให้มีการจัดทำรายงาน Checklist รายเดือน, การจัดทำรายงาน EIA Monitoring ทุก 6 เดือน 42.14 จัดให้มีการจัดทำรายงานบันทึกการสังเกตกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น กรณีค่าฝุ่นเกินค่าที่กำหนด หรือเกินค่ามาตรฐาน 42.15 การมีส่วนร่วมของประชาชนรอบพื้นที่โครงการในการติดตาม โดยใช้ Social Media ที่โครงการจัดทำขึ้น ซึ่งต้องมี Menu Rich (Function) อย่างน้อย 6 หัวข้อ ที่สามารถใช้งาน ดูข้อมูลรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรายงาน EIA รายงาน Check List การปฏิบัติตามมาตรการฯ ราย 1 เดือน ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ การแจ้งเรื่องร้องเรียน และระบบการติดตามสถานะของการดำเนินงาน ผลลัพธ์ การแจ้งเรื่องต่อหน่วยงานอนุญาต และต่อสำนักงานเขต สิทธิ และทางเลือกในการชดเชย เยียวยาผลกระทบด้านต่างๆ 43. จัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงอากาศ ความสั่นสะเทือน ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 44. กำหนดให้มีการตรวจหาแหล่งเสียงตามจุดของเข็มนาฬิกาของเข็มนาฬิกา (จาก third party) ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจากหน่วยงานราชการ โดยมีความถี่ในการสอบการทำงาน และการสอบเทียบ ทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ให้นำผลการเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ทุกครั้งเพื่อให้สามารถเรียก		



จำนวน 2568

จำนวน 2568



(นายกริช จันทโรจกุล)

(นางสาวพินิดา หินพวย)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สุภลัย เซนส์ แอ่งวัฒนะ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ตุกาลัย เซนส์ จังหวัดนะ-หลกส์ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKS)

ของ บริษัท ตุกาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง มาตรการด้านการรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ - จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอันเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการไว้ในที่โครงการ ตลอดระยะเวลาระยะ ก่อสร้าง - ติดตามตรวจสอบและหากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการทันทีที่ผู้ก่อเหตุ ช่างเสียใจโครงการได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย ทหารหรือ/หาข้อตกลงร่วมกับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความสะดวกเพื่อหาแนวทาง และวิธีแก้ไข ปัญหา ซึ่งสามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย เช่น เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ ดัดตั้งวัสดุกันฝุ่น เมทชีท (Mesh Sheet) ชนิดกันฝนลมที่สุ่มขึ้นหรือเพิ่มจำนวนขึ้น เป็นต้น - ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาคำยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยผู้พัฒนาโครงการ จะต้องเป็นฝ่ายริเริ่มการดำเนินการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์ว่าผลกระทบมีสาเหตุมาจากโครงการหรือไม่		
1.5 เสียง	ดำเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.00-17.00 น. และให้คนงานออกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินระยะเวลาที่กำหนด จะทำได้เฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่อนุญาตก่อสร้างก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันจึงจะดำเนินการได้ และจะต้องแจ้งให้ผู้	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ตุกาลัย จำกัด (มหาชน)	



จำนวน 2568

(นายกริช สันทรเจริญสุข)

จำนวน 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา ชื่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ตุกาลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์ เซนต์ แง้วพัฒนา-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 17)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยการทำเป็นหนังสือแจ้งและติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่ดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง 2. ให้โครงการก่อสร้างรั้วความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดทำประตูผู้ไ้ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้า-ออกโครงการ 3. กำหนดจุดติดตั้งการตรวจวัดระดับเสียงแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแสดงผลด้วยระบบ Real Time บริเวณทิศเหนือของโครงการ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบอ่านผล และส่งการ คือ Safety Engineer โดยตั้งค่าเตือนแบบเรโซลโทม (Warning Level) เมื่อระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะนั้นเท่ากับ 70 dB(A) ในช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 8.00-17.00 น. (8 ชั่วโมง) ดังนี้ (1) เมื่อระบบแจ้งเตือนทำงานที่ระดับเสียงตรวจวัด 70 dB(A) ครั้งที่ 1 ให้ Safety Engineer แจ้งต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นผู้รับผิดชอบสั่งการให้ทวนขึ้นตอนการทำงานก่อสร้าง โดยปรับลดกิจกรรมที่มีเสียงดัง ลดจำนวนอุปกรณ์การก่อสร้างลงบางส่วน รวมถึงให้ตรวจสอบตำแหน่งของกำแพงกันเสียงให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยดำเนินการภายในระยะเวลา 30 นาที และติดตามตรวจสอบระดับเสียงจาก Sensor วัดระดับความดังของเสียงแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง (2) หากระบบแจ้งเตือนทำงานที่ระดับเสียงตรวจวัด 70 dB(A) ครั้งที่ 2 แสดงว่าการแก้ไขปัญหาข้างต้นอาจยังไม่เพียงพอ ให้ Safety Engineer แจ้งต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง เพื่อยุติกิจกรรมที่มีเสียงดังทันที และทำการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง ความสมบูรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงความเรียบร้อยของกำแพงกันเสียง โดยต้องแก้ไขให้		



ธันวาคม 2568

(นายกรัษฎา จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้อำนวยการส่วนบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) 41/192

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพชร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 18)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. จัดให้มีกำแพงกันเสียงสำหรับการก่อสร้างอาคารในช่วงต่างๆ ดังนี้ 4.1 ช่วงงานฐานราก กำหนดให้ติดตั้งกำแพงกันเสียง ชั้นที่ 1 เป็น แผ่น BLOXTEG (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ที่มีความสามารถลดระดับเสียงลงได้ 48.3 เดซิเบล (เอ) สูง 3 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิด 1.5 เมตร และกำแพงกันเสียง ชั้นที่ 2 เป็นเมทัลชีท ที่มีความสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 เดซิเบล (เอ) สูง 6 เมตร ที่ติดตั้งรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ 4.2 ช่วงงานโครงสร้าง และช่วงตกแต่งและเก็บงาน กำหนดให้ติดตั้งกำแพงกันเสียง ชั้นที่ 1 เป็น แผ่น BLOXTEG (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) ที่มีความสามารถลดระดับเสียงลงได้ 48.3 เดซิเบล (เอ) สูง 3 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิด 0.5 เมตร และกำแพงกันเสียง ชั้นที่ 2 เป็นเมทัลชีท ที่มีความสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 เดซิเบล (เอ) สูง 6 เมตร ที่ติดตั้งรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ 5. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 6. ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน 7. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวไม่มีการดับเครื่องหรือเบเครื่องลงระหว่างการพัก 8. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ 9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากพร้อมๆ กัน 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งอาคารใกล้เคียง ถึงกำหนดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ไม่ล่าช้าจนสมควร โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน			



วันรวม 2568


(นายกริช จันทระเจริญสุข)

(นางสาวพิดา พินพยุร)

(นางสกุญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักลี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 19)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	พร้อมจัดให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือนเสาเข็ม และหาทางป้องกันแก้ไขพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 11. ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง รวมถึงแจ้งผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ติดไว้ด้านหน้าโครงการ 12. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงฐานรากและเสาเข็ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 13. กำหนดให้มีการตรวจทดสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์วัดเสียง (จาก third party) ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจากหน่วยงานราชการ โดยมีความถี่ในการสอบเทียบการทำงาน และการสอบเทียบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ให้มีการเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ทุกครั้งเพื่อให้สามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 14. จัดให้มีการบันทึกการทำงานในแต่ละวันของการทำงาน เพื่อตรวจสอบว่า ในกรณีวันที่มีการตรวจวัดเกินค่ามาตรฐาน สอดคล้องกับกิจกรรมและการใช้เครื่องจักรใด เพื่อจะได้วางแผนการทำงาน ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านเสียง อากาศ ความสั่นสะเทือน ในระหว่างดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างอีกในอนาคต โดยผู้รับผิดชอบคือ Safety Engineer และจัดทำบันทึกในรายงานมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (monitor)		



ต้นฉบับ 2568

ต้นฉบับ 2568

ต้นฉบับ 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พินบุตร)

(นางสุกัญญา อุ่นพินนาทิลป)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ็จวิธนะ-หัททสี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 20)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.6 ความสิ้นสละเจียน	1. ควบคุมและกำหนดเวลาการก่อสร้างเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากของอาคาร โดยแบ่งช่วงการทำงาน เป็นระยะตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีระยะเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. ให้ดำเนินการตรวจสอบอาคารในบริเวณข้างเคียงก่อนจะทำการก่อสร้าง โดยผู้ทำการตรวจสอบประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนเจ้าของอาคารข้างเคียง และตัวแทนของผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่เจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอม ให้บันทึกวันเวลา และเหตุผลไว้ให้ชัดเจนต่อหน้าเจ้าของอาคารข้างเคียงพร้อมกับเจ้าของอาคารข้างเคียงลงชื่อรับทราบไปเป็นหลักฐาน แต่ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้ผู้ทำการตรวจสอบที่เหลือลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในวันทำการตรวจสอบด้วยพร้อมกันแจ้งว่าถ้าประสงค์จะส่งเอกสารใดๆ หรือจะให้บุคคลที่สามตรวจสอบ (Third Party) ก็ให้ส่งผลการตรวจมาก่อนจะมีการก่อสร้าง และเมื่อดำเนินการทำฐานรากเสร็จแล้วให้เข้าไปตรวจสอบยังอาคารข้างเคียงซ้ำอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังมีการทำฐานราก ว่าแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ หากพบว่ามีความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นให้เจรจากดกลงเพื่อทำการซ่อมแซม พร้อมกับตรวจสอบครั้งที่สามเมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว เพื่อตรวจสอบยืนยันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการอีกครั้ง เพื่อขอชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นหากสามารถเจรจากดกลงกันได้ก็ให้ชดเชยหรือเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาได้ช้อยู่ แต่ดำเนินการเจรจาต่อรองกันได้ให้เจ้าของโครงการเสนอเรื่องตามกระบวนการไกล่เกลี่ยระดับข้อพิพาทที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภลัย เซนส์ จังหวัดพะเยา-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 21)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ถ้าความเสียหายนี้เป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคารโครงการจริงให้เจ้าของโครงการสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อการชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปก่อน 3. คัดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 4. คัดป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน "อันตรายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลภายนอกเข้า" 5. ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการขนาด 3.6x4.8 เมตร โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และหน่วยงานอนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน 6. การชดเชยความเสียหายเบื้องต้น กำหนดให้ทางโครงการเตรียมวงเงินสำรองชดเชยเยียวยาเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่ระบบประกันภัยไว้อย่างน้อย 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสามารถนำเงินดังกล่าวมาชดเชยเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 7. กำหนดให้ผู้รับเหมาหลักจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยต้องมีวงเงินอาประกันภัยต่อครั้งไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร 8. จัดให้มีเงินทุนสำรอง เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารในโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรประกันภัย ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารในโครงการต่อผู้เสียหายทั้งหมดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าของโครงการต้อง		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ จังหวัดยะลา (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 22)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	รับผิดชอบทุกกรณี 9. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบว่าโครงการมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบความสิ้นเปลืองบริเวณพื้นที่โครงการทุกวันในระหว่างก่อสร้างและหลังจากนั้นตรงจุดทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และแจ้งผลให้ประชาชนทราบ โดยติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 10. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ จัดตั้งกลุ่มไลน์ กล้องรับฟังความคิดเห็นติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่ในสำนักงานก่อสร้างของโครงการเพื่อคอยรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างและเปิดดูรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาให้นำเสนอหัวหน้างานเพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยทันที และหากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมเก็บใบแจ้งการทำข้อตกลงในการชดเชยที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 11. กำหนดให้มีการตรวจหาสารปนเปื้อนตามข้อกำหนดของเซ็นเซอร์ตรวจวัดความสิ้นเปลือง (จาก third party) ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจากหน่วยงานราชการ ทุก 6 เดือน และมีการเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ไว้ทุกครั้งเพื่อให้สามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 12. กำหนดระดับเฝ้าระวังค่าความสิ้นเปลือง (warning level) โดยผู้รับผิดชอบอ่านผลและแจ้งการคือ Safety Engineer ทั้งนี้ เมื่อผลการตรวจวัดความสิ้นเปลืองจากการตรวจวัดแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแสดงผลด้วยระบบ Real Time ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน คือ 4.5 มิลลิเมตร/		



ธันวาคม 2568

(นายอภิสิทธิ์ จันทระเจริญสุข)
กรรมการผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพิญ)
บุตรธรรมธาดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

(นางสุกัญญา ย่นพัฒนาศิลป์)
บุตรธรรมธาดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 23)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	วินาที (90 % ของค่ามาตรฐานสำหรับอาคารประเภทที่ 2 กำหนดไว้เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) ให้หยุดก่อสร้าง และ Safety Engineer ทำการตรวจสอบว่าเกิดจากแหล่งกำเนิดใด รวมถึงหาวิธีเพื่อป้องกัน/ควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก เช่น การลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน การลดเวลาการทำงานหรือปรับปรุงวิธีการทำงาน เป็นต้น 13. เมื่อบ้าน/อาคารและถนนสาธารณะที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที โดย 13.1 เมื่อได้รับเรื่องเรียน โครงการฯ ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความเสียหายที่บ้าน/สถานประกอบการ เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการในเบื้องต้น 13.2 จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินความเสียหายในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับความคิดเห็นหรือจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคารหรือส่วนของอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีแตกร้าว/ทรุดตัว ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิศวกรรมพื้นที่เมื่อได้รับการแจ้งเหตุจากผู้ได้รับผลกระทบ 13.3 เสร็จจากข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นกรณีที่ได้รับการยอมรับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้ของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยผู้พัฒนาโครงการจะต้องเป็นผู้ริเริ่มการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)"		



ธันวาคม 2568
 (นายรัช จันทระเจริญสุข)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
 ธันวาคม 2568
 (นางสาวพินดา พินพยุร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 24)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	14. ให้โครงการติดตามค่าที่ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแบบ Sensor และการแสดงผลแบบ Real Time ทั้งนี้ ในกรณีที่มีระดับเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน ให้ทีมงานสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย Safety Engineer และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ตรวจสอบหาสาเหตุและเร่งแก้ไขโดยทันที 15. นอกจากติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ ให้โครงการจัดให้มีช่องทางสื่อสารสองทางผ่านช่องทาง Social Media ที่โครงการจัดทำขึ้น เช่น เว็บไซต์ของโครงการ โดยต้องมี Menu Rich (Function) อย่างน้อย 6 หัวข้อ ที่สามารถใช้งาน ดูข้อมูล รายละเอียดเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 15.1 รายงาน Check List การปฏิบัติตามมาตรการฯ ราย 1 เดือน 15.2 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ มาตราการติดตามตรวจสอบ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 15.3 การแจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ โดยแจ้งจุดบริการการสื่อสาร พร้อมเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานของโครงการ 15.4 การแจ้งเรื่องต่อหน่วยงานอนุญาต และต่อสำนักงานเขตหลักสี่ 15.5 สิทธิ และทางเลือกในการชดเชย เยียวยาผลกระทบด้านต่างๆ 16. มาตราการเชิงรุกด้านความสัมพันธ์ในระยะก่อสร้างฐานราก กับอาคารที่อยู่ในระยะประชิดพื้นที่โครงการ ดังนี้ 16.1 ก่อนการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก ให้โครงการจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าพบเพื่อแจ้ง		



ธันวาคม 2568

(นายพรชัย จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 48/192

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 25)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.7 ทรัพยากรน้ำ	รายละเอียดการก่อสร้างเสริมและฐานราก แผนงานและกำหนดการทำเสาเข็ม ให้อาคารโดยรอบทราบอย่างชัดเจน และต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และช่องทางการประสานงานต่างๆ ที่โครงการจัดให้มีเพื่อให้สามารถแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นได้ทันที 16.2 อธิบายขั้นตอนการเสริมและฐานราก และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมีการส่งเป็นเอกสารลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกเหนือจากการแสดงมาตรการฯ ไว้ทางช่องทาง Social Media ที่โครงการจัดไว้ 16.3 ให้ safety engineer ทำหน้าที่เฝ้าระวังและสังเกตด้วยระบบ Real Time มีค่าสูงเกินกว่าความสั่นสะเทือนแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแสดงผลด้วยระบบ Real Time มีค่าสูงเกินกว่า 90% ของค่ามาตรฐาน หรือ 4.5 มิลลิเมตร/วินาที (แจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟฉุกเฉิน) ให้หยุดดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากทันที และทำการตรวจสอบว่าเกิดจากแหล่งกำเนิดใด รวมถึงหาวิธีเพื่อป้องกัน/ควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก เช่น การลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน การลดเวลาการทำงานหรือปรับปรุงวิธีการทำงาน เป็นต้น - ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียที่ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรกจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายสุริช จันทน์เจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พินพชร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 26)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ตัดป่าเตียน "ด้านผาหรือทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครอง" ไว้รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้พื้นที่	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สามารถสำรองน้ำได้ในระยะก่อสร้างได้น้อย 1 วัน (ภาพที่ 1) 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดตั้งถังเก็บน้ำไว้บริเวณใกล้เคียงกับก๊อกน้ำ ด้วยข้อความ "ช่วยปิดก๊อกน้ำหลังเลิกใช้" 3. ในกรณีที่พักคนงานประปาที่ท่อหรือก๊อกน้ำให้รับดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่โครงการ) 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง ปริมาตรรวม 30 ลูกบาศก์เมตร 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดตั้งถังเก็บน้ำไว้บริเวณใกล้เคียงกับก๊อกน้ำ ด้วยข้อความ "ช่วยปิดก๊อกน้ำหลังเลิกใช้"	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้จัดการ

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพชร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แจ้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 27)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	3. ในกรณีที่เกิดปัญหาการรั่วซึมของน้ำประปาที่ท่อหรือก๊อกน้ำให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานจำนวน 5 ห้อง และจัดให้มีห้องน้ำและอ่างล้างมือสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 1 ห้อง แยกจากห้องน้ำสำหรับคนงานบริเวณพื้นที่โครงการ (ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีส้วมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง) 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 โดยคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. 3. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียช่วงก่อสร้าง เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ 4. ถึงกับำบัดน้ำเสียของคนงานก่อสร้างบริเวณหน้างานหลังจากที่การก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้สูบของเสียออกจากส้วมเกราะของถังบำบัดน้ำเสียให้หมดก่อนรื้อถอน โดยใช้ยาฆ่าเชื้อโรคกรดถึงบำบัดน้ำเสียที่รื้อถอนแล้ว หลังจากนั้นก็ตรวจสอบว่าถังบำบัดน้ำเสียยังสามารถนำกลับไปใช้ได้สักหรือไม่ หากยังใช้ได้ให้ล้างทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคกรดอีกครั้ง ในกรณีเกิดการแตกหักชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกให้ทำการตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนนำไปเก็บกองรวมกับวัสดุก่อสร้างที่ต้องขนไปกำจัด และประสานงานกับบริษัทที่รับกำจัดที่มีใบอนุญาตมาจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป 5. กำหนดให้สูบลูบจากระบบบำบัดน้ำเสียปีละ 1 ครั้ง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายศรีช จันทระเจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่มพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 28)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6. หากตรวจพบว่าค่าพารามิเตอร์ของน้ำทิ้ง มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ให้หยุดการระบายน้ำทิ้งออกสู่สาธารณะทันที และดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศ การพักน้ำ หรือปรับการเติมสารเคมี จนกว่าค่าที่ตรวจวัดจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 7. ให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งซ้ำในจุดที่มีค่าผิดปกติอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะได้ค่าที่เหมาะสมจึงจะสามารถระบายน้ำออกจากรูที่โครงการได้ พร้อมจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัด และแนวทางการแก้ไขไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 8. การใช้ห้องส่วนของคนงานก่อสร้างอาจก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง ดังนั้น 8.1 หากบริเวณพื้นที่ห้องส่วน สำหรับคนงานก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวนโครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น 8.2 ตรวจสอบรอบรั้วบริเวณห้องน้ำคนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 8.3 จัดให้มีการรักษาเชื้อโรคและนำยาดับกลิ่นสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำคนงานบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่โครงการ) 1. จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส่วนที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาลสำหรับคนงาน 6 ห้อง แยกเป็นห้องน้ำชาย 4 ห้อง และห้องน้ำหญิง 2 ห้อง 2. จัดให้มีทอรวบรวมน้ำเสียจากห้องส่วนนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่สาธารณะ		



ธันวาคม 2568 ธันวาคม 2568
 (นายเศรษฐ จันทระเจริญสุข) (นางสาวพินิตา พิณพชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ จังหวัดนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 29)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ร้อยละ 92 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่า BOD_{500k} 20 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 4. กำหนดให้สูบน้ำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 ปี 5. ในการรื้อถอนห้องส้วมของคณงานให้ปฏิบัติตามดังนี้ 5.1 ถังบำบัดน้ำเสียของคณงานก่อสร้างบริเวณหน้างานหลังจากที่ทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้สูบน้ำของเสียออกจากส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียให้หมดก่อนรื้อถอน โดยใช้ยาฆ่าเชื้อโรคราดถึงถังบำบัดน้ำเสียที่รื้อถอนแล้ว หลังจากนั้นตรวจสอบว่าถังบำบัดน้ำเสียยังสามารถนำกลับไปใช้ได้หรือไม่ หากยังใช้ได้ ให้ล้างทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคราดอีกครั้ง ในกรณีเกิดการแตกหักชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกให้ทำการตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนนำไปเก็บกองรวมกับวัสดุก่อสร้างที่ต้องขนไปกำจัด และประสานงานกับบริษัทรับกำจัดที่มีใบอนุญาตมาจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป 5.2 ผึ่งกลบและปรับบริเวณพื้นที่ห้องส้วมให้มีระดับเสมอกับพื้นที่โดยรอบ 5.3 ขีดินหน้าฆ่าแมลงและพาหะนำโรคหลังเสร็จสิ้นการรื้อถอนห้องส้วม และให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคซ้ำอีกครั้งหลังการรื้อถอนแล้วประมาณ 1 เดือน		



ธันวาคม 2568

(นายวิชาญ จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พินพยุร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แ่งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 30)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว พร้อมบ่อพักตะกอน/ตกขยะ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 2. จัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดโดยเฉพาะ และมีที่ทิ้งขยะดิน เศษทรายออกจากน้ำล้างเครื่องมือก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยเก็บกวาดขยะออกจากบ่อพักตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการทุกวัน 4. ขุดลอกแนวรางระบายน้ำชั่วคราวที่ขุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างและบ่อพักตะกอน/บ่อหน้าทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
3.4 การจัดการมูลฝอย	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ที่มีสภาพแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม และมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงวัน และสุนัขได้ จำนวน 5 ถัง แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (แห้ง) 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง 2. กำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยคัดแยกมูลฝอยประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว กระป๋องพลาสติก ออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ 3. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ โดยเลือกบริเวณที่ไม่เกิดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่เก็บกองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (ขยะอันตราย)	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



จำนวน 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

SUPALAI
PUBLIC COMPANY LIMITED

จำนวน 2568

(นางสาวพินิตา พินพชร)

(นางสุกัญญา อุณพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักลี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 31)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. ตรวจสอบภาพชนวนรองรับมูลฝอยที่อยู่ในสภาพดีอยู่แล้วและไม่พบมูลฝอยเลยถึง หากพบว่ามีปัญหาต้องติดต่อให้รถเก็บขนของสำนักงานเขตหลักสี่เข้ามาเก็บขนทันที หรือเพิ่มถึงรองรับมูลฝอยรองรับให้เพียงพอ. 5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นๆ 6. ให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีต อิฐมวลเบา เท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการกำจัดไว้กับศูนย์ฯ กำจัดมูลฝอย 7. สำหรับเศษวัสดุก่อสร้างที่ศูนย์ฯ กำจัดและแปรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างศูนย์ฯ ไม่รับกำจัดให้ส่งไปกำจัดยังผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่อไป และห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด 8. ให้ทำรายงานบันทึก ผู้ปฏิบัติงาน วัน เวลา และปริมาณ ที่นำเศษวัสดุก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการทุกครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 9. ในการขนย้ายมูลฝอยจากการก่อสร้างไปทิ้งหรือกำจัดต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ตกหล่น ปลิวหรือฟุ้งกระจาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 10. ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาในการปฏิบัติตามมาตรการเป็นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ประจำการอยู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		



ธันวาคม 2568

(นายวิชาญ จันทร์เจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์อร)

ธันวาคม 2568

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 32)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่โครงการ) 1. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร เพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง จำนวน 14 ถึง แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ 6 ถึง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 4 ถึง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (แห้ง) 2 ถึง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 2 ถึง พร้อมติดสติ๊กเกอร์บอกประเภทมูลฝอยข้างถัง/บนฝาถังให้เห็นอย่างชัดเจน 2. กำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยคัดแยกมูลฝอยประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว กระเบื้อง พลาสติก ออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ		
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง และการใช้ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการ 3. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหัวหน้าคนงานต้องให้คำแนะนำในระลอกก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 4. ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สาธารณะมองเห็นได้ง่าย 5. จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมีเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือช็อต	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายอภิสิทธิ์ จันทร์เจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

(นางสุกัญญา ชุ่มพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ่งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 33)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การระบายอากาศ	1. จัดทำรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ สูง 6 เมตร 2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงรอบโครงการ 3. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ "ไม่เกิดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้างและทางสาธารณะ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีผ้าใบปิดคลุมตลอดเวลา ยกเว้นจะเปิดเมื่อรถวิ่งเข้า-ออก 4. ปิดท้ายรถบรรทุกในขณะขนดิน/เศษวัสดุก่อสร้าง และวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการขนส่งในระยษะชั่วโมงเร่งด่วน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
3.7 การคมนาคมขนส่ง/ การจราจร	1. ติดป้ายเตือน "โปรดระมัดระวังพื้นที่ก่อสร้าง" "ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก" บริเวณถนนซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 ด้านหน้าโครงการ ในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาที่รถบรรทุกวิ่งเข้าออกพื้นที่โครงการบริเวณถนนซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 ด้านหน้าโครงการในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน 3. ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในระหว่างการก่อสร้าง 4. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเศษวัสดุบริเวณถนนซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 ด้านหน้าโครงการ ตลอดถนนใกล้เคียงโครงการโดยตรง 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณถนนซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 และบริเวณทางเข้าออกของโครงการ 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



จำนวน 2568

จำนวน 2568

(นายวิรัช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ตูกล้าย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท ตูกล้าย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 34)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว ในระยะที่มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกโครงการ 7. วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในระยะที่ผ่านชุมชน โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด และดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความสั่นสะเทือนและความเสียหายแก่พื้นที่ที่ขุดผ่าน 8. ตรวจสอบยานพาหนะและเครื่องจักรต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดขณะใช้งาน 9. จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถไว้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 10. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณจุดเชื่อมต่อทางเข้า-ออก โครงการทุกวัน 11. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ชุมชน และบนทางหลวงด้วยไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 12. หลีกเลี่ยงการขนส่งในระยะเวลาเร่งด่วน และระยะเวลาเลิกเรียน กำชับให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชน และจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 13. ควบคุมการเข้า-ออกของรถบรรทุกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถบนถนนขอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 และผู้สัญจรบนทางเท้า โดยผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามงานกับหน่วยงานจำหน่ายคอนกรีต รวมถึงคนขับรถทุกคันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร เพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถ โดยให้เข้า-ออกสลับกันไปมาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์พื้นที่ที่ก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อรับแผนการส่งวัสดุก่อสร้าง/คอนกรีตเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้สัมพันธ์กันให้มากที่สุด 14. การขนส่งดิน/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้างต้องหาผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกและ		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

58/192

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักลี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKS)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 36)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. วางผังระบบสาธารณูปโภคสำหรับคมนาคมให้เพียงพอเป็นระยะปี และรื้อถอนหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมพังดูแลภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ประกอบด้วย (ภาพที่ 1) - ประดับบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ลานล้างสนาม - ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 6 ห้อง (อัตราการใช้ 15 คน/ห้อง) - ตั้งเก็บน้ำเสียรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถึง - ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จัดไว้ 1 ชุด รองรับน้ำเสีย 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด - ตั้งรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 5 ถึง แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (เปียก) 1 ถึง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 2 ถึง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถึง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถึง และถังรองรับถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ 1 ถึง - พื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง - พื้นที่วางแบบแบบถมดิน - พื้นที่ล้างล้างรถ - รางระบายน้ำ พร้อมบ่อตกตะกอน/บ่อหน่วง/ดักขยะ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



จำนวน 2568

จำนวน 2568

CM CM



(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่มพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 37)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. รื้อถอนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ใช้ระยะก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ 4. การเก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ให้จัดไว้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบ ไม่เกะกะกีดขวางเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ก่อสร้าง 5. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้ลักษณะของอาคารเป็นไปตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และวิศวกรคุมงานก่อสร้างต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบอย่างเคร่งครัด 6. กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของโครงการอย่างเคร่งครัด โดยในการก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้นจะต้องมีการตรวจสอบว่าแต่ละชั้นมีพื้นที่ และความสูงเท่าไร ซึ่งทำการตรวจสอบทุกช่วงชั้นก่อนที่จะทำการก่อสร้างอาคารในชั้นต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ และรับทราบเพื่อกำกับดูแลตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 7. จัดให้มีที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างคอยวางแผน และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของระยะต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระยะเวลาก่อสร้าง 8. ก่อนการก่อสร้างต้องมีการใช้กล้องสำรวจที่มีคุณภาพสูง ในการกำหนดพิกัดต่างๆ เพื่อให้การวัดระยะแนวโค้ง และแนวราบมีความถูกต้อง-แม่นยำ โดยผู้รับเหมาต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบระยะต่างๆ ให้วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด		



ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568

นางสาวพินิดา พิมพ์บูร

(นางสุกัญญา อุ่มพัฒนาศิลป์)

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พิมพ์บูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์ เซนต์ แจ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน) (ต่อ 38)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม	9. วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบผลงานขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ค่าแห่ง ขนาด ระยะต่างๆ ถูกต้องตามแบบแปลน และเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง 10. มีการตรวจสอบแนวอาคารตามแนวดังทุกชั้นที่มีการเทพื้น และก่อนนั้น โดยใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง (ยิงเลเซอร์) เพื่อป้องกันมิให้การก่อสร้างอาคารคลาดเคลื่อนจากระยะที่กำหนด ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการกวาดแชนของ Tower Crane ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยควบคุม เฉพาะให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันความเสียหายจากชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงโครงการ		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม	1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 3. ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้สำหรับสำเนาของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียน จากชุมชนสามารถเรียกตรวจสอบได้ 4. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็น การ รบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 5. จัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทย และเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างดาวผิด กฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568


(นางสาวพินิตา พินทุพร)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 39)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุตัวสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสวนติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว 7. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีเท่านั้น เพื่อลดความเสียหายในการเกิดปัญหา และลดข้อขัดแย้งของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ 8. จัดให้มีการดอกลบตรลงเวลาทำงาน พัก และเลิกงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรดอกลบตรและระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานะภาพของคนงานในโครงการตลอดเวลา 9. ออกมาตรการระเบียบข้อบังคับให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการและมีโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยมีมาตรการอย่างชัดเจน 10. ให้โครงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับอย่างรวดเร็ว 11. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้เจ้าของโครงการติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที 12. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3.6x4.8 เมตร การแจ้งประชาสัมพันธ์และการแจกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการฯ ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง 1 เดือน ให้กับเจ้าชองอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อกับพื้นที่รบกวนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่ของ		



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้อำนวยการนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2568

(นางสาวพินิดา ทิมพยุร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

จำนวน 2568

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 40)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้ติดต่อกับหรือแจ้งเรื่องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุกประการ 13. ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการติดตามตรวจสอบมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ดัดไว้ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ชุมชนโดยรอบนั้นใจและร่วมตรวจสอบได้ว่าโครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เสนอไว้จริง ขณะเดียวกันผลการตรวจวัดต่างๆ ที่แจ้งให้ทราบจะช่วยเหลือข้อห่วงกังวลของชุมชนโดยรอบว่าผลกระทบที่เคยห่วงกังวลนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว (ภาพที่ 2) 14. ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัยข้างเคียง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที 15. ในกรณีการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องมีการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ และแจ้งผลการดำเนินการแก้ไข และความคืบหน้าในการแก้ไข (ทุกสัปดาห์) ต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และดำเนินการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อสำนักงานเขตหลักสี่ ทั้งนี้ หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องของใกล้เคียงข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 16. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ ได้แก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมร่วมกิจกรรมชุมชนกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		



ธันวาคม 2568

(นายกรัช จันทร์เจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินทุย)

(นางสุกัญญา อุนพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 41)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อประชาชนข้างเคียง โครงการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด 2. การขจัดขยะความเสียหายเบื้องต้น กำหนดให้ทางโครงการเตรียมเงินสำรองขจัดขยะเสียวยาเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่ระบบประปาภิโยวอย่างน้อย 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสามารถนำเงินดังกล่าวมาชดเชยเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 3. นอกจากกิตติบัญชประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการ ให้โครงการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสองทางผ่านช่องทาง Social Media ที่โครงการจัดทำขึ้น เช่น Website , Line Official Account โดยต้องมี Menu Rich (Function) อย่างน้อย 6 หัวข้อ ที่สามารถใช้งานได้ ข้อมูล รายละเอียด เนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 3.1 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรายงาน EIA (ทั้งในระยะรื้อถอน ก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ โดยเฉพาะในเรืองที่มีการร้องเรียน เช่น เสียงดัง ความสั่นสะเทือน เป็นต้น) 3.2 รายงาน Check List การปฏิบัติตามมาตรการฯ ราย 1 เดือน 3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ มาตรการติดตามตรวจสอบ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 3.4 การแจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และระบบการติดตามสถานการณ์งาน ผลลัพธ์ โดยแจ้งจุดบริการการสื่อสาร พร้อมเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเรียนที่สำนักงานของโครงการ 3.5 การแจ้งเรื่องต่อหน่วยงานอนุญาต และต่อสำนักงานเขตหลักสี่ 3.6 สิทธิ และทางเลือกในการชดเชย เยียวยาผลกระทบด้านต่างๆ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นายพรช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568


(นางสาวพินิดา พินทุย)

(นางสุกัญญา อุ่มพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 42)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) การประเมินการส่งต่อ ผู้ป่วย	1. จัดให้มีอาสาสมัครประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เพียงพอ 2. ผู้รับเหมาคัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) / Safety Engineer ในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการไม่การป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุ 3. มีการอบรมคนงานก่อสร้าง โดยคนงานทุกคนจะต้องทราบระเบียบวิธีการแ่งเหตุ และที่ต่งของโทรศัพท์ โดยหมายเลขฉุกเฉินจะแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 4. โครงการจะต้องจัดเตรียมขั้นตอนต่างๆ ในการส่งผู้ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง 5. จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรพพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 6. โครงการมีการจัดสวัสดิการ การประกันอุบัติเหตุ และระบบประกันอื่นๆ ตามความเหมาะสมครอบคลุมการรักษาพยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้างในสถานพยาบาลในพื้นที่ และสถานพยาบาลใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



จำนวน 2568

(นายวิช จันทระจริยสุข)

จำนวน 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

(นางสุกัญญา ย่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 43)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง) (1.1) โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงานที่ดำเนินงานปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆ และกำชับให้คนงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมีให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ 2. ติดป้ายเตือนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน 3. ในระยะฤดูร้อนและฤดูหนาวให้ใช้น้ำฉีดพรมถนนและบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำการพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 4. กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองจะตั้งปิดหรือคลุมในพื้นที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้าง 3 ด้าน หรือฉีดพรมน้ำให้พื้นผิวเปียกอยู่เสมอ 5. กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การตัด การเจียร ให้กระทำในห้องที่มีหลังคาคลุม และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน 6. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งานเพื่อลดการปล่อยมลพิษโดยไม่จำเป็น และดูแลสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ชั้นวาคม 2568

ธันวาคม 2568

W

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)
(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)
บุคลากรตรวจผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็ม. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



(นายกรีช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักลี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 44)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(1.2) ไรศที่เกี่ยวข้อยกับ การได้ยื่น (เอกสารท-ด้านเสียง)	กำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง ดังนี้ 1. ปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดเสียง 1.1 ปำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน หรือก่อนที่ จะเกิดการชำรุด การตรวจเติมสารหล่อลื่น เพื่อลดการสึกหรอ เนื่องจากการเสียดสี และตรวจสอบ/ขันนอต ยึดส่วนประกอบต่างๆ ให้แน่นสนิท 1.2 เลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก เช่น เครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้า 1.3 การติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคง และติดอุปกรณ์แรงสั่นสะเทือนที่ฐาน หรือขาของเครื่องจักร เช่น ยาง หรือสปริง เมื่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรลดลง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะลดลงตามลงด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเสียงดังที่ส่งผ่านไปตาม โครงสร้างของอาคารด้วย 1.4 ย้ายเครื่องจักร หรือขั้นตอนการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณที่แยกเฉพาะ หรือไม่มี ระยะทางห่างออกไปจากผู้ปฏิบัติงาน 1.5 หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน 1.6 ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน 1.7 อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นประจำควรมีได้ครอบหรือเบาะเครื่องลงระหว่างการพักเครื่อง 2. การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง 2.1 จัดหอกับังเสียง และผู้ไม่การรุด การเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงสำหรับคนงาน 2.2 ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นาย/รช จันทร์เจริญสุข)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาเลิศ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 45)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. การป้องกันที่ตัวบุคคล 3.1 จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูลดเสียง หรือ ปลั๊กอุดหู ที่ทำจากโฟม หรือวัสดุอื่นที่อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองใช้อุดหูทั้งสองข้าง และจัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสลับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน ในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง 4. บริเวณการทำงานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังตลอดระยะเวลาที่ทำงานสัมผัสเสียงดัง 5. หัวหน้างานหรือ จป. / Safety Engineer ต้องแจ้งวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องให้กับคนงาน ทุกคน โดยเฉพาะคนงานที่รับเข้ามาใหม่		
(1.3) โรคจากความสัมพันธ์	มาตรการฯ ควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสัมพันธ์ 1. ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ด้านของเครื่องมือ 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรสม่ำเสมอเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน มาตรการฯ ควบคุมที่ตัวบุคคล 1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือสองชั้นหรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2. ใช้การปูพื้นด้วยวัสดุป้องกันความสัมพันธ์สั่นสะเทือนสำหรับรถยก 3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกิดความสัมพันธ์สั่นสะเทือนอย่างสม่ำเสมอ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568

(นายเกรียง จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินดา พิมพ์บุร)


(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 46)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(1.4) โรคผิวหนัง	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทงานที่ทำและกำชับให้คนงาน ก่อสร้างใช้ชุดหมวกกันน็อกกันสารพิษ ถุงมือยาง เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี และรองเท้า ยางหุ้มเส้น เมื่อต้องทำงานที่อาจสัมผัสกับสารเคมีอันตราย 2. ติดป้ายเตือนในพื้นที่ที่เป็นอันตรายใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน 3. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีอันตราย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนไม่ให้เห็นได้ชัดเจน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
(1.5) โรคที่เกิดจาก ความร้อน	1. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน 2. จัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวัน ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด มีอากาศถ่ายเท ได้สะดวก และไม่แออัด	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมของ การทำงาน และ บ้านพักคนงาน - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ- นำโรค	1. กำชับให้คนงานปิดฝาถังรองรับมูลสัตว์ให้สนิททุกครั้งหลังทิ้ง เพื่อป้องกันหนู สุนัข แมลงวัน เข้าไปหาอาหาร 2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด 3. ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณโดยรอบบ้านพักคนงานก่อสร้าง 4. จัดให้มีห้องล้างมือที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดสม่ำเสมอ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)



วันทาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

วันทาคม 2568

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แง้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 47)

องค์ประกอบหนังสือแจ้ง และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เพื่อไม่ให้เป็นที่เกิดของโรคต่างๆ 6. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำ รวมทั้งตรวจสอบภาชนะต่างๆ เช่น ขวด กระป๋องต่างๆ ให้ปิดฝาปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นที่เกิดของโรคต่างๆ 7. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศ หรือพบผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงาน 8. อบรมและให้คำแนะนำแก่คนงานในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาทิ การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าส้วม เป็นต้น 9. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน เมาเสลา ดังนี้ 9.1 กำจัดหนู โดยวิธีวางยาพิษ หรือใช้สารเคมีกำจัดหนู 9.2 ดัดพื้นหมอกควันกำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ หรือผงกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 9.3 ดัดพื้นยกกำจัดแมลงสาบ โดยยึดพื้นภายในหลังจากที่คนงานก่อสร้างย้ายออกจากพื้นที่หมดแล้ว 10. เมื่อรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่ก่อสร้างออก ให้กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างออก โดยประสานงานกับสำนักงานเขตฯ ให้เข้ามาเข้าไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงสุขสิ่งปฏิกูลภายในถึงบำบัดน้ำเสียของคนงานในระหว่างก่อสร้างออกให้หมด และทำการฝังกลบบริเวณถึงบำบัดและห้องน้ำ ห้องส้วมทันที 11. ทำความสะอาดพื้นที่ภายในหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงานทันที			



วันเวลา 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 71/192

วันเวลา 2568

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

บุคลากรผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็ม. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

(นางสุกัญญา อุ่นหัตถ์ศิลป์)

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 48)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- โรคติดต่อ	1. ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) และต้องกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ 2. คนงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด และรวบรวมผลการตรวจสุขภาพของคนงานไว้ที่สำนักงานของผู้รับเหมามาเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 3. จัดให้มีระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณูปโภคให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ น้ำดื่ม ระบายน้ำเสีย และถังรองรับมูลฝอย โดยจัดให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน มีรายละเอียดดังนี้ 4.1 จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การสวมหน้ากาก การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น 4.2 ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 4.3 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องไม่มีความสะอาด และกำหนดให้ทำความสะอาดห้องทุกสัปดาห์ 4.4 จัดหาน้ำใช้ระบบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 4.5 ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 4.6 อำนาจความสะอาดทำให้เจ้าหน้าที่กรมนี้มีโรคระบาด	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายวิชาญ จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา หินพวย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

(นางศุภิญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
 ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 49)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง) (2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน	1. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ของสำนักงานความปลอดภัย กรมสวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน 2. จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำในหน่วยงานก่อสร้าง 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ / Safety Engineer เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันจัดทำ และเตรียมพร้อมให้พนักงานตรวจสอบ 5. การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายให้ควมผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้พิจารณา ก่อนดำเนินการ 6. แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่น เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568 ธันวาคม 2568
 (นายกริช จันทระเจริญสุข) (นางสาวพินดา หิมพยุร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เชนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 50)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(2.2) สวัสดิการและ การคุ้มครองแรงงาน	กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง 7. จัดให้มีการตรวจรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างประจำปีให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 8. โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยช่วยกันภัย และความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 9. กำชับให้คนงานทำงานด้วยความระมัดระวัง มีการอบรมการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้ถูกวิธี และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ 10. โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด 1. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาดำเนินการต้องพิจารณาความสามารถการรับผิดชอบต่อภัย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้ ต้องกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.1 กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)



ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภลัย เทาส์ แฉงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 51)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1.2 การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ ให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 1.3 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. จัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวัน ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่แออัด 3. จัดเตรียมผ้ากันเสียดสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน 4. จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้แยกจากที่พักสำหรับคนงานทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ 5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีเอกสารการจ้างคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ที่ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด 6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับคนงานที่เหม่าละสม 7. จัดให้มียาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสำนักงาน สนาม เพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจำเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 8. จัดให้มีอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ประจำห้องปฐมพยาบาล เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายคนงานก่อสร้างที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน 9. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่นำเหตุแห่งการมีประกันอุบัติเหตุหรือกองทุนใดๆ มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง		



ธันวาคม 2568

(นายสุรพงษ์ จันทระเจริญสุข)
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศุภลัย จำกัด



ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พินทุพร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 52)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ทัศนียภาพ และ สุนทรียภาพ	1. ดูแลการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของโรงงานก่อสร้างในบริเวณบ้านพักคนงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลักสุขาภิบาล 2. จัดทำรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ สูง 6 เมตร โดยให้รั้ว metal sheet สีเขียว เพื่อป้องกันทัศนียภาพไม่ให้เสียจากการก่อสร้าง 3. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันภูมิทัศน์ที่ไม่ได้จากการก่อสร้าง และป้องกันฝุ่นละอองที่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงรอบโครงการ 4. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดยก ไม่กีดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้าง และทางสาธารณะ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีผ้าใบปิดคลุมตลอดเวลา ยกเว้นจะเปิดเมื่อรถวิ่งเข้า-ออก 5. มาตรการการฟื้นฟูดินบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมดินสำหรับการปลูกต้นไม้ ดังนี้ 5.1 บริเวณพื้นที่ที่เคยถูกปิดทับด้วยคอนกรีตมาเป็นเวลานานก่อนนำมาใช้เป็นที่ปลูกต้นไม้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ ต้องขุดหน้าดินเดิมออก และไถพรวนดินเพื่อให้ดินที่อยู่ด้านล่างได้รับออกซิเจนและธาตุอาหาร โดยดำเนินการก่อนใช้พื้นที่สำหรับการจัดสวนอย่างน้อย 1 เดือน 5.2 นำดินใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาถมที่ต้นส่วนที่ขุดออกหน้าดินออกไป 5.3 ในการบำรุงดินให้เลือกใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือเศษพืชต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
4.4 การป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัย สาธารณะ	1) การป้องกันอัคคีภัย 1. โครงการต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด ดังนี้	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้อำนวยการนามบริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินิตพชร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ON ON



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ จังหวัดนะ-ทลัส (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 53)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1.1 ไม่เก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างทำการก่อสร้าง และที่พักอาศัยของลูกจ้างในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าจำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น 1.2 ดูแลมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการเก็บวัสดุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด และจัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือ "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ" หรือป้ายซึ่งข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณนั้น 1.3 จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กิโลกรัม โดยให้มีอย่างน้อย 1 เครื่อง ในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายไวไฟหรือติดไฟ งานที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ หรือบริเวณที่มีการเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร หรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง 1.4 จัดให้มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใด กีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟทั้งนี้ ทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถ้าเป็นบันไดชั่วคราวจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้		



ธันวาคม 2568
 (นายกริช จันทร์เจริญสุข)
 กรรมการผู้อำนวยการส่วนบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568
 (นางสาวพินดา พิมพ์)
 (นางสุกัญญา อุบพันนาศิลป์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

77/192

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แอ่งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 54)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- กำหนดพื้นที่สุขุมวิทให้เป็นสัดส่วนโดยติดป้ายเตือนห้ามสุขุมวิทในที่ห้ามสุขุมวิทชัดเจนพร้อมกำหนดมาตรการรถบรรทุกขนส่งวัสดุผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้ปนแหล่งเชื้อเพลิง - ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละอันไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้ได้ถูกต้องทันที - จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และทำการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีภาวการณ์เสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที โดยผู้รับผิดชอบแผนฯ คือ ผู้จัดการโครงการ (เอกสารแนบที่ 1) - จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับสถานดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ (สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง) ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ (สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง) สถานพยาบาล และสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียง ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที - มาตรการด้านอัคคีภัยกรณีที่โครงการอยู่ใกล้กับคลังกระจายสินค้า FedEx 9.1 ให้โครงการประสานขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์กระจายสินค้า Fed Ex ไว้สำหรับประสานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยกรณีเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ของโครงการประสานสถานีดับเพลิงใกล้เคียงเพื่อเข้ามาสกัดเพลิงบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งประเมินผลกระทบเบื้องต้น		



อันวาคม 2568

(นายตรีช จันทระเจริญสุข)

อันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 55)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ต่อโครงการ หากไม่สามารถระบุได้ให้ไม่ในศูนย์กระจายสินค้า Fed Ex ที่อยู่ข้างเคียงได้ ให้ดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยในโครงการและดำเนินการตามแผนอพยพหนีไฟของโครงการในพื้นที่ 9.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แผนการอพยพและระงับเหตุเพลิงไหม้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโครงการกับศูนย์กระจายสินค้า Fed Ex และชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 9.3 จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ อย่างสม่ำเสมอ 9.4 จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติที่ได้มาตรฐาน 9.5 จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนการรับมืออย่างชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 9.6 จัดให้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้ และวิธีการป้องกันตนเอง 2) ความปลอดภัยสาธารณะ 1. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ 2. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง และออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3. จัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 4. ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียน		



ธันวาคม 2568

(นายศรีช จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568


(นางสาวพินดา พินพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 56)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	จากชุมชนจะได้เรียกตรวจสอบได้ 5. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีแหล่งไทยสำหรับปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจตราอย่างถี่ถ้วนทั้งพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 6. จัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยและเลือกคนไม่ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างวัฒนธรรมหมายหรือคนที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือในการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง 7. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสวนติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว 8. จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีเท่านั้น เพื่อลดความเสียหายในการเกิดปัญหาและลดข้อพิพาททางกฎหมายของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ 9. ชี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 10. จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อน ราคาจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาทางแก้ไขทันที โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาร้องเรียน		



ธันวาคม 2568

(นายพีรช จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพิชิตา พิณพชร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 57)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การบำบัดสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง ของดิน	- ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการจะทำการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ สามารถแจ้งหรือเรียกเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบำบัดสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของดิน ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง โดยเมื่อไม่เป็นการดัดแปลงโครงการดังกล่าว บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบำบัดสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของดิน ที่ขึ้นเคียง โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดทำแผนการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบำบัดสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของดิน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจากันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตหลักสี่ ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่ส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
2. ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจากันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด


 (นายหริษ จันทโรจรัญสุข)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
 ธันวาคม 2568



ธันวาคม 2568
 (นางสาวพินิดา พินพยุร)
 (นางสุกัญญา อุณหพัฒนาศิลป์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พหุมาตรการที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- น้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุก - การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก - ความเร็ว - ช่วงเวลาการจราจร	- จัดเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ทุกครั้งที่มีการบรรทุกของรถบรรทุกตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP)	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Hi-Volume และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric	- บริเวณกลางพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 1)	- ตรวจวัดทุกวัน ช่วงรื้อถอน และรายงานผลการตรวจวัดต่อการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10})	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Size Selective Hi-Volume	- บริเวณวัดหลักสี่	- ทุก 1 สัปดาห์ โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง	
	- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$)	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี $PM_{2.5}$ Size Selective Hi-Volume และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric		- ตรวจวัด 1 ครั้ง ต่อเนื่องทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	
	- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- Gas Bag	- บริเวณกลางพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 1)	- CO NO_2 SO_2 และ HC	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)	- Chemiluminescence method - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนด		- ตรวจวัด 1 ครั้ง ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	

ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568


(นายวิชาญ จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิตา พินทุพร)

(นางสุกัญญา ชุ่มพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) 121/192

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภลัย เซนส์ แง้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 1)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	หาวิธีมาตรการที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)		มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป - Gas Bag	- บริเวณวัดหลักสี่	- ทุก 1 สัปดาห์ โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด 1 วันตลอดระยะเวลา รื้อถอน	
- เรื่องการร้องเรียน - บันทึกข้อบกพร่อง - หนังสือรายงานแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไข		- ตรวจสอบจากช่องทางต่างๆ ที่จัดไว้ใน การรับเรื่อง ร้องเรียน - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบเอกสารต่างๆ แยกเป็นรายๆ	- บ้านในระยะประชิดและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทุกวันจนกว่าจะแก้ไข ปัญหา แล้ว เสร็จ ตลอดระยะเวลา รื้อถอน	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
- รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตรการฯ		- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบสภาพและความชัดเจนของป้าย	- ป้ายประชาสัมพันธ์น้ำพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลารื้อถอน	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
- สภาพการทำงานของเครื่องตรวจวัดอากาศแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวัง และสภาพจอแสดงผลด้วยระบบ Real Time		- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบสภาพเครื่องตรวจวัดอากาศแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและจอแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- บริเวณที่ตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศแบบ Sensor และจอแสดงผล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา รื้อถอน	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)



จำนวน 2568

จำนวน 2568



(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (นาย เอล. คอนซิลแมนท์ จำกัด)

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 2)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พหุมิติเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- รายงานการบันทึกวันที่ เวลา และกิจกรรมการก่อสร้างแนวทางการแก้ไขในวันที่มีฝุ่นเกินมาตรฐาน	- จัดให้มี Safety Engineer ทำหน้าที่จดบันทึก	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2. ระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 ชม.) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงรบกวน - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ที่ 90 (L90)	- เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) - ตรวจสอบจากช่องทางต่างๆ ที่จัดให้มีการรับเรื่องราวร้องเรียน - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบเอกสารต่างๆ แยกเป็นรายๆ	- บริเวณที่ต่อเนื่องพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 1) - บริเวณวัดหลักสี่	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการรื้อถอน - ทุก 1 สัปดาห์ โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- เรื่องการร้องเรียน - บันทึกข้อตกลง - หนังสือรายงานแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไข	- ตรวจเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบสภาพและความชัดเจนของป้าย - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-เสียง และป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการฯ	- บ้านโนนระยะประชิดและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- สภาพการใช้งาน	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบขณะเปิดใช้งานเครื่องจักร	- ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
			- เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

ธันวาคม 2568

(นายวัชร จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่มพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แ่งวังมะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 3)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- สภาพการทำงานของเครื่องตรวจวัดเสียงแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและสภาพจอแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- จัดให้มี Safety Engineer ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องตรวจวัดเสียงแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและจอแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- บริเวณที่ตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงแบบ Sensor และจอแสดงผล (ภาพที่ 1)	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
3. แรงสั่นสะเทือน	- วัดระดับแรงสั่นสะเทือน โดยใช้วิธีการตาม ป ร ช ก ค คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐาน - การรื้อถอนเรื่องความเดือดร้อนรำคาญ และความเสียหายจากแรง สั่นสะเทือน - ความเสียหายของสิ่งก่อสร้างภายในบ้าน/อาคาร	- เครื่องมือวัดค่าแรงสั่นสะเทือน (Vibration meter) - ตรวจสอบจากช่องทางต่างๆ ที่จัดไว้ในการรับเรื่องราวร้องเรียน - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต่างๆ แยกเป็นรายๆ	- บริเวณที่ติดตั้งนอกของพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 1) - อาคาร/บ้านเรือน และทรัพย์สินของ ป ร ช ก ค น ประกอบการที่แจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ - อาคาร/บ้านเรือน และทรัพย์สินของ ป ร ช ก ค น ประกอบการที่แจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นางกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุ)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็ม. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ สุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 4)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	หามาติเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- รายงานผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนในระหว่างรื้อถอนและป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการฯ	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบสภาพและความชัดเจนของป้าย	- ป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- สภาพการทำงานของเครื่องตรวจวัดสั่นสะเทือนแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวัง และสภาพแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- จัดให้มี Safety Engineer ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องตรวจวัดสั่นสะเทือนแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนด้วยระบบ Real Time	- บริเวณที่ตั้งเครื่องตรวจวัดสั่นสะเทือนแบบ Sensor และจอแสดงผล (ภาพที่ 1)	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
4. การจัดการน้ำเสีย	- จำนวนห้องน้ำ/ห้องส้วมที่เพียงพอสำหรับคนงาน (จัดไว้อย่างน้อย 5 ห้องสำหรับคนงาน 90 คน)	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบการใช้งานของห้องน้ำ/ห้องส้วม	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	- pH Meter - วิธียูทมิเตอร์ดิจิตอล - วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบที่อุณหภูมิตั้งแต่ 103 ถึง 105 องศาเซลเซียส เป็น	- บ่อตรวจคุณภาพก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



จำนวน 2568

(นายวิรัช จันทรีเจริญสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2568

(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)
บริษัท สุภาลัย จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แอ็งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 5)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolve Solids)	เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง - วิธีระเหยด้วยอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบที่อุณหภูมิตั้งแต่ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง - วิธีไอโอโคเดเมทริก หรือวิธีเมทีลีนบลู - วิธีเจลดาล์ด (Kjeldahl)			
	- ซัลไฟด์ (Sulfide)				
	- ไทเดเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)				
	- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)				
5. การระบายน้ำ	- สภาพการชำรุด - สภาพการอุดตันระบบระบายน้ำฝน บ่อพักน้ำฝนชั่วคราว	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบ - วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันจากของน้ำมันและไขมัน	- ระบบระบายน้ำพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (รางระบายน้ำและบ่อพักน้ำฝนชั่วคราว)	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
6. การจัดการมูลฝอย	- สภาพการชำรุด - รอยรั่วหรือแตก	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบสภาพการใช้งาน	- ถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

จำนวน 2568

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) จัดทำโดย บริษัท เอ.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 6)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจราจร	- การปิดคลุมรถบรรทุกเรียบร้อย - การล้างล้อรถ - สภาพร่างกาย ความพร้อมของคนขับรถ - การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ - สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบ บร บ ร ทุก บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบ	- รถบรรทุกที่ออกจากโครงการ - เรื่องการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบและในขณะที่ยี่รถถอน	- ทุกครั้งที่รถบรรทุกออกจากพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาที่รื้อถอน - ทุกวันตลอดระยะเวลาที่ยี่รถถอน	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฯ ของคนงานก่อนเริ่มและขณะปฏิบัติงาน - จัดเจ้าหน้าที่บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- คนงานในขณะปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการ - ป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มและขณะปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ยี่รถถอน - ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่ยี่รถถอน	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตหลักสี่ ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่ส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
2. ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการฯ แต่ไม่สามารถลงจากดกลังกันไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เป็นผล ผู้ใช้สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้

โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด



ธันวาคม 2568

(นายวิรัช จันทน์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พิมพ์)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง สุภาลัย เซนส์ แอ่งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรดิน	- ความมั่นคงแข็งแรงของรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- จัดเจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบ	- รั้วหรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2. ธรณีวิทยา	- ความมั่นคงแข็งแรง โดยไม่มีรอยแตกร้าว/ทรุดตัว	- จัดวิศวกรงานโครงสร้างตรวจสอบบริเวณอาคารที่ก่อสร้าง	- บริเวณฐานราก เสาเข็ม และตัวอาคาร	- ทุกวัน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
3. คุณภาพอากาศ	- น้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุก	- จัดเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกครั้งที่มีการบรรทุกของรถบรรทุก	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก				
	- ความเร็ว				
	- ช่วงเวลาการจราจร				
	- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP)	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Hi-Volume และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric	- บริเวณกลางพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 1)	- TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀)	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี PM ₁₀ Size Selective Hi-Volume และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric		- ตรวจวัดทุกวันช่วงทำฐานราก และรายงานผลการตรวจวัด ต่อสำนักงานเขตทุกสัปดาห์	
	- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	- เก็บตัวอย่างด้วยวิธี PM _{2.5} Size Selective Hi-Volume และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric		- ตรวจวัด 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด 1 วันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินดา พินพยุ)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนศิลป์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แอ่งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 1)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพย์สินที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)	- Gas Bag - Chemiluminescence methode	- บริเวณกลางพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 1)	- ทุก 1 เดือน โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด 1 วันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)	- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	- บริเวณวัดหลักสี่	- ทุก 1 เดือน โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด 1 วันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
	- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)	- Gas Bag		- ทุกวันจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- เรื่องการร้องเรียน - บันทึกข้อตกลง - หนังสือรายงานแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไข	- ตรวจสอบจากช่องทางต่างๆ ที่จัดไว้ในารับเรื่องราวร้องเรียน - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต่างๆ แยกเป็นรายๆ	- บ้านโนนระยะประชิดและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ		

วันรวม 2568

วันรวม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)


(นางสาวพินิดา พินพยุร)

(นางสุกัญญา ย่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แอ่งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 2)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีตรวจวัด/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการฯ	- จัดให้มี Safety Engineer ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพและความชัดเจนของป้าย	- ป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่โครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- สภาพการทำงานของเครื่องตรวจวัดอากาศแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและสภาพจอแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องตรวจวัดอากาศแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและจอแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- บริเวณที่ตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศแบบ Sensor และจอแสดงผล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- รายงานการบันทึกวันที่ เวลา และกิจกรรมการก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข ในวันที่มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน	- จัดให้มี Safety Engineer ทำหน้าที่จัดบันทึก	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
4. ระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 ชม.) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงรบกวน - ระดับเสียงเบรตส์ที่ 90 (L ₉₀)	- เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)	- บริเวณทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 1)	- ทุกวันช่วงเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขต ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด 1 วัน ตลอด	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิตา พิลพยุร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาคิลป์)
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศุภลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 3)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- เรื่องการร้องเรียน - บันทึกข้อบกพร่อง - หนังสือรายงานแจ้งความเคืบหน้าในการแก้ไข - รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงและป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการฯ - สภาพการไ้งาน			- บริเวณวัดหลักสี่	- ทุก 1 เดือน โดยตรวจวัด 3 วันต่อเมื่อครบกลุ่มวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
		- ตรวจสอบจากช่องทางต่างๆ ที่จัดไว้ในารรับเรื่องร้องเรียน - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบเอกสารต่างๆ แยกเป็นรายๆ	- บ้านในระยะประชิดและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทุกวันจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
		- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบสภาพและความชัดเจนของป้าย	- ป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่โครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
		- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบขณะเปิดใช้งานเครื่องจักร	- เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)



จำนวน 2568

จำนวน 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์ เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน) (ต่อ 4)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- สภาพการทำงานของเครื่องตรวจวัดเสียงแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวัง และสภาพจอแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- จัดให้มี Safety Engineer ทำหน้าที่ตรวจ สอบ สภาพ เครื่องตรวจวัดเสียงแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและจอแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- บริเวณที่ตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงแบบ Sensor และจอแสดงผล (ภาพที่ 1)	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)
5. แรงสั่นสะเทือน	- วัดระดับแรงสั่นสะเทือน โดยใช้วิธีการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานการสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- เครื่องมือวัดค่าแรงสั่นสะเทือน (Vibration meter)	- บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 1)	- ทุกวัน ช่วงงานเสาเข็ม และฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน	- บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)
			- บริเวณวัดหลักสี่	- ทุก 1 เดือน โดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
	- การร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อน รำคาญ และความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน	- ตรวจสอบจากช่องทางต่างๆ ที่จัดไว้ในการรับเรื่องราวร้องเรียน	- อาคาร/บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชน/สถานประกอบการที่แจ้งร้องเรียนมายังโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2568

จำนวน 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์การค้า (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 5)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ความเสียหายของสิ่งก่อสร้าง ภายในบ้าน/อาคาร	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบเอกสารต่างๆ แยกเป็นรายๆ	- อาคาร/บ้านเรือน และทรัพย์สิน ของประชาชน/สถานที่ประกอบการ ที่แจ้งเรื่องเรียนมายังโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- รายงานผลการตรวจวัดระดับ แรงสั่นสะเทือนในระหว่างก่อสร้าง และป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม มาตรการฯ	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบสภาพและความชัดเจนของ ป้าย	- ป้ายประชาสัมพันธ์น้ำพื้นที่ โครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
6. การใช้น้ำ	- สภาพการทำงานเครื่องตรวจวัด สั่นสะเทือนแบบ Sensor เพื่อเฝ้า ระวัง และสภาพจอแสดงด้วยระบบ Real Time	- จัดให้มี Safety Engineer ทำ หน้าที่ตรวจ สอบ สภาพ เครื่องตรวจวัดสั่นสะเทือนแบบ Sensor เพื่อเฝ้าระวังและ จอแสดงผลด้วยระบบ Real Time	- บริเวณที่ตั้งเครื่องตรวจวัด สั่นสะเทือนแบบ Sensor และ จอแสดงผล (ภาพที่ 1)	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
	- ระบบท่อ ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบประปาไม่มีการ รั่วซึม	- ระบบท่อ ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบประปาไม่มีการ รั่วซึม	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ก่อนการใช้งานและ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
7. การจัดการน้ำเสีย	- สภาพการชำระ - ความพร้อมในการใช้งาน	- ตรวจสอบ จอมแซมอุปกรณ์ใน ระบบบำบัดน้ำเสียตามคู่มือการใช้ งานที่ระบุไว้โดยเจ้าหน้าที่	- ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ ก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้ชำนาญการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุร)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์การค้า เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศูนย์การค้า (มหาชน) (ต่อ 6)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - บิโอดี (Biochemical Oxygen Demand) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolve Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)		- pH Meter - วิธีย่อยเคมีดิฟเฟอเรนเชียล - วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบที่อุณหภูมิตั้งแต่ 103 ถึง 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง - วิเคราะห์ด้วยวิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบที่อุณหภูมิตั้งแต่ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง - วิธีย่อยไอโอโดเมตริก หรือวิธีเมทิลบลู - วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl) - วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันของน้ำมันและไขมัน	- ป้อมตรวจคุณภาพก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณพื้นที่โครงการ	- ทุกเดือน - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศูนย์การค้า (มหาชน)



ธันวาคม 2568

(นายสุวิทย์ จันทร์เจริญสุข)

บริษัท ศูนย์การค้า (มหาชน)

ธันวาคม 2568


(นางสาวพินิดา พิมพ์พร)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 7)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พหุมาตรการที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำ	- สภาพการชำรุด - สภาพการอุดตัน	- เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ	- ระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (รางระบายน้ำและบ่อพัก น้ำในชั่วคราว)	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
9. การจัดการมูลฝอย	- บันทึกปริมาณเศษวัสดุที่เหลือ จากการก่อสร้างนำไปกำจัดที่ ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก การก่อสร้างในศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช หรือสถานที่กำจัดของ เอกชนที่ได้รับอนุญาตตาม กฎหมาย	- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ได้รับ จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาต	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกครั้งที่มีการนำเศษ วัสดุไปกำจัด ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
10. ระบบไฟฟ้า	- รายการการบันทึก ปริมาณ และ ใบเสร็จรับเงิน	- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ได้รับ จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาต	- สำนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
	- สภาพการชำรุด - รอยร้าวหรือแตกของถังรับมูลฝอย	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบสภาพการใช้งาน	- ถึงรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบริเวณบ้านพัก คนงาน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
	- ไม่ชำรุดและอยู่ในสภาพใช้งานได้	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบ	- สายไฟและระบบอุปกรณ์ต่างๆ ใน ระบบไฟฟ้า	- ทุกสัปดาห์ หรือก่อน การใช้งานทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)



วันทศ 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)


วันทศ 2568

(นางสาวพินิดา พินพยุ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภาลัย เซนส์ แสงวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 8)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พหุมาตรการที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
11. การจราจร	- การปิดถนนรอบรถทุกเที่ยว - การล้างล้อรถ - สภาพร่างกาย ความพร้อมของ คนขับรถ - การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ได้รับผลกระทบ - สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง - สภาพของถนนและส่วนประกอบ ในเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ รถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบ - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบ	- รถบรรทุกที่ออกจากโครงการ - เรื่องการร้องเรียนจากชุมชน โดยรอบและในขณะที่กำลัง - ถนนในเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง	- ทุกครั้งที่รถบรรทุก ออกจากพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุกครั้งที่รถบรรทุก ออกจากพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
12. การสื่อสาร	- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ได้รับผลกระทบ	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบ	- เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่อยู่ โดยรอบพื้นที่โครงการเกี่ยวกับการ บังคับใช้นโยบายและทรัพย์สิน	- ตลอดระยะเวลาในช่วง ก่อสร้างจนถึงเปิดใช้ อาคารแล้ว 3 เดือน	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
13. สังคมและเศรษฐกิจ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในสภาพดี ไม่เปลี่ยนแปลง - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ ความคิดเห็นของประชาชน สถาน ประกอบการและหน่วยงานที่	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบการมองเห็นของป้าย - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านสังคมศาสตร์ เข้าพบปะ ประชาชนเพื่อสอบถามถึง	- ประชาชนกลุ่มระยะประชิดพื้นที่ โครงการ กลุ่มผู้พักอาศัยและสถาน ประกอบการที่อยู่ในระยะ 100	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนถึงก่อนการขอ	- บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



จำนวน 2568

(นายกริช จันทระเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2568

(นางสาวทิพา พินทุย)


บุคลากรควบคุมสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์ เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของบริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน) (ต่อ 9)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พหุมาตรการที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อการ - ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ - เรื่องร้องเรียน - บันทึกข้อบกพร่อง - หนังสือรายงานแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไข	ผลกระทบ ความเดือดร้อน/รำคาญ ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบจากช่องทางต่างๆ ที่จัดไว้ในกรรับเรื่องราวร้องเรียน - จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบเอกสารต่างๆ แยกเป็นรายๆ	เมตร พื้นที่รอบใน และผู้ชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร และพื้นที่ตลอดตามแนวเส้นทางขนส่ง - ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	อนุญาตเปิดใช้อาคาร - ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)
14. การสาธารณสุข	- เบอร์ดิตต่อรถฉุกเฉินหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานและความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือ และการมีป้าย/เอกสารที่บอกเบอร์ดิตต่อรถฉุกเฉิน หรือสถานพยาบาลให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะ ยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)


 (นายกริช จันทระจริยสุท)

วันทาม 2568

วันทาม 2568


 (นางศกัญญา พินพอร)

(นางสาวพินดา พินพอร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สุภลัย เซมส์ แง้ววัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)

ของ บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน) (ต่อ 10)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
15. อากาศภายในและภายนอกอาคาร	- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฯ ของคนงานก่อนเริ่มและขณะปฏิบัติงาน	- คนงานในขณะปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการ	- ก่อนเริ่มและขณะปฏิบัติงาน	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- จัดเจ้าหน้าที่บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือน	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
16. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพและความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบพร้อมทำบันทึกในการตรวจสอบไว้ทุกครั้ง	- ดัชนีดับเพลิงเคมี ป้ายเตือน ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามไฟ และจุดรวมพลให้สามารถใช้งานได้ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือน	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
	- เอกสารรับรองการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับสถานับดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมทำบันทึกในการตรวจสอบไว้ทุกครั้ง	- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	- ทุก 1 ปี	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
17. ความปลอดภัยสาธารณะ	- สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV)	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ-สอบ พร้อมทำบันทึกในการตรวจสอบไว้ทุกครั้ง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน	- บริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)
	- เรื่องร้องเรียนจากทรัพย์สินสูญหายหรือเหตุอันตรายต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง	- เจ้าหน้าที่เวรยามคอยตรวจรักษาความปลอดภัย			



จำนวน 2568

จำนวน 2568

(นายกริช จันทริเจริญสุข)

(นางสาวพินิดา พินพยุ)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท สุภลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ศูนย์ฯ เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่ (SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI)
ของ บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) (ต่อ 11)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	พหุมาตรการที่ใช้ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
18. สุขภาพ	- สภาพการจ้างงานของแรงงาน เขตพื้นที่โครงการ	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบตามแนวเขตพื้นที่โครงการ	- รั้วที่ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)
	- สภาพการจ้างงานของผ้าใบ	- จัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจ- สอบรอบแนวอาคาร	- ผ้าใบที่คลุมรอบบริเวณอาคารที่ กำลังก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และส่งสำนักงานเขตหลักสี่ ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่ปฏิบัติตามฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
2. ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และดำเนินการดำเนินการดังกล่าวนำมาใช้

เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด



วันเวลา 2568

วันเวลา 2568

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางสาวพินิตา พินพยุ)

(นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอ็น. เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด



ภาคผนวกที่ 2

ใบอนุญาตการก่อสร้าง (แบบ ขพ. 4)

ด่วนมาก

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ

แบบ ยผ.๑ เลขรับที่ ๒

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙



แบบ ยผ. ๔

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตร

เลขที่ ๒ / ๒๕๖๙

ได้รับแจ้งจาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายกริช จันทร์เจริญสุข เจ้าของอาคาร
หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑๑ ตรอก/ซอย -
ถนน พระรามที่ ๓ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ช้องนันทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☒ ก่อสร้างอาคาร
☐ ดัดแปลงอาคาร
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะ
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ห้วยสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ ส.ค.๑ เลขที่ ๓๓๒๑ ๓๖๑๘ และ ๓๖๑๙
เป็นที่ดินของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร A) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๗๘ ห้อง)
สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์ มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว ๘,๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ
ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน ๑๓๒ คัน มีพื้นที่ ๑,๒๗๔.๐๐ ตารางเมตร/เมตร (ทั้งโครงการ)
๒.๒ ชนิด ตึก ๘ ชั้น (อาคาร B) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๕๐ ห้อง)
และจอดรถยนต์ มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว ๗,๐๖๘.๐๐ ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์
และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน มีพื้นที่ - ตารางเมตร
๒.๓ ชนิด ตึก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ห้องเครื่องนาระบบไฟฟ้า
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว ๔๓.๐๐ ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์
จำนวน - คัน มีพื้นที่ - ตารางเมตร
๒.๔ ชนิด รั้ว ค.ส.ล จำนวน - เพื่อใช้เป็น กันแนวเขตที่ดิน
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว ๓๖.๐๐ ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์
จำนวน - คัน มีพื้นที่ - ตารางเมตร
EIA โครงการ ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ-หลักสี่

๒.๕ ชนิด ท่อระบายน้ำ.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว.....๑๑๘.๐๐.....ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์
จำนวน.....คัน มีพื้นที่.....ตารางเมตร
๒.๖ ชนิด ป้ายโครงเหล็ก (บนหลังคา) อาคาร B จำนวน.....เพื่อใช้เป็นป้ายชื่อสถานประกอบการ
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว.....๔.๐๐.....ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์
จำนวน.....คัน มีพื้นที่.....ตารางเมตร

ข้อ ๓ โดยมี

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| ☒ | นายชโลธร ศิริภัทรประวัติ ส-สธ ๒๙๕๙ | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| ☒ | นายณวัชร วุฒิพงษ์วรโชค ส-สธ ๓๐๙๓ | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| ☒ | นายอธิป นิลจุ สย.๑๑๐๓๐ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง |
| ☒ | นายดำรงศักดิ์ วนิชยาโกศล สย.๑๐๕๓๓ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| ☐ | - | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ |
| ☐ | - | ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| ☐ | - | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศ |
| ☐ | - | ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| ☒ | นายกิตติเทพ เลขะวิวัฒน์ สส.๓๐๐ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย |
| ☒ | นายอนวัช ฉวีสุข ภส.๘๓๒ | และภาระบายน้ำทิ้ง |
| ☒ | นายอนวัช ฉวีสุข ภส.๘๓๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย |
| ☒ | นายอนวัช ฉวีสุข ภส.๘๓๒ | และภาระบายน้ำทิ้ง |
| ☐ | - | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา |
| ☐ | - | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา |
| ☐ | - | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ |
| ☐ | - | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ |
| ☐ | - | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า |
| ☐ | - | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |
| ☒ | นายธรรมนุญ แสงเสยโย วย.๑๐๒๑ | เป็นวิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบงานออกแบบ |
| ☒ | นายธรรมนุญ แสงเสยโย วย.๑๐๒๑ | และคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน.....๒.....ปี โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ก่อสร้างอาคาร/รื้อถอนอาคาร
วันที่.....๘ มกราคม ๒๕๖๙.....และจะแล้วเสร็จวันที่.....๗ มกราคม ๒๕๗๑.....

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / ดัดแปลง

(๑) อาคาร จำนวนเงิน.....	๗๑,๓๓๘.๐๐	บาท
(๒) ท่อระบายน้ำ ร้ว เชื้อน กำแพงหรืออื่นๆ จำนวนเงิน.....	๑๕๔.๐๐	บาท
(๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน.....	๖๓๗.๐๐	บาท
(๔) ป้าย จำนวนเงิน.....	๑๖.๐๐	บาท
(๕) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง จำนวนเงิน.....	๒๐๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน.....	๗๒,๓๔๕.๐๐	บาท

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้ง อีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการ ตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ของอาคารที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี หนังสือแจ้ง ข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าวให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบกพร่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ในวันอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่ากรณีก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อบกพร่องได้ตลอดเวลา

(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรื้อถอนที่สาธารณะ

(๔.๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ

(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบรับแจ้งดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งจะต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณด้านนอกโครงการตามแนวเขตที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ข้อ ๑๔ ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดควันดำหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน หรือขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๑๕ ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลงรถยนต์ เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักชดต่อประกาศผู้อำนวยการท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๖. ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๒๗๒๓๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๗ ผู้แจ้งจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีเหตุอื่นใดที่ทำให้อาคารจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือจะต้องยื่นขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นใด อันเป็นเหตุเกิดจากการอนุญาตในครั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๑๘ หลังจากได้รับใบรับแจ้ง หากพบว่ามี การก่อสร้าง ดัดแปลง เพิ่มพื้นที่ในท้องที่ หรือในอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ ผู้ได้รับใบรับแจ้งจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๑๙ อาคารเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบ ดำเนินการใช้วัสดุตามรายละเอียดที่กฎกระทรวงกำหนดไว้ และจัดส่งหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

ข้อ ๒๐ หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขมีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

ออกให้ ณ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๙


(นายประพาส เหลืองศิรินภา)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้แจ้งจะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. เมื่อผู้แจ้งก่อสร้างหรือก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือก่อสร้างอาคารนั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง เว้นแต่จะได้ใบรับรองการก่อสร้างหรือก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว



ภาคผนวกที่ 3

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร
หรือผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 39 ทวิ (6) (7)

เขียนที่ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน).....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ข้าพเจ้า นายดำรงศักดิ์ วนิชชาโกศล อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย
 อยู่บ้านเลขที่ 49/204 ต.รอก/ซอย 57 ท.วัด 64 เขต 13 ถนน วิทยุรังสิต
 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลาดบางพล อำเภ/เขต นนทบุรี
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 081 804 1266 ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
 วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
 ประเภท สถาปนิก วิชา โยธา
 แขนง ตามใบอนุญาตเลขที่ทะเบียน สย. 10533
 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว และไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ ขอ
 รับรองว่า

(1) ข้าพเจ้า

- ☐ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
- ☐ เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
- ☒ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ/ระบบระบายอากาศ/ระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมระบบปรับอากาศ/ระบบระบายอากาศ/ระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ตามหนังสือแจ้งของ.....บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน).....ซึ่งประสงค์จะทำการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/
รื้อถอนอาคาร.....ตึก 8 ชั้น (อาคาร A) จำนวน.....1.....หลัง เพื่อใช้เป็น.....อาคารชุดอยู่อาศัย (178 ห้อง) สโมสร สระว่ายน้ำ
และ ที่จอดรถยนต์ทั้งโครงการ 132 คัน และ ตึก 8 ชั้น (อาคาร B) จำนวน.....1.....หลัง เพื่อใช้เป็น.....อาคารชุดอยู่อาศัย (150
ห้อง) และ อาคารห้องเครื่อง จำนวน.....1.....หลัง เพื่อใช้เป็น.....ห้องเครื่องงานระบบไฟฟ้า และ.....รั้ว.....จำนวน.....1.....แห่ง ความ
ยาว.....36.00.....เมตร เพื่อใช้.....กันแนวเขตที่ดิน และ ท่อระบายน้ำ.....จำนวน.....1.....แห่ง ความยาว.....118.00.....เมตร เพื่อใช้
ระบายน้ำโครงการ และ ป้ายบนอาคาร.....จำนวน.....1.....แห่ง เพื่อใช้เป็น.....ป้ายชื่อสถานประกอบการ ที่บ้านเลขที่.....-
ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....แจ้งวัฒนะ.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งสองห้อง.....อำเภอ/เขต.....หลักสี่.....จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โดยไม่ยื่นคำขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ

(2) ข้าพเจ้าในฐานะ

☐ ผู้ออกแบบอาคาร ขอรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและการออกแบบอาคาร ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา
หรือ ผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น

☐ ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร ขอรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและการออกแบบ
และคำนวณอาคารถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ออกพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ผู้ทุพพลภาพคนชราหรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
สะดวกนั้น

☒ ผู้ควบคุมงาน ขอรับรองว่าจะควบคุมงานก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้องตามแบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณตามที่ได้แจ้งไว้และที่ได้มีการแก้ไข ตามข้อทักท้วง หรือ
ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ).....วิศวกร/สถาปนิก

(นายดำรงศักดิ์ วิจิตรพงศ์ศิลป์) ผู้รับรอง

(ลายมือชื่อ).....ผู้แจ้ง

(บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน))

(ลายมือชื่อ).....พยาน

(นายอริยะ พลังไกร)

(ลายมือชื่อ).....พยาน

(นายธนวิทย์ อินทร์บุญสังข์)

หมายเหตุ (1) ข้อความที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

(2) ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



๑๖๑๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สายด่วน ๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๕๕, ๐-๒๙๓๕-๖๖๕๗
www.coe.or.th

ที่ D-COE๐๐๐๕๖๗/๒๕๖๙

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายดำรงศักดิ์ วนิชยาโกศล เลขทะเบียนใบอนุญาต
สย.๑๐๕๓๓ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ฉบับปัจจุบันออกให้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๑ ขณะนี้ไม่ได้ถูก
พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙



สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อมูลสรุปตามที่ระบุไว้ในคำขอหนังสือรับรองนี้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ มาตรา 39 ทวิ

ประเภทงาน งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งานที่รับผิดชอบ ก่อสร้าง


สิ่งปลูกสร้างชนิด อาคารคสล.8ชั้นอาคารA 1หลัง อาคารB 1หลัง อาคารห้องเครื่อง 1หลัง

เจ้าของ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบตาม QR CODE ท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate





รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

1

เลขรหัสประจำบ้าน

1036-016346-7

สำนักงานทะเบียน

ท้องถิ่น เขตหลักสี่

รายการที่อยู่

49/204 หมู่ที่ 3

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน

บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

4 กันยายน 2535

ลงชื่อ

(นางสังัด สืบยวบ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

3 กุมภาพันธ์ 2554

นายทะเบียน

95 หมู่ 3 ต.บางเขน เขตหลักสี่ (มท.ร.)
ใหม่

คิงส์

2

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

1036-016346-7

ลำดับที่

1

ชื่อ นายดำรงศักดิ์ วนิชยาโกศล

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1012-03571-53-8 สถานภาพ

โสด อายุ 16 ปี เกิดเมื่อ 16 เม.ย 2511

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แฉล้ม

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กิตติ

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กิตติ

สัญชาติ ไทย

มาจาก 409/43 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 3 ก.พ. 2554

(นางสังัด สืบยวบ)

นายทะเบียน

ไป

นายทะเบียน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 1012 03571 53 8

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ดำรงค์ดี วณิชยาโกศล



Name Mr. Damrongsak

Last name Vanichayakosol

เกิดวันที่ 16 เม.ย. 2511

Date of Birth 16 Apr. 1968

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 49/204 ซ.นิภาวดีรังสิต 64 แขวง คลองสามวา

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

16 เม.ย. 2566

วันออกบัตร

26 Apr. 2023

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)

เจ้าพนักงานออกบัตร

15 เม.ย. 2575

วันบัตรหมดอายุ

15 Apr. 2032

Date of Expiry



1041-03-04260955

วงษ์ วณิชยา งามดี (มทป)
ไพฑูริย์
ดำรงดี

หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร
หรือผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 39 ทวิ (6) (7)

เขียนที่ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ เดือน พ.ศ.
ข้าพเจ้า นายณวิธ วุฒิพงษ์วร โโชค อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ 186/59 ตรอก/ซอย - ถนน มาตรฐาน
หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ อำเภอ/เขต เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์ โทรศัพท์ 089-4010347 ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
ประเภทสามัญสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมหลัก แขนง - ตามใบอนุญาตเลขที่ทะเบียน ศ-สถ 3093
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว และไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ ขอ
รับรองว่า

(1) ข้าพเจ้า

- ☐ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
- ☒ เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ โครงสร้าง
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงาน โครงสร้าง
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ/ระบบระบายอากาศ/ระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมระบบปรับอากาศ/ระบบระบายอากาศ/ระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
- ☐ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ตามหนังสือแจ้งของ.....บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน).....ซึ่งประสงค์จะทำการก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/
รื้อถอนอาคาร ดีก 8 ชั้น (อาคาร A) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (178 ห้อง) สโมสร สระว่ายน้ำ
และ ที่จอดรถยนต์ทั้งโครงการ 132 คัน และ ดีก 8 ชั้น (อาคาร B) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (150
ห้อง) และ อาคารห้องเครื่อง จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น ห้องเครื่องงานระบบไฟฟ้า และ รั้ว จำนวน 1 แห่ง ความ
ยาว 36.00 เมตร เพื่อใช้ กันแนวเขตที่ดิน และ ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ความยาว 118.00 เมตร เพื่อใช้
ระบายน้ำโครงการ และ ป้ายบนอาคาร จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น ป้ายชื่อสถานประกอบการ ที่บ้านเลขที่ -
ตรอก/ซอย - ถนน จังหวัด ถนน ตำบล/แขวง ทั้งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โดยไม่ยื่นคำขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ

(2) ข้าพเจ้าในฐานะ

☐ ผู้ออกแบบอาคาร ขอรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและการออกแบบอาคาร ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา
หรือ ผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น

☐ ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร ขอรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและการออกแบบ
และคำนวณอาคารถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ผู้ทุพพลภาพคนชราหรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
นั้น

☒ ผู้ควบคุมงาน ขอรับรองว่าจะควบคุมงานก่อสร้าง คัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้องตามแบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณตามที่ได้แจ้งไว้และที่ได้มีการแก้ไข ตามข้อทักท้วง หรือ
ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ) พร ภิเษกรโศ จิสดร/สถาปนิก

(นายณวิทย์ วุฒิพงษ์วรโชค) ผู้รับรอง

(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง

(บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน))

(ลายมือชื่อ) พยาน

(นายอริยะ พลังไกร)

(ลายมือชื่อ) พยาน

(นายธนวิทย์ อินทร์บุญสังข์)

หมายเหตุ (1) ข้อความที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

(2) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

6099-0364-2

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ ๖

รายการที่อยู่ 186/59 ถนนมาตุลี

ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน ขี้ฉาบ

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ॐ

ลักษณะบ้าน

นายทะเบียน

๑) ส่วนประกอบ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 พฤษภาคม 2547

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของ **สิริพร หัสบุญจำบ้าน**

6099-036471-2

ลำดับที่

ชื้อ นายทวีต วุฒิกุลวโรชิต

สัตยชาติ ไทย

๗๕๙ ๗๕๙

เลขประจำตัวประชาชน: 5-6099-90035-~~6~~5-9

สำนักพิมพ์ **W** ผู้รู้ค่า

เกิดเมื่อ 21 ต.ค. 2523

ឈ្មោះអ្នកប្រកាស ឈ្មោះ

ស័ព្ទបទ ១៣៧

บอกเล่าให้กำเนิด ชื่อ

កំពូល ២០២២

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 26 ธ.ค. 25

นางสาวพิมพ์ลรัตน์ สำนวน

• Unit 5 • Job / Interview

2023-02411-5

#เพื่อควมมั่นคงทางอาหารอยู่ไทย ของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) #

ข้อควรระวัง ถนนที่แจ้งขึ้นจะแขวงทางสองห้อง เขตหลักสี่

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 โนนทบุรี 321,363,83619

รับรองตำแหน่งถูกต้อง

๑๐๖



บัตรประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 5 6099 90035 08 9
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นววิธ วุฒิพงษ์วรโชค



ชื่อ Mr. Nawawit

ชื่อ นามจริง Wuthiphongworach

เกิดวันที่ 21 ต.ค. 2523

Date of Birth Oct. 1980

ศาสนา

ที่อยู่ 186/52 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์

จ.นครสวรรค์

26 ต.ค. 2567

วันออกบัตร

26-Oct. 2023

Date of Issue

อายุ 44 ปี

(ภาพถ่าย - ชลประทาน)

เจ้าหน้าที่ ออกบัตร

20 ต.ค. 2576

วันหมดอายุ

20 Oct. 2033

Date of Expiry

1017-05-10261108



#ใช้เพื่อควบคุมการออกบัตรประชาชน

ก่อสร้างที่ กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10261

รับรองสำเนาถูกต้อง
นาย นววิธ วุฒิพงษ์วรโชค

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ARCHITECT LICENSE

นาย นววิธ วุฒิพงษ์วรโชค
Nawat Wuthiphongworachok

สาขา สถาปัตยกรรมหลัก
Field: Architecture

รับรองสำนักงานสถาปัตย์
Licensed Architect

เลขที่ใบอนุญาต-ร.ส.ท. 3093 Lic.Arch. 3093

ออกบัตร 27 กันยายน 2555 วันที่ออกบัตร 27 Sep 2012

หมดอายุ 26 กันยายน 2570 Date of Expiry 26 Sep 2027

นาย นววิธ วุฒิพงษ์วรโชค
Signature

สภาสถาปนิก
ARCHITECT COUNCIL OF THAILAND

12 ถนนพหลโยธิน ซอย 36 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10240
12 Phloeyth Road, Soi 36, Haeprathai, Bangkok, Bangkok 10240, Thailand
Tel: 02-2318 2318 Fax: 02-2318 2311-2 E-mail: office@act.or.th

นาย นววิธ วุฒิพงษ์วรโชค
Mr. Nawat Wuthiphongworachok

สมาชิกสามัญ
Ordinary Member No. 013193

นาย ประทีป พนาวิไลกุล
นายเกรียงศักดิ์
Secretary General President

#ใช้เพื่อควบคุมงานเป็นของตนเอง (มหาชน)#

10210 โฉนดเลขที่ 10210

รับรองสำนักงานสถาปัตย์

นาย นววิธ วุฒิพงษ์วรโชค



ARCHITECT
COUNCIL OF
THAILAND

AC+20
ARCHITECT COUNCIL OF THAILAND



หน้าหลัก ขอมติรับรอง หน้าของจีน ออกจากระบบ คู่มือการใช้งาน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าการชำระเงินถูกตรวจสอบ กรุณานำ Barcode ด้านล่างไปสแกนยังจุดให้บริการเพื่อทำการชำระค่าบริการ

อาคารพักอาศัย บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ: นาย นวโร วุฒิพงษ์วิชัย
ใบอนุญาต: ส.ส. 3093
สถาปัตยกรรมควบคุมสาขา: สถาปัตยกรรมหลัก
วันหมดอายุ: 26 กันยายน 2570

โครงการ: อาคารพักอาศัย บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 1 ตรอก/ซอย - ถนน แขวง/เขต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
รับผิดชอบในชั้นงาน: บริหารและอำนวยความสะดวกสร้าง (ควบคุมงาน)
จะทำการ: ก่อสร้าง
ใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ: ตามมาตรา 39 ทวิ
เจ้าของโครงการ: บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
ที่ดิน: โฉนดที่ดิน เลขที่ 3321,3618,3619 เป็นที่ดินของ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

อาคารในโครงการ

#	ชนิดอาคาร	ประเภทอาคาร **ไม่แสดงใน เอกสาร	ความสูงอาคาร (เมตร) **ไม่ แสดงในเอกสาร	จำนวนชั้น บนดิน (ชั้น)	จำนวนชั้น ใต้ดิน (ชั้น)	จำนวน หลัง (หลัง)	พื้นที่ต่อหลัง (ตารางเมตร) **ไม่แสดงใน เอกสาร	ใช้เพื่อเป็น
1	ค.ส.ล. 8 ชั้น (อาคาร A)	อาคารอยู่อาศัย รวม	22.9	8	0	1	9,900	อาคารชุดอยู่อาศัย (178 ห้อง), สโมสร สระว่ายน้ำ และ ที่จอดรถยนต์ทั้งโครงการ 132 คัน
2	ค.ส.ล. 8 ชั้น (อาคาร B)	อาคารอยู่อาศัย รวม	22.9	8	0	1	9,900	อาคารชุดอยู่อาศัย (150 ห้อง)
3	ค.ส.ล. อาคารห้อง เครื่อง 1 ชั้น	อาคารห้อง เครื่อง	12	1	0	1	2,000	ห้องเครื่องจากระบบไฟฟ้า
4	รั้ว	รั้ว	2	1	0	1	36	กั้นแนวเขตที่ดิน ยาว 36.00 เมตร
5	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ	0	0	0	1	118	ทางระบายน้ำโครงการ ยาว 118.00 เมตร
6	ป้ายบน อาคาร	ป้ายบนอาคาร	3	8	0	1	200	ป้ายชื่อสถานที่ประกอบการ

ช่องทางการชำระเงิน

ท่านสามารถสแกน Barcode ด้านล่างผ่าน Mobile Banking Application

หรือนำ Barcode ด้านล่างไปสแกนที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เช่น 7-11) เพื่อทำการชำระค่าบริการ

ท่านจะได้รับ Email แจ้งเตือนยืนยันการชำระเงินภายใน 2 วันทำการ


ช่องทางชำระเงิน: เคาน์เตอร์เซอร์วิส (15 บาท)* หรือโมบายแบงก์กิง

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000059027 สภาสถาปนิก	ค่าบริการใบคำร้องขอมติรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อใช้แบบในการยื่นคำขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร	เลขอ้างอิงที่ 1 (Ref1): 39563259 เลขอ้างอิงที่ 2 (Ref2): 1150 จำนวนเงิน 500.00
---	--	--



ภาคผนวกที่ 4

Lay Out Site + ตำแหน่งเครื่องจักร

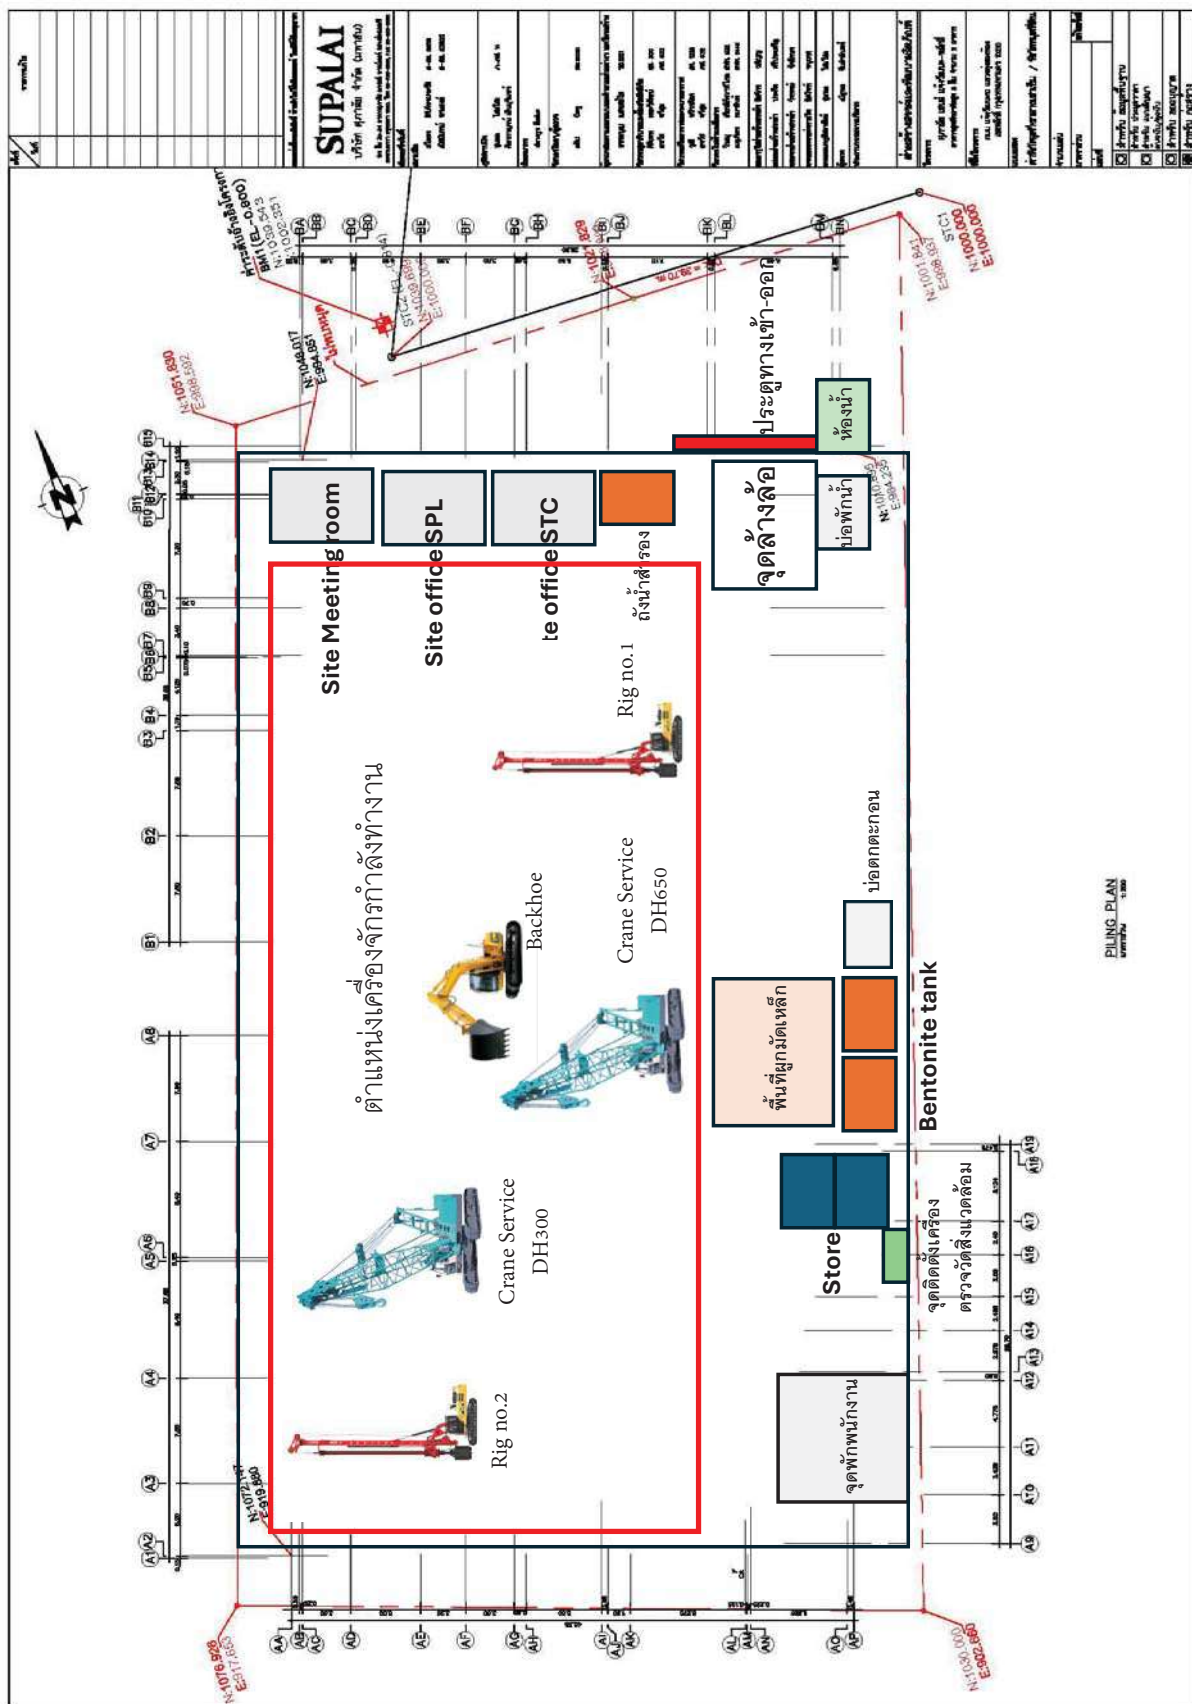



ภาคผนวกที่ 5
เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร

การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2)

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300

Sn. 214012 No.5

ของ

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 5/15 หมู่ 6 กม.15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โครงการ : ศุภาลักษณ์ส์ แจ้งวัฒนะ

วันที่ทดสอบ : 10 มีนาคม 2569

ทดสอบโดย

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2567-0249

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการทดสอบปั้นจั่น พ.ศ.2565

วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ส่งรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2)

หมายเลขเครื่องจักร Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

ตามที่ทาง บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ตามใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2567-0249 ได้รับมอบหมายจาก บริษัท สยามโทเนะ จำกัด ให้ตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบ, อุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2) หมายเลขเครื่องจักร Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5 ตั้งอยู่เลขที่ 5/15 หมู่ 6 กม.15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งขณะทดสอบปั้นจั่นได้ใช้งานอยู่ที่โครงการ ศุภาลักษณ์สแควร์ จังหวัดนนทบุรี บัดนี้งานดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

ทาง บริษัทฯ ผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่าเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรงและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จึงขอส่งรายงานให้ท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายยิ่งยง เรือนไธสง)

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

1. การทดสอบกรณี

☐ (1) การทดสอบตามข้อ 57

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ แต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☐ ประเภทก่อสร้าง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ _____ ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☒ (2) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ 58

(2.1) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ _____

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ _____

การทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ _____

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ _____

การทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ _____

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

2. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ _____ บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ 0105532005299

ประกอบกิจการ _____ รับจ้างก่อสร้างฐานรากสูงและชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสายเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องชุดเจาะ

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน _____

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ _____ 5/15 หมู่ 6 ซอย _____ ถนน _____ บางนา-ตราด

แขวง/ตำบล _____ บางโกล้ง เขต/อำเภอ _____ บางพลี

จังหวัด _____ สมุทรปราการ โทรศัพท์ _____ 02 312 5300

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน _____ เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่ _____

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ _____ โครงการ ศุภาลัยเซ็นส์ แจ้งวัฒนะ

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายอัยยง เรียงโรส) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

3. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง NIPPON SHARYO SEIZO KAISHA, LTD.

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) _____

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม _____

ยี่ห้อ Nippon Sharyo

ประเทศ NAGOYA, JAPAN ปีที่ผลิต 07/1981 หมายเลขเครื่อง Sn. 214012 No.5

รุ่น DH300 ขนาดเครื่องตันกำลัง 125 กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) _____ ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

4. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135566027759

ที่อยู่เลขที่ 88/125 ซอย _____ ถนน _____

แขวง/ตำบล ลำผักกูด

เขต/อำเภอ _____

จังหวัด _____

จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์/โทรสาร 080-7842285

E-mail sierthin@gmail.com

ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☐ (1) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน _____ ระดับ _____ หมดอายุวันที่ _____

และใบสำคัญ (ตามมาตรา 9) เลขที่ _____

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายอึ้งย้ง เรียงโสง) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

☒ (2) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
เลขทะเบียน 2755/67 หมุดอายุวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570
และใบอนุญาต (ตามมาตรา 11) เลขที่ 0602-03-2567-0249
หมุดอายุวันที่ 23 เมษายน 2570 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ นายยิ่งยง เรือนไธสง
เลขทะเบียน 202636 ระดับ สามัญวิศวกร หมุดอายุวันที่ 14 ธันวาคม 2569
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 3106 00568 34 4

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและ
ตามรายการ ดังนี้

- 1) แบบปั้นจั่น ☐ รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง ☒ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาก
☐ เรือปั้นจั่น ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____
- 2) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด¹ ให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดนา
หนักยก (Load chart) ประกอบด้วย
☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 1.30 (R = 14 m.) ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 5 (R = 4.7 m.) ตัน
☐ ที่มุมมองตามากสุด _____ ตัน และที่มุมมองค่าน้อยสุด _____ ตัน
☒ อื่นๆ Boom length 19 m

3) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม
การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล _____

4) การตัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น²
☐ มี (ระบุ) _____ ☒ ไม่มี

5) โครงสร้างปั้นจั่น

5.1) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น³

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.2) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.3) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

6) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง⁴

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

7) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8) ระบบดันกำลัง

8.1) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

8.1.1) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.2) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569
บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายยิ่งยง เรือนไธสง) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

- 8.1.3) ระบบระบายความร้อน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.1.4) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.2) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก
- 8.3.1) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เพื่อง โซ่ และสายพาน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3.2) ระบบคลัตช์
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3.3) ระบบเบรก
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 9) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยึด หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย
☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 10) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย
☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 11) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น⁵
- 11.1) สภาพของแผงควบคุม
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 11.2) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)
- 12.1) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12.2) สภาพของท่อลมและข้อต่อ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 13) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)⁶
- 13.1) การทำงานของตะขอชดชวย (Upper Limit Switches)
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 13.2) มุมแขนปั้นจั่น
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 14) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ
- 15.1) สภาพม้วนลวดสลิง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.2) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.3) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด
- 15.3.1) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

- 15.3.2) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.3.3) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4) สภาพตะขอ
- 15.4.1) การบิดตัวของตะขอ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.2) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.3) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.4) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.5) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.6) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 16) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)
- 16.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Main) 23.05 ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)
เท่ากับ 5 อายุการใช้งาน สลิงใหม่ เดือน/ปี
- 16.2) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 16.3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Aux) 22.84 ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)
เท่ากับ 5 อายุการใช้งาน สลิงใหม่ เดือน/ปี
- 16.4) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 16.5) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Boom Hoist) 14.18 ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)
เท่ากับ 5 อายุการใช้งาน - เดือน/ปี
- 16.6) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 17) ลวดสลึงยึดโยง (Standing Ropes)
- 17.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 3.5 (Safety Factor)
เท่ากับ _____ อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี
- 17.2) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า 2 เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว
หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____



หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569
บริษัท สยามโตะเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายอึ้งย้ง เรียงโสง) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

18) สภาพลวดสลิง

18.1) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.2) ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.3) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.4) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.5) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

19) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

20) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

21) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

22) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

23) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24) ระบบความปลอดภัย⁷

24.1) Anti-two block devices

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.2) Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.3) Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.4) Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.5) อื่นๆ (ระบุ) _____

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

25) ขายันพื้น (Outriggers)⁸

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

26) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำหนักหรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

27) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁹

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ _____

น้ำหนัก _____ ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ Vernier Caliper , Cartridges meters วิธีการตรวจสอบแนวเข็ม ระบุ ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check)

อื่นๆ ระบุ เครื่องมีการติดตั้งเครื่องเจาะ ซึ่งเป็นออฟชั่นของผู้ผลิตอยู่แล้วและน้ำหนักการยกไม่เกินตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายอึ้งยง เรียงไธสง) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

28) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

28.1) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

28.2) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1-1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด¹⁰ แต่ต้องไม่เกินตามตาราง แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระทุก 3 เดือน/ปี

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

29) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ไม่เกิน 75 % ตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

29.1) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.2) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.3) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.4) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

30) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

-ไม่มี-

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

1. ณ วันที่เวลาที่ได้ทำการตรวจและทดสอบ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานปั้นจั่น (Crane is good condition of on the date, time and place of inspected)

2. เครื่องมีการติดตั้งอุปกรณ์เจาะ ซึ่งเป็น Option ส่วนหนึ่งของบริษัทผู้ผลิตเครนและมีน้ำหนักไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย

1. จะต้องมีการตรวจสภาพและบำรุงรักษาประจำวันอยู่เสมอ หากพบสิ่งบกพร่องต้องหยุดและทำการแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน

2. หากมีการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆ จะต้องทำการตรวจรับรองความปลอดภัยใหม่ ทุกครั้ง

3. ปั้นจั่นจะต้องยืนอยู่บนพื้นที่แข็งแรง มั่นคง โดย Ground Pressure ต้องไม่น้อยกว่าคู่มือกำหนด หรือตามที่วิศวกรกำหนด

4. ห้ามใช้งานปั้นจั่นขณะที่มีลมแรง โดย wind speed ต้องไม่เกิน 9.8 m/s

5. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด

หมายเหตุ

1. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

2. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจสอบได้

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด




ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายอึ้งย้ง เรืองไธสง) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

ภาพการทดสอบและตรวจสอบเครื่องจักร

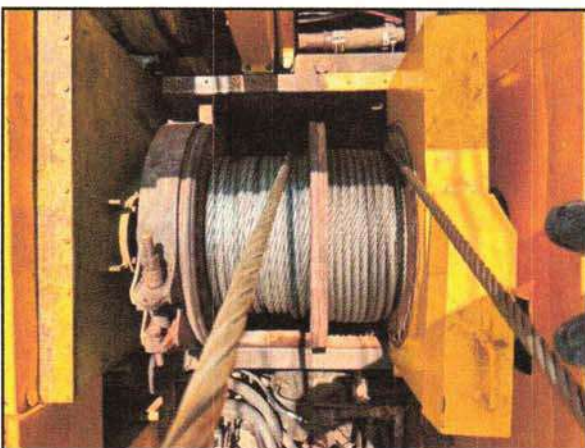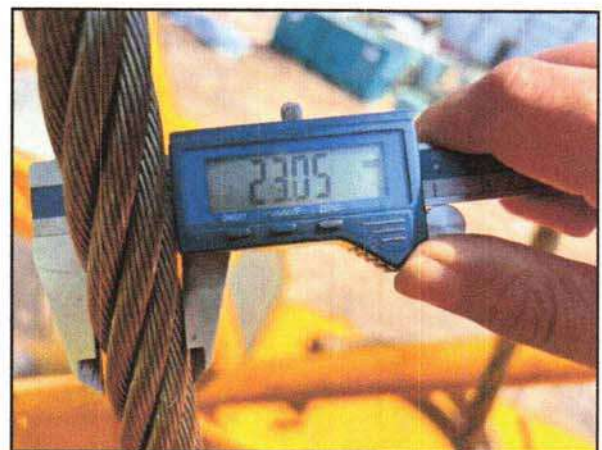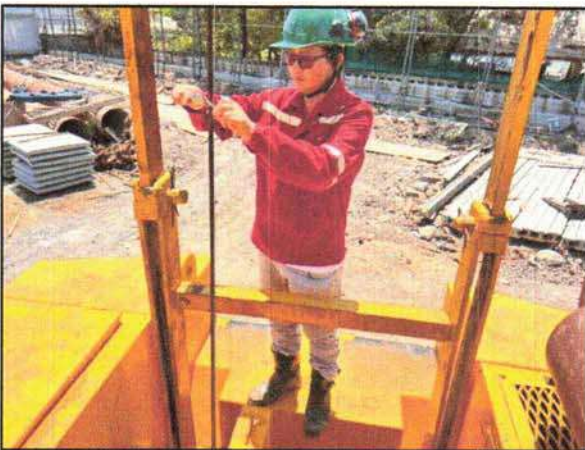

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ¹ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
- ² วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก
- ³ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อนแขนต่อ ข้อต่อทุกจุดสลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
- ⁴ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ ปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- ⁵ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
- ⁶ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
- ⁷ ระบบความปลอดภัย
Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ด้วยยกพร้อมกัน
Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมขึ้นเกินพิกัด
Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
- ⁸ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายัน สลักยึด แผ่นรองและระบบไฮดรอลิก
- ⁹ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
- ⁸ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น
ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6×1.25 จะเท่ากับ 7.5 ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน
ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9×1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน
เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม



แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ
ปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และ
ปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่
ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ 4 (1) ลงชื่อ _____ วันที่ _____
(_____)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ 4 (2) ลงชื่อ _____ วันที่ 10 มีนาคม 2569
(นายอึ้งยง เรือนไธสง)



นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 /หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ _____ วันที่ 10 มีนาคม 2569
(นายอึ้งยง เรือนไธสง)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ 4 (2) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ



ลงชื่อ _____ วันที่ 10 มีนาคม 2569
(นายสุระศักดิ์ กวางพล)

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็น
การตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

ใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



แบบ กภ.บุญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๒๕๙

อนุญาตให้ บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๖๖๐๒๗๗๕๙

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘/๑๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำผักกูด อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการ
ได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาต
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อ
แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นายอึ้งยง เรืองโรจน์
วันที่ 10 มีนาคม 2569

(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตสานต์)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569
บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายอึ้งยง เรืองโรจน์) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH300 , Sn. 214012 No.5

ใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๒๕๙

๑. นายยิ่งยง เรียนโรส
๒. นายศิริมงคล ผาสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(Signature)

(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตตานนท์)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thailand Professional Engineering License
เลขประจำตัวประชาชน 3-3106-00569-34-4
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ยิ่งยง เรียนโรส
Title/Name Surinpong Mr. Yingyong Rianthong
เลขทะเบียน License No. สก.4210 เลขที่สมาชิก Member No. 202632
ระดับ Level สามัญชีพ Professional Eng สาขา Discipline Mechanical Eng
วันอนุญาต Date Issue 15 ธ.ค. 2564 วันบัตรหมดอายุ Date of Expiry 14 ธ.ค. 2569
000024632
สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569
บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายยิ่งยง เรียนโรส) วันที่ 10/03/2569

การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2)

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2

Sn. 203-0432 (No.04)

ของ

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 5/15 หมู่ 6 กม.15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โครงการ : ONCE WONGAMAT ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ทดสอบ : 22 ตุลาคม 2568

ทดสอบโดย

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2567-0249

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการทดสอบปั้นจั่น พ.ศ.2565

วันที่ 22 ตุลาคม 2568

เรื่อง ส่งรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถป็นจัน (ปจ.2)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถป็นจัน (ปจ.2)

หมายเลขเครื่องจักร Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

ตามที่ทาง บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทดสอบป็นจัน ตามใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2567-0249 ได้รับมอบหมายจาก บริษัท สยามโทเนะ จำกัด ให้ตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบ,อุปกรณ์สำหรับรถป็นจัน (ปจ.2) หมายเลขเครื่องจักร Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04) ตั้งอยู่เลขที่ 5/15 หมู่ 6 กม.15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งขณะทดสอบป็นจันได้ใช้งานอยู่ที่ โครงการ ONCE WONGAMAT ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บัดนี้งานดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย และผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

ทาง บริษัทฯ ผู้ให้บริการทดสอบป็นจัน ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่าเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรงและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จึงขอส่งรายงานให้ท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป



(นายย้งยง เรือนไธสง)

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

1. การทดสอบกรณี

☐ (1) การทดสอบตามข้อ 57

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☐ ประเภทก่อสร้าง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ _____ ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☒ (2) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ 58

(2.1) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ _____

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ _____

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ _____

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ _____

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

2. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ _____ บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ 0105532005299

ประกอบกิจการ _____ รับจ้างก่อสร้างฐานรากสูงและชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขายเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องชุดเจาะ

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน _____

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 5/15 หมู่ 6 ซอย - ถนน บางนา-ตราด

แขวง/ตำบล บางโกล้ง เขต/อำเภอ บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02 312 5300

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน _____ เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ โครงการ ONCE WONGAMAT

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายยิ่งยง เรียงไธสง) วันที่ 22/10/2568

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

3. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) _____

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม _____

ยี่ห้อ Hitachi

ประเทศ Japan ปีที่ผลิต 56-12 หมายเลขเครื่อง Sn.203-0432

รุ่น Hitachi : KH180-2 ขนาดเครื่องตันกำลัง 110 กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) - ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) -

ที่อยู่ -

โทรศัพท์ - โทรสาร -

4. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135566027759

ที่อยู่เลขที่ 88/125 ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล ลำผักกูด เขต/อำเภอ ธีรบุรี

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์/โทรสาร 080-7842285

E-mail sierthin@gmail.com

ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☐ (1) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน - ระดับ - หมดอายุวันที่ -

และใบสำคัญ (ตามมาตรา 9) เลขที่ -

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต



หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569

บริษัท สยามไทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายยิ่งยง เรียนโฮง) วันที่ 22/10/2568

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

☒ (2) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน 2755/67 หมดอายุวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570

และใบอนุญาต (ตามมาตรา 11) เลขที่ 0602-03-2567-0249

หมดอายุวันที่ 23 เมษายน 2570 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ นายยิ่งยง เรียนโรส

เลขทะเบียน 202636 ระดับ สามัญวิศวกร หมดอายุวันที่ 14 ธันวาคม 2569

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 3106 00568 34 4

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

- 1) แบบปั้นจั่น ☐ รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง ☒ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาบ
☐ เรือปั้นจั่น ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____
- 2) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด¹ ให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย
☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 1.15 (R = 34.0 m.) ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 50 (R = 3.7 m.) ตัน
☐ ที่มุมมองมากที่สุด _____ ตัน และที่มุมมองน้อยสุด _____ ตัน
☐ อื่นๆ _____

3) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล _____

4) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น²

☐ มี (ระบุ) _____ ☒ ไม่มี

5) โครงสร้างปั้นจั่น

5.1) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น³

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.2) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.3) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

6) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง⁴

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

7) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8) ระบบต้นกำลัง

8.1) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

8.1.1) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.2) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____



หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายยิ่งยง เรียนโรส) วันที่ 22/10/2568

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

- 8.1.3) ระบบระบายความร้อน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.1.4) การติดตั้งมันคงแข็งแรง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.2) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก
- 8.3.1) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ และสายพาน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3.2) ระบบคลัตช์
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3.3) ระบบเบรก
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 9) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยึด หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย
☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 10) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย
☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 11) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น⁵
- 11.1) สภาพของแผงควบคุม
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 11.2) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)
- 12.1) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12.2) สภาพของท่อลมและข้อต่อ
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 13) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)⁶
- 13.1) การทำงานของตะขอชดชวย (Upper Limit Switches)
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 13.2) มุมแขนปั้นจั่น
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 14) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ
- 15.1) สภาพม้วนลวดสลิง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.2) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.3) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ได้ผลิตกำหนด
15.3.1) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569

บริษัท สยามไทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายยิ่งยง เรียงโรส) วันที่ 22/10/2568

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ บันจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

15.3.2) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.3.3) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4) สภาพตะขอ (Service hook)

15.4.1) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.2) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.3) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.4) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.5) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

15.4.6) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) , ให้แก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

☐ เรียบร้อย ☒ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

16) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

16.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ 20.13 _____ ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)

เท่ากับ _____ 5 _____ อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี

16.2) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

16.3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ 20.02 _____ ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)

เท่ากับ _____ 5 _____ อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี

16.4) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

16.5) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ 13.63 _____ ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)

เท่ากับ _____ 5 _____ อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี

16.6) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

17) ลวดสลึงยึดโยง (Standing Ropes)

17.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ - _____ ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 3.5 (Safety Factor)

เท่ากับ _____ - _____ อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี

17.2) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า 2 เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____



หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายยิ่งยง เรียนโรง) วันที่ 22/10/2568

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

18) สภาพลวดสลิง

18.1) ลวดเส้นนอกสีกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.2) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.3) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.4) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.5) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

19) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

20) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

21) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

22) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

23) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24) ระบบความปลอดภัย⁷

24.1) Anti-two block devices

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.2) Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.3) Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.4) Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.5) อื่นๆ (ระบุ) _____

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

25) ขายันพื้น (Outriggers)⁸

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

26) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำหรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

27) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁹

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ Weight (incl. hook + Actual weight) น้ำหนัก 7.5 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ Vernier Caliper , Cartridges meters วิธีการตรวจสอบแนวเข็ม ระบุ ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check)

อื่นๆ ระบุ _____

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

28) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

28.1) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

28.2) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1-1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด¹⁰ แต่ต้องไม่เกินตามตาราง แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระทุก 3 เดือน/ปี

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

29) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ไม่เกิน 75 % ตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

29.1) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.2) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.3) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.4) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

30) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

-ไม่มี-

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

-ไม่มี-

หมายเหตุ

1. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

2. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้

หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายยิ่งยง เรียงไธสง) วันที่ 22/10/2568

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

ภาพการทดสอบและตรวจสอบเครื่องจักร



แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ¹ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
 - ² วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก
 - ³ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลลา ล้อ รางเลื่อนแขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
 - ⁴ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ ปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
 - ⁵ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
 - ⁶ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
 - ⁷ ระบบความปลอดภัย
Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ด้วยยกพร้อมกัน
Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมขึ้นเกินพิกัด
Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
 - ⁸ Outriggers หมายความว่ารวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ข่ายัน สลักยึด แผ่นรองและระบบไฮดรอลิก
 - ⁹ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
- เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
- การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
- ⁸ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น
- ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6×1.25 จะเท่ากับ 7.5 ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน
- ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9×1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน
- เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง
- ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน
- หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม



หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569

บริษัท สยามโตะเนะ จำกัด

ลงชื่อ) วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายยิ่งยง เรียนโธง) วันที่ 22/10/2568

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ บันจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ
ปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แกะไข และ
ปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่
ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ 4 (1) ลงชื่อ _____ วันที่ _____
(_____)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ 4 (2) ลงชื่อ _____ วันที่ 22 ตุลาคม 2568
(นายยิ่งยง เรียนไธสง)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 /หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ _____ วันที่ 22 ตุลาคม 2568
(นายยิ่งยง เรียนไธสง)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ 4 (2) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ



ลงชื่อ _____ วันที่ _____
(_____)

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็น
การตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

ใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



แบบ กก.บุญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๒๔๙

อนุญาตให้ บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๖๖๐๒๗๗๕๙

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘/๑๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่อง การทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการ
ได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาต
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อ
แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่

๒๕

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นาย ยืนยง เรืองโรส

วันที่ 22 ตุลาคม 256๗

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)
โครงการ : ONCE WONGAMAT

(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตสานต์)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569
บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) วิศวกรผู้ทดสอบ
(นาย ยืนยง เรืองโรส) วันที่ 22/10/2568

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Hitachi KH180-2 , Sn. 203-0432 (No.04)

ใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๒๔๙

๑. นายยิ่งยง เรียนโรสง
๒. นายศิริมงคล ผาสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตสานต์)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



หมดอายุ (Date of Expiry) : 21 มกราคม 2569
บริษัท สยามโตะเนะ จำกัด

ลงชื่อ) วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายยิ่งยง เรียนโรสง) วันที่ 22/10/2568

การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2)

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650

Sn.A61601(No.1)

ของ

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 5/15 หมู่ 6 กม.15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โครงการ : ศุภาลักษณ์ แฉ่งวัฒนะ

วันที่ทดสอบ : 10 มีนาคม 2569

ทดสอบโดย

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2567-0249

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการทดสอบปั้นจั่น พ.ศ.2565

วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ส่งรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2)

หมายเลขเครื่องจักร Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

ตามที่ทาง บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ตามใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2567-0249 ได้รับมอบหมายจาก บริษัท สยามโทเนะ จำกัด ให้ตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบ, อุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น (ปจ.2) หมายเลขเครื่องจักร Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1) ตั้งอยู่เลขที่ 5/15 หมู่ 6 กม.15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งขณะทดสอบปั้นจั่นได้ใช้งานอยู่ที่โครงการ ศุภาลักษณ์ แสงวัฒนะ บัดนี้งานดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

ทาง บริษัทฯ ผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่าเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรงและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จึงขอส่งรายงานให้ท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายอึ้งย้ง เรือนไธสง)

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

1. การทดสอบกรณี

☐ (1) การทดสอบตามข้อ 57

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☐ ประเภทก่อสร้าง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ _____ ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด _____ ตัน

☒ (2) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ 58

(2.1) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ _____

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ _____

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ _____

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

(2.2) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ อื่นๆ _____

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ _____

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน

ทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึ้นไป

ทดสอบอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

2. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ _____ บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ 0105532005299

ประกอบกิจการ _____ รับจ้างก่อสร้างฐานรากสูงและชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขายเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องชุดเจาะ

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน _____

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ _____ 5/15 หมู่ 6 ซอย _____ ถนน _____ บางนา-ตราด

แขวง/ตำบล _____ บางโกล้ง เขต/อำเภอ _____ บางพลี

จังหวัด _____ สมุทรปราการ โทรศัพท์ _____ 02 312 5300

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน _____ เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่ _____

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ _____ โครงการ ศุภาลัยเซนต์ แจ้งวัฒนะ

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายอึ้งย้ง เจริญโรจน์) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

- | | | |
|-----------|--|---|
| (1) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (2) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |
| (3) _____ | ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) | ☐ ไม่ผ่านการอบรม |

3. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย : ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง NIPPON SHARYO SEIZO KAISHA, LTD.

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) _____

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม _____

ยี่ห้อ Nippon Sharyo

ประเทศ NAGOYA, JAPAN ปีที่ผลิต 1987-06 หมายเลขเครื่อง Sn. A61601

รุ่น DH650 ขนาดเครื่องต้นกำลัง 185 กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) _____ ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

4. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135566027759

ที่อยู่เลขที่ 88/125 ซอย _____ ถนน _____

แขวง/ตำบล ลำผักกูด เขต/อำเภอ ธัญบุรี

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์/โทรสาร 080-7842285

E-mail sierthin@gmail.com

ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☐ (1) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน _____ ระดับ _____ หมดอายุวันที่ _____

และใบสำคัญ (ตามมาตรา 9) เลขที่ _____

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโตะเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายอึ้งย้ง เรืองโรจน์) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

☒ (2) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
เลขทะเบียน 2755/67 หมดยุติวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570
และใบอนุญาต (ตามมาตรา 11) เลขที่ 0602-03-2567-0249
หมดยุติวันที่ 23 เมษายน 2570 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ นายยิ่งยง เรียนโรสง
เลขทะเบียน 202636 ระดับ สามัญวิศวกร หมดยุติวันที่ 14 ธันวาคม 2569
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 3106 00568 34 4

5. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

- 1) แบบปั้นจั่น ☐ รถปั้นจั่นไฮดรอลิกลอย ☒ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาก
☐ เรือปั้นจั่น ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____
- 2) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด¹ ให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย
☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 1.05 (R = 38 m.) ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 65 (R = 3.7 m.) ตัน
☐ ที่มุมมองตามากสุด _____ ตัน และที่มุมมองคาน้อยสุด _____ ตัน
☐ อื่นๆ _____

3) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล _____

4) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น²

☐ มี (ระบุ) _____ ☒ ไม่มี

5) โครงสร้างปั้นจั่น

5.1) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น³

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.2) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

5.3) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

6) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง⁴

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

7) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8) ระบบต้นกำลัง

8.1) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

8.1.1) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

8.1.2) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายยิ่งยง เรียนโรสง) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

- 8.1.3) ระบบระบายความร้อน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.1.4) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.2) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก
- 8.3.1) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ และสายพาน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3.2) ระบบคลัทช์
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 8.3.3) ระบบเบรก
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 9) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยึด หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย
☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 10) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย
☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 11) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น⁵
- 11.1) สภาพของแผงควบคุม
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 11.2) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)
- 12.1) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 12.2) สภาพของท่อลมและข้อต่อ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 13) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)⁶
- 13.1) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 13.2) มุมแขนปั้นจั่น
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 14) การทำงานของชุดควบคุมพิชิตน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ
- 15.1) สภาพม้วนลวดสลิง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.2) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.3) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามผู้ผลิตกำหนด
- 15.3.1) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

- 15.3.2) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.3.3) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15 : 1 หรืออัตราส่วน _____ ที่ผู้ผลิตกำหนด
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4) สภาพตะขอ
- 15.4.1) การบิดตัวของตะขอ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.2) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.3) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ 10
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.4) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.5) ไม่มีการเสีรูปทรงหรือสึกหรอของท่วงตะขอ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 15.4.6) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) , ให้ทำการแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
☐ เรียบร้อย ☒ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) หลวม คลอน
- 16) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)
- 16.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Main) 21.42 ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)
 เท่ากับ 5 อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี
- 16.2) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
 เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 16.3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Aux) 22.41 ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)
 เท่ากับ 5 อายุการใช้งาน สลิงใหม่ เดือน/ปี
- 16.4) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
 เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 16.5) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Boom Hoist) 15.69 ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 5 (Safety Factor)
 เท่ากับ 5 อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี
- 16.6) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า 3 เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า 6 เส้น ในหลายเส้น
 เกลียวรวมกันหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 17) ลวดสลึงยึดโยง (Standing Ropes)
- 17.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง _____ ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 3.5 (Safety Factor)
 เท่ากับ _____ อายุการใช้งาน _____ เดือน/ปี
- 17.2) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า 2 เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว
 หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) _____
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

18) สภาพลวดสลิง

18.1) ลวดเส้นนอกสีกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.2) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.3) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.4) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

18.5) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

19) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

20) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

21) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

22) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

23) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24) ระบบความปลอดภัย⁷

24.1) Anti-two block devices

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.2) Boom backstop devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.3) Swing radius warning devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.4) Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

24.5) อื่นๆ (ระบุ) _____

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

25) ขายันพื้น (Outriggers)⁸

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

26) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำหรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

27) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ⁹

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ Weight (incl. hook + Actual weight) น้ำหนัก 4.4 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ Vernier Caliper, Cartridges meters วิธีการตรวจสอบแนวเชือก ระบุ ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check)

อื่นๆ ระบุ เทียบน้ำหนักที่ใช้ทดสอบจริงกับโหลดชาร์ต (Compare to actual weight with load chart)

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ) วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายอึ้งย้ง เรียงไธสง) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

28) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))

28.1) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) _____

28.2) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1-1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด¹⁰ แต่ต้องไม่เกินตามตาราง แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระทุก 3 เดือน/ปี

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

29) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ไม่เกิน 75 % ตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

29.1) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.2) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.3) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

29.4) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน _____ ตัน ที่ระยะ _____

30) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

-ไม่มี-

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

-ไม่มี-

หมายเหตุ

1. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

2. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด



ลงชื่อ) _____ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายอึ้งย้ง เรียนไธสง) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

ภาพการทดสอบและตรวจสอบเครื่องจักร

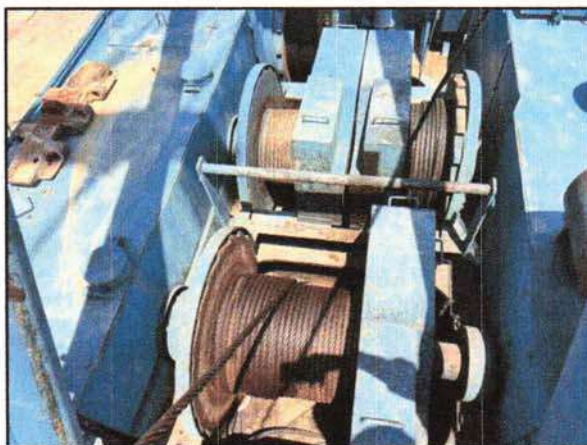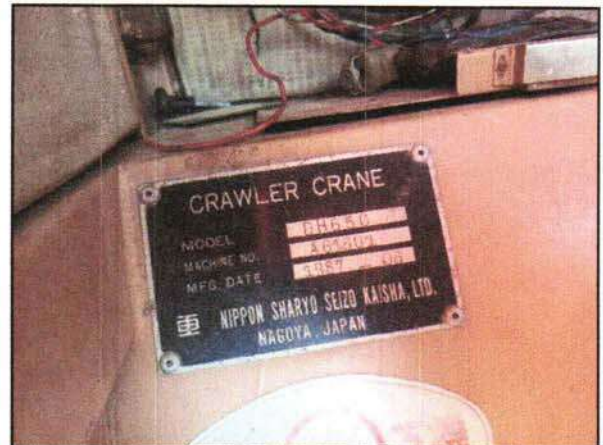

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ¹ วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
 - ² วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก
 - ³ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลาล้อ รางเลื่อนแขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
 - ⁴ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ ปั้นจั่นบนรถ เรือ แพโป๊ะหรือพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
 - ⁵ ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
 - ⁶ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุดหลังสุด มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
 - ⁷ ระบบความปลอดภัย
Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ด้วยพร้อมกัน
Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด
Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
 - ⁸ Outriggers หมายถึง ความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายัน สลักยึด แผ่นรองและระบบไฮดรอลิก
 - ⁹ น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้ทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
 - ⁸ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น
ตัวอย่างที่ 1 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 6 ตัน จะต้องทดสอบที่ 6 x 1.25 จะเท่ากับ 7.5 ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 7.5 ตัน
ตัวอย่างที่ 2 ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ 10 ตัน ใช้งานจริงสูงสุด 9 ตัน จะต้องทดสอบที่ 9 x 1.25 จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ 10 ตัน
เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน
- หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม



แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ
ปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และ
ปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่
ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ 4 (1) ลงชื่อ _____ วันที่ _____
(_____)

วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 เป็นผู้ทดสอบ



ตามข้อ 4 (2) ลงชื่อ _____ วันที่ 10 มีนาคม 2569
(นายยิ่งยง เรือนไธสง)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 /หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ _____ วันที่ 10 มีนาคม 2569
(นายยิ่งยง เรือนไธสง)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ 4 (2) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ



ลงชื่อ _____ วันที่ 10 มีนาคม 2569
(นายสุระศักดิ์ กลางหมาก)

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็น
การตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

ใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



แบบ กก.บญ

นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๒๕๙

อนุญาตให้ บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๖๖๐๒๗๗๕๙

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘/๑๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำผักกูด อำเภอถ้ำพระ จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการ
ได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบและอุปกรณ์
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อ
แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ภายใต้อนุญาตนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตสุวรรณ)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569

บริษัท สยามโตะเนะ จำกัด

ลงชื่อ วิศวกรผู้ทดสอบ

(นายอึ้งย้ง เรืองโรส) วันที่ 10/03/2569

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

Crawler Crane Model : Nippon Sharyo DH650 , Sn.A61601(No.1)

ใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๒๕๙

๑. นายยิ่งยง เรียนโรสง
๒. นายศิริมงคล ผาสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
เลขประจำตัวประชาชน 3-3106-00608-34-4
ชื่อและนามสกุล นาย ยิ่งยง เรียนโรสง
Title/Name Surinong
เลขทะเบียน ๒๕๖๓ 4210
License No. 202636
ระดับ ระดับ ๒
Level Professional Eng
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
Discipline Mechanical Eng
วันออก 15 ธ.ค. 2564
Date of Issue 15 Dec 2021
วันหมดอายุ 14 ธ.ค. 2569
Date of Expiry 14 Dec 2026
000024632
สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

หมดอายุ (Date of Expiry) : 9 มิถุนายน 2569
บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

ลงชื่อ วิศวกรผู้ทดสอบ
(นายยิ่งยง เรียนโรสง) วันที่ 10/03/2569



รายงานการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

บริษัท เบนไลน์ ทรานสปอร์ต (2001) จำกัด

ROUGH TERRAIN CRANE CRANE NO. 0732

MODEL : TR-250 M-6 SER.NO : FB2204 CAP : 25.0 TONS.



วันที่ตรวจสอบ 18 พฤษภาคม 2569
ตรวจสอบครั้งต่อไป 18 สิงหาคม 2569



บริษัทมาร์เวล โกลบอล เอ็นจิเนียริง จำกัด
MARVEL GLOBAL ENGINEERING CO., LTD.
TEL.099 419 1639, 086 251 2549, 064 329 4914

รายงานการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

๑. การทดสอบกรณี

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๖

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรมตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด..... ตัน

☐ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด..... ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด..... ตัน

☒ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่น ๆ ระบุ

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่น ๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน
๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☒ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่น ๆ

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ
อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☒ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เบนไลน์ ทรานสปอร์ต (2001) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115544006643

ประกอบกิจการ ให้เช่ารถเครน

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 2/8 หมู่ 2 ซอย - ถนน หนามแดง-บางพลี

แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-753-7007

สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่นจำนวน เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ บจก.เบนไลน์ ทรานสปอร์ต (2001)

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ตามเอกสารแนบ ☒ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ตามเอกสารแนบ ☒ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

(๑) ตามเอกสารแนบ ☒ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

(๑) ตามเอกสารแนบ ☒ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย: ☒ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง TADANO LTD.

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ยี่ห้อ TADANO เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ) -

ประเทศ JAPAN ปีที่ผลิต 1997 หมายเลขเครื่อง S/N FB2204

รุ่น TR-250M-6 ขนาดเครื่องต้นกำลัง 250 PS กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี) - ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) -

ที่อยู่ -

โทรศัพท์ - โทรสาร -

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
หรือนิติบุคคล (ชื่อ) บริษัท มาร์เวล โกลบอล เอ็นจิเนียริง จำกัด
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135561027190
ที่อยู่เลขที่ 59/277 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บางเมือง เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 099-419-1639
E-mail admin@marvel-eng.com

ผู้ทำการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน ระดับ หมดอายุ

และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๕) เลขที่

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

☒ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน 2050/65 หมดอายุวันที่ 9 มกราคม 2571

และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ 0602.03.2565.0030

หมดอายุวันที่ 16 มีนาคม 2571 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ นายธณภูมิ ปะนานะเส

เลขทะเบียน สก.4226 ระดับ สามัญวิศวกร เครื่องกล หมดอายุ 14 กุมภาพันธ์ 2570

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน

ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

๑) แบบปั้นจั่น ☒ รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง ☐ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาบ
☐ เรือปั้นจั่น ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

๒) ตารางแสดงพิสัยน้ำหนักยก (Load chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด* ให้แนบเอกสารตาราง

แสดงพิสัยน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

☒ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด 0.950 ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด 25.0 ตัน

☐ ที่มุมมองสามกสุด ตัน และที่มุมมองสามน้อยที่สุด ตัน

☐ อื่น ๆ ตัน

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้

การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น^๒

☐ มี (ระบุ) ☒ ไม่มี

๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น^๓

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดยึด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๖) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง^๔ (ไม่ได้ติดตั้งในระบบ)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘) ระบบคั่นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดท่อนกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ และสายพาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๙) ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยึด หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☒ มี/เรียบร้อย

☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น^๕

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)^๖

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุกยก (Upper Limit Switches)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิคค่าน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่คุณผลิตกำหนด

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔) สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหัวตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Main Hoist 15.5, 15.6 mm. / Aux 15.6, 15.7 mm. ค่าความปลอดภัย
ต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) เท่ากับ >5 อายุการใช้งาน - เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขนาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand)
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) (ไม่ได้ติดตั้งในระบบ)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor)
เท่ากับ อายุการใช้งาน เดือน/ปี

๑๗.๒) เส้นลวดขนาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกหรอน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ป็นจันทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ป็นจัน และรอกของตะขอ (Hook Block)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับป็นจันเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานเกี่ยวกับป็นจัน ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับป็นจัน หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔) ระบบความปลอดภัย

๒๔.๑) Anti-two block devices

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๒) Boom backstop devices

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๓) Swing radius warning devices

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๔) Boom Angle indicator

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ)

☐ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๖) ระบบวัดความเร็ว (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ Steel Weight น้ำหนัก 4.9 ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ เวอร์เนียคาลิเปอร์, คลื่นเมตร วิธีการตรวจสอบแนวเข็ม ระบุ ตรวจสอบด้วยสายตา

อื่นๆ ระบุ

๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation)

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่าของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน (ระบุ)

๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด^๑ แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระทุก 3 เดือน/ปี

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))

๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน 4.9 ตัน ที่ระยะ 11.3 เมตร

๒๙.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๒๙.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตัน ที่ระยะ

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

*****ไม่มีรายการแก้ไข*****

หมายเหตุ

๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว

๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นที่มีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนมาตรา ๕ หรือผู้ได้รับอนุญาตมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้

คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

“วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด

“วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ กรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก

“โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลลา ล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น

“ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยน้ำอย่างอื่น โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

“ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก

“Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด

“ระบบความปลอดภัย

Anti – two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ด้วยพร้อมกัน

Boom Backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด

Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด

Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก

“Outriggers หมายถึงความรวมถึงแขนหรือขาที่ยึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขาขึ้นสลักยึดแผ่นรอง และระบบไฮดรอลิก

“น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load Cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียสคาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้คุณสมบัติของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตาการใช้สารแทรกซึมผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ ให้วิศวกรผู้ทดสอบ ระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

“กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ 6×1.25 จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๕ ตัน จะต้องทดสอบที่ 5×1.25 จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขและปรับปรุงกรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

(นายรณภูมิ ปะนามะเส)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน



และลงชื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

(นายรณภูมิ ปะนามะเส)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร


และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ



ลงชื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569


(.....)

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน

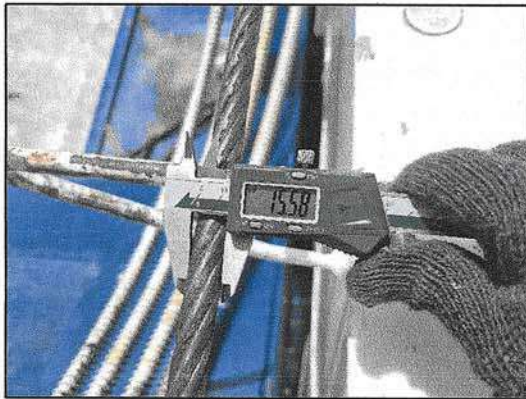

LOAD TEST

TEST WEIGHT	Boom Length (Meter)	Working Radius (Meter)	Angle (Degree)	Load (Tons.)
Main Hoist	17.4	11.3	40.1	4.9
Load at 100 %		Holding Time 15 min.		

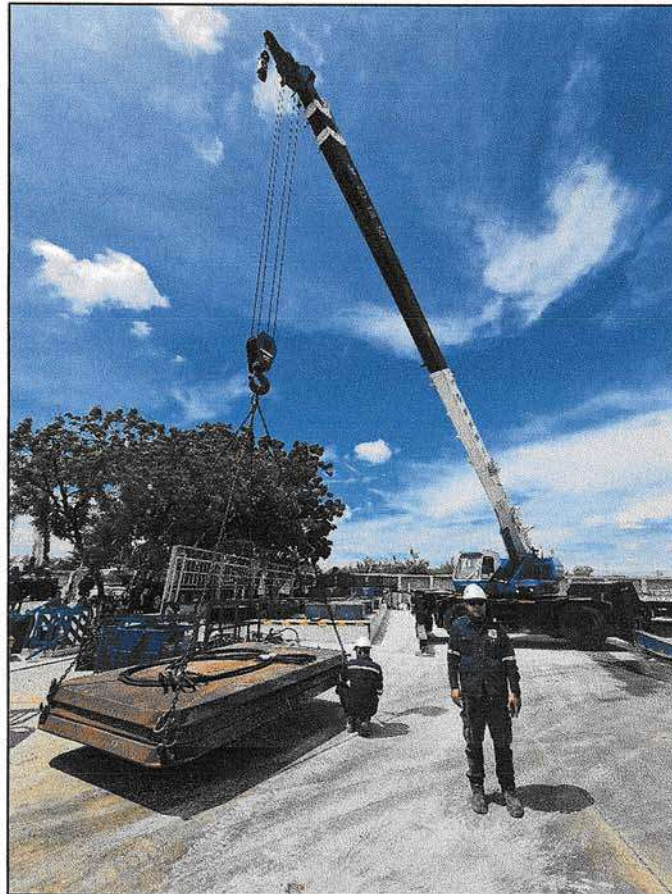



CRANE TYPE	ROUGH TERRAIN CRANE	วันที่ตรวจสอบ : 18 พฤษภาคม 2569
CRANE NO.	NO.0732	ตรวจสอบครั้งต่อไป : 18 สิงหาคม 2569
MODEL NO.	TR-250 M-6	
SER.NO	FB2204	
CAPACITY	25.0 TONS.	นายรณภูมิ ปะนามะเส (วิศวกรผู้ทดสอบ)



แบบ ภก.บุญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๐

อนุญาตให้ บริษัท มาร์เวล โกลบอล เอ็นจิเนียริง จำกัด


เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๖๑๐๒๗๑๙๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๒๗๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลวงเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้ สามารถดำเนินการ
ได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน
และการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร
จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
บริษัท มาร์เวล โกลบอล เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๓๐

๑. นายรณภูมิ ปะนามะเส
๒. นายกำพล ถาวร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

CERTIFICATE OFF INSPECTION

Project: BENLINE TRANSPORT 2001

Certificate No. : 0732

Location of inspection : BENLINE TRANSPORT 2001

Date of inspection : 6 Feb 2026

Standard : EN 1492-1 / EN13889



Date of next inspection : 6 Feb 2027

Scope of Work : Visual Inspection.


A) Description

Equipment :

No	Specification	Serial No.	WLL/Ton.	quantity
1	Webbing Sling Length 4 M.	192857	3	1
2	Webbing Sling Length 6 M.	192831	3	1
3	Anchor Shackle Size 5/8"	N/A	3-1/4	2
4	Anchor Shackle Size 7/8"	N/A	6-1/2	2
5	Anchor Shackle Size 1"	N/A	8-1/2	2

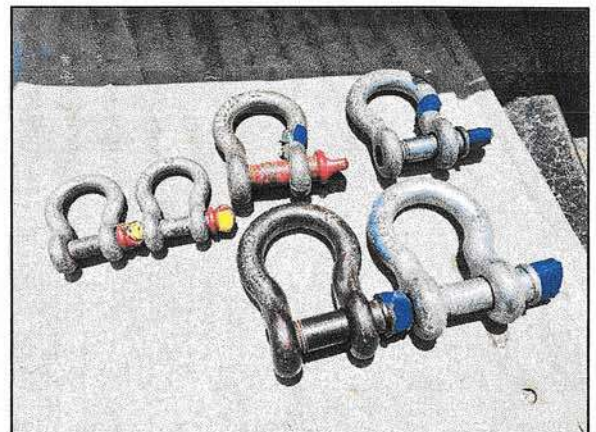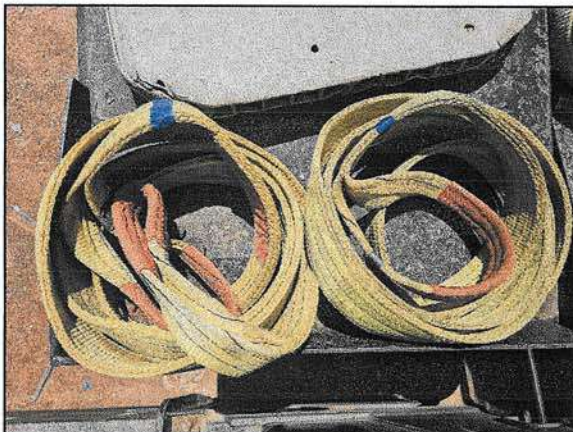

B) Results : The above item Visual Inspection. Revealed no defects that would otherwise impair its Continue use.

CERTIFY BY: 
(Ronnaphum Panamase) สก.4226





ภาคผนวกที่ 6
คู่มือความปลอดภัย



บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด

คู่มือ/ข้อปฏิบัติ

ความปลอดภัยในการ

ทำงาน

คำนำ

คู่มือนี้กล่าวถึงข้อควรระวังที่ทุกคนควรปฏิบัติ เมื่ออยู่ในบริเวณหน่วยงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ยังได้อธิบาย หรือชี้แจงถึงมาตรฐานของการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ที่หน่วยงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโครงการฯ ที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติโดยหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่แล้ว พนักงานจึงควรติดคู่มือเพื่อจะหยิบอ่านได้สะดวก หมั่นอ่านและศึกษา และปฏิบัติตาม เมื่อกำลังทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือก่อนเริ่มทำงานของแต่ละวันทุกคนควรตั้งปณิธานที่จะทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุ เพราะการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ อาจนำความเสียหายและความเศร้าโศกมาสู่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานได้

ขอให้ตระหนักและคิดคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ

ฝ่ายความปลอดภัย

สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ	ก
นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ข-ค
ระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน	ง
1. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	1
2. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน	1
3. การป้องกันตนเอง	3
4. การจัดรักษาสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ	4
5. การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือนและกั้นบริเวณที่อาจก่อให้เกิด อันตรายในการปฏิบัติงาน	5
6. ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	5
7. ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของหนักโดยมือและ โดยรถเครน	6
8. การใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย	6
9. ความปลอดภัยในการใช้บันไดและนั่งร้าน	7
10. การเลือกใช้ตะขอ, โซ่ยกที่หนีบจับให้ยึดแน่นกับโครงสร้าง	8
11. ความปลอดภัยในการขุด	9
12. การใช้เครื่องมือไฟฟ้า / อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย	10
13. การจราจรและที่จอดรถ	10
14. การป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง	11
15. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	12
16. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ตัวเครื่องจักร	13
17. การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่าง ๆ	13
18. การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน	14

หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

วิสัยทัศน์ (VISION)

"บริษัท สยาม โทเนะจำกัด จะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

"Siam Tone Co., Ltd strives to be organization acknowledged for excellence in safety, health and environment of all sectors to provide employees with better quality of life in the workplace."

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมพัฒนา และกำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานในทุกภาคส่วนและหน่วยงานของบริษัท
3. ลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ผ่านระบบการจัดการอันตรายและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยภายในองค์กร
4. สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรในบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา ให้มีความเข้าใจและมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่การดำเนินงานของบริษัท

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (POLICIES SHE)

บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจากการปฏิบัติงานได้ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้อสภาพการทำงานและ สิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร บริษัทจึงกำหนดให้เป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานและ ผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัท ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทถือว่า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎระเบียบ, ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง และมาตรฐานเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

2. บริษัทจะจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

3. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน และให้อิสระกับผู้บริหาร ทุกระดับอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานใดๆ เพื่อให้บรรลุผลนี้

4. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย ระเบียบที่บริษัทได้ กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

5. บริษัทจะสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ ทางด้านความปลอดภัยต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้มีสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจงใจให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย

6. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการ และหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมเพื่อวางแผนงาน และจัดทำโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนา แผนงาน โครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

7. บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยๆ ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

8. บริษัทจะจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ

กฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา
2. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เฉพาะงานตามที่หน่วยงานกำหนด
3. ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงานหรืออยู่ในพื้นที่ทำงาน
4. ห้ามผู้ปฏิบัติงานดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
5. ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายเรียบร้อยรัดกุม
6. ห้ามผู้ปฏิบัติงานพกอาวุธเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน
7. ผู้ปฏิบัติงานต้องสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
8. ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
9. ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐานก่อนเข้าปฏิบัติงาน
10. ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และผู้อื่น
11. ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้น

1. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 80 เกิดจากการกระทำของคน

- ทำงานลดขั้นตอนหรือรีบเร่งเกินไป
- ไม่หยุดเครื่องจักร ก่อนซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา
- ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ในขณะที่ทำงานที่มีอันตราย
- ยก เคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยท่าทางที่ไม่ปลอดภัย
- ฝ่าฝืนกฎระเบียบและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
- ปฏิบัติงาน โดยไม่มีหน้าที่ หรือขาดความรู้
- หยอกล้อระหว่างทำงาน
- แต่งกายไม่รัดกุม รุ่มร่าม

2. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเหมือนภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทร

ความสูญเสียทางตรง

- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าทดแทน
- ค่าทำขวัญ

ความสูญเสียทางอ้อม

ลูกจ้าง

- ได้รับความเจ็บปวด
- ได้รับความทรมาน
- ความพิการ
- ความสูญเสียงาน
- เสียขวัญและกำลังใจ

ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ



ครอบครัว

- สูญเสียคนรัก
- ขาดรายได้
- สูญเสียโอกาส

นายจ้าง

- ผลผลิตลดลง
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าใช้จ่ายฝึกคนงานใหม่
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
- เสียเวลา
- เสียชื่อเสียง

ประเทศชาติ

- ขาดกำลังคนชำนาญงาน
- เสริมธุรกิจเสียหาย



3. การป้องกันตนเอง

“จงทำงานด้วยจิตใจที่สดชื่น พร้อมด้วยจิตสำนึกในความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นเบื้องต้น”

- ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่งห้ามมีส่วนยื่นห้อย และห้ามถอดเสื้อและหรือนุ่งกางเกงขาสั้นในขณะที่ปฏิบัติงานตามปกติ
- ห้ามหยอกส่อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน
- ต้องใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาทำงานในสภาพปกติที่สามารถใส่ได้
- ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาทำงานในสภาพปกติที่สามารถใส่ได้ถ้าคุณมีความกังวลที่เกี่ยวกับงานควรปรึกษาหัวหน้างาน
- จำไว้ว่า การอยู่ดีก การดื่มจัด และการพนันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในวันรุ่งขึ้น
- สังเกตและปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
- อย่าทำงานในที่ลับตาคนเพียงคนเดียว โดยไม่มีใครทราบโดยเฉพาะการทำงานหลังเวลาทำงานปกติ



4. การจัดรักษาสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ

- สถานที่ปฏิบัติงานต้องปราศจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และต้องไม่มีเศษขยะ น้ำมันและน้ำบนพื้น
- จัดทางเดินให้โล่งเพื่อสามารถเข้าไปยังที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ห้องน้ำตลอดจนอ่างล้างมือต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
- อาหารต้องไม่จัดเก็บไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ขยะและของเหลือใช้ต้องนำออกไปนอกเขตปฏิบัติงานทุกวัน
- ห้ามจัดวางวัสดุที่ง่ายต่อการลุกไหม้ใกล้กับจุดติดตั้งหลอดไฟหรือวัสดุ ที่มีความร้อน/

มีประกายไฟ

- น้ำมัน จาระบีที่หกกระจายบนพื้น ต้องรีบทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- จัดเก็บวัสดุบนพื้นที่ได้ระดับ และอยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคง
- จัดทำลิ้มไม้หมอน สำหรับรองวัสดุที่เป็นรูปวงกลมเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว
- การจัดรักษาให้เป็นระเบียบที่ดี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้



5. การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือนและกั้นบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน

- บริเวณเขตก่อสร้างต้องจัดทำรั้ว พร้อมปิดป้ายประกาศ “เขตก่อสร้าง บุคคลภายนอกห้ามเข้า” โดยรอบบริเวณที่ทำการก่อสร้าง
- บริเวณเขตอันตรายต้องจัดทำรั้ว พร้อมปิดป้ายประกาศ “เขตอันตรายในการก่อสร้าง” และมีไฟสัญญาณสีแดงแสดงให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน
- พื้นที่สูง พื้นที่ที่มีช่องเปิดต่างๆ ต้องทำราวกันตกที่มั่นคงแข็งแรง
- ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือหมคน้ำที่เข้าไปในเขตก่อสร้าง และเขตอันตรายในการก่อสร้าง
- ห้ามผู้ปฏิบัติงานพักอาศัยในบริเวณเขตก่อสร้าง



6. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก

- ต้องสวมถุงมือชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะทำการยก
- ถ้ายกหนักเกินกว่าจะยกคนเดียวได้ให้เรียกคนมาช่วยมากพอที่จะยกได้ โดยไม่ต้องฝืนออกแรงมากจนเกินกำลัง งอเข่าและก้มตัวไปด้านหลังให้ ลำตัวชิดลง ให้หลังตรงเกือบเป็นแนวตั้งแล้ว ยืนขาทั้งสองข้าง ให้ใช้ขาช่วยยกให้หลังยก เมื่อจะวางของให้ทำวิธีย้อนกลับตามวิธีเดิม

การยกสิ่งของ 1 คน



การยกสิ่งของ 2 คน



7. ความปลอดภัยในการยกโดยรถปั้นจั่น

- จัดให้มีผู้ให้สัญญาณที่ชำนาญเพียงคนเดียว
- อย่าเข้าใกล้ส่วนที่เครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง
- ในกรณีที่มีการขุดตอกันอาณาบริเวณไว้โดยรอบ
- ห้ามเข้าไปอยู่ใต้วัสดุที่กำลังยกโดยเด็ดขาด
- การทำงาน ในเวลากลางคืน จัดให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณตลอดเวลาที่ทำงาน
- ห้ามดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเครน
- จัดให้มีสัญญาณเสียง และแสงวับวาบเตือนให้ทราบขณะรถเคลื่อนที่
- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถเครนเป็นภาษาไทยให้พนักงานขับรถศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง



8. การใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ต้องมีที่ครอบป้องกันอันตรายในบริเวณส่วนที่หมุน ส่วนที่ถ่ายกำลังให้มิดชิด
- อย่าเข้าใกล้ส่วนของเครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง
- ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีจุดที่ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
- ผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักร ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายตามสภาพและลักษณะงาน
- มีที่ปิดบังประกายไฟของเครื่องจักร
- เมื่อซ่อมแซมต้องติดป้าย “ กำลังซ่อมห้ามเปิดสวิช ”

- ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ผิดประเภท
- ห้ามถือเครื่องมือโดยหิวสายไฟ และถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ
- เมื่อพบเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด ต้องหยุดการใช้ โดยตัดสวิทช์ไฟ และแขวนป้าย “ชำรุดห้ามใช้” พร้อมส่งซ่อมทันที
- ห้ามโดยสารไปกับรถหรือเครื่องจักรกล ที่ไม่ได้ทำไว้เพื่อการโดยสาร




9. ความปลอดภัยในการใช้บันได

- ควรใช้บันไดที่ผลิตจากโรงงานชนิดบันไดใช้กับงานหนัก
- บันไดที่ชำรุด แตกหัก ห้ามใช้และควรติดป้าย “ห้ามใช้งาน”
- ห้ามนำบันได 2 อันมามัดต่อกันเพื่อให้ยาวขึ้น
- อย่าตั้งบันไดบริเวณที่ลื่น มีขยะ
- ปลายของบันไดต้องเกินจากจุดที่พาดผ่าน 3 ฟุต
- ห้ามยกของ แบกของขึ้นทางบันได
- ห้ามใช้บันไดโลหะกับงานไฟฟ้าโดยเด็ดขาด



10. การเลือกใช้ตะขอ, โซ่ยก, ที่หนีบจับ ให้ยึดแน่นกับโครงสร้าง

- ใช้ตะขอกรณีที่มีที่ยึดเกี่ยวในการยกที่เดียว และจะใช้ตรวนเมื่อยกที่มีที่ยึดมากกว่าสองที่ขึ้นไป
- ตะขอต้องมีสลักนิรภัยติดอยู่ (ยกเว้นตะขอบางประเภท)
- ใช้ตะขอยกน้ำหนัก โดยให้น้ำหนักวัสดุตกตรงร่องตะขอ
- ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนการผูกมัดวัสดุกับโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกินขีดจำกัดของโครงสร้างนั้น
- ห้ามใช้ที่หนีบจับสำหรับแผ่นโลหะ คีม ที่หนีบจับท่อ แทนที่หนีบจับที่ใช้กับโครงสร้าง
- ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติตะขอ โซ่ยกและที่หนีบจับที่ใช้กับโครงสร้างก่อนการใช้ทุกครั้ง ห้ามใช้เกินจากพิกัดน้ำหนักที่กำหนด
- พิกัดน้ำหนักที่จะยกต้องระบุเด่นชัดบนอุปกรณ์
- ไม่ปล่อยวัสดุที่จะยกอยู่ในสภาพไม่รัดกุม และไม่ได้รับการเฝ้าระวัง ถูกห้อยแขวนอยู่กับโซ่ยก
- ไม่ยื่นหรือให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ด้านล่างของวัสดุที่กำลังยกโดยโซ่ยก
- ไม่ใช่โซ่ม้วนรัดวัสดุ เพื่อทำการยก
- ต้องมีการตรวจสอบโซ่ก่อนมีการยกวัสดุ การตรวจสอบด้วยสายตาให้ ตรวจรวมไปถึงตะขอที่อาจผิดปกติตลอดจนสภาพที่เสียหายอันเนื่องจากการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

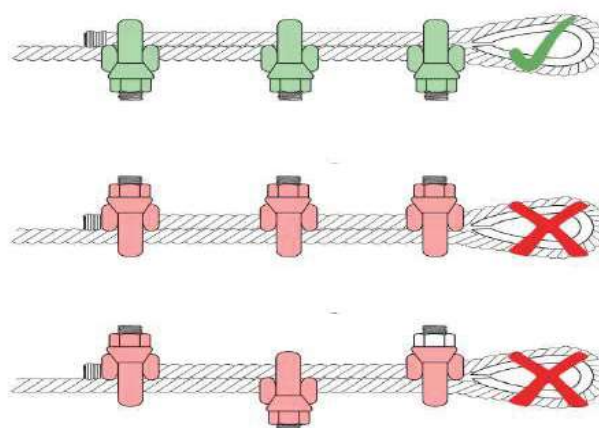

11. ความปลอดภัยในการขุด

- การขุดพื้นดิน ภูเขา ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมีการลั่นหรือทำให้ลาดเอียง และต้องมีการตรวจสอบโดยพนักงานทุกวันก่อนมีการเข้าไปทำงาน และการตรวจสอบต้องมีการทำบันทึกเก็บไว้
- จำเป็นที่จะต้องมีการใช้เครื่องกีดขวาง และเครื่องหมายติดตั้งรอบบริเวณที่ทำการขุด
- คนงานขุดดินต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าหุ้มส้น
- ไม่ควรให้บุคคลใดเข้าไปใกล้บริเวณขอบหลุมที่ทำการขุด หรือวัสดุอื่นใด เมื่อมีการทำงานของเครื่องจักร
- ต้องจัดหาบันไดเมื่อมีการขุดพื้นดินสำหรับการเข้า-ออกพื้นที่ และต้องมีทางออก
- สิ่งสกปรกหรือของที่ได้จากการขุด หรือวัสดุอื่นใด ต้องจัดเก็บห่างจากขอบของการขุดอย่างน้อย 1 เมตร
- ต้องทำการตรวจสอบพื้นที่ของการขุดหลังจากฝนตก และต้องมีการป้องกันการเกิดน้ำท่วม



12. การใช้เครื่องมือไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Circuit breaker)
 - ส่วนที่เป็นโลหะของแผงสวิตช์ต้องต่อสายดิน
 - เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องมีฉนวนหุ้ม
 - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะต้องต่อสายดิน
 - มีการตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำเมื่อพบการชำรุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วต้องรีบเปลี่ยนใหม่
 - อย่าใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมือเปียกน้ำ



13. การจราจรและที่จอดรถ

- อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง สามารถขับขี่ในเขตก่อสร้าง
- จำกัดความเร็วในเขตก่อสร้างที่ 20 กม./ชม. และให้เคารพกฎที่ปรากฏบนป้ายจราจร
- ไม่อนุญาตให้ขับรถเป็นทางเดียวซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย
- การแข่งอย่างปลอดภัยของยานพาหนะ อนุญาตให้แข่งในความเร็วที่กำหนดเท่านั้น
- ขณะขับรถพนักงานต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และรถยนต์ทุกคันต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
- ให้พนักงานเดินทางขามือบนถนนในเขตก่อสร้าง ในขณะที่รถยนต์วิ่งสวนกับพนักงาน
- พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎที่ปรากฏบนป้ายจราจร และให้ทางกับผู้เดินบนพื้นถนน
- จอดได้ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดให้จอดโดยมีป้ายจราจรอนุญาตให้จอดรถติดตั้งไว้
- กฎระเบียบว่าด้วยการจราจรทั่วไปให้มีผลบังคับในเขตก่อสร้างด้วย



14. การป้องกันอัคคีภัย และเครื่องดับเพลิง

- ผู้รับจ้าง / ผู้รับเหมาต้องจัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินให้กับพนักงาน
- พนักงานต้องทราบสถานที่ที่ใกล้ที่สุดของสัญญาณบอกเหตุเพลิงไหม้ และรู้ถึงการใช้พนักงานต้องทราบถึงชนิดต่างๆ ของสัญญาณบอกเหตุ เช่น ไฟไหม้ การอพยพ หรือภัยอื่นๆ และรู้เส้นทางหนีไฟตลอดจนจุดนัดพบ
- พนักงานต้องทราบสถานที่ที่ใกล้ที่สุดของถังดับเพลิงและรู้วิธีการใช้
- วัสดุไวไฟต้องเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ
- เมื่อเติมน้ำมันให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องปิด เครื่อง หรือเครื่องยนต์นั้นต้องไม่ร้อน
- ทิ้งบุหรี่ในที่ที่จัดหาให้ ไม่ทิ้งในตะกร้า หรือถังขยะทั่วไป
- จุดและสถานที่ที่ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุ จะต้องติดประกาศบนบอร์ดของเซฟตี้
- เมื่อเกิดเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมที่ได้จัดติดตั้งไว้แล้วตามจุดต่างๆ ที่จำเป็น คือ เครื่องดับเพลิงชนิด ABC ขนาดหนัก 5-7 กก. ผู้ประสบเหตุต้องเอาออกมาใช้ดับไฟทันที

เตรียมพร้อม ป้องกัน อัคคีภัย



1. หมั่นตรวจเช็ค เพิ่มความเข้มงวด และความรู้ในการตรวจตราระบบดับเพลิง/ระบบป้องกันเพลิงไหม้ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

2. ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัย , แผนฉุกเฉิน, มาตรการป้องกัน

3. วางแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า

4. สำรองจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัสดุไวไฟ, เชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย, แหล่งความร้อนต่างๆ

15. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- พนักงานทุกคนต้องทราบถึงสถานที่เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์นั้น
- หมวดนิรภัยต้องมีให้กับพนักงานทุกคน
- อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้า (เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเต็มส่วน ครอบอยู่บนแว่นตานิรภัย สำหรับงานขัดและงานตัด) ต้องถูกนำมาใช้กับงานที่ดวงตาและใบหน้าที่มีโอกาสได้รับอันตราย
- สวมรองเท้านิรภัยหนังหรือบู๊ทที่แข็งแรงตลอดเวลาทำงาน
- ใส่เครื่องป้องกันหู เมื่อทำงานประเภทที่มีเสียงดังมากเกินกว่า 90 dB ณ ตำแหน่งทำงานที่ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร
- สวมเข็มขัดนิรภัยในการทำงานในที่สูงเกินกว่า 4 เมตร



16. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ตัวเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือทำรั้วกันส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร/เครื่องมือซึ่งในภาวะปกติอาจมีบุคคลไปสัมผัสได้
- ห้ามนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร/เครื่องมือออกจากตัวเครื่องขณะปฏิบัติงาน
- ก่อนการปฏิบัติงานต้องนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรที่ถูกถอดออกไปซ่อม หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นกลับมาติดตั้งให้เรียบร้อย
- หากต้องใช้เครื่องมือประเภทมอเตอร์เจียร์ / ตัด ให้ตรวจฝาครอบหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย ต้องให้มืออยู่ครบ ก่อนนำไปใช้งาน



17. การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่างๆ

- เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และต้องมีรายงานถึงแผนกความปลอดภัยทราบ
- อุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงานและอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
- อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ (ภายใน Site งานเท่านั้น)
- อุปกรณ์ / เครื่องมือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
- ไฟไหม้เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย การกระทำ / สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบทันที



18. การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ท่านอาจจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ มีชีวิตรอดโดยวิธีการดังนี้ :

- ประเมินสถานการณ์ (เช่น ยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ ใครเจ็บหนักที่สุด)
- ตัดสินใจช่วยผู้ที่บาดเจ็บมากที่สุดก่อน
- ติดต่อขอรับการช่วยเหลือ จากพยาบาลที่ห้องปฐมพยาบาล หรือแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- หัวหน้างานและ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลมาแล้ว ให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล สำหรับกรณีคนเจ็บเลือดออกมาก หรือกรณีคนเจ็บกระดูกหัก หรือกรณีคนเจ็บหมดสติไม่รู้สีกตัว หรือกรณีบาดเจ็บภายใน หรือกรณีเป็นลม หรือกรณีถูกสารพิษ หรือกรณีถูกไฟไหม้
- ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรง ต้องเตรียมรถเพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือเรียกรถพยาบาล

การปฐมพยาบาล ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

การห้ามเลือด

- กดตรงกลางนิ้วโป้งและนิ้วชี้ลงบนบาดแผล
- กดตรงกลางนิ้วโป้งและนิ้วชี้ลงบนบาดแผล (ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้)
- กดตรงกลางนิ้วโป้งและนิ้วชี้ลงบนบาดแผล (ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้)
- กดตรงกลางนิ้วโป้งและนิ้วชี้ลงบนบาดแผล (ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้)

กระดูกหัก

- ถ้าพบกระดูกหัก วางมือข้างหนึ่งบนกระดูกหัก
- ถ้าไม่พบกระดูกหัก วางมือข้างหนึ่งบนกระดูกหัก
- ถ้าไม่พบกระดูกหัก วางมือข้างหนึ่งบนกระดูกหัก
- ถ้าไม่พบกระดูกหัก วางมือข้างหนึ่งบนกระดูกหัก

ข้อเคล็ด ข้อแพลง

- ใช้นิ้วโป้งกด (ใช้นิ้วโป้งกด) ลงที่ข้อเคล็ด
- ใช้นิ้วโป้งกด (ใช้นิ้วโป้งกด) ลงที่ข้อเคล็ด
- ใช้นิ้วโป้งกด (ใช้นิ้วโป้งกด) ลงที่ข้อเคล็ด
- ใช้นิ้วโป้งกด (ใช้นิ้วโป้งกด) ลงที่ข้อเคล็ด

© 2013 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | อสมท | อสมท

CPR วิธีปฏิบัติที่ทุกคนควรรู้

การทำให้ CPR เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ และสามารถใช้ได้ ซึ่งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงควรเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้

01 เมื่อพบคนหมดสติ ควรตรวจสอบความปลุกเร้าในพื้นท้องแขนซ้ายและขวา

02 ปลุกเร้าด้วยเสียงดัง พร้อมตะโกนดังๆ อย่างชัดเจน

03 เรียกขอความช่วยเหลือใครโทรแจ้ง 1669 พร้อมแจ้งตำแหน่ง AED มาด้วย

04 ประเมินสัญญาณชีพ หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หรือหายใจผิดปกติ ให้เริ่มทำ CPR ทันที

05 เริ่มทำการ CPR

วางคนเจ็บนอนหงาย กางแขนขาตรง วางเท้าคนเจ็บตรง

เริ่มกดหน้าอก CPR ด้วยความลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร ในอัตราความเร็ว 100-120 ครั้ง/นาที

เมื่อ AED มาถึง ให้รีบใช้งานตามขั้นตอนที่เครื่องสั่งการ พร้อมทำการ CPR จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง

© 2013 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | อสมท | อสมท



ภาคผนวกที่ 7
กฎระเบียบภายในโครงการ

กฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงานภายในหน่วยงาน

1. ต้องเป็นพนักงานของทางบริษัท สยามโทเนะ จำกัด หรือผู้รับเหมาที่ทางบริษัท สยามโทเนะ จำกัด เท่านั้น
2. ต้องสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของบริษัท
3. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายกำหนด เช่น หมวก, เสื้อสะท้อนแสง, รองเท้าบูท , แวนตา หรือหน้ากากเชื่อม
4. ขณะทำงานในที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย
5. ห้ามดื่ม หรือเสพสารเสพติด ของมีเมา ในบริเวณหน่วยงานโดยเด็ดขาด
6. ต้องทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่ที่เตรียมไว้เท่านั้น
7. ห้ามทะเลาะวิวาทกันภายในหน่วยงานโดยเด็ดขาด
8. ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาในหน่วยงาน และห้ามไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานใน ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากทางการแล้ว
9. ห้ามพกพาอาวุธ สารเสพติดโดยเด็ดขาด
10. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
11. การทำงานที่มีประกายไฟ ต้องรับอนุญาต และต้องมีถังดับเพลิงไว้ในบริเวณสถานที่ทำงาน
12. ห้ามมิให้พนักงานของ บริษัท สยามโทเนะ พักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง
13. ผู้ใดพบเห็นสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือจุดต่อแหลม หรืออาจเป็นอันตรายต้องแจ้ง หัวหน้างานทราบ
14. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และเด็กเข้าในหน่วยงานโดยเด็ดขาด
15. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
16. ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ จะถูกลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ



ภาคผนวกที่ 8
เอกสารสำรวจบ้านข้างเคียง

รายงานการสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านพักอาศัยรอบโครงการ

(ก่อนเริ่มงานเจาะเสาเข็มเจาะ)

219 - 219 / 1

โครงการ

ศุภาลัย เซนส์ แจ็งวัฒนะ - หลักสี่

จัดทำโดย

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

219 - 219 / 1

219 - 219 / 1




219 - 219 / 1






219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

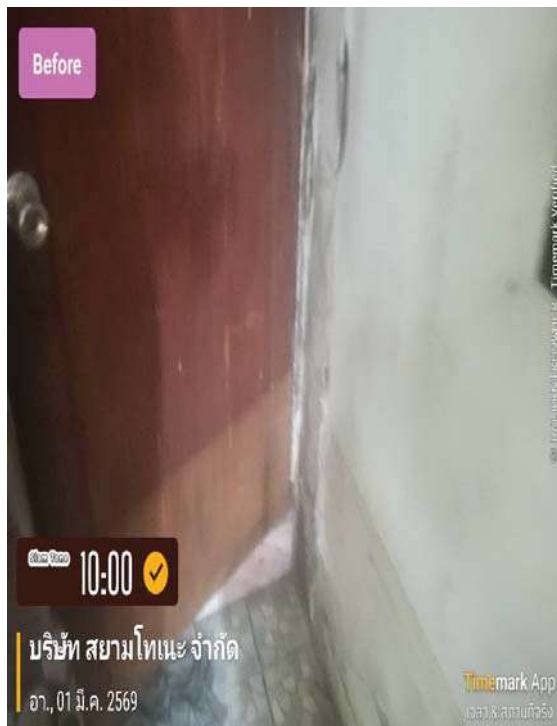

219 - 219 / 1

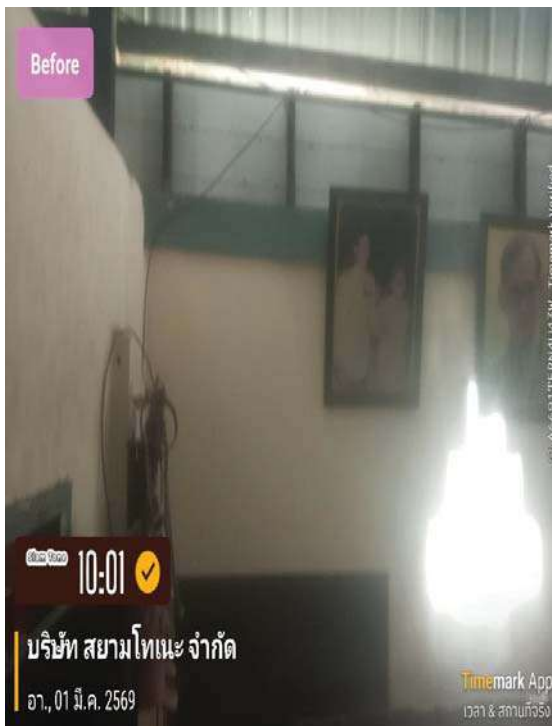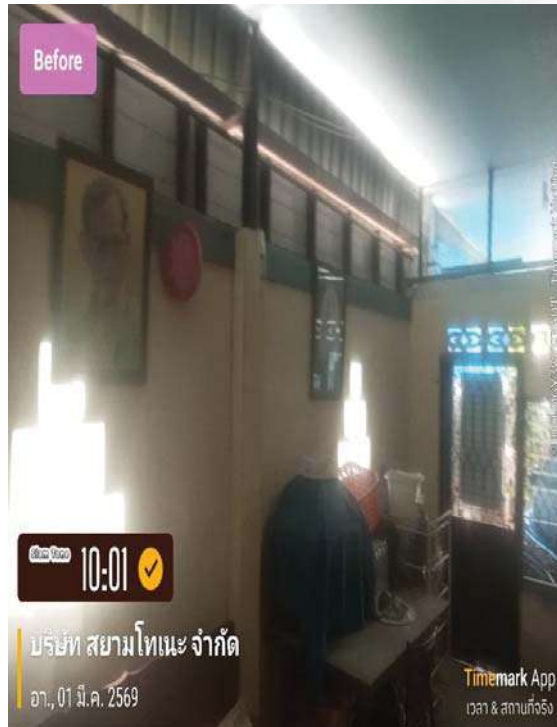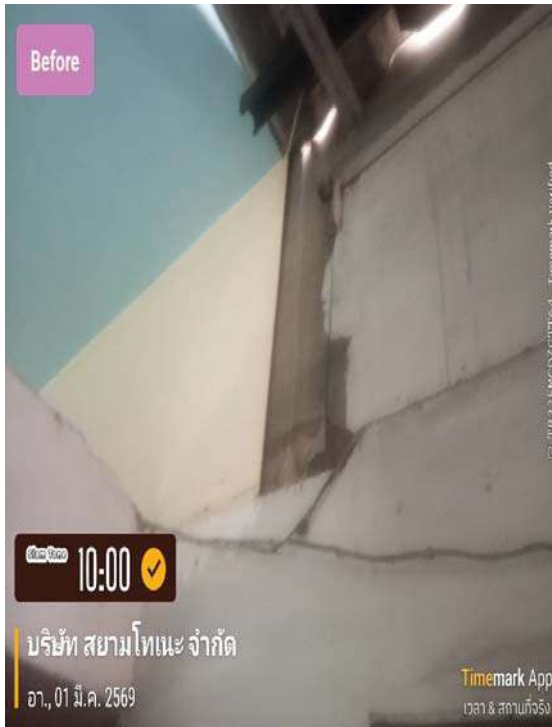


219 - 219 / 1

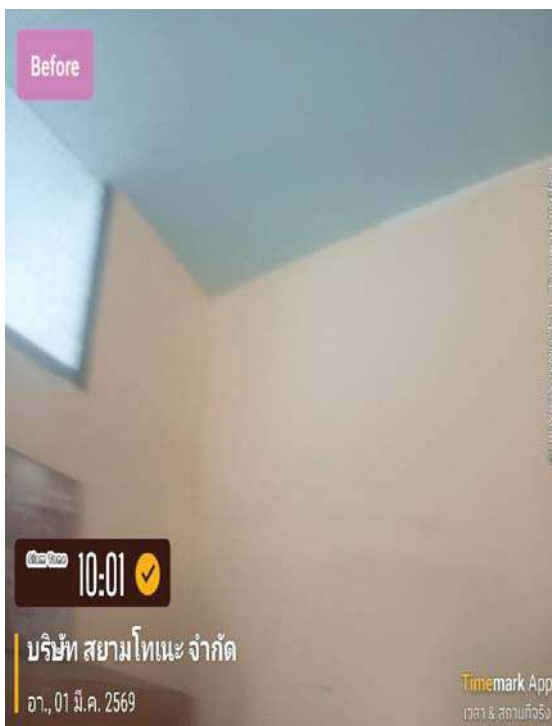


219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

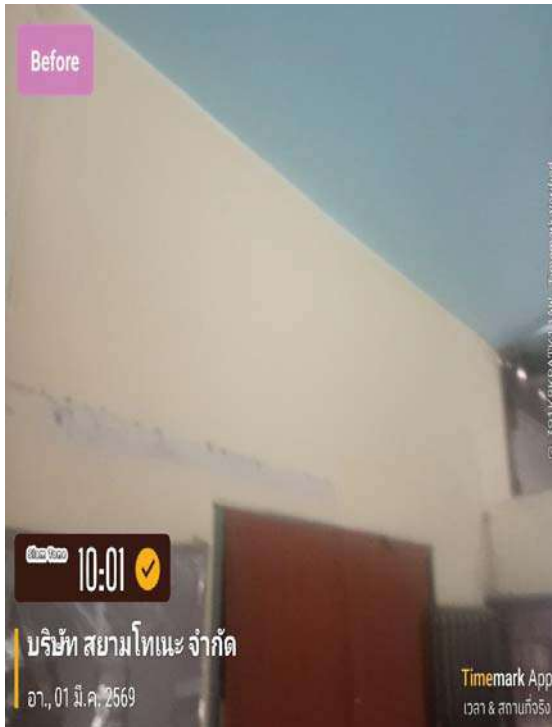


219 - 219 / 1

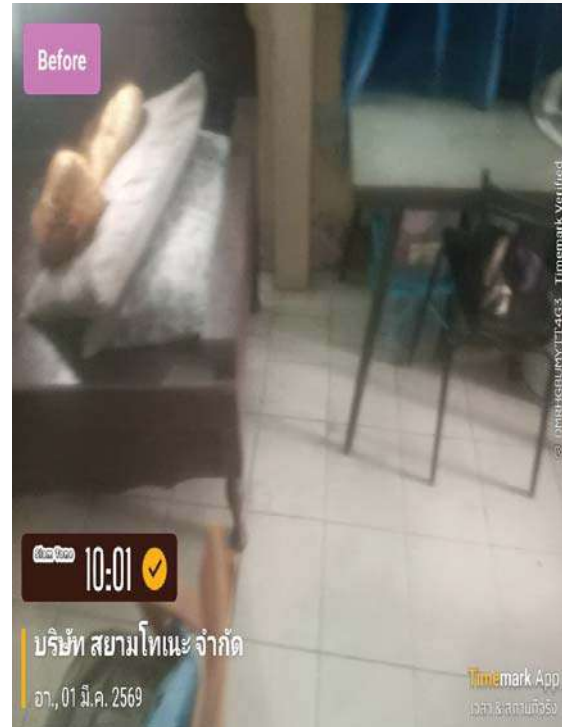



219 - 219 / 1

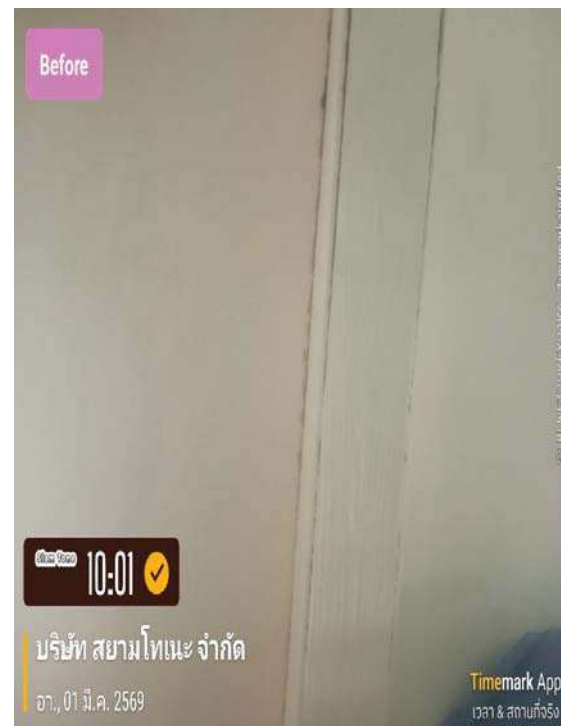


219 - 219 / 1

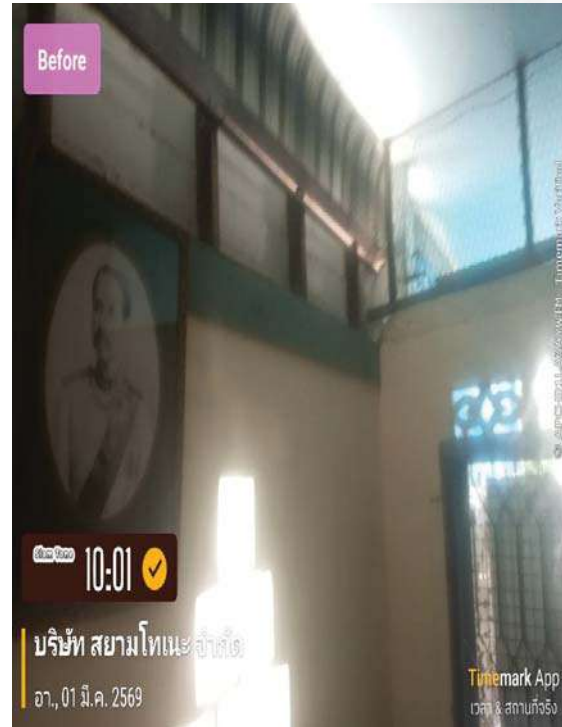

219 - 219 / 1

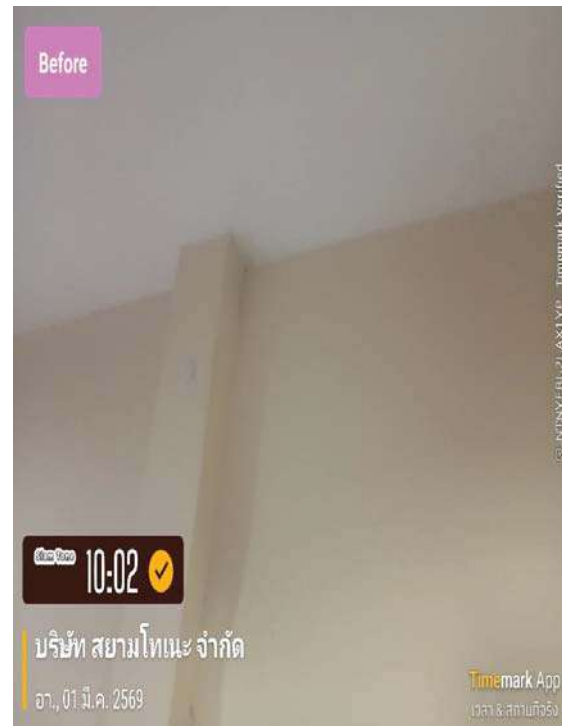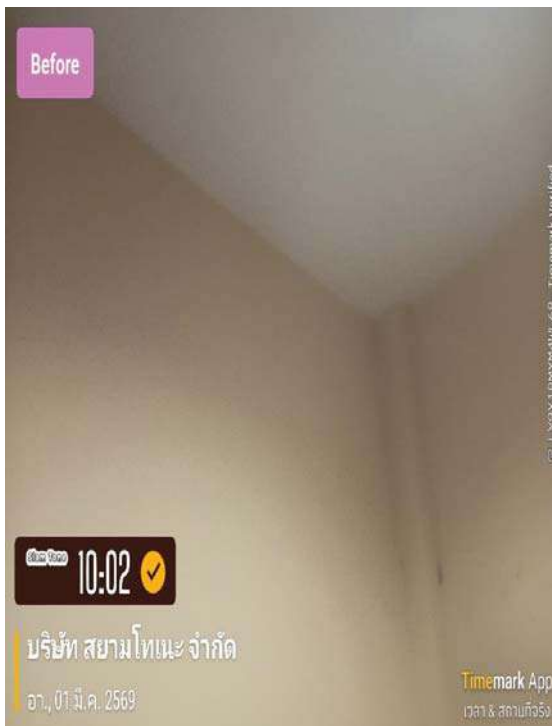


219 - 219 / 1


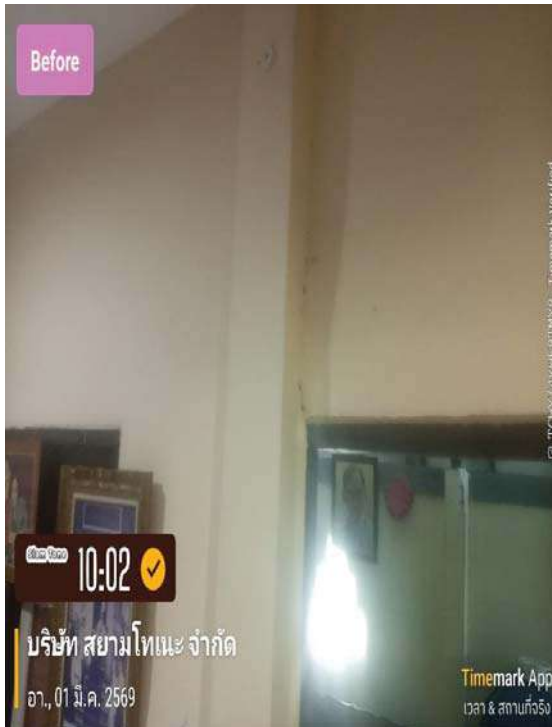






219 - 219 / 1

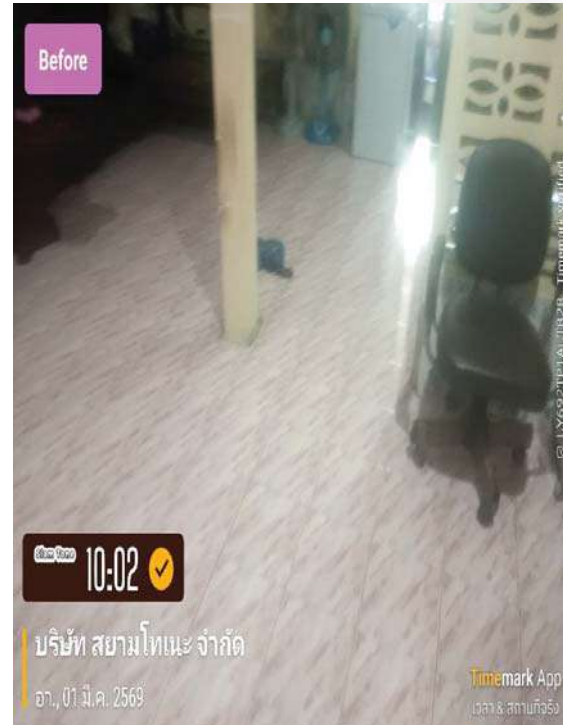


219 - 219 / 1

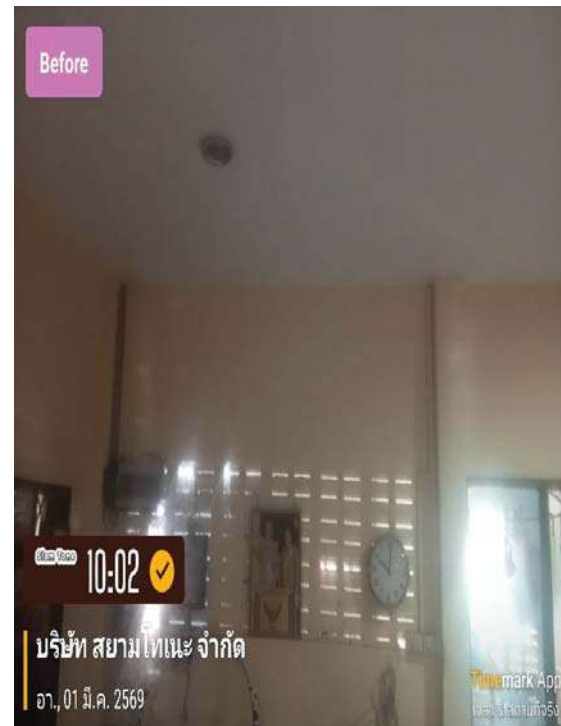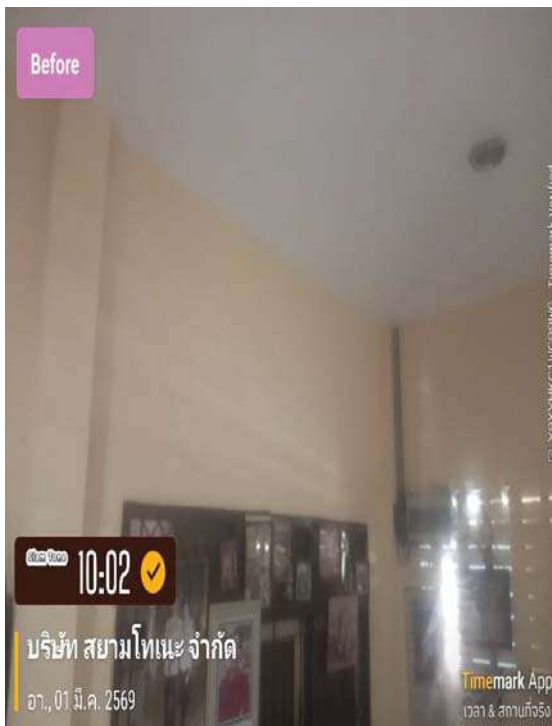



219 - 219 / 1

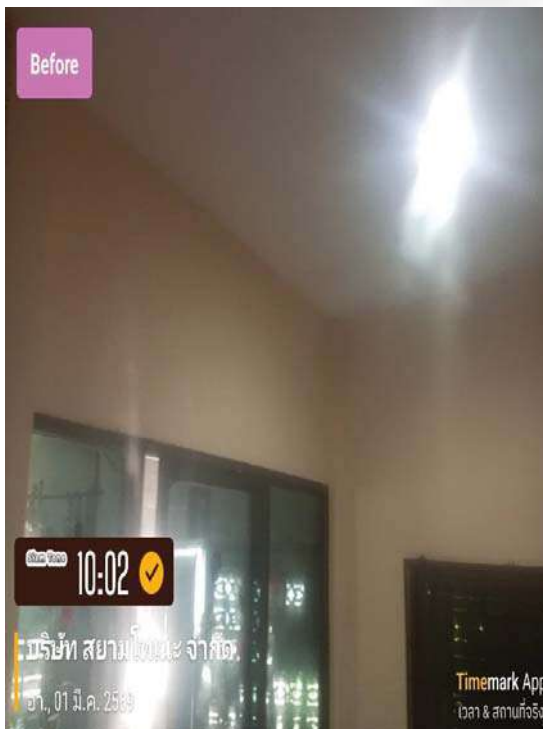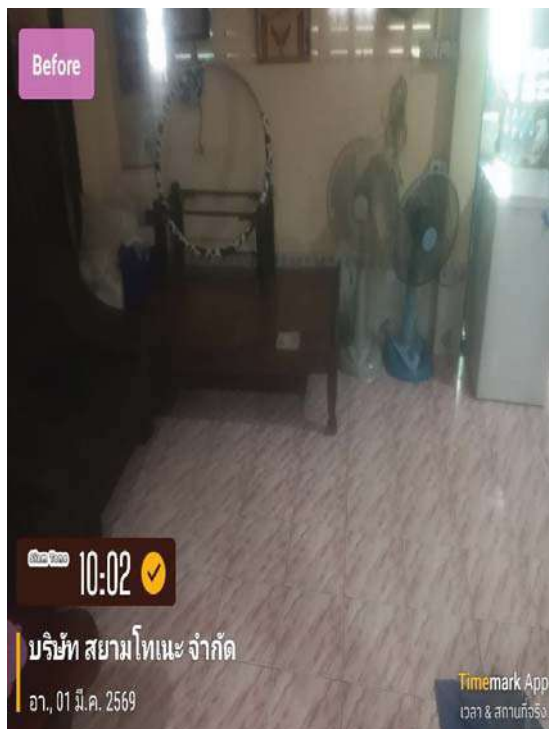

219 - 219 / 1

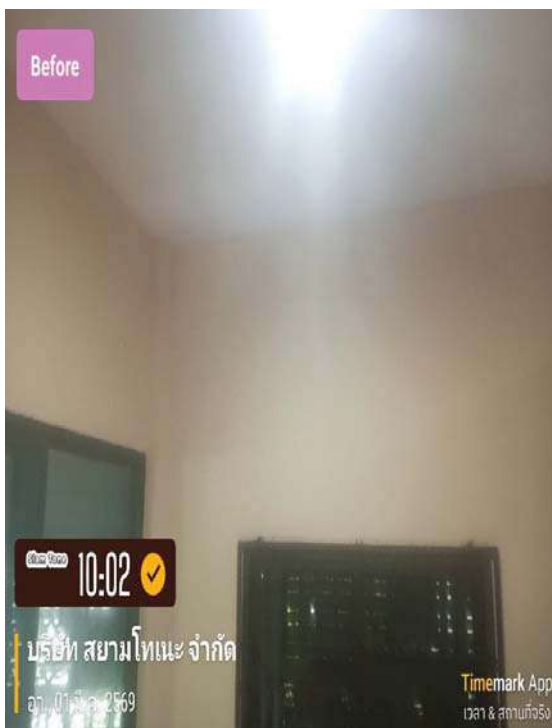



219 - 219 / 1

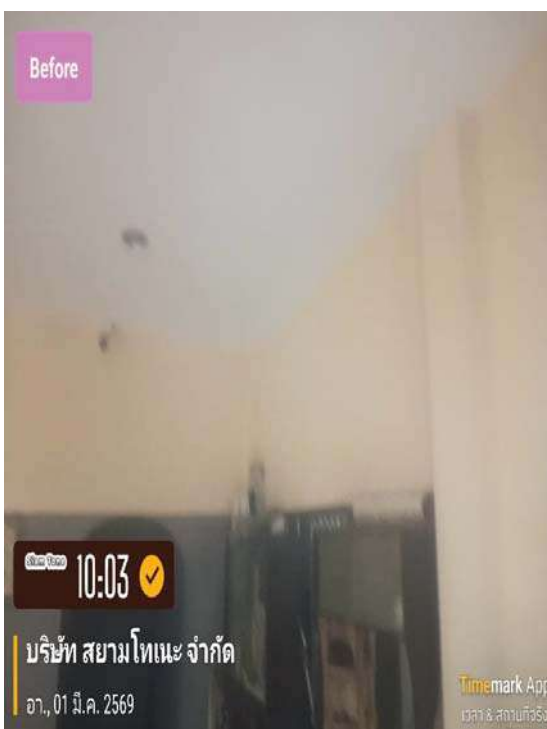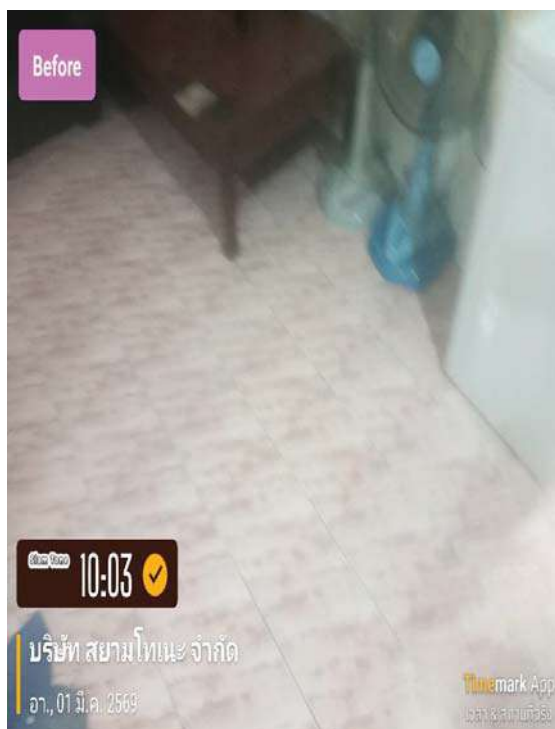



219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

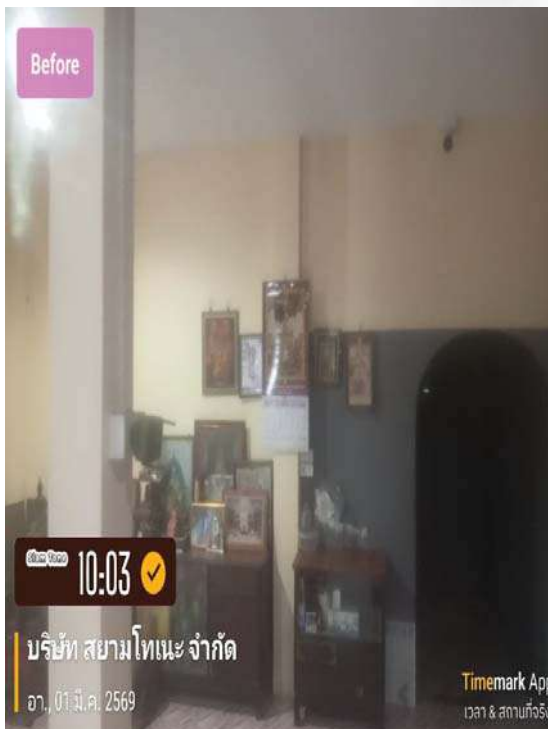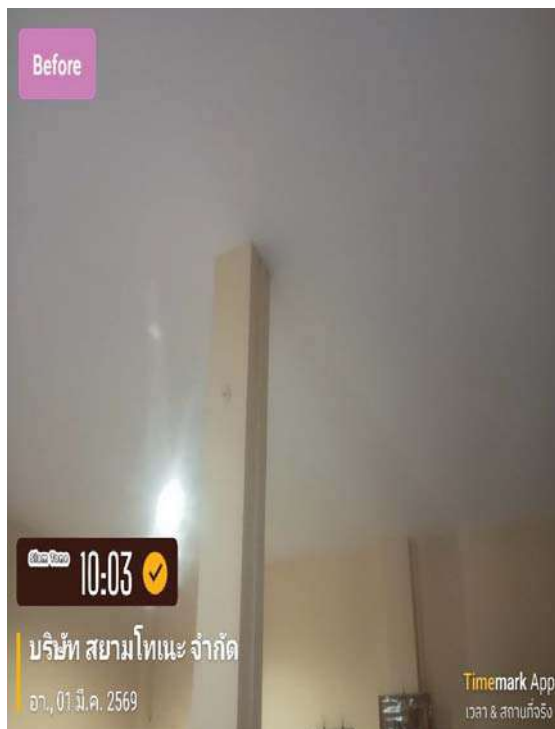

219 - 219 / 1

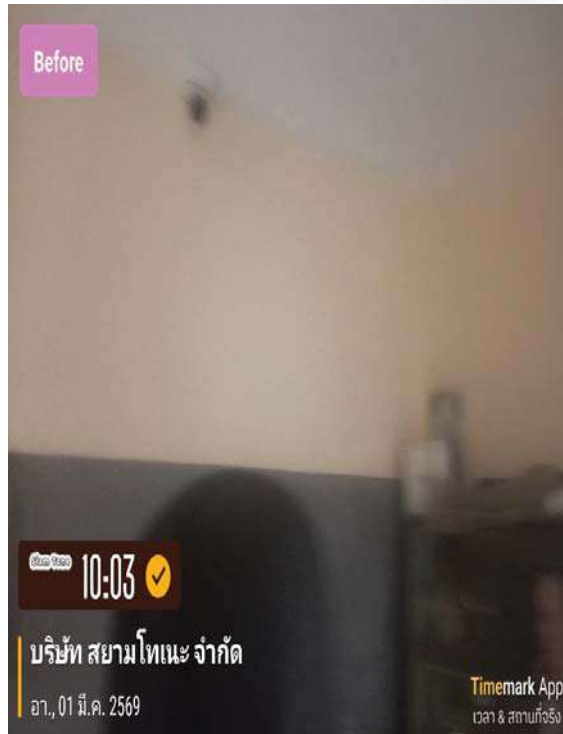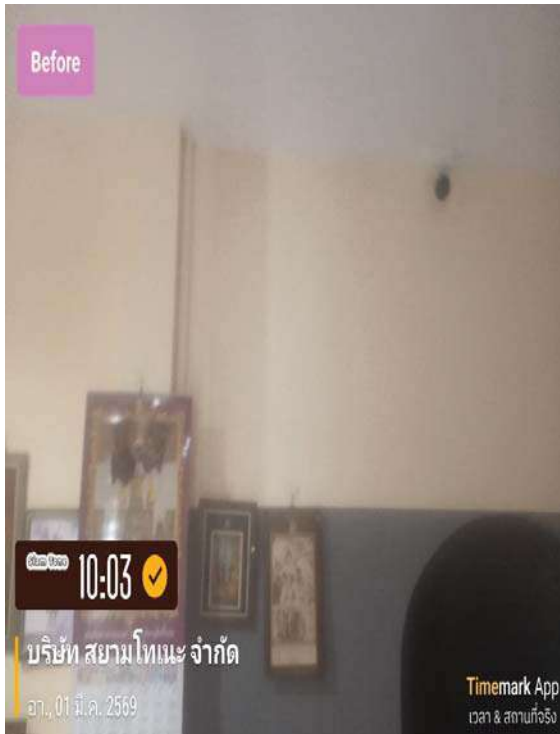



219 - 219 / 1

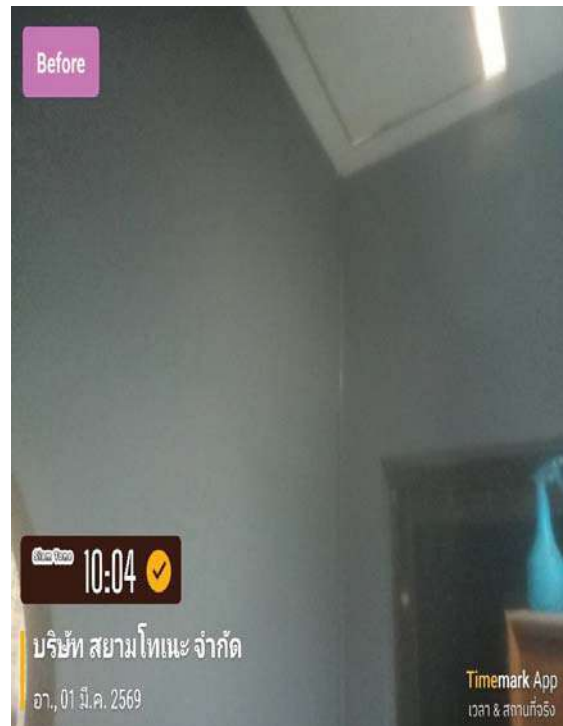


219 - 219 / 1





219 - 219 / 1

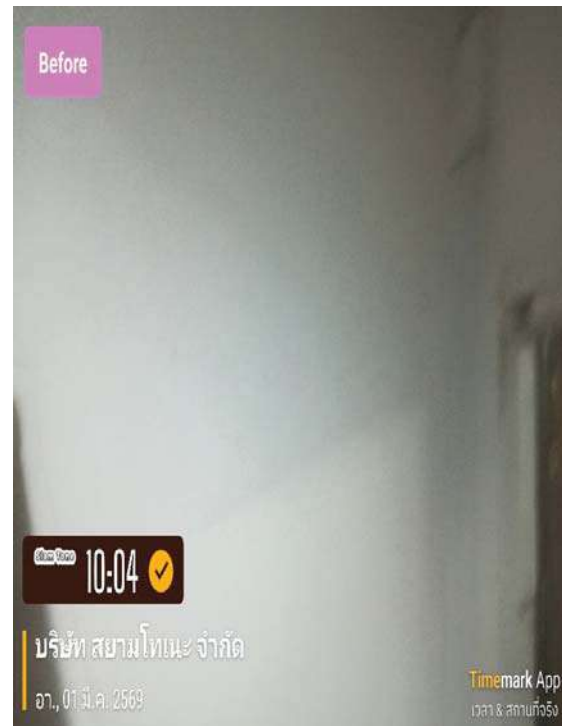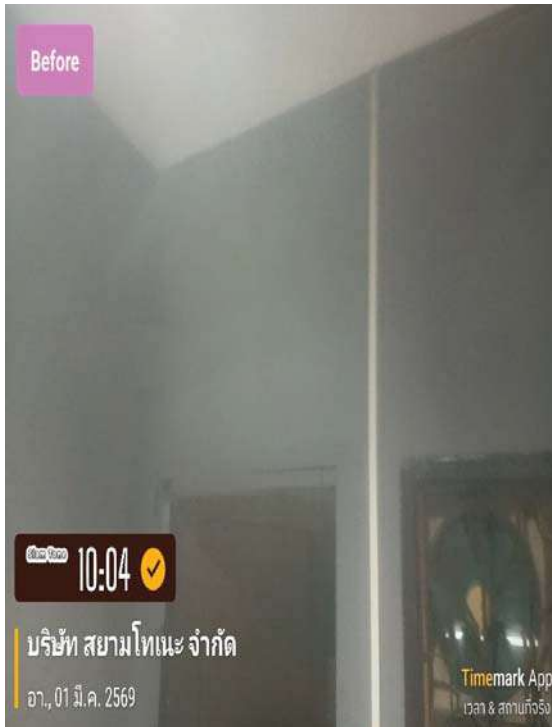





219 - 219 / 1

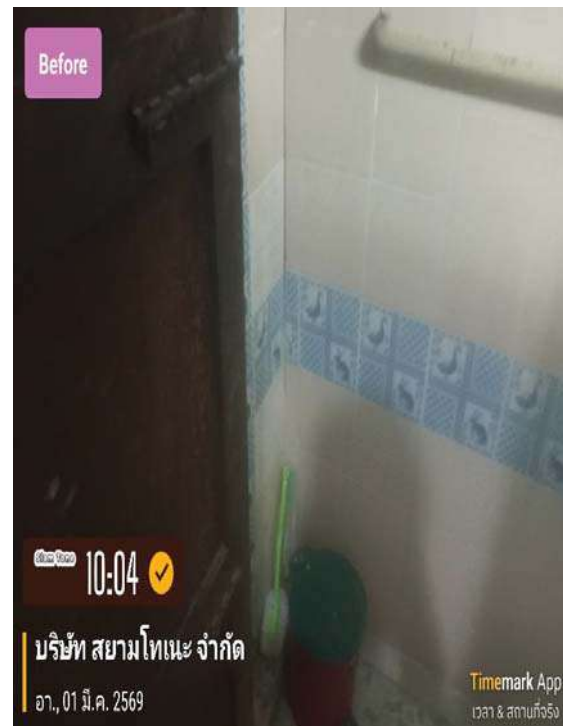

219 - 219 / 1

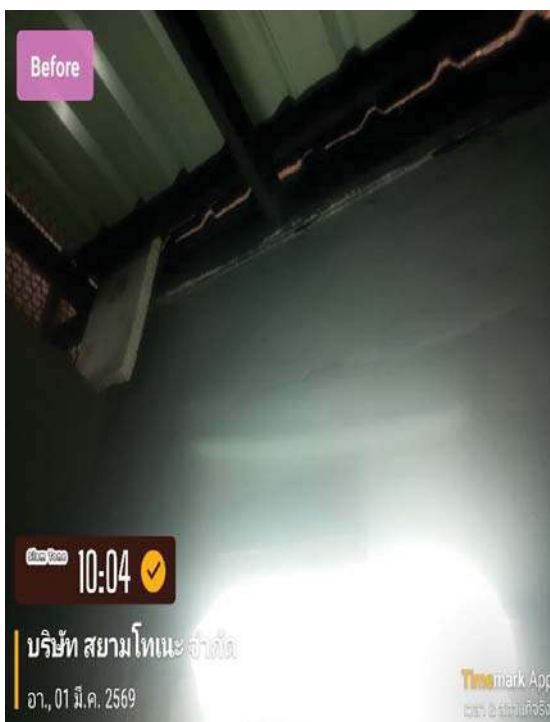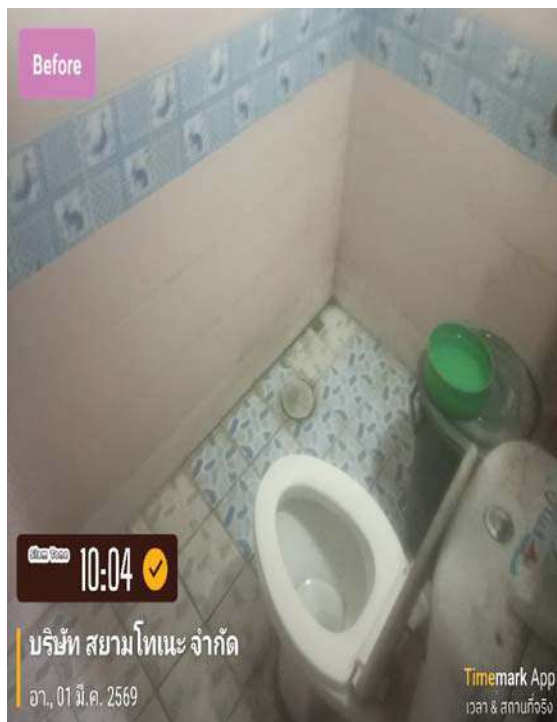



219 - 219 / 1

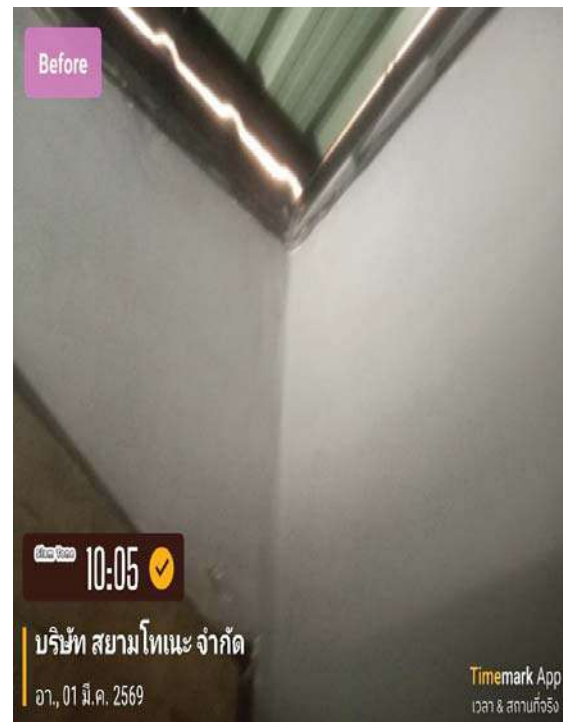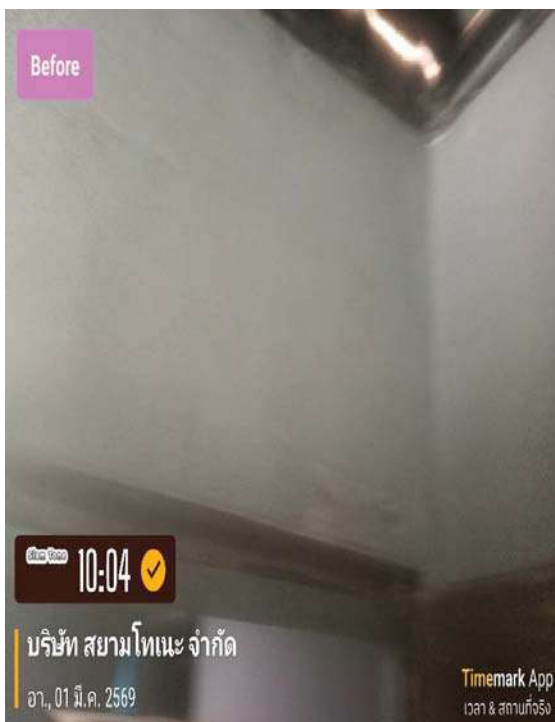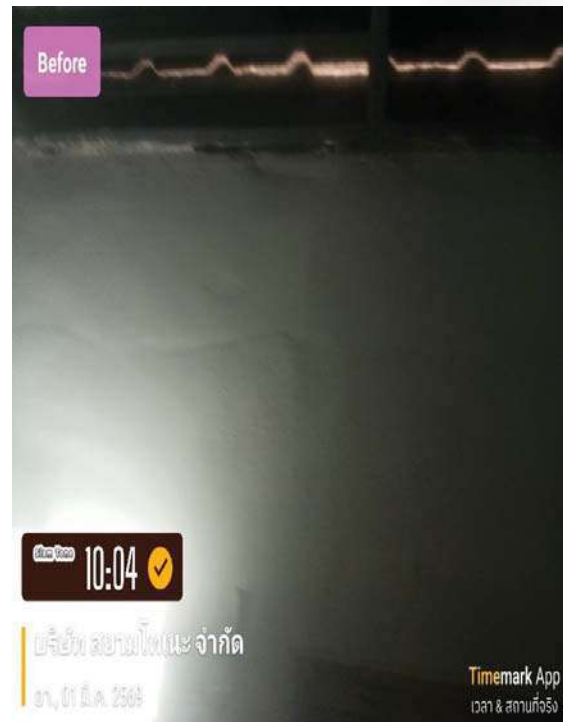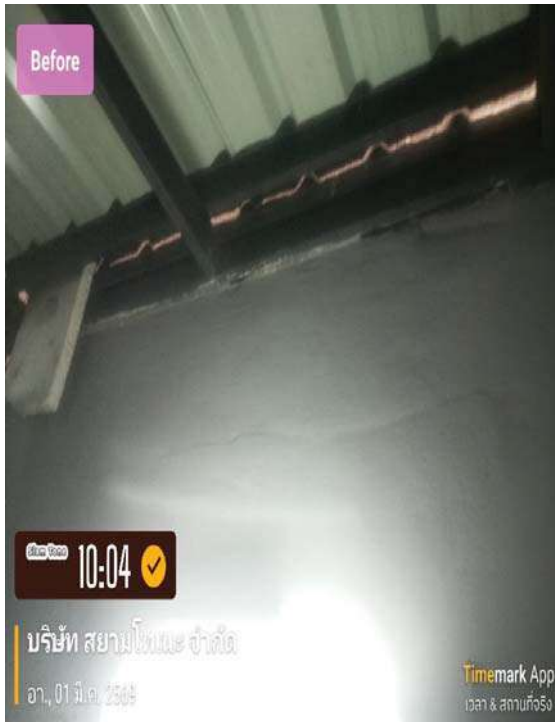


219 - 219 / 1





219 - 219 / 1

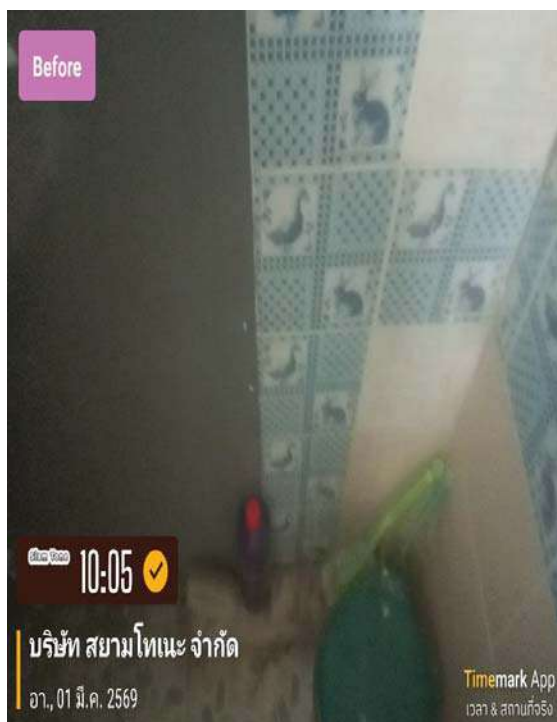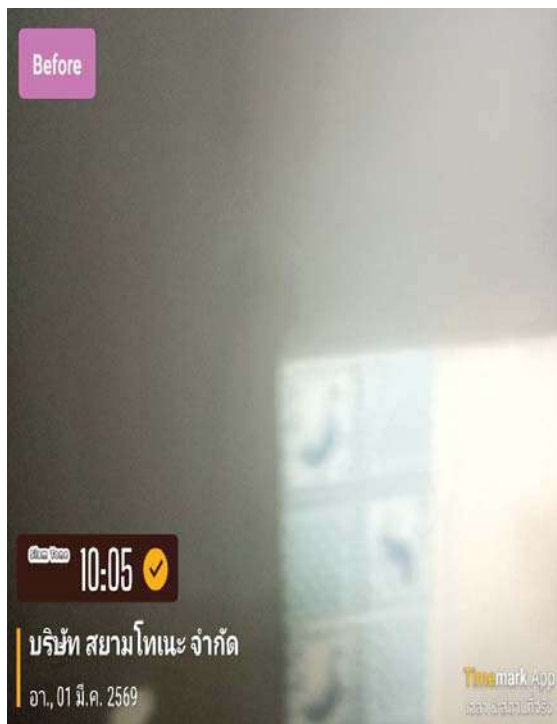


219 - 219 / 1

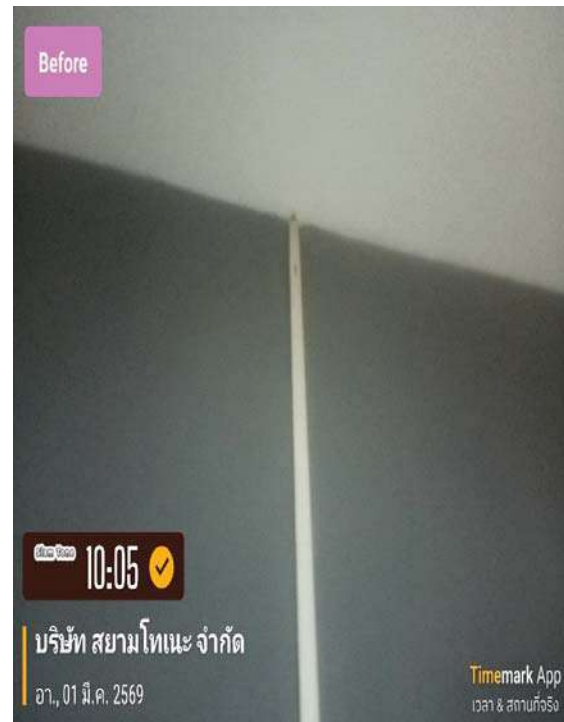




219 - 219 / 1

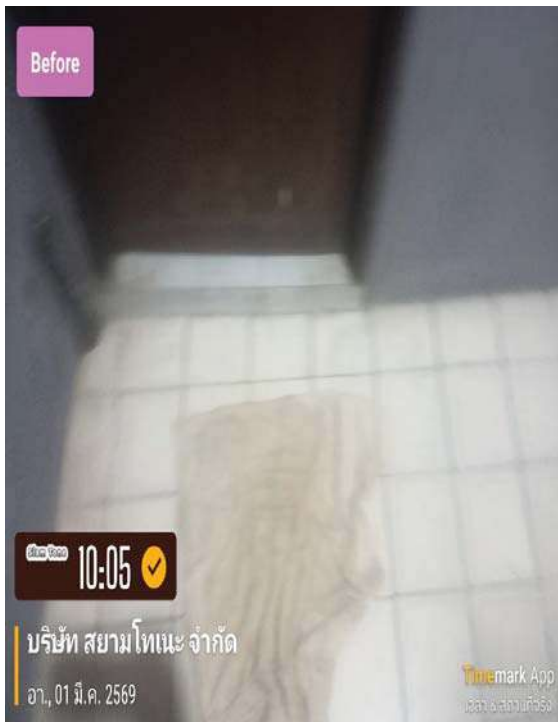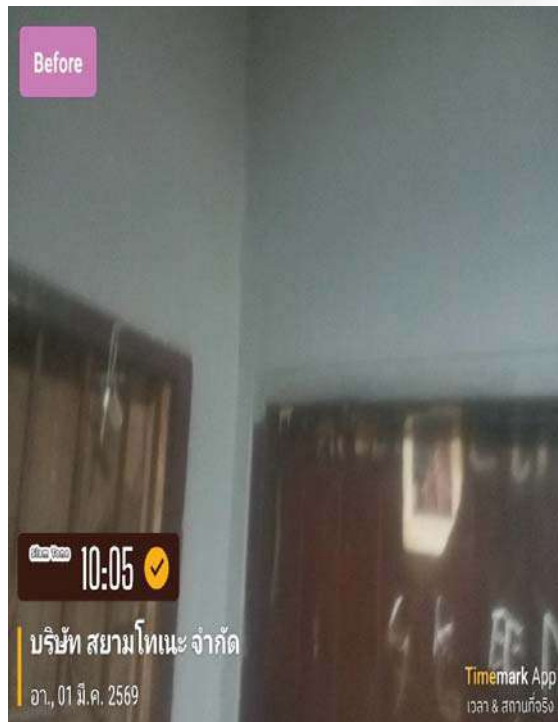


219 - 219 / 1

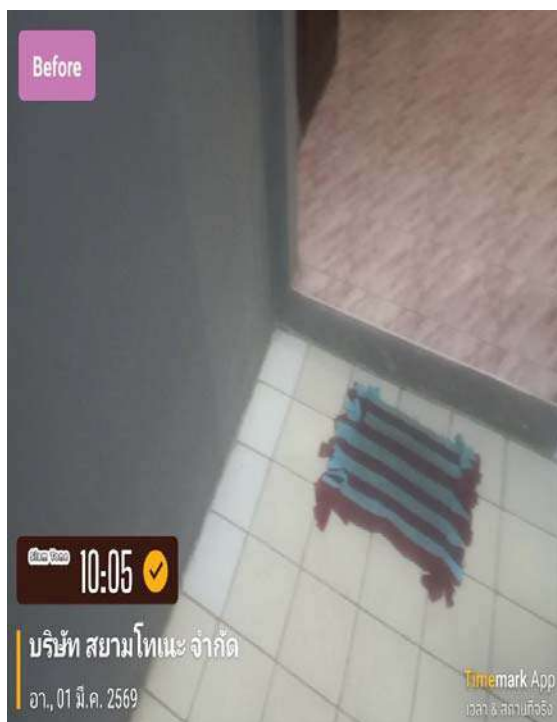




219 - 219 / 1

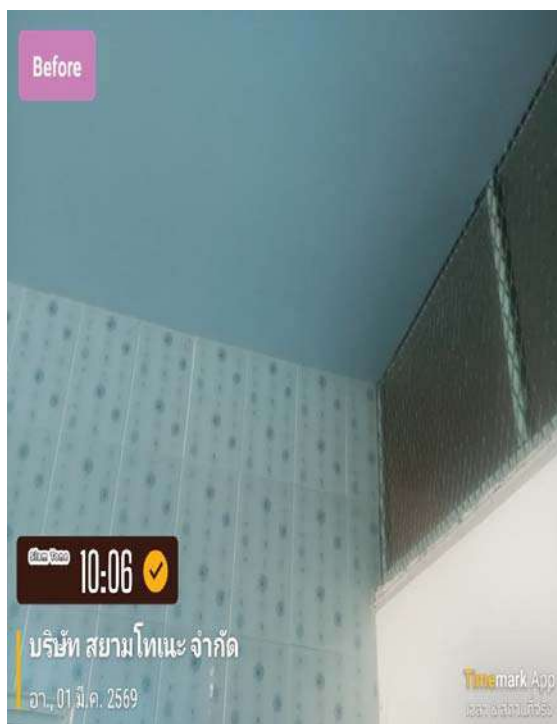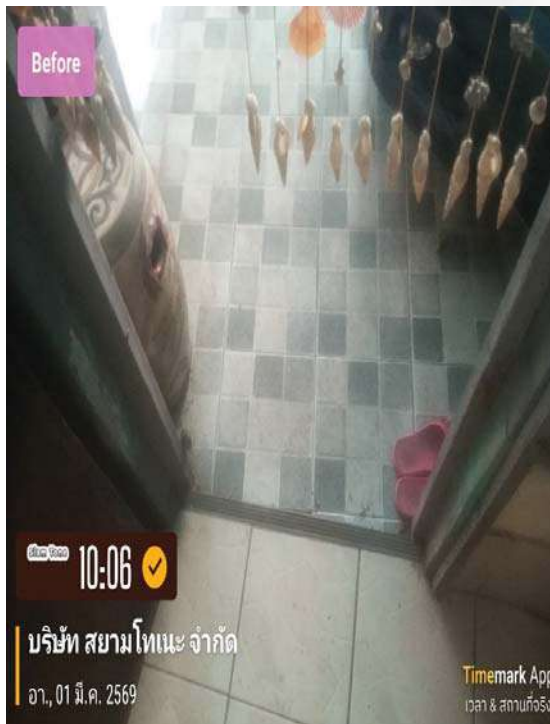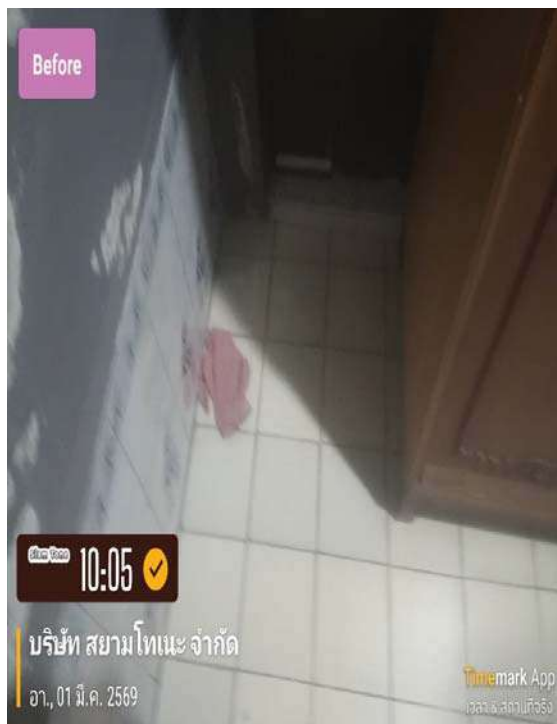


219 - 219 / 1

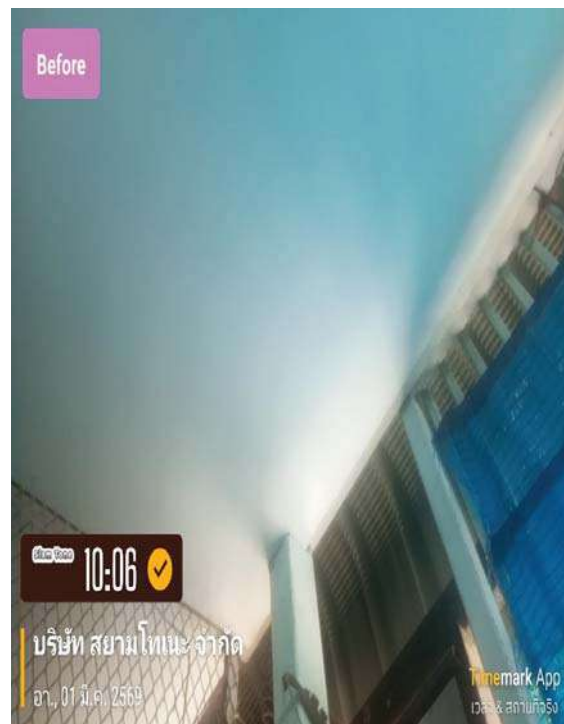


219 - 219 / 1

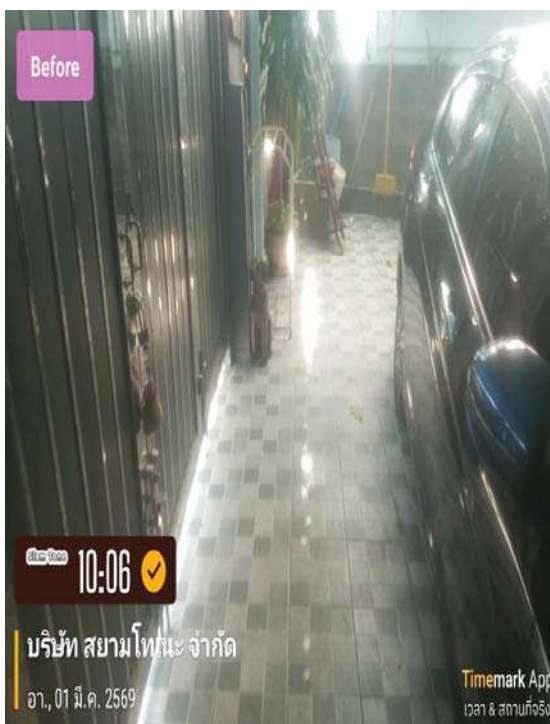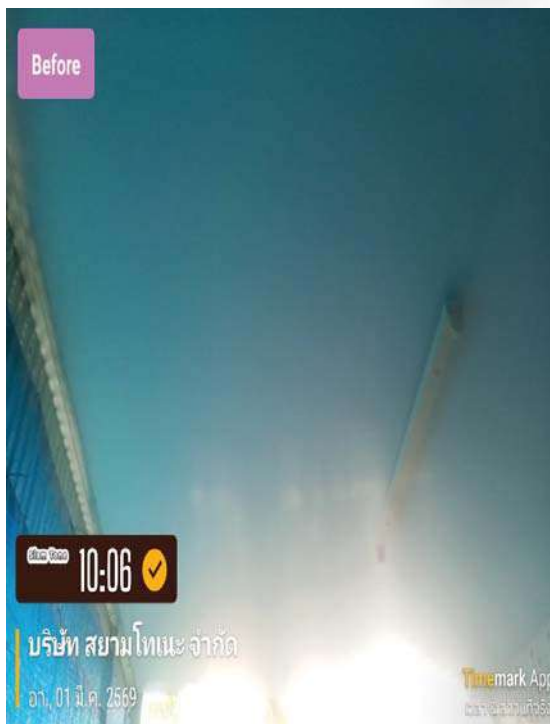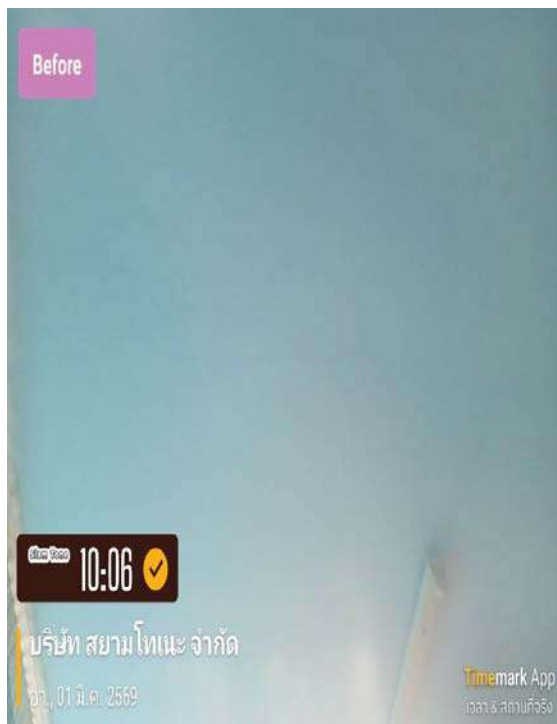

219 - 219 / 1

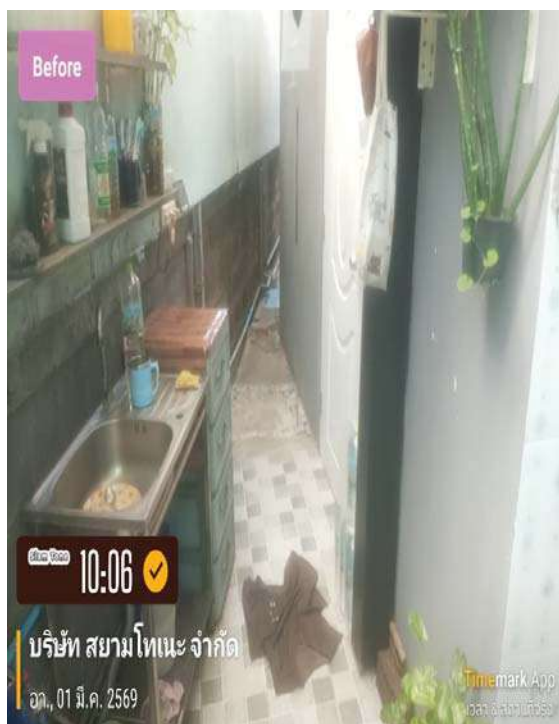


219 - 219 / 1

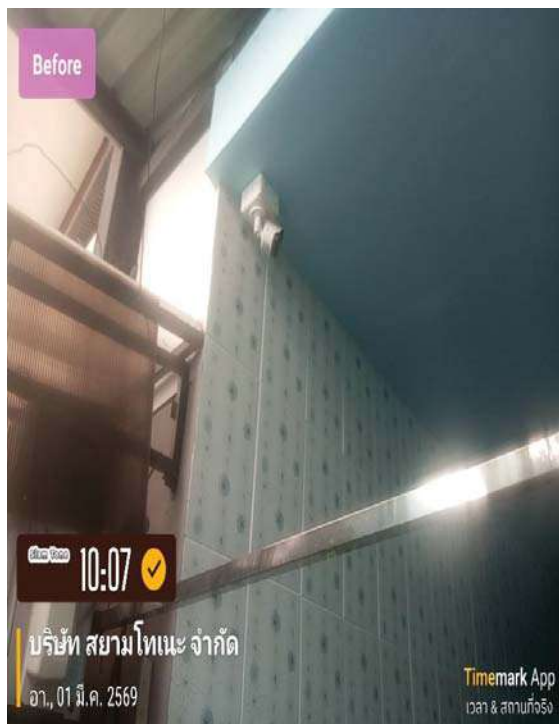


219 - 219 / 1





219 - 219 / 1

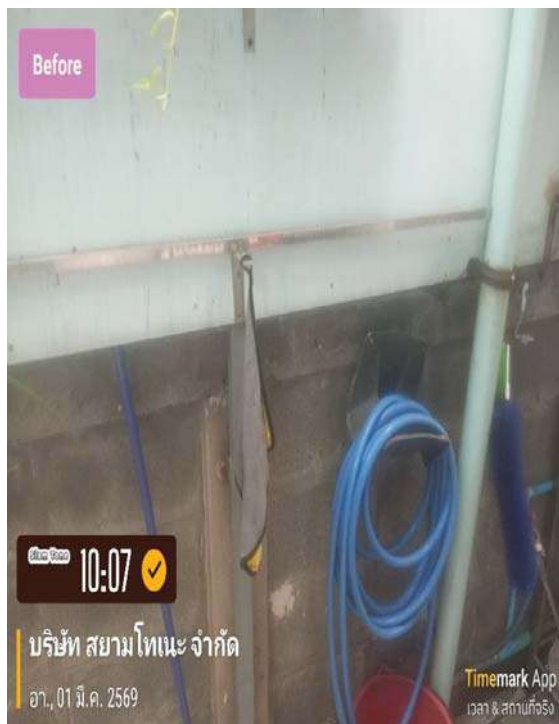




219 - 219 / 1

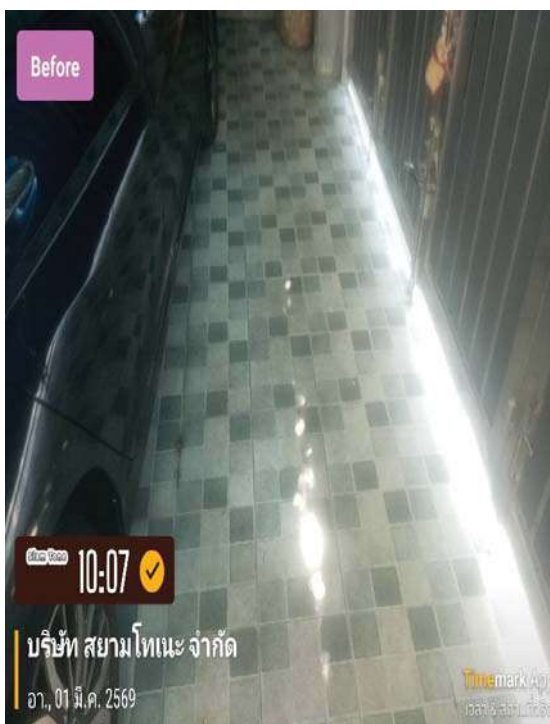




219 - 219 / 1

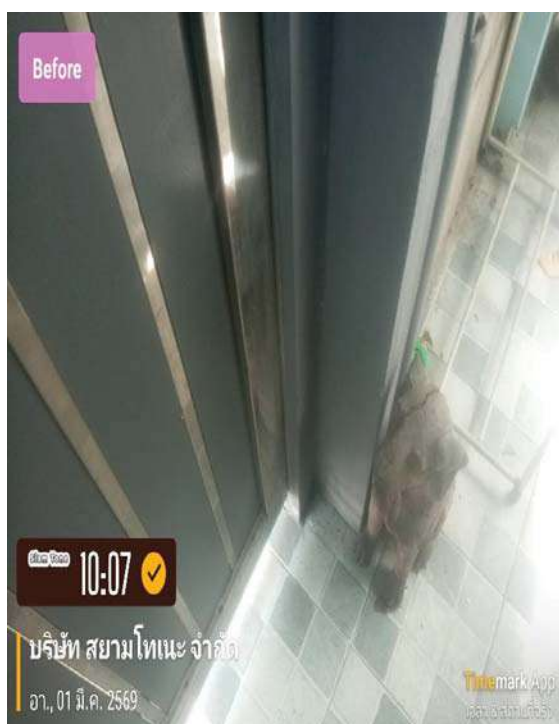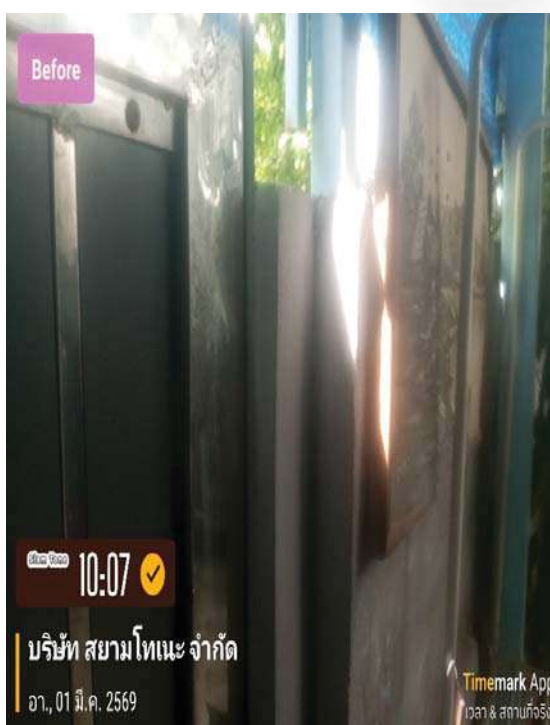




219 - 219 / 1

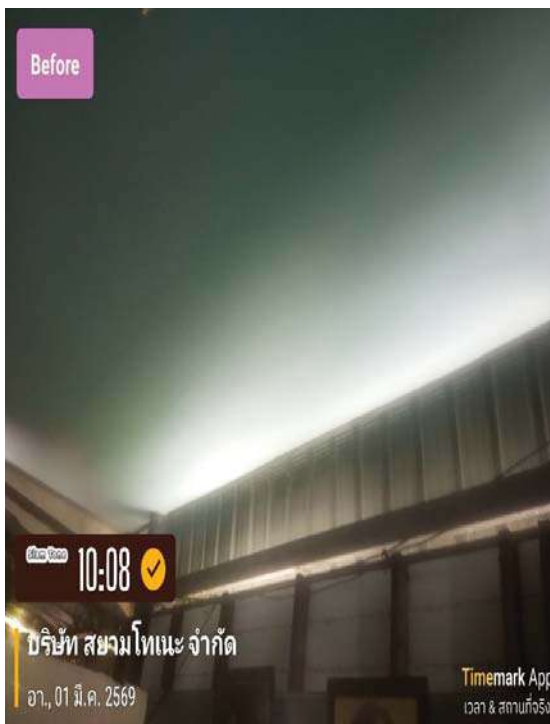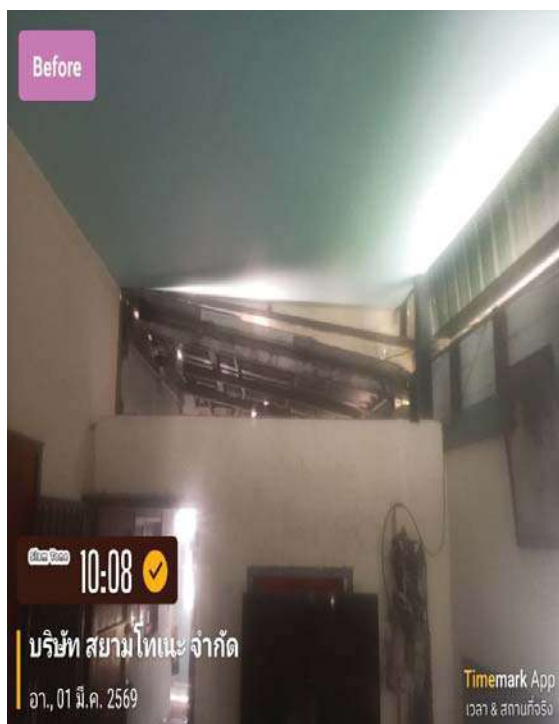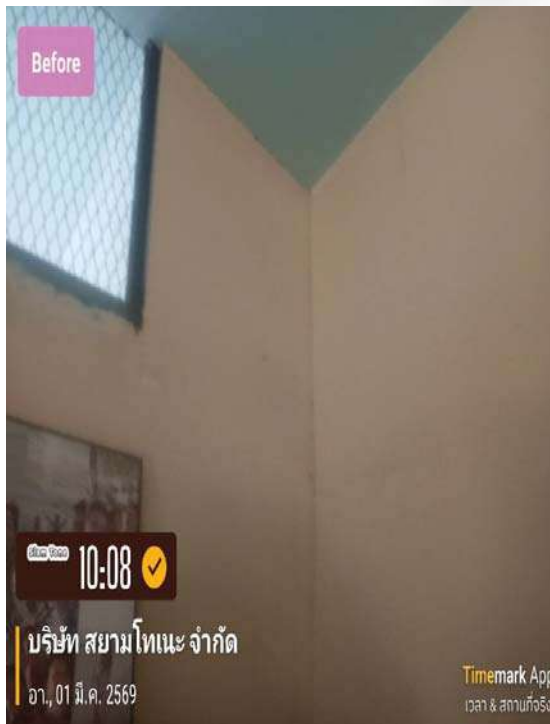




219 - 219 / 1

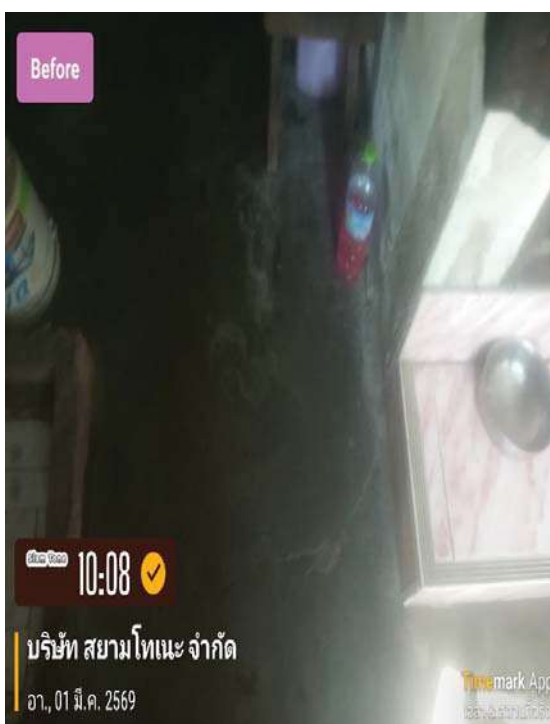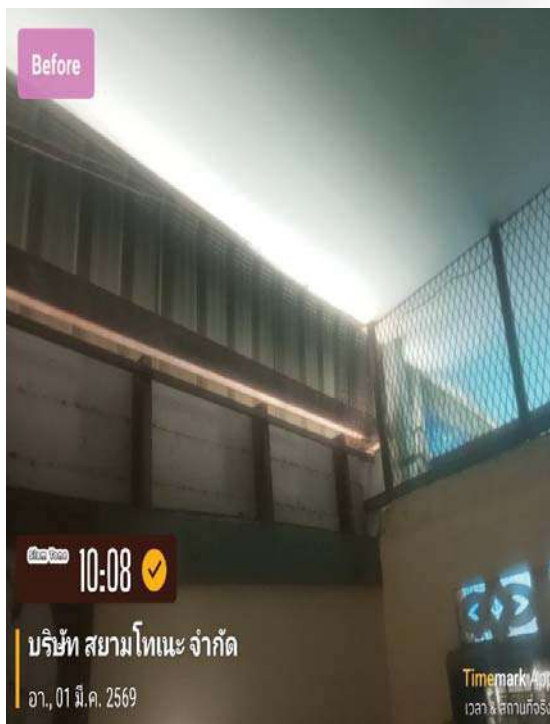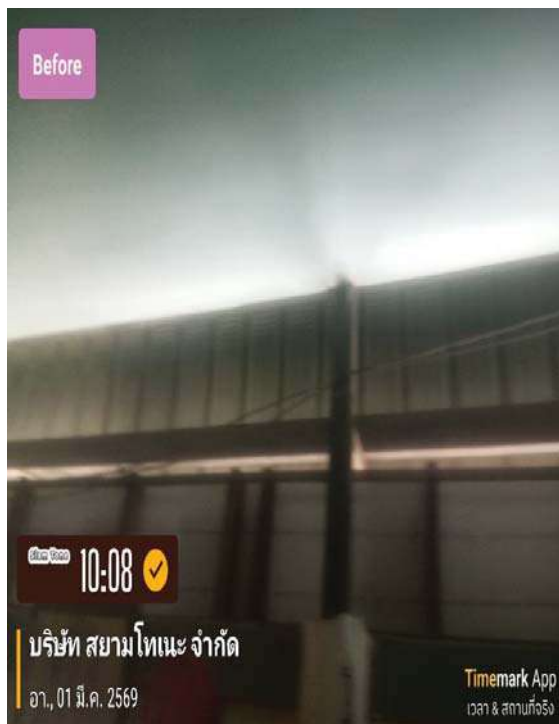

219 - 219 / 1

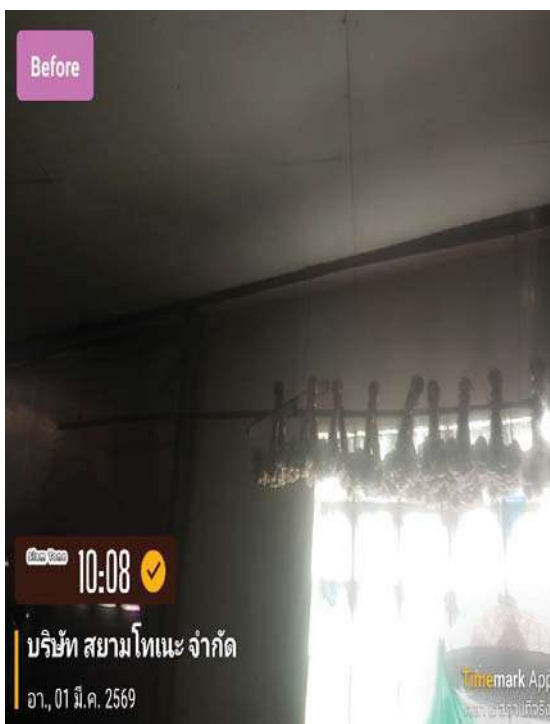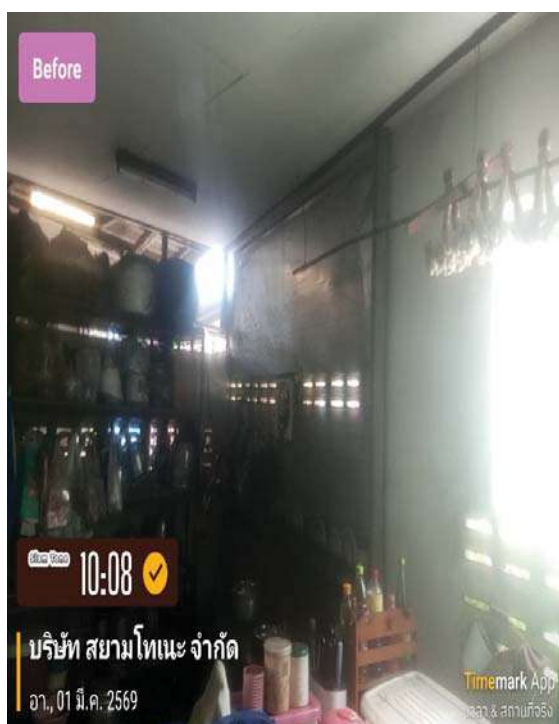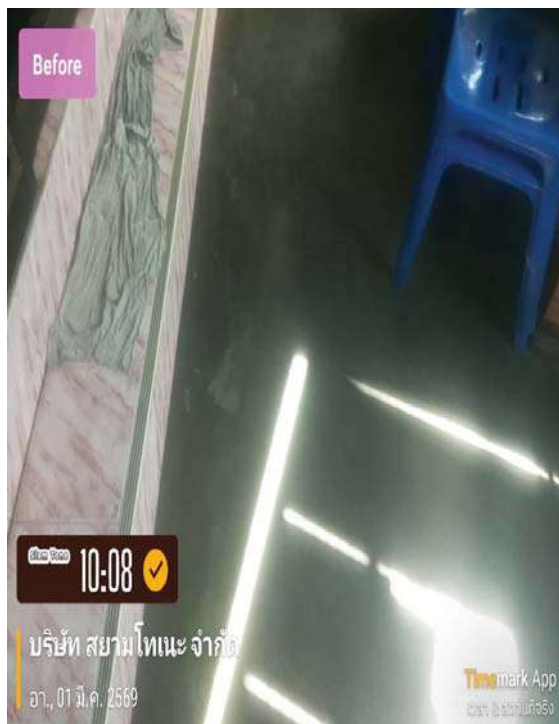

219 - 219 / 1

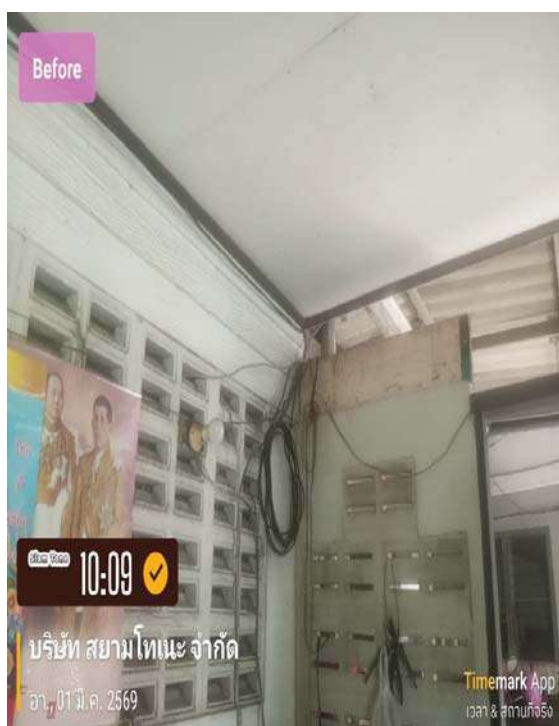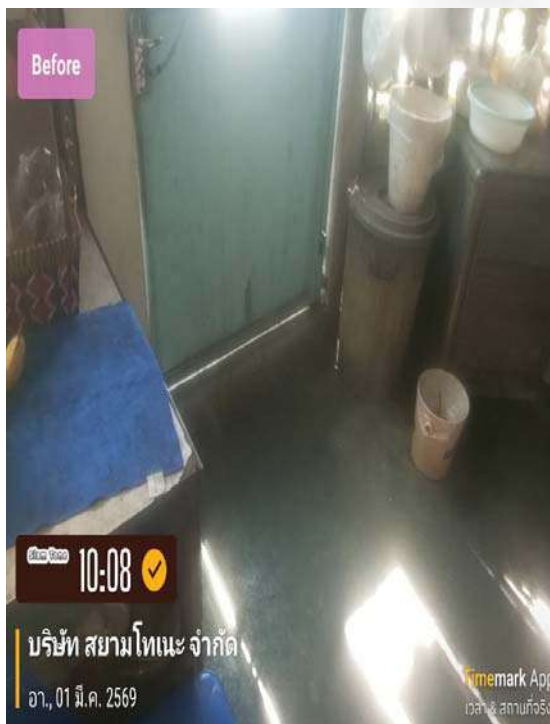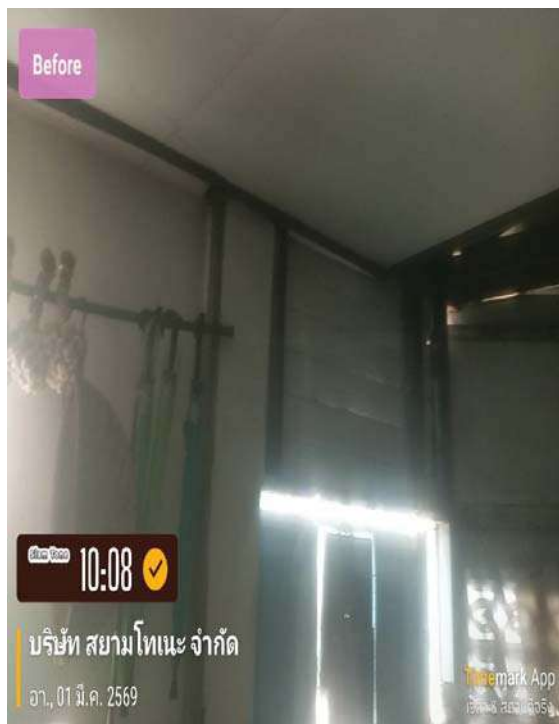




219 - 219 / 1




219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

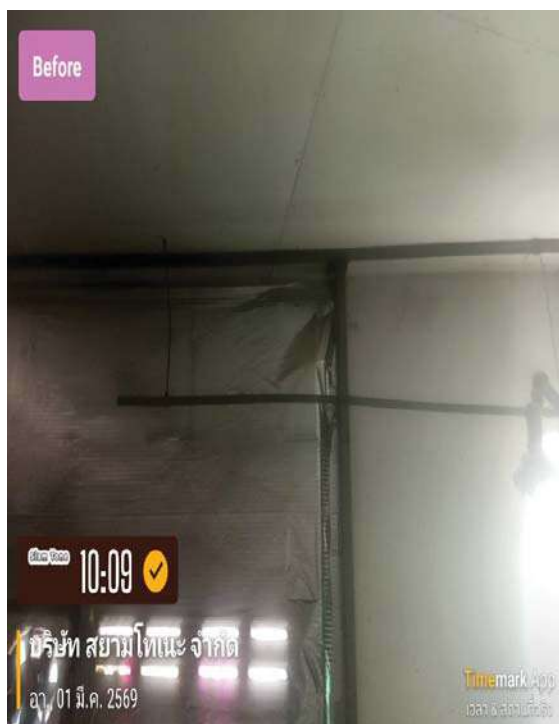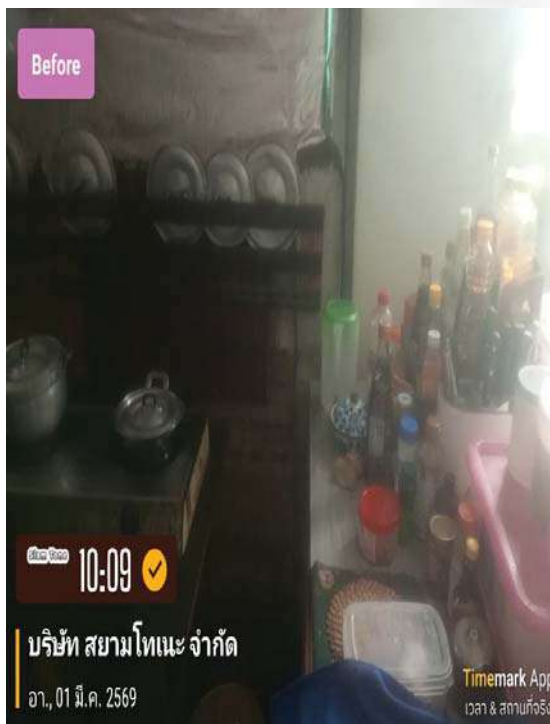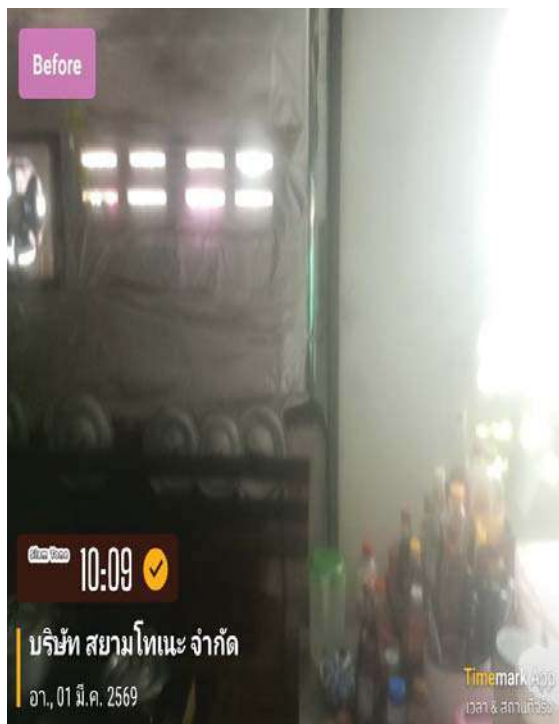


219 - 219 / 1

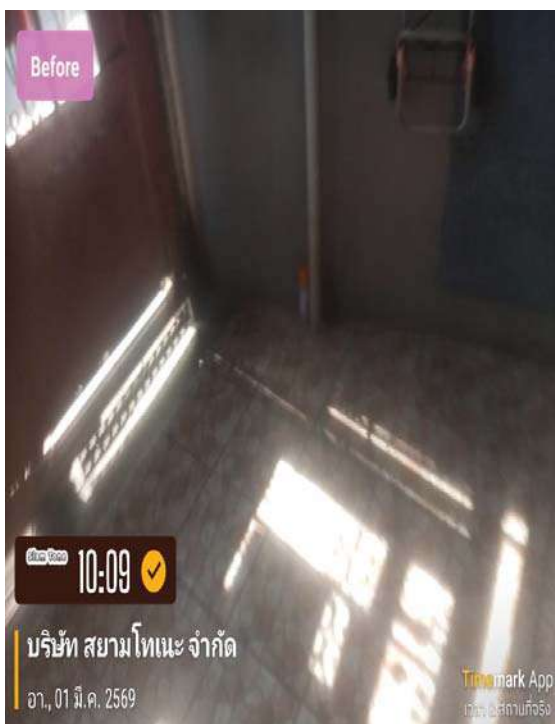


219 - 219 / 1

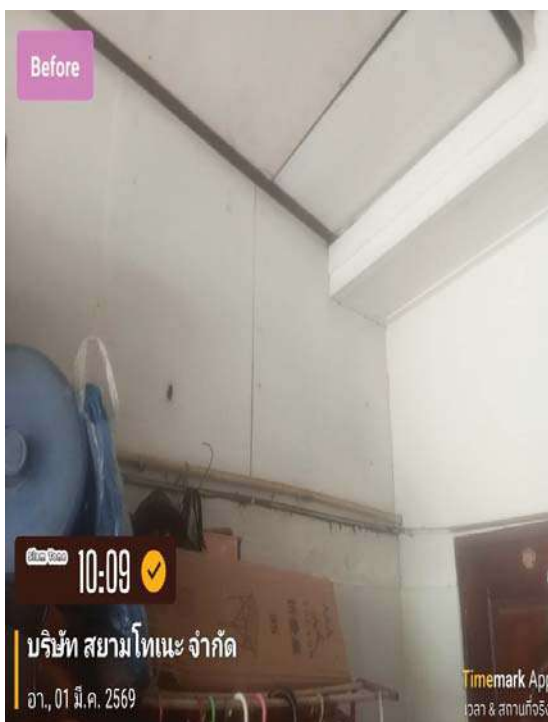

219 - 219 / 1

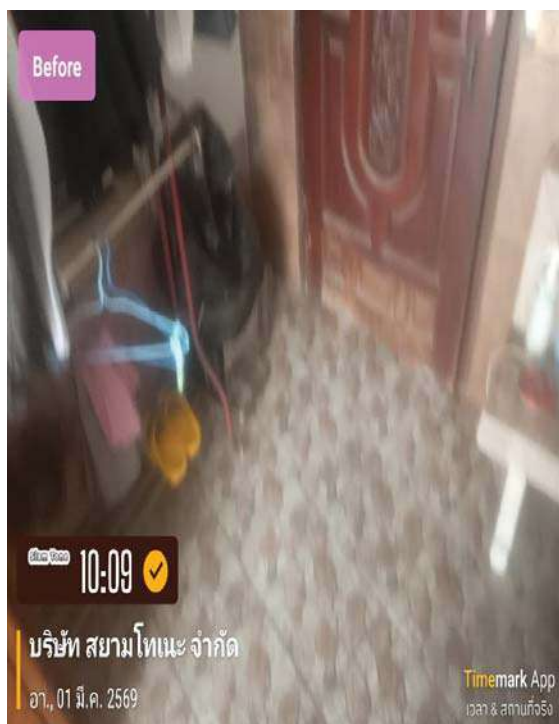



219 - 219 / 1

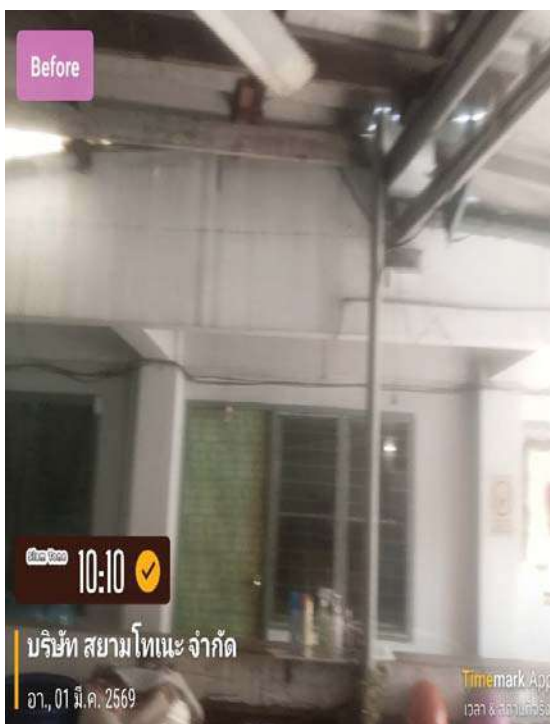

219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

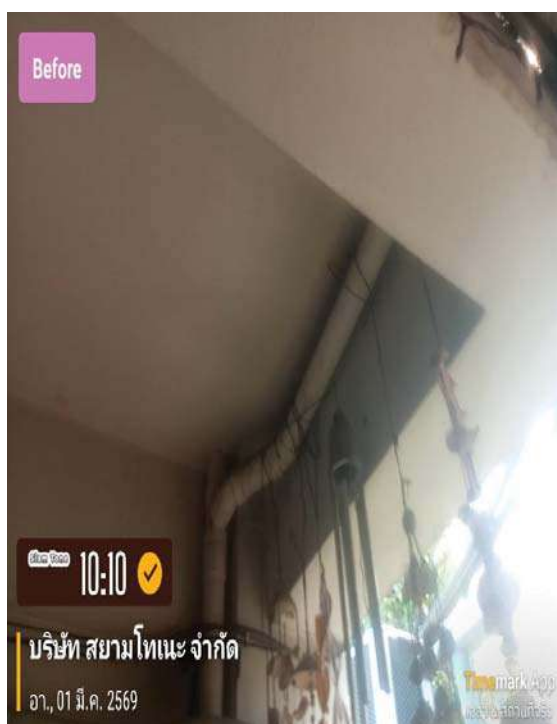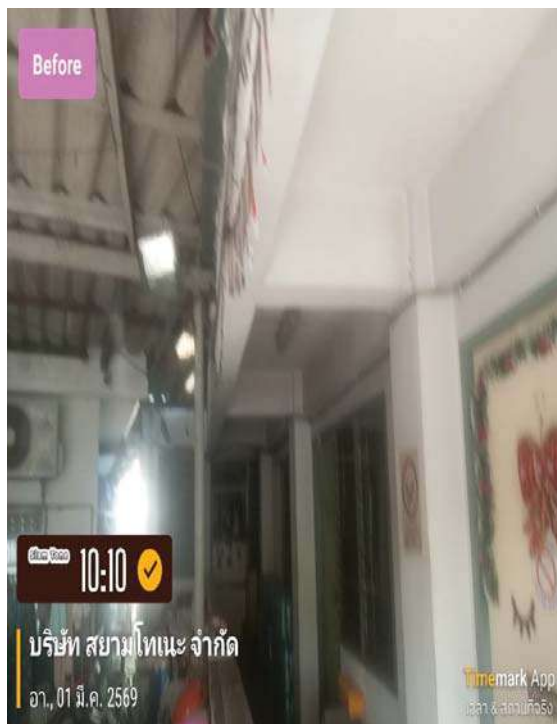




219 - 219 / 1







219 - 219 / 1

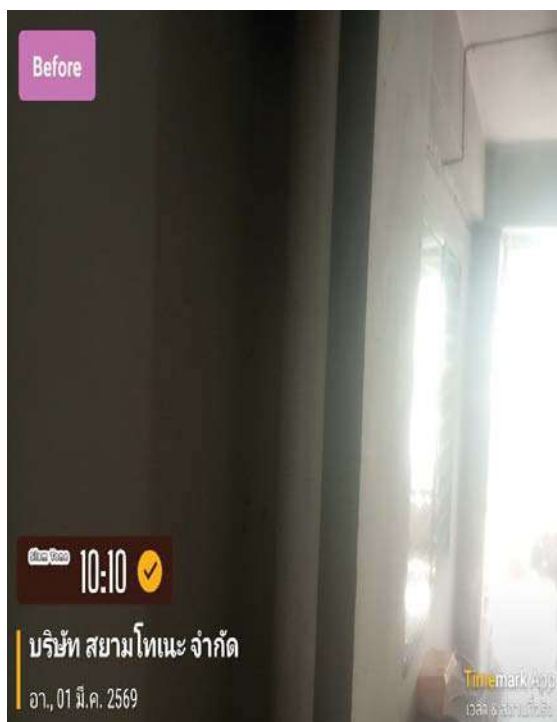





219 - 219 / 1

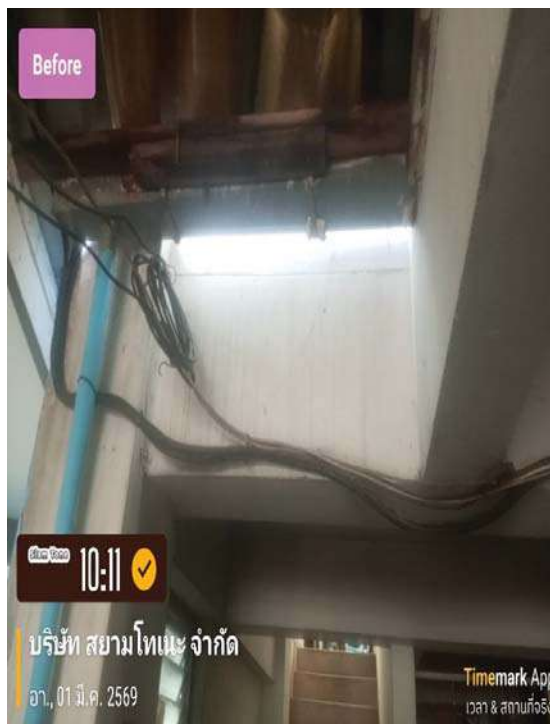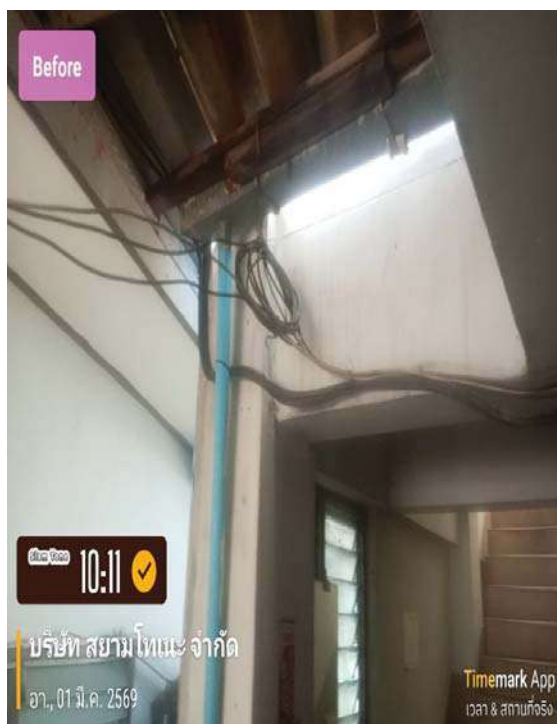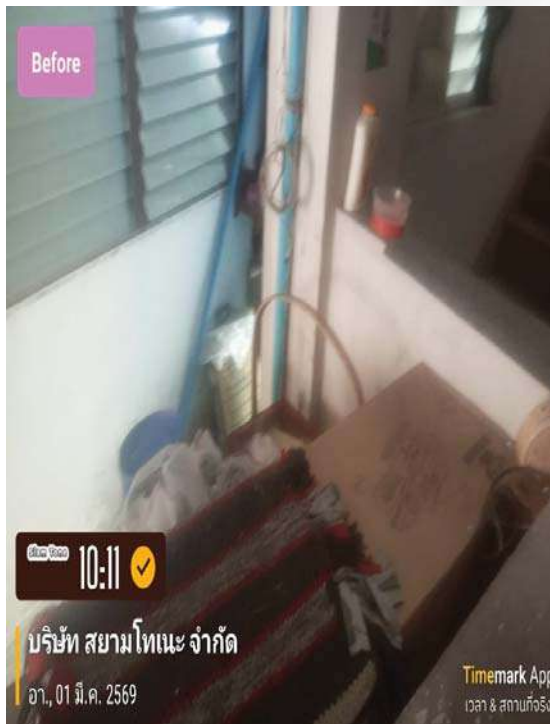




219 - 219 / 1

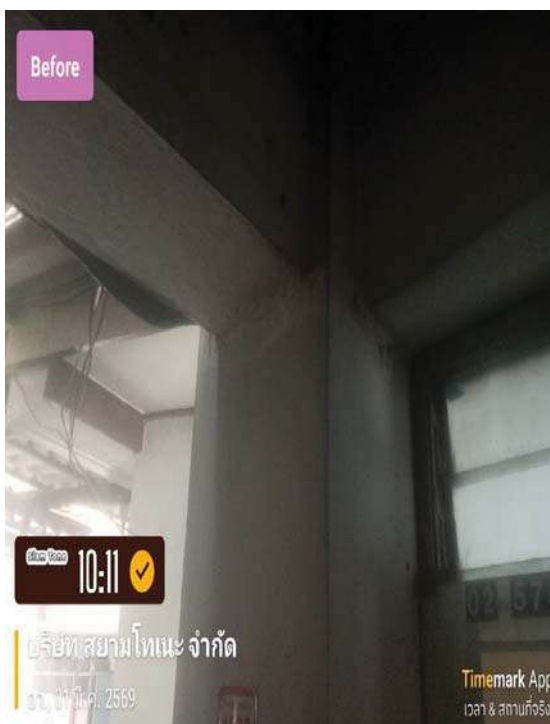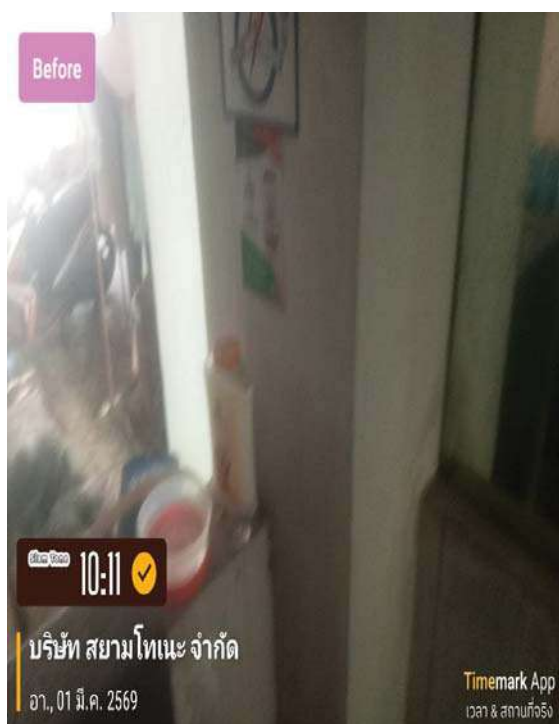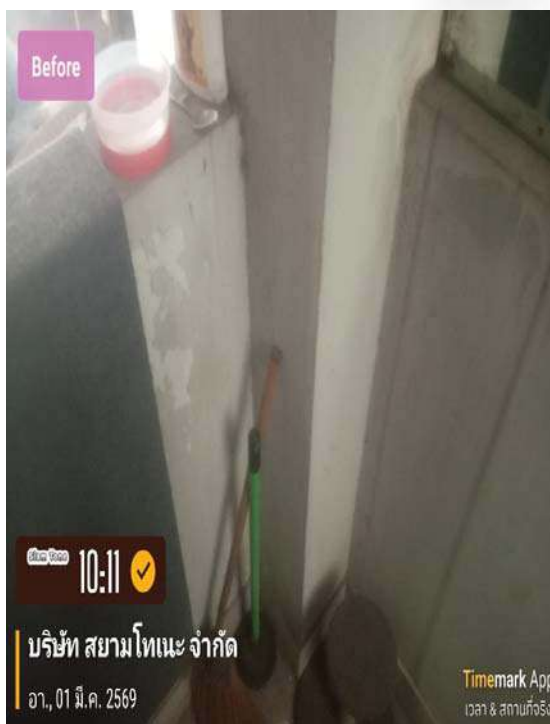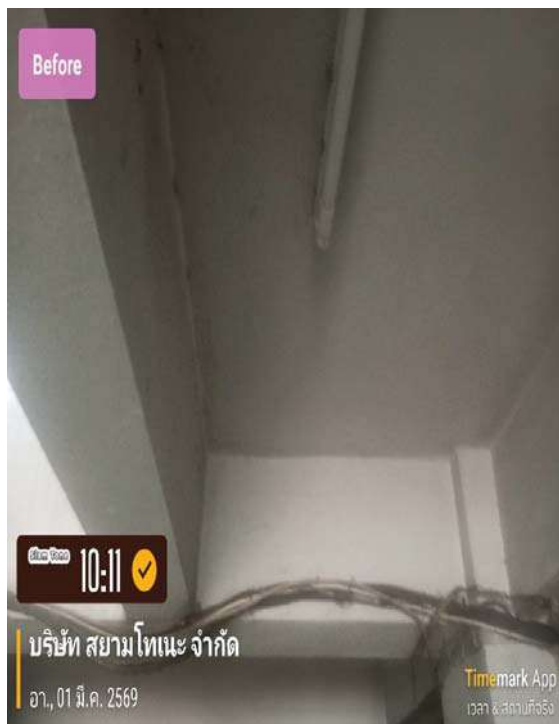




219 - 219 / 1

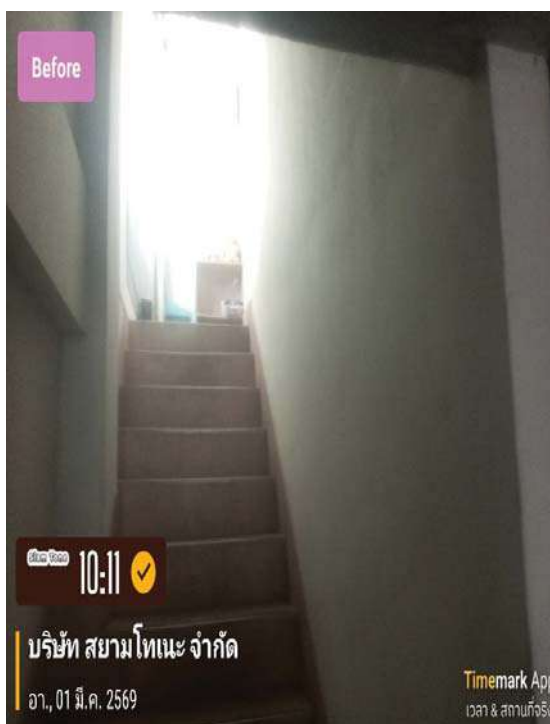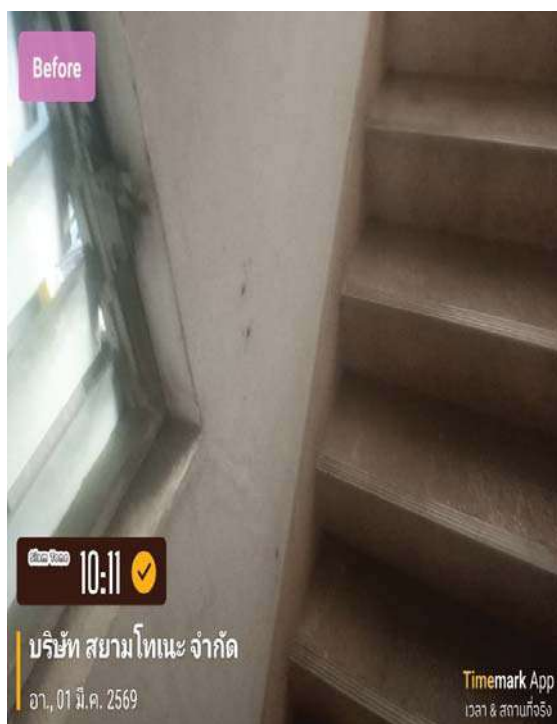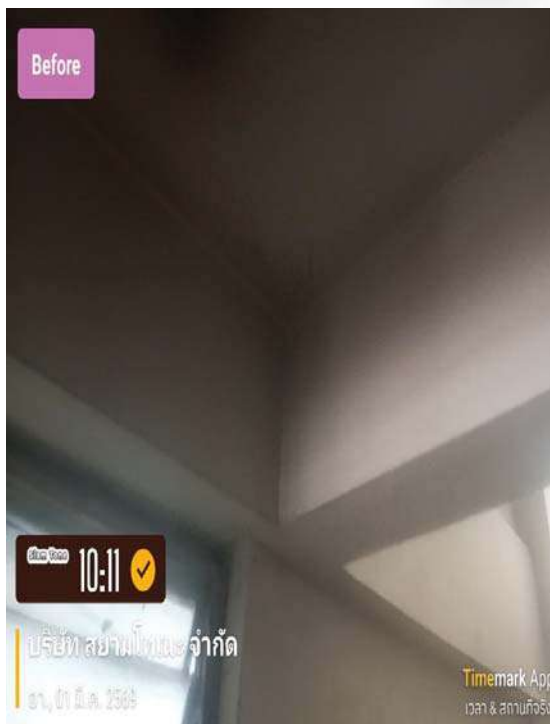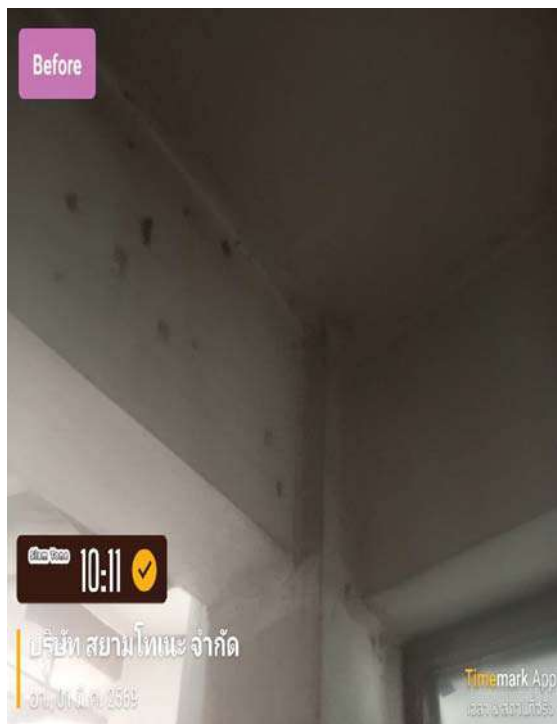

219 - 219 / 1

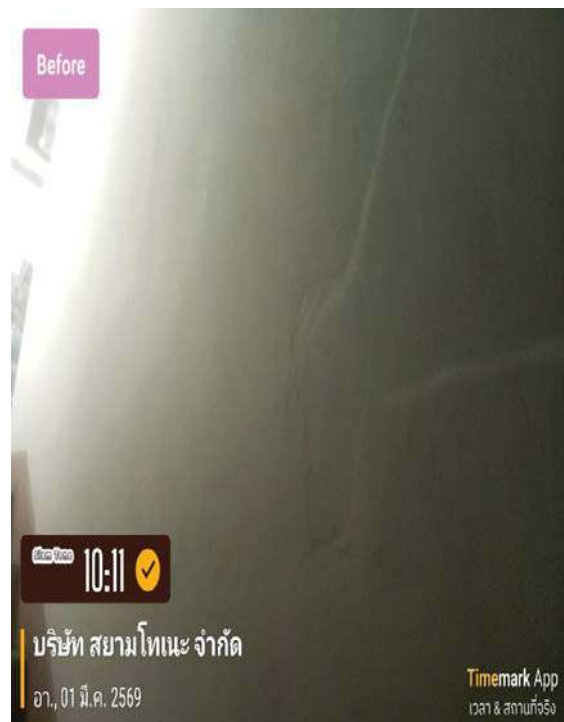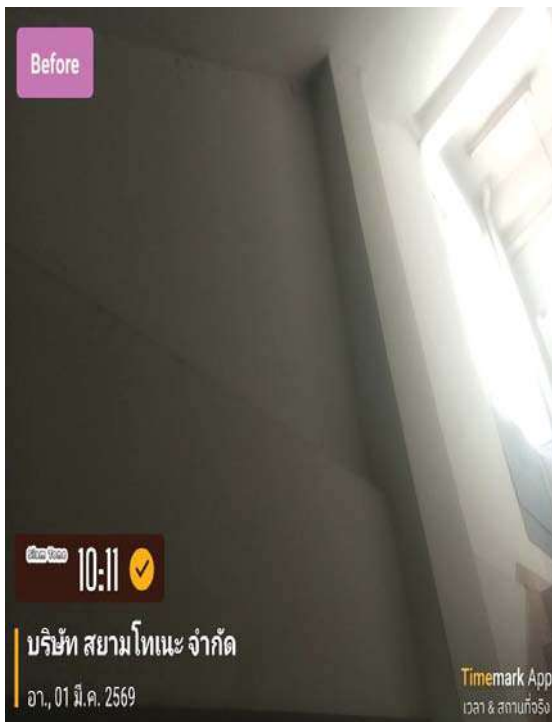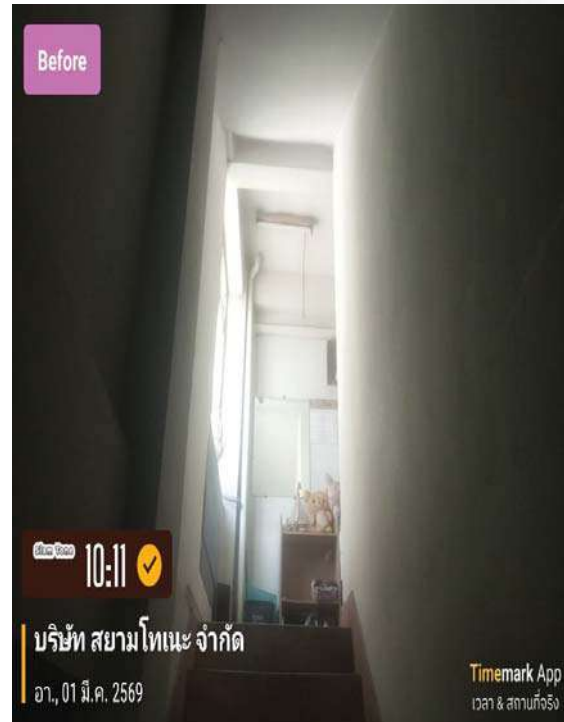


219 - 219 / 1

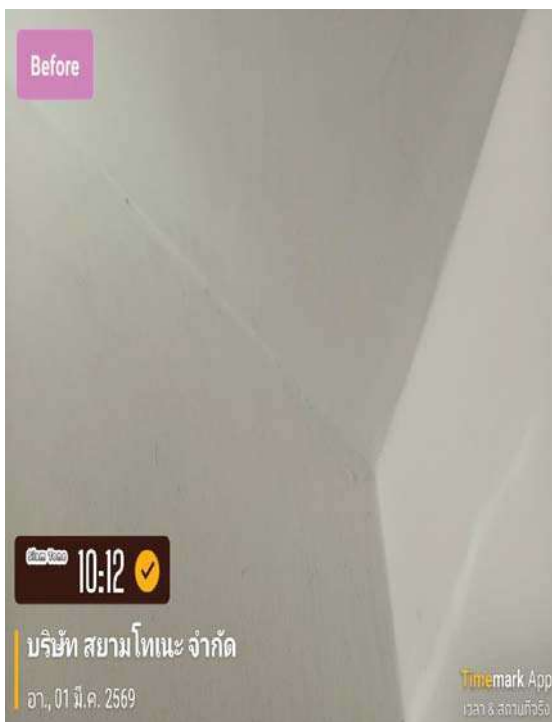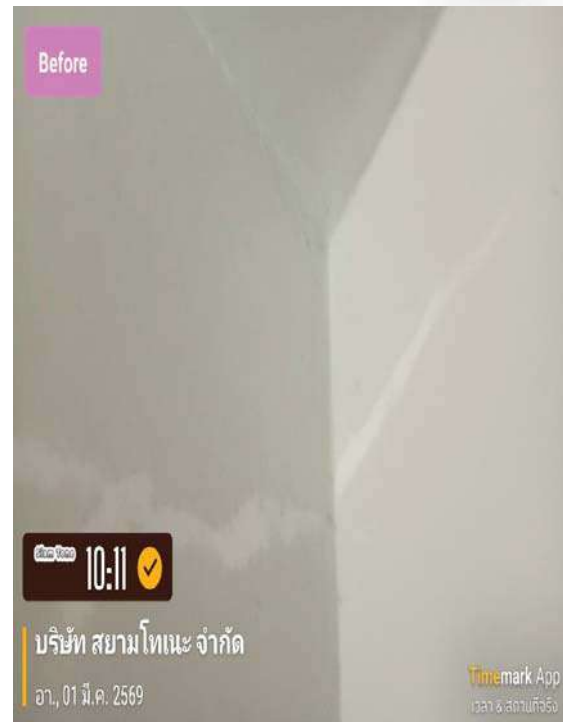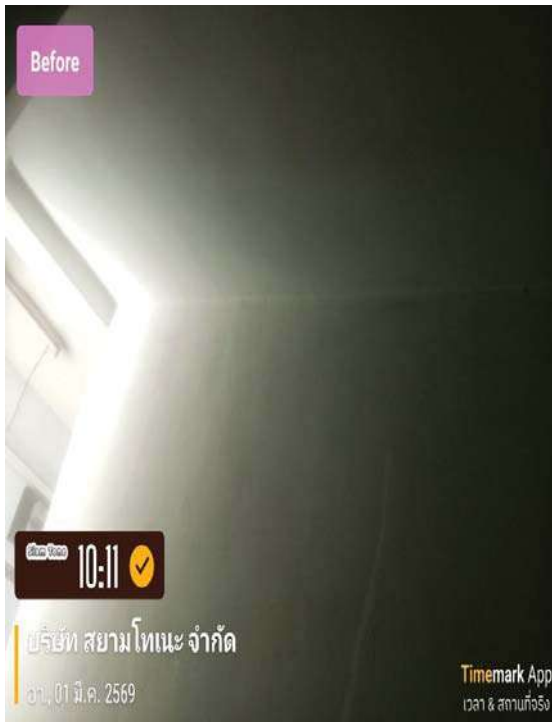

219 - 219 / 1





219 - 219 / 1

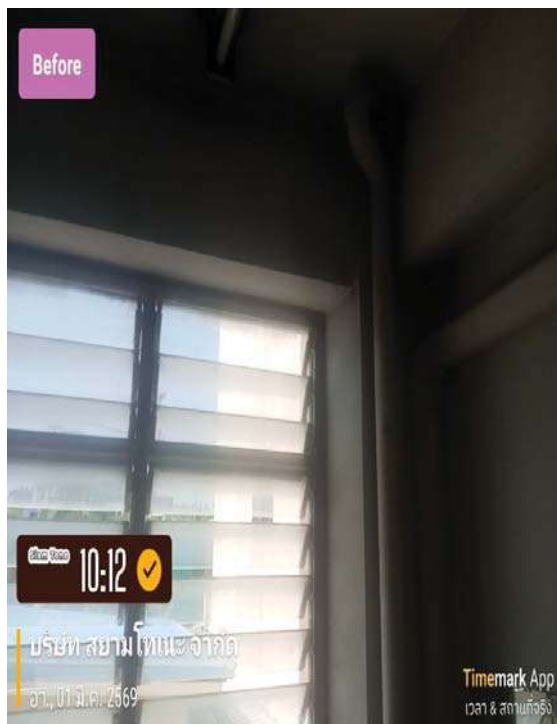


219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

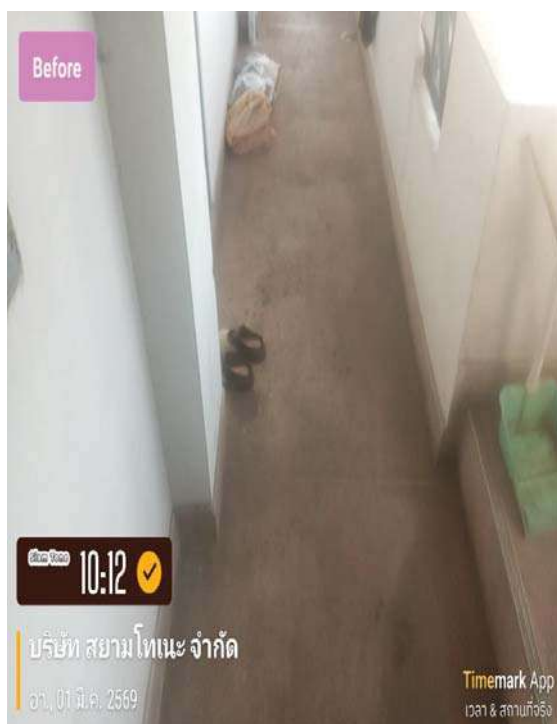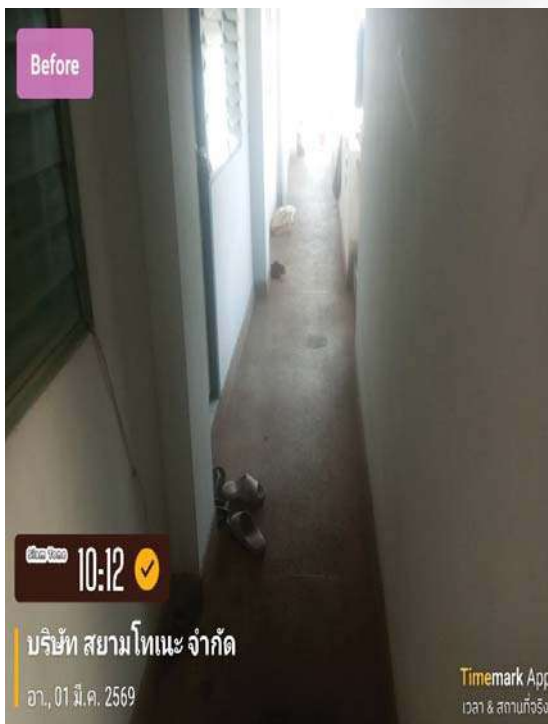



219 - 219 / 1

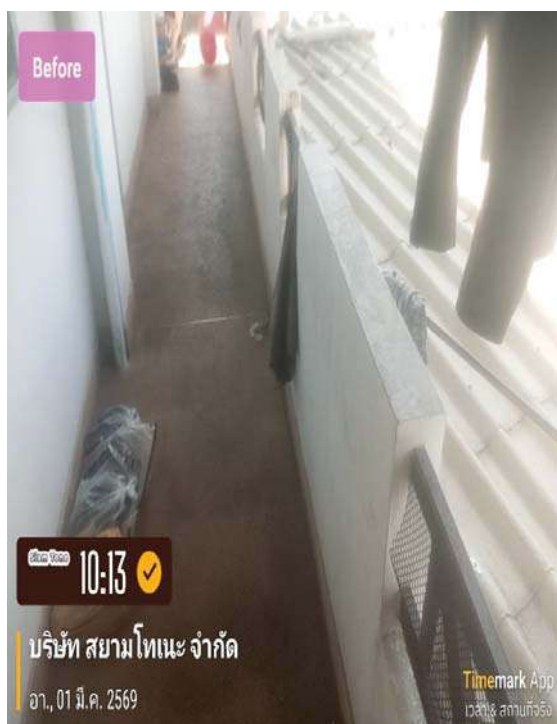



219 - 219 / 1

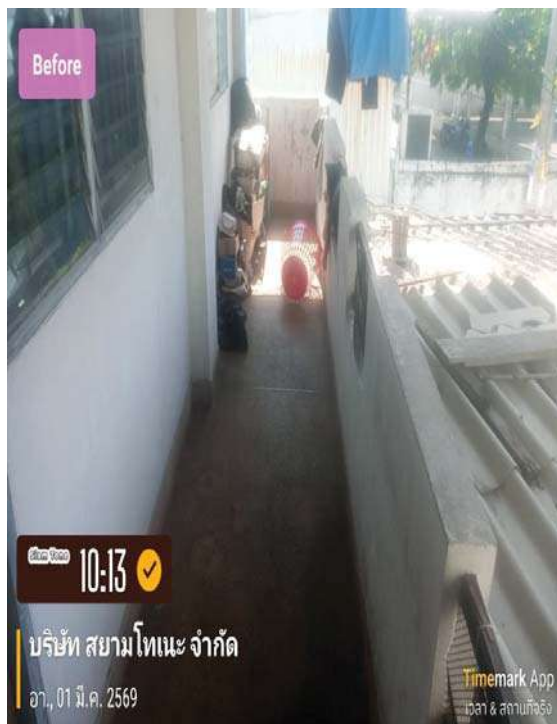


219 - 219 / 1

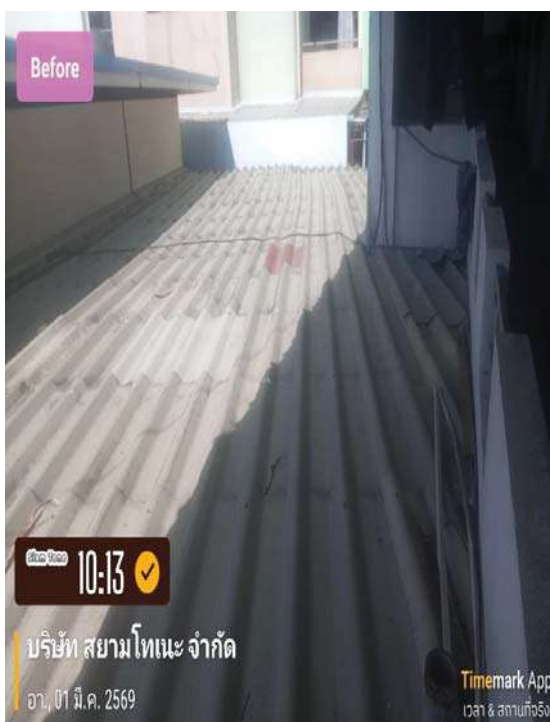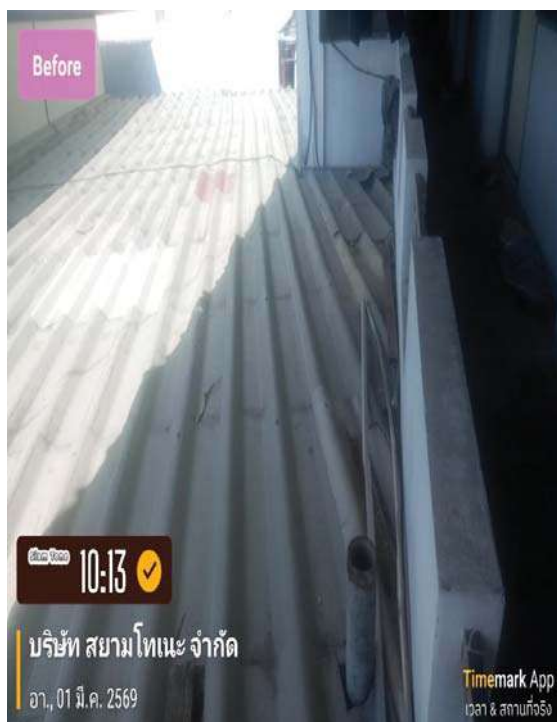


219 - 219 / 1

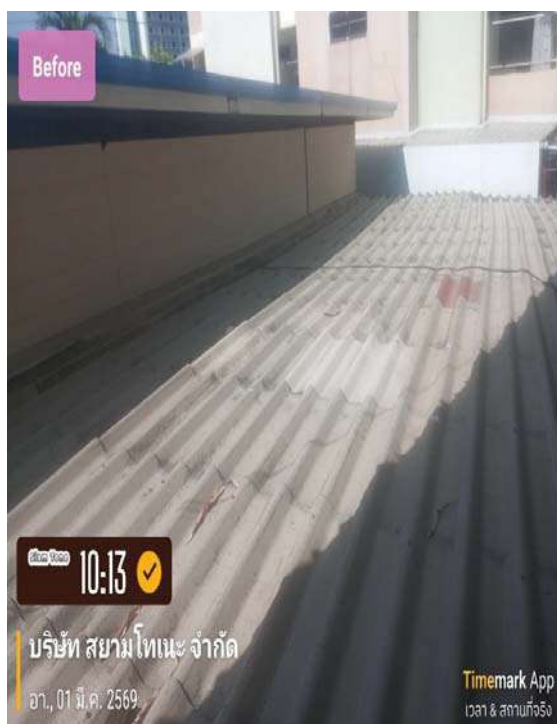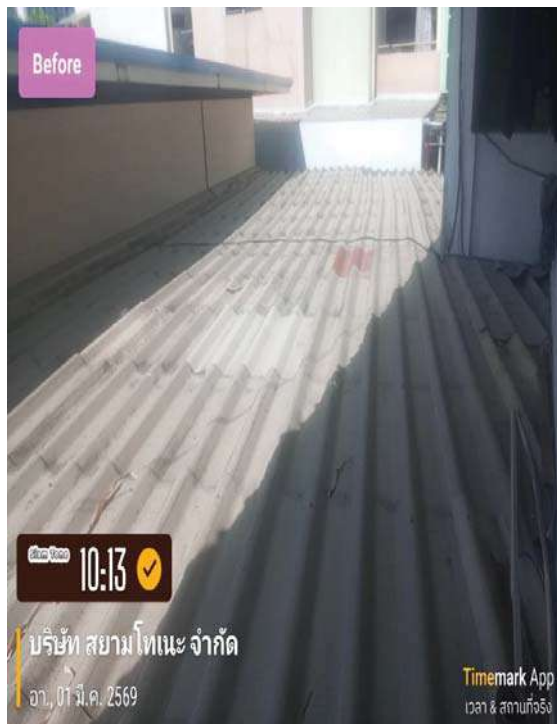


219 - 219 / 1

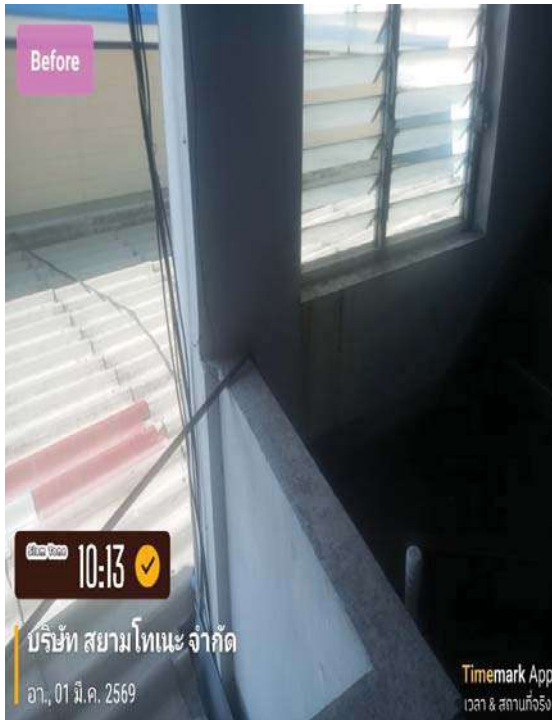

219 - 219 / 1

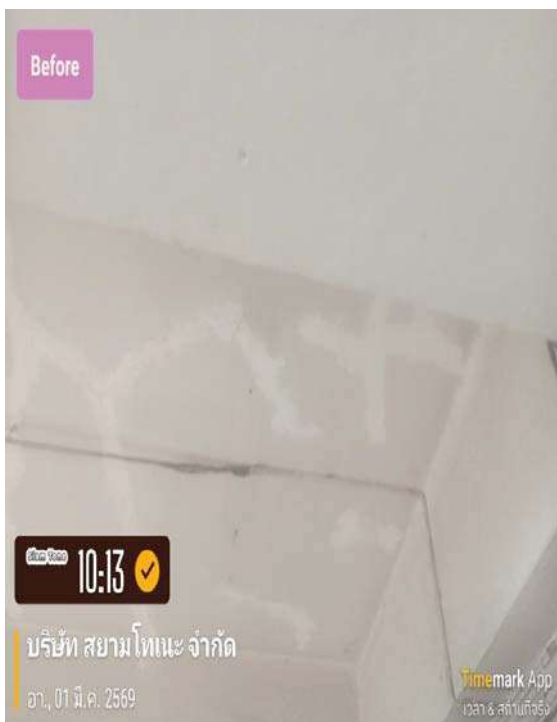

219 - 219 / 1

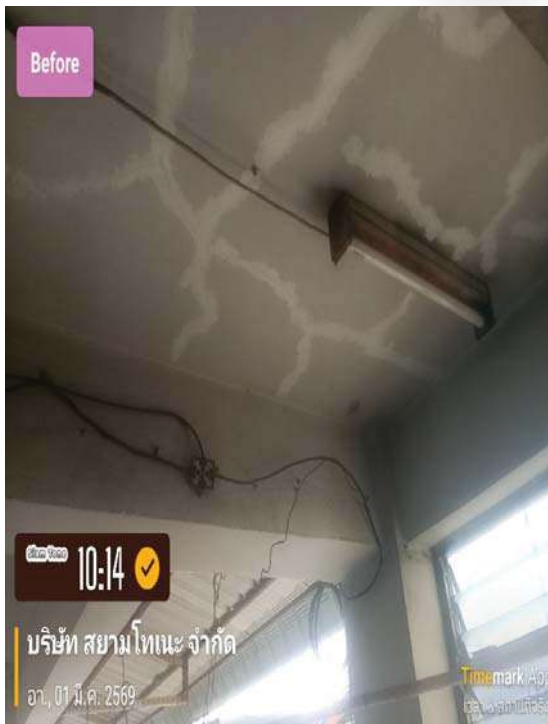

219 - 219 / 1




219 - 219 / 1




219 - 219 / 1





219 - 219 / 1

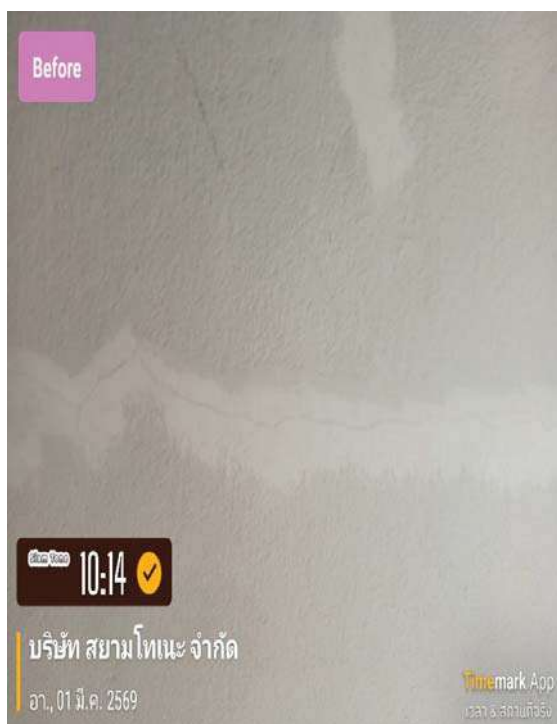


219 - 219 / 1

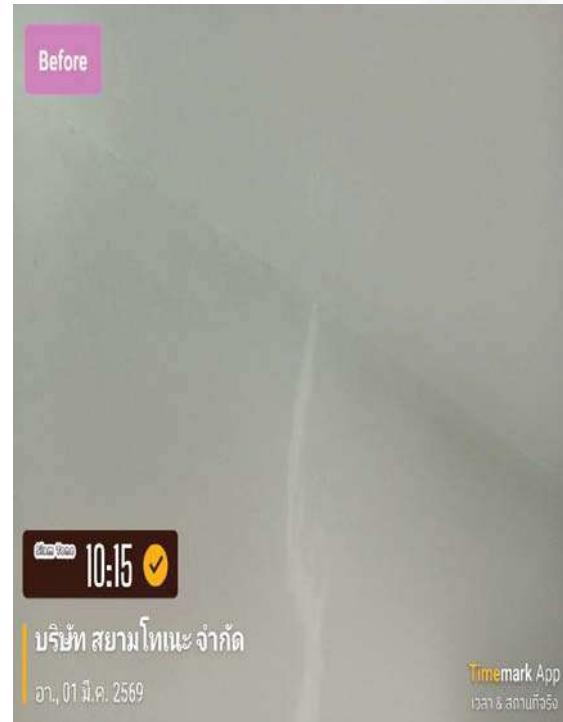


219 - 219 / 1

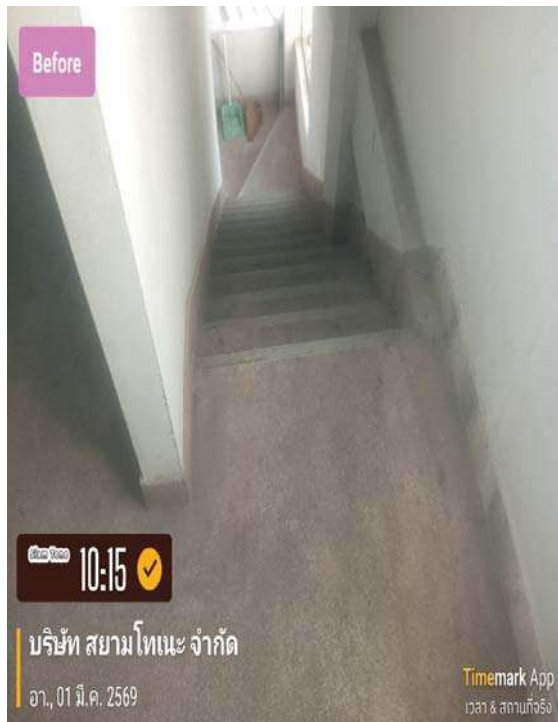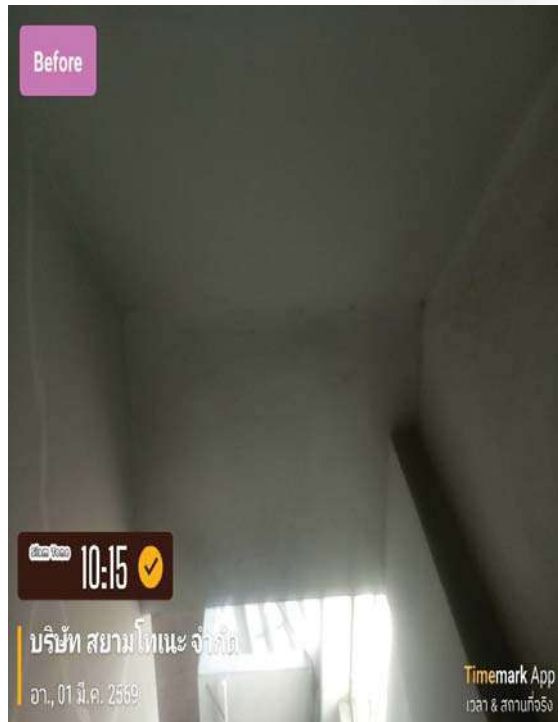


219 - 219 / 1

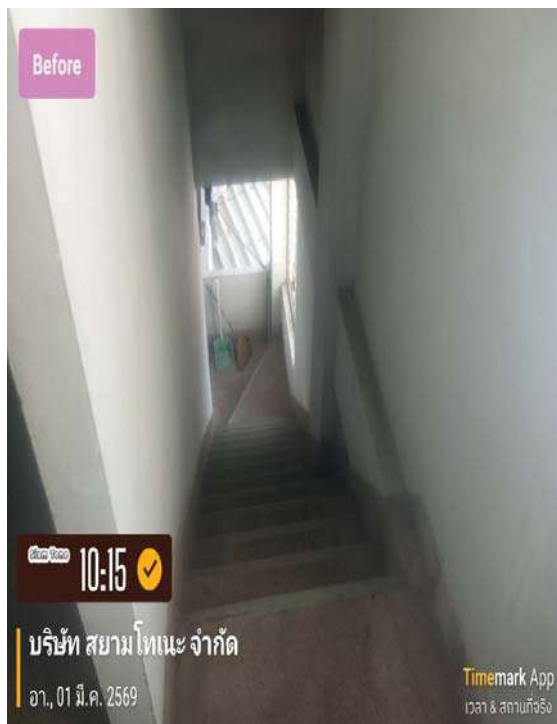



219 - 219 / 1

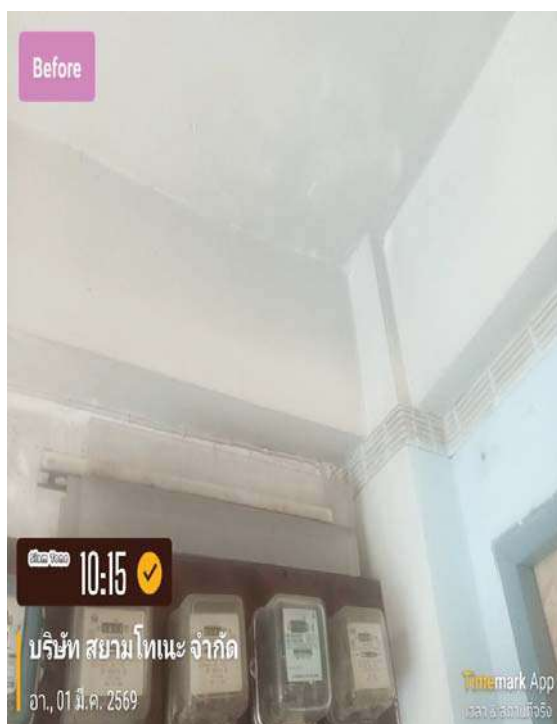


219 - 219 / 1

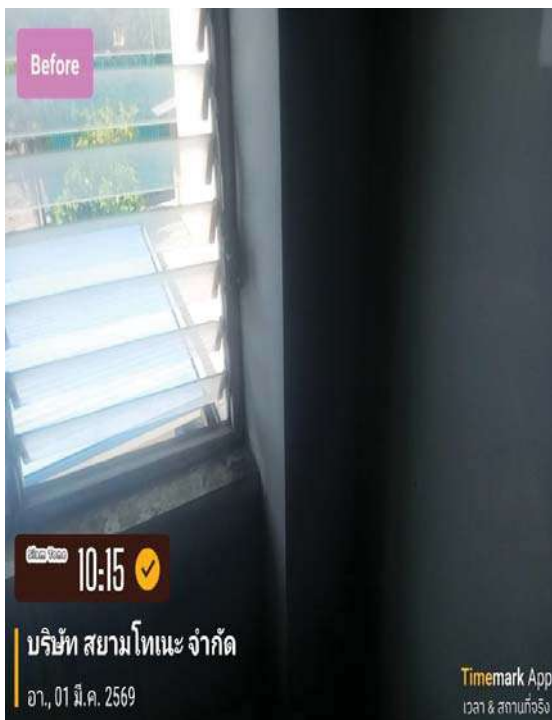


219 - 219 / 1

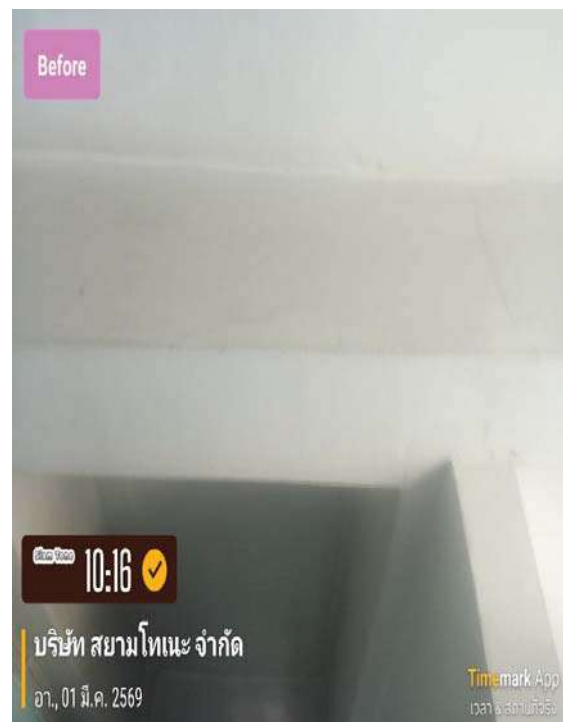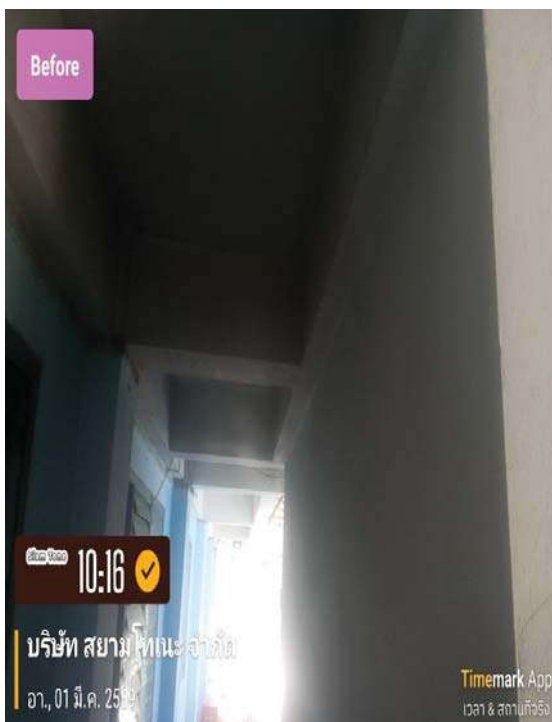


219 - 219 / 1

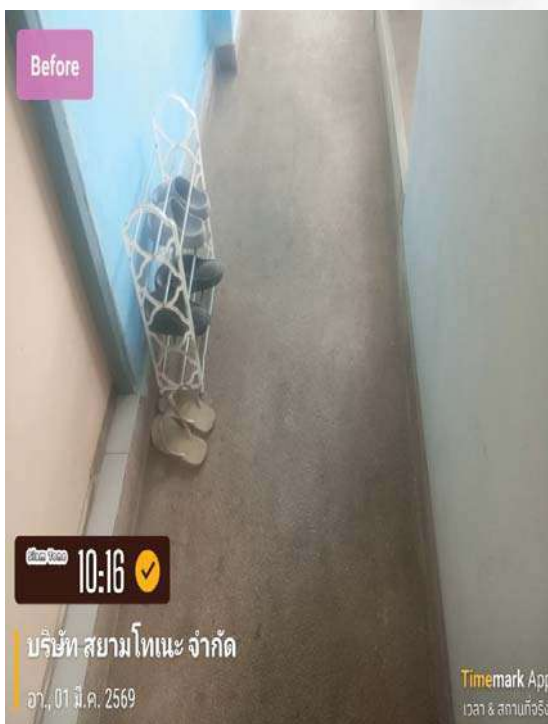



219 - 219 / 1

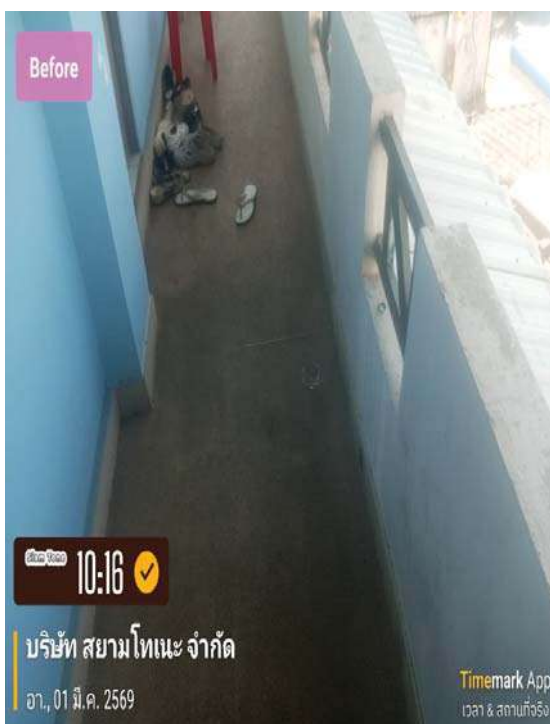



219 - 219 / 1

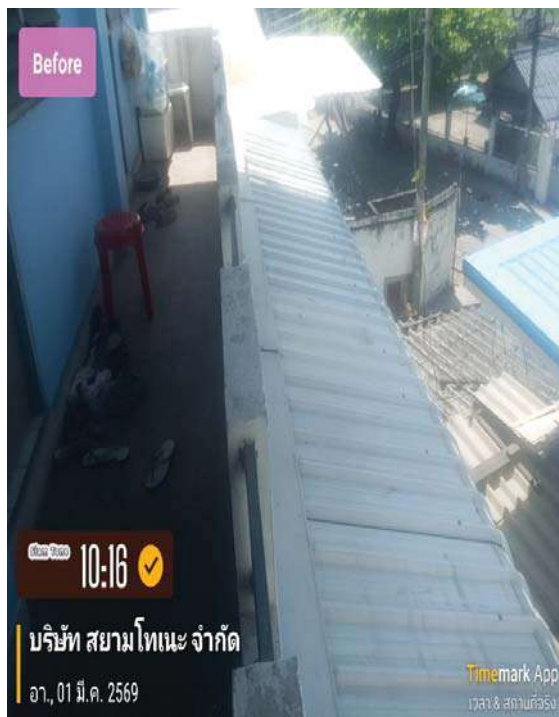




219 - 219 / 1

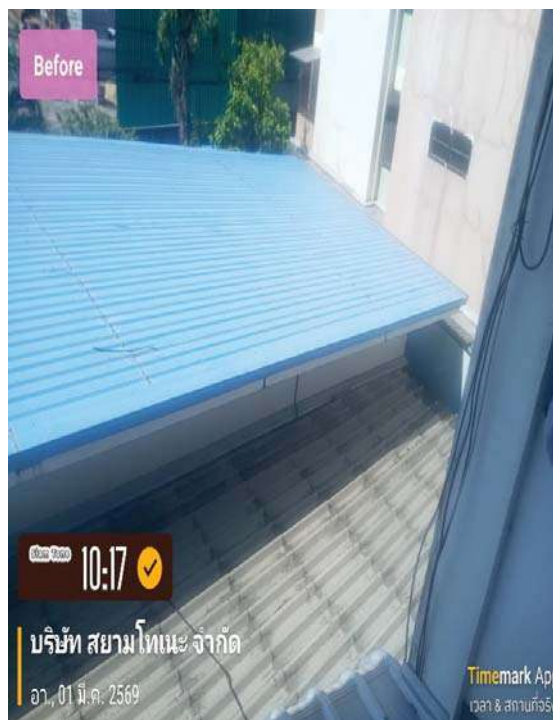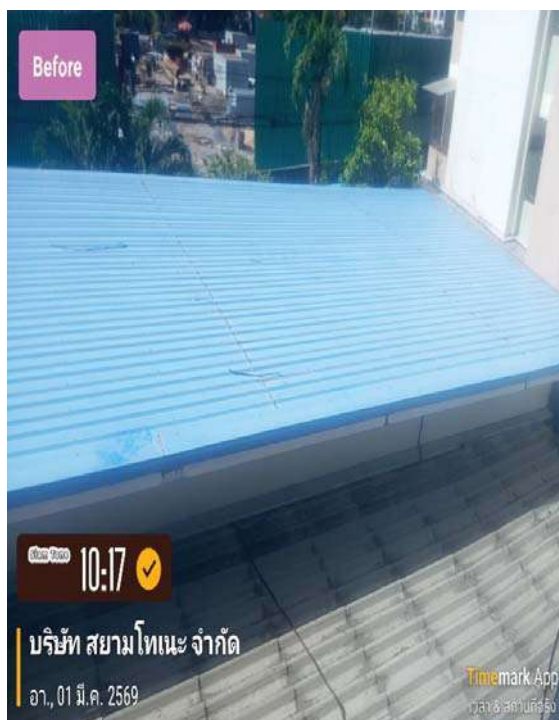



219 - 219 / 1

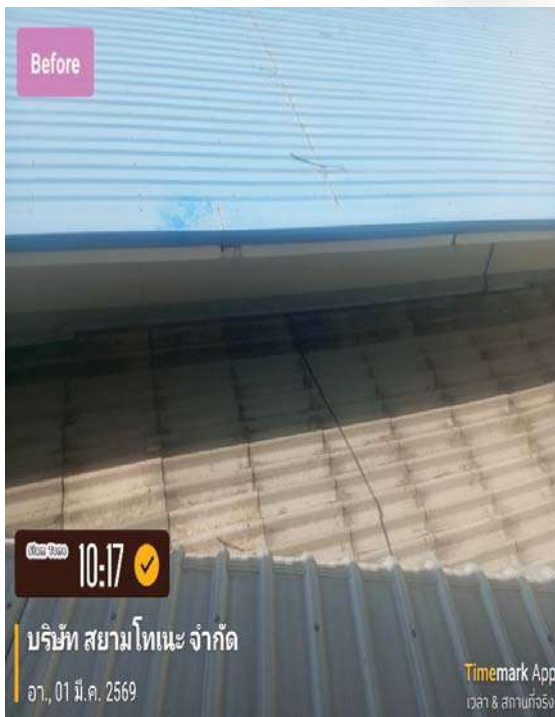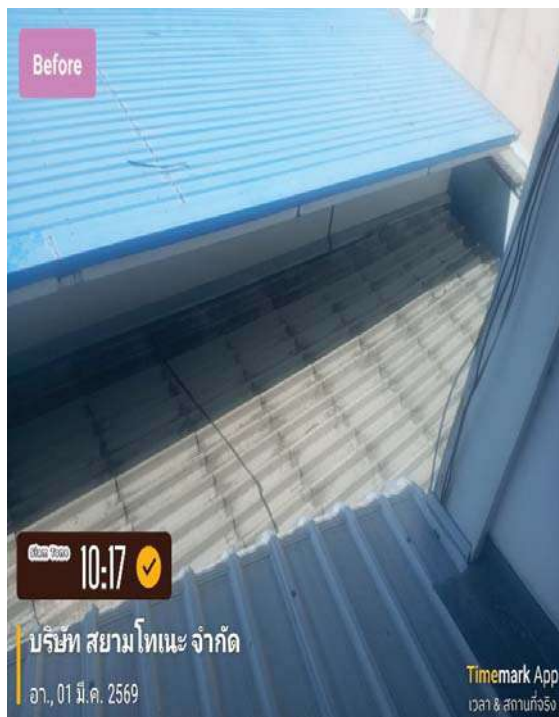

219 - 219 / 1

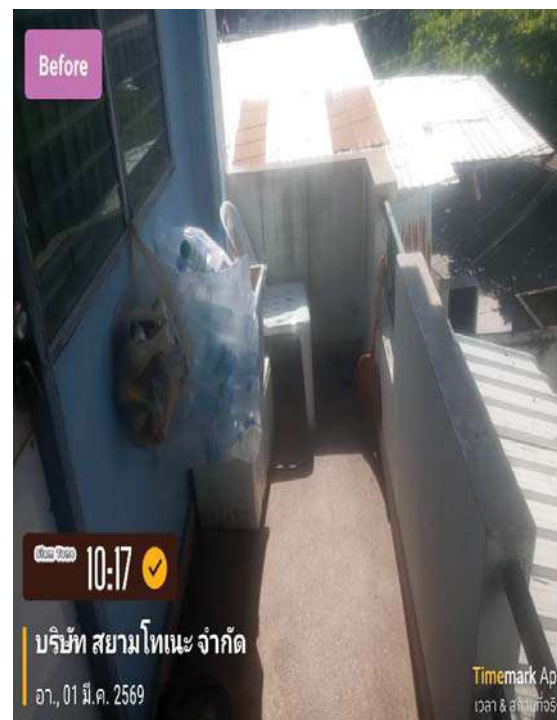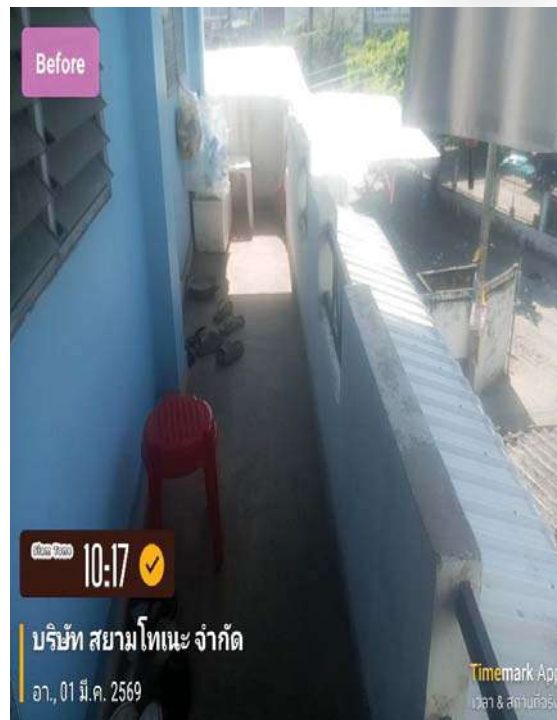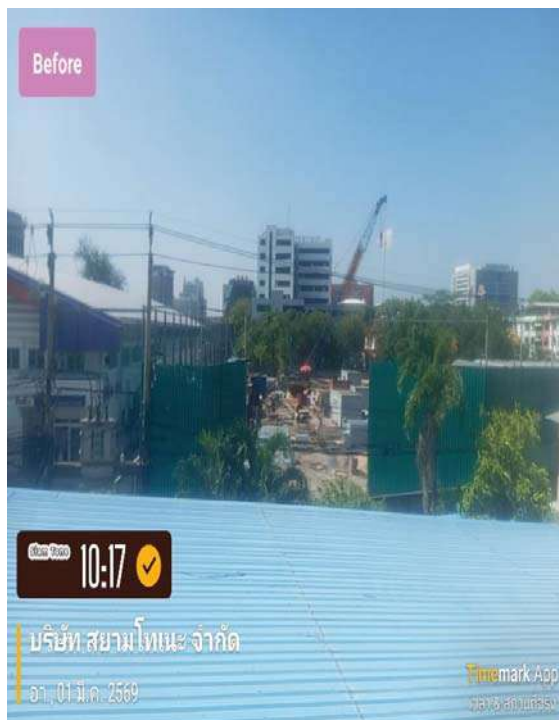

219 - 219 / 1

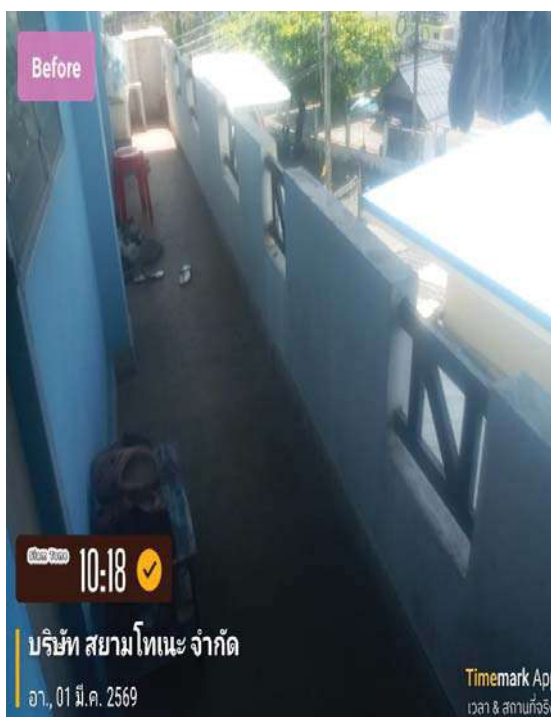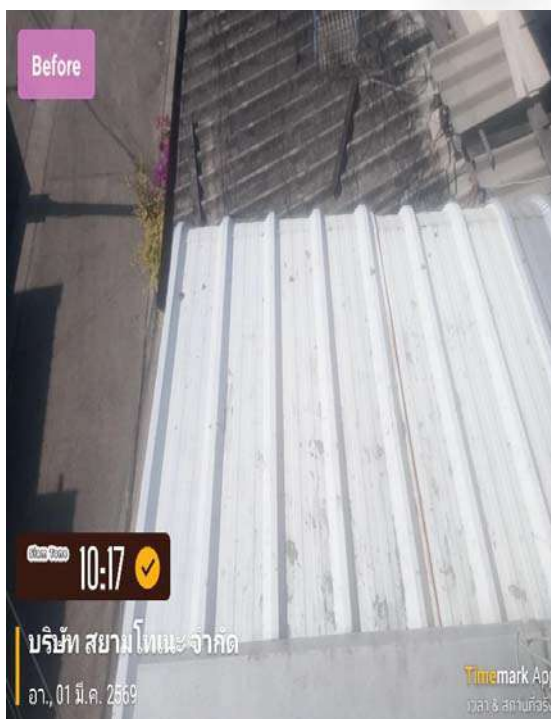



219 - 219 / 1




219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

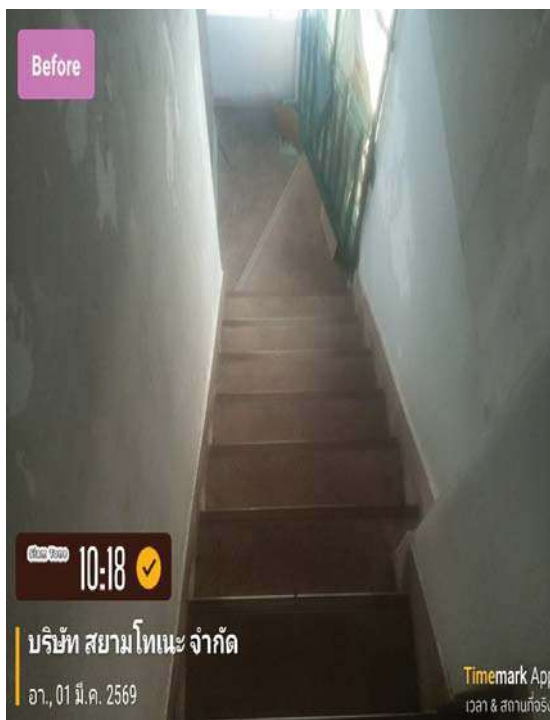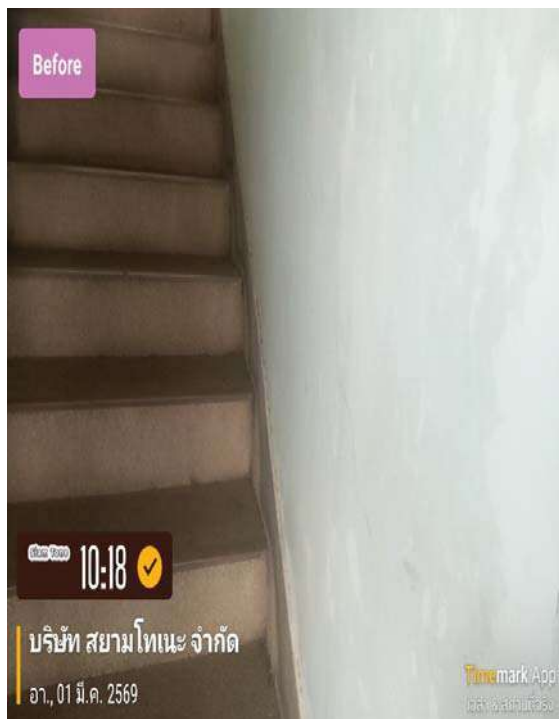

219 - 219 / 1

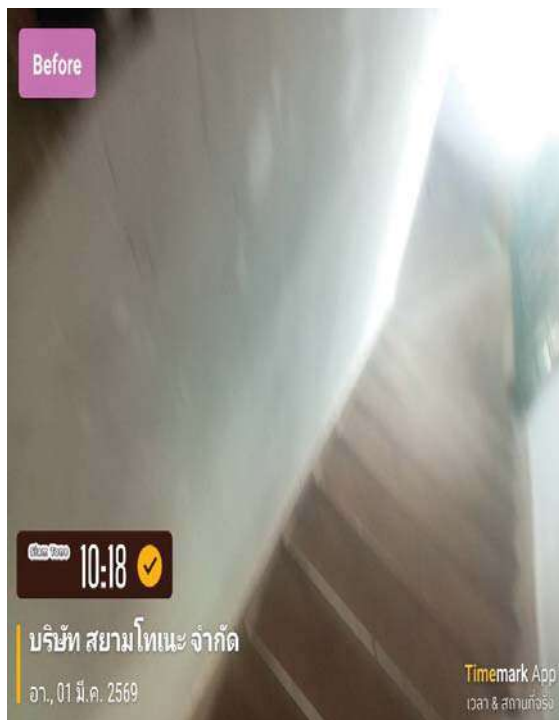




219 - 219 / 1

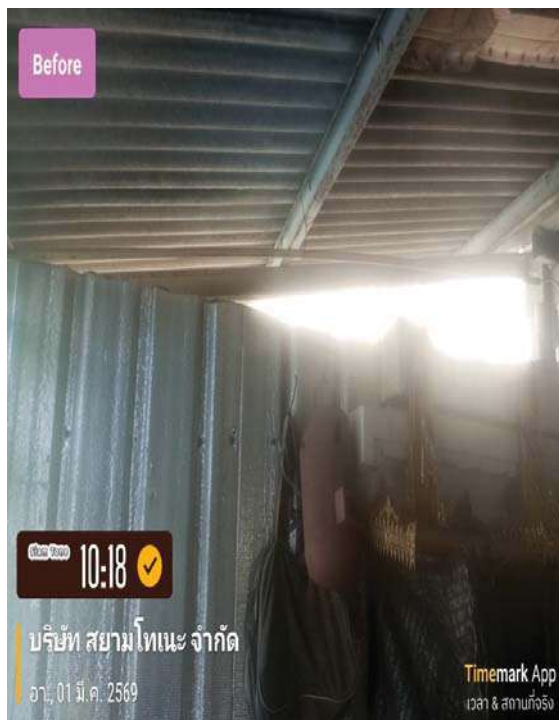

219 - 219 / 1





219 - 219 / 1

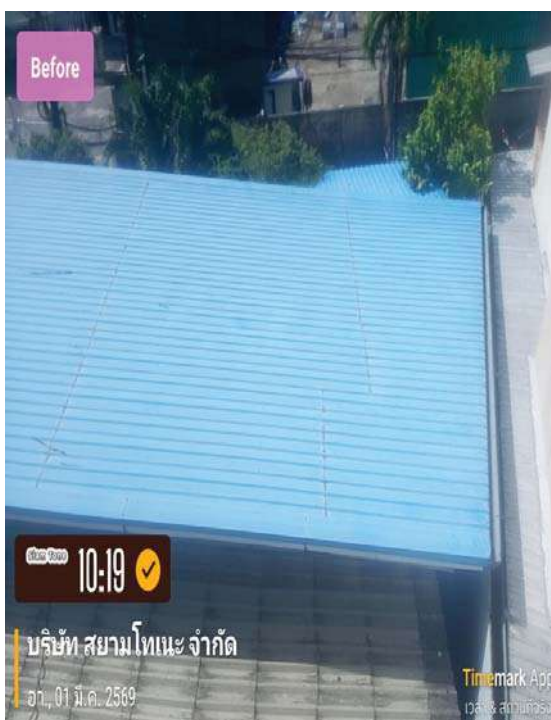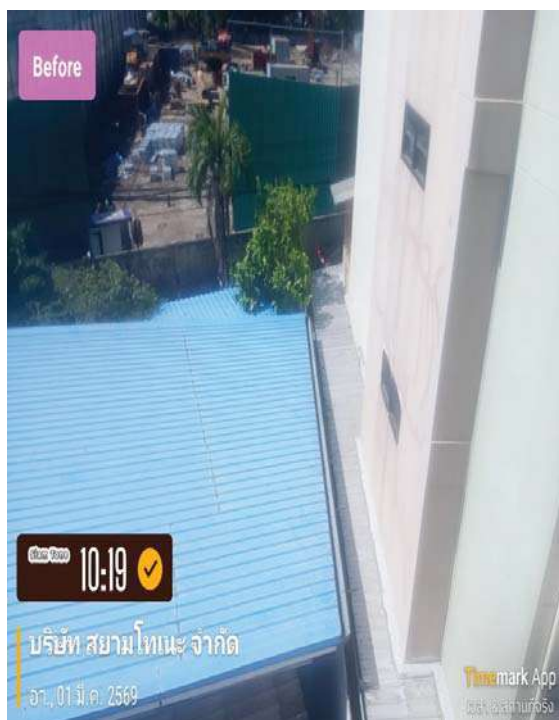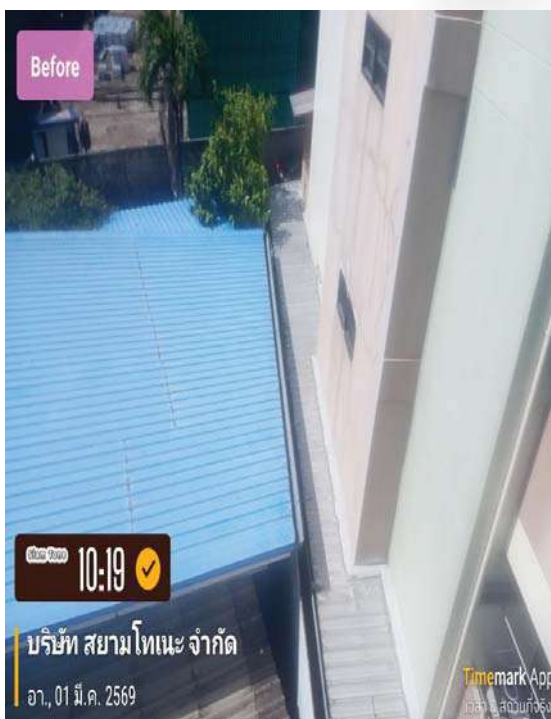

219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

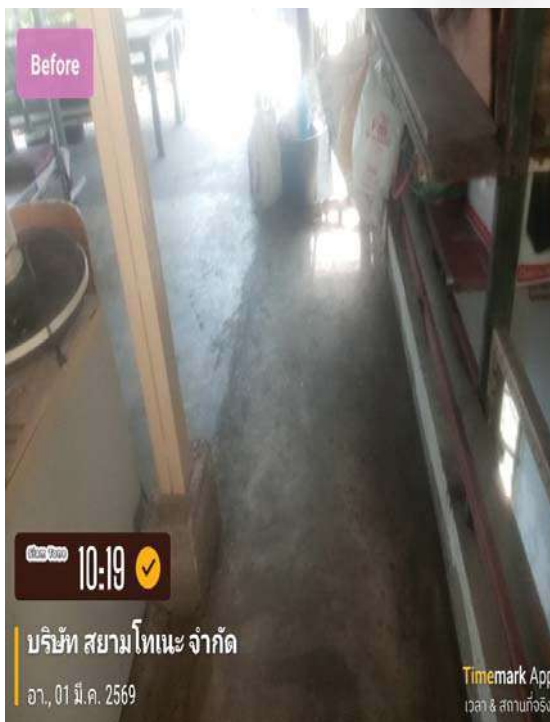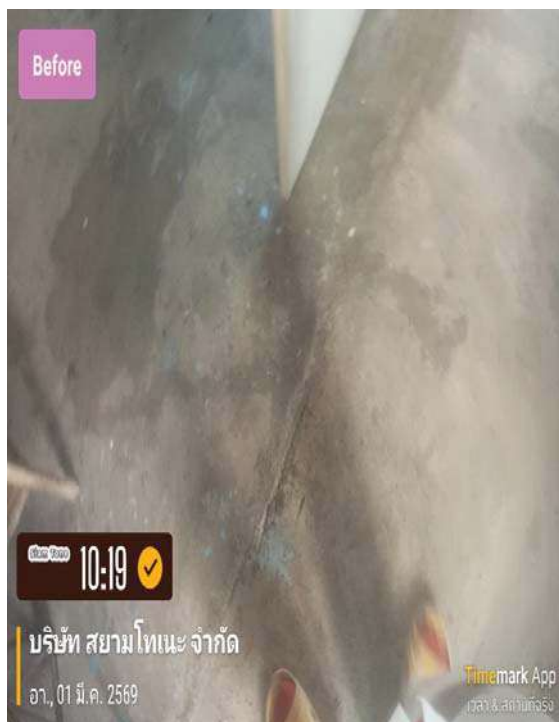


219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

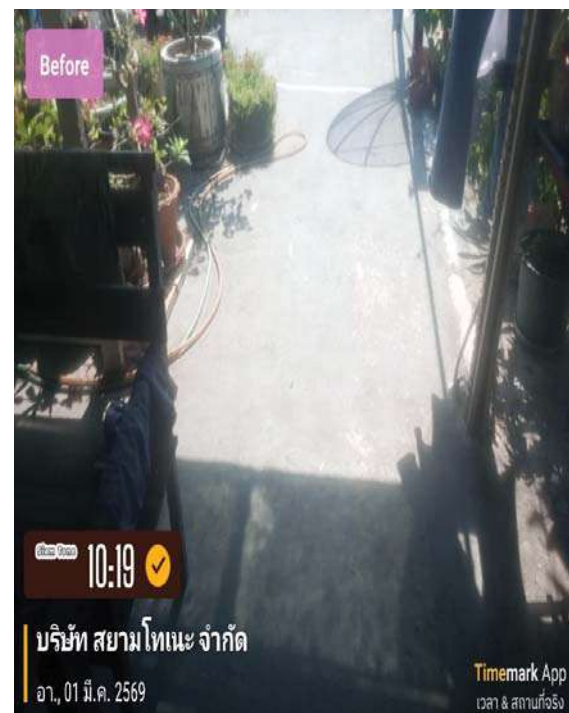


219 - 219 / 1

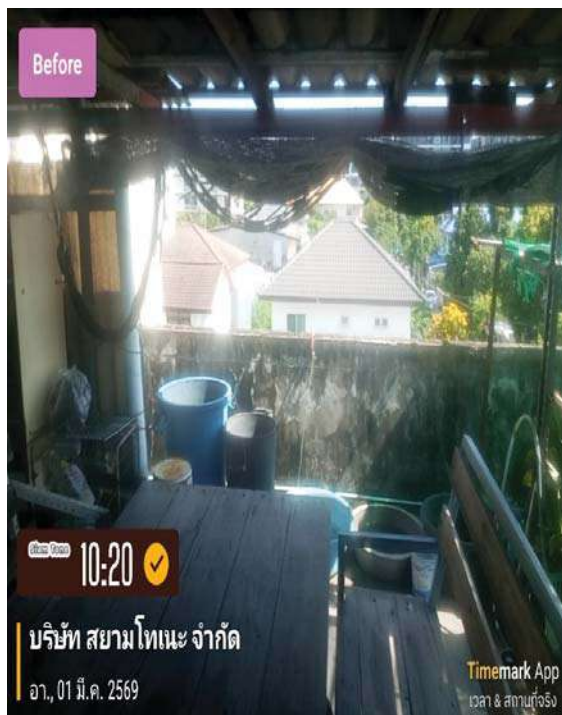

219 - 219 / 1

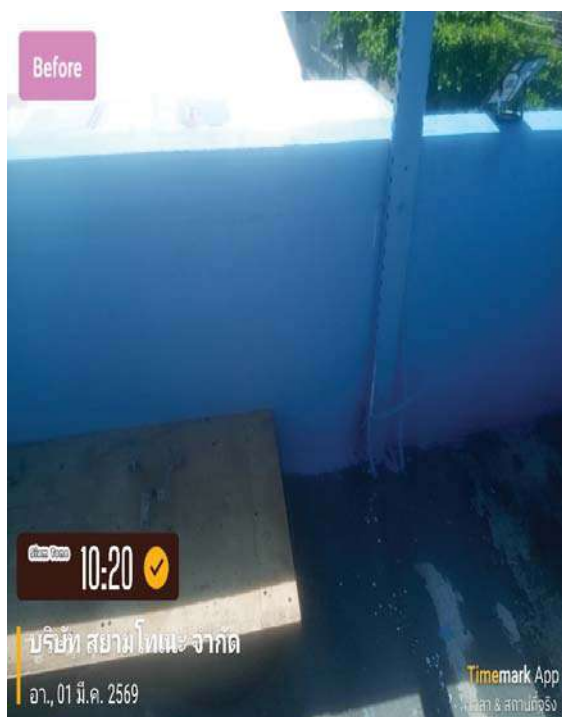

219 - 219 / 1

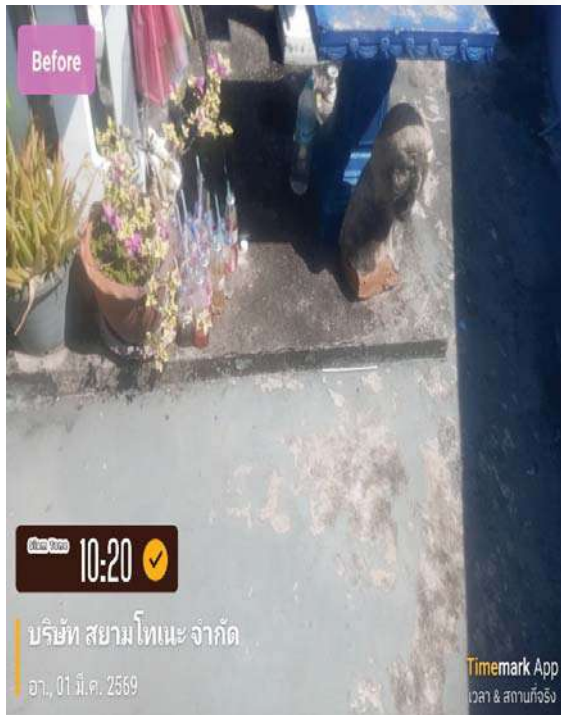



219 - 219 / 1





219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

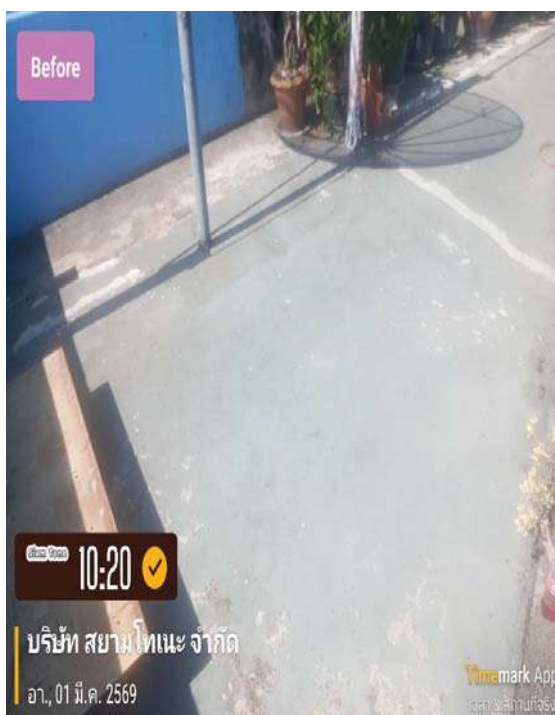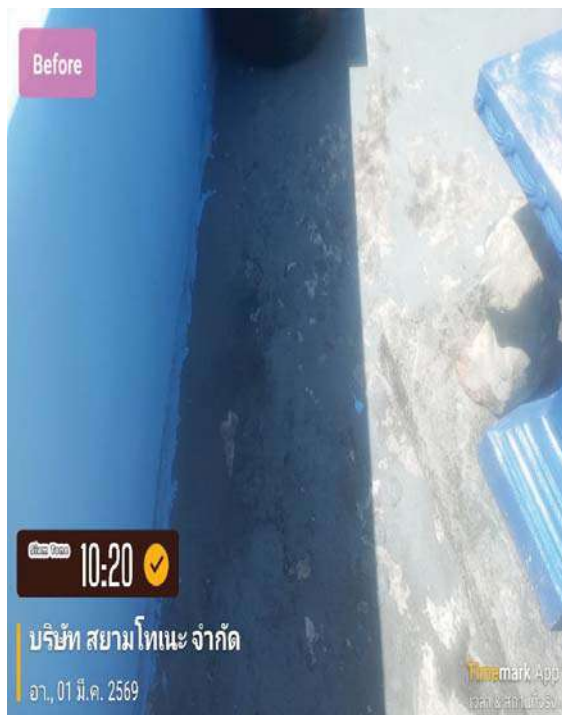




219 - 219 / 1

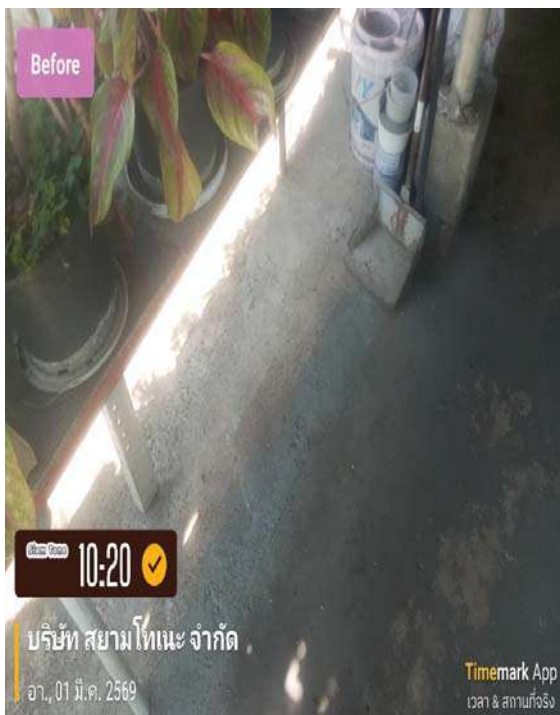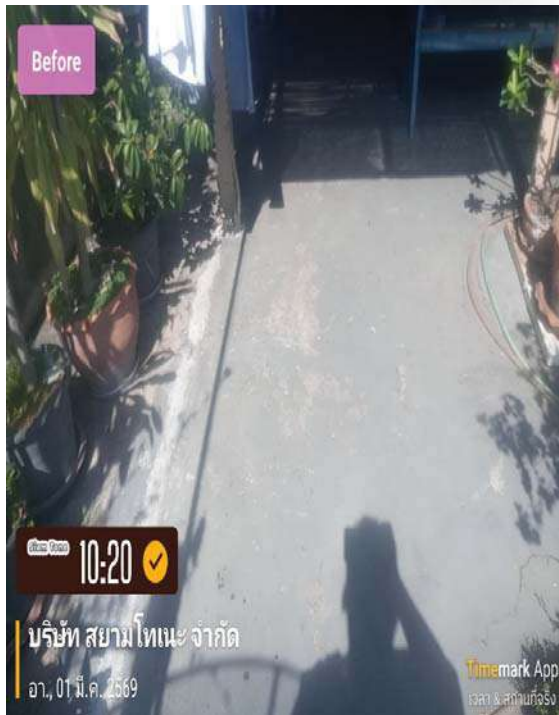


219 - 219 / 1

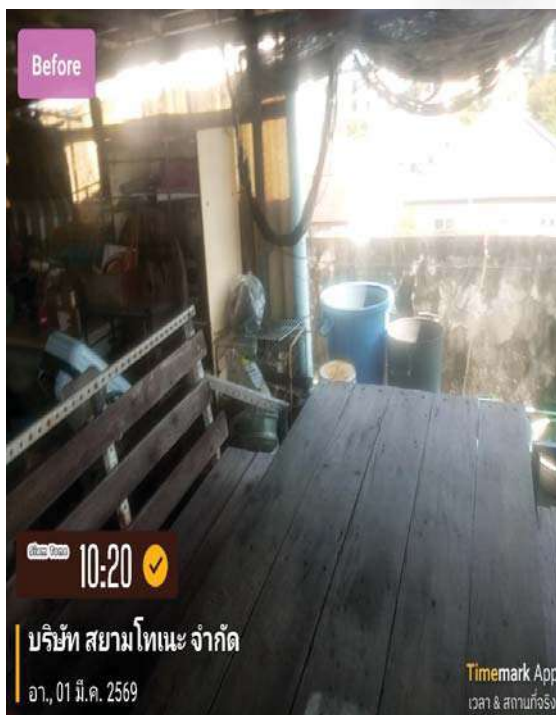





219 - 219 / 1

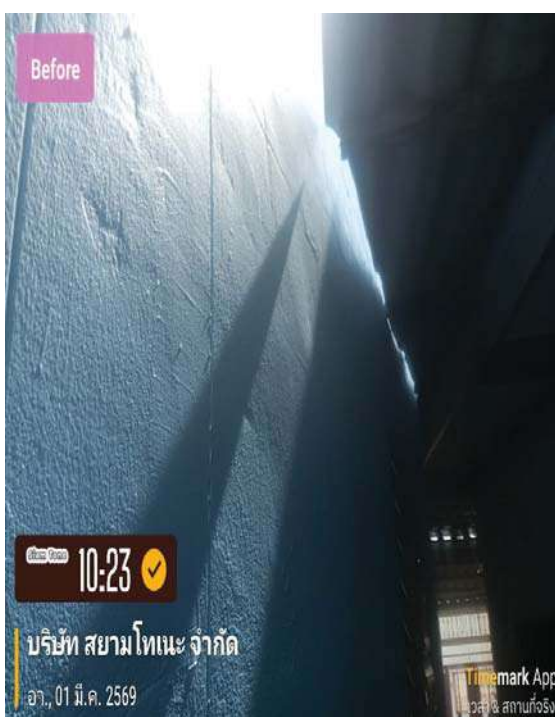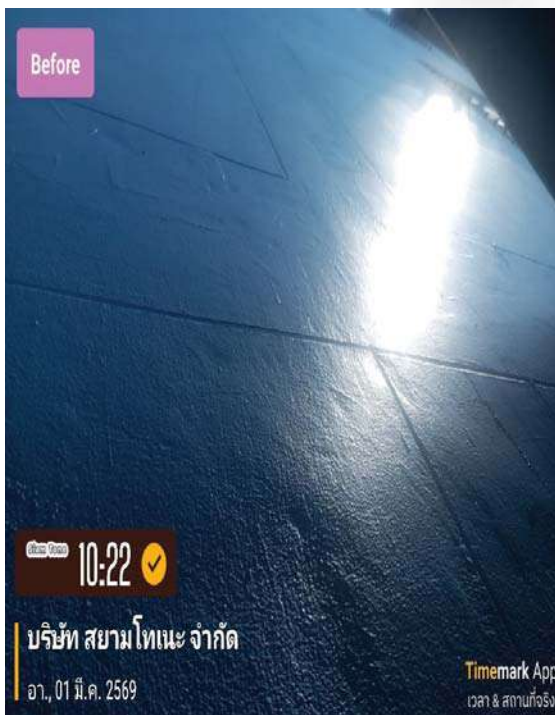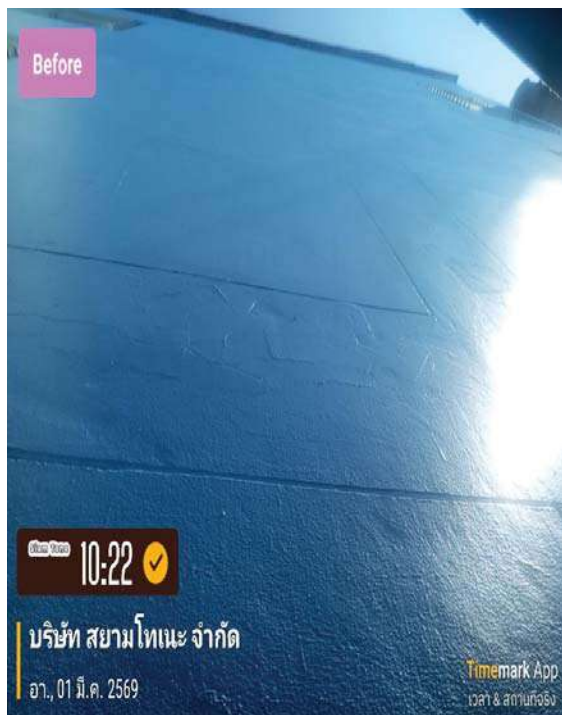

219 - 219 / 1

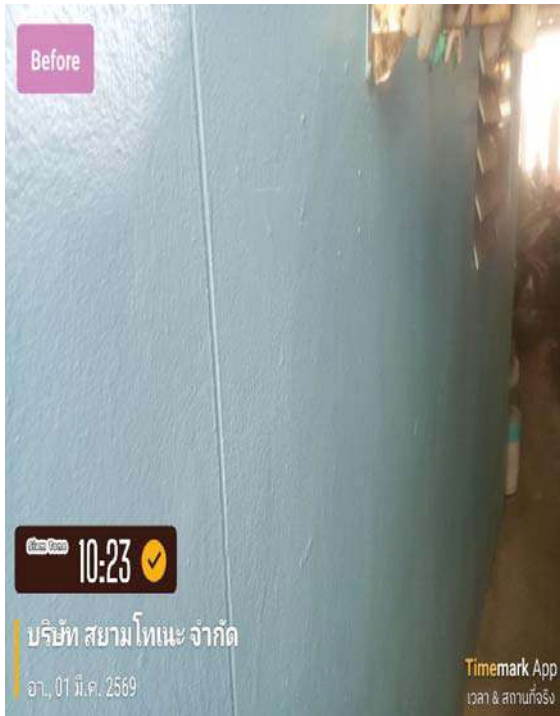

219 - 219 / 1

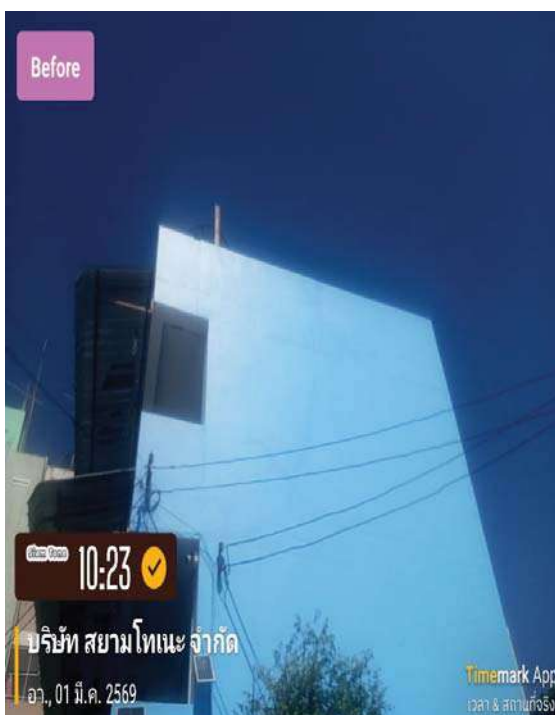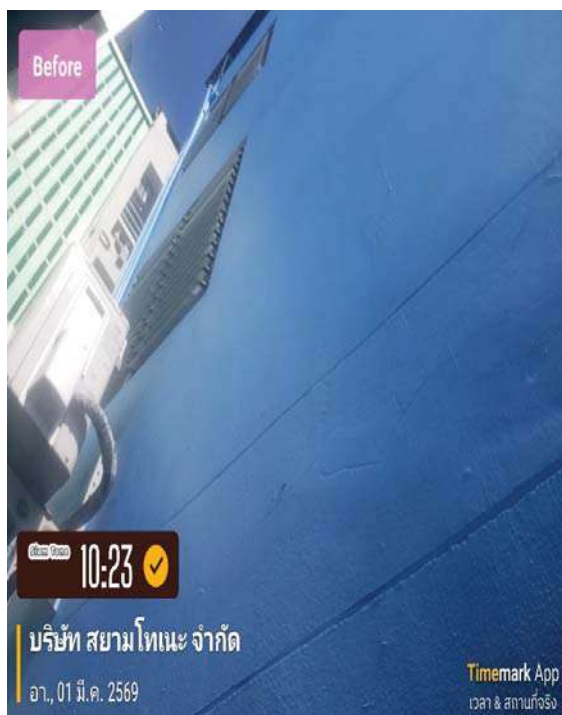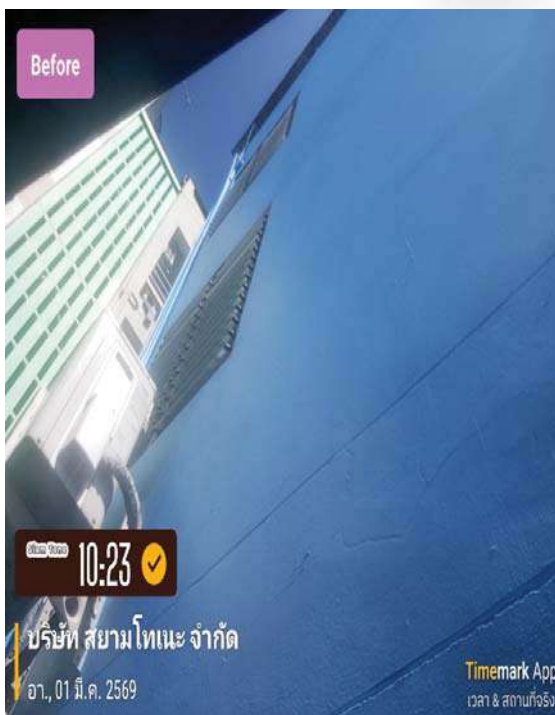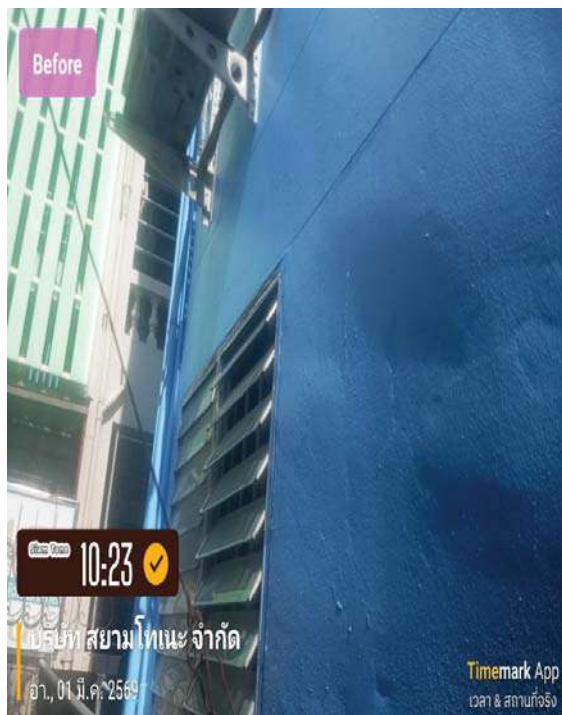


219 - 219 / 1




219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

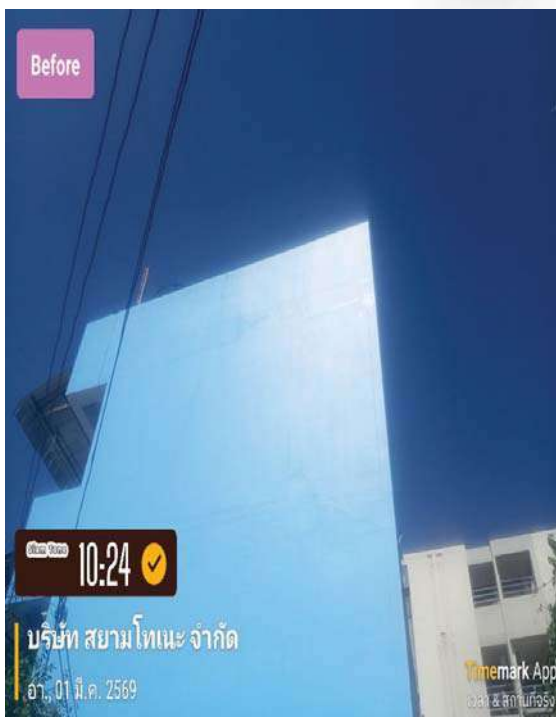

219 - 219 / 1

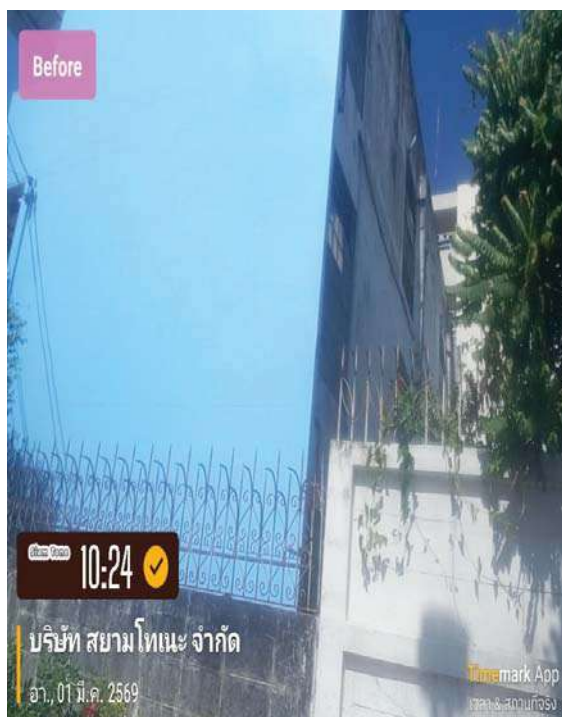

219 - 219 / 1

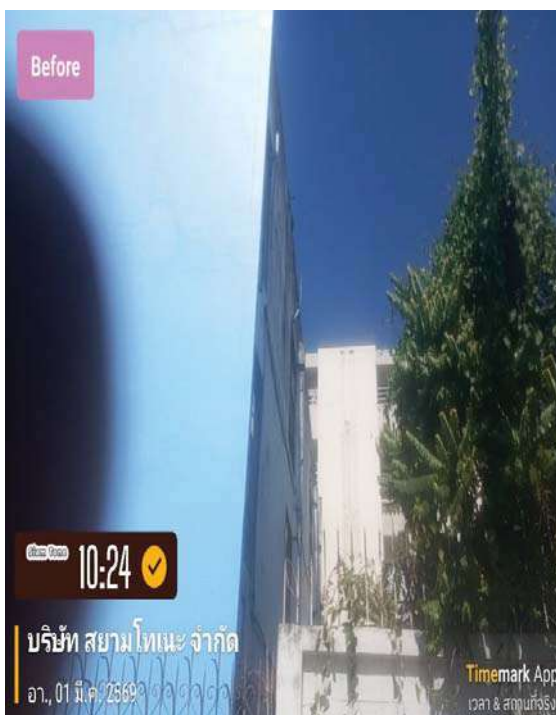

219 - 219 / 1




219 - 219 / 1





219 - 219 / 1






219 - 219 / 1

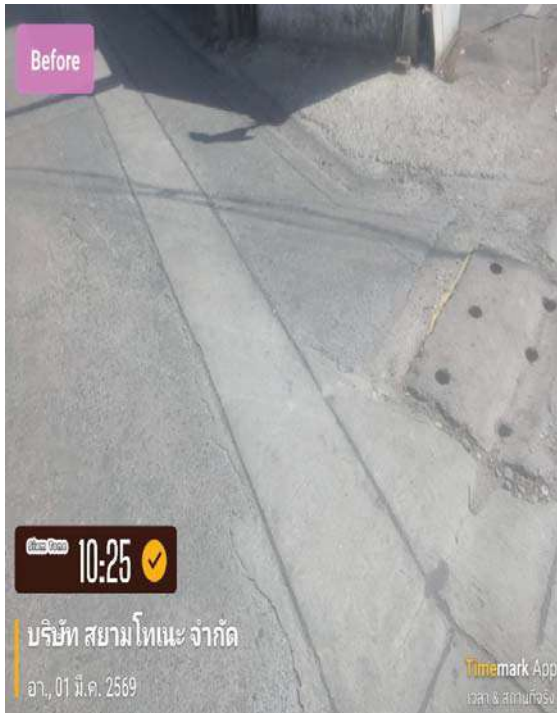



219 - 219 / 1

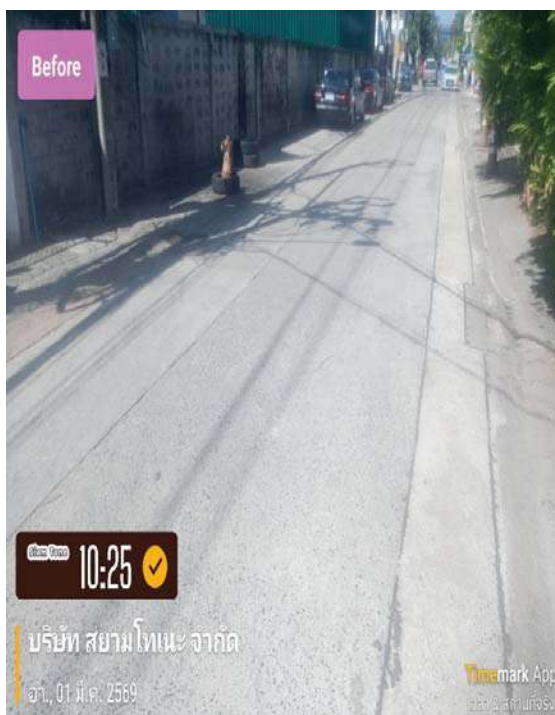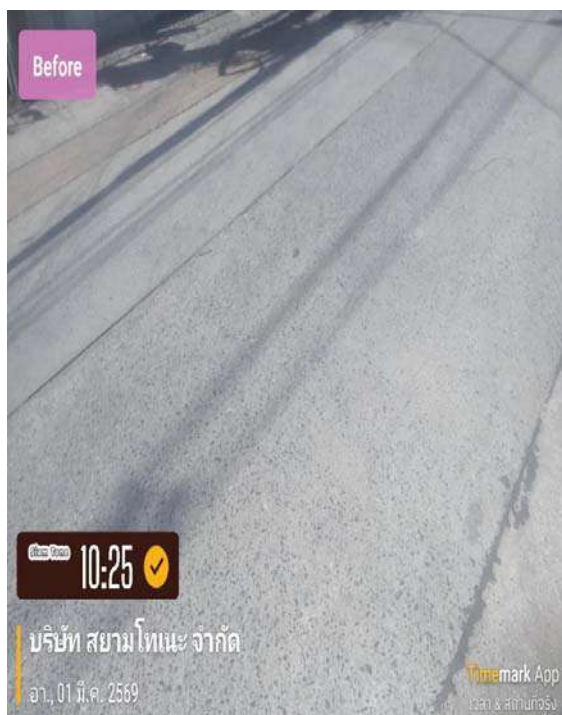


219 - 219 / 1

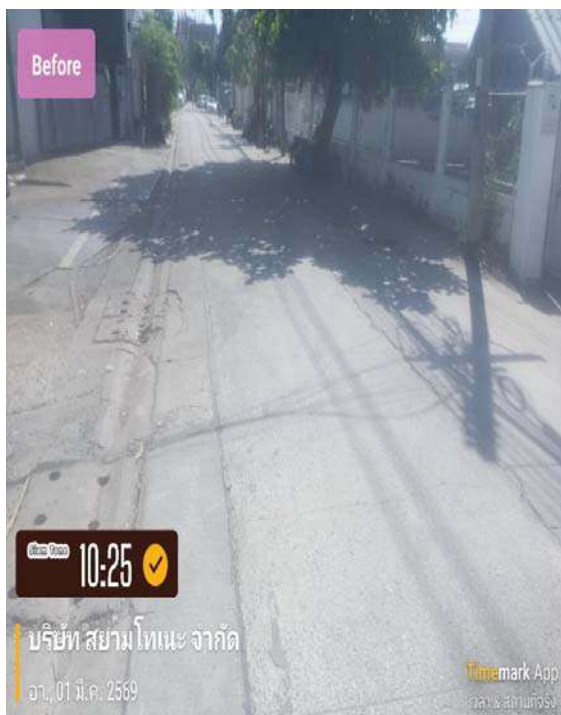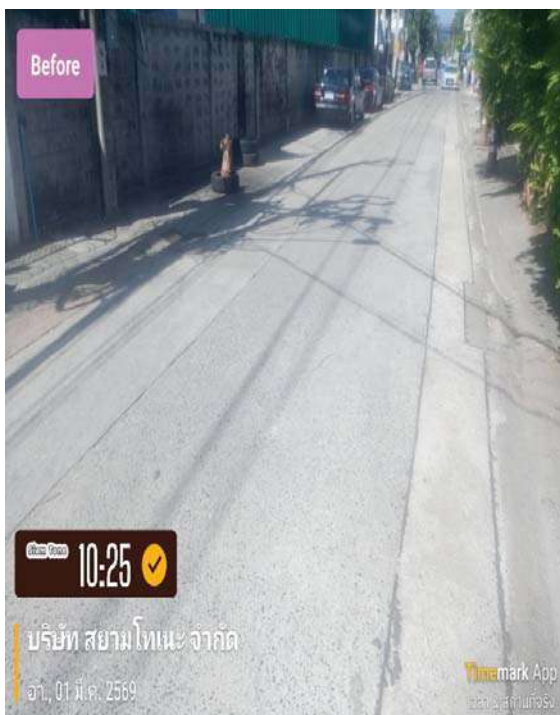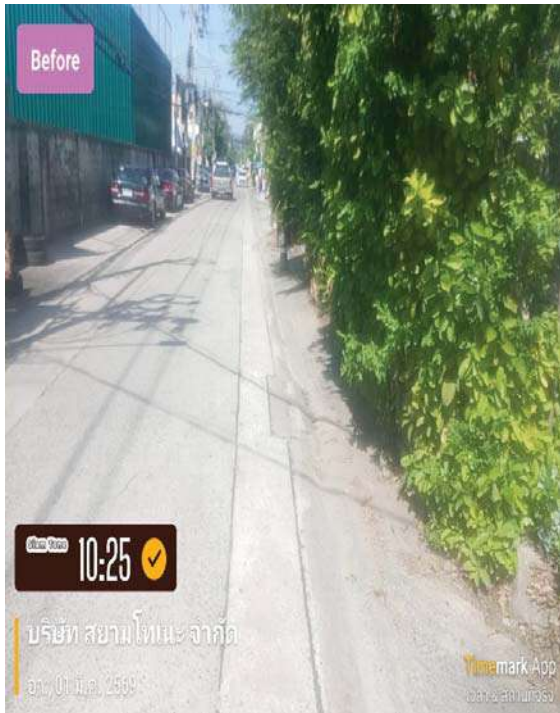

219 - 219 / 1

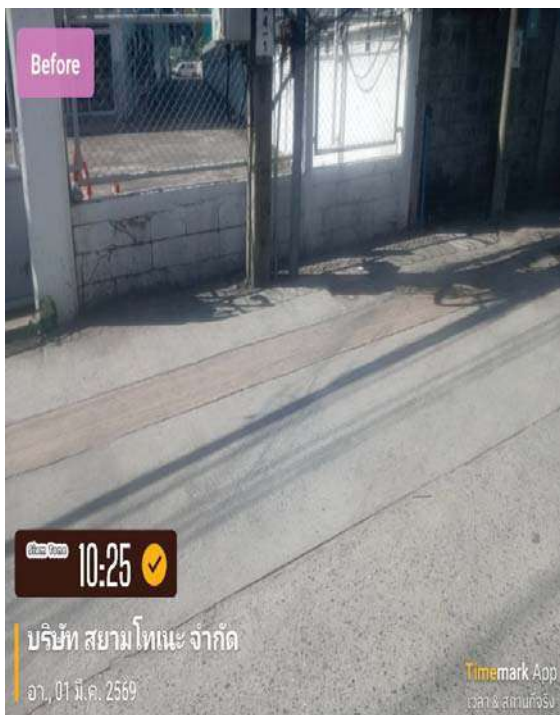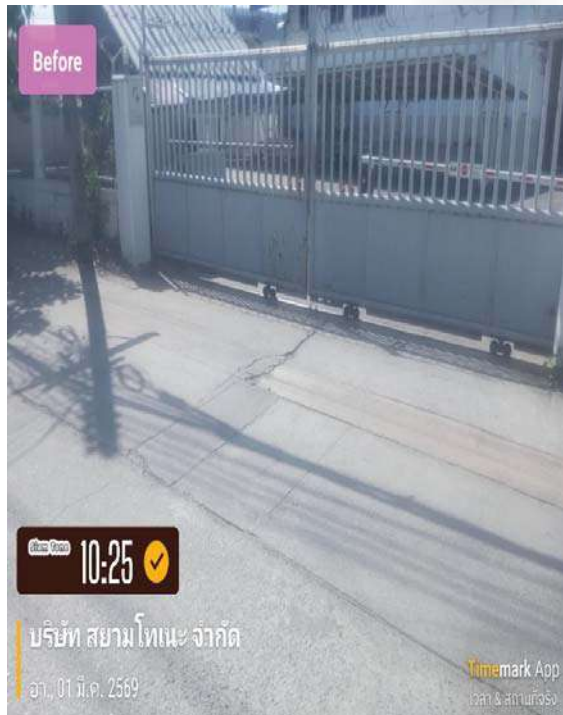


219 - 219 / 1

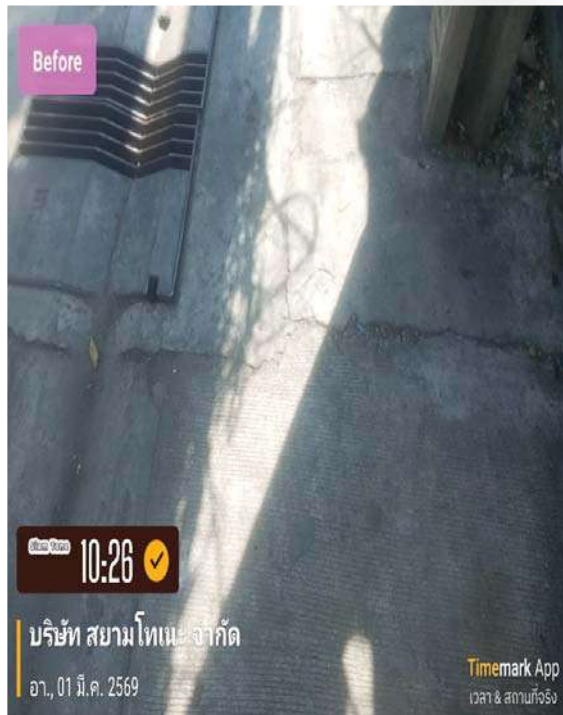




219 - 219 / 1




219 - 219 / 1

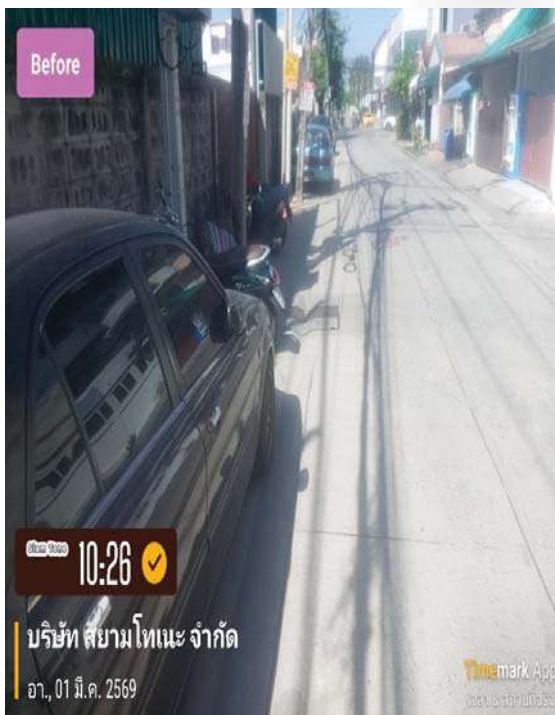

219 - 219 / 1

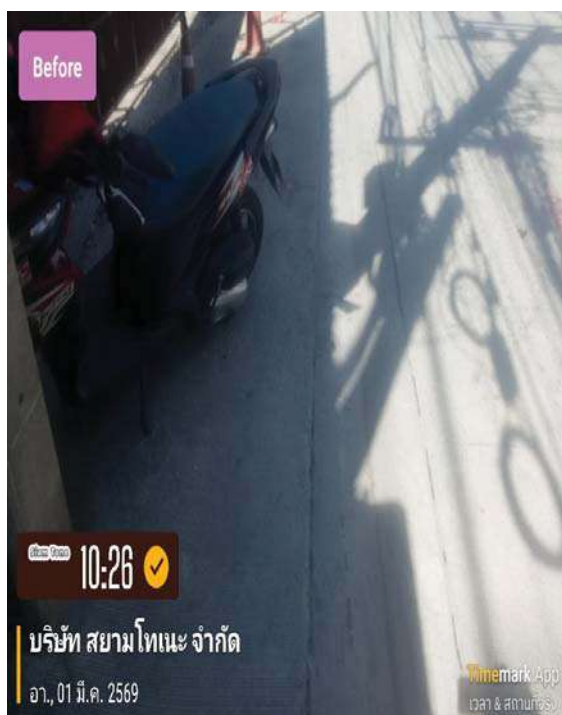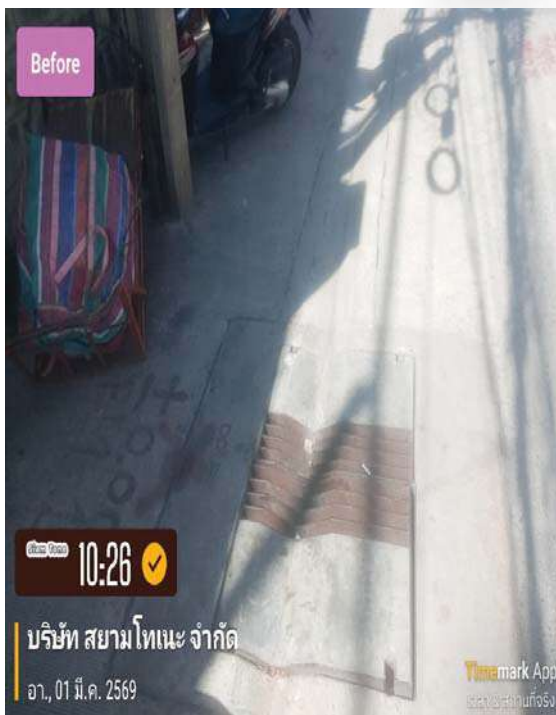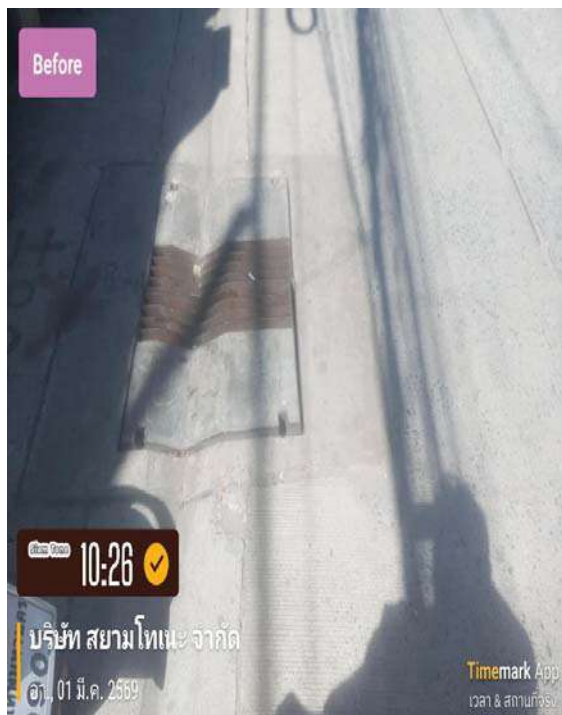




219 - 219 / 1

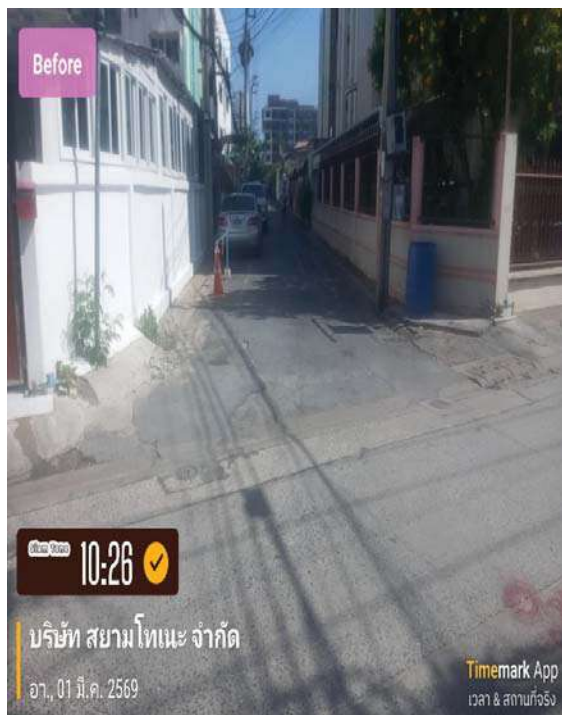

219 - 219 / 1





219 - 219 / 1

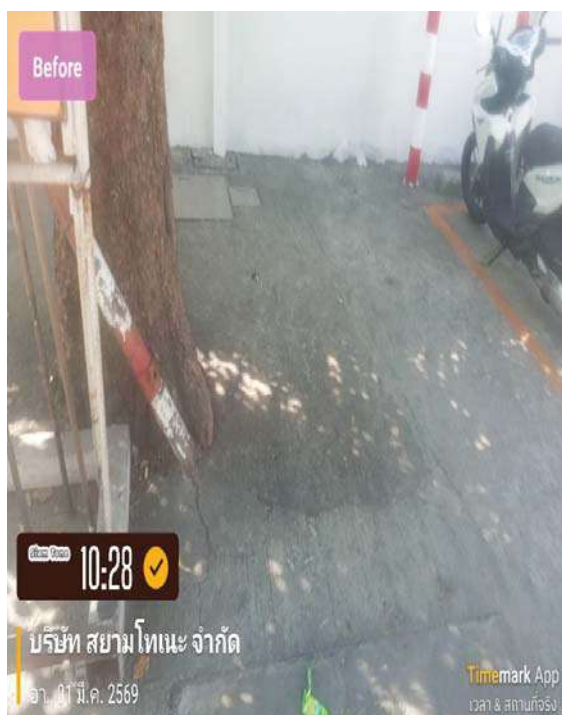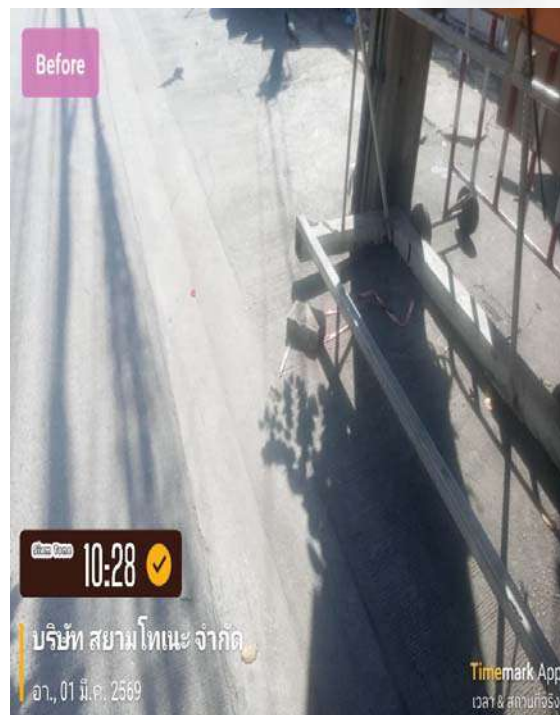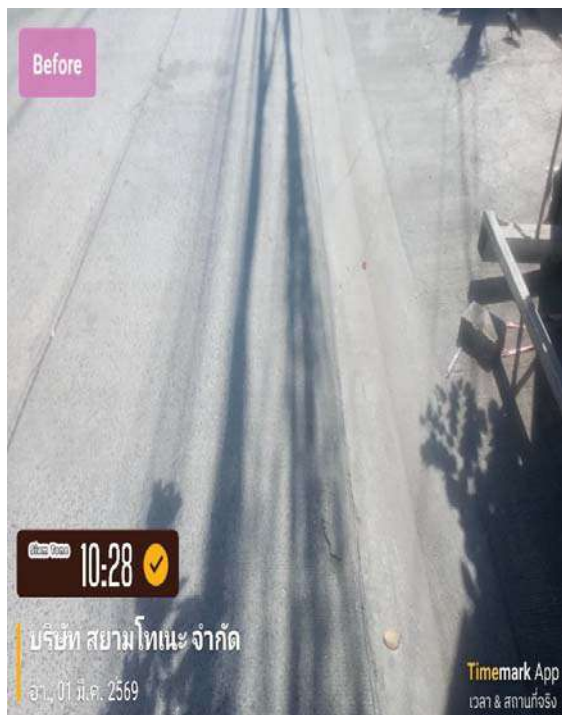

219 - 219 / 1



219 - 219 / 1

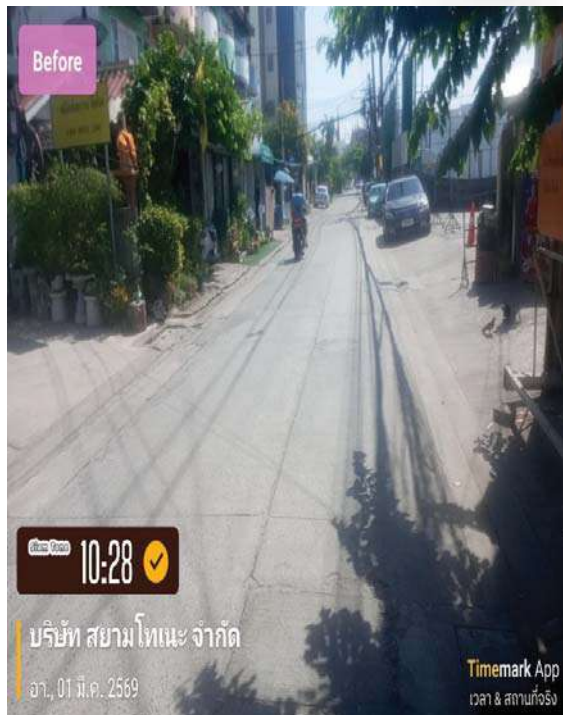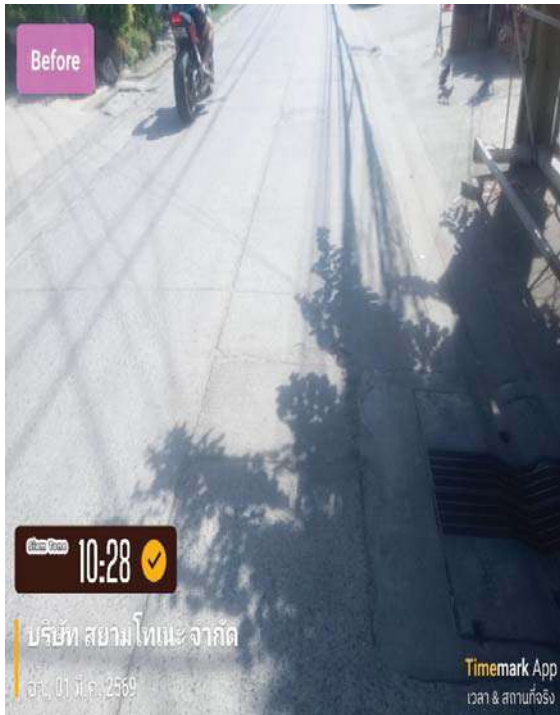

รายงานการสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านพักอาศัยรอบโครงการ

(ก่อนเริ่มงานเจาะเสาเข็มเจาะ)

99 / 498-497

โครงการ

ศุภาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ - หลักสี่


จัดทำโดย

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด




99 / 498-497

99 / 498-497

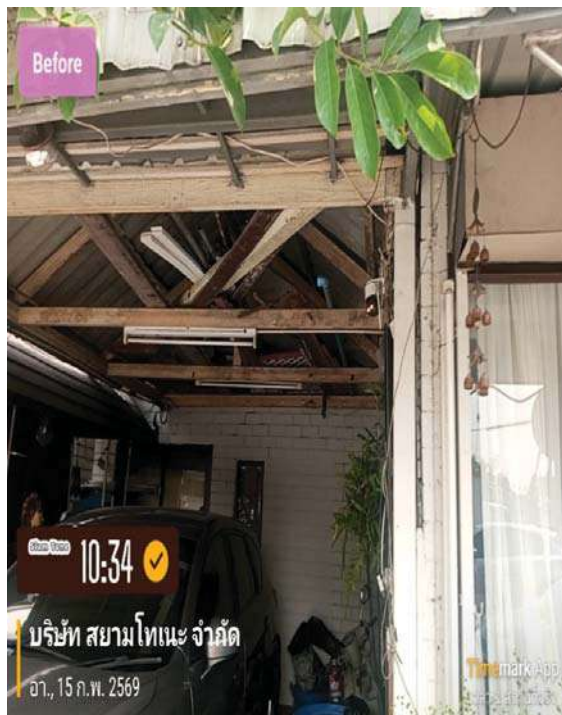



99 / 498-497

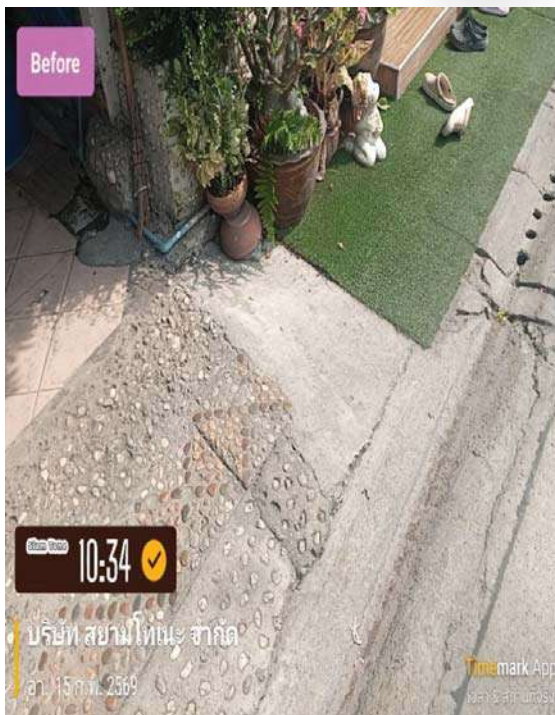


99 / 498-497



99 / 498-497

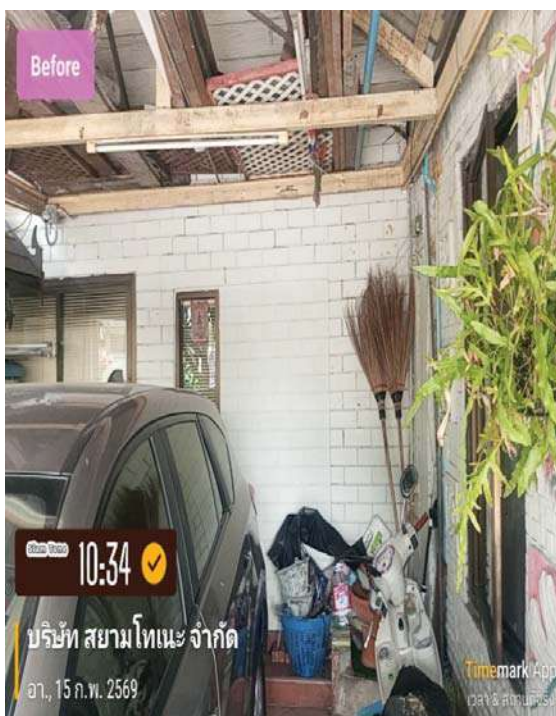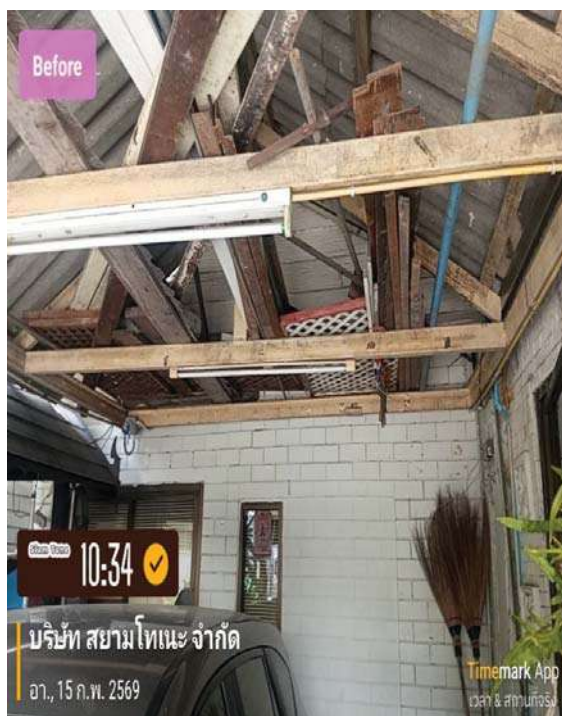


99 / 498-497

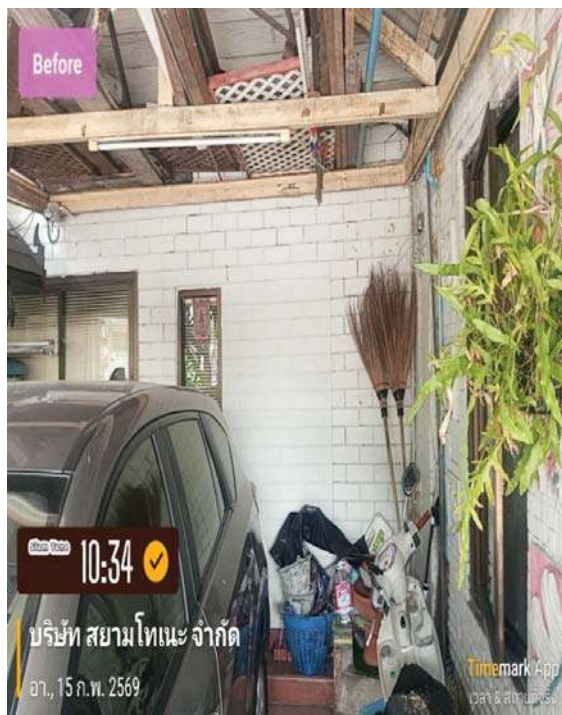

99 / 498-497



99 / 498-497

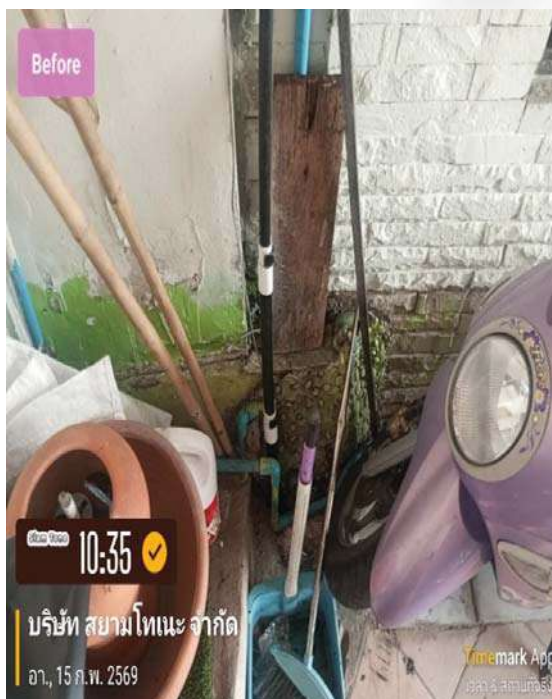

99 / 498-497



99 / 498-497




99 / 498-497




99 / 498-497




99 / 498-497

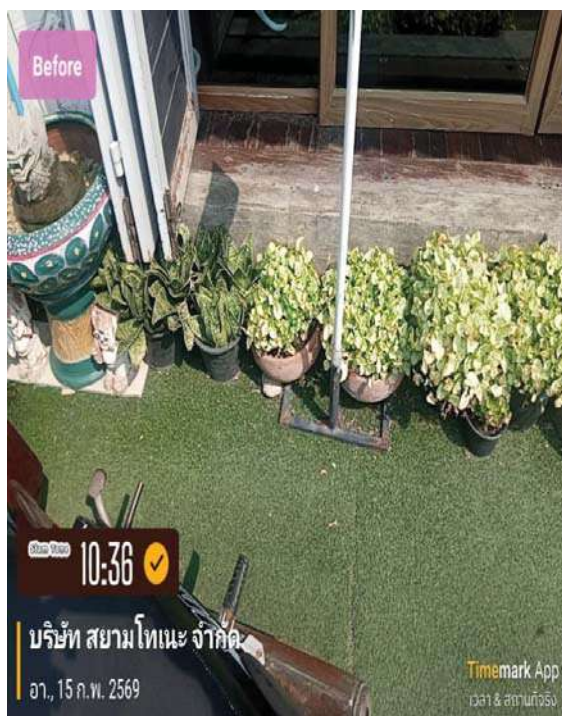


99 / 498-497

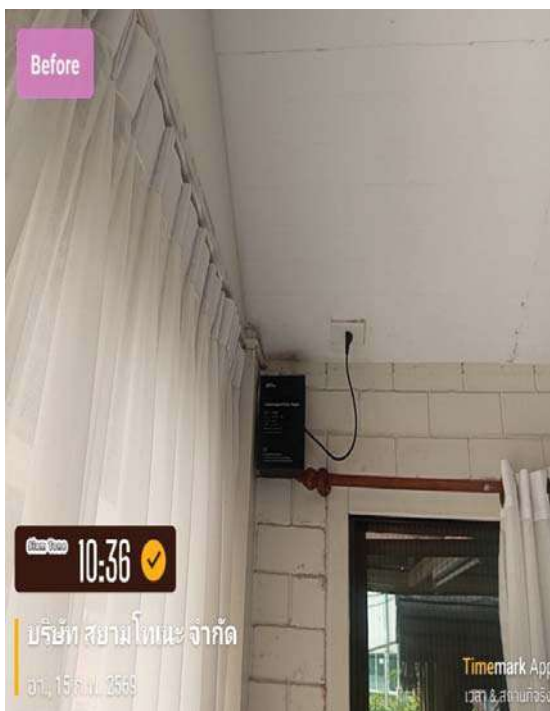


99 / 498-497

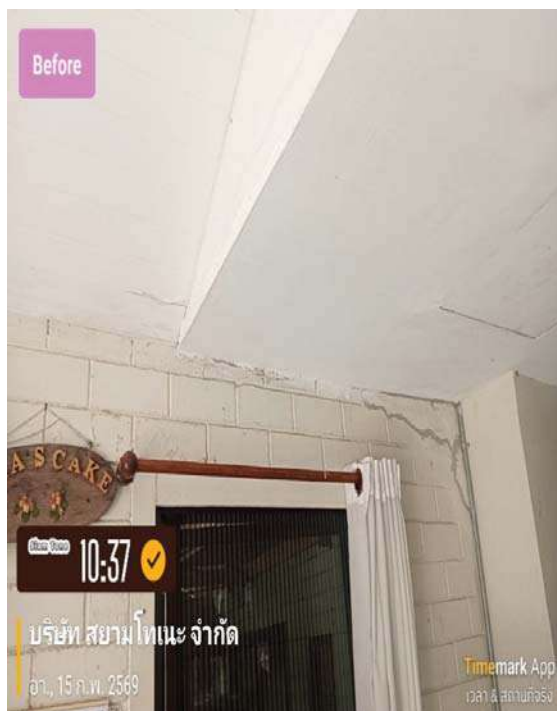

99 / 498-497

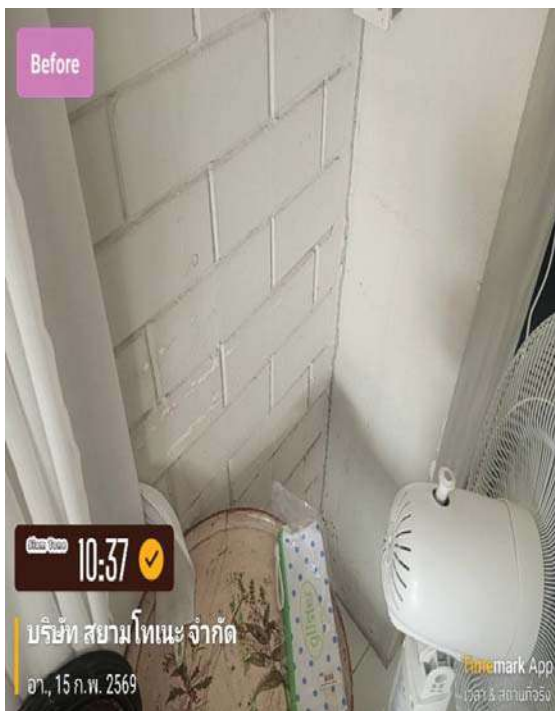


99 / 498-497

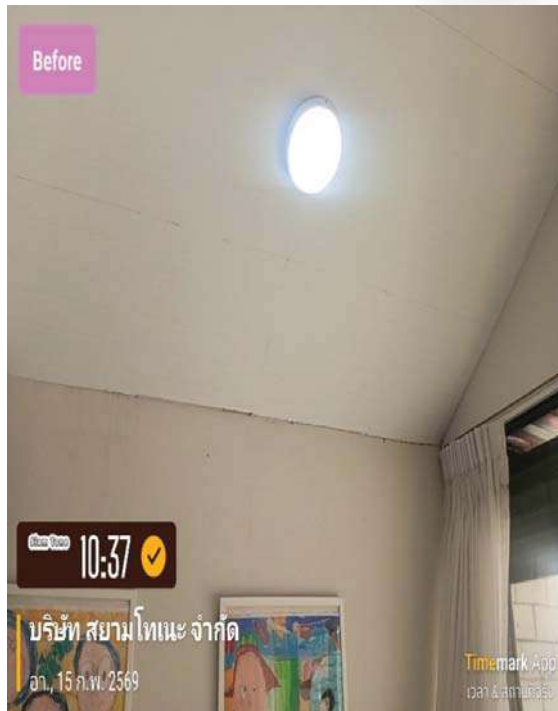

99 / 498-497




99 / 498-497

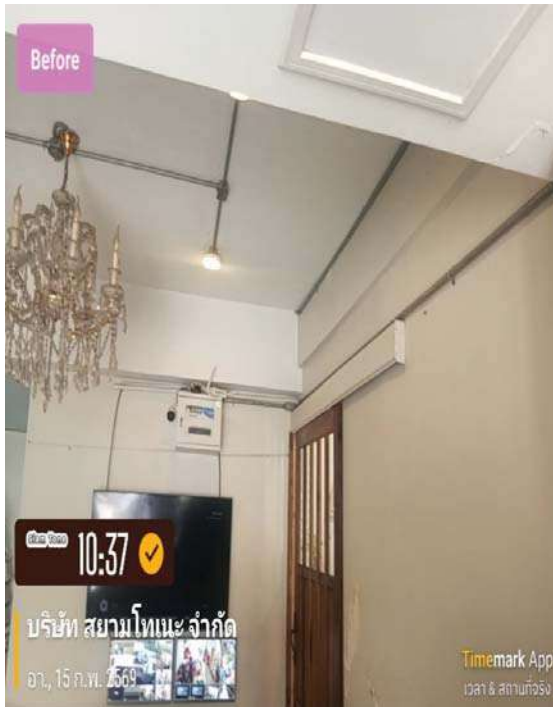



99 / 498-497





99 / 498-497

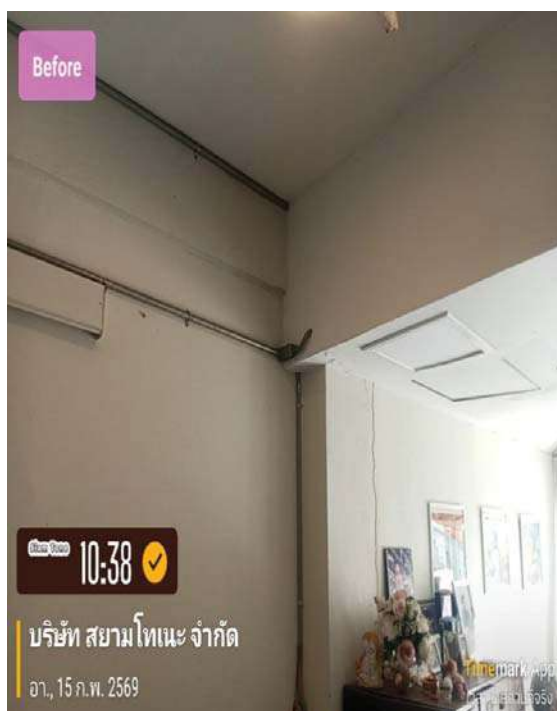


99 / 498-497

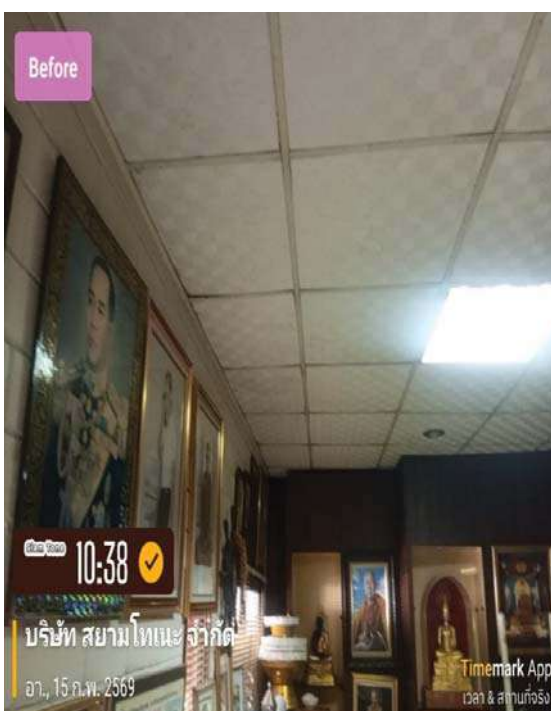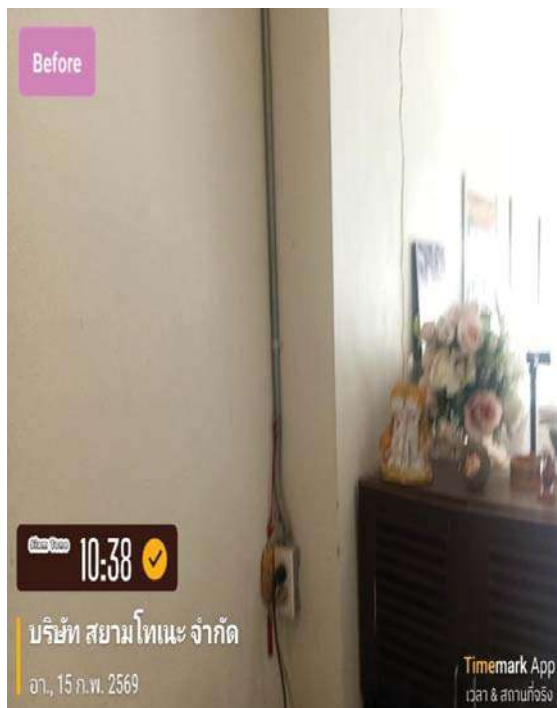

99 / 498-497

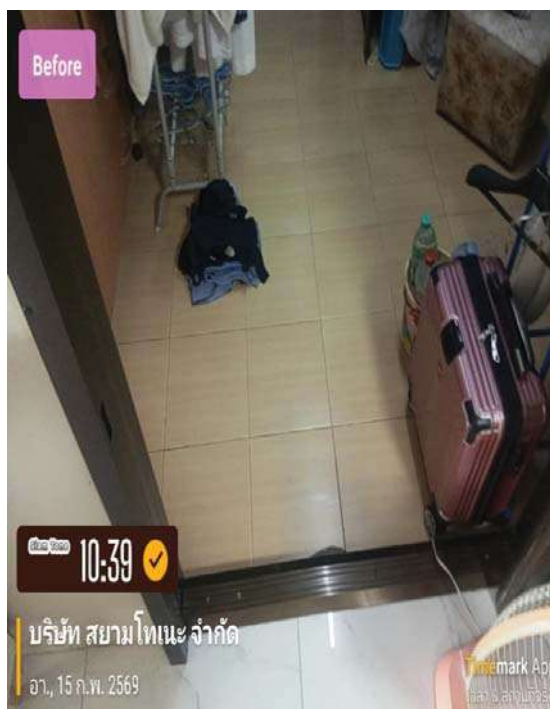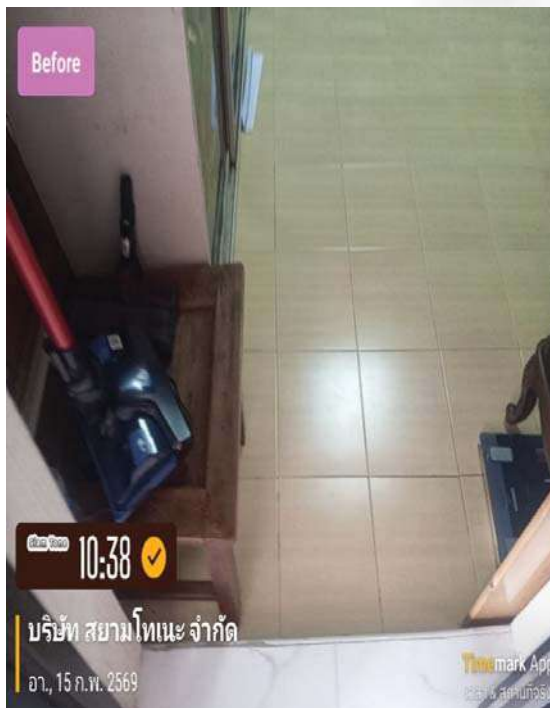

99 / 498-497

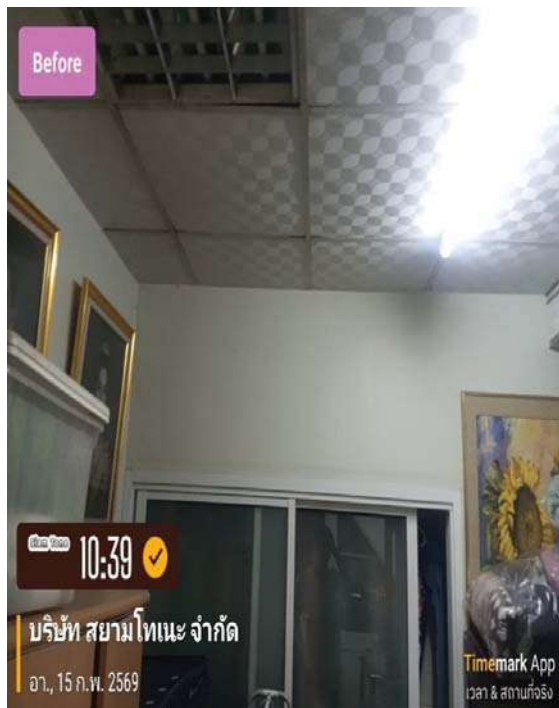



99 / 498-497




99 / 498-497



99 / 498-497

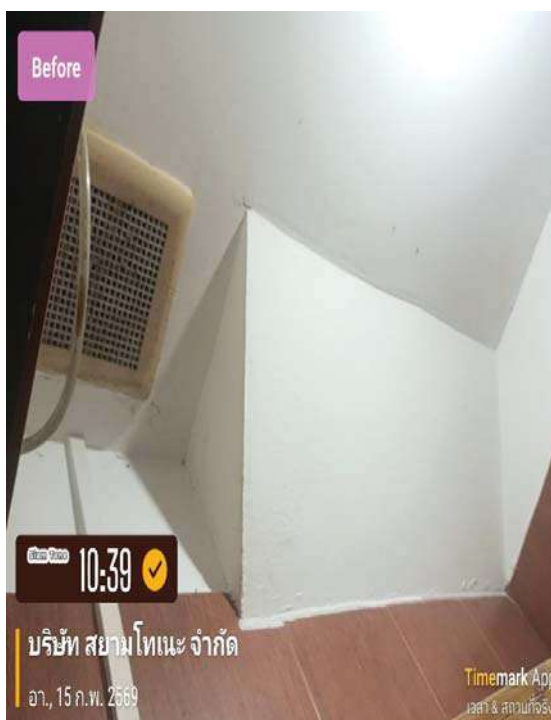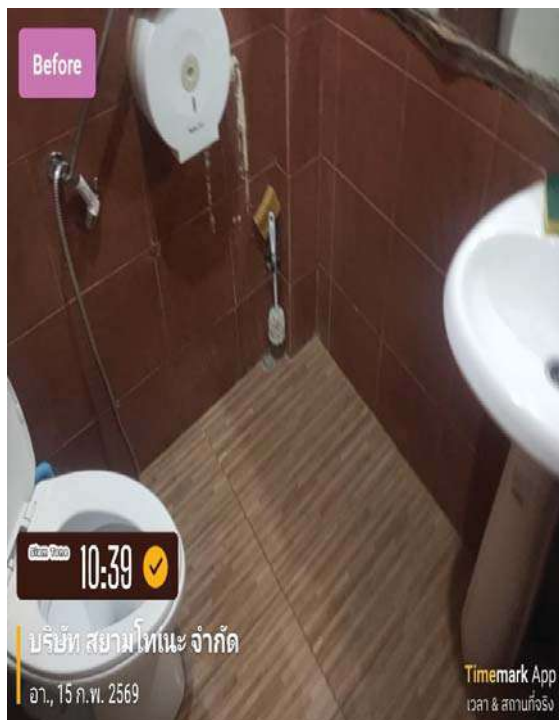


99 / 498-497

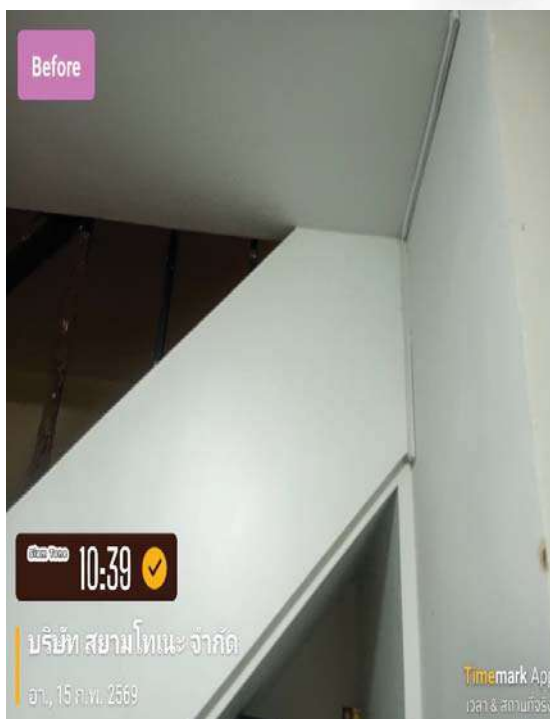


99 / 498-497



99 / 498-497

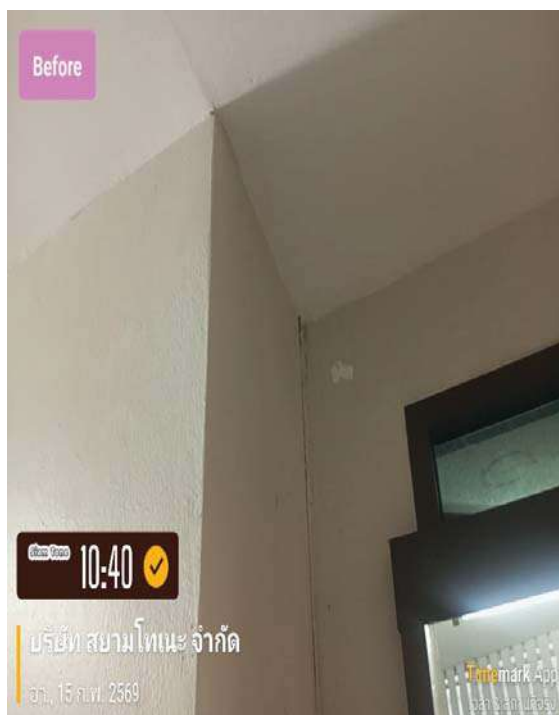



99 / 498-497

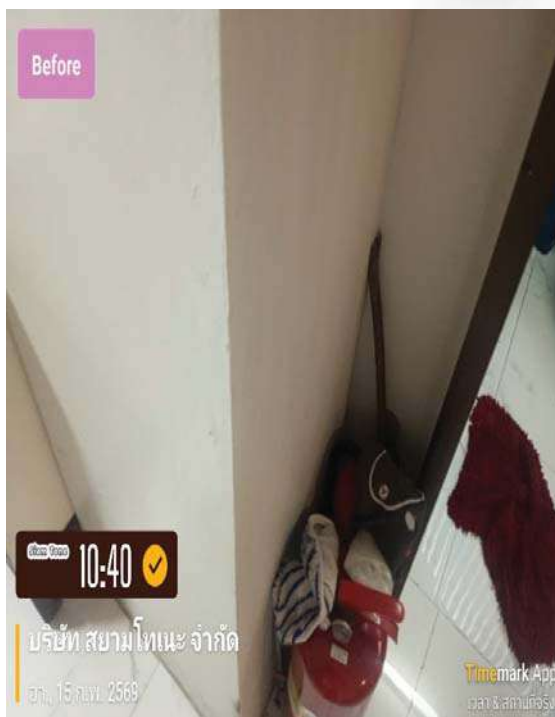

99 / 498-497




99 / 498-497

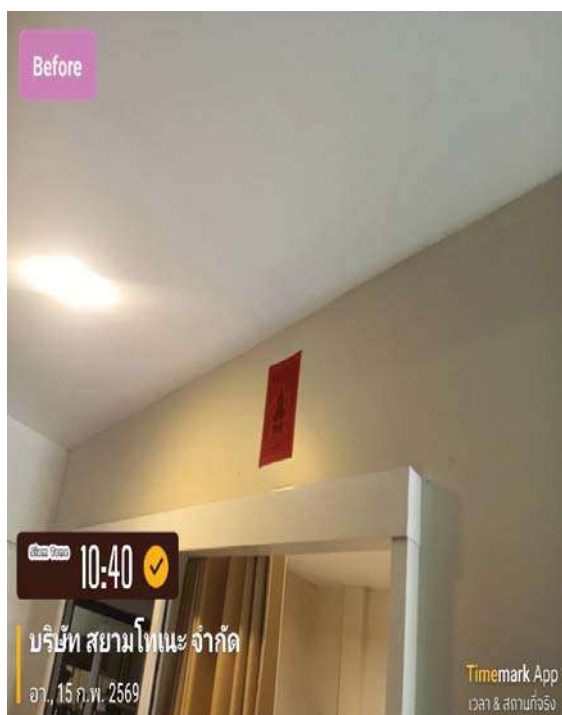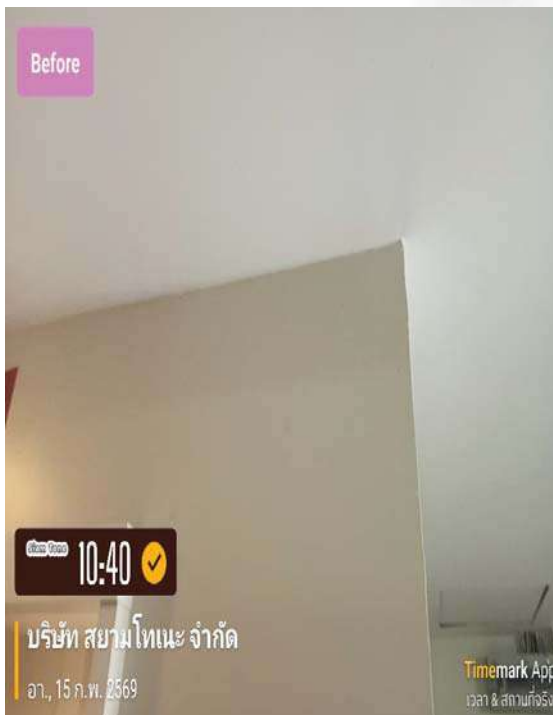

99 / 498-497




99 / 498-497

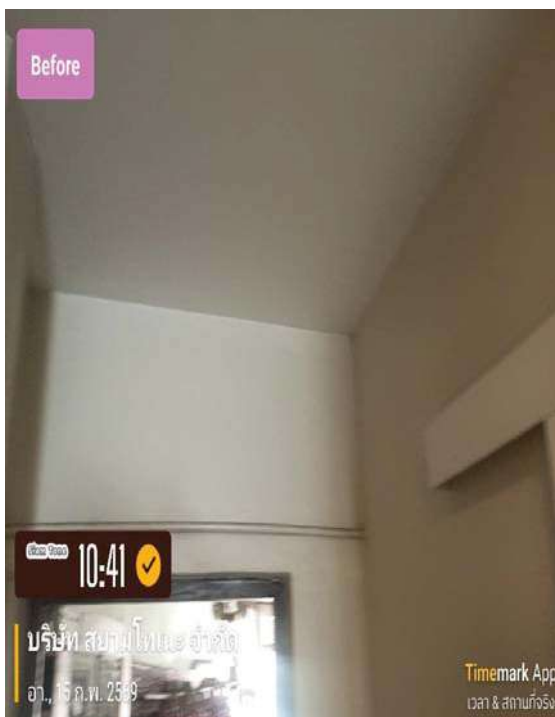



99 / 498-497



99 / 498-497

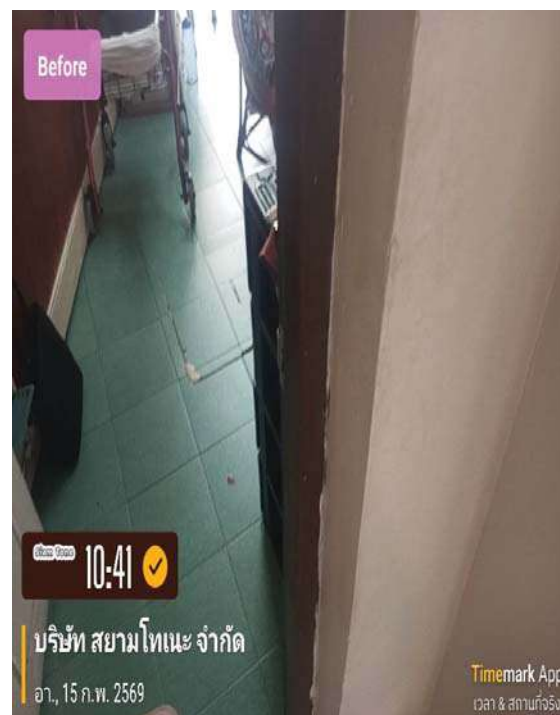


99 / 498-497

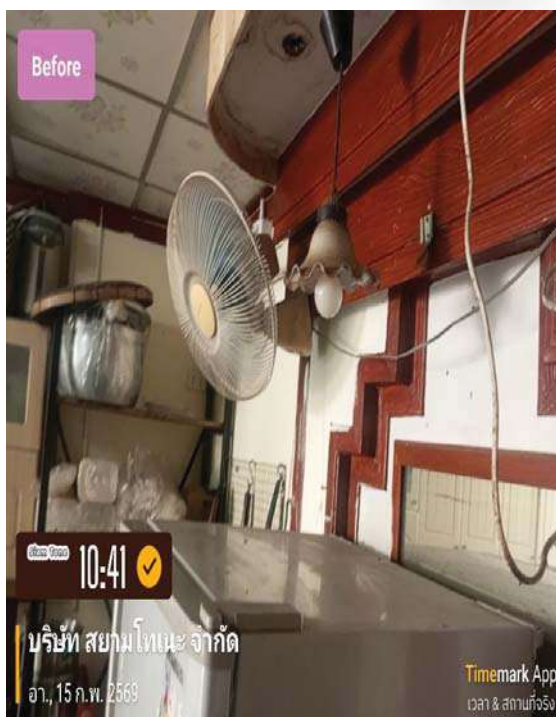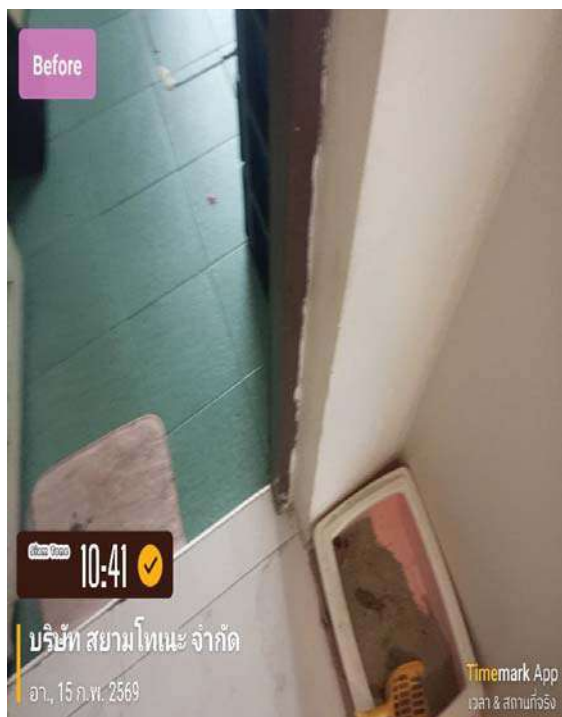


99 / 498-497



99 / 498-497

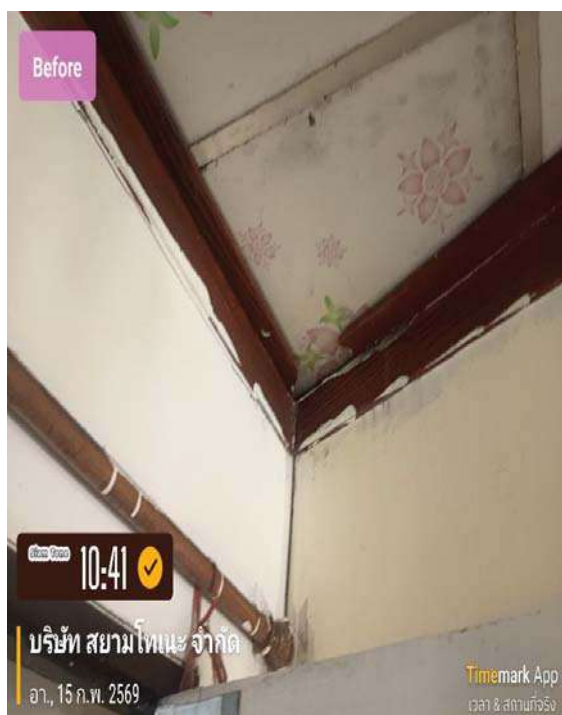

99 / 498-497

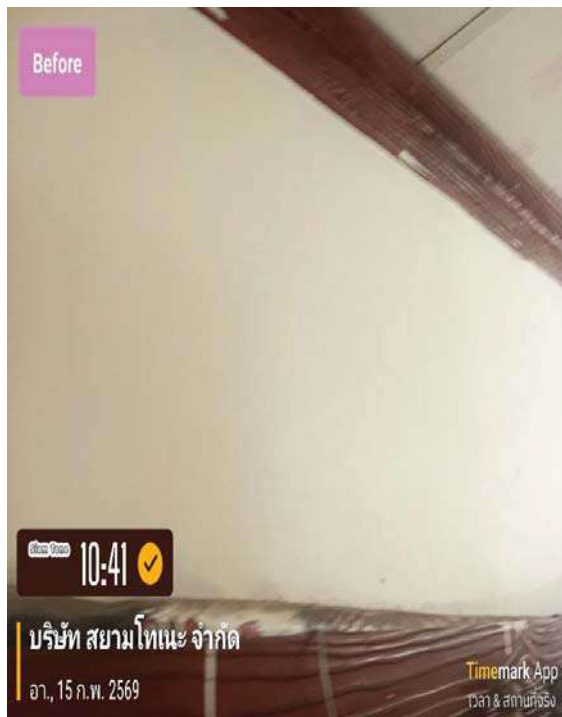

99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497




99 / 498-497





99 / 498-497




99 / 498-497

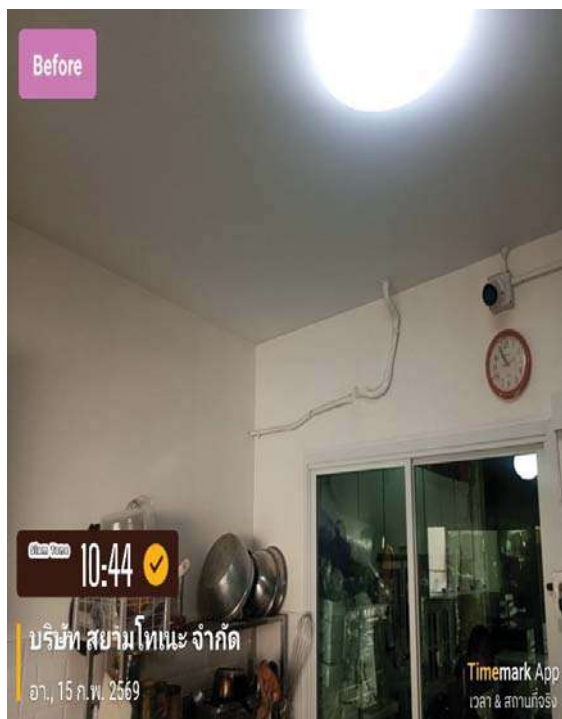

99 / 498-497

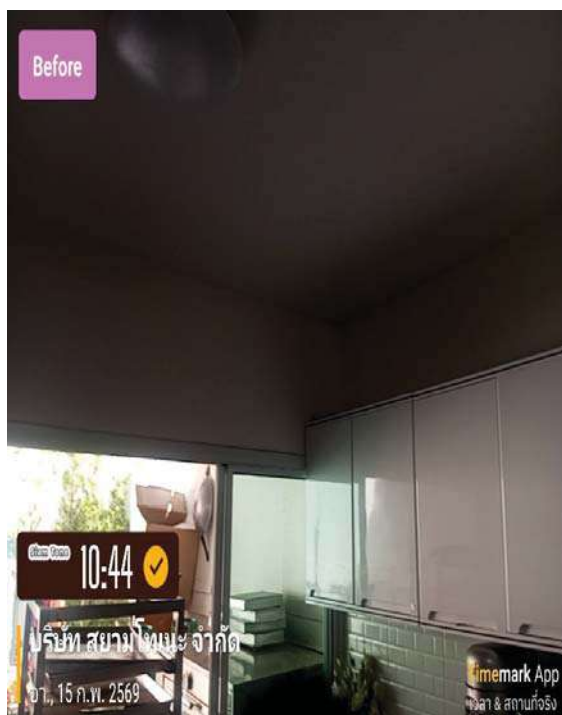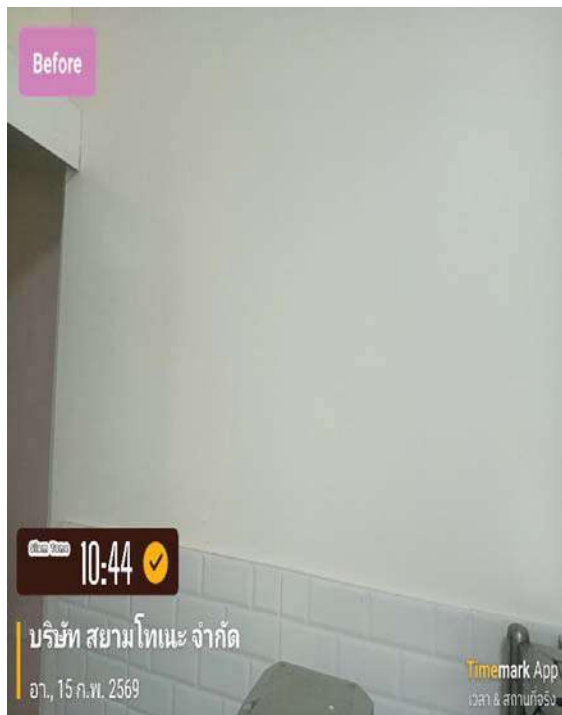

99 / 498-497

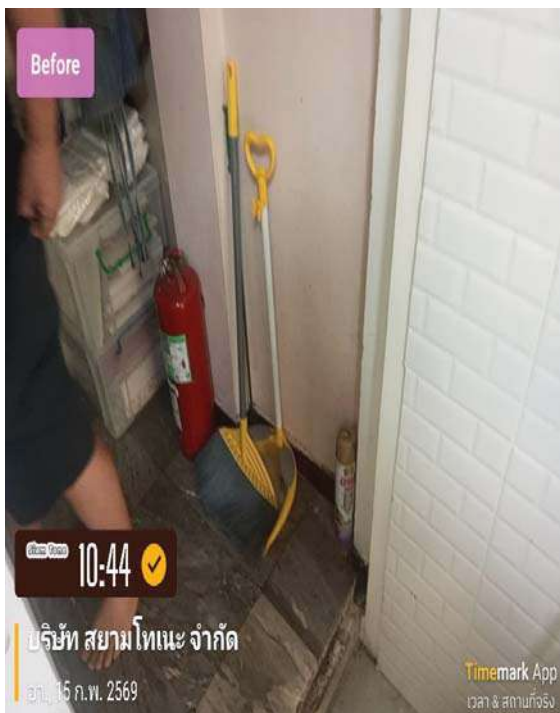



99 / 498-497




99 / 498-497



99 / 498-497

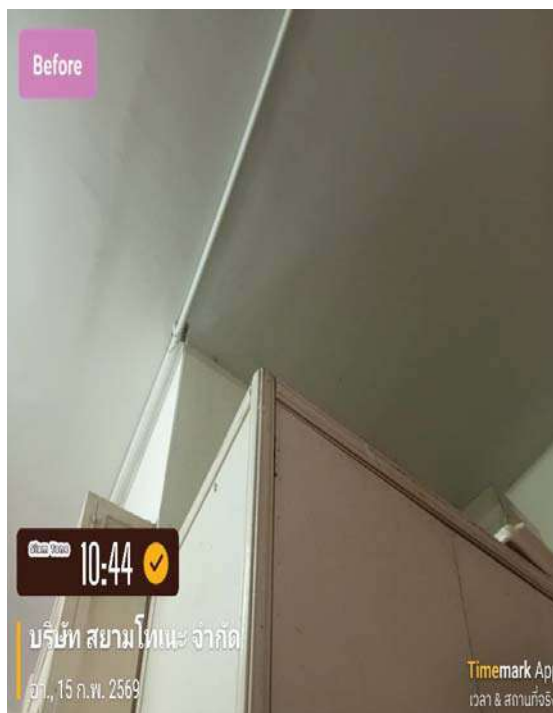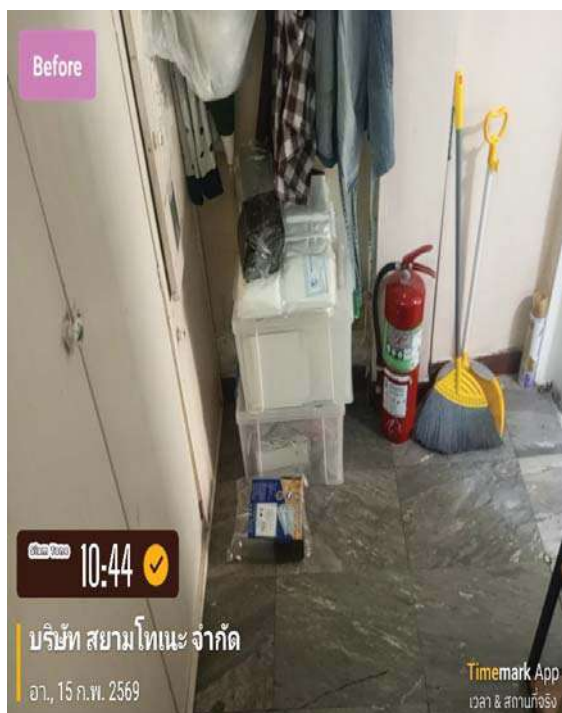

99 / 498-497

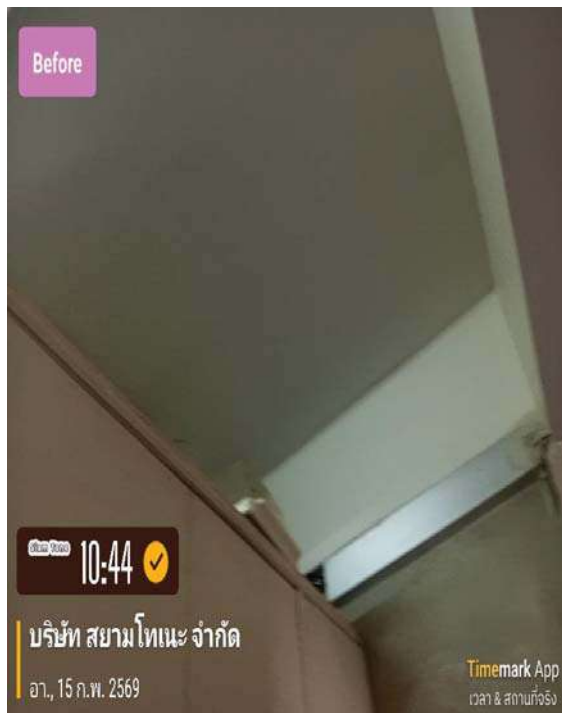


99 / 498-497





99 / 498-497



99 / 498-497

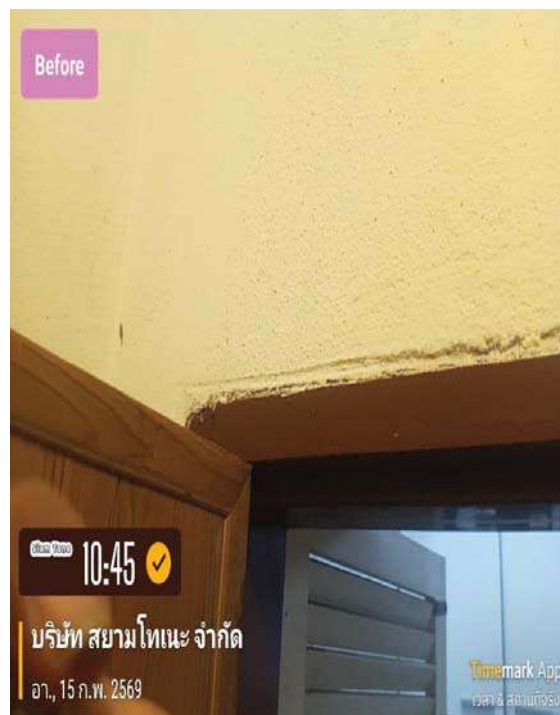



99 / 498-497

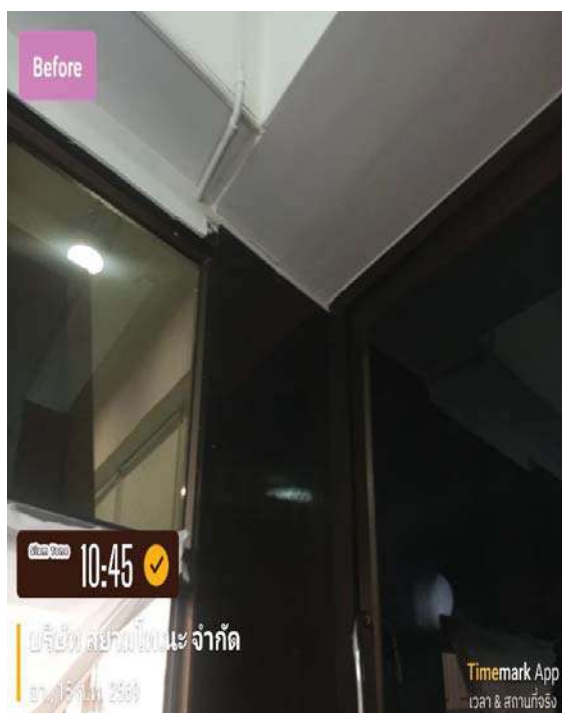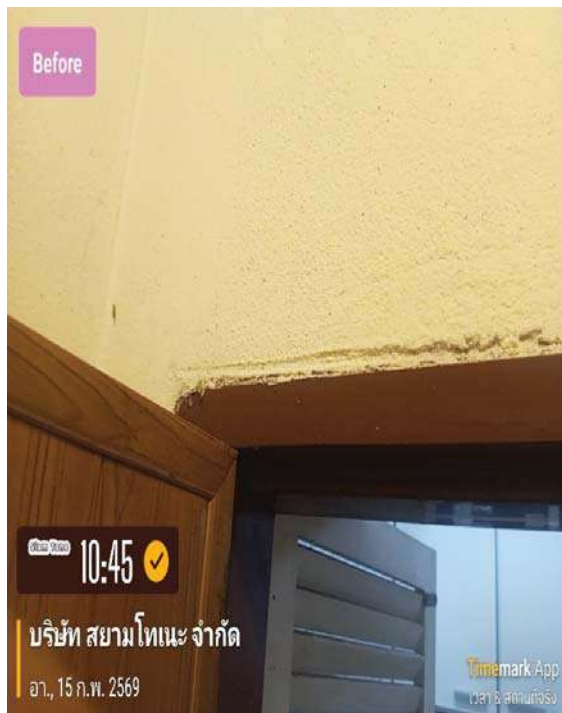

99 / 498-497



99 / 498-497

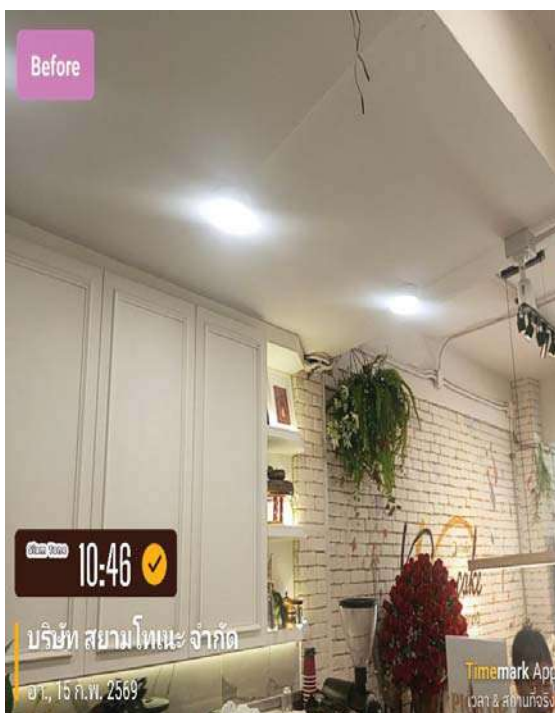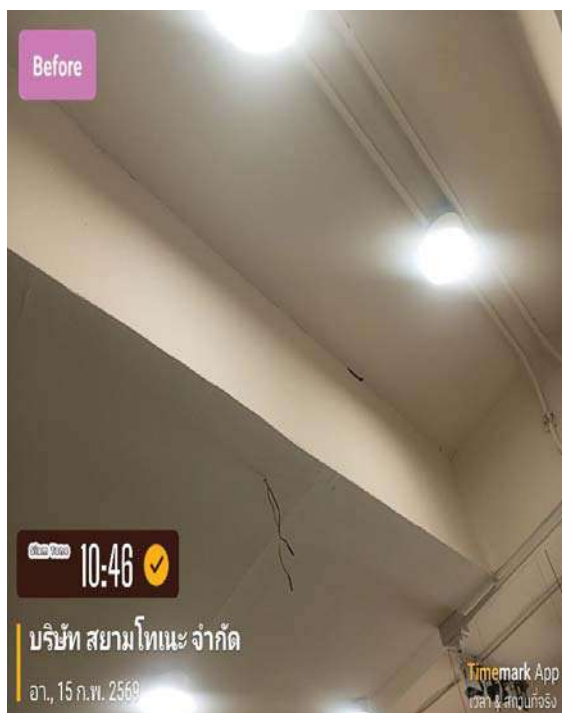

99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497



99 / 498-497




99 / 498-497





99 / 498-497





99 / 498-497

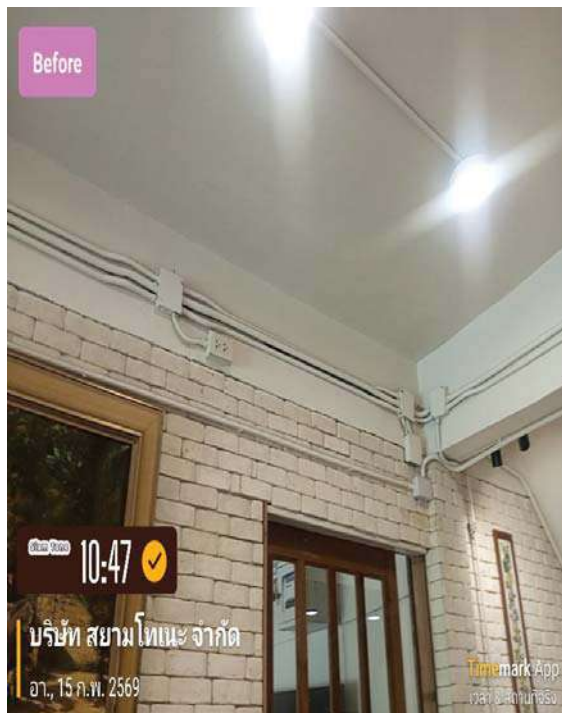

99 / 498-497

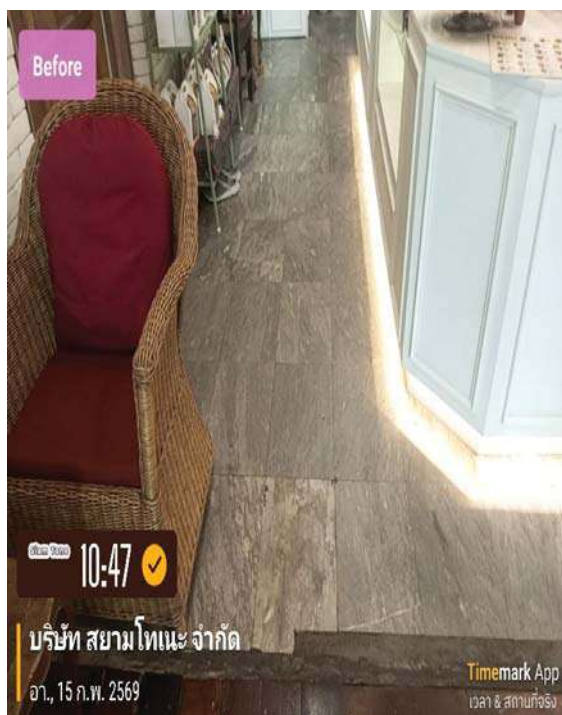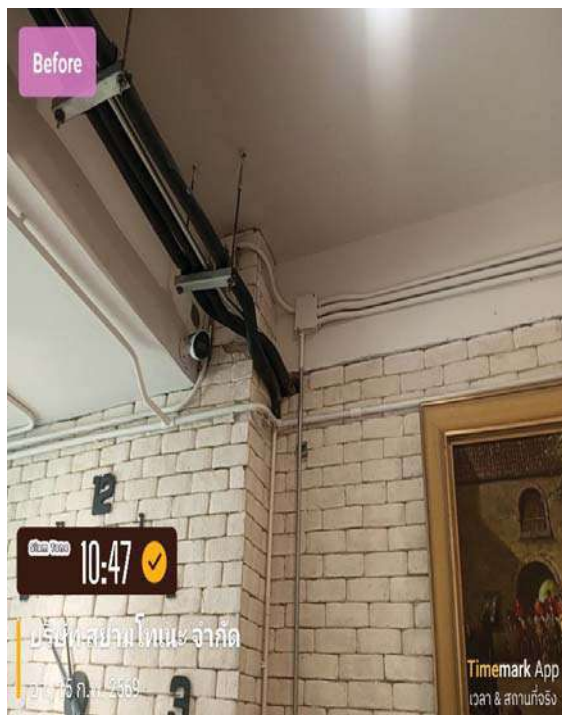


99 / 498-497

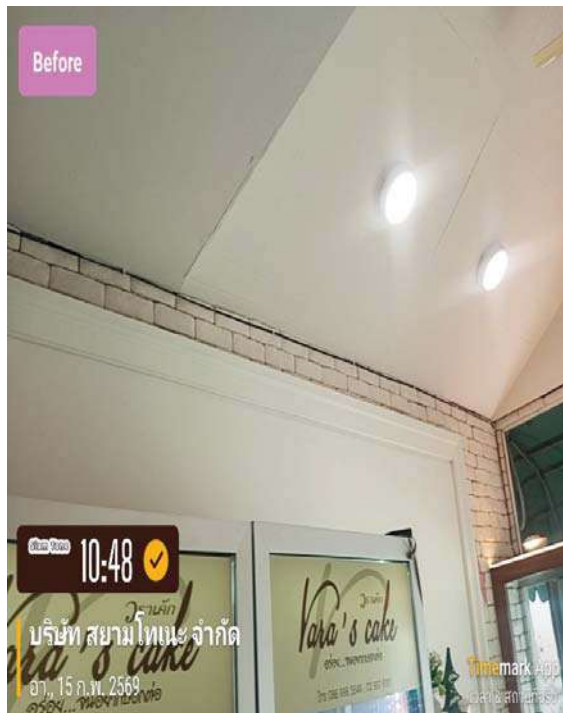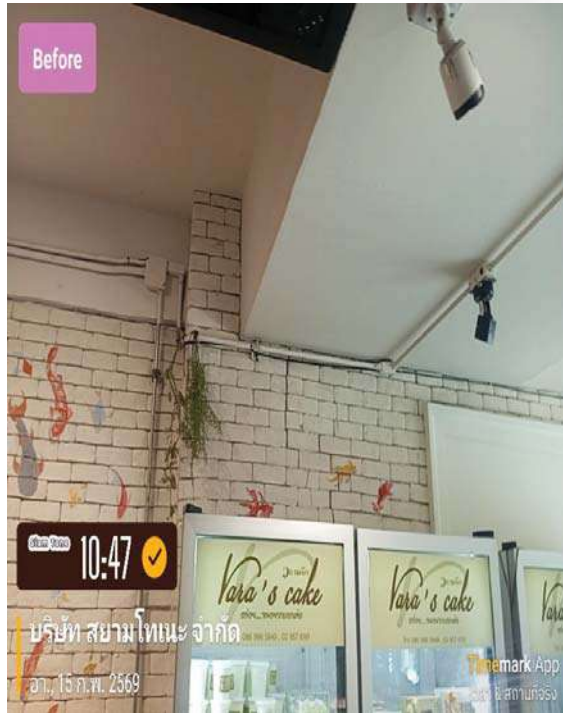

99 / 498-497



99 / 498-497

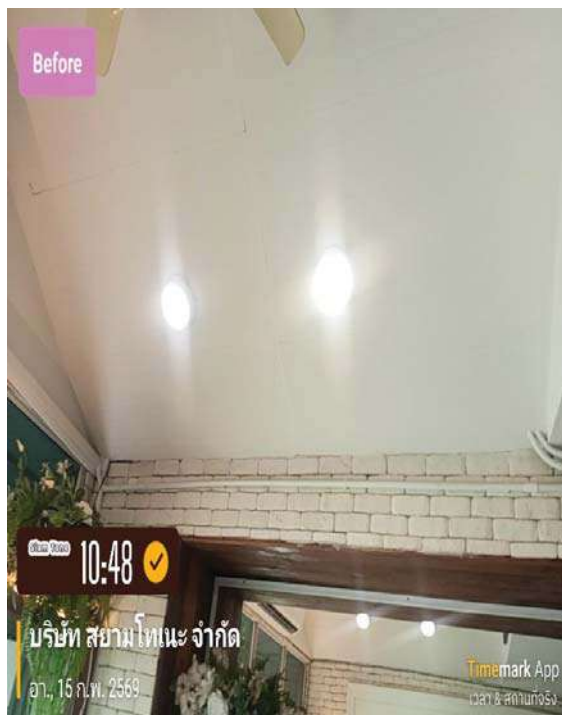

99 / 498-497





ภาคผนวกที่ 9
เอกสารบันทึกการทำงาน



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/039	วันที่ : 1 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนภา แสงสวาท
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนฟ้าคะนอง ☐ ฝนปรปรวน ☐ ฝนแล้ง ☐ ฝนเล็กน้อย	ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P75, P40 และ P11	1 nos
2	งานเจาะดิน	P21, P56 และ P75	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P21, P56 และ P75	1 nos
งานทั่วไป			
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos
			5 nos



ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	3	คัน	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	28	คัน
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	51.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	536.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รถป.ค.	1 คน
รวม		37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" / Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m., 0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น :  ชื่อ : (นางสาวพธนภา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น :  ชื่อ : (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 11/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 11/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ลำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☒ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/040	วันที่ : 2 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสว่าง
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ ฝนปานกลาง ☐ ฝนเล็กน้อย	ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย		☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ	
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P63, P68 และ P14	1 nos
2	งานเจาะดิน	P46, P11 และ P40	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P46, P11 และ P40	1 nos
งานทั่วไป			
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos
5 nos			

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	3	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	31	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	60.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	596.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รปภ.	1 คน
รวม		37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพธนา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : นายพงษ์ธร กอนพงษ์ภักดี ชื่อ : วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 2/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 2/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ผู้จ้าง / ตัวแทนผู้จ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/041	วันที่ : 3 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสวาท
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ แดด ☐ เมฆมาก ☐ ฝนเล็กน้อย	ปิดโปรง ☐	ฝนปานกลาง ☐ ฝนหนัก ☐
ช่วงเวลา.....17:00..... น ถึง.....18:00.....น			
ประเภทงาน :	☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ		
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P22, P77 P65 และ P41	1 nos
2	งานเจาะดิน	P63, P68, P22 และ P14	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P63, P68, P22 และ P14	1 nos
	งานทั่วไป		
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos
			5 nos



ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	4	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	35	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	76.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	672.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โพรแมน / ผู้ช่วยโพรแมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รปภ.	1 คน
	รวม	37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Service Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Service Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น :  ชื่อ : (นางสาวพธนา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น :  ชื่อ : วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 31/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 31/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตาเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☒ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง : เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/042	วันที่ : 4 เมษายน 2569	
ผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน : พธนา แสงสว่าง		
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ☐	ปลอดภัย ☐ ☐ เหมะมาก ☐ ☐ ฝนเล็กน้อย ☐ ☐ ฝนปานกลาง ☐ ☐ ฝนหนัก ☐ ☐	
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P17, P94 และ P62	1 nos
2	งานเจาะดิน	P77	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P77	1 nos
	งานทั่วไป		
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos
			5 nos


ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	1	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ได้ทั้งหมด	36	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	14.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	686.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รถป.	1 คน
	รวม	37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Service Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Service Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น :  ชื่อ : (นางสาวพธนา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น :  ชื่อ : (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : <u>4/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : <u>4/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI


งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/043	วันที่ : 5 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสว่าง
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนฟ้าคะนอง ☐ ฝนปรปรวน ☐ ฝนแล้ง	ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย		☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ	
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	ไม่มีการดำเนินการทำงาน (วันหยุด)		

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	0	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มที่ทำได้ทั้งหมด	36	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	0.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	686.50	m ³

บุคลากร			เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน	ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ผู้จัดการโครงการ	-	1	Service Crane DH650	1 units
2	วิศวกรโครงการ	-	2	Welding Machine	3 units
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	-	3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	-	4	Drilling Crane KH180	1 units
5	ช่างสำรวจ	-	5	Tremie Pipe 10" / Tremie Pipe 8"	2 units
6	ช่างเหล็ก	-	6	Steel plate	123 units
7	คนงาน เข็มเจาะ	-	7	Bucket 0.8"	2 units
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	-	8	Bucket 0.6"	2 units
9	ช่างเชื่อม	-	9	Bentonite Tank	3 units
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	-	10	Service Crane DH-300	1 units
11	พนักงานขับรถบริการ	-	11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	-	12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	แม่บ้าน	-	13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m., 0.6 m.	5 units
14	รถป.ค.	2 คน	14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	2 คน		รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพธนา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น :  ชื่อ : วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 7/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 7/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานะ : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		

รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง : เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/045	วันที่ : 7 เมษายน 2569	
ผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน : พริมา แสงสวาท		
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ☐	ปลอดภัย ☐ ☐ เหมืองมาก ☐ ☐ ฝนเล็กน้อย ☐ ☐ ฝนปานกลาง ☐ ☐ ฝนหนัก ☐ ☐	
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P52, P10 และ P85	1 nos
2	งานเจาะดิน	P65, P17, P62 และ P52	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P65, P17, P62 และ P52	1 nos
	งานทั่วไป		
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	4	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	40	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	86.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	772.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โพรแมน / ผู้ช่วยโพรแมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รปภ.	1 คน
	รวม	37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Service Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" / Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Service Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m., 0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ : (นางสาวพริมา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : ชื่อ : นายพงศธร อนนงนันทิ วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : <u>7/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น : ชื่อ : คุณกมลสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : <u>7/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
--	---	---

สถานะ : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน | ผู้จ้าง / ตัวแทนผู้จ้าง



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/046	วันที่ : 8 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสวาท
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ ฝนปรำปรำ ☐ ฝนแล้ง	ลม : ☐ ไม่มีลม ☐ ลมแรง ☐ ลมพัด
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P71, P97, P60 และ P12	1 nos
2	งานเจาะดิน	P94, P41, P10 และ P85	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P94, P41, P10 และ P85	1 nos
งานทั่วไป			
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	4	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ได้ทั้งหมด	44	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	76.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	848.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรใช้ทำงาน	1 คน
4	โพรแมน / ผู้ช่วยโพรแมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รถป.	1 คน
รวม		37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น :  ชื่อ : (นางสาวพธนา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : นายพงศธร อนพวงษ์ภักดี ชื่อ : วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 8/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณกมลสันต์ บรรณสาธิตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 8/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI


งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/047	วันที่ : 9 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสว่าง
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ ฝนปานกลาง ☐ ฝนหนัก	ปลอดภัย ☐ เหมืองมาก ☐ ฝนเล็กน้อย
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P112, P87, P37 และ P67	1 nos
2	งานเจาะดิน	P97, P60, P71 และ P112	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P97, P60, P71 และ P112	1 nos
	งานทั่วไป		
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	4	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	48	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	74.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	922.50	m ³

บุคลากร			เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน	ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน	1	Service Crane DH650	1 units
2	วิศวกรโครงการ	-	2	Welding Machine	3 units
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน	3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน	4	Drilling Crane KH180	1 units
5	ช่างสำรวจ	3 คน	5	Tremie Pipe 10" / Tremie Pipe 8"	2 units
6	ช่างเหล็ก	5 คน	6	Steel plate	123 units
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน	7	Bucket 0.8"	2 units
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน	8	Bucket 0.6"	2 units
9	ช่างเชื่อม	2 คน	9	Bentonite Tank	3 units
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน	10	Service Crane DH-300	1 units
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน	11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน	12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	แม่บ้าน	1 คน	13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m., 0.6 m.	5 units
14	รปภ.	1 คน	14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	37 คน		รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพธนา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : <u>นายพงศธร อนพวงษ์ภักดี</u> ชื่อ : <u>วิศวกรสนามอาวุโส</u> (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : <u>9/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : <u>คุณกมลสันต์ บรรณสาธิตร์</u> (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : <u>9/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานะ : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง : เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/048	วันที่ : 10 เมษายน 2569	
ผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน : พธนา แสงสวาท		
จากปกติเวลา...08 : 00.....น ถึง...17 : 00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ แดด ☐ เมฆมาก ☐ ฝนเล็กน้อย		
	☐ ฝนปานกลาง ☐ ฝนหนัก		
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ		
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P90	1 nos
2	งานเจาะดิน	P87, P12, P37 และ P67	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P87, P12, P37 และ P67	1 nos
	งานทั่วไป		
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos


ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	4	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	52	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	86.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,008.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โพรแมน / ผู้ช่วยโพรแมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เเข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รปภ.	1 คน
	รวม	37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น :  ชื่อ : (นางสาวพธนา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : <u>นายพงศธร คุณพงษ์วิภาติ</u> ชื่อ : <u>วิศวกรสนามอาวุโส</u> (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : <u>10/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : <u>10/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานะ : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน	ผู้จ้าง / ตัวแทนผู้จ้าง	



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI


งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/049	วันที่ : 11 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสว่าง
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ ฝนปรำ ☐ เมฆมาก ☐ ฝนเล็กน้อย	
		☐ ฝนปานกลาง ☐ ฝนหนัก	
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย			
☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	หยุดการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์		

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	0	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ได้ทั้งหมด	52	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	0.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,008.50	m ³

บุคลากร			เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน	ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ผู้จัดการโครงการ	-	1	Survice Crane DH650	1 units
2	วิศวกรโครงการ	-	2	Welding Machine	3 units
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	-	3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	-	4	Drilling Crane KH180	1 units
5	ช่างสำรวจ	-	5	Tremie Pipe 10" / Tremie Pipe 8"	2 units
6	ช่างเหล็ก	-	6	Steel plate	123 units
7	คนงาน เข็มเจาะ	-	7	Bucket 0.8"	2 units
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	-	8	Bucket 0.6"	2 units
9	ช่างเชื่อม	-	9	Bentonite Tank	3 units
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	-	10	Survice Crane DH-300	1 units
11	พนักงานขับรถบริการ	-	11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	-	12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	แม่บ้าน	-	13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m., 0.6 m.	5 units
14	รถป.ก.	2 คน	14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	2 คน		รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพธนา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : ชื่อ : นายพชร อึ้งนงษ์วิภาดิ วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 11/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น : ชื่อ :  คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 11/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☒ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง : เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/050	วันที่ : 12 เมษายน 2569	
ผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน : พรณภา แสงสวาท		
จากปกติเวลา...08 : 00.....น ถึง...17 : 00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ☐	ปลอดภัย ☐ ☐ เมฆมาก ☐ ☐ ฝนเล็กน้อย ☐ ☐ ฝนปานกลาง ☐ ☐ ฝนหนัก ☐ ☐	
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศฯ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	หยุดการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์		

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	0	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	52	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	0.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,008.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	-
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	-
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	-
5	ช่างสำรวจ	-
6	ช่างเหล็ก	-
7	คนงาน เข็มเจาะ	-
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	-
9	ช่างเชื่อม	-
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	-
11	พนักงานขับรถบริการ	-
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	-
13	แม่บ้าน	-
14	รถปค.	2 คน
รวม		2 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ : (นางสาวพรณภา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : <u>นายพงศธร อนพวงษ์วิภาตี</u> ชื่อ : <u>วิศวกรสนามอาวุโส</u> (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : <u>16/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น : ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : <u>16/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ลำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง : เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/051	วันที่ : 13 เมษายน 2569	
ผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน : พริณดา แสงสว่าง		
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ☐	ปลอดภัย ☐ ☐ เหมามาก ☐ ☐ ฝนเล็กน้อย ☐ ☐ ฝนปานกลาง ☐ ☐ ฝนหนัก ☐ ☐	
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	หยุดการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์		

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	0	คัน	รวมจำนวนเสาเข็มที่ทำได้ทั้งหมด	52	คัน
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	0.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,008.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	-
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	-
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	-
5	ช่างสำรวจ	-
6	ช่างเหล็ก	-
7	คนงาน เข็มเจาะ	-
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	-
9	ช่างเชื่อม	-
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	-
11	พนักงานขับรถบริการ	-
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	-
13	แม่บ้าน	-
14	รถป.ก.	2 คน
รวม		2 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ : (นางสาวพริณดา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : ชื่อ : นายพงษ์ธร ขาวหงษ์วิจิตร วิศวกรควบคุมอาคาร (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 16/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น : ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 16/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง : เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/052	วันที่ : 14 เมษายน 2569	
ผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน : พรณภา แสงสวาท		
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ☐	ปลอดภัย ☐ ☐ เหมามาก ☐ ☐ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ☐ ☐ ฝนหนัก ☐ ☐	
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	หยุดการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์		

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	0	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ได้ทั้งหมด	52	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	0.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,008.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	-
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	-
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	-
5	ช่างสำรวจ	-
6	ช่างเหล็ก	-
7	คนงาน เข็มเจาะ	-
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	-
9	ช่างเชื่อม	-
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	-
11	พนักงานขับรถบริการ	-
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	-
13	แม่บ้าน	-
14	รปภ.	2 คน
รวม		2 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ : (นางสาวพรณภา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : ชื่อ : นายพงษ์ธร อึ้งอัมพรวิไล วิศวกรควบคุมงาน (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 16/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น : ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 16/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☒ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/053	วันที่ : 15 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสวาท
จากปกติเวลา...08 : 00.....น ถึง...17 : 00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ ฝนปรำปรำ ☐ ฝนแล้ง	ลม : ☐ ไม่มีลม ☐ ลมพัดแรง ☐ ลมพัดเบา
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	หยุดการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์		



ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	0	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มที่ทำได้ทั้งหมด	52	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	0.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,008.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	-
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	-
4	โพรแกรม / ผู้ช่วยโพรแกรม	-
5	ช่างสำรวจ	-
6	ช่างเหล็ก	-
7	คนงาน เข็มเจาะ	-
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	-
9	ช่างเชื่อม	-
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	-
11	พนักงานขับรถบริการ	-
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	-
13	แม่บ้าน	-
14	รถปค.	2 คน
รวม		2 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น :  ชื่อ : (นางสาวพธนา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น :  ชื่อ : (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 16/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 16/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☒ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/054	วันที่ : 16 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธกษา แสงสว่าง
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนฟ้าคะนอง ☐ ฝนปรปรวน ☐ ฝนแล้ง ☐ ฝนเล็กน้อย	ปิดโปรง ☐ เมฆมาก ☐ ฝนเล็กน้อย
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย		☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ	
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เซ็น	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P126, P66, P13 และ P38	1 nos
2	งานทดสอบเสาเข็มเจาะ Seismic test & Single shock test	P78, P51, P22, P21, P20, P17, P6, P6 และ P5	1 nos
	งานทั่วไป		
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	0	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มที่ทำได้ทั้งหมด	52	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	0.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,008.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรโครงสร้าง	1 คน
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รปภ.	1 คน
	รวม	37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพธกษา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : <u>นายพงศธร อนนพยัณห์ชาติ</u> ชื่อ : <u>วิศวกรสนามอาวุโส</u> (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : <u>16/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : <u>คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์</u> (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : <u>16/4/69</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/055	วันที่ : 17 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนภา แสงสวาท
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนตกโปรย ☐ เมฆมาก ☐ ฝนเล็กน้อย ☐ ฝนปานกลาง ☐ ฝนหนัก	
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P124 และ P98	1 nos
2	งานเจาะดิน	P126, P90 และ P38	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P126, P90 และ P38	1 nos
	งานทั่วไป		
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos

ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	3	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	55	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	52.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,060.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รถป.ก.	1 คน
	รวม	37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	123 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	147 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพธนภา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : นายพงศธร อนพวงษ์ชาติ ชื่อ : วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 17/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 17/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานะ : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/056	วันที่ : 18 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสว่าง
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ ฝนปรปรวน ☐ ฝนแล้ง	ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย		☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ	
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P61, P140, P53 และ P31	1 nos
2	งานเจาะดิน	P124, P66, P13 และ P61	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P124, P66, P13 และ P61	1 nos
งานทั่วไป			
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos


ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	4	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มที่ทำได้ทั้งหมด	59	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	75.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,135.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรโครงสร้าง	1 คน
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รถป.ก.	1 คน
รวม		37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Service Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	133 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Service Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		157 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพธนา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : ชื่อ : นายพงศกร อนพนธ์วิภา วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 18/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น : ชื่อ :  คุณสมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 18/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง : เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/057	วันที่ : 19 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พจนานาม แสงสาท
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ ฝนปรปรวน ☐ ฝนแล้ง	ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย ☐ ปลอดภัย

ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	หยุดงานประจำสัปดาห์ (Sunday Off)		


ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	0	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ทำได้ทั้งหมด	59	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	0.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,135.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	-
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	-
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	-
5	ช่างสำรวจ	-
6	ช่างเหล็ก	-
7	คนงาน เข็มเจาะ	-
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	-
9	ช่างเชื่อม	-
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	-
11	พนักงานขับรถบริการ	-
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	-
13	แม่บ้าน	-
14	รปภ.	2 คน
	รวม	2 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	133 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	157 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น :  ชื่อ : (นางสาวพจนาน แสงสาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น :  ชื่อ : นายพจนาน อนพนันภักดิ์ วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : <u>2014/169</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : <u>2014/169</u> บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
---	--	--

สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ว่าจ้าง / คัดแทนผู้ว่าจ้าง
--



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง : เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/058	วันที่ : 20 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน : พรณภา แสงสวาท	
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น	สภาพอากาศ : ☒ ฝนตก ☐ ฝนปรอย ☐ เมฆมาก ☐ ฝนเล็กน้อย	
	☐ ฝนปานกลาง ☐ ฝนหนัก	

ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P39, P86, P139 และ P26	1 nos
2	งานเจาะดิน	P98, P140, P53 และ P39	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P98, P140, P53 และ P39	1 nos
	งานทั่วไป		
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos


ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	4	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มเจาะที่ได้ทั้งหมด	63	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	76.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,211.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รปค.	1 คน
	รวม	37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	133 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
	รวม	157 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพรณภา แสงสวาท) วิศวกรสนาม บริษัท สยามโทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : ชื่อ : นายพงศธร อนพนงษ์ภักดี วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 20/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น :  ชื่อ : คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 20/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานะ : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



รายงานการทำงานประจำวัน (Daily Report)

โครงการ : SUPALAI SENSE CHAENGWATTANA-LAKSI

งานก่อสร้าง :	เสาเข็มเจาะ	เลขที่ : STC/SPL/3086/DRP/059	วันที่ : 21 เมษายน 2569
ผู้รับจ้าง :	บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ผู้รายงาน	พธนา แสงสว่าง
จากปกติเวลา...08:00.....น ถึง...17:00.....น		สภาพอากาศ : ☒ ฝน	ปลอดภัย ☐ เหมะมาก ☐ ฝนเล็กน้อย ☐ ☐ ฝนปานกลาง ☐ ฝนหนัก ☐
ประเภทงาน : ☐ งานโครงสร้าง ☐ งานสถาปัตยกรรม ☐ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ☐ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ☐ งานระบบปรับอากาศ ☒ งานเข็มเจาะ			
ลำดับ	รายละเอียดของงาน	เบอร์เข็ม	ปริมาณงาน
1	งานวางหมุดและกด Casing	P59, P137, P91 และ P15	1 nos
2	งานเจาะดิน	P139, P86, P31 และ P59	1 nos
3	งานเทคอนกรีตเสาเข็ม	P139, P86, P31 และ P59	1 nos
งานทั่วไป			
1	งานผูกมัดเหล็ก		1 nos
2	งานขนย้ายดิน		1 nos
3	งานไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ		1 nos


ปริมาณงาน

จำนวนเสาเข็มที่เจาะได้	4	ต้น	รวมจำนวนเสาเข็มที่ทำได้ทั้งหมด	67	ต้น
ปริมาณคอนกรีตที่ใช้	75.00	m ³	รวมปริมาณคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด	1,286.50	m ³

บุคลากร		
ลำดับ	รายการ	จำนวนคน
1	ผู้จัดการโครงการ	1 คน
2	วิศวกรโครงการ	-
3	สถาปนิก / วิศวกรไซต์งาน	1 คน
4	โฟร์แมน / ผู้ช่วยโฟร์แมน	3 คน
5	ช่างสำรวจ	3 คน
6	ช่างเหล็ก	5 คน
7	คนงาน เข็มเจาะ	9 คน
8	พนักงานควบคุมเครื่องจักร	5 คน
9	ช่างเชื่อม	2 คน
10	ช่างซ่อมเครื่องยนต์/ช่างไฟฟ้า	2 คน
11	พนักงานขับรถบริการ	3 คน
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety	1 คน
13	แม่บ้าน	1 คน
14	รถป.ก.	1 คน
รวม		37 คน

เครื่องจักร		
ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	Survice Crane DH650	1 units
2	Welding Machine	3 units
3	Excavator PC200-15, zaxis 200	1 units
4	Drilling Crane KH180	1 units
5	Tremie Pipe 10" /Tremie Pipe 8"	2 units
6	Steel plate	133 units
7	Bucket 0.8"	2 units
8	Bucket 0.6"	2 units
9	Bentonite Tank	3 units
10	Survice Crane DH-300	1 units
11	Generator DCA150SPK 150Kva	1 units
12	Generator DCA220SPM 220Kva	1 units
13	Casing pipe 14 m Dai. 0.8 m.,0.6 m.	5 units
14	Drilling Crane MX6515B	1 units
รวม		157 units

☐ หมายเหตุอุปสรรคในการทำงาน

ลายเซ็น : ชื่อ :  (นางสาวพธนา แสงสว่าง) วิศวกรสนาม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด	ลายเซ็น : ชื่อ : นายพงศธร อนพงษ์วิชาติ วิศวกรสนามอาวุโส (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ : 21/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ลายเซ็น : ชื่อ :  คุณคมสันต์ บรรณศาสตร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) วันที่ : 21/4/69 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สำเนา : ☐ ผู้รับจ้าง ☐ ผู้ควบคุมงาน ☐ ผู้ว่าจ้าง / ตัวแทนผู้ว่าจ้าง		



ภาคผนวกที่ 10
ใบอนุญาตผู้ควบคุมเครน



บริษัท เอสพี เอ็มเอส จำกัด

มอบหมายให้จัดทำ

นาย สุวิทย์ เทพยศ

บริษัท เอสพี เอ็มเอส จำกัด

จัดทำเอกสารมอบหมาย

มอบหมายให้จัดทำ (๑ ฉบับ)

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามข้อที่ ๑๒ แห่งกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน การ คุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และอาชีวอนามัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นสูบลม และหม้อต้ม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ให้อำนาจและวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา
ผู้ให้สัญญาฉบับนี้ขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ให้ใช้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นาย อรรถวิทย์ ชื่นศิริ พงษ์

กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ



บริษัท เอสพี เอ็นvironment แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มอบสมุดคู่มือให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย นพพร เกษสุโขทัย

บริษัท เอสพี เอ็นvironment จำกัด

ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตร

บทบาทการทางเทคนิคขั้นสูง (๑ ชั่วโมง)

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามข้อที่ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงว่าพหุสมรรถนะในการบริหาร จัดการ และดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานและวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และการอบรมทางวิชาการทางเกี่ยวกับขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นาย อรรถวิษฐ์ ชาติศิริพจน์

กรรมการผู้จัดการและฝ่ายการ

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย คุณ ดวงศรี

ได้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกอบรมกวนการดำเนินงานเกี่ยวกับปิ่นจั้น

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ (จำนวน ๖ ชั่วโมง)

สถานที่ตั้งในการฝึกอบรม ณ เลขที่ ๓๓๓/๒๕๘ หมู่ที่ ๒ ซอยกิ่งแก้ว ๑๔/๑ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ตามข้อที่ ๗๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปืนจั้น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปิ่นจั้น ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับปิ่นจั้น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปิ่นจั้น และการฝึกอบรมทวนการทำงานเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับปิ่นจั้น
(ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗)


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

นายทวีศักดิ์ ภัทรมานนท์

รองประธานกรรมการ



SRL CONSTRUCTION CO., LTD.

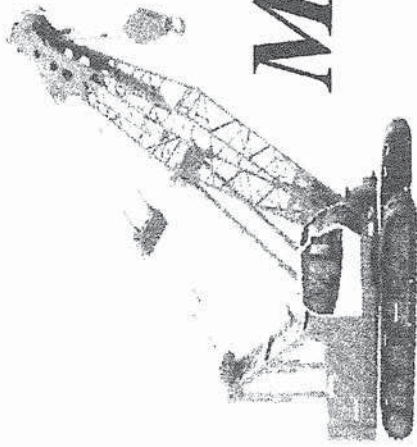

This is to certify that
นายวุฒิธรศักดิ์

Mr. Prasan Khamkhayai

has successfully completed

ผ่านการสอบหลักสูตร การรื้อถอน ผู้ควบคุมการรื้อถอนเป็นเจ้าหน้าที่สัญญากร
ผู้รับผิดชอบ และ ผู้จัดการวัสดุ

Training Course for Supervisor & CRANE SIGNALMAN-SAFE RIGGING

ตามเอกสารแจ้งการรื้อถอน 450 ระยะเวลาดำเนินการรื้อถอน 18 ชั่วโมง / 18 hrs.

สำเร็จการอบรมระหว่าง วันที่ 09-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 / On 09-11 / Feb / 2023

Prasan



Mrs. Prasan Khamkhayai จ.ป. วิศวกร ผู้ควบคุม (MC)
สัญญากร (TRAINING) SRL



ACH-CER No. MC/SRL/02055/FRB-2023



ภาคผนวกที่ 11
แผนงานความปลอดภัย



Item	แผนและกิจกรรม / Safety Activity	ผู้รับผิดชอบ	กุมภาพันธ์ 2569		มีนาคม 2568		เมษายน 2568		พฤษภาคม 2569		Remark	
			3	4	1	2	3	4	1	2		3
1	การจัดการด้านความปลอดภัย											
	1.1 แผนงานด้านความปลอดภัย	จป.										เริ่มโครงการ
	1.2 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (JSA)	จป.										เริ่มโครงการ
	1.3 คู่มือความปลอดภัย / ประกาศคำสั่งด้านความปลอดภัย	จป.										เริ่มโครงการ
2	การประชุมพนักงานด้านความปลอดภัย											
	2.1 กิจกรรมสนทนาพูดคุยด้านความปลอดภัย ก่อนเริ่มงาน (Morning Talk)	จป./หัวหน้างาน										ทุกสัปดาห์
	2.2 ประชุมโครงการฯ ประจำสัปดาห์	จป.ผู้ที่เกี่ยวข้อง										ทุกสัปดาห์
3	การสำรวจและการตรวจด้านความปลอดภัย											
	3.1 ตรวจสอบเครื่องจักรหนักประจำปีโครงการ (ปจ.2)	วิศวกรหน่วยงานภายนอก										เริ่มโครงการ/ทุก ๆ 3 เดือน
	3.2 ตรวจสอบความปลอดภัยฯ ของเครื่องจักรประจำวัน	แต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง										ทุกวัน
	3.3 ใบอนุญาตของพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร	จป.										เริ่มโครงการ
	3.4 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรเกี่ยวกับทำงาน	แต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง										ทุก ๆ 1 เดือน
4	สภาพแวดล้อม											
	4.1 รถเข้าออกทุกคัน ต้องล้างล้อ ก่อนออกจาก Site งาน	แต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง										ทุกวัน
	4.2 อำนาจความสะดวก การจราจร ภายใน Site งาน	แต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง										ทุกวัน
	4.3 จัดให้มีการทำความสะอาดทางตามความเหมาะสม	แต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง										ทุกวัน
5	บ้านข้างเคียง และมวลชนสัมพันธ์											
	5.1 การเข้าสำรวจสภาพบ้าน / สิ่งปลูกสร้าง ข้างเคียงก่อนก่อสร้าง ช่วงดำเนินการก่อสร้าง หลังก่อสร้าง	จป.										ทุกสัปดาห์
	5.2 เติมน้ำมันสัมพันธ์	จป.										ทุกสัปดาห์

ผู้จัดทำ :(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)

อนุมัติ :ผู้จัดการ

(.....)



ภาคผนวกที่ 12
เบอร์ติคต่ออุกเหิน

SIAM TONE CO., LTD.

5/15 Moo 6 (km 15) Bangna-Trad
Road Bangchalong
BangpleeSamutprakarn 10540



บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด

5/15 หมู่ 6 (กม.15) ถนน บางนา-ตราด
ต.บางโหลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ อุกฉุณ

กรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน ติดต่อบุคคล ดังต่อไปนี้

บริษัท สยามโทเนะ จำกัด

นายประยูร	ภูธราดล	Project Manager	093 - 749 - 1889
นายทรงกลด	กนกนาค	Safety Officer	098 - 973 - 9423
นางสาวพรนภา	แสงสวาท	Engineer	062 - 408 - 7449
นายสุทัศน์	สีลาเหลี่ยม	Foreman	092 - 254 - 1244
นายอมตะ	อังกาบ	Foreman	096 - 382 - 9698

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือ เหตุอุกฉุณ ให้ติดต่อบุคคล ดังต่อไปนี้


นายประยูร	ภูธราดล	Project Manager	093 - 749 - 1889
นายทรงกลด	กนกนาค	Safety Officer	098 - 973 - 9423
นางสาวพรนภา	แสงสวาท	Engineer	062 - 408 - 7449
นายสุทัศน์	สีลาเหลี่ยม	Foreman	092 - 254 - 1244
นายอมตะ	อังกาบ	Foreman	096 - 382 - 9698

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือ อุกฉุณ ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

สายด่วนกู้ชีพและการแพทย์	1669
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ	02 - 574 - 5000
สายด่วนดับเพลิง	199
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน	02 - 521 - 0397
สายด่วนสถานีตำรวจ	191
สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง	02 - 574 - 6465



ภาคผนวกที่ 13
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

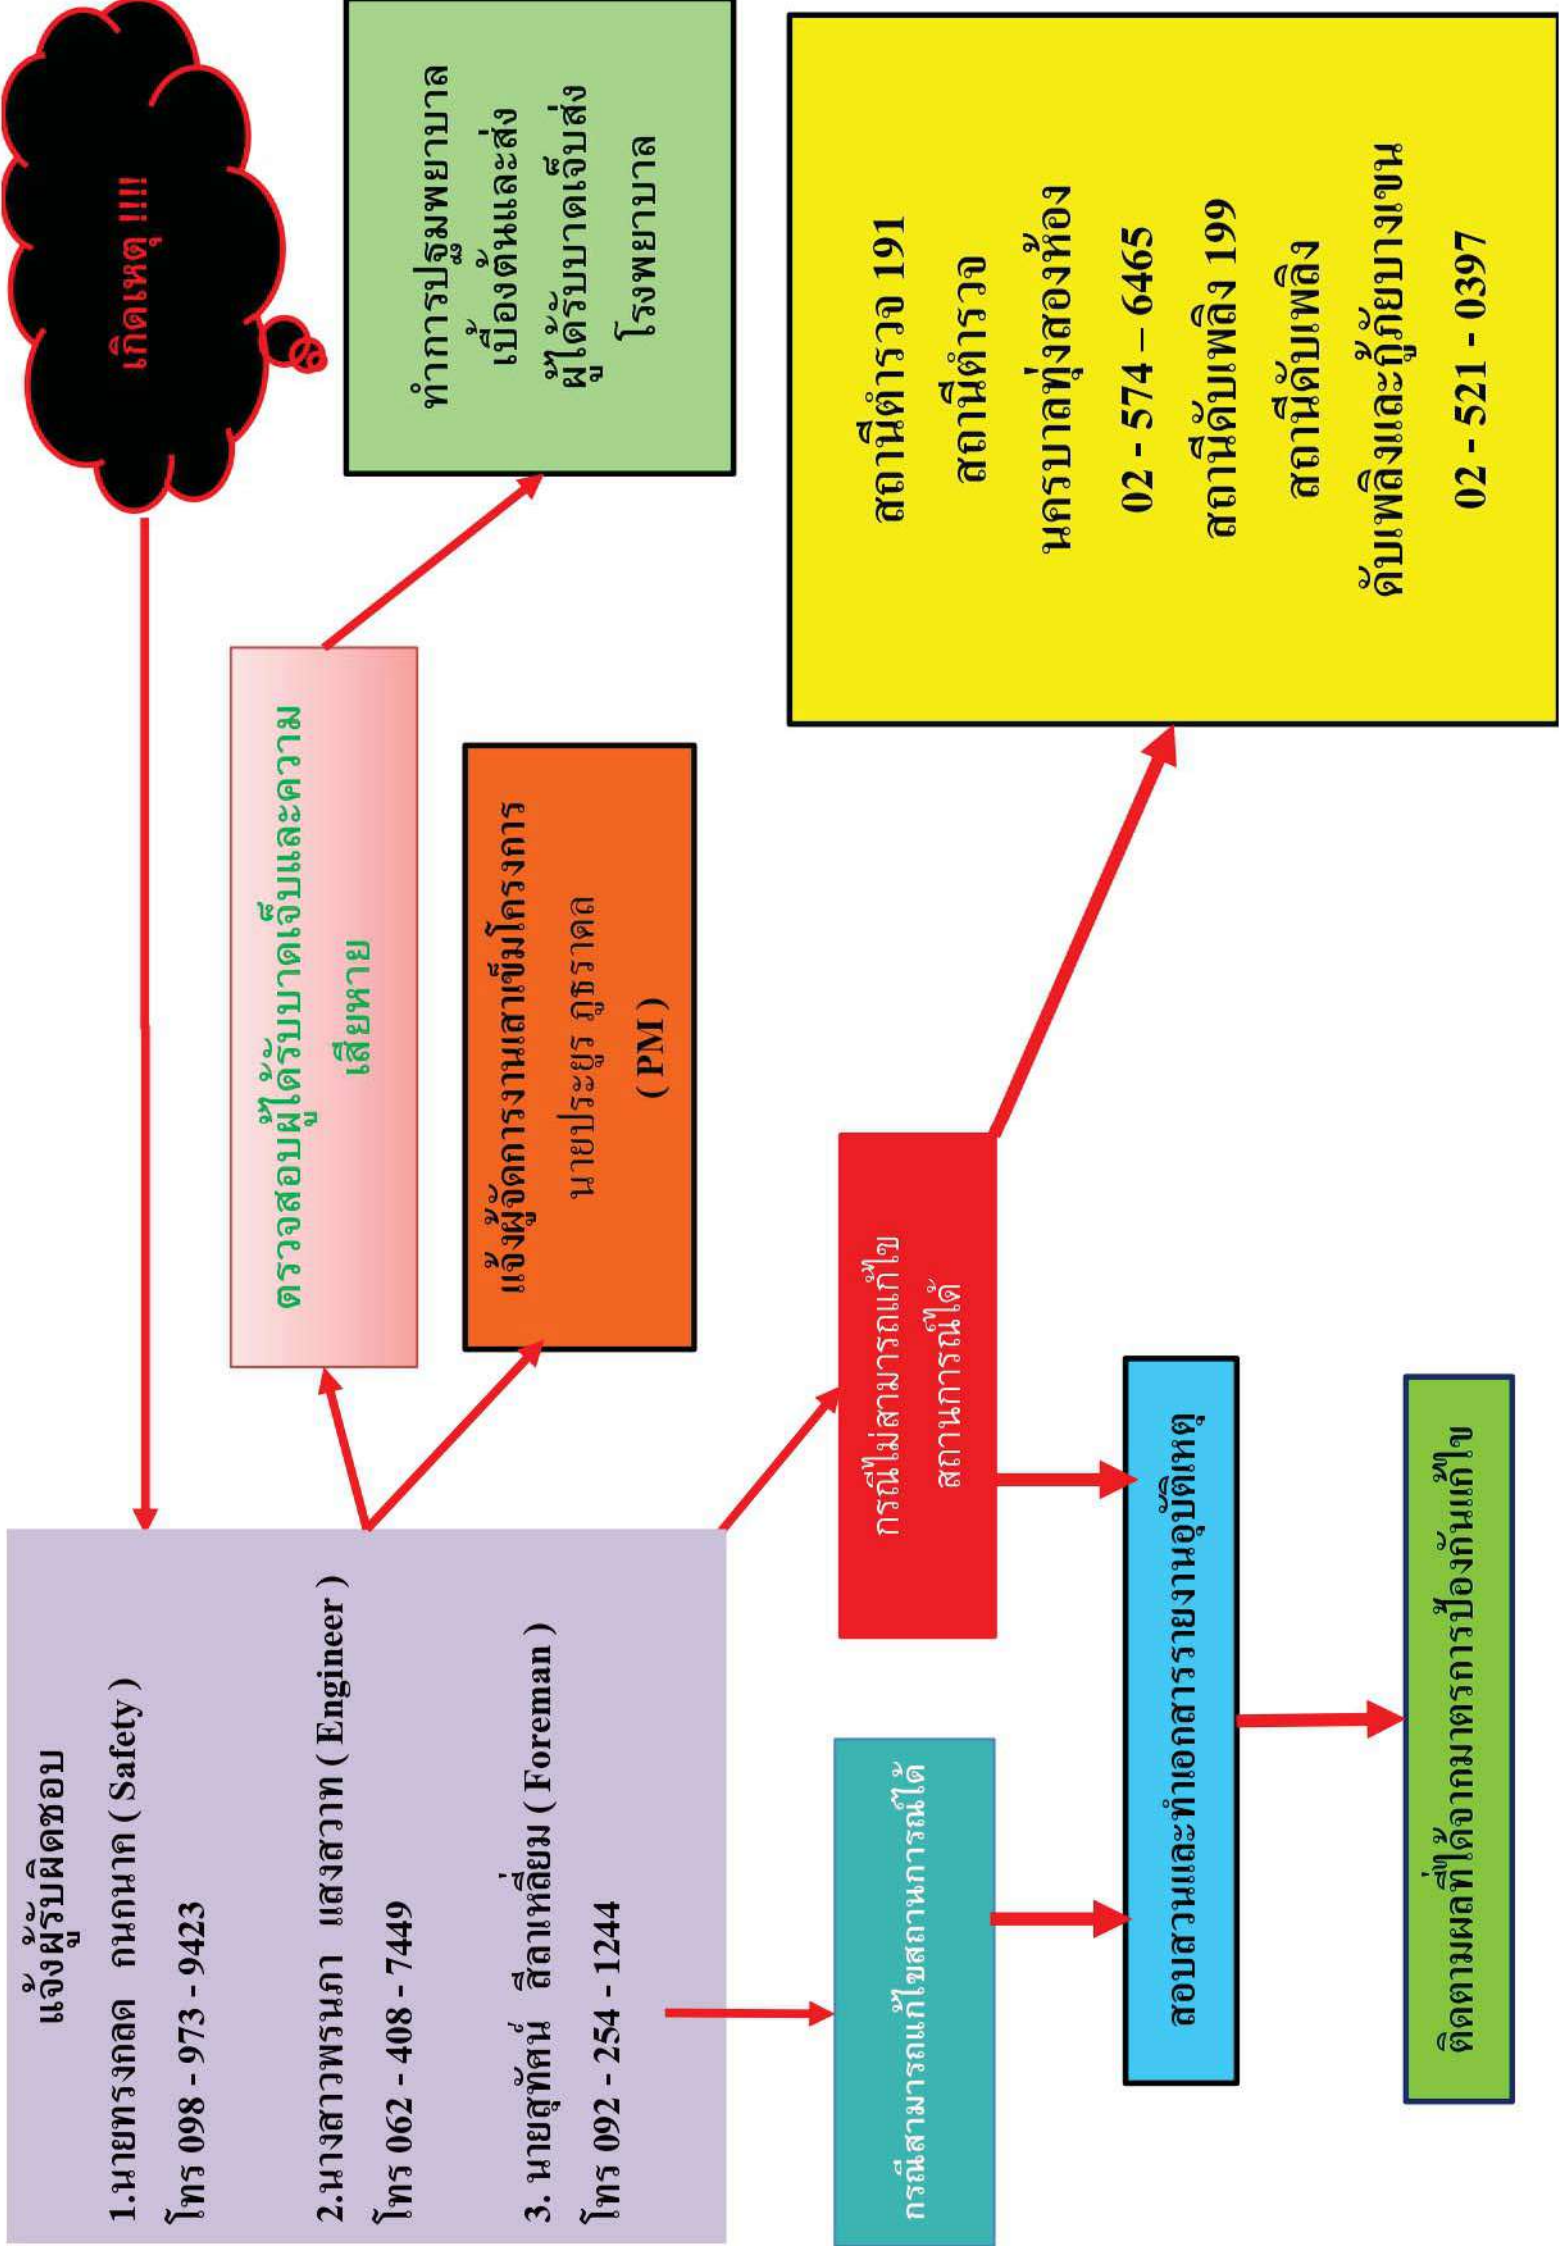



ภาคผนวกที่ 14
แผนงานการก่อสร้าง

[illegible]



ภาคผนวกที่ 15

ชี้แจงผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน



บริษัท สยามโทเน จำกัด

Siam Tone Co., Ltd.

15 หมู่ 6 (กม. 15) ถ. บางนา-ตราด ต. บางโกลน อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทร. 312-5281-300 โทรสาร 312-5304, 750-8597

15 Moo 6 (km. 15) Bangna-Trad Rd. Bangchalong, Bangplee Samutprakarn 10540 Tel. 312-5281-300 Fax. 312-5304, 750-8597

บันทึก
MEMORANDUM

วันที่ 30 มกราคม 2569

โครงการ สุกาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ - หลักสี่
เรื่อง ขี้เถ้าฝุ่น TSP , PM - 10 และ PM - 2.5 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
เรียน บริษัท เอ็น ไวลีบ จำกัด (EVL)
จาก คุณทรงกลด กนกนาค บริษัท สยามโทเน จำกัด (STC)

ตามที่บริษัท สยามโทเน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการให้ทำการก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ
โครงการ สุกาลัย เซนส์ แจ้งวัฒนะ - หลักสี่ ขอชี้แจงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่น TSP , PM - 10 และ PM - 2.5 ที่ส่งผลให้มีค่า
เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน มีกิจกรรมงานย้ายของภายในโครงการและงานเจาะและเทคอนกรีตเสาเข็มงานเจาะเสาเข็ม (Wet Process)

โดยมีรายละเอียดวันที่ค่าฝุ่น TSP , PM - 10 และ PM - 2.5 ที่ส่งผลให้มีค่าเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานดังนี้

1. วันที่ 21 - 22 เมษายน 2569 ค่า TSP = 0.296 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร
2. วันที่ 21 - 22 เมษายน 2569 ค่า PM - 10 = 0.115 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร
3. วันที่ 21 - 22 เมษายน 2569 ค่า PM - 2.5 = 50.9 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร

ซึ่งต่อจากนี้ทีมงานเสาเข็มจะทำงานอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดโดยทางทางเราได้จัดทำและแก้ไขดังต่อไปนี้

โดยมีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้

1. จัดกิจกรรม Moring Talk และ กิจกรรม KYT กับคนขับเครื่องและผู้เกี่ยวข้อง
2. ช่วงเวลาเจาะและเทคอนกรีตจะระมัดระวังการทำงานที่ทำให้เกิดฝุ่น จัดให้มีพรมน้ำตามช่วงเวลา
3. ภายในโครงการจัดให้มีสปริงเกอร์รดน้ำรอบโครงการ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ทรงกลด กนกนาค)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
หน่วยงานเสาเข็มเจาะบริษัท สยาม โทเน จำกัด



15 หมู่ 6 (กม. 15) ถ. บางนา-ตราด ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทร. 312-5281-300 โทรสาร 312-5304, 750-8597

15 Moo 6 (km. 15) Bangna-Trad Rd. Bangchalong, Bangplee Samutprakam 10540 Tel. 312-5281-300 Fax. 312-5304, 750-8597



จัดกิจกรรม Morning Talk และ กิจกรรม KYT กับคนขับเครื่องและผู้เกี่ยวข้อง



15 หมู่ 6 (กม. 15) อ. บางนา-ตราด ต. บางโคก อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทร. 312-5281-300 โทรสาร 312-5304, 750-8597

15 Moo 6 (km. 15) Bangna-Trad Rd. Bangchalong, Bangplee Samutprakarn 10540 Tel. 312-5281-300 Fax. 312-5304, 750-8597




ช่วงเวลาเจาะและเทคอนกรีตจะระมัดระวังการทำงานที่ทำให้เกิดฝุ่น จัดให้มีรถพรมน้ำตามช่วงเวลา



15 หมู่ 6 (กม. 15) ถ. บางนา-ตราด ต. บางโคลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทร. 312-5281-300 โทรสาร 312-5304, 750-8597

15 Moo 6 (km. 15) Bangna-Trad Rd. Bangchalong, Bangplee Samutprakam 10540 Tel. 312-5281-300 Fax. 312-5304, 750-8597

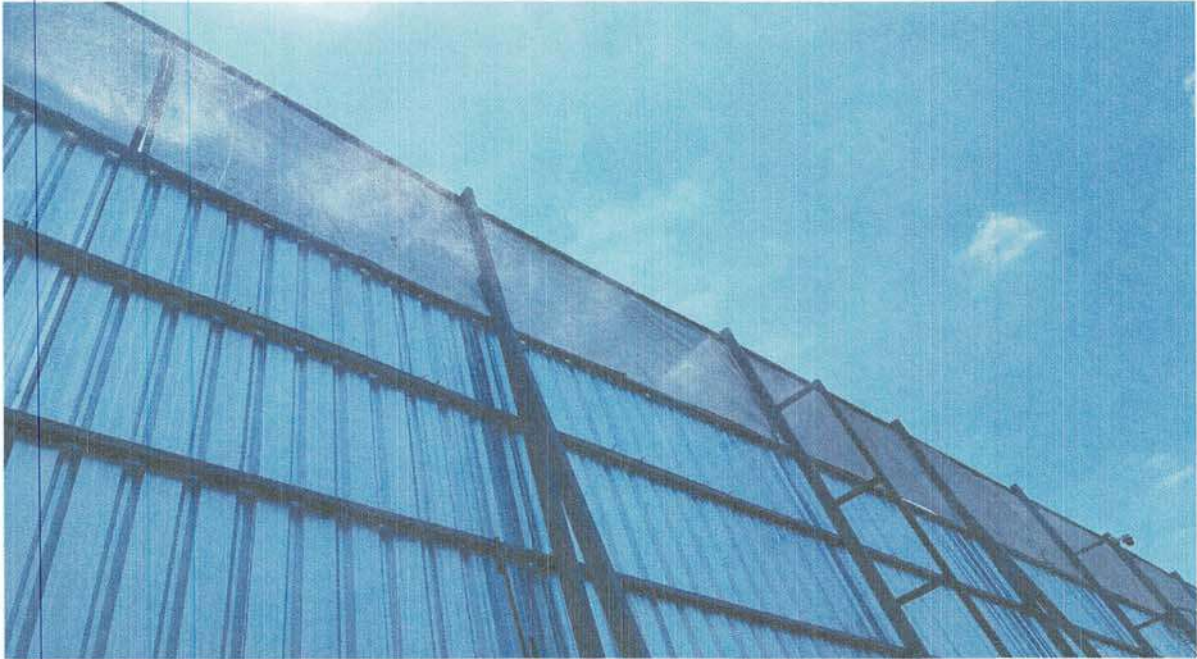

เอกสารแจ้งเวลาพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นภายในโครงการ

ระบบแบบ สปริงเกอร์ รอบรั้วชั่วคราวของโครงการ			
ครั้งที่	ช่วงเวลา	จำนวนนาที	หมายเหตุ
1	09.00 - 09.10	10 นาที	ตลอดแนวรั้วชั่วคราวของโครงการ
2	11.30 - 11.40	10 นาที	ตลอดแนวรั้วชั่วคราวของโครงการ
3	14.00 - 14.10	10 นาที	ตลอดแนวรั้วชั่วคราวของโครงการ
4	16.00 - 16.10	10 นาที	ตลอดแนวรั้วชั่วคราวของโครงการ

ด้านนอกเมื่อช่วงเวลาที่มีกิจกรรมทำให้เกิดฝุ่นค่อข้างเยอะ ทางเราจะมีเปิดพ่นน้ำตามตารางจะเปิดครั้งละ 20 นาที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นายทรงกลด กนกนาค)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
หน่วยงานเสนาี่ยมเจอะบริษัท สยามโพนะ จำกัด

ภายในโครงการจัดให้มีสปริงเกอร์รดน้ำ รอบโครงการ





ภาคผนวกที่ 16
เอกสารการใช้สถานที่



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ที่ E-MNT-690012

อ้างอิงเลขที่ HO2600005

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฉะเชิงเทรา

ตามที่ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ สุภาลัย เซนส์-หลักสี่ (Supalai Sense Changwattana-laksi)

ดังนั้น ทางบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจวัด จำนวน 20 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งเครื่องตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงงานโครงสร้างอาคาร (ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเดือน) โดยเริ่มระหว่างเดือน มีนาคม 2569 – กันยายน 2570 โดยมีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังรายการต่อไปนี้

- 1.เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP)
- 2.เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- 3.เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
- 4.เครื่องวัดปริมาณก๊าซ
- 5.เครื่องวัดระดับเสียง
- 6.เครื่องตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์

ทั้งนี้ ค่ากระแสไฟฟ้าและสถานที่ ทางบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยินดีจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและสถานที่ ที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัด ช่วงงานโครงสร้างอาคาร (ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเดือน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(คมกิต วัฒน สำโรงแสง)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

ผู้ตรวจสอบเอกสาร

(นางสาวกัลย์สุดา มานะ)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

หนังสือตอบรับการขออนุญาตติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

ผลอนุมัติการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม .

(✓) อนุมัติ ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

() ไม่อนุมัติ ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก



ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(**ช.ดาชัย แก้วใส**)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ

เมื่อท่านกรอกข้อมูลในหนังสือตอบรับเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้รับทราบด้วย
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ที่ E-MNT-690012

อ้างอิงเลขที่ HO2600005

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป

เรียน เจ้าอาวาสวัดหลักสี่

ตามที่ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ สุภาลัย เซนส์-หลักสี่ (Supalai Sense Changwattana-laksi)

ดังนั้น ทางบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจวัด จำนวน 20 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งเครื่องตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงงานโครงสร้างอาคาร (ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเดือน) โดยเริ่มระหว่างเดือน มีนาคม 2569 – กันยายน 2570 โดยมีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังรายการต่อไปนี้

- 1.เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP)
- 2.เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- 3.เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
- 4.เครื่องวัดปริมาณก๊าซ
- 5.เครื่องวัดระดับเสียง
- 6.เครื่องตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์

ทั้งนี้ ค่ากระแสไฟฟ้าและสถานที่ ทางบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยินดีจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและสถานที่ ที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัด ช่วงงานโครงสร้างอาคาร (ดำเนินการตรวจวัดตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเดือน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท ต่อเดือน (หนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(คมวิวัฒน์ สำโรงแสง)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

หนังสือตอบรับการขออนุญาตติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวเล็ป จำกัด

ผลอนุมัติการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(/) อนุมัติ ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

() ไม่อนุมัติ ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก

.....

ตราประทับสำคัญ(ถ้ามี)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
()
เจ้าอาวาสวัดหลักดี
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

เมื่อท่านกรอกข้อมูลในหนังสือตอบรับเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย
บริษัท เอ็นไวเล็ป จำกัด ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้



ภาคผนวกที่ 17
ทะเบียนประวัติคนงาน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง	วันเริ่มงาน
1	4251	นาย	สุขเกษม	ทองศรี	โพรแมน	09/04/2561
2	6700/M	นาย	สุทัศน์	สีลาเหลียม	ผช.โพรแมน	27/03/2564
3	4518	นาย	สุเมศ	มนกลม	เซอร์เวย์	26/02/2567
4	6534/M	นาย	สงกรานต์	อินทร์แก้ว	ช่างเชื่อม	30/07/2568
5	4311	นาย	แพน	เดชสูงเนิน	ขับเครน	23/08/2545
6	4562	นาย	ชัชวาล	อินตา	ช่างไฟฟ้า	11/07/2566
7	6346/M	นาย	สมนึก	ฤกษ์โอภาส	คนงาน	04/05/2565
8	6710/M	นาย	จักรี	ศรีพลเรือน	พนักงานขับรถ	22/05/2568
9	8056	นาย	สถิต	พันธ์กัน	แมคคานิค	07/11/2550
10	6751	นางสาว	เพ็ญศิริ	สั่งสอน	คนงาน	01/03/2569
11	6750	นางสาว	ไพรินทร์	เจริญจิมี	คนงาน	01/03/2569



ภาคผนวกที่ 18

Green List



บัญชีสีเขียว

Green List

รทหมายเลขทะเบียน

40-1961

นนทบุรี

ขึ้นทะเบียนบัญชีสีเขียว ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
(วันหมดอายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนบัญชีสีเขียว วันที่ 30 กันยายน 2569)

(นายธัชชาติ สิริพิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Print Certificate

Return to Dashboard



บัญชีสีเขียว

Green List

รทหมายเลขทะเบียน

33-8157

กรุงเทพมหานคร

ขึ้นทะเบียนบัญชีสีเขียว ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
(วันหมดอายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนบัญชีสีเขียว วันที่ 30 กันยายน 2569)

(นายอิชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Print Certificate

Return to Dashboard
