

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง	แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ชื่อโครงการ	ไทดีดีลักซ์ ซอยสุขุมวิท 34
สถานที่ตั้งโครงการ	14 ซอยสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของโครงการ	บริษัท ทองหล่อสปีด จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	427/4 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
วันที่เก็บตัวอย่าง	21 พฤษภาคม 2569

3.1 บันทึกผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้ง โดยเก็บตัวอย่างจากบริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อน
เข้าระบบและจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้ง

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้ง โดยดัชนีที่ทำการตรวจวัดเป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด		
	น้ำเข้าระบบน้ำเสีย	น้ำออกระบบน้ำเสีย	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾
pH	6.6	6.7	5.5 – 9.0
Total Dissolved Solids	524	230	≤ 1,000
Total Suspended Solids	66	22	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	56	14	≤ 30
Sulfide	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	61.60	26.60	≤ 35
Oil & Grease	<5	<5	≤ 20
Settleable Solids	0.3	0.0	-
Total Coliform Bacteria	2.1×10^4	3.5×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	1.7×10^4	2.4×10^3	-
Appearance	สีเหลืองขุ่นมีตะกอน	สีเหลืองใส	-

⁽¹⁾ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

การดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย




ภาพที่ 3.2-1 การดูแลระบบบำบัด

การจัดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัด และน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 3.2-1(1) เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดโครงการส่งตรวจสอบ

การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

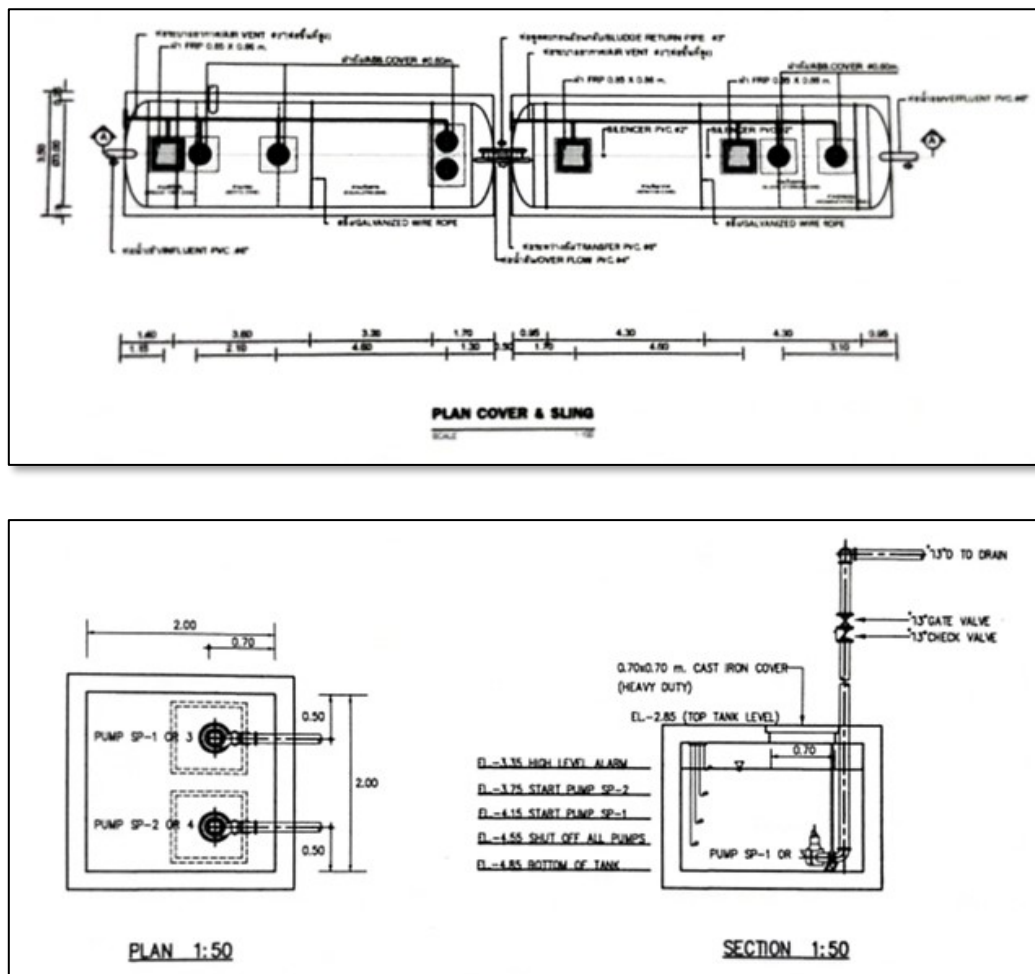

ภาพที่ 3.2-2 การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

อัปเดตสถานะบำรุงรักษา

- 03/06/2562 เปลี่ยนลูกปืนปั๊มและซีล PUMP SP-1 : สถานะปกติ
- 09/04/2562 สูบปล่อยไขมัน บ่อบำบัด และบ่อเกรอะ โดยเขตกลองเตย : สถานะปกติ
- 31/03/2562 ลอกท่อระบายน้ำตักตะกอนบ่อกัก : สถานะปกติ
- 29/07/2562 ตรวจเช็คการทำงาน PUMP SP-1 Overload : สถานะปกติ
- 07/10/2562 ติดตั้ง PUMP SP-1 ตัวใหม่เนื่องจากตัวเก่าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ : สถานะปกติ
- 11/02/2562 เปลี่ยนลูกลอย PUMP SP-1 และ SP-2 เนื่องจากตัวเก่าสายชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ : สถานะปกติ
- 02/03/2564 บำรุงรักษาระบบบ่อบำบัด ติดตั้งปั๊มใหม่ 2 ตัว พร้อมทั้งเปลี่ยนไคตใหม่ทั้งหมดพร้อมสูบล้างไขมัน บ่อบำบัด และบ่อเกรอะ : สถานะปกติ
- 13/09/2567 บำรุงรักษาระบบบ่อบำบัด ติดตั้งปั๊มใหม่ 1 ตัว : สถานะปกติ
