

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ

บริษัท แบริฟิค แลบบอราตอรี จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงแรมเบญจสิริ อัลไลแอนซ์ (Benchasiri Alliance Hotel) ของบริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด ด้านต่าง ๆ ได้แก่

- 1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบด้วย ภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และทรัพยากรน้ำ
- 2) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ทรัพยากรชีวภาพบนบก และ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
- 3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย การใช้น้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย พลังงานและไฟฟ้า การระบายอากาศ การคมนาคมขนส่ง/การจราจร การสื่อสาร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- 4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจสังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ และสุนทรียภาพ การป้องกัน อนุรักษ์และความปลอดภัยสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงลมและบดบังแสงพระอาทิตย์

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โรงแรมเบญจสิริ อัลไลแอนซ์ (Benchasiri Alliance Hotel) ของบริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด ในระหว่าง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-2

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป			
โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเบญจสิริ อัลไลแอนซ์ (Benchasiri Alliance Hotel) ของบริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการโรงแรม จำนวน 311 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 27,622 ตารางเมตร ดำเนินการบนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 24.6 ตารางวา (2,898.40 ตารางเมตร) ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารโรงแรมสูง 37 ชั้น และชั้นใต้ดิน 7 ชั้น จำนวน 1 อาคารจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเบญจสิริ อัลไลแอนซ์ (Benchasiri Alliance Hotel) ของบริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด อย่างเคร่งครัด	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 เดือนมกราคม – มิถุนายน	-	-
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้	- เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ	-	- รูปที่ 2-1
2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับเจ้าของสิทธิรายใหม่ (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของสิทธิรายใหม่ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดหากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าของโครงการให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาทางหรือมาตรการในการแก้ไข	- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารข้างเคียง กรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-1
6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้าง	- โครงการมีการแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งรายหลักและรายย่อยให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ			
การประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการในระยะประชิดติดโครงการ และระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย สถานีดับเพลิงคลองเตย และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน			
1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร และนำส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการให้กับอาคารในพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเปิดใช้อาคาร	- เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีการเปิดใช้อาคาร	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 ภูมิประเทศ			
1. การก่อสร้างอาคารและรายละเอียดต่างๆ ภายในโครงการ จะต้องดำเนินการตามแบบที่เสนอไว้ในรายงานฯ เท่านั้น	- โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแบบที่เสนอไว้ในรายงานฯ	-	- ภาคผนวกที่ 1-1
2. จัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 เมตร บริเวณรอบแนวเขต พื้นที่ก่อสร้าง และปิดคลุมรอบตัวอาคารด้วยผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามตลอดแนวด้านข้างและความสูง ของอาคารที่กำลังก่อสร้าง	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 เมตร บริเวณรอบแนวเขต พื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet รอบตัวอาคารขณะ ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-16
3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างอาคาร และการวาง กองวัสดุก่อสร้าง จำกัดเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของ โครงการเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตลอดจน ก่อสร้างอาคารในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-4
4. การขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง ต้องจัดให้มีที่ค้ำยัน หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและต้องตรวจสอบการค้ำยัน และ ฐานรากให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ	- กิจกรรมการขุดดินในบริเวณที่ใกล้อาคาร ถนน หรือกำแพง โครงการ ได้จัดให้มีที่ค้ำยัน และฐานรากเสริมเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งมีวิศวกร ทำหน้าที่ตรวจสอบค้ำยัน และฐานรากให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัย อยู่เสมอ ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการ ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร กิจกรรมช่วง งานดินดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-6
5. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ ก่อสร้างที่เหมาะสมโดยเฉพาะงานฐานรากและงาน โครงสร้างหลัก รวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการ ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการก่อสร้างที่เหมาะสม ตามกฎกระทรวง อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดิน			
1. จัดตั้งรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำรั้วที่ชั่วคราว ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-2
2. ก่อนที่จะขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำฐานรากของอาคารให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งและจัดให้มีการสำรวจสภาพรั้ว กำแพงตัวอาคารบ้านพักอาศัยข้างเคียง และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย โดยจะแจ้งกำหนดการเข้าสำรวจแก่บ้าน/อาคารข้างเคียงที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งและสำรวจสภาพรั้ว กำแพง ตัวอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียง และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารข้างเคียงกรณีที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-3 - ภาคผนวกที่ 2-4
3. จัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงไดอะแฟรม (Diaphragm wall) และปลายกำแพงไดอะแฟรมอยู่ที่ระดับ-30.00 เมตร โดยก่อสร้างด้วยระบบ Bottom-up และใช้เหล็ก H-Beam เป็นค้ำยันชั่วคราวในระหว่างการขุดดิน	- โครงการติดตั้งกำแพงกันดินเป็นกำแพงไดอะแฟรม (Diaphragm wall) ในช่วงงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร กิจกรรมช่วงงานดินดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7
4. การขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนน หรือกำแพง ต้องจัดให้มีที่ค้ำยัน หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบการค้ำยันและฐานรากให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ	- โครงการติดตั้งกำแพงกันดินเป็นกำแพงไดอะแฟรม (Diaphragm wall) และค้ำยันในช่วงงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร กิจกรรมช่วงงานดินดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-7

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)			
5. ดินที่ขุดออกเพื่อวางฐานราก ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบห่างจากคูระบายน้ำชั่วคราว	- ดินที่เกิดจากกิจกรรมงานดินและงานระบบสาธารณูปโภคชั้นใต้ดิน โครงการเก็บกองไว้ในพื้นที่ห่างจากคูระบายน้ำ (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร กิจกรรมช่วงงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)	-	- รูปที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-5
6. การขนส่งดินต้องหาผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกและผู้กมด ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการร่ว่งหล่นตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง	- โครงการมีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการร่ว่งหล่นตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง	-	- รูปที่ 2-9
7. ติดป้ายชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ และเบอร์โทร ติดต่อข้างตัวรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสะดวก ในการติดต่อหรือ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายในกรณีที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากการขนส่งดังกล่าว	- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ ก่อสร้าง เพื่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้สัญจรผ่านไปมาสามารถ ติดต่อดูได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบ	-	- รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-10
8. โครงการต้องจัดให้มีวิศวกร/ผู้ควบคุมการก่อสร้างที่มี คุณภาพ เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักวิศวกรรมเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-10
9. จัดทำประกันภัยตามกฎหมายกำหนดอาคารที่ต้องทำ ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดย ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร	- โครงการได้จัดทำประกันภัยตามกฎหมายกำหนดอาคารที่ต้องทำ ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564	-	- ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)			
10. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่า INCLINOMETER ในช่วงก่อนเปิดหน้าดินและขณะก่อสร้างชั้นใต้ดินไว้บริเวณแนวกำแพงกันดินทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน และตรวจสอบผลที่ตรวจวัดได้โดยการเปรียบเทียบกับค่าระดับการเตือนหรือความระมัดระวังในการทำงานโดยแบ่งระดับการเตือนภัยออกเป็น 3 ระดับ คือ Alarm 70% Alert 80% และ Action 90%	- โครงการมีการติดตั้ง Inclinator ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินภายในพื้นที่โครงการ บริเวณแนวกำแพงกันดินทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-6
11. เจ้าของโครงการต้องควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าของสถานที่ที่ดินปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้หากไม่มีการปฏิบัติตามจะระงับไม่นำดินไปปรับถมโดยเด็ดขาด	- โครงการได้กำกับดูแลเจ้าของพื้นที่สำหรับการนำดินไปทิ้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 กิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)	-	- รูปที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-5
12. จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ทิ้งดิน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-11 - รูปที่ 2-12

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)			
13. กำหนดให้บริเวณที่ถมดินห่างจากแนวเขตที่ดินโดยรอบไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยมีระดับการปรับถมไม่เกิน +2.00 เมตร จากระดับถนนภายนอก (ปัจจุบันมีระดับต่ำกว่าที่ดินข้างเคียงประมาณ 1-2 เมตร) และกำหนด Slope ของดินที่ปรับถมเท่ากับ 1 : 1.5 พร้อมบดอัดดินให้แน่นจนได้ระดับและคลุมด้วยตาข่ายกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการมีวิศวกร และเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้งกำกับดูแลเจ้าของพื้นที่สำหรับการนำดินไปทิ้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินพ.ศ. 2548 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 กิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-5 - ภาคผนวกที่ 2-5
14. จัดให้มีร่องระบายน้ำกว้าง 1 เมตร รอบพื้นที่ทั้งดินและรวบรวมการระบายน้ำที่อาจมีการปนเปื้อนตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หวาย ที่ไหลมากับน้ำฝนมายังบ่อดักตะกอน น้ำส่วนนี้ให้นำไปฉีดพรมฝุ่น และล้างล้อรถหากมีเหลือและจำเป็นต้องระบายออกให้กักตะกอนไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการมีบ่อดักน้ำ และบ่อดักตะกอนดินจากการล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งน้ำจากการล้างทำความสะอาดจะเป็นการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่	-	- รูปที่ 2-13
15. เจ้าของโครงการจะต้องดูแลพื้นที่โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบไม่ให้มีการพังทลายของดินรูก้ำพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกันให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ (ถ้ามี)	- โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งและสำรวจสภาพรั้ว กำแพง ตัวอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียง และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน มีการจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารข้างเคียง กรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-3 - ภาคผนวกที่ 2-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.3 ธรณีวิทยา			
1. ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามวิศวกรโครงสร้างออกแบบไว้ และต้องระมัดระวังส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดความเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้	-	- รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-10
2. ในช่วงที่มีการก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการดำเนินงานโดยตลอดเพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของอาคารได้ออกแบบไว้	- ในการก่อสร้างช่วงฐานราก และงานโครงสร้างชั้นใต้ดินโครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 กิจกรรมงานดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-10
3. จัดให้มีข้อปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติตน เช่น แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น	- โครงการมีการซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังเกิดเหตุ	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-15 - ภาคผนวกที่ 2-7 - ภาคผนวกที่ 2-8
4. จัดให้มีแผนการชักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งมีการฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- โครงการมีการซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังเกิดเหตุ	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-15 - ภาคผนวกที่ 2-7 - ภาคผนวกที่ 2-8
1.4 คุณภาพอากาศ			
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง			
1. จัดทำรั้วชั่วคราว (Metal Sheet) รอบแนวเขตโครงการ ความสูง 6 เมตร และจัดให้มีระบบสเปรย์น้ำติดตั้งต่อจากแนวรั้วเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราว (Metal Sheet) ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมรอบตัวอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังอาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet รอบตัวอาคารขณะก่อสร้าง อีกทั้ง มีการติดตั้งละอองน้ำรอบแนวรั้วโครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและการฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-15 - รูปที่ 2-16 - ภาคผนวกที่ 2-8
3. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นอยู่ให้ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด อีกทั้ง มีการติดตามค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)	-	- รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-17 - รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-9 - ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11
4. โครงการจะติดตามข่าวสารผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หากพบว่าความเข้มข้นของฝุ่นภายในพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน ในช่วงการก่อสร้างจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) อาทิ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัด เจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้ดีเซล เป็นต้น และในกรณีที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือใดๆ โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการติดตามข่าวสารผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดผลกระทบจากเขม่า อีกทั้ง มีการติดตั้งละอองน้ำรอบแนวรั้วโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังอาคารข้างเคียง และมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-17 - รูปที่ 2-18 - ภาคผนวกที่ 2-9 - ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
5. จัดห้องเก็บฝุ่นในการตัด การเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์กันฝุ่นสำหรับคนงาน	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่มีงานตัด เจียร พร้อมทั้งติดตั้ง Protection ภายในอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอกโครงการ	-	- รูปที่ 2-18
6. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการมีการกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่มีฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-9
7. ฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการมีการกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่มีฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-9
8. วางกองวัสดุภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีพื้นที่และห้องสำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-4
9. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิด หรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด หรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้พื้นผิวเปียกอยู่เสมอ หรือใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสม	- โครงการจัดให้มีพื้นที่และห้องสำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-19
10. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการจะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก	-	- รูปที่ 2-20
11. ตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างหากเกินค่ามาตรฐานจะต้องปรับปรุงก่อนหรือห้ามนำมาใช้ในการก่อสร้าง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่า	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
มาตรการด้านการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน			
12. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น	- โครงการได้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-21
13. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างและระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อผู้ร้องเรียน วัน และเวลาที่ร้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างจะมีการดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-4
14. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองโดยระบุสาเหตุและเวลา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ	-	- รูปที่ 2-6
15. บริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- บริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการและบริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ทำหน้าที่กำกับและควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินงานตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-10
มาตรการด้านการก่อสร้าง			
16. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด	- การก่อสร้างโครงการเป็นระบบสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปไม่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่โครงการ (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
มาตรการด้านการก่อสร้าง			
17. ฤกษ์ซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด และมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี รวมทั้งขนย้ายฤกษ์ซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างออกไปนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่โดยรอบทันทีเมื่อพื้นที่พักบรรจุเต็มแล้ว หรือกำหนดเวลาในการขนย้ายเป็นประจำทุกสัปดาห์	- โครงการจัดให้มีพื้นที่และห้องสำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-4
18. การผสมคอนกรีตหรือปูน การใส่ไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต้องทำในพื้นที่ที่คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในท้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้านหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	- การก่อสร้างโครงการเป็นระบบสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปไม่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่โครงการ โดยในช่วงการก่อสร้างโครงการได้มีการติดตั้งละอองน้ำรอบแนวรั้ว พร้อมทั้งติดตั้ง Protection ภายในอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอกโครงการ	-	- รูปที่ 2-16 - รูปที่ 2-18
มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร			
19. การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียก โดยมีน้ำหล่อระหว่างใบพัดและกระเบื้องเพื่อป้องกันฝุ่น	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่มีงานตัด เจียร พร้อมทั้งติดตั้ง Protection ภายในอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอกโครงการ	-	- รูปที่ 2-18
20. จัดปล่องยางทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง หรือลิฟต์ขนของเท่ากับ ความสูงของอาคาร	- โครงการจัดให้มีลิฟต์ชั่วคราวสำหรับขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	-	- รูปที่ 2-22
21. ตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11
22. ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้/ไม่เดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- โครงการไม่มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ และไม่เดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
มาตรการด้านการจัดการของเสีย 23. ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-23
มาตรการด้านขนส่ง 24. การขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และดินรวมถึงการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ โดยรถบรรทุก ใช้ขนส่งต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะวิ่งโดยกำหนดช่วงเวลาขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน	- โครงการมีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการรบกวนตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง	-	- รูปที่ 2-9
25. กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างและดิน รวมถึงการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 2-24
26. ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างและแหล่งที่ดินนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-11
27. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง และในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้ฉีดน้ำและกวาดพื้นที่ให้สะอาดทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-25

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
28. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และรถขนส่งคนงานเมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วห้ามติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้เด็ดขาด เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น	- รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และรถขนส่งคนงานจะไม่มี การติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น อีกทั้ง มีการตรวจสอบเครื่องยนต์เครื่องจักรอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-10
29 ให้มีตรวจวัดควันดำเครื่องจักร และรถยนต์ทุกชนิดที่ใช้ น้ำมันดีเซล โดยต้องได้รับใบรับรองการตรวจวัดควันดำ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และตรวจติดตามทุกๆ 6 เดือน หากไม่ผ่านการรับรอง ต้องนำไปปรับปรุงก่อนนำมาใช้งาน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการ เกิดมลพิษทางอากาศ	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11
1.5 เสียง			
1. ดำเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างที่ ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดจะทำได้เฉพาะการ เทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ต้องได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานที่อนุญาตก่อสร้างก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการจึงจะดำเนินการได้และจะต้องแจ้ง ให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการ โดยการทำเป็นหนังสือแจ้งและติดประกาศไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุด นักชัตกฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ 08.00- 17.00 น. และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้าง เกินเวลา ได้มีการกำหนดและควบคุมดูแลให้ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งหน่วยงานและผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 วัน	-	- ภาคผนวกที่ 2-12

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง (ต่อ)			
2. ให้โครงการก่อสร้างรั้ว Steel ความหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดทำประตูผ้าใบด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้า-ออกโครงการ (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-20
3. จัดให้มีกำแพงกันเสียงสำหรับการก่อสร้าง ในช่วงต่างๆ ดังนี้ <u>3.1 ช่วงงาน D-Wall (เดือนที่ 1-3)</u> - กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 เมตร โดยวัสดุกันเสียงที่เลือกใช้ คือ Steel, 24 ga ความหนา 0.64 mm. (0.025") (หรือวัสดุเทียบเท่า) บริเวณที่ติดกับอาคารพาณิชย์ (บ้านเลขที่ 594 และ 596) ติดตั้งตามแนวเขตที่คงไว้ให้เป็นที่ยอดรถหลังอาคารพาณิชย์ส่วนที่เหลือติดตั้งตลอดแนวเขตที่ดิน	- โครงการได้มีการติดตั้งแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร และผ้าใบกันฝุ่นสูง 3 เมตร บริเวณที่ติดกับอาคารพาณิชย์ (บ้านเลขที่ 594 และบ้านเลขที่ 596) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการได้มีการรื้อแนวผ้าใบออก เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวรั้วถาวร	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-26
<u>3.2 ช่วงงานเสาเข็มและฐานรากอาคาร (เดือนที่ 4-7)</u> - กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 เมตร โดยวัสดุกันเสียงที่เลือกใช้ คือ Steel, 24 ga ความหนา 0.64 mm. (0.025") (หรือวัสดุเทียบเท่า) บริเวณที่ติดกับอาคารพาณิชย์ (บ้านเลขที่ 594 และ 596) ติดตั้งตามแนวเขตที่คงไว้ให้เป็นที่ยอดรถหลังอาคารพาณิชย์ส่วนบ้านที่เหลือติดตั้งตลอดแนวเขตที่ดิน	- โครงการได้มีการติดตั้งแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร และผ้าใบกันฝุ่นสูง 3 เมตร บริเวณที่ติดกับอาคารพาณิชย์ (บ้านเลขที่ 594 และบ้านเลขที่ 596) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการได้มีการรื้อแนวผ้าใบออก เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวรั้วถาวร	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-26

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง (ต่อ)			
<u>3.3 ช่วงงานเสาเข็มและฐานรากซ้อนกับงานขึ้นโครงสร้างอาคาร (เดือน 7)</u> - ทิศเหนือกำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่มีเสียงดัง เป็นห้องที่มีผนังกัน มีการติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3
- ทิศตะวันออกบริเวณสวนเบญจสิริกำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้นห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีค่า STC 2540 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)			
- ทิศใต้บริเวณอาคาร THE EMSPHERE 15 ชั้นกำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 0.2 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่มีเสียงดัง เป็นห้องที่มีผนังกัน มีการติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3
- ทิศตะวันตก บริเวณอาคาร THE EMSPHERE 10 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง (ต่อ)			
<u>3.4 ช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคาร (เดือนที่ 7-33)</u> - ทิศตะวันตกบริเวณอาคาร THE EMSPHERE 10 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกัน เสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่มีเสียงดัง เป็นห้องที่มีผนังกัน มีการติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3
<u>3.5 ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน (เดือนที่ 15-39)</u> - ทิศเหนือบริเวณริมถนนสุขุมวิท กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้นห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) - บริเวณอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้นห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) - บริเวณอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น (เอเชีย เอิร์ป) กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้นห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มี STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่มีเสียงดัง เป็นห้องที่มีผนังกัน มีการติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง (ต่อ) <u>3.5 ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน (เดือนที่ 15-39)</u> - ทิศตะวันออกบริเวณสวนเบญจสิริ กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้นห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) - ทิศใต้ บริเวณอาคาร THE EMSPHERE 15ชั้นกำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้นห่างจากแนวอาคาร 0.2 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ดค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) - ทิศตะวันตกบริเวณอาคาร THE EMSPHERE 10 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่มีเสียงดัง เป็นห้องที่มีผนังกัน มีการติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3
<u>3.6 ช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคารซ้อนกับงานตกแต่งและเก็บงาน (เดือนที่ 19-30)</u> - ทิศเหนือบริเวณริมถนนสุขุมวิท กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่มีเสียงดัง เป็นห้องที่มีผนังกัน มีการติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง (ต่อ)			
<u>3.6 ช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคารซ้อนกับงานตกแต่งและเก็บงาน (เดือนที่ 19-30)</u> - บริเวณอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละ ช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) - บริเวณอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น (เอเชีย เอิร์ป) กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้นห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มี STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) - ทิศตะวันออก บริเวณสวนเบญจสิริ กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ใน แต่ละช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) - ทิศใต้ บริเวณอาคาร THE EMSPHERE 15 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้นห่างจากแนวอาคาร 0.2 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)	- โครงการได้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่มีเสียงดัง เป็นห้องที่มีผนังกัน มีการติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง (ต่อ)			
<u>3.6 ช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคารซ้อนกับงานตกแต่งและเก็บงาน (เดือนที่ 19-30)</u> - ทิศตะวันตกบริเวณอาคาร THE EMSPHERE 10 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นสมาร์ทบอร์ด ที่มีค่า STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า)	- โครงการได้ติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวลำ Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3
<u>3.7 ช่วงงานรื้อถอนเดิมซ้อนกับงานตกแต่งและเก็บงาน (เดือนที่ 37, ครึ่งเดือนแรก)</u> - ทิศเหนือบริเวณอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 เมตร ห่างจากแนวถนนที่จะรื้อถอน 0.5 เมตร โดยวัสดุกันเสียงที่เลือกใช้ คือ Steel, 24 ga ความหนา 0.64 mm. (0.025") (หรือวัสดุเทียบเท่า)	- โครงการได้ติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวลำ Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3
<u>3.8 ช่วงงานเพิ่มก่อสร้างบ่อหมุนน้ำซ้อนกับงานตกแต่งและเก็บงาน (เดือนที่ 37, ครึ่งเดือนหลัง)</u> - ทิศเหนือบริเวณอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 เมตร ห่างจากแนวบ่อหมุนน้ำที่จะก่อสร้าง 0.5 เมตร โดยวัสดุกันเสียงที่เลือกใช้ คือ Steel 24 ga ความหนา 0.64 mm. (0.025") (หรือวัสดุเทียบเท่า)	- โครงการได้ติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้าง และแนวลำ Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง (ต่อ)			
<u>3.9 ช่วงงานก่อสร้างบ่อน้ำ (เดือนที่ 38-41)</u> - ทิศเหนือ บริเวณอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ห่างจากแนวบ่อน้ำที่จะก่อสร้าง 0.5 เมตร โดยวัสดุกันเสียงที่เลือกใช้ คือ Steel, 24 ga สูง 6 เมตรความหนา 0.64 mm. (0.025”) (หรือวัสดุเทียบเท่า)	- โครงการได้ติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดแนวความสูงอาคารที่กำลังก่อสร้างและแนวรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งประตูเข้า-ออกปิดทึบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยรั้วจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงช่วยลดความเข้มเสียงที่ออกเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3
4. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	- โครงการวางผังพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบและจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุด	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-14
5. ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน	- โครงการลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน	-	-
6. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบาคูระหว่างพัก	- โครงการมีการหยุดและเบาคูเครื่องจักร/อุปกรณ์ปรณที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว	-	-
7. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11
8. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากพร้อมๆ กัน	- โครงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง (ต่อ)			
3.9 ช่วงงานก่อสร้างบ่อหนองน้ำ (เดือนที่ 38-41)			
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งอาคารใกล้เคียง ถึงกำหนดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในสำนักงานโครงการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดรับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่าระดับเสียงและเสียงรบกวนเกินจากค่าที่มีการประเมินไว้ต้องหยุดการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดระดับเสียง หรือเสียงรบกวนเกินค่าที่ประเมินและให้ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้ระดับเสียงอยู่ในระดับที่ประเมินไว้จากนั้นจึงให้ก่อสร้างต่อไปได้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง และสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการได้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-21
10. ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง รวมถึงแจ้งผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้วติดไว้ด้านหน้าโครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้างแก่อาคารข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-27
1.6 ความสั่นสะเทือน			
1. เลือกใช้การลงเสาเข็มเจาะ แต่ก่อนดำเนินการโครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาที่จะทำเสาเข็มให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อแจ้งถึงกำหนดการก่อสร้างและการลงเสาเข็มเจาะ อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง กิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานเข็มได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.6 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)			
2. ให้ดำเนินการตรวจสอบอาคารในบริเวณข้างเคียงก่อน จะทำการก่อสร้าง โดยผู้ทำการตรวจสอบประกอบด้วย ตัวแทนโครงการ เจ้าของอาคารข้างเคียง และตัวแทนของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอม ให้บันทึกวันเวลา และเหตุผลไว้ให้ชัดเจนต่อหน้าเจ้าของ อาคารข้างเคียงพร้อมกับให้เจ้าของอาคารข้างเคียงลงชื่อ รับทราบไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียง ไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้ผู้ทำการตรวจสอบที่เหลือน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบันทึกการตรวจสอบด้วย พร้อม กับแจ้งว่าถ้าประสงค์จะส่งเอกสารใด ๆ หรือจะให้บุคคลที่ สามตรวจสอบ (Third Party) ก็ให้ส่งผลการตรวจมาก่อน จะมีการก่อสร้าง และเมื่อดำเนินการทำฐานรากเสร็จแล้วให้ เข้าไปตรวจสอบยังอาคารข้างเคียงอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบ สภาพก่อนและหลังมีการทำฐานราก ว่าแตกต่างไปจากเดิม หรือไม่ หากพบว่ามีความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นให้เจรจา ตกลงเพื่อทำการซ่อมแซม พร้อมกับการตรวจสอบครั้งที่สาม เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว เพื่อตรวจสอบ ยืนยันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการอีกครั้ง เพื่อชดเชยและเยียวยา ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากสามารถ เจรจาตกลงกันได้ก็ให้ชดเชยหรือเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่าย เจรจาได้ข้อยุติ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งและจัดให้มีการสำรวจสภาพรั้ว กำแพงตัวอาคารบ้านพักอาศัยข้างเคียง และถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐาน มีการจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครอง และชดเชยความเสียหายของอาคารข้างเคียง กรณีที่อาจได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบ ผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรม การก่อสร้างจะมีการดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-3 - ภาคผนวกที่ 2-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.6 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)			
แต่ถ้าไม่สามารถเจรจาต่อรองกันได้ให้เจ้าของโครงการเสนอเรื่องตามกระบวนการไกล่เกลี่ยระดับข้อพิพาทที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไกล่เกลี่ยทั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ถ้าความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคารโครงการจริงให้เจ้าของโครงการสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อการชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปก่อน โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของบริษัทประกันภัยในอัตราร้อยละ 30 ของค่าความเสียหายที่มีการประเมินในเบื้องต้น และจะต้องเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายในส่วนที่เหลือโดยเร็วต่อไป			
3. โครงการฯ ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อสามารถติดต่อ ประสานกับโครงการได้โดยตรงเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการฯ และต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในกรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างจะมีการดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8
4. วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชน โดยใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด และดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความสิ้นสะท้อนและความเสียหายแก่พื้นที่ที่ขั้วผ่าน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในเส้นทางที่ผ่านชุมชนจะใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด และดำเนินการอย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกเพื่อป้องกันการตกลงของวัสดุ	-	- รูปที่ 2-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.6 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)			
5. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสิ้นสะท้อนรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสิ้นสะท้อนรบกวนน้อยที่สุด	-	-
6. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความสิ้นสะท้อนรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความสิ้นสะท้อนรบกวนน้อยที่สุด	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11
7. หากพบว่า ผู้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้าน เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ในกรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างจะมีการดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-4
8. จัดทำประกันภัยตามกฎหมายกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และทำประกันภัยภาคสมัครใจ (CAR) โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร	- โครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารข้างเคียง กรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-1
9. จัดให้มีวิศวกรโครงการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้	- โครงการมีเจ้าหน้าที่และวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.6 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)			
10. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความสะดวกจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าวทรงตัวให้เป็นไปตาม หลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรมทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเหตุจากผู้ได้รับความเสียหาย	- ก่อนการก่อสร้างโครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง และวิศวกรเข้าสำรวจอาคารข้างเคียงและถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน อีกทั้งจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารข้างเคียง กรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างจะมีการดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-1 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-3 - ภาคผนวกที่ 2-4
11. เจ้าของโครงการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีเกิดความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการทุกกรณี	- โครงการได้จัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารข้างเคียง กรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-1
12. กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ หรือมีข้อขัดแย้งกันให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ (ถ้ามี)	- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารข้างเคียง กรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ โครงการจะจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาหาข้อตกลงร่วมกัน โดยร่วมกันกำหนดแนวทางชดเชยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป	-	- ภาคผนวกที่ 2-1
1.7 ทรัพยากรน้ำ			
1. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วมให้เพียงพอับความต้องการของคนงาน และพนักงานจำนวน 22 ห้อง (ตามมาตรฐานกะแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีส้วมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง)	- ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการจัดให้มีห้องส้วมชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 25 ห้อง สำหรับจำนวนคนงานและเจ้าหน้าที่สูงสุด 464 คน ซึ่งมี 1 ห้อง ต่อ 15 คน (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-28

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)			
2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดรองรับ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	-	- รูปที่ 2-29
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก			
1. ติดป้ายเตือน “ห้ามฆ่าหรือทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครอง” ไว้รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ผู้รับเหมาของโครงการติดป้าย “ห้ามฆ่าหรือทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครอง” ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม Morning Talk - หากพบสัตว์ป่าคุ้มครองฯ จากอุทยานเบญจสิริ เข้ามายังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งสัตว์ป่าคุ้มครองคืนสู่อุทยานฯ ทันที	-	- รูปที่ 2-30 - รูปที่ 2-31
2. หากพบสัตว์ป่าคุ้มครองฯ จากอุทยานเบญจสิริ เข้ามายังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อนำส่งสัตว์ป่าคุ้มครองคืนสู่อุทยานฯ			
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ			
-			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ			
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ในช่งก่อสร้างได้อย่างน้อย 1 วัน	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ภายในกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	-	- รูปที่ 2-32

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ			
2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำไว้บริเวณใกล้เคียงกับก๊อกน้ำด้วยข้อความ "ช่วยปิดก๊อกน้ำหลังเลิกใช้"	- ผู้รับเหมาของโครงการมีการติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ อีกทั้งประชาสัมพันธ์และกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-33
3. ในกรณีที่พบการรั่วซึมของน้ำประปาที่ท่อหรือก๊อกน้ำให้รีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำประปา กรณีที่พบการรั่วซึมที่ท่อหรือก๊อกน้ำจะมีการดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-	-
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
1. จัดให้มีส้วมสำหรับคนงานจำนวน 22 ห้อง บริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงานนอก โครงการ (สัดส่วน 12 คน/ห้อง : ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีส้วมในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 คน/ห้อง)	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการจัดให้มีห้องส้วมชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 25 ห้อง สำหรับจำนวนคนงานและเจ้าหน้าที่สูงสุด 464 คน ซึ่งมี 1 ห้อง ต่อ 15 คน (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	กิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละช่วงจะจำนวนมีคนที่ไม่เท่ากันอย่างไรก็ตามโครงการได้พิจารณาจัดเตรียมห้องส้วมไว้ในพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอในแต่ละช่วงของกิจกรรมการก่อสร้างโดยให้มีอัตราไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 15 คน	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-28
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 โดยคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการ (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร)	กิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละช่วงจะจำนวนมีคนที่ไม่เท่ากันอย่างไรก็ตามโครงการได้พิจารณาจัดเตรียมห้องส้วมไว้ในพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอในแต่ละช่วงของกิจกรรมการก่อสร้างโดยให้มีอัตราไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 15 คน	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-28

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)			
3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไว้ในบริเวณบ้านพักคนงานนอกโครงการมีประสิทธิภาพในการบำบัด ร้อยละ 92 โดยคุณภาพน้ำทั้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.	- โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงาน	-	- รูปที่ 2-29
4. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ	- โครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	- รูปที่ 2-29
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม			
1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร รอบโครงการ พร้อมบ่อดักตะกอน/ดักขยะ ขนาด กว้าง 1 เมตร ลึก 1.2 เมตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- โครงการมีรางระบายน้ำชั่วคราว บ่อพักน้ำ และบ่อดักตะกอนดินจากการล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งน้ำจากการล้างทำความสะอาดจะมีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ไม่มีการระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-12 - รูปที่ 2-34
2. จัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดโดยเฉพาะ และมีที่กรองเศษดิน เศษทรายออกจากน้ำล้างเครื่องมือก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดโดยเฉพาะ มีที่กรองเศษดิน เศษทรายออกจากน้ำล้างเครื่องมือ ซึ่งน้ำจากการล้างทำความสะอาดจะมีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ไม่มีการระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-13 - รูปที่ 2-34
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยเก็บกวาดขยะออกจากตะกอนบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการทุกวัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นที่โครงการ และทำความสะอาดบ่อดักตะกอนเป็นประจำ	-	- รูปที่ 2-34
4. ขุดลอกแนวรางระบายน้ำชั่วคราวที่ขุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างและบ่อดักตะกอนทุก 1 สัปดาห์	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นที่โครงการ และทำความสะอาดบ่อดักตะกอนเป็นประจำ	-	- รูปที่ 2-34

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย			
1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างขนาด 240 ลิตร ที่มีสภาพแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม และมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงวัน และสุนัข ได้ จำนวนอย่างน้อย 11 ถัง แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) จำนวน 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) จำนวน 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 4 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง และถังรองรับหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ถัง	- โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยแยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ก่อนจะประสานงานให้สำนักงานเขตเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 2-35
2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงานขนาด 240 ลิตร ที่มีสภาพแข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม และมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงวัน และสุนัข ได้ จำนวนอย่างน้อย 16 ถัง แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) จำนวน 5 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) จำนวน 4 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 6 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง และถังรองรับหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ถัง	- โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยและจัดรวบรวม ไว้ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน และจะมีการประสานงานให้หน่วยงานเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 2-35
3. กำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยคัดแยกมูลฝอยประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว ครอบงพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และนำไปขายให้แก่ผู้รับ	- โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว ครอบงพลาสติก อีกทั้งผู้รับเหมามีการประชาสัมพันธ์และกำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-35

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			
4. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ โดยเลือกบริเวณที่ไม่ขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่เก็บกองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด)	- โครงการมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ โดยจัดพื้นที่สำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด)	-	- รูปที่ 2-36
5. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอและไม่มีปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหา ต้องติดต่อให้รถเก็บขนของสำนักงานเขตคลองเตยเข้ามาเก็บขนทันทีหรือเพิ่มรองรับมูลฝอยรองรับให้เพียงพอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่โครงการและตรวจสอบการจัดการมูลฝอยภายในโครงการไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้าง ก่อนจะประสานงานให้สำนักงานเขตเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 2-35 - รูปที่ 2-37 - ภาคผนวกที่ 2-13
6. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณนั้น ๆ	- ผู้รับเหมาห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณนั้น ๆ ผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- รูปที่ 2-31
7. ให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีต อิฐมวลเบาเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงกำจัดฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอย สำหรับเศษวัสดุก่อสร้างที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง โรงกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับกำจัด ให้ส่งไปกำจัดยังผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่อไปและห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร ในส่วนของเศษวัสดุจากการก่อสร้างโครงการได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามารับไปกำจัด สำหรับมูลฝอยภายในโครงการ ได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ก่อนจะประสานงานให้สำนักงานเขตเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 2-35 - รูปที่ 2-36 - รูปที่ 2-38 - ภาคผนวกที่ 2-13

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			
8. ให้ทำรายงานบันทึกผู้ปฏิบัติงาน วัน เวลา และ ปริมาณที่นำเศษวัสดุก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการ ทุกครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการ ก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร ในส่วนของเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โครงการได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามารับไปกำจัด สำหรับมูลฝอย ภายในโครงการ ได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ถังรองรับมูล ฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ก่อนจะประสานงานให้ สำนักงานเขตเข้าเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 2-35 - รูปที่ 2-36 - รูปที่ 2-38 - ภาคผนวกที่ 2-13
9. ในการขนย้ายมูลฝอยจากการก่อสร้างไปทิ้งหรือ กำจัดต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ตกหล่น ปลิวหรือฟุ้งกระจาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			
10. จัดจ้างบริษัทที่มีใบอนุญาตในการกำจัดมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับกำจัด เข้ามาจัดเก็บ มูลฝอยในโครงการ			
3.5 พลังงานและไฟฟ้า			
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟ ในขณะที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ ความชำนาญในการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ ปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-39
2. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ ก่อสร้าง และการใช้ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎ วงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ ความชำนาญในการจ่ายไฟฟ้า	-	- รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-39
3. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหัวหน้า คนงานต้องให้คำแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	- ผู้รับเหมาฯ ช่างและแนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- รูปที่ 2-31
4. ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” ไว้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- โครงการมีการติดป้ายและสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดพลังงาน” ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	-	- รูปที่ 2-40

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)			
5. จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือช็อต	- โครงการจัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือช็อต	-	- รูปที่ 2-39
3.6 การระบายอากาศ			
1. จัดทำรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวความสูง 6 เมตร รอบเขตพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-2
2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงรอบโครงการ	- โครงการติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet รอบตัวอาคารขณะก่อสร้าง อีกทั้งมีการติดตั้งละอองน้ำรอบแนวรั้วโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังอาคารข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-16
3. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ไม่กีดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้างและทางสาธารณะ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีผ้าใบปิดคลุมตลอดเวลายกเว้นจะเปิดเมื่อรถวิ่งเข้า-ออก	- โครงการมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ไม่กีดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้จัดให้มีประตูปิดทึบตลอดเวลา โดยจะเปิดเมื่อมีรถวิ่งเข้า-ออก	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-20
4. ในขณะที่ขุดดิน/เศษวัสดุก่อสร้าง และวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด และผูกยึดกับตัวรถให้เรียบร้อย รวมถึงหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน	- โครงการมีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการรบกวนตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง	-	- รูปที่ 2-9
3.7 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร			
1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะและรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 2-24

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.7 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร (ต่อ)			
2. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และช่วงเวลาเลิกเรียน กำชับให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและจุด เข้า-ออก โครงการ	- โครงการหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และช่วงเวลาเลิกเรียน อีกทั้งกำชับให้พนักงานขับรถ ขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและจุดที่เข้า-ออกโครงการ	-	-
3. ควบคุมการเข้า-ออกของรถบรรทุกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและผู้ใช้รถบนทางเท้าบนถนนสุขุมวิท โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยผู้รับเหมาต้องใช้ประสานกับหน่วยงานจำหน่ายคอนกรีตรวมถึงคนขับรถทุกคันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสารเพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถ โดยให้เข้า-ออก สลับกันไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์พื้นที่ที่ก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อปรับแผนการส่งวัสดุก่อสร้าง คอนกรีต-ออกพื้นที่ โครงการให้สัมพันธ์กันให้มากที่สุด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถที่วิ่งเข้า-ออก จากโครงการ และควบคุมการเข้า-ออกของรถบรรทุกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและผู้ใช้รถบนทางเท้าบนถนนสุขุมวิท โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- รูปที่ 2-41
4. ติดป้ายชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อบริษัท ผู้รับเหมา และเบอร์โทรติดต่อข้างตัวรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดังกล่าว	- โครงการมีการติดป้ายชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อบริษัท ผู้รับเหมา และเบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้ารถบรรทุกเพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่ง	-	- รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-42
5. โครงการต้องคืนสภาพทางเท้าบริเวณทางเข้า-ออกใหม่ที่ในช่วงก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินโครงการ	- การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.7 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร (ต่อ)			
6. จัดหาป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง พร้อมทั้งสัญญาณจราจรไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อการเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	- รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-41 - รูปที่ 2-43
7. ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนและเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดคนถ่ายวัสดุบนถนนสุขุมวิทด้วย	- โครงการได้มีการกำหนดให้รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ วิ่งในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนสำหรับการขนส่งในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดคนถ่ายวัสดุบนถนนสุขุมวิทด้วย	-	- รูปที่ 2-44
8. จัดทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสุขุมวิท และรถบรรทุกที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่แยกโศก แยกสวัสดิ์ จนถึงทางเข้า - ออกโครงการให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจร	-	- รูปที่ 2-41

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.7 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร (ต่อ)			
9. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า – ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง พร้อมทั้งสัญญาณจราจรไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อการเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	- รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-43 - รูปที่ 2-44
10. จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการให้เพียงพอเพื่อเป็นที่จอดรถ รับ รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับ - ส่งคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการให้เพื่อเป็นที่จอดสำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ - ส่งคนงานก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-44
11. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ - ส่งคนงานบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	- โครงการห้ามผู้รับเหมาก่อสร้างจอดรถบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะอื่น ๆ หรือบริเวณใกล้เคียงโครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ - ส่งคนงานไว้ภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-44
12. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง	-	-
13. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดขณะใช้งาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11
14. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินโดยใช้ น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากบรรทุก	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-11 - รูปที่ 2-12
15. จัดการให้ใช้ผ้าคลุมที่มิดชิดสำหรับรถบรรทุกดินหินทราย เพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นปลิวออกจากรถบรรทุกได้	- โครงการมีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการรบกวนตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง	-	- รูปที่ 2-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.7 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร (ต่อ)			
16. จัดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง พร้อมทั้งสัญญาณจราจรไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อการเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	- รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-43 - รูปที่ 2-44
3.8 การสื่อสาร			
1. จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานของโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการให้โดยสะดวก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-10
2. จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อรายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนพร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างจะมีการดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-4
3. ในกรณีโครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีกรณีอาคารข้างเคียงแจ้งการรบกวนสัญญาณ	-	- รูปที่ 2-1
4. แก้ไขและลดผลกระทบเมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ดังนี้ 4.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีกรณีอาคารข้างเคียงแจ้งการรบกวนสัญญาณ	-	- รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.8 การสื่อสาร (ต่อ)			
4.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีกรณีอาคารข้างเคียงแจ้งการรบกวนสัญญาณ	-	- รูปที่ 2-1
4.3 กรณีไม่สามารถปรับแนว R แผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมี มากกว่า 1 จุด พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีกรณีอาคารข้างเคียงแจ้งการรบกวนสัญญาณ	-	- รูปที่ 2-1
5. ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการอื่น คำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีกรณีอาคารข้างเคียงแจ้งการรบกวนสัญญาณ	-	- รูปที่ 2-1
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน			
1. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)			
2. จัดวางแผนผังระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้างในพื้นที่โครงการ ดังนี้ สำนักงานสนาม - ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 22 ห้อง สำหรับคนงาน 250 คน คิดสัดส่วน 12 คน/ห้อง - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ออกแบบรองรับน้ำเสีย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง - ถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 11 ถัง แยกเป็น ถังรองรับ - มูลฝอยย่อยสลายได้ 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 4 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และถังรองรับหน้ากากอนามัย 1 ถัง - บริเวณที่จอดรถยนต์และรถบรรทุก - พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง ขนาด 3.5x10 เมตร - ที่ล้างล้อรถ - บ่อดักตะกอนขนาด 1.0x1.0 เมตร ลึก 1.2 เมตร จำนวน 1 บ่อ และวางระบายน้ำฝนรอบ โครงการ เป็นรางเปิดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ความลาดเอียง 1:200 - มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือไว้ตามจุดต่างๆ ในโครงการ	- พื้นที่โครงการบริเวณสำนักงานสนามผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอกับความต้องการของคนงานในแต่ละช่วงกิจกรรม พร้อมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังสำรองน้ำภายในโครงการ พื้นที่จอดรถ พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่สำหรับล้างล้อรถ บ่อดักตะกอนดิน ถังรองรับมูลฝอย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด อีกทั้งถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือไว้ในพื้นที่โครงการ (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงโครงสร้างอาคาร คนงานและเจ้าหน้าที่สูงสุดเดือนธันวาคม 2569 จำนวน 464 คน)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-28 - รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-32 - รูปที่ 2-35 - รูปที่ 2-36 - รูปที่ 2-45 - รูปที่ 2-46

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)			
1. การเก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ให้จัดไว้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบ ไม่เกะกะกีดขวางเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุก่อสร้างไว้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-4
2. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้ลักษณะของอาคารเป็นไปตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ บริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด และวิศวกรคุมงานก่อสร้างต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบอย่างเคร่งครัด	- บริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ และ บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ทำหน้าที่กำกับและควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินงานตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-10
3. ให้โครงการชี้แจงหรือกำหนดเส้นอ้างอิงไว้ตรวจสอบระยะห่างของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตลอดเวลาขณะทำการก่อสร้างบ่อบำบัดฯ และจัดให้มีวิศวกร/หัวหน้างานตรวจสอบแนวการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้าง	- โครงการมีวิศวกรกำกับและควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดฯ เพื่อป้องกันมิให้มีความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-10

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม			
1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร การแจ้งประชาสัมพันธ์และการแจกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการก่อนเริ่มงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้กับเจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อ ใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้างพร้อมทั้งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลาโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ ในมาตรการทั่วไปทุกประการ	- โครงการประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการฯ ก่อนเริ่มงานก่อสร้างให้กับเจ้าของอาคาร และผู้พักอาศัยในเขตใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - ภาคผนวกที่ 2-14
2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าและคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด	- บริษัท เบญจสิริ อัลไลแอนซ์ จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ และบริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ทำหน้าที่กำกับและควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินงานตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-10

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม			
3. ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน และติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อผู้รับเหมาผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน/หน่วยงานอนุญาตได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ	- โครงการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนและติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้ด้านหน้าโครงการ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างจะมีการดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - รูปที่ 2-10 - รูปที่ 2-21 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-4 - ภาคผนวกที่ 2-15
4. มีช่องทางติดต่อสื่อสาร และลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ	-	- รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-8 - รูปที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-4
5. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ ได้แก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 5.1 ด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 5.2 ด้านอนามัย - สนับสนุนบริจาคถังรองรับมูลฝอยให้กับพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	- โครงการจัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยติดตั้งไฟและแสงสว่างบริเวณทางเท้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ	-	- ภาคผนวกที่ 2-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม			
5.3 ด้านความปลอดภัย - สนับสนุนบริจาคถังดับเพลิงให้กับพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	- โครงการจัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยติดตั้งไฟและแสงสว่างบริเวณทางเข้าอาคารและด้านหน้าโครงการ	-	- ภาคผนวกที่ 2-16
5.4 โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนอย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรมให้แก่ชุมชนใกล้เคียงชุมชนโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกปี			
6. กำหนดมาตรการขั้นตอนและระเบียบการชดเชยเยียวยาหากเกิดความเสียหายต่ออาคาร ช้างเคียงหรือบุคคลทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการเพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น	- โครงการได้จัดทำมตรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารช้างเคียง หรือบุคคลทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ กรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-1
7. การชดเชยความเสียหายเบื้องต้น โดยกำหนดให้ทางโครงการเตรียมเงินสำรองชดเชยเยียวยาเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบประกันภัยไว้อย่างน้อย 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสามารถนำเงินดังกล่าวมาชดเชยเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา โครงการได้ทันทีภายใน 3 วัน หลังได้รับเรื่องร้องเรียน	- โครงการได้จัดทำมตรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหายของอาคารช้างเคียง หรือบุคคลทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ กรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-1
8. กรณีมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โครงการยินดียะชดเชยและเยียวยา ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยให้เป็นการเจรจาตกลงของทั้งสองฝ่าย คือ เจ้าของโครงการและ ผู้ได้รับผลกระทบหากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- โครงการได้จัดทำมตรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองและชดเชยความเสียหาย กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยเป็นการเจรจาตกลงของทั้งสองฝ่าย คือ เจ้าของโครงการและ ผู้ได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถตกลงกันได้จะมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	-	- ภาคผนวกที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม			
9. ในระหว่างที่มีการรื้อถอนถนนเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำและระบบระบายน้ำในช่วง 6 เดือนสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ โครงการต้องขุดเซยและจัดหาพื้นที่จอดรถชั่วคราวให้กับอาคารพาณิชย์ 2 คูหา โดยเช่าพื้นที่จอดรถที่อยู่ใกล้เคียงอาคารพาณิชย์ 2 คูหาให้มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในอาคารพาณิชย์ทั้ง 2 คูหา	- เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีการรื้อถอนถนนเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำและระบบระบายน้ำ	-	- รูปที่ 2-1
4.2 การสาธารณสุข			
ผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชนข้างเคียงโครงการ			
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	-	-
2. เจ้าของโครงการจัดให้มีเงินทุนสำรองประจำโครงการซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เป็นธรรม และมีมูลค่าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริง เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการในพื้นที่โดยมีต้องรอปะกันภัย เช่น การจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และการชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กในกรณีมีผลพิสูจน์จากแพทย์ว่าการเจ็บป่วยเกิดจากการก่อสร้างโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละราย	- โครงการได้จัดให้มีเงินทุนสำรองประจำโครงการเพื่อชดเชยและเยียวยาความเสียหาย กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ จะมีการดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-3 - ภาคผนวกที่ 2-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)			
ผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชนข้างเคียงโครงการ			
3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.5 เรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด	-	-
4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.2 เรื่องการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และในหัวข้อ 3.4 การจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการจัดมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-29 - รูปที่ 2-35 - รูปที่ 2-36
5. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องการจราจร และหัวข้อ 4.5 เรื่องความปลอดภัยสาธารณะอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องการจราจร และความปลอดภัยสาธารณะอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-41 - รูปที่ 2-43
6. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปเยี่ยมเยียน/สอบถามปัญหาความเดือดร้อนรำคาญตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ - โครงการได้จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third Party) ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2569 มีแผนจะดำเนินการช่วงปลายปี	-	- รูปที่ 2-6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.1) ฝุ่นละอองและมลภาวะทางอากาศ			
1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงานที่คนงานปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆ และกำชับให้คนงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมีให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ และกำชับให้คนงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมีให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ	-	- รูปที่ 2-47
2. ติดป้ายเตือนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน	- โครงการได้ติดป้ายเตือนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน	-	- รูปที่ 2-48
3. ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวให้ใช้น้ำฉีดพรมถนนและบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำการพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการมีการฉีดพรมถนนและบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 2-19
4. กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองจะต้องปิดหรือคลุมในพื้นที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้าง 3 ด้านหรือฉีดพรมน้ำให้ผิวเปียกอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่และห้องสำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 2-4
5. กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การตัด การเจียร ให้กระทำในห้องที่มีหลังคาคลุมและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่มีงานตัด เจียร พร้อมทั้งติดตั้ง Protection ภายในอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอกโครงการ	-	- รูปที่ 2-18
6. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งานเพื่อลดการปล่อยมลพิษโดยไม่จำเป็น และดูแลสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	- โครงการไม่มีการเดินเครื่องจักรขณะไม่ได้มีการใช้งาน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน (ผลกระทบด้านเสียง)			
กำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงต่อพนักงานก่อสร้าง ดังนี้			
1. ปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดเสียง			
1.1 บำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาการทำงาน หรือก่อนจะเกิดการชำรุด การตรวจเติมสารหล่อลื่น เพื่อลดการสีกหรือ เนื่องจากการเสียดสี และตรวจสอบ/ขันนอตยึดส่วนประกอบต่างๆ ให้แน่นสนิท	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11
1.2 เลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก เช่น เครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้า	- โครงการเลือกใช้เครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการก่อให้เกิดเสียงดัง	-	-
1.3 การติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่ที่มีความมั่นคงและติดอุปกรณ์แรงสั่นสะเทือนที่ฐาน หรือ ขาของเครื่องจักร เช่น ยาง หรือสปริง เมื่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของ เครื่องจักรลดลง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะลดตามลงด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเสียงดังที่ส่งผ่านไปตามโครงสร้างของอาคารด้วย	- โครงการติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่ที่มีความมั่นคงและติดอุปกรณ์แรงสั่นสะเทือนที่ฐาน เพื่อช่วยลดปัญหาเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักร	-	-
1.4 ย้ายเครื่องจักรหรือขั้นตอนการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณกั้นแยกเฉพาะหรือให้มีระยะห่างออกไปจากผู้ปฏิบัติงาน	- โครงการมีวิศวกรควบคุมการย้ายเครื่องจักรหรือขั้นตอนการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณกั้นแยกเฉพาะหรือให้มีระยะห่างออกไปจากผู้ปฏิบัติงาน	-	- รูปที่ 2-5
1.5 หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน	- โครงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน (ผลกระทบด้านเสียง)			
1.6 ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	- โครงการลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	-	-
1.7 อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาคีรื่องลงระหว่างการพักเครื่อง	- อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวโครงการจะมีการเบาคีรื่องลงระหว่างการพักเครื่อง	-	-
2. การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง			
2.1 จัดห้องเก็บเสียงและฝุ่นในการตัด การเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงสำหรับคนงาน	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่ม้งานตัด เจียร พร้อมทั้งติดตั้ง Protection ภายในอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอกโครงการ	-	- รูปที่ 2-18
2.2 ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-10
3. การป้องกันที่ตัวบุคคล			
3.1 จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูลดเสียง หรือ ปลั๊กอุดหู ที่ทำจากโฟม หรือวัสดุอื่นที่อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองใช้อุดหูทั้งสองข้าง และจัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนี้			
(1) ช่วงการทำฐานรากกำหนดให้คนงานที่ทำงานกับ Pile Driver และคนงานที่ทำงานใน ระยะ 10 เมตร จากเครื่องจักร กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟมที่มีค่า NPR เท่ากับ 30	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน (ผลกระทบด้านเสียง)			
(2) ช่วงขึ้นโครงสร้าง กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับ Drill และคนงานที่ทำงานในระยะ 10 เมตร จากเครื่องจักร กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟมที่มีค่า MA เท่ากับ 30 ส่วนคนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟมที่มีค่าเท่ากับ NRR 50	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในแต่ละพื้นที่ นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47
(3) ช่วงงานตกแต่ง กำหนดให้คนงานที่ทำงาน PAVER Drill และคนงานที่ทำงานในระยะ 10 เมตร จากเครื่องจักร กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่ทำจากโฟม ที่มีค่า NPR เท่ากับ 30 ส่วนคนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหู ห้างโพน ที่มีค่า NBR เท่ากับ 50	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในแต่ละพื้นที่ นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47
(4) ให้คนงานที่ทำงานในพื้นที่โครงการในระยะ 10 เมตร จากเครื่องจักร ช่วงตกแต่งให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน หลังจากนั้นให้หยุดแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นหรือเปลี่ยนคนงานคนใหม่มาสลับหน้าที่กัน	- ผู้รับเหมาได้กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ทำงานไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน และมีการผลัดเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น หรือเปลี่ยนคนงานคนใหม่มาสลับหน้าที่กัน	-	-
3.2 จัดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมส่วนบุคคล โดยติดไว้ที่คนงานที่ทำหน้าที่ควบคุมรถกดเสาเข็ม เพื่อ บันทึกเสียงสะสมที่คนงานได้รับในแต่ละวัน และนำไปพิจารณา เลือกอุปกรณ์มีความเหมาะสมต่อคนงานในแต่ละกิจกรรม หรือ กิจกรรมอื่นที่ทำหมุนเวียน	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในแต่ละพื้นที่ นั้น ๆ อีกทั้งมีการหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	-	- รูปที่ 2-47

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน (ผลกระทบด้านเสียง)			
1. บริเวณการทำงานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังตลอดระยะเวลาที่ทำงานสัมผัสเสียงดัง	- โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงานที่คนงานปฏิบัติในพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47
2. หัวหน้างานหรือ จป. ต้องแจ้งวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีให้กับคนงานทุกคน โดยเฉพาะคนงานที่รับเข้ามาใหม่	- ผู้รับเหมาของโครงการ แจ้งวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีให้กับคนงานทุกคน โดยเฉพาะคนงานที่รับเข้ามาใหม่	-	- รูปที่ 2-49
(1.3) โรคจากความสั่นสะเทือน			
1. ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนหุ้มที่ด้ามของเครื่องมือ	- โครงการใช้วัสดุป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนหุ้มที่ด้ามของเครื่องมือ	-	-
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรสม่ำเสมอเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวกที่ 2-10
มาตรการฯ ควบคุมที่ตัวบุคคล			
1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือสองชั้นหรือถุงมือสำหรับป้องกันแรง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47
2. ใช้การบุตึ้นด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือนสำหรับรถขุดเจาะสั่นสะเทือน	- โครงการบุตึ้นด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือนสำหรับรถขุดเจาะสั่นสะเทือน	-	-
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกิดความสั่นสะเทือนอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการตรวจสอบการทำงานของผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกิดความสั่นสะเทือนอย่างสม่ำเสมอ	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
1.3) โรคจากความสั่นสะเทือน (ต่อ)			
มาตรการฯ ควบคุมที่ตัวบุคคล			
4. กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรที่เกิดความสั่นสะเทือนพักช่วงการทำงาน 20 นาที ทุกระยะเวลา 2 ชั่วโมง	- โครงการกำหนดให้คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรที่เกิดความสั่นสะเทือนพักช่วงการทำงาน 20 นาที ทุกระยะเวลา 2 ชั่วโมง	-	-
(1.4) สารเคมีในงานก่อสร้าง			
1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกำชับให้คนงานก่อสร้างใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถู่มืออย่าง เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีและรองเท้ายางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่อาจสัมผัสกับสารเคมีอันตราย	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงาน ในพื้นที่นั้นๆ	-	- รูปที่ 2-47
2. ติดป้ายเตือนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน	- โครงการได้ติดป้ายเตือนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการทำงาน	-	- รูปที่ 2-48
3. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีอันตรายพร้อมทั้งติดป้าย	- โครงการจัดให้มีพื้นที่และห้องสำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน อีกทั้งมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเคมีภัณฑ์ไว้ในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-50
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-15
5. จัดให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงาน	-	- รูปที่ 2-51 - รูปที่ 2-52

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.5) โรคที่เกิดจากความร้อน			
1. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน	- โครงการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-53
2. จัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวันที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่แออัด	- โครงการจัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวันที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่แออัด	-	- รูปที่ 2-54
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานและบ้านพักคนงาน			
- โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค			
1. กำชับให้คนงานปิดฝาถังรองรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้งหลังทิ้ง เพื่อป้องกันหนู สุนัข แมลงวันเข้าไปหาอาหาร	- ผู้รับเหมาของโครงการกำชับให้คนงานจัดการให้ถูกวิธี ผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- รูปที่ 2-31
2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดสนิท	- ผู้รับเหมาของโครงการกำชับให้คนงานเก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดสนิทผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- รูปที่ 2-31
3. ใช้สารเคมีปลอดภัยพ่นภายในและบริเวณโดยรอบบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาของโครงการมีการฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน	-	- รูปที่ 2-55
4. จัดให้มีห้องส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดสม่ำเสมอ	- ผู้รับเหมาของโครงการจัดให้มีห้องส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดสม่ำเสมอ	-	- รูปที่ 2-28 - รูปที่ 2-56
5. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ อีกทั้งมีการฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน	-	- รูปที่ 2-55

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานและบ้านพักคนงาน			
6. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำ รวมทั้งตรวจสอบภาชนะต่างๆ เช่น ขวด กระป๋องต่าง ๆ ให้ปิดฝาปิดสนิทเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขังอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลปิดภาชนะเก็บน้ำ รวมทั้งตรวจสอบภาชนะต่าง ๆ เช่น ขวด กระป๋อง ให้ปิดฝาปิดสนิทเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขังอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อีกทั้งมีการฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน	-	- รูปที่ 2-55
7. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในกรณี โรคไข้เลือดออกกระบาดหรือพบผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงาน	- ผู้รับเหมามีการฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน	-	- รูปที่ 2-55
8. อบรมและให้คำแนะนำแก่คนงานในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาทิ การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าส้วม เป็นต้น	- ผู้รับเหมาของโครงการอบรมและให้คำแนะนำแก่คนงานในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาทิ การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าส้วม ผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- รูปที่ 2-31
9. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ดังนี้ 9.1 กำจัดหนูโดยวิธีวางกาวดัก หรือใช้สารเคมีกำจัดหนู 9.2 ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลอน หลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 9.3 ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบ โดยพ่นภายหลังจากที่คนงานก่อสร้าง ย้ายออกจากพื้นที่หมดแล้ว	- ผู้รับเหมาของโครงการได้มีการฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณบ้านพักคนงาน ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-55

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานและบ้านพักคนงาน (ต่อ)			
10. เมื่อรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่ก่อสร้างออก ให้กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างออก โดยประสานงานกับสำนักงานเขตฯ ให้เข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาลรวมถึงสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียของคนงานในช่วงก่อสร้างออกให้หมด และทำการฝังกลบบริเวณถังบำบัดและห้องน้ำ ห้องส้วมทันที	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ	-	- รูปที่ 2-1
11. ทำความสะอาดพื้นภายในหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงานทันที	- ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ	-	- รูปที่ 2-1
- โรคติดต่อ			
1. ให้บริษัทผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) และต้องกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	- ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) และกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานและพนักงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	-	- ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18
2. คนงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด และรวบรวมผลการตรวจสุขภาพของคนงานไว้ที่สำนักงานของผู้รับเหมาเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ	- โครงการกำหนดให้คนงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจะต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานและบ้านพักคนงาน (ต่อ)			
3. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ น้ำดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย และถังรองรับมูลฝอย โดยจัดให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	- พื้นที่โครงการบริเวณสำนักงานสนาม และบริเวณบ้านพักคนงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอความต้องการของคนงานในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังสำรองน้ำ ถังรองรับมูลฝอย ถังดับเพลิงเคมี พร้อมทั้ง มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านพักคนงาน (ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร คนงานและเจ้าหน้าที่สูงสุดเดือน มิถุนายน 2569 ประมาณ 464 คน)	-	- รูปที่ 2-55 - รูปที่ 2-56 - รูปที่ 2-57
4. กำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาด ภายในบ้านพักคนงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 4.1 จัดอบรมและให้คำแนะนำงานในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น	- ผู้รับเหมาของโครงการอบรมและให้คำแนะนำงานในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกาย ผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- รูปที่ 2-31
4.2 ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- ผู้รับเหมาของโครงการควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 2-48 - รูปที่ 2-57
4.3 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์	- บริเวณบ้านพักคนงานมีพ่อบ้านดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	-	- รูปที่ 2-57

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานและบ้านพักคนงาน (ต่อ)			
- โรคติดต่อ 4.4 จัดหาน้ำใช้ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้	- ผู้รับเหมาของโครงการจัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ อีกทั้งได้มีการฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้	-	- รูปที่ 2-55 - รูปที่ 2-57
4.5 ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- โครงการเข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	-	-
4.6 อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรณีมีโรคระบาด	- โครงการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรณีมีโรคระบาด	-	-
5. มาตรการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19			
5.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง และประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน/ห้องพัก/ที่พักด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันของทางราชการ หรือที่หน่วยงานกำหนด หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่กระบวนการทำงาน	- ปัจจุบันเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 สถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตามผู้รับเหมาของโครงการได้มีมาตรการฯ ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง และประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านหรือห้องพัก หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่สถานที่ปฏิบัติงานต่อไป	-	- รูปที่ 2-57 - รูปที่ 2-58
5.2 กำหนดทางเข้า-ออกสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจำและจำกัดทางเข้า-ออกให้เป็นช่องทางเดียวเพื่อควบคุมการเข้า-ออก และสามารถคัดกรองผู้เข้า-ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ปัจจุบันเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 สถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการกำหนดทางเข้า-ออกสถานที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงานเป็นช่องทางเดียวเพื่อควบคุมการเข้า-ออก และสามารถคัดกรองผู้เข้า-ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	- รูปที่ 2-58 - รูปที่ 2-59

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานและบ้านพักคนงาน (ต่อ)			
5.3 ผู้ปฏิบัติงาน แรงงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน ต้องมีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแสดงผลประเมินอาการเสี่ยงของตนเอง (แอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)” หรือระบบที่รัฐกำหนด) หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้พักคอยและวัดอุณหภูมิอีกครั้งหากอุณหภูมิไม่ลดจะถือว่า มีไข้ ไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน และให้อยู่ในพื้นที่กักตัวชั่วคราว (Isolation Area) และรายงานให้ จป. หรือผู้รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยงดำเนินการตามระดับความเสี่ยงต่อไป	- ปัจจุบันเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 สถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการมีนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในโครงการ และบริเวณบ้านพักคนงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ มาตรการฯ ป้องกันและคัดกรองเกี่ยวกับโรคติดต่อของทางโครงการ	-	- รูปที่ 2-58 - รูปที่ 2-59
5.4 ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน ตนเองเพิ่มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบ หน้า (Face Shield) เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ	- ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ภายในโครงการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการฯ ป้องกัน และคัดกรองเกี่ยวกับโรคติดต่อของทางโครงการ	-	- รูปที่ 2-58 - รูปที่ 2-59
5.5 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์หรือ เจลแอลกอฮอล์ (ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อย ร้อยละ 70) ไว้ ณ จุดทางเข้า-ออก บริเวณต่างๆ และจุดที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสร่วม เช่น จุดลงชื่อเข้าทำงานที่ติดต่อ สถานที่รับประทานอาหาร จุดกั้นน้ำดื่ม ห้องส้วม สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ	- ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ภายในโครงการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการฯ ป้องกัน และคัดกรองเกี่ยวกับโรคติดต่อของทางโครงการ	-	- รูปที่ 2-58 - รูปที่ 2-59

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานและบ้านพักคนงาน (ต่อ)			
5.6 กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร ตามความเหมาะสมรวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล	- โครงการกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล	-	-
5.7 ปรับรูปแบบการทำงาน จัดระบบการทำงานเพื่อลดความหนาแน่น ลดโอกาสเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การเหลื่อมเวลาการทำงาน เหลื่อมพื้นที่ทำงาน สลับวัน เป็นต้น	- เพื่อลดความหนาแน่น ลดโอกาสเสี่ยงจากการทำงาน ทางโครงการปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสม และจัดระบบการทำงานเพื่อลดความหนาแน่นของคนงานระหว่างปฏิบัติงาน	-	-
5.8 จัดให้คนงานทำงานเป็นกลุ่มใช้ชีวิตเฉพาะในกลุ่มของตนเอง (Bubble) และกำหนดให้มีกิจกรรมข้ามกลุ่มให้น้อยที่สุด โดยการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้าง เช่น การแบ่งกลุ่มคนงานของผู้รับเหมาแต่ละเจ้า จะไม่มีกิจกรรมหรือปฏิบัติงาน ในพื้นที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน แยกพื้นที่การทำงาน	- โครงการกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตามความเหมาะสม โดยการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้าง	-	-
5.9 งดกิจกรรมการรวมตัว กิจกรรมสังสรรค์ กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน			
5.10 หากมีการรับ-ส่งพนักงาน ให้ดูแลด้านความปลอดภัยของคนงาน เช่น จำกัดจำนวนคนในรถรับ-ส่งไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้ชนหน้าเข้าหากัน และให้สวมหน้ากากหรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็นตลอดระยะเวลาการเดินทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมโดยสารและไม่แวะระหว่างทาง	- เพื่อลดความหนาแน่น และลดโอกาสเสี่ยงจากการรับ-ส่งพนักงาน ผู้รับเหมาของโครงการจำกัดจำนวนคนในรถรับ-ส่งไม่ให้แออัด อีกทั้ง ให้สวมหน้ากากหรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็นตลอดระยะเวลาการเดินทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมโดยสารและไม่แวะระหว่างทาง	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง)			
(1.6) โรคติดต่อที่เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานและบ้านพักคนงาน (ต่อ)			
5.11 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่พนักงาน แรงงาน ผู้รับเหมาโดยให้มีสัดส่วนคนมีภูมิคุ้มกัน (เคยติดเชื้อ+วัคซีน+ตรวจพบภูมิคุ้มกัน) ในสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้างมากที่สุด (ระดับความปลอดภัยสูง >70%, ปานกลาง 30-70 96, ต่ำ<30%)	- โครงการสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่พนักงาน คนงาน ก่อสร้าง และผู้รับเหมา อีกทั้งได้มีการกำหนดมาตรการฯ ป้องกัน และคัดกรองเกี่ยวกับโรคติดต่อ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 สถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการมีนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในโครงการ และบริเวณบ้านพักคนงาน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการฯ ป้องกันและคัดกรอง เกี่ยวกับโรคติดต่อของทางโครงการ	-	- รูปที่ 2-58 - รูปที่ 2-59
5.12 ใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเมื่อสงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคโควิด-19 หากไม่มีผู้ที่มีอาการ สงสัยให้สุ่มตรวจเชิงรุก โดยใช้ PCR หรือ Antigen Test Kit ในพนักงานและแรงงานเป็นระยะตามขนาดจำนวนคนงาน			
5.13 ประสานดำเนินการเพื่อให้คนงานทุกคนมีโรงพยาบาล คู่สัญญาที่จะให้การดูแลรักษาเมื่อพบว่ามีอาการป่วยหรือติดเชื้อ	- โครงการได้มีการประสานและดำเนินการเพื่อให้คนงานทุกคน มีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะให้การดูแลรักษาเมื่อพบว่ามีอาการป่วย หรือติดเชื้อ	-	-
5.14 เตรียมแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุ โดยทำความเข้าใจกับคนงานตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์ระบาด	- โครงการมีการเตรียมแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุ ผ่าน กิจกรรม Morning Talk	-	- รูปที่ 2-31
5.15 จัดเตรียมสถานที่แยกกักตัวผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยง จากการสัมผัสผู้ติดเชื้อภายในสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน ก่อสร้าง (Camp Isolation) คนดูแลอาหาร น้ำ และมีระบบส่ง ต่อไปสถานพยาบาลที่กำหนด	- โครงการได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับแยกกักตัวในกรณีมีผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อภายในสถานที่ก่อสร้าง และมีระบบส่งต่อไปสถานพยาบาลที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคณงาน			
1. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ของสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน	- ผู้รับเหมาของโครงการได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้ง มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ประจำโครงการเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-15 - ภาคผนวกที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-20
2. จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง	- โครงการจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-48 - รูปที่ 2-49
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและคณงานก่อสร้าง โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549	- โครงการมีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ประจำโครงการเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-15
4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันจัดทำและเตรียมพร้อมให้พนักงานตรวจสอบ	- เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ประจำโครงการได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-15 - ภาคผนวกที่ 2-21
5. การกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายให้วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้พิจารณา ก่อนดำเนินการ	- การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่อาจเกิดอันตราย โครงการจะมีวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้พิจารณาก่อนดำเนินการ	-	- รูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน			
6. แต่งตั้งหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่น เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน อีกทั้งจัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่ เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-49
7. จัดให้มีการตรวจรับรองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างประจำปีให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องชนิดและประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องชนิดและประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-11
8. โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติประกันภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558	- โครงการมีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน			
9. กำชับให้คนงานทำงานด้วยความระมัดระวัง มีการอบรมการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้ถูกวิธี และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- ผู้รับเหมาของโครงการกำชับให้คนงานทำงานด้วยความระมัดระวัง มีการอบรมการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้ถูกวิธี และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Talk	-	- รูปที่ 2-31 - รูปที่ 2-49
10. โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-15 - ภาคผนวกที่ 2-20 - ภาคผนวกที่ 2-21
11. โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้ง มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และป้องกันการตกจากที่สูง ที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น และการตกหล่น	-	- รูปที่ 2-60 - รูปที่ 2-61 - รูปที่ 2-63 - ภาคผนวกที่ 2-15 - ภาคผนวกที่ 2-20 - ภาคผนวกที่ 2-21
12. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน			
13. โครงการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยัน พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน	-	- ภาคผนวกที่ 2-15 - ภาคผนวกที่ 2-19
14. โครงการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ	-	- รูปที่ 2-62 - ภาคผนวกที่ 2-15
15. ในการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ถึงเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือโครงสร้างส่วนอื่นๆ ที่มีสภาพเป็นพื้นที่อับอากาศ ต้องจัดให้พัดลมพร้อมท่ออากาศเป่าเพื่อระบายอากาศเข้าสู่พื้นที่อับอากาศทั้งนี้ ต้องมีอัตราการหมุนเวียนอากาศมากกว่า 4 เท่าของปริมาณอากาศต่อชั่วโมงลง การก่อสร้างในพื้นที่นั้นๆ	- กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่อับอากาศบริเวณชั้นใต้ดิน โครงการได้จัดให้มีพัดลมพร้อมท่ออากาศเป่าเพื่อระบายอากาศในพื้นที่นั้นๆ	-	- รูปที่ 2-62
16. การทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่อับอากาศ ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ตรวจสอบประเมินความปลอดภัยของพื้นที่ดังกล่าว ก่อนอนุญาตให้คนงานก่อสร้างเข้าทำงานในพื้นที่นั้น ๆ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อดูแลการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่อับอากาศทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของพื้นที่ดังกล่าวก่อนอนุญาตให้คนงานก่อสร้างเข้าทำงานในพื้นที่นั้นๆ	-	- รูปที่ 2-62 - ภาคผนวกที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-20

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน			
17. โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564	- โครงการมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	- ภาคผนวกที่ 2-15 - ภาคผนวกที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-20
18. ในกรณีที่ทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นที่อาคาร ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป จัดให้มีนั่งร้าน บันไดขาหยั่ง หรือม้ายืนที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสำหรับลูกจ้างในการทำงาน	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงาน ในพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-60 - รูปที่ 2-61
19. ในกรณีที่ทำงานบนที่ลาดชันที่ทำมุมเกินสามสิบองศา จากแนวราบและสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไปต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัย พร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันอันตรายที่มีลักษณะเดียวกันให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อเกิดความปลอดภัย	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-60 - รูปที่ 2-61

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคณงาน			
20. ในกรณีที่ทำงานในสถานที่ที่อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกหรือถูกวัสดุพังทับ เช่น การทำงานบนหรือในเสา ตอม่อ เสาไฟฟ้า ปล่อง หรือคานที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือทำงานบนหรือในถัง บ่อ กรวยสำหรับเทวัสดุ ต้องจัดทำราวกันหรือราวกันตก ตาข่ายสิ่งปิดกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของลูกจ้างหรือสิ่งของ และจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคณงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-60 - รูปที่ 2-61
21. งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทำให้คณงานก่อสร้างหรือสิ่งของพลัดตก ต้องจัดทำฝาปิดที่แข็งแรง ราวกันกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงที่บหรือขอบกันของตมมีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตรพร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคณงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้ง ได้ติดตั้งราวกันตกและตาข่ายปิดช่องเพื่อป้องกันการพลัดตก	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-61 - รูปที่ 2-63 -
22. ในกรณีที่ทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดโล่ง และอาจพลัดตกลงมาได้ ต้องจัดทำราวหรือราวกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปณัมภ์	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคณงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้ง ได้ติดตั้งราวกันตกและตาข่ายปิดช่องเพื่อป้องกันการพลัดตก	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-61 - รูปที่ 2-63
23. ในกรณีที่มีการทำงานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมกัน จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ทำงานอยู่ชั้นล่าง ให้สร้าง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคณงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้ง มีการตรวจสอบนั่งร้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-61 - รูปที่ 2-63

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน			
24. ในกรณีที่ต้องใช้ขาหยั่งหรือม้ายืนในการทำงานต้องจัดให้มีการดูแลขาหยั่งหรือม้ายืนนั้นให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย และมีพื้นที่สำหรับยืนทำงานอย่างเพียงพอ	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-63
25. ในกรณีที่ทำงานในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย หรือการกระเด็นหรือตกหล่นของหินดินทรายหรือวัสดุต่าง ๆ ต้องจัดทำไหล่หิน ดิน ทรายหรือวัสดุนั้นให้ลาดเอียงเป็นมุมหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการพังทลาย	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-63
26. ในกรณีที่ทำงานในท่อ ช่อง โพรงอุโมงค์ หรือบ่อที่อาจมีการพังทลายต้องจัดทำผนังกันค้ำยัน หรือใช้วิธีอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายนั้นได้	- โครงการติดตั้งกำแพงกันดินเป็นกำแพงไดอะแฟรม (Diaphragm wall) ในช่วงงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (กิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานดินได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566)	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-7
27. ไม่ให้ทำงานบนนั่งร้านเมื่อพื้นนั่งร้านลื่น หรือที่มีส่วนใดชำรุดอาจเป็นอันตราย การทำงานบนนั่งร้านแขวนหรือนั่งร้านแบบกระเช้าขณะฝนตกหรือลมแรง อันอาจเป็นอันตราย และในกรณีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวให้รีบนำนั่งร้านดังกล่าวลงสู่พื้นดิน	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้ง มีการตรวจสอบนั่งร้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-63
28. ให้ป้องกันการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่ายหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะเดียวปิดกันหรือรองรับ	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สำหรับคนงานตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานในพื้นที่นั้น ๆ	-	- รูปที่ 2-47 - รูปที่ 2-63

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน			
29. ในกรณีที่มีการลำเลียงวัสดุขึ้นหรือลงจากที่สูง หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งให้จัดทำรางปล่องหรือใช้เครื่องมือและวิธีลำเลียงที่เหมาะสมและปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีลิฟต์ชั่วคราวสำหรับขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	-	- รูปที่ 2-22
(2.2) สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน			
1. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาต้องพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องระบุและครอบคลุมถึงการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้ ต้องกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้	- โครงการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาจากเกณฑ์ และมาตรการด้านความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน	-	- รูปที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-19 - ภาคผนวกที่ 2-20
1.1 กฎเกณฑ์ และปฏิบัติงานในการทำงาน			
1.2 การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ ให้เหมาะสมตลอดเวลาปฏิบัติงาน			
1.3 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	- โครงการจัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวันที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่แออัด	-	- รูปที่ 2-54
2. จัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวันที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่แออัด			
3. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน			
	- โครงการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนงานก่อสร้างที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน	-	- รูปที่ 2-53

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(2) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)			
(2.2) สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน			
4. จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้แยกจากที่พักสำหรับคนงานทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้แยกจากที่พักสำหรับคนงานทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ อีกทั้ง มีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-64
5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีเอกสารการจ้างคนงานอย่างถูกต้องมีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ที่ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจัดเก็บเอกสารการจ้างงานและประวัติคนงาน อีกทั้งสวัสดิการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด	-	- ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18
6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับคนงานที่เหมาะสม	- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจัดเก็บเอกสารการจ้างงานและประวัติคนงาน อีกทั้งสวัสดิการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด	-	- ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18
7. จัดให้มีอาสาสมัครประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสำนักงานสนามเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจำเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เกิดขึ้น	- โครงการได้จัดเตรียมอาสาสมัครประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสำนักงานสนาม	-	- รูปที่ 2-52 - รูปที่ 2-65
8. จัดให้มีอุปกรณ์และเปลสนามประจำห้องปฐมพยาบาล เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายคนงานก่อสร้างที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน	- โครงการจัดทำแผนและขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษาพยาบาลในสถานที่ใกล้เคียง กรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-66
9. กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่นำเหตุแห่งการมีประกันอุบัติเหตุหรือกองทุนใดๆ มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นในฐานะนายจ้าง	-	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
(3) การประเมินการส่งต่อผู้ป่วย			
1. จัดให้มีอาสาสมัครประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เพียงพอ	- โครงการได้จัดเตรียมอาสาสมัครประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	- รูปที่ 2-52 - รูปที่ 2-65
2. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) ประจำโครงการในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วยและการได้รับอุบัติเหตุ	-	- ภาคผนวกที่ 2-15
3. มีการอบรมคนงานก่อสร้าง โดยคนงานทุกคนจะต้องทราบระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ และที่ตั้งของโทรศัพท์โดยหมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉินจะต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน	- โครงการมีการติดข้อปฏิบัติและผังแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ในพื้นที่โครงการ อีกทั้งมีการอบรมคนงานก่อสร้างให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการแจ้งเหตุ	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-49 - รูปที่ 2-66
4. โครงการจะต้องจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษาพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการมีการซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งได้จัดทำแผนและขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษาพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-66
5. จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งได้จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-66
6. โครงการมีการจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ และระบบประกันอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ครอบคลุมการรักษาพยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้างในสถานพยาบาลในพื้นที่ และสถานพยาบาลใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ และระบบประกันอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ครอบคลุมการรักษาพยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	- ภาคผนวกที่ 2-17 - ภาคผนวกที่ 2-18

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.4 ทศนียภาพ และสุนทรียภาพ			
1. ดูแลการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของคณงานก่อสร้างในบริเวณบ้านพักคณงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลักสุขาภิบาล	- โครงการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของคณงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลักสุขาภิบาล	-	- รูปที่ 2-13 - รูปที่ 2-57
2. จัดทำรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการสูง 6 เมตร เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง	-	- รูปที่ 2-2
3. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดโดยรอบอาคาร เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงรอบโครงการ	- โครงการติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet รอบตัวอาคารขณะก่อสร้าง อีกทั้งมีการติดตั้งละอองน้ำรอบแนวรั้วโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังอาคารข้างเคียง	-	- รูปที่ 2-3 - รูปที่ 2-16
4. จัดให้มีรั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร กันตลอดแนวเดิรรถเดิม ส่วนบริเวณหลังบ้านระยะประชิดเสริม Mesh Sheet ต่ออีก 3 เมตร	- โครงการได้จัดทำรั้วชั่วคราวความสูง 6 เมตร กันตลอดแนวเดิรรถเดิม ส่วนบริเวณหลังบ้านระยะประชิดเสริม Mesh Sheet ต่ออีก 3 เมตร	-	- รูปที่ 2-2 - รูปที่ 2-3
5. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ไม่กีดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้างและทางสาธารณะ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีผ้าใบปิดคลุมตลอดเวลา ยกเว้นจะเปิดเมื่อรถวิ่งเข้า-ออก	- โครงการมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ไม่กีดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงบริเวณทางเข้า – ออก โครงการได้จัดให้มีประตูปิดทึบตลอดเวลา โดยจะเปิดเมื่อมีรถวิ่งเข้า-ออกเท่านั้น	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-20

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/ หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ			
1) การป้องกันอัคคีภัย			
1. โครงการต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.1 ห้ามจัดเก็บวัสดุไวไฟไว้ในอาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและที่พักอาศัยของคณงานก่อสร้างเว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น	- โครงการมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ไม่กีดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุไวไฟไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานประจำวันเท่านั้น	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-67
1.2 ดูแลมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟและจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ” หรือติดไฟหรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟให้เห็นได้ชัดเจน	- โครงการมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ ไว้บริเวณพื้นที่โครงการที่เห็นได้ชัดเจน	-	- รูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-48

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ			
1) การป้องกันอัคคีภัย			
1.3 จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 เครื่อง ในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะงานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายไวไฟหรือติดไฟ งานที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ หรือบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟ โดยในการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร หรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และในจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ	-	- รูปที่ 2-46 - รูปที่ 2-68
1.4 จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทั้งนี้ทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย	- โครงการติดตั้งเส้นทางปลอดภัยภายในอาคาร และข้อปฏิบัติ/ผังแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ภายในพื้นที่โครงการ อีกทั้งมีการอบรมคนงานก่อสร้างให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการแจ้งเหตุ	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-49
1.5 จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้โดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร	- โครงการมีการติดตั้งแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ในพื้นที่โครงการ มีการอบรมคนงานก่อสร้างให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการแจ้งเหตุ อีกทั้งจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณสำนักงานสนาม	-	- รูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-49 - รูปที่ 2-69

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)			
2. กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วนโดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่แยกจากที่พักสำหรับคนงานทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ อีกทั้ง มีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 2-64
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- รูปที่ 2-39
4. ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้แหล่งเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นมาตรการทั่วไปที่สามารถปฏิบัติได้	- โครงการมีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้แหล่งเชื้อเพลิง	-	- ภาคผนวกที่ 2-14
5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละอันไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ถูกต้องทันที	- โครงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละอันไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ถูกต้องทันที	-	- รูปที่ 2-46
6. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และทำการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที โดยผู้รับผิดชอบฯ คือ ผู้จัดการโครงการ	- โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อีกทั้งมีการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการครั้งสุดท้ายสุดเดือนสิงหาคม 2568	-	- รูปที่ 2-70 - ภาคผนวกที่ 2-7
7. จัดให้มีจุดรวมพลขนาด 80 ตารางเมตร ปลอดภัยสำหรับการอพยพคนงานไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร	- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลสำหรับการอพยพคนงานไว้บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานโครงการ	-	- รูปที่ 2-14

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)			
8. จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบและข้อบังคับในหน่วยงาน ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ	-	- รูปที่ 2-23
9. ชี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่ได้รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด	- โครงการมีการอบรม และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้จะมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด	-	- รูปที่ 2-23
10. จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและ เจ้าของโครงการ เพื่อหาทางแก้ไขทันที โดยมีขั้นตอนการร้องเรียน และแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการก่อสร้าง อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง กรณีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ผู้รับเหมาของโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-6 - รูปที่ 2-10 - ภาคผนวกที่ 2-2 - ภาคผนวกที่ 2-4
4.6 การเปลี่ยนแปลงลมและบดบังแสงพระอาทิตย์			
1. หากในช่วงก่อสร้างโครงการมีผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลมและการบดบังแสงพระอาทิตย์จากอาคารโครงการ สามารถหารือกับเจ้าหน้าที่ของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากการเปลี่ยนแปลงของลมและการบดบังแสงพระอาทิตย์จากอาคารโครงการ	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข/หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การเปลี่ยนแปลงลมและบดบังแสงพระอาทิตย์ (ต่อ)			
2. ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับวิธีการและช่องทาง ในการเรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลมและการบดบังแสงอาทิตย์	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ระหว่างเดือนระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงงานโครงสร้างอาคาร ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากการเปลี่ยนแปลงของลม และการบดบังแสงพระอาทิตย์จากอาคารโครงการ	-	- รูปที่ 2-1 - รูปที่ 2-5 - รูปที่ 2-6
3. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการ และจัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ			
4. ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้เนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562			



มกราคม 2569



กุมภาพันธ์ 2569



มีนาคม 2569



เมษายน 2569



พฤษภาคม 2569




มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-1 สถานะโครงการช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-2 แนวรั้ว Metal Sheet รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ

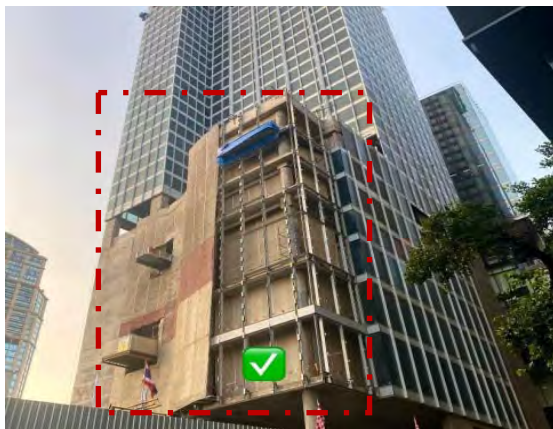

รูปที่ 2-3 ติดตั้ง Mesh Sheet

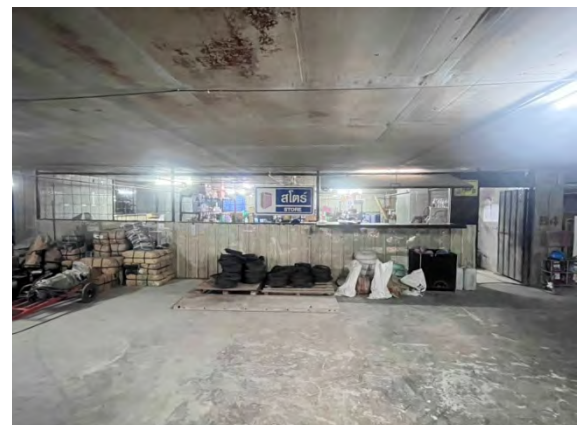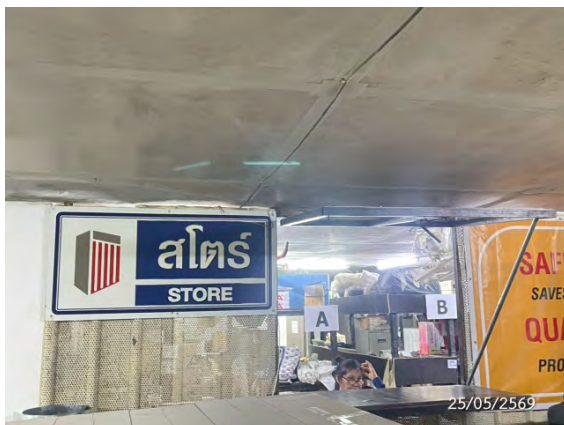


รูปที่ 2-4 STORE จัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 2-5 ป้ายรายละเอียดวิศวกรและผู้ควบคุมงานประจำโครงการ



รูปที่ 2-6 ตัวอย่างเจ้าหน้าที่โครงการพบปะและสำรวจอาคารข้างเคียง

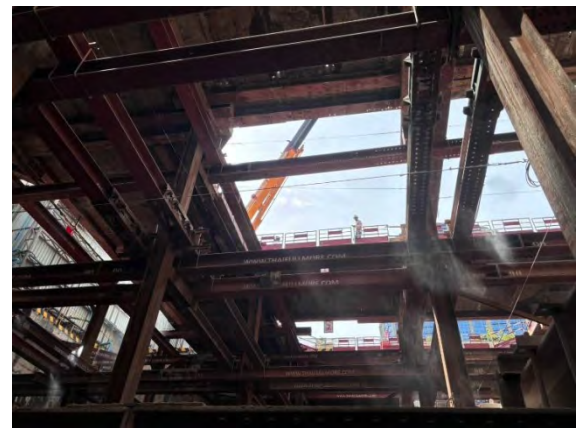

รูปที่ 2-7 กำแพงกันดิน (Diaphragm wall)/ค้ำยัน (ช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน)




รูปที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมอาคารข้างเคียง




รูปที่ 2-9 การปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 2-10 ป้ายรายละเอียดโครงการ (ผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน)

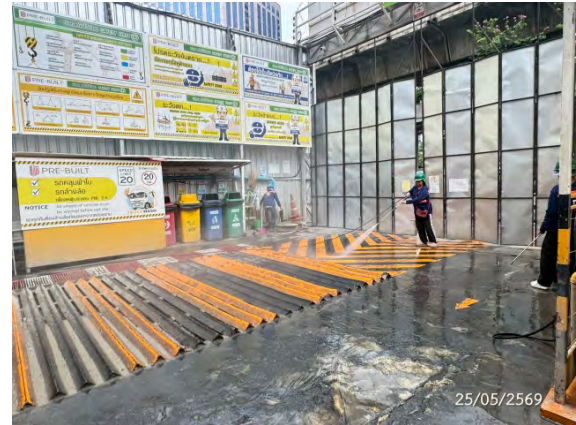

รูปที่ 2-11 พื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก

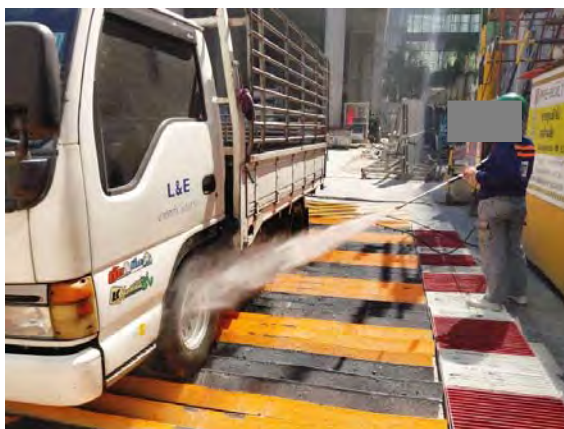

รูปที่ 2-12 ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-13 บ่อพักน้ำ และบ่อดักตะกอนดิน



จุดรวมพล



Site Safety Route Plan




ป้ายทางออกภายในอาคาร




ป้ายแสดงเลขชั้นภายในอาคาร

รูปที่ 2-14 จุดรวมพล/ผังเส้นทางปลอดภัย และตำแหน่งจัดวางเครื่องจักรภายในโครงการ

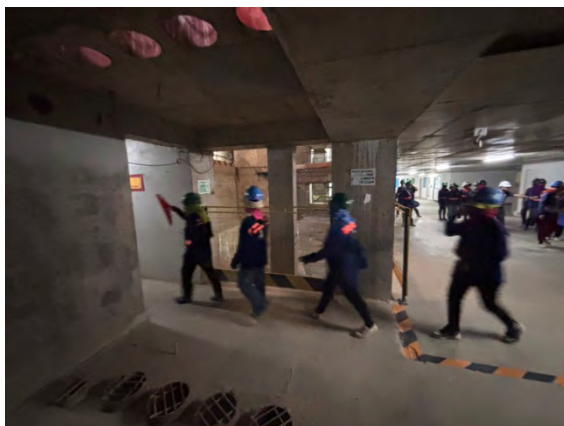

รูปที่ 2-15 การซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

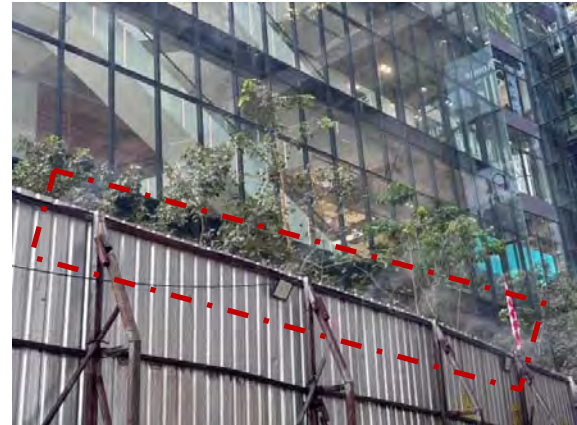

รูปที่ 2-16 ติดตั้งละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง



รูปที่ 2-17 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเรียลไทม์



รูปที่ 2-18 ติดตั้ง Protection ภายในอาคารป้องกันฝุ่นละออง





รูปที่ 2-19 คนงานทำความสะอาด/ฉีดพรมน้ำภายในโครงการเพื่อลดฝุ่นละออง



รูปที่ 2-20 การปิดทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 2-21 กล่องรับความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ

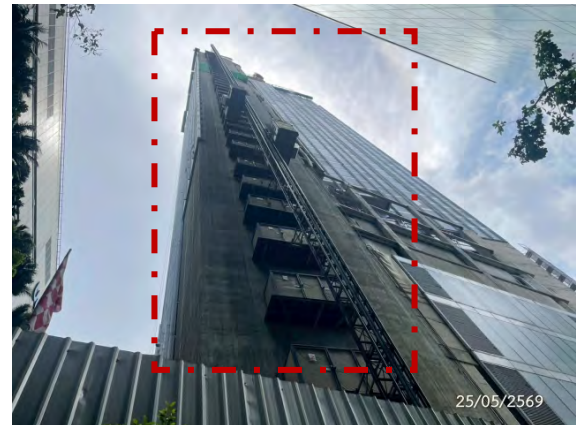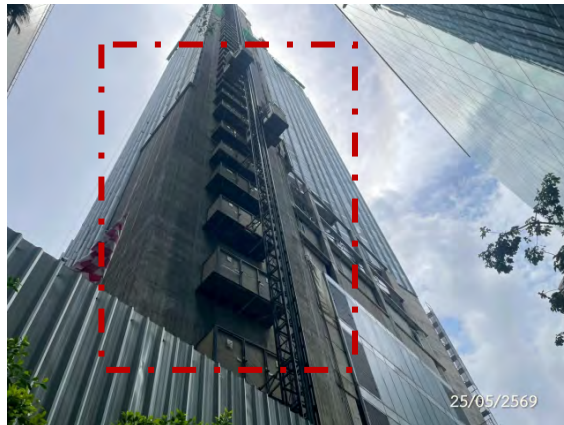

รูปที่ 2-22 ลิฟต์ชั่วคราวสำหรับขนวัสดุ



รูปที่ 2-23 ข้อกำหนด/ข้อปฏิบัติในหน่วยงาน



รูปที่ 2-24 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 2-25 คนงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง



แนวรั้ว Metal sheet (ติดอาคารพาณิชย์)

แนวรั้ว Metal sheet (ติดถนนทางเดินรถเดิม)

รูปที่ 2-26 แนวรั้ว Metal sheet บริเวณติดอาคารข้างเคียง



รูปที่ 2-27 ตารางมาตรการฯ บริเวณด้านหน้าโครงการ



ห้องส้วมบริเวณพื้นที่โครงการ



ห้องส้วมบริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 2-28 ห้องน้ำ/ห้องส้วม



ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบริเวณพื้นที่โครงการ



ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 2-29 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 2-30 ป้าย “ห้ามฆ่าหรือทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครอง”



รูปที่ 2-31 กิจกรรม Morning talk/Safety talk



รูปที่ 2-32 ถังสำรองน้ำชั่วคราวของโครงการ



รูปที่ 2-33 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ



รูปที่ 2-34 จุดพักน้ำ/เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ่อพักและตักตะกอนดิน




ภาพขณะรองรับมูลฝอยในพื้นที่โครงการ



จุดคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่โครงการ



จุดรวบรวมมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน

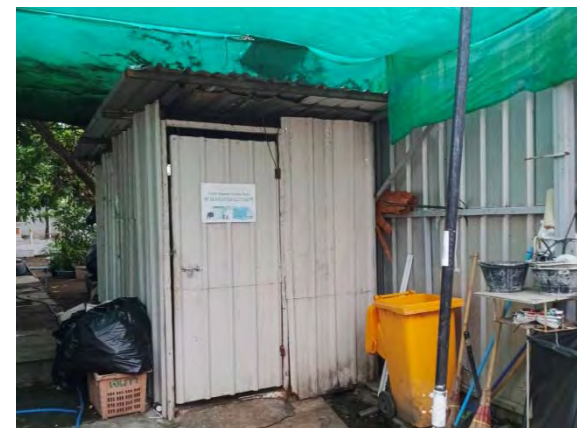

รูปที่ 2-35 ภาพขณะรองรับและจุดรวบรวมมูลฝอยของโครงการ



รูปที่ 2-36 พื้นที่จัดเก็บเศษเหล็ก/การเก็บขนไปกำจัด



บริเวณพื้นที่โครงการ



บริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 2-37 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจรวบรวมมูลฝอย



รูปที่ 2-38 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเก็บขนขยะ



รูปที่ 2-39 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลระบบตู้ไฟฟ้า




รูปที่ 2-40 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 2-41 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร



รูปที่ 2-42 ชื่อบริษัทผู้รับเหมา และเบอร์โทรติดต่อด้านหน้ารถบรรทุก

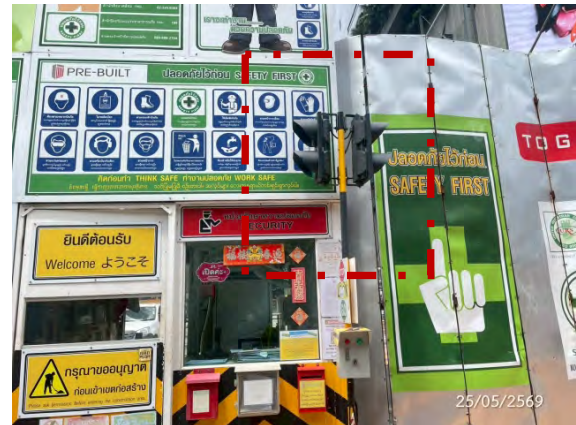

รูปที่ 2-43 ป้ายเตือนและสัญญาณจราจรด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-44 พื้นที่จอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ




ห้องควบคุม CCTV ในพื้นที่โครงการ

CCTV ด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-45 กล้อง CCTV



รูปที่ 2-46 ถังดับเพลิงเคมีและวิธีการใช้งาน

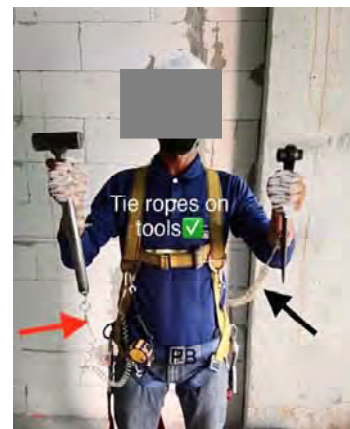

รูปที่ 2-47 การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

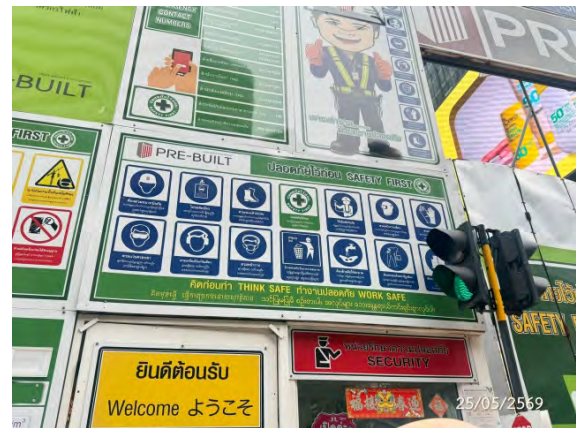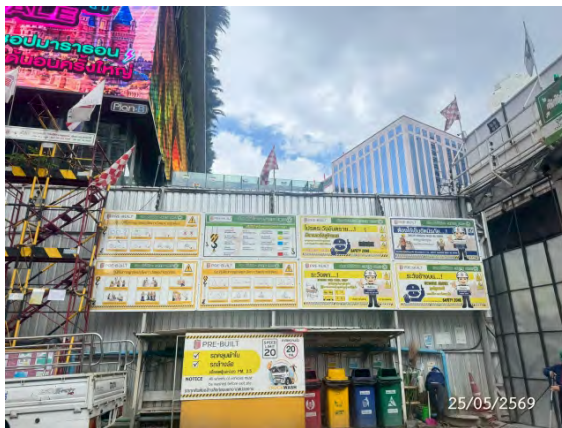

รูปที่ 2-48 ป้ายเตือนพื้นที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 2-49 การอบรมพนักงานใหม่และวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 2-50 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเคมีภัณฑ์



รูปที่ 2-51 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 2-52 ห้องปฐมพยาบาล




รูปที่ 2-53 จุดบริการน้ำดื่มสำหรับคนงาน



รูปที่ 2-54 พื้นที่พักระหว่างวันสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-55 เจ้าหน้าที่ทำลายและฉีดพ่นแหล่งเพาะพันธุ์

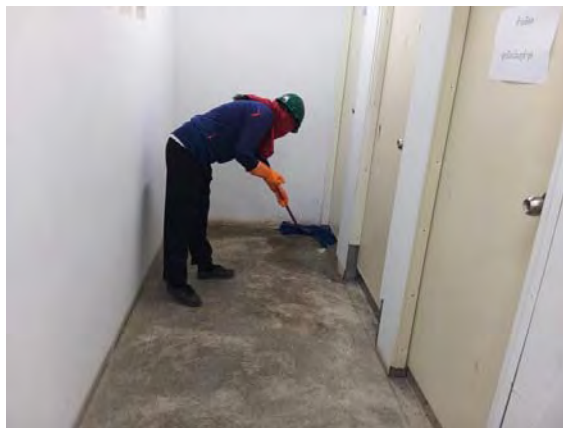

พื้นที่โครงการ

บ้านพักคนงาน

รูปที่ 2-56 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องส้วม



ป้ายกฎระเบียบและข้อปฏิบัติบริเวณบ้านพักคนงาน



ห้องพักสำหรับคนงาน



ถังสำรองน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

รูปที่ 2-57 บ้านพักคนงาน



ห้องน้ำ/ห้องส้วม



ลานอาบ/ซักล้าง



ถังดับเพลิงเคมีและวิธีการใช้งาน



ข้อปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับ COVID-19
บริเวณบ้านพักคนงาน

พ่อบ้านดูแลความเรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 2-57 (ต่อ) บ้านพักคนงาน



รูปที่ 2-58 จุดล้างมือบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-59 จุดทางเดินเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 2-60 อุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกจากที่สูง (Fall Prevention)



รูปที่ 2-61 ติดตั้งตาข่ายป้องกันการพลัดตก



รูปที่ 2-62 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ




รูปที่ 2-63 ราวกันตก



รูปที่ 2-64 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่



รูปที่ 2-65 ห้องปฐมพยาบาล

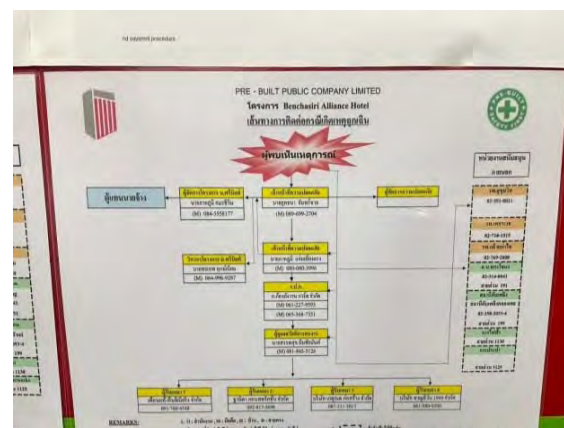



รูปที่ 2-66 เบอร์ดัดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-67 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ



รูปที่ 2-68 ถังดับเพลิงเคมีจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ

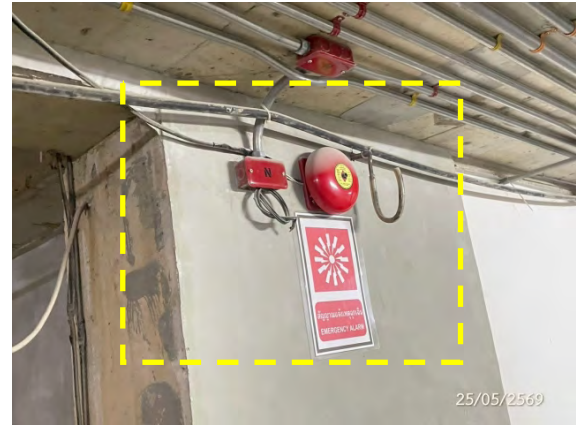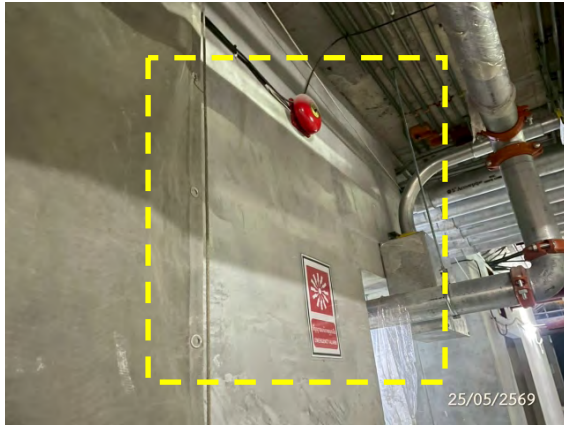

รูปที่ 2-69 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm)



รูปที่ 2-70 การอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ (สิงหาคม 2568)
