

บทที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่นิคมอุตสาหกรรมชุดโครงการ เสนาทิพย์ บีทีเอส-สะพานใหม่ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามตามเงื่อนไขของมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เสนาภิบาล บีทีเอส-สะพานใหม่

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ วิธีการจัดการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. การใช้น้ำ	ระบบจ่ายน้ำประปา	- ตรวจสอบการรั่วซึม หรือ แตกของท่อจ่ายน้ำประปา	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการรั่วซึม หรือ แตกของท่อจ่ายน้ำประปาอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.7
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของ ผนังและเสา ของถังเก็บน้ำ ชั้นใต้ดินให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดร่อน	ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- จัดให้มีการดำเนินการล้างทำความสะอาดถังเก็บ น้ำสำรองเป็นประจำทุก 1 ปี	-
	ปริมาณคลอรีนอิสระ คงเหลือ (Free Chlorine)	- ถังเก็บน้ำสำรอง	ในช่วงที่มีการทำความ สะอาดทุก 6 เดือน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ดำเนินการเก็บน้ำไปตรวจสอบเป็นประจำทุก 1 เดือน	ภาคผนวก 2.2
2. การใช้ไฟฟ้า และ อนุรักษ์พลังงาน	ระบบไฟฟ้าโครงการ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบ ไฟฟ้าโครงการ	ปีละ 2 ครั้งตลอดระยะ เปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลต้องจัดให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ที่ ชำนาญการเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี	-
3. การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ปริมาณมูลฝอย และ สภาพห้องพักมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพห้องพัก มูลฝอยให้อากาศถ่ายเท และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอย ให้อากาศถ่ายเท และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	ภาพที่ 2.5

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เสนาคิท์ บีทีเอส-สะพานใหม่

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ วิธีการจัดการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง(PH) - บีโอดี(BOD) - สารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ตะกอนหนัก (Settleable Solid) - ซัลไฟด์(Sulfide) - ทีเคเอ็น(TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and Grease) - ฟีคอล โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)	จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 3 จุด ได้แก่ - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนการบำบัด(บ่อสูบน้ำเสีย/ปรับสภาพน้ำเสีย อาคารA - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังการบำบัด(บ่อน้ำใส) - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนออกนอกโครงการ(บ่อตรวจคุณภาพน้ำ)	เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ดำเนินการเก็บน้ำไปตรวจสอบเป็นประจำทุก 1 เดือน	ภาคผนวก 2.2

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เสนาคิทท์ บีทีเอส-สะพานใหม่

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ วิธีการจัดการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำที่ผ่าน การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ตรวจสอบปริมาณ ไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อตก ขยะถ้ามีปริมาณมาก ให้คัดออก และ ประสานงานให้ สำนักงานเขตสาย ไหมเก็บขนต่อไป	- ถังดักไขมัน	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการโดยต้องทำ การสูบออกทุก 1 เดือนหรือเมื่อมี ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่มาก ตามความ เหมาะสม	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการดำเนินการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน	-
5. การป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ และจัดให้มีการ อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ ของระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย ประมาณ 2 ครั้งต่อปี และการซ้อมแผนการ หนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิงทุกๆ 1 เดือน - และมีการจัดจ้างบริษัทอบรมแผนการซ้อมอพยพ หนีไฟเป็นประจำทุก 1 ปี	ภาพที่ 2.8

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เสนาคิทท์ เสนาคิทท์ บีทีเอส-สะพานใหม่

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ วิธีการจัดการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
6. สระว่ายน้ำ 6.1 โครงสร้างสระ ว่ายน้ำ	พื้นที่สระว่ายน้ำ	ตรวจสอบสภาพกระเบื้อง อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการดำเนินการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน	ภาพที่ 2.10
	อุปกรณ์ทางไฟฟ้า/ หลอดบริเวณสระ ว่ายน้ำ	ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ งานไม่ชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ตรวจสอบ สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	ภาพที่ 2.6
	ทางเดินรอบสระว่าย น้ำ	ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ งานไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการตรวจสอบ สภาพพร้อมใช้งานไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง	ภาพที่ 2.1
6.2 อุบัติเหตุจากการ จมน้ำ	อุปกรณ์ช่วยชีวิต ประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วย ชีวิต	ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ไม่ชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการตรวจสอบ สภาพการใช้งานอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่ให้ชำรุด	-
	ตรวจสอบสภาพป้าย บอกระดับความลึก หรือเลขบอกตัว	ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ งานสามารถมองเห็นได้ ชัดเจนไม่ชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการตรวจสอบ สภาพป้ายบอกระดับความลึก สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนไม่ชำรุด	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เสนาคิทท์ เสนาคิทท์ บีทีเอส-สะพานใหม่

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ วิธีการจัดการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
6.2 อุบัติเหตุจากการ จมน้ำ(ต่อ)	ระดับความลึกที่ สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน ไม่ลบลื่อน				
6.3 คุณภาพน้ำสระ ว่ายน้ำ	เก็บตัวอย่างน้ำใน สระว่ายน้ำจำนวน 1 จุด	ตรวจสอบคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ ได้แก่ - ค่าความเป็นกรด(PH) และปริมาณคลอรีน อิสระคงเหลือ(Residual chlorine)	ทุกวันวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด บริการ ตลอด ระยะเวลาช่วงเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำทุกวัน	ภาพที่ 2.10
		- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliform bacteria) - ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform bacteria)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำทุกวัน	ภาพผนวก 2.2
		- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในสระว่ายน้ำ ได้แก่ คลอรีนที่ร่วมกับสาร อื่น	ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตโดยกรม โรงงาน เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบเป็น ประจำ	ภาพผนวก 2.2

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เสนาคิทท์ เสนาคิทท์ บีทีเอส-สะพานใหม่

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ วิธีการจัดการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
6.3 คุณภาพน้ำสระ ว่ายน้ำ(ต่อ)		- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ค่าความกระด้าง (Calcium Hardness) - คลอไรด์ (Chloride) - กรดไซคยานูริก (Cyanuric Acid) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - Escherichia coli - Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa			
	ความสะอาดของสระ ว่ายน้ำ	ตรวจสอบสระว่ายน้ำไม่มี ตะกอนตะไคร่น้ำ และเศษผง	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่าย น้ำทุกวัน	ภาพที่ 2.10

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เสนาคีทท์ บีทีเอส-สะพานใหม่

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ วิธีการจัดการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย	พื้นที่สีเขียวของ โครงการ	ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ไม้ให้ล้ม เขตที่ดิน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีบริษัทดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการดูแล รักษาให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ ไม้ให้ล้ม เขตที่ดิน	ภาพที่ 2.2
8. คุณภาพ	สภาพการใช้นถนน ซอยพลโยธิน 50 แยก 11 และถนน สาธารณะใกล้เคียง โครงการ	เก็บข้อมูลทะเบียนรถยนต์ ของผู้ที่พังกาซภายใน โครงการทุกคัน โดยจะ ตรวจสอบบนถนน ถนน ซอยพลโยธิน 50 แยก 11 ภายนอกโครงการ เพื่อ ไม่ให้ผู้พังกาซใน โครงการมีการนำรถยนต์ ส่วนตัวไปจอดบนถนน ซอยพลโยธิน 50 แยก 11	- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าหน้าที่ประจำโครงการต้องดำเนินการเก็บ ข้อมูลทะเบียนรถยนต์ของผู้ที่พังกาซภายใน โครงการทุกคัน	-
9. การจราจร	เรื่องร้องเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน และตรวจสอบ จนถึงภายหลังการจัด ทะเบียนนิติบุคคลอาคาร ชุดเป็นระยะเวลา 1 ปี	- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าหน้าที่ประจำโครงการต้องรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบจนถึงภายหลังการจัดทะเบียนนิติ บุคคลอาคารชุดเป็นระยะเวลา 1 ปี	-


ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ เสนาคิท์ บีทีเอส-สะพานใหม่

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ วิธีการจัดการ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
10. การบดบังแสงแดด ทิศทางลม และ สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์	เรื่องร้องเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน และตรวจสอบ จนถึงภายหลังการจัด ทะเบียนนิติบุคคลอาคาร ชุดเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงโครงการ ภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการต้องทำการศึกษา สำรวจสภาพเศรษฐกิจ และ สังคม รวมทั้งดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของ ประชาชนตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ โดย ดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนแปลงโครงการ พร้อมแสดงภาพตำแหน่ง การสำรวจประกอบ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ เรื่องร้องเรียนทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนก่อน ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลง โครงการในช่วงเปิด ดำเนินการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - โครงการต้องสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โครงการในช่วงเปิดดำเนินการ - โครงการดำเนินการมาแล้วมากกว่า 1 ปี	-

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 3 จุด ได้แก่ จุดตรวจคุณภาพน้ำก่อนการบำบัด จำนวน 1 จุด จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังการบำบัด และบ่อกักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ บนถนนสาธารณะจำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 1 จุด ได้แก่ น้ำในสระว่ายน้ำที่บริเวณ สระว่ายน้ำ จำนวน 1 บริเวณที่มีการใช้บริการมากที่สุด เดือนละ 1 ครั้ง

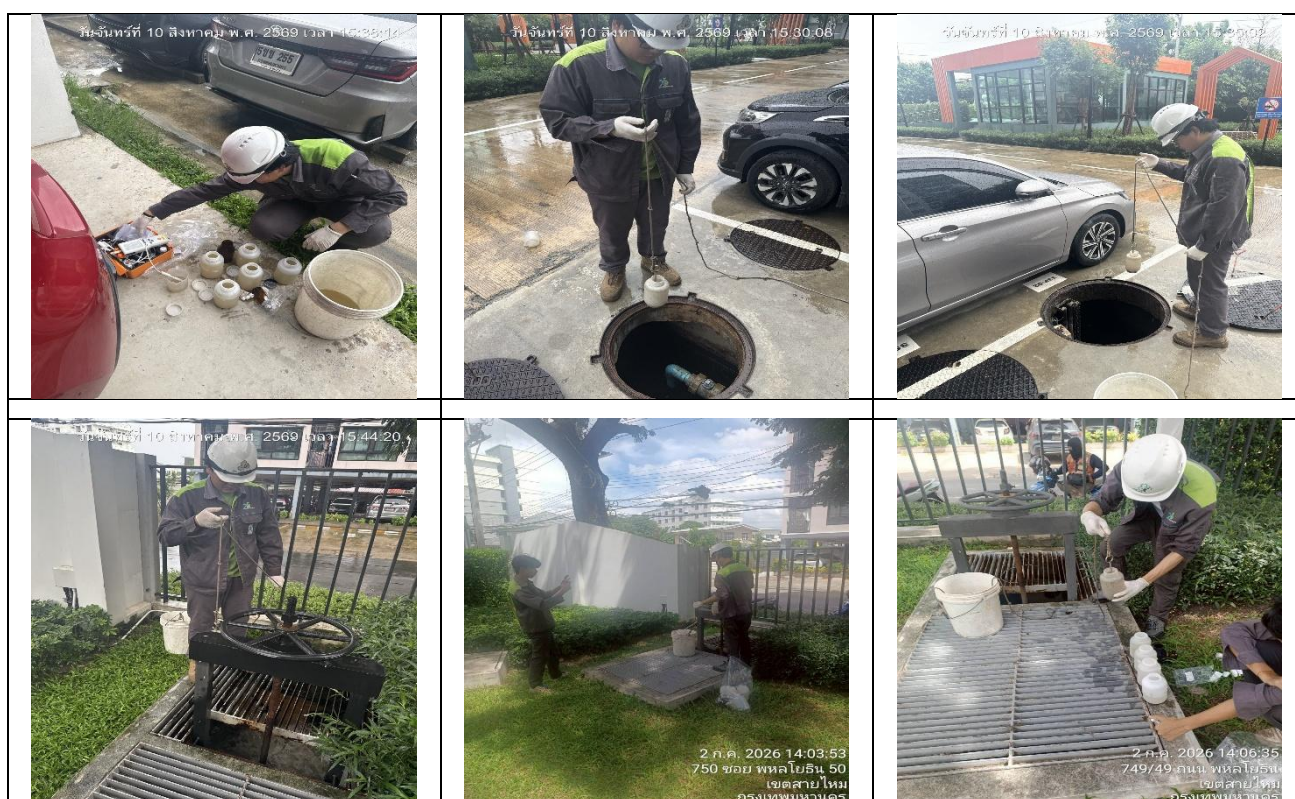

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และทำการเก็บตัวอย่างน้ำตามที่มาตรการกำหนด ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ได้ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เสนาคีทท์ บีทีเอส สะพานใหม่ ของ นิติบุคคลอาคารชุดเสนาคีทท์ บีทีเอส สะพานใหม่
 จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)
 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี x = 674132.79 y = 1536223.02 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ^(๓)
		17 ม.ค.	16 ก.พ.	16 มี.ค.	17 เม.ย.	14 พ.ค.	2 มิ.ย.		
pH	-	7.95	7.30	7.26	7.25	7.41	7.40	5-9	
BOD	mg/l	45	59	22	107	112	96	≤ 30	
SS	mg/l	58	61	35	46	70	39	≤ 40	
TDS	mg/l	483	451	294	433	514	535	≤ 1000	
Settleable Solid	Mg/l	0.9	0.8	0.1	0.1	0.5	<0.1	≤ 0.5	
Sulfide	mg/l	0.8	0.6	0.9	2.5	2.8	2.4	≤ 1.0	
TKN	mg/l	56.36	85.58	60.20	74.43	94.93	64.94	≤ 35	
Oil & Grease	ml/l/hr	8.4	12.1	5.8	5.6	3.6	3.4	≤ 20	
TCB	MPN/100 mL	1.6×10	1.6×10	1.6×10	1.6×10	1.6×10	1.6×10	-	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
 (๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เสนาคีทท์ บีทีเอส สะพานใหม่ ของ นิติบุคคลอาคารชุดเสนาคีทท์ บีทีเอส สะพานใหม่

จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บ่อน้ำใส

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 674132.79$ $y = 1536223.02$ 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน (๒)	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ^(๓)
		17 ม.ค.	16 ก.พ.	16 มี.ค.	17 เม.ย.	14 พ.ค.	2 มิ.ย.		
pH	-	7.25	7.57	7.48	6.90	7.74	7.97	5-9	
BOD	mg/l	23	28	131	31	20	4	≤ 30	
SS	mg/l	35	34	33	28	14	5	≤ 40	
TDS	mg/l	266	523	260	442	180	166	≤ 1000	
Settleable Solid	Mg/l	0.4	0.5	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 0.5	
Sulfide	mg/l	<0.2	0.2	1.6	1.3	0.3	0.3	≤ 1.0	
TKN	mg/l	34.89	26.24	68.03	44.45	20.09	0.58	≤ 35	
Oil & Grease	ml/l/hr	6.5	10.9	9.1	2.2	1.7	0.9	≤ 20	
TCB	MPN/100 mL	1.6×10	1.6×10	1.6×10	1.3×10	1.6×10	1.6×10	-	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เสนาคีทท์ บีทีเอส สะพานใหม่ ของ นิติบุคคลอาคารชุดเสนาคีทท์ บีทีเอส สะพานใหม่
จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี x = 674132.79 y = 1536223.02 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ^(๓)
		17 ม.ค.	16 ก.พ.	16 มี.ค.	17 เม.ย.	14 พ.ค.	2 มิ.ย.		
pH	-	7.40	7.28	7.33	7.70	7.27	7.42	5-9	
BOD	mg/l	21	20	93	18	120	23	≤ 30	
SS	mg/l	37	38	59	14	27	9	≤ 40	
TDS	mg/l	285	389	386	424	368	578	≤ 500	
Settleable Solid	Mg/l	0.1	<0.1	3.0	<0.1	2	0.1	≤ 0.5	
Sulfide	mg/l	<0.2	0.5	5.4	0.9	1.8	0.7	≤ 1.0	
TKN	mg/l	28.33	24.75	21.07	30.27	31.16	5.24	≤ 35	
Oil & Grease	ml/l/hr	2.0	3.6	13.5	2.1	4.3	1.5	≤ 20	
TCB	MPN/100 mL	1.6×10	1.6×10	1.6×10	7.9×10	1.6×10	1.6×10	-	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เสนาคีทท์ บีทีเอส สะพานใหม่ ของ นิติบุคคลอาคารชุดเสนาคีทท์ บีทีเอส สะพานใหม่
จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด สระว่ายน้ำ
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 674132.79$ $y = 1536223.02$ 47P

ดัชนีคุณภาพ น้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน (๒)	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ ^(๓)
		17 ม.ค.	16 ก.พ.	16 มี.ค.	17 เม.ย.	14 พ.ค.	2 มิ.ย.		
Total Coliform Bacteria	MPN /100 ml	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	≤ 10	
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 ml	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ND ²	ตรวจไม่พบ	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

