

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ 23 LUXURY SUITES
ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด
39 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ฉบับประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
(ระยะก่อสร้าง)



TNP
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ 23 LUXURY SUITES

ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด

39 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ฉบับประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

(ระยะก่อสร้าง)



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th


หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ 23 LUXURY SUITES

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองนี้ขอรับรองว่า บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES ตั้งที่อยู่ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท พี.เอส.สวีทส์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (☒) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
- (☐) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569
- (☐) อื่น ๆ

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวภาคินี เชื้อเวียง		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาววิมลวรรณ แก่นวงษ์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวอภิญญา จันทุภา		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ ร.ต.หญิงพฤษชาติ วงศ์ชัย		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 ขอแสดงความนับถือ

 นางสาวเบญจวรรณ ประสารถยา
 กรรมการผู้จัดการ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ 23 LUXURY SUITES**

1. ชื่อโครงการ โครงการ 23 LUXURY SUITES
2. สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
5. จัดทำโดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เลขที่ ทส 1009.5/6575
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ :
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES ของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 2)
8. รายละเอียดภายในโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยมีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคารเท่ากับ 104.80 เมตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารของโครงการทั้งหมดประมาณ 16,000.00ตารางเมตร ภายในโครงการมีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 54 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 54 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์(ร้านอาหาร) จำนวน 1 ห้อง โดยสามารถจอดรถยนต์ภายในโครงการได้ทั้งหมดจำนวน 100 คัน
 - ขนาดพื้นที่โครงการ 1 ไร่ 28ตารางวา (1-0-20 ไร่) หรือประมาณ 1,712.00 ตารางเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ นำเสนอรายละเอียดในบทที่ 1 และบทที่ 2

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4 แผนการดำเนินการประจำปี 2569	1-2
1.5 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน	1-4
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ	
2.1 ที่ตั้งและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ	2-1
2.2 รายละเอียดโครงการ	2-5
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-8
4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-8
4.1.2 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซในบรรยากาศ	4-19
4.1.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-24
4.1.4 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน	4-37
4.1.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-56
4.1.6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาตลอดระยะดำเนินการก่อสร้างโครงการ	4-63
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ	5-1
ภาคผนวก ก	
ก-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน	
ก-2 มาตรการโครงการ ฉบับลงนาม	
ภาคผนวก ข ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการ	
ภาคผนวก ค เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ	
ภาคผนวก ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	



สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 สภาพภายในโครงการ	1-4
2-1 ที่ตั้งโครงการ	2-2
2-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ	2-3
2-3 เส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ	2-4
2-4 ระยะเวลางานก่อสร้างโครงการ	2-6
2-5 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง	2-7
2-6 แผนที่แสดงเส้นทางขนส่งดิน	2-13
2-7 ผังแสดงพื้นที่ที่ดินสำหรับนำดินจากโครงการมาทิ้ง	2-14
4-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป TSP	4-18
4-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป PM-10	4-18
4-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)	4-22
4-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	4-22
4-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	4-23
4-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)	4-23
4-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของ L _{eq} 24 hr	4-35
4-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสุดของ L _{max}	4-35
4-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	4-36
4-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	4-58
4-11 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)	4-58
4-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS)	4-59
4-13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)	4-59
4-14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)	4-60
4-15 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids)	4-60
4-16 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease)	4-61
4-17 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)	4-61
4-18 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	4-62
4-19 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโคลิฟอร์ม	4-62



สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-20 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป TSP ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-83
4-21 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป PM-10 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-85
4-22 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-89
4-23 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-90
4-24 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-91
4-25 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-93
4-26 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของ L _{eq} 24 hr ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-129
4-27 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสุดของ L _{max} ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-131
4-28 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-133
4-29 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-198
4-30 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-198
4-31 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-199
4-32 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-199
4-33 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-200
4-34 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-200
4-35 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-201
4-36 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-194



สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-37 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-202
4-38 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิโคลโคลิฟอร์ม ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2569	4-202



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-3
2-1 องค์ประกอบของมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง	2-10
2-2 ปริมาณดินขุดและดินถมของโครงการ	2-12
3-1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)	3-2
3-2 ตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	3-5
4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4-2 ตารางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	4-2
5-1 มาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	5-1
5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	5-2



บทที่ 1

บทนำ



บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด มีแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อโครงการว่า 23 LUXURY SUITES ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด จำนวน 3 แปลง ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1 ไร่ 28 ตารางวา (1-0-20 ไร่) หรือประมาณ 1,712.00 ตารางเมตร เป็นอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 55 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยจำนวน 54 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านอาหาร) จำนวน 1 ห้อง ซึ่งก่อสร้างภายหลังได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ

ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) ทางเจ้าของโครงการมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายของหนังสือเห็นชอบ ทั้งนี้ บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด จึงได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ให้ดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitor) เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรายงานฉบับนี้เป็นารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ 23 LUXURY SUITES ของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและต่อพื้นที่ข้างเคียง

3) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ 23 LUXURY SUITES ของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติม กรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดำเนินการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.4 แผนการดำเนินการประจำปี 2569

จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES ของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามเลขที่ ทส 1010.5/1053 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 และแสดงแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดัง ตารางที่ 1-1



ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2567	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2568	✓, ค.1	✓	✓	✓	✓	✓, ค.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2569	✓, ค.3	✓	✓	✓	✓	✓, ค.4						

หมายเหตุ :

✓ หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำเดือน

ค.1 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2567)

ค.2 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568)

ค.3 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2568)


ค.4 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ (ผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2569)

การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการปฏิบัติงานจริงของโครงการ



1.5 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน

สถานภาพทั่วไปของโครงการ ระยะก่อสร้าง ช่วงงานโครงสร้าง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 แสดงดังภาพการก่อสร้างโครงการปัจจุบัน รูปที่ 1-1

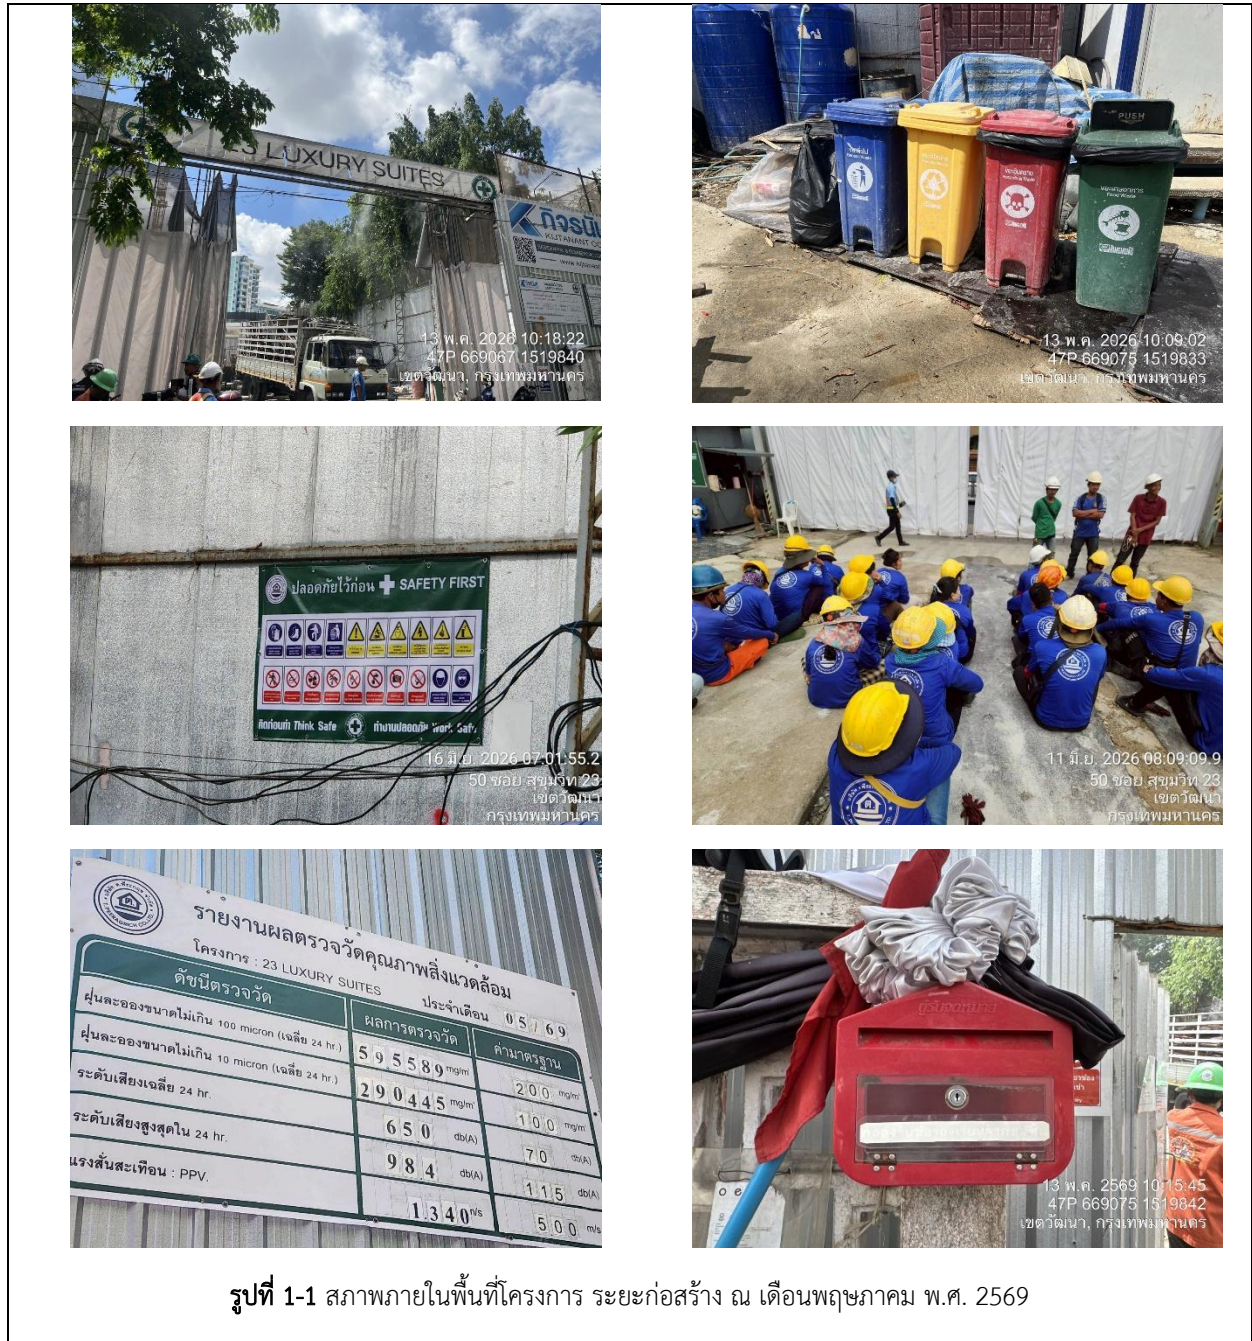

บทที่ 2

รายละเอียดของโครงการ



บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

2.1 ที่ตั้งและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ

2.1.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการ 23 LUXURY SUITES ตั้งอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โครงการตั้งอยู่บนกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด จำนวน 3 แปลง มีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1 ไร่ 28 ตารางวา (1-0-28 ไร่) หรือประมาณ 1,712.00 ตารางเมตร ดำเนินการโดย บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ภายในโครงการมีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 55 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 54 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านอาหาร) จำนวน 1 ห้อง โดยสามารถจอดรถยนต์ภายในโครงการได้ทั้งหมดจำนวน 100 คัน

2.1.2 อาณาเขตติดกับพื้นที่โดยรอบ

ทิศเหนือ	ติดกับ	พื้นที่ว่างของบุคคลอื่น
ทิศใต้	ติดกับ	อาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ทิศตะวันออก	ติดกับ	อาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ซอยสุขุมวิท 23 ซึ่งมีลักษณะเป็นทางสาธารณะประโยชน์ มีความกว้างประมาณ 11.10-12.55 เมตร


2.1.3 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้รถยนต์ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (MRT) เป็นหลัก โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก สถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี และถนนซอยสุขุมวิท 23 ซึ่งทางรถยนต์จะใช้ถนนซอยสุขุมวิท 23 เป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่ถนนสุขุมวิท โดยเดินทางออกจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 1.70 กิโลเมตร จะถึงปากซอยสุขุมวิท 23 เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท

1) เดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก จากสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก เข้าสู่ถนนสุขุมวิทแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านแยกอโศกมนตรีเป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร จะพบซอยสุขุมวิท 23 อยู่ทางซ้ายมือจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 23 แล้วมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 1.70 กิโลเมตร จะพบที่ตั้งโครงการทางด้านขวามือ (ทิศตะวันออก)

2) เดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี จากสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี เข้าสู่ถนนอโศกมนตรีแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 900 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 29 แยก 1 แล้วตรงไปอีกประมาณ 150 เมตร จะพบซอยสุขุมวิท 23 อยู่ทางซ้ายมือ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 23 แล้วมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการทางด้านขวามือ (ทิศตะวันออก)



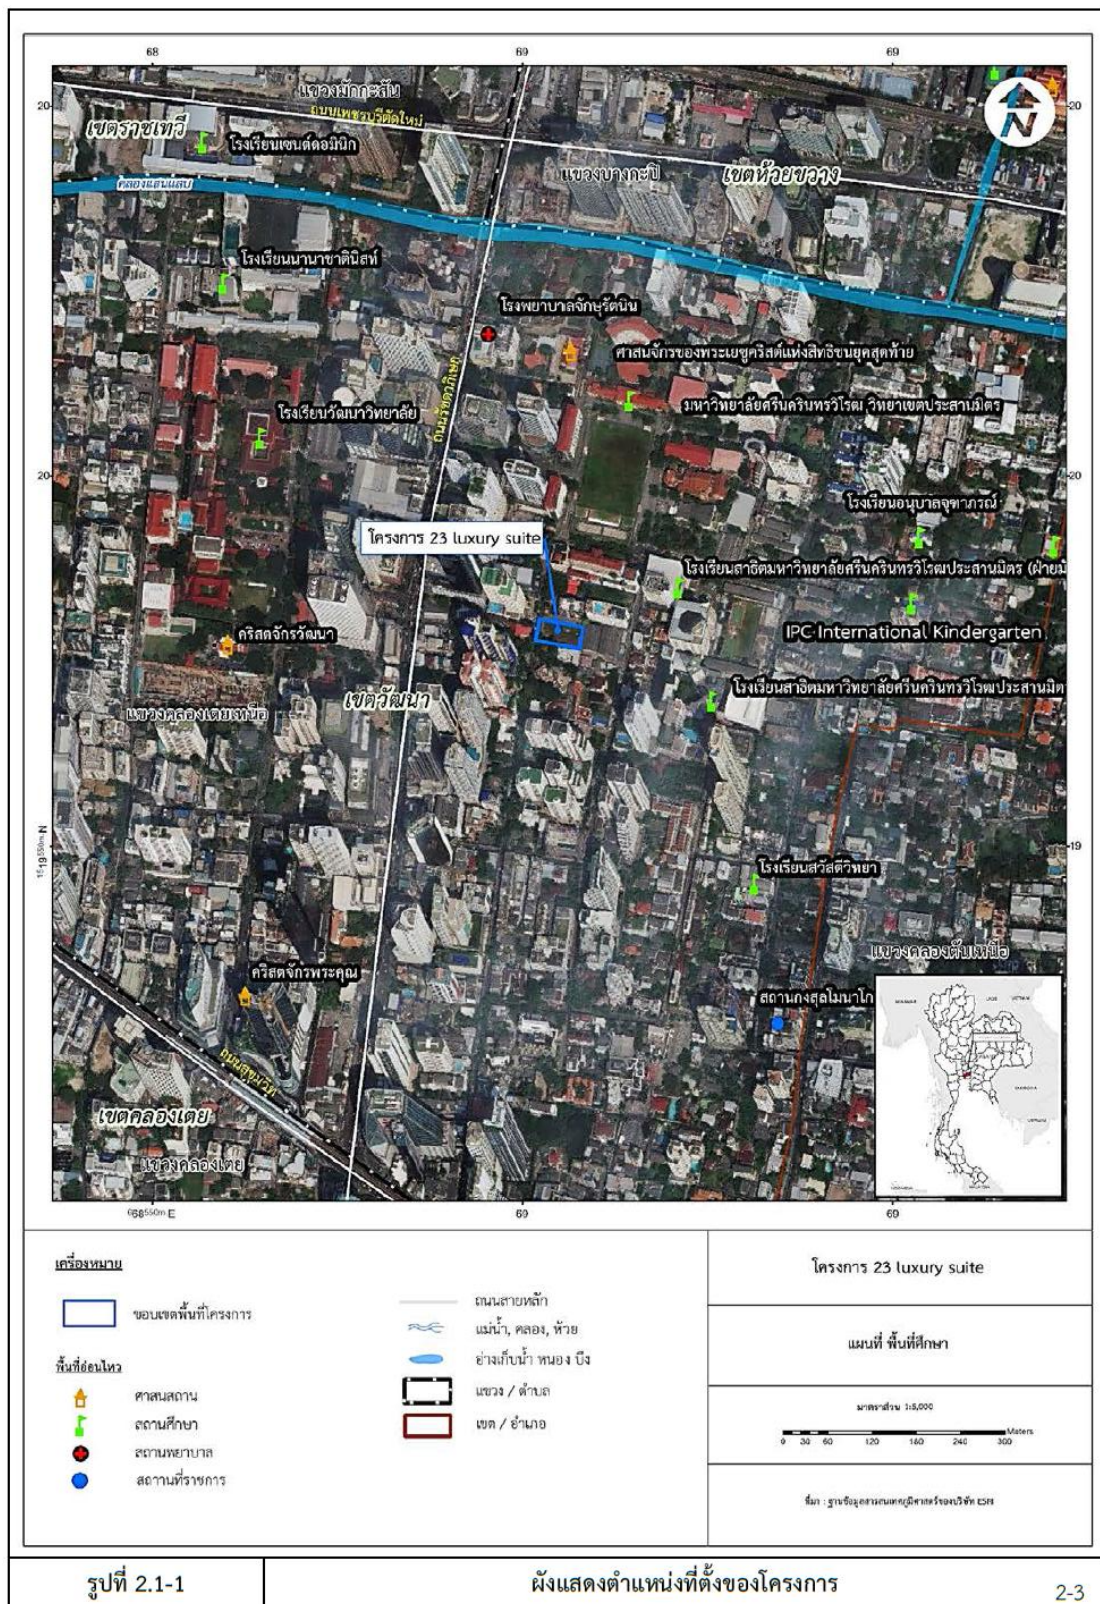

รูปที่ 2.1-1


ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ

2-3

ภาพที่ 2-1 ที่ตั้งโครงการ

(อ้างอิงข้อมูลจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : EIA)



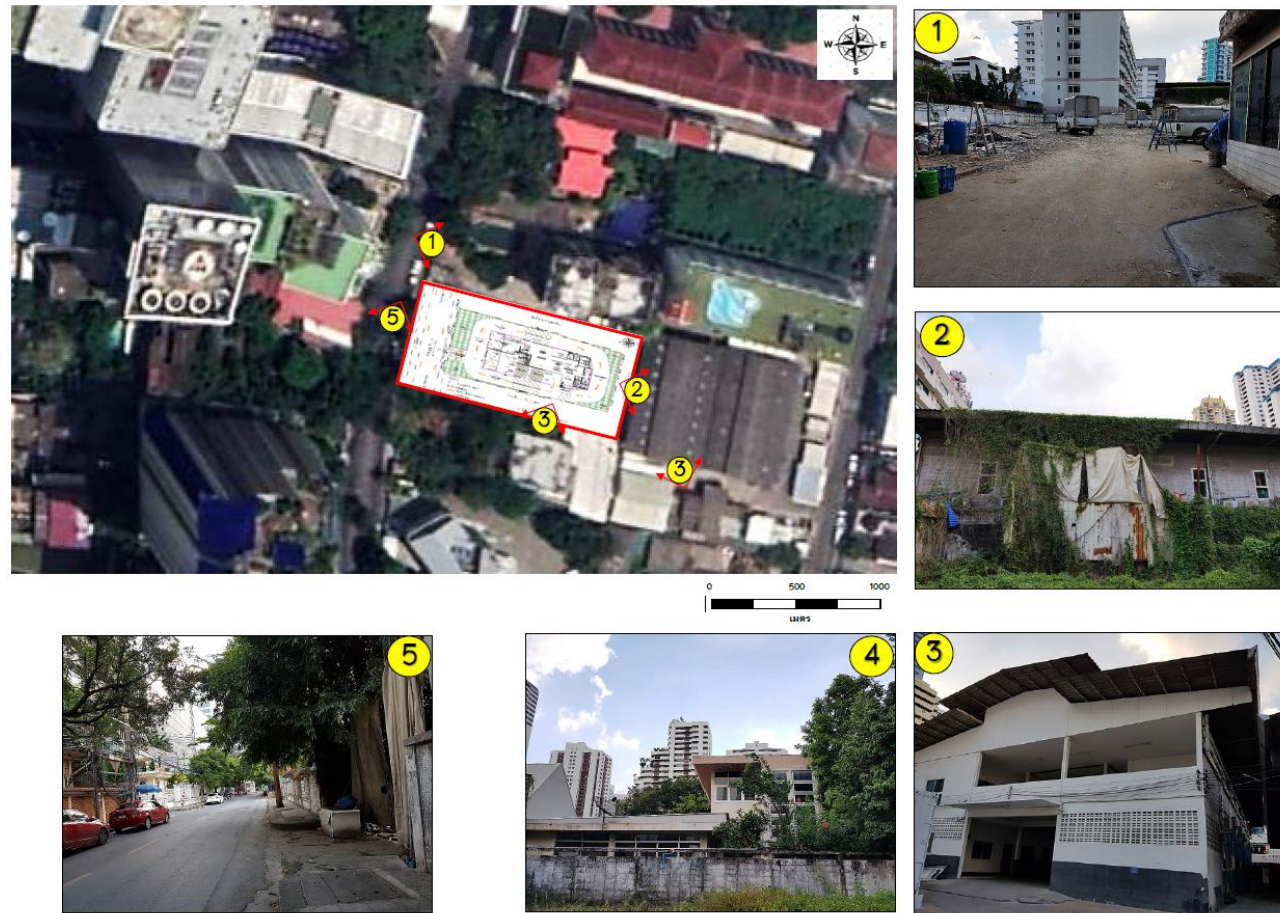


รูปที่ 2.1-4

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ

2-6

ภาพที่ 2-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ
(อ้างอิงข้อมูลจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : EIA)



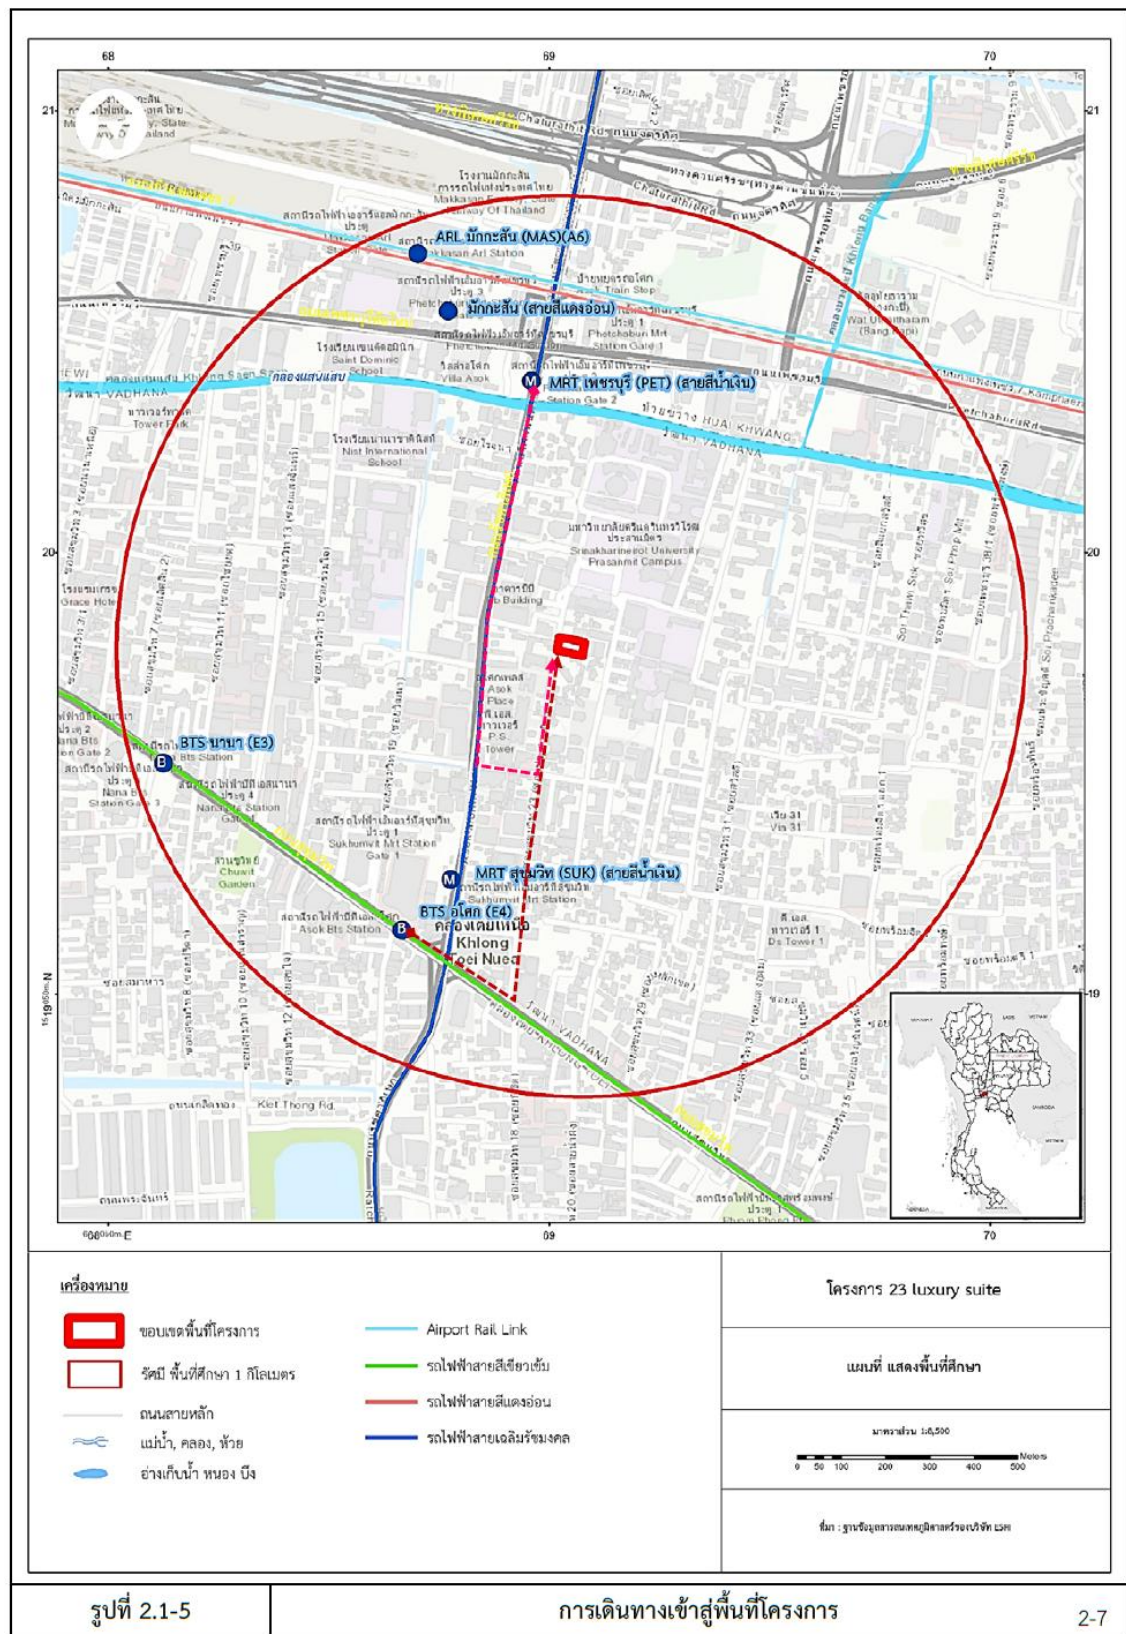

ภาพที่ 2-3 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ
(อ้างอิงข้อมูลจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : EIA)



2.2 รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ

2.2.1 กำหนดการก่อสร้างโครงการ

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 11 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร ข้อ 113 กำหนดให้ “ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างซึ่งก่อให้เกิดเสียงและแสงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่าง 22.00 น. ถึง 06.00 น. เว้นแต่จะได้มีการป้องกันและได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” โดยโครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และห้ามดำเนินการใดๆ ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ทางโครงการต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการดำเนินการก่อสร้างและกิจกรรมการก่อสร้างต้องเป็นกิจกรรมเบา อาทิเช่น กิจกรรมการตกแต่ง แต่ทั้งนี้ห้ามดำเนินการก่อสร้างใดๆ ในช่วงเวลา 22.00-06.00 น.

สำหรับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 33 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่งานวางเสาเข็ม งานระบบป้องกันดินพัง งานวางฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ งานระบบลิฟต์ งานระบบระบายน้ำและถนนภายนอกอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม งานทำความสะอาดและเก็บงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) งานวางเสาเข็ม	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	3	เดือน
2) งานระบบป้องกันดินพัง	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	6	เดือน
3) งานวางฐานราก	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	4	เดือน
4) งานโครงสร้างอาคาร	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	12	เดือน
5) งานสถาปัตยกรรม	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	19	เดือน
6) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	20	เดือน
7) งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	20	เดือน
8) งานระบบปรับอากาศ	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	5	เดือน
9) งานระบบลิฟต์	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	6	เดือน
10)งานระบบระบายน้ำและถนนภายนอกอาคาร	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	6	เดือน
11)งานภูมิสถาปัตยกรรม	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	3	เดือน
12)งานทำความสะอาดและเก็บงาน	จะใช้ระยะเวลาประมาณ	6	เดือน



ตารางที่ 2.18-1 แผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ

รายละเอียด	ระยะเวลาก่อสร้าง (เดือน)																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1. งานวางเสาเข็ม																																		
2. งานระบบป้องกันดินพัง																																		
3. งานวางฐานราก																																		
4. งานโครงสร้างอาคาร																																		
5. งานสถาปัตย์																																		
6. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร																																		
7. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง																																		
8. งานระบบปรับอากาศ																																		
9. งานระบบลิฟต์																																		
10. งานระบบระบายน้ำ																																		
11. งานภูมิสถาปัตย์																																		
12. งานทำความสะอาดและเก็บงาน																																		

ภาพที่ 2-4 ระยะเวลางานก่อสร้างโครงการ
(อ้างอิงข้อมูลจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : EIA)





2.2.2 คนงานก่อสร้างโครงการ

การก่อสร้างโครงการจะดำเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของโครงการกำกับดูแลงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน โดยคาดว่าจะมีจำนวนคนงานก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 100 คน ซึ่งมีความชำนาญในแต่ละสาขาการก่อสร้าง โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันมาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้น จำนวนคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานในบริเวณพื้นที่โครงการในแต่ละวันจะมีจำนวนไม่เกิน 100 คน โดยคนงานก่อสร้างทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่

2.2.3 สาธารณูปโภคสำหรับคนงานก่อสร้าง

1) น้ำใช้และน้ำดื่มของคนงานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

การใช้น้ำในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะขอใช้น้ำชั่วคราวจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุโขวิท โดยมีจุดรับน้ำตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานควบคุมการก่อสร้างบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งมีอัตราการใช้น้ำของคนงานก่อสร้างประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน (วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร การออกแบบ ติดตั้งและการบำรุงรักษา : ศ.ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต และคณะ) โดยโครงการมีจำนวนคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน ซึ่งคิดเป็นความต้องการน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำใช้เพื่อการก่อสร้างจะมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณน้อย เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตผสมสำเร็จรูป ดังนั้น การใช้น้ำเพื่อการก่อสร้างจึงมีเฉพาะส่วนของงานก่ออิฐฉาบและงานฉาบ ซึ่งจะใช้น้ำไม่เกิน 10.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมเป็นความต้องการใช้น้ำในช่วงของการก่อสร้างโครงการทั้งหมดประมาณ 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในส่วนของน้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้าง ทางโครงการจะจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มบรรจุถังที่มีขายตามท้องตลาดภายในบริเวณสำนักงานก่อสร้างโครงการเพื่อบริการแก่คนงานก่อสร้าง

2) การจัดการน้ำเสียภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

โครงการมีจำนวนคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน ซึ่งคิดเป็นความต้องการน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อคิดปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้จากคนงานก่อสร้างจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยการใช้น้ำของคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นการใช้น้ำเพื่อการชำระล้าง ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2515 ที่

สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทางโครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิด Contact Aeration Treatment จำนวน 1 ถัง สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีความเพียงพอในการรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ประมาณร้อยละ 92 ซึ่งกำหนดให้น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีค่า BOD ประมาณ 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ประมาณ 20 มิลลิกรัม/ลิตร



3) การระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

โครงการได้จัดสรรพื้นที่ในช่วงของการก่อสร้างโครงการเพื่อก่อสร้างสำนักงานโครงการชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วมของคณงานก่อสร้าง บ่อตกตะกอนดิน รวมทั้งวางระบบน้ำฝนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- สำนักงานโครงการชั่วคราว มีจำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้สำหรับเป็นห้องประชุม เตรียมงานโครงการของวิศวกรและช่างก่อสร้าง

- โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง มีจำนวน 1 หลัง โดยใช้เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ขนส่งจากโครงการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กีดขวางการทำงานของคณงานก่อสร้าง

- ห้องน้ำและห้องส้วม จัดให้มีห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง และห้องส้วม จำนวน 4 ห้อง โดยโครงการได้กันรั้วสังกะสีสูง 2.00 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมจะผ่านบ่อเกรอะ-บ่อกรองใ้รออากาศก่อนที่จะไหลไปยังบ่อตกตะกอนดินภายในโครงการ

ทั้งนี้ โครงการจะขุดร่องดินสำหรับระบายน้ำฝนที่ไหลบ่าไปยังแนวเขตที่ดินของโครงการ ซึ่งร่องดินดังกล่าวมีขนาดความกว้างประมาณ 1.00 เมตร ลึกประมาณ 1.00 เมตร โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่โครงการจะไหลตามความลาดชันลงสู่รางระบายที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ จากนั้นจะระบายลงสู่บ่อตกตะกอนดิน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีบ่อตกตะกอนดินตามทางเลี้ยงของรางระบายน้ำขนาดพื้นที่ประมาณ 4.00 ตารางเมตร (2.00 x 2.00 เมตร) และลึกประมาณ 1.50 เมตร โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 6.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกรณีที่ฝนตกในปริมาณมากปริมาณน้ำฝนบางส่วนจะไหลซึมลงสู่ดินและส่วนมากจะไหลบ่าหน้าดินลงสู่ร่องดินระบายน้ำฝนและบ่อตกตะกอนดินโดยไม่ไหลบ่าไปยังพื้นที่ข้างเคียง ส่วนในกรณีที่ฝนไม่ตก ปริมาณน้ำที่ที่เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ซึ่งมีประมาณ 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะไหลลงสู่บ่อตกตะกอนดินบริเวณใกล้กับห้องน้ำ-ห้องส้วมของคณงานก่อสร้าง โดยโครงการจะนำปริมาณน้ำที่ดังกล่าวไปใช้ในการรดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง

4) การจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

มูลฝอยของคณงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเกิดจากภาชนะบรรจุอาหารของคณงานก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณที่น้อยมากในแต่ละวัน โดยปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากคณงานก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างคาดว่าจะมีไม่เกิน 1 ใน 3 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากบุคคลในแต่ละวัน (3 ลิตร/คน/วัน) หรือคิดเป็นปริมาณมูลฝอยจากคณงานก่อสร้างประมาณ 1 ลิตร/คน/วัน โดยในช่วงของการก่อสร้างโครงการที่มีจำนวนคณงานก่อสร้างมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะมีไม่เกิน 100 คน/วัน โดยคิดเป็นปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคณงานก่อสร้างประมาณ 100.00 ลิตร/วัน หรือ 0.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิด จำนวน 3 ถัง ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยแยกเป็นถังมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) และถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยในช่วงของการก่อสร้างโครงการได้ประมาณ 0.72 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 7 วัน โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมไปกำจัดโดยสำนักงานเขตวัฒนา สำหรับเศษวัสดุก่อสร้าง ทางโครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำออกจากพื้นที่โครงการทั้งหมดเมื่องานการก่อสร้างแล้วเสร็จ



ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของมูลฝอยแต่ละประเภทที่เกิดจากการก่อสร้างมากที่สุดในโครงการ อันดับแรกคือ เศษคอนกรีต โดยมีค่าเฉลี่ยการเกิดเท่ากับ ร้อยละ 50 อันดับสอง คือ เศษเหล็ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 28 อันดับสาม คือ เศษไม้แบบ มีค่าเฉลี่ยการเกิดเท่ากับ ร้อยละ 18 และอันดับสี่ และห้า คือ อื่นๆ เช่น ยิปซัมบอร์ดเศษถุงและพลาสติก และ เศษกระดาช มีค่าเฉลี่ยการเกิดเท่ากับ ร้อยละ 2 (เทพฤทธิ์ มนต์แก้ว และจรงค์ ผลิตประเสริฐ(2563)

ตารางที่ 2-1 องค์ประกอบของมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

องค์ประกอบ	อัตราการผลิตของเสีย ^{1/} (คิดเป็นร้อยละของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ตัน)	
คอนกรีต	50	899.68×0.50	449.84
เหล็ก	28	899.68×0.28	251.91
ไม้แบบ	18	899.68×0.18	161.94
อื่นๆ เช่น ยิปซัมบอร์ดเศษ ถังสี ถังทินเนอร์ สายไฟ ถุงและ พลาสติก	2	899.68×0.02	17.99
กระดาช	2	899.68×0.02	17.99
รวม			899.68

ที่มา : ^{1/} กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยมหิดล และ German Technical. (2549). รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้าง
สำหรับประเทศไทย. หน้า 3-7

จากการประเมินองค์ประกอบหลักของมูลฝอยแต่ละประเภทที่เกิดจากการก่อสร้างในโครงการ สามารถแยกชนิดของมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างได้แก่ คอนกรีต เหล็ก ไม้แบบ กระดาช และอื่นๆ เช่น ยิปซัมบอร์ดเศษ ถุงและพลาสติก เป็นต้น โดยในส่วนของคอนกรีตโครงการจะนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และในส่วนที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับกำจัด ซึ่งได้แก่ เหล็ก ไม้แบบ กระดาช และอื่นๆ เช่น ยิปซัมบอร์ดเศษ ถุงและพลาสติก เป็นต้น โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและเพื่อความสะดวกในการจัดการเศษวัสดุ ซึ่งบางส่วนสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือยังมีมูลค่าเพียงพอที่จะนำไปขายได้ โดยแยกเป็นประเภทดังนี้

(1) เหล็ก ไม้แบบ และกระดาชนั้นเจ้าของโครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมามีแผนในการคัดแยกขยะดังกล่าวตามลักษณะทางกายภาพโดยเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือทำการคัดแยกเพื่อขายต่อไป โดยโครงการจะติดต่อผู้รับซื้อของเก่าที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้เคลได้

(2) ถุง และถุงพลาสติก เศษวัสดุจากการตกแต่งอาคาร เช่น ถังสี ถังทินเนอร์ สายไฟ หรือขยะทั่วไปต่างๆทางโครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาเก็บรวบรวมจะเก็บและรวบรวมไว้ภายในส่วนพักมูลฝอยแต่ละประเภท เพื่อรอให้สำนักงานเขตพัฒนาเข้ามาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยประเภทต่างๆ ไปกำจัดตามความเหมาะสมต่อไป



(3) แผ่นยิปซัมบอร์ด กระดาษหรือ และมูลฝอยจากการก่อสร้างชนิดอื่นๆ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาเก็บรวบรวมนำไปผสมรวมกับดินชุด บริเวณซอยอุดมสุข 42 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด

(4) ปริมาณการเกิดมูลฝอยประเภท โคลน Bentonite ดังนี้

(4.1) การเตรียม Silo สำหรับใส่สารละลายอย่างน้อย 4 ตัน (เสาเข็ม)

(4.2) เติมน Bentonite 5 กิโลกรัม / สารละลาย 1.00 ลูกบาศก์เมตร

(4.3) เติมน Polymer 0.70 กิโลกรัม / สารละลาย 1.00 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้โครงการได้แสดงวิธีการกำจัด โคลน Bentonite โดยหลังจากปล่อยให้ Bentonite ตกตะกอนใน Silo และจะปล่อยออกโดยให้ Bentonite ผสมกับดิน ที่เจาะเสาเข็มแล้วนำไปทิ้ง โดยโครงการได้ทำการคำนวณปริมาณ Bentonite ที่เหลือใช้ดังนี้

เสาเข็มเจาะของโครงการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	=	1.00 เมตร
พื้นที่หน้าตัด	=	0.786 ตารางเมตร
ระดับความลึกเสาเข็มเจาะ	=	- 55.00 เมตร
ระดับดินเดิม	=	- 0.50 เมตร
ระดับของสารละลายเบนโทไนต์ต่ำกว่าระดับดินเดิม 2 00 เมตร	=	- 2.50 เมตร
ความสูงของสารละลายเบนโทไนต์	=	52.50 เมตร
ปริมาณสารละลายเบนโทไนต์/ เสาเข็มเจาะ 1 ตัน	=	พท.หน้าตัดเสาเข็มเจาะ x ความสูงของสารละลายเบนโทไนต์
	=	41.25 ลูกบาศก์เมตร
สารละลายเบนโทไนต์สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพใช้ได้ 3 ครั้ง		
ปริมาณสารละลายเบนโทไนต์/ เสาเข็มเจาะ 3 ตัน	=	13.75 ลูกบาศก์เมตร
จำนวนเสาเข็มเจาะทั้งหมดของโครงการ	=	60.00 ตัน
ปริมาณสารละลายเบนโทไนต์/ เสาเข็มเจาะทั้งหมด	=	275.00 ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น คิดเป็นปริมาณสารละลายเบนโทไนต์/ ที่เหลือใช้ต้องนำไปกำจัดประมาณ 275.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการนำไปทิ้งที่บริเวณ ซอยอุดมสุข 42 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างของ บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด บนที่ดินจำนวน 21 แปลง รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 86.00 ตารางวา หรือประมาณ 4,344.00 ตารางเมตร โดยนายชาญบุษย์ ศรีชวาลา ได้อนุญาตให้ บริษัท พี เอส. สวีทส์ จำกัด ถมดินในที่ดินดังกล่าวแล้ว

5) การใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวขนาด 100 kVA เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย 1) การใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมการ



ก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเชื่อมสำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 2) การใช้ไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน

2.2.4 การขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง

โครงการมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 28 ตารางวา (1-0-28 ไร่) หรือประมาณ 1,712.00 ตารางเมตร โดยพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการในปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างรอการพัฒนา ซึ่งมีระดับพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกับระดับถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ โดยการก่อสร้างอาคารของโครงการจะมีการขุดเปิดพื้นที่โครงการเพื่อวางเสาเข็มและฐานราก รวมถึงงานระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ถังเก็บน้ำใต้ดิน และท่อระบายน้ำซึ่งคิดเป็นปริมาณดินขุดภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 8,978.00 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะนำดินที่ขุดได้มาใช้ในการเกลี่ยสภาพพื้นที่โครงการ ซึ่งคิดเป็นปริมาณดินถมกลับประมาณ 5,211.09 ลูกบาศก์เมตร โดยคิดเป็นปริมาณดินขุดส่วนเกินที่โครงการต้องนำออกจากพื้นที่โครงการประมาณ 3,767.50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในการนำดินไปทิ้งบริเวณ ซอยอุดมสุข 42 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการไปยังพื้นที่ทิ้งดินประมาณ 10.00 กิโลเมตร (วัดในระยะกระจัด) แหล่งทิ้งดินมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด บนที่ดินจำนวน 21 แปลง รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 86.00 ตารางวา หรือประมาณ 4,344.00 ตารางเมตร โดยนาย ชารูปชิงห์ ศรีขวลา ได้ยินยอมให้บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ถมดินในที่ดินดังกล่าวแล้ว

โดยโครงการมีระดับที่ดินเดิมในแปลงดังกล่าวมีค่าระดับ -1.00 เมตร และปรับถมดินให้มีความสูงเป็น 0.00 เมตร ซึ่งมีระดับเท่ากับถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ดินที่ถูกนำมาถมนั้นจะมีส่วนผสมของดินที่เกิดจากการเตรียมสารละลายเบนโทไนต์ (MSDS ของ Benton) ที่เสื่อมสภาพจากการใช้ในการเจาะเสาเข็ม และผ่านเครื่องแยกของเหลวออกจากของแข็งแล้วโดยสามารถนำไปผสมกับดินขุดและนำมาถมในพื้นที่ดินดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ซึ่งที่ดินทั้ง 21 แปลง ที่นำมารองรับการถมดินนั้นไม่ติดกับลำรางสาธารณะแต่อย่างใด ในส่วนของน้ำที่แยกออกมาจากดินจะมี pH มากกว่า 12 จะได้รับการปรับสภาพให้อยู่ระหว่าง 5.5-9.0 และนำไปใช้งานด้านอื่นๆ เช่น รดน้ำป้องกันฝุ่นภายในโครงการได้อย่างปลอดภัยต่อไป




ตารางที่ 2-2 ปริมาณดินขุดและดินถมของโครงการ

รายละเอียด	ปริมาณดินขุด (ลูกบาศก์เมตร)	ปริมาณดินถม (ลูกบาศก์เมตร)
1. งานฐานราก	736.08	368.04
2. งานขุดเปิดชั้นใต้ดิน	8,178.96	-
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย	222.43	66.73
4. บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	4.37	-
5. บ่อหน่วงน้ำ	327.70	98.31
6. ท่อระบายน้ำ	128.00	64.00
7. ปรับถมพื้นที่โครงการ	-	776.25
รวม	9,597.53	1,373.33

สำหรับการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการจะใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดความจุประมาณ 12.00 ตัน โดยคาดว่าจะใช้จำนวนเที่ยวรถในการขนส่งดินทั้งหมดประมาณ 314 เที่ยว เมื่อรวมกับจำนวนเที่ยวรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการอีกประมาณ 100 เที่ยว จะมีจำนวนเที่ยวรถที่ใช้ในการขนส่งรวมทั้งสิ้นประมาณ 414 เที่ยว ซึ่งตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 กำหนดให้ “ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 06.00-09.00 น. และระหว่างเวลา 16.00-20.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ” โดยคิดเป็นช่วงเวลาที่สามารถเดินรถได้ประมาณ 7 ชั่วโมง/วัน ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งโครงการได้กำหนดให้มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยคิดเป็นช่วงเวลาที่สามารถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างได้ประมาณ 5 ชั่วโมง/วัน และให้ดำเนินการขนส่งได้ชั่วโมงละ 1 เที่ยว เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรจากการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างและเป็นการป้องกันการจอดรถบรรทุกคอยบนถนนสาธารณะ ดังนั้น คิดเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมดประมาณ 83 วันหรือประมาณ 3 เดือน



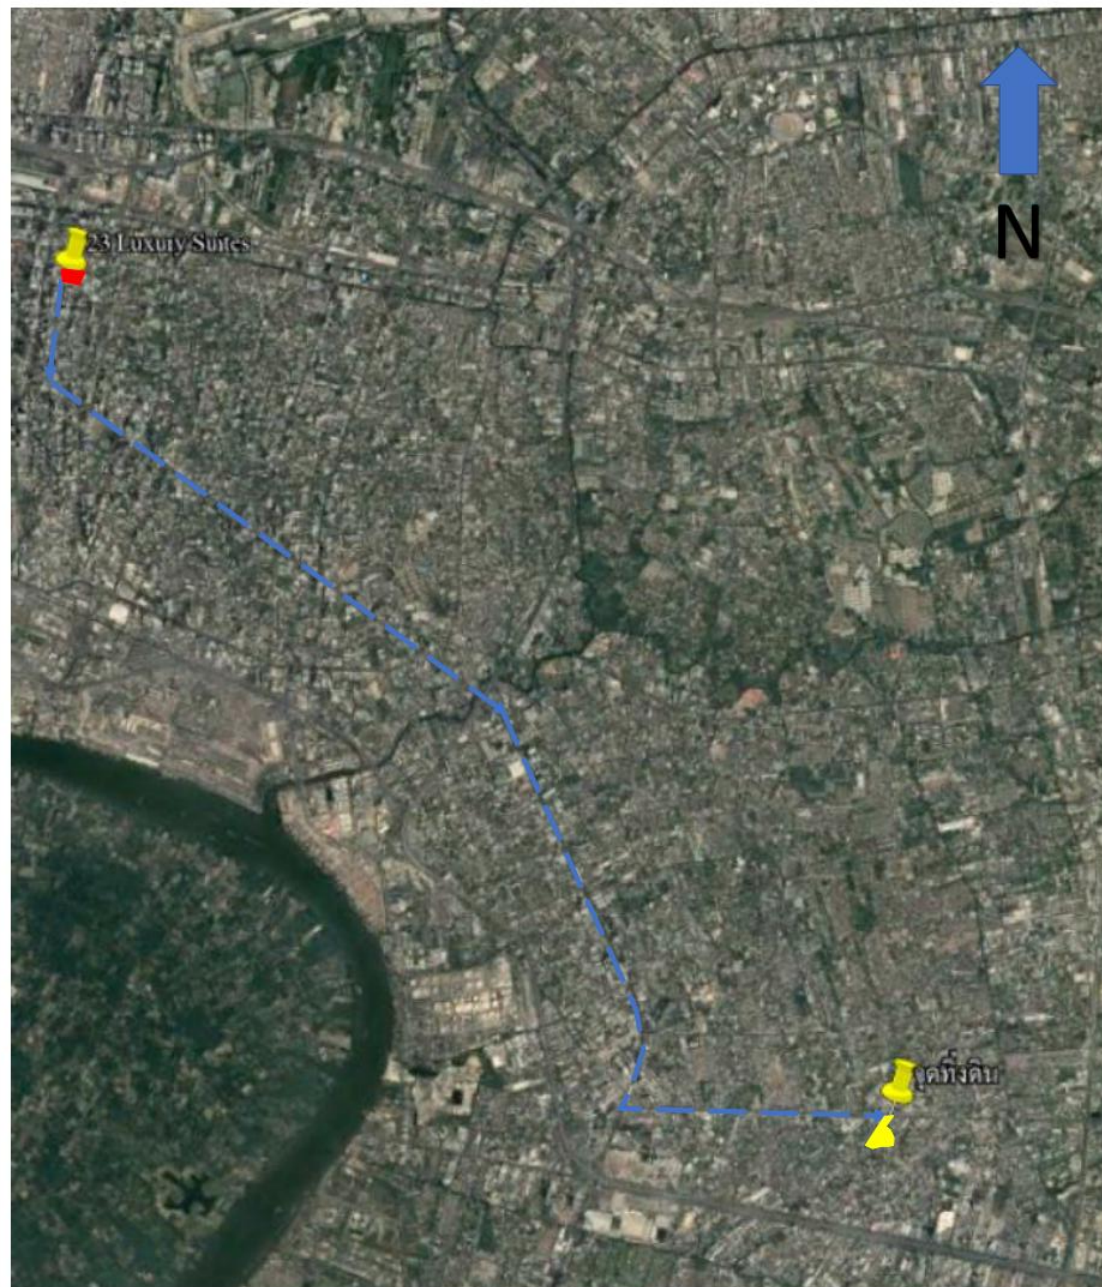

- ที่ตั้งโครงการ
- จุดตั้งดิน
- ▶ เส้นทางเดินรถ


รูปที่ 2.18-2

แผนที่แสดงเส้นทางขนส่งดิน

2-221

ภาพที่ 2-6 แผนที่แสดงเส้นทางขนส่งดิน
(อ้างอิงข้อมูลจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : EIA)



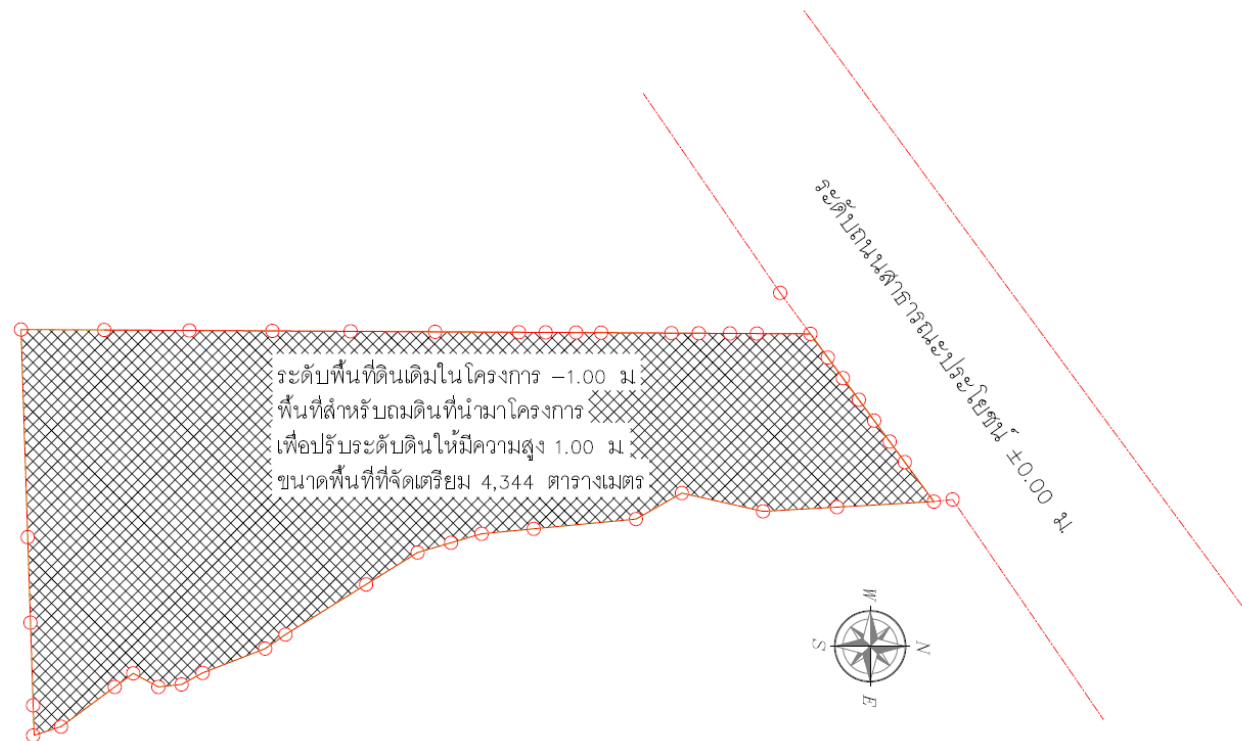

ขนาดพื้นที่ดินที่จัดเตรียม
= 2-2-86 ไร่
= 4,344 ตารางเมตร

รูปที่ 2.18-3 ผังแสดงพื้นที่ดินสำหรับนำดินจากโครงการมาทิ้ง

2-222

ภาพที่ 2-7 ผังแสดงพื้นที่ที่ดินสำหรับนำดินจากโครงการมาทิ้ง
(อ้างอิงข้อมูลจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : EIA)



2.2.5 การรักษาความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างโครงการ

โครงการจะจัดให้มีแนวรั้วชั่วคราว Metal Sheet (Aluminium Sheet) ล้อมรอบแนวเขตที่ดินทั้ง 4 ด้านเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกโครงการในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการ สำหรับตัวอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะติดตั้งแนวแผงผ้าใบ (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด้าน ตลอดแนวความสูงของอาคารเพื่อป้องกันการพังกระเจาของฝุ่นละอองและป้องกันเศษวัสดุตกหล่น โดยติดตั้งไว้ตลอดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารไปจนกว่าการก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ

2.2.6 การจัดการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะควบคุมการปฏิบัติงานของคณานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน โดยได้คัดเลือกคณานก่อสร้างที่มีความรู้ ความชำนาญในงานที่ถนัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุด พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรฐานการก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้ โครงการยังได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- แบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อนของคณานก่อสร้าง เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้แล้ว
- ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น โดยขนาดของป้ายเตือนนั้นจะต้องมีขนาดที่สามารถเห็นได้โดยชัดเจน
- จัดเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประจำ ณ จุดผ่านเข้า-ออก และคอยตรวจตราในบริเวณต่างๆ ไป รวมทั้งควบคุมการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ
- จัดให้มีการทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน

2) ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ-เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย
- เครื่องมือ-เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือ-เครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
- ก่อนการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักรและหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ และ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานเป็นไปอย่างปกติ

3) ความปลอดภัยในส่วนบุคคล

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างในแต่ละประเภท
- ออกกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับสำหรับการทำงานเพื่อความปลอดภัย



- จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทางด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
- จัดให้มีการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-

4) มาตรการป้องกันอัคคีภัย

สำหรับกิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงของการก่อสร้างโครงการนั้นอาจเกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อมและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและการตกแต่งภายใน โดยโครงการได้มีมาตรการในการป้องกันอัคคีภัยของโครงการในช่วงก่อสร้างโดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 3 งานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย

นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างนอกเหนือจากข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จะต้องกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และต้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ทุกวัน
- กำหนดมาตรการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด โดยแยกที่พักคนงานออกจากพื้นที่ก่อสร้างติดป้ายห้ามประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น การประกอบอาหาร การจุดเทียน เป็นต้น เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
- เก็บรวบรวม คัดแยกมูลฝอยหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย และนำไปกำจัดภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สายไฟไม่ฉีกขาด บูด บวม เปื่อยยุ่ย หรือมีรอยเพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ไม่เดินสายไฟฟ้าแบบชั่วคราว ไม่ใช่ชุดสายพ่วงต่อพ่วงกันหลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้าจะเกินขนาดพิกัดที่กำหนด ทำให้เกิดความร้อนสูง และเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร
- จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า และป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ทำให้เกิดเพลิงไหม้
- ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติในงานก่อสร้าง
- กรณีที่มีการเชื่อมโลหะในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีที่กำบังสะเก็ดไฟ หรือนำผ้ากันไฟมาคลุมวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นใส่ ทำให้เกิดเพลิงไหม้
- ห้ามเทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน้ำหรือท่อระบายสิ่งโสโครกอื่นๆ
- ก่อนเลิกงานจะต้องตัดสวิทช์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต และเมื่อพบเห็นสิ่งที่ยากก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ต้องรีบรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที



- จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเหตุเพลิงไหม้หมายเลข 199 (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ (โทร : 02-258-2094) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (โทร : 02-022-2222) และสถานีดับเพลิงคลองเตย (โทร : 02-258-2094)

2.2.7 ที่พักคนงาน

ในการก่อสร้างโครงการคาดว่าจะใช้คนงานก่อสร้างจำนวนทั้งหมดประมาณ 100 คน โครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างทั้งหมดพักอาศัยอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการเนื่องจากข้อจำกัดจำกัดของพื้นที่ โดยจะมีรถบริการรับ-ส่งคนงานก่อสร้างจากที่พักคนงานก่อสร้างไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ดังนั้น จึงไม่มีบ้านพักคนงานก่อสร้างในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้เพียงพอภายในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนคนงานที่เข้าพักสูงสุดประมาณ 100 คน ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีห้องพักทั้งหมดจำนวน 60 ห้อง โดยแต่ละห้องสามารถพักได้ 2 คน/ห้อง ซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนงานก่อสร้างได้ทั้งหมดประมาณ 120 คน และโครงการจะจัดทำรั้วรอบสูงอย่างน้อย 2.00 เมตร โดยโครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท.1010-34)

1) ปริมาณน้ำใช้ภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

การใช้น้ำสำหรับบ้านพักคนงานก่อสร้างจะใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การอาบน้ำ ชำระล้าง โดยคิดปริมาณความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยที่ 200 ลิตร/คน/วัน (กลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2560) โดยโครงการมีจำนวนคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน ซึ่งคิดเป็นความต้องการน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำซึ่งมีลักษณะเป็นถังก่ออิฐฉาบปูนขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) 5.00 x 6.00 x 1.00 เมตร ความจุประมาณ 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถังเพื่อใช้ในการอุปโภคและถึงขนาด 150 ลิตร ซึ่งตั้งไว้ในห้องส้วมแต่ละห้องจำนวน 20 ห้อง

2) การจัดการน้ำเสียภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

คนงานก่อสร้างของโครงการมีความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อคิดปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้จากคนงานก่อสร้าง จะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกระโถน-กรองไร้อากาศ จำนวน 1 ถัง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีประสิทธิภาพในการลดค่า BOD และค่าของแข็งแขวนลอยในน้ำ (SS) ประมาณร้อยละ 90 โดยกำหนดให้น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีค่า BOD ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าของแข็งแขวนลอยในน้ำ (SS) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าของแข็งแขวนลอยในน้ำ (SS) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับคนงานก่อสร้างในช่วงของก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย ส่วนแยกของแข็ง (Solid Separation Chamber) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Chamber) และส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chamber) นอกจากนี้ โครงการยังได้จัดให้มีบ่อดักไขมันภายในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณลานซักล้าง เพื่อดักเอาไขมันที่เกิดจากกิจกรรมการซักล้างก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำโดยรอบบ้านพักคนงานก่อสร้าง



3) การระบายน้ำภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

โครงการจะขุดร่องดินสำหรับระบายน้ำฝนที่ตกภายในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ซึ่งร่องดินดังกล่าวมีขนาดความกว้างประมาณ 1.00 เมตร ลึกประมาณ 1.00 เมตร โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่จะไหลตามความลาดชันลงสู่รางระบายที่อยู่โดยรอบพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง จากนั้นจะระบายลงสู่บ่อดักตะกอนดิน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีบ่อดักตะกอนดินตามทางเลี้ยวของรางระบายน้ำขนาดพื้นที่ประมาณ 4.00 ตารางเมตร (2.00 x 2.00 เมตร) และลึกประมาณ 1.50 เมตร โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 6.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกรณีที่ฝนตกในปริมาณมากปริมาณน้ำฝนบางส่วนจะไหลซึมลงสู่ดินและส่วนมากจะไหลบ่าหน้าดินลงสู่ร่องดินระบายน้ำฝน และบ่อดักตะกอนดินโดยไม่ไหลบ่าไปยังพื้นที่ข้างเคียง ส่วนในกรณีที่ฝนไม่ตก ปริมาณน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำภายในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะไหลลงสู่บ่อดักตะกอนดินบริเวณใกล้กับห้องน้ำ-ห้องส้วมก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ

4) การจัดการมูลฝอยภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

มูลฝอยของคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเกิดจากภาชนะบรรจุอาหารของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณที่น้อยมากในแต่ละวัน โดยปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้างภายในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างคาดว่าจะมีประมาณ 3 ลิตร/คน/วัน (กลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2560) โดยโครงการมีจำนวนคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน ซึ่งคิดเป็นปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างประมาณ 300 ลิตร/วัน หรือ 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิด จำนวน 6 ถัง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยแยกเป็นถังมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) ถังมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) และถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 2 ถัง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยในช่วงของการก่อสร้างโครงการได้ประมาณ 1.44 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 4.80 วัน เพื่อรอให้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่บ้านพักคนงานตั้งอยู่เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะไปกำจัดต่อไป

5) การใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวขนาด 100 kVA เพื่อใช้ภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น

6) การจัดการด้านความปลอดภัยภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องควบคุมและดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง โดยกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

ก) จัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้าง คอยควบคุมดูแลการพักอาศัยของคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง

ข) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตน อาทิเช่น

- ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
- ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท



- ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและห้ามมีไว้ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคณงานก่อสร้างและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง

- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนชุมชนข้างเคียง

- ห้ามทะเลาะวิวาทในทุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคณงานก่อสร้าง และหากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย

- ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกกรณี

- ห้ามลักขโมยและหากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี

- ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่บ้านพักคณงานก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคณงานก่อสร้าง

- ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด

ทั้งนี้ ผู้รับเหมาแต่ละรายต้องกำหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง) บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามเลขที่ ทส 1010.5/1053 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ทั้งนี้สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-1 มาตรการทั่วไป และ ตารางที่ 3-2 มาตรการระยะก่อสร้าง



ตารางที่ 3-1 ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (มาตรการทั่วไป)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.มาตรการทั่วไป				
	1.โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES ของ บริษัท พี.เอส.สวีทส์ จำกัด อย่างเคร่งครัด	โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	2.โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานที่อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน	-	ภาคผนวก ง



ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (มาตรการทั่วไป)

บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารและรูป ประกอบมาตรการฯ
	3.ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 3.1)หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	ณ วันที่ติดตามตรวจสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โครงการยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวก ค.16



ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (มาตรการทั่วไป)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
	3.2)หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	ณ วันที่ติดตามตรวจสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวก ค.16



บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารและรูป ประกอบมาตรการฯ
	4.เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ณ วันที่ติดตามตรวจสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ หากดำเนินการเสร็จสิ้น เจ้าของโครงการจะแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ค.16
	5.หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเจ้าของโครงการ จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ โครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า	-	ภาคผนวก ค.2

ตารางที่ 3-2 ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารและรูป ประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1.จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 รูปแบบ ดังนี้ - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการเจ้าของโครงการ บริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต พร้อมระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง - จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผังรับเรื่องร้องเรียน ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 0.5x1.0 เมตร พร้อมจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ประจำสำนักงานโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดโครงการ	โครงการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ บริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ด้านหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 1
	2.จัดทำรั้ว Metal Sheet (Aluminum Sheet) หนา 3.18 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร ปิดกันตามแนวเขตที่ดินของโครงการที่ติดต่อกับสาธารณะหรือที่ดินต่าง ๆ ผู้ครอบครอง เพื่อแบ่งเขตการก่อสร้างที่ชัดเจน โดยรอบโครงการและป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแบ่งเขตการก่อสร้างที่ชัดเจนและป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 2

บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารและรูป ประกอบมาตรการฯ
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	3.ควบคุมการก่อสร้างและจัดทำบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี	โครงการควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้นและมีทีมวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้	-	-
	4.ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	โครงการควบคุมการดำเนินงานปรับสภาพพื้นที่ และก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	-	-
	5.ดูแลบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาก่อสร้าง	โครงการคอยดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 3
	6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพรั้วให้มีความแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการ พังทลายของดิน	1.โครงการก่อสร้างแนว Sheet Pile โดยใช้ระบบ Silent Piler ซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนเนื่องจากเป็นระบบไฮดรอลิก เพื่อป้องกันการพังทลายของดินโดยรอบแนวอาคาร	โครงการติดตั้งระบบ Sheet Pile รอบบริเวณก่อสร้างบ่อลิฟต์และบริเวณก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันดินพัง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 4

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารและรูป ประกอบมาตรการฯ
1.2 ทรัพยากรดินและการ พังทลายของดิน	2.จัดให้มีการติดตั้งเครื่อง Inclinometer เพื่อวัดการเคลื่อนตัวของดิน โดยติดตั้งและตรวจวัดบริเวณด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังระหว่าง ขั้นตอนการก่อสร้างและป้องกันการพังทลายของดินช่วงก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลชั้นใต้ดิน โดยมีวิศวกรโยธา ควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและ ควบคุมการก่อสร้างใกล้ชิด	โครงการมีระบบกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน และช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 4
	3.ดินที่อยู่ระหว่างรอกำหนดนำไปใช้ประโยชน์ ต้องจัดให้มีกองเก็บไว้ ภายในพื้นที่โครงการ มีการป้องกันการชะล้างพังทลายไปสู่พื้นที่ ข้างเคียง และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	โครงการจะลดปริมาณการกองดินภายในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด โดยจะเปิดหน้าดินเฉพาะจุดที่มีการดำเนินงานเท่านั้น และมีการ ป้องกันการชะล้างพังทลายไปสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	-
	4.ทำรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำชั่วคราวเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตก ภายในพื้นที่ รวมถึงน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการที่ต้องระบายออก โดยมี บ่อดักขยะก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	โครงการมีรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำฝนที่ ตกภายในพื้นที่ รวมถึงน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการที่ต้องระบาย ออก และมีบ่อดักขยะก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 5
	5.ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขนาดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และยาวไม่ น้อยกว่า 1 เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน 40 เมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน	โครงการจัดทำราวกันตรอบบ่อดิน เพื่อป้องกันการพลัดตกของ คนงาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 6

บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารและรูป ประกอบมาตรการฯ
1.2 ทรัพยากรดินและ การพังทลายของดิน (ต่อ)	6.จัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะขุดและต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 240 เซนติเมตร ในบริเวณที่ขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดิน	โครงการจัดทำราวกันตรอบบ่อดิน เพื่อป้องกันการพลัดตกของ คนงาน และเพื่อแสดงขอบเขตที่จะขุดดิน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 6
	7.ก่อนก่อสร้างโครงการ ต้องดำเนินการสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร/บ้านข้างเคียง เพื่อเป็นเกณฑ์การชดเชย ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	โครงการจัดให้มีทีมผู้ควบคุมการก่อสร้าง ไปสำรวจสภาพเดิมของ อาคารในระยะประชิด โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพ ประกอบและทำบันทึกร่วมกันก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ	-	-
	8.จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัดและหากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ จะต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างนั้นทันที แล้วหาสาเหตุและ ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จจึงจะก่อสร้างต่อไปได้ออกแบบ โครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามมาตรฐานว่าด้วย การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภา วิศวกรรมรับรองตามกฎหมายกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความ ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	โครงการกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้ได้รับ ผลกระทบจะรีบดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	- ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภาวิศวกรรับรองตามกฎหมายกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	โครงการดำเนินการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยทีมงานผู้ชำนาญการ	-	ภาคผนวก ค.11
1.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	มาตรการฯ ด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1.จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะเกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์ของโครงการที่นำมาใช้ในงานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	-	-
	2.จัดห้องเก็บเสียงและฝุ่น ในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์กันเสียง และกันฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) สำหรับคนงาน	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานในการลงวัสดุก่อสร้างต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และมีวัสดุรองรับเพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเสียงดัง	-	-
	3.ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการจะให้น้ำในการก่อสร้างเท่าที่จำเป็น และมีรางระบายหรือท่อระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำภายในพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 5
	4.ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	โครงการได้กำชับผู้รับเหมาไม่ให้กองเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน โดยจะประสานงานให้รถบรรทุกมารับไปกำจัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 32



บริษัท พี.เอส. สวิตส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารและรูป ประกอบมาตรการฯ
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	5. กำจัดผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการไม่อนุญาตให้มีการเผาขยะภายในโครงการ โดยขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างทางโครงการจะประสานงานให้รถบรรทุกมารับไปกำจัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 28
	มาตรการฯ ด้านการก่อสร้าง 1.ติดตั้งรั้ว Metal Sheet (Aluminum Sheet) หนา 3.18 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันเสียงดังและฝุ่นละออง	โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแบ่งเขตการก่อสร้างที่ชัดเจนและป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษภายนอกเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 2
	2.ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	โครงการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 58
	3.หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน	โครงการจะเลือกใช้วิธีการพรมน้ำบริเวณผิวดินหรือผิวคอนกรีตก่อนดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 7
	4.การเก็บกองทรายให้พื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน Bund หรือฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	โครงการจะเลือกใช้วิธีการพรมน้ำบริเวณผิวดินหรือผิวคอนกรีตก่อนดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 7
	5.การนำผงซีเมนต์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	โครงการจะเลือกใช้ส่วนใหญ่ใช้ปูนจากรถบรรทุกปูนแบบผสมสำเร็จ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 8
	6.ในกรณีที่ใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บไว้ในถุงให้มิดชิด	หากมีการนำปูนผงมาใช้ โครงการจะกำชับให้คนงานจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 8

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ)	7.โครงการต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าค่า PM2.5 ในบริเวณพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนย้ายเศษวัสดุรื้อถอนออกจากพื้นที่โครงการ การทุบ ตัด เจาะ สกัด ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และกรณีที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุดการรื้อถอน/ก่อสร้างหรือขอความร่วมมือใดๆ โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	โครงการจะติดตามรายงานคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 57
	มาตรการฯ ด้านการเดินรถและใช้เครื่องจักร 1.ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการรบกวนบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่โครงการ ปิดคลุมด้วยผ้าใบที่อย่างมิดชิด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 9
	2.อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและดับเครื่องระหว่างพักหรือไม่มีการใช้งาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 17
	3.ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	โครงการจำกัดความเร็วที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 10



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ)	4.ติดป้ายเตือนไว้ด้านหน้าโครงการ และทำหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ให้รถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างทุกชนิดรวมถึงรถรับ-ส่งคนงาน วิ่งผ่านเข้าไปในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและซอยประสานมิตร ฝั่งประตู 2 ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด และหากมีผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกตักเตือนและหากเกิดซ้ำอีกครั้ง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องมีบทปรับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้กระทำผิดในครั้งต่อไป	โครงการไม่อนุญาตให้รถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างทุกชนิดรวมถึงรถรับ-ส่งคนงาน วิ่งผ่านเข้าไปในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและซอยประสานมิตร ฝั่งประตู 2 ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด	-	-
	มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1.ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง	โครงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-
	2.จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 11 และ 12
	มาตรการด้านการขนส่งดิน 1.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00 -16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 13



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ)	2.จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่ง โดยใช้ น้ำฉีดก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 14
	3.บริเวณปากทางเข้า-ออกเชื่อมกับถนนซอยสุขุมวิท 23 ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการได้จัดให้มีประตูบริเวณทางเข้า-ออก และจะปิดทึบตลอดเวลา ก่อสร้าง โดยเปิดเฉพาะเวลามีรถเข้า-ออกโครงการเท่านั้น และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 12 และ 15
	4.ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดเวลา ก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	โครงการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองตลอดเวลา ก่อสร้าง และติดตั้งสเปรย์ละอองน้ำบริเวณแนวรั้ว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 7 และ 16
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	1) <u>ผลกระทบด้านเสียง</u> <u>มาตรการฯ ด้านเสียง</u> 1.กำหนดช่วงเวลาในการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00 -17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราวให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เป็นงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเก็บกวาด การเก็บเครื่องมือ เป็นต้น ยกเว้น การเทปูนฐานราก โดยกิจกรรมการก่อสร้างที่เกินเวลา 17.00 น. นั้น จะต้องดำเนินการไม่เกิน 3 วัน/	โครงการกำหนดให้ปฏิบัติงานก่อสร้าง วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางโครงการหยุดกิจกรรมก่อสร้าง ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกินช่วงเวลาปกติ ทางโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ เข้าพบพูดคุยและแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 13



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	สัปดาห์ และแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ โดยจะกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด			
	2.ในช่วงก่อสร้างฐานราก ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความหนา 3.18 มิลลิเมตร หรือเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินทุกด้าน ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ 25 dB(A)	โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแบ่งเขตการก่อสร้างที่ชัดเจนและป้องกันไม่ให้เกิดคนภายนอกเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 2
	3.ช่วงงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค โดยจะติดตั้งแผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ในการก่อสร้างชั้น 2-6 ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง	โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	4.ช่วงงานตกแต่งภายในและภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง (ประเมินกรณีที่มีการก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่ง และงานเก็บทำความสะอาดพร้อมกัน)	โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	5.ก่อสร้างงานฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง	โครงการใช้เสาเข็มเจาะ ในการก่อสร้างโครงการ เพื่อช่วยลดความสั่นสะเทือน และป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	6.อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบາเครื่องลงระหว่างการพัก	โครงการได้มีการกำชับคนงานให้ดับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ขณะจอดรอหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 17
	7.ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง	โครงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-
	มาตรการฯ ด้านเสียง (ต่อ) 8.ใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	โครงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-
	9.โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	-	-
	10.ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับให้ผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดเสียงดัง การขนวัสดุก่อสร้างเข้ามาในเวลากลางคืน ให้จอดรอไว้ภายในพื้นที่โครงการและยกลงในตอนเช้า	โครงการกำชับบริษัทผู้รับเหมาให้ควบคุมการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เข้ามาในพื้นที่โครงการเป็นไปตามหลักการขนย้าย	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 13



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
	11.จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	โครงการจัดจ้างบริษัท ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ และบริษัท ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
	12.ปฏิบัติตามมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 อย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	13.ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง และมาตรการด้านการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
1.5 เสี่ยงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	2) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 1.จัดให้มีมาตรการเชิงรุก กับบ้านเลขที่ 48, เลขที่ 64, เลขที่ 52 และเลขที่ 58 โดย (1) <u>ก่อนเริ่มงานก่อสร้างฐานราก</u> - โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่จากโครงการและผู้รับเหมา เข้าพบปะพูดคุยให้รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างโครงการและแผนงานการกดเสาเข็ม - อธิบายขั้นตอนวิธีการขุดเจาะเสาเข็ม ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และขั้นตอนวิธีการในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเจาะเสาเข็ม	โครงการมีทีมงานเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง รวมทั้งแสดงช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 18 และ 19



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.5 เสี่ยงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	(2) ระหว่างการก่อสร้างฐานราก - โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการและผู้รับเหมาเข้าพบบ้าน/อาคาร ที่ได้รับระดับแรงสั่นสะเทือนเกิน 2.5 มิลลิเมตร/วินาที เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ร่วมด้วย	โครงการมีทีมงานเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง รวมทั้งแสดงช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 18 และ 19
	2.ก่อนการก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 เดือน โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการและผู้รับเหมาเข้าแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัยและอาคารข้างเคียงทุกด้าน โดยมีวิศวกรเข้าสำรวจ ถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน ตัวอาคารเดิม ร่วมกับเจ้าของบ้านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาความเสียหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น ในกรณีที่เจ้าของบ้านหรืออาคารไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการสำรวจอาคาร โครงการจะแจ้งข้อมูลการติดต่อที่สามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรงกับเจ้าของบ้าน/อาคาร นั้นๆ	โครงการจัดให้มีทีมผู้ควบคุมการก่อสร้าง ไปสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกันก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ	-	ภาคผนวก ค ค-14



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	2) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน (ต่อ) 3.กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนทุกวันในช่วงทำฐานราก โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนทางด้านทิศใต้ ติดกับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 48 และทางด้านทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น ของบริษัท พชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64 ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้เคียงมากที่สุด พร้อมรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์โดยการติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถมองเห็นและรับทราบผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนของโครงการได้	โครงการจัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 20 และ 21
	4.จัดให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงทำเสาเข็มด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ซึ่งเป็นบ้าน/อาคารพักอาศัยสูง 2 ชั้น หากมีผลกระทบต่อบ้าน/อาคารข้างเคียง ต้องหาแนวทางเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อให้ความสั่นสะเทือนลดลงทันที และหากค่าแรงสั่นสะเทือนที่อ่านได้จากเครื่องตรวจวัดมีระดับความสั่นสะเทือนเกินค่าที่ประเมินได้ (2.01 มิลลิเมตร/วินาที) โครงการต้องหยุดหาเสาเข็มและปรับปรุงวิธีการก่อสร้างไม่ให้เกินค่าดังกล่าว	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาระมัดระวังการดำเนินกิจกรรมช่วงทำโครงสร้างเป็นพิเศษ หากพบว่าบ้าน/อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบ จะหาแนวทางเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อให้ความสั่นสะเทือนลดลงทันที	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 18 และ ค-14
	5.ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างโครงการ โดยใช้วิธีการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เพื่อลดผลกระทบด้านสั่นสะเทือน	โครงการใช้เสาเข็มเจาะ ในการก่อสร้างโครงการ เพื่อช่วยลดความสั่นสะเทือน และป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.5 เสี่ยงและควมสันสะเทือน (ต่อ)	6.จัดให้มีการทำประกันภัยแบบ CAR (Construction All Risk) หรือประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดครอบคลุมความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยหากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะเข้าไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าของบ้าน/อาคาร พร้อมกับแจ้งบริษัทประกันให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนที่สุดให้กลับสู่สภาพเดิมหรือได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นตามที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของอาคารโดยกำหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นเป็นวงเงินจำนวน 15 ล้านบาทถ้วน โดยวงเงินดังกล่าวโครงการจะจัดเตรียมไว้นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี	โครงการจัดทำประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	ภาพผนวก ค ค-2
	7.โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหรือในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	โครงการมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดมาตรการฯ ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ พร้อมแจ้งให้ทีมผู้รับเหมารับทราบและปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 1
	8.จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	โครงการควบคุมงานก่อสร้าง โดยกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 21



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
1.5 เสี่ยงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	9.การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการจะระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้พิจารณาตัดเดือนก่อน หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม	โครงการควบคุมงานก่อสร้าง โดยกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับตามความเหมาะสม	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 1
1.6 ทรัพยากรน้ำ	1) ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำผิวดิน - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-
	2) ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำใต้ดิน - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1.ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)	โครงการดำเนินการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยทีมงานผู้ชำนาญการ	-	-
	2.ในการก่อสร้างจริงโครงการจะกำหนดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างดูแลการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและรายงานสถานการณ์ก่อสร้างทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างจริง	โครงการควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ก ก-2



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	3.หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต้องแจ้งให้กับหน่วยงานที่อนุญาตโครงการได้ทราบและได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ	ณ วันที่ติดตามตรวจสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวก ค ค-16
3.2 การใช้น้ำ	1.จัดให้มีการสำรองปริมาณน้ำใช้ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน)	โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 50
	2.ตรวจสอบจุดรั่วซึมของถังเก็บน้ำและท่อประปาภายในโครงการ หากพบการรั่วซึมของระบบประปาภายในโครงการให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน	โครงการดำเนินการตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอ	-	-
	3.กักเก็บน้ำให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	โครงการกักเก็บน้ำให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 22
	4.เตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมากเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ	โครงการกักเก็บน้ำให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 27 และ 28
3.3 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1.ควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างทิ้งเศษมูลฝอยลงสู่ท่อระบายน้ำ	โครงการกักเก็บน้ำให้คนงานทิ้งมูลฝอยในถังมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 27 และ 28
	2.จัดให้มีห้องส้วมคนงานที่ถูกหลักสุขาภิบาลและมีจำนวนเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง โดยจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 4 ห้อง แยกชาย-หญิง ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไม่รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	โครงการจัดให้มีห้องส้วมภายในพื้นที่โครงการ โดยมีจำนวนเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 23



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.3 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	3.จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศจำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคณงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับห้องน้ำคณงาน เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 24
	4.สูบน้ำทิ้งในสวนเกราะอย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตวัฒนาให้เข้ามาจัดเก็บและนำไปกำจัด	โครงการจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบน้ำทิ้งในบ่อเกราะไปกำจัด เมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม	-	-
	5.รวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างทั้งหมดลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	โครงการมีรางระบายหรือท่อระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่ รวมถึงน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการที่ต้องระบายออก ให้ตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 5
	6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานก่อสร้างเพื่อคอยดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมโดยไม่ให้มีกลิ่นรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	โครงการจัดให้มีคณงานคอยดูแลความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 25
	7.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการดำเนินการตรวจสอบถังบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	8.กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	โครงการใช้วิธีการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี หรือการฉีดพ่นยากำจัดแมลง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 56



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.3 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	9.เมื่อเลิกใช้ห้องส้วมแล้วต้องรื้อถอนห้องส้วมและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดการสื่อกากตะกอนออกและปรับสภาพพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนนำพื้นที่ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป	ณ วันที่ติดตามตรวจสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ หากถึงช่วงเวลาดำเนินการโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ค ค-16
3.4 การระบายน้ำ	1.จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ขนาดความกว้าง 1 เมตร และลึก 1 เมตร และจัดให้มีบ่อดักตะกอนดินตามทางเลี้ยงของรางระบายน้ำขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร (2x2 เมตร) และลึก 1.5 เมตร เพื่อดักตะกอนดินส่วนเกิน และดำเนินการสูบน้ำใสส่วนบนในบ่อไปรตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการมีรางระบายหรือท่อระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่ รวมถึงน้ำที่ภายในพื้นที่โครงการที่ต้องระบายออก และมีบ่อดักขยะก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 5
	2.ขุดลอกดินตะกอนออกจากรางระบายน้ำ บ่อดักตะกอนดินและจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อมิให้ดินตะกอนเกิดการสะสมและอุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 26
	3.โครงการประสานกับสำนักงานเขตวัฒนา ในการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโครงการก่อนเข้าฤดูฝนและภายหลังเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้อาคาร	ณ วันที่ติดตามตรวจสอบ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 โครงการยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ หากถึงช่วงเวลาดำเนินการโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.5 การจัดการมูลฝอย	มาตรการฯ ด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง 1. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่โครงการ ปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบอย่างมิดชิด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 9
	2. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด กำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 31
	3. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบา และผนังปูน เท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดและเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยฯ	โครงการมีการจัดการวัสดุจากการก่อสร้าง โดยวัสดุประเภทเศษคอนกรีต จะกำหนดให้ผู้รับเหมานำวัสดุก่อสร้างดังกล่าวส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 32
	4. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ประเภทเศษเหล็ก ไม้แบบ และเศษกระดาไปกำจัดภายนอกโครงการยังแหล่งรับซื้อ เช่น บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นต้น	โครงการมีการจัดการเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยประสานให้บริษัทเอกชนนอกไปกำจัด และไม่นำออกไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 32



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
 บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.5 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)	5. ประสานบริษัทรับกำจัดที่มีใบอนุญาต เช่น บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือเทียบเท่า มาจัดเก็บมูลฝอยประเภทกระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องหลังคา โดยจะต้องมีใบกำกับการขนส่งและบัญชีแสดงรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อไปกำจัด ในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่มีสถานที่กำจัดขยะดังกล่าว	โครงการมีการจัดการเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยประสานให้บริษัทเอกชนขนออกไปกำจัด และไม่นำออกไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 59
	6. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ	โครงการมีการจัดการเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยประสานให้บริษัทเอกชนขนออกไปกำจัด และไม่นำออกไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 59
	มาตรการฯ ด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง 1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยแห้ง ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตรายอย่างละ 1 ถัง วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนาฯ เก็บขนไปกำจัดต่อไป	โครงการจัดให้ถังรองรับมูลฝอยวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 27
	มาตรการฯ ด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	โครงการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยในถังมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 28



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3.หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวนโครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอยทั้งภายใน และภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของมูลฝอยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 28
	4.ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที	โครงการใช้วิธีการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมี หรือการฉีดพ่นยากำจัดแมลง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 56
	5.ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีสภาพไม่แตกชำรุดหรือมีรอยรั่วซึมและมีฝาปิดมิดชิด	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอยทั้งภายใน และภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของมูลฝอยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 28
	6.จัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเปียก เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่นที่เกิดจากการย่อยสลายของมูลฝอยเปียก	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอยทั้งภายใน และภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของมูลฝอยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 28
	7.ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะมูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการไม่อนุญาตให้มีการเผาขยะภายในโครงการ โดยขยะเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างทางโครงการจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกไปกำจัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 42



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.6 การคมนาคมและการจราจร	1.จัดทำป้ายชี้โครงการ ลูกศรแสดงทิศ ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอความเร็วเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัยทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	โครงการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน และจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 1 , 29 และ 30
	2.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า-ออกโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนซอยสุขุมวิท 23 และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 30
	3.จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการให้เพียงพอ เพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่ง คนงานก่อสร้าง ไม่ให้จอดเป็นแถวคอยบนซอยสุขุมวิท 23 และถนนสาธารณะอื่นๆ	โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ และสำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างอยู่ภายในพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 31
	4.จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ รวมทั้งเข้าไปกลับรถในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ห้ามกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ บนซอยสุขุมวิท 23 โดยเด็ดขาด	โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวจราจรของถนนสาธารณะ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 31 และ 32



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.6 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	5.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น. และ 20.00-06.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. และ 21.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนซอยสุขุมวิท 23 ด้วย	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00 -16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 13
	6.จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ	โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 14
	7.จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกรบกวนบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัยและหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งร่วนหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย	โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่โครงการ ปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบอย่างมิดชิด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 9



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.6 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	8.ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งสินค้าขนส่งวัสดุ ก่อสร้างและรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช่เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งสินค้าขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน	โครงการคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 40
	9.ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในงานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	-	-
	10.รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สะท้อนแสงติดบริเวณตัวรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานบนถนนสังเกตเห็น	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 33
	11.กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำชับคนขับรถบรรทุกทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก	โครงการจำกัดความเร็วที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 10
	12.กำหนดให้รถรับส่งพนักงานและรถยนต์ที่มีไว้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างให้กลับไปพื้นที่เมื่อส่งพนักงานเรียบร้อยแล้วและห้ามจอดทิ้งไว้ในพื้นที่โครงการ	โครงการคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1.จัดให้มีช่างเทคนิคในการควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าของคนงานก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด	โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 34
	2.กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเข้าใจถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 35
	3.ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า	โครงการติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 34
	4.จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือกระตุกกับชุมชนข้างเคียง	โครงการมีหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือกระตุกกับชุมชนข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 36
3.8 การบำบัดสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวิทย์	- เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	โครงการได้แจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ทันที ณ วันที่ติดตามตรวจสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ยังไม่พบปัญหาดังกล่าว	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 19 และ ภาคผนวก ค-2



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	1.วิถีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ระยะก่อสร้างตามข้อ 1.1 อย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	มาตรการด้านวิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม 1.พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	โครงการพิจารณาเลือกคนไทยเข้ามาทำงานเป็นอันดับแรก	-	ภาคผนวก ค ค-10
	2.กรณีที่ได้รับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	โครงการเลือกรับคนงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน	-	ภาคผนวก ค ค-10
	3.จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้	โครงการมีการจัดเก็บหลักฐานการขึ้นทะเบียนแรงงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสอได้เสมอ	-	ภาคผนวก ค ค-10
	มาตรการด้านวิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม (ต่อ) 4.ออกกฎระเบียบ ห้ามไม่ให้คนงานทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังและจัดเลี้ยงภายในห้องพัก อันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง	โครงการกำหนดกฎระเบียบสำหรับคนงานที่มาปฏิบัติภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง	-	ภาคผนวก ค ค-4



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	5.กำหนดช่วงเวลาในการทำงานก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว ให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เป็นงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเก็บกวาด การเก็บเครื่องมือ เป็นต้น ยกเว้นการเทปูนฐานราก โดยกิจกรรมก่อสร้างที่เกินเวลา 17.00 น. นั้น จะต้องดำเนินการไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีกรก่อสร้างใดๆ โดยจะกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	โครงการกำหนดให้ปฏิบัติงานก่อสร้าง วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางโครงการหยุดกิจกรรมก่อสร้าง ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกินเวลาปกติทางโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ เข้าพบพูดคุยและแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 13
	6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และให้ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	โครงการมีทีมงานเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง รวมทั้งแสดงช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 18 และ ค-14
	7.จัดทำทะเบียนรายชื่อคนงานก่อสร้างโดยให้มีบัตรคนงานพร้อมวางกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติแก่คนงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดให้มีหัวหน้าคนงานในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 50 เพื่อคอยควบคุม	โครงการมีการจัดเก็บหลักฐานการขึ้นทะเบียนแรงงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสอบได้เสมอ	-	ภาคผนวก ค ค-10



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	ดูแลงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการและมีบทลงโทษกรณีคนงานก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน			
	8.มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน	โครงการมีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น	-	ภาคผนวก ค ค-2
	มาตรการฯ ด้านการช่วยเหลือชุมชน (CSR) 1.จัดให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้ที่แนวรั้วด้านหน้าพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือและทิศใต้ โดยหันหน้ากล้องออกไปทางถนนซอยสุขุมวิท 23 เพื่อคอยสอดส่องความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรไป - มาบนถนนซอยสุขุมวิท 23 และบ้าน/อาคาร ละแวกใกล้เคียง	โครงการได้ติดตั้ง CCTVไว้บริเวณด้านหน้าและด้านในโครงการ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 37
	2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทาง	โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณทางเดินและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 38
	3.ประสานงานกับสำนักงานเขตวัฒนาในการฉีดพ่นยุงให้กับชุมชนในซอยสุขุมวิท 23 ในช่วงฤดูฝนปีละ 1 ครั้ง จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการมีการประสานงานกับสำนักงานเขตวัฒนาในการฉีดพ่นยุงให้กับชุมชนในซอยสุขุมวิท 23 ในช่วงฤดูฝน ปีละ 1 ครั้ง	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	2.ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง มาตรการด้านการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 1.เจ้าของโครงการกำหนดให้มีเงินชดเชยเบื้องต้นในวงเงินจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อความรวดเร็วในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและความเสียหาย ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย	โครงการได้จัดทำประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการ แต่หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางโครงการจะสำรองจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว โดยไม่รอประกันภัย	-	ภาพผนวก ค ค-1
	มาตรการด้านการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น (ต่อ) 2.กรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะชดเชยเป็นจำนวนเงินเบื้องต้นร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยซึ่งในระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากได้ตรวจสอบแล้วว่าความเสียหายมาจากโครงการ โดยจำนวนเงินสูงสุดรวมกันทุกรายไม่เกิน 15 ล้านบาท และภายหลังจากบริษัทประกันภัยเข้าตรวจสอบความเสียหายและประเมินราคาโดยละเอียดแล้วจะดำเนินการจ่ายค่าเสียหายในส่วนต่างที่เหลือต่อไป	โครงการได้จัดทำประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการ แต่หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางโครงการจะสำรองจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว โดยไม่รอประกันภัย	-	ภาพผนวก ค ค-1
	3.จัดให้มีการทำประกันภัยแบบ CAR (Construction All Risk) หรือประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดครอบคลุมความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนารายการกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการจัดทำประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	ภาพผนวก ค ค-1



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	4.ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้ร้องเรียน) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	โครงการได้จัดทำประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการ แต่หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางโครงการจะสำรองจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว โดยไม่รอประกันภัย	-	ภาพผนวก ค ค-1
	5.โครงการจะจัดจ้างทีมผู้คุมงานที่มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการจะระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้พิจารณาดักเตือนก่อน หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม	โครงการควบคุมงานก่อสร้าง โดยกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับตามความเหมาะสม	-	ภาพผนวก ค ค-15



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	-	ภาพผนวก ข ภาพที่ 30
	3.จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	โครงการได้ติดตั้ง CCTV ครอบคลุมด้านหน้าและด้านในโครงการ	-	ภาพผนวก ข ภาพที่ 37
	4.โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง	โครงการมี จป. ประจำโครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง	-	ภาพผนวก ค ค-9
	5.จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน ดังนี้ - จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานของเครนอย่างใกล้ชิด - ขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยก จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร - ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพของการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยก และจะต้องทดลองควบคุมโดยไม่มี Load - ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงานและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที	โครงการมีผู้ชำนาญการในการควบคุมการทำงานของเครนภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบการตรวจอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพผนวก ค ค-7



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	- การติดตั้งเครนจะต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรองรวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น - จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้เครนที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านงานยกควบคุมตลอดเวลาที่มีการทำงาน			
4.2 ด้านสุขภาพ	1.ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 1.1ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <u>โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้</u> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ อย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-
	<u>โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน</u> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง อย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-
	<u>โรคผิวหนังและเชื้อโรค</u> 1.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอย อย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ	2.ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น	โครงการกำชับคนงานไม่ให้ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ		--
	โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง เช่น COVID-19 (ต่อ) 3.จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - โครงการจะต้องสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีระบบระบายอากาศที่ดีไม่แออัด จัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนอย่างเหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป	โครงการมาตรฐานในการจัดหาที่พักอาศัยให้กับคนงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	-
	- จัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง 2 ห้อง และห้องส้วม 5 ห้อง โดยแยกชาย-หญิง ชัดเจน	โครงการจัดให้มีห้องส้วมภายในพื้นที่โครงการ โดยมีจำนวนเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 23
	- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ	โครงการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 39
	- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับห้องน้ำคนงาน เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 24
	- จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอ	โครงการจัดให้ถังรองรับมูลฝอยวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 27
	4.จัดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับคนงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 กรณีมีการพัฒนาขึ้นมาใช้ใหม่	หากมีการพัฒนาฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ขึ้นมาใหม่โครงการจะจัดหาฉีดให้กับคนงาน	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ	1.2ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ 1.จัดให้มีแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้สัญจรไป-มา บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สะท้อนแสงติดบริเวณตัวรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็น	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 33
	2.จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง	โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่โครงการ ปิดคลุมด้วยผ้าใบที่มิดชิด	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 9
	1.2ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ต่อ) 3.รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัทและเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก	โครงการคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-
	4.กำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มิใช่สภาพการจราจรไม่หนาแน่นคับคั่งเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อจราจรภายนอกโครงการ	โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00 -16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 13
	5.กำหนดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	โครงการจำกัดความเร็วที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 10



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ(ต่อ)	6.ใช้ทาวเวอร์เครนแบบแขนกระดกหรือชนิดที่สามารถควบคุมรัศมีการทำงานให้อยู่ในภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้เท่านั้น ไม่ล้ำออกไปภายนอก	โครงการเลือกใช้ทาวเวอร์เครนแบบแขนกระดกหรือชนิดที่สามารถควบคุมรัศมีการทำงานให้อยู่ในภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	-	-
	2.สุขภาพจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล การนอนไม่หลับ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-
	2.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.1ผลกระทบด้านการให้บริการสาธารณสุข -	-	-	-
	2.2ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค ผลกระทบด้านฝุ่นละออง 1.กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่การเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	โครงการคอยกำชับให้คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมากสวมใส่หน้ากากซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นละอองตลอดเวลาที่ทำงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	2.ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	โครงการจะเปิดหน้าดินเฉพาะจุดที่มีการดำเนินงานเท่านั้น	-	-
	3.ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไปรวมทั้งมีการสเปรย์น้ำบริเวณแนวรั้วโครงการ	โครงการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองตลอดเวลาก่อสร้าง และติดตั้งสเปรย์ละอองน้ำบริเวณแนวรั้ว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 7 และ 16
	4.ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	โครงการจำกัดความเร็วที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 10
	<u>ผลกระทบด้านเสียง</u> 1.โครงการต้องจัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A) ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR 32 dB(A) และปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า NRR 30 dB(A) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้างและเครื่องจักร รายละเอียดดังนี้	โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	<u>ช่วงงานปรับสภาพพื้นที่และงานทำฐานราก</u> - คนงานก่อสร้างที่ทำงานในระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ทำงานในระยะ 3 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ที่อุดหู (Ear Plug) จึงสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง <u>ช่วงงานโครงสร้างอาคาร</u> - คนงานก่อสร้างที่ทำงานในระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ทำงานในระยะ 3 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ที่อุดหู (Ear Plug) จึงสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง <u>ช่วงงานโครงสร้างอาคาร และงานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด ซ่อนกัน</u> - คนงานก่อสร้างที่ทำงานในระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) จึงสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง <u>ช่วงงานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด</u> - คนงานก่อสร้างที่ทำงานในระยะ 1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ทำงานในระยะ 3 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ที่อุดหู (Ear Plug) จึงสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง	โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	2.เปลี่ยนงานให้คนงานหรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dB(A)	โครงการมีการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาการทำงานของคนงานในแต่ละวันอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	-	-
	3.โครงการต้องกำหนดมาตรการสำหรับลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม 2561 โดยวิธีการตรวจวัดให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 57 ง วันที่ 12 มีนาคม 2561	โครงการกำหนดมาตรการสำหรับลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับ โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	4.โครงการต้องจัดให้มีและดูแลให้คนงานก่อสร้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549	โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน	-	-
	<u>ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน</u> <u>มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน</u> 1.ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	2.ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	3.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	4.โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	โครงการคอยตรวจเช็คสภาพและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	<u>ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน (ต่อ)</u> <u>มาตรการป้องกันและควบคุมที่ส่วนบุคคล</u> 1.กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 8 ชั่วโมงใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร	โครงการมีการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาการทำงานของคนงานในแต่ละวันอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	-	ภาคผนวก ค ค-8
	2.ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 43
	3.ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	โครงการคอยตรวจเช็คสภาพและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	-
	<u>ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้าง</u> 1.โครงการต้องดำเนินการตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	โครงการจัดให้มี จป. ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ค ค-13
	3.จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง	โครงการมี จป. ประจำโครงการ และหัวหน้างาน ให้ความรู้ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานประจำวันและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานให้ถูกต้องและครบถ้วน	-	ภาคผนวก ค ค-13
	<u>ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้าง</u> 4.จัดผังพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม กับบริเวณพื้นที่ทำงาน เครื่องจักร พื้นที่สัญจรยานพาหนะ พื้นที่ทำงานของคนงาน เป็นต้น มีการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือน และจำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการมีการกันพื้นที่ทำงานเครื่องจักร พื้นที่สัญจรยานพาหนะ พื้นที่ทำงานของคนงาน และการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 10 , 29 และ 42
	<u>โรคผิวหนัง</u> 1.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากาก ป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมี กระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มสัน เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ	โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้คนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 43



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	2.ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	โครงการติดป้ายสัญญาณเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้าง ในที่มองเห็นได้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 43
	3.กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะและติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน	โครงการมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และมีการดูแลตรวจระยะเวลาก่อสร้าง	-	-
	4.จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล	โครงการมีการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 44
	5.จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงานเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด ฯลฯ และต้องมีการฝึกฝนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการมี จป. คอยดูแลการเตรียมการสำหรับการเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และได้มีการติดเบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุ	-	ภาคผนวก ค ค-13 และ 40
	6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง	โครงการมี จป. ประจำโครงการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของคนงานและพื้นที่ในการปฏิบัติงาน	-	ภาคผนวก ค ค-13
	<u>โรคติดต่อ และโรคติดต่อร้ายแรง เช่น COVID-19</u> 1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส (COVID-19) ให้แก่คนงานก่อสร้างและจัดให้มีสบู เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง	โครงการมี จป. ประจำโครงการ และหัวหน้างาน ให้ความรู้ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานประจำวันให้คนงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 40



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	2.จัดให้มีการคัดกรองคนงานก่อสร้างก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบคนงานป่วยให้หยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่เชื้อโรค	โครงการการคัดกรองคนงานก่อสร้างก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 40
	3.หากมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ไปตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังตามระเบียบประกาศและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	หากพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยโครงการจะให้ไปตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังตามระเบียบประกาศและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	-	-
	4.หากตรวจพบว่ามีคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงจะเกิดโรค COVID -19 ไม่ว่าจะได้รับการตรวจวัดคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อ ถูกแยกหรือกักกันตัวจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้ผู้รับเหมาแจ้งพนักงานตรวจแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	หากพบว่า มีคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงจะเกิดโรค COVID -19 ไม่ว่าจะได้รับการตรวจวัดคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อจะถูกแยกหรือกักกันตัว	-	-
	5.หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่า ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรค COVID-19 ให้ไปรับการตรวจรักษาหรือรับการพิสูจน์ทางการแพทย์ และแจ้งให้โครงการทราบเพื่อแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเร็ว	หากพบว่า มีคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะติดโรค COVID-19 จะรีบให้ไปรับการตรวจรักษาในทันที	-	-
	6.หากคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกักตัวไว้ที่ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.2 ด้านสุขภาพ (ต่อ)	โรคติดต่อ และโรคติดต่อร้ายแรง เช่น COVID-19 7.ผู้รับเหมาต้องอนุญาตให้คนงานให้สิทธิลาป่วยตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน กรณีที่คนงานมีความเสี่ยงจะติดโรค COVID-19 จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษาหรือรับการพิสูจน์ทางการแพทย์	โครงการอนุญาตให้คนงานให้สิทธิลาป่วยตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน กรณีที่คนงานมีความเสี่ยงจะติดโรค COVID-19	-	-
	8.กำหนดให้คนงานก่อสร้างและผู้ที่ต้องทำงานภายในพื้นที่ก่อสร้างใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	โครงการกำชับและควบคุมให้คนงานก่อสร้างและผู้ที่ต้องทำงานภายในพื้นที่ก่อสร้างใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 40
	9.จัดให้คนงานมีการเว้นระยะห่างในทุกกิจกรรมของการก่อสร้างอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น การประชุม การรับประทานอาหารกลางวัน รวมทั้งล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	10.จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ ไว้บริการบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	11.โครงการต้องกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับคนงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 กรณีมีการพัฒนาขึ้นมาใช้แล้ว	หากมีการพัฒนาฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ขึ้นมาใหม่โครงการจะจัดหาฉีดให้กับคนงาน	-	-



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	1.จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม ดังนี้ - ในช่วงทำฐานราก ต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 10 ปอนด์ บริเวณแนวเขตที่ดินรอบโครงการ จำนวน 5 ถัง - ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่ง จะต้องติดตั้งถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง/ชั้น	โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ตามพื้นที่ต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความทันท่วงทีในการใช้งาน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 45
	2.ติดตั้งขั้นตอนการใช้งานไว้บริเวณที่ตั้งถังดับเพลิง เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้พบเหตุการณ์จะสามารถใช้ถังดับเพลิงดับไฟในเบื้องต้นได้	โครงการติดตั้งวิธีการใช้งานถังดับเพลิงไว้บริเวณที่มีถังดับเพลิง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 60
	3.เลือกใช้ Mesh Sheet คุ้มอาคารแบบกันไฟลาม เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 58
	4.หลีกเลี่ยงการสะสมของประเภทวัสดุติดไฟง่ายในปริมาณมากโดยคัดแยกจากขยะประเภทอื่นๆ ให้ชัดเจนและขนย้ายไปกำจัดทุกวัน	โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	5.ห้ามคนงานก่อสร้างสูบบุหรี่ภายในอาคารที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด และจัดสถานที่สูบบุหรี่ให้กับคนงานก่อสร้างให้ชัดเจน	โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ให้กับคนงานก่อสร้างให้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 46
	6.ในระหว่างก่อสร้างต้องจัดให้มีจุดรวมพล โดยจะใช้พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร ได้แก่ บริเวณพื้นที่ว่างขนาดพื้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 100 คน ได้อย่างเพียงพอ	โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล ที่สามารถรองรับคนได้ 100 คน ได้อย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 47



ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	7.โครงการต้องประสานสถานดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย มาฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมการอพยพหนีไฟปี ละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานดับเพลิงให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนหนีไฟให้โครงการ มีแผนซ้อมปลายปี 2569	-	-
	8.โครงการต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง	โครงการมี จป. ประจำโครงการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานและพื้นที่ในการปฏิบัติงาน	-	ภาคผนวก ค ค-8
	9.โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม การซักซ้อม การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คอยดูแลควบคุมงานก่อสร้าง	โครงการมี จป. ประจำโครงการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานและพื้นที่ในการปฏิบัติงาน	-	ภาคผนวก ค ค-8
	10.โครงการต้องจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดของอาคารให้ชัดเจน	โครงการมีการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	-
4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	1.จัดทำรั้วทึบ Metal Sheet (Aluminum Sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการความสูง 6 เมตร โดยปิดกันตามแนวเขตที่ดินของโครงการที่ติดต่อกับสาธารณะหรือที่ดินว่างผู้ครอบครอง เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นและบดบังมลทัศน์จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ	โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแบ่งเขตการก่อสร้างที่ชัดเจนและป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 2

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง)



บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารและรูปประกอบมาตรการฯ
	2.ติดตั้งผ้าใบ (Mesh Sheet) ที่มีคุณสมบัติกันไฟลามปิดคลุมรอบอาคาร ความสูงเท่ากับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	โครงการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 58
	3.ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	โครงการควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น และมีทีมวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้	-	-
	4.จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม และควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ	โครงการคอยดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข ภาพที่ 3



บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES ของบริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทั้ง ทั้งนี้เจ้าของโครงการดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง ตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด
ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)	ช่วงงานเสาเข็มฐานราก ตรวจวัดทุกวัน หลังงานฐานรากแล้วเสร็จ ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง)
ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC)	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง)
ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)	ระดับเสียง (Leq 24 hr, Lmax, L ₉₀ , เสียงรบกวน)	ช่วงงานเสาเข็มฐานราก ตรวจวัดทุกวัน หลังงานฐานรากแล้วเสร็จ ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง)
ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) บริเวณด้านทิศตะวันออก (ใกล้บ้านเลขที่ 64)	ความสั่นสะเทือน	ช่วงงานเสาเข็มฐานราก ตรวจวัดทุกวัน หลังงานฐานรากแล้วเสร็จ ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง)
ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณบ่อบำบัดน้ำก่อน ระบายลงสู่ท่อสาธารณะ	คุณภาพน้ำทิ้ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง



ตารางที่ 4-2 ตารางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
1.สภาพภูมิประเทศ	1.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้แก่ การจัดวางผังการก่อสร้างการกองวัสดุ ฯลฯ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการปรับสภาพพื้นที่โครงการก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง	-
	2.สภาพความมั่นคง แข็งแรง ของรั้ว	- รั้วรอบโครงการ	-ตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-
	3.ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและปิดคลุมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้งหลังการใช้งาน	-
2.ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน	1.ปริมาณตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในโครงการ และท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในโครงการ และท่อระบายน้ำ	-
	2.ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบประเด็นปัญหาการร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาช่องทางต่างๆ	-
3.คุณภาพอากาศ	1.ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ได้แก่ - ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.	- บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48	- TSP และ PM-10 ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่	-



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
3.คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม. - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม. - ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม. - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)		- CO, SO ₂ , NO ₂ , HC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง(ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		
	2.ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบประเด็นปัญหาการร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาช่องทางต่างๆ	-
	3.สภาพการใช้งานได้ดี ความสมบูรณ์ ของ Mesh Sheet	- Mesh Sheet ที่คลุมรอบตัวอาคารของโครงการ	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพของ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงดีเสมอ	-
	4.สภาพความสมบูรณ์ และการทำงานของเครื่องจักรกล	- เครื่องจักรกลก่อสร้างของโครงการ	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	-



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
4.ระดับเสียง	1.ระดับเสียง ได้แก่ Leq_{24hr} , L_{max} , L_{dn} , L_{90} และเสียงรบกวน โดยกำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ยภายใน 24 ชั่วโมง (Leq_{24hr}) ไม่เกิน 70 dB(A) ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ไม่เกิน 115 dB(A) และค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A)	- บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48	- ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานปรับถมพื้นที่และก่อสร้างฐานราก และตรวจวัดทุกๆ 1 เดือนในช่วงงานโครงสร้างอาคารและช่วงงานตกแต่งอาคาร การตรวจวัดแต่ละครั้ง ให้ทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง	โครงการได้จ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดค่าระดับเสียงภายในพื้นที่	-
4.ระดับเสียง (ต่อ)	2.ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบประเด็นปัญหาการร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาช่องทางต่างๆ	-
5.สั่นสะเทือน	1.ความสั่นสะเทือน	- ด้านทิศใต้ ติดกับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 48 และทางด้าน ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น ของบริษัท พชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อพื้นที่ติดโครงการทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการได้จ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่	-



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
6.การใช้น้ำ	1.สภาพอุปกรณ์จ่ายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- เส้นท่อประปาภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถังสำเร็จรูปภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน	-
7.การจัดการน้ำเสีย	ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil and Grease, Settleable Solids และ TDS	- บ่อบำบัดน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในพื้นที่โครงการ	-
8.การระบายน้ำ	1.การสะสมของตะกอนดินในบ่อดักตะกอนดิน	- บ่อดักตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในโครงการและท่อระบายน้ำ	-
	2.ขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะและดักตะกอน	- บ่อดักขยะและบ่อดักตะกอน	- สัปดาห์ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในโครงการและท่อระบายน้ำ	-
9.การจัดการมูลฝอย	1.สภาพถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ความเพียงพอต่อการรองรับมูลฝอยรวมทั้งปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีถังรองรับมูลฝอยวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีคอยตรวจสอบสภาพถังมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ	-
	2.ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบประเด็นปัญหาการร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาช่องทางต่างๆ	-



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
9.การจัดการมูลฝอย	3.บันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนักประเภท และลักษณะปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่นำไปกำจัดศูนย์กำจัดขยะวัสดุก่อสร้างอ่อนนุช	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกครั้งที่ขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการควบคุมดูแลการคัดแยกขยะมูลฝอย และตรวจสอบปริมาณขยะที่นำออกไปกำจัดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-
10.การจราจร	1.สภาพป้ายชี้โครงการ ป้ายและสัญลักษณ์จราจร อยู่ในสภาพดีมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลื่น	- ป้ายชี้โครงการ และป้ายแสดงทิศทางจราจรต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟเตือน ไฟกระพริบบริเวณด้านหน้าโครงการ และมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายอยู่เสมอ	-
	2.สภาพยานพาหนะและเครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	- ยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้งานก่อสร้างโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการเลือกใช้บริษัทรถบรรทุกที่ได้รับการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของรถให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-
11.การใช้ไฟฟ้า	1.สภาพพร้อมใช้งาน	- อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าและแสงส่องสว่าง ที่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการ ไฟโดยแสงไฟจะไม่สาดส่องไปยังอาคารข้างเคียง	-
	2.อายุการใช้งาน	- อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ	-



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
12.การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ	ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีทีมประสานงานระหว่างชุมชนกับโครงการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและการตัดสินใจร่วมกัน ในการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ	-
13.สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	1.สำรวจสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้โครงการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	- บ้าน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ - บ้าน/สถานประกอบการ ในระยะ 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ - หน่วยงานพื้นที่อ่อนไหว รัศมี 1 กิโลเมตร - หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รัศมี 1 กิโลเมตร	- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบประเด็นปัญหาการร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาช่องทางต่างๆ	-
	2.สภาพความสมบูรณ์ ไม่เปลี่ยนแปลงของป่าயประชาสัมพันธ์โครงการ	- ป่าயประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของป่าயประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-
	3.สภาพดีพร้อมใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมต่อการใช้งานของกล้อง CCTV ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ตารางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 23 LUXURY SUITES (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/ การแก้ไข
13.สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	4.ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบประเด็นปัญหาการร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาช่องทางต่างๆ	-
14.สุขภาพ	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-
15.การป้องกันและระงับอัคคีภัย	1.สภาพพร้อมใช้งาน	- ถังดับเพลิงเคมีภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีเจ้าหน้าที่ จป. คอยตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-
	2.อายุการใช้งาน	- ถังดับเพลิงเคมีภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีเจ้าหน้าที่ จป. คอยตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-
	3.สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบลบเลือน	- ป้ายและเครื่องหมายของการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีเจ้าหน้าที่ จป. คอยตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง และป้ายแนะนำการใช้งานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-
16.ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	ความมั่นคง แข็งแรง และการใช้งานได้ดีของรั้วและผ้าใบที่ปิดคลุมอาคาร	- รั้วรอบโครงการ - ผ้าใบที่ปิดคลุมอาคารโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-
17.การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการระยะ 100 เมตร	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการมีทีมประสานงานระหว่างชุมชนกับโครงการ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและการตัดสินใจร่วมกัน ในการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ	-



4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

(1) ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.1-1 และ ภาพที่ 4-1

(2) ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.1-1 และ ภาพที่ 4-2



ตารางที่ 4.1.1-1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
01-02/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
02-03/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
03-04/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
04-05/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
05-06/01/2569	0.0685	0.0340
06-07/01/2569	0.0740	0.0367
07-08/01/2569	0.0727	0.0342
08-09/01/2569	0.0701	0.0342
09-10/01/2569	0.0766	0.0371
10-11/01/2569	0.0667	0.0322
11-12/01/2569	*	*
12-13/01/2569	0.0711	0.0346
13-14/01/2569	0.1789	0.0897
14-15/01/2569	0.1123	0.0579
15-16/01/2569	0.0697	0.0344
16-17/01/2569	0.0676	0.0335
17-18/01/2569	0.0768	0.0376
18-19/01/2569	*	*
19-20/01/2569	0.0690	0.0344
20-21/01/2569	0.0643	0.0321
21-22/01/2569	0.0698	0.0352
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* หมายถึง วันที่ไม่มีกรตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

**⁽¹⁾ หมายถึง วันที่ 01 – 05 มกราคม พ.ศ. 2569 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
22-23/01/2569	49.4298	24.0145
23-24/01/2569	55.7996	27.2266
24-25/01/2569	73.8010	36.0029
25-26/01/2569	*	*
26-27/01/2569	63.1699	31.1128
27-28/01/2569	55.5644	26.8503
28-29/01/2569	52.6542	25.4487
29-30/01/2569	66.9903	33.3201
30-31/01/2569	54.6902	26.8918
31/01/-01/02/2569	56.3017	27.1940
01-02/02/2569	*	*
02-03/02/2569	64.6389	32.3695
03-04/02/2569	59.4239	28.4026
04-05/02/2569	86.2924	42.2050
05-06/02/2569	50.4457	25.0472
06-07/02/2569	72.2053	35.3547
07-08/02/2569	68.7908	33.7407
08-09/02/2569	*	*
09-10/02/2569	71.6932	35.3213
10-11/02/2569	84.0211	41.0759
11-12/02/2569	63.5287	30.0191
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
12-13/02/2569	43.6192	22.5374
13-14/02/2569	40.9243	20.9674
14-15/02/2569	41.4960	22.2084
15-16/02/2569	*	*
16-17/02/2569	53.9047	25.4813
17-18/02/2569	41.2749	19.6118
18-19/02/2569	51.3474	24.3811
19-20/02/2569	47.2923	22.0495
20-21/02/2569	54.3327	26.9662
21-22/02/2569	54.3327	26.9662
22-23/02/2569	*	*
23-24/02/2569	56.6473	26.5783
24-25/02/2569	60.2863	28.1169
25-26/02/2569	62.5377	31.8192
26-27/02/2569	53.5322	26.6160
27-28/02/2569	68.2161	34.4571
28/02-01/03/2569	63.6284	33.5097
24-25/03/2569	56.3341	27.8892
25-26/03/2569	48.9576	23.3925
26-27/03/2569	52.9490	24.0493
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)


วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
27-28/04/2569	60.1082	31.1729
28-29/04/2569	58.4944	29.6020
29-30/04/2569	52.4294	26.2910
20-21/05/2569	58.2410	28.3348
21-22/05/2569	59.5589	29.0445
22-23/05/2569	52.7666	25.6990
17-18/06/2569	82.8639	41.9693
18-19/06/2569	84.4505	42.3276
19-20/06/2569	78.4622	38.3866
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



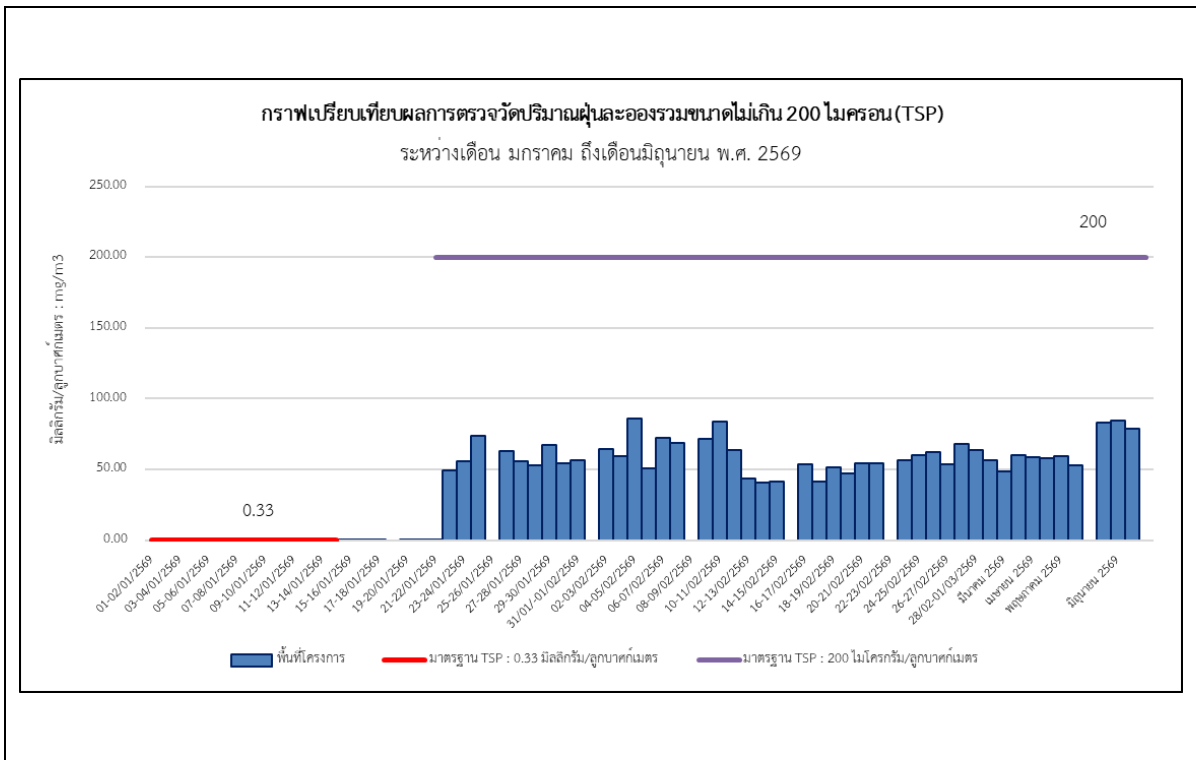

ภาพที่ 4-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)
ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

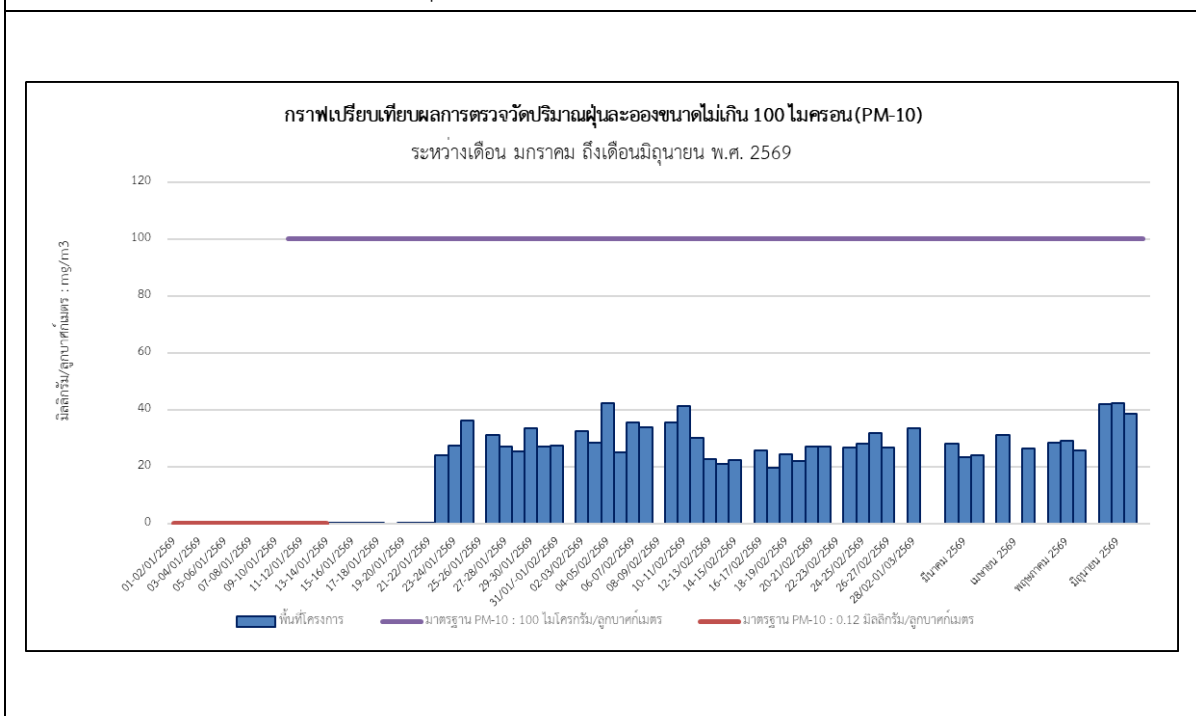

ภาพที่ 4-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



4.1.2 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซในบรรยากาศ

(1) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศ จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.2-1 และ ภาพที่ 4-3

(2) ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) ในบรรยากาศ จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในบรรยากาศ โดยกำหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ไม่เกิน 120 ส่วนในล้านส่วน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.2-1 และ ภาพที่ 4-4

(3) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ในบรรยากาศ จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าไม่เกิน 50 และ 100 ส่วนในล้านส่วน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.2-2 และ ภาพที่ 4-5

(4) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ในบรรยากาศ จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีค่าอยู่ในช่วง 1.900 – 2.159 ส่วนในล้านส่วน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.2-2 และ ภาพที่ 4-6



ตารางที่ 4.1.2-1 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) และ ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (หน่วย ppm)		ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (หน่วย ppm)	
	CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	NO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	NO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
19-20/01/2569	1.2734	1.5456	0.0166	0.0185
20-21/01/2569	1.3189	1.9565	0.0164	0.0184
21-22/01/2569	1.3462	1.7842	0.0160	0.0174
06-07/02/2569	1.49	1.96	16.6	18.6
07-08/02/2569	1.41	1.70	16.0	17.2
08-09/02/2569	1.32	1.66	16.2	17.6
24-25/03/2569	1.40	1.86	16.6	19.4
25-26/03/2569	1.43	1.85	16.5	18.6
26-27/03/2569	1.50	1.78	16.3	18.3
27-28/04/2569	1.49	1.88	16.2	18.4
28-29/04/2569	1.48	1.85	16.4	18.6
29-30/04/2569	1.42	1.69	16.6	19.2
20-21/05/2569	1.49	1.88	16.6	19.4
21-22/05/2569	1.38	1.75	16.5	19.3
22-23/05/2569	1.35	1.87	16.4	18.5
17-18/06/2569	1.47	1.85	16.6	18.6
18-19/06/2569	1.36	1.66	16.5	18.3
19-20/06/2569	1.35	1.87	16.7	19.6
มาตรฐาน	9	30	-	≤ 120

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.2-2 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และ ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (หน่วย ppb)		ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) (หน่วย ppm)
	SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	
19-20/01/2569	0.0024	0.0038	2.048
20-21/01/2569	0.0023	0.0036	2.075
21-22/01/2569	0.0025	0.0035	2.044
06-07/02/2569	2.8	3.9	2.017
07-08/02/2569	2.7	3.8	2.073
08-09/02/2569	2.6	3.9	2.104
24-25/03/2569	2.2	3.3	2.046
25-26/03/2569	2.4	3.8	2.033
26-27/03/2569	2.3	3.6	2.059
27-28/04/2569	2.4	3.9	2.013
28-29/04/2569	2.3	3.8	1.985
29-30/04/2569	2.5	3.6	2.140
20-21/05/2569	2.5	3.8	2.153
21-22/05/2569	2.4	3.4	2.144
22-23/05/2569	2.6	3.7	2.127
17-18/06/2569	2.5	3.6	2.154
18-19/06/2569	2.4	3.3	2.104
19-20/06/2569	2.3	3.6	2.142
มาตรฐาน	0.12 ⁽¹⁾	0.30 ⁽²⁾	-


หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm


หมายเหตุ : ppb หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน




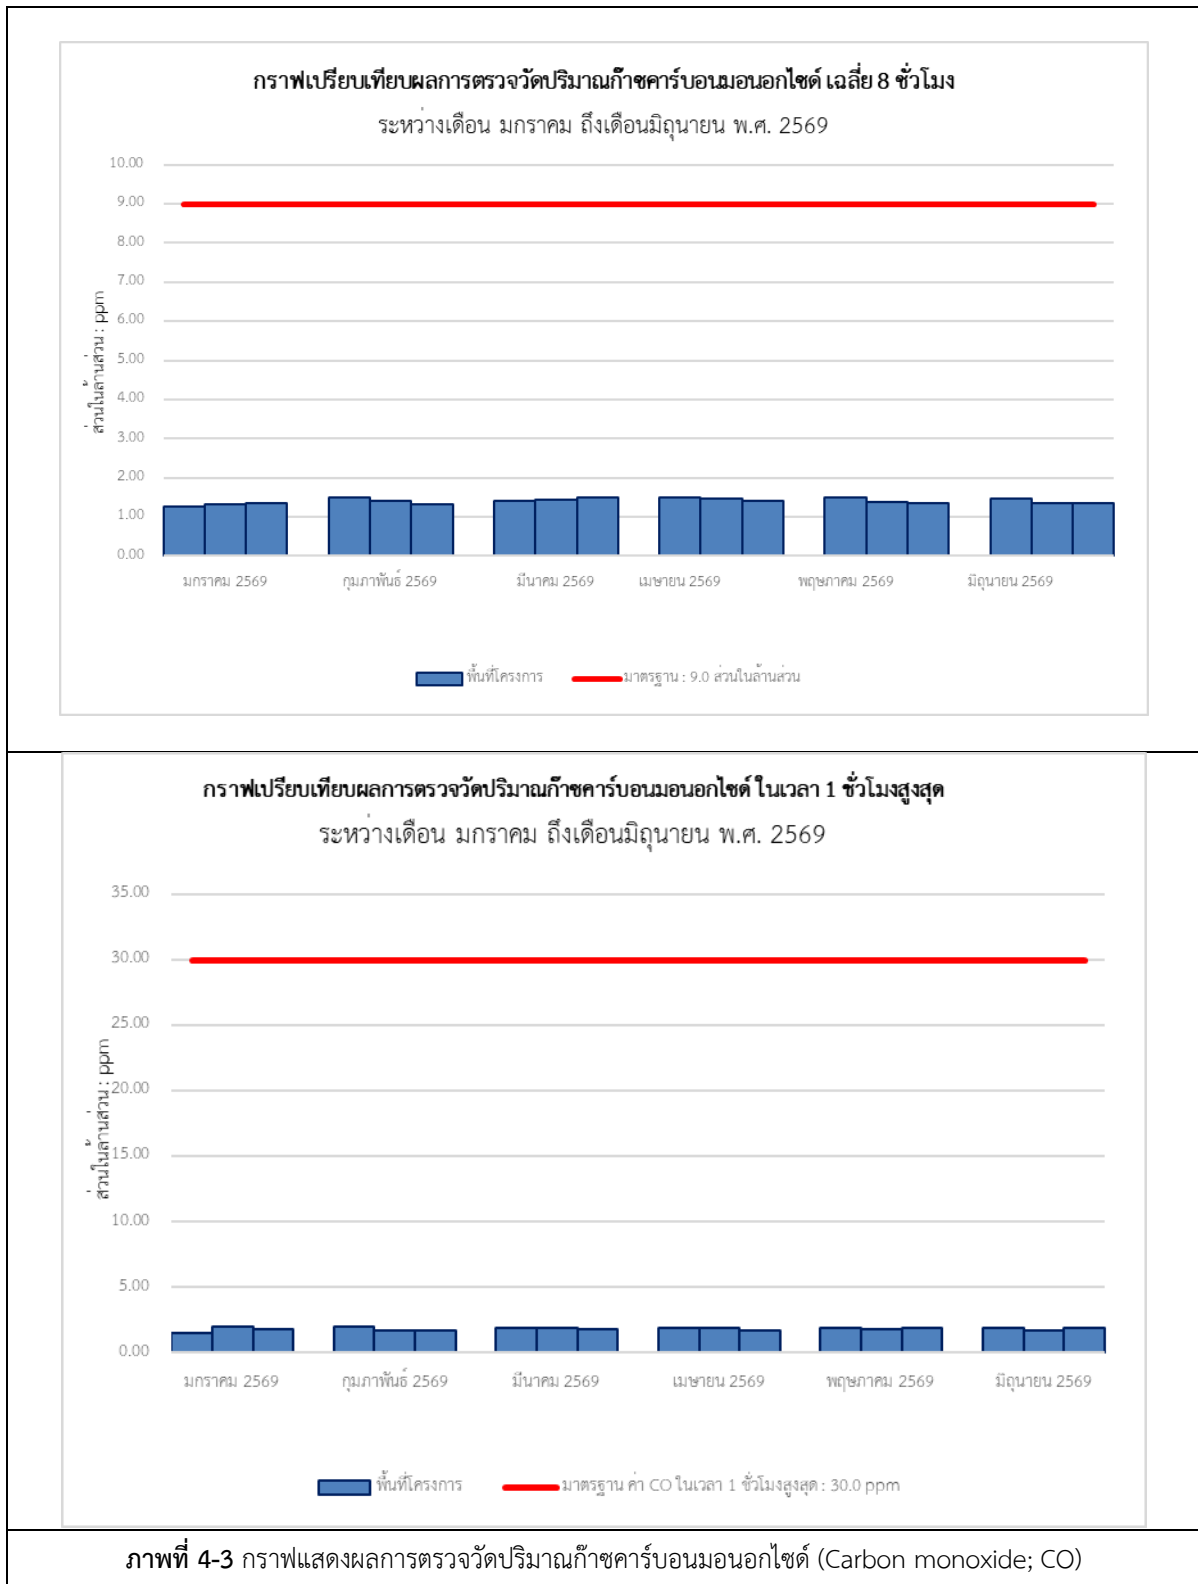

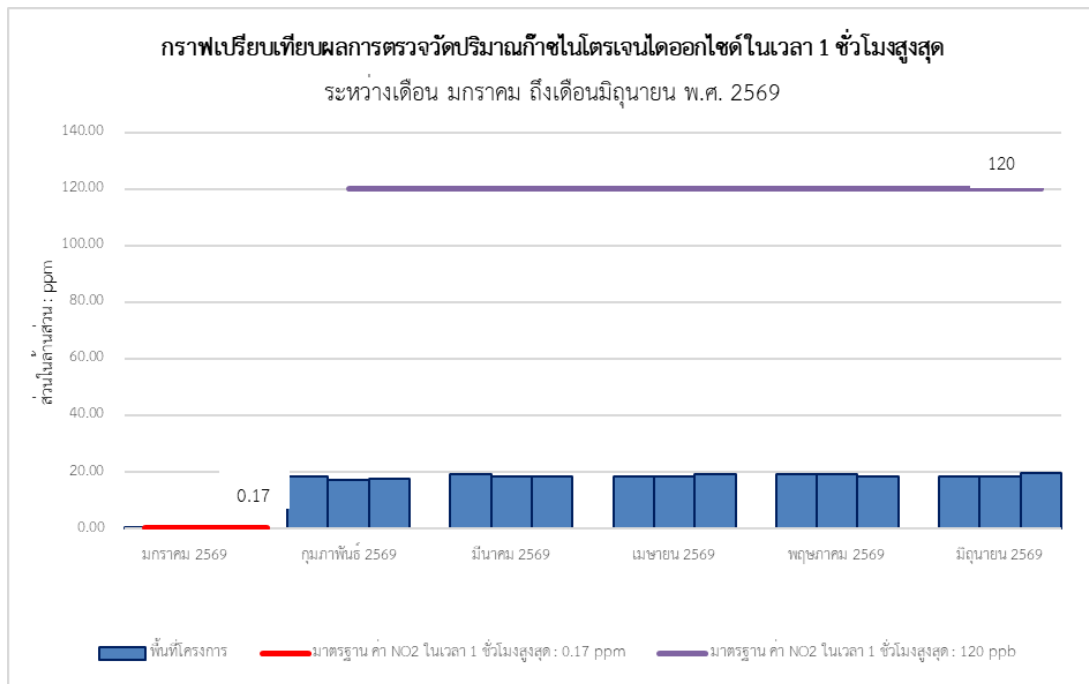


ภาพที่ 4-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO₂)

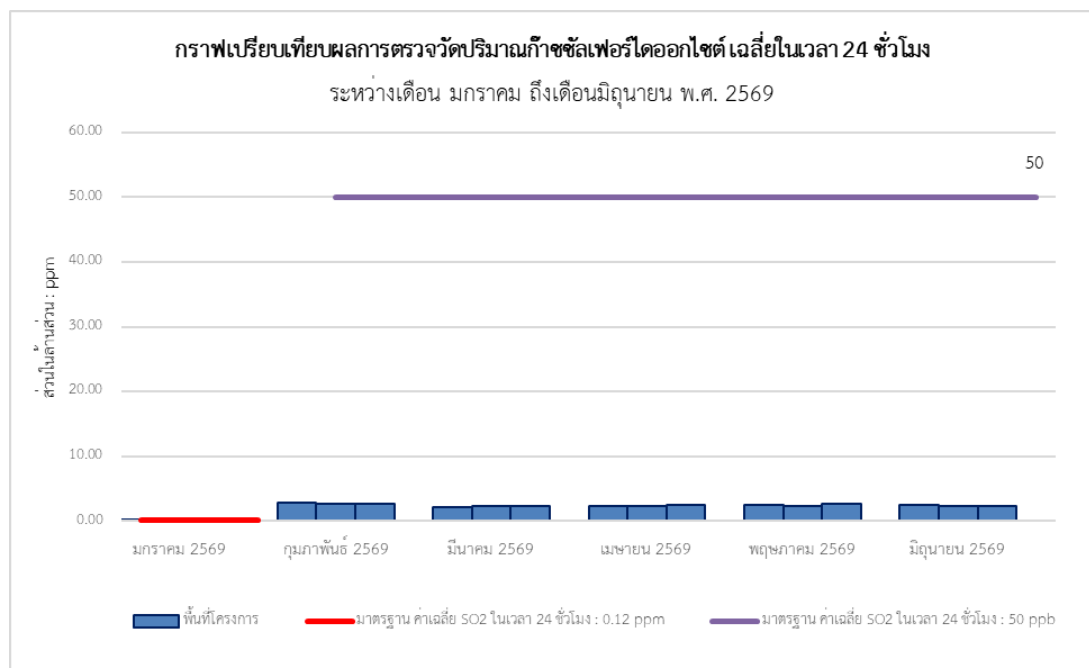

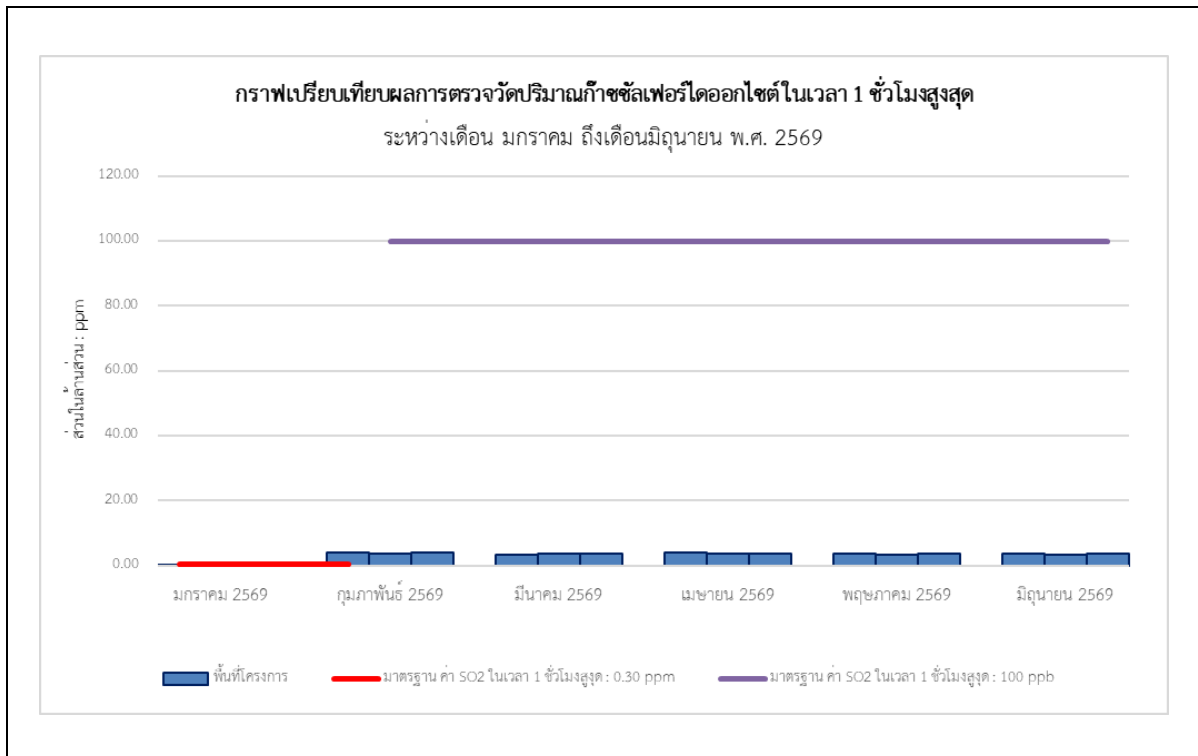

ภาพที่ 4-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO₂)

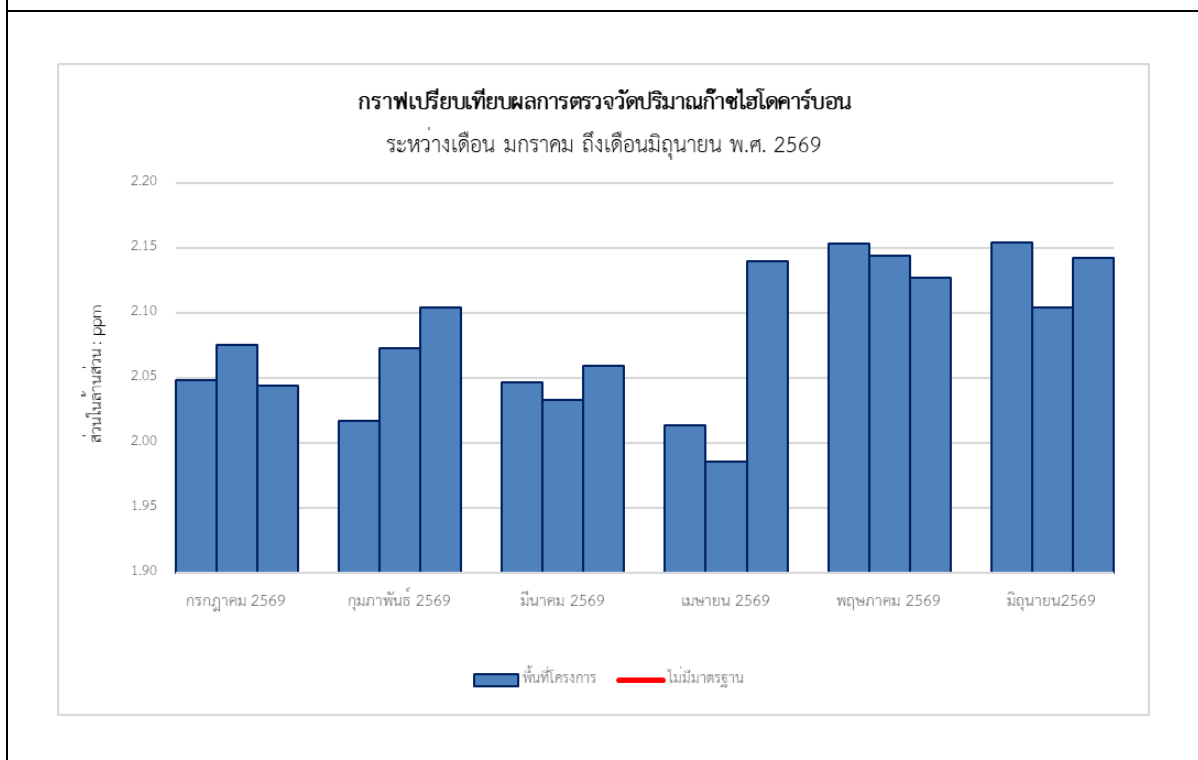

ภาพที่ 4-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)



4.1.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บรรยากาศ จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้เท่ากับ 70.0 (dB(A)) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 115.0 (dB(A)) ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ที่กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนไว้เท่ากับ 10 (dB(A)) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.3-1 และ ภาพที่ 4-7 ถึง ภาพที่ 4-9



บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศใต้

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียง



ตารางที่ 4.1.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
02-03/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
03-04/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
04-05/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
05-06/01/2569	59.7	93.4	9.2
06-07/01/2569	58.9	87.1	9.8
07-08/01/2569	61.3	89.7	9.5
08-09/01/2569	63.1	96.7	8.9
09-10/01/2569	62.4	97.7	9.1
10-11/01/2569	61.7	96.5	7.0
11-12/01/2569	*	*	*
12-13/01/2569	60.4	97.8	8.0
13-14/01/2569	62.9	104.1	9.3
14-15/01/2569	64.9	98.2	10.0
15-16/01/2569	62.3	102.7	8.5
16-17/01/2569	61.8	100.2	6.1
17-18/01/2569	63.1	98.3	9.0
18-19/01/2569	*	*	*
19-20/01/2569	61.5	89.8	6.1
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

* หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

**⁽¹⁾ หมายถึง วันที่ 01 – 05 มกราคม พ.ศ. 2569 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.1.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
20-21/01/2569	63.2	99.2	9.8
21-22/01/2569	62.8	98.4	7.8
22-23/01/2569	65.2	94.4	9.9
23-24/01/2569	63.3	97.2	9.9
24-25/01/2569	62.3	95.9	9.2
25-26/01/2569	*	*	*
26-27/01/2569	64.2	96.1	9.5
27-28/01/2569	64.4	99.4	9.8
28-29/01/2569	63.2	95.6	9.1
29-30/01/2569	63.1	98.2	6.7
30-31/01/2569	63.0	94.1	9.7
31/01/01/02/2569	61.0	95.1	9.5
01-02/02/2569	*	*	*
02-03/02/2569	62.4	98.5	9.8
03-04/02/2569	64.0	96.2	6.1
04-05/02/2569	61.5	98.6	8.2
05-06/02/2569	63.8	98.5	10.0
06-07/02/2569	63.2	100.3	10.0
07-08/02/2569	63.6	95.2	9.7
08-09/02/2569	*	*	*
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
09-10/02/2569	62.4	97.7	9.1
10-11/02/2569	61.3	98.2	7.0
11-12/02/2569	62.2	95.2	8.4
12-13/02/2569	63.2	95.2	9.5
13-14/02/2569	64.0	99.4	7.9
14-15/02/2569	62.6	98.2	9.9
15-16/02/2569	*	*	*
16-17/02/2569	63.7	98.5	8.0
17-18/02/2569	62.5	98.3	9.8
18-19/02/2569	64.3	99.4	9.5
19-20/02/2569	62.1	98.6	8.7
20-21/02/2569	60.9	97.6	9.2
21-22/02/2569	61.8	97.2	9.8
22-23/02/2569	*	*	*
23-24/02/2569	62.5	98.5	9.3
24-25/02/2569	61.2	95.2	8.6
25-26/02/2569	65.1	98.6	10.0
26-27/02/2569	66.3	97.8	9.9
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
27-28/02/2569	63.6	95.2	9.0
28/02-01/03/2569	63.2	95.6	10.0
24-25/03/2569	58.9	87.1	4.8
25-26/03/2569	63.1	96.7	3.9
26-27/03/2569	62.4	97.7	4.1
27-28/04/2569	63.6	89.1	7.0
28-29/04/2569	64.0	83.1	4.5
29-30/04/2569	62.5	98.2	3.1
20-21/05/2569	65.0	98.4	8.8
21-22/05/2569	62.3	88.5	10.0
22-23/05/2569	62.9	95.1	5.7
17-18/06/2569	62.0	97.2	3.4
18-19/06/2569	61.3	98.6	2.0
19-20/06/2569	58.9	95.2	4.7
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน


หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด


dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



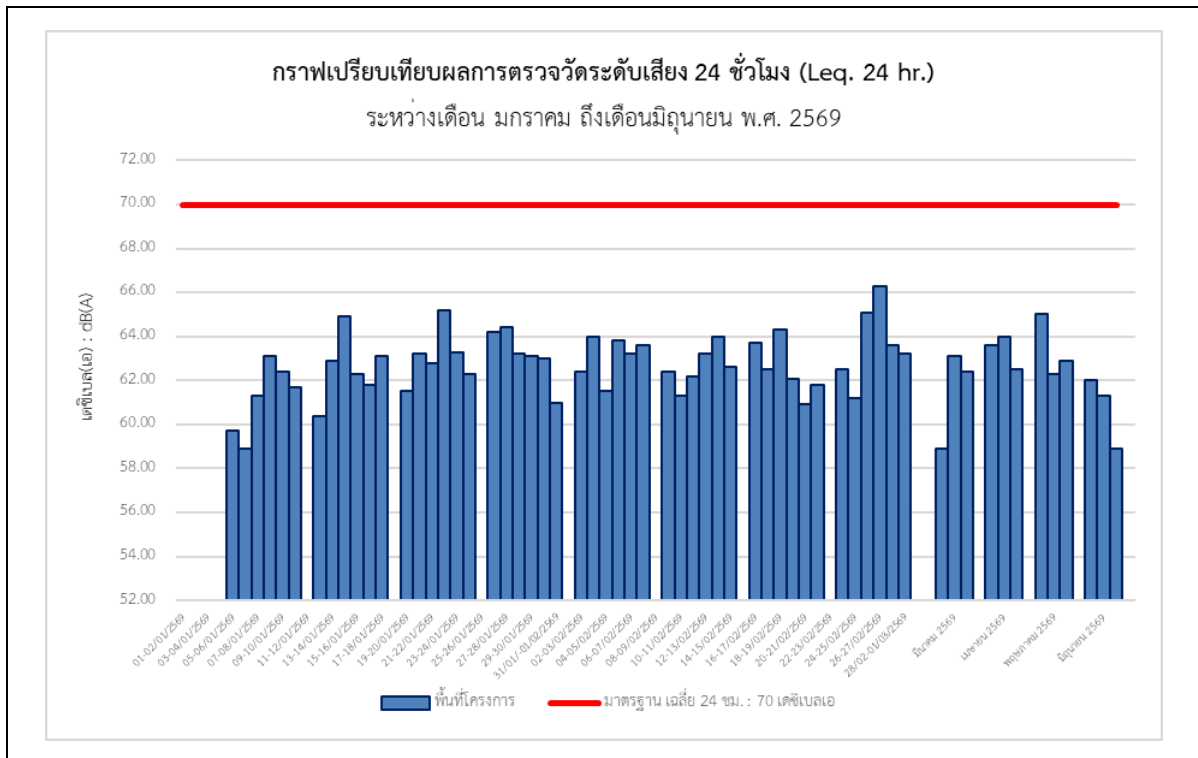


ภาพที่ 4-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของ L_{eq} 24 hr

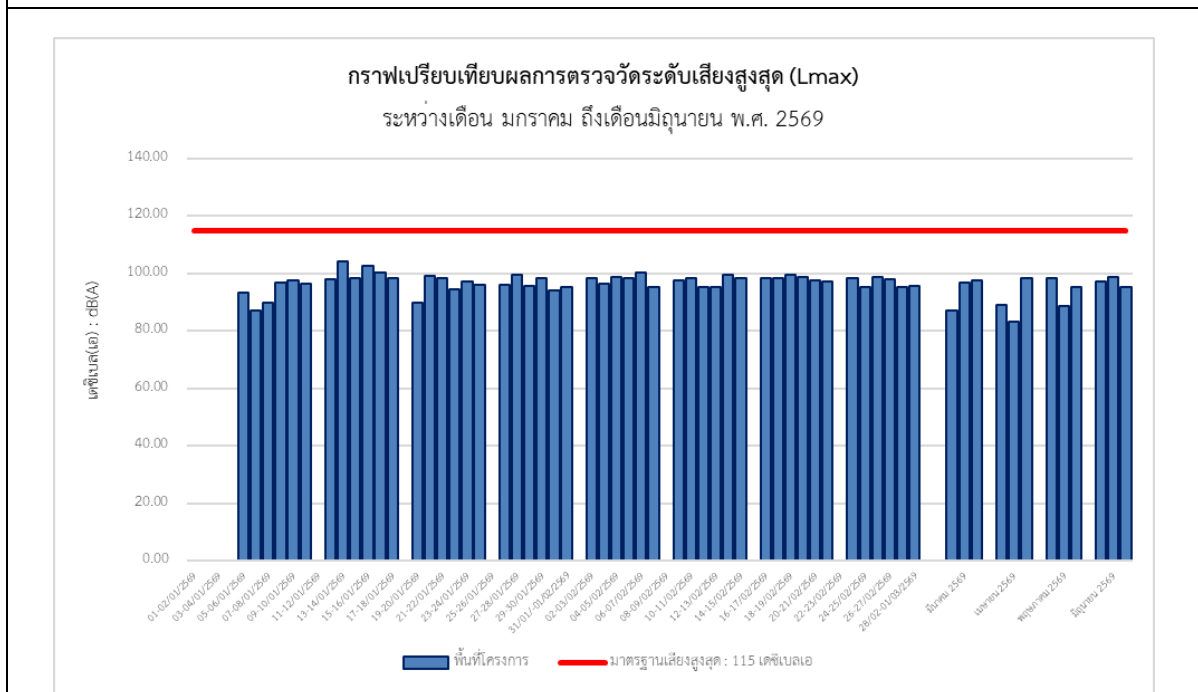

ภาพที่ 4-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสุดของ L_{max}



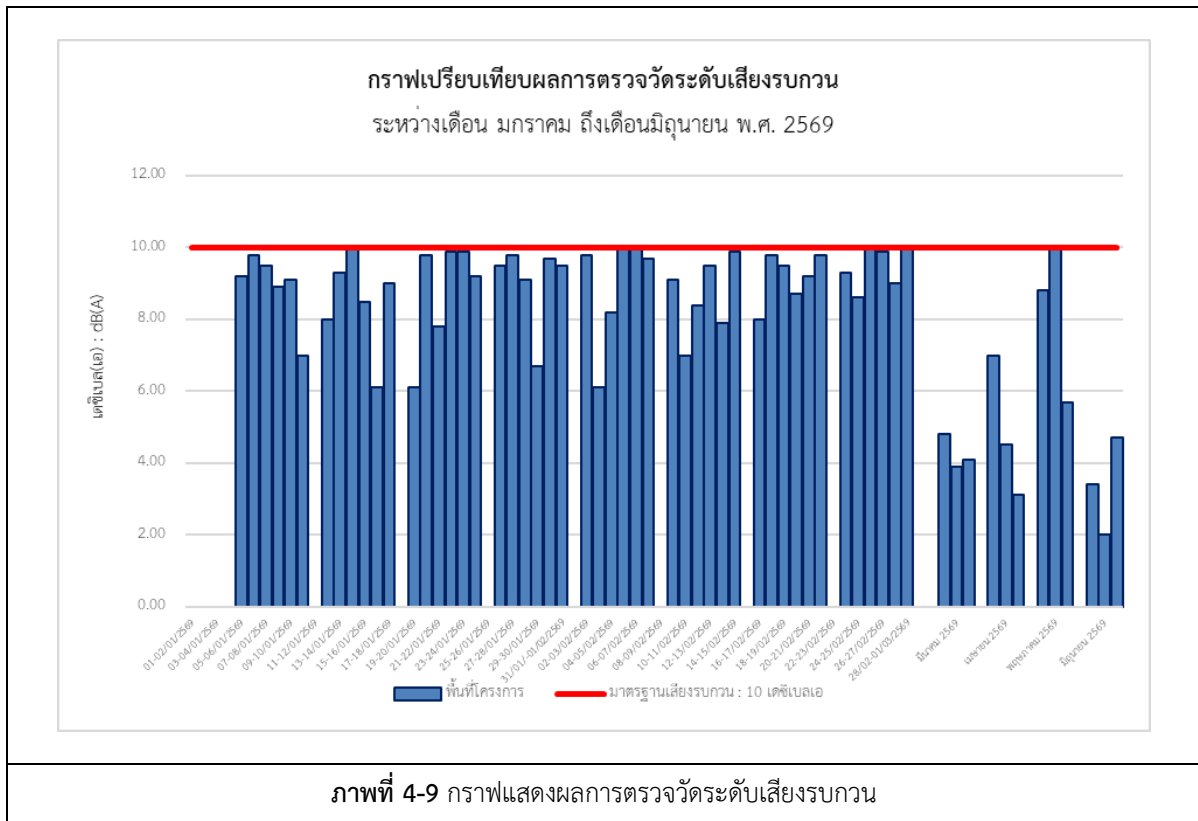

ภาพที่ 4-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน



4.1.4 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48) และด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รายละเอียดรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.4-1 และ ตารางที่ 4.1.4-2

	
บริเวณพื้นที่โครงการ	
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน	



ตารางที่ 4.1.4-1 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
01-02/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
02-03/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
03-04/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
04-05/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
05-06/01/2569	แกนตั้ง	0.365	21.0	7.750
06-07/01/2569	แกนตามขวาง	0.457	21.0	7.750
07-08/01/2569	แกนตั้ง	0.895	26.0	9.000
08-09/01/2569	แกนตั้ง	0.701	13.0	5.750
09-10/01/2569	แกนตามยาว	0.985	17.0	6.750
10-11/01/2569	แกนตามยาว	0.552	16.0	6.500
11-12/01/2569	*	*	*	*
12-13/01/2569	แกนตามยาว	0.956	39.0	12.250
13-14/01/2569	แกนตั้ง	1.198	39.0	12.250
14-15/01/2569	แกนตั้ง	1.174	48.0	14.500
15-16/01/2569	แกนตั้ง	0.899	21.0	7.750
16-17/01/2569	แกนตามยาว	0.845	45.0	13.750
17-18/01/2569	แกนตามยาว	0.726	19.0	7.250
18-19/01/2569	*	*	*	*
19-20/01/2569	แกนตั้ง	0.784	11.0	5.250
20-21/01/2569	แกนตั้ง	1.947	21.0	7.750

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันที่ไม่มีตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

**⁽¹⁾ หมายถึง วันที่ 01 - 05 มกราคม พ.ศ. 2569 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.1.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
21-22/01/2569	แกนตั้ง	1.450	51.0	15.100
22-23/01/2569	แกนตามขวาง	0.956	22.0	8.000
23-24/01/2569	แกนตั้ง	1.419	64.0	16.400
24-25/01/2569	แกนตามขวาง	1.125	33.0	10.750
25-26/01/2569	*	*	*	*
26-27/01/2569	แกนตั้ง	0.717	51.0	15.100
27-28/01/2569	แกนตั้ง	2.940	> 100	20.000
28-29/01/2569	แกนตั้ง	1.663	56.0	15.600
29-30/01/2569	แกนตั้ง	1.127	54.0	15.400
30-31/01/2569	แกนตั้ง	1.269	47.0	14.250
31-01/01-02/2569	แกนตามขวาง	0.845	11.0	5.250
01-02/02/2569	*	*	*	*
02-03/02/2569	แกนตามยาว	0.986	11.0	5.250
03-04/02/2569	แกนตั้ง	1.671	46.0	14.000
04-05/02/2569	แกนตั้ง	1.206	45.0	13.750
05-06/02/2569	แกนตั้ง	1.419	59.0	15.900
06-07/02/2569	แกนตามยาว	0.986	16.0	6.500
07-08/02/2569	แกนตั้ง	1.032	33.0	10.750
08-09/02/2569	*	*	*	*
09-10/02/2569	แกนตั้ง	1.434	44.0	13.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันที่ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
10-11/02/2569	แกนตั้ง	1.860	47.0	14.250
11-12/02/2569	แกนตั้ง	1.963	36.0	11.500
12-13/02/2569	แกนตั้ง	2.593	47.0	14.250
13-14/02/2569	แกนตั้ง	1.785	31.0	10.250
14-15/02/2569	แกนตามขวาง	1.025	32.0	10.500
15-16/02/2569	*	*	*	*
16-17/02/2569	แกนตั้ง	1.734	26.0	9.000
17-18/02/2569	แกนตั้ง	1.215	33.0	10.750
18-19/02/2569	แกนตามขวาง	1.326	33.0	10.750
19-20/02/2569	แกนตามยาว	1.154	48.0	14.500
20-21/02/2569	แกนตั้ง	1.947	51.0	15.100
21-22/02/2569	แกนตั้ง	1.215	33.0	10.750
22-23/02/2569	*	*	*	*
23-24/02/2569	แกนตั้ง	0.956	55.0	15.5.00
24-25/02/2569	แกนตามยาว	1.215	22.0	8.000
25-26/02/2569	แกนตามขวาง	1.326	22.0	8.000
26-27/02/2569	แกนตามยาว	1.326	22.0	8.000
27-28/02/2569	แกนตั้ง	1.154	52.0	15.200
28/02-01/03/2569	แกนตามยาว	1.326	55.0	15.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
24-25/03/2569	แกนตั้ง	1.222	8.4	5.000
25-26/03/2569	แกนตามยาว	1.167	2.8	5.000
26-27/03/2569	แกนตามขวาง	1.072	2.2	5.00
27-28/04/2569	แกนตั้ง	1.154	5.2	5.000
28-29/04/2569	แกนตามยาว	1.021	5.5	5.000
29-30/04/2569	แกนตามขวาง	0.956	6.3	5.000
20-21/05/2569	แกนตั้ง	1.222	10.0	5.000
21-22/05/2569	แกนตั้ง	1.340	4.4	5.000
22-23/05/2569	แกนตามขวาง	1.215	8.3	5.000
17-18/06/2569	แกนตามขวาง	1.125	14.0	6.000
18-19/06/2569	แกนตามขวาง	1.254	16.0	6.500
19-20/06/2569	แกนตามยาว	1.065	15.0	6.250

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
21-22/01/2569	แกนตั้ง	0.895	25.0	8.750
22-23/01/2569	แกนตั้ง	0.946	3.8	5.000
23-24/01/2569	แกนตั้ง	1.277	54.0	15.400
24-25/01/2569	แกนตามขวาง	0.962	2.9	5.000
25-26/01/2569	*	*	*	*
26-27/01/2569	แกนตั้ง	0.891	32.0	10.500
27-28/01/2569	แกนตั้ง	0.914	21.0	7.750
28-29/01/2569	แกนตั้ง	1.072	36.0	11.500
29-30/01/2569	แกนตามยาว	0.847	51.0	15.100
30-31/01/2569	แกนตั้ง	0.993	39.0	12.250
31-01/01-02/2569	แกนตั้ง	1.292	42.0	13.000
01-02/02/2569	*	*	*	*
02-03/02/2569	แกนตั้ง	0.985	31.0	10.250
03-04/02/2569	แกนตั้ง	0.954	38.0	12.000
04-05/02/2569	แกนตามขวาง	0.985	51.0	15.100
05-06/02/2569	แกนตามขวาง	0.845	33.0	10.750
06-07/02/2569	แกนตั้ง	1.072	39.0	12.250
07-08/02/2569	แกนตามขวาง	0.845	63.0	16.300
08-09/02/2569	*	*	*	*
09-10/02/2569	แกนตั้ง	0.922	43.0	13.250

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
10-11/02/2569	แกนตามยาว	1.072	27.0	9.250
11-12/02/2569	แกนตั้ง	1.056	22.0	8.000
12-13/02/2569	แกนตามยาว	0.854	6.2	5.000
13-14/02/2569	แกนตามขวาง	0.987	24.0	8.500
14-15/02/2569	แกนตั้ง	0.875	41.0	12.750
15-16/02/2569	-	*	*	*
16-17/02/2569	แกนตั้ง	1.624	5.2	5.000
17-18/02/2569	แกนตั้ง	0.981	14.0	6.000
18-19/02/2569	แกนตามยาว	1.096	2.8	5.000
19-20/02/2569	แกนตั้ง	1.441	4.4	5.000
20-21/02/2569	แกนตั้ง	1.072	2.9	5.000
21-22/02/2569	แกนตั้ง	0.969	5.2	5.000
22-23/02/2569	-	*	*	*
23-24/02/2569	แกนตั้ง	0.845	6.5	5.000
24-25/02/2569	แกนตามขวาง	0.966	4.7	5.000
25-26/02/2569	แกนตามขวาง	0.956	5.6	5.000
26-27/02/2569	แกนตามขวาง	0.854	9.6	5.000
27-28/02/2569	แกนตามขวาง	0.875	5.6	5.000
28/02-01/03/2569	แกนตามขวาง	0.985	44.0	13.500
24-25/03/2569	แกนตามยาว	0.997	2.4	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน
* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
25-26/03/2569	แกนตามยาว	1.159	4.3	5.000
26-27/03/2569	แกนตั้ง	0.956	6.0	5.000
27-28/04/2569	แกนตั้ง	0.874	2.1	5.000
28-29/04/2569	แกนตั้ง	0.885	7.4	5.000
29-30/04/2569	แกนตามขวาง	0.854	4.2	5.000
20-21/05/2569	แกนตามยาว	0.854	7.1	5.000
21-22/05/2569	แกนตามยาว	0.965	9.5	5.000
22-23/05/2569	แกนตามขวาง	0.884	4.1	5.000
17-18/06/2569	แกนตามขวาง	1.036	11.0	5.250
18-19/06/2569	แกนตามยาว	0.967	10.0	5.000
19-20/06/2569	แกนตามขวาง	0.956	7.4	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



4.1.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ 23 LUXURY SUITES ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยทำการตรวจวัดน้ำทิ้งในพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ pH, TDS, Oil&Grease, Settleable Solids, TKN พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.5-1



บริเวณพื้นที่โครงการ

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง



ตารางที่ 4.1.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด						
	มกราคม 69	กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69	เมษายน 69	พฤษภาคม 69	มิถุนายน 69	มาตรฐาน
pH	8.8	8.0	7.8	7.8	7.9	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	158	242	248	112	142	228	≤ 1,300
Total Suspended Solids	11.6	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 50
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 40
Sulfide	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-
Oil and Grease	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 40
Total Coliform Bacteria	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	-


หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567, อาคารประเภท ค

หมายเหตุ : ND หมายถึง วิเคราะห์ไม่พบ



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)


ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

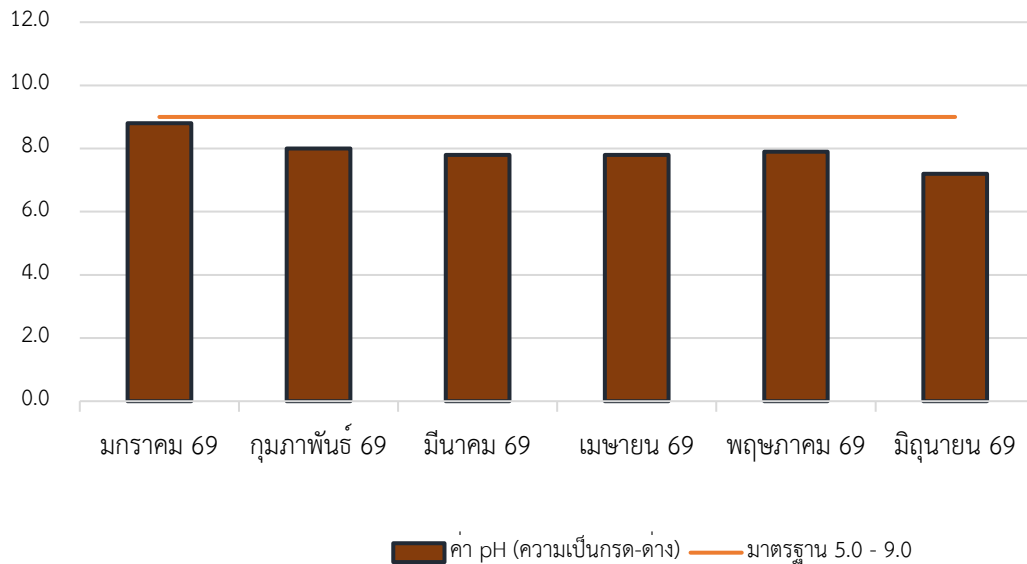

ภาพที่ 4-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

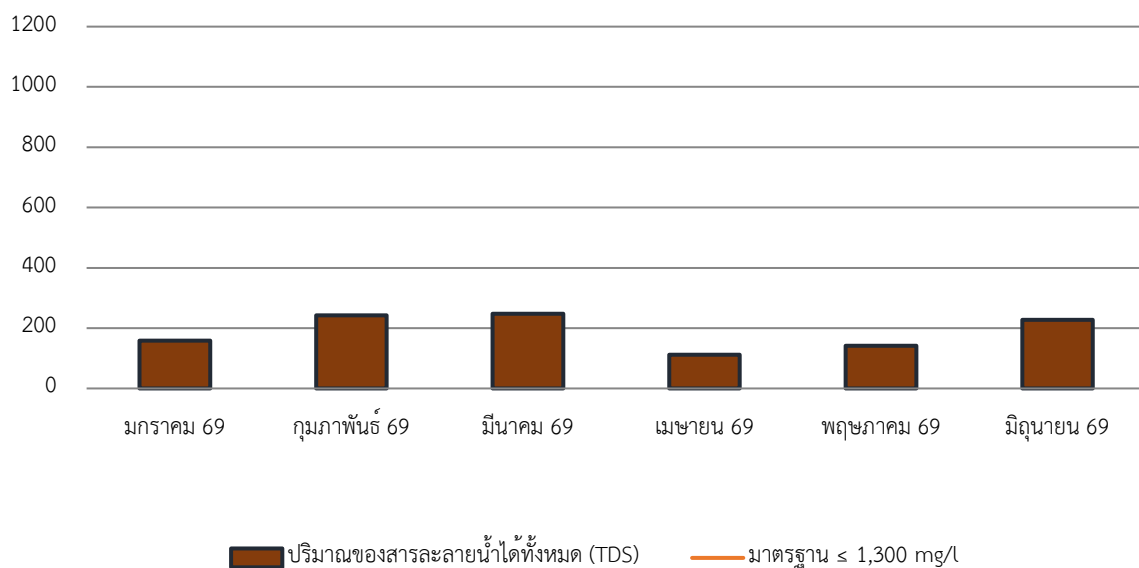


ภาพที่ 4-11 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS)


ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

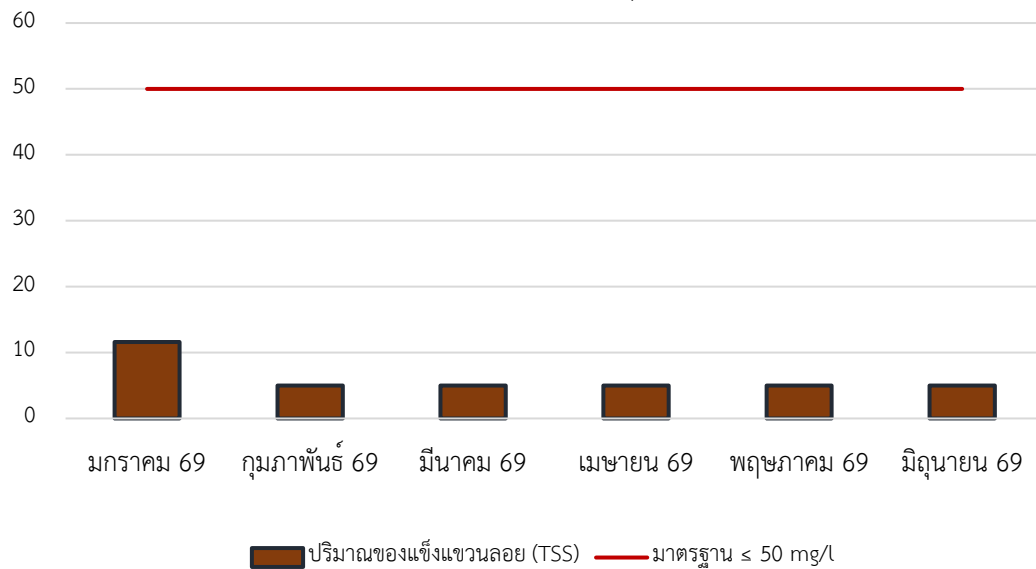

ภาพที่ 4-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

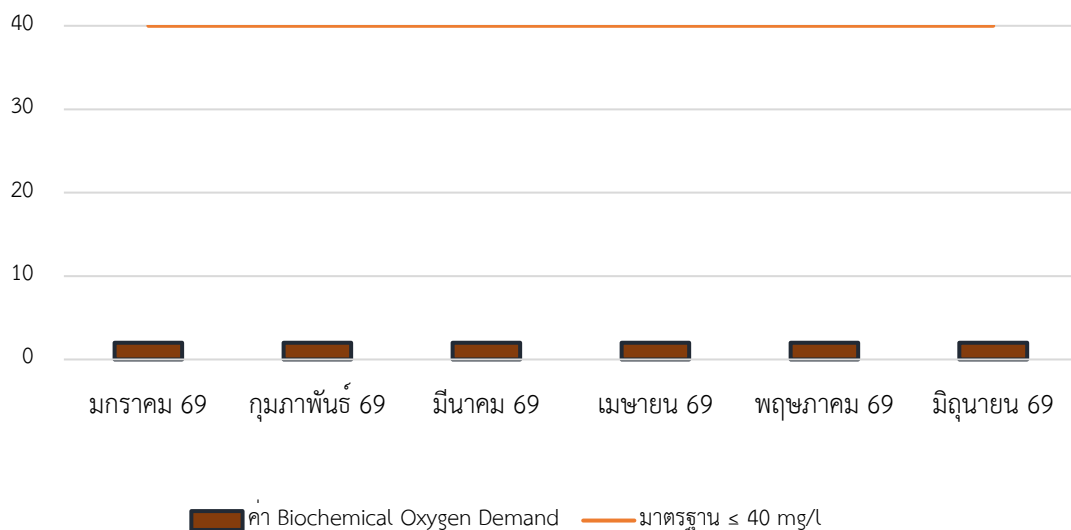


ภาพที่ 4-13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)


ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

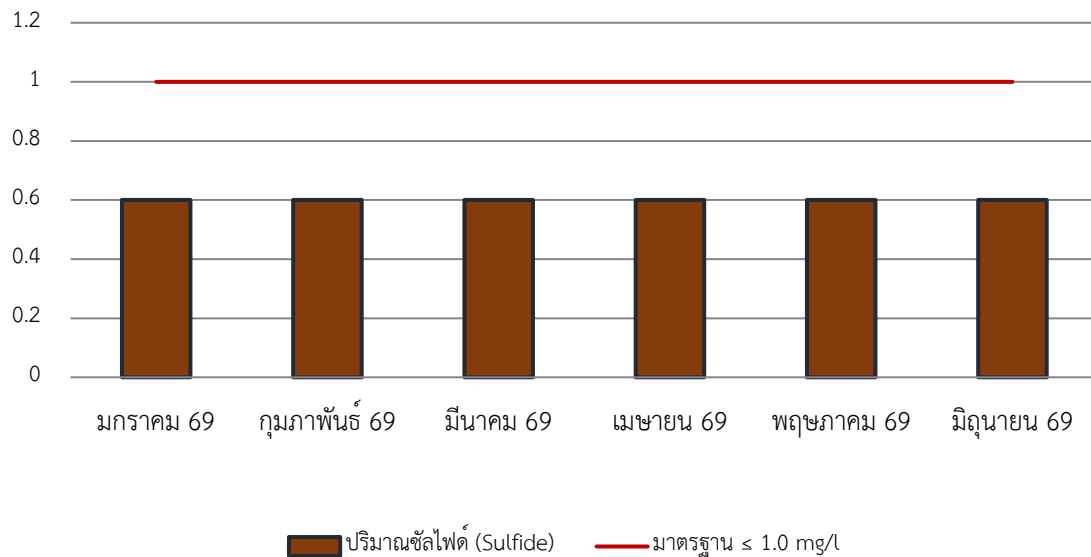

ภาพที่ 4-14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของตะกอนหนัก (Settable Solids)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

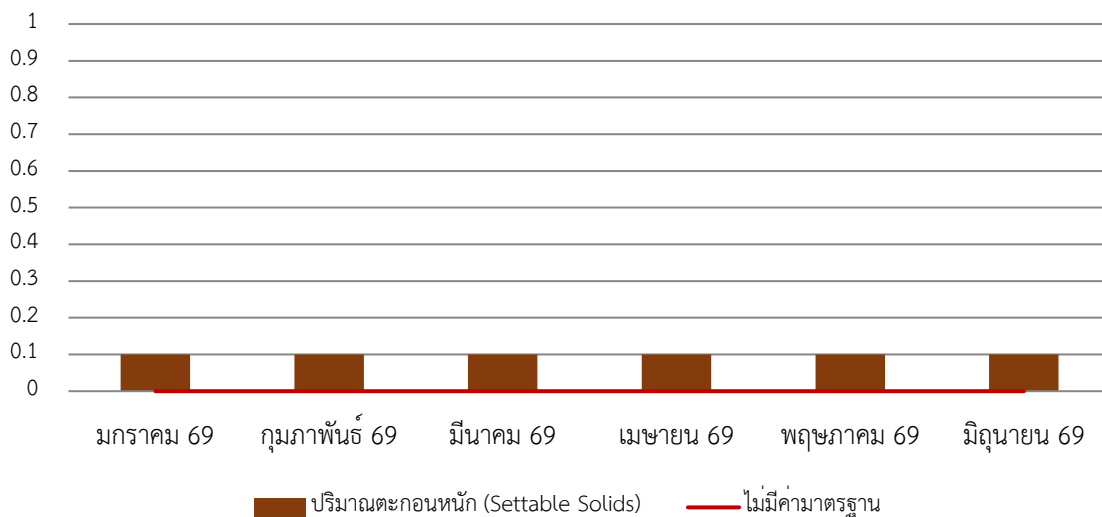


ภาพที่ 4-15 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids)



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease)


ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

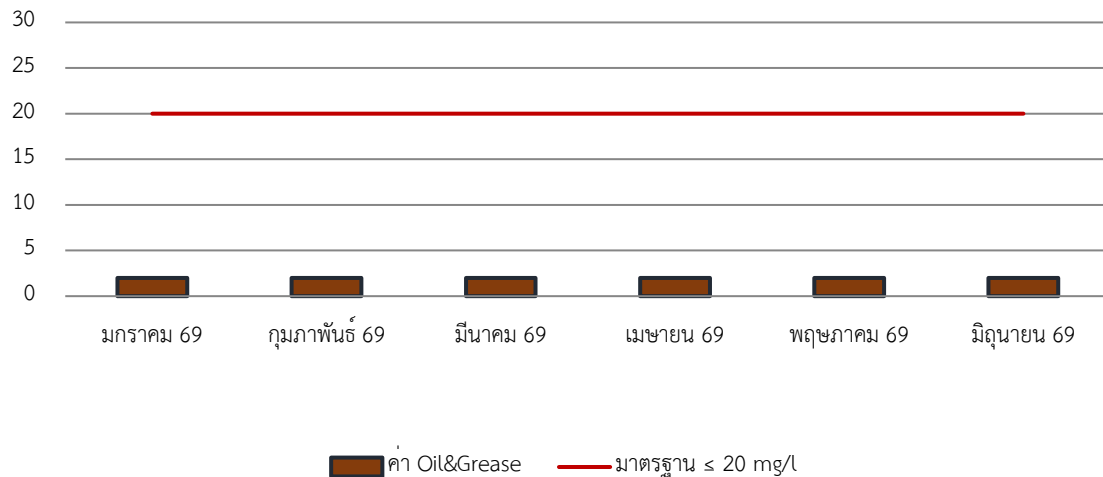

ภาพที่ 4-16 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

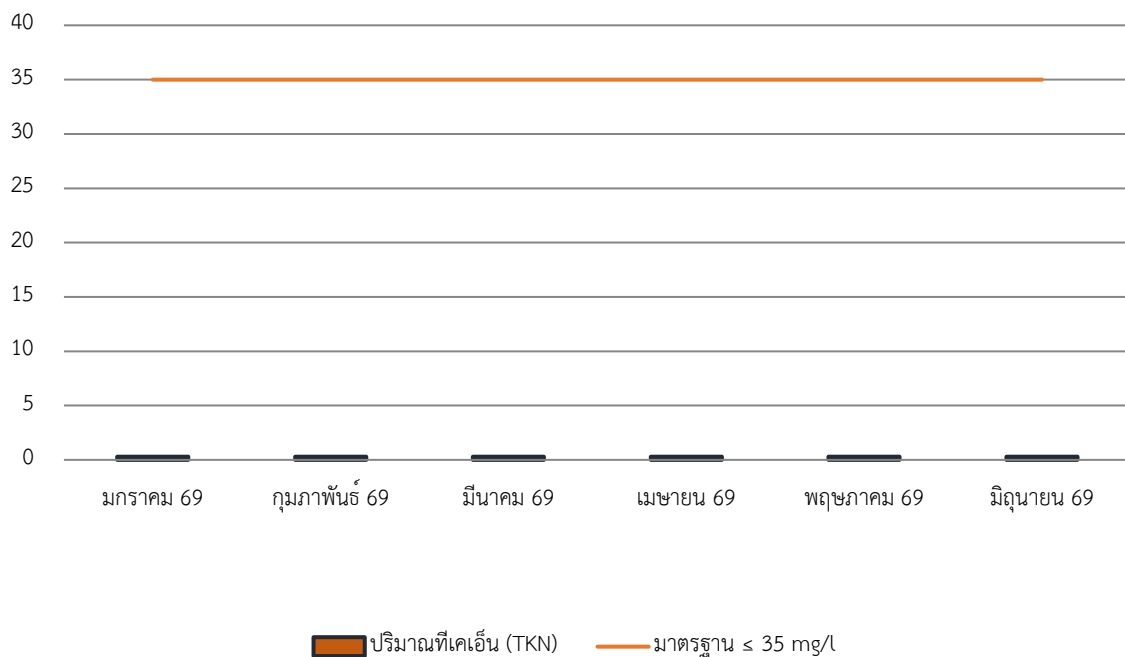


ภาพที่ 4-17 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด


ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

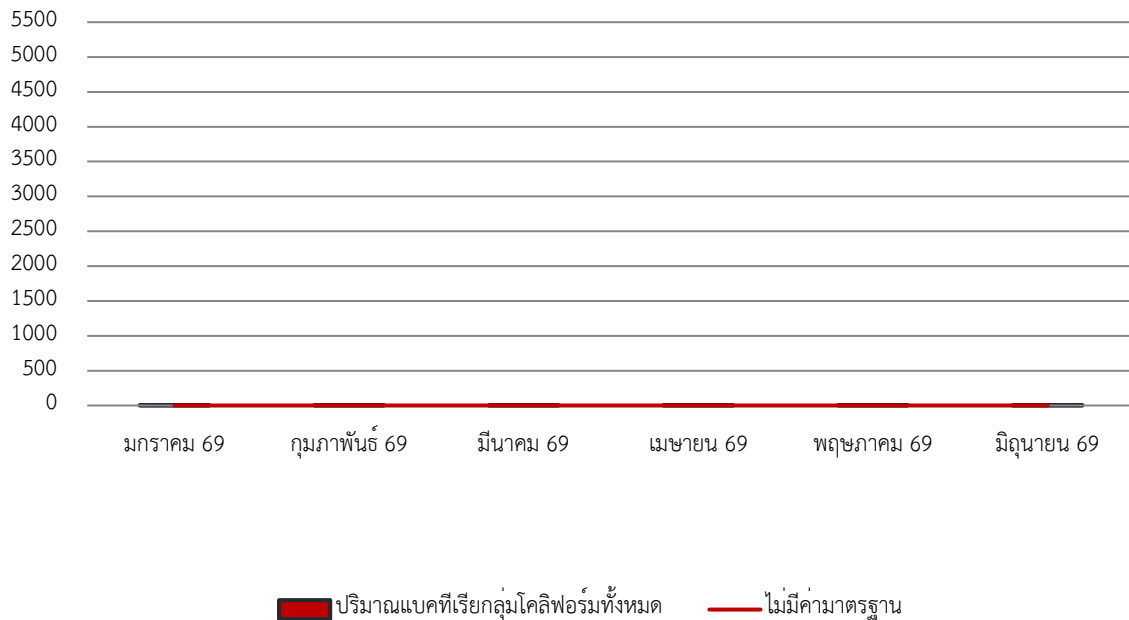

ภาพที่ 4-18 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

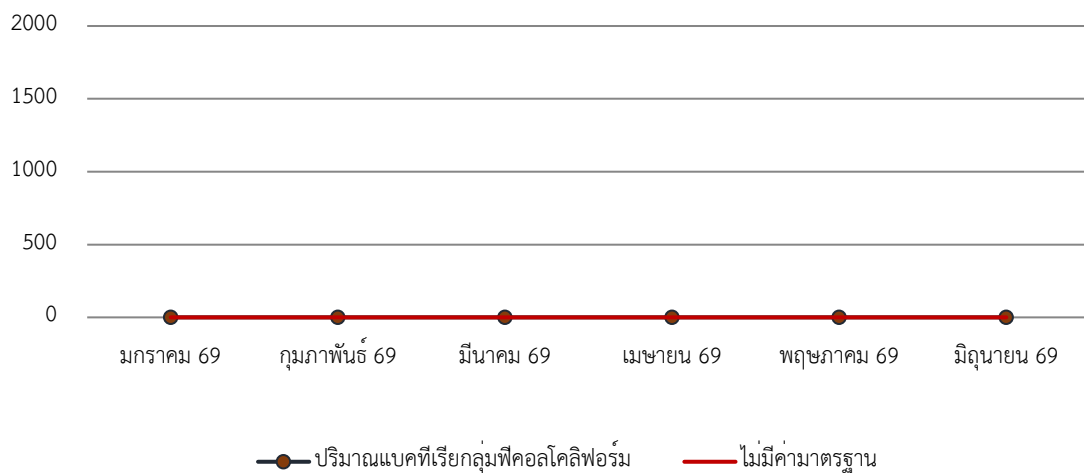

ภาพที่ 4-19 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (F)



4.1.6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาตลอดระยะดำเนินการก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 4.1.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
06-07/05/2567	0.0668	0.0337
07-08/05/2567	0.0653	0.0325
08-09/05/2567	0.0664	0.0309
09-10/05/2567	0.0673	0.0320
10-11/05/2567	0.0638	0.0307
11-12/05/2567	0.0653	0.0327
12-13/05/2567	*	*
13-14/05/2567	0.0542	0.0262
14-15/05/2567	0.0612	0.0355
15-16/05/2567	0.0627	0.0303
16-17/05/2567	0.0752	0.0392
17-18/05/2567	0.0550	0.0252
18-19/05/2567	0.0608	0.0296
19-20/05/2567	*	*
20-21/05/2567	0.0662	0.0334
21-22/05/2567	0.0651	0.0324
22-23/05/2567	**	**
23-24/05/2567	0.0467	0.0226
24-25/05/2567	0.0507	0.0255
25-26/05/2567	0.0442	0.0235
26-27/05/2567	*	*
27-28/05/2567	0.0439	0.0223
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
28-29/05/2567	0.0279	0.0131
29-30/05/2567	0.0344	0.0166
30-31/05/2567	0.0287	0.0147
31/05-01/06/2567	0.0205	0.0076
01-02/06/2567	0.0135	0.0023
02-03/06/2567	*	*
03-04/06/2567	0.0159	0.0077
04-05/06/2567	0.0147	0.0062
05-06/06/2567	0.0122	0.0110
06-07/06/2567	0.0167	0.0108
07-08/06/2567	0.0167	0.0108
08-09/06/2567	0.0188	0.0076
09-10/06/2567	*	*
10-11/06/2567	0.0131	0.0091
11-12/06/2567	0.0141	0.0073
12-13/06/2567	0.0128	0.0080
13-14/06/2567	0.0263	0.0121
14-15/06/2567	0.0171	0.0096
15-16/06/2567	0.0230	0.0092
16-17/06/2567	*	*
17-18/06/2567	0.0220	0.0077
18-19/06/2567	0.0305	0.0201
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
19-20/06/2567	0.0244	0.0157
20-21/06/2567	0.0236	0.0142
21-22/06/2567	0.0249	0.0132
22-23/06/2567	0.0257	0.0141
23-24/06/2567	*	*
24-25/06/2567	0.0290	0.0149
25-26/06/2567	0.0272	0.0123
26-27/06/2567	0.0264	0.0130
27-28/06/2567	0.0324	0.0150
28-29/06/2567	0.0245	0.0115
29-30/06/2567	0.0267	0.0139
30/06-01/07/2567	*	*
01-02/07/2567	0.0237	0.0116
02-03/07/2567	0.0243	0.0120
03-04/07/2567	0.0248	0.0136
04-05/07/2567	0.0211	0.0107
05-06/07/2567	0.0186	0.0103
06-07/07/2567	0.0208	0.0123
07-08/07/2567	*	*
08-09/07/2567	0.0210	0.0122
09-10/07/2567	0.0195	0.0104
10-11/07/2567	0.0207	0.0083
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
11-12/07/2567	0.0118	0.0091
12-13/07/2567	0.0132	0.0085
13-14/07/2567	0.0180	0.0091
14-15/07/2567	*	*
15-16/07/2567	0.0130	0.0066
16-17/07/2567	0.0154	0.0086
17-18/07/2567	0.0201	0.0100
18-19/07/2567	0.0228	0.0117
19-20/07/2567	0.0147	0.0094
20-21/07/2567	0.0159	0.0103
21-22/07/2567	*	*
22-23/07/2567	*	*
23-24/07/2567	0.0182	0.0090
24-25/07/2567	0.0193	0.0112
25-26/07/2567	0.0212	0.0118
26-27/07/2567	0.0195	0.0088
27-28/07/2567	0.0211	0.0095
28-29/07/2567	*	*
29-30/07/2567	*	*
30-31/07/2567	0.0262	0.0131
31/07-01/08/2567	0.0315	0.0162
01-02/08/2567	0.0266	0.0152
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
02-03/08/2567	0.0244	0.0134
03-04/08/2567	0.0256	0.0130
04-05/08/2567	*	*
05-06/08/2567	0.0330	0.0155
06-07/08/2567	0.0371	0.0182
07-08/08/2567	0.0273	0.0133
08-09/08/2567	0.0444	0.0215
09-10/08/2567	0.0304	0.0149
10-11/08/2567	0.0358	0.0169
11-12/08/2567	*	*
12-13/08/2567	**	**
13-14/08/2567	0.0369	0.0177
14-15/08/2567	0.0395	0.0197
15-16/08/2567	0.0385	0.0192
16-17/08/2567	0.0411	0.0205
17-18/08/2567	0.0363	0.0182
18-19/08/2567	*	*
19-20/08/2567	0.0375	0.0189
20-21/08/2567	0.0369	0.0186
15-16/08/2567	0.0385	0.0192
16-17/08/2567	0.0411	0.0205
17-18/08/2567	0.0363	0.0182
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
18-19/08/2567	*	*
19-20/08/2567	0.0375	0.0189
20-21/08/2567	0.0369	0.0186
21-22/08/2567	0.0394	0.0196
22-23/08/2567	0.0380	0.0185
23-24/08/2567	0.0413	0.0206
24-25/08/2567	0.0407	0.0203
25-26/08/2567	*	*
26-27/08/2567	0.0384	0.0191
27-28/08/2567	0.0356	0.0170
28-29/08/2567	0.0332	0.0161
29-30/08/2567	0.0320	0.0151
30-31/08/2567	0.0348	0.0148
31/08-01/09/2567	0.0339	0.0163
01-02/09/2567	*	*
02-03/09/2567	0.0344	0.0157
03-04/09/2567	0.0361	0.0153
04-05/09/2567	0.0326	0.0115
05-06/09/2567	0.0355	0.0158
06-07/09/2567	0.0404	0.0196
07-08/09/2567	0.0399	0.0179
08-09/09/2567	*	*
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
09-10/09/2567	0.0382	0.0189
10-11/09/2567	0.0345	0.0168
11-12/09/2567	0.0354	0.0172
12-13/09/2567	0.0403	0.0198
13-14/09/2567	0.0327	0.0159
14-15/09/2567	0.0281	0.0140
15-16/09/2567	*	*
16-17/09/2567	0.0275	0.0132
17-18/09/2567	0.0291	0.0143
18-19/09/2567	0.0274	0.0127
19-20/09/2567	0.0224	0.0109
20-21/09/2567	0.0216	0.0097
21-22/09/2567	0.0209	0.0101
22-23/09/2567	*	*
23-24/09/2567	0.0216	0.0106
24-25/09/2567	0.0296	0.0143
25-26/09/2567	0.0287	0.0141
26-27/09/2567	0.0229	0.0112
27-28/09/2567	0.0242	0.0118
28-29/09/2567	0.0310	0.0154
29-30/09/2567	*	*
30/09-01/10/2567	0.0247	0.0120
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
01-02/10/2567	0.0514	0.0254
02-03/10/2567	0.0549	0.0271
03-04/10/2567	0.0420	0.0209
04-05/10/2567	0.0450	0.0221
05-06/10/2567	0.0442	0.0219
06-07/10/2567	*	*
07-08/10/2567	0.0437	0.0216
08-09/10/2567	0.0465	0.0230
09-10/10/2567	0.0437	0.0216
10-11/10/2567	0.0457	0.0226
11-12/10/2567	0.0463	0.0228
12-13/10/2567	0.0496	0.0244
13-14/10/2567	*	*
14-15/10/2567	**	**
15-16/10/2567	0.0386	0.0191
16-17/10/2567	0.0328	0.0162
17-18/10/2567	0.0344	0.0166
18-19/10/2567	0.0374	0.0184
19-20/10/2567	0.0378	0.0187
20-21/10/2567	*	*
21-22/10/2567	0.0403	0.0196
22-23/10/2567	*	*
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
23-24/10/2567	**	**
24-25/10/2567	0.0415	0.0222
25-26/10/2567	0.0418	0.0205
26-27/10/2567	0.0377	0.0185
27-28/10/2567	*	*
28-29/10/2567	0.0390	0.0118
29-30/10/2567	0.0316	0.0155
30/10-01/11/2567	0.0331	0.0162
01-02/11/2567	0.0726	0.0358
02-03/11/2567	0.0729	0.0363
03-04/11/2567	*	*
04-05/11/2567	0.0733	0.0361
05-06/11/2567	0.0758	0.0373
06-07/11/2567	0.0711	0.0350
07-08/11/2567	0.0743	0.0368
08-09/11/2567	0.0702	0.0347
09-10/11/2567	0.1015	0.0503
10-11/11/2567	*	*
11-12/11/2567	0.0761	0.0378
12-13/11/2567	0.0748	0.0371
13-14/11/2567	0.0762	0.0380
14-15/11/2567	0.0758	0.0377
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
15-16/11/2567	0.0739	0.0367
16-17/11/2567	0.0780	0.0388
17-18/11/2567	*	*
18-19/11/2567	0.0752	0.0374
19-20/11/2567	0.0768	0.0381
20-21/11/2567	0.0716	0.0352
21-22/11/2567	0.0809	0.0401
22-23/11/2567	0.0763	0.0378
23-24/11/2567	0.0358	0.0174
24-25/11/2567	*	*
25-26/11/2567	0.0785	0.0389
26-27/11/2567	0.0744	0.0367
27-28/11/2567	0.0751	0.0373
28-29/11/2567	0.0666	0.0327
29-30/11/2567	0.0670	0.0333
30/11-01/12/2567	0.0946	0.0470
01-02/12/2567	*	*
02-03/12/2567	0.0956	0.0472
03-04/12/2567	0.0777	0.0384
04-05/12/2567	0.0965	0.0479
05-06/12/2567	**	**
06-07/12/2567	0.0935	0.0464
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
07-08/12/2567	0.0760	0.0377
08-09/12/2567	*	*
09-10/12/2567	0.0872	0.0431
10-11/12/2567	**	**
11-12/12/2567	0.1658	0.0825
12-13/12/2567	0.0154	0.0768
13-14/12/2567	0.1822	0.0909
14-15/12/2567	0.1738	0.0863
15-16/12/2567	*	*
16-17/12/2567	0.1130	0.0564
17-18/12/2567	0.1080	0.0538
18-19/12/2567	0.1200	0.0596
19-20/12/2567	0.0926	0.0461
20-21/12/2567	0.1281	0.0636
21-22/12/2567	0.1093	0.0543
22-23/12/2567	*	*
23-24/12/2567	0.0974	0.0484
24-25/12/2567	0.1074	0.0533
25-26/12/2567	**	**
26-27/12/2567	**	**
27-28/12/2567	**	**
28-29/12/2567	**	**
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
29-30/12/2567	**	**
30-31/12/2567	**	**
31/12/2567-01/01/2568	**	**
01-02/02/2568	0.0788	0.0391
02-03/02/2568	*	*
03-04/02/2568	0.0720	0.0356
04-05/02/2568	0.0843	0.0419
05-06/02/2568	0.0754	0.0375
06-07/02/2568	0.0667	0.0329
07-08/02/2568	0.0779	0.0385
08-09/02/2568	0.0969	0.0480
09-10/02/2568	*	*
10-11/02/2568	0.0217	0.0105
11-12/02/2568	0.0750	0.0369
12-13/02/2568	**	**
13-14/02/2568	0.0694	0.0339
14-15/02/2568	0.0765	0.0379
15-16/02/2568	0.0541	0.0268
16-17/02/2568	*	*
17-18/02/2568	0.0659	0.0326
18-19/02/2568	0.0637	0.0314
19-20/02/2568	0.0553	0.0272
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
20-21/02/2568	0.0574	0.0285
21-22/02/2568	0.0426	0.0210
22-23/02/2568	0.0305	0.0149
23-24/02/2568	*	*
24-25/02/2568	0.0687	0.0341
25-26/02/2568	0.0728	0.0362
26-27/02/2568	0.0635	0.0316
27-28/02/2568	0.1192	0.0594
28/02-01/03/2568	0.0731	0.0363
01-02/03/2568	0.1032	0.0514
02-03/03/2568	*	*
03-04/03/2568	0.0756	0.0375
04-05/03/2568	0.0743	0.0369
05-06/03/2568	0.0664	0.0331
06-07/03/2568	0.0767	0.0382
07-08/03/2568	0.0633	0.0314
08-09/03/2568	0.1309	0.0652
09-10/03/2568	*	*
10-11/03/2568	0.0784	0.0388
11-12/03/2568	0.0762	0.0377
12-13/03/2568	0.0724	0.0359
13-14/03/2568	0.0771	0.0382
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
14-15/03/2568	0.0643	0.0320
15-16/03/2568	0.0682	0.0339
16-17/03/2568	*	*
17-18/03/2568	0.0847	0.0422
18-19/03/2568	0.1711	0.0853
19-20/03/2568	0.1614	0.0805
20-21/03/2568	0.0937	0.0466
21-22/03/2568	0.1381	0.0688
22-23/03/2568	0.2259	0.1125
23-24/03/2568	*	*
23-24/03/2568	*	*
24-25/03/2568	0.1036	0.0514
25-26/03/2568	0.0473	0.0234
26-27/03/2568	0.0571	0.0283
27-28/03/2568	0.0545	0.0269
28-29/03/2568	0.0462	0.0228
29-30/03/2568	0.0562	0.0278
30-31/03/2568	*	*
31/03-01/04/2568	0.0523	0.0259
01-02/04/2568	0.0494	0.0245
02-03/04/2568	0.0538	0.0267
03-04/04/2568	0.0359	0.0117
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
04-05/04/2568	0.0624	0.0310
05-06/04/2568	0.0651	0.0323
06-07/04/2568	*	*
07-08/04/2568	**	**
08-09/04/2568	0.0780	0.0388
09-10/04/2568	0.0644	0.0319
10-11/04/2568	0.0892	0.0443
11-12/04/2568	**	**
12-13/04/2568	**	**
13-14/04/2568	**	**
14-15/04/2568	**	**
15-16/04/2568	**	**
16-17/04/2568	**	**
17-18/04/2568	0.0855	0.0426
18-19/04/2568	0.0793	0.0394
19-20/04/2568	0.0748	0.0371
20-21/04/2568	*	*
21-22/04/2568	0.0824	0.0410
22-23/04/2568	0.0608	0.0302
23-24/04/2568	0.0629	0.0313
24-25/04/2568	0.0769	0.0382
25-26/04/2568	0.0737	0.0366
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
26-27/04/2568	0.1335	0.0664
27-28/04/2568	*	*
28-29/04/2568	0.1093	0.0542
29-30/04/2568	0.1425	0.0710
30/04-01/05/2568	0.1237	0.0616
01-02/05/2568	**	**
02-03/05/2568	0.0748	0.0370
03-04/05/2568	0.0913	0.0454
04-05/05/2568	*	*
05-06/05/2568	**	**
06-07/05/2568	0.0780	0.0387
07-08/05/2568	0.0761	0.0376
08-09/05/2568	0.0795	0.0394
09-10/05/2568	0.0643	0.0319
10-11/05/2568	0.0596	0.0295
11-12/05/2568	*	*
11-12/05/2568	*	*
12-13/05/2568	**	**
13-14/05/2568	0.0662	0.0330
14-15/05/2568	0.0714	0.0335
15-16/05/2568	0.0868	0.0432
16-17/05/2568	0.0695	0.0344
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
17-18/05/2568	0.0811	0.0403
18-19/05/2568	*	*
19-20/05/2568	0.0772	0.0384
20-21/05/2568	0.0755	0.0366
21-22/05/2568	0.0642	0.0312
22-23/05/2568	0.0728	0.0360
23-24/05/2568	0.0654	0.0325
24-25/05/2568	0.0734	0.0366
25-26/05/2568	*	*
26-27/05/2568	0.0719	0.0357
27-28/05/2568	0.0613	0.0304
28-29/05/2568	0.0977	0.0485
29-30/05/2568	0.0809	0.0400
30-31/05/2568	0.0987	0.0491
31/05-01/06/2568	0.0824	0.0410
01-02/06/2568	*	*
02-03/06/2568	0.0642	0.0319
03-04/06/2568	**	**
04-05/06/2568	0.0769	0.0382
05-06/06/2568	0.0834	0.0414
06-07/06/2568	0.0752	0.0374
07-08/06/2568	0.1364	0.0680
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
08-09/06/2568	*	*
09-10/06/2568	0.0778	0.0387
10-11/06/2568	0.0805	0.0400
11-12/06/2568	0.0782	0.0389
12-13/06/2568	0.0734	0.0365
13-14/06/2568	0.0616	0.0306
14-15/06/2568	0.0729	0.0361
15-16/06/2568	*	*
16-17/06/2568	*	*
17-18/06/2568	0.0751	0.0367
18-19/06/2568	0.0801	0.0394
19-20/06/2568	0.0937	0.0466
20-21/06/2568	0.0695	0.0336
21-22/06/2568	0.0769	0.0381
22-23/06/2568	*	*
23-24/06/2568	0.0661	0.0328
24-25/06/2568	0.0745	0.0369
25-26/06/2568	0.0635	0.0316
26-27/06/2568	0.0724	0.0357
27-28/06/2568	0.0710	0.0345
28-29/06/2568	0.0852	0.0421
29-30/06/2568	*	*
มาตรฐาน	0.330 ⁽¹⁾	0.120 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
30/06-01/07/2568	0.0987	0.0491
01-02/07/2568	0.0639	0.0313
02-03/07/2568	0.0661	0.0328
03-04/07/2568	0.0642	0.0319
04-05/07/2568	0.0657	0.0317
05-06/07/2568	0.0629	0.0307
06-07/07/2568	*	*
07-08/07/2568	0.0849	0.0417
08-09/07/2568	0.0834	0.0412
09-10/07/2568	0.0855	0.0421
10-11/07/2568	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
11-12/07/2568	** ⁽²⁾	** ⁽²⁾
12-13/07/2568	0.0879	0.0429
13-14/07/2568	*	*
14-15/07/2568	0.0863	0.0426
15-16/07/2568	0.0888	0.0439
16-17/07/2568	0.0874	0.00431
17-18/07/2568	0.0812	0.0378
18-19/07/2568	0.0587	0.0423
19-20/07/2568	0.0847	0.0412
20-21/07/2568	*	*
21-22/07/2568	0.0851	0.0461
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
22-23/07/2568	0.0875	0.0432
23-24/07/2568	0.0978	0.0483
24-25/07/2568	0.0902	0.0448
25-26/07/2568	0.0916	0.0456
26-27/07/2568	0.0872	0.0431
27-28/07/2568	*	*
28-29/07/2568	** ⁽³⁾	** ⁽³⁾
29-30/07/2568	0.1167	0.0575
30-31/07/2568	0.0775	0.0380
31/07-01/08/2568	0.0719	0.0347
01-02/08/2568	0.0832	0.0409
02-03/08/2568	0.0788	0.0363
03-04/08/2568	*	*
04-05/08/2568	0.0846	0.0416
05-06/08/2568	0.0898	0.0437
06-07/08/2568	0.0575	0.0260
07-08/08/2568	0.0649	0.0295
08-09/08/2568	0.0656	0.0318
09-10/08/2568	0.0592	0.0283
10-11/08/2568	*	*
11-12/08/2568	0.0779	0.0364
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
12-13/08/2568	** ⁽⁴⁾	** ⁽⁴⁾
13-14/08/2568	0.0644	0.0303
14-15/08/2568	0.0742	0.0368
15-16/08/2568	0.0704	0.0320
16-17/08/2568	0.0794	0.0373
17-18/08/2568	*	*
18-19/08/2568	0.0655	0.0306
19-20/08/2568	0.0728	0.0340
20-21/08/2568	0.0609	0.0299
21-22/08/2568	0.0584	0.0246
22-23/08/2568	0.0634	0.0302
23-24/08/2568	0.0519	0.0251
24-25/08/2568	*	*
25-26/08/2568	0.0662	0.0313
26-27/08/2568	0.0608	0.0292
27-28/08/2568	0.0644	0.0320
28-29/08/2568	0.0528	0.0252
29-30/08/2568	0.0492	0.0248
30-31/08/2568	0.0416	0.0236
31/07-01/08/2568	*	*
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
01-02/09/2568	0.0520	0.0252
02-03/09/2568	0.0561	0.0270
03-04/09/2568	0.0629	0.0317
04-05/09/2568	0.0586	0.0281
05-06/09/2568	0.0644	0.0304
06-07/09/2568	0.0719	0.0344
07-08/09/2568	*	*
08-09/09/2568	0.0608	0.0297
09-10/09/2568	0.0636	0.0311
10-11/09/2568	0.0591	0.0281
11-12/09/2568	0.0619	0.0297
12-13/09/2568	0.0568	0.0238
13-14/09/2568	0.0577	0.0269
14-15/09/2568	*	*
15-16/09/2568	0.0622	0.0290
16-17/09/2568	0.0581	0.0263
17-18/09/2568	0.0573	0.0281
18-19/09/2568	0.0618	0.0304
19-20/09/2568	0.0509	0.0241
20-21/09/2568	0.0555	0.0273
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
21-22/09/2568	*	*
22-23/09/2568	0.0521	0.0238
23-24/09/2568	0.0457	0.0181
24-25/09/2568	0.0586	0.0249
25-26/09/2568	0.0250	0.0533
26-27/09/2568	0.0533	0.0256
27-28/09/2568	0.0489	0.0217
28-29/09/2568	*	*
29-30/09/2568	0.0495	0.0241
30/09-01/10/2568	0.0426	0.0258
01-02/10/2568	0.0423	0.0244
02-03/10/2568	0.0447	0.0232
03-04/10/2568	0.0498	0.0253
04-05/10/2568	0.0410	0.0202
05-06/10/2568	*	*
06-07/10/2568	0.0406	0.0275
07-08/10/2568	0.0462	0.0256
08-09/10/2568	0.0411	0.0218
09-10/10/2568	0.0394	0.0191
10-11/10/2568	0.0446	0.0210
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
11-12/10/2568	0.0368	0.0195
12-13/10/2568	*	*
13-14/10/2568	** ⁽⁵⁾	** ⁽⁵⁾
14-15/10/2568	0.0402	0.0211
15-16/10/2568	0.0391	0.0188
16-17/10/2568	0.0467	0.0244
17-18/10/2568	0.0453	0.0235
18-19/10/2568	0.0439	0.0208
19-20/10/2568	*	*
20-21/10/2568	0.0476	0.0235
21-22/10/2568	0.0494	0.0251
22-23/10/2568	0.0412	0.0205
23-24/10/2568	** ⁽⁶⁾	** ⁽⁶⁾
24-25/10/2568	0.0482	0.0239
25-26/10/2568	0.0449	0.0212
26-27/10/2568	*	*
27-28/10/2568	0.0458	0.0221
28-29/10/2568	0.0467	0.0244
29-30/10/2568	0.0418	0.0222
30-31/10/2568	0.0463	0.0235
30/10-01/11/2568	0.0430	0.0211
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
01-02/11/2568	0.0471	0.0230
02-03/11/2568	*	*
03-04/11/2568	0.0424	0.0208
04-05/11/2568	0.0436	0.0215
05-06/11/2568	0.0501	0.0249
06-07/11/2568	0.0466	0.0227
07-08/11/2568	0.0416	0.0199
08-09/11/2568	0.0391	0.0175
09-10/11/2568	*	*
10-11/11/2568	0.0515	0.0272
11-12/11/2568	0.0492	0.0241
12-13/11/2568	0.0549	0.0286
13-14/11/2568	0.0527	0.0258
14-15/11/2568	0.0382	0.0158
15-16/11/2568	0.0413	0.0201
16-17/11/2568	*	*
17-18/11/2568	0.0390	0.0188
18-19/11/2568	0.0344	0.0162
19-20/11/2568	0.0403	0.0197
20-21/11/2568	0.0396	0.0194
21-22/11/2568	0.0459	0.0222
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
22-23/11/2568	0.0363	0.0178
23-24/11/2568	*	*
24-25/11/2568	0.0370	0.0166
25-26/11/2568	0.0395	0.0191
26-27/11/2568	0.0383	0.0174
27-28/11/2568	0.0401	0.0206
28-29/11/2568	0.0486	0.0245
29-30/11/2568	0.0478	0.0233
30/10-01/11/2568	*	*
01-02/12/2568	0.0582	0.0294
02-03/12/2568	0.0548	0.0235
03-04/12/2568	0.0592	0.0270
04-05/12/2568	0.0544	0.0268
05-06/12/2568	** ⁽⁷⁾	** ⁽⁷⁾
06-07/12/2568	0.0249	0.0591
07-08/12/2568	*	*
08-09/12/2568	0.0283	0.0408
09-10/12/2568	0.0193	0.0520
10-11/12/2568	** ⁽⁸⁾	** ⁽⁸⁾
11-12/12/2568	0.0520	0.0254
12-13/12/2568	0.0243	0.0121
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
13-14/12/2568	0.0545	0.0263
14-15/12/2568	*	*
15-16/12/2568	0.0472	0.0235
16-17/12/2568	0.0498	0.0244
17-18/12/2568	0.0571	0.0284
18-19/12/2568	0.0538	0.0267
19-20/12/2568	0.0459	0.0223
20-21/12/2568	0.0223	0.0498
21-22/12/2568	*	*
22-23/12/2568	0.0436	0.0217
23-24/12/2568	0.0482	0.0423
24-25/12/2568	0.0519	0.0523
25-26/12/2568	0.0534	0.0265
26-27/12/2568	0.0467	0.0236
27-28/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾
28-29/12/2568	*	*
29-30/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾
30-31/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾
31/12-/2568-01/01/2569	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
01-02/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
02-03/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
03-04/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
04-05/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
05-06/01/2569	0.0685	0.0340
06-07/01/2569	0.0740	0.0367
07-08/01/2569	0.0727	0.0342
08-09/01/2569	0.0701	0.0342
09-10/01/2569	0.0766	0.0371
10-11/01/2569	0.0667	0.0322
11-12/01/2569	*	*
12-13/01/2569	0.0711	0.0346
13-14/01/2569	0.1789	0.0897
14-15/01/2569	0.1123	0.0579
15-16/01/2569	0.0697	0.0344
16-17/01/2569	0.0676	0.0335
17-18/01/2569	0.0768	0.0376
18-19/01/2569	*	*
19-20/01/2569	0.0690	0.0344
20-21/01/2569	0.0643	0.0321
21-22/01/2569	0.0698	0.0352
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

**⁽¹⁾ หมายถึง วันที่ 01 – 05 มกราคม พ.ศ. 2569 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
22-23/01/2569	49.4298	24.0145
23-24/01/2569	55.7996	27.2266
24-25/01/2569	73.8010	36.0029
25-26/01/2569	*	*
26-27/01/2569	63.1699	31.1128
27-28/01/2569	55.5644	26.8503
28-29/01/2569	52.6542	25.4487
29-30/01/2569	66.9903	33.3201
30-31/01/2569	54.6902	26.8918
31/01/-01/02/2569	56.3017	27.1940
01-02/02/2569	*	*
02-03/02/2569	64.6389	32.3695
03-04/02/2569	59.4239	28.4026
04-05/02/2569	86.2924	42.2050
05-06/02/2569	50.4457	25.0472
06-07/02/2569	72.2053	35.3547
07-08/02/2569	68.7908	33.7407
08-09/02/2569	*	*
09-10/02/2569	71.6932	35.3213
10-11/02/2569	84.0211	41.0759
11-12/02/2569	63.5287	30.0191
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
12-13/02/2569	43.6192	22.5374
13-14/02/2569	40.9243	20.9674
14-15/02/2569	41.4960	22.2084
15-16/02/2569	*	*
16-17/02/2569	53.9047	25.4813
17-18/02/2569	41.2749	19.6118
18-19/02/2569	51.3474	24.3811
19-20/02/2569	47.2923	22.0495
20-21/02/2569	54.3327	26.9662
21-22/02/2569	54.3327	26.9662
22-23/02/2569	*	*
23-24/02/2569	56.6473	26.5783
24-25/02/2569	60.2863	28.1169
25-26/02/2569	62.5377	31.8192
26-27/02/2569	53.5322	26.6160
27-28/02/2569	68.2161	34.4571
28/02-01/03/2569	63.6284	33.5097
24-25/03/2569	56.3341	27.8892
25-26/03/2569	48.9576	23.3925
26-27/03/2569	52.9490	24.0493
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m^3 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (หน่วย mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m ³)
27-28/04/2569	60.1082	31.1729
28-29/04/2569	58.4944	29.6020
29-30/04/2569	52.4294	26.2910
20-21/05/2569	58.2410	28.3348
21-22/05/2569	59.5589	29.0445
22-23/05/2569	52.7666	25.6990
17-18/06/2569	82.8639	41.9693
18-19/06/2569	84.4505	42.3276
19-20/06/2569	78.4622	38.3866
มาตรฐาน	0.33 ⁽¹⁾	0.12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : mg/m⁽³⁾ หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (หน่วย ppm)		ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (หน่วย ppm)	
	CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	NO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	NO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
20-21/05/2567	1.1227	1.1763	0.0212	0.0276
21-22/05/2567	1.1472	1.1854	0.0211	0.0267
22-23/05/2567	1.0943	1.1475	0.0218	0.0269
20-21/06/2567	1.0750	1.1963	0.0176	0.0216
21-22/06/2567	1.0609	1.1394	0.0181	0.0229
22-23/06/2567	1.0272	1.2650	0.0181	0.0139
15-16/07/2567	0.9388	0.9653	0.0180	0.0215
16-17/07/2567	0.9078	0.9362	0.0177	0.0223
17-18/07/2567	0.8976	0.9451	0.0181	0.0240
13-14/08/2567	0.8458	0.8660	0.0185	0.0226
14-15/08/2567	0.8454	0.8624	0.0187	0.0226
15-16/08/2567	0.9378	0.9786	0.0178	0.0221
17-18/09/2567	2.3014	2.3540	0.0173	0.0241
18-19/09/2567	1.7059	1.8030	0.0141	0.0202
19-20/09/2567	2.2260	2.6380	0.0169	0.0235
28-29/10/2567	1.3517	1.9263	0.0191	0.0226
29-30/10/2567	2.0914	2.9983	0.0187	0.0226
30-31/10/2567	2.2110	2.8953	0.0172	0.0218
04-05/11/2567	1.5778	2.4562	0.0185	0.0226
05-06/11/2567	2.0733	2.7593	0.0171	0.0205
มาตรฐาน	9	30	-	0.17 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป

⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (หน่วย ppm)		ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (หน่วย ppm)	
	CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	NO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	NO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
06-07/11/2567	1.9695	2.9856	0.0173	0.0206
20-21/12/2567	1.4691	1.9652	0.0177	0.0223
21-22/12/2567	1.4317	1.9886	0.0174	0.0214
22-23/12/2567	1.6091	2.1000	0.0165	0.0210
17-18/02/2568	1.8024	2.3653	0.0175	0.0195
18-19/02/2568	1.6957	2.3563	0.0173	0.0196
19-20/02/2568	1.5115	2.4581	0.0174	0.0194
25-26/03/2568	2.0270	2.7681	0.0176	0.0198
26-27/03/2568	2.0674	2.6583	0.0172	0.0195
27-28/03/2568	2.1123	2.6984	0.0173	0.0192
01-02/04/2568	2.0289	2.9563	0.0177	0.0194
02-03/04/2568	2.1111	2.6592	0.0175	0.0196
03-04/04/2568	2.1151	2.8653	0.0174	0.0193
19-20/05/2568	2.1148	2.9895	0.0177	0.0196
20-21/05/2568	2.1222	2.6595	0.0175	0.0194
21-22/05/2568	1.8601	2.8455	0.0174	0.0153
12-13/06/2568	2.2899	2.9895	0.0193	0.0176
13-14/06/2568	1.9111	2.6592	0.0192	0.0172
14-15/06/2568	2.0492	2.6594	0.0186	0.0196
มาตรฐาน	9	30	-	0.17 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป

⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (หน่วย ppm)		ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (หน่วย ppm)	
	CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	NO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	NO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
16-17/07/2568	2.1673	2.8784	0.0174	0.0192
17-18/07/2568	2.2578	2.8863	0.0170	0.0196
18-19/07/2568	2.3320	2.9562	0.0176	0.0195
01-02/08/2568	2.3109	2.9895	0.0175	0.0197
02-03/08/2568	2.1370	2.8753	0.0169	0.0192
03-04/08/2568	1.9759	2.4541	0.0167	0.0195
22-23/09/2568	1.6975	2.3212	0.0165	0.0183
23-24/09/2568	1.7199	2.4540	0.0170	0.0185
24-25/09/2568	1.8899	2.6563	0.0167	0.0186
10-11/10/2568	1.8482	2.1253	0.0172	0.0195
11-12/10/2568	1.6427	2.3254	0.0170	0.0193
12-13/10/2568	1.6101	2.1542	0.0171	0.0192
07-08/11/2568	1.4461	1.7875	0.0168	0.0192
08-09/11/2568	1.3385	1.6593	0.0169	0.0184
09-10/11/2568	1.2545	1.6582	0.0167	0.0185
25-26/12/2568	1.4383	1.8754	0.0169	0.0192
26-27/12/2568	1.5602	1.9852	0.0167	0.0193
27-28/12/2568	1.5137	1.9562	0.0172	0.0194
มาตรฐาน	9	30	-	0.17 ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (หน่วย ppm)		ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (หน่วย ppm)	
	CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	NO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	NO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
19-20/01/2569	1.2734	1.5456	0.0166	0.0185
20-21/01/2569	1.3189	1.9565	0.0164	0.0184
21-22/01/2569	1.3462	1.7842	0.0160	0.0174
06-07/02/2569	1.49	1.96	16.6	18.6
07-08/02/2569	1.41	1.70	16.0	17.2
08-09/02/2569	1.32	1.66	16.2	17.6
24-25/03/2569	1.40	1.86	16.6	19.4
25-26/03/2569	1.43	1.85	16.5	18.6
26-27/03/2569	1.50	1.78	16.3	18.3
27-28/04/2569	1.49	1.88	16.2	18.4
28-29/04/2569	1.48	1.85	16.4	18.6
29-30/04/2569	1.42	1.69	16.6	19.2
20-21/05/2569	1.49	1.88	16.6	19.4
21-22/05/2569	1.38	1.75	16.5	19.3
22-23/05/2569	1.35	1.87	16.4	18.5
17-18/06/2569	1.47	1.85	16.6	18.6
18-19/06/2569	1.36	1.66	16.5	18.3
19-20/06/2569	1.35	1.87	16.7	19.6
มาตรฐาน	9	30	-	≤ 120

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป

⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (หน่วย ppm)		ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) (หน่วย ppm)
	SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	
20-21/05/2567	0.0032	0.0038	2.178
21-22/05/2567	0.0031	0.0036	2.078
22-23/05/2567	0.0032	0.0037	2.191
20-21/06/2567	0.0020	0.0027	2.137
21-22/06/2567	0.0018	0.0025	2.129
22-23/07/2567	0.0019	0.0026	1.977
15-16/07/2567	0.0017	0.0023	2.095
16-17/07/2567	0.0017	0.0021	2.098
17-18/07/2567	0.0017	0.0022	2.140
13-14/08/2567	0.0018	0.0025	1.962
14-15/08/2567	0.0019	0.0024	2.000
15-16/08/2567	0.0019	0.0023	2.010
17-18/09/2567	0.0061	0.0084	2.032
18-19/09/2567	0.0052	0.0065	2.058
19-20/09/2567	0.0060	0.0082	1.889
28-29/10/2567	0.0021	0.0029	1.960
29-30/10/2567	0.0020	0.0026	1.966
30-31/10/2567	0.0019	0.0026	1.897
มาตรฐาน	0.12 ⁽¹⁾	0.30 ⁽²⁾	-

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (หน่วย ppm)		ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) (หน่วย ppm)
	SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	
04-05/11/2567	0.0027	0.0036	2.065
05-06/11/2567	0.0026	0.0033	1.893
06-07/11/2567	0.0028	0.0039	1.958
20-21/12/2567	0.0040	0.0058	2.071
21-22/12/2567	0.0035	0.0047	2.154
22-23/12/2567	0.0043	0.0066	*
17-18/02/2568	0.0023	0.0038	*
18-19/02/2568	0.0024	0.0039	2.114
19-20/02/2568	0.0027	0.0037	2.031
25-26/03/2568	0.0024	0.0036	1.987
26-27/03/2568	0.0027	0.0038	2.038
27-28/03/2568	0.0025	0.0037	2.008
01-02/04/2568	0.0028	0.0038	2.103
02-03/04/2568	0.0028	0.0037	2.032
03-04/04/2568	0.0025	0.0039	1.991
19-20/05/2568	0.0024	0.0037	2.114
20-21/05/2568	0.0029	0.0036	2.031
21-22/05/2568	0.0025	0.0038	1.987
มาตรฐาน	0.12 ⁽¹⁾	0.30 ⁽²⁾	-

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (หน่วย ppm)		ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) (หน่วย ppm)
	SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	
12-13/06/2568	0.0027	0.0038	2.042
13-14/06/2568	0.0029	0.0039	2.027
14-15/06/2568	0.0027	0.0036	1.939
16-17/07/2568	0.0026	0.0039	2.044
17-18/07/2568	0.0025	0.0038	2.041
18-19/07/2568	0.0028	0.0036	2.004
01-02/08/2568	0.0029	0.0037	1.900
02-03/08/2568	0.0028	0.0038	2.053
03-04/08/2568	0.0025	0.0036	2.079
22-23/09/2568	0.0023	0.0032	1.997
23-24/09/2568	0.0024	0.0039	2.027
24-25/09/2568	0.0022	0.0036	2.054
10-11/10/2568	0.0026	0.0038	2.133
11-12/10/2568	0.0027	0.0036	2.089
12-13/10/2568	0.0025	0.0039	2.120
07-08/11/2568	0.0025	0.0036	2.039
08-09/11/2568	0.0026	0.0038	1.981
09-10/11/2568	0.0024	0.0037	1.971
มาตรฐาน	0.12 ⁽¹⁾	0.30 ⁽²⁾	-

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (หน่วย ppm)		ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) (หน่วย ppm)
	SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	
25-26/12/2568	0.0025	0.0036	2.064
26-27/12/2568	0.0024	0.0038	2.159
27-28/12/2568	0.0023	0.0037	2.125
มาตรฐาน	0.12 ⁽¹⁾	0.30 ⁽²⁾	-

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

หมายเหตุ : ppm หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน



ตารางที่ 4.1.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (หน่วย ppb)		ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) (หน่วย ppm)
	SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด	
19-20/01/2569	0.0024	0.0038	2.048
20-21/01/2569	0.0023	0.0036	2.075
21-22/01/2569	0.0025	0.0035	2.044
06-07/02/2569	2.8	3.9	2.017
07-08/02/2569	2.7	3.8	2.073
08-09/02/2569	2.6	3.9	2.104
24-25/03/2569	2.2	3.3	2.046
25-26/03/2569	2.4	3.8	2.033
26-27/03/2569	2.3	3.6	2.059
27-28/04/2569	2.4	3.9	2.013
28-29/04/2569	2.3	3.8	1.985
29-30/04/2569	2.5	3.6	2.140
20-21/05/2569	2.5	3.8	2.153
21-22/05/2569	2.4	3.4	2.144
22-23/05/2569	2.6	3.7	2.127
17-18/06/2569	2.5	3.6	2.154
18-19/06/2569	2.4	3.3	2.104
19-20/06/2569	2.3	3.6	2.142
มาตรฐาน	0.12 ⁽¹⁾	0.30 ⁽²⁾	-

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

หมายเหตุ : ppb หมายถึง หน่วยที่เป็นหนึ่งในล้านส่วน




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)


ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568

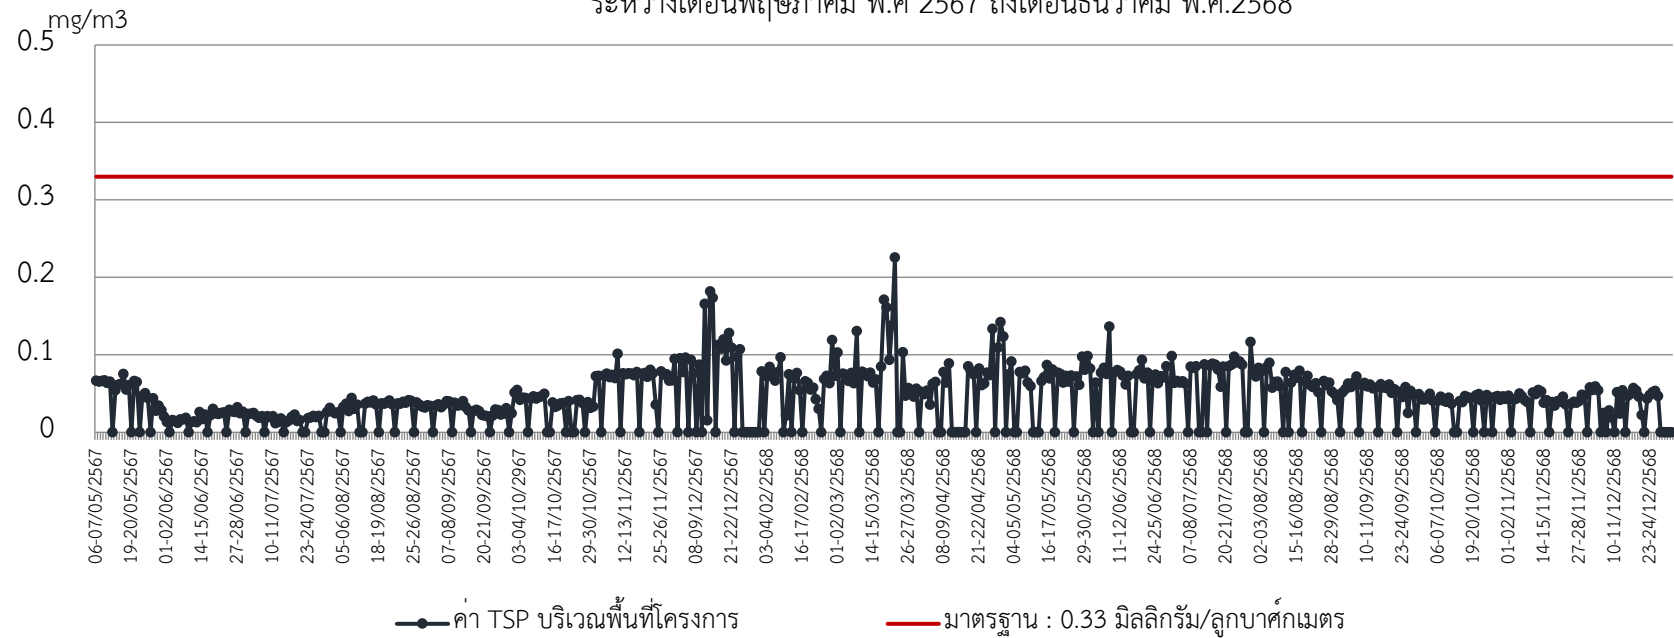


ภาพที่ 4-20 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568



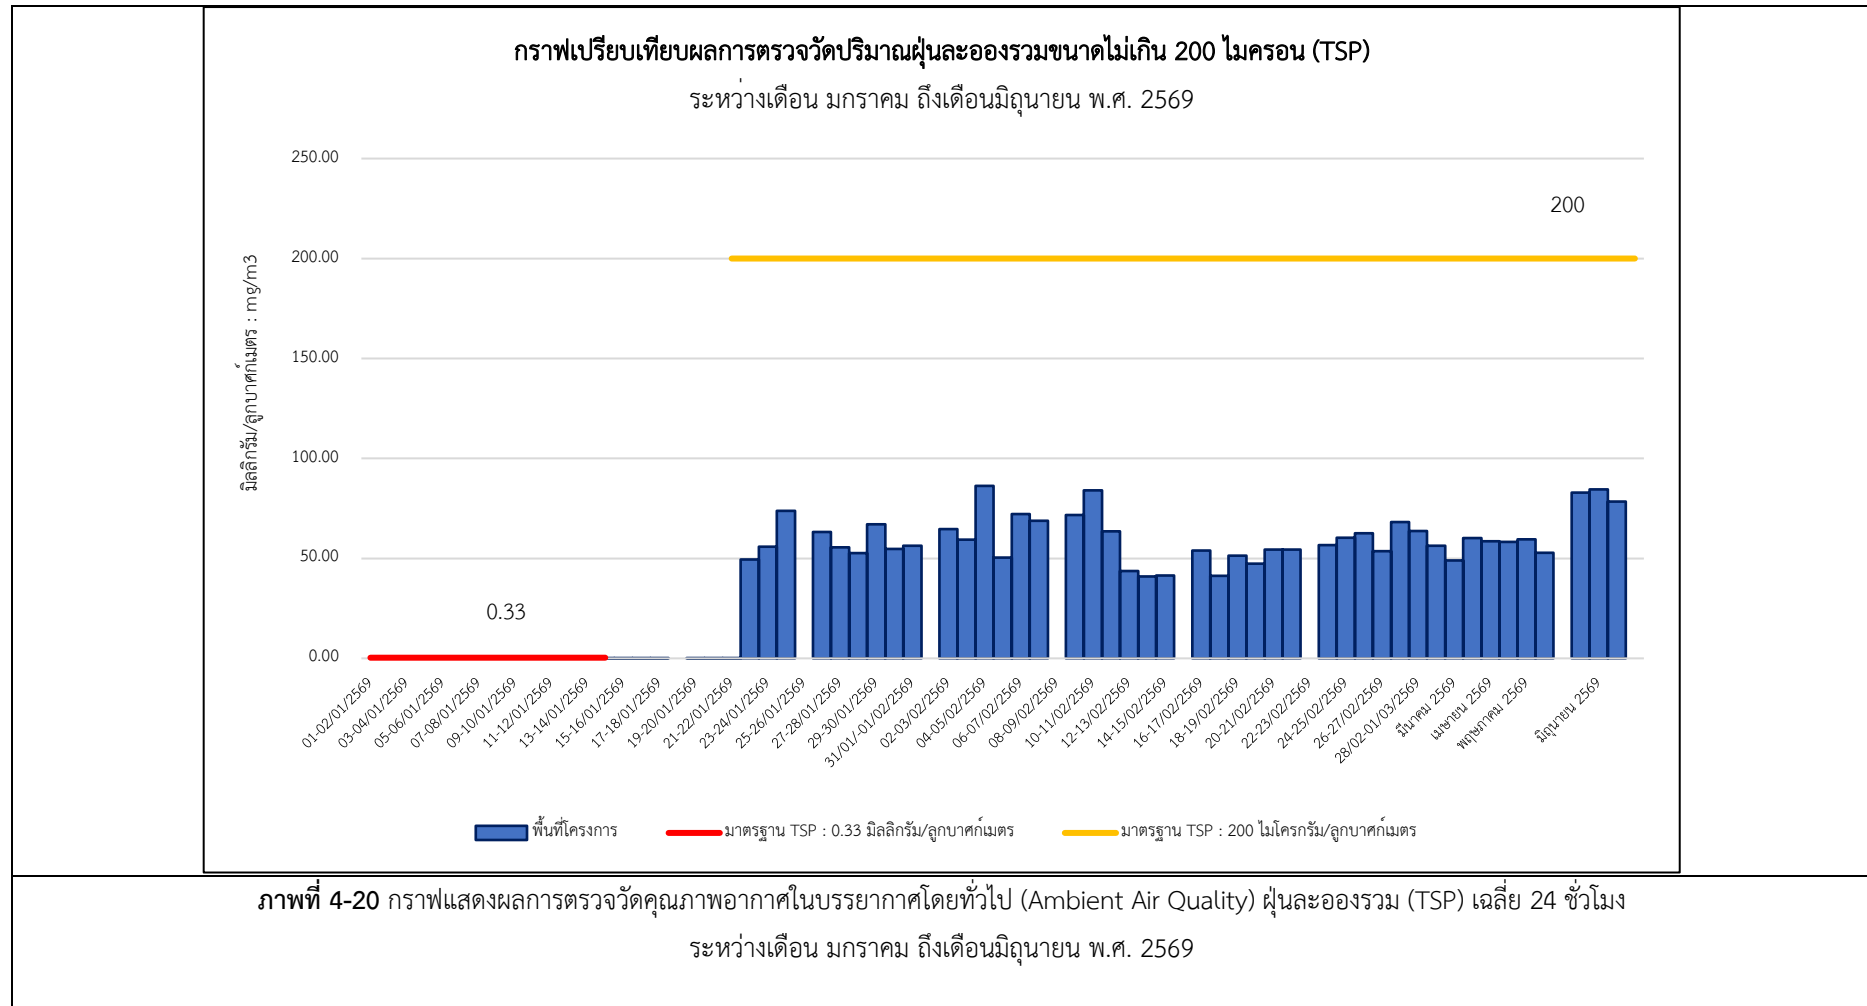

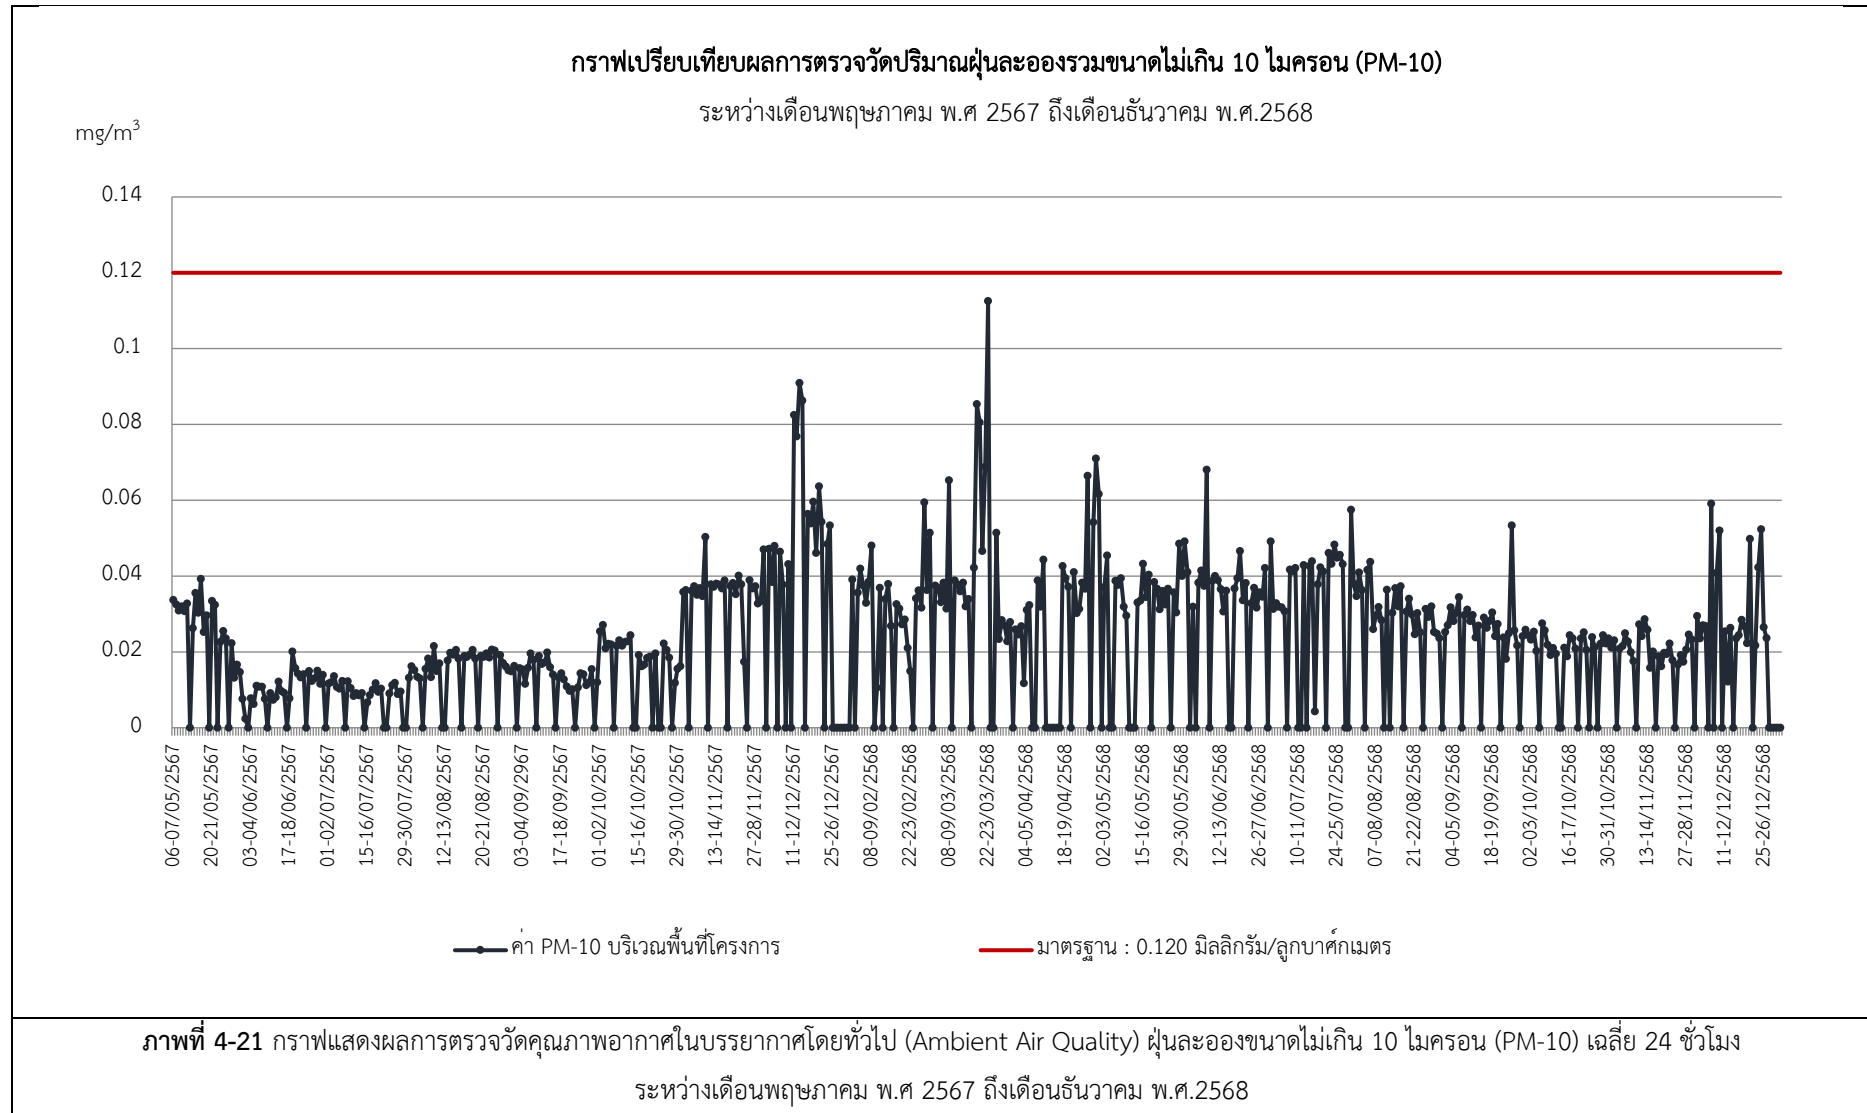

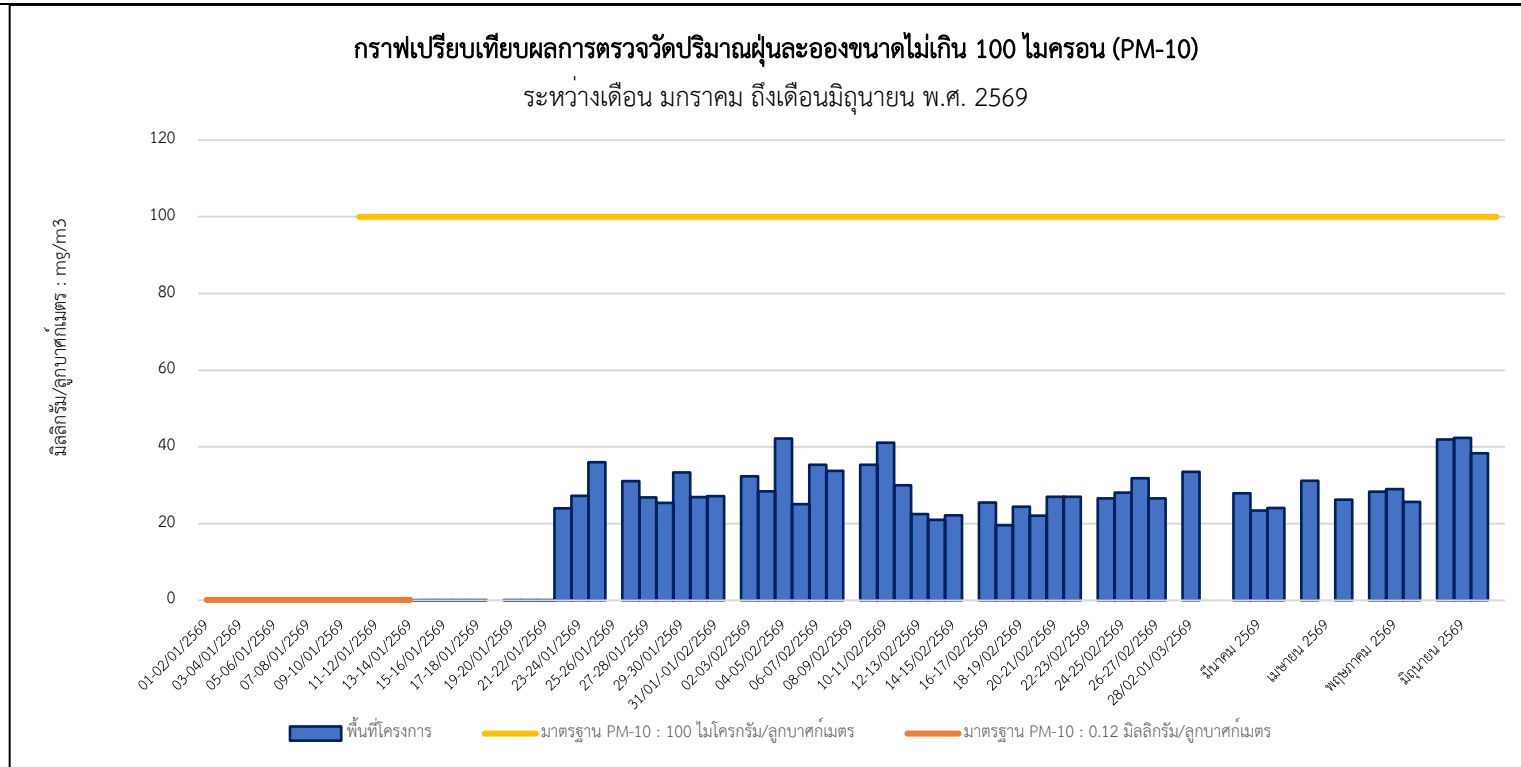

ภาพที่ 4-21 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569






ภาพที่ 4-22 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568








ภาพที่ 4-22 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



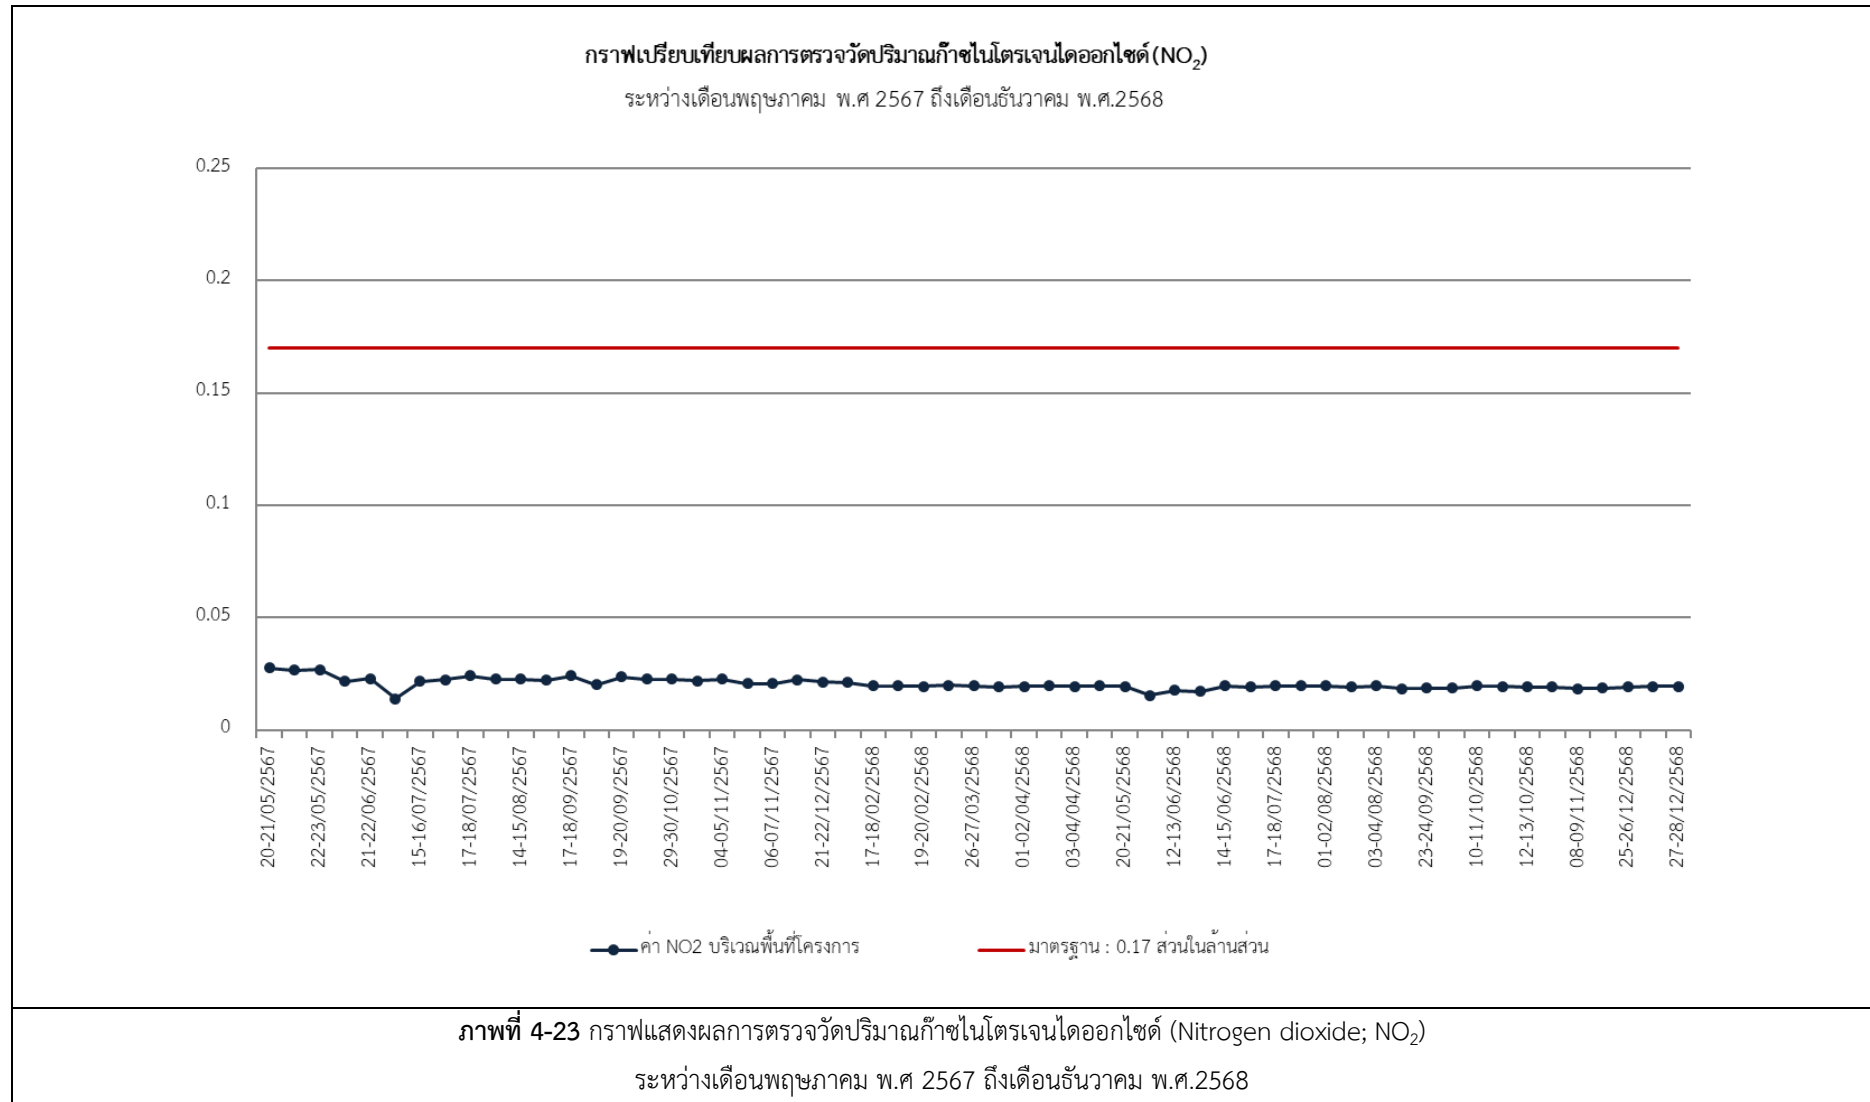


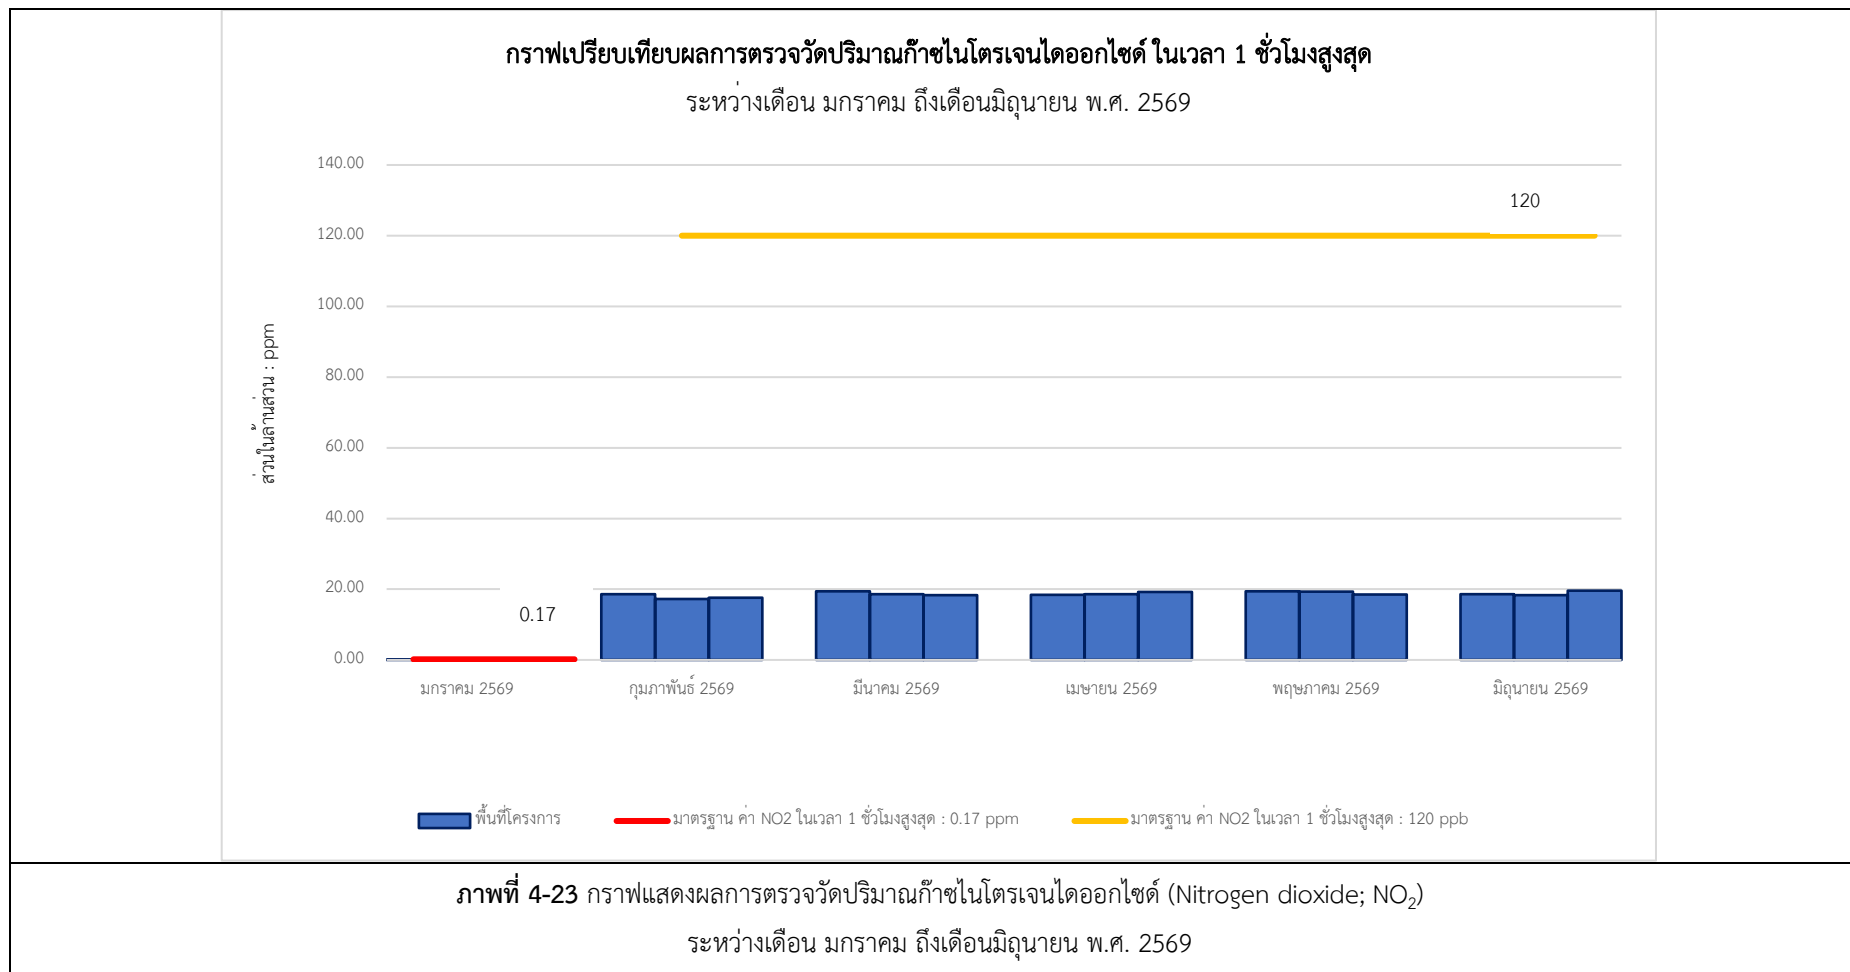

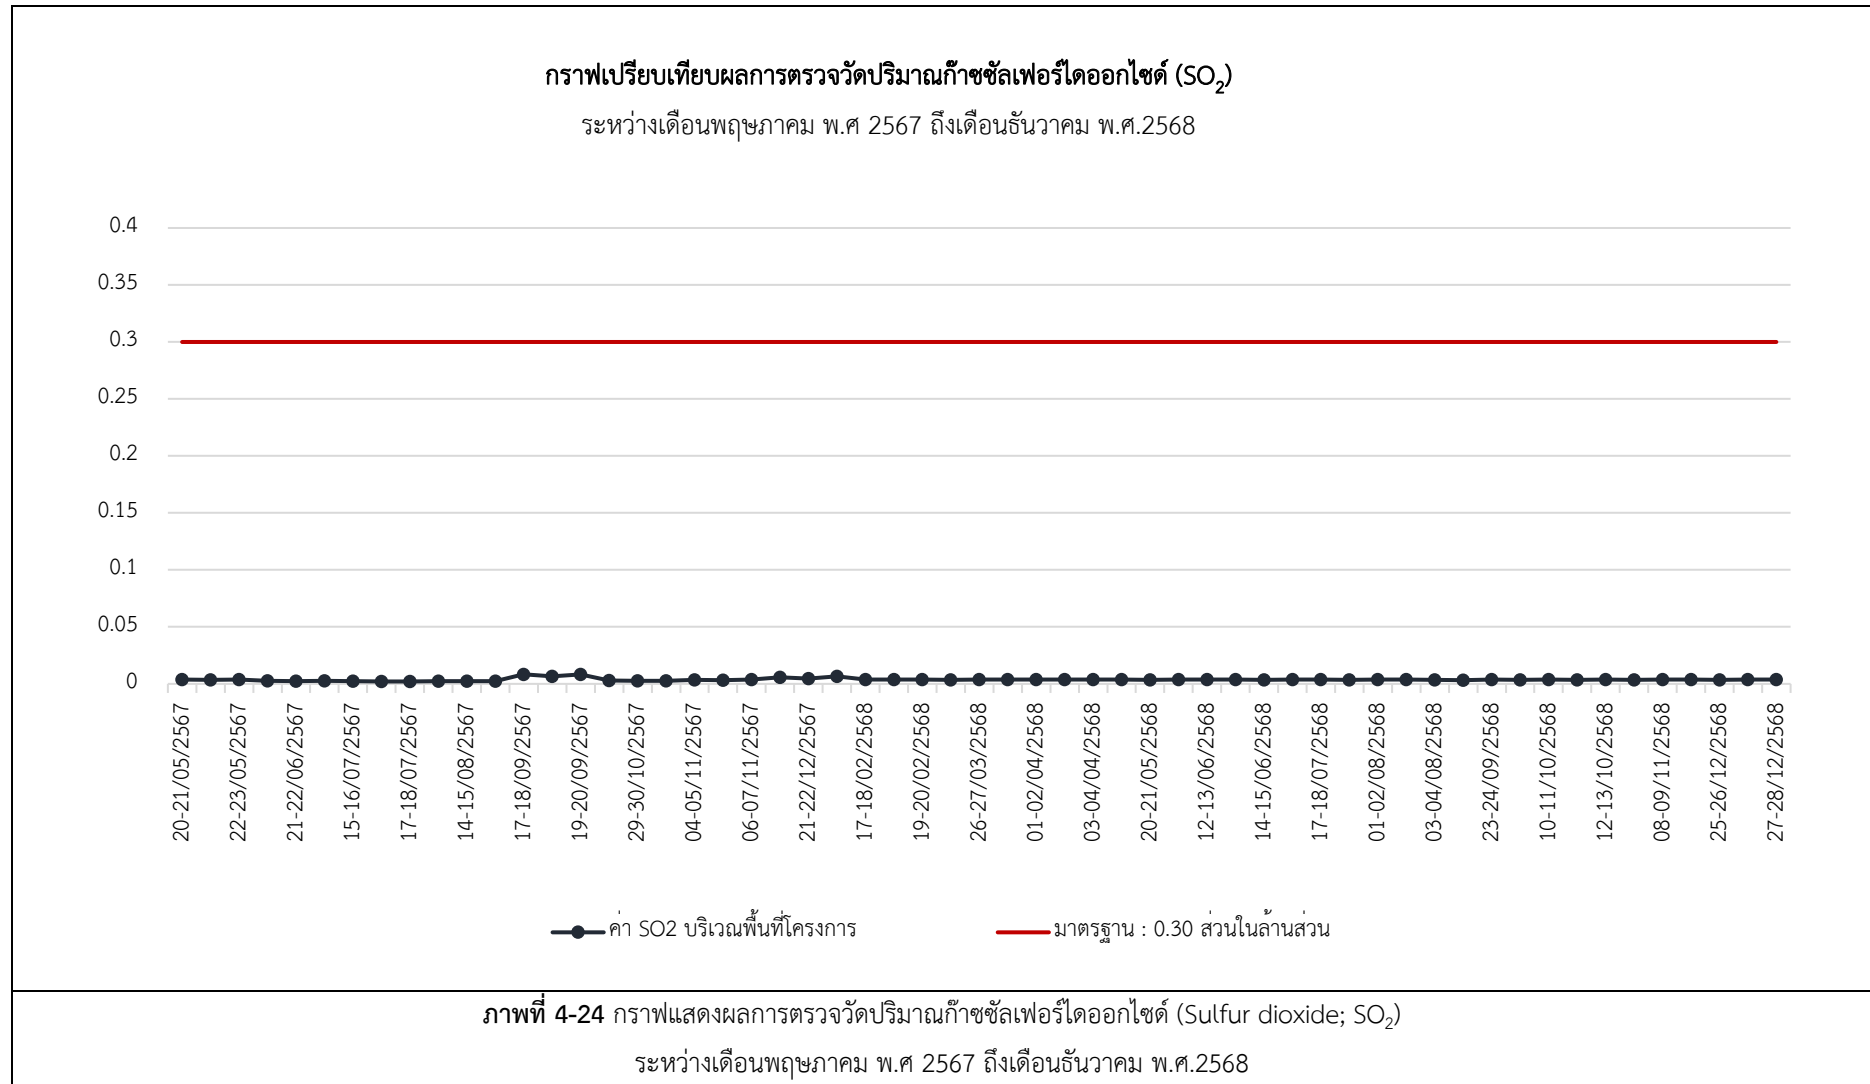

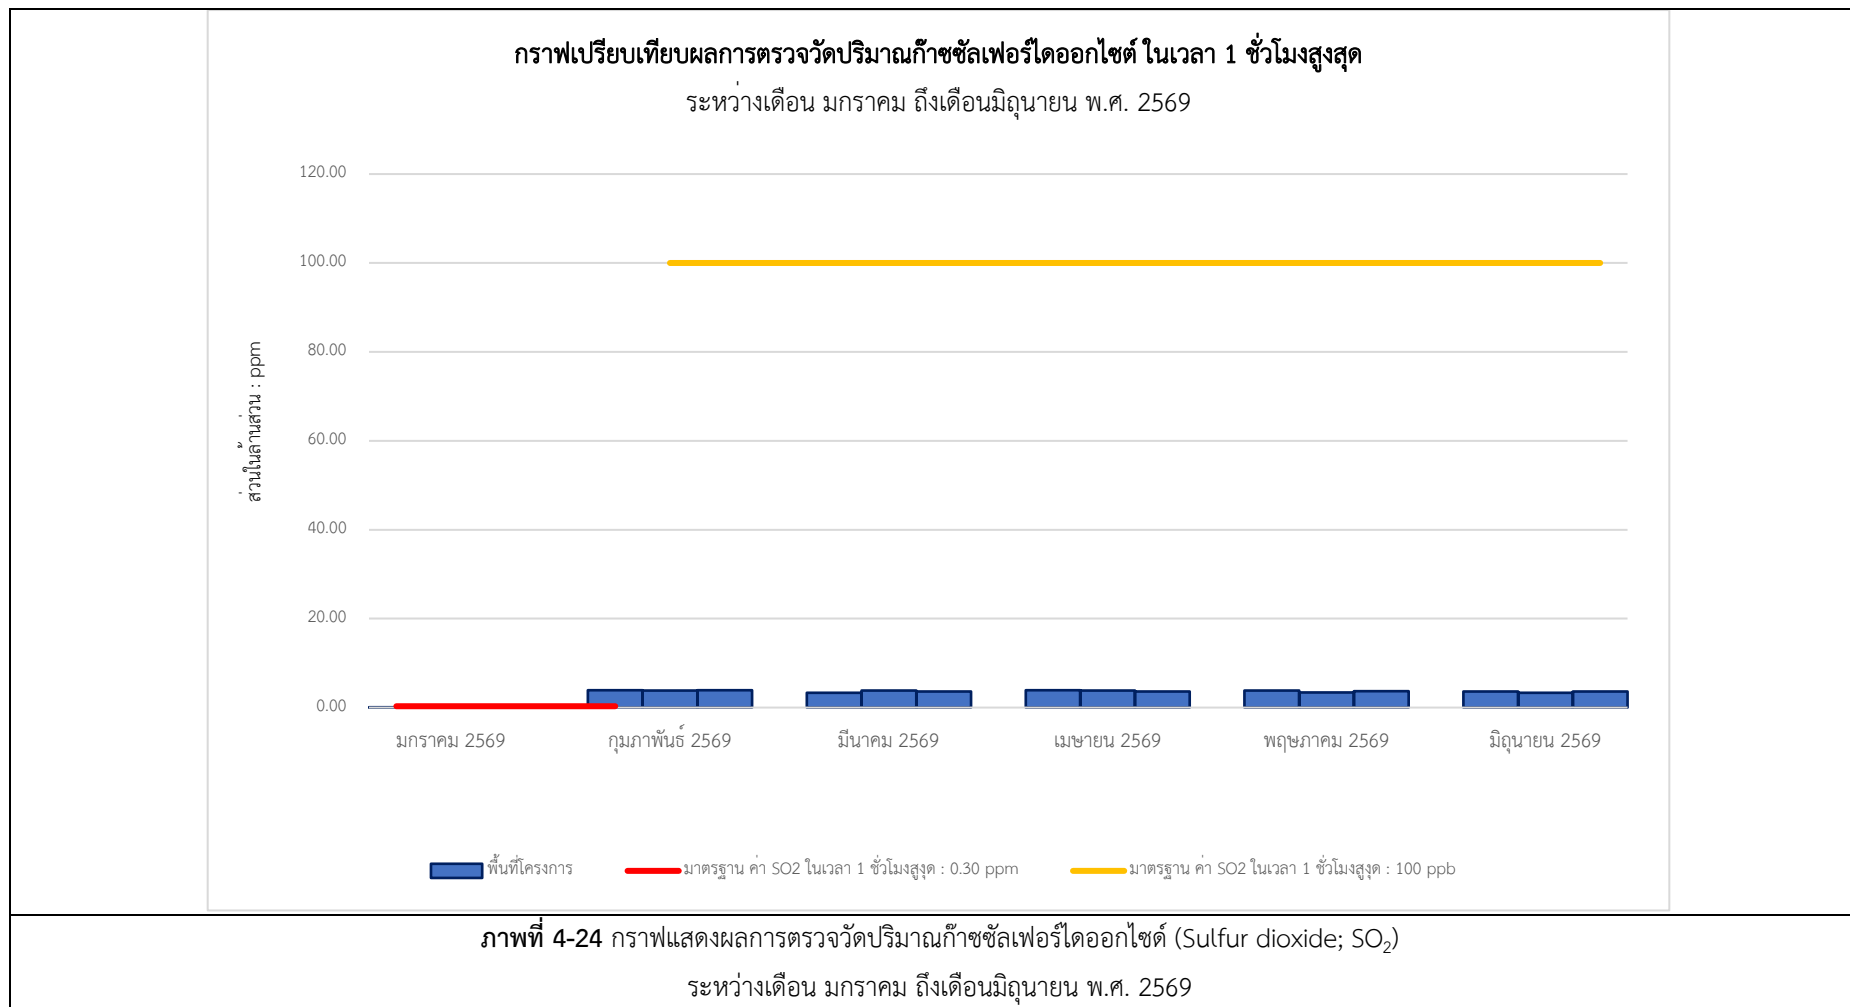


กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568

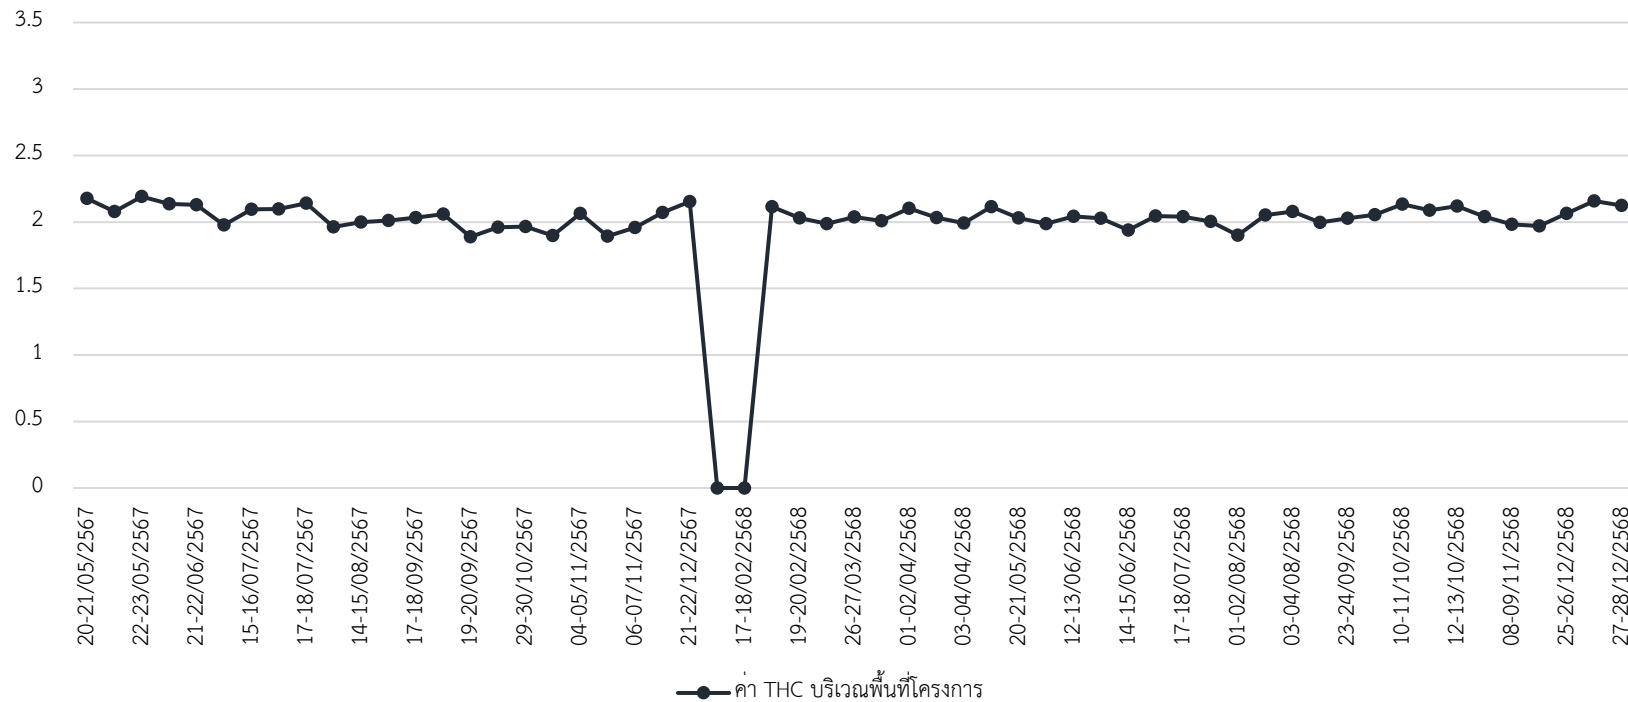

ภาพที่ 4-25 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568



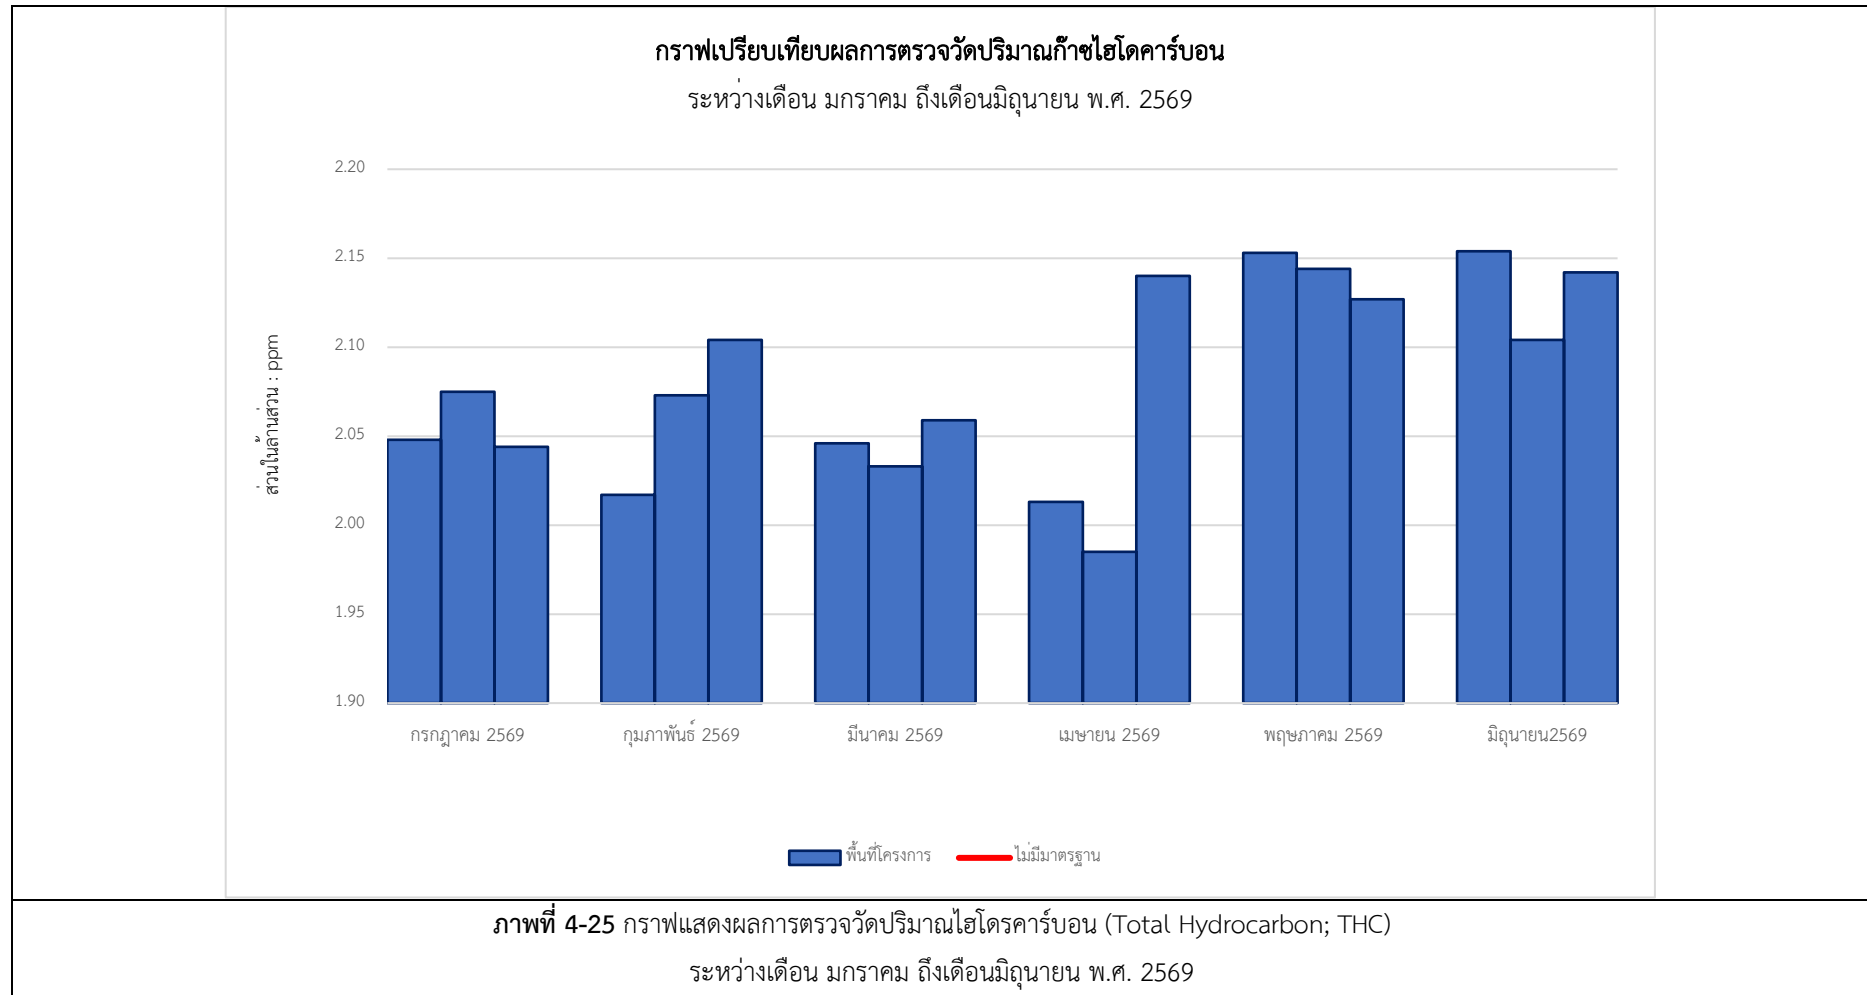

ตารางที่ 4.1.6-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
06-07/05/2567	57.8	102.8	7.0
07-08/05/2567	55.0	111.2	8.9
08-09/05/2567	63.4	83.6	4.2
09-10/05/2567	55.8	100.4	9.9
10-11/05/2567	56.5	91.9	10.0
11-12/05/2567	55.2	83.2	9.5
12-13/05/2567	*	*	*
13-14/05/2567	58.2	87.4	9.6
14-15/05/2567	61.6	102.5	9.0
15-16/05/2567	64.3	93.2	8.8
16-17/05/2567	67.1	92.9	9.9
17-18/05/2567	63.6	89.3	6.8
18-19/05/2567	63.2	90.5	6.2
19-20/05/2567	*	*	*
20-21/05/2567	65.7	95.4	7.3
21-22/05/2567	66.4	91.5	9.1
22-23/05/2567	64.5	91.5	8.4
23-24/05/2567	66.1	102.3	5.8
24-25/05/2567	65.8	97.6	7.0
25-26/05/2567	67.4	98.2	7.2
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
26-27/05/2567	*	*	*
27-28/05/2567	66.7	98.3	9.9
28-29/05/2567	66.7	96.2	9.2
29-30/05/2567	67.8	98.2	8.4
30-31/05/2567	69.0	96.0	8.3
31/05-01/06/2567	66.8	98.7	9.8
01-02/06/2567	66.6	96.8	9.4
02-03/06/2567	*	*	*
03-04/06/2567	67.2	97.9	9.8
04-05/06/2567	66.9	104.3	9.2
05-06/06/2567	66.9	102.4	9.9
06-07/06/2567	63.4	88.5	9.1
07-08/06/2567	64.8	91.6	9.3
08-09/06/2567	66.2	102.4	9.9
09-10/06/2567	*	*	*
10-11/06/2567	63.3	93.2	7.0
11-12/06/2567	65.6	98.8	7.6
12-13/06/2567	65.8	101.3	9.9
13-14/06/2567	65.0	101.6	8.0
14-15/06/2567	66.4	92.8	9.5
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
15-16/06/2567	67.0	92.3	9.4
16-17/06/2567	*	*	*
17-18/06/2567	66.8	95.6	10.0
18-19/06/2567	67.5	101.3	4.9
19-20/06/2567	64.7	98.6	7.3
20-21/06/2567	64.5	91.2	9.2
21-22/06/2567	67.3	96.3	6.0
22-23/06/2567	66.8	91.4	7.9
23-24/06/2567	*	*	*
24-25/06/2567	63.4	88.2	6.2
25-26/06/2567	66.1	96.7	9.4
26-27/06/2567	64.1	64.1	6.7
27-28/06/2567	62.5	88.5	10.0
28-29/06/2567	64.8	93.5	9.9
29-30/06/2567	62.4	92.0	6.0
30/06-01/07/2567	*	*	*
01-02/07/2567	66.7	98.7	9.2
02-03/07/2567	67.0	94.0	9.9
03-04/07/2567	65.8	98.1	8.1
04-05/07/2567	64.9	97.0	10.0
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
05-06/07/2567	66.6	97.0	9.9
06-07/07/2567	65.6	91.2	8.6
07-08/07/2567	*	*	*
08-09/07/2567	64.7	90.5	7.9
09-10/07/2567	68.1	97.9	9.8
10-11/07/2567	66.2	104.7	7.4
11-12/07/2567	66.6	96.9	9.3
12-13/07/2567	66.7	102.0	6.9
13-14/07/2567	66.3	92.8	9.7
14-15/07/2567	*	*	*
15-16/07/2567	66.3	101.1	9.8
16-17/07/2567	66.2	104.2	7.1
17-18/07/2567	66.2	102.2	7.7
18-19/07/2567	66.3	98.6	7.3
19-20/07/2567	66.2	102.0	6.9
20-21/07/2567	65.1	95.0	8.9
21-22/07/2567	*	*	*
22-23/07/2567	*	*	*
23-24/07/2567	65.8	97.2	9.8
24-25/07/2567	65.7	97.3	9.1
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
25-26/07/2567	65.4	99.2	8.8
26-27/07/2567	58.4	96.7	9.6
27-28/07/2567	64.1	93.4	7.1
28-29/07/2567	*	*	*
29-30/07/2567	*	*	*
30-31/07/2567	65.5	98.7	7.5
31/07-01/08/2567	66.3	95.3	8.7
01-02/08/2567	66.2	110.9	8.2
02-03/08/2567	65.4	95.6	9.8
03-04/08/2567	56.7	92.0	9.0
04-05/08/2567	*	*	*
05-06/08/2567	64.3	95.3	7.0
06-07/08/2567	66.0	98.2	6.2
07-08/08/2567	64.7	92.5	9.8
08-09/08/2567	65.9	99.7	9.4
09-10/08/2567	66.0	102.3	8.4
10-11/08/2567	63.9	93.6	7.4
11-12/08/2567	*	*	*
12-13/08/2567	*	*	*
13-14/08/2567	65.5	103.9	9.6
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
14-15/08/2567	64.9	101.7	9.7
15-16/08/2567	66.4	99.1	9.3
16-17/08/2567	66.4	96.4	10.0
17-18/08/2567	65.0	98.4	7.6
18-19/08/2567	*	*	*
19-20/08/2567	64.5	100.5	9.6
20-21/08/2567	65.9	99.4	9.0
21-22/08/2567	66.4	99.4	8.5
22-23/08/2567	65.9	104.5	7.9
23-24/08/2567	65.8	97.2	9.2
24-25/08/2567	53.7	95.6	7.4
25-26/08/2567	*	*	*
26-27/08/2567	66.7	105.6	6.2
27-28/08/2567	64.5	108.8	5.1
28-29/08/2567	65.7	108.8	9.4
29-30/08/2567	65.5	98.1	9.9
30-31/08/2567	65.8	98.6	6.4
31/08-01/09/2567	62.7	93.4	5.8
01-02/09/2567	*	*	*
02-03/09/2567	67.3	100.6	9.9
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
03-04/09/2567	67.0	97.6	9.4
04-05/09/2567	65.6	94.1	9.7
05-06/09/2567	65.7	93.4	9.9
06-07/09/2567	67.1	100.5	8.7
07-08/09/2567	65.9	88.9	6.6
08-09/09/2567	*	*	*
09-10/09/2567	62.8	97.4	8.4
10-11/09/2567	60.7	84.8	8.6
11-12/09/2567	60.7	84.8	8.6
12-13/09/2567	65.6	93.4	9.6
13-14/09/2567	65.5	103.9	9.6
14-15/09/2567	59.1	84.7	9.9
15-16/09/2567	*	*	*
16-17/09/2567	60.7	84.8	9.1
17-18/09/2567	60.7	95.4	7.6
18-19/09/2567	64.5	94.1	6.3
19-20/09/2567	64.6	98.7	9.6
20-21/09/2567	65.2	90.4	7.1
21-22/09/2567	65.8	91.9	8.9
22-23/09/2567	*	*	*
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
23-24/09/2567	65.4	103.6	9.8
24-25/09/2567	63.2	102.7	9.5
25-26/09/2567	63.8	92.3	8.6
26-27/09/2567	64.1	105.3	7.4
27-28/09/2567	65.6	98.9	9.5
28-29/09/2567	64.3	95.3	7.0
29-30/09/2567	*	*	*
30/09-01/10/2567	66.1	93.5	5.7
01-02/10/2567	65.7	92.4	8.2
02-03/10/2567	66.4	95.6	8.0
03-04/10/2567	66.7	102.4	7.0
04-05/10/2567	65.5	98.6	6.1
05-06/10/2567	63.6	102.5	9.6
06-07/10/2567	*	*	*
07-08/10/2567	64.3	102.1	8.4
08-09/10/2567	62.8	97.4	8.9
09-10/10/2567	62.3	101.0	7.8
10-11/10/2567	60.7	84.8	8.6
11-12/10/2567	65.7	93.4	9.7
12-13/10/2567	64.5	81.2	8.0
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
13-14/10/2567	*	*	*
14-15/10/2567	**	**	**
15-16/10/2567	62.4	88.7	6.6
16-17/10/2567	64.2	93.2	9.3
17-18/10/2567	66.2	96.4	9.2
18-19/10/2567	63.0	99.4	9.5
19-20/10/2567	62.8	92.2	9.6
20-21/10/2567	*	*	*
21-22/10/2567	65.8	91.9	8.9
22-23/10/2567	*	*	*
23-24/10/2567	**	**	**
24-25/10/2567	66.6	105.2	5.3
25-26/10/2567	64.5	108.8	5.1
26-27/10/2567	64.1	106.5	9.5
27-28/10/2567	*	*	*
28-29/10/2567	65.5	105.9	9.6
29-30/10/2567	64.5	108.8	5.1
30-31/10/2567	65.7	92.4	8.2
31/10-01/11/2567	61.7	103.6	9.7
01-02/11/2567	61.5	106.2	9.0
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
02-03/11/2567	55.3	93.5	3.0
03-04/11/2967	*	*	*
04-05/11/2567	65.5	98.6	6.1
05-06/11/2567	55.9	95.1	8.2
06-07/11/2567	61.9	92.5	5.4
07-08/11/2567	56.1	90.5	2.5
08-09/11/2567	61.2	97.4	8.9
11-12/11/2567	65.7	93.4	9.7
12-13/11/2567	64.5	81.2	8.0
13-14/11/2567	63.8	96.8	10.0
14-15/11/2567	62.4	88.7	8.0
15-16/11/2567	63.9	93.2	7.3
16-17/11/2567	63.5	96.4	8.9
17-18/11/2567	*	*	*
18-19/11/2567	53.6	99.4	9.9
19-20/11/2567	62.7	96.2	8.5
20-21/11/2567	62.6	60.4	3.8
21-22/11/2567	53.0	109.1	8.8
22-23/11/2567	64.3	95.3	7.5
23-24/11/2567	55.5	83.2	10.0
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
24-25/11/2567	*	*	*
25-26/11/2567	54.0	85.2	8.2
26-27/11/2567	62.8	94.4	6.9
27-28/11/2567	63.0	98.6	1.5
28-29/11/2567	64.5	108.8	5.1
29-30/11/2567	62.5	102.1	9.0
30/11-01/12/2567	55.2	103.6	9.6
01-02/12/2567	*	*	*
02-03/12/2567	64.5	103.9	9.6
03-04/12/2567	58.7	85.5	8.3
04-05/12/2567	58.5	88.1	7.3
05-06/12/2567	**	**	**
06-07/12/2567	60.9	83.0	4.8
07-08/12/2567	52.2	100.8	7.7
08-09/12/2567	*	*	*
09-10/12/2567	52.7	95.6	5.7
10-11/12/2567	**	**	**
11-12/12/2567	61.1	97.4	1.4
12-13/12/2567	63.3	96.8	9.1
13-14/12/2567	58.1	93.2	9.4
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
14-15/12/2567	59.1	103.5	9.4
15-16/12/2567	*	*	*
16-17/12/2567	61.8	90.2	*
17-18/12/2567	60.0	89.8	9.4
18-19/12/2567	63.3	91.6	9.0
19-20/12/2567	62.4	88.4	8.4
20-21/12/2567	59.0	98.7	6.5
21-22/12/2567	63.0	91.2	9.9
22-23/12/2567	*	*	*
23-24/12/2567	62.5	102.5	7.3
24-25/12/2567	67.6	96.7	8.2
25-26/12/2567	**	**	**
26-27/12/2567	**	**	**
27-28/12/2567	**	**	**
28-29/12/2567	**	**	**
29-30/12/2567	**	**	**
30-31/12/2567	**	**	**
31/12/2567-01/01/2568	**	**	**
01-02/01/2568	**	**	**
03-04/01/2568	**	**	**
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
04-05/01/2568	**	**	**
05-06/01/2568	**	**	**
06-07/01/2568	61.6	95.2	9.1
07-08/01/2568	52.7	95.2	8.3
08-09/01/2568	62.0	95.2	9.8
09-10/01/2568	61.0	89.4	7.4
10-11/01/2568	60.1	91.6	2.9
11-12/01/2568	60.3	95.6	8.5
12-13/01/2568	*	*	*
13-14/01/2568	63.3	104.9	9.5
14-15/01/2568	62.2	98.5	7.7
15-16/01/2568	62.1	93.5	8.4
16-17/01/2568	63.5	99.7	7.9
17-18/01/2568	63.8	96.4	6.7
18-19/01/2568	57.6	85.6	9.9
19-20/01/2568	*	*	*
20-21/01/2568	64.3	95.0	3.7
21-22/01/2568	60.7	89.7	6.2
22-23/01/2568	64.1	95.1	6.6
23-24/01/2568	63.9	92.6	3.8
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
24-25/01/2568	64.5	98.5	9.5
25-26/01/2568	60.7	102.7	8.6
26-27/01/2568	*	*	*
27-28/01/2568	53.6	94.5	8.6
28-29/01/2568	63.2	95.2	9.7
29-30/01/2568	63.2	90.4	8.7
30-31/01/2568	63.3	97.5	9.3
31-1/02/2568	62.0	88.5	9.7
01-02/02/2568	61.9	96.5	9.9
02-03/02/2568	*	*	*
03-04/02/2568	52.3	84.5	7.3
04-05/02/2568	63.1	95.2	10.0
05-06/02/2568	61.4	95.3	9.6
06-07/02/2568	63.4	95.6	9.8
07-08/02/2568	61.5	97.5	9.4
08-09/02/2568	62.0	95.2	9.8
09-10/02/2568	*	*	*
10-11/02/2568	62.0	105.5	7.0
11-12/02/2568	62.7	99.6	9.2
12-13/02/2568	*	*	*
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
13-14/02/2568	62.4	106.2	6.8
14-15/02/2568	69.6	107.9	5.3
15-16/02/2568	61.9	102.9	8.0
16-17/02/2568	*	*	*
17-18/02/2568	62.2	93.5	9.0
18-19/02/2568	51.7	96.4	7.7
19-20/02/2568	60.7	106.4	7.7
20-21/02/2568	61.7	108.8	7.1
20-21/02/2568	61.4	108.3	7.9
22-23/02/2568	61.7	95.9	5.5
23-24/02/2568	*	*	*
24-25/02/2568	61.1	98.5	6.2
25-26/02/2568	60.7	102.7	8.6
26-27/02/2568	61.2	94.1	4.1
27-28/02/2568	60.9	91.2	4.3
28/02-01/03/2568	63.2	95.2	9.7
01-02/03/2568	61.6	96.5	8.8
02-03/03/2568	*	*	*
03-04/03/2568	61.5	98.2	5.1
04-05/03/2568	63.1	95.2	10.0
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
05-06/03/2568	61.6	97.1	4.5
06-07/03/2568	60.6	107.1	6.4
07-08/03/2568	60.8	87.8	7.9
08-09/03/2568	61.2	96.3	8.5
09-10/03/2568	*	*	*
10-11/03/2568	68.7	99.3	9.3
11-12/03/2568	60.6	107.1	6.8
12-13/03/2568	62.4	104.3	6.3
13-14/03/2568	61.4	95.3	7.2
14-15/03/2568	64.9	104.1	9.7
15-16/03/2568	62.4	100.9	6.7
16-17/03/2568	*	*	*
17-18/03/2568	62.2	93.5	7.2
18-19/03/2568	51.7	96.4	7.7
19-20/03/2568	60.7	106.4	7.7
20-21/03/2568	61.7	108.8	7.1
21-22/03/2568	62.0	95.2	9.4
22-23/03/2568	61.7	95.9	5.5
23-24/03/2568	*	*	*
24-25/03/2568	62.3	98.5	8.8
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
25-26/03/2568	63.4	102.7	7.6
26-27/03/2568	64.3	91.1	10.0
27-28/03/2568	60.9	91.2	6.3
28-29/03/2568	63.2	95.2	9.7
29-30/03/2568	63.0	93.5	6.9
30-31/03/2568	*	*	*
31/03-01/04/2568	61.5	101.2	9.3
01-02/04/2568	62.3	98.1	9.1
02-03/04/2568	62.8	99.7	4.0
03-04/04/2568	63.6	97.8	9.5
04-05/04/2568	63.1	95.2	10.0
05-06/04/2568	61.6	97.1	4.5
06-07/04/2568	*	*	*
07-08/04/2568	*	*	*
08-09/04/2568	66.1	105.3	9.4
09-10/04/2568	62.3	96.3	7.2
10-11/04/2568	63.2	98.5	7.3
11-12/04/2568	**	**	**
12-13/04/2568	**	**	**
13-14/04/2568	**	**	**
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
14-15/04/2568	**	**	**
15-16/04/2568	**	**	**
16-17/04/2568	**	**	**
17-18/04/2568	62.2	96.2	7.2
18-19/04/2568	62.4	100.9	6.2
19-20/04/2568	60.8	100.1	9.7
20-21/04/2568	*	*	*
21-22/04/2568	62.4	95.3	9.1
22-23/04/2568	60.7	99.3	8.9
23-24/04/2568	63.2	99.5	9.4
24-25/04/2568	63.4	100.5	9.3
25-26/04/2568	61.8	108.8	5.2
26-27/04/2568	62.0	107.3	8.3
27-28/04/2568	*	*	*
28-29/04/2568	62.5	95.3	9.6
29-30/04/2568	61.8	100.1	7.9
30/04-01/05/2568	62.8	94.4	7.4
01-02/05/2568	*	*	*
02-03/05/2568	62.8	93.7	10.0
03-04/05/2568	62.0	91.6	5.6
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
04-05/05/2568	*	*	*
06-07/05/2568	60.6	107.1	6.4
07-08/05/2568	61.5	95.6	9.6
08-09/05/2568	60.8	96.3	8.5
09-10/05/2568	**	**	**
10-11/05/2568	62.3	99.3	6.2
11-12/05/2568	*	*	*
12-13/05/2568	**	**	**
13-14/05/2568	61.4	95.3	7.2
14-15/05/2568	64.9	104.1	9.7
15-16/05/2568	61.5	95.3	6.7
16-17/05/2568	62.1	107.6	9.9
17-18/05/2568	61.4	106.3	6.4
18-19/05/2568	*	*	*
19-20/05/2568	61.3	96.3	2.0
20-21/05/2568	61.4	108.8	8.0
21-22/05/2568	62.0	95.2	9.4
22-23/05/2568	61.9	97.3	9.2
23-24/05/2568	61.2	95.2	6.2
24-25/05/2568	61.9	90.7	8.1
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
25-26/05/2568	*	*	*
26-27/05/2568	62.7	98.5	9.7
27-28/05/2568	62.0	95.3	9.4
28-29/05/2568	61.7	95.3	5.8
29-30/05/2568	62.9	101.2	4.4
30-31/05/2568	65.5	97.2	7.8
31-01/05/2568	62.0	92.6	9.8
01-02/06/2568	*	*	*
02-03/06/2568	62.2	110.1	9.1
03-04/06/2568	**	**	**
04-05/06/2568	63.7	92.7	10.0
05-06/06/2568	63.8	105.7	7.5
06-07/06/2568	64.0	97.2	6.5
07-08/06/2568	62.5	96.5	8.8
08-09/06/2568	*	*	*
09-10/06/2568	62.3	97.8	10.0
10-11/06/2568	61.2	101.1	8.1
11-12/06/2568	62.1	94.8	9.8
12-13/06/2568	62.8	98.8	8.0
13-14/06/2568	61.5	95.3	8.1
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
14-15/06/2568	64.9	104.1	9.7
15-16/06/2568	*	*	*
16-17/06/2568	62.0	107.6	8.8
17-18/06/2568	63.4	99.9	9.4
18-19/06/2568	63.0	96.4	9.8
19-20/06/2568	62.5	96.1	8.3
20-21/06/2568	62.1	97.4	9.1
21-22/06/2568	63.3	99.5	8.5
22-23/06/2568	*	*	*
23-24/06/2568	61.6	96.4	3.8
24-25/06/2568	61.9	90.7	8.1
25-26/06/2568	63.4	102.7	7.6
26-27/06/2568	62.9	98.5	9.7
27-28/06/2568	61.3	105.9	9.7
28-29/06/2568	62.1	95.2	6.1
29-30/06/2568	62.1	93.5	2.6
30/06-01/07/2568	62.2	96.9	9.5
01-02/07/2568	62.1	99.3	10.0
02-03/07/2568	61.5	100.5	5.1
03-04/07/2568	61.7	95.2	8.0
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
04-05/07/2568	62.4	94.4	8.4
05-06/07/2568	61.6	94.1	3.9
06-07/07/2568	*	*	*
07-08/07/2568	64.8	99.7	9.6
08-09/07/2568	62.8	95.2	9.8
09-10/07/2568	62.0	95.9	8.7
10-11/07/2568	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
11-12/07/2568	** ⁽²⁾	** ⁽²⁾	** ⁽²⁾
12-13/07/2568	62.5	95.2	8.8
13-14/07/2568	*	*	*
14-15/07/2568	63.0	96.4	9.8
15-16/07/2568	63.3	95.6	8.9
16-17/07/2568	64.1	97.5	4.3
17-18/07/2568	61.7	94.3	8.5
18-19/07/2568	63.4	96.4	9.5
19-20/07/2568	63.1	62.9	9.5
20-21/07/2568	*	*	*
21-22/07/2568	63.9	92.5	9.2
22-23/07/2568	65.2	97.6	6.0
23-24/07/2568	61.9	90.7	8.1
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
24-25/07/2568	64.8	94.6	7.4
25-26/07/2568	62.7	96.2	8.3
26-27/07/2568	62.8	98.5	8.0
27-28/07/2568	*	*	*
28-29/07/2568	** ⁽³⁾	** ⁽³⁾	** ⁽³⁾
29-30/07/2568	64.8	96.3	10.0
30-31/07/2568	63.6	97.3	5.9
31/06-01/07/2568	64.0	95.2	10.0
01-02/08/2568	62.4	98.4	9.9
02-03/08/2568	62.8	95.4	9.5
03-04/08/2568	*	*	*
04-05/08/2568	62.5	92.1	9.3
05-06/08/2568	63.1	91.7	9.5
06-07/08/2568	64.1	97.2	6.9
07-08/08/2568	63.4	94.1	9.8
08-09/08/2568	61.0	92.6	8.9
09-10/08/2568	63.2	95.6	10.0
10-11/08/2568	*	*	*
11-12/08/2568	62.0	95.2	9.2
12-13/08/2568	** ⁽⁴⁾	** ⁽⁴⁾	**
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
13-14/08/2568	62.5	94.9	8.6
14-15/08/2568	63.0	96.4	9.8
15-16/08/2568	62.5	96.3	9.4
16-17/08/2568	60.9	93.5	9.3
17-18/08/2568	*	*	*
18-19/08/2568	63.5	95.1	9.7
19-20/08/2568	63.3	92.9	9.5
20-21/08/2568	65.0	93.5	9.7
21-22/08/2568	62.8	100.5	9.2
22-23/08/2568	63.8	97.6	5.2
23-24/08/2568	63.1	95.4	3.1
24-25/08/2568	*	*	*
25-26/08/2568	62.3	96.5	9.6
26-27/08/2568	62.4	93.6	10.0
27-28/08/2568	62.9	93.2	1.6
28-29/08/2568	62.8	92.3	8.9
29-30/08/2568	63.5	93.3	8.7
30-31/08/2568	62.5	92.3	9.5
31/06-01/08/2568	*	*	*
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/09/2568	64.0	98.4	10.0
02-03/09/2568	63.6	91.2	9.5
03-04/09/2568	63.7	96.5	9.2
04-05/09/2568	62.9	95.3	10.0
05-06/09/2568	61.7	92.6	9.1
06-07/09/2568	62.6	94.2	7.8
07-08/09/2568	*	*	*
08-09/09/2568	62.3	95.4	9.2
09-10/09/2568	63.2	96.1	8.3
10-11/09/2568	62.4	94.1	10.0
11-12/09/2568	63.1	94.1	4.8
12-13/09/2568	62.5	96.8	7.8
13-14/09/2568	61.8	107.9	8.9
14-15/09/2568	*	*	*
15-16/09/2568	62.7	99.1	9.6
16-17/09/2568	62.9	94.2	7.6
17-18/09/2568	62.1	96.5	5.1
18-19/09/2568	62.0	92.5	8.8
19-20/09/2568	63.0	96.4	8.5
20-21/09/2568	62.1	92.6	6.4
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
21-22/09/2568	*	*	*
22-23/09/2568	63.2	96.9	9.7
23-24/09/2568	62.4	94.5	9.1
24-25/09/2568	63.4	97.2	9.4
25-26/09/2568	63.7	98.8	9.7
26-27/09/2568	63.4	98.4	10.0
27-28/09/2568	61.7	95.6	2.4
28-29/09/2568	*	*	*
29-30/09/2568	63.0	92.6	9.6
30/09-01/10/2568	62.9	100.5	9.1
01-02/10/2568	63.5	95.7	9.0
02-03/10/2568	63.1	92.5	8.8
03-04/10/2568	62.3	94.5	1.4
04-05/10/2568	61.0	88.8	5.6
05-06/10/2568	*	*	*
06-07/10/2568	62.4	98.2	9.3
07-08/10/2568	63.1	93.3	9.5
08-09/10/2568	62.6	94.2	6.2
09-10/10/2568	64.7	97.6	9.3
10-11/10/2568	62.8	92.5	5.3
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
11-12/10/2568	62.8	94.5	7.8
12-13/10/2568	*	*	*
13-14/10/2568	** ⁽⁵⁾	** ⁽⁵⁾	** ⁽⁵⁾
14-15/10/2568	62.5	96.4	8.9
15-16/10/2568	62.1	105.9	9.7
16-17/10/2568	61.7	96.5	6.7
17-18/10/2568	61.8	89.3	9.9
18-19/10/2568	61.4	91.8	7.1
19-20/10/2568	*	*	*
20-21/10/2568	62.3	96.3	7.2
21-22/10/2568	62.2	96.2	7.2
22-23/10/2568	60.8	96.5	9.7
23-24/10/2568	** ⁽⁶⁾	** ⁽⁶⁾	** ⁽⁶⁾
24-25/10/2568	61.7	92.4	9.8
25-26/10/2568	63.7	87.7	9.2
26-27/10/2568	*	*	*
27-28/10/2568	65.3	105.8	8.0
28-29/10/2568	63.4	98.4	10.0
29-30/10/2568	62.8	94.2	9.5
30-31/10/2568	64.2	100.5	8.5
31/10-01/11/2568	62.4	94.8	5.7
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
02-03/11/2568	*	*	*
03-04/11/2568	62.8	77.3	9.7
04-05/11/2568	63.3	91.8	8.0
05-06/11/2568	63.3	99.5	5.9
06-07/11/2568	63.1	92.9	9.8
07-08/11/2568	62.0	85.6	6.0
08-09/11/2568	62.8	88.7	6.8
09-10/11/2568	*	*	*
10-11/11/2568	62.7	96.6	5.5
11-12/11/2568	63.0	94.5	2.8
12-13/11/2568	62.5	96.8	7.6
13-14/11/2568	63.4	96.1	7.7
14-15/11/2568	64.6	93.4	9.6
15-16/11/2568	61.7	90.3	5.7
16-17/11/2568	*	*	*
17-18/11/2568	63.8	100.3	9.4
18-19/11/2568	62.9	95.6	7.9
19-20/11/2568	64.1	95.2	9.6
20-21/11/2568	62.1	92.7	9.7
21-22/11/2568	63.5	90.7	8.2
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
22-23/11/2568	62.5	95.2	8.4
23-24/11/2568	*	*	*
24-25/11/2568	65.3	96.5	9.6
25-26/11/2568	63.5	93.6	9.9
26-27/11/2568	62.8	90.6	8.0
27-28/11/2568	63.4	89.9	9.9
28-29/11/2568	64.7	93.4	8.4
29-30/11/2568	63.1	98.2	6.7
30/11-01/12/2568	*	*	*
01-02/12/2568	61.7	93.2	9.8
02-03/12/2568	62.8	90.9	8.4
03-04/12/2568	62.5	77.3	9.3
04-05/12/2568	63.3	89.3	10.0
05-06/12/2568	** ⁽⁷⁾	** ⁽⁷⁾	** ⁽⁷⁾
06-07/12/2568	63.6	92.6	5.4
07-08/12/2568	*	*	*
08-09/12/2568	63.9	90.9	9.3
09-10/12/2568	62.9	89.6	8.0
10-11/12/2568	** ⁽⁸⁾	** ⁽⁸⁾	** ⁽⁸⁾
11-12/12/2568	63.6	92.6	8.9
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
12-13/12/2568	63.0	90.6	9.9
13-14/12/2568	59.6	91.2	9.6
14-15/12/2568	*	*	*
15-16/12/2568	64.5	95.5	9.6
16-17/12/2568	62.6	96.5	8.9
17-18/12/2568	63.1	95.2	7.2
18-19/12/2568	64.3	99.4	9.7
19-20/12/2568	61.5	89.8	6.1
20-21/12/2568	62.2	86.2	6.2
21-22/12/2568	*	*	*
22-23/12/2568	62.0	91.3	9.3
23-24/12/2568	62.7	91.5	8.4
24-25/12/2568	63.5	91.2	8.3
25-26/12/2568	63.4	96.6	9.1
26-27/12/2568	60.8	93.6	9.8
27-28/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾
28-29/12/2568	*	*	*
29-30/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾
30-31/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾
31/12/2568-01/01/2569	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
01-02/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
02-03/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
03-04/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
04-05/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
05-06/01/2569	59.7	93.4	9.2
06-07/01/2569	58.9	87.1	9.8
07-08/01/2569	61.3	89.7	9.5
08-09/01/2569	63.1	96.7	8.9
09-10/01/2569	62.4	97.7	9.1
10-11/01/2569	61.7	96.5	7.0
11-12/01/2569	*	*	*
12-13/01/2569	60.4	97.8	8.0
13-14/01/2569	62.9	104.1	9.3
14-15/01/2569	64.9	98.2	10.0
15-16/01/2569	62.3	102.7	8.5
16-17/01/2569	61.8	100.2	6.1
17-18/01/2569	63.1	98.3	9.0
18-19/01/2569	*	*	*
19-20/01/2569	61.5	89.8	6.1
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

* หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

**⁽¹⁾ หมายถึง วันที่ 01 – 05 มกราคม พ.ศ. 2569 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L _{eq} 24 hr	L _{max}	ระดับเสียงรบกวน
20-21/01/2569	63.2	99.2	9.8
21-22/01/2569	62.8	98.4	7.8
22-23/01/2569	65.2	94.4	9.9
23-24/01/2569	63.3	97.2	9.9
24-25/01/2569	62.3	95.9	9.2
25-26/01/2569	*	*	*
26-27/01/2569	64.2	96.1	9.5
27-28/01/2569	64.4	99.4	9.8
28-29/01/2569	63.2	95.6	9.1
29-30/01/2569	63.1	98.2	6.7
30-31/01/2569	63.0	94.1	9.7
31/01/01/02/2569	61.0	95.1	9.5
01-02/02/2569	*	*	*
02-03/02/2569	62.4	98.5	9.8
03-04/02/2569	64.0	96.2	6.1
04-05/02/2569	61.5	98.6	8.2
05-06/02/2569	63.8	98.5	10.0
06-07/02/2569	63.2	100.3	10.0
07-08/02/2569	63.6	95.2	9.7
08-09/02/2569	*	*	*
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
09-10/02/2569	62.4	97.7	9.1
10-11/02/2569	61.3	98.2	7.0
11-12/02/2569	62.2	95.2	8.4
12-13/02/2569	63.2	95.2	9.5
13-14/02/2569	64.0	99.4	7.9
14-15/02/2569	62.6	98.2	9.9
15-16/02/2569	*	*	*
16-17/02/2569	63.7	98.5	8.0
17-18/02/2569	62.5	98.3	9.8
18-19/02/2569	64.3	99.4	9.5
19-20/02/2569	62.1	98.6	8.7
20-21/02/2569	60.9	97.6	9.2
21-22/02/2569	61.8	97.2	9.8
22-23/02/2569	*	*	*
23-24/02/2569	62.5	98.5	9.3
24-25/02/2569	61.2	95.2	8.6
25-26/02/2569	65.1	98.6	10.0
26-27/02/2569	66.3	97.8	9.9
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
	L_{eq} 24 hr	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
27-28/02/2569	63.6	95.2	9.0
28/02-01/03/2569	63.2	95.6	10.0
24-25/03/2569	58.9	87.1	4.8
25-26/03/2569	63.1	96.7	3.9
26-27/03/2569	62.4	97.7	4.1
27-28/04/2569	63.6	89.1	7.0
28-29/04/2569	64.0	83.1	4.5
29-30/04/2569	62.5	98.2	3.1
20-21/05/2569	65.0	98.4	8.8
21-22/05/2569	62.3	88.5	10.0
22-23/05/2569	62.9	95.1	5.7
17-18/06/2569	62.0	97.2	3.4
18-19/06/2569	61.3	98.6	2.0
19-20/06/2569	58.9	95.2	4.7
มาตรฐาน	70.0 ⁽¹⁾	115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน


หมายเหตุ : L_{eq} 24 hr หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

L_{max} หมายถึง ค่าระดับเสียงสูงสุด

dB(A) หมายถึง หน่วยเป็นเดซิเบลเอ


* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง




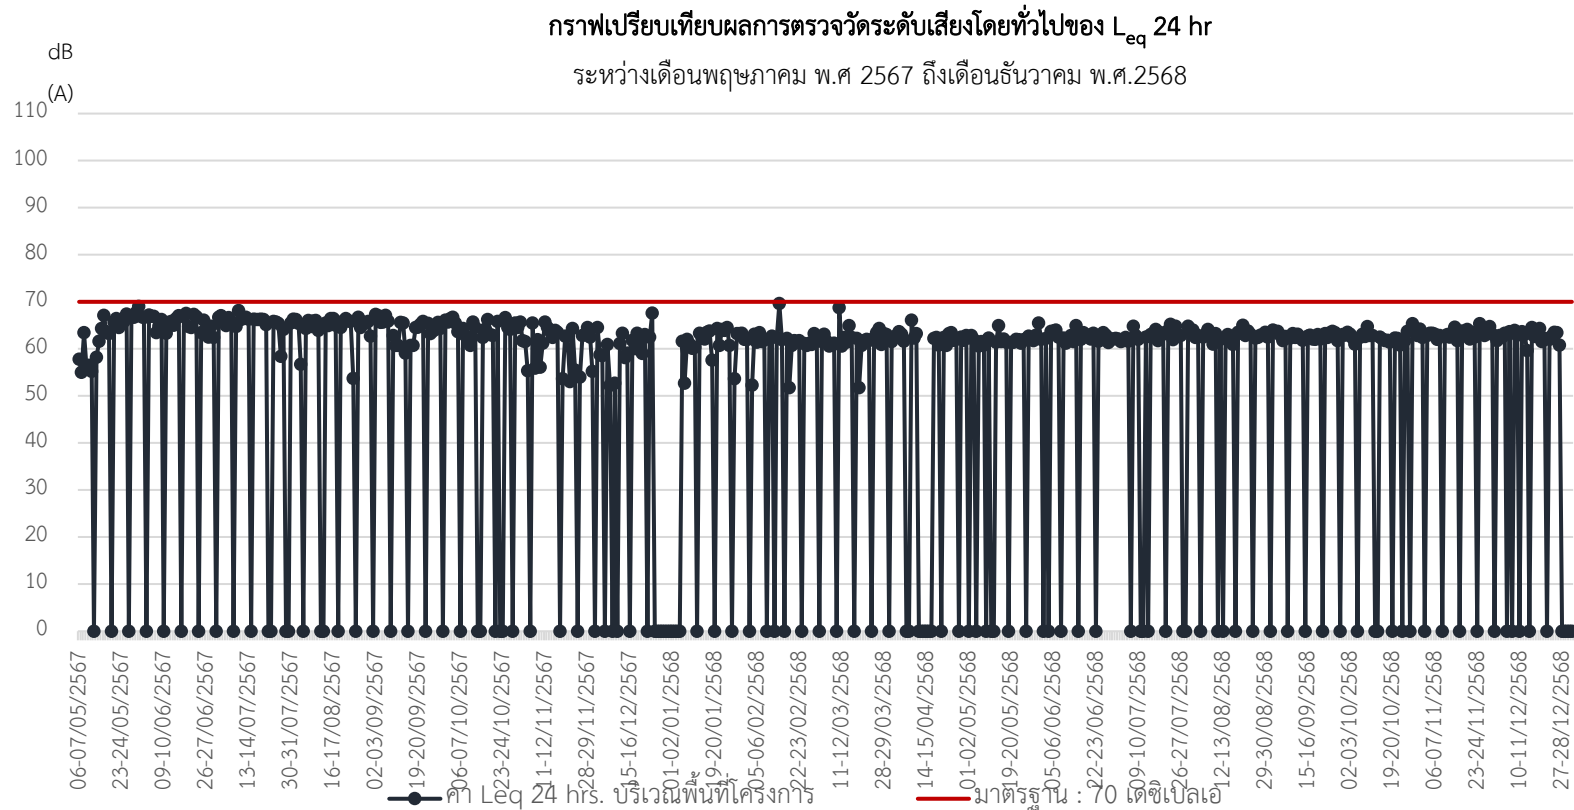


ภาพที่ 4-26 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของ L_{eq} 24 hr
ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568



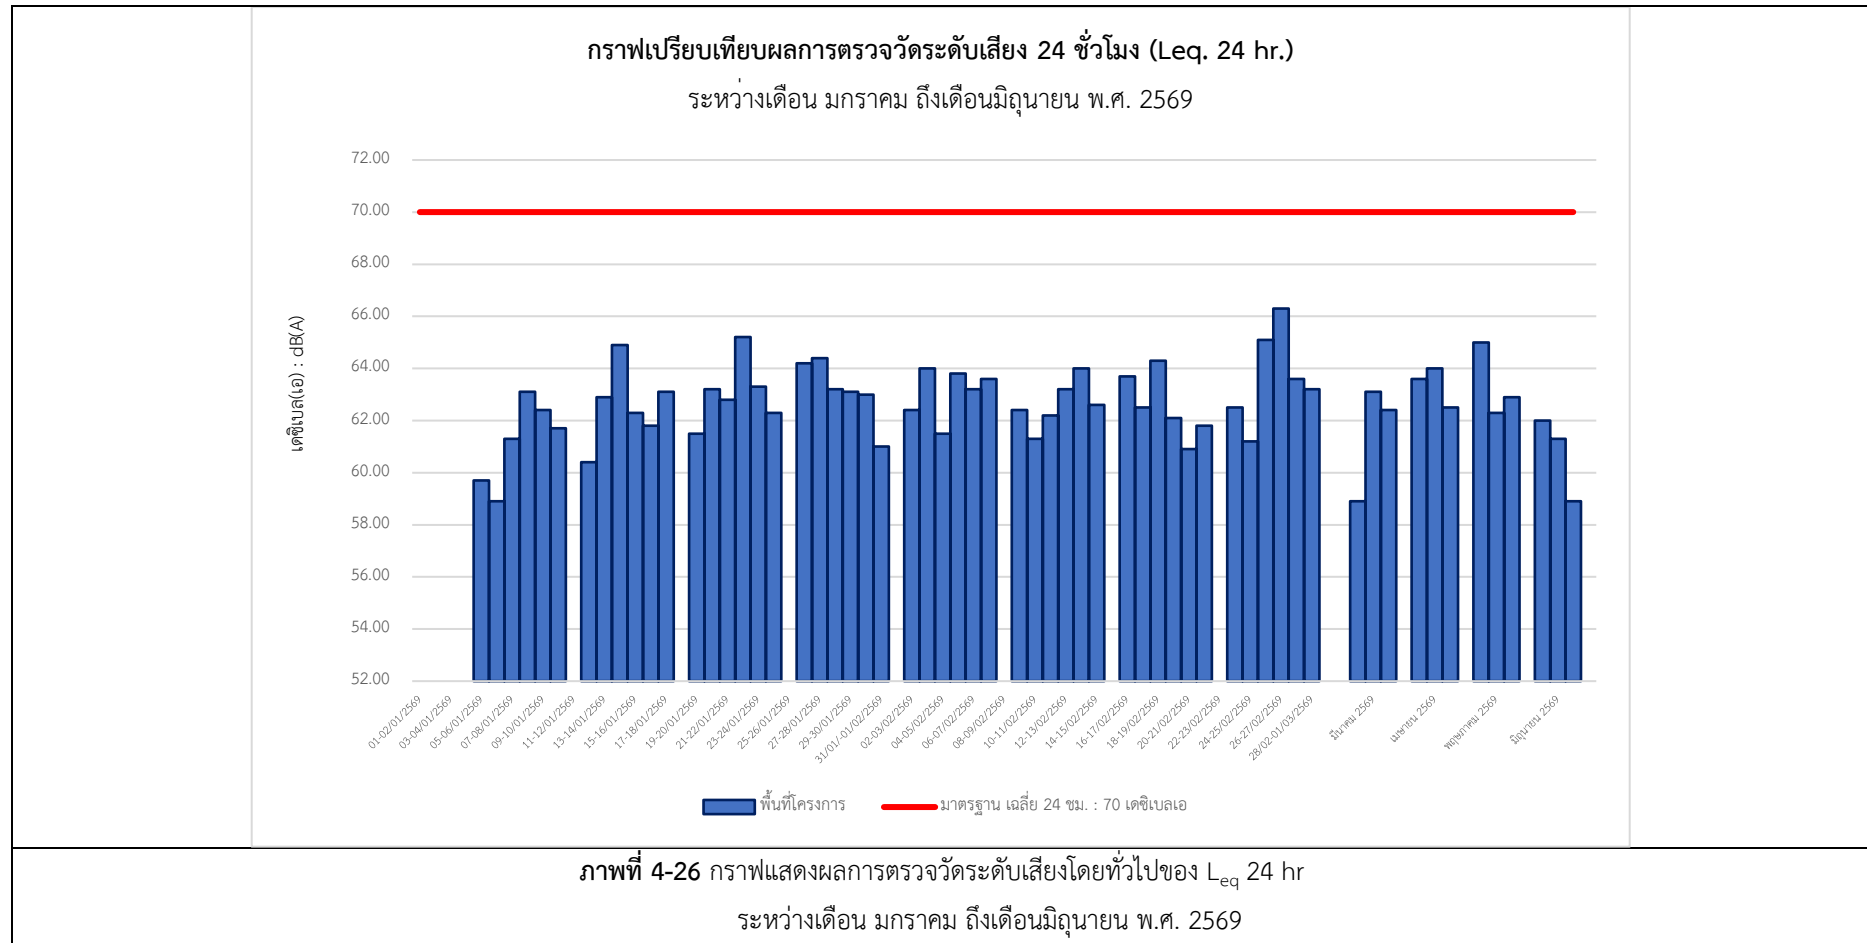


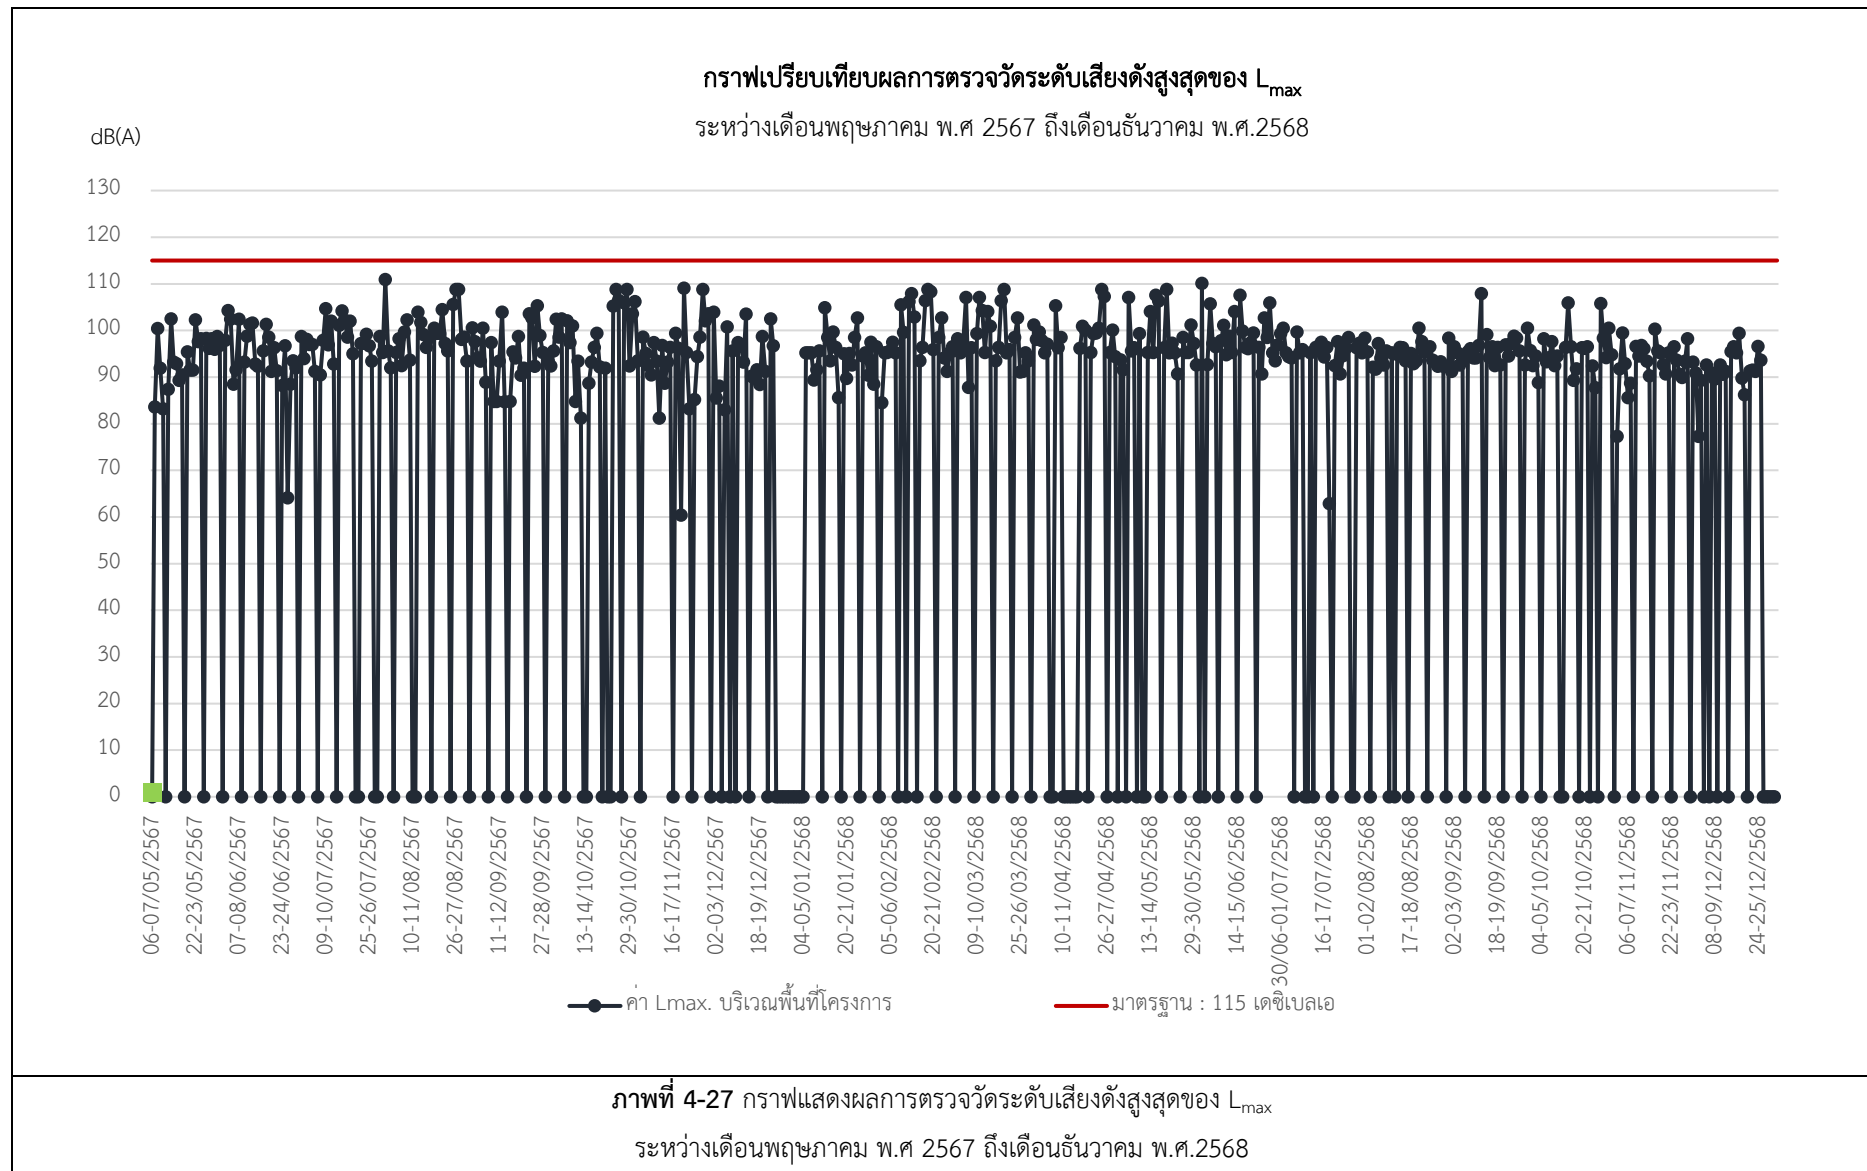

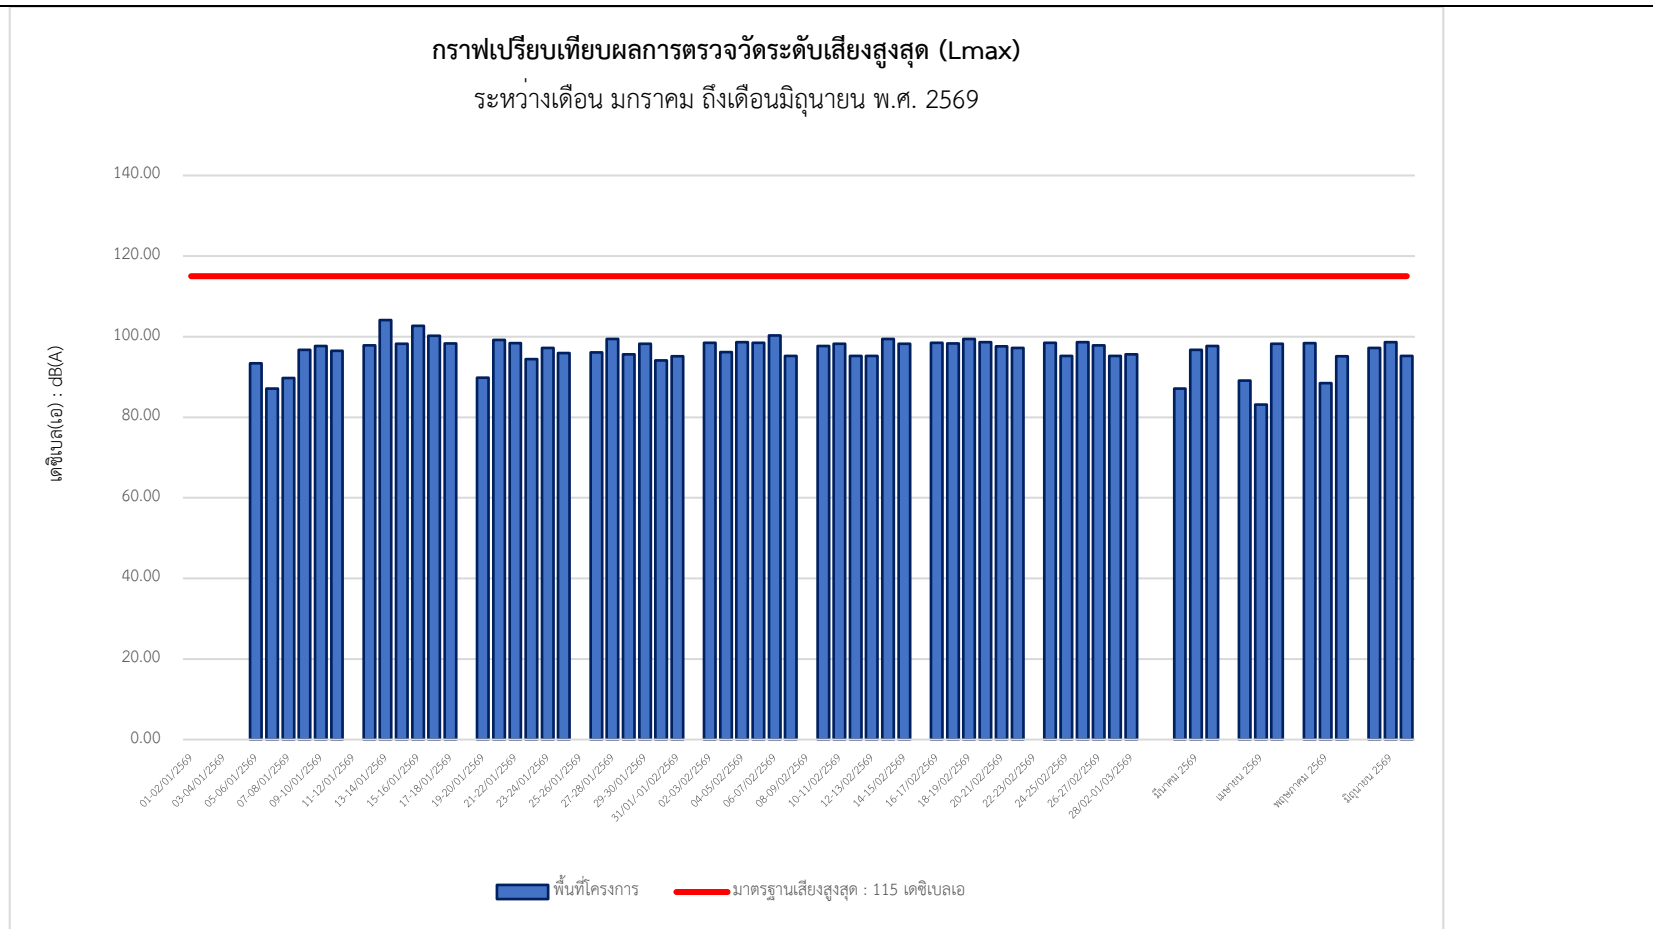

ภาพที่ 4-27 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสุดของ L_{max}
ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



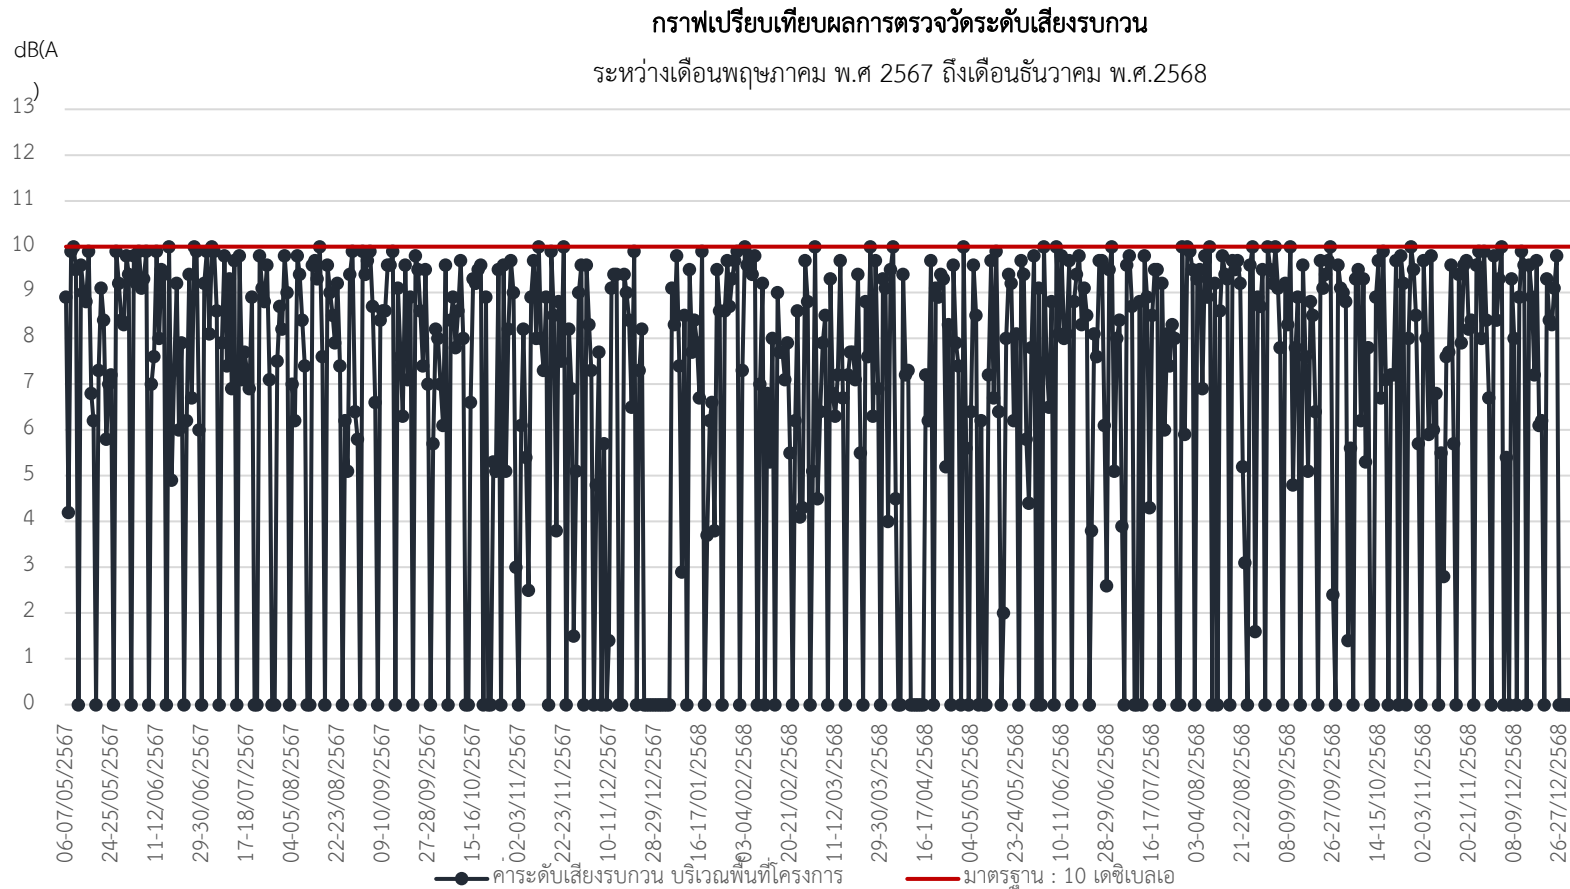

ภาพที่ 4-28 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568



ตารางที่ 4.1.6-3 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
06-07/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.789	7.0	5.000
07-08/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.033	39.0	12.250
08-09/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.923	85.0	18.500
09-10/05/2567	แนวแกนตามขวาง	0.938	2.9	5.000
10-11/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.364	64.0	16.400
11-12/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.663	5.3	5.000
12-13/05/2567	*	*	*	*
13-14/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.199	3.8	5.000
14-15/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.309	6.8	5.000
15-16/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.584	4.8	5.000
16-17/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.010	4.8	5.000
17-18/05/2567	แนวแกนตามขวาง	0.943	16.0	6.500
18-19/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.215	7.3	5.000
19-20/05/2567	*	*	*	*
20-21/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.097	4.6	5.000
21-22/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.656	4.5	5.000
22-23/05/2567	*	*	*	*
23-24/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.687	3.2	5.000
24-25/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.498	3.5	5.000
25-26/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.135	4.0	5.000
26-27/05/2567	*	*	*	*
27-28/05/2567	แนวแกนตามยาว	7.890	60.0	8.250

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
28-29/05/2567	แนวแกนตั้ง	0.820	6.5	5.000
29-30/05/2567	แนวแกนตั้ง	0.851	9.8	5.000
30-31/05/2567	แนวแกนตั้ง	0.560	10.8	5.200
31/05-01/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.814	4.6	5.000
01-02/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.238	5.9	5.000
02-03/06/2567	*	*	*	*
03-04/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.168	6.3	5.000
04-05/06/2567	แนวแกนตั้ง	3.271	4.6	5.000
05-06/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.341	7.9	5.000
06-07/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.821	1.8	5.000
07-08/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.357	4.6	5.000
08-09/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.805	4.5	5.000
09-10/06/2567	*	*	*	*
10-11/06/2567	แนวแกนตั้ง	3.421	4.7	5.000
11-12/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.987	13.8	5.950
12-13/06/2567	แนวแกนตั้ง	3.082	4.8	5.000
13-14/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.948	4.7	5.000
14-15/06/2567	แนวแกนตั้ง	3.862	4.8	5.000
15-16/06/2567	แนวแกนตั้ง	3.318	4.2	5.000
16-17/06/2567	*	*	*	*
17-18/06/2567	แนวแกนตั้ง	3.444	4.2	5.000
18-19/06/2567	แนวแกนตั้ง	3.949	23.0	8.250

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
19-20/06/2567	แนวแกนตั้ง	3.295	4.5	5.000
20-21/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.767	5.1	5.000
21-22/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.459	4.9	5.000
22-23/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.057	4.5	5.000
23-24/06/2567	*	*	*	*
24-25/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.041	3.8	5.000
25-26/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.710	4.5	5.000
26-27/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.907	4.2	5.000
27-28/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.380	12.0	5.500
28-29/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.372	4.3	5.000
29-30/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.065	5.4	5.000
30/06-01/07/2567	*	*	*	*
01-02/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.451	5.0	5.000
02-03/07/2567	แนวแกนตั้ง	3.933	4.8	5.000
03-04/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.964	6.6	5.000
04-05/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.491	3.8	5.000
05-06/07/2567	แนวแกนตั้ง	3.113	4.8	5.000
06-07/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.483	3.9	5.000
07-08/07/2567	*	*	*	*
08-09/07/2567	แนวแกนตั้ง	3.712	4.7	5.000
09-10/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.940	4.5	5.000
10-11/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.309	4.5	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
11-12/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.979	4.1	5.000
12-13/07/2567	แนวแกนตั้ง	3.752	4.6	5.000
13-14/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.680	6.3	5.000
14-15/07/2567	*	*	*	*
15-16/07/2567	แนวแกนตามยาว	2.830	3.1	5.000
16-17/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.570	4.8	5.000
17-18/07/2567	แนวแกนตามยาว	1.829	7.6	5.000
18-19/07/2567	แนวแกนตั้ง	1.892	7.6	5.000
19-20/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.577	4.8	5.000
11-12/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.979	4.1	5.000
12-13/07/2567	แนวแกนตั้ง	3.752	4.6	5.000
13-14/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.680	6.3	5.000
14-15/07/2567	*	*	*	*
15-16/07/2567	แนวแกนตามยาว	2.830	3.1	5.000
16-17/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.570	4.8	5.000
17-18/07/2567	แนวแกนตามยาว	1.829	7.6	5.000
18-19/07/2567	แนวแกนตั้ง	1.892	7.6	5.000
19-20/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.577	4.8	5.000
20-21/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.625	6.0	5.000
21-22/07/2567	*	*	*	*
22-23/07/2567	*	*	*	5.000
23-24/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.569	4.4	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
24-25/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.948	4.8	5.000
25-26/07/2567	-	*	*	*
26-27/07/2567	แนวแกนตามขวาง	2.018	5.9	5.000
27-28/07/2567	แนวแกนตามขวาง	2.908	14.4	7.500
28-29/07/2567	*	*	*	*
29-30/07/2567	*	*	*	*
30-31/07/2567	แนวแกนตั้ง	3.161	4.6	5.000
31/07-01/08/2567	แกนตั้ง	3.232	4.1	5.000
01-02/08/2567	แกนตั้ง	1.947	8.6	5.000
02-03/08/2567	แกนตั้ง	2.664	5.0	5.000
03-04/08/2567	แกนตามขวาง	1.773	4.8	5.000
04-05/08/2567	*	*	*	*
05-06/08/2567	แกนตามยาว	2.971	5.1	5.000
06-07/08/2567	แกนตั้ง	0.528	6.1	5.000
07-08/08/2567	แกนตั้ง	0.449	4.9	5.000
08-09/08/2567	แกนตั้ง	0.566	6.2	5.000
09-10/08/2567	แกนตั้ง	0.434	10.0	5.000
10-11/08/2567	แกนตั้ง	2.569	6.2	5.000
11-12/08/2567	*	*	*	*
12-13/08/2567	**	**	**	**
13-14/08/2567	แกนตั้ง	0.867	4.6	5.000
14-15/08/2567	แกนตามยาว	1.574	11.0	5.250

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
15-16/08/2567	แกนตั้ง	2.152	4.2	5.000
16-17/08/2567	แกนตั้ง	2.034	4.8	5.000
17-18/08/2567	แกนตั้ง	3.082	6.1	5.000
18-19/08/2567	*	*	*	*
19-20/08/2567	แกนตั้ง	0.751	3.9	5.000
20-21/08/2567	แกนตั้ง	1.103	5.6	5.000
21-22/08/2567	แกนตั้ง	3.318	5.1	5.000
22-23/08/2567	แกนตั้ง	2.845	4.7	5.000
23-24/08/2567	แกนตั้ง	1.387	5.9	5.000
24-25/08/2567	แกนตามยาว	2.026	4.4	5.000
25-26/08/2567	*	*	*	*
26-27/08/2567	แกนตามยาว	3.846	5.6	5.000
27-28/08/2567	แกนตามขวาง	1.884	4.7	5.000
28-29/08/2567	แกนตามขวาง	2.640	5.4	5.000
29-30/08/2567	แกนตั้ง	0.854	3.6	5.000
30-31/08/256731	แกนตั้ง	2.908	5.2	5.000
31/08-01/09/2567	แกนตั้ง	2.451	4.2	5.000
01-02/09/2567	*	*	*	*
02-03/09/2567	แกนตั้ง	1.947	8.6	5.000
03-04/09/2967	แกนตั้ง	2.499	4.5	5.000
04-05/09/2567	แกนตามขวาง	1.994	9.7	5.000
05-06/09/2567	แกนตามยาว	1.584	18.0	7.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
06-07/09/2567	แกนตามยาว	5.297	32.0	18.000
07-08/09/2567	แกนตามยาว	2.830	3.1	5.000
08-09/09/2567	*	*	*	*
09-10/09/2567	แกนตามยาว	2.190	7.6	5.000
10-11/09/2567	แกนตามขวาง	1.632	3.8	5.000
11-12/09/2567	แกนตามยาว	1.025	2.5	5.000
12-13/09/2567	แกนตามยาว	1.931	2.8	5.000
13-14/09/2567	แกนตามยาว	1.395	8.8	5.000
14-15/09/2567	แกนตามขวาง	1.978	2.3	5.000
15-16/09/2567	*	*	*	*
16-17/09/2567	แกนตามยาว	0.938	6.4	5.000
17-18/09/2567	แกนตามยาว	1.474	1.3	5.000
18-19/09/2567	แกนตามยาว	0.930	3.1	5.000
19-20/09/2567	แกนตามขวาง	1.127	3.3	5.000
20-21/09/2567	แกนตามขวาง	0.906	2.6	5.000
21-22/09/2567	แกนตามขวาง	0.757	5.1	5.000
22-23/09/2567	*	*	*	*
23-24/09/2567	แกนตามยาว	0.946	3.8	5.000
24-25/09/2567	แกนตามขวาง	1.127	4.1	5.000
25-26/09/2567	แกนตามยาว	1.253	6.1	5.000
26-27/09/2567	แกนตั้ง	1.870	4.0	5.000
27-28/09/2567	แกนตามยาว	1.151	5.7	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
28-29/09/2567	แกนตั้ง	2.057	4.5	5.000
29-30/09/2567	*	*	*	*
30/09-01/10/2567	แกนตั้ง	2.459	4.9	5.000
01-02/10/2567	แกนตามขวาง	2.119	5.3	5.000
02-03/10/2567	แกนตามยาว	0.772	3.7	5.000
03-04/10/2567	แกนตามยาว	2.203	1.0	5.000
04-05/10/2567	แกนตามขวาง	2.119	5.3	5.000
05-06/10/2567	แกนตามยาว	0.749	2.1	5.000
06-07/10/2567	*	*	*	*
07-08/10/2567	แกนตั้ง	1.654	4.9	5.000
08-09/10/2567	แกนตามขวาง	1.040	6.2	5.000
09-10/10/2567	แกนตามยาว	2.190	7.6	5.000
10-11/10/2567	แกนตามยาว	1.985	3.3	5.000
11-12/10/2567	แกนตามขวาง	1.040	6.2	5.000
12-13/10/2567	แกนตามยาว	1.931	2.8	5.000
13-14/10/2567	*	*	*	*
14-15/10/2567	**	**	**	**
15-16/10/2567	แกนตามยาว	0.835	2.6	5.000
16-17/10/2567	แกนตามขวาง	1.466	5.3	5.000
17-18/10/2567	แกนตั้ง	1.632	2.3	5.000
18-19/10/2567	แกนตั้ง	0.986	8.4	5.000
19-20/10/2567	แกนตามยาว	0.906	2.6	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
20-21/10/2567	*	*	*	*
21-22/10/2567	แกนตั้ง	1.452	6.7	5.000
22-23/10/2567	*	*	*	*
23-24/10/2567	**	**	**	**
24-25/10/2567	แกนตามยาว	0.993	4.0	5.000
25-26/10/2567	แกนตามยาว	0.946	3.8	5.000
26-27/10/2567	แกนตามขวาง	1.127	4.1	5.000
27-28/10/2567	*	*	*	*
28-29/10/2567	แกนตั้ง	1.870	4.0	5.000
29-30/10/2567	แกนตามยาว	1.253	6.1	5.000
30-31/10/2567	แกนตามยาว	1.151	5.7	5.000
31/10-01/11/2567	แกนตามขวาง	1.654	3.4	5.000
01-02/11/2567	แกนตั้ง	1.947	8.6	5.000
02-03/11/2567	แกนตั้ง	1.847	2.6	5.000
03-04/11/2567	*	*	*	*
04-05/11/2567	แกนตามยาว	3.253	9.5	5.000
05-06/11/2567	แกนตามยาว	0.749	2.1	5.000
06-07/11/2567	แกนตามยาว	2.203	1.0	5.000
07-08/11/2567	แกนตั้ง	1.947	8.6	5.000
08-09/11/2567	แกนตามยาว	1.734	8.7	5.000
09-10/11/2567	แกนตามขวาง	1.632	3.8	5.000
10-11/11/2567	*	*	*	*

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
11-12/11/2567	แกนตามยาว	1.985	3.3	5.000
12-13/11/2567	แกนตามขวาง	1.040	6.2	5.000
13-14/11/2567	แกนตามยาว	1.531	2.8	5.000
14-15/11/2567	แกนตามยาว	1.431	2.8	5.000
15-16/11/2567	แกนตั้ง	1.372	5.6	5.000
16-17/11/2567	แกนตั้ง	2.045	8.5	5.000
17-18/11/2567	*	*	*	*
18-19/11/2567	แกนตั้ง	2.125	2.4	5.000
19-20/11/2567	แกนตั้ง	1.632	2.3	5.000
20-21/11/2567	แกนตั้ง	2.057	6.9	5.000
21-22/11/2567	แกนตามขวาง	1.584	2.6	5.000
22-23/11/2567	แกนตามยาว	1.547	11.0	5.000
23-24/11/2567	แกนตั้ง	2.152	4.2	5.000
24-25/11/2567	*	*	*	*
25-26/11/2567	แกนตั้ง	2.034	4.8	5.000
26-27/11/2567	แกนตั้ง	3.082	6.1	5.000
27-28/11/2567	แกนตามยาว	1.865	3.8	5.000
28-29/11/2567	แกนตั้ง	1.103	5.6	5.000
29-30/11/2567	แกนตามยาว	1.537	8.5	5.000
30/11-01/12/2567	แกนตั้ง	2.451	4.2	5.000
01-02/12/2567	*	*	*	*
02-03/12/2567	แกนตั้ง	1.498	17.4	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
03-04/12/2567	แกนตามยาว	0.812	3.6	5.000
04-05/12/2567	แกนตามยาว	0.670	3.4	5.000
05-06/12/2567	**	**	**	**
06-07/12/2567	แกนตามยาว	0.725	3.6	5.000
07-08/12/2567	แกนตามขวาง	0.946	9.3	5.000
08-09/12/2567	*	*	*	5.000
09-10/12/2567	แกนตามขวาง	1.632	3.8	5.000
10-11/12/2567	**	**	**	**
11-12/12/2567	แกนตามยาว	0.954	4.5	5.000
12-13/12/2567	แกนตั้ง	2.814	4.6	5.000
13-14/12/2567	แกนตั้ง	2.238	5.9	5.000
14-15/12/2567	แกนตั้ง	2.168	6.3	5.000
15-16/12/2567	แกนตั้ง	1.372	5.6	5.000
16-17/12/2567	แกนตั้ง	0.914	7.3	5.000
17-18/12/2567	แกนตามยาว	1.474	1.3	5.000
18-19/12/2567	แกนตามยาว	0.930	3.1	5.000
19-20/12/2567	แกนตามขวาง	1.127	3.3	5.000
20-21/12/2567	แกนตามขวาง	0.906	2.6	5.000
21-22/12/2567	แกนตามขวาง	1.584	2.6	5.000
22-23/12/2567	*	*	*	*
23-24/12/2567	แกนตั้ง	2.152	4.2	5.000
24-25/12/2567	แกนตั้ง	2.034	4.8	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
25-26/12/2567	**	**	**	**
26-27/12/2567	**	**	**	**
27-28/12/2567	**	**	**	**
28-29/12/2567	**	**	**	**
29-30/12/2567	**	**	**	**
30-31/12/2567	**	**	**	**
31/12/2567-01/01/2568	**	**	**	**
01-02/02/2568	แกนนตั้ง	1.947	8.6	5.000
02-03/02/2568	*	*	*	*
03-04/02/2568	แกนนตั้ง	1.639	6.0	5.000
04-05/02/2568	แกนนตั้ง	1.236	12.3	5.500
05-06/02/2568	แกนนตั้ง	1.365	8.6	5.000
06-07/02/2568	แกนตามยาว	1.325	5.4	5.000
07-08/02/2568	แกนตามยาว	1.256	11.0	5.500
08-09/02/2568	แกนตามยาว	2.136	47.0	14.000
09-10/02/2568	*	*	*	*
10-11/02/2568	แกนตามยาว	2.554	7.6	5.000
11-12/02/2568	แกนนตั้ง	2.372	9.6	5.000
12-13/02/2568	**	*	*	*
13-14/02/2568	แกนตามขวาง	1.655	15.5	6.500
14-15/02/2568	แกนตามขวาง	1.425	21.3	8.900
15-16/02/2568	แกนตามยาว	0.938	6.4	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
16-17/02/2568	*	*	*	*
17-18/02/2568	แกนตั้ง	0.930	5.0	5.000
18-19/02/2568	แกนตั้ง	1.048	3.5	5.000
19-20/02/2568	แกนตามยาว	1.474	5.8	5.000
20-21/02/2568	แกนตามขวาง	0.906	2.6	5.000
21-22/02/2568	แกนตั้ง	0.977	3.1	5.000
22-23/02/2568	แกนตั้ง	1.096	64.0	16.400
23-24/02/2568	*	*	*	*
24-25/02/2568	แกนตั้ง	1.565	54.0	15.400
25-26/02/2568	แกนตั้ง	1.326	51.0	15.100
26-27/02/2568	แกนตั้ง	1.245	23.0	5.000
27-28/02/2568	แกนตั้ง	1.326	51.0	15.100
28/02/-01/03/2568	แกนตามยาว	1.325	41.0	12.750
01-02/03/2568	แกนตั้ง	1.852	4.8	5.000
02-03/03/2568	*	*	*	*
03-04/03/2568	แกนตามขวาง	1.182	51.0	15.100
04-05/03/2568	แกนตั้ง	1.419	11.0	5.500
05-06/03/2568	แกนตามยาว	1.490	20.0	7.500
06-07/03/2568	แกนตามขวาง	1.907	20.0	7.500
07-08/03/2568	แกนตามยาว	1.365	42.0	13.000
08-09/03/2568	แกนตามขวาง	1.513	19.0	7.250
09-10/03/2568	*	*	*	*

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
10-11/03/2568	แกนตามยาว	2.041	21.0	7.750
11-12/03/2568	แกนตั้ง	1.230	46.0	14.000
12-13/03/2568	แกนตั้ง	1.419	54.0	15.400
13-14/03/2568	แกนตั้ง	1.474	33.0	10.750
14-15/03/2568	แกนตามยาว	1.326	52.0	15.200
15-16/03/2568	แกนตามยาว	0.899	46.0	14.000
16-17/03/2568	*	*	*	*
17-18/03/2568	แกนตั้ง	1.111	36.0	11.500
18-19/03/2568	แกนตามขวาง	0.996	57.0	15.700
19-20/03/2568	แกนตามขวาง	2.396	25.0	8.750
20-21/03/2568	แกนตามยาว	1.789	54.0	15.400
21-22/03/2568	แกนตามยาว	1.495	55.0	15.500
22-23/03/2568	แกนตามยาว	2.948	68.0	16.800
23-24/03/2568	*	*	*	*
24-25/03/2568	แกนตามยาว	2.034	37.0	11.750
25-26/03/2568	แกนตั้ง	2.554	27.0	9.250
26-27/03/2568	แกนตามยาว	2.895	30.0	10.000
27-28/03/2568	แกนตามขวาง	3.090	20.0	7.500
28-29/03/2568	แกนตามขวาง	20.150	<1.0	5.000
29-30/03/2568	แกนตั้ง	1.308	24.0	8.500
30-31/03/2568	*	*	*	*
31/03-01/04/2568	แกนตามขวาง	1.679	24.0	8.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
01-02/04/2568	แกนตามยาว	1.926	49.0	14.750
02-03/04/2568	แกนตั้ง	2.554	49.0	14.750
03-04/04/2568	แกนตามยาว	1.821	62.0	16.200
04-05/04/2568	แกนตั้ง	1.419	11.0	5.250
05-06/04/2568	แกนตามยาว	1.490	20.0	7.500
06-07/04/2568	*	*	*	*
07-08/04/2568	**	*	*	*
08-09/04/2568	แกนตั้ง	1.419	54.0	15.400
09-10/04/2568	แกนตามยาว	1.652	52.0	15.200
10-11/04/2568	แกนตั้ง	1.326	51.0	15.100
11-12/04/2568	**	**	**	**
12-13/04/2568	**	**	**	**
13-14/04/2568	**	**	**	**
14-15/04/2568	**	**	**	**
15-16/04/2568	**	**	**	**
16-17/04/2568	แกนตามยาว	**	**	**
17-18/04/2568	แกนตั้ง	2.948	68.0	16.800
18-19/04/2568	แกนตามขวาง	2.554	27.0	9.250
19-20/04/2568	*	3.090	20.0	7.500
20-21/04/2568	แกนตามยาว	*	*	*
21-22/04/2568	แกนตามยาว	2.895	30.0	10.000
22-23/04/2568	แกนตามยาว	2.316	32.0	10.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
23-24/04/2568	แกนตั้ง	2.120	45.0	13.750
24-25/04/2568	แกนตามยาว	2.546	54.0	15.400
25-26/04/2568	แกนตามขวาง	2.125	14.0	6.000
26-27/04/2568	*	1.513	19.0	7.250
27-28/04/2568	แกนตามยาว	*	*	*
28-29/04/2568	แกนตั้ง	1.876	22.0	8.000
29-30/04/2568	แกนตามขวาง	1.758	17.0	6.750
30/04-01/05/2568	**	1.679	24.0	8.500
01-02/05/2568	**	*	*	*
02-03/05/2568	แกนตั้ง	1.947	32.0	10.500
03-04/05/2568	แกนตามขวาง	1.182	51.0	15.100
04-05/05/2568	*	*	*	*
05-06/05/2568	**	*	*	*
06-07/05/2568	แกนตามขวาง	1.907	20.0	7.500
07-08/05/2568	แกนตามยาว	1.365	42.0	13.000
08-09/05/2568	แกนตามขวาง	1.907	30.0	10.000
09-10/05/2568	**	*	*	*
10-11/05/2568	แกนตามขวาง	1.884	38.0	12.000
11-12/05/2568	*	*	*	*
12-13/05/2568	**	*	*	*
13-14/05/2568	แกนตามยาว	2.530	37.0	11.750
14-15/05/2568	แกนตั้ง	2.365	42.0	13.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
15-16/05/2568	แกนตามยาว	0.899	46.0	14.000
16-17/05/2568	แกนตามขวาง	0.996	57.0	15.700
17-18/05/2568	แกนตั้ง	1.111	36.0	11.500
18-19/05/2568	*	*	*	*
19-20/05/2568	แกนตามขวาง	2.396	25.0	8.750
20-21/05/2568	แกนตามยาว	1.789	54.0	15.400
21-22/05/2568	แกนตามยาว	1.495	55.0	15.500
22-23/05/2568	แกนตั้ง	3.461	73.0	17.300
23-24/05/2568	แกนตั้ง	1.387	57.0	15.700
24-25/05/2568	แกนตั้ง	2.609	12.6	5.650
25-26/05/2568	*	*	*	*
26-27/05/2568	แกนตามขวาง	2.325	66.0	16.600
27-28/05/2568	แกนตั้ง	2.658	41.0	12.750
28-29/05/2568	แกนตามขวาง	3.554	36.0	11.500
29-30/05/2568	แกนตามขวาง	1.776	45.0	13.750
30-31/05/2568	แกนตามยาว	1.365	26.0	9.000
31-05-01/6/2568	แกนตามขวาง	1.584	21.0	7.750
01-02/06/2568	*	*	*	*
02-03/06/2568	แกนตามขวาง	1.616	26.0	9.000
03-04/06/2568	**	**	**	**
04-05/06/2568	แกนตั้ง	1.498	85.0	18.500
05-06/06/2568	แกนตามยาว	1.623	33.0	10.750

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
06-07/06/2568	แกนตามยาว	1.989	25.0	8.750
07-08/06/2568	แกนตั้ง	1.616	22.0	8.000
08-09/06/2568	*	*	*	*
09-10/06/2568	แกนตามยาว	1.687	64.0	16.400
10-11/06/2568	แกนตั้ง	1.608	20.0	7.500
11-12/06/2568	แกนตั้ง	1.779	14.0	6.000
12-13/06/2568	แกนตั้ง	1.529	13.0	5.750
13-14/06/2568	แกนตั้ง	1.521	36.0	11.750
14-15/06/2568	แกนตั้ง	1.876	26.0	9.000
15-16/06/2568	*	*	*	*
16-17/06/2568	แกนตั้ง	1.647	43.0	13.250
17-18/06/2568	แกนตั้ง	1.482	16.0	6.500
18-19/06/2568	แกนตั้ง	1.671	15.0	6.250
19-20/06/2568	แกนตามยาว	2.278	47.0	14.250
20-21/06/2568	แกนตามยาว	1.655	34.0	11.000
21-22/06/2568	แกนตามยาว	1.521	37.0	11.750
22-23/06/2568	*	*	*	*
23-24/06/2568	แกนตั้ง	1.545	41.0	12.750
24-25/06/2568	แกนตั้ง	1.884	25.0	8.750
25-26/06/2568	แกนตั้ง	1.798	33.0	10.750
26-27/06/2568	แกนตั้ง	1.884	51.0	15.100
27-28/06/2568	แกนตามยาว	1.787	36.0	11.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
28-29/06/2568	แกนตั้ง	1.679	45.0	13.750
29-30/06/2568	แกนตามขวาง	1.387	53.0	15.300
30/06-01/07/2568	แกนตั้ง	1.458	17.0	6.750
01-02/07/2568	แกนตั้ง	0.701	47.0	14.250
02-03/07/2568	แกนตามยาว	1.419	17.0	6.750
03-04/07/2568	แกนตั้ง	1.718	51.0	15.100
04-05/07/2568	แกนตั้ง	1.624	24.0	8.500
05-06/07/2568	แกนตั้ง	1.608	20.0	7.500
06-07/07/2568	*	*	*	*
07-08/07/2568	แกนตามยาว	1.687	64.0	16.400
08-09/07/2568	แกนตั้ง	2.672	47.0	14.250
09-10/07/2568	แกนตั้ง	1.742	48.0	14.500
10-11/07/2568	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	**
11-12/07/2568	** ⁽²⁾	** ⁽²⁾	** ⁽²⁾	**
12-13/07/2568	แกนตั้ง	1.625	48.0	14.500
13-14/07/2568	*	*	*	*
14-15/07/2568	แกนตามยาว	1.521	45.0	13.750
15-16/07/2568	แกนตามยาว	1.326	22.0	8.000
16-17/07/2568	แกนตั้ง	1.326	47.0	14.250
17-18/07/2568	แกนตั้ง	1.655	47.0	14.250
18-19/07/2568	แกนตั้ง	2.017	18.0	7.000
19-20/07/2568	แกนตั้ง	2.026	32.0	10.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
20-21/07/2568	*	*	*	*
21-22/07/2568	แกนตั้ง	1.844	30.0	10.000
22-23/07/2568	แกนตั้ง	1.135	26.0	9.000
23-24/07/2568	แกนตั้ง	1.648	41.0	12.750
24-25/07/2568	แกนตั้ง	1.096	51.0	15.100
25-26/07/2568	แกนตั้ง	1.387	57.0	15.700
26-27/07/2568	แกนตั้ง	1.687	46.0	14.000
27-28/07/2568	*	*	*	*
28-29/07/2568	** ⁽³⁾	** ⁽³⁾	** ⁽³⁾	**
29-30/07/2568	แกนตามขวาง	1.387	53.0	15.300
30-31/07/2568	แกนตั้ง	1.860	45.0	13.750
01-02/08/2568	แกนตั้ง	1.616	27.0	11.500
02-03/08/2568	แกนตามยาว	1.516	8.3	5.000
03-04/08/2568	*	*	*	*
04-05/08/2568	แกนตั้ง	1.624	24.0	8.500
05-06/08/2568	แกนตั้ง	1.454	33.0	10.750
06-07/08/2568	แกนตั้ง	1.710	39.0	12.250
07-08/08/2568	แกนตั้ง	1.895	44.0	13.500
08-09/08/2568	แกนตั้ง	1.736	44.0	13.500
09-10/08/2568	แกนตามยาว	1.970	45.0	13.750
10-11/08/2568	*	*	*	*
11-12/08/2568	แกนตั้ง	1.779	14.0	6.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
12-13/08/2568	** (4)	** (4)	** (4)	**
13-14/08/2568	แกนตั้ง	1.521	36.0	11.500
14-15/08/2568	แกนตามยาว	1.521	45.0	13.750
15-16/08/2568	แกนตามยาว	1.561	38.0	12.000
16-17/08/2568	แกนตามยาว	1.654	47.0	14.250
17-18/08/2568	*	*	*	*
18-19/08/2568	แกนตามยาว	1.461	45.0	13.750
19-20/08/2568	แกนตั้ง	1.340	48.0	14.500
20-21/08/2568	แกนตั้ง	1.665	47.0	14.250
21-22/08/2568	แกนตามขวาง	1.813	57.0	15.700
22-23/08/2568	แกนตั้ง	1.454	55.0	15.500
23-24/08/2568	แกนตั้ง	1.537	42.0	13.000
24-25/08/2568	*	*	*	*
25-26/08/2568	แกนตั้ง	1.546	36.0	11.500
26-27/08/2568	แกนตั้ง	1.332	23.0	8.250
27-28/08/2568	แกนตั้ง	1.860	57.0	15.700
28-29/08/2568	แกนตามยาว	1.766	38.0	12.000
29-30/08/2568	แกนตามยาว	1.639	44.0	13.500
30-31/08/2568	แกนตั้ง	1.695	42.0	13.000
31/07-01/08/2568	*	*	*	*
01-02/09/2568	แกนตั้ง	1.214	27.0	9.250
02-03/09/2568	แกนตั้ง	0.843	47.0	14.250

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
03-04/09/2568	แกนตั้ง	1.345	38.0	12.000
04-05/09/2568	แกนตั้ง	1.277	37.0	11.750
05-06/09/2568	แกนตั้ง	1.298	36.0	11.500
06-07/09/2568	แกนตั้ง	1.251	53.0	15.300
07-08/09/2568	*	*	*	*
08-09/09/2568	แกนตามยาว	1.362	24.0	8.500
09-10/09/2568	แกนตั้ง	1.453	22.0	8.000
10-11/09/2568	แกนตามขวาง	1.726	>100	20.000
11-12/09/2568	แกนตั้ง	1.513	37.0	11.750
12-13/09/2568	แกนตั้ง	1.340	56.0	15.600
13-14/09/2568	แกนตามขวาง	1.395	39.0	12.250
14-15/09/2568	*	*	*	*
15-16/09/2568	แกนตามขวาง	1.190	45.0	13.750
16-17/09/2568	แกนตามขวาง	1.425	47.0	14.250
17-18/09/2568	แกนตั้ง	1.498	47.0	14.250
18-19/09/2568	แกนตั้ง	1.482	10.0	5.000
19-20/09/2568	แกนตั้ง	1.190	46.0	14.000
20-21/09/2568	แกนตั้ง	1.490	14.0	6.000
21-22/09/2568	*	*	*	*
22-23/09/2568	แกนตามยาว	2.562	1.5	5.000
23-24/09/2568	แกนตั้ง	3.760	57.0	15.700
24-25/09/2568	แกนตั้ง	2.034	>100	20.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
25-26/09/2568	แกนตั้ง	1.293	36.0	11.500
26-27/09/2568	แกนตามยาว	1.197	47.0	14.250
27-28/09/2568	แกนตั้ง	1.056	36.0	11.500
28-29/09/2568	*	*	*	*
29-30/09/2568	แกนตามยาว	1.325	47.0	14.250
30/09-01/10/2568	แกนตั้ง	1.325	22.0	8.000
01-02/10/2568	แกนตั้ง	1.655	85.0	18.500
02-03/10/2568	แกนตั้ง	1.592	73.0	17.300
03-04/10/2568	แกนตั้ง	1.844	30.0	10.000
04-05/10/2568	แกนตามขวาง	1.425	47.0	14.250
05-06/10/2568	*	*	*	*
06-07/10/2568	แกนตั้ง	0.835	64.0	16.400
07-08/10/2568	แกนตามยาว	1.325	44.0	13.500
08-09/10/2568	แกนตั้ง	1.505	37.0	11.750
09-10/10/2568	แกนตั้ง	1.365	22.0	8.000
10-11/10/2568	แกนตั้ง	1.215	45.0	13.750
11-12/10/2568	แกนตามยาว	1.371	45.0	13.750
12-13/10/2568	*	*	*	*
13-14/10/2568	** ⁽⁵⁾	** ⁽⁵⁾	** ⁽⁵⁾	**
14-15/10/2568	แกนตามขวาง	1.513	19.0	7.250
15-16/10/2568	แกนตั้ง	2.404	39.0	12.250
16-17/10/2568	แกนตั้ง	1.663	73.0	17.300

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
17-18/10/2568	แกนตั้ง	0.891	64.0	16.400
18-19/10/2568	แกนตั้ง	1.301	64.0	16.400
19-20/10/2568	*	*	*	*
20-21/10/2568	แกนตั้ง	1.622	25.0	8.750
21-22/10/2568	แกนตั้ง	1.545	42.0	13.000
22-23/10/2568	แกนตามยาว	1.215	32.0	10.500
23-24/10/2568	** ⁽⁶⁾	** ⁽⁶⁾	** ⁽⁶⁾	**
24-25/10/2568	แกนตามขวาง	1.154	49.0	14.750
25-26/10/2568	แกนตั้ง	1.254	36.0	11.500
26-27/10/2568	*	*	*	*
27-28/10/2568	แกนตั้ง	1.103	>100	20.000
28-29/10/2568	แกนตั้ง	1.702	34.0	11.000
29-30/10/2568	แกนตามยาว	1.365	47.0	14.250
30-31/10/2568	แกนตามขวาง	1.458	22.0	8.000
31/10-01/11/2568	แกนตั้ง	1.439	>100	20.000
01-02/11/2568	แกนตั้ง	1.434	64.0	16.400
02-03/11/2568	*	*	*	*
03-04/11/2568	แกนตามยาว	0.845	44.0	13.500
04-05/11/2568	แกนตามขวาง	1.658	55.0	15.500
05-06/11/2568	แกนตั้ง	1.625	28.0	9.500
06-07/11/2568	แกนตามยาว	1.958	22.0	8.000
07-08/11/2568	แกนตามยาว	2.018	37.0	11.750

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
08-09/11/2568	แกนตามขวาง	1.860	30.0	10.000
09-10/11/2568	*	*	*	*
10-11/11/2568	แกนตั้ง	1.971	22.0	8.000
11-12/11/2568	แกนตั้ง	1.325	36.0	11.500
12-13/11/2568	แกนตั้ง	1.301	46.0	14.000
13-14/11/2568	แกนตั้ง	1.190	54.0	15.400
14-15/11/2568	แกนตั้ง	1.766	36.0	11.500
15-16/11/2568	แกนตั้ง	1.521	45.0	13.750
16-17/11/2568	*	*	*	*
17-18/11/2568	แกนตั้ง	1.021	33.0	10.750
18-19/11/2568	แกนตั้ง	1.355	3.6	5.000
19-20/11/2568	แกนตามขวาง	1.325	36.0	11.500
20-21/11/2568	แกนตั้ง	1.332	18.0	7.000
21-22/11/2568	แกนตามขวาง	1.215	32.0	10.500
22-23/11/2568	แกนตามขวาง	1.326	5.6	5.000
23-24/11/2568	*	*	*	*
24-25/11/2568	แกนตามยาว	1.102	4.1	5.000
25-26/11/2568	แกนตามยาว	1.215	11.0	5.250
26-27/11/2568	แกนตั้ง	1.215	33.0	10.750
27-28/11/2568	แกนตามยาว	1.325	44.0	13.500
28-29/11/2568	แกนตามขวาง	1.201	51.0	15.100
29-30/11/2568	แกนตามขวาง	1.254	36.0	11.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
30/11-01/12/2568	*	*	*	*
01-02/12/2568	แกนตามขวาง	1.625	24.0	8.500
02-03/12/2568	แกนตามขวาง	1.145	33.0	10.750
03-04/12/2568	แกนตั้ง	1.121	22.0	8.000
04-05/12/2568	แกนตั้ง	1.044	35.0	11.250
05-06/12/2568	** ⁽⁷⁾	** ⁽⁷⁾	** ⁽⁷⁾	**
06-07/12/2568	แกนตั้ง	1.215	11.0	5.250
07-08/12/2568	*	*	*	*
08-09/12/2568	แกนตามยาว	0.895	17.0	6.750
09-10/12/2568	แกนตามขวาง	1.125	32.0	10.500
10-11/12/2568	** ⁽⁸⁾	** ⁽⁸⁾	** ⁽⁸⁾	**
11-12/12/2568	แกนตั้ง	0.985	22.0	8.000
12-13/12/2568	แกนตามขวาง	1.454	45.0	13.750
13-14/12/2568	แกนตามขวาง	1.215	32.0	10.500
14-15/12/2568	*	*	*	*
15-16/12/2568	แกนตามขวาง	0.956	22.0	8.000
16-17/12/2568	แกนตั้ง	1.021	22.0	8.000
17-18/12/2568	แกนตามขวาง	1.121	36.0	11.500
18-19/12/2568	แกนตามยาว	1.452	18.0	7.000
19-20/12/2568	แกนตามขวาง	1.321	45.0	13.750
20-21/12/2568	แกนตามขวาง	1.254	44.0	13.500
21-22/12/2568	*	*	*	*

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
22-23/12/2568	แกนตั้ง	1.458	11.0	5.250
23-24/12/2568	แกนตั้ง	1.111	64.0	16.400
24-25/12/2568	แกนตามยาว	1.325	51.0	15.100
25-26/12/2568	แกนตั้ง	1.214	41.0	12.750
26-27/12/2568	แกนตามขวาง	1.245	28.0	9.500
27-28/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	**
28-29/12/2568	*	*	*	*
29-30/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	**
30-31/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	**
31/12/2568-01/01/2569	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	**

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
01-02/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
02-03/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
03-04/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
04-05/01/2569	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾
05-06/01/2569	แกนตั้ง	0.365	21.0	7.750
06-07/01/2569	แกนตามขวาง	0.457	21.0	7.750
07-08/01/2569	แกนตั้ง	0.895	26.0	9.000
08-09/01/2569	แกนตั้ง	0.701	13.0	5.750
09-10/01/2569	แกนตามยาว	0.985	17.0	6.750
10-11/01/2569	แกนตามยาว	0.552	16.0	6.500
11-12/01/2569	*	*	*	*
12-13/01/2569	แกนตามยาว	0.956	39.0	12.250
13-14/01/2569	แกนตั้ง	1.198	39.0	12.250
14-15/01/2569	แกนตั้ง	1.174	48.0	14.500
15-16/01/2569	แกนตั้ง	0.899	21.0	7.750
16-17/01/2569	แกนตามยาว	0.845	45.0	13.750
17-18/01/2569	แกนตามยาว	0.726	19.0	7.250
18-19/01/2569	*	*	*	*
19-20/01/2569	แกนตั้ง	0.784	11.0	5.250
20-21/01/2569	แกนตั้ง	1.947	21.0	7.750

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

**⁽¹⁾ หมายถึง วันที่ 01 – 05 มกราคม พ.ศ. 2569 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
21-22/01/2569	แกนตั้ง	1.450	51.0	15.100
22-23/01/2569	แกนตามขวาง	0.956	22.0	8.000
23-24/01/2569	แกนตั้ง	1.419	64.0	16.400
24-25/01/2569	แกนตามขวาง	1.125	33.0	10.750
25-26/01/2569	*	*	*	*
26-27/01/2569	แกนตั้ง	0.717	51.0	15.100
27-28/01/2569	แกนตั้ง	2.940	> 100	20.000
28-29/01/2569	แกนตั้ง	1.663	56.0	15.600
29-30/01/2569	แกนตั้ง	1.127	54.0	15.400
30-31/01/2569	แกนตั้ง	1.269	47.0	14.250
31-01/01-02/2569	แกนตามขวาง	0.845	11.0	5.250
01-02/02/2569	*	*	*	*
02-03/02/2569	แกนตามยาว	0.986	11.0	5.250
03-04/02/2569	แกนตั้ง	1.671	46.0	14.000
04-05/02/2569	แกนตั้ง	1.206	45.0	13.750
05-06/02/2569	แกนตั้ง	1.419	59.0	15.900
06-07/02/2569	แกนตามยาว	0.986	16.0	6.500
07-08/02/2569	แกนตั้ง	1.032	33.0	10.750
08-09/02/2569	*	*	*	*
09-10/02/2569	แกนตั้ง	1.434	44.0	13.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
10-11/02/2569	แกนตั้ง	1.860	47.0	14.250
11-12/02/2569	แกนตั้ง	1.963	36.0	11.500
12-13/02/2569	แกนตั้ง	2.593	47.0	14.250
13-14/02/2569	แกนตั้ง	1.785	31.0	10.250
14-15/02/2569	แกนตามขวาง	1.025	32.0	10.500
15-16/02/2569	*	*	*	*
16-17/02/2569	แกนตั้ง	1.734	26.0	9.000
17-18/02/2569	แกนตั้ง	1.215	33.0	10.750
18-19/02/2569	แกนตามขวาง	1.326	33.0	10.750
19-20/02/2569	แกนตามยาว	1.154	48.0	14.500
20-21/02/2569	แกนตั้ง	1.947	51.0	15.100
21-22/02/2569	แกนตั้ง	1.215	33.0	10.750
22-23/02/2569	*	*	*	*
23-24/02/2569	แกนตั้ง	0.956	55.0	15.5.00
24-25/02/2569	แกนตามยาว	1.215	22.0	8.000
25-26/02/2569	แกนตามขวาง	1.326	22.0	8.000
26-27/02/2569	แกนตามยาว	1.326	22.0	8.000
27-28/02/2569	แกนตั้ง	1.154	52.0	15.200
28/02-01/03/2569	แกนตามยาว	1.326	55.0	15.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ใกล้บ้านเลขที่ 48)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
24-25/03/2569	แกนตั้ง	1.222	8.4	5.000
25-26/03/2569	แกนตามยาว	1.167	2.8	5.000
26-27/03/2569	แกนตามขวาง	1.072	2.2	5.00
27-28/04/2569	แกนตั้ง	1.154	5.2	5.000
28-29/04/2569	แกนตามยาว	1.021	5.5	5.000
29-30/04/2569	แกนตามขวาง	0.956	6.3	5.000
20-21/05/2569	แกนตั้ง	1.222	10.0	5.000
21-22/05/2569	แกนตั้ง	1.340	4.4	5.000
22-23/05/2569	แกนตามขวาง	1.215	8.3	5.000
17-18/06/2569	แกนตามขวาง	1.125	14.0	6.000
18-19/06/2569	แกนตามขวาง	1.254	16.0	6.500
19-20/06/2569	แกนตามยาว	1.065	15.0	6.250

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
06-07/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.653	5.1	5.000
07-08/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.970	5.4	5.000
08-09/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.238	4.8	5.000
09-10/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.994	8.7	5.000
10-11/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.278	7.0	5.000
11-12/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.470	2.5	5.000
12-13/05/2567	*	*	*	*
13-14/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.789	4.7	5.000
14-15/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.632	6.0	5.000
15-16/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.214	5.0	5.000
16-17/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.767	5.2	5.000
17-18/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.869	6.2	5.000
18-19/05/2567	แนวแกนตั้ง	0.977	4.6	5.000
19-20/05/2567	*	*	*	*
20-21/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.475	5.6	5.000
21-22/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.018	6.7	5.000
22-23/05/2567	*	*	*	*
23-24/05/2567	แนวแกนตั้ง	0.512	3.7	5.000
24-25/05/2567	แนวแกนตามขวาง	0.441	3.5	5.000
25-26/05/2567	แนวแกนตามขวาง	0.670	4.5	5.000
26-27/05/2567	*	*	*	*
27-28/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.782	3.9	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
29-30/05/2567	แนวแกนตั้ง	1.576	5.3	5.000
30-31/05/2567	แนวแกนตั้ง	2.262	4.8	5.000
31/05-01/06/2567	แนวแกนตามขวาง	2.680	10.0	5.000
01-02/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.371	13.0	5.000
02-03/06/2567	*	*	*	*
03-04/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.253	6.0	5.000
04-05/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.702	57.0	17.300
05-06/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.939	5.6	5.000
06-07/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.152	4.9	5.000
07-08/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.301	51.0	15.100
08-09/06/2567	แนวแกนตามขวาง	2.136	47.0	14.250
09-10/06/2567	*	*	*	*
10-11/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.064	5.7	5.000
11-12/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.498	4.5	5.000
12-13/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.387	4.6	5.000
13-14/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.262	9.1	5.000
14-15/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.128	5.5	5.000
15-16/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.900	5.8	5.000
16-17/06/2567	*	*	*	*
17-18/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.609	4.8	5.000
18-19/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.710	4.4	5.000
19-20/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.324	6.5	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
20-21/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.766	4.9	5.000
21-22/06/2567	แนวแกนตามขวาง	1.080	9.1	5.000
22-23/06/2567	แนวแกนตั้ง	0.804	3.9	5.000
23-24/06/2567	*	*	*	*
24-25/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.128	4.6	5.000
25-26/06/2567	แนวแกนตั้ง	1.742	4.5	5.000
26-27/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.341	13.0	5.000
27-28/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.782	3.9	5.000
28-29/06/2567	แนวแกนตั้ง	2.081	5.9	5.000
30/06-01/07/2567	*	*	*	*
01-02/07/2567	แนวแกนตามยาว	1.655	47.0	14.250
02-03/07/2567	แนวแกนตามขวาง	1.529	18.0	7.000
03-04/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.168	6.4	5.000
04-05/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.664	8.8	17.300
05-06/07/2567	แนวแกนตั้ง	1.419	4.8	5.000
06-07/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.451	5.2	5.000
07-08/07/2567	*	*	*	*
08-09/07/2567	แนวแกนตั้ง	1.561	4.9	5.000
09-10/07/2567	แนวแกนตั้ง	1.033	5.3	5.000
10-11/07/2567	แนวแกนตามยาว	0.969	4.9	5.000
11-12/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.262	4.5	5.000
12-13/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.199	5.1	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
13-14/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.995	4.5	5.000
14-15/07/2567	*	*	*	*
15-16/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.231	4.6	5.000
16-17/07/2567	แนวแกนตั้ง	3.042	4.8	5.000
17-18/07/2567	แนวแกนตั้ง	3.176	5.8	5.000
18-19/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.294	4.4	5.000
19-20/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.491	6.6	5.000
20-21/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.893	3.8	5.000
21-22/07/2567	*	*	*	*
22-23/07/2567	*	*	*	*
23-24/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.443	4.9	5.000
24-25/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.451	5.6	5.000
25-26/07/2567	*	*	*	*
26-27/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.018	5.9	5.000
27-28/07/2567	*	*	*	*
28-29/07/2567	*	*	*	*
29-30/07/2567	*	*	*	*
30-31/07/2567	แนวแกนตั้ง	2.467	8.5	5.000
31/07-01/08/2567	แกนตั้ง	3.358	3.9	5.000
01-02/08/2567	แกนตั้ง	2.412	6.6	5.000
02-03/08/2567	แกนตั้ง	2.104	7.2	5.000
03-04/08/2567	แกนตั้ง	2.215	6.2	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
04-05/08/2567	*	*	*	*
05-06/08/2567	แกนตั้ง	2.964	5.2	5.000
06-07/08/2567	แกนตั้ง	2.727	6.0	5.000
07-08/08/2567	แกนตั้ง	0.993	3.4	5.000
08-09/08/2567	แกนตั้ง	1.734	4.7	5.000
09-10/08/2567	แกนตั้ง	3.082	4.9	5.000
10-11/08/2567	แกนตั้ง	1.151	3.8	5.000
11-12/08/2567	*	*	*	*
12-13/08/2567	**	**	**	**
13-14/08/2567	แกนตั้ง	1.553	3.6	5.000
14-15/08/2567	แกนตั้ง	0.851	6.0	5.000
15-16/08/2567	แกนตั้ง	0.567	3.1	5.000
16-17/08/2567	แกนตามยาว	0.394	3.2	5.000
17-18/08/2567	แกนตั้ง	1.277	16.3	6.575
18-19/08/2567	*	*	*	*
19-20/08/2567	แกนตั้ง	1.568	7.3	5.000
20-21/08/2567	แกนตั้ง	0.567	4.8	5.000
21-22/08/2567	แกนตั้ง	1.033	5.1	5.000
22-23/08/2567	แกนตั้ง	1.348	5.8	5.000
23-24/08/2567	แกนตั้ง	1.277	4.5	5.000
24-25/08/2567	แกนตั้ง	1.033	5.5	5.000
25-26/08/2567	*	*	*	*

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
26-27/08/2567	แกนตั้ง	1.301	4.8	5.000
27-28/08/2567	แกนตั้ง	1.490	4.7	5.000
28-29/08/2567	แกนตั้ง	1.096	5.7	5.000
29-30/08/2567	แกนตามยาว	1.537	47.0	14.250
01-02/09/2567	*	*	*	*
02-03/09/2567	แกนตามยาว	1.490	5.3	5.000
03-04/09/2567	แกนตามยาว	7.031	30.0	10.000
04-05/09/2567	แกนตั้ง	2.215	6.2	5.000
05-06/09/2567	แกนตั้ง	2.964	5.2	5.000
06-07/09/2567	แกนตั้ง	2.956	6.2	5.000
07-08/09/2567	*	*	*	*
08-09/09/2567	แกนตั้ง	1.096	5.7	5.000
09-10/09/2567	แกนตั้ง	2.861	4.4	5.000
10-11/09/2567	แกนตั้ง	2.703	3.5	5.000
11-12/09/2567	แกนตามยาว	1.395	8.8	5.000
12-13/09/2567	แกนตามขวาง	1.316	4.5	5.000
13-14/09/2567	แกนตามยาว	1.781	2.9	5.000
14-15/09/2567	แกนตามยาว	3.184	4.7	5.000
15-16/09/2567	*	*	*	*
16-17/09/2567	แกนตามยาว	0.993	4.0	5.000
17-18/09/2567	แกนตั้ง	0.965	5.1	5.000
18-19/09/2567	แกนตามขวาง	0.945	4.0	6.575

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
19-20/09/2567	แกนตามขวาง	0.899	2.9	5.000
20-21/09/2567	แกนตามขวาง	0.835	2.6	5.000
21-22/09/2567	แกนตามขวาง	0.969	4.3	5.000
22-23/09/2567	*	*	*	*
23-24/09/2567	แกนตามขวาง	0.985	3.3	5.000
24-25/09/2567	แกนตามขวาง	1.411	2.6	5.000
25-26/09/2567	แกนตามยาว	0.835	2.1	5.000
26-27/09/2567	แกนตั้ง	0.835	4.2	5.000
27-28/09/2567	แกนตามยาว	0.977	7.8	5.000
28-29/09/2567	แกนตามยาว	0.993	4.0	5.000
29-30/09/2567	*	*	*	*
30/09-01/10/2567	แกนตั้ง	2.443	4.9	5.000
01-02/10/2567	แกนตามยาว	1.490	5.3	5.000
02-03/10/2567	แกนตั้ง	2.036	4.2	5.000
03-04/10/2567	แกนตั้ง	2.102	1.6	5.000
04-05/10/2567	แกนตามขวาง	1.199	10.0	5.000
05-06/10/2567	แกนตั้ง	1.039	2.6	5.000
06-07/10/2567	*	*	*	*
07-08/10/2567	แกนตั้ง	1.268	5.4	5.000
08-09/10/2567	แกนตามขวาง	1.332	3.1	5.000
09-10/10/2567	แกนตามขวาง	1.978	2.3	5.000
10-11/10/2567	แกนตั้ง	2.420	6.9	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
11-12/10/2567	แกนตั้ง	2.695	6.9	5.000
12-13/10/2567	แกนตามยาว	1.698	2.8	5.000
13-14/10/2567	*	*	*	*
14-15/10/2567	**	**	**	**
15-16/10/2567	แกนตามยาว	0.993	4.0	5.000
16-17/10/2567	แกนตั้ง	1.065	3.5	5.000
17-18/10/2567	แกนตามยาว	0.993	4.0	5.000
18-19/10/2567	แกนตั้ง	1.568	1.7	5.000
19-20/10/2567	แกนตามขวาง	1.647	8.5	5.000
20-21/10/2567	*	*	*	*
21-22/10/2567	แกนตั้ง	1.752	6.7	5.000
22-23/10/2567	*	*	*	*
23-24/10/2567	**	**	**	**
24-25/10/2567	แกนตามขวาง	1.647	8.5	5.000
25-26/10/2567	แกนตามขวาง	0.985	3.3	5.000
26-27/10/2567	แกนตามขวาง	1.965	4.4	5.000
27-28/10/2567	*	*	*	*
28-29/10/2567	แกนตามขวาง	1.654	3.9	5.000
29-30/10/2567	แกนตามขวาง	1.411	2.6	5.000
30-31/10/2567	แกนตามขวาง	1.654	3.4	5.000
31/10-01/11/2567	แกนตามยาว	1.742	3.5	5.000
01-02/11/2567	แกนตามยาว	2.175	4.2	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
02-03/11/2567	แกนตามยาว	2.652	1.5	5.000
03-04/11/2967	*	*	*	*
04-05/11/2567	แกนตามยาว	3.035	6.3	5.000
05-06/11/2567	แกนตั้ง	1.039	2.6	5.000
06-07/11/2567	แกนตามยาว	3.253	0.3	5.000
07-08/11/2567	แกนตามยาว	1.364	2.3	5.000
08-09/11/2567	แกนตามขวาง	1.332	3.1	5.000
09-10/11/2567	แกนตั้ง	2.703	3.5	5.000
10-11/11/2567	*	*	*	*
11-12/11/2567	แกนตั้ง	2.561	4.4	5.000
12-13/11/2567	แกนตั้ง	1.315	2.3	5.000
13-14/11/2567	แกนตั้ง	2.695	6.9	5.000
14-15/11/2567	แกนตามยาว	2.190	7.6	5.000
15-16/11/2567	แกนตามยาว	1.356	6.3	5.000
16-17/11/2567	แกนตามยาว	1.994	3.6	5.000
17-18/11/2567	*	*	*	*
18-19/11/2567	แกนตั้ง	1.568	1.7	6.575
19-20/11/2567	แกนตามยาว	0.906	2.6	5.000
20-21/11/2567	แกนตามขวาง	1.647	8.5	5.000
21-22/11/2567	แกนตั้ง	1.752	6.7	5.000
22-23/11/2567	แกนตั้ง	0.815	6.0	*
23-24/11/2567	แกนตั้ง	0.567	3.1	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
24-25/11/2567	*	*	*	*
25-26/11/2567	แกนตามยาว	0.394	3.2	5.000
26-27/11/2567	แกนตั้ง	1.277	5.6	5.000
27-28/11/2567	แกนตั้ง	1.568	7.3	5.000
28-29/11/2567	แกนตั้ง	0.567	4.8	5.000
29-30/11/2567	แกนตั้ง	1.088	4.3	5.000
30/11-01/12/2567	แกนตั้ง	2.160	6.5	5.000
01-02/12/2567	*	*	*	*
02-03/12/2567	แกนตั้ง	0.891	5.1	5.000
03-04/12/2567	แกนตามขวาง	0.741	14.6	6.150
04-05/12/2567	แกนตามยาว	0.796	3.5	5.000
05-06/12/2567	**	**	**	**
06-07/12/2567	แกนตั้ง	0.946	4.0	5.000
07-08/12/2567	แกนตั้ง	0.985	5.3	5.000
08-09/12/2567	*	*	*	*
09-10/12/2567	แกนตั้ง	2.703	3.5	5.000
10-11/12/2567	**	**	**	**
11-12/12/2567	แกนตั้ง	2.561	4.4	5.000
12-13/12/2567	แกนตั้ง	1.315	2.3	5.000
13-14/12/2567	แกนตั้ง	2.695	6.9	5.000
14-15/12/2567	แกนตามยาว	2.190	7.6	5.000
15-16/12/2567	แกนตามยาว	1.356	6.3	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
16-17/12/2567	แกนตามยาว	0.457	3.5	5.000
17-18/12/2567	แกนตั้ง	0.965	5.1	5.000
18-19/12/2567	แกนตามขวาง	0.495	4.0	5.000
19-20/12/2567	แกนตามขวาง	0.889	2.9	5.000
20-21/12/2567	แกนตามขวาง	0.835	2.6	5.000
21-22/12/2567	แกนตามขวาง	0.969	4.3	5.000
22-23/12/2567	*	*	*	*
23-24/12/2567	แกนตั้ง	0.567	3.1	5.000
24-25/12/2567	แกนตั้ง	1.088	4.3	5.000
25-26/12/2567	**	**	**	**
26-27/12/2567	**	**	**	**
27-28/12/2567	**	**	**	**
28-29/12/2567	**	**	**	**
29-30/12/2567	**	**	**	**
30-31/12/2567	**	**	**	**
31/12/2567-01/01/2568	**	**	**	**
01-02/02/2568	แกนตามยาว	2.175	4.2	5.000
02-03/02/2568	*	*	*	*
03-04/02/2568	แกนตามยาว	1.639	5.1	5.000
04-05/02/2568	แกนตามยาว	1.326	6.2	5.000
05-06/02/2568	แกนตามยาว	1.546	4.3	5.000
06-07/02/2568	แกนตั้ง	1.317	12.3	5.575

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
07-08/02/2568	แกนตามยาว	1.325	6.3	5.000
08-09/02/2568	แกนตามยาว	1.679	2.2	5.000
09-10/02/2568	*	*	*	*
10-11/02/2568	แกนตามยาว	1.639	5.1	5.000
11-12/02/2568	แกนตามขวาง	1.256	11.3	5.325
12-13/02/2568	**	**	**	**
13-14/02/2568	แกนตามขวาง	1.364	13.0	5.750
14-15/02/2568	แกนตามยาว	1.364	5.2	5.000
15-16/02/2568	แกนตั้ง	0.962	8.3	5.000
16-17/02/2568	*	*	*	*
17-18/02/2568	แกนตั้ง	1.639	2.9	5.000
18-19/02/2568	แกนตั้ง	2.049	3.1	5.000
19-20/02/2568	แกนตั้ง	1.371	5.0	5.000
20-21/02/2568	แกนตั้ง	0.906	8.5	5.000
21-22/02/2568	แกนตั้ง	1.332	3.1	5.000
22-23/02/2568	แกนตั้ง	1.474	33.0	10.750
23-24/02/2568	*	*	*	*
24-25/02/2568	แกนตั้ง	1.419	54.0	15.400
25-26/02/2568	แกนตั้ง	1.230	46.0	14.000
26-27/02/2568	แกนตามยาว	1.652	52.0	15.200
27-28/02/2568	แกนตามยาว	1.302	45.0	13.750
28/02-01/03/2568	แกนตามยาว	1.326	52.0	15.200

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
01-02/03/2568	แกนตามยาว	2.175	4.2	5.000
02-03/03/2568	*	*	*	*
03-04/03/2568	แกนตามขวาง	0.983	51.0	15.100
04-05/03/2568	แกนตามขวาง	1.663	20.0	7.500
05-06/03/2568	แกนตามขวาง	1.624	51.0	15.100
06-07/03/2568	แกนตามขวาง	1.939	20.0	7.500
07-08/03/2568	แกนตั้ง	1.658	21.0	7.750
08-09/03/2568	แกนตั้ง	1.006	47.0	14.250
09-10/03/2568	*	*	*	*
10-11/03/2568	แกนตั้ง	1.565	42.0	13.000
11-12/03/2568	แกนตั้ง	1.245	23.0	8.250
12-13/03/2568	แกนตั้ง	2.026	5.2	5.000
13-14/03/2568	แกนตั้ง	1.326	51.0	15.100
14-15/03/2568	แกนตั้ง	3.807	6.2	5.000
15-16/03/2568	แกนตั้ง	0.796	3.3	5.000
16-17/03/2568	*	*	*	*
17-18/03/2568	แกนตั้ง	2.326	20.0	7.500
18-19/03/2568	แกนตั้ง	1.474	49.0	14.750
19-20/03/2568	แกนตามยาว	2.254	51.0	15.100
20-21/03/2568	แกนตามขวาง	2.711	26.0	9.000
21-22/03/2568	แกนตั้ง	1.103	26.0	9.000
22-23/03/2568	แกนตามยาว	2.316	32.0	10.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
23-24/03/2568	*	*	*	*
24-25/03/2568	แกนตามยาว	2.136	25.0	8.750
25-26/03/2568	แกนตามยาว	2.316	23.0	8.250
26-27/03/2568	แกนตั้ง	2.546	54.0	15.400
27-28/03/2568	แกนตามขวาง	2.002	28.0	9.500
28-29/03/2568	แกนตามขวาง	19.325	<1.0	5.000
29-30/03/2568	แกนตามขวาง	1.852	36.0	11.500
30-31/03/2568	*	*	*	*
31/03-01/04/2568	แกนตั้ง	1.901	34.0	11.000
01-02/04/2568	แกนตามขวาง	1.458	36.0	11.500
02-03/04/2568	แกนตามยาว	2.368	48.0	14.500
03-04/04/2568	แกนตามขวาง	1.632	51.0	15.100
04-05/04/2568	แกนตามขวาง	1.663	20.0	7.500
05-06/04/2568	แกนตามขวาง	1.624	51.0	15.100
06-07/04/2568	*	*	*	*
07-08/04/2568	**	*	*	*
08-09/04/2568	แกนตั้ง	1.230	46.0	14.000
09-10/04/2568	แกนตามยาว	1.325	41.0	12.750
10-11/04/2568	แกนตั้ง	1.565	54.0	15.400
11-12/04/2568	**	**	**	**
12-13/04/2568	**	**	**	**
13-14/04/2568	**	**	**	**

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
14-15/04/2568	**	**	**	**
15-16/04/2568	**	**	**	**
16-17/04/2568	**	**	**	**
17-18/04/2568	แกนตามยาว	2.316	32.0	10.500
18-19/04/2568	แกนตั้ง	2.191	24.0	8.500
19-20/04/2568	แกนตามขวาง	2.002	28	9.500
20-21/04/2568	*	*	*	*
21-22/04/2568	แกนตั้ง	2.546	54.0	15.400
22-23/04/2568	แกนตั้ง	1.308	24.0	8.500
23-24/04/2568	แกนตามยาว	2.593	15.0	6.250
24-25/04/2568	แกนตั้ง	2.546	54.0	15.400
25-26/04/2568	แกนตามยาว	2.499	19.0	7.250
26-27/04/2568	แกนตามยาว	2.316	32.0	10.500
27-28/04/2568	*	*	*	*
28-29/04/2568	แกนตามยาว	2.081	18.0	7.000
29-30/04/2568	แกนตามขวาง	1.365	26.0	9.000
30/04-01/05/2568	แกนตั้ง	1.901	34.0	11.000
01-02/05/2568	**	**	**	**
02-03/05/2568	แกนตามยาว	1.403	25.0	8.750
03-04/05/2568	แกนตามขวาง	1.568	25.0	8.750
04-05/05/2568	*	*	*	*
05-06/05/2568	**	**	**	**

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
06-07/05/2568	แกนตามขวาง	1.939	20.0	7.500
07-08/05/2568	แกนตั้ง	1.658	21.0	7.750
08-09/05/2568	แกนตามยาว	1.458	36.0	11.500
09-10/05/2568	**	**	**	**
10-11/05/2568	แกนตั้ง	1.699	32.0	10.500
11-12/05/2568	*	*	*	*
12-13/05/2568	**	**	**	**
13-14/05/2568	แกนตั้ง	1.326	51.0	15.100
14-15/05/2568	แกนตั้ง	1.659	23.0	8.250
15-16/05/2568	แกนตั้ง	0.796	3.3	5.000
16-17/05/2568	แกนตั้ง	1.474	49.0	14.750
17-18/05/2568	แกนตั้ง	2.326	20.0	7.500
18-19/05/2568	*	*	*	*
19-20/05/2568	แกนตามยาว	2.254	51.0	15.100
20-21/05/2568	แกนตามขวาง	2.711	26.0	9.000
21-22/05/2568	แกนตั้ง	1.103	26.0	16.000
22-23/05/2568	แกนตามยาว	2.034	37.0	11.750
23-24/05/2568	แกนตามยาว	2.316	23.0	8.250
24-25/05/2568	แกนตั้ง	2.554	27.0	9.250
25-26/05/2568	*	*	*	*
26-27/05/2568	แกนตั้ง	2.475	19.0	7.250
27-28/05/2568	แกนตั้ง	2.333	18.0	7.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
28-29/05/2568	แกนตามขวาง	2.002	28.0	9.500
29-30/05/2568	แกนตามยาว	1.776	45.0	13.750
30-31/05/2568	แกนตามขวาง	1.365	26.0	9.000
31/05-01/06/2568	แกนตั้ง	1.584	21.0	7.750
01-02/06/2568	*	*	*	*
02-03/06/2568	แกนตามยาว	1.545	34	11.000
03-04/06/2568	**	**	**	**
04-05/06/2568	แกนตั้ง	1.513	19.0	7.250
05-06/06/2568	แกนตามยาว	1.450	37.0	11.750
06-07/06/2568	แกนตั้ง	1.592	13.0	5.750
07-08/06/2568	แกนตั้ง	1.584	27.0	9.250
08-09/06/2568	*	*	*	*
09-10/06/2568	แกนตั้ง	1.592	15.0	6.250
10-11/06/2568	แกนตั้ง	1.505	17.0	6.750
11-12/06/2568	แกนตามขวาง	1.639	30.0	10.000
12-13/06/2568	แกนตั้ง	1.513	27.0	9.250
13-14/06/2568	แกนตั้ง	13.95	26.0	9.000
14-15/06/2568	แกนตามยาว	1.876	20.0	7.500
15-16/06/2568	*	*	*	*
16-17/06/2568	แกนตั้ง	1.568	20.0	7.500
17-18/06/2568	แกนตามขวาง	1.781	27.0	9.250
18-19/06/2568	แกนตามยาว	1.395	17.0	6.750

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
19-20/06/2568	แกนตามขวาง	1.458	64.0	16.400
20-21/06/2568	แกนตามยาว	1.844	25.0	8.750
21-22/06/2568	แกนตามขวาง	1.758	43.0	13.250
22-23/06/2568	*	*	*	*
23-24/06/2568	แกนตั้ง	1.625	22.0	8.000
24-25/06/2568	แกนตั้ง	1.647	35.0	9.250
25-26/06/2568	แกนตามยาว	1.545	22.0	8.000
26-27/06/2568	แกนตามยาว	1.487	32.0	10.500
27-28/06/2568	แกนตามขวาง	1.583	43.0	13.250
28-29/06/2568	แกนตั้ง	1.345	53.0	15.300
29-30/06/2568	แกนตามขวาง	1.316	51.0	15.100
30/06-01/07/2568	แกนตามยาว	13.26	22.0	8.000
01-02/07/2568	แกนตามยาว	1.308	4.5	5.000
02-03/07/2568	แกนตั้ง	1.593	33.0	17.300
03-04/07/2568	แกนตั้ง	1.475	22.0	5.000
04-05/07/2568	แกนตั้ง	1.498	15.0	5.000
05-06/07/2568	แกนตั้ง	1.395	26.0	15.100
06-07/07/2568	*	*	*	*
07-08/07/2568	แกนตั้ง	1.442	35.0	8.000
08-09/07/2568	แกนตั้ง	1.395	47.0	5.000
09-10/07/2568	แกนตามยาว	1.955	51.0	14.250
10-11/07/2568	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	** ⁽¹⁾	**

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
11-12/07/2568	** (2)	** (2)	** (2)	**
12-13/07/2568	แกนตามยาว	1.514	6.2	5.000
13-14/07/2568	*	*	*	*
14-15/07/2568	แกนตั้ง	1.036	2.4	5.000
15-16/07/2568	แกนตั้ง	1.537	24.0	8.500
16-17/07/2568	แกนตั้ง	1.789	37.0	11.750
17-18/07/2568	แกนตั้ง	2.199	51.0	15.100
18-19/07/2568	แกนตั้ง	1.616	27.0	9.250
19-20/07/2568	แกนตั้ง	1.679	27.0	9.250
20-21/07/2568	*	*	*	*
21-22/07/2568	แกนตั้ง	1.718	14.0	6.000
22-23/07/2568	แกนตั้ง	1.324	39.0	12.250
23-24/07/2568	แกนตั้ง	1.625	22.0	8.750
24-25/07/2568	แกนตั้ง	1.265	45.0	13.750
25-26/07/2568	แกนตามขวาง	1.213	25.0	8.750
26-27/07/2568	แกนตั้ง	1.475	45.0	13.750
27-28/07/2568	*	*	*	*
28-29/07/2568	** (3)	** (3)	** (3)	**
29-30/07/2568	แกนตั้ง	1.436	23.0	8.250
30/07-01/08/2568	แกนตั้ง	1.379	25.0	8.750
01-02/08/2568	แกนตามยาว	1.261	34.0	11.000
02-03/08/2568	แกนตั้ง	1.320	44.0	13.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
03-04/08/2568	*	*	*	*
04-05/08/2568	แกนตั้ง	1.679	27.0	9.250
05-06/08/2568	แกนตั้ง	1.265	45.0	13.750
06-07/08/2568	แกนตั้ง	1.348	11.0	5.250
07-08/08/2568	แกนตามขวาง	1.306	11.0	5.250
08-09/08/2568	แกนตั้ง	1.584	12.0	5.500
09-10/08/2568	แกนตั้ง	1.316	45.0	13.750
10-11/08/2568	*	*	*	*
11-12/08/2568	แกนตั้ง	1.584	41.0	12.750
12-13/08/2568	** ⁽⁴⁾	** ⁽⁴⁾	** ⁽⁴⁾	**
13-14/08/2568	แกนตั้ง	1.332	23.0	8.250
14-15/08/2568	แกนตามขวาง	1.103	20.0	8.000
15-16/08/2568	แกนตามยาว	1.365	45.0	13.750
16-17/08/2568	แกนตั้ง	1.296	57.0	15.400
17-18/08/2568	*	*	*	*
18-19/08/2568	แกนตามขวาง	1.121	48.0	14.500
19-20/08/2568	แกนตามยาว	1.325	51.0	15.100
20-21/08/2568	แกนตั้ง	1.326	41.0	12.750
21-22/08/2568	แกนตั้ง	1.214	41.0	12.750
22-23/08/2568	แกนตั้ง	1.293	39.0	12.250
23-24/08/2568	แกนตั้ง	1.285	58.0	15.800
24-25/08/2568	*	*	*	*

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
25-26/08/2568	แกนตามขวาง	1.136	49.0	14.750
26-27/08/2568	แกนตั้ง	1.111	64.0	16.400
27-28/08/2568	แกนตั้ง	1.860	57.0	15.700
28-29/08/2568	แกนตามขวาง	1.245	28.0	9.500
29-30/08/2568	แกนตามยาว	1.471	36.0	11.500
30/07-01/08/2568	*	*	*	*
01-02/09/2568	แกนตั้ง	1.222	36.0	11.500
02-03/09/2568	แกนตั้ง	1.264	53.0	15.300
03-04/09/2568	แกนตามขวาง	1.326	26.0	9.000
04-05/09/2568	แกนตั้ง	1.048	36.0	11.500
05-06/09/2568	แกนตามขวาง	1.125	44.0	13.500
06-07/09/2568	แกนตั้ง	1.064	47.0	17.250
07-08/09/2568	*	*	*	*
08-09/09/2568	แกนตั้ง	1.032	22.0	8.000
09-10/09/2568	แกนตั้ง	1.116	45.0	13.750
10-11/09/2568	แกนตามยาว	0.845	45.0	13.750
11-12/09/2568	แกนตามขวาง	1.285	6.8	5.000
12-13/09/2568	แกนตั้ง	1.348	50.0	15.000
13-14/09/2568	แกนตามขวาง	1.112	33.0	10.750
14-15/09/2568	*	*	*	*
15-16/09/2568	แกนตั้ง	1.364	46.0	14.000
16-17/09/2568	แกนตั้ง	1.332	26.0	9.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
17-18/09/2568	แกนตามขวาง	1.021	48.0	14.500
18-19/09/2568	แกนตามขวาง	1.032	21.0	7.750
19-20/09/2568	แกนตั้ง	1.490	46.0	14.000
20-21/09/2568	แกนตั้ง	1.162	35.0	11.250
21-22/09/2568	*	*	*	*
22-23/09/2568	แกนตั้ง	0.736	55.0	15.500
23-24/09/2568	แกนตามขวาง	0.965	22.0	8.000
24-25/09/2568	แกนตามยาว	0.825	36.0	11.500
25-26/09/2568	แกนตามขวาง	0.969	25.0	8.750
26-27/09/2568	แกนตั้ง	0.952	57.0	15.700
27-28/09/2568	แกนตั้ง	1.230	45.0	13.750
28-29/09/2568	*	*	*	*
29-30/09/2568	แกนตามยาว	1.471	36.0	11.500
30/09-01/10/2568	แกนตั้ง	1.254	33.0	10.750
01-02/10/2568	แกนตั้ง	1.135	26.0	9.000
02-03/10/2568	แกนตั้ง	1.321	15.0	6.250
03-04/10/2568	แกนตั้ง	1.352	32.0	
04-05/10/2568	แกนตั้ง	1.184	45.0	13.750
05-06/10/2568	*	*	*	*
06-07/10/2568	แกนตามขวาง	1.102	12.0	5.500
07-08/10/2568	แกนตั้ง	0.658	32.0	10.500
08-09/10/2568	แกนตามขวาง	0.985	14.0	6.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
09-10/10/2568	แกนตามขวาง	1.009	10.0	5.000
10-11/10/2568	แกนตั้ง	1.442	28.0	9.500
11-12/10/2568	แกนตามขวาง	1.215	33.0	10.750
12-13/10/2568	*	*	*	*
13-14/10/2568	** ⁽⁵⁾	** ⁽⁵⁾	** ⁽⁵⁾	**
14-15/10/2568	แกนตั้ง	1.244	5.9	5.000
15-16/10/2568	แกนตามยาว	2.175	4.2	5.000
16-17/10/2568	แกนตั้ง	1.365	8.6	5.000
17-18/10/2568	แกนตามขวาง	1.521	32.0	10.500
18-19/10/2568	แกนตามยาว	1.625	35.0	11.250
19-20/10/2568	*	*	*	*
20-21/10/2568	แกนตั้ง	1.021	22.0	8.000
21-22/10/2568	แกนตั้ง	1.251	22.0	8.000
22-23/10/2568	แกนตามขวาง	1.052	37.0	11.750
23-24/10/2568	** ⁽⁶⁾	** ⁽⁶⁾	** ⁽⁶⁾	**
24-25/10/2568	แกนตามขวาง	1.021	33.0	10.750
25-26/10/2568	แกนตามขวาง	1.254	7.3	5.000
26-27/10/2568	*	*	*	*
27-28/10/2568	แกนตั้ง	1.356	47.0	14.250
28-29/10/2568	แกนตั้ง	1.371	26.0	9.000
29-30/10/2568	แกนตามขวาง	0.982	12.0	8.750
30-31/10/2568	แกนตั้ง	0.795	12.0	8.750
31/10-01/11/2568	แกนตั้ง	0.985	14.0	6.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
01-02/11/2568	แกนตามขวาง	1.154	36.0	11.500
02-03/11/2568	*	*	*	*
03-04/11/2568	แกนตามยาว	0.812	34.0	11.000
04-05/11/2568	แกนตามขวาง	0.985	22.0	8.000
05-06/11/2568	แกนตามขวาง	1.119	32.0	10.500
06-07/11/2568	แกนตามขวาง	1.321	43.0	13.250
07-08/11/2568	แกนตั้ง	1.513	26.0	9.000
08-09/11/2568	แกนตั้ง	1.215	33.0	10.750
09-10/11/2568	*	*	*	*
10-11/11/2568	แกนตั้ง	0.957	15.0	6.250
11-12/11/2568	แกนตั้ง	1.151	35.0	11.250
12-13/11/2568	แกนตามขวาง	1.103	19.0	7.250
13-14/11/2568	แกนตั้ง	1.124	11.0	5.250
14-15/11/2568	แกนตั้ง	1.096	5.7	5.000
15-16/11/2568	แกนตามขวาง	1.112	32.0	10.500
16-17/11/2568	*	*	*	*
17-18/11/2568	แกนตามขวาง	0.985	4.6	5.000
18-19/11/2568	แกนตามขวาง	1.011	32.0	10.500
19-20/11/2568	แกนตั้ง	1.102	33.0	10.750
20-21/11/2568	แกนตามขวาง	1.152	18.0	7.000
21-22/11/2568	แกนตามขวาง	0.985	11.0	5.250
22-23/11/2568	แกนตามยาว	0.985	11.0	5.000
23-24/11/2568	*	*	*	*

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
24-25/11/2568	แกนตั้ง	1.032	22.0	8.000
25-26/11/2568	แกนตั้ง	0.995	5.2	5.000
26-27/11/2568	แกนตามขวาง	0.994	4.5	5.000
27-28/11/2568	แกนตั้ง	0.985	44.0	13.500
28-29/11/2568	แกนตั้ง	0.985	45.0	13.750
30/11-01/12/2568	*	*	*	*
01-02/12/2568	แกนตามขวาง	0.956	21.0	7.750
02-03/12/2568	แกนตามขวาง	0.985	45.0	13.750
03-04/12/2568	แกนตั้ง	1.154	33.0	10.750
04-05/12/2568	แกนตั้ง	1.230	45.0	13.750
05-06/12/2568	** ⁽⁷⁾	** ⁽⁷⁾	** ⁽⁷⁾	**
06-07/12/2568	แกนตั้ง	0.828	47.0	14.250
07-08/12/2568	*	*	*	*
08-09/12/2568	แกนตามขวาง	0.956	17.0	6.750
09-10/12/2568	แกนตามขวาง	0.756	47.0	14.250
10-11/12/2568	** ⁽⁸⁾	** ⁽⁸⁾	** ⁽⁸⁾	**
11-12/12/2568	แกนตั้ง	0.985	8.5	5.000
12-13/12/2568	แกนตามยาว	1.121	11.0	5.250
13-14/12/2568	แกนตามขวาง	0.895	41.0	12.750
14-15/12/2568	*	*	*	*
15-16/12/2568	แกนตามยาว	1.012	36.0	11.500
16-17/12/2568	แกนตั้ง	0.985	45.0	13.750
17-18/12/2568	แกนตามขวาง	0.956	12.0	5.500

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
18-19/12/2568	แกนตั้ง	1.111	51.0	15.100
19-20/12/2568	แกนตามขวาง	0.956	4.1	5.000
20-21/12/2568	แกนตามยาว	0.966	5.2	5.000
21-22/12/2568	*	*	*	*
22-23/12/2568	แกนตามยาว	1.215	33.0	10.750
23-24/12/2568	แกนตามขวาง	1.064	33.0	10.750
24-25/12/2568	แกนตามขวาง	1.125	33.0	10.750
25-26/12/2568	แกนตามยาว	1.065	47.0	14.250
26-27/12/2568	แกนตั้ง	1.258	34.0	11.000
27-28/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	**
28-29/12/2568	*	*	*	*
29-30/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	**
30-31/12/2568	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	**
31/12/2568-01/01/2569	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	** ⁽⁹⁾	**

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
21-22/01/2569	แกนตั้ง	0.895	25.0	8.750
22-23/01/2569	แกนตั้ง	0.946	3.8	5.000
23-24/01/2569	แกนตั้ง	1.277	54.0	15.400
24-25/01/2569	แกนตามขวาง	0.962	2.9	5.000
25-26/01/2569	*	*	*	*
26-27/01/2569	แกนตั้ง	0.891	32.0	10.500
27-28/01/2569	แกนตั้ง	0.914	21.0	7.750
28-29/01/2569	แกนตั้ง	1.072	36.0	11.500
29-30/01/2569	แกนตามยาว	0.847	51.0	15.100
30-31/01/2569	แกนตั้ง	0.993	39.0	12.250
31-01/01-02/2569	แกนตั้ง	1.292	42.0	13.000
01-02/02/2569	*	*	*	*
02-03/02/2569	แกนตั้ง	0.985	31.0	10.250
03-04/02/2569	แกนตั้ง	0.954	38.0	12.000
04-05/02/2569	แกนตามขวาง	0.985	51.0	15.100
05-06/02/2569	แกนตามขวาง	0.845	33.0	10.750
06-07/02/2569	แกนตั้ง	1.072	39.0	12.250
07-08/02/2569	แกนตามขวาง	0.845	63.0	16.300
08-09/02/2569	*	*	*	*
09-10/02/2569	แกนตั้ง	0.922	43.0	13.250

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ

ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
10-11/02/2569	แกนตามยาว	1.072	27.0	9.250
11-12/02/2569	แกนตั้ง	1.056	22.0	8.000
12-13/02/2569	แกนตามยาว	0.854	6.2	5.000
13-14/02/2569	แกนตามขวาง	0.987	24.0	8.500
14-15/02/2569	แกนตั้ง	0.875	41.0	12.750
15-16/02/2569	-	*	*	*
16-17/02/2569	แกนตั้ง	1.624	5.2	5.000
17-18/02/2569	แกนตั้ง	0.981	14.0	6.000
18-19/02/2569	แกนตามยาว	1.096	2.8	5.000
19-20/02/2569	แกนตั้ง	1.441	4.4	5.000
20-21/02/2569	แกนตั้ง	1.072	2.9	5.000
21-22/02/2569	แกนตั้ง	0.969	5.2	5.000
22-23/02/2569	-	*	*	*
23-24/02/2569	แกนตั้ง	0.845	6.5	5.000
24-25/02/2569	แกนตามขวาง	0.966	4.7	5.000
25-26/02/2569	แกนตามขวาง	0.956	5.6	5.000
26-27/02/2569	แกนตามขวาง	0.854	9.6	5.000
27-28/02/2569	แกนตามขวาง	0.875	5.6	5.000
28/02-01/03/2569	แกนตามขวาง	0.985	44.0	13.500
24-25/03/2569	แกนตามยาว	0.997	2.4	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (ติดกับห้องเช่า 2 ชั้น เลขที่ 64)			
	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/ss)
25-26/03/2569	แกนตามยาว	1.159	4.3	5.000
26-27/03/2569	แกนตั้ง	0.956	6.0	5.000
27-28/04/2569	แกนตั้ง	0.874	2.1	5.000
28-29/04/2569	แกนตั้ง	0.885	7.4	5.000
29-30/04/2569	แกนตามขวาง	0.854	4.2	5.000
20-21/05/2569	แกนตามยาว	0.854	7.1	5.000
21-22/05/2569	แกนตามยาว	0.965	9.5	5.000
22-23/05/2569	แกนตามขวาง	0.884	4.1	5.000
17-18/06/2569	แกนตามขวาง	1.036	11.0	5.250
18-19/06/2569	แกนตามยาว	0.967	10.0	5.000
19-20/06/2569	แกนตามขวาง	0.956	7.4	5.000

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่พบค่าการสั่นสะเทือน

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.6-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด										
	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มาตรฐาน
pH	7.6	6.9	8.2	8.0	7.2	8.3	7.6	7.2	*	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	256	222	452	398	153	136	144	150	*	143	≤ 1,000
Total Suspended Solids	< 5.0	< 5.0	30.8	28.9	< 5.0	< 5.0	< 5.0	13.9	*	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	< 2.0	15.3	13.3	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	*	< 2.0	≤ 30
Sulfide	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	*	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	*	< 0.1	≤ 0.5
Fat, Oil and Grease	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	*	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	< 0.28	<1.00	2.44	2.44	1.79	1.21	1.84	1.01	*	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria	1.8	< 1.8	1.8	1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	*	< 1.8	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	Not Detected	Not Detected	Not Detected	*	Not Detected	≤ 1,000

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567, อาคารประเภท ข

หมายเหตุ : ND หมายถึง วิเคราะห์ไม่พบ

* ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากโครงการดำเนินการถมบ่อน้ำทิ้งเพื่อปรับระดับพื้นดิน

- ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากโครงการยังไม่ได้ดำเนินการขุดทำบ่อน้ำทิ้ง



ตารางที่ 4.1.6-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด										
	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	ต.ค 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	มาตรฐาน
pH	7.6	7.9	7.8	7.3	8.1	7.2	8.2	7.4	7.6	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	120	156	163	190	219	142	193	166	139	174	≤ 1,000
Total Suspended Solids	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	< 2.0	< 2.0	2.7	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 30
Sulfide	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	≤ 0.5
Fat, Oil and Grease	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	≤ 1,000

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567, อาคารประเภท ข

หมายเหตุ : ND หมายถึง วิเคราะห์ไม่พบ

* ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากโครงการดำเนินการถมบ่อน้ำทิ้งเพื่อปรับระดับพื้นดิน

- ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากโครงการยังไม่ได้ดำเนินการขุดทำบ่อน้ำทิ้ง



ตารางที่ 4.1.6-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด						
	มกราคม69	กุมภาพันธ์69	มีนาคม69	เมษายน69	พฤษภาคม69	มิถุนายน69	มาตรฐาน
pH	8.8	8.0	7.8	7.8	7.9	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	158	242	248	112	142	228	≤ 1,300
Total Suspended Solids	11.6	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 50
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 40
Sulfide	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-
Oil and Grease	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 40
Total Coliform Bacteria	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	Not Detected	-


หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567, อาคารประเภท ค

หมายเหตุ : ND หมายถึง วิเคราะห์ไม่พบ



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

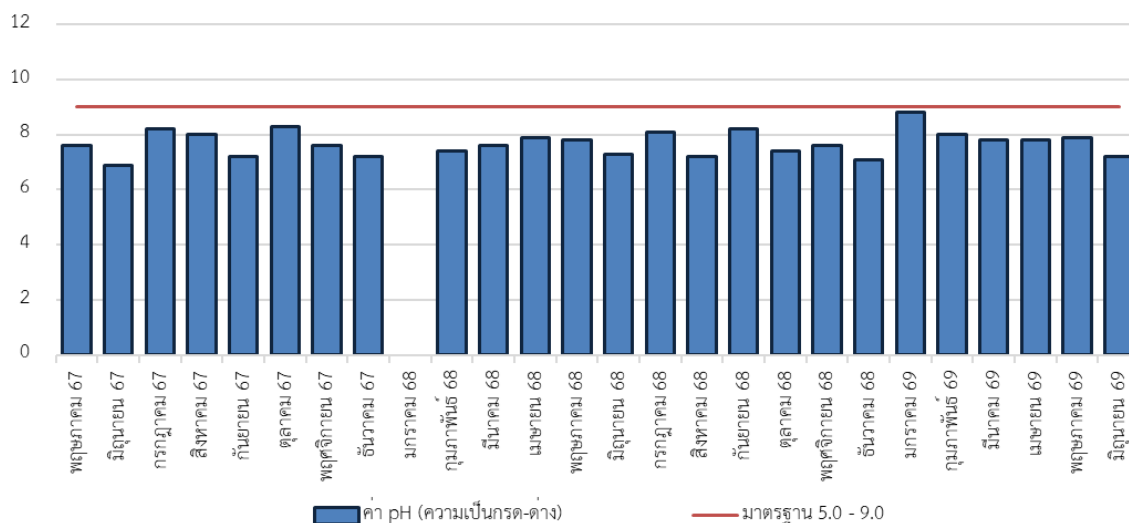


ภาพที่ 4-29 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

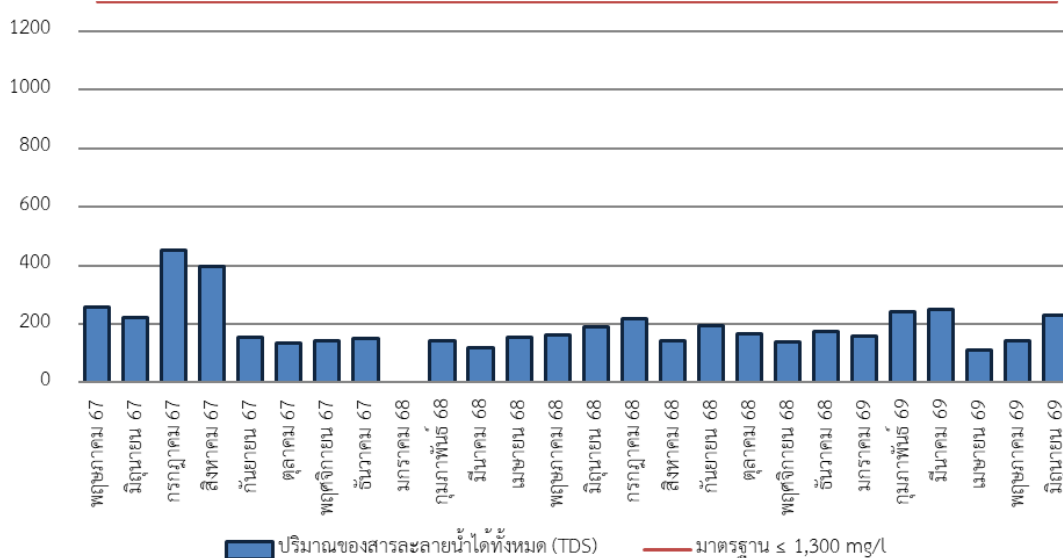


ภาพที่ 4-30 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

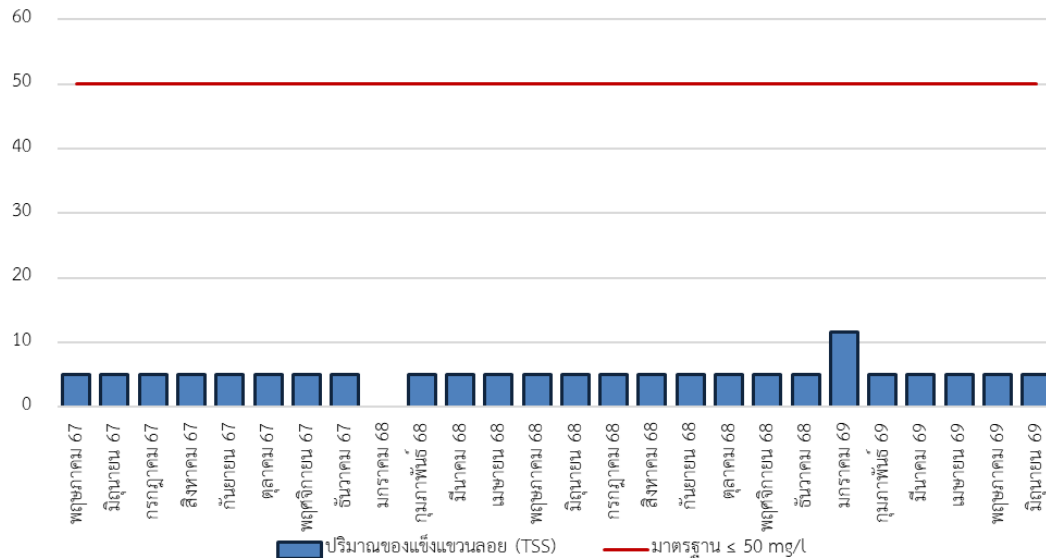


ภาพที่ 4-31 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

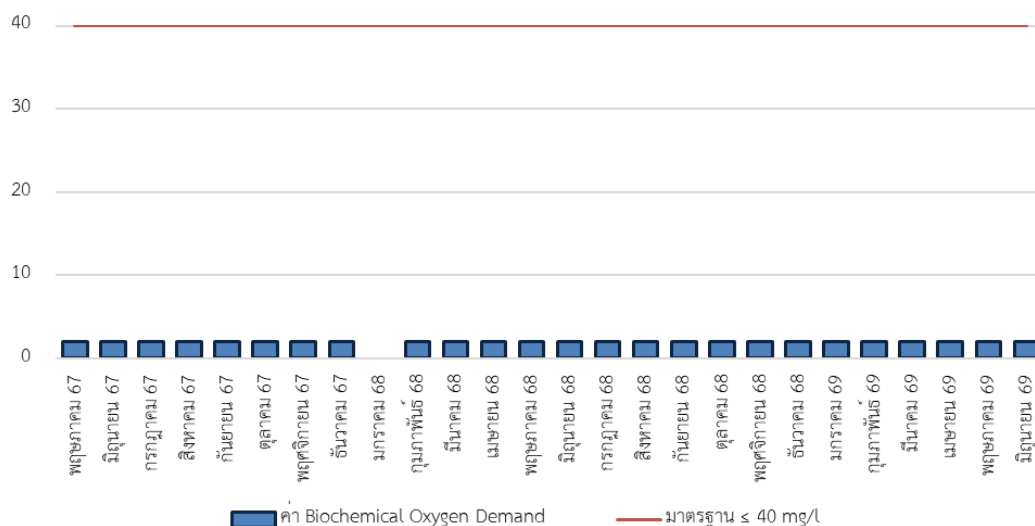


ภาพที่ 4-32 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

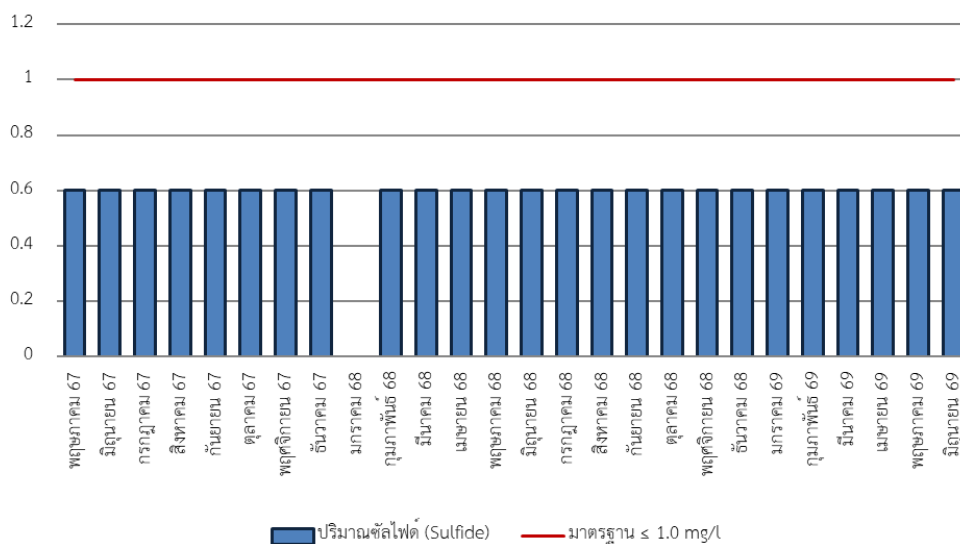


ภาพที่ 4-33 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของตะกอนหนัก (Settable Solids)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

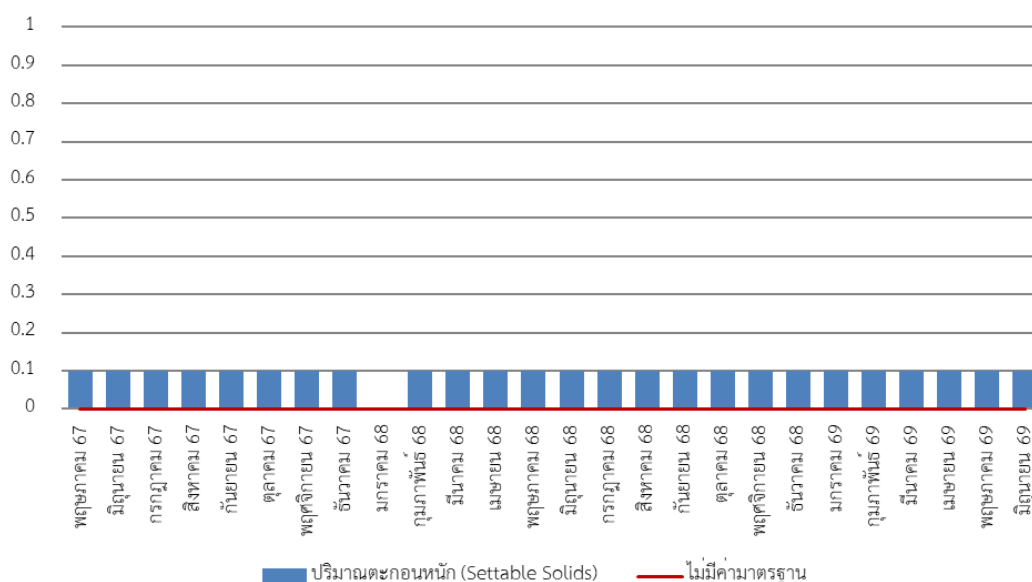


ภาพที่ 4-34 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

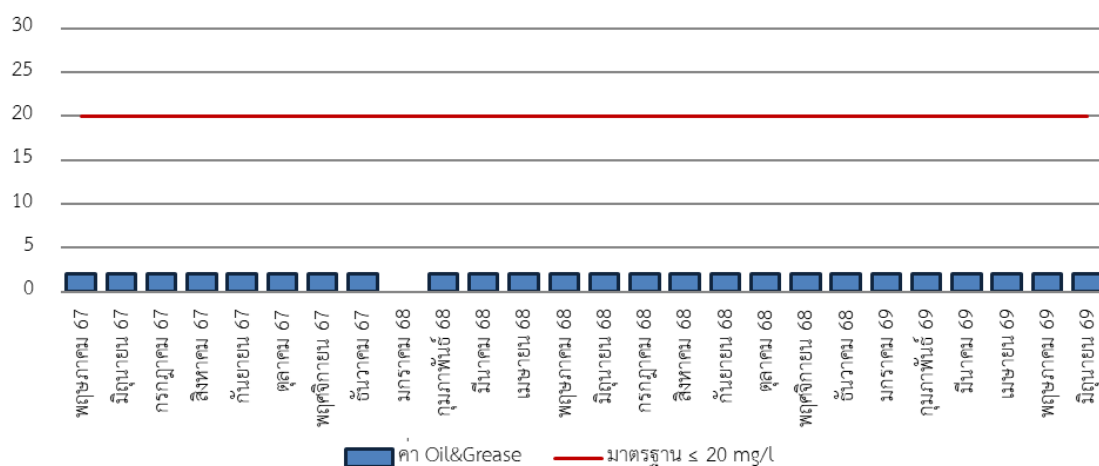


ภาพที่ 4-35 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

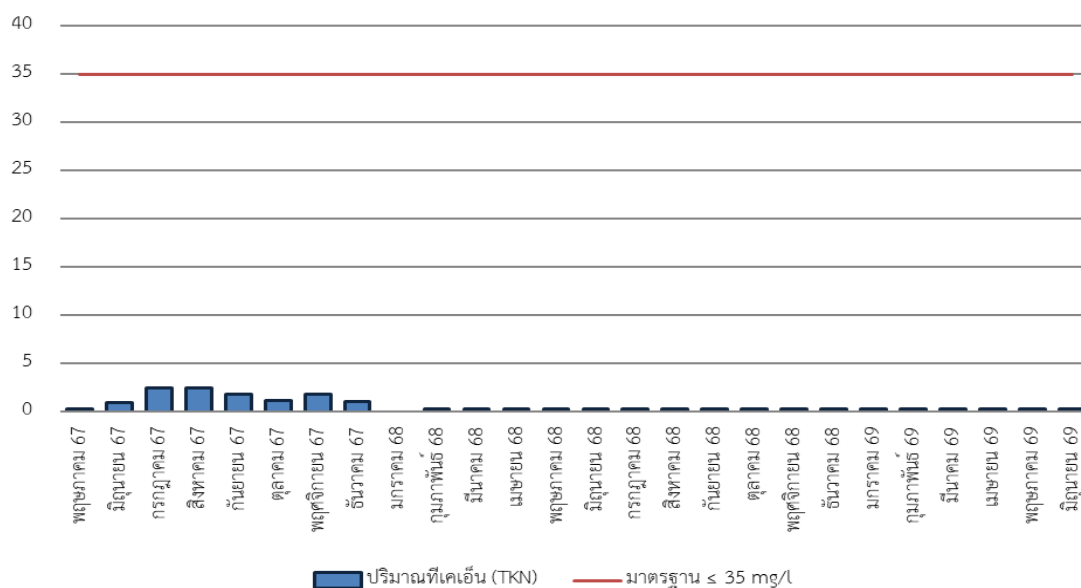


ภาพที่ 4-36 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

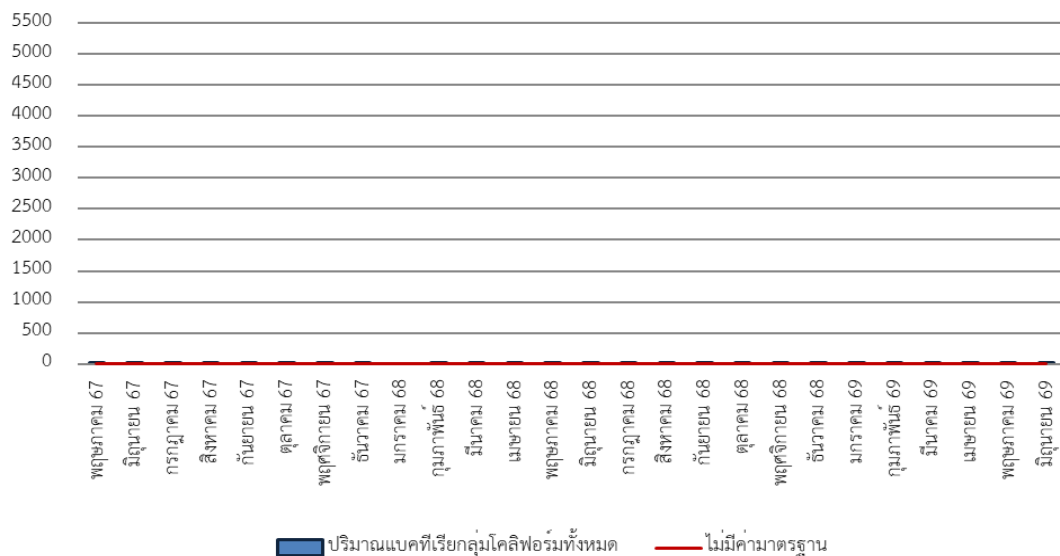


ภาพที่ 4-37 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

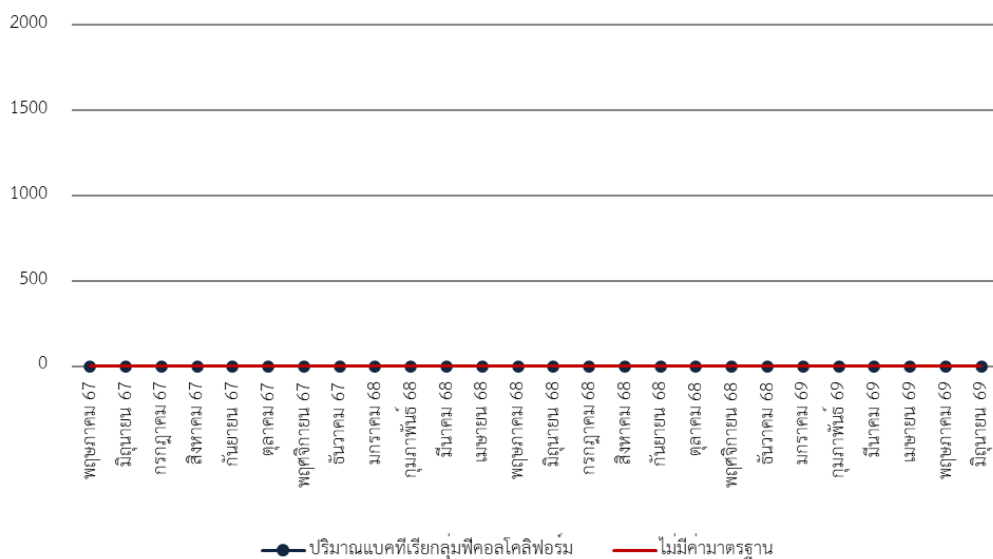

ภาพที่ 4-38 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (F)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 / 099-1599979

Email : tnp.envi@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th

