

[illegible]

PLUS+ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด				
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลี้ภัย				
Document No.	SOP-PMR-047	Revision	02	Update Date 01/06/2023
Head of Department	(คอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ และหอพัก) ฝ่ายบริหารอาคารที่			
QMR/FMR/EMR Approve	ตัวแทนฝ่ายบริหารหน่วยงานกลุ่มภาพ, รักษาการผู้อำนวยการ และการจัดการสิ่งแวดล้อม			

รายการแก้ไขเอกสาร			
แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร พร้อมกันเพื่อเพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เห็นด้วยเห็น FMR Approve, เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C, เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณสุเมธรา เป็นคุณณัฏฐ์ ชาญวัฒนาวิบูล, เพิ่ม Footer และลงนาม
02	DAR-PMR-064	01/06/2023	เห็นรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเห็น ข้อนอนการปฏิบัติงานรูปแบบ Flow

ชั้น ตอน ที่	หัวข้อ/รูป สื่อ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับแจ้งเหตุฯ ลิฟต์ค้าง	1.1 ฝ่ายจัดการ / รปภ. รับแจ้งเหตุฯลิฟต์ที่ค้าง 1.2 ฝ่ายจัดการ /ช่างประจำหน่วยงาน / รปภ. สอบถาม ผู้โดยสารในลิฟต์ว่า อยู่ชั้นใดและลิฟต์ค้างที่ไว้ที่ใด Intercom และพูดขอผู้โดยสารมาไว้ที่ถอยหลัง หัวหน้างาน งานก็จะพาช่างเข้าไปแก้ไขที่จุดเหตุ	ทันทีที่ได้รับ แจ้ง	N/A	-BM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	
2	เข้าดำเนินการให้ ความสงบเรียบร้อย ติดอยู่ในลิฟต์	ช่างประจำหน่วยงาน/ทีมวิศวกรปฏิบัติงานเข้าใช้การซ่อมลิฟต์ 2.1 กรณีลิฟต์ค้าง 1) ช่างประจำหน่วยงาน เข้าตรวจสอบและหาจุดหยุดลิฟต์ โดย ใช้วิทยุขอเปิดประตูลิฟต์ที่ติดอยู่โดยสามารถส่งผู้โดยสารได้ 2) ดำเนินการถอดสายข้อ 2 2.2 กรณีลิฟต์เข้าชั้นที่ติดอยู่ค้าง <u>กรณีลิฟต์ติดอยู่ระหว่างชั้น</u> 1) ช่างประจำหน่วยงาน เปิดประตูลิฟต์ เพื่อส่งผู้โดยสาร ออกจากลิฟต์โดยทันที 2) ปิดประตูลิฟต์ และเปิด Circuit Breaker คือป้ายลิฟต์ ที่ติดอยู่เพื่อป้องกันผู้โดยสารใช้ลิฟต์ <u>กรณีลิฟต์ติดอยู่ระหว่างชั้น</u> 1) ช่างประจำหน่วยงาน เปิดประตูลิฟต์ และเปิด Circuit Breaker คือป้ายลิฟต์ที่ติดอยู่เพื่อป้องกันผู้โดยสารใช้ลิฟต์ และแจ้งผู้โดยสารในลิฟต์ว่ารอจนเสร็จจากชั้นที่ติดอยู่ให้รอขึ้น ลิฟต์จากชั้นโดยสาร ผ่านทาง Intercom และพูดขอผู้โดยสาร ความไว้ใจที่ถอยหลัง 2) BM/ช่างประจำหน่วยงาน แจ้งแจ้งช่างดูแลลิฟต์ เข้ามา ซ่อมเพื่อลดความไม่ปลอดภัยนั้น หากติดอยู่ได้ หรือ ผู้ติด อยู่ลิฟต์ที่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่ดีที่มีอาการทางกายให้ แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร.199 และแจ้งแจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669 หรือ 1666 เพื่อขอความช่วยเหลือ 3) หัวหน้างาน ช่างประจำหน่วยงานที่ ช่างประจำหน่วยงาน ประจำอยู่ที่บริเวณนั้น 30-40 นาทีตามปกติ เพื่อให้หากเกิด เหตุฉุกเฉินได้ทันที 4) ช่างปฏิบัติงานเสร็จ ช่างผู้โดยสารรอรถจากลิฟต์โดยทันที	ทันทีที่พบ เหตุ/ลิฟต์ค้าง	N/A	ช่างประจำ หน่วยงาน/ จนท.รปภ.	ช่างประจำ หน่วยงานต้อง พร้อมจะรับมือ และต้องได้รับ อนุญาตจาก บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลิฟต์ได้ หาก ไม่อนุญาตก็ ต้องเข้ามาทำ ได้ขาด
3	การจัดการทั้ง สามารถช่วยเหลือ เมื่อ เกิดเหตุที่ต่าง ได้	3.1 BM/ช่างผู้ดูแล และผู้ปฏิบัติงานลิฟต์ แก้ไขเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 3.2 หากลิฟต์ติดอยู่และประตูเปิด ให้ดำเนินการแจ้งบริษัท ที่ 3 ช่างผู้ดูแล /ช่างประจำหน่วยงานตั้งในลิฟต์แจ้งบริษัท ขอเปิดลิฟต์ประจำหน่วยงาน 3.4 สอบถามและสรุปให้พนักงานประจำโรงจอดรถทราบ ภายใน 3 วัน	หลังจาก ช่างเหตุลิฟต์ ที่ติดอยู่ลิฟต์	1. FORM-PMR- 054 ใบแจ้งเห ต 2. FORM- PMR- 056 สรุปเหตุ ประจำ หน่วยงาน	-BM -ฝ่ายจัดการ -ช่างประจำ หน่วยงาน	
4	การแจ้งหัวหน้างาน ตามขั้นตอน	4.1 BM /ช่างประจำหน่วยงานที่ได้รับแจ้งปัญหาความเสียหาย และช่างประจำหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเหตุฯผิดปกติทางระบบลิฟต์ โดยทางบริษัทผู้รับ 4.2 ฝ่ายจัดการ จัดรับรายงานการปฏิบัติงานตามแจ้งเข้ามา หรือ ให้ผู้จัดการซ่อมหน่วยงาน	ภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ	FORM-PMR- 137 แบบฟอร์ม รายงาน เหตุการณ์ ฉุกเฉิน	-BM -ฝ่ายจัดการ	

[illegible]

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการแก้ไขเอกสาร			
แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/11/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรายละเอียดสาร พร้อมเก็บเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานใช้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มตำแหน่ง FMR Approve เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C, เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากศูนย์กัญชามีติกาชุมชน เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ ปลอดภัย, เพิ่ม Footer และลายน้ำ
02	DAR-PMR-063	01/06/2023	เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบ Flow

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+					
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด					
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุต่างๆในพื้นที่โครงการ					
Document No.	SOP-PMR-048	Revision	03	Update Date	01/06/2023
Head of Department	(คอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์) และทาวนเฮ้าส์) ... ฝ่ายบริหารอาคารที่โครงการต่างจังหวัด)				
QMR/FMR/ EMR Approve	(				
ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ, ทรัพยากรคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม					

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการะบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิชาการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุพิพาทร่วมกันในพันธกิจโครงการ
- 1.3 เพื่อรักษามาตรฐานสำหรับควบคุมผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการเหตุน้ำท่วมภายในโครงการ จนเข้าสู่สภาวะปกติ ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินค้าใหม่ทดแทน
3.2 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุหน้าท่วม ในพื้นที่โครงการ	Document No.	SOP-PMR-048
			Revision	03
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Update Date	01/06/2023
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR		Page	Page 1 of 4

CODE	ORANGE					
ชั้นศูนย์ที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	พนักงาน หรือ ได้รับแจ้งเหตุพบเห็นภายในโครงการ	1.1 ฝ่ายจัดการ/ รป.บ. พนักงาน หรือ ได้รับแจ้งจากลูกจ้างภายในโครงการ 1.2 ฝ่ายจัดการ/ รป.บ. เข้าตรวจสอบทันทีเพื่อหาสาเหตุ นำทีมและจัดการตามแนวปฏิบัติ 1.3 BM/V/M แจ้ง OM, SSI ให้ทราบ และรายงานผลให้ทราบเป็นต้น	ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/V/M -ฝ่ายจัดการ -รป.บ.	ทุกโครงการต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันทันที
2	การจัดการเหตุพบเห็นภายในโครงการ	กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 1) ฝ่ายจัดการ/ รป.บ. เข้าดำเนินการจัดแนวเขตห้ามสัญจร และวางรถสอบหมายติดกับบริเวณ จักรรถเคลื่อนย้ายสารเคมี, ขยะอันตรายและใช้ปั๊ม น้ำยาล้างเพื่อป้องกันคนละอองหรือสารเคมีเข้าตาได้ 2) ฝ่ายประจำหน่วยงาน แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ คอยติดตามความคืบหน้าการดำเนินการรายงานทุก 10 นาทีรวมทั้งการนำรถฉีดน้ำเพื่อฉีดล้างภายใน 3) กรณีมีปริมาณน้ำเกินความเหมาะสม จะต้องเปิดปั๊มติดี 4) พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี และแจ้งลูกจ้างให้ไปอยู่จุดที่พอจะปลอดภัยแล้ว (อาจจากหน่วยบรรเทาทุกข์ เช่น กรณีถังแก๊สและบรรเทาสารเคมี/รถบรรทุก)	ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้ง	N/A	-ฝ่ายประจำหน่วยงาน / รป.บ. -ฝ่ายจัดการประจำโครงการ -ทีม SSI	
		3.2) กรณีลูกค้าที่มีผู้รับผิดชอบฝ่ายจัดการต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการให้มีการยกเลิกพื้นที่การกักกันโรคโควิด (COVID19) ดัชนีแจ้งให้เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ) PPE 3.3) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องมีการรายงานเหตุให้ได้รับทราบ เพื่อแจ้งความและขอใช้เจ้าหน้าที่การเคลื่อนย้าย 3.4) ฝ่ายจัดการต้องทราบรายละเอียดที่ถูกต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่จุดใหม่ เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกจ้าง 3.5) ทีม SSI ต้องแจ้งให้พนักงานทราบความผิดปกติภายในโครงการ เพื่อป้องกัน/โครงการ และให้การช่วยเหลือลูกค้าที่มีผู้รับผิดชอบเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการ 3.6) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝ่ายจัดการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดทุกข้อปฏิบัติโครงการที่มีผลใช้ โดยแจ้งผ่านช่องทาง Home Service Application				
		กรณีเกิดเหตุการรั่วไหลของสารเคมี 1) ฝ่ายจัดการ/ รป.บ. เข้าดำเนินการจัดแนวเขตห้ามสัญจร และวางรถสอบหมายติดกับบริเวณ และใช้ปั๊มน้ำยาล้าง อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานเพื่อหาสาเหตุ และให้ทางประจำหน่วยงานเร่งรีบนำชุดไปฉีดน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาลุกลาม เช่น ใช้น้ำล้างน้ำ และปิดระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันคนละอองสารเคมีเข้าตาได้ สารเคมีที่รั่วซึมดำเนินการแก้ไขทาง หมายเหตุ กรณีที่อุปกรณ์ป้องกันภายในโครงการไม่สามารถใช้งานได้ ควรอพยพไปยัง PMS ที่ประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งโดยงบประมาณค่าใช้จ่ายทันที				
3	การจัดการเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะฉุกเฉิน	1) ฝ่ายจัดการ/ ส.ร.บ. และ ส.ร.บ.ประจำพื้นที่ได้รับแจ้งเตือน ส่งให้ PAM, OM, SSI 2) ฝ่ายจัดการดำเนินการในการจัดการกับเหตุแจ้งให้ลูกค้าทราบ	ภายใน 24 ชม.	1. SOP-PMR-033 วิธีการตอบสนองถึงไม่พบเหตุ	-BM/V/M -ฝ่ายจัดการ -ฝ่ายประจำ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต


PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม ในพื้นที่โครงการ	Document No.	SOP-PMR-048
			Revision	03
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Update Date	01/06/2023
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR		Page	Page 2 of 4

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ (ต่อ)

CODE	ORANGE				
ชั้น ตอน ที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ
		3.3 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ดำเนินการติดตั้งและจัดทำเอกสารส่งให้กับบริษัทประกันโดยด่วนภายใน 24 ชม. (หากมี) 3.4 ฝ่ายจัดการดำเนินการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยปฏิบัติตาม SOP-PMR-070 การบริหารจัดการขยะ	ภายใน 24 ชม.	2. SOP-PMR-070 การบริหารจัดการของเสีย	
4	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	4.1 BM/VM รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.2 ฝ่ายจัดการ จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าเพิ่มกลาง หรือ โดฟท์กลางของหน่วยงาน 4.3 ฝ่ายจัดการ ติดตาม แก้ไข จนกว่าจะเข้าสู่สภาพปกติ	ภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ	1. ใบเสนอค่า สินไหมทดแทนที่มี BM/VM ลงนาม 2. FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงาน เหตุการณ์ฉุกเฉิน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ - ฝ่ายประจำ หน่วยงาน

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม ในพื้นที่โครงการ	Document No.	SOP-PMR-048
			Revision	03
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Update Date	01/06/2023
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR		Page	Page 3 of 4

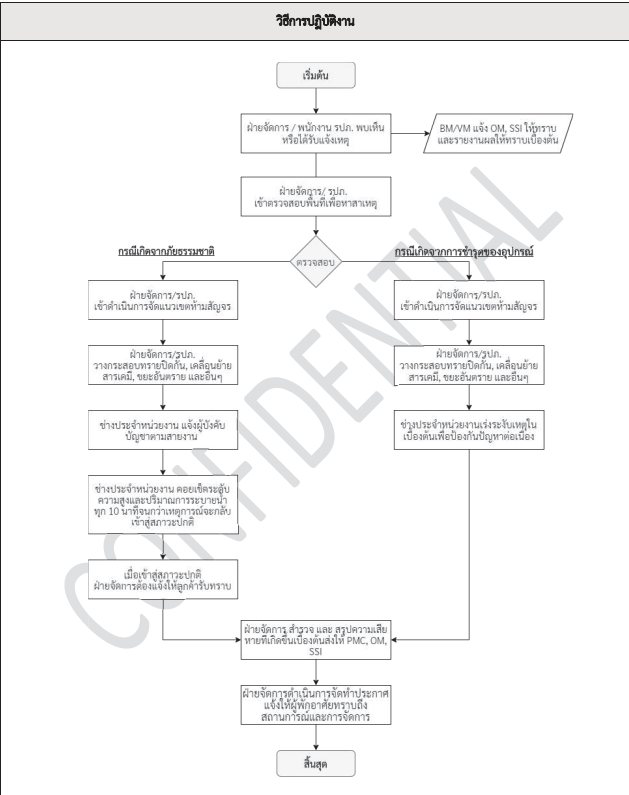

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม ในพื้นที่โครงการ	Document No.	SOP-PMR-048
			Revision	03
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Update Date	01/06/2023
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR		Page	Page 4 of 4

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-002	29/07/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร พร้อมกันเพิ่มแผนรายการเลือดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-002	08/10/2021	เพิ่มตำแหน่ง FRM Approve, เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C, เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณกฤติยา มีดีการุณย์ เป็น คุณเลขาภรณ์ พันธ์วัฒน์วิจิตร, เพิ่ม Footer และลายน้ำ
02	DAR-PMR-042	09/02/2022	เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเพิ่มความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่ภายในโครงการและการจัดการกับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในการจัดการเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ และเพิ่มตำแหน่ง EMR Approve
03	DAR-PMR-064	01/06/2023	เพิ่ม วิธีการปฏิบัติงานรูปแบบ Flow

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

PLUS+					
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด					
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว					
Document No.	SOP-PMR-050	Revision	03	Update Date	15/10/2025
Head of Department	(คอนโดมิเนียมและ... และทาวเวอร์ห้าห้า) ฝ่ายบริหารอาคารที่... ปรกการต่างจังหวัด)				
QMR/FMR/EMR Approve	ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม				

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการะบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุผลอื่น ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าติดตามและจัดการหลังเหตุแผ่นดินไหวสูง ในทุกโครงการ (C, HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน
SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยด่วน

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

CODE ORANGE						
ขั้นตอนที่	ท้ายข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับแจ้งสถานการณ์เตือนแผ่นดินไหว (Information) Phase : Before (ก่อน)	1.1 ฝ่ายจัดการ ได้รับทราบจากทีมเตือนแผ่นดินไหวจากหน่วยงานราชการ หรือแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast หรือใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย (Emergency Response Team) 1.2 BM/VM ฝ่ายจัดการ ประกาศเตือนให้ลูกบ้านเตรียมพร้อม และติดตามข่าวสารต่อเนื่องในจากหน่วยงานราชการ หรือแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast หรือใช้แอปพลิเคชันของกรม (Emergency Response Team) 1.3 BM/VM รายงานผลให้ OM ทีม SSI และทีมดูแลนิคมขององค์กร (Emergency Response Team) รายงานเบื้องต้น หมายเหตุ: กรณี ที่ไม่สามารถรับทราบการแจ้งเตือนได้ ทีมงานควรตั้งชื่อเป็นวันทำการตามข้อ 6	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM ฝ่ายจัดการ	ประกาศทางอาคารเพื่อแจ้งลูกบ้านทราบ ตรวจสอบรายการรายชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทีม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กลุ่มผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร แผนกวิศวกรรม ศูนย์นิคม หรือในอุปกรณ์ขององค์กร
2	การเตรียมความพร้อม (Preparedness) Phase : Before (ก่อน)	2.1 BM/VM จัดทำประกาศแจ้งลูกบ้านโดยให้ Template ตามที่กำหนด และทำการประกาศตามช่องทางสื่อสารเข้าถึงได้ เพื่อให้ลูกบ้านทราบสถานการณ์ แผนแนวทางการปฏิบัติงานปลอดภัยจากอันตราย เพื่อเตรียมพร้อมอพยพไปรวมตัวที่จุดรวมพล (Assembly Point) ที่กำหนดไว้ 2.2 ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบสายสัญญาณไฟฟ้าภาคใต้ในโครงการ และขอให้ลูกบ้านปฏิบัติตามคำแนะนำของทีม SSI หรือบุคลากรจากหน่วยงานราชการภายนอก (นอก) ปี พ.ร.บ.1784 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อทรัพย์สิน กรณีได้รับการ "แจ้งเตือน" ให้หยุดปฏิบัติงานชั่วคราว "แจ้งเตือน" หรือ "ปิดพื้นที่" บริเวณเชื่อมระหว่างส่วนประกอบ ส่วนนิคมภาคตะวันออก 3 กรณี "ไม่ปกติ" หยุดปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ตามข้อ 6	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	Template ประกาศสื่อสาร	-BM/VM ฝ่ายจัดการ	ตรวจสอบสถานะการสื่อสาร เช่น Application / Line Group หรือข้อมูลทางอื่นๆ อีก
3	การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน (Emergency Alert) Phase : Before (ก่อน)	BM/VM ประกาศแจ้งลูกบ้านโดยให้ Template ตามที่กำหนด พร้อมรับทราบจากหน่วยงานราชการ แจ้งเข้าถึงได้ เพื่อให้ลูกบ้านทราบสถานการณ์และดำเนินการตามหน้าที่ซึ่ง	หลังจากได้รับแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว	Template ประกาศสื่อสาร	-BM/VM ฝ่ายจัดการ	กรณีที่ผู้ควบคุมห้องควบคุม (Fire Alarm) ไม่สามารถเปิดเสียงเตือนได้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมอาคาร ช่างเดินสายสื่อสาร ช่างเดินสายโทรคมนาคม ช่างเดินสายไฟ ช่างเดินสายประปา ช่างเดินสายปรับอากาศ ช่างเดินสายลิฟต์ ช่างเดินสายเครื่องปรับอากาศ ช่างเดินสายเครื่องปรับอากาศ

[illegible]


เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

```

graph TD
    Start([เริ่มต้น]) --> Step1[ฝ่ายจัดการ ได้รับแจ้งว่าการเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว]
    Step1 --> Step2[BMA/M ฝ่ายจัดการ ประกาศเตือนภัยฉุกเฉิน หรืออพยพ และสื่อสารการแจ้งเตือนให้ทราบของสถานการณ์]
    Step1 --> Box1["- หน่วยงานราชการ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ / กองฉีกรับรู้และแจ้งเหตุการฉุกเฉินแห่งชาติ) - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเหตุการณ์ฉุกเฉินขององค์กร (Emergency Response Team)"]
    Step2 --> Step3[BMA/M รายงานผลให้ OM, ทีม SSI และทีมฉุกเฉินขององค์กรทราบถึงผล]
    Step3 --> Step4[BMA/M จัดทำประกาศแจ้งเตือนภัยให้ Template ตามที่กำหนด]
    Step4 --> Box2[Template ประกาศภัยพิบัติ]
    Step4 --> Step5[BMA/M ประกาศตามแผนการที่ระบุไว้ตามจุดชี้แจงให้เตือนให้รู้ทั่วถึงกับสถานการณ์ และนำคำกล่าวขานกล่าวขอปล่อยผู้บาดเจ็บกลับสู่ศูนย์เตือนภัยและอพยพไปรวมกันที่จุดรวมพล (Assembly Point) ให้ทราบแล้ว]
    Step5 --> Box3["- Application - Line Group - ช่องทางอื่นๆ"]
    Step5 --> Step6[ฝ่ายจัดการตรวจสอบรายชื่อ จำนวนผู้หายากในโครงการ และนำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งทีมงานด้านบรรเทาสาธารณภัย (งบฯ โครงการ 1784 เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
    Step6 --> End((1))
  
```

[illegible]

เอกสารฉบับนี้ภายใน บริษัท พลิัส หรือเพอร์ตี จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาต

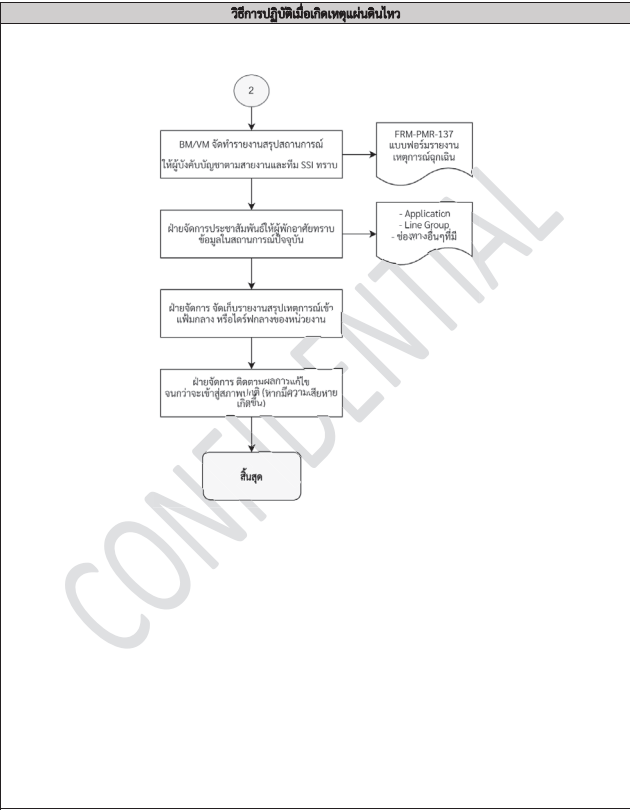

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตารางที่ 1 : ข้อมูลแสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity)

อันดับ	ความสั่นไหว	ลักษณะความรุนแรง / ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ระดับสีสัญญาณ
I	ไม่รู้สึก (Not felt)	เป็นอันดับที่อ่อนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ	
II	อ่อนมาก (Very slight)	พอรู้สึกได้สำหรับผู้ที่อยู่สูง ๆ ในอาคารสูง ๆ	
III	เล็กน้อย (Weak)	พอรู้สึกได้สำหรับผู้อยู่ในบ้าน แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก	
IV	เบา (Light)	ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่ามีบ้านสั่นไหว	
V	ปานกลาง (Moderate)	รู้สึกเกือบทุกคน ของในบ้านเริ่มแกว่งไกว	
VI	แรง (Strong)	รู้สึกได้กับทุกคนของหนักในบ้านเริ่มเคลื่อนไหว	
VII	แรงมาก (Very strong)	ทุกคนต่างหวาดใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มปรากฏความเสียหาย	
VIII	รุนแรง (Severe)	เสียหายค่อนข้างมากในอาคารธรรมดา	
IX	รุนแรงมาก (Violent)	สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดี เสียหายมาก	
X	ร้ายแรงที่สุด (Extreme)	อาคารพัง ราบราบไปโดย	
XI	ร้ายแรงที่สุด (Extreme)	อาคารสิ่งก่อสร้างพังหลายเกือบทั้งหมด ทั่วโลกถูกยุบและเลื่อนเป็นคลื่นบนพื้นดินอ่อน	
XII	ร้ายแรงที่สุด (Extreme)	ทำลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน	

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา / USGS

ตารางที่ 2 : เบอร์ติดต่อฉุกเฉินหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)	1784	ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงมหาดไทย		
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (สายการปฏิบัติการ บางมด)	02-399-4114	ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ (ตม.) กรมอุตุนิยมวิทยา	1182 กด 0 กด 4 หรือ 02-366-9410, 02-399-0969, 02-399-4547 กด 6381	ตลอด 24 ชั่วโมง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์บัญชาการ)	1669	ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

รายการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-003	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรหัสเอกสาร เพิ่มเนื้อหาและขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับเหตุการณ์ พร้อมเพิ่มเพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มตำแหน่ง FRM Approve , เปลี่ยน FRM-PMR เป็น PMR-C, เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณกฤติยา มีลีลาญจน์ เป็นคุณเชษฐาดี พลรัตน์ศิริกุล, เพิ่ม Footer และลายน้ำ
02	DAR-PMR-063	01/06/2023	เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบ "Flow"
03	DAR-PMR-090	15/10/2025	ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบ Before / During / After

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบ พส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ที คอนโด แบบบี ร้อยรพ รวชทุกฯ-เจริญ13

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 398 หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : ราชพฤกษ์ แขวง/ตำบล : บางมด เขต/ตำบล : เขตภาษีเจริญ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 586

สังกัด : การทะเล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : นมคยฯ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

วันที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เจ้าของบริษัทหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ นมคยฯ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ นมคยฯ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 48.00 ลบ.ม./วัน

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 48.00 ลบ.ม./วัน

3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 48.00 ลบ.ม./วัน

4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 48.00 ลบ.ม./วัน

5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 48.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [] แบบต่อเนื่อง [X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ3/5)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี [] เครื่องสูบลอยตัว [] อื่นๆ [] อื่นๆ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองและพนักงานบริษัท เจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียมีหน้าที่สังเกตผลดี ผลร้าย หรือไม่พบทั้งปวงที่หรือรายงานตามตาราง ๔๐ ต้องรายงานข้อมูลไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๑๖
๒. ผู้ครอบระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานแต่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๑๗

```
graph TD; A[น้ำดิบจากคลองบางกอกใหญ่] --> B[บ่อดักไขมันจากห้องครัว]; B --> C[บ่อกระตะจากห้องน้ำ]; C --> D[บ่อดกตะกอนและน้ำจากธรรมชาติ]; D --> E[บ่อเติมอากาศ]; E --> F[บ่อเติมอากาศ 2]; F --> G[บ่อ Sludge Return]; G --> H[บ่อน้ำทิ้งออกคลองบางกอกใหญ่]; G --> I[คลองบางกอกใหญ่]; I --> J[คลองบางกอกใหญ่];
```

The flowchart illustrates the wastewater treatment process at the Bangkok Waterworks. It begins with raw water from the Bangkok Canal (น้ำดิบจากคลองบางกอกใหญ่) entering a primary sedimentation tank (บ่อดักไขมันจากห้องครัว). The effluent then moves to a secondary sedimentation tank (บ่อกระตะจากห้องน้ำ), followed by a tertiary sedimentation tank (บ่อดกตะกอนและน้ำจากธรรมชาติ). The water then enters an aeration tank (บ่อเติมอากาศ), which feeds into a second aeration tank (บ่อเติมอากาศ 2). The effluent from the second aeration tank goes to a sludge return tank (บ่อ Sludge Return). From this tank, some sludge is recycled back to the tertiary sedimentation tank, while the rest is discharged into the Bangkok Canal (บ่อน้ำทิ้งออกคลองบางกอกใหญ่). The final effluent is discharged into the Bangkok Canal (คลองบางกอกใหญ่).

น.3/23

[illegible]

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองบางเชือกหนัง
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 4,189.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้เข้าทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 3,127.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 3,064.500 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งเก่าแก่มีหน้าที่ช่วยควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับสถิติ ข้อมูล หรือแนวโน้มทางสถิติหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องรายงานให้เจ้าพนักงานเก็บเงินหนึ่งเดือน หรือปีแล้วเก็บเงินหนึ่งบาท หรือทั้งห้าถึงแปดบาทตามตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ จะต้องรายงานให้เจ้าพนักงานเก็บเงินห้าปี หรือปีแล้วเก็บเงินหนึ่งบาทตามตรา ๑๐๗

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 398 ถนนพทุภะ แขวงบางนาแวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 02-861-9816 ถึง 02-981-9815 นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แมมบีที รีลิสท์ ราชพทุภะ-จรัญฯ 13 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ในอนุญาตเลขที่ น.บ.6 เลขที่ 5/2556 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

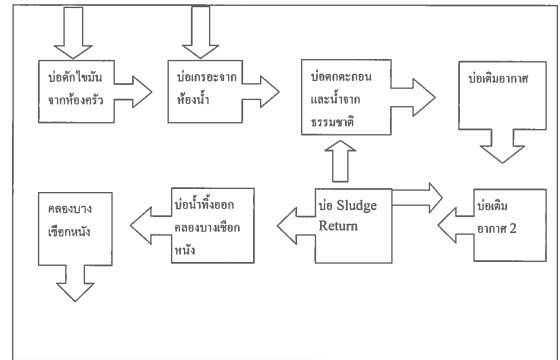

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(a) การขาดงานบ่อยครั้งอาจกระทบงานได้หรือไม่? ไม่ได้/ใช่

(b) เมื่อเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการทีมงานที่ (เลือกหรือคิดค้นเอง) ไม่ได้/ใช่

(c) หากท่านสามารถระบุได้ว่ามีสิ่งใดและเหตุผลดังนี้

- ประสิทธิภาพน้อย ☐ ปกติ ☐ ดีมาก (ระบุ)
- ต้องเรียนรู้ ☐ ปกติ ☐ ดีมาก (ระบุ)
- ต้องมีสมาธิ ☐ ปกติ ☐ ดีมาก (ระบุ)
- ต้องทำงานละเอียด ☐ ปกติ ☐ ดีมาก (ระบุ) ไม่ได้
- ต้องมีความละเอียด ☐ ปกติ ☐ ดีมาก (ระบุ) ไม่ได้
- ต้องรู้ความเร่ง ☐ ปกติ ☐ ดีมาก (ระบุ) ไม่ได้
- ต้องรู้จุดประสงค์ ☐ ปกติ ☐ ดีมาก (ระบุ) ไม่ได้
- ต้อง ☐ ปกติ ☐ ดีมาก (ระบุ)

(d) เมื่อเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการทีมงานที่เลือกหรือคิดค้นเอง ทั้งนี้ไม่ได้ถูกถามซ้ำ

(e) กรุณา อธิบาย และแนะนำงานที่ ไม่ได้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์

คำอธิบาย ๑. เจ้าพระยาอภัยภูเบศรขณะเป็นเจ้าเมืองมณฑล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ปฏิบัติตามหรือรายงานตามมาตรฐาน คอ๑ ต้องวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๑๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กระทรวงพาณิชย์แสดงข้อความว่า
อันเป็นเท็จ ต้องวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๑๑

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ที คอนโด แคมป์ รีสอร์ท ราชพฤกษ์-จรัญ13

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 398	หมู่ที่ : -	ซอย : -
ถนน : ราชพฤกษ์	แขวง/ตำบล : บางเวก	เขต/ตำบล : เขตภาษีเจริญ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์ : [REDACTED]	โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 586

สังกัด : การเคหะ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : _____ ออกให้โดย : _____ นานอยู่ : _____

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____	ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ลงชื่อ _____	ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____	นานอยู่ <u>20 เมษายน 74</u>
ออกให้โดย _____	กรมควบคุมมลพิษ
ลงชื่อ _____	ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____	นานอยู่ _____
ออกให้โดย _____	

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย		แหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย		ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)		48.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)		48.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)		48.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)		48.00 ลบ.ม./วัน
5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)		48.00 ลบ.ม./วัน
(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	[] แบบต่อเนื่อง	ชั่วโมง/วัน
	[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (รอบ) 3/5	
(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
	[] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย	[] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี
	[] เครื่องสูบลมถอน	[] ชี้น้ำ
		[] ชี้น้ำ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ตลอดจนเชื้อเพลิง		
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด		
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน		
(1) ปริมาณการไฟฟ้าที่ใช้ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)		4,584,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระบบของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)		3,389,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)		3,321,200 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	☐ X ระบายทุกวัน ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ☐ ไม่ระบายเลย	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้		ปริมาณ หน่วย
1.		0.00 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	☐ X ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☐ X ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☐ X ปกติ	☐ ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด		0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข		

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยปกติจะต้อง อนุมัติ หรือให้ท่านบันทึกหรือรายงานตามเวลา *do* ต้องรายงานโทษหากไม่บันทึกเตือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำหรือปรับตามตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยปกติหรือรายงานผิดหรือล่าช้าเกินบันทึก ต้องรายงานโทษหากไม่บันทึกหนึ่ง หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำหรือปรับตามตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 398 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ [REDACTED] นิตินันต์ บุคคผลาการชุด ดี คอนโด แคมป์ วิสโรธร ถนนพหลโยธิน-จรัญฯ 13 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ ใบ อ.6 เลขที่ 5/2556 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ
ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

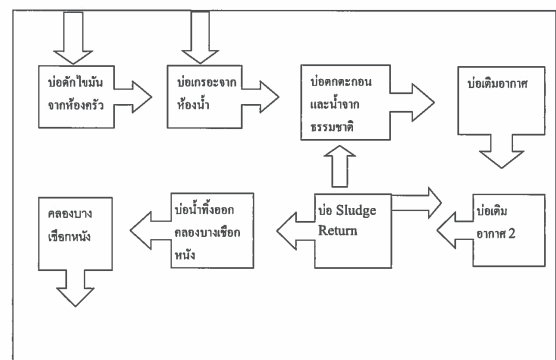

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible][illegible][illegible]

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

```
graph TD; A[น้ำทิ้งจากครัวเรือนและอาคารพาณิชย์] --> B[บ่อดักไขมันจากห้องครัว]; B --> C[บ่อกรองตะกอนหึ่งน้ำ]; C --> D[บ่อตกตะกอนและน้ำจากธรรมชาติ]; D --> E[บ่อเติมอากาศ]; E --> F[บ่อเติมอากาศที่ 2]; F --> G[บ่อ Sludge Return]; G --> H[บ่อน้ำทิ้งออกคลองบางเชือกหนัง]; G --> I[คลองบางเชือกหนัง]; I --> J[น้ำทิ้งจากครัวเรือนและอาคารพาณิชย์];
```

The flowchart illustrates the wastewater treatment process at the Nakhon Phanom Water Treatment Plant. It begins with 'น้ำทิ้งจากครัวเรือนและอาคารพาณิชย์' (Domestic and commercial wastewater), which flows into 'บ่อดักไขมันจากห้องครัว' (Kitchen grease trap). From there, it goes to 'บ่อกรองตะกอนหึ่งน้ำ' (Aeration tank), then to 'บ่อตกตะกอนและน้ำจากธรรมชาติ' (Settling tank and natural water). The water then moves to 'บ่อเติมอากาศ' (Aeration tank) and then to 'บ่อเติมอากาศที่ 2' (Aeration tank 2). From 'บ่อเติมอากาศที่ 2', the water flows to 'บ่อ Sludge Return'. From 'บ่อ Sludge Return', the water flows to 'บ่อน้ำทิ้งออกคลองบางเชือกหนัง' (Effluent tank to Bang Cheuk Hong Canal). Finally, the water is discharged into 'คลองบางเชือกหนัง' (Bang Cheuk Hong Canal), which then flows back to 'น้ำทิ้งจากครัวเรือนและอาคารพาณิชย์'.

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible][illegible]

สถิติและข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ C											
ปี พ.ศ. ค.ศ.	การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11										
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
15669	67	27	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.5	36.5
15669	71	30	29.4	30.4	31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4
15669	72	39	36.2	37.2	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2
15669	76	37	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3	44.3
15669	70	33	32.3	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3
15669	73	31	30.4	31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4
15669	73	30	29.4	30.4	31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4
15669	75	33	32.3	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3
15669	79	39	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2
15669	76	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3
15669	78	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3
15669	77	38	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3
15669	71	33	32.3	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3
15669	82	39	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2
15669	73	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3
15669	69	38	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3
15669	84	37	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3	44.3
15669	76	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3
15669	75	34	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3

สถิติและข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ C											
ปี พ.ศ. ค.ศ.	การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11										
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
15669	62	32	31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4	39.4
15669	38	47	46.1	47.1	48.1	49.1	50.1	51.1	52.1	53.1	54.1
15669	40	50	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0
15669	38	44	43.1	44.1	45.1	46.1	47.1	48.1	49.1	50.1	51.1
15669	38	50	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0
15669	41	45	44.1	45.1	46.1	47.1	48.1	49.1	50.1	51.1	52.1
15669	38	32	31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4	39.4
15669	38	58	56.8	57.8	58.8	59.8	60.8	61.8	62.8	63.8	64.8
15669	40	31	30.4	31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4
15669	38	27	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5
15669	39	76	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5	82.5
15669	40	40	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2	47.2
15669	39	30	29.4	30.4	31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4
15669	39	47	46.1	47.1	48.1	49.1	50.1	51.1	52.1	53.1	54.1
15669	29	63	61.7	62.7	63.7	64.7	65.7	66.7	67.7	68.7	69.7
15669	42	95	93.1	94.1	95.1	96.1	97.1	98.1	99.1	100.1	101.1
15669	10	73	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5
15669	19	97	95.1	96.1	97.1	98.1	99.1	100.1	101.1	102.1	103.1
15669	45	71	69.6	70.6	71.6	72.6	73.6	74.6	75.6	76.6	77.6

สถิติและข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ C											
ปี พ.ศ. ค.ศ.	การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11										
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
15669	67	27	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.5	36.5
15669	74	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3
15669	76	37	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3	44.3
15669	76	37	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3	44.3
15669	76	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3
15669	75	34	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3
15669	73	33	32.3	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3
15669	76	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3

สถิติและข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ C											
ปี พ.ศ. ค.ศ.	การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11										
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
15669	67	27	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.5	36.5
15669	76	37	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3	44.3
15669	76	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3
15669	75	34	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3
15669	73	33	32.3	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3
15669	76	35	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 398 ถนนพญาศรี แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 02-861-9816 โทรสาร 02-861-9815 นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท ราชพฤกษ์-เจริญฯ 13 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วยอาคารประเภท ร

ใบอนุญาตเลขที่ 5/2556 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมวดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับเดือน มกราคม พ.ศ.2558 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....ระบบของแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ รหัสอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 365/2554 หมวดอายุ

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งของรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม/วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมงวัน ☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 3-5 ชั่วโมง วัน 1 ชั่วโมง
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องยกเสลลาคาร์บ ☐ เครื่องยกเสลลาคาร์บ ☐ เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งของรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ☒ สูบระบายออกคลองบางเขื่อนท่ง
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทาง กรม.สูบน้ำไปกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ให้ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 398 ถนนพญาศรี แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท ราชพฤกษ์-เจริญฯ 13 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ ใบ ๑.6 เลขที่ 5/2556 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม หมวดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

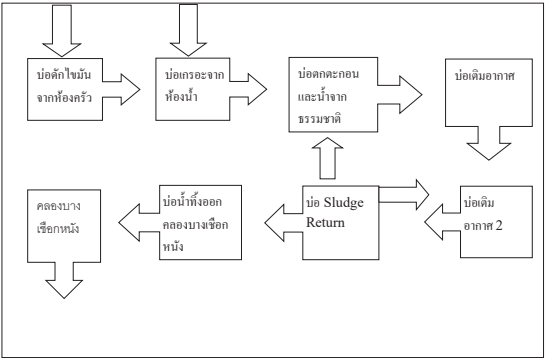

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑. ไม่ถูกต้องและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการนี้ระบบบำบัดน้ำเสียมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำซึ่งแบบอัตโนมัติ ในแบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำซึ่งอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

หมายเหตุ

- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ได้ใช้
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่เข้ามาที่ใช้ (ลิตรหรือกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องขลิบซาก ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องยกเสลลาคาร์บ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องยกเสลลาคาร์บ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนที่ส่งมาจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม) ยังไม่ได้ทำการกำจัด
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาและอุปกรณ์

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๒
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๔๐๔

[illegible][illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 398 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 02-861-9816 โทรสาร 02-861-9815 นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส วิสธอร์ ราชพฤกษ์-เจริญ 13 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ร

ใบอนุญาตเลขที่ ๒๖๕๖ ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมายเลข ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

..... เจ้าของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ 365/2554 หมายเลข
ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วโมงเว้น ☐ ชั่วโมง
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
- ☐ เครื่องผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี
- ☐ เครื่องสูบลำลาย ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สูบระบายออกคลองบางเชือกหนัง
- (๕) วิธีการตรวจสอบที่เก็บชิ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไปทาง ท่อสูบน้ำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณน้ำใช้เพื่อของระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้เพื่อกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- สูบระบายออกคลองบางเชือกหนัง

- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสาร/วัตถุชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่ได้ใช้
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำลาย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนที่เก็บจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ยังไม่ได้ทำการกำจัด
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อนี้แสดงข้อความขึ้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๔๐๓

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
D Condo รัชโยธิน		26/1/69			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
A		A1			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คมอเตอร์และชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 394 T-R 397 Vol	/			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 2.9 S 2.8 T 2.4 AMP	/			
12	หลอดไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดกลุ่	/			
หมายเหตุ					
ลงชื่อ					
26/1/69 26/1/69 26/1/69					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
D Condo รัชโยธิน		26/1/69			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
A		A1			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คมอเตอร์และชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S 391 S-T 393 T-R 392 Volt No.1	/			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 2.9 S 2.8 T 2.4 AMP No.1	/			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดกลุ่	/			
หมายเหตุ					
ลงชื่อ					
26/1/69 26/1/69 26/1/69					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ... 2.1 ... A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรั	/			
9	แรงดัน R-S ... 393 ... S-T ... 391 ... T-R ... 392 ... Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S ... 392 ... S-T ... 391 ... T-R ... 393 ... Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R ... 1.5 ... S ... 1.3 ... T ... 1.4 ... AMP. No.1	/			
11	กระแส R ... 1.6 ... S ... 1.5 ... T ... 1.5 ... AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ... 4 ... A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรั	/			
9	แรงดัน R-S ... 394 ... S-T ... 392 ... T-R ... 393 ... Volt.	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R ... 2.9 ... S ... 2.7 ... T ... 2.4 ... AMP.	/			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ... 4.3 ... A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรั	/			
9	แรงดัน R-S ... 391 ... S-T ... 392 ... T-R ... 392 ... Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R ... 0.9 ... S ... 1 ... T ... 1.0 ... AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ... 2.1 ... A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรั	/			
9	แรงดัน R-S ... 392 ... S-T ... 394 ... T-R ... 393 ... Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S ... 393 ... S-T ... 391 ... T-R ... 392 ... Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R ... 1.3 ... S ... 1.5 ... T ... 1.6 ... AMP. No.1	/			
11	กระแส R ... 1.6 ... S ... 1.6 ... T ... 1.5 ... AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน <u>D. danda ๑๒-13</u>		วันที่ตรวจรอบ <u>26/1/69</u>			
อาคาร <u>C</u>		รหัสอุปกรณ์ <u>C1</u>			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>4</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S <u>392</u> S-T <u>394</u> T-R <u>393</u> Volt	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R <u>2.3</u> S <u>2.4</u> T <u>2.3</u> AMP	/			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดกลอย	/			
หมายเหตุ					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u> <u>26/1/69</u>					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน <u>D. danda ๑๒-13</u>		วันที่ตรวจรอบ <u>26/1/69</u>			
อาคาร <u>C</u>		รหัสอุปกรณ์ <u>C1</u>			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>1.3</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S <u>393</u> S-T <u>392</u> T-R <u>391</u> Volt No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R <u>0.9</u> S <u>0.9</u> T <u>0.9</u> AMP No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดกลอย	/			
หมายเหตุ					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u> <u>26/1/69</u>					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน <u>D. danda ๑๒-13</u>		วันที่ตรวจรอบ <u>26/1/69</u>			
อาคาร <u>C</u>		รหัสอุปกรณ์ <u>C1</u>			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>2.1</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S <u>394</u> S-T <u>393</u> T-R <u>393</u> Volt No.1	/			
9	แรงดัน R-S <u>392</u> S-T <u>393</u> T-R <u>392</u> Volt No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R <u>1.6</u> S <u>1.6</u> T <u>1.3</u> AMP No.1	/			
11	กระแส R <u>1.6</u> S <u>1.5</u> T <u>1.4</u> AMP No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดกลอย	/			
หมายเหตุ					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u> <u>26/1/69</u>					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน <u>D. danda ๑๒-13</u>		วันที่ตรวจรอบ <u>26/1/69</u>			
อาคาร <u>C</u>		รหัสอุปกรณ์ <u>C1</u>			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>2.1</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S <u>394</u> S-T <u>393</u> T-R <u>393</u> Volt No.1	/			
9	แรงดัน R-S <u>392</u> S-T <u>394</u> T-R <u>393</u> Volt No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R <u>1.6</u> S <u>1.6</u> T <u>1.3</u> AMP No.1	/			
11	กระแส R <u>1.6</u> S <u>1.5</u> T <u>1.6</u> AMP No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดกลอย	/			
หมายเหตุ					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u> <u>26/1/69</u>					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน <u>D dondo ๑๙-13</u>		วันที่ตรวจสอบ <u>๒๕/11/๖๙</u>			
อาคาร <u>C</u>		รหัสอุปกรณ์ <u>C2</u>			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>1.5</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัล	/			
9	แรงดัน R-S <u>393</u> S-T <u>394</u> T-R <u>392</u> Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	/			
11	กระแส R <u>0.9</u> S <u>0.9</u> T <u>0.9</u> AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค <u>[Signature]</u> วันที่ <u>25/11/69</u> ผู้จัดการอาคาร <u>[Signature]</u>					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน <u>D dondo ๑๙-13</u>		วันที่ตรวจสอบ <u>๒๕/11/๖๙</u>			
อาคาร <u>C</u>		รหัสอุปกรณ์ <u>C2</u>			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>4</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัล	/			
9	แรงดัน R-S <u>394</u> S-T <u>392</u> T-R <u>393</u> Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	/			
11	กระแส R <u>2.4</u> S <u>2.4</u> T <u>2.4</u> AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค <u>[Signature]</u> วันที่ <u>25/11/69</u> ผู้จัดการอาคาร <u>[Signature]</u>					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน <u>D dondo ๑๙-13</u>		วันที่ตรวจสอบ <u>๑๙/11/๖๙</u>			
อาคาร <u>A</u>		รหัสอุปกรณ์ <u>A1</u>			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>4</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัล	/			
9	แรงดัน R-S <u>392</u> S-T <u>393</u> T-R <u>392</u> Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	/			
11	กระแส R <u>2.9</u> S <u>2.8</u> T <u>2.8</u> AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค <u>[Signature]</u> วันที่ <u>19/11/69</u> ผู้จัดการอาคาร <u>[Signature]</u>					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน <u>D dondo ๑๙-13</u>		วันที่ตรวจสอบ <u>๑๙/11/๖๙</u>			
อาคาร <u>A</u>		รหัสอุปกรณ์ <u>A1</u>			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>1.5</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัล	/			
9	แรงดัน R-S <u>392</u> S-T <u>393</u> T-R <u>392</u> Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	/			
11	กระแส R <u>1.1</u> S <u>1.1</u> T <u>0.9</u> AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค <u>[Signature]</u> วันที่ <u>19/11/69</u> ผู้จัดการอาคาร <u>[Signature]</u>					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
D.dondo ๑๒-13		๑/๑/๒๙		A	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 392 T-R 393 Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 393 T-R 392 Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 1.4 S 1.6 T 1.5 AMP. No.1	/			
11	กระแส R 1.6 S 1.8 T 1.7 AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
D.dondo ๑๒-13		๑/๑/๒๙		A	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 392 T-R 394 Volt.	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 2.4 S 2.9 T 2.8 AMP.	/			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
D.dondo ๑๒-13		๑/๑/๒๙		A	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.5 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 392 T-R 391 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 1.1 S 1.1 T 1.1 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
D.dondo ๑๒-13		๑/๑/๒๙		A	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 392 T-R 393 Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 391 T-R 393 Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 1.8 S 1.6 T 1.4 AMP. No.1	/			
11	กระแส R 1.6 S 1.7 T 1.8 AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump				
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		หมายเหตุ
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓		
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	✓		
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	กระแส R 2.5 S 2.9 T 2.6 AMP	✓		
12	หลอดไฟแสงสว่าง	✓		
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓		
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจเช็ค				
หัวหน้าช่าง				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump				
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		หมายเหตุ
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	✓		
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	✓		
9	แรงดัน R-S 396 S-T 393 T-R 393 Volt No.1	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	กระแส R 1.1 S 1.1 T 0.9 AMP No.1	✓		
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓		
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจเช็ค				
หัวหน้าช่าง				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

ใบตรวจเช็ค Sump Pump				
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		หมายเหตุ
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	✓		
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	✓		
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 392 Volt No.1	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	กระแส R 1.6 S 1.7 T 1.6 AMP No.1	✓		
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓		
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจเช็ค				
หัวหน้าช่าง				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump				
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		หมายเหตุ
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓		
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	✓		
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	กระแส R 2.6 S 2.4 T 2.8 AMP	✓		
12	หลอดไฟแสงสว่าง	✓		
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓		
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจเช็ค				
หัวหน้าช่าง				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		D.ando ๑๒-13		วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๙/๖๙	
อาคาร		C		รหัสอุปกรณ์ C1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดสายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 13 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S 391 S-T 394 T-R 394 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 1 S 1.1 T 1 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Signature] [Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		D.ando ๑๒-13		วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๙/๖๙	
อาคาร		C		รหัสอุปกรณ์ C1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดสายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 21 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S 391 S-T 394 T-R 393 Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 392 T-R 390 Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 1.5 S 1.7 T 1.5 AMP. No.1	/			
11	กระแส R 1.5 S 1.5 T 1.3 AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Signature] [Signature]					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		D.ando ๑๒-13		วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๙/๖๙	
อาคาร		C		รหัสอุปกรณ์ C1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดสายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 393 T-R 396 Volt.	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 2.9 S 2.8 T 2.8 AMP.	/			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Signature] [Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		D.ando ๑๒-13		วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๙/๖๙	
อาคาร		C		รหัสอุปกรณ์ C1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดสายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 13 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 392 T-R 393 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 1 S 0.9 T 1 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Signature] [Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน <u>D.ando 985-13</u>			วันที่ตรวจสอบ <u>6/3/69</u>		
อาคาร <u>C</u>			รหัสอุปกรณ์ <u>C2</u>		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>9.1</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟฟิว	/			
9	แรงดัน R-S <u>393</u> S-T <u>392</u> T-R <u>394</u> Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S <u>393</u> S-T <u>393</u> T-R <u>392</u> Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R <u>1.5</u> S <u>1.5</u> T <u>1.5</u> AMP. No.1	/			
11	กระแส R <u>1.5</u> S <u>1.5</u> T <u>1.5</u> AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u>					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน <u>D.ando 985-13</u>			วันที่ตรวจสอบ <u>6/3/69</u>		
อาคาร <u>A</u>			รหัสอุปกรณ์ <u>A1</u>		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>4</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟฟิว	/			
9	แรงดัน R-S <u>393</u> S-T <u>394</u> T-R <u>393</u> Volt.	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R <u>2.4</u> S <u>2.4</u> T <u>2.6</u> AMP.	/			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u>					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน <u>D.ando 985-13</u>			วันที่ตรวจสอบ <u>6/3/69</u>		
อาคาร <u>A</u>			รหัสอุปกรณ์ <u>A1</u>		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>1.5</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟฟิว	/			
9	แรงดัน R-S <u>393</u> S-T <u>394</u> T-R <u>392</u> Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R <u>1.5</u> S <u>1.5</u> T <u>1.5</u> AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u>					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน <u>D.ando 985-13</u>			วันที่ตรวจสอบ <u>6/3/69</u>		
อาคาร <u>A</u>			รหัสอุปกรณ์ <u>A1</u>		
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set <u>2.1</u> A	/			
8	ตรวจเช็คไฟฟิว	/			
9	แรงดัน R-S <u>393</u> S-T <u>392</u> T-R <u>393</u> Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S <u>393</u> S-T <u>393</u> T-R <u>392</u> Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R <u>1.5</u> S <u>1.5</u> T <u>1.5</u> AMP. No.1	/			
11	กระแส R <u>1.6</u> S <u>1.5</u> T <u>1.5</u> AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u>					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		Dando 98-13		วันที่ตรวจสอบ 6/3/67	
อาคาร		A		รหัสอุปกรณ์ A9	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟฟ้	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 392 T-R 393 Volt	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 2.6 S 2.4 T 2.6 AMP	✓			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		Dando 98-13		วันที่ตรวจสอบ 6/3/67	
อาคาร		A		รหัสอุปกรณ์ A2	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.5 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟฟ้	✓			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 393 T-R 392 Volt No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1 S 0.9 T 1 AMP No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		Dando 98-13		วันที่ตรวจสอบ 6/3/67	
อาคาร		A		รหัสอุปกรณ์ A2	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟฟ้	✓			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 393 T-R 394 Volt No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.5 S 1.4 T 1.4 AMP No.1	✓			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		Dando 98-13		วันที่ตรวจสอบ 6/3/67	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์ B1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟฟ้	✓			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 393 T-R 393 Volt	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 2.6 S 2.4 T 2.5 AMP	✓			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
Dando 90-13		6/3/69		81	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 393 T-R 393 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	/			
11	กระแส R 1 S 0.9 T 1 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted Signature] [Redacted Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
Dando 90-13		6/3/69		81	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 392 T-R 393 Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 393 T-R 392 Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	/			
11	กระแส R 1.8 S 1.0 T 1.6 AMP. No.1	/			
11	กระแส R 1.6 S 1.9 T 1.8 AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted Signature] [Redacted Signature]					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
Dando 90-13		6/3/69		81	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 394 T-R 393 Volt.	/			
10	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	/			
11	กระแส R 2.6 S 2.5 T 2.4 AMP.	/			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted Signature] [Redacted Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
Dando 90-13		6/3/69		81	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดตายภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 392 T-R 392 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	/			
11	กระแส R 1 S 1 T 0.9 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted Signature] [Redacted Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
D. dondo ๑๒-13		6/3/69		C.1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt. No.1	/			
10	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 392 Volt. No.2	/			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
12	กระแส R 1.8 S 1.7 T 1.8 AMP. No.1	/			
13	กระแส R 1.9 S 1.8 T 1.6 AMP. No.2	/			
14	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
15	ตรวจเช็คจุดหลุดลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] 29					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
D. dondo ๑๒-13		6/3/69		C.2	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	/			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 393 Volt	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 2.4 S 2.6 T 2.8 AMP	/			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
13	ตรวจเช็คจุดหลุดลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] 29					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
D. dondo ๑๒-13		6/3/69		C.2	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	/			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 393 T-R 393 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 0.9 S 1 T 1 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
13	ตรวจเช็คจุดหลุดลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] 29					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
D. dondo ๑๒-13		6/3/69		C.1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	/			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 393 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 1.2 S 1.3 T 1.4 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
13	ตรวจเช็คจุดหลุดลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] 29					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน	D.ando ๑๖-13		วันที่ตรวจสอบ	13/4/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมระบบ Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟฟิว	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 392 T-R 393 Volt	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 2.9 S 2.9 T 2.4 AMP	✓			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ 13/ 13/ 13/					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน	D.ando ๑๖-13		วันที่ตรวจสอบ	13/4/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมระบบ Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.5 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟฟิว	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 392 Volt No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.1 S 1.1 T 1.1 AMP No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ 13/ 13/ 13/					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน	D.ando ๑๖-13		วันที่ตรวจสอบ	13/4/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมระบบ Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 9.1 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟฟิว	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.4 S 1.3 T 1.3 AMP No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ 13/ 13/ 13/					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน	D.ando ๑๖-13		วันที่ตรวจสอบ	13/4/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A2	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมระบบ Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟฟิว	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 2.4 S 2.4 T 2.6 AMP	✓			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ 13/ 13/ 13/					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
D.dondo ๑๒-13		13/14/69			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
A		A9			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซรั	✓			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 393 Volt. No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1 S 1 T 0.9 AMP. No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
D.dondo ๑๒-13		13/14/69			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
A		A9			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซรั	✓			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 393 Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 393 Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.4 S 1.2 T 1.6 AMP. No.1	✓			
11	กระแส R 1.3 S 1.3 T 1.8 AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted Signature]					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
D.dondo ๑๒-13		13/14/69			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
B		B1			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซรั	✓			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 392 Volt. No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 2.4 S 1.6 T 1.7 AMP. No.1	✓			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
D.dondo ๑๒-13		13/14/69			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
B		B1			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซรั	✓			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 394 Volt. No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1 S 1 T 1.1 AMP. No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 9.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S..... 393 S-T..... 394 T-R..... 393 Volt. No.1	/			
10	แรงดัน R-S..... 394 S-T..... 393 T-R..... 392 Volt. No.2	/			
11	ตรวจสอบการทำงานอง Control	/			
12	กระแส R..... 1.3 S..... 1.3 T..... 1.3 AMP. No.1	/			
13	กระแส R..... 1.6 S..... 1.4 T..... 1.6 AMP. No.2	/			
14	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
15	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S..... 394 S-T..... 393 T-R..... 393 Volt	/			
10	ตรวจสอบการทำงานอง Control	/			
11	กระแส R..... 2.4 S..... 2.8 T..... 2.4 AMP	/			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.5 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S..... 392 S-T..... 393 T-R..... 393 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานอง Control	/			
11	กระแส R..... 1 S..... 0.9 T..... 1 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ			
อาคาร		รหัสอุปกรณ์			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 9.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S..... 394 S-T..... 393 T-R..... 392 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานอง Control	/			
11	กระแส R..... 1.3 S..... 1.3 T..... 1.3 AMP. No.1	/			
12	กระแส R..... 1.6 S..... 1.4 T..... 1.6 AMP. No.2	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน	Dando สข-13		วันที่ตรวจสอบ	13/4/69	
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	C9	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมระบบ Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัล	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 2.5 S 2.6 T 2.7 AMP	/			
12	หลอดไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดกลุ่กลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน	Dando สข-13		วันที่ตรวจสอบ	13/4/69	
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	C9	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมระบบ Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัล	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 0.9 S 1 T 1 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดกลุ่กลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน	Dando สข-13		วันที่ตรวจสอบ	13/4/69	
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	C9	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมระบบ Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัล	/			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt. No.1	/			
10	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 393 Volt. No.2	/			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
12	กระแส R 1.4 S 1.6 T 1.4 AMP. No.1	/			
13	กระแส R 1.6 S 1.6 T 1.4 AMP. No.2	/			
14	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
15	ตรวจเช็คชุดกลุ่กลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน	Dando สข-13		วันที่ตรวจสอบ	13/5/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมระบบ Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัล	/			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 392 Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R 2.6 S 2.5 T 2.8 AMP. No.1	/			
12	หลอดไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดกลุ่กลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump				
หน่วยงาน		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/		
8	ตรวจเช็คไฟฟ้	/		
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.1	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/		
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.1	/		
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/		
13	ตรวจเช็คชุดกลอย	/		
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจเช็ค				
หัวหน้าช่าง				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

ใบตรวจเช็ค Sump Pump				
หน่วยงาน		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/		
8	ตรวจเช็คไฟฟ้	/		
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.1	/		
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.2	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/		
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.1	/		
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.2	/		
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/		
13	ตรวจเช็คชุดกลอย	/		
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจเช็ค				
หัวหน้าช่าง				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump				
หน่วยงาน		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/		
8	ตรวจเช็คไฟฟ้	/		
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.1	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/		
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.1	/		
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/		
13	ตรวจเช็คชุดกลอย	/		
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจเช็ค				
หัวหน้าช่าง				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump				
หน่วยงาน		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย
CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/		
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	/		
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/		
8	ตรวจเช็คไฟฟ้	/		
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.1	/		
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/		
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.1	/		
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/		
13	ตรวจเช็คชุดกลอย	/		
หมายเหตุ				
ผู้ตรวจเช็ค				
หัวหน้าช่าง				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน	D.ondo ๑๒-13		วันที่ตรวจสอบ	๑๖/๕/๖๙	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	๘๑	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ๑.1 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 393 Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.6 S 1.7 T 1.8 AMP. No.1	✓			
11	กระแส R 1.4 S 1.8 T 1.6 AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ ๑๖ ๖๙					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน	D.ondo ๑๒-13		วันที่ตรวจสอบ	๑๖/๕/๖๙	
อาคาร	B		รหัสอุปกรณ์	81	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt.	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 2.5 S 2.6 T 2.7 AMP.	✓			
12	หม้อแปลงสวิตช์	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ ๑๖ ๖๙					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน	D.ondo ๑๒-13		วันที่ตรวจสอบ	๑๖/๕/๖๙	
อาคาร	B		รหัสอุปกรณ์	81	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 394 T-R 393 Volt. No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.6 S 0.9 T 1 AMP. No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ ๑๖ ๖๙					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน	D.ondo ๑๒-13		วันที่ตรวจสอบ	๑๖/๕/๖๙	
อาคาร	B		รหัสอุปกรณ์	81	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุดควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ๑.1 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S 392 S-T 394 T-R 393 Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.6 S 1.6 T 1.3 AMP. No.1	✓			
11	กระแส R 1.4 S 1.8 T 1.4 AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ ๑๖ ๖๙					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		วันที่ตรวจรอบ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		C1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัฟ	/			
9	แรงดัน R-S S-T T-R Volt	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R S T AMP	/			
12	หลอดไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค ผู้หน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ 9/					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		วันที่ตรวจรอบ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		C1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัฟ	/			
9	แรงดัน R-S S-T T-R Volt No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R S T AMP No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค ผู้หน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ 9/					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		วันที่ตรวจรอบ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		C1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัฟ	/			
9	แรงดัน R-S S-T T-R Volt No.1	/			
9	แรงดัน R-S S-T T-R Volt No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R S T AMP No.1	/			
11	กระแส R S T AMP No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค ผู้หน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ 9/					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจสอบ		วันที่ตรวจรอบ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		C1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซรัฟ	/			
9	แรงดัน R-S S-T T-R Volt	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R S T AMP	/			
12	หลอดไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค ผู้หน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ 9/					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		รหัสอุปกรณ์	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 394 Volt No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1 S 1 T 0.9 AMP No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดกลุกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
หัวหน้าช่าง					
ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		รหัสอุปกรณ์	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุม Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 392 T-R 393 Volt No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.9 S 1.8 T 1.8 AMP No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดกลุกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
หัวหน้าช่าง					
ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		รหัสอุปกรณ์	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คสายยึดจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวหลัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันที่เครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน 50 PSI	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 50 PSI	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	✓			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
8	แรงดัน R-S 395 S-T 396 T-R 396 Volt	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส 1 R 4.1 S 4.5 T 4.5 AMP	✓			
11	กระแส 2 R 4.1 S 4.6 T 4.6 AMP	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Pressure Switch	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
หัวหน้าช่าง					
ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ	
อาคาร		รหัสอุปกรณ์		รหัสอุปกรณ์	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
2	ตรวจเช็คสายยึดจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คตัวหลัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันที่เครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน 50 PSI	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 50 PSI	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	✓			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
8	แรงดัน R-S 396 S-T 397 T-R 396 Volt	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส 1 R 3.5 S 3.5 T 3.5 AMP	✓			
11	กระแส 2 R 4.0 S 4.1 T 4.1 AMP	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Pressure Switch	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค					
หัวหน้าช่าง					
ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ					

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		ดี คอนโด แคมป์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต		วันที่ตรวจสอบ 27/3/69	
อาคาร		A		รหัสอุปกรณ์ BP	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดต่อกันในมอเตอร์ Pump	/			
2	ตรวจเช็คลูกยางยึดสายต่อท่อ	/			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	/			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	/			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันเครื่องและอุปกรณ์ใกล้เคียง	/			
7	ตรวจเช็คแรงดันถังลม 30 PSI.	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 30 PSI.	/			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI.	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คตู้ภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	/			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
8	แรงดัน R-S 0.87 S-T 0.92 T-R 0.86 Volt.	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
10	กระแส 1 R 5.9 S 5.8 T 5.5 AMP.	/			
11	กระแส 2 R 5.1 S 5.2 T 5.3 AMP.	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจสอบสภาพ Pressure Switch	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [ลายเซ็น]					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		ดี คอนโด แคมป์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต		วันที่ตรวจสอบ 27/3/69	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์ BP	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดต่อกันในมอเตอร์ Pump	/			
2	ตรวจเช็คลูกยางยึดสายต่อท่อ	/			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	/			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	/			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันเครื่องและอุปกรณ์ใกล้เคียง	/			
7	ตรวจเช็คแรงดันถังลม 30 PSI.	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 30 PSI.	/			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI.	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คตู้ภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	/			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
8	แรงดัน R-S 0.68 S-T 0.70 T-R 0.71 Volt.	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
10	กระแส 1 R 4.0 S 4.1 T 4.4 AMP.	/			
11	กระแส 2 R 4.1 S 4.1 T 4.1 AMP.	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจสอบสภาพ Pressure Switch	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [ลายเซ็น]					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		ดี คอนโด แคมป์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต		วันที่ตรวจสอบ 27/3/69	
อาคาร		C		รหัสอุปกรณ์ BP	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดต่อกันในมอเตอร์ Pump	/			
2	ตรวจเช็คลูกยางยึดสายต่อท่อ	/			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	/			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	/			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันเครื่องและอุปกรณ์ใกล้เคียง	/			
7	ตรวจเช็คแรงดันถังลม 30 PSI.	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 30 PSI.	/			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI.	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คตู้ภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	/			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
8	แรงดัน R-S 0.94 S-T 0.90 T-R 0.95 Volt.	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
10	กระแส 1 R 5.6 S 5.5 T 5.3 AMP.	/			
11	กระแส 2 R 5.5 S 5.5 T 5.4 AMP.	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจสอบสภาพ Pressure Switch	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [ลายเซ็น]					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		ดี คอนโด แคมป์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต		วันที่ตรวจสอบ 28/4/69	
อาคาร		A		รหัสอุปกรณ์ BP	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดต่อกันในมอเตอร์ Pump	/			
2	ตรวจเช็คลูกยางยึดสายต่อท่อ	/			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	/			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	/			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันเครื่องและอุปกรณ์ใกล้เคียง	/			
7	ตรวจเช็คแรงดันถังลม 30 PSI.	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 30 PSI.	/			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI.	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คตู้ภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	/			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
8	แรงดัน R-S 0.90 S-T 0.90 T-R 0.90 Volt.	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
10	กระแส 1 R 5.4 S 5.2 T 5.3 AMP.	/			
11	กระแส 2 R 5.0 S 5.1 T 5.1 AMP.	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจสอบสภาพ Pressure Switch	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [ลายเซ็น]					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

ERM-PMR-081 Rev 00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-081 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-081 Rev 00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		ดี คอนโด แคมป์ริสอร์ท จ.ภูเก็ต		วันที่ตรวจสอบ 1/6/69	
อาคาร		A		รหัสอุปกรณ์ BP	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	✓			
2	ตรวจเช็คดูยางรองค้ำจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวปั๊ม Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำปั๊ม 30 PSI.	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 30 PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI.	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	✓			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
8	แรงดัน R-S 394 S-T 396 T-R 395 Volt	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส 1. R 4.3 S 4.4 T 4.6 AMP.	✓			
11	กระแส 2. R 4.2 S 4.2 T 4.3 AMP.	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Pressure Switch	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ 					

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		ดี คอนโด แคมป์ริสอร์ท จ.ภูเก็ต		วันที่ตรวจสอบ 1/6/69	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์ BP	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	✓			
2	ตรวจเช็คดูยางรองค้ำจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวปั๊ม Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำปั๊ม 30 PSI.	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 30 PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI.	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	✓			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
8	แรงดัน R-S 394 S-T 393 T-R 395 Volt	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส 1. R 4.2 S 4.4 T 4.5 AMP.	✓			
11	กระแส 2. R 4.4 S 4.2 T 4.3 AMP.	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Pressure Switch	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ 					

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค BOOSTER PUMP					
หน่วยงาน		ดี คอนโด แคมป์ริสอร์ท จ.ภูเก็ต		วันที่ตรวจสอบ 1/6/69	
อาคาร		C		รหัสอุปกรณ์ BP	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	✓			
2	ตรวจเช็คดูยางรองค้ำจุดต่อท่อ	✓			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวปั๊ม Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำปั๊ม 30 PSI.	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน Start 30 PSI.	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดัน Stop 40 PSI.	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 6 A	✓			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
8	แรงดัน R-S 396 S-T 398 T-R 393 Volt	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส 1. R 4.9 S 4.3 T 4.4 AMP.	✓			
11	กระแส 2. R 4.0 S 4.2 T 4.4 AMP.	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Pressure Switch	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ 					

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-081 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน		ดี คอนโด แคมป์ริสอร์ท จ.ภูเก็ต		วันที่ตรวจสอบ 26/6/69	
อาคาร		A		รหัสอุปกรณ์ A1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 393 Volt	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 9.9 S 9.5 T 9.9 AMP.	✓			
12	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดอุปกรณ์	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ 					

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-080 Rev.00/ 15 Aug 2020

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน	D. danda city-13		วันที่ตรวจสอบ	96/6/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ SetA	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.1	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	[Redacted Signature]				

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน	D. danda city-13		วันที่ตรวจสอบ	96/6/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ SetA	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.1	✓			
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.1	✓			
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.2	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	[Redacted Signature]				

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน	D. danda city-13		วันที่ตรวจสอบ	96/6/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A2	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ SetA	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.1	✓			
12	หม้อแปลงสวิตช์	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	[Redacted Signature]				

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน	D. danda city-13		วันที่ตรวจสอบ	96/6/69	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A2	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ SetA	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
9	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....Volt. No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R.....S.....T.....AMP. No.1	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลิ้ง	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	[Redacted Signature]				

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน	D. danda 93ny-13		วันที่ตรวจสอบ	96/6/64	
อาคาร	A		รหัสอุปกรณ์	A9	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 9.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S..... 399..... S-T..... 394..... T-R..... 393..... Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S..... 399..... S-T..... 391..... T-R..... 392..... Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R..... 1.3..... S..... 1.5..... T..... 1.6 AMP. No.1	/			
11	กระแส R..... 1.6..... S..... 1.6..... T..... 1.5 AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted] [Redacted]					
96 / 6 / 64 20 / 6 / 64 20 / 6 / 64 69					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน	D. danda 93ny-13		วันที่ตรวจสอบ	96/6/64	
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	d1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S..... 392..... S-T..... 394..... T-R..... 393..... Volt.	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R..... 2.8..... S..... 2.9..... T..... 2.8 AMP.	/			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	/			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
14	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน	D. danda 93ny-13		วันที่ตรวจสอบ	96/6/64	
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	d1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.3 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S..... 393..... S-T..... 392..... T-R..... 391..... Volt. No.1	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R..... 0.9..... S..... 1..... T..... 0.9 AMP. No.1	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted] [Redacted]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน	D. danda 93ny-13		วันที่ตรวจสอบ	96/6/64	
อาคาร	C		รหัสอุปกรณ์	d1	
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงชุดควบคุม Control	/			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 9.1 A	/			
8	ตรวจเช็คไฟไซร์	/			
9	แรงดัน R-S..... 394..... S-T..... 393..... T-R..... 393..... Volt. No.1	/			
9	แรงดัน R-S..... 392..... S-T..... 393..... T-R..... 399..... Volt. No.2	/			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
11	กระแส R..... 1.6..... S..... 1.5..... T..... 1.3 AMP. No.1	/			
11	กระแส R..... 1.9..... S..... 1.5..... T..... 1.3 AMP. No.2	/			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			
13	ตรวจเช็คชุดลูกกลอย	/			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Redacted] [Redacted] [Redacted]					
96 / 6 / 64 20 / 6 / 64 20 / 6 / 64 69					

ใบตรวจเช็ค Aerator Pump					
หน่วยงาน D Condo 94-13		วันที่ตรวจสอบ 26/6/64			
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ 09			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 4 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไหม้	✓			
9	แรงดัน R-S 399 S-T 399 T-R 393 Volt	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 9.8 S 2.6 T 2.7 AMP	✓			
12	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
14	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sludge Pump					
หน่วยงาน D Condo 94-13		วันที่ตรวจสอบ 26/6/64			
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ 09			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 1.5 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไหม้	✓			
9	แรงดัน R-S 393 S-T 394 T-R 392 Volt No.1	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 0.9 S 0.9 T 0.9 AMP No.1	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Signature]					

ใบตรวจเช็ค Sump Pump					
หน่วยงาน D Condo 94-13		วันที่ตรวจสอบ 26/6/64			
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ 09			
ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อแปลงควบคุมชุด Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 2.1 A	✓			
8	ตรวจเช็คไฟไหม้	✓			
9	แรงดัน R-S 374 S-T 373 T-R 373 Volt No.1	✓			
9	แรงดัน R-S 372 S-T 374 T-R 373 Volt No.2	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส R 1.6 S 1.6 T 1.6 AMP No.1	✓			
11	กระแส R 1.3 S 1.3 T 1.6 AMP No.2	✓			
12	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คชุดลูกลอย	✓			
หมายเหตุ					
ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ [Signature]					

PLUS+

บริษัท พัลล หรือเพอร์มิตี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค P - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260100007
วันที่ปฏิบัติงาน	06/01/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงลิฟท์ โถงลิฟท์ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set 6 แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T 397 โวลต์				
	R-S 395 โวลต์				
	T-R 394 โวลต์				
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
7	ตรวจเช็คความดัน	✓			
	R 5.0 แอมป์				
	S 5.2 แอมป์				
	T 5.1 แอมป์				
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 145 PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
6	ตรวจเช็คดีดลมระบบอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำจ่าย...110...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ

สาเหตุ เครื่องควบคุมพร้อม

คำแนะนำ สี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุแบตเตอรี่

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

PLUS+

บริษัท พลิค หรือเพอร์ดี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค P - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260100016
วันที่ปฏิบัติงาน	13/01/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงลิฟท์ โถงลิฟท์ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
4	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คดีดลมระบบอากาศ MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	S...5.0...แอมป์				
	R...5.1...แอมป์				
	T...5.2...แอมป์				
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...6...แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ Control	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			

PLUS+

บริษัท พลิค หรือเพอร์ดี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค P - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260100027
วันที่ปฏิบัติงาน	27/01/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงลิฟท์ โถงลิฟท์ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คดีดลมระบบอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	R...5.1...แอมป์				
	T...5.1...แอมป์				
	S...5.2...แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...6...แอมป์				
4	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...391...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ
สาเหตุ เกี่ยวกับความพร้อม
คำแนะนำ สี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
7	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจุสารเคมี
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค IP - สัปดาห์

รหัสงานFP/IP-W

รหัสเครื่องจักรJockey Pump

เลขที่ใบงานPM260200007

วันปฏิบัติงาน03/02/2026

ชื่ออาคารB | B1 | ส่วนกลาง | ไบรปู | ไบรปู | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
4	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R.S...399...โวลต์				
	S.T...398...โวลต์				
	T.R...398...โวลต์				
9	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	T...5.2...แอมป์				
	R...5.1...แอมป์				
	S...5.1...แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คลิ้นระบายอากาศ MOTOR	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค IP - สัปดาห์

รหัสงานFP/IP-W

รหัสเครื่องจักรJockey Pump

เลขที่ใบงานPM260200016

วันปฏิบัติงาน10/02/2026

ชื่ออาคารB | B1 | ส่วนกลาง | ไบรปู | ไบรปู | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คลิ้นระบายอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S.T...398...โวลต์				
	R.S...398...โวลต์				
	T.R...398...โวลต์				
5	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	T...5.1...แอมป์				
	S...5.1...แอมป์				
	R...5.2...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ
สาเหตุ เกิดจากความผิดปกติ
คำแนะนำ สี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	R...S.1...แอมป์				
	T...S.1...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุแบตเตอรี่
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลิธ หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260200018
วันที่ปฏิบัติงาน	17/02/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระบุ ไน้ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยาอื่น...145...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยา...110...PSI				
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายใน Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คระดับ	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
8	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	S...S.0...แอมป์				

PLUS+

บริษัท พลิธ หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260200028
วันที่ปฏิบัติงาน	24/02/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระบุ ไน้ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คลักษณะภายนอก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยา...110...PSI				
7	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยาอื่น...145...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คระดับ	✓			
	R-S...394...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
3	ตรวจเช็คกระแส	✓			
	T...S.2...แอมป์				
	R...S.1...แอมป์				
	S...S.3...แอมป์				
4	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายใน Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าสี Set...6...แอมป์				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ
- สาเหตุ เกิดจากความผิดปกติ
- คำแนะนำ สี
- การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด ตรวจเช็คประจุแบตเตอรี่
- สาเหตุ ปกติ
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM26030006
วันที่ปฏิบัติงาน	03/03/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงระบุ โถงระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คประจุไฟฟ้าออก	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยาออก...145...PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คลิ้นระบายอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำยาเข้า	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยาเข้า...110...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าสี Set...6...แอมป์				
2	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คแผงรับ	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
4	ตรวจเช็คความเส	✓			
	R...S.1...แอมป์				
	T...S.2...แอมป์				
	S...S.1...แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260300016
วันที่ปฏิบัติงาน	10/03/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงระบุ โถงระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คประจุไฟฟ้าออก	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยาออก...145...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวลิ้น PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คลิ้นระบายอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำยาเข้า	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยาเข้า...110...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าสี Set...6...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คแผงรับ	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...396...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คความเส	✓			
	S...S.3...แอมป์				
	R...S.1...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	T...S2...แอมป์				
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบจ่ายค่าค่า
สาเหตุ ปกติ
ค่าเบี่ยง -
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบการทำงาน
สาเหตุ เหมืองควมพร้อมการทำงาน
ค่าเบี่ยง สี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค P - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/P-W

รหัสเครื่องจักร

Jockey Pump

เลขที่ใบงาน

PM260300018

วันเริ่มปฏิบัติงาน

17/03/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงยุ | โถงยุ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า...145...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบระดับอุณหภูมิ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า...110...PSI				
6	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบชุดภายใน Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบระดับ	✓			
	R-S...394...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
7	ตรวจสอบความเร็ว	✓			
	S...S.3...แอมป์				
	R...S.2...แอมป์				
	T...S.2...แอมป์				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค P - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/P-W

รหัสเครื่องจักร

Jockey Pump

เลขที่ใบงาน

PM260300027

วันเริ่มปฏิบัติงาน

24/03/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงยุ | โถงยุ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบระดับอุณหภูมิ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเข้า...110...PSI				
5	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำออก...145...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบระดับ	✓			
	T-R...396...โวลต์				
	S-T...394...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
5	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบชุดภายใน Control	✓			
9	ตรวจสอบความเร็ว	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ใจ	ฮางกรณิธิ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมอัตโนมัติ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสายสัญญาณ Control	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ Control	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจเช็คแผงเดิน	✓			
	S-T...396...ไว้ด				
	A-S...395...ไว้ด				
	T-R...391...ไว้ด				
7	ตรวจเช็คการผสม	✓			
	S...5.3...เมตร				
	R...5.1...เมตร				
	T...5.1...เมตร				
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ OVER LOAD	✓			
	ค่าไฟ Set...8...เมตร				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแผงเดินไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแผงเดินไฟฟ้า...110...PSI				
3	ตรวจเช็คติดตั้งระบบจากภายนอก MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายไฟฟ้าเดิน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสายไฟฟ้าเดิน PUMP	✓			

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใส	อาการผิดปกติ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบลักษณะของภายนอก MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำถัง	✓			
	ตรวจสอบความดันน้ำถัง.....110....PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบความดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบความดันน้ำออก.....145....PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบความดัน	✓			
	R-S...391...โวลต์				
	T-R...392...โวลต์				
	S-T...393...โวลต์				
5	ตรวจสอบสายแล	✓			
	S...5.1...เมตร				
	R...5.2...เมตร				
	T...5.2...เมตร				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สภาพ ปกติ
ค่าแรงค่าวัสดุ -
การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
6	ตรวจเช็คแรงดันปั๊บน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สภาพ ไม่ดี
ค่าแรงค่าวัสดุ -
การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260400016
วันที่ปฏิบัติงาน	14/04/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงประตู โถงประตู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	5-T...398...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	T...5.1...แอมป์				
	R...5.1...แอมป์				
	S...5.0...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คหีบห่อระบบภายนอก MOTOR	✓			

PLUS+

รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260400024
วันที่ปฏิบัติงาน	21/04/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงประตู โถงประตู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คหีบห่อระบบภายนอก MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...387...โวลต์				
	5-T...387...โวลต์				
	R-S...386...โวลต์				
5	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	T...5.2...แอมป์				
	S...5.3...แอมป์				
	R...5.2...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Show	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบ Show	✓			
9	ตรวจสอบการ Control	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลิค หรือเพอร์รี่ จำกัด	
ตารางตรวจเช็ค P - สัปดาห์	
รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM26040027
วันที่ปฏิบัติงาน	28/04/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระบุ ไน้ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาออก	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำยาออก.....145...PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาเข้า	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำยาเข้า.....110...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
2	ตรวจสอบชุด Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
4	ตรวจสอบการดูแล	✓			
	R...5.2...แอมป์				
	T...5.3...แอมป์				
	S...5.1...แอมป์				
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			

PLUS+

บริษัท พลิค หรือเพอร์รี่ จำกัด	
ตารางตรวจเช็ค P - สัปดาห์	
รหัสงาน	FP/P-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM26050005
วันที่ปฏิบัติงาน	05/05/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระบุ ไน้ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
2	ตรวจสอบชุดอากาศ Control	✓			
3	ตรวจสอบชุด Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบชุดวาล์ว	✓			
	R-S.....396.....โวลต์				
	T-R.....396.....โวลต์				
	S-T.....397.....โวลต์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบชุดอากาศ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบที่ M Show	✓			
8	ตรวจสอบชุดวาล์ว	✓			
	R.....5.2.....แอมป์				
	S.....5.1.....แอมป์				
	T.....5.2.....แอมป์				
9	ตรวจสอบชุด OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบชุดวาล์วระบบ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบชุดวาล์วระบบ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบชุดวาล์วระบบอากาศ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบชุดวาล์วระบบน้ำยา	✓			
	ตรวจสอบชุดวาล์วระบบน้ำยา.....110.....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....145....PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

ภาพ

ส่วนประกอบ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุแบตเตอรี่

ภาพ ปกติ

ส่วนประกอบ -

การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลิค หรือเพอร์ดี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM26050016
วันที่ปฏิบัติงาน	12/05/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระบุ ไน้ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....145....PSI				
4	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คลิ้นลมระบายอากาศ MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110....PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของB1 Motor และ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T.....397.....โวลต์				
	R-S.....396.....โวลต์				
	T-R.....396.....โวลต์				
4	ตรวจเช็คความถี่	✓			
	S.....5.1.....แอมป์				
	R.....5.2.....แอมป์				
	T.....5.2.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

PLUS+

บริษัท พลิค หรือเพอร์ดี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM26050017
วันที่ปฏิบัติงาน	19/05/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระบุ ไน้ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....145....PSI				
5	ตรวจเช็คการทำงานของB1 Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คลิ้นลมระบายอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....110....PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....6.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S.....399.....โวลต์				
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
6	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คความถี่	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	T...5.0...แอมป์				
	S...5.1...แอมป์				
	R...5.1...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ: ไม่มี

คำแนะนำ: ..

การแก้ปัญหา: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
6	ตรวจเช็คสภาพตัวล๊อค PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ: ปกติ

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260500027
วันที่ปฏิบัติงาน	26/05/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระยุ ไน้ระยุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าไฟ Set...6...แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดคอนโทรลใหญ่ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
	R-S...396...โวลต์				
8	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	R...5.1...แอมป์				
	S...5.2...แอมป์				
	T...5.1...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวล๊อค MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คคัตเตอร์เบรกของ MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260600004
วันที่ปฏิบัติงาน	02/06/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระยุ ไน้ระยุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คคัตเตอร์เบรกของ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
4	ตรวจเช็คสภาพตัวล๊อค PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตัวล๊อค MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
5	ตรวจเช็ควาล์ว	✓			
	T...5.0...แอมป์				
	S...5.2...แอมป์				
	R...5.1...แอมป์				
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าไฟ Set...6...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็คชุดถ้อยภายใน Control	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
9	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ: ปกติ

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
6	ตรวจเช็คดีดระบบอากาศ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำจ่าย...110...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คระบบ

สาเหตุ: เครื่องความดัน

คำแนะนำ: สี

การแก้ปัญหา: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260600015
วันที่ปฏิบัติงาน	09/06/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระปู ไน้ระปู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	T-R...393...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
2	ตรวจเช็คความเส	✓			
	T...S.1...แอมป์				
	S...S.2...แอมป์				
	R...S.1...แอมป์				
3	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...6...แอมป์				
5	ตรวจเช็คชุดถ้อยภายใน Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คไม่ Show	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ MOTOR	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค IP - สัปดาห์

รหัสงาน	FP/IP-W
รหัสเครื่องจักร	Jockey Pump
เลขที่ใบงาน	PM260600018
วันที่ปฏิบัติงาน	16/06/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระปู ไน้ระปู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คดีดระบบอากาศ MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...110...PSI				
5	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดถ้อยภายใน Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คไม่ Show	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	R-S...394...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
7	ตรวจเช็คความเส	✓			
	R...S.1...แอมป์				
	S...S.2...แอมป์				
	T...S.1...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
8	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...6...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบการทำงาน
สภาพ เครื่องควบคุม
ค่าแรงม้า สี
การปฏิบัติงาน ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดวาล์ว BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบวาล์วแรงดัน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบ
สภาพ เครื่องควบคุม
ค่าแรงม้า สี
การปฏิบัติงาน ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - 10 นาที

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM26010008
วันที่ปฏิบัติงาน	06/01/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงปู โถงปู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบชุดอากาศไม่เย็น	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบชุดอากาศไม่เย็น	✓			
4	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบชุดอากาศ	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...610...ลิตร				
9	ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ	✓			
10	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง...0...F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ค่าไม่มีการทำงาน...0...ชม.				
12	ตรวจสอบชุดเครื่องเรือน	✓			
13	ตรวจสอบชุดน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	CONTROL				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - 10 นาที

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM260100017
วันที่ปฏิบัติงาน	13/01/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงปู โถงปู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดวาล์ว BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบวาล์วแรงดัน	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบชุดอากาศ	✓			
3	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจสอบค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...600...ลิตร				
7	ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...145...PSI				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
	ค่าไม่มีการทำงาน...0...ชม.				
	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง...0...F				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...110...PSI				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
9	ตรวจสอบชุดอากาศไม่เย็น	✓			
10	ตรวจสอบชุดเครื่องเรือน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
11	ตรวจเช็คระดับน้ำพอลเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คหอยจากโมลลิ	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คหอยจากโมลลิ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คการทำงาน

สาเหตุ เครื่องความพอมเครื่อง

คำแนะนำ สี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - 10 นาที

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM260100028
วันที่ปฏิบัติงาน	27/01/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงประตู โถงประตู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดหอย BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวพอมเย็น	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำพอลเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คความดันจ่ายพอมของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำขึ้นลง	✓			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นลง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นลง...610...ลิตร				
7	ตรวจเช็คระบบความดัน	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องพอมและ PUMP	✓			
	จำนวนการทำงาน...7.6...ชม.				
	เฉลี่ย...6...แอมป์				
	ปริมาณน้ำ...110...PSI				
	ความเร็วรอบ...1900...RPM				
	แรงดันน้ำขึ้นลง...PSI				
	อุณหภูมิ...80...F				
	แรงดันน้ำขึ้นลง...PSI				
	ปริมาณน้ำ...145...PSI				
9	ตรวจเช็คหอยจากโมลลิ	✓			
10	ตรวจเช็คตัวพอม PUMP	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - 10 นาที

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM260200006
วันที่ปฏิบัติงาน	03/02/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงประตู โถงประตู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คความดันจ่ายพอมของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำขึ้นลง	✓			
5	ตรวจเช็คระบบความดัน	✓			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นลง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นลง...600...ลิตร				
7	ตรวจเช็คหอยจากโมลลิ	✓			
8	ตรวจเช็คตัวพอม PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องพอมและ PUMP	✓			
	จำนวนการทำงาน...0...ชม.				
	อุณหภูมิ...0...F				
	เฉลี่ย...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำขึ้นลง...0...PSI				
	ปริมาณน้ำ...0...PSI				
	แรงดันน้ำขึ้นลง...0...PSI				
	ปริมาณน้ำ...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...00...RPM				
11	ตรวจเช็คหอยจากโมลลิ	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องพอม	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำพอลเย็น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวให้แรงดัน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[Redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจําตำแหน่ง
สาเหตุ ปกติ
สาเหตุอื่น ๆ -
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดเล็กน้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คตัวรีด PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[Redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ
สาเหตุ เครื่องมีความพร้อม
สาเหตุอื่น ๆ สี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดเล็กน้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM262020017

วันที่ปฏิบัติงาน

10/02/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงรูป | โถงรูป | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบตัวให้แรงดัน	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
	จำไม่ถาวรทำงาน.....ชม.				
	แรงดันน้ำเข้าที่ไหลลง.....PSI				
	อุณหภูมิตัวถังลงเย็น.....F				
	แอมป์มอเตอร์.....แอมป์				
	แรงดันน้ำจับไหลขึ้น.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....RPM				
2	ตรวจสอบท่ออากาศไม่เสียง	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบท่ออากาศไม่สี	✓			
6	ตรวจสอบหีบระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบหีบความว่างถังน้ำของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบสายพาน	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบหีบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....610.....ลิตร				

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM262020019

วันที่ปฏิบัติงาน

17/02/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงรูป | โถงรูป | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบตัวให้แรงดัน	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	จำไม่ถาวรทำงาน...0...ชม.				
	แรงดันน้ำเข้าที่ไหลลง...0...PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น...0...F				
	แอมป์มอเตอร์...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำจับไหลขึ้น...0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
2	ตรวจสอบท่ออากาศไม่เสียง	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบท่ออากาศไม่สี	✓			
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบความว่างถังน้ำของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบสายพาน	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...600...ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศ	
11	ตรวจสอบระบบความดัน	✓			
12	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
13	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[Redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
สถานะ ปกติ
ค่าเฉลี่ย -
การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศ	
	แรงดันน้ำขึ้นถึงเพดาน.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....1900...RPM				
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[Redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบ
สถานะ เครื่องความดัน
ค่าเฉลี่ย สี
การปฏิบัติงาน ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ห้องเก็บ

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM260200027

วันที่ปฏิบัติงาน

24/02/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงประตู | โถงประตู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบตัวพร้อมเดิน	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบชุดจ่ายน้ำเชื้อเพลิง	✓			
2	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบชุดจ่ายน้ำเชื้อเพลิง	✓			
5	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจสอบค่าความดันจ่ายน้ำของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบสถานะ	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ.....610...ลิตร				
10	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็วรอบ	✓			
11	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของชุดเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	จุดตรวจวัดน้ำหล่อเย็น.....70...F				
	แรงดันน้ำขึ้นถึงเพดาน.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....145...RPM				
	ค่าเฉลี่ยค่าแรง.....7.6...ชม.				
	ความเร็วรอบน้ำเข้า.....90...PSI				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ห้องเก็บ

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM260300007

วันที่ปฏิบัติงาน

03/03/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงประตู | โถงประตู Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบตัวพร้อมเดิน	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบชุดจ่ายน้ำเชื้อเพลิง	✓			
3	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบค่าความดันจ่ายน้ำของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ.....600...ลิตร				
8	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็วรอบ	✓			
9	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของชุดเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	จุดตรวจวัดน้ำหล่อเย็น.....0...F				
	แรงดันน้ำขึ้นถึงเพดาน.....0...PSI				
	ความเร็วรอบ.....0...RPM				
	ค่าเฉลี่ยค่าแรง.....0...ชม.				
	ความเร็วรอบน้ำเข้า.....0...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
11	ตรวจสอบเชื้อเพลิงจากถังน้ำมัน	✓			
12	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
1	ตรวจสอบชุดวาล์ว BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบวาล์วระบาย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM26030017

วันที่ปฏิบัติงาน

10/03/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงยุ | โถงยุ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสายพาน	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง.....610...ลิตร				
4	ตรวจสอบระดับความดัน	✓			
5	ตรวจสอบตัวรับ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ตรวจสอบน้ำออก.....0...PSI				
	ตรวจสอบน้ำเชื้อเพลิง.....0...PSI				
	ตรวจสอบน้ำเข้า.....0...PSI				
	อุณหภูมิห้องเครื่องยนต์.....0...F				
	ตรวจสอบน้ำมันหล่อเย็น.....0...PSI				
	แอมป์มอเตอร์.....แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....0...RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน.....0...ชม.				
9	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจสอบเชื้อเพลิงจากถัง	✓			
11	ตรวจสอบความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจสอบท่อจากถังน้ำมัน	✓			
	CONTROL				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM26030019

วันที่ปฏิบัติงาน

17/03/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงยุ | โถงยุ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดวาล์ว BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบวาล์วระบาย	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบท่อจากถังน้ำมัน	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ตรวจสอบน้ำเชื้อเพลิง.....PSI				
	ตรวจสอบน้ำเข้า.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.				
	แอมป์มอเตอร์.....แอมป์				
	อุณหภูมิห้องเครื่องยนต์.....F				
	ตรวจสอบน้ำมันหล่อเย็น.....PSI				
	ตรวจสอบน้ำออก.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....RPM				
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบเชื้อเพลิงจากถัง	✓			
6	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบสายพาน	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง.....610...ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
11	ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่	✓			
12	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
13	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบการทำงาน
สภาพ เครื่องความพร้อมของระบบ
ค่าแรงค่าวัสดุ สี
การปฏิบัติงาน ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
12	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง.....610.....ลิตร				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบการทำงาน
สภาพ เครื่องความพร้อม
ค่าแรงค่าวัสดุ สี
การปฏิบัติงาน ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - 10 นาที

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM26030028

วันที่ปฏิบัติงาน

24/03/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงรูป | โถงรูป | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดตัว BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบตัวถังตัวถัง	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจสอบชุดอากาศไอ	✓			
3	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....95.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....1900.....RPM				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อลื่น.....80.....F				
	แรงดันลม.....6.....mmHg				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....7.6.....mm				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....145.....PSI				
7	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
9	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
10	ตรวจสอบชุดอากาศไอ	✓			
11	ตรวจสอบสถานะ	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - 10 นาที

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM26030029

วันที่ปฏิบัติงาน

31/03/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงรูป | โถงรูป | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบตัวถังตัวถัง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดตัว BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจสอบชุดอากาศไอ	✓			
3	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจสอบสถานะ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....mm				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....F				
	แรงดันลม.....mmHg				
	เวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
8	ตรวจสอบชุดอากาศไอ	✓			
9	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
12	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...610...ลิตร				
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คระบบ
สภาพ ใกล้เคียงความพร้อม
ค่าเฉลี่ย สี
การปฏิบัติงาน ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
11	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
13	ตรวจเช็คหออากาศ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจําดับเพลิง
สภาพ ปกติ
ค่าเฉลี่ย -
การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พรีคัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ห้องเก็บ

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM26040005

วันที่ปฏิบัติงาน

07/04/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงรูป | โถงรูป | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวพร้อมดับเพลิง	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...610...ลิตร				
3	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น...70...F				
	ความเร็วรอบ...1900...RPM				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ปริมาณน้ำดับเพลิง...110...PSI				
	แอมป์...6...แอมป์				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ปริมาณน้ำดับเพลิง...145...PSI				
	ใช้น้ำดับเพลิง...7.5...ชม.				
4	ตรวจเช็คระบบควบคุมการดับเพลิง	✓			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คหออากาศ	✓			
8	ตรวจเช็คความดันของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

PLUS+

บริษัท พรีคัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ห้องเก็บ

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM260400015

วันที่ปฏิบัติงาน

14/04/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | โถงรูป | โถงรูป | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...650...ลิตร				
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	ใช้น้ำดับเพลิง...0...ชม.				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
	ปริมาณน้ำดับเพลิง...90...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ปริมาณน้ำดับเพลิง...150...PSI				
	อุณหภูมิห้องเย็น...0...F				
	แอมป์...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คหออากาศ	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คหออากาศ	✓			
10	ตรวจเช็คความดันของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบควบคุมการดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดตัวถัง BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังและถัง	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สภาพ ไม่ดี
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
1	ตรวจเช็คชุดตัวถัง BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังและถัง	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สภาพ ปกติ
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พันธ์ หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FR/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM26040025
วันที่ปฏิบัติงาน	21/04/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระบุ ไน้ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...610...ลิตร				
4	ตรวจเช็คระดับระดับความดัน	✓			
5	ตรวจเช็คตัวถัง PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	วัดระดับน้ำออก...0...PSI				
	วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	วัดระดับน้ำเข้า...0...PSI				
	จุดประกายไฟ...0...F				
	วัดระดับน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
	แอมป์...0...แอมป์				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน...0...ชม.				
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
11	ตรวจเช็คความดันของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คท่อจากเครื่อง	✓			
	CONTROL				

PLUS+

บริษัท พันธ์ หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

รหัสงาน	FR/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM26040026
วันที่ปฏิบัติงาน	28/04/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระบุ ไน้ระบุ Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดตัวถัง BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังและถัง	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่อจากเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...600...ลิตร				
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศ	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คความดันของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	วัดระดับน้ำเข้า...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...0...ชม.				
	จุดประกายไฟ...0...F				
	วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แอมป์...0...แอมป์				
	วัดระดับน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
	วัดระดับน้ำออก...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
10	ตรวจเช็คระดับระดับความดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศ	
11	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
สภาพ -
ค่าแรง -
การปฏิบัติงาน -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศ	
1	ตรวจสอบตัวเรือน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดตัว BATTERY	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจสอบประจำสัปดาห์
สภาพ ปกติ
ค่าแรง -
การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค FRP - ชั้นห้า

รหัสงาน

FR/FR-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM26050004

วันที่ปฏิบัติงาน

05/05/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | ไน้ระบุ | ไน้ระบุ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง...610...ลิตร				
3	ตรวจสอบระบบระบายน้ำ	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
7	ตรวจสอบชุดอากาศไม่เสีย	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...PSI				
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...F				
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...PSI				
	ตรวจสอบน้ำออก...0...PSI				
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...PSI				
	ตรวจสอบ...6...แอมป์				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน...0...ชม.				
9	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจสอบชุดอากาศไม่เสีย	✓			
11	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ	✓			
	CONTROL				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค FRP - ชั้นห้า

รหัสงาน

FR/FR-W

รหัสเครื่องจักร

Fire Pump

เลขที่ใบงาน

PM260500015

วันที่ปฏิบัติงาน

12/05/2026

ชื่ออาคาร

B | B1 | ส่วนกลาง | ไน้ระบุ | ไน้ระบุ | Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบชุดอากาศไม่เสีย	✓			
2	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...PSI				
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...0...ชม.				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...F				
	ตรวจสอบ...6...แอมป์				
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...PSI				
	ตรวจสอบน้ำจ่าย...0...PSI				
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจสอบชุดอากาศไม่เสีย	✓			
6	ตรวจสอบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง...610...ลิตร				
11	ตรวจสอบระบบระบายน้ำ	✓			
12	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดตัวถัง BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คประจําชั่วโมง

สาเหตุ: ปกติ

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเมื่อเพลิง...600...ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบควบคุมความดัน	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจเช็คประจําชั่วโมง

สาเหตุ: ปกติ

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลิธ หรือเพอร์วี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ห้องเก็บ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM260500018
วันที่ปฏิบัติงาน	19/05/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงบัน โถงบัน Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว	✓			
3	ตรวจเช็คชุดตัวถัง BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุดเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	จำไม่ทราบค่างาน...0...ชม.				
	เวลาที่น้ำดับเมื่อเพลิง...0...PSI				
	เวลาที่ดับน้ำดับเมื่อเพลิง...0...F				
	แอมป์มอเตอร์...0...แอมป์				
	เวลาที่ดับน้ำดับเมื่อเพลิง...0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
2	ตรวจเช็คสถานะของชุดเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะของชุดเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะของชุดตัวถังและวาล์ว BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
10	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเมื่อเพลิง	✓			

PLUS+

บริษัท พลิธ หรือเพอร์วี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ห้องเก็บ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM260500028
วันที่ปฏิบัติงาน	26/05/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง โถงบัน โถงบัน Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสถานะของชุดเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะของชุดเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะของชุดเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะของชุดตัวถังและวาล์ว BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
8	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว	✓			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเมื่อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเมื่อเพลิง...610...ลิตร				
10	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบควบคุมความดัน	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของชุดเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แอมป์มอเตอร์...6...แอมป์				
	เวลาที่ดับน้ำดับเมื่อเพลิง...0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...0...PSI				
	จำไม่ทราบค่างาน...0...ชม.				
	เวลาที่ดับน้ำดับเมื่อเพลิง...0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	เวลาที่ดับน้ำดับเมื่อเพลิง...0...F				
	ความเร็วรอบ...0...RPM				
13	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว PUMP	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
1	ตรวจเช็คตัวถังแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สภาพ ปกติ
จำนวนน้ำ -
การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คตัวลิ้น PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
สภาพ ปกติ
จำนวนน้ำ -
การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM26060005
วันที่ปฏิบัติงาน	02/06/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระย ไน้ระย Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวถังแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง...600...ลิตร				
5	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	ระดับน้ำในถังสำรอง.....0...PSI				
	ระดับน้ำในถังสำรอง.....0...PSI				
	ระดับน้ำในถังสำรอง.....0...PSI				
	ระดับน้ำในถังสำรอง.....0...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำ.....0...F				
	ความเร็วรอบ.....0...RPM				
	จำนวนการทำงาน.....0...ชม.				
	แอมป์.....0...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องปั๊ม	✓			

PLUS+

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	Fire Pump
เลขที่ใบงาน	PM260600016
วันที่ปฏิบัติงาน	09/06/2026
ชื่ออาคาร	B B1 ส่วนกลาง ไน้ระย ไน้ระย Fire Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อากาศเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวลิ้น PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
6	ตรวจเช็คความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง...610...ลิตร				
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังสำรอง	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM				
	แอมป์.....แอมป์				
	ระดับน้ำในถังสำรอง.....PSI				
	ระดับน้ำในถังสำรอง.....PSI				
	ระดับน้ำในถังสำรอง.....PSI				
	จำนวนการทำงาน.....ชม.				
	อุณหภูมิของน้ำ.....F				
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องปั๊ม	✓			
	CONTROL				

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการผิดปกติ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คความดันน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดหลังสิ้น	✓			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดเชื้อเพลิง ๕-610...ลิตร				
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพแบริ่ง	✓			
	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	ห้ามเข้าทำงาน.....ชม.				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	ปริมาณน้ำเข้า.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F				
	แอมแปร์.....แอมป์				
	แรงดันน้ำฉีดหลังสิ้น.....PSI				
	ปริมาณน้ำออก.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....RPM				
12	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดหลังสิ้น	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
	CONTROL				

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีก (CM)

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ERM-PMR-059 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-059 Rev 00/ 15 Aug 2020

ERM-PMP-001 Rev 00/15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำปี ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิเคอนโด จํรญ13			
				เวลาบันทึก 9.00 น.			
วันที่	1123 มิเตอร์อาคาร A		49068 มิเตอร์อาคาร B		54307 มิเตอร์อาคาร C		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	1165	42	49113	45	54307	6	
2	1203	38	49151	38	54313	6	
3	1256	53	49192	41	54327	14	
4	1327	71	49231	39	54358	31	
5	1400	73	49269	38	54373	15	
6	1472	72	49309	40	54411	38	
7	1544	72	49347	38	54481	70	
8	1617	73	49385	38	54528	47	
9	1688	71	49424	39	54570	42	
10	1759	71	49462	38	54612	42	
11	1821	62	49502	40	54654	42	
12	1892	71	49540	38	54681	27	
13	1965	73	49579	39	54721	40	
14	2037	72	49607	40	54764	43	
15	2111	74	49658	51	54807	43	
16	2185	74	49704	46	54846	39	
17	2258	73	49750	46	54888	42	
18	2332	74	49797	47	54930	42	
19	2405	73	49843	50	54973	43	
20	2478	73	49897	48	55015	42	
21	2550	72	49944	47	55059	44	
22	2623	73	49994	50	55101	42	
23	2695	72	50049	55	55144	43	
24	2766	71	50102	63	55186	42	
25	2838	72	50156	64	55227	41	
26	2910	72	50209	63	55270	43	
27	2981	71	50263	64	55312	42	
28	3053	72	50316	63	55355	43	
29							
30							
31							
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 4/3/69				วันที่ 4/3/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำปี ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิเคอนโด จํรญ13			
				เวลาบันทึก 9.00 น.			
วันที่	110500 มิเตอร์อาคาร A		117886 มิเตอร์อาคาร B		107836 มิเตอร์อาคาร C		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	110619	119	117916	30	107877	41	
2	110724	105	117954	38	107915	38	
3	110824	103	117981	27	107956	41	
4	111006	179	118075	94	107995	39	
5	111097	91	118091	16	108033	38	
6	111175	78	118108	17	108070	37	
7	111318	143	118136	28	108119	49	
8	111474	159	118212	76	108159	40	
9	111670	93	118235	23	108198	39	
10	111923	153	118299	64	108232	34	
11	111826	103	118317	18	108269	37	
12	111906	80	118346	29	108293	24	
13	112041	135	118378	49	108328	35	
14	112147	106	118405	30	108365	37	
15	112317	170	118516	91	108405	40	
16	112388	71	118516	0	108449	37	
17	112551	163	118599	63	108497	55	
18	112633	82	118605	26	108509	10	
19	112747	114	118645	40	108544	37	
20	112851	104	118675	27	108581	37	
21	112967	116	118704	29	108629	48	
22	113069	102	118734	30	108666	37	
23	113210	141	118796	62	108707	41	
24	113326	116	118826	30	108746	39	
25	113456	130	118890	64	108796	50	
26	113551	95	118939	9	108804	8	
27	113629	78	118948	19	108837	33	
28	113746	117	118967	19	108870	33	
29							
30							
31							
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 4/3/69				วันที่ 4/3/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำปี ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิเคอนโด จํรญ13			
				เวลาบันทึก 9.00 น.			
วันที่	131221 มิเตอร์อาคาร C						
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	131367	46					
2	131394	27					
3	131425	31					
4	131466	41					
5	131505	39					
6	131525	20					
7	131587	62					
8	131626	39					
9	131653	27					
10	131704	51					
11	131756	52					
12	131799	23					
13	131826	47					
14	131861	35					
15	131896	35					
16	131931	35					
17	131977	46					
18	132022	45					
19	132056	36					
20	132094	36					
21	132130	36					
22	132165	35					
23	132200	35					
24	132250	50					
25	132281	31					
26	132336	55					
27	132378	22					
28	132391	36					
29							
30							
31							
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 4/3/69				วันที่ 4/3/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำปี ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิเคอนโด จํรญ13	
วันทึ่	No. 010	จำนวนการใชั้	No. 031	No. 032	ผู้บันทึก
	6992 kWh	(หน่วย)	On Peak (kW)	Off Peak (kW)	
1	6998	5	0.000	0.282	
2	6903	6	0.000	0.312	
3	6909	6	0.293	0.312	
4	6915	6	0.293	0.335	
5	6920	5	0.303	0.335	
6	6925	5	0.303	0.335	
7	6930	5	0.303	0.335	
8	6935	5	0.303	0.335	
9	6941	6	0.303	0.335	
10	6946	5	0.331	0.335	
11	6951	5	0.331	0.335	
12	6956	5	0.331	0.335	
13	6961	5	0.331	0.335	
14	6966	5	0.331	0.335	
15	6971	5	0.331	0.335	
16	6976	5	0.331	0.335	
17	6981	5	0.331	0.335	
18	6985	4	0.331	0.335	
19	6990	5	0.331	0.335	
20	6995	5	0.331	0.335	
21	7000	5	0.331	0.335	
22	7005	5	0.331	0.335	
23	7011	6	0.331	0.335	
24	7016	5	0.331	0.335	
25	7021	5	0.331	0.347	
26	7026	5	0.331	0.347	
27	7032	6	0.331	0.347	
28	7037	5	0.331	0.347	
29	7043	6	0.331	0.347	
30	7048	5	0.331	0.347	
31	7053	5	0.331	0.347	
บันทึกเพิ่มเติม					

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำปี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิคอนได จรัญ13			
				เวลาบันทึก 8.00 น.			
วันที่	3058 มิเตอร์อาคาร A		5036 มิเตอร์อาคาร B		5535 มิเตอร์อาคาร C		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	3124	31	50430	64	55396	41	
2	3195	31	50486	56	55438	42	
3	3266	31	50550	64	55479	41	
4	3355	69	50619	69	55523	44	
5	3441	87	50699	40	55564	41	
6	3519	87	50777	56	55607	43	
7	3607	78	50778	61	55649	42	
8	3680	73	50825	47	55691	42	
9	3751	71	50868	43	55732	41	
10	3822	71	50913	45	55772	40	
11	3895	73	50959	46	55814	42	
12	3968	73	51017	58	55862	48	
13	4041	73	51076	61	55931	69	
14	4114	73	51144	66	56007	76	
15	4184	70	51199	55	56080	73	
16	4255	71	51243	44	56156	76	
17	4331	76	51297	54	56231	75	
18	4402	71	51355	58	56304	73	
19	4474	72	51405	50	56377	73	
20	4547	73	51459	59	56451	74	
21	4619	71	51515	56	56525	74	
22	4692	73	51572	57	56600	75	
23	4762	70	51621	49	56675	75	
24	4839	70	51667	46	56749	74	
25	4905	73	51710	43	56824	75	
26	4974	69	51759	49	56897	73	
27	5049	75	51803	49	56975	78	
28	5117	68	51846	43	57046	71	
29	5189	72	51890	44	57122	76	
30	5258	69	51933	43	57193	71	
31	5333	75	51978	45	57270	77	
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 1/4/69				วันที่ 1/4/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำปี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิคอนได จรัญ13			
				เวลาบันทึก 9.00 น.			
วันที่	11346 มิเตอร์ในตู้		12042 มิเตอร์อาคาร A		10237 มิเตอร์อาคาร B		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	113890	144	121035	68	102905	35	
2	113986	96	121054	22	102940	35	
3	114081	95	121080	23	102974	34	
4	114208	127	121116	46	103014	37	
5	114335	127	121190	62	103046	69	
6	114441	107	121219	29	103083	37	
7	114575	125	121243	29	103148	45	
8	114699	122	121298	50	103182	34	
9	114797	100	121327	29	103212	30	
10	114902	105	121357	30	103252	40	
11	115044	124	121415	58	103298	46	
12	115148	104	121444	29	103333	35	
13	115272	124	121487	43	103373	40	
14	115376	104	121520	31	103409	36	
15	115491	115	121564	44	103449	40	
16	115634	143	121617	53	103494	45	
17	115734	100	121644	31	103520	26	
18	115870	136	121697	49	103569	49	
19	115940	110	121735	28	103615	44	
20	116115	135	121765	40	103679	59	
21	116229	107	121794	29	103713	41	
22	116356	134	121846	52	103755	42	
23	116469	113	121875	29	103797	40	
24	116603	134	121911	46	103846	48	
25	116717	114	121951	30	103894	48	
26	116841	124	121997	46	103939	45	
27	116956	115	122026	29	103981	42	
28	117081	125	122054	28	104045	64	
29	117194	113	122084	30	104086	41	
30	117321	127	122127	43	104132	46	
31	117481	160	122206	79	104174	42	
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 1/4/69				วันที่ 1/4/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำปี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิคอนได			
				เวลาบันทึก 9.00			
วันที่	132394 มิเตอร์อาคาร C						
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง					
1	132431	39					
2	132467	36					
3	132501	34					
4	132539	38					
5	132574	35					
6	132612	38					
7	132649	37					
8	132685	36					
9	132721	36					
10	132759	38					
11	132794	35					
12	132832	38					
13	132866	36					
14	132903	35					
15	132943	40					
16	132978	35					
17	133016	40					
18	133055	37					
19	133099	37					
20	133127	35					
21	133162	35					
22	133202	40					
23	133240	38					
24	133278	38					
25	133314	36					
26	133347	33					
27	133387	40					
28	133422	35					
29	133460	38					
30	133495	35					
31	133534	39					
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 1/4/69				วันที่ 1/4/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำปี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิคอนได จรัญ13			
วันที่	No. 010 7059Wh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 031 On Peak (kW)	No. 032 Off Peak (kW)			ผู้บันทึก
1	7059	6	0.174	0.399			
2	7064	5	0.320	0.320			
3	7069	5	0.320	0.324			
4	7074	5	0.320	0.324			
5	7079	5	0.320	0.324			
6	7085	6	0.320	0.324			
7	7091	6	0.320	0.324			
8	7097	6	0.320	0.324			
9	7102	5	0.320	0.324			
10	7106	6	0.320	0.327			
11	7113	5	0.320	0.327			
12	7118	5	0.320	0.327			
13	7123	5	0.320	0.327			
14	7129	6	0.320	0.327			
15	7134	5	0.320	0.327			
16	7140	6	0.320	0.327			
17	7145	5	0.320	0.327			
18	7151	6	0.320	0.327			
19	7157	6	0.320	0.327			
20	7163	6	0.320	0.327			
21	7169	6	0.320	0.327			
22	7175	6	0.320	0.327			
23	7180	5	0.343	0.347			
24	7186	6	0.343	0.347			
25	7191	6	0.343	0.347			
26	7197	5	0.343	0.347			
27	7204	7	0.343	0.347			
28	7209	5	0.343	0.347			
29	7216	6	0.343	0.347			
30	7220	5	0.343	0.347			
31							
บันทึกเพิ่มเติม							
ผู้ตรวจสอบ				การอาคาร 5.5.69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจุดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569				หน่วยงาน คีคอนโด จรัญ13			
				เวลาบันทึก 9.00 น.			
วันที่	5333 มิเตอร์อาคาร A		53976 มิเตอร์อาคาร B		5727 มิเตอร์อาคาร C		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	5405	72	52092	44	57345	75	
2	5476	71	52065	43	57419	74	
3	5547	71	52106	41	57494	75	
4	5617	70	52146	40	57566	74	
5	5687	70	52188	42	57639	73	
6	5758	71	52230	42	57661	42	
7	5833	75	52275	43	57704	43	
8	5905	72	52316	43	57746	42	
9	5977	68	52357	41	57787	41	
10	6044	71	52400	43	57834	41	
11	6120	76	52445	45	57881	43	
12	6186	66	52485	40	57909	38	
13	6256	70	52526	41	57949	40	
14	6327	71	52569	43	57991	42	
15	6398	71	52610	41	58030	39	
16	6472	74	52655	45	58074	44	
17	6540	68	52696	41	58114	40	
18	6610	70	52739	43	58155	41	
19	6680	70	52780	41	58195	40	
20	6753	73	52826	46	58237	42	
21	6825	72	52867	41	58279	42	
22	6897	72	52912	45	58320	41	
23	6966	69	52950	38	58361	41	
24	7038	72	52993	43	58402	41	
25	7107	69	53033	40	58442	40	
26	7178	71	53073	40	58482	40	
27	7250	72	53114	41	58525	43	
28	7324	74	53161	47	58566	41	
29	7392	68	53204	43	58606	40	
30	7465	73	53249	45	58646	40	
31							
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 5/5/69				วันที่ 5/5/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจุดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569				หน่วยงาน คีคอนโด จรัญ13			
				เวลาบันทึก 9.00 น.			
วันที่	117461 มิเตอร์ในตู้		122806 มิเตอร์อาคาร A		124174 มิเตอร์อาคาร B		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	117586	105	122999	23	124218	44	
2	117706	120	122977	42	124257	39	
3	117821	115	122900	99	124306	49	
4	117934	117	122929	29	124360	54	
5	118069	131	122978	49	124407	47	
6	118180	111	122409	31	124447	40	
7	118299	119	122441	32	124491	44	
8	118422	123	122504	63	124514	23	
9	118537	115	122533	29	124589	55	
10	118663	126	122580	47	124612	43	
11	118775	112	122612	32	124654	42	
12	118873	98	122660	48	124674	20	
13	118980	103	122688	28	124720	46	
14	119078	98	122718	30	124758	38	
15	119155	79	122738	20	124780	22	
16	119284	129	122785	47	124827	47	
17	119391	107	122815	30	124873	46	
18	119498	107	122844	29	124919	46	
19	119606	108	122872	28	124964	45	
20	119729	123	122912	40	125019	55	
21	119878	149	122982	70	125048	29	
22	119957	109	123014	32	125092	44	
23	120094	107	123040	26	125132	40	
24	120228	134	123102	62	125188	56	
25	120313	85	123125	23	125193	55	
26	120427	114	123183	48	125224	31	
27	120575	146	123205	32	125283	59	
28	120664	109	123250	45	125312	29	
29	120798	114	123279	29	125373	61	
30	120925	127	123325	46	125422	49	
31							
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 5/5/69				วันที่ 5/5/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจุดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน คีคอนโด จรัญ13			
				เวลาบันทึก 9.00 น.			
วันที่	133534 มิเตอร์อาคาร C						
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง					
1	133579	38					
2	133609	37					
3	133644	35					
4	133679	35					
5	133715	36					
6	133752	37					
7	133791	40					
8	133827	35					
9	133859	32					
10	133895	36					
11	133930	35					
12	133960	30					
13	133992	32					
14	134022	30					
15	134052	30					
16	134086	34					
17	134119	33					
18	134151	32					
19	134184	33					
20	134222	38					
21	134259	37					
22	134295	36					
23	134331	37					
24	134368	36					
25	134403	35					
26	134438	35					
27	134474	36					
28	134506	34					
29	134535	29					
30	134563	28					
31							
บันทึกโดย				ตรวจสอบโดย			
ช่างเทคนิค							
วันที่ 5/5/69				วันที่ 5/5/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจุดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569			หน่วยงาน คีคอนโด จรัญ13		
วันที่	No. 010 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 031 On Peak (kW)	No. 032 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	7226	6	0.000	0.306	
2	7232	6	0.000	0.305	
3	7239	5	0.000	0.305	
4	7243	6	0.000	0.317	
5	7249	6	0.167	0.319	
6	7254	5	0.320	0.329	
7	7259	5	0.320	0.329	
8	7264	5	0.320	0.329	
9	7269	5	0.320	0.329	
10	7274	5	0.320	0.329	
11	7280	6	0.320	0.329	
12	7285	5	0.320	0.329	
13	7290	5	0.320	0.329	
14	7295	5	0.320	0.329	
15	7300	5	0.324	0.330	
16	7305	5	0.324	0.330	
17	7310	5	0.324	0.330	
18	7317	7	0.324	0.330	
19	7321	4	0.324	0.329	
20	7326	5	0.324	0.329	
21	7331	5	0.324	0.329	
22	7336	5	0.324	0.329	
23	7341	5	0.324	0.329	
24	7347	6	0.324	0.329	
25	7352	5	0.324	0.329	
26	7358	6	0.324	0.329	
27	7364	6	0.324	0.329	
28	7369	5	0.324	0.329	
29	7374	5	0.324	0.329	
30	7379	5	0.324	0.329	
31	7385	6	0.324	0.329	
บันทึกเพิ่มเติม					

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

913/94
ERM-PMR005984v.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าป้อนบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569						หน่วยงาน ดิคอนโด จรัญ13	
เวลาบันทึก 9.00 น.							
วันที่	มิเตอร์อาคาร A		มิเตอร์อาคาร B		มิเตอร์อาคาร C		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	9886	89	54465	45	61042	79	
2	9968	42	54509	42	61116	34	
3	10099	74	54550	49	61191	35	
4	10105	33	54592	42	61264	36	
5	10171	32	54633	41	61341	34	
6	10233	76	54675	42	61417	36	
7	10336	83	54718	43	61495	38	
8	10421	85	54761	43	61571	77	
9	10496	35	54801	40	61645	33	
10	10545	39	54843	42	61721	36	
11	10635	80	54885	42	61793	36	
12	10749	87	54927	42	61874	37	
13	10813	31	54968	41	61950	36	
14	10943	80	55009	41	62027	37	
15	10992	79	55051	42	62105	78	
16	11046	34	55093	42	62183	33	
17	11123	39	55134	44	62257	39	
18	11200	35	55179	42	62333	36	
19	11276	76	55222	43	62410	77	
20	11352	76	55264	42	62487	37	
21	11428	76	55309	45	62563	76	
22	11512	64	55356	47	62644	81	
23	11593	31	55398	42	62716	72	
24	11660	37	55447	44	62797	36	
25	11735	35	55486	44	62867	35	
26	11812	37	55530	44	62944	37	
27	11894	82	55575	45	63024	80	
28	11980	86	55619	44	63109	85	
29	12076	96	55667	48	63198	89	
30	12156	80	55709	42	63276	78	
31							
บันทึกโดย						ตรวจสอบโดย	
ช่างเทคนิค							
วันที่ 1/7/69						วันที่ 1/7/69	

บริหารงานโดย บริษัท พัลลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569						หน่วยงาน ดิคอนโด จรัญ13	
เวลาบันทึก 9.00 น.							
วันที่	มิเตอร์ใหญ่		มิเตอร์อาคาร A		มิเตอร์อาคาร B		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	124793	139	124464	31	106960	57	
2	124933	130	124493	29	107029	69	
3	125044	84	124538	45	107080	51	
4	125220	143	124606	68	107148	68	
5	125354	134	124699	53	107182	34	
6	125430	116	124700	41	107225	43	
7	125639	167	124736	76	107281	36	
8	125801	161	124855	77	107326	45	
9	125930	129	124904	41	107369	36	
10	126094	93	124949	46	107376	16	
11	126137	104	124979	30	107414	39	
12	126246	114	125001	29	107462	45	
13	126364	118	125073	39	107480	8	
14	126464	100	125101	28	107491	91	
15	126563	104	125146	45	107513	22	
16	126666	93	125185	39	107535	22	
17	126735	109	125234	49	107558	23	
18	126866	91	125282	28	107583	25	
19	126967	96	125297	30	107610	27	
20	127058	96	125321	29	107637	27	
21	127136	118	125372	51	107664	27	
22	127260	104	125402	30	107693	29	
23	127399	119	125464	62	107717	24	
24	127498	89	125499	28	107741	24	
25	127608	120	125532	40	107798	57	
26	127687	39	125589	29	107845	17	
27	127779	90	125586	27	107819	24	
28	127892	115	125632	46	107848	29	
29	127996	104	125662	30	107880	32	
30	128098	102	125689	27	107918	38	
31							
บันทึกโดย						ตรวจสอบโดย	
ช่างเทคนิค							
วันที่ 1/7/69						วันที่ 1/7/69	

บริหารงานโดย บริษัท พัลลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569						หน่วยงาน ดิคอนโด จรัญ13	
เวลาบันทึก 9.00 น.							
วันที่	มิเตอร์อาคาร C						
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	135730	47					
2	135762	32					
3	135789	27					
4	135822	33					
5	135866	44					
6	135917	31					
7	135932	35					
8	135969	37					
9	136019	50					
10	136047	28					
11	136080	33					
12	136115	35					
13	136149	34					
14	136198	49					
15	136231	33					
16	136265	34					
17	136297	34					
18	136334	35					
19	136371	37					
20	136408	37					
21	136445	37					
22	136483	40					
23	136517	32					
24	136552	35					
25	136593	41					
26	136625	32					
27	136661	36					
28	136698	37					
29	136738	40					
30	136772	34					
31							
บันทึกโดย						ตรวจสอบโดย	
ช่างเทคนิค							
วันที่ 1/7/69						วันที่ 1/7/69	

บริหารงานโดย บริษัท พัลลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คระดับน้ำ อาคาร B										หน่วยงาน ดิคอนโด จรัญ13			
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเช้า 08.00 น.)													
วันที่	ค่าเคมีระดับน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.6		/						877	30		
2	3.0	7.6		/						882	35		
3	3.0	7.6		/						887	37		
4	3.0	7.6		/						896	27		
5	3.0	7.6		/						896	20		
6	3.0	7.6		/						899	16		
7	3.0	7.6		/						905	23		
8	3.0	7.6		/		15kg				909	77		
9	3.0	7.6		/						909	7		
10	3.0	7.6		/		15kg				1008	3		
11	3.0	7.6		/						1008	3		
12	3.0	7.6		/						1008	3		
13	3.0	7.6		/		15kg				1012	4		
14	3.0	7.6		/						1012	0		
15	3.0	7.6		/						1012	0		
16	3.0	7.6		/		15kg				1012	0		
17	3.0	7.6		/						1012	0		
18	3.0	7.6		/		10kg				1012	0		
19	3.0	7.6		/						1014	2		
20	3.0	7.6		/		15kg				1018	4		
21	3.0	7.6		/						1021	3		
22	3.0	7.6		/						1024	3		
23	3.0	7.6		/						1026	2		
24	3.0	7.6		/		15kg				1031	5		
25	3.0	7.6		/						1031	0		
26	3.0	7.6		/		1kg				1031	0		
27	3.0	7.6		/						1031	0		
28	3.0	7.6		/		1kg				1031	0		
29	3.0	7.6		/						1032	1		
30	3.0	7.6		/						1032	0		
31													
ตรวจสอบโดย										วันที่ 1/7/69			

บริหารงานโดย บริษัท พัลลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

13/95
FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คระดับน้ำ อาคาร B										หน่วยงาน ดิคอนโด จรัญ13			
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงกลางคืน 22.00 น.)													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ					ปริมาณการเติมเคมี (Kg)				มีเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	SAR	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอส Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.6		✓						334	35		
2	3.0	7.6		✓						374	40		
3	3.0	7.6		✓						409	25		
4	3.0	7.6		✓						426	27		
5	3.0	7.6		✓						439	10		
6	3.0	7.6		✓						464	25		
7	3.0	7.6		✓						481	17		
8	3.0	7.6		✓		1.5kg				496	15		
9	3.0	7.6		✓						1007	5		
10	3.0	7.6		✓		1.5kg				1002	7		
11	3.0	7.6		✓						1005	3		
12	3.0	7.6		✓						1008	3		
13	3.0	7.6		✓		1.5kg				1011	3		
14	3.0	7.6		✓						1012	1		
15	3.0	7.6		✓						1012	0		
16	3.0	7.6		✓		1.5kg				1012	0		
17	3.0	7.6		✓						1012	0		
18	3.0	7.6		✓		1.5kg				1012	0		
19	3.0	7.6		✓						1014	2		
20	3.0	7.6		✓		1.5kg				1013	4		
21	3.0	7.6		✓						1021	3		
22	3.0	7.6		✓						1024	3		
23	3.0	7.6		✓						1026	2		
24	3.0	7.6		✓		1.5kg				1031	5		
25	3.0	7.6		✓						1031	0		
26	3.0	7.6		✓		1kg				1031	0		
27	3.0	7.6		✓						1031	0		
28	3.0	7.6		✓		1kg				1031	0		
29	3.0	7.6		✓						1032	2		
30	3.0	7.6		✓						1032	0		
31													
ตรวจสอบโดย XXXXXXXXXX										วันที่ 17/69			

บริหารงานโดย บริษัท พรหมเพชชี จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน น้ำ



ตะแกรงดักขยะ ดักขยะออก




ดูแลรักษาบ่อน้ำ



ตัดไขมัน



ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

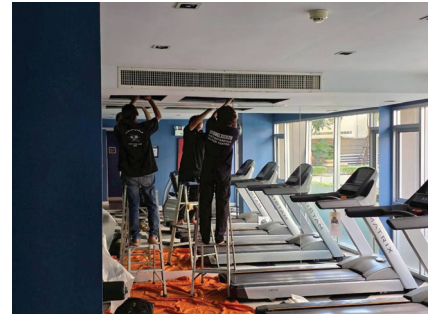

เก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ



ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



ป้ายแสดงความลึก สระว่ายน้ำ



ป้ายหน้าห้องไฟ

