

## บทที่ 3

### การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลีฟ พัฒนาการ ปัจจุบันโครงการได้เปิดดำเนินการแล้ว เป็นโครงการอาคารพักอาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) อาคารชุดพักอาศัย ขนาดสูง 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 393 ห้อง จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขที่ ทส. 1009.5/7402 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังตารางที่ 3.1

#### 3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ

#### 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการมีแผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง คุณภาพน้ำ น้ำใช้ การจัดการมูลฝอย การป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทั้งนี้ขอบเขตการติดตามตรวจสอบจะดำเนินการภายในพื้นที่ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ

ตารางที่ 3-1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลีฟ พัฒนาการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            | บริเวณที่ตรวจวัด/<br>ความถี่         | พารามิเตอร์                                                                       | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข                  | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1. คุณภาพน้ำ<br>1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง<br>ก่อนการบำบัด | - ถังแยกตะกอน<br>(เดือนละ 1 ครั้ง)   | - pH<br>- BOD<br>- SS<br>- Oil & Grease<br>- Sulfide<br>- TKN<br>- Total Coliform | ◎                                                                                                                                                               | โครงการมีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังแยกตะกอนและถังพักน้ำทิ้ง ซึ่งผลวิเคราะห์น้ำส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ตรวจคุณภาพน้ำ<br>ตามความถี่ที่<br>มาตรการกำหนด | ภาคผนวก ง     |
| 1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง<br>หลังการบำบัด                 | - ถังพักน้ำทิ้ง<br>(เดือนละ 1 ครั้ง) | - pH<br>- BOD<br>- SS<br>- Oil & Grease<br>- Sulfide<br>- TKN<br>- Total Coliform | ◎                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                |               |
| 2. น้ำใช้                                         | - เส้นท่อประปา<br>(เดือนละ 1 ครั้ง)  | - การแตกหรือรั่วซึมของ<br>ท่อประปา                                                | ✓                                                                                                                                                               | โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นท่อเป็นประจำทุกเดือน                                                      | -                                              | -             |

**ตารางที่ 3-1(ต่อ)** รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลีฟ พัฒนาการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจวัด/ความถี่                                                                               | พารามิเตอร์                                                 | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                            | ปัญหา/<br>อุปสรรค/แนว<br>ทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 3. มลฝอย               | - บริเวณห้องพักมูลฝอย<br>ประจำชั้นและห้องพักมูล<br>ฝอยรวมของโครงการ<br>(ตลอดระยะเวลาเปิด<br>ดำเนินการ) | - ปริมาณมูลฝอย<br>ตกค้าง<br>- ความสะอาด                     | ✓                                                                                                                                                               | โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลทำความสะอาด<br>ห้องพักมูลฝอยรวมและห้องพักมูลฝอยประจำชั้นสม่ำเสมอ                                      | -                                 | ภาคผนวก ข<br>รูปภาพที่ 9  |
| 4. ระบบป้องกันอัคคีภัย | 1. อุปกรณ์ในระบบป้องกัน<br>และสัญญาณเตือนอัคคีภัย<br>(3 เดือน/ ครั้ง)                                  | - สภาพพร้อมใช้งาน                                           | ✓                                                                                                                                                               | โครงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามบริเวณจุดต่างๆ และจัด<br>ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้<br>อย่างประสิทธิภาพ | -                                 | ภาคผนวก ข<br>รูปภาพที่ 14 |
|                        | 2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง<br>(3 เดือน/ ครั้ง)                                                              | - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่<br>ตลอดเวลา และมี<br>สภาพพร้อมใช้งาน | ✓                                                                                                                                                               | โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบจ่าย<br>ไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ                                               | -                                 | -                         |
|                        | 3. ป้ายและเครื่องหมาย<br>แสดงการหนีไฟ และ<br>แผนผังเส้นทางหนีไฟ<br>(3 เดือน/ ครั้ง)                    | - สภาพดี มองเห็น<br>ชัดเจนและไม่ลบ<br>เลือน                 | ✓                                                                                                                                                               | โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบป้ายเครื่องหมายแสดง<br>การหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟให้เห็นชัดเจน                                    | -                                 | ภาคผนวก ข<br>รูปภาพที่ 14 |

**ตารางที่ 3-1(ต่อ)** รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลีฟ พัฒนาการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม          | บริเวณที่ตรวจวัด/ความถี่                                                  | พารามิเตอร์                            | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                  | ปัญหา/<br>อุปสรรค/แนว<br>ทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 4. ระบบป้องกันอัคคีภัย<br>(ต่อ) | 4. อุปกรณ์ดับเพลิง<br>- เครื่องดับเพลิง<br>แบบหิ้วได้<br>(3 เดือน/ ครั้ง) | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- อายุการใช้งาน   | ✓                                                                                                                                                               | โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้มี<br>สภาพพร้อมใช้งานเสมอ | -                                 | ภาคผนวก ข<br>รูปภาพที่ 14 |
|                                 | - หัวรับน้ำดับเพลิง<br>(3 เดือน/ ครั้ง)                                   | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- เข้าถึงได้สะดวก | ✓                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                   |                           |
|                                 | - สายฉีดน้ำดับเพลิง<br>และตู้เก็บสายฉีด (FHC)<br>(1 เดือน/ ครั้ง)         | - สภาพพร้อมใช้งาน                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                   |                           |
|                                 | - ถังเก็บน้ำใช้<br>และน้ำดับเพลิง<br>(1 เดือน/ ครั้ง)                     | - สภาพพร้อมใช้งาน                      | ✓                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                   |                           |
|                                 | - Sprinkler System<br>(1 เดือน/ ครั้ง)                                    | - สภาพพร้อมใช้งาน                      | ✓                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                   |                           |
|                                 | - เครื่องสูบน้ำดับเพลิง<br>(Fire Pump)<br>(1 เดือน/ ครั้ง)                | - สภาพพร้อมใช้งาน                      | ✓                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                   |                           |

**ตารางที่ 3-1(ต่อ)** รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลีฟ พัฒนาการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                              | บริเวณที่ตรวจวัด/ความถี่                                                  | พารามิเตอร์                                                                   | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ |                                                                                                                                                                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค/แนว<br>ทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 4. ระบบป้องกันอัคคีภัย<br>(ต่อ)                                     | 5. บันไดหนีไฟและเส้นทาง<br>ในการหนีไฟ<br>(1 เดือน/ ครั้ง)                 | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- ไม่มีสิ่งกีดขวาง                                       | ✓                                                                                                                                                               | โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบบันไดหนีไฟและเส้นทาง<br>ในการหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่มีสิ่งกีดขวาง                                                        | -                                 | ภาคผนวก ข<br>รูปภาพที่ 14 |
| 5. ระบบระบายอากาศ                                                   | - ช่องระบายอากาศ<br>ธรรมชาติ เช่น<br>หน้าต่างและประตู<br>(1 เดือน/ ครั้ง) | - ไม่มีวัตถุหรือ<br>สิ่งกีดขวาง                                               | ✓                                                                                                                                                               | โครงการตรวจสอบช่องระบายอากาศไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง<br>สามารถระบายอากาศได้ตลอดเวลา                                                                                | -                                 | ภาคผนวก ข<br>รูปภาพที่ 19 |
| 6. คุณภาพชีวิตและ<br>ความพึงพอใจของผู้<br>อยู่อาศัยภายใน<br>โครงการ | - ผู้อยู่อาศัย<br>(ตลอดระยะเวลาเปิด<br>ดำเนินการ)                         | - ประเมินเรื่องราว<br>ร้องทุกข์ข้อเสนอแนะ<br>และข้อคิดเห็นของผู้<br>อยู่อาศัย | ✓                                                                                                                                                               | โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งได้จัดตั้ง<br>กล่องรับฟังความคิดเห็นไว้โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้<br>ปัจจุบันยังไม่พบเรื่องร้องเรียนใดๆ | -                                 | -                         |

### 3.4 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ (ระยะดำเนินการ) กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการจำนวน 2 จุด ได้แก่ ถังแยกตะกอน, ถังพักน้ำทิ้ง, โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

#### 3.4.1. ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ (ระยะดำเนินการ) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการจำนวน 2 จุด ความถี่ในการตรวจวัด 1 เดือน/ครั้ง โดยมีรายละเอียดการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1

ตารางที่ 3.4-1 ขอบเขตการดำเนินการ และวิธีการวิเคราะห์

| มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                            | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                              | ความถี่         | ช่วงเวลาทำการตรวจวัด |         |          |          |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                 | ม.ค. 69              | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 |
| 1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      |         |          |          |         |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>น้ำทิ้งก่อนการบำบัด ถึงแยกตะกอน</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>pH</li><li>Biochemical Oxygen Demand</li><li>Suspended Solids</li><li>Sulfide</li><li>Fat Oil and Grease</li><li>Total Kjeldahl Nitrogen</li><li>Total Coliform Bacteria</li></ul> | เดือนละ 1 ครั้ง |                      |         |          |          |         | ✓        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>น้ำทิ้งหลังการบำบัด ถึงพักน้ำทิ้ง</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>pH</li><li>Biochemical Oxygen Demand</li><li>Suspended Solids</li><li>Sulfide</li><li>Fat Oil and Grease</li><li>Total Kjeldahl Nitrogen</li><li>Total Coliform Bacteria</li></ul> |                 |                      |         |          |          |         | ✓        |

### 3.4.2. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### 1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น ถนนพัฒนาการ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังตารางที่ 3.4-2 ถึงตารางที่ 3.4-3 และรูปภาพที่ 3.2-1 ถึงรูปภาพที่ 3.2-3 เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งหลังการบำบัด มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ส่วนคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่องจากน้ำทิ้งดังกล่าวไม่ได้ปล่อยออกสู่สาธารณะ

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณที่ตรวจวัด : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด ถึงแยกตะกอน


| ดัชนีการตรวจวิเคราะห์     | หน่วย     | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |         |          |          |         |                     |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|----------|---------|---------------------|
|                           |           | ม.ค. 69                     | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69            |
| pH                        | -         | -                           | -       | -        | -        | -       | 7.5                 |
| Total Suspended Solids    | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | 20                  |
| Biochemical Oxygen Demand | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | 40                  |
| Sulfide                   | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | <1.0                |
| Total Kjeldahl Nitrogen   | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | 42.56               |
| Oil and Grease            | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | <5                  |
| Total Coliform Bacteria   | MPN/100mL | -                           | -       | -        | -        | -       | 2.1x10 <sup>2</sup> |

มาตรฐาน : ไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข เนื่องจากน้ำทิ้งดังกล่าวไม่ได้ปล่อยออกสู่สาธารณะ  
- ไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ


**ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณที่ตรวจวัด : น้ำทิ้งหลังการบำบัด ถึงพักน้ำทิ้ง**

| ดัชนีการตรวจวิเคราะห์     | หน่วย     | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |         |          |          |         |          | มาตรฐาน |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
|                           |           | ม.ค. 69                     | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 |         |
| pH                        | -         | -                           | -       | -        | -        | -       | 7.6      | 5.5-9.0 |
| Total Suspended Solids    | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | 24       | <40     |
| Biochemical Oxygen Demand | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | 18       | <30     |
| Sulfide                   | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | <1.0     | <1.0    |
| Total Kjeldahl Nitrogen   | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | 23.24    | <35     |
| Oil and Grease            | mg/L      | -                           | -       | -        | -        | -       | <5       | <20     |
| Total Coliform Bacteria   | MPN/100mL | -                           | -       | -        | -        | -       | 1.8      | -       |

**มาตรฐาน** : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข  
- ไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

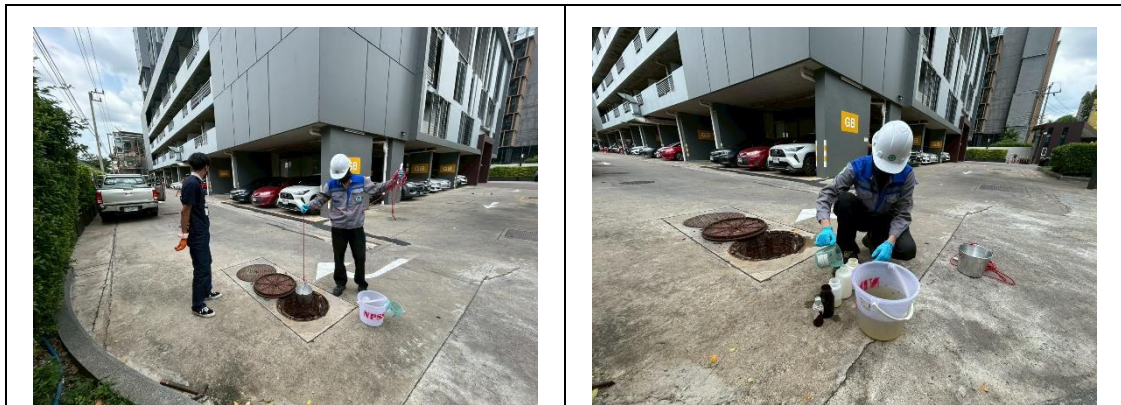

**รูปภาพที่ 3.4-1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง**  
บริเวณที่ตรวจวัด : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด ถึงแยกตะกอน

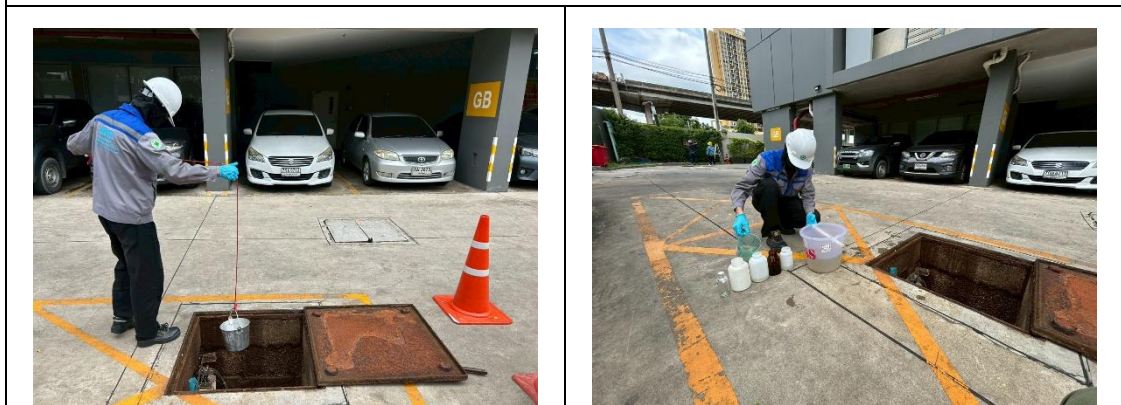

**รูปภาพที่ 3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง**  
บริเวณที่ตรวจวัด : น้ำทิ้งหลังการบำบัด ถึงพักน้ำทิ้ง

