

บทที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดนิช โมโน สุขุมวิท-ปิ่นเกล้า ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามตามเงื่อนไขของมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิช โมโน สุขุมวิท-ปทุมเจ้า

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2. ระยะดำเนินการ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ความเสียหายของต้นไม้ภายในโครงการ	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• ตรวจสอบและดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ถ้ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกใหม่ทดแทนทันที	ภาพที่ 2.3
2.2 การเกิดแผ่นดินไหว	- อาคารของโครงการ	- การแตกร้าว/ความเรียบร้อยของโครงสร้างอาคาร	ปีละ 1 ครั้ง	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารทุก 1 ปี	ภาคผนวก 2.6
2.3 คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน	ปีละ 3 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และในช่วงเดือนกันยายน	• จัดให้มีการจัดจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่าง	ภาคผนวก 2.2

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการนิช โมโน สุขุมวิท-ปู้เจ้า

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- พื้นที่สีเขียว	- ความเสียหายของต้นไม้ภายในโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.3
2.4 น้ำใช้	- ท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างประจำอาคารตรวจสอบตามแผนการบำรุงรักษา	ภาคผนวก 2.9
2.5 คุณภาพน้ำทิ้ง	- ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ จำนวน 4จุด ดังนี้ 1) น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด 2) น้ำทิ้งหลังออกกระบบบำบัด 3) บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ (หน้าโครงการ) 4) บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ (ท้ายโครงการ)	- pH - BOD - Suspended Solid - Total Dissolved Solid - SulFide - TKN - Grease & Oil - Total Coliform Bacterial	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• ตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาของระบบ • จัดให้มีการจัดจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่าง	ภาพที่ 3.1 ภาคผนวก 2.9

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิช โมโน สุขุมวิท-ปทุมเจ้า

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.5 คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร	- ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
2.6 การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำ	- สิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ตรวจสอบระบบระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการเป็นประจำ หากพบว่ามีสิ่งอุดตันหรือสะสมของตะกอนดิน เศษวัสดุอื่นๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ จะทำการลอกทำความสะอาดทันที	ภาคผนวก 2.9
2.7 การจัดการมูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอย	- การแตกรั่วของถัง	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลความสะอาดบริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมทุกวัน	ภาพที่ 1.5

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการนิช โมโน สุขุมวิท-ปู้เจ้า

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.7 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)	- ห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น	ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นประจำ	ภาพที่ 1.5
2.8 ระบบไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	การชำรุดของไฟส่องสว่าง	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้อยู่ในสภาพดี หากชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว	ภาคผนวก 2.9
2.9 การอนุรักษ์พลังงาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	ความเสียหายของต้นไม้ภายในโครงการ	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ	ภาพที่ 2.6

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิช โมโน สุขุมวิท-ปุเจ้า

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.10 การป้องกันอัคคีภัย	- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งานโดยตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• เจ้าหน้าที่ช่างประจำอาคารตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการตามคู่มืออุปกรณ์ ต้องอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ภาพที่ 1.8
	- เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- จัดอบรมให้ความรู้	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมและซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุก 1 ปี	ภาคผนวก 2.7
2.11 การระบายอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ความเสียหายของไม้ยืนต้นไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ถ้ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกใหม่ทดแทนทันที	ภาพที่ 2.3
	- ที่จอดรถ	- สิ่งกีดขวาง/ปิดกั้นการระบายอากาศ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่จอดไม่ให้มีการติดตั้งสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	ภาพที่ 2.2

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิช โมโน สุขุมวิท-ปทุมธานี

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2.12 การคมนาคม	- ป้ายและเครื่องหมายจราจร	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีถลอกขีดจางให้เปลี่ยนใหม่	ภาพที่ 2.2

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 4 จุด ได้แก่ น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด จำนวน 1 จุด น้ำทิ้งหลังออกระบบบำบัด จำนวน 1 จุด บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ (บริเวณถนนสุขุมวิท) จำนวน 1 จุด และบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ (บริเวณถนนปู้เจ้าสายเก่า) จำนวน 1 จุด



ภาพที่ 3.1 ภาพการเก็บตัวอย่างน้ำเสียภายในโครงการ

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และทำการเก็บตัวอย่างน้ำตามที่มาตรการกำหนด ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ได้ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท-ปุเจ้า ของ นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน สุขุมวิท ปุเจ้า

จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน)

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 672243.25$ $y = 1508314.58$ 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ ^(๓)
		26 ม.ค.	26 ก.พ.	26 มี.ค.	6 เม.ย.	11 พ.ค.	4 มิ.ย.		
pH	-	8.20	7.55	7.93	7.28	7.50	7.48	5-9	
BOD	mg/l	16	29	51	124	202	117	≤ 20	
SS	mg/l	18	61	51	62	46	40	≤ 30	
TDS	mg/l	283	351	466	548	522	604	≤ 1000	
Settleable Solids	mg/l	<0.1	0.8	1.0	0.5	0.1	0.1	≤0.5	
Sulfide	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	1.9	0.2	2.1	≤ 1.0	
TKN	mg/l	16.70	35.78	59.64	71.06	81.42	82.12	≤ 35	
Oil & Grease	ml/l/hr	2.7	1.2	0.7	4.4	4.6	4.3	≤ 20	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท-ปุเจ้า ของ นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน สุขุมวิท ปุเจ้า

จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน)

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 672243.25$ $y = 1508314.58$ 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ ^(๓)
		26 ม.ค.	26 ก.พ.	26 มี.ค.	6 เม.ย.	11 พ.ค.	4 มิ.ย.		
pH	-	7.50	7.82	7.89	7.21	7.41	7.46	5-9	
BOD	mg/l	10	8	133	57	32	59	≤ 20	
SS	mg/l	15	14	132	16	17	28	≤ 30	
TDS	mg/l	266	323	858	448	480	534	≤ 1000	
Settleable Solids	mg/l	<0.1	<0.1	2.0	0.5	0.1	<0.1	≤ 0.5	
Sulfide	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	0.6	≤ 1.0	
TKN	mg/l	15.21	16.40	76.04	57.15	44.05	39.89	≤ 35	
Oil & Grease	ml/l/hr	2.8	1.9	4.2	1.4	0.8	1.4	≤ 20	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท-ปุเจ้า ของ นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน สุขุมวิท ปุเจ้า

จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน)

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ (ถนนสุขุมวิท)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 672243.25$ $y = 1508314.58$ 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ ^(๓)
		26 ม.ค.	26 ก.พ.	26 มี.ค.	6 เม.ย.	11 พ.ค.	4 มิ.ย.		
pH	-	7.65	7.53	8.11	7.70	7.51	7.84	5-9	
BOD	mg/l	11	1	5	14	8	7	≤ 20	
SS	mg/l	17	13	10	17	56	22	≤ 30	
TDS	mg/l	285	389	238	192	152	238	≤ 1000	
Settleable Solids	mg/l	<0.1	<0.1	0.1	0.5	0.7	<0.1	≤ 0.5	
Sulfide	mg/l	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	≤ 1.0	
TKN	mg/l	18.49	14.91	1.78	1.22	0.91	15.06	≤ 35	
Oil & Grease	ml/l/hr	2.3	2.8	0.8	1.0	0.8	1.1	≤ 20	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท-ปุเจ้า ของ นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน สุขุมวิท ปุเจ้า

จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ (ถนนสายเก่า)



ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 672243.25$ $y = 1508314.58$ 47P



ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ ^(๓)
		26 ม.ค.	26 ก.พ.	26 มี.ค.	6 เม.ย.	11 พ.ค.	4 มิ.ย.		
pH	-	7.50	7.80	7.93	7.09	7.56	7.45	5-9	
BOD	mg/l	9	10	16	62	47	61	≤ 20	
SS	mg/l	15	18	30	15	23	43	≤ 30	
TDS	mg/l	236	210	368	234	264	498	≤ 1000	
Settleable Solids	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	≤0.5	
Sulfide	mg/l	<0.2	<0.2	0.2	0.4	<0.2	0.2	≤ 1.0	
TKN	mg/l	12.52	17.30	8.35	16.40	8.51	14.27	≤ 35	
Oil & Grease	ml/l/hr	2.3	1.6	1.7	1.8	1.3	1.6	≤ 20	



หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้



(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

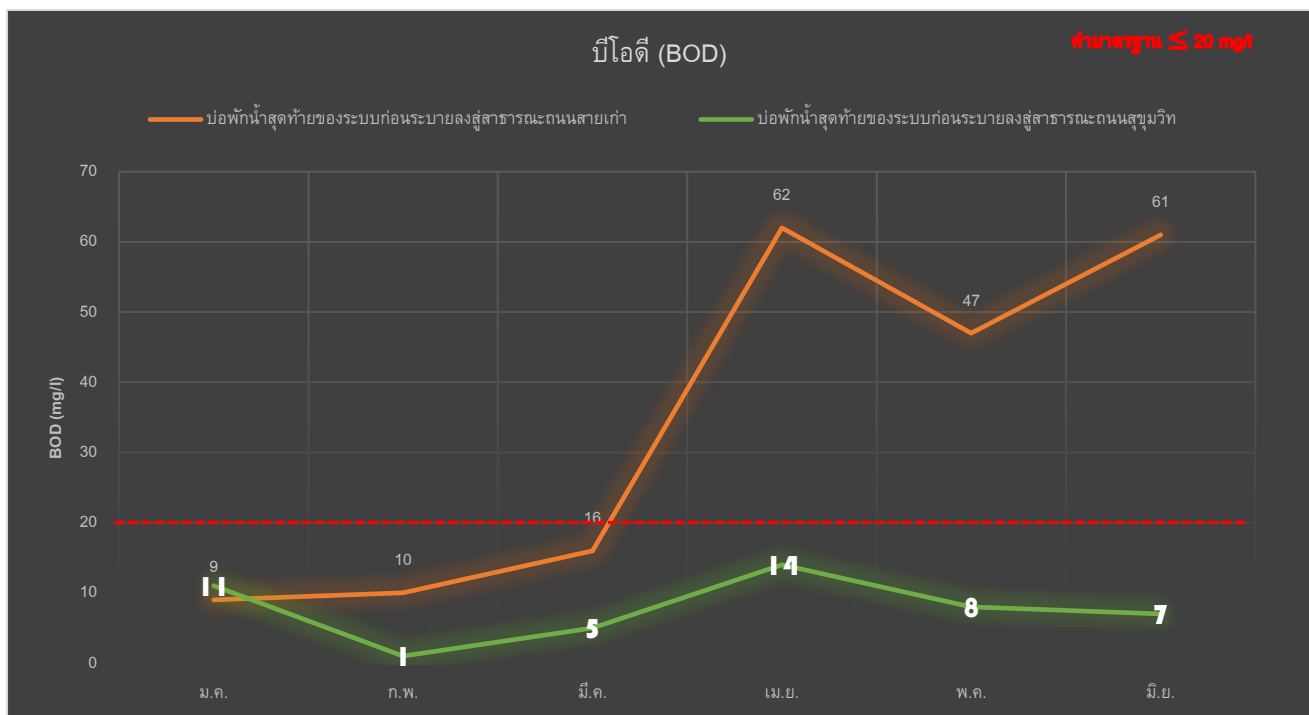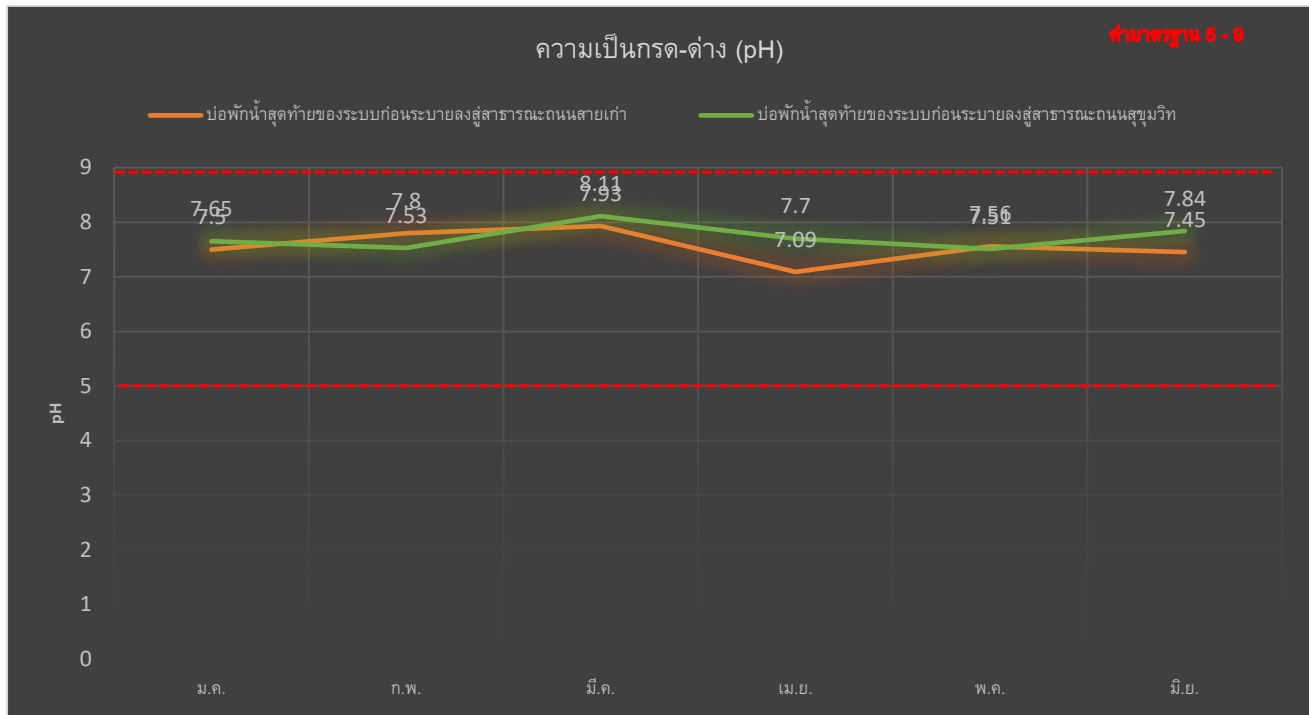

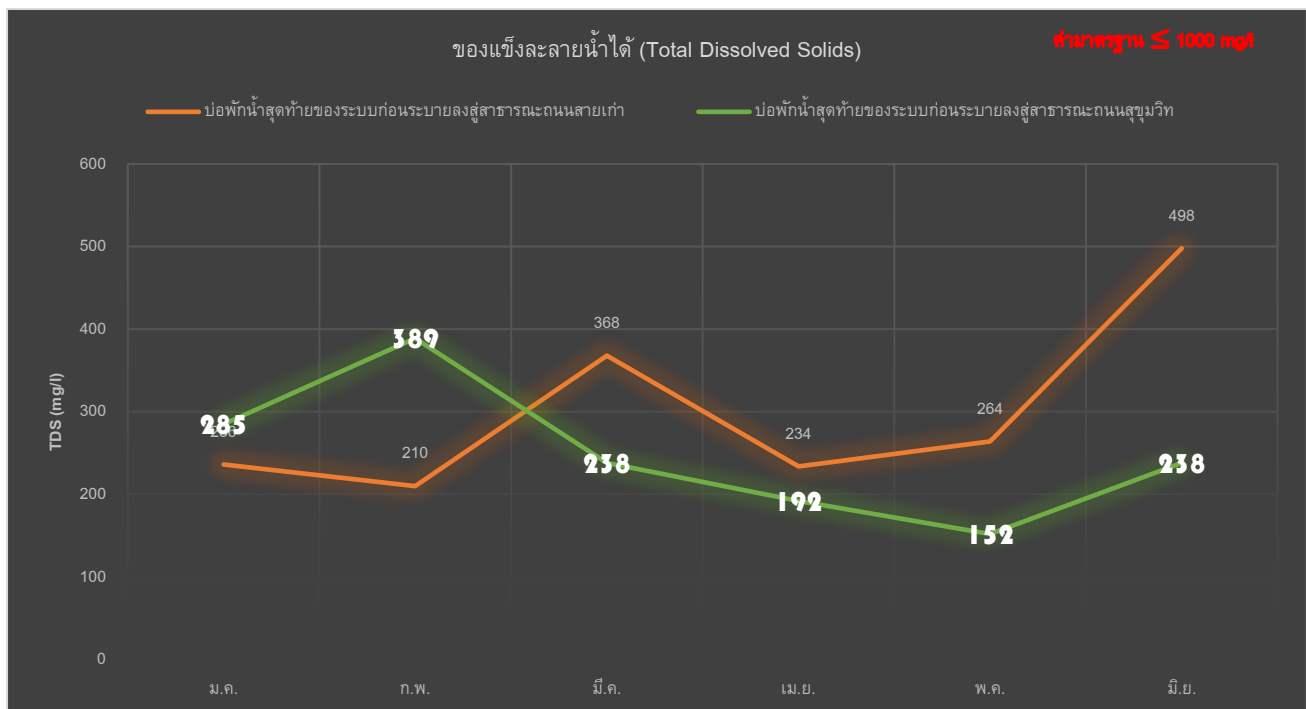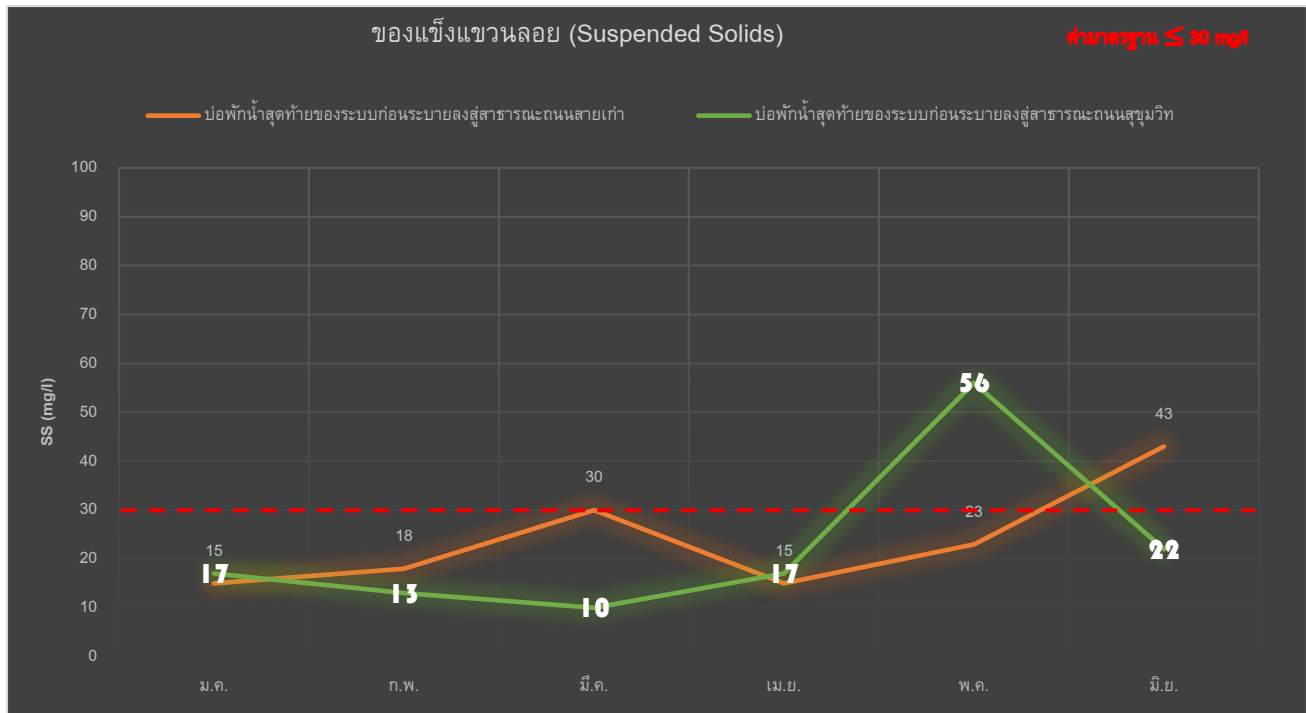

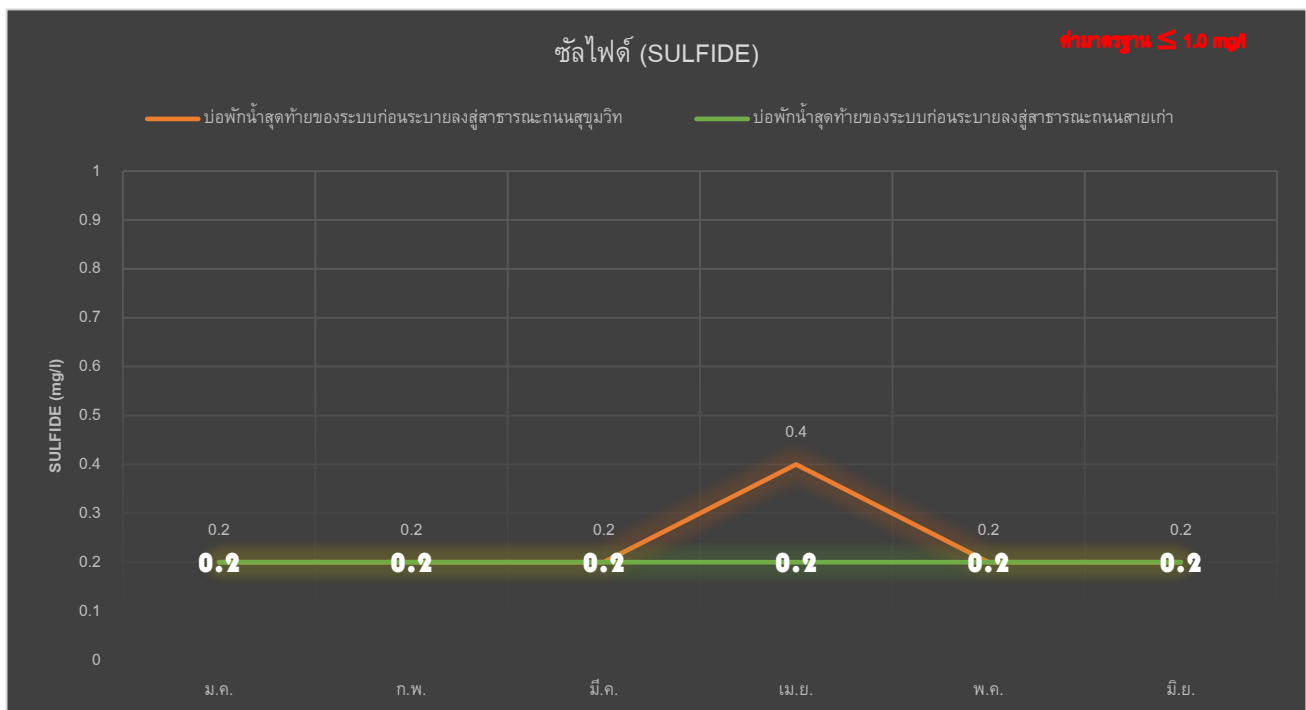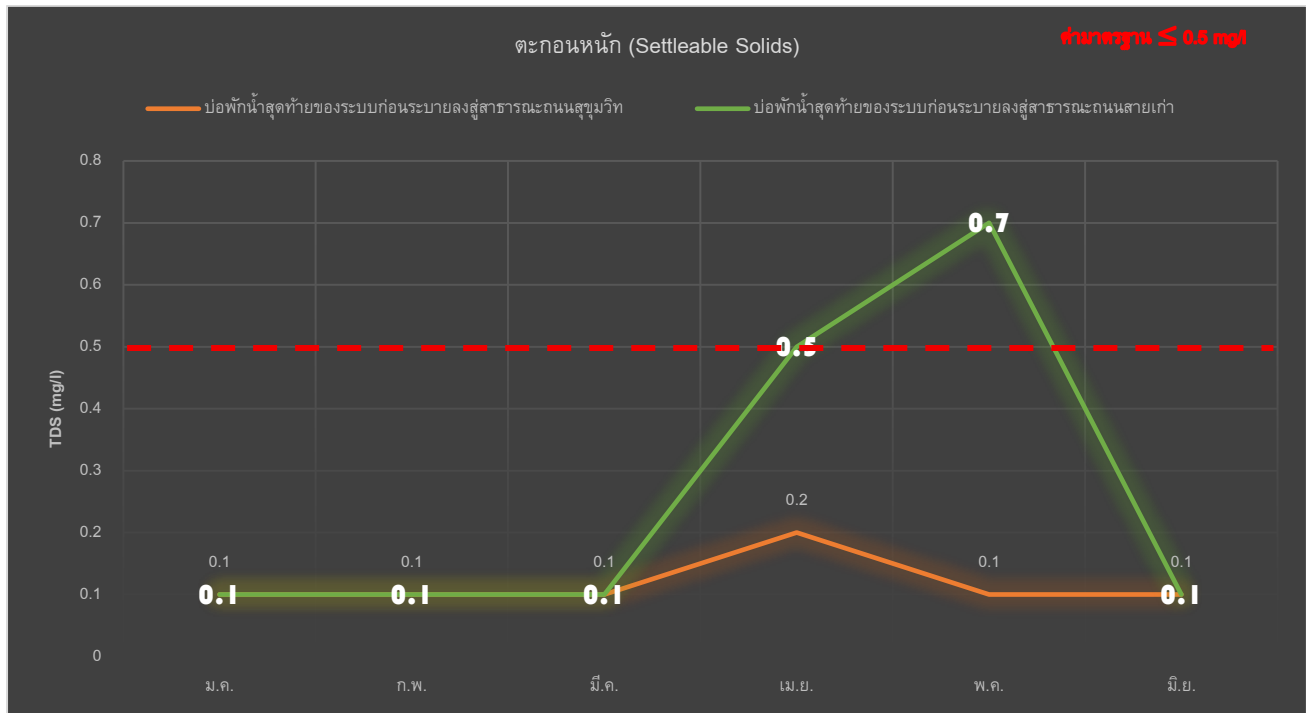

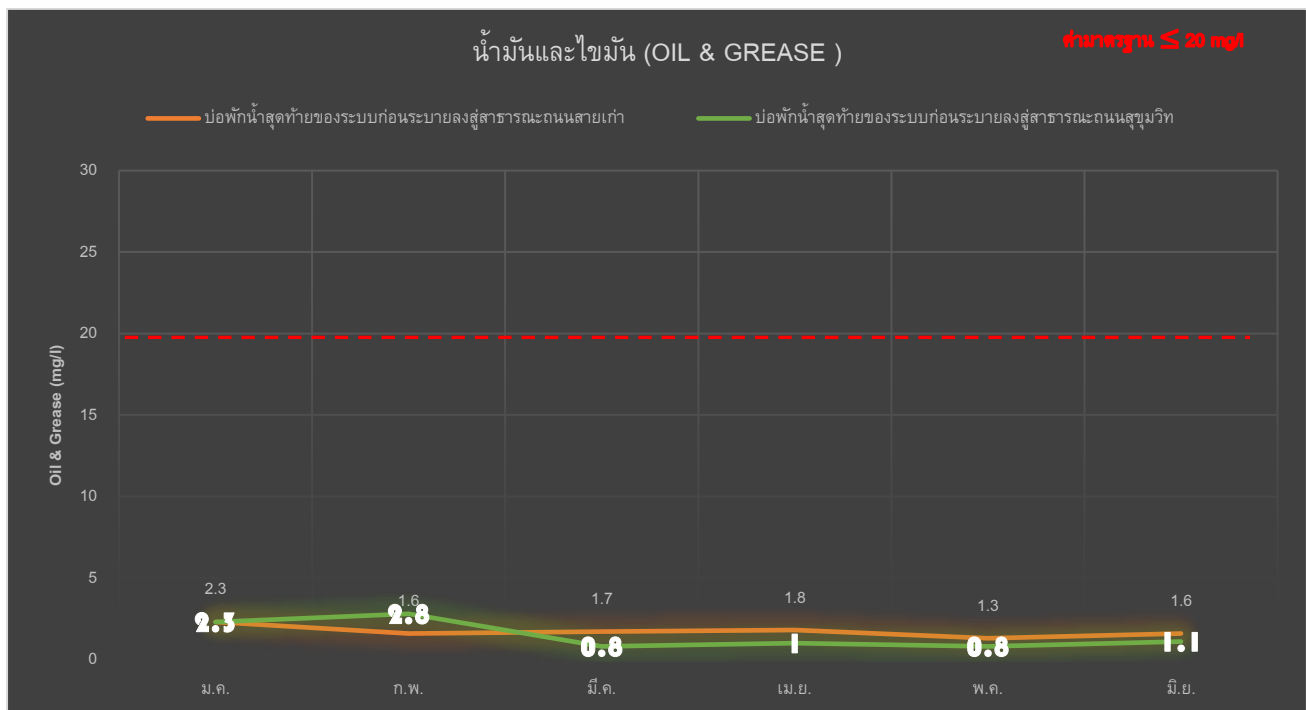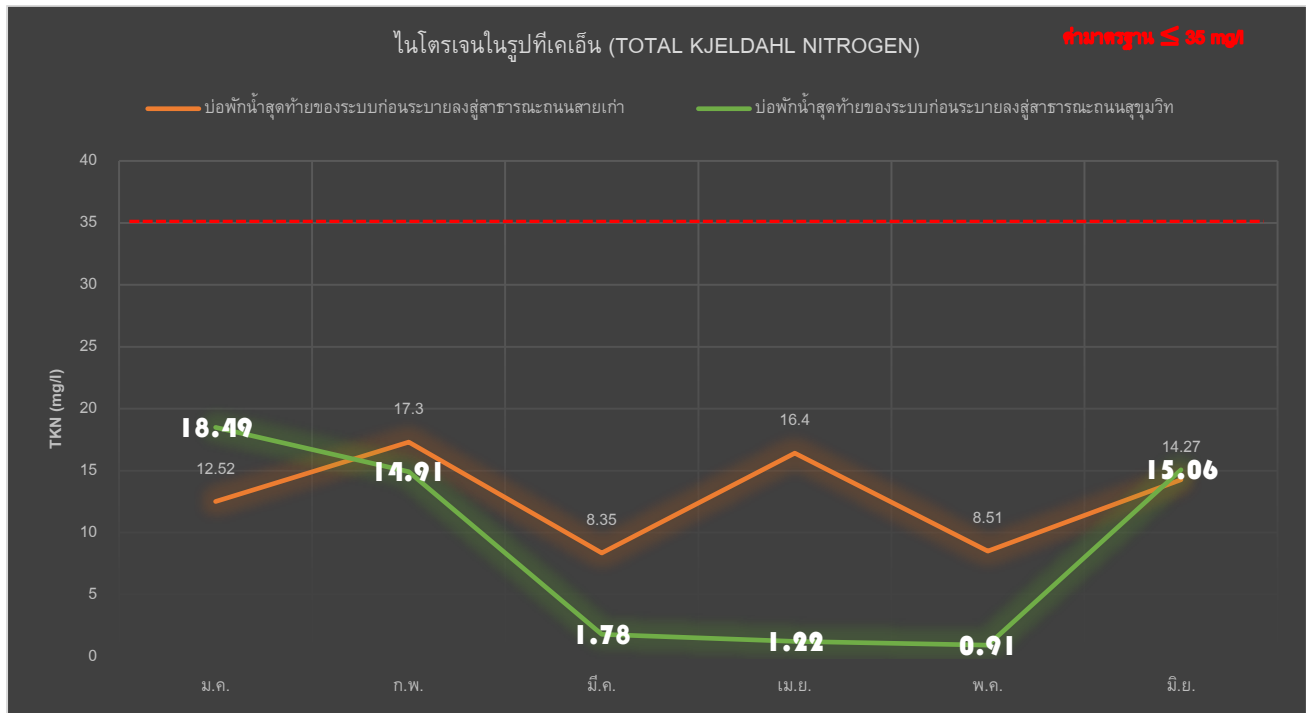

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ภายในโครงการ ระหว่างอาคาร B และ C ปีละ 3 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และในช่วงเดือนกันยายน



ภาพที่ 3.2 ภาพการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และทำการเก็บตัวอย่าง ตามที่มาตรการกำหนด ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เทียบกับมาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศได้ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท - ปู่เจ้า ของ นิติบุคคลอาคารชุด นิช โมโน สุขุมวิท - ปู่เจ้า

จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน)

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณโครงการ

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 672243.25$ $y = 1508314.58$ 47P

ดัชนีคุณภาพอากาศ		หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน
			30 มี.ค.						
PM ₁₀		(mg/m ³)	35						ไม่เกิน 100
SO ₂	1 hr. ⁽⁵⁾	(mg/m ³)	4.87						ไม่เกิน 100
	24 hrs.	(mg/m ³)	6.45						ไม่เกิน 50
NO ₂	1 hr. ⁽⁵⁾	(mg/m ³)	12.47						ไม่เกิน 120
	24 hrs.	(mg/m ³)	10.65						-

- หมายเหตุ
- (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 - (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
 - (3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 - (4) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
 - (5) เป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง (Max 1 hr.) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

