

### 3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 พบว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ที่โครงการต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้น 10 ปัจจัย รวม 36 มาตรการ

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3

| <div>ตารางที่ 3</div> <div>สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569</div> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                            | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. ทรัพยากรทางกายภาพ<br>1.1 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน                                                                                                                                                  | 1) มีการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และระดับเสียง | 1) มีป้ายกำหนดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม. บริเวณทางเข้า-ออก และกระจายตามแนวถนนภายในโครงการ รวมทั้งมีสัญญาณชะลอความเร็วเพื่อช่วยลดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการ | ไม่มี                                                    | <div>  <p>ป้ายจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม. บริเวณทางเข้า-ออก</p>  <p>ป้ายจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม. ภายในโครงการ</p>  <p>สัญญาณชะลอความเร็ว บริเวณทางเข้า-ออก</p>  <p>สัญญาณชะลอความเร็วโครงการ</p> </div> |



| ตารางที่ 3                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                    |
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                 | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                 | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข                                       | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                      |
| 1.2 การชะล้างพังทลายของดิน                                                                                                                                                             | มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาดันไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ บริเวณบ่อหนองน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ                                                                                             | มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาดันไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ดันไม้ และพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหนองน้ำอยู่ในสภาพดี                                                                                        | ดูแลรักษาดันไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตัดหญ้าในส่วนที่ขึ้นรก |  <p>ดันไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหนองน้ำ</p> |
| 2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์<br>2.1 การใช้น้ำ                                                                                                                                      | 1) จัดให้มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัดและ/หรือเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ                                                                        | 1) มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ รวมทั้งมีการรณรงค์ผ่านเสียงตามสายให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด                                                                   | ไม่มี                                                                                          |  <p>สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำศูนย์ชุมชน</p>            |
|                                                                                                                                                                                        | 2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์และป้องกันการปนเปื้อนของน้ำประปา | 2) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบท่อประปา และก๊อกน้ำส่วนกลาง ส่วนเครื่องสุขภัณฑ์ในหน่วยพักเป็นความรับผิดชอบดูแลของผู้พักอาศัยแต่ละหน่วย จากการตรวจสอบพบว่า ระบบจ่ายน้ำ ระบบท่อประปา และก๊อกน้ำส่วนกลางอยู่ในสภาพดี | ไม่มี                                                                                          |  <p>ระบบเส้นท่อประปา</p>                      |


| <p style="text-align: center;"><b>ตารางที่ 3</b><br/> <b>สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                                          | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการและแนวทางแก้ไข                                                                         | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2 การระบายน้ำฝน                                                                                                                                                                                                                                       | 1) มีบ่อหนองน้ำฝนขนาดความจุ 4,458.04 ลบ.ม. ก่อนระบายลงสู่ลำรางสาธารณะด้านข้างโครงการ คิดเป็นเวลาพักกักน้ำประมาณ 45 นาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมของพื้นที่ก่อนมีโครงการ                                                                                                                             | 1) มีบ่อหนองน้ำ ซึ่งมีขนาดความจุและมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการตามที่มาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มี                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักขยะ และท่อระบายน้ำ และบ่อหนองน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ต้อยเสมอ รวมทั้งทำการขุดลอกกระดืบตะกอนและวัชพืชในบ่อหนองน้ำเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และให้มีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว บริเวณบ่อหนองน้ำไม่ให้มีรากหญ้ารก | 2) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำ ตะแกรงดักขยะ ท่อระบายน้ำ และบ่อหนองน้ำ แต่ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบระบายน้ำ ตะแกรงดักขยะ ท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพดี ส่วนต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหนองน้ำ จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหนองน้ำอยู่ในสภาพดี | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในโครงการ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพที่ต้อยเสมอ โดยตัดหญ้าในส่วนที่ขึ้นรก |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 3) ติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ” บริเวณบ่อหนองน้ำ ซึ่งเป็นบ่อเปิด เพื่อเตือนให้ผู้พบเห็นระมัดระวังและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น                                                                                                                                                               | 3) มีรั้วรอบบ่อหนองน้ำความสูง 1.20 เมตร และมีป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ” บริเวณรั้วรอบบ่อหนองน้ำตามที่มาตรการกำหนด จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหนองน้ำอยู่ในสภาพดี                                                                                                                      | ไม่มี                                                                                                                                    | <p>ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหนองน้ำ</p>  <p>ป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ”</p>  <p>รั้วรอบบ่อหนองน้ำ</p> |

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 การจัดการน้ำเสีย                   | 1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้มีหน่วยบำบัดครบตามจำนวนและขนาดที่ออกแบบไว้                       | 1) โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นชนิดและมีขนาดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ มีรายละเอียดดังนี้<br>- ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เป็นระบบบำบัดแบบติดกับที่ ชนิดถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 1.0 ลบ.ม. ติดตั้งไว้ประจำบ้านพัก หน่วยละ 1 ชุด<br>- ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter Tank) ขนาด 2.0 ลบ.ม. สำหรับศูนย์ชุมชน จำนวน 1 ชุด<br>- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเลี้ยงตะกอนแบบฟิล์มตรึงชนิดเติมอากาศ (Fixed Film Aeration) สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียสูงสุดได้ 3,000 ลบ.ม./วัน<br>จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชำรุด | ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้สามารถทำงานได้ตามปกติ  |  <p>ระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยพัก</p>  <p>ระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์ชุมชน</p>  <p>ระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p> |
|                                        | 2) ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียและให้จัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย | 2) มีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม แต่ยังไม่มีการจัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียรวม             |  <p>มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

| <p style="text-align: center;"><b>ตารางที่ 3</b><br/> <b>สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                                          | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการและแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
| 2.3 การจัดการน้ำเสีย<br>(ต่อ)                                                                                                                                                                                                                           | 3) จัดให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เหมาะสมตามข้อกำหนดของทางราชการ ทำหน้าที่ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ                                                                                                       | 3) มีช่างเทคนิคจากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูคอยดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มี                                                            | -                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 4) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ                                                   | 4) มีช่างเทคนิคจากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูคอยดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางชำรุด โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1)                                                                                                                  | ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้ตามปกติ                  | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแสดงไว้ในภาคผนวก ข                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 5) ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้ดีเสมอ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว                                                      | 5) มีช่างเทคนิคจากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูคอยดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือของระบบบำบัดน้ำเสีย จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชำรุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มี                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 6) ตรวจสอบตะกอนในบ่อกักตะกอนทุก 2 เดือน หากพบว่ามีปริมาณมากเกินไป (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง) ต้องดำเนินการสูบออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนแข็งติดอยู่ก้นบ่อ กำจัดออกได้ยาก และส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดของระบบ | 6) มีช่างเทคนิคจากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อกักตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม แต่ยังไม่มีการสูบตะกอนในบ่อกักตะกอนไปกำจัด เนื่องจากปริมาณยังไม่เกินขีดกักเก็บ 1 ใน 3 ของความสูงถังและจากการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชำรุด โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า SS น้อยมาก และมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1) |                                                                  |                                                                                      |

| ตารางที่ 3                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                 | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.4 การจัดการมูลฝอย                                                                                                                                                                    | 1) จัดให้มีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะสามารถป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวน โดยมีขนาดที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน                                                                                                                                                                                  | 1) มีโรงพักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้นาน 3 วัน ตามที่มาตรการกำหนด จากการตรวจสอบยังไม่มีการเปิดใช้งานโรงพักมูลฝอยรวม                                             | ไม่มี                                                    | <br>โรงพักขยะมูลฝอยรวม                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                        | 2) ตรวจสอบที่พักมูลฝอยรวมเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดหรือรั่วซึม ต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                     | 2) ยังไม่มีการเปิดใช้งานโรงพักมูลฝอยรวม เนื่องจากมีถังขยะประจำหน่วยพักแต่ละหน่วยพัก โดยมีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูเข้ามาเก็บขนเป็นประจำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จากการตรวจสอบไม่พบขยะตกค้างภายในโครงการ | ไม่มี                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                        | 3) กำหนดให้มีการทำความสะอาดที่พักขยะมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดที่พักมูลฝอยให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ                                                                                                                                                               | 3) ยังไม่มีการทำความสะอาดที่พักขยะมูลฝอย เนื่องจากยังไม่มีการเปิดใช้งานโรงพักมูลฝอยรวม                                                                                                        | ไม่มี                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                        | 4) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย                                                                                                                                                                                                                                           | 4) มีการส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย ผ่านเสียงตามสาย รวมทั้งมีจุดคัดแยกขยะไว้บริเวณด้านหน้าศูนย์ชุมชน                                       | ไม่มี                                                    | <br>เสียงตามสาย<br><br>จุดคัดแยกขยะบริเวณศูนย์ชุมชน<br><br>ถังขยะอันตรายบริเวณศูนย์ชุมชน |
|                                                                                                                                                                                        | 5) จัดให้มีถังขยะรองรับขยะอันตรายที่มีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร จุดละ 1 ถัง และมีป้ายเตือน “ถังขยะอันตราย” ซึ่งจะสามารถรวบรวมขยะอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการจะจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดประเภทขยะอันตราย และแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของถังขยะรองรับขยะอันตราย เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำไปทิ้งยังถังรองรับได้อย่างถูกต้อง | 5) มีถังรองรับขยะอันตรายที่มีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้บริเวณศูนย์ชุมชนและมีป้าย “ถังขยะอันตราย” รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์แจ้งจุดทิ้งขยะอันตรายผ่านเสียงตามสาย              | ไม่มี                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                        | 6) หากมีปริมาณขยะอันตรายมากพอให้เจ้าหน้าที่โครงการเก็บรวบรวมไปไว้ยังโรงคัดแยกขยะ และประสานงานไปยังเทศบาลที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ จัดหาบริษัทที่ได้รับอนุญาตขนส่งและกำจัดขยะอันตรายของเทศบาลนั้นๆ เพื่อนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี                                                                                            | 6) มีการประสานงานให้เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูเข้ามาเก็บขนขยะอันตรายภายในโครงการเมื่อมีปริมาณมาก                                                                                                  | ไม่มี                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                      | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการและแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5 การคมนาคมขนส่ง                             | 1) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง ป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ ในระยะทางที่เหมาะสม และมีไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน | 1) มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทิศทางการเดินทาง และป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ ก่อนถึงโครงการ ระยะ 200 เมตร และมีไฟส่องสว่างซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน | ไม่มี                                                            |  <p>ป้ายชื่อโครงการ</p>  <p>ป้ายแสดงทิศทางการเดินทาง</p>  <p>ป้ายแสดงก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ</p> |
|                                                | 2) ต้องมีสัญญาณความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และสามารถชะลอความเร็วได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย            | 2) มีสัญญาณความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ                                                                                                              | ไม่มี                                                            |  <p>สัญญาณชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p>                                                                                                                                                                                                                      |

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                           | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                 | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)               | 3) ควบคุมการจราจรภายในโครงการโดยติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว และป้ายแสดงทางแยกทุกแห่งให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจน จัดทำเครื่องหมายบนพื้นถนนแสดงทิศทางการจราจรที่ชัดเจน | 3) มีการควบคุมการจราจรภายในโครงการ โดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม. สันนุนชะลอความเร็วป้ายจราจร และป้ายกฤษฎาชะลอความเร็ว กระจายตามแนวถนนภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการจราจรบนพื้นถนน และป้ายกฤษฎาชะลอความเร็วมีสภาพเลือนราง รวมทั้งมีต้นไม้บดบังป้ายจราจรบางส่วนภายในโครงการ | จัดให้มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการจราจรบนพื้นถนนภายในโครงการ และซ่อมแซมป้ายกฤษฎาชะลอความเร็วให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งดูแลต้นไม้ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตัดต้นไม้ในส่วนที่บดบังป้ายจราจรภายในโครงการ |  <p>ป้ายจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม.</p>  <p>ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ</p>  <p>ป้ายกฤษฎาชะลอความเร็ว</p>  <p>สันนุนชะลอความเร็ว</p> |

| <p style="text-align: center;"><b>ตารางที่ 3</b><br/> <b>สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                                          | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการและแนวทางแก้ไข                                                                                                            | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.5 การคมนาคมขนส่ง<br>(ต่อ)                                                                                                                                                                                                                             | 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรบริเวณทางเข้าออกทุก<br>แห่งและจัดระเบียบการจอดรถเพื่อให้การเข้าออกเป็นไปด้วย<br>ความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจร                                                                   | 4) ยังไม่มีเจ้าหน้าที่จัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ<br>จากการตรวจสอบยังไม่พบอุบัติเหตุด้านการจราจรภายใน<br>โครงการ                                                                         | จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการ<br>จราจรบริเวณทางเข้า-ออก<br>โครงการ เพื่อให้การเข้าออก<br>เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว<br>และเป็นระเบียบไม่กีดขวาง<br>การจราจร                  | -                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 5) จัดให้มีการประสานงานหรืออำนวยความสะดวกให้มีบริการ<br>ขนส่งมวลชนสาธารณะ สำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่าง<br>เพียงพอ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี<br>สะพานลอยสำหรับคนข้ามหรือทางม้าลายและป้ายแสดง<br>ตำแหน่งคนข้าม | 5) มีบริการขนส่งมวลชนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ<br>แต่ยังไม่มีมีการประสานงานกับแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู<br>เพื่อก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนข้ามบริเวณถนนทางเข้า-<br>ออกโครงการ (ทางหลวงหมายเลข 228) | ประสานงานให้แขวงทางหลวง<br>หนองบัวลำภู เพื่อก่อสร้าง<br>สะพานลอยสำหรับคนข้ามถนน<br>พร้อมป้ายแสดงตำแหน่งคน<br>ข้ามบนบริเวณถนนทางเข้า-<br>ออกโครงการ (ทางหลวง<br>หมายเลข 228) | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.6 อากาศ                                                                                                                                                                                                                                               | 1) กำหนดให้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ออกแบบไว้และ<br>ให้ได้ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย<br>ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                                     | 1) มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่มาตรการ<br>กำหนด                                                                                                                                   | ไม่มี                                                                                                                                                                       |  <p>ถังดับเพลิงภายในอาคาร<br/>ศูนย์ชุมชน</p>  <p>หัวรับน้ำดับเพลิง</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงปีละ 1<br>ครั้ง                                                                                                                                                                             | 2) ยังไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบ<br>ดับเพลิง                                                                                                                                       | ตรวจสอบประสิทธิภาพของ<br>อุปกรณ์ระบบดับเพลิงเป็น<br>ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ         | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                             | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข                                                                | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6 อากาศ (ต่อ)                                | 3) ติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลหนองบัวลำภู             | 3) มีการประสานงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ จากการตรวจสอบยังไม่มีเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ                                                                                                           | ไม่มี                                                                                                                   | -                                                                                                                                |
|                                                | 4) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้า-ออกโครงการ | 4) ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง แต่มีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยอำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้า-ออกโครงการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ จากการตรวจสอบยังไม่มีเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง                                                    | -                                                                                                                                |
|                                                | 5) จัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                 | 5) ยังไม่มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในโครงการ                                                                                                                                                                              | ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ในการจัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | -                                                                                                                                |
| 3. คุณค่าคุณภาพชีวิต<br>3.1 สุขภาพและทัศนียภาพ | กำหนดให้ดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ                                         | มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้อยู่ในสภาพดี แต่พื้นที่สีเขียวมีหญ้าขึ้นรก                                                                                                          | ดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยตัดหญ้าในส่วนที่ขึ้นรก                                    |  <p>ต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p> |

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการและแนวทางแก้ไข                | เอกสารอ้างอิง                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 เศรษฐกิจและสังคม                           | <p>1) ให้คณะกรรมการบริหารชุมชน ทำหน้าที่ดูแลชุมชนและร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการเชิญตัวแทนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นครั้งคราว พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชุมชนดังนี้</p> <p>(1) จัดประชุมทุก 6 เดือน หรือตามมติคณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>(2) มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน เสียงดัง เป็นต้น</p> <p>(3) มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน</p> <p>(4) มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน</p> | <p>1) มีคณะกรรมการชุมชนทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการตามที่มาตรการกำหนด จากการตรวจสอบยังไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ</p> | ไม่มี                                                                           |  <p>สำนักงานบริหารดูแลโครงการ</p> |
|                                                | <p>2) ให้สำนักงานเคหะชุมชนเชิญผู้นำชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>2) ยังไม่มีการเชิญผู้นำชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                    | <p>เชิญผู้นำชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> | -                                                                                                                    |

### 3.2 มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ทั้งสิ้น 4 รายการ แสดงดังตารางที่ 4

| <p style="text-align: center;">ตารางที่ 4</p> <p style="text-align: center;">สรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 2</p> <p style="text-align: center;">โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569</p>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| วิธีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการและแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง               |
| 1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ของการเคหะแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                           | 1) มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน                                                                                                                                                                           | ไม่มี                                                            | รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 |
| 2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  | 2) โครงการได้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยครั้งสุดท้ายได้นำเสนอรายงานฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาต และเสนอรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา | ไม่มี                                                            | -                           |
| 3) ในกรณีที่โครงการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการดังนี้                                                                                                                          | 3) โครงการมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวบางส่วนเป็นพื้นที่ลานออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น รายละเอียดแสดงดังข้อ 2.3.8 พื้นที่สีเขียวซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                 | ไม่มี                                                            | -                           |
| (3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                             |

ตารางที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 2  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

| วิธีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการและแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| (3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ |                                                                                                                                  |                                                                  |               |
| 4) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขต่อไป                                                                                           | 4) มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ซึ่งจากการดำเนินการโครงการ ยังไม่มีข้อร้องเรียนผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ | ไม่มี                                                            | -             |

### 3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้

#### 3.3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

1) **วิธีการศึกษา :** ดำเนินการการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำในท่อระบายน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ และคุณภาพน้ำผิวดิน ตามแผนที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว รวมทั้งเพิ่มเติมการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ชุมชน รายละเอียดดังนี้

(1) **คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย :** ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

(1.1) บ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria

(1.2) บ่อพักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Nitrate และ Fecal Coliform Bacteria

(2) **คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ :** ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Nitrate, Total Phosphorus และ Fecal Coliform Bacteria

(3) **คุณภาพน้ำผิวดิน :** ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 2 จุด ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

(3.1) คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร ได้แก่ pH, DO, BOD, SS, TKN และ Fecal Coliform Bacteria

(3.2) คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร ได้แก่ pH, DO, BOD, SS, TKN และ Fecal Coliform Bacteria

2) **วิธีการตรวจวิเคราะห์ และรักษาสภาพตัวอย่าง :** ตัวอย่างคุณภาพน้ำที่เก็บในภาคสนามจะดำเนินการรักษาสภาพตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition, 2023 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5

3) **การประเมินผลการศึกษา :** การประเมินผลการศึกษา : โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 731 หน่วย จึงจัดเป็นที่ดินจัดสรรประเภท ก ดังนั้นจึงนำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564

และนำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

| ตารางที่ 5<br>ดัชนีตรวจวิเคราะห์ วิธีเก็บรักษา และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ |                                                               |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีคุณภาพ                                                                 | วิธีการเก็บรักษา                                              | วิธีการวิเคราะห์                                                                                                        |
| pH                                                                          | วิเคราะห์ทันที                                                | Electrometric                                                                                                           |
| BOD                                                                         | แช่เย็นที่ $\leq 6^{\circ}\text{C}$                           | 5-day BOD Test, Membrane Electrode Method                                                                               |
| Total Suspended Solids (SS)                                                 | แช่เย็นที่ $\leq 6^{\circ}\text{C}$                           | Dried at $103-105^{\circ}\text{C}$ Method                                                                               |
| Total Dissolved Solids                                                      | แช่เย็นที่ $\leq 6^{\circ}\text{C}$                           | Dried at $180^{\circ}\text{C}$ Method                                                                                   |
| Oil & Grease                                                                | เติมกรดซัลฟิวริกจน pH <2, แช่เย็นที่ $\leq 6^{\circ}\text{C}$ | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method                                                                              |
| TKN (น้ำเสีย)                                                               | เติมกรดซัลฟิวริกจน pH <2, แช่เย็นที่ $\leq 6^{\circ}\text{C}$ | Semi-Micro Kjeldahl Method                                                                                              |
| TKN (น้ำผิวดิน)                                                             | เติมกรดซัลฟิวริกจน pH <2, แช่เย็นที่ $\leq 6^{\circ}\text{C}$ | Macro Kjeldahl Method                                                                                                   |
| Nitrate                                                                     | แช่เย็นที่ $\leq 6^{\circ}\text{C}$                           | Cadmium Reduction Method                                                                                                |
| Total Phosphorus                                                            | เติมกรดซัลฟิวริกจน pH <2, แช่เย็นที่ $\leq 6^{\circ}\text{C}$ | Sulfuric Acid-Nitric Acid digestion, Vanadomolybdophosphoric Acid Method                                                |
| Fecal Coliform Bacteria                                                     | แช่เย็นที่ $\leq 10^{\circ}\text{C}$                          | Multiple-Tube Fermentation Technique Method, Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure, Estimation of Bacterial Density |



การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และคุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (รูปที่ 4 และภาพที่ 2) มีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในลำรางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร
- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในลำรางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร
- 


[illegible]



บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม

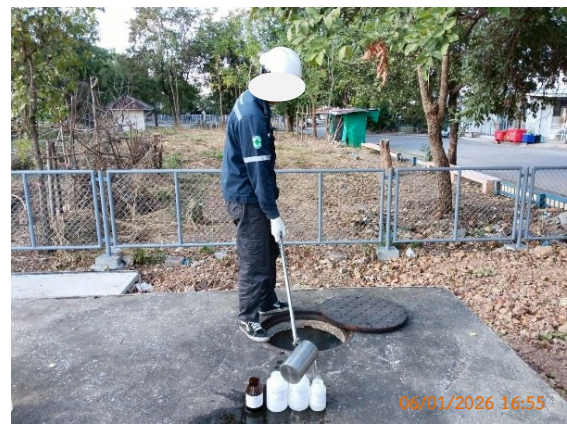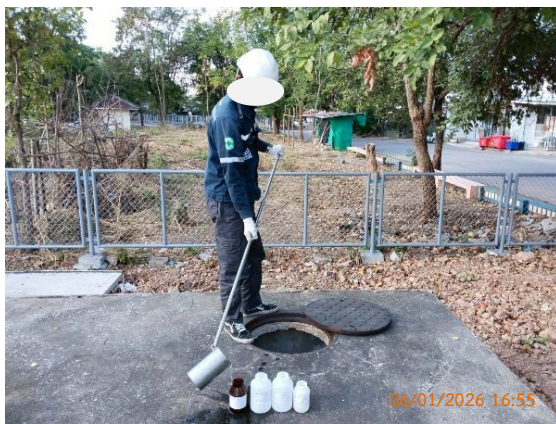

บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

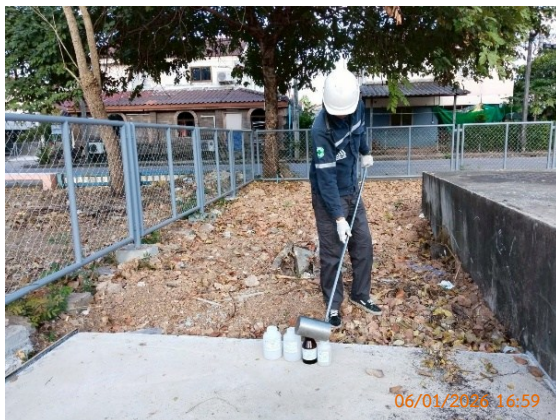

บ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ

ก. วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม



บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม



บ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ



คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ  
ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร

คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ  
หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร

ข. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)



บ่อกักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม



บ่อกักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม



บ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ

ค. วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569


ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)



บ่อกักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม



บ่อกักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

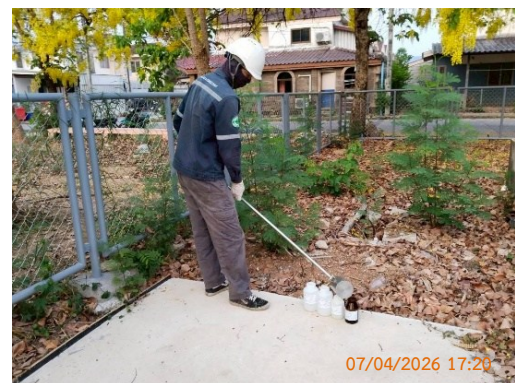

บ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ

ง. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2568



ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)



บ่อกักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม



บ่อกักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

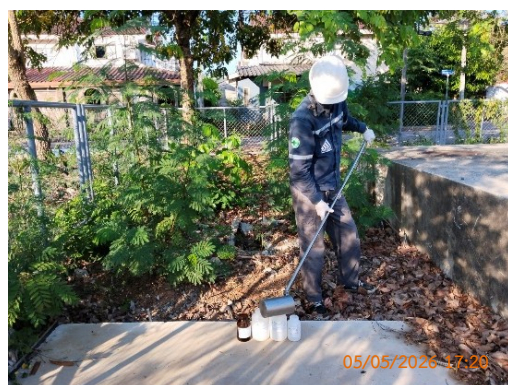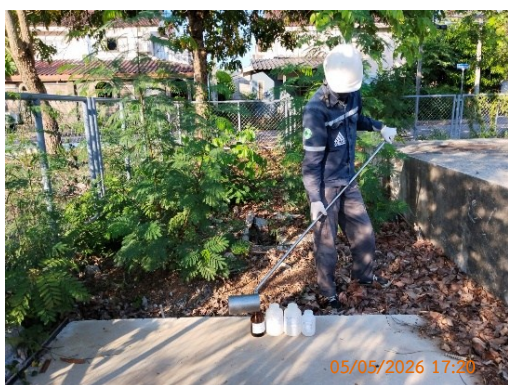

บ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ

จ. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)



บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม



บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

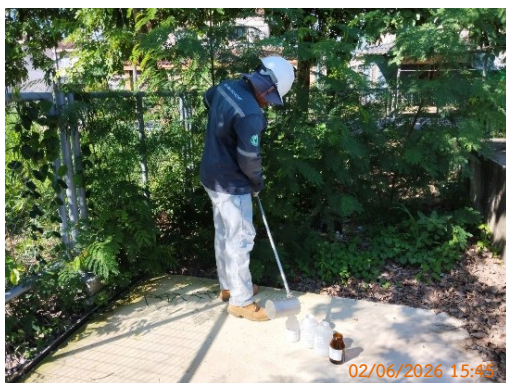

บ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ

ฉ. วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

## 1) คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแต่ละเดือนดังนี้ (ตารางที่ 6 และรูปที่ 5 สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในภาคผนวก ข)

**วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569 :** คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 40.8 mg/L, SS มีค่าเท่ากับ 25 mg/L, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 14.1 mg/L, TKN มีค่าเท่ากับ 30.8 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $3.2 \times 10^3$  MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.98 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L, Nitrate มีค่าเท่ากับ 0.354 mg/L as  $\text{NO}_3^-$ -N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 18 MPN/100 ml ไม่สามารถคิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้

**วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 :** คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 34.0 mg/L, SS มีค่าเท่ากับ 14 mg/L, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 15.0 mg/L, TKN มีค่าเท่ากับ 30.8 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $1.4 \times 10^3$  MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.49 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L, Nitrate มีค่าเท่ากับ 0.229 mg/L as  $\text{NO}_3^-$ -N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 20 MPN/100 ml ไม่สามารถคิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้

**วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 :** คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.5, BOD มีค่าเท่ากับ 27.2 mg/L, SS มีค่าเท่ากับ 27 mg/L, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 4.10 mg/L, TKN มีค่าเท่ากับ 33.3 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $1.6 \times 10^3$  MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 6.7, BOD มีค่าเท่ากับ 0.42 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 1 mg/L, Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L, Nitrate มีค่าเท่ากับ 0.364 mg/L as  $\text{NO}_3^-$ -N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $1.7 \times 10^2$  MPN/100 ml ไม่สามารถคิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้

**วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2569 :** คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.2, BOD มีค่าเท่ากับ 23.6 mg/L, SS มีค่าเท่ากับ 55 mg/L, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 8.90 mg/L, TKN มีค่าเท่ากับ 38.1 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $4.8 \times 10^3$  MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.48 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L, Nitrate มีค่าเท่ากับ 0.421 mg/L as  $\text{NO}_3^-$ -N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 18 MPN/100 ml ไม่สามารถคิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้

**วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 :** คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 38.2 mg/L, SS มีค่าเท่ากับ 33 mg/L, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 7.90 mg/L, TKN มีค่าเท่ากับ 36.0 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $2.9 \times 10^3$  MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.3, BOD มีค่าเท่ากับ 0.30 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L, Nitrate มีค่าเท่ากับ 0.513 mg/L as  $\text{NO}_3^-$ -N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 18 MPN/100 ml ไม่สามารถคิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้




**วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569 :** คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 57.4 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 387 mg/l, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 15.3 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 34.9 mg/l และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $3.8 \times 10^3$  MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.30 mg/l, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 1.72 mg/l, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/l, Nitrate มีค่าเท่ากับ 0.670 mg/l as  $\text{NO}_3^-$ -N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 20 MPN/100 ml ไม่สามารถคิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้

จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ก แต่ไม่สามารถคิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้ เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด ดังนั้น ผู้บริหารโครงการปัจจุบันต้องซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้ตามปกติ





เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566-ธันวาคม พ.ศ. 2568) พบว่า มีค่าความสกปรกใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยยังคงมีค่าคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 7 และรูปที่ 6)

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

INF = บ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม      EFF = บ่อพักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

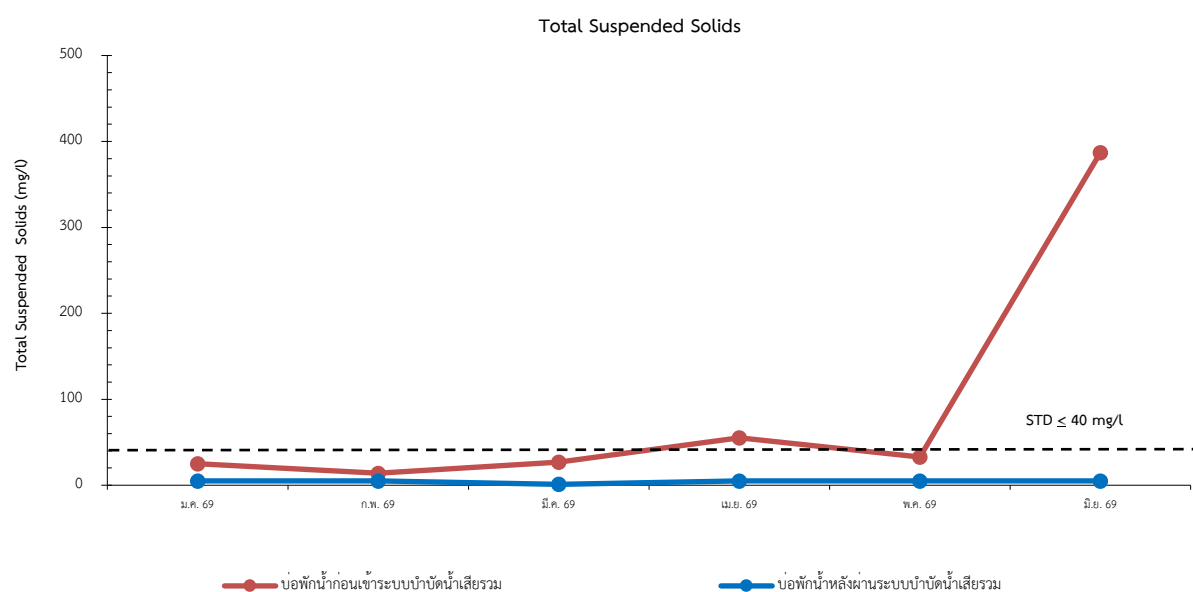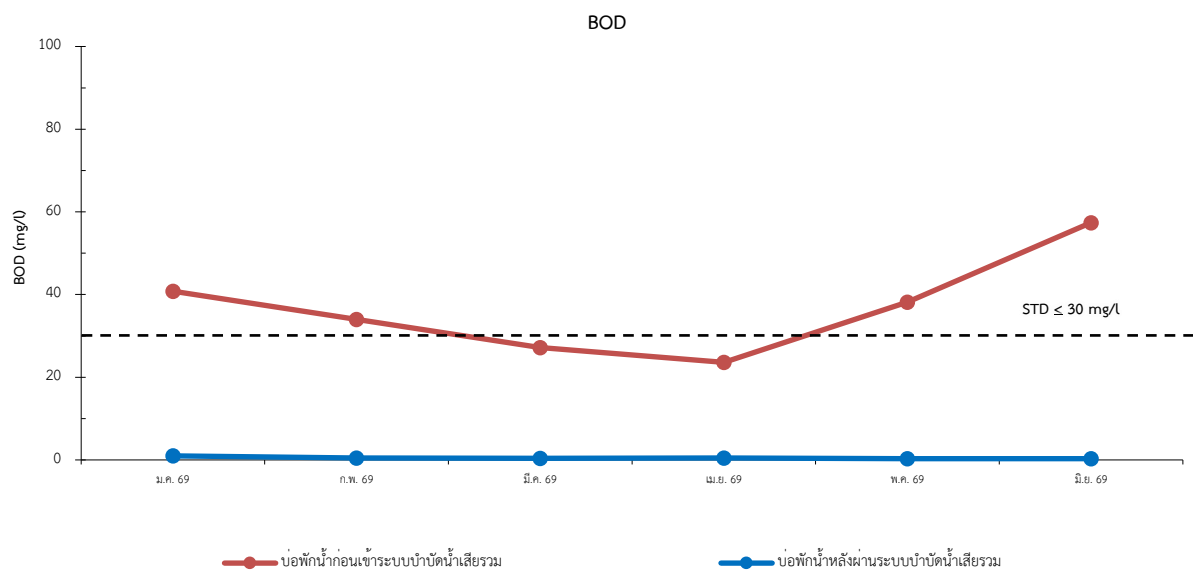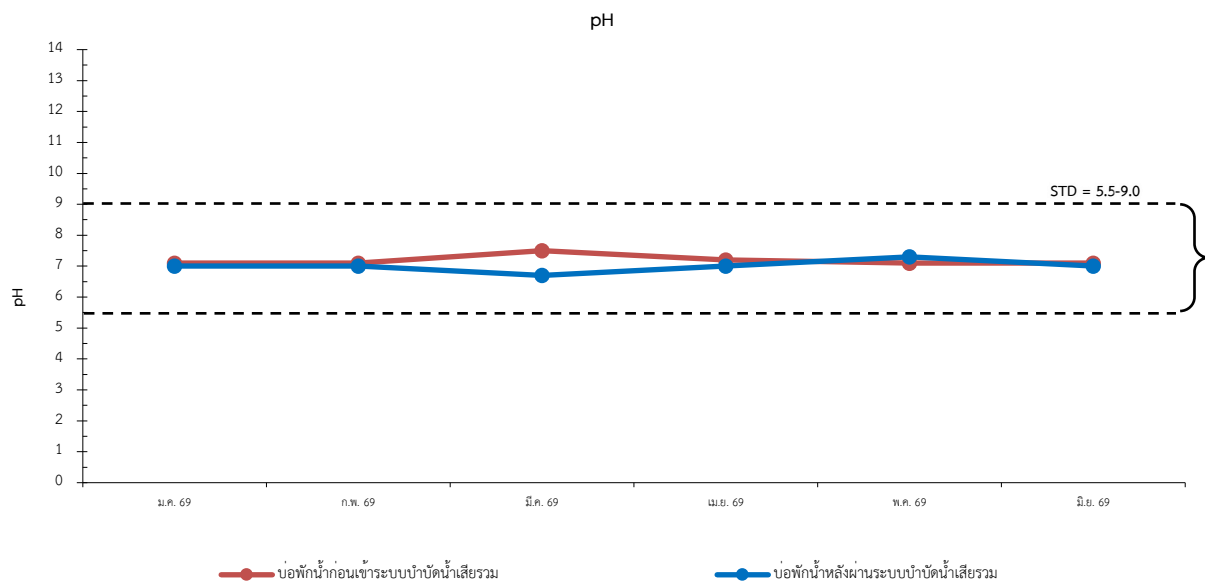

**รูปที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย**

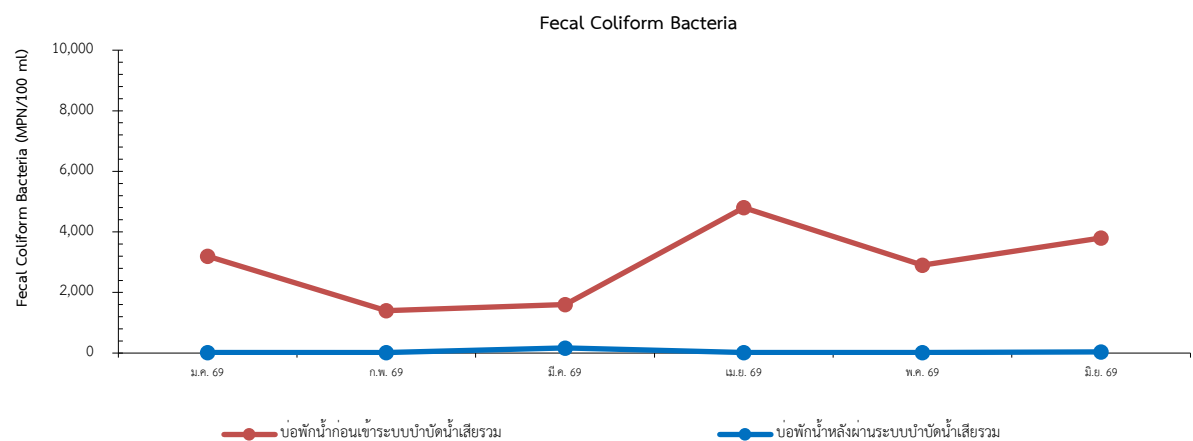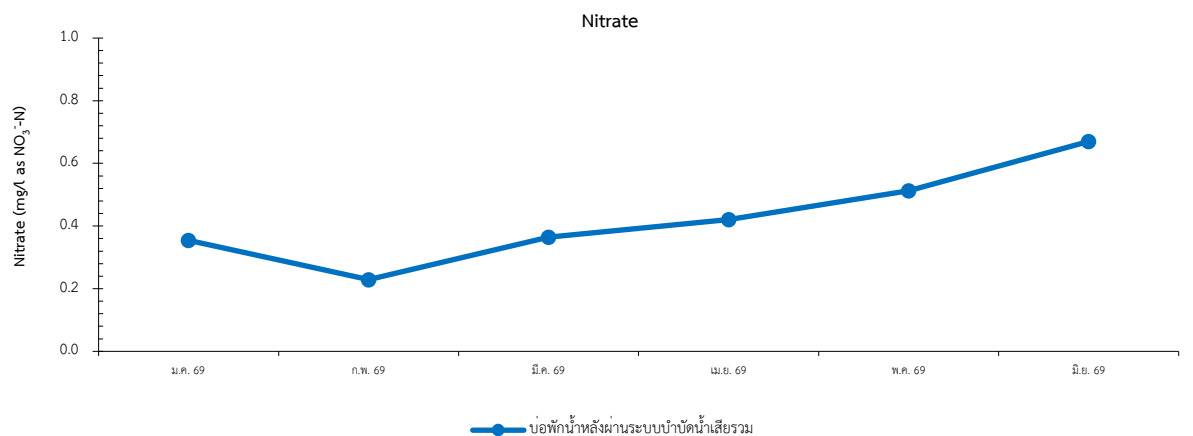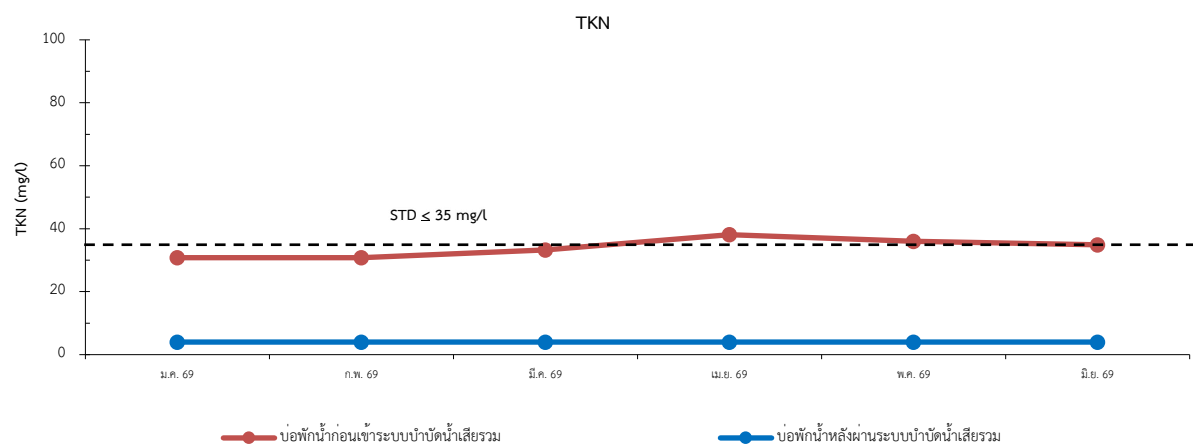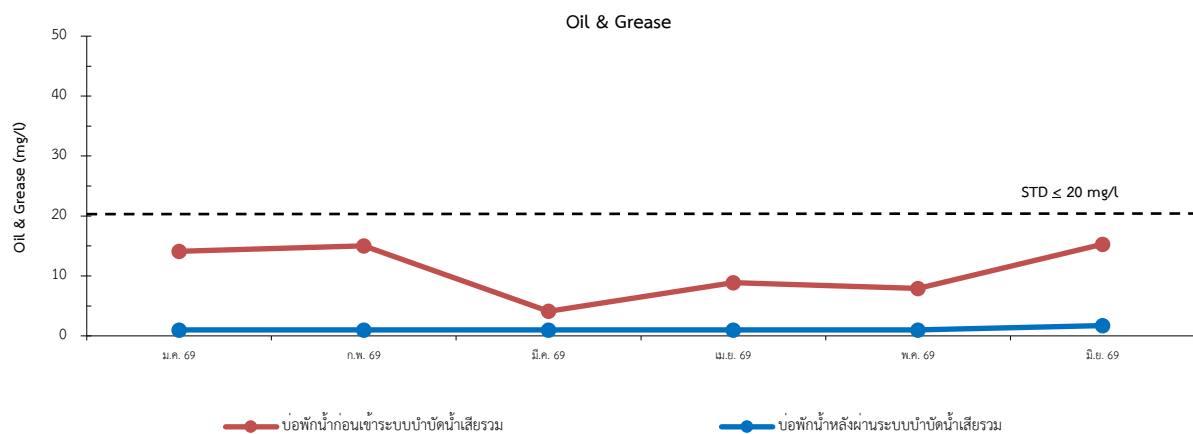

รูปที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)










| ตารางที่ 7                                                      |                                         |            |                     |       |                     |       |                     |                     |                     |       |                     |       |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) |                                         |            |                     |       |                     |       |                     |                     |                     |       |                     |       |                     |       |
| ดัชนีคุณภาพ                                                     | หน่วย                                   | มาตรฐาน*   | ม.ค. 69             |       | ก.พ. 69             |       | มี.ค. 69            |                     | เม.ย. 69            |       | พ.ค. 69             |       | มิ.ย. 69            |       |
|                                                                 |                                         |            | INF                 | EFF   | INF                 | EFF   | INF                 | EFF                 | INF                 | EFF   | INF                 | EFF   | INF                 | EFF   |
| pH**                                                            | -                                       | 5.5-9.0    | 7.1                 | 7.0   | 7.1                 | 7.0   | 7.5                 | 6.7                 | 7.2                 | 7.0   | 7.1                 | 7.3   | 7.1                 | 7.0   |
| BOD                                                             | mg/l                                    | ไม่เกิน 20 | 40.8                | 0.98  | 34.0                | 0.49  | 27.2                | 0.42                | 23.6                | 0.48  | 38.2                | 0.30  | 57.4                | 0.30  |
| Total Suspended Solids                                          | mg/l                                    | ไม่เกิน 30 | 25                  | <5    | 14                  | <5    | 27                  | <1                  | 55                  | <5    | 33                  | <5    | 387                 | <5    |
| Oil & Grease                                                    | mg/l                                    | ไม่เกิน 20 | 14.1                | <1.00 | 15.0                | <1.00 | 4.10                | <1.00               | 8.90                | <1.00 | 7.90                | <1.00 | 15.3                | 1.72  |
| TKN                                                             | mg/l                                    | ไม่เกิน 35 | 30.8                | <4.00 | 30.8                | <4.00 | 33.3                | <4.00               | 38.1                | <4.00 | 36.0                | <4.00 | 34.9                | <4.00 |
| NO <sub>3</sub>                                                 | mg/l as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N | -          | ***                 | 0.354 | ***                 | 0.229 | ***                 | 0.364               | ***                 | 0.421 | ***                 | 0.513 | ***                 | 0.670 |
| Fecal Coliform Bacteria                                         | MPN/100 ml                              | -          | 3.2×10 <sup>3</sup> | <18   | 1.4×10 <sup>3</sup> | 20    | 1.6×10 <sup>3</sup> | 1.7×10 <sup>2</sup> | 4.8×10 <sup>3</sup> | <18   | 2.9×10 <sup>3</sup> | <18   | 3.8×10 <sup>3</sup> | 40    |
| ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD                                       |                                         |            | ****                |       | ****                |       | ****                |                     | ****                |       | ****                |       | ****                |       |

หมายเหตุ : \* มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

\*\* ตรวจวัดภาคสนาม      \*\*\* ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์      \*\*\*\* ไม่สามารถคิดประสิทธิภาพในการบำบัดได้เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด      - ไม่ได้กำหนดค่า

INF = บ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม      EFF = บ่อพักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

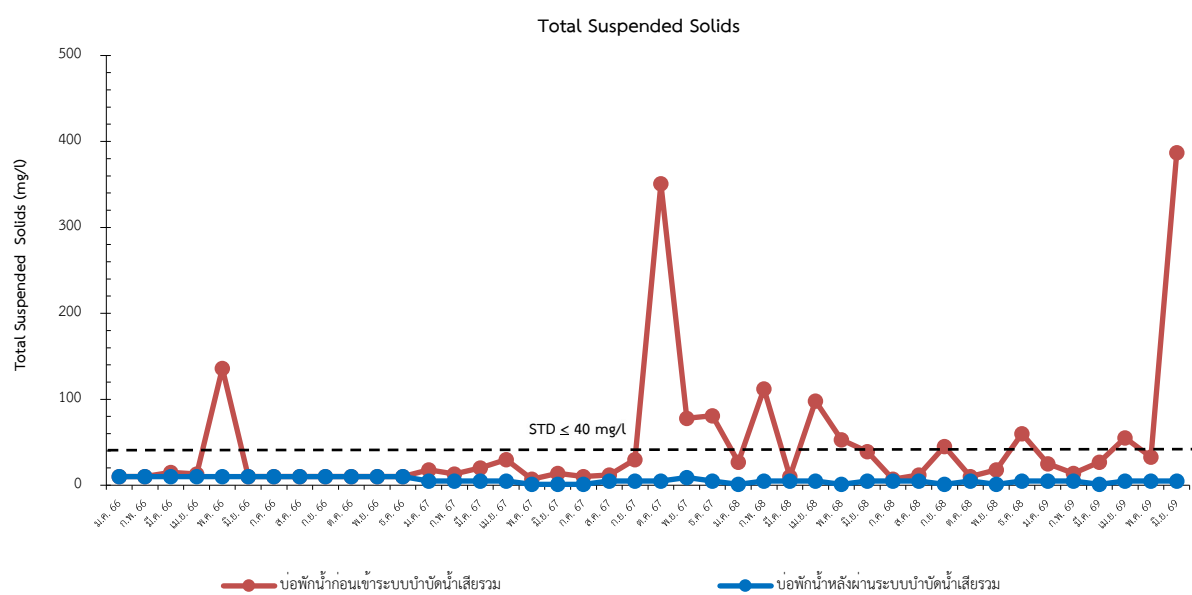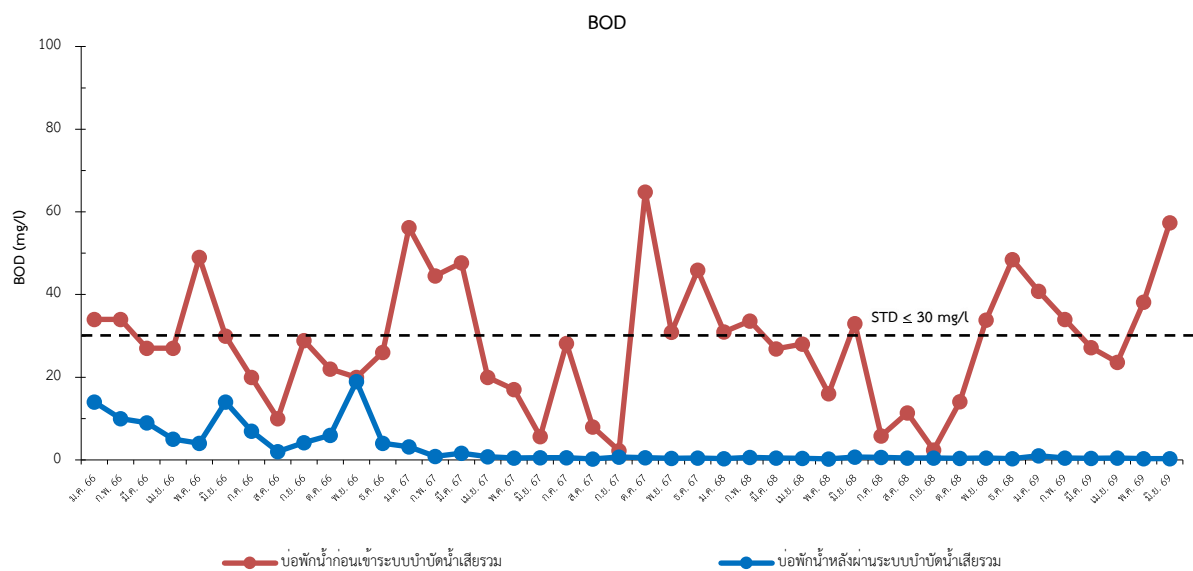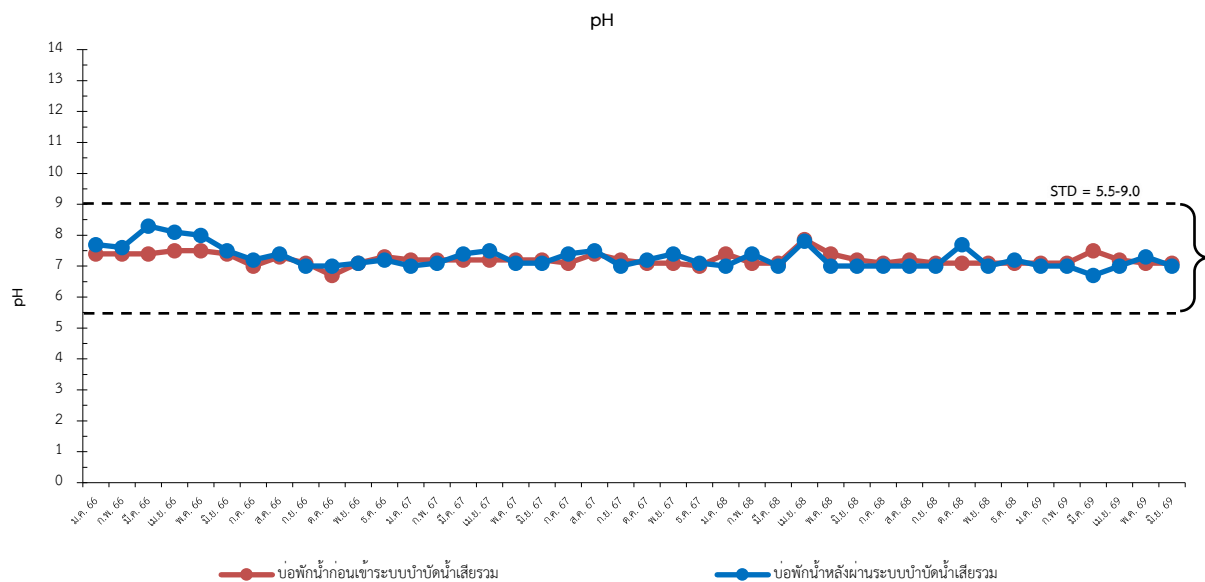

รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

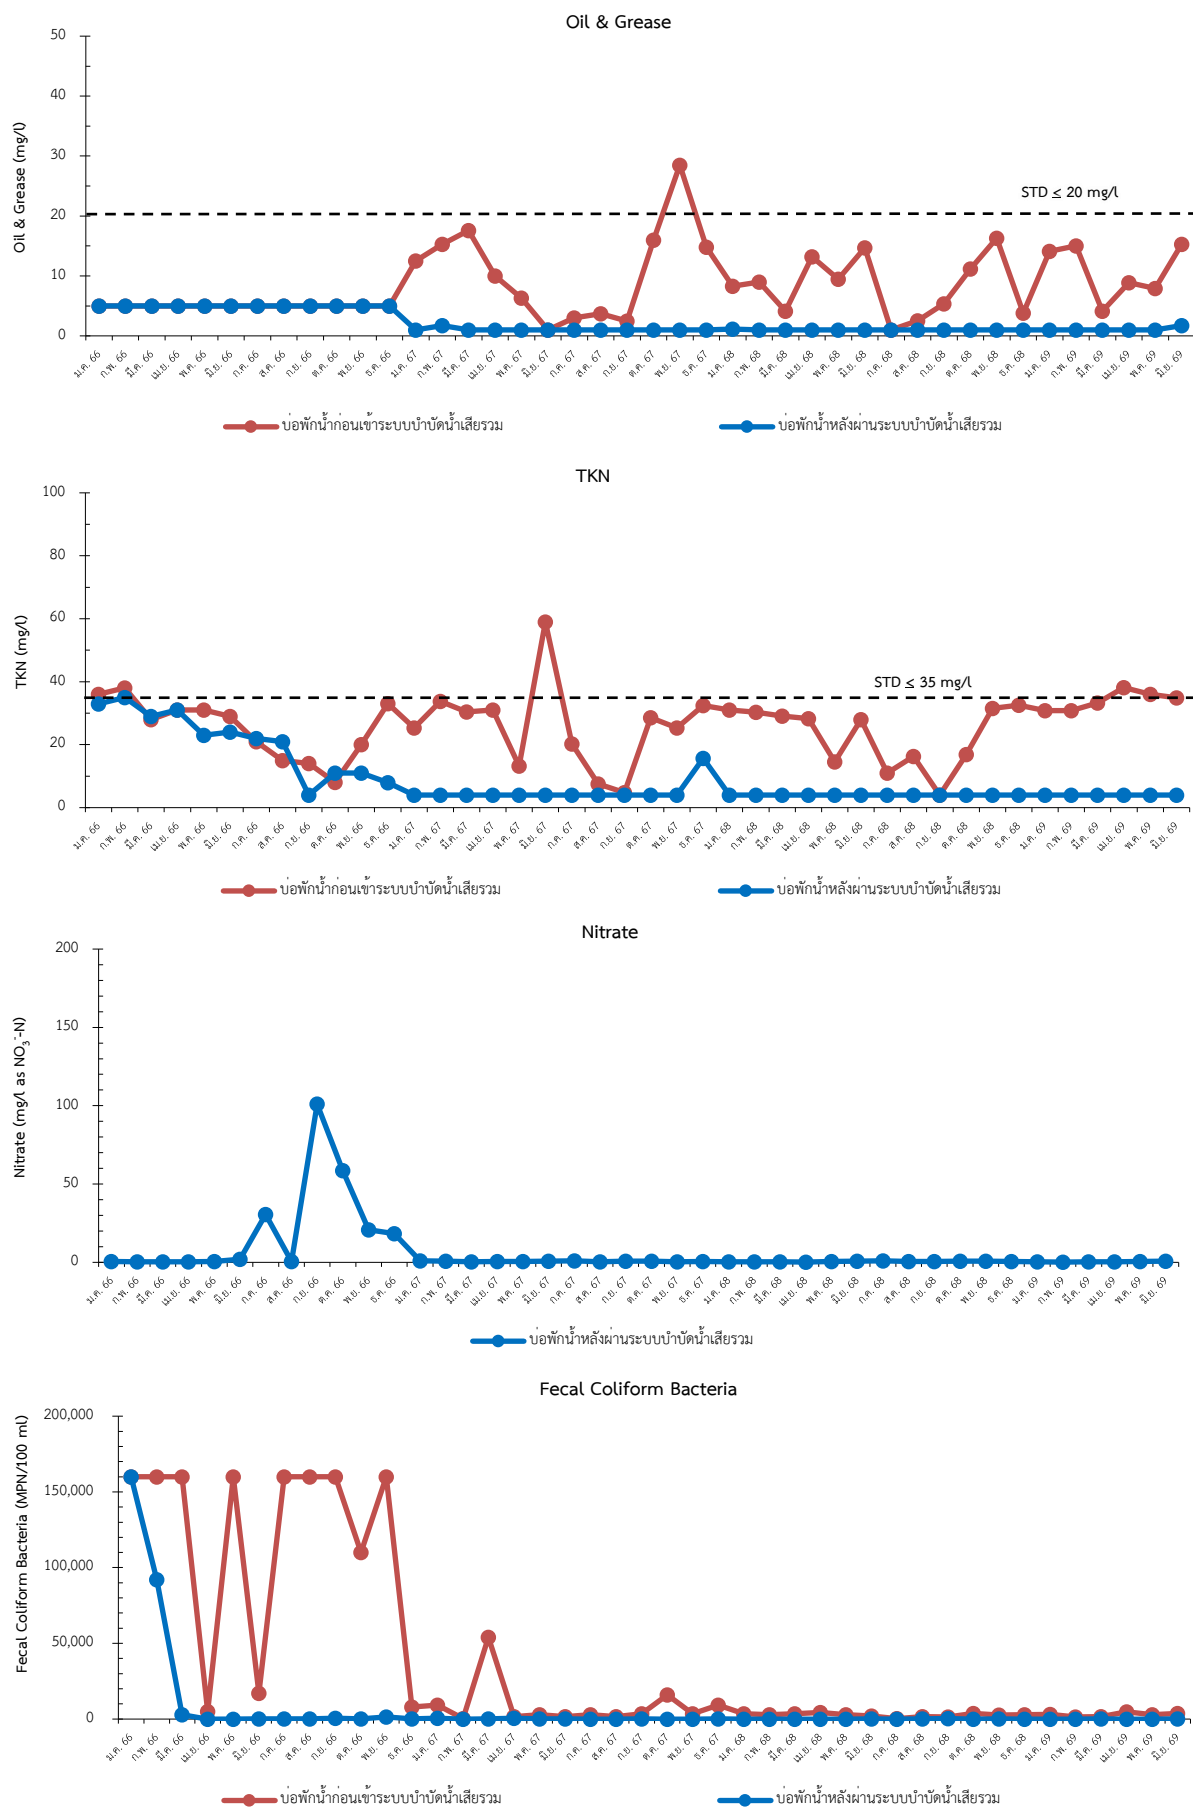

รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

## 2) คุณภาพน้ำในบ่อบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแต่ละเดือนดังนี้ (ตารางที่ 8 และรูปที่ 7 สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในภาคผนวก ข)

**วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569 :** มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.62 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L,  $\text{NO}_3$  มีค่าเท่ากับ 0.359 mg/L, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 1.20 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $1.7 \times 10^2$  MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

**วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 :** มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.65 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 2.90 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L,  $\text{NO}_3$  มีค่าเท่ากับ 0.200 mg/L, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 0.848 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 18 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

**วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 :** มีค่า pH เท่ากับ 6.3, BOD มีค่าเท่ากับ 0.34 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 1 mg/L, Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 1.70 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L,  $\text{NO}_3$  มีค่าเท่ากับ 0.332 mg/L, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 0.993 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 18 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

**วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2569 :** มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.43 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L,  $\text{NO}_3$  มีค่าเท่ากับ 0.436 mg/L, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 1.14 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $1.7 \times 10^2$  MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

**วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 :** มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.15 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L,  $\text{NO}_3$  มีค่าเท่ากับ 0.568 mg/L, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 1.11 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 18 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

**วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569 :** มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 0.33 mg/L, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/L, Oil & Grease มีค่าน้อยกว่า 1.00 mg/L, TKN มีค่าน้อยกว่า 4.00 mg/L,  $\text{NO}_3$  มีค่าเท่ากับ 0.684 mg/L, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 1.44 mg/L และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 18 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติต้องควบคุมให้ผู้บริหารดูแลโครงการในปัจจุบันตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำ หากพบว่ามีปริมาณตะกอนสูงเกิน 1 ใน 3 ของความสูงของรางระบายน้ำต้องดำเนินการขุดลอก

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566-ธันวาคม พ.ศ. 2568) พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าความสกปรกใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น คุณภาพน้ำในเดือนมีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2566 มีค่า TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 9 และรูปที่ 8)

ตารางที่ 8





ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

| ดัชนีคุณภาพ             | หน่วย                      | มาตรฐาน*   | 6 ม.ค. 69           | 3 ก.พ. 69 | 10 มี.ค. 69 | 7 เม.ย. 69          | 5 พ.ค. 69 | 2 มิ.ย. 69 |
|-------------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|------------|
| pH**                    | -                          | 5.5-9.0    | 7.0                 | 7.0       | 6.3         | 7.0                 | 7.0       | 7.0        |
| BOD                     | mg/l                       | ไม่เกิน 20 | 0.62                | 0.65      | 0.34        | 0.43                | 0.15      | 0.33       |
| Total Suspended Solids  | mg/l                       | ไม่เกิน 30 | <5                  | <5        | <1          | <5                  | <5        | <5         |
| Oil & Grease            | mg/l                       | ไม่เกิน 20 | 1.00                | 2.90      | 1.70        | <1.00               | <1.00     | <1.00      |
| TKN                     | mg/l                       | ไม่เกิน 35 | <4.00               | <4.00     | <4.00       | <4.00               | <4.00     | <4.00      |
| NO <sub>3</sub>         | mg/l as NO <sub>3</sub> -N | -          | 0.359               | 0.200     | 0.332       | 0.436               | 0.568     | 0.684      |
| Total Phosphorus        | mg/l as P                  | -          | 1.20                | 0.848     | 0.993       | 1.14                | 1.11      | 1.44       |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 ml                 | -          | 1.7×10 <sup>2</sup> | <18       | <18         | 1.7×10 <sup>2</sup> | <18       | 18         |


หมายเหตุ : \* มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

\*\* ตรวจวัดภาคสนาม - ไม่ได้กำหนดค่า

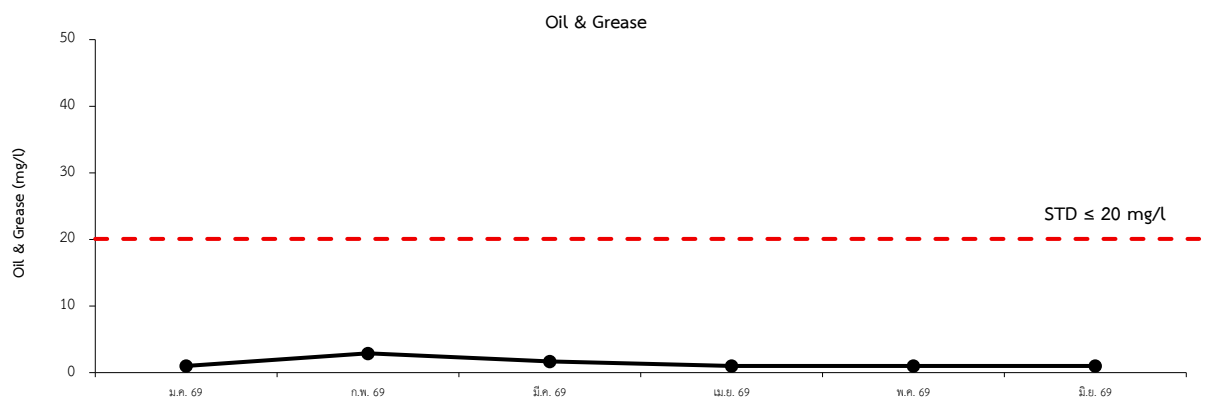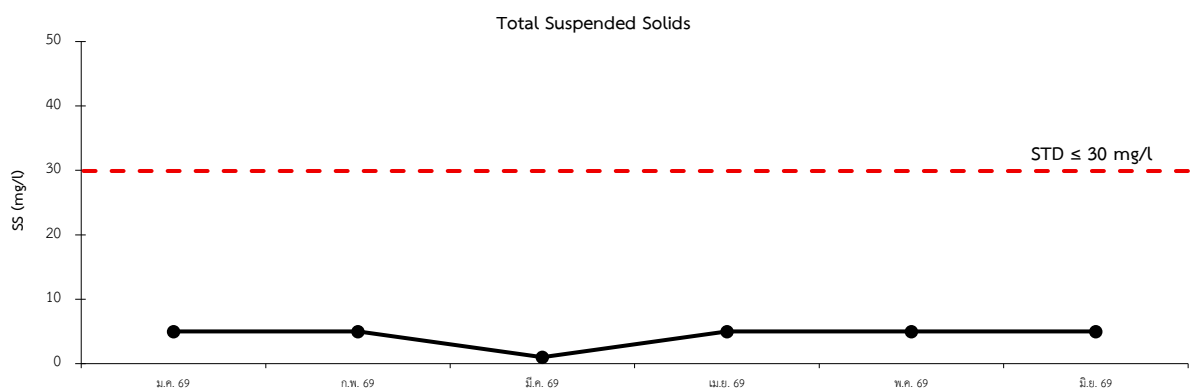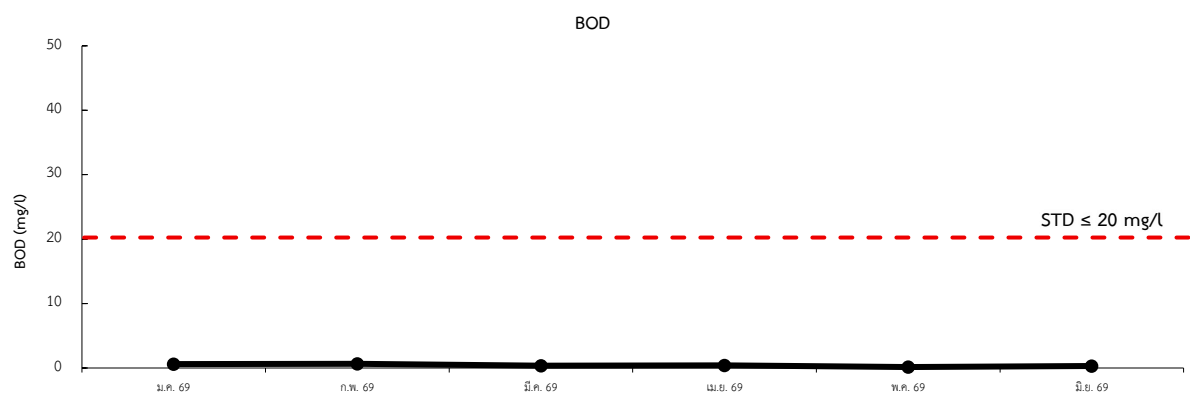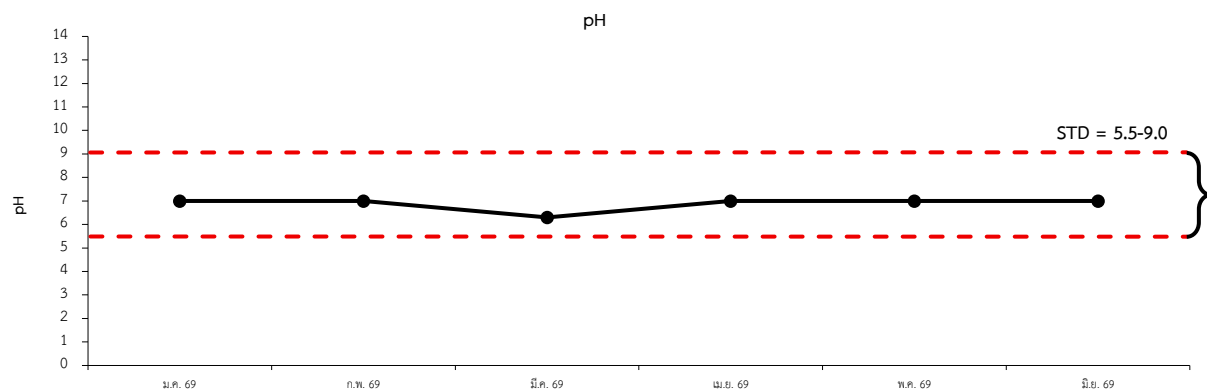


รูปที่ 7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ

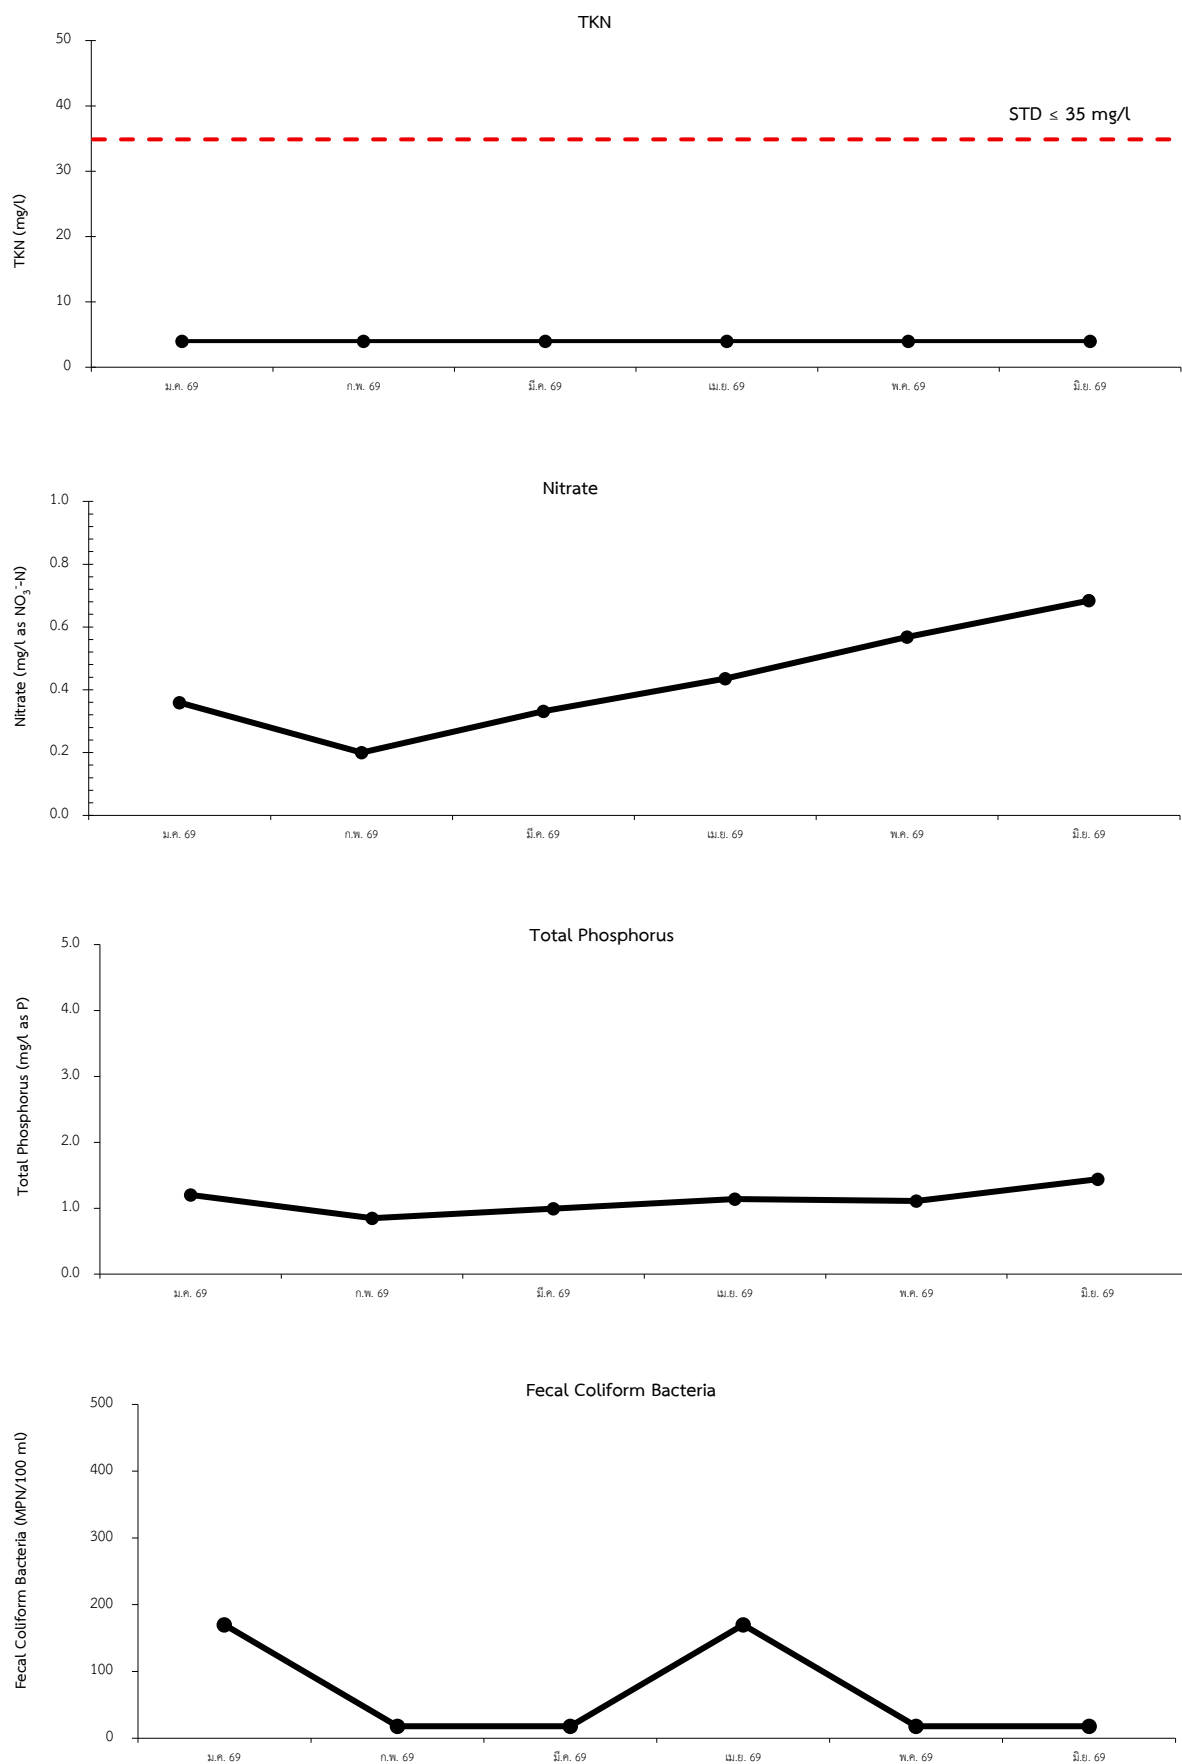




รูปที่ 7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ (ต่อ)





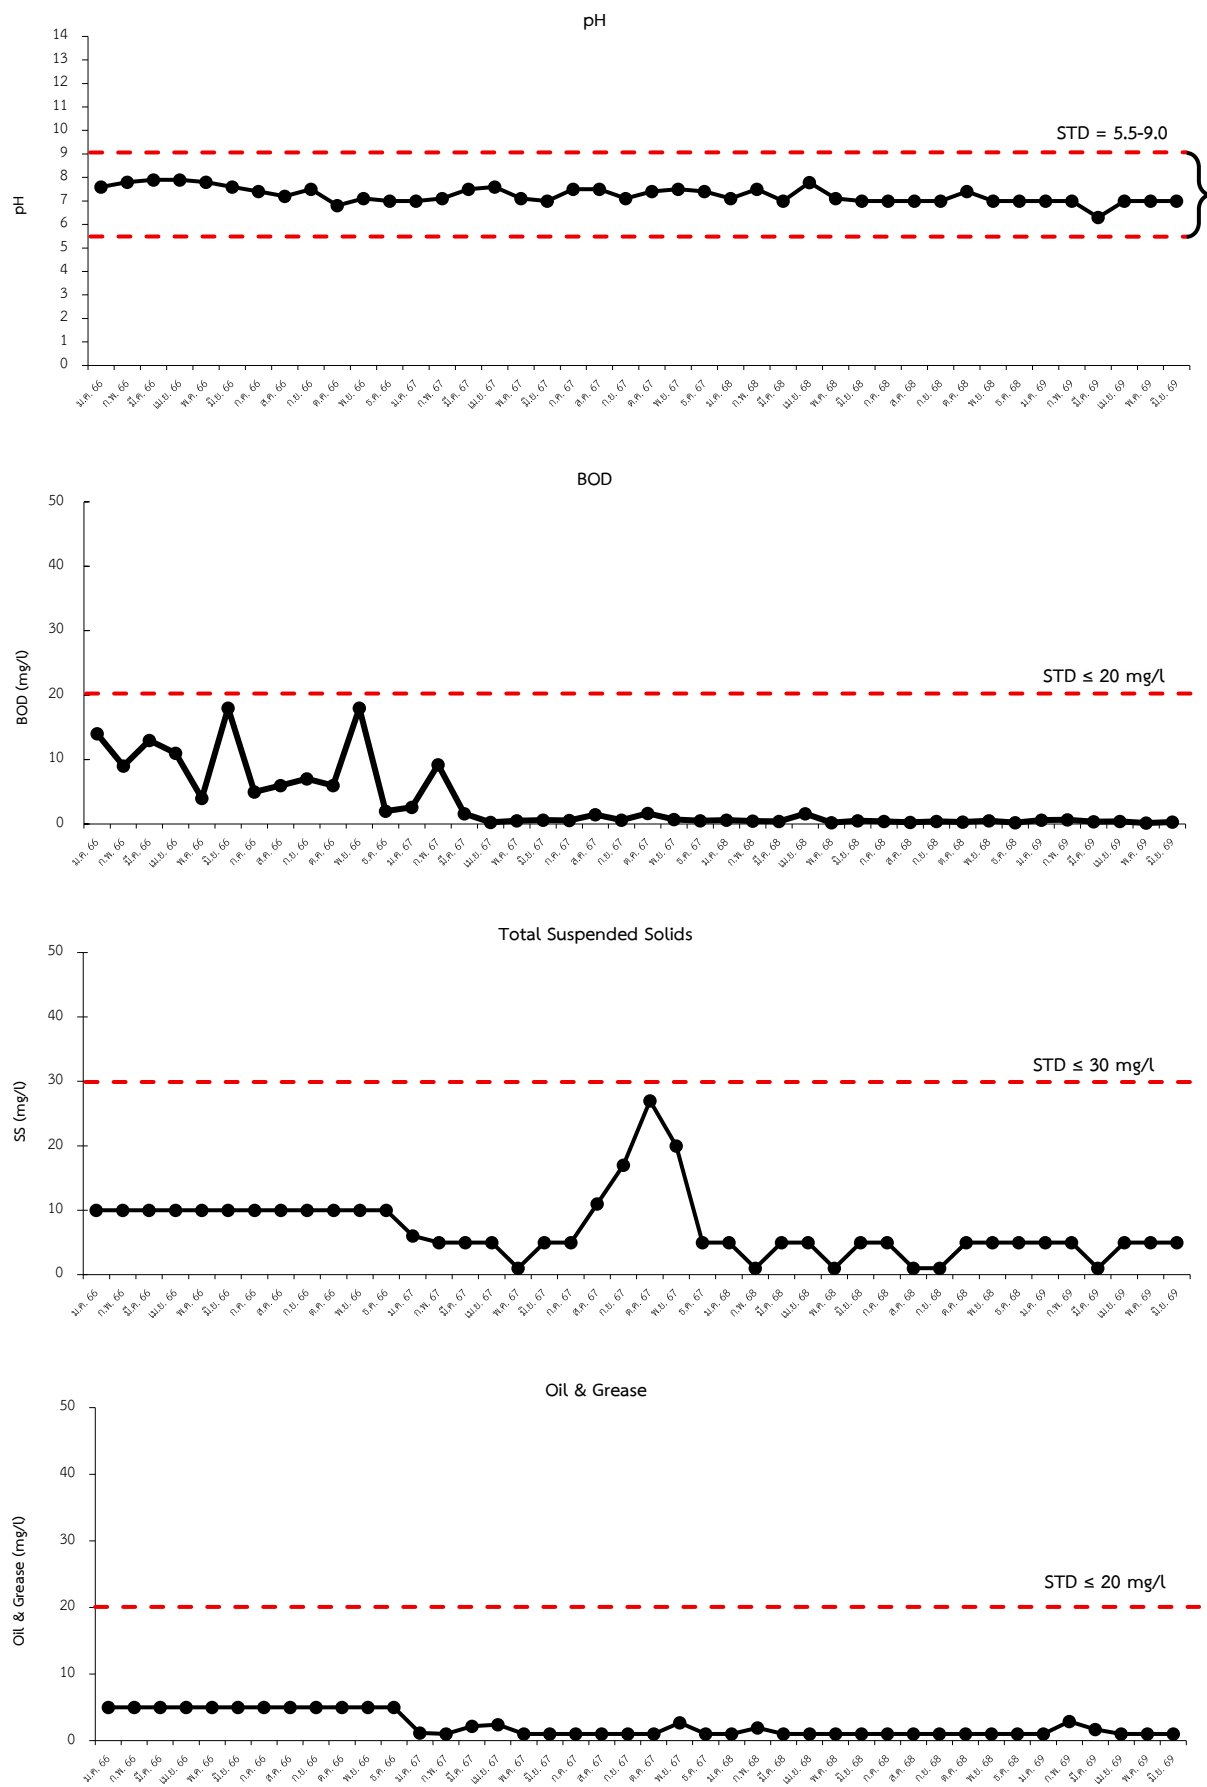

รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ

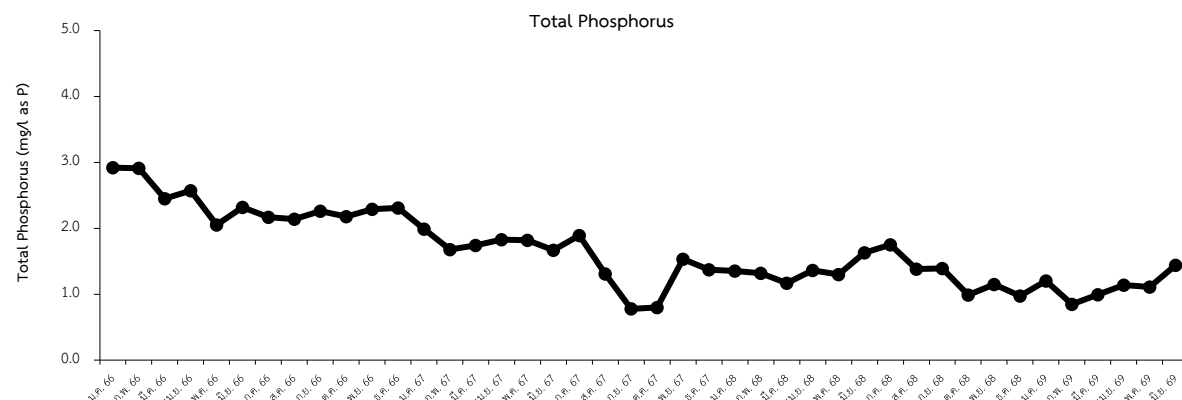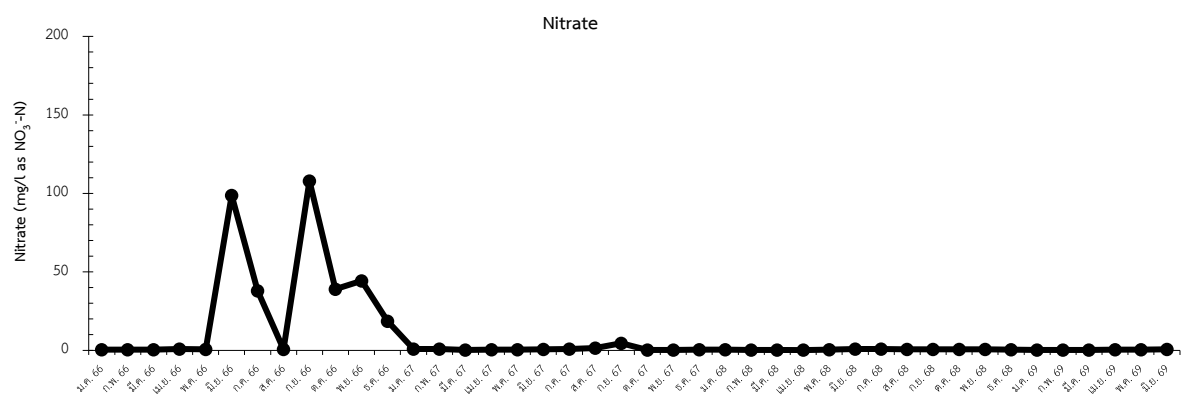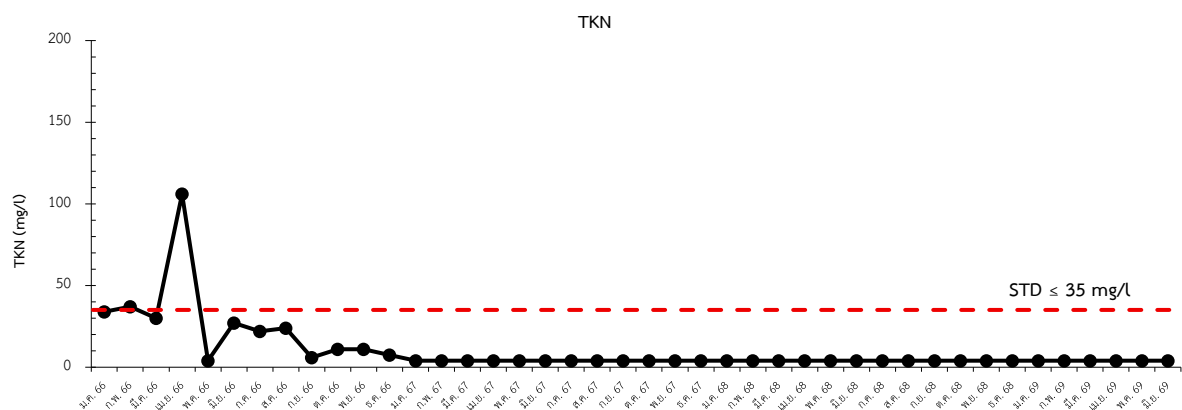

รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ (ต่อ)

### 3) คุณภาพน้ำผิวดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำรางด้านข้างโครงการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้ (ตารางที่ 10 สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในภาคผนวก ข)

**คุณภาพน้ำในลำรางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร :** มีค่า Temperature เท่ากับ 29.2 C, pH เท่ากับ 7.0, DO มีค่าเท่ากับ 5.7 mg/l, BOD มีค่าเท่ากับ 2.45 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 14 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 10.5 mg/l และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $6.8 \times 10^2$  MPN/100 ml โดยจัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4

**คุณภาพน้ำในลำรางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร :** มีค่า Temperature เท่ากับ 29.4 C, pH เท่ากับ 7.0, DO มีค่าเท่ากับ 5.4 mg/l, BOD มีค่าเท่ากับ 5.12 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 20 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 10.5 mg/l และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ  $1.4 \times 10^2$  MPN/100 ml โดยจัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5

จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และใช้เพื่อการอุตสาหกรรม ส่วนคุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

| <div> <div>ตารางที่ 10</div> <div>ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน</div> </div> |            |                         |                 |                 |                 |             |                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| ดัชนีคุณภาพ                                                                      | หน่วย      | มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* |                 |                 |                 |             | วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 |                   |
|                                                                                  |            | ประเภทที่ 1             | ประเภทที่ 2     | ประเภทที่ 3     | ประเภทที่ 4     | ประเภทที่ 5 | St.1                          | St.2              |
| Temperature**                                                                    | C          | ๘                       | -               | -               | -               | -           | 29.2                          | 29.4              |
| pH**                                                                             | -          | -                       | 5.0-9.0         | 5.0-9.0         | 5.0-9.0         | -           | 7.0                           | 7.0               |
| DO**                                                                             | mg/l       | ๘                       | ไม่น้อยกว่า 6.0 | ไม่น้อยกว่า 4.0 | ไม่น้อยกว่า 2.0 | -           | 5.7                           | 5.4               |
| BOD                                                                              | mg/l       | ๘                       | ไม่เกิน 1.5     | ไม่เกิน 2.0     | ไม่เกิน 4.0     | -           | 2.45                          | 5.12              |
| Total Suspended Solids                                                           | mg/l       | ๘                       | -               | -               | -               | -           | 14                            | 20                |
| TKN                                                                              | mg/l       | -                       | -               | -               | -               | -           | 10.5                          | 10.5              |
| Fecal Coliform Bacteria                                                          | MPN/100 ml | ๘                       | ไม่เกิน 1,000   | ไม่เกิน 4,000   | -               | -           | $6.8 \times 10^2$             | $1.4 \times 10^2$ |
| จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่                                                  |            |                         |                 |                 |                 |             | 4                             | 5                 |

หมายเหตุ : \* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน

ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและ สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน, 2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของ สัตว์น้ำ วิถี วัฒนธรรมพื้นฐานและ 3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน, 2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ, 3) การประมง และ 4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้น้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และ 2) การเกษตร

ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้น้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และ2) การอุตสาหกรรม

ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้น้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

๘ = ธรรมชาติไม่ได้รับผลจากการกระทำของมนุษย์      ๘' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

\*\* ตรวจวัดภาคสนาม - ไม่ได้กำหนดค่า

St.1 คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร      St.2 คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566-สิงหาคม พ.ศ. 2568) มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 11 และรูปที่ 9)

**คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร : มีรายละเอียดดังนี้**

**ฤดูแล้ง :** คุณภาพน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีค่าคุณภาพน้ำลดลงจากผลการติดตามตรวจสอบในระยะที่ผ่านมา โดยจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และใช้เพื่อการอุตสาหกรรม สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

**คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร : มีรายละเอียดดังนี้**

**ฤดูแล้ง :** คุณภาพน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีค่าใกล้เคียงกับผลการติดตามตรวจสอบในระยะที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 และกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

### 3.3.2 การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพของประชาชน

จะดำเนินการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569

สำหรับผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 12



| ตารางที่ 11                                        |            |                         |                 |                 |                 |             |                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) |            |                         |                 |                 |                 |             |                                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| ดัชนีคุณภาพ                                        | หน่วย      | มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* |                 |                 |                 |             | หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                    |            | ประเภทที่ 1             | ประเภทที่ 2     | ประเภทที่ 3     | ประเภทที่ 4     | ประเภทที่ 5 | ก.พ. 66 <sup>1</sup>                 | ส.ค. 66 <sup>1</sup> | ก.พ. 67             | ส.ค. 67             | ก.พ. 68             | ส.ค. 68             | ก.พ. 69             |
| pH**                                               | -          | ธ                       | 5.0-9.0         | 5.0-9.0         | 5.0-9.0         | -           | 7.3                                  | 7.0                  | 7.1                 | 7.4                 | 7.4                 | 7.0                 | 7.0                 |
| DO**                                               | mg/l       | ธ                       | ไม่น้อยกว่า 6.0 | ไม่น้อยกว่า 4.0 | ไม่น้อยกว่า 2.0 | -           | 3.2                                  | 2.1                  | 5.9                 | 2.0                 | 2.1                 | 6.2                 | 5.4                 |
| BOD                                                | mg/l       | ธ                       | ไม่เกิน 1.5     | ไม่เกิน 2.0     | ไม่เกิน 4.0     | -           | 30                                   | 4                    | 3.28                | 1.76                | 9.90                | 0.87                | 5.12                |
| Total Suspended Solids                             | mg/l       | -                       | -               | -               | -               | -           | <10                                  | <10                  | 13                  | <5                  | 35                  | 10                  | 20                  |
| TKN                                                | mg/l       | -                       | -               | -               | -               | -           | 9                                    | 13                   | 1.41                | 4.30                | 31.4                | 4.79                | 10.5                |
| Fecal Coliform Bacteria                            | MPN/100 ml | ธ                       | ไม่เกิน 1,000   | ไม่เกิน 4,000   | -               | -           | 240                                  | 7,900                | 1.8×10 <sup>2</sup> | 3.5×10 <sup>3</sup> | 1.4×10 <sup>2</sup> | 1.3×10 <sup>2</sup> | 1.4×10 <sup>2</sup> |
| จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่                    |            |                         |                 |                 |                 |             | 5                                    | 5                    | 5                   | 4                   | 5                   | 2                   | 5                   |

ที่มา : 'รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล จำกัด

หมายเหตุ : \* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน

ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและ สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน, 2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของ สัตว์น้ำ วิถี วัฒนธรรมระดับพื้นฐานและ 3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน, 2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ, 3) การประมง และ 4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ




ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และ 2) การเกษตร

ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และ2) การอุตสาหกรรม




ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ธ = ธรรมชาติไม่ได้รับผลจากการกระทำของมนุษย์      ธ' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

\*\* ตรวจวัดภาคสนาม - ไม่ได้กำหนดค่า

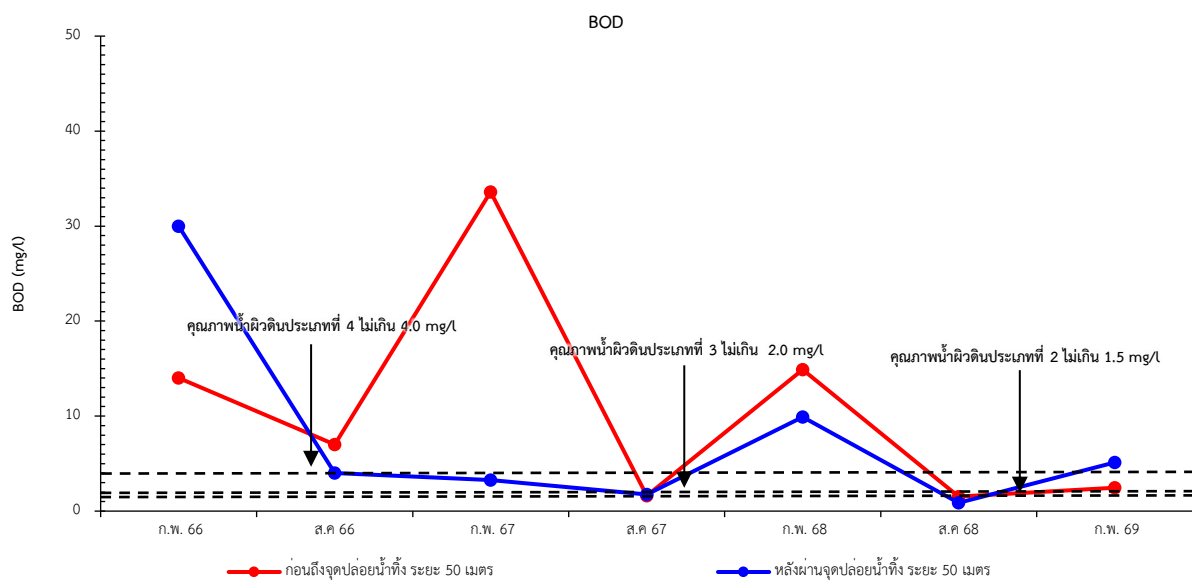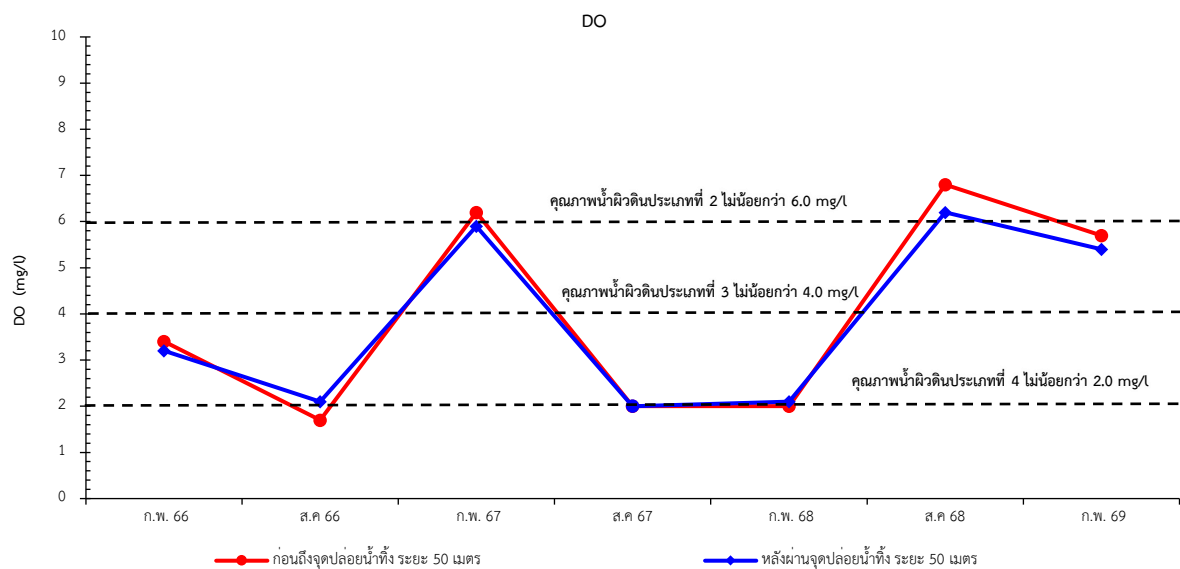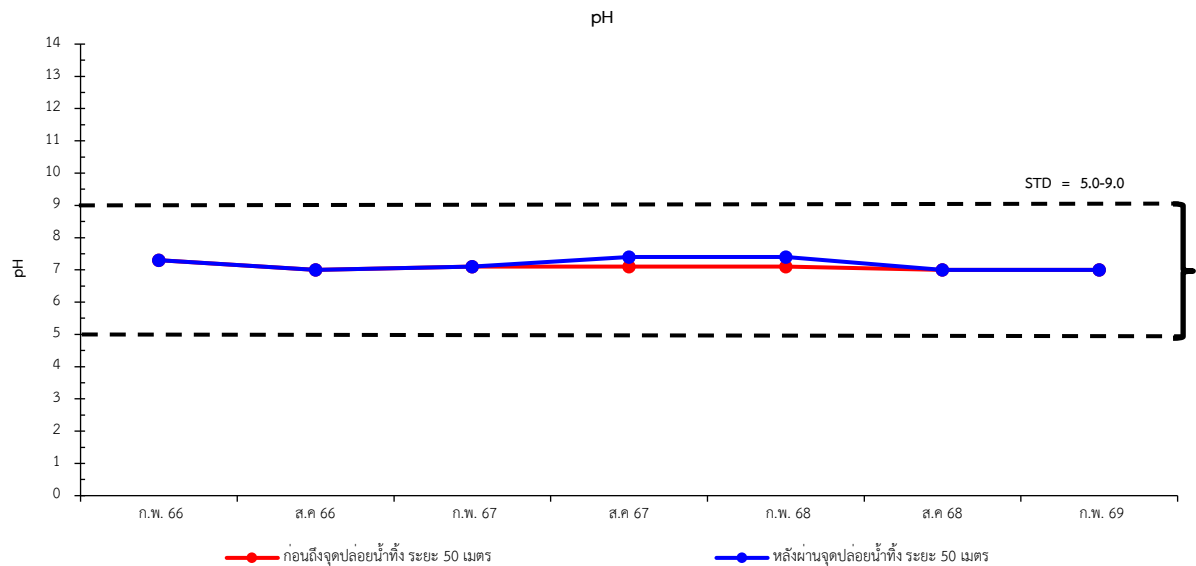

**รูปที่ 9 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน**

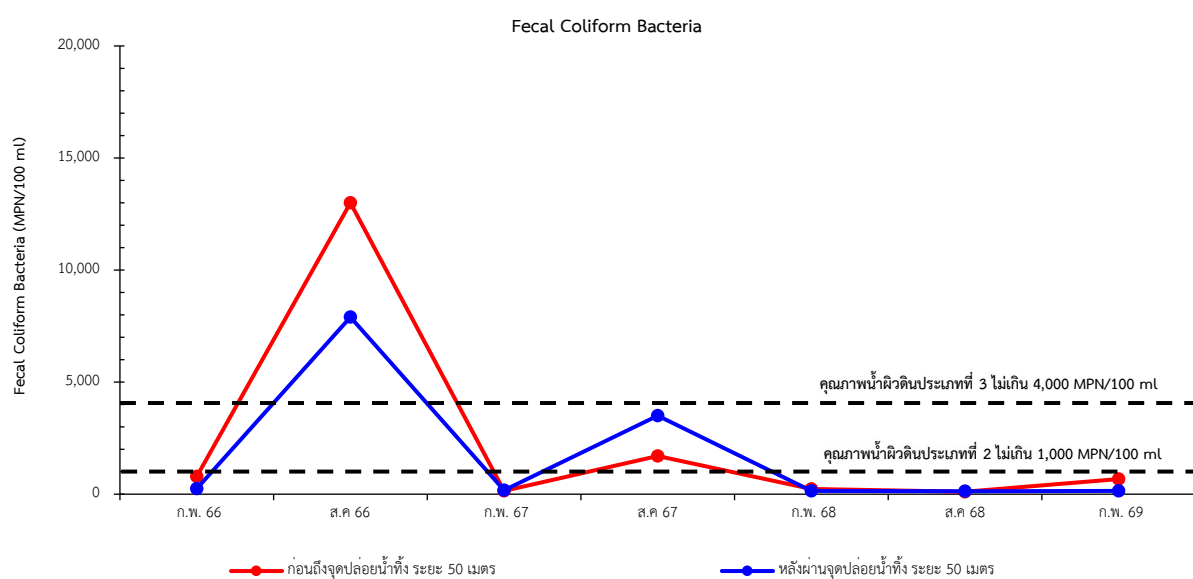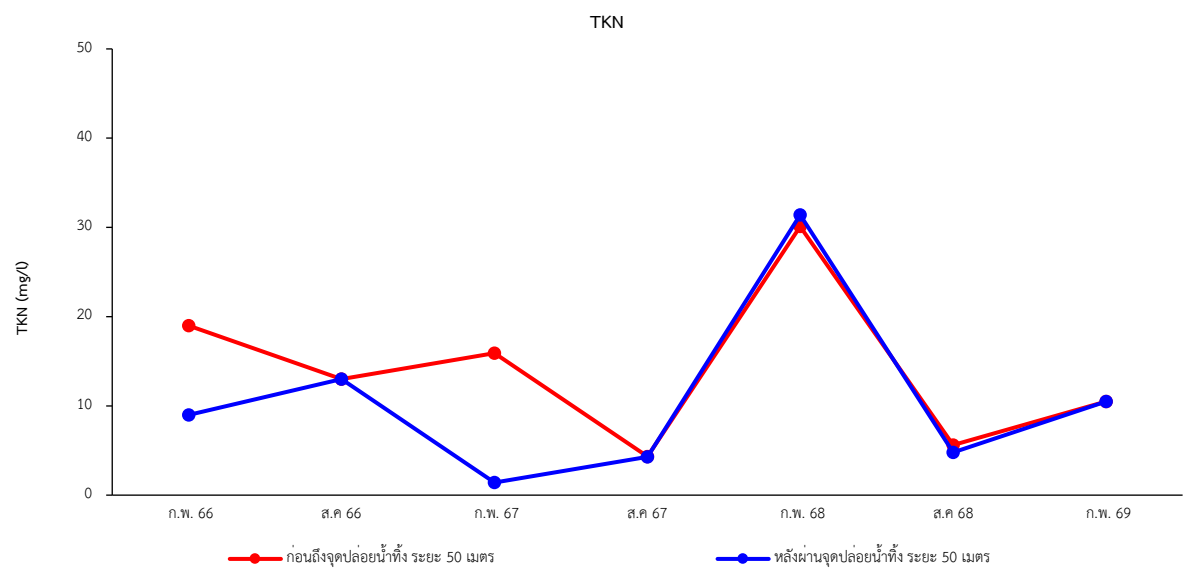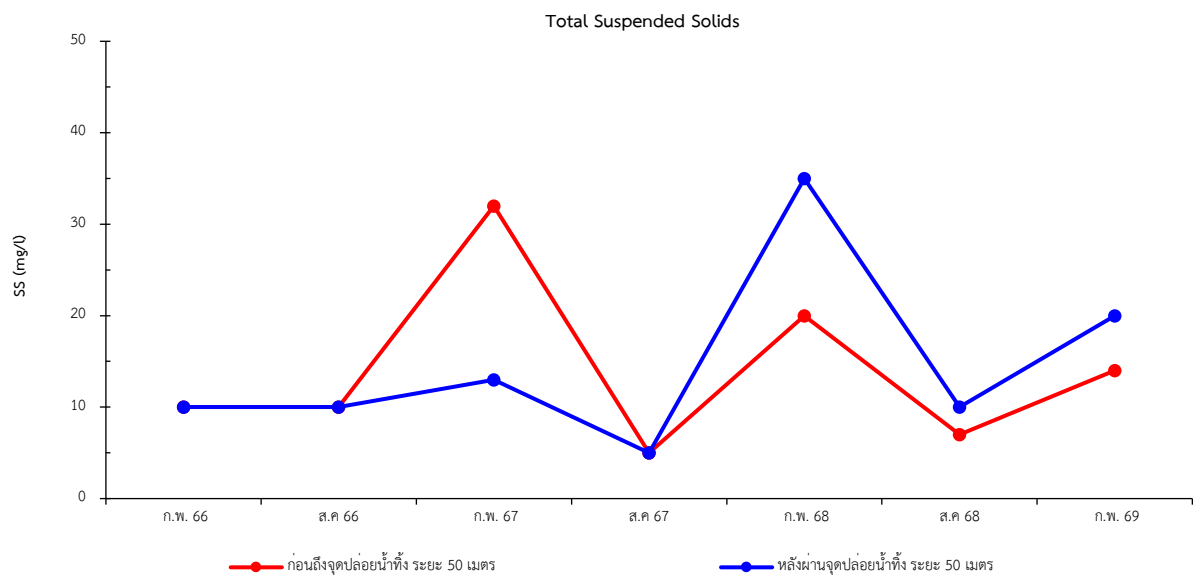

รูปที่ 9 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

| <div> <div>ตารางที่ 12</div> <div>สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                        | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข |
| 1. คุณภาพน้ำเสีย และน้ำทิ้ง                                                                                                                                                                                                   | 1) ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง มีดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย : pH, BOD, SS, Oil &amp; Grease, TKN และ Fecal Coliform Bacteria</li> <li>- น้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย : pH, BOD, SS, Nitrate, TKN, Oil &amp; Grease และ Fecal Coliform Bacteria</li> </ul> | 1) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามที่มาตรการกำหนด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1)                                                                                                                                                 | ไม่มี                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                               | 2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Nitrate, Total Phosphorus และ Fecal Coliform Bacteria                                                                                                                                                                                                                                    | 2) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อกักน้ำก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามที่มาตรการกำหนด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1)                                                                                                                                                                                                                                | ไม่มี                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำลำรางด้านข้างโครงการ บริเวณก่อนถึงจุดระบายน้ำ และบริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการ รวม 2 จุด โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, DO, BOD, SS, TKN, และ Fecal Coliform Bacteria โดยมีความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน                                                                                                                                                                         | 3) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำลำรางด้านข้างโครงการ บริเวณก่อนถึงจุดระบายน้ำ และบริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการ โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามที่มาตรการกำหนด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ส่วนคุณภาพน้ำผิวดินในลำรางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง ระยะ 50 เมตร จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 (รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1) | ไม่มี                                                    |

| <div>ตารางที่ 12</div> <div>สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 3/2 และระยะที่ 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                 | วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                          | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข |
| 2. เศรษฐกิจ-สังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                                                                                                              | <p>1) ติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ สังคม พื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 1.0 กม. โดยสำรวจความคิดเห็นและเสนอต่อการดำเนินโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี</p> <p>2) ติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ สังคม พื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 1.0 กม. โดยรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบในการพัฒนาการปฏิบัติงานและปรับปรุงมาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ดำเนินการต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี</p> <p>3) ติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ สังคม พื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 1.0 กม. โดยรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี</p> <p>4) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 1.0 กม. และพื้นที่ใกล้เคียง โดยประสานงานกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์แนวทางปฏิบัติและความพร้อมในการสนับสนุนโครงการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามวาระโอกาสหรือวันสำคัญต่างๆ ดำเนินการต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ตามวาระโอกาสหรือวันสำคัญ</p> <p>5) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 1.0 กม. และพื้นที่ใกล้เคียง โดยพบปะหารือกับผู้นำชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถานเพื่อสอบถามแผนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชนโดยรอบ ดำเนินการต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี</p> | จะดำเนินการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 | ไม่มี                                                    |

